Tauramena Casanare, 20 de Junio de 2025

SEÑORES:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Calle 5 No. 14-34, piso 2 Centro Administrativo Municipal de Tauramena

Ref: Entrega Informe Final de Ejecución

Cordial saludo,

Por medio de la presente hago entrega del Informe Final de Ejecución del CONVENIO SOLIDARIO No. 039 DE 2024 que tiene por objeto para **"PLAN VERANO DE MANTENIMIENTO RED VIAL TERCIARIA, 2024-2025, MUNICIPIO DE TAURAMENA",** se radica;

a) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

Agradezco de antemano su atención,

Recibido.
Junio 20-25.
4:09 pm

Cordialmente,

HENRY PAUL ALFONSO
Representante legal ASOJUNTAS
NIT. No. 900.002.220-8

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO SOLIDARIO No. 039 DE 2024

"PLAN VERANO DE MANTENIMIENTO RED VIAL TERCIARIA, 2024-2025, MUNICIPIO DE TAURAMENA"



EJECUTOR: ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"

R/L: HENRY PAUL ALFONSO

TAURAMENA - CASANARE

10 DE MAYO DE 2025 A 15 DE JUNIO DE 2025

PRESENTACIÓN

El presente informe refleja las actuaciones de la Contratación directa No. CDMT-SI-080-2024 que tiene por objeto "PLAN VERANO DE MANTENIMIENTO RED VIAL TERCIARIA, 2024-2025, MUNICIPIO DE TAURAMENA", durante el período de ejecución del contrato y la supervisión, seguimiento, control y acompañamiento del mismo.

ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y VIABILIZACIÓN.

De acuerdo a lo expuesto, el presente proceso contractual se realizó de acuerdo al cumplimiento de los estatutos de "la ASOJUNTAS" *en el capítulo cuarto, Articulo 14, numeral 18, según naturaleza de los convenios, ítem 3, "Asamblea General: desde (60) salarios mínimo legales mensuales vigentes, más de un peso ($1,00)..."* se le solicita autorización a la asamblea, para que el presidente HENRY PAUL ALFONSO celebre el convenio cuyo objeto es: "PLAN VERANO DE MANTENIMIENTO RED VIAL TERCIARIA, 2024-2025, MUNICIPIO DE TAURAMENA" por valor de TRESCIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($398.659.651.00) CON EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, , elaborado y aprobado para tal fin, con un concepto favorable de las siguientes características:

ALCANCE.

El municipio necesita mantener las vías del sector rural, en aras de apalancar el desarrollo turístico, agrícola y pecuario, así como de facilitar el acceso a los servicios públicos y de educación por parte de la comunidad rural hacia el área urbana y viceversa.
En el plan de desarrollo vigente, se contempla el eje estratégico "Tauramena Es Conectividad Territorial Para El Desarrollo", en el programa estratégico "INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL", subprograma: INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE, objetivo priorizado: "Fortalecer la infraestructura de servicios para impulsar
la conectividad física y digital, de la población del municipio, como soporte del desarrollo integral de territorio".
Para el logro de estos objetivos las entidades territoriales en desarrollo de los principios de planeación realizan proyectos de inversión para el mantenimiento y adecuación de la red vial, los cuales con el paso del tiempo sufren deterioros propios del uso, lo que conlleva a desmejorar el estado de los corredores viales de los municipios; sumado al deterioro presentado por la época de invierno.
Finalmente, este proyecto es necesario para mejorar las condiciones de accesibilidad hacia y desde el área rural del Municipio de Tauramena por medio del mantenimiento de la franja vial de las vías terciarias, recuperando la calzada vial y sus drenajes. Estas vías son esenciales para la movilidad de la comunidad de las veredas, con el fin de garantizar el acceso de la población rural de esta zona al casco urbano del Municipio y hacia los diferentes sectores de las veredas, para movilizarse hacia sus trabajos, así como también en busca de servicios de salud principalmente.

Atendiendo a los argumentos presentados anteriormente y teniendo en cuenta la necesidad del mantenimiento vial, se hace necesario la puesta en marcha de un convenio solidario para el mantenimiento de la red terciaria vial del Municipio de Tauramena.
Con el propósito de garantizar la calidad del servicio en la red vial terciaria no pavimentada, se garantiza el tránsito de los usuarios en forma aceptable, permanente y que la circulación sufra las mínimas interrupciones, promoviendo más movilidad de bienes y pasajeros, la Asociación, deberá ejecutar dentro del proyecto las siguientes actividades:

Mantenimiento vías terciarias mediante conformación de la subrasante (incluye escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación). (las maquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo) en 140 kms y la limpieza y desmonte para el mantenimiento de la franja vial (a =3m a cada lado) en 28,50 km.

BENEFICIARIOS. Habitantes de la zona rural de Tauramena.

TIEMPO INICIAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DIAS.

TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: CUATRO (04) MESES Y CUARENTA Y SIETE (47) DIAS.

PRORROGA No.1: UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS

PRORROGA No.2: VEINTIDOS (22) DIAS

PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL A LA FECHA APORTE MUNICIPIO: 100%.

PLAN FINANCIERO: el proyecto corresponde a $ 398.659.651,00 (Aporte del Municipio: $358.370.740,00 y Aporte de la asociación $ 40.288.911,00)

CÓDIGO	PROYECTO	VALOR A EJECUTAR	CDP No.	ORIGEN RECURSOS
2.3.24.2402.0600.2020854100009	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL Y CAMINOS ANCESTRALES EN EL MUNICIPO DE TAURAMENA.	$53.755.611	1112 16/12/2024	1.2.1.0.00 I.C.L.D.
		$304.615.129	VF-15 16/12/2024	1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE INVERSION
VALOR TOTAL		**$358,370,740.00**		

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONVENIO SOLIDARIO N.º	039 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO:	PLAN VERANO DE MANTENIMIENTO RED VIAL TERCIARIA, 2024-2025, MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	ASOJUNTAS TAURAMENA
REPRESENTANTE LEGAL	HENRY PAUL ALFONSO
SUPERVISOR	ING. LINO RODRIGUEZ OCHOA
TIEMPO DE EJECUCIÒN INICIAL	TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DIAS
ACTA DE INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	09 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA No.1	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA No.2	VEINTIDOS (22) DIAS
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN	15 DE JUNIO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($398.659.651,00)
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($358.370.740,00)
VALOR APORTE DE LA ASOCIACIÓN	CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($ 40.288.911,00)

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL CONVENIO SOLIDARIO

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	%	ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
BY-100048669	CUMPLIMIENTO	20%	SEGUROS MUNDIAL	$ 79.731.930.20	30/12/2024	19/08/2025
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10%	SEGUROS MUNDIAL	$ 39.865.965.10	30/12/2024	19/04/2028
BY-100007320	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	200S MLV	SEGUROS MUNDIAL	$ 260.000.000	30/12/2024	19/04/2025

ACTUALIZACION DE POLIZAS PRORROGA No.1

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	%	ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
BY-100048669 (Anexo 1)	CUMPLIMIENTO	20%	SEGUROS MUNDIAL	$ 79.731.930.20	07/04/2025	14/01/2025
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10%	SEGUROS MUNDIAL	$ 39.865.965.10	07/04/2025	13/06/2028
BY-100007320 (Anexo 1)	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	200S MLV	SEGUROS MUNDIAL	$ 284.700.000.00	30/12/2024	13/06/2025

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	%	ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
BY-100048669	CUMPLIMIENTO	20%	SEGUROS MUNDIAL	$ 79.731.930.20	30/12/2024	19/08/2025
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10%	SEGUROS MUNDIAL	$ 39.865.965.10	30/12/2024	19/04/2028
BY-100007320	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	200S MLV	SEGUROS MUNDIAL	$ 260.000.000	30/12/2024	19/04/2025

ACTUALIZACION DE POLIZAS PRORROGA No.2

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	%	ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
BY-100048669 (Anexo 1)	CUMPLIMIENTO	20%	SEGUROS MUNDIAL	$ 79.731.930.20	07/04/2025	14/10/2025

	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10%	SEGUROS MUNDIAL	$ 39.865.965.10	07/04/2025	13/06/2028
BY-100007320 (Anexo 1)	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	200S MLV	SEGUROS MUNDIAL	$ 284.700.000.00	30/12/2024	13/06/2025

ESTADIO FINANCIERO ACTUAL DEL PROYECTO

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA ACTA DE INICIO
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	$358.370.740,00	31-12-2024
APORTE DE LA ASOCIACIÓN	$ 40.288.911,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$398.659.651,00**	

PRORROGA No.1 AL CONVENIO SOLIDARIO.

Se solicitó la suscripción de una prórroga por un (1) mes y quince (15) días para el Convenio Solidario, a fin de dar cumplimiento de las obligaciones adquiridas, la solicitud se soportó en lo siguiente:

- ✓ Que el Convenio Solidario se encontraba vigente y tenía como fecha de terminación el día 09 de Abril de 2025.
- ✓ Que la MOTONIVELADORA MARCA CASE MODELO 845B SERIES 2, Presentó una falla en el desarrollo de sus actividades en donde hubo un desprendimiento de las cuchillas por desgaste en los protectores inferiores del sistema de desplazamiento lateral moldboard (side shift), en donde también se vio afectado el Émbolo templado de 50 mm diámetro x 142.5 centímetros de longitud y fue necesario suspender la ejecución de las actividades que realiza el equipo como la escarificación y nivelación del terreno, se transportó el equipo hacia el Municipio de Tauramena y en donde su reparación duró varios días, teniendo en cuenta la mano de obra y los repuestos que se encontraron únicamente en la Ciudad de Bogotá.
- ✓ Que fue necesario suspender las actividades mientras se realizaron los mantenimientos preventivos de la Motoniveladora, vibrocompactador y retroexcavadora de acuerdo al plan y programa de mantenimientos de los equipos el cual corresponde al cumplimiento de horómetro cada 250 horas; con el fin de verificar el funcionamiento de los equipos sin contratiempos ni averías que puedan ocasionar a futuro fallos mayores.
- ✓ Que durante los meses de Febrero y Marzo, las precipitaciones en el área de intervención impidieron el normal desarrollo de las actividades programadas.
- ✓ La presente solicitud no genera mayor valor en la ejecución del Convenio Solidario No. 039 de 2024.

De acuerdo a lo anterior se suscribió la Prorroga No. 1 el día 07 de Abril de 2025 suscrito entre el Municipio de Tauramena Casanare y la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de Tauramena.

PRORROGA No.2 AL CONVENIO SOLIDARIO.

Se solicitó la suscripción de una prórroga por veintidós (22) días para el Convenio Solidario, a fin de dar cumplimiento de las obligaciones adquiridas, la solicitud se soportó en lo siguiente:

- ✓ Que el Convenio Solidario se encuentra vigente y tiene como fecha de terminación el día 24 de Mayo de 2025.
- ✓ Que el plazo restante de Convenio Solidario No. 039 de 2024 es de 4 días calendario.
- ✓ Que fue necesario suspender las actividades mientras se realizaron los mantenimientos correctivos de la Motoniveladora, vibrocompactador y retroexcavadora el cual corresponde al cumplimiento de horómetro cada 250 horas; con el fin de verificar el funcionamiento de los equipos sin contratiempos ni averías que puedan ocasionar a futuro fallos mayores.
- ✓ Que durante el mes Abril y Mayo, las precipitaciones en el área de intervención impidieron el normal desarrollo de las actividades programadas.
- ✓ La presente solicitud no genera mayor valor en la ejecución del Convenio Solidario No. 039 de 2024.

De acuerdo a lo anterior se suscribió la Prorroga No. 2 el día 21 de Mayo de 2025 suscrito entre el Municipio de Tauramena Casanare y la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de Tauramena.

ACTIVIDADES ADELANTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONVENIO.

- Se realizó visita de control y seguimiento con el coordinador de maquinaria e Inspector SST para evaluar las condiciones de las vías terciarias a intervenir en Vereda Yaguaros, Vereda Iquia y Vereda Villa Rosa del Municipio de Tauramena, así mismo se realizó inspección de las condiciones de la maquinaria amarilla de acuerdo al formato preoperacional de cada equipo por cada semana.

- La inspectora SST se verificaron las afiliaciones al SGSS, Planilla de pagos SGSS, se organizó un cronograma de actividades y charlas al SST, actividades de Seguridad y Salud en el trabajo, inspección de seguridad, registro de asistencia y estadísticas de accidentalidad. (se anexa informe de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo);

- Se realizó visita técnica de supervisión por parte de la ingeniera Residente de Obra, Coordinador de maquinaria y el Inspector SST para hacer el recorrido de los kilómetros intervenidos y terminados.

MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA POR CUMPLIMIENTO DE HOROMETRO;

VOLQUETA AUMAN BJ1226;

Se realizó la adquisición del cambio de aceite y filtros para el mantenimiento por cumplimiento de kilometraje (filtro aceite motor, filtro aire externo, filtro aire interno, 2 filtros combustible separador de agua y cambio de aceite 15W40 Navitrans)





MOTONIVELADORA CASE 845B SERIES 2 VHP;

Se realizó mantenimiento correctivo en la motoniveladora para mantener en buenas condiciones la maquina y prolongar su vida útil, se llevó a cabo la reparación de una llanta de acuerdo a una falla presentada por pinchazo;







RETROEXCAVADORA CASE 575SV;

- Se realizó mantenimiento correctivo de acuerdo al aire acondicionado, el cual evidenciaba una falla en el compresor, el cual se envió a diagnostico;







- Para la Retroexcavadora se realizó el cambio y soldada de los dientes del cucharon; ya que presentaban desgaste por el desarrollo de las actividades diarias del Convenio Solidario;





EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.

Se ejecutaron los siguientes ítems contractuales dando óptimo cumplimiento al Convenio Solidario con el fin de satisfacer las necesidades de las vías terciarias del Municipio de Tauramena;

AVANCE DE EJECUCIÓN - APORTE MUNICIPIO

ITEM 1. Mantenimiento vías terciarias mediante conformación de la subrasante (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación), las maquinas son del Municipio de Tauramena, No incluye costo equipo).

En 140 kms de malla vial terciaria del Municipio de Tauramena, se adelantaron diferentes actividades en tramos pertenecientes a Cabañas, Delicias, Visinaca, Aceite Alto, Chitamena Alto, Chitamena Bajo, Bendiciones, Jaguito, Raizal, El Juve, Esmeralda, Yaguaros y Batallera del Municipio de Tauramena, en donde se realizó disgregación de la superficie del terreno por medio de la motoniveladora y la retroexcavadora así mismo se llevó a cabo limpieza, formación, reconstrucción y perfilado de cunetas

para cumplir la función de protección de la calzada, especialmente de la acción erosiva del agua, pues favorecen la conducción del agua de escorrentía hacia los drenajes, posterior a esto se realizó la compactación con el cilindro compactador para eliminar los espacios vacíos, aumentar su densidad, la capacidad de soporte y estabilidad de la vía.

Se llevaron a cabo actividades de reconformación y recuperación de la banca, mediante el empleo de la maquinaria amarilla, la motoniveladora inicio su operación de escarificación ubicándose en uno de los extremos del área donde baja los escarificadores hasta ponerlos en contacto con el material. Iniciará su maniobra lentamente hasta lograr penetrarlos a una profundidad adecuada de acuerdo con el tipo de material en tratamiento hasta llegar al extremo opuesto donde se da la vuelta y se regresa cubriendo la franja continua. Este proceso se repitió hasta lograr cubrir toda el área.

Una vez se escarifico, la motoniveladora repitió la operación similar a la del escarificado, pero con la cuchilla ligeramente sesgada con el fin de acordonar el material a lo largo del área en tratamiento.

El Vibrocompactador inicio su maniobra de compactación previa preparación del área con la motoniveladora. Se ubicó en uno de los extremos de la vía hacia el borde y comenzó a desplazarse lentamente hasta llegar al otro extremo en donde se gira y se devuelve, este proceso se repite las veces que sea necesario hasta que se obtiene el grado de compactación adecuad

- **Para el periodo comprendido entre el 10 de Mayo de 2025 al 15 de Junio de 2025, para el desarrollo de este Ítem se obtuvo un avance del 21,63% evidenciado en 30,28 km intervenidos.**
- **La ejecución total del Convenio Solidario de acuerdo al Aporte del Municipio se encuentra en 100% y 140 km intervenidos.**
- **A continuación, se encuentra el mapeo y registro fotográfico de los tramos intervenidos.**

- **Veredas intervenidas en total:** Cabañas, Delicias, Visinaca, Aceite Alto, Chitamena Alto, Chitamena Bajo, Bendiciones, Jaguito, Raizal, El Juve, Esmeralda, Yaguaros, Vila Rosa, Iquia y Batallera del Municipio de Tauramena

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
CAMARA DE COMERCIO No. 1077 DE MARZO DE 1999
Nit. 900.022.220-8

DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

DÍAS	KM INTERVENIDO DIARIO		DIA	TRAMOS INTERVENIDOS kms	LUGAR
1	0,97	km	31/12/2024		
DESCANSO			1/01/2025		
2	0,34	km	2/01/2025		
3	0,39	km	3/01/2025		
4	0,48	km	4/01/2025		
DESCANSO			5/01/2025	5,25	CABAÑAS (Sector A,B,C,D,E,F)
DESCANSO			6/01/2025		
5	0,96	km	7/01/2025		
6	0,75	km	8/01/2025		
7	0,45	km	9/01/2025		
8	0,28	km	10/01/2025		
9	0,63	km	11/01/2025		
DESCANSO			12/01/2025		
10	0,93	km	13/01/2025		
11	1,06	km	14/01/2025		
12	0,63	km	15/01/2025		
13	0,82	km	16/01/2025		
14	1,2	km	17/01/2025		
15	0,96	km	18/01/2025	11,04	VISINACA (A,B,C)
DESCANSO			19/01/2025		
16	0,99	km	20/01/2025		
17	0,86	km	21/01/2025		
18	0,69	km	22/01/2025		
19	0,96	km	23/01/2025		
20	0,96	km	24/01/2025		
21	0,98	km	25/01/2025		
DESCANSO			26/01/2025		
22	1,84	km	27/01/2025		
23	1,36	km	28/01/2025		
24	1,25	km	29/01/2025		
25	1,38	km	30/01/2025	9,58	DELICIAS
26	1,12	km	31/01/2025		
27	1,69	km	1/02/2025		
DESCANSO			2/02/2025		
28	0,94	km	3/02/2025		
29	0,91	km	4/02/2025		
30	0,49	km	5/02/2025	2,00	ACEITE ALTO
31	0,6	km	6/02/2025		
32	0,13	km	7/02/2025		
33	0,17	km	8/02/2025	0,30	BARRIO ESPERANZA
DESCANSO			9/02/2025		
34	0,04	km	10/02/2025		
35	0,14	km	11/02/2025	0,30	BARRIO PRIMAVERA
36	0,12	km	12/02/2025		
37	1,97	km	13/02/2025		
38	1,98	km	14/02/2025	6,00	CHITAMENA BAJO
39	2,05	km	15/02/2025		
DESCANSO			16/02/2025		
40	1,56	km	17/02/2025		
41	1,5	km	18/02/2025		
42	1,23	km	19/02/2025		
43	1,49	km	20/02/2025		
44	1,35	km	21/02/2025		
45	1,45	km	22/02/2025	15,45	CHITAMENA ALTO
DESCANSO			23/02/2025		
46	1,36	km	24/02/2025		
47	1,58	km	25/02/2025		
48	1,30	km	26/02/2025		
49	1,36	km	27/02/2025		
50	1,27	km	28/02/2025		
TOTAL	49,92	km			

Bernabe.

BERNABE VIVAS BAUTISTA
Coordinador de Maquinaria
C.S. 039/2024

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
CAMARA DE COMERCIO No. 1077 DE MARZO DE 1999
Nit. 900.022.220-8

DESDE EL 01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

DÍAS	KM INTERVENIDO DIARIO		DIA	TRAMOS INTERVENIDOS kms	LUGAR
1	1,8	km	1/03/2025	9,79	BENDICIONES Y JAGUITO
DESCANSO			2/03/2025		
2	1,25	km	3/03/2025		
3	0,85	km	4/03/2025		
4	0,45	km	5/03/2025		
5	1,39	km	6/03/2025		
6	0,60	km	7/03/2025		
7	1,5	km	8/03/2025		
DESCANSO			9/03/2025	7,72	DELICIAS
8	0,75	km	10/03/2025		
9	0,63	km	11/03/2025		
10	0,83	km	12/03/2025		
11	1,3	km	13/03/2025		
12	0,88	km	14/03/2025		
13	0,96	km	15/03/2025		
DESCANSO			16/03/2025		
14	0,89	km	17/03/2025	2,83	RAIZAL
15	1,25	km	18/03/2025		
16	0,89	km	19/03/2025		
17	1,2	km	20/03/2025	4,60	CHITAMENA BAJO
18	1,36	km	21/03/2025		
19	0,94	km	22/03/2025		
DESCANSO			23/03/2025		
DESCANSO			24/03/2025		
20	1,1	km	25/03/2025		
21	0,83	km	26/03/2025	2,40	EL JUVE
22	0,82	km	27/03/2025		
23	0,75	km	28/03/2025		
24	0,69	km	29/03/2025	1,38	LA ESMERALDA
DESCANSO			30/03/2025		
25	0,69	km	31/03/2025		
TOTAL	28,72	km			

Bernabez

BERNABE VIVAS BAUTISTA
Coordinador de Maquinaria
C.S. 039/2024

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
CAMARA DE COMERCIO No. 1077 DE MARZO DE 1999
Nit. 900.022.220-8

DESDE EL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 09 DE MAYO DE 2025

DÍAS	KM INTERVENIDO DIARIO		DIA	TRAMOS INTERVENIDOS kms	LUGAR
1	0,75	km	1/04/2025		
2	0,53	km	2/04/2025		
3	0,65	km	3/04/2025		
4	0,67	km	4/04/2025		
5	0,45	km	5/04/2025		
DESCANSO			6/04/2025	6,40	CHITAMENA ALTO
6	0,75	km	7/04/2025		
7	0,94	km	8/04/2025		
8	0,89	km	9/04/2025		
9	0,44	km	10/04/2025		
10	0,33	km	11/04/2025		
11	0,34	km	12/04/2025		
DESCANSO			13/04/2025		
12	0,28	km	14/04/2025		
13	0,42	km	15/04/2025		
14	0,41	km	16/04/2025	2,32	CUERNAVACA
DESCANSO			17/04/2025		
DESCANSO			18/04/2025		
15	0,61	km	19/04/2025		
DESCANSO			20/04/2025		
16	0,26	km	21/04/2025		
17	1,44	km	22/04/2025		
18	1,69	km	23/04/2025		
19	1,83	km	24/04/2025		
20	1,99	km	25/04/2025		
21	1,69	km	26/04/2025		
DESCANSO			27/04/2025		
22	1,81	km	28/04/2025	17,78	YAGUAROS
23	1,78	km	29/04/2025		
24	1,88	km	30/04/2025		
DESCANSO			1/05/2025		
25	0,99	km	2/05/2025		
26	1,45	km	3/05/2025		
DESCANSO			4/05/2025		
27	1,23	km	5/05/2025		
28	1,2	km	6/05/2025		
29	1	km	7/05/2025	4,58	BATALLERA
30	1,25	km	8/05/2025		
31	1,13	km	9/05/2025		
TOTAL	31,08	km			

Bernabe V.

BERNABE VIVAS BAUTISTA
Coordinador de Maquinaria
C.S. 039/2024

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
CAMARA DE COMERCIO No. 1077 DE MARZO DE 1999
Nit. 900.022.220-8

DESDE EL 10 DE MAYO DE 2025 AL 15 DE JUNIO DE 2025

DÍAS	KM INTERVENIDO DIARIO		DIA	TRAMOS INTERVENIDOS kms	LUGAR
1	0,36	km	10/05/2025		
DESCANSO			11/05/2025		
2	0,39	km	12/05/2025		
3	0,58	km	13/05/2025		
4	0,26	km	14/05/2025	2,50	YAGUAROS
5	0,57	km	15/05/2025		
6	0,16	km	16/05/2025		
7	0,18	km	17/05/2025		
DESCANSO			18/05/2025		
8	1,02	km	19/05/2025		
9	0,77	km	20/05/2025		
10	0,93	km	21/05/2025		
11	1,06	km	22/05/2025		
12	1,15	km	23/05/2025		
13	1,28	km	24/05/2025	11,30	VILLA ROSA
DESCANSO			25/05/2025		
14	1,26	km	26/05/2025		
15	0,79	km	27/05/2025		
16	0,78	km	28/05/2025		
17	0,87	km	29/05/2025		
18	1,39	km	30/05/2025		
19	1,25	km	31/05/2025		
DESCANSO			1/06/2025		
DESCANSO			2/06/2025		
20	1,15	km	3/06/2025		
21	1,79	km	4/06/2025		
22	1,45	km	5/06/2025		
23	1,88	km	6/06/2025		
24	1,87	km	7/06/2025	16,48	IQUIA
DESCANSO			8/06/2025		
25	1,36	km	9/06/2025		
26	1,36	km	10/06/2025		
27	1,55	km	11/06/2025		
28	1,26	km	12/06/2025		
29	0,46	km	13/06/2025		
30	1,1	km	14/06/2025		
DESCANSO			15/06/2025		
TOTAL	**30,28**	**km**			

Bernabe V.

BERNABE VIVAS BAUTISTA
Coordinador de Maquinaria
C.S. 039/2024

Fig. 2 Localización Geografica, Tramo Intervenido en 11,30 km, localizado en la Vereda Villa Rosa.



Fuente: Google Earth

Fig. 1 Localización Geografica, Tramos intervinos 2,5 km, localizado en la Vereda Yaguaros.



Fuente: Google Earth

Fig. 3 Localización Geografica, Tramos intervenidos en 16,48 km, localizado en la Vereda El Iquia.




Fuente: Google Earth

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VEREDA EL YAGUAROS

ANTES



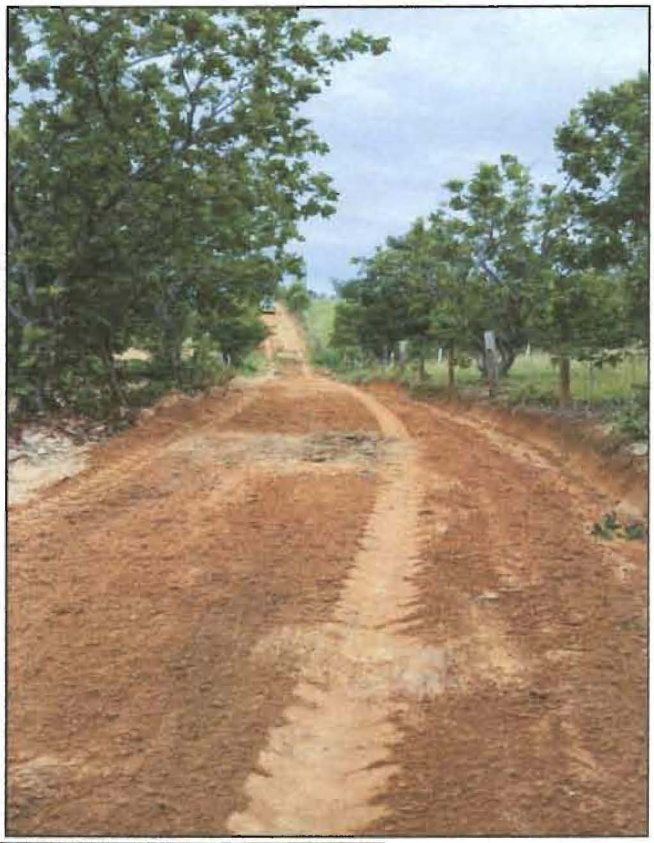




INTERVENCION VEREDA YAGUAROS - DURANTE





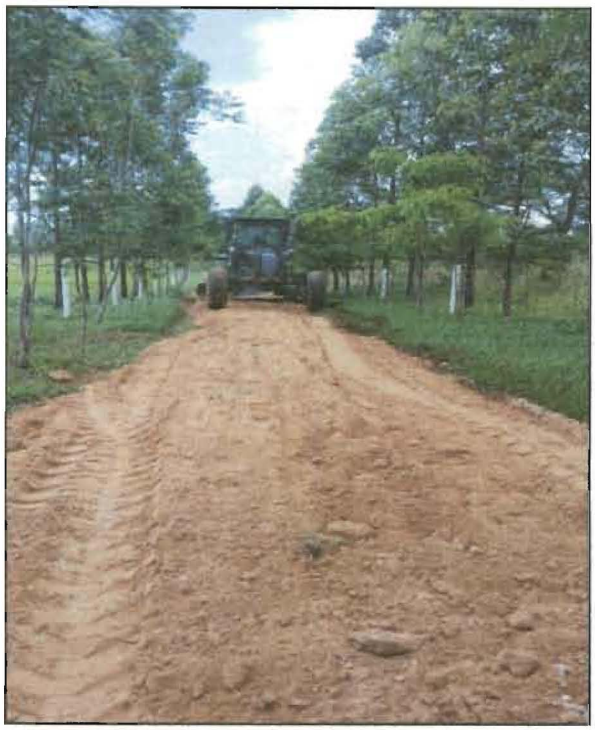



INTERVENCION VEREDA YAGUAROS - DESPUÉS







REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VEREDA VILLA ROSA


ANTES








REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VEREDA VILLA ROSA - DURANTE

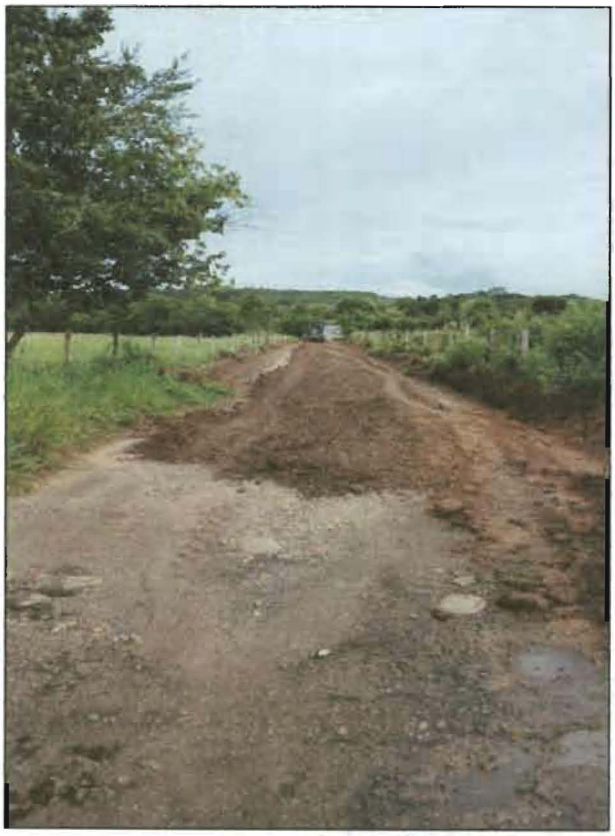







REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VEREDA VILLA ROSA - DESPUÉS

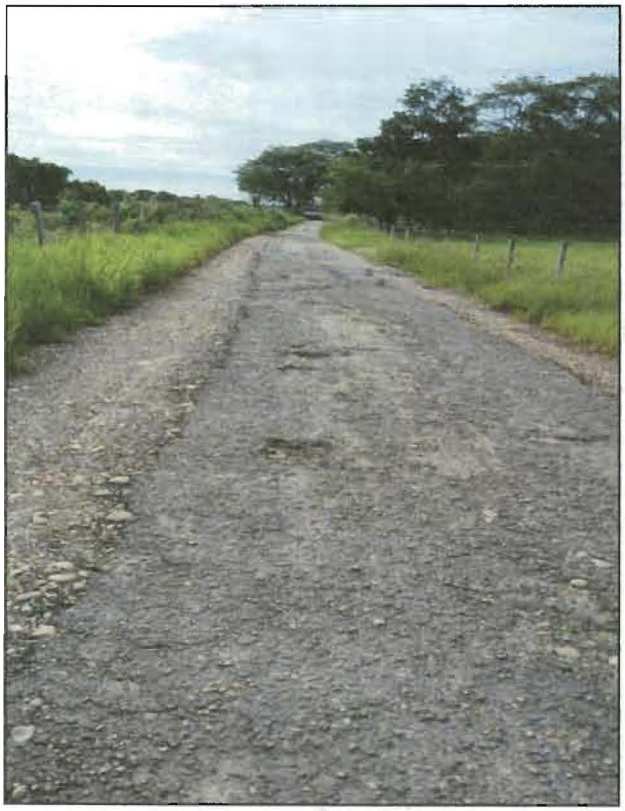

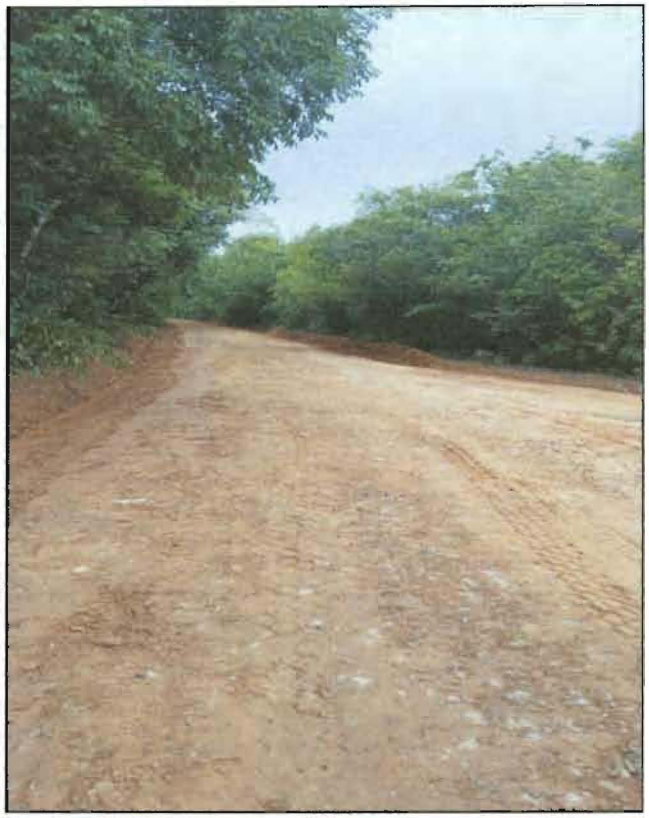

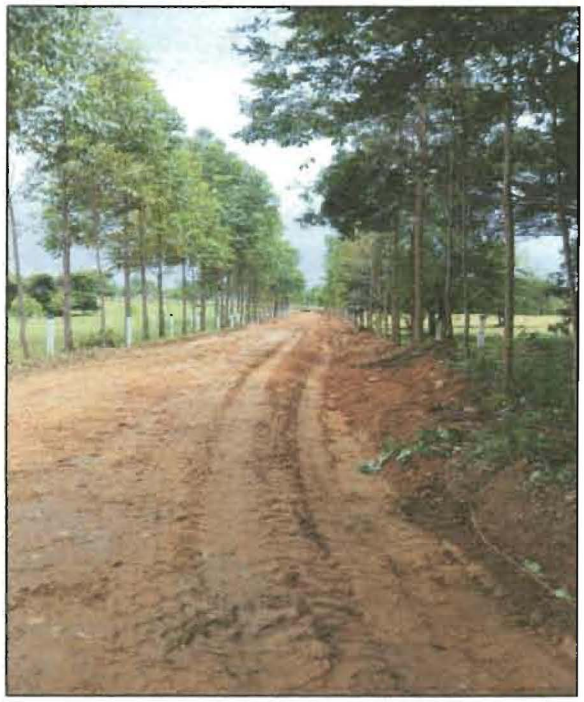

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VEREDA IQUIA


ANTES









REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VEREDA IQUIA - DURANTE

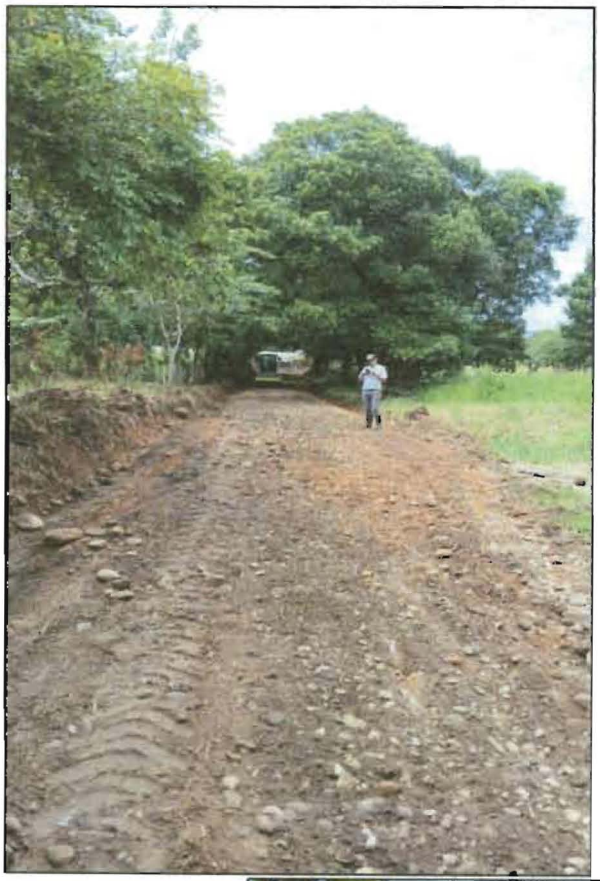


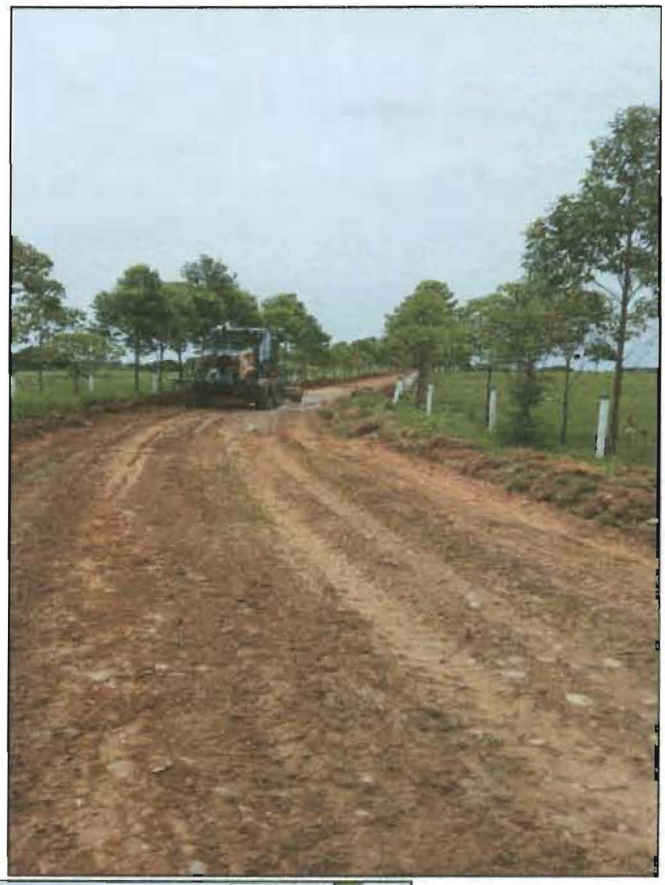

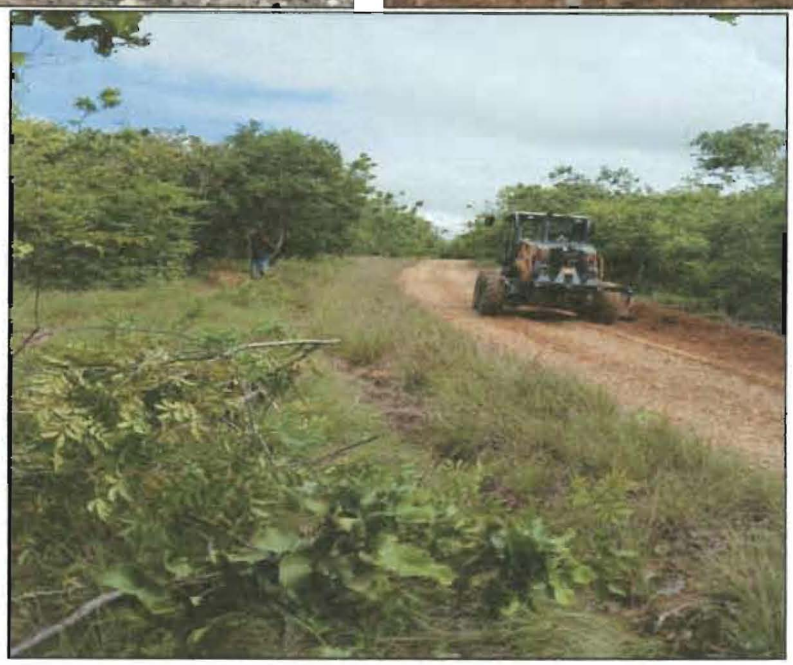

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VEREDA IQUIA - DESPUÉS



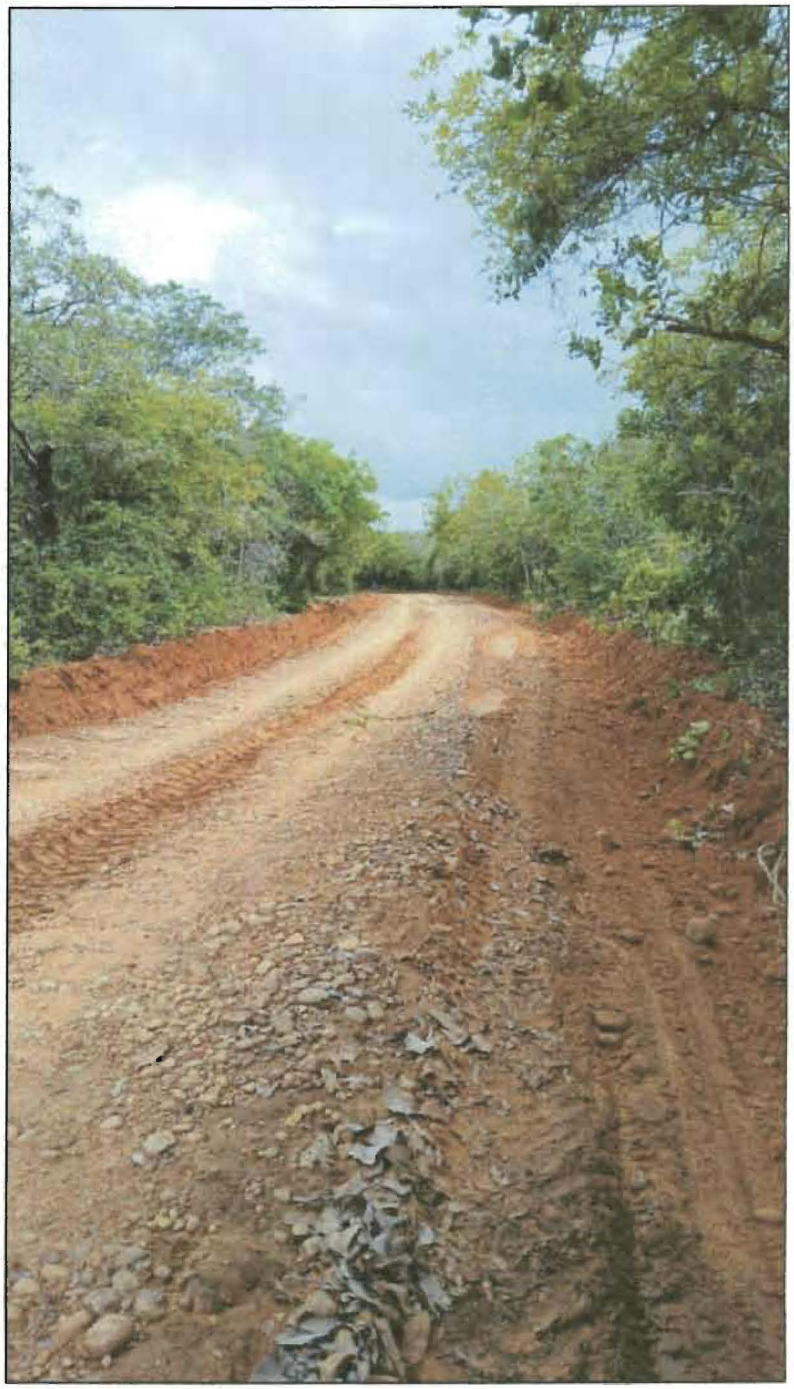

AVANCE DE EJECUCIÓN - APORTE POR PARTE DE ASOJUNTAS TAURAMENA

ITEM 2. Limpieza y desmonte para el mantenimiento de la franja vial (a=3m de cada lado).


El aporte por parte de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL "ASOJUNTAS TAURAMENA" Se evidencio mediante el apoyó en la ejecución de la actividad del mejoramiento de las vías terciarias del Municipio de Tauramena con el fin de garantizar la accesibilidad del área rural hacia la urbana y viceversa en donde se garantiza el tránsito de los usuarios en forma aceptable, permanente y que la circulación sufra las mínimas interrupciones, promoviendo más movilidad de bienes y pasajeros de este modo haciendo parte a las comunidades el proceso de desarrollo local, así mismo dar seguridad y comodidad a los vehículos que transitan por las vías, y que se vea reflejado en la economía, reducción en los tiempos de viaje y el deterioro que puedan tener.


Son actividades que de acuerdo con sus especificaciones no son complejas, no requieren tecnología avanzadas y se realizan con mano de obra local. Buscan dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo nacional y territorial y propender por mejorar el acceso vehicular y peatonal de la población para el acceso a bienes y servicios en la población del Municipio, de igual modo mejorando la calidad de vida de los usuarios de estas vías.

- **Para el periodo comprendido entre el 10 de Mayo de 2025 al 15 de Junio de 2025, para el desarrollo de este Ítem se obtuvo un avance del 12,28% y 3,50 km.**

- **La ejecución total del Convenio Solidario de acuerdo al aporte por parte de ASOJUNTAS TAURAMENA se encuentra en 100% y 28,50 km intervenidos.**

evidenciado en el siguiente registro fotográfico;

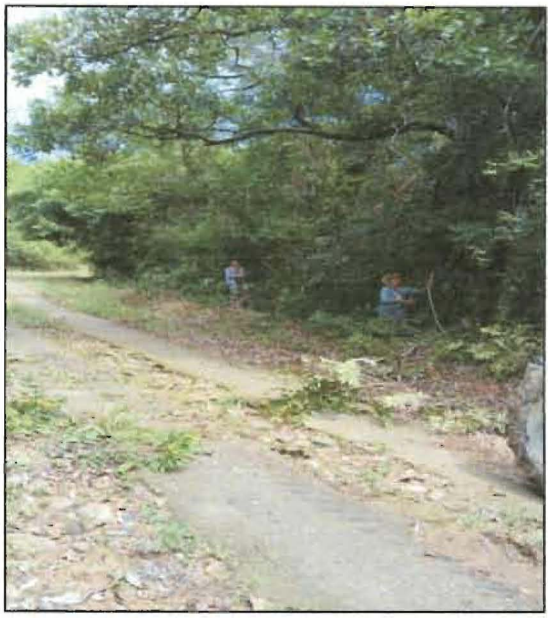

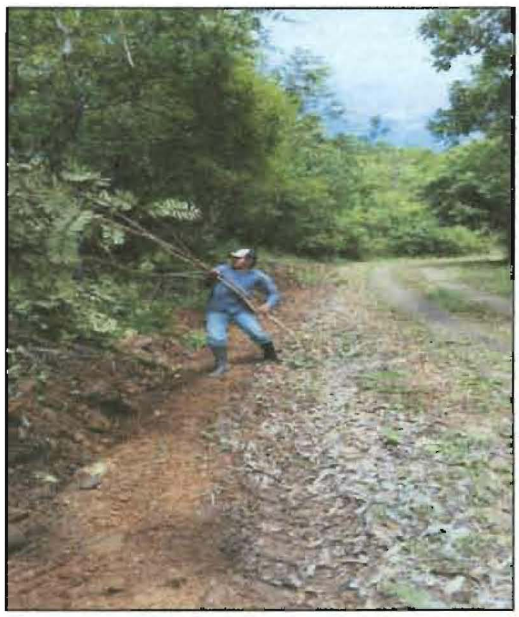

INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.

Durante el desarrollo de las actividades del Convenio Solidario, la maquinaria amarilla ha presentado inconvenientes de mínima medida por las condiciones del terreno; debido a las lluvias presentadas en las zonas de intervención.

	INFORME DE EJECUCION	**COD: AJC-HSEQ-FO-16**
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	**Versión: 00**
		PAGINA 1 DE 1


AVANCE TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.

El presente Convenio Solidario No. 039 del 30 de Diciembre de 2024, presenta el siguiente avance de ejecución:


- Para el periodo comprendido entre el **10 de Mayo de 2025 al 15 de Junio de 2025**, para la ejecución del Convenio Solidario **Aporte Municipio** se obtuvo un avance del **21,63%** evidenciado en **30,28 kms** intervenidos.
- Para el periodo comprendido entre el **10 de Mayo de 2025 al 15 de Junio de 2025**, La ejecución total del Convenio Solidario **Aporte Asojuntas Tauramena** se obtuvo un avance del **12,28%** evidenciado en **3,50 kms** intervenidos.

- **La ejecución total Aporte Municipio se encuentra en 100% y 140 km intervenidos.**
- **La ejecución total Aporte Asojuntas Tauramena se encuentra en 100% y 28,50 km intervenidos.**

AVANCE DE EJECUCIÓN APORTE MUNICIPIO

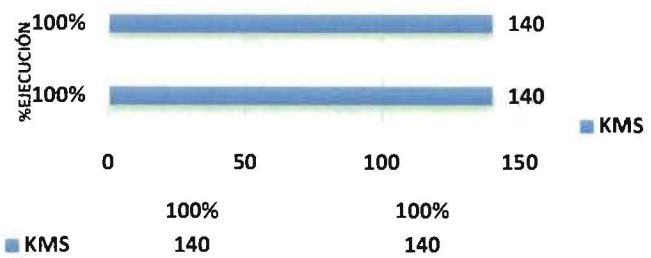

AVANCE DE EJECUCIÓN APORTE ASOJUNTAS

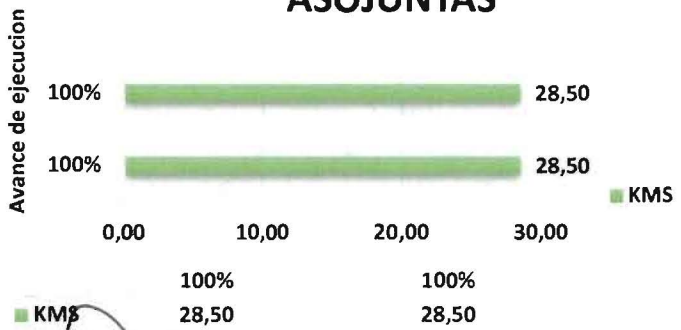

HENRY PAUL ALFONSO
Representante legal ASOJUNTAS
NIT. No. 900.002.220-8

ANGIE LORENA GONZALEZ
Ing. Residente
C.S. 039/2024
