Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-012205 Id: 523166
Folios: 1 Fecha: 11-04-2025 18:58:26
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Subdirección de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

ASUNTO: Remisión informe de ejecución del Ministerio del Interior – Convenio No.1909 de 2022 Municipio de El Cantón de San Pablo - Chocó, periodo de marzo de 2025.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito para su información y fines pertinentes el informe mensual de supervisión correspondiente al mes de marzo de 2025 en el marco del Convenio No.1909 de 2022 - Municipio de El Cantón de San Pablo - Chocó.

Atentamente,

Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado
Supervisor del convenio 1909 de 2022

Anexos: 392 Folios

Proyectó: Lina María Rodríguez Raguá / Profesional apoyo a la supervisión SPS.

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No.**1909-2022** MUNICIPIO DE **CANTÓN DE SAN PABLO-CHOCO**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **MARZO DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO"*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	BARRIO LAS BRISAS - POBLACIÓN DE MANAGRU		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE CHOCÓ		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.931.858.630,00
	ADICIÓN MIN – FONSECON		$ 1.103.560.995,48
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 693.857.405,00
	ADICIÓN ENTIDADES PUBLICAS		$ 205.304.425,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 5.934.581.455,48
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/03/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	30/08/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Manuel Antonio Linares	DESDE: 26/08/2024	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Manuel A. Linares D.	21/12/2022	28/01/2024
	Julian Felipe Valencia Marín	29/01/2024	17/07/2024
	Edgar Ricardo González Patiño	18/07/2024	29/07/2024
	Angela Jaramillo Gómez	30/07/2024	12/08/2024
	Sergio Sanjuan Santiago	13/08/2024	25/08/2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Oscar Javier Cuadros	21/12/2022	31/12/2022
	Gonzalo Flórez Peña	27/01/2023	14/02/2024
	Julian Camilo Hernández C.	15/02/2024	24/09/2024
	Julian Camilo Hernández C.	09/10/2024	31/12/2024
	Julian Camilo Hernández C.	26/02/2025	05/03/2025
	Lina María Rodríguez Raguá	06/03/2025	Actual
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	21324	16/01/2024	31/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	13424	16/01/2024	31/12/2024
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 128	23/03/2022	31/12/2022
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3002240	16/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	16/12/2022		
	PRIMERA MODIFICACIÓN		FECHA: 29/02/2024

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: 04/07/2024 (HASTA EL 31/12/2024)
	PRIMERA ADICIÓN	FECHA: 04/07/2024
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: 27/12/2024 (HASTA EL 30/08/2025)
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN	FECHA: 29/02/2024
	PRIMERA REANUDACIÓN	FECHA: 17/06/2024
		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	PRIMERA REANUDACIÓN: 09/01/2025	
	PRIMERA PRÓRROGA Y ADICIÓN: 01/07/2025	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRA	$ 4.160.457.625,00	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRA	$ 465.033.732,00	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	**N/A**	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 1.165.289.991,34	
VALOR ADICIONAL DE INTERVENTORÍA	$ 143.675.429,14	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. designación del supervisor del convenio por parte del municipio C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. D. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio.	NO APLICA	15/06/2023	$ 1.965.929.315
SEGUNDO DESEMBOLSO – PRIMERA ADICIÓN	A. Certificación del supervisor designado por el Departamento y/o Municipio que acredite el inicio de las actividades de obra, B. Ampliación de cobertura y vigencia de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio de conformidad con la presente adición y prorroga y aprobación por parte del área de Gestión Contractual del Ministerio del Interior de la misma. C. Cronograma actualizado del convenio. D. Entrega de otrosí modificatorio de los contratos estudios diseños y obra e interventoría si aplica y sus correspondientes registros presupuestales	NO APLICA	20/03/2025	$ 1.103.560.995,48
TERCER DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor.	70%	DD/MM/AAAA	$ 1.572.743.452,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega	100%	DD/MM/AAAA	$ 393.185.863,00

	de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.			
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 3.069.490.310,35
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 1.950.413.437,35

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3002240	Cumplimiento	$ 593.458.146,00	19/07/2024	01/07/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños, Obra.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato 001-LP-OP	*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.*		$ 4.160.457.625,00
Link de consulta	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-1-227674&g-recaptcha-response=03AFcWeA7L-mW4VbyJW13GcqpK6iMH1mF8PLmecLMmeriXcuYSZB8I22nM7SboWDOGM47tJWz9VJpqH6wulatGYv38oAIlwm5ErkIsPUQz7dYbCQFduNr7p_69Jwjv8ku7BdZCACFPIlSj9t4J1jeaYTezeUDaCt8QU6wASFQvh49NtKaJYaF3h37c8usqwF-xFZxPqITNHqSKi2HDyvq1m0tVywPhIcfCyF0fV3xDxwfEwz9SCp59ddmvNwwnelXHe2S5PoEHzFXJ9LAVsSMbqK9HooZ1J0qEAoi26KxymqWckJTw01zhk0uQLf1ti7Gtb1MyBRXojz8BqkGiAEZtkqpZ_B609bsNYIQYNCBtAsl2SXHSJi3Wcw06mOq9v53jt8Q110mPab4BjwH86fToCmb6A7uJwi9PhwMLOI534kxWMYP5Pj27vG4MwtyoPdP1A_swiTMTMt-YGwtPQQjkreKiP7-2LBLmjrzdWWU0vMFzqhf8DRhYdPWqEsl8Mmy94MZF2X5NjFEtlqeRoqzp9Oh750liFUL1hTeKGfekXmVUEyGy-7WzL4LqulkkP-6iB0DHOmGGwAjHICIlUi8K7oJn4HrskhW1rZoXALEqzHPjD2u_zETW0v4GwSG-e1CjQp89C1yADB9TqISSByHaNxVTtL33SGFjBcKupNQ-elX512LN_qBxbxfrWqQBE5uiuof1E_FK2ECOWqSjQJpY0sn93DvvdQovv4jxDayoTq-rEc9aJ57l0NV-hOUh9yUfdJ-qEQ4tV6EYiytQlM7fRNhC2R-wHtAMHSyA5YKD1mGXDlzjQ3LOiZX5V-ZsylxRA5BMcRvn__YpMV7LhGcLccoNRaANeaChthsxfqNJNqEYTb1WWESYNec		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	15/07/2024		$ 1.165.289.991,34
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	YEISON ALBORNOZ RIVAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	08/03/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN	07/11/2023	
	PRIMERA REANUDACIÓN	04/12/2023	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	06/12/2023	
	SEGUNDA SUSPENSIÓN	22/12/2023	
	SEGUNDA REANUDACIÓN	08/07/2024	
	PRIMERA PRÓRROGA	15/07/2024	
	SEGUNDA PRÓRROGA	11/12/2024	
	TERCERA PRÓRROGA	31/12/2025	
Fecha de terminación del contrato	30/07/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 5.325.747.616,34

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTDO**
PÓLIZA No.	17-40-101027222
FECHA DE LA PÓLIZA	24/02/2023

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños, Obra.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato 001-I-CM	*INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO".*		$ 465.033.732,00
Link de consulta	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13478620&g-recaptcha-response=03AFcWeA67N9C5Lk-8rF1o0e6ZXBSutBt8_CrLIKlZwRrjPjh-Qzxx4C68TixOuKU5ybz5xU8NMQTJCWIA8kKNkzQ4XtS5OqNwfnP0Eto_1JAMXMqH2jE1NGHVo0V2hMhst0Uj1QS61BR1G0aHI2oDhxv9RnHVJ9qWtc_kND_d6eTH_eM9rjN78wBLn4NWp6JiLWm-P8rXE5h5ZNWOSTBOZcPdhDQpbuSp_F7pzWheXTk19ZuQRR64jCLo0z_N8Wr_UzpQlLhqTNT_86OvjwbhJD701K1XGDzfPV54xID3eH-mFZ9oyZ30kaP2zW5Gt7qSHdqthm3GZOYEcqzlUu0kmL4ighMPaKVWhq14fzqMZqTfQHvZdNXEQDHfTwqMNDBfFXwlWw5UzhmZzAivP3Tw8nlpNQnWumSD7zNtwiDMzEL64sce1n9KHOI4UQFJSG_sj6E2qHbOWFkWj_ziZ04QYqOSssn6PPeYbsSUHEdnL5lqyg8zKWV6kWwH7T-Cqlr1uZRhNHB6ak14LjnuducLqVYHoq8aGrNdBOfByhoXSELbhRE2sxU7RFQ1cRUL2pufraGcOs8qynh9zTbwO4FUpvXM7B63cKaBzW9v-nyiESJlcudMi6L--mU1XrxiCwALPAmOleLoX73musD55KYGYUBEemKD-eyE_Tl3Aa3mGRYhWJRidnYTDAyTZ76wmXi8XxOXl3QLEFn7TC1oYsC9eYsw9AYNCMCqwSeDB-9OtBf74A98V7qlKCXBkOwFoie5y2GKukExcG72GVd2tl5sC5dddK2AZJk8yCcqYj5squ3eF38E1ZZUJjLv90Lvr25Ky13PPlBefg9hqmBbLzLhXN4YvYcicAlgyt14u3fk0R5ghRR1m4s
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	15/07/2024		$ 143.675.429,14
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	YORK STIVENSON PEREA AYALA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	08/03/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN	07/11/2023	
	PRIMERA REANUDACIÓN	04/12/2023	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	06/12/2023	
	SEGUNDA SUSPENSIÓN	22/12/2023	
	SEGUNDA REANUDACIÓN	08/07/2024	
	PRIMERA PRÓRROGA	15/07/2024	
	SEGUNDA PRÓRROGA	11/12/2024	
	TERCERA PRÓRROGA	31/12/2025	
Fecha de terminación del contrato	30/07/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 608.833.839,14
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	**17-44-101208799**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**21/02/2023**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: DICIEMBRE 2024	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	No. 38 del 24 al 30 de marzo de 2025.	
INFORME FINANCIERO	Febrero de 2025	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 3.125.467,14 con corte al 28 de febrero de 2025	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Con un avance del 0,58% del proyecto. Avance en bordillos y viga y placa aérea.	
OTROS		**X**

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**54,54%**
% EJECUTADO DE OBRA	**39,10%**

PERIODO: Marzo de 2025
PORCENTAJE EJECUCIÓN: 39.10%
VIGENCIA: 30/07/2025

COMPONENTE TÉCNICO.

En el mes de marzo de 2025, se avanzó solo un 0,62% en la ejecución de la obra, teniendo en cuenta el reporte de problemas de orden público y fuerte invierno en la zona, a continuación, encontrará la consolidación de los informes semanales de interventoría remitidos por el Municipio de El Cantón de San Pablo:

- Según lo establecido en el Informe Semanal de Interventoría No. 35, correspondiente al período comprendido entre el 3 y el 9 de marzo de 2025, el proyecto registró un avance físico acumulado del 38,48%, frente a un avance programado del 49,32%. Durante dicho período, no se reportó ejecución de actividades (0,0%), lo cual el contratista atribuyó a situaciones de orden público que impidieron el desarrollo normal de las labores, así como al cierre de las vías que comunican Medellín, Quibdó y Pereira.

- De acuerdo con el Informe Semanal de Interventoría No. 36, correspondiente al período del 10 al 16 de marzo de 2025, el proyecto presentó un avance físico acumulado del 38,48%, en contraste con un avance programado del 50,19%. Durante este período, se reportaron condiciones climáticas adversas, específicamente fuertes precipitaciones, que han dificultado el transporte de materiales hacia el sitio de la obra. No obstante, se ha continuado con la fabricación de bloques de concreto con espesores de 15 y 20 cm, a medida para optimizar el tiempo y avanzar en otras actividades.

- De acuerdo con el Informe Semanal de Interventoría No. 37, correspondiente al período del 17 al 23 de marzo de 2025, el proyecto presentó un avance físico acumulado del 38,52%, en contraste con un avance programado del 50,42%. Durante este período, se reportaron condiciones climáticas adversas. No obstante, se ha continuado con la fabricación de bloques de concreto con espesores de 15 y 20 cm, a medida para optimizar el tiempo y avanzar en otras actividades.

- De acuerdo con el informe semanal de interventoría No. 38 correspondiente al período del 24 al 30 de marzo de 2025, se contó con un porcentaje de avance del 39,10% y programado del 54,54%, teniendo en cuenta que se reportó una avance semanal de 0.58% ejecutando actividades como: pega de bloque de 15 y 20 cm y se continuo con la elaboración de bloques de 15 y 20 cm.

A la fecha de acuerdo con el cronograma de obra se evidencia un atraso del 23,9 % y frente al cronograma del convenio un atraso del 25,9%, se deben adelantar por parte del Municipio de El Cantón de San Pablo todas las acciones necesarias que permitan dar cumplimiento al cronograma de obra y del convenio.

Por parte del Municipio de El Cantón de San Pablo, se remitió el informe de supervisión del mes de febrero de 2025 donde se relaciona la ejecución de las siguientes actividades:
“MURO INTERNO DE ESPESOR 15 CM BLOQUE No. 5 O SIMILAR en este periodo se fabricaron bloques en obra hasta donde la maquina bloquera pudo trabajar, se ejecutó durante este periodo 65,15 M² equivalentes al 6,10% de esta actividad.
MURO EXTERNO ESPESOR 20 CM BLOQUE ESTRUCTURAL en este periodo se fabricaron bloques en la obra hasta donde la formaleta lo permitió durante este periodo se ejecutaron 66,08 M² equivalentes al 5,90% de esta actividad”.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

- El 10 de marzo de 2025, teniendo en cuenta la notificación por parte del anterior apoyo a la supervisión por parte del ministerio, el municipio remite la siguiente información por medio de correo electrónico:
  1. INFORME DE SUPERVISIÓN FEBRERO
  2. INFORME FINANCIERO FEBRERO
  3. INFORME INTERVENTORÍA FEBRERO
  4. INFORME OBRA FEBRERO
  5. INFORME AMBIENTAL OBRA
  6. INFORME SOCIAL OBRA
  7. INFORME SST OBRA
  8. INFORMES SEMANALES 31,32, 33 Y 34.

- El 17 de marzo de 2025 se realiza citación a reunión presencial en las oficinas del Ministerio del Interior para el día 25 de marzo del 2025.

- El 25 de marzo de 2025 se realiza reunión presencial con el Municipio de El Cantón de San Pablo, donde se presentan por parte del Municipio de el Cantón de San Pablo, Chocó el señor alcalde Henry Ramirez, el supervisor del convenio por parte del Municipio Ingeniero Néstor Mosquera, Contratista de Obra el Ingeniero Freider Albornoz y el contratista de Interventoría el Ing. York Stivenson Perea Ayala, así mismo por parte del Ministerio del Interior, el arquitecto Manuel Antonio Linares Donato como Supervisor designado y el apoyo a la supervisión la ingeniera Lina María Rodríguez Raguá. Durante la reunión se oficializó la presentación de la ingeniería Lina Rodríguez como nuevo apoyo a la supervisión del convenio. Además, se abordó la situación

relacionada con el posible atraso en la ejecución del proyecto. En este sentido, el Ministerio del Interior, representado por el arquitecto Manuel Linares, solicitó al Municipio la elaboración y entrega de un plan de contingencia que permita alcanzar los porcentajes de avance establecidos en el cronograma del convenio con compromiso de entrega para el 28 de marzo de 2025. Asimismo, se recomendó optimizar esfuerzos para garantizar la ejecución del proyecto dentro de la vigencia fiscal 2025, considerando que el convenio no contempla vigencias futuras.

- El 01 de abril de 2025 el municipio realiza el envío de los informes semanales de interventoría del No. 35 al No.38, por medio de correo electrónico.

COMPONENTE FINANCIERO.

- Por parte del Municipio de El Cantón de San Pablo, se remitió el informe financiero con corte al 28 de febrero de 2025, el cual refleja un saldo disponible de $3.125.467,14. Durante el período reportado no se registraron movimientos en la cuenta bancaria del convenio.

- El Ministerio del Interior efectuó el segundo desembolso correspondiente al convenio No. 1909 de 2022, el día 20 de marzo de 2025, por un valor de $1.103.560.995.

- De igual manera se presenta el estado financiero del convenio y los contratos derivados con corte al mes de febrero de 2025:

ESTADO FINANCIERO
CONVENIO No. 1909 DE 2022 - MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ

CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR
No. CUENTA: 979123817 / BANCO DE BOGOTÁ

RECURSOS APORTADOS

VALOR CONVENIO	$ 5.934.581.455,48	APORTES MINISTERIO	$	3.931.858.630,00
		APORTES MUNICIPIO	$	693.857.405,00
		APORTES MINISTERIO	$	1.103.560.995,48
		APORTES MUNICIPIO	$	205.304.425,00

DESEMBOLSOS	CONCEPTO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	APORTANTE	VALOR	TOTAL
DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA CUENTA DEL CONVENIO						
Primer desembolso	A. Suscripción del acta de inicio. B. Designación del supervisor del convenio por parte del municipio. C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio porparte del supervisor del Ministerio. D. Reunión de socialización del proyecto con las especificaciones técnicas del proyecto.	179700323	15/06/2023	Ministerio del Interior	$ 1.965.929.315,00	
Segundo desembolso	A. Certificación del supervisor designado por el Departamento y/o Municipio que acredite el inicio de las actividades de obra B. Ampliación de cobertura y vigencia de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio de conformidad con la presente adición y prorroga y aprobación por parte del área de Gestión Contractual del Ministerio del Interior de la misma. C. Cronograma actualizado del convenio. D. Entrega de otrosí modificatorio de los contratos estudios diseños y obra e interventoría si aplica y sus correspondientes registros presupuestales.	74147525	20/03/2025	Ministerio del Interior	$ 1.103.560.995	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS					**$ 3.069.490.310,48**	60,96%
DESEMBOLSOS DEL MUNICIPIO A LA CUENTA DEL CONVENIO						
Primer desembolso	Cofinanciacion	N/A	30/06/2023	Municipio	$ 816.001.162,14	
Segundo desembolso	Cofinanciacion	N/A			$ -	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS					**$ 816.001.162,14**	90,75%
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA DEL CONVENIO						**$ 3.885.491.472,62**

PAGOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO A CONTRATOS DERIVADOS

		VALOR CONTRATADO		
CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATADO	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL CONTRATADO
001-LP-OP	YEISON ALBORNOZ RIVAS	$ 4.160.557.625,00	$ 1.165.289.991,34	$ 5.325.847.616,34
001-I-CM	YORK STIVENSON PEREA AYALA	$ 465.003.732,00	$ 143.800.107,14	$ 608.803.839,14

PAGOS	CONCEPTO	No. ORDEN DE PAGO	No.COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACIÓN DE RECURSOS	VALOR	TOTAL
PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE OBRA							
Primer pago	Acta parcial No.1 (Anticipo)	162	165	23/03/2023	Municipio	$ 500.000.000,00	
Segundo Pago	Acta parcial No.1 (Anticipo)	327	309	3/05/2023	Municipio	$ 192.857.405,00	
Tercer Pago	Acta parcial No.1 (Anticipo)	464	466	29/06/2023	Ministerio del Interior	$ 970.325.645,00	
Cuarto Pago	Acta parcial No.1 (Anticipo)	544	544	15/08/2024	Ministerio del Interior	$ 436.884.558,34	
Quinto Pago	Acta parcial No. 2	644	660	16/09/2024	Ministerio del Interior	$ 375.395.133,00	
Sexto Pago	Acta parcial No. 3	1034	1020	23/12/2024	Municipio	$ 100.200.000,00	
TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE OBRA						**$ 2.575.662.741,34**	48,36%
PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA							
Primer pago	Acta parcial No.1 (Estudios y diseños)	579	607	11/08/2023	Ministerio del Interior	$ 116.258.433,01	
Segundo pago	Acta Parcial No. 1	516	661	16/009/2024	Ministerio del Interior	$ 51.549.668	
TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA						**$ 167.808.101,01**	27,56%
TOTAL RECURSOS PAGADOS A LOS CONTRATOS DERIVADOS							**$ 2.743.470.842,35**

TOTAL RECURSOS PENDIENTES POR PAGAR A FEBRERO 2025	**$ 1.142.020.630,27**
SALDO EN LA CUENTA A FEBRERO 2025	**$ 3.125.467,14**

NOTA:
- La diferencia entre el total de recursos por pagar y el saldo en cuenta corresponde a las estampillas y rendimientos financieros generados.
- Ultimo extracto a febrero 2025

COMPONENTE JURÍDICO.

- El convenio interadministrativo 1909 de 2022, se encuentra vigente con un plazo de ejecución hasta el treinta (30) de agosto de 2025.

ANEXOS

A continuación, se enlistan los correos electrónico y documentos que fueron remitidos y recibidos durante el mes de marzo de 2025:

- Informe mensual técnico y financiero correspondiente al mes de febrero de 2025.
- Informe semanal de interventoría No. 35, 36, 37 y 38.
- Correo de citación enviado por el Ministerio del interior.

- Acta de reunión presencial del 25 de marzo de 2025, con su respectivo listado de asistencia.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Durante el mes de marzo de 2025, el avance físico del proyecto ejecutado en el marco del convenio ha sido limitado, finalizando el mes con 39,10%, debido a diversos factores que han impactado directamente la ejecución de las actividades programadas. Entre las principales causas se identifican afectaciones por el orden público, que impidieron el desarrollo normal de las labores en campo, así como bloqueos en las principales vías de acceso (Medellín–Quibdó–Pereira), que restringieron el transporte de materiales e insumos necesarios para la obra. Además, se presentan condiciones climáticas adversas, con intensas precipitaciones que limitarán la movilidad y el ingreso al sitio de intervención.

Pese a estas dificultades, el contratista ha continuado con actividades complementarias que no requieren desplazamiento ni intervención directa en el terreno, como la elaboración de bloques de concreto con espesores de 15 y 20 cm, lo cual permitirá avanzar de manera más eficiente una vez se normalicen las condiciones. En respuesta a la preocupación por el atraso en el cronograma, el Ministerio del Interior solicitó formalmente al Municipio la elaboración de un plan de contingencia orientado a recuperar el tiempo perdido y asegurar el cumplimiento de las metas dentro de la vigencia 2025, considerando que el convenio no cuenta con recursos comprometidos en vigencias futuras.

Todo lo anteriormente mencionado queda plasmado en los anexos del presente informe.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

08/03/2023	20/11/2024	21/11/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO Supervisor Convenio No. 1909 de 2022	**LINA MARÍA RODRÍGUEZ RAGUÁ** Apoyo a la supervisión del Convenio No. 1908-22

Lina Maria Rodriguez Ragua

De: planeacion planeacion <planeacion@elcantondesanpablo-choco.gov.co>
Enviado el: lunes, 10 de marzo de 2025 6:37 p. m.
Para: Lina Maria Rodriguez Ragua
Asunto: REMISIÓN DE INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO 1909 DE 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025
Datos adjuntos: 11. Informe-mensual-de-supervision_febrero- 2025.pdf; 14. INFORMES FINANCIERO FEBRERO 2025.pdf; INFORM~1.PDF; INFORME TÉCNICO #8.pdf; INFORME AMBIENTAL #8.pdf; INFORME SOCIAL #8.pdf; INFORME SST #8.pdf; INFORME INTERVENTORIA SEMANA 32- ESTACION- MANAGRU.pdf; INFORME INTERVENTORIA SEMANA 31- ESTACION- MANAGRU.pdf; INFORME INTERVENTORIA SEMANA 34- ESTACION- MANAGRU.pdf; INFORME INTERVENTORIA SEMANA 33- ESTACION- MANAGRU.pdf

Cordial saludo.

Por medio del presente y en cumplimiento del convenio del asunto se anexa la siguiente información:
1. INFORME DE SUPERVISIÓN FEBRERO
2. INFORME FINANCIERO FEBRERO
3. INFORME INTERVENTORÍA FEBRERO
4. INFORME OBRA FEBRERO
5. INFORME AMBIENTAL OBRA
6. INFORME SOCIAL OBRA
7. INFORME SST OBRA
8. INFORMES SEMANALES 31,32, 33 Y 34

Lina Maria Rodriguez Ragua

De: Lina Maria Rodriguez Ragua
Enviado el: lunes, 17 de marzo de 2025 4:26 p. m.
Para: planeacion planeacion
Asunto: RE: Citación a reunión presencial

Buenas tardes,

Señores Cantón de San Pablo, confirmo el día de la reunión la cual la fecha es INAMOVIBLE teniendo en cuenta que se ha reprogramado DOS veces, este espacio está destinado para revisar el avance del proyecto, agradecemos contar con información actualizada para la reunión.

Fecha: 25 de marzo
Hora: 10:00 am
Lugar: Edificio Bancol, Bogotá.

Interior

Lina María Rodríguez Raguá
Contratista - Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la seguridad y Convivencia Ciudadana.
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: planeacion planeacion <planeacion@elcantondesanpablo-choco.gov.co>
Enviado el: lunes, 17 de marzo de 2025 4:18 p. m.
Para: Lina Maria Rodriguez Ragua <lina.rodriguez@mininterior.gov.co>
Asunto: Re: Citación a reunión presencial

Cordial saludo.

Se anexa al presente al presente, solicitud de reprogramación de fecha para la reunión

Quedamos atentos a su respuesta.

El jue, 13 mar 2025 a las 15:53, Lina Maria Rodriguez Ragua (<lina.rodriguez@mininterior.gov.co>) escribió:

> Buenas tardes, agradezco su colaboracion con la Confirmacion de la asistencia a la reunion.

Lina Maria Rodriguez Ragua

De: planeacion planeacion <planeacion@elcantondesanpablo-choco.gov.co>
Enviado el: martes, 1 de abril de 2025 4:42 p. m.
Para: Lina Maria Rodriguez Ragua
Asunto: INFORMES SEMANALES No 35, 36, 37 y 38 - convenio 1909 de 2022
Datos adjuntos: INFORME INTERVENTORIA SEMANA 37- ESTACION- MANAGRU.pdf; INFORME INTERVENTORIA SEMANA 35- ESTACION- MANAGRU.pdf; INFORME INTERVENTORIA SEMANA 38- ESTACION- MANAGRU.pdf; INFORME INTERVENTORIA SEMANA 36- ESTACION- MANAGRU.pdf

Cordial saludo.

Se anexan al presente los informes semanales relacionados en el asunto, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

ACTA No.	MARZO DE 2025
FECHA	25-03-2025
CIUDAD	BOGOTA D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1909 de 2022 Municipio El Cantón de San Pablo – Chocó.
OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO"*
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	38,52% según informe de interventoría semana No. 37.
MOTIVO:	Reunión de seguimiento y control al convenio 1909 de 2022.

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: Manuel Antonio Linares Donato C.C.: 71.796.795 Cargo: Supervisor del convenio Ministerio del Interior.	Nombre: Henry Ramirez C.C./ NIT: 11635268 Cargo: Alcalde Municipal
Nombre: Lina María Rodríguez Raguá C.C.:1.090.495.654 Cargo: Apoyo a la supervisión del convenio	Nombre: Nestor Mosquera C.C./ NIT: 1.077.433.520 Cargo: Secretario de Planeación
Nombre: C.C.: Cargo:	Nombre: York Stivenson Perea Ayala C.C./ NIT: 9.732.848 Cargo: Contratista Interventoría
Nombre: C.C.: Cargo:	Nombre: Freider Albornoz C.C./ NIT: 1.053.793.900 Cargo: Contratista de Obra

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El 25 de marzo de 2025, en cumplimiento de la citación presencial convocada por la supervisión del Ministerio del Interior, se presentan por parte del Municipio de el Cantón de San Pablo, Chocó el señor alcalde Henry Ramirez, el supervisor del convenio por parte del Municipio Ingeniero Néstor Mosquera, Contratista de Obra el Ingeniero Freider Albornoz y el contratista de Interventoría el Ing. York Stivenson Perea Ayala, así mismo por parte del Ministerio del Interior, el arquitecto Manuel Antonio Linares Donato como Supervisor designado y el apoyo a la supervisión la ingeniera Lina María Rodríguez Raguá.

El objeto de la presente reunión es llevar a cabo el seguimiento del convenio, con el fin de que se esté llevando a cabo el cumplimiento de las obligaciones contractuales del mismo, por lo anterior, la supervisión del Ministerio inicia realizando una presentación del nuevo apoyo a la supervisión del convenio, la Ing. Lina Rodríguez, así mismo solicita información del avance real ejecutado en obra, el cual el municipio comparte el informe semanal No. 37 de interventoría mostrando un avance del 38,52%, a lo cual el supervisor del convenio manifiesta un posible retraso en la ejecución.

El municipio toma la palabra dando a conocer que se han presentado retrasos en el aprovisionamiento de material necesario para la obra, por cuenta de grupos al margen de la ley que no han permitido el transporte al sitio.

Por su parte, el Ministerio del Interior, representado por el arquitecto Manuel Linares, recomendó optimizar esfuerzos para la ejecución del proyecto dentro de la vigencia 2025, considerando que el convenio no cuenta con vigencias futuras, así mismo se solicita un plan de contingencia que permita dar cumplimiento a las cronograma contractual del proyecto.

Finalmente, el Municipio se comprometió a enviar el plan de contingencia el 28 de marzo de 2025 con la revisión y aprobación del municipio.

Siendo la 11:00 am del día 25 de marzo de 2025 se da por finalizada la reunión del convenio 1909 de 2022.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio El Cantón de San Pablo	Plan de contingencia para el 28 de marzo con aprobación del municipio.	**28 de marzo de 2025**

Listado de asistentes

Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

Tema: Seguimiento y control del Convenio No. 1909 de 2022 - Municipio El Cantón de San Pablo

Responsable u organizador: Ministerio del Interior — Dependencia: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

Ciudad: Bogotá, D.C. — Lugar y/o enlace: Edificio Bancol. — ☒Presencial ☐Virtual — Fecha: Día 25, Mes 03, Año 2025 — Hora inicial — Hora final

Tipo ☒ Comité ☐ Junta ☐ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividad ☐ Otro: ¿Cuál?_____

Para el diligenciamiento del siguiente formato, tener en cuenta los siguientes acrónimos: * **Sexo de Nacimiento (SN):** Mujer (M); Hombre (H); Intersexual (I); Prefiero no decirlo (PN). **Persona con Discapacidad (PD):** Física (F); Visual (V); Auditiva (A); Intelectual (I); Psicosocial (P); Múltiple (M); Sordoceguera (S) **Pertenencia Étnica (PE):** Indígena (I); Gitano(a) (G); Raizal (R); Palenquero(a) (P); Afrocolombiano (a)/Afrodescendiente (A); No Aplica (NA).

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	SN	PD	PE	¿ES USTED VICTIMA DEL CONFLICTO, DE VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH? SI	NO	PN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	FIRMA
1	Lina Rodriguez R	1026295674	-					-		Sub Proyecto	Apoyo a la supervisión	lina.rodriguez@mininterior.gov.co	3163916879	
2	Henry Ramirez F.	11635268					-			Municipio El Cantón de San Pablo	Alcalde	henryrapzo@hotmail.com	3216295353	
3	Nestor Mosquera Andrade	1077433520						-		Municipio El Cantón De San P	S. Planeacion	Planeacion@elcantondesanpablo.gov	3104357456	
4	York Perea Perea	9732848						X		Interventoría	contratista	yorkperea@Hotmail.com	3108365732	
5	Freider Albornoz R.	1053793900						X		Contratista	Contratista	Freidralbem@gmail.com	3213093890	
6														
7														
8														

Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

Tema:	Seguimiento y control del Convenio No. 1909 de 2022 - Municipio El Cantón de San Pablo.				
Responsable u organizador: Ministerio del Interior		Dependencia: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana			
Ciudad: Bogotá, D.C.	Lugar y/o enlace: Edificio Bancol.	☒ Presencial ☐ Virtual	Fecha		Hora inicial
			Día / Mes / Año: 25 / 03 / 2025		Hora final
Tipo ☒ Comité ☐ Junta ☐ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividad ☐ Otro: ¿Cuál?_____					

Para el diligenciamiento del siguiente formato, tener en cuenta los siguientes acrónimos: * **Sexo de Nacimiento (SN):** Mujer (M); Hombre (H); Intersexual (I); Prefiero no decirlo (PN). **Persona con Discapacidad (PD):** Física (F); Visual (V); Auditiva (A); Intelectual (I); Psicosocial (P); Múltiple (M); Sordoceguera (S) **Pertenencia Étnica (PE)**: Indígena (I); Gitano(a) (G); Raizal (R); Palenquero(a) (P); Afrocolombiano (a)/Afrodescendiente (A); No Aplica (NA).

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	SN	PD	PE	¿ES USTED VICTIMA DEL CONFLICTO, DE VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH? SI	NO	PN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	FIRMA
1	Lina Rodríguez R.	1075294856	-					-		Sb Proyectos	Apoyo a la supervisión	lina.rodriguez@mininterior.gov.co	3163496879	
2	Henry Ramírez P.	11635268					-			Municipio El cantón	Alcalde	henryrapo@hotmail.com	3216295353	
3	Nestor Mosquera Andrade	1077433520						-		Municipio El Canton Del San P	S. Planeacion	Planeacion@el cantondesanpablo.gov	3104357456	
4	York Yuverson Perea Ayala	9732848						X		Interventoría	contratista	yorkperea@Hotmail.com	3108365731	
5	Freider Albornoz R.	1053793900						X		Contratista	Contratista	Freidrider@gmail.com	3213893890	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.

Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

1. RESUMEN DE LA REUNIÓN: (Aspectos relevantes)

Se da inicio de reunión realizando una presentación de los participantes de la ramión, la presentación de nuevo apoyo a la supervisión.
Recordar el envio de información Trim. y Municipio, Avance 38,40%, se les comunica el retraso.

Supervisor de Cerramiento, recordar lista de Chequeo para intervención, Atraso del 11%, Plan de contingencia, se solicita un plan de contingencia para reflejar el retraso. y poder quedar al dia.

Se recuerda el cumplimiento de las obligaciones contractales del convenio, así mismo se le da a conocer al municipio la próxima visita para el dia 22 y 23 de abril del 2025. Así mismo recordarle informe financiero completo de cada pago.

2. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

1. Presentar plan de Contingencia para el dia. viernes 28 de Marzo de 2025 revisado por el Municipio.
2.
3.
4.

- . En el Item *"2. Observaciones y/o conclusiones generales"*, se sugiere incluir el listado de compromisos, sus responsables y fechas de cumplimiento.
-

Elaboró resumen y conclusiones
Firma:
Nombres: Lina Rodriguez.
Cargo o Rol: Apoyo a la supervisión.
Área: Subdirección de Proyectos.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
1909 de 2022 No.20 _, MUNICIPIO: CANTON DE PABLO- DEPARTAMENTO: CHOCÓ
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	MANAGRÚ- BARRIO LAS BRISAS		
BENEFICIARIO:	CANTON DE SAN PABLO-CHOCÓ		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 5.035.419.625,48
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		899.161.830
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 5.934.581.455,48
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/08/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	NESTOR MOSQUERA ANDRADES		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	YIVIOLA RAMIREZ MORERNO	16/12/2022	01/01/2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 2-2022-030809	19/07/2022	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 128	23/03/2022	30/12/2022
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	**No. 3002240**	09/08/2022 24/09/2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	16/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRIMERA PRORROGA**		**FECHA: 04/07/2024**
	PRIMERA ADICIÓN		**FECHA: 04/07/2024**
	SEGUNDA PRORROGA		**FECHA: 27/12/2024**
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRIMERA SUSPENSIÓN**		**FECHA: 29/02/2024**
	PRIMERA REANUDACIÓN		**FECHA: 17/06/2024**
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA: 24/09/2024: suscripción del convenio**		
	FECHA: 24/09/2024: Acta de reanudación No 1		
	FECHA: 01/07/2025: Primera adición y prorroga		
	FECHA: 01/03/2026: Segunda prorroga		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216.526.237,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 156.524.576		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			

VALOR DE OBRA	$ 3.943.931.388,00
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 1.165.289.991,34
VALOR INTERVENTORÍA	$ 465.035.732,00
VALOR ADICIONAL DE INTERVENTORIA	$ 143.800.107,14

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio B. Designación del supervisor del convenio por parte del municipio. C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del ministerio. D. Reunión de socialización del proyecto con las especificaciones técnicas del proyecto.	NO APLICA	15/06/2023	$ 1.965.929.315
SEGUNDO DESEMBOLSO	SEGUNDO DESEMBOLSO - PRIMERA ADICIÓN: Por la suma de MIL CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($1.103.560.995,48), previo cumplimiento de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Certificación del supervisor designado por el Departamento y/o Municipio que acredite el inicio de las actividades de obra, B. Ampliación de cobertura y vigencia de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio de conformidad con la presente adición y prorroga y aprobación por parte del área de Gestión Contractual del Ministerio del Interior de la misma. C. Cronograma actualizado del convenio. D. Entrega de otrosí modificatorio de los contratos estudios diseños y obra e interventoría si aplica y sus correspondientes registros presupuestales.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$1.103.560.995,48
TERCER DESEMBOLSO	UN TERCER DESEMBOLSO en la vigencia 2024 equivalente a la suma de MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.572.743.452,00), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor.	70 %	DD/MM/AAAA	$1.572.743.452,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	UN ÚLTIMO DESEMBOLSO en la vigencia 2024 equivalente a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($393.185.863), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 393.185.863
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.965.929.315
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**$ 1,950,413,437.35**

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3002240 (4)	Cumplimiento	$593.458.146,00	02/01/2025	01/3/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños; obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. LP-001-2023	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO- DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.		$ 4.160.457.625,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**15/07/2024**		$ 1.165.289.991,34
Nombre contratista	YEISON ALBORNOZ RIVAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	8/MARZO/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN	07/11/2023	
	PRIMER REANUDACIÓN	04/12/2023	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	06/12/2023	
	SEGUNDA SUSPENSIÓN	22/12/2023	
	SEGUNDA REANUDACIÓN	08/07/2024	
	PRIMERA PRÓRROGA	15/07/2024	
	PRIMERA ADICIÓN	15/07/2024	
	SEGUNDA PRORROGA	11/12/2024	
	TRCERA PRORROGA	31/12/2024	
Fecha de terminación del contrato	**30/07/2025**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 5.325.747.616,34		
COMPAÑÍA ASEGURADORA			**SEGUROS DEL ESTADO S. A**
PÓLIZA No.	17-44-101208889 - CUMPLIMIENTO		
FECHA DE LA PÓLIZA	15/12/2029		
PÓLIZA No.	17-40-101027222 - RC		
FECHA DE LA PÓLIZA	31/10/2025		

➢ ***Contrato de ejecución de Interventoría Estudios y Diseños, obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. CM-001-2023	INTERVENTORIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO"		$ 465.033.732,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	04/07/2024		$ 143.800.107,14
Nombre contratista	YORK STIVENSON PEREA AYALA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	8/MARZO/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN	07/11/2023	
	PRIMER REANUDACIÓN	04/12/2023	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	06/12/2023	
	SEGUNDA SUSPENSIÓN	22/12/2023	
	SEGUNDA REANUDACIÓN	08/07/2024	
	PRIMERA PRÓRROGA	15/07/2024	
	PRIMERA ADICIÓN	15/07/2024	
	SEGUNDA PRORROGA	11/12/2024	
	TERCERA PRORROGA	31/12/2024	
Fecha de terminación del contrato	**30/07/2024**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 5,934,551,455.48**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	**17-44-101208799**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**31/07/2028**		

5. RESUMEN DE PAGOS REALIZADOS A LA FECHA

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
001-LP-OP	PAGO PARCIAL ANTICIPO	162	165	23/03/2023	$ 0.00	$ 500,000,000.00	$ 500,000,000.00
001-LP-OP	PAGO PARCIAL ANTICIPO	327	309	03/05/2023	$ 0.00	$ 192,857,405.00	$ 192,857,405.00
001-LP-OP	PAGO PARCIAL ANTICIPO	464	466	27/06/2023	$ 970,325,645.00	$ 0.00	$ 970,325,645.00
001-I-CM	PAGO ACTA INTERVENTORIA, ESTUDIOS Y DISEÑO	579	607	11/08/2023	$ 116,258,433.01	$ 0.00	$ 116,258,433.01
001-LP-OP	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N 1	544	544	15/08/2024	$ 436,884,558.34	$ 0.00	$ 436,884,558.34
001-LP-OP	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N 2	644	660	12/09/2024	$ 375,395,133.00	$ 0.00	$ 375,395,133.00
001-I-CM	PAGO ACTA DE COSTOS INTERVENTORIA N 1	516	661	12/09/2024	$ 51,549,668.00	$ 0.00	$ 51,549,668.00
001-LP-OP	PAGO ABONO1 ACTA PARCIAL DE OBRA N 3	1034	1020	23/12/2024		$ 120,000,000.00	$ 0.00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 1,950,413,437.35	$ 812,857,405.00	$ 2,643,270,842.35

6. RESUMEN DE MANEJO DEL ANTICIPO DE OBRA

MANEJO ANTICIPO DE OBRA	
VALOR INICAL DEL CONTRATO	$4,160,457,625.00
VALOR ADICION	$1,165,289,991.34
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$5,325,747,616.34
VALOR ANTICPO OTORGADO	$1,664,183,050.00
VALOR AMORTIZADO ACTA No 1	$198,390,766.70
VALOR AMORTIZADO ACTA No 2	$170,468,209.17
VALOR POR AMORTIZAR	$1,295,324,074.13

7. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: ENERO 2025	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA: No 30 del 27 de enero al 02 de febrero de 2025	X	
INFORME FINANCIERO: FEBRERO 2025	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA: $ 3,125,441.14	X	
➢ MURO INTERNO DE ESPESOR 15 CM BLOQUE No. 5 O SIMILAR en este periodo se fabricaron bloques en obra hasta donde la maquina bloquera pudo trabajar, se ejecutó durante este periodo 65,15 M² equivalentes al 6,10% de esta actividad. ➢ MURO EXTERNO ESPESOR 20 CM BLOQUE ESTRUCTURAL en este periodo se fabricaron bloques en la obra hasta donde la formaleta lo permitió durante este periodo se ejecutaron 66,08 M² equivalentes al 5,90% de esta actividad		

8. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
SE REALIZARON LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**48.66%**
% EJECUTADO DE OBRA	**38.48%**

PERIODO: FEBRERO 2025
VIGENCIA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO 1909: 31/12/2024
AVANCE DE OBRA: 38.48%

Componente técnico:
Para el periodo reportado se continua con el desarrollo de las actividades en obra las cuales se listaron en el numeral anterior y se evidencian en el registro fotográfico anexo.

Componente administrativo: Se avanza con la ejecución del convenio y sus contratos derivados, los cuales han presentado varios contratiempos.

Componente financiero: Se realiza El abono a la cuenta del convenio por concepto de rendimiento por un valor de $ 26.00, para un total de $ 1,759,345.00
Componente Jurídico: No se presentaron actuaciones en este componente durante el periodo de evaluación.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: Para el periodo de corte se registra un avance de del **38.48 %** el cual se justifica con las actividades relacionadas en el numeral anterior y se anexan los informes semanales de interventoría los informes mensuales de obra e interventoría correspondiente.

9. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

15/03/2023	17/03/2023	15/07/2024	25/07/2024	21/11/2024	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

10. SUPERVISOR

NESTOR MOSQUERA ANDRADES
Supervisor convenio 1909 de 2022 Municipio El Cantón Del San Pablo-Chocó

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1909 DE 2022

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO-DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

INFORME FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO 2025
MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO

PROYECTO (S):	**AUNAR ESFUERZO TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO-DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.**

CUENTA (AHORROS) No.: 979123817 — **DEL BANCO: DE BOGOTA**

VALOR CONVENIO	**$ 5,934,581,455.48**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 5,035,419,625.48**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO	**$ 0.00**
VALOR APORTE MUNICIPIO	**$ 899,161,830.00**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

GIROS MINISTERIO		
FECHA DE GIRO	**GIROS**	**VALOR DE GIROS**
15/06/2023	GIRO 1	$ 1,965,929,315.00
	GIRO 2	$ 0.00
	GIRO 3	$ 0.00
		$ 0.00
TOTAL GIRO MINISTERIO		**$ 1,965,929,315.00**
GIROS MUNICIPIO		
15/03/2023	GIRO 1	$ 505,000,000.00
16/04/2023	GIRO 2	$ 188,897,405.00
17/05/2023	GIRO 3	$ 2,000,000.00
31/07/2023	GIRO 4	$103,757.14
23/12/2024	GIRO 5	$100,200,000.00
TOTAL GIRO MUNICIPIO		**$ 796,201,162.14**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 979123817 A LA FECHA	**$ 2,762,130,477.14**
VALOR CONTRATADO:	$

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
001-LP-OP	YEISON ALBORNOZ RIVAS	$ 4,160,457,625.00	$ 1,165,289,991.34	$5,325,747,616.34
001-I-CM	YORK STIVENSON PEREA AYALA	$ 465,003,732.00	$ 143,800,107.14	$608,803,839.14
TOTAL CONTRATADO				**$ 5,934,551,455.48**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
001-LP-OP	PAGO PARCIAL ANTICIPO	162	165	23/03/2023	$ 0.00	$ 500,000,000.00	$ 500,000,000.00
001-LP-OP	PAGO PARCIAL ANTICIPO	327	309	03/05/2023	$ 0.00	$ 192,857,405.00	$ 192,857,405.00
001-LP-OP	PAGO PARCIAL ANTICIPO	464	466	27/06/2023	$ 970,325,645.00	$ 0.00	$ 970,325,645.00
001-I-CM	PAGO ACTA INTERVENTORIA, ESTUDIOS Y DISEÑO	579	607	11/08/2023	$ 116,258,433.01	$ 0.00	$ 116,258,433.01
001-LP-OP	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N 1	544	544	15/08/2024	$ 436,884,558.34	$ 0.00	$ 436,884,558.34
001-LP-OP	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N 2	644	660	12/09/2024	$ 375,395,133.00	$ 0.00	$ 375,395,133.00
001-I-CM	PAGO ACTA DE COSTOS INTERVENTORIA N 1	516	661	12/09/2024	$ 51,549,668.00	$ 0.00	$ 51,549,668.00
001-LP-OP	PAGO ABONO1 ACTA PARCIAL DE OBRA N 3	1034	1020	23/12/2024		$ 100,200,000.00	$ 100,200,000.00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 1,950,413,437.35**	**$ 793,057,405.00**	**$ 2,743,470,842.35**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/03/2023	$ 14,753.00
30/04/2023	$ 2,770.00
31/05/2023	$ 1,082.00
30/06/2023	$ 225,066.00
31/07/2023	$ 123,937.00
31/08/2023	$ 116,235.00
31/09/2023	$ 111,369.00
31/10/2024	$ 110,795.00
31/11/2023	$ 110,809.00
31/12/2023	$ 110,823.00
31/01/2024	$ 110,837.00
29/02/2024	$ 110,850.00
31/03/2024	$ 110,864.00
30/04/2024	$ 110,878.00
31/05/2024	$ 110,892.00
30/06/2024	$ 110,906.00
31/07/2024	$ 76,457.00
31/08/2024	$ 56,706.00
30/09/2024	$ 21,178.00
31/10/2024	$ 8,264.00
30/11/2024	$ 3,332.00
31/12/2024	$ 482.00
31/01/2025	$ 34.00
28/01/2025	$ 26.00
TOTAL (3)	**$ 1,759,345.00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
NO	NO	NO
TOTAL (4)	**$ 0.00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 2,762,130,477.14**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 2,743,470,842.35**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	**$ 1,759,345.00**
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	**$ 0.00**
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 1,759,345.00**

ESCUENTOS BANCARIO	**GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO**	**23/03/2023**	**$ 2,000,000.00**
	TOTAL IVA	**24/03/2023**	**$ 1,349.00**
	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**24/03/2023**	**$ 33.00**
	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**03/05/2023**	**$ 771,430.00**
	TOTAL IVA	**04/05/2023**	**$ 1,349.00**
	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**04/05/2023**	**$ 33.00**
	TOTAL IVA	**29/06/2023**	**$ 11,611.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**29/06/2023**	**$ 3,881,587.00**
	TOTAL IVA	**11/08/2023**	**$ 1,349.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**31/08/2023**	**$ 369,735.00**
	TOTAL IVA	**12/09/2023**	**$ 733.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**12/09/2023**	**$ 51,172.00**
	TOTAL IVA	**14/08/2024**	**$ 1,469.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**14/08/2024**	**$ 1,459,231.00**
	IVA	**12/09/2024**	**$ 2,267.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**12/09/2024**	**$ 1,288,828.00**
	IVA	**13/11/2024**	**$ 6,752.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**13/11/2024**	**$ 769,692.00**
	IVA	**24/12/2024**	**$ 3,104.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**24/12/2024**	**$ 400,878.00**
	IVA	**13/01/2025**	**$ 844.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**13/01/2025**	**$ 9,621.00**
	DEDUCCIONES MUNICIPIO	**31/01/2025**	**$ 3,856,005.65**
	CARGO DISPERCIÓN	**13/01/2025**	**$ 2,404,440.00**
TOTAL DESCUENTOS			**$ 17,293,512.65**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 20,418,979.79**
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR X DEVOLVER (INFORME FINAL)	**$ 15,293,512.65**
SALDO EN CUENTA APLICANDO DESCUENTOS BANCARIOS	**$ 3,125,467.14**

FIRMA

Felipe Hinestroza Trellez

FELIPE HINESTROZA TRELLEZ
Tesorero General
Secretario de hacienda

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos | www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025030102AH0358103902



ESTUDIO DISENOS Y CONTRUCCION DE LA ESTA
CR 5 2-1
MANAGRU,CHOCO
Entrega: EM Oficina: 2037 Gerencia Oficial 2 - Quibdó
6008

FECHA EXTRACTO **Febrero - Febrero 2025**
Desde: Febrero 01 Hasta: Febrero 28
Cuenta Número: 979123817
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 2037
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**3,125,441.14**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	26.00
Saldo Final:	**3,125,467.14**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/02	GT01	Intereses ganados	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		26.00	3,125,467.14
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

MINISTERIO DEL INTERIOR	**INFORME DE INTERVENTORIA** **YORK STIVENSON PEREA AYALA** **INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO"**	CANTÓN DE SAN PABLO	YORK STIVENSON PEREA AYALA
Versión: 01			

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	**35**	**MES: MARZO**			**FECHA DE INFORME**		
CONTRATO No	001-LCM de 2023	**OBJETO:**	INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO"		**DEL**	**3-mar-25**	**AL**	**9-mar-25**

INTERVENTOR:**YORK STIVENSON PEREA AYALA**	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. KATHERINE HINESTROZA**	**DIRECTOR DE OBRA: ARQ YEISON ALBORNOZ RIVAS**


1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

MANAGRÚ - MUNICIPIO CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 4.160.457.625,00		
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**	$ 1.165.289.591,34		
PLAZO	VEINTE (20) MESES			**FECHA DE TERMINACION:**	viernes, 8 de diciembre de 2023		
PRORROGAS N° 1,2,3,4:	Cuatro (11) meses y seis (6) dias			**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	Mercoles, 30 de julio de 2025		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 5.325.747.616,34			**VALOR DEL ANTICIPO:**	$ 1.664.183.050,00		
CONTRATISTA:	YISSON ALBORNOZ RIVAS			**REPRESENTANTE LEGAL:**	YE ISON ALBORNOZ RIVAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	151 DIAS			**PLAZO RESTANTE:**	166 DIAS		
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,00%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	38,48%	**PROGRAM. SEMANA**	0,68%	**PROGRAM. ACUMULADO**	49,32%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 0,00	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 2.049.396.589,68	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 34.888.923,93	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 2.626.397.715

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES DEL CONVENIO

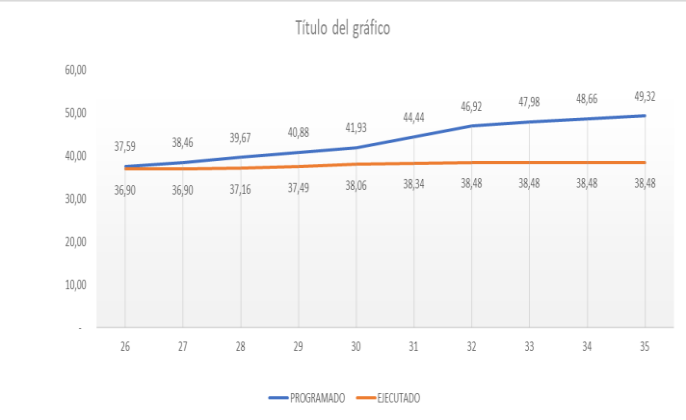

4. RESUMEN DE AVANCE DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO INICIAL	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.				
1	REPLANTEO GENERAL	$ -	$ -	$ 8.746.825,68	$ 8.746.825,68
2	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.20M. INCLUYE CARGUE)	$ -	$ -	$ 39.854.104,80	$ 39.854.104,80
3	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ 53.056.766,88	$ 53.056.766,88
4	RELLENO EN RECEBO SUBBASE (SUMINISTRO E INSTALACION EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	$ -	$ -	$ 205.304.425,60	$ 205.304.425,60
5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA	$ -	$ -	$ 156.842.473,09	$ 156.842.473,09
6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	$ -	$ -	$ 20.930.652,00	$ 20.930.652,00
7	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ 31.779.266,76	$ 31.779.266,76
8	SUMINISTRO E INSTALACION CEMENTO CICLOPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3000 PSI	$ -	$ -	$ 83.239.921,72	$ 83.239.921,72
9	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28MPA). GRAVA COMUN (INCLUYE BOMBEO, SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	$ -	$ -	$ 50.868.480,00	$ 50.868.480,00
10	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ACERO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ 327.157.806,40	$ 327.157.806,40
11	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	$ -	$ -	$ 30.943.153,36	$ 30.943.153,36
12	MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLITELENO CALIBRE 6	$ -	$ -	$ 4.400.917,92	$ 4.400.917,92
14	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ACERO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ 11.279.586,33	$ 11.279.586,33
15	COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI. (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	$ -	$ -	$ -	$ -
16	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	$ -	$ -	$ -	$ -
17	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ -	$ -
18	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ACERO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -	$ -
19	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.20M. INCLUYE CARGUE)	$ -	$ -	$ -	$ -
20	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	$ -	$ -	$ -	$ -
21	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ -	$ -
22	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ACERO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -	$ -
26	ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ACERO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -	$ -
	COLUMNETA Y VIGA-CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI. (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALTEO EN MADERA, COLOCACION Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	$ -	$ -	$ -	$ -
40	RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ 13.828.330,00	$ 13.828.330,00
41	RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ 2.710.497,00	$ 2.710.497,00
42	PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ 197.000,00	$ 197.000,00
43	PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -
44	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60X0.60M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ -	$ 6.128.636,00	$ 6.128.636,00
45	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.120.120 (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ -	$ 4.602.000,00	$ 4.602.000,00
46	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.450.45 (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ -	$ 15.156.261,00	$ 15.156.261,00
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	$ -	$ -	$ 462.879,01	$ 462.879,01
48	MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M. CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS	$ -	$ -	$ 205.308.634,08	$ 205.308.634,08
49	MURO INTERNO DE ESPESOR 15 CM BLOQUE NO S O SIMILAR	$ -	$ -	$ 21.470.872,00	$ 21.470.872,00
50	MURO EXTERNO ESPESOR 20 CM BLOQUE ESTRUCTURAL	$ -	$ -	$ 32.150.602,56	$ 32.150.602,56
			$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL		$ -	$ 1.208.845.992,42	$ 1.273.502.768,13
	AUI		$ -	$ 433.046.349,24	$ 453.749.022,72
	VALOR TOTAL		$ -	$ 1.641.907.353,36	$ 1.727.251.790,85

AVANCE EJECUTADO	38,48%	
AVANCE PROGRAMADO	49,32%	
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	-10,84%	

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	VR_UNITARIO	VR/PARCIAL EJECUTADO	VR/PARCIAL ACUMULADO
REPLANTEO GENERAL	M2	0,00	0	753,84	$ 11.607,00	$ -	$ 8.746.825,68
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	753,84	$ 52.870,00	$ -	$ 39.854.104,80
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	16.584,84	$ 3.197,00	$ -	$ 53.056.766,88
RELLENO EN RECEBO SUBBS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	0,00	0	1.264,27	$ 159.834,00	$ -	$ 205.304.425,60
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA	M3/KM	0,00	0	33.368,71	$ 3.146,00	$ -	$ 156.842.473,09
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	0,00	0	494,64	$ 42.161,00	$ -	$ 20.930.652,00
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	12.913,10	$ 2.461,00	$ -	$ 31.779.266,76
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIMIENTO CICLOPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,00	0	1641	$ 461.670,00	$ -	$ 83.239.921,72
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28MPA). GRAVA COMUN (INCLUYE BOMBEO, SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO).	M3	0,00	0	51,20	$ 993.535,00	$ -	$ 50.868.480,00
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	M3	0,00	0	37,04	$ 834.271,00	$ -	$ 30.943.153,36
MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO	M2	0,00	0	0,00	$ 95.699,00	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLITELENO CALIBRE 6	M2	0,00	0	753,84	$ 5.838,00	$ -	$ 4.400.917,92
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ACERO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	37.894,23	$ 8.634,00	$ -	$ 327.157.806,40
COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI. (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALTEO EN MADERA, COLOCACION Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO).	M3	0,00	0	70,64	$ 959.900,00	$ -	$ 72.538.336,33
VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	0,00	$ 923.333,00	$ -	$ -
BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 25CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACIÓN).	ML	0,00	0	0,00	$ 43.700,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ACERO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	1.303,40	$ 8.634,00	$ -	$ 11.279.586,33
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0,00	0	89,84	$ 207.241,00	$ -	$ 18.432.814,04
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	3.312,44	$ 17.833,00	$ -	$ 41.282.901,20
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ACERO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.634,00	$ -	$ -
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	0,00	$ 6.746,00	$ -	$ -
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	0,00	0	0,00	$ 42.161,00	$ -	$ -
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	0,00	$ 2.461,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ACERO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.634,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ACERO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.634,00	$ -	$ -
COLUMNETA Y VIGA-CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI. (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALTEO EN MADERA, COLOCACION Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	0,00	$ 896.552,00	$ -	$ -
RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	299,02	$ 67.131,00	$ -	$ 13.828.330,00
RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	23,50	$ 104.294,00	$ -	$ 2.710.497,00
PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	10	2,40	$ 123.139,00	$ -	$ 295.533,60
PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	0	0,00	$ 102.414,00	$ -	$ -
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60X0.60M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	7,00	$ 875.519,00	$ -	$ 6.128.636,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.120.120 (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	6,00	$ 767.000,00	$ -	$ 4.602.000,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.450.45 (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	23,00	$ 659.707,00	$ -	$ 15.156.261,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	UN	0,00	0	1,00	$ 79.628,00	$ -	$ 79.628,00
MURO INTERNO DE ESPESOR 15 CM BLOQUE NO S O SIMILAR	M²	0,00	0	253,15	$ 98.700,00	$ -	$ 25.007.182,19
MURO EXTERNO ESPESOR 20 CM BLOQUE ESTRUCTURAL	M²	0,00	0	227,79	$ 163.713,00	$ -	$ 24.656.454,13
MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M. CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	M²	0,00	0	424,22	$ 417.956,00	$ -	$ 177.257.438,64
SUB TOTAL SEMANA							$ 1.362.895.949,45
					AUI	$ -	$ 404.643.807,29
					TOTAL SEMANA 34	$ -	$ 1.767.539.756,84
						0,00%	38,48%

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% CANTIDAD PROGRAMADA	OBSERVACION
BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 25CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACIÓN).	ML	10,20	4	
VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	3,60	3	
PANTALLAS EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, BOMBEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO).	M3	10,38	3	
COLUMNETA Y VIGA-CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI. (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO).	ML	7,10	2	
TUBERIA PE-AL-PE D=16MM CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NTC 2505	ML	62,00	100	

7. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

ACTA PARCIAL

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	si	9-mar-23	30-nov-25	$ 532.074.761,63	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101038889
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION	si	9-mar-23	30-jun-26	$ 1.064.163.030,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101038889
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	si	9-mar-23	30-jun-28	$ 532.074.761,63	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101038889
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	si	5 AÑOS, 9 MESES Y 0 DIAS		$ 532.074.761,63	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101038889
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	si	9-mar-23	31-oct-26	$ 222.000.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-49-101027330

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL
ACTA NO. 1	8/05/2025		1	1.765.280.997,24	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	4 MESES 5 DIAS	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
ACTA NO 2	19/08/2025							

8. PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANTIDAD	PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE OBRA	1	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
INGENIERO AMBIENTAL - SISO	1	INGENIERO AMBIENTAL - SISO	1
TRABAJADORA SOCIAL	1	TRABAJADORA SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1		
ALMACENISTA	1		
JEFE DE PERSONAL	1		
MAESTRO DE OBRA	1		
OFICIALES	4		
AYUDANTES	10		

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Esta semana no hubo avance en la obra, no se laboro por que las vias siguen cerradas hacia el departamento del chocó continua el cierre vial de las comunidades indigenas, por este motivo no ha llegado materiala la obra, esta semana no hubo avance, se le recomienda al contratista seguir con la elaboracion de bloques en la obra para que una ves se normalice lo de las vias reiniciar con la pega de bloques y las actividades que se puedan llevar a cabo en obra, para que se pueda tener un mejor rendimiento en obra.

OBSERVACIONES

esta semana tampoco se pudo laborar por problemas de orden publico, los indigenas siguen con el toponamiento de las vias Medellin - Quibdó y Pereira - Quibdó durante esta semana sigue el departamento del chocó incomunicado, por este motivo siguen suspendidos los trabajos por esta semana, apenas se estan haciendo los bloques de concreto en sitio.

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

*Despues de iniciar las actividades en obra esta interventoria tiene por prioridad estar pendiente de los EPP como lo son el casco, las botas de seguridahd industrial, las gafas que se utilizan para evitar accidentes en los ojos, guantes y los cuidados que debe manejar el trabajador para su seguridad integral, se le reitera al contratista renovar la dotacion de guantes, gafas y chalecos que se encuentran en mal estado y algunos obreros ya no los tienen.

Elaborado por:

YOMI STHAINTON PEREA AYALA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
NIT.: 9.732.845 - 2

FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPIO O GOBERNACION

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO





CORTADA DE TABILLAS PARA ELABORACION DE BLOQUES





CORTADA DE TABILLAS PARA ELABORACION DE BLOQUES



ARRUMANDO TABILLAS PARA ELABORACION DE BLOQUES



ARRUME DE TABILLAS PARA ELABORACION DE BLOQUES

	INFORME DE INTERVENTORIA **YORK STIVENSON PEREA AYALA** **INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO"**		
MINISTERIO DEL INTERIOR		CANTÓN DE SAN PABLO	YORK STIVENSON PEREA AYALA
Versión: 01			

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	**36**	**MES: MARZO**			**FECHA DE INFORME**		
CONTRATO No	001-I-CM de 2023	**OBJETO:**	INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO"	**DEL**	**10-mar-25**	**AL**	**16-mar-25**
INTERVENTOR:**YORK STIVENSON PEREA AYALA**		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. KATHERINE HINESTROZA**			**DIRECTOR DE OBRA: ARQ YEISON ALBORNOZ RIVAS**		


1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

MANAGRÚ - MUNICIPIO CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 4.160.457.625,00		
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**	$ 1.165.289.591,34		
PLAZO	VEINTE (20) MESES			**FECHA DE TERMINACION:**	viernes, 8 de diciembre de 2023		
PRORROGAS N° 1,2,3,4:	Cuatro (11) meses y seis (6) dias			**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	Mercoles, 30 de julio de 2025		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 5.325.747.616,34			**VALOR DEL ANTICIPO:**	$ 1.664.183.050,00		
CONTRATISTA:	YISSON ALBORNOZ RIVAS			**REPRESENTANTE LEGAL:**	YE ISON ALBORNOZ RIVAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	159	DIAS		**PLAZO RESTANTE:**	166	DIAS	
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,00%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	38,48%	**PROGRAM. SEMANA**	0,87%	**PROGRAM. ACUMULADO**	50,19%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 0,00	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 2.049.396.589,68	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 46.554.492,22	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 2.672.932.207,15

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES DEL CONVENIO

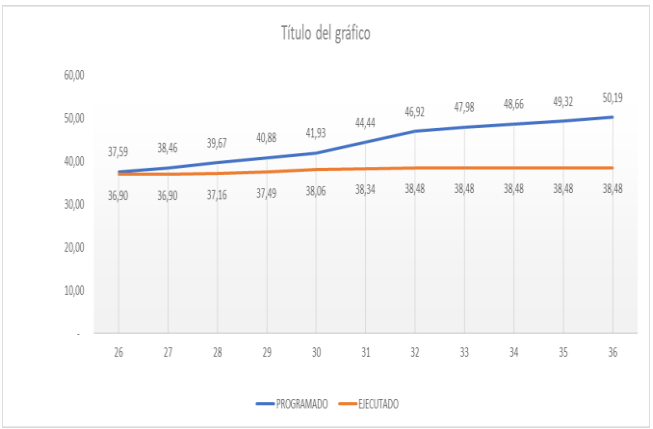

4. RESUMEN DE AVANCE DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO INICIAL	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.				
1	REPLANTEO GENERAL	$ -	$ -	$ 8.746.825,68	$ 8.746.825,68
2	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M) INCLUYE CARGUE)	$ -	$ -	$ 39.854.104,80	$ 39.854.104,80
3	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ 53.056.766,88	$ 53.056.766,88
4	RELLENO EN RECEBO SUBO (SUMINISTRO E INSTALACION EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	$ -	$ -	$ 205.304.420,00	$ 205.304.420,00
5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA	$ -	$ -	$ 156.842.473,09	$ 156.842.473,09
6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE.	$ -	$ -	$ 20.928.052,20	$ 20.928.052,20
7	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ 31.779.356,76	$ 31.779.356,76
8	SUMINISTRO E INSTALACION CEMENTO CICLOPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3000 PSI	$ -	$ -	$ 83.239.921,72	$ 83.239.921,72
9	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE BOMBEO, SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	$ -	$ -	$ 50.868.480,00	$ 50.868.480,00
10	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM-A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ULERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ 327.157.806,40	$ 327.157.806,40
11	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	$ -	$ -	$ 30.943.153,39	$ 30.943.153,39
12	MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLITELENO CALIBRE 6	$ -	$ -	$ 4.400.917,92	$ 4.400.917,92
14	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM-A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ULERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ 11.279.586,33	$ 11.279.586,33
15	COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI. (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	$ -	$ -	$ -	$ -
16	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	$ -	$ -	$ -	$ -
17	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ -	$ -
18	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM-A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ULERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -	$ -
19	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M) INCLUYE CARGUE)	$ -	$ -	$ -	$ -
20	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE.	$ -	$ -	$ -	$ -
21	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ -	$ -
22	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM-A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ULERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -	$ -
26	ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM-A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ULERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -	$ -
	COLUMNETA Y VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI. (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO Y FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	$ -	$ -	$ -	$ -
40	RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ 13.828.336,00	$ 13.828.336,00
41	RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ 2.710.497,00	$ 2.710.497,00
42	PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ 197.000,00	$ 197.000,00
43	PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -
44	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ -	$ 6.128.636,00	$ 6.128.636,00
45	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ -	$ 4.602.000,00	$ 4.602.000,00
46	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.45X0.45M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ -	$ 15.156.261,00	$ 15.156.261,00
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	$ -	$ -	$ 462.879,01	$ 462.879,01
48	MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M. CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	$ -	$ -	$ 205.308.634,08	$ 205.308.634,08
49	MURO INTERNO DE ESPESOR 15 CM BLOQUE NO 5 O SIMILAR	$ -	$ -	$ 21.470.872,00	$ 21.470.872,00
50	MURO EXTERNO ESPESOR 20 CM BLOQUE ESTRUCTURAL	$ -	$ -	$ 32.193.600,96	$ 32.193.600,96
			$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL		$ -	$ 1.208.845.868,42	$ 1.273.582.768,13
	AUI		$ -	$ 433.046.349,24	$ 453.749.032,72
	VALOR TOTAL		$ -	$ 1.640.907.353,36	$ 1.727.251.790,85

AVANCE EJECUTADO	38,48%	
AVANCE PROGRAMADO	50,19%	
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	-11,71%	

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	VR_UNITARIO	VR/PARCIAL EJECUTADO	VR/PARCIAL ACUMULADO
REPLANTEO GENERAL	M2	0,00	0	753,84	$ 11.497,00	$ -	$ 8.746.825,68
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M) INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	753,84	$ 33.870,00	$ -	$ 39.854.104,80
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	19.394,64	$ 2.737,00	$ -	$ 53.056.766,88
RELLENO EN RECEBO SUBO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	0,00	0	1.264,27	$ 159.834,00	$ -	$ 205.304.420,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA	M3/KM	0,00	0	33.366,71	$ 3.146,00	$ -	$ 156.842.473,09
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE.	M3	0,00	0	464,64	$ 42.161,00	$ -	$ 20.928.052,20
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	12.913,16	$ 2.461,00	$ -	$ 31.779.356,76
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIMIENTO CICLOPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,00	0	164,61	$ 461.670,00	$ -	$ 83.239.921,72
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE BOMBEO, SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	M3	0,00	0	51,20	$ 993.535,00	$ -	$ 50.868.480,00
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	M3	0,00	0	37,04	$ 834.271,00	$ -	$ 30.943.153,39
MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO	M2	0,00	0	0,00	$ 65.699,00	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLITELENO CALIBRE 6	M2	0,00	0	753,84	$ 5.838,00	$ -	$ 4.400.917,92
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM-A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ULERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	27.864,23	$ 8.634,00	$ -	$ 327.157.806,40
COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI. (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION Y CURADO. NO INCL. REFUERZO).	M3	0,00	0	70,64	$ 959.900,00	$ -	$ 72.538.336,00
VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	0,00	$ 923.333,00	$ -	$ -
BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 15CM X 20CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUIR EXCAVACIÓN, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACIÓN).	ML	0,00	0	0,00	$ 43.700,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM-A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ULERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	1.303,40	$ 8.634,00	$ -	$ 11.279.586,33
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0,00	0	80,84	$ 207.241,00	$ -	$ 16.432.614,04
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	3.312,44	$ 17.833,00	$ -	$ 41.282.961,20
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM-A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ULERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.634,00	$ -	$ -
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M) INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	0,00	$ 6.746,00	$ -	$ -
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE.	M3	0,00	0	0,00	$ 42.161,00	$ -	$ -
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	0,00	$ 2.461,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMAS ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ULERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.634,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM-A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ULERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.634,00	$ -	$ -
COLUMNETA Y VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI. (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO Y FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	0,00	$ 896.552,00	$ -	$ -
RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	299,02	$ 67.131,00	$ -	$ 13.828.336,00
RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	23,50	$ 104.294,00	$ -	$ 2.710.497,00
PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	10	2,40	$ 123.139,00	$ -	$ 295.533,60
PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	0	0,00	$ 102.414,00	$ -	$ -
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	7,00	$ 875.519,00	$ -	$ 6.128.636,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	6,00	$ 767.010,00	$ -	$ 4.602.060,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.45X0.45M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	23,00	$ 659.707,00	$ -	$ 15.193.894,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	UN	0,00	0	1,00	$ 79.638,00	$ -	$ 79.638,00
MURO INTERNO DE ESPESOR 15 CM BLOQUE NO 5 O SIMILAR	M2	0,00	0	253,15	$ 99.795,00	$ -	$ 25.697.182,15
MURO EXTERNO ESPESOR 20 CM BLOQUE ESTRUCTURAL	M2	0,00	0	227,79	$ 163.713,00	$ -	$ 24.656.454,13
MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M. CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	M2	0,00	0	404,23	$ 417.956,00	$ -	$ 177.207.438,84
SUB TOTAL SEMANA						$ -	$ 1.362.895.949,45
					AUI	$ -	$ 404.643.807,29
					TOTAL SEMANA 36	$ -	$ 1.767.539.756,84
						0,00%	38,48%

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% CANTIDAD PROGRAMADA	OBSERVACION
VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,64	0,3	
CONEXIÓN ACOMETIDA HIDRAULICA PVC PRESIÓN 1" HASTA 5M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	10,00	0,15	
PUNTO HIDRAÚLICO PVC 1/2" RDE 11 HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	10,00	0,15	
RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 3/4" RDE 11 (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1,50	0,15	
RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 1/2" RDE 11 (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	19,35	0,15	
REGISTRO DE BOLA DE 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2,00	0,15	

7. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

ACTA PARCIAL

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	si	9-mar-23	30-nov-25	$ 532.074.761,63	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101038889
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION	si	9-mar-23	30-jun-26	$ 1.064.163.030,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101038889
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	si	9-mar-23	30-jun-26	$ 532.074.761,63	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101038889
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	si	5 AÑOS, 9 MESES Y 0 DIAS		$ 532.074.761,63	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101038889
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	si	9-mar-23	31-oct-26	$ 222.000.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-49-101027333

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL
ACTA NO. 1	8/08/2025		1	1.765.280.997,24	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	4 MESES 5 DIAS	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
ACTA NO 2	19/09/2025							

8. PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANTIDAD	PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE OBRA	1	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
INGENIERO AMBIENTAL - SISO	1	INGENIERO AMBIENTAL - SISO	1
TRABAJADORA SOCIAL	1	TRABAJADORA SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1		
ALMACENISTA	1		
JEFE DE PERSONAL	1		
MAESTRO DE OBRA	1		
OFICIALES	4		
AYUDANTES	10		

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Esta semana no hubo avance fisico en obra, no se pudieron ejecutar las actividades programadas para la misma, las vias siguen teniendo dificultaes ahora por el fuerte invierno en departamento del chocó, por este motivo no ha llegado material a la obra, se trabajo en la elaboracion de bloques en concreto de e= 15 y 20 cm, ya teniendo una buena cantidad de bloqueshechos en obra para la proxima semana se le recomienda al contrista reiniciar con la pega de los mismos y abrir otros frentes de trabajo.

OBSERVACIONES

esta semana tampoco se pudo laborar por el fuerte invierno en la zona que ha tenido las vias cerradas con trafico restringido, por este motivo siguen los trabajos fisicos en obra lentos esta semana, se siguen elaborando los bloques de concreto en sitio.

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

*Despues de iniciar las actividades en obra esta interventoria tiene por prioridad estar pendiente de los EPP como lo son el casco, las botas de seguridahd industrial, las gafas que se utilizan para evitar accidentes en los ojos, guantes y los cuidados que debe manejar el trabajador para su seguridad integral, se le reitera al contratista renovar la dotacion de guantes, gafas y chalecos que se encuentran en mal estado y algunos obreros ya no los tienen.

Elaborado por:

YOMI LEVANTON PEREA AYALA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
NIT.: 9.732.845 - 2

FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPIO O GOBERNACION

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO




CERNIDO MATERIAL DE PLAYA PARA LA ELABORACION DE LOS BLOQUES




MOLDES PARA LA ELABORACION DE BLOQUES




NUEVA BLOQUERA, ELABORANDO LOS BLOQUES




BLOQUES DE CONCRERTO DE e = 20Cm

	INFORME DE INTERVENTORIA **YORK STIVENSON PEREA AYALA** **INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO"**		
MINISTERIO DEL INTERIOR		CANTÓN DE SAN PABLO	YORK STIVENSON PEREA AYALA
Versión: 01			

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	37	**MES: MARZO**			**FECHA DE INFORME**		
CONTRATO No	001-I-CM de 2023	**OBJETO:**	INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO"	**DEL**	**17-mar-25**	**AL**	**23-mar-25**

INTERVENTOR:**YORK STIVENSON PEREA AYALA**	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. KATHERINE HINESTROZA**	**DIRECTOR DE OBRA: ARQ YEISON ALBORNOZ RIVAS**

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

MANAGRÚ - MUNICIPIO CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 4.160.457.625,00		
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**	$ 1.165.289.591,34		
PLAZO	VEINTE (20) MESES			**FECHA DE TERMINACION:**	viernes, 8 de diciembre de 2023		
PRORROGAS N° 1,2,3,4:	Cuatro (11) meses y seis (6) dias			**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	Mercoles, 30 de julio de 2025		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 5.325.747.616,34			**VALOR DEL ANTICIPO:**	$ 1.664.183.050,00		
CONTRATISTA:	YISSON ALBORNOZ RIVAS			**REPRESENTANTE LEGAL:**	YE ISON ALBORNOZ RIVAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	191 DIAS			**PLAZO RESTANTE:**	166 DIAS		
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,03%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	36,52%	**PROGRAM. SEMANA**	0,23%	**PROGRAM. ACUMULADO**	50,42%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 1.836.773,07	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 2.051.233.372,74	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 12.457.746,13	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 2.685.409.953,28

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES DEL CONVENIO



4. RESUMEN DE AVANCE DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO INICIAL SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.			
1	REPLANTEO GENERAL	$ -	$ 8.746.825,68	$ 8.746.825,68
2	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	$ -	$ 39.854.104,80	$ 39.854.104,80
3	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ 53.056.709,88	$ 53.056.709,88
4	RELLENO EN RECEBO B200 (SUMINISTRO E INSTALACION EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	$ -	$ 205.304.425,00	$ 205.304.425,00
5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA	$ -	$ 166.842.473,09	$ 166.842.473,09
6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	$ -	$ 20.930.652,00	$ 20.930.652,00
7	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ 31.779.356,76	$ 31.779.356,76
8	SUMINISTRO E INSTALACION CEMENTO CICLOPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3000 PSI	$ -	$ 83.239.921,72	$ 83.239.921,72
9	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28MPA) GRAVA COMÚN (INCLUYE BOMBEO, SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	$ -	$ 50.868.480,00	$ 50.868.480,00
10	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM-A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ACERO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ 327.157.806,40	$ 327.157.806,40
11	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	$ -	$ 33.943.153,36	$ 33.943.153,36
12	MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO	$ -	$ -	$ -
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO CALIBRE 6	$ -	$ 4.400.917,92	$ 4.400.917,92
14	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM-A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ACERO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ 11.279.586,33	$ 11.279.586,33
15	COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI. (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	$ -	$ -	$ -
16	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	$ -	$ -	$ -
17	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ -
18	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM-A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ACERO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -
19	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	$ -	$ -	$ -
20	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	$ -	$ -	$ -
21	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ -
22	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM-A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ACERO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -
26	ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM-A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ACERO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -
	COLUMNETA Y VIGA-CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI. (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALTEO EN MADERA, COLOCACION Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	$ -	$ -	$ -
40	RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ 13.828.330,00	$ 13.828.330,00
41	RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ 2.710.497,00	$ 2.710.497,00
42	PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ 197.000,00	$ 197.000,00
43	PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -
44	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6X0.6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ 6.128.636,00	$ 6.128.636,00
45	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6X0.8M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ 4.602.000,00	$ 4.602.000,00
46	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6X0.8M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ 15.156.261,00	$ 15.156.261,00
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	$ -	$ 462.879,01	$ 462.879,01
48	MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M. CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS	$ -	$ 205.308.634,08	$ 205.308.634,08
49	MURO INTERNO DE ESPESOR 15 CM BLOQUE NO S O SIMILAR	$ 649.830,00	$ 21.478.872,00	$ 22.128.702,00
50	MURO EXTERNO ESPESOR 24 CM BLOQUE ESTRUCTURAL	$ 766.469,00	$ 22.190.882,96	$ 22.957.335,00
		$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL	$ 1.416.279,04	$ 1.359.841.668,42	$ 1.374.969.837,77
	AUI	$ 420.493,63	$ 433.066.349,24	$ 454.253.653,18
	VALOR TOTAL	$ 1.836.772,67	$ 1.645.907.353,36	$ 1.729.172.490,93

AVANCE EJECUTADO	38,52%
AVANCE PROGRAMADO	50,42%
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	-11,91%

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	VR_UNITARIO	VR/PARCIAL EJECUTADO	VR/PARCIAL ACUMULADO
REPLANTEO GENERAL	M2	0,00	0	753,84	$ 11.607,00	$ -	$ 8.746.825,68
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	753,84	$ 52.870,00	$ -	$ 39.854.104,80
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	16.594,84	$ 3.197,00	$ -	$ 53.056.709,88
RELLENO EN RECEBO B200 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	0,00	0	1.264,57	$ 159.834,00	$ -	$ 205.304.425,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA	M3/KM	0,00	0	33.366,71	$ 3.196,00	$ -	$ 166.842.473,09
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	0,00	0	464,64	$ 42.161,00	$ -	$ 20.930.652,00
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	12.913,10	$ 2.461,00	$ -	$ 31.779.356,76
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIMIENTO CICLOPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,00	0	1.640,61	$ 461.670,00	$ -	$ 83.239.921,72
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28MPA) GRAVA COMÚN (INCLUYE BOMBEO, SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	M3	0,00	0	311,20	$ 993.535,00	$ -	$ 50.868.480,00
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	M3	0,00	0	37,54	$ 904.271,00	$ -	$ 33.943.153,36
MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO	M2	0,00	0	0,00	$ 95.699,00	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO CALIBRE 6	M2	0,00	0	753,84	$ 5.838,00	$ -	$ 4.400.917,92
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM-A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ACERO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	27.864,23	$ 8.634,00	$ -	$ 327.157.806,40
COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI. (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALTEO EN MADERA, COLOCACION Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	70,64	$ 959.900,00	$ -	$ 72.538.336,00
VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	0,00	$ 923.333,00	$ -	$ -
BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 20CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACIÓN).	ML	0,00	0	0,00	$ 43.730,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ACERO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	1.303,40	$ 8.634,00	$ -	$ 11.279.586,33
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0,00	0	89,84	$ 207.241,00	$ -	$ 18.432.814,04
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	3.312,44	$ 17.833,00	$ -	$ 41.282.961,20
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ACERO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.634,00	$ -	$ -
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	0,00	$ 6.746,00	$ -	$ -
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	0,00	0	0,00	$ 42.161,00	$ -	$ -
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	0,00	$ 2.461,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM-A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ACERO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.634,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM-A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REF.ACERO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.634,00	$ -	$ -
COLUMNETA Y VIGA-CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI. (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALTEO EN MADERA, COLOCACION Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	0,00	$ 896.552,00	$ -	$ -
RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	299,02	$ 67.131,00	$ -	$ 13.828.330,00
RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	23,50	$ 104.294,00	$ -	$ 2.710.497,00
PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	10	2,40	$ 123.139,00	$ -	$ 295.533,60
PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	0	0,00	$ 102.414,00	$ -	$ -
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6X0.6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	7,00	$ 875.519,00	$ -	$ 6.128.636,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6X0.8M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	6,00	$ 767.010,00	$ -	$ 4.602.060,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6X0.8M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	23,00	$ 659.707,00	$ -	$ 15.193.894,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	UN	0,00	0	1,00	$ 79.638,00	$ -	$ 79.638,00
MURO INTERNO DE ESPESOR 15 CM BLOQUE NO S O SIMILAR	M²	5,34	0	258,49	$ 99.795,00	$ 527.386,70	$ 25.532.766,00
MURO EXTERNO ESPESOR 24 CM BLOQUE ESTRUCTURAL	M²	5,34	0	223,13	$ 165.715,00	$ 884.523,20	$ 34.646.977,40
MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M. CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	M²	0,00	0	424,22	$ 417.956,00	$ -	$ 177.287.656,64
SUB TOTAL SEMANA							$ 1.363.387.389,46
					AUI		$ 404.565.057,03
					TOTAL SEMANA 37	$ 1.836.772,67	$ 1.768.956.036,49
						0,03%	38,52%

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% CANTIDAD PROGRAMADA	OBSERVACION
BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 20CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACIÓN).	ML	10,20	4	
VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	3,60	3	
PANTALLAS EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, BOMBEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO).	M3	10,38	2	
COLUMNETA Y VIGA-CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI. (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO).	ML	7,10	2	
TUBERIA PE-AL-PE D=16MM CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NTC 2505	ML	62,00	100	

7. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

ACTA PARCIAL

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	si	9-mar-23	30-nov-25	$ 532.074.761,63	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101038889
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION	si	9-mar-23	30-jun-26	$ 1.064.163.530,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101038889
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	si	9-mar-23	30-jun-26	$ 532.074.761,63	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101038889
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	si	5 AÑOS, 6 MESES Y 0 DIAS		$ 532.074.761,63	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101038889
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	si	9-mar-23	31-oct-26	$ 222.000.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-45-101027333

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL
ACTA NO. 1	8/08/2025		1	1.765.280.997,24	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	4 MESES 5 DIAS	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
ACTA NO 2	19/09/2025							

8. PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANTIDAD	PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE OBRA	1	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
INGENIERO AMBIENTAL - SISO	1	INGENIERO AMBIENTAL - SISO	1
TRABAJADORA SOCIAL	1	TRABAJADORA SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1		
ALMACENISTA	1		
JEFE DE PERSONAL	1		
MAESTRO DE OBRA	1		
OFICIALES	4		
AYUDANTES	10		

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Esta semana se reinicio con la pega de bloque de 15 y 20 cm, se espera la llegada de material, se continuo con la eleboracion de bloques de 15 y 20 cm, se le reitera al contratista una ves con material en obra tener varios frentes de trabajo para mejorar el nrendimiento del mismo.

OBSERVACIONES

Esta semana pese al fuerte invierno en la zona se reinicio con la pega de bloques y se siguio con la elaboracion de los mismos, se le recomienda al contratista retomar la implemantacion del plan de contingencia, para poder mejorar el rendimiento y poder complir con la programacion en el tiempo estipulado.

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

*Despues de iniciar las actividades en obra esta interventoria tiene por prioridad estar pendiente de los EPP como lo son el casco, las botas de seguridahd industrial, las gafas que se utilizan para evitar accidentes en los ojos, guantes y los cuidados que debe manejar el trabajador para su seguridad integral, se le reitera al contratista renovar la dotacion de guantes, gafas y chalecos que se encuentran en mal estado y algunos obreros ya no los tienen.

Elaborado por:

TOMAS DAMASCO PEREA AYALA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
NIT.: 9.732.845 - 2

FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPIO O GOBERNACION

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO




ELABORACION DE LOS BLOQUES




ALMACENAMIENTO DE BLOQUES




LLEGADA DE MATERIAL DE PEGA Y PEGA DE BLOQUES




PEGA BLOQUES DE CONCRERTO DE e = 20Cm

	INFORME DE INTERVENTORIA **YORK STIVENSON PEREA AYALA** **INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO"**		
REGISTRO DEL INTERVENTOR		CANTON DE SAN PABLO	YORK STIVENSON PEREA AYALA
Versión: 01			

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	**38**	**MES: MARZO**			**FECHA DE INFORME**		
CONTRATO No	001-I-Citrix-2023	**OBJETO**	INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO"		**DEL** 24-mar-25	**AL**	30-mar-25
INTERVENTOR: **YORK STIVENSON PEREA AYALA**		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA: ING. KATHERINE HINESTROZA**			**DIRECTOR DE OBRA: ARQ YEISON ALBORNOZ RIVAS**		


1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

MINAGRO - MUNICIPIO CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 4.160.457.625,00		
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**	$ 1.160.269.991,34		
PLAZO	VEINTE (20) MESES			**FECHA DE TERMINACION:**	viernes, 8 de diciembre de 2023		
PRORROGAS N° 1,2,3,4:	Cuatro (11) meses y seis (6) días			**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	Miercoles, 30 de julio de 2025		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 5.325.747.616,34			**VALOR DEL ANTICIPO:**	$ 1.664.183.050,00		
CONTRATISTA:	YEISON ALBORNOZ RIVAS			**REPRESENTANTE LEGAL:**	YEISON ALBORNOZ RIVAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	703 DÍAS			**PLAZO RESTANTE:**	166 DIAS		
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,58%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	39,16%	**PROGRAM. SEMANA**	4,12%	**PROGRAM. ACUMULADO**	54,54%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 31.100.357,27	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 2.082.338.730,02	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 219.417.265,64	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 2.904.827.218,73

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES DEL CONVENIO

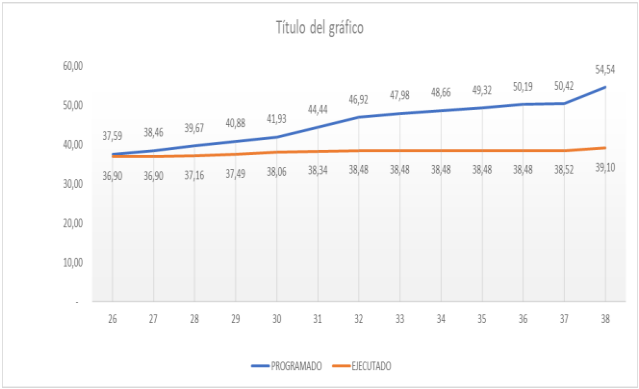

4. RESUMEN DE AVANCE DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO INICIAL SUMMA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CHOCO.			
1	REPLANTEO GENERAL	$ -	$ 8.749.609,68	$ 8.749.609,68
2	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN(E=0.20M) INCLUYE CARGUE)	$ -	$ 24.604.164,80	$ 24.604.164,80
3	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ 53.056.766,88	$ 53.056.766,88
4	RELLENO EN RECEBO S200 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTANDEO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	$ -	$ 205.394.425,00	$ 205.394.425,00
5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA	$ -	$ 163.842.472,29	$ 163.842.472,29
6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN(INCLUYE CARGUE	$ -	$ 20.530.852,26	$ 20.530.852,26
7	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ 31.779.399,76	$ 31.779.399,76
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CEMENTO CEOLOPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3000 PSI	$ -	$ 60.229.421,75	$ 60.229.421,75
9	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (20MPA), GRAVA COMUN (INCLUYE BOMBEO, SUMIN., FORMALETEO ENMADERA, COLOCACION Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	$ -	$ 60.868.480,00	$ 60.868.480,00
10	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PORMI. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ 327.157.806,42	$ 327.157.806,42
11	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	$ -	$ 30.963.133,04	$ 30.963.133,04
12	MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO	$ -	$ -	$ -
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO CALIBRE 6	$ -	$ 4.400.917,92	$ 4.400.917,92
14	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PORMI. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ 11.279.580,33	$ 11.279.580,33
15	COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI, (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	$ -	$ -	$ -
16	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	$ -	$ -	$ -
17	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ -
18	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PORMI. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -
19	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.20M) INCLUYE CARGUE)	$ -	$ -	$ -
20	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN(INCLUYE CARGUE	$ -	$ -	$ -
21	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ -
22	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PORMI. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -
23	VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN CON FIBRAS POLISÉRICAS (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	$ -	$ -	$ -
24	PANTALLAS EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, BOMBEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	$ -	$ 88,84	$ 88,84
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA TIPO GATO. (INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	$ -	$ 2.312,64	$ 2.312,64
26	ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PORMI. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ 1.080.983,01	$ -	$ 1.080.983,01
27	COLUMNETA Y VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	$ 5.497.119,97	$ -	$ 5.497.119,97
40	RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ 13.609.026,60	$ 13.609.026,60
41	RED SANITARIA PVC 8" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ 2.710.467,00	$ 2.710.467,00
42	PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ 197.009,00	$ 197.009,00
43	PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -
44	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60X0.60 (H=1M INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ 6.128.629,00	$ 6.128.629,00
45	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80X0.80 (H=1M INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ 4.602.560,00	$ 4.602.560,00
46	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.40 (H=1M INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ 15.196.261,00	$ 15.196.261,00
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	$ -	$ 462.879,01	$ 462.879,01
48	MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	$ -	$ 200.308.834,68	$ 200.308.834,68
49	MURO INTERNO DE ESPESOR 15 CM BLOQUE NO 5 O SIMILAR	$ 8.209.792,84	$ 32.120.703,59	$ 40.330.496,43
50	MURO EXTERNO ESPESOR 20 CM BLOQUE ESTRUCTURAL	$ 9.157.386,13	$ 32.907.333,55	$ 42.164.737,68
			$ -	
	SUBTOTAL	$ 22.964.391,43	$ 1.359.641.960,62	$ 1.356.903.439,22
	5,0 %	$ 1.125.965,57	$ 631.566.345,24	$ 662.798.293,83
	VALOR TOTAL	$ 31.105.357,27	$ 1.645.997.265,86	$ 1.765.702.731,05

AVANCE EJECUTADO	39,10%
AVANCE PROGRAMADO	54,54%
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	-15,44%

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	VR_UNITARIO	VR/PARCIAL EJECUTADO	VR/PARCIAL ACUMULADO
REPLANTEO GENERAL	M2	0,00	0	733,84	$ 11.407,08	$ -	$ 8.749.609,68
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	733,84	$ 33.519,00	$ -	$ 24.604.164,80
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	19.599,84	$ 2.707,00	$ -	$ 53.056.766,88
RELLENO EN RECEBO S200 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	0,00	0	33.398,71	$ 159.834,00	$ -	$ 5.337.615.437,94
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA	M3/KM	0,00	0	496,60	$ 3.799,00	$ -	$ 1.588.815,34
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN(INCLUYE CARGUE	M3	0,00	0	12.913,16	$ 42.161,00	$ -	$ 544.631.738,76
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	184,91	$ 2.491,00	$ -	$ 456.325,31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CEMENTO CICLOPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,00	0	51,20	$ 461.670,00	$ -	$ 23.637.760,00
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (20MPA), GRAVA COMUN (INCLUYE BOMBEO, SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	M3	0,00	0	27,04	$ 963.533,00	$ -	$ 27.296.608,00
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	M3	0,00	0	0,00	$ 924.271,00	$ -	$ -
MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO	M2	0,00	0	733,84	$ 95.699,00	$ -	$ 70.136.473,64
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO CALIBRE 6	M2	0,00	0	0,00	$ 5.638,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PORMI. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	70,64	$ 8.838,00	$ -	$ 634.386,56
COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI, (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	0,00	$ 958.893,00	$ -	$ -
VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	0,00	$ 905.533,00	$ -	$ -
BORDILLO EN CONCRETO CIBVIAL COMUN 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 25CM. REFUERZO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACION).	ML	0,00	0	1.303,69	$ 43.739,00	$ -	$ 59.996.896,56
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PORMI. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.838,00	$ -	$ -
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0,00	0	2.312,64	$ 207.241,00	$ -	$ 479.232.378,24
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	0,00	$ 17.833,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PORMI. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.838,00	$ -	$ -
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	0,00	$ 6.706,00	$ -	$ -
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN(INCLUYE CARGUE	M3	0,00	0	0,00	$ 42.161,00	$ -	$ -
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	0,00	$ 2.491,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PORMI. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	134,01	0	134,01	$ 8.838,00	$ 1.069.195,74	$ 1.069.195,74
COLUMNETA Y VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	6,13	0	6,13	$ 896.532,00	$ 5.495.537,16	$ 5.495.537,16
RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	24,00	$ 67.123,00	$ -	$ 1.771.385,00
RED SANITARIA PVC 8" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	2,40	$ 109.254,00	$ -	$ 255.165,60
PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	10	0,00	$ 123.139,00	$ -	$ -
PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	0	7,00	$ 153.414,00	$ -	$ 716.666,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60X0.60 (H=1M INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	5,00	$ 872.516,00	$ -	$ 5.233.188,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80X0.80 (H=1M INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	2,00	$ 767.810,00	$ -	$ 17.648.782,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.40 (H=1M INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	1,00	$ 666.767,00	$ -	$ 666.767,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	UN	0,00	0	0,00	$ 79.638,00	$ -	$ -
MURO INTERNO DE ESPESOR 15 CM BLOQUE NO 5 O SIMILAR	M²	93,11	0	341,60	$ 96.765,00	$ 9.010.109,33	$ 33.748.818,31
MURO EXTERNO ESPESOR 20 CM BLOQUE ESTRUCTURAL	M²	87,09	0	338,13	$ 103.713,00	$ 9.157.386,11	$ 33.840.372,31
MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	M²	0,00	0	434,22	$ 417.936,00	$ -	$ 177.287.838,84
SUB TOTAL SEMANA							$ 11.198.111.343,00
					AIU	$ -	$ 3.324.719.317,12
					TOTAL	$ 31.105.357,27	$ 14.523.830.660,11
					SEMANA 38	0,39%	39,19%

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% CANTIDAD PROGRAMADA	OBSERVACION
BORDILLO EN CONCRETO CIBVIAL COMUN 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 25CM. REFUERZO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACION).	ML	10,00	4	
VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	2,65	3	
PANTALLAS EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, BOMBEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	M3	10,00	3	
COLUMNETA Y VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	ML	7,10	3	
TUBERIA PE-AL-PE D=16MM CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NTC 2505	ML	62,00	100	

7. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

ACTA PARCIAL

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	si	8-mar-23	30-nov-25	$ 532.374.791,63	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-46-101208809
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION	si	8-mar-23	30-jul-25	$ 1.684.163.550,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-46-101208809
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	si	8-mar-23	30-jul-28	$ 532.374.791,63	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-46-101208809
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	si	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 532.374.791,63	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-46-101208809
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	si	8-mar-23	31-oct-23	$ 232.000.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-46-101077232

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL
ACTA NO. 1	8/06/2023		1	1.765.289.991,24	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	4 MESES 0 DIAS	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
ACTA NO 2	19/09/2023							

8. PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANTIDAD	PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
RESIDENTE DE OBRA	1	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
INGENIERO AMBIENTAL - SISO	1	INGENIERO AMBIENTAL - SISO	1
TRABAJADOR SOCIAL	1	TRABAJADORA SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1		
ALMACENISTA	1		
JEFE DE PERSONAL	1		
MAESTRO DE OBRA	1		
OFICIALES	8		
AYUDANTES	16		

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Esta semana se continuo con la pega de bloque de 15 y 20 cm y se continuo con la elaboracion de bloques de 15 y 20 cm, se le reitera al contratista una ves con material en obra tener varios frentes de trabajo para mejorar el rendimiento del mismo.

OBSERVACIONES

Esta semana pese al fuerte invierno en la zona se continuo con la pega de bloques y se siguió con la elaboracion de los mismos, se le recomienda al contratista comenzar con la implemantacion del plan de contingencia, para poder mejorar el rendimiento y poder cumplir con la programacion en el tiempo estipulado.

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Después de iniciar las actividades en obra esta interventoria tiene por prioridad estar pendiente de los EPP como lo son el casco, las botas de seguridahd industrial, las gafas que se utilizan para evitar accidentes en los ojos, guantes y los cuidados que debe manejar el trabajador para su seguridad integral, se le reitera al contratista renovar la dotacion de guantes, gafas y chalecos que se encuentran en mal estado y algunos obreros ya no los tienen.

Elaborado por:

YONIC ESMINSON FEREA AYALA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
NIT.: 9.732.848 - 2

SUPERVISOR MUNICIPIO O GOBERNACION

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SUMINISTRO MATERIAL DE PLAYA PARA LA ELABORACION DE LOS BLOQUES



PEGA DE BLOQUES DE CONCRETO



ELABORACION Y ARRUME DE BLOQUES



ACERO DE REFUERZO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Y FUNDIDA DE COLUMNETAS
