INFORME BIODIGESTORES

CONTRATO 807-2019

OBJETO: contratar el suministro e instalación de 7 biodigestores de flujo continuo, en material de geomembrana para el tratamiento de las aguas residuales provenientes de actividades porcicolas en predios ubicados en el cañón del combeima del municipio de Ibagué; departamento del Tolima y que son beneficiarios del proyecto de picc ii de cortolima.

El presente informe corresponde a la construcción e instalación de 3 biodigestores de los 7 contratados

PERIDODO LABORADO: DEL 13 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO Y DEL 3 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO

SITIO 1

- **VEREDA LA MARÍA COMBEIMA – USUARIO OLGA MARLENY RESTREPO.**

















Sitio 2

- **LA MARÍA, MIRADOR PIEDRA GRANDE - USUARIO PABLO RONCANCIO**














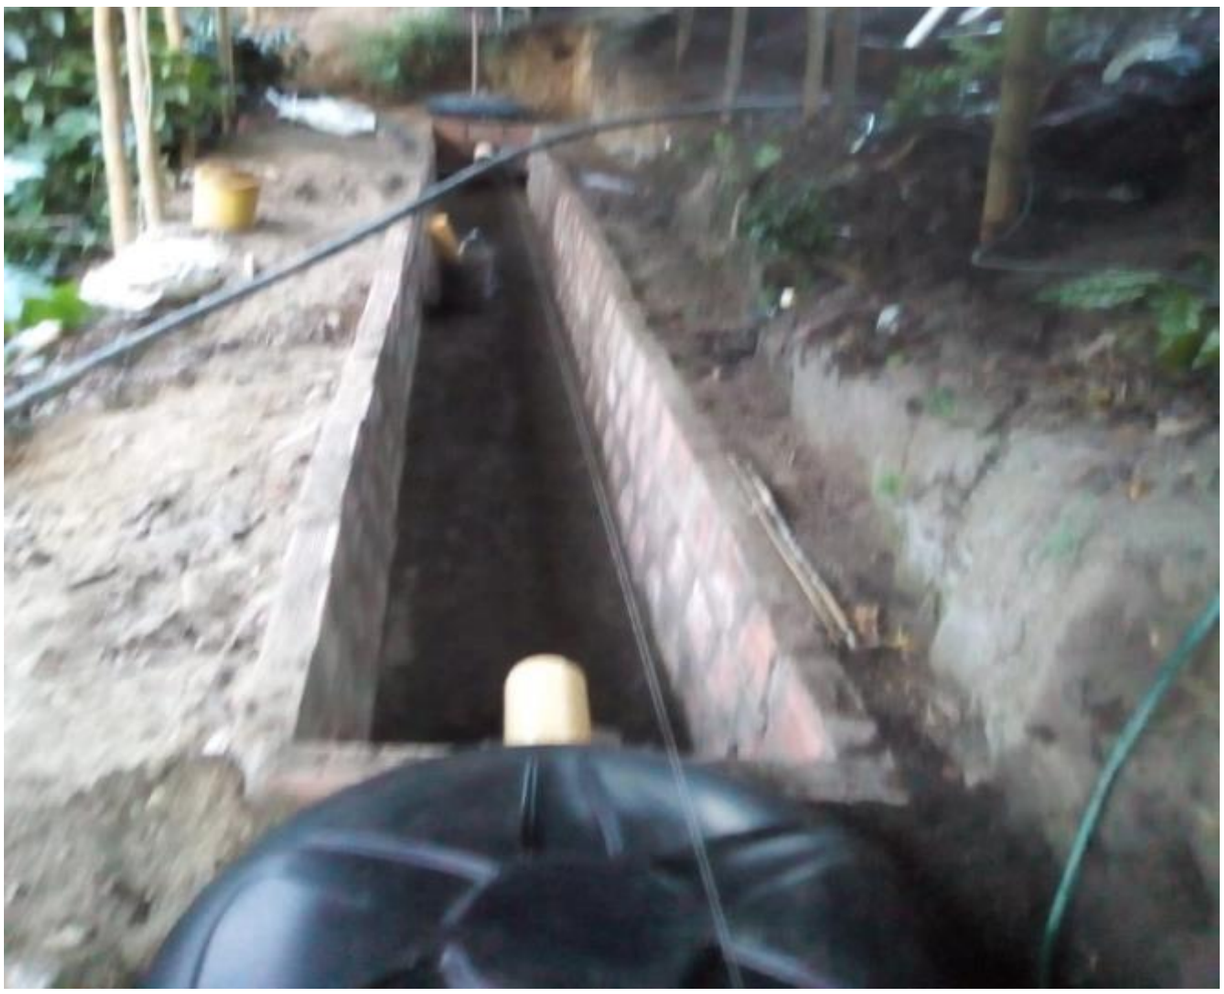

SITIO 3

- **Vereda el secreto - usuario Diana Magally Padilla**










abba


abba

SOLINTER

SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S

NIT. 900410106-6





FABIAN RODRIGO LONGAS M
Representante Legal

SOLINTER
Nit. 900.410.106-6 - Régimen Común

SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S.
Cra 7 N° 3-29 Neiva - Huila
Tel: (8) 2471878 Cel: 3505461645
E-mail: solintersas@gmail.com

FECHA DE EMISION
17 de julio de 2020

FACTURA DE VENTA No. 487

SEÑOR CORTOLIMA — **CEDULA o NIT:** 890704536-7

DIRECION CRA 5 Av FERROCARRIL CALLE 44 — **TELEFONO** 2654551

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762010664431 HABILITADA DE 228 AL 1000, 09/10/2018 - 08/10/2020

CANTIDAD	DETALLE	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
3	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES EN GEOMEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN GRANJAS PORCICOLAS BENEFICIARIAS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA CORPORACION CON LOS MUNICIPIOS DEL TOLIMA	3.241.296,40	9.723.889,20
	CONTRATO No 807 DE 2019 ACTIVIDADES COMPRENDIDAS ENTRE EL13 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO Y DEL 3 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO		0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0

SUB TOTAL	$	9.723.889
IVA 19%	$	1.847.539
TOTAL	**$**	**11.571.428**

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA COMPRADOR

SOLINTER
SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S
NIT. 900410106-6

INFORME FINANCIERO

CONTRATO: 807-2019

OBJETO: contratar el suministro e instalación de 7 biodigestores de flujo continuo, en material de geomembrana para el tratamiento de las aguas residuales provenientes de actividades porcicolas en predios ubicados en el cañón del Combeima del municipio de Ibagué; departamento del Tolima y que son beneficiarios del proyecto de picc ii de cortolima.

VALOR DEL CONTRATO	26.999.999	
VALOR DE LA PRESENTE FACTURA		$11.571.428
SALDO		15.428.571

Cordialmente.

FABIAN RODRIGO LONGAS MENDEZ
Representante legal
11.222.907 de Girardot-Cundinamarca

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURIDICA

Yo, **FABIAN RODRIGO LONGAS MENDEZ**, identificado con cedula **N°11.222.907** de Girardot en mi condición de Representante Legal de **SOLINTER S.A.S** identificada con Nit 900410106-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **IBAGUE - TOLIMA** certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario , por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Neiva, a los 17 días del mes de Julio del 2020

FABIAN RODRIGO LONGAS MENDEZ
Representante Legal
CC 11.22.907 de Girardot

ACTA PARCIAL

Nro: 1

Fecha Acta: jueves, 6 de agosto de 2020

Tipo Compromiso:	**CONTRATO / 807 / martes, 10 de diciembre de 2019**				
Valor Comprom.	**Inicial:**	**26,999,000.00**	**Modific:**	**0.00**	**Final** **26,999,000.00**
Tiempo Comp (dias)	**Inicial:**	**120**	**Modific:**	**0**	**Final** **120**
Clase Compromiso:	**SUMINISTRO / SERVICIOS**				
Fecha :	**Inicial:**	**13/02/2020**	**Terminacion:**		**20/08/2020**
Objeto Compromiso	**CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 BIODIGESTORES DE FLUJO CONTINUO, EN MATERIAL DE GEOMEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PORCÍCOLAS EN PREDIOS UBICADOS EN EL CAÑÓN DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ;**				
Contratista/Intervent:	**SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONA**	**PINEDA RAMOS JAVIER OSWALDO**			
Porcentaje Ejecuc.	**Fisico:**	**42.86**	**Financiero:**	**42.86**	**Dias:** **93.05**
Trazabilidad	**4.04.02.01-2019-FU:SA-RE:RP**				

Observ. / Descrip

ACTA PARCIAL No 1 Contrato No 807 de 2019 Soluciones Integrales Internacionales - SOLINTER S.A.S.

OBJETO: "Contratar el Suministro e Instalación de 7 Biodigestores de Flujo Continuo, en material de geomembrana para el tratamiento de las aguas residuales provenientes de actividades porcicolas en predios ubicados en el cañón del Combeima del municipio de Ibagué.

Presentan factura No 487 de fecha 17/07/2020

NOTA: Es de aclarar que la situación sanitaria por el "COVID 19" ha generado inconvenientes para el cumplimiento del Objeto contractual, por lo que se tuvo que suspender en tres ocasiones la ejecución del contrato "Actas de suspensión que están en el programa de interventorías de CORTOLIMA".

Como resultado de las visitas de seguimiento y Supervisión realizadas por funcionarios de CORTOLIMA - SDA - PICC II, en las diferentes veredas y predios "beneficiados del Proyecto PICC II", del cañón del Combeima, se pudo evidenciar el avance de actividades propias del Objeto del contrato de suministro e instalación de 7 Biodigestores de flujo continuo.

Predios Objeto de la presente acta parcial:

PREDIO No 1. LA SECRETA. PROPIETARIA DIANA MAGALI PADILLA. (N

ACTA PARCIAL

Nro: 1

Fecha Acta: jueves, 6 de agosto de 2020

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006

Tipo Compromiso:	CONTRATO / 807 / martes, 10 de diciembre de 2019				
Valor Comprom.	Inicial:	26,999,000.00	Modific:	0.00	Final 26,999,000.00
Tiempo Comp (dias)	Inicial:	120	Modific:	0	Final 120
Clase Compromiso:	SUMINISTRO / SERVICIOS				
Fecha :	Inicial:	13/02/2020	Terminacion:		20/08/2020
Objeto Compromiso	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 BIODIGESTORES DE FLUJO CONTINUO, EN MATERIAL DE GEOMEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PORCÍCOLAS EN PREDIOS UBICADOS EN EL CAÑÓN DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ;				
Contratista/Intervent:	SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONA		PINEDA RAMOS JAVIER OSWALDO		
Porcentaje Ejecuc.	Fisico:	42.86	Financiero:	42.86	Dias: 93.05
Trazabilidad	4.04.02.01-2019-FU:SA-RE:RP				

PREDIO No 1, LA SECRETA, PROPIETARIA DIANA MAGALI PADILLA, (N 4°30´36" W 75? 75°18´08"), VEREDA EL SECRETO
En visita realizada el día miércoles 17de junio del 2020 entre el supervisor del PICC II de CORTOLIMA Ing. Javier Pineda Ramos y el doctor Mauricio Jaramillo experto en Biodigestores y Profesional de PML, se pudo evidenciar que el sistema en este predio ya está instalado en su totalidad y cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato 807 de 2019, se dejaron unas recomendaciones a los usuarios relacionadas con el manejo de drenes de aguas lluvias que pueden afectar el sistema si no se corrigen. Pendiente visita para verificar estos manejos.

En desarrollo de la visita se revisaron todas las partes que componen el Sistema, y se verifico la correcta instalación de cada una de estas, pese a que el contratista cumplió con la correcta instalación, no se recibe aun por la supervisaría este sistema hasta que inicie la producción de gas y se verifique el funcionamiento de la estufa. Hay que aclara que el sistema ya está siendo alimentado por los vertimientos de las cocheras y se encuentra en proceso de estabilización para iniciar el proceso de producción de gas y generación de bioabono, igualmente se constató que el contratista ya realizo la actividad de capacitación al usuario del funcionamiento y manejo del sistema.

PREDIO No 2. El Mirador, JOSE PABLO RONCANCIO (N 4°30´02" W 75°17´46"), vereda María Piedra Grande.
En visita realizada el día miércoles 17de junio del 2020 entre el supervisor

ACTA PARCIAL

Nro: 1

Fecha Acta: jueves, 6 de agosto de 2020

Tipo Compromiso:	CONTRATO / 807 / martes, 10 de diciembre de 2019				
Valor Comprom.	Inicial:	26,999,000.00	Modific:	0.00	Final 26,999,000.00
Tiempo Comp (dias)	Inicial:	120	Modific:	0	Final 120
Clase Compromiso:	SUMINISTRO / SERVICIOS				
Fecha :	Inicial:	13/02/2020	Terminacion:		20/08/2020
Objeto Compromiso	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 BIODIGESTORES DE FLUJO CONTINUO, EN MATERIAL DE GEOMEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PORCÍCOLAS EN PREDIOS UBICADOS EN EL CAÑÓN DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ;				
Contratista/Intervent:	SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONA	PINEDA RAMOS JAVIER OSWALDO			
Porcentaje Ejecuc.	Fisico: 42.86	Financiero: 42.86	Dias: 93.05		
Trazabilidad	4.04.02.01-2019-FU:SA-RE:RP				

del PICC II de CORTOLIMA Ing. Javier Pineda Ramos y el doctor Mauricio Jaramillo experto en Biodigestores y Profesional de PML, se pudo evidenciar que el sistema en este predio ya está instalado en su totalidad y cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato 807 de 2019, se dejaron unas recomendaciones al usuario relacionadas con el manejo de la evacuación de las aguas lluvias que provienen del techo de la Cochera y que tienen dirección hacia el sitio donde está instalado el Sistema Biodigestor y si no se corrige que pueden afectar el sistema.

En desarrollo de la visita se revisaron todas las partes que componen el Sistema, y se verifico la correcta instalación de cada una de estas, pese a que el contratista cumplió con la correcta instalación, no se recibe aun por la supervisaría este sistema hasta que inicie la producción de gas y se verifique el funcionamiento de la estufa. Hay que aclara que el sistema ya está siendo alimentado por los vertimientos de las cocheras y se encuentra en proceso de estabilización para iniciar el proceso de producción de gas y generación de bioabono, igualmente se constató que el contratista ya realizo la actividad de capacitación al usuario del funcionamiento y manejo del sistema.

PREDIO No 3. LA FE LA MARIA, Coordenadas: N 4°29´01" - W 75°17´16", vereda MARÍA COMBEIMA, OLGA MARLENY RESTREPO
En visita realizada el día miércoles 17de junio del 2020 entre el supervisor del PICC II de CORTOLIMA Ing. Javier Pineda Ramos y el doctor Mauricio Jaramillo experto en Biodigestores y Profesional de PML, se pudo

ACTA PARCIAL

Nro: 1

Fecha Acta: jueves, 6 de agosto de 2020

Tipo Compromiso:	**CONTRATO / 807 / martes, 10 de diciembre de 2019**				
Valor Comprom.	**Inicial:**	**26,999,000.00**	**Modific:**	**0.00**	**Final** **26,999,000.00**
Tiempo Comp (dias)	**Inicial:**	**120**	**Modific:**	**0**	**Final** **120**
Clase Compromiso:	**SUMINISTRO / SERVICIOS**				
Fecha :	**Inicial:**	**13/02/2020**	**Terminacion:**		**20/08/2020**
Objeto Compromiso	**CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 BIODIGESTORES DE FLUJO CONTINUO, EN MATERIAL DE GEOMEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PORCÍCOLAS EN PREDIOS UBICADOS EN EL CAÑÓN DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ;**				
Contratista/Intervent:	**SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONA**	**PINEDA RAMOS JAVIER OSWALDO**			
Porcentaje Ejecuc.	**Fisico:**	**42.86**	**Financiero:**	**42.86**	**Dias:** **93.05**
Trazabilidad	**4.04.02.01-2019-FU:SA-RE:RP**				

evidenciar que el sistema en este predio ya está instalado en su totalidad y cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato 807 de 2019, se dejaron unas recomendaciones al usuario relacionadas con el manejo de aguas lluvias y hacer el encerramiento del área donde fue instalado el sistema para evitar la entrada de animales que puedan afectar la estructura.

En desarrollo de la visita se revisaron todas las partes que componen el Sistema, y se verifico la correcta instalación de cada una de estas, pese a que el contratista cumplió con la correcta instalación, no se recibe aun por la supervisaría este sistema hasta que inicie la producción de gas y se verifique el funcionamiento de la estufa. Hay que aclara que el sistema ya está siendo alimentado por los vertimientos de las cocheras y se encuentra en proceso de estabilización para iniciar el proceso de producción de gas y generación de bioabono, igualmente se constató que el contratista ya realizo la actividad de capacitación al usuario del funcionamiento y manejo del sistema.

PREDIO No 4. Predio Los Naranjos, Coordenadas N 4°29´22" W 75°14´51" de Propiedad de RAMON ELÍAS SAAVEDRA vereda La Cascada. En visita realizada el día miércoles 17de junio del 2020 entre el supervisor del PICC II de CORTOLIMA Ing. Javier Pineda Ramos, un Representante del Contratista SOLIN SAS, y el doctor Mauricio Jaramillo experto en Biodigestores y Profesional de PML, se pudo evidenciar que las actividades de revestimiento de la fosa están adelantadas en un 95%, se dejaron unas recomendaciones como terminar las esquinas y adecuar el

ACTA PARCIAL

Nro: 1

Fecha Acta: jueves, 6 de agosto de 2020

Tipo Compromiso:	**CONTRATO / 807 / martes, 10 de diciembre de 2019**				
Valor Comprom.	**Inicial:**	**26,999,000.00**	**Modific:**	**0.00**	**Final** **26,999,000.00**
Tiempo Comp (dias)	**Inicial:**	**120**	**Modific:**	**0**	**Final** **120**
Clase Compromiso:	**SUMINISTRO / SERVICIOS**				
Fecha :	**Inicial:**	**13/02/2020**	**Terminacion:**		**20/08/2020**
Objeto Compromiso	**CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 BIODIGESTORES DE FLUJO CONTINUO, EN MATERIAL DE GEOMEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PORCÍCOLAS EN PREDIOS UBICADOS EN EL CAÑÓN DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ;**				
Contratista/Intervent:	**SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONA**	**PINEDA RAMOS JAVIER OSWALDO**			
Porcentaje Ejecuc.	**Fisico:**	**42.86**	**Financiero:**	**42.86**	**Dias:** **93.05**
Trazabilidad	**4.04.02.01-2019-FU:SA-RE:RP**				

nivel en el piso dejando 5 centímetros de diferencia entre la entrada y salida del sistema, además de profundizar un poco más los drenes para evacuar aguas lluvias.

En desarrollo de la visita se revisaron las actividades de explanación, revestimiento de la fosa, techado y manejo de los drenes, para estas actividades se dejaron unas recomendaciones como terminar el revestimiento en uno de los extremos, ajustar los niveles del piso y profundizar más los drenes de aguas lluvias, queda pendiente ya la instalación del Sistema por el contratista SOLINTER SAS. Se programará para la segunda o tercera semana de julio una nueva visita para verificar nuevos avances. Para este cuarto predio no se tiene en cuenta para pago parcial.

CONCLUSIONES:

· Pese a la suspensión del contrato 807 de 2019 por motivos de la Cuarentena por el COVID 19, las actividades adelantadas en los cuatro predios tres de estos cumplen en casi su totalidad con las expectativas y compromisos propios del Objeto contractual
· En uno de los predios visitados se dejaron unas observaciones y recomendaciones para poder instalar el Sistema "Biodigestor de flujo Continuo".
· En los tres predios visitados y que ya fueron instalados los Sistemas, se recomendó a los usuarios mejorar los drenajes de aguas lluvias para evitar con el tiempo que se colmaten las fosas en las que fueron

ACTA PARCIAL

Nro: 1

Fecha Acta: jueves, 6 de agosto de 2020

Tipo Compromiso:	**CONTRATO / 807 / martes, 10 de diciembre de 2019**				
Valor Comprom.	**Inicial:**	**26,999,000.00**	**Modific:**	**0.00**	**Final** **26,999,000.00**
Tiempo Comp (dias)	**Inicial:**	**120**	**Modific:**	**0**	**Final** **120**
Clase Compromiso:	**SUMINISTRO / SERVICIOS**				
Fecha :	**Inicial:**	**13/02/2020**	**Terminacion:**		**20/08/2020**
Objeto Compromiso	**CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 BIODIGESTORES DE FLUJO CONTINUO, EN MATERIAL DE GEOMEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PORCÍCOLAS EN PREDIOS UBICADOS EN EL CAÑÓN DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ;**				
Contratista/Intervent:	**SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONA**	**PINEDA RAMOS JAVIER OSWALDO**			
Porcentaje Ejecuc.	**Fisico:**	**42.86**	**Financiero:**	**42.86**	**Dias:** **93.05**
Trazabilidad	**4.04.02.01-2019-FU:SA-RE:RP**				

instalados los Sistemas.

· Quedan pendientes visitas para verificar la funcionalidad de los Sistemas instalados y las mejoras pendientes en los drenes de aguas lluvias.

RECOMENDACIONES:

· Continuar con visitas de seguimiento a estos Sistemas para verificar la funcionalidad y el manejo que estén dando los beneficiarios.

*** El supervisor del contrato 807 de 2019 reviso y constato que los pagos de salud, pensión "Parafiscales" esten al dia segun el avance de actividades.**

En el informe,

JAVIER OSWALDO PINEDA RAMOS
P/U SDA - Supervisor contrato 807 de 2019 - Proyecto PICC II

Se recibe la Factura Nro 487 de Fecha 17 de julio 2020 por Valor de

Corporación Autónoma Regional del Tolima
Nit: 890,704,536-7

ACTA PARCIAL

Nro: 1

Fecha Acta: jueves, 6 de agosto de 2020

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006

Tipo Compromiso:	**CONTRATO / 807 / martes, 10 de diciembre de 2019**				
Valor Comprom.	**Inicial:**	**26,999,000.00**	**Modific:**	**0.00**	**Final** **26,999,000.00**
Tiempo Comp (dias)	**Inicial:**	**120**	**Modific:**	**0**	**Final** **120**
Clase Compromiso:	**SUMINISTRO / SERVICIOS**				
Fecha :	**Inicial:**	**13/02/2020**	**Terminacion:**		**20/08/2020**
Objeto Compromiso	**CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 BIODIGESTORES DE FLUJO CONTINUO, EN MATERIAL DE GEOMEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PORCÍCOLAS EN PREDIOS UBICADOS EN EL CAÑÓN DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ;**				
Contratista/Intervent:	**SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONA**		**PINEDA RAMOS JAVIER OSWALDO**		
Porcentaje Ejecuc.	**Fisico:**	**42.86**	**Financiero:**	**42.86**	**Dias:** **93.05**
Trazabilidad	**4.04.02.01-2019-FU:SA-RE:RP**				

Se recibe la Factura Nro 487 de Fecha 17 de julio 2020 por Valor de 11´571.428

POLIZAS

MUNDIAL SEGUROS	CUMPLIMIENTO	4,049,850	10/12/201 03/01/2023	100021682
MUNDIAL SEGUROS	SALARIOS, PRESTAC SOCIALES	5,399,800	10/12/201 21/08/2024	100021682

ACTAS

20/01/2020	Entrega Contrato a Interventor	1	12/02/2020	Delegación Interventoria	1
13/02/2020	Acta Iniciación	1	26/03/2020	Acta Suspensión	1
05/05/2020	Acta Suspensión	2	19/05/2020	Acta Suspensión	3
06/08/2020	Acta Parcial	1			

BALANCE CORTOLIMA

Valor Contrato	26,999,000.00	
Valor Pagos Anteriores		0.00
Valor Presente Acta		11,571,428.00
Valor Especie		0.00
Saldo por Ejecutar		15,427,572.00
Sumas Iguales	26,999,000.00	26,999,000.00

PINEDA RAMOS JAVIER OSWALDO
DA-SUBD DESARROLLO AMBIENTAL

SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACI
900410106

Corporación Autónoma Regional del Tolima
Nit: 890.704.536-7

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 1 of 1	

ACTAS DE INICIACION

Nro: 1

Fecha Acta: jueves, 13 de febrero de 2020

Tipo Compromiso:	CONTRATO
Numero Compromis	807
Clase Compromiso:	SUMINISTRO
Subclase Compromis	SERVICIOS
Valor Compromiso:	26,999,000.00 Valor Adicion 0.00 Total Comp. 26,999,000.00
Fecha Compromiso	martes, 10 de diciembre de 2019
Objeto Compromiso	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 BIODIGESTORES DE FLUJO CONTINUO, EN MATERIAL DE GEOMEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PORCÍCOLAS EN PREDIOS UBICADOS EN EL CAÑÓN DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ; DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y QUE SON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PICC II
Trazabilidad	4.04.02.01-2019-FU:SA-RE:RP
Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S. SOLIN
Interventor:	PINEDA RAMOS JAVIER OSWALDO
	DA-SUBD DESARROLLO AMBIENTAL
Pago Anticipado	0.00
Observ. / Descripc	

PINEDA RAMOS JAVIER OSWALDO
DA-SUBD DESARROLLO AMBIENTAL

SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACI

Scanned with CamScanner

Corporación Autónoma Regional del Tolima
Nit: 890,704,536-7

ACTAS DE SUSPENSION

Nro: 3

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 1 of 1	

Fecha Acta: martes, 19 de mayo de 2020

Tipo Compromiso:	**CONTRATO / 807 / martes, 10 de diciembre de 2019**
Valor Comprom.	**Inicial: 26,999,000.00 Modific: 0.00 Final 26,999,000.00**
Tiempo Comp (dias)	**Inicial: 120 Modific: 0 Final 120.00**
Clase Compromiso:	**SUMINISTRO / SERVICIOS**
Fecha :	**Inicial: 13/02/2020 Posible Termin.: 21/08/2020**
Objeto Compromiso	**CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 BIODIGESTORES DE FLUJO CONTINUO, EN MATERIAL DE GEOMEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PORCÍCOLAS EN PREDIOS UBICADOS EN EL CAÑÓN DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ;**
Trazabilidad	**4.04.02.01-2019-FU:SA-RE:RP**
Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S. SOLIN**
Interventor:	**PINEDA RAMOS JAVIER OSWALDO**
	DA-SUBD DESARROLLO AMBIENTAL
Fecha Reinicio:	**miércoles, 03 de junio de 2020**

Observ. / Descripc

Por mutuo acuerdo entre el supervisor por parte de vCORTOLIMA del contrato de suministro e instalacion No 807 del 10 de diciembre de 2019 Soluciones Integrales Internacionales SOLINTER SAS. cuyo Objeto es Cointratar el Suministro e Instalacion de 7 Biodigestores de Flujo continuo, en material de geomembrana para el tratamiento de las aguas residuales provenientes de actividades porcicolas en predios ubicados en el Ca;on del Copmbeima del municipio de Ibagu. El contratista argumenta que por motivo de la Pandemia originada por el COVID 19 y que a la fecha el gobierno Nacional y local tienen restringida actividades propias del contrato y que hacen parte integral del compromisos contractual ademas que los provedores nuestros aun no tienewn el visto bueno de la secretaria de Salud del Municipiop de Ibag[e y de la ARL en cuanto al cumplimiento de condiciones de bioseguridad para reiniciar labores *Protocolo de Seguridad y Plan de Reinicio de Actividades(, por lo que se amplia el ,tiempo de suspensi[on del contrato por 15 dias mas, del martes 19 de mayo al miercoles 03 de junio

PINEDA RAMOS JAVIER OSWALDO
Prof. Universitario 10
DA-SUBD DESARROLLO AMBIENTAL

SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S. SOLIN

Corporación Autónoma Regional del Tolima
Nit: 890,704,536-7

ACTAS DE SUSPENSION

Nro: 1

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 1 of 1	

Fecha Acta: jueves, 26 de marzo de 2020

Tipo Compromiso:	**CONTRATO / 807 / martes, 10 de diciembre de 2019**
Valor Comprom.	**Inicial: 26,999,000.00 Modific: 0.00 Final 26,999,000.00**
Tiempo Comp (dias)	**Inicial: 120 Modific: 0 Final 120.00**
Clase Compromiso:	**SUMINISTRO / SERVICIOS**
Fecha :	**Inicial: 13/02/2020 Posible Termin.: 22/07/2020**
Objeto Compromiso	**CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 BIODIGESTORES DE FLUJO CONTINUO, EN MATERIAL DE GEOMEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PORCÍCOLAS EN PREDIOS UBICADOS EN EL CAÑÓN DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ;**
Trazabilidad	**4.04.02.01-2019-FU:SA-RE:RP**
Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S. SOLIN**
Interventor:	**PINEDA RAMOS JAVIER OSWALDO**
	DA-SUBD DESARROLLO AMBIENTAL
Fecha Reinicio:	**martes, 5 de mayo de 2020**

Observ. / Descripc

Por motivos de la emergencia sanitaria originada por la pandemia del coronavirus, y la obligación de acatar los decretos 457 del 2020 del gobierno nacional, el decreto, .322 del 2020 del gobierno departamental y la resolución 0601 del 24 de marzo del 2020 de CORTOLIMA y demás que den manejo al tema sanitario actual - emergencia por salud pública que atraviesa la ciudad y el país.

Por mutuo acuerdo y respaldado por oficio del contratista SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES - SOLINTER S,A,S, radicada en CORTOLIMA a través de la ventanilla ambiental virtual el día martes 24 de marzo del 2020 en el que solicitan la suspensión del contrato 807 del 10 de diciembre del 2019 por los anteriores motivos, este contrato está por valor $ 26´999.000, que tiene acta de inicio del 13 de marzo del 2020 y cuyo objeto es Contratar el Suministro e Instalación de 7 Biodigestores de Flujo Continuo en material de geomembrana, para tratar las aguas residuales provenientes de actividades piscícolas en predios ubicados en el Cañón del Cpmbeima de la Ciudad de Ibagué Tolima.

Las Actividad a la fecha presenta un avance del 20% y por los motivos antes expuestos se requiere la suspensión de las actividades desde el día de hoy 26 de marzo hasta el día 4 de mayo del 2020

PINEDA RAMOS JAVIER OSWALDO
Prof. Universitario 10
DA-SUBD DESARROLLO AMBIENTAL

SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S. SOLIN

Escaneado con CamScanner

Corporación Autónoma Regional del Tolima
Nit: 890,704,536-7

ACTAS DE SUSPENSION

Nro: 2

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 1 of 3	

Fecha Acta: martes, 5 de mayo de 2020

Tipo Compromiso:	**CONTRATO / 807 / martes, 10 de diciembre de 2019**
Valor Comprom.	**Inicial:** 26,999,000.00 **Modific:** 0.00 **Final** 26,999,000.00
Tiempo Comp (dias)	**Inicial:** 120 **Modific:** 0 **Final** 120.00
Clase Compromiso:	**SUMINISTRO / SERVICIOS**
Fecha :	**Inicial:** 13/02/2020 **Posible Termin.:** 05/08/2020
Objeto Compromiso	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 BIODIGESTORES DE FLUJO CONTINUO, EN MATERIAL DE GEOMEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PORCÍCOLAS EN PREDIOS UBICADOS EN EL CAÑÓN DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ;
Trazabilidad	**4.04.02.01-2019-FU:SA-RE:RP**
Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S. SOLIN**
Interventor:	**PINEDA RAMOS JAVIER OSWALDO**
	DA-SUBD DESARROLLO AMBIENTAL
Fecha Reinicio:	**martes, 19 de mayo de 2020**

Corporación Autónoma Regional del Tolima
Nit: 890,704,536-7

ACTAS DE SUSPENSION

Nro: 2

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 2 of 3	

Fecha Acta: martes, 5 de mayo de 2020

Tipo Compromiso:	**CONTRATO / 807 / martes, 10 de diciembre de 2019**
Valor Comprom.	**Inicial: 26,999,000.00 Modific: 0.00 Final 26,999,000.00**
Tiempo Comp (dias)	**Inicial: 120 Modific: 0 Final 120.00**
Clase Compromiso:	**SUMINISTRO / SERVICIOS**
Fecha :	**Inicial: 13/02/2020 Posible Termin.: 05/08/2020**
Objeto Compromiso	**CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 BIODIGESTORES DE FLUJO CONTINUO, EN MATERIAL DE GEOMEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PORCÍCOLAS EN PREDIOS UBICADOS EN EL CAÑÓN DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ;**
Trazabilidad	**4.04.02.01-2019-FU:SA-RE:RP**
Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S. SOLIN**
Interventor:	**PINEDA RAMOS JAVIER OSWALDO**
	DA-SUBD DESARROLLO AMBIENTAL
Fecha Reinicio:	**martes, 19 de mayo de 2020**

Observ. / Descripc

Por motivos de la emergencia sanitaria originada por la pandemia del coronavirus, y la obligación de acatar el Decreto No 593 del 24 de abril del 2020 del gobierno nacional; solo ciertas actividades pueden reiniciarse y las actividades que se desarrollan en el mencionado contrato no se encuentran en este listado de excepciones así mismo nuestros proveedores de geomembranas y de otros elementos necesarios para la instalación de los biodigestores no tienen permitido en el marco del Decreto, adicionalmente estaría el agravante de movilizar e ingresar personal foráneo a veredas y fincas lo que se podría asumir como un riesgo para la salud de la comunidad. de acuerdo al acta de suspensión Nro. 1 del contrato 807 del 10 de diciembre del 2019 la fecha de reanudación del mismo es a partir del día 04 de mayo del año en curso; y aclarando que el Decreto 593 del 24 de abril del 2020 solo ciertas actividades pueden reiniciarse y la actividad que se desarrolla en el mencionado contrato no se encuentra en este listado de excepciones.

Por lo anterior y por mutuo acuerdo y respaldado por oficio del contratista SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES - SOLINTER S,A,S, radicada en CORTOLIMA a través de la ventanilla ambiental virtual el día lunes 27 de abril del 2020 en el que solicitan ampliación de la suspensión del contrato 807 del 10 de diciembre del 2019 por 15 días más, este contrato está por valor $ 26´999.000, que tiene acta de inicio del 13 de marzo del 2020 y cuyo objeto es Contratar el Suministro e Instalación de 7 Biodigestores de Flujo Continuo en material de geomembrana, para tratar las aguas residuales provenientes de actividades piscícolas en predios ubicados en el Cañón del Cpmbeima de la Ciudad de Ibagué Tolima.

Las Actividad a la fecha presenta un avance del 20% y por los motivos antes expuestos se requiere la ampliación de la suspensión de las actividades desde el día 05 de mayo al 18 del mismo mes del año 2020 con reinicio el 19 del mismo mes.

Corporación Autónoma Regional del Tolima
Nit: 890,704,536-7

ACTAS DE SUSPENSION

Nro: 2

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 3 of 3	

Fecha Acta: martes, 5 de mayo de 2020

Tipo Compromiso:	CONTRATO / 807 / martes, 10 de diciembre de 2019				
Valor Comprom.	Inicial:	26,999,000.00	Modific:	0.00	Final 26,999,000.00
Tiempo Comp (dias)	Inicial:	120	Modific:	0	Final 120.00
Clase Compromiso:	SUMINISTRO / SERVICIOS				
Fecha :	Inicial:	13/02/2020	Posible Termin.:		05/08/2020
Objeto Compromiso	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 BIODIGESTORES DE FLUJO CONTINUO, EN MATERIAL DE GEOMEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PORCÍCOLAS EN PREDIOS UBICADOS EN EL CAÑÓN DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ;				
Trazabilidad	4.04.02.01-2019-FU:SA-RE:RP				
Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S. SOLIN				
Interventor:	PINEDA RAMOS JAVIER OSWALDO				
	DA-SUBD DESARROLLO AMBIENTAL				
Fecha Reinicio:	martes, 19 de mayo de 2020				

PINEDA RAMOS JAVIER OSWALDO
Prof. Universitario 10
DA-SUBD DESARROLLO AMBIENTAL

SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S. SOLIN

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045

No. PÓLIZA	NV-100021682	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	34157925	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/07/2020	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/02/2020	24:00 Horas Del	21/08/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	9004101066
DIRECCIÓN	CARRERA 8 NO 33A - 22	TELÉFONO	3132691584
ASEGURADO	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA	No. DOC. IDENTIDAD	8907045367
DIRECCIÓN	CARRERA 5 AV FERROCARRIL	TELÉFONO	2654551
BENEFICIARIO	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA	No. DOC. IDENTIDAD	8907045367
DIRECCIÓN	CARRERA 5 AV FERROCARRIL	TELÉFONO	2654551

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESNETE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE INICIO CON FECHA DEL 13/02/2020, ACTA DE SUSPENSION NRO 1 DE FECHA 26/03/2020, ACTA DE REINICIO NRO 1 CON FECHA 05/05/2020, ACTA DE SUSPENSION NRO 2 DE FECHA 05/05/2020, ACTA DE REINICIO NRO 2 CON FECHA 19/05/2020 Y ACTA DE SUSPENSION NRO 3 DE FECHA 19/05/2020, ACTA DE REINICIO NRO 3 CON FECHA 03/06/2020.
SE AJSUTA LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.807 DE 10 DIC 2019 , CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE7 BIODIGESTORES DE FLUJO CONTINUO, EN MATERIAL DE GEOMEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PORCICOLAS EN PREDIOS UBICADOS EN EL CAÑÓN DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE; DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y QUE SON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PIC II DE CORTOLIMA. LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO Y DEFINEN IGUALMENTE LAS ACTIVIDADES,ALCANCE Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO.
ASEGURADO/BENEFICIARIO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA CON NIT 890.704.536-7

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO	00:00: Horas Del 13/02/2020	24:00: Horas Del 03/01/2021	4.049.850	0
PRESTACIONES SOCIALES	00:00: Horas Del 13/02/2020	24:00: Horas Del 21/08/2024	5.399.800	0
		TOTAL ASEGURADO		

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ERSARF SEGUROS CIA L	AGENCIAS	100.00

PRIMA BRUTA	$	0
DESCUENTOS	$	0
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0
GASTOS EXP.	$	0
IVA	$	0
TOTAL A PAGAR	$	0

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/07/2020

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

EL TOMADOR Y/O ASGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NV-100021682** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES SAS** Asegurado o Beneficiario: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA** / **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA**, expedida por la Compañía en **11/07/2020,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

Se firma en **AGENCIA NEIVA** a los **11** días del mes **JULIO** del año **2020**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES
IDENTIFICACION:	NI-9004101066
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SOLINTER
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-03-11
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-03-09
FECHA DE PAGO:	2020-03-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-02
PERIODO SALUD:	2020-03
NUMERO PLANILLA:	16158421
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	16158421
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 35.200	$ 35.400
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 35.200	$ 35.400
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 140.500	$ 141.300
14-23	860011153	POSITIVA	2	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	2	$ 0	$ 0	$ 400	$ 70.400	$ 70.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 290.500	$ 292.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/04/2020

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES
IDENTIFICACION:	NI-9004101066
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SOLINTER
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-04-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-04-09
FECHA DE PAGO:	2020-04-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-03
PERIODO SALUD:	2020-04
NUMERO PLANILLA:	17248521
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	17248521
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 35.200	$ 35.400
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 35.200	$ 35.400
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 140.500	$ 141.300
14-23	860011153	POSITIVA	2	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	2	$ 0	$ 0	$ 400	$ 70.400	$ 70.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 290.500	$ 292.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/05/2020

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES
IDENTIFICACION:	NI-9004101066
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SOLINTER
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-07-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-07-09
FECHA DE PAGO:	2020-07-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-06
PERIODO SALUD:	2020-07
NUMERO PLANILLA:	17328618
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	17328618
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 35.200	$ 35.400
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 35.200	$ 35.400
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 140.500	$ 141.300
14-23	860011153	POSITIVA	2	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	2	$ 0	$ 0	$ 400	$ 70.400	$ 70.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 290.500	$ 292.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/08/2020


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 11.222.907
LONGAS MENDEZ
APELLIDOS
FABIAN RODRIGO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1978
FLANDES
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
20-MAR-1997 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
A-2908200-63164071-M-0011222907-20071217 02463 07351A 02 239956021

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14637078897

(415)7707212489984(8020) 000001463707889 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 1 0 1 0 6	6	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			Año Mes Día

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S

36. Nombre comercial:	37. Sigla
	SOLINTER S.A.S.

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 74 C 1 C 05 BRR MIRA RIO I I

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
fabianlongas@hotmail.com		3 1 8 5 9 9 0 6 7 3	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2
4 7 1 1	2 0 1 6 1 2 1 3	4 7 5 9	2 0 1 6 1 2 1 3		7 1 1 0	5 6 2 1

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	9	1	4	3	3	4	2	4	8															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO 60. No. de Folios: 1 8 61. Fecha: 2 0 1 9 0 7 2 9 Día

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CACAIS REINOSO ALVARO ANDRES
985. Cargo: Analista IV

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9004101066, se encuentra vinculado (a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-664-13-00060-1.

Se expide en PIEDRAS, a losa los veinte y siete (27) días del mes de mayo de 2020, con destino a: SOLICITUD DEL INTERESADO

Banco Agrario de Colombia
Of. Piedras - Tolima
Emerson Garcia
DIRECTOR (A) OFICINA

FIRMA AUTORIZADA

Escaneado con CamScanner
