MATRIZ SEGUIMIENTO EQUIPO REGALÍAS MME 2025

	INFORMACION BASICA																			RESPONSABLES					ESTRUCTURACIÓN					MESAS TECNICAS JUNIO				VERIFICACION PRELIMINAR				PROYECTOS GUIA				REUNIONES CON IPSE/UPME				APOYO OTRAS FUENTES A.D, A.L Y RECUROS PROPIOS			
	BPIN	Departamento	Municipio	Código DANE	Municipio	Inicio PF	Nombre del proyecto	Fuente de financiación	Entidad que presenta el proyecto	Tipo de proyecto	Prioridad Estrategica	Capacidad Instalada (MW)	No. Usuarios	# Potencial C.E.	# Potencial M.E.	Saldo IP 2023-2024	Valor SGR	Valor otros	Valor total	Plazo ejecución (meses)	Equipo	Responsable territorial	Responsable formulación		Responsable seguimiento ejecución		Reportado FNCER	Estado actual	Nivel estructuración	Contacto estructuración	Comentarios estructuración	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2	2024810650088	Arauca	Arauquita	81065	SI	SI	Construcción De Alobrado Público Solar Autosuficiente En Los Centros Poblados De Aguachica, El Oasis y La Paz Del Municipio De Arauquita, Departamento De Arauca	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Arauquita	Alumbrado Publico con FNCER	Otra-ZNI	0,00	1		0	$ 3.072.069.229	$ 3.071.205.200	$ -	$ 3.071.205.200		Equipo Llanos	Luis Bernal	Luis Fernando				N.A.	En estructuración	Medio	1. Carmenza Pico 2. Yocelin Calixto 3. Astrid Gómez1. Jefe Banco de Proyectos 2. Sec. Planeación 3. Jefe de obra1. 3115755755 2. 31 34508781	01/04/25: se realizó mesa técnica con UPME para presentación de subsanaciones, se hacen compromisos y espera entrega de información para nuevo cargue. 28/01/2025: se realizó mesa técnica con MME para presentación de subsanaciones. 03/12/24: es emitido CTUS por parte de la UPME en el cual se advierten varias cosas relacionadas con el diseño, cumplimiento del RETILAP y temas presupuestales.																						
10	2024131600108	Bolivar	Cantagallo	13160	SI	SI	Construcción del microacueducto para el centro poblado Medio San Juan del municipio de Cantagallo - Bolivar	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Cantagallo	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,0044	1	0	1	$4.297.260.204,00	################	$ -	$ 2.030.643.468		Equipo Eje Cafetero	Juan Vesga	Luis Fernando				N.A.	En estructuración	Medio	MAXIMILIANO GARCIAASESOR PROYECTOS PLANEACION3105726281 secretariadeplaneacion@cantagallo-bolivar.gov.co	30/04/2025: ET continúa con las subsanaciones a la espera de cargar nuevamente la primera semana de Mayo. 15/04/2025: Se sostiene mesa técnica con Minvivienda y se subsanan las observaciones, a la espera de consolidar y solicitar nuevo concepto de viabilidad. 04/04/2025: Se recibe segundo concepto de viabilidad con observaciones. ET se encuentra trabajando en las subsanaciones.																						
15	2024410010162	Huila	Neiva	41001	SI	NO	Construcción de vivienda de Interés Prioritario (V.I.P) en Sitio Propio en áreas rurales dispersas en el municipio de Neiva- Huila	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Neiva	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,07	21		0	$ 2.482.409.152	$ 2.445.516.273	$ -	$ 2.445.516.273		Equipo Eje Cafetero	Angélica Pacheco	Luis Fernando				N.A.	En estructuración	Alto	German Mosquera Director de Prospectiva 3167482213 direccionprospectiva@alcaldianeiva.gov.co	> 23/04/2025 • La ET informa que ha presentado problemas en otorgar los subsidios dados los lineamientos que los usuarios deben de cumplir (500 mts a una red y/o certificados de libertad y tradición). También indican que ya subsanaron las observaciones con respectos al C.I. de Mn Vivienda. >01/04/2025 • La ET informa que ha presentado problemas en otorgar los subsidios dados los lineamientos que los usuarios deben de cumplir (500 mts a una red y/o																						
21	2021310101931	Putumayo	Mocoa	86001	SI	SI	Implementación Soluciones Fotovoltaicas Individuales Para Usuarios Rurales Ubicados En El Municipio De Mocoa	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Mocoa	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,09	84	5	0	$ 719.712.183	$ 2.500.467.246	$ -	$ 2.500.467.246		Equipo Eje Cafetero	Fabian Rodriguez	Luis Fernando				N.A.	Viabilizado pero no Aprobado	Alto		> 19/02/2025 • Verificación de requisitos DNP CUMPLE. Proyecto a la espera de ser citado a la próxima sesión de OCAD Paz. > 26/01/2025 • La VR emitida por el DNP "NO CUMPLE" el día 26/12. Se envía correo electronico a la ET para poder subsanar las observaciones. Se espera realizar MT el dia 16/01. A espera de cargum la carta de respuesta por parte del MME.																						
66	2024156460014	Boyacá	Samacá	15646	SI	NO	Mejoramiento de la vía la capilla mediante la construcción de placa huella en la vereda salamanca municipio de Samacá Boyacá	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Samacá	Alumbrado Publico con FNCER	Otra-ZNI	0,00	1		1	$ 438.154.430	$ 895.427.097	$ -	$ 895.427.097		Equipo Llanos	Wendy Martinez	Luis Fernando				N.A.	En estructuración	Medio	Danilo Viencha Sec. Planeación Cel: 311 2611268	05/06/2025 Mesa técnica con ET y estructurador verificación subsanaciones a observaciones componente electrico. 22/05/2025 Mesa técnica con ET y estructurador, revisión subsanaciones componente electrico 06/05/2025 A la fecha no se ha emitido ficha de MinTransporte, sin embargo se realizó mesa para revisar observaciones de la UPME, donde se observa que aun se tienen	X																					
75	2024505680143	Meta	Puerto Gaitán	50568	SI	NO	Construcción De Sistemas De Energía Solar Fotovoltaica En Zonas Rurales en el municipio de Puerto Gaitán	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Puerto Gaitán	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	1,10	1002	12		$ 38.214.358.603	$ 33.465.620.987	$ -	$ 33.465.620.987		Equipo Llanos	Luis Bernal	Luis Fernando/Yvonne Cruz				N.A.	En estructuración	Medio	1. Gustavo Peña1. secretario de planeación1. 3212155754alcalde@puertogaitan-meta.gov.co contactenos@puertogaitan-meta.gov.co planeacion@puertogaitan-meta.gov.co	11-06-25 - Se realizó mesa técnica el 09 y 11 de junio para verificar subsanaciones con IPSE y generar compromisos. Se estima cargue en 2 semanas. 20/05/25 se envie CTUS no. 04 con observaciones reiteradas, se envia oficialmente al municipio y se presiona para hacer las subsanaciones correctamente. 03-04-25 - Es emitido CTUS solicitado el 31-03-25 sin revisión por error de la E.T. 14-03-25 - ETIJURIA		X																				
290	2024810010102	Arauca	Arauca	81001	SI	NO	Mejoramiento de la infraestructura educativa a través de la implementación de sistemas de energía fotovoltaica para promover el mejor uso de los recursos energéticos en diferentes instituciones educativas del municipio de Arauca Departamento de Arauca	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Arauca	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,20	4	0	1	$ 2.880.570.869	$ 2.880.570.869	$ 421.620.376	$ 3.302.191.245		Equipo Llanos	Luis Bernal	Luis Fernando				N.A.	En estructuración	Medio	1. Carmenza Pico 2. Yocelin Calixto 3. Astrid Gómez1. Jefe Banco de Proyectos 2. Sec. Planeación 3. Jefe de obra1. 3115755755 2. 31 34508781	31/03/25: La ET aún no remite subsaciones para evaluación, incumplendo reiteradamente compromisos 20/02/25: Se envía correo a la E.T. solicitando información.. 27/11/24: UPME emite ficha no favorable. Se eleva consulta al alcalde quién manifiesta darán celeridad al proceso.																						
294	2024157900042	Boyacá	Tasco	15790	SI	NO	Construcción plaza de ferias en el municipio de Tasco Boyacá	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Tasco	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,00	1			$ 444.999.476	$ 568.102.941	$ -	$ 568.102.941		Equipo Llanos	Wendy Martinez	Luis Fernando				N.A.	En estructuración	Bajo	GERMAN CAMILO MORALES RINCON Felipe RomeroAlcalde Sec. Planeación 3106882041	06/05/2025 MinAgricultura no ha emitido el concepto 28/04/2025 Solicito viabilidad el 09/04, se envio el 29/04. 03/04/2025 MinAgricultura emitió concepto, sin embargo, por problemas en la plataforma no se cargó el documento, se volverá a solicitar viabilidad para que sea cargada la ficha nuevamente.																						
303	SIN BPIN	Casanare	Monterrey	85162	SI	NO	Construccion Alumbrado Publico Fotovoltaico Tipo Off-Grid, Para Luminarias Stand Alone En Las Veredas Guafil, Brisas Del Llano Y Palo Negro Del Municipio De Monterrey Casanare	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Monterrey	Alumbrado Publico con FNCER	Otra-ZNI	0,00	1		0	$ 463.448.758	$ 463.448.758	$ -	$ 463.448.758		Equipo Llanos	Antonio Porras	Luis Fernando	Antonio Porras			N.A.	En identificación	N.A.	HUGO ALEJANDRO BALLESTEROS RIVERA - ANDRES MONTESOAlcalde secretario de Planeación 3202 360218 3229425715despachoalcalde@monterrey-casanare.gov.co planeacion@monterrey-casanare.gov.co	09/06/2025 Radicación por parte de ET link con carpetas donde presentan subsanación a observaciones preliminares al proyecto. Pendiente programar mesa técnica 08/04/2025: Comunicación telefónica con Camilo Chaparro de Infraestructura, pendiente programar mesa técnica para verificar avance estructuración. 13/02/2025: Se envia correo a ET con observaciones revisión preliminar No. 2 para ajuste.				X																		
306	2024852630043	Casanare	Pore	85263	SI	NO	Construcción y mejoramiento, con fuentes de iluminación renovables en la ciudadela del parque recreativo San José primera etapa municipio de Pore, departamento de Casanare	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Pore	Alumbrado Publico con FNCER	Otra-ZNI	0,00	1		0	$ 1.140.621.967	$ 1.131.082.138		$ 1.131.082.138		Equipo Llanos	Antonio Porras	Luis Fernando	Antonio Porras			N.A.	En estructuración	Medio	JORGE EZEQUIEL GARZÓN - LEONARDO MONTAÑAAlcalde secretario de Planeación 312 3261740 322416 3 36 3contactenos@pore-casanare.gov.co	21/05/2025 Comunicación telefónica con ET proyecto cargado en SUIFP, pendiente concepto UPME. 31/03/2025: el 27 de marzo se remitió a la ET ficha de revisión del Grupo de Regalías para últimos ajustes a los documentos compartidos por Drive el día 20 de marzo. Se espera que la ET subsane complementarmente y vuelva a cargar en SUIFP. 06/03/2025: Se realizó mesa técnica interna entre Grupo de Regalías y ET para revisar																						
366	2024680550035	Santander	Sabana De Torres	68655	SI	NO	Sistema Fotovoltaico De 116,5 Kwp Para Paneles Solares, Inversores, Tableros De Protección, Acometidas Electricas Y Arianeras Para La Estación De Bombeo Del Acueducto Del Municipio De Sabana De Torres, Santander Sabana De Torres	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Sabana De Torres	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,12	1	1	1	$ 2.566.592.055,00	################	$ -	$ 1.856.265.511		Equipo Eje Cafetero	Rafael Fonseca	Luis Fernando				N.A.	En estructuración	Alto	JUAN CARLOS GÓMEZ secrETARIO DE PLANEACION 317511225 3planeacion@sabanadetorres-santander.gov.co	>10/06/2025 Mesa técnica con ET y estructurador, verificación subsanación observaciones concepto preliminar > 23/05/2025 Mesa técnica MME_ET y estructurador, avance estructuración 08/04/2025: el municipio aun esta subsanando ha tenido dificultades con los estructuradores. 31/04/2025: el municipio aun está subsanando, no cumplió con la fecha de entrega. ET ha			X																			
383	2024734110059	Tolima	Líbano	73411	SI	NO	Instalación de sistemas integrados de energía solar fotovoltaica autosostenible en escenarios deportivos del Líbano	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Líbano	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos		1	1	1	$ 488.164.024	$ 488.164.024	$ -	$ 488.164.024		Equipo Eje Cafetero	Angélica Pacheco	Luis Fernando				N.A.	En identificación	N.A.	Sandra Rocio Moreno Páez 314 2286559 secretariaplaneacion@libano-tolima.gov.co	>26/03/2025: La entidad territorial esta elaborando la mga, se espera que el día de mañana 27/03/2025 se cargue el proyecto a SUIFP >19/03/2025: En comunicación con la entidad territorial se programa reunión para revisión de la ficha técnica el día 25/03/2025. >11/03/2025: Se realizó reunión en donde se presentaron las subsanaciones, la entidad manifestó que aun no cuenta con todo lo pedido en la ficha																						
384	SIN BPIN	Tolima	Melgar	73449	SI	NO	Construcción de un sistema de autogeneración para el palacio municipal y la empresa Empumelgar del municipio de Melgar	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Melgar	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas					$ 1.508.122.032	$ -	$ -	$ -		Equipo Eje Cafetero	Angélica Pacheco	Luis Fernando				N.A.	En identificación	N.A.	Sandra Rodriguez secretaria de Planeación 3208494678 planeacion@melgar-tolima.gov.co	>20/05/2025 Mesa Técnica revisión documentación y avance estructuración. Socialización Convocatoria MME IP >26/03/2025: Esta semana no se logró comunicación con la entidad territorial. >19/03/2025: Esta semana no se logró comunicación con la entidad territorial. >27/02/2025: Se realizó mesa técnica con la entidad territorial, se socializó el avance del proyecto. La secretaria de planeación pueda de asistir al caso mesa técnica una vez tengan																						
385	SIN BPIN	Tolima	Ortega	73504	SI	NO	Optimización y modernización de Alumbrado Público.	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Ortega	Alumbrado Publico con FNCER	Otra-ZNI					$ 1.679.538.317	$ -	$ -	$ -		Equipo Eje Cafetero	Angélica Pacheco	Luis Fernando				N.A.	En identificación	N.A.	Jhon Harold Villanueva secretario de Planeación 3142050917 despachoalcalde@ortega-tolima.gov.co	08/04/2025: Comunicación telefónica con Harold Villanueva de Planeación, Contrato de consultoría suspendido, pendiente cotizaciones con proveedores. >26/02/2025: Se realizó MT en donde el municipio presentó avance del proyecto; próxima reunión en un mes despues de que el contratista de consultoria realice las gestiones para obtener los diseños de iluminación. >06/01/2025: Se realizó MT en donde el municipio presentó avance del proyecto.																						
396	2024863200055	Putumayo	Orito	86320	SI	SI	Construcción Poldeportivo Cubierto Para Escuela Rural Mixta El Naranjito Municipio De Orito Departamento Del Putumayo	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Orito	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos	0,0020	1	1	1	$ 1.426.730.699	$ 1.766.346.070	$ -	$ 1.766.346.070		Equipo Eje Cafetero	Fabian Rodriguez	Luis Fernando				N.A.	En estructuración	Medio	Antonio Osorio secretario de Planeación 314 3951912 secretariadeplaneacion@orito-putumayo.gov.co	>03/04/2025. La ET viajo a la secretaría de educación departamental para obtención de los certificados solicitados en concepto. La secretaria de Edu-Departamental argumenta baja cobertura de la ET beneficiaria, solicitan migrar proyecto a Min Deportes. > 26/03/2025. La ET informa que trabaja en las últimos ajustes del proyecto. Calculo estructural del cerramiento doble con varillas 3/4" y malla eslabonada y cimentacion del cerramiento. Se requiere la entrega suso concepto el 31/03.																						
424	2024136700069	Bolivar	San Pablo (Bolivar)	13670	SI	SI	Implantación de infraestructura de autogeneración a pequeña escala mediante uso de sistema solares fotovoltaicos destinados a la eficiencia energética del Palacio Municipal y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado infraestructura a cargo del municipio de San Pablo	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	San Pablo (Bolivar)	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos		2	2	0	$463.025.724,00	$ 486.662.042,59	$ -	$ 486.662.043		Equipo Eje Cafetero	Rafael Fonseca	Luis Fernando				N.A.	En estructuración	Bajo	DIEGO CRUZASESOR PROYECTOS SGR 32 32105 355 secretariadeplaneacion@cantagallo-bolivar.gov.co	30/04/2025: Equipo estructurador de la ET se encuentra subsanando las observaciones. 11/04/2025: Equipo estructurador de la ET se encuentra subsanando las observaciones. 04/04/2025: ET se encuentra revisando las subsanaciones enviadas a través de la ficha del grupo de regalías. 26/03/2025: Se remite primera ficha preliminar a la ET por parte del grupo de regalías el																						
432	2024415180005	Huila	Paicol	41518	SI	NO	Construcción alumbrado público vía caja de agua Paicol	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Paicol	Alumbrado Publico con FNCER	Otra-ZNI					$ 581.165.603	$ 1.419.687.207	$ -	$ 1.419.687.207		Equipo Eje Cafetero	Angélica Pacheco	Luis Fernando				N.A.	En estructuración	Medio	Gerardo Emilio García Cel 3183120909	>06/05/2025 Mesa técnica con ET y MME Revisión avance subsanación observaciones >02/05/2025 Mesa técnica con ET , UPME y MME revisión y aclaración observaciones concepto No Favorable de 09/04/2025 la ET continua subsanando. > 23/04/2025 • Emisión de C.I. No Favorable por UPME el dia 11/04. Se realizo MT el dia																						
462	SIN BPIN	Tolima	Purificación	73585	SI	NO	Optimización acueducto interveredal, veredas Madrofio, Cedrito y Damas, municipio de Purificación, Tolima.	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Purificación	Autogenerador Colectivo	Municipios y Territorios Energéticos					$ 2.370.675.358	$ 2.370.675.358	$ -	$ 2.370.675.358		Equipo Eje Cafetero	Angélica Pacheco	Luis Fernando				N.A.	En identificación	N.A.	Egidio Orlando Martínez Covaleda secretario de Planeación 311 4721103 contactenos@purificacion-tolima.gov.co	> 21/05/2025: Comunicación telefónica con Secretario Planeación. En revisión de diseños entregados por Consultor, pendiente programar mesa técnica. >18/03/2025: En comunicación con la entidad territorial informan que se reunieron con el contratista y asumieron el compromiso de entregar el proyecto el 31/03/2025.																						
475	2024868850055	Putumayo	Villagarzon	86885	SI	SI	Implementación de alumbrado público con sistemas de energía solar fotovoltaica en el municipio de Villagarzón departamento del Putumayo	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	Villagarzón	Alumbrado Publico con FNCER	Otra-ZNI		1	1	0	$ 1.677.594.681	$ 1.677.594.680	$ -	$ 1.677.594.680		Equipo Eje Cafetero	Fabian Rodriguez	Luis Fernando				N.A.	En estructuración	Medio	CARLOS CERÓN BANCO DE PROYECTOS 3208039242	>03/04/2025. Se realizo MT programada para el 02/04/2025. El consultor no asistio a pesar de dias anteriores confirmar asistencia. Se solicito a la entidad territorial tomar acciones sobre el asunto, si es posible buscar nuevos consultores para avanzar con el proyecto. >08/04/2025:Mesa técnica presentación proyecto componente técnico, con observaciones																						
488	2024130101492	PUTUMAYO	PUERTO ASIS	86568	SI	SI	AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL ASENTAMIENTO INDÍGENA NUEVO AMANECER DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO PUERTO ASÍS	Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros	PUERTO ASIS	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN		197				$ 1.311.511.742		$ 1.311.511.742		Equipo Eje Cafetero		Luis Fernando				En estructuración	Medio	Ing Cristhiam cel 3138475728 Estructurador																						
497	2025130101161	Bolivar	San Juan Nepomuceno y El Carmen de Bolivar				CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO Y EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	Asignación para la paz	San Juan Nepomuceno	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN		224				$ 14.879.589.496		$ 14.879.589.496	10			Luis Fernando				En estructuración	Bajo	(575) 6890596 Alcaldía San Juan Nepomuceno GUIDO JOSÉ FIGUEROA MARTÍNEZ despachoalcalde@sanjuannepomuceno-bolivar.gov.co																						
498	2025130101641	Caquetá	La Montañita, Solano				CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO Y EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	Asignación para la paz	IPSE	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN		197				$ 6.397.564.716	################	$ 10.662.607.830				Luis Fernando				En estructuración	Medio	Ing Cristhiam cel 3138475728 Estructurador																						
499	2025130101114	Bolivar	Córdoba				Implementación DE SOLUCIONES MIXTA SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MONTAÑITA Y Solano	Asignación para la paz	Córdoba	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,52	257			$ 7.688.019.651		$ 7.688.019.651				Luis Fernando						(575) 6890596 Alcaldía San Juan Nepomuceno GUIDO JOSÉ FIGUEROA MARTÍNEZ despachoalcalde@sanjuannepomuceno-bolivar.gov.co																						
500	2025130101328	Bolivar	San Jacinto y San Juan Nepomuceno				Implementación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica en viviendas rurales ubicadas en zonas no interconectadas del municipio de Córdoba departamento de Bolivar	Asignación para la paz	Córdoba	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,30	274			$ 7.688.019.651		$ 7.688.019.651				Luis Fernando						María José Navas Sec. Planeación Córdoba (57 3114327431) secretaria_de_planeacion@cordoba-bolivar.gov.co																						
501	2025130101010	Bolivar	El Carmen de Bolivar y San Juan Nepomuceno				Construcción de infraestructura eléctrica en zona rural de los municipios de San Juan de Nepomuceno y El Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar	Asignación para la paz	San Juan Nepomuceno	Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos	Comunidades Energéticas	0,38	490			$ 14.000.834.099		$ 14.000.834.099				Luis Fernando						(575) 6890596 Alcaldía San Juan Nepomuceno GUIDO JOSÉ FIGUEROA MARTÍNEZ (57 3206314881) despachoalcalde@sanjuannepomuceno-bolivar.gov.co 3205121077 planeacion@sanjuannepomuceno-bolivar.gov.co Manuel Medina 3007600050 planeacion@sanjacinto-bolivar.gov.co (+57) 3017601605	>25/06/2025 Mesa técnica con ET San Jacinto y San Juan Nepomuceno, verificación estado estructuración y observaciones a ficha mga. Pendiente por ET enviar listado usuarios y kmz para validar.				X																	
502	2025130101470	Bolivar	El Carmen de Bolivar y San Juan Nepomuceno				Construcción de infraestructura eléctrica en zona rural de los municipios de San Juan de Nepomuceno y El Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar	Asignación para la paz	San Juan Nepomuceno	Sistema Interconectado Nacional	Otra-SIN		809			$ 14.899.589.496	$ 20.000.000	$ 14.919.589.496				Luis Fernando						planeacion@sanjuannepomuceno-bolivar.gov.co, Manuel Medina 3007600050, oficinadeplaneacion@elcarmen-bolivar.gov.co Aníbal Eduardo Gallo 300622702	>26/06/2025 Mesa técnica con ET San Juan Nepomuceno y El Carmen de Bolivar, verificación estado estructuración y observaciones a ficha mga.				X																	
	N/A	N/A	N/A				Apoyo en diseño y estructuración de proyectos Tipo como (MONTELIBANO, AGP 36,70,100 KW); Acompañamiento a las ET para la estructuración de proyectos en otras fuentes como: A.D, AL , OXI, Manaure La Guajira AGPE Alcaldía, Parque Solar San Felipe Guainia.																Luis Fernando				N/A		Bajo		>25/06/2025 Nivel de avance proyecto tipo Sedes Educativas >05/06/2025 Reunión DNP, MINEDUCACIÓN, MME Proyecto Tipo SSFV Escuelas árbol de problemas y objetivos > 23/05/2025 Lineamientos y observaciones a Anexo 1 Manual OXI > 21/05/2025 ARTICULACION DE CRITERIOS MME - DNP (PRESENCIAL) , Convenio MME - UPME >14/05/2025 Emision CTUS BPIN 202113010111919 Puerto Ospina Puerto leguizamo Putumayo. NF > 14/05/2025 Mesa técnica ajuste BPIN 202100007002 3 Parque solar San Felipe, Guainia >06/05/2025 Mesa Técnica UPME Manaure BPIN 202444560005 2 >06/05/2025 Emision CTUS BPIN 202413010110091 FAVORABLE								x			x										

LUGAR:	Reunión virtual
FECHA:	28 de mayo de 2025

HORA INICIO:	10:00 a.m.	**HORA FIN:**	11:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento proyecto de inversión "Construcción implementación y puesta en funcionamiento de soluciones de energía solar centralizada en el corregimiento de san Felipe, departamento del Guainía" BPIN 2021000070023.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD / ORGANIZACIÓN / AREA**
Andrés Eduardo Losada Ramírez	Consultor Jurídico	Grupo GES SGR PGN
Aranxa Rosa Sierra Gómez	Ingeniera profesional de apoyo a la supervisión SPID	GOBERNACION DE GUAINIA
Ariel Martínez Giraldo	Contratista	SGR - MME
LUIS FERNANDO LINARES PULIDO	CONTRATISTA	GRUPO REGALÍAS MME
LEIDY CAROLINA ACEVEDO	CONTRATISTA	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Natalia Carolina Ruiz González	Asesora	Ministerio de Minas y Energía
Javier Chaparro Rodríguez	Consultor Técnico	PGN
Ludwing Gómez Almeida	Coordinador grupo regalías	Ministerio de minas y energía
Beyer cantor	Profesional apoyo contratista	Consorcio Solar San Felipe

Carlos Ernesto Díaz Ospina	Profesional Universitario - Supervisor Designado	Secretaría de Planeación Departamental - Gobernación de Guainía
LILIANA PÉREZ RODRÍGUEZ	Contratista	Ministerio de Minas y Energía
Ivonne Cruz	Contratista	MME
Luis Felipe Velásquez Álvarez	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	Gobernación del Guainía
NIXON RODRIGUEZ	INGENIERO AMBIENTAL INTERVENTORIA	DINAMO DE COLOMBIA LTDA
Mauricio Vargas Pinto	Asesor	PGN

AGENDA	
1	Presentación estado del proyecto por parte entidad ejecutora.
2	Compromisos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Punto 1 de la agenda: Presentación del proyecto.

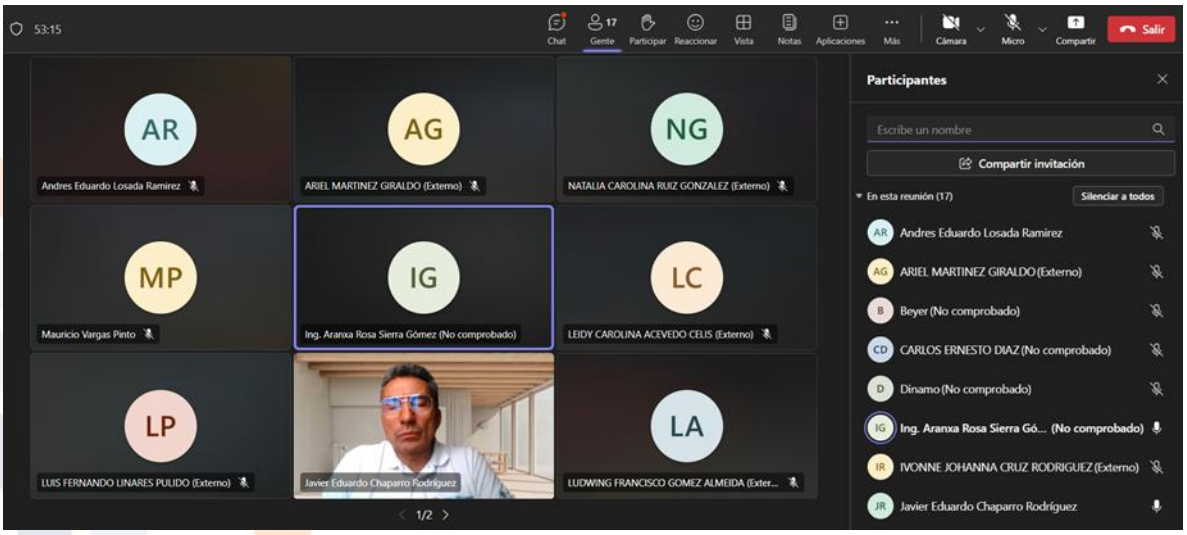

La Gobernación del Guainía realiza presentación del proyecto de inversión con el porcentaje de la ejecución física y financiera, estableciendo un balance de lo programado (Cronograma de Ejecución del proyecto), proyectando la siguiente información:

Concepto	Contrato de Obra No. 1582 de 2023	Contrato de Interventoría No. 1597 de 2023	Contrato de Apoyo a la Supervisión No. 1630 de 2023	Capacitación y Asistencia Técnica	Inspección Rete	Valor Disponible del Proyecto	Valor Total del Proyecto
Valor Inicial y/o contratado	$6.358.913.531,39	$309.494.178	$31.769.226,00	$9.457.951,00	$36.655.004,00	$16.239.077,61	$6.762.528.968,00
Valor Anticipo	$3.179.456.765,69	$123.797.671,20	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.303.254.436,89
% Anticipo	50%	40%	N.A.	0,00%	0,00%	0,00%	48,85%
Valor Ejecutado	$0,00	$14.737.818,00	$25.415.380,00	$0,00	$0,00	$0,00	$40.153.198,00
% avance programado	0,00%	0,00%	79,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,58%
% Avance Físico	0,00%	4.76%	79.99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%
% Avance Financiero	0,00%	0,00%	79.99%	0,00%	0,00%	0,00%	0.59%

Seguidamente, fue presentada la trazabilidad de la solicitud del ajuste, en trámite:

- Indicándose que el día 14 de mayo se llevo a cabo una mesa técnica con el Ministerio de Minas y Energía para resolver dudas sobre las observaciones dadas en la solicitud de ajuste el día 29 de abril.

- El 20 de mayo de 2024 la entidad ejecutora remitió la versión N°6 de la lista de requisitos exigibles conforme a aprobado mediante el Acuerdo No. 14 del 24 de marzo de 2023 del Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD Región Llanos para revisión y aprobación de la Secretaría Técnica del OCAD.

- El 23 de mayo de 2024 se realizó una mesa técnica la secretaria técnica del OCAD para exposición de las causas técnicas, jurídicas, financieras y ambientales de la solicitud de modificación y adición del proyecto. Del cual se está a la espera de respuesta de cumplimiento y aprobación de los requisitos, creación y registro en el SUIFP –SGR.

Los representantes del Ministerio de Minas y Energía precisaron que una vez se encuentre cargada la información entregada por la entidad ejecutora, y la Secretaría Técnica del OCAD les de traslado para emitir el concepto de viabilidad del ajuste, dentro de los términos legales, 12 días, este será emitido.

Continuando con la presentación se señala la Relación de pagos del anticipo, con fechas de giros a la Fiducia, contratistas, proveedores y rendimientos financieros, teniendo como base el informe de FIDUCOLDEX, entidad fiduciaria.

Amanera de conclusión frente a la inversión del anticipo se tiene:

1. **Ejecución del anticipo**: 70.18% destinado a materiales (saldo pendiente: $900.7 millones).

2. **Rendimientos**: Generaron $5.3 millones en abril, con giros acumulados de $198.2 millones.

3. **Impacto de la suspensión**: Sin pagos en abril, pero se mantienen rendimientos activos.

La presentación termina con la descripción de las situaciones presentadas durante la ejecución del proyecto, señalando suspensiones y reinicios y las causas que los generaron.

Una vez se cumplan los compromisos, el Grupo Especial de Seguimiento del SGR, revisará la información y convocará a una nueva mesa técnica de seguimiento al proyecto.

Punto 2 de la agenda:	Compromisos.

Luego de la formulación de preguntas, por parte de los Consultores del Grupo GES SGR PGN, las cuales fueron atendidas por parte de la entidad ejecutora e interventoría, se establecieron compromisos así:

COMPROMISOS

No	Descripción	Responsable	Fecha Final de compromiso
1	La entidad ejecutora emitirá una solicitud, a la Secretaría Técnica del OCAD llanos para que certifique el estado de la revisión y cargue de la información del ajuste que le entregara la Gobernación del Guainía, se debe indicar en la solicitud que la respuesta debe comunicarse a los correos vigilanciaintegralSGR@procuraduria.gov.co y delegadaregalias@procuraduria.gov.co.	Entidad ejecutora Carlos Ernesto Díaz Ospina	28/05/2025
2	Cumplimiento de los compromisos de publicidad de la mesa virtual de seguimiento adelantada el 29 de abril de 2025.	Entidad ejecutora Carlos Ernesto Díaz Ospina	Por definir

Se anexa lista de asistencia a la reunión.

GES SGR GRUPO ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN PNUD	**LISTA DE ASISTENCIA**	Código	FORPLA3
		Versión	1
		Página	Página **1** de **2**
	Planeación		

Fecha y hora: 28 de mayo de 2025, 10:00 a.m.

Tema: Mesa de seguimiento Proyecto BPIN: 2021000070023

Equipo: Grupo GES SGR PGN

Organizador: Grupo GES SGR PGN

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR
Andrés Eduardo Losada Ramírez	Consultor Jurídico	Grupo GES SGR PGN	e-alosada@procuraduría.gov.co	3142372377
Aranxa Rosa Sierra Gómez	Ingeniera profesional de apoyo a la supervisión SPID	GOBERNACION DE GUAINIA	aranxarsg@gmail.com	3004134921
Ariel Martínez Giraldo	Contratista	SGR - MME	amartinez@minenergia.gov.co	3012744321
LUIS FERNANDO LINARES PULIDO	CONTRATISTA	GRUPO REGALÍAS MME	lflinares@minenergia.gov.co	3112084148
LEIDY CAROLINA ACEVEDO	CONTRATISTA	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	LCACEVEDO@MINENERGIA.GOV.CO	3007601170
Natalia Carolina Ruiz González	Asesora	Ministerio de Minas y Energía	ncruiz@minenergia.gov.co	3214587548
Javier Chaparro Rodríguez	Consultor Técnico	PGN	e-jchaparro@procuraduria.gov.co	3015704538
Ludwing Gómez Almeida	Coordinador grupo regalías	Ministerio de minas y energía	lfgomez@minenergia.gov.co	3134242824
Beyer cantor	Profesional apoyo contratista	Consorcio Solar San Felipe	ing.beyer07@gmail.com	3183832231
Carlos Ernesto Díaz Ospina	Profesional Universitario - Supervisor Designado	Secretaría de Planeación Departamental - Gobernación de Guainía	infra.planeacion.guainia@gmail.com	3223651480
LILIANA PÉREZ RODRÍGUEZ	Contratista	Ministerio de Minas y Energía	lperezro@minenergia.gov.co	3118784656

Ivonne Cruz	Contratista	MME	ijcruz@mineenrgia.gov.co	3123737602
Luis Felipe Velásquez Álvarez	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	Gobernación del Guainía	Controlinterno@guainia.gov.co	3134988620
NIXON RODRIGUEZ	INGENIERO AMBIENTAL INTERVENTORIA	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	dinamocltda@gmail.com	3212509885

Energía	**FORMATO LISTA DE ASISTENTES**	SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	E-ME-F-07
		16-06-2023	V-4

TEMA O NOMBRE DE LA REUNIÓN		**Proyecto BPIN 20251301010328: Construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica en zona rural de los municipios de San Jacinto y San Juan Nepomuceno departamento de Bolívar**	**EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR**		**Ministerio de Minas y Energía**	
CIUDAD		**Virtual**	**LUGAR**		**Virtual**	
FECHA		**25/06/2025**	**HORA**		**2:00 p. m.**	
No.	**NOMBRE Y APELLIDO**	**ENTIDAD O DEPENDENCIA**	**CARGO**	**TELEFONO**	**CORREO ELECTRONICO**	**FIRMA**
1	Luis Fernando Linares	Ministerio de Minas y Energía - Grupo de Regalías	Contratista	3112084148	lflinares@minenergia.gov.co	
2	Juan Manuel Quiroz	San Jacinto	Secretario de Planeación	3017601605	planeacion@sanjacinto-bolivar.gov.co	
3	Manuel Medina	San Juan Nepomuceno	Secretario de Planeación	3007600050	planeacion@sanjuannepomuceno-bolivar.gov.co	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Presentación participantes
2. Contexto proyecto
3. Presentación observaciones ficha mga

No.	COMPROMISOS (*)	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLES
1	Remitir observaciones, Formato lista de usuarios y enlace Proyecto Tipo SISFV	25/06/2025	Grupo Regalías - Luis Linares
2	Revisar observaciones, remitir lista usuarios y adelantar ajustes al proyecto		ET que presenta el proyecto (San Jacinto)

*** Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones.**
Nota: Incluir las filas que se requieran.

Aviso para el tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí recolectados, son suministrados por usted de manera libre y voluntaria y se encuentran protegidos de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y la Politica de Protección de Datos Personales de la entidad. Si usted no autoriza el tratamiento de su información en la base de datos para uso institucional, por favor comunicarlo a la persona responsable del espacio en el cual se encuentra. Consulte la Política en: www.minenergía.gov.co.

Energía	**FORMATO LISTA DE ASISTENTES**	SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	E-ME-F-07
		16-06-2023	V-4

TEMA O NOMBRE DE LA REUNIÓN		**Proyecto BPIN 20251301010470: Construcción de infraestructura eléctrica en zona rural de los municipios de San Juan de Nepomuceno y El Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar**	**EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR**		**Ministerio de Minas y Energía**	
CIUDAD		**Virtual**	**LUGAR**		**Virtual**	
FECHA		**26/06/2025**	**HORA**		**8:00 a. m.**	
No.	**NOMBRE Y APELLIDO**	**ENTIDAD O DEPENDENCIA**	**CARGO**	**TELEFONO**	**CORREO ELECTRONICO**	**FIRMA**
1	Luis Fernando Linares	Ministerio de Minas y Energía - Grupo de Regalías	Contratista	3112084148	lflinares@minenergia.gov.co	
2	Manuel Medina	San Juan Nepomuceno	Secretario de Planeación	3007600050	planeacion@sanjuannepomuceno-bolivar.gov.co	
3	Anibal Gallo	El Carmen de Bolívar	Secretario de Planeación	3206222702	oficinadeplaneacion@elcarmen-bolivar.gov.co	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Presentación participantes
2. Contexto proyecto
3. Presentación observaciones ficha mga

No.	COMPROMISOS (*)	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLES
1	Remitir observaciones	26/06/2025	Grupo Regalías - Luis Linares
2	Revisar observaciones y adelantar ajustes al proyecto		ET que presenta el proyecto (San Juan Nepomuceno)

*** Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones.**
Nota: Incluir las filas que se requieran.

Aviso para el tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí recolectados, son suministrados por usted de manera libre y voluntaria y se encuentran protegidos de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y la Politica de Protección de Datos Personales de la entidad. Si usted no autoriza el tratamiento de su información en la base de datos para uso institucional, por favor comunicarlo a la persona responsable del espacio en el cual se encuentra. Consulte la Política en: www.minenergía.gov.co.

Junio 2025

Calendario, Calendario

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
26 May 8:00 REUNIÒN FORMUL 9:00 #Capacitación Part	27 11:00 Equipo MinEnergí	28 10:00 PGN-Convocatoria	29	30	31	1 Jun
02 8:00 REUNIÒN FORMUL	03	04 8:00 Revisión Punto de Co	05 9:00 RE: Proyecto Tipo S 14:00 CRITERIOS GENERAL 14:00 #Socialización Ac	06	07	08
09 8:00 REUNIÒN FORMUL 9:00 Mesa técnica Minener	10 8:00 Capacitación Evaluaci 8:30 #SeguridadVial Fa 15:20 mesa tecnica sabana 15:20 Reunión sábana de t	11 10:00 Mesa técnica SSIFV-F	12 9:30 Conéctate y conoce c	13 8:30 VERIFICAR - NOTAS TI 15:00 Capacitación QGIS	14	15
16 8:00 REUNIÒN FORMUL 10:00 #Socialización Tra 15:00 Capacitación QGIS	17	18 9:00 #Capacitación | Conoc	19 8:00 ¿Sabes cómo interactu 9:00 NIVEL DE AVANCE- PF 15:00 Criterios Unificados -	20 10:00 #Charla Aprendan 15:00 Capacitación QGIS	21	22
23 8:00 REUNIÒN FORMUL	24 9:00 #Capacitación Conc	25 9:00 NIVEL DE AVANCE- PF 14:00 Mesa Técnica BPIN 2 14:30 Mesa Técnica BPIN 2	26 8:00 Mesa Técnica BPIN 20 8:00 #Capacitación Gest	27 10:00 Mesa técnica BPIN 2	28	29
30 8:00 REUNIÒN FORMUL	1 Jul	02	03	04	05	06
