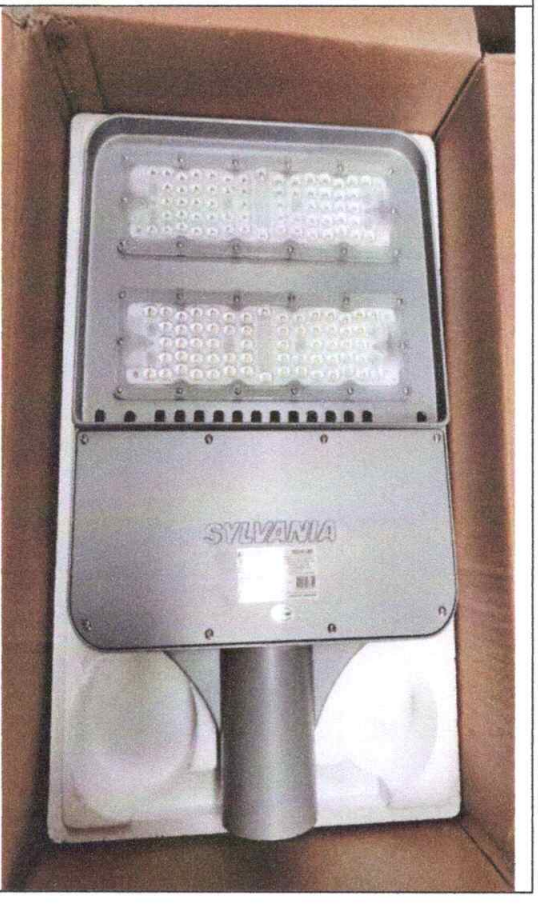
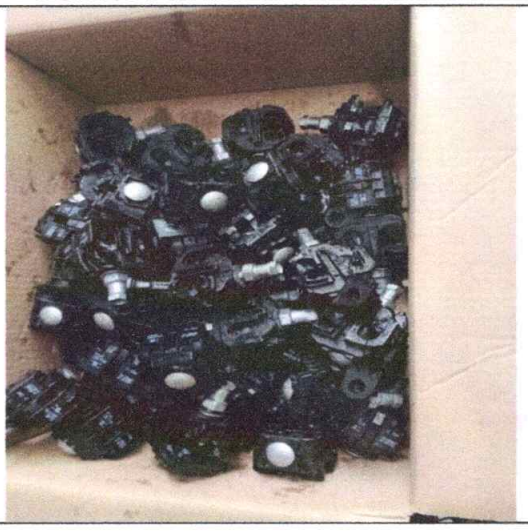
INFORME FOTOGRÁFICO Y ESCRITO - ALUMBRADO MUNICIPIO DE ARCABUCO

CONTRATO SAMC MA 007-2025

SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ORIENTADOS A LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO

ARCABUCO – BOYACÁ
2025


Brazo galvanizado para luminaria de 11/2" con collarín	Brazos
	
CABLE AISLADO 3X14	**Luminaria LED**
	

CONECTORES PERFORANTES	LUMINARIA LED 80 WATIOS
	


LUMINARIA ARMADA CON BRAZO, CABLE, FOTOCELDA



INSTALACIÓN LUMINARIAS VEREDA RUPAVITA VARIOS SECTORES

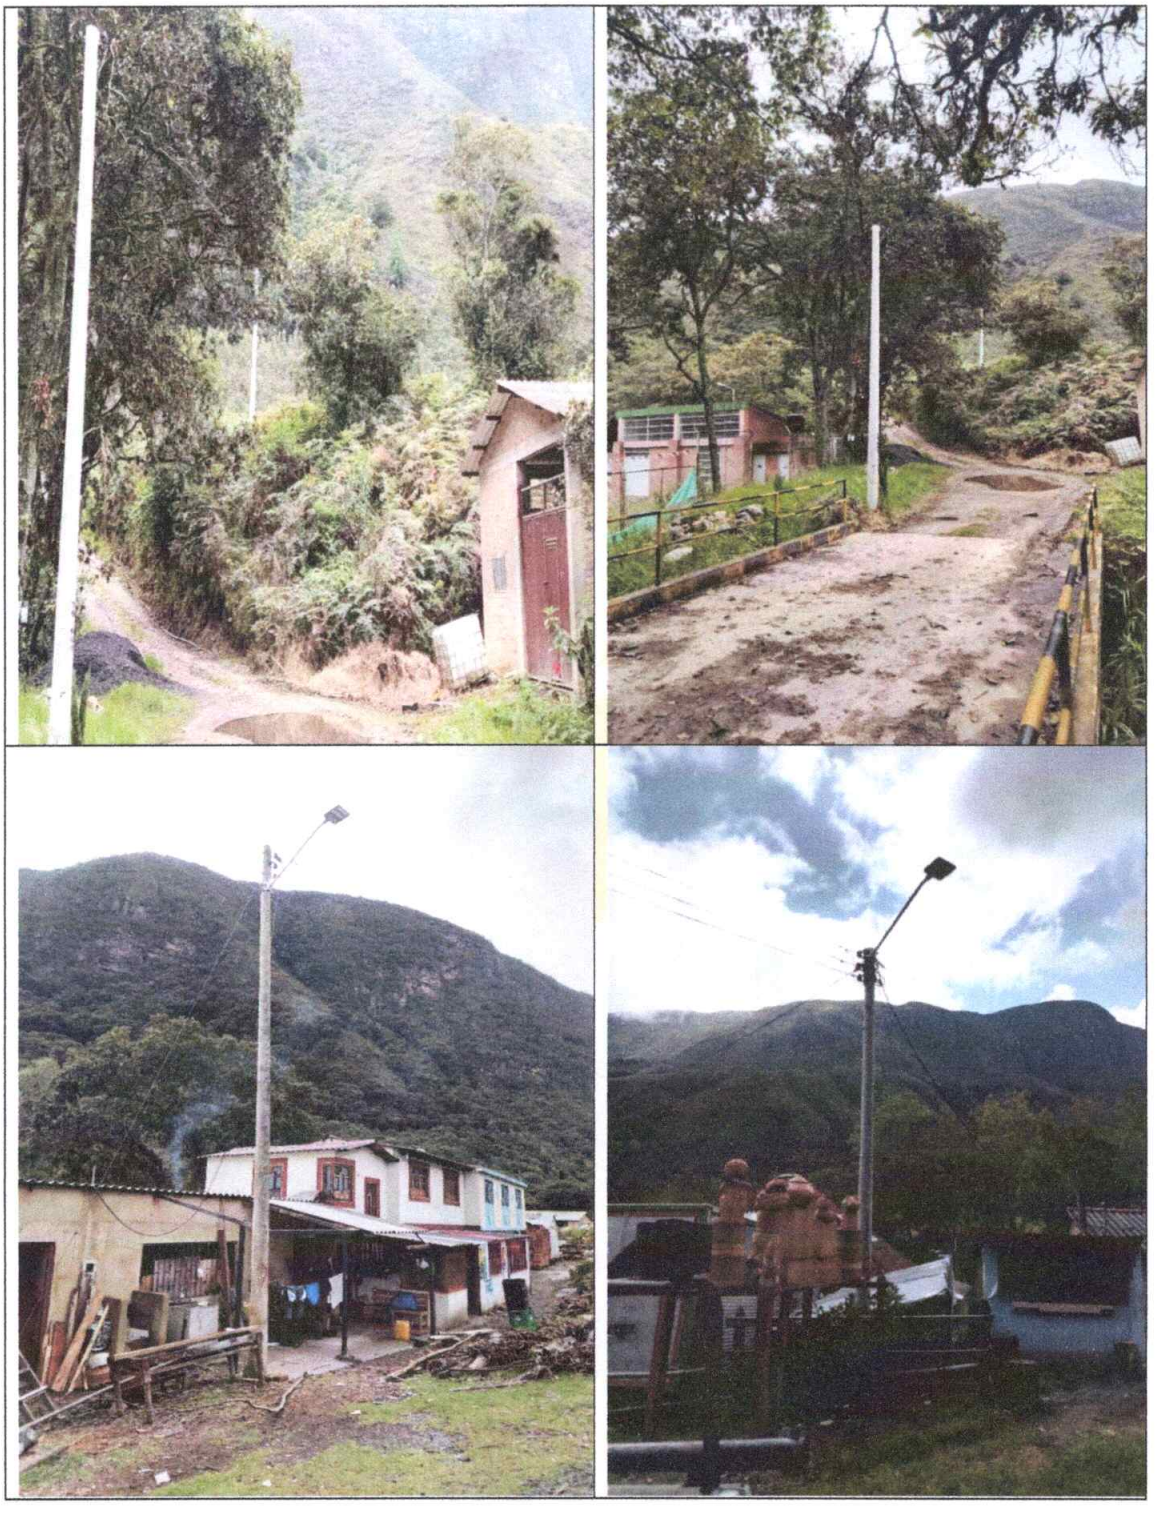



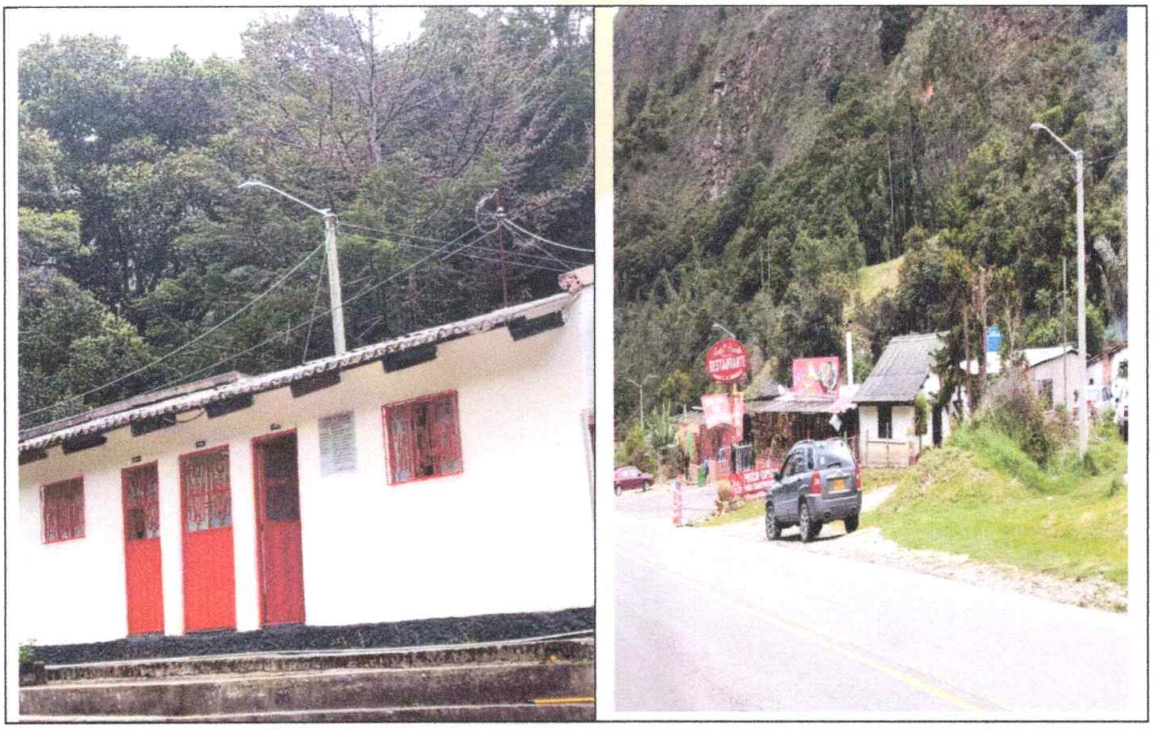



VEREDA QUIRVAQUIRA 2 SECTOR CARROCERIAS






LUMINARIAS INSTALADAS EN FUNCIONAMIENTO ENCENDIDAS DE NOCHE




INSTALACIÓN LUMINARIAS VEREDA QUIRVAQUIRA 1 "SECTOR CASA BLANCA"

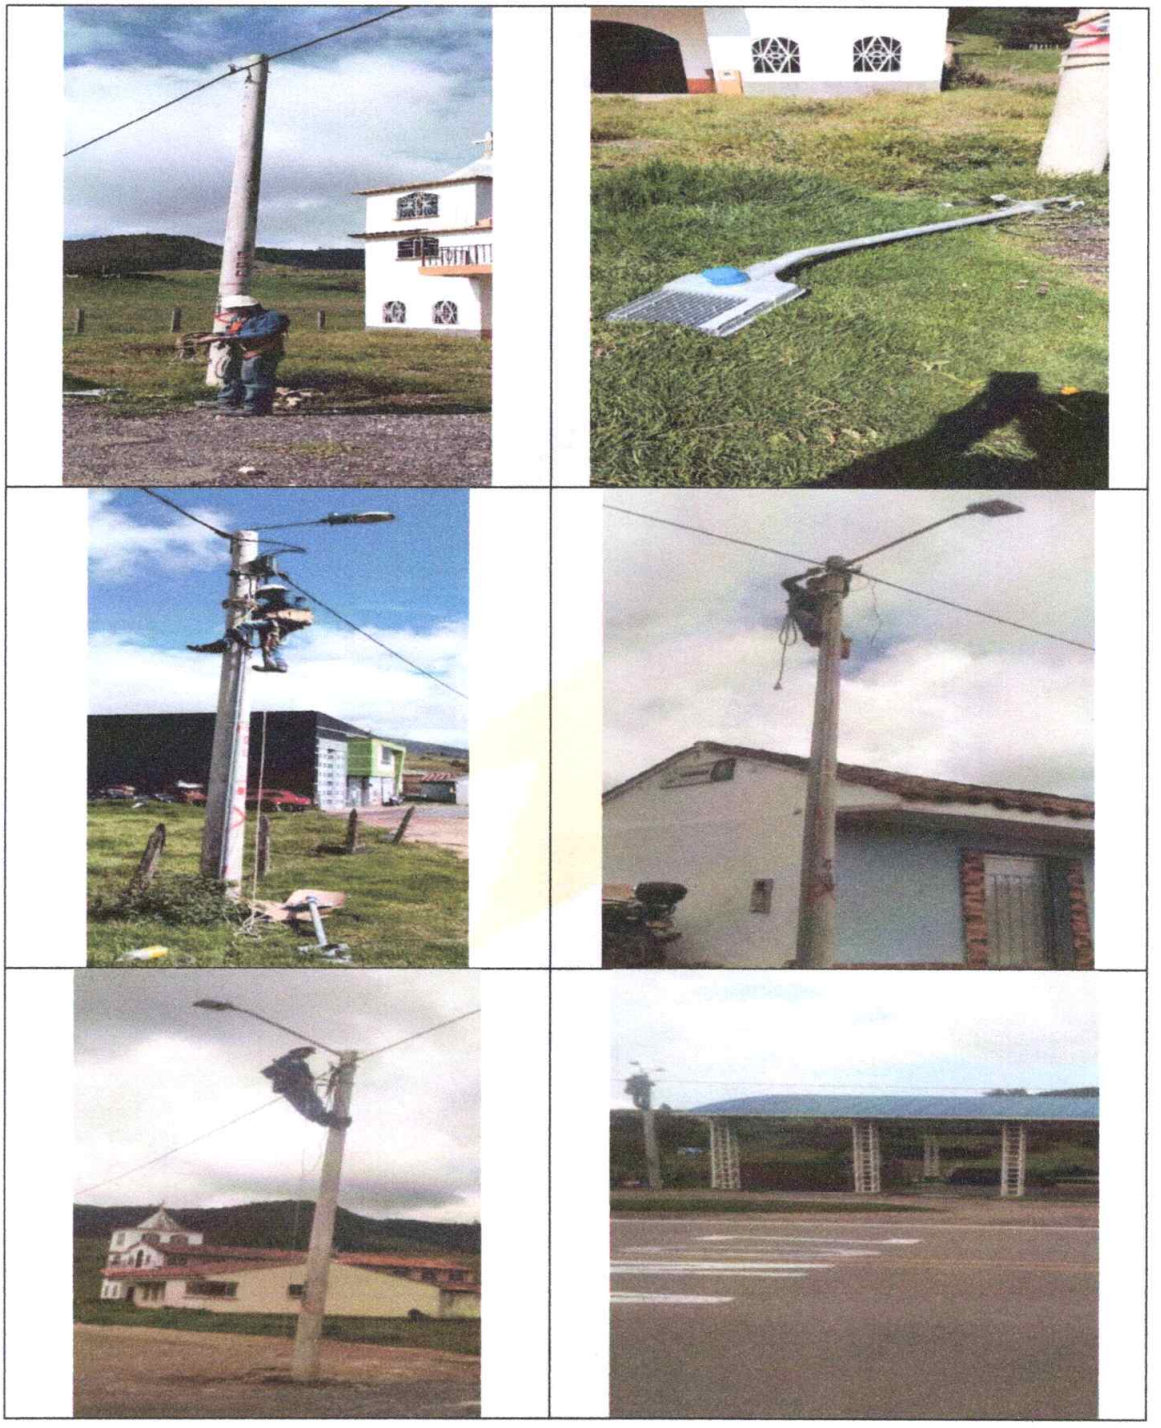



QUIRVAQUIRA SECTOR CARROCERIAS

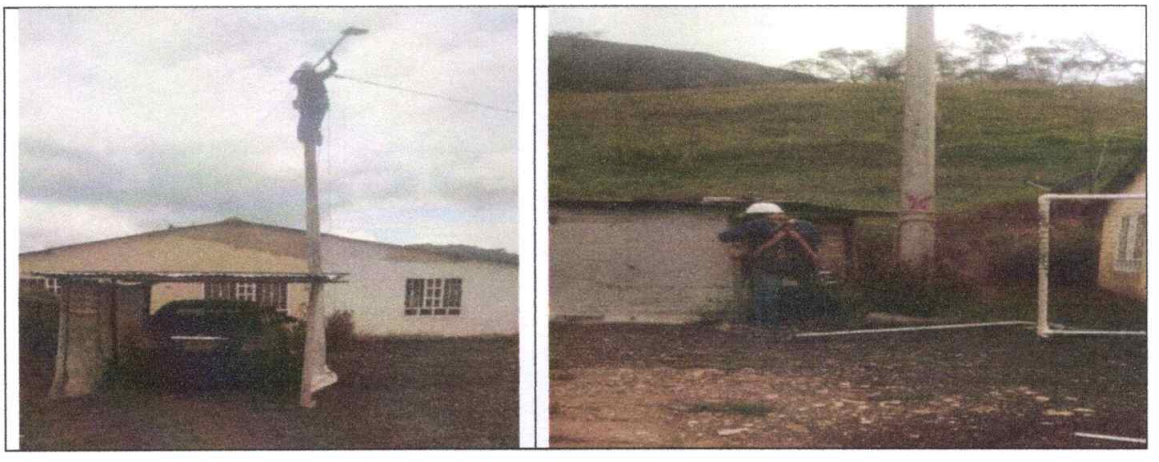



INSTALACIÓN LUMINARIAS LED –SECTOR RUPAVITA



INFORME ESCRITO

Para la ejecución del contrato en mención se desarrolló una serie de actividades previas tales como:

1.revision de las estructuras o posterío instalada en cada uno de los sitios de los tres sectores a intervenir.

Vereda QUIRVAQUIRA 1 sector CASA BLANCA

Vereda QUIRVAQUIRA 2 sector CARROCERIAS

Vereda RUPAVITA: Restaurantes, taller de ornamentación, Museo, Artesanías, Muebles.

Una vez visitado los sitios por nuestro personal técnico y profesional, se comprobó que la infraestructura reunía las condiciones para instalar el alumbrado, y para efectos de suscribir y firmar el acta de inicio de obra, se acordó y realizo la visita con las autoridades Municipales: alcalde, secretario Planeación, concejales y comunidad.

Durante la visita se tuvo en cuenta las grandes necesidades de iluminación de estos sectores, dado que son frecuentados por personas de las veredas, habitantes del sector, y la petición de las comunidades para que se implementara el alumbrado por los riesgos en el cruce de las vías, la inseguridad y los accidentes presentados ante el escaso o casi nulo número de luminarias instaladas, que son de tecnología obsoleta o se encuentran en mal estado.

Adquiridas las luminarias y demás accesorios contratados, se buscó un sitio cercano a los lugares por intervenir, para almacenar, armar y luego distribuir teniendo en cuenta que con los resultados de la visita se obtuvo los siguientes datos:

- En Quirvaquira 1, se instalarán 2º luminarias

- En Quirvaquira 2, se instalarán 12

Y las restantes 12 luminarias LED en cinco pequeños subsectores dentro de la vereda siguiendo el corredor cercano a la vía principal que comunica al municipio de Arcabuco con la ciudad de Tunja.

Dentro del plazo convenido y estipulado dentro del contrato se ejecutó dicha instalación, teniendo en cuenta que las luminarias fueron probadas previamente

para evitar demoras y riesgos durante el proceso de subida y colgada en las estructuras definidas con antelación.

En el siguiente cuadro resumen se detalla el número de luminarias efectivamente instaladas en cada uno de los sectores intervenidos:

VEREDA O SECTOR	No. LUMINARIAS INSTALADAS
Quirvaquira 1	20
Quirvaquira 2	12
Rupavita	12
Total	**44**

Tan pronto se terminó la obra se realizó visita de recibo a satisfacción con el Arquitecto Cristian Camilo Largo Segura, Alcalde Dr. Carlos David Zarate Báez, Ingeniero Jorge Pulido Cuadros Representante Legal INGELCO PROYECTOS E.U. firma contratista, comunidad de cada uno de los sectores, concejales y visitantes.

JORGE PULIDO CUADROS
REPRESENTANTE LEGAL
INGELCO PROYECTOS E.U.
