
7. TABLA DE ANEXOS

No DE ANEXOS	DESCRIPCION
Anexo 1	Presupuesto ejecutado octubre
Anexo 2	Memoria de cantidades corte 31 octubre de 2024
Anexo 3	Curva S – Presupuesto programado vs presupuesto ejecutado.
Anexo 4	Cursa S – Porcentaje programado vs porcentaje ejecutado.



CARLOS ADOLFO GUTIÉRREZ PINTO
Representante Legal
Consorcio de García Rovira.
C.C. 91.273.201 de Bucaramanga

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
1,06	DEMOLICION DE CIMIENTOS ENTERRADOS

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	M3
	Ancho	Largo (M)	Alto	Vol	TOTAL	22,04
MODULO D						
VIGAS	0,60	1,00	0,90	0,54		0,54
	0,60	3,40	1,00	2,04		2,04
	0,60	3,00	1,00	1,80		1,80
	0,60	4,40	1,00	2,64		2,64
	0,60	2,50	1,00	1,50		1,50
	0,60	14,70	1,00	8,82		8,82
	1,00	0,60	0,60	0,36		0,36
	2,40	0,70	0,50	0,84		0,84
MODULO E						
VIGA	0,70	5,00	1,00	4		3,50

ACUMULADO	22,04
ACTA MODIFICATORIA 3	108,76
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	86,72
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	20,84
CANTIDADES PRESENTE ACTA	1,20

OBSERVACIONES: Demolicion de cimientos enterrados en el modulo D y E existentes.

UBICACIÓN PLANO

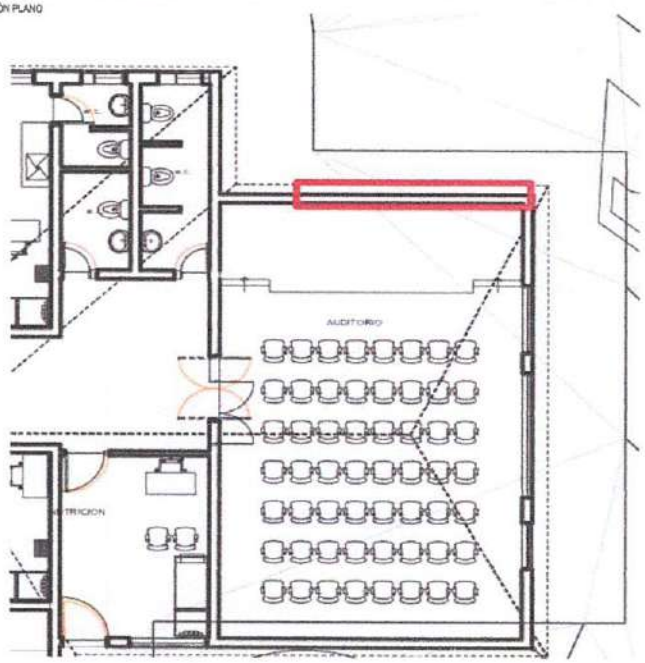










ALEXIS RONCON MUNOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
1,08	DEMOLICIÓN DE MUROS TABICÓN TOLETE COMÚN 10 - 15CM, INCLUYE RETIRO				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	167,51
	Ancho	Largo (M)	Alto	Cant		
MODULO E						
MURO CARA POSTERIOR HACIA MODULO A		3,30	2,2	5		36,30
MODULO F						
M1		3,90	3,30			12,87
M2		3,65	3,30			12,05
M3		7,00	3,30			23,10
CIRCUNFERENCIA QUIROFANOS		15,40	3,30			50,82
M4		1,65	3,30			5,45
M5		1,50	3,30			4,95
M6		2,70	3,30			8,91
M7		2,70	3,30			8,91
M8		1,26	3,30			4,16
					ACUMULADO	167,51
					ACTA MODIFICATORIA 3	1001,77
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	834,26
					COBRADAS PARCIAL No 1	
					COBRADAS PARCIAL No 2	
					COBRADAS PARCIAL No3	36,30
					CANTIDADES PRESENTE ACTA	131,21
OBSERVACIONES:						

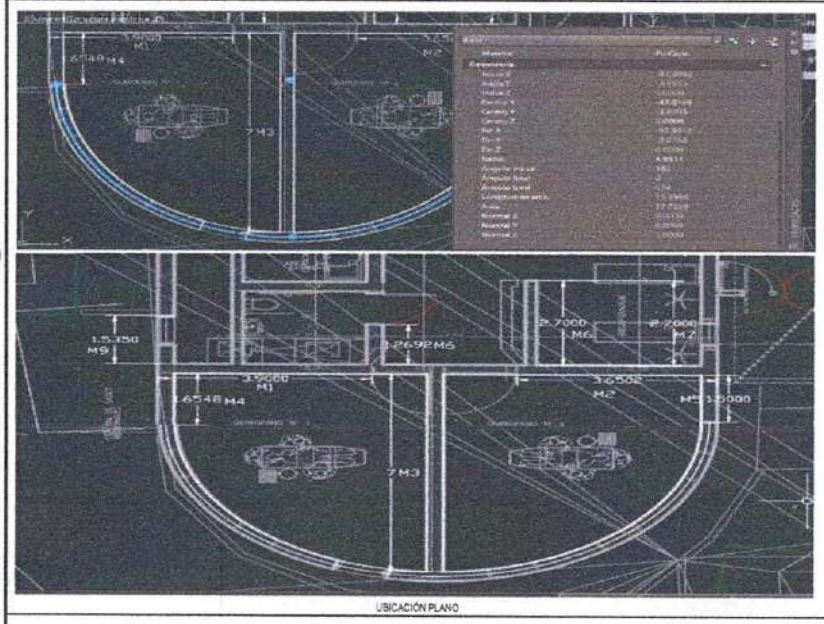

UBICACIÓN PLANO

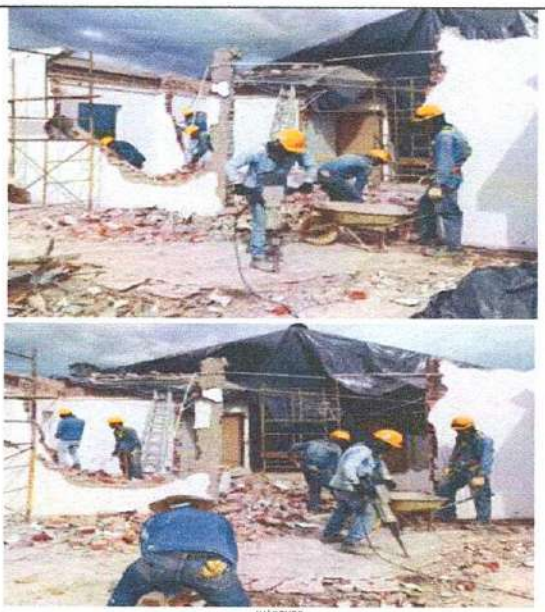

IMÁGENES


ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO BANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
1,09	DESMONTE Y RETIRO CUBIERTA (TEJA A-C) Y ESTRUCTURA, INCLUYE RETIRO				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	481,09
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)		
MODULO D EXISTENTE						
CUBIERTA	11,50	15,66		180,09	180,09	180,09
CUBIERTA	11,50	8,90		102,35	102,35	102,35
CUBIERTA	13,55	6,94		94,04	94,04	94,04
MODULO f EXISTENTE						
CUBIERTA CAMAS HOSPITALIZACION				49,71		49,71
CUBIERTA SEMICIRCUNFERENCIA				54,90		54,90
					ACUMULADO	481,09
					ACTA MODIFICATORIA 3	1042,29
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	561,20
					COBRADAS PARCIAL No 1	
					COBRADAS PARCIAL No 2	376,48
					COBRADAS PARCIAL No3	
					CANTIDADES PRESENTE ACTA	104,61

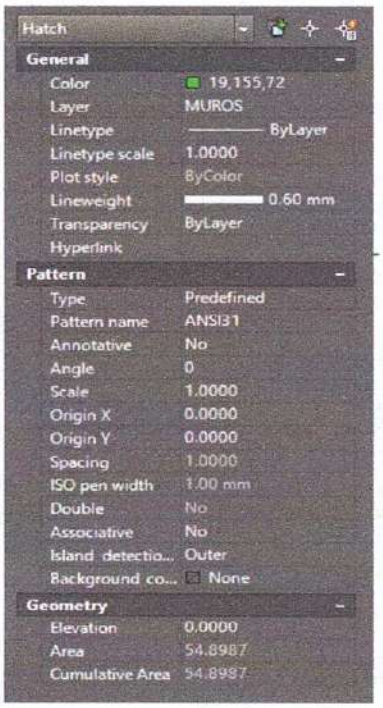

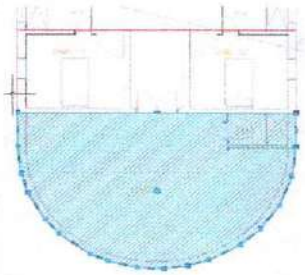





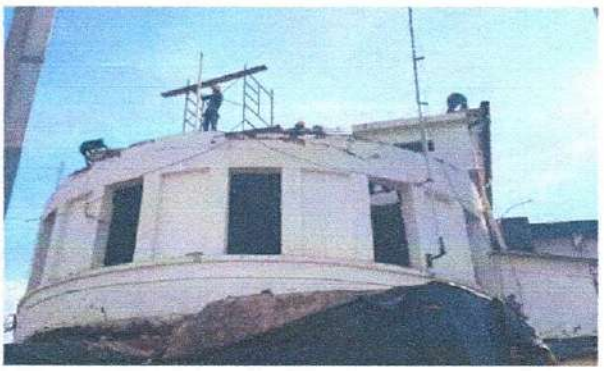

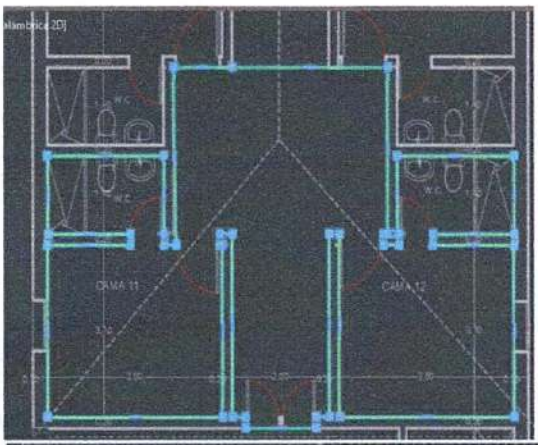



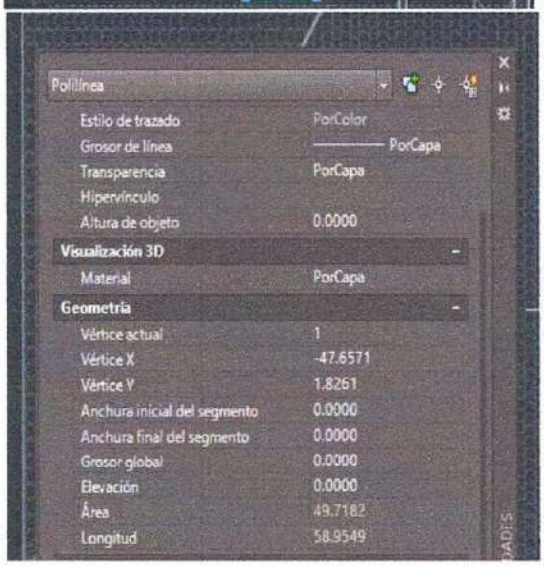

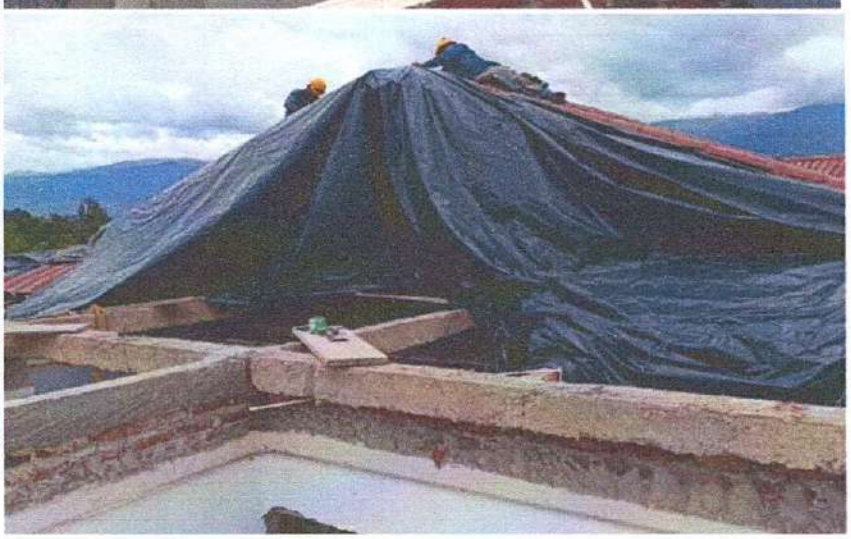

ALEXIS ROJON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
1,11	DEMOLICION DE PLACA DE PISO				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	421,23
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL
MODULO B						
FRENTE HABITACIONES INTENSIVA	20,30	0,60		12		12,18
PASILLO HABITACIONES NORTE	8,30	0,60		5		4,98
PASILLO HABITACION SUR	7,30	0,60		4		4,38
PASILLO ZONAS HUMEDAS	8,20	0,60		5		4,92
BAÑO PACIENTES	18,00	0,60		11		10,80
BAÑO AISLADOS	5,20	0,60		3		3,12
PASILLO OCCIDENTE	15,90	0,60		10		9,54
CAJAS	0,80	0,80		1		0,64
CAJAS	0,60	0,60		0		0,36
CAJAS	0,60	0,60		0		0,36
CAJAS	0,60	0,60		0		0,36
CAJAS	0,60	0,60		0		0,36
ZAPATAS	1,50	1,50		2		2,25
ZAPATAS	1,50	1,50		2		2,25
ZAPATAS	1,50	1,50		2		2,25
ZAPATAS	1,50	1,50		2		2,25
MODULO D						
Ñ1 10´1´	2,10	2,10		4,41		4,41
VC CIM 10´1´	0,60	2,80		1,68		1,68
	0,80	9,30		7,44		7,44
O1 10´1´	2,30	2,70		6,21		6,21
VG CIM Ñ1´	0,70	4,50		3,15		3,15
VG CIM 9´1´	3,70	8,30		30,71		30,71
	0,80	6,00		4,80		4,80
P1 9´1´	2,40	3,00		7,20		7,20
VC CIM O1	0,60	1,90		1,14		1,14
Eje P1 - 10´1´	0,70	3,45		2,42		2,42
EJE P1 - 9´1´ AL Ñ1 - 9´1´	4,20	9,20		38,64		38,64
EJE P1 - 8´ AL Ñ1 -8´	3,70	4,70		17,39		17,39
EJE P1 - 7´ AL Ñ1 -7´	3,00	9,20		27,60		27,60
MODULO E						
ZAPATA EJE G1-14	1,25	1,25		1,56		1,56
ZAPATA EJE G1-13	1,25	1,25		1,56		1,56
ZAPATA EJE G1-12	1,25	1,25		1,56		1,56
ZAPATA EJE H1-14	1,25	1,25		1,56		1,56
ZAPATA EJE H1-12	1,25	1,25		1,56		1,56
CORREDOR RESONADOR	20,00	2,30		46,00		46,00
MODULO F						
TERRAZA QUIROFANOS 2 PISO				52,10		52,10
	2,30	1,37				3,15
	3,00	1,00				3,00
	4,40	3,40				14,96
CIRUGIA						
OBSERVACION DE CIRUGIA	1,20	2,60		3,12		3,12
	1,10	0,80		0,88		0,88
PISO RESONADOR	31,00	1,50		46,50		46,50
TANQUE DE ALMANCENAMIENTO						
DEMOLICION PLACA SUPERIOR	4,40	3,40		14,96		14,96
DEMOLICION PLACA INFERIOR	4,40	3,40		14,96		14,96

	ACUMULADO	421,23
	ACTA MODIFICATORIA 3	1656,69
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1235,46
	COBRADAS PARCIAL No 1	

	COBRADAS PARCIAL No 2	7,81
	COBRADAS PARCIAL No3	340,21
	CANTIDADES PRESENTE ACTA	73,21
OBSERVACIONES:		

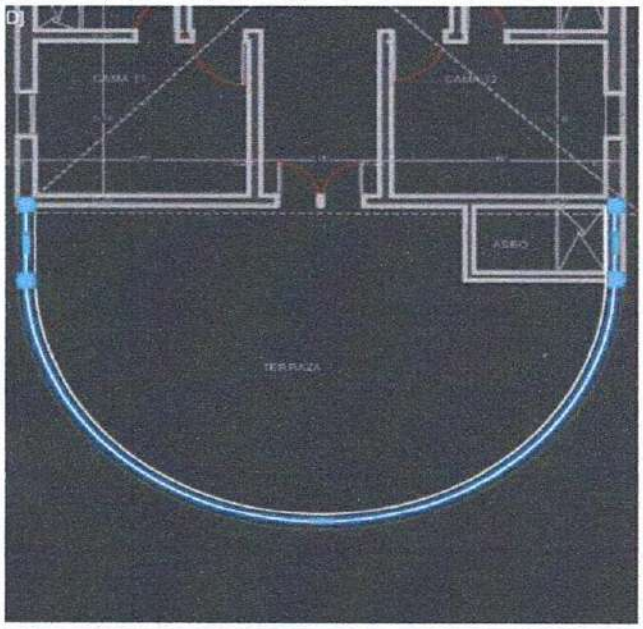

Polilínea	
Estilo de trazado	PorColor
Grosor de línea	PorCapa
Transparencia	PorCapa
Hipervínculo	
Altura de objeto	0.0000
Visualización 3D	
Material	PorCapa
Geometría	
Vértice actual	1
Vértice X	-47.8093
Vértice Y	-1.6757
Anchura inicial del segmento	0.0000
Anchura final del segmento	0.0000
Grosor global	0.0000
Elevación	0.0000
Área	52.1055
Longitud	18.3021
Varios	
Cerrado	No
Creación de tipos de línea	Desactivada







ALEXIS ROJON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
1,14	DEMOLICION DE PISOS


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	M2
					TOTAL	57,39
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
CUARTO 1	2,74	3,20		8,77		8,77
CUARTO 2	2,74	3,20		8,77		8,77
CUARTO 3	2,74	3,20		8,77		8,77
CUARTO 4	2,68	2,90		7,77		7,77
CUARTO 5	2,68	2,90		7,77		7,77
CUARTO 6	2,68	2,90		7,77		7,77
CUARTO 7	2,68	2,90		7,77		7,77

ACUMULADO	57,39
ACTA MODIFICATORIA 3	63,28
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	5,89
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No 3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	57,39

OBSERVACIONES:

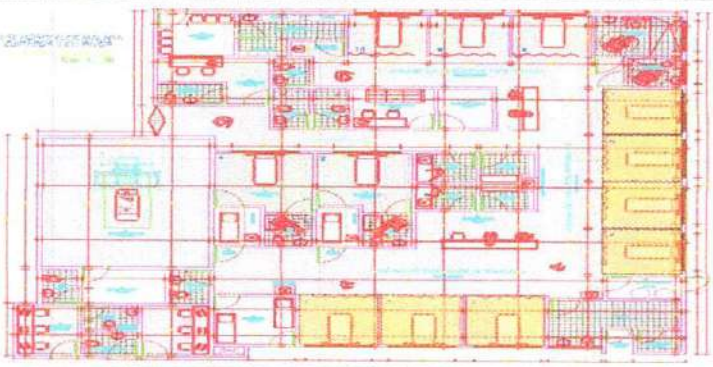



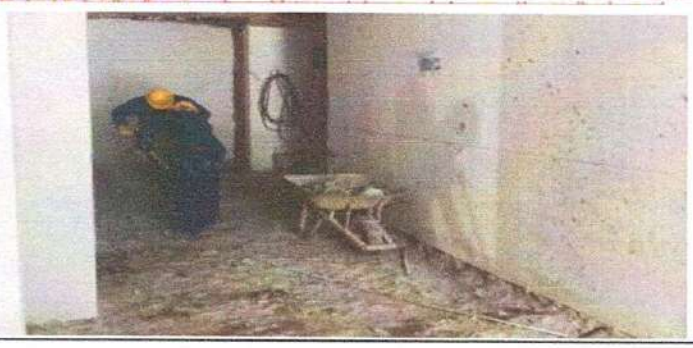




ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
1,15	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS				UNIDAD	UND
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	159,00
	Ancho	Largo (M)	Alto	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
PUERTAS DOBLES PASILLOS				8		8,00
PUERTAS HABITACIONES				13		13,00
PUERTAS BAÑOS				6		6,00
PUERTAS ZONAS HUMEDAS				17		17,00
PUERTAS PERSONAL MEDICO				5		5,00
VENTANAS PERIMETRALES				8		8,00
VENTANAS DE PASILLO				8		8,00
MODULO B						
PUERTAS				8		8,00
VENTANAS				15		15,00
MODULO D						
PUERTAS				13		13,00
VENTANAS				31		31,00
MODULO F						
PUERTAS 1 PISO				8		8,00
VENTANAS 1 PISO				11		11,00
PUERTAS 2 PISO				6		6,00
VENTANAS 2 PISO				2		2,00
					ACUMULADO	159,00
					ACTA MODIFICATORIA 3	189,00
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	30,00
					COBRADAS PARCIAL No 1	
					COBRADAS PARCIAL No 2	117,00
					COBRADAS PARCIAL No3	15,00
					CANTIDADES PRESENTE ACTA	27,00
OBSERVACIONES:						

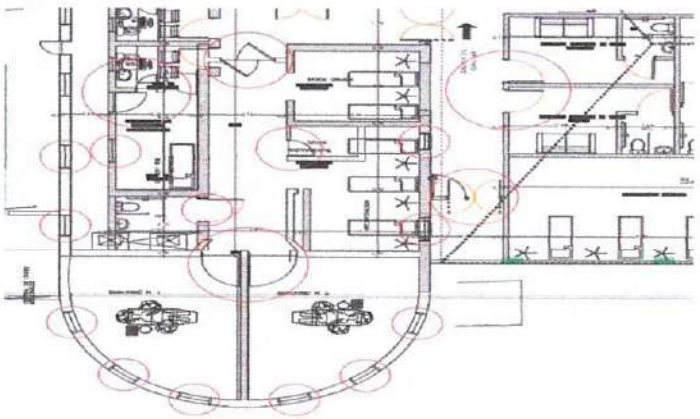



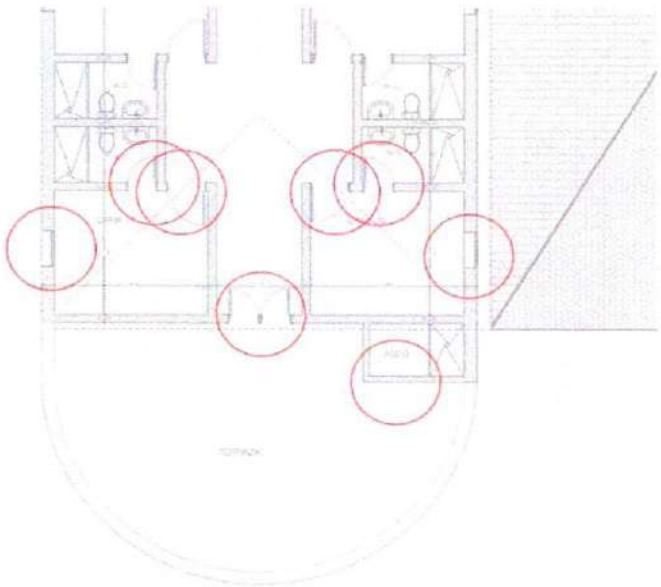

UBICACIÓN PLANO







IMÁGENES

ALEXIS KONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
2,01	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO DE SOBRANTES				UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	8028,59
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Volumen	SUBTOTAL
MODULO A						
MODULO A SECCION HASTA NIVEL -4.30						
MODULO A SECCION (+ 00.00 HASTA + 0.05)		5,00		8,19	94,93	94,93
MODULO A SECCION (+ 0.050 HASTA + 10.00)		5,00		29,78	247,70	247,70
MODULO A SECCION (+ 10.00 HASTA + 15.00)		5,00		69,30	377,58	377,58
MODULO A SECCION (+ 15.00 HASTA + 20.00)		5,00		81,73	313,95	313,95
MODULO A SECCION (+ 20.00 HASTA + 25.00)		5,00		43,85	203,98	203,98
MODULO A SECCION (+ 25.00 HASTA + 30.00)		5,00		37,74	182,73	182,73
MODULO A SECCION (+ 30.00 HASTA + 35.00)		5,00		35,35	179,53	179,53
MODULO A SECCION (+ 35.00 HASTA + 40.00)		5,00		36,46	164,20	164,20
MODULO A SECCION (+ 40.00 HASTA + 45.00)		5,00		29,22	164,33	164,33
MODULO A SECCION (+ 45.00 HASTA + 50.00)		5,00		36,51	218,80	218,80
MODULO A SECCION (+ 50.00 HASTA + 55.00)		5,00		51,01	256,00	256,00
MODULO A SECCION (+ 55.00 HASTA + 60.00)		5,00		51,39	251,33	251,33
MODULO A SECCION (+ 60.00 HASTA + 65.00)		5,00		49,14	244,18	244,18
MODULO A SECCION (+ 65.00 HASTA + 70.00)		5,00		48,53	250,73	250,73
MODULO A SECCION (+ 70.00 HASTA + 75.00)		5,00		51,76	210,80	210,80
MODULO A SECCION (+ 75.00 HASTA + 80.00)		5,00		32,56	138,50	138,50
MODULO A SECCION (+ 80.00 HASTA + 85.00)		5,00		22,84	108,88	108,88
MODULO A SECCION (+ 85.00 HASTA + 90.00)		5,00		20,71	77,03	77,03
MODULO A SECCION (+ 90.00 HASTA + 95.00)		5,00		10,10	35,08	35,08
MODULO A SECCION (+ 95.00 HASTA + 100.00)		5,00		3,93	18,63	18,63
MODULO A SECCION (+ 100.00 HASTA + 105.00)		5,00		3,52	19,55	19,55
MODULO A SECCION (HASTA + 105.00)		5,00		4,30	10,75	10,75
EXCAVACION ZAPATAS						
EJE A-1	1,50	1,50	2,45		5,51	5,51
EJE A-2	2,00	2,00	2,51		10,04	10,04
EJE A-3	2,50	2,50	3,93		24,56	24,56
EJE A-4	2,50	2,50	3,80		23,75	23,75
EJE B-1	1,50	1,50	2,60		5,85	5,85
EJE B-2	2,50	2,50	3,58		22,38	22,38
EJE B-3	2,50	2,50	2,79		17,44	17,44
EJE B-4	2,50	2,50	3,60		22,50	22,50
EJE C-1					0,00	0,00
EJE C-2					0,00	0,00
EJE C-3	2,50	2,50	3,14		19,63	19,63
EJE C-4	2,50	2,50	3,33		20,81	20,81
EJE D-1					0,00	0,00
EJE D-2					0,00	0,00
EJE D-3	2,50	2,50	2,59		16,19	16,19
EJE D-4	2,50	2,50	3,40		21,25	21,25
EJE E-1					0,00	0,00
EJE E-2					0,00	0,00
EJE E-3	2,50	2,50			0,00	0,00
EJE E-4	2,50	2,50	3,30		20,63	20,63
EJE F-1					0,00	0,00
EJE F-2					0,00	0,00
EJE F-3	2,50	2,50	2,75		17,19	17,19


EJE F-4	2,50	2,50	3,20		20,00	20,00
EJE G-1					0,00	0,00
EJE G-2	2,75	2,75	2,58		19,51	19,51
EJE G-3	2,75	2,75	2,85		21,55	21,55
EJE G-4	2,50	2,50	3,44		21,50	21,50
EJE H-1					0,00	0,00
EJE H-2	2,75	2,75	2,85		21,55	21,55
EJE H-3	2,75	2,75	3,00		22,69	22,69
EJE H-4	2,50	2,50	3,44		21,50	21,50
EJE I-1					0,00	0,00
EJE I-2	2,50	2,50	2,91		18,19	18,19
EJE I-3	2,50	2,50	2,80		17,50	17,50
EJE I-4	2,50	2,50	3,44		21,50	21,50
EJE J-1					0,00	0,00
EJE J-2					0,00	0,00
EJE J-3					0,00	0,00
EJE J-4	2,50	2,50	3,44		21,50	21,50
EJE K-1					0,00	0,00
EJE K-2					0,00	0,00
EJE K-3					0,00	0,00
EJE K-4	2,50	2,50	3,44		21,50	21,50
EXCAVACION MUROS DE CONTENCION						
MURO CONTENCION 2.40 MTS ENTRE EJES G - 4 Y H - 4	2,80	7,95	3,44		76,57	76,57
DESCUENTO ZAPATAS G - 4					-21,50	-21,50
MURO CONTENCION 4.40 MTS ENTRE EJES H -4 Y K - 4	3,50	28,30	3,44		340,73	340,73
DESCUENTO ZAPATAS H - 4, I - 4, J - 4, y K - 4					-86,00	-86,00
EXCAVACION VIGAS DE CIMENTACION						
VIGA EJE 4 ENTRE EJE A - B	0,40	4,53	0,50		0,91	0,91
VIGA EJE 4 ENTRE EJE B - C	0,40	5,51	0,50		1,10	1,10
VIGA EJE 4 ENTRE EJE C - D	0,40	2,93	0,50		0,59	0,59
VIGA EJE 4 ENTRE EJE D - E	0,40	5,56	0,50		1,11	1,11
VIGA EJE 4 ENTRE EJE E - F	0,40	6,75	0,50		1,35	1,35
VIGA EJE 4 ENTRE EJE F - G	0,40	7,22	0,50		1,44	1,44
VIGA EJE 3 ENTRE EJE A - B	0,40	4,53	0,50		0,91	0,91
VIGA EJE 3 ENTRE EJE B - C	0,40	5,51	0,50		1,10	1,10
VIGA EJE 3 ENTRE EJE C - D	0,40	2,93	0,50		0,59	0,59
VIGA EJE 3 ENTRE EJE D - E	0,40	5,56	0,50		1,11	1,11
VIGA EJE 3 ENTRE EJE E - F	0,40	6,75	0,50		1,35	1,35
VIGA EJE 3 ENTRE EJE F - G	0,40	7,22	0,50		1,44	1,44
VIGA EJE 3 ENTRE EJE G - H	0,40	6,58	0,50		1,32	1,32
VIGA EJE 3 ENTRE EJE H - I	0,40	8,49	0,50		1,70	1,70
VIGA EJE 3 ENTRE EJE I - J	0,40	4,94	0,50		0,99	0,99
VIGA EJE 3 ENTRE EJE J - K	0,40	6,76	0,50		1,35	1,35
VIGA EJE 2 ENTRE EJE A - B	0,40	4,93	0,50		0,99	0,99
VIGA EJE 2 ENTRE EJE H - I	0,40	8,66	0,50		1,73	1,73
VIGA EJE 2 ENTRE EJE I - J	0,40	4,19	0,50		0,84	0,84
VIGA EJE 2 ENTRE EJE J - K	0,40	6,76	0,50		1,35	1,35
VIGA EJE 1 ENTRE EJE A - B	0,40	4,30	0,50		0,86	0,86
VIGA EJE A ENTRE EJE 1 - 2	0,40	2,64	0,50		0,53	0,53
VIGA EJE A ENTRE EJE 2 - 3	0,40	4,32	0,50		0,86	0,86
VIGA EJE A ENTRE EJE 3 - 4	0,40	7,75	0,50		1,55	1,55
VIGA EJE B ENTRE EJE 1 - 2	0,40	2,52	0,50		0,50	0,50
VIGA EJE B ENTRE EJE 2 - 3	0,40	4,27	0,50		0,85	0,85
VIGA EJE B ENTRE EJE 3 - 4	0,40	7,90	0,50		1,58	1,58
VIGA EJE C ENTRE EJE 3 - 4	0,40	7,90	0,50		1,58	1,58
VIGA EJE D ENTRE EJE 3 - 4	0,40	7,90	0,50		1,58	1,58
VIGA EJE E ENTRE EJE 3 - 4	0,40	7,90	0,50		1,58	1,58
VIGA EJE F ENTRE EJE 3 - 4	0,40	7,90	0,50		1,58	1,58
VIGA EJE G ENTRE EJE 3 - 4	0,40	7,90	0,50		1,58	1,58

VIGA EJE G ENTRE EJE 2 - 3	0,40	4,27	0,50		0,85	0,85
VIGA EJE H ENTRE EJE 1- 2	0,40	2,52	0,50		0,50	0,50
VIGA EJE H ENTRE EJE 2- 3	0,40	4,09	0,50		0,82	0,82
VIGA EJE H ENTRE EJE 3- 4	0,40	7,72	0,50		1,54	1,54
VIGA EJE I ENTRE 1-2	0,40	2,52	0,50		0,50	0,50
VIGA EJE I ENTRE 2-3	0,40	4,27	0,50		0,85	0,85
VIGA EJE I ENTRE 3-4	0,40	7,90	0,50		1,58	1,58
VIGA EJE J ENTRE 1-2	0,40	2,38	0,50		0,48	0,48
VIGA EJE J ENTRE 2-3	0,40	4,26	0,50		0,85	0,85
VIGA EJE J ENTRE 3-4	0,40	7,90	0,50		1,58	1,58
VIGA EJE K ENTRE 3-4	0,40	7,90	0,50		1,58	1,58
ZONA DE AMBULANCIAS						
MURO DE CONTENCION 4.40 ENTRE EJES K - 4 Y N - 4	3,50	21,01	3,30		242,67	242,67
ZAPATA EJE 3 ENTRE K-L	2,50	2,20	2,02		11,11	11,11
ZAPATA L-3	2,40	2,20	2,02		10,67	10,67
ZAPATA M-3	2,20	2,20	2,02		9,78	9,78
VIGA EJE 3 ENTRE K-L	2,39	0,80	2,02		3,86	3,86
VIGA EJE 3ENTRE L-M	4,52	0,80	2,02		7,30	7,30
VIGA EJE 3 ENTRE M-N	5,40	1,00	1,90		10,26	10,26
ZAPATA N-3	2,20	2,20	2,02		9,78	9,78
EXCAVACION TANQUE						
TANQUE	15,90	6,60	4,50		472,23	472,23
MODULO D						
MODULO D - SECCION MURO EN GAVION						
MODULO D SECCION (+ 00.80 HASTA + 10.00)		2,00		12,29	46,22	46,22
MODULO D SECCION (+ 10.00 HASTA + 20.00)		10,00		33,93	337,50	337,50
MODULO D SECCION (+ 20.00 HASTA + 30.00)		10,00		33,57	335,75	335,75
MODULO D SECCION (+ 30.00)		0,00		33,58	0,00	0,00
EXCAVACION ZAPATAS						
ZAPATA EJE Ñ1´- 10´1´	1,75	1,75	2,20		6,74	6,74
ZAPATA EJE Ñ1´- 7´	1,75	1,75	2,20		6,74	6,74
ZAPATA EJE O1 - 10´1´	2,00	2,00	1,90		7,60	7,60
ZAPATA EJE P1 - 10´1´	2,00	2,00	1,90		7,60	7,60
ZAPATA EJE Ñ1´- 9´1´	2,50	2,50	1,80		11,25	11,25
ZAPATA EJE Ñ1´- 8´	2,50	2,50	1,80		11,25	11,25
ZAPATA EJE O1- 9´1´	2,50	2,50	1,80		11,25	11,25
ZAPATA EJE P1- 8´	2,50	2,50	1,80		11,25	11,25
ZAPATA EJE P1- 7´	2,50	2,50	1,80		11,25	11,25
ZAPATA EJE O1- 6´	2,50	2,50	3,70		23,13	23,13
ZAPATA EJE P1- 6´	2,50	2,50	3,70		23,13	23,13
ZAPATA EJE 01 - 4´	2,50	2,50	6,97		43,56	43,56
ZAPATA EJE P1 - 4´	2,50	2,50	6,97		43,56	43,56
ZAPATA EJE P1 - 9´1´	3,00	3,00	1,80		16,20	16,20
ZAPATA EJE O1 - 8´	3,00	3,00	1,80		16,20	16,20
ZAPATA EJE O1 - 7´	3,00	3,00	1,80		16,20	16,20
EXCAVACION VIGAS DE CIMENTACION						
VG-CIM 10´1´	12,39	0,40	0,50		2,48	2,48
VG-CIM 9´1´	12,54	0,40	0,50		2,51	2,51
VG-CIM 8´1´	12,54	0,40	0,50		2,51	2,51
VG-CIM 7´1´	12,42	0,40	0,50		2,48	2,48
VG-CIM Ñ1´	18,33	0,40	0,50		3,67	3,67
VG-CIM O1	24,38	0,40	0,50		4,88	4,88
VG-CIM P1	24,38	0,40	0,50		4,88	4,88
VG-CIM 6´	9,14	0,40	0,85		3,11	3,11
VG-CIM 6´A	10,25	0,40	0,85		3,49	3,49
VG-CIM O1´	5,31	0,40	0,85		1,81	1,81
VG-CIM P1´	2,91	0,40	0,85		0,99	0,99
VG-CIM INT	5,52	0,40	0,85		1,88	1,88
					PORCENTAJE DE EXPANSIÓN DEL SUELO 25%	1605,72
					ACUMULADO	8028,59
					ACTA MODIFICATORIA 3	8215,99
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	187,40

	COBRADAS PARCIAL No 1	1241,77
	COBRADAS PARCIAL No 2	3937,07
	COBRADAS PARCIAL No 3	2837,53
	CANTIDADES PRESENTE ACTA	12,22
OBSERVACIONES:		



UBICACIÓN PLANO

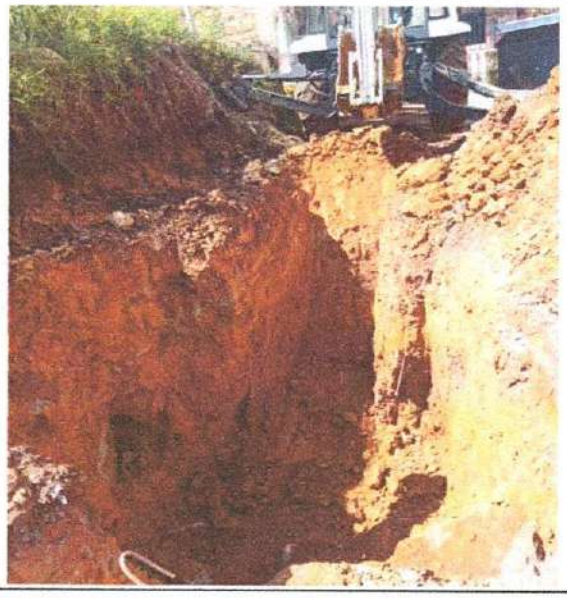

ALEXIS ROJAS MUNOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
M No.						
2,02	EXCAVACIÓN MANUAL A CIELO ABIERTO EN TIERRA DURA H=1M, INCLUYE RETIRO				UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	121,70
	largo	ancho	Alto	Volumen	Elementos	SUBTOTAL
UCI						
RENTE HABITACIONES INTENSIVA	20,30	0,30	0,60	3,65		3,65
PASILLO HABITACIONES NORTE	8,30	0,30	0,60	1,49		1,49
PASILLO HABITACION SUR	7,30	0,30	0,60	1,31		1,31
PASILLO ZONAS HUMEDAS	8,20	0,30	0,60	1,48		1,48
BAÑO PACIENTES	3,00	0,30	0,60	0,54		0,54
BAÑO AISLADOS	5,20	0,30	0,60	0,94		0,94
PASILLO OCCIDENTE	15,90	0,30	0,60	2,86		2,86
CAJAS	0,60	0,60	0,60	0,22		0,22
CAJAS	0,60	0,60	0,60	0,22		0,22
CAJAS	0,60	0,60	0,60	0,22		0,22
CAJAS	0,60	0,60	0,60	0,22		0,22
CAJAS	0,80	0,80	0,60	0,38		0,38
ZAPATA	1,50	1,50	0,60	1,35		1,35
ZAPATA	1,50	1,50	0,60	1,35		1,35
ZAPATA	1,50	1,50	0,60	1,35		1,35
ZAPATA	1,50	1,50	0,60	1,35		1,35
EXCAVACION PARA DADOS DE COLUMNAS METALICAS 1	0,80	0,80	0,60	0,38		0,38
EXCAVACION PARA DADOS DE COLUMNAS METALICAS 2	0,80	0,80	0,60	0,38		0,38
XCAVACION PARA DADOS DE COLUMNAS METALICAS 3	0,80	0,80	0,60	0,38		0,38
ODULO D						
EXCAVACION PARA TUBERIA SANITARIA 6"	31,81	0,6	0,80	1	15,27	15,27
	0,60	0,6	0,90	2	1,30	1,30
EXCAVACION PARA TUBERIA SANITARIA 2" Y 3"	33,34	0,6	0,90	1	18,00	18,00
EXCAVACION PARA TUBERIA SANITARIA 4"	10,55	0,6	0,90	1	5,70	5,70
MODULO A						
EXCAVACION SANITARIA DE 6"	45,00	0,60	1,00		27,00	27,00
EXCAVACION SANITARIA DE 4"	16,70	0,60	1,00		10,02	10,02

	PORCENTAJE DE EXPANSIÓN DEL SUELO 25%	24,34
	ACUMULADO	121,70
	ACTA MODIFICATORIA 3	171,38
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	49,68
	COBRADAS PARCIAL No 1	
	COBRADAS PARCIAL No 2	
	COBRADAS PARCIAL No3	20,08
	CANTIDADES PRESENTE ACTA	101,62
OBSERVACIONES:	Se adjuntan planos en DWG	








ALEXIS KONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
3,01	BASE CONCRETO POBRE 5CM				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	267,05
	Longitud (m)	Ancho (M)	Alto (m)	Area (m2)		SUBTOTAL
MODULO A						
EJE A ENTRE 1-2	3,34	0,40				1,34
EJE A ENTRE 2-3	4,32	0,40				1,73
EJE A ENTRE 3-4	7,75	0,40				3,10
EJE B ENTRE 1-2	3,12	0,40				1,25
EJE B ENTRE 2-3	4,27	0,40				1,71
EJE B ENTRE 3-4	7,90	0,40				3,16
EJE C ENTRE 3-4	7,90	0,40				3,16
EJE D ENTRE 3-4	7,90	0,40				3,16
EJE E ENTRE 3-4	7,90	0,40				3,16
EJE F ENTRE 3-4	7,90	0,40				3,16
EJE G ENTRE 2-3	4,27	0,40				1,71
EJE G ENTRE 3-4	7,90	0,40				3,16
EJE H ENTRE 1-2	3,34	0,40				1,34
EJE H ENTRE 2-3	4,09	0,40				1,64
EJE H ENTRE 3-4	7,90	0,40				3,16
EJE I ENTRE 1-2	3,34	0,40				1,34
EJE I ENTRE 2-3	4,27	0,40				1,71
EJE I ENTRE 3-4	7,90	0,40				3,16
EJE J ENTRE 1-2	2,39	0,40				0,96
EJE J ENTRE 2-3	4,27	0,40				1,71
EJE J ENTRE 3-4	7,90	0,40				3,16
EJE K ENTRE 3-4	7,65	0,40				3,06
EJE 1 ENTRE A-B	4,93	0,40				1,97
EJE 2 ENTRE A-B	4,93	0,40				1,97
EJE 3 ENTRE A-B	4,53	0,40				1,81
EJE 4 ENTRE A-B	4,53	0,40				1,81
EJE 3 ENTRE B-C	5,51	0,40				2,20
EJE 4 ENTRE B-C	5,51	0,40				2,20
EJE 3 ENTRE C-D	2,93	0,40				1,17
EJE 4 ENTRE C-D	2,93	0,40				1,17
EJE 3 ENTRE D-E	5,56	0,40				2,22
EJE 4 ENTRE D-E	5,56	0,40				2,22
EJE 3 ENTRE E-F	6,75	0,40				2,70
EJE 4 ENTRE E-F	6,75	0,40				2,70
EJE 3 ENTRE F-G	7,22	0,40				2,89
EJE 4 ENTRE F-G	7,22	0,40				2,89
EJE 2 ENTRE G-H	6,58	0,40				2,63
EJE 3 ENTRE G-H	6,58	0,40				2,63
EJE 4 ENTRE G-H	6,75	0,40				2,70
EJE 1 ENTRE H-I	8,41	0,40				3,36
EJE 2 ENTRE H-I	8,66	0,40				3,46
EJE 3 ENTRE H-I	8,49	0,40				3,40
EJE 4 ENTRE H-I	8,66	0,40				3,46
EJE 1 ENTRE I-J	4,07	0,40				1,63
EJE 2 ENTRE I-J	4,19	0,40				1,68
EJE 3 ENTRE I-J	4,94	0,40				1,98

EJE 4 ENTRE I-J	4,69	0,40				1,88
EJE 3 ENTRE J-K	6,76	0,40				2,70
EJE 4 ENTRE J-K	6,51	0,40				2,60
ZAPATAS ZONA DE AMBULACION						
VIGA EJE 4 ENTRE K-L	2,39	0,60				1,43
VIGA EJE 4 ENTRE L-M	4,55	0,60				2,73
VIGA EJE 4 ENTRE M-N	1,00	0,60				0,60
VIGA EJE 3 ENTRE K-L	2,39	0,60				1,43
VIGA EJE 3 ENTRE L-M	4,55	0,60				2,73
VIGA EJE 3 ENTRE M-N	1,00	0,60				0,60
VIGA EJE 4 ENTRE K-L	4,45	0,60				2,67
VIGA EJE 4 ENTRE L-M	6,10	0,60				3,66
VIGA EJE 4 ENTRE M-N	0,80	0,60				0,48
VIGA EJE K-L ENTRE 3-4	7,00	0,60				4,20
VIGA EJE L ENTRE 3-4	7,00	0,60				4,20
VIGA EJE M ENTRE 3-4	7,00	0,60				4,20
VIGA EJE N ENTRE 3-4	7,00	0,60				4,20
MODULO D						
VG-CIM 10´1´	12,39	0,40				4,96
VG-CIM 9´1´	12,54	0,40				5,02
VG-CIM 8´1´	12,54	0,40				5,02
VG-CIM 7´1´	12,42	0,40				4,97
VG-CIM Ñ1´	18,33	0,40				7,33
VG-CIM O1	24,38	0,40				9,75
VG-CIM P1	24,38	0,40				9,75
VG-CIM 6´	9,14	0,40				3,66
VG-CIM 4´	8,85	0,40				3,54
VG-CIM 6´A	10,25	0,40				4,10
VG-CIM BRD	9,57	0,20				1,91
VG-CIM O1´	8,27	0,40				3,31
VG-CIM P1´	8,27	0,40				3,31
VG-CIM INT	9,97	0,40				3,99
VG-CIM 4´A	10,25	0,20				2,05
PLACA MACIZA	3,01	4,62		13,91		13,9
	3,01	4,62		13,91		13,9
	3,01	4,62		13,91		13,9
	0,81	2,51		2,03		2,03
	0,81	3,01		2,44		2,44

ACUMULADO	**267,05**
ACTA MODIFICATORIA 3	**359,92**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**92,87**
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No 3	262,85
CANTIDADES PRESENTE ACTA	**4,20**

OBSERVACIONES:	





ALEXIS RONDON MUNOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
3,02	ACERO DE REFUERZO FG					UNIDAD	KG
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	161076,84
		No Varilla	Largo (M)	Peso ml/kg	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
	MODULO A						
VG- CIM - A							
	Superior	6	8,5	2,25	4	1	76,5
		6	7,75	2,25	4	1	69,8
		6	7,5	2,25	4	1	67,5
	Inferior	6	6,25	2,25	4	1	56,3
		6	9,25	2,25	4	1	83,3
		6	8,25	2,25	4	1	74,3
	Flejes	4	1,46	0,996	108	1	157,0
	Ganchos	3	0,57	0,56	216	1	68,9
VG- CIM - B							
	Superior	6	8,5	2,25	4	1	76,5
		6	7,75	2,25	4	1	69,8
		6	7,5	2,25	4	1	67,5
	Inferior	6	6,25	2,25	4	1	56,3
		6	9,25	2,25	4	1	83,3
		6	8,25	2,25	4	1	74,3
	Flejes	4	1,46	0,996	108	1	157,0
	Ganchos	3	0,57	0,56	216	1	68,9
VG- CIM - C							
	Superior	6	8,5	2,25	4	1	76,5
		6	7,75	2,25	4	1	69,8
		6	7,5	2,25	4	1	67,5
	Inferior	6	6,25	2,25	4	1	56,3
		6	9,25	2,25	4	1	83,3
		6	8,25	2,25	4	1	74,3
	Flejes	4	1,46	0,996	108	1	157,0
	Ganchos	3	0,57	0,56	216	1	68,9
VG- CIM - D							
	Superior	6	8,5	2,25	4	1	76,5
		6	7,75	2,25	4	1	69,8
		6	7,5	2,25	4	1	67,5
	Inferior	6	6,25	2,25	4	1	56,3
		6	9,25	2,25	4	1	83,3
		6	8,25	2,25	4	1	74,3
	Flejes	4	1,46	0,996	108	1	157,0
	Ganchos	3	0,57	0,56	216	1	68,9
VG- CIM - E							
	Superior	6	8,5	2,25	4	1	76,5
		6	7,75	2,25	4	1	69,8
		6	7,5	2,25	4	1	67,5
	Inferior	6	6,25	2,25	4	1	56,3
		6	9,25	2,25	4	1	83,3
		6	8,25	2,25	4	1	74,3
	Flejes	4	1,46	0,996	108	1	157,0
	Ganchos	3	0,57	0,56	216	1	68,9
VG- CIM - F							
	Superior	6	8,5	2,25	4	1	76,5
		6	7,75	2,25	4	1	69,8
		6	7,5	2,25	4	1	67,5
	Inferior	6	6,25	2,25	4	1	56,3
		6	9,25	2,25	4	1	83,3
		6	8,25	2,25	4	1	74,3

	Flejes	4	1,46	0,996	108	1	157,0
	Ganchos	3	0,57	0,56	216	1	68,9
VG- CIM - G							
	Superior	6	8,5	2,25	4	1	76,5
		6	7,75	2,25	4	1	69,8
		6	7,5	2,25	4	1	67,5
	Inferior	6	6,25	2,25	4	1	56,3
		6	9,25	2,25	4	1	83,3
		6	8,25	2,25	4	1	74,3
	Flejes	4	1,46	0,996	108	1	157,0
	Ganchos	3	0,57	0,56	216	1	68,9
VG- CIM - I							
	Superior	6	8,5	2,25	4	1	76,5
		6	7,75	2,25	4	1	69,8
		6	7,5	2,25	4	1	67,5
	Inferior	6	6,25	2,25	4	1	56,3
		6	9,25	2,25	4	1	83,3
		6	8,25	2,25	4	1	74,3
	Flejes	4	1,46	0,996	108	1	157,0
	Ganchos	3	0,57	0,56	216	1	68,9
VG- CIM - H							
	Superior	6	8,5	2,25	4	1	76,5
		6	7,75	2,25	4	1	69,8
		6	7,5	2,25	4	1	67,5
	Inferior	6	6,25	2,25	4	1	56,3
		6	9,25	2,25	4	1	83,3
		6	8,25	2,25	4	1	74,3
	Flejes	4	1,46	0,996	106	1	154,1
	Ganchos	3	0,57	0,56	212	1	67,7
VG- CIM - J							
	Superior	6	8,5	2,25	4	1	76,5
		6	7,75	2,25	4	1	69,8
		6	7,5	2,25	4	1	67,5
	Inferior	6	6,25	2,25	4	1	56,3
		6	9,25	2,25	4	1	83,3
		6	8,25	2,25	4	1	74,3
	Flejes	4	1,46	0,996	107	1	155,6
	Ganchos	3	0,57	0,56	214	1	68,3
VG- CIM - K							
	Superior	6	7,75	2,25	4	1	69,8
		6	4,75	2,25	4	1	42,8
	Inferior	6	6,5	2,25	4	1	58,5
		6	6	2,25	4	1	54,0
	Flejes	4	1,46	0,996	48	1	69,8
	Ganchos	3	0,57	0,56	96	1	30,6
	Superior	6	5,5	2,25	4	1	49,5
		6	5,5	2,25	4	1	49,5
		6	8,5	2,25	4	1	76,5
		6	8,5	2,25	4	1	76,5
		6	9,5	2,25	4	1	85,5
		6	10	2,25	4	1	90,0
		6	9,5	2,25	4	1	85,5
		6	11,5	2,25	4	1	103,5
		6	6	2,25	4	1	54,0
		6	5,5	2,25	4	1	49,5
	Inferior	6	4,75	2,25	4	1	42,8
		6	8	2,25	4	1	72,0
		6	7	2,25	4	1	63,0
		6	7	2,25	4	1	63,0
		6	9	2,25	4	1	81,0
		6	9,75	2,25	4	1	87,8
		6	10	2,25	4	1	90,0
		6	10,5	2,25	4	1	94,5
		6	9,5	2,25	4	1	85,5
		6	4,5	2,25	4	1	40,5

	Flejes	4	1,46	0,996	346	1	503,1
	Ganchos	6	0,57	2,25	692	1	887,5
VG- CIM - 2							
	Superior	6	5,5	2,25	4	1	49,5
		6	5,5	2,25	4	1	49,5
		6	8,5	2,25	4	1	76,5
		6	8,5	2,25	4	1	76,5
		6	9,75	2,25	4	1	87,8
		6	10	2,25	4	1	90,0
		6	9,5	2,25	4	1	85,5
		6	11,25	2,25	4	1	101,3
		6	6	2,25	4	1	54,0
		6	5,5	2,25	4	1	49,5
	Inferior	6	4,5	2,25	4	1	40,5
		6	8,25	2,25	4	1	74,3
		6	7	2,25	4	1	63,0
		6	7	2,25	4	1	63,0
		6	9	2,25	4	1	81,0
		6	9,75	2,25	4	1	87,8
		6	10	2,25	4	1	90,0
		6	10,5	2,25	4	1	94,5
		6	9,5	2,25	4	1	85,5
		6	4,5	2,25	4	1	40,5
	Flejes	4	1,46	0,996	372	1	540,9
	Ganchos	3	0,57	0,56	4	1	1,3
VG- CIM - 3							
	Superior	6	5,5	2,25	4	1	49,5
		6	5,5	2,25	4	1	49,5
		6	8,5	2,25	4	1	76,5
		6	8,5	2,25	4	1	76,5
		6	9,5	2,25	4	1	85,5
		6	10	2,25	4	1	90,0
		6	9,75	2,25	4	1	87,8
		6	11,25	2,25	4	1	101,3
		6	7,5	2,25	4	1	67,5
		6	9,75	2,25	4	1	87,8
		6	4,25	2,25	4	1	38,3
	Inferior	6	4,75	2,25	4	1	42,8
		6	8	2,25	4	1	72,0
		6	7	2,25	4	1	63,0
		6	7	2,25	4	1	63,0
		6	9	2,25	4	1	81,0
		6	9,75	2,25	4	1	87,8
		6	10	2,25	4	1	90,0
		6	10,5	2,25	4	1	94,5
		6	9,5	2,25	4	1	85,5
		6	8,5	2,25	4	1	76,5
		6	6	2,25	4	1	54,0
	Flejes	4	1,46	0,996	414	1	602,0
	Ganchos	3	0,57	0,56	828	1	264,3
VG- CIM - 4							
	Superior	6	5,5	2,25	4	1	49,5
		6	5,5	2,25	4	1	49,5
		6	8,5	2,25	4	1	76,5
		6	8,5	2,25	4	1	76,5
		6	9,5	2,25	4	1	85,5
		6	10	2,25	4	1	90,0
		6	9,75	2,25	4	1	87,8
		6	11,25	2,25	4	1	101,3
		6	7,5	2,25	4	1	67,5
		6	9,75	2,25	4	1	87,8
		6	4,25	2,25	4	1	38,3
	Inferior	6	4,75	2,25	4	1	42,8
		6	8	2,25	4	1	72,0
		6	7	2,25	4	1	63,0
		6	7	2,25	4	1	63,0

		6	9	2,25	4	1	81,0
		6	9,75	2,25	4	1	87,8
		6	10	2,25	4	1	90,0
		6	10,5	2,25	4	1	94,5
		6	9,5	2,25	4	1	85,5
		6	8,5	2,25	4	1	76,5
		6	6	2,25	4	1	54,0
	Flejes	4	1,46	0,996	413	1	600,6
	Ganchos	3	0,57	0,56	826	1	263,7
Zapata tipo 1	Zapata tipo 1						
	RLx	5	2,85	1,56	34	14	2116,3
	RLy	5	2,85	1,56	34	14	2116,3
	Refuerzo ciclopeo	4	1,2	0,996	16	14	267,7
Zapata tipo 1A							
	RLx	8	3,15	3,975	40	2	1001,7
	RLy	8	3,15	3,975	40	2	1001,7
	Refuerzo ciclopeo	4	1,2	0,996	16	2	38,2
Zapata tipo 1B							
	RLx	8	3,15	3,975	40	1	500,9
	RLy	8	3,15	3,975	40	1	500,9
	Refuerzo ciclopeo	4	1,2	0,996	16	1	19,1
Zapata tipo 1C							
	RLx	8	3,15	3,975	40	2	1001,7
	RLy	8	3,15	3,975	40	2	1001,7
	Refuerzo ciclopeo	4	1,2	0,996	16	2	38,2
Zapata tipo 2							
	RLx	5	3,1	1,56	36	6	1044,6
	RLy	5	3,1	1,56	36	6	1044,6
	Refuerzo ciclopeo	4	1,2	0,996	16	6	114,7
Zapata tipo 3							
	RLx	5	2,35	1,56	26	2	190,6
	RLy	5	2,35	1,56	26	2	190,6
	Refuerzo ciclopeo	4	1,2	0,996	16	2	38,2
Zapata tipo 3A							
	RLx	7	2,55	3,042	32	1	248,2
	RLy	7	2,55	3,042	32	1	248,2
	Refuerzo ciclopeo	4	1,2	0,996	16	1	19,1
Zapata tipo 4							
	RLx	6	1,95	2,25	20	10	877,5
	RLy	6	1,95	2,25	20	10	877,5
	Refuerzo ciclopeo	4	1,2	0,996	16	10	191,2
Zapata tipo 4A							
	RLx	6	1,95	2,25	20	2	175,5
	RLy	6	1,95	2,25	20	2	175,5
	Refuerzo ciclopeo	4	1,2	0,996	16	2	38,2
Zapata tipo 4B							
	RLx	5	1,85	1,56	20	2	115,4
	RLy	5	1,85	1,56	20	2	115,4
	Refuerzo ciclopeo	4	1,2	0,996	16	2	38,2
Pedestales tipo 1							
	Verticales	8	1,65	3,975	32	15	3148,2
	Flejes	4	4,66	0,996	9	15	626,6
	Ganchos	3	1,31	0,56	72	15	792,3
Pedestales tipo 1 - Eje 4 (H y I) h= 2.60mts							
	Verticales	8	3,3	3,975	32	2	839,5
	Flejes	4	4,66	0,996	25	2	232,1
	Ganchos	3	1,31	0,56	200	2	293,4
Pedestales tipo 1A							
	Verticales	8	2	3,975	40	2	636,0
	Flejes	4	5,26	0,996	12	2	125,7
	Ganchos	3	1,46	0,56	120	2	196,2
Pedestales tipo 2							
	Verticales	8	1,65	3,975	32	6	1259,3
	Flejes	4	4,66	0,996	9	6	250,6
	Ganchos	3	1,31	0,56	72	6	316,9
Pedestales tipo 3							

	Verticales	8	1,65	3,975	22	2	288,6
	Flejes	4	3,66	0,996	9	2	65,6
	Ganchos	3	1,06	0,56	72	2	85,5
Pedestales tipo 3A							
	Verticales	8	1,65	3,975	22	1	144,3
	Flejes	4	3,66	0,996	12	1	43,7
	Ganchos	3	1,06	0,56	98	1	57,0
Pedestales tipo 4							
	Verticales	8	2	3,975	46	11	4022,7
	Flejes	4	5,66	0,996	14	11	868,2
	Ganchos	3	1,56	0,56	154	11	1479,9
Pedestales tipo 4A							
	Verticales	8	2	3,975	46	2	731,4
	Flejes	4	5,66	0,996	12	2	135,3
	Ganchos	3	1,56	0,56	132	2	230,6
Pedestales tipo 4B							
	Verticales	8	3,4	3,975	46	2	1243,4
	Flejes	4	5,66	0,996	26	2	293,1
	Ganchos	3	1,56	0,56	130	2	227,1
	Flejes	4	4,1	0,996	52	2	424,7
MUROS DE CONTENCION - MODULO A							
URO DE CONTENCION H=5.90 MTS							0,00
ZARPA	Longitud total muro	48,35					0,00
	Horizontal superior	6,00	4,45	2,25	322	1,00	3227,4
	Horizontal Inferior	6,00	4,45	2,25	322	1,00	3227,4
	Longitudinal superior	5,00	53,72	1,56	14	1,00	1173,3
	Longitudinal Inferior	5,00	53,72	1,56	14	1,00	1173,3
MURO	Vertiical Exterior	5,00	6,45	1,56	193	1,00	1946,0
	Vertical Interior	8,00	6,95	3,975	322	1,00	8904,9
	Longitudinal Exterior	5,00	53,72	1,56	20	1,00	1676,1
	Longitudinal Interior	5,00	53,72	1,56	20	1,00	1676,1
Anclajes ciclopeo	Ganchos	4,00	1,40	0,996	484	1,00	674,2
Descuento por kg/m3							-2750,15
MURO DE CONTENCION H=4.40 MTS							
ZARPA							
	Horizontal superior	6,00	3,95	2,25	142	1,00	1262,0
	Horizontal Inferior	6,00	3,95	2,25	142	1,00	1262,0
	Longitudinal superior	5,00	28,30	1,56	12	1,00	529,8
	Longitudinal Inferior	5,00	28,30	1,56	12	1,00	529,8
MURO	Vertiical Exterior	5,00	5,60	1,56	114	1,00	995,9
	Vertical Interior	7,00	6,00	3,042	189	1,00	3449,6
	Longitudinal Exterior	5,00	31,30	1,56	17	1,00	830,1
	Longitudinal Interior	5,00	31,30	1,56	17	1,00	830,1
nclajes ciclopeo	Ganchos	4,00	1,40	0,996	283	1,00	394,6
escuento por kg/m3							-1370,29
MURO DE CONTENCION H=2.40 MTS							0,00
ZARPA							0,00
	Horizontal superior	5,00	3,15	1,56	40	1,00	196,56
	Horizontal Inferior	5,00	3,15	1,56	40	1,00	196,56
	Longitudinal superior	4,00	7,95	1,00	10	1,00	79,18
	Longitudinal Inferior	4,00	7,95	1,00	10	1,00	79,18
MURO	Vertiical Exterior	4,00	3,40	1,00	27	1,00	91,43
	Vertical Interior	5,00	3,65	1,56	80	1,00	455,52
	Longitudinal Exterior	4,00	7,95	1,00	9	1,00	71,26
	Longitudinal Interior	4,00	7,95	1,00	9	1,00	71,26
Anclajes ciclopeo	Ganchos	4,00	1,40	1,00	67	1,00	93,42
Descuento por kg/m3							-242,32
ZONA DE AMBULANCIAS							
MURO DE CONTENCION EJE 4 ENTRE K-M							
	LONGITUDINALES	6,00	5,9	2,25	120	1,00	1593,00
	LONGITUDINALES	6,00	5,9	2,25	80	1,00	1062,00
	TRANSVERSALES	6,00	12,95	2,25	60	1,00	1748,25
MURO DE CONTENCION EJE 3 ENTRE K-M							
	LONGITUDINALES	8,00	5,5	4	80	1,00	1760,00
	LONGITUDINALES	8,00	5,5	4	60	1,00	1320,00
	TRANSVERSALES	6,00	12,95	2,25	53	1,00	1544,29
Descuento por kg/m3							-491,28

MURO DE CONTENCION EJE 4 ENTRE M-N							
	LONGITUDINALES	6,00	5,9	2,25	58	1,00	769,95
	LONGITUDINALES	6,00	5,9	2,25	38	1,00	504,45
	TRANSVERSALES	6,00	12,95	2,25	27	1,00	786,71
	TRANSVERSALES	6,00	12,95	2,25	40	1,00	1165,50
MURO DE CONTENCION EJE 3 ENTRE M-N							
	LONGITUDINALES	8,00	5,5	4	43	1,00	946,00
	LONGITUDINALES	8,00	5,5	4	32	1,00	704,00
	TRANSVERSALES	6,00	12,95	2,25	27	1,00	786,71
	TRANSVERSALES	6,00	12,95	2,25	20	1,00	582,75
Descuento por kg/m3							-232,70
VG- CIM - 3							
	Superior	8	9,25	3,975	6	1	220,6
		8	8,5	3,975	6	1	202,7
		8	9,25	3,975	6	1	220,6
		8	5,25	3,975	6	1	125,2
	Inferior	8	4,25	3,975	6	1	101,4
		8	7,5	3,975	6	1	178,9
		8	8,75	3,975	6	1	208,7
		8	8,5	3,975	6	1	202,7
		8	4,75	3,975	6	1	113,3
	Flejes	4	2,46	0,996	208	1	509,6
	Ganchos	3	0,67	0,56	832	1	312,2
VG- CIM - 4							
	Superior	8	9,25	3,975	6	1	220,6
		8	8,5	3,975	6	1	202,7
		8	9,25	3,975	6	1	220,6
		8	4,25	3,975	6	1	101,4
	Inferior	8	4,25	3,975	6	1	101,4
		8	4,25	3,975	6	1	101,4
		8	7,5	3,975	6	1	178,9
		8	8,75	3,975	6	1	208,7
		8	10,75	3,975	6	1	256,4
	Flejes	4	2,46	0,996	200	1	490,0
	Ganchos	3	0,67	0,56	800	1	300,2
VG- CIM - K							
	Superior	6	10,25	2,25	6	1	138,4
	Inferior	6	10,25	2,25	6	1	138,4
	Flejes	4	2,06	0,996	52	1	106,7
	Ganchos	3	0,67	0,56	208	1	78,0
VG- CIM - L							
	Superior	6	10,25	2,25	6	1	138,4
	Inferior	6	10,25	2,25	6	1	138,4
	Flejes	4	2,06	0,996	52	1	106,7
	Ganchos	3	0,67	0,56	208	1	78,0
VG- CIM - M							
	Superior	6	10,25	2,25	6	1	138,4
	Inferior	6	10,25	2,25	6	1	138,4
	Flejes	4	2,06	0,996	52	1	106,7
	Ganchos	3	0,67	0,56	208	1	78,0
VIGA CORONA EJE 3 ENTRE K-M							
	SUPERIOR	6,00	10,25	2,25	6	3,00	415,13
	INFERIOR	6,00	10,25	2,25	6	3,00	415,13
	ESTRIBOS	4,00	2,06	1,00	52	3,00	321,36
	GANCHOS	3,00	0,67	0,56	208	3,00	234,12
ZAPATA TIPO 1							
	Rlx	5	2,55	1,56	30	7	835,4
	Rly	5	2,55	1,56	30	7	835,4
COLUMNAS TIPO T1 EJE 4 (K-L-M)							
	LONGITUDINAL	6,00	7,50	2,25	6	4,00	405,00
		6,00	3,25	2,25	6	4,00	175,50
	LONGITUDINAL	8,00	4,00	4,00	6	4,00	384,00
		8,00	4,00	7,75	6	4,00	744,00
	ESTRIBOS	4	2,34	1	120	4,00	1123,20

	GANCHOS	3	0,73	0,56	480	4,00	784,90
COLUMNAS TIPO T1 EJE 3 (K-L-M-N)							
	LONGITUDINAL	6,00	6,40	2,25	6	4,00	345,60
	LONGITUDINAL	8,00	6,60	4,00	6	4,00	633,60
	ESTRIBOS	4,00	2,34	1,00	67	4,00	627,12
	GANCHOS	3,00	0,73	0,56	268	4,00	438,23
	REFUERZO CICLOPEO	4,00	1,40	1,00	49	4,00	274,40
PEDESTAL EJE 4 ENTRE K-M							
	LONGITUDINAL	8,00	3,91	4,00	16	3,00	750,72
	TRANSVERSAL	4,00	2,86	1,00	32	3,00	274,56
	GANCHOS	3,00	0,86	0,56	192	3,00	277,40
VG- CIM - N							
	Superior	6	10,25	2,25	6	1	138,4
	Inferior	6	10,25	2,25	6	1	138,4
	Flejes	4	2,06	0,996	52	1	106,7
	Ganchos	3	0,67	0,56	208	1	78,0
VIGA CORONA EJE 4 ENTRE M-N							
	SUPERIOR	6,00	8,00	2,25	6	1,00	108,00
	INFERIOR	6,00	8,00	2,25	6	1,00	108,00
	ESTRIBOS	4,00	8,00	1,00	52	1,00	416,00
	GANCHOS	3,00	0,67	0,56	208	1,00	78,04
ZAPATA TIPO 1							
	Rix	5	2,55	1,56	30	1	119,3
	Riy	5	2,55	1,56	30	1	119,3
PEDESTAL EJE 4 ENTRE K-M							
	LONGITUDINAL	8,00	3,91	4,00	16	1,00	250,24
	TRANSVERSAL	4,00	2,86	1,00	32	1,00	91,52
	GANCHOS	3,00	0,86	0,56	192	1,00	92,47
	MODULO D						
ZAPATAS							
ZAPATA TIPO 1	LONGITUDINAL, TRANSVERSAL	5,00	2,10	1,56	80	1,00	262,08
ZAPATA TIPO 2	LONGITUDINAL, TRANSVERSAL	5,00	2,35	1,56	96	1,00	351,94
ZAPATA TIPO 3	LONGITUDINAL, TRANSVERSAL	5,00	2,85	1,56	392	1,00	1742,83
ZAPATA TIPO 4	LONGITUDINAL, TRANSVERSAL	5,00	3,35	1,56	204	1,00	1066,10
ZAPATA TIPO 3A	LONGITUDINAL, TRANSVERSAL	5,00	3,05	1,56	128	1,00	609,02
	ANCLAJES (CICLOPEO)	4,00	2,00	1,00	98	1,00	196,00
DESTAL T1	TRANSVERSAL (ESTRIBOS)	4,00	6,06	1,00	18	1,00	109,08
	LONGITUDINAL	8,00	1,65	4,00	104	1,00	686,40
		3,00	1,66	0,56	144	1,00	133,86
	TRANSVERSAL (DADO)	4,00	5,10	1,00	36	1,00	183,60
PEDESTAL T2	TRANSVERSAL (ESTRIBOS)	4,00	5,26	1,00	90	1,00	473,40
	LONGITUDINAL	8,00	1,65	4,00	400	1,00	2640,00
		3,00	1,46	0,56	720	1,00	588,67
	TRANSVERSAL (DADO)	4,00	4,40	1,00	180	1,00	792,00
PEDESTAL T3	TRANSVERSAL (ESTRIBOS)	4,00	6,66	1,00	18	1,00	119,88
	LONGITUDINAL	8,00	1,65	4,00	124	1,00	818,40
		3,00	1,81	0,56	216	1,00	218,94
	TRANSVERSAL (DADO)	4,00	5,70	1,00	36	1,00	205,20
PEDESTAL T4	TRANSVERSAL (ESTRIBOS)	4,00	6,06	1,00	64	1,00	387,84
	LONGITUDINAL	8,00	4,10	4,00	104	1,00	1705,60
		3,00	1,66	0,56	512	1,00	475,96
	TRANSVERSAL (DADO)	4,00	5,10	1,00	128	1,00	652,80
VG - CIM 10'1'	LONGITUDINAL	6,00	9,50	2,25	4	1,00	85,50
		6,00	9,00	2,25	4	1,00	81,00
		6,00	6,75	2,25	4	1,00	60,75
		6,00	8,50	2,25	4	1,00	76,50
		6,00	4,25	2,25	4	1,00	38,25
	TRANSVERSAL (ESTRIBOS)	4,00	1,46	1,00	103	1,00	150,38

	GANCHOS	3,00	0,57	0,56	206	1,00	65,76
VG - CIM 8´1´	LONGITUDINAL	6,00	9,50	2,25	4	1,00	85,50
		6,00	9,00	2,25	4	1,00	81,00
		6,00	6,75	2,25	4	1,00	60,75
		6,00	8,50	2,25	4	1,00	76,50
		6,00	4,25	2,25	4	1,00	38,25
	TRANSVERSAL (ESTRIBOS)	4,00	1,46	1,00	105	1,00	153,30
	GANCHOS	3,00	0,57	0,56	210	1,00	67,03
VG - CIM 9´1´	LONGITUDINAL	6,00	9,50	2,25	4	1,00	85,50
		6,00	9,00	2,25	4	1,00	81,00
		6,00	6,75	2,25	4	1,00	60,75
		6,00	8,50	2,25	4	1,00	76,50
		6,00	4,25	2,25	4	1,00	38,25
	TRANSVERSAL (ESTRIBOS)	4,00	1,46	1,00	105	1,00	153,30
	GANCHOS	3,00	0,57	0,56	210	1,00	67,03
VG - CIM 7´1´	LONGITUDINAL	6,00	9,50	2,25	4	1,00	85,50
		6,00	9,00	2,25	4	1,00	81,00
		6,00	6,75	2,25	4	1,00	60,75
		6,00	8,50	2,25	4	1,00	76,50
		6,00	4,25	2,25	4	1,00	38,25
	TRANSVERSAL (ESTRIBOS)	4,00	1,46	1,00	103	1,00	150,38
	GANCHOS	3,00	0,57	0,56	206	1,00	65,76
VG - CIM Ñ1´	LONGITUDINAL	6,00	9,50	2,25	4	1,00	85,50
		6,00	10,75	2,25	4	1,00	96,75
		6,00	7,25	2,25	4	1,00	65,25
		6,00	5,75	2,25	4	1,00	51,75
		6,00	10,00	2,25	4	1,00	90,00
		6,00	8,50	2,25	4	1,00	76,50
		6,00	4,25	2,25	4	1,00	38,25
	TRANSVERSAL (ESTRIBOS)	4,00	1,46	1,00	156	1,00	227,76
	GANCHOS	3,00	0,57	0,56	312	1,00	99,59
VG - CIM O1 Y P1	LONGITUDINAL	6,00	9,25	2,25	4	2,00	166,50
		6,00	10,50	2,25	4	2,00	189,00
		6,00	9,25	2,25	4	2,00	166,50
		6,00	5,75	2,25	4	2,00	103,50
		6,00	4,75	2,25	4	2,00	85,50
		6,00	8,50	2,25	8	2,00	306,00
		6,00	10,00	2,25	4	2,00	180,00
		6,00	4,00	2,25	4	2,00	72,00
	TRANSVERSAL (ESTRIBOS)	4,00	1,46	1,00	210	2,00	613,20
	GANCHOS	3,00	0,57	0,56	420	2,00	268,13
VG -CIM 6´	LONGITUDINAL	6,00	2,00	2,25	8	1,00	36,00
		6,00	6,45	2,25	4	1,00	58,05
		6,00	7,25	2,25	4	1,00	65,25
		6,00	9,50	2,25	4	1,00	85,50
		6,00	4,00	2,25	4	1,00	36,00
		5,00	6,25	1,56	2	1,00	19,50
		5,00	7,00	1,56	2	1,00	21,84
		6,00	7,00	2,25	4	1,00	63,00
		6,00	6,50	2,25	4	1,00	58,50
	TRANSVERSAL (ESTRIBOS)	4,00	2,16	1,00	73	1,00	157,68
	GANCHOS	3,00	0,92	0,56	146	1,00	75,22
VG - CIM 4´	LONGITUDINAL	6,00	2,00	2,25	8	1,00	36,00
		6,00	6,55	2,25	4	1,00	58,95
		6,00	7,25	2,25	4	1,00	65,25
		6,00	4,00	2,25	4	1,00	36,00
		6,00	9,50	2,25	4	1,00	85,50
		5,00	7,00	1,56	2	1,00	21,84
		5,00	6,25	1,56	2	1,00	19,50
		6,00	6,50	2,25	4	1,00	58,50
		6,00	7,00	2,25	4	1,00	63,00
	TRANSVERSAL (ESTRIBOS)	4,00	2,16	1,00	71	1,00	153,36
	GANCHOS	3,00	0,92	0,56	142	1,00	73,16
VG -CIM 6´A	LONGITUDINAL	7,00	8,25	3,06	5	1,00	126,23
		7,00	5,25	3,06	5	1,00	80,33
		5,00	4,50	1,56	2	1,00	14,04

		5,00	8,25	1,56	2	1,00	25,74
		7,00	3,75	3,06	5	1,00	57,38
		7,00	9,75	3,06	5	1,00	149,18
	TRANSVERSAL (ESTRIBOS)	4,00	2,16	1,00	95	1,00	205,20
	GANCHOS	3,00	0,92	0,56	190	1,00	97,89
VG - CIM BRD	LONGITUDINAL	6,00	5,50	2,25	2	1,00	24,75
		6,00	6,75	2,25	2	1,00	30,38
		6,00	8,00	2,25	2	1,00	36,00
		6,00	4,25	2,25	2	1,00	19,13
	TRANSVERSAL (ESTRIBOS)	4,00	1,10	1,00	82	1,00	90,20
VG -CIM O1' Y P1'	LONGITUDINAL	6,00	2,00	2,25	8	2,00	72,00
		6,00	5,70	2,25	4	2,00	102,60
		6,00	8,30	2,25	4	2,00	149,40
		6,00	5,75	2,25	4	2,00	103,50
		6,00	7,00	2,25	4	2,00	126,00
		5,00	5,00	1,56	2	2,00	31,20
		5,00	7,75	1,56	2	2,00	48,36
		6,00	4,75	2,25	4	2,00	85,50
		6,00	8,00	2,25	4	2,00	144,00
	TRANSVERSAL (ESTRIBOS)	4,00	2,16	1,00	73	2,00	315,36
	GANCHOS	3,00	0,92	0,56	146	2,00	150,44
G -CIM INT	LONGITUDINAL	7,00	5,50	3,06	5	1,00	84,15
		7,00	7,25	3,06	5	1,00	110,93
		5,00	4,50	1,56	2	1,00	14,04
		5,00	7,75	1,56	2	1,00	24,18
		7,00	8,25	3,06	5	1,00	126,23
		7,00	4,50	3,06	5	1,00	68,85
	TRANSVERSAL (ESTRIBOS)	4,00	2,16	1,00	86	1,00	185,76
	GANCHOS	3,00	0,92	0,56	172	1,00	88,61
VG - CIM 4'A	LONGITUDINAL	7,00	8,25	3,06	2	1,00	50,49
		7,00	5,25	3,06	2	1,00	32,13
		5,00	8,25	1,56	2	1,00	25,74
		5,00	4,50	1,56	2	1,00	14,04
		7,00	9,75	3,06	2	1,00	59,67
		7,00	3,75	3,06	2	1,00	22,95
	TRANSVERSAL (ESTRIBOS)	4,00	1,80	1,00	95	1,00	171,00
PLACA MACIZA	LONGITUDINAL	3,00	10,65	0,56	152	1,00	906,53
	TRANSVERSAL	3,00	11,35	0,56	144	1,00	915,26
	UCI						
COLUMNAS		5,00	4,00	1,56	8,00	4,00	199,68
		5,00	2,65	1,56	8,00	4,00	132,29
		4,00	1,52	1,00	45,00	4,00	273,60
ZAPATA 1		5,00	1,53	1,56	18,00	1,00	42,96
		5,00	1,83	1,56	18,00	1,00	51,39
PATA 2		5,00	1,53	1,56	18,00	1,00	42,96
		5,00	1,43	1,56	18,00	1,00	40,15
ZAPATA 3		5,00	1,43	1,56	18,00	1,00	40,15
		5,00	1,83	1,56	18,00	1,00	51,39
ZAPATA 4		5,00	1,43	1,56	18,00	1,00	40,15
		5,00	1,83	1,56	18,00	1,00	51,39
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO						
	REFUERZOS PLACA INFERIOR	5,00	9,00	1,56	33	1,00	463,32
		5,00	4,25	1,56	33	1,00	218,79
		5,00	4,25	1,56	33	1,00	218,79
		5,00	9,00	1,56	33	1,00	463,32
		5,00	1,35	1,56	33	1,00	69,50
		5,00	1,35	1,56	33	1,00	69,50
		5,00	3,95	1,56	33	1,00	203,35
		5,00	3,95	1,56	33	1,00	203,35
		5,00	6,95	1,56	106	1,00	1149,25
		5,00	6,95	1,56	106	1,00	1149,25
	VG -1	6,00	7,05	2,55	3	1,00	53,93
		6,00	7,05	2,55	3	1,00	53,93
		4,00	0,80	1,00	55	1,00	43,82
	VG -2	6,00	7,05	2,55	3	1,00	53,93
		6,00	7,05	2,55	3	1,00	53,93
		4,00	0,80	1,00	55	1,00	43,82

	VG -3	6,00	7,05	2,55	3	1,00	53,93
		6,00	7,05	2,55	3	1,00	53,93
		4,00	0,80	1,00	55	1,00	43,82
	VG -4	6,00	7,05	2,55	3	1,00	53,93
		6,00	7,05	2,55	3	1,00	53,93
		4,00	0,80	1,00	55	1,00	43,82
	VG -A'	6,00	2,75	2,55	2	1,00	14,03
		6,00	2,75	2,55	2	1,00	14,03
		4,00	0,60	1,00	27	1,00	16,14
	VG -A'	6,00	1,75	2,55	2	1,00	8,93
		6,00	1,75	2,55	2	1,00	8,93
		4,00	0,60	1,00	11	1,00	6,57
	COLUMNA T1	5,00	3,75	1,56	4	6,00	140,40
		5,00	3,75	1,56	4	6,00	140,40
		4,00	0,85	1,00	37	6,00	187,95
		4,00	0,36	1,00	74	6,00	159,20
	COLUMNA T2	5,00	4,15	1,56	4	6,00	155,38
		5,00	4,15	1,56	4	6,00	155,38
		4,00	0,85	1,00	37	6,00	187,95
		4,00	0,36	1,00	74	6,00	159,20
	REFUERZOS ESQUINA	4,00	3,00	1,00	1376	1,00	4111,49
	REFUERZO VERTICAL MUROS	5,00	3,75	1,56	44	1,00	257,40
		5,00	3,75	1,56	44	1,00	257,40
		5,00	4,23	1,56	44	1,00	290,35
		5,00	4,23	1,56	44	1,00	290,35
		5,00	3,75	1,56	44	1,00	257,40
		5,00	3,75	1,56	44	1,00	257,40
		5,00	3,75	1,56	106	1,00	620,10
		5,00	3,75	1,56	106	1,00	620,10
		5,00	3,75	1,56	106	1,00	620,10
		5,00	3,75	1,56	106	1,00	620,10
	REFUERZOS ADICIONAL VERTICALES	5,00	1,05	1,56	44	1,00	72,07
		5,00	1,05	1,56	44	1,00	72,07
	REFUERZO HORIZONTAL MUROS	5,00	6,95	1,56	19	1,00	206,00
		5,00	6,95	1,56	19	1,00	206,00
		5,00	6,95	1,56	19	1,00	206,00
		5,00	6,95	1,56	19	1,00	206,00
		5,00	9,00	1,56	19	2,00	533,52
		5,00	8,25	1,56	19	2,00	489,06
		5,00	4,25	1,56	19	2,00	251,94
		5,00	8,75	1,56	19	2,00	518,70
		5,00	5,25	1,56	19	2,00	311,22
	MURO DIVISORIO TANQUE	5,00	3,75	1,56	68	1,00	397,80
		5,00	3,75	1,56	67	1,00	391,95
		5,00	4,75	1,56	14	1,00	103,74
		5,00	4,75	1,56	13	1,00	96,33
		5,00	13,23	1,56	20	1,00	412,78
		5,00	14,73	1,56	20	1,00	459,58
						ACUMULADO	161076,84
						ACTA MODIFICATORIA 3	210892,02
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	49815,18
						COBRADAS PARCIAL No 1	32716,10
						COBRADAS PARCIAL No 2	
						COBRADAS PARCIAL No 3	101151,69
						CANTIDADES PRESENTE ACTA	27209,05

OBSERVACIONES:	















ALEXIS RONDON MUNOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
3,07	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESCALERA Y MURO DE CONTENCION INCLUYE ACERO DE REFUERZO

UNIDAD	M3
TOTAL	423,90

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A						
MURO DE CONTENCION 2.40 MTS		7,95		2,54		20,19
MURO DE CONTENCION 4.40 MTS		28,30		4,04		114,19
MURO DE CONTENCION 5.90 MTS DESDE EL EJE K HASTA EL H		48,35		4,74		229,18
ZONA DE AMBULANCIAS						
MURO EJE 3 ENTRE K-M	0,40	12,00	4,00			19,20
MURO EJE 4 ENTRE K-M	0,40	12,00	4,53			21,74
MURO EJE 3 ENTRE M-N	0,40	6,40	4,00			10,24
MURO EJE 4 ENTRE M-N	0,40	5,72	4,00			9,15

ACUMULADO	423,90
ACTA MODIFICATORIA 3	730,88
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	306,98
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	53,33
COBRADAS PARCIAL No 3	295,48
CANTIDADES PRESENTE ACTA	75,09

OBSERVACIONES:










PROPERTIES

Polyline

General	
Color	ByLayer
Layer	0
Linetype	ByLayer
Linetype scale	.0500
Plot style	ByColor
Lineweight	ByLayer
Transparency	ByLayer
Hyperlink	
Thickness	.0000
3D Visualization	
Material	ByLayer
Geometry	
Current Vertex	1
Vertex X	-75382.2938
Vertex Y	-51232.4343
Start segment...	.0000
End segment...	.0000
Global width	.0000
Elevation	.0000
Area	4.7000
Length	19.6038
Misc	
Closed	No
Linetype gener...	Disabled

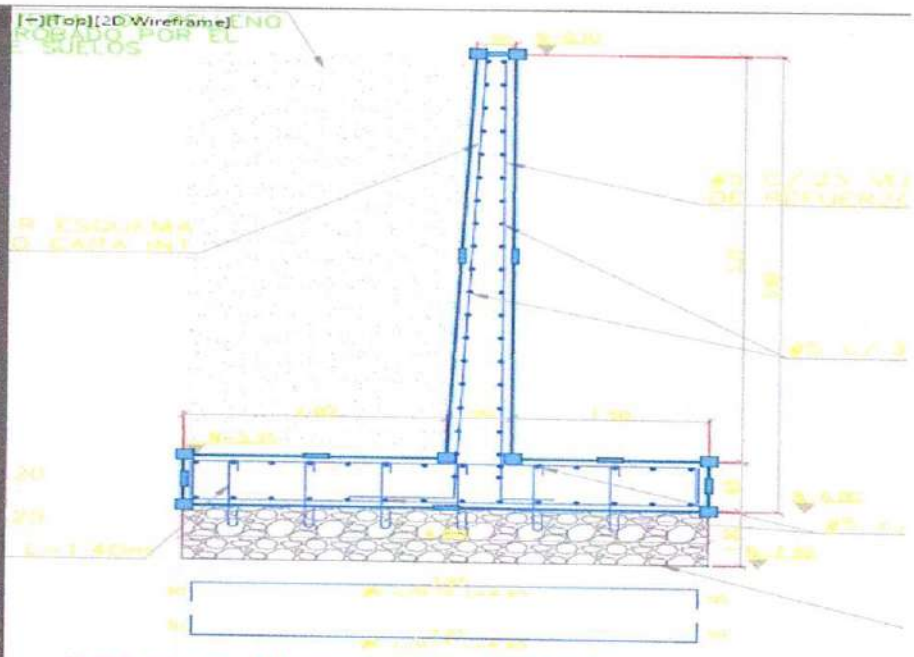

DETALLE MURO CONTENCIÓN h=5.90m

ESC: 1:50

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
3,08	CONCRETO DE 4000 PSI PARA TANQUE SUBTERRANEO

UNIDAD	M3
TOTAL	30,06

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area Transversal	M3	SUBTOTAL
ZONA DE AMBULANCIAS						
LOSA CIMENTACIÓN TANQUE INTERNA	6,00			5,01	30,06	30,06

ACUMULADO	30,06
ACTA MODIFICATORIA 3	32,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1,94
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No 3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	30,06

OBSERVACIONES:

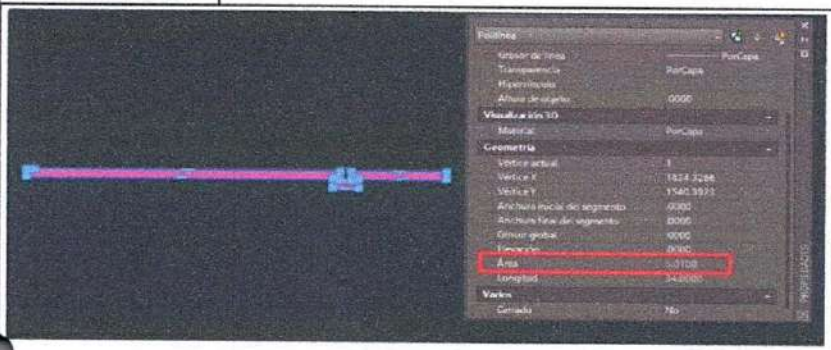

UBICACIÓN PLANO





IMÁGENES

ALEXIS PARDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
3,10	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 15CM C/U CON ANCLAJE EPÓXICO


UNIDAD	ML
TOTAL	148,27

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					
	Ancho	Largo (M)	Alto	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
COLUMNETAS CONSULTORIOS		2,33		28		65,24
COLUMNETAS EXTERIORES		2,33		25		58,25
COLUMNETAS ADMISIONES Y FACTURACION		2,70		2		5,40
		3,80		1		3,80
CENTRAL DE GASES						
COLUMNETA 1		2,74		1,00		2,74
COLUMNETA 2		2,60		1,00		2,60
COLUMNETA 3		2,70		2,00		5,40
COLUMNETA 4		2,42		2,00		4,84

ACUMULADO	148,27
ACTA MODIFICATORIA 3	700,05
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	551,78
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	1,38
COBRADAS PARCIAL No 3	122,11
CANTIDADES PRESENTE ACTA	24,78


OBSERVACIONES:



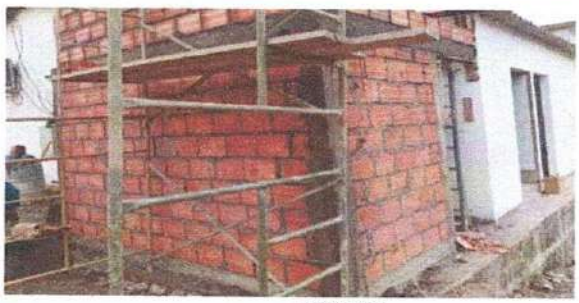

UBICACIÓN PLANO



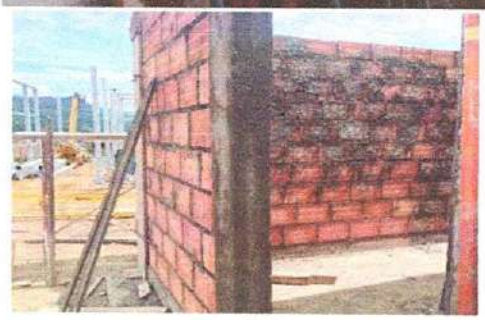

IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUNOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
3,11	VIGA DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 10CM C/U EMBEBIDA EN MURO ESTRUCTURAL A LA VISTA Y PLACA				UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	294,90
	Ancho	Largo (M)	Alto	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
CONSULTORIOS 1, 2 Y 3		2,70		4		10,80
BAÑOS DISCAPACITADOS		2,23		1		2,23
BAÑOS DISCAPACITADOS		2,05		1		2,05
CONSULTORIOS 4, 5, 6 Y 7		2,91		5		14,55
LAVADO DE PATOS, CUARTO DE RESIDUOS Y ASEO		3,73		1		3,73
		1,53		1		1,53
		1,53		1		1,53
		0,81		1		0,81
NSULTORIOS 8, 9 Y 10		3,36		4		13,44
ESO A UCI		4,43		1		4,43
		0,90		1		0,90
PUESTO DE CONTROL, ADMINISTRACION Y BAÑOS		1,35		1		1,35
		3,55		1		3,55
		2,66		1		2,66
		1,72		1		1,72
		2,52		1		2,52
CONSULTORIOS PACIENTE AISLADOS 1 Y 2		5,50		1		5,50
		0,96		1		0,96
		0,60		1		0,60
		0,64		1		0,64
		2,36		1		2,36
		2,55		1		2,55
		5,57		1		5,57
		0,68		1		0,68
		0,54		1		0,54
		0,60		1		0,60
		2,36		1		2,36
		2,64		1		2,64
ROPA LIMPIA Y TRABAJO LIMPIA		1,17		1		1,17
		1,77		1		1,77
		0,60		1		0,60
		0,84		1		0,84
ESTACION DE ENFERMERIA 2		4,26		1		4,26
PASILLO CONSULTORIO 5-6		2,70		1		2,70
		0,82		1		0,82
MEDICAMENTOS Y TRABAJO SUCIO		0,60		1		0,60
		1,08		1		1,08
		1,92		1		1,92
PASILLO INGRESO PACIENTES UCI		9,42		1		9,42
DEPOSITO DE EQUIPOS		2,61		1		2,61
DESCANSO DE PERSONAL Y BAÑO FEMENINO		0,91		1		0,91
		2,75		1		2,75
		2,42		1		2,42
		2,60		1		2,60


		2,71		1		2,71
		2,91		1		2,91
PUERTA		1,02		2		2,04
PASILLO HOSPITALIZACION COVID		7,67		1		7,67
ESTACION DE ENFERMERIA 1		2,92		1		2,92
FILTRO DE INGRESO PROVISIONAL		1,75		1		1,75
		1,30		1		1,30
		1,33		1		1,33
MUROS PERIMETRAL		1,30		1		1,30
		6,60		1		6,60
		5,50		1		5,50
		4,80		1		4,80
		1,45		1		1,45
		6,60		1		6,60
		6,60		1		6,60
		4,17		1		4,17
		6,70		1		6,70
		6,70		1		6,70
		2,05		1		2,05
VIGA ADMISIONES Y FACTURACION		23,80		1		23,80
VIGA DE CORONA ADMISIONES Y FACTURACION		7,20		1		7,20
VIGA ADMISIONES Y FACTURACION		8,25		1		8,25
CENTRAL DE GASES		7,20		1		7,20
VIGA DE AMARRE INFERIOR						
VIGA DE AMARRE SUPERIOR		19,25			19,25	19,25
		24,83			24,83	24,83

ACUMULADO	**294,90**
ACTA MODIFICATORIA 3	**800,00**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**505,10**
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	5,87
COBRADAS PARCIAL No 3	222,30
CANTIDADES PRESENTE ACTA	**66,73**

OBSERVACIONES:



UBICACION PLANO

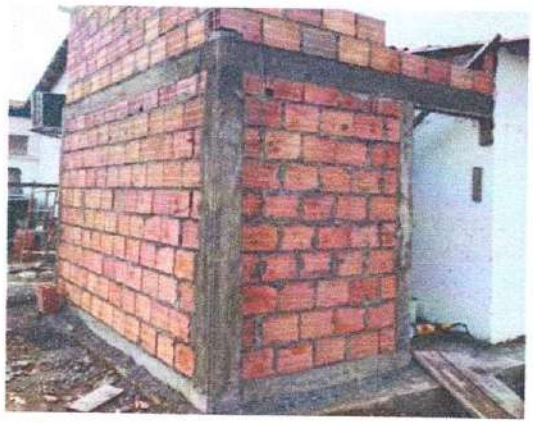

IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
9,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)
UNIDAD	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	2,75
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
PASILLO		2,75				2,75

ACUMULADO	2,75
ACTA MODIFICATORIA 3	2,80
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,05
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	2,75

OBSERVACIONES:



ALEXIS RONDÓN MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
9,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)					UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	2,02
		Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS							
PASILLO			2,02				2,02
						ACUMULADO	2,02
						ACTA MODIFICATORIA 3	47,00
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	44,98
						COBRADAS PARCIAL No 1	
						COBRADAS PARCIAL No 2	
						COBRADAS PARCIAL No3	
						CANTIDADES PRESENTE ACTA	2,02
OBSERVACIONES:							





ALEXIS RONDON MUNOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
9,21	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 1-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)					UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL	10,45
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area		Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS							
PASILLO		10,45					10,45
						ACUMULADO	10,45
						ACTA MODIFICATORIA 3	74,61
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	64,16
						COBRADAS PARCIAL No 1	
						COBRADAS PARCIAL No 2	
						COBRADAS PARCIAL No3	
						CANTIDADES PRESENTE ACTA	10,45
OBSERVACIONES:							






ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
9,22	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 1-1/4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)					UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	11,00
		Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS							
PASILLO			11,00				11,00
						ACUMULADO	11,00
						ACTA MODIFICATORIA 3	59,04
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	48,04
						COBRADAS PARCIAL No 1	
						COBRADAS PARCIAL No 2	
						COBRADAS PARCIAL No3	
						CANTIDADES PRESENTE ACTA	11,00
OBSERVACIONES:							

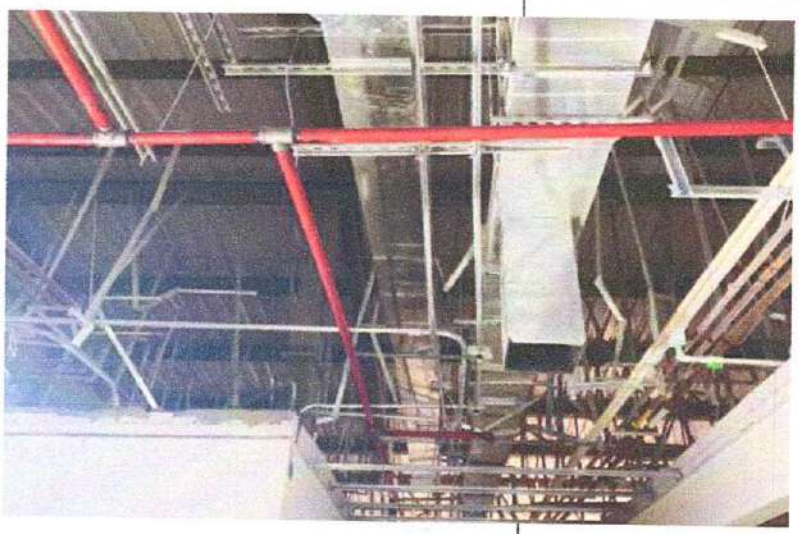

ALEXIS PARDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
9,23	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERIA HG DE 1" (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)				UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	97,82
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
PASILLO		2,58				2,58
		0,56				0,56
		3,14				3,14
		0,53				0,53
		1,08				1,08
		4,31				4,31
		3,43				3,43
		4,33				4,33
		0,82				0,82
		7,44				7,44
ACCESO A UCI		3,13				3,13
PUESTO CONTROL		2,90				2,90
CUARTO 1		3,16				3,16
		0,66				0,66
CUARTO 2		3,60				3,60
CUARTO 3		3,48				3,48
CUARTO 4		3,16				3,16
CUARTO 5		3,22				3,22
CUARTO 6		0,57				0,57
CUARTO 7		2,83				2,83
CUARTO 8		3,18				3,18
CUARTO 9		3,18				3,18
CUARTO 10		3,10				3,10
LAVADO DE PATOS		6,65				6,65
ROPA LIMPIA		1,46				1,46
TRABAJO LIMPIO		0,63				0,63
PACIENTE AISLADO 1		6,96				6,96
PACIENTE AISLADO 2		7,18				7,18
DEPOSITO DE EQUIPO		2,70				2,70
DESCANSO PERSONAL		2,70				2,70
TRABAJO SUCIO		1,14				1,14
MEDICAMENTOS		1,14				1,14
BAÑO MASCULINO		2,88				2,88

ACUMULADO	97,82
ACTA MODIFICATORIA 3	1616,14
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1518,32
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	97,82

OBSERVACIONES:









ALEXIS RONTON MUNOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO / ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
9,24	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE COUPLING ACERO NEGRO DE 4"				UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	1,00
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
GABINETE EN LA UCI					1,00	1,00

ACUMULADO	1,00
ACTA MODIFICATORIA 3	2,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1,00
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	1,00

OBSERVACIONES:





ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO / ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
9,26	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE COUPLING ACERO NEGRO DE 2-1/2"				UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	10,00
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
RED RCI DE 2-1/2"					10,00	10,00

ACUMULADO	10,00
ACTA MODIFICATORIA 3	47,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	37,00
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	10,00

OBSERVACIONES:

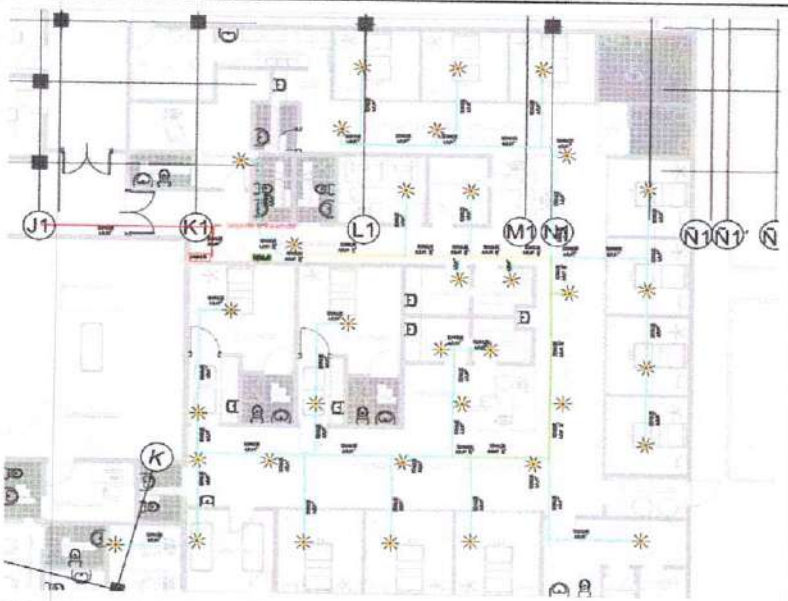



ALEXIS RONCON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
9,28	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE COUPLING ACERO NEGRO DE 1-1/2"					UNIDAD	UND
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL	14,00
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area		Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS							
RED RCI 1-1/2"						14,00	14,00

ACUMULADO	14,00
ACTA MODIFICATORIA 3	15,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1,00
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	14,00

OBSERVACIONES:

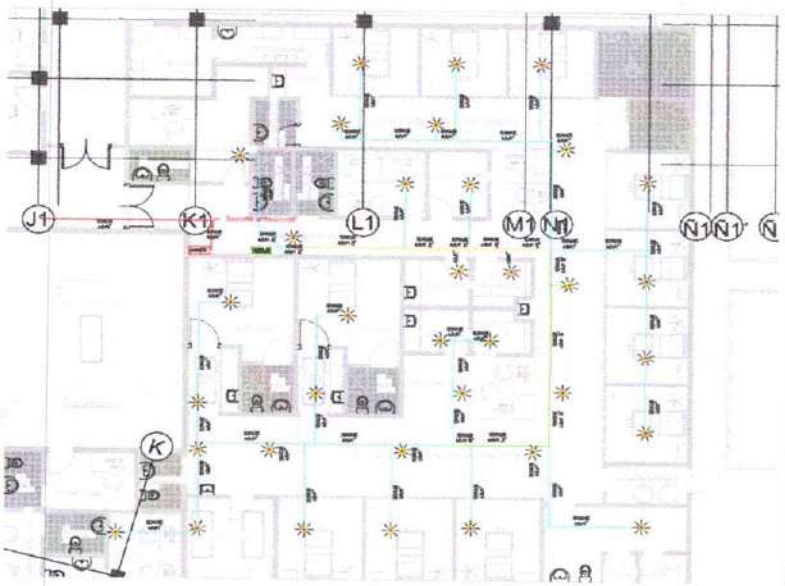



ALEXIS RONCON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
9,29	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE COUPLING ACERO NEGRO DE 1-1/4"

UNIDAD	UND
TOTAL	11,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
RED RCI 1-1/4"					11,00	11,00

ACUMULADO	11,00
ACTA MODIFICATORIA 3	12,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1,00
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	11,00

OBSERVACIONES:

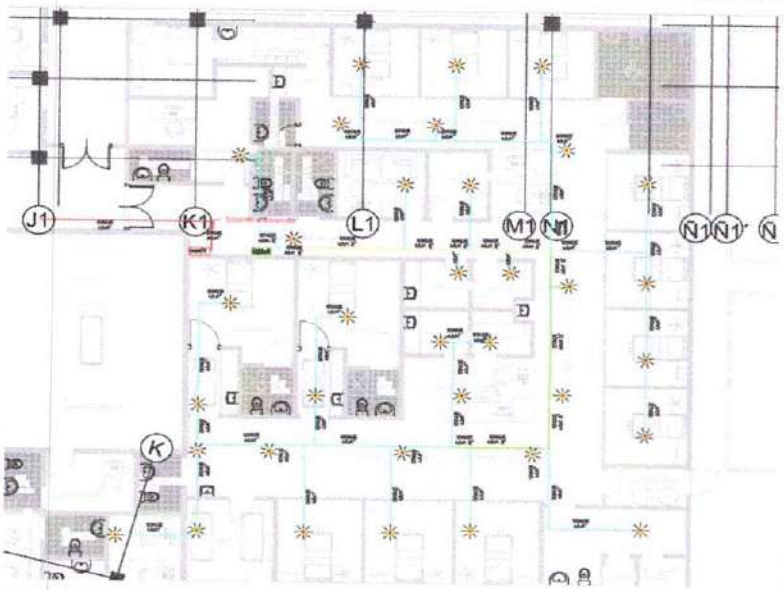



ALEXIS RONDON MUNOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
9,28	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA ANTISISMICA 2 VIAS

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	ML
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	TOTAL	1,00
					Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
Tuberia cercana al gabinete					1,00	1,00

ACUMULADO	1,00
ACTA MODIFICATORIA 3	7,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	6,00
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	1,00

OBSERVACIONES:

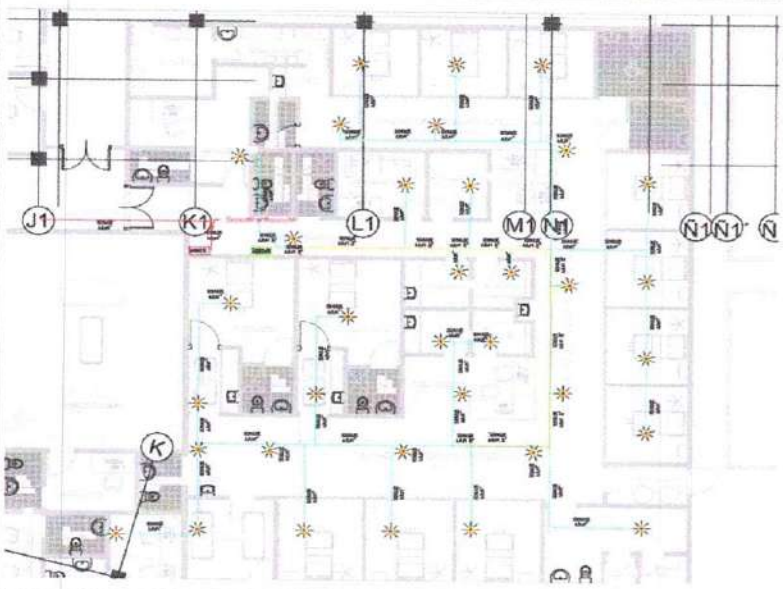



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
9,32	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM, INCLUYE ESCUDO

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	UND
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	TOTAL	35,00
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS					Elementos	SUBTOTAL
PACIENTE AISLADO 1					2,00	2,00
PACIENTE AISLADO 2					2,00	2,00
PUESTO CONTROL					1,00	1,00
ACCESO A UCI					1,00	1,00
CUARTO 1					1,00	1,00
CUARTO 2					1,00	1,00
CUARTO 3					1,00	1,00
CUARTO 4					1,00	1,00
CUARTO 5					1,00	1,00
CUARTO 6					1,00	1,00
CUARTO 7					1,00	1,00
CUARTO 8					1,00	1,00
CUARTO 9					1,00	1,00
CUARTO 10					1,00	1,00
LAVADO DE PATOS					1,00	1,00
DESCANSO PERSONAL					1,00	1,00
DEPOSITO EQUIPOS					1,00	1,00
MEDICAMENTOS					1,00	1,00
TRABAJO SUCIO					1,00	1,00
ROPA LIMPIA					1,00	1,00
TRABAJO LIMPIO					1,00	1,00
PASILLOS					1,00	1,00
					12,00	12,00

ACUMULADO	35,00
ACTA MODIFICATORIA 3	446,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	411,00
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	35,00

OBSERVACIONES:	









ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	

9,46	PINTURA DE TUBERIA DE ACERO DIAMETRO HASTA 2"				UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	119,27
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ACERO		10,45				10,45
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ACERO		11,00				11,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERIA HG DE 1"		97,82				97,82

ACUMULADO	119,27
ACTA MODIFICATORIA 3	188,87
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	69,60
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	119,27

OBSERVACIONES:









ALEXIS ROJON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
9,47	PINTURA DE TUBERIA DE ACERO DIAMETROS DE 2-1/2" A 6"

UNIDAD	ML
TOTAL	4,77

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)		2,75				2,75
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)		2,02				2,02

ACUMULADO	4,77
ACTA MODIFICATORIA 3	439,21
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	434,44
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	4,77

OBSERVACIONES:

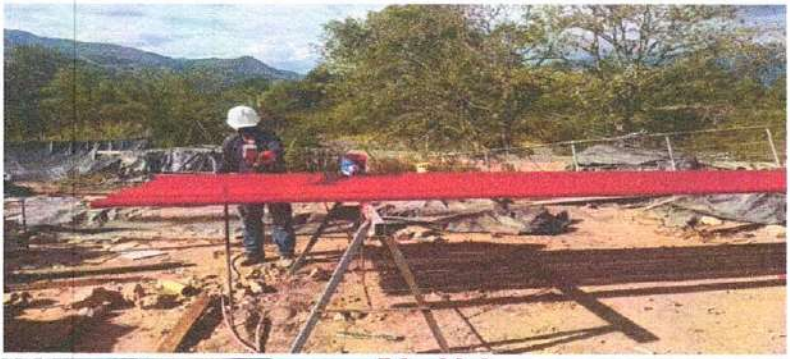







ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
10.69	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3#12, TUBERÍA EMT 3/4" Y CAJAS RADWELT CUADRADA. DISTANCIA PROMEDIO 5 METROS.	TOTAL	102,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				ML	
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Cantidad		
UCI				102,00		102,00
Transfer Paciente Aislado 1				2,00		2,00
Transfer Paciente Aislado 2				2,00		2,00
Paciente Aislado 1				2,00		2,00
Paciente Aisledo 2				2,00		2,00
Baño Paciente Aislado 1				1,00		1,00
Baño Paciente Aislado 2				1,00		1,00
Trabajo Sucio				1,00		1,00
Trabajo Limpio				1,00		1,00
Ropa Limpia				1,00		1,00
Medicamentos				1,00		1,00
Estacion de Enfermeria 147				3,00		3,00
Estacion de Enfermeria 146				2,00		2,00
Deposito de Equipos				2,00		2,00
Descanso de Personal				2,00		2,00
U.S Masculino 61				1,00		1,00
U.S Masculino 60				1,00		1,00
Baño Pesonal 41				1,00		1,00
Acceso UCI				2,00		2,00
Camillas 1-2-3				6,00		6,00
Habitación 55				3,00		3,00
Deposito de Residuos				1,00		1,00
Cuarto de Aseo				1,00		1,00
Filtro de Salida de Visitas 54				3,00		3,00
Camillas 4-5-6-7				8,00		8,00
Baño Pacientes				2,00		2,00
Baño Pacientes Movilidad Reducida				2,00		2,00
Camillas 8-9-10				6,00		6,00
U.S Femenico UCI 62				1,00		1,00
Ingreso de Personal				4,00		4,00
Baño U.S Femenino Ingreso de Personal 63				1,00		1,00
Filtro Ingreso Visitas				2,00		2,00
Lavamanos Quirurgico				1,00		1,00
Sala de Espera				2,00		2,00
Pasillos UCI				31,00		31,00

	ACUMULADO	102,00
	ACTA MODIFICATORIA 3	1428,00
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1326,00
	COBRADAS PARCIAL No 1	
	COBRADAS PARCIAL No 2	
	COBRADAS PARCIAL No3	
	CANTIDADES PRESENTE ACTA	102,00


OBSERVACIONES:	

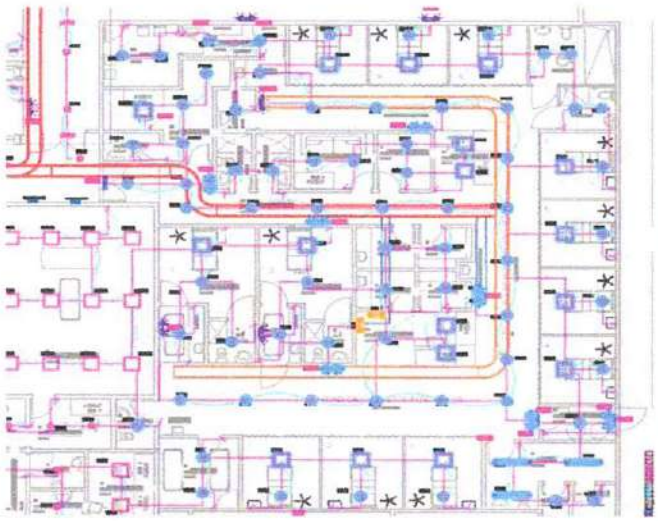







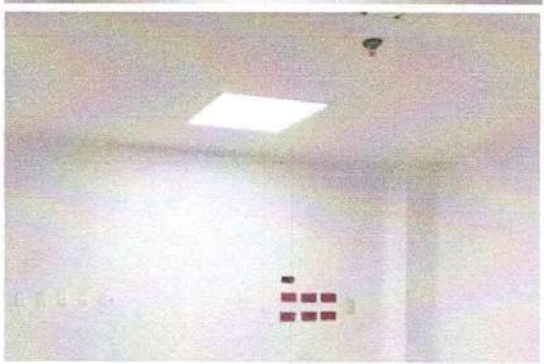

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
10.71	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 2#12F+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" PVC. DISTANCIA PROMEDIO 3 METROS.	TOTAL	28,00


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UND	
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Cantidad		
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
RESIDUOS				3,00		3,00
PACIENTE AISLADO 1				2,00		2,00
PACIENTE AISLADO 2				2,00		2,00
CONSULTORIOS				10,00		10,00
ESTACION DE ENFERMERIA				1,00		1,00
TRABAJO LIMPIO				1,00		1,00
ROPA LIMPIA				1,00		1,00
TRABAJO SUCIO				1,00		1,00
MEDICAMENTOS				1,00		1,00
DEPOSITO DE EQUIPOS				1,00		1,00
DESCANSO PERSONAL				1,00		1,00
BAÑO MASCULINO				1,00		1,00
BAÑO FEMENINO				1,00		1,00
BAÑO FEMENINO 2				1,00		1,00
VESTIER				1,00		1,00

ACUMULADO	28,00
ACTA MODIFICATORIA 3	276,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	248,00
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	28,00

OBSERVACIONES

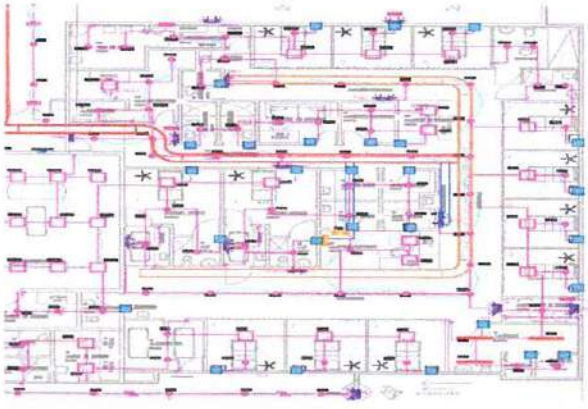





ALEX[illegible] RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
10.74	INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3#12F+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" PVC. DISTANCIA PROMEDIO 8 METROS.	TOTAL	6,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UND	
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Cantidad		
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
FILTRO DE VISITA				2,00		2,00
PACIENTE AISLADO 1				2,00		2,00
PACIENTE AISLADO 2				2,00		2,00

ACUMULADO	6,00
ACTA MODIFICATORIA 3	48,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	42,00
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	6,00

OBSERVACIONES

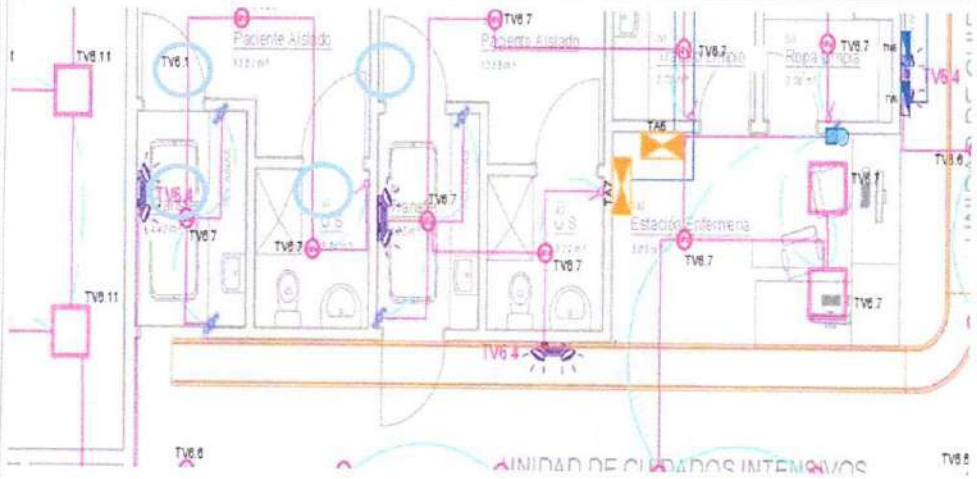

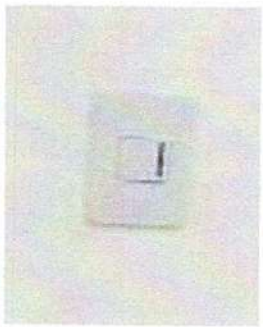


ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
10.76	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LED EMERG 2X1.6W					TOTAL	9,00
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					UND	
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Cantidad			
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS							
PASILLOS				7,00			7,00
FILTRO DE VISITA				2,00			2,00
					ACUMULADO		9,00
					ACTA MODIFICATORIA 3		120,00
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		111,00
					COBRADAS PARCIAL No 1		
					COBRADAS PARCIAL No 2		
					COBRADAS PARCIAL No3		
					CANTIDADES PRESENTE ACTA		9,00

OBSERVACIONES

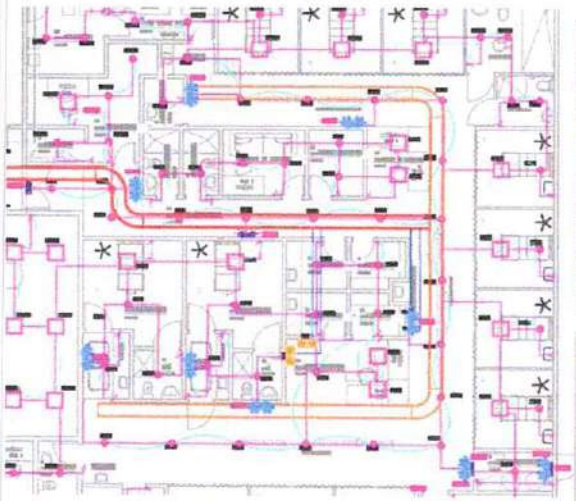









ALEXIS ROJDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
10.83	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE NORMALES, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" Y TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA. DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	TOTAL	2,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UND	
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Cantidad		
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
ESTACION DE ENFERMERIA				2,00		2,00
					ACUMULADO	2,00
					ACTA MODIFICATORIA 3	583,00
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	581,00
					COBRADAS PARCIAL No 1	
					COBRADAS PARCIAL No 2	
					COBRADAS PARCIAL No3	
					CANTIDADES PRESENTE ACTA	2,00

OBSERVACIONES

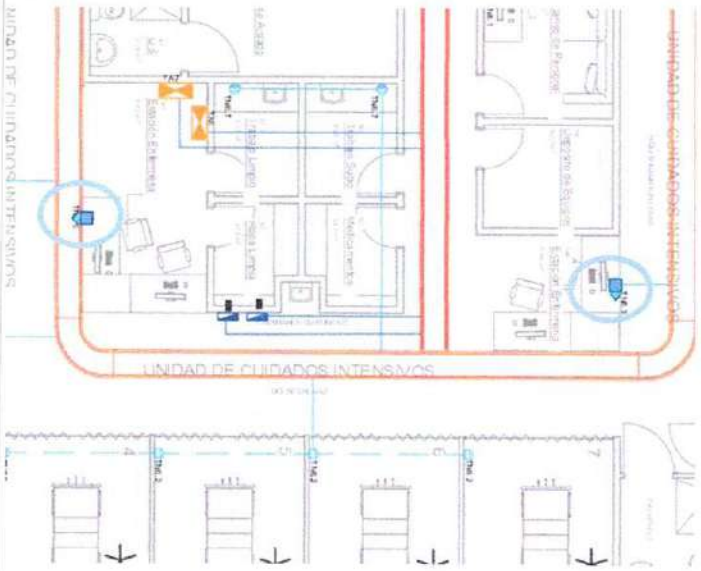

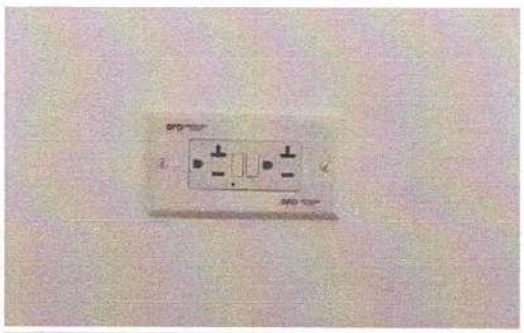

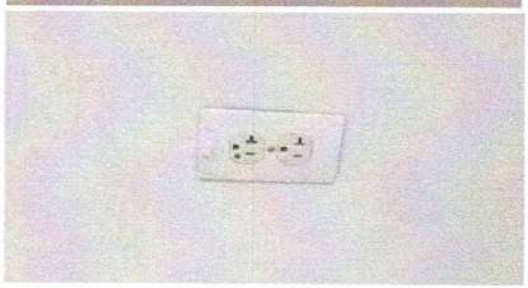

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA





CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
10.87	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE CRITICA GRADO HOSPITALARIO, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+2#12T, TUBERIA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO DOBLE CON POLO A TIERRA.. DISTANCIA PROMEDIO 10 METROS.	TOTAL	76,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UND	
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Cantidad		
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
CONSULTORIOS UCI				60,00		60,00
ESTACION DE ENFERMERIA 1 Y 2				4,00		4,00
PACIENTE AISLADO 1 Y 2				12,00		12,00

ACUMULADO	76,00
ACTA MODIFICATORIA 3	266,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	190,00
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	76,00

OBSERVACIONES

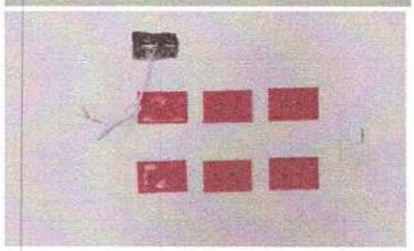
ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
10.90	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES SELLADA (DUCTO CERRADO CON TAPA) 54/500 PARA RED ELECTRICA. INCLUYE SOPORTE DE SUJECIÓN, VARILLAS ROSCADAS, TORNILLOS DE UNIÓN.	TOTAL	15,00


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				ML
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Cantidad	
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS					
CORREDOR	15,00				15,00

ACUMULADO	15,00
ACTA MODIFICATORIA 3	593,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	578,00
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	15,00

OBSERVACIONES

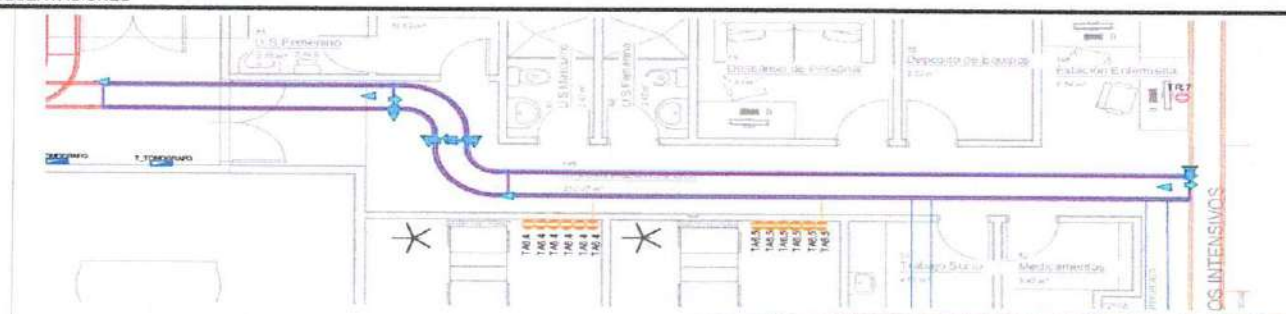



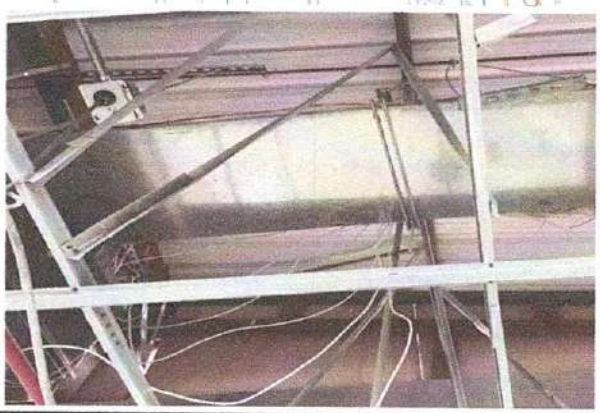

ALVARO RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
10.91	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES SELLADA (DUCTO CERRADO CON TAPA) 54/300 PARA COMUNICACIONES. INCLUYE SOPORTE DE SUJECIÓN, VARILLAS ROSCADAS, TORNILLOS DE UNIÓN.	TOTAL	30,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				ML	
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Cantidad		
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
CORREDOR	30,00					30,00
					ACUMULADO	30,00
					ACTA MODIFICATORIA 3	1433,00
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1403,00
					COBRADAS PARCIAL No 1	
					COBRADAS PARCIAL No 2	
					COBRADAS PARCIAL No3	
					CANTIDADES PRESENTE ACTA	30,00

OBSERVACIONES

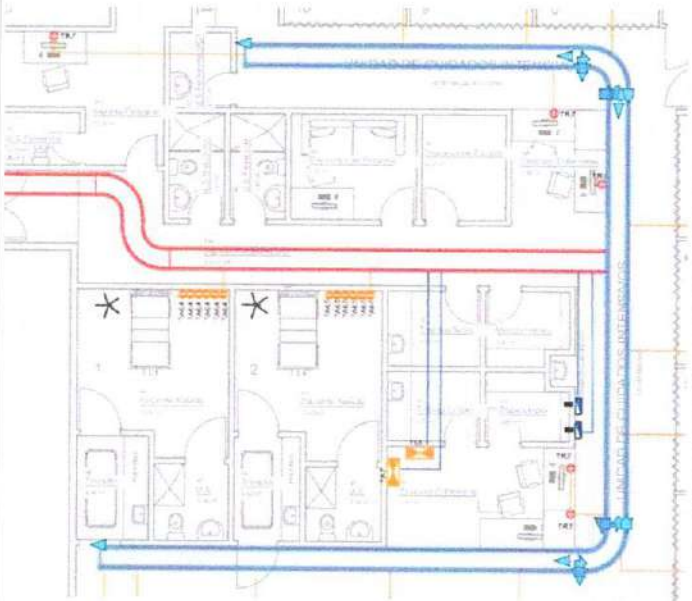





ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
10.101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LLAMADA DE ENFERMERA. INCLUYE: TUBERIA DE EMT 3/4", CABLES UTP CAT 6, FACE PLATE DE 1 SALIDAS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TOTAL	12,00


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UND	
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Cantidad		
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
CONSULTORIOS 1 - 10				10,00		10,00
PACIENTE AISLADO 1 Y 2				2,00		2,00
					ACUMULADO	**12,00**
					ACTA MODIFICATORIA 3	**115,00**
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**103,00**
					COBRADAS PARCIAL No 1	
					COBRADAS PARCIAL No 2	
					COBRADAS PARCIAL No3	
					CANTIDADES PRESENTE ACTA	**12,00**

OBSERVACIONES

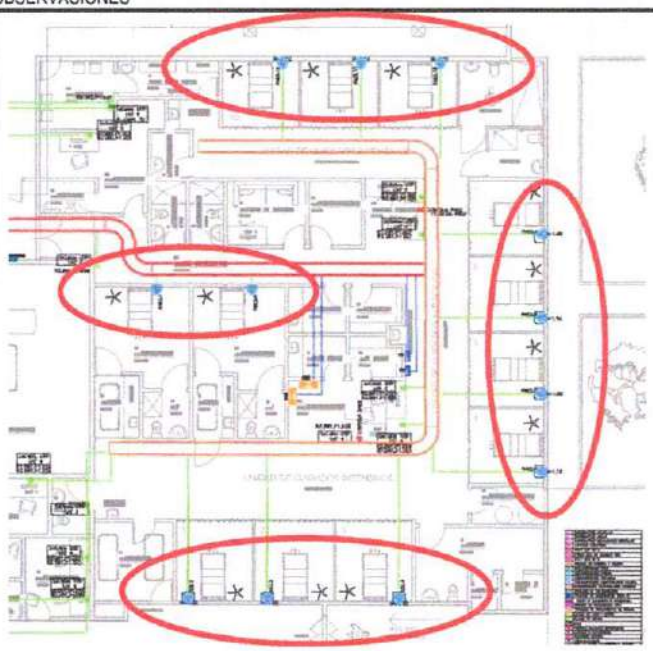







ANGIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
11,06	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO
UNIDAD	M2
TOTAL	58,75

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					
	Ancho	Largo (M)	Alto	Cantidad	AREA	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
PERIMETRO		15,80		1		15,80
		20,58		1		20,58
		22,37		1		22,37

ACUMULADO	58,75
ACTA MODIFICATORIA 3	2334,69
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	2275,94
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No 3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	58,75

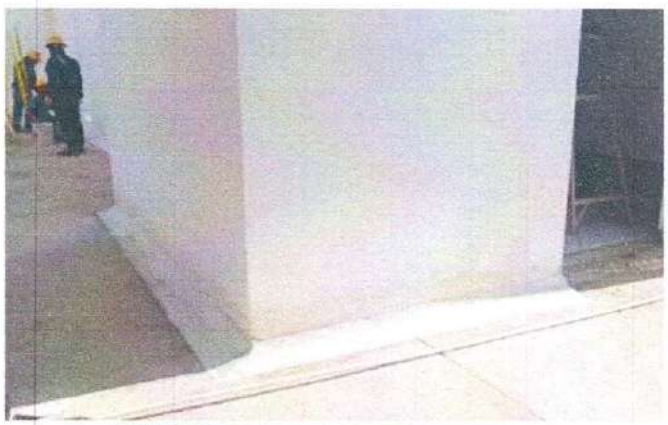



UBICACIÓN PLANO





IMAGENES


ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
13,04	DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS INCLUYE RETIRO					UNIDAD	ML
LOCALIZACION		DIMENSIONES				TOTAL	216,40
		Ancho	Largo (M)	Alto	Elementos	Caras	SUBTOTAL
MODULO E EXISTENTE							
PASILLO CIRCULACION COLUMNAS			2,60		6		15,60
PASILLO CIRCULACION VIGAS			17,90		1		17,90
VIGAS RESONADOR			18,00		1		18,00
TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE							
VIGAS TANQUE			4,40		4,00		17,60
			3,40		4,00		13,60
COLUMNA TANQUE			1,70		4,00		6,80
ZONA DE HOSPITALIZACION (MOD A)							
DEMOLICION DE VIGA EXISTENTE			3,30				3,30
ZONA DE CIRUGIA EXISTENTE (MOD F)							
VIGA CORREA			6,00		4		24,00
VIGAS			10,40		4		41,60
COLUMNAS			5,00		6		30,00
			3,50		8		28,00
						ACUMULADO	216,40
						ACTA MODIFICATORIA 3	350,70
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	134,30
						COBRADAS PARCIAL No 1	
						COBRADAS PARCIAL No 2	
						COBRADAS PARCIAL No3	89,50
						CANTIDADES PRESENTE ACTA	126,90
OBSERVACIONES							

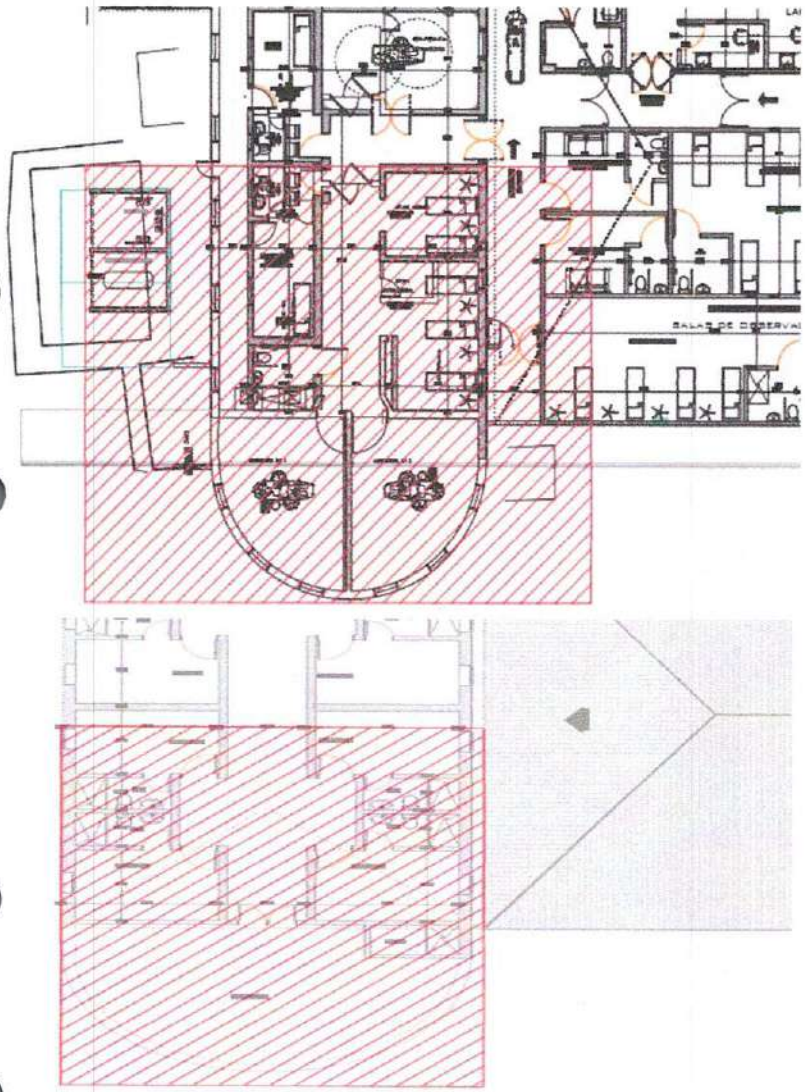

UBICACIÓN PLANO

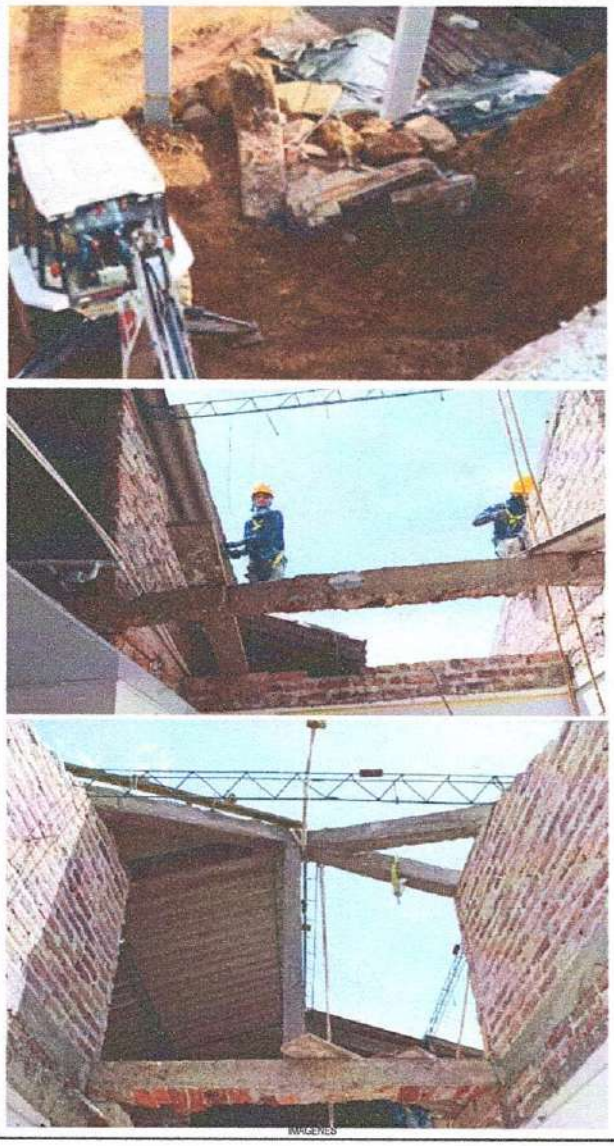

IMAGENES

ALEXIS ROMDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO / ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
14,01	SUMINISTRO ,TRANSPORTE Y COLOCACION DE BALDOSA EN CERAMICA PARA BAÑO				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	357,20
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)		
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
ENCHAPE DE MURO						
LAVADO DE PATOS	2,65		2,55	6,76		6,76
	1,98		2,55	5,04		5,04
	0,89		2,55	2,27		2,27
	0,96		0,48	0,46		0,46
	0,15		2,55	0,38		0,38
	0,77		2,55	1,96		1,96
	3,66		2,55	9,33		9,33
	0,77		2,55	1,96		1,96
	0,68		2,55	1,73		1,73
	1,36		2,55	3,47		3,47
	2,96		0,48	1,42		1,42
	1,00		0,48	0,48		0,48
	0,12		2,14	0,26		0,26
DEPOSITO DE RESIDUOS	1,41		2,55	7,19	2,00	7,19
	0,43		2,55	1,1		1,10
	1,65		2,55	4,21		4,21
CUARTO DE ASEO	1,42		2,55	3,62		3,62
	0,95		0,50	0,48		0,48
	0,90		2,55	2,3		2,30
BAÑO PACIENTE AISLADO	1,80		2,55	4,59		4,59
	1,70		2,55	4,34		4,34
	0,63		2,55	1,61		1,61
	1,00		0,48	0,48		0,48
BAÑO PACIENTE AISLADO	1,60		2,55	4,08		4,08
	0,73		2,55	1,86		1,86
	1,69		2,55	4,31		4,31
	1,38		2,55	3,52		3,52
	0,98		0,40	0,39		0,39
	0,26		2,55	0,66		0,66
	0,18		2,55	0,46		0,46
BAÑO PTO CONTROL	1,73		2,55	4,41		4,41
	1,96		2,55	5		5,00
	1,61		2,55	4,11		4,11
	1,00		2,55	2,55		2,55
BAÑO AUX	2,08		2,55	5,3		5,30
	1,48		2,55	3,77		3,77
	1,96		2,55	5		5,00
	1,04		0,53	0,55		0,55
BAÑO DE PACIENTES	1,96		2,55	5		5,00
	1,85		2,55	4,72		4,72
	2,15		2,55	5,48		5,48
	0,89		2,55	2,27		2,27
	0,15		2,55	0,38		0,38
	0,43		1,00	0,43		0,43
BAÑO DE PACIENTES	0,15		2,55	0,38		0,38
	2,59		2,55	6,6		6,60
	2,18		2,55	5,56		5,56
	2,39		2,55	6,09		6,09

	3,09		2,55	7,88		7,88
U.S FEMENINO	1,17		2,55	2,98		2,98
	2,63		2,55	6,71		6,71
	2,50		2,55	6,38		159,18
	0,23		2,55	0,57		0,57
U.S. MASCULINO	2,61		2,55	6,66		6,66
	1,19		2,55	3,03		3,03
	2,14		2,55	5,46		5,46
BAÑO PEROSNAL	2,26		2,55	5,76		5,76
	1,46		2,55	3,72		3,72
	1,46		2,55	3,72		3,72
	1,26		2,55	3,21		3,21

	ACUMULADO	357,20
	ACTA MODIFICATORIA 3	1640,04
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1282,84
	COBRADAS PARCIAL No 1	
	COBRADAS PARCIAL No 2	
	COBRADAS PARCIAL No3	
	CANTIDADES PRESENTE ACTA	357,20


OBSERVACIONES:

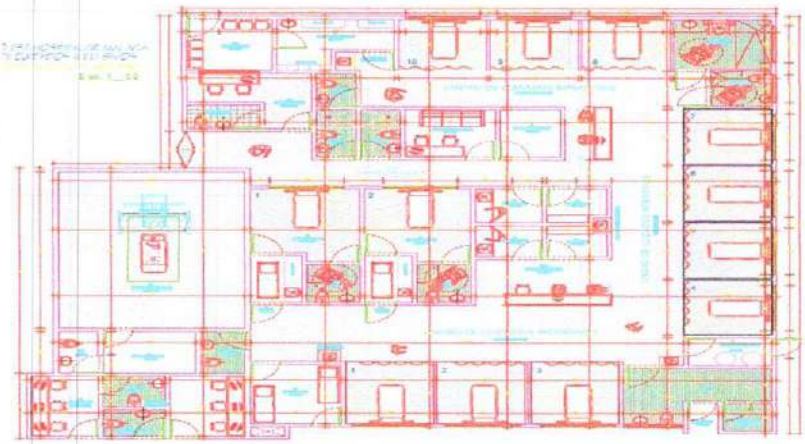

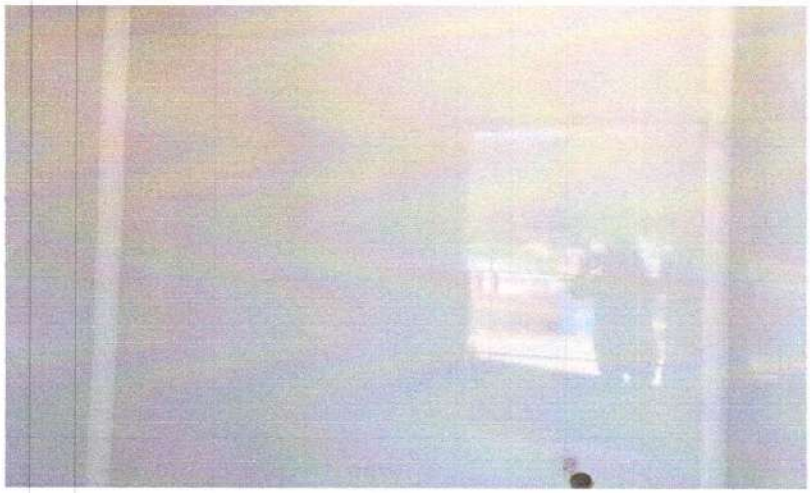

UBICACIÓN PLANO



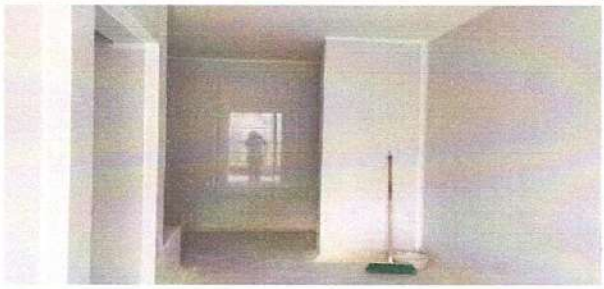



IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
4,02	REMATE BOCEL ALUMINIO				UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	55,45
	Ancho	Largo (M)	Alto	ML	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
BAÑO MACULINO				2,48		2,48
				1,01		1,01
BAÑO FEMENINO				2,08		2,08
				1,03		1,03
BAÑO PACIENTES				2,08		2,08
				1,01		1,01
BAÑO PACIENTES				2,1		2,10
				0,94		0,94
LAVADO DE PATOS				2,53	2,00	5,06
				1		1,00
				0,62		0,62
				0,76		0,76
				2,04		2,04
DEPOSITO RESIUOS				0,92		0,92
CUARTO DE ASEO				1		1,00
				2,1		2,10
				2,51	2,00	5,02
				2,07		2,07
				1		1,00
BAÑO PERSONAL				2,08		2,08
				1,06		1,06
BAÑO PACIENTE AISLADO 1				1,96		1,96
				2,42		2,42
BAÑO PACIENTE AISLADO 2				1,96	2,00	3,92
				1		1,00
				2,42		2,42
BAÑO PTO CONTROL				2,16		2,16
				1,01		1,01
BAÑO ADMISIONES				2,08		2,08
				1,02		1,02
					ACUMULADO	55,45
					ACTA MODIFICATORIA 3	363,44
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	307,99
					COBRADAS PARCIAL No 1	
					COBRADAS PARCIAL No 2	
					COBRADAS PARCIAL No3	
					CANTIDADES PRESENTE ACTA	55,45

OBSERVACIONES:	





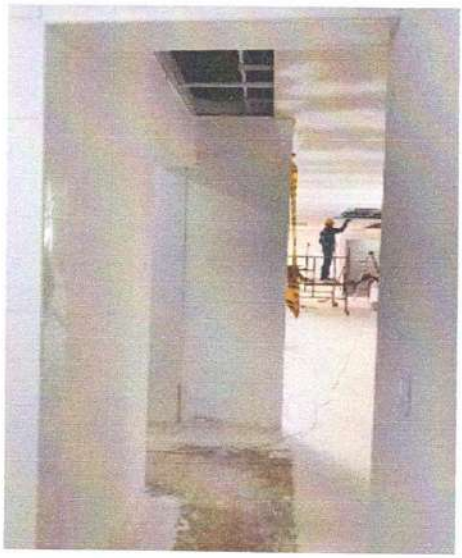

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO / ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
14,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE GUARDACAMILLAS EN PVC DE ALTO IMPACTO ANCHO 20 CM				UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	38,65
	Ancho	Largo (M)	Alto	Cantidad	ML	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
PASILLOS		5,10				5,10
		3,00				3,00
		1,80				1,80
		7,30				7,30
		2,71				2,71
		7,62				7,62
		0,56				0,56
ACCESO UCI		10,56				10,56

ACUMULADO	38,65
ACTA MODIFICATORIA 3	663,13
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	624,48
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	38,65

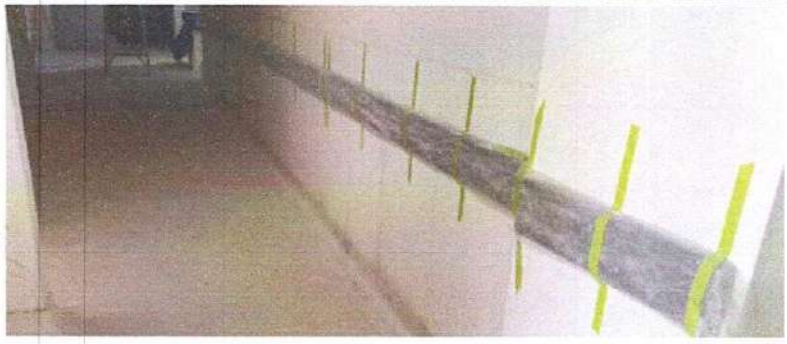



UBICACIÓN PLANO



IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
15,02	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO 1/2 CAÑA				UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	392,44
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)		
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
CUARTO 1		9,74			9,74	9,74
CUARTO 2		9,93			9,93	9,93
CUARTO 3		9,48			9,48	9,48
ARTO 4		8,82			8,82	8,82
CUARTO 5		9,17			9,17	9,17
CUARTO 6		8,89			8,89	8,89
CUARTO 7		8,99			8,99	8,99
CUARTO 8		8,38			8,38	8,38
CUARTO 9		8,39			8,39	8,39
CUARTO 10		8,45			8,45	8,45
ARTO DE ASEO		5,95			5,95	5,95
RESIDUOS		4,13			4,13	4,13
FILTRO DE SALIDA DE VISITAS		3,25			3,25	3,25
		3,60			3,60	3,60
LAVADO DE PATOS		6,40			6,40	6,40
		6,32			6,32	6,32
LAV. QUIRURGICO		1,66			1,66	1,66
ACCESO A UCI		4,76			4,76	4,76
		7,71			7,71	7,71
PTO.CONTROL		4,82			4,82	4,82
		6,02			6,02	6,02
BAÑO PERSONAL		3,80			3,80	3,80
PACIENTE AISLADO 1		3,55			3,55	3,55
		7,88			7,88	7,88
		15,60			15,60	15,60
ÑO		2,05			2,05	2,05
		2,05			2,05	2,05
		1,79			1,79	1,79
PACIENTE AISLADO 2		3,55			3,55	3,55
		22,05			22,05	22,05
		15,60			15,60	15,60
BAÑO		2,05			2,05	2,05
		2,05			2,05	2,05
		1,79			1,79	1,79
TRABAJO LIMPIO					0,00	0,00
ROPA LIMPIA		6,40			6,40	6,40
ESTACION ENFERMERIA		4,74			4,74	4,74
MEDICAMENTOS		7,08			7,08	7,08
TRABAJO SUCIO		7,10			7,10	7,10
ESTACION ENFEERMERIA 2		3,80			3,80	3,80
		3,47			3,47	3,47
DEPOSITO DE EQUIPOS		8,43			8,43	8,43
DESCANSO PERSONAL		10,52			10,52	10,52
U.S FEMENINO		7,00			7,00	7,00
U.S MASCULINO		7,27			7,27	7,27
BAÑO PACIENTES		10,63			10,63	10,63
BAÑO PACIENTES		7,02			7,02	7,02
PASILLO		59,25			59,25	59,25
ADMISIONES Y FACTURACION		9,90			9,90	9,90

BAÑO ADM Y FACT		6,44			6,44	6,44
BAÑO PTO CONTROL		4,72			4,72	4,72


	ACUMULADO	392,44
	ACTA MODIFICATORIA 3	2098,71
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1706,27
	COBRADAS PARCIAL No 1	
	COBRADAS PARCIAL No 2	
	COBRADAS PARCIAL No 3	
	CANTIDADES PRESENTE ACTA	392,44
OBSERVACIONES:		





UBICACIÓN PLANO



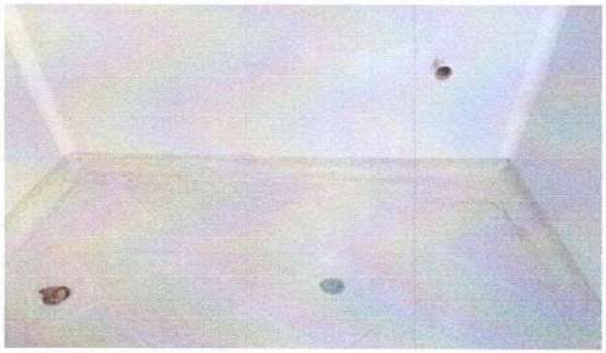

IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUNOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO / ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
15,03	SUMINISTRO ,TRANSPORTE Y COLOCACION DE BALDOSA EN CERAMICA PARA BAÑO				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	35,11
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)		
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
ENCHAPE DE PISO						
LAVADO DE PATOS	2,10		4,77	10,02		10,02
DEPOSITO DE RESIDUOS	0,75		1,53	1,15		1,15
CUARTO DE ASEO	1,27		1,51	1,92		1,92
BAÑO PACIENTE AISLADO	1,66		1,73	2,87		2,87
BAÑO PACIENTE AISLADO	1,56		1,73	2,7		2,70
BAÑO PTO CONTROL	1,86		1,66	3,09		3,09
BAÑO AUX	1,37		2,00	2,74		2,74
BAÑO PERSONAL	1,12		2,13	2,39		2,39
U.S FEMENINO	1,05		2,56	2,69		2,69
U.S. MASCULINO	1,05		2,54	2,67		2,67
AÑO PERSONAL	1,90		1,25			2,38
	1,10		0,45			0,50
					ACUMULADO	35,11
					ACTA MODIFICATORIA 3	190,65
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	155,54
					COBRADAS PARCIAL No 1	
					COBRADAS PARCIAL No 2	
					COBRADAS PARCIAL No 3	
					CANTIDADES PRESENTE ACTA	35,11

OBSERVACIONES:

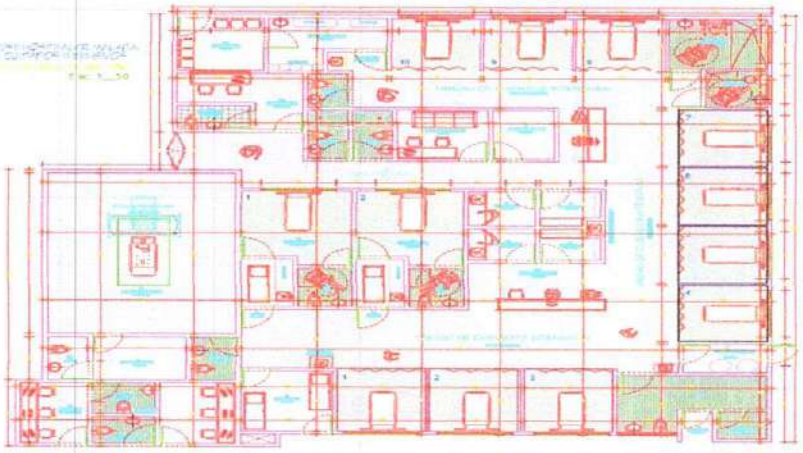

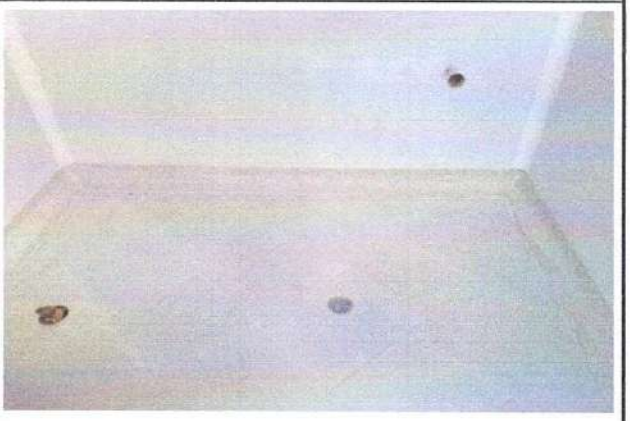







ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	

,01	ESTUCO PREPARADO	UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	712,02
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)		
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
CUARTOS 1	9,33		2,65	24,72		24,72
CUARTOS 2	8,42		2,65	22,31		22,31
CUARTOS 3	9,51		2,65	25,2		25,20
UARTOS 4	8,70		2,65	23,06		23,06
CUARTOS 5	9,03		2,65	23,93		23,93
CUARTOS 6	8,75		2,65	23,19		23,19
CUARTOS 7	8,80		2,65	23,32		23,32
CUARTOS 8	8,25		2,65	21,86		21,86
CUARTOS 9	8,31		2,65	22,02		22,02
CUARTOS 10	8,29		2,65	21,97		21,97
FILTRO SALIDA DE VISITAS	7,04		2,65	18,66		18,66
ACCESO A UCI	10,48		2,65	27,77		27,77
PTO DE CONTROL	10,74		2,65	28,46		28,46
ADMISIONES Y FACTURACION	10,28		2,65	27,24		27,24
PACIENTE AISLADO 1	20,47		2,65	54,25		54,25
PACIENTE AISLADO 2	19,01		2,65	50,38		50,38
TRABAJO LIMPIO	7,10		2,65	18,82		18,82
OPA LIMPIA	7,33		2,65	19,42		19,42
TRABAJO SUCIO	6,84		2,65	18,13		18,13
MEDICAMENTOS	6,11		2,65	16,19		16,19
DEPOSITO EQUIPOS	8,33		2,65	22,07		22,07
DESCANSO PERSONAL	10,39		2,65	27,53		27,53
PASILLO	52,59		2,65	139,36		139,36
ESTACION D3 ENFERMERIA 1	4,04		0,80	3,23		3,23
ESTACION D3 ENFERMERIA 2	6,00		0,80	4,8		4,80
AVAMANOS QUIRURGICOS	1,56		2,65	4,13		4,13

ACUMULADO	712,02
ACTA MODIFICATORIA 3	12784,38
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	12072,36
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No 3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	712,02

OBSERVACIONES:	









ALEXIS ROMÁN MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
17,02	ESTUCO PREPARADO (METRO LINEAL)

UNIDAD	ML
TOTAL	101,02

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)		
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
CUARTOS 1			2,65			2,65
CUARTOS 2			2,65			2,65
CUARTOS 3			2,65			2,65
CUARTOS 4			2,65			2,65
CUARTOS 5			2,65			2,65
CUARTOS 6			2,65			2,65
CUARTOS 7			2,65			2,65
CUARTOS 8			2,65			2,65
CUARTOS 9			2,65			2,65
CUARTOS 10			2,65			2,65
FILTRO SALIDA DE VISITAS			2,65			2,65
			2,10			2,10
			2,18			2,18
ACCESO A UCI			2,63			2,63
			2,29			2,29
PTO DE CONTROL			2,16			2,16
			2,16			2,16
BAÑO PTO CONTROL			2,16			2,16
ADMISIONES Y FACTURACION			2,16			2,16
			2,09			2,09
PACIENTE AISLADO 1			2,12			2,12
			2,12			2,12
			2,12			2,12
PACIENTE AISLADO 2			2,12			2,12
			2,12			2,12
			2,12			2,12
			2,12			2,12
TRABAJO LIMPIO			2,12			2,12
ROPA LIMPIA			2,12			2,12
TRABAJO SUCIO			2,12			2,12
MEDICAMENTOS			2,12			2,12
DEPOSITO EQUIPOS			2,12			2,12
DESCANSO PERSONAL			2,12			2,12
U.S FEMENINO			2,12			2,12
U.S MASCULINO			2,12			2,12
U.S FEMENINO			2,65			2,65
LAV QUIRURGICO			2,65			2,65
			2,65			2,65
			2,65			2,65
			2,65			2,65
BAÑO PACIENTES			2,12			2,12
BAÑO PACIENTES			2,65			2,65
			2,12			2,12


	ACUMULADO	101,02
	ACTA MODIFICATORIA 3	211,34
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	110,32
	COBRADAS PARCIAL No 1	
	COBRADAS PARCIAL No 2	

	COBRADAS PARCIAL No 3	
	CANTIDADES PRESENTE ACTA	101,02
OBSERVACIONES:		





UBICACIÓN PLANO

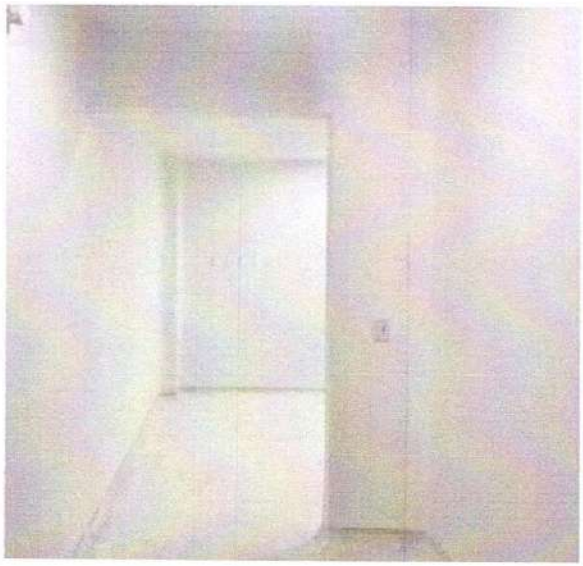



IMÁGENES

ALEXIS ROMSON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO / ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
17,01	FILOS Y DILATACIONES				UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	270,78
	Ancho	Largo (M)	Alto	Elementos		
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
FACHADA ORIENTE			2,29	15		34,35
			2,28	4		9,12
			3,09	4		12,36
			2,20	2		4,40
			2,14	4		8,56
			1,94	2		3,88
			5,31	2		10,62
			1,10	9		9,90
			1,50	4		6,00
FACHADA SUR			2,18	1		2,18
			2,32	4		9,28
			2,10	2		4,20
			2,28	2		4,56
			2,24	3		6,72
			2,27	1		2,27
			2,25	2		4,50
			2,04	2		4,08
			2,20	2		4,40
			2,27	2		4,54
			2,14	2		4,28
			2,33	2		4,66
			0,92	1		0,92
			1,24	2		2,48
			1,62	2		3,24
			2,01	2		4,02
			1,77	2		3,54
			1,53	2		3,06
FACHADA OCCIDENTE			5,05	2		10,10
			0,76	2		1,52
			4,53	2		9,06
			1,94	2		3,88
			2,20	2		4,40
			1,75	2		3,50
			0,96	2		1,92
			11,01	2		22,02
			3,81	2		7,62
			3,97	2		7,94
			2,30	1		2,30
			2,50	2		5,00
			9,70	2		19,40
					ACUMULADO	270,78
					ACTA MODIFICATORIA 3	4170,00
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	3899,22
					COBRADAS PARCIAL No 1	
					COBRADAS PARCIAL No 2	
					COBRADAS PARCIAL No3	

		CANTIDADES PRESENTE ACTA	270,78
OBSERVACIONES:			

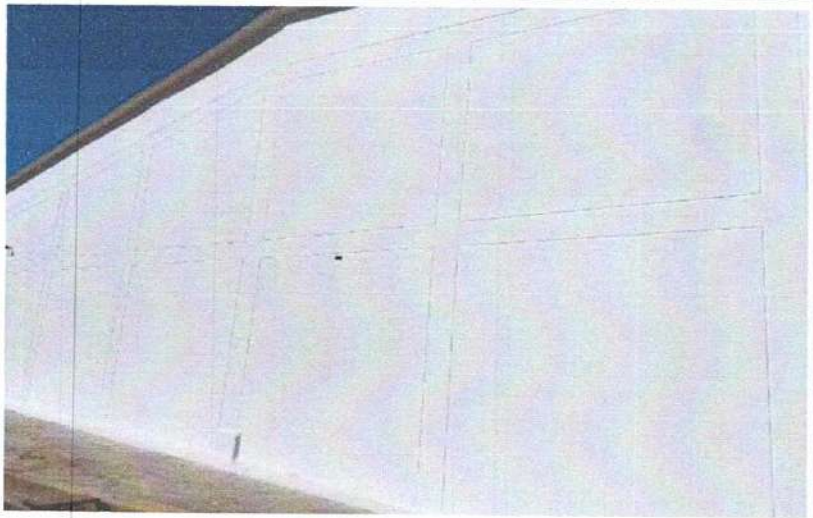







UBICACIÓN PLANO

ALEXIS ROMAN MUNOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


OYECTO / ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
17,06	PINTURA VINILO TIPO KORAZA				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	311,80
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)		
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
FACHADA ORIENTE	15,40		4,03	62,06		62,06
				5,51	2,00	11,02
FACHADA SUR	18,20		4,03	73,35		73,35
FACHADA OCCIDENTE	10,82		5,46	59,08		59,08
	30,81		3,45	106,29		106,29

ACUMULADO	311,80
ACTA MODIFICATORIA 3	2866,10
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	2554,30
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	311,80

OBSERVACIONES:	





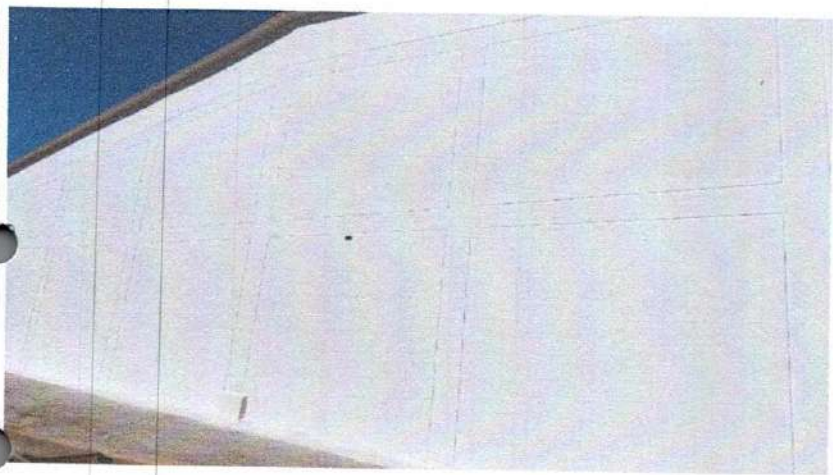

UBICACIÓN PLANO



IMAGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
18,06	PEROFORACIONES DE 60X60 PARA ILUMINACION LED Y REJILLAS DE VENTILACION

UNIDAD	UND
TOTAL	10,00


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					
	Ancho	Largo (M)	Alto	UND	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
ARTO 1				1		1,00
CUARTO 2				1		1,00
CUARTO 3				1		1,00
CUARTO 4				1		1,00
CUARTO 5				1		1,00
CUARTO 6				1		1,00
CUARTO 7				1		1,00
CUARTO 8				1		1,00
CUARTO 9				1		1,00
ARTO 10				1		1,00


ACUMULADO	10,00
ACTA MODIFICATORIA 3	290,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	280,00
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No 3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	10,00


OBSERVACIONES:

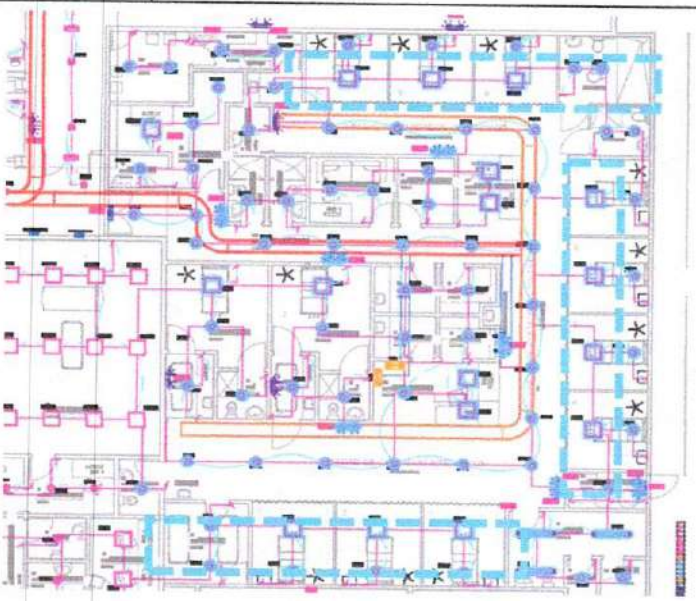




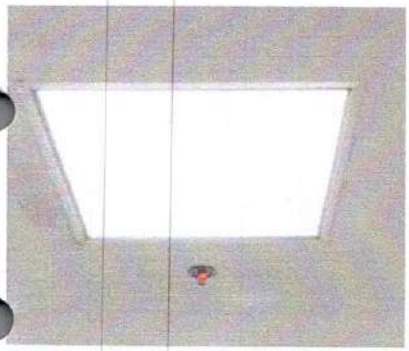

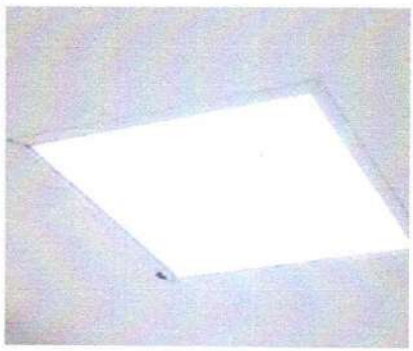





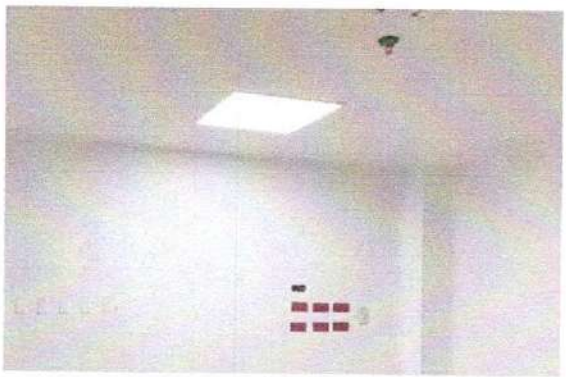

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
18,07	PERORACIONES PARA ROCIADORES Y BALAS DE ILUMINACION DIAMETRO MAX. 15 CM				UNIDAD	UND
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	35,00
	Ancho	Largo (M)	Alto	UND	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
ROCIADORES - RCI						
PACIENTE AISLADO 1					2,00	2,00
PACIENTE AISLADO 2					2,00	2,00
PUESTO CONTROL					1,00	1,00
ACCESO A UCI					1,00	1,00
CUARTO 1					1,00	1,00
CUARTO 2					1,00	1,00
CUARTO 3					1,00	1,00
CUARTO 4					1,00	1,00
CUARTO 5					1,00	1,00
CUARTO 6					1,00	1,00
CUARTO 7					1,00	1,00
CUARTO 8					1,00	1,00
CUARTO 9					1,00	1,00
CUARTO 10					1,00	1,00
LAVADO DE PATOS					1,00	1,00
DESCANSO PERSONAL					1,00	1,00
DEPOSITO EQUIPOS					1,00	1,00
MEDICAMENTOS					1,00	1,00
TRABAJO SUCIO					1,00	1,00
ROPA LIMPIA					1,00	1,00
TRABAJO LIMPIO					1,00	1,00
PASILLOS					1,00	1,00
					12,00	12,00
					ACUMULADO	35,00
					ACTA MODIFICATORIA 3	1520,00
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1485,00
					COBRADAS PARCIAL No 1	
					COBRADAS PARCIAL No 2	
					COBRADAS PARCIAL No 3	
					CANTIDADES PRESENTE ACTA	35,00

OBSERVACIONES:	

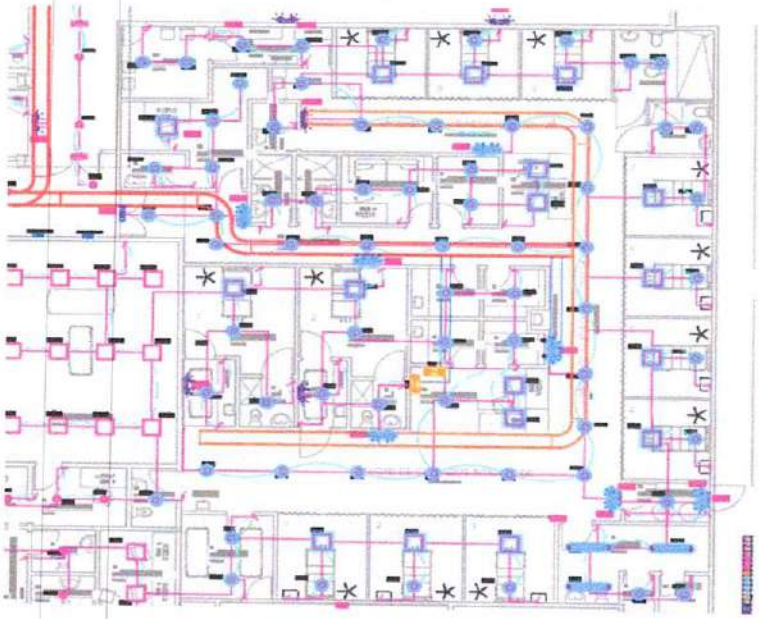









ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
18,08	MEDIA CAÑA EN YESO CON MALLA, ENTRE MUROS Y ENTRE CIELO RAZO Y MUROS				UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	328,15
	Ancho	Largo (M)	Alto	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
CUARTOS 1			2,55	2		5,10
			0,40	2		0,80
CUARTOS 2			2,55	4		10,20
			0,40	2		0,80
CUARTOS 3			2,55	2		5,10
			0,40	2		0,80
CUARTOS 4			2,55	3		7,65
			0,40	2		0,80
CUARTOS 5			2,55	4		10,20
			0,40	2		0,80
CUARTOS 6			2,55	3		7,65
			0,40	2		0,80
CUARTOS 7			2,55	2		5,10
			0,40	2		0,80
CUARTOS 8			2,55	2		5,10
			0,40	2		0,80
CUARTOS 9			2,55	2		5,10
			0,40	2		0,80
CUARTOS 10			2,55	2		5,10
			0,40	2		0,80
CUARTO PACIENTE ISLADO 1			2,55	4		10,20
			0,40	1		0,40
POLAINAS			2,55	2		5,10
			0,40	2		0,80
BAÑO			2,55	4		10,20
CUARTO PACIENTE ISLADO 2			2,55	6		15,30
			0,40	2		0,80
POLAINAS			2,55	2		5,10
			0,40	1		0,40
BAÑO			2,55	5		12,75
			0,40	1		0,40
PTO DE CONTROL			2,55	2		5,10
			0,40	2		0,80
BAÑO PTO CONTROL			2,55	3		7,65
			0,40	1		0,40
ADMISIONES Y FACTURACION			2,55	2		5,10
			0,40	2		0,80
BAÑO AUX			2,55	3		7,65
			0,40	1		0,40
ACCESO A UCI			2,55	5		12,75
			0,40	1		0,40
BAÑO PERSONAL			2,55	1		2,55
			0,40	2		0,80
LAVADO DE PATOS			2,55	4		10,20
D.RESIDUOS			2,55	2		5,10
			0,40	2		0,80
CUARTO ASEO			2,55	5		12,75
BAÑO DE PACIENTES			2,55	3		7,66


			0,40	1		0,40
BAÑO PACIENTES			2,55	3		7,65
TRABAJO LIMPIO			2,55	4		10,20
			0,40	1		0,40
ROPA LIMPIA			2,55	4		10,20
			0,40	1		0,40
MEDICAMENTOS			2,55	4		10,20
			0,40	1		0,40
TRABAJO SUCIO			2,55	3		7,65
			0,40	1		0,40
DEPOSITO DE EQUIPOS			2,55	4		10,20
			0,40	1		0,40
DESPACHO DE PERSONAL			2,55	3		7,65
			0,40	1		0,40
U.S.FEMENINO			2,55	3		7,65
			0,40	1		0,40
U.S MASCULINO			2,55	3		7,65
			0,40	1		0,40
U.S. FEMENINO			2,55	2		5,10
			0,40	1		0,40
LAV. QUIRURGICO			2,55	2		5,10
LAV. QUIRURGICO			2,55	2		5,10
INGRESO PERSONAL			2,55	3		7,65
FILTRO SALIDA DE VISITAS			2,55	2		5,10
			0,40	1		0,40

ACUMULADO	328,15
ACTA MODIFICATORIA 3	577,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	248,85
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	328,15

OBSERVACIONES:

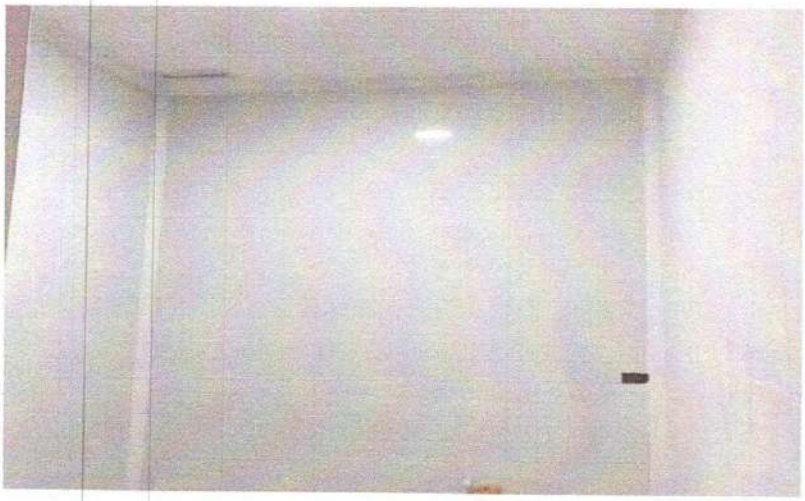

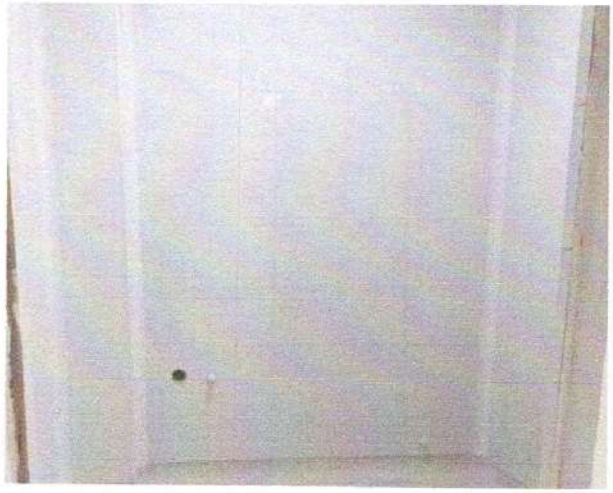

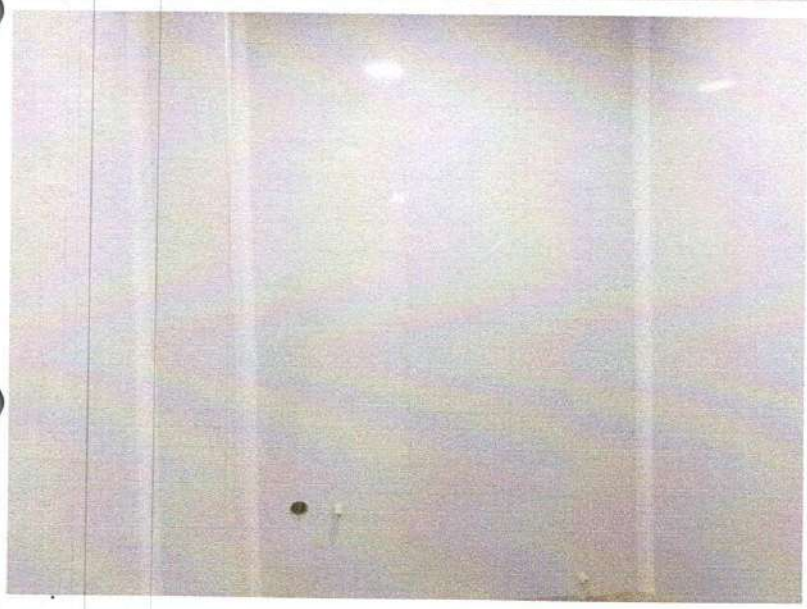



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	


22,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA COBRE TIPO L DE 1/2", INCLUYE, MANO DE OBRA, SOLDADURA, LIMPIEZA, PINTURA , ETIQUETAS, ACCESORIOS, SOPORTES Y PRUEBAS.	UNIDAD	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	86,40
	Ancho	Largo (M)	Alto	UND	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
TUBERIA DE 1/2 PULG EN 12 CONSULTORIOS (O2-AIRE-VACIO)		2,40		36		86,40

ACUMULADO	86,40
ACTA MODIFICATORIA 3	1561,15
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1474,75
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No 3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	86,40

OBSERVACIONES:

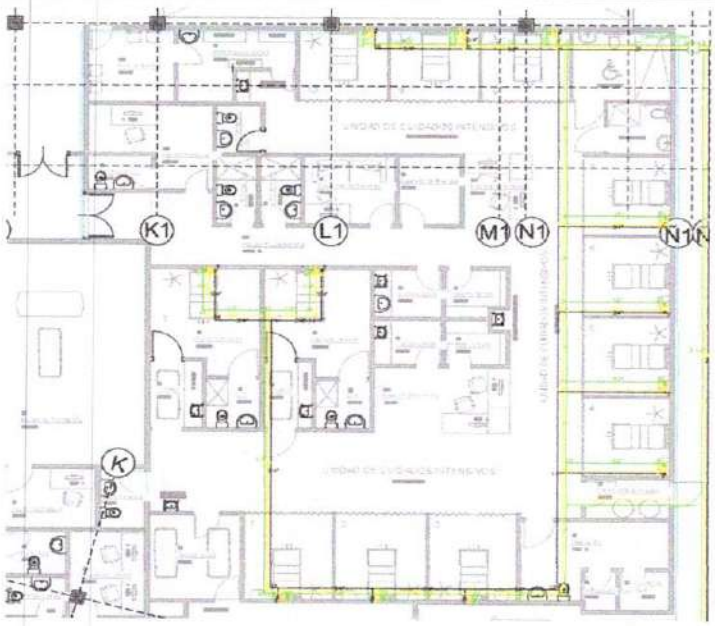

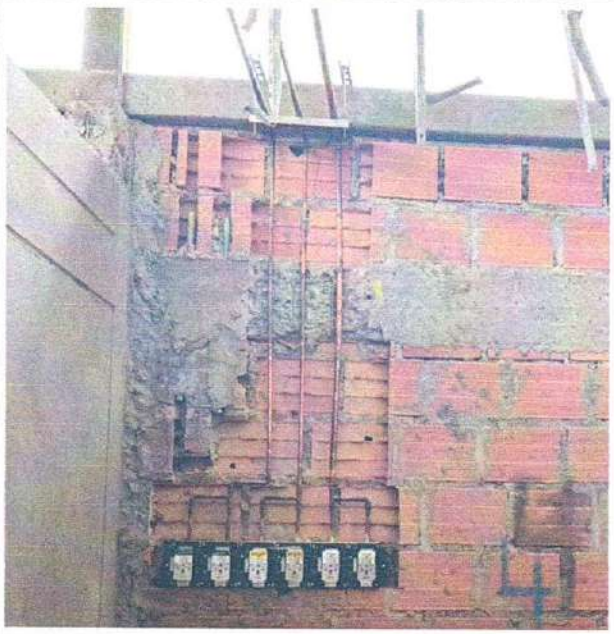

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	

22,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA COBRE TIPO L DE 3/4", INCLUYE, MANO DE OBRA, SOLDADURA, LIMPIEZA, PINTURA , ETIQUETAS, ACCESORIOS, SOPORTES Y PRUEBAS	UNIDAD	ML


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	90,00
	Ancho	Largo (M)	Alto	UND	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
TUBERIA DE 3/4 RAMIFICACION DE TUBERIA DE 1" PARA LOS 12 CONSULTORIOS (O2-AIRE-VACIO)		2,50		36		90,00

ACUMULADO	90,00
ACTA MODIFICATORIA 3	726,06
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	636,06
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No 3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	90,00

OBSERVACIONES:

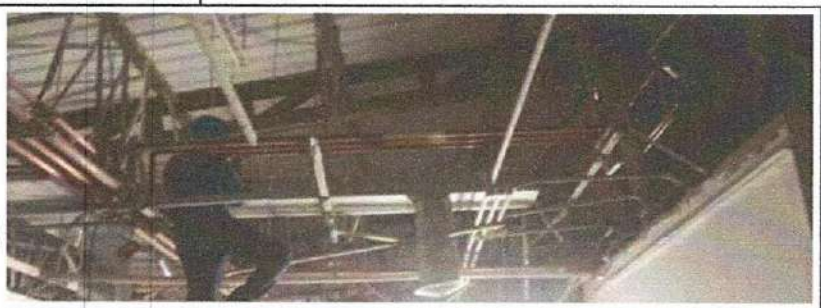



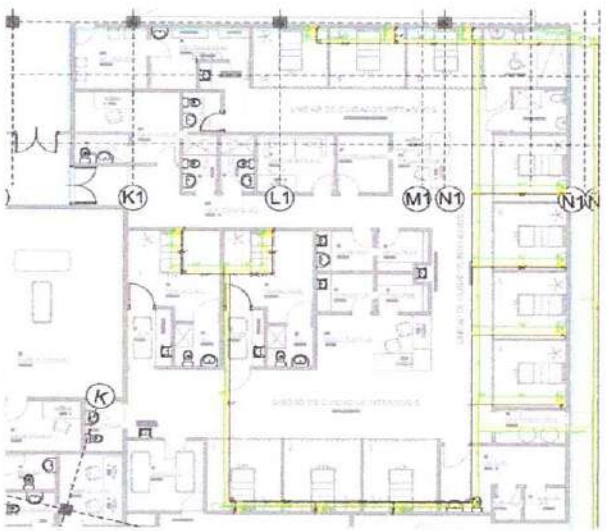

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	

22,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA COBRE TIPO L DE 1", INCLUYE, MANO DE OBRA, SOLDADURA, LIMPIEZA, PINTURA , ETIQUETAS, ACCESORIOS, SOPORTES Y PRUEBAS	UNIDAD	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	112,50
	Ancho	Largo (M)	Alto	UND	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
TUBERIA RED PRINCIPAL CENTRAL (O2-AIRE-VACIO)		37,50		3		112,50

ACUMULADO	112,50
ACTA MODIFICATORIA 3	113,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,50
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No 3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	112,50

OBSERVACIONES:

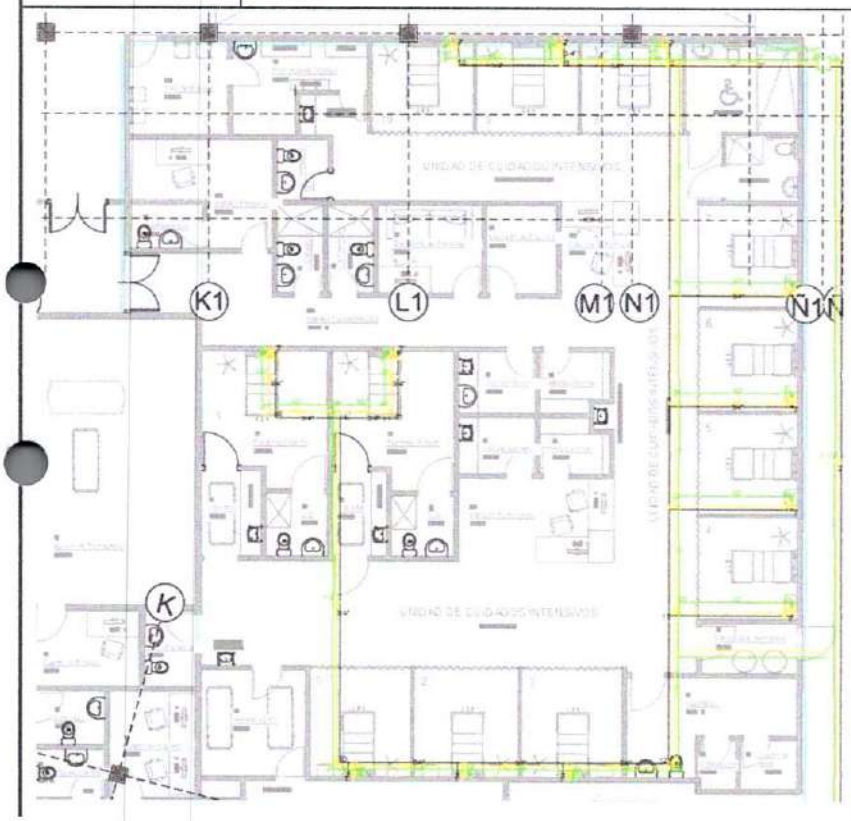







ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO / ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
22,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA COBRE TIPO L DE 1-1/2", INCLUYE, MANO DE OBRA, SOLDADURA, LIMPIEZA, PINTURA , ETIQUETAS, ACCESORIOS, SOPORTES Y PRUEBAS				UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	80,40
	Ancho	Largo (M)	Alto	UND	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
TUBERIA RED DE DISTRIBUCION A LA RED PRINCIPAL - VIENE DESDE LA CENTRAL DE GASES EXISTENTE (O2-AIRE-VACIO)		26,80		3		80,40

ACUMULADO	80,40
ACTA MODIFICATORIA 3	352,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	271,60
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No 3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	80,40

OBSERVACIONES:

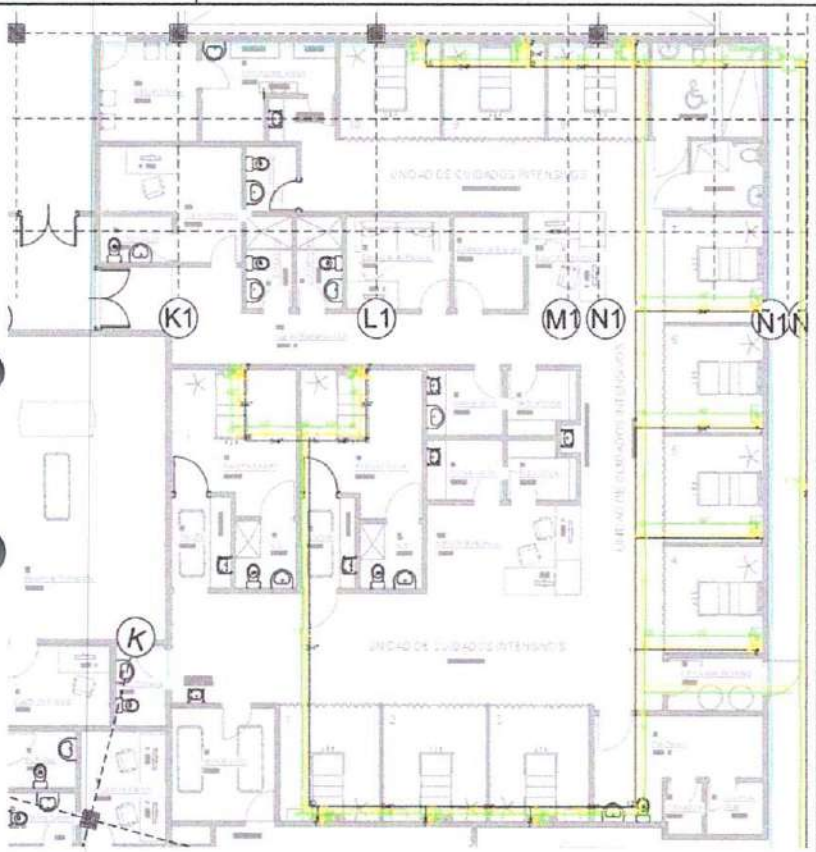





ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
NP2	PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI, 15CM					UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL	199.35
	Ancho	Largo (M)	Alto	Cantidad		Elementos	SUBTOTAL
CUARTO DE SUBESTACION ELECTRICA							
PLACA SUBESTACION							
	13.50	9.10					122.85
	13.50	3.00					40.50
PLACA SUBESTACION ELECTRICA	3.40	4.00					13.60
	4.40	3.30					14.52
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS							
PLACA AIRES ACONDICIONADOS	2.67	2.95					7.88

ACUMULADO	199.35
ACTA MODIFICATORIA 3	2338.93
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	2139.58
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	10.00
COBRADAS PARCIAL No3	166.95
CANTIDADES PRESENTE ACTA	22.40



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
NP3	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZAPATAS				UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	158,19
	Longitud (L)	Ancho (A)	Alto (h)	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A						
EJE A-1	1,50	1,50	0,65	1	1	1,46
EJE A-2	2,00	2,00	0,65	1	1	2,60
EJE A-3	2,50	2,50	0,65	1	1	4,06
EJE A-4	2,50	2,50	0,65	1	1	4,06
EJE B-1	1,50	1,50	0,65	1	1	1,46
EJE B-2	2,50	2,50	0,50	1	1	3,13
EJE B-3	2,50	2,50	0,50	1	1	3,13
EJE B-4	2,50	2,50	0,50	1	1	3,13
C-3	2,50	2,50	0,50	1	1	3,13
EJE C-4	2,50	2,50	0,50	1	1	3,13
EJE D-3	2,50	2,50	0,50	1	1	3,13
EJE D-4	2,50	2,50	0,50	1	1	3,13
EJE E-3	2,75	2,75	0,50	1	1	3,78
EJE E-4	2,50	2,50	0,50	1	1	3,13
EJE F-3	2,75	2,75	0,50	1	1	3,78
F-4	2,50	2,50	0,50	1	1	3,13
G-2	2,75	2,75	0,50	1	1	3,78
EJE G-3	2,75	2,75	0,50	1	1	3,78
EJE H-1	1,50	1,50	0,65	1	1	1,46
EJE H-2	2,75	2,75	0,50	1	1	3,78
EJE H-3	2,75	2,75	0,50	1	1	3,78
EJE I-1	1,50	1,50	0,65	1	1	1,46
EJE I-2	2,50	2,50	0,50	1	1	3,13
EJE I-3	2,50	2,50	0,50	1	1	3,13
EJE J-1	1,50	1,50	0,65	1	1	1,46
EJE J-2	1,50	1,50	0,65	1	1	1,46
EJE J-3	2,00	2,00	0,50	1	1	2,00
EJE K-3	1,50	1,50	0,65	1	1	1,46
ZAPATAS ZONA DE AMBULACION						
EJE 4 ENTRE K-L	2,20	2,20	0,60	1	1	2,90
E L-4	2,20	2,20	0,60	1	1	2,90
M-4	2,20	2,20	0,60	1	1	2,90
EJE K-L-3	2,20	2,20	0,60	1	1	2,90
EJE L-3	2,20	2,20	0,60	1	1	2,90
EJE M-3	2,20	2,20	0,60	1	1	2,90
EJE N-3	2,20	2,20	0,60	1	1	2,90
EJE N-4	2,20	2,20	0,60	1	1	2,90
ZAPATAS MODULO D						
PATA EJE Ñ1' - 10'1'	1,75	1,75	0,50	1	1,00	1,53
ZAPATA EJE Ñ1' - 7'	1,75	1,75	0,50	1	1,00	1,53
ZAPATA EJE O1 - 10'1'	2,00	2,00	0,50	1	1,00	2,00
ZAPATA EJE P1 - 10'1'	2,00	2,00	0,50	1	1,00	2,00
ZAPATA EJE Ñ1'- 9'1'	2,50	2,50	0,50	1	1,00	3,13
ZAPATA EJE Ñ1'- 8'	2,50	2,50	0,50	1	1,00	3,13
	2,50	2,50	0,50	1	1,00	3,13
ZAPATA EJE P1- 8'	2,50	2,50	0,50	1	1,00	3,13
ZAPATA EJE P1- 7'	2,50	2,50	0,50	1	1,00	3,13
ZAPATA EJE O1- 6'	2,50	2,50	0,50	1	1,00	3,13
ZAPATA EJE P1- 6'	2,50	2,50	0,50	1	1,00	3,13
ZAPATA EJE 01 - 4'	2,50	2,50	1,00	1	1,00	6,25
ZAPATA EJE P1 - 4'	2,50	2,50	1,00	1	1,00	6,25
ZAPATA EJE P1 - 9'1'	3,00	3,00	0,50	1	1,00	4,50

ZAPATA EJE O1 - 8'		3,00	3,00	0,50	1	1,00	4,50
ZAPATA EJE O1 - 7'		3,00	3,00	0,50	1	1,00	4,50
						ACUMULADO	158,19
						ACTA MODIFICATORIA 3	212,97
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	54,78
						COBRADAS PARCIAL No 1	
						COBRADAS PARCIAL No 2	65,54
						COBRADAS PARCIAL No3	86,85
						CANTIDADES PRESENTE ACTA	5,80





UBICACIÓN PLANO





IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
NP4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION

UNIDAD	M3
TOTAL	127,78

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					
	Longitud (L)	Ancho (A)	Alto (h)	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A						
EJE A ENTRE 1-2	3,34	0,40	0,50			0,67
EJE A ENTRE 2-3	4,32	0,40	0,50			0,86
EJE A ENTRE 3-4	7,75	0,40	0,50			1,55
EJE B ENTRE 1-2	3,12	0,40	0,50			0,62
EJE B ENTRE 2-3	4,27	0,40	0,50			0,85
EJE B ENTRE 3-4	7,90	0,40	0,50			1,58
E C ENTRE 3-4	7,90	0,40	0,50			1,58
EJE D ENTRE 3-4	7,90	0,40	0,50			1,58
EJE E ENTRE 3-4	7,90	0,40	0,50			1,58
EJE F ENTRE 3-4	7,90	0,40	0,50			1,58
EJE G ENTRE 2-3	4,27	0,40	0,50			0,85
EJE G ENTRE 3-4	7,90	0,40	0,50			1,58
E H ENTRE 1-2	3,34	0,40	0,50			0,67
H ENTRE 2-3	4,09	0,40	0,50			0,82
EJE H ENTRE 3-4	7,90	0,40	0,50			1,58
EJE I ENTRE 1-2	3,34	0,40	0,50			0,67
EJE I ENTRE 2-3	4,27	0,40	0,50			0,85
EJE I ENTRE 3-4	7,90	0,40	0,50			1,58
EJE J ENTRE 1-2	2,39	0,40	0,50			0,48
EJE J ENTRE 2-3	4,27	0,40	0,50			0,85
EJE J ENTRE 3-4	7,90	0,40	0,50			1,58
EJE K ENTRE 3-4	7,65	0,40	0,50			1,53
EJE 1 ENTRE A-B	4,93	0,40	0,50			0,99
EJE 2 ENTRE A-B	4,93	0,40	0,50			0,99
EJE 3 ENTRE A-B	4,53	0,40	0,50			0,91
E 4 ENTRE A-B	4,53	0,40	0,50			0,91
JE 3 ENTRE B-C	5,51	0,40	0,50			1,10
EJE 4 ENTRE B-C	5,51	0,40	0,50			1,10
EJE 3 ENTRE C-D	2,93	0,40	0,50			0,59
EJE 4 ENTRE C-D	2,93	0,40	0,50			0,59
EJE 3 ENTRE D-E	5,56	0,40	0,50			1,11
EJE 4 ENTRE D-E	5,56	0,40	0,50			1,11
E 3 ENTRE E-F	6,75	0,40	0,50			1,35
JE 4 ENTRE E-F	6,75	0,40	0,50			1,35
EJE 3 ENTRE F-G	7,22	0,40	0,50			1,44
EJE 4 ENTRE F-G	7,22	0,40	0,50			1,44
EJE 2 ENTRE G-H	6,58	0,40	0,50			1,32
EJE 3 ENTRE G-H	6,58	0,40	0,50			1,32
EJE 4 ENTRE G-H	6,75	0,40	0,50			1,35
EJE 1 ENTRE H-I	8,41	0,40	0,50			1,68
EJE 2 ENTRE H-I	8,66	0,40	0,50			1,73
EJE 3 ENTRE H-I	8,49	0,40	0,50			1,70
EJE 4 ENTRE H-I	8,66	0,40	0,50			1,73
EJE 1 ENTRE I-J	4,07	0,40	0,50			0,81

EJE 2 ENTRE I-J	4,19	0,40	0,50			0,84
EJE 3 ENTRE I-J	4,94	0,40	0,50			0,99
EJE 4 ENTRE I-J	4,69	0,40	0,50			0,94
EJE 3 ENTRE J-K	6,76	0,40	0,50			1,35
EJE 4 ENTRE J-K	6,51	0,40	0,50			1,30
ZAPATAS ZONA DE AMBULACION						
VIGA EJE 4 ENTRE K-L	2,39	0,80	0,60			1,15
VIGA EJE 4 ENTRE L-M	4,55	0,80	0,60			2,18
VIGA EJE 4 ENTRE M-N	1,00	0,80	0,60			0,48
VIGA EJE 3 ENTRE K-L	2,39	0,80	0,60			1,15
VIGA EJE 3 ENTRE L-M	4,55	0,80	0,60			2,18
VIGA EJE 3 ENTRE M-N	1,00	0,80	0,60			0,48
GA EJE 4 ENTRE K-L	4,45	0,60	0,60			1,60
VIGA EJE 4 ENTRE L-M	6,10	0,60	0,60			2,20
VIGA EJE 4 ENTRE M-N	0,80	0,60	0,60			0,29
VIGA EJE K-L ENTRE 3-4	7,00	0,60	0,60			2,52
VIGA EJE L ENTRE 3-4	7,00	0,60	0,60			2,52
VIGA EJE M ENTRE 3-4	7,00	0,60	0,60			2,52
VIGA EJE N ENTRE 3-4	7,60	0,60	0,60			2,74
A EJE 4 ENTRE M-N	4,30	0,80	0,80			2,75
VIGA EJE 4 ENTRE M-N (CORONA DE MURO)	4,50	0,60	0,60			1,62
VIGA EJE 3 ENTRE M-N	4,30	0,80	0,80			2,75
ZAPATAS MODULO D						
VG-CIM 10'1'	12,39	0,40	0,50			2,48
VG-CIM 9'1'	12,54	0,40	0,50			2,51
VG-CIM 8'1'	12,54	0,40	0,50			2,51
VG-CIM 7'1'	12,42	0,40	0,50			2,48
VG-CIM Ñ1'	18,33	0,40	0,50			3,67
VG-CIM O1	24,38	0,40	0,50			4,88
VG-CIM P1	24,38	0,40	0,50			4,88
VG-CIM 6'	9,14	0,40	0,70			2,56
VG-CIM 4'	8,85	0,40	0,70			2,48
G-CIM 6'A	10,25	0,40	0,70			2,87
VG-CIM BRD	9,57	0,20	0,50			0,96
VG-CIM O1'	8,27	0,40	0,70			2,32
VG-CIM P1'	8,27	0,40	0,70			2,32
VG-CIM INT	9,97	0,40	0,70			2,79
VG-CIM 4'A	10,25	0,20	0,70			1,44

ACUMULADO	**127,78**
ACTA MODIFICATORIA 3	**212,97**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**85,19**
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	65,54
COBRADAS PARCIAL No 3	52,38
CANTIDADES PRESENTE ACTA	**9,86**





UBICACIÓN PLANO





IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	

NP12	MOVIMIENTO DE PAQUETE CONDENSADOR POR AIRE DE 5 TR				UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	1,00
	Ancho	Largo (M)	Alto	UND	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
REUBICACION DE PAQUETE CONDENSADOR SEGÚN DISEÑO DE AIRES ACONDICIONADOS				1		1,00

ACUMULADO	1,00
ACTA MODIFICATORIA 3	1,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,00
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No 3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	1,00

OBSERVACIONES:



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	

NP67	ESTUCO PREPARADO PARA EXTERIOR				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	311,80
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)		
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
FACHADA ORIENTE	15,40		4,03	62,06		62,06
				5,51	2,00	11,02
FACHADA SUR	18,20		4,03	73,35		73,35
FACHADA OCCIDENTE	10,82		5,46	59,08		59,08
	30,81		3,45	106,29		106,29

ACUMULADO	311,80
ACTA MODIFICATORIA 3	2677,54
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	2365,74
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No 3	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	311,80

OBSERVACIONES:







UBICACIÓN PLANO



IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUNOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	

NP 68	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS				UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	14,69
	Longitud (L)	Ancho (A)	Alto (h)	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
ZONA DE AMBULANCIA						
EJE 3 ENTRE K-L	0,60	0,60	4,00	1	1	1,44
EJE L-3	0,60	0,60	4,00	1	1	1,44
EJE M-3	0,60	0,60	4,00	1	1	1,44
EJE 4 ENTRE K-L	0,60	0,60	3,63	1	1	1,31
EJE L-4	0,60	0,60	3,63	1	1	1,31
EJE M-4	0,60	0,60	3,63	1	1	1,31
EJE N-4	0,60	0,60	3,63	1	1	1,31
E N-3	0,60	0,60	4,00	1	1	1,44
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
COLUMNAS	0,50	0,50	3,70	4	1	3,70

ACUMULADO	14,69
ACTA MODIFICATORIA 3	32,92
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	18,23
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No 3	11,94
CANTIDADES PRESENTE ACTA	2,75





UBICACIÓN PLANO





IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
NP 75	CONCRETO DE 4000 PSI PARA PEDESTALES

UNIDAD	M3
TOTAL	84,52

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					
	Longitud (L)	Ancho (A)	Alto (h)	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A						
EJE A-1	1,50	1,50	0,70	1	1	1,58
EJE A-2	1,00	1,00	0,70	1	1	0,70
EJE A-3	1,40	1,40	0,70	1	1	1,37
EJE A-4	1,40	1,40	0,70	1	1	1,37
EJE B-1	1,50	1,50	0,70	1	1	1,58
EJE B-2	1,25	1,25	0,50	1	1	0,78
EJE B-3	1,25	1,25	0,50	1	1	0,78
EJE B-4	1,25	1,25	0,50	1	1	0,78
EJE C-3	1,25	1,25	0,50	1	1	0,78
EJE C-4	1,25	1,25	0,50	1	1	0,78
EJE D-3	1,25	1,25	0,50	1	1	0,78
EJE D-4	1,25	1,25	0,50	1	1	0,78
EJE E-3	1,25	1,25	0,50	1	1	0,78
EJE E-4	1,25	1,25	0,50	1	1	0,78
EJE F-3	1,25	1,25	0,50	1	1	0,78
EJE F-4	1,25	1,25	0,50	1	1	0,78
EJE G-2	1,25	1,25	0,50	1	1	0,78
EJE G-3	1,25	1,25	0,50	1	1	0,78
EJE G-4	1,25	1,25	0,50	1	1	0,78
EJE H-1	1,50	1,50	0,70	1	1	1,58
EJE H-2	1,25	1,25	0,50	1	1	0,78
EJE H-3	1,60	1,60	0,50	1	1	1,28
EJE H-4	1,25	1,25	2,65	1	1	4,14
EJE I-1	1,50	1,50	0,70	1	1	1,58
EJE I-2	1,25	1,25	0,50	1	1	0,78
EJE I-3	1,25	1,25	0,50	1	1	0,78
EJE I-4	1,25	1,25	2,65	1	1	4,14
EJE J-1	1,50	1,50	0,70	1	1	1,58
EJE J-2	1,50	1,50	0,70	1	1	1,58
EJE J-3	1,00	1,00	0,50	1	1	0,50
EJE J-4	1,50	1,50	2,65	1	1	5,96
EJE K-3	1,50	1,50	0,70	1	1	1,58
EJE K-4	1,50	1,50	2,65	1	1	5,96
ZONA DE AMBULANCIA						
EJE 4 entre K - L	0,80	0,80	2,65	1	1	1,70
EJE L-4	0,80	0,80	2,65	1	1	1,70
EJE M-4	0,80	0,80	2,65	1	1	1,70
EJE N-4	0,80	0,80	2,70	1	1	1,73
PEDESTALES MODULO D						
PEDESTAL EJE Ñ1' - 10'1'	1,75	1,75	0,50	1	1,00	1,53
PEDESTAL EJE Ñ1' - 7'	1,75	1,75	0,50	1	1,00	1,53
PEDESTAL EJE O1 - 10'1'	1,40	1,40	0,50	1	1,00	0,98
PEDESTAL EJE P1 - 10'1'	1,40	1,40	0,50	1	1,00	0,98
PEDESTAL EJE Ñ1'- 9'1'	1,60	1,60	0,50	1	1,00	1,28
PEDESTAL EJE Ñ1'- 8'	1,60	1,60	0,50	1	1,00	1,28
PEDESTAL EJE O1- 9'1'	1,40	1,40	0,50	1	1,00	0,98
PEDESTAL EJE P1- 8'	1,40	1,40	0,50	1	1,00	0,98
PEDESTAL EJE P1- 7'	1,40	1,40	0,50	1	1,00	0,98
PEDESTAL EJE O1- 6'	1,40	1,40	0,50	1	1,00	0,98
PEDESTAL EJE P1- 6'	1,40	1,40	0,50	1	1,00	0,98
PEDESTAL EJE 01 - 4'	1,60	1,60	2,45	1	1,00	6,27

PEDESTAL EJE P1 - 4´	1,60	1,60	2,45	1	1,00	6,27
PEDESTAL EJE P1 - 9´1´	1,40	1,40	0,50	1	1,00	0,98
PEDESTAL EJE O1 - 8´	1,40	1,40	0,50	1	1,00	0,98
PEDESTAL EJE O1 - 7´	1,40	1,40	0,50	1	1,00	0,98
					ACUMULADO	84,52
					ACTA MODIFICATORIA 3	111,63
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	27,11
					COBRADAS PARCIAL No 1	
					COBRADAS PARCIAL No 2	
					COBRADAS PARCIAL No 3	82,79
					CANTIDADES PRESENTE ACTA	1,73





ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	

NP 80	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DRENAJE DE 60X60 CM DE TUBERIA PERFORADA DE 6 PULG. INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 Y GRAVA FILTRANTE DE 1" A 3"				UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	84,47
	Longitud (L)	Ancho (A)	Alto (h)	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A						
MURO DE CONTENCION H=5.90 MTS LONG ITEM 3.07	48,35					48,35
MODULO ZONA DE AMBULANCIAS						
MURO DE CONTENCION H=5.90 MTS LONG ITEM 3.07	36,12					36,12

ACUMULADO	84,47
ACTA MODIFICATORIA 3	160,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	75,53
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No 3	59,90
CANTIDADES PRESENTE ACTA	24,57

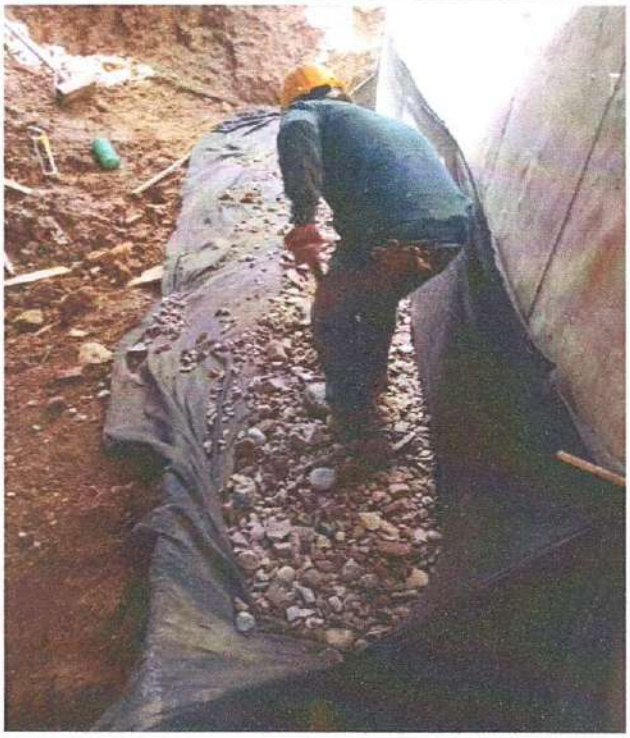



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	956368369	9474602798	E	2024/10/02	2024/10/03	BANCO DAVIVIENDA	1	$36,318,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (73 Afiliados)								$117,972,534	$18,953,600			$117,972,534	$4,720,500			$117,897,868	$4,717,500			$117,972,534		$7,899,800		$0	$0		$36,291,400
Centro de Trabajo: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (73 Afiliados)								$117,972,534	$18,953,600			$117,972,534	$4,720,500			$117,897,868	$4,717,500			$117,972,534		$7,899,800		$0	$0		$36,291,400
Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER (73 Afiliados)								$117,972,534	$18,953,600			$117,972,534	$4,720,500			$117,897,868	$4,717,500			$117,972,534		$7,899,800		$0	$0		$36,291,400
1	CC	1100752411	ARRIETA CONTRERAS JUAN PABLO	X		23030 1	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF39	2	$86,667	$3,500	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$20,900
2	CC	1100752411	ARRIETA CONTRERAS JUAN PABLO			23030 1	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF39	28	$1,213,334	$48,600	14-4	28	$1,213,334	6.960%	$84,500	28	$0	$0	SI	$375,900
3	CC	13929589	BARAJAS HERNANDEZ JOSE EULISES			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	13929922	BARAJAS ANAYA MARCO ANTONIO	X		23030 1	13	$563,334	$90,200	EPS002	13	$563,334	$22,600	CCF39	13	$563,334	$22,600	14-4	13	$563,334	6.960%	$39,300	13	$0	$0	SI	$174,700
5	CC	13906579	BASTO SANCHEZ CARLOS JULIO			25-14	30	$1,680,000	$268,800	EPS037	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$403,200
6	CC	1098152038	BASTO DIAZ DARLY MELISA			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
7	CC	5613984	BASTO MURILLO SADY ROBERTO			25-14	30	$1,680,000	$268,800	EPS005	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
8	CC	13171873	BAUTISTA IBAÑEZ JUAN			23100 1	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$3,500	CCF39	2	$86,667	$3,500	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$20,900
9	CC	13171873	BAUTISTA IBAÑEZ JUAN			23100 1	28	$1,213,334	$194,200	EPS041	28	$1,213,334	$48,600	CCF39	28	$1,213,334	$48,600	14-4	28	$1,213,334	6.960%	$84,500	28	$0	$0	SI	$375,900
10	CC	1096956290	BLANCO BLANCO DIEGO ALEXANDER			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
11	CC	91487260	CARREÑO SANABRIA ALFONSO			23020 1	30	$7,616,000	$1,294,800	EPS002	30	$7,616,000	$304,700	CCF39	30	$7,616,000	$304,700	14-4	30	$7,616,000	6.960%	$530,100	30	$0	$0	SI	$2,434,300
12	CC	1102362432	CARVAJAL ORDUZ JULIAN ANDRES			23030 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS037	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
13	CC	5609548	CASTELLANOS BARRERA FILEMON			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
14	CC	1096946960	CASTRO AMAYA EDWIN JAVIER			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
15	CC	13925004	CASTRO PARRA ROBERTO			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
16	CC	1093748517	CELIS RICO JAIRO			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
17	CC	1098101480	CHAVARRIA CHAPARRO EDINSON ALBERTO			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
18	CC	5613736	CONDE OJEDA RAUL			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
19	CC	1098680172	CORREA MOGOLLON WERNER ALDAY			23030 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS037	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
20	CC	13924705	DELGADO CHAPARRO ANGELMIRO			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
21	CC	5613551	DELGADO NUMAEL			23030 1	30	$2,016,000	$322,600	EPS041	30	$2,016,000	$80,700	CCF39	30	$2,016,000	$80,700	14-4	30	$2,016,000	6.960%	$140,400	30	$0	$0	SI	$624,400
22	CC	1127592492	DELGADO CASTELLANOS SERGIO ANDRES			23030 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS037	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
23	CC	13749125	DIAZ RINCON JORGE			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
24	CC	13444433	DIAZ CASTELLANOS JOSE HERNAN			25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500

aportes en línea

Planilla Resumen

25	CC	91355833	DUARTE PICO WILSON JAVIER			230201	30	$1,680,000	$268,800	EPS002	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
26	CC	79183413	FUENTES MILLAN VICTOR MANUEL			25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
27	CC	91352609	GARAVITO VASQUEZ JAIRO			25-14	30	$1,680,000	$268,800	EPS037	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
28	CC	5609615	GARCIA MORA WILSON			230301	30	$1,680,000	$268,800	EPS005	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
29	CC	13926575	GOMEZ CALDERON WILMER			25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF39	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	SI	$866,900
30	CC	1098761067	GONZALEZ RUEDA CRISTIAN ORLANDO			25-14	30	$4,611,439	$737,900	EPS037	30	$4,611,439	$184,500	CCF39	30	$4,611,439	$184,500	14-4	30	$4,611,439	6.960%	$321,000	30	$0	$0	SI	$1,427,900
31	CC	1098772653	GOYENECHE CARDENAS MONICA ALEXANDRA	X		25-14	29	$2,690,007	$430,500	EPS005	29	$2,690,007	$107,700	CCF39	29	$2,690,007	$107,700	14-4	29	$2,690,007	6.960%	$187,300	29	$0	$0	SI	$833,200
32	CC	1098644710	GUERRERO GARCIA JUAN NORBEY			25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
33	CC	1096948176	GUERRERO VALDERRAMA LUIS CARLOS			230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
34	PT	2356593	GUERRERO JACOME MIGUEL ALFREDO		X	230301	4	$173,334	$27,800	EPS002	4	$173,334	$7,000	CCF39	4	$173,334	$7,000	14-4	4	$173,334	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$41,800
35	PT	2356593	GUERRERO JACOME MIGUEL ALFREDO			230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS002	26	$1,126,667	$45,100	CCF39	26	$1,126,667	$45,100	14-4	26	$1,126,667	6.960%	$78,500	26	$0	$0	SI	$349,000
36	CC	91232897	GUTIERREZ PINTO IVAN ALONSO			25-14	30	$1,987,689	$318,100	EPS010	30	$1,987,689	$79,600	CCF39	30	$1,987,689	$79,600	14-4	30	$1,987,689	6.960%	$138,400	30	$0	$0	SI	$615,700
37	CC	1098150540	HUERTAS TARAZONA JOSE SILVESTRE		X	230301	3	$168,000	$26,900	EPS005	3	$168,000	$6,800	CCF39	3	$168,000	$6,800	14-4	3	$168,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$40,500
38	CC	1098150540	HUERTAS TARAZONA JOSE SILVESTRE			230301	27	$1,512,000	$242,000	EPS005	27	$1,512,000	$60,500	CCF39	27	$1,512,000	$60,500	14-4	27	$1,512,000	6.960%	$105,300	27	$0	$0	SI	$468,300
39	CC	5609131	JAIMES JAIMES LIBARDO		X	230201	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF39	3	$130,000	$5,200	14-4	3	$130,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$31,200
40	CC	5609131	JAIMES JAIMES LIBARDO			230201	27	$1,170,000	$187,200	EPS005	27	$1,170,000	$46,800	CCF39	27	$1,170,000	$46,800	14-4	27	$1,170,000	6.960%	$81,500	27	$0	$0	SI	$362,300
41	CC	13930113	LEAL ORDUÑA MIGUEL ANGEL			25-14	30	$1,680,000	$268,800	EPS002	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
42	CC	13924491	LOPEZ CACERES ANDRES	X		231001	14	$784,000	$125,500	EPS005	14	$784,000	$31,400	CCF39	14	$784,000	$31,400	14-4	14	$784,000	6.960%	$54,600	14	$0	$0	SI	$242,900
43	PT	5393250	MONTOYA CHACON GARDELINO DANTES			230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
44	CC	5612669	NIÑO CARVAJAL EDRAS			230301	30	$2,891,184	$462,600	EPS037	30	$2,891,184	$115,700	CCF39	30	$2,891,184	$115,700	14-4	30	$2,891,184	6.960%	$201,300	30	$0	$0	SI	$895,300
45	CC	1095821797	OLARTE SILVA AURA ALEXANDRA			230301	30	$4,611,439	$737,900	EPS037	30	$4,611,439	$184,500	CCF39	30	$4,611,439	$184,500	14-4	30	$4,611,439	6.960%	$321,000	30	$0	$0	SI	$1,427,900
46	CC	79787862	ORJUELA ESTEPA VICTOR DAWER			25-14	11	$616,000	$98,600	EPS002	11	$616,000	$24,700	CCF39	11	$616,000	$24,700	14-4	11	$616,000	6.960%	$42,900	11	$0	$0	SI	$190,900
47	CC	79787862	ORJUELA ESTEPA VICTOR DAWER		X	25-14	19	$1,064,000	$170,300	EPS002	19	$1,064,000	$42,600	CCF39	19	$1,064,000	$42,600	14-4	19	$1,064,000	0.000%	$0	19	$0	$0	SI	$255,500
48	CC	5747663	ORTIZ SUAREZ FLORENCIO			231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
49	CC	1044605940	ORTIZ ORTIZ JULIO ENRIQUE			230201	30	$1,680,000	$268,800	EPS037	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
50	CC	72240872	ORTIZ ORTIZ SILFREDO			230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF39	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	SI	$866,900
51	CC	88311317	PABUENCE ORTIZ OLIVO	X		230301	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF39	8	$309,334	$12,400	14-4	8	$346,667	6.960%	$24,200	8	$0	$0	SI	$106,000
52	CC	5748006	PARRA PARRA ROBERTO			230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
53	CC	1099662522	PINZON NOVA CRISTIAN YESID			230301	30	$1,680,000	$268,800	EPS005	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
54	CC	1096954148	PINZON ORTIZ LUIS EUSEBIO	X		230301	8	$346,667	$55,500	EPS002	8	$346,667	$13,900	CCF39	8	$346,667	$13,900	14-4	8	$346,667	6.960%	$24,200	8	$0	$0	SI	$107,500
55	CC	13927235	PINZON ARGUELLO LUIS ENRIQUE	X		230201	12	$520,000	$83,200	EPS005	12	$520,000	$20,800	CCF39	12	$520,000	$20,800	14-4	12	$520,000	6.960%	$36,200	12	$0	$0	SI	$161,000
56	CC	1096954022	PINZON CRISTANCHO YORMAN HALI			230301	6	$260,000	$41,600	EPS005	6	$260,000	$10,400	CCF39	6	$260,000	$10,400	14-4	6	$260,000	6.960%	$18,100	6	$0	$0	SI	$80,500
57	CC	1096954022	PINZON CRISTANCHO YORMAN HALI		X	230301	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF39	9	$390,000	$15,600	14-4	9	$390,000	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$93,600
58	CC	1096954022	PINZON CRISTANCHO YORMAN HALI		X	230301	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF39	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$156,000
59	CC	13279613	RINCON CUADROS SANTIAGO		X	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF39	2	$86,667	$3,500	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$20,900

aportes en línea

Planilla Resumen

60	CC	13279613	RINCON CUADROS SANTIAGO			23030 1	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF39	28	$1,213,334	$48,600	14-4	28	$1,213,334	6.960%	$84,500	28	$0	$0	SI	$375,900
61	CC	1099662017	ROA QUINTERO WEYMAR YESID			25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
62	CC	1096957820	RODRIGUEZ RANGEL DANDY SHIRLEY			23030 1	30	$2,633,800	$421,500	EPS002	30	$2,633,800	$105,400	CCF39	30	$2,633,800	$105,400	14-4	30	$2,633,800	6.960%	$183,400	30	$0	$0	SI	$815,700
63	CC	13929337	RODRIGUEZ JAIMES NIXON YESID			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
64	CC	13927795	RODRIGUEZ JAIMES PEDRO VICENTE			23100 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS002	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
65	CC	1098780824	ROJAS ORTIZ HENRY ALBERTO			23030 1	30	$3,821,502	$611,500	EPS002	30	$3,821,502	$152,900	CCF39	30	$3,821,502	$152,900	14-4	30	$3,821,502	6.960%	$266,000	30	$0	$0	SI	$1,183,300
66	CC	1096950590	ROJAS SANGUINO LEONARDO			25-14	30	$1,680,000	$268,800	EPS037	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
67	CC	2087411	SANCHEZ CASERES RAUL			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
68	CC	1096957220	SANDOVAL DIMAS IVAN FERNEY			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
69	CC	1096951842	SEPULVEDA CASTELLANOS WILMER LEONARDO	X		23030 1	12	$672,000	$107,600	EPS005	12	$672,000	$26,900	CCF39	12	$672,000	$26,900	14-4	12	$672,000	6.960%	$46,800	12	$0	$0	SI	$208,200
70	CC	1096950893	SEQUEDA ESTUPIÑAN RONALD FERNEY		X	23100 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
71	CC	1099303035	SIERRA BECERRA ANDERSON DONEY	X	X	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF39	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
72	CC	5609425	SIERRA ORLANDO			25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
73	CC	13852880	SILVA REYES ALEXIS ANTONIO			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
74	CC	1096947438	SUAREZ DAZA DIEGO FERNEY	X		23100 1	29	$1,948,800	$311,900	EPS002	29	$1,948,800	$78,000	CCF39	29	$1,948,800	$78,000	14-4	29	$1,948,800	6.960%	$135,700	29	$0	$0	SI	$603,600
75	CC	13926847	SUAREZ DIAZ LUIS EDGAR	X		23030 1	8	$346,667	$55,500	EPS002	8	$346,667	$13,900	CCF39	8	$309,334	$12,400	14-4	8	$346,667	6.960%	$24,200	8	$0	$0	SI	$106,000
76	CC	1127066876	SUAREZ ANGARITA MICHEL ALEXANDER	X		23030 1	8	$346,667	$55,500	EPS041	8	$346,667	$13,900	CCF39	8	$346,667	$13,900	14-4	8	$346,667	6.960%	$24,200	8	$0	$0	SI	$107,500
77	CC	1099894523	TARAZONA RANGEL FERMIN ALONSO			23030 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS005	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
78	CC	13922207	TUTIRA DIAZ LIBARDO			23030 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS041	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
79	CC	1102042913	URIBE LOPEZ LUIS ALDEMAR	X	X	23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF39	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
80	CC	5692422	VELOSA SANCHEZ LUIS FREDY	X		23030 1	12	$672,000	$107,600	EPS005	12	$672,000	$26,900	CCF39	12	$672,000	$26,900	14-4	12	$672,000	6.960%	$46,800	12	$0	$0	SI	$208,200
81	CC	1095827911	VELOZA REYES LAURA CAMILA			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
82	CC	4099539	ZAMBRANO VALBUENA GUSTAVO			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Total		**Afiliados(73)**						$117,972,534	$18,953,600			$117,972,534	$4,720,500			$117,897,868	$4,717,500			$117,972,534		$7,899,800		$0	$0		$36,291,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	956368369	9474602798	E	2024/10/02	2024/10/03	BANCO DAVIVIENDA	1	$36,318,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				73	$18,953,600	$13,900	$0	$18,967,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,442,300	$1,100	$0	$1,443,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$4,706,400	$3,400	$0	$4,709,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	$10,057,300	$7,200	$0	$10,064,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$2,747,600	$2,200	$0	$2,749,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				73	$7,899,800	$5,700	$0	$7,905,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	73	$7,899,800	$5,700	$0	$7,905,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				73	$4,717,500	$3,400	$0	$4,720,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	73	$4,717,500	$3,400	$0	$4,720,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				73	$4,720,500	$3,700	$0	$4,724,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$159,600	$200	$0	$159,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$1,335,000	$1,000	$0	$1,336,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$369,900	$300	$0	$370,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	20	$1,548,400	$1,200	$0	$1,549,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	$1,307,600	$1,000	$0	$1,308,600
TOTAL				73	$36,291,400	$26,700	$0	$36,318,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1033034484	9476934200 ✓	E	2024/11/05	2024/11/06	BANCO DAVIVIENDA	1	$38,962,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (71 Afiliados)																							$125,774,711	$20,200,900			$125,774,711	$5,031,900			$125,634,711	$5,026,300			$125,774,711		$8,674,800		$0	$0		$38,933,900
Centro de Trabajo: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (71 Afiliados)																							$125,774,711	$20,200,900			$125,774,711	$5,031,900			$125,634,711	$5,026,300			$125,774,711		$8,674,800		$0	$0		$38,933,900
Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER (71 Afiliados)																							$125,774,711	$20,200,900			$125,774,711	$5,031,900			$125,634,711	$5,026,300			$125,774,711		$8,674,800		$0	$0		$38,933,900
1	CC	1100752491	ARRIETA CONTRERAS JUAN PABLO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	13929589	BARAJAS HERNANDEZ JOSE EULISES																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
3	CC	13929922	BARAJAS ANAYA MARCO ANTONIO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	13906579	BASTO SANCHEZ CARLOS JULIO											X							25-14	15	$840,000	$134,400	EPS037	15	$840,000	$33,600	CCF39	15	$840,000	$33,600	14-4	15	$840,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$201,600
5	CC	13906579	BASTO SANCHEZ CARLOS JULIO																		25-14	15	$840,000	$134,400	EPS037	15	$840,000	$33,600	CCF39	15	$840,000	$33,600	14-4	15	$840,000	6.960%	$58,500	15	$0	$0	SI	$260,100
6	CC	1098152038	BASTO DIAZ DARLY MELISA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
7	CC	5613984	BASTO MURILLO SADY ROBERTO																		25-14	30	$1,680,000	$268,800	EPS005	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
8	CC	13171873	BAUTISTA IBAÑEZ JUAN																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
9	CC	1096956290	BLANCO BLANCO DIEGO ALEXANDER																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
10	CC	91487260	CARREÑO SANABRIA ALFONSO																		23020 1	30	$7,616,000	$1,294,800	EPS002	30	$7,616,000	$304,700	CCF39	30	$7,616,000	$304,700	14-4	30	$7,616,000	6.960%	$530,100	30	$0	$0	SI	$2,434,300
11	CC	1102362432	CARVAJAL ORDUZ JULIAN ANDRES																		23030 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS037	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
12	CC	5609540	CASTELLANOS BARRERA FILEMON																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
13	CC	1096946960	CASTRO AMAYA EDWIN JAVIER																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
14	CC	13925004	CASTRO PARRA ROBERTO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
15	CC	1093748517	CELIS RICO JAIRO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
16	CC	1098101480	CHAVARRIA CHAPARRO EDINSON ALBERTO																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
17	CC	5613736	CONDE OJEDA RAUL																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
18	CC	1098680172	CORREA MOGOLLON WERNER ALDAY																		23030 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS037	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
19	CC	13924705	DELGADO CHAPARRO ANGELMIRO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
20	CC	5613551	DELGADO NUMAEL																		23030 1	30	$2,016,000	$322,600	EPS041	30	$2,016,000	$80,700	CCF39	30	$2,016,000	$80,700	14-4	30	$2,016,000	6.960%	$140,400	30	$0	$0	SI	$624,400
21	CC	1127592492	DELGADO CASTELLANOS SERGIO ANDRES																		23030 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS037	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
22	CC	13749125	DIAZ RINCON JORGE																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
23	CC	13444433	DIAZ CASTELLANOS JOSE HERNAN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
24	CC	91355833	DUARTE PICO WILSON JAVIER											X							23020 1	3	$168,000	$26,900	EPS002	3	$168,000	$6,800	CCF39	3	$168,000	$6,800	14-4	3	$168,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$40,500

2024/11/06 03:33 PM

Planilla Resumen

25	CC	91355833	DUARTE PICO WILSON JAVIER																		23020 1	27	$1,512,000	$242,000	EPS002	27	$1,512,000	$60,500	CCF39	27	$1,512,000	$60,500	14-4	27	$1,512,000	6.960%	$105,300	27	$0	$0	SI	$468,300
26	CC	79183413	FUENTES MILLAN VICTOR MANUEL																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
27	CC	91352609	GARAVITO VASQUEZ JAIRO																		25-14	30	$1,680,000	$268,800	EPS037	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
28	CC	5609615	GARCIA MORA WILSON																		23030 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS005	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
29	CC	13926575	GOMEZ CALDERON WILMER																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF39	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	SI	$866,900
30	CC	1098761067	GONZALEZ RUEDA CRISTIAN ORLANDO																		25-14	30	$4,611,439	$737,900	EPS037	30	$4,611,439	$184,500	CCF39	30	$4,611,439	$184,500	14-4	30	$4,611,439	6.960%	$321,000	30	$0	$0	SI	$1,427,900
31	CC	1098772653	GOYENECHE CARDENAS MONICA ALEXANDRA																		25-14	30	$2,782,765	$445,300	EPS005	30	$2,782,765	$111,400	CCF39	30	$2,782,765	$111,400	14-4	30	$2,782,765	6.960%	$193,700	30	$0	$0	SI	$861,800
32	CC	1098644710	GUERRERO GARCIA JUAN NORBEY																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
33	CC	1096948176	GUERRERO VALDERRAMA LUIS CARLOS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
34	PT	2356593	GUERRERO JACOME MIGUEL ALFREDO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
35	CC	91232897	GUTIERREZ PINTO IVAN ALONSO																		25-14	30	$1,987,689	$318,100	EPS010	30	$1,987,689	$79,600	CCF39	30	$1,987,689	$79,600	14-4	30	$1,987,689	6.960%	$138,400	30	$0	$0	SI	$615,700
36	CC	1098150540	HUERTAS TARAZONA JOSE SILVESTRE																		23030 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS005	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
37	CC	5609131	JAIMES JAIMES LIBARDO																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
38	CC	13930113	LEAL ORDUÑA MIGUEL ANGEL		X																25-14	30	$1,680,000	$268,800	EPS002	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
39	CC	13924491	LOPEZ CACERES ANDRES																		23100 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS005	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
40	PT	5393250	MONTOYA CHACON GARDELINO DANTES																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
41	CC	13929148	MORENO CACERES CESAR LEANDRO	X																	25-14	3	$168,000	$26,900	EPS037	3	$168,000	$6,800	CCF39	3	$168,000	$6,800	14-4	3	$168,000	6.960%	$11,700	3	$0	$0	SI	$52,200
42	CC	5612669	NIÑO CARVAJAL EDRAS																		23030 1	30	$2,891,184	$462,600	EPS037	30	$2,891,184	$115,700	CCF39	30	$2,891,184	$115,700	14-4	30	$2,891,184	6.960%	$201,300	30	$0	$0	SI	$895,300
43	CC	1095821797	OLARTE SILVA AURA ALEXANDRA																		23030 1	30	$4,611,439	$737,900	EPS037	30	$4,611,439	$184,500	CCF39	30	$4,611,439	$184,500	14-4	30	$4,611,439	6.960%	$321,000	30	$0	$0	SI	$1,427,900
44	CC	79787862	ORJUELA ESTEPA VICTOR DAWER																		25-14	30	$1,680,000	$268,800	EPS002	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
45	CC	5747663	ORTIZ SUAREZ FLORENCIO																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
46	CC	1044605940	ORTIZ ORTIZ JULIO ENRIQUE		X																23020 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS037	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
47	CC	72240872	ORTIZ ORTIZ SILFREDO																		23030 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF39	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	SI	$866,900
48	CC	88311317	PABUENCE ORTIZ OLIVO																		23030 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS037	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
49	CC	5748006	PARRA PARRA ROBERTO																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
50	CC	1099662522	PINZON NOVA CRISTIAN YESID																		23030 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS005	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
51	CC	1096954148	PINZON ORTIZ LUIS EUSEBIO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
52	CC	13927235	PINZON ARGUELLO LUIS ENRIQUE																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
53	CC	1096954022	PINZON CRISTANCHO YORMAN HALI																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
54	CC	13279613	RINCON CUADROS SANTIAGO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
55	CC	1099662017	ROA QUINTERO WEYMAR YESID																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
56	CC	1096957820	RODRIGUEZ RANGEL DANDY SHIRLEY							X											23030 1	30	$2,782,765	$445,300	EPS002	30	$2,782,765	$111,400	CCF39	30	$2,782,765	$111,400	14-4	30	$2,782,765	6.960%	$193,700	30	$0	$0	SI	$861,800
57	CC	13929337	RODRIGUEZ JAIMES NIXON YESID																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
58	CC	13927795	RODRIGUEZ JAIMES PEDRO VICENTE																		23100 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS002	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
59	CC	1098780824	ROJAS ORTIZ HENRY ALBERTO							X											23030 1	30	$4,611,430	$737,900	EPS002	30	$4,611,430	$184,500	CCF39	30	$4,611,430	$184,500	14-4	30	$4,611,430	6.960%	$321,000	30	$0	$0	SI	$1,427,900
60	CC	1096950590	ROJAS SANGUINO LEONARDO																		25-14	30	$1,680,000	$268,800	EPS037	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200

2024/11/06 03:33 PM

Planilla Resumen

aportes en línea

61	CC	2087411	SANCHEZ CASERES RAUL																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
62	CC	1096957220	SANDOVAL DIMAS IVAN FERNEY																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
63	CC	1096951842	SEPULVEDA CASTELLANOS WILMER LEONARDO																	230301	30	$1,680,000	$268,800	EPS005	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
64	CC	5609425	SIERRA ORLANDO																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
65	CC	13852880	SILVA REYES ALEXIS ANTONIO																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
66	CC	1096947438	SUAREZ DAZA DIEGO FERNEY																	231001	30	$2,016,000	$322,600	EPS002	30	$2,016,000	$80,700	CCF39	30	$2,016,000	$80,700	14-4	30	$2,016,000	6.960%	$140,400	30	$0	$0	SI	$624,400
67	CC	13926847	SUAREZ DIAZ LUIS EDGAR																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$396,900
68	CC	1127066876	SUAREZ ANGARITA MICHEL ALEXANDER																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
69	CC	1099894523	TARAZONA RANGEL FERMIN ALONSO																	230301	30	$1,680,000	$268,800	EPS005	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
70	CC	13922207	TUTIRA DIAZ LIBARDO																	230301	30	$1,680,000	$268,800	EPS041	30	$1,680,000	$67,200	CCF39	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$520,200
71	CC	5692422	VELOSA SANCHEZ LUIS FREDY										X							230301	3	$168,000	$26,900	EPS005	3	$168,000	$6,800	CCF39	3	$168,000	$6,800	14-4	3	$168,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$40,500
72	CC	5692422	VELOSA SANCHEZ LUIS FREDY																	230301	27	$1,512,000	$242,000	EPS005	27	$1,512,000	$60,500	CCF39	27	$1,512,000	$60,500	14-4	27	$1,512,000	6.960%	$105,300	27	$0	$0	SI	$468,300
73	CC	1095827911	VELOZA REYES LAURA CAMILA																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
74	CC	4099539	ZAMBRANO VALBUENA GUSTAVO																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Total		Afiliados(71)																				$125,774,711	$20,200,900			$125,774,711	$5,031,900			$125,634,711	$5,026,300			$125,774,711		$8,674,800		$0	$0		$38,933,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1033034484	9476934200	E	2024/11/05	2024/11/06	BANCO DAVIVIENDA	1	$38,962,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				71	$20,200,900	$14,700	$0	$20,215,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,276,200	$1,000	$0	$1,277,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$4,741,000	$3,400	$0	$4,744,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	42	$11,311,200	$8,100	$0	$11,319,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$2,872,500	$2,200	$0	$2,874,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				71	$8,674,800	$6,200	$0	$8,681,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	71	$8,674,800	$6,200	$0	$8,681,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				71	$5,026,300	$3,600	$0	$5,029,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	71	$5,026,300	$3,600	$0	$5,029,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				71	$5,031,900	$3,700	$0	$5,035,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$159,600	$200	$0	$159,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$1,393,100	$1,000	$0	$1,394,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$407,900	$300	$0	$408,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	20	$1,694,200	$1,200	$0	$1,695,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	$1,377,100	$1,000	$0	$1,378,100
TOTAL				71	$38,933,900	$28,200	$0	$38,962,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	1131747377	9478975986	Y	2024/10/02	2024/12/17	BANCO DAVIVIENDA	76	$95,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$90,500
Centro de Trabajo: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$90,500
Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$90,500
1 CC 90518696	RIVERA ARIZA JOHN JAIRO	X		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	no	$90,500
Afiliados(1)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$90,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	1131747377	9478975986	Y	2024/10/02	2024/12/17	BANCO DAVIVIENDA	76	$95,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$4,900	$0	$95,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$90,500	$4,900	$0	$95,400
TOTAL				1	$90,500	$4,900	$0	$95,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA, CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1131747377	9478976006	Y	2024/11/05	2024/12/17	BANCO DAVIVIENDA	42	$93,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$90,500
Centro de Trabajo: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$90,500
Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$90,500
1	CC	91018696	RIVERA ARIZA JOHN JAIRO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$90,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA, CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1131747377	9478976006	Y	2024/11/05	2024/12/17	BANCO DAVIVIENDA	42	$93,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$2,700	$0	$93,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$90,500	$2,700	$0	$93,200
TOTAL				1	$90,500	$2,700	$0	$93,200

CERTIFICADO BANCARIO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BUCARAMANGA, SANTANDER, 30/07/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA** con NIT **901.740.580-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 046669997234

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

CERTIFICADO PAGO DE PARAFISCALES

PAZ Y SALVO DE PARAFISCALES

Bucaramanga, 02 de diciembre de 2024

Yo JESSICA MARCELA CAMELO VACA, en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa TGA ASOCIADOS, INGENIERIA, CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS identificado con Nit No. 901.424.605-4, me permito CERTIFICAR BAJO LA GRAVEDADA DE JURAMENTO que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Cajas de Compensación Familiar durante los últimos seis (06) meses anteriores a la presente certificación.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Dada en Bucaramanga, a los dos (2) días del mes de diciembre del año 2024

Cordialmente,

CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO
C.C. 91.273.201
Representante legal

JESSICA CAMELO VACA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 211938-T
CC 1.102.355.623

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9Z90D385FFB0668E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESSICA MARCELA CAMELO VACA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102355623 de PIEDECUESTA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 211938-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



211938-T

JESSICA MARCELA
CAMELO VACA
C.C. 1102355623

RESOLUCION INSCRIPCION 852 **FECHA 22/12/2015**

UNIVERSIDAD UNIDADES TECN. DE SANTANDER

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 224961

214670

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.102.355.623

CAMELO VACA
APELLIDOS

JESSICA MARCELA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-MAR-1988
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

17-ABR-2006 PIEDECUESTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00218366-F-1102355623-20100226 0021312676A 1 32979595

FACTURA ELECTRONICA
No. CGR7

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA
NIT 901.740.580-3
CLL 32-28-70
Tel: (607) 3107667943
Bucaramanga - Colombia
ingenierosconstructores1973@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CGR 7

Señores	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.067.169-9	**Teléfono**	(607) 6607475 - Ext. 000	**Generación**	18/12/2024, 11:03
Dirección	CR 7 15 80 B UNION	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia	**Expedición**	18/12/2024, 11:04
				Vencimiento	05/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
1	Acta parcial N° 04 del contrato de obra 087 -09-08-23	1.00	1,049,480,954.95	0.00

Total items: 1

Valor en Letras: Mil cuatrocientos tres millones cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos cincuenta y ocho pesos m/cte con setenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-05 $ 1,403,466,358.77 por

Total Bruto	1,039,604,710.20
Administración 28.05%	291,609,121.21
Imprevistos 1.00%	10,396,047.10
Utilidad 5.00%	51,980,235.51
IVA 19%	9,876,244.75
Total a Pagar	1,403,466,358.77

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083699321 aprobado en 20241119 prefijo CGR desde el número 5 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: dfb2e0127eb7513e97c3c1f272bbd38026ce1b50775db4ffe87b4afee901c883a3ad1e558bda956d5cfc6541cd2fa3a9

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

1. *INFORMACION GENERAL:*

Tipo de Contrato:	OBRA
Fecha Elaboración del Informe:	DICIEMBRE 18 DE 2024
Informe de Supervisión:	004
Periodo de Seguimiento:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
Contrato No:	087 DE AGOSTO 09 DE 2023
Contratista	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA
NIT o C.C.	901.740.580 - 3
Fecha de inicio:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Fecha de finalización:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Valor Inicial del Contrato:	$ 64.028.082.699,20
Valor Adicional	$ 665.389.158,15
Anticipo inicial:	$ 25.611.233.079,68
Amortización anticipo en Pago No. 001:	$ 4.272.477.426.75
Amortización anticipo en Pago No. 002:	$ 1.221.709.405,00
Amortización anticipo en Pago No. 003:	$ 1.779.384.020,81
Amortización anticipo en Factura Actual No. CGR 6 (40%):	$ 561.386.543,50
Número de CD y fecha:	23-00146 // 21/04/2023 Y 23-00251 // 06/07/2023
Número de RP y fecha:	23-00417 // 09/08/2023
Número de CD Adiciona y fecha:	23-00433 // 28/12/2023
Número de RP Adicional y fecha:	23-00660 //28/12/2023
Objeto del Contrato:	ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER.

2. *REVISION JURIDICA:*

Garantías exigidas: fechas de cobertura: modificaciones si las hay.	
Cumplimiento	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Buen manejo del anticipo	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial

Calidad y correcto funcionamiento	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Salarios y prestaciones sociales	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Estabilidad de la obra	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Responsabilidad Civil Extracontractual	B-100010061 Anexo 01 - Actualizada el 18/08/2023 por Seguros Mundial

Pago de seguridad social: Se verifica, Certificación del Revisor Fiscal y del Representante Legal de Paz y Salvo de aportes para fiscales, de fecha 02 de diciembre de 2024; y copia de las Planillas de Pago de Seguridad Social para el personal del Consorcio de García Rovira correspondientes a los meses de septiembre y octubre de la vigencia 2024, así:

PLANILLA	PERÍODO	FECHA DE PAGO
9474602798	Pensión, ARL y CC - Septiembre de 2024 Salud – Octubre de 2024	03/10/2024
9476934200	Pensión, ARL y CC - Octubre de 2024 Salud – Noviembre de 2024	06/11/2024
9778975986	Pensión, ARL y CC - Septiembre de 2024 Salud – Septiembre de 2024	17/12/2024
9478976006	Pensión, ARL y CC - Octubre de 2024 Salud – Octubre de 2024	17/11/2024

Salud:	Se adjuntan planillas Nos. 9474602798 9476934200 9778975986 9478976006
Pensión:	Se adjuntan planillas Nos. 9474602798 9476934200 9778975986 9478976006
Riesgos profesionales:	Se adjuntan planillas Nos. 9474602798 9476934200 9778975986 9478976006
Parafiscales:	Se adjuntan planillas Nos. 9474602798 9476934200 9778975986 9478976006
Multas:	No Aplica

3. REVISION TECNICA:

Descripción del avance del contrato:	
Obligaciones: Las actividades específicas a desarrollar serán las definidas en el Anexo No. 1 presupuesto (Según proyecto radicado ante Minsalud), según las condiciones económicas establecidas por el CONTRATISTA en su oferta económica.	Se revisan los soportes de las actividades realizadas durante el período objeto de esta supervisión del 01 de

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. Que los alcances de la ejecución contractual se encuentra contenidos en los documentos que se relacionan a continuación: a. Anexo No. 1 Presupuesto (Según proyecto radicado ante Minsalud) b. Anexo No. 2 Análisis de precios unitarios – APU`S (Según proyecto radicado ante Minsalud) c. Anexo No. 3 Memorias de Cantidades de Obra d. Anexo No. 4 Especificaciones técnicas (Según proyecto radicado ante Minsalud) e. Anexo No. 5 Planos y diseños arquitectónicos f. Anexo No. 6 Planos y diseños estructurales g. Anexo No. 7 Planos y diseños eléctricos h. Anexo No. 8 Planos y diseños hidrosanitarios i. Anexo No. 9 Planos y diseños Red contra incendios j. Anexo No. 10 Planos y diseños Red de Gases k. Anexo No. 11 Planos y diseños aire acondicionado Dentro de las Actividades Ejecutadas en el Período de esta supervisión están: Frentes de Trabajo: Módulo Ambulancia: Excavación de vigas Eje 3 y Eje 4. Módulo Unidad de Cuidados Intensivos: Acabados de Muros, estuco interior y estuco exterior en fachada; instalación de fachada. Trabajos eléctricos instalación de circuito de luminarias. Módulo Tanque de Almacenamiento: Armado de Acero placa inferior. Módulo A y D: Demolición Eje 1. Se inicia con la excavación de la Red Sanitaria y de Agua lluvia en sus diferentes diámetros.	septiembre de 2024 a 31 de octubre de 2024, la cual se encuentra soportada por el Informe de Apoyo a la Supervisión Acta Parcial de Obra No. 04
Obligación: ACTIVIDADES ADICIONALES	No se tienen actividades adicionales durante el período objeto de esta supervisión del 01 de septiembre de 2024 a 31 de octubre de 2024.

Cumplimiento de obligaciones del contratista al periodo de reporte:

Se verifica el cumplimiento de las diferentes obligaciones contractualmente pactadas en el periodo objeto de esta supervisión del 01 de septiembre de 2024 a 31 de octubre de 2024.

De acuerdo con el plazo de ejecución contractual el avance de las actividades ejecutadas fue del 29,15%, para el periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024. Y para el periodo del 01 de octubre al 31 de octubre de 2024 este porcentaje asciende al 30,28%.

Descuentos y/o Glosas: NO APLICA.

Documentos verificados para el pago:

- Factura Electrónica No. CGR 7 expedida el 18 de diciembre de 2024.
- Planillas de pago de Seguridad Social Nos. 9474602798 9476934200 9778975986 9478976006, del personal Contratado por el Consorcio de García Rovira para el periodo objeto de esta supervisión del 01 de septiembre de 2024 a 31 de octubre de 2024 con fechas de pago registradas en el ítem de pago de seguridad social descrito en la página 2 del presente informe.
- Certificación de pago de parafiscales firmada por el Revisor fiscal y Representante Legal del Consorcio García Rovira del Pago de Parafiscales de fecha 02 de diciembre de 2024.
- Informe escrito y un CD con las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato durante el periodo de supervisión.
- Se realiza descuento por amortización del anticipo equivalente al 40% del valor total de la actual Factura No. CGR 7, por valor $ 561.386.543,50

PRODUCTOS ENTREGADOS: (si los hay)	**DOCUMENTO DE VERIFICACION y/o ubicación del documento.**

- Informes Escritos Avance de Obra, de las actividades realizadas para los siguientes períodos:
  - Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024.
  - Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2024
- Un (1) CD con las evidencias de las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato en el periodo objeto de esta supervisión desde el 01 de septiembre de 2024 a 31 de octubre de 2024.
- Informe del contratista apoyo de la supervisión.
- Planilla de pago de aportes al SGSSS de los meses de Septiembre y Octubre de la vigencia 2024
- Certificación de pago de parafiscales firmada por el Revisor fiscal y Representante Legal del Consorcio García Rovira del Pago de Parafiscales de fecha 02 de Diciembre de 2024.

4. REVISION FINANCIERA:

RUBROS	VALOR
2.3.2.01.01.001.02.08.01	$1.403.466.358,77
TOTAL GENERAL	$1.403.466.358,77

Valor del contrato:	$ 64.028.082.699,20
Valor Adición No. 001	$ 665.389.158,15
Valor Total del Contrato:	$ 64.693.471.857,35
Valor Anticipo:	$ 25.611.233.079,68
Valor anticipos amortizados acumulados facturas anteriores Acta No. 001, Acta No. 002 y Acta No. 003	$ 7.273.570.852,56
Valor anticipo amortizado en la presente factura Acta No. 004	$ 561.386.543,50
Saldo anticipo después de amortizaciones	$ 17.776.275.683,62
Valor Pagado Acta No. 001	$ 10.681.193.566,88
Valor Pagado Acta No. 002	$ 3.054.273.511,53
Valor Pagado Acta No. 003	$ 4.448.460.052,02
Valor pagado a la fecha:	$ 18.183.927.130,43
Valor de la presente factura Acta No. 004	$ 1.403.466.358,77
Descuentos a realizar Amortización anticipo (40%) presente factura Acta No. 004:	$ 561.386.543,508
Valor a Pagar después de descuentos	$ 842.079.815,262
Saldo por ejecutar después del pago del presente periodo:	$ 27.329.802.684,530

5. RADICACION PARA PAGO

FECHA DE ENTREGA	ANEXOS PARA EL PAGO
Diciembre 18 de 2024	Factura Original No. CGR 7 Expedida el 18 de Diciembre De 2024. Planillas de Pago de Seguridad Social Nos. 9474602798 9476934200 9778975986 y 9478976006, del personal del Consorcio de García Rovira para el periodo objeto de supervisión del 01 de septiembre de 2024 a 31 de octubre de 2024 con fechas de pago registradas en el ítem de pago de seguridad social descrito en la página 2 del presente informe, correspondientes al período de está supervisión. Certificación del Revisor Fiscal y Representante Legal del Consorcio García Rovira del Pago de Parafiscales de fecha 02 de diciembre de 2024.

	Informe Técnico de Apoyo a la Supervisión de fecha 06 de Diciembre de 2024 de la Empresa Constructora C&F Asociados S.A.S. con NIT: 900.803.291-8, que tiene objeto contractual: "Prestación de servicios para la consultoría, asesoría, seguimiento, verificación, control y cierre técnico de todos los proyectos de infraestructura y de gestión de la ESE Hospital Regional de García Rovira" Certificado Bancario del Consorcio De García Rovira de fecha 30 de julio de 2024. Acta Parcial Obra No. 4 correspondiente al periodo de pago del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2024, con su pertinente sabana anexo acta, respectivamente firmada. Informes Escritos Avance de Obra, de las actividades realizadas para los siguientes períodos: 1. Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024. 2. Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2024 Un (1) CD con el informe completo de las actividades ejecutadas, fotos, cantidades de obra y demás que hacen parte del informe e esta supervisión.

6. QUIEN SUSCRIBE EL INFORME:

Nombre:	**MARTHA LILIANA DUARTE RUEDA**
Cargo:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA Supervisora
Firma:	

Elaborado por: Zayda Milena Pereira Gutiérrez	Fecha: 18-12-2024	Firma:
Revisado por: Karen Andrea Méndez Espinosa – Asesora de Gerencia	Fecha: 18-12-2024	Firma:

GARCIA ROVIRA	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 68-00796 NIT. 900.067.169-9	**FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA CONTABILIDAD Y PAGOS**

CODIGO	PA-GAF-CN-FTO-02
VERSION	1
FECHA	10/07/2024
PAG	1 de 1

BENEFICIARIO	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA
CONCEPTO	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE
PERIODO	01 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE DE 2024

REQUISITOS PARA CONTABILIZAR					
	DOCUMENTOS	**SI**	**NO**	**NA**	**RESPONSABLE**
FECHA DE RECIBIDO	1. Factura/Cuenta de Cobro/Resolución	X			**V.B PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD**
	2.Documento Equivalente				
	3. Verificar Valor No del RP del cual debe hacerse la acusación de los valores.	X			
	4. Entrada a Farmacia o Almacén en el casò de suministros				
	5. Tiquetes de Viaje en caso de Viáticos				
	6. Certificación para Efectos de la Retención				
ELABORADO POR	7. Informe de Supervisión/Interventor	X			
	8. Planilla, recibo de pago y certificación pago aportes parafiscales				
	9. Rut para contratistas nuevos				
	10. Orden de compra de almacén donde conste el recibido a satisfacción				
	11. Formato de Declaración juramentada primer pago				
	12. Certificación Bancaria primer pago	X			
	13. Acto administrativo de Asignación de Supervisor				

REQUISITOS PARA PAGO					
	DOCUMENTOS	**SI**	**NO**	**NA**	**RESPONSABLE**
Vo. Bo Supervisor	14. Comprobante de Contabilización de la cuenta	X			CONTABILIDAD
	15. Recibo de Estampillas Departamentales visadas por Contabilidad				BENEFICIARIO
	16. Invitación o citación de entidad Pública/Privada informe de actividades o certificado de permanencia en caso de viáticos				BENEFICIARIO
	17. Acta Inicial o acta final				BENEFICIARIO Y SUPERVISOR

CARGO		**FIRMA**
REVISÓ:	Profesional Universitario de Contabilidad	
	Área de Tesorería	
	Sugerente Administrativo	
	Aprobación Gerencia	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional García Rovira
Málaga – Santander
COD PRES: 68-00796 NIT. 900.067.169-9

REPUBLICA DE COLOMBIA
ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
NIT 900.067.169-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:24-00713

EL JEFE DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia fiscal, existe disponibilidad en los siguientes rubros:

Sección o Unidad Ejecutora	: ESE ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA	
Código de presupuesto	: 2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	Código rápido: 240046
Fondo / Fte de Financiación	: APN APORTES NACIONALES	

2	: Gastos
2.3	: Inversión
2.3.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.3.2.01	: Adquisición de activos no financieros
2.3.2.01.01	: Activos fijos
2.3.2.01.01.001	: Edificaciones y estructuras
2.3.2.01.01.001.02	: Edificaciones distintas a vivienda
2.3.2.01.01.001.02.08	: Edificios relacionados con salud
2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	: Adecuación y Mantenimiento Edificios - infraestructura

Valor CDP	$:	842,079,815.26			
Saldo antes del CDP	$:	23,775,791,396.61	Nuevo Saldo	$:	22,933,711,581.35

Para : CUENTAS POR PAGAR ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

Por la suma de : OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON********** VEINTISEIS CENTAVOS m/cte. ($842,079,815.26)**********

Dado en el día Diciembre 19 de 2024
Elaboró:

MABEL CALDERON ACEROS
Profesional Universitario

CESAR AUGUSTO BECERRA CORREA
Gerente ESE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional García Rovira
Málaga – Santander
COD PRES: 68-00796 NIT: 900.067.169-9

REPUBLICA DE COLOMBIA
ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
NIT 900.067.169-9

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 24-00815

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 24-00713

Sección o Unidad Ejecutora	: ESE ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
Código de presupuesto	: 2.3.2.01.01.001.02.08.01.099 Código rápido: 240046
Fondo / Fte de Financiación	: APN APORTES NACIONALES
2	: Gastos
2.3	: Inversión
2.3.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.3.2.01	: Adquisición de activos no financieros
2.3.2.01.01	: Activos fijos
2.3.2.01.01.001	: Edificaciones y estructuras
2.3.2.01.01.001.02	: Edificaciones distintas a vivienda
2.3.2.01.01.001.02.08	: Edificios relacionados con salud
2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	: Adecuación y Mantenimiento Edificios - infraestructura

Valor Registro :$ 842,079,815.26

Para : CD 24-00713, CUENTAS POR PAGAR ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

NIT: 00901740580 - 3 CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

Por la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS*** QUINCE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS m/cte. ($842,079,815.26)**********

Dado en el día Diciembre 19 de 2024
Elaboró:

MABEL CALDERON ACEROS
Profesional Universitario

CESAR AUGUSTO BECERRA CORREA
Gerente ESE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional García Rovira
Málaga – Santander
CCD PRES 08-00196 NIT 900067169-9

ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA DE MÁLAGA
Nit: 00900067169 - 9
MáLAGA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	12	19	No: OP 24-00994 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901740580 - 3 - CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CP 24-00815, CD 24-00713, CUENTAS POR PAGAR ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,039,604,710.20	0.00	Base para el Iva	9,876,244.75	0.00
Iva retenido	0.00	1,481,436.71	Retención en la fuente	0.00	20,792,094.20

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Remu	036010	2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	APN	842,079,815.26	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	842,079,815.26	0.00
3	Ingreso Diferido por Subvenciones Cond	29900301			842,079,815.26	0.00	842,079,815.26
4	Iva Retenido	24362501			0.00	1,481,436.71	9,876,244.75
5	contratos de obra	24362601			0.00	20,792,094.20	1,039,604,710.20
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	767,826,048.84	842,079,815.26
7	Contribucion contratos de obra publica 5	24402301			0.00	51,980,235.51	0.00
8	otras construcciones en curso	161590			1,403,466,358.77	0.00	0.00
9	Nacional	44300501			0.00	1,403,466,358.77	0.00
				TOTALES $	**3,087,625,989.29**	**3,087,625,989.29**	

Elaboró: **RUDY VANESA ESTUPIÑAN SUAREZ**

MABEL CALDERON ACEROS
Profesional Universitario

CESAR AUGUSTO BECERRA CORREA
Gerente ESE

19	12	2024	767,826,048.84

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS***** m/cte**********

ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA DE MÁLAGA Nit: 00900067169 - 9 MáLAGA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2024	12	19	No: CE 24-00710 Con: 1	1

Doc. de Pago : 24-00710	Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Cuenta Número : 312-000014-08	Nombre Cuenta : CTA AHORROS RES. 933 2023
Benef : CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA	
Nit : 00901740580 - 3	

OP 24-00994, CP 24-00815, CD 24-00713, CUENTAS POR PAGAR ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la fuente	20,792,094.20	Iva Retenido	1,481,436.71
Total Descuentos $	**22,273,530.91**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			767,826,048.84	0.00	767,826,048.84
5142	Servicios personales Indirectos ? Remun	037010	2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	APN	842,079,815.26	0.00	767,826,048.84
5050	Servicios personales Indirectos ? Remun	036010			0.00	842,079,815.26	767,826,048.84
1788	Depositos en instituciones financieras	11321001			0.00	767,826,048.84	767,826,048.84
				SUMAS IGUALES $	**1,609,905,864.10**	**1,609,905,864.10**	

Valor a pagar: $ 767,826,048.84
En letras: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS m/cte.*********

MANCILLA ROSAS NANCY

Elaboró | Proyectó: Mabel Calderón Aceros | Aprobó: Cesar Augusto Becerra | Recibí: C.C. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPR SOCIAL DEL ESTAD
NIT: 900067169
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: APILOTPAGO
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 31200001408

Fecha: 20-12-2024 **Hora:** 07:03:04
Fecha de Generación: 20-12-2024

Fecha de envío del pago: 19-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2024

Impreso por: HOSPITAL24

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $767,826,048.84	**Valor Registros Procesados:** $767,826,048.84	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000046669997234	Corriente	9017405803	CONSORCIO DE GARCI	767,826,048.84	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
