
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Costo	Costo real
1		**CONSORCIO MITIGACION CODITO FASE 4**	**128 días**	**jue 23/01/25**	**vie 25/07/25**	**66%**	**$ 3,104,074,785.00**	**$ 1,321,956,761.42**
2		**INICIO**	128 días	jue 23/01/25	vie 25/07/25	66%	$ 3,104,074,785.00	$ 1,321,956,761.42
3		**Preliminares**	**7 días**	**jue 23/01/25**	**vie 31/01/25**	**100%**	**$ 17,593,164.00**	**$ 17,593,164.00**
4		Localización, trazado y replanteo de obras	5 días	jue 23/01/25	mié 29/01/25	100%	$ 16,125,663.00	$ 16,125,663.00
5		VALLA MÓVIL DE 1.20m x 1.20m EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO DE 2 x 1-1/8" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. Incluye suministro e instalación. Impresión 720 DPI, Tintas para exteriores.	2 días	jue 30/01/25	vie 31/01/25	100%	$ 1,467,501.00	$ 1,467,501.00
6		**Excavaciones**	**30 días**	**jue 23/01/25**	**mié 5/03/25**	**100%**	**$ 16,858,430.00**	**$ 16,858,430.00**
7		Descapote manual en material común (e=0.1m. Incluye cargue)	10 días	jue 30/01/25	mié 12/02/25	100%	$ 8,149,165.00	$ 8,149,165.00
8		Excavación manual en material común. (Incluye cargue de material excavado).	10 días	lun 3/02/25	vie 14/02/25	100%	$ 290,483.00	$ 290,483.00
9		Excavación mecánica en roca. (Incluye cargue de material excavado .	20 días	jue 30/01/25	mié 20/02/25	100%	$ 9,009,004.00	$ 9,009,004.00
10		Excavacion mecánica en material común. (Incluye cargue de material excavado).	30 días	jue 23/01/25	mié 5/03/25	100%	$ 1,608,978.00	$ 1,608,978.00
11		**Transportes**	**89 días**	**mar 4/02/25**	**jue 12/06/25**	**83%**	**$ 92,321,530.00**	**$ 76,626,869.90**
12		Transporte de escombros a sitio autorizado. (Distancia de transporte 40 km. Incluye trasiego interno).	72 días	mar 4/02/25	jue 12/06/25	83%	$ 86,398,152.00	$ 71,710,466.16
13		Disposición final de escombros en sitio autorizado.	72 días	mar 4/02/25	jue 12/06/25	83%	$ 5,923,378.00	$ 4,916,403.74
14		**Obras de Estabilizacion**	**120 días**	**jue 30/01/25**	**lun 21/07/25**	**59%**	**$ 2,699,055,296.00**	**$ 1,109,461,721.08**
15		Perforacion por rotacion de bloques inestables - Pernos de anclaje 1" L=12M (incluye inyeccion y espaciadores)	77 días	lun 24/02/25	jue 10/07/25	58%	$ 1,042,113,600.00	$ 604,425,888.00
16		Perforacion por rotacion de bloques inestables - Pernos de anclaje 1" L=6M (incluye inyeccion y espaciadores)	91 días	lun 10/02/25	jue 10/07/25	65%	$ 421,820,136.00	$ 274,183,088.40
17		Suministro e instalacion de kit de cabeza perno (incluye platina, tuerca y arandelas) 1¨	8 días	jue 10/07/25	lun 21/07/25	0%	$ 47,592,744.00	$ 0.00
18		LLoraderos en tuberia de 3" RDE 41, L= 0,35 M (drenaje concreto lanzado	8 días	jue 10/07/25	lun 21/07/25	0%	$ 10,424,908.00	$ 0.00
19		Suministro, transporte e instalacion del sistema malla de alambre de acero de alta resistencia de 150 kn/m, con accesorios	8 días	jue 10/07/25	lun 21/07/25	0%	$ 832,011,075.00	$ 0.00
20		Manipuladores telescópicos o Telehandlers	89 días	jue 13/02/25	vie 11/07/25	63%	$ 107,611,536.00	$ 67,795,267.68
21		Descargue talud (incluye instalacion y materiales de conformacion tunel bajante).	25 días	jue 30/01/25	mié 5/03/25	100%	$ 163,057,477.00	$ 163,057,477.00
22		Concreto lanzado de 21 Mpa, e=0,15 m para protección de taludes (Incluye Suministro y lanzado)	8 días	jue 10/07/25	lun 21/07/25	0%	$ 74,423,820.00	$ 0.00
23		**MURO DE CONTENCION**	**43 días**	**mar 27/05/25**	**vie 25/07/25**	**24%**	**$ 236,767,931.00**	**$ 59,938,142.44**
24		Concreto para muros de contención 4000 psi	43 días	mar 27/05/25	vie 25/07/25	26%	$ 132,003,638.00	$ 34,320,945.88
25		Acero de refuerzo 60000 psi	43 días	mar 27/05/25	vie 25/07/25	26%	$ 50,713,639.00	$ 13,185,546.14
26		Concreto ciclópeo, 2500 psi 40% rajón para bases	43 días	mar 27/05/25	vie 25/07/25	23%	$ 50,834,409.00	$ 11,691,914.07
27		Concreto clase f, 2000 psi para solados y atraques	43 días	mar 27/05/25	vie 25/07/25	23%	$ 3,216,245.00	$ 739,736.35
28		**OBRAS DE DRENAJE**	**27 días**	**lun 24/02/25**	**mié 2/04/25**	**100%**	**$ 41,237,346.00**	**$ 41,237,346.00**
29		Concreto para cunetas según diseño f'c=28 MPa (incluye reconstrucción de cunetas y cunetas nuevas, estructura típica de caida de cunetas, suministro e instalación)	20 días	lun 3/03/25	lun 31/03/25	100%	$ 2,175,917.00	$ 2,175,917.00
30		Concreto para disipador según diseño f'c=28 MPa (estructura típica de caida de cunetas, suministro e instalación)	15 días	mié 12/03/25	mié 2/04/25	100%	$ 5,698,829.00	$ 5,698,829.00
31		Acero de refuerzo para cunetas fy=420 Mpa (incluye cuneta Subdren No. 1, estructura típica de caida de cunetas, suministro e instalación)	16 días	lun 24/02/25	lun 17/03/25	100%	$ 20,444,484.00	$ 20,444,484.00
32		Concreto para Desarenadores f'c=28 Mpa (incluye suministro e instalación)	5 días	mar 25/03/25	lun 31/03/25	100%	$ 2,633,550.00	$ 2,633,550.00
33		Material Granular Filtrante (incluye suministro e instalación para conformación de filtros)	15 días	mié 12/03/25	mié 2/04/25	100%	$ 0.00	$ 0.00
34		Material de relleno compactado para obras varias: (sumidero, trincheras drenantes, cunetas y mejoramiento piso) (incluye suministro e instalación)	15 días	mié 12/03/25	mié 2/04/25	100%	$ 10,284,566.00	$ 10,284,566.00
35		Tubería PVC U.M. EXT Corrugado/INT Liso U.M. (Norma NTC 3722-1) D=12" Incluye suministro e instalación.	20 días	lun 24/02/25	vie 21/03/25	100%	$ 0.00	$ 0.00
36		Tubería PVC 4" (incluye suministro e instalación)	20 días	lun 24/02/25	vie 21/03/25	100%	$ 0.00	$ 0.00
37		**OBRAS DE CERRAMIENTO**	**0 días**	**vie 25/07/25**	**vie 25/07/25**	**100%**	**$ 241,088.00**	**$ 241,088.00**
38		Cerramiento en malla eslabonada C 10 incluye (angulo, tuberia estructural Galvanizada de 2").	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	100%	$ 241,088.00	$ 241,088.00
39		**FIN**	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	0%	$ 0.00	$ 0.00

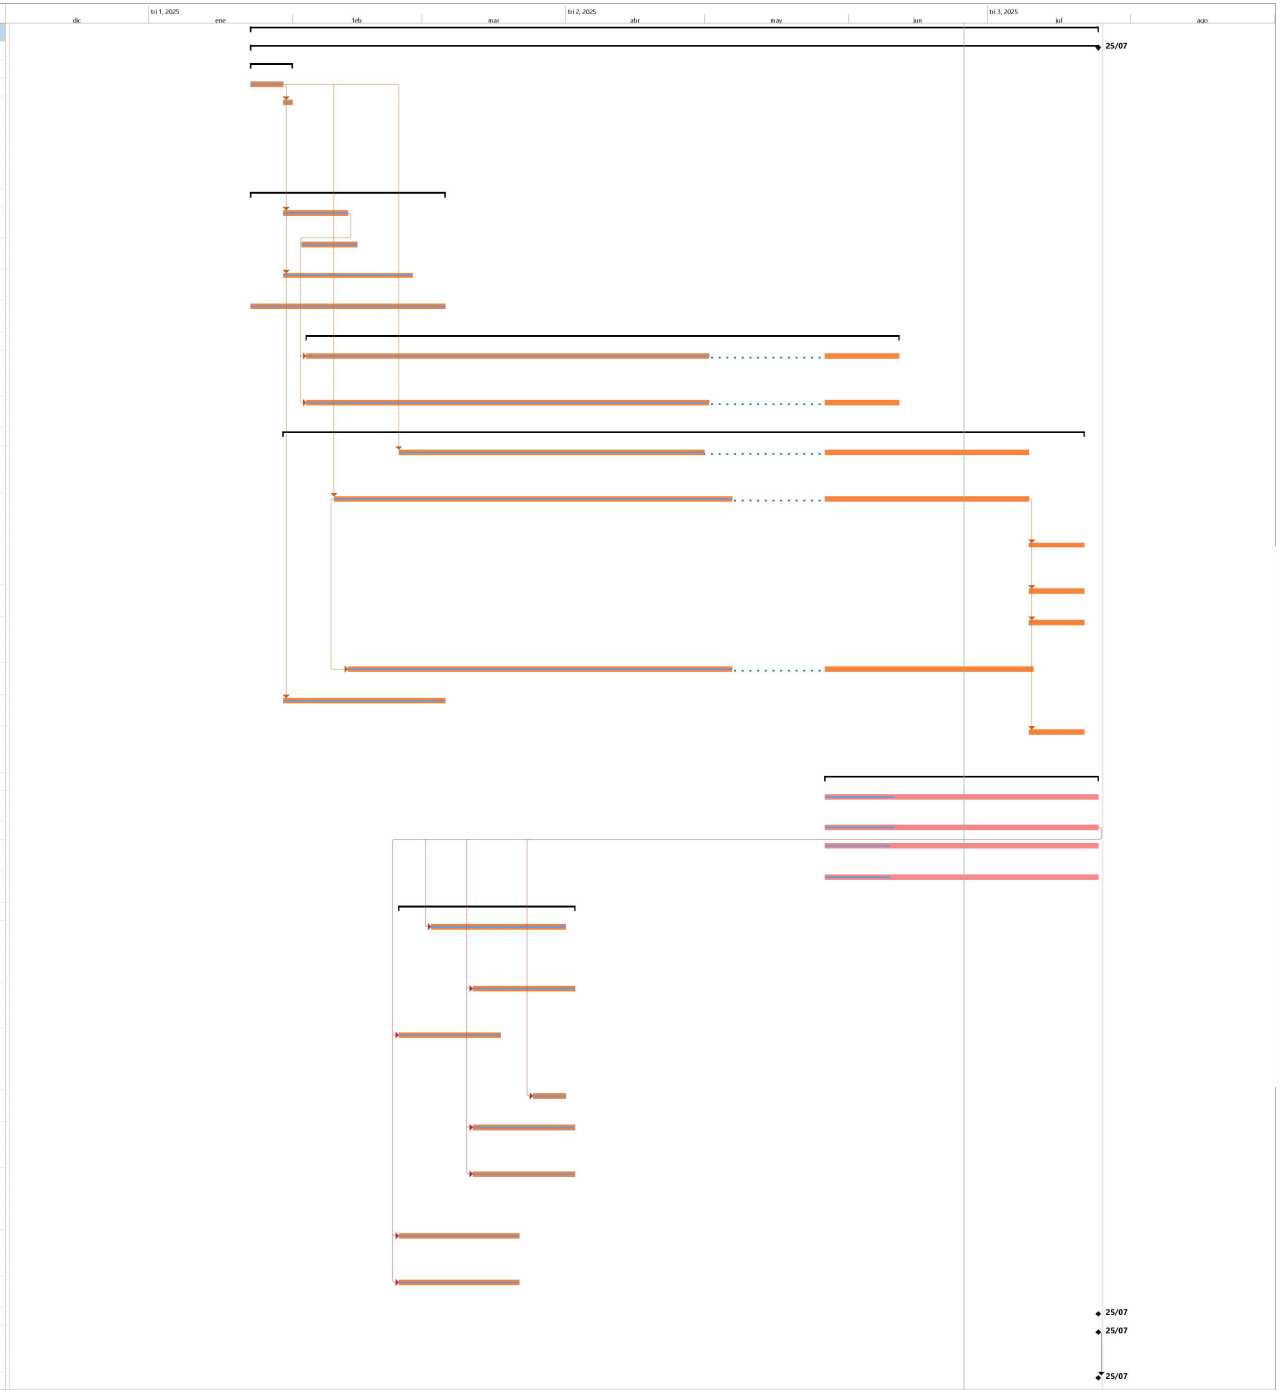

Proyecto: Programacion Codito
Fecha: jue 26/06/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual
