PISCÍCOLA SAN SILVESTRE
Alimento para el mundo



"Aunar esfuerzos entre el distrito de Barrancabermeja y la Piscícola San Silvestre S.A para la recuperación y conservación ambiental de conexiones hídricas en áreas urbanas y rurales, en el distrito de Barrancabermeja."

Convenio 1732-24
Informe final y de liquidación

El presente documento consta de:

Información del presupuesto mediante actividades y rubros durante el periodo ejecutado.

INTRODUCIÓN

En busca de fortalecer la conservación ambiental y garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos en el Distrito de Barrancabermeja, el Convenio No. 1732-2024 establece una alianza estratégica entre el Distrito de Barrancabermeja y la empresa Piscícola San Silvestre S.A. El propósito de este convenio es aunar esfuerzos para la recuperación y conservación de las conexiones hídricas en las áreas tanto urbanas como rurales del distrito, con el fin de mejorar la calidad del agua y promover la preservación de los ecosistemas acuáticos en la región.

El periodo de ejecución de las actividades contempladas en este acuerdo está comprendido entre el 21de junio al 30 de diciembre de 2024. En este contexto, el presente documento tiene como objetivo proporcionar información detallada sobre el presupuesto asignado, desglosado por actividades y rubros, durante el periodo ejecutado. De esta manera, se busca ofrecer una visión clara de la distribución y uso de los recursos en función de las actividades realizadas bajo este convenio.

INFORME FINANCIERO

4. ADMINISTRATIVOS

4.1. ACTIVIDADES INICIALES DE ADMINISTRATIVOS

- **ACTIVIDADES DE PERSONAL TÉCNCO Y ADMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)**

En el presente cuadro se presenta las cantidades y valores iniciales del capítulo de administrativos.

CONVENIO 1732-24

ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.

ADMINISTRATIVOS ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DIAS TRABAJADOS	VALOR UNTARIO	COSTO TOTAL	PORCENTAJE FINANCIERO
4.1	PERSONAL TÉCNCO Y ARDMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)						
4.1.4	Ingeniero de produccion	MES	4,616	138 DÍAS	$ 6.504.120,00	$ 30.022.980,00	4,6730%
4.1.5	Ingeniero pesquero	MES	4,000	120 DÍAS	$ 6.892.140,00	$ 27.568.560,00	4,2910%
4.1.6	Medico veterinario	MES	4,000	120 DÍAS	$ 6.504.120,00	$ 26.016.480,00	4,0494%
4.1.9	Profesional residente	MES	4,000	120 DÍAS	$ 9.117.600,00	$ 36.470.400,00	5,6765%
4.1.10	Auxiliar Administrativo	MES	4,000	120 DÍAS	$ 2.566.500,00	$ 10.266.000,00	1,5979%
4.1.11	Ingeniero Ambiental o afines	MES	5,667	147 DÍAS	$ 6.504.120,00	$ 36.856.680,00	5,7366%
4.1.12	Ingeniero Ambiental o afines	MES	5,500	112 DÍAS	$ 6.504.120,00	$ 35.772.660,00	5,5679%
						$ 202.973.760,00	31,5223%

4.1.1 ACTIVIDADES FINALES Y DE LIQUIDACIÓN DE PERSONAL TÉCNCO Y ADMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)

En el presente cuadro se muestran las cantidades y actividades financieras correspondiente al periodo final de liquidación de personal técnico y administrativo observando que durante el periodo contemplado se evidencia una ejecución financiera de **30,8660%** del capítulo, llegando a un **97,7011%** financiero de las actividades contempladas. Dejando un saldo a favor correspondiente a **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CINCO MILESIMAS M/CTE ($ 4.666.063,45)** Donde se contempla un porcentaje financiero sin ejecución **0,7262%.**

CONVENIO 1732-24			Liquidacion 10%										
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.			(FECHA-30-12-24)										
ADMINISTRATIVOS ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE AVANCE FISICO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	CANTIDAD	VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
4.1	PERSONAL TÉCNCO Y ARDMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)												
4.1.4	Ingeniero de produccion	MES	0,3695	4,5089	7,7011%	97,7011%	$ 3.501.822,00	$ 29.332.796,55	0,10811	$ 680.183,46	4,9696%	E2400536-E2400634-E2403542	$ 680.183,46
4.1.5	Ingeniero pesquero	MES	0,3080	3,9080	7,7011%	97,7011%	$ 4.135.284,00	$ 28.934.800,00	0,09195	$ 633.760,00	4,6323%	E2400536-E2400634-E2403542	$ 633.760,00
4.1.6	Medico veterinario	MES	0,3080	3,9080	7,7011%	97,7011%	$ 2.003.568,00	$ 26.416.400,00	0,09195	$ 666.080,00	5,0000%	E2400536-E2400634-E2403542	$ 666.080,00
4.1.9	Profesional residente	MES	0,3080	3,9080	7,7011%	97,7011%	$ 2.880.374,26	$ 36.632.000,00	0,09195	$ 836.400,00	6,6455%	E2400536-E2400634	$ 836.400,00
4.1.10	Auxiliar Administrativo	MES	0,3080	3,9080	7,7011%	97,7011%	$ 717.901,15	$ 10.030.000,00	0,09195	$ 236.000,00	1,8811%	E2400536-E2400634	$ 236.000,00
4.1.11	Ingeniero Ambiental o afines	MES	0,4364	5,5364	7,7011%	97,7011%	$ 2.468.636,31	$ 36.008.400,00	0,13027	$ 847.280,00	5,8840%	E2400536-E2403542	$ 847.280,00
4.1.12	Ingeniero Ambiental o afines	MES	0,4236	5,3736	7,7011%	97,7011%	$ 2.406.584,55	$ 34.660.300,00	0,12644	$ 822.360,00	5,4399%	E2400536-E2403542-E2403494	$ 822.360,00
				31,0520	7,7011%	97,7011%	$ 17.794.170,26	$ 198.307.696,55		$ 4.666.063,46	30,8660%		$ 4.666.063,46

La anterior relación presenta los valores de cierre y liquidación del capítulo 4,1, donde se realiza el ajuste en el factor multiplicador, teniendo en cuenta los descuentos presentes en los procesos administrativos de la piscícola san Silvestre S.A (De acuerdo con el Articulo 25 de la ley 1706 del 2012); una vez realizado el ajuste del factor multiplicador este queda en 1.70, siendo menor al estipulado en el otrosí modificatorio N°2, que tiene por objeto ampliar los alcances de las actividades 1 y 3 del convenio interadministrativo N° 1732-24, por lo tanto, al realizar el cierre financiero se presenta un saldo a favor del distrito de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CINCO MILESIMAS M/CTE ($ 4.666.063,45)** como se muestra en el cuadro PERSONAL TÉCNCO Y ADMINISTRATIVO (Inc. Prest. Soc.)

4.1.2 PERSONAL TÉCNCO Y ADMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)

ADMINISTRATIVOS		UNIDAD	CANTIDAD	DIAS TRABAJADOS
ITEM	DESCRIPCION			
4,1	PERSONAL TÉCNCO Y ARDMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)			
4,1,4	Ingeniero de produccion	MES	4,616	138 DÍAS
4,1,5	Ingeniero pesquero	MES	4,000	120 DÍAS
4,1,6	Medico veterinario	MES	4,000	120 DÍAS
4,1,9	Profesional residente	MES	4,000	120 DÍAS
4,1,10	Auxiliar Administrativo	MES	4,000	120 DÍAS
4,1,11	Ingeniero Ambiental o afines	MES	5,667	147 DÍAS
4,1,12	Ingeniero Ambiental o afines	MES	5,500	112 DÍAS

4. ACTIVIDADES INICIALES DE OFICINA, PAPELERIA Y OTROS

4.2 OFICINA, PAPELERIA Y OTROS

En el presente cuadro se presenta las cantidades y valores iniciales del capítulo de oficina, papelería y otros

CONVENIO 1732-24

ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.

4,2	OFICINA, PAPELERIA Y OTROS	UNIDAD	CANT	VL UNT	COSTO TOTAL	
4,2,1	Arrendamiento oficina			$ -	$ -	
4,2,2	Costo papeleria, fotocopias, etc	MES	4,00000000	$ 2.657.337,00	$ 10.629.348,00	1,65442699780567%
4,2,3	Servicios publicos y operacionales	MES	4,00000000	$ 2.500.000,00	$ 10.000.000,00	1,55647081815899%
4,2,4	Alquiler de equipos de computo y comunicaciones	MES	4,00000000	$ 5.700.000,00	$ 22.800.000,00	3,54875345540251%
4,2,5	vehiculos)	MES	8,00000000	$ 19.230.000,00	$ 153.840.000,00	23,94474706555800%
4,2,6	Campamentos container incluye serv. públicos				$ -	
4,2,7	Polizas 0,7%				$ -	
					$ 197.269.348,00	30,70439834792519%

1.2.1. ACTIVIDADES FINALES Y DE LIQUIDACIÓN DE OFICINA, PAPELERIA Y OTROS

En el presente cuadro se muestran las cantidades y actividades financieras correspondiente al periodo final de liquidación de la actividad de oficina, papelería y otros, observando que durante el periodo contemplado se evidencia una ejecución financiera de **30,7043983479251%**, llegando a un **100%** de ejecutado de las actividades contempladas.

CONVENIO 1732-24			Liquidacion 10%										
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.			(FECHA-30-12-24)										
4.2	OFICINA, PAPELERIA Y OTROS	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE AVANCE FISICO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA	VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	CANTIDAD	VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
4.2.1	Arrendamiento oficina												$ -
4.2.2	Costo papeleria, fotocopias, etc	MES	0,40000	4,00000000	10,000000000000%	100,00%	$ 1.062.934,80	$ 10.629.348,00000	0,00000	$ -	1,85442699780567%		$ -
4.2.3	Servicios publicos y operacionales	MES	0,40000	4,00000000	10,000000000000%	100,00%	$ 1.000.000,00	$ 10.000.000,00000	0,00000	$ -	1,55847081815899%		$ -
4.2.4	Alquiler de equipos de computo y comunicaciones	MES	0,40000	4,00000000	10,000000000000%	100,00%	$ 2.280.000,00	$ 22.800.000,00000	0,00000	$ -	3,54870346540251%	CUENTA DE COBRO	$ -
4.2.5	vehiculos)	MES	1,53603	8,00000000	19,100350026575%	100,00%	$ 29.383.978,48	$ 153.840.000,00000	0,00000	$ -	23,94474708655800%	E2439512	$ -
4.2.6	Campamentos container incluye serv. públicos												
4.2.7	Polizas 0.7%												
					12,275087806643%	100,000%	$ 33.726.913,28	$ 197.269.348,00		$ -	30,7043983479251%		$ -

2. ACTIVIDADES INICIALES DE REPOBLAMIENTO DE ESPECIES NATIVAS ECOSISTEMICAS

2.1 REPOBLAMIENTO ICTICO

En el presente cuadro se presenta las cantidades y valores iniciales del capítulo de repoblamiento ictico.

CONVENIO 1732-24						
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.						
2	REPOBLAMIENTO ICTICO	UNIDAD	CANT	VL UNT	COSTO TOTAL	
2.1	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Bocachico (Prochilodus magdalenae)	UN	401145,50429799	$ 349,00	$ 139.999.781,00	21,78055736751500%
2.2	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Dorada (Brycon moorei)	UN	116603,19196429	$ 448,00	$ 52.238.230,00	8,13072805872777%
2.3	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Blanquillo (Sorubim cuspicaudus)	UN	16666,00000000	$ 3.000,00	$ 49.998.000,00	7,78204279663134%
					$ 242.236.011,00	37,70332822287410%

2.1.1 ACTIVIDADES FINALES Y DE LIQUIDACIÓN DE REPOBLAMIENTO DE ESPECIES NATIVAS ECOSISTEMICAS

- **REPOBLAMIENTO ICTICO**

En el presente cuadro se muestran las cantidades y actividades financieras correspondiente al periodo final de liquidación de repoblamiento ictico, observando que durante el periodo contemplado se evidencia una ejecución financiera de **37,7033148368266%** del capitulo, llegando a un **99,99996449637700% %** financiero de las actividades contempladas. Dejando un saldo a favor correspondiente a **OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 86,00)** Donde se contempla un porcentaje financiero sin ejecución **0,00001338604750%.**

CONVENIO 1732-24				Liquidacion 10%										
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.				(FECHA-30-12-24)										
2	REPOBLAMIENTO ICTICO	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE AVANCE FISICO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA	VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	CANTIDAD	VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
2.1	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Bocachico (Prochilodus magdalenae)	UNI	401145,50439799	0,0000000	401.145,50439799	0,0000000%	100,00%	$ -	$ 139.669.781,00000	0,00	$ -	21,79068736751507%	CANTIDADES EJECUTAS EN EL PERIODO	$ -
2.2	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Dorada (Brycon moorei)	UNI	116603,49199439	11660,1272264	116.602,99999439	9,9998354%	99,99954%	$ 5.223.737,00	$ 52.238.143,69744	0,79	$ 86,0026	0,13991467268004%	CANTIDADES EJECUTAS EN EL PERIODO	$ 86,00
2.3	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Blanquillo (Sorubim cuspicaudus)	UNI	1666,66666633	1666,6000000	16.666,00000000	10,0000005%	100,00%	$ 4.999.800,00	$ 49.998.000,00000	0,00	$ -	7,78235278995113%	SIN CANTIDADES EJECUTAS EN EL PERIODO	$ -
						0,0000112%	100,00%	$ 10.223.537,00	$ 242.235.924,9974		$ 86,0026	37,70331483682699%		$ 86,00

3. CONCLUSIONES

- La empresa Piscícola San Silvestre S.A. cumplió con los compromisos y el alcance establecido en el Convenio Interadministrativo No. 1732-24, suscrito con la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja.

- La ejecución financiera de los recursos entregados por la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja por parte de Piscícola San Silvestre S.A. alcanzó un total de **SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($637.812.970,00)** lo que representa el 99,27372745481% del monto total del aporte acordado en el convenio.

- En el apartado de Personal Técnico y Administrativo (incluidas las prestaciones sociales), se evidenció un saldo a favor de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CINCO MILESIMAS M/CTE ($ 4.666.063,45).**

- En el capítulo correspondiente a repoblamiento íctico, durante la ejecución del convenio, se generó un saldo a favor de **OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 86,00).**

- Como consecuencia de la no ejecución total de las actividades planificadas en el convenio, Piscícola San Silvestre S.A. procede a reintegrar un monto total de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CINCO MILESIMAS M/CTE ($ 4.666.063,45)** correspondiente, a un saldo no ejecutado de la contrapartida de la **Piscícola San Silvestre S.A.**

- A partir de la ejecución financiera reportada y los saldos a favor en los capítulos correspondientes, se concluye que **Piscícola San Silvestre S.A.** gestionó de manera adecuada los recursos del acuerdo de la contrapartida. Sin embargo, la no ejecución total de las actividades previstas en el convenio, específicamente en los capítulos de **Personal Técnico y Administrativo y Repoblamiento íctico**, resultó en un saldo no utilizado que dio lugar a un saldo a favor **de un total de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($4.666.235)**. Esta devolución corresponde a los recursos no invertidos debido a la no finalización de algunas de las actividades inicialmente planteadas en el proyecto.

4. ANEXO CUADRO RELACION FINANCIERA

CONVENIO 1732-24								Liquidacion 10%											
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.								(FECHA-30-12-24)											
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DIAS TRABAJADOS	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL	PORCENTAJE FINANCIERO	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE AVANCE FISICO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	CANTIDAD	VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
4.1	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)																		
4.1.4	Ingeniero de produccion	MES	4,610	138 DIAS	$ 6.504.120,00	$ 30.022.680,00	4,6730%	0,3855	4,5090	7,7011%	97,7011%	$ 3.591.822,00	$ 29.332.796,55	0,10811	$ 690.183,45	4,5090%	E2403539-E2500034-E2403542	$ 690.183,45
4.1.5	Ingeniero pesquero	MES	4,200	120 DIAS	$ 6.892.140,00	$ 27.568.560,00	4,2910%	0,3080	3,8080	7,7011%	97,7011%	$ 4.135.284,00	$ 26.934.800,00	0,09195	$ 633.760,00	4,1185%	E2500034-E2403542	$ 633.760,00
4.1.6	Medico veterinario	MES	4,200	120 DIAS	$ 6.504.120,00	$ 26.016.480,00	4,0494%	0,3080	3,8080	7,7011%	97,7011%	$ 2.003.568,00	$ 25.418.400,00	0,09195	$ 598.080,00	3,8868%	E2500034-E2403542	$ 598.080,00
4.1.9	Profesional residente	MES	4,200	120 DIAS	$ 9.117.800,00	$ 38.470.400,00	5,9765%	0,3080	3,8080	7,7011%	97,7011%	$ 2.950.374,25	$ 36.832.000,00	0,09195	$ 838.400,00	5,9468%	E2403539-E2500034	$ 838.400,00
4.1.10	Auxiliar Administrativo	MES	4,000	120 DIAS	$ 2.568.500,00	$ 10.266.000,00	1,5970%	0,3080	3,8080	7,7011%	97,7011%	$ 717.801,15	$ 10.030.000,00	0,09185	$ 236.000,00	1,6911%	E2403539-E2500034	$ 236.000,00
4.1.11	Ingeniero Ambiental o afines	MES	5,067	147 DIAS	$ 6.504.120,00	$ 36.856.680,00	5,7305%	0,4364	5,5364	7,7011%	97,7011%	$ 2.468.836,31	$ 36.009.400,00	0,13027	$ 847.280,00	6,0648%	E2500034-E2403542	$ 847.280,00
4.1.12	Ingeniero Ambiental o afines	MES	5,000	112 DIAS	$ 6.504.120,00	$ 35.772.660,00	5,5879%	0,4236	5,3736	7,7011%	97,7011%	$ 2.406.584,05	$ 34.950.300,00	0,12644	$ 822.360,00	5,4399%	E2500034-E2403542-E2403494	$ 822.360,00
						$ 202.975.760,00	31,5839%		31,8539	7,7011%	97,7011%	$ 17.704.170,28	$ 199.307.696,55		$ 4.668.063,45	30,0880%		$ 4.668.063,45

CONVENIO 1732-24								Liquidacion 10%											
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.								(FECHA-30-12-24)											
4.2	OFICINA PAPELERIA Y OTROS	UNIDAD	CANT		VL UNT	COSTO TOTAL		CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE AVANCE FISICO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA	VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	CANTIDAD	VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
4.2.1	Arrendamiento oficina				$ -	$ -												$ -
4.2.2	Costo papeleria, fotocopias, etc	MES	4,00000000		$ 2.667.337,00	$ 10.629.348,00	1,6644288978068%	0,4000	4,0000000	10,0000000000%	100,00%	$ 1.092.984,60	$ 10.629.348,00000	0,00000	$ -	1,6644288978068%		$ -
4.2.3	Servicios publicos y operacionales	MES	4,00000000		$ 2.500.000,00	$ 10.000.000,00	1,5664708181588%	0,4000	4,0000000	10,0000000000%	100,00%	$ 1.000.000,00	$ 10.000.000,00000	0,00000	$ -	1,5664708181588%		$ -
4.2.4	comunicaciones	MES	4,00000000		$ 5.700.000,00	$ 22.800.000,00	3,5487534854025%	0,4000	4,0000000	10,0000000000%	100,00%	$ 2.280.000,00	$ 22.800.000,00000	0,00000	$ -	3,5487534854025%		$ -
4.2.5	vehiculos	MES	8,00000000		$ 19.230.000,00	$ 153.840.000,00	23,9447470885500%	1,5360	8,0000000	19,1937500000%	100,00%	$ 20.360.975,40	$ 153.840.000,00000	0,00000	$ -	23,9447470885500%	E2403512	$ -
4.2.6	Campamentos contener incluye serv. públicos					$ -												
4.2.7	Polizas 0,7%					$ -												
						$ 197.269.348,00	30,7043883479261%			12,3730875068438%	100,000%	$ 33.736.913,20	$ 197.269.348,00		$ -	30,7043883479261%		$ -
3	REPOBLAMIENTO ICTICO	UNIDAD	CANT		VL UNT	COSTO TOTAL		CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE AVANCE FISICO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA	VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	CANTIDAD	VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
3.1	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Bocachico (Prochilodus magdalenae)	UN	401146,80439799		$ 349,00	$ 139.999.784,20	21,7908579676164%	0,0000000	401.146,80439799	0,0000000%	100,00%	$ -	$ 139.999.781,00000	0,00	$ -	21,7908579675165%	CANTIDADES EJECUTAS EN EL PERIODO	$ -
3.2	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Dorada (Brycon moorei)	UN	110000,12722854		$ 448,00	$ 92.256.256,00	8,6307363972727%	11000,1272254	110.922,99999429	9,9999954%	99,99994%	$ 5.223.737,00	$ 92.236.143,99744	0,19	$ 86,0039	8,6307363972727%	CANTIDADES EJECUTAS EN EL PERIODO	$ 86,00
3.3	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Blanquillo (Sorubim cuspicaudus)	UN	10000,00000000		$ 3.000,00	$ 49.999.000,00	7,7920427868834%	1000,0000000	10.000,0000000	100,0000000%	100,00%	$ 4.999.900,00	$ 49.999.000,00000	0,00	$ -	7,7920427868834%	CANTIDADES EJECUTAS EN EL PERIODO	$ -
						$ 242.256.011,00	37,7705382397410%			8,8998812%	100,00%	$ 10.223.537,00	$ 242.235.924,99744		$ 86,0039	37,7693148368888%		$ 86,00
						$ 642.479.119,00	100,000%			8,8998%	99,2382%	$ 61.734.628,54	$ 637.912.579		$ 4.668.149,45065049	99,2727245491%		$ 4.668.149,45

5. ANEXO CUADRO RELACION FINANCIERA CONSOLIDADO

CONVENIO 1732-24								CONSOLIDADO										
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.								(FECHA-30-12-24)										
ADMINISTRATIVOS																		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DIAS TRABAJADOS	VALOR UNTARIO	COSTO TOTAL	PORCENTAJE FINANCIERO	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE AVANCE FISICO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECICION FINANCIERA	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	CANTIDAD	VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
4,1	PERSONAL TÉCNCO Y ARDMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)																	
4,1,4	Ingeniero de produccion	MES	4,616	138 DÍAS	$ 6.504.120,00	$ 30.022.960,00	4,6730%	0,3695	4,5099	7,7011%	97,7011%	$ 3.501.822,00	$ 29.332.796,55	0,10911	$ 690.183,45	4,5695%	E2433542-E2433542	$ 690.183,45
4,1,5	Ingeniero pesquero	MES	4,000	120 DÍAS	$ 6.892.140,00	$ 27.568.560,00	4,2910%	0,3080	3,9080	7,7011%	97,7011%	$ 4.135.284,00	$ 26.934.800,00	0,09195	$ 633.760,00	4,1923%	E2433542-E2433542	$ 633.760,00
4,1,6	Medico veterinario	MES	4,000	120 DÍAS	$ 6.504.120,00	$ 26.016.480,00	4,0494%	0,3080	3,9080	7,7011%	97,7011%	$ 2.003.568,00	$ 25.418.400,00	0,09195	$ 598.080,00	3,9583%	E2433463-E2500034-E2433494-E2433542	$ 598.080,00
4,1,9	Profesional residente	MES	4,000	120 DÍAS	$ 9.117.600,00	$ 36.470.400,00	5,6765%	0,3080	3,9080	7,7011%	97,7011%	$ 2.550.374,25	$ 35.632.000,00	0,09195	$ 838.400,00	5,5480%	E2433442-E2500014	$ 838.400,00
4,1,10	Auxiar Administrativo	MES	4,000	120 DÍAS	$ 2.566.500,00	$ 10.266.000,00	1,5979%	0,3080	3,9080	7,7011%	97,7011%	$ 717.901,15	$ 10.030.000,00	0,09195	$ 236.000,00	1,5611%	E2433442-E2500014	$ 236.000,00
4,1,11	Ingeniero Ambiental o afines	MES	5,687	147 DÍAS	$ 6.504.120,00	$ 36.856.680,00	5,7366%	0,4364	5,5364	7,7011%	97,7011%	$ 2.488.636,31	$ 36.009.400,00	0,13027	$ 847.280,00	5,6046%	E2433494	$ 847.280,00
4,1,12	Ingeniero Ambiental o afines	MES	5,500	112 DÍAS	$ 6.504.120,00	$ 35.772.660,00	5,5679%	0,4236	5,3736	7,7011%	97,7011%	$ 2.406.984,55	$ 34.950.300,00	0,12644	$ 822.360,00	5,4399%	E2433405-E2433473-E2433493-E2433420-	$ 822.360,00
						$ 262.973.760,00	31,6823%		31,0520	7,7011%	97,7011%	$ 17.784.170,26	$ 198.367.696,55		$ 4.606.063,45	30,8888%		$ 4.606.063,45

5. ANEXO CUADRO RELACION FINANCIERA CONSOLIDADO

CONVENIO 1732-24							CONSOLIDADO										
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.							(FECHA-30-12-24)										
ADMINISTRATIVO																	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL	PORCENTAJE FINANCIERO	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE AVANCE FISICO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	CANTIDAD	VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO	SOPORTE CONTABLE	SALDO
4.1	PERSONAL TECNICO Y ARDMINISTRATIVO (Incl Prest. Soc.)																
4.1.4	Ingeniero de producción	MES	4.616	$ 6.504.120,00	$ 30.022.980,00	4,6730%	0,3846	4,5099	7,7011%	97,7011%	$ 3.501.622,00	$ 29.332.796,55	0,10611	$ 690.183,45	4,5999%	E2433169-E2433215-E2433248-E2433285-E2433323-E2433353-E2433397-E2433420-E2433475-E2433639-E2433261-E2433332-E2433376-E2433453-E2500034-E2433442-E2433542	$ 690.183,45
4.1.5	Ingeniero ambiental	MES	4.000	$ 6.892.140,00	$ 27.568.560,00	4,2910%	0,3850	3,9090	7,7011%	97,7011%	$ 4.135.284,00	$ 26.934.800,00	0,09195	$ 633.760,00	4,1992%	E2433169-E2433285-E2433323-E2433353-E2433397-E2433420-E2433475-E2433639-E2433453-E2433494-E2433542	$ 633.760,00
4.1.6	Medico veterinario	MES	4.200	$ 6.504.120,00	$ 28.018.480,00	4,0494%	0,3850	3,9090	7,7011%	97,7011%	$ 2.003.988,00	$ 26.418.400,00	0,09195	$ 599.080,00	3,9583%	E2433169-E2433215-E2433285-E2433323-E2433353-E2433397-E2433420-E2433475-E2433639-E2433376-E2433453-E2433494-E2433542	$ 599.080,00
4.1.9	Profesional residente	MES	4.000	$ 9.117.600,00	$ 36.470.400,00	5,8756%	0,3850	3,9090	7,7011%	97,7011%	$ 2.560.374,25	$ 35.832.000,00	0,09195	$ 638.400,00	5,5460%	E2433215-E2433248-E2433285-E2433353-E2433397-E2433420-E2433475-E2433639-E2433376-E2433453-E2433494-E2433442-E2500014	$ 638.400,00
4.1.10	Auxiliar Administrativo	MES	4.000	$ 2.568.500,00	$ 10.298.000,00	1,6679%	0,3850	3,9090	7,7011%	97,7011%	$ 717.901,15	$ 10.030.000,00	0,09195	$ 268.000,00	1,6611%	E2433215-E2433248-E2433285-E2433353-E2433397-E2433420-E2433475-E2433639-E2433376-E2433453-E2433494-E2433442-E2500014	$ 234.000,00
4.1.11	Ingeniero Ambiental o afines	MES	5.667	$ 6.504.120,00	$ 36.856.660,00	5,7356%	0,4384	5,5384	7,7011%	97,7011%	$ 2.460.636,31	$ 36.009.400,00	0,13027	$ 847.260,00	5,6048%	E2433215-E2433248-E2433285-E2433353-E2433397-E2433420-E2433475-E2433161-E2433261-E2433332-E2433376-E2433453-E2433642-E2433494	$ 847.260,00
4.1.12	Ingeniero Ambiental o afines	MES	5.500	$ 6.504.120,00	$ 35.772.660,00	5,5679%	0,4226	5,3726	7,7011%	97,7011%	$ 2.406.564,55	$ 34.950.300,00	0,12644	$ 822.360,00	5,4399%	E2433169-E2433110-E2433143-E2433169-E2433206-E2433215-E2433248-E2433285-E2433323-E2433135-E2433161-E2433285-E2433261-E2433332-E2433376-E2433453-E2433397-E2500014-E2500034-E2433494-E2433206-E2433475-E2433453-E2433420	$ 822.360,00
					$ 202.975.760,00	31,5323%		21,0520	7,7011%	97,7011%	$ 17.784.170,26	$ 199.307.636,55		$ 4.466.043,45	30,8668%		$ 4.466.043,45

CONVENIO 1732-24							CONSOLIDADO									
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.							(FECHA-30-12-24)									
4.2	OFICINA, PAPELERIA Y OTROS	UNIDAD	CANT	VL UNT	COSTO TOTAL		CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE AVANCE FISICO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA	VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	CANTIDAD	VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
4.2.1	Arrendamiento oficina			$ -	$ -												$ -
4.2.2	Costo papeleria, fotocopias, etc	MES	4,00000000	$ 2.657.337,00	$ 10.629.348,00	1,65442699780567%	0,40000	4,00000000	10,00000000000%	100,00%	$ 1.062.934,80	$ 10.629.348,00000	0,00000	$ -	1,65442699780567%	E2433137	$ -
4.2.3	Servicios publicos y operacionales	MES	4,00000000	$ 2.500.000,00	$ 10.000.000,00	1,55547039181588%	0,40000	4,00000000	10,00000000000%	100,00%	$ 1.000.000,00	$ 10.000.000,00000	0,00000	$ -	1,55547039181588%	E2433275-E2433253-E2433331-E2433361-E2433430	$ -
4.2.4	Alquiler de equipos de computo y comunicaciones	MES	4,00000000	$ 5.700.000,00	$ 22.800.000,00	3,54678346840251%	0,40000	4,00000000	10,00000000000%	100,00%	$ 2.280.000,00	$ 22.800.000,00000	0,00000	$ -	3,54678346840251%	E2433394-E2433343-E2433435-E2500016	$ -
4.2.5	Alquiler de camioneta (sola trabla * 5 vehiculos)	MES	8,00000000	$ 19.230.000,00	$ 153.840.000,00	23,94474708858800%	1,52803	8,00000000	19,10000000000%	100,00%	$ 29.383.978,48	$ 153.840.000,00000	0,00000	$ -	23,94474708858800%	E2433191-E2433393-E2433347-E2433410-E2433512	$ -
4.2.6	Campamentos container incluye serv. públicos			-	$ -												
4.2.7	Polizas 0,7%				$ -												
					$ 197.269.348,00	30,70439834792251%			12,27556759664390%	100,000%	$ 33.726.913,28	$ 197.269.348,00		$ -	30,70439834792251%		$ -
2	REPOBLAMIENTO ICTICO	UNIDAD	CANT	VL UNT	COSTO TOTAL		CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE AVANCE FISICO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA	VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	CANTIDAD	VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
2.1	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Bocachico (Prochilodus magdalenae)	UN	401146,90429799	$ 349,00	$ 139.999.781,00	21,79055736751500%	0,0000000	401.146,90429799	0,00000000%	100,00%	$ -	$ 139.999.781,00000	0,00	$ -	21,79055736751500%	CERTIFICADO	$ -
2.2	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Dorada (Brycon moorei)	UN	116602,99999429	$ 448,00	$ 52.238.230,00	8,13072505872777%	1680,1272264	116.602,99999429	0,00582514%	100,00%	$ 5.223.737,00	$ 52.238.143,99744	0,19	$ 85,003	8,13071497265056%	CERTIFICADO	$ 85,003
2.3	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Blanquillo (Sorubim cuspicaudus)	UN	16666,00000000	$ 3.000,00	$ 49.998.000,00	7,78204278983134%	1666,6000000	16.666,00000000	10,00000000%	100,00%	$ 4.999.800,00	$ 49.998.000,00000	0,00	$ -	7,78204278983134%	CERTIFICADO	$ -
					$ 242.236.011,00	37,70332822287410%			6,666912%	100,00%	$ 10.223.537,00	$ 242.236.924,9974		$ 85,003	37,70331483682680%		$ 85,003
					$ 642.479.119,00	100,000%			0,0000%	99,9337%	$ 61.734.620,54	$ 637.812.970,00		$ 4.666.149,45665840	99,27372745481%		$ 4.666.149,45

ACCIÓN	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Contadora Piscicola San Silvestre S.A CPS	Eliana Andrea Jiménez Mahecha	
Aprobó	Gerente Encargado Piscicola San Silvestre S.A	José de Jesús Quicano Flórez	

PISCÍCOLA
SAN SILVESTRE
Alimento para el mundo



"Aunar esfuerzos entre el distrito de Barrancabermeja y la Piscícola San Silvestre S.A para la recuperación y conservación ambiental de conexiones hídricas en áreas urbanas y rurales, en el distrito de Barrancabermeja."

Convenio 1732-24
Informe final y de liquidación

El presente documento consta de:

Información del presupuesto mediante actividades y rubros durante el periodo ejecutado.

INTRODUCIÓN

En busca de fortalecer la conservación ambiental y garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos en el Distrito de Barrancabermeja, el Convenio No. 1732-2024 establece una alianza estratégica entre el Distrito de Barrancabermeja y la empresa Piscícola San Silvestre S.A. El propósito de este convenio es aunar esfuerzos para la recuperación y conservación de las conexiones hídricas en las áreas tanto urbanas como rurales del distrito, con el fin de mejorar la calidad del agua y promover la preservación de los ecosistemas acuáticos en la región.

El periodo de ejecución de las actividades contempladas en este acuerdo está comprendido entre el 21 de junio al 30 de diciembre de 2024. En este contexto, el presente documento tiene como objetivo proporcionar información detallada sobre el presupuesto asignado, desglosado por actividades y rubros, durante el periodo ejecutado. De esta manera, se busca ofrecer una visión clara de la distribución y uso de los recursos en función de las actividades realizadas bajo este convenio.

INFORME FINANCIERO

1. OBRAS DE CONECTIVIDAD HIDRICA

1.1. ACTIVIDADES INICIALES LIMPIEZA MANUAL Y ROCERIA EN CAÑOS URBANOS

- **CAÑOS URBANOS**

En el presente cuadro se presenta las cantidades y valores iniciales del capítulo de rocería manual de caños urbanos.

CONVENIO 1732-24						
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO						
URBANOS			CANTIDAD	VALOR UNTARIO	COSTO TOTAL	PORCENTAJE FINANCIERO
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD				
1.1.1	Limpieza de caños de 0 a 5 metros de ancho	ML	25801,000473	$ 38.175,00	$ 984.953.193,000000	7,01511141807412%
1.1.2	Limpieza de caños de 5 a 10 metros de ancho	ML	8164,00000000	$ 51.689,00	$ 421.988.996,00	3,005523353982 60%
1.1.3	Rocería menor a un metro de alto	M2	103204,00189147	$ 3.903,00	$ 402.805.219,00	2,868891142390 30%
1.1.4	Rocería mayor a un metro de alto	M2	40329,00000000	$ 5.294,00	$ 213.501.726,00	1,52061885426177%
					$ 2.023.249.134,00	14,410144768708 80%

1.1.1 ACTIVIDADES FINALES Y DE LIQUIDACIÓN DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERIA EN CAÑOS URBANOS

- **CAÑOS URBANOS**

En el presente cuadro se muestran las cantidades y actividades financieras correspondiente al periodo final de liquidación de la actividad de limpieza manual y rocería, observando que durante el periodo contemplado se evidencia una ejecución financiera de **14,410144590651 80%** del capítulo, llegando a un **99,99999876436380%** de ejecutado de las actividades contempladas. Dejando un saldo a favor de la actividad correspondiente a **VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 25,00)**. Donde se contempla un porcentaje financiero sin ejecución **0,00000017805697%**

CONVENIO 1732-24			Liquidacion 10%										
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO			FECHA (30-12-24)										
URBANOS			CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	TERMINO		% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE SOPORTE CONTABLE	SALDO $
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD							CANTIDAD	VALOR			
1.1.1	Limpieza de caños de 0 a 5 metros de ancho	ML	0,00000	25.801,00000000	0,00000000000000%	99,99999817%	$ -	$ 984.953.175,00000	0,00	$ 18,00	7,01511238807310%	SIN OBSERVACIONES O NOVEDADES EN EL PERIODO	$ 18,00
1.1.2	Limpieza de caños de 5 a 10 metros de ancho	ML	0,00000	8.164,00000000	0,00000000000000%	100,000%	$ -	$ 421.988.996,00000	0,00	$ -	3,00552335398260%		$ -
1.1.3	Rocería menor a un metro de alto	M2	0,00000	103.204,00000000	0,00000000000000%	99,999999%	$ -	$ 402.805.212,00000	0,00	$ 7,00	2,86889108283435%		$ 7,00
1.1.4	Rocería mayor a un metro de alto	M2	0,00000	40.329,00000000	0,00000000000000%	100,000%	$ -	$ 213.501.726,00000	0,00	$ -	1,52061885426177%		$ -
					0,00000000000000%	99,999999%	$ -	$ 2.023.349.109,00000000		$ 25,00	14,41014459065180%		$ 25,00

1.2. ACTIVIDADES INICIALES LIMPIEZA MANUAL Y ROCERIA EN CAÑOS RURAL

- **CAÑOS RURALES**

En el presente cuadro se presenta las cantidades y valores iniciales del capítulo de rocería manual de caños rurales.

ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO						
RURAL			CANTIDAD	VL UNT	COSTO TOTAL	PORCENTAJE FINANCIERO
ITEM	DESCRIPCION	UNDAD				
1.2.1	Limpieza de caños rurales mayores a 10 metros de ancho	ML	40440,00000000	$ 59.975,00	$ 2.425.928.775,00	17,27814150954960%
1.2.2	Limpieza, desfronque y rocería mayor a 1 metro de alto	M2	159303,00000000	$ 6.552,00	$ 1.043.753.256,00	7,433901870520 30%
					$ 3.469.682.031,00	24,712043380070 20%

1.2.1 ACTIVIDADES FINALES Y DE LIQUIDACIÓN DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERIA EN CAÑOS URBANOS.

- **CAÑOS RURALES**

En el presente cuadro se muestran las cantidades y actividades correspondiente al periodo final de liquidación de la actividad de limpieza manual y rocería rural, observando que durante el periodo contemplado se evidencia una ejecución financiera de **24,712043380070 20%**, llegando a un **100%** de ejecutado de las actividades contempladas.

CONVENIO 1732-24			Liquidacion 10%										
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO			FECHA (30-12-24)										
RURAL			CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERENCIA		% DE AVANCE FISICO/FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
ITEM	DESCRIPCION	UNDAD							CANTIDAD	VALOR			
1.2.1	Limpieza de caños rurales mayores a 10 metros de ancho	ML	0,00	40.440,00	0,00000000000000%	100,00%	$ -	$ 2.425.928.775,00	0,00	$ -	17,27814150954960%	SIN CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	$ -
1.2.2	Limpieza, desfronque y rocería mayor a 1 metro de alto	M2	00/11,00000	159.303,00	00,00700[illegible]%	100,00%	$ 581.240.151,00	$ 1.043.753.256,00	0,00	$ -	7,43390187052030%	FACTURA-INCO2	$ -
					27,0[illegible]%	100,00%	$ 581.240.151,00	$ 3.469.682.031,00			24,71204338007020%		

2. ACTIVIDADES INICIALES MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HIDRICA EN CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS

2.1 LIMPIEZA MANUAL.

En el presente cuadro se presenta las cantidades y valores iniciales del capítulo de Mejoramiento de la movilidad hídrica en cuerpos lenticos y loticos de los trabajos de limpieza manual.

CONVENIO 1732-24						
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO						
ITEM	LIMPIEZA MANUAL DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNT	COSTO TOAL	PORCENTAJE FINANCIERO
2.1	Limpieza y Retiro del Material Emergente, flotante y medial que se encuentre en el espejo de agua y laderas (Incluye cargue, transporte y disposicion final en sitio autorizado)	M2	240,000	$ 5.060,00	$ 1.214.400.000,00	8,649295587500280%
					$ 1.214.400.000,00	8,649295587500280%

2.1.1 ACTIVIDADES FINALES Y DE LIQUIDACIÓN MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HIDRICA EN CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS

- **LIMPIEZA MANUAL**

En el presente cuadro se muestran las cantidades y actividades financieras correspondiente al periodo final de liquidación de mejoramiento de la movilidad hídrica en cuerpos lenticos y loticos de los trabajos de limpieza manual, observando que durante el periodo contemplado se evidencia una ejecución financiera de **8,649295587500280%** del capítulo, llegando a un **100%** de ejecutado de las actividades contempladas.

CONVENIO 1732-24			Liquidacion 10%										
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO			FECHA (30-12-24)										
ITEM	LIMPIEZA MANUAL DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERENCIA CANTIDAD	DIFERENCIA VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
2.1	Limpieza y Retiro del Material Emergente, flotante y medial que se encuentre en el espejo de agua y laderas (Incluye cargue, transporte y disposicion final en sitio autorizado)	M2	143943,02747	240.000,00000000	59,976613630433080%	100,00000%	$ 728.356.964,7136520	$ 1.214.400.000,00000	0,00000	0,00000	8,649295587500280%	FACTURA-NC22 FACTURA-NC23	$ -
											8,649295587500280%		

2.2 VALLA INFORMATIVAS.

En el presente cuadro se presenta las cantidades y valores iniciales del capítulo de Mejoramiento de la movilidad hídrica en cuerpos lenticos y loticos de los trabajos de vallas informativas.

CONVENIO 1732-24						
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO						
2.1	VALLAS INFORMATIVAS	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNT	COSTO TOTAL	PORCENTAJE FINANCIERO
2.1.1	Suministro e instalacion de valla con enfoque en la conservacion de cuerpos hidricos en el perimetro urbano (De acuerdo a especificaciones)	UN	10,00000000	$ 1.424.334,00	$ 14.243.340,00	0,10144504101882890%
2.1.2	Suministro e instalacion de valla con enfoque en la conservacion de cuerpos hidricos en zona rural (De acuerdo a especificaciones)	UN	5,00000000	$ 1.749.334,00	$ 8.746.670,00	0,06229623944137979%
					$ 22.990.010,00	0,16374126486296670%

2.2.1 ACTIVIDADES FINALES Y DE LIQUIDACIÓN DE VALLA INFORMATIVAS.

En el presente cuadro se muestran las cantidades y actividades financieras correspondiente al periodo final de liquidación de mejoramiento de la movilidad hídrica en cuerpos lenticos y loticos de los trabajos de vallas informativas, observando que durante el periodo contemplado se evidencia una ejecución financiera de **0,16374126486296670%** del capítulo, llegando a un **100%** de ejecutado de las actividades contempladas.

CONVENIO 1732-24			Liquidacion 10%										
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO			FECHA (31-12-24)										
2.1	VALLAS INFORMATIVAS	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERENCIA CANTIDAD	DIFERENCIA VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
2.1.1	Suministro e instalacion de valla con enfoque en la conservacion de cuerpos hidricos en el perimetro urbano (De acuerdo a especificaciones)	UN	0,00000	10,00000000	0%	100,00%	$ -	$ 14.243.340,00000	0,00	$ -	0,10144504101882890%	SIN CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	$ -
2.1.2	Suministro e instalacion de valla con enfoque en la conservacion de cuerpos hidricos en zona rural (De acuerdo a especificaciones)	UN	0,00000	5,00000000	0%	100,00%	$ -	$ 8.746.670,00000	0,00	$ -	0,06229623944137979%	SIN CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	$ -
					0,00000000%	100,00%	$ -	$ 22.990.010,00		$ -	0,16374126486296670%		

3. ACTIVIDADES INICIALES DE LIMPIEZA MECANICA EN CAÑOS URBANOS

3.1 LIMPIEZA MECANICA

En el presente cuadro se presenta las cantidades y valores iniciales del capítulo de Mejoramiento de la Remoción de sedimentos de los trabajos de limpieza manual

CONVENIO 1732-24						
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO						
3.1	LIMPIEZA MECANICA	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNT	COSTO TOTAL	PORCENTAJE FINANCIERO
3.1.1	Remoción de sedimentos	UN	17160,61887965	$ 185.023,00	$ 3.175.109.167	22,61401340657 99%

3.1.1 ACTIVIDADES FINALES, Y DE LIQUIDACIÓN DE LIMPIEZA MECANICA

En el presente cuadro se muestran las cantidades y actividades financieras correspondiente al periodo final de liquidación de limpieza mecánica observando que durante el periodo contemplado se evidencia una ejecución financiera de **22,5947488598617%** del capítulo, llegando a un **99,91481146503320%** de ejecutado de las actividades contempladas. Dejando un saldo a favor de la actividad correspondiente a **DOS MILLONES SETESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($2.704.829,00).** Donde se contempla un porcentaje financiero sin ejecución **0,0192645467183%**

CONVENIO 1732-24			Liquidacion 10%										
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO			FECHA (30-12-24)										
3.1	LIMPIEZA MECANICA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECICION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERECIA		% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
									CANTIDAD	VALOR			
3.1.1	Remoción de sedimentos	UN	0,00000	17.146,00000000	0%	99,91481146503672%	$ -	$ 3.172.404.308,09908	14,61887965511015	$ 2.704.829,00	22,5947488598617%	SIN CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	$ 2.704.829,00
											22,5947488598617%		

4. ACTIVIDADES INICIALES DE ADMINISTRATIVOS

4.1 ACTIVIDADES DE PERSONAL TÉCNCO Y ADMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)

En el presente cuadro se presenta las cantidades y valores iniciales del capítulo de administrativos.

CONVENIO 1732-24							
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO							
4,1	PERSONAL TÉCNCO Y ADMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)	UNIDAD	CANT	DÍAS TRABAJADOS	VL UNT	COSTO TOTAL	PORCENTAJE FINANCIERO
4,1,1	Coordinador	MES	4,300	129 DÍAS	$ 13.311.000,00	$ 57.237.300,0000000	0,4077%
4,1,2	Abogado	MES	4,000	120 DÍAS	$ 11.334.360,00	$ 45.337.440,0000000	0,3229%
4,1,3	Ingeniero Ambiental o afines	MES	4,930	147 DÍAS	$ 6.504.120,00	$ 32.064.465,9993588	0,2284%
4,1,7	Contador	MES	5,900	177 DÍAS	$ 6.892.140,00	$ 40.663.626,00	0,2896%
4,1,8	Coordinador de produccion	MES	4,000	120 DÍAS	$ 9.117.600,00	$ 36.470.400,00	0,2598%
						$ 211.773.232,00	1,5083%

4.1.1 ACTIVIDADES FINALES Y DE LIQUIDACIÓN DE PERSONAL TÉCNCO Y ADMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)

En el presente cuadro se muestran las cantidades y actividades financieras correspondiente al periodo final de liquidación de personal técnico y administrativo observando que durante el periodo contemplado se evidencia una ejecución financiera de **1,4680%** del capítulo, llegando a un **97,3302%** financiero de las actividades contempladas. Dejando un saldo a favor correspondiente a **CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($ 5.653.873,00)** donde se contempla un porcentaje financiero sin ejecución **0,0402%**

CONVENIO 1732-24				Liquidacion 10%										
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO				FECHA (30-12-24)										
4,1	PERSONAL TÉCNCO Y ADMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERENCIA CANTIDAD	DIFERENCIA VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
4,1,1	Coordinador	MES	4,300	0,07547	4,1421	0,7319%	99,3289%	$ 4.997.877,16	$ 55.135.977,16	0,1579	$ 2.101.322,84	0,3827%	E2433538	$ 2.101.322,84
4,1,2	Abogado	MES	4,000	0,08080	3,9080	0,7651%	97,7011%	$ 346.872,94	$ 44.295.200,00	0,0920	$ 1.042.240,00	0,3155%	E2433507	$ 1.042.240,00
4,1,3	Ingeniero Ambiental o afines	MES	4,930	0,08323	4,8185	1,6878%	97,7011%	$ 543.383,84	$ 31.327.351,84	0,1133	$ 737.114,16	0,2234%	E2433494-E2433542-E2433538	$ 737.114,16
4,1,7	Contador	MES	5,900	0,36437	5,7644	6,1757%	97,7011%	$ 2.511.274,00	$ 39.728.830,00	0,1358	$ 934.796,00	0,2830%	E2433540	$ 934.796,00
4,1,8	Coordinador de produccion	MES	4,000	0,03246	3,9080	0,8114%	97,7011%	$ 295.912,94	$ 35.832.000,00	0,0920	$ 838.400,00	0,2539%	E2433494	$ 838.400,00

La anterior relación presenta los valores de cierre y liquidación del capítulo 4,1, donde se realiza el ajuste en el factor multiplicador, teniendo en cuenta los descuentos presentes en los procesos administrativos de la piscícola san Silvestre S.A (De acuerdo con el Articulo 25 de la ley 1706 del 2012); una vez realizado el ajuste del factor multiplicador este queda en 1.70, siendo menor al estipulado en el otrosí modificatorio N°2, que tiene por objeto ampliar los alcances de las actividades 1 y 3 del convenio interadministrativo N° 1732-24, por lo tanto, al realizar el cierre financiero se presenta un saldo a favor del distrito de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($ 5.653.873,00)** como se muestra en el cuadro PERSONAL TÉCNCO Y ADMINISTRATIVO (Inc. Prest. Soc.)

4.1.2 PERSONAL TÉCNCO Y ADMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)

4,1	PERSONAL TÉCNCO Y ADMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)	UNIDAD	CANT	DÍAS TRABAJADOS
4,1,1	Coordinador	MES	4,300	129 DÍAS
4,1,2	Abogado	MES	4,000	120 DÍAS
4,1,3	Ingeniero Ambiental o afines	MES	4,930	147 DÍAS
4,1,7	Contador	MES	5,900	177 DÍAS
4,1,8	Coordinador de produccion	MES	4,000	120 DÍAS

5. ACTIVIDADES INICIALES DE REPOBLAMIENTO DE ESPECIES NATIVAS ECOSISTEMICAS

5.1 REPOBLAMIENTO ICTICO

En el presente cuadro se presenta las cantidades y valores iniciales del capítulo de repoblamiento ictico.

ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO					
2	REPOBLAMIENTO ICTICO	UNIDAD	CANT	COSTO TOTAL	PORCETAJE FINANCIERO
2.1	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Bocachico (Prochilodus magdalenae)	UN	2099809,49670000	$ 732.833.514,00	5,21944472908965%
2.2	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Dorada (Brycon moorei)	UN	540001,99996000	$ 241.920.895,98	1,72302811111818%
2.3	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Blanquillo (Sorubim cuspicaudus)	UN	430114,00000000	$ 1.290.342.000,00	9,19017569743600%
				$ 2.265.096.409,98	16,13264853764380%

5.1 ACTIVIDADES FINALES Y DE LIQUIDACIÓN DE REPOBLAMIENTO DE ESPECIES NATIVAS ECOSISTEMICAS

- **REPOBLAMIENTO ICTICO**

  En el presente cuadro se muestran las cantidades y actividades financieras correspondiente al periodo final de liquidación de repoblamiento ictico, observando que durante el periodo contemplado se evidencia una ejecución financiera de **16,13264853764380%** del capítulo, llegando a un **100%** de ejecución de las actividades contempladas.

CONVENIO 1732-24			Liquidacion 10%										
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO			FECHA (30-12-24)										
2	REPOBLAMIENTO ICTICO	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECICION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERECIA CANTIDAD	DIFERECIA VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
2.1	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Bocachico (Prochilodus magdalenae)	UN	0,0000000	2.099.809,49570000	0,0000000%	100,00%	$ -	$ 732.833.513,99930	0,00	$ -	5,219444720089%	SIN CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	$ -
2.2	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Dorada (Brycon moorei)	UN	0,0000000	540.001,99998000	0,0000000%	100,00%	$ -	$ 241.920.895,98208	0,00	$ -	1,723028111118186%	SIN CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	$ -
2.3	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Blanquillo (Sorubim cuspicaudus)	UN	0,0000000	430.114,00000000	0,0000000%	100,00%	$ -	$ 1.290.342.000,00000	0,00	$ -	9,190175997439000%	SIN CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	$ -
					0,000000%	100,00%	$ -	$ 2.265.096.409,9814		$ -	16,132648537643800%		$ -

6. ACTIVIDADES INICIALES DE MONITOREOS PARCITIPATIVOS.

6.1 MONITOREOS PARCITIPATIVOS.

En el presente cuadro se presenta las cantidades y valores iniciales del capítulo de monitoreos participativos.

CONVENIO 1732-24						
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO						
3	MONITOREOS PARCITIPATIVOS	UNIDAD	CANT	VL UNT	COSTO TOTAL	PORCETAJE FINANCIERO
3.1	Formación de monitores ambientales participativos	MES	120,00000000	$ 129.000,00	$ 15.480.000	0,110252878536318O%
3.2	Monitoreos ambientales (incluye transporte)	MES	480,00000000	$ 3.087.046,00	$ 1.481.782.080	10,553665354233400O%
3.3	Monitoreo fisicoquimico del agua.	UN	12,00000000	$ 695.294,15	$ 8.343.530	0,059424968736142%
3.4	Vigias ambientales	UND	68,00000000	$ 2.243.296,00	$ 152.544.128	1,086461835646800%
					$ 1.658.149.738	11,809805015290100%

6.2 ACTIVIDADES FINALES Y DE LIQUIDACIÓN MONITOREOS PARCITIPATIVOS.

- **MONITOREOS PARCITIPATIVOS.**

  En el presente cuadro se muestran las cantidades y actividades financieras correspondiente al periodo final de liquidación de monitoreo participativos, observando que durante el periodo contemplado se evidencia una ejecución financiera de **11,8098050152901000%** del capítulo, llegando a un **100%** de ejecución de las actividades contempladas.

CONVENIO 1732-24			Liquidacion 10%										
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO			FECHA (30-12-24)										
									DIFERECIA				
3	MONITOREOS PARCITIPATIVOS	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	CANTIDAD	VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO REAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
3.1	Formación de monitores ambientales participativos	MES	0,0000000	120,00000000	0,00000000%	100,00%	$ -	$ 15.480.000,00000	$ -	$ -	0,1 [illegible]	CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	$ -
3.2	Monitoreos ambientales (incluye transporte)	MES	15,0000000	480,00000000	3,12500000%	100,00%	$ 46.305.852,00	$ 1.481.782.080,00000	$ -	$ -	10,8[illegible]	E2435485-E2435486-E2435505-E2435483-E2435518-E2435478-E2435543-E2435478	$ -
3.3	Monitoreo fisicoquímico del agua.	UN	4,0000000	12,00000000	33,33333333%	100,00%	$ 4.171.765	$ 8.343.530	$ -	$ -	0,0[illegible]	FACTURA-PELA-1065	$ -
3.4	Vigias ambientales	UND	12,0000000	48,00000000	17,64705882%	100,00%	$ 26.919.562,00	$ 152.544.128,00000	$ -	$ -	1,0[illegible]	E2435482-E2435516-E2435481-E2435505-E2435541	$ -
					17,65%	100,00%	$ 77.397.006,80	$ 1.858.149.738		$ -	11,8098050152901000%		$ 8.358.727,06

7. CONCLUSIONES

- La empresa Piscícola San Silvestre S.A. cumplió con los compromisos y el alcance establecido en el Convenio Interadministrativo No. 1732-24, suscrito con la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja.

- La ejecución financiera de los recursos entregados por la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja por parte de Piscícola San Silvestre S.A. alcanzó un total de **CATORCE MIL TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL QUINCE PESOS M/CTE (14.032.091.015,00),** lo que representa el **99,9404668128713%** del monto total del aporte acordado en el convenio.

- En el capítulo correspondiente a Caños Urbanos, durante la ejecución del convenio, se generó un saldo a favor de **VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 25,00).**

- En el capítulo correspondiente a Limpieza Mecánica, durante la ejecución del convenio, se generó un saldo a favor de **DOS MILLONES SETESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($2.704.829,00).**

- En el apartado de Personal Técnico y Administrativo (incluidas las prestaciones sociales), se evidenció un saldo a favor de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES M/CTE ($5.653.873,00).**

- Como consecuencia de la no ejecución total de las actividades planificadas en el convenio, Piscícola San Silvestre S.A. procede a devolver un monto total de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS VEINTISIETE M/CTE ($8.358.727,00)** a la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, correspondiente a los recursos no utilizados debido a la no finalización de las actividades previstas.

- A partir de la ejecución financiera reportada y los saldos a favor en los capítulos correspondientes, se concluye que **Piscícola San Silvestre S.A.** gestionó de manera adecuada los recursos asignados. Sin embargo, la no ejecución total de las actividades previstas en el convenio, específicamente en los capítulos de **limpieza manual y rocería en caños urbanos, Limpieza Mecánica y Personal Técnico y Administrativo**, resultó en un saldo no utilizado que dio lugar a la **devolución de un total de OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS VEINTISIETE M/CTE ($8.358.727,00).** Esta devolución corresponde a los recursos no invertidos debido a la no finalización de algunas de las actividades inicialmente planteadas en el proyecto.

CONVENIO 1732-24

ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO

Liquidacion 10%

FECHA (06-12-24)

								CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERECIA CANTIDAD	DIFERECIA VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
4.1	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)	UNIDAD	CANT	VL UNT	COSTO TOTAL	PORCENTAJE FINANCIERO												
4.1.1	Coordinador	MES	4,200	$ 13.311.000,00	$ 57.237.300,0000000	0,4077%		0,37547	4,1421	0,7310%	90,3368%	$ 4.867.877,16	$ 55.135.977,16	0,1579	$ 2.101.322,84	0,3927%	E24333538	$ 2.101.322,84
4.1.2	Abogado	MES	4,000	$ 11.334.360,00	$ 45.337.440,0000000	0,3229%		0,00000	3,8580	0,7031%	97,7011%	$ 346.872,84	$ 44.295.200,00	0,0000	$ 1.042.240,00	0,3167%	E24333538	$ 1.042.240,00
4.1.3	Ingeniero Ambiental o afines	MES	4,000	$ 8.504.120,00	$ 32.784.480,0000000	0,2334%		0,00001	4,0000	1,0001%	97,7011%	$ 541.183,84	$ 31.327.381,84	0,1633	$ 737.114,16	0,2231%	E24333494-E24333495-E24333538	$ 737.114,16
4.1.4	Ingeniero de produccion		PISCICOLA									$ -	$ -		$ -		APORTE PISCICOLA	$ -
4.1.5	Ingeniero pesquero	MES	PISCICOLA									$ -	$ -		$ -		APORTE PISCICOLA	$ -
4.1.6	Medico veterinario	MES	PISCICOLA									$ -	$ -		$ -		APORTE PISCICOLA	$ -
4.1.7	Contador	MES	5,000	$ 6.892.140,00	$ 40.663.626,00	0,2896%		0,30437	5,7644	6,1757%	97,7011%	$ 2.111.274,00	$ 39.728.930,00	0,1356	$ 934.706,00	0,2830%	E2433540	$ 934.706,00
4.1.8	Coordinador de produccion	MES	4,000	$ 9.117.600,00	$ 36.470.400,00	0,2598%		0,03248	3,9080	0,8114%	97,7011%	$ 295.912,84	$ 35.832.000,00	0,0920	$ 638.400,00	0,2539%	E2433494	$ 638.400,00
4.1.9	Profesional residente	MES	PISCICOLA									$ -	$ -		$ -		APORTE PISCICOLA	$ -
4.1.10	Auxiliar Administrativo	MES	PISCICOLA									$ -	$ -		$ -		APORTE PISCICOLA	$ -
4.1.11	Ingeniero Ambiental o afines	MES	PISCICOLA									$ -	$ -		$ -		APORTE PISCICOLA	$ -
4.1.12	Ingeniero Ambiental o afines	MES	PISCICOLA									$ -	$ -		$ -		APORTE PISCICOLA	$ -
					$ 211.773.252,00	1,5083%												
					$ 211.773.252,00					3,6546%	97,4267%	$ 8.093.120,00	$ 206.119.350,00		$ 5.653.873,00	1,4660%		$ 5.653.873,00
4.2	OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:	UNIDAD	CANT	VL UNT	COSTO TOTAL			CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE AVANCE FISICO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO		SALDO $
4.2.1	Arrendamiento oficina	MES			$ -								$ -					$ -
4.2.2	Costo papeleria, fotocopias, etc	MES	PISCICOLA									$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -
4.2.3	Servicios publicos y operacionales	MES	PISCICOLA									$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -
4.2.4	comunicaciones	MES	PISCICOLA									$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -
4.2.5	* 3 vehiculos)	MES	PISCICOLA									$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -
4.2.6	serv. públicos provisionales y	MES			$ -								$ -					$ -
4.2.7	Polizas 0,7%	MES			$ -								$ -					$ -
					$ -							$ -	$ -		$ -			$ -
2	REPOBLAMIENTO ICTICO	UNIDAD	CANT	VL UNT	COSTO TOTAL	PORCETAJE FINANCIERO		CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERECIA CANTIDAD	DIFERECIA VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
2.1	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Bocachico (Prochilodus magdalenae)	UN	2099809,49570000	$ 348,00	$ 732.933.914,09	5,2194447280868%		0,000000	2.099.809,49570000	0,0000000%	100,00%	$ -	$ 732.933.913,99000	0,00	$ -	5,2194447280868%	SIN CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	$ -
2.2	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Dorada (Brycon moorei)	UN	540001,99999000	$ 446,00	$ 241.920.895,96	1,7230381111818%		0,00000000	540.001,99999000	0,0000000%	100,00%	$ -	$ 241.920.895,96208	0,00	$ -	1,7230381111818%	CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	$ -
2.3	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Blanquillo (Sorubim cuspicaudus)	UN	430114,00000000	$ 3.000,00	$ 1.290.342.500,00	9,1901758674900%		0,000000	430.114,00000000	0,0000000%	100,00%	$ -	$ 1.290.342.000,00000	0,00	$ -	9,1901758674900%	SIN CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	$ -
					$ 2.265.096.409,98	16,1326485376438%				0,000000%	100,00%	$ -	$ 2.265.096.409,9814		$ -	16,1326485376438%		$ -
3	MONITOREOS PARCITIPATIVOS	UNIDAD	CANT	VL UNT	COSTO TOTAL	PORCETAJE FINANCIERO		CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERECIA CANTIDAD	DIFERECIA VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
3.1	Formación de monitores ambientales participativos	MES	120,00000000	$ 129.000,00	$ 15.480.000	0,1102528785363180%		0,0000000	120,0000000	0,0000000%	100,00%	$ -	$ 15.480.000,00000	$ -	$ -	0,1102528785363180%	CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	$ -
3.2	Monitoreos ambientales (Incluye transporte)	MES	480,00000000	$ 3.087.046,00	$ 1.481.782.080	10,5538653542334000%		14,0000000	480,0000000	2,1280000%	100,00%	$ 46.305.000,00	$ 1.481.782.080,00000	$ -	$ -	10,5538653542334000%	E2433495-E2433496-E2433535-E2433498-E2433518-E2433498-E2433543-E2433181-E2433478	$ -
3.3	Monitoreo fisicoquímico del agua.	UN	12,00000000	$ 695.294,15	$ 8.343.530	0,0594246468736142%		0,0000000	12,0000000	0,0000000%	100,00%	$ 4.171.765	$ 8.343.530	$ -	$ -	0,0594246468736142%	FACTURA-FELA 1005	$ -
3.4	Vigias ambientales	UND	68,00000000	$ 2.243.296,00	$ 152.544.128	1,0864815356468000%		12,0000000	68,0000000	17,6470588%	100,00%	$ 38.810.650,00	$ 152.544.128,00000	$ -	$ -	1,0864815356468000%	E2433495-E2433518-E2433181-E2433535-E2433541	$ -
					$ 1.858.149.738	11,8888850152901000%				17,88%	100,00%	$ 77.397.806,90	$ 1.858.149.738		$ -	11,8888850152901000%		$ 8.358.727,00
					$ 14.040.449.742,00	100,000%				13,84%	96,67%	$ 1.345.868.223,08	$ 14.032.091.015,00		$ 8.358.727,00	99,9404981287413%		

9. ANEXO CUADRO RELACION FINANCIERA CONSOLIDADO

CONVENIO 1732-24

ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL	PORCENTAJE FINANCIERO
1.1.1	Limpieza de caños de 0 a 5 metros de	ML	25801,000473	$ 38.175,00	$ 984.953.193,000000	7,015111418074 12%
1.1.2	Limpieza de caños de 5 a 10 metros	ML	8164,00000000	$ 51.689,00	$ 421.988.996,00	3,005623353982 60%
1.1.3	Rocería menor a un metro de alto	M2	103204,00189147	$ 3.903,00	$ 402.805.219,00	2,868691142594 30%
1.1.4	Rocería mayor a un metro de alto	M2	40329,00000000	$ 5.294,00	$ 213.501.726,00	1,520618854261 77%
					$ 2.023.249.134,00	14,410144780870 80%

ITEM	RURAL DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNT	COSTO TOTAL	PORCENTAJE FINANCIERO
1.2.1	Limpieza de caños rurales mayores a	ML	40449,00000000	$ 59.975,00	$ 2.425.928.775,00	17,278141509548 90%
1.2.2	Limpieza, destronque y rocería mayor	M2	159303,00000000	$ 6.552,00	$ 1.043.753.256,00	7,433901870520 30%
					$ 3.469.682.031,00	24,712043390670 20%

ITEM	MEJORAMIENTO DE LA	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNT	COSTO TOAL	PORCENTAJE FINANCIERO
2.1	Limpieza y Retiro del Material Emergente, flotante y medial que se	M2	240.000	$ 5.060,00	$ 1.214.400.000,00	8,649295587500 20%
					$ 1.214.400.000,00	8,649295587500 20%

2.1	VALLAS INFORMATIVAS	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNT	COSTO TOTAL	PORCENTAJE FINANCIERO
2.1.1	Suministro e instalacion de valla con	UN	10,00000000	$ 1.424.334,00	$ 14.243.340,00	0,101445041018 80%
2.1.2	Suministro e instalacion de valla con	UN	5,00000000	$ 1.749.334,00	$ 8.746.670,00	0,062296223844 30%
					$ 22.990.010,00	0,163741264802 70%

3.1	REMOCION MECANICA	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNT	COSTO TOTAL	PORCENTAJE FINANCIERO
3.1.1	Remoción de sedimentos	UN	17150,51983985	$ 185.023,00	$ 3.175.109.167	22,614013466570 90%
					$ 3.175.109.167,00	22,614013466570 90%

CONSOLIDADO

FECHA (21-06-24 a 30-12-24)

CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERECIA CANTIDAD	DIFERECIA VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
0,00000	25.801,00000000	0,00000000000000%	99,99999517%	$ -	$ 984.953.175,00000	0,00	$ 18,00	7,015111288673 10%		$ 18,00
0,00000	8.164,00000000	0,00000000000000%	100,00%	$ -	$ 421.988.996,00000	0,00	$ -	3,005623353982 60%	E2433514-E2433515	$ -
0,00000	103.204,00000000	0,00000000000000%	99,999999%	$ -	$ 402.805.212,00000	0,00	$ 7,00	2,868691002534 35%	FACTURA-INCO3	$ 7,00
0,00000	40.329,00000000	0,00000000000000%	100,00%	$ -	$ 213.501.726,00000	0,00	$ -	1,520618854261 77%		$ -
		0,00000000000000%	99,999999%	$ -	$ 2.023.249.109,00000000		$ 25,00	14,410144809065 190%		$ 25,00

CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERECIA CANTIDAD	DIFERECIA VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
0,00	40.449,00	0,00000000000000%	100,00%	$ -	$ 2.425.928.775,00	0,00	$ -	17,278141509548 90%	E2433514-E2433515	$ -
68711,88678	159.303,00	55,687505419384 30%	100,00%	$ 581.240.151,00	$ 1.043.753.256,00	0,00	$ -	7,433901870530 30%	FACTURA-INCO4	$ -
		27,043782796821%	100,00%	$ 581.240.151,00	$ 3.469.682.031,00			24,712043390670 20%		

CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERECIA CANTIDAD	DIFERECIA VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
140943,67247	240.000,00000000	58,976613630430 80%	100,0000%	$ 728.305.994,7135520	$ 1.214.400.000,00000	0,00000	0,00000	8,649295587500 20%	FACTURA-INCO2 FACTURA-INCO3	$ -
								8,649295587500 20%		

CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERECIA CANTIDAD	DIFERECIA VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
0,00000	10,00000000	0,000000%	100,00%	$ -	$ 14.243.340,00000	0,00	$ -	0,101445041018 80%	E2433515	$ -
0,00000	5,00000000	0,000000%	100,00%	$ -	$ 8.746.670,00000	0,00	$ -	0,062296223844 13780%	E2433515	$ -
		0,0000000%	100,00%	$ -	$ 22.990.010,00		$ -	0,163741264802 70%		

CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERECIA CANTIDAD	DIFERECIA VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
0,00000	17.148,00000000	0%	99,81481949589672%	$ -	$ 3.172.484.362,00000	14,61087985110 15	$ 2.704.829,00	22,594746959589 17%	E2433513-E2500133-E2500134-E2500151	$ 2.704.829,00
								22,594746959589 17%		

CONVENIO 1732-24

ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO

4,1	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)	UNIDAD	CANT	DÍAS TRABAJADOS	VL UNT	COSTO TOTAL	PORCENTAJE FINANCIERO
4,1,1	Coordinador	MES	4,300	129 DÍAS	$ 13.311.000,00	$ 57.237.300,0000000	0,4077%
4,1,2	Abogado	MES	4,000	120 DÍAS	$ 11.334.360,00	$ 45.337.440,0000000	0,3229%
4,1,3	Ingeniero Ambiental o afines	MES	4,930	147 DÍAS	$ 6.504.120,00	$ 32.084.465,9963588	0,2284%
4,1,4	Ingeniero de produccion		PISCICOLA				
4,1,5	Ingeniero pesquero	MES	PISCICOLA				
4,1,6	Medico veterinario	MES	PISCICOLA				
4,1,7	Contador	MES	6,000	177 DÍAS	$ 6.892.140,00	$ 40.683.828,00	0,2898%
4,1,8	Cavilinador de produccion	MES	4,000	120 DÍAS	$ 9.117.600,00	$ 36.470.400,00	0,2598%
4,1,9	Profesional residente	MES	PISCICOLA				
4,1,10	Audar Administrativo	MES	PISCICOLA				
4,1,11	Ingeniero Ambiental o afines	MES	PISCICOLA				
4,1,12	Ingeniero Ambiental o afines	MES	PISCICOLA				
						$ 211.773.232,00	1,5083%
						$ 211.773.232,00	

4,2	OFICINA PAPELERIA Y OTROS:	UNIDAD	CANT		VL UNT	COSTO TOTAL
4,2,1	Arrendamiento oficina	MES				$ -
4,2,2	Costo papeleria, fotocopias, etc	MES	PISCICOLA			
4,2,3	Servicios publicos y operacionales	MES	PISCICOLA			
4,2,4	comunicaciones	MES	PISCICOLA			
4,2,5	vehiculos)	MES	PISCICOLA			
4,2,6	públicos provisionales y bienestar (50	MES				$ -
4,2,7	Polizas 0,7%	MES				$ -
						$ -

CONSOLIDADO

FECHA (21-06-24 a 30-12-24)

CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERECIA		% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
						CANTIDAD	VALOR			
0,2705	4,1421	6,7319%	96,3389%	$ 4.997.877,16	$ 55.135.977,16	0,1579	$ 2.101.322,84	0,3827%	E2433216-E2433247-E2433286-E2433323-E2433350-E2433388-E2433421-E2433474-E2433506-E2433550-E2433570-E2433591-E2500003-E2500022-E2433441-E2500035	$ 2.101.322,84
0,0936	3,8080	6,7861%	97,7011%	$ 346.872,94	$ 44.295.200,00	0,0920	$ 1.042.240,00	0,3158%	E2433092-E2433113-E2433143-E2433170-E2433216-E2433247-E2433286-E2433323-E2433350-E2433388-E2433421-E2433474-E2433506-E2433550-E2433570-E2433591-E2433333-E2433376-E2433401	$ 1.042.240,00
0,0932	4,8185	1,6879%	97,7011%	$ 541.183,84	$ 31.327.351,84	0,1133	$ 737.114,16	0,2231%	E2433143-E2433170-E2433216-E2433247-E2433286-E2433323-E2433350-E2433388-E2433421-E2433474-E2433506-E2433550-E2433570-E2433591-E2433376-E2433401-E2500003-E2433441-E2500015-E2433538	$ 737.114,16
				$ -	$ -		$ -		APORTE PISCICOLA	$ -
				$ -	$ -		$ -		APORTE PISCICOLA	$ -
				$ -	$ -		$ -		APORTE PISCICOLA	$ -
0,2844	8,7544	6,1799%	97,7011%	$ 2.611.274,00	$ 39.728.830,00	0,1385	$ 934.796,00	0,2832%	E2433113-E2433143-E2433170-E2433216-E2433247-E2433286-E2433323-E2433350-E2433388-E2433421-E2433474-E2433506-E2433550-E2433570-E2433591-E2433376-E2433456-E2500003-E2433440-E2500014	$ 934.796,00
0,0325	3,8080	6,8114%	97,7011%	$ 295.912,94	$ 35.632.000,00	0,0920	$ 838.400,00	0,2539%	E2133170-E2433216-E2433247-E2433286-E2433323-E2433350-E2433388-E2433421-E2433474-E2433506-E2433233-E2433376-E2433454-E2500003-E2433484-E2500022	$ 838.400,00
				$ -	$ -		$ -		APORTE PISCICOLA	$ -
				$ -	$ -		$ -		APORTE PISCICOLA	$ -
				$ -	$ -		$ -		APORTE PISCICOLA	$ -
				$ -	$ -		$ -		APORTE PISCICOLA	$ -
		3,6344%	97,4267%	$ 8.893.120,88	$ 206.119.308,00		$ 6.653.873,00	1,4689%		$ 6.653.873,00

CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE AVANCE FISICO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO		SALDO $
					$ -					$ -
				$ -	$ -		$ -			$ -
				$ -	$ -		$ -			$ -
				$ -	$ -		$ -			$ -
				$ -	$ -		$ -			$ -
					$ -					$ -
					$ -					$ -
				$ -	$ -		$ -			$ -

CONVENIO 1732-24							CONSOLIDADO										
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO							FECHA (01-06-24 a 30-12-24)										
2	REPOBLAMIENTO ICTICO	UNIDAD	CANT	VR UNT	COSTO TOTAL	PORCETAJE FINANCIERO	CANTIDAD PLANIFICADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERENCIA CANTIDAD	DIFERENCIA VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
2.1	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Bocachico (Prochilodus magdalenae)	UN	208980,46670909	$ 349,00	$ 732.833.544,00	5,218444728085805%	0,0000000	2.089.804,46670000	0,0000000%	100,00%	$ -	$ 732.833.513,66000	0,00	$ -	5,218444728085805%	CERTIFICADO	$ -
2.2	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Dorada (Brycon moorei)	UN	540004,39999000	$ 446,00	$ 241.920.995,95	1,722029111181615%	0,0000000	540.001,99999000	0,0000000%	100,00%	$ -	$ 241.920.995,95208	0,00	$ -	1,722029111181615%	CERTIFICADO	$ -
2.3	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Blanquillo (Sorubim cuspicaudus)	UN	430114,00000000	$ 3.000,00	$ 1.290.342.000,00	9,189179887436000%	0,0000000	430.114,00000000	0,0000000%	100,00%	$ -	$ 1.290.342.000,00000	0,00	$ -	9,189179887436000%	CERTIFICADO	$ -
					$ 2.265.096.409,90	16,132648537843699%			0,0000000%	100,00%	$ -	$ 2.265.096.409,9014		$ -	16,132648537843699%		$ -
II	MONITOREOS PARCITIPATIVOS	UNIDAD	CANT	VR UNT	COSTO TOTAL	PORCETAJE FINANCIERO	CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERENCIA CANTIDAD	DIFERENCIA VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
3.1	Formación de monitores ambientales participativos	MES	120,00000000	$ 129.000,00	$ 15.480.000,00	0,110238947883631%	0,0000000	120,00000000	0,0000000%	100,00%	$ -	$ 15.480.000,00000	$ -	$ -	0,110238947883631%	E2435338-E2435357-E2435357	$ -
3.2	Monitoreos ambientales (incluye transporte)	mes	480,00000000	$ 3.087.046,00	$ 1.481.782.080,00	10,553665354233400%	16,0000000	480,00000000	3,1280000%	100,00%	$ -46.566.600,00	$ 1.481.782.080,00000	$ -	$ -	10,553665354233400%	E2435351-E2435019-E2435301-E2435143-E2435171-E2435357-E2435338-E2435357-E2435344-E2435373-E2435391-E2435393-E2435435-E2435444-E2435459-E2435477-E2435476-E2435495-E2435485-E2435504-E2435503-E2435522-E2435338-E2435484-E2435435-E2435455-E2435341-E2435344-E2435491-E2435391-E2435505-E2435344-E2435373-E2435476-E2435495

PISCICOLA SAN SILVESTRE
Alimento para el mundo

DESEMBOLSO

N 01 Y 02

CONVENIO 1732-24							2° desembolso $4.212.134.922 - 50%						
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO							FECHA: (04-11-2024)						
URBANOS													
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		COSTO TOTAL	PORCENTAJE FINANCIERO	CANTIDAD EJECUTADA FISICO	VALOR EJECUTADO FIANACIERO	% DE AVANCE FISICO	% DE AVANCE FINANCIERO	VALOR TOTAL	DIFERENCIA	SALDO $ -
1.1.1	Limpieza de caños de 0 a 5 metros de ancho	ML	25801,000479	$ 38.179,00	$ 984.953.193,000000	7,015111418074 12%	25.801,000000	$ 984.953.175,0000	99,999982%	7,0%	$ 984.953.175,00	$ -	$ 18,00
1.1.2	Limpieza de caños de 5 a 10 metros de ancho	ML	8164,00000000	$ 51.689,00	$ 421.988.996,00	3,005523353982 60%	8164,000000	$ 421.988.996,0000	100,0000%	3,0%	$ 421.988.996,00	$ -	$ -
1.1.3	Roceria menor a un metro de alto	M2	103204,00169147	$ 3.903,00	$ 402.805.219,00	2,868891142390 30%	103.264,00000000	$ 402.805.212,0000	99,9993062%	2,9%	$ 402.805.212,00	$ -	$ 7,00
1.1.4	Roceria mayor a un metro de alto	M2	40329,00000000	$ 5.294,00	$ 213.501.726,00	1,520618654261 77%	40329,000000	$ 213.501.726,0000	100,0000%	1,5%	$ 213.501.726,00	$ -	$ -
					$ 2.023.249.134,00	14,41014476870880%	TOTAL	$ 2.023.249.108,00	100,000%		$ 2.023.249.109,00	$ -	$ 25,00
RURAL													
ITEM	DESCRIPCION	UNDAD	CANTIDAD	VL UNT	COSTO TOTAL	PORCENTAJE FINANCIERO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO FIANACIERO	% DE AVANCE FISICO	% DE AVANCE FINANCIERO	VALOR TOTAL	DIFERENCIA	SALDO $
1.2.1	Limpieza de caños rurales mayores a 10 metros de ancho	ML	40449,00000000	$ 59.975,00	$ 2.425.928.775,00	17,275141509549 90%	37771	$ 2.285.313.725,0000	93,4%	16,1%	$ 2.285.315.725,00	$ -	$ 160.613.050,00
1.2.2	Limpieza, destroncjes y roceria mayor a 1 metro de alto	M2	156393,00000000	$ 6.652,00	$ 1.043.753.256,00	7,433901870520 30%	6563,992934	$ 43.138.057,0000	4,1%	0,3%	$ 43.136.057,00	$ -	$ 1.000.615.199,00
					$ 3.469.682.031,00	24,71204339907820%	TOTAL	$ 2.308.453.782,00	46,788%		$ 2.308.453.782,00	$ -	$ 1.161.228.249,00
ITEM	LIMPIEZA MANUAL	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNT	COSTO TOAL	PORCENTAJE FINANCIERO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO FIANACIERO	% DE AVANCE FISICO	% DE AVANCE FINANCIERO	VALOR TOTAL		SALDO $
	DESCRIPCION												
2.1	Limpieza y Retiro del Material Estraguito, flotante y medial que se encuentre en el espejo de agua y laderas (Incluye cargue, transporte y disposicion final en sitio autorizado)	M2	240.000	$ 5.060,00	$ 1.214.400.000,00	8,649295587500280%	52010	$ 263.170.800,0000	21,671%	1,9%	$ 263.170.800,00	$ -	$ 951.229.400,00
					$ 1.214.400.000,00	8,649295587500280%							
2.1	VALLAS INFORMATIVAS	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNT	COSTO TOTAL	PORCENTAJE FINANCIERO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO FIANACIERO	% DE AVANCE FISICO	% DE AVANCE FINANCIERO	VALOR TOTAL		SALDO $
2.1.1	Suministro e instalacion de valla con enfoque en la conservacion de cuerpos hidricos en el perimetro urbano (De acuerdo a especificaciones)	UN	10,00000000	$ 1.424.334,00	$ 14.243.340,00	0,101445041088290%	10	$ 14.243.340,0000	100,0%	0,1%	$ 14.243.340,00	$ -	$ -
2.1.2	Suministro e instalacion de valla con enfoque en la conservacion de cuerpos hidricos en zona rural (De acuerdo a especificaciones)	UN	5,00000000	$ 1.749.334,00	$ 8.746.670,00	0,062286223844137 90%	5	$ 8.746.670,0000	100,0%	0,1%	$ 8.746.670,00	$ -	$ -
					$ 22.990.010,00	0,163741264862967 0%		$ 22.990.010,00	100,0%		$ 22.990.010,00	$ -	$ -
3.1	LIMPIEZA MECANICA	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNT	COSTO TOTAL	PORCENTAJE FINANCIERO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO FIANACIERO	% DE AVANCE FISICO	% DE AVANCE FINANCIERO	VALOR TOTAL		SALDO $
3.1.1	Retencion de sedimentos	UN	17180,61887985	$ 185.023,00	$ 3.175.109.187,00	22,614013406578 90%	4203,26	$ 777.699.775,0000	24,494%	5,5%	$ 777.699.774,98	$ 0,02	$ 2.397.409.412,02
					$ 3.175.109.187,00	22,614013406578 90%		$ 777.699.775,00	24,494%		$ 777.699.774,98	$ 0,02	$ 2.397.409.412,02

CONVENIO 1732-24							2° desembolso $4.212.134.922 - 50%						
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO							FECHA: (04-11-2024)						
4.1	PERSONAL TÉCNCO Y ADMINISTRATIVO (Incl.Prest. Soc.)	UNIDAD	CANT	VL UNT	COSTO TOTAL	PORCENTAJE FINANCIERO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	% DE AVANCE FINANCIERO	VALOR TOTAL		SALDO $
4.1.1	Coordinador	MES	4,900	$ 11.311.000,00	$ 57.237.300,0000000	0,4077%	2,2333	$ 29.727.900,00	61,9%	0,2%	$ 29.727.900,00	$ 0,00	$ 27.509.400,00
4.1.2	Abogado	MES	4,900	$ 11.334.360,00	$ 45.337.440,0000000	0,3229%	2,7000	$ 30.602.772,00	67,5%	0,2%	$ 30.602.772,00	$ -	$ 14.734.668,00
4.1.3	Ingeniero Ambiental o afines	MES	4,930	$ 8.504.120,00	$ 32.054.486,8903560	0,2284%	3,1667	$ 20.596.380,00	64,2%	0,1%	$ 20.596.380,00	-$ 0,00	$ 11.468.086,00
4.1.7	Contador	MES	5,900	$ 6.892.140,00	$ 40.663.626,00	0,2896%	3,1667	$ 21.825.110,00	53,7%	0,2%	$ 21.825.110,00	$ -	$ 18.838.516,00
4.1.8	Coordinador de produccion	MES	4,000	$ 9.117.600,00	$ 36.470.400,00	0,2598%	3,1667	$ 28.872.400,00	79,2%	0,2%	$ 28.872.400,00	$ -	$ 7.598.000,00
					$ 211.773.232,00	1,5083%		$ -					
					$ 211.773.232,00		TOTAL	$ 131.624.562,00	63,302%		$ 131.624.562,00	$ 0,00	$ 80.148.670,00
4.2	OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:	UNIDAD	CANT	VL UNT	COSTO TOTAL		CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	% DE AVANCE FINANCIERO	VALOR TOTAL		SALDO $
4.2.1	Arrendamiento oficina	MES			$ -								
4.2.2	Costo papeleria, fotocopias, etc	MES	PSICOLA					$ -			$ -	$ -	$ -
4.2.3	Servicios publicos y operacionales	MES	PSICOLA					$ -			$ -	$ -	$ -
4.2.4	comunicaciones	MES	PSICOLA					$ -			$ -	$ -	$ -
4.2.5	* 3 vehiculos)	MES	PSICOLA					$ -			$ -	$ -	$ -
4.2.6	serv. públicos provisionales y	MES			$ -			$ -					
4.2.7	Polizas 0,7%	MES			$ -								
					$ -		TOTAL	$ -		#¡DIV/0!	$ -	$ -	$ -
2	REPOBLAMIENTO ICTICO	UNIDAD	CANT	VL UNT	COSTO TOTAL	PORCETAJE FINANCIERO	CANTIDAD EJECUTADA		% DE AVANCE FISICO		VALOR TOTAL		SALDO $
2.1	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie native Bocachico (Prochilodus magdalenae)	UN	2089609,49579000	$ 349,00	$ 732.833.514,00	5,2184447208666%	2.099.808,50	$ 732.833.514,0000	100,0%	5,2%	$ 732.833.514,00	$ 0,00	$ -
2.2	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie native Dorada (Brycon moorei)	UN	540001,99999000	$ 448,00	$ 241.920.895,98	1,7230281111161%	437.706,000	$ 196.091.840,0000	81,1%	1,4%	$ 196.091.840,00	$ -	$ 45.829.055,98
2.3	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie native Blanquillo (Sorubim cuspicaudus)	UN	430114,00000000	$ 3.000,00	$ 1.290.342.000,00	9,1901758974360%	297.299,00	$ 891.798.000,0000	69,1%	6,4%	$ 891.798.000,00	$ -	$ 398.544.000,00
					$ 2.265.096.409,98	16,132648537643800%	TOTAL	$ 1.820.723.354,00	83,380%		$ 1.820.723.354,00	$ 0,00	$ 444.373.055,98
3	MONITOREOS PARCITIPATIVOS	UNIDAD	CANT	VL UNT	COSTO TOTAL	PORCETAJE FINANCIERO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	% DE AVANCE FINANCIERO	VALOR TOTAL		SALDO $
3.1	Formación de monitores ambientales participativos	MES	120,00000000	$ 129.000,00	$ 15.480.000,00	0,1102528785363180%	86,10	$ 11.109.900,0000	71,8%	0,1%	$ 11.109.900,00	$ -	$ 4.373.100,00
3.2	Monitoreos ambientales (Incluye transporte)	MES	480,00000000	$ 3.087.046,00	$ 1.481.782.080,00	10,553866354233400%	335,00	$ 1.034.160.410,0000	69,8%	7,4%	$ 1.034.160.410,00	$ -	$ 447.621.670,00
3.3	Monitoreo fisicoquimicos del agua.	UN	12,00000000	$ 695.294,15	$ 8.343.529,80	0,0594249468736142%	6	$ 4.171.765,0000	50,0%	0,0%	$ 4.171.764,90	$ 0,100000	$ 4.171.764,90
3.4	Vigias ambientales	UND	56,00000000	$ 2.243.296,00	$ 152.644.128,00	1,0874619358468000%	12,00	$ 26.919.552,0000	17,647%	0,2%	$ 26.919.552,00	$ -	$ 125.624.576,00
					$ 1.656.149.737,80	11,8008505152901000%	TOTAL	$ 1.876.358.627,90	82,297%		$ 1.876.358.626,90		$ 581.791.110,98
					$ 14.040.449.742,00	100,000%		$ 8.424.209.819,0000	61,74%	60,000%	$ 8.424.209.819,00		$ 5.616.179.923,00

PISCÍCOLA
SAN SILVESTRE
Alimento para el mundo

DESEMBOLSO
N° 03

CONVENIO 1732-24	3° desembolso $4.212.134.922 - 90%						
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO	FECHA (15-12-25)						
URBANOS							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	DIFERENCIA	% DE AVANCE FISICO	VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	CANTIDAD ACUMULADA	SALDO $
1.1.1	Limpieza de caños de 0 a 5 metros de ancho	0,0000000	25.801,00000000	0,000	0%	$ -	25.801	$ 19,00
1.1.2	Limpieza de caños de 6 a 10 metros de ancho	0,0000000	8.164,00000000	0,000	0%	$ -	8.164	$ -
1.1.3	Roceria menor a un metro de alto	0,0000000	103.204,00000000	0,002	0,00%	$ -	103.204,00000000	$ 7,00
1.1.4	Roceria mayor a un metro de alto	0,0000000	40.329,00000000	0,000	0%	$ -	40.329	$ -
					0,00%	$ -		$ 26,00
RURAL								
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	DIFERENCIA	% DE AVANCE FISICO	VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	CANTIDAD ACUMULADA	SALDO $
1.2.1	Limpieza de caños rurales mayores a 10 metros de ancho	2578,00000000	40.449,000	0,00000	7%	$ 160.613.050,00	40.449	$ -
1.2.2	Limpieza, destronque y roceria mayor a 1 metro de ato	64007,18071	70.591,133	66,712	40%	$ 419.375.048,00	70.591	$ 581.240.151,00
					23%	$ 579.988.098,00		$ 581.240.151,00
ITEM	LIMPIEZA MANUAL	CANTIDAD EJECUTADA			% DE AVANCE FISICO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	SALDO $
	DESCRIPCION							
2.1	Limpieza y Retiro del Material Emergente, flotante y medial que se encuentre en el espejo de agua y laderas (Incluye cargue, transporte y disposicion final en sitio autorizado)	44.046,13	96.056,129	143,944	18%	$ 222.873.406,29	96.056	$ 729.356.894,71
2.1	VALLAS INFORMATIVAS	CANTIDAD EJECUJTADA			% DE AVANCE FISICO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	SALDO $
2.1.1	Suministro e instalacion de valla con enfoque en la conservacion de cuerpos hidricos en el perimetro urbano (De acuerdo a especificaciones)	0	10.000	0	0%	$ -	10	$ -
2.1.2	Suministro e instalacion de valla con	0	6.000	0	0%	$ -	6	$ -
					0%	$ -		
3.1	LIMPIEZA MECANICA	CANTIDAD EJECUJTADA			% DE AVANCE FISICO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	SALDO $
3.1.1	Remoción de sedimentos	12942,74	17.146	15	75%	$ 2.394.704.583,02	17.146	$ 2.704.829,00
					75%	$ 2.394.704.583,02		$ 2.704.829,00
4.1	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)	CANTIDAD EJECUTADA			% DE AVANCE FISICO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	SALDO $
4.1.1	Coordinador	1,833	3,76667	0,533	36%	$ 20.410.200,00	3,77	$ 7.099.200,00
4.1.2	Abogado	1,177	3,87744	0,123	29%	$ 13.345.856,06	3,88	$ 1.389.112,94
4.1.3	Ingeniero Ambiental o afines	1,567	4,73333	0,197	32%	$ 10.189.788,00	4,73	$ 1.278.298,00
4.1.4	Ingeniero de produccion							
4.1.5	Ingeniero pesquero					$ -		$ -
4.1.6	Medico veterinario					$ -		$ -
4.1.7	Contador	2,233	5,40000	0,500	38%	$ 15.392.448,00	5,40	$ 3.448.070,00
4.1.8	Coordinador de produccion	0,709	3,87659	0,124	18%	$ 6.463.687,06	3,88	$ 1.134.312,94
4.1.9	Profesional residente					$ -		$ -
4.1.10	Auxiliar Administrativo					$ -		$ -
4.1.11	Ingeniero Ambiental o afines					$ -		$ -
4.1.12	Ingeniero Ambiental o afines					$ -		$ -
					30%	$ 65.801.676,12		$ 14.348.993,88

4,2	OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:	CANTIDAD EJECUTADA			% DE AVANCE FISICO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	SALDO $
4,2,1	Arrendamiento oficina							
4,2,2	Costo papeleria, fotocopias, etc					$ -		$ -
4,2,3	Servicios publicos y operacionales					$ -		$ -
4,2,4	comunicaciones					$ -		$ -
4,2,5	3 vehiculos)					$ -		$ -
4,2,6	públicos provisionales y bienestar (50							
4,2,7	Polizas 0,7%							
						$ -		$ -

2	REPOBLAMIENTO ICTICO	CANTIDAD EJECUTADA			% DE AVANCE FISICO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	SALDO $
2.1	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Bocachico (Prochilodus magdalenae)	0,00	2.099.809,4957	0,000	0%	$ -	2.099.809,50	$ -
2.2	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Dorada (Brycon moorei)	102.297,00	540.002,0000	0,000	19%	$ 45.829.055,98	540.002,00	$ -
2.3	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Blanquillo (Sorubim cuspicaudus)	132.848,00	430.114,0000	0,000	31%	$ 398.544.000,00	430.114,00	$ -
					17%	$ 444.373.055,98		$ -

3	MONITOREOS PARCITIPATIVOS	CANTIDAD EJECUTADA			% DE AVANCE FISICO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	SALDO $
3.1	Formación de monitores ambientales participativos	33,90	120,00000	0,000	28%	$ 4.373.100,00	120,00	$ -
3.2	Monitoreos ambientales (incluye transporte)	130,00	465,00000	15,000	27%	$ 401.315.980,00	465,00	$ 46.305.690,00
3.3	Monitoreo fisicoquímico del agua.	0,00	6,00000	6,000	0%	$ -	6,00	$ 4.171.764,90
3.4	Vigias ambientales	44,00	56,00000	12,000	65%	$ 98.705.024,00	56,00	$ 26.919.552,00
					30%	$ 504.394.104,00		$ 77.397.006,90

		fisico	24,26%	$ 4.212.134.922,00		$ 1.464.048.690,00

ACUMULADO FISICO	86,02%	ACUMULADO FINANCIERO

PISCICOLA
SAN SILVESTRE
Alimento para el mundo

DESEMBOLSO FINAL Y DE LIQUIDACION

CONVENIO 1752-24	Liquidacion 10%
ACTIVIDADES - INFORME TECNICO Y FINANCIERO	FECHA (30-12-24)

	URBANOS	CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERENCIA		% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
ITEM	DESCRIPCION							CANTIDAD	VALOR	SOPORTE CONTABLE		
1.1.1	Limpieza de caños de 0 a 5 metros de ancho	0,00000	25.801,00000000	0,00000000000000%	99,99999617%	$ -	$ 984.953.175,00000	0,00	$ 18,00	7,01811128067210%	SIN CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	$ 18,00
1.1.2	Limpieza de cañosde 5 a 10 metros de ancho	0,00000	8.164,00000000	0,00000000000000%	100,000%	$ -	$ 421.988.996,00000	0,00	$ -	3,00683214[illegible]%		$ -
1.1.3	Rocería menor a un metro de alto	0,00000	103.204,00000000	0,00000000000000%	99,999999%	$ -	$ 402.805.212,00000	0,00	$ 7,00	2,86685108253435%		$ 7,00
1.1.4	Rocería mayor a un metro de alto	0,00000	40.329,00000000	0,00000000000000%	100,000%	$ -	$ 213.551.726,00000	0,00	$ -	1,53061886426177%		$ -
				0,00000000000000%	99,999999%	$ -	$ 2.023.249.109,0000000		$ 25,00	14,41914490965180%		$ 25,00

	RURAL	CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERENCIA		% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
ITEM	DESCRIPCION							CANTIDAD	VALOR			
1.2.1	Limpieza de caños rurales mayores a 10 metros de ancho	0,00	48.440,00	0,00000000000000%	100,00%	$ -	$ 2.425.928.775,00	0,00	$ -	17,27814109845889%	SIN CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	$ -
1.2.2	Limpieza, desmonte y rocería mayor a 1 metro de alto	8871,84475	189.380,00	55,68758641[illegible]9389%	100,00%	$ 661.240.151,00	$ 1.043.753.256,00	0,00	$ -	7,43260187068836%	FACTURA-INCO2	$ -
				27,84378270969211%	100,00%	$ 661.240.151,00	$ 3.469.682.031,00			24,71204338007020%		

ITEM	LIMPIEZA MANUAL	CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERENCIA		% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
	DESCRIPCION							CANTIDAD	VALOR			
2.1	Limpieza y Retiro del Material Emergente, flotante y medial que se encuentre en el espejo de agua y laderas (Incluye cargue, transporte y disposicion final en sitio autorizado)	143943,87247	240.000,00000000	59,97961263643669%	100,0000%	$ 728.306.984,7115620	$ 1.214.400.000,00000	0,00000	0,00000	0,54[illegible]%	FACTURA-INCO2 FACTURA-INCO3	$ -
										8,54329568780038%		

2.1	VALLAS INFORMATIVAS	CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERENCIA		% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
								CANTIDAD	VALOR			
2.1.1	Suministro e instalacion de valla con enfoque en la conservacion de cuerpos hidricos en el perimetro urbano (De acuerdo a especificaciones)	0,00000	10,00000000	0%	100,00%	$ -	$ 14.243.340,00000	0,00	$ -	0,[illegible]%	SIN CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	$ -
2.1.2	Mantenimiento a instalacion de valla [illegible]	0,00000	5,00000000	0%	100,00%	$ -	$ 8.746.670,0000	0,00	$ -	0,[illegible]%	SIN CANTIDADES	$ -
				0,00000000%	100,00%	$ -	$ 22.990.010,00		$ -	0,16374126485209702%		

3.1	LIMPIEZA MECANICA	CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERENCIA		% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
								CANTIDAD	VALOR			
3.1.1	Remoción de sedimentos	0,00000	17.140,00000000	0%	99,99481140[illegible]%	$ -	$ 3.172.404.308,00000	14,61687965110151	$ 3.794.939,00	22,[illegible]%	SIN CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	$ 3.794.939,00
										22,58474888998617%		

4.1	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (Ing.Pesq. Ing.)	CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERENCIA		% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
								CANTIDAD	VALOR			
4.1.1	Coordinador	0,37548698662069000	4,14213837	8,73180340295110[illegible]%	98,32875288110130%	$ 4.997.977,16	$ 55.135.977,160000	0,15758383471284[illegible]	$ 2.101.322,840	9,3[illegible]%	E2433539	$ 2.101.322,8400
4.1.2	Abogado	0,03603866357043410	3,90804588	0,76509158206620[illegible]%	97,70114942525740%	$ 346.872,94	$ 44.295.200,000000	0,00195402298850[illegible]	$ 1.042.240,000	0,3[illegible]%	E2433507	$ 1.042.240,0000
4.1.3	Ingeniero Ambiental o afines	0,06320631126896680	4,81963055	1,[illegible]%	97,70114942525740%	$ 541.163,64	$ 31.327.351,840000	0,11331034495[illegible]	$ 737.184,150	6,3251221393591[illegible]%	E2433494-E2433[illegible]	$ 737.184,1500
4.1.4	Ingeniero de produccion					$ -	$ -		$ -		E2433538	$ -
4.1.5	Ingeniero pesquero					$ -	$ -		$ -		APORTE PISCICOLA	$ -
4.1.6	Medico veterinario					$ -	$ -		$ -		APORTE PISCICOLA	$ -
4.1.7	Contador	0,39430784609195400	5,70436782	0,17572589647378[illegible]%	97,70114942525740%	$ 2.511.274,00	$ 39.726.830,000000	0,13983218390804[illegible]	$ 934.796,000	0,2[illegible]%	E2433540	$ 934.796,0000
4.1.8	Coordinador de produccion	0,03245513514806780	3,90804588	0,81137837870219[illegible]%	97,70114942525740%	$ 286.912,94	$ 36.632.000,00	0,00195402298850[illegible]	$ 838.400,000	0,2[illegible]%	E2433494	$ 838.400,0000
4.1.9	Profesional residente					$ -	$ -		$ -		APORTE PISCICOLA	$ -
4.1.10	Auxiliar Administrativo					$ -	$ -		$ -		APORTE PISCICOLA	$ -
4.1.11	Ingeniero Ambiental o afines					$ -	$ -		$ -		APORTE PISCICOLA	$ -
4.1.12	Ingeniero Ambiental o afines					$ -	$ -		$ -		APORTE PISCICOLA	$ -
				3,83439968774419%	97,42667007946031%	$ 6.693.120,68	$ 206.119.350,00		$ 6.653.873,000	1,48882957999035%		$ 6.653.873,0000
							$ 6.653.873,00			97,33922301922690%		

4.2	OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE AVANCE FISICO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% DE AVANCE FINANCIERO		SALDO $
4.2.1	Arrendamiento oficina						$ -					$ -
4.2.2	Costo papeleria, fotocopias, etc					$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -
4.2.3	Servicios publicos y operacionales					$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -
4.2.4	comunicaciones					$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -
4.2.5	3 vehiculos)					$ -	$ -		$ -	0,00%		$ -
4.2.6	públicos provisionales y bienestar (50						$ -					$ -
4.2.7	Polizas 0,7%						$ -					$ -
						$ -	$ -		$ -			$ -
							$ 211.773.232,00			0,040268460791865%		

2	REPOBLAMIENTO ICTICO	CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERECIA		% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
								CANTIDAD	VALOR			
2.1	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Bocachico (Prochilodus magdalenae)	0,0000000	2.099.909,4970000	0,0000000%	100,00%	$ -	$ 732.833.513,99930	0,00	$ -	5,2184447290886%	SIN CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	$ -
2.2	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Dorada (Brycon moorei)	0,0000000	540.901,9940000000	0,0000000%	100,00%	$ -	$ 241.820.985,98200	0,00	$ -	1,7230291911810%	SIN CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	$ -
2.3	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Blanquillo (Sorubim cuspicaudum)	0,0000000	430.114,80000000	0,0000000%	100,00%	$ -	$ 1.290.342.000,00000	0,00	$ -	9,1901736974060%	SIN CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	$ -
				0,000000%	100,00%	$ -	$ 2.265.096.409,9614		$ -	16,132648837843890%		$ -

3	MONITOREOS PARTICIPATIVOS	CANTIDAD EJECUTADA DEL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA FINAL	% DE AVANCE FISICO DEL PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE FISICO	EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	DIFERECIA		% DE AVANCE FINANCIERO FINAL	SOPORTE CONTABLE	SALDO $
								CANTIDAD	VALOR			
3.1	Formación de monitores ambientales participativos	0,0000000	126,00000000	0,0000000%	100,00%	$ -	$ 15.489.000,00000	$ -	$ -	0,1102328783363108%	SIN CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	$ -
3.2	Monitoreos ambientales (incluye transporte)	15,0000000	468,00000000	3,1250000%	100,00%	$ 48.308.880,00	$ 1.481.782.080,00000	$ -	$ -	10,5530885423340000%	E2433495-E2433496-E2433505-E2433493-E2433518-E2433438-E2433543-E2433181-E2433429	$ -
3.3	Monitoreo fisicoquimico del agua.	6,0000000	12,00000000	50,0000000%	100,00%	$ 4.171.764,00	$ 8.343.528,00000	$ -	$ -	0,0594348468735142%	FACTURA-FELA-1985	$ -
3.4	Vigias ambientales	12,0000000	66,00000000	17,6470588%	100,00%	$ 25.919.952,00	$ 152.544.120,00000	$ -	$ -	1,0864916359480000%	E2433492-E2433518-E2433491-E2433539-E2433541	$ -
				17,65%	100,00%	$ 77.397.606,00	$ 1.658.149.737,00		$ -	11,808680152901000%		$ 8.358.727,00

				13,84%	99,97%	$ 1.396.896.373,000	$ 14.022.091.015,00		$ 8.358.727,00000	99,8408815291213%		

PISCICOLA SAN SILVESTRE

LIMPIEZA MANUAL Y ROCERIA EN CAÑOS URBANOS Y RURALES

Espacio para diligenciar Cheque

PISCICOLASANSILVESTRE

N.I.T: 829000291

Valor: $	0.00	Fecha:	27/12/24
Tipo de Documento:	COMP. DE EGRESO	Número:	E2433514

Tercero:	901864847 **UNION TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024**
Dirección:	CRR EL CENTRO VDA CAMPO Teléfono:
Son:	
Detalle:	DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIE
Observaciones:	

Cheque: **Cuenta:** **Banco:** -

FC E2433514	DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN DE 27/12/2024		
2401.01	(E2433514) DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN DE	29,248,294.00	
1110.06.19	DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA		-29,248,294.00

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal: *OBP00685 -OBP00685*

Rubro - nombre		Débitos	Créditos
2.1.2.02.02.008	*SERVICIOS PRESTADOS A LAS* *DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN*	*30,658,590.00*	
	Fte: 1.0 PROPIOS		

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
*** No se han definido Impuestos automáticos ****	0.00	0.00	0.00
Valor Neto: 0.00	Total de Descuentos:		0.00

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado Por:	Autorizado por:
WENDY BUACON	WENDY BUACON		
Auxiliar Contable	Encargado	Contador(a)	Gerente

Recibí:

C.C:

UNION TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024
NIT: 901864847-7
Dirección: CRR EL CENTRO VRDA CAMPO 22
Teléfonos: 3204909469
E-mail: utlimpiezainco@gmail.com
Ciudad: Barrancabermeja - Santander - Colombia
Departamento: Santander

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. INCO2
FACTURAS ELECTRONICAS
S/N RES No.: 18764081293119
Vigencia desde **09/10/2024** hasta **09/10/2026**
No.INCO1 A INCO50

Cliente:	PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A	Fecha de Emisión:	24/12/2024 10:29:12
NIT / C.C.:	829000291-4	Fecha de Validación:	24/12/2024 10:29:12
Dirección:	VIA AL LLANITO ESTACION PISCICOLA ESTACION DE BOMBEO	Fecha de Vencimiento:	24/01/2025
Teléfono:	3134234312	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	contabilidad@plsansilvestre.com	Medio de Pago:	Consignación bancaria
Ciudad:	Barrancabermeja - Colombia	Período de Facturación:	09/10/2024 - 09/10/2026
Departamento:	Santander	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	WORFRAN ARTURO PALENCIA RAMIREZ

Cufe: 1844d1ba0cf85b9060e4e6f4d803c8f00421ba3b710e15482f5528012c3d7a308c479cd19b2c7dc9e6907912eaf3e11d

DETALLES

Linea	Codigo	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	S001	ACTA 1. CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERIA EN LOS CAÑOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HIDRICA EN SUS CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS		2025-01-24	1.00	Unidad	30,658,590.00	0.00	E		30,658,590.00	ACTA 1. CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERIA EN LOS CAÑOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HIDRICA EN SUS CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS
2	S002	ACTA 2. CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERIA EN LOS CAÑOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HIDRICA EN SUS CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS		2025-01-24	1.00	Unidad	1,482,556,758.00	0.00	E		1,482,556,758.00	ACTA 2. CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERIA EN LOS CAÑOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HIDRICA EN SUS CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS
Total		TOTAL DE LINEA 2										

NOTAS FINALES

ACTA 1 Y 2 . CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERIA EN LOS CAÑOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HIDRICA EN SUS CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total

Total Valor Bruto	1,513,215,348.00
Total Base Imponible	0.00
IVA:	0.00
Impuesto Consumo:	0.00
Impuesto Saludable:	0.00
Total Descuentos:	0.00
Total Cargos:	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	1,513,215,348.00

MIL QUINIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,513,215,348.00

4% = 60'528 613,92
9079 292
6%=

Nota:
Condiciones comerciales:
Información bancaria:
Firma Elaborado por:
Firma Recibido por:

ACTA PARCIAL No 01 CONTRATO DE OBRA No 095 DE 2024

CONTRATANTE:	PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024
NIT:	901.864.847-7
REP LEGAL:	**JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO**
IDENTIFICACION:	CC No. 1.098.678.531 De Bucaramanga.
TELÉFONO/CELULAR:	**3145005447**
OBJETO:	"CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERÍA EN LOS CAÑOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HÍDRICA EN SUS CUERPOS LÉNTICOS Y LOTICOS"
VALOR:	**SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($6.730.321.175,00)**
DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	00214 DEL 21 DE AGOSTO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	00334 DEL 29 DE AGOSTO DE 2024
SUPERVISOR:	GICELA SANTOS CAJAR
FECHA DE INICIO:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2024

En las instalaciones de la Piscicola San Silvestre S.A., ubicadas al Kilómetro 7 vía al llanito, corregimiento que pertenece al Municipio de Barrancabermeja, se reunieron, **GICELA SANTOS CAJAR**, identificada con cedula de ciudadanía N° 28.020.077 actuando en calidad de representante legal de la Piscicola San Silvestre S.A, el contratista, **UNIÓN TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024,** identificado con NIT N° 901.864.847-7, actuando a través de su representante legal, **JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO** identificado con cedula de ciudadanía 1.098.678.531 de Bucaramanga, para suscribir el **ACTA PARCIAL N°01** del contrato en mención, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

• Valor Total del Contrato:	$6.730.321.175,00	
• Pago Acta Parcial N°1:		$ 30.658.590,00
• Subtotal:		$ 30.658.590,00
• **Saldo a Favor del Contratista:**		$ 6.699.662.585
• Sumas Iguales:	$6.730.321.175,00	$6.730.321.175,00

Los abajo firmantes CERTIFICAN que la información que está en la plataforma del SECOP II es la misma que se radica físicamente ante la unidad de contabilidad y de tesorería para el trámite de cuentas y que todos los documentos cargados corresponden al contrato **095-2024** a nombre de **UNIÓN TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024.**

Para constancia se firma por los intervinientes, en Barrancabermeja a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

El Contratante,

GICELA SANTOS CAJAR.
Gerente
Piscícola San Silvestre S.A
NIT. 829.000.291-4

El Contratista,

UNION TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024
NIT.901.864.847-7
R.L. JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO
C.C No. 1.098.678.531 De Bucaramanga.

Supervisor,

ALEXANDER BRAM MARTINEZ
Ingeniero de Producción
Piscícola San Silvestre S.A.

ACCIÓN	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Revisó aspectos legales	*Abogada Judicante*	*Angie Stephany Franco Petro*	
Aprobó aspectos legales	*Abogada*	*Carolina Alexandra Gómez Peñaloza*	
Revisó aspectos contables	*Contador*	*José de Jesús Quiceno Flórez*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

PISCÍCOLA SAN SILVESTRE Alimento para el mundo	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 1
		FECHA:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
NÚMERO DEL CONTRATO	**095-2024**
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERÍA EN LOS CAÑOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HÍDRICA EN SUS CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS"
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024
NIT	901.864.847-7
R.L.	JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO
IDENTIFICACIÓN	CC N° 1.098.678.531 DE BUCARAMANGA (SANTANDER).
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
VALOR DEL CONTRATO	**SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($6.730.321.175,00)**
FECHA DE INICIO	**30 DE AGOSTO DE 2024**
FECHA FINAL	**29 DE DICIEMBRE DE 2024**
SUPERVISOR	GICELA SANTOS CAJAR

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
ADICIÓN EN VALOR	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO	N/A
ADICIÓN EN TIEMPO	N/A
TOTAL TIEMPO EJECUTADO	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

En Barrancabermeja, se reunieron, **GICELA SANTOS CAJAR**, identificada con cedula de ciudadanía N° 28.020.077 actuando en calidad de representante legal de la Piscícola San Silvestre S.A, el contratista, **UNIÓN TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024**, identificada con NIT N° 901.864.847-7, actuando a través de su representante legal, **JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO**, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.098.678.531 de Bucaramanga, con el fin de suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción según lo descrito en el contrato de obra No. 095-2024, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

PISCÍCOLA SAN SILVESTRE Alimento para el mundo	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 1
		FECHA:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNID	CANT
1	**LIMPIEZA MANUAL Y ROCERÍA EN CAÑOS URBANOS Y RURALES**		
1,1	**Caños urbanos**		
1,1,1	Limpieza de caños de 0 a 5 metros de ancho (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	ml	570,00
1,1,2	Limpieza de caños entre 5 a 10 metros (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	ml	0,00
1,1,3	Rocería menor a 1 metro de alto (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	m2	2280,00
1,1,4	Rocería mayor a 1 metro de alto (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	m2	0,00
1,2	**Caños rurales**		
1,2,1	Limpieza de caños mayores a 10 metros de ancho	ml	0,00
1,2,2	Limpieza, destronque y rocería mayor a 1 metro de alto	m2	0,00
2,0	**MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HÍDRICA EN CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS**		
2,1	**LIMPIEZA MANUAL**		
2,1,1	Limpieza y Retiro del Material Emergente, flotante y medial que se encuentre en el espejo de agua y laderas (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	m2	0,00
2,2	**VALLAS INFORMATIVAS**		
2,2,1	Suministro e instalación de valla con enfoque en la conservación de cuerpos hídricos en el perímetro urbano (De acuerdo a especificaciones)	und	0,00
2,2,2	Suministro e instalación de valla con enfoque en la conservación de cuerpos hídricos en zona rural (De acuerdo a especificaciones)	und	0,00

Una vez verificadas las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto del contrato de obra No. 095-2024, se identificó que éstos se encuentran debidamente ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas.

PISCÍCOLA SAN SILVESTRE Alimento para el mundo	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 1
		FECHA:

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción elementos objeto del contrato, los mismos, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Barrancabermeja a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

QUIEN ENTREGA:

JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO
CC No. 1098.678.531 De Bucaramanga
UNIÓN TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024
Nit. 901.864.847-7

QUIEN RECIBE,

GICELA SANTOS CAJAR
Gerente
Piscícola San Silvestre S.A
Nit: 829.000.291-4.

Supervisor,

ALEXANDER BRAM MARTINEZ
Ingeniero de Producción
Piscícola San Silvestre S.A.

ACCIÓN	*CARGO*	*NOMBRE*	*FIRMA*
Revisó aspectos legales	*Abogada Judicante*	*Angie Franco Petro*	
Aprobó aspectos legales	*Abogada*	*Carolina Alexandra Gomez*	
Revisó aspectos contables	*Contador*	*José de Jesús Quicano Flórez*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/01/2025 09:46:54

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.
Usuario: GICELA SANTOS CAJAR
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1062

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 29,248,294,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/12/2024
Hora: 15:48:29

Número de documento: 63401777

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	****0518	UNION TEMPORAL LIMPIEZA INCO	$ 29,248,294,00	Pago Exitoso	

Espacio para diligenciar Cheque

PISCICOLASANSILVESTRE

N.I.T: 829000291

Valor: $	0.00	Fecha:	27/12/24
Tipo de Documento:	COMP. DE EGRESO	Número:	E2433515

Tercero:	901864847 **UNION TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024**
Dirección:	CRR EL CENTRO VDA CAMPO Teléfono:
Son:	
Detalle:	DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIE
Observaciones:	

Cheque: **Cuenta:** **Banco:**

FC E2433515	DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN DE 27/12/2024		
2401.01	(E2433515) DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN DE	1,414,359,147.00	
1110.06.19	DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA		-1,414,359,147.00

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal: *OBP00688 -OBP00688*

Rubro - nombre		*Débitos*	*Créditos*
2.1.2.02.02.008	*SERVICIOS PRESTADOS A LAS* *Fte: 1.0 PROPIOS*	*DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN*	*1,482,556,758.00*

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
*** No se han definido Impuestos automáticos ****	0.00	0.00	0.00
Valor Neto: 0.00	Total de Descuentos:		0.00

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado Por:	Autorizado por:
WENDY GUARIN	WENDY GUARIN		
Auxiliar Contable	Encargado	Contador(a)	Gerente

Recibí:

C.C:

ACTA PARCIAL No 02 CONTRATO DE OBRA No 095 DE 2024

CONTRATANTE:	PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024
NIT:	901.864.847-7
REP LEGAL:	**JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO**
IDENTIFICACIÓN:	CC No. 1.098.678.531 De Bucaramanga.
TELÉFONO/CELULAR:	**3145008447**
OBJETO:	"CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERÍA EN LOS CAÑOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HÍDRICA EN SUS CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS"
VALOR:	**SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 6.730.321.175,00)**
DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR EXISTENCIA PRESUPUESTAL, LO QUE OCURRA PRIMERO.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	00214 DEL 21 DE AGOSTO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	00334 DEL 29 DE AGOSTO DE 2024
SUPERVISOR:	GICELA SANTOS CAJAR
FECHA DE INICIO:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2024

En las instalaciones de la Piscicola San Silvestre S.A., ubicadas al Kilómetro 7 vía al Llanito, corregimiento que pertenece al Municipio de Barrancabermeja, se reunieron, **GICELA SANTOS CAJAR**, identificada con cedula de ciudadanía N° 28.020.077 actuando en calidad de representante legal de la Piscicola San Silvestre S.A, el contratista, **UNIÓN TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024,** identificado con **NIT** N°901.864.847-7, actuando a través de su representante legal, **JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO** identificado con cedula de ciudadanía 1.098.678.531 de Bucaramanga, para suscribir el **ACTA PARCIAL N°02** del contrato en mención, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

• Valor Total del Contrato:	$6.730.321.175,00	
• Pago Acta Parcial N°1:		$ 30.658.590,00
• Pago presente Acta Parcial N°2:		$ 1.482.556.758,00
• Subtotal:		$ 1.513.215.348,00
• **Saldo a Favor del Contratista:**		$ 5.217.105.827,00
• Sumas Iguales:	$6.730.321.175,00	$6.730.321.175,00

Los abajo firmantes CERTIFICAN que la información que está en la plataforma del SECOP II es la misma que se radica físicamente ante la unidad de contabilidad y de tesorería para el trámite de cuentas y que todos los documentos cargados corresponden al contrato 095-2024 a nombre de **UNIÓN TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024.**

Para constancia se firma por los intervinientes, en Barrancabermeja a los 24 días del mes de noviembre de 2024.

El Contratante,

GICELA SANTOS CAJAR.
Gerente
Piscicola San Silvestre S.A
NIT. 829.000.291-4

El Contratista,

UNION TEMPORAL LIMPIEZA-INCO 2024
NIT. 901.864.847-7
R.L. **JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO**
C.C No. 1.098.678.531 De Bucaramanga.

Supervisor

ALEXANDER BRAM MARTINEZ
Ingeniero de producción
Piscicola San Silvestre S.A

ACCIÓN	*CARGO*	*NOMBRE*	*FIRMA*
Revisó aspectos legales	*Abogada Judicante*	*Angie Franco Petro*	
Aprobó aspectos legales	*Abogada*	*Carolina Alexandra Gómez Peñaloza*	
Revisó aspectos contables	*Contador*	*José de Jesús Quiceno Flórez*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

PISCÍCOLA SAN SILVESTRE Alimento para el mundo	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 1
		FECHA:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
NÚMERO DEL CONTRATO	095-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERÍA EN LOS CAÑOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HÍDRICA EN SUS CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS"
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024
NIT	901.864.847-7
R.L.	JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO
IDENTIFICACIÓN	CC N° 1.098.678.531 DE BUCARAMANGA (SANTANDER).
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
VALOR DEL CONTRATO	**SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($6.730.321.175,00)**
FECHA DE INICIO	**30 DE AGOSTO DE 2024**
FECHA FINAL	**29 DE DICIEMBRE DE 2024**
SUPERVISOR	GICELA SANTOS CAJAR

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
ADICIÓN EN VALOR	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO	N/A
ADICIÓN EN TIEMPO	N/A
TOTAL TIEMPO EJECUTADO	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

En Barrancabermeja, se reunieron, **GICELA SANTOS CAJAR**, identificada con cedula de ciudadanía N° 28.020.077 actuando en calidad de representante legal de la Piscícola San Silvestre S.A, el contratista, **UNIÓN TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024**, identificada con NIT N° 901.864.847-7, actuando a través de su representante legal, **JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO**, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.098.678.531 de Bucaramanga, con el fin de suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción según lo descrito en el contrato de obra No. 095-2024, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

PISCÍCOLA SAN SILVESTRE Alimento para el mundo	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 1
		FECHA:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNID	CANT
1	**LIMPIEZA MANUAL Y ROCERÍA EN CAÑOS URBANOS Y RURALES**		
1,1	**Caños urbanos**		
1,1,1	Limpieza de caños de 0 a 5 metros de ancho (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	ml	14534,00
1,1,2	Limpieza de caños entre 5 a 10 metros (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	ml	1484,00
1,1,3	Rocería menor a 1 metro de alto (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	m2	57360,00
1,1,4	Rocería mayor a 1 metro de alto (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	m2	10433,00
1,2	**Caños rurales**		
1,2,1	Limpieza de caños mayores a 10 metros de ancho	ml	4186,00
1,2,2	Limpieza, destronque y rocería mayor a 1 metro de alto	m2	6580,00
2,0	**MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HÍDRICA EN CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS**		
2,1	**LIMPIEZA MANUAL**		
2,1,1	Limpieza y Retiro del Material Emergente, flotante y medial que se encuentre en el espejo de agua y laderas (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	m2	52010,00
2,2	**VALLAS INFORMATIVAS**		
2,2,1	Suministro e instalación de valla con enfoque en la conservación de cuerpos hídricos en el perímetro urbano (De acuerdo a especificaciones)	und	9,00
2,2,2	Suministro e instalación de valla con enfoque en la conservación de cuerpos hídricos en zona rural (De acuerdo a especificaciones)	und	1,00

Una vez verificadas las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto del contrato de obra No. 095-2024, se identificó que éstos se encuentran debidamente ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas.

PISCÍCOLA SAN SILVESTRE Alimento para el mundo	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 1
		FECHA:

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción elementos objeto del contrato, los mismos, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Barrancabermeja a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

QUIEN ENTREGA:

JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO
CC No. 1.098.678.531 De Bucaramanga
UNIÓN TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024
Nit. 901.864.847-7

QUIEN RECIBE,

GICELA SANTOS CAJAR
Gerente
Piscícola San Silvestre S.A
Nit: 829.000.291-4.

Supervisor,

ALEXANDER BRAM MARTINEZ
Ingeniero de Producción
Piscícola San Silvestre S.A

ACCIÓN	*CARGO*	*NOMBRE*	*FIRMA*
Revisó aspectos legales	*Abogada Judicante*	*Angie Stephany Franco Petro*	
Aprobó aspectos legales	*Abogada*	*Carolina Alexandra Gómez Peñaloza*	
Revisó aspectos contables	*Contador*	*José de Jesús Quiceno Flórez*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/01/2025 09:47:20

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.
Usuario: GICELA SANTOS CAJAR
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1062

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.414.359.147,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/12/2024
Hora: 15:55:06

Número de documento: 63402234

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	****0518	UNION TEMPORAL LIMPIEZA INCO	$ 1.414.359.147,00	Pago Exitoso	

Espacio para diligenciar Cheque

SAN SILVESTRE

PISCICOLASANSILVESTRE

N.I.T: 829000291

Valor: $	2,000,000,000.00	**Fecha:**	11/04/25
Tipo de Documento:	COMP. DE EGRESO	**Número:**	E2500135

Tercero:	901864847 **UNION TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024**
Dirección:	CRR EL CENTRO VDA CAMPO **Teléfono:**
Son:	DOSMIL MILLONES Pesos Colombianos
Detalle:	ABONO A FACTURA ELECTRONICA N° 03
Observaciones:	

Cheque: **Cuenta:** **Banco:** -

FC E2500135	ABONO A FACTURA ELECTRONICA N° 03	**11/04/2025**		
2401.01	(E2500135) ABONO A FACTURA ELECTRONICA N° 03		2,000,000,000.00	
1110.06.19	ABONO A FACTURA ELECTRONICA N° 03			-2,000,000,000.00

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal: *OBP00133 -OBP00133*

Rubro - nombre		*Débitos*	*Créditos*
CP.3.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS	*ABONO A FACTURA ELECTRONICA N°*	*2,000,000,000.00*	
Fte: 1.0 PROPIOS			

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
*** No se han definido Impuestos automáticos ****	2,000,000,000.00	0.00	0.00
Valor Neto: 2,000,000,000.00	Total de Descuentos:		0.00

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado Por:	Autorizado por:
Karol Valero	Karol Valero		
Auxiliar Contable	Encargado	Contador(a)	Gerente

Recibí:

C.C:

2024 PISCICOLASANSILVESTRE

N.I.T: 829000291 | Página: 1

Valor: $	0.00	Fecha:	31/12/24
Tipo de Documento:	NOTA CAUSACION	Número:	NC240520

Tercero:	901864847 UNION TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024
Dirección:	CRR EL CENTRO VDA CAMPO Teléfono:
Son:	
Detalle:	DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIE
Observaciones:	

FC NC240520	DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN DE 31/12/2024		
5111.80	(NC240520) DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN DE	4,544,073,239.00	
2436.05	DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA		-181,762,929.56
2436.291	DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA		-27,264,439.00
2401.01	DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA		-4,335,045,870.44

Presupuestos. Documento(s): OBG00686 -OBG00686

Rubro - nombre			Débitos	Créditos
2.1.2.02.02.008	*SERVICIOS PRESTADOS A LAS*	*DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN*	*4,544,073,239.00*	
	Fte: 1.0 PROPIOS			

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
*** No se han definido Impuestos automáticos ****	0.00	0.00	0.00

Valor: $ 0.00 Total de Descuentos: 0.00

(=) Valor Neto a Pagar: $ 0.00

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado Por:	Autorizado por:
Auxiliar Contable	Encargado	Contador(a)	Gerente

Abono 2 000 000 000

Falta x paga. = $2'335 045 870,44

Pago 11/04/2025

UNION TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024
NIT: 901864847-7
Dirección: CRR EL CENTRO VRDA CAMPO 22
Teléfonos: 3204909469
E-mail: utlimpiezainco@gmail.com
Ciudad: Barrancabermeja - Santander - Colombia
Departamento: Santander

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. INCO3
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No.: **18764081293119**
Vigencia desde **09/10/2024** hasta **09/10/2026**
No.INCO1 A INCO50

Cliente:	PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A	Fecha de Emisión:	24/12/2024 10:47:12
NIT / C.C.:	829000291-4	Fecha de Validación:	24/12/2024 10:47:12
Dirección:	VIA AL LLANITO ESTACION PISCICOLA ESTACION DE BOMBEO	Fecha de Vencimiento:	24/01/2025
Teléfono:	3134234312	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	contabilidad@pisansilvestre.com	Medio de Pago:	Consignación bancaria
Ciudad:	Barrancabermeja - Colombia	Período de Facturación:	09/10/2024 - 09/10/2026
Departamento:	Santander	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	WORFRAN ARTURO PALENCIA RAMIREZ

Cufe: 15fca98a7b282324e91b07cbb0089d85194bf19f47054ee808a222f23f87ddcd52d14fba1dd55e2afefdd83ca196f502

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	S003	ACTA 3. CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERIA EN LOS CAÑOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HIDRICA EN SUS CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS		2025-01-24	1.00	Unidad	4,544,073,239.00	0.00	E		4,544,073,239.00	ACTA 3. CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERIA EN LOS CAÑOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HIDRICA EN SUS CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS
Total		TOTAL DE LINEA 1										

NOTAS FINALES

ACTA 3. CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERIA EN LOS CAÑOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HIDRICA EN SUS CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total

Total Valor Bruto	4,544,073,239.00
Total Base Imponible	0.00
IVA:	0.00
Impuesto Consumo:	0.00
Impuesto Saludable:	0.00
Total Descuentos:	0.00
Total Cargos:	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	4,544,073,239.00

CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	4,544,073,239.00

Nota:
Condiciones comerciales:
Información bancaria:
Firma Elaborado por:
Firma Recibido por:

2000.000.000

PISCÍCOLA SAN SILVESTRE

ACTA PARCIAL No 03 CONTRATO DE OBRA No. 095 DE 2024

CONTRATANTE:	PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024
NIT:	901.864.847-7
REP LEGAL:	**JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO**
IDENTIFICACION:	CC No. 1.098.678.531 De Bucaramanga.
TELÉFONO/CELULAR:	**3145005447**
OBJETO:	"CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERÍA EN LOS CAÑOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HÍDRICA EN SUS CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS"
VALOR:	**SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($6.730.321.175,00)**
DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	00214 DEL 21 DE AGOSTO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	00334 DEL 29 DE AGOSTO DE 2024
SUPERVISOR:	GICELA SANTOS CAJAR
FECHA DE INICIO:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2024

En las instalaciones de la Piscícola San Silvestre S.A., ubicadas al Kilómetro 7 vía al llanito, corregimiento que pertenece al Municipio de Barrancabermeja, se reunieron, **GICELA SANTOS CAJAR**, identificada con cedula de ciudadanía N° 28.020.077 actuando en calidad de representante legal de la Piscícola San Silvestre S.A, el contratista, **UNIÓN TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024,** identificado con NIT N° 901.864.847-7, actuando a través de su representante legal, **JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO** identificado con cedula de ciudadanía 1.098.678.531 de Bucaramanga, para suscribir el **ACTA PARCIAL N°03** del contrato en mención, a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

• Valor Total del Contrato:	$6.730.321.175,00	
• Pago Acta Parcial N°1:		$ 30.658.590,00
• Pago Acta Parcial N°2:		$ 1.482.556.758,00
• Pago Presente Acta Parcial N°3:		$ 4.544.073.239,00
• Subtotal:		$ 6.057.288.587,00
• **Saldo a Favor del Contratista:**		$ 673.032.588,00
• Sumas Iguales:	$6.730.321.175,00	$6.730.321.175,00

Los abajo firmantes CERTIFICAN que la información que está en la plataforma del SECOP II es la misma que se radica físicamente ante la unidad de contabilidad y de tesorería para el trámite de cuentas y que todos los documentos cargados corresponden al contrato **095-2024** a nombre de **UNIÓN TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024.**

Para constancia se firma por los intervinientes, en Barrancabermeja a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

El Contratante,

GICELA SANTOS CAJAR.
Gerente
Piscícola San Silvestre S.A
NIT. 829.000.291-4

El Contratista,

UNION TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024
NIT. 901.864.847-7
R.L. JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO
C.C No. 1.098.678.531 De Bucaramanga.

Supervisor,

ALEXANDER BRAM MARTINEZ
Ingeniero de Producción
Piscícola San Silvestre S.A.

ACCIÓN	*CARGO*	*NOMBRE*	*FIRMA*
Revisó aspectos legales	*Abogada Judicante*	*Angie Stephany Franco Peiro*	
Aprobó aspectos legales	*Abogada*	*Caroline Alexandra Gómez Peñaloza*	
Revisó aspectos contables	*Contador*	*José de Jesús Quicano Flórez*	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

PISCÍCOLA SAN SILVESTRE Alimento para el mundo	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 1
		FECHA:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
NÚMERO DEL CONTRATO	095-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERÍA EN LOS CAÑOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HÍDRICA EN SUS CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS"
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024
NIT	901.864.847-7
R.L.	JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO
IDENTIFICACIÓN	CC N° 1.098.678.531 DE BUCARAMANGA (SANTANDER).
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
VALOR DEL CONTRATO	**SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y** CINCO PESOS M/CTE ($6.730.321.175,00)
FECHA DE INICIO	**30 DE AGOSTO DE 2024**
FECHA FINAL	**29 DE DICIEMBRE DE 2024**
SUPERVISOR	GICELA SANTOS CAJAR

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
ADICIÓN EN VALOR	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO	N/A
ADICIÓN EN TIEMPO	N/A
TOTAL TIEMPO EJECUTADO	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

En Barrancabermeja, se reunieron, **GICELA SANTOS CAJAR**, identificada con cedula de ciudadanía N° 28.020.077 actuando en calidad de representante legal de la Piscícola San Silvestre S.A, el contratista, **UNIÓN TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024**, identificada con NIT N° 901.864.847-7, actuando a través de su representante legal, **JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO**, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.098.678.531 de Bucaramanga, con el fin de suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción según lo descrito en el contrato de obra No. 095-2024, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNID	CANT
1	**LIMPIEZA MANUAL Y ROCERÍA EN CAÑOS URBANOS Y RURALES**		
1,1	**Caños urbanos**		
1,1,1	Limpieza de caños de 0 a 5 metros de ancho (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	ml	570,00
1,1,2	Limpieza de caños entre 5 a 10 metros (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	ml	0,00
1,1,3	Rocería menor a 1 metro de alto (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	m2	2280,00
1,1,4	Rocería mayor a 1 metro de alto (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	m2	0,00
1,2	**Caños rurales**		
1,2,1	Limpieza de caños mayores a 10 metros de ancho	ml	0,00
1,2,2	Limpieza, destronque y rocería mayor a 1 metro de alto	m2	0,00
2,0	**MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HÍDRICA EN CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS**		
2,1	**LIMPIEZA MANUAL**		
2,1,1	Limpieza y Retiro del Material Emergente, flotante y medial que se encuentre en el espejo de agua y laderas (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	m2	0,00
2,2	**VALLAS INFORMATIVAS**		
2,2,1	Suministro e instalación de valla con enfoque en la conservación de cuerpos hídricos en el perímetro urbano (De acuerdo a especificaciones)	und	0,00
2,2,2	Suministro e instalación de valla con enfoque en la conservación de cuerpos hídricos en zona rural (De acuerdo a especificaciones)	und	0,00

Una vez verificadas las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto del contrato de obra No. 095-2024, se identificó que éstos se encuentran debidamente ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas.

PISCÍCOLA SAN SILVESTRE Alimento para el mundo	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 1
		FECHA:

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción elementos objeto del contrato, los mismos, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Barrancabermeja a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

QUIEN ENTREGA:

JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO
CC No. 1.098.678.531 De Bucaramanga
UNIÓN TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024
Nit. 901.864.847-7

QUIEN RECIBE,

GICELA SANTOS CAJAR
Gerente
Piscícola San Silvestre S.A
Nit: 829.000.291-4.

Supervisor,

ALEXANDER BRAM MARTINEZ
Ingeniero de Producción
Piscícola San Silvestre S.A.

ACCIÓN	*CARGO*	*NOMBRE*	*FIRMA*
Revisó aspectos legales	*Abogada Judicante*	*Angie Stephany Franco Petro*	
Aprobó aspectos legales	*Abogada*	*Carolina Alexandra Gomez Peñaloza*	
Revisó aspectos contables	*Contador*	*José de Jesús Quiceno Flórez*	
*Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el **documento** y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo **nuestra** responsabilidad lo presentamos para firma.*			

Fecha: 22/04/2025 15:20:44
Producto: Cuenta de ahorros **********1062

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 2.000.000.000,00
Fecha de movimiento:	11/04/2025
Hora de movimiento:	18:06:01
Cuenta de origen:	**********1062
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	639297
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Transfer.C **0000
Usuario:	JOSE DE JESUS QUICENO FLOREZ
Id cliente Originador:	8290002914
Referencia de Pago:	65410900
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES

UNION TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024
NIT: 901864847-7
Dirección: CRR EL CENTRO VRDA CAMPO 22
Teléfonos: 3204909469
E-mail: utilimpiezainco@gmail.com
Ciudad: Barrancabermeja - Santander - Colombia
Departamento: Santander

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. INCO4
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No.: **18764081293119**
Vigencia desde **09/10/2024** hasta **09/10/2026**
No.**INCO1** A **INCO50**

Cliente:	PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A	Fecha de Emisión:	10/01/2025 14:42:34
NIT / C.C.:	829000291-4	Fecha de Validación:	10/01/2025 14:42:34
Dirección:	VIA AL LLANITO ESTACION PISCICOLA ESTACION DE BOMBEO	Fecha de Vencimiento:	10/02/2025
Teléfono:	3134234312	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	contabilidad@pisansilvestre.com	Medio de Pago:	Consignación bancaria
Ciudad:	Barrancabermeja - Colombia	Período de Facturación:	09/10/2024 - 09/10/2026
Departamento:	Santander	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	WORFRAN ARTURO PALENCIA RAMIREZ

Cufe: 7448b826f0ca9cd250dd726fe4272a527463279af8a0ed73295dbd37436fba3865bb49e37a350a1d5636ed2136f7826e

DETALLES

Linea	Codigo	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	S003	ACTA FINAL. CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERIA EN LOS CAÑOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HIDRICA EN SUS CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS		2025-02-10	1.00	Unidad	673,032,563.00	0.00	E		673,032,563.00	ACTA FINAL. CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERIA EN LOS CAÑOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HIDRICA EN SUS CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS
Total		TOTAL DE LINEA 1										

NOTAS FINALES

ACTA FINAL. CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERIA EN LOS CAÑOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HIDRICA EN SUS CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total

Total Valor Bruto	673,032,563.00
Total Base Imponible	0.00
IVA:	0.00
Impuesto Consumo:	0.00
Impuesto Saludable:	0.00
Total Descuentos:	0.00
Total Cargos:	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	673,032,563.00

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	673,032,563.00

Nota:
Condiciones comerciales:
Información bancaria:
Firma Elaborado por:
Firma Recibido por:

PISCICOLA SAN SILVESTRE

LIMPIEZA MECANICA EN CAÑOS URBANOS

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: negocios@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito

Espacio para diligenciar Cheque

PISCICOLASANSILVESTRE

N.I.T: 829000291

Valor: $	0.00	Fecha:	27/12/24
Tipo de Documento:	COMP. DE EGRESO	Número:	E2433513

Tercero:	829002572-8 **CONSTRUMULL S.A.S**
Dirección:	VDA LA CIRA CORREGIMIENTO EL Teléfono:
Son:	
Detalle:	DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE OBRA PARA REMOCIÓN DE SEDIMENTOS, MANTEN
Observaciones:	

Cheque: **Cuenta:** **Banco:** -

FC E2433513	DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN DE 27/12/2024		
2401.01	(E2433513) DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN DE	741,925,584.98	
1110.06.19	DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA		-741,925,584.98

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal: *OBP00634 -OBP00684*

Rubro - nombre		*Débitos*	*Créditos*
2.1.2.02.02.008	*SERVICIOS PRESTADOS A LAS* *DISPONIBILIDAD PARA SUSCRIPCIÓN*	*777,699,774.98*	
	Fte: 1.0 PROPIOS		

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
*** No se han definido Impuestos automáticos ****	0.00	0.00	0.00
Valor Neto: 0.00	Total de Descuentos:		0.0

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado Por:	Autorizado por:
WENDI GUARIN T	WENDI GUARIN T		
Auxiliar Contable	Encargado	Contador(a)	Gerente

Recibí:

C.C:

CONSTRUMULL S.A.S.
NIT 829.002.572-8
CALLE 47 No. 47-04
Tel: 3506672608
Barrancabermeja - Colombia
construmull@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 419

				Fecha y hora Factura	
Señores	PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A			Generación	26/12/2024, 10:49
NIT	829.000.291-4	Teléfono	(607) 3134234312 - Ext. 000	Expedición	26/12/2024, 10:49
Dirección	VIA AL LLANITO ESTACION PISCICOLA ESTAC BOMBEO	Ciudad	Barrancabermeja - Colombia	Vencimiento	26/12/2024

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1 CONTRATO DE OBRA No. 113 de 2024 PARA REMOCIÓN DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS ECOLÓGICAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	4,203.26	0 %	0.00	777,699,774.98	777,699,774.98

4% = 31'107 990,1992

Total items: 1

Total Bruto	777,699,774.98
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	777,699,774.98

Valor en Letras:
Setecientos setenta y siete millones seiscientos noventa y nueve mil setecientos setenta y cuatro pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 777,699,774.98

Grafica → 4'666.199
con la 741'925.584,98

Observaciones:
CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA No..013035514 A NOMBRE DE CONSTRUMULL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764074407403 aprobado en 20240704 prefijo FE desde el número 376 al 500 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 1

CUFE: a414b107c9a84095e5aea9ae5b35b1beaa1874e46d1c905bbc0ccc25c1fadfea897038a22910a0d14bee523068198a9a

Factura Software y Proyectos Tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Número Software Siigo 14. Fecha de creación ver en el XML

PISCÍCOLA SAN SILVESTRE

ACTA PARCIAL No 01 CONTRATO DE OBRA No 113 DE 2024

CONTRATANTE:	PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A
NIT:	829.000.291-4
CONTRATISTA:	CONSTRUMULL S.A.S
NIT:	829.002.572-8
REP LEGAL:	**JHON ALEXANDER NARVAEZ MACMAHON**
IDENTIFICACION:	CC No. 91.246.760 De Bucaramanga.
TELÉFONO/CELULAR:	**3506672808**
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA LABOR PARA LA REMOCION DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS ECOLOGICAS DE CONVERVACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR:	**TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 3.175.109.187,00)**
DURACIÓN:	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	00252 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	00389 DEL 27 SEPTIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR:	GICELA SANTOS CAJAR
FECHA DE INICIO:	01 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2024

En las instalaciones de la Piscícola San Silvestre S.A., ubicadas al Kilómetro 7 vía al llanito, corregimiento que pertenece al Municipio de Barrancabermeja, se reunieron, **GICELA SANTOS CAJAR**, identificada con cedula de ciudadanía N° 28.020.077 actuando en calidad de representante legal de la Piscícola San Silvestre S.A, el contratista, **CONSTRUMULL S.A.S**, identificado con NIT N° 829.002.572-8, actuando a través de su representante legal, **JHON ALEXANDER NARVAEZ MACMAHON** identificado con cedula de ciudadanía 91.246.760 de Bucaramanga, para suscribir el **ACTA PARCIAL N° 01** del contrato en mención, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

• Valor Total del Contrato:	$3.175.109.187,00	
• Pago presente Acta Parcial N°1:		$ 777.699.774,00
• Subtotal:		$ 777.699.774,00
• **Saldo a Favor del Contratista:**		$2.397.409.413,00
• Sumas iguales:	$3.175.109.187,00	$3.175.109.187,00

Los abajo firmantes CERTIFICAN que la información que está en la plataforma del SECOP II es la misma que se radica físicamente ante la unidad de contabilidad y de tesorería para el trámite de cuentas y que todos los documentos cargados corresponden al contrato **113-2024** a nombre de **CONSTRUMULL S.A.S**

Para constancia se firma por los intervinientes, en Barrancabermeja a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

El Contratante,

GICELA SANTOS CAJAR.
Gerente
Piscícola San Silvestre S.A
NIT. 829.000.291-4

El Contratista,

CONSTRUMULL S.A.S
NIT. 829.002.572-8
R.L. JHON ALEXANDER NARVAEZ MACMAHON
C.C No. 91.246.760 De Bucaramanga.

ACCIÓN	*CARGO*	*NOMBRE*	*FIRMA*
Revisó aspectos legales	*Abogada Judicante*	*Angie Stephany Franco Pabo*	
Aprobó aspectos legales	*Abogada*	*Carolina Alexandra Gómez Peñaloza*	
Revisó aspectos contables	*Contador*	*José de Jesús Quiceno Flórez*	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

PISCÍCOLA SAN SILVESTRE Alimento para el mundo	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 1
		FECHA:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
NÚMERO DEL CONTRATO	113-2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA LABOR PARA REMOCION DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS ECOLOGICAS DE CONVERVACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSTRUMULL S.A.S
NIT	829.002.572-8
R.L.	JHON ALEXANDER NARVAEZ MACMAHON
IDENTIFICACIÓN	CC N°91.246.760 DE BUCARAMANGA (SANTANDER).
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
VALOR DEL CONTRATO	**TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($3.175.109.187,00)**
FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA FINAL	30 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	GICELA SANTOS CAJAR

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
ADICIÓN EN VALOR	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO	N/A
ADICIÓN EN TIEMPO	N/A
TOTAL TIEMPO EJECUTADO	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

En Barrancabermeja, se reunieron, **GICELA SANTOS CAJAR**, identificada con cedula de ciudadanía N° 28.020.077 actuando en calidad de representante legal de la Piscícola San Silvestre S.A, el contratista, **CONSTRUMULL S.A.S,** identificada con NIT N° 829.002.572-8, actuando a través de su representante legal, **JHON ALEXANDER NARVAEZ MACMAHON**, identificado con cedula de ciudadanía N° 91.246.760 de Bucaramanga, con el fin de suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción según lo descrito en el contrato de obra No. 113-2024, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

PISCÍCOLA SAN SILVESTRE Alimento para el mundo	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 1
		FECHA:

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO
Contrato Nº 113-2024	$3.175.109.187,00		-	-
ACTA PARCIAL N°1		24,49%	$ 777.699.774,98	$ 777.699.774,98
ACTA PARCIAL N°2		52,18%	$ 1.656.814.356,72	$ 1.656.814.356,72
ACTA PARCIAL Nº 3		13,33%	$ 423.084.136,60	$ 423.084.136,60
ACTA FINAL		9,91%	$ 314.806.089,70	$ 314.806.089,70
TOTAL, ACUMULADO		99,91%	$ 3.172.404.358,00	$ 3.172.404.358,00
SALDO A FAVOR DE PISICOLA SAN SILVESTRE	$ 2.704.829,00	0,09 %		

Una vez verificadas las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto del contrato de obra No. 113-2024, se identificó que éstos se encuentran debidamente ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas.

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción elementos objeto del contrato, los mismos, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Barrancabermeja a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

QUIEN ENTREGA:

JHON ALEXANDER NARVAEZ MACMAHON
CC No. 91.246.760 De Bucaramanga
CONTRUMULL S.A.S
Nit. 829.002.572-8

QUIEN RECIBE,

GICELA SANTOS CAJAR
Gerente
Piscícola San Silvestre S.A
Nit: 829.000.291-4.

ACCIÓN	*CARGO*	*NOMBRE*	*FIRMA*
Revisó aspectos legales	*Abogada Judicante*	*Angie Stephany Franco Petro*	
Aprobó aspectos legales	*Abogada*	*Carolina Alexandra Peñaluza*	
Revisó aspectos contables	*Contador*	*José de Jesús Quiceno Flórez*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/01/2025 09:46:02

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.
Usuario: GICELA SANTOS CAJAR
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1062

Destino de los Fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 741,925,584,98
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/12/2024
Hora: 15:33:49

Número de documento: 62480983

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	****5514	CONSTRUHULL SAS	$ 741,925,584,98	Pago Exitoso	

Espacio para diligenciar Cheque

SAN SILVESTRE

PISCICOLASANSILVESTRE

N.I.T: 829000291

Valor: $	1,580,600,896.31	Fecha:	10/04/25
Tipo de Documento:	COMP. DE EGRESO	Número:	E2500133

Tercero:	829002572-8 **CONSTRUMULL S.A.S**
Dirección:	VDA LA CIRA CORREGIMIENTO EL Teléfono:

Son: MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS Pesos Colombianos

Detalle:	DISPONIBILIDAD PARA PAGO ACTA PARCIAL N° 2 CONTRATO DE OBRA N° 113 DE 2024
Observaciones:	

Cheque: **Cuenta:** **Banco:** -

FC E2500133	DISPONIBILIDAD PARA PAGO ACTA PARCIAL N° 2 10/04/2025		
2401.01	(E2500133) DISPONIBILIDAD PARA PAGO ACTA PARCIAL N° 2	1,580,600,896.31	
1110.06.19	DISPONIBILIDAD PARA PAGO ACTA PARCIAL N° 3 CONTRATO		-1,580,600,896.

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal: *OBP00131 -OBP00131*

Rubro - nombre		Débitos	Crédito
CP.3.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS	*DISPONIBILIDAD PARA PAGO ACTA*	*1,580,600,896.31*	
Fte: 1.0 PROPIOS			

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valo
*** No se han definido Impuestos automáticos ****	1,580,600,896.31	0.00	0.0
Valor Neto: 1,580,600,896.31	Total de Descuentos:		0.

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado Por:	Autorizado por:
Karol Valero	Karol Valero		
Auxiliar Contable	Encargado	Contador(a)	Gerente

Recibí:

C.C:

PISCICOLASANSILVESTRE

Nit de la Entidad: 829000291 **Fecha: 25/03/2025**

Tipo de Documento:	NC	Número de documento:	NCC25041
Tercero:	829002572-8 CONSTRUMULL S.A.S		
Valor: $	0.00		
Son:			

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
25032025	25/03/2025	DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE FACTURA N° 431 CUENTA PARCIAL N° 2

Código	Costos	Nit	Concepto / detalle	Débitos	Créditos
1384.95 Otras Cuentas por...	000	800197268-4 DIAN	ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE E ICA...		76,213,460.41
5111.80 Servicios	000	829002572-8 CONSTRUMULL S.A.S	ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE E ICA...	1,656,814,356.72	
2401.01 Bienes y servicios	000	829002572-8 CONSTRUMULL S.A.S	DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE FACTURA N°...		1,580,600,896.31
		Totales documento NC NCC25041		1,656,814,356.72	1,656,814,356.72

Elaborado por: Karol Valero Contabilizado por: Karol Valero Revisado por: Aprobado por:

RECIBI:
Nit-C.C.:

CONSTRUMULL S.A.S.
NIT 829.002.572-8
CALLE 47 No. 47-04
Tel: 3506672608
Barrancabermeja - Colombia
construmull@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 431

Señores	PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A			**Fecha y hora Factura**	
NIT	829.000.291-4	**Teléfono**	(607) 3134234312 - Ext. 000	**Generación**	25/03/2025, 09:26
Dirección	VIA AL LLANITO ESTACION PISCICOLA ESTAC BOMBEO	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia	**Expedición**	25/03/2025, 09:26
				Vencimiento	25/03/2025

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2 CONTRATO DE OBRA No. 113 de 2024 PARA REMOCIÓN DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS ECOLÓGICAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	8,954.64	0 %	0.00	1,656,814,356.72	1,656,814,356.72

Total Items: 1

Total Bruto 1,656,814,356.72

Valor en Letras:
Mil seiscientos cincuenta y seis millones ochocientos catorce mil trescientos cincuenta y seis pesos m/cte con setenta y dos cent.

Total a Pagar **1,656,814,356.72**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,656,814,356.72

Observaciones:
CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA No..013035514 A NOMBRE DE CONSTRUMULL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074407403 aprobado en 20240704 prefijo PB desde el número 376 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 1
CUFE: db2c1819173e03dadc075ec8dda1cf8c1b2c4b8fc6ee96033c82def2176a32fc96cca734cb9c865ab10044057d4ede3e

Espacio para diligenciar Cheque

SAN SILVESTRE

PISCICOLASANSILVESTRE

N.I.T: 829000291

Valor: $	402,776,098.00	Fecha:	11/04/25
Tipo de Documento:	COMP. DE EGRESO	Número:	E2500134

Tercero: 829002572-8 **CONSTRUMULL S.A.S**

Dirección: VDA LA CIRA CORREGIMIENTO EL **Teléfono:**

Son: CUATROCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO Pesos Colombianos

Detalle: DISPONIBILIDAD PARA PAGO ACTA PARCIAL N°3 CONTRATO DE OBRA N° 113 DE 2024

Observaciones:

Cheque: **Cuenta:** **Banco:** -

FC E2500134	DISPONIBILIDAD PARA PAGO ACTA PARCIAL N°3 11/04/2025		
2401.01	(E2500134) DISPONIBILIDAD PARA PAGO ACTA PARCIAL N°3	402,776,098.00	
1110.06.19	DISPONIBILIDAD PARA PAGO ACTA PARCIAL N°3 CONTRATO DE		-402,776,098.00

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal: *OBP00132 -OBP00132*

Rubro - nombre		Débitos	Créditos
RP.2.2.02.03.09	*Otros adquisiciones de servicios*	*DISPONIBILIDAD PARA PAGO ACTA*	*423,084,136.00*
	Fte: 1.0 PROPIOS		

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
*** No se han definido Impuestos automáticos ****	402,776,098.00	0.00	0.00
Valor Neto: **402,776,098.00**	Total de Descuentos:		0.00

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado Por:	Autorizado por:
Karol Valero	Karol Valero		
Auxiliar Contable	Encargado	Contador(a)	Gerente

Recibí:

C.C:

PISCICOLASANSILVESTRE

N.I.T: 829000291

Página: 1

Valor: $ 0.00 Fecha: 11/04/25

Tipo de Documento: NOTA CAUSACION Número: NC250071

Tercero: 829002572-8 **CONSTRUMULL S.A.S**

Dirección: VDA LA CIRA CORREGIMIENTO EL Teléfono:

Son:

Detalle: DISPONIBILIDAD PARA PAGO ACTA PARCIAL N° 3 CONTRATO DE OBRA N° 113 DE 2024

Observaciones:

FC NC250071	**DISPONIBILIDAD PARA PAGO ACTA PARCIAL N° 3 11/04/2025**		
5111.80	(NC250071) DISPONIBILIDAD PARA PAGO ACTA PARCIAL N° 3	423,084,136.00	
2436.05	DISPONIBILIDAD PARA PAGO ACTA PARCIAL N° 3 CONTRATO		-16,923,365.00
2436.30	DISPONIBILIDAD PARA PAGO ACTA PARCIAL N° 3 CONTRATO		-3,384,673.00
2401.01	DISPONIBILIDAD PARA PAGO ACTA PARCIAL N° 3 CONTRATO		-402,776,098.00

Presupuestos. Documento(s):

...ro - nombre	*Débitos*	*Créditos*

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
*** No se han definido Impuestos automáticos ****	0.00	0.00	0.00

Valor: $ **0.00** Total de Descuentos: 0.00

(=) Valor Neto a Pagar: $ **0.00**

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado Por:	Autorizado por:
Karol Valero	Karol Valero		
Auxiliar Contable	Encargado	Contador(a)	Gerente

Pagada

CONSTRUMULL SAS
NIT 829.002.572-8 CALLE 47 No. 47-04 Tel: 3506872608
Barrancabermeja - Colombia construmull@gmail.com

Factura electrónica de venta
N.º FE 432

				Fecha y hora Factura	
Señores	PISCICOLA SAN SILVESTRE SA				
LIENDRE	829.000.291-4	Teléfono	(607) 3134234312 - Ext. 000	Generación	25/03/2025, 09:40
Dirección	VIA AL LLANITO ESTACION PISCICOLA ESTAC BOMBEO	Ciudad	Barrancabermeja - Colombia	Expedición	25/03/2025, 09:40
				Vencimiento	25/03/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Carga Impoñible	Valor Imp.Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3 CONTRATO DE OBRA No. 113 de 2024 PARA REMOCIÓN DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS ECOLÓGICAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	1.00	0 %	0.00	423.084.136,60	423.084.136,60

Total de artículos: 1

Bruto total	423.084.136,60
Total a Pagar	423.084.136,60

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintitres millones ochenta y cuatro mil ciento treinta y seis pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 423.084.136,60

Observaciones:
CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA No.013035514 A NOMBRE DE CONSTRUMULL SAS

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764074407403 aprobado en 20240704 prefijo FE desde el número 376 al 500 Vigencia: 12 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 1
CUFE: 9ff258de7cffb9afd1b67bb26accbc81a16c83dfce544ea4ac6ca41f5f38a9ab8a736855c4bf719c4754cf77c06bc0b3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: por un mil 30/8

Fecha: 22/04/2025 15:19:25
Producto: Cuenta de ahorros **********1062

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 402,776.098,00
Fecha de movimiento:	11/04/2025
Hora de movimiento:	14:03:21
Cuenta de origen:	**********1062
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	500372
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Transfer.C **0000
Usuario:	JOSE DE JESUS QUICENO FLOREZ
Id cliente Originador:	8290002914
Referencia de Pago:	65400431
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES

Espacio para diligenciar Cheque

SAN SILVESTRE

PISCICOLASANSILVESTRE

N.I.T: 829000291

Valor: $	299,695,397.41	Fecha:	22/04/25
Tipo de Documento:	COMP. DE EGRESO	Número:	E2500151

Tercero:	829002572-8 CONSTRUMULL S.A.S
Dirección:	VDA LA CIRA CORREGIMIENTO EL Teléfono:
Son:	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos
Detalle:	DISPONIBILIDAD PARA PAGO FINAL DE FACTURA N° 433 CONTRATO 113-2024
Observaciones:	

Cheque: **Cuenta:** **Banco:** -

FC E2500151 DISPONIBILIDAD PARA PAGO FINAL DE FACTURA 22/04/2025

2401.01	(E2500151) DISPONIBILIDAD PARA PAGO FINAL DE FACTURA N°	299,696,116.70	
1110.06.06	DISPONIBILIDAD PARA PAGO FINAL DE FACTURA N° 433		-299,695,397.4
4808.251	DISPONIBILIDAD PARA PAGO FINAL DE FACTURA N° 433		-719.2

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal: *OBP00148 -OBP00148*

Rubro - nombre		Débitos	Créditos
RP.2.2.02.03.09	*Otras adquisiciones de servicios*	*DISPONIBILIDAD PARA PAGO FINAL*	*314,806,089.70*
	Fte: 1.0 PROPIOS		

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
*** No se han definido Impuestos automáticos ****	299,695,397.41	0.00	0.00
Valor Neto: 299,695,397.41	Total de Descuentos:		0.0

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado Por:	Autorizado por:
Karol Valero	Karol Valero	Eliana	
Auxiliar Contable	Encargado	Contador(a)	Gerente

Recibí:

C.C:

SAN SILVESTRE

PISCICOLASANSILVESTRE

N.I.T: 829000291

Página: 1

Valor: $	0.00	Fecha:	22/04/25
Tipo de Documento:	NOTA CAUSACION	Número:	NC250080

Tercero:	829002572-8 **CONSTRUMULL S.A.S**
Dirección:	VDA LA CIRA CORREGIMIENTO EL — Teléfono:
Son:	
Detalle:	DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 DE LA PISCICOLA SAN SILVESTRE SA
Observaciones:	

FC NC250080	DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE 22/04/2025		
5111.80	(NC250080) DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE	314,606,809.70	
2436.05	DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA		-12,592,244.0
2436.30	DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA		-2,518,449.0
2401.01	DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA		-299,696,116.7

Presupuestos. Documento(s):

Rubro - nombre	*Débitos*	*Crédito*

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
*** No se han definido impuestos automáticos ****	0.00	0.00	0.0

Valor: $ 0.00 Total de Descuentos: 0.0

(=) Valor Neto a Pagar: $ 0.00

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado Por:	Autorizado por:
Karol valero	Karol valero		
Auxiliar Contable	Encargado	Contador(a)	Gerente

CONSTRUMULL S.A.S.
NIT 829.002.572-8
CALLE 47 No. 47-04
Tel: 3506672608
Barrancabermeja - Colombia
construmull@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 433

Señores	PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A			**Fecha y hora Factura**	
NIT	829.000.291-4	**Teléfono**	(607) 3134234312 - Ext. 000	**Generación**	25/03/2025, 09:46
Dirección	VIA AL LLANITO ESTACION PISCICOLA ESTAC BOMBEO	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia	**Expedición**	25/03/2025, 09:46
				Vencimiento	25/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto
1	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA No. 113 de 2024 PARA REMOCIÓN DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS ECOLÓGICAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	1.00	0 %	0.00	314,806,089.70	314,806,089.70

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Trescientos catorce millones ochocientos seis mil ochenta y nueve pesos m/cte con setenta cent.

Total Bruto	314,806,089.70
Total a Pagar	**314,806,089.70**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 314,806,089.70

Observaciones:
CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA No..013035514 A NOMBRE DE CONSTRUMULL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074407403 aprobado en 20240704 prefijo FE desde el número 376 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 1
CUFE: 7e8d6b8b019681ada35ac0bb894d8b7778a183e5a81b4c1bb7b6874d7a07b3e05317d614f03f982530e350403e2c1eeb2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en cl.NAL

Fecha: 30/04/2025 14:44:14
Producto: Cuenta de ahorros **********1062

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 299.695.397,00
Fecha de movimiento:	22/04/2025
Hora de movimiento:	15:16:33
Cuenta de origen:	**********1062
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	943794
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Transfer.C **0000
Usuario:	JOSE DE JESUS QUICENO FLOREZ
Id cliente Originador:	8290002914
Referencia de Pago:	65575107
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES

PISCÍCOLA SAN SILVESTRE

Alimento para el mundo

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N°113 DEL 2024

CONTRATO No.	113-2024
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE:	PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A.
NIT:	829.000.291-4
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE DE JESUS QUICENO FLOREZ
CONTRATISTA:	CONSTRUMULL S.A.S.
NIT	829.002.572-8
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON ALEXANDER NARVEZ MACMAHON
IDENTIFICACION	C.C. N° 91.246.760
OBJETO	"CONTRATO DE OBRA PARA REMOCION DE SEDIMIENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS ECOLOGICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NÚMERO Y FECHA CDP	CDP 00252 DE 13/09/2024
NÚMERO Y FECHA RP	RP 00389 DE 27/09/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
PLAZO EJECUTADO	DOS (2) MESES Y SIETE (7) DIAS CALENDARIOS
VALOR	TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($3.175.109.187)
SUPERVISOR	EDWIN DAVID TAMARA SANABRIA
GARANTIAS	AMPARO: CUMPLIMIENTO AMPARO: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
FECHA DE CELEBRACION	27/09/2024
FECHA DE INICIO	01/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/12/2024
FECHA TERMINACION FINAL	07/12/2024

Entre los suscritos a saber: **JOSE DE JESUS QUICENO FLOREZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.096.187.823 de Barrancabermeja en calidad de supervisor, y **CONSTRUMULL S.A.S.** Nit 829.002.572-8, R.L. **JHON ALEXANDER NARVEZ MACMAHON** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.246.760, actuando en calidad de contratista, con el fin de suscribir el **ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N°113-2024** del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago, así:

1. CONSIDERANDOS

a) Que el convenio de la referencia fue celebrado y aprobado el día 06 de junio de 2024, en la plataforma SECOP 2, por las partes anteriormente identificadas, cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y LA PISCÍCOLA SAN SILVESTRE SA PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL DE CONEXIONES HÍDRICAS EN ÁREAS URBANAS Y RURALES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y EL REPOBLAMIENTO ICTICO DE LAS FUENTES HÍDRICAS."**, por un plazo de SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

b) Que el mismo se ha venido ejecutando desde el 21 de junio de 2024, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio.

c) Que la PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A., en cumplimiento de los deberes contractuales en el convenio de la referencia en su actividad contractual *3.1.1 REMOCION DE SEDIMENTOS*, da inicio a los trámites administrativos y contractuales para contar con la prestación y ejecución de esa actividad.

d) Que la PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A de acuerdo con el manual de contratación enruta administrativamente la elección del contratista, el día 09 de septiembre 2024 mediante el proceso interno de selección abreviada, fijando como objeto contractual *"CONTRATO DE OBRA PARA REMOCION DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS ECOLOGICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"*.

e) Que la PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A estructura las reglas para participar en el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA N° 002-2024.

f) Que el día 17 de septiembre de 2024 eleva invitaciones para presentar propuestas económicas a tres (3) entidades.

g) Que las entidades anteriormente mencionadas presentaron propuestas con sus respectivos anexos y requisitos documentales el día 20 de septiembre de 2024.

h) Que el día 23 de septiembre 2024, el comité presentó informe de evaluación del proceso de selección.

i) Que el día 25 de septiembre 2024, el ordenador del gasto emitió acto administrativo de adjudicación al proceso de selección.

j) Que el día 25 de septiembre 2024, el ordenador del gasto emitió acto administrativo de adjudicación al proceso de selección.

k) Que el día 27 de septiembre de 2024, las partes firman el contrato obra N° 113-2024, con plazo de TRES (3) MESES, con valor $3.175.109.187.

l) Que el día 01 de octubre de 2024, se hizo la verificación y aprobación de las pólizas exigidas dentro del proceso.

m) Que el día 01 de octubre de 2024, las partes suscriben el acta de inicio, dándole de esta manera la formalidad en la ejecución.

n) Que debido a la terminación de la ejecución por principio de anualidad y cierre de la vigencia presupuestal 2024, se constituyó como reserva presupuestal el contrato de la referencia, mediante la resolución N° 003 del 03 de enero 2025, con fundamento en la no presentación de las facturas.

2. INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Que el contratista ha cumplido a cabalidad durante el término de DOS (02) MESES Y SIETE (7) DIAS CALENDARIOS, dicha ejecución finalizó de forma anticipada, en periodo comprendidos entre el 01 de octubre de 2024 al 07 de diciembre de 2024 con las actividades descritas en el contrato N°113-2024, tal y como se relaciona.

Con base en las especificaciones técnicas y presupuestales del contrato de la referencia, el apoyo supervisión revisó y avaló las cantidades de obra en los informes de actividades 1°, 2°, 3° y el final del contratista CONSTRUMULL. A continuación, se enuncia cantidades de obra ejecutadas por el contratista.

INFORME DE ACTIVIDADES N°1 DE ACUERDO CON LA SUPERVISION DE LA PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.

La supervisión del contrato de la referencia realizó sus funciones durante la ejecución contractual en vigencia 2024 y concluyó técnicamente lo siguiente:

(...) Durante el PRIMER MES de ejecución del contrato de obra labor No. 113-24 PARA LA REMOCION DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS ECOLOGICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, correspondiente al periodo comprendido entre 01 de octubre de 2024 a 31 de octubre de 2024, se ejecutó un porcentaje físico de 24,49% de las actividades del contrato.

En la siguiente gráfica podemos observar, el avance físico con el respectivo porcentaje programado vs el porcentaje ejecutado.

En el siguiente apartado del informe, se describen las actividades administrativas y operativas ejecutadas por el contratista durante el periodo del 01 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024.(...)

Tabla 1 Avance físico programado y ejecutado de obra

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Durante el periodo	19.18%	24.49%	5,31%
Acumulado Actual	19.18%	24.49%	5,31%

Fuente: Informe supervisión N°1

Figura 1 % Avance físico de obra



Fuente: Fuente: Informe supervisión N°1

(...) En la siguiente gráfica se presenta el avance financiero el contrato, se relaciona el valor ejecutado con el respectivo porcentaje y valor durante los periodos ejecutados vs el porcentaje y valor que falta por ejecutar para completar el valor contractual. (...)


Tabla 2 Avance financiero del contrato de obra

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	% SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	% SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
ACUMULADO ANTERIOR	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	0,00%
DURANTE EL PERIODO	$ 608.910.693,00	19,18%	$ 777.699.774,98	24,49%	5,31%

ACUMULADO ACTUAL	$ 608.910.693,00	19,18%	$ 777.699.774,98	24,49%	5,31%
POR EJECUTAR	-	-	$ 2.397.409.412,02	75,51%	-

Fuente: Elaboración propia

Figura 2 Avance financiero del contrato de obra

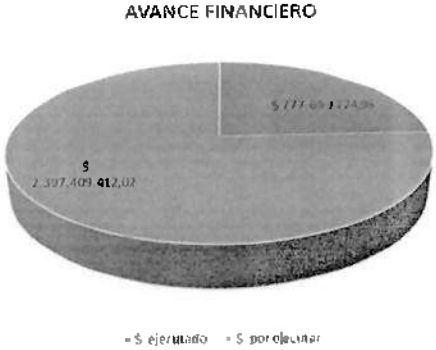

Fuente: Fuente: Informe supervisión N°1

(...) En el siguiente cuadro se muestran las cantidades ejecutadas para la actividad de remoción mecánica objeto del contrato durante el mes 1:

Tabla 3 Cantidades de obra ejecutadas Acta parcial 2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNID		CONDICIONES ORIGINALES			ACTA PARCIAL N°1		ACUMULADO GENERAL	
			DURACION MESES	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
ACTIVIDAD 1. OBRAS DE CONECTIVIDAD HIDRICA										
1	LIMPIEZA MECANICA EN CAÑOS URBANOS									
1.1	LIMPIEZA MECANICA									
1.1.1	Remoción de sedimentos	m3	3	17160,62	$185.023,00	$ 3.175.109.187,00	4.203,26	$ 777.699.774,98	4.203	$ 777.699.774,98
					TOTAL CONTRATO	$ 3.175.109.187	TOTAL ACTA 1	$ 777.699.774,98	TOTAL ACUMULADO	$ 777.699.774,98

Fuente: Fuente: Informe supervisión N°1

(...) Actividades preliminares

El contratista ejecutó labores previas al inicio de las labores de remoción mecánica, correspondientes a actividades de tipo administrativos, socializaciones, visitas, caracterización y levantamiento de actas de vecindad de las viviendas cercanas al área a intervenir y un levantamiento topográfico.

En cuanto a las labores de tipo administrativas, realizo las siguientes actividades:

- ✓ *Preparación de documentos para entrega a la supervisión posterior a la firma de acta de inicio.*
- ✓ *Formalización y compra de dotación, elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de las actividades contempladas en el contrato.*
- ✓ *Entrevistas con proveedores y formalización de compra de insumos necesarios para el desarrollo del contrato.*
- ✓ *Selección y contratación de personal requerido para la ejecución de las actividades contractuales.*

Por otro lado, el día 06 de octubre de 2024 en el sector pozo 7, se llevó a cabo socialización del contrato 113-24, liderada por el contratista CONSTRUMULL y la supervisión PISICOLA SAN SILVESTRE SA, en el que participaron las comunidades de los asentamientos humanos Renacer, Bendición de Dios, Pozo Siete, El Diamante y Las Torres.

Durante esta reunión, se realizó la presentación de la empresa responsable de la ejecución del proyecto (CONSTRUMULL SAS), se detallaron los alcances y el trazado de los sectores a intervenir con la remoción mecánica para el retiro de sedimentos orgánicos e inorgánicos del cuerpo hídrico.

Adicionalmente, se realizó visita técnica al área y a los tramos a intervenir, en la que se inspeccionó los puntos críticos, y se dieron las orientaciones e indicaciones por parte del supervisor a la comunidad y contratista. Se anexa listado de asistencia (...)

Figura 3 Registro fotográfico socialización del contrato 113-2024 y visita realizada a los caños



(...) Por otro lado, se evidenció que el contratista realizó la caracterización y levantamiento de actas de vecindad a 33 viviendas que se encontraban cerca al caño pozo 7 y eran susceptibles de presentar alguna afectación por el ingreso y trabajos de la maquinaria pesada.

En el desarrollo del levantamiento del acta de cada vivienda se verificó la siguiente información: estado de la infraestructura, tiempo de construido, sistema constructivo utilizado, tipo de material, y si cuenta con servicios básicos (agua, gas, energía electica.). Se evidenció que la totalidad de las viviendas no cumple con los procedimientos constructivos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), además presentan afectaciones estructurales (agrietamiento) por asentamiento e inestabilidad del terreno como se observa en los documentos anexos (actas de vecindad). (...)

Figura 4 Actas de vecindad barrio bendición de Dios



Figura **5 Actas** de vecindad barrio Nuevo Renacer



Figura 6 Acta de vecindad sector Bendicion de Dios



Figura **7** Acta de vecindad sector el diamante




Figura 8 Equipo consirumuli en toma de actas de vecindad



(...) Por último, previo a la realización de la actividad de remoción mecánica, el contratista realizó levantamientos topográficos antes y después para determinar los volúmenes de sedimentos extraídos en el sector pozo 7 sector puente.

Este proceso proporciona información precisa sobre las características físicas y geográficas del terreno. Además, gracias a esta evaluación detallada, se puede determinar con mayor exactitud la cantidad de sedimentos acumulados y definir las zonas prioritarias para la intervención. (...)

Figura 9 Registro fotografico de actividades de topografia

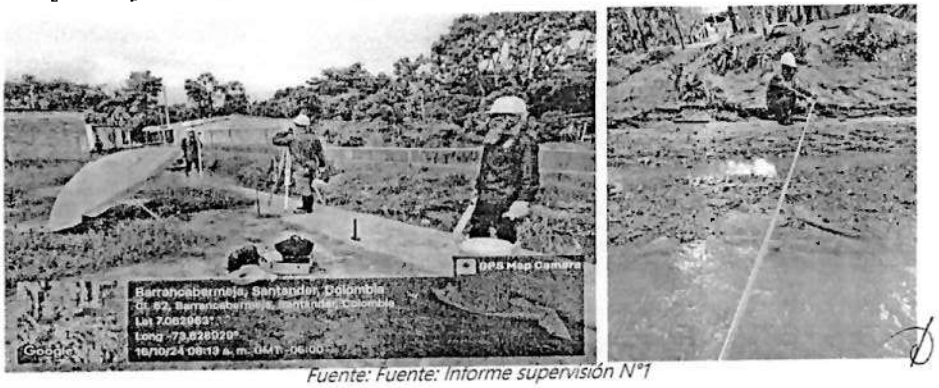

Fuente: Fuente: Informe supervisión N°1



Fuente: Informe supervisión N°1

(...) La supervisión revisó y verifico las carteras de campo y los planos generales y secciones transversales presentados por el contratista, y recibió a satisfacción la información presentada en el informe No. 1 (...)

(...) Actividades operativas ejecutadas

De acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato 113-24, la supervisión revisó y avala las cantidades de obra presentas en el informe No. 1 del contratista CONSTRUMULL, las cuales dieron inicio desde el viernes 18 de octubre de 2024 en el Caño Pozo 7 especificamente en el sector el puente. Por lo tanto, en el presente informe se relacionan las cantidades ejecutadas durante el periodo del 18 de octubre al 31 de octubre de 2024.

La actividad de remoción mecánica de sedimentos consistió en la limpieza mecánica de los sedimentos y material firmal que taponan los caños y su respectiva disposición final en el relleno o escombrera, de acuerdo con la característica del residuo. En esta actividad el contratista realizó la movilización de vehiculos, como excavadoras y retroexcavadoras, y parque automotor tipo volqueta para el transporte de los desechos extraido hasta el punto autorizado denominado escombrera LA ESPERANZA. A continuación, se detalla la localización del sector intervenido. (...)

Tabla 4 Coordenadas del tramo intervenido

COORDENADAS TRAMO CAÑO POZO 7(07) SECTOR EL PUENTE		
Inicio de tramo	7° 3'45.55"N	73°49'46.15"O
Final de tramo	7° 3'47.92"N	73°49'39.69"O

Fuente: Informe supervisión N°1

Figura 10 Localización geoespacial de caño pozo 7 sector el puente



Fuente: Elaboracion propia con base en Google Earth

(...) Frente a esta actividad, para el mes del presente informe, la supervisión inspeccionó y recibió a satisfacción las siguientes cantidades ejecutadas por el contratista CONSTRUMULL, y presentadas en el informe de ejecución No. 1. (...)


Tabla 5 Cantidades ejecutadas por el contratista


UMPIEZA MECANICA EN CAÑOS URBANOS	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANT EJECUTADA MES 1	CANTIDAD POR EJECUTAR
Remoción de sedimentos	m3	17.160,62	4.203,26	12.957,36

Fuente: Informe supervisión N°1

(...) Adicionalmente, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas por el contratista antes, durante y después de la actividad de remoción mecánica. (...)

Tabla 6 Registro fotografico de las actividades realizadas

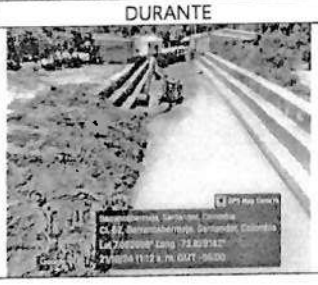ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

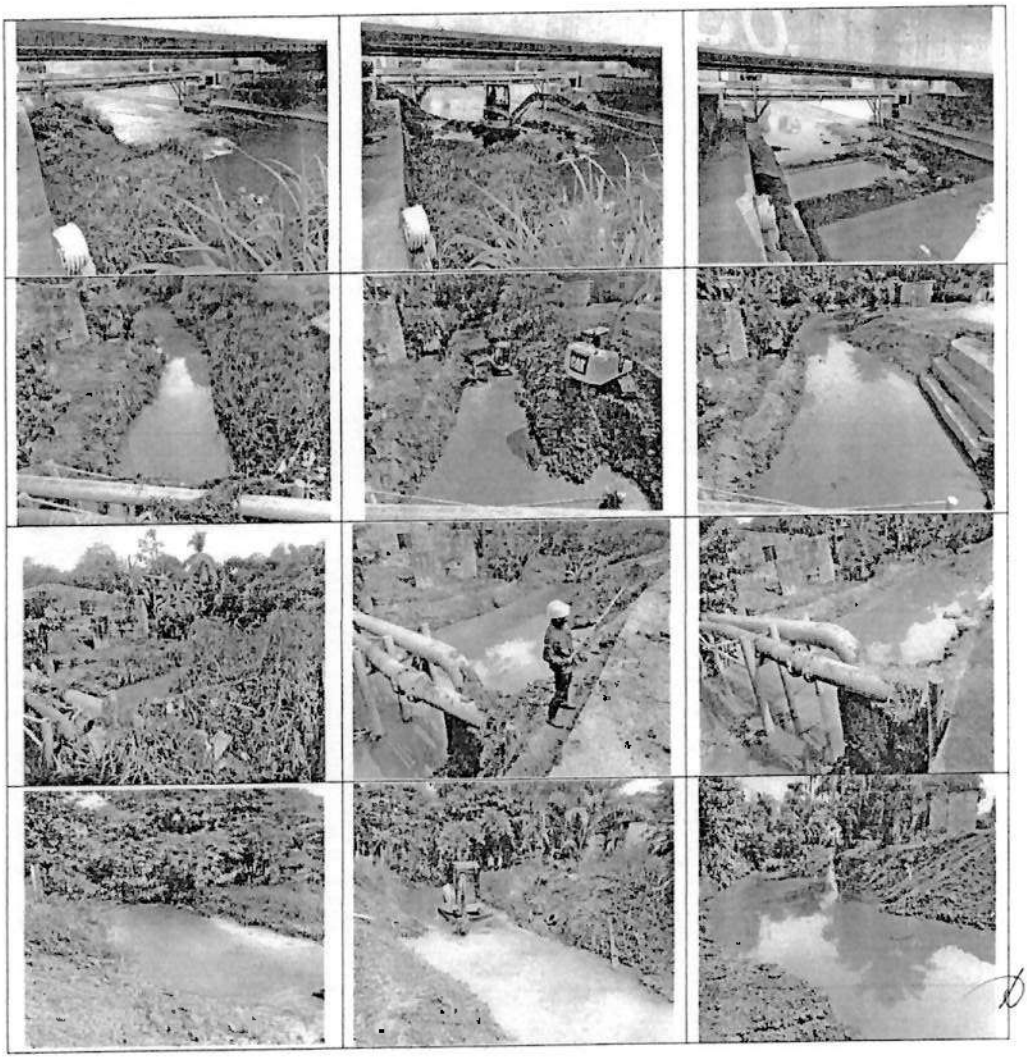






Fuente: Informe supervisión N°1

(...) En cuanto a la disposición final del material extraído del caño, la supervisión verificó la legalidad del sitio de disposición, para lo cual el contratista aportó la respectiva licencia de funcionamiento de la escombrera.

La supervisión constato que el material acopiado, es llevado mediante volquetas y dispuesto en la escombrera RCD- La esperanza localizada en el municipio de Yondo, la cual cuenta con licencia para su funcionamiento SPTDT No 096 del 19 de diciembre de 2023, tal cual como se evidencia en las siguientes imágenes.(...)

Figura 11 Registro fotografico del acopio y disposicion final de material en la escombrera

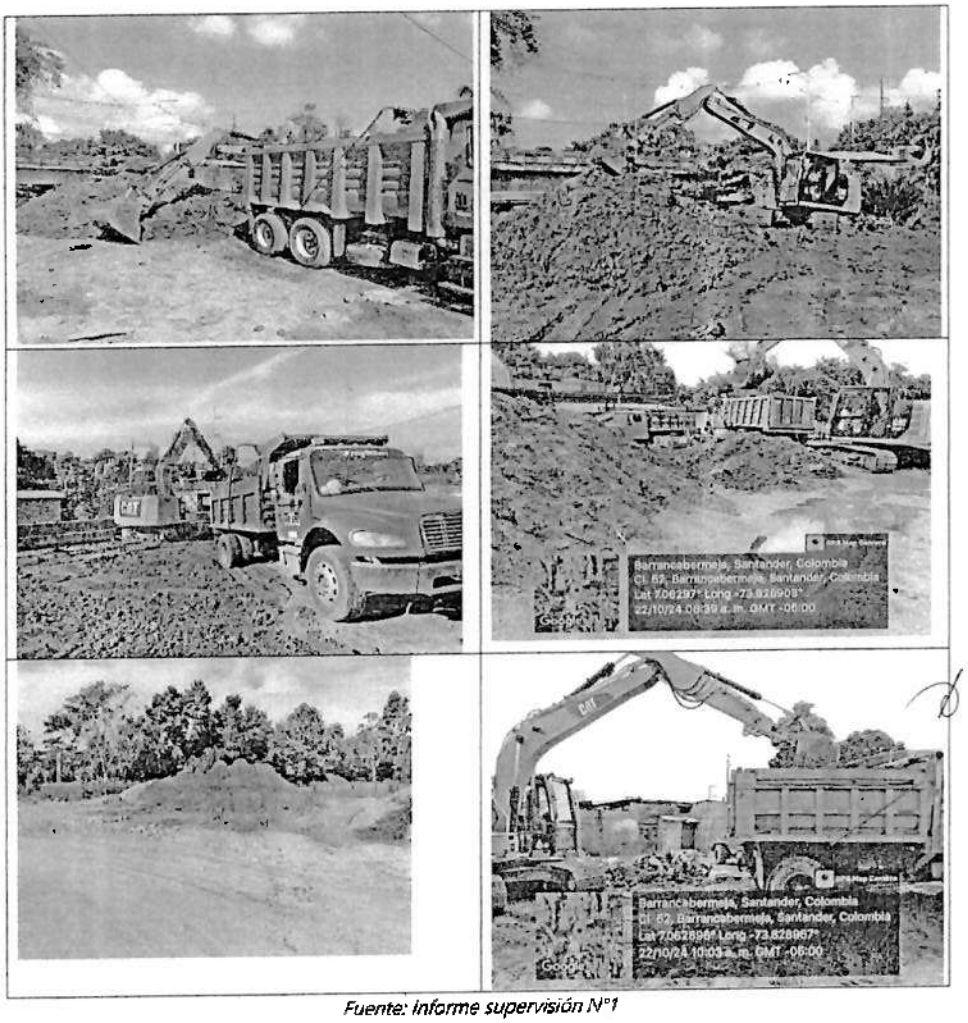

Fuente: Informe supervisión N°1

(...) VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA

Para la ejecución de las actividades en el marco del contrato No. 113-24, el contratista utilizó la siguiente maquinaria pesada:

Tabla 7 Relación de equipos utilizados por el contratista

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Excavadora Oruga	1	CATERPILLAR LINEA 313 FL
excavadora oruga	1	CATERPILLAR LINEA 312
Mini cargador	1	CATERPILLAR 236
Volquetas	8	Sqc 599 7 y 8 metros cúbicos TAQ 135 URB. 086. INJ 237 INJ. 467 OSJ. 587. SAA 864 ZIF 696

Fuente: Informe supervisión N°1

La supervisión realizó la verificación de los documentos aportados por el contratista, y se constató que soportan legalidad y cumplimiento de las normas de tránsito y transporte. El contratista aporto licencias de conducción, SOAT, pólizas y RUNT de los vehículos y maquinaria utilizada para la ejecución del contrato. (...)

(...) VERIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Durante el primer mes de ejecución del contrato No. 113-24, el contratista CONSTRUMULL, realiza las actividades del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo direccionado por el supervisor HSE, dando el cumplimiento a lo establecido en el cronograma de actividades del SGSST.

- *La supervisión realizó seguimiento a las siguientes actividades ejecutadas por le contratista:*
- *Implementación de acciones de prevención, preparación, sensibilización y respuestas ante emergencias que se presenten durante el periodo de ejecución.*
- *Capacitación y sensibilización del personal operativo del contrato N° 113-2024, sobre los riesgos y peligros identificados en el área de trabajo por medio de inducciones y socialización.*
- *Fortalecimiento de la cultura de salud y seguridad durante el periodo de ejecución, promoviendo el compromiso en el personal operativo que se encuentra activo por medio de capacitaciones según cronograma.*
- *Registro de inspecciones periódicas de herramientas, equipos y vehículos.*

Verificaciones De Capacitaciones Y Charlas

El contratista realiza las debidas inducciones al personal que ingresa por primera vez, donde se exponen temas como descripción general de la empresa, políticas de HSEQ, políticas de acoso laboral, política de alcohol,

sustancias psicoactivas y tabaquismo, objetivos y metas, misión y visión, reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, entre otros temas. De igual manera se realizan las charlas de seguridad programadas para el mes de octubre. El contratista aporta los soportes de las capacitaciones y charlas.

Tabla 8 Capacitaciones y charlas realizadas por el contratista

TEMA	PROGRAMADO	EJECUTADO
PELIGROS, RIESGOS Y CONTROLES DEL AREA DE TRABAJO.	18/10/2024	SI
ESTRÉS LABORAL	19/10/2024	SI
CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS	21/10/2024	SI
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA	22/10/2024	SI
ACTOS INSEGUROS Y CONDICIONES SUBESTANDAR	23/10/2024	SI
MANEJO DE EXTINTORES	24/10/2024	SI
USO ADECUADO DE EPP	25/10/2024	SI
ACCIDENTES OFÍDICOS	26/10/2024	SI
USO EFICIENTE DEL AGUA	28/10/2024	SI
RIESGO BIOLÓGICO	29/10/2024	SI
PREVINIENDO LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA	30/10/2024	SI
LÍNEA DE PELIGRO	31/10/2024	SI
TOTAL	SI	12
	NO	0

Fuente: Informe supervisión N°1

Tabla 9 Cumplimiento de indicador

INDICADOR	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO
$IF = \frac{\text{NÚMERO DE CAPACITACIONES EJECUTADAS}}{\text{NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS}} X100$	$IF = \frac{12}{12} X100$ IF= 100 %


Fuente: Informe supervisión N°1

Se evidencia un cumplimiento del 100% de las charlas de seguridad sobre la totalidad de las charlas programadas para el mes de octubre.

Inspecciones De Seguridad.

Dentro del desarrollo del contrato N° 113-2024, el contratista realiza inspecciones periódicas dirigidas hacia las áreas de trabajo, los elementos de protección personal y dotación evaluando el estado de estos y verificando el uso correcto, de igual manera se realizan inspecciones dirigidas a herramientas menores, vehículos y maquinaria.

Figura 12 Verificacion e inspección de maquinarias

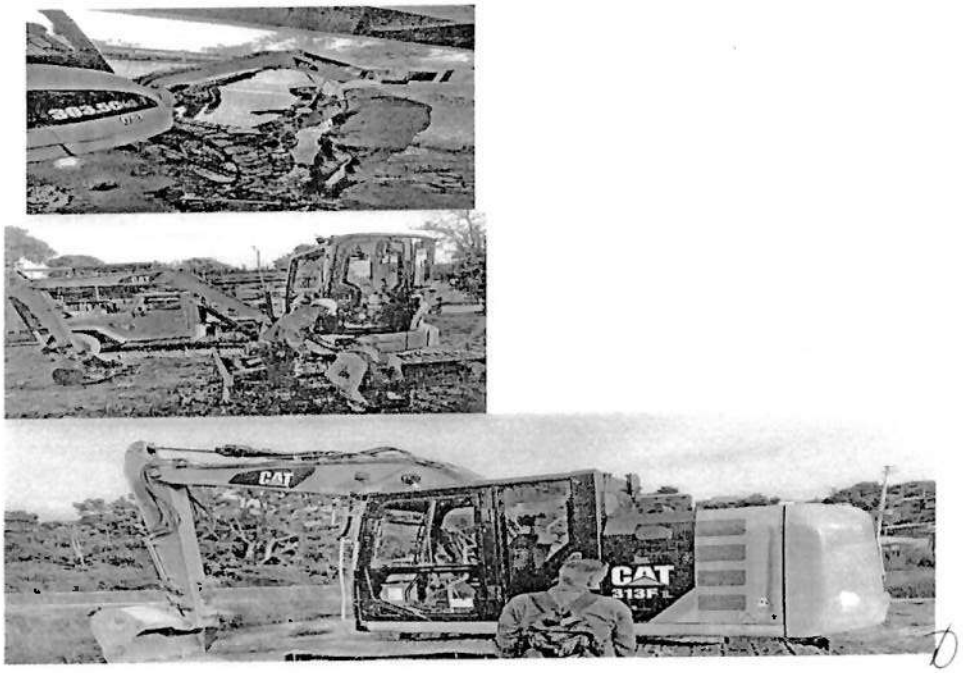

La Supervisión realiza el seguimiento al contratista CONSTRUMULL evidenciando el cumplimiento de los estándares mínimo del SGSST al momento de visitar el frente de trabajo se observa la inspección diaria del área a intervenir dejando evidencia fotográfica, inspección de herramientas, botiquín, la instalación de la señalización, el orden y el aseo, la entrega y el uso de los EPP, pausas activas, inducción, capacitación y charlas de seguridad.

El informe presentado fue revisado y analizado por Interventoría, de manera general el informe se evidencia que está bien estructurado se dejan las siguientes recomendaciones:

- *Retroalimentar capacitación sobre Riesgos Biológicos enfatizar sobre medidas de prevención mordedura de serpiente.*

- *Se recomienda coordinar diariamente con los conductores de las la recolección de los residuos, para evitar dejar los residuos en sitios donde pueda generar incomodidad a la comunidad.*
- *Los residuos deben estar señalizados y acordonados con cinta de seguridad*
- *Enfatizar en el uso de los EPP por parte de los trabajadores.*

En conclusión, la supervisión establece que el informe HSE entregado por el contratista fue revisado y analizado, de manera general se evidencia que está bien estructurado y se culmina con el 100% de las actividades de seguridad y salud en el trabajo. (...)

(...) INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

Se describe a continuación el avance de la obra, cantidades y acumulado de las actividades ejecutadas durante el mes 1 de ejecución del contrato de obra 113-2024 cuyo objeto "CONTRATO DE OBRA PARA REMOCION DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS ECOLOGICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" en el periodo comprendido entre 01 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024.

Tabla 10 Resumen de cantidades ejecutadas

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 1	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	% DE EJECUCION MES 1
LIMPIEZA MECANICA EN CAÑOS URBANOS						
1	Remoción de sedimentos	M³	17.160,62	4203.26	4203.26	24.49%

Fuente: Informe supervisión N°1

Como soporte y anexo de las cantidades ejecutadas en el mes 1, se anexa las memorias de cálculo con los diferentes trabajos realizados de remoción mecánica de sedimentos en los distintos caños del Distrito de Barrancabermeja.

Seguimiento A La Programación De Obra

En el siguiente cuadro se muestra el avance físico de obra programado y ejecutado en cada una de las actas realizadas para el Contrato N° 113-24.


Tabla 11 Seguimiento avance de obra

PROYECTO		ACTA 1
PROGRAMADO MENSUAL	P	$ 608.910.693,00

PROYECTO		ACTA 1
	%	19,18%
PROGRAMADO ACUMULADO	P	$ 608.910.693,00
	%	19,18%
EJECUTADO MENSUAL	E	$ 777.699.774,98
	%	24,49%
EJECUTADO ACUMULADO	E	$ 777.699.774,98
	%	24,49%

Fuente: Informe supervisión N°1

Figura 13 Curva de avance de obra

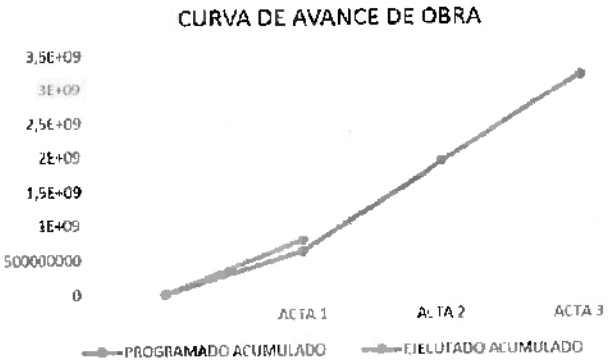

Fuente: Informe supervisión N°1

Para el periodo de ejecución de las actividades del 01 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024, se presentó un avance de obra de 24.49% equivalente a $ 777.699.774,98 de los costos directos. Con este avance se alcanzó a cumplir con lo proyectado para el primer mes de ejecución, el cual estaba por 19,18% y por un valor de $ 777.699.774,98 de los costos directos. Es decir, que durante el primer mes de ejecución no se presentaron atrasos. (...)

(...) VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Verificación del personal
Para el periodo del presente informe, el contratista CONSTRUMUL realizó la contratación del siguiente personal:

Tabla 12 Relacion del personal

NOMBRE	PROFESION	CARGO	CANTIDAD

Víctor Mario Montagut Carvajal	Ingeniero Civil	Ingeniero Residente	1
Jorge Armando Bustillo Rojas	Ingeniero Ambiental y saneamiento	Supervisor HSE	1
Gerardo Javier Borja Ibarguen	Bachiller	Guía Vial	1
Yurlevinson Forero Cala	Bachiller	Cadenero	1
Daniel Bermúdez Ardila	Bachiller	Operador de retroexcavadora	1
Jonathan Romero León	Bachiller	Oficial	1
Jose Enrique Badillo Piñeres	Bachiller	Obrero	1
Yeisson Alejandro Pérez Sanabria	Bachiller	Obrero	1
Carlos Daniel Trespalacios	Bachiller	Obrero	1
PERSONAL TOTAL			9

Fuente: Informe supervisión N°1

El contratista aportó la documentación de las respectivas hojas de vida, afiliaciones y soporte de pago de salarios, las cuales fueron revisadas y verificadas por la supervisión, encontrándose acorde con las obligaciones establecidas en el contrato.

Control De Correspondencia

Durante el periodo del primer mes de contrato, se llevó el control de la correspondencia generada, de tal forma que se intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas por la comunidad y supervisión. La correspondencia enviada y recibida, se anexa en el presente informe. Ver anexo

Tabla 13 Relación de correspondencia enviada a supervisión

No	RADICADO	FECHA	ASUNTO
1	CONSTRUMULL-BAR-131-2024-001	15 de octubre de 2024	Personal Profesional
2	CONSTRUMULL-BAR-131-2024-003	15 de octubre de 2024	Plan De Manejo De Tránsito.
3	CONSTRUMULL-BAR-131-2024-004	17 de octubre de 2024	Pólizas Actualizadas Según Acta De Inicio.
4	CONSTRUMULL-BAR-131-2024-005	17 de octubre de 2024	Documentación Retroexcavadora
5	CONSTRUMULL-BAR-131-2024-006	17 de octubre de 2024	Hojas De Vida, Afiliaciones Y Contrato.
6	CONSTRUMULL-BAR-131-2024-007	17 de octubre de 2024	Plan De Manejo Ambiental.
7	CONSTRUMULL-BAR-131-2024-008	18 de octubre de 2024	Plan Detallado De Trabajo

Fuente: Informe supervisión N°1

Tabla 14 Relación de correspondencia recibida de supervisión

No	RADICADO	FECHA	ASUNTO
1	SIN RADICADO	07 de octubre de 2024	Solicitud de documentación para dar inicio de actividades en campo del CONTRATO DE OBRA No 113-24

Fuente: Informe supervisión N°1

Comité Semanal De Seguimiento De Obra
En el periodo del 01 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024, se realizaron 4 Comités de seguimiento de Obra al contrato 113-24, para tratar temas referentes al proyecto. Ver anexo (copias de actas seguimiento de contrato). (...)

Tabla 15 Relacion de comites de seguimiento realizados

No	FECHA	ASUNTO
1	04 de octubre de 2024	Socialización de las generalidades del Contrato N°113-2024, firmado entre la Piscícola San Silvestre S.A. y la empresa CONSTRUMULL S.A.S.
2	11 de octubre de 2024	Revisar los compromisos, definir posibles fechas de inicio de las actividades, y discutir los levantamientos topográficos necesarios para el tramo comprendido entre el Puente Pozo 7 y el sector Renacer.
3	18 de octubre de 2024	Avance de la ejecución del contrato No 113-24
4	25 de octubre de 2024	Avance de la ejecución del contrato No 113-24

Fuente: Informe supervisión N°1


(...) Informes Semanales
Semanalmente el contratista presenta informe técnico, donde se evidencia las actividades ejecutadas durante la semana y el porcentaje de ejecución, los cuales fueron revisados y validado por la supervisión.

Seguimiento A Las Obras Ejecutadas
La supervisión realiza el seguimiento al plan de trabajo, y el cumplimiento por parte del contratista de las actividades contractuales. Se pudo verificar que el contratista ejecutó las actividades conforme a las especificaciones técnicas en el sector intervenido para el acta parcial No. 1. Adicionalmente, se verificó que el contratista realizara las respectivas inspecciones a los equipos y maquinarias vinculadas al proyecto, y haya realizado las charlas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento de la actualización de las pólizas cuando diera lugar.

A continuación, se muestra un registro fotográfico de las actividades de supervisión por parte de la piscola al contrato de obra No. 113-24

Tabla 16 Evidencias fotograficas de actividades de supervisión


	
Visitas técnicas con la secretaria de Medio Ambiente	*Visitas técnicas Pisicola y Secretaria de medio ambiente*
	
Inspección de los sitios de acopio de material extraido	*Revisión de la información presentada en sitio*

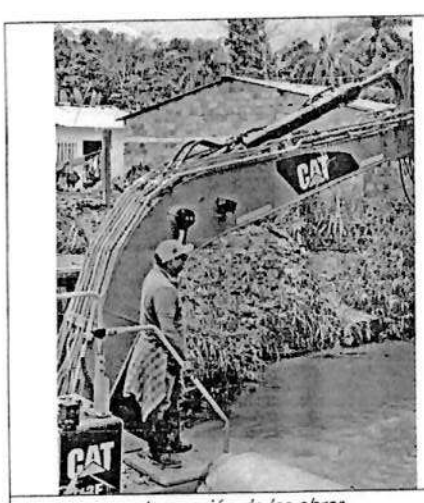

Inspección de las obras



Inspección de los trabajos

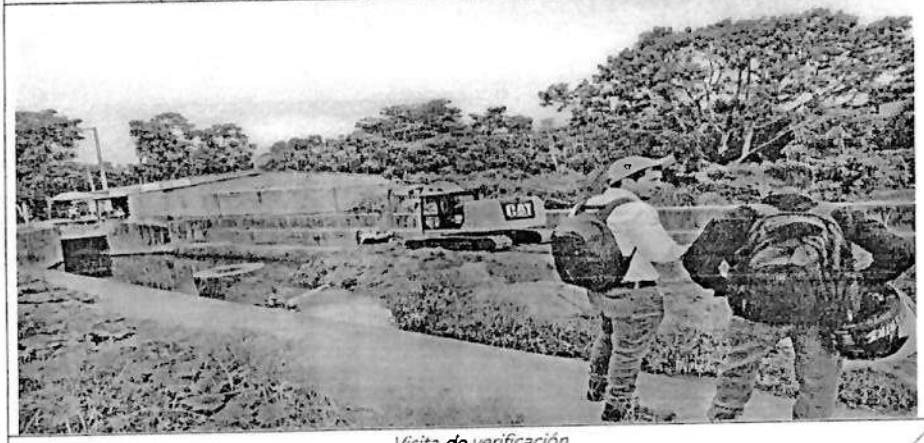

Visita de verificación

Verificación Del Pago De Seguridad Social Y Aportes Parafiscales
Para el periodo del presente informe, se verifica el pago de los aportes de seguridad social (Pensión, Salud y Riesgos Profesionales) y los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar) de los trabajadores correspondiente al mes de octubre, y certificación de revisor fiscal.

VERIFICACIÓN DE ESTADO FINANCIERO Y ECONOMICO DEL CONTRATO

De acuerdo con las actividades de obra ejecutadas en el periodo del 01 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024, el valor a facturar durante el mes 1 será de $ 777.699.774,98

Tabla 17 Estado financiero y económico del contrato

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
Contrato N° 113-2024	$3.175.109.187,00	-	-	-
ACTA PARCIAL N°1		$ 777.699.774,98	$ 777.699.774,98	-
TOTAL, ACUMULADO		$ 777.699.774,98	$ 777.699.774,98	-
SALDO	$ 2.397.409.412,02			

Fuente: Informe supervisión N°1

*A continuación, se muestra el Acta Parcial No. 1, para el cobro de **$ 777.699.774,98** que corresponde al porcentaje del **24.49%** de avance financiero ejecutado en el periodo del 01 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024 por parte del contratista CONSTRUMULL, la cual es autorizada y validada por supervisión para su correspondiente pago. (...)*

(...) VERIFICACION AVANCE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

El Plan de Manejo de Tránsito (PMT) es fundamental para la ejecución segura y eficiente del proyecto de remoción de sedimentos en Barrancabermeja. Para garantizar un transporte adecuado de la maquinaria, se han establecido una serie de pasos que minimizan los riesgos y aseguran la seguridad de todos los involucrados.

En la fase de preparación, se procedió a verificar el estado de la cama baja y la retroexcavadora hidráulica, asegurando que ambos equipos estén en condiciones óptimas para el transporte. También se revisó la documentación necesaria, incluyendo permisos y registros requeridos por las autoridades competentes. Además, se designó un conductor experimentado para operar la cama baja y la camioneta de custodia, garantizando que cuente con la capacitación necesaria.

El proceso de transporte inició con la salida de la cama baja con la retroexcavadora hidráulica desde el punto de origen. La camioneta de custodia precedió al transporte, guiando el desplazamiento hacia el sitio de destino. Durante el trayecto, se transitó por la ruta designada, respetando todas las señales de tráfico y límites de velocidad establecidos, hasta llegar al área de parqueo designada en el sitio de destino.

Figura 14 Ingreso de la cama baja al sector pozo 7




Fuente: Informe supervisión N°1

Una vez en el lugar, se posicionó la cama baja en el área designada para la descarga. Se procedió a bajar la retroexcavadora hidráulica de la cama baja, asegurando que el proceso se realice de manera controlada y segura. Posteriormente, se verificó que la máquina estuviera segura y lista para iniciar sus operaciones.

Para garantizar la seguridad durante el transporte, se utilizó señales de advertencia y luces intermitentes, alertando a otros conductores y peatones de la presencia de maquinaria pesada. También se mantuvo una distancia segura entre vehículos y se verificó el estado del clima antes y durante el transporte, ajustando el plan en caso de condiciones adversas.

Figura 15 Descargue de la maquinaria al sector pozo siete

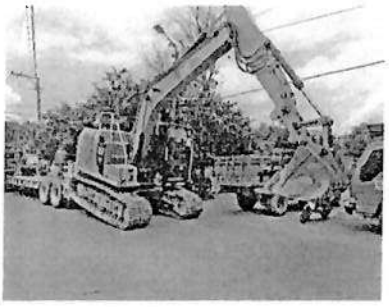

Fuente: Informe supervisión N°1

En caso de contingencias, se estableció un plan de emergencia para situaciones imprevistas, como accidentes o problemas mecánicos que puedan surgir durante el transporte. Se designó un equipo de respuesta preparado para actuar de manera rápida y efectiva en caso de incidentes.

Finalmente, se mantuvo un registro detallado del transporte y la descarga de la maquinaria, documentando el cumplimiento de cada etapa del proceso. Cualquier incidente o problema que ocurra durante el transporte será registrado, garantizando que se tomen las medidas adecuadas para prevenir futuros inconvenientes.

Figura 16 Verificación de la documentación de la retroexcavadora hidráulica



Fuente: Informe supervisión N°1

En conclusión, la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) es un componente esencial para la correcta ejecución del proyecto de remoción de sedimentos en Barrancabermeja. Este plan asegurará un transporte seguro de la maquinaria, minimizando los riesgos y garantizando la seguridad de todos los usuarios de la vía.

VERIFICACIÓN AVANCE SEGUIMIENTO AL PLAN AMBIENTAL

El seguimiento al Plan de Manejo Ambiental – PMA - del proyecto, CONTRATO DE OBRA PARA REMOCION DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS ECOLOGICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA", se realiza con el fin de hacer una evaluación de las actividades contempladas por la empresa.


A continuación, se detallan los avances, y se realiza una breve descripción de las actividades realizadas en cumplimiento del PMA establecido.

FICHA No.1. Ficha técnica manejo de combustible

Durante el periodo del presente informe, se emprendieron acciones para el control del consumo de combustible de las maquinarias utilizadas para la ejecución del proyecto, mediante el mantenimiento preventivo de las mismas, lo que permitió obtener 0 accidentes por combustibles inflamables.

Es de resaltar, que el personal contratado es el idóneo y capacitado para la operación de la maquinaria pesada.

Figura 17 Registro fotografico de mantenimiento preventivo de las maquinas

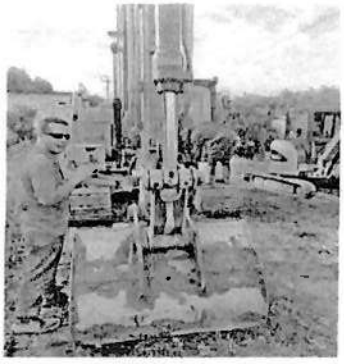

Fuente: Informe supervisión N°1

FICHA No.2. Ficha técnica Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles

Con el objetivo de minimizar el impacto generado por los procesos de combustión de los vehículos, se realizaron actividades de mantenimiento periódico a las maquinarias utilizadas. Así mismo, se garantizó que los vehículos contaran con la documentación legal para su funcionamiento tales como seguro, tecnicomecanica. (...)

Figura 18 certificacion de revisión tecnicomecanica


RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

DATOS VEHÍCULO

PLACA: DNZ264 CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET MODELO: 2010

SERVICIO: COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: NRO. MOTOR: 4HK1 164

NRO. CHASIS: VIN:

LÍNEA: NPR HTRD

COLOR: VERDE

NOMBRE PROPIETARIO:

FIRMA DEL RESPONSABLE

INFORME DE ACTIVIDADES N°2 DE ACUERDO CON LA SUPERVISION DE LA PISCICOLA SAN SILVESTRE SA

La supervisión del contrato de la referencia realizó sus funciones durante la ejecución contractual en vigencia 2024 y concluyó técnicamente lo siguiente:

(...) SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

Ejecución Física Y Financiera Del Contrato De Obra

Durante el SEGUNDO MES de ejecución del contrato de obra labor No. 113-24 PARA LA REMOCION DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS ECOLOGICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, correspondiente al periodo comprendido entre 01 de noviembre de 2024 a 30 de noviembre de 2024, se ejecutó un porcentaje físico de 52,18% de las actividades del contrato.

En la siguiente gráfica podemos observar, el avance físico con el respectivo porcentaje

Fuente: Informe supervisión N°2

Figura 19 % Avance físico de obra



Fuente: Informe supervisión N°2

En la siguiente gráfica se presenta el avance financiero el contrato, se relaciona el valor ejecutado con el respectivo porcentaje y valor durante los periodos ejecutados vs el porcentaje y valor que falta por ejecutar para completar el valor contractual.

Tabla 18 Avance financiero del contrato de obra

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	% SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	% SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO

ACUMULADO ANTERIOR	$ 608.970.693,00	19,18%	$ 777.699.774,98	24,49%	16,70%
DURANTE EL PERIODO	$ 1.295.161.000,00	40,79%	$ 1.656.814.356,72	52,18%	11,39%
ACUMULADO ACTUAL	$ 1.904.071.693,00	59,97%	$ 2.434.514.131,70	76,67%	28,09%
POR EJECUTAR	$ 1.271.037.494,00	-	$ 740.595.055,30	23,33%	-

Fuente: Informe supervisión N°2

Figura 20 Avance financiero del contrato de obra



Fuente: Informe supervisión N°2

En el siguiente cuadro se muestran las cantidades ejecutadas para la actividad de remoción mecánica objeto del contrato durante el mes 2:

Tabla 19 Cantidades de obra ejecutadas Acta parcial 2

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 1	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 2	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	% DE EJECUCION MES 2	% DE EJECUCION ACUMULADO
LIMPIEZA MECANICA EN CAÑOS URBANOS								
1	Remoción de sedimentos	M³	17.160,62	4203,26	8.954,64	13.157,90	52,18%	76,67%

Fuente: Informe supervisión N°2

Al presente informe, se anexa el acta parcial de cobro No. 2

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el SEGUNDO MES de ejecución del contrato de obra 113-24 "CONTRATO DE OBRA PARA REMOCION DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS ECOLOGICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" correspondiente al periodo comprendido entre 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024, el contratista CONSTRUMULL, ejecutó las siguientes actividades, las cuales fueron supervisadas y recibidas a satisfacción por parte de la supervisión:


Actividades preliminares

El contratista ejecutó labores previas al inicio de las labores de remoción mecánica, correspondientes a actividades de tipo administrativas, visitas, caracterización y levantamiento de actas de vecindad de las viviendas cercanas al área a intervenir y un levantamiento topográfico.

En el desarrollo del levantamiento del acta de cada vivienda se verificó la siguiente información: estado de la infraestructura, tiempo de construido, sistema constructivo utilizado, tipo de material, y si cuenta con servicios básicos (agua, gas, energía efectica.). Se evidenció que la totalidad de las viviendas no cumple con los procedimientos constructivos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), además presentan afectaciones estructurales (agrietamiento) por asentamiento e inestabilidad del terreno como se observa en los documentos anexos (actas de vecindad).

Por último, previo a la realización de la actividad de remoción mecánica, el contratista realizó levantamientos topográficos antes y después para determinar los volúmenes de sedimentos extraídos en el sector pozo 7 sector puente.

Figura 21 Registro fotografico de actividades de topografia



Fuente: Informe supervisión N°2

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente informe se deja constancia que la supervisión revisó y verifico las carteras de campo y los planos generales y secciones transversales presentados por el contratista, y recibió a satisfacción la información presentada en el informe No. 2

Actividades operativas ejecutadas

De acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato 113-24, la supervisión revisó y avala las cantidades de obra presentas en el informe No. 2 del contratista CONSTRUMULL. Por lo tanto, en el presente informe se relacionan las cantidades ejecutadas durante el periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024.

A continuación, se detallan los tramos y cantidades de obra ejecutadas por le contratista.

Tabla 20 Coordenadas del tramo intervenido en el sector El Puente

COORDENADAS TRAMO CAÑO POZO 7(07) SECTOR EL PUENTE		
Inicio de tramo	7° 3'47.92"N	73°49'39.69"O
Final de tramo	7° 3'48.08"N	73°49'35.70"O

Fuente: Informe supervisión N°2

Figura 22 Localización geoespacial de caño pozo 7 sector el puente



Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth

Tabla 21 Coordenadas del tramo intervenido Sector bendición de Dios

COORDENADAS TRAMO CAÑO POZO 7(07) SECTOR BENDICIÓN DE DIOS		
Inicio de tramo	7° 3'48.10"N	73°49'35.63"O
Final de tramo	7° 3'50.41"N	73°49'25.21"O

Fuente: Informe supervisión N°2

Figura 23 Localización geoespacial de caño pozo 7 sector el puente



Tabla 22 Coordenadas del tramo intervenido en el sector Renacer

COORDENADAS TRAMO CAÑO POZO 7(07) SECTOR RENACER		
Inicio de tramo	7° 3'50.41"N	73°49'25.21"O
Final de tramo	7° 3'50.69"N	73°49'17.56"O

Fuente: Informe supervisión N°2

Figura 24 Localización geoespacial de caño pozo 7 sector Bendicion de



Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth

Frente a esta actividad, para el mes del presente informe, la supervisión inspeccionó y recibió a satisfacción las siguientes cantidades ejecutadas por el contratista CONSTRUMULL en los siguientes lugares, las cuales fueron presentadas en el informe de ejecución No. 2.

Tabla 23 Cantidad ejecutada en cada tramo intervenido

No	NOMBRE DEL CAÑO	COMUNA	CANTIDAD
1	Caño Pozo 7- sector el puente	6	407,25
2	Caño Pozo 7- sector Renacer	6	6.569,63
3	Caño Pozo 7- Sector Bendición de Dios	6	1.977,76
TOTAL			8.954,64

Fuente: Informe supervisión N°2

Tabla 24 Cantidad ejecutada total por actividad

LIMPIEZA MECANICA EN CAÑOS URBANOS	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANT EJECUTADA MES 1	CANT EJECUTADA MES 2	CANTIDAD POR EJECUTAR
Remoción de sedimentos	m3	17.160,62	4.203,26	8.954,64	4.002,72

Fuente: Informe supervisión N°2

Adicionalmente, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas por el contratista antes, durante y después de la actividad de remoción mecánica.

Tabla 25 Registro fotográfico de las actividades realizadas en el tramo sector el Puente

ANTES	DURANTE	DESPUÉS


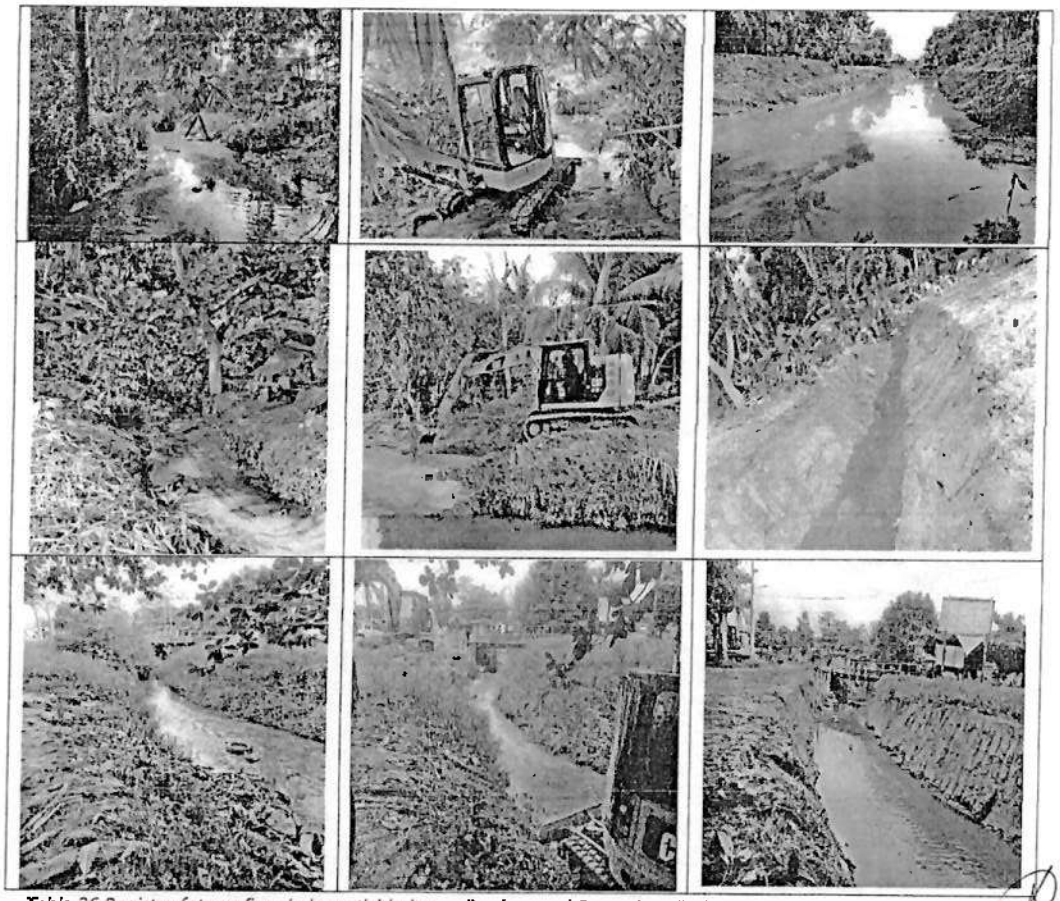


Tabla 26 Registro fotografico de las actividades realizadas en el Sector bendición de Dios

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		
		
		





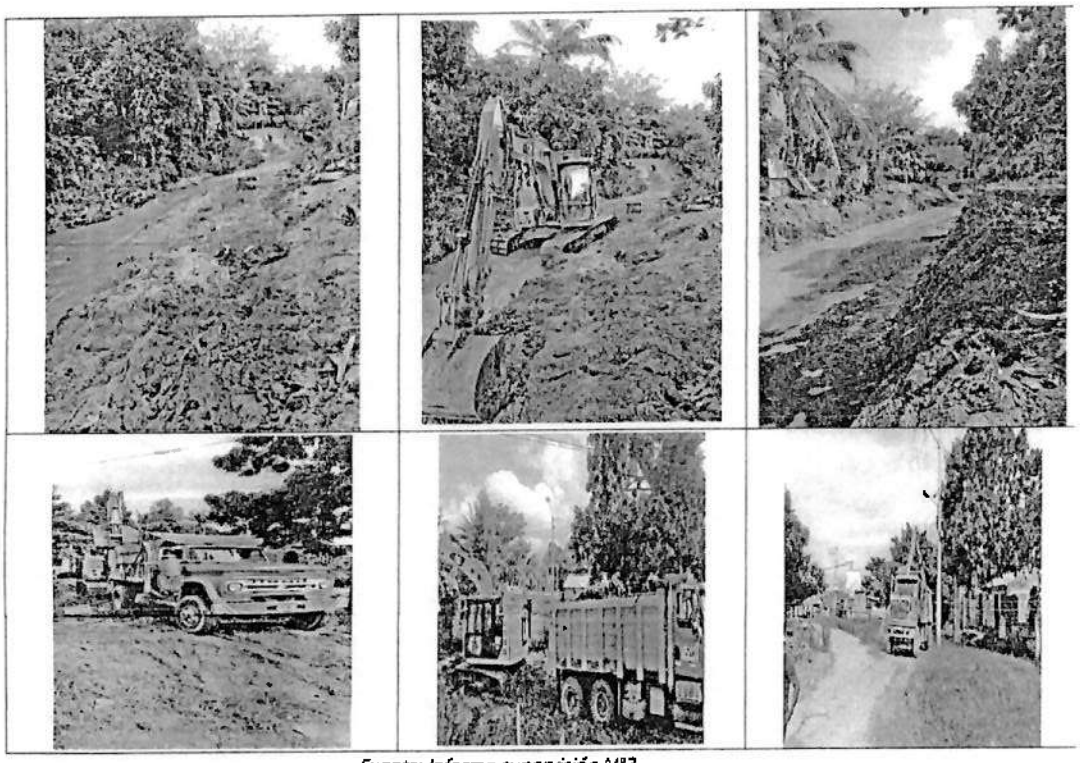

Fuente: Informe supervisión N°2

Tabla 27 Registro fotográfico de las actividades realizadas en el tramo Sector Renacer

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		









Fuente: Informe supervisión N°2

(...) En cuanto a la disposición final del material extraído del caño, la supervisión verificó la legalidad del sitio de disposición, para lo cual el contratista aportó la respectiva licencia de funcionamiento de la escombrera, así como el acta de disposición emitida por la escombrera.

La supervisión constató que el material acopiado, es llevado mediante volquetas y dispuesto en la escombrera RCD- La esperanza localizada en el municipio de Yondo, la cual cuenta con licencia para su funcionamiento SPTDT No 096 del 19 de diciembre de 2023, tal cual como se evidencia en las siguientes imágenes. (...)

Figura 25 Registro fotografico del acopio y disposicion final de material en la escombrera

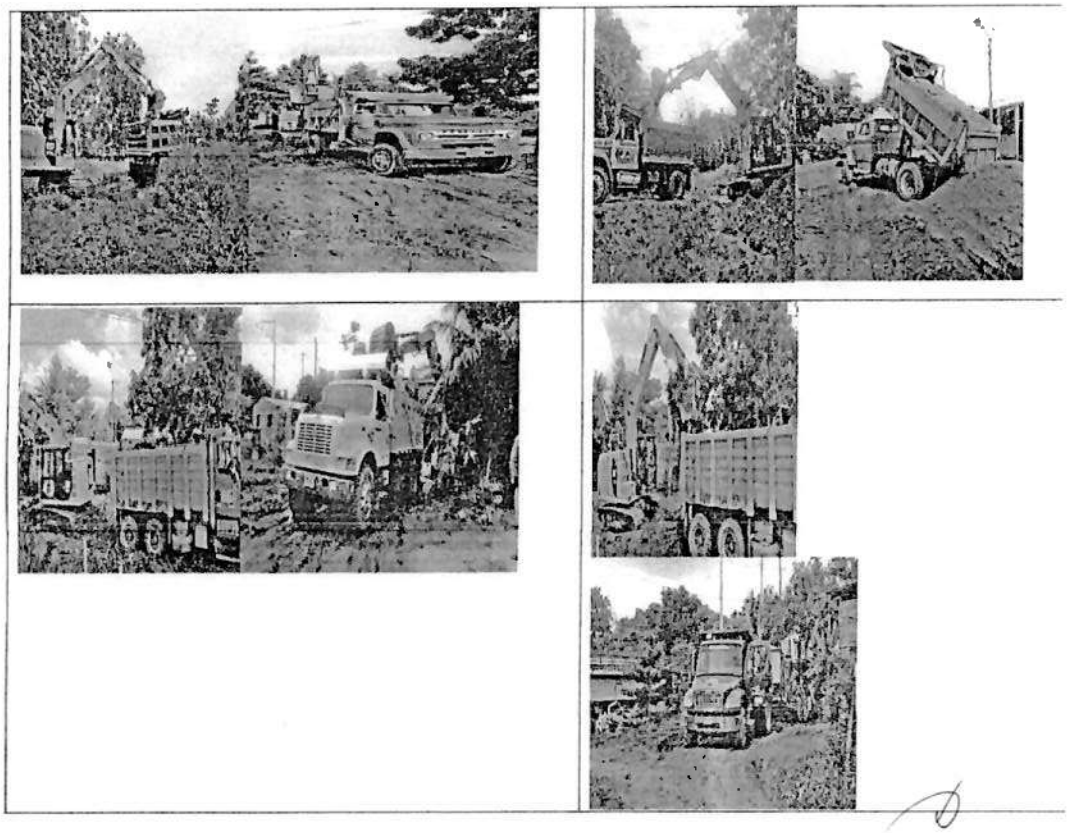

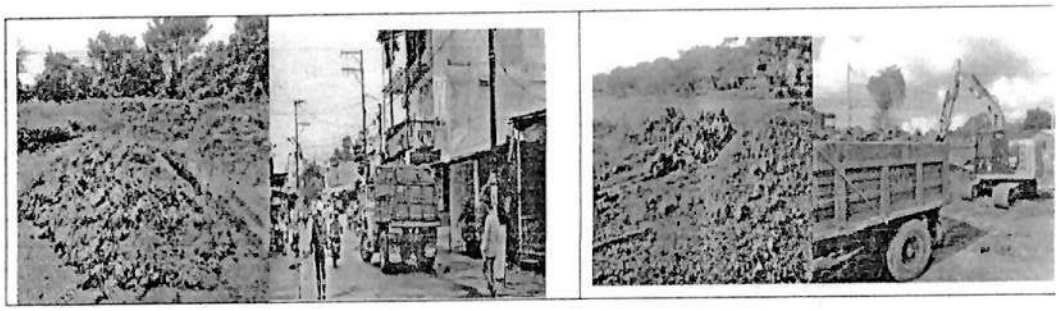

Fuente: Informe supervisión N°2

(...) VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA
Para la ejecución de las actividades en el marco del contrato No. 113-24, el contratista utilizó la siguiente maquinaria pesada:
Tabla 28 Relación de equipos utilizados por el contratista

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Excavadora Oruga	2	CATERPILLAR LINEA 313 FL
excavadora oruga	1	CATERPILLAR LINEA 312
Volquetas	12	SQC 599 TAQ 135 URB. 086. INJ 237 INJ. 467 OSJ. 587. SAA 864 ZIF 696 INA 144 OZI 121 SRR 095 TAQ065

Fuente: Informe supervisión N°2

La supervisión realizó la verificación de los documentos aportados por el contratista, y se constató que soportan legalidad y cumplimiento de las normas de tránsito y transporte. El contratista aporto licencias de conducción, SOAT, pólizas y RUNT de los vehículos y maquinaria utilizada para la ejecución del contrato. (...)

(...) VERIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Durante el segundo mes de ejecución del contrato No. 113-24, el contratista CONSTRUMULL, realiza las actividades del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo direccionado por el supervisor HSE, dando el cumplimiento a lo establecido en el cronograma de actividades del SGSST.

- *La supervisión realizó seguimiento a las siguientes actividades ejecutadas por el contratista.*

- *Implementación de acciones de prevención, preparación, sensibilización y respuestas ante emergencias que se presenten durante el periodo de ejecución.*

- *Capacitación y sensibilización del personal operativo del contrato N° 113-2024, sobre los riesgos y peligros identificados en el área de trabajo por medio de inducciones y socialización.*
- *Fortalecimiento de la cultura de salud y seguridad durante el periodo de ejecución, promoviendo el compromiso en el personal operativo que se encuentra activo por medio de capacitaciones según cronograma.*

- *Registro de inspecciones periódicas de herramientas, equipos y vehículos. (...)*

(...) Verificaciones De Capacitaciones Y Charlas
El contratista realiza las debidas inducciones al personal que ingresa por primera vez, donde se exponen temas como descripción general de la empresa, políticas de HSEQ, políticas de acoso laboral, política de alcohol, sustancias psicoactivas y tabaquismo, objetivos y metas, misión y visión, reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, entre otros temas. De igual manera se realizan las charlas de seguridad programadas para el mes de octubre. El contratista aporta los soportes de las capacitaciones y charlas. (...)
Tabla 29 Capacitaciones y charlas realizadas por el contratista

PROGRAMADO	TEMA	EJECUTADO
1/11/2024	PELIGROS, RIESGOS Y CONTROLES DEL AREA DE TRABAJO	SI
2/11/2024	ESTRÉS LABORAL	SI
4/11/2024	CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS	SI
5/11/2024	DIVULGACIÓN DE FICHA TOXICOLÓGICA CREOLINA	SI
6/11/2024	ACTOS INSEGUROS Y CONDICIONES SUBESTANDAR	SI
7/11/2024	MANEJO DE EXTINTORES	SI
8/11/2024	USO ADECUADO DE EPP	SI
9/11/2024	MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	SI
11/11/2024	USO EFICIENTE DEL AGUA	SI
12/11/2024	INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SI
13/11/2024	PREVINIENDO LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA	SI
14/11/2024	LÍNEA DE PELIGRO	SI
15/11/2024	IMPORTANCIA DEL ORDEN Y EL ASEO	SI
16/11/2024	CUIDADO DE MANOS	SI
18/11/2024	USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA	SI
19/11/2024	RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO	SI
20/11/2024	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA	SI
21/11/2024	GOLPE DE CALOR	SI
22/11/2024	EXPOSICIÓN AL RUIDO	SI
23/11/2024	RIESGO BIOLÓGICO	SI
25/11/2024	TRABAJO EN EQUIPO	SI
26/11/2024	RIESGO PSICOSOCIAL	SI
27/11/2024	DIVULGACIÓN DE FICHA TOXICOLÓGICA CAL	SI
28/11/2024	ACCIDENTES ORÍDICOS	SI
29/11/2024	COMUNICACIÓN ACERTIVA	SI
30/11/2024	ORDEN PÚBLICO (RECOMENDACIONES)	SI

Fuente: Informe supervisión N°2

Tabla 30 Cumplimiento de indicador


INDICADOR	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO
$IF = \frac{\text{NÚMERO DE CAPACITACIONES EJECUTADAS}}{\text{NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS}} X100$	$IF = \frac{26}{26} X100$ $IF = 100\ \%$

Fuente: Informe supervisión N°2

Se evidencia un cumplimiento del 100% de las charlas de seguridad sobre la totalidad de las charlas programadas para el mes de octubre.(...)

(...) Inspecciones De Seguridad.
Dentro del desarrollo del contrato N° 113-2024, el contratista realiza inspecciones periódicas dirigidas hacia las áreas de trabajo, los elementos de protección personal y dotación evaluando el estado de estos y verificando el uso correcto, de igual manera se realizan inspecciones dirigidas a herramientas menores, vehículos y maquinaria. (...)

Figura 26 Verificacion e inspección de maquinarias

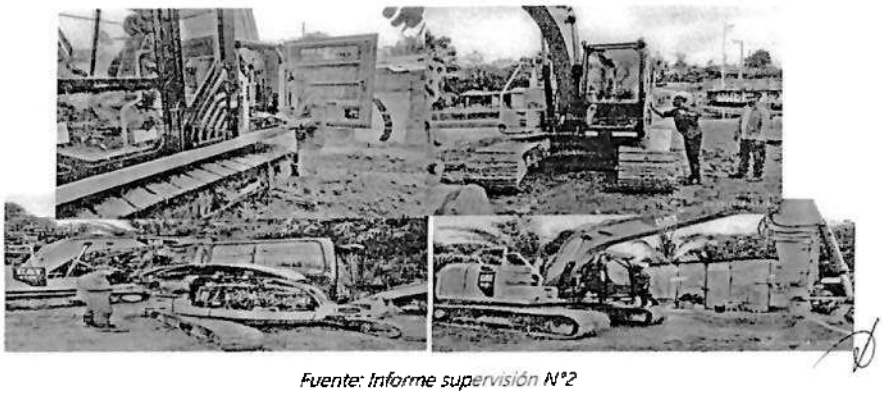

Fuente: Informe supervisión N°2

(...) La Supervisión realiza el seguimiento al contratista CONSTRUMULL evidenciando el cumplimiento de los estándares mínimo del SGSST al momento de visitar el frente de trabajo se observa la inspección diaria del área a intervenir dejando evidencia fotográfica, inspección de herramientas, botiquín, la instalación de la señalización, el orden y el aseo, la entrega y el uso de los EPP, pausas activas, inducción, capacitación y charlas de seguridad.

El informe presentado fue revisado y analizado por Interventoría, de manera general el informe se evidencia que está bien estructurado se dejan las siguientes recomendaciones:

- *Retroalimentar capacitación sobre Riesgos Biológicos enfatizar sobre medidas de prevención mordedura de serpiente.*

- *Se recomienda coordinar diariamente con los conductores de las la recolección de los residuos, para evitar dejar los residuos en sitios donde pueda generar incomodidad a la comunidad.*
- *Los residuos deben estar señalizados y acordonados con cinta de seguridad*
- *Enfatizar en el uso de los EPP por parte de los trabajadores.*

En conclusión, la supervisión establece que el informe HSE entregado por el contratista fue revisado y analizado, de manera general se evidencia que está bien estructurado y se culmina con el 100% de las actividades de seguridad y salud en el trabajo. (...)

(...) INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

Se describe a continuación el avance de la obra, cantidades y acumulado de las actividades ejecutadas durante el mes 2 de ejecución del contrato de obra 113-2024 cuyo objeto "CONTRATO DE OBRA PARA REMOCION DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS ECOLOGICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" en el periodo comprendido entre 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024. (...)

Tabla 31 Seguimiento a la programacion

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 1	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 2	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	% DE EJECUCION MES 2	% DE EJECUCION ACUMULADO
LIMPIEZA MECANICA EN CAÑOS URBANOS								
1	Remoción de sedimentos	M³	17.160,62	4203,26	8.954,64	13.157,90	52,18%	76,67%

Fuente: Informe supervisión N°2

(...) Como soporte y anexo de las cantidades ejecutadas en el mes 2, el contratista presentó las memorias de cálculo y registros de cantidades con los diferentes trabajos realizados de remoción mecánica de sedimentos en los distintos caños del Distrito de Barrancabermeja.

Seguimiento A La Programación De Obra
En el siguiente cuadro se muestra el avance físico de obra programado y ejecutado en cada una de las actas realizadas para el Contrato N° 113-24. (...)


Tabla 32 Seguimiento avance de obra

PROYECTO		ACTA 1	ACTA 2
PROGRAMADO MENSUAL	P	$ 608.910.693,00	$ 1.295.161.000,00
	%	19,18%	40,79%

PROYECTO		ACTA 1	ACTA 2
PROGRAMADO ACUMULADO	P	$ 608.910.693,00	$ 1.904.071.693,00
	%	19,18%	59,97%
EJECUTADO MENSUAL	E	$ 777.699.774,98	$ 1.656.814.356,72
	%	24,49%	52,18%
EJECUTADO ACUMULADO	E	$ 777.699.774,98	$ 2.434.514.131,70
	%	24,49%	76,67%

Fuente: Informe supervisión N°2

Figura 27 Curva de avance de obra



Fuente: Informe supervisión N°2

(...) Para el periodo de ejecución de las actividades del segundo mes, ejecutadas en el periodo del 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024, se presentó un avance de obra de 52,18% equivalente a $ 1.656.814.356,72 de los costos directos. Con este avance se alcanzó a cumplir y superar lo proyectado para el segundo mes de ejecución, el cual estaba por 40,79% y por un valor de $ 1.295.161.000,00 de los costos directos. Es decir, que durante el segundo mes de ejecución no se presentaron atrasos. (...)

(...) VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Verificación del personal

Para el periodo del presente informe, el contratista CONSTRUMUL realizó la contratación del siguiente personal:

Tabla 33 Relacion del personal

NOMBRE	PROFESION	CARGO	CANTIDAD	FECHA DE INGRESO
Victor Mario Montagut Carvajal	Ingeniero Civil	Ingeniero Residente	1	01 de octubre 2024
Jorge Armando Bustillo Rojas	Ingeniero Ambiental y saneamiento	Supervisor HSE	1	18 de octubre 2024
Gerardo Javier Borja Ibarguen	Bachiller	Guía Vial	1	21 de octubre 2024
Yurlevinson Forero Cala	Bachiller	Cadenero	1	16 de octubre 2024
Daniel Bermúdez Ardila	Bachiller	Operador de retroexcavadora	1	17 de octubre 2024
Jonathan Romero León	Bachiller	Oficial	1	16 de octubre 2024

Tabla 67 Coordenadas del tramo intervenido en el sector Diamante las torres

COORDENADAS TRAMO SECTOR DIAMANTE LAS TORRES		
Inicio de tramo	7° 3'37.13"N	73°49'57.79"O
Final de tramo	7° 3'36.04"N	73°50'0.03"O

Fuente: Informe supervisión final

Figura 47 Localización geoespacial de caño sector Diamante las Torres



Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth

Frente a esta actividad, para el periodo del acta final, la supervisión inspeccionó y recibió a satisfacción las siguientes cantidades ejecutadas por el contratista CONSTRUMULL en los siguientes lugares, las cuales fueron presentadas en el informe de ejecución final.

Tabla 68 Cantidad ejecutada en cada tramo intervenido

No	NOMBRE DEL CAÑO	COMUNA	CANTIDAD m3
1	Caño sector Diamante- Las Torres	7	1.701,44
TOTAL			1.701,44

Fuente: Informe supervisión final

Tabla 69 Cantidad ejecutada total por actividad

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 1	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 2	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 3	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	% DE EJECUCION Acta final	% DE EJECUCION ACUMULADO
LIMPIEZA MECANICA EN CAÑOS URBANOS										
1	Remoción de sedimentos	M³	17.160,62	4.203,26	8.954,64	2.286,66	1.701,44	17.146,00	9,91%	99,91%

Fuente: Informe supervisión final

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

Adicionalmente, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas por el contratista antes, durante y después de la actividad de remoción mecánica.

Tabla 70 Registro fotográfico de las actividades realizadas en el tramo Caño el Diamante las Torres.

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		
		
		
		

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA



Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA



Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@plsansilvestre.com
Web: www.plsansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA




En cuanto a la disposición final del material extraído del caño, la supervisión verificó la legalidad del sitio de disposición, para lo cual el contratista aportó la respectiva licencia de funcionamiento de la escombrera, así como el acta de disposición emitida por la escombrera.

La supervisión constató que el material acopiado, es llevado mediante volquetas y dispuesto en la escombrera RCD- La esperanza localizada en el municipio de Yondo, la cual cuenta con licencia para su funcionamiento SPTDT No 096 del 19 de diciembre de 2023, tal cual como se evidencia en las siguientes imágenes.

Figura 48 Registro fotografico del acopio y disposicion final de material en la escombrera

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

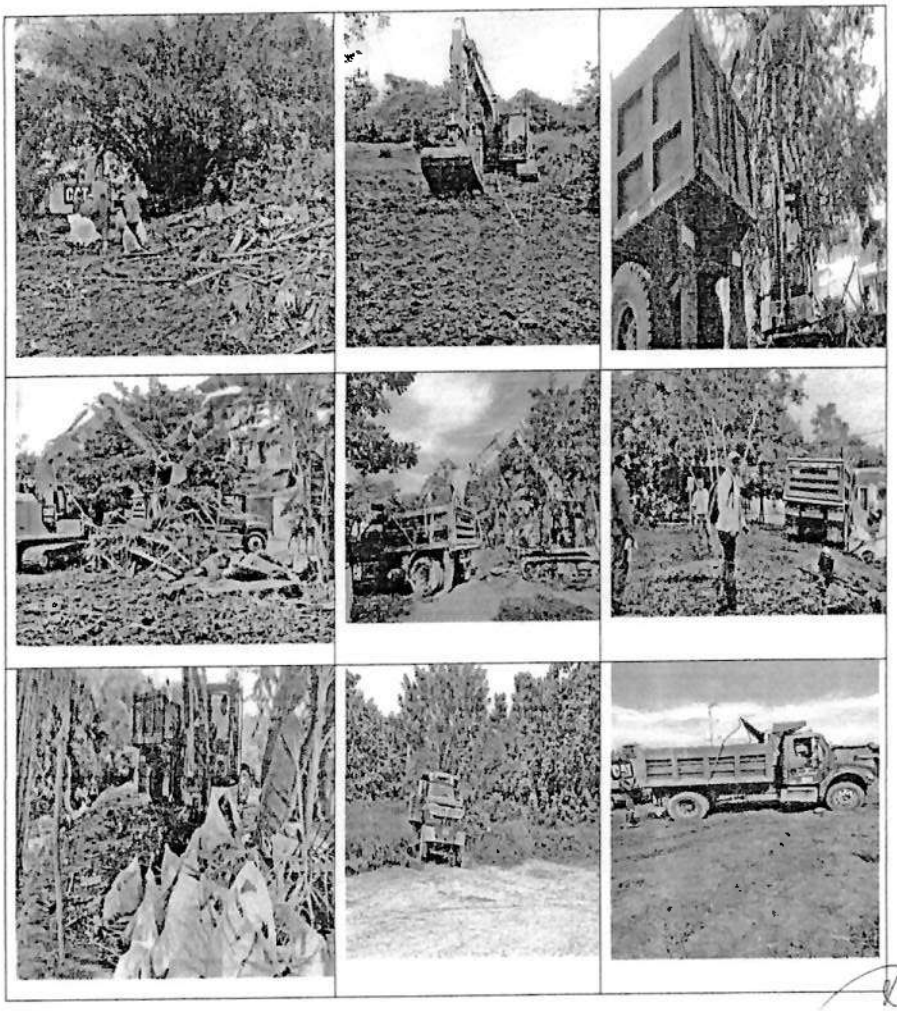

Fuente: Informe supervisión N°3

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

En el presente acápite, se realiza el consolidado de las actividades y cantidades ejecutadas durante el periodo del 01 de octubre de 2024 al 07 de diciembre de 2024, las cuales se ejecutaron conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato de obra No 113-2024 con el debido acompañamiento de supervisión. A continuación, se detalla la localización de los sectores intervenidos en el contrato.

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

Tabla 71 Coordenadas del tramo intervenido

COORDENADAS TRAMO CAÑO POZO 7(07) SECTOR EL PUENTE		
Inicio de tramo	7° 3'45.55"N	73°49'46.15"O
Final de tramo	7° 3'48.08"N	73°49'35.70"O

Figura 49 Localización geoespacial de caño pozo 7 sector el puente



Fuente: Elaboracion propia con base en Google Earth

Tabla 72 Coordenadas del tramo intervenido en el sector bendición de Dios

COORDENADAS TRAMO CAÑO POZO 7(07) SECTOR BENDICIÓN DE DIOS		
Inicio de tramo	7° 3'48.10"N	73°49'35.63"O
Final de tramo	7° 3'50.41"N	73°49'25.21"O

Fuente: Informe supervisión final

Figura 50 Localización geoespacial de caño pozo 7 sector



Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth

Tabla 73 Coordenadas del tramo intervenido en el sector Renacer

COORDENADAS TRAMO CAÑO POZO 7(07) SECTOR RENACER		
Inicio de tramo	7° 3'50.41"N	73°49'25.21"O
Final de tramo	7° 3'50.69"N	73°49'17.56"O

Fuente: Informe supervisión final

Figura 51 Localización geoespacial de caño pozo 7 sector Renacer

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@piscansilvestre.com
Web: www.piscansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA




Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth

Tabla 74 Coordenadas del tramo intervenido en el sector Diamante las torres

COORDENADAS TRAMO SECTOR DIAMANTE LAS TORRES		
Inicio de tramo	*7° 3'45.52"N*	*73°49'46.29"O*
Final de tramo	*7° 3'37.13"N*	*73°49'57.79"O*

Fuente: Informe supervisión final

Figura 52 Localización geoespacial de caño sector Diamante las Torres

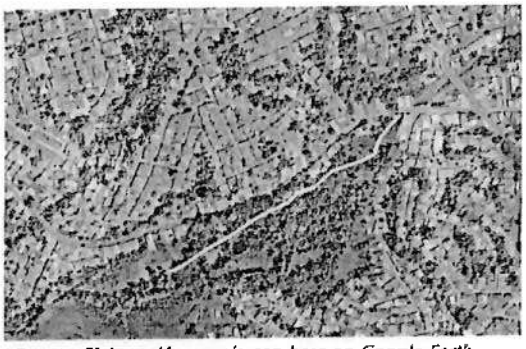

Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth

En la siguiente tabla se indica la localización de los sitios intervenidos, con sus respectivas cantidades ejecutadas, según las actas parciales y final.

Tabla 75 Cantidad ejecutada en cada tramo intervenido

REMOCION DE SEDIMENTOS							
Sectores intervenidos	*Cantidad contractual*	*Unidad*	*Acta parcial 1*	*Acta parcial 2*	*Acta Parcial 3*	*Acta Final*	*Total*
Caño Pozo 7- Sector el Puente	*17.160,62*	*M3*	*4203,26*	*407,250*	*0,00*	*0,00*	*4.610,51*
Caño Pozo 7- Sector Bendición de Dios			*0,00*	*1977,76*	*0,00*	*0,00*	*1977,76*


Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

Caño Pozo 7- Sector Renacer			0,00	6.569,63	0,00	0,00	6.569,63
Caño sector Diamante-Las Torres			0,00	0,00	2.286,66	1.701,44	3.988,10
TOTAL			4203,26	8.954,640	2.286,66	1.701,44	17.146,00
NOTA	De la cantidad total por ejecutar, quedó un saldo en cantidad de 14,62 m3						


Fuente: Informe supervisión final

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas por el contratista antes, durante y después de la actividad de remoción mecánica en cada uno de los sectores intervenidos.


Figura 53 Registro fotografico de remocion de sedimentos caño Pozo 7 sector el puente

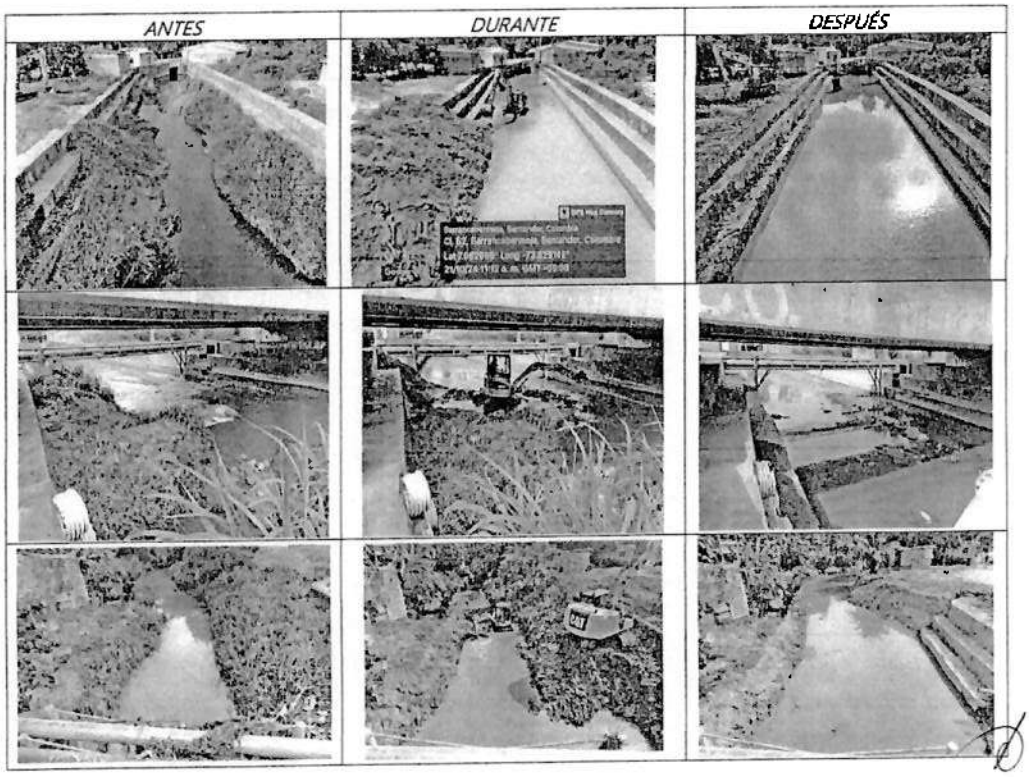

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

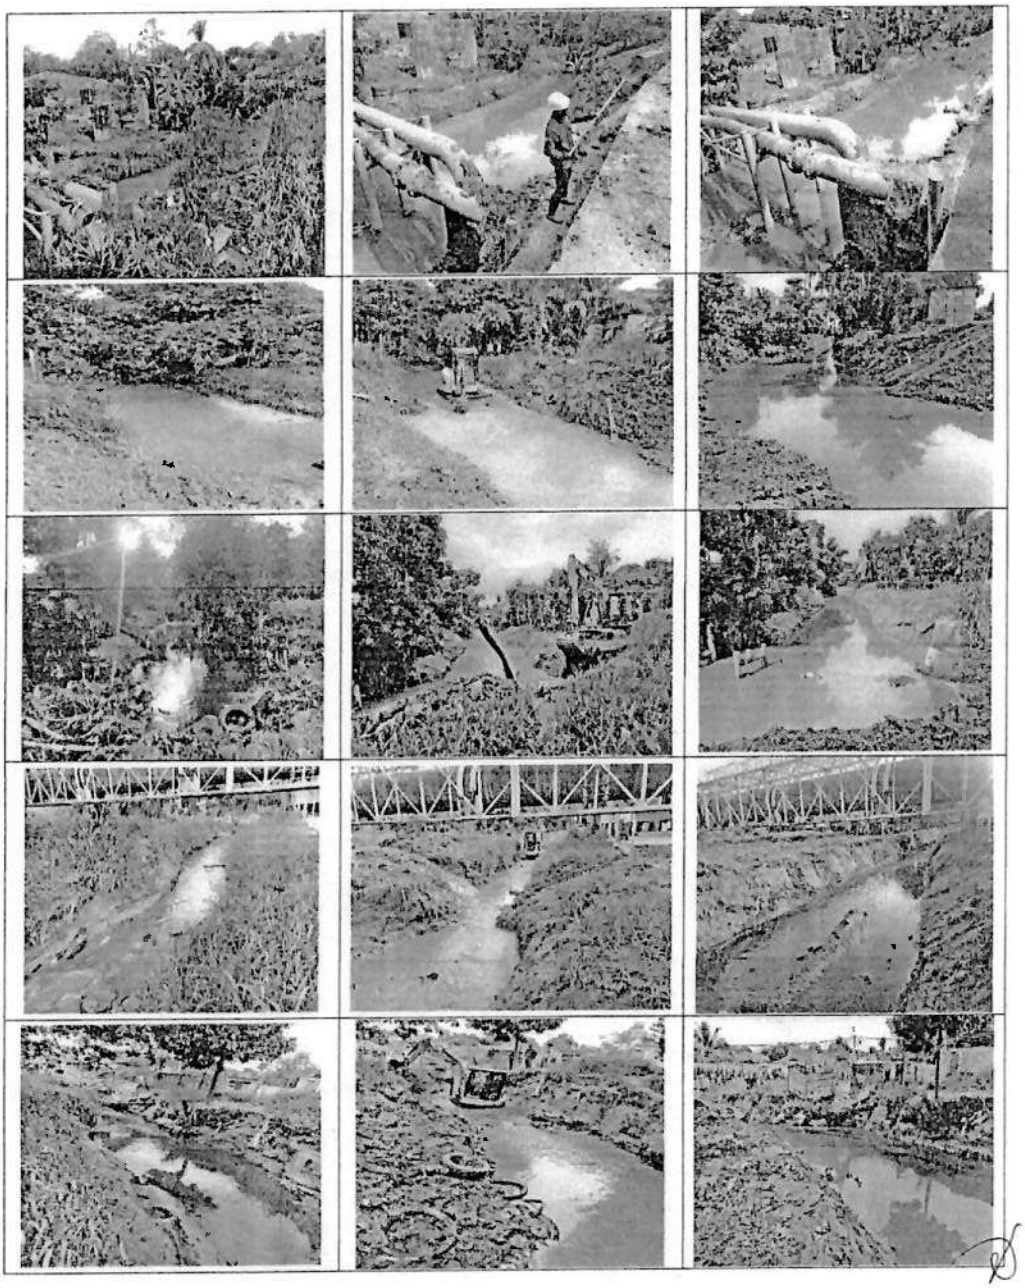


Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

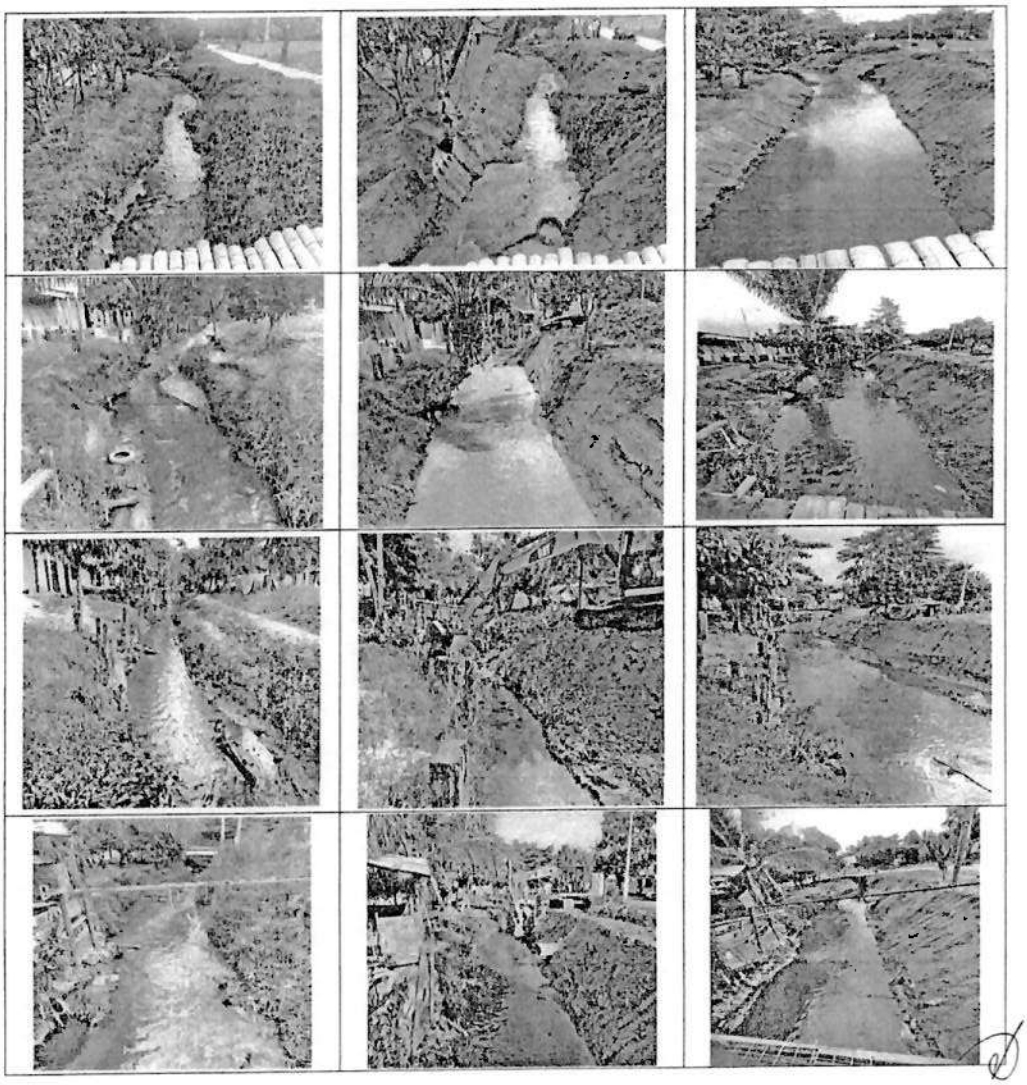


Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA



Figura 54 Registro fotográfico de las actividades realizadas en el tramo bendición de Dios

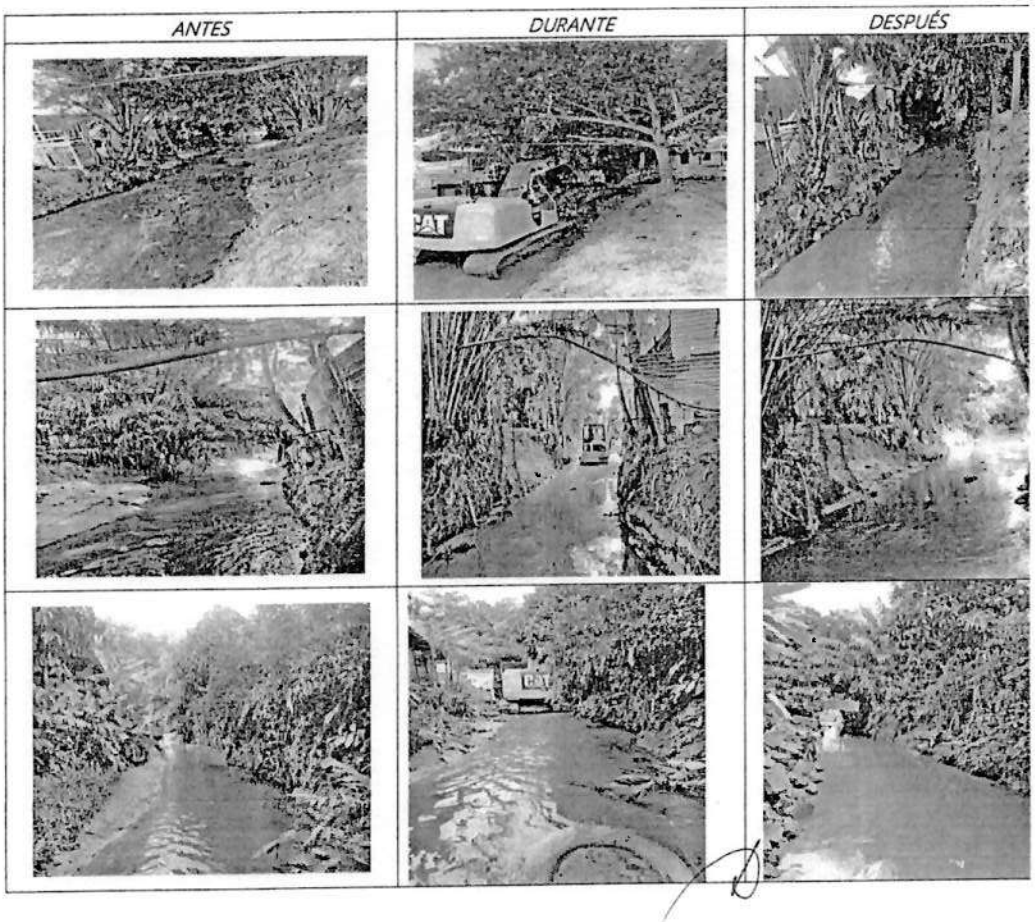

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

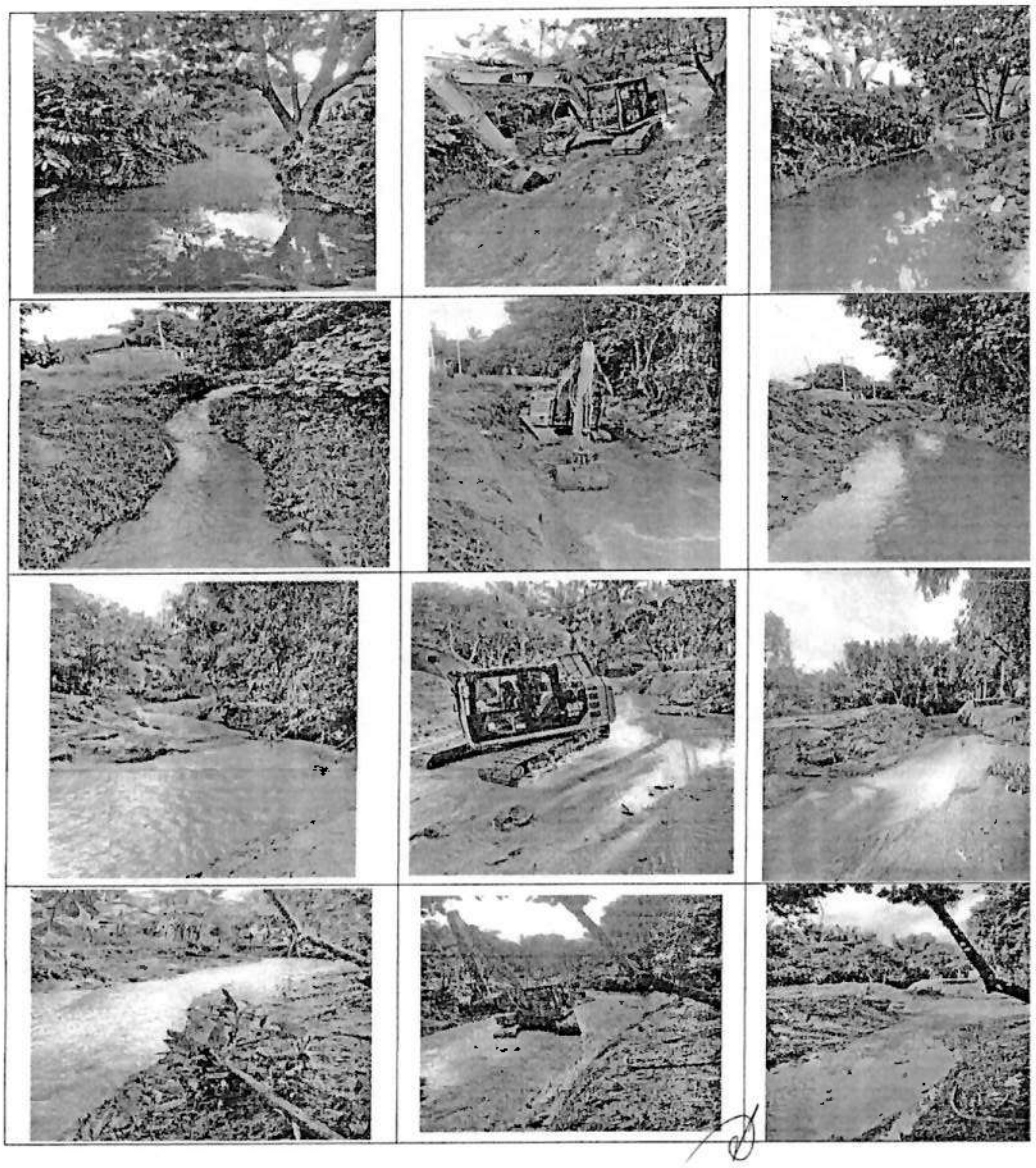

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@piscansilvestre.com
Web: www.piscansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA


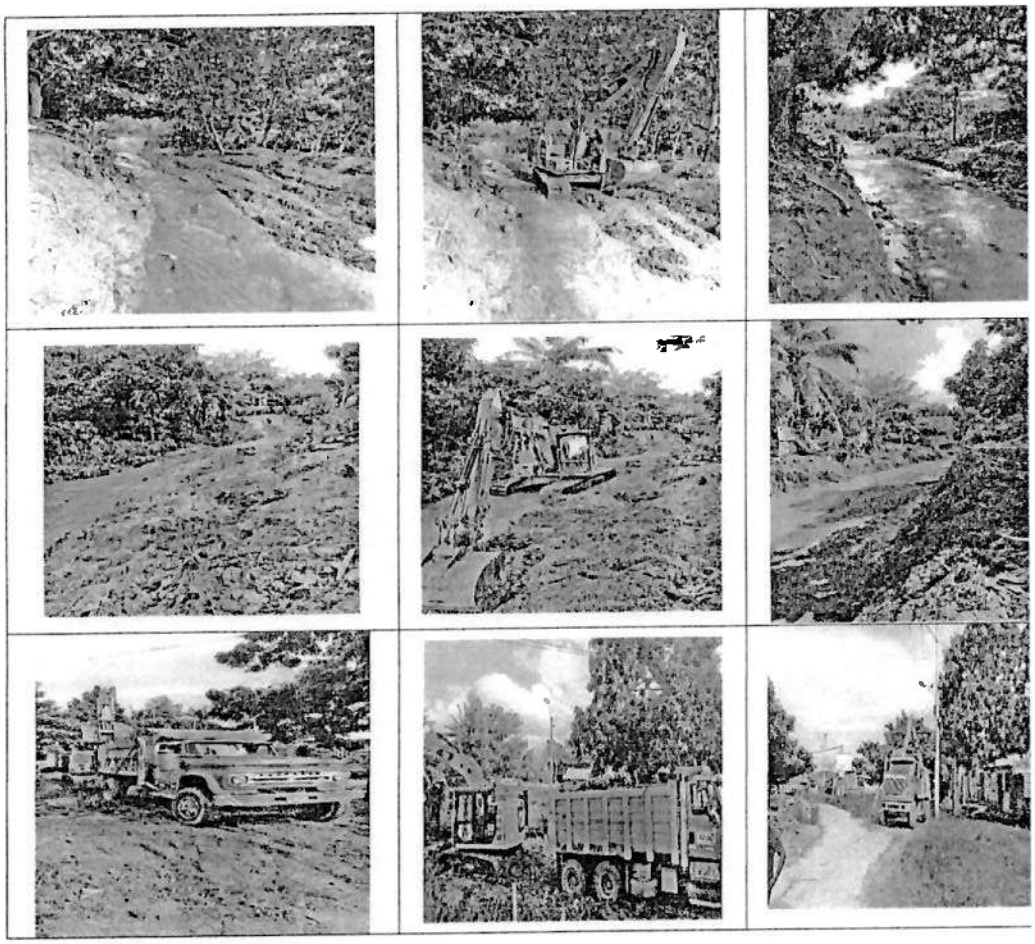



Tabla 76 Registro fotográfico de las actividades realizadas en el tramo Sector Renacer

ANTES	DURANTE	DESPUÉS

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

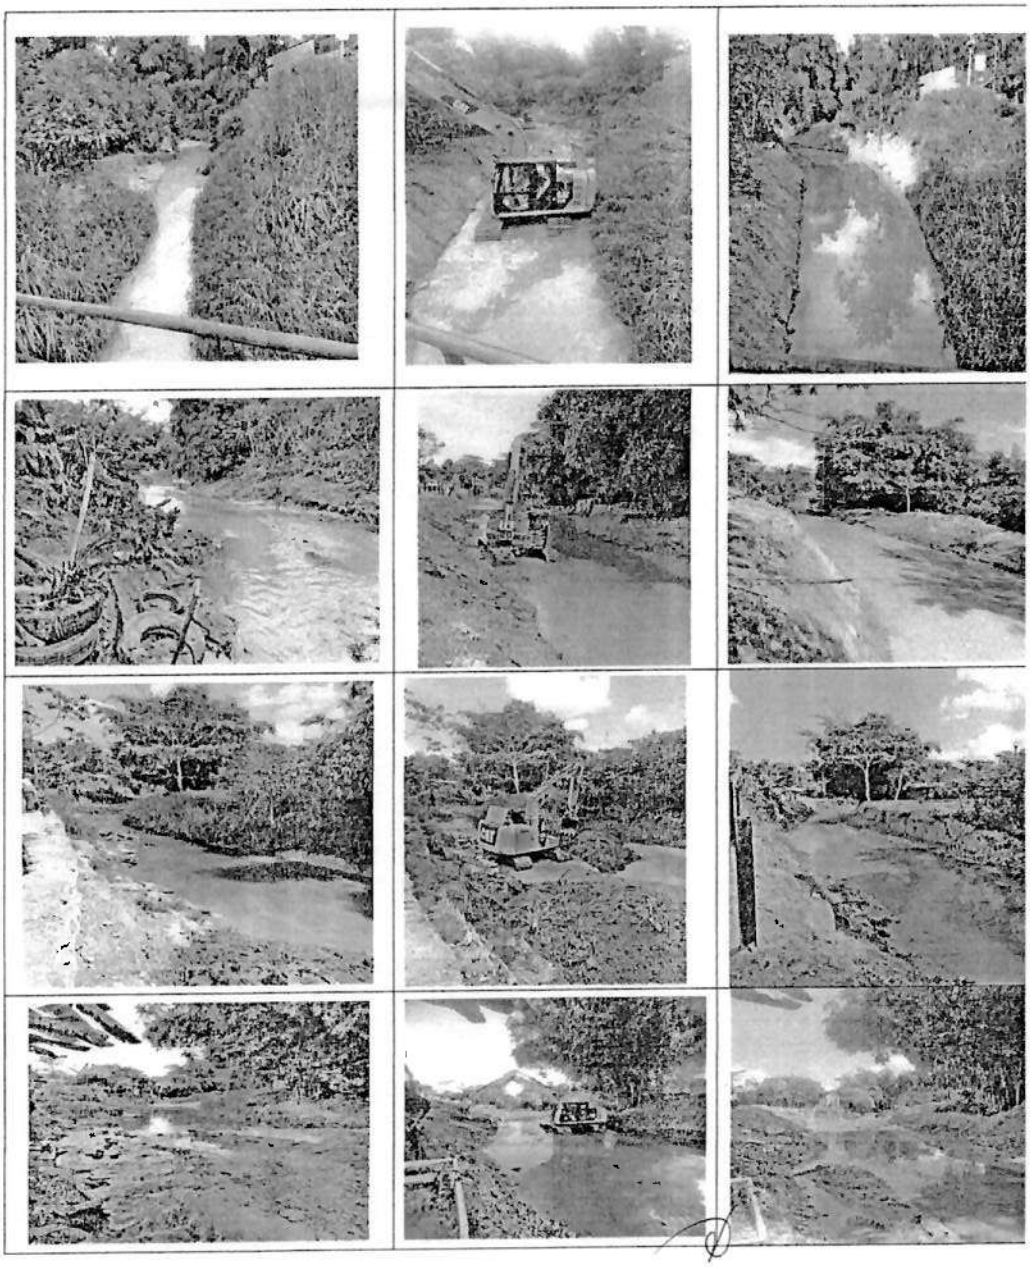


Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@plsansilvestre.com
Web: www.plsansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

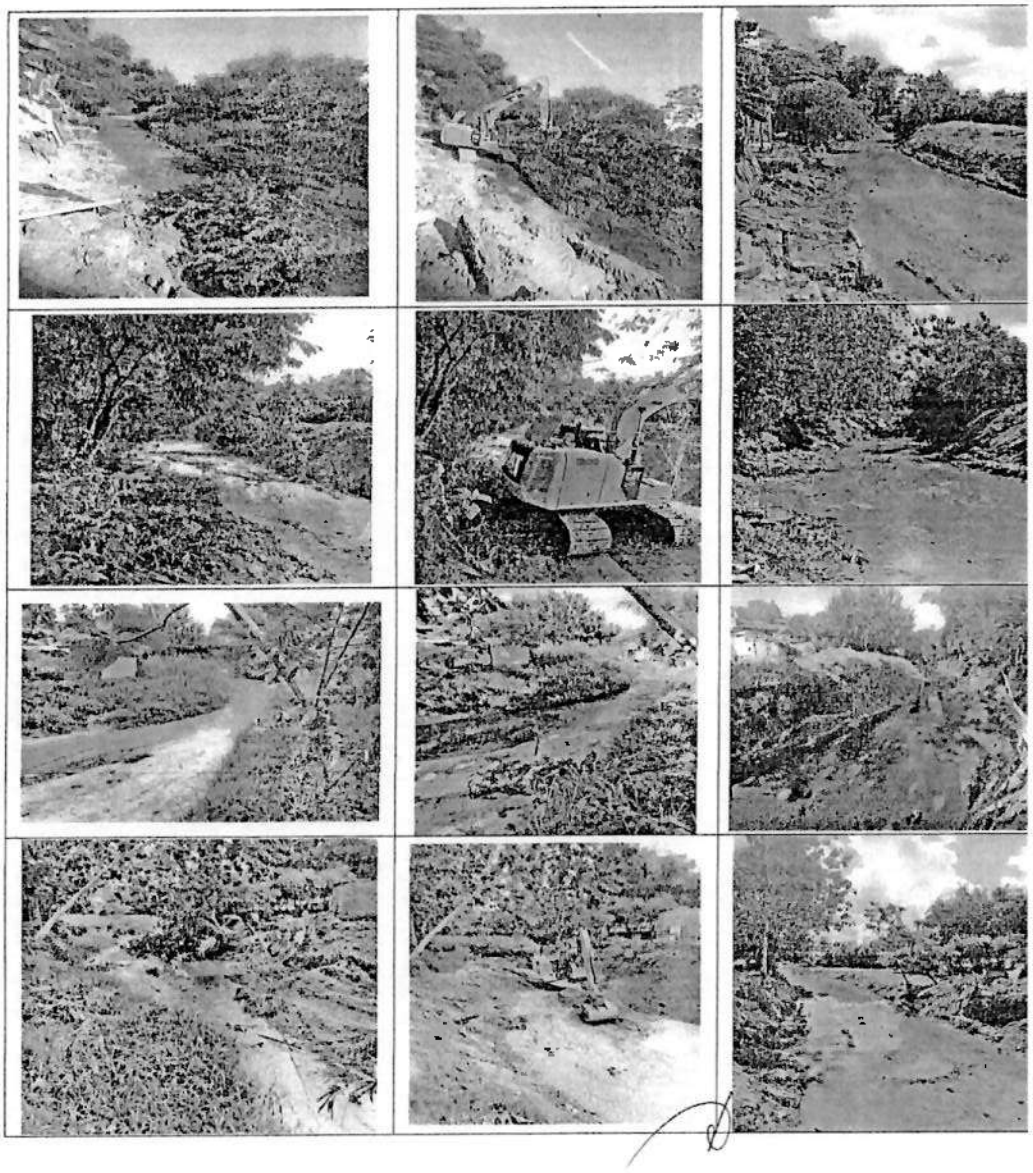


Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA



Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

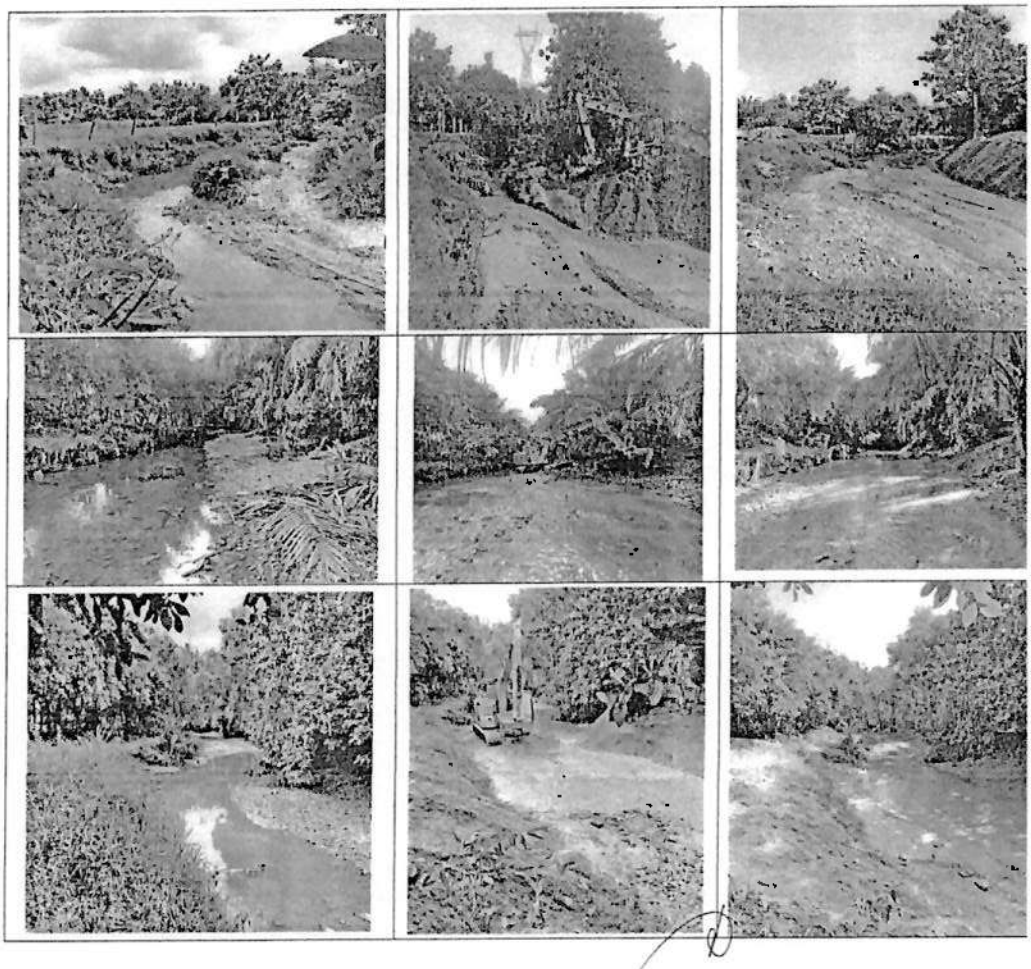


Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativo@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

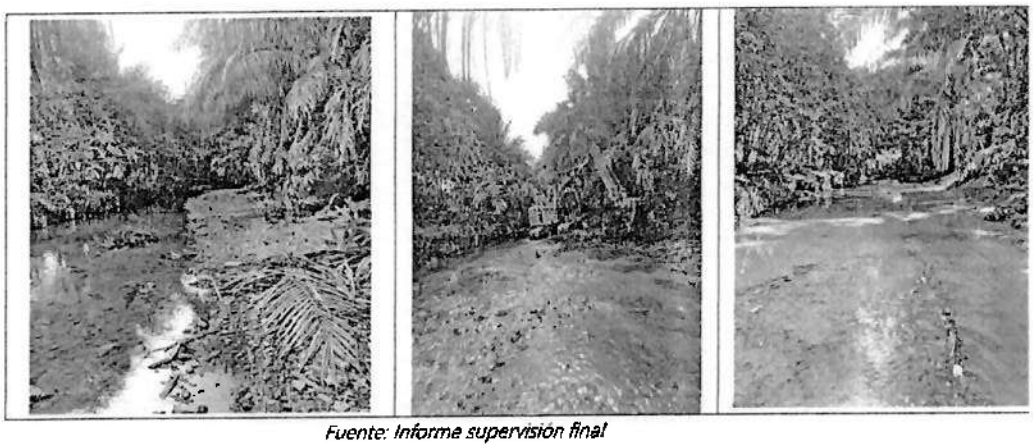

Fuente: Informe supervisión final


Figura 55 Registro fotográfico de las actividades realizadas en el tramo Diamante las Torres.

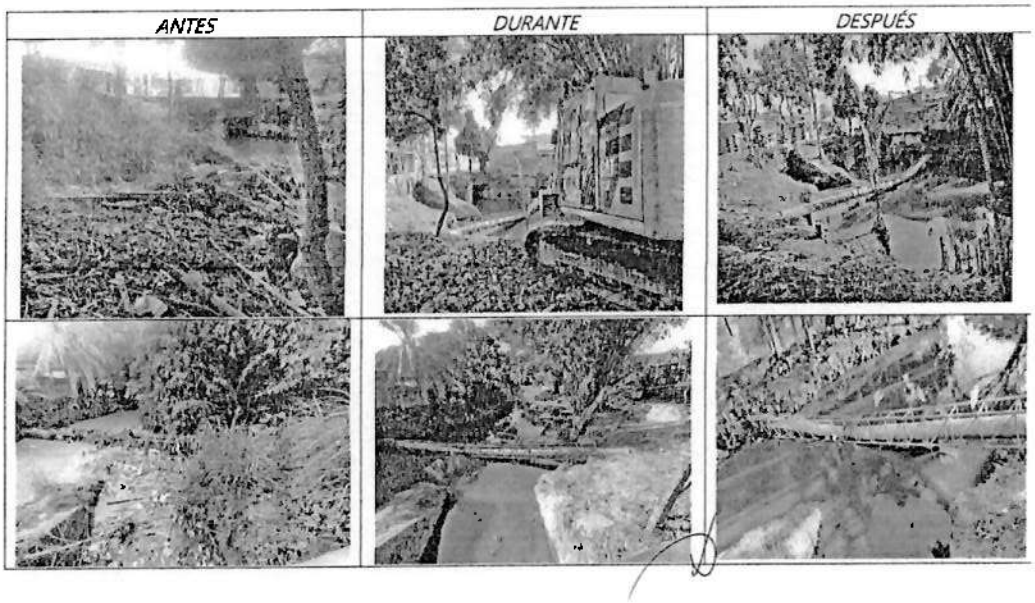

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA



Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

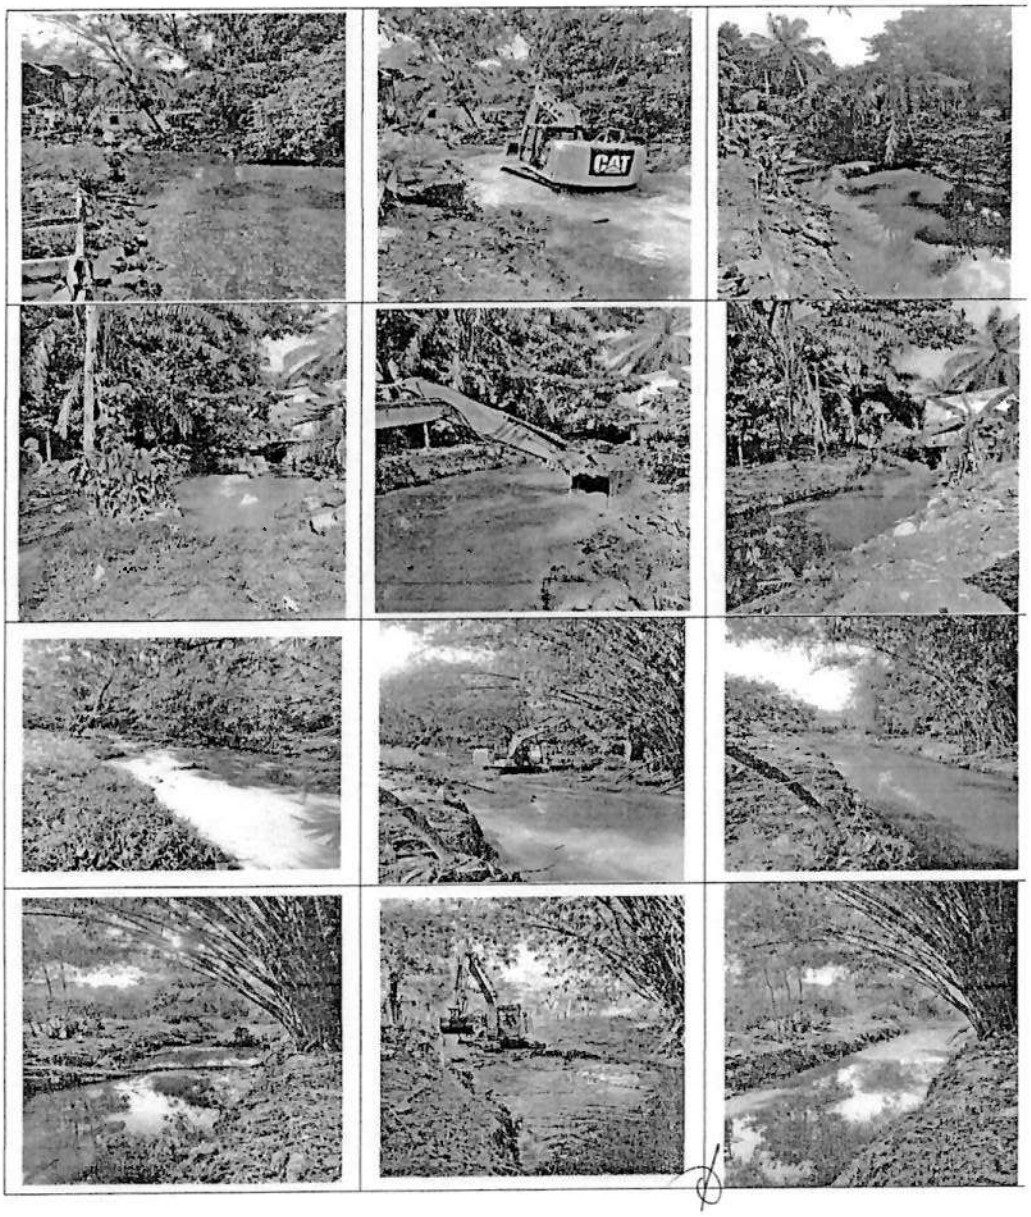

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pcsansilvestre.com
Web: www.pcsansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA



Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA



Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pis-ansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA




Fuente: Informe supervisión final

Otras actividades realizadas por el contratista

El día 29 de noviembre de 2024, realizó la entrega de 250 bultos de cemento a la Piscícola San Silvestre, para su respectiva entrega a la subsecretaria de gestión del riesgo, tal como se indica en las actas de entrega de fecha 29 y 30 de noviembre adjuntas en el informe No. 2, para mitigar el impacto sobre las viviendas ubicadas colindante al caño, que permita generar algún tipo de contención en las laderas con el objetivo de reducir la erosión, y generar mayor estabilización de las mismas.

Figura 56 Entrega de sacos de cemento

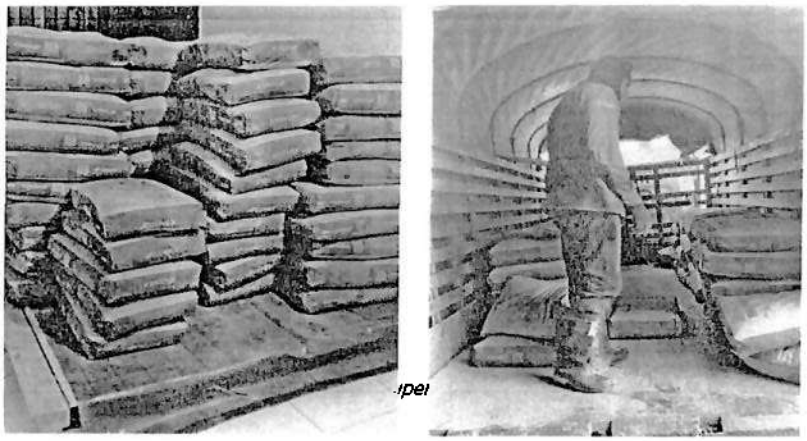

Por otro lado, el día 02 de diciembre de 2024, la empresa CONSTRUMUL comprometida con la gestión ambiental en los proyectos que interviene, y en aras de compensar el impacto ambiental en el recurso flora ocasionado por la ejecución de las actividades de remoción mecánica en los diferentes caños objeto del contrato del asunto; realizó la entrega de 200 individuos de especies arbóreas presentes en el distrito, para la siembra en la ronda hídrica del caño Palmira, de las siguientes especies:

Tabla 77 Especies arboreas donadas a PISCICOLA

No	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE COMUN

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

1	Enterolobium cyclocarpum	Piñón de oreja, orejero, piñón
2	Cordia gerascanthus	Móncoro, solera
3	Handroanthus serratifolius	Guayacan Polvillo
4	Ochroma pyramidale	Balso

Fuente: Informe supervisión final

De lo anterior, la empresa apoyó a la PISCICOLA en la siembra de 30 individuos en la ronda hídrica del caño el Diamante- Las Torres, tal cual como se evidencia en el siguiente registro fotográfico.

Figura 57 Jornada de siembra de árboles Caño sector Diamante las torres



1.1 VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA

Para la ejecución de las actividades en el marco del contrato No. 113-24, el contratista utilizó la siguiente maquinaria pesada:

Tabla 78 Relación de equipos utilizados por el contratista

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Excavadora Oruga	2	CATERPILLAR LINEA 313 FL
excavadora oruga	1	CATERPILLAR LINEA 312

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

José Enrique Badillo Piñeres	Bachiller	Obrero	1	21 de octubre 2024
Yeisson Alejandro Pérez Sanabria	Bachiller	Obrero	1	16 de octubre 2024
Carlos Daniel Trespalacios	Bachiller	Obrero	1	16 de octubre 2024
Luz Mila Florez Peña	Bachiller	Guía Vial	1	14 de noviembre 2024
Anderson Julian Gómez Ramírez	Bachiller	Operador retroexcavadora	1	01 de noviembre 2024
PERSONAL TOTAL			11	

Fuente: Informe supervisión N°2

El contratista aportó la documentación de los respectivos soporte de pago de salarios, las cuales fueron revisadas y verificadas por la supervisión, encontrándose acorde con las obligaciones establecidas en el contrato. (...)

(...) Comité Semanal De Seguimiento De Obra

En el periodo del 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre 2024, se realizaron 2 Comités de seguimiento de Obra al contrato 113-24, para tratar temas referentes al proyecto. Ver anexo (copias de actas seguimiento de contrato).

Tabla 34 Relacion de comites de seguimiento realizados

No	FECHA	ASUNTO
1	01 de noviembre de 2024	Comité de seguimiento No. 5 Seguimiento al avance de la ejecución del contrato No 113-24
2	15 de noviembre de 2024	Comité de seguimiento No. 6 Seguimiento al avance de la ejecución del contrato No 113-24
3	22 de noviembre de 2024	Comité de seguimiento No. 7 Seguimiento al avance de la ejecución del contrato No 113-24
4	29 de noviembre de 2024	Comité de seguimiento No. 8 Seguimiento al avance de la ejecución del contrato No 113-24

Fuente: Informe supervisión N°2

Tabla 35 Registro fotografico de comites de seguimiento



Adicional a lo anterior, el día 07 de noviembre de 2024, se realizó visita conjunta entre la Piscícola, la empresa Construmull y la subsecretaría de Gestión del Riesgo, al sector de la Bendición de Dios, con el fin de atender la solicitud por parte de la comunidad relacionada con el no acuerdo de la ejecución de las actividades en un tramo del sector donde se ubican unas viviendas colindantes al caño, que podrían verse afectada por el ingreso de maquinaria y la remoción mecánica de sedimentos, llegando a ocasionar erosión, desestabilización del talud y hasta el colapso de las viviendas.

Al respecto, la subsecretaria de gestión del riesgo sugirió que para mitigar el impacto sobre las viviendas ubicadas colindante al caño, se debía generar algún tipo de contención en las laderas con el objetivo de reducir la erosión, y generar mayor estabilización de las mismas. (...)

Tabla 36 Registro fotográfico de visita conjunta



(...) Por lo anterior, la empresa CONSTRUMULL como obra social, el día 29 de noviembre de 2024, realizó la entrega de 250 bultos de cemento a la Piscícola San Silvestre, para su respectiva entrega a la subsecretaria de gestión del riesgo, tal como se indica en las actas de entrega de fecha 29 y 30 de noviembre adjuntas en el presente informe.

Informes Semanales
Semanalmente el contratista presenta informe técnico, donde se evidencia las actividades ejecutadas durante la semana y el porcentaje de ejecución, los cuales fueron revisados y validado por la supervisión.

Seguimiento A Las Obras Ejecutadas
La supervisión realiza el seguimiento al plan de trabajo, y el cumplimiento por parte del contratista de las actividades contractuales. Se pudo verificar que el contratista ejecutó las actividades conforme a las especificaciones técnicas en el sector intervenido para el acta parcial No. 2. Adicionalmente, se verificó que el contratista realizara las respectivas inspecciones a los equipos y maquinarias vinculadas al proyecto, y haya realizado las charlas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento de la actualización de las pólizas cuando diera lugar.

A continuación, se muestra un registro fotográfico de las actividades de supervisión por parte de la piscola al contrato de obra No. 113-24

Tabla 37 Evidencias fotograficas de actividades de supervisión

	
Visita de verificación levantamiento topográfico	*Visita técnica de verificación maquinarias*
	
Inspección de los sitios intervenidos	*Visita técnica de inspección de los trabajos realizados*
	
Visita técnica de inspección de los trabajos realizados	*Verificación de las actividades del Plan de manejo transito*

Verificación Del Pago De Seguridad Social Y Aportes Parafiscales
Para el periodo del presente informe, se verifica el pago de los aportes de seguridad social (Pensión, Salud y Riesgos Profesionales) y los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar) de los trabajadores correspondiente al mes de octubre, y certificación de revisor fiscal. (...)

(...) VERIFICACIÓN DE ESTADO FINANCIERO Y ECONOMICO DEL CONTRATO

De acuerdo con las actividades de obra ejecutadas en el periodo del 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024, el valor a facturar durante el mes 2 será de $ 1.656.814.356,72

Tabla 38 Estado financiero y económico del contrato

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO
Contrato N° 113-2024	$3.175.109.187,00	-	-
ACTA PARCIAL N°1		$ 777.699.774,98	$ 777.699.774,98
ACTA PARCIAL N°2		$ 1.656.814.356,72	$ 1.656.814.356,72
TOTAL, ACUMULADO		$ 2.434.514.131,70	$ 2.434.514.131,70
SALDO	$ 740.595.055,30		

Fuente: Informe supervisión N°2

Al presente informe se anexa el Acta Parcial No. 2, para el cobro de $ 1.656.814.356,72 que corresponde al porcentaje del 52,18% de avance financiero ejecutado en el periodo del 01 de noviembre de 2024 al 31 de noviembre de 2024, la cual es autorizada y validada por supervisión para su correspondiente pago. (...)

(...) Rubros Presupuestales
En el siguiente cuadro se muestra los rubros presupuestales de los cuales se le descontaría el valor a pagar para el periodo del Acta No.2.

Tabla 39 Rubros presupuestales contrato 113-24

PISCICOLA SAN SILVESTRE SA CONTRATO: 113-24 REGISTRO PRESUPUESTAL: RPG00389 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024					
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 2024	CONCEPTO	VALOR	ACTA PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2	SALDO POR EJECUTAR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas, servicios de producción	$ 3.175.109.187	$ 777.699.774,98	$ 1.656.814.356,72	$ 740.595.055,30
			$ 777.699.774,98	$ 1.656.814.356,72	$ 740.595.055,30

Fuente: Informe supervisión N°2

(...) Registro Cronológico De Los Pagos, Ajustes Y Deducciones Efectuados.
Tabla 40 Pagos, ajustes y deducciones efectuadas.

	VALOR DEL CONTRATO	ACTA PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2
VALOR INICIAL	$ 3.175.109.187	$ 777.699.774,98	$ 1.656.814.356,72
SALDO	$ 740.595.055,30		

Fuente: Informe supervisión N°2

Factura Presentada Por La Empresa Contratista

Se revisa factura No. FE 416 presentada por la empresa contratista para el pago del acta parcial N°2, y se aprueba su respectivo pago.

VERIFICACIÓN ASPECTOS LEGALES
Tabla 41 Relacion de actas del contratista

ACTA	FECHA	OBSERVACION
INICIO	01 de octubre de 2024	N/A
PARCIAL No. 1	31 de octubre de 2024	Periodo del 01 de octubre al 31 de octubre
PARCIAL No. 2	30 de noviembre de 2024	Periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre
FINAL Y LIQUIDACIÓN	-	-

Fuente: Informe supervisión N°2

Cambios Técnicos Y/O Modificaciones Del Contrato
A la fecha del presente informe, el contrato obra N° 113-24 no ha sufrido cambio o modificaciones en su objeto y alcance.

Cuadro De Control De Pólizas Del Contratista
Se realizó la revisión de las pólizas debidamente actualizadas, para cada uno de los amparos requeridos en el proceso contractual.

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Tabla 42 Polizas del contrato inicial

CONTRATO INICIAL				
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)	
56-44-101008598	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/09/2024	28/04/2025	$317,510,918,70

56-40-101003739	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	27/09/2024	28/12/2027	$635,021,637,40

Fuente: Informe supervisión N°2

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Tabla 43 Polizas del acta de inicio

ACTA DE INICIO				
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)	
56-44-101008598	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/10/2024	02/05/2025	$317,510,918,70
56-44-101008598	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	01/10/2024	01/01/2028	$317,510,918,70
56-44-101008598	CALIDAD DE SERVICIO	01/10/2024	01/01/2026	$317,510,918,70
56-40-101003739	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	01/10/2024	02/05/2025	$635,021,637,40

Fuente: Informe supervisión N°2

VERIFICACION AVANCE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

El Plan de Manejo de Tránsito (PMT) es fundamental para la ejecución segura y eficiente del proyecto de remoción de sedimentos en Barrancabermeja. Para garantizar un transporte adecuado de la maquinaria, se han establecido una serie de pasos que minimizan los riesgos y aseguran la seguridad de todos los involucrados.

En la fase de preparación, se procedió a verificar el estado de la cama baja y la retroexcavadora hidráulica, asegurando que ambos equipos estén en condiciones óptimas para el transporte. También se revisó la documentación necesaria, incluyendo permisos y registros requeridos por las autoridades competentes. Además, se designó un conductor experimentado para operar la cama baja y la camioneta de custodia, garantizando que cuente con la capacitación necesaria.

El proceso de transporte inició con la salida de la cama baja con la retroexcavadora hidráulica desde el punto de origen. La camioneta de custodia precedió al transporte, guiando el desplazamiento hacia el sitio de destino. Durante el trayecto, se transitó por la ruta designada, respetando todas las señales de tráfico y límites de velocidad establecidos, hasta llegar al área de parqueo designada en el sitio de destino.

Figura 28 Ingreso de la cama baja al sector pozo 7



Fuente: Informe supervisión N°2

Una vez en el lugar, se posicionó la cama baja en el área designada para la descarga. Se procedió a bajar la retroexcavadora hidráulica de la cama baja, asegurando que el proceso se realice de manera controlada y segura. Posteriormente, se verificó que la máquina estuviera segura y lista para iniciar sus operaciones.

Para garantizar la seguridad durante el transporte, se utilizó señales de advertencia y luces intermitentes, alertando a otros conductores y peatones de la presencia de maquinaria pesada. También se mantuvo una distancia segura entre vehículos y se verificó el estado del clima antes y durante el transporte, ajustando el plan en caso de condiciones adversas.

Figura 29 Descargue de la maquinaria al sector pozo siete



Fuente: Informe supervisión N°2

En caso de contingencias, se estableció un plan de emergencia para situaciones imprevistas, como accidentes o problemas mecánicos que puedan surgir durante el transporte. Se designó un equipo de respuesta preparado para actuar de manera rápida y efectiva en caso de incidentes.

Finalmente, se mantuvo un registro detallado del transporte y la descarga de la maquinaria, documentando el cumplimiento de cada etapa del proceso. Cualquier incidente o problema que ocurra durante el transporte será registrado, garantizando que se tomen las medidas adecuadas para prevenir futuros inconvenientes.

Figura 30 Verificación de la documentación de la retroexcavadora hidráulica



Fuente: Informe supervisión N°2

En conclusión, la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) es un componente esencial para la correcta ejecución del proyecto de remoción de sedimentos en Barrancabermeja. Este plan asegurará un transporte seguro de la maquinaria, minimizando los riesgos y garantizando la seguridad de todos los usuarios de la vía.

VERIFICACIÓN AVANCE SEGUIMIENTO AL PLAN AMBIENTAL
El seguimiento al Plan de Manejo Ambiental – PMA - del proyecto, CONTRATO DE OBRA PARA REMOCION DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS ECOLOGICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA", se realiza con el fin de hacer una evaluación de las actividades contempladas por la empresa.

A continuación, se detallan los avances, y se realiza una breve descripción de las actividades realizadas en cumplimiento del PMA establecido.

FICHA No.1. Ficha técnica manejo de combustible

Durante el periodo del presente informe, se emprendieron acciones para el control del consumo de combustible de las maquinarias utilizadas para la ejecución del proyecto, mediante el mantenimiento preventivo de las mismas, lo que permitió obtener 0 accidentes por combustibles inflamables.

Es de resaltar, que el personal contratado es el idóneo y capacitado para la operación de la maquinaria pesada.

Figura 31 Registro fotografico de mantenimiento preventivo de las maquinas



Fuente: Informe supervisión N°2

FICHA No.2. Ficha técnica Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles

Con el objetivo de minimizar el impacto generado por los procesos de combustión de los vehículos, se realizaron actividades de mantenimiento periódico a las maquinarias utilizadas. Así mismo, se garantizó que los vehículos contaran con la documentación legal para su funcionamiento tales como seguro, tecnicomecanica. (...)

Figura 32 certificacion de revisión tecnicomecanica



Página 1 de 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DEL TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 17602834

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA EL BOSTON
NIT: 901413727 — No. de Certificado de Acreditación: 31-CDA-075
Fecha de expedición: 2024/07/23 — Fecha de vencimiento: 2025/07/23

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WLS164 — CLASE: VOLQUETA
MARCA: CHEVROLET — MODELO: 1995
SERVICIO: Particular — COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 10500 — NRO. MOTOR: 50389180
NRO. CHASIS: 2937810895 — VIN:
LÍNEA: SIN LINEA
COLOR: VERDE
NOMBRE PROPIETARIO: GILDARDO NAVARRO Q

FIRMA DEL RESPONSABLE
WILSON BUENO CALDERÓN

INFORME DE ACTIVIDADES N°3 DE ACUERDO CON LA SUPERVISION DE LA PISCICOLA SAN SILVESTRE SA

La supervisión del contrato de la referencia realizó sus funciones durante la ejecución contractual en vigencia 2024 y concluyó técnicamente lo siguiente:

(...) INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

Ejecución Física Y Financiera Del Contrato De Obra

Durante el TERCER PERIODO de ejecución del contrato de obra labor No. 113-24 PARA LA REMOCION DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS ECOLOGICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, comprendido entre 01 de diciembre de 2024 a 04 de diciembre de 2024, se ejecutó un porcentaje físico de 13,33% de las actividades del contrato.

En la siguiente gráfica podemos observar, el avance físico con el respectivo porcentaje programado vs el porcentaje ejecutado.

Tabla 44 Avance físico programado y ejecutado de obra

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	59,97%	76,67%	16,70%
Durante el periodo	22,88%	13,33%	-9,55%
Acumulado Actual	82,85%	90,00%	7,15%

Fuente: Informe supervisión N°3

Figura 33 % Avance físico de obra



Fuente: Informe supervisión N°3


En la siguiente gráfica se presenta el avance financiero el contrato, se relaciona el valor ejecutado con el respectivo porcentaje y valor durante los periodos ejecutados vs el porcentaje y valor que falta por ejecutar para completar el valor contractual.

Tabla 45 Avance financiero del contrato de obra

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	% SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	% SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
ACUMULADO ANTERIOR	$ 1.904.071.693,00	59,97%	$ 2.434.514.131,70	76,67%	0,00%
DURANTE EL PERIODO	$ 726.307.139,00	22,88%	$ 423.084.136,60	13,33%	-9,55%
ACUMULADO ACTUAL	$ 2.630.378.832,00	82,84%	$ 2.857.598.268,30	90,00%	-9,55%
POR EJECUTAR	$ 544.730.355,00	-	$ 317.510.918,70	10,00%	-

Fuente: Informe supervisión N°3

Figura 34 Avance financiero del contrato de obra

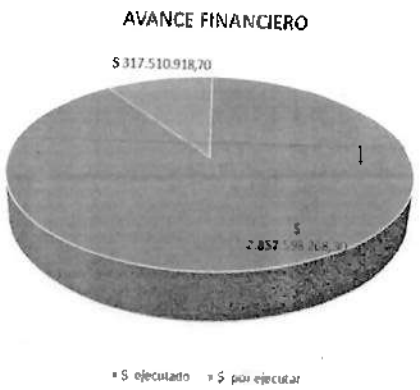

Fuente: Informe supervisión N°3

En el siguiente cuadro se muestran las cantidades ejecutadas para la actividad de remoción mecánica objeto del contrato durante el mes 2:

Tabla 46 Cantidades de obra ejecutadas Acta parcial 3

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N°1	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 2	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N°3	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	% DE EJECUCION periodo 3	% DE EJECUCION ACUMULADO
LIMPIEZA MECANICA EN CAÑOS URBANOS									
1	Remoción de sedimentos	M³	17.160,62	4.203,26	8.954,64	2.286,66	15.444,56	13,33%	90,00%

Fuente: Informe supervisión N°3

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el TERCER PERIODO de ejecución del contrato de obra 113-24 "CONTRATO DE OBRA PARA REMOCION DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS ECOLOGICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" correspondiente al periodo comprendido entre 01 de diciembre de 2024 al 04 de diciembre de 2024, el contratista CONSTRUMULL, ejecutó las siguientes actividades, las cuales fueron supervisadas y recibidas a satisfacción por parte de la supervisión:

Actividades preliminares

El contratista ejecutó labores previas al inicio de las labores de remoción mecánica, correspondientes a actividades de tipo administrativas, visitas, caracterización y levantamiento de actas de vecindad de las viviendas cercanas al área a intervenir y un levantamiento topográfico.

En el desarrollo del levantamiento del acta de cada vivienda se verificó la siguiente información: estado de la infraestructura, tiempo de construido, sistema constructivo utilizado, tipo de material y si cuenta con servicios básicos (agua, gas, energía electica.). Se evidenció que la totalidad de las viviendas no cumple con los procedimientos constructivos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), además presentan afectaciones estructurales (agrietamiento) por asentamiento e inestabilidad del terreno como se observa en los documentos anexos (actas de vecindad).

Por último, previo a la realización de la actividad de remoción mecánica, el contratista realizó levantamientos topográficos antes y después para determinar los volúmenes de sedimentos extraídos en el sector pozo 7 sector puente.

Figura 35 Registro fotografico de actividades de topografia



Fuente: Informe supervisión N°3

Teniendo en cuenta que el presente informe, solo corresponde a una cantidad parcial del caño el diamante las torres, los resultados del levantamiento topográfico, tales como el plano general, plano de secciones transversales y la cartera de campo antes y después de los trabajos de remoción mecánica, se adjuntarán en el informe final del contrato.

Actividades operativas ejecutadas

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

De acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato 113-24, la supervisión revisó y avala las cantidades de obra presentas en el informe No. 2 del contratista CONSTRUMULL, Por lo tanto, en el presente informe se relacionan las cantidades ejecutadas durante el periodo del 01 de diciembre al 04 de diciembre de 2024.

A continuación, se detallan los tramos y cantidades de obra ejecutadas por le contratista.

Tabla 47 Coordenadas del tramo intervenido en el sector Diamante las torres

COORDENADAS TRAMO SECTOR DIAMANTE LAS TORRES		
Inicio de tramo	7° 3'45.52"N	73°49'46.29"O
Final de tramo	7° 3'37.13"N	73°49'57.79"O

Fuente: Informe supervisión N°3

Figura 36 Localización geoespacial de caño sector Diamante las Torres



Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth

Frente a esta actividad, para el tercer periodo del presente informe, la supervisión inspeccionó y recibió a satisfacción las siguientes cantidades ejecutadas por el contratista CONSTRUMULL en los siguientes lugares, las cuales fueron presentadas en el informe de ejecución No. 3.

Tabla 48 Cantidad ejecutada en cada tramo intervenido

No	NOMBRE DEL CAÑO	COMUNA	CANTIDAD m3
1	Caño sector Diamante- Las Torres	7	2.286,66
TOTAL			2.286,66

Fuente: Informe supervisión N°3

Tabla 49 Cantidad ejecutada total por actividad

LIMPIEZA MECANICA EN CAÑOS URBANOS	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANT EJECUTADA ACTA PARCIAL 1	CANT EJECUTADA ACTA PARCIAL 2	CANT EJECUTADA ACTA PARCIAL 3	CANTIDAD POR EJECUTAR
Remoción de sedimentos	m3	17.160,62	4.203,26	8.954,64	2.286,66	1.716,06

Fuente: Informe supervisión N°3


Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

Adicionalmente, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas por el contratista antes, durante y después de la actividad de remoción mecánica.

Tabla 50 Registro fotográfico de las actividades realizadas en el tramo Caño el Diamante las Torres.

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		
		
		

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@sansilvestre.com
Web: www.piscsilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

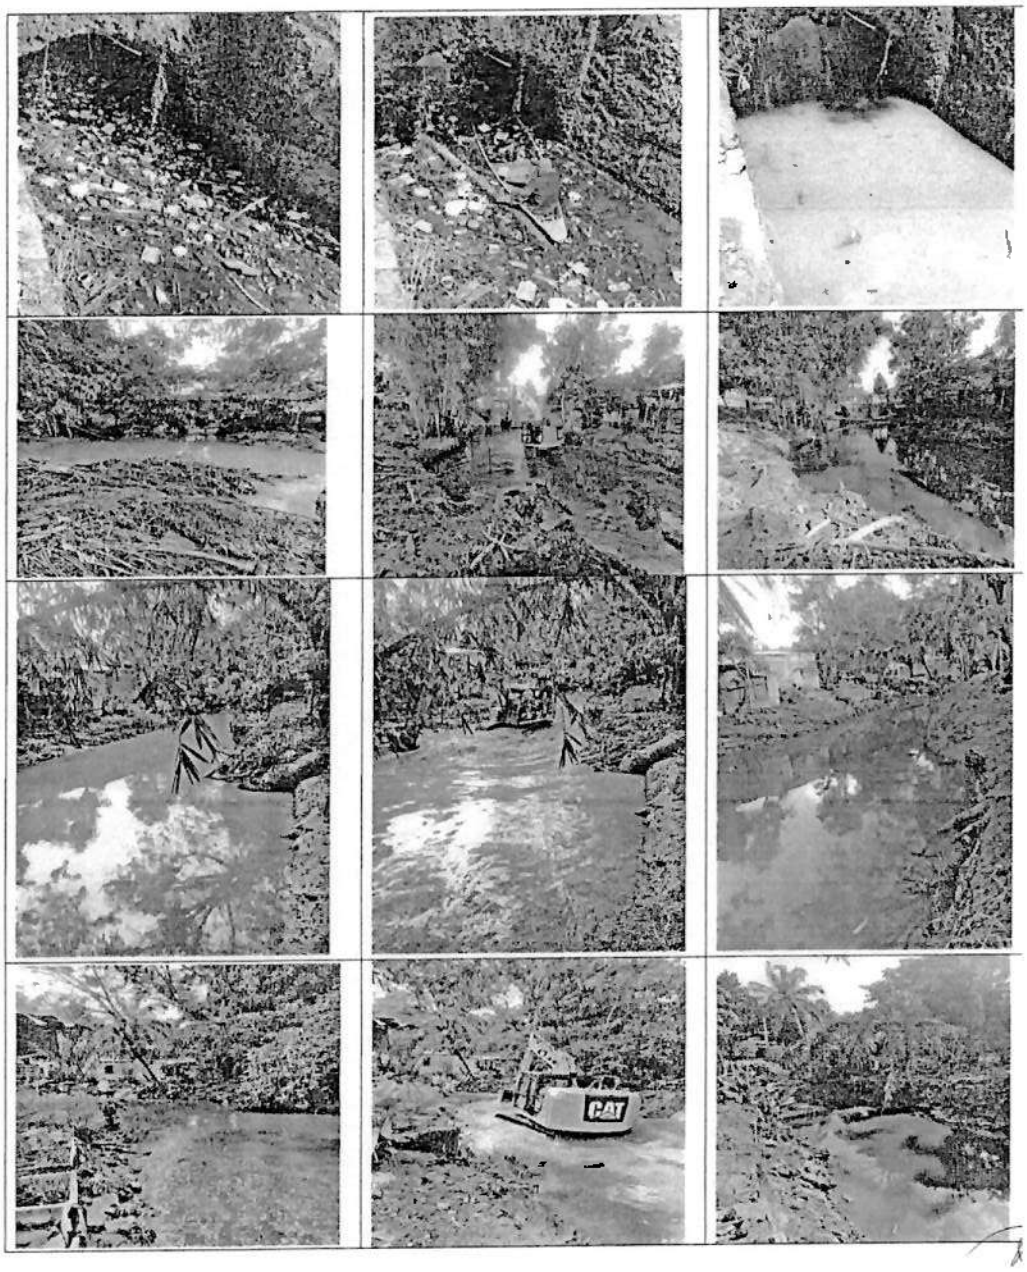

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA



Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 via Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA



Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA



Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@psansilvestre.com
Web: www.psansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

En cuanto a la disposición final del material extraído del caño, la supervisión verificó la legalidad del sitio de disposición, para lo cual el contratista aportó la respectiva licencia de funcionamiento de la escombrera, así como el acta de disposición emitida por la escombrera.

La supervisión constató que el material acopiado, es llevado mediante volquetas y dispuesto en la escombrera RCD- La esperanza localizada en el municipio de Yondo, la cual cuenta con licencia para su funcionamiento SPTDT No 096 del 19 de diciembre de 2023, tal cual como se evidencia en las siguientes imágenes.

Figura 37 Registro fotografico del acopio y disposicion final de material en la escombrera



Fuente: Informe supervisión N°3

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA

Para la ejecución de las actividades en el marco del contrato No. 113-24, el contratista utilizó la siguiente maquinaria pesada:

Tabla 51 Relación de equipos utilizados por el contratista

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Excavadora Oruga	2	CATERPILLAR LINEA 313 FL
excavadora oruga	1	CATERPILLAR LINEA 312
Volquetas	12	SQC 599 TAQ 135 URB. 086. INJ 237 INJ. 467 OSJ. 587. SAA 864 ZIF 696 INA 144 OZI 121 SRR 095 TAQ065

Fuente: Informe supervisión N°3

La supervisión realizó la verificación de los documentos aportados por el contratista, y se constató que soportan legalidad y cumplimiento de las normas de tránsito y transporte. El contratista aporto licencias de conducción, SOAT, pólizas y RUNT de los vehículos y maquinaria utilizada para la ejecución del contrato.

VERIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Durante el segundo mes de ejecución del contrato No. 113-24, el contratista CONSTRUMULL, realiza las actividades del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo direccionado por el supervisor HSE, dando el cumplimiento a lo establecido en el cronograma de actividades del SGSST.

- *La supervisión realizó seguimiento a las siguientes actividades ejecutadas por el contratista.*
- *Implementación de acciones de prevención, preparación, sensibilización y respuestas ante emergencias que se presenten durante el periodo de ejecución.*
- *Capacitación y sensibilización del personal operativo del contrato N° 113-2024, sobre los riesgos y peligros identificados en el área de trabajo por medio de inducciones y sócialización.*
- *Fortalecimiento de la cultura de salud y seguridad durante el periodo de ejecución, promoviendo el compromiso en el personal operativo que se encuentra activo por medio de capacitaciones según cronograma.*
- *Registro de inspecciones periódicas de herramientas, equipos y vehículos.*

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

Verificaciones De Capacitaciones Y Charlas

El contratista realiza las debidas inducciones al personal que ingresa por primera vez, donde se exponen temas como descripción general de la empresa, políticas de HSEQ, políticas de acoso laboral, política de alcohol, sustancias psicoactivas y tabaquismo, objetivos y metas, misión y visión, reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, entre otros temas. De igual manera se realizan las charlas de seguridad programadas para el mes de octubre. El contratista aporta los soportes de las capacitaciones y charlas.

Tabla 52 Capacitaciones y charlas realizadas por el contratista

PROGRAMADO	TEMA	EJECUTADO
2/11/2024	RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO	SI
3/11/2024	GOLPE DE CALOR	SI
4/11/2024	USO ADECUADO DE EPP	SI
5/11/2024	RIESGO BIOLÓGICO	SI

Fuente: Informe supervisión N°3

Tabla 53 Cumplimiento de indicador

INDICADOR	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO
$IF = \frac{\text{NÚMERO DE CAPACITACIONES EJECUTADAS}}{\text{NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS}} X100$	$IF = \frac{4}{4} X100$ IF= 100 %

Fuente: Informe supervisión N°3


Se evidencia un cumplimiento del 100% de las charlas de seguridad sobre la totalidad de las charlas programadas para el mes de octubre.

Inspecciones De Seguridad.

Dentro del desarrollo del contrato N° 113-2024, el contratista realiza inspecciones periódicas dirigidas hacia las áreas de trabajo, los elementos de protección personal y dotación evaluando el estado de estos y verificando el uso correcto, de igual manera se realizan inspecciones dirigidas a herramientas menores, vehículos y maquinaria.

Figura 38 Verificacion e inspección de maquinarias



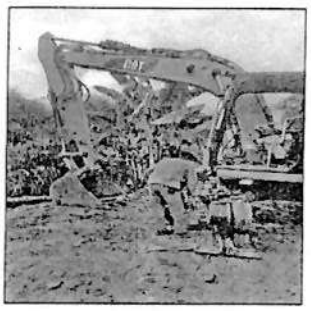

Fuente: Informe supervisión N°3

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

La Supervisión realiza el seguimiento al contratista CONSTRUMULL evidenciando el cumplimiento de los estándares mínimo del SGSST al momento de visitar el frente de trabajo se observa la inspección diaria del área a intervenir dejando evidencia fotográfica, inspección de herramientas, botiquín, la instalación de la señalización, el orden y el aseo, la entrega y el uso de los EPP, pausas activas, inducción, capacitación y charlas de seguridad.

El informe presentado fue revisado y analizado por interventoría, de manera general el informe se evidencia que está bien estructurado se dejan las siguientes recomendaciones:

- *Riesgos controlados: Se han identificado y controlado los riesgos asociados con la limpieza del caño, como el riesgo de caídas y resbalones.*
- *Cumplimiento de protocolos: Se ha verificado que los trabajadores han cumplido con los protocolos de seguridad establecidos para la limpieza del caño, incluyendo el uso de equipo de protección personal (EPP).*
- *Incidentes menores: No se presentaron incidentes menores ni accidentes graves durante la limpieza del caño.*
- *Eficacia de las medidas de control: Las medidas de control implementadas han demostrado ser eficaces para prevenir accidentes y enfermedades laborales.*
- *Oportunidades de mejora: Se han identificado oportunidades de mejora en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, como la necesidad de mejorar la señalización en el área de trabajo y la capacitación adicional para los trabajadores.*

En conclusión, la supervisión establece que el informe HSE entregado por el contratista fue revisado y analizado, de manera general se evidencia que está bien estructurado y se culmina con el 100% de las actividades de seguridad y salud en el trabajo.

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
Teniendo en cuenta lo estipulado en el CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, del contrato 113-24 cuyo objeto "CONTRATO DE OBRA PARA REMOCION DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS ECOLOGICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA", en la cual se establece que el valor contractual se pagará de la siguiente manera:

A. ACTAS DE AVANCE MENSUAL: Hasta un noventa por ciento (90%) del valor del contrato, por medio de actas de avance mensual, previa presentación de factura y/o cuenta de cobro, informe de actividades con las evidencias de ejecución del periodo, acta de aprobación por parte de la supervisión, soporte de pago de los aportes al sistema integral de seguridad social

B. ACTA DE PAGO FINAL: Correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, se pagará cuando el contrato este ejecutado el cien por ciento (100%), previa presentación del informe final de

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisanalvestre.com
Web: www.pisanalvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

ejecución con las respectivas evidencias, aprobado por la supervisión y certificado de cumplimiento de aportes parafiscales y seguridad social de la empresa ejecutora

Se describe a continuación el avance de la obra, cantidades y acumulado de las actividades ejecutadas durante el periodo 3 para alcanzar el 90% del valor del contrato.
Tabla 54 Seguimiento a la programacion

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 1	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 2	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 3	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	% DE EJECUCION periodo 3	% EJECUCION ACUMULADO
LIMPIEZA MECANICA EN CAÑOS URBANOS									
1	Remoción de sedimentos	M³	17.160,62	4.203,26	8.954,64	2.286,66	15.444,56	13,33%	90,00%

Fuente: Informe supervisión N°3

Como soporte y anexo de las cantidades ejecutadas en el periodo 3, se anexa las memorias de cálculo con los diferentes trabajos realizados de remoción mecánica de sedimentos en los distintos caños del Distrito de Barrancabermeja.

Seguimiento A La Programación De Obra


En el siguiente cuadro se muestra el avance físico de obra programado y ejecutado en cada una de las actas realizadas para el Contrato N° 113-24.

Tabla 55 Seguimiento avance de obra

PROYECTO		ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3
PROGRAMADO MENSUAL	P	$ 608.910.693,00	$ 1.295.161.000,00	$ 726.307.139
	%	19,18%	40,79%	22,88%
PROGRAMADO ACUMULADO	P	$ 608.910.693,00	$ 1.904.071.693,00	$2.630.378.832
	%	19,18%	59,97%	82,84%
EJECUTADO MENSUAL	E	$ 777.699.774,98	$ 1.656.814.356,72	$ 423.084.136,60
	%	24,49%	52,18%	13,33%
EJECUTADO ACUMULADO	E	$ 777.699.774,98	$ 2.434.514.131,70	$ 2.857.598.268,30
	%	24,49%	76,67%	90,00%

Fuente: Informe supervisión N°3

Figura 39 Curva de avance de obra

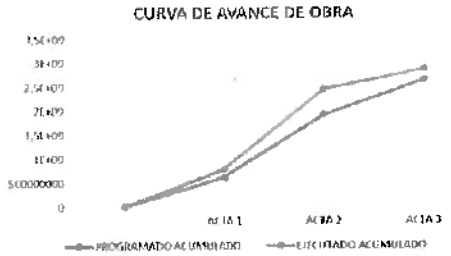

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

Para el periodo de ejecución de las actividades No. 3, ejecutadas en el periodo del 01 de diciembre de 2024 al 04 de diciembre de 2024, se presentó un avance de obra de 13,33% equivalente a $ 423.084.136,60 de los costos directos, alcanzando el 90% de ejecución para el acta parcial No. 3.

VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Verificación del personal
Para el periodo del presente informe, el contratista CONSTRUMUL realizó la contratación del siguiente personal:

Tabla 56 Relacion del personal

NOMBRE	PROFESION	CARGO	CANTIDAD	FECHA DE INGRESO
Victor Mario Montagut Carvajal	Ingeniero Civil	Ingeniero Residente	1	01 de octubre 2024
Jorge Armando Bustillo Rojas	Ingeniero Ambiental y saneamiento	Supervisor HSE	1	18 de octubre 2024
Gerardo Javier Borja Ibarguen	Bachiller	Guia Vial	1	21 de octubre 2024
Yurlevinson Forero Cala	Bachiller	Cadenero	1	16 de octubre 2024
Daniel Bermúdez Ardila	Bachiller	Operador de retroexcavadora	1	17 de octubre 2024
Jonathan Romero León	Bachiller	Oficial	1	16 de octubre 2024
José Enrique Badillo Pifieres	Bachiller	Obrero	1	21 de octubre 2024
Yeisson Alejandro Pérez Sanabria	Bachiller	Obrero	1	16 de octubre 2024
Carlos Daniel Trespalacios	Bachiller	Obrero	1	16 de octubre 2024
Luz Mila Florez Peña	Bachiller	Guia Vial	1	14 de noviembre 2024
Anderson Julian Gómez Ramirez	Bachiller	Operador retroexcavadora	1	01 de noviembre 2024
PERSONAL TOTAL			11	

Fuente: Informe supervisión N°3

Durante el periodo del presente informe, el contratista no realizó contratación de personal adicional al relacionado en la tabla anterior.

Teniendo en cuenta que el presente informe solo corresponde al periodo de 4 dias, la planilla de seguridad social, se presentará en el informe final para el cobro del 10% de ejecución restante.

Control De Correspondencia
Durante el periodo del segundo mes de contrato, se llevó el control de la correspondencia generada, de tal forma que se intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas por la comunidad y supervisión. La correspondencia enviada y recibida, se anexa en el presente informe. Ver anexo

Tabla 57 Relación de correspondencia enviada a supervisión

No	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
1	02 de diciembre de 2024	Entrega de plántulas arbóreas	Piscícola
2	02 de diciembre de 2024	Acta de entrada y recibo donación No. 01-2024	CONSTRUMULL Y SUBSECREATIA DE GESTION DEL RIESGO

Fuente: informe supervisión N°3

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

Comité Semanal De Seguimiento De Obra

En el periodo del 01 de diciembre de 2024 al 04 de diciembre 2024, no se realizaron Comités de seguimiento de Obra al contrato 113-24.

Informes Semanales

Semanalmente el contratista presenta la supervisión informe donde evidencia las actividades ejecutadas durante la semana y el porcentaje de ejecución. Teniendo en cuenta que el presente informe corresponde al periodo de 4 dias, se presentará el informe semanal No. 7 junto al informe final de ejecución.

Seguimiento A Las Obras Ejecutadas

La supervisión realiza el seguimiento al plan de trabajo, y el cumplimiento por parte del contratista de las actividades contractuales. Se pudo verificar que el contratista ejecutó las actividades conforme a las especificaciones técnicas en el sector intervenido para el acta parcial No. 3. Adicionalmente, se verificó que el contratista realizara las respectivas inspecciones a los equipos y maquinarias vinculadas al proyecto, y haya realizado las charlas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento de la actualización de las pólizas cuando diera lugar.

A continuación, se muestra un registro fotográfico de las actividades de supervisión por parte de la piscola al contrato de obra No. 113-24

Tabla 58 Evidencias fotograficas de actividades de supervisión

	
***Visita** de inspección a los sitios*	*Visita verificación tecnica*

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

	
Estado del caño Palmira	*Visita técnica de inspección de los trabajos realizados*
	
Atención a solicitudes de la comunidad	*Atención a solicitudes de la comunidad*

Verificación Del Pago De Seguridad Social Y Aportes Parafiscales
Para el periodo del presente informe, el contratista presento soporte de seguridad social del mes de noviembre y certificación de revisor fiscal, toda vez que el periodo del presente informe solo es de 4 dias de diciembre. El contratista presentará para el cobro del acta final el soporte de la planilla de seguridad social a los trabajadores del mes de diciembre.

VERIFICACIÓN DE ESTADO FINANCIERO Y ECONOMICO DEL CONTRATO

A continuación se relacionan las cantidades ejecutadas en el periodo del 01 de diciembre de 2024 al 04 de diciembre de 2024, para el cobro de hasta el 90% del valor total del contrato. Por lo tanto, el valor a facturar corresponderá al 13,33%, por un valor de $ 423.084.136,60

Tabla 59 Estado financiero y económico del contrato

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

Contrato N° 113-2024	$3.175.109.187,00	-	-
ACTA PARCIAL N°1		$ 777.699.774,98	$ 777.699.774,98
ACTA PARCIAL N°2		$ 1.656.814.356,72	$ 1.656.814.356,72
ACTA PARCIAL N° 3		$ 423.084.136,60	$ 423.084.136,60
TOTAL ACUMULADO		$ 2.857.598.268,30	$ 2.857.598.268,30
SALDO	$ 317.510.918,70		

Fuente: Informe supervisión N°3

Al presente informe se anexa el Acta Parcial No. 3, para el cobro de $ 423.084.136,60 que corresponde al porcentaje del 13,33% de avance financiero, alcanzando el 90% acumulada del contrato de obra. , la cual es autorizada y validada por supervisión para su correspondiente pago.

Rubros Presupuestales

En el siguiente cuadro se muestra los rubros presupuestales de los cuales se le descontaría el valor a pagar para el periodo del Acta No.2.

Tabla 60 Rubros presupuestales contrato 113-24

	PISCICOLA SAN SILVESTRE SA CONTRATO: 113-24					
	REGISTRO PRESUPUESTAL: RPG00389 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024					
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 2024	CONCEPTO	VALOR	ACTA PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2	ACTA PARCIA 3	SALDO POR EJECUTAR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas, servicios de producción	$ 3.175.109.187	$ 777.699.774,98	$ 1.656.814.356,72	$ 423.084.136,60	$ 317.510.918,70
			$ 777.699.774,98	$ 1.656.814.356,72		$ 317.510.918,70

Fuente: Informe supervisión N°3

Registro Cronológico De Los Pagos, Ajustes Y Deducciones Efectuados.
Tabla 61 Pagos, ajustes y deducciones efectuadas.

	VALOR DEL CONTRATO	ACTA PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2	ACTA PARCIAL 3
VALOR INICIAL	$ 3.175.109.187	$ 777.699.774,98	$ 1.656.814.356,72	$ 423.084.136,60
SALDO	$ 317.510.918,70			

Fuente: Informe supervisión N°3

Factura Presentada Por La Empresa Contratista

Se revisa factura presentada por la empresa contratista para el pago del acta parcial N°3, y se aprueba su respectivo pago.

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

VERIFICACIÓN ASPECTOS LEGALES

Tabla 62 Relacion de actas del contratista

ACTA	FECHA	OBSERVACION
INICIO	01 de octubre de 2024	N/A
PARCIAL No. 1	31 de octubre de 2024	Periodo del 01 de octubre al 31 de octubre
PARCIAL No. 2	30 noviembre de 2024	Periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre
PARCIAL No. 3	04 de diciembre de 2024	Periodo del 01 de diciembre al 04 de diciembre
FINAL Y LIQUIDACIÓN	-	-

Fuente: Informe supervisión N°3

Cambios Técnicos Y/O Modificaciones Del Contrato

A la fecha del presente informe, el contrato obra N° 113-24 no ha sufrido cambio o modificaciones en su objeto y alcance.

Cuadro De Control De Pólizas Del Contratista

Se realizó la revisión de las pólizas debidamente actualizadas, para cada uno de los amparos requeridos en el proceso contractual.

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Tabla 63 Polizas del contrato inicial

CONTRATO INICIAL				
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA Desde (día, mes, año)	VIGENCIA Hasta (día, mes, año)	VALOR
56-44-101008598	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/09/2024	28/07/2027	$317,510,918.70
56-40-101003739	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	27/09/2024	28/04/2025	$635,021,637.40

Fuente: Informe supervisión N°3

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Tabla 64 Polizas del acta de inicio

ACTA DE INICIO				
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA Desde (día, mes, año)	VIGENCIA Hasta (día, mes, año)	VALOR
56-44-101008598	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/10/2024	02/05/2025	$317,510,918.70
56-44-101008598	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	01/10/2024	01/01/2028	$317,510,918.70

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

56-44-101008598	CALIDAD DE SERVICIO	01/10/2024	01/01/2026	$317,510,918,70
56-40-101003739	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	01/10/2024	02/05/2025	$635,021,637,40

Fuente: Informe supervisión N°3

VERIFICACION AVANCE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

El Plan de Manejo de Tránsito (PMT) es fundamental para la ejecución segura y eficiente del proyecto de remoción de sedimentos en Barrancabermeja. Para garantizar un transporte adecuado de la maquinaria, se han establecido una serie de pasos que minimizan los riesgos y aseguran la seguridad de todos los involucrados.

En la fase de preparación, se procedió a verificar el estado de la cama baja y la retroexcavadora hidráulica, asegurando que ambos equipos estén en condiciones óptimas para el transporte. También se revisó la documentación necesaria, incluyendo permisos y registros requeridos por las autoridades competentes. Además, se designó un conductor experimentado para operar la cama baja y la camioneta de custodia, garantizando que cuente con la capacitación necesaria.

El proceso de transporte inició con la salida de la cama baja con la retroexcavadora hidráulica desde el punto de origen. La camioneta de custodia precedió al transporte, guiando el desplazamiento hacia el sitio de destino. Durante el trayecto, se transitó por la ruta designada, respetando todas las señales de tráfico y límites de velocidad establecidos, hasta llegar al área de parqueo designada en el sitio de destino.

Figura 40 Ingreso de la cama baja al Sector Diamante las torres




Fuente: Informe supervisión N°3

Una vez en el lugar, se posicionó la cama baja en el área designada para la descarga. Se procedió a bajar la retroexcavadora hidráulica de la cama baja, asegurando que el proceso se realice de manera controlada y segura. Posteriormente, se verificó que la máquina estuviera segura y lista para iniciar sus operaciones.

Para garantizar la seguridad durante el transporte, se utilizó señales de advertencia y luces intermitentes, alertando a otros conductores y peatones de la presencia de maquinaria pesada. También se mantuvo una distancia segura entre vehículos y se verificó el estado del clima antes y durante el transporte, ajustando el plan en caso de condiciones adversas.

Figura 41 Descargue de la maquinaria al sector pozo siete

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@piscicolasansilvestre.com
Web: www.piscicolasansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

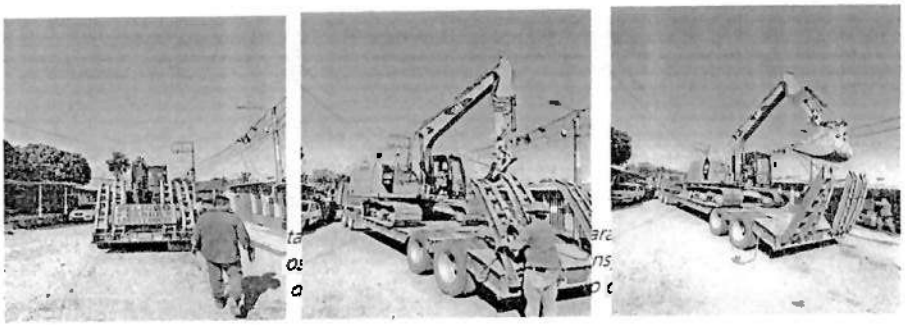

Finalmente, se mantuvo un registro detallado del transporte y la descarga de la maquinaria, documentando el cumplimiento de cada etapa del proceso. Cualquier incidente o problema que ocurra durante el transporte será registrado, garantizando que se tomen las medidas adecuadas para prevenir futuros inconvenientes.

Figura 42 Verificación de la documentación de la retroexcavadora hidráulica



Fuente: Informe supervisión N°3

En conclusión, la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) es un componente esencial para la correcta ejecución del proyecto de remoción de sedimentos en Barrancabermeja. Este plan asegurará un transporte seguro de la maquinaria, minimizando los riesgos y garantizando la seguridad de todos los usuarios de la vía.

VERIFICACIÓN AVANCE SEGUIMIENTO AL PLAN AMBIENTAL
El seguimiento al Plan de Manejo Ambiental – PMA - del proyecto, CONTRATO DE OBRA PARA REMOCION DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS ECOLOGICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA", se realiza con el fin de hacer una evaluación de las actividades contempladas por la empresa.

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@sansilvestre.com
Web: www.sansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Uanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

A continuación, se detallan los avances, y se realiza una breve descripción de las actividades realizadas en cumplimiento del PMA establecido.

FICHA No.1. Ficha técnica manejo de combustible

Durante el periodo del presente informe, se emprendieron acciones para el control del consumo de combustible de las maquinarias utilizadas para la ejecución del proyecto, mediante el mantenimiento preventivo de las mismas, lo que permitió obtener 0 accidentes por combustibles inflamables.

Es de resaltar, que el personal contratado es el idóneo y capacitado para la operación de la maquinaria pesada.

Figura 43 Registro fotografico de mantenimiento preventivo de las maquinas



Fuente: Informe supervisión N°3

FICHA No.2. Ficha técnica Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles

Con el objetivo de minimizar el impacto generado por los procesos de combustión de los vehículos, se realizaron actividades de mantenimiento periódico a las maquinarias utilizadas. Así mismo, se garantizó que los vehículos contaran con la documentación legal para su funcionamiento tales como seguro, tecnicomecanica. (...)

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

Figura 44 certificacion de revisión tecnicomecanica



RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

DATOS DEL CENTRO DIAGNÓSTICO

DATOS VEHÍCULO

PLACA:		CLASE:	VOLQUETA
MARCA:	CHEVROLET	MODELO:	1995
SERVICIO:	Particular	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	10000	NRO. MOTOR:	
NRO. CHASIS:		VIN:	
LÍNEA:	SIN LINEA		
COLOR:	VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: GERARDO NAVARRO G.

FIRMA DEL RESPONSABLE
WILSON SUCRE CALDERON

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL DE ACUERDO CON LA SUPERVISION DE LA PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.

La supervisión del contrato de la referencia realizó sus funciones durante la ejecución contractual en vigencia 2024 y concluyó técnicamente lo siguiente:

(...) INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

Ejecución Física Y Financiera Del Contrato De Obra

Para el cobro del acta final de ejecución del contrato de obra labor No. 113-24 PARA LA REMOCION DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS ECOLOGICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, comprendido entre 05 de diciembre de 2024 a 07 de diciembre de 2024, se ejecutó un porcentaje físico de 9,91% de las actividades del contrato.

En la siguiente gráfica podemos observar, el avance físico con el respectivo porcentaje programado vs el porcentaje ejecutado.

Figura 45 % Avence fisico de obra

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA



Fuente: Informe supervisión final

En la siguiente gráfica se presenta el avance financiero el contrato, se relaciona el valor ejecutado con el respectivo porcentaje y valor durante los periodos ejecutados vs el porcentaje y valor que falta por ejecutar para completar el valor contractual.

Tabla 65 Avance financiero del contrato de obra

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	% SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	% SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
ACUMULADO ANTERIOR	$ 2.630.378.832,00	82,84%	$ 2.857.598.268,30	90,00%	7,16%
DURANTE EL PERIODO	$ 544.730.355,00	17,16%	$ 314.806.089,70	9,91%	-7,24%
ACUMULADO ACTUAL	$ 3.175.109.187,00	100,00%	$ 3.172.404.358,00	99,91%	-0,09%
POR EJECUTAR	$ 0,00	-	$ 2.704.829,00	0,09%	-

Fuente: Informe supervisión final

Figura 46 Avance financiero del contrato de obra



Fuente: Informe supervisión final

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

En el siguiente cuadro se muestran las cantidades ejecutadas para la actividad de remoción mecánica objeto del contrato durante periodo del acta final:

Tabla 66 Cantidades de obra ejecutadas Acta parcial final

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N°1	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N°2	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N°3	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	% DE EJECUCION Acta final	% DE EJECUCION ACUMULADO
LIMPIEZA MECANICA EN CAÑOS URBANOS										
1	Remoción de sedimentos	M³	17.160,62	4.203,26	8.954,64	2.286,66	1.701,44	17.146,00	9,91%	99,91%

Fuente: Informe supervisión final

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que a pesar que CONSTRUMULL SAS intervino la totalidad de los sectores definidos en el contrato, en el acta final no se alcanzó el 100% de la cantidad contractual, teniendo en cuenta que en el control de las cantidades ejecutadas y al realizar los cálculos topográficos antes y después de la remoción, se consideró pertinente dejar un saldo de cantidad mínima a favor de PISCICOLA, correspondiente 14,62 m3, ya que, en el caso de continuar con la remoción de sedimentos, la cantidad ejecutada superaría la cantidad contractual.

Como soporte y anexo de las cantidades ejecutadas en el periodo del acta final, el contratista aportó al informe final las memorias de cálculo con los diferentes trabajos realizados de remoción mecánica de sedimentos en los distintos caños del Distrito de Barrancabermeja.

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el periodo de ejecución del acta final del contrato de obra 113-24 "CONTRATO DE OBRA PARA REMOCION DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS ECOLOGICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" correspondiente al periodo comprendido entre 05 de diciembre de 2024 al 07 de diciembre de 2024, el contratista CONSTRUMULL, ejecutó las siguientes actividades, las cuales fueron supervisadas y recibidas a satisfacción por parte de la supervisión:

Actividades operativas ejecutadas

De acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato 113-24, la supervisión revisó y avala las cantidades de obra presentas en el informe final del contratista CONSTRUMULL, Por lo tanto, en el presente informe se relacionan las cantidades ejecutadas durante el periodo del 05 de diciembre al 07 de diciembre de 2024.

A continuación, se detallan los tramos y cantidades de obra ejecutadas por le contratista.

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

Volquetas	12	SQC 599 TAQ 135 URB 086 INU 237 INU 467 OSJ 587 SAA 864 ZIF 696 INA 144 OZI 121 SRR 095 TAQ065

Fuente: Informe supervisión final

La supervisión realizó la verificación de los documentos aportados por el contratista, y se constató que soportan legalidad y cumplimiento de las normas de tránsito y transporte. El contratista aporto licencias de conducción, SOAT, pólizas y RUNT de los vehículos y maquinaria utilizada para la ejecución del contrato.

VERIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Durante el periodo de ejecución del acta parcial final del contrato No. 113-24, el contratista CONSTRUMULL, realiza las actividades del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo direccionado por el supervisor HSE, dando el cumplimiento a lo establecido en el cronograma de actividades del SGSST.

- *La supervisión realizó seguimiento a las siguientes actividades ejecutadas por el contratista.*
- *Implementación de acciones de prevención, preparación, sensibilización y respuestas ante emergencias que se presenten durante el periodo de ejecución.*
- *Capacitación y sensibilización del personal operativo del contrato N° 113-2024, sobre los riesgos y peligros identificados en el área de trabajo por medio de inducciones y socialización.*
- *Fortalecimiento de la cultura de salud y seguridad durante el periodo de ejecución, promoviendo el compromiso en el personal operativo que se encuentra activo por medio de capacitaciones según cronograma.*

- *Registro de inspecciones periódicas de herramientas, equipos y vehículos.*

Verificaciones De Capacitaciones Y Charlas

Para la ejecución del contrato 113-2024, se realizó una programación de charlas diarias de seguridad y salud donde se plantearon temáticas referentes a los peligros y riesgos a los cuales estaban expuestos los trabajadores diariamente. Dentro de las temáticas consideradas se encuentran temas relacionados con peligros mecánicos, biológicos, físicos, químicos, sicológicos, ergonómicos, locativos, entre otros.

Es de resaltar que se le dio cumplimiento al 100% de las charlas diarias de seguridad programadas para el contrato, evidenciándose el compromiso por parte del ingeniero residente, supervisor HSE y demás personal de la cuadrilla.

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

Inspecciones De Seguridad.
En el desarrollo del contrato N° 113-2024 se realizaron inspecciones en campo de extintor, camilla, preoperacionales de vehículos, preoperacionales de maquinaria, inspección de elementos de protección personal, inspecciones de herramientas menores, entre otros, permitiendo identificar aspectos por mejorar en pro de la salud y la seguridad de cada uno de los colaboradores del contrato. Así mismo, dichas inspecciones permitieron realizar seguimiento a los controles y recomendaciones establecidos previamente.

La Supervisión realiza el seguimiento al contratista CONSTRUMULL evidenciando el cumplimiento de los estándares mínimo del SGSST al momento de visitar el frente de trabajo se observa la inspección diaria del área a intervenir dejando evidencia fotográfica, inspección de herramientas, botiquín, la instalación de la señalización, el orden y el aseo, la entrega y el uso de los EPP, pausas activas, inducción, capacitación y charlas de seguridad.

El informe presentado fue revisado y analizado por supervisión de manera general el informe se evidencia que está bien estructurado se dejan las siguientes recomendaciones:

- *Riesgos controlados: Se han identificado y controlado los riesgos asociados con la limpieza del caño, como el riesgo de caídas y resbalones.*
- *Cumplimiento de protocolos: Se ha verificado que los trabajadores han cumplido con los protocolos de seguridad establecidos para la limpieza del caño, incluyendo el uso de equipo de protección personal (EPP).*
- *Incidentes menores: No se presentaron incidentes menores ni accidentes graves durante la limpieza del caño.*
- *Eficacia de las medidas de control: Las medidas de control implementadas han demostrado ser eficaces para prevenir accidentes y enfermedades laborales.*
- *Oportunidades de mejora: Se han identificado oportunidades de mejora en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, como la necesidad de mejorar la señalización en el área de trabajo y la capacitación adicional para los trabajadores.*

En conclusión, la supervisión establece que el informe HSE entregado por el contratista fue revisado y analizado, de manera general se evidencia que está bien estructurado y se culmina con el 100% de las actividades de seguridad y salud en el trabajo.

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
Teniendo en cuenta lo estipulado en el CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, del contrato 113-24 cuyo objeto "CONTRATO DE OBRA PARA REMOCION DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS ECOLOGICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA", en la cual se establece que el valor contractual se pagará de la siguiente manera:

A. ACTAS DE AVANCE MENSUAL: Hasta un noventa por ciento (90%) del valor del contrato, por medio de actas de avance mensual, previa presentación de factura y/o cuenta de cobro, informe de actividades con las evidencias de ejecución del periodo, acta de aprobación por parte de la supervisión, soporte de pago de los aportes al sistema integral de seguridad social

B. ACTA DE PAGO FINAL: Correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, se pagará cuando el contrato este ejecutado el cien por ciento (100%), previa presentación del informe final de

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

ejecución con las respectivas evidencias, aprobado por la supervisión y certificado de cumplimiento de aportes parafiscales y seguridad social de la empresa ejecutora

Se describe a continuación el avance de la obra, cantidades y acumulado de las actividades ejecutadas durante el periodo 3 para alcanzar el 90% del valor del contrato.

Tabla 79 Seguimiento a la programacion

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES ORIGINALES	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 1	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 2	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 3	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	% DE EJECUCION Acta final	% DE EJECUCION ACUMULADO
LIMPIEZA MECANICA EN CAÑOS URBANOS										
9	Remoción de sedimentos	M³	17.160,62	4.203,26	8.954,64	2.286,66	1.701,44	17.146,00	9,91%	99,91%
									SALDO	0,09%

Fuente: Informe supervisión final

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que a pesar que CONSTRUMULL SAS intervino la totalidad de los sectores definidos en el contrato, en el acta final no se alcanzó el 100% de la cantidad contractual, teniendo en cuenta que en el control de las cantidades ejecutadas y al realizar los cálculos topográficos antes y después de la remoción, se consideró pertinente dejar un saldo de cantidad mínima a favor de PISCICOLA, correspondiente 14,62 m3, ya que, en el caso de continuar con la remoción de sedimentos, la cantidad ejecutada superaría la cantidad contractual.

Como soporte y anexo de las cantidades ejecutadas en el periodo del acta final, se anexa las memorias de cálculo con los diferentes trabajos realizados de remoción mecánica de sedimentos en los distintos caños del Distrito de Barrancabermeja.

Seguimiento A La Programación De Obra
En el siguiente cuadro se muestra el avance físico de obra programado y ejecutado en cada una de las actas realizadas para el Contrato N° 113-24.


Tabla 80 Seguimiento avance de obra

PROYECTO		ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	FINAL
PROGRAMADO MENSUAL	P	$ 608.910.693,00	$ 1.295.161.000,00	$ 726.307.139	$ 544.730.355
	%	19,18%	40,79%	22,88%	17,16%
PROGRAMADO ACUMULADO	P	$ 608.910.693,00	$ 1.904.071.693,00	$2.630.378.832	$ 3 175. 109.187
	%	19,18%	59,97%	82,84%	100%
EJECUTADO MENSUAL	E	$ 777.699.774,98	$ 1.656.814.356,72	$ 423.094.136,60	$ 314.806.089,70
	%	24,49%	52,18%	13,33%	9,91%
EJECUTADO ACUMULADO	E	$ 777.699.774,98	$ 2 434 514 131,70	$ 2.857.596.268,30	$ 3 172 404 358,00
	%	24,49%	76,67%	90,00%	99,91%

Fuente: Informe supervisión final

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

Figura 58 Curva de avance de obra



Para el periodo de ejecución del acta final, del 05 de diciembre de 2024 al 07 de diciembre de 2024, se presentó un avance de obra de 9,91% equivalente a $ 314.806.089,70 de los costos directos, alcanzando un porcentaje de ejecución total del 99,91% del valor total del contrato.

VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Verificación del personal

Para el periodo del presente informe, el contratista CONSTRUMUL realizó la contratación del siguiente personal:

Tabla 81 Relacion del personal

NOMBRE	PROFESION	CARGO	CANTIDAD	FECHA DE INGRESO	FECHA TERMINACIÓN
Víctor Mario Montagut Cyarvajal	Ingeniero Civil	Ingeniero Residente	1	01 de octubre 2024	07 de diciembre 2024
Jorge Armando Bustillo Rojas	Ingeniero Ambiental y saneamiento	Supervisor HSE	1	18 de octubre 2024	07 de diciembre 2024
Gerardo Javier Borja Ibarguen	Bachiller	Guía Vial	1	21 de octubre 2024	07 de diciembre 2024
Yurlevinson Forero Cela	Bachiller	Cadenero	1	16 de octubre 2024	07 de diciembre 2024
Daniel Bermúdez Ardila	Bachiller	Operador de retroexcavadora	1	17 de octubre 2024	07 de diciembre 2024
Jonathan Romero León	Bachiller	Oficial	1	16 de octubre 2024	07 de diciembre 2024
José Enrique Badillo Piñeres	Bachiller	Obrero	1	21 de octubre 2024	07 de diciembre 2024
Yeisson Alejandro Pérez Sanabria	Bachiller	Obrero	1	16 de octubre 2024	07 de diciembre 2024
Carlos Daniel Trespalacios	Bachiller	Obrero	1	16 de octubre 2024	07 de diciembre 2024
Luz Mila Florez Peña	Bachiller	Guía Vial	1	14 de noviembre 2024	07 de diciembre 2024
Anderson Julian Gómez Ramirez	Bachiller	Operador retroexcavadora	1	01 de noviembre 2024	07 de diciembre 2024
PERSONAL TOTAL			11		

Fuente: Informe supervisión final

El contratista no realizó contratación de personal adicional, y teniendo en cuenta que el informe presentado corresponde al final, presentó los respectivos soportes de pago al sistema de seguridad integral de los meses del contrato, los desprendibles de pago de nómina, liquidación y paz y salvo de los trabajadores contratados para la labor.

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilometro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

Control De Correspondencia.
Durante el periodo del informe final, el contratista generó los siguientes oficios por lo tanto se relacionan en el presente apartado.

Tabla 82 Relación de correspondencia enviada a supervisión

No	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
1	09 de diciembre de 2024	Comunicación finalización de actividades	Piscicola

Fuente: Informe supervisión final

Comité Semanal De Seguimiento De Obra
En el periodo del 04 de diciembre de 2024 al 07 de diciembre 2024, se realizó un Comités de seguimiento de Obra al contrato 113-24.

Tabla 83 Relación de comités de seguimiento realizados

No	FECHA	ASUNTO
1	06 de diciembre de 2024	Comité de seguimiento No. 9 Seguimiento al avance de la ejecución del contrato No 113-24

Fuente: Informe supervisión final


Informes Semanales
Semanalmente el contratista presenta informe técnico, donde se evidencia las actividades ejecutadas durante la semana y el porcentaje de ejecución, los cuales fueron revisados y validado por la supervisión.

Seguimiento de la supervisión a las Obras Ejecutadas
La supervisión realiza el seguimiento al plan de trabajo, y el cumplimiento por parte del contratista de las actividades contractuales. Se pudo verificar que el contratista ejecutó las actividades conforme a las especificaciones técnicas en el sector intervenido para el acta final. Adicionalmente, se verificó que el contratista realizara las respectivas inspecciones a los equipos y maquinarias vinculadas al proyecto, y haya realizado las charlas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento de la actualización de las pólizas cuando diera lugar.

A continuación, se muestra un registro fotográfico de las actividades de supervisión por parte de la piscola al contrato de obra No. 113-24

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

Tabla 84 Evidencias fotograficas de actividades de supervisión

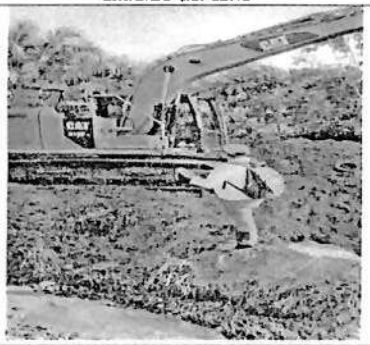	
Visita de inspección a los sitios intervenidos	*Toma de registro fotográfico de actividades realizadas*
	
Recorridos con monitores ambientales los sitios intervenidos	*Verificación de la recolección del material extraído del caño*
	
Inspección y verificación de actividades de remoción	*Inspección y verificación de actividades de remoción*


Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

Las actividades de supervisión, consistieron en verificar y documentar los avances en los trabajos de remoción mecánica de sedimentos, residuos sólidos y material vegetal en los sectores designados, asegurando el cumplimiento de las actividades bajo los parámetros del contrato y los estándares ambientales exigidos.

Durante la supervisión de las labores en el sector Diamante - Las Torres, se evidenció que este constituye el punto de acumulación final de los residuos provenientes de los sectores anteriores y de las descargas no controladas en la quebrada. Entre los hallazgos más relevantes se destacan:

- *Residuos vegetales: Se encontraron grandes cantidades de bambú, troncos, ramas y hojas, las cuales formaban tapones que obstruían el flujo normal del caño.*
- *Residuos sólidos: Se identificó una acumulación masiva de residuos urbanos, tales como partes de electrodomésticos (neveras), botellas plásticas, bolsas, muebles en descomposición y otros materiales de gran volumen.*
- *Tapones hídricos: La combinación de material vegetal y residuos sólidos generó bloqueos importantes en el caño, afectando directamente la capacidad de evacuación del agua, lo cual incrementa el riesgo de inundaciones y deterioro de la infraestructura aledaña.*

Figura 16 Registro fotográfico de las actividades realizadas en el tramo Diamante las Torres.

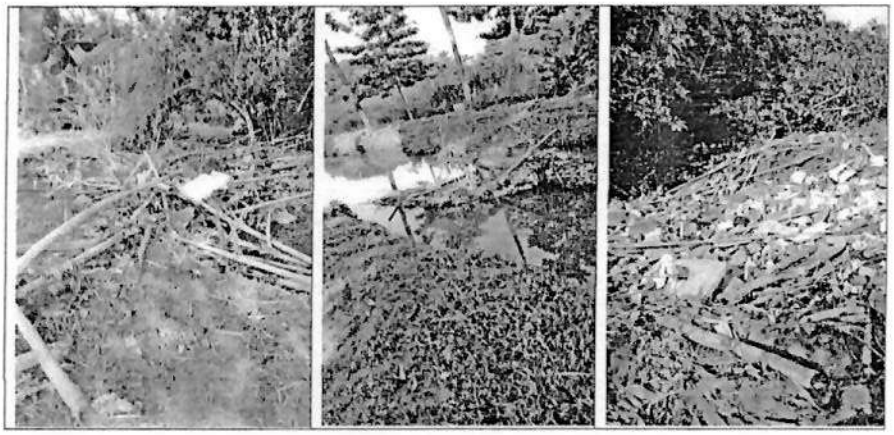


Fuente: Informe supervisión final

Como parte de los trabajos ejecutados en el sector Diamante - Las Torres, se supervisó lo siguiente:

- *Remoción de residuos con maquinaria: Se utilizó una retroexcavadora para retirar los sedimentos acumulados, así como los residuos vegetales y sólidos presentes en el cauce.*
- *Clasificación de residuos: Los materiales extraídos se clasificaron de acuerdo a su naturaleza (residuos sólidos urbanos y residuos vegetales). Los residuos sólidos fueron colocados en sacos para su posterior disposición adecuada.*
- *Extracción y disposición final: Se verificó que todos los residuos fueran retirados del sitio y dispuestos en los lugares autorizados, conforme a la normativa ambiental vigente.*

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

Figura 17 Ingreso de la cama baja al Sector Diamante las torres

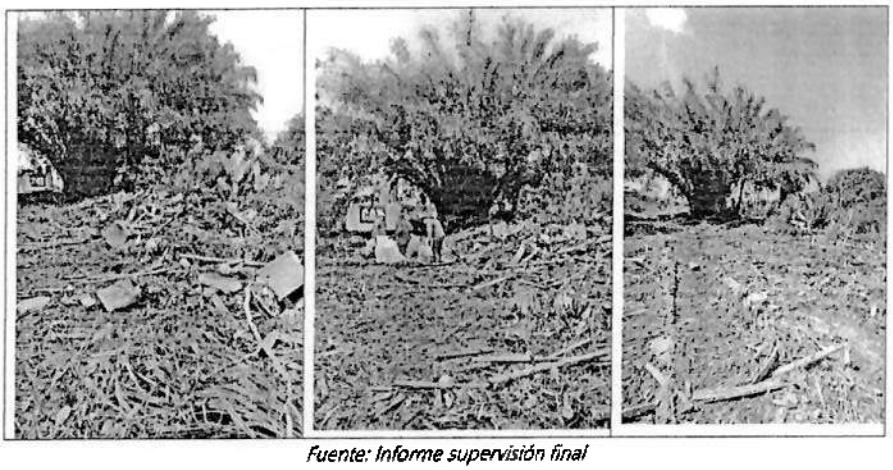

Fuente: Informe supervisión final

De las actividades ejecutadas por el contratista, se obtuvieron los siguientes resultados, las cuales, durante el proceso de supervisión, se constató que las actividades se realizaron con profesionalismo y en cumplimiento de las especificaciones del contrato. Los trabajos observados incluyen:

- *Eliminación completa de tapones en el sector final.*
- *Mejoramiento del flujo hídrico en el caño.*
- *Reducción de riesgos de inundaciones por obstrucción.*
- *Retiro y clasificación de residuos de manera ordenada y segura.*
- *Impacto ambiental y reflexión*

La acumulación de residuos en la Quebrada Palmira refleja la falta de cultura ambiental y la ausencia de manejo adecuado de residuos sólidos por parte de las comunidades aledañas. El sector Diamante - Las Torres, al ser el punto final de descarga, evidencia con mayor magnitud esta problemática.

Figura 18 Sector Diamante las torres



Fuente: Informe supervisión final

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

La intervención realizada no solo permite recuperar la funcionalidad hídrica del caño, sino también contribuye a la mitigación de impactos ambientales, mejorando las condiciones de salubridad y previniendo posibles emergencias por desbordamientos.

Verificación Del Pago De Seguridad Social Y Aportes Parafiscales

Para el periodo del presente informe, se verifica el pago de los aportes de seguridad social (Pensión, Salud y Riesgos Profesionales) y los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar) de los trabajadores correspondiente al mes de diciembre, y certificación de revisor fiscal.

VERIFICACIÓN DE ESTADO FINANCIERO Y ECONOMICO DEL CONTRATO

A continuación, se relacionan las cantidades ejecutadas en el periodo del 04 de diciembre de 2024 al 07 de diciembre de 2024, para el cobro del 9,91% del valor total del contrato. Por lo tanto, el valor a facturar corresponderá al 9,91%, por un valor de $ 314.806.089,70

Tabla 85 Estado financiero y económico del contrato

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO
Contrato N° 113-2024	$3.175.109.197,00		-	-
ACTA PARCIAL N°1		24,49%	$ 777.699.774,98	$ 777.699.774,98
ACTA PARCIAL N°2		52,18%	$ 1.656.814.356,72	$ 1.656.814.356,72
ACTA PARCIAL N° 3		13,33%	$ 423.084.136,60	$ 423.084.136,60
ACTA FINAL		9,91%	$ 314.806.089,70	$ 314.806.089,70
TOTAL, ACUMULADO		99,91%	$ 3.172.404.358,00	$ 3.172.404.358,00
SALDO A FAVOR DE PISICOLA SAN SILVESTRE	$ 2.704.839,00	0,09 %		

Fuente: Informe supervisión final

Al presente informe se anexa el Acta final para el cobro de $ 314.806.089,70 que corresponde al porcentaje del 9,91% de avance financiero, alcanzando el 99,91% acumulada del contrato de obra, la cual es autorizada y validada por supervisión para su correspondiente pago.

Rubros Presupuestales

En el siguiente cuadro se muestra los rubros presupuestales de los cuales se le descontaría el valor a pagar para el periodo del Acta final

Tabla 86 Rubros presupuestales contrato 113-24

PISCICOLA SAN SILVESTRE SA CONTRATO: 113-24 REGISTRO PRESUPUESTAL: RPG00989 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 2024	CONCEPTO	VALOR	ACTA PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2	ACTA PARCIA 3	ACTA FINAL	SALDO A FAVOR DE PISICOLA

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas, servicios de producción	$ 3.175.109.187	$ 777.699.774,98	$ 1.656.814.356,72	$ 423.084.136,60	$ 314.806.089,70	$ 2.704.829,00
			$ 777.699.774,98	$ 1.656.814.356,72	$ 423.084.136,60	$ 314.806.089,70	$ 2.704.829,00

Fuente: Informe supervisión final

Registro Cronológico De Los Pagos, Ajustes Y Deducciones Efectuados.
Tabla 87 Pagos, ajustes y deducciones efectuadas.

	VALOR DEL CONTRATO	ACTA PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2	ACTA PARCIAL 3	ACTA FINAL
VALOR INICIAL	$ 3.175.109.187	$ 777.699.774,98	$ 1.656.814.356,72	$ 423.084.136,60	$ 314.806.089,
SALDO A FAVOR DE PISCIOLA	$ 2.704.829,00				

Fuente: Informe supervisión final

Factura Presentada Por La Empresa Contratista

Se revisa factura presentada por la empresa contratista para el pago del acta final correspondiente a un valor de $ 314.806.089,70, y se aprueba su respectivo pago.

VERIFICACIÓN ASPECTOS LEGALES
Tabla 88 Relacion de actas del contratista

ACTA	FECHA	OBSERVACION
INICIO	01 de octubre de 2024	N/A
PARCIAL No. 1	31 de octubre de 2024	Periodo del 01 de octubre al 31 de octubre
PARCIAL No. 2	30 noviembre de 2024	Periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre
PARCIAL No. 3	04 de diciembre de 2024	Periodo del 01 de diciembre al 04 de diciembre
FINAL Y LIQUIDACIÓN	07 de diciembre de 2024	Periodo del 05 de diciembre al 07 de diciembre

Fuente: Informe supervisión final

Cambios Técnicos Y/O Modificaciones Del Contrato
A la fecha del presente informe, el contrato obra N° 113-24 no ha sufrido cambio o modificaciones en su objeto y alcance.

Cuadro De Control De Pólizas Del Contratista
Se realizó la revisión de las pólizas debidamente actualizadas, para cada uno de los amparos requeridos en el proceso contractual, y se solicitó al contratista la actualización de las pólizas una vez sea expedida el acta final del contrato.

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Tabla 89 Polizas del contrato inicial

CONTRATO INICIAL	
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)	
56-44-101008598	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/09/2024	28/07/2027	$317,510,918,70
56-40-101003739	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	27/09/2024	28/04/2025	$635,021,637,40

Fuente: Informe supervisión final

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Tabla 90 Polizas del acta de inicio

ACTA DE INICIO				
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)	
56-44-101008598	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/10/2024	02/05/2025	$317,510,918,70
56-44-101008598	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	01/10/2024	01/01/2028	$317,510,918,70
56-44-101008598	CALIDAD DE SERVICIO	01/10/2024	01/01/2026	$317,510,918,70
56-40-101003739	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	01/10/2024	02/05/2025	$635,021,637,40

Fuente: Informe supervisión final

VERIFICACION AVANCE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

El Plan de Manejo de Tránsito (PMT) es fundamental para la ejecución segura y eficiente del proyecto de remoción de sedimentos en Barrancabermeja. Para garantizar un transporte adecuado de la maquinaria, se han establecido una serie de pasos que minimizan los riesgos y aseguran la seguridad de todos los involucrados.

En la fase de preparación, se procedió a verificar el estado de la cama baja y la retroexcavadora hidráulica, asegurando que ambos equipos estén en condiciones óptimas para el transporte. También se revisó la documentación necesaria, incluyendo permisos y registros requeridos por las autoridades competentes. Además, se designó un conductor experimentado para operar la cama baja y la camioneta de custodia, garantizando que cuente con la capacitación necesaria.

El proceso de transporte inició con la salida de la cama baja con la retroexcavadora hidráulica desde el punto de origen. La camioneta de custodia precedió al transporte, guiando el desplazamiento hacia el sitio de destino. Durante el trayecto, se transitó por la ruta designada, respetando todas las señales de tráfico y límites de velocidad establecidos, hasta llegar al área de parqueo designada en el sitio de destino.

Figura 19 Ingreso de la cama baja al Sector Diamante las torres

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA




Fuente: Informe supervisión final

Una vez en el lugar, se posicionó la cama baja en el área designada para la descarga. Se procedió a bajar la retroexcavadora hidráulica de la cama baja, asegurando que el proceso se realice de manera controlada y segura. Posteriormente, se verificó que la máquina estuviera segura y lista para iniciar sus operaciones.

Para garantizar la seguridad durante el transporte, se utilizó señales de advertencia y luces intermitentes, alertando a otros conductores y peatones de la presencia de maquinaria pesada. También se mantuvo una distancia segura entre vehículos y se verificó el estado del clima antes y durante el transporte, ajustando el plan en caso de condiciones adversas.

Figura 20 Descargue de la maquinaria al sector pozo siete

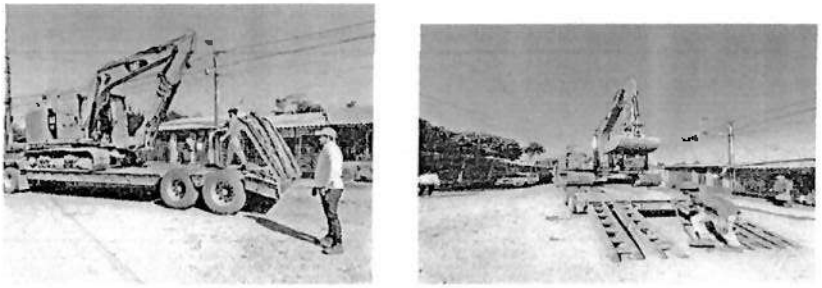


Fuente: Informe supervisión final

En caso de contingencias, se estableció un plan de emergencia para situaciones imprevistas, como accidentes o problemas mecánicos que puedan surgir durante el transporte. Se designó un equipo de respuesta preparado para actuar de manera rápida y efectiva en caso de incidentes.

Finalmente, se mantuvo un registro detallado del transporte y la descarga de la maquinaria, documentando el cumplimiento de cada etapa del proceso. Cualquier incidente o problema que ocurra durante el transporte será registrado, garantizando que se tomen las medidas adecuadas para prevenir futuros inconvenientes.

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

Figura 21 Verificación de la documentación de la retroexcavadora hidráulica

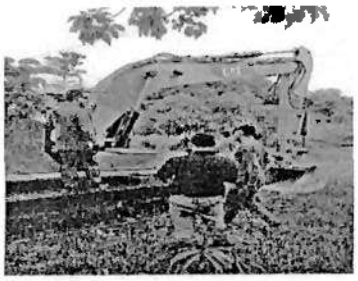

Fuente: Informe supervisión final

La implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) es un componente esencial para la correcta ejecución del proyecto de remoción de sedimentos en Barrancabermeja. Este plan asegurará un transporte seguro de la maquinaria, minimizando los riesgos y garantizando la seguridad de todos los usuarios de la vía. En conclusión el contratista ejecuto en debida forma durante el periodo del contrato las actividades contempladas en el Plan de Manejo de Tránsito.

VERIFICACIÓN AVANCE SEGUIMIENTO AL PLAN AMBIENTAL
El seguimiento al Plan de Manejo Ambiental – PMA - del proyecto, CONTRATO DE OBRA PARA REMOCION DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS ECOLOGICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA", se realiza con el fin de hacer una evaluación de las actividades contempladas por la empresa.

A continuación, se detallan los avances, y se realiza una breve descripción de las actividades realizadas en cumplimiento del PMA establecido.

FICHA No.1. Ficha técnica manejo de combustible

Durante el periodo del presente informe, se emprendieron acciones para el control del consumo de combustible de las maquinarias utilizadas para la ejecución del proyecto, mediante el mantenimiento preventivo de las mismas, lo que permitió obtener 0 accidentes por combustibles inflamables.

Es de resaltar, que el personal contratado es el idóneo y capacitado para la operación de la maquinaria pesada.

Figura 22 Registro fotografico de mantenimiento preventivo de las maquinas

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA



Fuente: Informe supervisión final

FICHA No.2. Ficha técnica Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles

Con el objetivo de minimizar el impacto generado por los procesos de combustión de los vehículos, se realizaron actividades de mantenimiento periódico a las maquinarias utilizadas. Así mismo, se garantizó que los vehículos contaran con la documentación legal para su funcionamiento tales como seguro, tecnicomecanica.

Figura 23 certificacion de revisión tecnicomecanica



RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

DATOS VEHÍCULO

PLACA		CLASE	VOLQUETA
MARCA	CHEVROLET	MODELO	1993
SERVICIO	Particular	COMBUSTIBLE	DIESEL
ODÓMETRO	10000	NRO. MOTOR	94708188
NRO. CHASIS	2S97D17903	VIN	
LÍNEA	SIN LINEA		
COLOR	VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO:

FIRMA DEL RESPONSABLE
WILSON BUENO CALDERON

Fuente: Informe supervisión final

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 Vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

3. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:

Asciende a la suma de TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($3.175.109.187,00).

A. ACTAS DE AVANCE MENSUAL: Hasta un noventa por ciento (90%) del valor del contrato, por medio de actas de avance mensual, previa presentación de factura y/o cuenta de cobro, informe de actividades con las evidencias de ejecución del periodo, acta de aprobación por parte de la supervisión, soporte de pago de los aportes al sistema integral de seguridad social

B. ACTA DE PAGO FINAL: Correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, se pagará cuando el contrato este ejecutado el cien por ciento (100%), previa presentación del informe final de ejecución con las respectivas evidencias, aprobado por la supervisión y certificado de cumplimiento de aportes parafiscales y seguridad social de la empresa ejecutora

4. BALANCE ECONOMICO DEL PERIODO A COBRAR:

La presente acta final y de liquidación sirve como fundamento para el cobro y tramite de la suma de DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($2.394.704.583.02). a favor del contratista.

5. PAGO DE SALUD, PENSIONES Y ARL DEL PERIODO A COBRAR:

Que el contratista presentó el pago de Salud, Pensiones y ARL correspondiente los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024 del personal mínimo, conforme a lo estipulado en la Ley 789 de 2002, así:

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Número de planilla 9476872839			
Periodo cotizado	Salud / noviembre 2024	Pensión / octubre 2024	
Concepto	Valor aporte	Valor Intereses	Valor total
Pensión	$1.270.600	$0.0	$1.270.600
Salud	$317.800	$0.0	$317.800
C.C.F	$317.800	$0.0	$317.800
ARL	$553.100	$0.0	$553.100
PARAFISCALES	$201.300	$0.0	$201.300
Totales	$2.459.300	$0.0	$2.459.300

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Número de planilla 9478114748

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrative@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

Periodo cotizado	Salud / diciembre 2024	Pensión / noviembre 2024	
Concepto	Valor aporte	Valor Intereses	Valor total
Pensión	$2.373.900	$0.0	$2.373.900
Salud	$593.500	$0.0	$593.500
C.C.F	$593.500	$0.0	$593.500
ARL	$1.032.800	$0.0	$1.032.800
PARAFISCALES	$402.500	$0.0	$402.500
Totales	$4.593.700	$0.0	$4.593.700

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Número de planilla 9478923377			
Periodo cotizado	Salud / enero 2025	Pensión / diciembre 2024	
Concepto	Valor aporte	Valor Intereses	Valor total
Pensión	$692.100	$0.0	$692.100
Salud	$173.300	$0.0	$173.300
C.C.F	$173.300	$0.0	$173.300
ARL	$301.600	$0.0	$301.600
PARAFISCALES	$107.500	$0.0	$107.500
Totales	$1.340.300	$0.0	$1.340.300

Que el contratista allego junto con su informe final certificado de *(...) cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, CONSTRUMULL S.A.S, con Nit 829.002.572-8 se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos de aportes a la caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar – ICBF, servicio nacional de aprendizaje SENA, así como SALUD PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES y que no tiene obligaciones pendientes por parafiscales y que lo pagado corresponde a lo que se asumió dentro del proyecto por recurso humano vinculado por contrato laboral de los empleados que laboraron con el contrato N°113-2024 (...)*

6. BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO DE OBRA N°. 113-2024

Que de acuerdo, a lo anterior se presenta a continuación el balance financiero del Contrato N°. 113-2024:

VALOR DEL CONTRATO	$3.175.109.187	
ACTA PARCIAL 01 (PAGADA)		*$777.699.774.98*
ACTA PARCIAL 02		$1.656.814.356.72
ACTA PARCIAL 03		$423.084.136.60
VALOR PRESENTE ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION		$314.806.089.70
VALOR A FAVOR DE LA PISCICOLA SAN SILVESTRE SA	*$2.704.829*	
SUMAS IGUALES		$3.172.404.358

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

AVANCE FISICO FINAL DEL CONTRATO		
% PROGRAMADO	% EJECUTADO DEL CONTRATO	DIFERENCIA %
100%	99,91%	0.09%

AVANCE FISICO FINAL DEL CONTRATO		
$ PROGRAMADO	$ EJECUTADO DEL CONTRATO	DIFERENCIA $
$3.175.109.187	$3.172.404.358	$2.704.829

A) PAGO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

DESCRIPCION	VALOR	VALOR PAGADO
Pago Anticipo o Anticipado	N/A	N/A

7. BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO DE OBRA N°. 113-2024

FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
N° FE 419	*26/12/2024*	*ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1*	*$777.699.774.98*
N° FE 431	25/03/2025	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2	$1.656.814.356.72
N° FE 432	25/03/2025	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3	$423.084.136.60
N° FE 433	25/03/2025	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° FINAL	$314.806.089.70

8. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. ADICIONES EN PLAZO

ADICIONAL No.	FECHA	PLAZO
N.A.	N.A.	N.A.

B. SUSPENSIONES

ACTA No.	FECHA

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

N.A.	N.A.
N.A.	N.A.

C. REINICIOS

ACTA No.	FECHA
N.A.	N.A.
N.A.	N.A.

D. ADICIONES EN VALOR

ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)
N.A.	N.A.	N.A.

9. GARANTIAS

A. GARANTIAS CONTRA EL CONTRA EL CONTRATO:

AMPARO DE CUMPLIMIENTO

ANEXO 0

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	56-44-101008598	27/09/2024	28/04/2025	$317.510.918.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACION	SEGUROS DEL ESTADO	56-44-101008598	27/09/2024	28/12/2027	$317.510.918.70
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	56-44-101008598	27/09/2024	28/12/2025	$317.510.918.70

AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ANEXO 0

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	SUMA ASEGURADA
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	56-40-101003739	27/09/2024	28/04/2025	$635.021.837.40

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

B. GARANTIAS CONTRA EL CONTRA EL ACTA DE INICIO:

AMPARO DE CUMPLIMIENTO

ANEXO 2

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	56-44-101008598	01/10/2024	02/05/2025	$317.510.918.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACION	SEGUROS DEL ESTADO	56-44-101008598	01/10/2024	01/01/2028	$317.510.918.70
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	56-44-101008598	01/10/2024	01/01/2026	$317.510.918.70

AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ANEXO 2

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	SUMA ASEGURADA
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	56-40-101003739	01/10/2024	02/05/2025	$635.021.837.40

C. MODIFICACIONES DE CUBRIMIENTO DE GARANTIAS DEL CONTRATO:

NUMERO DE ACTA	FECHA DE APROBACION	MOTIVO MODIFICACION
NA	NA	NA

D. GARANTIAS FINALES:

AMPARO DE CUMPLIMIENTO

ANEXO 3

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	56-44-101008598	01/10/2024	02/05/2025	$317.510.918.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACION	SEGUROS DEL ESTADO	56-44-101008598	01/10/2024	01/01/2028	$317.510.918.70

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	SUMA ASEGURADA
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	56-44-101008598	01/10/2024	01/01/2026	$317.510.918.70

AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ANEXO 2

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	SUMA ASEGURADA
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	56-40-101003739	01/10/2024	02/05/2025	$635.021.837.40

10. DECLARACIONES

- Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por EL CONTRATISTA y por el SUPERVISOR por lo tanto se soporta con los documentos contenidos en el expediente contractual.

- Que las partes expresan que aceptan la liquidación bilateral del contrato descrita en la presente acta y a partir de la fecha de suscripción de esta, previa el cumplimiento de las obligaciones pendientes, si existen.

NOTA 1: Se aclara que la fecha de terminación de ejecución en el contrato de la referencia en los documentos *"Acta de entrega y recibo a satisfacción parcial / y Acta parcial N° 01"*, realmente fue SIETE (7) DE DICIEMBRE DE 2024 y no ~~*30 de diciembre 2024*~~ como de forma errada se indicó es dichos documentos.

NOTA 2: Se aclara que la fecha de terminación del cubrimiento del amparo de predio laborales y operaciones N° 56-40-101003739, es 28/04/2025. Ya que por error involuntario se estableció en el segundo informe ~~*28/42/2027*~~.

Las partes firmantes de esta acta manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de liquidación bilateral y se deja las siguientes constancias:

1. Que las actividades derivadas del "CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION Y REPRODUCCION DE PECES NATIVOS.", fue entregado por el contratista a entera satisfacción, durante el plazo de ejecución.

2. Que en la presente acta de liquidación del contrato están incluidos todos los valores ejecutados por el contratista.

3. Que el Contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo durante la ejecución del contrato; por sueldos, jornales, honorarios y prestaciones sociales indemnizaciones tal como está estipulado en las pólizas de garantías.

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

4. Que el Contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa e indirectamente a la piscícola San Silvestre S.A., por efecto de la ejecución de las actividades del contrato.

5. Que al contratista no se le impusieron multas y/o sanciones en el plazo de ejecución.

6. Que de acuerdo a las obligaciones contractuales plasmadas en el estudio previo y en el contrato de obra N°113-2024, que fueron ejecutadas y cumplidas conforme a lo enunciado por la gerente de su momento y el supervisor; además de lo contenido en los artículos: 3°, 4°, numeral 10 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, en el numeral primero del artículo Quinto (5), artículo 51° de la ley 80 de 1993 y artículo 54 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 del 2021, es por ello que la Piscícola San Silvestre S.A., se procede a la presente a desarrollar el acta de liquidación bilateral.

7. Que el Contratista manifiesta que Piscícola San Silvestre S.A., cumplió con todas las obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente liquidación bilateral.

8. Que el contrato se ejecutó técnica, jurídica y financieramente de acuerdo con los APUS y presupuesto del convenio interadministrativo N°1732-24.

9. El contratista declara de manera expresa una vez se encuentre a paz y salvo por concepto de las obligaciones surgidas en virtud del contrato y de la presente acta de liquidación, renuncia a ejercer acción o reclamación alguna por conceptos tales como mayor permanencia, solicitudes de compensación o indemnización, o cualquier otra de conformidad con las disposiciones legales, en contra de la entidad.

10. El supervisor del contrato verificó y corroboró el correspondiente pago de los aportes al sistema de seguridad social (SALUD, PENSION Y ARL) durante todos los meses de la ejecución y del plazo del contrato celebrado.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron a los diez (10) días del mes de abril 2025

JOSE DE JESUS QUICENO FLOREZ
Gerente (E)
Piscícola San Silvestre S.A.

CONSTRUMULL S.A.S.
Nit 829.002.572-8
R.L. JHON ALEXANDER NARVEZ MACMAHON
C.C. No. 91.246.760
Contratista.

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectó	ANGIE STEPHANY FRANCO PETRO	JUDICANTE PSS SA		ABR 2025
Revisó Aspectos Jurídicos	DEIVI DIAZ RIVERA	ASESOR JURIDICO PSS SA		ABR 2025
Revisó Aspectos Contables	ELIANA ANDREA JIMENEZ MAHECHA	CONTADORA PSS SA		ABR 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.				

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

Fecha: 22/04/2025 15:22:51
Producto: Cuenta de Ahorros **********1062

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 1.580.600.896,31
Fecha de movimiento:	10/04/2025
Hora de movimiento:	12:39:31
Cuenta de origen:	**********1062
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	PORTAL PYMES [INTERBANCAR]
Documento:	166902
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Transfer.C **0000
Usuario:	JOSE DE JESUS QUICENO FLOREZ
Id cliente Originador:	8290002914
Referencia de Pago:	69374453
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES
