CIIF_BTA_DPS_409_2021_7141

Bogotá, 12 de enero de 2024

Señores:
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Atn.: LUIS ALBERTO COQUECO
Supervisor Convenio 681 FIP – 2021
Carrera 7 No. 27-18 Piso 8
Edificio Itaú
Ciudad

REF: **CONTRATO No 409 DE 2021. CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON EL PROPOSITO DE APORTAR A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE ESPACIOS COMUNITARIOS PARA LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y RECONCILIACION SOCIAL.**

ASUNTO: **REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 21 PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 156 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO N° 681 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA – VALLE DEL CAUCA Y PROSPERIDAD SOCIAL Y FIP CUYO NOMBRE ES "CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA CRA 9 ENTRE CLL 12 Y 13 Y CALLE 13 ENTRE CRA 9 Y 11 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA - VALLE DEL CAUCA" PRESENTADO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA N°001-2020 INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA.**

Cordial saludo;

Esta Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales correspondientes al convenio 681 FIP de 2021 celebrado entre el municipio de Caicedonia - Departamento del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, nos permitimos remitir para su conocimiento y fines pertinentes, el informe semanal de interventoría N°21 correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 28 de diciembre de 2023.

Agradecemos la atención prestada, cualquier inquietud no dude en comunicarse con nosotros.

Atentamente,

CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2021

JORGE GÓMEZ FALLA
Representante Legal

SE ANEXA LO ENUNCIADO EN DIECISEIS (16) FOLIOS.
Elaboro: JLGQ
Reviso: WASP
Aprobó: JGF
Copia: PROYECTOS\DPS\EN_EJECUCION\CI2021_DPS_409_2021\CORRESPONDENCIA\OFICIOS

PROSPERIDAD SOCIAL	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 4

FECHA DE INFORME:	29/12/2023		INFORME N°:	21	PERÍODO DEL	25/12/2023
			ETAPA:	CONSTRUCCIÓN	AL	29/12/2023
N° Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS):	681 DE 2021		ID DEL PROYECTO:	E-2020-2203-248649		
DEPARTAMENTO:	Valle del Cauca		MUNICIPIO:	Caicedonia		
N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	409 DE 2021		SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):	LUIS ALBERTO COQUECO		

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA	No. Beneficiarios	1348 HABITANTES
N° ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA (o su equivalente):	26/07/2022	**Nota: Verificar que el Acta se encuentra suscrita por todas las partes intervinientes**	

PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)			**CONTRATO DE OBRA**	
N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente):	No. 14 - REGIÓN I		N° Y AÑO DE CONTRATO:	156
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -FIP		CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAICEDONIA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2021		CONTRATISTA:	JUAN CARLOS MARTÍN
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	N/A		PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	N/A
PLAZO CONSTRUCCIÓN:	3 MESES		PLAZO CONSTRUCCION:	3 MESES
PLAZO TOTAL INICIAL:	3 MESES		PLAZO TOTAL INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	26/07/2022		FECHA DE INICIO:	26/07/2022
FECHA INICIAL DE TERMINACION:	25/10/2022		FECHA INICIAL DE TERMINACION:	25/10/2022
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° :1	25/10/2022		*FECHA DE SUSPENSION N° :1	25/10/2022
FECHA DE AMPLACION N° 1 A LA SUSPENSION N°1	4/11/2022		FECHA DE AMPLACION N° 1 A LA SUSPENSION N°1	4/11/2022
FECHA DE AMPLACION N° 2 A LA SUSPENSION N°1	19/11/2022		FECHA DE AMPLACION N° 2 A LA SUSPENSION N°1	19/11/2022
FECHA DE AMPLACION N° 3 A LA SUSPENSION N°1	27/11/2022		FECHA DE AMPLACION N° 3 A LA SUSPENSION N°1	27/11/2022
*FECHA DE REINICIO N°:1	30/11/2022		*FECHA DE REINICIO N°:1	30/11/2022
*FECHA DE PRORROGA N°:1	30/11/2022		*FECHA DE REINICIO N°:1	30/11/2022
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° :2	19/12/2022		*FECHA DE SUSPENSION N° :2	19/12/2022
FECHA DE AMPLACION N° 1 A LA SUSPENSION N°2	1/01/2023		FECHA DE AMPLACION N° 1 A LA SUSPENSION N°2	1/01/2023
FECHA DE AMPLACION N° 2 A LA SUSPENSION N°2	21/01/2023		FECHA DE AMPLACION N° 2 A LA SUSPENSION N°2	21/01/2023
FECHA DE AMPLACION N° 3 A LA SUSPENSION N°2	5/02/2023		FECHA DE AMPLACION N° 3 A LA SUSPENSION N°2	5/02/2023
FECHA DE AMPLACION N° 4 A LA SUSPENSION N°2	20/02/2023		FECHA DE AMPLACION N° 4 A LA SUSPENSION N°2	20/02/2023
FECHA DE AMPLACION N° 5 A LA SUSPENSION N°2	13/03/2023		FECHA DE AMPLACION N° 5 A LA SUSPENSION N°2	13/03/2023
FECHA DE AMPLACION N° 6 A LA SUSPENSION N°2	28/03/2023		FECHA DE AMPLACION N° 6 A LA SUSPENSION N°2	28/03/2023
FECHA DE AMPLACION N° 7 A LA SUSPENSION N°2	19/04/2023		FECHA DE AMPLACION N° 7 A LA SUSPENSION N°2	19/04/2023
FECHA DE AMPLACION N° 8 A LA SUSPENSION N°2	4/05/2023		FECHA DE AMPLACION N° 8 A LA SUSPENSION N°2	4/05/2023
FECHA DE AMPLACION N° 9 A LA SUSPENSION N°2	19/05/2023		FECHA DE AMPLACION N° 9 A LA SUSPENSION N°2	19/05/2023
FECHA DE AMPLACION N° 10 A LA SUSPENSION N°2	5/06/2023		FECHA DE AMPLACION N° 10 A LA SUSPENSION N°2	5/06/2023
FECHA DE AMPLACION N° 11 A LA SUSPENSION N°2	20/06/2023		FECHA DE AMPLACION N° 11 A LA SUSPENSION N°2	20/06/2023
FECHA DE AMPLACION N° 12 A LA SUSPENSION N°2	30/06/2023		FECHA DE AMPLACION N° 12 A LA SUSPENSION N°2	30/06/2023
FECHA DE AMPLACION N° 13 A LA SUSPENSION N°2	30/09/2023		FECHA DE AMPLACION N° 13 A LA SUSPENSION N°2	30/09/2023
FECHA DE AMPLACION N° 14 A LA SUSPENSION N°2	30/10/2023		FECHA DE AMPLACION N° 14 A LA SUSPENSION N°2	30/10/2023
*FECHA DE REINICIO N°:2	01/12/20223		*FECHA DE REINICIO N°:2	1/12/2023
*FECHA DE PRORROGA N°:2	10/12/2023		*FECHA DE PRORROGA N°:2	10/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023		FECHA DE TERMINACION:	31/12/2023
PLAZO ACTUALIZADO:	142		PLAZO ACTUALIZADO:	142
PLAZO TRANSCURRIDO:	521 EQUIVALE AL 3,67		PLAZO TRANSCURRIDO:	521 EQUIVALE AL 3,67


PROSPERIDAD SOCIAL	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 4


VALOR INICIAL :	$	90.857.690,00		VALOR INICIAL :	$ 843.755.661,06
*VALOR ADICIÓN N° :	$	-		*VALOR ADICIÓN N° :	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$	90.857.690,00		VALOR ACTUALIZADO:	$ 843.755.661,06
PORCENTAJE DE EJECUCION		60,08%		PORCENTAJE DE EJECUCION	60,08%
VALOR EJECUTADO	$	54.586.968,92		VALOR EJECUTADO:	$ 506.925.325,17
PORCENTAJE DE PAGO		0%		PORCENTAJE DE PAGO	0%
VALOR PAGADO:				VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR EJECUTAR:	$	36.270.721,08		VALOR POR EJECUTAR:	$ 336.830.335,89
SUPERVISOR DE CONVENIO O CONTRATO:	LUIS ALBERTO COQUECO			SUPERVISOR DESIGNADO POR EL CONTRATANTE:	CARLOS ALBERTO QUINTERO QUINCENO - HECTOR EMILIO LONDOÑO PAEZ

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. PORCENTAJE DE AVANCE FISICO Y EJECUCION PRESUPUESTAL

	Planeado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	68,40%	60,08%	-8,32%
2.2 AVANCE - EJECUCION PRESUPUESTO ($)	$ 577.151.145	$ 506.925.325,17	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	-$ 70.225.820		

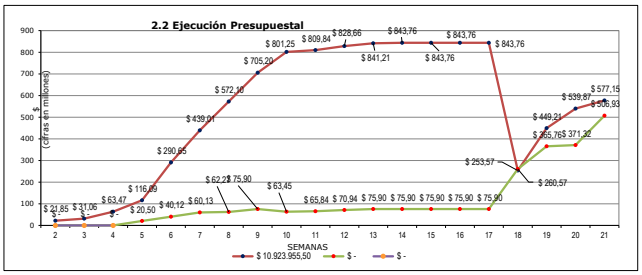

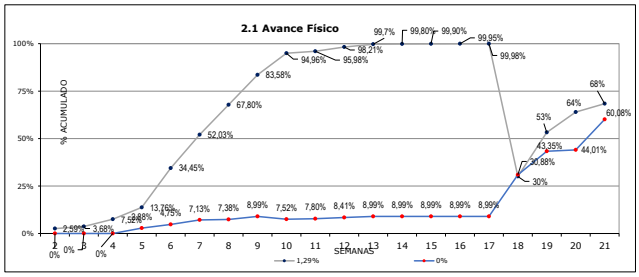

3. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS VISIBLES E INTERMEDIAS

No.	FECHA PROGRAMADA	HORA INICIO/ HORA FIN	LUGAR	FECHA REAL
1	1-sep-22	18.00 PM	UNIVALLE CAICEDONIA	1-sep-22
2				
3				

4. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Con corte a la programacion a la fecha del presente informe tenemos un programado fisico del 68,40% vs a un ejecutado fisico del 60.08% con un atraso de -8,32%, durante este periodo realizaron actividades suministro e instalación de demolicion de losas en concerto,subbase, pavimento hidraulico, construcción de bordillos; Durante este periodo se presentaron fuertes lluvias en la zona afectando el normal desarrollo de

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cuenta en obra con 1 maestro, 2 ayudantes, 1 retroexcavadora, 1 vibrocompactador, 3 volquetas, 1 Mezcladora de concreto, 1 vibrador de concreto, 1 Ing Residente, 1 Director de obra, 1 Ingeniero de apoyo, 1 Residente Social, 1 Residente pgio.

4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

La inversión realizada hasta la fecha de corte del presente informe es de un avance físico del 60,08% equivalente a $506.925.335,68 vs a un programado del 68,4% equivalente a $577.151.145 para un atraso en inversión de -$70.225.809.

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Se reitera al contratista la entrega de resultados de las densidades de la subbase y de concreto de las actividades ejecutadas en el periodo; ademas del diseño de mezcla del MR para el pavimento hidraulico.

4.5. MANEJO AMBIENTAL

El contratista tiene la obra aseada en el proceso de retiro de escombros.

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL

En este periodo hace presencia en obra el personal PGIO,inicialas charlas,y en proceso de instalacion de los puntos ecológicos, etc.

4.7 SALUD OCUPACIONAL

Reiteramos al contratista subsanación a las observaciones del PGIO en informes anteriores, además de completar documentación del personal actual de obra.

4.8 ASPECTOS SOCIALES

El contratista realizo las Subsanacion a las observaciones de los informes sociales.

PROSPERIDAD SOCIAL	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 4

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA
4,3	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	El contratista entrega polizas actualizadas del contrato en proceso de revision y aprobacion por las partes.	DICOIN S.A.S	1/12/2023	21/12/2023
4,1	PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)	El contratista completa informe con soportes por las actividades desarrolladas por el contratista en suspension, se solicita plan de accion por la presencia de fuerts lluvias en la zona.	DICOIN S.A.S	1/12/2023	Inmediato
4,3	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	Se solicita al contratista plan de accion que incluya los factores presupuestales para realizarlo.	DICOIN S.A.S	19/12/2023	Inmediato
4,6	SEGURIDAD INDUSTRIAL	El contratista presenta al nuevo personal PGIO en obra el cual se avala por la interventoria,Se solicita al contratista 1- Subsanación a las observaciones del PGIO en informes anteriores, además de la documentación del personal actual de obra,de las charlas, puntos ecológicos, etc.	DICOIN S.A.S	11/12/2022	Inmediato
4,8	ASPECTOS SOCIALES	El contratista se encuentra en proceso de subsanacion de los informes sociales	DICOIN S.A.S	1/12/2023	Inmediato
4,8	ASPECTOS SOCIALES	Se realiza actualizaion de las actas de las viviendas que se vieron afectadas por inestabilidad del terreno y fuertes lluvias	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS 2021-SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DICOIN	11/12/2022	21/12/2023

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

1- Con corte a la programación a la fecha del presente informe tenemos un programado físico del 68,40% vs a un ejecutado físico del 60.08% con un atraso de -8,32%, durante este periodo realizaron actividades suministro e instalación de demolicion de losas en concerto,subbase, pavimento hidraulico, construcción de bordillos; Durante este periodo se presentaron fuertes lluvias en la zona afectando el normal desarrollo de las mismas.

2- La inversión realizada hasta la fecha de corte del presente informe es de un avance físico del 60,08% equivalente a $506.925.335,68 vs a un programado del 68,4% equivalente a $577.151.145 para un atraso en inversión de -$70.225.809.

3- Durante este periodo se presentaron fuertes lluvias en la zona afectando el normal desarrollo de las mismas, el contratista no presento el plan de contingencia solicitado.

4- Se reitera al contratista la entrega de resultados de concreto de las actividades ejecutadas en el periodo.

5- En este periodo hace presencia en obra el personal PGIO, inicia las charlas y en proceso de instalación de los puntos ecológicos, etc..

6- Reiteramos al contratista subsanación a las observaciones del PGIO en informes anteriores, además de completar la documentación del personal actual de obra.

7- El contratista realizo las Subsanación a las observaciones de los informes sociales.

8- El día 18 de diciembre del año 2023 el municipio suscribio la cesion del contrato de obra en referencia. Cedente: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DICOIN S.A.S Cesionario: JUAN CARLOS MARTÍN.

8. ANEXOS

*Acta de comité semanal
*Registro fotográfico
*Bitácora semanal

FIRMA:_____

INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)

NOMBRE:DIEGO MATIN LOPEZ

TP Nº:

Notas:
1. El informe debe ser enviado del correo registrado por parte del Interventor.
2. El informe debe incluir todos los anexos relacionados.
3. El informe ejecutivo debe ser diligenciado conforme al formato establecido.

PROSPERIDAD SOCIAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	**Código:** F-IP-209
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	**Versión: 3**

N° Y AÑO CONVENIO (DPS): 681 DE 2021

ID PROYECTO (DPS): E-2020-2203-248649

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:"CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA

FECHA (D/M/A):30-12-2023

SEMANA DEL 25 al 29 de diciembre de 2023

POTENCIAL BENEFICIARIO:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO:

DIRECCION:CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA

SECTOR: [x] Vías y Transporte [ ] Social Comunitario [ ] Espacio Público, Recreación y Deporte

MODALIDAD DE INTERVENCION: [ ] Unidad Sanitaria [ ] Unidad de Cocina [ ] Unidad Habitacional [ ] Pisos [ ] Cubierta [ ] Área Aprendizaje

KIT:
[ ] KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración
[ ] KIT B - Tanque de almacenamiento
[ ] KIT C -Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo)
[ ] KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) -
Unidad Cocinas/ Habitacional

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN


Condiciones del area de trabajo por la Lluvia en las zonas



Observación Técnica y/o Social (según el caso):

Condiciones del area de trabajo por la Lluvia en las zonas

Fundicion de Pavimeto Hidarulico K0+000 AL K0+040 CALZADA IZQ.

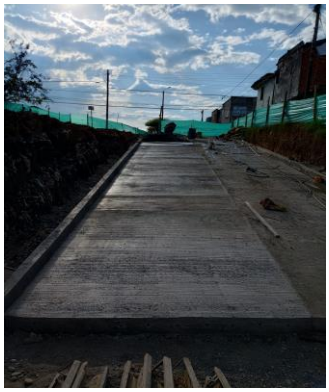

Observación Técnica y/o Social (según el caso): Fundicion de pavimentohidraulico K0+000 AL k0+040, calzada izquierda

Condiciones del area de trabajo por la Lluvia en las zonas

FUNDICION DE BORDILLOS K0+000 AL K0+050



Observación Técnica y/o Social (según el caso):
Fundicion de Bordillos K0+000 AL K0+050

Toma de Muestras de concreto



Observación Técnica y/o Social (según el caso): Toma de muestras de concreto
FUNDICION DE BORDILLOS K0+000 AL K0+050

FORMALETA PARA PAVIMENTO HIDRAULICO



Observación Técnica y/o Social (según el caso):
Formaleta para pavimento hidraulico

Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades.
Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas.
En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto.
Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)

Nombre:	PEDRO LUIS PUCHANA SOSA
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Entidad:	CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2021

MARTES 26 DE DICIEMBRE 2023.

PERSONAL EN OBRA

RESTEC. OBRA 1
PROFESIONAL PGIO 1
PROFESIONAL JUDICIAL 1
MAESTRO OBRA 1
AYUDANTES 3
OPERADOR MAQ. 2.
RESIDENTE INT. 1

CONDICIONES CLIMATOLOGICAS

LUNES 7:00 AM a 10:00 AM

EQUIPO EN OBRA

1 MEZCLADORA 1 OLLA
1 VIBRADOR CTO
1 VIBRADOR PAVIMENTO
1 FORMALETA BORDILLO Y PAV.
1 RETROEXCAVADORA.

INICIAN DEMOLICION DE LOSAS CARRIL 9 CON 13, CONTINUA EL SUMINISTRO DE SUBBASE Y PREPARAN FORMALETA Y ACERO PARA EL BORDILLO EN LOS PRIMEROS 30METROS, REITERAMOS LA TOMA DE MUESTRAS Y DENSIDADES DE LA SUBBASE.

RES INT.
CIC 2021.

MIERCOLES 27 DE DICIEMBRE 2023.

RES TECNICO OBRA 1
PROFESIONAL PGIO 1
PROFESIONAL JUDICIAL 1
MAESTRO OBRA 1
AYUDANTES 3
OPERADOR MAQ. 2
RESIDENTE. TEC. INT 1

CONDICIONES CLIMATOLOGICAS

NUBLADO

EQUIPO EN OBRA

1 MEZCLADORA DE CONCRETO
1 VIBRADOR DE CONCRETO
1 VIBROCOMPACTADOR
1 RETROEXCAVADORA
1 FORMALETA PARA BORDILLO Y PAV.
(1 VIB)

FUNDICION DE BORDILLOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE, TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO

REITERAMOS LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN PENDIENTE PGIO, JUDICIAL Y TECNICA

RES INT.
CIC 2021

JUEVES 28 DICIEMBRE 2023.

PERSONAL EN OBRA	CONDICIONES CLIMATOLOGICAS
RESIDENTE TEC. 1	NUBLADO
PROFESIONAL PGIO 1	EQ. EN OBRA
PROFESIONAL JOVAL 1	1 MEZCLADORA CONCRETO
MAESTRO OBRA 1	1 VIBRADOR CONCRETO
AYUDANTE OBRA 3	1 RETROEXCAVADORA
RESIDENTE TEC. INT. 1	1 VIBROCOMPACTADOR.

SE ORGANIZAN FORMALETA PARA EL PAVIMENTO E INICIAN FUNDICIÓN
CONTINUAN ACTIVIDADES DE BORDILLO Y SUBBASE.
TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO PENDIENTE ENTREGA DE RESULTADOS
REITERAMOS AL CONTRATISTA LA ENTREGA DE RESULTADOS Y DOCUMEN
CON PENDIENTE PGIO, JOVAL Y TECNICO.

RES INT.
CIC 2021

VIERNES 29 DICIEMBRE 2023.

PERSONAL EN OBRA	CONDICIONES CLIMATOLOGICAS
RESIDENTE TECNICO 1	NUBLADO
PROFESIONAL PGIO 1	EQ. EN OBRA
PROFESIONAL JOVAL 1	MEZCLADORA CTO 1
MAESTRO OBRA 1	VIBRADOR CTO 1
AYUDANTE OBRA 3	RETRO EXCAVADORA 1
RESIDENTE INT. 1	VIBROCOMPACTADOR 1

CONTINUAN ACTIVIDADES DE BORDILLO, PAVIMENTO HIDRAULICO
SUBBASE
TOMAN MUESTRAS
REITERAMOS AL CONTRATISTA QUE AUN NO SE HA RECIBIDO LA
INFORMACIÓN SOLICITADA RESPECTO A LOS PERFILES PGIO Y TECNICO.

RES INT.
CIC 2021

PROSPERIDAD SOCIAL	**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA** (INSPECCIÓN SEMANAL DE INTERVENTORIA)	**Código:** F-IP-205
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión:** 3

Informe de Interventoría N°: 21	Período del	25 de diciembre de 2023	Al	31 de diciembre de 2023
Tipo de Informe PGIO:	~~SEMANAL~~	Diciembre		Etapa: Obra
Fecha de Inspección:	26 de diciembre de 2023			
Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCION DOBLE CALZADA CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA			
N° y Año del Convenio (DPS):	681 DE 2021			
ID del Proyecto:	E-2020-2203-248649			
Contrato de obra No.	156 DE 2022			
Departamento:	VALLE DEL CAUCA			
Municipio:	CAICEDONIA			
Nombre del Contratante de Obra:	MUNICIPIO DE CAICEDONIA			
Nombre Contratista de Obra:	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DICOIN S.A.S			
Residente de obra:	ING JUAN CARLOS MARTIN			
N° y año del Convenio/Contrato de Interventoría:	409 DE 2022			
Nombre Contratista Interventoría:	CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2021			
Supervisor DPS:	LUIS ALBERTO COQUECO			
Plazo de ejecución:	TRES (3)MESES			
Nombre de la persona que realiza la inspección:	JAIRO ARANGO ESPINOSA			
Cargo de la persona que realiza la inspección:	ING RESIDENTE			

Instructivo: Califique como "1" las caracteristicas que cumplen , "0" las caracteristicas que no cumplen y "N/A" las caracteristicas que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así:

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja
70% - 89% Cumple parcialmente y arrojará una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

	Característica a Inspeccionar	Calificación	Indique la Evidencia de Cumplimiento
A) EJE DE CALIDAD			
1	Está la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministradas por el supervisor del contrato?	1	Se evidencia en obra valla instalada, de acuerdo a especificaciones del DPS.
2	Existe por parte del **constructor**, operador, ejecutor (según sea el caso que corresponda), un Ingeniero/Arquitecto residente para la obra, cumpliendo con los siguientes aspectos: 1. Personal con el perfil requerido 2. Personal disponible 100% en obra	1	Se evidencia en obra el Ingeniero Residente - Juan Carlos Martín
3	Existe por parte del **constructor**, operador, ejecutor (según sea el caso que corresponda), el personal requerido (según control operativo SST) para la implementación y ejecución del PGIO que cumpla con los siguientes aspectos? 1. Personal cumpliendo perfil requerido (normatividad vigente) 2. Personal disponible en obra 100%.	1	El profesional PGIO se encuentra contratado por parte del contratista, con asistencia eventual a la obra, ya que se encuentra realizando trabajo administrativo con las subsanaciones del PGIO INICIAL y los informes mensuales del año 2022.
4	Encuentra en la obra diseños de mezcla? Corrobore que la dosificación diseñada corresponda con la que se está haciendo en obra. Haga comentario respecto a la calidad del material y la protección al mismo (agregados - cemento - otros)	1	Se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría
5	Verifique el cronograma de obra e inspeccione que las actividades programadas al corte se estén ejecutando, en caso contrario indagar el porcentaje de retraso y el plan de acción programado para ajustar los tiempos de ejecución al requerido o si se está tramitando prórroga.	1	Se realiza el corte de acuerdo a la programación presentada por el contratista, debido a que realizaron actividades en suspensión se ha solicitado presentar informe técnico con su respectivos informes para establecer si cumplen o no con las normas y leyes vigentes.
6	Verifique que **estén disponibles en obra** los planos vigentes del proyecto y que se lleve un control de las versiones. Verifique que cuenten con la aprobación de la entidad competente.	1	Los planos del proyecto se encuentran en obra.
7	Verifique que **estén disponibles en obra** las especificaciones técnicas del proyecto.	1	Especificaciones técnicas del proyecto se encuentran en obra
8	Verifique que **estén disponibles en obra** las **hojas de seguridad** de los productos químicos utlizados.	0	No se evidencia, debido a que aun no se ha presentado el personal PGIO en obra
9	Se han hecho capacitaciones en manejo de hojas de seguridad, verifíquelo y pregunte acerca de su uso.	1	En el reinicio de obra no se han manejado productos quimicos al momento
10	Se está llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD establecido en el PGIO. Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él.	1	Debido a que realizaron actividades en suspensión se ha solicitado presentar informe técnico con su respectivos informes para establecer si cumplen o no con las normas y leyes vigentes.
11	Se entregan oportunamente los informes de PGIO a la interventoría para su aprobación (incluyendo el reporte de cumplimiento para la gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo)?. Cite el último número del Informe del PGIO presentado a la Interventoría con su fecha respectiva.	1	El contratista se compromete a entregar informe mensual PGIO el 28 de diciembre 2023.
12	La Bitácora está disponible en sitio, diligenciada y protegida contra el daño, deterioro o pérdida.	1	Si evidencia bitácora el obra.
13	Se está registrando diariamente en bitácora como mínimo los siguientes aspectos: *Actividades de obra desarrolladas y localizadas. *Personal de interventoría y de obra (maestros - obreros - residente - etc). *Estado del tiempo. *Equipos e instrucciones impartidas. *Situaciones que se generen en el desarrollo de la obra.	1	Se lleva el registro diariamente en bitácora.
14	La matriz de requisitos legales, se encuentra actualizada? Compruebe el cumplimiento de la misma, verificando como mínimo dos requisitos.	0	A la fecha se encuentra en actualización por parte del nuevo profesional PGIO

Informe de Interventoría N°: 21	Período del	25 de diciembre de 2023	Al	31 de diciembre de 2023
Tipo de Informe PGIO:	~~SEMANAL~~	Diciembre		Etapa: Obra
Fecha de Inspección:	26 de diciembre de 2023			
Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA			
N° y Año del Convenio (DPS):	681 DE 2021			
ID del Proyecto:	E-2020-2203-248649			
Contrato de obra No.	156 DE 2022			
Departamento:	VALLE DEL CAUCA			
Municipio:	CAICEDONIA			
Nombre del Contratante de Obra:	MUNICIPIO DE CAICEDONIA			
Nombre Contratista de Obra:	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DICOIN S.A.S			
Residente de obra:	ING JUAN CARLOS MARTIN			
N° y año del Convenio/Contrato de Interventoría:	409 DE 2022			
Nombre Contratista Interventoría:	CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2021			
Supervisor DPS:	LUIS ALBERTO COQUECO			
Plazo de ejecución:	TRES (3)MESES			
Nombre de la persona que realiza la inspección:	JAIRO ARANGO ESPINOSA			
Cargo de la persona que realiza la inspección:	ING RESIDENTE			

Instructivo: Califique como "1" las caracteristicas que cumplen , "0" las caracteristicas que no cumplen y "N/A" las caracteristicas que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así:

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja
70% - 89% Cumple parcialmente y arrojará una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

	Característica a Inspeccionar	Calificación	Indique la Evidencia de Cumplimiento
15	Se han hecho ensayos y pruebas de calidad?: verifique que estén registrados en la bitácora y que coincidan con los propuestos en el plan de inspección y ensayo.	1	Debido a que realizaron actividades en suspensión se ha solicitado presentar informe técnico con su respectivos informes para establecer si cumplen o no con las normas y leyes vigentes.
16	Se tiene copia de Certificados de calibración de equipos con los que se validan los resultados de los ensayos de laboratorio (materiales granulares, bordillos, pavimento rígido, etc.) ?	1	Debido a que realizaron actividades en suspensión se ha solicitado presentar informe técnico con su respectivos informes para establecer si cumplen o no con las normas y leyes vigentes.
17	Los equipos de medición (ejemplo: equipos topografía, balanzas, entre otros) utilizados en obra se encuentran calibrados con patrones certificados y/o laboratorios certificados.	1	Debido a que realizaron actividades en suspensión se ha solicitado presentar informe técnico con su respectivos informes para establecer si cumplen o no con las normas y leyes vigentes.
18	Se dispone de un control documentado para los equipos de medición, conforme al anexo control de equipos de medición	N/A	Por reinicio de obra.
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE CALIDAD		**15**	
B) EJE AMBIENTAL			
1	Se ha documentado, implementado y efectuado seguimiento del plan de trabajo específico para el proyecto, en gestión ambiental?	0	No se evidencia implementación del plan de trabajo ambiental.
2	Se están implementando en obra las medidas de manejo ambiental para los acopios temporales de materiales, escombros, sacos de cemento, material de excavación, separación de residuos ordinarios, peligrosos, reciclables, entre otros?. *Se implementan los recipientes para la clasificación de residuos (las 3 canecas)?. *Se cuenta en obra con el Kit de señalización ambiental. Está debidamente instalado?. *Se identifican todos los residuos tanto sólidos como líquidos?.	0	Se ha realizado la solicitud al contratista, sin embargo hasta la fecha el contratista no implementa el uso del punto ecológico.
3	Se ha realizado la disposición final de los residuos (escombros, residuos peligrosos, reciclables y ordinarios) con empresas o sitios autorizados, de acuerdo con lo exigido en la normatividad ambiental legal vigente?. *Se cuenta con los certificados de disposición final de escombros? *Se cuenta con los certificados de disposición final de residuos peligrosos (bolsas de cemento, recipientes usados de químicos o material combustible, entre otros)?. * Se entrega de manera oportuna todos los soportes de proveedores de materiales pétreos y sitio de disposición final de residuos producto de las actividades de obra?.	1	cuentan con tres volquetas para la salida de escombros al botadero oficial.
4	Se implementan las medidas de manejo ambiental necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua?.	1	Cuentan con tres volquetas para la salida de escombros al botadero oficial.
5	Se encuentra documentada la matriz de aspectos e impactos ambientales con sus respectivos controles y se efectua el seguimiento conforme a lo establecido?	N/A	No aplica para el proyecto ya que no se evidencia aledaño a este sistema de alcantarillado.
6	Se están llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO AMBIENTAL establecido en el PGIO. Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él.	0	No se evidencia seguimiento a las actividades ambientales en obra.
7	¿Existen procedimientos de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos, herramientas ?	0	No se evidencia procedimientos ni docuemtnos del mantenimiento preventivo de las máquinas y equipos.
8	La obra cuenta con canecas o un sistema para lavado de herramientas, y se realiza su deposición final de manera correcta?	N/A	Por las actividades actuales no se requiere
9	Los materiales combustibles (gasolina, ACPM, madera, papel, etc.) o sustancias químicas (solventes, thinner, ácidos, combustibles, entre otros)? Para cuando aplique, están éstos debidamente identificados y rotulados? Tienen la hoja de seguridad ? Cuentan con los recursos necesarios para mitigar los posibles derrames que se presenten? El personal conoce los riesgos, cómo actuar en caso de emergencia frente a un riesgo con los materiales o sustancias químicas?.	N/A	No se almacenan químicos combustibles en obra.

Informe de Interventoría N°: 21	Período del	25 de diciembre de 2023	Al	31 de diciembre de 2023
Tipo de Informe PGIO:	~~SEMANAL~~	Diciembre		Etapa: Obra
Fecha de Inspección:	26 de diciembre de 2023			
Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA			
N° y Año del Convenio (DPS):	681 DE 2021			
ID del Proyecto:	E-2020-2203-248649			
Contrato de obra No.	156 DE 2022			
Departamento:	VALLE DEL CAUCA			
Municipio:	CAICEDONIA			
Nombre del Contratante de Obra:	MUNICIPIO DE CAICEDONIA			
Nombre Contratista de Obra:	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DICOIN S.A.S			
Residente de obra:	ING JUAN CARLOS MARTIN			
N° y año del Convenio/Contrato de Interventoría:	409 DE 2022			
Nombre Contratista Interventoría:	CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2021			
Supervisor DPS:	LUIS ALBERTO COQUECO			
Plazo de ejecución:	TRES (3)MESES			
Nombre de la persona que realiza la inspección:	JAIRO ARANGO ESPINOSA			
Cargo de la persona que realiza la inspección:	ING RESIDENTE			

Instructivo: Califique como "1" las caracteristicas que cumplen , "0" las caracteristicas que no cumplen y "N/A" las caracteristicas que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así:

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja
70% - 89% Cumple parcialmente y arrojará una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

	Característica a Inspeccionar	Calificación	Indique la Evidencia de Cumplimiento
10	Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas Ambientales? Que temas se han dictado? Se encuentran las evidencias?	0	No se ha realizado capacitaciones ambientales debido que no se encuentra en obra el profesional PGIO.
11	Los sumideros en obra se encuentra debidamente protegidos?	N/A	No aplica ya que no se evidencian sumideros aledaños a la obra.
12	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra se encuentran protegidos con plásticos o lonas en buen estado, debidamente acordonados, identificados y con la respectiva señalización?	1	Por las actividades desarrolladas llenos estos una vez llegan se extienden y sellan.
13	Existe en obra el equipo mínimo (escobas, palas, carretillas, bolsas y demás implementos necesarios) para que las instalaciones se encuentren en adecuadas condiciones de aseo y limpieza?	1	Cuenta en obra con elementos para hacer aseo:Escobas, palas, recogedores y demás.
14	El campamento e instalaciones de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado?.	N/A	No hay campamento de obra
15	Las zonas verdes que existan en el área de intervención de la obra, se encuentran libres de materiales de construcción y residuos. Si es imprescindible su utilización, son restauradas o recuperadas las áreas intervenidas (conservando o mejorando las condiciones existentes antes de la afectación)?	N/A	No hay zonas verdes aledañas al proyecto
16	Se emplean materiales adecuados para el aislamiento y control de material particulado producido por la obra? (p. ej. Poli sombra, cintas de seguridad, barreras en ladrillo)	1	En proceso de cerramiento con polisombra
17	Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante la E.S.P. correspondiente?	1	Los servicios públicos estan debidamente legalizados
18	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con el decreto 1609 del 2002 o aquella que la que sustituya o modifique (por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera).	N/A	No aplica ya que el contratista no transporta residuos peligrosos de los cuales hace referencia la normativa.
19	Existe en obra copia del SOAT y la REVISIÓN TECNICO-MECÁNICA de los vehículos que transportan materiales (materiales pétreos, materiales en obra)?. Indique la vigencia de estos.	1	El contratista presenta los documentos de las volquetas que ingresan a obra.
20	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las vías? Se implementa un sistema de verificación de este ítem?	0	El contratista no ha presentado documentación.
21	Se cuenta con las unidades sanitarias de acuerdo con lo exigido por la normatividad legal vigente?	1	Hasta el momento no se ha instalado, ya que la obra solo cuenta con 2 trabajadores que viven en la misma calle donde se ejecuta el proyecto, por lo tanto, los trabajadores se desplazan hasta sus viviendas en caso de ser necesario.
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE AMBIENTAL		**8**	
C) EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST			
1	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley al Sistema General de Seguridad Social: ARL, EPS y AFP?.	1	El contratista entrega la documentación a la interventoría que certifica la afiliación del personal al Sistema General de Seguridad Social, sin embargo esta tiene observaciones.
2	Se encuentran en obra las planillas de pago de la seguridad social del personal ? Indique la fecha del último pago efectuado.	N/A	El contratista debe entregar las planillas con novedad de pago el 05 de enero de 2024.
3	Al personal que labora en el proyecto se le ha efectuado valoración médica ocupacional de ingreso, post incapacidad, reintegro, periódico y/o egreso?. Verifique que en obra se encuentra el respectivo examen firmado por un médico con licencia en salud ocupacional, además que la IPS cuenta con la habilitación y requisitos que solicita la norma para la prestación del servicio.	1	Se cuenta con los exámenes medicos ocupacionales de ingreso del personal debidamente firmados, los cuales fueron entregados a la interventoría.
4	Se ha documentado, implementado y ha efectuado seguimiento del plan de trabajo específico para el proyecto, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo?	1	Se encuentra debidamente documentada y se entregó a la interventoria en el PGIO INICIAL.

Informe de Interventoría N°: 21	Período del	25 de diciembre de 2023	Al	31 de diciembre de 2023
Tipo de Informe PGIO:	~~SEMANAL~~	Diciembre		Etapa: Obra
Fecha de Inspección:	26 de diciembre de 2023			
Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA			
N° y Año del Convenio (DPS):	681 DE 2021			
ID del Proyecto:	E-2020-2203-248649			
Contrato de obra No.	156 DE 2022			
Departamento:	VALLE DEL CAUCA			
Municipio:	CAICEDONIA			
Nombre del Contratante de Obra:	MUNICIPIO DE CAICEDONIA			
Nombre Contratista de Obra:	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DICOIN S.A.S			
Residente de obra:	ING JUAN CARLOS MARTIN			
N° y año del Convenio/Contrato de Interventoría:	409 DE 2022			
Nombre Contratista Interventoría:	CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2021			
Supervisor DPS:	LUIS ALBERTO COQUECO			
Plazo de ejecución:	TRES (3)MESES			
Nombre de la persona que realiza la inspección:	JAIRO ARANGO ESPINOSA			
Cargo de la persona que realiza la inspección:	ING RESIDENTE			

Instructivo: Califique como "1" las caracteristicas que cumplen , "0" las caracteristicas que no cumplen y "N/A" las caracteristicas que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así:

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja
70% - 89% Cumple parcialmente y arrojará una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

	Característica a Inspeccionar	Calificación	Indique la Evidencia de Cumplimiento
5	Se encuentra documentada la matriz de peligros y riesgos con sus respectivos controles y se efectúa el seguimiento conforme a lo establecido?	1	Se encuentra debidamente documentada y se entregó a la interventoria en el PGIO INICIAL.
6	Se han efectuado las inducciones y capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas de Seguridad y Salud en el trabajo? Que temas se han dictado?. Se encuentran las evidencias? Se diferencia el tipo de formación (charlas de 5 minutos y/o capacitaciones)? Se deja constancia escrita y firmada por los trabajadores de los riesgos a los que estará expuesto cada trabajador en su lugar de trabajo?.	0	No se evidencia, se ha solicitado al contratista la presentación de los documentos.
7	Se ha divulgado al personal de la obra que los accidentes (casi accidentes o accidentes) de trabajo deben ser reportados en un término máximo de 48 horas hábiles, ante quién se reporta, con qué medio se reporta y quién o quienes son las personas encargadas de reportarlo y el procedimiento que se realiza en caso de presentarse?	0	No se evidencia, se ha solicitado al contratista los soportes de la socialización de procedimiento.
8	Pregunte si ha habido accidentes, casi accidentes y/o enfermedades laborales. Verifique que se ha realizado todo el proceso respectivo de manejo del accidente o casi accidente acorde con la normatividad legal vigente y que esté reportado en los formatos aprobados de acuerdo con lo descrito en el Control Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo. *Reporte a la ARL Furat *Investigación del ATEL (Accidentes o enfermedades laborales). *Lecciones aprendidas *Seguimiento médico, cuando aplique. *Seguimiento a los controles propuestos para evitar que vuelva a presentarse el suceso.	N/A	Hasta la fecha no se han presentado accidentes, casi accidentes ni enfermedades laborales.
9	El personal cuenta con la dotación (calzado y vestido) requerida de acuerdo con los riesgos y actividad contratada?. Se ha establecido control de cambios cuando se requiera?	1	El personal en obra cuenta con los elementos requeridos para el desarrollo de las actividades.
10	El personal porta adecuadamente la dotación suministrada por el contratista y ésta se encuentra en buen estado?	1	Se evidencia en buen estado la dotación del personal.
11	Se ha dotado al personal con los Elementos de Protección Personal - E.P.P. requeridos para la ejecución segura de las labores en obra y se capacita sobre su uso?	1	El personal en obra cuenta con los elementos requeridos para el desarrollo de las actividades
12	El personal de obra utiliza los elementos de protección personal?	1	El personal en obra usa adecuandamente los elementos de protección personal
13	Se encuentra documentado y verificado el plan de emergencias específico para el proyecto? Se encuentra dentro del plan de emergencias la valoración de vulnerabilidad de acuerdo a las amenazas identificadas. Cuenta con los procedimientos operativos normalizados - PON - por cada amenaza identificada?	1	Se cuenta con el plan de emergencia especifico para el proyecto, el cual esta siendo subsanado por parte del profesional PGIO.
14	Todos los frentes de obra cuentan con los elementos necesarios (definidos en el plan de emergencias) para que la brigada pueda actuar en caso de emergencia? Ejemplo: Botiquín, extintores multipropósito, camilla de traslado o inmovilización de pacientes, inmovilizadores de cuello, extremidades superiores inferiores.	0	No se evidencia, se ha solicitado al contratista la presentacion de los documentos
15	Se tiene publicado el MEDEVAC (ficha de evacuación médica del personal accidentado) en los frentes de obra?. El personal conoce el procedimiento en caso de contar con un compañero accidentado? Conocen el MEDEVAC?	0	No se evidencia, se ha solicitado al contratista la presentación de los documentos.
16	Todos los frente de obra cuentan con la señalización de acuerdo a los riesgos identificados? Cuentan con señales de prevención, informativas, de advertencia entre otras de acuerdo a la normatividad legal vigente y los riesgos identificados en obra?. La señalización es distinta de la señalización vial?	0	No se evidencia, se ha solicitado al contratista la presentacion de los documentos
17	Se han realizado simulacros de emergencias? Se ha realizado la planificación del tipo de simulacro que se implementará, se evalúa el simulacro, se retroalimenta al personal y se analiza su efectividad?	N/A	No aplica por reinicio de obra.
18	Se verifica que se realizan las inspecciones preoperacionales de los vehículos, equipos, herramientas usadas en el proyecto? Se inspecciona el lugar y no se evidencian derrames o goteos a causa de daño de equipos, vehículos o herramientas? Se verifica que los vehículos y equipos cuenten con toda la documentación necesaria para su operación? (acorde con el PGIO) Se programa y se ejecuta el mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y manual de uso y/u operación?.	0	No se evidencia, se ha solicitado al contratista la presentación de los documentos
19	Se socializa a todo el personal de la obra la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmados por el Representante Legal de la empresa?. Se encuentran en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos (registro capacitación-registro fotográfico)	0	No se evidencia, se ha solicitado al contratista la presentación de los documentos

Informe de Interventoría N°: 21	Período del	25 de diciembre de 2023	Al	31 de diciembre de 2023
Tipo de Informe PGIO:	~~SEMANAL~~	Diciembre		Etapa: Obra
Fecha de Inspección:	26 de diciembre de 2023			
Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA			
N° y Año del Convenio (DPS):	681 DE 2021			
ID del Proyecto:	E-2020-2203-248649			
Contrato de obra No.	156 DE 2022			
Departamento:	VALLE DEL CAUCA			
Municipio:	CAICEDONIA			
Nombre del Contratante de Obra:	MUNICIPIO DE CAICEDONIA			
Nombre Contratista de Obra:	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DICOIN S.A.S			
Residente de obra:	ING JUAN CARLOS MARTIN			
N° y año del Convenio/Contrato de Interventoría:	409 DE 2022			
Nombre Contratista Interventoría:	CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2021			
Supervisor DPS:	LUIS ALBERTO COQUECO			
Plazo de ejecución:	TRES (3)MESES			
Nombre de la persona que realiza la inspección:	JAIRO ARANGO ESPINOSA			
Cargo de la persona que realiza la inspección:	ING RESIDENTE			

Instructivo: Califique como "1" las caracteristicas que cumplen , "0" las caracteristicas que no cumplen y "N/A" las caracteristicas que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así:

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja
70% - 89% Cumple parcialmente y arrojará una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

	Característica a Inspeccionar	Calificación	Indique la Evidencia de Cumplimiento
20	Los miembros del COPASST o VIGIA se reunen mensualmente, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	0	No se evidencia, se ha solicitado al contratista la presentación de los documentos
21	Se realizan actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores?	0	No se evidencia, se ha solicitado al contratista la presentación de los documentos
22	Todas las sustancias químicas estan inventariadas, cuentan con ficha de seguridad y son etiquetadas utilizando el Sistema Globalmente Armonizado - SGA? Son socializadas con el personal involucrado en su manejo?.	0	No se evidencia, se ha solicitado al contratista la presentacion de los documentos
23	Las sustancias químicas se almacenan según las medidas de seguridad que dictan las hojas de seguridad, están rotuladas y se encuentra señalizado el sitio de almacenamiento?	0	No se evidencia, se ha solicitado al contratista la presentacion de los documentos
24	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, están activas, especializadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento periódico, se ejecuta y existen los soportes?.	0	No se evidencia, se ha solicitado al contratista la presentacion de los documentos
25	Se realizan simulacros de emergencia?.	0	No se evidencia programación del simulacro de emergencias.
26	Se aplican los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo: en caliente, alturas, espacios confinados?	N/A	No aplica, el contratista no ejecuta para esta semana actividades de alto riesgo.
27	Se cuenta con procedimientos / instructivos / ATS para actividades de riesgos prioritarios y/o críticos?	N/A	No aplica por reinicio de obra.
28	El personal de trabajo en altura está dotado con los elementos de protección personal y colectivo requeridos por ley?.	N/A	No aplica para esta semana ya que durante este período no se evidencia trabajo seguro en alturas.
29	Se ejecutan las actividades según el cronograma o plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para el proyecto?	0	No se evidencia, se ha solicitado al contratista la presentación de los documentos
30	Se elabora y se cumple con un sistema de archivo o retención documental, acorde con la normatividad vigente y las políticas de la empresa? Para ello verifique: 1. Que en el documento esté descrito el manejo o custodia documental de: *Perfil epidemiologico: Conceptos de exámenes médicos ocupacionales, paraclínicos, entre otros. *Resultados de monitoreos o mediciones ambientales *Registro de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo. *Registro de suministro de elementos y equipos de protección personal. 2. Tome 2 o 3 evidencias de todos los documentos del sistema de gestión establecidos y verifique que cumplen su control documental de acuerdo con lo definido.	0	No se evidencia en obra un sistema de archivo y/o retención documental.
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST		**9**	

Informe de Interventoría N°: 21	Período del	25 de diciembre de 2023	Al	31 de diciembre de 2023
Tipo de Informe PGIO:	~~SEMANAL~~	Diciembre		Etapa: Obra
Fecha de Inspección:	26 de diciembre de 2023			
Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA			
N° y Año del Convenio (DPS):	681 DE 2021			
ID del Proyecto:	E-2020-2203-248649			
Contrato de obra No.	156 DE 2022			
Departamento:	VALLE DEL CAUCA			
Municipio:	CAICEDONIA			
Nombre del Contratante de Obra:	MUNICIPIO DE CAICEDONIA			
Nombre Contratista de Obra:	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DICOIN S.A.S			
Residente de obra:	ING JUAN CARLOS MARTIN			
N° y año del Convenio/Contrato de Interventoría:	409 DE 2022			
Nombre Contratista Interventoría:	CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2021			
Supervisor DPS:	LUIS ALBERTO COQUECO			
Plazo de ejecución:	TRES (3)MESES			
Nombre de la persona que realiza la inspección:	JAIRO ARANGO ESPINOSA			
Cargo de la persona que realiza la inspección:	ING RESIDENTE			

Instructivo: Califique como "1" las caracteristicas que cumplen , "0" las caracteristicas que no cumplen y "N/A" las caracteristicas que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así:

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja
70% - 89% Cumple parcialmente y arrojará una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

Característica a Inspeccionar		Calificación	Indique la Evidencia de Cumplimiento
	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	**SEMANA DEL 14/ AL 19/08/2023**	
	A) EJE CALIDAD	**88%**	
	B) EJE AMBIENTAL	**57%**	
	C) EJE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**38%**	
TOTAL VALORACIÓN CALIDAD, AMBIENTAL Y SST		**61%**	

Observaciones:

El contratista ya cuenta con el profesional PGIO el cual visita eventualmente la obra, ya que se encuentra realizando trabajo administrativo en materia de la subsanacion del PGIO INICIAL y los informes mensuales del año2022

PLANES DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR

N°	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	CUMPLIÓ SI/NO	OBSERVACIÓN
1	Presencia del Personal PGIO en obra	Inmediato	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DICOIN S.A.S	SI	
2	Presentacion de documentos de personal y equipos en obra.	Inmediato	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DICOIN S.A.S	SI	En proceso de revision
4	Instalación de Puntos ecológicos	Inmediato	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DICOIN S.A.S	NO	En proceso

JUAN CARLOS MARTIN
Ing residente de obra

JAIRO ARANGO ESPINOSA
RESIDENTE TECNICO INTERVENTORIA

Nota: Las verificaciones consideradas anteriormente no eximen al interventor y al contratista de realizar los controles a las actividades complementarias necesarias para la ejecución del proyecto, de acuerdo con su pertinencia y a otras actividades que no estén contempladas en el listado, con base en la normatividad vigente, criterio del interventor y/o el contrato de Interventoría.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

CODIGO	FR-PRO-010	
N° VER	F. ABROB.	F. REV.
1	06/12/2017	

CONTRATO OBRA: E-2020-2203-248649

CONTRATO INTERVENTORIA: 409 de 2021

CONTRATISTA: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DICOIN S.A.S

INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2021

PERIODO: DE 25 A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA: 24.12.2023

DESCRIPCIÓN / DÍAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PERSONAL DE CAMPO																															
Valentina Matin (Directora de obra) CC 1121941276																										1		1			
Juan Carlos Matin (Residente de obra) CC 17326563																										1	1	1	1	1	
William Suarez (ayudante de obra) CC 4228640																										1	1	1	1	1	
Noray Suarez (Maestro de obra) CC 79526554																										1	1	1	1	1	
Jeidy Alejandra Muriel (Residente Social) CC 1.115.421.360																										1	1	1	1	1	
Oscar Eduardo Rodriguez Agudelo 1.115.186.731																										1	1	1	1	1	
TOTAL PERSONAL POR DIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	6	5	5	0

OBSERVACIONES

INSPECTOR

ELABORADO

ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIEGO ALEJANDRO OSORIO ARANGO

Vo.Bo.

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ivan Posada	Andrés Flechas	Lina Diaz
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: PROFESIONAL RUC Y CALIDAD	CARGO: COORDINADOR SSTAC

PROSPERIDAD SOCIAL	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	**Código:** F-IP-209
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	**Versión:** 3

N° Y AÑO CONVENIO (DPS): 681 DE 2021

ID PROYECTO (DPS): E-2020-2203-248649

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:"CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA

FECHA (D/M/A):26-12-2023

SEMANA DEL 25 al 31 de diciembre de 2023

POTENCIAL BENEFICIARIO:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO:

DIRECCIÓN:CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA

SECTOR: [x] Vías y Transporte [ ] Social Comunitario [ ] Espacio Público, Recreación y Deporte

MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: [ ] Unidad Sanitaria [ ] Unidad de Cocina [ ] Unidad Habitacional [ ] Pisos [ ] Cubierta [ ] Área Aprendizaje

KIT:
- [ ] KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración
- [ ] KIT B - Tanque de almacenamiento
- [ ] KIT C -Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo)
- [ ] KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) - Unidad Cocinas/ Habitacional

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN

Condiciones del area de trabajo por la Lluvia en las zonas





Observación Técnica y/o Social (según el caso):

Condiciones del area de trabajo por la Lluvia en las zonas

FUNDICION DE BORDILLOS K0+000 AL K0+050





Observación Técnica y/o Social (según el caso):
FUNDICION DE BORDILLOS K0+000 AL K0+050
FORMALETA PARA PAVIMENTO HIDRAULICO



Observación Técnica y/o Social (según el caso):
Formaleta para pavimento hidraulico

Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades.
Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas.
En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto.
Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)

Nombre:	JAIRO ARANGO ESPINOSA
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Entidad:	CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2021
