FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL- AEROCIVIL**			**FECHA:**	31/5/2025
Semana No	**52**	**Del :**	25/5/2025	AL:	31/5/2025
Plazo Total		558	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		360	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		64,52%			
Nombre del Supervisor :		Gisell Sánchez Pastrana			

OBJETO DEL CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO TOLÚ.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,28%	74,83%	(%) Ejecutado	0,46%	81,05%
Valor programado ($)	$ 5.555.100,00	$ 1.494.013.083,00	Valor ejecutado ($)	$ 9.118.563,85	$ 1.618.166.964,51
			Evaluación	Porcentaje Adelanto	6,22%
				Valor Adelanto	$ 124.153.881,51

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	ABILE SAS	Contratista:	CONSORCIO SERVINC-BETMAF 2024
Contrato No:	23001186 H4 DE 2023	Contrato No:	23001301 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 1.996.500.065	Valor Inicial:	$ 1.117.574.559
Valor Actualizado al modificatorio :	NA	Valor Actualizado al modificatorio :	NA
Valor actualizado 2:	NA	Valor actualizado 2:	NA
Plazo inicial:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025	Plazo inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo actualizado:	NA	Plazo actualizado:	NA
Fecha de iniciación:	5-jun-24	Fecha de iniciación:	5-jun-24
Fecha de vencimiento:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025	Fecha de vencimiento:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Modificatorio No. Prórroga No.	NA	Modificatorio No. Prórroga No.	NA
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	NA	Fecha de Terminación Según Prórroga No.	NA
Suspensión No.	NA	Suspensión No.	NA
Periodo de Suspensión No.	NA	Periodo de Suspensión No.	NA
Levantamiento de la suspensión No.	NA	Levantamiento de la suspensión No.	NA
Nueva fecha de terminación	NA	Nueva fecha de terminación	NA
Valor total actual del contrato	$ 1.996.500.065	Valor total actual del contrato	$ 1.117.574.559

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se tramita informe semanal No. 51. Se revisa Plan de Trabajo propuesto por Contratista y se realizan observaciones. Se realizan observaciones al Acta parcial de obra No. 10. Se participa de comisión presencial de obra, comité y recorrido con Contratista y Supervisión en las instalaciones del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo.

OBRAS LADO TIERRA

SE REPORTA LAS SIGUIENTES ACTIVADES DURANTE LA SEMANA :

-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR (15,85 M²) [BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS]
-SERVICIO DE JARDINERÍA (0,4 HA) [ZONA PERIMETRAL VIA DE ACCESO]
-POR LA BMA SE REPORTA SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN 90M DE CABLE #6 [ACOMETIDA CASETA DE COMBUSTIBLE], SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 30M DE CABLE #10 [ACOMETIDA CASETA DE COMBUSTIBLE], SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 30M DE CABLE #12 [ACOMETIDA OFICINA DE VIGILANCIA], SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 15M DE TUBERIA EMT [ACOMETIDA OFICINA DE VIGILANCIA], SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 2 TABLEROS ELECTRICOS DE 18 CIRCUITOS [OFICINA VIGILANCIA, CASETA DE COMBUSTIBLE], SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 5 BREAKER DE 20 AMP [CASETA DE COMBUSTIBLE], 1 SALIDA PARA TOMA 110V [CASETA DE COMBUSTIBLE]



Actividades de rocería




Actividades de rocería



Instalación tablero Oficina de Vigilancia



Acometida Caseta de Combustibles



Aplicación pintura de bajantes



Aplicación pintura exterior bajantes



Acometida Caseta de Combustibles



Instalación tablero Oficina de Vigilancia

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

AVANCE DE OBRA:
Se presenta un avance acumulado de 80,59% en la ejecución de las actividades.

-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR (15,85 M²) [BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS]
-SERVICIO DE JARDINERÍA (0,4 HA) [ZONA PERIMETRAL VIA DE ACCESO]
-POR LA BMA SE REPORTA SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN 90M DE CABLE #6 [ACOMETIDA CASETA DE COMBUSTIBLE], SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 30M DE CABLE #10 [ACOMETIDA CASETA DE COMBUSTIBLE], SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 30M DE CABLE #12 [ACOMETIDA OFICINA DE VIGILANCIA], SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 15M DE TUBERIA EMT [ACOMETIDA OFICINA DE VIGILANCIA], SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 2 TABLEROS ELECTRICOS DE 18 CIRCUITOS [OFICINA VIGILANCIA, CASETA DE COMBUSTIBLE], SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 5 BREAKER DE 20 AMP [CASETA DE COMBUSTIBLE], 1 SALIDA PARA TOMA 110V [CASETA DE COMBUSTIBLE]


FINANCIERO:
Se realizó desembolso del anticipo.
Se aprueba por parte de Interventoría el acta parcial de obra No. 01, por un valor de $ 23.200.454 y acta No. 02 por un valor de $ 47.602.415; acta No. 03 por un valor de $ 75.183.934; acta No. 04 por un valor de $ 42.348.675; acta No. 05 por un valor de $64.720.146; acta No. 06 por un valor de $ 264.538.180, acta No. 07 por un valor de $ 610.682.692, acta No. 08 por un valor de $229.391.077 y acta No. 09 por un valor de $74.588.067, para un acumulado total de 71,74% del proyecto.

AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas:
Se desarrolla la adecuada disposición de residuos. Se da la aprobación al informe mensual ambiental de febrero y la no aprobación al correspondiente del mes de marzo.


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
-Se hace uso de elementos de protección personal.
-Se realizan charlas diarias de 5 minutos en temas de seguridad y salud en el trabajo(Cambio climatico, Uso correcto de extensiones eléctricas, el reciclaje posturas correctas y equipos para trabajos en alturas seguro
-El contratista realiza registro documental a través de formatos de su empresa (ATS, permisos de trabajo, inspecciones de equipos utilizados en la semana a la guadaña.)
-Se realiza capacitación por la contratista (Cuidado del corazón) que tubo como objetivo prinipal la importancia del cuidado del corazon.
-Se hace reinducción a dos oficiales eléctricos que empezaron que reingresaron el 26 de mayo, ambos subcontratados.
-El dia 26 de mayo de 2025 fueron despedidos un oficial de obra y un ayudante, estas dos personas estan relacionadas en el número total de personal del contratista.
-Se realiza comité presencial el dia 29 de mayo donde tuvo la participación la supervisión de la aerocivil, la interventoría y el contratista, uno de los temas tratados en esta reunión en materia SST fue el trabajo seguro en alturas.
-En la semana reportada no se presentaron accidentes laborales.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORÍA

Personal de Interventoría	6
Personal del Contratista	10
Total Personal en Obra	16

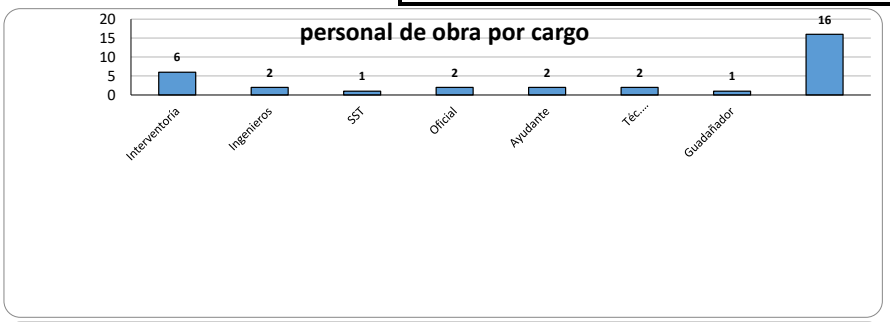

En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.

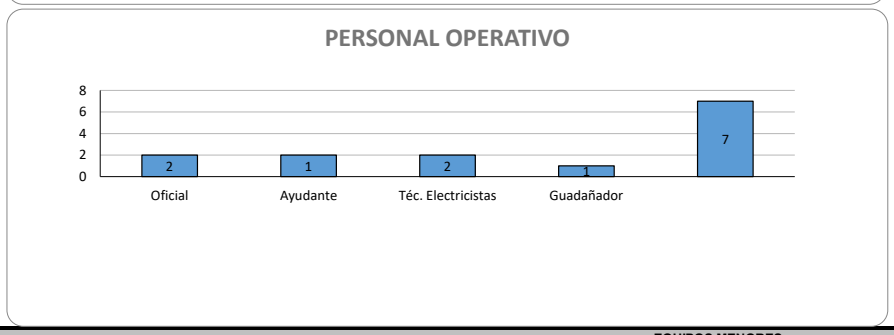

En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

EQUIPOS MENORES

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
GUADAÑADORA		1	
ESCALERA		2	
ANDAMIOS		0	
HIDRO LAVADORA		1	
PULIDORA		2	
TALADROS		2	
Total Equipos		8	

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	05/06/2024 - 04/07/2024	$ 23.200.454,00
2	05/07/2024 - 04/08/2024	$ 47.602.415,00
3	05/08/2024 - 04/09/2025	$ 75.183.934,00
4	05/09/2024 - 04/10/2025	$ 42.348.675,00
5	05/10/2024 - 04/11/2025	$ 64.720.146,00
6	05/11/2024 - 04/12/2025	$ 264.538.180,00
7	05/12/2024 - 31/12/2025	$ 610.682.692,00
8	01/01/2025 - 31/01/2025	$ 229.391.077,00
9		
Total Acumulado	**$ 1.357.667.573,00**	

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 1.996.500.065,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 1.357.667.573,00
% Avance facturado Acumulado
68,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	05/06/2024 - 04/07/2024	$ 42.800.730,00
2	05/07/2024 - 04/08/2024	$ 37.046.902,00
3	05/08/2024 - 04/09/2024	$ 41.812.759,00
4	05/09/2024 - 04/10/2024	$ 45.105.296,00
5	05/10/2024 - 04/11/2024	$ 50.666.541,00
6	05/11/2024 - 04/12/2024	$ 72.106.411,00
7	05/12/2024 - 12/31/2024	$ 114.934.236,00
8	01/01/2025 - 31/01/2025	$ 83.367.190,00
Total Acumulado	**$ 487.840.065,00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 1.117.574.559,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 487.840.065,00
% Avance facturado Acumulado
43,65%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	ISMAEL MAFIOLY RODRIGUEZ
