INFORME FINAL

CONTRATO: MV-MC-OBRA - 001 / 2025.

CONSTRUCCION (MANO DE OBRA) REPARCHEO EN CONCRETO RIGIDO EN SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIJES - VALLE DEL CAUCA.



INGÉNICO
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

INGENICO Y CONSULTORIA SAS
R.L : XIMENA BECHARA RAMIREZ

CONSTRUCCION (MANO DE OBRA) REPARCHEO EN CONCRETO RIGIDO EN SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIJES -VALLE DEL CAUCA

OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo principal realizar un informe integral de las diversas actividades realizadas por parte del contratista para dar cumplimiento a las obras ejecutadas en el contrato: MV-MC-OBRA - 001 / 2025

INDICE

1.0 INTRODUCCIÓN 3
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 3
1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 3
1.3 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4

2.0 DATOS CONTRACTUALES 4
2.1 CONTRATO CIVIL DE MANO DE OBRA 4
2.2 DESARROLLO DEL CONTRATO 5
2.3 ACTA DE LIQUIDACION 7
2.4 INTERVENCIONES REALIZADAS 8
2.5 PERSONAL DE OBRA 19

3.0 INFORMACIÓN GENERAL 19
3.1 COMITÉ TECNICO 19

4.0 CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO 20
4.1 BALANCE DEL PRESUPUESTO Y PROYECTO 20
4.2 POLIZAS 20
4.3 SEGURIDAD SOCIAL 21


1.0 INTRODUCCIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL.

El proyecto se planteó a partir de las necesidades básicas y fundamentales para el buen desarrollo y funcionamiento de los espacios públicos existentes teniendo como objeto principal prestar los servicios de obra civil para garantizar el mantenimiento de la malla vial del casco urbano el cual que presentaba un marcado deterioro en sitios puntuales del municipio de Vijes Valle del Cauca, dentro de los programas sociales de la alcaldía municipal.

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las actividades se realizaron en diferentes zonas del centro poblado del municipio de Vijes -Valle del Cauca, siguiendo las directrices de la planificación de la secretaria de infraestructura

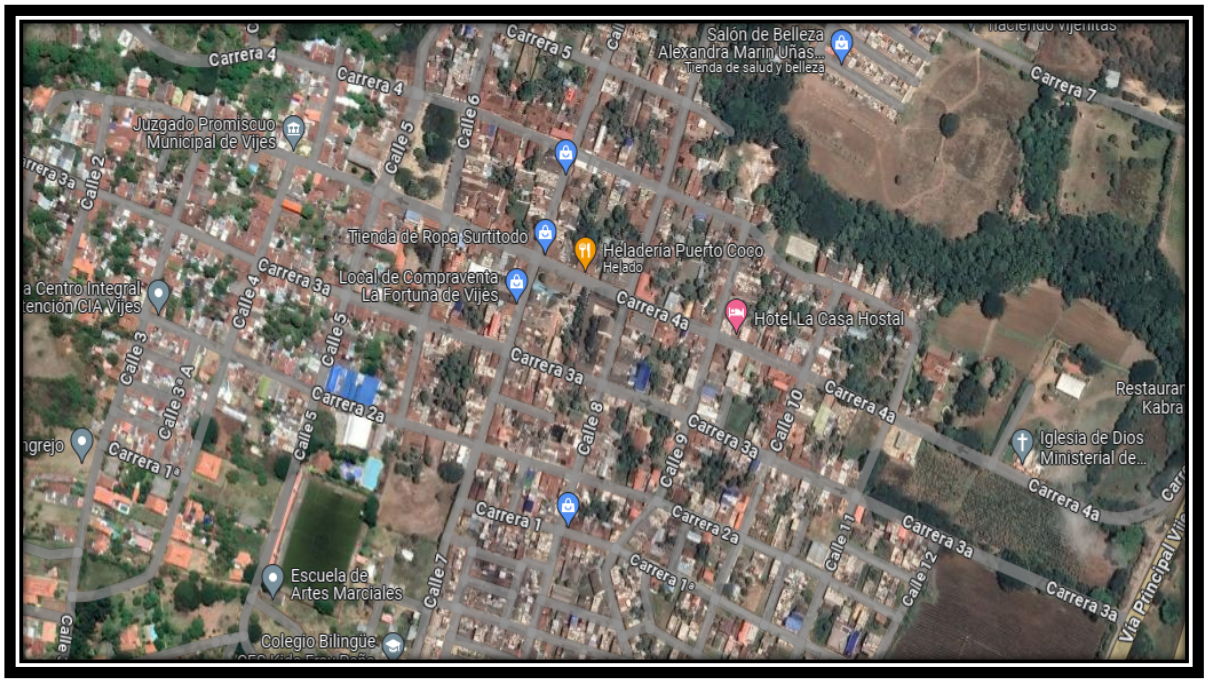

1.3 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en realizar actividades de mantenimiento y enlucimiento como lo son las siguientes:

1. realizar la respectiva señalización a las áreas a intervenir.

2. realizar actividades de corte y demolición de pavimentos en concreto rígido, con su respectivo retiro de obra a sitios autorizados.

3. Mano de obra para el relleno con el material importado suministrado por el municipio para la estructura de los repacheos a realizar.

4. Mano de obra para la aplicación del pavimento en concreto 3000 psi e= 20 cms, con sus respectivos acabados. (materiales suministrados por la administración municipal)

2.0 DATOS CONTRACTUALES

2.1 CONTRATO DE MANO DE OBRA CIVIL


CONTRATO Nº.	**MV-MC-OBRA - 001 / 2025.**
OBJETO.	CONSTRUCCION (MANO DE OBRA) REPARCHEO EN CONCRETO RIGIDO EN SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIJES -VALLE DEL CAUCA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VIJES
CONTRATISTA Y C.C.	**INGENICO SAS** NIT: 900.889.941-1 representado legalmente por la ingeniera XIMENA BECHARA RAMIREZ con CC . 25.273.051, de Popayan Dir: KM 3.5 Vía Chipaya Parcelación Océano Verde Casa 35 B, CEL: 3113679527, E-mail. Ingenico.administracion@gmail.com
VALOR DEL CONTRATO	$ $ 39.834.548
VALOR ADICIONAL	$19.612.784
VALOR TOTAL	$ 59.447.332
VALOR LIQUIDADO	$ 59.436.837
SALDO	$10.495
PLAZO	1 mes
CDP	613 de Junio 3 de 2025
RP	1043 de Junio 7 de 2025

SUPERVISOR	**DIANA MARCELA JIMENEZ ROMERO** Secretaria INFRAESTRCUTURA TEL 2520280, email: infraestructura@vijes-valle.gov.co
FORMA DE PAGO	Anticipo y final
INICIO	10 de Junio de 2025
GARANTIAS	***Conforme Decreto 1082 de 2015. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en el Título III, de las Disposiciones Especiales del Presente Decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documento previos. Teniendo en cuenta lo anterior, el Municipio de Vijes Valle NO exigirá al contratista la constitución de la Garantía dada su forma de pago, por considerarse que NO existe riesgo que amparar***

2.2. DESARROLLO DEL CONTRATO

El 10 de junio del año 2025, el contratista de obra inicia actividades haciendo reconocimiento de las zonas de intervención y corroborando la información dada por la entidad contratante, no obstante, se realizan los chequeos y ajustes necesarios, con el fin de cumplir con las garantias necesarias en los reparcheos a ejecutar.

El dia 16 de junio se solicita una revison por parte de la la supervison para la viabilidad de la aprobacion de un recuros adicional con el fin de dar cumplimento y garantizar las acciones a relaizar, basados en el siguiente informe:

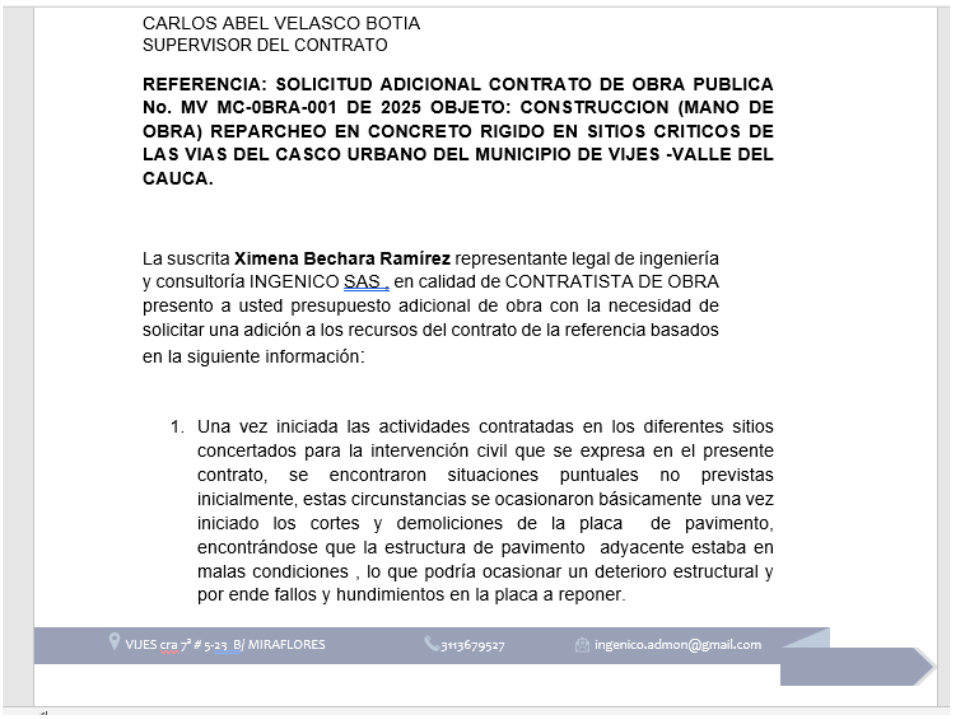

CARLOS ABEL VELASCO BOTIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

REFERENCIA: SOLICITUD ADICIONAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MV MC-0BRA-001 DE 2025 OBJETO: CONSTRUCCION (MANO DE OBRA) REPARCHEO EN CONCRETO RIGIDO EN SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIJES -VALLE DEL CAUCA.

La suscrita **Ximena Bechara Ramírez** representante legal de ingeniería y consultoría INGENICO SAS , en calidad de CONTRATISTA DE OBRA presento a usted presupuesto adicional de obra con la necesidad de solicitar una adición a los recursos del contrato de la referencia basados en la siguiente información:

1. Una vez iniciada las actividades contratadas en los diferentes sitios concertados para la intervención civil que se expresa en el presente contrato, se encontraron situaciones puntuales no previstas inicialmente, estas circunstancias se ocasionaron básicamente una vez iniciado los cortes y demoliciones de la placa de pavimento, encontrándose que la estructura de pavimento adyacente estaba en malas condiciones , lo que podría ocasionar un deterioro estructural y por ende fallos y hundimientos en la placa a reponer.

VIJES cra 7ª # 5-23 B/ MIRAFLORES 3113679527 ingenico.admon@gmail.com

2. Dicha situación se encuentra básicamente en el barrio chiminangos y municipal, en los cuales las actividades previstas de reparcheos no revierten la garantía suficiente para la estabilidad de la obra, por las zonas adyacentes deterioradas no incluidas.

3. Es por este motivo que se inició un proceso de balanceo de obra el cual da como resultado el siguiente presupuesto adicional de obra que se presenta en este oficio con el fin de saber el monto al cual asciende los recursos adicionales necesario para suplir dicha situación para su revisios y posible aprobación.

INGENIERIA Y CONSULTORIA INGENICO SAS			
BALANCE DE OBRA PARA SOLICITUD DE ADICIONAL			
Objeto:	CONSTRUCCION (MANO DE OBRA) REPARCHEO EN CONCRETO RIGIDO EN SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIJES - VALLE DEL CAUCA.	CONTRATO:	IV-MC-OBRA 001 DE 2025

ENCAB	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
		BARRIO MUNICIPAL Y CHIMINANGOS				
CAP	1	PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA VIAL				12.824.254
330301	1.1	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	1	152.708,00	152.708,00
082011	1.2	ACOMPAÑAMIENTO A DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS HASTA 20 CM DE ESPESOR	M2	138	4.330,00	597.540,00
083201	1.3	RELLENO MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO	M3	27,6	14.704,00	405.830,00
010302-1P	1.4	MANO DE OBRA PAV.CONCR.MR=36 MEZCLA IN SITU E=0.20	M2	138	84.552,00	11.668.176,00
STCAP		SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA VIAL:				12.824.254

CAP	2	OBRAS PRELIMINARES URBANISTICAS				1.823.084
100602	2.1	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	48,3	37.745,00	1.823.084,00
STCAP		SUBTOTAL CAP. 2 OBRAS PRELIMINARES URBANISTICAS :				1.823.084

VALOR COSTOS DIRECTOS	14.647.338,00

COSTOS INDIRECTOS		
VALOR COSTOS DIRECTOS		14.647.338
ADMINISTRACION	24,90%	3.647.187
IMPREVISTOS	1,00%	146.473
UTILIDAD	8,00%	1.171.786
TOTAL AIU	33,90%	4.965.446
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		19.612.784

VALOR TOTAL PRESUPUESTO	19.612.784

Ante esta situcion la administarcion municipal dio el visto bueno para la aprobacion del recuros adicional y se elabora otro si para la actualizacion de las respectivas polizas y sus amparos.

2.3. ACTA DE LIQUIDACION

UNICIPIO DE VIJES - VALLE DEL CAUCA	CONTRATO No. MV MC-0BRA-001 DE 2025		
	ACTA DE LIQUIDACION FINAL		
MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA	OBJETO: CONSTRUCCION (MANO DE OBRA) REPARCHEO EN CONCRETO RIGIDO EN SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIJES -VALLE DEL CAUCA.		
	CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA $ 39.834.548,00	OBRA EJECUTADA FINAL	
	CONTRATISTA: INGENICO SAS $ 19.612.784,00		
CONTRATO No. MV MC-0BRA-001 DE 2025	SUPERVISOR: DIANA MARCELA JIMENEZ ROMERO		
	INICIACION: 13 DE JUNIO DE 2025	FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 10 DE JUNIO DE 2025	

CONTRATO No. MV MC-0BRA-001 DE 2025						OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1	PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA VIAL								
1.1	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	2	152.708,00	305.416	1,32	201.599	1,32	201.599
1.2	ACOMPAÑAMIENTO A DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS HASTA 20 CM DE ESPESOR	M2	416	4.330,00	1.801.280	408,59	1.769.183	408,59	1.769.183
1.3	RELLENO MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO	M3	83,2	14.704,00	1.223.372	85,99	1.264.390	85,99	1.264.390
1.4	MANO DE OBRA PAV.CONCR.MR=36 MEZCLA IN SITU E=0.20	M2	416	84.552,00	35.173.632	408,58	34.546.070	408,58	34.546.070
2	OBRAS PRELIMINARES URBANISTICAS								
2.1	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	103,9	37.745,00	3.921.705	89,79	3.388.950	89,79	3.388.950
3	EQUIPO Y MANO DE OBRA								
3.1	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	M	268	7.356,00	1.971.408	279,97	2.059.459	279,97	2.059.459
N.P	NO PREVISTOS								
N.P 1	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE ANDEN E= 10CMS 3000 PSI	M2		27.125,00	-	42,74	1.159.323	42,74	1.159.323

	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 44.396.813		$ 44.388.974		$ 44.388.974
	TOTAL COSTO INDIRECTO				$ 15.050.519		$ 15.047.863		$ 15.047.862
	ADMINISTRACION	24,90%			$ 11.054.806		$ 11.052.855		$ 11.052.855
	IMPREVISTOS	1%			$ 443.968		$ 443.890		$ 443.890
	UTILIDAD	8%			$ 3.551.745		$ 3.551.118		$ 3.551.118
	COSTO TOTAL (DIRECTO +INDIRECTO)				$ 59.447.332		$ 59.436.837		$ 59.436.837

SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VENTISEIS PESOS M/CTE.

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO


VALOR CONTRATADO	$ 39.834.548	
VALOR ADICIONA (OTRO SI 01)	$ 19.612.784	
ANTICIPO (40%) NO SUMA		$ 15.933.819
VALOR A PAGAR EN PRESENTE ACTA		$ 59.436.837
SALDO SIN EJECUTAR		$ 10.495
SUMAS IGUALES	**$ 59.447.332**	**$ 59.447.332**

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 25 dias de junio de 2025

2.4. INTERVENCIONES REALIZADAS

2.4.1 BARRIO CHIMINANGOS

BARRIO CHIMINANGOS
calle 5ta entre cras 5ta y 6ta

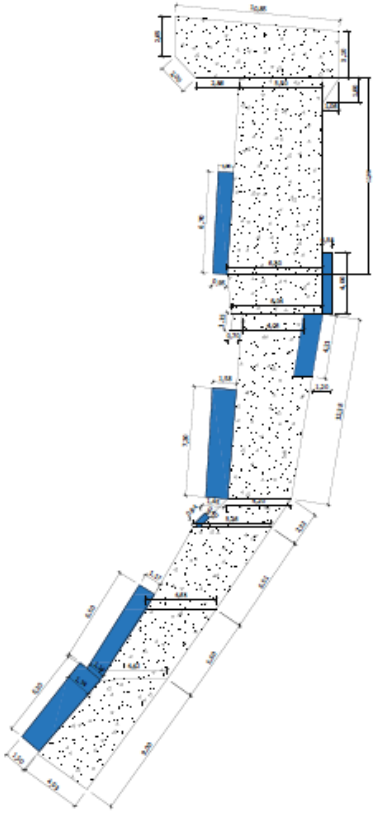

Se realizan actividaes tales como :

- Señalizacion de areas
- Corte de pavimento
- Demolicion de andenes y pavimento
- Excavacion a mano
- Relleno con materal importado
- Mano de obra de pavimento E= 20 cms
- Mano de obra de construccion de andenes E = 10 cms
- Limpieza area

Registro fotografico






Señalizacion, pavimento de via E = 20 cms , rellenos con material importado, concreto de andenes





Pavimento de via, corte de losa

2.4.2 BARRIO EL LIDO

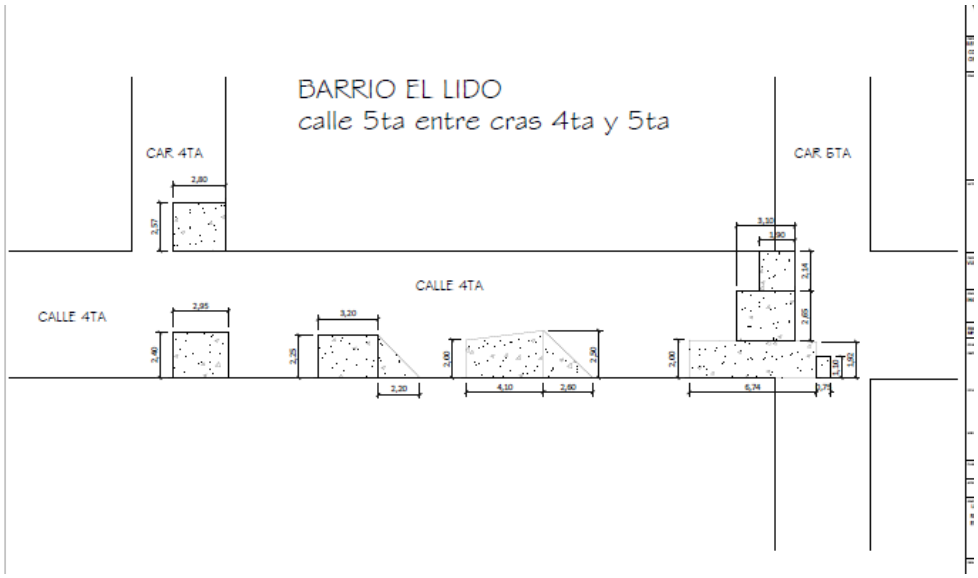

Se realizan actividaes tales como :

- Señalizacion de areas
- Corte de pavimento
- Demolicion de andenes y pavimento
- Excavacion a mano
- Relleno con materal importado
- Mano de obra de pavimento E= 20 cms
- Limpieza area

Registro fotografico






Señalizacion, reparcheo



Demolicio, relleno

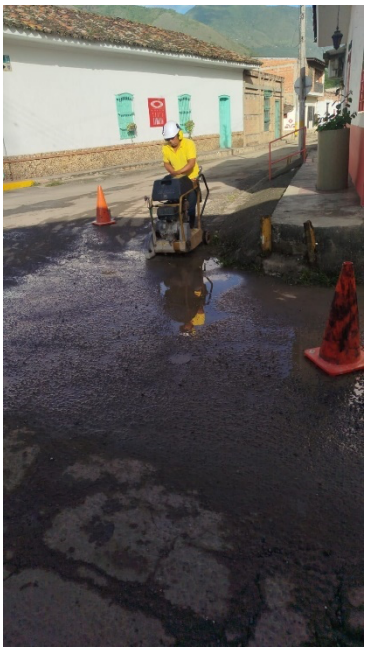





Cortes, demoliciones, rellenos resanes.

2.4.3 CALLE 7MA Y CALLE 5TA

calle 7ta entre cras 3ta y 4ta



Calle 5ta entre cras 2da y 3era

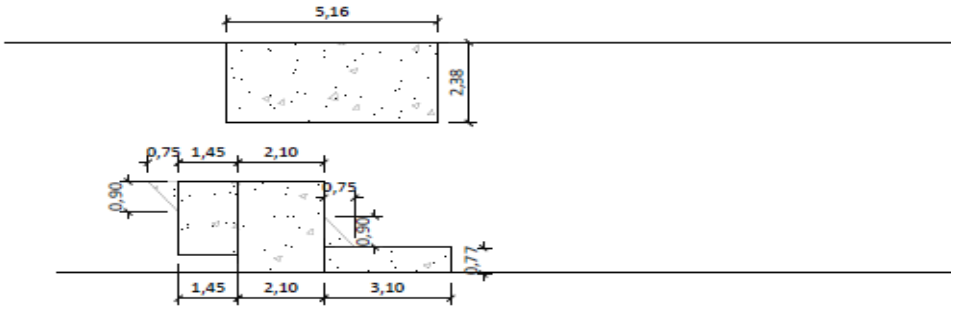

Se realizan actividaes tales como :

- Señalizacion de areas
- Corte de pavimento
- Demolicion de andenes y pavimento
- Excavacion a mano
- Relleno con materal importado
- Mano de obra de pavimento E= 20 cms
- Limpieza area

Registro fotografico










Señalización, cortes, demoliciones, rellenos y reparcheos

2.4.4 BARRIO MUNICIPAL

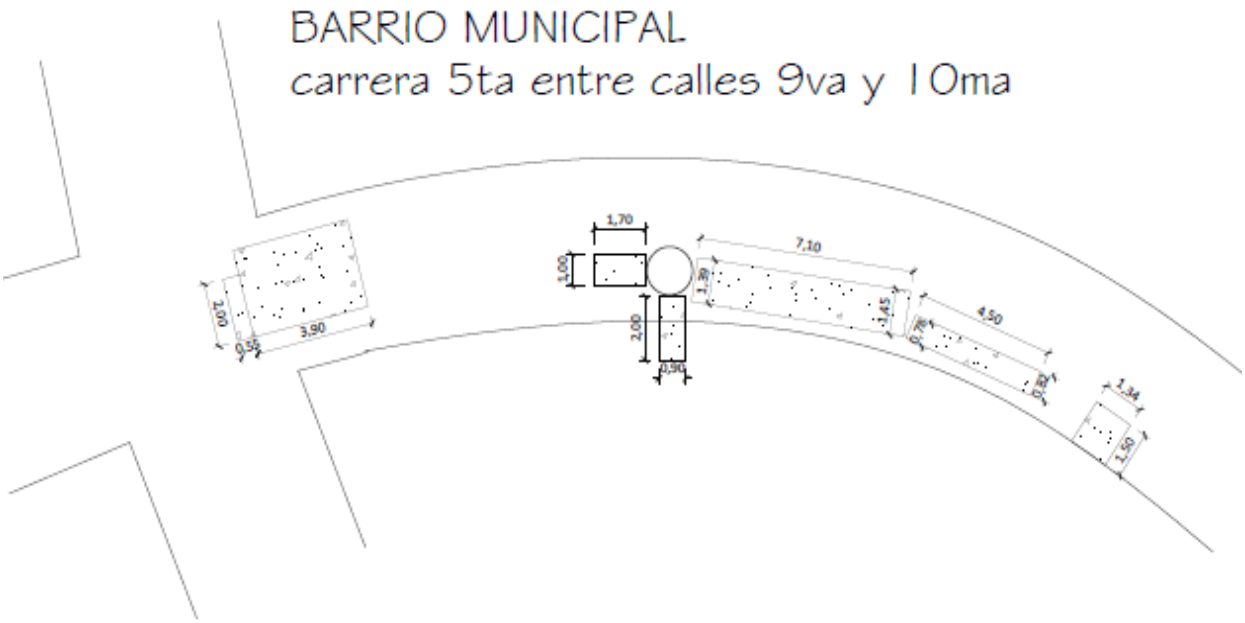

Se realizan actividaes tales como :

- Señalizacion de areas
- Corte de pavimento
- Demolicion de andenes y pavimento
- Excavacion a mano
- Relleno con materal importado
- Mano de obra de pavimento E= 20 cms
- Limpieza area


Registro fotografico





Señalizacion, reparcheo, aplicación de antisol.

2.4.5 CALLE 2DA

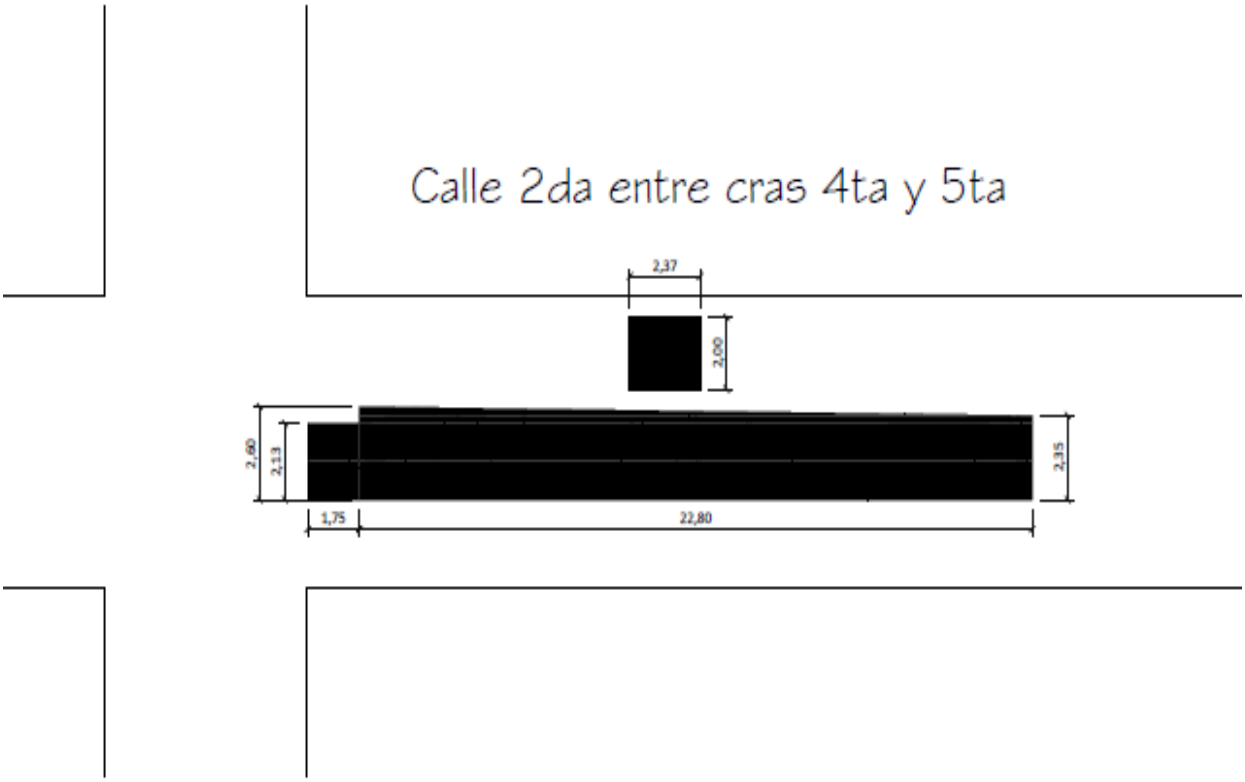

Se realizan actividaes tales como :

- Señalizacion de areas
- Corte de pavimento
- Demolicion de andenes y pavimento
- Excavacion a mano
- Relleno con materal importado
- Mano de obra de pavimento E= 20 cms
- Limpieza area

Registro fotografico







Deoliicones, señalizacion, reparcheo

Las diferentes áreas de intervención se encuentran en un 100 % terminadas

2.5. PERSONAL DE OBRA

El personal utilizado para las diversas actividades son 1 cuadrillas compuestas por 4 personas cada una con sus respectiva dotacion y equipos necesarios para los trabajos encomendados, no esta de mas decir que todos cuenta con una experiencia sufiente para la ejecucion de las actiivdades sugeridas de la mejor manera.

3.0 INFORMACION GENERAL

CONSTRUCCION (MANO DE OBRA) REPARCHEO EN CONCRETO RIGIDO EN SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIJES - VALLE DEL CAUCA	Para la realización de este proyecto se tuvo en cuenta Que el Municipio de Vijes Valle del Cauca, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios que determine la Ley, administrar los asuntos municipales; igualmente ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso local; la promoción de la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes l para esto la secretaria de infraestructura hizo un análisis de necesidades por parte del personal técnico a las vias y zonas del casco urbano con más necesidades de tipo vial. esto con el fin de realizar las labores del presente contrato cuyo marco general se encuentra en el actual plan de desarrollo del municipio
Municipio, Departamento:	Vijes, Valle del Cauca.
Nombre de Contratista:	INGENICO SAS
Nombre del supervisor:	DIANA MARCELA JIMENEZ

3.1 COMITE TECNICO

COMITÉ TÉCNICO		
Descripción	**Fecha**	**Lugar**
Comité técnico N° 1	10 - junio - 2025	SEC. INFRAEST-
Comité técnico N° 2	16 - junio - 2025	ZONA DE INTERVENCION
Comité técnico N° 3	25 DE junio - 2025	ZONA DE INTERVENCION


4.0 CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

4.1 BALANCE DEL PRESUPUESTO Y PROYECTO

El contrato se encuentra a la fecha balanceado

Avance de obra 100%

4.2 POLIZAS

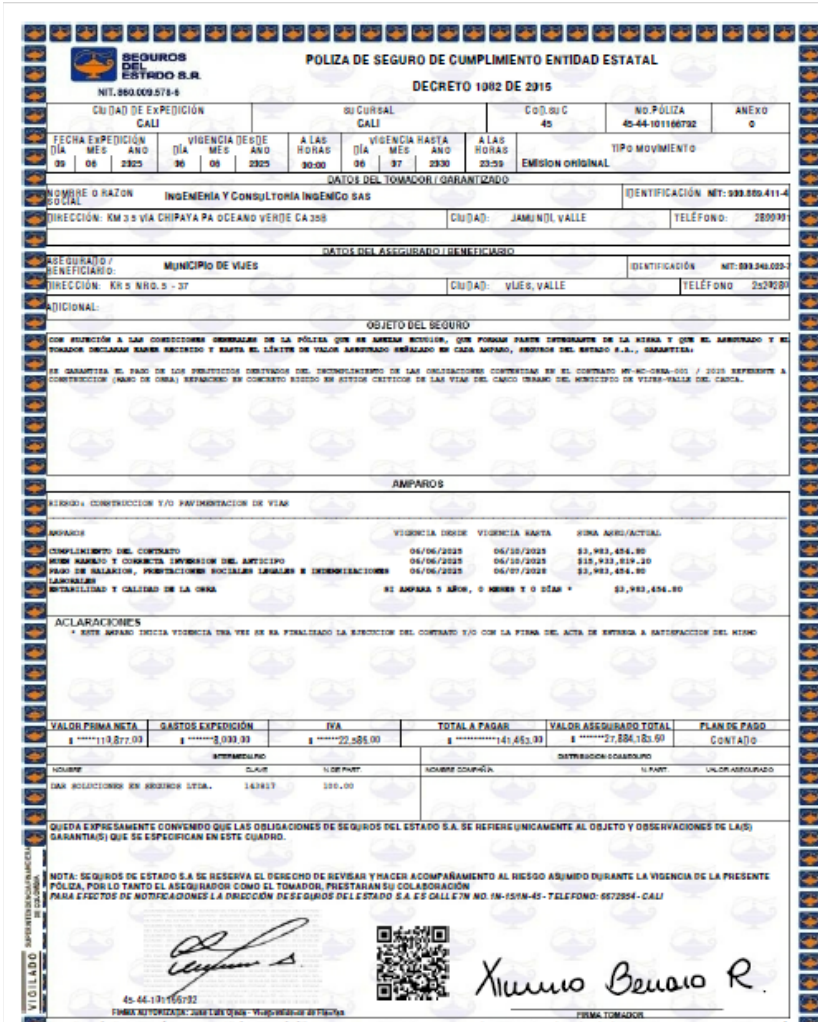

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD. SUC	NO. PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-44-101166732	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	06	2025	06	06	2025	00:00	06	07	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGENICO SAS — IDENTIFICACIÓN NIT: 900.889.411-4

DIRECCIÓN: KM 3.5 VIA CHIPAYA PA OCEANO VERDE CA 358 — CIUDAD: JAMUNDI, VALLE — TELÉFONO: 3899301

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE VIJES — IDENTIFICACIÓN NIT: 890.340.023-7

DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 5 - 37 — CIUDAD: VIJES, VALLE — TELÉFONO 2529280

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXA EXCLUSIVO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO AMPARADO EN CADA AMPARO, AMPARA EL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MV-MC-OBRA-005 / 2025 REFERENTE A CONSTRUCCION (NAME DE OBRA) REFERENTE EN CONCRETO RIGIDO EN SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIJES-VALLE DEL CAUCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/06/2025	06/10/2025	$3,983,456.80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/06/2025	06/10/2025	$15,933,819.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/06/2025	06/07/2028	$3,983,456.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SE AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$3,983,456.80

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******119,877.03	$ *******3,000.00	$ *******22,986.00	$ **********141,463.03	$ *******27,884,183.60	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA.	143817	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A ES CALLE 7N NO. 5N-15/N-45 - TELEFONO: 6672854 - CALI


45-44-101166732

FIRMA AUTORIZADA: Julio Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONTRATO INICIAL

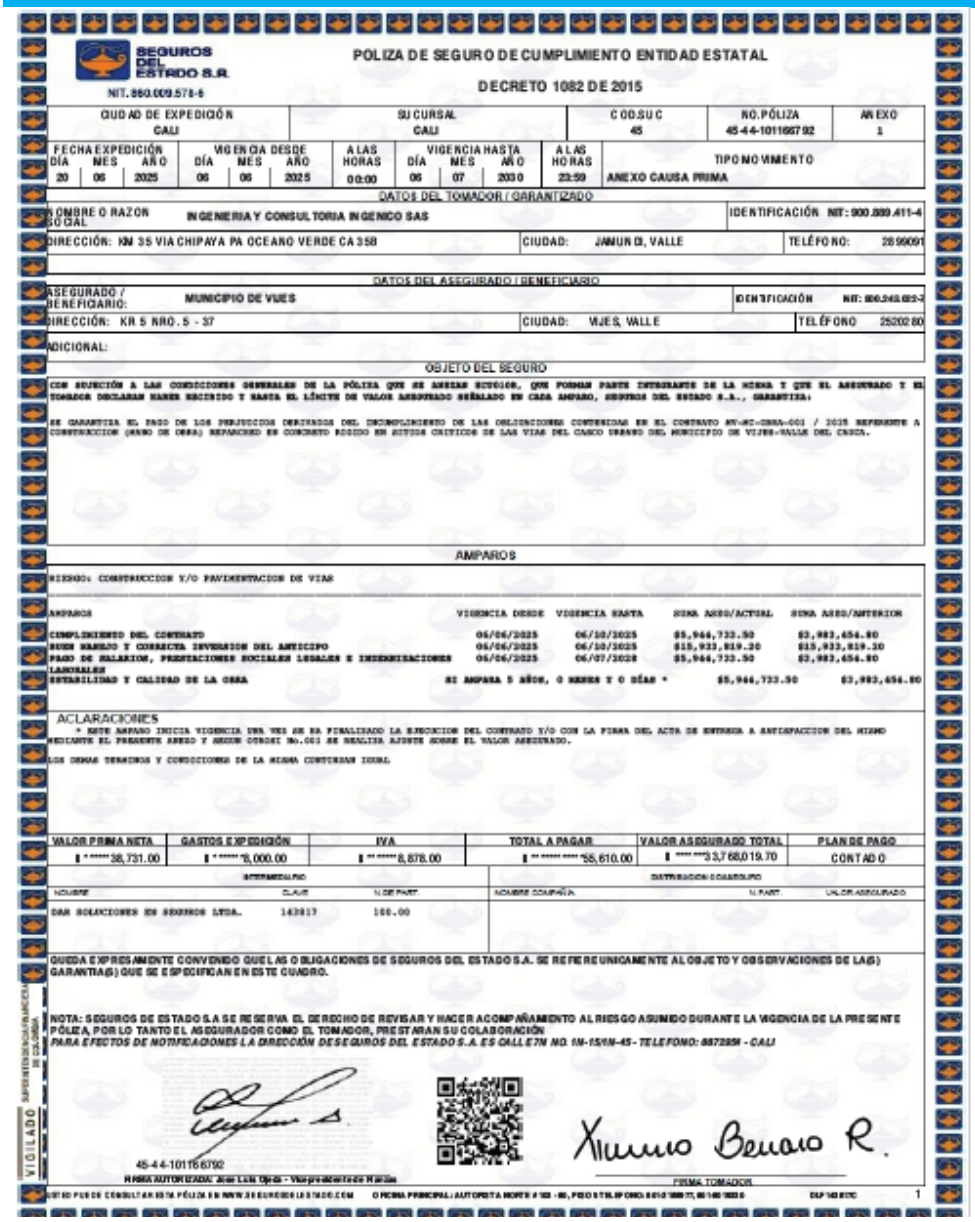

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO. PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-44-101165792	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	06	2025	06	06	2025	00:00	06	07	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGENICO SAS	NIT: 900.889.411-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KM 35 VIA CHIPAYA PA OCEANO VERDE CA 358	JAMUNDI, VALLE	2899091

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE VIJES	NIT: 890.343.693-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 5 - 37	VIJES, VALLE	2520280

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ESTUDIO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MV-MC-OBRA-001 / 2025 REFERENTE A CONSTRUCCION (OBRA DE OBRA) REPARCHEO EN CONCRETO RIGIDO EN SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIJES-VALLE DEL CAUCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/06/2025	06/10/2025	$5,944,733.50	$3,983,456.80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/06/2025	06/10/2025	$15,933,819.20	$15,933,819.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/06/2025	06/07/2028	$5,944,733.50	$3,983,456.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SE AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$5,944,733.50	$3,983,456.80

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE EA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN CORTE No.001 SE REALIZA AJUSTE SOBRE EL VALOR ASEGURADO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA MISMA CONTINUAN IGUAL

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****38,731.00	$ ****8,000.00	$ ****8,878.00	$ ******55,610.00	$ ******3,768,019.70	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA.	142817	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 5N-15/N-45 - TELEFONO: 8872894 - CALI

45-44-101165792

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente Ramos

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OTRO SI

4.3 SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta planillas

Ximena Bechara R.

INGENICO SAS

XIMENA BECHARA RAMIREZ

REP. LEGAL
