CONSORCIO
GMC

GMC-127-227-2024

Bogotá D.C., agosto 27 de 2024

Doctora:
KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA
ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY
ALCALDIA LOCAL DE KENNDY
Email: yaneth.echeverria@gobiernobogota.gov.co
Ciudad

Ref: **Contrato de Interventoría FDLK- CIN -832-2022** INV-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: **Remisión Informe Mensual de Consultoría No. 7.**

Respetada Doctora Marín:

La Interventoría Consorcio GMC en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, remite debidamente revisado y **aprobado** el informe mensual No. 7 de Consultoría correspondiente al periodo del 15 de diciembre de 2023 al 21 de diciembre de 2023 y del 22 de enero de 2024 al 14 de febrero de 2024.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: Carpeta comprimida con los informes mensuales de los cuatro (4) componentes.
C.C. Archivo
Realizó: AFA
Revisó: CJH

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CON-831-2022

INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA LOCALIDAD DE KENNEDY



INFORME COMPONENTE SOCIAL No. 7
Periodo del 15 al 21 de diciembre del 2023 y del 22 de enero al 14 de febrero de 2024

BOGOTÁ, ABRIL DE 2024

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
0	9 de abril de 2024	Presentación informe mensual No 7

VALIDACIONES DEL DOCUMENTO CONSULTORIA

Elaboró	Revisó	Revisó Interventoría	Aprobó Interventoría
Firma: 	**Firma.** 	**Firma:** 	**Firma:** 
Nombre: María Alejandra Martínez	**Nombre**: Ing. Rodrigo Cerón	**Nombre:** Paola Pava	**Nombre:** Ing. Jairo Geovanni Ortiz
Cargo: Profesional social consultoría	**Cargo:** Director consultoría	**Cargo:** Profesional social Interventoría	**Cargo** Director Interventoría

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5

2. OBJETIVOS 5

3. OBJETO DEL CONTRATO 6

4. GENERALIDADES 8

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO 8
4.2 LOCALIZACIÓN 8
4.2.1 Localización especifica. 9

5. INFORMACIÓN ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL 19

5.1 COMITÉ DE APOYO COMUNITARIO 19
5.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO 19
5.3 IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS SOCIALES (MATRIZ MENSUAL) 19
5.4 DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO Y CARACTERIZACIÓN SOCIALES 19
5.5 MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN CON RECOMENDACIONES URBANÍSTICAS, ECONÓMICAS, SOCIALES Y DE MOVILIDAD (MENSUAL) 19
5.6 DIRECTORIO DE ACTORES SOCIALES E INSTITUCIONALES GEORREFERENCIADOS 19
5.7 INFORMES DE GESTIÓN 19
5.7.1 Informe Mensual 20
5.7.2 Informes Semanales 20

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21

INDICE DE TABLAS

TABLA 1. DATOS GENERALES CONSULTOR 6
TABLA 2. DATOS GENERALES INTERVENTORÍA 7
TABLA 3. LISTADO DE SEGMENTO PRIORIZADOS UPZ 45 9
TABLA 4. LISTADO DE SEGMENTO PRIORIZADOS UPZ 46 10
TABLA 5. LISTADO DE SEGMENTO PRIORIZADOS UPZ 48 11
TABLA 6. LISTADO DE SEGMENTO PRIORIZADOS UPZ 79 12
TABLA 7. LISTADO DE SEGMENTO PRIORIZADOS UPZ 80 13
TABLA 8. LISTADO DE SEGMENTO PRIORIZADOS UPZ 81 15
TABLA 9. LISTADO DE SEGMENTO PRIORIZADOS UPZ 82 16

INDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1. LOCALIZACIÓN GENERAL DE KENNEDY 9
ILUSTRACIÓN 2. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA CIV´S UPZ45 10
ILUSTRACIÓN 3. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA CIV´S UPZ46 11
ILUSTRACIÓN 4. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA CIV´S UPZ48 12
ILUSTRACIÓN 5. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA CIV´S UPZ79 13
ILUSTRACIÓN 6. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA CIV´S UPZ80 15
ILUSTRACIÓN 7. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA CIV´S UPZ81 16
ILUSTRACIÓN 8. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA CIV´S UPZ82 18

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe las actividades sociales ejecutadas en el periodo del 15 al 21 de diciembre del 2023 y del 22 de enero al 14 de febrero de 2024 por parte de la Consultoría, en el marco del Contrato No. 831 de 2022: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY”. con el fin de dar cumplimiento al Plan de Gestión Social. Es de aclarar que el presente contrato estuvo suspendido desde el 22/12/2023 al 21/01/2024.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Describir las actividades realizadas durante el período correspondiente del del 15 al 21 de diciembre del 2023 y del 22 de enero al 14 de febrero de 2024 para dar cumplimiento al Plan de Gestión Social.

3. OBJETO DEL CONTRATO

Contrato de Consultoría -831-2022 INV-080 Realizar los estudios y diseños para la construcción de la malla vial y su espacio público asociado de la localidad de Kennedy.

Tabla 1. Datos Generales consultor

Contrato de Consultoría	No. 831-2022
Objeto del Contrato	INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.
Localización	UPZ 45 – CARVAJAL, UPZ 46 - CASTILLA, UPZ 48 - TIMIZA, UPZ 79 - CALANDAIMA, UPZ 80 - CORABASTOS, UPZ 81 – GRAN BRITALIA Y UPZ 82 – PATIO BONITO
Consultor	GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S- GEICOL
Valor del Contrato	MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.934.101.490 M/CTE)
Plazo de Ejecución	Ocho (8) meses.
Fecha de Inicio del contrato	15/02/2023
Fecha de terminación inicial del contrato	14/10/2023
Suspensión No. 1	Desde 28/03/2023 al 27/04/2023
Suspensión No. 2	Desde 28/03/2023 al 27/05/2023
Suspensión No. 3	Desde 01/09/2023 al 30/09/2023
Suspensión No. 4	Desde 31/08/2023 al 02/11/2023
Suspensión No. 5	Desde 22/12/2023 al 21/01/2024
Fecha de Terminación Actual	15/03/2024

Fuente: Propia

Tabla 2. Datos Generales Interventoría

Contrato de Interventoría	NO. 832 DE 2022
Objeto del Contrato	"INV-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS NO. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C".
Localización	LOCALIDAD DE KENNEDY, QUE CONTEMPLA CIENTO VEINTITRÉS (125) SEGMENTOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADOS EN LA UPZ 45 – CARVAJAL, UPZ 46 - CASTILLA, UPZ 48 - TIMIZA, UPZ 79 - CALANDAIMA, UPZ 80 - CORABASTOS, UPZ 81 – GRAN BRITALIA Y UPZ 82 – PATIO BONITO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C".
Interventoría	CONSORCIO GRUPO METRO COLOMBIA GMC
Valor del Contrato	MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.934.101.490 M/CTE)
Plazo de Ejecución	OCHO (8) MESES
Fecha de Inicio del contrato	15/02/2023
Fecha de terminación inicial del contrato	14/10/2023
Suspensión No. 1	28/03/2023 al 27/04/2023
Suspensión No. 2	28/03/2023 al 27/05/2023
Suspensión No. 3	01/09/2023 al 30/09/2023
Suspensión No. 4	31/08/2023 al 02/11/2023
Suspensión No. 5	22/12/2023 al 21/01/2024

Fecha de Terminación Actual	15/03/2024

Fuente: Interventoría Consorcio GMC

4. GENERALIDADES


4.1 Descripción General Del Contrato.

El Fondo De Desarrollo Local De Kennedy FDLK, mediante contrato de consultoría 831 de 2022 adjudica a GEICOL S.A.S, el proyecto cuyo objeto es “INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY”.

4.2 Localización

El proyecto se ejecutará en la localidad de Kennedy, que contempla ciento veinticinco (125) segmentos viales se encuentran localizados en la UPZ 45 – Carvajal, UPZ 46 - Castilla, UPZ 48 - Timiza, UPZ 79 - Calandaima, UPZ 80 - Corabastos, UPZ 81 – Gran Britalia y UPZ 82 – Patio Bonito. (117)

Ilustración 1. Localización general de Kennedy

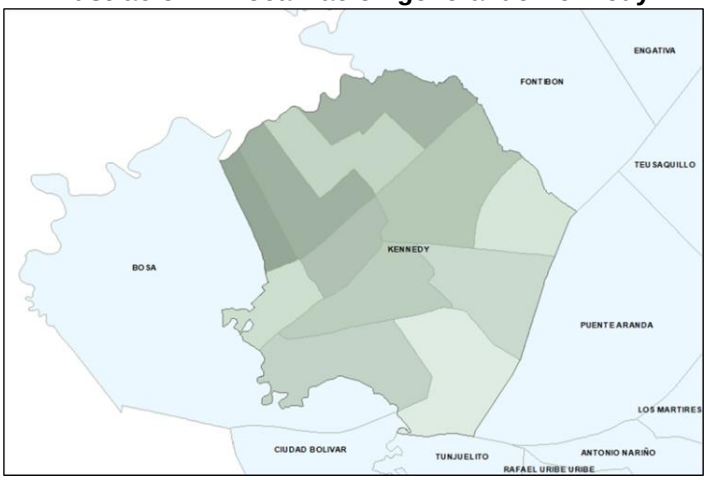

Fuente: Propia

4.2.1 Localización especifica.


De acuerdo con el contrato el proyecto se enfoca en ciento veinticinco (125) CIVs ubicados en la localidad de Kennedy, elementos que fueron priorizados por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, el listado se muestra a continuación, y se presenta de una manera general la localización de los CIVs a intervenir.

Tabla 3. Listado de segmento priorizados UPZ 45

CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA
8011426	UPZ45	KR 68B	CL 38F S	CL 39 S
8011426	UPZ45	KR 68B	CL 38F S	CL 39 S

Fuente: Propia

Ilustración 2. Localización específica CIV´s UPZ45

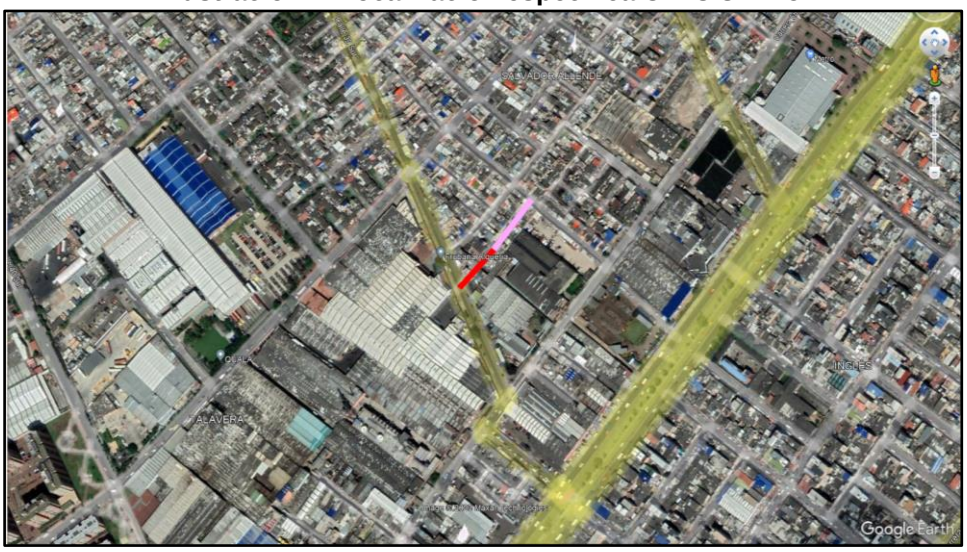


Fuente: Propia – Google Earth

Tabla 4. Listado de segmento priorizados UPZ 46

CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA
8011984	UPZ46	CL 15A	AK 80	KR 80C
8000167	UPZ46	CL 16	KR 8A BIS	KR 80B
8000981	UPZ46	KR 81C	CL 8D	CL 8F
8000153	UPZ46	CL 16	KR 80B	KR 80C

Fuente: Propia

Ilustración 3. Localización específica CIV´s UPZ46

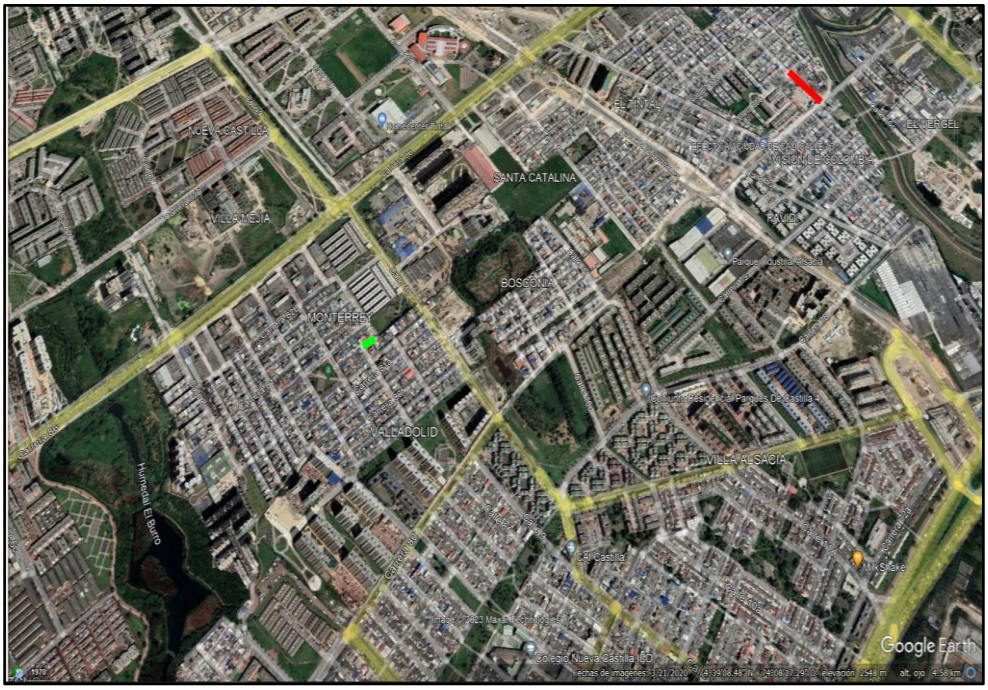

Fuente: Propia – Google Earth

Tabla 5. Listado de segmento priorizados UPZ 48

CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA
8008973	UPZ48	CL 47ABIS S	KR 78B	KR 78C
8008509	UPZ48	CL 42H S	KR 78D	KR 78F
8008608	UPZ48	CL 42H S	KR 78C	KR 78D
8008715	UPZ48	CL 42H S	KR 78B	KR 78C
8008806	UPZ48	CL 42H S	KR 78A	KR 78B
8008956	UPZ48	CL 42H S	KR 78	KR 78A
8008811	UPZ48	CL 47ABIS S	KR 78D	KR 78D
8008900	UPZ48	CL 47ABIS S	KR 78B	KR 78C

Fuente: Propia

Ilustración 4. Localización específica CIV´s UPZ48




Fuente: Propia – Google Earth

Tabla 6. Listado de segmento priorizados UPZ 79

CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA
8002005	UPZ79	CL 35A S	KR 89C	KR 89D

Fuente: Propia

Ilustración 5. Localización específica CIV´s UPZ79

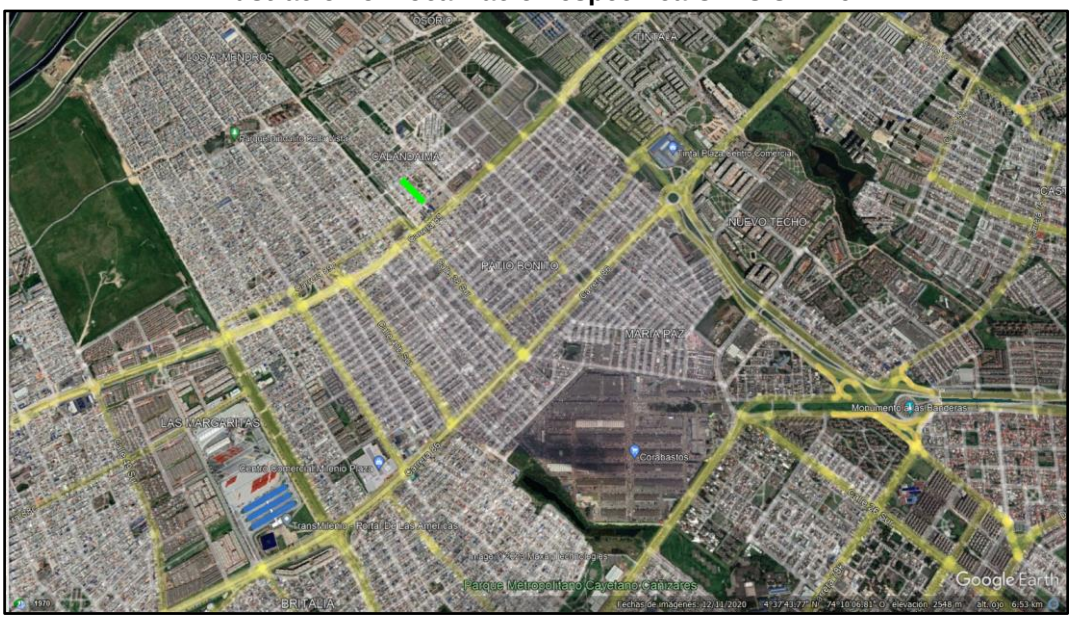

Fuente: Propia – Google Earth

Tabla 7. Listado de segmento priorizados UPZ 80

CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA
8014024	UPZ80	CL 41A S	KR 81K	KR 82B
8004798	UPZ80	CL 41A S	KR 81H	KR 81K
8004518	UPZ80	CL 41A S	KR 84	KR 85
8004585	UPZ80	CL 41A S	KR 82D	KR 83
8004545	UPZ80	CL 41A S	KR 83	KR 84
8004601	UPZ80	CL 41A S	KR 82B	KR 82D
8005104	UPZ80	CL 42C S	KR 82	KR 82A
8004904	UPZ80	KR 81K	CL 41DBIS S	CL 41F S
8004987	UPZ80	CL 42C S	KR 82B	KR 82D
8005166	UPZ80	CL 42C S	KR 81L	KR 82

8005191	UPZ80	KR 82	CL 42C S	CL 42FBIS S
8004481	UPZ80	KR 84	CL 40D S	CL 41 S
8004383	UPZ80	KR 83	CL 40BISB S	CL 40B S
8004697	UPZ80	KR 81K	CL 41 S	CL 41A S
8004722	UPZ80	KR 81K	CL 41A S	CL 41ABIS S
8004761	UPZ80	KR 81K	CL 41ABIS S	CL 41B S
8004812	UPZ80	KR 81K	CL 41BBIS S	CL 41C S
8014026	UPZ80	CL 42D S	KR 81D	KR 81G
8005646	UPZ80	CL 42C S	KR 81CBIS	KR 81D
8005449	UPZ80	CL 42D S	KR 81G	KR 81H
8005702	UPZ80	CL 42C S	KR 81BBIS	KR 81CBIS
8005812	UPZ80	CL 42C S	KR 81BIS	KR 81ABIS
8005986	UPZ80	CL 42C S	KR 80H	KR 80I
8004540	UPZ80	KR 82D	CL 40D S	CL 41 S
8005856	UPZ80	CL 42C S	KR 81	KR 81BIS
8005940	UPZ80	CL 42C S	KR 80I	KR 80J
8005887	UPZ80	CL 42C S	KR 80J	KR 80JBIS
8012238	UPZ80	CL 42C S	KR 81B	KR 81BBIS
8006036	UPZ80	CL 42C S	KR 80GBIS	KR 80H
8004811	UPZ80	CL 42C S	KR 84	KR 85A
8005666	UPZ80	KR 81	CL 42 S	DG 42A S
8005630	UPZ80	CL 42 S	KR 80I	KR 80J
8005579	UPZ80	CL 42 S	KR 80J	KR 81
8004966	UPZ80	CL 41D S	KR 81H	KR 81K
8004741	UPZ80	CL 41ABIS S	KR 81K	KR 82B
8004877	UPZ80	CL 41DBIS S	KR 81K	KR 82B
8004406	UPZ80	KR 82D	CL 40BISB S	CL 40B S
8004368	UPZ80	KR 83A	CL 40BISB S	CL 40B S
8004622	UPZ80	KR 85	CL 41A S	CL 42A S
8004747	UPZ80	KR 82D	CL 41A S	CL 42A S
8012964	UPZ80	CL 41F S	KR 80DBIS	KR 80F

8004780	UPZ80	CL 41BBIS S	KR 81K	KR 82B
8004965	UPZ80	KR 81H	CL 41C S	CL 41D S
8004882	UPZ80	KR 81H	CL 41ABIS S	CL 41B S
8005081	UPZ80	CL 40F S	KR 80J	KR 81C
8004762	UPZ80	KR 81H	CL 41 S	CL 41A S
8004923	UPZ80	KR 81H	CL 41B S	CL 41C S
8014458	UPZ80	CL 26 S	KR 73	KR 73B
8005150	UPZ80	CL 40C S	KR 80F	KR 80J
8006311	UPZ80	CL 42CBIS S	KR 80D	KR 80F
8005395	UPZ80	CL 42D S	KR 81H	KR 81I

Fuente: Propia

Ilustración 6. Localización específica CIV´s UPZ80



Fuente: Propia – Google Earth

Tabla 8. Listado de segmento priorizados UPZ 81

CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA
8013716	UPZ81	KR 81J	CL 56A S	CL 56B S
8013713	UPZ81	KR 81J	DG 57A S	DG 57ABIS S

8013714	UPZ81	KR 81J	DG 57 S	DG 57A S
8013715	UPZ81	KR 81J	CL 56B S	CL 57 S
8013998	UPZ81	KR 81J	DG 57ABISC S	DG 57C S
8013999	UPZ81	KR 81J	DG 57ABISB S	DG 57ABISC S
8014002	UPZ81	KR 81J	DG 57ABIS S	DG 57ABISB S
8013717	UPZ81	KR 81J	CL 56A S	CL 56A S
8013712	UPZ81	KR 81J	CL 56 S	CL 56A S
8006531	UPZ81	CL 48A S	KR 81C	KR 81CBIS
8013993	UPZ81	KR 81J	DG 57C S	DG 57D S
8008417	UPZ81	CL 57H S	KR 80J S	KR 81 S
8008530	UPZ81	CL 57H S	CL 58 S	KR 80J

Fuente: Propia

Ilustración 7. Localización específica CIV´s UPZ81



Fuente: Propia – Google Earth

Tabla 9. Listado de segmento priorizados UPZ 82

CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA
8004052	UPZ82	KR 86C	CL 40A S	CL 40ABIS S
8001305	UPZ82	KR 97B	CL 42G S	AC 43 S

8003998	UPZ82	KR 86C	CL 40BIS S	CL 40BISA S
8004024	UPZ82	KR 86C	CL 40BISA S	CL 40A S
8001239	UPZ82	KR 97B	CL 42F S	CL 42G S
8003968	UPZ82	KR 86C	CL 40 S	CL 40BIS S
8001605	UPZ82	KR 95B	CL 42G S	AC 43 S
8001534	UPZ82	KR 95B	CL 42F S	CL 42G S
8000825	UPZ82	KR 99D	CL 42G S	AC 43 S
8000974	UPZ82	KR 99	CL 42G S	AC 43 S
8000919	UPZ82	KR 99	CL 42F S	CL 42G S
8000881	UPZ82	KR 99A	CL 42F S	CL 42G S
8000847	UPZ82	KR 99B	CL 42F S	CL 42G S
8000749	UPZ82	KR 97BBIS	CL 38 S	CL 38C S
8002088	UPZ82	KR 89D	CL 38A S	CL 38 S
8011939	UPZ82	KR 93D	CL 42B S	CL 42F S
8003316	UPZ82	CL 42C S	KR 88FBIS	KR 88H
8002120	UPZ82	KR 89D	CL 38A S	CL 38B S
8002157	UPZ82	KR 89D	CL 38B S	CL 38C S
8003275	UPZ82	KR 87I	CL 40 S	CL 40B S
8011963	UPZ82	CL 42B S	KR 93B	KR 93C
8001153	UPZ82	KR 96B	CL 42 S	CL 42A S
8003676	UPZ82	KR 87D	CL 40D S	CL 41 S
8000894	UPZ82	KR 96	CL 38 S	CL 38C S
8000861	UPZ82	KR 96A	CL 38 S	CL 38C S
8001066	UPZ82	CL 40A S	KR 96	KR 96A
8003380	UPZ82	CL 42C S	KR 88DBIS	KR 88FBIS
8001002	UPZ82	KR 96	CL 38C S	CL 40 S
8000952	UPZ82	KR 96A	CL 38C S	CL 40 S
8000913	UPZ82	KR 96B	CL 38C S	CL 40 S
8003736	UPZ82	CL 40D S	KR 87BBIS	KR 87D
8003735	UPZ82	KR 87BBIS	CL 40C S	CL 40D S
8003771	UPZ82	KR 87BBIS	CL 40D S	CL 41 S

8003635	UPZ82	KR 87D	CL 40C S	CL 40D S
8011957	UPZ82	KR 97F	CL 42A S	CL 42F S
8011966	UPZ82	CL 42B S	KR 94	KR 94A
8002538	UPZ82	KR 91A	CL 42F S	CL 42G S
8000940	UPZ82	KR 95B	CL 38 S	SE
8001255	UPZ82	KR 94B	CL 40 S	CL 40A S
8004732	UPZ82	KR 86A	CL 42G S	AC 43 S
8004669	UPZ82	KR 86 BIS	CL 42 F BIS S	S.E
8004695	UPZ82	KR 86 BIS	CL 42F BIS S	CL 42F BISA S
8011964	UPZ82	CL 42B S	KR 93C	KR 93D
8011965	UPZ82	CL 42B S	KR 93D	KR 94
8011967	UPZ82	CL 42B S	KR 94A	KR 94B
8011959	UPZ82	KR 98 BIS	CL 42A S	CL 42F S

Fuente: Propia

Ilustración 8. Localización específica CIV´s UPZ82



Fuente: Propia – Google Earth

5. INFORMACIÓN ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL

5.1 Comité de apoyo comunitario

Durante este periodo no se desarrolló comité de apoyo comunitario.

5.2 Programa de Atención al Usuario

Durante este periodo no se recibieron PQRS por parte de la comunidad en ninguno de los canales de atención al usuario de la Consultoría.

5.3 Identificación, Evaluación y Análisis de Impactos Sociales (Matriz mensual)

Durante este periodo no se presentó la matriz de impactos sociales

5.4 Diagnóstico Socio económico y Caracterización Sociales

Durante este periodo no se presentó el diagnostico socio económico

5.5 Matriz de Sistematización con recomendaciones urbanísticas, económicas, sociales y de movilidad (mensual)

Durante este periodo no se presentó la matriz de recomendaciones urbanísticas.

5.6 Directorio de actores sociales e institucionales Georreferenciados

Durante este periodo no se presentó el directorio de actores sociales georreferenciados

5.7 Informes de Gestión

5.7.1 *Informe Mensual*

- Durante este periodo se hizo entrega a la Interventoría Consorcio GMC del informe social No. 5 mediante comunicado GEI-049-24 de fecha 14 de febrero de 2024

5.7.2 *Informes Semanales*

- Durante este periodo no se reportaron informes semanales

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Conforme a las actividades estipuladas en el Plan de Gestión Social se encuentra pendiente realizar por parte de la Consultoría la entrega de los siguientes insumos: Matriz de identificación y análisis de impactos sociales, Diagnóstico Socio económico y Caracterización Sociales, Matriz de Sistematización con recomendaciones urbanísticas, económicas, sociales y de movilidad y el Directorio de actores sociales e institucionales Georreferenciados.

- Es de aclarar que el presente contrato entró a la suspensión No. 5 desde el 22/12/2023 al 21/01/2024, razón por la cual no fue posible dar continuidad a las actividades del Plan de Gestión Social.

7. ANEXOS

ANEXO 1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO /RADICADO	**FECHA**	**DESTINO**	**ASUNTO**
GEI-034-24	01/02/2024	CONSORCIO GMC	ENTREGA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIALES ACTUALIZADO
GEI-041-24	07/02/2024	CONSORCIO GMC	ATENCIÓN A COMUNICADO DE INTERVENTORÍA GMC-127-124-2023 DE FECHA 17/11/2023
GEI-049-24	14/02/2024	CONSORCIO GMC	ENTREGA DE INFORME SOCIAL No. 5

Bogotá, febrero 01 de 2024

GEI-034-24

Señores
CONSORCIO GMC
Atención: Ing. Jairo Geovanni Ortiz
Director
Bogotá D.C.

Referencia: **RESPUESTA A COMUNICADO GMC-127-121-2023 de fecha 16 Nov de 2023**
CONTRATO DE CONSULTORIA CON-831-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIOPÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.CONTRATO DE CONSULTORIA CON-831-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

Cordial saludo;

Dando atención al comunicado de la referencia hacemos entrega del cronograma de actividades del componente social actualizado para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

RODRIGO CERON
DIRECTOR DE CONSULTORIA CONTRATO CC831.
GEICOL S.A.S.

Anexo: Cronograma social actualizado

Bogotá, febrero 07 de 2024

GEI-041-24

Señores
CONSORCIO GMC
Atención: Ing. Jairo Geovanni Ortiz
Director
Bogotá D.C.

Referencia: **RESPUESTA A COMUNICADO GMC-127-124-2023 de fecha 17 Nov de 2023**
CONTRATO DE CONSULTORIA CON-831-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIOPÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.CONTRATO DE CONSULTORIA CON-831-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

Cordial saludo;

Dando atención al comunicado de la referencia hacemos entrega del formato de la PQRS No. 1 instaurada por el ciudadano Wilmer Gustavo Gutiérrez, para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

RODRIGO CERON
DIRECTOR DE CONSULTORIA CONTRATO CC831.
GEICOL S.A.S.

Anexo: Formato de PQRS No.1 consultoría, respuesta al ciudadano comunicado GEI-820-23

Bogotá, febrero 14 de 2024

GEI-049-24

Señores
CONSORCIO GMC
Atención: Ing. Jairo Geovanni Ortiz
Director
Bogotá D.C.

Referencia: **INFORME MENSUAL COMPONENTE SOCIAL No. 5**
CONTRATO DE CONSULTORIA CON-831-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIOPÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.CONTRATO DE CONSULTORIA CON-831-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

Cordial saludo;

Dando atención a las obligaciones contractuales hacemos entrega del informe mensual No. 5 del componente social para su respectiva revisión y aprobación.

Cordialmente,

DIRECTOR DE CONSULTORIA CONTRATO CC831.
GEICOL S.A.S.

Anexo: Se entrega la información en formato editable y con anexos en el siguiente enlace
https://drive.google.com/drive/folders/1iHWFpUUrNA1x5GY3rMkmueQAvnfw6O-Z?usp=drive_link
