INFORME DE INTERVENTORIA N° 2 DEL 12 DE ABRIL DE 2025 AL 11 DE MAYO DE 2025

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZON CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024
CONTRATISTA: CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° SP-MC-CI-128-2025

1. INTRODUCCIÓN

El municipio de Villapinzon Cundinamarca ha venido adelantando la limpieza de la fachada del templo San Juan Bautista, con el fin de mejorar el aspecto físico del municipio, promover el turismo.

Dicha adecuación se está realizando en la Carrera 4 N° 4 -20 templo y casa cural con el fin de brindar a los habitantes y visitantes una mejor visual del parque

En el presente informe, se muestran las actividades realizadas a la fecha en la parte técnica, administrativa, legal, financiera, ambiental y seguridad y salud del trabajador; que se está llevando dentro de la obra y de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra que tiene por objeto "contratar las obras de limpieza general de la fachada principal del templo de San Juan Bautista Villapinzon Cundinamarca, convenio IDECUT 541 de 2024".

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACION

El municipio de Villapinzón se encuentra situado, Latitud:5.21583. Longitud: -73.5967. Latitud: 5°12´57" Norte, sobre una altura de 2715 metros sobre el nivel del mar.
Limita con Lenguazaque al Noroeste y Oeste, con Ventaquemada al Norte en Boyacá, con Turmequé al Nordeste en Boyacá, con Úmbita al Este en Boyacá, con Chocontá al Suroeste y a al Oeste, con Tibiritá al Sur, con La Capilla al Sureste en Boyacá.
El municipio tiene una extensión territorial de 249 Km2

La intervención que se viene realizando dentro de este contrato es la limpieza general de la fachada general del templo San Juan Bautita y fachada de la casa cural ubicadad en la Carrera 4 # 4-50, frente al parque principal.

En la primera imagen se presenta una fotografía aérea del casco urbano del municipio de Villapinzón, donde se puede observar la distribución general del tejido urbano, vías, zonas residenciales y comerciales que componen el centro del municipio.

En la segunda imagen, se realiza un acercamiento o "zoom" sobre una zona específica del casco urbano, donde se referencia de manera destacada el Templo San Juan Bautista, un punto de interés arquitectónico y cultural dentro del municipio, el cual se esta interviniendo mejorando su aspecto general con el mantenimiento y limpieza de fachada general.

PLANO DE LOCALIZACIÓN TRAMO EN INTERVENCIÓN



Fuente. Google Earth



Fuente. Google Earch

Dirección: Calle 14B N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

2.2. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO














Dirección: Calle 14B N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242








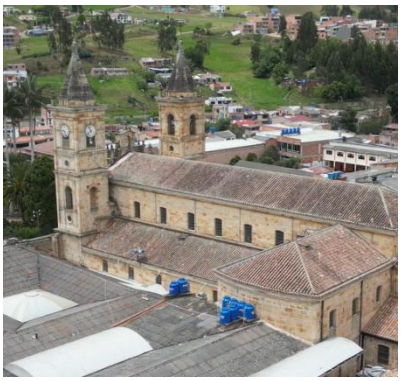






Dirección: Calle 14B N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

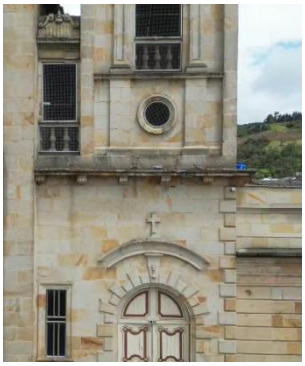Dirección: Calle 14B N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

2.3. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

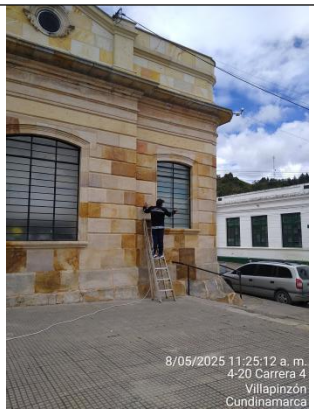Dirección: Calle 14B N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

2.4. ACTIVIDADES TECNICAS DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**preliminares**				
1,1	Andamios y cerramiento				
1,1,1	Señalización preventiva y manejo de transito vehicular y peatonal	ML	100,00	$ 25.000,00	$ 2.500.000,00
1,1,2	Instalación, desmonte y retiro de cerramiento perimetral de control ambiental en poli sombra h=2,10 m	ML	30,00	$ 39.270,35	$ 1.178.110,50
1,1,3	Campamento de obra	M2	30,00	$ 19.164,65	$ 574.939,50
1,1,4	Andamio certificado sobre la fachada para la ejecución de los trabajos	MES	2,00	$ 12.466.119,93	$ 24.932.239,86
				subtotal de andamios y cerramiento	**$ 29.185.289,86**
1,2	Pruebas en sitio y laboratorios				
1,2,1	Pruebas sitio	UN	10,00	$ 350.000,00	$ 3.500.000,00
1,2,2	Pruebas en sitio de laboratorio	UN	2,00	$ 3.500.000,00	$ 7.000.000,00
				subtotal pruebas en sitio y laboratorios	**$ 10.500.000,00**
2	**Retiros y desmontes**				
2,1	Retiro de resanes en morteros de cemento o cal desprendidos	M2	25,00	$ 10.568,07	$ 264.201,75
				subtotal retiros y desmontes	**$ 264.201,75**

Dirección: Calle 14B N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

3	**Limpieza general**						
3,1	Limpieza superficial fachadas en piedra. Limpieza manuela de agua y cepillo de cerda suave	M2	650,00	$	23.700,00	$	15.405.000,00
3,2	Limpieza superficial cornisas y relieves en piedra. Limpieza manual de agua y cepillo de cerda suave	ML	130,00	$	35.250,00	$	4.582.500,00
3,3	Limpieza de elementos especiales (balaustres y pináculos)	UN	18,00	$	27.800,00	$	500.400,00
3,4	Limpieza especial de vapor	M2	81,00	$	26.070,00	$	2.111.670,00
					subtotal limpieza general	**$**	**22.599.570,00**
4	**Desinfección**						
4,1	Desinfección superficies en piedra	M2	390,00	$	32.587,50	$	12.709.125,00
4,2	Desinfección superficies en piedra cornisas y relieves en piedra	ML	80,00	$	58.162,50	$	4.653.000,00
4,3	Desinfección de elementos especiales balaustres y pináculos	UN	17,00	$	45.870,00	$	779.790,00
					sub total de desinfección	**$**	**18.141.915,00**
5	**Eliminación de costras negras**						
4,1	Desinfección superficies en piedra	M2	10,00	$	33.575,00	$	335.750,00
4,2	Desinfección superficie en piedra cornisas y relieves en piedra	ML	33,00	$	61.687,50	$	2.035.687,50
4,3	Desinfección de elementos especiales balaustres y pináculos	UN	17,00	$	48.650,00	$	827.050,00
					subtotal eliminación costras negras	**$**	**3.198.487,50**
6	**Consolidación**						
6,1	Desinfección superficies en piedra	M2	185,00	$	32.587,50	$	6.028.687,50
6,2	Desinfección superficies en piedra cornisas y relieves en piedra	ML	33,00	$	58.162,50	$	1.919.362,50
6,3	Desinfección de elementos especiales balaustres y pináculos	UN	17,00	$	45.870,00	$	779.790,00
					subtotal consolidación	**$**	**8.727.840,00**

Dirección: Calle 14B N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242



7	**Resanes de juntas y faltantes de piedra**				
7,1	Resanes de juntas en mortero de cal y arenisca 1:1	M2	140,00	$ 48.184,20	$ 6.745.788,00
7,2	Resanes de piedra en morteros de cemento blanco y arenisco 2:1	M2	140,00	$ 48.184,20	$ 6.745.788,00
	subtotal resanes de juntas y faltantes de piedra				**$ 13.491.576,00**
8	**Restitución de pañete imitación piedra**				
8,1	Resanes mortero de cal arenisca 1:1	M2	25,00	$ 48.184,20	$ 1.204.605,00
	subtotal restitución de pañete imitación piedra				**$ 1.204.605,00**
9	**Carpinterías en madera**				
9,1	Limpieza superficial puertas en madera, limpieza manual con agua y cepillo de cerda suave	M2	40,00	$ 23.700,00	$ 948.000,00
9,2	Eliminación de capa de protección con pistola de calor	M2	40,00	$ 42.660,00	$ 1.706.400,00
9,3	Aplicación de nueva capa de protección base agua	M2	40,00	$ 76.788,00	$ 3.071.520,00
	subtotal carpintería de madera				**$ 5.725.920,00**
10	**Aseo y limpieza**				
10,1	Aseo general de obra	MES	3,00	$ 1.300.000,00	$ 3.900.000,00
10,2	Retiro de escombros y material sobrante	M3	8,00	$ 464.096,10	$ 3.712.768,80
	subtotal de carpinterías en madera				**$ 7.612.768,80**
	subtotal de costos directos				**$ 120.652.173,91**
	costos indirectos				
	Administración		0,20		$ 24.130.434,78
	Imprevistos		0,05		$ 6.032.608,70
	Utilidad		0,03		$ 3.619.565,22
	subtotal de costos indirectos				**$ 33.782.608,70**
	TOTAL				**$ 154.434.783,00**

Dirección: Calle 14B N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

2.4.1. ACTIVIDADES DE ACUERDO AL BALANCE

Nº	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				BALANCE	
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**						
1,1	Andamios y cerramiento						
1,1,1	Señalización preventiva y manejo de transito vehicular y peatonal	ML	100,00	25.000,00	2.500.000,00	12,00	$ 300.000
1,1,2	Instalación, desmonte y retiro de cerramiento perimetral de control ambiental en poli sombra h=2,10 m	ML	30,00	39.270,35	1.178.110,50	44,00	$ 1.727.895
1,1,3	Campamento de obra	M2	30,00	19.164,65	574.939,50	0,00	$ 0
1,1,4	Andamio certificado sobre la fachada para la ejecución de los trabajos	MES	2,00	12.466.119,93	24.932.239,86	1,00	$ 12.466.120
	Subtotal de andamios y cerramiento				**29.185.289,86**		**$ 14.494.015**
1,2	Pruebas en sitio y laboratorios						
1,2,1	Pruebas sitio	UN	10,00	350.000,00	3.500.000,00	0,00	$ 0
1,2,2	Pruebas en sitio de laboratorio	UN	2,00	3.500.000,00	7.000.000,00	0,00	$ 0
	Subtotal pruebas en sitio y laboratorios				**10.500.000,00**		**$ 0**
2	**RETIROS Y DESMONTES**						
2,1	Retiro de resanes en morteros de cemento o cal desprendidos	M2	25,00	10.568,07	$ 264.201,75	2,00	$ 21.136
	Subtotal retiros y desmontes				**$ 264.201,75**		**$ 21.136**
3	**LIMPIEZA GENERAL**						
3,1	Limpieza superficial fachadas en piedra. Limpieza manuela de agua y cepillo de cerda suave	M2	650,00	23.700,00	$ 15.405.000	365,00	$ 8.650.500

Dirección: Calle 14B N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

3,2	Limpieza superficial cornisas y relieves en piedra. Limpieza manual de agua y cepillo de cerda suave	ML	130,00	35.250,00	$ 4.582.500	365,00	$ 12.866.250
3,3	Limpieza de elementos especiales (balaustres y pináculos)	UN	18,00	27.800,00	$ 500.400	6,00	$ 166.800
3,4	Limpieza especial de vapor	M2	81,00	26.070,00	$ 2.111.670	0,00	$ 0
	Subtotal limpieza general				**$ 22.599.570**		**$ 21.683.550**
4	**DESINFECCIÓN**						
4,1	Desinfección superficies en piedra	M2	390,00	32.587,50	$ 12.709.125	365,00	$ 11.894.438
4,2	Desinfección superficies en piedra cornisas y relieves en piedra	ML	80,00	58.162,50	$ 4.653.000	365,00	$ 21.229.313
4,3	Desinfección de elementos especiales balaustres y pináculos	UN	17,00	45.870,00	$ 779.790	6,00	$ 275.220
	Sub total de desinfección				**$ 18.141.915**		**$ 33.398.970**
5	**ELIMINACIÓN DE COSTRAS NEGRAS**						
5,1	Desinfección superficies en piedra	M2	10,00	33.575,00	$ 335.750	88,80	$ 2.981.460
5,2	Desinfección superficie en piedra cornisas y relieves en piedra	ML	33,00	61.687,50	$ 2.035.688	12,03	$ 742.302
5,3	Desinfección de elementos especiales balaustres y pináculos	UN	17,00	48.650,00	$ 827.050	2,00	$ 97.300
	Subtotal eliminación costras negras				**$ 3.198.488**		**$ 3.821.062**
6	**CONSOLIDACIÓN**						
6,1	Desinfección superficies en piedra	M2	185,00	32.587,50	$ 6.028.688	365,00	$ 11.894.438
6,2	Desinfección superficies en piedra cornisas y relieves en piedra	ML	33,00	58.162,50	$ 1.919.363	365,00	$ 21.229.313
6,3	Desinfección de elementos especiales balaustres y pináculos	UN	17,00	45.870,00	$ 779.790	6,00	$ 275.220
	Subtotal consolidación				**$ 8.727.840**		**$ 33.398.970**

Dirección: Calle 14B N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242



7	**RESANES DE JUNTAS Y FALTANTES DE PIEDRA**						
7,1	Resanes de juntas en mortero de cal y arenisca 1:1	M2	140,00	48.184,20	$ 6.745.788	2,00	$ 96.368
7,2	Resanes de piedra en morteros de cemento blanco y arenisco 2:1	M2	140,00	48.184,20	$ 6.745.788	1,00	$ 48.184
	Subtotal resanes de juntas y faltantes de piedra				**$ 13.491.576**		**$ 144.553**
8	**RESTITUCIÓN DE PAÑETE IMITACIÓN PIEDRA**						
8,1	Resanes mortero de cal arenisca 1:1	M2	25,00	48.184,20	$ 1.204.605	2,00	$ 96.368
	Subtotal restitución de pañete imitación piedra				**$ 1.204.605**		**$ 96.368**
9	**CARPINTERIAS EN MADERA**						
9,1	Limpieza superficial puertas en madera, limpieza manual con agua y cepillo de cerda suave	M2	40,00	23.700,00	$ 948.000	85,88	$ 2.035.356
9,2	Eliminación de capa de protección con pistola de calor	M2	40,00	42.660,00	$ 1.706.400	85,88	$ 3.663.641
9,3	Aplicación de nueva capa de protección base agua	M2	40,00	76.788,00	$ 3.071.520	85,88	$ 6.594.553
	Subtotal carpintería de madera				**$ 5.725.920**		**$ 12.293.550**
10	**ASEO Y LIMPIEZA**						
10,1	Aseo general de obra	MES	3,00	1.300.000,00	3.900.000,00	1,00	$ 1.300.000
10,2	Retiro de escombros y material sobrante	M3	8,00	464.096,10	3.712.768,80	0,00	$ 0
	Subtotal de aseo y limpieza				**$ 7.612.769**		**$ 1.300.000**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 120.652.174**		**$ 120.652.174**
COSTOS INDIRECTOS							

Dirección: Calle 14B N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

Administración	20%		24.130.434,78		
Imprevistos	5%		6.032.608,70		6.032.608,71
Utilidad	3%		3.619.565,22		3.619.565,23
Subtotal de costos indirectos			**33.782.608,70**		**33.782.608,78**
	VALOR TOTAL		**$ 154.434.783**		**$ 154.434.783**

2.4.2. ACTIVIDDADES EJECUTADAS MES 2 Y FINALES

N°	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				BALANCE	
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**						
1,1	Andamios y cerramiento						
1,1,1	Señalización preventiva y manejo de transito vehicular y peatonal	ML	100,00	25.000,00	2.500.000,00	12,00	$ 300.000
1,1,2	Instalación, desmonte y retiro de cerramiento perimetral de control ambiental en poli sombra h=2,10 m	ML	30,00	39.270,35	1.178.110,50	44,00	$ 1.727.895
1,1,3	Campamento de obra	M2	30,00	19.164,65	574.939,50	0,00	$ 0
1,1,4	Andamio certificado sobre la fachada para la ejecución de los trabajos	MES	2,00	12.466.119,93	24.932.239,86	1,00	$ 12.466.120
	Subtotal de andamios y cerramiento				**29.185.289,86**		**$ 14.494.015**
1,2	Pruebas en sitio y laboratorios						
1,2,1	Pruebas sitio	UN	10,00	350.000,00	3.500.000,00	0,00	$ 0
1,2,2	Pruebas en sitio de laboratorio	UN	2,00	3.500.000,00	7.000.000,00	0,00	$ 0
	Subtotal pruebas en sitio y laboratorios				**10.500.000,00**		**$ 0**
2	**RETIROS Y DESMONTES**						

Dirección: Calle 14B N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

2,1	Retiro de resanes en morteros de cemento o cal desprendidos	M2	25,00	10.568,07	$ 264.201,75	2	6
	Subtotal retiros y desmontes				**$ 264.201,75**		**$ 21.136**
3	**LIMPIEZA GENERAL**						
3,1	Limpieza superficial fachadas en piedra. Limpieza manuela de agua y cepillo de cerda suave	M2	650,00	23.700,00	$ 15.405.000	365,00	$ 8.650.500
3,2	Limpieza superficial cornisas y relieves en piedra. Limpieza manual de agua y cepillo de cerda suave	ML	130,00	35.250,00	$ 4.582.500	365,00	$ 12.866.250
3,3	Limpieza de elementos especiales (balaustres y pináculos)	UN	18,00	27.800,00	$ 500.400	6,00	$ 166.800
3,4	Limpieza especial de vapor	M2	81,00	26.070,00	$ 2.111.670	0,00	$ 0
	Subtotal limpieza general				**$ 22.599.570**		**$ 21.683.550**
4	**DESINFECCIÓN**						
4,1	Desinfección superficies en piedra	M2	390,00	32.587,50	$ 12.709.125	365,00	$ 11.894.438
4,2	Desinfección superficies en piedra cornisas y relieves en piedra	ML	80,00	58.162,50	$ 4.653.000	365,00	$ 21.229.313
4,3	Desinfección de elementos especiales balaustres y pináculos	UN	17,00	45.870,00	$ 779.790	6,00	$ 275.220
	Sub total de desinfección				**$ 18.141.915**		**$ 33.398.970**
5	**ELIMINACIÓN DE COSTRAS NEGRAS**						
5,1	Desinfección superficies en piedra	M2	10,00	33.575,00	$ 335.750	88,80	$ 2.981.460
5,2	Desinfección superficie en piedra cornisas y relieves en piedra	ML	33,00	61.687,50	$ 2.035.688	12,03	$ 742.302
5,3	Desinfección de elementos especiales balaustres y pináculos	UN	17,00	48.650,00	$ 827.050	2,00	$ 97.300
	Subtotal eliminación costras negras				**$ 3.198.488**		**$ 3.821.062**
6	**CONSOLIDACIÓN**						

Dirección: Calle 14B N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

6,1	Desinfección superficies en piedra	M2	185,00	32.587,50	$ 6.028.688	365	$ 11.894.438
6,2	Desinfección superficies en piedra cornisas y relieves en piedra	ML	33,00	58.162,50	$ 1.919.363	365,00	$ 21.229.313
6,3	Desinfección de elementos especiales balaustres y pináculos	UN	17,00	45.870,00	$ 779.790	6,00	$ 275.220
	Subtotal consolidación				**$ 8.727.840**		**$ 33.398.970**
7	**RESANES DE JUNTAS Y FALTANTES DE PIEDRA**						
7,1	Resanes de juntas en mortero de cal y arenisca 1:1	M2	140,00	48.184,20	$ 6.745.788	2,00	$ 96.368
7,2	Resanes de piedra en morteros de cemento blanco y arenisco 2:1	M2	140,00	48.184,20	$ 6.745.788	1,00	$ 48.184
	Subtotal resanes de juntas y faltantes de piedra				**$ 13.491.576**		**$ 144.553**
8	**RESTITUCIÓN DE PAÑETE IMITACIÓN PIEDRA**						
8,1	Resanes mortero de cal arenisca 1:1	M2	25,00	48.184,20	$ 1.204.605	2,00	$ 96.368
	Subtotal restitución de pañete imitación piedra				**$ 1.204.605**		**$ 96.368**
9	**CARPINTERIAS EN MADERA**						
9,1	Limpieza superficial puertas en madera, limpieza manual con agua y cepillo de cerda suave	M2	40,00	23.700,00	$ 948.000	85,88	$ 2.035.356
9,2	Eliminación de capa de protección con pistola de calor	M2	40,00	42.660,00	$ 1.706.400	85,88	$ 3.663.641
9,3	Aplicación de nueva capa de protección base agua	M2	40,00	76.788,00	$ 3.071.520	85,88	$ 6.594.553
	Subtotal carpintería de madera				**$ 5.725.920**		**$ 12.293.550**
10	**ASEO Y LIMPIEZA**						
10,1	Aseo general de obra	MES	3,00	1.300.000,0	3.900.000,00	1,00	$ 1.300.000

Dirección: Calle 14B N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

				0			
10,2	Retiro de escombros y material sobrante	M3	8,00	464.096,10	3.712.768,80	0,00	$ 0
	Subtotal de aseo y limpieza				**$ 7.612.769**		**$ 1.300.000**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 120.652.174**		**$ 120.652.174**
COSTOS INDIRECTOS							
Administración			20%		24.130.434,78		24.130.434,84
Imprevistos			5%		6.032.608,70		6.032.608,71
Utilidad			3%		3.619.565,22		3.619.565,23
Subtotal de costos indirectos					**33.782.608,70**		**33.782.608,78**
	VALOR TOTAL				**$ 154.434.783**		**$ 154.434.783**

2.5. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

El proceso de selección del contrato de obra se da mediante la metodología de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA en donde se adjudicó el contrato de obra N° SP-SAMC-COP-118-2025 cuyo objeto es el "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZON CUNDINAMARCA, CONVENIO IDECUT 541 DE 2024" a la empresa ARQUILAT SAS y su representante legal el ARQ. WILSON ALEXANDER LATORRE HERNANDEZ con quien la administración municipal de Villapinzon Cundinamarca suscribió el respectivo contrato. De igual forma el proceso de mínima cuantía para contratar la interventoría por medio del cual se adjudicó al ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ.

2.5.1. CONTRATO N° SP-SAMC-COP-118-2025

CONTRATO N°:	SP -SAMC -COP- 118 -2 025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VILLAPINZON, NIT 899.999.445 -3
CONTRATISTA:	ARQUILAT SAS
NIT	900448471- 4
R.L	WILSON ALEXANDER LATORRE HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN	3.169.929 de Sesquilé

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"
CLASE DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA.
VALOR:	CIENTO CINCUENTA CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 154.434.783)
INTERVENTOR: **IDENTIFICACION:**	CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ C.C. 1.069.263.339 de Chocontá
FECHA DE INICIO:	12 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	11 DE MAYO DE 2025

2.6. CONTROL DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA N° SP -SAMC -C OP- 118 -2 025

2.6.1. POLIZAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA Nº 178 DE 2020				
GARANTÍAS	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	
CUPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	**03/03/2025**	**03/09/2025**	**$15.443.478,30**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO	**5 AÑOS**		**$30.886.956,60**
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	**03/03/2025**	**03/05/2028**	**$7.721.739,15**

SOCIALES				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	**07/03/2025**	**07/05/2025**	**$284.700.000**

2.7. OBRAS EJECUTADAS

- Retiro de resanes en morteros de cemento o cal desprendidos

Se llevó a cabo el retiro manual de partes de mortero de cemento sueltas en la fachada de la casa cural. Estas se desprendían fácilmente con la presión ejercida por la hidrolavadora, lo que evidenciaba su falta de adherencia y deterioro. Posteriormente, se procedió al vaciado de las juntas, retirando el mortero restante de forma cuidadosa para no dañar los elementos adyacentes. Finalmente, se realizó la limpieza exhaustiva del área intervenida, eliminando los residuos generados durante la actividad.

- Limpieza superficial fachadas en piedra. Limpieza agua y cepillo de cerda suave

Se llevó a cabo el proceso de limpieza de la fachada de la casa cural, iniciando en el costado derecho de la casa cural llegando hasta le esquina en la parte izquierda.

Para esta actividad se empleó agua a presión combinada con jabón, la cual fue aplicada sobre todas las áreas previamente seleccionadas. Posteriormente, se procedió con el restregado manual utilizando cepillos y escobas de cerdas suaves, con el fin de remover eficientemente las impurezas, residuos, suciedad acumulada y manchas superficiales.

Este procedimiento permite recuperar la tonalidad original de la piedra, resaltando su valor arquitectónico y mejorando significativamente el aspecto estético de la fachada, sin generar daños en el material.

- Limpieza de elementos especiales de pintura

Se ejecutaron labores de limpieza sobre las superficies en pañete de la fachada de la casa cural, las cuales presentan un acabado en pintura que simula piedra. El procedimiento tuvo como finalidad la remoción de agentes contaminantes, depósitos de suciedad y otros residuos adheridos, con el propósito de preservar la integridad del revestimiento y restituir la tonalidad original del acabado decorativo. Esta intervención contribuye a la conservación estética y material del inmueble, respetando sus características.

- Desinfección superficies en piedra

Se dio inicio al proceso de desinfección de la fachada de la casa cural, comenzando desde el costado derecho, continuando por la zona central y finalizando en el costadoizquierdo, observando la edificación desde el frente de la pila del parque principal.

Para esta actividad se utilizó el producto químico Preventol 601, el cual fue aplicado en su forma pura (100%) mediante el uso de una fumigadora, garantizando una cobertura uniforme en todas las superficies tratadas.

El Preventol 601 actúa como un agente biocida, con capacidad para eliminar y prevenir la aparición de hongos, algas y otros microorganismos que puedan afectar la piedra a lo largo del tiempo. La aplicación directa del producto en estado puro asegura una mayor efectividad y durabilidad del tratamiento, contribuyendo a la conservación del material original de la fachada.

- Desinfección superficies en piedra (costras negras)

Tras la limpieza general de la fachada de la casa cural con agua a presión y jabón, se identificaron zonas con manchas negras fuertemente adheridas a la piedra natural, las cuales no pudieron ser eliminadas mediante el proceso estándar de lavado.

Para tratar estas áreas, se procedió a la aplicación del producto Stone Brigh, un enjuague químico especializado diseñado para la remoción de contaminantes, eflorescencias y manchas profundas en superficies de piedra natural.

El producto fue aplicado directamente sobre las zonas más contaminadas, seguido de un proceso de restregado manual utilizando alfombra y cepillos de cerdas blandas, repitiendo el procedimiento las veces necesarias hasta lograr una limpieza eficaz. Una vez eliminada la mayor parte de la mancha, se efectuó un lavado final con hidrolavadora para retirar tanto los residuos del producto como las impurezas desprendidas durante la fricción.

Cabe destacar que Stone Brigh actúa como un tratamiento progresivo, con un efecto visible durante un periodo de cuatro (4) días posteriores a su aplicación, durante los cuales la tonalidad de la piedra se va aclarando gradualmente, alcanzando un resultado más homogéneo y natural en la superficie intervenid

- Desinfección superficies en piedra (Consolidación)

Una vez finalizadas las actividades de sellado de juntas y remoción de costras negras, se dio inicio a la aplicación del producto Nanosil 10, un hidrófugo de alta concentración, formulado para proteger superficies de piedra natural contra la humedad y las filtraciones.

El proceso se desarrolló de forma ordenada, del costado derecho al costado izquierdo de la fachada de la cada cural. Previamente a la aplicación, se realizó una verificación detallada del estado de la superficie, asegurando que se encontrara completamente limpia, seca y libre de partículas o residuos que pudieran interferir con la adherencia y eficacia del producto.

Se aplicó una primera capa uniforme, permitiendo su absorción total por parte del sustrato. Una vez filtrada esta capa, se procedió con la aplicación de una segunda capa, garantizando una cobertura completa de la superficie tratada, siguiendo las recomendaciones de la ficha técnica.

Finalmente, se dejó el producto en proceso de curado durante un periodo de siete (7) días, tiempo necesario para que el hidrófugo actúe completamente y brinde una protección efectiva contra la humedad y futuras filtraciones, asegurando así la durabilidad de la intervención realizada en la fachada de la iglesia.

- Resanes de juntas en mortero de cal y arenisca 1:1

Se inició con una inspección visual detallada de la fachada de la casa cural para identificar las juntas deterioradas o faltantes que requerían intervención. A partir de esta revisión, se determinaron las áreas específicas a resanar.

Posteriormente, se procedió a realizar una muestra para definir el color de la mezcla, mediante la dosificación de cemento, cal, arena (pasa 200), agua y la incorporación de tinte, con el fin de igualar el tono original de las juntas existentes y asegurar la uniformidad estética en toda la superficie intervenida.

Se dio inicio al proceso de sellado de juntas, el cual se desarrolló en tres fases:

Limpieza de las juntas: se retiraron residuos, polvo y material suelto para asegurar una adecuada adherencia.

Aplicación de la mezcla: la mezcla previamente definida se aplicó cuidadosamente en cada junta.

Orden de trabajo: el procedimiento se realizó iniciando por la torre derecha, seguido de la torre izquierda, y finalizando en la zona central de la fachada.

Una vez que la mezcla aplicada secó completamente, se retiró el excedente o rebaba con ayuda de una grata, definiendo así cada junta y logrando una uniformidad visual y constructiva entre los bloques de piedra y el material de resane.

- Limpieza superficial puertas en madera, limpieza manual con agua y cepillo de cerda suave

Para llevar a cabo la limpieza de las puertas internas de la iglesia, se realizó previamente el armado de andamios certificados en el interior del templo, garantizando condiciones seguras para el acceso y el trabajo en altura por parte del personal técnico.

Una vez instalados los andamios, se procedió a retirar todo tipo de polvo, suciedad, residuos y otras impurezas acumuladas en la superficie de las puertas, dejando las áreas completamente limpias y libres de cualquier material que pudiera interferir con los tratamientos posteriores.

Esta actividad se ejecutó específicamente en la puerta del costado derecho y la puerta central interna de la iglesia, como parte del proceso de preparación para mantenimiento o restauración de los elementos de madera.

- Eliminación de capa de protección con pistola de calor

Una vez finalizado el proceso de limpieza, se procedió al retiro de la capa de pintura existente en las puertas ubicadas en el costado derecho y en el acceso central de la iglesia, en su cara interna.

Para esta actividad se utilizó un soplete térmico que permitió ablandar la pintura, facilitando su remoción con el uso de espátulas, sin generar daños en la madera. Este procedimiento fue realizado cuidadosamente para proteger la estructura original de las puertas.

Posteriormente, se empleó una pulidora con disco fino, la cual permitió eliminar los residuos de pintura restantes y nivelar la superficie, dejando el acabado liso y listo para los tratamientos posteriores, sin afectar el material base ni su integridad estructural.

- Curado de puertas

Tratamiento curativo y estético en puertas de madera

Como parte del proceso de restauración, una vez eliminada la capa de pintura original, se llevó a cabo un tratamiento específico para controlar una infestación de gorgojo detectada

Dirección: Calle 14B N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

en la parte inferior de las puertas. Este procedimiento tuvo como finalidad preservar la integridad estructural de la madera y evitar su deterioro progresivo.

Para lograr una adecuada penetración del producto y minimizar el riesgo de daños, se utilizó un compresor, permitiendo así que la mezcla fuera absorbida eficazmente por la madera. El compuesto aplicado consistió en una mezcla de gasolina con tintillas naturales conocidas como “miel” y “tabasco”, las cuales tienen propiedades protectoras y colorantes.

Este tratamiento no solo sirvió como medida de control biológico, sino también como base tonal, ya que las puertas no recibirían una nueva capa de pintura. Por tanto, se buscó uniformar visualmente las superficies, otorgándoles una apariencia homogénea y coherente entre sí, respetando las características originales del bien patrimonial y su valor estético.

- Sellado de puertas

Como parte del proceso de conservación, se realizó el sellado de las puertas de madera con el objetivo de protegerlas de la humedad ambiental y otros agentes externos que pudieran afectar su integridad a largo plazo. Este procedimiento, además de cumplir una función protectora, permitió mejorar la uniformidad visual de la superficie, facilitando la posterior aplicación del barniz.

Para la aplicación del sellador se empleó un compresor, lo que garantizó una distribución homogénea del producto sobre las superficies de madera. La mezcla utilizada estuvo compuesta por un sellador base y tintillas naturales de tonos “caoba” y “tabaco”, seleccionadas por su capacidad de enriquecer el acabado final sin alterar la apariencia natural del material.

Este tratamiento aportó una capa de preparación que resalta las vetas de la madera, manteniendo su valor estético y patrimonial, y asegurando la adhesión y durabilidad del acabado final.

- Acabado final de las puertas con barniz

Como etapa final del tratamiento de conservación, se procedió a aplicar un acabado con barniz sobre las puertas de madera. Este recubrimiento cumple una doble función: proteger la superficie frente a la humedad, el desgaste ambiental y otros agentes externos, y realzar la apariencia estética de la madera, respetando su textura y color natural.

Para este procedimiento se utilizó un compresor, lo cual permitió una aplicación uniforme y controlada del producto. Se empleó barniz de tipo **Barnex Alta Protección para uso**

exterior, especialmente formulado para condiciones ambientales exigentes. La mezcla fue enriquecida con tintillas naturales en tonos “caramelo” y “miel”, seleccionadas cuidadosamente para armonizar la tonalidad final de las puertas y resaltar las vetas propias del material.

Este tratamiento brindó una capa protectora duradera y un acabado visual homogéneo, asegurando la conservación del aspecto original de las puertas y prolongando su vida útil como parte integral del patrimonio arquitectónico.

- Aseo general de obra

Se llevó a cabo el aseo general de la obra, con el objetivo de dejar las áreas intervenidas en óptimas condiciones de limpieza y presentación.

Se inició con el lavado de las escaleras utilizando una hidrolavadora, permitiendo la remoción efectiva de todo tipo de residuos, polvo y suciedad acumulada durante el desarrollo de los trabajos.

Posteriormente, se realizó el lavado del atrio de la iglesia, para lo cual se utilizó una manguera tipo bombero, logrando una limpieza profunda de toda la superficie. El procedimiento incluyó el restregado manual del piso con agua y jabón, permitiendo recuperar su textura y aspecto original.

Finalmente, los residuos generados durante el lavado fueron recolectados y retirados de la obra, dejando el espacio completamente limpio y libre de materiales sobrantes, en cumplimiento con los estándares de limpieza y orden en la fase final del proyecto

Las actividades descritas anteriormente fueron ejecutadas durante el primer periodo de intervención, comprendido entre el 12 de abril de 2025 y el 11 de mayo de 2025, conforme al presupuesto y contrato de obra vigente.

Durante este periodo, la interventoría llevó a cabo el seguimiento técnico, administrativo y de calidad de cada uno de los ítems mencionados, realizando verificaciones en campo y supervisión permanente del desarrollo de los trabajos.

Gracias a este control riguroso, se logró asegurar que el contratista implementara las mejores técnicas constructivas disponibles, garantizando un proceso de ejecución eficiente, conforme con los requisitos del objeto contractual, y promoviendo la durabilidad y calidad final de la intervención.

2.8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Durante el segundo mes de ejecución del proyecto se han presentado diversas dificultades que han requerido la implementación de varios cambios en el desarrollo de las actividades. Dichos ajustes han sido debidamente registrados y soportados en la bitácora de obra, conforme a los procedimientos establecidos para el control y seguimiento del proyecto

- Durante el transcurso del segundo mes de ejecución se presentaron condiciones climáticas adversas, principalmente lluvias durante la jornada laboral. Esta situación afectó el avance de las actividades programadas, especialmente aquellas que requerían que el personal trabajara en los andamios que estaban frente a la casa cural, por razones de seguridad, fue necesario suspender temporalmente dichas labores en los días de lluvia, se priorizó la integridad del personal, reanudando las actividades únicamente cuando las condiciones climáticas fueron seguras.
- Durante el proceso, se presentó un inconveniente en la aplicación del impermeabilizante. El producto requiere un tiempo de secado de ocho horas; sin embargo, ese día se registró una fuerte lluvia, lo que impidió que el material se adhiriera correctamente, posteriormente, se solicitó al contratista la aplicación de una capa adicional, ya que tras realizar una prueba de humedad se evidenció que en algunas zonas de la fachada de la casa cural el producto no estaba presente. El contratista procedió con la aplicación de esta segunda capa sin inconvenientes, y el secado se llevó a cabo correctamente.

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO N°:	SP-MC-CI-128-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VILLAPINZON, NIT 899.999.445 -3 SECRETARIO DE PLANEACION VILLAPINZON
CONTRATISTA: **IDENTIFICACIÓN**	Ing. Cesar Alejandro Castañeda Rodriguez C.C. 1.069.263.339 de Chocontá
OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024
CLASE DE CONTRATO:	Contrato de interventoría – Mínima cuantía
VALOR:	DIEZ MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREITNA Y OCHO PESOS ($ 10.084.238).
FECHA DE INICIO:	12 DE MARZO DE 2025
FECHA DE REINICIO:	11 DE MAYO DE 2025
PLAZO:	2 meses

3.1.1. CONTROL DE POLIZAS CONTRARO DE INTERVENTORIA SP-MC-CI-128-2025

Las pólizas con acta de inicio del contrato de interventoría N° SP-MC-CI-128-2025 se denominan así: Póliza de cumplimiento N° NB-100373981 y póliza RCE N° NB-100096798, expedida por la aseguradora SEGUROS MUNDIAL, cuyos amparos son:

CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA SP-MC-CI-128-2025				
GARANTÍAS	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	
CUPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	**12/03/2025**	**11/09/2025**	**$2.016.847,60**
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS MUNIDAL.	**12/03/2025**	**11/05/2028**	**$504.211,90**
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL	**12/03/2025**	**11/05/2028**	**$2.016.847,60**
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	SEGUROS MUNDIAL	**12/03/2025**	**12/05/2025**	**$284.700.000,00**

Dirección: Calle 14B N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

3.2. ACTIVIDADES TECNICAS

- Durante la ejecución de las actividades de limpieza e intervención en la fachada de la casa cural, se evidenciaron desprendimientos, fisuras y zonas con pérdida de material en el revestimiento de pañete. Estos deterioros se presentaban principalmente en áreas de transición y contacto entre los distintos materiales que conforman la fachada, cabe destacar que dicha fachada está compuesta por una combinación de piedra natural y pañete con acabado en pintura que imita la apariencia de la piedra. Esta solución mixta, utilizada probablemente con fines estéticos y económicos, requiere un tratamiento diferenciado en función de los materiales originales y su comportamiento ante la intemperie, la detección de estos faltantes permitió establecer criterios para su restauración, empleando técnicas compatibles con los materiales existentes y garantizando la integración visual y estructural del sistema de fachada.
- El tratamiento de las puertas se llevó a cabo mediante un proceso con la eliminación de la capa de pintura existente. Esta remoción se realizó principalmente mediante el uso de lijas de distintos granos, adecuadas para respetar la textura y evitar el deterioro de la madera original, en las zonas donde no era viable el uso de lija, ya sea por la geometría compleja, molduras o detalles de difícil acceso se emplearon productos químicos especializados para la remoción de pintura, los cuales permitieron desprender el recubrimiento sin comprometer la integridad del sustrato, esta fase fue fundamental para preparar adecuadamente la superficie de la madera, permitiendo la correcta aplicación de los tratamientos posteriores y garantizando una adecuada absorción de los productos protectores y de acabado.
- Como parte del proceso de mejoramiento y restauración de las puertas de madera, se procedió a la aplicación de una masilla formulada especialmente para carpintería. Este procedimiento tuvo una doble finalidad: por un lado, mejorar la apariencia estética de las superficies, y por otro, sellar fisuras, hendiduras y aberturas presentes en la madera, la masilla fue aplicada en aquellas zonas donde se evidenciaban daños superficiales o pequeñas cavidades, producto del desgaste natural o del ataque de agentes externos. Su uso permitió nivelar la superficie, aportando uniformidad visual, al tiempo que cumplía una función protectora al obstruir posibles puntos de ingreso de humedad, que podrían comprometer la estabilidad y conservación del material en el futuro, este paso fue fundamental para garantizar la durabilidad de los tratamientos posteriores, como el sellado y el barnizado, asegurando una superficie continua, estable y visualmente homogénea.

3.3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

La interventoría ha desarrollado una gestión administrativa conforme a los lineamientos y parámetros establecidos en el contrato de obra. En este sentido, se han emitido conceptos, correos y demás solicitando la información requerida para la ejecución de la obra, como lo son la documentación pertinente a productos, materiales y demás documentos relacionados para la ejecución de la obra, donde se determina la calidad de los productos.

En atención a lo anterior, la interventoría ha mantenido un seguimiento constante, emitiendo reiteraciones para solicitar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales, con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo del proyecto conforme a lo establecido en el contrato de obra.

3.4. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Durante el primer mes de ejecución del contrato de obra N.° SP-SAMC-COP-118-2025, se ha realizado el respectivo seguimiento financiero, a través del cual se evidenció un avance del 100% en relación con el valor total del contrato.

Este porcentaje corresponde a un valor ejecutado de ciento cincuenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos ochenta y tres pesos ($154.434.783), de acuerdo a las mediciones realizadas en terreno. A continuación, se describe el balance financiero del contrato.

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 154.434.783	
VALOR ANTICIPO	0	0
VALOR EJECUTADO	0	$ 154.434.783
VALOR POR EJECUTAR	0	0
VALOR POR EJECUTAR	0	0
SUMAS IGUALES	$ 154.434.783	$ 154.434.783

Cabe resaltar que, según lo indicado en la tabla de seguimiento financiero, durante el segundo mes de ejecución no se ha radicado ni cobrado ninguna acta parcial de obra, a pesar de que se cuenta con un avance físico estimado del 100%.

La interventoría continuará con el seguimiento correspondiente para garantizar que se presenten las actas de cobro de manera oportuna, conforme al avance ejecutado y lo estipulado contractualmente.

3.5. ACTIVIDADES LEGALES

Por parte de la interventoría se ha venido realizando el seguimiento al contrato de obra N° SP-SAMC-COP-118-2025 cuyo objeto es "contratar las obras de limpieza general de la fachada principal del templo de San Juan Bautista Villapinzon Cundinamarca, convenio IDECUT 541 de 2024". En el cual se ha verificado las pólizas de obra, fecha de vencimiento de las mismas, como se muestra en la tabla descrita anteriormente denominada control de pólizas contrato de obra Nº SP-SAMC-COP-118-2025.

3.6. CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.6.1. CONTROL SOCIO – AMBIENTAL.

El impacto de un proyecto constructivo depende principalmente de sus características propias, del entorno donde se desarrolla, de las condiciones climáticas durante la ejecución de la obra, del tipo de tecnología empleada para la construcción.

Se debe identificar los impactos del proyecto para reducir, mitigar, corregir o compensar estos impactos negativos, pero así mismo potencializar los positivos.

Impactos típicos causados por la ejecución de una obra civil; Pérdida o alteración de las características físicas y químicas del suelo, generación de procesos erosivos y de inestabilidad. Contaminación de las fuentes de agua por vertimiento de sustancias inertes, tóxicas o biodegradables.

Aumento en los niveles de ruido y emisiones atmosféricas (material particulado, gases y olores) que repercuten sobre la salud de la población, la fauna y la flora. Generación de escombros y otros residuos sólidos.

Modificaciones en el paisaje y alteración de la cobertura vegetal. Cese o interrupción parcial, total, temporal o definitiva de los procesos de producción, distribución y consumo del sector industrial o comercial aledaño. Desplazamiento de población. Alteración del flujo vehicular o peatonal. Alteración o deterioro del espacio público.

Afectación a la infraestructura de servicios públicos e interrupción en la prestación de los mismos. Posibilidades de mitigación de impactos. Aumento de riesgos de ocurrencia de eventos contingentes tales como accidentes potenciales de peatones, vehículos, obreros, daños a estructuras cercanas, incendios, deslizamientos y movimientos en masa.

3.6.1.1. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Los residuos sólidos generados durante el proceso de construcción son de diversos tipos. Una adecuada clasificación de los mismos permitirá reciclar o reutilizar algunos de los

materiales, minimizando así la cantidad de desechos no aprovechables. De esta forma, se reducen costos de disposición final, se optimiza el uso de los materiales y se alcanza un menor impacto ambiental. En la obra se explica la importancia del manejo de los residuos sólidos, se explica su clasificación, y se tienen en la bodega carteleras con esta clasificación.

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS

Estos residuos son entregados a la empresa recolectora de basura, entre estos residuos también se encuentra la ropa de trabajo y calzado desechados. Además se encuentran el PVC, polietileno expandido y otros materiales inertes no recuperables.

MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Se separa los residuos de construcción y demolición de los demás residuos corrientes. La disposición de estos residuos se hace para llenos no estructurales, adecuar vías y senderos peatonales, previa autorización del propietario del lote.

Se optimiza al máximo el uso del espacio ocupado por los escombros, con el fin de reducir las áreas afectadas.

Para el transporte de los escombros se verifica que las volquetas cubran la carga con lona o plástico atendiendo las medidas de manejo enunciadas en la resolución 541 del Ministerio del Medio Ambiente (1994).

Se verifica que no se utilice las zonas públicas para la disposición temporal de materiales sobrantes

MANEJO DE SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN

La disposición de estos residuos se hace para llenos no estructurales, adecuar vías y senderos peatonales, previa autorización del propietario del lote y de la supervisión del municipio. El material procedente de excavaciones no puede interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular, debe estar apilado, bien protegido, acordonado. Se debe evitar la acción erosiva del agua y del viento.

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Lubricantes, aceites, combustibles, sustancias químicas o sus respectivos empaques se separa de los demás tipos de residuos para evitar que se contaminen y crezca el volumen de residuos

para manejar, para darles un manejo especial. Se deben marcar y rotular los recipientes donde se almacenen estos residuos, se deben colocar en lugares libres de humedad y de calor excesivo

RECOMENDACIONES DE TIPO LOGISTICO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

- Es necesario identificar a las personas o entidades que estén interesadas en recibir materiales reciclables o reutilizables, resultantes de las actividades del proyecto.
- Diariamente, al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza general de la zona donde se realicen las obras. Recoger todos los desperdicios, basuras o elementos extraños presentes en el área.
- Una vez concluida la obra, se deberán recoger todos los materiales sobrantes y la señalización provisional utilizados durante su ejecución.
- No se permite la quema de ningún tipo de residuo (Articulo 29 del Decreto 948 de 1995).
- Todo el personal que labora en la obra debe estar informado sobre la obligatoriedad de depositar los residuos en las canecas o contenedores, según su etiqueta y no apilar o dejar los residuos desprotegidos en otras áreas no autorizadas.

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

La contaminación atmosférica generada durante el desarrollo del proyecto, procede de tres fuentes principales: emisiones difusas de material particulado, gases de combustión y ruido generado por la operación de maquinaria y demolición de estructuras.

REDUCCIÓN DE LA EMISIÓN FUGITIVA DE MATERIAL PARTICULADO

La obra se encuentra totalmente cerrada, en la cual han instalado polisombra dejando incomunicado este tramo de vía donde se vienen ejecutando actividades de mejoramiento y limpieza de la fachada de la iglesia San Juan Bautista. Dentro de la obra el contratista adecuo un espacio para el acopio de materiales, para dicha actividad el contratista pide el permiso necesario al propietario para que le dejen acopiar todo tipo de material evitando problemas con la comunidad.

Se prohíbe realizar quemas a cielo abierto, en los sitios donde se adelantan las obras (Articulo 29 del Decreto 948 de 1995);

A continuación, en las fotografías se puede evidenciar el cerramiento perimetral del atrio de la iglesia frente a la fachada y la rotulación de los productos peligrosos que se encuentran en obra.

Fotografía del cerramiento perimetral





Fotografía de la rotulación de los productos químicos





3.6.2. CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se ha llevado un control diario del uso de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores, se observa que todos los utilizan y son conscientes los problemas de salud que les puede llegar a generar el no utilizarlos.

Durante la ejecución de la obra se le solicita al contratista mantener en el lugar de trabajo las hojas de seguridad de los productos químicos que se utilizan en la obra. Lo anterior fue acatado de la mejor manera.

Además se verifica el control que se está siguiendo en cuanto a la dotación de elementos de protección personal a cada uno de los trabajadores de la obra.

Por seguridad y prevención de los trabajadores y de las personas que viven cerca de la obra, se le ha solicitado al contratista señalizar los sitios que puedan ser peligrosos o que produzcan algún tipo de accidente.

Fotografías se evidencia la señalización y demás implementos de seguridad






3.6.2.1. DOTACION DEL PERSONAL DE OBRA

Dirección: Calle 14B N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

Para darle cumplimiento a este capítulo el contratista realizo la entrega de la dotación a cada uno de los obreros que se encuentran hasta la fecha. A continuación en la fotografía se evidencia que el personal tiene, botas punta de acero, casco, guantes, traje impermeable.

Fotografías elementos de seguridad personal



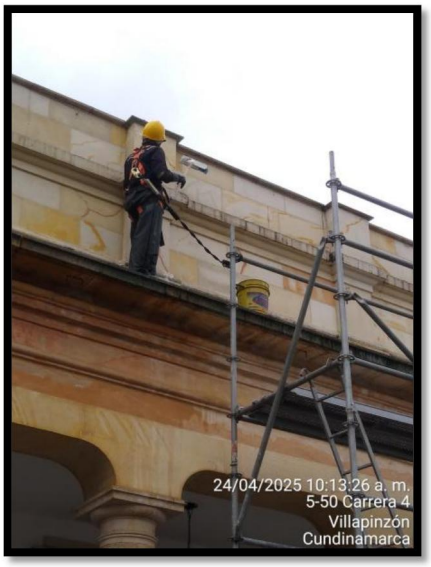




Dirección: Calle 14B N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

4. CONCLUSIONES

- Durante las labores en obra, se ha evidenciado que el personal está haciendo uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y de los equipos requeridos para trabajo en alturas.
- A la fecha, se ha evidenciado un cumplimiento satisfactorio del cronograma de obra, con un avance físico del 100%, correspondiente a las actividades programadas para el segundo mes de ejecución.
  Dicho avance ha sido alcanzado sin presentar contratiempos significativos, lo cual refleja una adecuada planeación, gestión y ejecución por parte del contratista, así como un seguimiento constante por parte de esta interventoría. Este cumplimiento permite proyectar un desarrollo positivo del proyecto en los plazos establecidos contractualmente
- Durante el periodo evaluado, se llevó a cabo un estricto control en los componentes de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo (SST), conforme a los lineamientos establecidos en el contrato y la normativa vigente.
- La interventoría realizó seguimiento continuo a las prácticas implementadas en obra, evidenciando una respuesta positiva por parte del contratista, quien ha atendido las recomendaciones y ha mostrado disposición para mantener condiciones adecuadas en estos frentes. Esta gestión ha permitido el desarrollo seguro y ambientalmente responsable de las actividades ejecutadas.
- Como medida de verificación, las partes involucradas el contratista, la interventoría y la supervisión participaron en la labor de toma de medidas finales. A través de este proceso, se logró un entendimiento completo de los trabajos realizados, alcanzando así un consenso final sobre la conformidad del proyecto.



ING. CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA
INTERVENTOR

Dirección: Calle 14B N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

ANEXO

INFORME FOTOGRÁFICO


Dirección: Calle 14b N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

INFORME FOTOGRAFICO

LIMPIEZA SUPERFICIAL FACHADAS EN PIEDRA. LIMPIEZA MANUELA DE AGUA Y CEPILLO DE CERDA SUAVE





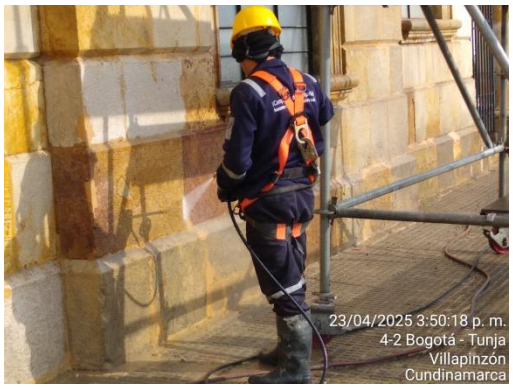





LIMPIEZA SUPERFICIAL RELIEVES EN PIEDRA. LIMPIEZA MANUAL DE AGUA Y CEPILLO DE CERDA SUAVE





Dirección: Calle 14b N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

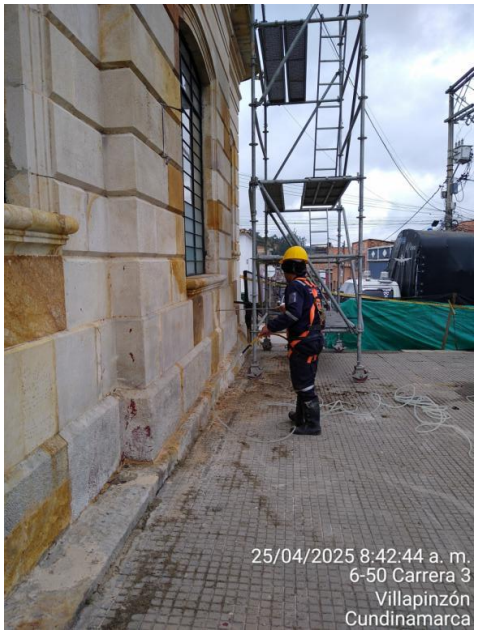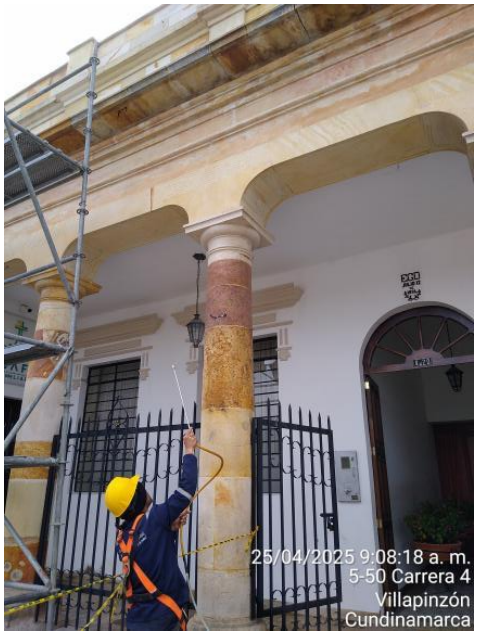DESINFECCIÓN SUPERFICIES EN PIEDRA	
	
	

Dirección: Calle 14b N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242


DESINFECCIÓN SUPERFICIES EN PIEDRA (COSTRAS NEGRAS)	
	
RESANES DE JUNTAS EN MORTERO DE CAL Y ARENISCA 1:1	
	
	


Dirección: Calle 14b N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

- **LIMPIEZA SUPERFICIAL PUERTAS EN MADERA, LIMPIEZA MANUAL CON AGUA Y CEPILLO DE CERDA SUAVE**
- **ELIMINACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN CON PISTOLA DE CALOR**


<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

Dirección: Calle 14b N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

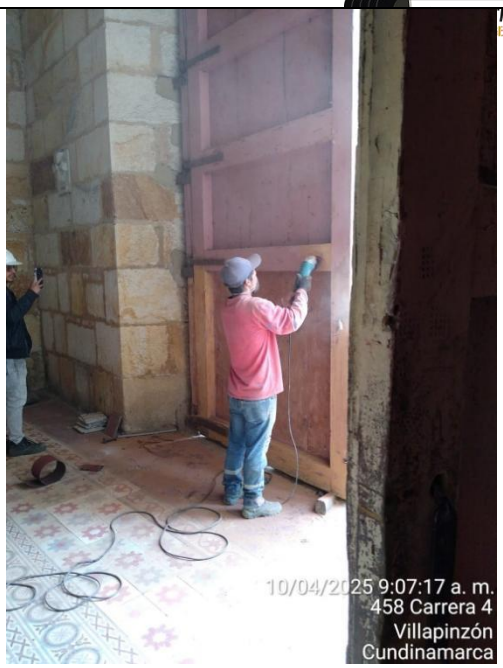
	

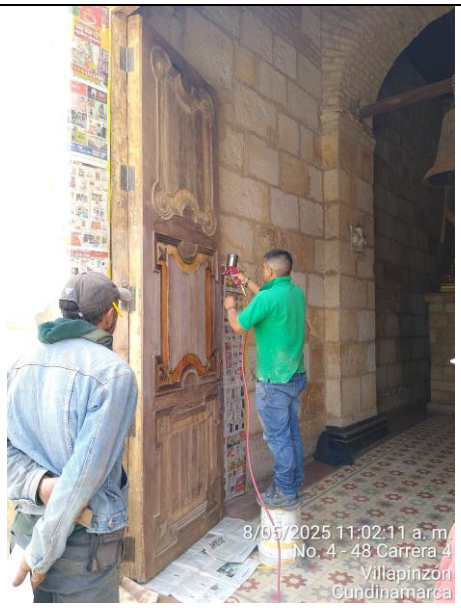PINTURA DE PUERTAS **CURADO DE LAS PUERTAS** **SELLADO DE PUERTAS**	
	

Dirección: Calle 14b N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

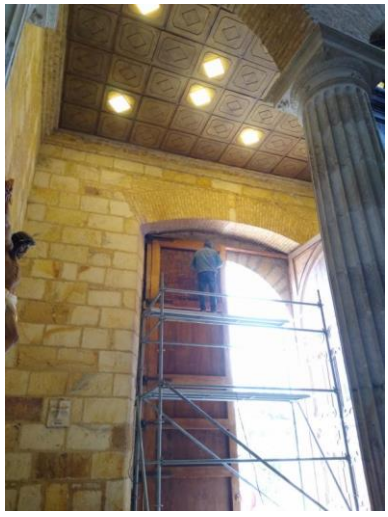Dirección: Calle 14b N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242



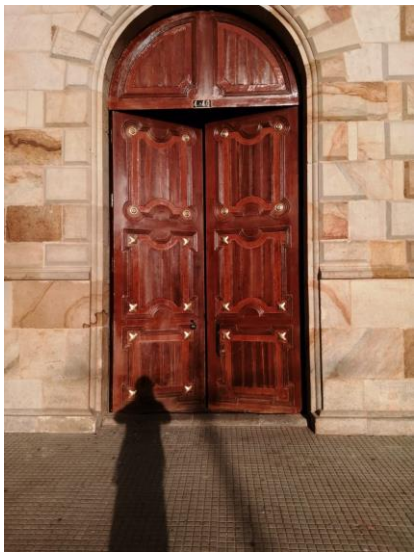






ASEO GENERAL DE OBRA






Dirección: Calle 14b N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

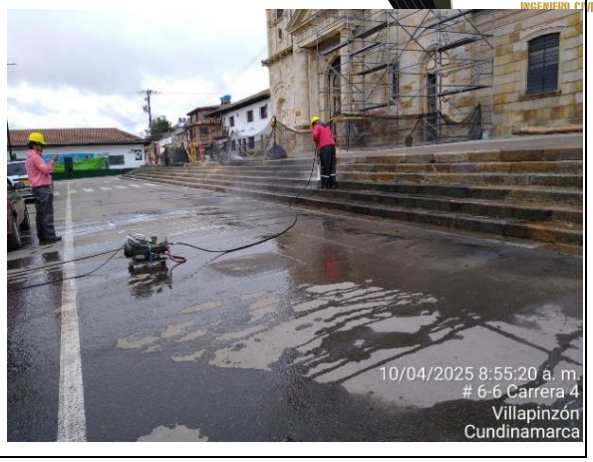FIRMA:



_____

ING. CESAR A. CASTAÑEDA R.
INTERVENTOR

ANEXO
SEGURIDAD SOCIAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Dirección: Calle 14b N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1069263339
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CESAR ALEJANDRO CASTANEDA RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHOCONTA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 4 11	TELÉFONO:	8560000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7967635663**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1461948134		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 57.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 57.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 99.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 99.100**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 28.500
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 42.800
		SUBTOTAL:		**$ 71.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 633.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 633.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1069263339
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CESAR ALEJANDRO CASTANEDA RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHOCONTA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 4 11	TELÉFONO:	8560000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7967635663**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/05/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1461948134

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:			**$ 57.000**	**$ 0**	**$ 57.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 42.800	$ 0	$ 42.800
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 28.500	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES:			**$ 71.300**	**$ 0**	**$ 71.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																		
1	CC 11388498	JIMENEZ RUBIANO DAVID RODRIGO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	106926333	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 633.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1069263339
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CESAR ALEJANDRO CASTANEDA RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHOCONTA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 4 11	TELÉFONO:	8560000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7966691373**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/05/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1464230685

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 28.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 28.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 99.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 99.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 533.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 533.400**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1069263339
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CESAR ALEJANDRO CASTANEDA RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHOCONTA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 4 11	TELÉFONO:	8560000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**7966691373**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1464230685

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 28.500	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES:			**$ 28.500**	**$ 0**	**$ 28.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES										
							COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA																PENSIÓN									SALUD							ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO				ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1069263339	CASTAÑEDA RODRIGUEZ CESAR ALEJANDRO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	106926333	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 533.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1069263339
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CESAR ALEJANDRO CASTANEDA RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHOCONTA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 4 11	TELÉFONO:	8560000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1111866417**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2611191200

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 83.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 83.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 65.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 65.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 25.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 25.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 36.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 36.400**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 19.100
		SUBTOTAL:		**$ 19.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 229.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 229.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1069263339
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CESAR ALEJANDRO CASTANEDA RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHOCONTA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 4 11	TELÉFONO:	8560000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	**1111866417**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2611191200		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.600	$ 0	$ 83.600
SUBTOTALES:										**$ 83.600**	**$ 0**	**$ 83.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 65.300
SUBTOTALES:													**$ 65.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 65.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 36.400	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 36.400
SUBTOTALES:									**$ 36.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 36.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 25.500	$ 0	$ 25.500
SUBTOTALES:			**$ 25.500**	**$ 0**	**$ 25.500**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 19.100	$ 0	$ 19.100
SUBTOTALES:			**$ 19.100**	**$ 0**	**$ 19.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 11388498	JIMENEZ RUBIANO DAVID RODRIGO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO		11															25-14 COLPENSIONES	11	$ 521.950	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.600	EPS005-SANITAS S.A.	11	$ 521.950	$ 65.300	$ 0	$ 65.300	14-11 - ARL SURA	11	$ 521.950	106926333	$ 36.400	11	$ 636.621	CCF24-COMPENSAR	$ 25.500	$ 0	$ 19.100	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 229.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1069263339
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CESAR ALEJANDRO CASTANEDA RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHOCONTA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 4 11	TELÉFONO:	8560000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7970610371**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1538044497

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	R															

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 28.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 28.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 99.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 99.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 533.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 533.400**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1069263339
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CESAR ALEJANDRO CASTANEDA RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHOCONTA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 4 11	TELÉFONO:	8560000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7970610371**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1538044497	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 28.500	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES:			**$ 28.500**	**$ 0**	**$ 28.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1069263339	CASTAÑEDA RODRIGUEZ CESAR ALEJANDRO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO		R-30															230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	106926333	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 533.400

ANEXO
POLIZAS DE INTERVENTORIA

Dirección: Calle 14b N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: SdPF2mp3kzo/3vr7ZVqqTQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100373981	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	72410569	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/03/2025	24:00 Horas Del	11/05/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CASTAÑEDA RODRIGUEZ, CESAR ALEJANDRO	**No. DOC. IDENTIDAD**	1.069.263.339
DIRECCIÓN	MZ 3 CA 11 BRR COLPAZ LAS ACACIAS	**TELÉFONO**	3203763471
ASEGURADO	MUNICIPIO DE VILLAPINZON - CUNDINAMARCA	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.445-3
DIRECCIÓN	CRA 5 # 4-25	**TELÉFONO**	8565243
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE VILLAPINZON - CUNDINAMARCA	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.445-3
DIRECCIÓN	CRA 5 # 4-25	**TELÉFONO**	8565243

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA ASEGURADORA CONOCE Y ACEPTA EL ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DE FECHA 11/05/2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SP-MC-CI-128-2025 , CUYO OBJETO ES

LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 12/03/2025	24:00 Horas Del 11/09/2025	2.016.847,60	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 12/03/2025	24:00 Horas Del 11/05/2028	504.211,90	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 12/03/2025	24:00 Horas Del 11/05/2028	2.016.847,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 4.537.907,10	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUXURY ASESORES EN SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/05/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100373981	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	72410569	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	16/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/03/2025	24:00 Horas Del	11/05/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO Y BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO - IDECUT DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NIT 900.294.905-6

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100373981** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **CASTAÑEDA RODRIGUEZ, CESAR ALEJANDRO** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE VILLAPINZON - CUNDINAMARCA / MUNICIPIO DE VILLAPINZON - CUNDINAMARCA ,** expedida por la Compañía en **16/05/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **16** días del mes **MAYO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

ANEXO
SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

Dirección: Calle 14b N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-18, 11:12:35 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1072772666

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 18/05/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARQUILAT SAS		
Documento	NI900448471	**Dirección**	CR 3 #8 - 23 ALTOS DE BOITIVA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3125873471
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SESQUILE	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	LATORRE HERNANDEZ WILSON ALEXANDER	**Identificación**	CC 3169929
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1077149165	MIGUEL ANGEL GUEVARA ABELLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.638.000	$ 262.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.638.000	$ 65.600	6,960	$ 1.638.000	$ 114.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.638.000	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507.400
CC 3169929	WILSON ALEXANDER LATORRE HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.061.500	$ 3.061.500	$ 3.061.500	$ 3.061.500	$ 489.900	$ 122.600	$ 121.600	$ 122.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 856.700	$ 0	$ 856.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-18, 11:11:23 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1072772703

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 18/05/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARQUILAT SAS		
Documento	NI900448471	**Dirección**	CR 3 #8 - 23 ALTOS DE BOITIVA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3125873471
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SESQUILE	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	LATORRE HERNANDEZ WILSON ALEXANDER	**Identificación**	CC 3169929
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1077149165	MIGUEL ANGEL GUEVARA ABELLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.638.000	$ 262.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.638.000	$ 65.600	6,960	$ 1.638.000	$ 114.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.638.000	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507.400
CC 3169929	WILSON ALEXANDER LATORRE HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.061.500	$ 3.061.500	$ 3.061.500	$ 3.061.500	$ 489.900	$ 122.600	$ 121.600	$ 122.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 856.700	$ 0	$ 856.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3023298	JAVIER WILFREDO GARAY ROMERO	CL 167 No 55 24 IN 3 AP 404	3103091967	jwgaray@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	19/05/2025	86512203	$1.525.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	625.000	0		0		0	0	0	0	625.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	100.000	0	0	100.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	625.000	625.000
Pensión	1	800.000	800.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	100.000	100.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.525.000	1.525.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3023298	JAVIER WILFREDO GARAY ROMERO		CL 167 No 55 24 IN 3 AP 404	3103091967	jwgaray@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	19/05/2025	86512203	$1.525.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	3023298	GARAY ROMERO JAVIER WILFREDO	3	0			N																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	625.000		0		0	CCF24	5.000.000	100.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SEGUROS

EFICAZ - SEDE SUBA
CL 139 # 103 85
6038781-3204159305
SUBALUZ2020@GMAIL.COM

RECIBO No.
026469

Fecha Recibo:2025-05-13

CLIENTE: LUIS ALEXANDER LINARES
IDENTIFICACION: CC-79875472
DIRECCION: 123
PERIODO: 2025-05
TELEFONO: 123
CONCEPTO: Aportes Mes

Cod	Concepto	Vr.Unit	Cant	Vr.Total
EPS	FAMISANAR	40,000	1	40,000
ARL	ARL SURA	25,000	1	25,000
AFP	PROTECCION	81,000	1	81,000
ADM	ADMON	20,000	1	20,000

VALOR EN LETRAS: Ciento sesenta y seis mil Pesos

FORMA DE PAGO : NEQUI

11070560

TOTAL OPERACION:	166,000
DESCUENTO:	0
VR. RECAUDADO:	166,000
SALDO:	0

OBSERVACIONES: CANCELA APORTES DE 15 DIAS CON NOVEDAD DE RETIRO
NOTA IMPORTANTE: NO OLVIDE REALIZAR SUS PAGOS LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES

CANCELADO

Nuestras Cuentas Para Realizar Consignaciones
 # Cuenta 060358173 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera BANCO DE BOGOTA
 # Cuenta 3162546251 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera NEQUI

Firma Recibido
ORIGINAL

Elaborado Por: CLAUDIA ORTIZ

Fecha de Impresion: 2025-05-13 16:32:23

Planilla Resumen General de Pago

Datos Generales del Aportante								
Identificacion	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
901743603	8	ACABADOS GREGORELLI S.A.S	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	NA	BOGOTA, D.C.	NA	SI

Datos Generales de la Liquidacion									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	10226469	4010226469	E	2025-06-13	2025-05-13	AV VILLAS	0	146,000

Liquidacion Detallada de Aportes

TD	EMPLEADO		N	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Ident.	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aportes
CC	79875472	LUIS LINARES		230201	30	1,423,500	81,000	EPS017	30	1,423,500	40,000			0	0	14-11	30	1,423,500	25,000	0	0	0

SEGUROS

EFICAZ - SEDE SUBA
CL 139 # 103 85
6038781-3204159305
SUBALUZ2020@GMAIL.COM

RECIBO No.
026082

Fecha Recibo:2025-04-14

CLIENTE: LUIS ALEXANDER LINARES
IDENTIFICACION: CC-79875472
DIRECCION: 123 **TELEFONO:** 123
PERIODO: 2025-04 **CONCEPTO:** Aportes Mes

Cod	Concepto	Vr.Unit	Cant	Vr.Total
EPS	**FAMISANAR**	**82,000**	**1**	**82,000**
ARL	**ARL SURA**	**70,000**	**1**	**70,000**
AFP	**PROTECCION**	**154,000**	**1**	**154,000**
ADM	**ADMON**	**25,000**	**1**	**25,000**

VALOR EN LETRAS: **Trescientos treinta y una mil Pesos**
FORMA DE PAGO : **NEQUI**
1332236

TOTAL OPERACION:	**331,000**
DESCUENTO:	**0**
VR. RECAUDADO:	**331,000**
SALDO:	**0**

OBSERVACIONES: APORTES POR FECHA DE INGRESO
NOTA IMPORTANTE: NO OLVIDE REALIZAR SUS PAGOS LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES

CANCELADO

Nuestras Cuentas Para Realizar Consignaciones
 # Cuenta 060358173 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera BANCO DE BOGOTA
 # Cuenta 3162546251 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera NEQUI

_____
Firma Recibido

ORIGINAL Elaborado Por: CLAUDIA ORTIZ Fecha de Impresion: 2025-04-14 16:21:09

Scanned with CamScanner

Planilla Resumen General de Pago

Datos Generales del Aportante

Identificacion	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
901743603	8	ACABADOS GREGORELLI S.A.S	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	NA	BOGOTA, D.C.	NA	SI

Datos Generales de la Liquidacion

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	10226470	4010226470	E	2025-06-10	2025-05-13	AV VILLAS	0	146,000

Liquidacion Detallada de Aportes

TD	EMPLEADO		N	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Ident.	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aportes
CC	1081418847	LUIS CARLOS ULTENGO PAJOY	I	230301	30	1,423,500	81,000	EPS037	30	1,423,500	40,000			0	0	14-11	30	1,423,500	25,000	0	0	0

SEGUROS

EFICAZ - SEDE SUBA
CL 139 # 103 85
6038781-3204159305
SUBALUZ2020@GMAIL.COM

RECIBO No.
026470

Fecha Recibo:2025-05-13

CLIENTE: LUIS CARLOS ULTENGO PAJOY
IDENTIFICACION: CC-1081418847
DIRECCION: 0
PERIODO: 2025-05
TELEFONO: 0
CONCEPTO: Aportes Mes

Cod	Concepto	Vr.Unit	Cant	Vr.Total
EPS	NUEVA EPS	40,000	1	40,000
ARL	ARL SURA	25,000	1	25,000
AFP	PORVENIR	81,000	1	81,000
ADM	ADMON	20,000	1	20,000

VALOR EN LETRAS: Ciento sesenta y seis mil Pesos

FORMA DE PAGO : NEQUI

11070560

TOTAL OPERACION:	166,000
DESCUENTO:	0
VR. RECAUDADO:	166,000
SALDO:	0

OBSERVACIONES: CANCELA APORTE DE 15 DIAS CON NOVEDAD DE RETIRO
NOTA IMPORTANTE: NO OLVIDE REALIZAR SUS PAGOS LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES

CANCELADO

Nuestras Cuentas Para Realizar Consignaciones
 # Cuenta 060358173 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera BANCO DE BOGOTA
 # Cuenta 3162546251 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera NEQUI

Firma Recibido
ORIGINAL

Elaborado Por: CLAUDIA ORTIZ

Fecha de Impresion: 2025-05-13 16:36:16

Planilla Resumen General de Pago

Datos Generales del Aportante

Identificacion	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
999999999	9	AFILIADOS INDEPENDIENTES	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 68 # 6-50	CALI	444444444	SI

Datos Generales de la Liquidacion

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	10226468	4010226468	E	2025-06-10	2025-05-13	AV VILLAS	0	290,000

Liquidacion Detallada de Aportes

TD	EMPLEADO		N	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Ident.	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aportes
CC	79820166	SALOMON PORRAS				0	0	EPS017	30	1,423,500	185,000			0	0	14-11	30	1,423,500	105,000	0	0	0

SEGUROS

EFICAZ - SEDE SUBA
CL 139 # 103 85
6038781-3204159305
SUBALUZ2020@GMAIL.COM

RECIBO No.
026468

Fecha Recibo:2025-05-13

CLIENTE: SALOMON PORRAS
IDENTIFICACION: CC-79820166
DIRECCION: 0
PERIODO: 2025-04
TELEFONO: 0
CONCEPTO: Aportes Mes

Cod	Concepto	Vr.Unit	Cant	Vr.Total
EPS	FAMISANAR	185,000	1	185,000
ARL	ARL SURA	105,000	1	105,000
ADM	ADMON	25,000	1	25,000

VALOR EN LETRAS: Trescientos quince mil Pesos
FORMA DE PAGO : NEQUI

TOTAL OPERACION:	315,000
DESCUENTO:	0
VR. RECAUDADO:	315,000
SALDO:	0

NOTA IMPORTANTE: NO OLVIDE REALIZAR SUS PAGOS LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES

Nuestras Cuentas Para Realizar Consignaciones
 # Cuenta 060358173 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera BANCO DE BOGOTA
 # Cuenta 3162546251 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera NEQUI

CANCELADO

Firma Recibido
ORIGINAL

Elaborado Por: CLAUDIA ORTIZ

Fecha de Impresion: 2025-05-13 16:26:24

SEGUROS

EFICAZ - SEDE SUBA
CL 139 # 103 85
6038781-3204159305
SUBALUZ2020@GMAIL.COM

RECIBO No.
026081

Fecha Recibo:2025-04-14

CLIENTE: HECTOR HERNANDO HOYOS COMETA
IDENTIFICACION: CC-79888663
DIRECCION: 123
PERIODO: 2025-04
TELEFONO: 133
CONCEPTO: Aportes Mes

Cod	Concepto	Vr.Unit	Cant	Vr.Total
EPS	FAMISANAR	82,000	1	82,000
ARL	ARL SURA	70,000	1	70,000
AFP	PORVENIR	154,000	1	154,000
ADM	ADMON	25,000	1	25,000

VALOR EN LETRAS: **Trescientos treinta y una mil Pesos**

FORMA DE PAGO : **NEQUI**

1332236

TOTAL OPERACION:	**331,000**
DESCUENTO:	**0**
VR. RECAUDADO:	**331,000**
SALDO:	**0**

OBSERVACIONES: APORTES POR FECHA DE INGRESO
NOTA IMPORTANTE: NO OLVIDE REALIZAR SUS PAGOS LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES

CANCELADO

Nuestras Cuentas Para Realizar Consignaciones
 # Cuenta 060358173 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera BANCO DE BOGOTA
 # Cuenta 3162546251 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera NEQUI

Firma Recibido
ORIGINAL

Elaborado Por: CLAUDIA ORTIZ

Fecha de Impresion: 2025-04-14 16:17:17

SEGUROS

EFICAZ - SEDE SUBA
CL 139 # 103 85
6038781-3204159305
SUBALUZ2020@GMAIL.COM

RECIBO No.
026082

Fecha Recibo:2025-04-14

CLIENTE: LUIS ALEXANDER LINARES
IDENTIFICACION: CC-79875472
DIRECCION: 123
PERIODO: 2025-04
TELEFONO: 123
CONCEPTO: Aportes Mes

Cod	Concepto	Vr.Unit	Cant	Vr.Total
EPS	FAMISANAR	82,000	1	82,000
ARL	ARL SURA	70,000	1	70,000
AFP	PROTECCION	154,000	1	154,000
ADM	ADMON	25,000	1	25,000

VALOR EN LETRAS: Trescientos treinta y una mil Pesos

FORMA DE PAGO : NEQUI

1332236

TOTAL OPERACION:	331,000
DESCUENTO:	0
VR. RECAUDADO:	331,000
SALDO:	0

OBSERVACIONES: APORTES POR FECHA DE INGRESO
NOTA IMPORTANTE: NO OLVIDE REALIZAR SUS PAGOS LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES

CANCELADO

Nuestras Cuentas Para Realizar Consignaciones
 # Cuenta 060358173 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera BANCO DE BOGOTA
 # Cuenta 3162546251 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera NEQUI

Firma Recibido
ORIGINAL

Elaborado Por: CLAUDIA ORTIZ

Fecha de Impresion: 2025-04-14 16:21:09

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3023298	JAVIER WILFREDO GARAY ROMERO	CL 167 No 55 24 IN 3 AP 404	3103091967	jwgaray@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	16/06/2025	87321998	$1.525.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	625.000	0		0		0	0	0	0	625.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	100.000	0	0	100.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	625.000	625.000
Pensión	1	800.000	800.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	100.000	100.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.525.000	1.525.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3023298	JAVIER WILFREDO GARAY ROMERO	CL 167 No 55 24 IN 3 AP 404	3103091967	jwgaray@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	16/06/2025	87321998	$1.525.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	3023298	GARAY ROMERO JAVIER WILFREDO	3	0			N																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	625.000		0		0	CCF24	5.000.000	100.000	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



ANEXO
DOCUMENTOS SOLICITADOS

Dirección: Calle 14b N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

FECHA: 03 / 05 / 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ZONAL/CFP/UFP/ÁREA: parroquia San Juan bautista villa pinzon

SEMESTRE / PERIODO: 01 - 29-25

MÓDULO FORMATIVO / CURSO: coordinador

PROYECTO / TAREA / ACTIVIDAD: desarmada cardamino y sellado piedra en parroquia

INSTRUCTOR / COLABORADOR RESPONSABLE: luis alexander piedra

Repaso de preguntas antes de iniciar una tarea:
1. ¿Qué tengo qué hacer?
2. ¿Cómo lo voy a hacer?
3. ¿Qué necesito para hacerlo?
4. ¿Es posible que me pueda accidentar?
5. ¿Qué haré para evitarlo?

II. TRABAJOS DEFINIDOS DE ALTO RIESGO. Ud. Deberá solicitar autorización para su realización

1. Trabajo en altura (mayor a 1.8 mt).	X	3. Trabajos de izaje y montaje de estructuras.		5. Trabajos en subestaciones eléctricas.	
2. Trabajos en espacios confinados.		4. Trabajos en caliente, corte, soldadura u otros que generan chispas.		6. Trabajos con materiales peligrosos.	X

III. ANÁLISIS DE RIESGOS

A) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - USO OBLIGATORIO (Marca con una "X").

Protección Ocular	Protección Auditiva	Guantes de Seguridad	Guantes aislantes	Botas Aislantes	Botas de Seguridad	Ropa de Trabajo	Casco de proteccion	Mascarilla	Máscara para Soldar
X	X	X			X	X	X	X	

B) ADVERTENCIA (Marca con una "X")

Riesgo Auditivo	Soldadura	Riesgo Eléctrico	Atrapamiento de Manos	Caída de Objetos	Piso resbaladizo	Riesgo de Explosión	Peligro Inflamable	Cuidado gas Comprimido	Riesgo de Accidentes

C) MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a utilizar)

fumigadora arma
eslingas cuerdas

D) ACTIVIDADES A REALIZAR

N°	Tarea / Actividad Operativa	Identificar Peligro	Riesgo	Medidas de control
1	desarmada y andamio y	caidas	A. Altura	utilizar EPP
2	sellado de piedra			contra caidas
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

IV. LISTA DE PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMA
1	Luis alexander Linares	74874572	
2	Golver on Pavos	79870766	
3	Luis carlos ufiengo	1081418847	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

VI. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

○	Peligrosos	☐
●	No reaprovechables	☐
○	Varios Aprovechables (vidrio, otros)	☐
○	Plásticos	☐
○	Papel y Cartón	☐
○	Metal	☐
●	Orgánicos	☐

Otros (Especificar):

Riesgo Quimico

Descripción de la eliminación de residuos sólidos:

V. REPORTE DE INCIDENTES:

Información importante que puede evitar accidentes.

¿Se identificaron incidentes durante la jornada de trabajo?

SI ☐ NO ☒

De ser afirmativo generar el reporte de incidente y entregar al Jefe o Superior.

INCIDENTE	REPORTADO POR:

Luis alexander linares

Nombre/Apellido y firma del Instructor / Colaborador Responsable de la tarea operativa

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

FECHA: 02 / 07 / 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ZONAL/CFP/UFP/ÁREA: Parroquia San Juan bautista billa piazon

SEMESTRE / PERIODO: 201. To. 25

MÓDULO FORMATIVO / CURSO: coordinador

PROYECTO / TAREA / ACTIVIDAD: invitacion Pintura y Sellado

INSTRUCTOR / COLABORADOR RESPONSABLE: Luis alexander Tinajero

Repaso de preguntas antes de iniciar una tarea:
1. ¿Qué tengo qué hacer?
2. ¿Cómo lo voy a hacer?
3. ¿Qué necesito para hacerlo?
4. ¿Es posible que me pueda accidentar?
5. ¿Qué haré para evitarlo?

II. TRABAJOS DEFINIDOS DE ALTO RIESGO. Ud. Deberá solicitar autorización para su realización

1. Trabajo en altura (mayor a 1.8 mt).	X	3. Trabajos de izaje y montaje de estructuras.		5. Trabajos en subestaciones eléctricas.	
2. Trabajos en espacios confinados.		4. Trabajos en caliente, corte, soldadura u otros que generan chispas.		6. Trabajos con materiales peligrosos.	X

III. ANÁLISIS DE RIESGOS

A) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - USO OBLIGATORIO (Marca con una "X").

Protección Ocular	Protección Auditiva	Guantes de Seguridad	Guantes aislantes	Botas Aislantes	Botas de Seguridad	Ropa de Trabajo	Casco de proteccion	Mascarilla	Mascara para Soldar
X			X		X	X	X	X	

B) ADVERTENCIA (Marca con una "X")

Riesgo Auditivo	Soldadura	Riesgo Eléctrico	Atrapamiento de Manos	Caida de Objetos	Piso resbaladizo	Riesgo de Explosión	Peligro Inflamable	Cuidado gas Comprimido	Riesgo de Accidentes

C) MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a utilizar)

arco, eslingas, espatulas, palustres, maquina de hidro lavadora

D) ACTIVIDADES A REALIZAR

N°	Tarea / Actividad Operativa	Identificar Peligro	Riesgo	Medidas de control
1	Pintura invitacion Piedra	caidas	Natural	Utilizar equipos con de caidas
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

IV. LISTA DE PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMA
1	Luis alexander Linares	79875472	
2	Solomon Lovos	79870766	
3	Luis carlos Ulitengo	81418847	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

VI. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

○	Peligrosos	☐
●	No reaprovechables	☐
○	Varios Aprovechables (vidrio, otros)	☐
○	Plásticos	☐
○	Papel y Cartón	☐
○	Metal	☐
●	Orgánicos	☐

Otros (Especificar):

Riesgos Quimicos

Descripción de la eliminación de residuos sólidos:

V. REPORTE DE INCIDENTES:

Información importante que puede evitar accidentes.

¿Se identificaron incidentes durante la jornada de trabajo?

SI ☐ NO ☒

De ser afirmativo generar el reporte de incidente y entregar al Jefe o Superior.

INCIDENTE	REPORTADO POR:

Luis alexander linares

Nombre/Apellido y firma del Instructor / Colaborador Responsable de la tarea operativa

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

FECHA: 30 / 04 / 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ZONAL/CFP/UFP/ÁREA: Parroquia Sangun bautista villapiuzon
SEMESTRE / PERIODO: - 01 - 20-25
MÓDULO FORMATIVO / CURSO: cordinador
PROYECTO / TAREA / ACTIVIDAD: iglesia villa piuzon actividad lavado con quimico
INSTRUCTOR / COLABORADOR RESPONSABLE: Ivel alexander linares

Repaso de preguntas antes de iniciar una tarea:
1. ¿Qué tengo qué hacer?
2. ¿Cómo lo voy a hacer?
3. ¿Qué necesito para hacerlo?
4. ¿Es posible que me pueda accidentar?
5. ¿Qué haré para evitarlo?

II. TRABAJOS DEFINIDOS DE ALTO RIESGO. Ud. Deberá solicitar autorización para su realización

1. Trabajo en altura (mayor a 1.8 mt).	X	3. Trabajos de izaje y montaje de estructuras.		5. Trabajos en subestaciones eléctricas.	
2. Trabajos en espacios confinados.		4. Trabajos en caliente, corte, soldadura u otros que generan chispas.		6. Trabajos con materiales peligrosos.	X

III. ANÁLISIS DE RIESGOS

A) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - USO OBLIGATORIO (Marca con una "X").

Protección Ocular	Protección Auditiva	Guantes de Seguridad	Guantes aislantes	Botas Aislantes	Botas de Seguridad	Ropa de Trabajo	Casco de proteccion	Mascarilla	Máscara para Soldar
X	X		X		X	X	X	X	

B) ADVERTENCIA (Marca con una "X")

Riesgo Auditivo	Soldadura	Riesgo Eléctrico	Atrapamiento de Manos	Caída de Objetos	Piso resbaladizo	Riesgo de Explosión	Peligro Inflamable	Cuidado gas Comprimido	Riesgo de Accidentes

C) MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a utilizar)

D) ACTIVIDADES A REALIZAR

N°	Tarea / Actividad Operativa	Identificar Peligro	Riesgo	Medidas de control
1	lavado con quimico desinfeccion	caidas y quemadu	14 horas	utilizar equipos contra caidas
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

IV. LISTA DE PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMA
1	Luis alexander Tinoco	29878472	
2	luis carlos ulfengo	1081418847	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

VI. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

●	Peligrosos	☐
●	No reaprovechables	☐
●	Varios Aprovechables (vidrio, otros)	☐
○	Plásticos	☐
●	Papel y Cartón	☐
○	Metal	☐
●	Orgánicos	☐

Otros (Especificar):

Riesgo químico

Descripción de la eliminación de residuos sólidos:

V. REPORTE DE INCIDENTES:

Información importante que puede evitar accidentes.

¿Se identificaron incidentes durante la jornada de trabajo?

SI ☐ NO ☒

De ser afirmativo generar el reporte de incidente y entregar al Jefe o Superior.

INCIDENTE	REPORTADO POR:

luis alexander tinoco

Nombre, Apellido y firma del Instructor / Colaborador Responsable de la tarea operativa

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

FECHA: 29 '04' 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ZONAL/CFP/UFP/ÁREA: Parroquia San Juan bautista villa Pinzon

SEMESTRE / PERIODO: 01 - 28.25

MÓDULO FORMATIVO / CURSO: Cordinador

PROYECTO / TAREA / ACTIVIDAD: Iglesia villa Pinzon actividad trabajos varios

INSTRUCTOR / COLABORADOR RESPONSABLE: Ivit Alexander Suarez

Repaso de preguntas antes de iniciar una tarea:
1. ¿Qué tengo qué hacer?
2. ¿Cómo lo voy a hacer?
3. ¿Qué necesito para hacerlo?
4. ¿Es posible que me pueda accidentar?
5. ¿Qué haré para evitarlo?

II. TRABAJOS DEFINIDOS DE ALTO RIESGO. Ud. Deberá solicitar autorización para su realización

1. Trabajo en altura (mayor a 1.8 mt).	X	3. Trabajos de izaje y montaje de estructuras.		5. Trabajos en subestaciones eléctricas.	
2. Trabajos en espacios confinados.		4. Trabajos en caliente, corte, soldadura u otros que generan chispas.		6. Trabajos con materiales peligrosos.	X

III. ANÁLISIS DE RIESGOS

A) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - USO OBLIGATORIO (Marca con una "X").

Protección Ocular	Protección Auditiva	Guantes de Seguridad	Guantes aislantes	Botas Aislantes	Botas de Seguridad	Ropa de Trabajo	Casco de proteccion	Mascarilla	Máscara para Soldar
X	X		X		X	X	X	X	

B) ADVERTENCIA (Marca con una "X")

Riesgo Auditivo	Soldadura	Riesgo Eléctrico	Atrapamiento de Manos	Caída de Objetos	Piso resbaladizo	Riesgo de Explosión	Peligro Inflamable	Cuidado gas Comprimido	Riesgo de Accidentes

C) MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a utilizar)

arnes hidrolavadora
cs lluvias cuerdas

D) ACTIVIDADES A REALIZAR

N°	Tarea / Actividad Operativa	Identificar Peligro	Riesgo	Medidas de control
1	Lavado con quimicos y trabajos de pintura	caidas y quimicos	quimico y altura	utilizar equipo y cuerdas para quimicos
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

IV. LISTA DE PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMA
1	Yuri alexandra Linares	79875412	
2	Luis carlos ulfengo	1081418847	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

V. REPORTE DE INCIDENTES:

Información importante que puede evitar accidentes.

¿Se identificaron incidentes durante la jornada de trabajo?

SI ☐ NO ☐

De ser afirmativo generar el reporte de incidente y entregar al Jefe o Superior.

INCIDENTE	REPORTADO POR:

VI. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

●	Peligrosos	☐
●	No reaprovechables	☐
●	Varios Aprovechables (vidrio, otros)	☐
○	Plásticos	☐
●	Papel y Cartón	☐
○	Metal	☐
●	Orgánicos	☐

Otros (Especificar):

Descripción de la eliminación de residuos sólidos:

Nombre/Apellido y firma del Instructor / Colaborador Responsable de la tarea operativa

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

FECHA: 28 / 04 / 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ZONAL/CFP/UFP/ÁREA: parroquia San Juan bautista villa Pinzon
SEMESTRE / PERIODO: I - 01 - 2025
MÓDULO FORMATIVO / CURSO: Coordinador
PROYECTO / TAREA / ACTIVIDAD: Pillado Piedra y pintura in, tation Piedra
INSTRUCTOR / COLABORADOR RESPONSABLE: Luis Eduardo Tuarez

Repaso de preguntas antes de iniciar una tarea:
1. ¿Qué tengo qué hacer?
2. ¿Cómo lo voy a hacer?
3. ¿Qué necesito para hacerlo?
4. ¿Es posible que me pueda accidentar?
5. ¿Qué haré para evitarlo?

II. TRABAJOS DEFINIDOS DE ALTO RIESGO. Ud. Deberá solicitar autorización para su realización

1. Trabajo en altura (mayor a 1.8 mt).	X	3. Trabajos de izaje y montaje de estructuras.		5. Trabajos en subestaciones eléctricas.	
2. Trabajos en espacios confinados.		4. Trabajos en caliente, corte, soldadura u otros que generan chispas.		6. Trabajos con materiales peligrosos.	X

III. ANÁLISIS DE RIESGOS

A) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - USO OBLIGATORIO (Marca con una "X").

									
Protección Ocular	Protección Auditiva	Guantes de Seguridad	Guantes aislantes	Botas Aislantes	Botas de Seguridad	Ropa de Trabajo	Casco de proteccion	Mascarilla	Máscara para Soldar

B) ADVERTENCIA (Marca con una "X")

									
Riesgo Auditivo	Soldadura	Riesgo Eléctrico	Atrapamiento de Mnaos	Caida de Objetos	Piso resbaladizo	Riesgo de Explosión	Peligro Inflamable	Cuidado gas Comprimido	Riesgo de Accidentes

C) MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a utilizar)

D) ACTIVIDADES A REALIZAR

N°	Tarea / Actividad Operativa	Identificar Peligro	Riesgo	Medidas de control
1	Impermeabilizacion y	caidas	altura	utilizar equipo
2	Pintura en Piedra y			de seguridad
3				como casco
4				y cuidado
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

IV. LISTA DE PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMA
1	Luis carlos Vilengo	1081418847	
2	Sonia Tasayco	29257[illegible]	
3	Luis Alexander Linares	74875472	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

VI. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

●	Peligrosos	☐
●	No reaprovechables	☐
●	Varios Aprovechables (vidrio, otros)	☐
○	Plásticos	☐
●	Papel y Cartón	☐
○	Metal	☐
●	Orgánicos	☐

Otros (Especificar):

Químicos Peligrosos

Descripción de la eliminación de residuos sólidos:

V. REPORTE DE INCIDENTES:

Información importante que puede evitar accidentes.

¿Se identificaron incidentes durante la jornada de trabajo?

SI ☐ NO ☒

De ser afirmativo generar el reporte de incidente y entregar al Jefe o Superior.

INCIDENTE	REPORTADO POR:

Luis Alexander Linares

Nombre/Apellido y firma del Instructor / Colaborador Responsable de la tarea operativa

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

FECHA: 25 / 04 / 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ZONAL/CFP/UFP/ÁREA: Parroquia Sanjuan bautista villa Pinzon
SEMESTRE / PERIODO: I - 0 - 20.25
MÓDULO FORMATIVO / CURSO: cordinador Alturas
PROYECTO / TAREA / ACTIVIDAD: iglesia villa Pinzon desinfeccion y sellado
INSTRUCTOR / COLABORADOR RESPONSABLE: Luis alexander Tuarez

Repaso de preguntas antes de iniciar una tarea:
1. ¿Qué tengo qué hacer?
2. ¿Cómo lo voy a hacer?
3. ¿Qué necesito para hacerlo?
4. ¿Es posible que me pueda accidentar?
5. ¿Qué haré para evitarlo?

II. TRABAJOS DEFINIDOS DE ALTO RIESGO. Ud. Deberá solicitar autorización para su realización

1. Trabajo en altura (mayor a 1.8 mt).	X	3. Trabajos de izaje y montaje de estructuras.		5. Trabajos en subestaciones eléctricas.	
2. Trabajos en espacios confinados.		4. Trabajos en caliente, corte, soldadura u otros que generan chispas.		6. Trabajos con materiales peligrosos.	X

III. ANÁLISIS DE RIESGOS

A) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - USO OBLIGATORIO (Marca con una "X").

Protección Ocular	Protección Auditiva	Guantes de Seguridad	Guantes aislantes	Botas Aislantes	Botas de Seguridad	Ropa de Trabajo	Casco de proteccion	Mascarilla	Máscara para Soldar
		X			X	X	X	X	

B) ADVERTENCIA (Marca con una "X")

Riesgo Auditivo	Soldadura	Riesgo Eléctrico	Atrapamiento de Mnaos	Caída de Objetos	Piso resbaladizo	Riesgo de Explosión	Peligro Inflamable	Cuidado gas Comprimido	Riesgo de Accidentes

C) MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a utilizar)

eppes eslingas
fumigadora

D) ACTIVIDADES A REALIZAR

N°	Tarea / Actividad Operativa	Identificar Peligro	Riesgo	Medidas de control
1	desinfeccion y sellado piedra	caidas	Alturas	utilizar equipos de seguridad
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

IV. LISTA DE PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMA
1	Luis alexander linares	79875477	
2	Luis carlos ulfengo	1031418847	
3	Salomon Pantoja	79620766	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

VI. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

●	Peligrosos	☐
●	No reaprovechables	☐
●	Varios Aprovechables (vidrio, otros)	☐
○	Plásticos	☐
●	Papel y Cartón	☐
○	Metal	☐
●	Orgánicos	☐

Otros (Especificar):

Químicos

Descripción de la eliminación de residuos sólidos:

V. REPORTE DE INCIDENTES:

Información importante que puede evitar accidentes.

¿Se identificaron incidentes durante la jornada de trabajo?

SI ☐ NO ☒

De ser afirmativo generar el reporte de incidente y entregar al Jefe o Superior.

INCIDENTE	REPORTADO POR:

Luis alexander Linares

Nombre, Apellido y firma del Instructor / Colaborador Responsable de la tarea operativa

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

FECHA: 24 04 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ZONAL/CFP/UFP/ÁREA: Parroquia Sanjuan bautista villa pinzon
SEMESTRE / PERIODO: - 01 - 20-25
MÓDULO FORMATIVO / CURSO: cordinador
PROYECTO / TAREA / ACTIVIDAD: iglesia villa pinzon actividad lavado piedra cerca via.
INSTRUCTOR / COLABORADOR RESPONSABLE: luis alexander limares

Repaso de preguntas antes de iniciar una tarea:
1. ¿Qué tengo qué hacer?
2. ¿Cómo lo voy a hacer?
3. ¿Qué necesito para hacerlo?
4. ¿Es posible que me pueda accidentar?
5. ¿Qué haré para evitarlo?

II. TRABAJOS DEFINIDOS DE ALTO RIESGO. Ud. Deberá solicitar autorización para su realización

1. Trabajo en altura (mayor a 1.8 mt).	X	3. Trabajos de izaje y montaje de estructuras.		5. Trabajos en subestaciones eléctricas.	
2. Trabajos en espacios confinados.		4. Trabajos en caliente, corte, soldadura u otros que generan chispas.		6. Trabajos con materiales peligrosos.	X

III. ANÁLISIS DE RIESGOS

A) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - USO OBLIGATORIO (Marca con una "X").

Protección Ocular	Protección Auditiva	Guantes de Seguridad	Guantes aislantes	Botas Aislantes	Botas de Seguridad	Ropa de Trabajo	Casco de proteccion	Mascarilla	Máscara para Soldar
X		X			X	X	X	X	

B) ADVERTENCIA (Marca con una "X")

Riesgo Auditivo	Soldadura	Riesgo Eléctrico	Atrapamiento de Mnaos	Caída de Objetos	Piso resbaladizo	Riesgo de Explosión	Peligro Inflamable	Cuidado gas Comprimido	Riesgo de Accidentes

C) MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a utilizar)

Eslingas arnes Hidrolavadora extinciones mangueras espatulas

D) ACTIVIDADES A REALIZAR

N°	Tarea / Actividad Operativa	Identificar Peligro	Riesgo	Medidas de control
1	Lavado de piedra con rinse restaurador	caidas	Altura	utilizar los equipos contra caidas
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

IV. LISTA DE PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMA
1	luis alexandir linares	79875472	
2	Salomon Porros	79820766	
3	luis carlos ultengo	10814198 47	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

VI. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

○	Peligrosos	☐
●	No reaprovechables	☐
○	Varios Aprovechables (vidrio, otros)	☐
○	Plásticos	☐
○	Papel y Cartón	☐
○	Metal	☐
○	Orgánicos	☐

Otros (Especificar):

Riesgo Quimico

Descripción de la eliminación de residuos sólidos:

V. REPORTE DE INCIDENTES:

Información importante que puede evitar accidentes.

¿Se identificaron incidentes durante la jornada de trabajo?

SI [ ] NO [X]

De ser afirmativo generar el reporte de incidente y entregar al Jefe o Superior.

INCIDENTE	REPORTADO POR:

luis alexandir linares

Nombre, Apellido y firma del Instructor / Colaborador Responsable de la tarea operativa

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

FECHA: 23 / 04 / 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ZONAL/CFP/UFP/ÁREA: Parroquia San juan bautista villa pinzon

SEMESTRE / PERIODO: 0-20-25

MÓDULO FORMATIVO / CURSO: cordinador alturas

PROYECTO / TAREA / ACTIVIDAD: parroquia sanjuan bautista - Resanes piedra i lavado

INSTRUCTOR / COLABORADOR RESPONSABLE: luis alexander linares

Repaso de preguntas antes de iniciar una tarea:
1. ¿Qué tengo qué hacer?
2. ¿Cómo lo voy a hacer?
3. ¿Qué necesito para hacerlo?
4. ¿Es posible que me pueda accidentar?
5. ¿Qué haré para evitarlo?

II. TRABAJOS DEFINIDOS DE ALTO RIESGO. Ud. Deberá solicitar autorización para su realización

1. Trabajo en altura (mayor a 1.8 mt).	X	3. Trabajos de izaje y montaje de estructuras.		5. Trabajos en subestaciones eléctricas.	
2. Trabajos en espacios confinados.		4. Trabajos en caliente, corte, soldadura u otros que generan chispas.		6. Trabajos con materiales peligrosos.	X

III. ANÁLISIS DE RIESGOS

A) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - USO OBLIGATORIO (Marca con una "X").

Protección Ocular	Protección Auditiva	Guantes de Seguridad	Guantes aislantes	Botas Aislantes	Botas de Seguridad	Ropa de Trabajo	Casco de proteccion	Mascarilla	Máscara para Soldar
X		X			X	X	X	X	

B) ADVERTENCIA (Marca con una "X")

Riesgo Auditivo	Soldadura	Riesgo Eléctrico	Atrapamiento de Mnaos	Caida de Objetos	Piso resbaladizo	Riesgo de Explosión	Peligro Inflamable	Cuidado gas Comprimido	Riesgo de Accidentes

C) MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a utilizar)

palustres espatulas
arnes eslingas Hidrolavadora. extenciones

D) ACTIVIDADES A REALIZAR

N°	Tarea / Actividad Operativa	Identificar Peligro	Riesgo	Medidas de control
1	Resanes en piedra y lavado con químicos y desengrasantes	caidas y quimicos	altura y quimico	utilizar los epp y protección personal
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

IV. LISTA DE PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMA
1	Luis Alexander Linares	79875472	
2	Luis Carlos Hitengo	1081418847	
3	Solano Carlos	29820766	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

V. REPORTE DE INCIDENTES:

Información importante que puede evitar accidentes.
¿Se identificaron incidentes durante la jornada de trabajo?
SI [ ] NO [X]

De ser afirmativo generar el reporte de incidente y entregar al Jefe o Superior.

INCIDENTE	REPORTADO POR:

VI. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

●	Peligrosos	☐
●	No reaprovechables	☐
●	Varios Aprovechables (vidrio, otros)	☐
○	Plásticos	☐
●	Papel y Cartón	☐
○	Metal	☐
●	Orgánicos	☐

Otros (Especificar):

Riesgos Químicos Quemaduras

Descripción de la eliminación de residuos sólidos:

Luis Alexander Linares

Nombre, Apellido y firma del Instructor / Colaborador Responsable de la tarea operativa

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

FECHA: 22 / 04 / 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ZONAL/CFP/UFP/ÁREA: parroquia sanjuan bautista villa pinzon
SEMESTRE / PERIODO: - 01 20.25
MÓDULO FORMATIVO / CURSO: cordinador w/d
PROYECTO / TAREA / ACTIVIDAD: parroquia sanjuan bautista actividad Resanes y pintado
INSTRUCTOR / COLABORADOR RESPONSABLE: luis alexander linares

Repaso de preguntas antes de iniciar una tarea:
1. ¿Qué tengo qué hacer?
2. ¿Cómo lo voy a hacer?
3. ¿Qué necesito para hacerlo?
4. ¿Es posible que me pueda accidentar?
5. ¿Qué haré para evitarlo?

II. TRABAJOS DEFINIDOS DE ALTO RIESGO. Ud. Deberá solicitar autorización para su realización

1. Trabajo en altura (mayor a 1.8 mt).	X	3. Trabajos de izaje y montaje de estructuras.		5. Trabajos en subestaciones eléctricas.	
2. Trabajos en espacios confinados.		4. Trabajos en caliente, corte, soldadura u otros que generan chispas.		6. Trabajos con materiales peligrosos.	X

III. ANÁLISIS DE RIESGOS

A) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - USO OBLIGATORIO (Marca con una "X").

Protección Ocular	Protección Auditiva	Guantes de Seguridad	Guantes aislantes	Botas Aislantes	Botas de Seguridad	Ropa de Trabajo	Casco de proteccion	Mascarilla	Máscara para Soldar
X		X			X	X	X	X	

B) ADVERTENCIA (Marca con una "X")

Riesgo Auditivo	Soldadura	Riesgo Eléctrico	Atrapamiento de Mnaos	Caida de Objetos	Piso resbaladizo	Riesgo de Explosión	Peligro Inflamable	Cuidado gas Comprimido	Riesgo de Accidentes

C) MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a utilizar)

arnes eslingas cuerdas
Raspetas espatulas

D) ACTIVIDADES A REALIZAR

N°	Tarea / Actividad Operativa	Identificar Peligro	Riesgo	Medidas de control
1	Resanes de piedra y pintado	caidas	alturas	utilizar equipos de alturas
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

IV. LISTA DE PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMA
1	Luis alexander Tuarez	74871472	
2	Luis carlos ultengo	1081418847	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

V. REPORTE DE INCIDENTES:

Información importante que puede evitar accidentes.
¿Se identificaron incidentes durante la jornada de trabajo?
SI [ ] NO [X]

De ser afirmativo generar el reporte de incidente y entregar al Jefe o Superior.

INCIDENTE	REPORTADO POR:

VI. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

●	Peligrosos	☐
●	No reaprovechables	☐
●	Varios Aprovechables (vidrio, otros)	☐
○	Plásticos	☐
●	Papel y Cartón	☐
○	Metal	☐
●	Orgánicos	☐

Otros (Especificar):
Quimicos y caidas

Descripción de la eliminación de residuos sólidos:

Luis alexander Tuarez

Nombre/Apellido y firma del Instructor / Colaborador Responsable de la tarea operativa

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

FECHA: 21/04/2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ZONAL/CFP/UFP/ÁREA: parroquia Sangay bautista villa pinzon
SEMESTRE/ PERIODO: 01 2025
MÓDULO FORMATIVO / CURSO: cordinador A.T
PROYECTO/ TAREA / ACTIVIDAD: parroquia Sangay bautista enbaguetado y relleno
INSTRUCTOR / COLABORADOR RESPONSABLE: Luis alexander Tivanes

Repaso de preguntas antes de iniciar una tarea:
1. ¿Qué tengo qué hacer?
2. ¿Cómo lo voy a hacer?
3. ¿Qué necesito para hacerlo?
4. ¿Es posible que me pueda accidentar?
5. ¿Qué haré para evitarlo?

II. TRABAJOS DEFINIDOS DE ALTO RIESGO. Ud. Deberá solicitar autorización para su realización

1. Trabajoen altura (mayor a 1.8 mt).	X	3. Trabajos de izaje y montaje de estructuras.		5. Trabajos en subestaciones eléctricas.	
2. Trabajoen espacios confinados.		4. Trabajos en caliente, corte, soldadura u otros que generan chispas.		6. Trabajos con materiales peligrosos.	X

III. ANÁLISIS DE RIESGOS

A) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - USO OBLIGATORIO (Marca con una "X").

Protección Ocular	Protección Auditiva	Guantes de Seguridad	Guantes aislantes	Botas Aislantes	Botas de Seguridad	Ropa de Trabajo	Casco de proteccion	Mascarilla	Máscara para Soldar
X		X			X	X	X		

B) ADVERTENCIA (Marca con una "X")

Riesgo Auditivo	Soldadura	Riesgo Eléctrico	Atrapamiento de Manos	Caída de Objetos	Piso resbaladizo	Riesgo de Explosión	Peligro Inflamable	Cuidado gas Comprimido	Riesgo de Accidentes

C) MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a utilizar)

Roladora el pedulas
arner eslingas

D) ACTIVIDADES A REALIZAR

N°	Tarea / Actividad Operativa	Identificar Peligro	Riesgo	Medidas de control
1	Rasuar de piedra y afinado	Caidas	altura	utilizar equipos de seguridad
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



ANEXO
BITÁCORA DE OBRA

Dirección: Calle 14b N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

Arquilat
DISEÑO, CONSTRUCCION, CONSULTORIA E INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"


BITACORA DE OBRA	Hoja No.	

FECHA: 21/04/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	8.00 am
FIN JORNADA LABORAL :	5:00 Pm

ESTADO DEL CLIMA

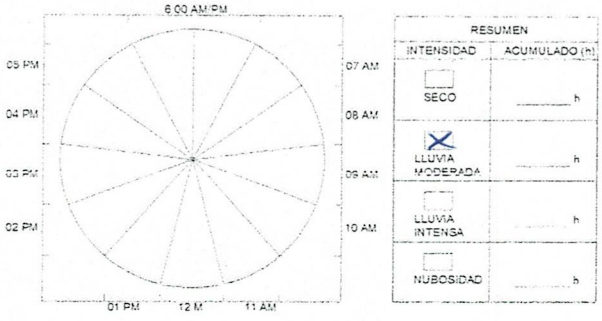

DESCRIPCION:

Sedce inicio con trabajo de Polidora con disco de ligo para remober la Pintura de los Puertas se evidencia uno de los elementos de andamios fuera del bautisterio en Parcelo se Hace el armada del andamio Pequeño Para trabajo de restauracion en Zonce de Coste circel.
y se hace el cerramiento.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR


ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat DISEÑO, CONSTRUCCION, CONSULTORIA E INTERVENTORIA	CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"
	BITACORA DE OBRA — Hoja No.
FECHA:	22/04/2025

JORNADA LABORAL	
INICIO JORNADA LABORAL:	7:00 am
FIN JORNADA LABORAL :	5:15 Pm

ESTADO DEL CLIMA



DESCRIPCION:

Se da inicio de trabajo de lijada de Puertas Parte exterior Trabajadores 4
ingreso cuadrilla de restauracion 8.30 am
salida cuadrilla de restauracion 3:30 PM

se hace Proceso de Pañete y enlagrillado de juntas y Friso.

tambien de manera Paralela se trabajo con la lijada de las Puertas

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA


CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"

BITACORA DE OBRA	Hoja No.	

FECHA: 23/04/2025

JORNADA LABORAL	
INICIO JORNADA LABORAL:	7:10
FIN JORNADA LABORAL :	5:20

ESTADO DEL CLIMA



DESCRIPCION:

Sedru inicio con la cuadrilla de Puertas Para el trabajo de lijada a las 8:00 am se da inicio con la cuadrilla de restauracion en trabajo de resanes de juntas y Pinetes

se hace Proceso de limpieza con desengrasante y con rinse uno Para la Parte de la Piedra Pintada y otro Para la Piedra natural

a las 4:16 finaliza actividades cuadrilla de resane y lijado.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat
DISEÑO, CONSTRUCCION, CONSULTORIA E INTERVENTORIA


CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"

BITACORA DE OBRA	Hoja No.	

FECHA: 24/04/2025

JORNADA LABORAL	
INICIO JORNADA LABORAL:	8:15 am
FIN JORNADA LABORAL :	5:00 Pm

ESTADO DEL CLIMA



DESCRIPCION:

Se da inicio con el Proceso de lijado en Puertas de la iglecia

demanera Paralela la cuadrilla de alturas hace trabajos de resane y pintura en Parte de la casa cural.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR


ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORIA E INTERVENTORIA	CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"
	BITACORA DE OBRA — Hoja No.
FECHA:	25/09/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	7:00 am
FIN JORNADA LABORAL :	

ESTADO DEL CLIMA



RESUMEN		
	INTENSIDAD	ACUMULADO (h)
☒	SECO	____ h
☐	LLUVIA MODERADA	____ h
☐	LLUVIA INTENSA	____ h
☐	NUBOSIDAD	____ h

DESCRIPCION:

Se da inicio con la cuadrilla de lijado en trabajos de remocion de pintura en puerta lateral derecha,

a las 8:20 se da inicio con la cuadrilla de alturas a la desinfeccion de la fachada de la casa cural,

se da inicio a la operacion de impermeabilizacion con nicosil 10 en la parte de piedra de la fachada de la casa cural Terminan 1 pm

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat
DISEÑO, CONSTRUCCION, CONSULTORIA E INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"


BITACORA DE OBRA | Hoja No.

FECHA: 28/04/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	7:00:am
FIN JORNADA LABORAL :	5:00 Pm

ESTADO DEL CLIMA

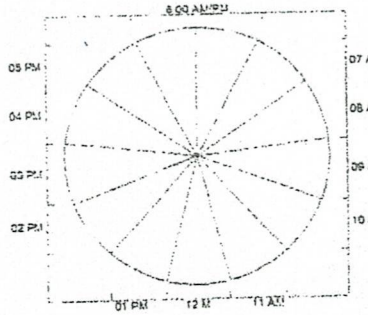

RESUMEN	
INTENSIDAD	ACUMULADO (h)
SECO	____ h
LLUVIA MODERADA	____ h
LLUVIA INTENSA	____ h
NUBOSIDAD	____ h

DESCRIPCION:

se hace trabajo en Puertas de la iglesia con el lijado

la cuadrilla de altura esta trabajando en los resanes de la Parte del Friso de la cosa Cural.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat
DISEÑO, CONSTRUCCION, CONSULTORIA E INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"


BITACORA DE OBRA | Hoja No.

FECHA: 29/04/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	7:00 am
FIN JORNADA LABORAL :	5:00 Pm

ESTADO DEL CLIMA



RESUMEN	INTENSIDAD	ACUMULADO (H)
SECO		h
LLUVIA MODERADA		h
LLUVIA INTENSA		h
NUBOSIDAD		h

DESCRIPCION:

Se da inicio con trabajo de Puertas con la cuadrilla de carpintería y se posponen para hacer arreglo de los Piedras del acceso Principal se arreglan y se le da el bate a dos Piedras y se Polen.

a las 8:00 am la cuadrilla de alturas inicia labores con la lavadora en fachada lateral derecha usando desengrasante industrial en Parte de Pintura.

en horas de la tarde la hidro lavadora se daña Por lo que se suspenden actividades de esa cuadrilla.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS	AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat
DISEÑO, CONSTRUCCION, CONSULTORIA E INTERVENTORIA


CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"

BITACORA DE OBRA | Hoja No.

FECHA: 30/09/2025

JORNADA LABORAL	
INICIO JORNADA LABORAL:	6:30 am
FIN JORNADA LABORAL :	4:50 Pm

ESTADO DEL CLIMA

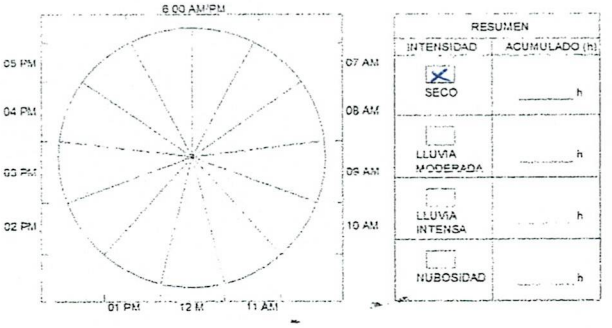

DESCRIPCION:

Se da inicio con labores de trabajo en altura con la limpieza de la fachada en piedra y el friso de pañete en la casa cural la teral derecha.

Se continua con las puertas en proceso de detalle de lijado en puerta lateral izquierda inicio 7.10 am

Se hace limpieza en zonas salpicadas por mortero de restauracion en fachada principal y arreglos en la pintura y limpieza de los restos de pelicion del ingeniero cesar.

Se informa a don salomon perez el cambio de color en fachada lateral izquierda.
se hizo desinfeccion y se aplico nicoil.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat
DISEÑO, CONSTRUCCION, CONSULTORIA E INTERVENTORIA


CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"

BITACORA DE OBRA | Hoja No.

FECHA: 01/05/2025

JORNADA LABORAL	
INICIO JORNADA LABORAL:	8:10 am
FIN JORNADA LABORAL :	5:00 PM

ESTADO DEL CLIMA



DESCRIPCION:

se da inicio con actividades de ligeda en las puertas de la iglesia dando continuidad al trabajo del dia anterior.

a las 9:00 se confirma que la cuadrilla de alturas no viene el dia de hoy

en el transcurso del dia se deja finalizado el trabajo de ligeda de la puerta lateral derecha y se aplica la resina con pegante y asemin instalada en puerta lateral derecha y lateral izquierda.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat
DISEÑO, CONSTRUCCION, CONSULTORIA E INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"


BITACORA DE OBRA | Hoja No.

FECHA: 02/05/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	7:00 am
FIN JORNADA LABORAL :	5:10 Pm

ESTADO DEL CLIMA



RESUMEN	INTENSIDAD	ACUMULADO (h)
SECO		h
LLUVIA MODERADA		h
LLUVIA INTENSA		h
NUBOSIDAD		h

DESCRIPCION:

Se da inicio con la cuadrilla de carpintería con la lijada de la Puerta lateral derecha. se hace resanes en Puertas con calbon de madera y con cesemin.

se da inicio de obra con la cuadrilla de alturas a la 7:30 am inicia con preparación de Pintura para la Parte superior del templo.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS	AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA


CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"

BITACORA DE OBRA | Hoja No.

FECHA: 03/05/2025

JORNADA LABORAL	
INICIO JORNADA LABORAL:	8:30 am
FIN JORNADA LABORAL :	12.00 Pm

ESTADO DEL CLIMA

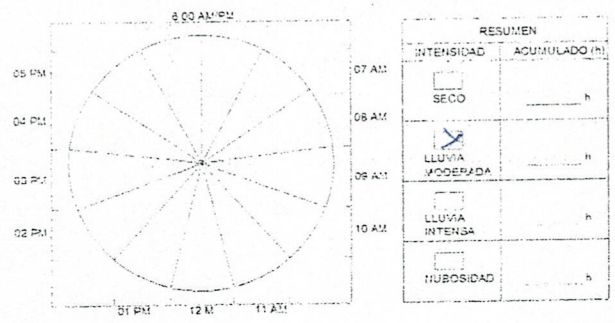

DESCRIPCION:

Se da inicio con la cuadrilla de carpintería con el tizado de la Puerta Principal
con la cuadrilla de albañiles se da inicio con el desarme del andamio.
Por parte de la interventoría se realiza la prueba de permeabilidad de la fachada de la iglesia, en donde se le aplica agua a la fachada por un tiempo determinado (30min) y luego se rectifica la fachada, para evidenciar las zonas donde (fue absorbida el agua por la piedra) absorvio el agua la piedra de fachada. En donde se evidencia que la fachada de la casa cural presenta absorciones. Por la cual esta interventoría solicita al contratista de obra realizar nuevamente el procedimiento para impermeabilizar la fachada. Esto debido a que dias anteriores aplicaron el producto y por las fuerte lluvias se daña el proceso de impermeabilizar que se ejecuto dias anteriores en la fachada de la casa cural.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR


ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA	CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"
	BITACORA DE OBRA — Hoja No.
FECHA:	06/05/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	7:15 am
FIN JORNADA LABORAL :	5:20 Pm

ESTADO DEL CLIMA

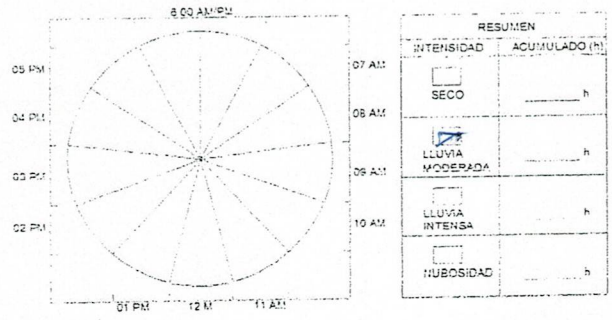

DESCRIPCION:

Se da inicio con las armadas del andamio en continuacion se inicia con Proceso de lijado y encerado de sunlas con cera de madera y esterin fino. Se continua con el trabajo de carpinteria y lijado de la puerta central y lateral izquierda por parte interna a las 11:00 am se Pasa al lado de la Puerta derecha para continuar con Proceso de lijado y reparacion de sunlas de dicha Puerta.
- Se hace Prueba de Pintura en Puerta lateral izquierda con broca - con laca transparente y con profilux color nogal. el resultado fue casi igual en todas las muestras por lo que se deja como comentario el cambio de color a usar en reunion con el cura, Parroco y los demas implicados en la obra.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS	AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat
DISEÑO, CONSTRUCCION, CONSULTORIA E INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"


BITACORA DE OBRA | Hoja No.

FECHA: 07/05/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	7:05 am
FIN JORNADA LABORAL :	5:00 Pm

ESTADO DEL CLIMA

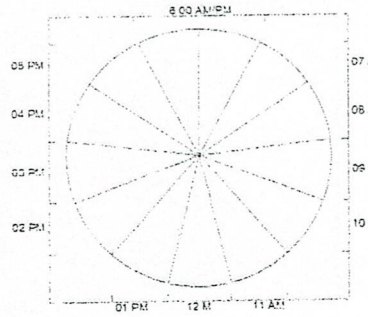

RESUMEN	INTENSIDAD	ACUMULADO (h)
	SECO	____ h
X	LLUVIA MODERADA	____ h
	LLUVIA INTENSA	____ h
	NUBOSIDAD	____ h

DESCRIPCION:

Se da inicio con la Polida y lijada de la Puerta central para finalizar remates en la Puerta lateral izquierda se limpian zonas de Prueva de colores del dia anterior. El contratista acata la recomendacion de acuerdo a la prueba realizada por la interventoria, y realiza la impermeabilizacion de la casa de la cural. Esto garantizando la proteccion de la fachada.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS	AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat
DISEÑO, CONSTRUCCION, CONSULTORIA E INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"


BITACORA DE OBRA | Hoja No.

FECHA: 08/05/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	7:00 am
FIN JORNADA LABORAL :	5:00 Pm

ESTADO DEL CLIMA

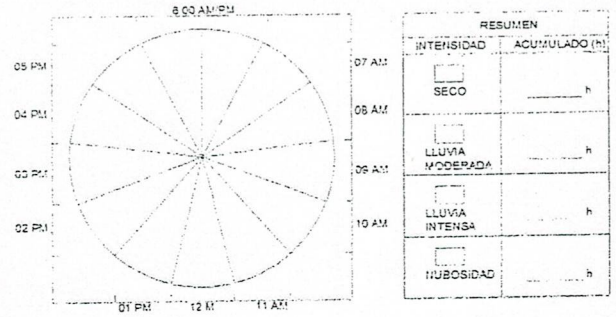

DESCRIPCION:

Se Procede con trabajos de carpintería en los Puertas de la iglesia con Pintura y aplicacion de tintillos

Don Salomon hace Proceso de impermeabilizacion en Fachada de la casa cural

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS	AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA


CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"

BITACORA DE OBRA | Hoja No.

FECHA: 09/05/2025

JORNADA LABORAL	
INICIO JORNADA LABORAL:	7:00 am
FIN JORNADA LABORAL :	5:00 Pm

ESTADO DEL CLIMA



DESCRIPCION:

Se da inicio con la Pulida de la Puerta lateral derecha para omogenizar Parte de la masilla instalada el dia anterior.

Se continua con la aPlicacion de la Primera capa con tintillar. Posterior a eso se hace limpieza de Puerta lateral izquierda y centro para seguir con la instalacion o aPlicacion de tintillo en las Puertas.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat
DISEÑO, CONSTRUCCION, CONSULTORIA E INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"


BITACORA DE OBRA | Hoja No.

FECHA: 10/05/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	7:30 am
FIN JORNADA LABORAL :	5:30 Pm

ESTADO DEL CLIMA

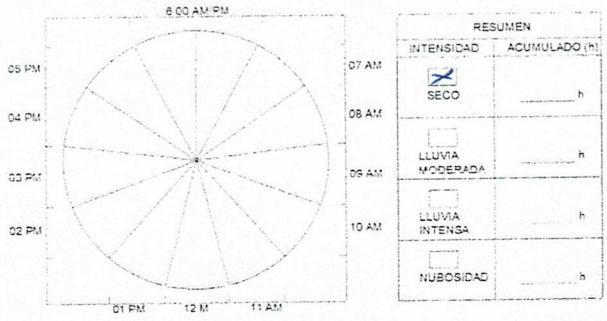

DESCRIPCION:

Sedu inicio con la aplicacion de los Tintillos en los Puertas del templo Por ambos coros.
a los 9:00 am se da inicio con el aplique a la Puerta lateral izquierda con la Pintura para dar el color de la muestra
a los 11:00 am se da inicio con la pintura de los estrellas y elementos decorativos de la Puerta lateral dzquierda.
los actividades siguen en Paralelo y consecutivo durante el dia.

a las 3:00 Pm se hace el arreglo del zocalo en los Pedestales del acceso de la iglesia
se finaliza con el desmonte de andamios y dejando el espacio limpio.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

FECHA: 03 / 05 / 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ZONAL/CFP/UFP/ÁREA: parroquia San Juan bautista villa pinzon

SEMESTRE / PERIODO: 01 - 29-25

MÓDULO FORMATIVO / CURSO: coordinador

PROYECTO / TAREA / ACTIVIDAD: desarmada cardamino y sellado piedra en parroquia

INSTRUCTOR / COLABORADOR RESPONSABLE: luis alexander piedra

Repaso de preguntas antes de iniciar una tarea:
1. ¿Qué tengo qué hacer?
2. ¿Cómo lo voy a hacer?
3. ¿Qué necesito para hacerlo?
4. ¿Es posible que me pueda accidentar?
5. ¿Qué haré para evitarlo?

II. TRABAJOS DEFINIDOS DE ALTO RIESGO. Ud. Deberá solicitar autorización para su realización

1. Trabajo en altura (mayor a 1.8 mt).	X	3. Trabajos de izaje y montaje de estructuras.		5. Trabajos en subestaciones eléctricas.	
2. Trabajos en espacios confinados.		4. Trabajos en caliente, corte, soldadura u otros que generan chispas.		6. Trabajos con materiales peligrosos.	X

III. ANÁLISIS DE RIESGOS

A) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - USO OBLIGATORIO (Marca con una "X").

Protección Ocular	Protección Auditiva	Guantes de Seguridad	Guantes aislantes	Botas Aislantes	Botas de Seguridad	Ropa de Trabajo	Casco de proteccion	Mascarilla	Máscara para Soldar
X	X	X			X	X	X	X	

B) ADVERTENCIA (Marca con una "X")

Riesgo Auditivo	Soldadura	Riesgo Eléctrico	Atrapamiento de Manos	Caída de Objetos	Piso resbaladizo	Riesgo de Explosión	Peligro Inflamable	Cuidado gas Comprimido	Riesgo de Accidentes

C) MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a utilizar)

fumigadora arma
eslingas cuerdas

D) ACTIVIDADES A REALIZAR

N°	Tarea / Actividad Operativa	Identificar Peligro	Riesgo	Medidas de control
1	desarmada y andamio y	caidas	A. Altura	utilizar EPP
2	sellado de piedra			contra caidas
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

IV. LISTA DE PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMA
1	Luis alexander Linares	74874572	
2	Golver on Pavos	79870766	
3	Luis carlos ufiengo	1081418847	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

VI. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

○	Peligrosos	☐
●	No reaprovechables	☐
○	Varios Aprovechables (vidrio, otros)	☐
○	Plásticos	☐
○	Papel y Cartón	☐
○	Metal	☐
●	Orgánicos	☐

Otros (Especificar):

Riesgo Quimico

Descripción de la eliminación de residuos sólidos:

V. REPORTE DE INCIDENTES:

Información importante que puede evitar accidentes.

¿Se identificaron incidentes durante la jornada de trabajo?

SI ☐ NO ☒

De ser afirmativo generar el reporte de incidente y entregar al Jefe o Superior.

INCIDENTE	REPORTADO POR:

Luis alexander linares

Nombre/Apellido y firma del Instructor / Colaborador Responsable de la tarea operativa

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

FECHA: 02 / 07 / 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ZONAL/CFP/UFP/ÁREA: Parroquia San Juan bautista billa piazon

SEMESTRE / PERIODO: 201. To. 25

MÓDULO FORMATIVO / CURSO: coordinador

PROYECTO / TAREA / ACTIVIDAD: invitacion Pintura y Sellado

INSTRUCTOR / COLABORADOR RESPONSABLE: Luis alexander Tinajero

Repaso de preguntas antes de iniciar una tarea:
1. ¿Qué tengo qué hacer?
2. ¿Cómo lo voy a hacer?
3. ¿Qué necesito para hacerlo?
4. ¿Es posible que me pueda accidentar?
5. ¿Qué haré para evitarlo?

II. TRABAJOS DEFINIDOS DE ALTO RIESGO. Ud. Deberá solicitar autorización para su realización

1. Trabajo en altura (mayor a 1.8 mt).	X	3. Trabajos de izaje y montaje de estructuras.		5. Trabajos en subestaciones eléctricas.	
2. Trabajos en espacios confinados.		4. Trabajos en caliente, corte, soldadura u otros que generan chispas.		6. Trabajos con materiales peligrosos.	X

III. ANÁLISIS DE RIESGOS

A) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - USO OBLIGATORIO (Marca con una "X").

Protección Ocular	Protección Auditiva	Guantes de Seguridad	Guantes aislantes	Botas Aislantes	Botas de Seguridad	Ropa de Trabajo	Casco de proteccion	Mascarilla	Mascara para Soldar
X			X		X	X	X	X	

B) ADVERTENCIA (Marca con una "X")

Riesgo Auditivo	Soldadura	Riesgo Eléctrico	Atrapamiento de Manos	Caida de Objetos	Piso resbaladizo	Riesgo de Explosión	Peligro Inflamable	Cuidado gas Comprimido	Riesgo de Accidentes

C) MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a utilizar)

arco, eslingas, espatulas, palustres, maquina de hidro lavadora

D) ACTIVIDADES A REALIZAR

N°	Tarea / Actividad Operativa	Identificar Peligro	Riesgo	Medidas de control
1	Pintura invitacion Piedra	caidas	Natural	Utilizar equipos con de caidas
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

IV. LISTA DE PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMA
1	Luis alexander Linares	79875472	
2	Solomon Lovos	79870766	
3	Luis carlos Ulitengo	81418847	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

VI. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

○	Peligrosos	☐
●	No reaprovechables	☐
○	Varios Aprovechables (vidrio, otros)	☐
○	Plásticos	☐
○	Papel y Cartón	☐
○	Metal	☐
●	Orgánicos	☐

Otros (Especificar):

Riesgos Quimicos

Descripción de la eliminación de residuos sólidos:

V. REPORTE DE INCIDENTES:

Información importante que puede evitar accidentes.

¿Se identificaron incidentes durante la jornada de trabajo?

SI ☐ NO ☒

De ser afirmativo generar el reporte de incidente y entregar al Jefe o Superior.

INCIDENTE	REPORTADO POR:

Luis alexander linares

Nombre/Apellido y firma del Instructor / Colaborador Responsable de la tarea operativa

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

FECHA: 30 / 04 / 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ZONAL/CFP/UFP/ÁREA: Parroquia Sangun bautista villapiuzon
SEMESTRE / PERIODO: - 01 - 20-25
MÓDULO FORMATIVO / CURSO: cordinador
PROYECTO / TAREA / ACTIVIDAD: iglesia villa piuzon actividad lavado con quimico
INSTRUCTOR / COLABORADOR RESPONSABLE: Ivel alexander linares

Repaso de preguntas antes de iniciar una tarea:
1. ¿Qué tengo qué hacer?
2. ¿Cómo lo voy a hacer?
3. ¿Qué necesito para hacerlo?
4. ¿Es posible que me pueda accidentar?
5. ¿Qué haré para evitarlo?

II. TRABAJOS DEFINIDOS DE ALTO RIESGO. Ud. Deberá solicitar autorización para su realización

1. Trabajo en altura (mayor a 1.8 mt).	X	3. Trabajos de izaje y montaje de estructuras.		5. Trabajos en subestaciones eléctricas.	
2. Trabajos en espacios confinados.		4. Trabajos en caliente, corte, soldadura u otros que generan chispas.		6. Trabajos con materiales peligrosos.	X

III. ANÁLISIS DE RIESGOS

A) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - USO OBLIGATORIO (Marca con una "X").

Protección Ocular	Protección Auditiva	Guantes de Seguridad	Guantes aislantes	Botas Aislantes	Botas de Seguridad	Ropa de Trabajo	Casco de proteccion	Mascarilla	Máscara para Soldar
X	X		X		X	X	X	X	

B) ADVERTENCIA (Marca con una "X")

Riesgo Auditivo	Soldadura	Riesgo Eléctrico	Atrapamiento de Manos	Caída de Objetos	Piso resbaladizo	Riesgo de Explosión	Peligro Inflamable	Cuidado gas Comprimido	Riesgo de Accidentes

C) MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a utilizar)

D) ACTIVIDADES A REALIZAR

N°	Tarea / Actividad Operativa	Identificar Peligro	Riesgo	Medidas de control
1	lavado con quimico desinfeccion	caidas y quemadu	14 horas	utilizar equipos contra caidas
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

IV. LISTA DE PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMA
1	Luis alexander Tinoco	29878472	
2	luis carlos ulfengo	1081418847	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

VI. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

●	Peligrosos	☐
●	No reaprovechables	☐
●	Varios Aprovechables (vidrio, otros)	☐
○	Plásticos	☐
●	Papel y Cartón	☐
○	Metal	☐
●	Orgánicos	☐

Otros (Especificar):

Riesgo químico

Descripción de la eliminación de residuos sólidos:

V. REPORTE DE INCIDENTES:

Información importante que puede evitar accidentes.

¿Se identificaron incidentes durante la jornada de trabajo?

SI ☐ NO ☒

De ser afirmativo generar el reporte de incidente y entregar al Jefe o Superior.

INCIDENTE	REPORTADO POR:

luis alexander tinoco

Nombre, Apellido y firma del Instructor / Colaborador Responsable de la tarea operativa

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

FECHA: 29 '04' 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ZONAL/CFP/UFP/ÁREA: Parroquia San Juan bautista villa Pinzon

SEMESTRE / PERIODO: 01 - 28.25

MÓDULO FORMATIVO / CURSO: Cordinador

PROYECTO / TAREA / ACTIVIDAD: Iglesia villa Pinzon actividad trabajos varios

INSTRUCTOR / COLABORADOR RESPONSABLE: Ivit Alexander Suarez

Repaso de preguntas antes de iniciar una tarea:
1. ¿Qué tengo qué hacer?
2. ¿Cómo lo voy a hacer?
3. ¿Qué necesito para hacerlo?
4. ¿Es posible que me pueda accidentar?
5. ¿Qué haré para evitarlo?

II. TRABAJOS DEFINIDOS DE ALTO RIESGO. Ud. Deberá solicitar autorización para su realización

1. Trabajo en altura (mayor a 1.8 mt).	X	3. Trabajos de izaje y montaje de estructuras.		5. Trabajos en subestaciones eléctricas.	
2. Trabajos en espacios confinados.		4. Trabajos en caliente, corte, soldadura u otros que generan chispas.		6. Trabajos con materiales peligrosos.	X

III. ANÁLISIS DE RIESGOS

A) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - USO OBLIGATORIO (Marca con una "X").

Protección Ocular	Protección Auditiva	Guantes de Seguridad	Guantes aislantes	Botas Aislantes	Botas de Seguridad	Ropa de Trabajo	Casco de proteccion	Mascarilla	Máscara para Soldar
X	X		X		X	X	X	X	

B) ADVERTENCIA (Marca con una "X")

Riesgo Auditivo	Soldadura	Riesgo Eléctrico	Atrapamiento de Manos	Caída de Objetos	Piso resbaladizo	Riesgo de Explosión	Peligro Inflamable	Cuidado gas Comprimido	Riesgo de Accidentes

C) MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a utilizar)

arnes hidrolavadora
cs lluvias cuerdas

D) ACTIVIDADES A REALIZAR

N°	Tarea / Actividad Operativa	Identificar Peligro	Riesgo	Medidas de control
1	Lavado con quimicos y trabajos de pintura	caidas y quimicos	quimico y altura	utilizar equipo y cuerdas para quimicos
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

IV. LISTA DE PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMA
1	Yuri alexandra Linares	79875412	
2	Luis carlos ulfengo	1081418847	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

V. REPORTE DE INCIDENTES:

Información importante que puede evitar accidentes.

¿Se identificaron incidentes durante la jornada de trabajo?

SI ☐ NO ☐

De ser afirmativo generar el reporte de incidente y entregar al Jefe o Superior.

INCIDENTE	REPORTADO POR:

VI. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

●	Peligrosos	☐
●	No reaprovechables	☐
●	Varios Aprovechables (vidrio, otros)	☐
○	Plásticos	☐
●	Papel y Cartón	☐
○	Metal	☐
●	Orgánicos	☐

Otros (Especificar):

Descripción de la eliminación de residuos sólidos:

Nombre/Apellido y firma del Instructor / Colaborador Responsable de la tarea operativa

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

FECHA: 28 / 04 / 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ZONAL/CFP/UFP/ÁREA: parroquia San Juan bautista villa Pinzon
SEMESTRE / PERIODO: I - 01 - 2025
MÓDULO FORMATIVO / CURSO: Coordinador
PROYECTO / TAREA / ACTIVIDAD: Pillado Piedra y pintura in, tation Piedra
INSTRUCTOR / COLABORADOR RESPONSABLE: Luis Eduardo Tuarez

Repaso de preguntas antes de iniciar una tarea:
1. ¿Qué tengo qué hacer?
2. ¿Cómo lo voy a hacer?
3. ¿Qué necesito para hacerlo?
4. ¿Es posible que me pueda accidentar?
5. ¿Qué haré para evitarlo?

II. TRABAJOS DEFINIDOS DE ALTO RIESGO. Ud. Deberá solicitar autorización para su realización

1. Trabajo en altura (mayor a 1.8 mt).	X	3. Trabajos de izaje y montaje de estructuras.		5. Trabajos en subestaciones eléctricas.	
2. Trabajos en espacios confinados.		4. Trabajos en caliente, corte, soldadura u otros que generan chispas.		6. Trabajos con materiales peligrosos.	X

III. ANÁLISIS DE RIESGOS

A) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - USO OBLIGATORIO (Marca con una "X").

									
Protección Ocular	Protección Auditiva	Guantes de Seguridad	Guantes aislantes	Botas Aislantes	Botas de Seguridad	Ropa de Trabajo	Casco de proteccion	Mascarilla	Máscara para Soldar

B) ADVERTENCIA (Marca con una "X")

									
Riesgo Auditivo	Soldadura	Riesgo Eléctrico	Atrapamiento de Mnaos	Caida de Objetos	Piso resbaladizo	Riesgo de Explosión	Peligro Inflamable	Cuidado gas Comprimido	Riesgo de Accidentes

C) MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a utilizar)

D) ACTIVIDADES A REALIZAR

N°	Tarea / Actividad Operativa	Identificar Peligro	Riesgo	Medidas de control
1	Impermeabilizacion y	caidas	altura	utilizar equipo
2	Pintura en Piedra y			de seguridad
3				como casco
4				y cuidado
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

IV. LISTA DE PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMA
1	Luis carlos Vilengo	1081418847	
2	Sonia Tasayco	29257[illegible]	
3	Luis Alexander Linares	74875472	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

VI. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

●	Peligrosos	☐
●	No reaprovechables	☐
●	Varios Aprovechables (vidrio, otros)	☐
○	Plásticos	☐
●	Papel y Cartón	☐
○	Metal	☐
●	Orgánicos	☐

Otros (Especificar):

Químicos Peligrosos

Descripción de la eliminación de residuos sólidos:

V. REPORTE DE INCIDENTES:

Información importante que puede evitar accidentes.

¿Se identificaron incidentes durante la jornada de trabajo?

SI ☐ NO ☒

De ser afirmativo generar el reporte de incidente y entregar al Jefe o Superior.

INCIDENTE	REPORTADO POR:

Luis Alexander Linares

Nombre/Apellido y firma del Instructor / Colaborador Responsable de la tarea operativa

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

FECHA: 25 / 04 / 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ZONAL/CFP/UFP/ÁREA: Parroquia Sanjuan bautista villa Pinzon
SEMESTRE / PERIODO: I - 0 - 20.25
MÓDULO FORMATIVO / CURSO: cordinador Alturas
PROYECTO / TAREA / ACTIVIDAD: iglesia villa Pinzon desinfeccion y sellado
INSTRUCTOR / COLABORADOR RESPONSABLE: Luis alexander Tuarez

Repaso de preguntas antes de iniciar una tarea:
1. ¿Qué tengo qué hacer?
2. ¿Cómo lo voy a hacer?
3. ¿Qué necesito para hacerlo?
4. ¿Es posible que me pueda accidentar?
5. ¿Qué haré para evitarlo?

II. TRABAJOS DEFINIDOS DE ALTO RIESGO. Ud. Deberá solicitar autorización para su realización

1. Trabajo en altura (mayor a 1.8 mt).	X	3. Trabajos de izaje y montaje de estructuras.		5. Trabajos en subestaciones eléctricas.	
2. Trabajos en espacios confinados.		4. Trabajos en caliente, corte, soldadura u otros que generan chispas.		6. Trabajos con materiales peligrosos.	X

III. ANÁLISIS DE RIESGOS

A) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - USO OBLIGATORIO (Marca con una "X").

Protección Ocular	Protección Auditiva	Guantes de Seguridad	Guantes aislantes	Botas Aislantes	Botas de Seguridad	Ropa de Trabajo	Casco de proteccion	Mascarilla	Máscara para Soldar
		X			X	X	X	X	

B) ADVERTENCIA (Marca con una "X")

Riesgo Auditivo	Soldadura	Riesgo Eléctrico	Atrapamiento de Mnaos	Caída de Objetos	Piso resbaladizo	Riesgo de Explosión	Peligro Inflamable	Cuidado gas Comprimido	Riesgo de Accidentes

C) MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a utilizar)

eppes eslingas
fumigadora

D) ACTIVIDADES A REALIZAR

N°	Tarea / Actividad Operativa	Identificar Peligro	Riesgo	Medidas de control
1	desinfeccion y sellado piedra	caidas	Alturas	utilizar equipos de seguridad
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

IV. LISTA DE PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMA
1	Luis alexander linares	79875477	
2	Luis carlos ulfengo	1031418847	
3	Salomon Pantoja	79620766	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

VI. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

●	Peligrosos	☐
●	No reaprovechables	☐
●	Varios Aprovechables (vidrio, otros)	☐
○	Plásticos	☐
●	Papel y Cartón	☐
○	Metal	☐
●	Orgánicos	☐

Otros (Especificar):

Químicos

Descripción de la eliminación de residuos sólidos:

V. REPORTE DE INCIDENTES:

Información importante que puede evitar accidentes.

¿Se identificaron incidentes durante la jornada de trabajo?

SI ☐ NO ☒

De ser afirmativo generar el reporte de incidente y entregar al Jefe o Superior.

INCIDENTE	REPORTADO POR:

Luis alexander Linares

Nombre, Apellido y firma del Instructor / Colaborador Responsable de la tarea operativa

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

FECHA: 24 04 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ZONAL/CFP/UFP/ÁREA: Parroquia Sanjuan bautista villa pinzon
SEMESTRE / PERIODO: - 01 - 20-25
MÓDULO FORMATIVO / CURSO: cordinador
PROYECTO / TAREA / ACTIVIDAD: iglesia villa pinzon actividad lavado piedra cerqueria
INSTRUCTOR / COLABORADOR RESPONSABLE: luis alexander limares

Repaso de preguntas antes de iniciar una tarea:
1. ¿Qué tengo qué hacer?
2. ¿Cómo lo voy a hacer?
3. ¿Qué necesito para hacerlo?
4. ¿Es posible que me pueda accidentar?
5. ¿Qué haré para evitarlo?

II. TRABAJOS DEFINIDOS DE ALTO RIESGO. Ud. Deberá solicitar autorización para su realización

1. Trabajo en altura (mayor a 1.8 mt).	X	3. Trabajos de izaje y montaje de estructuras.		5. Trabajos en subestaciones eléctricas.	
2. Trabajos en espacios confinados.		4. Trabajos en caliente, corte, soldadura u otros que generan chispas.		6. Trabajos con materiales peligrosos.	X

III. ANÁLISIS DE RIESGOS

A) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - USO OBLIGATORIO (Marca con una "X").

Protección Ocular	Protección Auditiva	Guantes de Seguridad	Guantes aislantes	Botas Aislantes	Botas de Seguridad	Ropa de Trabajo	Casco de proteccion	Mascarilla	Máscara para Soldar
X		X			X	X	X	X	

B) ADVERTENCIA (Marca con una "X")

Riesgo Auditivo	Soldadura	Riesgo Eléctrico	Atrapamiento de Mnaos	Caída de Objetos	Piso resbaladizo	Riesgo de Explosión	Peligro Inflamable	Cuidado gas Comprimido	Riesgo de Accidentes

C) MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a utilizar)

Eslingas arnes Hidrolavadora extinciones mangueras espatulas

D) ACTIVIDADES A REALIZAR

N°	Tarea / Actividad Operativa	Identificar Peligro	Riesgo	Medidas de control
1	Lavado de piedra con rinse restaurador	caidas	Altura	utilizar los equipos contra caidas
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

IV. LISTA DE PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMA
1	luis alexandir linares	79875472	
2	Salomon Porros	79820766	
3	luis carlos ultengo	10814198 47	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

VI. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

○	Peligrosos	☐
●	No reaprovechables	☐
○	Varios Aprovechables (vidrio, otros)	☐
○	Plásticos	☐
○	Papel y Cartón	☐
○	Metal	☐
○	Orgánicos	☐

Otros (Especificar):

Riesgo Quimico

Descripción de la eliminación de residuos sólidos:

V. REPORTE DE INCIDENTES:

Información importante que puede evitar accidentes.

¿Se identificaron incidentes durante la jornada de trabajo?

SI [ ] NO [X]

De ser afirmativo generar el reporte de incidente y entregar al Jefe o Superior.

INCIDENTE	REPORTADO POR:

luis alexandir linares

Nombre, Apellido y firma del Instructor / Colaborador Responsable de la tarea operativa

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

FECHA: 23 / 04 / 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ZONAL/CFP/UFP/ÁREA: Parroquia San juan bautista villa pinzon

SEMESTRE / PERIODO: 0-20-25

MÓDULO FORMATIVO / CURSO: cordinador alturas

PROYECTO / TAREA / ACTIVIDAD: parroquia sanjuan bautista - Resanes piedra i lavado

INSTRUCTOR / COLABORADOR RESPONSABLE: luis alexander linares

Repaso de preguntas antes de iniciar una tarea:
1. ¿Qué tengo qué hacer?
2. ¿Cómo lo voy a hacer?
3. ¿Qué necesito para hacerlo?
4. ¿Es posible que me pueda accidentar?
5. ¿Qué haré para evitarlo?

II. TRABAJOS DEFINIDOS DE ALTO RIESGO. Ud. Deberá solicitar autorización para su realización

1. Trabajo en altura (mayor a 1.8 mt).	X	3. Trabajos de izaje y montaje de estructuras.		5. Trabajos en subestaciones eléctricas.	
2. Trabajos en espacios confinados.		4. Trabajos en caliente, corte, soldadura u otros que generan chispas.		6. Trabajos con materiales peligrosos.	X

III. ANÁLISIS DE RIESGOS

A) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - USO OBLIGATORIO (Marca con una "X").

Protección Ocular	Protección Auditiva	Guantes de Seguridad	Guantes aislantes	Botas Aislantes	Botas de Seguridad	Ropa de Trabajo	Casco de proteccion	Mascarilla	Máscara para Soldar
X		X			X	X	X	X	

B) ADVERTENCIA (Marca con una "X")

Riesgo Auditivo	Soldadura	Riesgo Eléctrico	Atrapamiento de Mnaos	Caida de Objetos	Piso resbaladizo	Riesgo de Explosión	Peligro Inflamable	Cuidado gas Comprimido	Riesgo de Accidentes

C) MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a utilizar)

palustres espatulas
arnes eslingas Hidrolavadora. extenciones

D) ACTIVIDADES A REALIZAR

N°	Tarea / Actividad Operativa	Identificar Peligro	Riesgo	Medidas de control
1	Resanes en piedra y lavado con químicos y desengrasantes	caidas y quimicos	altura y quimico	utilizar los epp y protección personal
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

IV. LISTA DE PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMA
1	Luis Alexander Linares	79875472	
2	Luis Carlos Hitengo	1081418847	
3	Solano Carlos	29820766	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

V. REPORTE DE INCIDENTES:

Información importante que puede evitar accidentes.
¿Se identificaron incidentes durante la jornada de trabajo?
SI [ ] NO [X]

De ser afirmativo generar el reporte de incidente y entregar al Jefe o Superior.

INCIDENTE	REPORTADO POR:

VI. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

●	Peligrosos	☐
●	No reaprovechables	☐
●	Varios Aprovechables (vidrio, otros)	☐
○	Plásticos	☐
●	Papel y Cartón	☐
○	Metal	☐
●	Orgánicos	☐

Otros (Especificar):

Riesgos Químicos Quemaduras

Descripción de la eliminación de residuos sólidos:

Luis Alexander Linares

Nombre, Apellido y firma del Instructor / Colaborador Responsable de la tarea operativa

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

FECHA: 22 / 04 / 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ZONAL/CFP/UFP/ÁREA: parroquia sanjuan bautista villa pinzon
SEMESTRE / PERIODO: - 01 20.25
MÓDULO FORMATIVO / CURSO: cordinador w/d
PROYECTO / TAREA / ACTIVIDAD: parroquia sanjuan bautista actividad Resanes y pintado
INSTRUCTOR / COLABORADOR RESPONSABLE: luis alexander linares

Repaso de preguntas antes de iniciar una tarea:
1. ¿Qué tengo qué hacer?
2. ¿Cómo lo voy a hacer?
3. ¿Qué necesito para hacerlo?
4. ¿Es posible que me pueda accidentar?
5. ¿Qué haré para evitarlo?

II. TRABAJOS DEFINIDOS DE ALTO RIESGO. Ud. Deberá solicitar autorización para su realización

1. Trabajo en altura (mayor a 1.8 mt).	X	3. Trabajos de izaje y montaje de estructuras.		5. Trabajos en subestaciones eléctricas.	
2. Trabajos en espacios confinados.		4. Trabajos en caliente, corte, soldadura u otros que generan chispas.		6. Trabajos con materiales peligrosos.	X

III. ANÁLISIS DE RIESGOS

A) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - USO OBLIGATORIO (Marca con una "X").

Protección Ocular	Protección Auditiva	Guantes de Seguridad	Guantes aislantes	Botas Aislantes	Botas de Seguridad	Ropa de Trabajo	Casco de proteccion	Mascarilla	Máscara para Soldar
X		X			X	X	X	X	

B) ADVERTENCIA (Marca con una "X")

Riesgo Auditivo	Soldadura	Riesgo Eléctrico	Atrapamiento de Mnaos	Caida de Objetos	Piso resbaladizo	Riesgo de Explosión	Peligro Inflamable	Cuidado gas Comprimido	Riesgo de Accidentes

C) MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a utilizar)

arnes eslingas cuerdas
Raspetas espatulas

D) ACTIVIDADES A REALIZAR

N°	Tarea / Actividad Operativa	Identificar Peligro	Riesgo	Medidas de control
1	Resanes de piedra y pintado	caidas	alturas	utilizar equipos de alturas
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

IV. LISTA DE PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMA
1	Luis alexander Tuarez	74871472	
2	Luis carlos ultengo	1081418847	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

V. REPORTE DE INCIDENTES:

Información importante que puede evitar accidentes.
¿Se identificaron incidentes durante la jornada de trabajo?
SI [ ] NO [X]

De ser afirmativo generar el reporte de incidente y entregar al Jefe o Superior.

INCIDENTE	REPORTADO POR:

VI. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

●	Peligrosos	☐
●	No reaprovechables	☐
●	Varios Aprovechables (vidrio, otros)	☐
○	Plásticos	☐
●	Papel y Cartón	☐
○	Metal	☐
●	Orgánicos	☐

Otros (Especificar):
Quimicos y caidas

Descripción de la eliminación de residuos sólidos:

Luis alexander Tuarez

Nombre/Apellido y firma del Instructor / Colaborador Responsable de la tarea operativa

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

FECHA: 21/04/2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ZONAL/CFP/UFP/ÁREA: parroquia Sangay bautista villa pinzon
SEMESTRE/ PERIODO: 01 2025
MÓDULO FORMATIVO / CURSO: cordinador A.T
PROYECTO/ TAREA / ACTIVIDAD: parroquia Sangay bautista enbaguetado y relleno
INSTRUCTOR / COLABORADOR RESPONSABLE: Luis alexander Tivanes

Repaso de preguntas antes de iniciar una tarea:
1. ¿Qué tengo qué hacer?
2. ¿Cómo lo voy a hacer?
3. ¿Qué necesito para hacerlo?
4. ¿Es posible que me pueda accidentar?
5. ¿Qué haré para evitarlo?

II. TRABAJOS DEFINIDOS DE ALTO RIESGO. Ud. Deberá solicitar autorización para su realización

1. Trabajoen altura (mayor a 1.8 mt).	X	3. Trabajos de izaje y montaje de estructuras.		5. Trabajos en subestaciones eléctricas.	
2. Trabajoen espacios confinados.		4. Trabajos en caliente, corte, soldadura u otros que generan chispas.		6. Trabajos con materiales peligrosos.	X

III. ANÁLISIS DE RIESGOS

A) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - USO OBLIGATORIO (Marca con una "X").

Protección Ocular	Protección Auditiva	Guantes de Seguridad	Guantes aislantes	Botas Aislantes	Botas de Seguridad	Ropa de Trabajo	Casco de proteccion	Mascarilla	Máscara para Soldar
X		X			X	X	X		

B) ADVERTENCIA (Marca con una "X")

Riesgo Auditivo	Soldadura	Riesgo Eléctrico	Atrapamiento de Manos	Caída de Objetos	Piso resbaladizo	Riesgo de Explosión	Peligro Inflamable	Cuidado gas Comprimido	Riesgo de Accidentes

C) MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a utilizar)

Roladora el pedulas
arner eslingas

D) ACTIVIDADES A REALIZAR

N°	Tarea / Actividad Operativa	Identificar Peligro	Riesgo	Medidas de control
1	Rasuar de piedra y afinado	Caidas	altura	utilizar equipos de seguridad
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
