CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1

2. OBJETO DEL CONTRATO 1

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
¡Error! Marcador no definido.

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
32

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 5

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 8

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	23000931 H4 DE 2023
Nombre del Contratista:	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
Periodo informe:	Del 12 de septiembre de 2023 al 25 de noviembre de 2023
Nombre de Supervisor:	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Regional Antioquia

2. OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTARIA EN EL AEROPUERTO DE URRAO."

3. EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ESTACION ALS RIO NEGRO:

1. ACTIVIDADES TECNICAS.

1.1 Localización y replanteo (lado aire).

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	LOCALIZACION Y REPLANTEO
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisar (a) delegada (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
LOCALIZACION MANGA VELETA 1	7,50	7,50	3,14	1,00	176,72
LOCALIZACION MANGA VELETA 2	7,50	7,50	3,14	1,00	176,72
LOCALIZACION CALZADA	45,00	6,00			270,00
LOCALIZACION HELIPUERTO	8,45	8,47	3,14	1,00	224,81
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					848,24
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					848,24
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2.6 Excavacion zapatas

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	EXCAVACION ZAPATAS
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ZAPATAS 1	0,80	0,80	0,70	8,00	3,58
ZAPATAS 2	0,60	0,60	0,40	4,00	0,58
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4,16
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					4,16
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO







2.7 Excavación vigas de cimentación

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	EXCAVACION VIGA DE CIMENTACION
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
VIGA 1	11,30	0,30	0,30	2,00	2,03
VIGA 2	3,70	0,30	0,30	3,00	1,00
VIGA 3	1,80	0,20	0,20	4,00	0,29
VIGA 4	13,00	0,20	0,20	1,00	0,52
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					3,84
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					3,84
TOTAL POR EJECUTAR					

Página 1



2.8 Excavación terreno e=0,30

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	EXCAVACION TERRENO E 0,30 MT
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegada (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
EXACAVCION	20,00	0,40	1,50	1,00	12,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					12,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					12,00
TOTAL POR EJECUTAR					590,00

Página 1



2.9 Acero de refuerzo 60.000 psi.

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) o delegada (a) por el IDU)

UBICACIÓN	ML	VARILLA DE 6 M	PESO DE VARRILA KG	CANTIDAD	TOTAL
VARIILA 1/2	770,00	6,00	1,00	766,92	766,92
VARILLA DE 3/8	175,00	6,00	0,56	98,00	98,00
FLEJES DE 3/8	375,00		0,56	210,00	210,00
FLEJES DE 1/4	214,00		0,38	81,32	81,32
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1156,24
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1156,24
TOTAL POR EJECUTAR					

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2.10 Malla eslabonada

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	MALLA ELESCTROSOLDADA
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) o delegada (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
MALLA ESLABONADA	6,00	2,50		19,00	285,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					285,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					285,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1



2.11 Concreto de limpieza e= 0,05

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CONCRETO DE LIMPIEZA e=0,05 M
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ZAPATAS 1	0,80	0,80	0,05	8,00	5,12
ZAPATAS 2	0,60	0,60	0,05	4,00	1,44
VIGA DE AMARRE 1	11,30	0,30	0,05	2,00	6,78
VIGA DE AMARRE 2	3,70	0,30	0,05	3,00	3,33
VIGA GARITAS	1,70	0,20	0,05	4,00	1,36
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					18,03
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					18,03
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1



2.12 Placa en contrapiso e=0,10.

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=0,10
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PLACA BODEGA	12,35	4,10		1,00	50,64
PLACA GARITA	4,00	4,00		1,00	16,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					66,64
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					66,64
TOTAL POR EJECUTAR					211,17

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2.14 Base de recebo

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	BASE RECEBO
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
BOEGA	12,35	4,10	0,07	1,00	3,54
GARITA NUEVA	4,00	4,00	0,07	1,00	1,12
TUBERIA	28,00	0,75	1,20	1,00	25,33
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					30,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					30,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1



2.15 Concreto Zapatas, Pedestales y viga de cimentación.

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CONCRETO PARA ZAPATAS,PEDESTALES Y VIGAS DE CIMENTACION
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ZAPATAS 1	0,80	0,80	0,40	8,00	2,05
ZAPATAS 2	0,60	0,60	0,30	4,00	0,43
VIGA 1	11,30	0,30	0,30	2,00	2,03
VIGA 2	3,70	0,30	0,30	3,00	1,00
VIGA GARITA	1,80	0,20	0,15	4,00	0,22
PEDESTALES	0,30	0,30	0,30	8,00	0,22
VIGA DIVISION PISTA	13,00	0,15	0,20	1,00	0,39
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					6,34
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					6,34
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Pagina 1



2.16 Concreto para Vigas Aereas

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CONCRETO PARA VIGAS AEREAS 2,60 MTS
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
VIGA1	11,30	0,30	0,30	2,00	2,03
VIGA2	3,70	0,30	0,30	3,00	1,00
VIGA GARITA	1,80	0,20	0,15	4,00	0,22
VIGA MURO DIVISION	10,00	0,20	0,15	1,00	0,30
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					3,55
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					3,55
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2.17 Concreto para Columnas 0,30 x 0,30

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CONCRETO PARA COLUMNAS 0,30 X 0,30
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
COLUMNAS 0,3 X 0,3	2,64	0,30	0,30	8,00	1,90
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,90
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1,90
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1



2.18 Dinteles incluye 2 varillas de 1/”2

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	DINDELES EN MANPOSTERIA INCLUYE REFUERZO DE 2 VARRILAS DE 1/2"
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
DINTEL PARA VENTANA BODEGAS	2,00	1,00	1,00	3,00	6,00
DINTEL PARA PUERTA BODEGA	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
DINTEL PARA VENTANA GARITA	0,85	1,00	1,00	3,00	2,55
DINTEL PARA PUERTA GARITA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					11,55
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					11,55
TOTAL POR EJECUTAR					8,45

Página 1



2.21 Muro em Bloque de Concreto e=12 cm

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=12 CM
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
BLOQUE EN CONCRETO E=12 CM	12,35		2,80	1,00	34,58
BLOQUE EN CONCRETO E=12 CM	12,35		2,40	1,00	29,64
BLOQUE EN CONCRETO E=12 CM	4,10		2,80	3,00	34,44
BLOQUE EN CONCRETO E=12 CM GARITA	1,80		2,00	4,00	14,40
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					113,06
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					113,06
TOTAL POR EJECUTAR					24,94

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2.22 Pañete em muro liso Interior y exterior incluye Filos y Dilataciones

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	PAÑETE EN MURO LISO INTERIOR E EXTERIOR-FILOS Y DILATACIONES
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
BLOQUE EN CONCRETO E=12 CM	12,35		3,35	4,00	165,49
BLOQUE EN CONCRETO E=12 CM (-)	2,00		1,00	10,00	20,00
BLOQUE EN CONCRETO E=12 CM	4,10		3,35	6,00	82,41
BLOQUE EN CONCRETO E=12 CM GARITA	1,80		2,00	8,00	28,80
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					256,70
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					256,70
TOTAL POR EJECUTAR					43,30

Página 1



2.25 Tubería de 1”2

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	TUBERIA 1/2"
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisar (a) delegada (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TUBO ELECTRICO 1/2"	3,00			36,00	108,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					108,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					108,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1



2.26 Tubería ¾

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	TUBERIA 3/4
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegada (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TUBOS 3/4	3,00			17,33	52,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					52,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					52,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2.28 Puntos sanitarios 2”

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	PUNTOS SANITARIOS 2"
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegada (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PUNTO SANITARIO BODEGAS				4,00	4,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					4,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1



2.29 Puntos Sanitarios de 4”

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	PUNTOS SANITARIOS DE 4"
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegada (o) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PUNTO SANITARIO				3,00	3,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					3,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					3,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1



2.30 Tubería Sanitaria de 2”

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	TUBERIA SANITARIA DE 2"
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TUBOERIA DE 2 PULGADAS	3,00			17,67	53,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					53,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					53,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2.31 Tubería Sanitaria de 4”

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	TUBERIA SANITARIA DE 4"
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TUBOERIA DE 4 PULGADAS	6,00			5,00	30,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					30,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					30,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1



2.39 Salida Toma corriente doble

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
INTERRUPTOR DOBLE				8,00	8,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					8,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					8,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1



2.45 Tubería de ½

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	TUBERIA 1/2"
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TABLERO ELCTRICO DE 8 CIRCUITOS CON BRAKES				1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2.46 Acometida eléctrica desde tablero terminal hasta bodega nueva

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE EL TABLERO TERMINAL HASTA NUEVA BODEGA
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TUBERIA ELECTRICA	3,00			14,33	43,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					43,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					43,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1



2.75 Regata con pulidora en la pared para tubería eléctrica y agua

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	REGATA CON PULIDORA EN PARED PARA TUBERIA ELECTRICA Y AGUA
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
REGATA CON PULIDORA	1,00			12,90	12,90
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					12,90
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					12,90
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1



2.76 Resana, adecuación de superficie y pintura de regata para puntos eléctricos y tubería de agua potable, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	Resane, adecuación de superficie y pintura de regata para puntos eléctricos y tuberias de agua potable, incluye todo lo necesario para su funcionamiento
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisar (a) delegada (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
RESANE BODEGA			12,42	1,00	12,42
RESANE PIEZA			12,00	1,00	12,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					24,42
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					24,42
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1



NP1 Localizacion y replanteo (lado tierra)

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	Localizacion y replanteo
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisar (a) delegada (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CONSTRUCCION DE BODEGA	12,35	5,70		1,00	70,40
ANDEN	24,00	1,20		1,00	28,80
GARITA	4,00	4,00		1,00	16,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					115,20
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					115,20
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1



NP2 Descapote manual

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	DESCAPOTE MANUAL
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
BODEGA	12,35	5,70		1,00	70,40
ANDEN	24,00	1,20		1,00	28,80
GARITA	4,00	4,00		1,00	16,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					115,20
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					115,20
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1



NP5 Demolición de piso, enchape y granito incluye trasiego

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	DEMOLICION DE PISO ENCHAPE Y GRANITO INCLUYE TRANSIEGO
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO

Objeto del Contrato
Escriba claramente el objeto de acuerdo con lo establecido en el contrato.

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
BALDOSA ANDEN GRANITO	35,00	1,52			53,20
ENCHAPE BAÑO		5,00	2,00		10,00
BALDOSA PISTA	4,43	7,50			33,19
DEMOLICION ANILLO MANGA VELETA 1					63,61
					160,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					160,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1



NP6 Concreto para columnetas

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CONCRETO PARA COLUMNETAS
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
COLUMNETAS BODEGA	0,15	0,20	2,40	6,00	0,43
COLUMNETAS GARITA	0,15	0,20	2,00	4,00	0,24
					0,67
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					0,67
TOTAL POR EJECUTAR					0,17

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



NP8 Suministro e instalación tubería 6”

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 6"
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TUBERIA SALIENTE DE PARQUEADERO A POZO SEPTICO	6,00			13,00	78,00
					78,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					78,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ACTA 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES PRESENTE ACTA PARCIAL 1	
			CANT	VALOR PARCIAL
1	**LADO AIRE**			
1,1	Localización y replanteo	m2	848,24	$ 2.216.352,00
1,2	Descapote a máquina en material común (e=10 cm) incluye cargue y retiro de material sobrante.	m2		$ -
1,3	Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye entibado temporal, cargue, transporte y botada de material	m3		$ -
1,4	Conformación de la calzada existente (especificaciones invias articulo 310), incluye ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA	m2		$ -
1,5	Suministro, transporte y colocación de SUB BASECON AFIRMADO DE LA ZONA, de tamaño máximo 1 1/2", compactada con medios mecánicos hasta una densidad del 95% del proctor modificado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Con un espesor mínimo de 0.15 m. y su medida será en el sitio ya compactada.	m3		$ -
1,6	Mástil 3,50 mts en tuberia Galvanizada de 1" y 1 1/4"aeronáutico con mangaveleta tipo tempestad sin logo	un		$ -
1,7	Mangaveleta Impermeable 45x24x200 cm, Tipo Tempestad Sin Logo (REPUESTO)	un		$ -
1,8	Construccion de señalizacion de mangaveletas en concreto 123, forma (anillo circular) donde su radio mayor es de 7,5 m y su radio menor es 6,3 m, espesor e=0,07 cm, ancho 1.5 m juntas de madera cada 1.50 m. Incluye pintura a base de aceite color blanco para demarcacion de mangaveleta.	m3		$ -
1,9	Construccion de base para mangaveleta en concreto 1,2,3, (cilindro circular recto) donde su radio 0,6 m h= 1. Incluye pintura a base de aceite de color blanco para demarcacion de mangaveletas.	m3		$ -
1,10	Suministro de Poste y malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, con el fin de sellar espacios entre postes y columnas en concreto, del cerramiento antiguo.	m2		$ -
1,11	Suministro e instalacion de tuberia metalica galvanizada, de 1,5" con un espacio entre tubo de 5 cm, con elementos verticales y horizontales en espacios debajo de muros de cerramiento, incluye concreto ciclopeo en la base de la tuberia.	m2		$ -
1,12	Tapas en Alfajor Calibre 11 (con recubrimiento galvanizado,zincado o similar), resaltes o taches en la superficie, para cajas de inspección de alcantarrillado. Incluye marco metalico, agarradera y pintura amarilla. Codio RS4-004 Tapa para Caja y camara de derivación de EPM	m2		$ -
2	**LADO TIERRA**			
2.1	Retiro de pasamanos	m2		$ -
2.2	Retiro de puertas	un		$ -
2.3	Demolición de muro culaquier espesor	m2		$ -
2.4	Desmonte de aparato sanitario (Incluye Retiro)	un		$ -
2.5	Desmonte de lavamanos (Incluye Retiro)	un		$ -
2.6	Excavaciones zapatas e=1,45 m	m3	4,16	$ 222.138,00
2.7	Excavacion vigas de cimentacion	m3	3,84	$ 205.050,00
2.8	Excavacion terreno e= 0,30mt	m3	12,00	$ 662.053,00
2.9	Acero de refuerzo 60,000PSI	KG	1156,24	$ 8.027.547,00
2.10	Malla elctrosoldada Q4 C.6mm de 15*15cm	KG	285,00	$ 2.010.886,00
2.11	Concreto de limpieza e= 0,05mt	m2	18,03	$ 903.620,00
2.12	Placa de contrapiso en concreto e= 0,10 mt	m2	66,64	$ 5.343.712,00
2.13	Afinado de piso e=,05mt	m2		$ -
2.14	Base en recebo	m3	30,00	$ 3.351.496,00
2.15	Concreto para zapatas, pedestales y vigas de cimentacion	m3	6,34	$ 6.778.069,00
2.16	Concreto para vigas aereas N+2,6 mt	m3	3,55	$ 4.308.456,00
2.17	Concreto para columnas 30*30cm	m3	1,90	$ 2.328.464,00
2.18	Dinteles en mamposteria, incluye refuerzo de 2 varillas de 1/2"	ml	11,55	$ 10.155.917,00

B. **ACTIVIDADES AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL**.

1. AFILIACION DEL PERSONAL.

Se verificó que todo el personal que labora en la obra esté afiliado al sistema de seguridad social.

2. INDUCCION AEROCIVIL.

Se realizó la inducción de la Aerocivil a todo el personal que labora en la obra.

3. DOTACION DEL PERSONAL.

Se entregó la dotación requerida para los trabajos a ejecutar, así como los elementos de protección personal para minimizar los riesgos por accidentes de trabajo. Se cumple con los requerimientos de trabajo seguro en alturas, contando con los respectivos permisos para el personal que realiza dichas actividades. Además se cumple con protocolos de bioseguridad establecidos.

4. SEÑALIZACION DE OBRA.

Se realizó la señalización de la obra, con cinta, para lograr un espacio adecuado y seguro de trabajo, en los espacios que presentan riesgo para el personal.

5. CAPACITACIONES AL PERSONAL.

Se realiza diferentes charlas al personal en temas relacionados con:

- Manejo de residuos sólidos.
- Utilización de elementos de protección personal.
- Manejo de herramientas de trabajo.
- Trabajo seguro en obra.

6. REVISION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Se verifico que tanto el equipo, vehículos y herramienta cumpliera con los requisitos técnicos y de seguridad. En cuanto a vehículos que se cuente con los documentos como SOAT, revisión técnico mecánica vigentes, y en cuanto a herramienta que estén adecuadas para laborar, realizándole el debido mantenimiento.

C. **SEGUIMIENTO PROGRAMACION.**

Se lleva control adecuado del programa de obra presentado, no obstante, las lluvias que se han presentado durante varios días de labores, así como la falta de materiales en la zona y trasladarlos vía terrestre hacia el Aeropuerto, lo que ha dificultado el acceso de personal y materiales al sitio de obra.

Registro fotográfico de actividades ejecutadas y supervisadas.






























































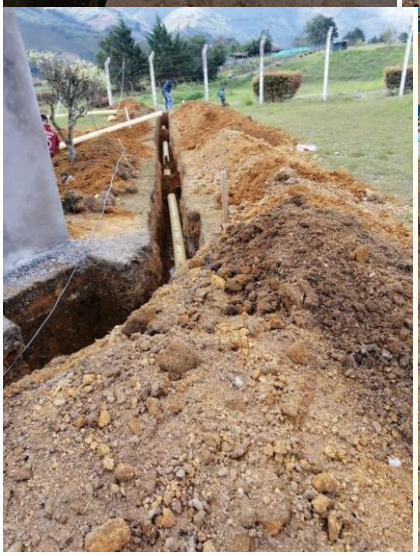

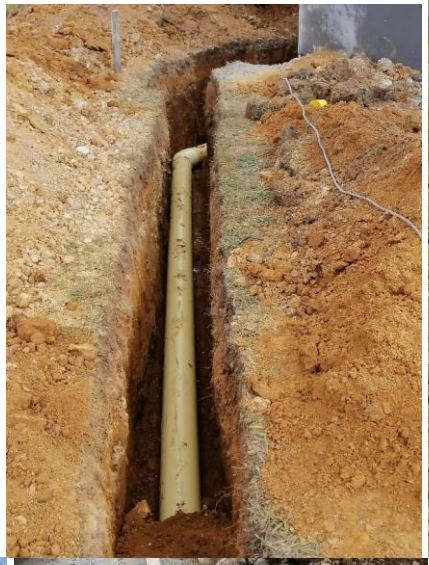


2.1 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

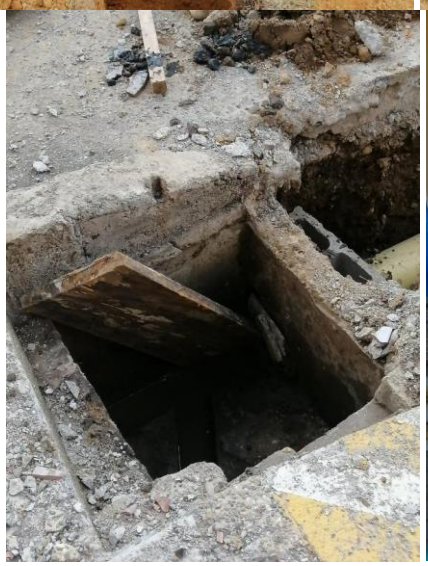De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo se realizó la entrega de la estación cerro verde, en la cual se pudo evidenciar en la visita realizada que se cumplieron al 100% todos los ítems contratados para estas instalaciones.

OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presenta ninguna observación.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

3.1 ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: No se materializo ningún riesgo		

3.2 VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

3.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
N/A	

¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
N/A	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
N/A	

3.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
16 de octubre de 2023	

3.3 PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		x

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección administrativa informe.

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

4.1 AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
23000931 H4 DE 2023	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTARIA EN EL AEROPUERTO DE URRAO	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($416.121.522.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	Del 12 de septiembre de 2023 al 25 de noviembre de 2023	$416.121.522	$0	$ 100.796.469,00

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 24.22% hasta el 25 de noviembre de 2023.

5.2 AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Al corte mensual del 25 de noviembre de 2023 se entrega el informe mensual correspondiente.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

SUPERVISOR
