ANEXO 2.
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES


CONCREFORMAS Y AGREGADOS LTDA.

Oficina: Calle 74 Sur N° 17 L-49 **Planta:** Carrera 17F N° 73B-01 sur **Telefax:** 766 4231 – 631 8035
Celular: 313 319 0060 **E-mail:** concreformasagr@yahoo.es Bogotá D.C. Colombia

VERSION:01/18

FICHA TÉCNICA

A-10

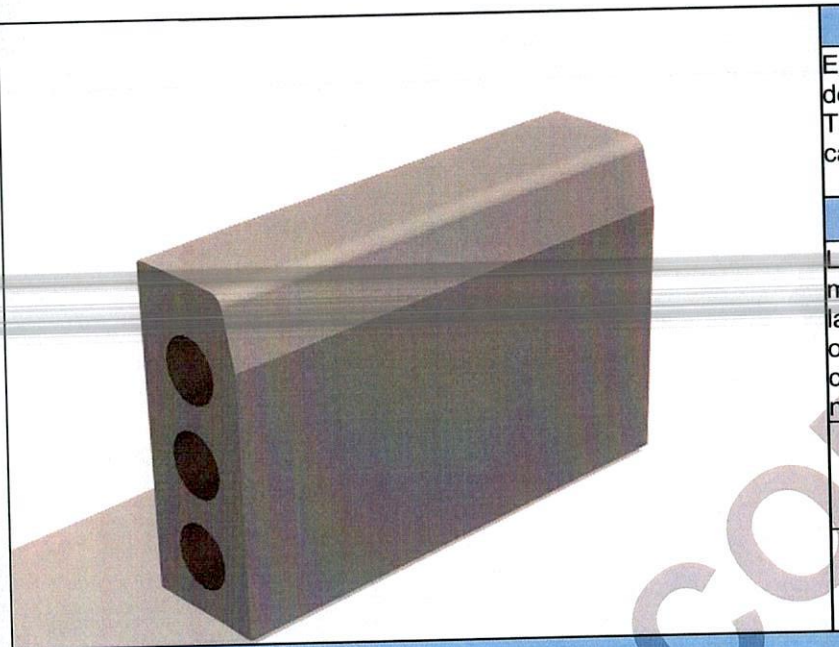

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El movimiento debe efectuarse cuidadosamente de manera que se eviten desportilladuras. No se debe hacer arrastrando las piezas sobre el piso. Tampoco se deben trasladar apoyandolos sobre los cantos mediante cabeceos susesivos.

OBSERVACIONES

Las fisuras menores, inherentes al método de fabricación, o las desportilladuras menores que resultan de los métodos usuales de manipulación en el despacho y en la entrega, no son motivo de rechazo. Las texturas de las caras pueden ser rústicas o lisas. Para el acabado liso de la pieza es sometida a un reproceso de afinado con cemento, aditivo y arena fina, lo cual es apreciable a simple vista. Este tratamiento no afecta el funcionamiento ni la estética de la pieza.

USO Y APLICACIÓN	Confinamiento.Estructura para desague de vías.
NORMATIVIDAD APLICADA	NTC 4109

ESPECIFICACION

DIMENSIONES	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**TOLERANCIAS**	**LONGITUD**	± 5 mm.
	80 cm	**20 cm**	**50 cm**		**ANCHO**	± 3 mm.
COLOR	GRIS				**ESPESOR**	± 3 mm
TEXTURA	LISA					
PESO SECO	140 Kg					
RENDIMIENTO	1.25 un/ml					
MÓDULO ROTURA- Promedio	4.0 Mpa. Mínimo					
MÓDULO ROTURA- Unidad	3.5 Mpa. Mínimo					

Firma y Sello_____


CONCREFORMAS Y AGREGADOS LTDA.

COPIA CONTROLADA

CONCREFORMAS Y AGREGADOS LTDA.

Oficina: Calle 74 Sur N° 17 L-49 **Planta:** Carrera 17F N° 73B-01 sur **Telefax:** 766 4231 – 631 8035
Celular: 313 319 0060 **E-mail:** concreformasagr@yahoo.es Bogotá D.C. Colombia

VERSION:01/18
FICHA TÉCNICA
A-80

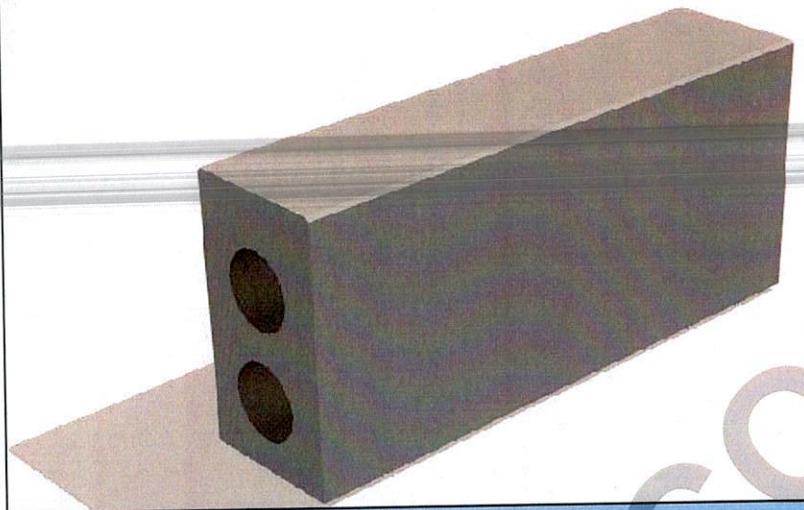

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El movimiento debe efectuarse cuidadosamente de manera que se eviten desportilladuras. No se debe hacer arrastrando las piezas sobre el piso. Tampoco se deben trasladar apoyandolos sobre los cantos mediante cabeceos susesivos.

OBSERVACIONES

Las fisuras menores, inherentes al método de fabricación, o las desportilladuras menores que resultan de los métodos usuales de manipulación en el despacho y en la entrega, no son motivo de rechazo. Las texturas de las caras pueden ser rústicas o lisas. Para el acabado liso de la pieza es sometida a un reproceso de afinado con cemento, aditivo y arena fina, lo cual es apreciable a simple vista. Este tratamiento no afecta el funcionamiento ni la estética de la pieza.

USO Y APLICACIÓN	Confinamientos de materiales, separador cuando hay cambio de materiales en una misma área y como bordes en zonas verdes
NORMATIVIDAD APLICADA	NTC 4109

ESPECIFICACION

DIMENSIONES	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**
	80 cm	**20 cm**	**35 cm**
COLOR	GRIS		
TEXTURA	LISA		
PESO SECO	96 Kg		
RENDIMIENTO	1.25 un/ml		
MÓDULO ROTURA- Promedio	4.0 Mpa. Mínimo		
MÓDULO ROTURA- Unidad	3.5 Mpa. Mínimo		

TOLERANCIAS	**LONGITUD**	± 5 mm.
	ANCHO	± 3 mm.
	ESPESOR	± 3 mm

Firma y Sello_____

CONCREFORMAS Y AGREGADOS LTDA.

COPIA CONTROLADA


CONCREFORMAS Y AGREGADOS LTDA.

Oficina: Calle 74 Sur N° 17 L-49 **Planta:** Carrera 17F N° 73B-01 sur **Telefax:** 766 4231 – 631 8035
Celular: 313 319 0060 **E-mail:** concreformasagr@yahoo.es Bogotá D.C. Colombia

VERSION:01/18

FICHA TÉCNICA

A-85

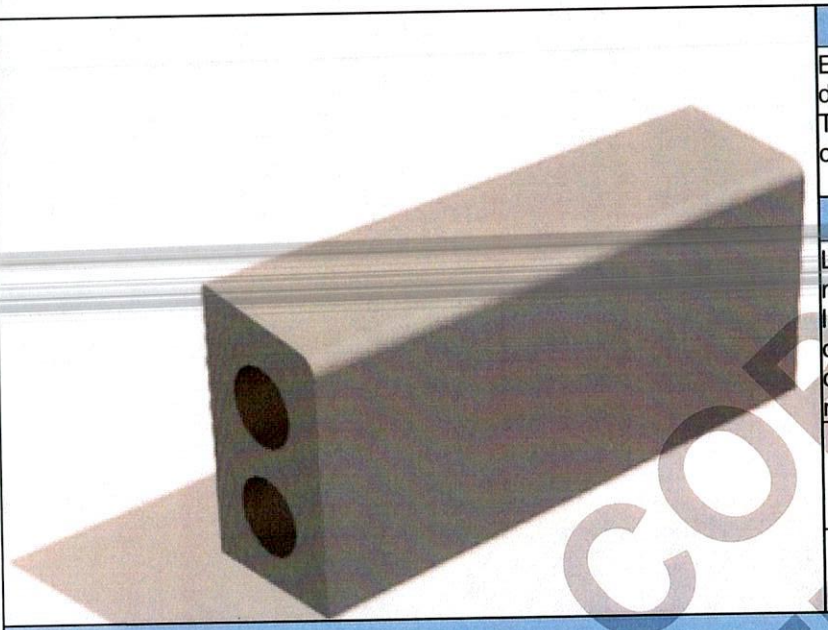

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El movimiento debe efectuarse cuidadosamente de manera que se eviten desportilladuras. No se debe hacer arrastrando las piezas sobre el piso. Tampoco se deben trasladar apoyandolos sobre los cantos mediante cabeceos susesivos

OBSERVACIONES

Las fisuras menores, inherentes al método de fabricación, o las desportilladuras menores que resultan de los métodos usuales de manipulación en el despacho y en la entrega, no son motivo de rechazo. Las texturas de las caras pueden ser rústicas o lisas. Para el acabado liso de la pieza es sometida a un reproceso de afinado con cemento, aditivo y arena fina, lo cual es apreciable a simple vista. Este tratamiento no afecta el funcionamiento ni la estética de la pieza

USO Y APLICACIÓN	Se instala en rampas o pasos peatonales, de manera que exista continuidad en el sardinel
NORMATIVIDAD APLICADA	NTC 4109

ESPECIFICACION

DIMENSIONES	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**TOLERANCIAS**	**LONGITUD**	
	80 cm	**20 cm**	**35 cm**		**ANCHO**	
COLOR	GRIS				**ESPESOR**	
TEXTURA	LISA					
PESO SECO	97 Kg					
RENDIMIENTO						
MÓDULO ROTURA- Promedio	4.0 Mpa. Mínimo					
MÓDULO ROTURA- Unidad	3.5 Mpa. Mínimo					

Firma y Sello_____

CONCREFORMAS Y AGREGADOS LTDA.

COPIA CONTROLADA


CONCREFORMAS Y AGREGADOS LTDA.

Oficina: Calle 74 Sur N° 17 L-49 **Planta:** Carrera 17F N° 73B-01 sur **Telefax:** 766 4231 – 631 8035
Celular: 313 319 0060 **E-mail:** concreformasagr@yahoo.es Bogotá D.C. Colombia

VERSION:01/18

FICHA TÉCNICA

A-120

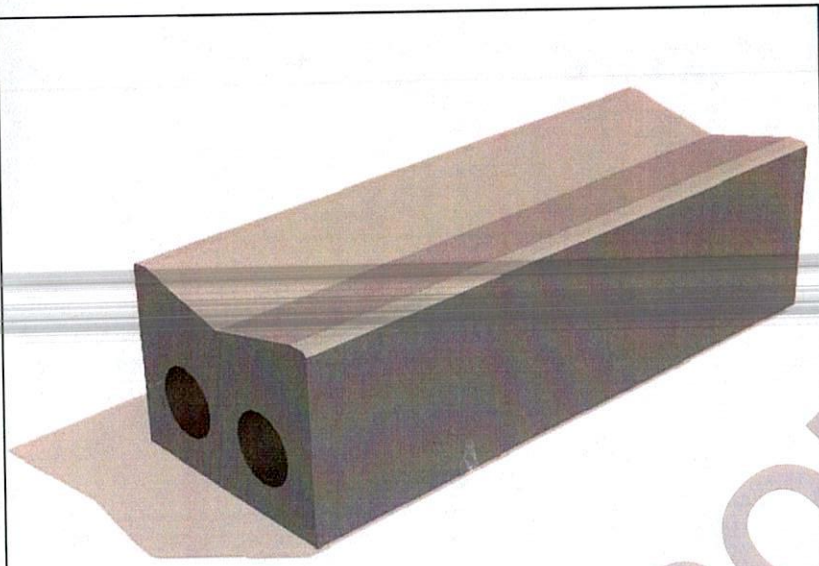

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El movimiento debe efectuarse cuidadosamente de manera que se eviten desportilladuras. No se debe hacer arrastrando las piezas sobre el piso. Tampoco se deben trasladar apoyandolos sobre los cantos mediante cabeceos susesivos.

OBSERVACIONES

Las fisuras menores, inherentes al método de fabricación, o las desportilladuras menores que resultan de los métodos usuales de manipulación en el despacho y en la entrega, no son motivo de rechazo. Las texturas de las caras pueden ser rústicas o lisas. Para el acabado liso de la pieza es sometida a un reproceso de afinado con cemento, aditivo y arena fina, lo cual es apreciable a simple vista. Este tratamiento no afecta el funcionamiento ni la estética de la pieza.

USO Y APLICACIÓN	Confinamiento.Estructura para desague de vías.
NORMATIVIDAD APLICADA	NTC 4109

ESPECIFICACION

DIMENSIONES	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**TOLERANCIAS**	**LONGITUD**	± 5 mm.
	80 cm	**30 cm**	**22.5 cm**		**ANCHO**	± 3 mm.
COLOR	GRIS				**ESPESOR**	± 3 mm
TEXTURA	LISA					
PESO SECO	96 Kg					
RENDIMIENTO	1.25 un/ml					
MÓDULO ROTURA- Promedio	4.0 Mpa. Mínimo					
MÓDULO ROTURA- Unidad	3.5 Mpa. Mínimo					

Firma y Sello_____

CONCREFORMAS Y AGREGADOS LTDA.

COPIA CONTROLADA

PAVCO wavin

GEOCELDA HDPE

2912462

GEOCELDA 445 - 150 PERFORADA

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

LOTE 231099

MEXICHEM COLOMBIA S.A.S (PAVCO WAVIN GEOSINTETICOS), *certifica que la geocelda cumple con los valores de las propiedades abajo mencionada; Nuestro laboratorio cuenta acreditación* ***GAI LAP (The Geosynthetic Institute),*** *nuestras soluciones han sido manufacturado bajo los controles establecidos por un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 certificado por* ***ICONTEC Internacional.***

PROPIEDADES FÍSICAS	METODO DE ENSAYO	UNIDAD	VALOR
Altura Celda	Medido	mm	150
Dimensiones de la sección expandida		m	5,04 x 9,12
Área de la sección expandida		m²	45,96
Dimensiones de la celda abierta		mm	315 x 304
Distancia entre costillas		mm	445
Material	-	-	HDPE Virgen
Densidad	ASTM D1505	g/cm³	0,945 - 0,960
Negro de humo	ASTM D1603	%	> 1,5
Espesor (Texturizado)	ASTM D5199	mm	1,50 (± 10%)
PROPIEDADES MECÁNICAS	**METODO DE ENSAYO**	**UNIDAD**	**VALOR**
Resistencia en la soldadura *Valor Mínimo (± 3%)*	ISO 13426-1 Método B	kN/m	16
Resistencia a la tensión en el punto de fluencia *Valor Mínimo (± 3%)*	ISO 10319	kN/m	22
Tiempo de inducción oxidación	ASTM D3895	min.	> 150

Fecha emisión: **oct-23**

Nota: Mexichem Colombia S.A.S (Pavco Wavin Geosintéticos) no asume responsabilidad en relación al uso final de esta información por parte del comprador. Este documento no debe ser interpretado como una recomendación de ingeniería.

Las recomendaciones para el manejo seguro de este producto las puede solicitar a nuestro departamento de Servicio al Cliente o consultarlas en nuestra pagina web • https://wavin.com/es-co

Operamos bajo sistemas internacionales de control de calidad. Contamos con la acreditación GAI LAP (The Geosynthetic Institute).

SIG Sistema Integrado de Gestión

COLOMBIA: Planta Bogota • Tel.: (571) 782 5000
Servicio al cliente : Tel. Bogota (571) 782 5000 Exts: 1518/19/20/21/22 • Resto del pais: 01 8000 912 286
• Medellín Tel.: (574) 3256660 • Cali Tel.: (572) 442 3442/44 • Barranquilla Tel.: (575) 375 8100
• E-mail: ingenieriageosinteticos@wavin.com • https://wavin.com/es-co

GAI-LAP

Powered by CamScanner

PAVCO wavin

GEOTEXTILES TEJIDOS

2904336

TR 6000

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

LOTE 240350

MEXICHEM COLOMBIA S.A.S (PAVCO WAVIN GEOSINTETICOS), *certifica que el geotextil cumple con los valores de las propiedades abajo mencionada; Nuestro laboratorio cuenta acreditación* ***GAI LAP (The Geosynthetic Institute)****, nuestras soluciones han sido manufacturado bajo los controles establecidos por un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 certificado por* ***ICONTEC Internacional.***

PROPIEDADES MECANICAS	METODO DE ENSAYO	UNIDAD	VMPR[1]
Método Grab Resistencia a la tensión	ASTM D 4632	N (lb)	2900 (653)
Elongación		%	22
Método Tira Ancha Sentido longitudinal	ASTM D 4595	kN/m (lbs/ft)	110 (7537)
Elongación		%	11
Sentido Transversal		kN/m (lbs/ft)	110 (7537)
Elongación		%	10
Resistencia al punzonamiento Método CBR	ASTM D 6241	kN (lb)	11,0 (2473)
Resistencia al Rasgado Trapezoidal	ASTM D 4533	N (lb)	1700 (382)
PROPIEDADES HIDRAULICAS	**METODO DE ENSAYO**	**UNIDAD**	**VMPR[1]**
Tamaño de abertura aparente[2]	ASTM D 4751	mm (No tamiz)	0.180 (80)
Permitividad	ASTM D 4491	s^{-1}	0,29
Permeabilidad		cm/s	1,4 x 10-2
Tasa de flujo		l/min/m²	430
PROPIEDADES FISICAS	**METODO DE ENSAYO**	**UNIDAD**	**VMPR[1]**
Resistencia UV @ 500 horas	ASTM D 4355	% resistencia retenida	>70

Fecha emisión: **mar-24**

1. Valor Mínimo Promedio por Rollo: corresponde al valor promedio del lote menos dos (2) veces la desviación estándar de los valores de la producción.
2. El valor de TAA representa el valor de apertura máxima por rollo

Nota: Mexichem Colombia S.A.S (Pavco Wavin Geosinteticos) no asume responsabilidad en relación al uso final de esta información por parte del comprador. Este documento no debe ser interpretado como una recomendación de ingeniería.

Las recomendaciones para el manejo seguro de este producto las puede solicitar a nuestro departamento de Servicio al Cliente o consultarlas en nuestra pagina web • https://wavin.com/es-co

Operamos bajo sistemas internacionales de control de calidad. Contamos con la acreditación GAI LAP (The Geosynthetic Institute).

SIG

COLOMBIA: Planta Bogota • Tel.: (571) 782 5000
Servicio al cliente : Tel. Bogota (571) 782 5000 Exts: 1518/19/20/21/22 • Resto del pais: 01 8000 912 286
• Medellin Tel.: (574) 3256660 • Cali Tel.: (572) 442 3442/44 • Barranquilla Tel.: (575) 375 8100
• E-mail: ingenieriageosinteticos@wavin.com • https://wavin.com/es-co

GAI-LAP

Powered by CamScanner

ANEXO 3.

ACTAS DE COMITÉ.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Comite conservación COP 748 - C/N 745
Fecha:	14 mayo 2025
Lugar:	Alcaldía local de Rafael Uribe
Dependencia:	
Hora de inicio:	
Hora de finalización:	
Nombre del Responsable:	
Modalidad:	Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL.	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1010777624	Alejandro Alvis C	—	Inspección FDC RUU									X	Jobe.ddl@gobiernos.gov	
CC	80169384	Santiago Gaitan.		Inventario			X						X		
CC	1130623882	Carlos Mauricio Castillo		Consorcio UR RUU			X						X	consorciour conservacion@gmail	
CC	52.249.722	Martha Coral		Consorcio UR RUU			X						X	Consorciour conservacion@gmail.com	
CC	80037388	Juan Pablo Lemus		Interventoria			X						X		

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Scanned with CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio a comité con las áreas técnicas, ambiental y social del contratista CONSORCIO VR RUU, interventoría CONSORCIO INTERVIAS ARM 2024 y la supervisión del contrato, con la siguiente información:

El contratista indica que ya realizo la solicitud de los PMT correspondientes a los segmentos viales a intervenir, esperando que estén listo para la semana del 19 al 23 de mayo de 2025.

La supervisión del contrato hace la solicitud de la programación de las próximos socialización o reuniones de inicio con la comunidad.

La supervisión del contrato hace la aclaración que los segmentos viales Pijaos CIV 18003163 y centenario CIV 18000313 no so contractuales y se incluirán en un modificatorio.

Se finaliza el comité con la información anteriormente consignada.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Programacion próximas socializaciones	Contratista	20 de mayo

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	comite conservacion COP 748 - CN 745
Fecha:	23 mayo 2025
Lugar:	Alcaldia local Patiel Uribe Uribe
Dependencia:	

Hora de inicio: _____
Hora de finalización: _____
Modalidad: Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Nombre del Responsable:

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
	1130623882	Carlos Castillo		Consorcio VR 2W			X						X	consorciovr conservacion@gm	
	52249722	Martha Coral		Consorcio VR 2W			X							Pac.748Conservacion 2W@gmail.com	
	80169384	Santiago Gaitan		Interventoria			X						X		
	80039888	Juan Pablo Limas		Interventoria											
	1091177618	Alejandro Rai	—	EPLG									X		

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demas normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Politica de Tratamiento y Proteccion de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3358000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sig

Scanned with CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio a comité con las áreas técnicas, ambiental y social del contratista CONSORCIO VR RUU, interventoría CONSORCIO INTERVIAS ARM 2024 y la supervisión del contrato, con la siguiente información:

El área social del contratista informa de la ejecución de la reunión de inicio en los CIV 18003126 – 18003182 La Esperanza realizada el día 22 de mayo, Contando con la participación de comunidad, lideres comunales y profesionales del contratista, interventoría y supervisión.

La supervisión del contrato hace mención que el modificatorio esta en proceso y se espera esté listo para la semana del 26 al 31 de mayo de 2025.

La supervisión del contrato solicita que el contratista envié a la interventoría el informe de diagnostico de pavimentos para la revisión.

La supervisión del contrato hace la recomendación de radicar las cuentas y los informes el primer día de cada mes.

Se finaliza el comité con la información anteriormente consignada.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Informe de diagnósticos de pavimentos a la interventoria	Contratista	26 mayo

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión

ANEXO 4.

INFORME DE DIAGNOSTICO SEGMENTOS VIALES.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

FORMATO TESTIGO DOCUMENTAL

N° Folio

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO			
Nombre de la Serie: Alcaldias locales			**Código:**
Nombre de la Subserie: Alcaldia local Rafael Uribe			**Código:**
Asunto del expediente:			
Nombre del documento: Informe de diagnostico de Pavimentos			
Fecha del documento:	**Número de páginas / Folios:**		
Autor:			

UBICACIÓN DEL DOCUMENTO EN EL EXPEDIENTE Y ARCHIVO				
SIGNATURA TOPOGRÁFICA N°. de estante / entrepaño		**ÓPTICO / MAGNÉTICO** (CD, DVD / Disquete)	X	**Url. (Documento Electrónico)**
N°. de Caja		**ELECTRÓNICO**		
N°. de Carpeta		**EMPASTADO / TEXTO / TOMO**		
N°. Consecutivo asignado al documento		**PLANOS**		
		MEDIOS SONOROS Y AUDIOVISUALES (Casete, BETA, VHS)		**Otro.**
Observaciones: Contiene informe diagnostico Pavimentos COP 748				

FUENTE: Archivo General de la Nación. Acuerdo 011 del 22 de mayo de 1996, Arts. 1 y 2.

INSTRUCCIONES:

- El material documental gráfico que se encuentra en el expediente entre las unidades de conservación debe extraerse dejando en su lugar un "testigo documental" y registrarse en la sección del archivo dispuesto para conservar este tipo de soportes diferentes.
- Entiéndase por material gráfico todos aquellos dibujos, croquis, mapas, planos, fotografías, ilustraciones, pictografías, códices, prensa, objetos tridimensionales, entre otros.
- El testigo documental debe colocarse en reemplazo y en el lugar que ocupaba el documento gráfico, diligenciando todos los campos.
- El testigo documental se debe foliar en el recuadro colocado en la parte superior derecha del formato.

ANEXO 5.

CORRESPONDENCIA ENVIADA.

CONSORCIO VR RUU

NIT: 901903181-9

Bogotá D.C, 08 de abril de 2025

CONSVRUU-BOG-748-2024-018-C

Señores:
A QUIEN LE INTERESE
Bogotá D.C – Colombia.

Ref: **CONTRATO 748 DE 2024. "EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".**

Asunto: CERTIFICACION DE NO GENERACIÓN DE RCD NI APROVECHAMIENTO

Cordial saludo.

Con el presente, nos permitimos certificar la no disposición, ni aprovechamiento del contrato 748-2024, ya que el Consorcio VR RUU se encuentra en etapa de revisión de estudios y diseños y alistamiento preliminar.

Atenta,

Cordialmente,

FARLEY ANDREA LARRARTE
Representante Legal
Consorcio VR RUU

CONSORCIO VR RUU

NIT: 901903181-9

Bogotá D.C, 01 de mayo de 2025

CONSVRUU-BOG-748-2024-019-C

Señores:
A QUIEN LE INTERESE
Bogotá D.C – Colombia.

Ref: **CONTRATO 748 DE 2024. "EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".**

Asunto: CERTIFICACION DE NO GENERACIÓN DE RCD NI APROVECHAMIENTO

Cordial saludo.

Con el presente, nos permitimos certificar la no disposición, ni aprovechamiento del contrato 748-2024, ya que el Consorcio VR RUU se encuentra en etapa de revisión de estudios y diseños y alistamiento preliminar.

Atenta,

Cordialmente,

FARLEY ANDREA LARRARTE
Representante Legal
Consorcio VR RUU

CONSORCIO VR RUU

NIT: 901.903.181-9

Bogotá D.C, 22 de Mayo de 2025

CONSVRUU-BOG-748-2024-020-C

Señores:
CONSORCIO INTER VIAS ARM 2024
Ing. Juan Pablo Lemus Acevedo
Representante Legal
Carrera 74 A ·49ª-91
Bogotá D.C – Colombia.

Ref: **CONTRATO 748 DE 2024. "EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".**

Asunto: PRIMERA ENTREGA NO PREVISTOS COP 748 DE 2024.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, el contratista CONSORCIO VR RUU hace entrega de los ítems no previstos No.1 del contrato de obra pública 748-2024, los cuales cuentan con precios de referencia IDU.

Quedamos atentos,

Cordialmente,

Farley Andrea Larrarte Barrera
Representante Legal
Consorcio Vr Ruu

ANEXO 6.

INFORMES SEMANALES.

CONSORCIO VR RUU / BOGOTÁ	ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE INFORME SEMANAL	**Código:** 33699 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 16/02/2018

FECHA	MAYO 2025	PERIODO No.	1	DEL	28/04/2025	AL	3/05/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	**"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÒN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PUBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE E EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE - BOGOTÁ D.C**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	745 de 2024			CONTRATO No.:	748 de 2024		
INTERVENTOR CONTRATISTA	INTER VIAS ARM 24			CONTRATISTA	CONSORCIO VR RUU		
PLAZO INICIAL:	Seis Meses (6)			PLAZO INICIAL:	Seis Meses (6)		
PLAZO FASE I - ESTUDIOS Y DI	Un Mes (01)			PLAZO FASE I - ESTUDIOS Y DISEÑOS:	Un Mes (01)		
PLAZO FASE II - EJECUCIÓN:	Seis Meses (6)			PLAZO FASE II - EJECUCIÓN:	Seis Meses (6)		
FECHA DE INICIACIÓN:	**25 de marzo de 2025**			FECHA DE INICIACIÓN:	**25 de marzo de 2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN:	**24 de septiembre de 2025**			FECHA DE TERMINACIÓN:	**24 de septiembre de 2025**		
PLAZO:	Seis Meses (6)			PLAZO:	Seis Meses (6)		
PLAZO TRANSCURRIDO:	39	EQUIVALE AL	21%	PLAZO TRANSCURRIDO:	39	EQUIVALE AL	21%
VALOR INICIAL :	$ 6.117.748.360,00			VALOR INICIAL :	$ 6.117.748.360,00		
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00			VALOR ADICION(ES):	$ 0,00		
VALOR TOTAL	$ 6.117.748.360,00			VALOR TOTAL	$ 6.117.748.360,00		

2. AVANCE DE OBRA

2.1. CONTROL DE TIEMPO EN OBRA

Tiempo total Contractual	183
Tiempo transcurrido	39
Faltante	144


2.2. FLUJO INVERSÓN DEL CONTRATO



2.3. PORCENTAJE PROGRAMACION DE OBRA

ACUMULADO SEMANA ANTERIOR		PRESENTE CORTE		ACUMULADO TOTAL		DIFERENCIA
% PROGRAMADO	%EJECUTADO	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	
0,00%	0,00%	2,07%	1,98%	2,07%	1,98%	1,98%

CURVA (S) AVANCE DE OBRA SEMANAL

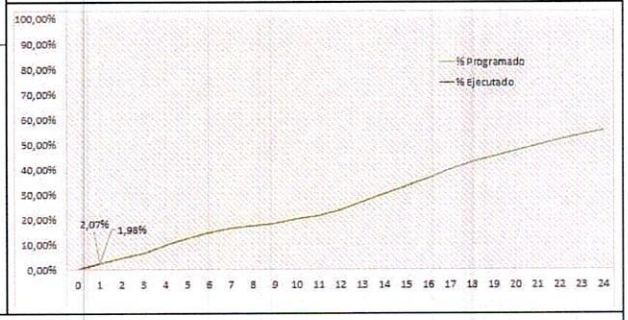

3. ACTIVIDADES

3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. Se realiza entrega de hojas de vida.	
2. Se realiza informe de diagnostico de pavimentos	
3. Se realiza recorridos con las ESP	
4. Se realiza entrega de los APUS	
5. Se realiza entrega de plan de calidad	
6. Se entrega cronograma general de obra.	
7. Se inicia levantamiento de actas de vecindad.	
8. Se realiza revisión de los anexos técnicos y pliegos de condiciones, correspondientes al contrato 748 de 2024, donde se evalúan los términos de referencia para desarrollar durante la ejecución de la etapa constructiva. Se realiza revision de normativa legal vigente la cual aplique para el desarrollo del contrato en su etapa constructiva.	
9. Se realiza recorrido de reconocimiento y caracterización ambiental de los frentes de obra estipulados en el anexo tecnico para la futura intervencion dentro del contrato Se realiza elaboración de los documentos legales, exigidos dentro de los pliegos de condiciones y anexo técnico del contrato, los cuales corresponden al Manual Ambiental de Obra junto con su componente D Programa de Seguridad y salud en el trabajo, y el Plan de Gestion y Manejo de RCD. Se radican a interventoría para su revisión y/o aprobación Se realiza la elaboración del informe 1 del contrato 748 que corresponde al periodo comprendido del 25 al 31 de marzo	

10. Se realiza, subsanación de observaciones emitidas por interventoria al MAO.SST y PGRCD. Se realiza solicitud de apertura de pin, el cual se asigna el 27064 Se realiza señalización enseguridad y salud en el trabajo, de la oficina PAC, con rutas de evacuacion, preventivas respectivo al plan de emergencias aprobado previo por la interventoria, se realiza instalacion de punto ecologico, punto de hidratacion y demas herramientas exigidas segun el Manual Ambeintal de obra	
11. Se realiza preparación y alistamiento de proximos frentes de obra los cuales se planean abrir, esto buscando alistar la señalización de movilidad, y la delimitacion correspondiente de cada frente de obra. Se realiza la elaboracion de los cargues del pin en 0 para proceder con la radicación a la interventoria y subir dichos cargues a la plataforma de la SDA	

PERSONAL CONTRATISTA:

Director de Obra: Andres Felipe Echandia
Residente Tècnico: Carlos Mauricio Castaño Londoño
Residente Tècnico: Sandra Marina Cuestas
Especialista en Estructuras: Ana Milena Olarte
Especialista en Redes Hidrosanitarias: Lisandro Nuñez Galeano
Especialista en Costos y Presupuestos: Monica Vanesa Galindo
Especialista en Pavimentos: Juan Ricardo Troncoso
Especialista en Trànsito y Transporte: Carlos Andres Muñoz Leon
Residente SST: Diana Coral
Residente Ambiental: Oscar Alejandro Santamaria
Residente Social: Martha Isabel Coral
Topográfo: Albaro Andres Valderrama
Inspector de Obra: Jennifer Adriana Quiroga Torralba
Inspector de Obra: Andrea Carolina Martin Cruz

NOVEDADES: N.A

ASPECTO CLIMA : Del 28 de abril al 03 de mayo se presentaron dias soleados, con lluvias intermitentes

	DIRECTOR DE PROYECTO OBRA
Firma:	
Nombre:	ANDRES FELIPE ECHANDIA
Cargo:	DIRECTOR DE PROYECTO OBRA

CONSORCIO VR RUU / BOGOTÁ	ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE INFORME SEMANAL	**Código:** 33699 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 16/02/2018

FECHA	MAYO 2025	PERIODO No.	2	DEL	5/05/2025	AL	10/05/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	**"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÒN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PUBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE E EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE - BOGOTÁ D.C**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	745 de 2024			CONTRATO No.:	748 de 2024		
INTERVENTOR CONTRATISTA	INTER VIAS ARM 24			CONTRATISTA	CONSORCIO VR RUU		
PLAZO INICIAL:	Seis Meses (6)			PLAZO INICIAL:	Seis Meses (6)		
PLAZO FASE I - ESTUDIOS Y DI	Un Mes (01)			PLAZO FASE I - ESTUDIOS Y DISEÑOS:	Un Mes (01)		
PLAZO FASE II - EJECUCIÓN:	Seis Meses (6)			PLAZO FASE II - EJECUCIÓN:	Seis Meses (6)		
FECHA DE INICIACIÓN:	**25 de marzo de 2025**			FECHA DE INICIACIÓN:	**25 de marzo de 2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN:	**24 de septiembre de 2025**			FECHA DE TERMINACIÓN:	**24 de septiembre de 2025**		
PLAZO:	Seis Meses (6)			PLAZO:	Seis Meses (6)		
PLAZO TRANSCURRIDO:	46	EQUIVALE AL	25%	PLAZO TRANSCURRIDO:	46	EQUIVALE AL	25%
VALOR INICIAL :	$ 6.117.748.360,00			VALOR INICIAL :	$ 6.117.748.360,00		
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00			VALOR ADICION(ES):	$ 0,00		
VALOR TOTAL	$ 6.117.748.360,00			VALOR TOTAL	$ 6.117.748.360,00		

2. AVANCE DE OBRA

2.1. CONTROL DE TIEMPO EN OBRA

Tiempo total Contractual	183
Tiempo transcurrido	46
Faltante	137


2.2. FLUJO INVERSÓN DEL CONTRATO



2.3. PORCENTAJE PROGRAMACION DE OBRA

ACUMULADO SEMANA ANTERIOR		PRESENTE CORTE		ACUMULADO TOTAL		DIFERENCIA
% PROGRAMADO	%EJECUTADO	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	
2,07%	1,98%	2,07%	1,98%	4,31%	3,07%	1,09%


CURVA (S) AVANCE DE OBRA SEMANAL

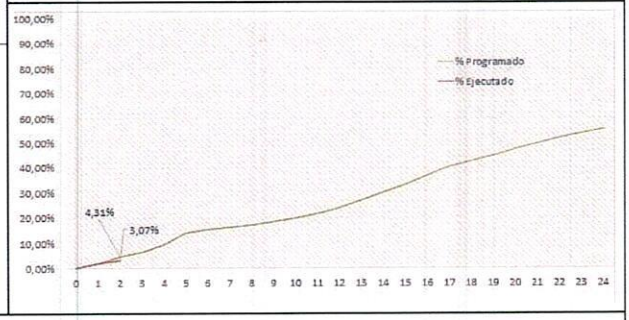

3. ACTIVIDADES

3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. SE REALIZA RADICACION DE PMT	1. SE PROGRAMAN INDUCCIONES
2. SE REALIZA RECORRIDO CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	
3. SE REALIZA ELABORACION DE INFORMES MENSUALES.	
4. SE PROGRAMA CHARLA INFORMATIVA	
5. SE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

REGISTRO FOTOGRAFICO

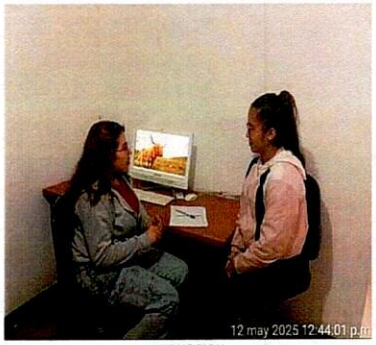

INDUCCION



ENTREGA DE EPP



ENTREGA DE EPP

3. ACTIVIDADES REALIZADAS


FRENTE 1. CONSUELO

3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. SE REALIZA ENTREGA DE VOLANTES DE ADECUACION DE VAJANTES.	
2. LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD	
3. SE REALIZA REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON JAC CONSUELO SUR	


REGISTRO FOTOGRAFICO



ENTREGA DE VOLANTES DE ADECUACION DE VAJANTES

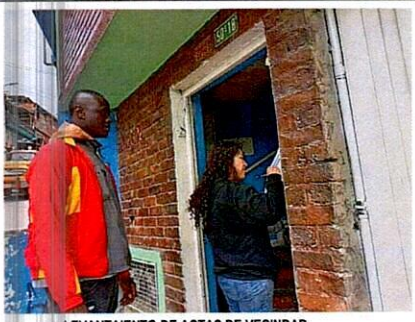

LEVANTAIENTO DE ACTAS DE VECINDAD

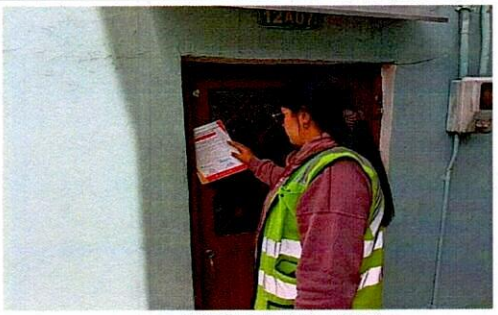

ENTREGA DE VOLANTES 2 VISITA

FRENTE 2. MARCO FIDEL SUAREZ CENTENARIO / LA ESPERANZA 7 MOLINOS DEL SUR

FRENTE 1. MARRUECOS

3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.SE REALIZA REUNION EXTRAORDINARIA JAC MARRUECOS.	

REGISTRO FOTOGRAFICO







REUNION EXTRAORDINARIA

PERSONAL CONTRATISTA:

Director de Obra: Andres Felipe Echandia
Residente Tècnico: Carlos Mauricio Castaño Londoño
Residente Técnico: Sandra Marina Cuestas
Especialista en Estructuras: Ana Milena Olarte
Especialista en Redes Hidrosanitarias: Lisandro Nuñez Galeano
Especialista en Costos y Presupuestos: Monica Vanesa Galindo
Especialista en Pavimentos: Juan Ricardo Troncoso
Especialista en Trànsito y Transporte: Carlos Andres Muñoz Leon
Residente SST: Diana Coral
Residente Ambiental: Oscar Alejandro Santamaria
Residente Social: Martha Isabel Coral
Topográfo: Albaro Andres Valderrama
Inspector de Obra: Jennifer Adriana Quiroga Torralba
Inspector de Obra: Andrea Carolina Martin Cruz

NOVEDADES: N.A

ASPECTO CLIMA : Del 5 al 10 de mayo se presentaron dias soleados, con lluvias intermitentes

DIRECTOR DE PROYECTO OBRA

Firma:	
Nombre:	ANDRES FELIPE ECHANDIA
Cargo:	DIRECTOR DE PROYECTO OBRA

CONSORCIO VR RUU / BOGOTÁ	ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE INFORME SEMANAL	Código: 33699 Versión: 1 Fecha de Aprobación: 16/02/2018

FECHA	MAYO 2025	PERIODO No.	3	DEL	12/05/2025	AL	17/05/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÒN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PUBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE E EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE - BOGOTÁ D.C


CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	745 de 2024			CONTRATO No.:	748 de 2024		
INTERVENTOR CONTRATISTA	INTER VIAS ARM 24			CONTRATISTA	CONSORCIO VR RUU		
PLAZO INICIAL:	Seis Meses (6)			PLAZO INICIAL:	Seis Meses (6)		
PLAZO FASE I - ESTUDIOS Y DI	Un Mes (01)			PLAZO FASE I - ESTUDIOS Y DISEÑOS:	Un Mes (01)		
PLAZO FASE II - EJECUCIÓN:	Seis Meses (6)			PLAZO FASE II - EJECUCIÓN:	Seis Meses (6)		
FECHA DE INICIACIÓN:	**25 de marzo de 2025**			FECHA DE INICIACIÓN:	**25 de marzo de 2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN:	**24 de septiembre de 2025**			FECHA DE TERMINACIÓN:	**24 de septiembre de 2025**		
PLAZO:	Seis Meses (6)			PLAZO:	Seis Meses (6)		
PLAZO TRANSCURRIDO:	53	EQUIVALE AL	29%	PLAZO TRANSCURRIDO:	53	EQUIVALE AL	29%
VALOR INICIAL :	$ 6.117.748.360,00			VALOR INICIAL :	$ 6.117.748.360,00		
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00			VALOR ADICION(ES):	$ 0,00		
VALOR TOTAL	$ 6.117.748.360,00			VALOR TOTAL	$ 6.117.748.360,00		

2. AVANCE DE OBRA

2.1. CONTROL DE TIEMPO EN OBRA

Tiempo total Contractual	183
Tiempo transcurrido	53
Faltante	130


2.2. FLUJO INVERSÓN DEL CONTRATO



2.3. PORCENTAJE PROGRAMACION DE OBRA

ACUMULADO SEMANA ANTERIOR		PRESENTE CORTE		ACUMULADO TOTAL		DIFERENCIA
% PROGRAMADO	%EJECUTADO	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	
4,31%	3,07%	2,07%	1,98%	6,28%	6,04%	2,97%

CURVA (S) AVANCE DE OBRA SEMANAL

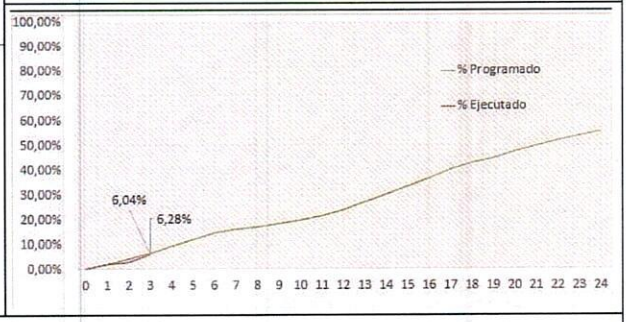

3. ACTIVIDADES

3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. SE REALIZA RADICACION DE PMT	
2. SE REALIZA RECORRIDO CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	
3. SE REALIZA ELABORACION DE INFORMES MENSUALES.	
4. SE PROGRAMA CHARLA INFORMATIVA	
5. SE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	
6. SE PROGRAMAN INDUCCIONES	

REGISTRO FOTOGRAFICO



INDUCCION



ENTREGA DE EPP



ENTREGA DE EPP

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	
FRENTE 1. LA ESPERANZA	
3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. ENTREGA DE VOLANTES PRIMER VISITA DE ACTAS DE VECINDAD.	
2. LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD.	
3. ENTREGA DE VOLANTES DE ADECUACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS.	

REGISTRO FOTOGRAFICO



VOLANTE 1 VISITA DE ACTAS DE VECINDAD




LEVANTAIENTOD DE ACTAS DE VECINDAD




VOLANTE DE ADECUACION DE AGUAS LLUVIAS

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	
FRENTE 2. MARCO FIDEL SUAREZ CENTENARIO / LA ESPERANZA 7 MOLINOS DEL SUR	
FRENTE 1. LA ESPERANZA	
3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.SE REALIZA ENTREGA DE VOLANTES DE SEGUNDA VISITA.	

REGISTRO FOTOGRAFICO



VOLANTES 2 VISITA

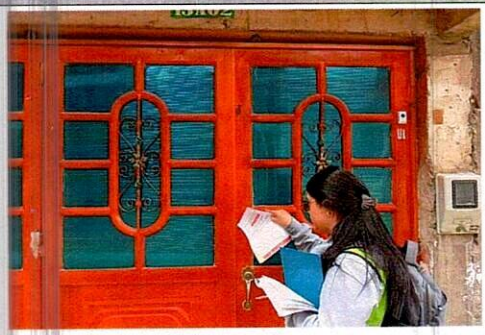

VOLANTES 2 VISITA



VOLANTES 2 VISITA

PERSONAL CONTRATISTA:
Director de Obra: Andres Felipe Echandia
Residente Técnico: Carlos Mauricio Castaño Londoño
Residente Técnico: Sandra Marina Cuestas
Especialista en Estructuras: Ana Milena Olarte
Especialista en Redes Hidrosanitarias: Lisandro Nuñez Galeano
Especialista en Costos y Presupuestos: Monica Vanesa Galindo
Especialista en Pavimentos: Juan Ricardo Troncoso
Especialista en Tránsito y Transporte: Carlos Andres Muñoz Leon
Residente SST: Diana Coral
Residente Ambiental: Oscar Alejandro Santamaria
Residente Social: Martha Isabel Coral
Topográfo: Albaro Andres Valderrama
Inspector de Obra: Jennifer Adriana Quiroga Torralba
Inspector de Obra: Andrea Carolina Martin Cruz

NOVEDADES: N.A

ASPECTO CLIMA : Del 12 al 17 de mayo se presentaron dias soleados, con lluvias intermitentes

DIRECTOR DE PROYECTO OBRA

Firma:	
Nombre:	ANDRES FELIPE ECHANDIA
Cargo:	DIRECTOR DE PROYECTO OBRA

CONSORCIO VR RUU / BOGOTÁ	ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE INFORME SEMANAL	Código: 33699 Versión: 1 Fecha de Aprobación: 16/02/2018

FECHA	MAYO 2025	PERIODO No.	4	DEL	19/05/2025	AL	24/05/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÒN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PUBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE E EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE - BOGOTÁ D.C


CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	745 de 2024			CONTRATO No.:	748 de 2024		
INTERVENTOR CONTRATISTA	INTER VIAS ARM 24			CONTRATISTA	CONSORCIO VR RUU		
PLAZO INICIAL:	Seis Meses (6)			PLAZO INICIAL:	Seis Meses (6)		
PLAZO FASE I - ESTUDIOS Y DI	Un Mes (01)			PLAZO FASE I - ESTUDIOS Y DISEÑOS:	Un Mes (01)		
PLAZO FASE II - EJECUCIÓN:	Seis Meses (6)			PLAZO FASE II - EJECUCIÓN:	Seis Meses (6)		
FECHA DE INICIACIÓN:	**25 de marzo de 2025**			FECHA DE INICIACIÓN:	**25 de marzo de 2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN:	**24 de septiembre de 2025**			FECHA DE TERMINACIÓN:	**24 de septiembre de 2025**		
PLAZO:	Seis Meses (6)			PLAZO:	Seis Meses (6)		
PLAZO TRANSCURRIDO:	60	EQUIVALE AL	33%	PLAZO TRANSCURRIDO:	60	EQUIVALE AL	33%
VALOR INICIAL :	$ 6.117.748.360,00			VALOR INICIAL :	$ 6.117.748.360,00		
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00			VALOR ADICION(ES):	$ 0,00		
VALOR TOTAL	$ 6.117.748.360,00			VALOR TOTAL	$ 6.117.748.360,00		

2. AVANCE DE OBRA

2.1. CONTROL DE TIEMPO EN OBRA

Tiempo total Contractual	183
Tiempo transcurrido	60
Faltante	123


2.2. FLUJO INVERSÓN DEL CONTRATO



2.3. PORCENTAJE PROGRAMACION DE OBRA

ACUMULADO SEMANA ANTERIOR		PRESENTE CORTE		ACUMULADO TOTAL		DIFERENCIA
% PROGRAMADO	%EJECUTADO	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	
6,28%	6,04%	0,75%	0,78%	7,03%	6,82%	0,78%

CURVA (S) AVANCE DE OBRA SEMANAL

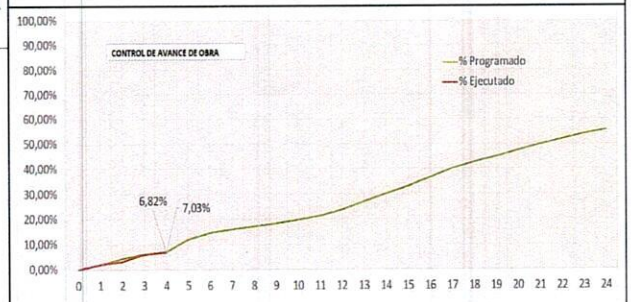

3. ACTIVIDADES

3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. APROBACION DE PMT	
2. SE CONTINUA EL RECORRIDO CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	
3. SE REALIZA ELABORACION DE INFORMES MENSUALES.	
4. SE PROGRAMA CHARLA INFORMATIVA	
5. SE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	
6. SE PROGRAMAN INDUCCIONES	

REGISTRO FOTOGRAFICO



INDUCCION



ENTREGA DE EPP



ENTREGA DE EPP

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	
FRENTE 1. CENTENARIO-MARRUECOS	
3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. ENTREGA DE VOLANTESSEGUNDA VISITA DE ACTAS DE VECINDAD.	
2. LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD.	
3. ENTREGA DE VOLANTES DE ADECUACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS.	
4. REUNION EXTRAORDINARIA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



VOLANTE 2 VISITA DE ACTAS DE VECINDAD



LEVANTAIENTOD DE ACTAS DE VECINDAD



VOLANTE DE ADECUACION DE AGUAS LLUVIAS

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	
FRENTE 2. PIJAOS-LA ESPERANZA	
3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. SE REALIZA SOCIALIZACION DE PMT	
2. SE REALIZA REUNION DE INICIO	

REGISTRO FOTOGRAFICO



SOCIALIZACION DE PMT



REUNION DE INICIO



REUNION DE INICIO

PERSONAL CONTRATISTA:
Director de Obra: Andres Felipe Echandia
Residente Tècnico: Carlos Mauricio Castaño Londoño
Residente Tècnico: Sandra Marina Cuestas
Especialista en Estructuras: Ana Milena Olarte
Especialista en Redes Hidrosanitarias: Lisandro Nuñez Galeano
Especialista en Costos y Presupuestos: Monica Vanesa Galindo
Especialista en Pavimentos: Juan Ricardo Troncoso
Especialista en Trànsito y Transporte: Carlos Andres Muñoz Leon
Residente SST: Diana Coral
Residente Ambiental: Oscar Alejandro Santamaria
Residente Social: Martha Isabel Coral
Topográfo: Albaro Andres Valderrama
Inspector de Obra: Jennifer Adriana Quiroga Torralba
Inspector de Obra: Andrea Carolina Martin Cruz

NOVEDADES: N.A

ASPECTO CLIMA : Del 19 al 24 de mayo se presentaron dias soleados, con lluvias intermitentes

DIRECTOR DE PROYECTO OBRA

Firma:	
Nombre:	ANDRES FELIPE ECHANDIA
Cargo:	DIRECTOR DE PROYECTO OBRA

CONSORCIO VR RUU / BOGOTÁ	ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE INFORME SEMANAL	**Código:** 33699 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 16/02/2018

FECHA	MAYO 2025	PERIODO No.	5	DEL	26/05/2025	AL	31/05/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	**"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÒN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PUBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE E EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE - BOGOTÁ D.C**


CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	745 de 2024			CONTRATO No.:	748 de 2024		
INTERVENTOR CONTRATISTA	INTER VIAS ARM 24			CONTRATISTA	CONSORCIO VR RUU		
PLAZO INICIAL:	Seis Meses (6)			PLAZO INICIAL:	Seis Meses (6)		
PLAZO FASE I - ESTUDIOS Y DI	Un Mes (01)			PLAZO FASE I - ESTUDIOS Y DISEÑOS:	Un Mes (01)		
PLAZO FASE II - EJECUCIÓN:	Seis Meses (6)			PLAZO FASE II - EJECUCIÓN:	Seis Meses (6)		
FECHA DE INICIACIÓN:	**25 de marzo de 2025**			FECHA DE INICIACIÓN:	**25 de marzo de 2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN:	**24 de septiembre de 2025**			FECHA DE TERMINACIÓN:	**24 de septiembre de 2025**		
PLAZO:	Seis Meses (6)			PLAZO:	Seis Meses (6)		
PLAZO TRANSCURRIDO:	67	EQUIVALE AL	37%	PLAZO TRANSCURRIDO:	67	EQUIVALE AL	37%
VALOR INICIAL :	$ 6.117.748.360,00			VALOR INICIAL :	$ 6.117.748.360,00		
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00			VALOR ADICION(ES):	$ 0,00		
VALOR TOTAL	$ 6.117.748.360,00			VALOR TOTAL	$ 6.117.748.360,00		

2. AVANCE DE OBRA

2.1. CONTROL DE TIEMPO EN OBRA

Tiempo total Contractual	183
Tiempo transcurrido	67
Faltante	116


2.2. FLUJO INVERSÓN DEL CONTRATO



2.3. PORCENTAJE PROGRAMACION DE OBRA

ACUMULADO SEMANA ANTERIOR		PRESENTE CORTE		ACUMULADO TOTAL		DIFERENCIA
% PROGRAMADO	%EJECUTADO	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	
7,03%	6,82%	1,33%	1,10%	8,36%	7,92%	1,10%

CURVA (S) AVANCE DE OBRA SEMANAL

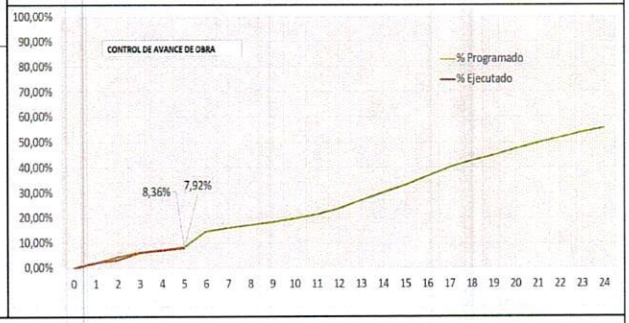

3. ACTIVIDADES

3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. APROBACION DE PMT	
2. SE CONTINUA EL RECORRIDO CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	
3. SE REALIZA ELABORACION DE INFORMES MENSUALES.	
4. SE PROGRAMA CHARLA INFORMATIVA	
5. SE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	
6. SE PROGRAMAN INDUCCIONES	

REGISTRO FOTOGRAFICO



INDUCCION



ENTREGA DE EPP



ENTREGA DE EPP

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	
FRENTE 1. MARCO FIDEL SUARES	
3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. ENTREGA DE VOLANTES Y PRIMER VISITA DE ACTAS DE VECINDAD.	
2. SE REALIZA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD.	
3. SE REALIZA REUNION EXTRAORDINARIA .	

REGISTRO FOTOGRAFICO



VOLANTE 1 VISITA DE ACTAS DE VECINDAD



LEVANTAIENTOD DE ACTAS DE VECINDAD



LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD


3. ACTIVIDADES REALIZADAS	
FRENTE 2. MARRUECOS	
3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. SE REALIZA ADECUACION DE VAJANTES	
2. SE REALIZA CAPACITACION	

REGISTRO FOTOGRAFICO



CAPACITACION



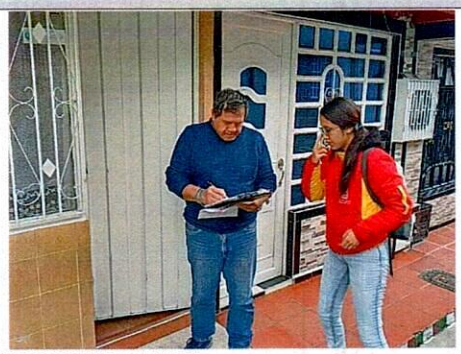

ENTREGA DE VOLANTE DE ADECUACION DE BAJANTES

PERSONAL CONTRATISTA:
Director de Obra: Andres Felipe Echandia
Residente Técnico: Carlos Mauricio Castaño Londoño
Residente Técnico: Sandra Marina Cuestas
Especialista en Estructuras: Ana Milena Olarte
Especialista en Redes Hidrosanitarias: Lisandro Nuñez Galeano
Especialista en Costos y Presupuestos: Monica Vanesa Galindo
Especialista en Pavimentos: Juan Ricardo Troncoso
Especialista en Tránsito y Transporte: Carlos Andres Muñoz Leon
Residente SST: Diana Coral
Residente Ambiental: Oscar Alejandro Santamaria
Residente Social: Martha Isabel Coral
Topográfo: Albaro Andres Valderrama
Inspector de Obra: Jennifer Adriana Quiroga Torralba
Inspector de Obra: Andrea Carolina Martin Cruz

NOVEDADES: N.A

ASPECTO CLIMA : Del 26 al 31 de mayo se presentaron dias soleados, con lluvias intermitentes

DIRECTOR DE PROYECTO OBRA

Firma:	
Nombre:	ANDRES FELIPE ECHANDIA
Cargo:	DIRECTOR DE PROYECTO OBRA

ANEXO 7.

INFORME DE ANÁLISIS PRELIMINAR SEGMENTOS VIALES

CONSORCIO VR RUU

CONSORCIO VR RUU

Contrato de Obra Pública No 748 de 2024

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C".

INFORME EJECUTIVO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTA D.C.

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES. 4

1.1. INTRODUCCIÓN 4
1.2. OBJETIVOS. 5
1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 5
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 5
1.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA. 6
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 6
1.5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 7
1.6. META FÍSICA. 7
3 CONCLUSIONES. 24

INDICE DE TABLAS.

Tabla 1 Datos contrato. Fuente propia. 6
Tabla 7. Listado contractual COP 748 de 2024. 9

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación quebrada Caño Los Políticos. 10
Ilustración 2. Estado Actual CIV 18003146 10
Ilustración 3. Estado Actual CIV 18003120 11
Ilustración 4. Estado Actual CIV 18008086 11
Ilustración 5. Estado Actual CIV 18003152 11
Ilustración 6. Estado Actual CIV 18003126 12
Ilustración 7. Estado Actual CIV 18003182 12
Ilustración 8. Estado Actual CIV 18004226 13
Ilustración 9. Estado Actual CIV 18006579 13
Ilustración 10. Estado Actual CIV 18006502 14
Ilustración 11. Estado Actual CIV 18006384 14
Ilustración 12. Estado Actual CIV 18004026 15
Ilustración 13. Estado Actual CIV 18001480 15
Ilustración 14. Ubicación Quebrada Albina. 16
Ilustración 15. Estado Actual CIV 18001969 16
Ilustración 16. Estado Actual CIV 18003049 17
Ilustración 17. Estado Actual CIV 18002587 17
Ilustración 18. Estado Actual CIV 18001036. 18
Ilustración 19. Estado Actual CIV 18005026. 19
Ilustración 20. Estado Actual CIV 18005042. 19
Ilustración 21. Estado Actual CIV 18005057. 19
Ilustración 22. Estado Actual CIV 18005087. 20
Ilustración 23. Estado Actual CIV 18005094. 20
Ilustración 24. Estado Actual CIV 18001737. 21
Ilustración 25. Estado Actual CIV 18002962. 21
Ilustración 26. Estado Actual CIV 18008166. 22
Ilustración 27. Estado Actual CIV 18005161. 22
Ilustración 28. Estado Actual CIV 18001971. 23
Ilustración 29. Estado Actual CIV 18005091 23

1. GENERALIDADES.

1.1. INTRODUCCIÓN

El Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, con el objetivo de dar cumplimiento a la licitación pública FDLRUU-LP-006-2024 para la ejecución y conservación de la malla vial local, ha formalizado el contrato de obra 748 de 2024. Este contrato corresponde a la línea de inversión del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local y abarca las intervenciones en las vías priorizadas. El propósito es garantizar una mejora significativa en el acceso a los barrios de la localidad y optimizar los tiempos de desplazamiento en la ciudad de Bogotá.

En este contexto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe suscribió con el CONSORCIO VR RUU el contrato 748 de 2024, cuyo objeto es "EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

En cumplimiento con las funciones establecidas en dicho contrato, el CONSORCIO VR RUU presenta a la interventoría y al Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe el informe final de las actividades previas correspondientes al periodo comprendido entre el 25 de marzo y el 30 de abril de 2025. Este informe incluye un detalle exhaustivo de todas las actividades ejecutadas por el contratista para llevar a cabo el objeto contractual asignado.

1.2. OBJETIVOS.

1.2.1 OBJETIVO GENERAL.

Informar sobre el estado del Contrato de Obra Pública No. 748 del 2024 cuyo objeto es "EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C." a nivel técnico, legal y financiero.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- ✓ Desarrollar intervenciones técnicas integrales en los corredores viales seleccionados de la localidad de Rafael Uribe Uribe, que incluyan actividades de evaluación, diseño, mantenimiento y mejora del espacio público, con el fin de optimizar la funcionalidad y seguridad de la infraestructura vial local e intermedia.

- ✓ Supervisar y reportar de manera sistemática el cumplimiento de los compromisos contractuales en sus componentes técnicos, jurídicos y financieros, garantizando el adecuado desarrollo del proyecto conforme a la normativa vigente.

1.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato:	COP 748 DE 2024
Objeto:	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."
Duración del Contrato:	SEIS (6) MESES.
Valor:	SEIS MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($6.117.748.360,00)
Inicio:	25 de marzo de 2025.
Final:	24 de septiembre de 2025.

Tabla 1 Datos contrato. Fuente propia.

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

La conservación de la malla vial en la localidad de Rafael Uribe Uribe constituye un factor clave para el desarrollo sostenible y la mejora de la infraestructura urbana. En este marco, se han contratado obras de mantenimiento integral de la malla vial local y el espacio público asociado. Dichas intervenciones incluyen la actualización de los estudios y diseños previos, los cuales se basan en análisis geotécnicos, evaluaciones del flujo vehicular y el estudio de las alternativas técnicas más idóneas para la conservación de la infraestructura vial. La ejecución de las obras físicas se llevará a cabo conforme a las especificaciones técnicas establecidas, garantizando la durabilidad y funcionalidad de las vías.

El Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, en su gestión para mejorar la infraestructura vial y el espacio público asociado, se enfoca en la intervención de las vías priorizadas mediante los recursos asignados del presupuesto del Fondo. El objetivo es optimizar el acceso a los distintos sectores de la localidad, reduciendo los tiempos de desplazamiento y mejorando la conectividad dentro de la ciudad de Bogotá. Las intervenciones estarán limitadas exclusivamente a los tramos viales que hayan sido aprobados en los estudios de viabilidad técnica y que cuenten con la autorización de la Alcaldía Local y el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe.

1.5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Las obras de desarrollaran en la localidad 18 Rafael Uribe Uribe, del distrito capital, se encuentra ubicada al sur oriente de la ciudad. Limita al oriente con la localidad de San Cristóbal, al occidente con la localidad de Tunjuelito, al norte y al sur con la Localidad de Usme. Se presenta la zona de estudio.



Imagen 1. Localización del Proyecto. Fuente. Google Maps

1.6. META FÍSICA.

La meta física inicial del contrato es de 2.39km/carril, 4684.79 m2 de espacio público, esto hace alusión a los 27 CIV contractuales entregados por el FDLRUU como se puede evidenciar a continuación:

UPZ	CIV	ELEMENTO	PK	DIRECCIÓN			
				TRAMO	DESDE	HASTA	BARRIO
39	18001480	CALZADA	20002215	CL 32A S	KR 18	KR 18A	QUIROGA
39	18001036	CALZADA	413011	KR 23	CL 34 S	CL 35 S	QUIROGA
		ANDEN	413010				
		ANDEN	413012				
54	18003126	CALZADA	418315	KR 13 C BIS	CL 51 C SUR	CL 51 C BIS SUR	LA ESPERANZA
		ANDEN	418316				
		ANDEN	418314				

54	18003182	CALZADA	418401	CL 49B S	KR 13 B	Sin Establecer	LA ESPERANZA
		ANDEN	418400				
		ANDEN	418402				
54	18004226	CALZADA	20002629	CALLE 48 H	CARRERA 9	Sin Establecer	ZARAZOTA
54	18004026	CALZADA	419779	KR 12A	CL 50C S	CL 50D S	CONSUELO SUR
		ANDEN	419780				
		ANDEN	419778				
54	18005026	CALZADA	20002169	CR 5 P	CL 49 A BIS S.	CL 49 B S	MARRUECOS
54	18005042	CALZADA	20008545	CR 5 P	CL 49 B S	CL 49 B BIS S	MARRUECOS
54	18005057	CALZADA	20003169	CR 5 P	CL 49 B BIS S	CL 49 C S.	MARRUECOS
54	18005087	CALZADA	20008640	CL 49 B S	CR 5 P	CR 5 N	MARRUECOS
54	18005094	CALZADA	20004100	CL 49 B BIS S	CR 5 P	CR 5 N	MARRUECOS
53	18002962	CALZADA	417962	CL 48A S	KR 12H	DG 46 S	MARCO FIDEL SUAREZ
		ANDEN	417963				
		ANDEN	417961				
55	18008166	PUENTE	24124582	KR 2B	48PBISC S		CERROS ORIENTALES
54	18005161	CALZADA	421473	KR 5P	CL 49H S	DG 50 S	MOLINOS DEL SUR
		ANDEN	421472				
		ANDEN	421474				
54	18005091	CALZADA	421398	KR 5T	CL 49G S	CL 50A S	MOLINOS DEL SUR
		ANDEN	421399				
		ANDEN	421397				
53	18003049	CALZADA	91030552	TV 13G BIS	DG 46 SUR	DG 49A BIS SUR	MARCO FIDEL SUAREZ
		ANDEN	418164				
		ANDEN	418166				
53	18001737	CALZADA	414891	KR 13K	CL 35A S	CL 35B S	GRANJAS SAN PABLO
		ANDEN	414892				
		ANDEN	414890				
53	18003146	CALZADA	485482	CL 41 S	KR 11DBIS	KR 11F	RESURECCION
		ANDEN	92068653				
53	18003120	CALZADA	418303	CL 41 S	KR 11GBIS	KR 11H	RESURECCION
		ANDEN	418304				
53	18008086	CALZADA	901775	CL 41 S	KR 11F	KR 11GBIS	RESURECCION
		ANDEN	92068652				
53	18003152	CALZADA	418359	CL 41 S	KR 11H	CL 42 BIS SUR	RESURECCION
		ANDEN	418360				
55	18006579	CALZADA	424610	CL 49ABISA S	KR 3F E	KR 3H E	DIANA TURBAY CULTIVOS
		ANDEN	424610				

55	18006502	CALZADA	424522	CL 49ABISA S	KR 3C E	KR 3D E	DIANA TURBAY CULTIVOS
		ANDEN	424523				
55	18006384	CALZADA	424312	CL 49ABISA S	KR 2F E	KR 3 E	DIANA TURBAY CULTIVOS
		ANDEN	424311				
		ANDEN	424313				
55	18001969	CALZADA	415498	CL 28C S	KR 12D	KR 12FBIS	BOSQUE DE SAAN CARLOS
		CALZADA	415496				
		ANDEN	415499				
		ANDEN	92057332				
		ANDEN	92057331				
		ANDEN	415495				
53	18002587	CALZADA	416981	DG 32DBIS S	KR 12D	KR 12G	GRANJAS DE SANTA SOFIA
		ANDEN	416980				
		ANDEN	416982				
55	18001971	CALZADA	415506	KR 13	CL 31F S	CL 32 S	HOSPITAL SAN CARLOS
		ANDEN	415507				
		ANDEN	415505				

Tabla 2. Listado contractual COP 748 de 2024.

2. DIAGNOSTICO GENERAL SEGMENTOS CONTRACTUALES

En el presente informe se realizará un diagnóstico general de todos los segmentos viales incluidos en el contrato, con el objetivo de identificar su estado actual y las condiciones particulares de cada uno. A partir de este análisis, se expondrán los requisitos técnicos y operativos que necesita cada segmento para su intervención, considerando las características propias del terreno, el grado de deterioro, y las necesidades específicas de mantenimiento o rehabilitación. Este diagnóstico permitirá priorizar y planificar de manera adecuada las acciones a ejecutar en cada tramo vial.

RESURECCIÓN

Para los segmentos viales 18003146, 18003120, 18008086 y 18003152 ubicados en el barrio Resurrección, se llevó a cabo en campo la caracterización ambiental y la identificación de áreas sensibles asociadas al componente ambiental. Como resultado de esta evaluación, se identificó en este frente de obra una afectación relevante debido a su localización dentro de una ronda hídrica. En particular, el tramo colinda directamente con la quebrada Caño Los Políticos, situación que ha sido verificada mediante la herramienta del visor geográfico de ecosistemas sensibles de la Secretaría Distrital de Ambiente. Esta condición implica consideraciones adicionales en el manejo ambiental del proyecto y en la planeación de sus actividades constructivas.

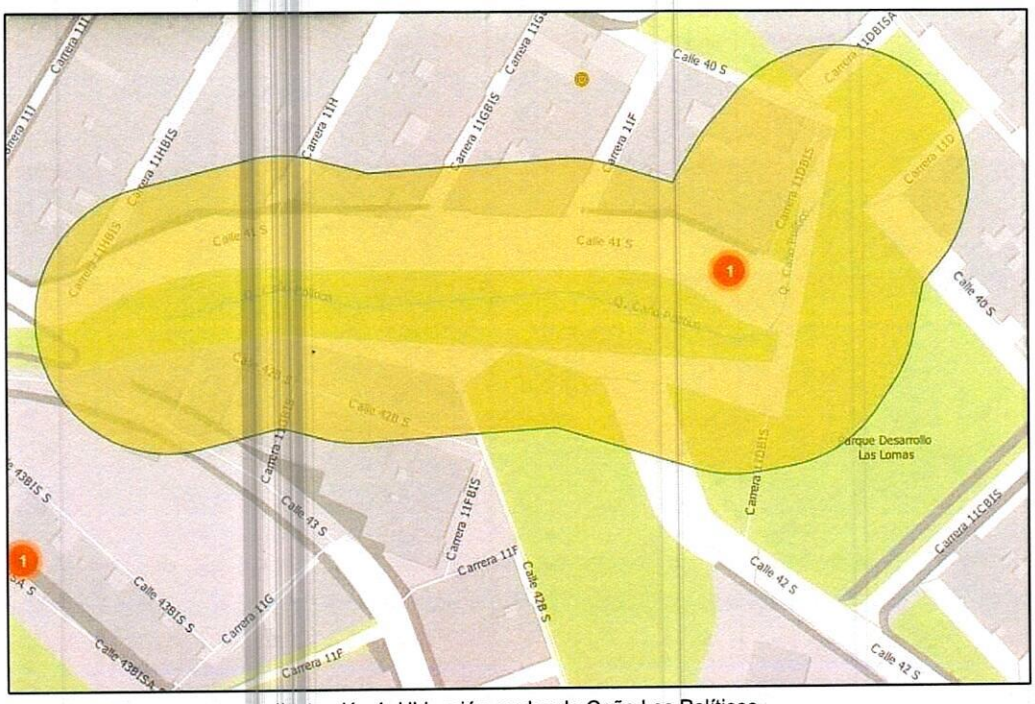


Ilustración 1. Ubicación quebrada Caño Los Políticos.

En la anterior ilustración se georreferencia el polígono de la ronda de ocupación de cauce, playas o lechos, según normatividad nacional Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 y Acuerdo CAR 010 de 1989, en lo que se determinaría la conclusión de la necesidad de tramitar un permiso de ocupación de cauce para la intervención de estos frentes de obra, es por tal razón que de parte del CONSORCIO VR RUU contrario 748-2024, se solicita a la alcaldía el permiso de ocupación de cauces, playas o lechos según lo solicita la normativa para proceder con la intervención de dichos frentes de obra.

- **18003146**



Ilustración 2. Estado Actual CIV 18003146

- **18003120**



Ilustración 3. Estado Actual CIV 18003120

- **18008086**



Ilustración 4. Estado Actual CIV 18008086

- **18003152**



Ilustración 5. Estado Actual CIV 18003152

LA ESPERANZA

Los segmentos viales 18003126 y 18003182 ubicados en el barrio La Esperanza no presentan novedades ni condiciones que limiten o comprometan su intervención. Tras la revisión técnica realizada, se concluye que el tramo se encuentra en condiciones aptas para la ejecución de las actividades contractuales previstas, sin requerir ajustes adicionales.

- **18003126**



Ilustración 6. Estado Actual CIV 18003126

- **18003182**

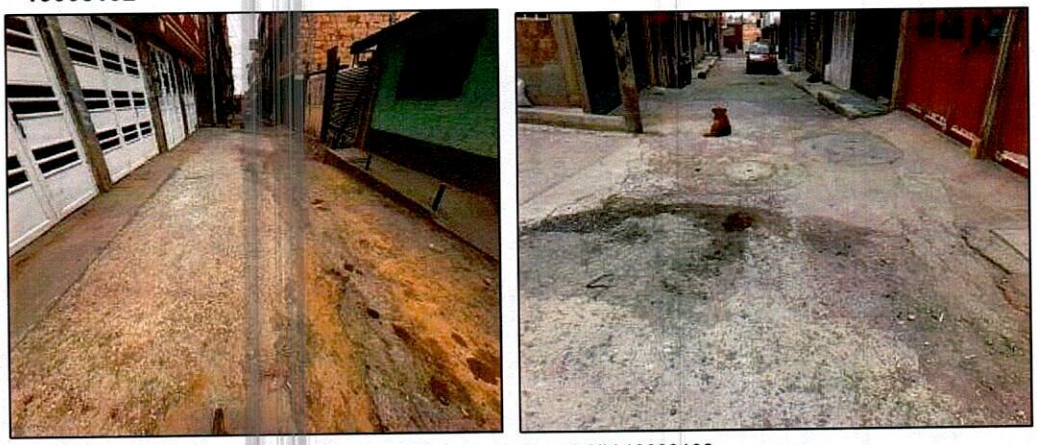


Ilustración 7. Estado Actual CIV 18003182

ZARAZOTA

El segmento vial 18004226 perteneciente a Zarazota no presenta novedades ni condiciones que limiten o comprometan su intervención. Tras la revisión técnica realizada, se concluye que el tramo

se encuentra en condiciones aptas para la ejecución de las actividades contractuales previstas, sin requerir ajustes adicionales.

- **18004226**

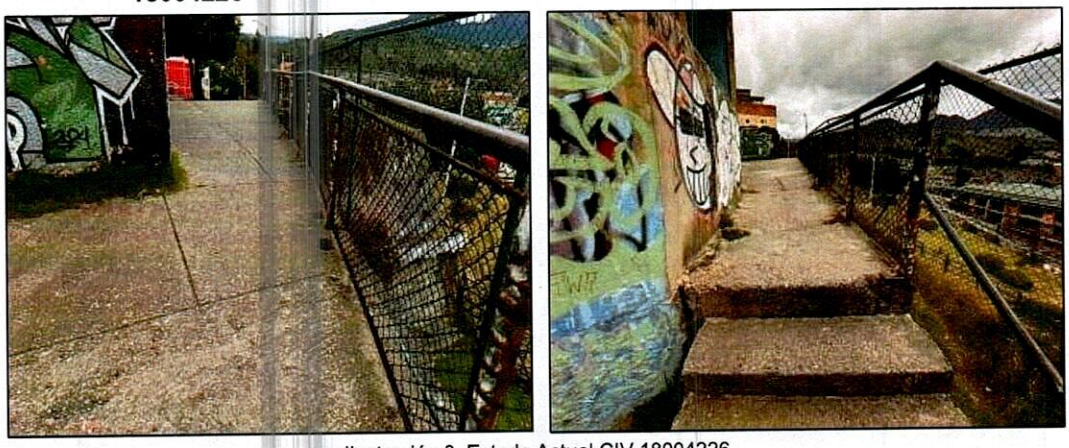


Ilustración 8. Estado Actual CIV 18004226

DIANA TURBAY CULTIVOS

Tras la evaluación técnica realizada, se determina que los siguientes segmentos viales 18006579, 18006502 y 18006384 ubicados en el barrio Diana Turbay cultivos se encuentran en buen estado, presentando condiciones estructurales y superficiales que cumplen con los parámetros establecidos en la normativa vigente. En consecuencia, no se considera necesaria su intervención dentro del alcance del presente contrato, ya que no presentan deterioros significativos ni factores que afecten su funcionalidad o seguridad vial.

- **18006579**



Ilustración 9. Estado Actual CIV 18006579

- **18006502**



Ilustración 10. Estado Actual CIV 18006502

- **18006384**

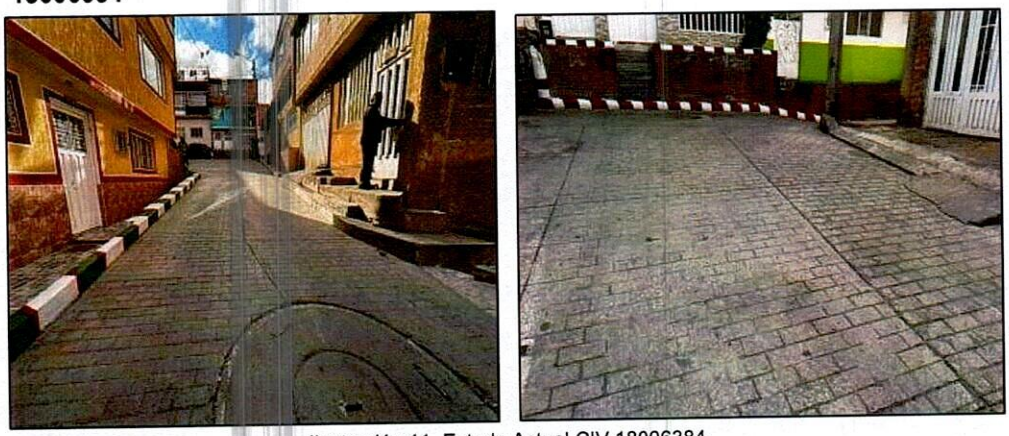


Ilustración 11. Estado Actual CIV 18006384

CONSUELO SUR

El segmento vial 18004026 ubicado en el barrio Consuelo Sur no presenta novedades ni condiciones que limiten o comprometan su intervención. Tras la revisión técnica realizada, se concluye que el tramo se encuentra en condiciones aptas para la ejecución de las actividades contractuales previstas, sin requerir ajustes adicionales.

- **18004026**

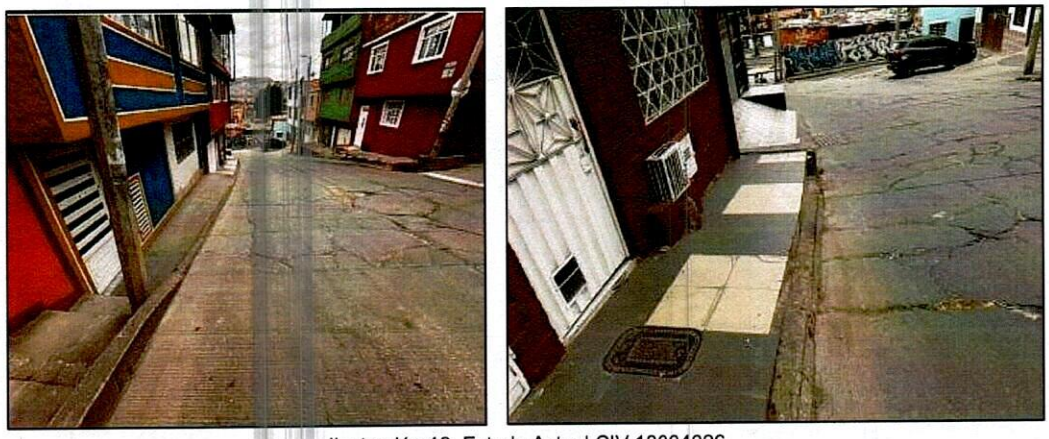


Ilustración 12. Estado Actual CIV 18004026

QUIROGA

El segmento vial 18001480 ubicado en el barrio Quiroga no presenta novedades ni condiciones que limiten o comprometan su intervención. Tras la revisión técnica realizada, se concluye que el tramo se encuentra en condiciones aptas para la ejecución de las actividades contractuales previstas, sin requerir ajustes adicionales.

- **18001480**



Ilustración 13. Estado Actual CIV 18001480

BOSQUES DE SAN CARLOS

Para el segmento vial 18001969 ubicado en el barrio Bosques de San Carlos, se llevó a cabo en campo la caracterización ambiental y la identificación de áreas sensibles asociadas al componente ambiental. Como resultado de esta evaluación, se identificó en este frente de obra una afectación relevante debido a su localización dentro de una ronda hídrica. En particular, el tramo colinda en

ambas calzadas con la Quebrada Albina, situación que ha sido verificada mediante la herramienta del visor geográfico de ecosistemas sensibles de la Secretaría Distrital de Ambiente. Esta condición implica consideraciones adicionales en el manejo ambiental del proyecto y en la planeación de sus actividades constructivas.

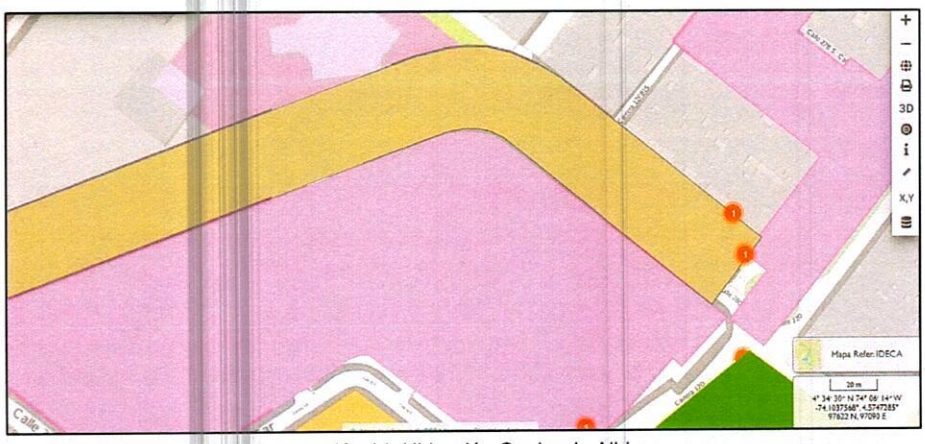


Ilustración 14. Ubicación Quebrada Albina.

En la anterior ilustración se georreferencia el polígono de la ronda de ocupación de cauce, playas o lechos, según normatividad nacional Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 y Acuerdo CAR 010 de 1989, en lo que se determinaría la conclusión de la necesidad de tramitar un permiso de ocupación de cauce para la intervención de estos frentes de obra, es por tal razón que de parte del CONSORCIO VR RUU contrario 748-2024, se solicita a la alcaldía el permiso de ocupación de cauces, playas o lechos según lo solicita la normativa para proceder con la intervención de dichos frentes de obra.

- **18001969**

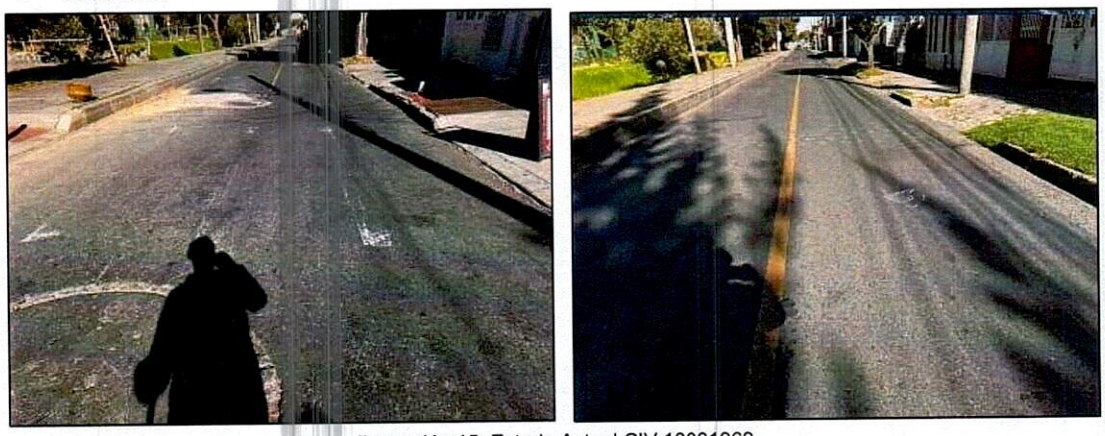


Ilustración 15. Estado Actual CIV 18001969

MARCO FIDEL SUAREZ

El segmento vial 18003049 ubicado en el barrio Marco Fidel Suarez no presenta novedades ni condiciones que limiten o comprometan su intervención. Tras la revisión técnica realizada, se concluye que el tramo se encuentra en condiciones aptas para la ejecución de las actividades contractuales previstas, sin requerir ajustes adicionales.

- **18003049**



Ilustración 16. Estado Actual CIV 18003049

GRANJAS DE SANTA SOFIA

El segmento vial 18002587 ubicado en el barrio Granjas de Santa Sofia no presenta novedades ni condiciones que limiten o comprometan su intervención. Tras la revisión técnica realizada, se concluye que el tramo se encuentra en condiciones aptas para la ejecución de las actividades contractuales previstas, sin requerir ajustes adicionales.

- **18002587**

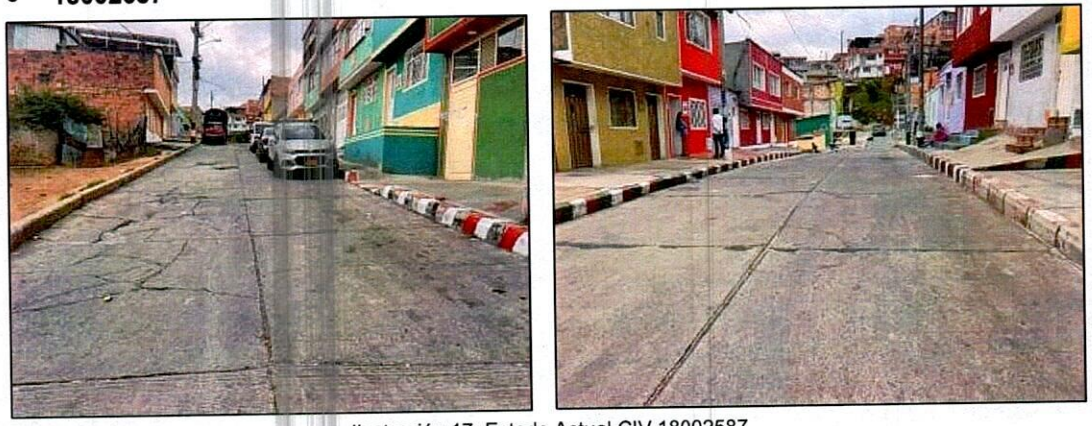


Ilustración 17. Estado Actual CIV 18002587

QUIROGA

El segmento vial identificado con el código 18001036, ubicado en el barrio Quiroga, presenta una afectación significativa en la infraestructura de tubería. Durante la inspección visual y el recorrido conjunto realizado con el supervisor responsable de la zona 3 del sistema de acueducto, se evidenció que la tubería existente corresponde a una conducción en ladrillo de 30", la cual presenta ondulaciones a lo largo de su trazado, así como huecos generados por procesos de socavación. Ante esta condición, se considera indispensable llevar a cabo una inspección detallada de las redes subterráneas con el fin de determinar el alcance de la afectación y establecer los lineamientos necesarios para la ejecución segura y efectiva de las actividades constructivas.

- **18001036**

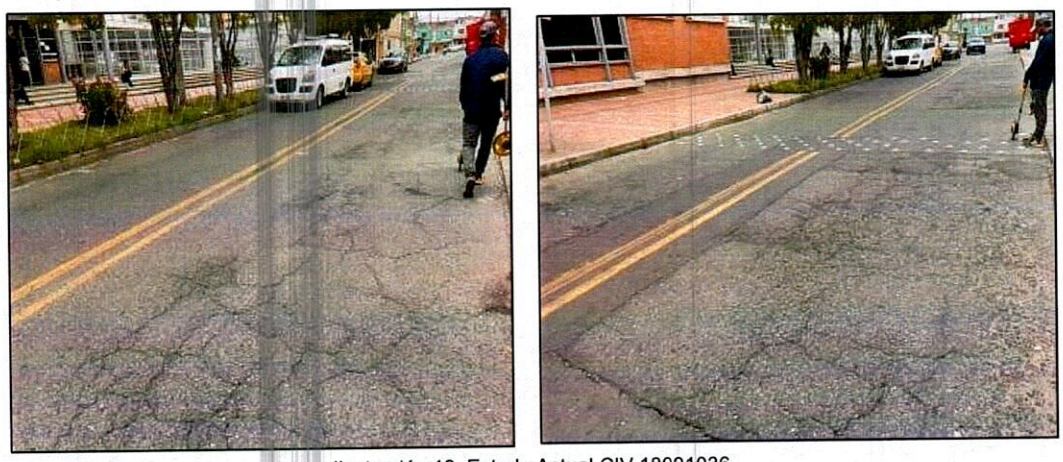


Ilustración 18. Estado Actual CIV 18001036.

MARRUECOS

Los segmentos viales 18005026, 18005042, 18005057, 18005087 y 18005094 ubicados en el barrio Marruecos no presentan novedades ni condiciones que limiten o comprometan su intervención. Tras la revisión técnica realizada, se concluye que el tramo se encuentra en condiciones aptas para la ejecución de las actividades contractuales previstas, sin requerir ajustes adicionales.

- **18005026**



Ilustración 19. Estado Actual CIV 18005026.

- **18005042**



Ilustración 20. Estado Actual CIV 18005042.

- **18005057**



Ilustración 21. Estado Actual CIV 18005057.
