Informe Mensual No. 4
CONTRATO 552-2024 COP (120683)
Periodo: del 27 de mayo al 18 de junio de 2025



OBJETO DEL CONTRATO:

“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”

CONTRATISTA:

Consorcio Teusavial

CONSORCIO TEUSAVIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

CONTRATO DE OBRA No. 552-2024 COP (120683)

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

Informe de Gestión Social No. 4

REVISIÓN Y APROBACIÓN


Número de revisión: 1		**Versión No. 1**
Elaborado por: CONSORCIO TEUSAVIAL		
Responsable por elaboración Residente social	Nombre	T.S Ángela María Quiroga G.
	Firma	
Aprobado por: CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG		
Responsable por Aprobación Residente Social de Interventoría	Nombre	T.S. Luz Escobar Ospina
	Firma	
Junio de 2025		

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. JUSTIFICACIÓN 7
3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO. 8
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 9
5. ALCANCE DEL PROYECTO 11
6. RECURSOS HUMANOS Y SOPORTE LOGÍSTICO - ÁREA SOCIAL 11
7. GESTIÓN SOCIAL 11
7.1 Objetivo General. 12
7.2 Objetivos Específicos. 12
8. PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL 12
9. PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD. 13
9.1 Afiches informativos 13
9.2 Reuniones de inicio 13
9.3. Reuniones de finalización 13
9.4. Reuniones Extraordinarias 13
9.5. Socializaciones 14
10. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO. 15
10.1. Objetivo General 15
10.2. Puntos satélites de información 15
10.3. Volante informativo de inicio de obra 17
10.4. Volante de convocatoria a reuniones de inicio de obra 17
10.5. Volante recomendaciones para adecuación de canales y bajantes de aguas lluvias 17
10.6. Volante notificación inicio actas de vecindad 17
10.7. Volante Oferta laboral 18
10.8. Volante de información ciudadana 18
10.9. Piezas de Información del Plan de Manejo de Tráfico - PMT 19
10.10. Volante otras informaciones 19
11. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA – ACTAS DE VECINDAD 20
11.1. Levantamiento de Actas de Vecindad iniciales. 20
11.2. Actas de compromiso. 21
11.3. Levantamiento de actas para acceso a rampas 21
11.4. Registro fílmico y fotográfico de vías de desvió. 22
11.5. Actas de Vecindad de cierre 22

12. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 23
12.1. Punto PAC fijo 24
12.2. Punto PAC VIRTUAL 24
12.3. Punto PAC Móvil 25
12.5 PQRSD 26
12.6. Participación Ciudadana Reuniones Comité Ciudadano 28
13. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 29
13.1. Objetivo General 29
14. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO. 30
14.1 Objetivo General 30
14.2 Capacitación mensual 30
15. PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO FORMADA 31
15.1 Objetivo General 31
15.2 Generación total de empleo 31
5.3. Vinculación de Mano de Obra No formada periodo No. 4 34
16. PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A DOTACIONES 37
16.1 Objetivo General. 37
16.2 Seguimientos por periodo 37
17 PROGRAMA DE GESTION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 38
17.1 Informes Semanales 38
17.2 Informe Mensual 38
17.3 Informe Final 38
18 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COSTOS 39
18.1 Comités de Gestión Social 39

Listado de Tablas

Tabla 1 Información del proyecto 8
Tabla 2 Información del Contratista 8
Tabla 3 Información de la Interventoría 9
Tabla 4 CIV´S del proyecto 10
Tabla 5 Personal mínimo requerido área social 11
Tabla 6 Consolidado actas de socializaciones realizadas en el periodo 15
Tabla 7 PSI vigentes en el periodo 16
Tabla 8 Indicador PSI instalados 16
Tabla 9 Indicador PSI actualizados 16
Tabla 10 Consolidado notificación inicio actas de vecindad en el periodo 18

Tabla 11 Indicador distribución de volantes levantamiento actas de vecindad primera visita en el periodo 18
Tabla 12 Consolidado notificación otras informaciones 19
Tabla 13 Indicador distribución de volantes de otras informaciones en el periodo 20
Tabla 14 Consolidado levantamiento actas de vecindad en el periodo 20
Tabla 15 Indicador levantamiento actas de vecindad en el periodo 21
Tabla 16 Indicador actas de rampas vehiculares en el periodo 21
Tabla 17 Consolidado registros fílmicos y fotográficos de vías de desvió PMT en el periodo 22
Tabla 18 Indicador registros fílmicos y fotográficos de vías de desvió PMT en el periodo 22
Tabla 19 Consolidado divulgación copias de actas de vecindad a la comunidad 23
Tabla 20 Indicador divulgación copias de actas de vecindad 23
Tabla 21 Tabla de atención PUNTO PAC 25
Tabla 22 Indicador Punto PAC Móvil 25
Tabla 23 Consolidado PQRSD 26
Tabla 24 Consolidado de reuniones comité de participación ciudadana 29
Tabla 25 Realización de capacitación mensual 30
Tabla 26 Indicador realización de capacitación mensual 30
Tabla 27 Personal contratado en el periodo No. 4 31
Tabla 28 Porcentajes MONF – Mujeres en el periodo 34
Tabla 29 Personal MONF en el periodo 34
Tabla 30 Indicador vinculación MONC 35
Tabla 31 listado de las mujeres vinculadas en cumplimiento al decreto 332 de 2021. 36
Tabla 32 Indicador generación de empleo de mujeres en el periodo 36
Tabla 33 Indicador control y seguimiento de dotaciones 37

Lista de Anexos

Anexo 1 Actas de socialización PMT Galerías, Chapinero Occidental y San Luis y registro fotográfico. Actas de socialización de inicio, tramo El Recuerdo – tramo 1 Chapinero Occidental, listados de firmas, esquema PMT y registros fotográficos. 14
Anexo 2 PSI vigentes en el periodo 16
Anexo 3 Formato control entrega de piezas de divulgación, volante levantamiento actas de vecindad primera visita y registro fotográfico Galerías. 18
Anexo 4 Formato control entrega de piezas de divulgación, volante convocatoria reunión del comité ciudadano y registro fotográfico Nicolás de Federmán. Formato control entrega de piezas de divulgación, volante socialización ampliación inicio de obra y registro fotográfico Alfonso López. 19
Anexo 5 Formatos de control entrega de copias de actas de vecindad y registros fotográficos Nicolas de Federmán. Tramo 1 y 2. 23

Anexo 6 PQRSD No. 2 y 3. 26
Anexo 7 Acta de reunión de participación ciudadana comité ciudadano tramo 1 Nicolás de Federmán. 29
Anexo 8 Registro de asistencia y fotográfico de capacitación No. 4 30

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo presentar los resultados y avances de la Gestión Social del contrato No. 552-2024 COP (120683) el cual hace parte integral de los componentes requeridos en el marco de ejecución, cuyo objeto es **"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES",** celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo y la firma Consorcio Teusavial.

Con base a lo anterior, el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, busca elevar las condiciones de bienestar de la ciudadanía, a través del cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas que deben desarrollar los contratistas en el marco del Plan de Desarrollo Local. Lo anterior con el fin de minimizar el impacto social generado por las obras de la construcción de vías en los diferentes barrios de la localidad de Teusaquillo, ejecutadas por la firma Consorcio Teusavial.

Dentro de los fines y objetivos del presente informe, se plantea describir las acciones realizadas desde la parte social del contratista en la etapa preliminar del contrato No. 552-2024 COP (120683), cabe señalar que este informe entregará un resumen de la gestión realizada en el **periodo No. 4, del 27 de mayo al 18 de junio de 2025**, a partir de los siguientes programas:

- Programa de divulgación e información a la comunidad.
- Programa de atención al ciudadano
- Programa de sostenibilidad.
- Programa de capacitación empleados del proyecto
- Programa de control y seguimiento a dotaciones.
- Programa de contratación de mano de obra no calificada.
- Programa de gestión de aseguramiento de la calidad.

2. JUSTIFICACIÓN

Con ocasión de la ejecución del contrato No. 552-2024 COP (120683), cuyo objeto **"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"** y teniendo en cuenta que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, es una entidad de carácter público, la cual es responsable de la contratación de múltiples obras de infraestructura junto con el espacio público, es importante ejecutar obras que den alcance y respuesta a las necesidades de las comunidades.

Por lo anterior la ejecución de obras en los diferentes segmentos viales de la localidad de Teusaquillo, se convierte en acciones de carácter misional que cumple el FDLT, mediante la intervención de obras de infraestructura vial y del espacio público que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad.

Por lo tanto, se plantean estrategias y actividades que mitiguen los impactos generados debido a la ejecución de las obras a través de la implementación del Plan de Gestión Social y sus respectivos programas.

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO.

Tabla 1 Información del proyecto

Entidad contratante: Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo	
Contrato No.	552-2024 COP (120683)
Objeto del contrato	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
Localización del proyecto	Teusaquillo
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de inicio	22 de enero de 2025
Fecha de terminación	21 de septiembre de 2025

Fuente: acta de inicio Contrato No. 552-2024 COP (120683)

Tabla 2 Información del Contratista

Contratista	
Contratista	Consorcio Teusavial
Director de obra	Ing. Juan Felipe Delgado.
Residente técnico	Ing. Andrés Echandía
Residente junior	Ing. Marcela Arévalo
Residente SST	Ing. Camilo Durán
Residente Ambiental	Ing. Camilo Durán
Residente Social	T.S Angela María Quiroga G.

Fuente: Archivos del contratista Contrato No. 552-2024 COP (120683)

Tabla 3 Información de la Interventoría


Interventoría	
Contratista	Consorcio Interteusaquillo JG
Director de obra	Ing. Jorge Gómez Falla
Residente técnico	Ing. Johan Mojica Sierra
Residente SST	Ing. Yesica Quíneme Fusca
Residente Ambiental	Ing. Yesica Quíneme Fusca
Residente Social	T.S. Luz Escobar Ospina

Fuente: residente social de interventoría

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

EL contrato se ejecuta en la localidad 13 de Teusaquillo, esta localidad está compuesta por seis UPL, las cuales son**:**

- ✓ UPL 100 Galerías
- ✓ UPL 101 Teusaquillo
- ✓ UPL 104 Parque Simón Bolívar – CAN
- ✓ UPL 106 La Esmeralda
- ✓ UPL 107 Quinta Paredes
- ✓ UPL 109 Ciudad Salitre Oriental

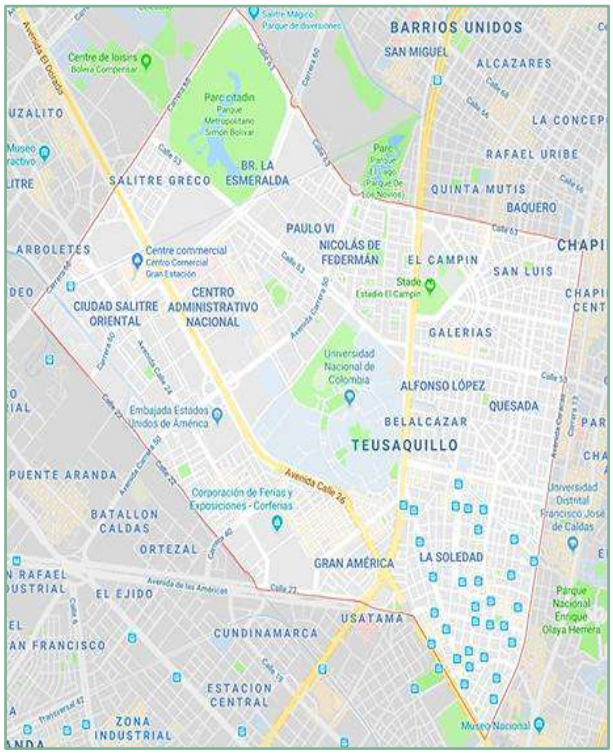

Fuente: Anexo técnico CCE-EICP-IDI-01
Imagen 1 Mapa de la localidad de Teusaquillo

El contrato No. 552-2024 COP (120683), realizará intervención vial en las UPL, Galerías, Teusaquillo, La Esmeralda y Quinta Paredes, de acuerdo con el listado de vías contempladas en el anexo técnico del contrato en referencia, lo cual representa un factor positivo para la ciudadanía puesto que habrá cobertura en un número significativo de UPL, de la localidad. A continuación, se relacionan los CIV´S a intervenir.

Tabla 4 CIV´S del proyecto

No	CIV o Código	No. UPL	Barrio	Eje Vial
1	13002387	101 Teusaquillo	Teusaquillo	Carrera 24 entre SE y Avenida Calle 34
2	13000593	100 Galerías	San Luis	Carrera 18 entre Calles 58B y 59
3	13000686	100 Galerías	San Luis	Carrera 18 entre Calles 58 y 58A
4	13000794	100 Galerías	San Luis	Carrera 16 entre Calles 57 y 58
5	13001165	100 Galerías	Alfonso López	Carrera 27 entre Calles 50 y 51
6	13002083	101 Teusaquillo	La Magdalena	Calle 38 entre Carreras 17A y 17
7	13000284	106 La Esmeralda	Nicolás de Federmán	Carrera 47 entre Calles 58A y 59
8	13000343	106 La Esmeralda	Nicolás de Federmán	Carrera 47 entre Calles 58 y 58A
9	13000476	106 La Esmeralda	Nicolás de Federmán	Carrera 36A entre Calles 57A y 57B
10	13000846	100 Galerías	Campin	Transversal 28 entre Carrera 28 y Diagonal 61B
11	13000875	100 Galerías	Galerías	Calle 53B entre Carrera 27 y Transversal 27A
12	13000864	106 La Esmeralda	Nicolás de Federmán	Calle 53A entre Carreras 35 y 36
13	13000336	100 Galerías	San Luis	Diagonal 61B entre Carreras 19A y 20
14	13000826	100 Galerías	Chapinero Occidental	Avenida Calle 57 entre Avenida Carrera 14 y Carrera 14A
15	13000814	100 Galerías	Chapinero Occidental	Carrera 14A entre Avenida Calle 57 y Calle 58

Fuente: Anexo técnico Contrato 552-2024 COP (120683)

5. ALCANCE DEL PROYECTO

En el presente documento da respuesta al lineamiento técnico y social del contrato COP-552-2024 COP (120683), donde se garantiza por parte del contratista el cumplimiento del Plan de Gestión Social, a través del desarrollo de los programas aquí planteados.

Cabe resaltar que todos los procesos que surjan deben contar con la aprobación de la Interventoría y por su parte el contratista brindará una atención permanente y oportuna a los requerimientos realizados por la comunidad.

6. RECURSOS HUMANOS Y SOPORTE LOGÍSTICO - ÁREA SOCIAL

El equipo humano de la gestión social está integrado por profesionales idóneos los cuales trabajarán de manera interdisciplinaria con los profesionales del área técnica: director, residente, residente ambiental, residente de seguridad y salud en el trabajo en pro de favorecer la ejecución de las obras de manera eficaz y oportuna. El Consorcio Teusavial, cuenta con el siguiente personal a fin de cubrir todas las obligaciones contenidas en el Plan de Gestión Social del Contrato:

Tabla 5 Personal mínimo requerido área social

Cargo	Nombres y apellidos	Dedicación
Residente Social	T.S Ángela María Quiroga G	100 %

Fuente: elaboración propia

7. GESTIÓN SOCIAL

Para el **cuarto periodo**, la firma contratista Consorcio Teusavial, por medio de la residente social, diseñó y realizó la distribución de diferentes piezas informativas, también se realizó socialización de Plan de Manejo de Tránsito de emergencia de vías asignadas para acciones de movilidad por la entidad contratante, barrios El Recuerdo y Chapinero Occidental.

7.1 Objetivo General.

Describir las acciones y actividades adelantas por el área de Gestión Social, de acuerdo a cada uno de los programas que hacen parte de este componente; garantizando a la comunidad del área de influencia directa del proyecto una información clara, veraz y oportuna que les permitan participar y apropiarse por las obras ejecutadas

7.2 Objetivos Específicos.

- Fomentar canales de comunicación que permitan al contratista brindar información clara, veraz y oportuna, a las comunidades del área de influencia del proyecto.
- Generar escenarios de participación comunitaria que faciliten la interacción entre la ciudadanía, el contratista y el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo.
- Brindar por medio de estrategias, una atención al ciudadano oportuna y eficaz, dando alcance a sus solicitudes, inquietudes, sugerencias quejas y/o reclamos que surjan con la ejecución de las obras.
- Mitigar los impactos sociales causados por la ejecución de las obras contempladas dentro del proyecto.

8. PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL

A continuación, se describe las actividades que adelantó el contratista desde el componente social en el **cuarto periodo**, en pro de dar cumplimiento a las obligaciones de gestión social, las cuales están encaminadas a garantizar que los usuarios beneficiarios de los diferentes frentes de obra o CIV del proyecto y/u otros actores representantes organizaciones sociales, socioeconómicas y ambientales, se mantengan informados sobre las obras:

- Recorridos por los frentes de obra.
- Elaboración de metodología y cronograma de actividades del Plan de Gestión Social.
- Asistencia a los comités de seguimiento.
- Realización de trabajo interdisciplinario con los profesionales de las otras áreas que hacen parte del proyecto (Técnica, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo SST), para garantizar el cumplimiento de los criterios del proyecto de manera integral.
- Implementación de los formatos, informes semanales, mensual, entre otros.

9. PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD.

El área social del contratista en el **periodo No. 4,** mantuvo el objetivo de fortalecer los procesos de comunicación con la comunidad y sus representantes, de manera que se genere una relación de confianza y participación constante, entre los diversos actores involucrados directa o indirectamente en la obra.

.

9.1 Afiches informativos

El contratista **en el periodo No. 4**, de acuerdo a directrices de la coordinación social del FDLT, se replanteó la pieza informativa de afiche para Punto PAC, la cual fue presentada a la interventoría y a la oficina de comunicaciones de FDLT y posteriormente fue aprobada el día 05 de mayo de 2025, para su elaboración e instalación.

Se implementará la publicación de afiches informativos, los cuales tendrán por objeto divulgar las actividades a realizar, dichos afiches serán instalados en los PSI, y funcionarán como estrategia informativa hacia la comunidad. Estos afiches fueron diseñados por el área social del contratista y enviados a la interventoría y comunicaciones del FDLT el día 20 de mayo para revisión; igualmente se notifica que los afiches en mención, fueron aprobados el día 22 de mayo de 2025.

9.2 Reuniones de inicio

El área social del contratista, para el **periodo No. 4,** no realizó reuniones de inicio de obra.

9.3. Reuniones de finalización

Una vez se culminen los trabajos técnicos de cada tramo, el área social del contratista realizará las reuniones de finalización, se hace salvedad que el proyecto se encuentra en etapa inicial, por tanto, no aplica para este periodo.

9.4. Reuniones Extraordinarias

Para este periodo, no se recibieron solicitudes por parte de la comunidad o la interventoría, tampoco surgieron situaciones que ameritaran la realización de reuniones extraordinarias. Por lo tanto, no se reporta ejecución de reuniones de este tipo para este mes.

9.5. Socializaciones

El área de Gestión Social del Consorcio Teusavial, para el periodo No. 4, por requerimiento de la Secretaría Distrital de Movilidad, realizó el levantamiento de actas de socialización de PMT, para los siguientes tramos de la siguiente manera:

Para cierre total de calzada

- Tramo 1 barrio Galerías CIV 13000875
- Tramo 1 barrio San Luis CIV 13000336.

Para cierre de espacio público

- Tramo 1 Chapinero Occidental, CIV´S 13000826 – 13000814.

Desde el área social del contratista se realizó visita predio a predio, se informó a la comunidad de zona de influencia directa las implicaciones del cierre total de calzada y espacio público, se recibió respuesta favorable de la comunidad, quienes firmaron las actas de socialización a conformidad.

Igualmente, se realizó socialización puerta a puerta en los barrios El Recuerdo y Chapinero Occidental, informando sobre el inicio de actividades de mantenimiento de calzada de emergencia, las cuales están contempladas dentro del Plan de Acción de Movilidad de la Alcaldía Local. Se informó a la comunidad los aspectos técnicos, sociales, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y ambientales que contemplan las diferentes intervenciones; así como el tiempo de ejecución general del tramo, se realizaron recomendaciones que contribuyan a que las obras se ejecuten dentro de un ambiente de confianza y satisfacción para la comunidad.

Se dio atención a la comunidad, se despejaron sus inquietudes y dudas frente a la intervención vial. A continuación, se presenta tabla de consolidado de socializaciones realizadas en este periodo.

Anexo 1 Actas de socialización PMT Galerías, Chapinero Occidental y San Luis y registro fotográfico. Actas de socialización de inicio, tramo El Recuerdo – tramo 1 Chapinero Occidental, listados de firmas, esquema PMT y registros fotográficos.

Tabla 6 Consolidado actas de socializaciones realizadas en el periodo

Periodo No. 4			
Fecha	**CIV**	**Barrio/tramo**	**Institución**
07/05/2025	13000875	Galerías	Terraza Bar Café
			Pan Express
			Hojaldre´s Colombia
			Vanite
			Parqueadero Los Quintero
			MS Radiología Dentofacial
			Edificio Salvador del Viento
			Parroquia Madre Salvador
15/05/2025	13001841 13001813	El Recuerdo	Comunidad de la Carrera 33A entre calle 25D y avenida calle 26
23/05/2025	13000985 13002468	Chapinero Occidental	Comunidad de la carrera 15 entre calles 54A y 55Bis
23/05/2025	13000826 13000814	Chapinero Occidental	Colegio Manuela Beltrán
			Colegio Principado de Mónaco
			Grupo Educativo Fortec
30/05/2025	13000336	San Luis	Comunidad diagonal 61B entre carreras 20 y 19A
			Jardín Infantil Olas de Alegría

10. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO.

10.1. Objetivo General

Mantener informada a la comunidad durante la ejecución del proyecto, por medio de piezas de divulgación del proyecto, que contengan información de las diferentes actividades y acontecimientos específicos que se puedan presentar y que impacten a la comunidad.

10.2. Puntos satélites de información

Los puntos satélites de información son equipamientos urbanos o puntos de encuentro ciudadano, para este proyecto tendrán como función difundir por medio de piezas de divulgación la información de este contrato la comunidad de la localidad de Teusaquillo.

Para el **periodo No. 4,** se realizó la instalación de (1) PSI en el barrio Galerías, también se realizó actualización de (4) PSI, ubicados en los tramos Nicolas de Federmán tramos 1, 2 y 3, se publicaron piezas informativas de acuerdo a la dinámica de la obra.

Anexo 2 PSI vigentes en el periodo

Tabla 7 PSI vigentes en el periodo

Periodo No. 4						
Fechas	**CIV**	**Barrio/tramo**	**Dirección**	**Instalación**	**Mantenimiento/ actualización**	**Desinstalación**
21/052025	13000284 13000343	Nicolás de Federmán tramo 1	Caseta parque de la carrera 47 con calle 58 y 59	0	1	0
20/05/2025	13000864	Nicolás de Federmán tramo 2	Carrera 35 # 53 - 53	0	1	0
21/052025	13000476	Nicolas de Federmán tramo 3	Carrera 36A # 57A-08	0	1	0
31/05/2025	13001165	Alfonso López	Carrera 27 # 50-77	0	1	0
08/05/2025	13000875	Galerías	Calle 53B # 27-31	1	0	0
Total				1	4	0

Tabla 8 Indicador PSI instalados

Ítem	**Formula**	**Meta**	**% de cumplimiento**
PSI	1 PSI instalados _____ 1 PSI requeridos * 100	Instalación de 1 PSI por tramo a intervenir	100%

Tabla 9 Indicador PSI actualizados

Ítem	**Formula**	**Meta**	**% de cumplimiento**
PSI	4 PSI actualizados _____ 4 PSI con necesidad de actualización * 100	Actualizar los PSI	100%

10.3. Volante informativo de inicio de obra

Para el **periodo No. 4,** no se distribuyeron volantes de inicio de obra, ya que por la dinámica del contrato no se dio la necesidad de implementarlas. Estas se aplicarán en el momento que sea necesario en concordancia a la dinámica del proyecto.

10.4. Volante de convocatoria a reuniones de inicio de obra

Para el **periodo No. 4,** no se distribuyeron volantes de reuniones de inicio de obra, ya que por la dinámica del contrato no se dio la necesidad de implementarlas. Estas se aplicarán en el momento que sea necesario en concordancia a la dinámica del proyecto.

10.5. Volante recomendaciones para adecuación de canales y bajantes de aguas lluvias

El contratista implementará esta pieza una vez se inicie la etapa de obra, en los predios que requieran su utilización, para acordar con la comunidad la correcta instalación de canales y bajantes de aguas lluvias, sin embargo, para **el periodo No. 4,** no aplica para, dado que el contrato se encuentra en etapa preliminar. Será implementada en el momento de requerirse.

10.6. Volante notificación inicio actas de vecindad

Para el **periodo No. 4,** desde el área social se realizó la distribución de volantes inicio actas de vecindad de primera visita para el tramo 1 del barrio Galerías, estas piezas informativas se entregaron predio a predio, de manera personalizada se explicó a la comunidad beneficiada por la obra, la importancia de realizar el levantamiento de actas de vecindad.

Igualmente, se realizó diseño del volante de inicio de actas de vecindad de primera visita para el tramo 1 del barrio San Luis, el cual será socializado para el próximo periodo. Los volantes en su debido momento, fueron presentados a la interventoría, contaron con su aprobación para impresión y distribución, se aplicó la metodología aprobada.

A continuación, se presenta tabla de consolidado de distribución de volantes de primera visita, durante el periodo.

Tabla 10 Consolidado notificación inicio actas de vecindad en el periodo

Periodo No. 4					
Tipo de volante	**CIV**	**Barrio**	**Tramo**	**Fecha**	**# volantes distribuidos**
Notificación primera visita actas de vecindad	13000875	Galerías	1	08/05/2025	6
Total					6

Anexo 3 Formato control entrega de piezas de divulgación, volante levantamiento actas de vecindad primera visita y registro fotográfico Galerías.

Tabla 11 Indicador distribución de volantes levantamiento actas de vecindad primera visita en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Divulgación	6 volantes de primera visita actas de vecindad distribuidos _____ 6 volantes de primera visita actas de vecindad requeridos * 100	Distribuir un volante por predio en zona de influencia directa de cada tramo a intervenir	100%

10.7. Volante Oferta laboral

Para el **periodo No. 4**, no se realizó publicación de volante de oferta laboral, sin embargo, en las reuniones de inicio de obra realizadas en los periodos anteriores se realizó la divulgación de oferta laboral para mano de obra no formada, se indicó a la comunidad el correo para el envío de las hojas de vida de las personas que estuvieran interesadas en las vacantes para cargos de BOAL y ayudantes de obra.

10.8. Volante de información ciudadana

Estas piezas se implementarán en caso de presentarse alguna contingencia, se adelantará información de las actividades según la programación de actividades técnicas específicamente cuando haya necesidad de brindar:

- Información sobre corte se servicios públicos.
- Cuando se presente intervención de tráfico vehicular.
- Cuando se presenten circunstancias de intervención particular.

Para el **periodo No. 4,** no se implementó esta pieza ya que no se generaron situaciones que diera lugar a su utilización, no aplica para este informe.

10.9. Piezas de Información del Plan de Manejo de Tráfico - PMT.

Para el presente periodo no se generó la necesidad de implementar este tipo de piezas informativas, por lo cual este ítem no aplica para este periodo.

10.10. Volante otras informaciones

El área de Gestión Social del Consorcio Teusavial, para el periodo No. 4, realizó convocatoria por medio de WhatsApp, a la primera reunión de comité ciudadano en el barrio Nicolás de Federmán tramo 1; por otro lado, diseñó la pieza de canales de comunicación, la cual fue aprobada por la Supervisión y será publicada en los PSI en el próximo periodo.

Igualmente, y ante la necesidad de mantener informada a la comunidad del barrio Alfonso López CIV 13001165 sobre el inicio de actividades, se diseñó un volante aclaratorio por la no intervención de la vía en la fecha estipulada en la reunión de inicio. Esta pieza fue remitida a la interventoría y la Supervisión, dando su aprobación para su respectiva distribución.

Tabla 12 Consolidado notificación otras informaciones

Periodo No. 4					
Tipo de volante	**CIV**	**Barrio**	**Tramo**	**Fecha**	**# volantes distribuidos**
Convocatoria comité de participación ciudadana	13000284 13000343 13002498	Nicolás de Federmán	1	22/05/2025	19 (enviados por WhatsApp)
Notificación ampliación de plazo inicio de obra	13001165	Alfonso López	1	31/05/2025	24
Total					43

Anexo 4 Formato control entrega de piezas de divulgación, volante convocatoria reunión del comité ciudadano y registro fotográfico Nicolás de Federmán. Formato control entrega de piezas de divulgación, volante socialización ampliación inicio de obra y registro fotográfico Alfonso López.

Tabla 13 Indicador distribución de volantes de otras informaciones en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Divulgación	43 volantes de ampliación plazo de inicio de obra / 43 volantes de ampliación plazo de inicio de obra requeridos * 100	Distribuir un volante por predio en zona de influencia directa de cada tramo a intervenir	100%

11. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA – ACTAS DE VECINDAD

11.1. Levantamiento de Actas de Vecindad iniciales.

Desde el componente social del contratista Consorcio Teusavial, para el **periodo No. 4,** se realizó levantamiento actas de vecindad, para el tramo No.1 del barrio Galerías CIV 13000875. El personal social y técnico del Consorcio Teusavial, realizó la toma de información detallada de manera fílmica, fotográfica y escrita del estado físico estructural de los predios de zonas de influencia directa del tramo referenciado, en cumplimiento a la metodología aprobada para tal fin, por parte de la interventoría.

Para este periodo, se generó la radicación a la interventoría de las actas de vecindad realizadas en el tramo No. 3 de Nicolas de Federmán, tramo No. 1 de Alfonso López y tramo No. 1 de Galerías, las cuales están en proceso de revisión.

A continuación, se presenta tabla de consolidado de levantamiento de actas de vecindad durante este periodo.

Tabla 14 Consolidado levantamiento actas de vecindad en el periodo

Periodo No. 4						
Barrio	**Tramo**	**CIV**	**No. De actas internas**	**No. De actas de fachada zona influencia directa con tres visitas**	**No. De actas de fachada de prevención**	**No. Total, De actas**
Galerías	1	13000875	4	0	0	4

Tabla 15 Indicador levantamiento actas de vecindad en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Acompañamiento social a actividades técnicas de obra	4 actas de vecindad levantadas _____ 4 actas de vecindad programadas * 100	Levantar el 100% de actas de vecindad de predios existes en zonas de influencia directa por tramo a intervenir.	100%

11.2. Actas de compromiso.

Para el presente periodo no surgieron situaciones que ameritaran el levantamiento de actas de compromiso, dado que el contrato se encuentra en etapa preliminar, por tal motivo no hay reporte referente a este tema, no aplica para este informe.

11.3. Levantamiento de actas para acceso a rampas

Para el **periodo No. 4,** desde el componente social del contratista Consorcio Teusavial, no se reporta levantamiento de actas para acceso a rampas, sin embargo, en los formatos de actas de vecindad se ha registrado el estado de las rampas de acceso vehicular a diferentes inmuebles, para un total de (1) predio con rampa para el tramo 1 del barrio Galerías CIV 13000875. Estas actas de vecindad fueron radicadas a la interventoría para revisión y firma en el mes de mayo de 2025.

Tabla 16 Indicador actas de rampas vehiculares en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Acompañamiento social a actividades técnicas de obra	1 registro de rampas vehiculares, plasmadas en formato de vecindad levantadas _____ 1 registros de rampas vehiculares, plasmadas en formato de vecindad programadas * 100	Levantar y registrar en formato de actas de vecindad el 100% de las rampas vehiculares de predios existes en zonas de influencia directa por tramo a intervenir.	100%

11.4. Registro fílmico y fotográfico de vías de desvió.

Para el **periodo No. 4,** desde el componente social del contratista Consorcio Teusavial, se reporta la realización de registros fílmicos y fotográficos de (4) vías aledañas y/o de posibles desvíos de PMT, para el tramo 1 del barrio Galerías CIV 13000875. Estos registros se realizaron con el fin de tener una evidencia de las vías anexas del tramo a intervenir, en caso de futuras reclamaciones por daños u afectaciones a causa del paso de volquetas y maquinaria de la obra. El registro fílmico y fotográfico fue radicado a la interventoría en el mes de mayo de 2025.

Tabla 17 Consolidado registros fílmicos y fotográficos de vías de desvió PMT en el periodo

Periodo No. 4			
Barrio	**Tramo**	**CIV**	**# de registros fílmicos y fotográficos vías de PMT**
Galerías	1	13000875	4

Tabla 18 Indicador registros fílmicos y fotográficos de vías de desvió PMT en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Acompañamiento social a actividades técnicas de obra	4 registros fílmicos y fotográficos / 4 registros fílmicos y fotográficos programadas * 100	Realizar registros fílmicos y fotográficos de las vías adyacentes a cada tramo, utilizadas en desvíos PMT	100%

11.5. Actas de Vecindad de cierre

Para el presente periodo no se realizaron actas de cierre dado que el proyecto se encuentra en etapa inicial, estas se verán reflejadas y reportadas cuando los procesos constructivos se encuentren finalizados.

11.6. Divulgación actas de vecindad a la comunidad

Durante el presente periodo se aprobaron las actas de vecindad de inicio de los tramos 1 y 2 CIV´S 13000284 – 13000343 Y 13000864 respectivamente; por tal motivo, se realizó la entrega de copias de actas de vecindad a la comunidad de los tramos Nicolás de Federmán tramos 1 y 2.

Anexo 5 Formatos de control entrega de copias de actas de vecindad y registros fotográficos Nicolas de Federmán. Tramo 1 y 2.

Tabla 19 Consolidado divulgación copias de actas de vecindad a la comunidad

Periodo No. 4				
Barrio	**Tramo**	**Fecha**	**CIV**	**Cantidad**
Nicolás de Federmán	1	21/05/2025	13000284	22
			13000343	27
	2	20/05/2025	13000864	23
TOTAL				72

Tabla 20 Indicador divulgación copias de actas de vecindad

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Acompañamiento social a actividades técnicas de obra	72 divulgación copias de actas de vecindad / 72 divulgación copias de actas de vecindad * 100	Divulgar el 100% de copias de actas de vecindad a la comunidad como soporte del estado inicial del predio	100%

12. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

El contratista en cumplimiento de sus obligaciones dará atención oportuna a la comunidad a través del trato digno y respetuoso que propenderá por la rápida solución de las diferentes consultas y requerimientos que se presenten; en virtud de ello contará con la instalación de un Punto PAC Fijo, virtual y móvil.

12.1. Punto PAC fijo

Desde el área social del contratista, se da cumplimiento a la metodología dispuesta para atención a la comunidad en caso de presentarse alguna petición, reclamo, queja, sugerencia, y/o denuncia, por tal motivo se instaló el Punto PAC fijo el cual cuenta con atención presencial, en la calle 39 A # 29 -21 piso 3.



Foto 1 Punto PAC

El equipamiento del Punto PAC, será dotado con los siguientes elementos y/o recursos:

- ✓ Espacio de recepción
- ✓ Escritorio y silla para la persona encargada de la atención del Punto PAC.
- ✓ Computador e impresora
- ✓ Sillas para la atención a la población.
- ✓ Material impreso: formato de sistema de atención PQRSD.
- ✓ Medios de comunicación: Línea telefónica para hacer la recepción de las llamadas realizadas por la población y cuenta de correo electrónico.
- ✓ Horario de atención al público.

12.2. Punto PAC VIRTUAL

La contratista continua con la disposición de la atención del Punto PAC Virtual, como mecanismo que no implique desplazamientos de la comunidad hasta el Punto físico, se realizó instalación de la línea de atención No. 3019072050, la cual está dispuesta para la atención a la comunidad y el correo electrónico: teusavialsocial@gmail.com.

Esta información ha sido plasmada en cada pieza informativa que se ha entregado a la comunidad y en el punto satélite de información. Para el presente informe por medio del correo electrónico no se recibieron PQRSD.

12.3. Punto PAC Móvil

Durante este periodo el contratista a través del área social realizó recorridos de reconocimiento de los tramos de obra, con el ánimo de tener un acercamiento directo con la comunidad, escuchar sus consultas y manifestaciones y así mismo tramitar su respuesta en lo posible de manera inmediata.

Para este periodo se presentó una (1) PQRSD, la cual será referenciada y se dará respectiva trazabilidad en el apartado PQRSD, al finalizar el programa atención al ciudadano. Se hace claridad que en la vigencia de este periodo el contratista Consorcio Teusavial continua con la disposición de canales de atención, los cuales se describen en la siguiente tabla.

Tabla 21 Tabla de atención PUNTO PAC

Horario de Atención Virtual		**Contacto**	**Responsable**
Días	**Horario**		
Lunes a viernes	8 am a 4:30 pm 	 Correo electrónico: teusavialsocial@gmail.com Teléfono Móvil: 3019072050	Profesional Social T.S Ángela María Quiroga G.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 22 Indicador Punto PAC Móvil

Ítems/programa	**Formula**	**Meta**	**% de cumplimiento**
Punto PAC Móvil	1 punto PAC móvil implementado _____ 1 punto PAC móvil programado * 100	Instalación de un Punto PAC móvil	100%

Fuente: elaboración propia.

12.5 PQRSD

Durante el **periodo No. 4,** se recibió una (1) PQRSD, correspondiente al consecutivo No. 3, dicha PQRSD corresponde a particularidades surgidas por los procesos constructivos en los tramos de obra. Igualmente, el área social realizó el respectivo trámite y cierre al PQRSD con consecutivo No. 2, la cual quedo abierta en el informe anterior. A continuación, se muestra consolidado y trazabilidad de las PQRSD generadas hasta la fecha de este informe.

Anexo 6 PQRSD No. 2 y 3.

Para el presente informe por medio del correo electrónico no se recibieron PQRSD.

Tabla 23 Consolidado PQRSD

# de PQRSD	Fecha apertura	Fecha de cierre	Solicitud	Peticionario	Dirección /teléfono	Trazabilidad	Estado/informe #
1	25/03/2025	7/04/2025	Copia acta de reunión de inicio tramo 1 Nicolás de Federmán	Jesika Aullon Guerrero Edificio Monterosso P-H Administración	Carrera 47 # 58 - 40 Edificio Monterosso	7/04/2025 Se emite correo electrónico con acta de reunión solicitada. En esta misma fecha se recibe notificación de la peticionaria, sobre el recibido de la información solicitada. Teniendo en cuenta la respuesta dada se genera cierre de la PARSD No. 1, a satisfacción de las partes.	Cerrado en informe No. 3

# de PQRSD	Fecha apertura	Fecha de cierre	Solicitud	Peticionario	Dirección /teléfono	Trazabilidad	Estado/informe #
2	29/04/2025	19/05/2025	Garantizar el paso para silla de ruedas costado occidental, tramo de la carrera 27 entre calles 50 y 51, Alfonso López	Yessica Olaya Sánchez Tel. 3178376564	Carreras 27 3 entre calles 50 y 51	29/04/2025 Por medio del correo electrónico de atención a la comunidad, se recibe petición de una residente del tramo Alfonso López, quien solicita que por el andén del costado occidental se garantice el paso de una silla de ruedas o persona con movilidad reducida. Se dará trámite en el periodo No. 4. 13/05/2025 Se realiza recorrido con el área técnica del contratista, donde se verifican los niveles del espacio público del costado occidental. Igualmente, se realiza adecuación de sobresalto en la junta de los andenes, quedando el andén en condiciones óptimas para la movilidad de silla de ruedas. 19/05/2025 Se envía respuesta formal a la señora Peticionaria, a través de correo electrónico. 23/05/2025 Se realiza visita al predio y se recibe firma física de la trazabilidad y cierre de la presente PQRSD.	Cerrado en informe No. 4

# de PQRSD	Fecha apertura	Fecha de cierre	Solicitud	Peticionario	Dirección /teléfono	Trazabilidad	Estado/informe #
3	08/05/2025	08/05/2025	Inconformidad referente al poco personal trabajando en el tramo y la maquinaria parada	Julia Moreno Tel. 6012219996	Calle 53A No. 35-10	Se informa a la Peticionaria que las actividades que se están adelantando son de tipo manual: excavación, adecuación de cárcamos y la instalación de tubería hacia los pozos. Igualmente, se le informa que las condiciones climáticas hacen que en ciertos lapsos de tiempo sea necesario suspender actividades, sin embargo, la ejecución se encuentra en los tiempos estipulados. La Peticionaria recibe la información suministrada y cierra el PQRSD a satisfacción.	Cerrado en informe No. 4

12.6. Participación Ciudadana Reuniones Comité Ciudadano

La firma Contratista, a través de la residente social estableció en reunión de inicio del tramo comunidad ubicada en el área de influencia directa del proyecto; los cuales, se reunirán una vez al mes, para informar a los participantes el avance de la obra y los cambios generados durante la intervención. Igualmente, los representantes del Contratista y la Interventoría identificarán las problemáticas manifestadas por los asistentes y ofrecerá alternativas y soluciones.

Durante el presente período, se llevó a cabo la primera reunión de Comité de Participación Ciudadana, contando con la asistencia de miembros del comité, representantes del FDLT, profesionales de la firma Interventora y Contratista, se brindó información del avance de obra en el tramo, se dio atención y respuesta a las inquietudes manifestadas por los integrantes del comité ciudadano.

Anexo 7 Acta de reunión de participación ciudadana comité ciudadano tramo 1 Nicolás de Federmán.

Tabla 24 Consolidado de reuniones comité de participación ciudadana

Periodo No. 4						
Fecha	**CIV**	**Barrio / tramo**	**Motivo**	**No. De acta de reunión**	**No. De asistentes comunidad**	**No. De asistentes interventoría / contratista otros**
28/05/2025	13000284 13000343	Nicolás de Federmán	Reunión Comité de Participación Ciudadana No. 1	1	4	11

13. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

13.1. Objetivo General

Brindará información por medio de plegables de sostenibilidad sobre la responsabilidad ciudadana en el buen uso y mantenimiento de las obras construidas, en pro de que las mismas se mantengan en el tiempo.

13.2. Plegables de Sostenibilidad

La implementación de los plegables se dará una vez se obtenga mínimo el 95% de terminación de actividades técnicas por tramo, teniendo en cuenta que el contrato está en etapa inicial, este ítem no aplica para el presente informe.

14. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO.

14.1 Objetivo General

Realizar acciones encaminadas a la formación del personal que hace parte del contrato, articuladas con las áreas SST y ambiental, a través de una capacitación mensual sobre temas que contribuyan al mejoramiento de la convivencia y desarrollo personal, laboral y social de los trabajadores adscritos al proyecto, además de enfatizar sobre el trato a la ciudadanía.

14.2 Capacitación mensual

Para el **periodo No.4**, desde el área social y SST, se implementó la capacitación No.4, la cual se desarrolló en los tramos de obra en el barrio Nicolas de Federmán, el tema abordado fue mecanismos de participación ciudadana parte 2, se contó con la participación activa del personal vigente.

Anexo 8 Registro de asistencia y fotográfico de capacitación No. 4

Tabla 25 Realización de capacitación mensual

Periodo No. 4		
Fecha	**Tema**	**No. De asistentes**
28/05/2025	Mecanismos de participación ciudadana: Voto	31

Tabla 26 Indicador realización de capacitación mensual

Ítems/programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Programa de capacitación a los empleados del proyecto.	31 trabajadores asistentes a la capacitación Mensual No. 4 _____ 31 trabajadores convocados a la capacitación * 100	Realización de una capacitación mensual.	100%

Fuente: elaboración propia.

15. PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO FORMADA

15.1 Objetivo General

Vincular mínimo al 30% de personal MONF[1], de la localidad de Teusaquillo, en concordancia al anexo técnico del contrato.

15.2 Generación total de empleo

Para el **periodo No. 4,** el Consorcio Teusavial continua con la plantilla de personal profesional requerida, se cumple con la vinculación de mano de obra femenina, también se realizó contratación de mano de obra no calificada, sin embargo, en este periodo se culmina la etapa preliminar y no aplica la vinculación de MONF de la localidad, dado que no hay ejecución de la etapa constructiva. A continuación, se presenta tabla.

Tabla 27 Personal contratado en el periodo No. 4

#	EMPRESA (CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA)	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	LOCALIDAD DE RESIDENCIA N°	CARGO
PERSONAL NUEVO					
1	CASTRO VARGAS INGENIEROS SAS	CARLOS ARTURO CADENA	1032383432	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR
2	DISTRICOMERCIO YLSAS	HUMBERTO VARGAS	80265284	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR
3	PAVIOBRAS SAS	EDGAR ALFONSO CASTRO BARRAGAN	79896322	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
4	EP INGENIEROS CIVILES SAS	OSCAR ENRIQUE DE LIMA	1118843305	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
5	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JOHAN SEBASTIAN RAMIREZ SANCHEZ	1033698531	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
6	VG EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS	KEVIN ANDRES ALZATE ROMERO	1105464056	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
7	EP INGENIEROS CIVILES SAS	HUMBERTO DAVID CHIRINOS GRIMAN	7094719	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
8	CONSORCIO TEUSAVIAL	OSCAR JAVIER GARZON MARTINEZ	107367696	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA

[1] Mano de obra no formada

9	CONSORCIO TEUSAVIAL	RONAL SALCEDO	5300663	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
10	CONSORCIO TEUSAVIAL	LUIS ALBERTO RIVERA CASTRO	4052960	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
11	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JOSE ANDRES NIETO ROA	1031132699	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR
12	CONSORCIO TEUSAVIAL	JOSE MIGUEL VARGAS ROA	79878620	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
13	CONSORCIO TEUSAVIAL	LEONARFO MERCADO	1143402900	BOSA	OPERADOR
PERSONAL ANTIGUO					
1	INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCIÓN	JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA	79947081	USAQUÉN	DIRECTOR DE OBRA
2	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA	80026555	PUENTE ARANDA	ESP. GEOTECNIA Y PAVIMENTOS
3	LISANDRO NUÑEZ GALEANO	LISANDRO NUÑEZ GALEANO	5471618	USAQUÉN	ESPECIALISTA HIDRAULICO
4	CONSORCIO TEUSAVIAL	SANDRA ISABEL PERILLA FONSECA	52104995	BOSA	AUXILIAR SOCIAL
5	CONSORCIO TEUSAVIAL	YOHANA MARCELA AREVALO MOLINA	1032380392	FONTIBÓN	INGENIERA CIVIL DE OBRAS Y TÉCNICA
6	CONSORCIO TEUSAVIAL	HENRY CAMILO DURAN MARQUEZ	80903575	MARTIRES	RESIDENTE AMBIENTAL
7	CONSORCIO TEUSAVIAL	ANDRES FELIPE ECHANDIA ROLDAN	79785617	USAQUÉN	RESIDENTE DE OBRA
8	CONSORCIO TEUSAVIAL	ANGELA MARIA QUIROGA GALVIS	52753727	PUENTE ARANDA	RESIDENTE SOCIAL
9	CONSORCIO TEUSAVIAL	TATIANA ANDREA VALDELEÓN MANRIQUE	1014240890	ENGATIVA	RESIDENTE SST
10	CONSORCIO TEUSAVIAL	DANIEL FELIPE SANCHEZ MOLINA	1023928966	TUNJUELITO	TOPOGRÁFO
11	CONSORCIO TEUSAVIAL	ISABEL CRISTINA AGUDELO	1193074894	ENGATIVA	INSPECTORA SST AMBIENTAL
12	CONSORCIO TEUSAVIAL	DAVID SEBASTIAN MARTINEZ ARENAS	1022421350	KENNEDY	INSPECTOR DE OBRA
13	CONSORCIO TEUSAVIAL	REINALDO SALAS GONZALEZ	1240640	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
14	CONSORCIO TEUSAVIAL	ALEXIS FEREIRA SALAS	1775189	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
15	CONSORCIO TEUSAVIAL	GLORIA ESPERANZA CAMPOS	52026157	BOSA	AUXILIAR SOCIAL

16	CONSORCIO TEUSAVIAL	RAFAEL GUTIERREZ	79122807	ENGATIVA	CONDUCTOR
17	PAVIOBRAS SAS	JOSE ALBERTO GUZMAN PERDOMO	93471010	TEUSAQUILLO	OPERADOR FRESADORA
18	EP INGENIEROS CIVILES SAS	EDWIN MALAMBO	123349149	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
19	EP INGENIEROS CIVILES SAS	NESTOR ALBERTO REYES	4226971	CIUDAD BOLIVAR	OFICIAL DE OBRA
20	VG EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS	JONATHAN ROZO MARTINEZ	1031137524	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR RETROEXCAVADORA
21	EP INGENIEROS CIVILES SAS	GIOVANNI GUIZA	1024524592	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR DE MINICARGADOR
22	CONSORCIO TEUSAVIAL	SANDRA LILIANA VACA	52971427	CIUDAD BOLIVAR	AUXILIAR TOPOGRAFIA
23	CONSORCIO TEUSAVIAL	JHON FREDY HERNANDEZ	74189712	CIUDAD BOLIVAR	AUXILIAR TOPOGRAFIA
24	CONSORCIO TEUSAVIAL	JULIÁN FERNANDO TRUJILLO DURÁN	1010200330	CIUDAD BOLIVAR	INSPECTOR SST-AMB
25	EP INGENIEROS CIVILES SAS	MIGUEL ANGEL ROA PEÑA	1023923191	CIUDAD BOLIVAR	OFICIAL DE OBRA
26	CONSORCIO TEUSAVIAL	JONATHAN CASTAÑO PIEDRAHITA	1012360118	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
27	CONSORCIO TEUSAVIAL	YDALIS DEXIRE TORREALBA	5900718	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
28	CONSORCIO TEUSAVIAL	LENIS CALDERON BOCANEGRA	79955833	BOSA	AYUDANTE DE OBRA
29	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JHON FREDY RAMIREZ	80254210	CIUDAD BOLIVAR	MAESTRO OBRA CIVIL
30	EP INGENIEROS CIVILES SAS	EULOGIO RAMIREZ	6004326	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
31	EP INGENIEROS CIVILES SAS	ANDRES GUSTAVO ROA	1023892019	CIUDAD BOLIVAR	OFICIAL DE OBRA
32	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JHON FREDY JIMENEZ	1074808680	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
33	EP INGENIEROS CIVILES SAS	RUBEN DARIO PINILLA ROMERO	80006819	MARTIRES	AYUDANTE DE OBRA
34	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JACKSON RODRIGUEZ RIVAS	18420022	MARTIRES	AYUDANTE DE OBRA

35	CONSORCIO TEUSAVIAL	WILMER JOSÉ PEROZO	993685	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA

5.3. Vinculación de Mano de Obra No formada periodo No. 4

Para el presente periodo se mantienen vinculadas (20) personas, con perfil mano de obra no formada, de las cuales (9) pertenecen a la localidad de Teusaquillo, las demás pertenecen a la localidad Ciudad Bolívar y otras localidades, desde el área de gestión humana del Consorcio Teusavial, se generó la vinculación de perfiles para actividades de auxiliares de tráfico y brigadistas de orden, aseo y limpieza con asignación de cargos de ayudantes de obra, desde el subcontratista de obra se realizaron vinculaciones para ayudantes de obra, para actividades operativas en los diferentes frentes del proyecto.

A continuación, se presenta tabla que permite verificar cuantitativamente los porcentajes alcanzados del ítem para vinculación laboral MONF y mujeres.

Tabla 28 Porcentajes MONF – Mujeres en el periodo

Periodo No. 4							
Total, MONF	**Total, MONF localidad Teusaquillo**	**Total, MONF otras localidades**	**Porcentaje cumplimiento MONF**	**Total, personal contratado (MONF, y Mujeres MONF)**	**Total, mujeres vinculadas al proyecto**	**Total, personal vinculado al proyecto**	**Porcentaje total vinculación (mujeres)**
20	9	11	45%	20	8	48	16.6%

Tabla 29 Personal MONF en el periodo

#	EMPRESA (CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA)	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	LOCALIDAD DE RESIDENCIA N°	CARGO
1	PAVIOBRAS SAS	EDGAR ALFONSO CASTRO BARRAGAN	79896322	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
2	EP INGENIEROS CIVILES SAS	OSCAR ENRIQUE DE LIMA	1118843305	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
3	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JOHAN SEBASTIAN RAMIREZ SANCHEZ	1033698531	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
4	VG EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS	KEVIN ANDRES ALZATE ROMERO	1105464056	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA

5	EP INGENIEROS CIVILES SAS	HUMBERTO DAVID CHIRINOS GRIMAN	7094719	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
6	CONSORCIO TEUSAVIAL	OSCAR JAVIER GARZON MARTINEZ	107367696	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
7	CONSORCIO TEUSAVIAL	RONAL SALCEDO	5300663	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
8	CONSORCIO TEUSAVIAL	LUIS ALBERTO RIVERA CASTRO	4052960	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
9	CONSORCIO TEUSAVIAL	JOSE MIGUEL VARGAS ROA	79878620	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
10	CONSORCIO TEUSAVIAL	REINALDO SALAS GONZALEZ	1240640	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
11	CONSORCIO TEUSAVIAL	ALEXIS FEREIRA SALAS	1775189	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
12	EP INGENIEROS CIVILES SAS	EDWIN MALAMBO	123349149	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
13	CONSORCIO TEUSAVIAL	JONATHAN CASTAÑO PIEDRAHITA	1012360118	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
14	CONSORCIO TEUSAVIAL	YDALIS DEXIRE TORREALBA	5900718	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
15	CONSORCIO TEUSAVIAL	LENIS CALDERON BOCANEGRA	79955833	BOSA	AYUDANTE DE OBRA
16	EP INGENIEROS CIVILES SAS	EULOGIO RAMIREZ	6004326	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
17	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JHON FREDY JIMENEZ	1074808680	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
18	EP INGENIEROS CIVILES SAS	RUBEN DARIO PINILLA ROMERO	80006819	MARTIRES	AYUDANTE DE OBRA
19	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JACKSON RODRIGUEZ RIVAS	18420022	MARTIRES	AYUDANTE DE OBRA
20	CONSORCIO TEUSAVIAL	WILMER JOSÉ PEROZO	993685	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA

Tabla 30 Indicador vinculación MONC

Programa	Formula	Meta	Cumplimiento
Contratación MONF	9 trabajadores MONF de localidad de Teusaquillo / 20 de trabajadores MONF * 100	30% mano de obra local y/o de localidades de estratos 1 y 2	45%

Es importante mencionar que, el contratista Consorcio Teusavial en el marco del contrato No. 552 – 2024 (120683), y en cumplimiento del acuerdo 332 de 2021 del Concejo de Bogotá, cuyo objetivo principal cerrar la brecha de pobreza y disminuir la informalidad económica e inclusión de mujeres en la contratación de obra pública, desde la etapa preliminar del contrato, realizó la vinculación de mano de obra femenina con un alcance del 16.6%, las cuales se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 31 listado de las mujeres vinculadas en cumplimiento al decreto 332 de 2021.

#	Contratista/ Subcontratista	Nombres Y Apellidos	Cédula	Localidad	Cargo
1	Consorcio Teusavial	Sandra Isabel Perilla Fonseca	52104995	Bosa	Auxiliar Social
2	Consorcio Teusavial	Yohana Marcela Arévalo Molina	1032380392	Fontibón	Ingeniera Civil De Obras Y Técnica
3	Consorcio Teusavial	Angela maría Quiroga Galvis	52753727	Puente Aranda	Residente Social
4	Consorcio Teusavial	Tatiana Valdeleón	1014240890	Engativá	Residente SST
5	Consorcio Teusavial	Isabel Cristina Agudelo	1193074894	Engativá	Inspectora SST-Ambiental
6	Consorcio Teusavial	Gloria Esperanza Campos	52026157	Bosa	Aux. Social
7	Consorcio Teusavial	Ydalis Dexire Torrealba	5900718	Teusaquillo	Ayudante de obra - Boal
8	Consorcio Teusavial	Sandra Liliana Vaca	52971427	Ciudad Bolívar	Aux. Topografía

Tabla 32 Indicador generación de empleo de mujeres en el periodo

Programa	Formula	Meta	Cumplimiento
Contratación mujeres	8 mujeres vinculadas al proyecto / 48 personas total vinculadas al proyecto * 100	Mantener mínimo el 13.4% mano de obra femenina en el desarrollo del contrato	16.6.7%

16. PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A DOTACIONES

16.1 Objetivo General.

Velar porque todos los empleados del proyecto utilicen adecuadamente los elementos de protección personal acorde a las actividades que cada uno realiza, cumpliendo con lo establecido en el Manual de Identidad Visual del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo.

16.2 Seguimientos por periodo

Para el **periodo No. 4**, desde el área social del Consorcio Teusavial, se efectúo el seguimiento a dotaciones, para personal administrativo y operativo del contrato, quienes portan la dotación acorde a la imagen corporativa privada del contratista y en concordancia a criterios del área SST.



Foto 2 Uso dotación personal administrativo y operativo

Tabla 33 Indicador control y seguimiento de dotaciones

Programa	Formula	Meta	Cumplimiento
Control y seguimiento de dotaciones	48 trabajadores portando la dotación requerida _____ 48 trabajadores contratados en el periodo * 100	Que todo el personal administrativo y operativo contratado, porten la dotación requerida en cada periodo	100%

17 PROGRAMA DE GESTION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

17.1 Informes Semanales

Semanalmente la residente social del Consorcio Teusavial, ha remitido vía correo electrónico a la Interventoría, el informe semanal de actividades de gestión social, se han atendido las observaciones y sugerencias de la interventoría, de acuerdo a la etapa preliminar a la fecha.

17.2 Informe Mensual

Este es un mecanismo que permite verificar el cumplimiento de los programas del plan de gestión social planteados para el proyecto. En concordancia se presenta **el informe No. 4**, a corte 18 de junio 2025**,** en este informe se describen las actividades que se realizaron durante el periodo. Posteriormente la interventora social realizará revisión, verificación, concepto y aprobación, para remitir a la alcaldía Local de Teusaquillo (FDLT).

17.3 Informe Final

Al finalizar el contrato se presentará un informe final a la firma interventoría, donde se plasme el consolidado de la implementación del Plan de Gestión Social en obra, dicho informe recogerá información cuantitativa y cualitativa de cada una de las actividades realizadas por tramo o sector intervenido. Como se proyecta realizar consolidado por tramo se dejará organizado el historial de anexos que den soporte de las actividades ejecutadas; los cuales fueron mencionados en los informes mensuales, pero que en el final también se registraran.

Las actas de vecindad harán parte de los anexos por cada segmento vial, estás llevaran un consolidado donde se registre el nombre del propietario, dirección teléfono y numero de acta, así mismo contarán con su respectivo soporte de acta de cierre que verifique si se generó alguna afectación y firma a satisfacción según sea el caso. El informe se entregará según los criterios de radicación del FDLT. El informe final contendrá los siguientes requisitos:

- ✓ Identificación, información del proyecto.
- ✓ Introducción.
- ✓ Componentes del Plan de Gestión Social con los programas y actividades desarrolladas por el contratista, incluirá consolidados e indicadores de cumplimiento.

- ✓ Análisis del cumplimiento del programa.
- ✓ Conclusiones y recomendaciones y anexos.

18 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COSTOS.

18.1 Comités de Gestión Social

El seguimiento del desempeño social del contratista ha sido verificado semanalmente por la interventoría, de acuerdo a las actividades de gestión en campo, seguimiento telefónico y por vía correo electrónico. Adicionalmente se ha realizado seguimiento y verificación del trabajo por medio de comités sociales e integrales, validados y efectuados por la interventoría a través de la lista de chequeo. Esta información reposa en actas de seguimiento de la interventoría.

Anexos

Anexo 1
Actas de socialización Galerías, El Recuerdo, Chapinero Occidental y San Luis.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/05/07 **HORA:** 1:45pm **LUGAR:** Calle 53B No. 27-31
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización establecimiento comercial Terraza Bar - Café para la implementación del PMT para Rehabilitación Vial de calzada en: **1. CALLE 53B ENTRE CARRERA 27A Y CARRERA 27**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	**AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.**

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES*, contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en dos etapas, con cierre de media calzada durante las 24 horas del día.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de calzada se realizarán con el cierre a media calzada, iniciando con la demolición, excavación y retiro del material existente, para la conformación de la nueva estructura que soportará la vía.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Los peatones podrán continuar por los andenes existentes, es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Teniendo en cuenta que se intervendrá la ciclorruta durante las dos etapas de ejecución, la propuesta de PMT plantea un desvío temporal sobre el andén el cual estará acompañado de dispositivos de canalización y auxiliares de tránsito.

No se podrá garantizar la entrada y salida de vehículos. No obstante, se garantizará en todo momento el tránsito peatonal de la zona y el funcionamiento del equipamiento descrito en el encabezado.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de junio de 2025 y durante los 6 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra.

El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Francisco Betancour (Administrador)	80210690	Calle 53B No. 27-31	3102445 09	invertbc@gmail.com.	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/05/07 **HORA:** 12:54pm **LUGAR:** Cll 53B No. 27-23 Local 1
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización establecimiento comercial Pan Express para la implementación del PMT para Rehabilitación Vial de calzada en: **1. CALLE 53B ENTRE CARRERA 27A Y CARRERA 27**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	**AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.**

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES*, contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en dos etapas, con cierre de media calzada durante las 24 horas del día.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de calzada se realizarán con el cierre a media calzada, iniciando con la demolición, excavación y retiro del material existente, para la conformación de la nueva estructura que soportará la vía.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Los peatones podrán continuar por los andenes existentes, es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Teniendo en cuenta que se intervendrá la ciclorruta durante las dos etapas de ejecución, la propuesta de PMT plantea un desvío temporal sobre el andén el cual estará acompañado de dispositivos de canalización y auxiliares de tránsito.

No se podrá garantizar la entrada y salida de vehículos. No obstante, se garantizará en todo momento el tránsito peatonal de la zona y el funcionamiento del equipamiento descrito en el encabezado.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de junio de 2025 y durante los 6 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra.

El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del dia.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Cristian Sánchez Administrador	1000 4705 30	cll 53B bis 27-23 Local 1	313 289 0814	c.douid.s16 hotmail.com	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/05/07 **HORA:** 12:57 **LUGAR:** Calle 53B No 27-23 Local 2
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización establecimiento comercial Hojaldre's Colombia para la implementación del PMT para Rehabilitación Vial de calzada en: **1. CALLE 53B ENTRE CARRERA 27A Y CARRERA 27**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	**AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.**

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en dos etapas, con cierre de media calzada durante las 24 horas del día.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de calzada se realizarán con el cierre a media calzada, iniciando con la demolición, excavación y retiro del material existente, para la conformación de la nueva estructura que soportará la vía.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Los peatones podrán continuar por los andenes existentes, es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Teniendo en cuenta que se intervendrá la ciclorruta durante las dos etapas de ejecución, la propuesta de PMT plantea un desvío temporal sobre el andén el cual estará acompañado de dispositivos de canalización y auxiliares de tránsito.

No se podrá garantizar la entrada y salida de vehículos. No obstante, se garantizará en todo momento el tránsito peatonal de la zona y el funcionamiento del equipamiento descrito en el encabezado.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de junio de 2025 y durante los 6 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra.

El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Esther Vega Propietaria	27·614·916	Calle 53B bis 27-23 Local 2	3118118510	— " —	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/05/07 **HORA:** 1:57 pm **LUGAR:** Calle 57B No. 27-23 2do piso
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización establecimiento comercial Vanite para la implementación del PMT para Rehabilitación Vial de calzada en: **1. CALLE 53B ENTRE CARRERA 27A Y CARRERA 27**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	**AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.**

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en dos etapas, con cierre de media calzada durante las 24 horas del día.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de calzada se realizarán con el cierre a media calzada, iniciando con la demolición, excavación y retiro del material existente, para la conformación de la nueva estructura que soportará la vía.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Los peatones podrán continuar por los andenes existentes, es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Teniendo en cuenta que se intervendrá la ciclorruta durante las dos etapas de ejecución, la propuesta de PMT plantea un desvío temporal sobre el andén el cual estará acompañado de dispositivos de canalización y auxiliares de tránsito.

No se podrá garantizar la entrada y salida de vehículos. No obstante, se garantizará en todo momento el tránsito peatonal de la zona y el funcionamiento del equipamiento descrito en el encabezado.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de junio de 2025 y durante los 6 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra.

El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Andres Carrión	1018430459	Calle 53B bis 22-23 2do piso	3143002486	andrescarrion.cardona@gmail.com	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/05/07 **HORA:** 1:12 pm **LUGAR:** Calle 53B No. 27-07 Ingreso por Cr 27A.
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización establecimiento comercial Los Quinteros parqueadero. para la implementación del PMT para Rehabilitación Vial de calzada en: **1. CALLE 53B ENTRE CARRERA 27A Y CARRERA 27**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	**AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.**

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES*, contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en dos etapas, con cierre de media calzada durante las 24 horas del día.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de calzada se realizarán con el cierre a media calzada, iniciando con la demolición, excavación y retiro del material existente, para la conformación de la nueva estructura que soportará la vía.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Los peatones podrán continuar por los andenes existentes, es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Teniendo en cuenta que se intervendrá la ciclorruta durante las dos etapas de ejecución, la propuesta de PMT plantea un desvío temporal sobre el andén el cual estará acompañado de dispositivos de canalización y auxiliares de tránsito.

No se podrá garantizar la entrada y salida de vehículos. No obstante, se garantizará en todo momento el tránsito peatonal de la zona y el funcionamiento del equipamiento descrito en el encabezado.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de junio de 2025 y durante los 6 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra.

El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Fredy Cespedes Empleada	93126877	Calle 578 bis 27-07	3177238012	Cespedesfredy0270@gmail.com	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/05/07 **HORA:** 1:20 pm **LUGAR:** Calle 53B No. 27-10
CONTRATO No.	FDLT-552-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
TEMA:	Socialización establecimiento comercial MS Radiología Dentofacial para la implementación del PMT para Rehabilitación Vial de calzada en: **1. CALLE 53B ENTRE CARRERA 27A Y CARRERA 27**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en dos etapas, con cierre de media calzada durante las 24 horas del día.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de calzada se realizarán con el cierre a media calzada, iniciando con la demolición, excavación y retiro del material existente, para la conformación de la nueva estructura que soportará la vía.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Los peatones podrán continuar por los andenes existentes, es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Teniendo en cuenta que se intervendrá la ciclorruta durante las dos etapas de ejecución, la propuesta de PMT plantea un desvío temporal sobre el andén el cual estará acompañado de dispositivos de canalización y auxiliares de tránsito.

No se podrá garantizar la entrada y salida de vehículos. No obstante, se garantizará en todo momento el tránsito peatonal de la zona y el funcionamiento del equipamiento descrito en el encabezado.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de junio de 2025 y durante los 6 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra.

El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Sthefanie Gómez Auxiliar Odontología	1030619280	Calle 513B No. 27-10	601348 1877	— " —	sthefanieGomez
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
	Acta de Socialización del PMT
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14 | Versión 1.0

FECHA:	2025/05/07 **HORA:** 12:37pm **LUGAR:** Calle 53B No. 27-24
CONTRATO No.	FDLT-552-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
TEMA:	Socialización establecimiento comercial Edificio Salvador del Viento para la implementación del PMT para Rehabilitación Vial de calzada en: 1. CALLE 53B ENTRE CARRERA 27A Y CARRERA 27
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoria CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en dos etapas, con cierre de media calzada durante las 24 horas del día.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de calzada se realizarán con el cierre a media calzada, iniciando con la demolición, excavación y retiro del material existente, para la conformación de la nueva estructura que soportará la vía.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Los peatones podrán continuar por los andenes existentes, es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Teniendo en cuenta que se intervendrá la ciclorruta durante las dos etapas de ejecución, la propuesta de PMT plantea un desvío temporal sobre el andén el cual estará acompañado de dispositivos de canalización y auxiliares de tránsito.

No se podrá garantizar la entrada y salida de vehículos. No obstante, se garantizará en todo momento el tránsito peatonal de la zona y el funcionamiento del equipamiento descrito en el encabezado.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de junio de 2025 y durante los 6 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra.

El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Martha Pinilla. Recepcionista	28'948.922	Calle 53B No. 27-24	6019278802	edificiosolnodal@gmail.com	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/05/07 **HORA:** 1:40pm **LUGAR:** C/ 53B No. 27-36
CONTRATO No.	FDLT-552-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización **Parroquia Madre Salvador** para la implementación del PMT para Rehabilitación Vial de calzada en: **1. CALLE 53B ENTRE CARRERA 27A Y CARRERA 27**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	**AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.**

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES*, contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en dos etapas, con cierre de media calzada durante las 24 horas del día.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de calzada se realizarán con el cierre a media calzada, iniciando con la demolición, excavación y retiro del material existente, para la conformación de la nueva estructura que soportará la vía.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Los peatones podrán continuar por los andenes existentes, es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Teniendo en cuenta que se intervendrá la ciclorruta durante las dos etapas de ejecución, la propuesta de PMT plantea un desvío temporal sobre el andén el cual estará acompañado de dispositivos de canalización y auxiliares de tránsito.

No se podrá garantizar la entrada y salida de vehículos. No obstante, se garantizará en todo momento el tránsito peatonal de la zona y el funcionamiento del equipamiento descrito en el encabezado.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de junio de 2025 y durante los 6 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra.

El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Olma Ceballos Secretaria	51562087	Clle 53B bis 27-36	321 236 0353	jardindelsaber@hotmail.com	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	07 de mayo de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Socialización PMT Barrio Galerías.
CIV 13000875

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
CODIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Contrato No.: _ 552-2024 COP (120683) HORA INICIO: 10:55 am Hoja 1 de 5

FECHA: MAYO 15 DE 2025 HORA DE FINALIZACIÓN: 11:47 am Acta N° 1

OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

ORDEN DEL DÍA

1.- Socialización del contrato y de las obras a ejecutar.

2.- Socialización de canales de atención del contrato.

3.- Recomendaciones a la comunidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- Socialización del contrato y de las obras a ejecutar:

CIV'S 13001841 - 13001813 Tramo carrera 33A entre calle 25D y avenida calle 26, Barrio El Recuerdo, UPL Quinta Paredes. Vía de emergencia por Plan de Acción de Movilidad de la Alcaldía Local.

El día 15 de mayo de 2025, se inicia el proceso de socialización del contrato 552-2024, en el tramo ubicado en la carrera 33A entre calle 25D y avenida calle 26 (Malla Vía Local), barrio El Recuerdo, UPL Quinta Paredes. Durante este proceso se informó a los ciudadanos residentes y comerciantes el nombre del contratista, denominado Consorcio Teusavial y la interventoría Consorcio Interteusaquillo JG, se menciona que los trabajos a ejecutar se harán el día 16 de mayo de 2025, con CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO (FRESADO Y CAMBIO DE CARPETA ASFÁLTICA).
Se socializa el esquema del PMT aprobado y se adjunta a la presente acta.

Se informa que el tiempo de ejecución del trabajo será de 24 horas; es decir, intervención diurna y nocturna.

2.- Socialización de canales de atención del contrato

Se socializa los datos del punto PAC virtual: Celular: 301 907 2050 / Correo electrónico: teusavialsocial@gmail.com / Punto PAC presencial: Calle 39A No.29-21 Barrio La Soledad

3.- Recomendaciones a la comunidad

Se realizan la siguientes recomendaciones a la comunidad:
1.- No ingresar a las zonas de trabajo las cuales se encontratrán aisladas durante la ejecución.
2.- Se recomienda atender la señalización informativa y reglamentaria dispuesta en el frente de obra.
3.-En caso de algún requerimiento de la comunidad por favor dirigirse al residente de obra, quien transmitira las inquietudes al área social,o a los canales de atención del contrato.
4.- Se recomienda el retiro de los vehículos de los garajes durante el tiempo de intervención.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

La comunidad no manifiesta ninguna inquietud, reciben la información a satisfacción.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS


COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
NINGUNO	N/A	N/A

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Se adjunta listado de asistencia		

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Luz Escobar Ospina
CARGO	Residente Social	Residente Social	Residente Interventoría
FIRMA	Angela M. Quiroga	Angela M. Quiroga	Luz Escobar

ANEXOS:	SI	X	NO		TIPO DE ANEXO: Listados de firmas, esquema PMT y registro fotográfico	CANTIDAD: 3

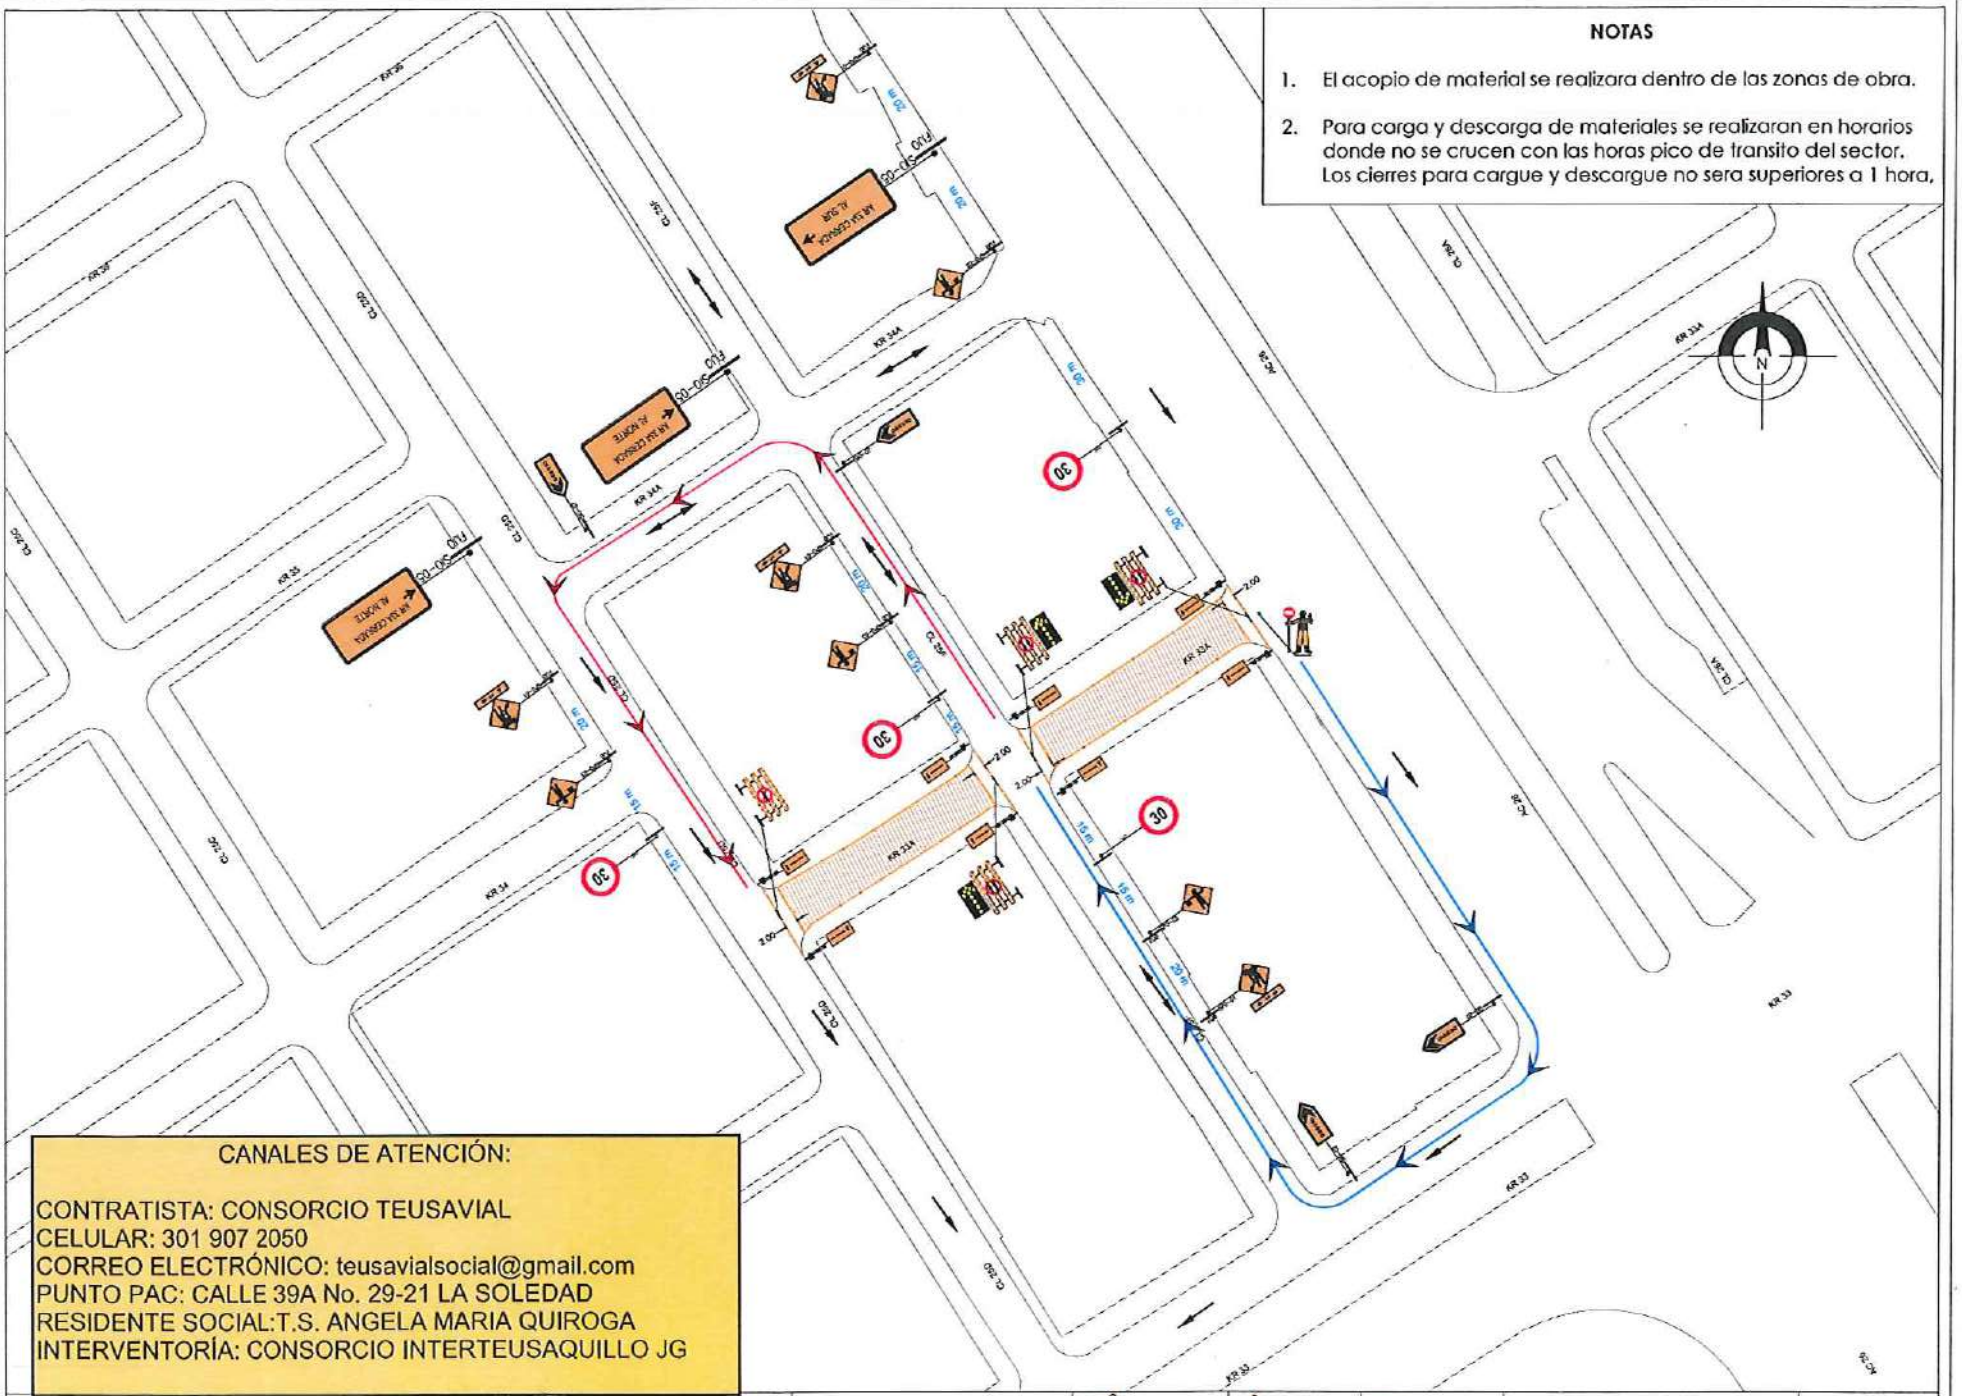
NOTAS
1. El acopio de material se realizara dentro de las zonas de obra.
2. Para carga y descarga de materiales se realizaran en horarios donde no se crucen con las horas pico de transito del sector. Los cierres para cargue y descargue no sera superiores a 1 hora.
CANALES DE ATENCIÓN:
CONTRATISTA: CONSORCIO TEUSAVIAL
CELULAR: 301 907 2050
CORREO ELECTRÓNICO: teusavialsocial@gmail.com
PUNTO PAC: CALLE 39A No. 29-21 LA SOLEDAD
RESIDENTE SOCIAL:T.S. ANGELA MARIA QUIROGA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
CONSORCIO VÍAS TEUSAQUILLO 2023
GSG INGENIERIA VIAL
CONTIENE:
PMT POR EMERGENCIA PARA FRESADO Y CAMBIO DE CARPETA EN LA KR 33A ENTRE CL 250 Y AC 26 (GV 13001841 Y 13001813)
"REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO - BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO."
CONVENCIONES
SEMAFOROS
HORARIO:
22:00-05:00
ESCALA : S/N
PLANO 1 DE 1

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	MAYO 15 DE 2025	TEMA	SOCIALIZACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PMT POR EMERGENCIA
LUGAR	VIA CARRERA 33A ENTRE CALLE 25D Y AVENIDA CALLE 26	BARRIO	EL RECUERDO
UPZ	QUINTA PAREDES	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO

No.	DOCUMENTO		NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	C.C T.I C.E	NÚMERO												
1	cc	20'526971	Mario Jimenez	68	COMUNIDAD	M	Ht	N	N	313 311 3678	Calle 26 No. 33-69	EL RECUERDO	— 11 —	
2	cc	52'273.775	Ingrid Gutierrez	49	COMUNIDAD	M	Ht	N	N	316629 9324	Calle 26 No 33A-05	EL RECUERDO	Instituto.celys @gmail.com	
3	—	— 11 —	— 11 —	—	COMUNIDAD	—	—	—	—	322890 0503	Cr 33A No. 25F-13	EL RECUERDO	— 11 —	Bajo puerta
4	Cc	1013651670	Julieth Gomez	31	COMUNIDAD	M	Ht	N	N	301619 8903	Cr 33A No. 25F-12	EL RECUERDO	Sharolgomez46 @gmail.com	
5	cc	53'084579	Natoly Triana	—	COMUNIDAD	M.	Ht	N	N	322 3167546	Calle 25F No. 33-66	EL RECUERDO	— 11 —	
6	cc	78'717.457	Jesus Geney	51	COMUNIDAD	H	Ht	N	N	313 883 3137	Calle 25F No 33-66 Local 2	EL RECUERDO	— 11 —	
7	cc	1116456 741	Juliana Marquez	20	COMUNIDAD	M	Ht	N	N	316 3422 170	Calle 25F No. 33A-04	EL RECUERDO	— 11 —	
8	cc	41.524659	Maria Helena Gonzalez	73	Comunidad	M	Ht	N	N	601 322 95 98	Calle 25F No 33A-07	EL RECUERDO	— 11 —	
9	cc	1007493332	Paula Parra	23	Comunidad	M	Ht	N	N	318 803 48 08	Cr 33A No. 25D-19	EL RECUERDO	paumabollap @gmail.com	
10	cc	79'980065	Cesar Herrera	—	Comunidad	H	Ht	N	N	321 282 4951	Calle 25D No. 33A-08	EL RECUERDO		
11	cc	79'471.725	Armando Lara	—	Comunidad	H	Ht	N	N	320 290 3404	Cr 33A No. 25D-10	EL RECUERDO	— 11 —	
12	cc	1013650702	Jonnatan Matiz	30	Comunidad	H	Ht	N	N	315 295 9283	Cr 33A No 25D-18	EL RECUERDO	— 11 —	
13	cc	79'369635	Daniel Bayuro	59	Comunidad	H	Ht	N	N	301 470 4865	calle 25F No. 33-65	EL RECUERDO	— 11 —	
14														
15														

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual/ I: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros(as)/G: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.


CONSORCIO TEUSAVIAL	Contrato No. 552-2024 COP (120683)	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. · ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO · BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLIA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 de mayo de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4



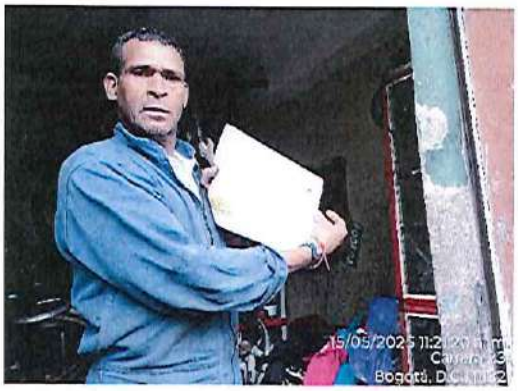





Observacion: Socialización Plan de Manejo de Transito para emergencia. Barrio El Recuerdo
CIV´S 13001841 - 13001813

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSION 2.0	

Contrato No.: 552-2024 COP (120683) HORA INICIO: 12:18 PM Hoja 1 de 5

FECHA: MAYO 23 DE 2025 HORA DE FINALIZACIÓN: 12:55 PM Acta N° 7

OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

ORDEN DEL DIA

1.- Socialización del contrato y de las obras a ejecutar.

2.- Socialización de canales de atención del contrato.

3.- Recomendaciones a la comunidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- Socialización del contrato y de las obras a ejecutar:

CIV´S 13000985 - 13002468 Tramo carrera 15 entre calles 54A y 55Bis, Barrio Chapinero Occidental , UPL Galerias. Vía de emergencia por Plan de Acción de Movilidad de la Alcaldía Local.

El día 23 de mayo de 2025, se inicia el proceso de socialización del contrato 552-2024, en el tramo ubicado en la carrera 15 entre calles 54A y 55Bis (Malla Vía Local), barrio Chapinero Occidental, UPL Galerias. Durante este proceso se informó a los ciudadanos residentes y comerciantes el nombre del contratista, denominado Consorcio Teusavial y la interventoría Consorcio Interteusaquillo JG, se menciona que los trabajos a ejecutar se harán el día 24 de mayo de 2025, con CIERRE A MEDIA CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO (FRESADO Y CAMBIO DE CARPETA ASFÁLTICA).
Se socializa el esquema del PMT aprobado y se adjunta a la presente acta.

Se informa que el tiempo de ejecución del trabajo será de 24 horas; es decir, intervención diurna y nocturna.

2.- Socialización de canales de atención del contrato

Se socializa los datos del punto PAC virtual: Celular: 301 907 2050 / Correo electrónico: teusavialsocial@gmail.com / Punto PAC presencial: Calle 39A No.29-21 Barrio La Soledad

3.- Recomendaciones a la comunidad

Se realizan la siguientes recomendaciones a la comunidad:
1.- No ingresar a las zonas de trabajo las cuales se encontratrán aisladas durante la ejecución.
2.- Se recomienda atender la señalización informativa y reglamentaria dispuesta en el frente de obra.
3.-En caso de algún requerimiento de la comunidad por favor dirigirse al residente de obra, quien transmitira las inquietudes al área social,o a los canales de atención del contrato.
4.- Se recomienda el retiro de los vehículos de los garajes durante el tiempo de intervención.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CODIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

La comunidad no manifiesta ninguna inquietud, reciben la información a satisfacción.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
NINGUNO	N/A	N/A

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Se adjunta listado de asistencia		

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Luz Escobar Ospina
CARGO	Residente Social	Residente Social	Residente Interventoría
FIRMA	Angela M. Quiroga	Angela M. Quiroga	Luz Escobar

ANEXOS:	SI	X	NO	\	**TIPO DE ANEXO:** Listados de firmas, esquema PMT y registro fotográfico	**CANTIDAD:** 3

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	MAYO 23 DE 2025	TEMA	SOCIALIZACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PMT POR EMERGENCIA CIV'S 13000985 - 13002468
LUGAR	VIA CARRERA 15 ENTRE CALLES 54A Y 55BIS	BARRIO	CHAPINERO OCCIDENTAL
UPZ	GALERÍAS	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO


No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	79'048917	Jose Marquez	—	COMUNIDAD	H	Ht	N	P	3163360920	Cr 15 No 54A-04	CHAPINERO OCCIDENTAL	No tiene	
2	—	—11—	—11—	—	COMUNIDAD	—	—	—	—	—11—	Cr 15 No 54A-12	CHAPINERO OCCIDENTAL	—11—	Bajo puerta
3		—11—	—11—	—	COMUNIDAD	—	—	—	—	—11—	Cr 15A 54A-28	CHAPINERO OCCIDENTAL	—11—	Bajo puerta
4		—11—	Julian Elpeja	—	COMUNIDAD	H.	Ht	N	P	—11—	Cr 15 No 54A-30	CHAPINERO OCCIDENTAL	No suministro	Atiende desde la ventana
5	CC	1'032873 31	Gabriel Silva	—	COMUNIDAD	—	—	—	—	320232 5414	Cr 15 No. 54A-42	CHAPINERO OCCIDENTAL	—11—	Silva Rubio
6	—	—11—	—11—	—	COMUNIDAD	—	—	—	—	—11—	Cl 55 No 14-96	CHAPINERO OCCIDENTAL	—11—	Bajo puerta
7	CC	41558125	Mem Reyes	—	COMUNIDAD	M	Ht	N	P	3118731385	Cr 15 No. 55-07	CHAPINERO OCCIDENTAL	—11—	
8	CC	39581584	Alexandra Giraldo	—	COMUNIDAD	M	Ht	N	N	3013497361	Cr 15 No 54A-29	CHAPINERO OCCIDENTAL	—11—	
9	—	—11—	—11—	—	COMUNIDAD	—	—	—	—	—11—	Cr 15 No 54A-23	CHAPINERO OCCIDENTAL	—11—	En Bazan
10	—	—11—	—11—	—	COMUNIDAD	—	—	—	—		Cl 54A No 15-08	CHAPINERO OCCIDENTAL		
11	CC	4'577488	Jose Humberto Carmona	—	COMUNIDAD	H	Ht	N	N	3138534271	Casa esta calle 54A con Cr 15	CHAPINERO OCCIDENTAL	—11—	
12		79143448	Juan Chaves	—	COMUNIDAD	H	Ht	N	N	—11—	Cr 15 No 54-50	CHAPINERO OCCIDENTAL	—11—	
13		7096034122	Nelson Landazo	—	COMUNIDAD	H	Ht	N	N	3133108649	Cr 15 No 54-55	CHAPINERO OCCIDENTAL	—11—	
14					COMUNIDAD							CHAPINERO OCCIDENTAL		
15					COMUNIDAD							CHAPINERO OCCIDENTAL		

Sexo. M: Mujer / **H:** Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / **Ht:** Heterosexual / **Bi:** Bisexual / **T:** Transexual/ **I:** Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / **R:** Raizales / **A:** Afrodescendientes / **I:** Indígenas / **P:** Palenqueros(as)/**G:** Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / **V:** Visual / **A:** Auditiva / **C:** Cognitiva / **MU:** Múltiple / **N:** Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

4 - 5

PMT TÍPICO
CIERRE DE UN CARRIL
CALZADA DE DOS (2) CARRILES UNIDIRECCIONAL

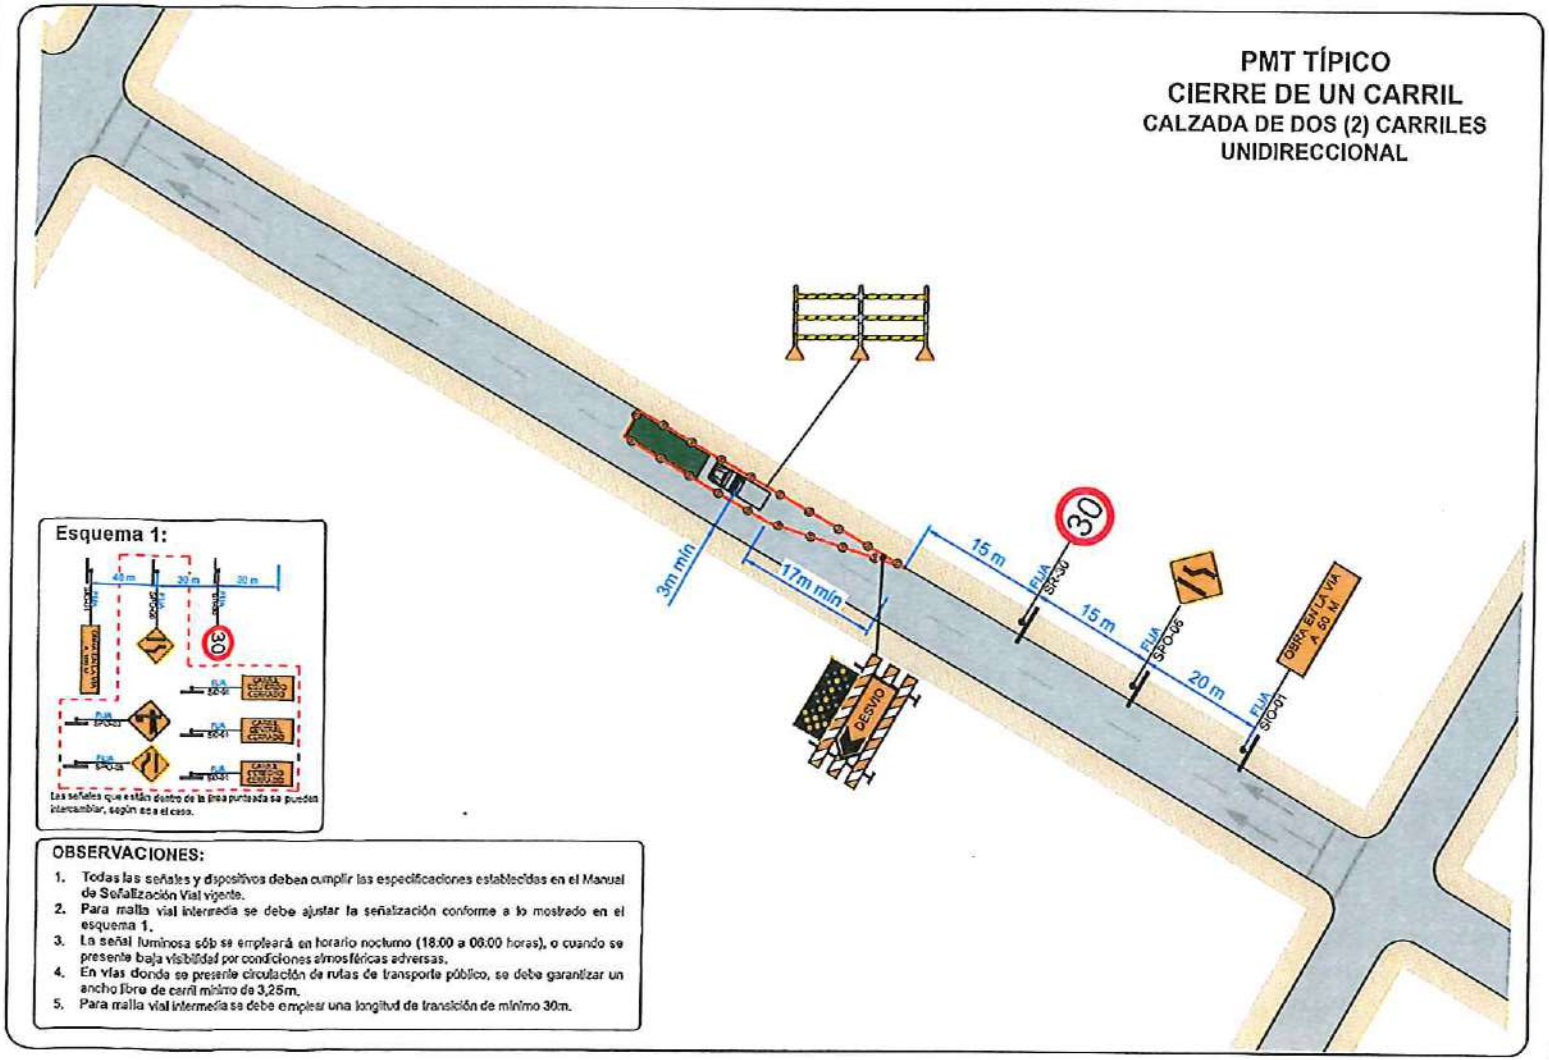

Esquema 1:

Las señales que están dentro de la línea punteada se pueden intercambiar, según sea el caso.

OBSERVACIONES:

1. Todas las señales y dispositivos debea cumplir las especificaciones establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
2. Para malla vial intermedia se debe ajustar la señalización conforme a lo mostrado en el esquema 1.
3. La señal luminosa sólo se empleará en horario nocturno (18:00 a 06:00 horas), o cuando se presente baja visibilidad por condiciones atmosféricas adversas.
4. En vías donde se presente circulación de rutas de transporte público, se debe garantizar un ancho libre de carril mínimo de 3,25m.
5. Para malla vial intermedia se debe emplear una longitud de transición de mínimo 30m.

CONVENCIONES

	SENTIDO CIRCULACIÓN VEHICULAR
	DESVIO VEHICULAR
	SEMAFORO
	DELINEADORES TUBULARES VISTA PERFIL
	DELINEADORES TUBULARES VISTA PLANTA
	CONOS VISTA PERFIL
	CONOS VISTA PLANTA
	BARRERAS PLÁSTICAS FLEXIBLES VISTA PERFIL
	BARRERAS PLÁSTICAS FLEXIBLES VISTA PLANTA
	BARRICADA VISTA PERFIL
	PANEL FLECHA LUMINOSA
	AUXILIAR DE TRÁNSITO
	SEÑALIZACIÓN VERTICAL TEMPORAL
	ZONA DE OBRA
	VEHICULO DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Movilidad

BOGOTÁ

SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO - SPMT

CONTIENE	REF.
PMT TÍPICO CIERRE DE UN CARRIL	22.4

Elaboró: FAGC

CANALES DE ATENCIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO TEUSAVIAL
CELULAR: 301 907 2050
CORREO ELECTRÓNICO: teusavialsocial@gmail.com
PUNTO PAC: CALLE 39A No. 29-21 LA SOLEDAD
RESIDENTE SOCIAL: T.S. ANGELA MARIA QUIROGA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	23 de mayo de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Socialización PMT Barrio Chapinero Occidental.
CIV´S 13000985 - 13002468

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/05/23 **HORA:** 3:47 pm **LUGAR:** Cr 14A No. 57-28
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización **Colegio Manuela Beltrán I.E.D. Sede A.** para la implementación del PMT para recuperación de espacio público con intervención de andenes **CALLE 57 ENTRE AVENIDA CARRERA 14 Y AVENIDA CARRERA 14A**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	Auxiliar Social Sandra Perilla

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la conformación y reconstrucción del andén, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de servicio.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de andenes se ejecutará en una sola etapa de ejecución, con cierre total del andén norte las 24 horas y cierre parcial de calzada costado norte para el traslado del sendero peatonal a la calzada.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra.

Durante la construcción de los andenes se garantizará la circulación de los peatones sobre la calzada existente con la implementación de un sendero peatonal provisional de mínimo 1,20 m de ancho, el cual estará protegido por maletines y colombinas. Contará con el apoyo de señalización y un auxiliar de tráfico, quien controlará el paso seguro de los peatones una vez se presente el ingreso y/o salida de vehículos de la obra.

No se presentan desvíos para el transporte público y el transporte particular teniendo en cuenta que quedará un carril habilitado para la circulación de los vehículos.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de junio de 2025 y durante los 4 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra. El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Juan Camilo Quintero	80182.464	Cr 14A Bis 57-28	305754 2960	sed.manuela.beltran13@educacionbogota.edu.co	
2	Auxiliar Administrativo.					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/05/23 **HORA:** 3:57pm **LUGAR:** Cr 14A D. 57-29
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización **Colegio Principado de Mónaco** para la implementación del PMT para recuperación de espacio público con intervención de andenes **CALLE 57 ENTRE AVENIDA CARRERA 14 Y AVENIDA CARRERA 14A**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	Auxiliar Social Sandra Perilla

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la conformación y reconstrucción del andén, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de servicio.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de andenes se ejecutará en una sola etapa de ejecución, con cierre total del andén norte las 24 horas y cierre parcial de calzada costado norte para el traslado del sendero peatonal a la calzada.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra.

Durante la construcción de los andenes se garantizará la circulación de los peatones sobre la calzada existente con la implementación de un sendero peatonal provisional de mínimo 1,20 m de ancho, el cual estará protegido por maletines y colombinas. Contará con el apoyo de señalización y un auxiliar de tráfico, quien controlará el paso seguro de los peatones una vez se presente el ingreso y/o salida de vehículos de la obra.

Teniendo en cuenta que las actividades se realizarán en el andén se requiere una zona para el cargue y descargue de materiales, la cual será en el carril occidental de la Avenida Carrera 14A entre Calle 57 y 30 m al Norte. Se ejecutará según concepto técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) de la SDM.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

No se presentan desvíos para el transporte público y el transporte particular teniendo en cuenta que quedará un carril habilitado para la circulación de los vehículos.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de junio de 2025 y durante los 4 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra. El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Leidy Carolina Tocua	53'177.706	Cr 14A bis. 57-29	3009485535	Secretaria-Bogota@cpm-edu.co	
2	Secretaria Academica					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/05/23 **HORA:** 4:02 pm **LUGAR:** Cr 14A No. 57-43
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización **Grupo Educativo Fortec** para la implementación del PMT para recuperación de espacio público con intervención de andenes **CALLE 57 ENTRE AVENIDA CARRERA 14 Y AVENIDA CARRERA 14A**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	Auxiliar Social Sandra Perilla

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la conformación y reconstrucción del andén, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de andenes se ejecutará en una sola etapa de ejecución, con cierre total del andén norte las 24 horas y cierre parcial de calzada costado norte para el traslado del sendero peatonal a la calzada.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra.

Durante la construcción de los andenes se garantizará la circulación de los peatones sobre la calzada existente con la implementación de un sendero peatonal provisional de mínimo 1,20 m de ancho, el cual estará protegido por maletines y colombinas. Contará con el apoyo de señalización y un auxiliar de tráfico, quien controlará el paso seguro de los peatones una vez se presente el ingreso y/o salida de vehículos de la obra.

No se presentan desvíos para el transporte público y el transporte particular teniendo en cuenta que quedará un carril habilitado para la circulación de los vehículos.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de junio de 2025 y durante los 4 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra. El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Andres Felipe Sepúlveda	1014242996	Cr 14#30-57-43	3133902662	andres.sepulveda@cogiobal.edu.co	
2	Docente					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	23 de mayo de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 3







Observacion: Socialización PMT Barrio Chapinero Occidental.
CIV´S 13000826 - 13000814

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/05/ 30 **HORA:** 12:41pm **LUGAR:** Vía Dg 61B entre cr 19A y 20
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización para la implementación del PMT para Rehabilitación Vial de calzada en: 1. **CALZADA SUR DIAGONAL 61B ENTRE CARRERA 20 Y CARRERA 19A** (CIV 13000336)
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	**AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.**

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en una sola etapa, con cierre de calzada sur durante las 24 horas del día. Por esta razón, se implementarán el siguiente contraflujo durante los cierres:

CALZADA SUR DIAGONAL 61B ENTRE CARRERA 20 Y CARRERA 19A

Por las condiciones de cierre total de **calzada sur,** durante la ejecución de la obra no se podrá garantizar el acceso vehicular al sector intervenido. Teniendo en cuenta lo anterior, se informa a la comunidad afectada el siguiente CONTRAFLUJO:

Las rutas de desvío para los vehículos particulares afectados durante la ejecución:

- **CALZADA SUR DIAGONAL 61B ENTRE CARRERA 20 Y CARRERA 19A** (CIV 13000336):

Desvío al oriente: En la Carrera 20 tomar contraflujo carril Norte Diagonal 61B hasta la Carrera 19A, empalmando con su recorrido habitual.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Teniendo en cuenta que se realizara cierre total de calzada sur y que no se afectara el espacio público, los peatones podrán continuar por los andenes existentes, es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Por esta razón, teniendo en cuenta las condiciones de cierre total de calzada sur, los predios que se encuentren en el área directa de las intervenciones, **no podrán acceder a sus garajes por el tiempo que dure la obra y asumirán los costos de estos hasta su habilitación.** No obstante, los andenes no se verán afectados, por lo cual el tránsito peatonal podrá seguir operando en condiciones de seguridad vial. Cabe resaltar que desde la administración del conjunto residencial se comprometen a hacer extensiva la presente socialización a los residentes. Respecto al manejo de basuras los residentes y/o propietarios deberán disponer de sus residuos en los días y horarios ya establecidos; en el punto más cercano a los cierres de obra durante el tiempo que dure la misma.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de mayo de 2025 y durante los 6 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra. El horario de trabajo y cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Dolly Rojas Propietaria	46672724	Dg 61B No. 19A-26	3106432397	dolly-rojas95@hotmail.com	
2	Mercedes Cabezas Familiar	No suministro	Dg 61B No. 19A-22	3002633487	—11—	
3	Cecilia Cardenas Arrendataria	41739361	Cr 19A No. 61-67/65	3124787494	—11—	
4	Daniel Mon Familiar propietario	1032456755	Dg 61B No. 19A-13	313838 7913	morogdaniel@gmail.com	
5	Constanza Leon Propietaria	41576398	Dg 61B No 19A-27	3165316583	—11—	
6						
7						
8						

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/05/ 30 **HORA:** 12:34pm **LUGAR:** Cr 20 Ds 61B-06
CONTRATO No.	FDLT-552-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización para la implementación del PMT: JARDIN INFANTIL OLAS DE ALEGRIA 1. **CALZADA SUR DIAGONAL 61B ENTRE CARRERA 20 Y CARRERA 19A** (CIV 13000336)
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	**AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.**

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES*, contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en una sola etapa, con cierre de calzada sur durante las 24 horas del día. Por esta razón, se implementarán el siguiente contraflujo durante los cierres:

CALZADA SUR DIAGONAL 61B ENTRE CARRERA 20 Y CARRERA 19A

Por las condiciones de cierre total de **calzada sur**, durante la ejecución de la obra no se podrá garantizar el acceso vehicular al sector intervenido. Teniendo en cuenta lo anterior, se informa a la comunidad afectada el siguiente CONTRAFLUJO:

Las rutas de desvío para los vehículos particulares afectados durante la ejecución:

- **CALZADA SUR DIAGONAL 61B ENTRE CARRERA 20 Y CARRERA 19A** (CIV 13000336):

Desvío al oriente: En la Carrera 20 tomar contraflujo carril Norte Diagonal 61B hasta la Carrera 19A, empalmando con su recorrido habitual.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Teniendo en cuenta que se realizara cierre total de calzada sur y que no se afectara el espacio público, los peatones podrán continuar por los andenes existentes, es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Por esta razón, teniendo en cuenta las condiciones de cierre total de calzada sur, los predios que se encuentren en el área directa de las intervenciones, **no podrán acceder a sus garajes por el tiempo que dure la obra y asumirán los costos de estos hasta su habilitación.** No obstante, los andenes no se verán afectados, por lo cual el tránsito peatonal podrá seguir operando en condiciones de seguridad vial. Cabe resaltar que desde la administración del conjunto residencial se comprometen a hacer extensiva la presente socialización a los residentes. Respecto al manejo de basuras los residentes y/o propietarios deberán disponer de sus residuos en los días y horarios ya establecidos; en el punto más cercano a los cierres de obra durante el tiempo que dure la misma.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de mayo de 2025 y durante los 6 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra. El horario de trabajo y cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Ligia mora Coordinadora	52'478.699	Cr 20 No. 61B-06	3108053805	paa_sami@hotmail.com	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	30 de mayo de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Socialización PMT Barrio San Luis.
CIV 13000336.

Anexo 2
PSIS vigentes en el periodo

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA		
21	05	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMUNIDAD
DIRECCIÓN: CASETA CARRERA 47 CON CALLE 58
TELÉFONO: 312 476 7226
PERSONA CONTACTO: SIGIFREDO ANZOLA
TRAMO: CARRERA 47 ENTRE CALLES 58 Y 59

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☑	1
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☑
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza punto satélite de información con volante de inicio de obra, se verifica en buenas condiciones y se mantiene informada a la comunidad de los avances de la obra.

CIV 13000284 - 13000343
Barrio: Nicolás de Federmán Tramo 1

6. FIRMAS

Sigifredo Anzola
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Angela M. Quiroga
T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

Luz Escobar
T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Unidad Local de Tesorería

FECHA		
20	05	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMUNIDAD
DIRECCIÓN: CARRERA 35 No. 53-53
TELÉFONO: 312 348 3811
PERSONA CONTACTO: MARIA JOSE BUITRAGO
TRAMO: 13000864 TRAMO 2

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☑	2
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☑
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza punto satélite de información con volante de inicio de obra y levantamiento de actas de vecindad, se verifica en buenas condiciones y se mantiene se informada a la comunidad de los avance de la obra.

CIV 13000864
Barrio: Nicolás de Federmán Tramo 2

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA		
21	05	**2025**

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: NEGOCIO
DIRECCIÓN: CARRERA 36A No. 57A-08
TELÉFONO:
PERSONA CONTACTO: HÉCTOR HERRERA
TRAMO: CIV 13000476 TRAMO 3

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☑	2
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☒
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza punto satélite de información con volante de inicio de obra y levantamiento de actas de vecindad, se verifica en buenas condiciones y se mantiene se informada a la comunidad de los avance de la obra.

CIV 13000476
Barrio: Nicolás de Federmán Tramo 3

6. FIRMAS

Nombres y apellidos	T.S. Angela María Quiroga G	T.S. Luz Escobar Ospina
Propietario /o quien autoriza el punto satélite	Residente Social del Contratista o Consultor	Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA		
08	05	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Negocio
DIRECCIÓN: Calle 53B No. 27-31
TELÉFONO: 3102744509
PERSONA CONTACTO: Francisco Betancour
TRAMO: CIV 13000875 TRAMO 1

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☑	1
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☒ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se instala PSI en predio con volante de levantamiento de actas de vecindad, con el fin de mantener informado a la comunidad sobre las actividades a realizar en el tramo Calle 53B entre Carreras 27 y 27.

CIV 13000875
Barrio: Galerías

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
31	05	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: NEGOCIO
DIRECCIÓN: CARRERA 27 No. 50-77
TELÉFONO: 3204956793
PERSONA CONTACTO: AMIR VERGEL
TRAMO: CIV 13001165 TRAMO 1

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☑	3
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☑
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza Punto Satélite de Información con volante No. 12 socialización ampliación plazo inicio de obra, con el fin de mantener informada a la comunidad las actividades realizadas y de avance de la obra.

CIV 13001165
Barrio: Alfonso López

6. FIRMAS

AMIR VERGEL.
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

Luz Escobar
T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

Anexo 3
Formato control entrega de piezas de divulgación, volante levantamiento actas de vecindad primera visita y registro fotográfico Galerías.

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo


TIPO DE PIEZA: VOLANTE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD PRIMERA VISITA

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis FECHA 08/05/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO BARRIO: GALERÍAS CIV : 13000875

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Francisco Betancour	cll 53B No. 27-31	3102744504	GALERIAS		1	—11—
2	Cristian Sánchez	cl 53B No. 27-23 L.1	3132890814	GALERIAS		1	—11—
3	Esther Vega	cll 53B No 27-23 L.2	3118178510	GALERIAS		1	—11—
4	Andrei Carrión	cll 53B No 27-23 2do piso	3143002186	GALERIAS		1	—11—
5	Fredy Céspedes	cll 53B No 27-07	3172238012	GALERIAS		1	—11—
6	Laura Gomez	cll 53B No 27A-07	3102616309	Galerias		1	—11—
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	6	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela M. Quiroga	Luz Escobar

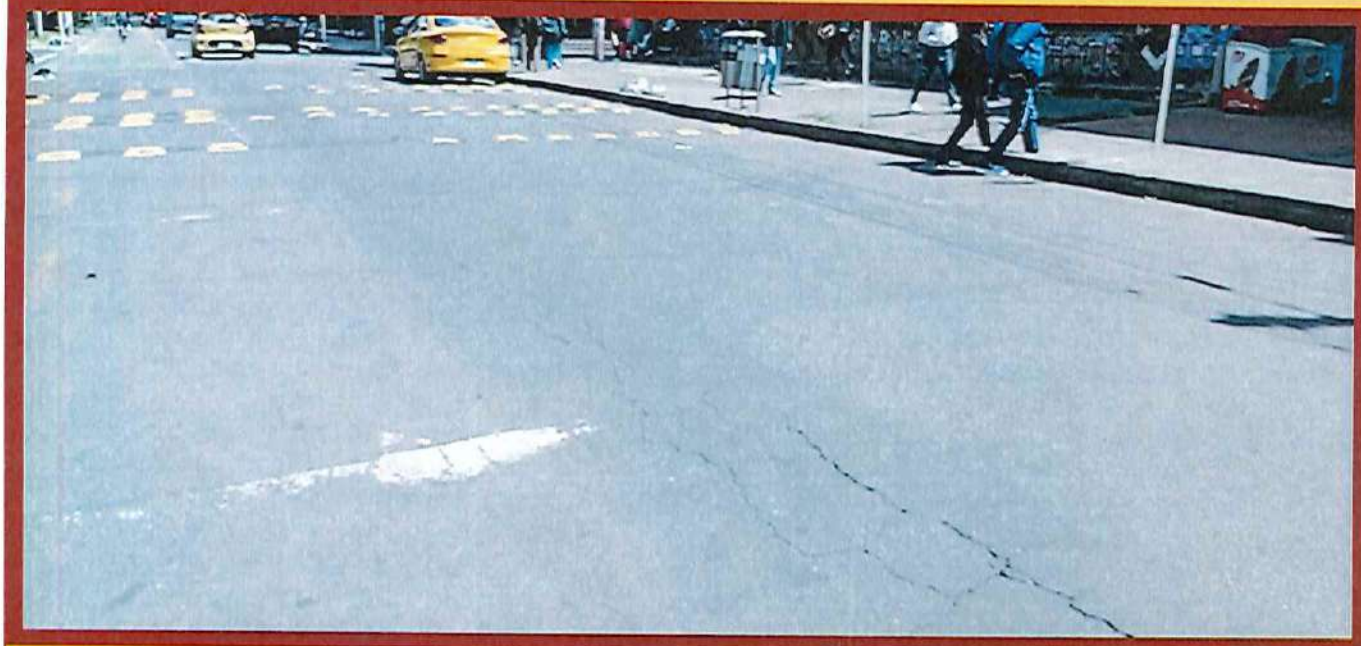

LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA Nº: FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad de la localidad del Barrio Galerías que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo realizará la intervención del tramo vial identificado con el CIV 13000875 (calle 53B entre carreras 27 y 27A), dentro del alcance del contrato de obra FDLT 552 2024 COP (120683) que tiene como objeto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES", Por tal motivo el día 12 de mayo de 2025, se realizarán las actas de vecindad en el horario de 8:00 am a 2:00 pm. Si desea coordinar el horario de la visita, por favor comunicarse con la profesional social de contratista

Fecha inicio: 12-05-2025

Lugar: Área de intervención, calle 53B entre carreras 27 y 27A.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 301 907 2050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. · ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO · BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLIA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	08 de mayo de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Entrega de volante para levantamiento de actas de vecindad de primera visita, barrio Galerías Calle 53B entre Carreras 27 y 27A CIV 13000875

Anexo 4
Formato control entrega de piezas de divulgación, volante convocatoria reunión comité ciudadano, volante socialización ampliación inicio de obra y registro fotográfico Galerías.

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE PIEZA: Convocatoria 1ra Reunión Comite Ciudadano - Volante No. 10.

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) RESPONSABLE: T.S.Angela Maria Quiroga Galvis

FECHA Mayo 22 / 2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO BARRIO: Nicolas de Federman

CIV: 13000284 Tramo 1
13000343

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	—11—	Comunidad Carrera 47 entre calle 58 y 59	—11—	Nicolás de Federman	—11—	19	Enviado por WhatsApp
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS 19

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela Maria Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Maria Quiroga	Luz Escobar



1ª REUNIÓN COMITÉ CIUDADANO

CONTRATO DE OBRA N.º FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, realizará la intervención de los tramos viales del Barrio Nicolás de Federman con CIV 13000284, CIV 13000343 y CIV 13002498 a través del contrato 552 de 2024 que tiene como objeto "*EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES*", por tal motivo se realizará la 1ª reunión de comité ciudadano el día 28 de mayo de 2025 a las 8:00 a.m., en donde se dará a conocer los avances del contrato.

Fecha reunión: 28-05-2025

Lugar: Frente a la Esquina del parque de la carrera 47 con calle 58 A.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 3019072050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de mayo de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4

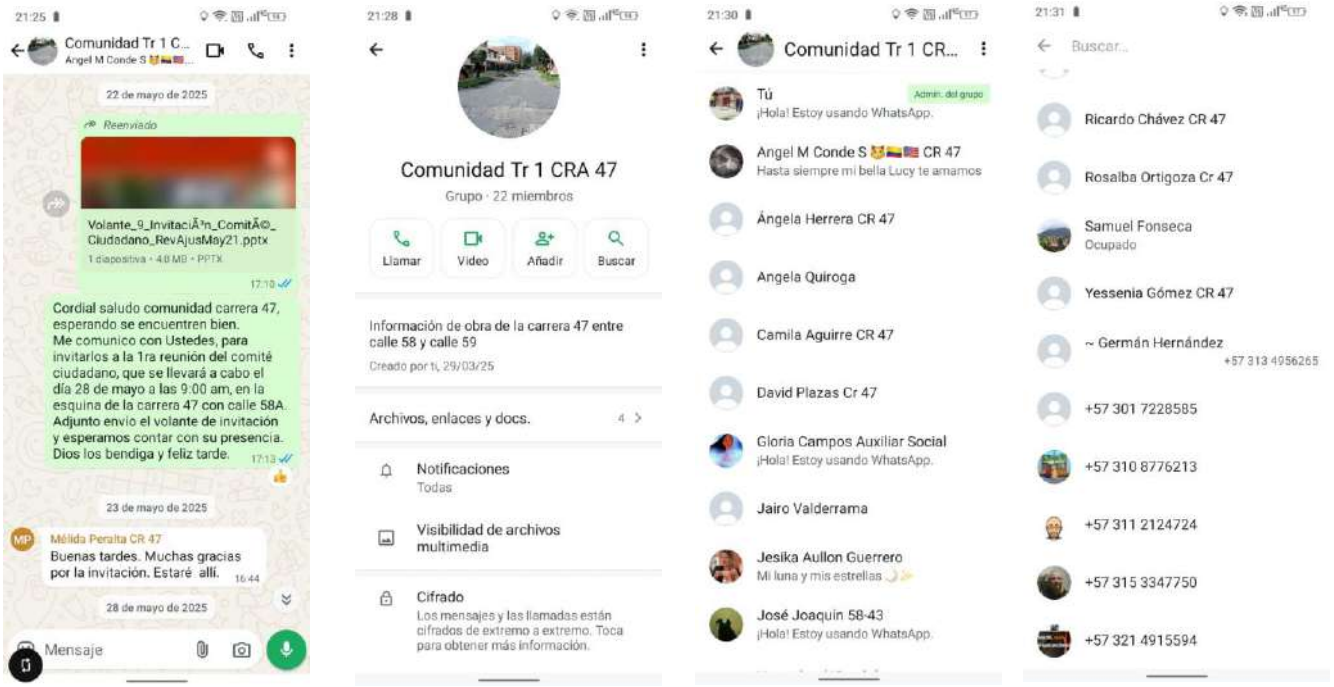

Observacion: Convocatoria por medio de WhatsApp a primera reunión de participación ciudadana con comité ciudano Barrio Nicolás de Federmán.
CIV´S 13000284 – 1300343 Tramo 1

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo


TIPO DE PIEZA: Socialización Ampliación plazo inicio de obra Volante No. 72.

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis FECHA 31/05/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO BARRIO: ALFONSO LOPEZ CIV : 13001165

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	— 11 —	CR 27 No. 50-07	— 11 —	ALFONSO LOPEZ	— 11 —	1	Baja puerta
2	Nicolás Rojas	CR 27 No. 50-19	3208494065	ALFONSO LOPEZ		1	— 11 —
3	— 11 —	CR 27 No. 50-27	— 11 —	ALFONSO LOPEZ	— 11 —	1	Baja puerta
4	Fabio Tenzura	CR 27 No. 50-37	3184239797	ALFONSO LOPEZ		1	4 L —
5	— 11 —	CR 27 No. 50-43	— 11 —	ALFONSO LOPEZ	— 11 —	1	Baja puerta
6	— 11 —	CR 27 No. 50-57 59	— 11 —	ALFONSO LOPEZ	— 11 —	1	Baja puerta
7	Francisco Hidrobo	CR 27 No. 50-61	3167586221	ALFONSO LOPEZ	Francisco Hidrobo	1	— 11 —
8	Rosa Garcia	CR 27 No. 50-67	3143939883	ALFONSO LOPEZ		1	— 11 —
9	Amin Vergel	CR 27 No. 50-77	3204956783	ALFONSO LOPEZ	Amin Vergel	1	— 11 —
10	— 11 —	CL 51 No. 27-07	— 11 —	ALFONSO LOPEZ	— 11 —	1	Baja puerta
11	Carlos Juez	CR 27 No. 50-08	3102207521	ALFONSO LOPEZ		1	— 11 —
12	Anadith Carolina Diaz	CR 27 No. 50-22	3228954210	ALFONSO LOPEZ		1	Atiende 2do piso
13	Carmen Penagos	CR 27 No. 50-30 36	— 11 —	ALFONSO LOPEZ		1	— 11 —
14	— 11 —	CR 27 No. 50-42	— 11 —	ALFONSO LOPEZ	— 11 —	6	En buzon
15	Holma Leon	CR 27 No. 50-52	3204909832	ALFONSO LOPEZ	Josman Leon	1	— 11 —
16	Alberto Betancur	CR 27 No. 50-58	— 11 —	ALFONSO LOPEZ		1	— 11 —
17	Olimpia Hernandez	CR 27 No. 50-68	2350391	ALFONSO LOPEZ		1	— 11 —
18	— 11 —	CR 27 No. 50-78	— 11 —	ALFONSO LOPEZ	— 11 —	1	Baja puerta
19	— 11 —	CR 27 No. 50-84	— 11 —	ALFONSO LOPEZ	— 11 —	1	En buzón
20	—	—	—	ALFONSO LOPEZ	—		—
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	24	

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela M Quiroga	Luz Escobar

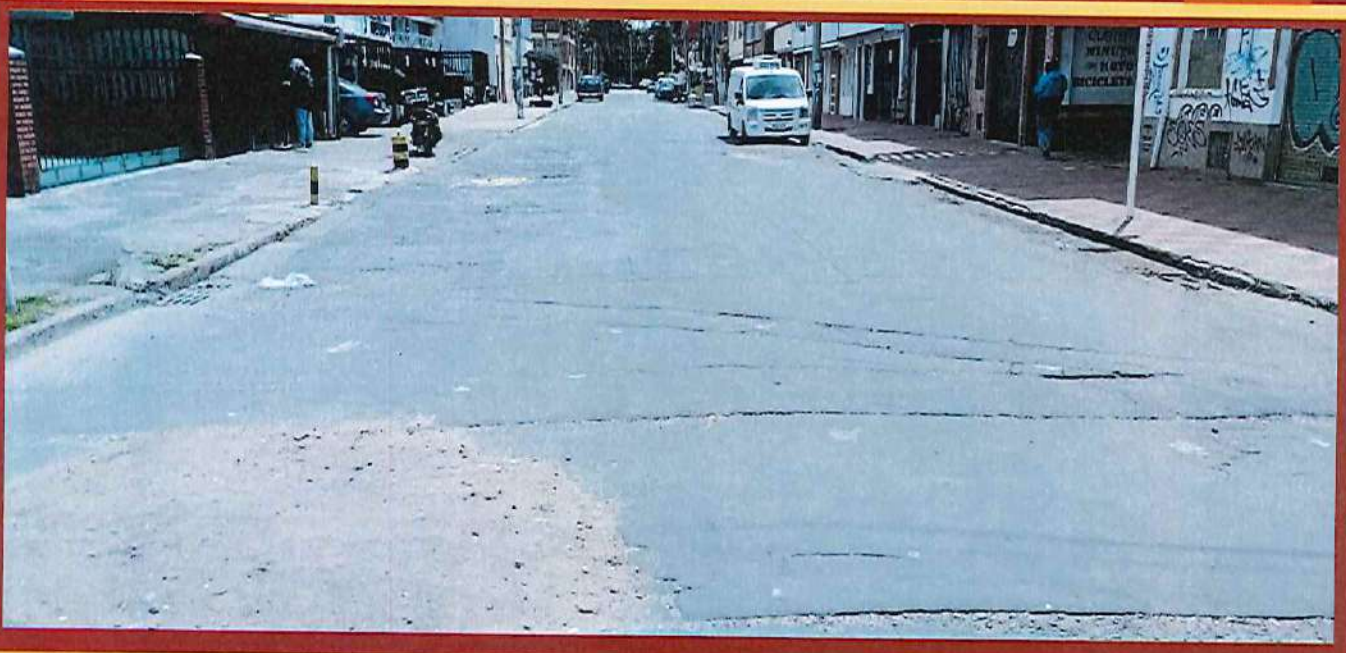

SOCIALIZACIÓN AMPLACIÓN DE PLAZO INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N.° FDLT-522-2024

El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo informa a la comunidad que la intervención vial correspondiente al CIV 13001165, ubicado en la carrera 27 entre calles 50 y 51 del barrio Alfonso López, que estaba proyectada para dar inicio el 13 de mayo de 2025, no ha podido iniciarse por las siguientes razones:

1. No se ha recibido aprobación del PMT por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad debido a que se tienen que hacer coordinaciones de tipo técnico y logístico con dicha entidad en el punto semafórico ubicado en la carrera 27 con calle 51. Esta adecuación semafórica es crítica para garantizar condiciones de seguridad vial y mitigar el impacto operativo en la movilidad del sector durante la ejecución de la obra.
2. Se tiene previsto que para el 6 de junio de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad lleve a cabo la revisión y validación técnica del PMT propuesto, con lo cual se espera obtener la aprobación del cierre vial requerido e iniciar posteriormente las actividades constructivas. Una vez se cuente con dicha autorización, se informará oportunamente a la comunidad la fecha de inicio de obra mediante los canales establecidos de socialización.

Agradecemos la comprensión de la comunidad y reiteramos el compromiso institucional con el cumplimiento del cronograma y la mejora de la infraestructura vial en la localidad de Teusaquillo.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 3019072050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	31 de mayo de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Socialización volante No. 2 ampliación plazo de inicio de obra. Alfonso López . CIV 13001165.

Anexo 5
Formatos de control entrega de copias de actas de vecindad y registros fotográficos Nicolas de Federmán. Tramo 1 y 2.

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ENTREGA COPIAS DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis** **FECHA** 21/05/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO: NICOLAS DE FEDERMAN** **CIV : 13000284**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Edilberto Po.	CR 47 No. 58A-21	3142687983	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
2	Edilberto	CR 47 No. 58A-21 APTO 204	3142687983	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
3	Edilberto	CR 47 No. 58A-21 APTO 205	3142687983	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
4	Edilberto	CR 47 No. 58A-21 APTO 304	3142687983	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
5	Edilberto.	CR 47 No. 58A-21 APTO 305	3142687983	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
6	Mariela Castillo	CR 47 No. 58A-31	4452728	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Recibe por ventana
7	Mariela Castillo	CR 47 No. 58A-31 APTO 101	4452728	NICOLAS DE FEDERMAN	Mariela Castillo	1	Recibe por ventana
8	Mariela Castillo	CR 47 No. 58A-31 APTO 102	4452728	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Recibe por ventana
9	Mariela Castillo	CR 47 No. 58A-31 APTO 201	4452728	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Recibe por ventana
10	Mariela Castillo	CR 47 No. 58A-31 APTO 202	4452728	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Recibe por ventana
11	David Plazas	CR 47 No. 58A-41	3138108061	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
12	— 11 —	CR 47 No. 58A-67 69	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Baja puerta
13	David Plazas	CR 47 No. 58A-77	3138108061	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
14	José Peña	CR 47 No. 58A-97	3102467102	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
15	Aureliano Aguirre	CR 47 No. 58A-99	3107856450	NICOLAS DE FEDERMAN	Aureliano Aguirre	1	— 11 —
16	Mauricio Mejia	PARQUE PÚBLICO CR 47 No. 58A-00	3243853599	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
17	Sor Asuncion Huidobro	CR 47 No. 58A-60		NICOLAS DE FEDERMAN	Asuncion Huidobro	1	— 11 —
18	— 11 —	CR 47 No. 58A-74	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Baja puerta
19	Camila Aguirre	CR 47 No. 58A-84 FACHADA Y APTO 101	3107571623	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
20	Julio Hernández	CR 47 No. 58A-84 FACHADA Y APTO 201	3112547807	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
				TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS		20	

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela M. Quiroga	Luz Escobar

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

ENTREGA COPIAS DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO N°: 652-2024 COP (120683) **RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis** **FECHA**

LOCALIDAD: **TEUSAQUILLO** **BARRIO: NICOLAS DE FEDERMAN** **CIV : 13000284**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1		CR 47 No. 58A-84 FACHADA Y APTO 301		NICOLAS DE FEDERMAN		1	
2	Jenny Hinz	CR 47 No. 58A-96	3015694040	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	2	

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela M. Quiroga	Luz Escobar

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLIA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	21 de mayo de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Entrega de copias de actas de vecindad. Barrio Nicolás de Federmán.
CIV 13000284

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Local de Investigación

ENTREGA COPIAS DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis** **FECHA** 21/05/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO: NICOLAS DE FEDERMAN** **CIV :** 13000343

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELEFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	— 11 —	CR 47 No. 57B-59	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo Puerta
2	Sigifredo Anzola	CR 47 No. 57B-67	3124767226	NICOLAS DE FEDERMAN	Sig. Fredo Anzola	1	— 11 —
3	Martha Isabel Ruano	CR 47 No. 58-05 APTO 101	3150025552	NICOLAS DE FEDERMAN	Atiende desde Ventana 2do piso	1	se deja debajo de puerta
4	— 11 —	CR 47 No. 58-05 APTO 201	315002	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
5	— 11 —	CR 47 No. 58-19 APTO 201	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
6	Martha Isabel Ruano	CR 47 No. 58-19 APTO 101	3150025552	NICOLAS DE FEDERMAN	Atiende desde Ventana 2do piso	1	Se deja debajo de puerta.
7	— 11 —	CR 47 No. 58-31	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	En bajos
8	— 11 —	CR 47 No. 58-43	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
9	Liliana Avendaño	CR 47 No. 58-63	3104147712	NICOLAS DE FEDERMAN	[signature]	1	— 11 —
10	— 11 —	CR 47 No. 58-69	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta.
11	Germán Hernández	CR 47 No. 58-73	3134958265	NICOLAS DE FEDERMAN	[signature]	1	— 11 —
12	Sigifredo Anzola	CR 47 No. 57B-50	3124767226	NICOLAS DE FEDERMAN	Sig. Fredo Anzola	1	— 11 —
13	José Vargas	CR 47 No. 58-40	3181775435	NICOLAS DE FEDERMAN	[signature]	1	— 11 —
14	José Vargas	CR 47 No. 58-40 APTO 203	3181154350	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
15	José Vargas	CR 47 No. 58-40 APTO 204	3181154350	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
16	José Vargas	CR 47 No. 58-40 APTO 205	3181154350	NICOLAS DE FEDERMAN	[signature]	1	— 11 —
17	José Vargas	CR 47 No. 58-40 APTO 206	3181154350	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
18	José Vargas	CR 47 No. 58-40 APTO 207	3181154350	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
19	José Vargas	CR 47 No. 58-40 APTO 208	3181154350	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
20	José Vargas	CR 47 No. 58-40 APTO 209	3181154350	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
				TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS		20	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	[signature]	[signature]

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo

ENTREGA COPIAS DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO Nº: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis** **FECHA**

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO: NICOLAS DE FEDERMAN** **CIV : 13000343**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	José Vargas	CR 47 No. 58-40 APTO 303	3181154350	NICOLAS DE FEDERMAN		1	-11-
2	José Vargas	CR 47 No. 58-40 APTO 304	3181154350	NICOLAS DE FEDERMAN		1	-11-
3	José Vargas	CR 47 No. 58-40 APTO 305	3181154350	NICOLAS DE FEDERMAN		1	-11-
4	Jose Vargas	CR 47 No. 58-40 APTO 306	3181154350	NICOLAS DE FEDERMAN		1	-11-
5	José Vargas	CR 47 No. 58-40 APTO 307	3181154350	NICOLAS DE FEDERMAN		1	-11-
6	José Vargas	CR 47 No. 58-40 APTO 308	3181154350	NICOLAS DE FEDERMAN		1	-11-
7	Jose Vargas	CR 47 No. 58-40 APTO 309	3181154350	NICOLAS DE FEDERMAN		1	-11-
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	7	


	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela M. Quiroga	Luz Escobar

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLIA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	21 de mayo de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4

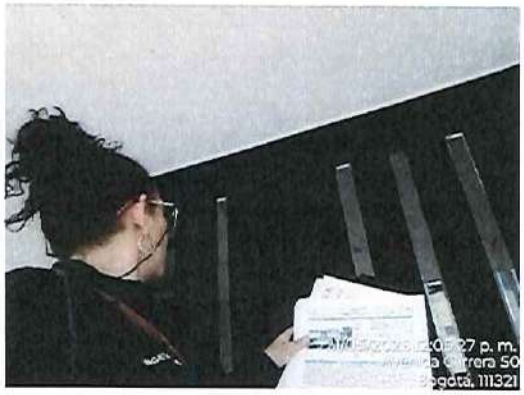







Observacion: Entrega de copias de actas de vecindad. Barrio Nicolás de Federmán.
CIV 13000343

FORMATO			
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0	

ENTREGA COPIAS DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis** **FECHA** 20/05/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO: NICOLAS DE FEDERMAN** **CIV : 13000864**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Thonys Molina	CR 35 No. 53-78	3014932629	NICOLAS DE FEDERMAN	Thonys Molina	1	— 11 —
2	Lilo Barreto	CL 53A No. 35-10 24	2219996	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
3	Sandra Prada	CL 53A No. 35-38	3138657746	NICOLAS DE FEDERMAN	Sandra Prada.	1	
4	Jhon Calced o	CL 53A No. 35-48	3105712715	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
5	— 11 —	CL 53A No. 35-68	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	En buzon
6	Milena. Lizarazo	CR 36 No. 53A-05	3107060466	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
7	Nathaly Sandoval	CR 36 No. 53-65	3015869177	NICOLAS DE FEDERMAN	Nathaly Sandoval	1	— 11 —
8	— 11 —	CR 36 No. 53-55	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	En buzon
9	Camilo Andres Vega	CR 36 No. 53-41	3185232028	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
10	Thonys Molina	CL 53 No, 35-72	3014932629	NICOLAS DE FEDERMAN	Thonys Molina	1	— 11 —
11	— 11 —	CL 53 No, 35-68	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	En buzon
12	— 11 —	CL 53A No, 35-83	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
13	Jorge Solarzano	CL 53A No, 35-51	3143759320	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
14	Jorge Solarzano	CL 53A No. 35-51 APTO 202	3143759320	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
15	Jorge Solarzano	CL 53A No. 35-51 APTO 204	3143759320	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
16	Jorge Solarzano	CL 53A No. 35-51 APTO 205	3143759320	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
17	Jorge Solarzano	CL 53A No. 35-51 APTO 206	3143759320	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
18	Jorge Solarzano	CL 53A No. 35-51 APTO 304	3143759320	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
19	Jorge Solarzano	CL 53A No. 35-51 APTO 305	3143759320	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
20	Jorge Solarzano	CL 53A No. 35-51 APTO 306	3143759320	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	20	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela M. Quiroga	Luz Escobar

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ENTREGA COPIAS DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis** FECHA 20/05/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO: NICOLAS DE FEDERMAN** **CIV : 13000864**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Angelo Vega	CL 53A No. 35-25	3109868262	NICOLAS DE FEDERMAN	Angelo Vega	1	— " —
2	— " —	CL 53A No. 35-23	— " —	NICOLAS DE FEDERMAN	— " —	1	Bogotá
3	María José Buitrago	CR 35 No. 53-53	3123483811	NICOLAS DE FEDERMAN	María José B.	1	— " —
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	3	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela M. Quiroga	Luz Escobar

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLIA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	20 de mayo de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Entrega de copias de actas de vecindad. Barrio Nicolás de Federmán.
CIV 13000864

Anexo 6
Anexo 6 PQRSD No. 2 y 3.

FORMATO ACTA DE COMPROMISO SOCIAL			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CÓDIGO FO-SC-22	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 2	

FECHA			SEGUIMIENTO No	CONTRATO CIN INTERVENTORÍA N°: 577 de 2024	CONTRATO 552-2024 COP (120683)	INICIO SEGUIMIENTO CIERRE
DD	MM	AA				
29	4	2025				

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

DESCRIPCIÓN:
El día 29 de abril de 2025 se recibe correo electrónico por medio del cual, solicitan garantizar el paso para silla de ruedas costado occidental, tramo de la carrera 27 entre calles 50 y 51, barrio Alfonso López.

PQRS No: 2	FECHA RADICACIÓN PQRS: 29 de abril de 2025	SEGUIMIENTO A PQRS	SEGUIMIENTO A ACTA
	FECHA CIERRE PQRS: 19 de mayo de 2025	2	2
	FECHA CIERRE COMPROMISO: 13 de mayo de 2025		

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
T.S. Ángela María Quiroga Galvis	52.753.727	C.C.	OTROS (ESPECIFIQUE)	
Yessica Olaya Sánchez			CIUDADANO	VIRTUAL

OTRO:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPLEMENTO A LA ACTIVIDAD (En Caso de requerirse)	2. IDENTIFICACIÓN
	Nombre del propietario y/o Ciudadano: Yessica Olaya Sánchez
	Dirección del inmueble y/o lugar de la PQRS: Carrera 27 No. 50-63
	Correo electrónico: bellaabril2@hotmail.com
	Teléfono fijo/ movil: Llamadas x WhatsApp (o mensajes WhatsApp) 3178376564
	Correo electrónico: N/A
	Nombre del propietario y/o Ciudadano : N/A
	Nombre del propietario y/o Ciudadano : N/A
	Nombre del propietario y/o Ciudadano : N/A

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Seguimiento No. 1. 29/04/2025: El área social confirma recibido de correo y se realizará las gestiones pertinentes para dar respuesta de manera oportuna al requerimiento.

Se dará seguimiento y atención en el mes de mayo de 2025, de acuerdo a consideraciones técnicas de la interventoría y el contratista.

Seguimiento No. 2. 13/05/2025: Se realiza recorrido con el área técnica del contratista, donde se verifican los niveles del espacio público del costado occidental; igualmente, se realiza adecuación de sobresalto en la junta de los andenes de los predios carrera 27 No. 50-61 y carrera 27 No. 50-67, quedando el andén en condiciones optimas para la movilidad de silla de ruedas o persona con movilidad reducida.

Respuesta para cierre 19/05/2025: se envía respuesta formal a la señora peticionaria mediante correo electrónico con oficio (TEUSAVIAL-552-059)

Se solicita a la señora peticionaria, confirmación de fecha y hora para recoger la firma física de la trazabilidad y cierre de la presente PQRSD.

FORMATO ACTA DE COMPROMISO SOCIAL			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CÓDIGO FO-SC-22	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 2	

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto No 1



Foto No 2

Descripción: El día 3 de mayo el área social envía respuesta donde manifiesta que el Consorcio tratará el tema en Comité Técnico



Foto No 3

Descripción: El día 13 demayo se realiza recorrido de verificación de los niveles del espacio público costado occidental



Foto No 4

Descripción: Identificación de sobresalto para el paso de silla de ruedas

Descripción: adecuación de los niveles del espacio público, para movilidad segura de silla de ruedas o persona con movilidad reducida.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA PRÓXIMO SEGUIMIENTO AL COMPROMISO
Adecuar el paso del andén del costado occidental para el paso seguro	CONTRATISTA/ CONSULTOR	13/05/2025	No aplica
de silla de ruedas y/o persona con movilidad reducida			

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de mayo de 2025.

ELABORÓ:

Ing. Andrés Echandía
Nombre

Firma
Residente Técnico – Contratista

REVISÓ:

FREDDY FERDINAND
Nombre

Firma
Residente Técnico – Interventoría

ACOMPAÑÓ:

Luz Escobar
Nombre Luz Escobar Ospina

Luz Escobar
Firma
Residente Social – Interventoría

T.S. Angela María Quiroga G.
Nombre

Firma
Residente Social – Contratista

Daniela Alzate
Nombre

CONTRATUAL
Firma
Propietario y/o Ciudadano(a)

CONSORCIO TEUSAVIAL

Bogotá D.C., 19 de mayo de 2025

TEUSAVIAL-552-059

Recibido
Enviado a la Sra Yessica por correo.

Señores
Yessica Olaya Sánchez
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE OBRA No. COP-552-2024 (120683)

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Asunto: respuesta a PQRSD No. 2 – Derecho de petición.

Respetada señora Yessica Olaya

De manera atenta nos permitimos dar respuesta al derecho de petición interpuesto por correo electrónico al área social del Consorcio Teusavial, el día 29 de abril de 2025, donde solicita lo siguiente:

> "entiendo en cuenta que nos están avisando de la obra que se va a realizar en el tramo vial del barrio Alfonso López requerimos que el espacio que se habilite para el tránsito de movilidad reducida se apto para la movilización de una silla con ruedas por este espacio y si no se realiza esto no es posible permitir que se haga el cierre de la calle. para esto quisiéramos saber cómo podemos proceder para que se tenga en cuenta este espacio de movilidad por la cera occidental (es decir la de los números impares) o si es posible por ambas ceras. También hay que tener en cuenta que ustedes están hablando de un espacio de 1.20 c.m y consideramos que este espacio no es suficiente pues en el momento de movilizar una silla de ruedas otros trasebuntrd no podrían pasar sin hacer filia detrás de la silla de rueda".

Ante la petición realizada, el contratista a través del área técnica realizó evaluación de las condiciones del nivel del andén occidental y su ancho, donde se pudo evidenciar que, dicho andén cuenta con un ancho de aproximadamente 3 metros y la diferencia de niveles es mínima, se observó un sobresalto en la junta de los andenes de los predios con nomenclaturas carrera 27 # 50-61 y carrera 27 # 50-67, para lo cual el Consorcio Teusavial, el día 13 de mayo de 2025, realizó un ajusté de transición, generando un paso nivelado y seguro, para el transito de una silla de ruedas o persona con movilidad reducida.

De esta manera, se da alcance a su solicitud, nos permitimos anexar registro fotográfico de las adecuaciones realizadas, estamos prestos a atender cualquier otra solicitud, para lo cual está el Punto PAC presencia, ubicado en la calle 39 A # 29 -21 piso 3, línea de atención fija: 601 5317157 - celular: 3019072050, residente social Angela María Quiroga Galvis.

CONSORCIO TEUSAVIAL

Antes



Después



Adjunto se envía formato de la PQRSD No. 2, para validación de la peticionaria y coordinación de la firma de cierre de la misma.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

JUAN FELIPE DELGADO
Director de obra
CONSORCIO TEUSAVIAL

FORMATO ACTA DE COMPROMISO SOCIAL			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO
CÓDIGO FO-SC-22	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 2	

FECHA			SEGUIMIENTO No	CONTRATO CIN INTERVENTORÍA N°: 577 de 2024	CONTRATO 552-2024 COP (120683)	INICIO SEGUIMIENTO CIERRE
DD	MM	AA				
8	5	2025				

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

DESCRIPCIÓN:
El día 07 de mayo del presente año durante recorrido de obra, la Señora Julia Moreno, propietaria del predio ubicado en la calle 53A No. 35-10 del barrio Nicolás de Federmán CIV 13000864, manifiesta a la residente SST de la interventoría su preocupación al ver poco personal trabajando en el tramo y la maquinaria parada.

PQRS No: 3	FECHA RADICACIÓN PQRS: 08 de mayo de 2025 FECHA CIERRE PQRS: FECHA CIERRE COMPROMISO: No aplica	SEGUIMIENTO A PQRS 3	SEGUIMIENTO A ACTA 3

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
T.S. Ángela María Quiroga Galvis	52.753.727	C.C.	OTROS (ESPECIFIQUE)	
Sra. Julia Moreno	20'136.788	C.C.	CIUDADANO	

OTRO:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPLEMENTO A LA ACTIVIDAD (En Caso de requerirse)



2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del propietario y/o Ciudadano: Julia Moreno
Dirección del inmueble y/o lugar de la PQRS: Calle 53A No. 35-10
Correo electrónico:
Teléfono fijo/ movil: 6012219996
Correo electrónico:
Nombre del propietario y/o Ciudadano :
Nombre del propietario y/o Ciudadano :
Nombre del propietario y/o Ciudadano :

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Seguimiento y cierre: Mayo 08/2025: Se realiza contacto con la señora Julia Moreno, propietaria del predio calle 53A N. 35-10/24 del Barrio Nicolás de Federmán, con el fin de atender la inconformidad referente al poco personal trabajando en el tramo y la maquinaria parada.

FORMATO ACTA DE COMPROMISO SOCIAL			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-22	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 2	

Se le informa a la Señora Julia que las actividades que se están adelantando son de tipo manual: excavación, adecuación de cárcamos y la instalación de tubería hacia los pozos.

Por otra parte, las condiciones climáticas hacen que en ciertos lapsos de tiempo sea necesario suspender actividades; sin embargo, la ejecución se encuentra dentro de los tiempos estipulados en la reunión de inicio. Se entrega soporte de actividades.

La señora Julia Moreno recibe a conformidad la información suministrada por la parte social y firma el cierre del Acta de Compromiso - PORSD.



Foto No 1

Visita para atención de inconformidad por intervención vía

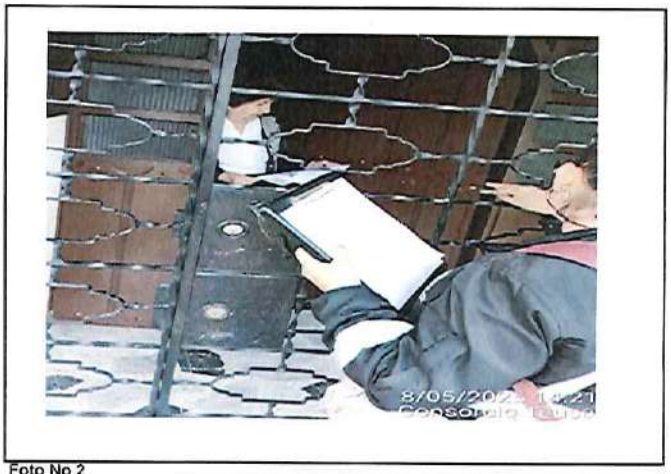


Foto No 2

Entrega de reg. fotográfico soporte de actividades técnicas

Descripción:



Foto No 3

Descripción: Diligenciamiento Acta de Compromiso-PQRSD



Foto No 4

Descripción: Firma y cierre de Acta de Compromiso-PQRSD-Propietaria

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. · ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO · BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLIA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	08 de mayo de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 2





Observacion: Soporte para verificación de actividades técnicas sobre la vía Calle 53A entre Carreras 35 y 36.
Regitro fotográfico de apoyo para cierre de PQRSD.

FORMATO ACTA DE COMPROMISO SOCIAL			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Fontibón
CÓDIGO FO-SC-22	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 2	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA PRÓXIMO SEGUIMIENTO AL COMPROMISO
Ninguno			

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 08 días del mes de mayo de 2025.

ELABORÓ:

ANDRES ECHANDIA
Nombre Ing. Andrés Echandía

Firma
Residente Técnico – Contratista

REVISÓ:

FREDY PEDRAZA R.
Nombre

Firma
Residente Técnico – Interventoría

ACOMPAÑÓ:

Luz Escobar
Nombre Luz Escobar Ospina

Luz Escobar
Firma
Residente Social – Interventoría

Angela Quiroga.
Nombre Angela María Quiroga G.

Firma
Residente Social – Contratista

Jirlia Moreno
Nombre

C.C.
Firma
Propietario y/o Ciudadano(a)

IMPORTANTE: SI LA PRESENTE ACTA SE GENERÓ COMO COMPROMISO PARA CIERRE DE UNA PQRS, ESTA SE DEBE ANEXAR A LA RESPUESTA QUE SE VA A DAR AL PETICIONARIO

Anexo 7
Acta de reunión de participación ciudadana comité ciudadano tramo 1 Nicolás de Federmán.

FORMATO ACTA PRIMER COMITÉ CIUDADANO BARRIO NICOLÁS DE FEDERMÁN TRAMO 1 CIV´S 13000284 - 1300343			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	

Contrato No.: 552-2024 COP (120683)	**HORA INICIO:**	9:10 a. m.	**Hoja** 1 de 3
FECHA: 28 de mayo de 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN**:	9.56 a.m.	**Acta N°** 1

OBJETO DEL CONTRATO:

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Intervención parte técnica del contratista
3. Intervención de la comunidad
4. Compromisos
5. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo, siendo el día 28 de mayo de 2025 a las 9:10 p.m. la residente social del contratista Consorcio Teusavial, saluda a los miembros del comité ciudadano del barrio Nicolás de Federman Tramo 1 CIV´S 13000284-13000343 ubicado en la carrera 47 entre calles 58 y 59, y procede a preguntar si hay autorización para grabar la reunión, a lo cual de manera unánime, refieren estar de acuerdo.

Se da inicio a la reunión No. 1 de comité ciudadano, se manifiesta que se va a dar a conocer el avance de la obra y se procede a presentar a los profesionales del área de infraetructura del FDLT, la trabajadora social Diana Silva, el ingeniero Juan Camilo Amaya; por parte de interventoría, el ingeniero Fredy Perdomo, residente técnico, la ingeniera Brenda Castillo, apoyo técnico y la residente social Luz Escobar. De parte del contratista se presenta a la ingeniera Marcela Arévalo, el ingeniero Sebastía Martínez, la residente SST Tatiana Valdeleón, del área social la persona de apoyo Sandra Perilla y la residente social Angela Quiroga. Se explica a la comunidad que se va a dar un resumen de las actividades realizadas en el tramo y al finalizar se resolverán las inquietudes.

2. Toma la palabra el ingeniero Sebastián Martinez por parte del contratista quien refiere que el tramo lleva un avance del 75% presentando cumpliendo con los tiempos estipulados en la reunión de inicio y a la fecha faltarían 78 días de intervención. Manifiesta que se han tenido contratiempos con respecto al clima. Informa a la comunidad presente, que se está realizando la conexión de los dos últimos sumideros del costado norte. Con relación de estructura de pavimentos, está pendiente de instalar la base estabilizada con cemento en un tramo aproximado de 15m y se espera que para la próxima semana ya se termine esta actividad. Se informa que una vez terminada la estructura de la vía, se procederá a la instalación del bordillo faltante y de la carpeta asfáltica, actividad a realizar en menos de dos semanas y de esta manera, dejar terminado en su totalidad el tramo. Igualmente, se manifiesta que se dará inicio al tramo siguiente: carrera 47 entre calles 58A y 59.

Toma la palabra el Señor José Gómez por parte del comité quien manifiesta que el contratista lleva un avance adecuado a pesar del invierno.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

3. Preguntas de los asistentes:

El señor José Gómez pregunta ¿el tramo faltante se va a realizar en su totalidad hasta la calle 59?. Manifiesta su inquietud debido a que en este tramo se encuentran dos edificios que tienen el mayor volumén de vehiculos.

Respuesta: la ingeniera Marcela Arevalo, indica que es necesario realizar el cierre total del tramo, debido a que se va a realizar el cambio de la tubería residual y el mejoramiento de la tubería pluvial, por tal motivo es difícil manejarlo por tramos o secciones. Se indica que el cierre va desde la terminación de la estructura actual, dejando ingreso a los vehículos de la bahía de la calle 58A.

El señor José Gómez, manifiesta que va a realizar coordinación con los residentes de los predios del tramo a intervenir, para darles apoyo y manifestarles que utilicen la bahía como zona de parqueo durante la obra, ya que fue útil para los residentes del tramo inicial. Igualmente, pregunta ¿el tiempo de intervención es similar al tramo inicial o más largo?

Respuesta: la ingeniera Marcela Arevalo, indica que el tiempo de ejecución puede ser mas largo, se debe realizar el manejo de los hundimientos de la vía, debido a las raíces de los árboles que se encuentran en zona. Este mejoramiento es una actividad adicional a las que se realizaron en el primer tramo.

El señor José Gómez, pregunta ¿cómo se va a realizar el manejo del espacio público, ya que en el costado oriental se encuentra más hundido y presenta apozamiento de agua?

Respuesta: la ingeniera Marcela Arevalo, manifiesta que el contrato en ejecución y sobre esta zona, no tiene autorización para la intervención del espacio público.

La señora Camila Aguirre, manifiesta su inconformidad con la no intervención del espacio público, nos indica que una vez cambien el sardinel, el cual quedará a mayor altura que el existente, se generará un apozamiento de agua en este espacio en temporada de invierno.

El señor José Gómez, pregunta ¿si existe alguna probabilidad de mejoramiento de este espacio?

Respuesta: la ingeniera Marcela Arevalo, manifiesta que el contratista en cuestión de sumideros, se encuentra evaluando alternativas en el empalme del tramo 1 que se está terminando, con los puntos más bajos sobre la calle 58A, ya que el sumidero existente se encuentra sobre esta calle. De esta manera, se busca mitigar el apozamiento y generar la movilidad a los transeúntes del sector.

Respuesta: el ingeniero Sebastían, indica que el trabajo a realizar busca mejorar las condiciones actuales, manifiesta que el cambio de nivel del bordillo mitigará en gran parte, el paso del agua de la vía hacia el andén.

El señor José Gómez, manifiesta la importancia de buscar una solución ante esta problemática, porque no tiene conocimiento si hay recursos para la intervención del parque.

Respuesta por parte del ingeniero de infraestructura : El ingeniero Juan Camilo Amaya del FDLT, manifiesta que dentro del alcance del contrato 552 en este momento, no esta contemplado la renovoción del espacio público; sin embargo, lo pueden considerar para la vigencias futuras. En este momento, lo que se va a garantizar es que la vía quede en buen estado, que tenga su escorrentia, sus sumideros. El presupuesto no da el alcance para la intervención del espacio público en la zona del parque.

El señor José Gómez y la señora Camila, preguntan ¿cuándo se va a realizar el cierre de la vía y hasta que fecha, si van a realizar suspensión del servicio de agua?

Respuesta: el ingeniero Sebastían, indica que el servicio de agua potable no será suspendido por la ejecución de la obra, a menos que se presente algún tipo de insidente cuando se realicen los trabajos.

Respuesta: la ingeniera Marcela Arevalo, manfiesta que en este momento no se puede dar fecha de cierre de la vía, se notificará una vez se termine la intervención en el tramo 1, probablemente en quince días.

4. Respuesta: la residente social Angela Quiroga, se compromete que faltanto 4 días para la culminación del primer tramo, notificará la fecha aproximada para el inicio de actividades por medio del grupo de WhastApp.

El señor Germán Hernández de la comunidad, pregunta ¿cuánto tiempo durará la intervención?

Respuesta: la ingeniera Marcela Arevalo, indica que el tiempo de ejecución del tramo será de tres meses aproximadamente.

5. La residente social Angela Quiroga da el agradecimiento a los miembros de la comunidad y solicitá que sean multiplicadores de la información suministrada, para que los residentes se preparen para el retiro de los vehículos del siguiente tramo. Una vez atendidas las inquietudes se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Informar a la comunidad la fecha de inicio del segundo tramo	Contratista	Abierta
Programar el segundo comité ciudadano	Contratista	Abierta mes Junio

FORMATO ACTA PRIMER COMITÉ CIUDADANO BARRIO NICOLÁS DE FEDERMÁN TRAMO 1 CIV´S 13000284 - 1300343			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	

Contrato No.: 552-2024 COP (120683)	**HORA INICIO:**	9:10 a. m.	**Hoja** 3 de 3
FECHA: 28 de mayo de 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN**:	9.56 a.m.	**Acta N°** 1

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Se adjunta listado de asistencia.		

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Luz Escobar Ospina
CARGO	Residente Social	Residente Social	Residente Interventoría
FIRMA	Angela M. Quiroga G.	Angela M. Quiroga G.	Luz Escobar.

ANEXOS:	**SI**	**X**	**NO**		**TIPO DE ANEXO:** Reg. Fotográfico	**CANTIDAD: 1**

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	MAYO 28 DE 2025	TEMA	PRIMERA REUNIÓN COMITÉ CIUDADANO
LUGAR	VIA CARRERA 47 ENTRE CALLES 58 Y 59	BARRIO	NICOLÁS DE FEDERMÁN
UPZ	LA ESMERALDA	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	52696[illegible]	Camila Aguirre	28	COMITE	F				3107541613	Kra 97 #68co 84	NICOLÁS DE FEDERMÁN	comi-cuhen ehotmail.com	
2	CC	19169383	Jose J Gomez	72	comite	M				3132362394	Cra 47 #58-43	NICOLÁS DE FEDERMÁN	[illegible]	
3	CC	40338143	German Hernandez	68	comite	M				3134956261	K 47 #58-73	NICOLÁS DE FEDERMÁN	[illegible]	
4	CC	1032399624	Diana Silva	37		F				3014012438	Salitre	NICOLÁS DE FEDERMÁN	[illegible]	
5	CC	1018459071	Juan Camilo Amaya P.	32		M				3215236085	Suba	NICOLÁS DE FEDERMÁN	—	
6	CC	1014240890	Tatiana Valdeleón Enrique	32		F				3207367585	Cr 16 # 160 - 23	NICOLÁS DE FEDERMÁN	ambsstvialda@gmail com	
7	CC	1072[illegible]	[illegible]	28		M				3204248[illegible]	Tv 70 # 11-35			
8	CC	1016[illegible]	Juan Trujillo	33		M				3102231591	—		—	
9	CC	52889627	Luz Escobar.	—	Inter Teusaquillo	F				—	Interventoría.	—	—	
10	CC	79499874	FREDY PERDOMO R.		INTER TEUSAQUILLO	M				3007995225	INTERVENTORIA	—	—	
11	CC	1124865[illegible]	Brenda Castillo	27		F				3216199442	Interventoria	—	—	
12	CC	14.200[illegible]	José B. Peña		comite	M				3102467102	CRA 47 N° 58A-97	NICOLAS	— 11 —	
13	CC	3068[illegible]	Ricardo Chaves							3216955953	Cra 97 #57B - 64			
14	CC	52453724	Angela Arroyo	43	C. Teusaquillo	F				3144283886	Punto PAE.	La Soledad	teusaludsocial@gmail.com	
15	CC	1032380394	Marcela Arevalo		C. Teusaquillo	F				3142243821	Cra 39A - 29 -		Consejero.Teusaquillo@gmail.com	

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual/ I: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros(as)/G: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	28 de mayo de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Primera reunión de participación ciudadana con comité ciudano Barrio Nicolás de Federmán. CIV´S 13000284 – 1300343 Tramo 1

Anexo 8
Registro de asistencia y fotográfico de capacitación No. 4

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	MAYO 28 DE 2025	TEMA	Mecanismos de participación Ciudadana: Voto				
LUGAR	FRENTES DE OBRA	BARRIO	NICOLÁS DE FEDERMÁN	UPZ	LA ESMERALDA	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	3094719	Humberto Chirinos	40	Teusaquil	H	Ht	N	P	3223857773	Alfonzo Lopez	Alfonzo Lopez	—	Humberto
2	CC	79855833	Jenio Cabrera B	40	Teusaquil	M	Ht	N	P	3158395861	Bosa	Bosa	—	
3	CC	79896392	Edgar Castro B	46	Teusaquil	H	Ht	N	P	3228279042	Molinos del Sur	Molinos	—	Edgar Castro B.
4	CC	1233496109	Edwin Stiven [illegible]	27	Teusaquil	H	Ht	N	P	3195920 02	Kr 99 N°40-21 sur	Patio bonito	stivencontreras@gmail.com	Edwin [illegible]
5	CC	1023923	Miguel Angel Boa	32	Teusaquil	H	Ht	N	P	3122748	Kra 10 #56-52 sur	Libertadores	—	Miguel
6	CC	5400718	Ydalis Desire Echevalba A.	21	Teusaquil	M	Ht	N	P	3014016394	Diag 75csur 75F 22	Santo domingo	ydalisecheverria@gmail.com	Ydalis.
7	CC	7073	Oscar Javier Garzón	18	Teusaquil	H	Ht	N	P	3073896515	Luis carlos galan	Luis carlos galan	—	
8	CC	52971427	Viviana Vaca	42	Teusaquil	M	Ht	N	P	3102359121	Calle 62 #30-64	Candelaria	—	
9	CC	7418977	Freddy Hernandez	44	Teusaquil	H	Ht	N	P	3125421436	Cra 22 H 67-57 sur	Candelaria	—	
10	CC	79122	Rafael Gallosa	61	Teusaquil	H	Ht	N	P	3106258	Kr 102 [illegible]	Palma 80	—	
11	CC	1020	Giovanni Güiza D	33	Teusaquil	H	Ht	N	P	3227926316	Cll 87 #91-90	Parques de bogota	—	
12	CC	1022	Sebastian Marquez	28	Teusaquil	H				3204768863	Tv 74 H 11a-35	Villa Alsacia		
13	CC	1020	Julian Trujillo	32	Teusaquil	H	N			3122	—	—	—	Julian Trujillo
14	CC	1042	JACKSON R. RIVAS	41	teusaquil	H	Ht	N	P	3123432893	C.R. 71 52 sur	Paraiso	—	RIVAS
15	CC	8000	Ruven Pinilla	48	teusaquil	H	Ht	N	P	3115886549	—	cierramoreno	—	Ruven Pi

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual/ I: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indigenas / P: Palenqueros(as)/G: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	MAYO 28 DE 2025	TEMA	Mecanismos de Participación Ciudadana: Voto
LUGAR	FRENTES DE OBRA	BARRIO	NICOLÁS DE FEDERMÁN
UPZ	LA ESMERALDA	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ETNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	1124865472	Brenda Castillo	27		F				3216189442	Cra 77 H 78-05	Granja	brendapontilla776@gmail	Brenda C.
2	CC	53889627	Luz Escobar	—	Inter Teusaquillo	F				—	Interactoria.	—	—	Luz Escobar
3	CC	79498674	Freddy Perdomo	—	Intoctecsic	MU				—	Interlocutor	—	—	
4	CC	1118843305	Oscar de Jesus.	43	Teusavial	M				3044523234	Trans 12 # 7 6 16 sur	Ducales.	delimocontreras@	
5	CC	7240640	Reinaldo Salas	32	Teusavial	M				3026069893	Transv 73G # 69-12	Perdomo Alto	salasReinaldo229@gmail.com	
6	CC	80086810	Ruben Pinilla	48	Teusavial	M				3115586539	— —	Pie de amor	— —	Ruben
7	CC	1019290890	Liliana Valdebán	32	Teusavial	F				3209386585	Cr 16 # 160-23	Orquideas	estcausecondiana@gmail.com	
8	CC	79878620	José Misael Valero	45	Teusavial					3117783201	— " —	Suacha	— " —	Jose Misael
9	CC	1000740462	Kevin cendales alcalde	19	Teusavial	F				3[illegible]4161141	— " —	— " —	— " —	Kevin
10	CC	1000000352	Jeiver Esteban Rodriguez M	24	teusavial	M				3026940166	—	Pescaderia	estebanrodriguez226@gmail.	
11	CC	1033688505	Andres Felipe Diaza R.	27	Teusavial	M				3178740940	—	Suacha	n	Andres Diaza
12	CC	1031132694	Andres Necio	34	Teusavial	M				3108802370	Calle 55° sur # 4°12	USME	— " —	Andres
13	CC	4226971	Nestor Reyes		EP Aseo					3123469[illegible]	— —	Bosa	— " —	
14	CC	80265264	Humberto Vargas	62	teusavial	M				3118021467	Cll. 55. sur # 102-5	Bosa	— " —	
15	CC	1012360448	Jonathan Castaño	35	Teusavial	M				3118406209	Calle 57A # 47B 55 sur	Bosa	— " —	

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual/ I: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros(as)/G: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	MAYO 28 DE 2025	TEMA	Mecanismos de participación ciudadana: Voto

LUGAR	frentes de obra	BARRIO	NICOLÁS DE FEDERMÁN	UPZ	LA ESMERALDA	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		1033698534	Jhoan Sebastian Ramirez	18	consorcio teusaquillo	M				3169768289	— 11 —	NICOLÁS DE FEDERMÁN	sebastiansanchez-4160@gmail.com	
2												NICOLÁS DE FEDERMÁN		
3												NICOLÁS DE FEDERMÁN		
4												NICOLÁS DE FEDERMÁN		
5												NICOLÁS DE FEDERMÁN		
6												NICOLÁS DE FEDERMÁN		
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

Sexo. M: Mujer / **H:** Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / **Ht:** Heterosexual / **Bi:** Bisexual / **T:** Transexual/ **I:** Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / **R:** Raizales / **A:** Afrodescendientes / **I:** Indígenas / **P:** Palenqueros(as)/**G:** Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / **V:** Visual / **A:** Auditiva / **C:** Cognitiva / **MU:** Múltiple / **N:** Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	28 de mayo de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Capacitación trabajadores de obra.
Nicolás de Federman.
