BOGOTÁ Secretaría de Educación	**CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.1577734** SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL **FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA** INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	**Versión: 1** **CÓDIGO:** ATC-FR-002 Página 1 de 2

SEMANA N°:	2	**TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:**	**PLAZO TOTAL:**	6 meses

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (04) DE (09) DE(20) AL (10) DE (09) DE (20)

CINCO Compañía de Interventoría y Consultoría S.A.S.

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753

SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS

Valor del Contrato: $ 186.472.567

Nombre del Gestor Territorial: Ing. Jairo Corrales — Nombre del Director de Interventoría: Ing. Carlos Bolaños Gonzalez

Plazo de Ejecución: 184 días — Fecha de Inicio: 25/08/2020 — Fecha de Terminación: 24/02/2021

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

OBJETO: **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3"**

Informe N° 2 — Fecha de informe: Del 04/09/2020 HASTA 10/09/2020

INFORMACIÓN GENERAL		**SEGUIMIENTO DE OBRA**				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		**AVANCE FÍSICO (%)**				
JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 2	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 1.212.305.529	% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	
Valor Adicional:	$ -	% Ejecutado	1,84%	2,62%	4,46%	#¡DIV/0!
Valor Total:	**$ 1.212.305.529**	Diferencia	1,84%	2,62%	4,46%	#¡DIV/0!
Fecha de Inicio	**25/08/2020**	**AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)**				En %
Suspensión N°	**N/A**	Programado(%)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Reinicio:	**N/A**	Ejecutado (%)	$ 22.316.174,00	$ 31.761.555,58	$ 54.077.729,58	4,46%
Prórroga N° :	**N/A**	Diferencia	$ 22.316.174,00	$ 31.761.555,58	$ 54.077.729,58	4,46%
Plazo actualizado:	**184 dias**	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		**PERSONAL PROMEDIO EN OBRA**	
CINCO SAS		Interventoría:	1 ing residente, 2 inspectores
Valor Contrato:	$ 186.472.567	Contratista:	2 residentes, 1 oficial, 6 ayudantes, 1 operador de minicargador
Valor Adicional:	$ -	**EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA**	
Valor Total:	**$ 186.472.567,00**	Herraminetas menores, 1 minicargador CAT	
Fecha de Inicio	**19/08/2020**		
Suspensión N°	**N/A**	**SEGUIMIENTO OBLIGACIONES**	**VERIFICADO POR** / **S/N/NA**
Reinicio:	**N/A**	Aportes a seguridad Social y parafiscales	**INTERVENTORIA** **S**
Prórroga N° :	**N/A**	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**INTERVENTORIA** **S**
Plazo actualizado:		Normas ambientales	INTERVENTORIA **S**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1: Instalación de manto asfaltico - Instituto Internacional de Fontibón



Foto 2: Seguimiento a las actividades - Instituto Internacional de Fontibón



Foto 3: Limpieza de superficie de placa para instalación de manto - Instituto Internacional de Fontibón



Foto 4: Imprimación - Intituto Internacional de Fontibón



Foto 5: Instalación de manto asfaltico bloque C - Instituto Internacional de Fontibón



Foto 6: Material de desecho - Iinstituto Internacional de Fontibón



Foto 7: Retiro de esquineros en cubierta metalica - Instituto Internacional de Fontibón




Foto 8:Instalación de manto asfaltico por debajo de la cubierta - Instituto Internacional de Fontibón



Foto 9:Manto asfaltico bloque C - Instituto Internacional de Fontibón



Foto 10: Seguimiento al Protocolo de bioseguridad - Colegio Villemar Sede C



Foto 11: Cerramiento provisonal - Colegio Villemar Sede C



Foto 12: Retiro de escombros producto de la demolición de estructuras de cerramiento antiguo - Colegio Villemar Sede C

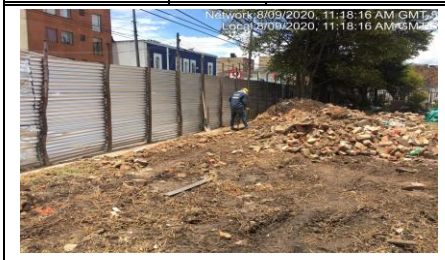


Foto 13: Demolición de estructuras cerramiento antiguo - Colegio Villemar Sede C



Foto 14: Visitas de seguimiento - Colegio Villemar Sede C



Foto 15: Reparación afectación eléctrica - Colegio Villemar Sede C



Foto 16: Modificación alcance de muro de cerramiento, Comité de seguimiento- Colegio Villemar Sede C



Foto 17: Acopio material de escombros - Colegio Villemar Sede B



Foto 18: Demoliciones de capa en concreto en cancha - Colegio Villemar Sede B



Foto 19: Comité de seguimiento - Colegio Villemar el Carmen Sede B



Foto 20: Retiro y transporte de escombros - Colegio Villemar el Carmen Sede B



Foto 21: Desmonte de cielo raso en machimbre- Colegio Silveria Espinosa




Foto 22: Desmonte de cielo raso en machimbre- Colegio Silveria Espinosa



Foto 23: Desmonte de cielo raso en machimbre- Colegio Silveria Espinosa

COLEGIO 1: INSTITUTO INTERNACIONAL DE FONTIBON	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	**ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR**
Retiro de manto asfaltico en bloque administrativo	Continuar con las instalación de manto asfaltico en bloque C y bloque administrativo
Se inicia la instalación de manto asfaltico en el bloque c	Aplicación de emulsión asfaltica
Se realizó el retiro de bodega por personal del colegio	Retiro y trasciego de material
COLEGIO 2: VILLEMAR EL CARMEN, SEDE C	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	**ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR**
Se continúa con la demolición del muro existente y cimentación	Continuar con excavación para cimentación
Localización y replanteo de pilotines para cerramiento nuevo	Instalación de sardinel
	Trasciego de material
COLEGIO 3: VILLEMAR DEL CARMEN, SEDE B	
Demolición de placa en concreto de 11 cmt de espesor	Excvación mecanica
Acopio de material- cañuela y bordillo	Mejoramiento de la subrasante
Retiro de material, 6 volquetas de 15 m3	Retiro de porterías y escombros
COLEGIO 4: COLEGIO SILVERIA ESPINOOSA	
Pintura con anticorrosivo y base finame en cerchas de estructura de cubierta	Instalación de tubería de iluminación

Retiro de tubería de iluminación	Retiro de cubierta de asbesto cemento
Demolición de machón y estructura de cubierta en escaleras	Iniciar la instalación de la cubierta tipo sandwich

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

2. Disponibilidad de Recursos: EL contratsita cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas

3. Ejecución Financiera:

4. Calidad de los trabajos:

5. Manejo Ambiental: Disposición final de ressiduos

6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se ceunta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimeinto al protocolo de bioseguridad

7. Programa salud ocupacional (si aplica): E el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES

LOS PRESUPUESTOS OFICIALES SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN Y SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE IGUAL MANERA LAS PROGRAMACIONES, SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA LA APERTURA DE UN NUEVO FRENTE DE OBRA, SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA EL CERTIFICADO DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
NOMBRE: CANDELARIA MENDOZA OVIEDO	**NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS**	**JAIRO CORRALES**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE
