FORMATO DE INFORME DE GESTION DEL SUPERVISION CONTRATO OBRAS

I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.4**	07-02-2025 al 07-03-2025	
Contrato N°	SA-015-2024		
Nombre del interventor	EDUBAR S.A.		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	OBRA	Otro:	
Nombre del contratista	CONSORCIO ARROYO 85		
Identificación del contratista	901.878.838-1		
Objeto del contrato	CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Plazo	21 MESES		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	N/A	Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy)	N/A
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	N/A	Fecha del R.P (dd-MM-yyyy)	N/A

Valor del contrato		
	Contrato Inicial	$117.038.433.119
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$117.038.433.119

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
07-11-2024	17-08-2026		

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

FORMATO DE INFORME DE GESTION DEL SUPERVISION CONTRATO OBRAS

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento del contrato	Nacional de Seguros	400059220	17-10-2024	17-11-2026
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones	Nacional de Seguros	400059220	17-10-2024	17-07-2029
Responsabilidad Civil Extracontractual	Nacional de Seguros	400059220	17-10-2024	17-07-2026
Estabilidad de la obra	Nacional de Seguros	400059220	17-07-2026	17-07-2031

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		**Valor**
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$117.038.433.119
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Ejecutado del Contrato		$0
Valor por ejecutar		$0
Valor a pagar en el presente Informe		**$0**
No. Factura o Cuenta de Cobro		N/A

5. ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	**BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO**	**APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE**

Salud	12.5%	$	
Pensión	16%	$	
ARL		$	
6. CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL-REVISOR FISCAL (Persona Jurídica) Fecha (dd-MM-yyyy):			

II. Aspectos administrativos:

1. Resumen sobre el estado general del contrato.

A la fecha del presente informe se continua con la etapa de apropiación, ajuste y complementación de los diseños, se realiza el mapeo de redes subterráneas y aéreas, revisión y ajuste a la localización, tamaño y trazado de los pozos de lanzamiento y rescate, diseño de las soluciones a interferencias por parte de AAA en los pozos de lanzamiento y rescate, diseño eléctrico y subterranización de redes, y el registro de los permisos ambientales.

Durante el presente periodo no se realizaron comités de obra.

2. Resumen sobre el cumplimiento de la programación de la ejecución del contrato.

No aplica

3. Se relaciona a continuacion las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecucion del contrato.

- Levantamientos topográficos
- Mapeo de redes.
- Formulación de PMT.
- Revisión de diseños AAA solución de interferencias para pozos.
- Revisión de trazado y dimensiones de pozos.
- Revisión de diseños estructurales para pilotes y pozos.

- Revisión de trazado de la tubería a instalar con Pipe Jacking.
- Revisión de diseños componente eléctrico.

4. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)

No aplica

5. Acta de reunión de la comunidad (En los casos que aplique)

No aplica

6. Otras actas suscritas durante el mes respectivo. (En los casos que aplique)

No aplica

7. Control del personal del contratista y del interventor. (En los casos que aplique)

N°	NOMBRE	CARGO
1	Director General de Interventoría	PEDRO MORA
2.	Residente de Interventoría	ZULLY MEDINA
3.	Residente de Interventoría	JORGE ACERO
4	Ingeniero Estructural	DIEGO RADA
5	Ingeniero especialista en pavimento	JUAN SAMPER
6	Ingeniero Eléctrico	JORGE VELASQUEZ
7	Especialista Ambiental	NATALIA PACHECO
8	Profesional Social	PALMIDES LOPEZ
9	Profesional SISO	GEYSON CERVANTES
10	Inspector de obra	EDGAR BLANCO

8. Relación de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO. (En los casos que aplique)

No aplica

9. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período. (En los casos que aplique)

No aplica

10. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período. (En los casos que aplique)

No aplica

III. Aspectos técnicos:

1. Planos récord entregados por el contratista. (En los casos que aplique)

No aplica

2. Análisis de precios unitarios. (En los casos que aplique)

No aplica

3. Análisis de precios y actividades no previstas. (En los casos que aplique)

No aplica


4. Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato. (En los casos que aplique)


No aplica

5. Pruebas y resultados. (En los casos que aplique)

No aplica

6. Registro fotográfico. (En los casos que aplique)

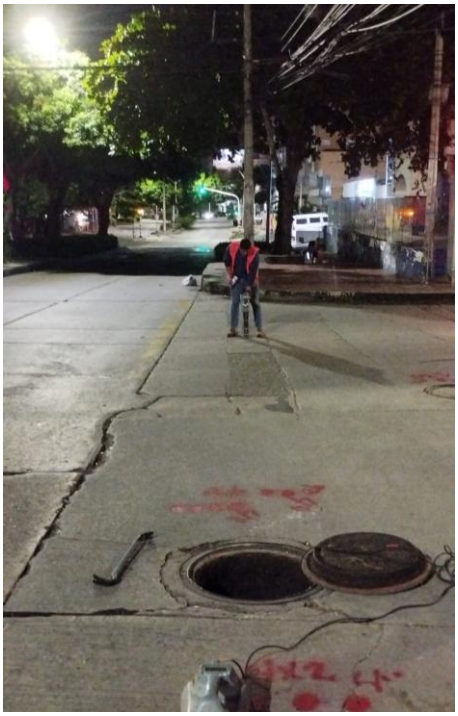

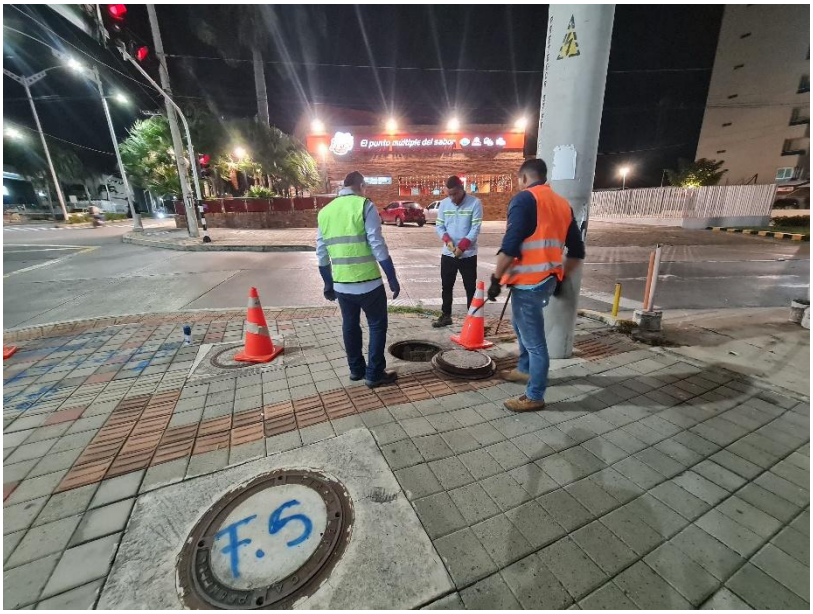

7. Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad. (En los casos que aplique)

No aplica

IV. Aspectos ambientales:

1. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial. (En los casos que aplique)

No aplica

2. Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad ambiental. (En los casos que aplique)

No aplica

3. Registro fotográfico. (En los casos que aplique)

V. Aspectos financieros y presupuéstales:

1. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que aplique)

No aplica

2. Balance financiero del contrato.

No aplica

3. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que aplique)

No aplica

VI. Aspectos legales:

1. Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal.

2. Informe sobre cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación. (En los casos que aplique)

No aplica

3. Informe sobre desviaciones del contratista o la Interventoría en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (En los casos que aplique)

No aplica

VII. Anexos Informe Final:

1. Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades ambientales, según proceda.

No aplica

2. Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las obras adicionales. (En los casos que aplique)

No aplica

3. Estado de cumplimiento de las metas contractuales.

No aplica

4. Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.

No aplica

5. Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservación de los bienes entregados. (En los casos que aplique)

No aplica

6. Libro o bitácora del contrato. (En los casos que aplique)

No aplica

ARMANDO MOVILLA NAVARRO, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los 7 días del mes de marzo de 2025

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
Supervisor
