

Id	Nombre de tarea	Días Calendario	Predecesoras	Sucesoras	Comienzo	Fin	Costo
1	**VIVIENDA LILIANA ISABEL ROMERO ROMERO**	**61 días**			**sáb 5/04/25**	**mié 4/06/25**	**$ 68,690,556.00**
2	**INICIO DE OBRA**	**0 días**		**4**	**sáb 5/04/25**	**sáb 5/04/25**	**$ 0.00**
3	**OBRAS PRELIMINARES**	**56 días**			**sáb 5/04/25**	**vie 30/05/25**	**$ 392,961.00**
4	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	56 días	2	6CC+1 día	sáb 5/04/25	vie 30/05/25	$ 392,961.00
5	**CIMENTACIÓN**	**22 días**			**lun 7/04/25**	**lun 28/04/25**	**$ 5,974,735.00**
6	EXCAVACIÓN A MANO	6 días	4CC+1 día	7;55	lun 7/04/25	sáb 12/04/25	$ 962,867.00
7	CONCRETO DE SANEAMIENTO 2000psi.	4 días	6	8	sáb 12/04/25	mar 15/04/25	$ 592,387.00
8	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 25 X 25 cm	14 días	7	18	mar 15/04/25	lun 28/04/25	$ 4,419,481.00
9	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**	**8 días**			**vie 23/05/25**	**vie 30/05/25**	**$ 14,514,491.00**
10	VIGAS AEREAS EN CONCRETO 12X17 cm	5 días	12FF	13FF;15FF;24	lun 26/05/25	vie 30/05/25	$ 1,962,693.00
11	DINTELES, CINTAS DE AMARRE Y ELEMENTOS DE BORDE 12 X 12cm	3 días	18FF	46;47;48;49;5	mié 28/05/25	vie 30/05/25	$ 866,589.00
12	COLUMNAS DE CONCRETO	5 días	18FF	10FF	lun 26/05/25	vie 30/05/25	$ 3,073,828.00
13	ACERO A - 37 ACERO N°2 - Ø 1/4"	4 días	10FF	14FF	mar 27/05/25	vie 30/05/25	$ 2,356,359.00
14	ACERO A - 60 ACERO Nº 3 - Ø 3/8"	8 días	13FF	59	vie 23/05/25	vie 30/05/25	$ 5,601,923.00
15	PLACA MACIZA e=12 cm	3 días	10FF	33;16FF	mié 28/05/25	vie 30/05/25	$ 478,735.00
16	RAMPAS DE ACCESO	3 días	15FF	59	mié 28/05/25	vie 30/05/25	$ 174,364.00
17	**MAMPOSTERIA**	**38 días**			**lun 28/04/25**	**mié 4/06/25**	**$ 7,307,724.00**
18	MAMPOSTERÍA BLOQUE ARCILLA Bloque N°5 o Similar	33 días	8	12FF;11FF;30	lun 28/04/25	vie 30/05/25	$ 7,144,292.00
19	MESON COCINA EN CONCRETO	5 días	43CC	41FF	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	$ 163,432.00
20	**PISOS**	**5 días**			**lun 26/05/25**	**vie 30/05/25**	**$ 8,350,657.00**
21	PLACA DE CONCRETO e=10 cm 2500 PSI	5 días	18FF	22CC;43	lun 26/05/25	vie 30/05/25	$ 6,048,738.00
22	MALLA ELECTRO SOLDADA Ø4 mm	5 días	21CC		lun 26/05/25	vie 30/05/25	$ 2,301,919.00
23	**CUBIERTA**	**6 días**			**lun 26/05/25**	**sáb 31/05/25**	**$ 10,204,090.00**
24	ESTRUCTURA METÁLICA	5 días	10FF	26CC	lun 26/05/25	vie 30/05/25	$ 3,605,027.00
25	OTROS ELEMENTOS DE CUBIERTA (CINTA FLANCHE)	2 días	27FF	28FF	vie 30/05/25	sáb 31/05/25	$ 342,832.00
26	TEJA TERMOACUSTICA 2,5 mm	6 días	24CC	27FF;35FF;31	lun 26/05/25	sáb 31/05/25	$ 4,352,264.00
27	CABALLETE TEJA TERMOACÚSTICA 2,5mm	3 días	26FF	25FF	jue 29/05/25	sáb 31/05/25	$ 576,744.00
28	ENCOROZADO E=12cm	3 días	25FF	59	jue 29/05/25	sáb 31/05/25	$ 1,327,223.00
29	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**	**8 días**			**mar 27/05/25**	**mar 3/06/25**	**$ 2,208,314.00**
30	RED HIDARULICA	4 días	18FF	33;55	mar 27/05/25	vie 30/05/25	$ 1,186,131.00
31	LAVADERO PREFABRICADO	4 días	26	59	sáb 31/05/25	mar 3/06/25	$ 417,792.00
32	DUCHA	4 días	26	59	sáb 31/05/25	mar 3/06/25	$ 120,869.00

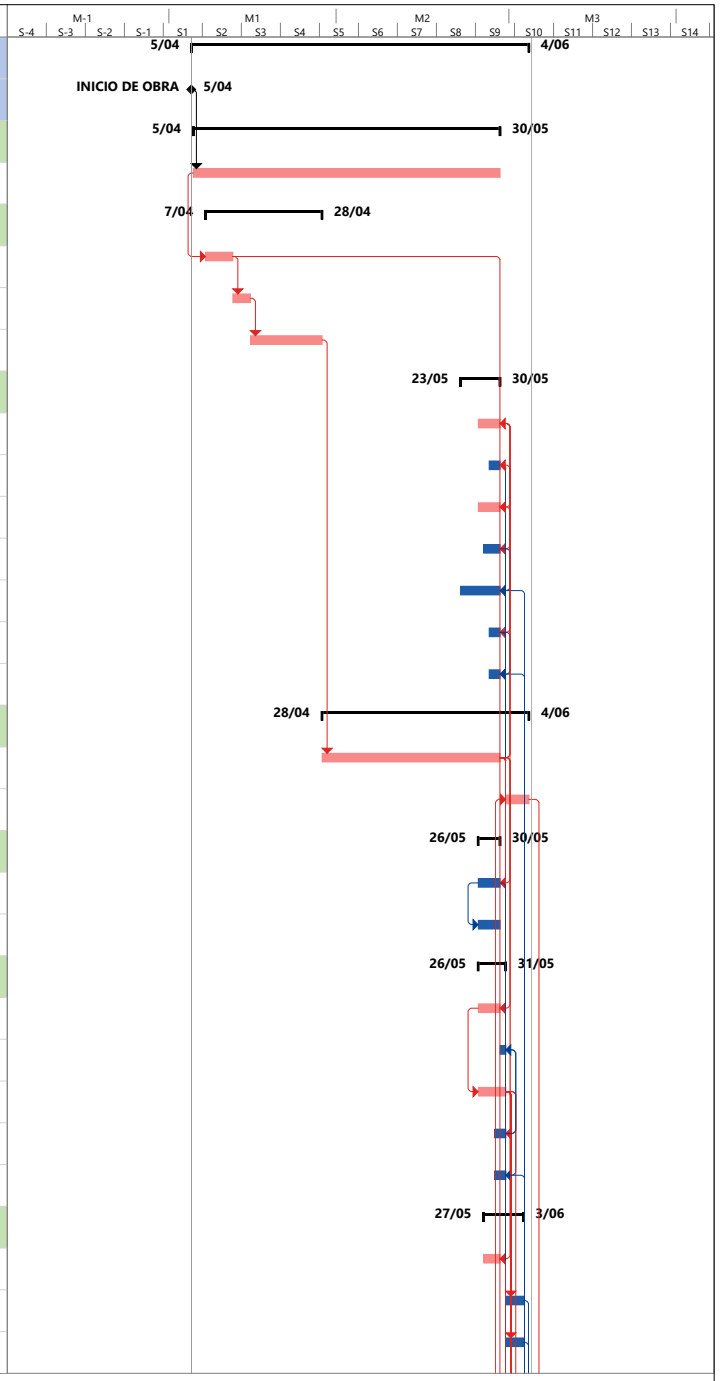

Proyecto: Sacúdete Cali
Fecha: vie 28/02/25

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Días Calendario	Predecesoras	Sucesoras	Comienzo	Fin	Costo
33	TANQUE ALMACENAMIENTO 500 L.	2 días	15;30	59	vie 30/05/25	sáb 31/05/25	$ 483,522.00
34	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**5 días**			**mar 27/05/25**	**sáb 31/05/25**	**$ 4,912,533.00**
35	RED ELÉCTRICA INTERNA	5 días	26FF	59	mar 27/05/25	sáb 31/05/25	$ 4,912,533.00
36	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**10 días**			**lun 26/05/25**	**mié 4/06/25**	**$ 2,860,060.00**
37	RED SANITARIA	5 días	18FF	38;55	lun 26/05/25	vie 30/05/25	$ 1,689,812.00
38	SANITARIO	2 días	37	40	vie 30/05/25	sáb 31/05/25	$ 340,383.00
39	INCRUSTRACIONES BAÑO	2 días	40	59	mar 3/06/25	mié 4/06/25	$ 83,089.00
40	LAVAMANOS CERAMICA	4 días	38	39	sáb 31/05/25	mar 3/06/25	$ 393,499.00
41	LAVAPLATOS	2 días	19FF	59	mar 3/06/25	mié 4/06/25	$ 353,277.00
42	**ACABADOS**	**5 días**			**sáb 31/05/25**	**mié 4/06/25**	**$ 2,297,962.00**
43	ENCHAPE PISOS EN CERAMICA	5 días	21;26	59;19CC	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	$ 863,306.00
44	ENCHAPE DE MUROS EN CERAMICA	5 días	18;26	59	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	$ 1,434,656.00
45	**CARPINTERIA METÁLICA**	**5 días**			**sáb 31/05/25**	**mié 4/06/25**	**$ 4,976,088.00**
46	PUERTA Y MARCO METALICOS-TIPO 1	5 días	18;11;26	59	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	$ 791,062.00
47	PUERTA Y MARCO METALICOS-TIPO 2	5 días	18;11;26	59	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	$ 746,265.00
48	PUERTA Y MARCO METALICOS- TIPO 3	5 días	18;11;26	59	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	$ 754,059.00
49	VENTANA METALICA TIPO 1	5 días	18;11;26	53FF	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	$ 1,384,500.00
50	VENTANA METALICA TIPO 2	5 días	18;11;26	53FF	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	$ 444,868.00
51	VENTANA METALICA TIPO 3	5 días	18;11;26	53FF	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	$ 855,334.00
52	**OTROS**	**5 días**			**sáb 31/05/25**	**mié 4/06/25**	**$ 590,709.00**
53	VIDRIOS 4mm	5 días	49FF;50FF;51F	59	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	$ 590,709.00
54	**POZO SEPTICO**	**6 días**			**vie 30/05/25**	**mié 4/06/25**	**$ 4,100,232.00**
55	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	6 días	6;30;37	56FF	vie 30/05/25	mié 4/06/25	$ 3,558,990.00
56	POZO DE ABSORCION	5 días	55FF	59	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	$ 541,242.00
57	**CARPINTERIA MADERA**	**5 días**			**sáb 31/05/25**	**mié 4/06/25**	**$ 0.00**
58	PUERTA Y MARCO EN MADERA	5 días	18;11;26	59	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	$ 0.00
59	**FIN DE OBRA**	**0 días**	**14;16;28;31;3**		**mié 4/06/25**	**mié 4/06/25**	**$ 0.00**

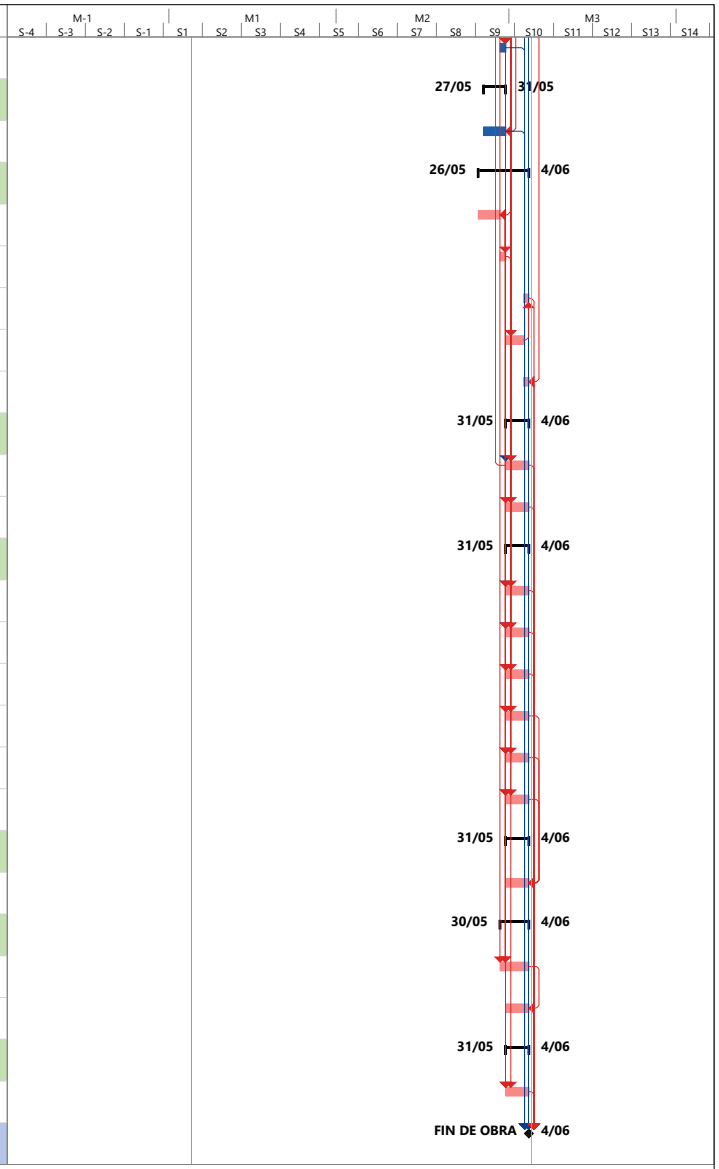

Proyecto: Sacúdete Cali
Fecha: vie 28/02/25

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual
