

Id	Nombre de tarea	Días Calendario	Predecesoras	Sucesoras	Comienzo	Fin	Costo
1	**VIVIENDA STELLA PALACIOS GONZALEZ**	**62 días**			**jue 20/03/25**	**mar 20/05/25**	**$ 68,690,556.00**
2	**INICIO DE OBRA**	**0 días**		**4**	**jue 20/03/25**	**jue 20/03/25**	**$ 0.00**
3	**OBRAS PRELIMINARES**	**57 días**			**jue 20/03/25**	**jue 15/05/25**	**$ 392,961.00**
4	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	57 días	2	6CC+1 día	jue 20/03/25	jue 15/05/25	$ 392,961.00
5	**CIMENTACIÓN**	**21 días**			**jue 20/03/25**	**mié 9/04/25**	**$ 5,974,735.00**
6	EXCAVACIÓN A MANO	9 días	4CC+1 día	7;55	jue 20/03/25	vie 28/03/25	$ 962,867.00
7	CONCRETO DE SANEAMIENTO 2000psi.	4 días	6	8	vie 28/03/25	lun 31/03/25	$ 592,387.00
8	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 25 X 25 cm	10 días	7	18	lun 31/03/25	mié 9/04/25	$ 4,419,481.00
9	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**	**9 días**			**jue 8/05/25**	**vie 16/05/25**	**$ 14,514,491.00**
10	VIGAS AEREAS EN CONCRETO 12X17 cm	5 días	12FF	13FF;15FF;24	lun 12/05/25	vie 16/05/25	$ 1,962,693.00
11	DINTELES, CINTAS DE AMARRE Y ELEMENTOS DE BORDE 12 X 12cm	3 días	18FF	46;47;48;49;5	mié 14/05/25	vie 16/05/25	$ 866,589.00
12	COLUMNAS DE CONCRETO	5 días	18FF	10FF	lun 12/05/25	vie 16/05/25	$ 3,073,828.00
13	ACERO A - 37 ACERO N°2 - Ø 1/4"	4 días	10FF	14FF	mar 13/05/25	vie 16/05/25	$ 2,356,359.00
14	ACERO A - 60 ACERO Nº 3 - Ø 3/8"	9 días	13FF	59	jue 8/05/25	vie 16/05/25	$ 5,601,923.00
15	PLACA MACIZA e=12 cm	3 días	10FF	33;16FF	mié 14/05/25	vie 16/05/25	$ 478,735.00
16	RAMPAS DE ACCESO	3 días	15FF	59	mié 14/05/25	vie 16/05/25	$ 174,364.00
17	**MAMPOSTERIA**	**42 días**			**mié 9/04/25**	**mar 20/05/25**	**$ 7,307,724.00**
18	MAMPOSTERÍA BLOQUE ARCILLA Bloque N°5 o Similar	38 días	8	12FF;11FF;30	mié 9/04/25	vie 16/05/25	$ 7,144,292.00
19	MESON COCINA EN CONCRETO	4 días	43CC	41FF	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	$ 163,432.00
20	**PISOS**	**5 días**			**lun 12/05/25**	**vie 16/05/25**	**$ 8,350,657.00**
21	PLACA DE CONCRETO e=10 cm 2500 PSI	5 días	18FF	22CC;43	lun 12/05/25	vie 16/05/25	$ 6,048,738.00
22	MALLA ELECTRO SOLDADA Ø4 mm	5 días	21CC		lun 12/05/25	vie 16/05/25	$ 2,301,919.00
23	**CUBIERTA**	**6 días**			**lun 12/05/25**	**sáb 17/05/25**	**$ 10,204,090.00**
24	ESTRUCTURA METÁLICA	5 días	10FF	26CC	lun 12/05/25	vie 16/05/25	$ 3,605,027.00
25	OTROS ELEMENTOS DE CUBIERTA (CINTA FLANCHE)	2 días	27FF	28FF	vie 16/05/25	sáb 17/05/25	$ 342,832.00
26	TEJA TERMOACUSTICA 2,5 mm	6 días	24CC	27FF;35FF;31	lun 12/05/25	sáb 17/05/25	$ 4,352,264.00
27	CABALLETE TEJA TERMOACÚSTICA 2,5mm	3 días	26FF	25FF	jue 15/05/25	sáb 17/05/25	$ 576,744.00
28	ENCOROZADO E=12cm	3 días	25FF	59	jue 15/05/25	sáb 17/05/25	$ 1,327,223.00
29	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**	**7 días**			**mar 13/05/25**	**lun 19/05/25**	**$ 2,208,314.00**
30	RED HIDARULICA	4 días	18FF	33;55	mar 13/05/25	vie 16/05/25	$ 1,186,131.00
31	LAVADERO PREFABRICADO	3 días	26	59	sáb 17/05/25	lun 19/05/25	$ 417,792.00
32	DUCHA	3 días	26	59	sáb 17/05/25	lun 19/05/25	$ 120,869.00

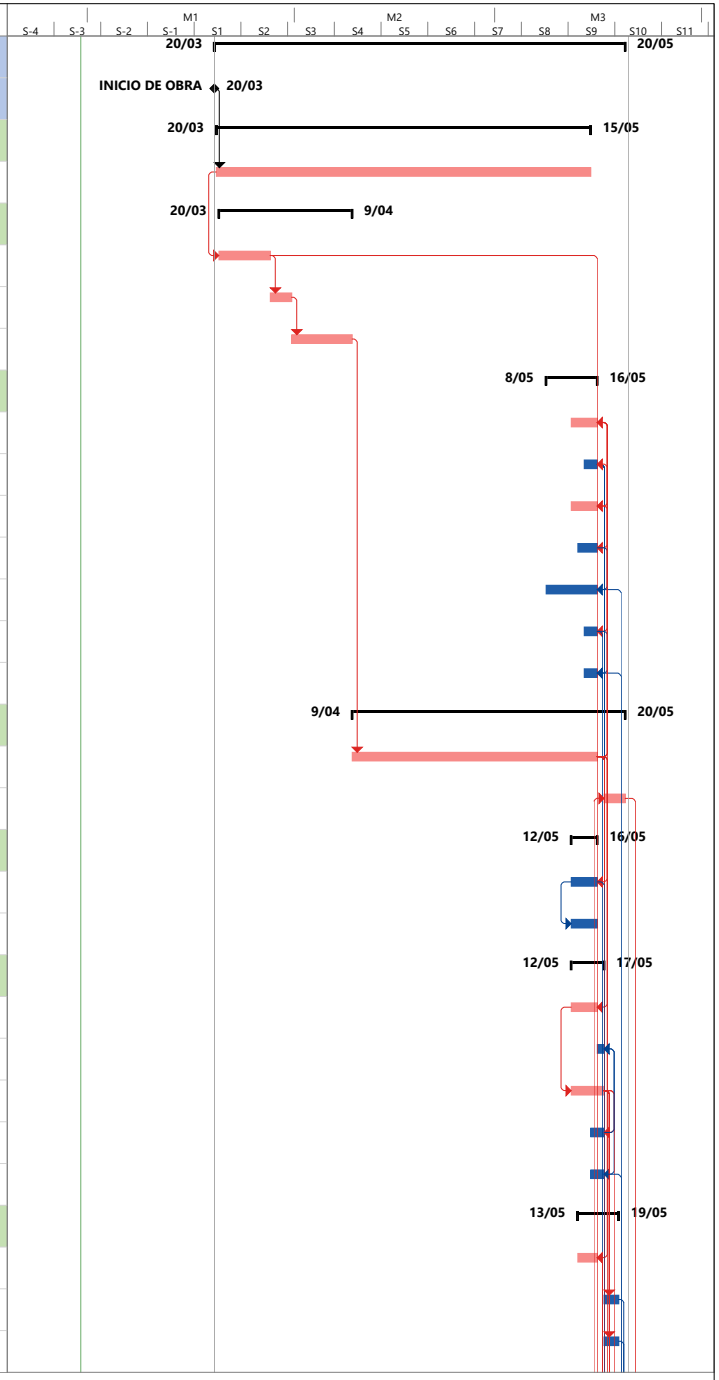

Proyecto: Sacúdete Cali
Fecha: vie 28/02/25

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Días Calendario	Predecesoras	Sucesoras	Comienzo	Fin	Costo
33	TANQUE ALMACENAMIENTO 500 L.	2 días	15;30	59	vie 16/05/25	sáb 17/05/25	$ 483,522.00
34	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**5 días**			**mar 13/05/25**	**sáb 17/05/25**	**$ 4,912,533.00**
35	RED ELÉCTRICA INTERNA	5 días	26FF	59	mar 13/05/25	sáb 17/05/25	$ 4,912,533.00
36	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**9 días**			**lun 12/05/25**	**mar 20/05/25**	**$ 2,860,060.00**
37	RED SANITARIA	5 días	18FF	38;55	lun 12/05/25	vie 16/05/25	$ 1,689,812.00
38	SANITARIO	2 días	37	40	vie 16/05/25	sáb 17/05/25	$ 340,383.00
39	INCRUSTRACIONES BAÑO	2 días	40	59	lun 19/05/25	mar 20/05/25	$ 83,089.00
40	LAVAMANOS CERAMICA	3 días	38	39	sáb 17/05/25	lun 19/05/25	$ 393,499.00
41	LAVAPLATOS	2 días	19FF	59	lun 19/05/25	mar 20/05/25	$ 353,277.00
42	**ACABADOS**	**4 días**			**sáb 17/05/25**	**mar 20/05/25**	**$ 2,297,962.00**
43	ENCHAPE PISOS EN CERAMICA	4 días	21;26	59;19CC	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	$ 863,306.00
44	ENCHAPE DE MUROS EN CERAMICA	4 días	18;26	59	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	$ 1,434,656.00
45	**CARPINTERIA METÁLICA**	**4 días**			**sáb 17/05/25**	**mar 20/05/25**	**$ 4,976,088.00**
46	PUERTA Y MARCO METALICOS-TIPO 1	4 días	18;11;26	59	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	$ 791,062.00
47	PUERTA Y MARCO METALICOS-TIPO 2	4 días	18;11;26	59	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	$ 746,265.00
48	PUERTA Y MARCO METALICOS- TIPO 3	4 días	18;11;26	59	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	$ 754,059.00
49	VENTANA METALICA TIPO 1	4 días	18;11;26	53FF	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	$ 1,384,500.00
50	VENTANA METALICA TIPO 2	4 días	18;11;26	53FF	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	$ 444,868.00
51	VENTANA METALICA TIPO 3	4 días	18;11;26	53FF	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	$ 855,334.00
52	**OTROS**	**4 días**			**sáb 17/05/25**	**mar 20/05/25**	**$ 590,709.00**
53	VIDRIOS 4mm	4 días	49FF;50FF;51F	59	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	$ 590,709.00
54	**POZO SEPTICO**	**5 días**			**vie 16/05/25**	**mar 20/05/25**	**$ 4,100,232.00**
55	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	5 días	6;30;37	56FF	vie 16/05/25	mar 20/05/25	$ 3,558,990.00
56	POZO DE ABSORCION	4 días	55FF	59	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	$ 541,242.00
57	**CARPINTERIA MADERA**	**4 días**			**sáb 17/05/25**	**mar 20/05/25**	**$ 0.00**
58	PUERTA Y MARCO EN MADERA	4 días	18;11;26	59	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	$ 0.00
59	**FIN DE OBRA**	**0 días**	**14;16;28;31;3**		**mar 20/05/25**	**mar 20/05/25**	**$ 0.00**

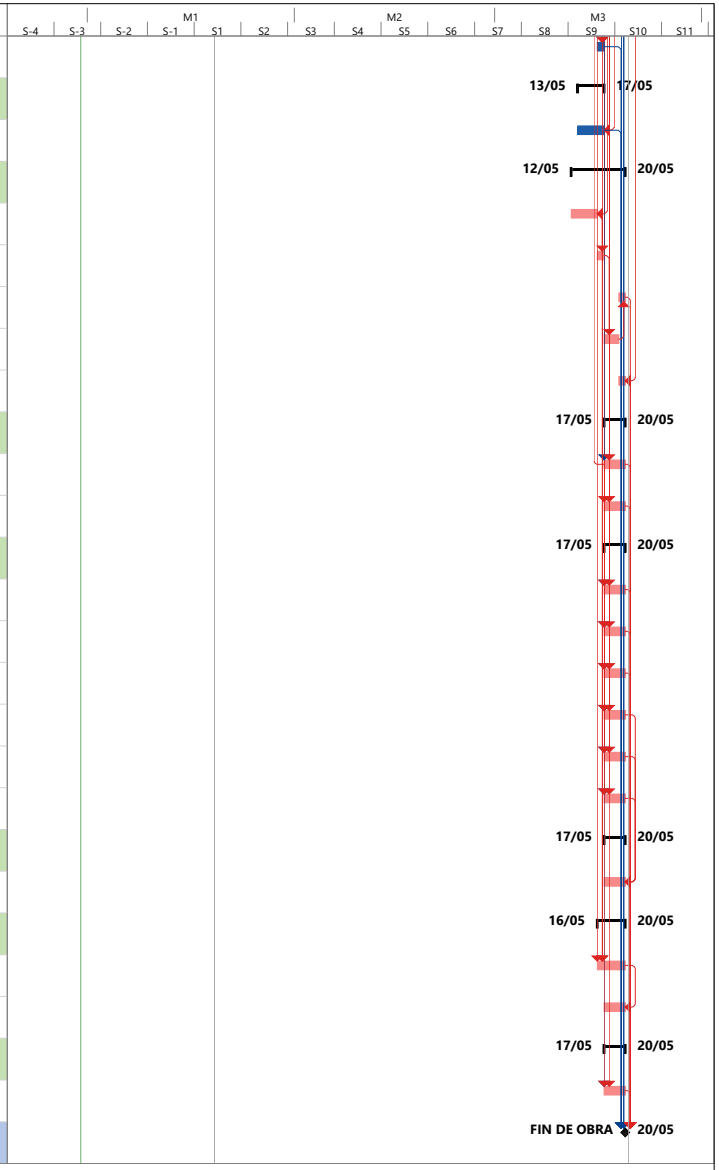

Proyecto: Sacúdete Cali
Fecha: vie 28/02/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
