

| Id | Nombre de tarea | Días Calendario | Predecesoras | Sucesoras | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **VIVIENDA GLORIA INES FANDIÑO LOPEZ** | **62 días** | | | **jue 20/03/25** | **mar 20/05/25** | **$ 68,690,556.00** |
| 2 | **INICIO DE OBRA** | **0 días** | | **4** | **jue 20/03/25** | **jue 20/03/25** | **$ 0.00** |
| 3 | **OBRAS PRELIMINARES** | **57 días** | | | **jue 20/03/25** | **jue 15/05/25** | **$ 392,961.00** |
| 4 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | 57 días | 2 | 6CC+1 día | jue 20/03/25 | jue 15/05/25 | $ 392,961.00 |
| 5 | **CIMENTACIÓN** | **21 días** | | | **jue 20/03/25** | **mié 9/04/25** | **$ 5,974,735.00** |
| 6 | EXCAVACIÓN A MANO | 9 días | 4CC+1 día | 7;55 | jue 20/03/25 | vie 28/03/25 | $ 962,867.00 |
| 7 | CONCRETO DE SANEAMIENTO 2000psi. | 4 días | 6 | 8 | vie 28/03/25 | lun 31/03/25 | $ 592,387.00 |
| 8 | VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 25 X 25 cm | 10 días | 7 | 18 | lun 31/03/25 | mié 9/04/25 | $ 4,419,481.00 |
| 9 | **ESTRUCTURA EN CONCRETO** | **9 días** | | | **jue 8/05/25** | **vie 16/05/25** | **$ 14,514,491.00** |
| 10 | VIGAS AEREAS EN CONCRETO 12X17 cm | 5 días | 12FF | 13FF;15FF;24 | lun 12/05/25 | vie 16/05/25 | $ 1,962,693.00 |
| 11 | DINTELES, CINTAS DE AMARRE Y ELEMENTOS DE BORDE 12 X 12cm | 3 días | 18FF | 46;47;48;49;5 | mié 14/05/25 | vie 16/05/25 | $ 866,589.00 |
| 12 | COLUMNAS DE CONCRETO | 5 días | 18FF | 10FF | lun 12/05/25 | vie 16/05/25 | $ 3,073,828.00 |
| 13 | ACERO A - 37 ACERO N°2 - Ø 1/4" | 4 días | 10FF | 14FF | mar 13/05/25 | vie 16/05/25 | $ 2,356,359.00 |
| 14 | ACERO A - 60 ACERO Nº 3 - Ø 3/8" | 9 días | 13FF | 59 | jue 8/05/25 | vie 16/05/25 | $ 5,601,923.00 |
| 15 | PLACA MACIZA e=12 cm | 3 días | 10FF | 33;16FF | mié 14/05/25 | vie 16/05/25 | $ 478,735.00 |
| 16 | RAMPAS DE ACCESO | 3 días | 15FF | 59 | mié 14/05/25 | vie 16/05/25 | $ 174,364.00 |
| 17 | **MAMPOSTERIA** | **42 días** | | | **mié 9/04/25** | **mar 20/05/25** | **$ 7,307,724.00** |
| 18 | MAMPOSTERÍA BLOQUE ARCILLA Bloque N°5 o Similar | 38 días | 8 | 12FF;11FF;30 | mié 9/04/25 | vie 16/05/25 | $ 7,144,292.00 |
| 19 | MESON COCINA EN CONCRETO | 4 días | 43CC | 41FF | sáb 17/05/25 | mar 20/05/25 | $ 163,432.00 |
| 20 | **PISOS** | **5 días** | | | **lun 12/05/25** | **vie 16/05/25** | **$ 8,350,657.00** |
| 21 | PLACA DE CONCRETO e=10 cm 2500 PSI | 5 días | 18FF | 22CC;43 | lun 12/05/25 | vie 16/05/25 | $ 6,048,738.00 |
| 22 | MALLA ELECTRO SOLDADA Ø4 mm | 5 días | 21CC | | lun 12/05/25 | vie 16/05/25 | $ 2,301,919.00 |
| 23 | **CUBIERTA** | **6 días** | | | **lun 12/05/25** | **sáb 17/05/25** | **$ 10,204,090.00** |
| 24 | ESTRUCTURA METÁLICA | 5 días | 10FF | 26CC | lun 12/05/25 | vie 16/05/25 | $ 3,605,027.00 |
| 25 | OTROS ELEMENTOS DE CUBIERTA (CINTA FLANCHE) | 2 días | 27FF | 28FF | vie 16/05/25 | sáb 17/05/25 | $ 342,832.00 |
| 26 | TEJA TERMOACUSTICA 2,5 mm | 6 días | 24CC | 27FF;35FF;31 | lun 12/05/25 | sáb 17/05/25 | $ 4,352,264.00 |
| 27 | CABALLETE TEJA TERMOACÚSTICA 2,5mm | 3 días | 26FF | 25FF | jue 15/05/25 | sáb 17/05/25 | $ 576,744.00 |
| 28 | ENCOROZADO E=12cm | 3 días | 25FF | 59 | jue 15/05/25 | sáb 17/05/25 | $ 1,327,223.00 |
| 29 | **INSTALACIONES HIDRAULICAS** | **7 días** | | | **mar 13/05/25** | **lun 19/05/25** | **$ 2,208,314.00** |
| 30 | RED HIDARULICA | 4 días | 18FF | 33;55 | mar 13/05/25 | vie 16/05/25 | $ 1,186,131.00 |
| 31 | LAVADERO PREFABRICADO | 3 días | 26 | 59 | sáb 17/05/25 | lun 19/05/25 | $ 417,792.00 |
| 32 | DUCHA | 3 días | 26 | 59 | sáb 17/05/25 | lun 19/05/25 | $ 120,869.00 |

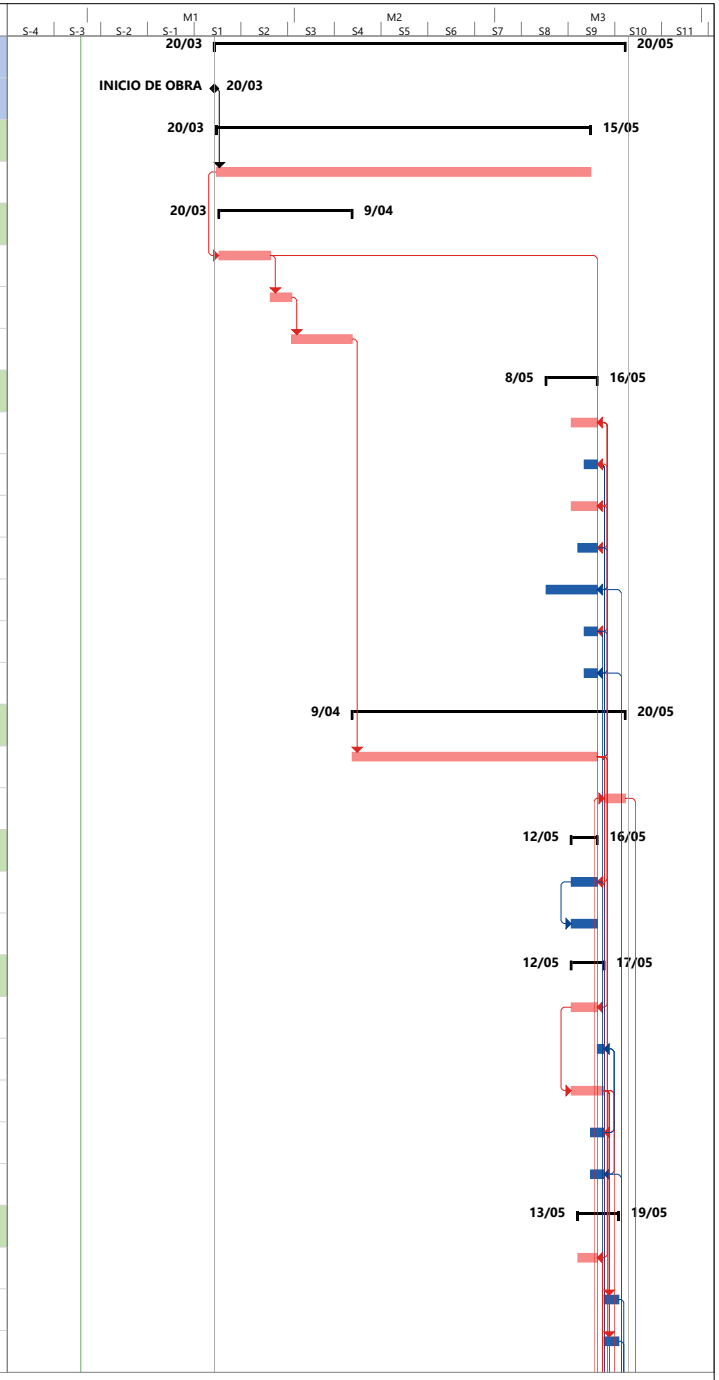


Proyecto: Sacúdete Cali
Fecha: vie 28/02/25

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

| Id | Nombre de tarea | Días Calendario | Predecesoras | Sucesoras | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | TANQUE ALMACENAMIENTO 500 L. | 2 días | 15;30 | 59 | vie 16/05/25 | sáb 17/05/25 | $ 483,522.00 |
| 34 | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | **5 días** | | | **mar 13/05/25** | **sáb 17/05/25** | **$ 4,912,533.00** |
| 35 | RED ELÉCTRICA INTERNA | 5 días | 26FF | 59 | mar 13/05/25 | sáb 17/05/25 | $ 4,912,533.00 |
| 36 | **INSTALACIONES SANITARIAS** | **9 días** | | | **lun 12/05/25** | **mar 20/05/25** | **$ 2,860,060.00** |
| 37 | RED SANITARIA | 5 días | 18FF | 38;55 | lun 12/05/25 | vie 16/05/25 | $ 1,689,812.00 |
| 38 | SANITARIO | 2 días | 37 | 40 | vie 16/05/25 | sáb 17/05/25 | $ 340,383.00 |
| 39 | INCRUSTRACIONES BAÑO | 2 días | 40 | 59 | lun 19/05/25 | mar 20/05/25 | $ 83,089.00 |
| 40 | LAVAMANOS CERAMICA | 3 días | 38 | 39 | sáb 17/05/25 | lun 19/05/25 | $ 393,499.00 |
| 41 | LAVAPLATOS | 2 días | 19FF | 59 | lun 19/05/25 | mar 20/05/25 | $ 353,277.00 |
| 42 | **ACABADOS** | **4 días** | | | **sáb 17/05/25** | **mar 20/05/25** | **$ 2,297,962.00** |
| 43 | ENCHAPE PISOS EN CERAMICA | 4 días | 21;26 | 59;19CC | sáb 17/05/25 | mar 20/05/25 | $ 863,306.00 |
| 44 | ENCHAPE DE MUROS EN CERAMICA | 4 días | 18;26 | 59 | sáb 17/05/25 | mar 20/05/25 | $ 1,434,656.00 |
| 45 | **CARPINTERIA METÁLICA** | **4 días** | | | **sáb 17/05/25** | **mar 20/05/25** | **$ 4,976,088.00** |
| 46 | PUERTA Y MARCO METALICOS-TIPO 1 | 4 días | 18;11;26 | 59 | sáb 17/05/25 | mar 20/05/25 | $ 791,062.00 |
| 47 | PUERTA Y MARCO METALICOS-TIPO 2 | 4 días | 18;11;26 | 59 | sáb 17/05/25 | mar 20/05/25 | $ 746,265.00 |
| 48 | PUERTA Y MARCO METALICOS- TIPO 3 | 4 días | 18;11;26 | 59 | sáb 17/05/25 | mar 20/05/25 | $ 754,059.00 |
| 49 | VENTANA METALICA TIPO 1 | 4 días | 18;11;26 | 53FF | sáb 17/05/25 | mar 20/05/25 | $ 1,384,500.00 |
| 50 | VENTANA METALICA TIPO 2 | 4 días | 18;11;26 | 53FF | sáb 17/05/25 | mar 20/05/25 | $ 444,868.00 |
| 51 | VENTANA METALICA TIPO 3 | 4 días | 18;11;26 | 53FF | sáb 17/05/25 | mar 20/05/25 | $ 855,334.00 |
| 52 | **OTROS** | **4 días** | | | **sáb 17/05/25** | **mar 20/05/25** | **$ 590,709.00** |
| 53 | VIDRIOS 4mm | 4 días | 49FF;50FF;51F | 59 | sáb 17/05/25 | mar 20/05/25 | $ 590,709.00 |
| 54 | **POZO SEPTICO** | **5 días** | | | **vie 16/05/25** | **mar 20/05/25** | **$ 4,100,232.00** |
| 55 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL | 5 días | 6;30;37 | 56FF | vie 16/05/25 | mar 20/05/25 | $ 3,558,990.00 |
| 56 | POZO DE ABSORCION | 4 días | 55FF | 59 | sáb 17/05/25 | mar 20/05/25 | $ 541,242.00 |
| 57 | **CARPINTERIA MADERA** | **4 días** | | | **sáb 17/05/25** | **mar 20/05/25** | **$ 0.00** |
| 58 | PUERTA Y MARCO EN MADERA | 4 días | 18;11;26 | 59 | sáb 17/05/25 | mar 20/05/25 | $ 0.00 |
| 59 | **FIN DE OBRA** | **0 días** | **14;16;28;31;3** | | **mar 20/05/25** | **mar 20/05/25** | **$ 0.00** |

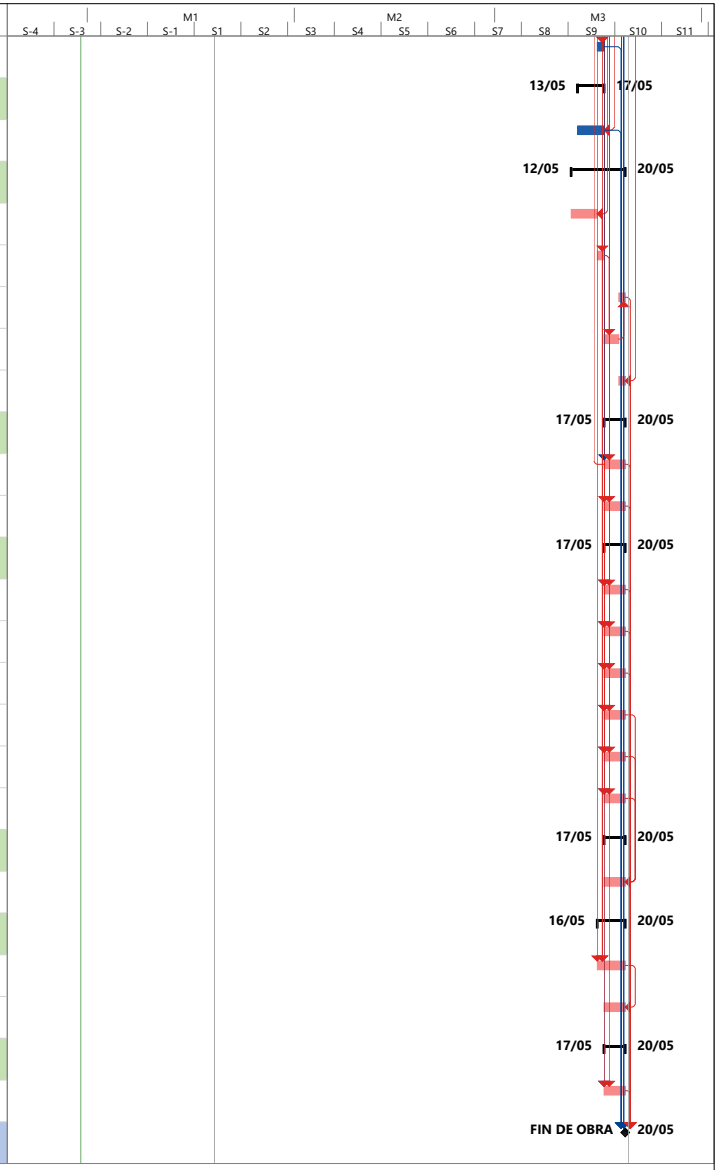


Proyecto: Sacúdete Cali
Fecha: vie 28/02/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
