CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 9
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 9
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 10

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24001040 H3 de la vigencia 2024
Nombre del Contratista:	COMERCIALIZADORA SOTINCOL S.A.S.
Periodo informe:	26 de septiembre de 2024 a 23 de octubre de 2024
Nombre de Supervisor:	Yasset Alfonso Véjar Uribe
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	Grupo de Mantenimiento Sistemas de Ayudas de Navegación Aérea

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR E INSTALAR TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ESTACION DE PARICUICA Y MANTENIMIENTO RED ENERGIA ELECTRICA

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Periodo: del 26 de septiembre de 2024 a 23 de octubre de 2024

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**Mantenimiento redes e instalaciones eléctricas**				
1.1	ESTRUCTURA TRIFÁSICO TIPO HORIZONTAL ALINEACIÓN SUPERIOR - ESTRUCTURA TRIFÁSICO TIPO HORIZONTAL FIN DE LÍNEA INFERIOR 34.5 kVA	und	6	$ 3.600.000	$ 21.600.000
1.2	ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO ALINEACIÓN y ÁNGULO MENOR A 5º 34.5 kV	und	4	$ 3.600.000	$ 14.400.000
1.3	SISTEMA PUESTA A TIERRA PARA MT INCLUYE VARILLA EN ACERO AUSTENICO	und	7	$ 1.600.000	$ 11.200.000
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS DE 100AMP A 34,5KV	und	3	$ 1.300.000	$ 3.900.000
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DPS A 34,5KV	und	3	$ 700.000	$ 2.100.000
1.6	ADECUACION DE PUNTO DE CONEXIÓN CON CONECTORES Y CABLE DE COBRE	glb	1	$ 4.450.000	$ 4.450.000
1.7	TENDIDO DE CABLE DE GUARDA PARA CIRCUITO TRIFASICO A 34,5KV	mts	700	$ 21.000	$ 14.700.000
1.8	INSTALACIÓN DE TRES (03) LÍNEAS EN CABLE DE ALUMINIO DE MEDIA TENSIÓN ENTRE EL NUEVO POSTE Y EL POSTE EXISTENTE INCLUYE LA PUESTA A TIERRA.	mts	2100	$ 29.000	$ 60.900.000
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS Y HERRAJES PARA CABLE DE GUARDA	und	7	$ 2.800.000	$ 19.600.000
				SUB TOTAL	$ 152.850.000
				Administración (5%)	$ 7.642.500
				Imprevistos (5%)	$ 7.642.500
				Utilidad (5%)	$ 7.642.500
				IVA (19%)	$ 1.452.075
				TOTAL GENERAL	**$ 177.229.575**

Registro fotográfico




























































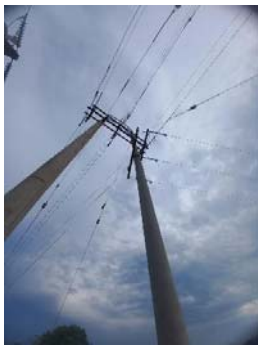





















4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No hubo.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No hubo.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: Durante la ejecución no se materializaron riesgos.		

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

No aplica.

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No aplica

5.3. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	×	

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

En razón a los pagos realizados el avance es del 0,00 %

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

En razón a las actividades ejecutadas el avance realizado es del 87,74%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

YASSET ALFONSO VÉJAR URIBE
CC 80.000.015
SUPERVISOR
