
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**PROYECTO IMPERMEABILIZACION**	**52 días**	**lun 21/10/24**	**mar 31/12/24**		**$ 446.561.871,00**
2		ACTA DE INICIO (ACTA VECINDAD Y BALANCE INICIAL)	8 días	lun 21/10/24	mié 30/10/24		$ 0,00
3		**PRELIMINARES**	**36 días**	**jue 31/10/24**	**jue 19/12/24**		**$ 45.792.182,45**
4		DESMONTE DE CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU.	2 días	jue 31/10/24	vie 1/11/24	2	$ 509.775,66
5		DESMONTE DE CUBIERTA	5 días	jue 31/10/24	mié 6/11/24	2	$ 1.396.605,13
6		DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	2 días	jue 7/11/24	vie 8/11/24	5	$ 1.610.081,80
7		DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN POLIUREA EN FRIO	7 días	lun 4/11/24	mar 12/11/24	4	$ 13.486.559,24
8		DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	5 días	mié 13/11/24	mar 19/11/24	7	$ 15.665.980,57
9		INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	2 días	mié 18/12/24	jue 19/12/24	25FF+2 días	$ 826.622,34
10		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	30 días	jue 31/10/24	mié 11/12/24	4CC	$ 12.296.557,71
11		**CARPINTERÍA METÁLICA**	**15 días**	**jue 31/10/24**	**mié 20/11/24**		**$ 5.710.400,63**
12		MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	15 días	jue 31/10/24	mié 20/11/24	2	$ 1.174.918,23
13		PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	15 días	jue 31/10/24	mié 20/11/24	2	$ 4.535.482,40
14		**CIELORRASOS**	**25 días**	**jue 31/10/24**	**mié 4/12/24**		**$ 13.168.935,45**
15		MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	25 días	jue 31/10/24	mié 4/12/24	2	$ 13.168.935,45
16		**CUBIERTAS**	**20 días**	**lun 11/11/24**	**vie 6/12/24**		**$ 8.554.751,43**
17		ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	15 días	lun 11/11/24	vie 29/11/24	6	$ 880.574,99
18		FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	2 días	jue 5/12/24	vie 6/12/24	19	$ 379.787,97
19		TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	3 días	lun 2/12/24	mié 4/12/24	17	$ 7.294.388,47
20		**ENCHAPE MUROS**	**25 días**	**jue 31/10/24**	**mié 4/12/24**		**$ 5.312.988,85**
21		CERÁMICA FORMATO 20X20CM	25 días	jue 31/10/24	mié 4/12/24	2	$ 5.312.988,85
22		**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**7 días**	**mié 18/12/24**	**jue 26/12/24**		**$ 18.136.907,04**
23		PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	7 días	mié 18/12/24	jue 26/12/24	25	$ 18.136.907,04
24		**IMPERMEABILIZACIÓN**	**6 días**	**mar 10/12/24**	**mar 17/12/24**		**$ 243.632.725,93**
25		SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIUREA	6 días	mar 10/12/24	mar 17/12/24	28CC+14 días	$ 243.632.725,93
26		**PISOS**	**39 días**	**jue 31/10/24**	**mar 24/12/24**		**$ 40.717.567,39**
27		PISO CERÁMICA 20X20CM	15 días	jue 31/10/24	mié 20/11/24	2	$ 5.372.864,61
28		ALISTADO DE PISO 4CM	5 días	mié 20/11/24	mar 26/11/24	8	$ 34.168.652,68
29		MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM	5 días	mié 18/12/24	mar 24/12/24	25	$ 1.176.050,10
30		**RED SANITARIA**	**3 días**	**mié 18/12/24**	**vie 20/12/24**		**$ 5.836.639,26**
31		SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	3 días	mié 18/12/24	vie 20/12/24	25	$ 5.836.639,26
32		**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**44 días**	**jue 31/10/24**	**mar 31/12/24**		**$ 2.587.517,61**
33		ASEO GENERAL DE OBRA	44 días	jue 31/10/24	mar 31/12/24	2	$ 2.587.517,61
34		**ADICIONALES**	**20 días**	**jue 31/10/24**	**mié 27/11/24**		**$ 57.111.254,96**
35		IMPERMEABILIZACION DE TABLETA EN GRES	10 días	jue 31/10/24	mié 13/11/24	2	$ 64.556,56
36		DESMONTE DE DOMOS	20 días	jue 31/10/24	mié 27/11/24	2	$ 1.795.662,09
37		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMOS	20 días	jue 31/10/24	mié 27/11/24	36CC	$ 55.251.036,31

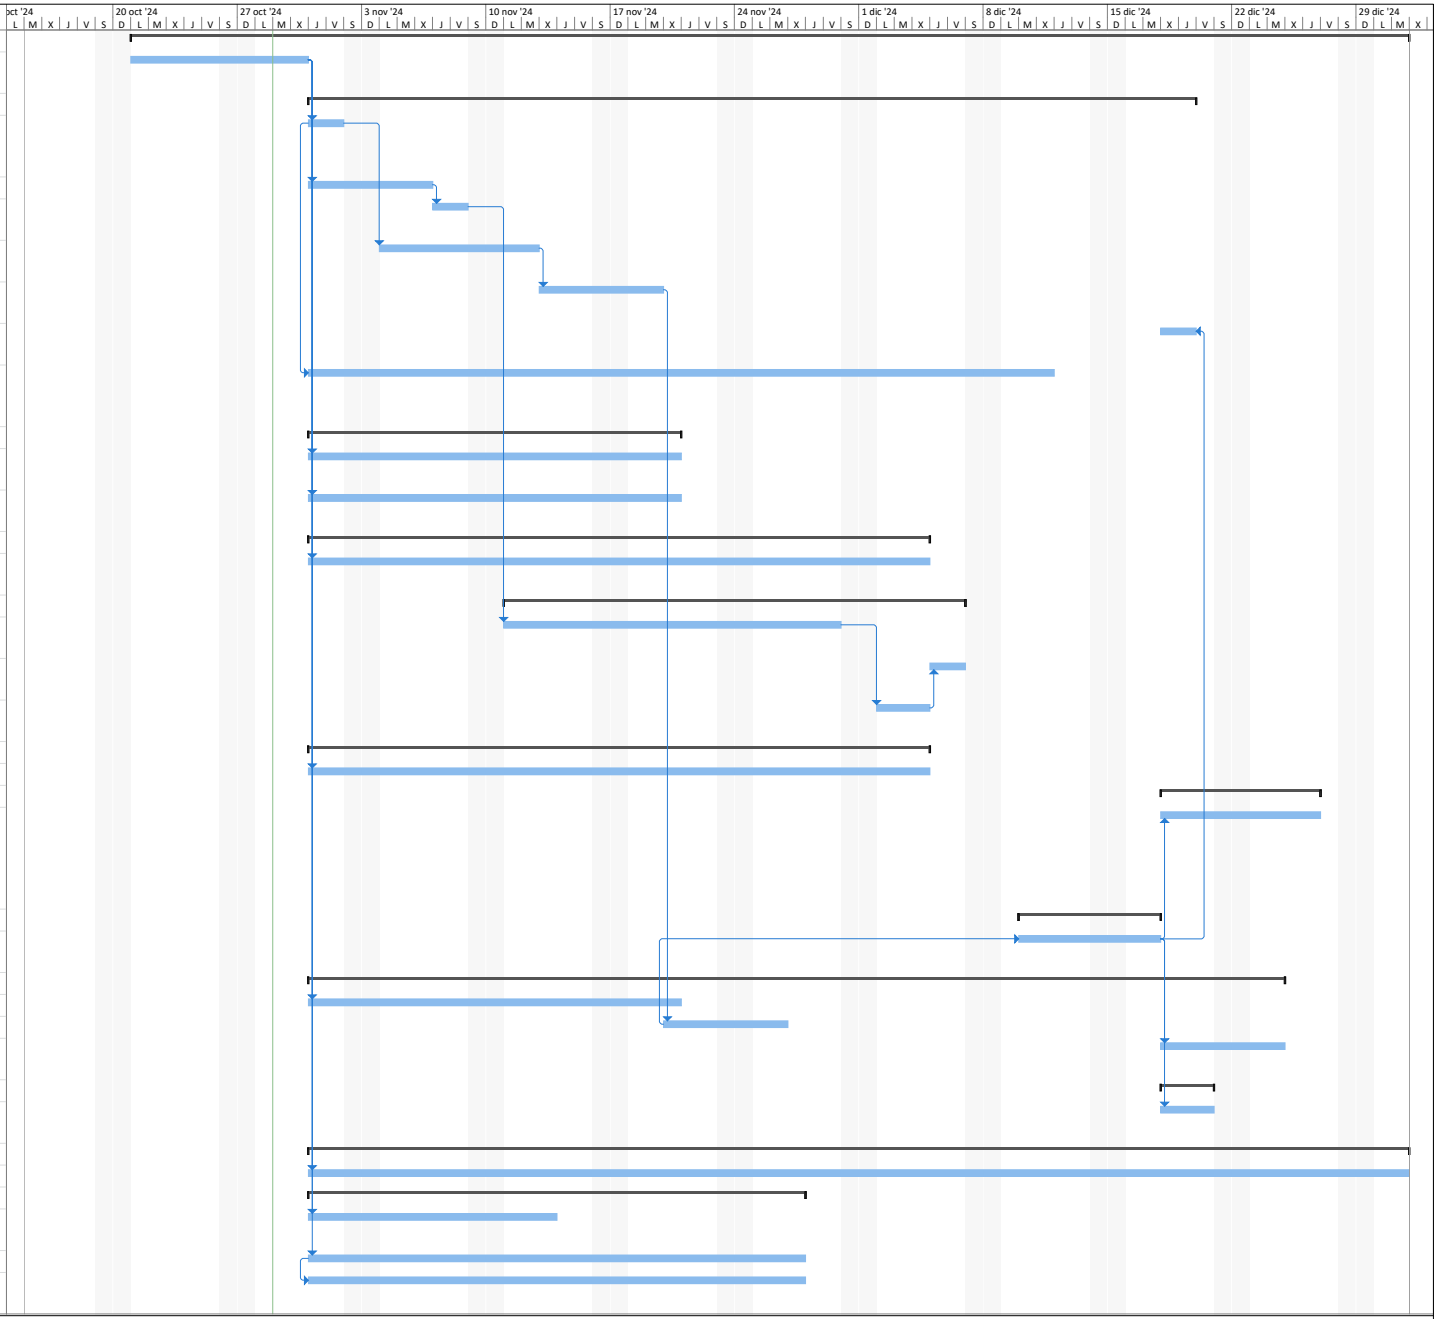

Proyecto: PORGAMACION IMPER
Fecha: mar 29/10/24

Tarea | Resumen | Hito externo | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | Sólo fin | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Fecha límite
Hito | Tareas externas | Hito inactivo | Sólo duración | Sólo el comienzo | Progreso
