Inicio / (/Inicio/Inicio.Xhtml) Proyecto

Detalle del Proyecto | Gestionar Avances | Modificar Proyecto | Galeria fotografica | Asociar contratos | Documentos del Proyecto | Bitácora del Proyecto | Requerimientos y especificaciones | Finalizar Proyecto | Historial de supervisores

ENERGÍA ELÉCTRICA

FAER-GGC-0651-2024-CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 2 MVA 34,5/13,2 KV Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE TRANSFORMADORES EN POSTE

Siguiendo

Piamonte, Cauca - ID: 3124

Cómo va el proyecto?

Tiempo Para La Finalización

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Días Horas Minutos Segundos

Semáforo Avance Fisico

64,31 %



Así Va Vrs. Así Debería Ir

64.31% 64.31% Así va

78.28% 78.28% Debería ir

Información

$ Valor Global Del Proyecto

$ 30.716.479.294

$ Proyecto
$ 30.716.479.294

$ Interventoría $ 0

Quienes Participan?

Contratante: Ministerio De Minas Y Energia

SUPERVISOR: ANA MARIA CAIRASCO AGUDELO

Interventor:

Datos Generales

N° Convenio: GGC-0651-2024

Desc. Convenio: GGC-0651-2024

N° Contrato: GGC-0651-2024

Objeto Del Proyecto:

Ejecutar el Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 2

Alcance:

así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y

Instalaciones Internas:

Número De Acta: 65

Comité Que Defi... CAFAER

Valor Unidad Instalaciones Internas: $ 0

Códigos De Los Proyectos:

Equipo de apoyo a la Supervision

Coordinador Técnico : Marcela Patricia Araujo Colina

Supervisor Apoyo Técnico : CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ

Supervisor Apoyo Jurídico : Elcy Esperanza Rodriguez Arias

Supervisor Apoyo Financiero : Ana Maria Vargas Moyano

Bitácoras

Fecha	Comentario

Datos relevantes

Duración
Desde: 2024-04-22
Hasta: 2026-03-28
706 DÍAS

Estado
Proyecto Actualmente
En Ejecución

Tipo De Proyecto: FAER
Subtipo: Subestaciones


Contratos asociados

Contrato	Objeto	Contratista	Duración	Valor Contrato	
GGC-0651-2024	Ejecutar El Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE	EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP	2024-04-22 Hasta 2045-01-04 (7563 Días)	$ 30.716.479.294	$ 30.716.4

Imágenes y evolución

Imágenes

Evolución

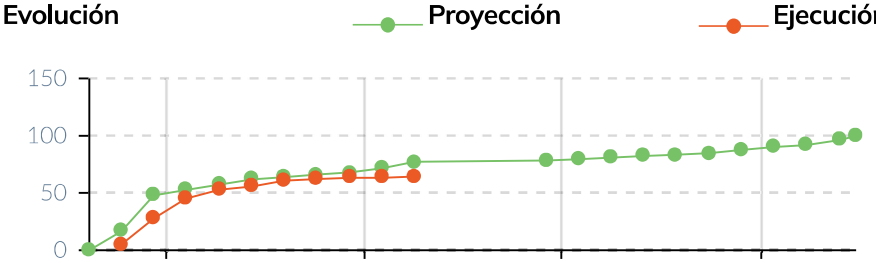

Jul 2025 Jul 2026



Antes



Ahora

Indicadores

Indicadores de Impacto (Son estaticos)

Indicadores de Alcance (tienen una meta y su alcance cambia en el tiempo)

Ejecutado
70%
Ejecutado / Meta
,7/1,0
% Avance De Obra Contratista

Ejecutado
0%
Ejecutado / Meta
,0/1,0
No. Usuarios Retirados

Ejecutado
0%
Ejecutado / Meta
,0/1,0
No. Usuarios Nuevos

Ejecutado
0%
Ejecutado / Meta
,0/2674,0
No. Usuarios Actas De Energización

Ejecutado
0%
Ejecutado / Meta
,0/2674,0
Usuario Beneficiado

Ejecutado
0%
Ejecutado / Meta
,0/2674,0
No. Usuarios Replanteo Actual

Dónde está ubicado el proyecto



Ubicación: Piamonte, Cauca
Municipio(S): Piamonte
Departamento(S): Cauca

Cronograma de Actividades

Diagrama de Gantt | Lista de actividades

Diagrama de Gantt

☐ Expandir ○ Semanal ◉ Mensual ○ Trimestral ○ Anual

☑ Fecha Inicio ☑ Fecha Fin ☑ % Ponderado ☑ % Ejecutado

Actividad	Inicio	Fin	% Ponderado	% Ejecutado	Mar, 2024	Apr, 2024	May, 2024	Jun, 2024	Jul, 2024	Aug, 2024	Sep
▸ **Etapa 1**	2024-04-22	2024-05-20	15%	100%		Avance: 1					
▾ **Etapa 2**	2024-05-20	2025-11-20	70%	70.45%							
Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	2024-05-20	2024-05-30	7.77%	100%			Avc				
Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	2024-05-30	2024-06-04	7.77%	100%			A				
Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y	2024-06-04	2024-06-09	7.78%	100%				A			
Avance de obra del 30%	2024-06-09	2024-07-29	7.78%	100%					Avance: 100%		
Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por	2024-06-09	2024-06-16	7.78%	100%				Av			
Avance de obra del 60%	2024-07-29	2024-09-17	7.78%	100%						Avance: 100%	
Avance de obra del 80%	2024-09-17	2025-01-08	7.78%	34.1%							
Acta de recibo de obras	2025-01-08	2025-02-07	7.78%	0%							
Actas de liquidación de los contratos de interventoría,	2025-05-22	2025-11-20	7.78%	0%							
▾ **Etapa 3**	2025-11-21	2026-03-28	15%	0%							
Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el	2025-11-21	2025-12-23	3.75%	0%							
Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos	2025-12-24	2026-02-21	3.75%	0%							
Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos	2026-02-22	2026-03-13	3.75%	0%							
Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en	2026-03-14	2026-03-28	3.75%	0%							

Reportes

Reporte Individual	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Ejecución	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe De Supervisión - Liquidación	Reporte PDF	Reporte EXCEL	Reporte WORD
Informe Incumplimiento - Contrato			Reporte WORD

Versión: 4.0.18

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo

(https://www.instagram.com/ministeriomir

(https://twitter.com/MinEnergiaCo)

(https://www.youtube.com/user/Ministerioc

(https://www.flickr.com/photos/minminasc

© Powered by Interkont.co
