
PROGRAMACION DE OBRA

ITEM	ACTIVIDAD	Dias
1	LIMPIEZA	
1.01	Limpieza, raspado y lavado mecanico de viga canal en concreto, ancho 0.20 - 1.0 m	5
1.02	Limpieza y sondeo tubería de acueducto/sanitario existente de 1/2", 3/4", 1, 1 ½", 2", 2 ½" 3" y 4"	5
1.03	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	8
2	DESMONTES Y DEMOLICION	
2.01	Desmonte cubiertas en acrilico, fibra de vidrio, con retiro	3
2.02	Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	1
3	ELECTRICIDAD	
3.01	Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	3
4	CUBIERTA Y MANTENIMIENTO	
4.01	Cubierta en policarbonato alveolar 8 mm sin estructura de soporte	8
4.02	Impermeabilizacion placas/viga canal con sikatecho E (4 capas) + sikafelt (2 capas) + 1 capa de alumol	2
4.03	Mantenimiento de griferia	2
4.04	Mortero Impermeabilizado 1:2 (desperdicio 5%)	1
4.05	Bajante A.LL. PVC 6"	1
4.06	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	10
4.07	Revestimiento bajante de aguas lluvias 6" en mortero 1:4	2
4.08	Reparacion de cubiertas con cinta de aluminio bituminosa a=0.15 m, para sello de juntas o fisuras	8

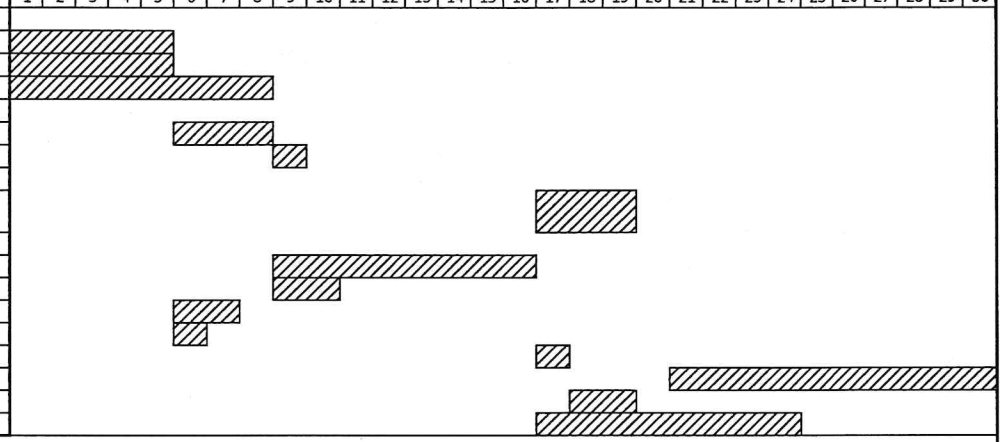

Diego Barrera

Proyectó: Diego Hernan Barrera Perez
Profesional de Apoyo Contratado S.P.O.P

Monica Rodriguez T.

Revisó: Monica Yulieth Rodriguez Torres
Secreataria de Planeacion y Obras Publicas
