

	PREACTA DE OBRA No.001		
MUNICIPIO DE ANSERMA			
DEPARTAMENTO DE CALDAS			
SECRETARIA DE PLANEACION			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Realización de actividades de demolición y adecuación del equipamiento público en el centro administrativo municipal		
ITEMS	PRELIMINARES	**Unidad**	UND
1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS		

UBICACIÓN *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)*	**DIMENSIONES**				**TOTAL**	**ESQUEMA**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT**		
TRAMOS						
DESMONTE LAVAMANOS PRIMER NIVEL 1 EN LA ANTERIOR OFICINA DE PLANEACION 1 EN LA ANTERIOR OFICINA DE HACIENDA				2	2,00	
DESMONTE SANITARIOS PRIMER NIVEL 1 EN LA ANTERIOR COMISARIA DE FAMILIA (RECAMBIO) 1 EN LA ANTERIOR OFICINA DE PLANEACION 1 EN LA ANTERIOR OFICINA DE HACIENDA				3	3,00	
DESMONTE LAVAMANOS TERCER NIVEL 1 EN EL BAÑO DE LOS HOMBRES 1 EN EL BAÑO DE LAS MUJERES				2	2,00	
DESMONTE ORINALES TERCER NIVEL 2 EN EL BAÑO DE LOS HOMBRES				2	2,00	
DESMONTE POSETA TERCER NIVEL 1 EN EL BAÑO DE LOS HOMBRES				1	1,00	
DESMONTE SANITARIOS CUARTO NIVEL 2 EN EL BAÑO DE LAS MUJERES 1 EN EL BAÑO DE LAS MUJERES				3	3,00	
DESMONTE LAVAMANOS DEL CUARTO NIVEL 1 EN EL BAÑO DE LOS HOMBRES 1 EN EL BAÑO DE LAS MUJERES				2	2,00	
DESMONTE ORINALES CUARTO NIVEL 2 EN EL BAÑO DE LOS HOMBRES				2	2,00	
					-	
SUB-TOTAL					17,00	











OBSERVACIONES:

	PREACTA DE OBRA No.001		
MUNICIPIO DE ANSERMA			
DEPARTAMENTO DE CALDAS			
SECRETARIA DE PLANEACION			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Realización de actividades de demolición y adecuación del equipamiento público en el centro administrativo municipal	**Unidad**	UND
ITEMS	PRELIMINARES		
5	DESMONTE PUERTAS		

UBICACIÓN *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)*	**DIMENSIONES**				**TOTAL**	**ESQUEMA**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT**		
TRAMOS						
DESMONTE DE PUERTAS PRIMER NIVEL: 2 PUERTAS ACCESO PRINCIPAL ANTERIOR SECRETARIA DE PLANEACIÓN 1 PUERTA DE BAÑO ANTERIOR SECRETARIA DE PLANEACIÓN 1 PUERTA DE BAÑO ANTERIOR SECRETARIA DE HACIENDA 2 PUERTAS EN EL ANTERIOR ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACION 2 PUERTAS DE ACCESO A LA ANTERIOR SECRETARIA DE HACIENDA				8	8,00	  
DESMONTE DE PUERTAS SEGUNDO NIVEL: 1 ANTERIOR OFICINA DE PERSONERÍA 1 ANTERIOR OFICINA DE COMUNICACIONES 1 ANTERIOR OFICINA DE TRÁNSITO 1 ANTERIOR BAÑO MIXTO NUEVO				4	4,00	
DESMONTE DE PUERTAS DEL TERCER NIVEL: 1 ANTERIOR OFICINA DE SISTEMAS 1 ANTERIOR OFICINA DE ALMACÉN				2	2,00	
					-	 
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
SUB-TOTAL					14,00	

OBSERVACIONES:

	PREACTA DE OBRA No.001		
MUNICIPIO DE ANSERMA			
DEPARTAMENTO DE CALDAS			
SECRETARIA DE PLANEACION			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Realización de actividades de demolición y adecuación del equipamiento público en el centro administrativo municipal	**Unidad**	UND
ITEMS	PRELIMINARES		
8	DESMONTE TANQUE AGUA POTABLE		

UBICACIÓN *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)*	**DIMENSIONES**				**TOTAL**	**ESQUEMA**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT**		
TRAMOS						
DESMONTE TANQUE DE AGUA POTABLE PRIMER NIVEL 1 EN EL BAÑO DE LA ANTERIOR SECRETARIA DE HACIENDA				1	1,00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
SUB-TOTAL					1,00	





OBSERVACIONES:

	PREACTA DE OBRA No.001		
MUNICIPIO DE ANSERMA			
DEPARTAMENTO DE CALDAS			
SECRETARIA DE PLANEACION			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Realización de actividades de demolición y adecuación del equipamiento público en el centro administrativo municipal		
ITEMS	PRELIMINARES	Unidad	M2
14	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS		

UBICACIÓN *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)*	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	
TRAMOS					
DEMOLICIÓN ENCHAPE ACCESO PRINCIPAL DE LA ANTERIOR SECRETARIA DE SALUD	7	2,00		1	14,00
DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO PORCELANATO DE LA ANTERIOR OFICINA SECRETARIO DE HACIENDA PRIMER NIVEL	5,00	6,00		1	30,00
DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO BAÑO DE LA ANTERIOR OFICINA PLANEACIÓN PRIMER NIVEL	4,00	2,50		1	10,00
DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO DE LA ANTERIOR OFICINA PLANEACIÓN PRIMER NIVEL	2,90	2,10		1	6,09
DEMOLICIÓN ENCHAPE BALCÓN CALLE 7 1 ANTERIOR SALA DE JUNTAS NIVEL 2	1,65	8,00		1	13,20
DEMOLICIÓN ENCHAPE BALCÓN CALLE 7 1 ANTERIOR OFICINA DE COMUNICACIONES NIVEL 2	1,70	8,00		1	13,60
DEMOLICIÓN ENCHAPE BALCÓN CALLE 7 1 BALCÓN ANTERIOR INSPECCIÓN DE POLICÍA TERCER NIVEL	2,50	6,45		1	16,13
DEMOLICIÓN ENCHAPE BALCÓN CALLE 7 1 BALCÓN CONCEJO TERCER NIVEL	2,50	6,60		1	16,50
DEMOLICIÓN ENCHAPE BALCÓN CALLE 7 1 BALCÓN CUARTO NIVEL CARRERA 5TA	2,50	6,50		1	16,25
DEMOLICIÓN ENCHAPE BALCÓN CALLE 7 1 BALCÓN CUARTO NIVEL CARRERA 4TA	2,50	6,50		1	16,25
				1	-
SUB-TOTAL					152,0

ESQUEMA




OBSERVACIONES:

	PREACTA DE OBRA No.001		
MUNICIPIO DE ANSERMA			
DEPARTAMENTO DE CALDAS			
SECRETARIA DE PLANEACION			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Realización de actividades de demolición y adecuación del equipamiento público en el centro administrativo municipal	**Unidad**	M2
ITEMS	PRELIMINARES		
15	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS		

UBICACIÓN *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)*	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT**	
TRAMOS					
DEMOLICIÓN ENCHAPE BAÑO TERCER NIVEL	8,05	3,80		1	30,59
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUB-TOTAL					30,59

ESQUEMA



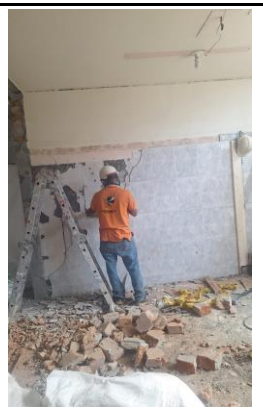






OBSERVACIONES:

	PREACTA DE OBRA No.001		
DEPARTAMENTO DE CALDAS			
SECRETARIA DE PLANEACION			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Realización de actividades de demolición y adecuación del equipamiento público en el centro administrativo municipal	**Unidad**	M2
ITEMS	PRELIMINARES		
23	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE		


UBICACIÓN *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)*	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT**	
TRAMOS					
DEMOLICIÓN MURO ANTEPECHO VENTANA ANTERIOR SECRETARIA DE HACIENDA POR LA CALLE 7MA	3,8	0,35		1	1,33
DEMOLICIÓN MUROS DE SEGURIDAD ESCALERA PRINCIPAL SEGUNDO NIVEL	7,1	1,10		1	7,81
DEMOLICIÓN MURO DINTEL ACCESO PRINCIPAL SEGUNDO NIVEL	1,85	0,45		1	0,83
DEMOLICIÓN DEL MURO PARA LA PUERTA DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA SEGUNDO NIVEL	1,20	2,80		1	3,36
DEMOLICIÓN DE MURO PARA HACER LA PUERTA DE LA OFICINA DE TRÁNSITO	1,20	2,80		1	3,36
DEMOLICIÓN DE MURO PARA LA NUEVA OFICINA DE SALUD Y CONVIVENCIA	2,15	2,80		1	6,02
DEMOLICIÓN MUROS ANTEPECHOS DE SALIDA A LOS 2 BALCONES TERCER NIVEL	4,65	2,00		1	9,30
DEMOLICIÓN ANTEPECHOS DE LAS VENTANAS AL FONDO DEL PASILLO CRA 5 TERCER NIVEL	1,05	3,00		1	3,15
DEMOLICIÓN ANTEPECHOS DE LAS VENTANAS AL FONDO DEL PASILLO CRA 4	1,05	3,00		1	3,15
DEMOLICIÓN MUROS DE SEGURIDAD DE LA ESCALERA PRINCIPAL TERCER NIVEL	9,25	1,10		1	10,18
DEMOLICIÓN MURO DINTEL ACCESO PRINCIPAL TERCER NIVEL	1,85	0,45		1	0,83
DEMOLICIÓN DE MUROS PARA AMPLIAR LAS PUERTAS DEL TERCER NIVEL	1,10	0,45		2	0,99
DEMOLICIÓN DE MUROS PARA AMPLIAR LAS PUERTAS DEL TERCER NIVEL	2,10	0,11		2	0,46
DEMOLICIÓN DE MUROS PARA AMPLIAR LAS PUERTAS DEL TERCER NIVEL	1,00	0,45		3	1,35
DEMOLICIÓN MURO ANTERIOR OFICINA DE URBANISMO	1,60	2,80		1	4,48
DEMOLICIÓN MURO ANTERIOR OFICINA DE URBANISMO	1,00	0,70		1	0,70
DEMOLICIÓN DE MURO PARA VENTANA FACHADA CRA 5TA DEL NUEVO DESPACHO CUARTO NIVEL	2,20	1,80		1	3,96
DEMOLICIÓN PARA AMPLIACIÓN DE VENTANA NUEVA SALA DE JUNTAS CUARTO NIVEL	1,80	1,50		1	2,70
					-

ESQUEMA









SUB-TOTAL	48,5

OBSERVACIONES:

	PREACTA DE OBRA No.001		
MUNICIPIO DE ANSERMA			
DEPARTAMENTO DE CALDAS			
SECRETARIA DE PLANEACION			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Realización de actividades de demolición y adecuación del equipamiento público en el centro administrativo municipal		
ITEMS	PRELIMINARES	Unidad	M3
24	DEMOLICIÓN MANUAL DE ELEMENTOS EN CONCRETO		

UBICACIÓN *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)*	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	
TRAMOS					
VIGAS DINTELES PUERTAS SEGUNDO NIVEL PUERTA SALA DE ESPERAS 2,75 PUERTA ANTERIOR COCINETA 1,25 PUERTA ANTERIOR BAÑO H 1,25 PUERTA ANTERIOR BAÑO M 1,25 PUERTA ANTERIOR CONTROL INTERNO 1,25 PUERTA ACCESO PRINCIPAL 1,75	9,5	0,20	0,25	2	0,48
DEMOLICION VIGAS DINTELES PUERTAS NIEL 3 PUERTA AURA 1,25 DINTEL INSPECCIÓN 1,25 DINTEL INSPECCIÓN 1,25 DINTEL COBRO C 1,25 DINTEL O DE TRABAJO 1,25 PUERTA ACCESO PRINCIPAL 1,75	8,00	0,20	0,25	2	0,40
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUB-TOTAL					0,88

ESQUEMA






OBSERVACIONES:

	PREACTA DE OBRA No.001		
MUNICIPIO DE ANSERMA			
DEPARTAMENTO DE CALDAS			
SECRETARIA DE PLANEACION			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Realización de actividades de demolición y adecuación del equipamiento público en el centro administrativo municipal		
ITEMS	PRELIMINARES	**Unidad**	M2
27	MANO DE OBRA INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)		

UBICACIÓN *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)*	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT**	
TRAMOS					
INSTALACIÓN DE REVOQUE CARTERAS VENTANAS DE 3M DE LARGO POR 0,5M DE ANCHO Y 1,80M EN ALTURA 2 FACHADA CARRERA 4 CUARTO NIVEL 1 FACHADA CARRERA 5 CUARTO NIVEL	6	0,25	3,60	3	7,20
INSTALACIÓN DE REVOQUE CARTERAS VENTANA DE 2,2M DE LARGO POR 0,5M DE ANCHO Y 1,80M EN ALTURA 1 FACHADA CARRERA 5 CUARTO NIVEL	4,40	0,25	3,60	1	2,00
INSTALACIÓN DE REVOQUE CARTERA DE LAS VENTANAS QUE DAN AL PATIO 3M DE LARGO POR 0,5M DE ANCHO Y 2,80M EN ALTURA 1 NUEVA SALA DE SISTEMAS CUARTO NIVEL 1 NUEVA SALA DE JUNTAS CUARTO NIVEL	6,00	0,25	5,60	2	5,80
INSTALACIÓN DE REVOQUE VANO AL PATIO VENTANA DE 2,15M DE LARGO POR 0,5M DE ANCHO Y 2,80M EN ALTURA 1 COSTADO SALA DE ESPERA NUEVO DESPACHO	4,30	0,25	5,60	1	2,48
INSTALACIÓN DE REVOQUE PUERTA DE BAÑO QUE SE CERRÓ EN LA NUEVA OFICINA DE TENCITO PRIMER NIVEL	0,90	2,10		1	1,89
INSTALACIÓN DE REVOQUE EN LA SALIDA DE LA NUEVA OFICINA DE SALUD SALIDA AL PATIO	0,80	2,10		1	1,68
INSTALACIÓN DE REVOQUE EN LA SALIDA DE LA NUEVA OFICINA DE SALUD SALIDA AL PATIO	1,90	0,65		1	1,24
INSTALACIÓN DE REVOQUE LATERAL CIELO RASOS LOBBY PRIMER NIVEL	3,20	0,25		1	0,80
INSTALACIÓN DE REVOQUE LATERAL CIELO RASOS LOBBY PRIMER NIVEL	6,20	0,25		2	3,10
INSTALACIÓN DE REVOQUE LATERALCIELO RASOS LOBBY PRIMER NIVEL	3,60	0,25		1	0,90
INSTALACIÓN DE REVOQUE MURO DE CERRAMIENTO VENTANA ANTERIOR BAÑO PUBLICO SEGUNDO NIVEL	0,60	1,60		1	0,96
REVOQUE EN MURO DE CERRAMIENTO VENTANA TRÁNSITO A PATIO	1,50	1,95		2	5,85

ESQUEMA









REVOQUE EN MURO DE CERRAMIENTO VENTANA TRÁNSITO A PATIO	1,50	1,95		2	5,85
REVOQUE DE PUERTA ENTRE OFICINAS DE SECRETARIAS DE TRÁNSITO	0,75	1,95		2	2,93
REVOQUE DE PUERTA QUE SE CERRO ECRETARIAS DE TRÁNSITO	1,00	2,20		2	4,40
REVOQUE DE PUERTA QUE SE CERRÓ NUEVA OFICINA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	1,10	2,20		2	4,84
REVOQUE DE PUERTA QUE SE CERRO NUEVA INSPECCIÓN DE POLICÍA	1,10	2,20		2	4,84
REVOQUE DE PUERTA QUE SE CERRO ANTERIOR DESPACHO PERSONERA	1,10	2,20		2	4,84
REVOQUE CARTERAS PUERTA NUEVA OFICINA DE PLANEACIÓN	2,40	0,25	4,30	1	1,68
REVOQUE DE CERRAMIENTO DE VENTANA EN LADRILLO NUEVA OFICINA DE PLANEACIÓN	1,15	0,90		2	2,07
INSTALACION REVOQUE CARTERAS DE LAS VENTANAS DE LOS REMATES DE LOS PACILLOS SEGUNDO NIVEL	6,00	0,25	5,60	2	5,80
REVOQUES DE LAS CARTERAS VERTICALES DE LAS PUERTAS DEL NIVEL 2 15 CARTERAS DE PISO A VIGA 2,8 M	2,80	0,25		18	12,60
REVOQUES DE LAS CARTERAS DE LAS PUERTAS DEL NIVEL 2 HORIZONTALES 3 PUERTA OBRAS PUBLICAS LICENCIAS 1 ANTERIOR TRÁNSITO 1 INSPECCIÓN	1,20	0,25		5	1,50
CARTERAS VENTANAS FACHADA HACIA LA CALLE 7 SECTOR ESCALERAS SEGUNDO NIVEL 3 UN DE 2,8M POR 0,68M	5,60	0,25	1,20	3	5,10
REVOQUE VIGAS NUEVA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS SEGUNDO NIVEL	3,60	1,00	6,40	1	10,00
REVOQUE VIGAS NUEVA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS SEGUNDO NIVEL	6,40	0,45		1	2,88
REVOQUE CARTERAS DE LAS VENTANAS DE LOS REMATES DE LOS PACILLOS TERCER NIVEL	6,00	0,25	5,60	2	5,80
REVOQUES DE LAS CARTERAS DE LAS PUERTAS DEL NIVEL 3 24 CARTERAS DE PISO A VIGA H=2,8	2,80	0,25		24	16,80
REVOQUES DE LAS CARTERAS DE LAS PUERTAS DEL NIVEL 3 4 CARTERAS DE PISO A DINTEL H=2,1	2,10	0,25		4	2,10
CARTERA PUERTAS TERCER NIVEL 1 CARTERA PUERTA CONCEJO CORREDOR DEL ASCENSOR B=,95 *2	1,90	0,25	4,00	1	1,48
CARTERA PUERTA TERCER NIVEL 2 CARTERAS PUERTA PRINCIPAL NIVEL 3	3,66	0,25	4,00	1	1,92
CARTERAS VENTANAS FACHADA HACIA LA CALLE 7 SECTOR ESCALERAS TERCER NIVEL	5,60	0,25	1,20	3	5,10
REVOQUE CARTERAS DE LAS VENTANAS DE LOS REMATES DE LOS PACILLOS CUARTO NIVEL	6,00	0,25	5,60	2	5,80










CARTERAS VENTANAS FACHADA HACIA LA CALLE 7 SECTOR ESCALERAS CUARTO NIVEL 3 UN DE 2,8M PO	5,60	0,25	1,20	3	5,10
REVOQUE CUCHILLAS CUARTO NIVEL	5,90	0,60		1	3,54
REVOQUE CUCHILLAS CUARTO NIVEL	5,80	0,08		1	0,46
REVOQUE CUCHILLAS CUARTO NIVEL	4,40	1,15		4	20,24
REVOQUE CUCHILLAS CUARTO NIVEL	5,70	0,40		1	2,28
REVOQUE CUCHILLAS CUARTO NIVEL	11,00	2,00		1	22,00
REVOQUE VENTANA QUE SE TAPÓ EN DONDE QUEDARA EL NUEVO DESPACHO	1,70	1,20		1	2,04
REVOQUES CARTERAS VENTANA NUEVA DE LA CULATA DE LA NUEVA SALA DE JUNTAS	1,80	0,25	2,00	1	0,95
REVOQUES CARTERAS VENTANA NUEVA DE LA CULATA DE LA NUEVA SALA DE JUNTAS	3,00	0,25		1	0,75
REVOQUES CARTERAS VENTANA NUEVA DE LA CULATA DE LA NUEVA SALA DE JUNTAS	1,80	0,25		2	0,90
REVOQUES CARTERAS VENTANA NUEVA DE LA CULATA DE LA NUEVA SALA DE JUNTAS	2,20	0,25		1	0,55
REVOQUE DONDE SE RETIRÓ MURO EN EL DESPACHO DEL CUARTO NIVEL	2,80	0,30		1	0,84
REVOQUE VENTANA QUE SE TAPÓ EN EL ESPACIO DONDE SE UBICARA EL BAÑO DEL CUARTO NIVEL	1,15	2,00		1	2,30
REVOQUE VENTANA QUE SE TAPÓ EN EL ESPACIO DONDE SE UBICARA EL BAÑO DEL CUARTO NIVEL	1,90	2,00		1	3,80
REVOQUE FILOS MURO ESQUINA DEL MURO CONTIGUO AL ASCENSOR CUARTO NIVEL	4,50	0,15		2	1,35
REVOQUE FILOS MURO ESQUINA DEL MURO CONTIGUO AL ASCENSOR CUARTO NIVEL	2,85	0,20		2	1,14
CARTERAS VENTANAS FACHADA HACIA LA CALLE 7 SECTOR ESCALERAS TERCER NIVEL 3 UN DE 2,8M POR 0,68M	5,60	0,25	1,20	3	5,10
SUB-TOTAL					215,54



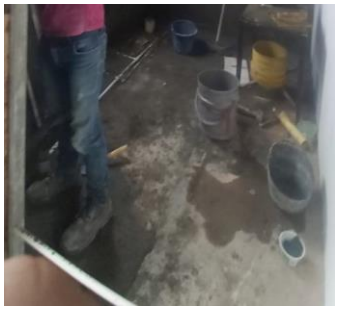

OBSERVACIONES:

	PREACTA DE OBRA No.001		
MUNICIPIO DE ANSERMA			
DEPARTAMENTO DE CALDAS			
SECRETARIA DE PLANEACION			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Realización de actividades de demolición y adecuación del equipamiento público en el centro administrativo municipal	**Unidad**	ML
ITEMS	PRELIMINARES		
29	INSTALACION TUBO METALICO 100X100MM CAL 14		

UBICACIÓN *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)*	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT**	
TRAMOS					
PRIMER NIVEL ACCESO A LA NUEVA SECRETARIA DE SALUD PRIMER NIVEL	5,8			1	5,80
SEGUNDO NIVEL SECTOR DE ANTERIOR COCINETA	4,20			1	4,20
REFUERZO VENTANA AL PATIO CUARTO NIVEL NUEVA SALA DE JUNTAS	5,60			1	5,60
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUB-TOTAL					15,60

ESQUEMA








OBSERVACIONES:

	PREACTA DE OBRA No.001		
MUNICIPIO DE ANSERMA			
DEPARTAMENTO DE CALDAS			
SECRETARIA DE PLANEACION			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Realización de actividades de demolición y adecuación del equipamiento público en el centro administrativo municipal	**Unidad**	M2
ITEMS	PRELIMINARES		
34	ASEO GENERAL		

UBICACIÓN *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)*	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT**	
TRAMOS					
PRIMER NIVEL				344,89	344,89
SEGUNDO NIVEL				354	354,00
TERCER NIVEL				430	430,00
CUARO NIVEL				443,4	443,38
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUB-TOTAL					1.572,27

ESQUEMA






OBSERVACIONES:
