INGES GROUP

NIT: 800.086.627-9

Factura de cobro

Calle 6c No. 24ª-53 Barrio: La Gaitana – Cel: 3043502527
Neiva / Huila / Colombia
Email: Ingespotrerillos@gmail.com

INGES GROUP

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
29cfa2e2ba6deee87f14cb8734f096cb442759b8c04a7f5d029f52b4048f9b5737133de118cf5a08918f40f1a54884e0

Número de Factura: FE-30
Fecha de Emisión: 10/04/2025
Fecha de Vencimiento: 10/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGES GROUP S.A.S
Nombre Comercial: INGES GROUP S.A.S
Nit del Emisor: 800086627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 32 16 60
Teléfono / Móvil: 3172851063
Correo: ingesgroupsas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE GARZÓN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180022
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 8 7 74
Teléfono / Móvil: 6088332992
Correo: contabilidad@garzon-huila.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	3	ACTA PARCIAL No2 CON TRATO 415 DE 2024	NIU	1,00	$ 50.368.747,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.570.062,10	19.00			$ 50.368.747,90

Notas Finales

Linea de negocio:

INGES GROUP

NIT: 800.086.627-9

Certificación bancaria

Calle 6c No. 24ª-53 Barrio: La Gaitana – Cel: 3043502527
Neiva / Huila / Colombia
Email: Ingespotrerillos@gmail.com

Certificación
Bancaria

Martes, 01 de abril de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que INGES GROUP SAS identificado(a) con NIT 800086627, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	45400023101	2019-01-18	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

INGES GROUP

NIT: 800.086.627-9

Acta parcial

Calle 6c No. 24ª-53 Barrio: La Gaitana – Cel: 3043502527
Neiva / Huila / Colombia
Email: Ingespotrerillos@gmail.com

ACTA PARCIAL 02

CONTRATO 415 de 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GARZON

CANT.	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		F.M.	Disponibilidad	VALOR SALARIO	MESES	VALOR TOTAL	% DE AVANCE	VALOR TOTAL	% DE AVANCE	VALOR TOTAL
	COSTOS DEL PERSONAL									
1,00	Ing. Director de Interventoria	1,97	30%	$ 5.000.000,00	5	$ 14.801.686,30	41,00%	$ 6.068.691,38	76,00%	$ 11.249.281,59
1,00	Ingeniero Residente de Interventoria	1,97	100%	$ 3.500.000,00	3	$ 20.722.360,82	41,00%	$ 8.496.167,94	76,00%	$ 15.748.994,22
1,00	Profesional SISO	1,97	100%	$ 1.800.000,00	3	$ 10.657.214,13	41,00%	$ 4.369.457,80	76,00%	$ 8.099.482,74
1,00	Inspector de interventoria	1,97	100%	$ 1.500.000,00	3	$ 8.881.011,78	41,00%	$ 3.641.214,83	76,00%	$ 6.749.568,95
1,00	Topografo	1,97	100%	$ 2.000.000,00	3	$ 11.841.349,04	41,00%	$ 4.854.953,11	76,00%	$ 8.999.425,27
1,00	Cadeneros	2,12	100%	$ 1.300.000,00	3	$ 8.275.128,46	41,00%	$ 3.392.802,67	76,00%	$ 6.289.097,63
1,00	Secretaria	2,12	100%	$ 1.250.000,00	3	$ 7.956.854,29	41,00%	$ 3.262.310,26	76,00%	$ 6.047.209,26
	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL					$ 83.135.604,82		$ 34.085.597,98		$ 63.183.059,67

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	TIEMPO (m)	COSTO TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
						% DE AVANCE	VALOR TOTAL	% DE AVANCE	VALOR TOTAL
	OTROS COSTOS DIRECTOS								
1,00	Alquiler camioneta 4x4 (incluye conductor)	MES	$ 6.500.000	3	$ 19.500.000,00	41,00%	$ 7.995.000,00	76,00%	$ 14.820.000,00
1,00	Equipo Topográfico.	MES	$ 2.250.000	3	$ 6.750.000,00	41,00%	$ 2.767.500,00	76,00%	$ 5.130.000,00
8,00	Ensayo de laboratorio (densidades de materiales granulares)	UND	$ 150.000	3	$ 3.600.000,00	41,00%	$ 1.476.000,00	76,00%	$ 2.736.000,00
4,00	Ensayo de laboratorio (ensayos de concreto en viga)	UND	$ 70.000	3	$ 840.000,00	41,00%	$ 344.400,00	76,00%	$ 638.400,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				$ 30.690.000,00		$ 12.582.900,00		$ 23.324.400,00

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	TIEMPO (m)	COSTO TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
						% DE AVANCE	VALOR TOTAL	% DE AVANCE	VALOR TOTAL
	COSTOS INDIRECTOS								
1,00	Alquiler oficina	MES	$ 1.000.000,00	5	$ 5.000.000,00	41,00%	$ 2.050.000,00	76,00%	$ 3.800.000,00
1,00	Servicio de energia	MES	$ 80.000,00	5	$ 400.000,00	41,00%	$ 164.000,00	76,00%	$ 304.000,00
1,00	Servicio de agua	MES	$ 110.000,00	5	$ 550.000,00	41,00%	$ 225.500,00	76,00%	$ 418.000,00
1,00	Servicio de internet	MES	$ 85.000,00	5	$ 425.000,00	41,00%	$ 174.250,00	76,00%	$ 323.000,00
1,00	Alquiler de equipos para comunicaciones	MES	$ 80.000,00	5	$ 400.000,00	41,00%	$ 164.000,00	76,00%	$ 304.000,00
1,00	Alquiler equipos de oficina	MES	$ 350.000,00	5	$ 1.750.000,00	41,00%	$ 717.500,00	76,00%	$ 1.330.000,00
1,00	Papeleria, copias e impresiones	MES	$ 100.000,00	5	$ 500.000,00	41,00%	$ 205.000,00	76,00%	$ 380.000,00
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 9.025.000,00		$ 3.700.250,00		$ 6.859.000,00
	SUBTOTAL				$ 122.850.605,00		$ 50.368.748,00		$ 93.366.460,00
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)			19,0%	$ 23.341.615,00		$ 9.570.062,00		$ 17.739.627,00
	COSTO TOTAL				$ 146.192.220,00		$ 59.938.810,00		$ 111.106.087,00

LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO
CC. 36.311.206 de Neiva
RL. INGES GROUP S.A.S.
NIT. 800.086.627-9

INGES GROUP

NIT: 800.086.627-9

Informe de interventoría

Calle 6c No. 24ª-53 Barrio: La Gaitana – Cel: 3043502527
Neiva / Huila / Colombia
Email: Ingespotrerillos@gmail.com

INGES GROUP

INGES GROUP

NIT: 800.086.627-9

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 000415



INFORME DEL ACTA PARCIAL No. 2

PERIODO: ENERO 31 DE 2025 – FEBRERO 19 DE 2025

ENTIDAD CONTRATANTE

Alcaldía municipal
Garzón

Calle 6c No. 24ª-53 Barrio: La Gaitana – Cel: 3043502527
Neiva / Huila / Colombia
Email: Ingespotrerillos@gmail.com

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. REVISIÓN Y APROBACIÓN 4
3. GENERALIDADES 5
3.1. ASPECTOS GENERALES 5
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 7
5. ASPECTOS GENERALES Y DE CONTROL DE POLIZAS 11
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES 15
7. INFORMACIÓN FINANCIERA 21
8. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 22
9. CONTROL DE CALIDAD 22
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO 23
11. SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SOCIAL Y AMBIENTAL 28
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA 36

1. INTRODUCCIÓN

Con el propósito de presentar control, revisión y supervisión de todas las etapas del proyecto contemplado en el contrato de obra No. 000495, suscrito entre la **ALCADÍA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN** y el **CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24** con **NIT 901.868.224-7** representado legalmente por **FERNANDO JIMENEZ ROA.** Se celebró con **INGES GROUP S.A.S.** con **NIT. 800.086.627-9** representado legalmente por **LEIDY JOHANNA PALACIOS**, el contrato de interventoría No. 000415 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA".

La interventoría lleva a cabo la vigilancia y respectivo control de calidad de los procesos constructivos con el fin de garantizar el éxito del proyecto y conseguir satisfacción en las partes interesadas, cumpliendo a cabalidad con su ejecución y velando por que los recursos utilizados, se inviertan correctamente y cumplan con los estándares de calidad, tal como lo exige el manual de Interventoría y las especificaciones técnicas de cada actividad.

El presente documento corresponde al informe del acta parcial **No. 2**, cuyo periodo comprende del **31 de enero al 19 de febrero de 2025** y contiene la descripción detallada de cada una de las actividades que forman parte de las obligaciones de los contratos de obra e interventoría, en cuanto a los componentes técnico, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo.

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN

REVISIÓN Y APROBACIÓN		
Responsable por la elaboración	Firma	
	Nombre	**WILMER RODRIGO PASSOS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Responsable por la revisión	Firma	
	Nombre	**CARLOS MAURICIO PEREZ GASTRO** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Responsable por la aprobación	Firma	
	Nombre	**LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO** R.L. INGES GROUP S.A.S.

3. GENERALIDADES

3.1. ASPECTOS GENERALES

Garzón es un municipio del departamento de Huila, ubicado al suroriente de Huila. Limita al norte con el Municipio de Gigante, al sur con el municipio de Guadalupe, al este con el departamento de Caquetá y al oeste con el municipio del Agrado. El municipio se encuentra en una meseta a unos 830 msnm y a una distancia de la capital del departamento de 116 km.

El municipio de Garzón Huila, siendo un ente territorial y como tal, una entidad fundamental de la división político administrativo del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la Constitución y la Ley, y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. La secretaría de Infraestructura y Obras públicas con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población, mejorar la comodidad, seguridad y economía en los desplazamientos, disminuir los tiempos en los recorridos y costos de operación vehicular de ciertos sectores del municipio (Sagrada Familia, Villa Karol, Zona industrial).

3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio del Garzón se encuentra ubicado en la región central del departamento del Huila al suroccidente colombiano, entre el valle del Río Magdalena y el Macizo de Garzón, más exactamente entre las Cordilleras Central y Oriental, su cabecera municipal está localizada a los 02°11'45" de latitud norte y 75°37'47" de longitud oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 830 msnm y de acuerdo a la localización de planchas en que se encuentra dividido el territorio nacional, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO DEL HUILA



MUNICIPIO DE GARZÓN



Ilustración 1 Ubicación espacial del proyecto

Los sectores de intervención se encuentran ubicados dentro del casco urbano del municipio. El sector de La Sagrada Familia con 100.48 m iniciando en el K0+000 con coordenadas (2°11'42.68"N; 75°36'53.74"O) y finalizando en el K0+100 con coordenadas (2°11'46.37"N;

75°36'57.09"O). El sector de Villa Karol Cra 2 con 133.89 m iniciando en el K0+000 con coordenadas (2°11'51.10"N; 75°37'5.96"O) y finalizando en el K0+133 con coordenadas (2°11'51.10"N; 75°37'6.02"). El sector de Villa Karol Cra 3ª con 35.9 m iniciando en el K0+000 con coordenadas (2°11'48.93"N; 75°37'14.99"O) y finalizando en el K0+035 con coordenadas (2°11'51.10"N; 75°37'6.02"). Y el sector de la Zona Industrial con 154.21 m iniciando en el K0+000 con coordenadas (2°11'57.10"N; 75°38'22.37"O) y finalizando en el K0+154 con coordenadas (2°11'53.44"N; 75°38'23.08"O).

3.3. INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

El 31 de diciembre de 2024 se suscribió el Acta de Suspensión N.º 1 con el propósito de resolver, en primer lugar, la posible interferencia entre los proyectos de cambio de red de alcantarillado por parte de EMPUGAR y, en segundo lugar, la solicitud del permiso de empalme ante la ANI, requerida para el tramo de la Zona Industrial. Las actividades se reiniciaron el 31 de enero de 2025 sin contar con dicho permiso, lo que restringe las labores del contratista hasta obtener una respuesta por parte de la ANI.

El 31 de enero de 2025 se realiza el otro sí al contrato de obra e interventoría donde se crea la **CLÁUSULA 26** donde asignan la supervisión de los contratos a la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS.**

Durante este periodo se realizó la intervención simultánea de la intersección del tramo de la Sagrada Familia, la intersección ubicada entre la Cra. 4 Este con Calle 11 y el tramo de la Zona industrial. Se inició con actividades preliminares de reconocimiento en campo de los tres tramos mencionados, revisión topográfica de manera conjunta entre el contratista y la interventoría. Seguidamente de la excavación mecánica, transporte de material sobrante de excavación, instalación, cereado y compactación de base granular y base granular estabilizada con cemento para la zona industrial, suministro e instalación de sardineles. Además, se realizó la apertura, habilitación y limpieza de los tramos 2 y 3.

El día 03 de febrero de 2025 se inicia la fundición de la intersección del tramo de la Sagrada Familia (K0+000 – K0+006.9). Seguidamente, el 06 de febrero se inicia con la fundición de la intersección de la Cra. 4 Este con Calle 11, estos dos tramos con concreto MR 4.0. En esta última intervención contemplada en el alcance del proyecto, fue necesaria la demolición de parte de las placas ubicadas sobre la Carrera 4 Este y la Calle 11, debido a que se encontraban deterioradas y no garantizaban la durabilidad de la pavimentación de la intersección; y, la construcción de vigas de confinamiento sobre la Carrera 4 Este, vía Condominio Tocheré. Para la intervención del tramo, se realizó la adecuación de una vía provisional sobre la Calle 12, con el fin de no afectar la movilidad del sector. Finalmente se inicia con la fundición el 13 de febrero en la zona industrial con concreto MR 4.2.

En el tramo de la Zona Industrial se reemplazaron los sardineles prefabricados por bordillos macizos, con refuerzo y fundidos en sitio, como una medida para garantizar la durabilidad gracias a que se logra una mayor resistencia ante posibles cargas accidentales ocasionadas por la

demanda del tránsito pesado presente en este tramo. Además, en aras de garantizar el acceso a las diferentes bodegas, se dispone de unas rampas de acceso a cada una de ellas.

En este tramo se realizó la pavimentación entre el K0+009.1 y K0+054.5 sobre la Calle 1 entre la ruta 45HLB y la carrera 23ª. Además, sobre la Cra. 23ª entre Calle 1 y Calle 2 entre el K0+000 y K0+104.05.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta que el objeto contractual del proyecto es "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"; las obras contratadas por la entidad contemplan 425.89 m de pavimentación de concreto rígido para cuatro tramos del municipio de Garzón, ubicados en el barrio La Sagrada Familia (Tramo 1; Diagonal 11 entre Cra 4E – Diagonal 10 con 101.89 m), Villa Karol con dos tramos (Tramo 2; Cra 2 Entre Calle 11 y 14; Tramo 3; Cra 3A Entre Calle 11 y 12; con 133.89 m y 35.92 m respectivamente) y la Zona Industrial (Tramo 4: 154.21 m). El pavimento para el tramo de La Sagrada Familia y Villa Karol Cra 2 entre Calle 11 y 14 están diseñados con MR 4.0.Y para los tramos de la Zona Industrial y Villa Karol Cra 3A entre Calle 11 y 12 están diseñados con MR 4.2. La base estabilizada con concreto hace parte de la estructura de los tramos 2 y 4.

El proceso constructivo inicia con la identificación en campo de los tramos, actividades de topografía, con la que se realiza la localización y replanteo para dar seguimiento a la conformación de la estructura de pavimento. Seguidamente se realiza la excavación mecánica, mejoramiento y compactación de subrasante, suministro e instalación de base granular y donde el diseño lo ordene, base granular estabilizada con cemento, cereado y compactación de la base, excavación manual e instalación de sardineles en los tramos 1, 3 y 4, instalación de formaleta, nivelación de pozos, fundición de concreto con MR especificado por diseño e instalación de dovelas de 0.35 m cada 0.30 m y acero de unión de ½" de 0.85 cm cada 1.2 m, curado del concreto, y la realización de juntas selladas.

4.1. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO

4.1.1. SECTOR LA SAGRADA FAMILIA.

Material	Símbolo	Espesor (cm)	Refuerzo (dovelas)
Losa en concreto MR3 (4.2MPa)		19.0	D=1", L= 35cm, @=30
Base granular		15.0	-
Subrasante (CL)		-	-

Tabla 1 Estructura de pavimento rígido para el tramo de La Sagrada Familia

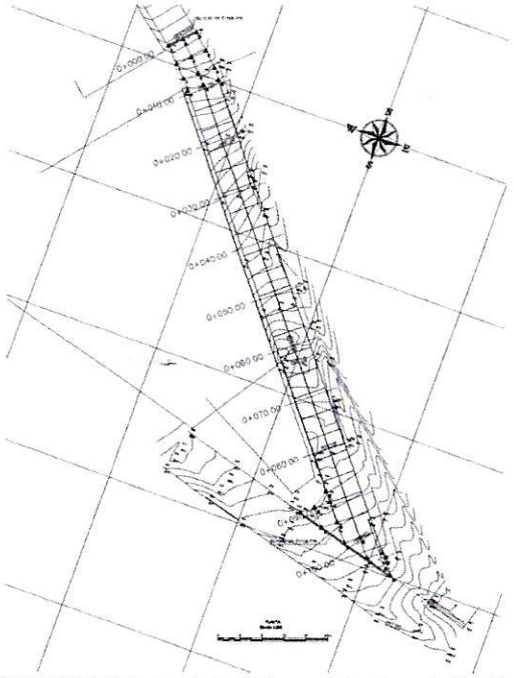


Ilustración 2 Vista en planta del tramo de La Sagrada Familia

4.1.2. SECTOR VILLA KAROL CRA 2 ENTRE CALLE 11 Y 14

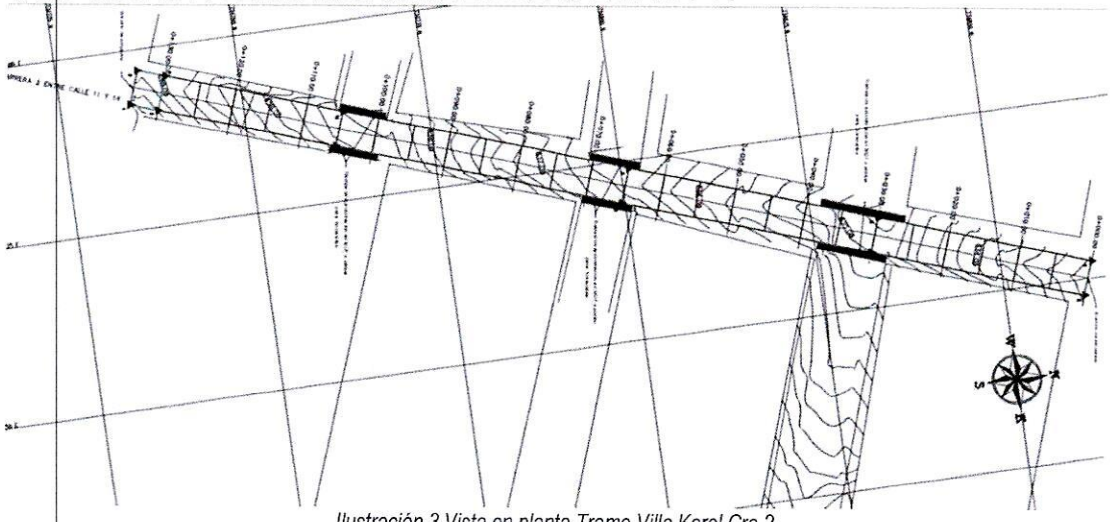


Ilustración 3 Vista en planta Tramo Villa Karol Cra 2

Material	Símbolo	Espesor (cm)	Refuerzo (dovelas)
Losa en concreto MR2 (4.0MPa)		19.0	D=1", L= 35cm, @=30
Base estabilizada con cemento		15.0	-
Subrasante (SC)		-	-

Tabla 2 Estructura de pavimento para el tramo de Villa Karol Cra 2

4.1.3. SECTOR VILLA KAROL CRA 3A ENTRE CALLE 11 Y 12

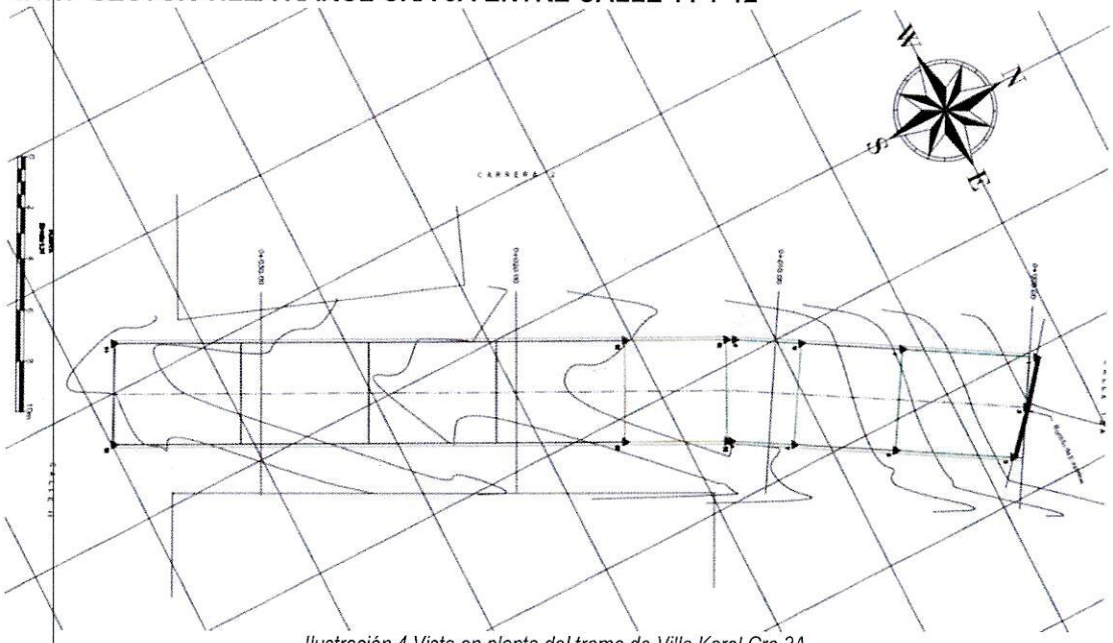


Ilustración 4 Vista en planta del tramo de Villa Karol Cra 3A

Material	Símbolo	Espesor (cm)	Refuerzo (dovelas)
Losa en concreto MR3 (4.2MPa)		19.0	D=1'', L= 35cm, @=30
Base granular		15.0	-
Subrasante (SC)		-	-

Tabla 3 Estructura de pavimento para el tramo de Villa Karol Cra 3A

4.1.4. SECTOR ZONA INDUSTRIAL

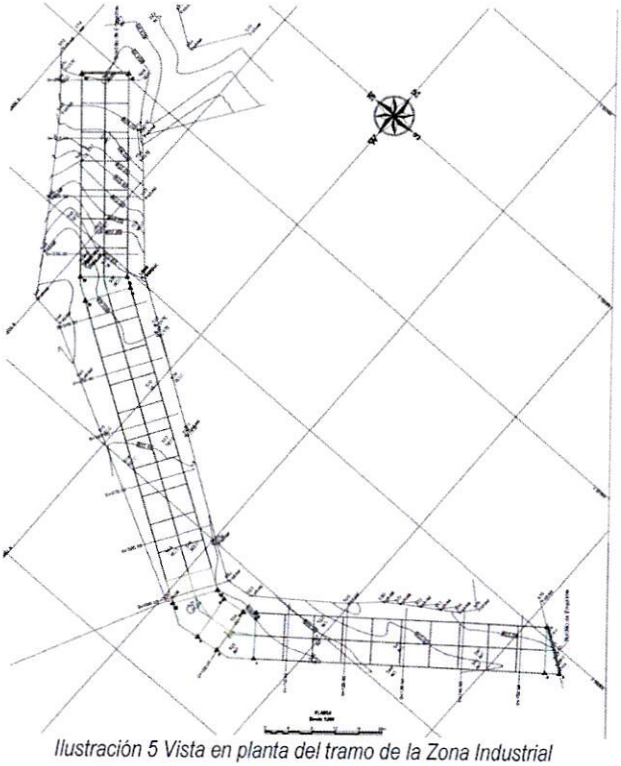


Ilustración 5 Vista en planta del tramo de la Zona Industrial

Material	Símbolo	Espesor (cm)	Refuerzo (dovelas)
Losa en concreto MR3 (4.2MPa)		20.0	D=1'', L= 35cm, @=30
Base estabilizada con cemento		15.0	-
Subrasante (CL)		-	-

Tabla 4 Estructura de pavimento rígido para tramo de la Zona Industrial

5. ASPECTOS GENERALES Y DE CONTROL DE POLIZAS

5.1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA

Contrato de obra No.	000495
Objeto	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA ".
Contratista	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24
Representante legal	Fernando Jiménez Roa C.C. 12.192.340 de Garzón - Huila.
Contratante	MUNICIPIO DE GARZON – HUILA
Fecha firma del contrato	10 de septiembre de 2024
Plazo inicial del contrato	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de tres (3) Meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. (31 de octubre de 2024).
Plazo adicional	No aplica
Plazo final del contrato	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de tres (3) Meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. (31 de octubre de 2024).
Fecha de iniciación	Octubre 31 de 2024
Suspensión No. 1	Diciembre 31 de 2024
Reinicio No. 1	Enero 31 de 2025
Otro sí No. 1	Enero 31 de 2025
Fecha de terminación	Marzo 01 de 2025
Valor inicial del contrato	MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.142.501.487.32) correspondientes a 878.85 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2024 (incluido IVA y AIU).
Estado actual	En ejecución
Porcentaje de avance físico	76.80%
Porcentaje de avance financiero	35.12%

Tabla 5 Información general contrato de obra

Así mismo se relacionan las garantías que amparan el contrato de obra:

- Según suscripción del contrato.

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.				
Fecha de expedición	10 de septiembre 2024 (anexo 0)			
Póliza No.	**Amparos**	**Desde**	**Hasta**	**Valor**
	Cumplimiento del contrato	10/09/2024	20/09/2025	$228.500.297,46

CHU-100030185	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	10/09/2024	20/12/2027	$114.250.148,73
	Estabilidad de la obra	5 años*		$342.750.446,20
CHU-100005518	Predios labores y operaciones	10/09/2024	20/12/2024	$260.000.000,00
	Perjuicios extrapatrimoniales	10/09/2024	20/12/2024	$260.000.000,00
	Daño emergente y lucro cesante	10/09/2024	20/12/2024	$260.000.000,00

Tabla 6 Actualización pólizas contrato de obra

*Inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción.

- Según acta de inicio

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.				
Fecha de expedición	14 de noviembre 2024 (anexo 3)			
Póliza No.	**Amparos**	**Desde**	**Hasta**	**Valor**
CHU-100030185	Cumplimiento del contrato	31/10/2024	31/05/2025	$228.500.297,46
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	31/10/2024	30/01/2028	$114.250.148,73
	Estabilidad de la obra	31/10/2024	30/01/2030	$342.750.446,20
CHU-100005518	Predios labores y operaciones	10/09/2024	31/01/2025	$260.000.000,00
	Perjuicios extrapatrimoniales	10/09/2024	31/01/2025	$260.000.000,00
	Daño emergente y lucro cesante	10/09/2024	31/01/2025	$260.000.000,00

Tabla 7 Actualización pólizas según acta de inicio de obra

- Según acta de reinicio

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
Fecha de expedición	24 de febrero 2025 (anexo 4)

Póliza No.	Amparos	Desde	Hasta	Valor
CHU-100030185	Cumplimiento del contrato	31/01/2025	30/06/2025	$228.500.297,46
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	31/01/2025	01/03/2028	$114.250.148,73
	Estabilidad de la obra	01/03/2025	01/03/2030	$342.750.446,20
CHU-100005518	Predios labores y operaciones	10/09/2024	02/03/2025	$260.000.000,00
	Perjuicios extrapatrimoniales	10/09/2024	02/03/2025	$260.000.000,00
	Daño emergente y lucro cesante	10/09/2024	02/03/2025	$260.000.000,00

Tabla 8 Actualización pólizas según acta de reinicio de obra

5.2. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato de interventoría No.	000415
Objeto	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"
Contratista	INGES GROUP S.A.S.
Representante legal	Leidy Johanna Palacios Enciso C.C. 36.311.206 de Neiva – Huila.
Contratante	MUNICIPIO DE GARZON – HUILA
Fecha firma del contrato	08 de agosto de 2024
Plazo inicial del contrato	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de tres (3) Meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta liquidación del contrato de obra.
Plazo adicional	No aplica
Plazo final del contrato	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de tres (3) Meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta liquidación del contrato de obra.
Fecha de iniciación	Octubre 31 de 2024
Suspensión No. 1	Diciembre 31 de 2024
Reinicio No. 1	Enero 31 de 2025
Otrosí No. 1	Enero 31 de 2025
Fecha de terminación	Marzo 01 de 2025

Valor inicial del contrato	**CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($146.192.220,00)** equivalentes a 112,455 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2024

Tabla 9 Información general contrato de interventoría

Así mismo se relacionan las garantías que amparan el contrato de Interventoría:

- Según suscripción del contrato.

SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Fecha de expedición	09 agosto 2024 (anexo 0)			
Póliza No.	**Amparos**	**Desde**	**Hasta**	**Valor**
61-44-101055218	Cumplimiento del contrato	08/08/2024	08/03/2025	$29.238.444,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	08/08/2024	08/11/2027	$29.238.444,00
	Calidad del servicio	08/08/2024	08/11/2029	$29.238.444,00
61-40-101020071	Predios labores y operaciones	08/08/2024	08/11/2024	$260.000.000
	Contratistas y subcontratistas	08/08/2024	08/11/2024	$260.000.000
	Vehículos propios y no propios	08/08/2024	08/11/2024	$260.000.000

Tabla 10 Pólizas contrato de interventoría

*Inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción.

- Según acta de inicio.

SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Fecha de expedición	12 noviembre 2024 (anexo 1 y 2)			
Póliza No.	**Amparos**	**Desde**	**Hasta**	**Valor**
61-44-101055218	Cumplimiento del contrato	31/10/2024	31/05/2025	$29.238.444,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	31/10/2024	31/01/2028	$29.238.444,00
	Calidad del servicio	31/10/2025	31/01/2030	$29.238.444,00
61-40-101020071	Predios labores y operaciones	31/10/2024	31/01/2025	$260.000.000

	Contratistas y subcontratistas	31/10/2024	31/01/2025	$260.000.000
	Vehículos propios y no propios	31/10/2024	31/01/2025	$260.000.000

Tabla 11 Actualización pólizas según acta de inicio de interventoría.

- Según acta de reinicio.

SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Fecha de expedición	20 febrero 2025 (anexo 3 y 4)			
Póliza No.	**Amparos**	**Desde**	**Hasta**	**Valor**
61-44-101055218	Cumplimiento del contrato	31/10/2024	30/06/2025	$29.238.444,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	31/10/2024	29/02/2028	$29.238.444,00
	Calidad del servicio	31/10/2025	31/01/2030	$29.238.444,00
61-40-101020071	Predios labores y operaciones	31/10/2024	28/02/2025	$284.700.000
	Contratistas y subcontratistas	31/10/2024	28/02/2025	$284.700.000
	Vehículos propios y no propios	31/10/2024	28/02/2025	$284.700.000

Tabla 12 Actualización pólizas según acta de reinicio de interventoría.

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 31 de enero y el 19 de febrero de 2025, el contratista de obra realizó las siguientes actividades:

Semana 10 – Del 31 de enero a 02 de febrero de 2025

Tramo La Sagrada Familia
Se inician la excavación mecánica, excavación manual para las vigas de confinamiento, corte y figurado de los aceros de refuerzo, adecuación manual de la base, instalación de formaleta y sellado de juntas.

Tramo Villa Karol Cra2 entre Calle 11 y 14, y Cra 3ª entre calle 11 y 12.
Se realiza la limpieza, retiro de escombros y sellado de juntas.

Intersección Cra. 4 Este con Calle 11

Se realiza el replanteo del abscisado, excavación mecánica, adecuación de vía alterna, demolición de pozos, losas y bordillos existentes, reparación de redes hidráulicas.

Tramo Zona Industrial
Se realiza el replanteo del abscisado, excavación mecánica, retiro de material de excavación, demolición de pozos existentes, reparación de redes hidráulica y compactación de subrasante.

Semana 11 – Del 03 a 09 de febrero de 2025

En esta semana se realiza el acta de mayores y menores cantidades.

Tramo La Sagrada Familia
Vaciado de concreto MR40, realce de pozo, corte y sellado de juntas.

Intersección Cra. 4 Este con Calle 11
Se realiza excavación mecánica con su respectiva disposición final, mejoramiento de subrasante con adición de material; suministro, instalación y compactación de base granular, reparación de redes hidráulicas, excavación manual para sardineles, instalación de sardineles, toma de densidades, instalación de formaletas, excavación manual para viga de confinamiento; corte, figurado e instalación de acero, vaciado de concreto MR 40 y corte para juntas de dilatación.

Tramo Zona Industrial
Se realiza excavación mecánica, retiro de material de excavación, reparación de redes hidráulica, mejoramiento y compactación de subrasante; suministro, instalación, cereado y compactación de base granular estabilizada con cemento. Además, el equipo de interventoría realiza la toma de muestra de la base granular para realizar especímenes y ensayos de resistencia.

Semana 12 – Del 10 a 16 de febrero de 2025

Tramo Zona Industrial
Se realiza la instalación de formaleta, adecuación manual del terreno a fundir, excavación manual para viga de confinamiento, corte e instalación de acero, vaciado de concreto MR42, corte para dilataciones, realce de pozos, excavación para rampas de acceso, instalación de formaleta para bordillos, suministro, instalación y compactación de base granular para rampas de acceso. En esta semana, las Empresas Públicas de Garzón realizan la intervención para instalar arranque de tubería de alcantarillado. Además, el equipo de interventoría realiza especímenes de vigas para ensayos de resistencia del pavimento MR42.

Semana 13 – Del 17 a 19 de febrero de 2025
Se realiza la instalación de formaleta para bordillos, suministro, instalación y compactación de base granular para rampas de acceso, vaciado de concreto MR 42 y MR40 para rampas y bordillos.

El equipo de interventoría realiza el ensayo de Proctor y toma de densidades para la base granular de los accesos a las bodegas. Además, realiza especímenes de vigas para ensayos de resistencia del pavimento MR42.

Se elabora el acta parcial No. 2

6.1. ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATISTA DE OBRA

6.1.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 31 de enero al 19 de febrero de 2025, el clima fue mayormente seco; se presentaron fuertes lluvias que no permitieron el desarrollo normal de las actividades en algunas jornadas. Se inicia la toma y realización de actas de cierre de vecindad.

Se realiza la localización y replanteo de los tramos a intervenir en conjunto con el equipo de interventoría, se replanteó y liberaron los ejes para que el contratista de obra realizara las secciones transversales y presentación de carteras de volúmenes de corte y relleno. Se intervienen los tramos de la Sagrada Familia, la intersección ubicada entre la Cra. 4 Este con Calle 11 y el tramo de la Zona industrial

A lo largo de este tiempo, se continuaron los trámites administrativos necesarios para la ejecución de la obra, se avanza en los planes de gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, así como el componente social.

6.1.2. PERSONAL DE CONTRATISTA DE OBRA

Se presentan los profesionales empleados en la ejecución de la obra – Contrato No. 00495

NOMBRE	PROFESIÓN	CARGO
Miguel Horacio Robles Guerrero	Ingeniero Civil, Magister en ingeniería de vías terrestres	Director de obra
Leonardo Andrés Ruiz Maldonado	Ingeniero Civil, Especialista en áreas afines.	Residente de Obra
Luz Karina Chamorro Bravo	Profesional en Salud Ocupacional	Residente SISO
Luisa Fernanda Guzmán Aragón	Ingeniero Civil, Especialista en ingeniería ambiental	Residente Ambiental
Karla Yuserli Molina Montes	Psicólogo o Trabajador Social	Residente Social
Ismael Rivera Perdomo	Técnico y/o tecnólogo en construcción y/o obras civiles	Inspector de obra

German David Castro Muñoz	Topógrafo tecnólogo en topografía.	Topógrafo
Carlos Herrán	No Aplica	Cadenero
Darío Vigoya Lara	No Aplica	Operador de Maquinaria
Ricardo Andrés Polo	No Aplica	Auxiliar de Residencia
Rogelio Carvajal	No Aplica	Ayudante de obra
Leonardo Molano	No Aplica	Ayudante de obra
Edwin Diaz	No Aplica	Ayudante de obra
John Gutiérrez	No Aplica	Ayudante de obra
Nelson Jiménez Roa	No aplica	Controlador vial
Edilzon Perdomo Olaya	No aplica	Vigilante
Héctor Angulo Vega	No aplica	Controlador Vial
Cristian Camilo Ramos	No aplica	Conductor volqueta
Andrés Profan	No aplica	Ayudante de obra
Yovani Muñoz	No aplica	Ayudante de obra
Wilson Arango Salcedo	No aplica	Ayudante de obra
Luis Alejandro Suárez	No aplica	Ayudante de obra

Tabla 13 Personal contratista de obra.

En el periodo del presente informe el contratista de obra sólo tiene vinculados 7 profesionales como mano de obra calificada, un operador de maquinaria, un conductor de volqueta, un auxiliar de residencia, un cadenero y 11 personas como mano de obra no calificada.

6.1.3. AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS Y ACUMULADAS DEL CONTRATO

En constancia de la programación y avance físico del contrato de obra, se adjunta la siguiente gráfica que contiene el control de programación del proyecto en ejecución. Por consiguiente, se presentan los valores ejecutados a corte de 19 febrero de 2025.

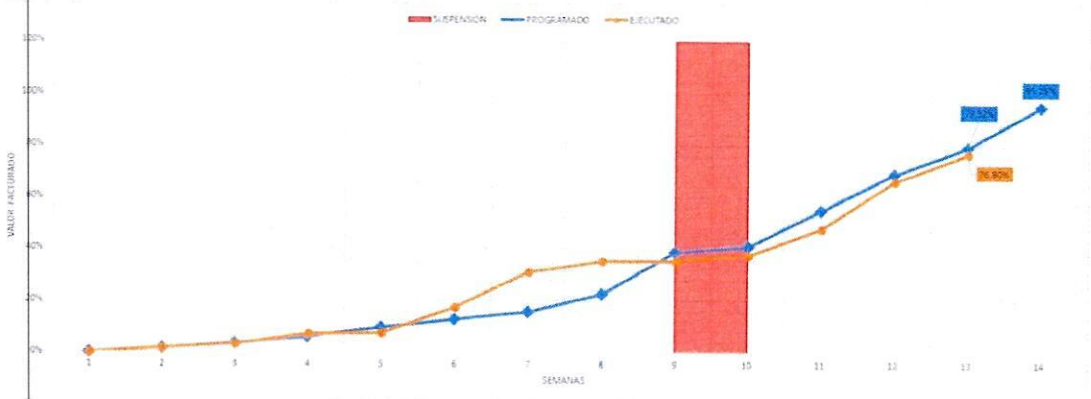


Ilustración 6 Control de programación acumulado.

Como se observa, durante el periodo del presente informe se registra un atraso del 2.72%. Si bien se han ejecutado trabajos de manera simultánea, las condiciones climáticas han afectado el desarrollo normal de las actividades, generando retrasos y retrabajos.

6.1.4. CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. PARCIAL	CANT. ACUMULADA
1	**EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA**			
1.1	EXCAVACION MECANICA (CAJEO DE LA VIA), NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION NI DISPOSICION FINAL DEL MISMO.	M3	1,204.88	1,907.48
1.2	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL SIN CLASIFICAR, NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION NI DISPOSICION FINAL DEL MISMO.	M3	1.48	7.32
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LA EXCAVACION A DISPOSICION FINAL PARA DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000 ML).	M3-KM	7,633.39	11,160.13
2	**ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO**			
2.1	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M2	75.33	76.25
2.2	BASE TRATADA CON CEMENTO RESISTENCIA R-3.5 (INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO).	M3	210.54	310.96
2.3	PAVIMENTO RIGIDO MR-4,0 , JUNTAS DE DILATACION SELLADAS, TEXTURIZADAS, PASADORES TRANSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIAMETRO 35 CM, ESPACIADOS CADA 30 CM Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIAMENTRO LONGITUD 85 CM SEPARADOS 1,20 M CURADO CON ANTISOL.	M3	15.24	270.75
2.4	PAVIMENTO RIGIDO MR-4,2 , JUNTAS DE DILATACION SELLADAS, TEXTURIZADAS, PASADORES TRANSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIAMETRO 35 CM, ESPACIADOS CADA 30 CM Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIAMENTRO LONGITUD 85 CM SEPARADOS 1,20 M CURADO CON ANTISOL	M3	253.09	280.39
2.5	ACERO DE 1/2 " DE DIAMETRO SEPARADAS CADA 0,25 M PARA LOSAS IRREGULARES	KG	4,977.94	6,034.02
2.6	CANASTILLA PARA BARRA PASAJUNTAS	ML	253.8	551.8
2.7	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,20X0,20 PARA BOCACALLES	M3	2.24	2.94
2.8	BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA TRANSICION ENTRE LOSA DE CONCRETO Y PAVIMENTO EXISTENTE.	M3	28.64	28.64
2.9	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO DE 0,16X0,45X1,00 METRO INCLUYE LA PREPARACION DE SUPERFICIE DE APOYO	ML	15.35	159.66

2.10.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR CLASE C TIPO INV 330-13. INCLUYE COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RECIBO POR PARTE DE LA ENTIDAD	M3	35.55	151.33
2.11.	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	1,389.05	2,819.22
2.12.	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000 ML)	M3-KM	20,384.59	39,496.80
3	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**			
3.1	NIVELACION DE POZOS	UN	6	9.00
3.2	CONEXION DOMICILIARIA ACUEDUCTO EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE TUBERIA, COLLAR DE DERIVACION Y ACCESORIS DE CONEXIÓN. LONGITUD PROMEDIO 4 ML	UN	24	42.00
3.3	EXCAVACIONES VARIAS	M3	58.81	59.51
4	**SEÑALIZACION**			
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES	UND	0.00	0.00
4.2	LINEAS DE DEMARCACION DE 12 CM, ACRILICABASE SOLVENTE INCLUYE MICRO ESFERA	ML	0.00	0.00
4.3	IMPRIMANTE DE 12 CM	ML	0.00	0.00
-	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	%	92	$20'127,606.50

Tabla 14 Cantidades ejecutadas.

6.2. ASPECTOS TÉCNICOS DE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

6.2.1. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el período transcurrido entre el 31 de enero y el 19 de febrero de 2025, la interventoría realizó las siguientes actividades:

- Acompañamiento y verificación del replanteo topográfico de los tres tramos, realizado por el contratista de obra.
- Seguimiento y control al contratista de obra, en los diferentes aspectos relacionados al área técnica, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo.
- Seguimiento en aspectos técnicos del pavimento, vaciado de concreto, espesor de placa, modulación, instalación de aceros de amarre, dovelas, canastillas y aceros para losas irregulares.

- Seguimiento al control del estado del tiempo, personal técnico y operativo, equipos, materiales y maquinaria en el sitio de obra.

- Revisión de afiliaciones al personal operativo vinculado al proyecto. Asimismo, se hizo acompañamiento a las actividades de inducción, capacitaciones y charlas preoperacionales diarias.

- Diligenciamiento de bitácora.

6.2.2. PERSONAL DE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta los profesionales empleados en la ejecución del contrato de interventoría No. 000415.

NOMBRE	PROFESIÓN	CARGO
Carlos Mauricio Pérez Castro	Ing. Civil o Ing. De Transportes y vías. Posgrado en Vías.	Director de Interventoría
Wilmer Rodrigo Passos Pérez	Ing. Civil Posgrado en Gerencia de Proyectos y/o Alta Gerencia	Profesional residente de Interventoría
Leidy Johanna Palacios Enciso	Profesional en Salud Ocupacional	Profesional SISO
Miller Manrique Saavedra	Topógrafo	Topógrafo
Joe Steban Tovar Quintero	No aplica	Cadenero
Carmen Elisa Cardoso Moreno	Ing. Civil	Inspector de interventoría
Ginna Lizeth Narváez Veloza	No aplica	Secretaria

Tabla 15 Personal contratista de interventoría.

7. INFORMACIÓN FINANCIERA

7.1. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente informe, se relaciona la información referente a los pagos realizados por la entidad contratante al contratista de obra, en la siguiente tabla.

No. ACTA	PERÍODO	VALOR PAGADO	% PAGADO	VALOR ACUMULADO	% PAGADO ACUMULADO
1	31 OCT – 30 DIC	$ 401,199,838.60	**35.12%**	$ 401,199,838.60	**35.12%**

Tabla 16 Relación de pagos contrato de obra

VALOR DEL CONTRATO			**$1.142.501.487,32**	
PERIODO	PESO (%)		CANTIDAD ($)	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
31 OCT – 30 NOV	7.38%	7.38%	$ 84,300,910.98	$ 84,300,910.98
1 DIC – 30 DIC	27.74%	35.12%	$ 316,898,927.02	$ 401,199,838.60
31 ENE – 19 FEB	41.68%	76.80%	$ 476,241,456.85	$ 877,441,295.45

EN VERDE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

Tabla 17 Porcentaje y valor ejecutado

7.2. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha del presente informe, la entidad contratante ha realizado el desembolso del acta parcial No. 1 por un valor de $51.167.277 a la interventoría. A continuación, se relaciona en la siguiente tabla, los recursos invertidos por la interventoría durante la ejecución del contrato.

PERIODO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	VALOR ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
31 OCT – 30 NOV	$ 10,786,977.03	7.38%	$ 10,786,977.03	7.38%
1 DIC – 30 DIC	$ 40,549,756.98	27.74%	$ 51,336,734.01	35.12%
31 ENE – 19 FEB	$60,938,890.95	41.68%	$ 112,275,624.96	76.80%

Tabla 18 Relación de avance contrato de interventoría

8. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

En el periodo comprendido entre el 31 de octubre de 2024 y el 19 de febrero de 2025, se presenta el siguiente control de programación para el contrato de obra:

	% PROGRAMADO	%EJECUTADO
AVANCE FÍSICO ACUMULADO: 31 DE OCTUBRE DE 2024 A 19 DE FEBRERO DE 2025	79.52%	76.80%

Tabla 19 Avance físico

Se presenta un avance del 76.80% y un porcentaje de programación acumulada de 79.52%; al finalizar el periodo del presente informe, se presenta una ejecución inferior a lo programado en un 2.72%. Lo anterior obedece a que las actividades han sido afectadas por lluvias, disminuyendo el desarrollo normal de actividades.

	$ PROGRAMADO	$ PAGADO
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 31 DE OCTUBRE DE 2024 A 19 DE FEBRERO DE 2025	$ 908,549,568.08	$ 401,199,838.60

Tabla 20 Avance financiero

Anexo 1 acta y memoria de cantidades.

9. CONTROL DE CALIDAD

9.1. CERTIFICADOS DE CALIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

En este periodo se presentan las fichas técnicas de los concreto con MR 40 y 42

9.2. CONTROL DE CALIDAD RESULTADOS DE LABORATORIO

En este periodo se ha realizado el control de la base granular y base granular estabilizada, como se evidencia en la siguiente tabla. Además, ensayos de resistencia de los concretos fundidos

SOLICITANTE	FECHA	ENSAYO	TRAMO
INTERVENTORÍA	05/02/2025	DENSIDAD (CONO Y ARENA)	INTERSECCIÓN ENTRE CRA. 4 ESTE Y CALLE 11
INTERVENTORÍA	06/02/2025	FALLO MUESTRAS DE BEC	ZONA INDUSTRIAL
INTERVENTORÍA	11/02/2025	VIGAS MR 42	ZONA INDUSTRIAL
INTERVENTORÍA	17/02/2025	DENSIDAD (CONO Y ARENA)	ZONA INDUSTRIAL
INTERVENTORÍA	19/02/2025	VIGAS MR 42	ZONA INDUSTRIAL

Tabla 21 Control de calidad, laboratorios de suelo.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ilustración 7 Adecuación manual de la base granular, excavación manual para vigas de confinamiento e instalación de acero. La Sagrada Familia



Ilustración 8 Realce de pozo y vaciado de concreto MR40 Sagrada Familia

TRAMO:	SAGRADA FAMILIA	TRAMO:	SAGRADA FAMILIA
DESCRIPCIÓN:	Excavación manual e instalación de acero del tramo de la Sagrada Familia sobre el K0+007	DESCRIPCIÓN:	Realce de pozo, vaciado de concreto MR40.



Ilustración 9 Corte de dilatación Sagrada Familia



Ilustración 10 Excavación mecánica intersección Cra. 4 Este y Calle 11.

TRAMO:	SAGRADA FAMILIA	**TRAMO:**	INTERSECCIÓN CRA. 4ESTE CALLE 11
DESCRIPCIÓN:	Corte para dilataciones	**DESCRIPCIÓN:**	Excavación mecánica



Ilustración 11 Espesor losa de la intersección Cra. 4 Este y Calle 11.

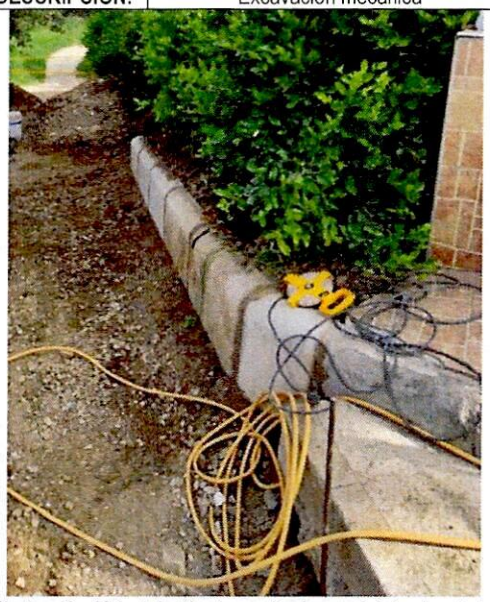


Ilustración 12 Instalación de sardineles prefabricados de la intersección Cra. 4 Este y Calle 11.

TRAMO:	INTERSECCIÓN CRA. 4ESTE CALLE 11	**TRAMO:**	INTERSECCIÓN CRA. 4ESTE CALLE 11
DESCRIPCIÓN:	Vaciado de concreto MR40	**DESCRIPCIÓN:**	Instalación de sardineles



Ilustración 13 Mejoramiento y compactación de base granular, instalación de acero para vigas de confinamiento y realce de pozo intersección Cra. 4 Este y Calle 11.



Ilustración 14 Demolición de placas deterioradas intersección Cra. 4 Este y Calle 11.

TRAMO:	INTERSECCIÓN CRA. 4ESTE CALLE 11	**TRAMO:**	INTERSECCIÓN CRA. 4ESTE CALLE 11
DESCRIPCIÓN:	Mejoramiento y compactación de base granular.	**DESCRIPCIÓN:**	Demolición de placas



Ilustración 15 Adecuación del terreno manual



Ilustración 16 Fundición de pavimento intersección Cra. 4 Este Calle 11

TRAMO:	INTERSECCIÓN CRA. 4ESTE CALLE 11	**TRAMO:**	INTERSECCIÓN CRA. 4ESTE CALLE 11
DESCRIPCIÓN:	Adecuación del terreno, instalación de acero par vigas de confinamiento	**DESCRIPCIÓN:**	Fundición



Ilustración 17 Armado losas irregulares.



Ilustración 18 Excavación mecánica

TRAMO:	INTERSECCIÓN CRA. 4ESTE CALLE 11	**TRAMO:**	ZONA INDUSTRIAL
DESCRIPCIÓN:	Armado de losas irregulares sobre la calle 11.	**DESCRIPCIÓN:**	Excavación mecánica

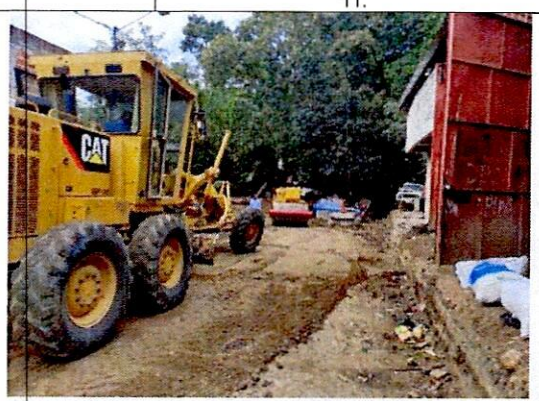


Ilustración 19 Cereo y compactación de base estabilizada con cemento.

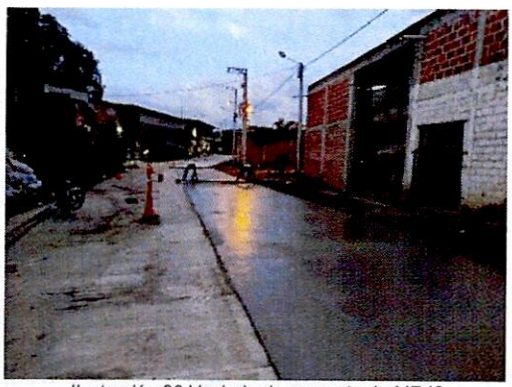


Ilustración 20 Vaciado de concreto de MR42

TRAMO:	ZONA INDUSTRIAL	**TRAMO:**	ZONA INDUSTRIAL
DESCRIPCIÓN:	Instalación de base estabilizada con cemento	**DESCRIPCIÓN:**	Concreto MR 42



Ilustración 21 Armado de losas irregulares.



Ilustración 22 Armado de losas irregulares.

TRAMO:	ZONA INDUSTRIAL
DESCRIPCIÓN:	Instalación de acero de refuerzo para losa irregulares.

TRAMO:	ZONA INDUSTRIAL
DESCRIPCIÓN:	Instalación de acero de refuerzo para losa irregulares.



Ilustración 23 Canastilla para soporte de dovelas.



Ilustración 24 Demolición de pozos existentes

TRAMO:	ZONA INDUSTRIAL
DESCRIPCIÓN:	Canastillas para soporte de dovelas.

TRAMO:	ZONA INDUSTRIAL
DESCRIPCIÓN:	Demolición de pozo existentes

11. SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SOCIAL Y AMBIENTAL

11.1. SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No 2.

La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente representa una de las herramientas de gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella su competitividad. Esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y estimule en todo momento la creación de una cultura en Seguridad y salud en el Trabajo que debe estar sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento de los procesos y puestos de trabajo, productividad, desarrollo del talento humano y la reducción de los costos operacionales.

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST está orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones.

11.1.1. EXAMENES MEDICOS DE INGRESO

Los exámenes médicos de ingreso se realizan al personal preseleccionado que haya cumplido con el perfil del cargo y se llevan a cabo teniendo en cuenta los factores de riesgo a los que estarán expuestos los trabajadores, para este periodo se realizaron tres exámenes de ingreso al personal de obra.

11.1.2. AFILIACIONES

Todo trabajador que el resultado del certificado médico laboral de ingreso registró concepto "Sin restricciones para el Cargo" se afilió a la administradora de riesgos laborales, salud y fondo de pensión como a la Caja de Compensación Familiar con el fin de brindar respaldo en caso de presentarse alguna situación anormal dentro de los frentes de trabajo, se verifica la afiliación del personal en campo.

11.1.3. RELACIÓN DE PERSONAL – PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

Relación de pago de planillas del contratista:

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	PLANILLA No.
Miguel Horacio Robles Guerrero	Director de obra	30%	9481808999
Leonardo Andrés Ruiz Maldonado	Residente de Obra	100%	9482965248
Luz Karina Chamorro Bravo	Residente SISO	50%	9482965248

Luisa Fernanda Guzman Aragon	Residente Ambiental	50%	8635273299
Karla Yuserli Molina Montes	Residente Social	50%	9482965248
Ismael Rivera Perdomo	Inspector de obra	100%	9482965248
German David Castro Muñoz	Topografo	100%	9482965248
Ricardo Andres Polo	Auxiliar de Residencia	-	9482965248
Nelson Jimenez Roa	Controlador Vial		9482965248
Edilson Andres Perdomo	Vigilante		9482965248
Darío Vigoya Lara	Operador de Maquinaria		9482965248
Rogelio Carvajal	Ayudante de obra		9482965248
Andres Relipe Perafan	Ayudante de obra		9482965248
Leonardo Andres Molano	Ayudante de obra		9482965248
Yovani Muñoz	Ayudante de obra		9482965248
Edwin Diaz	Ayudante de obra		9482965248
John Gutierrez	Ayudante de obra		9482965248
Hector Angulo Vega	Controlador Vial		9482965248
Cristian Camilo Ramos	Ayudante de obra		9482965248
Wilson Arango Salcedo	Ayudante de obra		9482965248
Luis Alejandro Suarez	Ayudante de obra		9482965248

Tabla 20. Personal contratista de obra.

En el **Anexo 2** se adjuntan las planillas del contratista.

Relación de pago de planillas de interventoría:

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	PLANILLA No.
Carlos Mauricio Pérez Castro	Director de Interventoría	30%	9482684314
Wilmer Rodrigo Passos Pérez	Profesional residente de Interventoría	100%	9482684314
Leidy Johanna Palacios Enciso	Profesional SISO	100%	9482684314
Miller Manrique Saavedra	Topógrafo	100%	9482684314
Joe Steban Tovar Quintero	Cadenero	100%	9482684314
Wladimir Abdon Murillo Losada	Inspector de interventoría	100%	9482684314
Ginna Lizeth Narváez Veloza	Secretaria	100%	9482684314

Tabla 21. Personal contratista de Interventoría.

En el **Anexo 3** se adjunta las planillas de la interventoría.

11.1.4. INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La inducción es el proceso inicial por medio del cual se proporcionará al nuevo empleado la información básica que le permita integrarse rápidamente al lugar de trabajo.

Durante el periodo el 31 de enero al 19 de febrero de 2025 se verifican las inducciones del personal de la obra, estas son anexas como soporte en el informe del contratista.

11.1.5. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se hace entrega de dotación y elementos de protección personal a cada persona que se vincule con base en la matriz de elementos de protección personal por actividad estipulada dentro del Sistema de Gestión Integrado de la empresa.

Para este periodo se verifica la entrega de EPP al personal operativo y administrativo tanto de obra como de interventoría.

11.1.6. CHARLAS SISO

Con el propósito de sensibilizar en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo necesarios para desempeñar las actividades en forma eficiente, segura y cumpliendo con los estándares de seguridad, se realizaron charlas pre-operacionales en cada uno de los frentes de trabajo, para este periodo el contratista realizó las siguientes charlas:

FECHA	TEMA
06/02/2025	Pausas activas
13/02/2025	Inspecciones
18/02/2025	Motivación para la Salud y el trabajo

Tabla 22. 22 Relación charlas y capacitaciones Febrero 2025

11.1.7. CONTROL DE VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y MAQUINARIA AMARILLA

Se manejarán vehículos pesados y maquinaria amarilla para dar continuidad a la ejecución de las actividades de obra. Los equipos, maquinaria y vehículos utilizados en obra, se recepcionará la documentación y se revisará su vigencia.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MARCA	LINEA	CAPACIDAD Y/O POTENCIA	NUMERO DE SERIAL O PLACA	AÑO DE FABRICACIÓN Y/O MODELO
VOLQUETA DOBLE TROQUE	INTERNACIONAL	WORKSTAR 7600 SBA	16.500 KG/PSJ	THR 903	2014

VOLQUETA DOBLE TROQUE	INTERNACIONAL	7600 SBA	16.580 KG/PSJ	SZS 298	2013
VIBROCOMPACTADOR	HYPAC	C840C	12 TON	9015808611452	2006
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOL RAND	SD 70D	7 TON	16632	REPOTENCIADO/2010
RETROCARGADOR	CASE	580N	85 HP	JJGN58NRPKC7615	2019
RETROCARGADOR	CASE	580SN	97 HP	JJGN58SRCJC7544D	2018
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	12H	145 HP	CAT0012HAAMZ00862	2006
VIBROCOMPACTADOR	POWERPRO	N/A	6 HP	N/A	2018
MOTONIVELADORA	CATERPILAR	12H	145 HP	CAT0012HAAMZ0662	2006

Tabla 23. Vehículos livianos, pesados y maquinaria amarilla en obra.

11.1.8. ACCIDENTES E INCIDENTES

Durante el periodo comprendido entre el 31 de enero al 19 de febrero de 2025, no se reportan accidentes o incidentes laborales.

11.2. SEGUIMIENTO SOCIAL DE LA INTERVENTORIA No. 2.

11.2.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El municipio del Garzón se encuentra ubicado en la región central del departamento del Huila al suroccidente colombiano, entre el valle del Río Magdalena y el Macizo de Garzón, más exactamente entre las Cordilleras Central y Oriental, su cabecera municipal está localizada a los 02°11'45" de latitud norte y 75°37'47" de longitud oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 830 msnm y de acuerdo a la localización de planchas en que se encuentra dividido el territorio nacional, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO DEL HUILA



MUNICIPIO DE GARZÓN



Ilustración 25 Ubicación espacial del proyecto.

11.2.2. PUNTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD

El contratista de obra tiene como punto de atención a la comunidad la oficina ubicada en la carrera 7 No. 9 – 47 casa 1 Garzon Huila, cuenta con correo electrónico consorcioingevialgarzon24@gmail.com , el horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.

11.2.3. REUNION DE SOCIALIZACION DE INICIO

Se realizó reunión de socialización del proyecto el día 01 de octubre de 2024 que contó con la participación de la comunidad del área de influencia del proyecto.

11.2.4. CONFORMACION DE VEEDURIA CIUDADANA

Durante este periodo se realizó la conformación de la veeduría ciudadana, a continuación, se relaciona la tabla de la conformación.

NOMBRE	CEDULA	TELEFONO	DIRECCION	CORREO
Ever Triviño Calderon	12.191.452	3115711755	Calle 13ª casa 64	N/A
Wilson Ardila España	12.195.644	3107985480	Manzana 5, Lote 2	s.p5.21@hotmail.com
Alexander Ortiz Murcia	12.202.491	3138481074	Diagonal 11 No. 4E-98	N/A
Carlos Andres Martinez Manjarrez	1.077.855.292	3123350886	Zona Industrial	N/A

Tabla 234 Comité veedor

11.2.5. CONTRATACION DEL PERSONAL

Teniendo en cuenta los procesos de selección y contratación de personal, el contratista realizó la recepción de las hojas de vida de acuerdo a los requerimientos en obra, posteriormente se realizó la evaluación y vinculación, durante este periodo se llevó a cabo la vinculación del personal profesional y técnico requerido, para este periodo se realizó la contratación de acuerdo al avance de actividades de mano de obra no calificada del AID.

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
Miguel Horacio Robles Guerrero	Director de obra	30%

Leonardo Andrés Ruiz Maldonado	Residente de Obra	100%
Luz Karina Chamorro Bravo	Residente SISO	50%
Luisa Fernanda Guzman Aragon	Residente Ambiental	50%
Karla Yuserli Molina Montes	Residente Social	50%
Ismael Rivera Perdomo	Inspector de obra	100%
German David Castro Muñoz	Topografo	100%
Ricardo Andres Polo	Auxiliar de Residencia	-
Nelson Jimenez Roa	Controlador Vial	
Edilson Andres Perdomo	Vigilante	
Darío Vigoya Lara	Operador de Maquinaria	
Rogelio Carvajal	Ayudante de obra	
Andres Relipe Perafan	Ayudante de obra	
Leonardo Andres Molano	Ayudante de obra	
Yovani Muñoz	Ayudante de obra	
Edwin Diaz	Ayudante de obra	
John Gutierrez	Ayudante de obra	
Hector Angulo Vega	Controlador Vial	
Cristian Camilo Ramos	Ayudante de obra	
Wilson Arango Salcedo	Ayudante de obra	
Luis Alejandro Suarez	Ayudante de obra	

Tabla 245 Relación personal contratista de obra

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
Carlos Mauricio Pérez Castro	Director de Interventoría	30%
Wilmer Rodrigo Passos Pérez	Profesional residente de Interventoría	100%
Leidy Johanna Palacios Enciso	Profesional SISO	100%
Miller Manrique Saavedra	Topógrafo	100%
Joe Steban Tovar Quintero	Cadenero	100%
Carmen Elisa Cardoso Moreno	Ing. Civil	100%
Ginna Lizeth Narváez Veloza	Secretaria	100%
Andres Tovar	Inspector de Interventoria 2	100%

Tabla 256 Relación personal contratista de Interventoría

11.3. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA No. 2.

11.3.1. ACCIDENTES E INCIDENTES

Durante el periodo comprendido entre el 31 de enero y el 19 de febrero de 2025, no se reportan accidentes o incidentes laborales.

11.3.2. CAMPAMENTO DE OBRA

Dentro de las instalaciones temporales para el proyecto se cuenta con lote localizado en el Kilómetro 1 de la vía Garzón 3 El Agrado de propiedad del señor Fernando Jiménez Roa, dicho lote se utiliza como sitio de acopio de materiales, bodega y campamento.

11.3.3. OFICINA

El contratista de obra tiene la oficina ubicada en la carrera 7 No. 9 – 47 casa 1 Garzón Huila, cuenta con correo electrónico consorcioingevialgarzon24@gmail.com , el horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.

11.3.4. CANTERAS

El contratista de obra cuenta con los siguientes proveedores:
Para el suministro de agua para la obra se cuenta con el apoyo y certificación correspondiente de empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado del municipio de Garzón Huila EMPRESAS PUBLICAS DE GARZÓN- EMPUGAR E.S.P.

Se cuenta para el suministro de material pétreo con empresa debidamente certificada y legalmente constituida EMPRESA AGROECOLOGICA Y DE GESTION BIOGESTION SAS, que se acredita en calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales. La Agencia Nacional de Minería certifica que permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos mediante inscripción del Registro único RUCOM.
Se cuenta con proveedor para concreto prefabricado debidamente certificada y legalmente constituida HORMIGONES DEL HUILA SAS.

No.	TIPO DE PERMISO	No. DE PERMISO	ENTIDAD OTORGANTE	MEDIDA DE COMPENSATORIA	% AVANCE	OBSERVACIONES
1	Suministro de agua para la obra	Certificación	EMPUGAR E.S.P.	N/A	N/A	
2	Suministro de material petreo	RUCOM EMPRESA AGROECOLOGICA Y DE GESTION BIOGESTION SAS	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	N/A	N/A	

3		Suministro de concreto	Certificación HORMIGONES DEL HUILA SAS	HORMIGONES DEL HUILA SAS	N/A	N/A	
4		Certificación RCD	Certificación	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE GARZON	N/A	N/A	

Tabla 267 Relación Permisos y Autorizaciones

11.3.5. MANEJO DE RESIDUOS

Para manejo de residuos sólidos en los frentes de obra se ubica punto ecológico para separación en la fuente de los residuos generados. Se coordina INTERASEO, la respectiva recolección de estos residuos sólidos convencionales generados.
Por otra parte, en este periodo no se entregaron residuos peligrosos, debido a que no se han generado en obra este tipo de residuos.

11.3.6. MANEJO DE RESIDUOS DE ESCOMBROS

Para la disposición de residuos de construcción y demolición RCD se cuenta con sitio ubicado en el lote 11 de la vereda Guacanas certificado por EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATICO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE GARZÓN.

11.3.7. MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIALES

Teniendo en cuenta que la obra se desarrolla en el área urbana del municipio de Garzón, el CONSORCIO INGEVIAL GARZÓN 24 cuenta con autorización de propietarios de viviendas para el uso de baños para los trabajadores, para el presente periodo se cuenta con permiso escrito en la vivienda del señor JOSE LUIS SANCHEZ ARTEAGA ubicada en la manzana Z casa 17 del barrio villa Karol.

11.3.8. CHARLAS Y CAPACITACIONES

Durante este periodo el contratista de obra realiza las capacitaciones programadas según su cronograma de actividades, la interventoría verifica la ejecución de estas actividades.

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

12.1. CONCLUSIONES

Se realiza la localización y replanteo de los tramos a intervenir en conjunto con el equipo de interventoría, se replanteó y liberaron los ejes para que el contratista de obra realizara las secciones transversales y presentación de carteras de volúmenes de corte y relleno. Se intervienen los tramos de la Sagrada Familia, la intersección ubicada entre la Cra. 4 Este con Calle 11 y el tramo de la Zona industrial.

Se realiza la instalación de formaleta para bordillos, suministro, instalación y compactación de base granular para rampas de acceso, vaciado de concreto MR 42 y MR40 para rampas y bordillos.

12.2. RECOMENDACIONES

Se le recomienda al contratista, aumentar las cuadrillas de mano de obra no calificada con el fin de recuperar el atraso presentado y evitar que aumente en el siguiente periodo.

Adelantar los trámites administrativos ante la Agencia Nacional de Infraestructura para realizar el empalme de la pavimentación de la zona industrial con la ruta 45HLB.

INGES GROUP

NIT: 800.086.627-9

ANEXO 1.
ACTA Y MEMORIA DE CANTIDADES

Calle 6c No. 24ª-53 Barrio: La Gaitana – Cel: 3043502527
Neiva / Huila / Colombia
Email: Ingespotrerillos@gmail.com

INGES GROUP

ACTA PARCIAL No.2

MUNICIPIO DE GARZÓN

DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24 R/L. FERNANDO JIMENEZ ROA	CONTRATO No.	495 de 2024
INTERVENTOR:	INGES GROUP SAS R/L. LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO	VR CONTRATO INICIAL:	$ 1,142,502,487.32
SUPERVISOR	CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS	VR. ANTICIPO (40%)	$ 0
FECHA DE INICIO	31/10/2024	VR.MODIFICACION	N/A
PLAZO INICIAL	3 meses	VR. VIGENTE:	$ 0
SUSPENSION No. 1	31/12/2024	VR. EJECUTADO	$ 877,441,295.45
REINICIO No. 1	31/01/2025	VR. PRESENTE ACTA	$ 476,241,456.85
SUSPENSION No. 2	20/02/2025		

ACTA PARCIAL No.2

ACTA No.	2	Parcial	X
		Final	
Hoja	1	de	2

Fecha Acta	Mes	Día	Año
	FEBRERO	19	2025

CONDICIONES VIGENTES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 1 (03-Feb-2025)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	Vr.UNIT	V. TOTAL	EJECUTADAS PRESENTE ACTA		ACUMULADAS	
						CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA								
1.1	EXCAVACION MECANICA (CAJEO DE LA VIA), NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION NI DISPOSICION FINAL DEL MISMO.	M3	1,944.24	$ 23,240.00	$ 45,184,137.60	1,204.88	$ 28,001,411.20	1,907.48	$ 44,329,835.20
1.2	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL SIN CLASIFICAR, NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION NI DISPOSICION FINAL DEL MISMO.	M3	7.32	$ 2,808.00	$ 20,554.56	1.48	$ 4,155.84	7.32	$ 20,554.56
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LA EXCAVACION A DISPOSICION FINAL PARA DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000 ML).	M3-KM	11,712.83	$ 2,443.00	$ 28,614,443.69	7,633.39	$ 18,648,371.77	11,160.13	$ 27,264,197.59
SUBTOTAL					$ 73,819,135.85		$ 46,653,938.81		$ 71,614,587.35
2	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO								
2.1	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M2	76.25	$ 7,310	$ 557,387.50	75.33	$ 550,662.30	76.25	$ 557,387.50
2.2	BASE TRATADA CON CEMENTO RESISTENCIA R-3.5 (INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO).	M3	322.22	$ 193,236	$ 62,264,503.92	210.54	$ 40,683,907.44	310.96	$ 60,088,666.56
2.3	PAVIMENTO RIGIDO MR-4,0 , JUNTAS DE DILATACION SELLADAS, TEXTURIZADAS, PASADORES TRANSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIAMETRO 35 CM, ESPACIADOS CADA 30 CM Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIAMENTRO LONGITUD 85 CM SEPARADOS 1,20 M CURADO CON ANTISOL	M3	270.75	$ 1,020,552	$ 276,314,454.00	15.24	$ 15,553,212.48	270.75	$ 276,314,454.00
2.4	PAVIMENTO RIGIDO MR-4,2 , JUNTAS DE DILATACION SELLADAS, TEXTURIZADAS, PASADORES TRANSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIAMETRO 35 CM, ESPACIADOS CADA 30 CM Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIAMENTRO LONGITUD 85 CM SEPARADOS 1,20 M CURADO CON ANTISOL	M3	301.98	$ 948,157	$ 286,324,450.86	253.09	$ 239,969,055.13	280.39	$ 265,853,741.23
2.5	ACERO DE 1/2 " DE DIAMETRO SEPARADAS CADA 0,25 M PARA LOSAS IRREGULARES	KG	7,018.77	$ 7,315	$ 51,342,302.55	4,977.94	$ 36,413,631.10	6,034.02	$ 44,138,856.30
2.6	CANASTILLA PARA BARRA PASAJUNTAS	ML	609.40	$ 21,620	$ 13,175,228.00	253.80	$ 5,487,156.00	551.80	$ 11,929,916.00
2.7	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0.20X0.20 PARA BOCACALLES	M3	3.57	$ 973,372	$ 3,474,938.04	2.24	$ 2,180,353.28	2.94	$ 2,861,713.68
2.8	BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA TRANSICION ENTRE LOSA DE CONCRETO Y PAVIMENTO EXISTENTE.	M3	57.25	$ 839,233	$ 48,046,089.25	28.64	$ 24,035,633.12	28.64	$ 24,035,633.12
2.9	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO DE 0,16X0,45X1,00 METRO INCLUYE LA PREPARACION DE SUPERFICIE DE APOYO	ML	159.66	$ 57,008	$ 9,101,897.28	15.35	$ 875,072.80	159.66	$ 9,101,897.28
2.10.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR CLASE C TIPO INV 330-13, INCLUYE COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RECIBO POR PARTE DE LA ENTIDAD	M3	166.96	$ 116,944	$ 19,524,970.24	35.55	$ 4,157,359.20	151.33	$ 17,697,135.52
2.11.	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	2,917.56	$ 3,056	$ 8,916,063.36	1,389.05	$ 4,244,936.80	2,819.22	$ 8,615,536.32
2.12.	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000 ML)	M3-KM	80,680.40	$ 1,390	$ 112,145,750.20	20,384.59	$ 28,334,580.10	39,496.80	$ 54,900,552.00
SUBTOTAL					$ 891,188,035.20		$ 402,485,559.75		$ 776,095,489.51

ACTA PARCIAL No.2

MUNICIPIO DE GARZÓN

DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24 R/L. FERNANDO JIMENEZ ROA	CONTRATO No.	495 de 2024
INTERVENTOR:	INGES GROUP SAS R/L. LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO	VR CONTRATO INICIAL:	$ 1,142,502,487.32
SUPERVISOR	CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS	VR. ANTICIPO (40%)	$ 0
FECHA DE INICIO	31/10/2024	VR.MODIFICACION	N/A
PLAZO INICIAL	3 meses	VR. VIGENTE:	$ 0
SUSPENSION No. 1	31/12/2024	VR. EJECUTADO	$ 877,441,295.45
REINICIO No. 1	31/01/2025	VR. PRESENTE ACTA	$ 476,241,456.85
SUSPENSION No. 2	20/02/2025		

ACTA PARCIAL No.2

ACTA No.	2	Parcial	X
		Final	
Hoja	1	de	2

Fecha Acta	Mes	Día	Año
	FEBRERO	19	2025

CONDICIONES VIGENTES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 1 (03-Feb-2025)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	Vr.UNIT	V. TOTAL	EJECUTADAS PRESENTE ACTA		ACUMULADAS	
						CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA								
1.1	EXCAVACION MECANICA (CAJEO DE LA VIA), NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION NI DISPOSICION FINAL DEL MISMO.	M3	1,944.24	$ 23,240.00	$ 45,184,137.60	1,204.88	$ 28,001,411.20	1,907.48	$ 44,329,835.20
1.2	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL SIN CLASIFICAR, NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION NI DISPOSICION FINAL DEL MISMO.	M3	7.32	$ 2,808.00	$ 20,554.56	1.48	$ 4,155.84	7.32	$ 20,554.56
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LA EXCAVACION A DISPOSICION FINAL PARA DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000 ML).	M3-KM	11,712.83	$ 2,443.00	$ 28,614,443.69	7,633.39	$ 18,648,371.77	11,160.13	$ 27,264,197.59
SUBTOTAL					$ 73,819,135.85		$ 46,653,938.81		$ 71,614,587.35
2	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO								
2.1	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M2	76.25	$ 7,310	$ 557,387.50	75.33	$ 550,662.30	76.25	$ 557,387.50
2.2	BASE TRATADA CON CEMENTO RESISTENCIA R-3.5 (INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO).	M3	322.22	$ 193,236	$ 62,264,503.92	210.54	$ 40,683,907.44	310.96	$ 60,088,666.56
2.3	PAVIMENTO RIGIDO MR-4,0 , JUNTAS DE DILATACION SELLADAS, TEXTURIZADAS, PASADORES TRANSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIAMETRO 35 CM, ESPACIADOS CADA 30 CM Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIAMENTRO LONGITUD 85 CM SEPARADOS 1,20 M CURADO CON ANTISOL	M3	270.75	$ 1,020,552	$ 276,314,454.00	15.24	$ 15,553,212.48	270.75	$ 276,314,454.00
2.4	PAVIMENTO RIGIDO MR-4,2 , JUNTAS DE DILATACION SELLADAS, TEXTURIZADAS, PASADORES TRANSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIAMETRO 35 CM, ESPACIADOS CADA 30 CM Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIAMENTRO LONGITUD 85 CM SEPARADOS 1,20 M CURADO CON ANTISOL	M3	301.98	$ 948,157	$ 286,324,450.86	253.09	$ 239,969,055.13	280.39	$ 265,853,741.23
2.5	ACERO DE 1/2 " DE DIAMETRO SEPARADAS CADA 0,25 M PARA LOSAS IRREGULARES	KG	7,018.77	$ 7,315	$ 51,342,302.55	4,977.94	$ 36,413,631.10	6,034.02	$ 44,138,856.30
2.6	CANASTILLA PARA BARRA PASAJUNTAS	ML	609.40	$ 21,620	$ 13,175,228.00	253.80	$ 5,487,156.00	551.80	$ 11,929,916.00
2.7	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0.20X0.20 PARA BOCACALLES	M3	3.57	$ 973,372	$ 3,474,938.04	2.24	$ 2,180,353.28	2.94	$ 2,861,713.68
2.8	BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA TRANSICION ENTRE LOSA DE CONCRETO Y PAVIMENTO EXISTENTE.	M3	57.25	$ 839,233	$ 48,046,089.25	28.64	$ 24,035,633.12	28.64	$ 24,035,633.12
2.9	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO DE 0,16X0,45X1,00 METRO INCLUYE LA PREPARACION DE SUPERFICIE DE APOYO	ML	159.66	$ 57,008	$ 9,101,897.28	15.35	$ 875,072.80	159.66	$ 9,101,897.28
2.10.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR CLASE C TIPO INV 330-13. INCLUYE COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RECIBO POR PARTE DE LA ENTIDAD	M3	166.96	$ 116,944	$ 19,524,970.24	35.55	$ 4,157,359.20	151.33	$ 17,697,135.52
2.11.	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	2,917.56	$ 3,056	$ 8,916,063.36	1,389.05	$ 4,244,936.80	2,819.22	$ 8,615,536.32
2.12.	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000 ML)	M3-KM	80,680.40	$ 1,390	$ 112,145,750.20	20,384.59	$ 28,334,580.10	39,496.80	$ 54,900,552.00
SUBTOTAL					$ 891,188,035.20		$ 402,485,559.75		$ 776,095,489.51

Alcaldía municipal
Garzón

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N° 2

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATO No.	000495 de 2024	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24		

ITEM	1.1	EXCAVACION MECANICA (CAJEO DE LA VIA), NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION NI DISPOSICION FINAL DEL MISMO.	UNIDAD	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO	LOCALIZACION	VOLUMEN [M3]	OBSERVACIONES	TOTAL
 	DIAGONAL 11 ENTRE CRA4E Y DIG10	323.31		323.31
	INTERSECCIÓN CARRERA 4 ESTE CON CALLE 11	47.98		47.98
	CARRERA 2 ENTRE CALLES 11 Y 14	304.34		304.34
	CARRERA 3A ENTRE CALLES 11 Y 12	74.95		74.95
	CARRERA23A ENTRE CALLES 1 Y 2	1,156.90		1,156.90

OBSERVACIONES:
La excavación adicional del tramo de la Sagrada Familia es la que se encuentra al frente del edificio MELI, donde se presentan las losas irregulares.
En la cartera de la Cra 3A entre calles 11 Y 12 - VILLA KAROL, el Area del Item Empalme hace referencia al radio de giro definido en el el empalme con la calle 12.
El volumen de excavación de la Interseccion de la Cra 4 Este con Calle 11 corresponde al calculo aritmetico del area intervenida por la altura promedio del terreno excavado

TOTAL ACUMULADO	1,907.48
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	702.60
TOTAL POR COBRAR PRESENTE ACTA	1,204.88

LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 19202222845 CAU

WILMER RODRIGO PASSOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P. 70202136685 TLM

CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24	CÓDIGO:	WT-GR-01
	VERSIÓN:	1
	FECHA:	19/02/2025

CARTERAS DE VOLUMENES EXCAVACIÓN

CONTRATO:	495 DE 2024
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CAPITULO: EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

EXCAVACION MECANICA (CAJEO DE LA VIA), NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION NI DISPOSICION FINAL DEL MISMO.

DIAGONAL 11 ENTREA CRAS 4 Este y 5 Este - SAGRADA FAMILIA

ITEM	ABSCISA DEL PROYECTO	AREA	VOLUMEN	TOTAL DE VOLUMENES
0	0	2.87	0.00	0.00
1	K0+5	2.42	13.23	13.23
2	K0+15	3.23	28.28	41.51
3	K0+25	3.07	31.54	73.04
4	K0+35	3.36	32.19	105.23
5	K0+45	2.64	30.02	135.25
6	K0+55	3.06	28.49	163.74
7	K0+65	3.76	34.08	197.82
8	K0+75	3.05	34.00	231.82
9	K0+85	3.31	31.76	263.57
10	K0+95	3.39	33.50	297.07
11	K0+100.48	3.05	17.64	314.71
INTERSECCION K0+090 AL K0+100,48: 21,4*0,4			8.6	323.31
		TOTAL	**323.31**	

CARRERA 2 ENTRE CALLES 11 Y 14 - VILLA KAROL

ITEM	ABSCISA DEL PROYECTO	AREA	VOLUMEN	TOTAL DE VOLUMENES
0	0	2.55	0.00	0.00
1	K0+10	2.33	24.43	24.43
2	K0+20	2.15	22.40	46.84
3	K0+30	2.45	22.98	69.82
4	K0+40	2.48	24.65	94.47
5	K0+50	2.35	24.14	118.61
6	K0+60	1.90	21.24	139.85
7	K0+70	2.48	21.90	161.75
8	K0+80	1.55	20.16	181.90
9	K0+90	2.39	19.72	201.62
10	K0+100	2.18	22.84	224.46
11	K0+110	2.29	22.33	246.79
12	K0+120	2.32	23.06	269.85
13	K0+130	2.64	24.80	294.64
14	K0+133.89	2.35	9.70	304.34
		TOTAL	**304.34**	

CARRERA 3A ENTRE CALLES 11 Y 12 - VILLA KAROL

ITEM	ABSCISA DEL PROYECTO	AREA	VOLUMEN	TOTAL DE VOLUMENES
Empalme	K0+000	4.00	1.76	1.76
0	K0+000	1.97	1.76	1.76
1	K0+10	2.52	22.48	24.24
2	K0+20	1.84	21.82	46.06
3	K0+30	1.74	17.91	63.97
4	K0+35.92	1.97	10.99	74.95
		TOTAL	**74.95**	

CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24	CÓDIGO:	WT-GR-01
	VERSIÓN:	1
	FECHA:	19/02/2025

CARTERAS DE VOLUMENES EXCAVACIÓN

CONTRATO:	495 DE 2024
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CAPITULO: EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

EXCAVACION MECANICA (CAJEO DE LA VIA), NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION NI DISPOSICION FINAL DEL MISMO.

CARTERA DE V0LUMENES

CALLE 2 SUR ENTRE CRAS 23 Y 23A - CIUDADELA METALMECANICA

ABSCISA	A. CORTE (M2)	V. CORTE (M3)	EXCAVACION POR OTROS CONCEPTOS	
			DESCRIPCION	VOL. (M3)
0	0.00			
9.1	5.40	0.00		
20	7.05	67.85		
30	7.95	75.00		
40	8.70	83.25		
50	10.50	96.00		
54.1	10.35	42.74		
	SUB TOTAL	364.85		
	TOTAL	**364.8**		

CARTERA DE V0LUMENES

CARRERA 23A ENTRE CALLE 1 Y 2 SUR - CIUDADELA METALMECANICA

ABSCISA	A. CORTE (M2)	V. CORTE (M3)	EXCAVACION POR OTROS CONCEPTOS	
			DESCRIPCION	VOL. (M3)
0	9.15			
10	10.05	96.00	FALLO K0+07 AL K0+012: 5*0,4*4 LADO DERECHO	8.00
20	8.85	94.50	FALLO K0+18 AL K0+22: 4*0.6*8,5	20.4
30	6.75	78.00	FALLO K0+18 AL K0+22: 4*1.2*8,5	40.8
40	6.15	64.50		
50	5.40	57.75		
60	5.70	55.50		
70	6.90	63.00		
80	6.00	64.50		
90	6.75	63.75		
104.05	5.40	85.35		
	SUB TOTAL	722.85		69.2
	TOTAL	**792.1**		
VOLUMEN TOTAL EXCAVACION ZI		**1,156.90**		

GERMAN DAVID CASTRO MUÑOZ
TOPOGRAFO:
L.P 01-14357 CPNT

Alcaldía municipal
Garzón

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N° 2

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATO No.	000495 de 2024	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24		
ITEM 1.2	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL SIN CLASIFICAR, NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION NI DISPOSICION FINAL DEL MISMO.	UNIDAD	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO





LOCALIZACION	ANCHO [m]	LONG. [m]	ALTO [m]	OBSERVACIONES	TOTAL
DIAGONAL 11 ENTRE CRA4E Y DIG10 SAGRADA FAMILIA	0.45	3.47	0.24		0.37
	0.47	7.11	0.2		0.67
	0.37	4.34	0.24		0.39
	0.4	1	0.07		0.03
	0.37	4.3	0.2		0.32
	0.45	5.8	0.13		0.34
	0.45	8.05	0.13		0.47
	0.45	5.6	0.08		0.20
	0.45	5.39	0.18		0.44
	0.4	9.03	0.15		0.54
	0.4	1.85	0.18		0.13
	0.4	4.1	0.18		0.30
	0.4	15.22	0.14		0.85
	0.4	3.07	0.11		0.14
	0.4	19.24	0.04		0.31
	0.35	6.43	0.07		0.16
	0.40	16.31	0.03		0.20
INTERSECCIÓN CARRERA 4 ESTE CON CALLE 11 (M.D)	0.25	5.30	0.15		0.20
INTERSECCIÓN CARRERA 4 ESTE CON CALLE 11 (M.I)	0.25	10.05	0.15		0.38
CARRERA 3A ENTRE CALLES 11 Y 12	0.25	24.00	0.15		0.90

OBSERVACIONES:

TOTAL ACUMULADO	7.32
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	5.84
TOTAL POR COBRAR PRESENTE ACTA	1.48

LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 19202222845 CAU

WILMER RODRIGO PASSOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P. 70202136685 TLM

Alcaldía municipal
Garzón

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N° 2

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATO No.	000495 de 2024	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24		

ITEM	1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LA EXCAVACION A DISPOSICION FINAL PARA DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000 ML).	UNIDAD	M3-KM

REGISTRO FOTOGRÁFICO	LOCALIZACION	CANTIDAD (m3)	FACTOR DE EXPANSIÓN	DISTANCIA (KM)	OBSERVACIONES	TOTAL
 	DIAGONAL 11 ENTRE CRA4E Y DIG10 - E - INTERSECCIÓN CARRERA 4 ESTE CON CALLE 11	380.31	1.30	7.00		3,460.79
	CARRERA 2 ENTRE CALLES 11 Y 14	304.34	1.30	6.00		2,373.85
	CARRERA 3A ENTRE CALLES 11 Y 12	75.85	1.30	6.00		591.63
	CARRERA23A ENTRE CALLES 1 Y 2	1213.81	1.30	3.00		4,733.85

OBSERVACIONES:

TOTAL ACUMULADO	11,160.13
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	3,526.74
TOTAL POR COBRAR PRESENTE ACTA	7,633.39

LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 19202222845 CAU

WILMER RODRIGO PASSOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P. 70202136685 TLM

Alcaldía municipal
Garzón

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N° 2

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATO No.	~~000495 de 2024~~	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24		
ITEM 2.1	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	UNIDAD	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACION	ANCHO [m]	LONG. [m]	ALTO [m]	AREA [m2]	AREA TOTAL
DIAGONAL 11 ENTRE CRA4E Y DIG10 (M.I)	0.15	6.14		0.92	0.92
DIAGONAL 11 ENTRE CRA4E Y DIG10 (M.I)	1.23	6.15		7.56	7.56
INTERSECCION CARRERA 4 ESTE CON CALLE 11	0.40	2.25		0.90	0.90
	6.05	5.55		33.58	33.58
	6.05	1.00		6.05	6.05
CRRA 23A ENTRE CALLES 1 Y 2	1.80	1.80	0.25	3.24	3.24
			0.25	0.79	0.79
	2.50	2.50	0.30	6.25	6.25
			0.30	0.94	0.94
	2.50	2.50	0.25	6.25	6.25
			0.50	2.28	2.28
	2.30	2.30	0.25	5.29	5.29
			0.70	2.20	2.20

OBSERVACIONES:

TOTAL ACUMULADO	76.25
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	0.92
TOTAL POR COBRAR PRESENTE ACTA	75.33

LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 19202222845 CAU

WILMER RODRIGO PASSOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P. 70202136685 TLM

Alcaldía municipal Garzón	MEMORIA CANTIDADES DE OBRA	

ACTA PARCIAL Nº 2					
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATO No.	000495 de 2024	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.		
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24				
ITEM 2.2	BASE TRATADA CON CEMENTO RESISTENCIA R-3.5 (INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO).			UNIDAD	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO	LOCALIZACION	VOLUMEN [M3]	OBSERVACIONES	TOTAL
	CARRERA 2 ENTRE CALLES 11 Y 14	100.42	SEGÚN CARTERA TOPOGRAFICA	100.42
	CARRERA23A ENTRE CALLES 1 Y 2	210.55	SEGÚN CARTERA TOPOGRAFICA	210.55

OBSERVACIONES:

TOTAL ACUMULADO	310.96
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	100.42
TOTAL POR COBRAR PRESENTE ACTA	210.54

LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 19202222845 CAU

WILMER RODRIGO PASSOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P. 70202136685 TLM

CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24	CÓDIGO:	WT-GR-01
	VERSIÓN:	1
	FECHA:	19/02/2025

CARTERAS DE VOLUMENES EXCAVACIÓN

CONTRATO:	495 DE 2024
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CAPITULO: EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

BASE TRATADA CON CEMENTO RESISTENCIA R-3.5 (INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO).

CARRERA 2 ENTRE CALLES 11 Y 14 - VILLA KAROL

ITEM	ABSCISA DEL PROYECTO	AREA	VOLUMEN	TOTAL DE VOLUMENES
0	0	0.75	0.00	0.00
1	K0+10	0.75	7.50	7.50
2	K0+20	0.75	7.50	15.00
3	K0+30	0.75	7.50	22.50
4	K0+40	0.75	7.50	30.00
5	K0+50	0.75	7.50	37.50
6	K0+60	0.75	7.50	45.00
7	K0+70	0.75	7.50	52.50
8	K0+80	0.75	7.50	60.00
9	K0+90	0.75	7.50	67.50
10	K0+100	0.75	7.50	75.00
11	K0+110	0.75	7.50	82.50
12	K0+120	0.75	7.50	90.00
13	K0+130	0.75	7.50	97.50
14	K0+133.89	0.75	2.92	100.42
		TOTAL	**100.42**	

CARTERA DE VOLUMENES

CARRERA 23A ENTRE CALLE 1 Y 2 SUR - CIUDADELA METALMECANICA

ABSCISA	A. CORTE (M2)	V. CORTE (M3)	BASE ADICIONAL POR OTROS CONCEPTOS	
			DESCRIPCION	VOL. (M3)
0	1.26			
9.1	1.26	0.00		
20	1.26	13.73		
30	1.26	12.60		
40	1.26	12.60		
50	1.26	12.60		
54.1	1.26	5.17	INTERSECCIÓN TRAMOS K0+054.1	3.145
	TOTAL	**56.70**		**3.15**
	VOLUMEN TOTAL TRAMO	**59.85**		

CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24	CÓDIGO:	WT-GR-01
	VERSIÓN:	1
	FECHA:	19/02/2025

CARTERAS DE VOLUMENES EXCAVACIÓN

CONTRATO:	495 DE 2024
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CAPITULO: EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

BASE TRATADA CON CEMENTO RESISTENCIA R-3.5 (INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO).

ABSCISA	A. CORTE (M2)	V. CORTE (M3)	BASE ADICIONAL POR OTROS CONCEPTOS	
			DESCRIPCION	VOL. (M3)
0	1.26			
10	1.26	12.60	FALLO K0+07 AL K0+012: 5*0,3*4 – LADO DERECHO	6
20	1.26	12.60		
30	1.26	12.60		
40	1.26	12.60	FALLO K0+18 AL K0+22: 4*0,4*8,5	13.6
50	1.26	12.60		
60	1.26	12.60		
70	1.26	12.60		
80	1.26	12.60		
90	1.26	12.60		
104.05	1.26	17.70		
	TOTAL	131.10		19.60
	VOLUMEN TOTAL TRAMO	150.70		

VOLUMEN TOTAL Z.I	210.55

GERMAN DAVID CASTRO MUÑOZ
TOPOGRAFO:
L.P 01-14357 CPNT

Alcaldía municipal
Garzón

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N° 2

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATO No.	000495 de 2024	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24		

ITEM	2.3	PAVIMENTO RIGIDO MR-4,0 , JUNTAS DE DILATACION SELLADAS, TEXTURIZADAS, PASADORES TRANSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIAMETRO 35 CM, ESPACIADOS CADA 30 CM Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIAMENTRO LONGITUD 85 CM SEPARADOS 1,20 M CURADO CON ANTISOL.		UNIDAD	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO






LOCALIZACION	ANCHO [m]	LONG. [m]	ALTO [m]	AREA [m2]	VOLUMEN TOTAL
DIAGONAL 11 ENTRE CRA4E Y DIG10			0.19	90.00	17.10
			0.19	112.50	21.38
			0.19	147.77	28.08
			0.19	64.64	12.28
			0.19	11.49	2.18
			0.19	100.43	19.08
			0.19	12.27	2.33
			0.19	4.04	0.77
			0.19	6.38	1.21
			0.19	3.00	0.57
			0.19	5.34	1.02
			0.19	4.48	0.85
			0.19	13.02	2.47
			0.19	9.00	1.71
			0.19	0.63	0.12
			0.19	0.36	0.07
INTERSECCIÓN	5.87	6.90	0.19	40.50	7.70
CARRERA 2 ENTRE CALLES 11 Y 14	5.00	133.89	0.19		127.20
INTERSECCIÓN CARRERA 4 ESTE CON CALLE 11			0.19	129.67	24.64

OBSERVACIONES:

TOTAL ACUMULADO	270.75
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	255.51
TOTAL POR COBRAR PRESENTE ACTA	15.24

LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 19202222845 CAU

WILMER RODRIGO PASSOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P. 70202136685 TLM

Alcaldía municipal
Garzón


MEMORIA CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL N° 2

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATO No.	000495 de 2024	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24		

ITEM	2.4	PAVIMENTO RIGIDO MR-4,2 , JUNTAS DE DILATACION SELLADAS, TEXTURIZADAS, PASADORES TRANSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIAMETRO 35 CM, ESPACIADOS CADA 30 CM Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIAMENTRO LONGITUD 85 CM SEPARADOS 1,20 M CURADO CON ANTISOL	UNIDAD	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

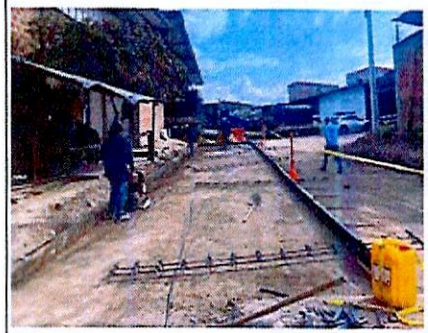

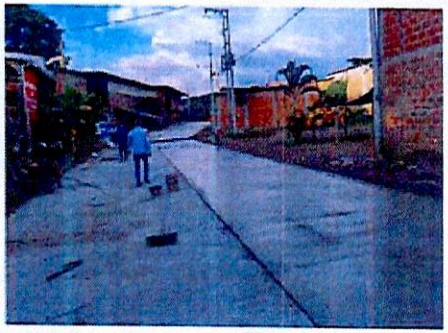





LOCALIZACION	ANCHO [m]	LONG. [m]	ALTO [m]	AREA [m2]	VOLUMEN TOTAL
CARRERA 3A ENTRE CALLES 11 Y 12	4.00	35.92	0.19	143.68	27.30
	2.00	2.00	0.19	2.00	0.38
	2.00	2.00	0.19	2.00	0.38
CARRERA23A ENTRE CALLES 1 Y 2	8.40	149.45	0.20	1255.38	251.08
SOBRE ANCHO IRREGULAR PR0+000 CARRERA23A ENTRE CALLES 1 Y 2			0.20	6.29	1.26

OBSERVACIONES:

TOTAL ACUMULADO	280.39
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	27.30
TOTAL POR COBRAR PRESENTE ACTA	253.09

LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 19202222845 CAU


WILMER RODRIGO PASSOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P. 70202136685 TLM

Alcaldía municipal

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N° 2

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATO No.	000495 de 2024	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24		
ITEM 2.5	ACERO DE 1/2 " DE DIAMETRO SEPARADAS CADA 0.25 M PARA LOSAS IRREGULARES	UNIDAD	KG

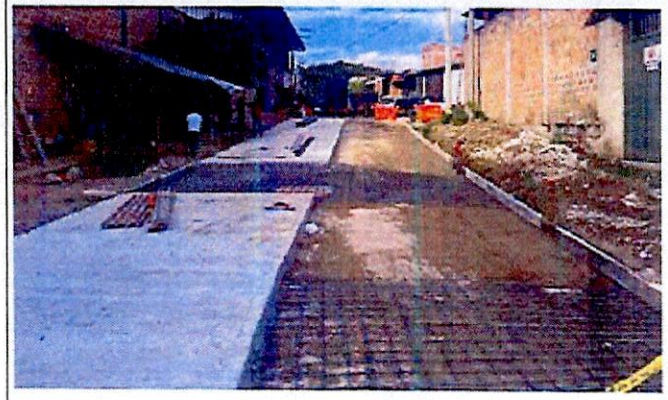REGISTRO FOTOGRÁFICO	LOCALIZACION	CANT (Und)	UBICACIÓN	LONGITUD (M)	Ø DE LA VARILLA	PESO X ML (KG)	TOTAL
		1.00	SF K0+085 -K0+101	0.92	1/2"	0.994	0.91
		1.00	SF K0+085 -K0+101	1.1	1/2"	0.994	1.09
		1.00	SF K0+085 -K0+101	1.32	1/2"	0.994	1.31
		1.00	SF K0+085 -K0+101	1.46	1/2"	0.994	1.45
		1.00	SF K0+085 -K0+101	1.62	1/2"	0.994	1.61
		1.00	SF K0+085 -K0+101	1.8	1/2"	0.994	1.79
		1.00	SF K0+085 -K0+101	2.05	1/2"	0.994	2.04
		1.00	SF K0+085 -K0+101	2.16	1/2"	0.994	2.15
		1.00	SF K0+085 -K0+101	2.3	1/2"	0.994	2.29
		1.00	SF K0+085 -K0+101	2.5	1/2"	0.994	2.49
		1.00	SF K0+085 -K0+101	2.7	1/2"	0.994	2.68
		1.00	SF K0+085 -K0+101	2.85	1/2"	0.994	2.83
		1.00	SF K0+085 -K0+101	3.05	1/2"	0.994	3.03
		1.00	SF K0+085 -K0+101	3.21	1/2"	0.994	3.19
		1.00	SF K0+085 -K0+101	3.41	1/2"	0.994	3.39
		1.00	SF K0+085 -K0+101	3.6	1/2"	0.994	3.58
		1.00	SF K0+085 -K0+101	3.86	1/2"	0.994	3.84
		1.00	SF K0+085 -K0+101	4	1/2"	0.994	3.98
		1.00	SF K0+085 -K0+101	4	1/2"	0.994	3.98
		1.00	SF K0+085 -K0+101	4	1/2"	0.994	3.98
		1.00	SF K0+085 -K0+101	4	1/2"	0.994	3.98
		1.00	SF K0+085 -K0+101	3.87	1/2"	0.994	3.85
		1.00	SF K0+085 -K0+101	4.16	1/2"	0.994	4.14
		1.00	SF K0+085 -K0+101	3.18	1/2"	0.994	3.16
		1.00	SF K0+085 -K0+101	2.85	1/2"	0.994	2.83
		1.00	SF K0+085 -K0+101	2.5	1/2"	0.994	2.49
		1.00	SF K0+085 -K0+101	2.2	1/2"	0.994	2.19
		1.00	SF K0+085 -K0+101	1.8	1/2"	0.994	1.79
		1.00	SF K0+085 -K0+101	1.55	1/2"	0.994	1.54
		1.00	SF K0+085 -K0+101	1.2	1/2"	0.994	1.19
		1.00	SF K0+085 -K0+101	0.9	1/2"	0.994	0.89
		1.00	SF K0+085 -K0+101	1.1	1/2"	0.994	1.09
		1.00	SF K0+085 -K0+101	1.28	1/2"	0.994	1.27
		1.00	SF K0+085 -K0+101	1.5	1/2"	0.994	1.49
		1.00	SF K0+085 -K0+101	1.6	1/2"	0.994	1.59
		1.00	SF K0+085 -K0+101	1.84	1/2"	0.994	1.83
		1.00	SF K0+085 -K0+101	2	1/2"	0.994	1.99
		1.00	SF K0+085 -K0+101	2.2	1/2"	0.994	2.19
		1.00	SF K0+085 -K0+101	2.38	1/2"	0.994	2.37
		1.00	SF K0+085 -K0+101	2.52	1/2"	0.994	2.50
		1.00	SF K0+085 -K0+101	2.78	1/2"	0.994	2.76
		1.00	SF K0+085 -K0+101	2.97	1/2"	0.994	2.95
		1.00	SF K0+085 -K0+101	3.31	1/2"	0.994	3.29
		1.00	SF K0+085 -K0+101	3.3	1/2"	0.994	3.28
		1.00	SF K0+085 -K0+101	3.56	1/2"	0.994	3.54
		1.00	SF K0+085 -K0+101	4.62	1/2"	0.994	4.59
		1.00	SF K0+085 -K0+101	4.27	1/2"	0.994	4.24
		1.00	SF K0+085 -K0+101	3.93	1/2"	0.994	3.91
		1.00	SF K0+085 -K0+101	3.65	1/2"	0.994	3.63
		1.00	SF K0+085 -K0+101	3.34	1/2"	0.994	3.32
		1.00	SF K0+085 -K0+101	3	1/2"	0.994	2.98
		1.00	SF K0+085 -K0+101	2.66	1/2"	0.994	2.64
		1.00	SF K0+085 -K0+101	2.34	1/2"	0.994	2.33
		1.00	SF K0+085 -K0+101	2.02	1/2"	0.994	2.01
		1.00	SF K0+085 -K0+101	1.65	1/2"	0.994	1.64

Alcaldía municipal

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N° 2

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATO No.	000495 de 2024	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24		
ITEM 2.5	ACERO DE 1/2 " DE DIAMETRO SEPARADAS CADA 0,25 M PARA LOSAS IRREGULARES	UNIDAD	KG

REGISTRO FOTOGRÁFICO







LOCALIZACION	CANT (Und)	UBICACIÓN	LONGITUD (M)	Ø DE LA VARILLA	PESO X ML (KG)	TOTAL
DIAGONAL 11 ENTRE CRA4E Y DIG10	1.00	SF K0+085 -K0+101	1.33	1/2"	0.994	1.32
	1.00	SF K0+085 -K0+101	1	1/2"	0.994	0.99
	1.00	SF K0+085 -K0+101	8.25	1/2"	0.994	8.20
	1.00	SF K0+085 -K0+101	0.67	1/2"	0.994	0.67
	1.00	SF K0+085 -K0+101	7.55	1/2"	0.994	7.50
	1.00	SF K0+085 -K0+101	6.92	1/2"	0.994	6.88
	1.00	SF K0+085 -K0+101	6.28	1/2"	0.994	6.24
	1.00	SF K0+085 -K0+101	0.65	1/2"	0.994	0.65
	1.00	SF K0+085 -K0+101	0.64	1/2"	0.994	0.64
	1.00	SF K0+085 -K0+101	0.68	1/2"	0.994	0.68
	1.00	SF K0+085 -K0+101	7.65	1/2"	0.994	7.60
	1.00	SF K0+085 -K0+101	5.31	1/2"	0.994	5.28
	1.00	SF K0+085 -K0+101	4.89	1/2"	0.994	4.86
	1.00	SF K0+085 -K0+101	4.44	1/2"	0.994	4.41
	1.00	SF K0+085 -K0+101	4.05	1/2"	0.994	4.03
	1.00	SF K0+085 -K0+101	3.62	1/2"	0.994	3.60
	1.00	SF K0+085 -K0+101	3.23	1/2"	0.994	3.21
	1.00	SF K0+085 -K0+101	2.85	1/2"	0.994	2.83
	1.00	SF K0+085 -K0+101	2.53	1/2"	0.994	2.51
	1.00	SF K0+085 -K0+101	2.16	1/2"	0.994	2.15
	1.00	SF K0+085 -K0+101	1.82	1/2"	0.994	1.81
	1.00	SF K0+085 -K0+101	1.54	1/2"	0.994	1.53
	1.00	SF K0+085 -K0+101	1.17	1/2"	0.994	1.16
	1.00	SF K0+085 -K0+101	0.93	1/2"	0.994	0.92
	1.00	SF K0+085 -K0+101	0.63	1/2"	0.994	0.63
	1.00	SF K0+085 -K0+101	0.32	1/2"	0.994	0.32
	1.00	SF K0+085 -K0+101	0.5	1/2"	0.994	0.50
	1.00	SF K0+085 -K0+101	0.75	1/2"	0.994	0.75
	1.00	SF K0+085 -K0+101	1.13	1/2"	0.994	1.12
	1.00	SF K0+085 -K0+101	1.6	1/2"	0.994	1.59
	1.00	SF K0+085 -K0+101	2.16	1/2"	0.994	2.15
	1.00	SF K0+085 -K0+101	4.76	1/2"	0.994	4.73
	1.00	SF K0+085 -K0+101	4.63	1/2"	0.994	4.60
	1.00	SF K0+085 -K0+101	4.44	1/2"	0.994	4.41
	1.00	SF K0+085 -K0+101	4.25	1/2"	0.994	4.22
	1.00	SF K0+085 -K0+101	4.05	1/2"	0.994	4.03
	1.00	SF K0+085 -K0+101	3.92	1/2"	0.994	3.90
	1.00	SF K0+085 -K0+101	3.71	1/2"	0.994	3.69
	1.00	SF K0+085 -K0+101	3.53	1/2"	0.994	3.51
	1.00	SF K0+085 -K0+101	3.31	1/2"	0.994	3.29
	1.00	SF K0+085 -K0+101	3.12	1/2"	0.994	3.10
	1.00	SF K0+085 -K0+101	2.94	1/2"	0.994	2.92
	1.00	SF K0+085 -K0+101	2.73	1/2"	0.994	2.71
	1.00	SF K0+085 -K0+101	2.53	1/2"	0.994	2.51
	1.00	SF K0+085 -K0+101	2.34	1/2"	0.994	2.33
	1.00	SF K0+085 -K0+101	2.16	1/2"	0.994	2.15
	1.00	SF K0+085 -K0+101	1.99	1/2"	0.994	1.98
	1.00	SF K0+085 -K0+101	1.8	1/2"	0.994	1.79
	1.00	SF K0+085 -K0+101	1.6	1/2"	0.994	1.59
	1.00	SF K0+085 -K0+101	1.47	1/2"	0.994	1.46
	1.00	SF K0+085 -K0+101	1.22	1/2"	0.994	1.21
	1.00	SF K0+085 -K0+101	1.03	1/2"	0.994	1.02
	1.00	SF K0+085 -K0+101	0.83	1/2"	0.994	0.83
	1.00	SF K0+085 -K0+101	0.7	1/2"	0.994	0.70
	4.00	SF K0+037	1	1/2"	0.994	3.98
	2.00	SF K0+037	1.6	1/2"	0.994	3.18
	1.00	SF K0+037	2	1/2"	0.994	1.99
	90.50	SF K0+085 -K0+101	0.98	1/2"	0.994	88.16
DIAGONAL 11 ENTRE CRA4E Y DIG10	25.0	K0+000 - K0+006.9	6.82	1/2"	0.994	169.48
	28.0		5.82	1/2"	0.994	161.98
	28.0		0.70	1/2"	0.994	19.48
	20.0		4.95	1/2"	0.994	98.41

Alcaldía municipal

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N° 2

OBJETO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATO No.	000495 de 2024	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24		
ITEM 2,5	ACERO DE 1/2 " DE DIAMETRO SEPARADAS CADA 0,25 M PARA LOSAS IRREGULARES	UNIDAD	KG

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACION	CANT (Und)	UBICACIÓN	LONGITUD (M)	Ø DE LA VARILLA	PESO X ML (KG)	TOTAL
CARRERA 2 ENTRE CALLES 11 Y 14	45.0	VILLA KAROL CRA 2 INTERSECCIONES CALLES 12, 13 Y 13A	5.85	1/2"	0.994	261.67
	57.0		4.85	1/2"	0.994	274.79
	3.0		1.93	1/2"	0.994	5.76
	3.0		1.79	1/2"	0.994	5.34
	3.0		1.77	1/2"	0.994	5.28
	3.0		1.86	1/2"	0.994	5.55
	3.0		2.21	1/2"	0.994	6.59
	3.0		3.01	1/2"	0.994	8.98
	3.0		2.96	1/2"	0.994	8.83
	3.0		2.95	1/2"	0.994	8.80
	3.0		3.04	1/2"	0.994	9.07
	3.0		3.39	1/2"	0.994	10.11
	3.0		1.75	1/2"	0.994	5.22
	3.0		1.41	1/2"	0.994	4.20
	3.0		1.33	1/2"	0.994	3.97
	3.0		1.36	1/2"	0.994	4.06
	3.0		1.52	1/2"	0.994	4.53
	3.0		2.70	1/2"	0.994	8.05
	3.0		2.40	1/2"	0.994	7.16
	3.0		2.32	1/2"	0.994	6.92
	3.0		2.35	1/2"	0.994	7.01
	3.00		2.51	1/2"	0.994	7.48
CARRERA 3A ENTRE CALLES 11 Y 12	13.00	K0+010 - K0+014.4	4.34	1/2"	0.994	56.08
	14.00		3.91	1/2"	0.994	54.41
	4.00		2.25	1/2"	0.994	8.95
	4.00		0.70	1/2"	0.994	2.78
	4.00		0.70	1/2"	0.994	2.78
	4.00		2.55	1/2"	0.994	10.14
	4.00		0.67	1/2"	0.994	2.66
	4.00	K0+000 - K0+001	1.20	1/2"	0.994	4.77
	2.00		1.00	1/2"	0.994	1.99
	1.00		0.50	1/2"	0.994	0.50
	1.00		0.30	1/2"	0.994	0.30
	1.00		0.60	1/2"	0.994	0.60
	1.00		0.40	1/2"	0.994	0.40
	1.00		0.20	1/2"	0.994	0.20
	1.00		0.10	1/2"	0.994	0.10
	1.00		0.80	1/2"	0.994	0.80
INTERSECCIÓN CARRERA 4 ESTE CON CALLE 11	1.00	SOBRE LA CALLE 11 ESQUINA LOSA CON NIVELACIÓN DE POZO	0.55	1/2"	0.994	0.55
	1.00		1.10	1/2"	0.994	1.09
	1.00		0.74	1/2"	0.994	0.74
	1.00		0.85	1/2"	0.994	0.84
	1.00		0.52	1/2"	0.994	0.52
	1.00		0.37	1/2"	0.994	0.37
	1.00		0.55	1/2"	0.994	0.55
	1.00		0.48	1/2"	0.994	0.48
	1.00		0.33	1/2"	0.994	0.33
	1.00		0.12	1/2"	0.994	0.12
	1.00		0.12	1/2"	0.994	0.12
	8.00		1.00	1/2"	0.994	7.95
	2.00		0.97	1/2"	0.994	1.93
	13.00		5.75	1/2"	0.994	74.30
	23.00		2.93	1/2"	0.994	65.87
	24.00		5.90	1/2"	0.994	140.75
	136.00	ACERO CONSTRUCTIVO	0.90	1/2"	0.994	121.67

Alcaldía municipal

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N° 2

OBJETO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATO No.	000495 de 2024	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24		
ITEM 2.6	ACERO DE 1/2 " DE DIAMETRO SEPARADAS CADA 0,25 M PARA LOSAS IRREGULARES	UNIDAD	KG

REGISTRO FOTOGRÁFICO	LOCALIZACION	CANT (Und)	UBICACIÓN	LONGITUD (M)	Ø DE LA VARILLA	PESO X ML (KG)	TOTAL
	CRA 23A ENTRE CALLES 1 Y 2	891.00	BORDILLO U	0.66	1/2"	0.994	584.53
		68.00	BORDILLO LONGITUDINALES	6.00	1/2"	0.994	405.55
		11.00	LOSA PRIMER POZO K0+102	6.00	1/2"	0.994	65.60
		11.00		3.00	1/2"	0.994	32.80
		27.00		2.80	1/2"	0.994	75.15
		16.00		1.60	1/2"	0.994	25.45
		15.00		2.20	1/2"	0.994	32.80
		42.00	LOSA SEGUNDO POZO K0+075	4.40	1/2"	0.994	183.69
		23.00		6.00	1/2"	0.994	137.17
		20.00		1.90	1/2"	0.994	37.77
		23.00		3.00	1/2"	0.994	68.59
		22.00	LOSA CURVA K 0+060	5.25	1/2"	0.994	114.81
		21.00		3.75	1/2"	0.994	78.26
		54.00		4.20	1/2"	0.994	225.44
		16.00	LOSA POZO TRES Y CUATRO K0+004 - K0+010	1.90	1/2"	0.994	30.22
		36.00		4.10	1/2"	0.994	146.71
		34.00		4.30	1/2"	0.994	145.32
		15.00		1.60	1/2"	0.994	23.86
		36.00	LOSA K0+000	3.50	1/2"	0.994	125.24
		16.00		0.65	1/2"	0.994	10.34
		18.00	LOSA CURVA K 0+013	4.10	1/2"	0.994	73.36
		17.00		4.30	1/2"	0.994	72.66
		1.00		4.19	1/2"	0.994	4.16
		1.00		4.92	1/2"	0.994	4.89
		45.00	LOSA CURVA K 0+008	6.00	1/2"	0.994	268.36
		20.00	LOSA CURVA K 0+055	4.10	1/2"	0.994	81.51
		17.00		4.30	1/2"	0.994	72.66
		1.00		4.19	1/2"	0.994	4.16
		1.00		4.92	1/2"	0.994	4.89
		8.00	ZI TRILLADORA BODEGA 2	5.20	1/2"	0.994	41.35
		16.00		6.00	1/2"	0.994	95.42
		64.00		1.95	1/2"	0.994	124.05
		8.00	ZI CHATARRERIA LOS OVIEDO	4.90	1/2"	0.994	38.95
		20.00		1.95	1/2"	0.994	38.77
		8.00	ZI BODEGA JESUS FERNANDEZ	4.10	1/2"	0.994	32.60
		17.00		1.95	1/2"	0.994	32.95
		16.00	ZI BODEGAS DIEGO FERNANDEZ	4.90	1/2"	0.994	77.93
		40.00		1.95	1/2"	0.994	77.53
		8.00	ZI PARQUEADERO TRILLADORA	4.90	1/2"	0.994	38.95
		20.00		1.95	1/2"	0.994	38.77
		8.00	ZI BODEGA TRILLADORA FRENTE A SUPER RECICLAJE	6.00	1/2"	0.994	47.71
		9.00		0.90	1/2"	0.994	7.16
		25.00		1.95	1/2"	0.994	48.46
		12.00	SOBREANCHOS	6.00	1/2"	0.994	71.57
		12.00		0.90	1/2"	0.994	10.74

TOTAL ACUMULADO	6,034.02
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	1,056.08
TOTAL POR COBRAR PRESENTE ACTA	4,977.94

LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 19202222645 CAU

WILMER RODRIGO PASSOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P. 70202136685 TLM

Alcaldía municipal
Garzón

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N° 2

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
~~CONTRATO No.~~	~~000495 de 2024~~	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24		

ITEM	2.6	CANASTILLA PARA BARRA PASAJUNTAS	UNIDAD	ML

REGISTRO FOTOGRÁFICO	LOCALIZACION	CANT	LONG. [m]	OBSERVACIONES	TOTAL
	DIAGONAL 11 ENTRE CRA4E Y DIG10	44.0	2.60		114.40
	CARRERA 2 ENTRE CALLES 11 Y 14	72.0	2.20		158.40
	CARRERA 3A ENTRE CALLES 11 Y 12	7.0	3.60		25.20
	INTERSECCIÓN CARRERA 4 ESTE CON CALLE 11	9.00	2.60		23.40
	CARRERA23A ENTRE CALLES 1 Y 2	64.0	3.60		230.40

OBSERVACIONES:

TOTAL ACUMULADO	551.80
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	298.00
TOTAL POR COBRAR PRESENTE ACTA	253.80

LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 19202222845 CAU

WILMER RODRIGO PASSOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P. 70202136685 TLM

Alcaldía municipal
Garzón

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N° 2

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATO No.	000495 de 2024	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24		
ITEM 2.7	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,20X0,20 PARA BOCACALLES	UNIDAD	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO





LOCALIZACION	CANTIDAD	LONG. [m]	ALTO [m]	ANCHO [m]	OBSERVACIONES	TOTAL
DIAGONAL 11 ENTRE CRA4E Y DIG10	1.0	37.04	0.20	0.20		1.48
CARRERA23A ENTRE CALLES 1 Y 2	1.00	8.40	0.20	0.20		0.34
INTERSECCIÓN CARRERA 4 ESTE CON CALLE 11	1.00	10.00	0.20	0.20		0.40
	3.00	6.00	0.20	0.20		0.72

OBSERVACIONES:

TOTAL ACUMULADO	2.94
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	0.70
TOTAL POR COBRAR PRESENTE ACTA	2.24

LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 19202222845 CAU

WILMER RODRIGO PASSOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P. 70202136685 TLM

Alcaldía municipal
Garzón

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N° 2

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATO No.	020495 de 2024	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24		
ITEM 2.8	BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA TRANSICION ENTRE LOSA DE CONCRETO Y PAVIMENTO EXISTENTE.		UNIDAD M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO





LOCALIZACION	CANTIDAD	ANCHO [m]	LONG. [m]	ALTO [m]	AREA (m2)	OBSERVACIONES	TOTAL
ZI TRILLADORA BODEGA 2	1.00	16.00	2.00	0.20			6.40
ZI CHATARRERÍA LOS OVIEDO	1.00	5.00	2.00	0.20			2.00
ZI BODEGA JESÚS FERNANDEZ	1.00	4.20	2.00	0.20			1.68
ZI BODEGAS DIEGO FERNANDEZ	1.00	10.00	2.00	0.20			4.00
ZI PARQUEADERO TRILLADORA	1.00	5.00	2.00	0.20			2.00
ZI BODEGA TRILLADORA FRENTE A SUPER RECICLAJE	1.00	6.30	2.00	0.20			2.52
SOBREANCHOS	12.00			0.20	0.86		2.06
BORDILLO	1	0.2	117.05	0.2			4.68
BORDILLO	1	0.2	164.89	0.1			3.30

OBSERVACIONES:

TOTAL ACUMULADO	28.64
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	0.00
TOTAL POR COBRAR PRESENTE ACTA	28.64

LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 19202222845 CAU

WILMER RODRIGO PASSOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P. 70202136685 TLM

Alcaldía municipal
Garzón

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N° 2

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATO No.	000495 de 2024	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24		
ITEM 2.9	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO DE 0,16X0,45X1,00 METRO INCLUYE LA PREPARACION DE SUPERFICIE DE APOYO	UNIDAD	ML

REGISTRO FOTOGRÁFICO





LOCALIZACION	CANT	LONG. [m]	OBSERVACIONES	TOTAL
DIAGONAL 11 ENTRE CRA4E Y DIG10	1.0	120.31		120.31
CARRERA 3A ENTRE CALLES 11 Y 12	1.0	24.00		24.00
INTERSECCIÓN CARRERA 4 ESTE CON CALLE 11	1.00	15.35		15.35

OBSERVACIONES:

TOTAL ACUMULADO	159.66
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	144.31
TOTAL POR COBRAR PRESENTE ACTA	15.35

LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 19202222845 CAU

WILMER RODRIGO PASSOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P. 70202136685 TLM

Alcaldía Municipal
Garzón

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N° 2

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATO No.	000495 de 2024	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24		
ITEM 2.10.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR CLASE C TIPO INV 330-13. INCLUYE COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RECIBO POR PARTE DE LA ENTIDAD	UNIDAD	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACION	CANTIDAD	ANCHO [m]	LONG. [m]	ALTO [m]	AREA [m2]	VOLUMEN	TOTAL
DIAGONAL 11 ENTRE CRA4E Y DIG10	1.0					93.63	93.63
INTERSECCIÓN CARRERA 4 ESTE CON CALLE 11	1.00			0.15	129.67	19.45	19.45
CARRERA 3A ENTRE CALLES 11 Y 12	1.0					22.15	22.15
	2.0	2.00	2.00	0.15	2.00	0.30	0.60
RAMPA TRILLADORA BODEGA 2	1.00	16.00	2.00	0.15		4.80	4.80
RAMPA CHATARRERÍA LOS OVIEDO	1.00	5.00	2.00	0.15		1.50	1.50
RAMPA BODEGA JESÚS FERNANDEZ	1.00	4.20	2.00	0.15		1.26	1.26
RAMPA BODEGAS DIEGO FERNANDEZ	1.00	10.00	2.00	0.15		3.00	3.00
RAMPA PARQUEADERO TRILLADORA	1.00	5.00	2.00	0.15		1.50	1.50
RAMPA BODEGA TRILLADORA FRENTE A SUPER RECICLAJE	1.00	6.30	2.00	0.15		1.89	1.89
CRA 23A ENTRE CALLES 1 Y 2 SOBREANCHOS	12.00			0.15	0.86	0.13	1.55

OBSERVACIONES:

TOTAL ACUMULADO	151.33
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	115.78
TOTAL POR COBRAR PRESENTE ACTA	35.55

LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 19202222845 CAU

WILMER RODRIGO PASSOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P. 70202136685 TLM

CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24	CÓDIGO:	WT-GR-01
	VERSIÓN:	1
	FECHA:	14/12/2024

CARTERAS DE VOLUMENES EXCAVACIÓN

CONTRATO:	495 DE 2024
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CAPITULO: EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR CLASE C TIPO INV 330-13. INCLUYE COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RECIBO POR PARTE DE LA ENTIDAD

DIAGONAL 11 ENTREA CRAS 4 Este y 5 Este - SAGRADA FAMILIA

ITEM	ABSCISA DEL PROYECTO	AREA	VOLUMEN	TOTAL DE VOLUMENES
0	0	0.90	0.00	0.00
1	K0+5	0.90	4.50	4.50
2	K0+15	0.90	9.00	13.50
3	K0+25	0.90	9.00	22.50
4	K0+35	0.90	9.00	31.50
5	K0+45	0.90	9.00	40.50
6	K0+55	0.90	9.00	49.50
7	K0+65	0.90	9.00	58.50
8	K0+75	0.90	9.00	67.50
9	K0+85	0.90	9.00	76.50
10	K0+95	0.90	9.00	85.50
11	K0+100.48	0.90	4.93	90.43
INTERSECCION K0+090 AL K0+100,48: 21,4*0,4			3.2	93.63
		TOTAL	**93.63**	

CARRERA 3A ENTRE CALLES 11 Y 12 - VILLA KAROL

ITEM	ABSCISA DEL PROYECTO	AREA BASE (M2)	VOLUMEN	TOTAL DE VOLUMENES
Empalme	0	4.00	0.60	0.60
0	0	0.60	0.60	0.60
1	K0+10	0.60	6.00	6.60
2	K0+20	0.60	6.00	12.60
3	K0+30	0.60	6.00	18.60
4	K0+36	0.60	3.55	22.15
		TOTAL	**22.15**	

GERMAN DAVID CASTRO MUÑOZ
TOPOGRAFO:
L.P 01-14357 CPNT

Alcaldia municipal
Garzón

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N° 2

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATO No.	000495 de 2024	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24		

ITEM 2.11. MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES — UNIDAD: M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO







LOCALIZACION	CANTIDAD	ANCHO [m]	LONG. [m]	ALTO [m]	AREA [m2]	OBSERVACIONES	AREA TOTAL
DIAGONAL 11 ENTRE CRA4E Y DIG10	1.0	6.00	102.84		617.04		617.04
CARRERA 2 ENTRE CALLES 11 Y 14	1.0	5.00	133.89		669.45		669.45
CARRERA 3A ENTRE CALLES 11 Y 12	1.00	4.00	35.92		143.68		143.68
	2.0	2.00	2.00		2.00		4.00
INTERSECCIÓN CARRERA 4 ESTE CON CALLE 11	1.00				129.67		129.67
CARRERA23A ENTRE CALLES 1 Y 2	1.00	8.40	149.45		1255.38		1,255.38

OBSERVACIONES:

TOTAL ACUMULADO	2,819.22
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	1,430.17
TOTAL POR COBRAR PRESENTE ACTA	1,389.05

LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 19202222845 CAU

WILMER RODRIGO PASSOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P. 70202136685 TLM

Alcaldía municipal
Garzón

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N° 2

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATO No.	000495 de 2024	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24		
ITEM 2.12.	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000 ML)	UNIDAD	M3-KM

REGISTRO FOTOGRÁFICO





LOCALIZACION	VOLUMEN [m3]	DINTANCIA DE ACARREO (KM)	FACTOR EXPANSION	TOTAL
DIAGONAL 11 ENTRE CRA4E Y DIG10	93.63	68.00	1.30	8,277.07
CARRERA 2 ENTRE CALLES 11 Y 14	100.42	68.00	1.30	8,876.91
CARRERA 3A ENTRE CALLES 11 Y 12	22.75	68.00	1.30	2,011.28
INTERSECCIÓN CARRERA 4 ESTE CON CALLE 11	19.45	68.00	1.30	1,719.37
CARRERA23A ENTRE CALLES 1 Y 2	210.55	68.00	1.30	18,612.18

OBSERVACIONES:

TOTAL ACUMULADO	39,496.80
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	19,112.21
TOTAL POR COBRAR PRESENTE ACTA	20,384.59

LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 19202222845 CAU

WILMER RODRIGO PASSOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P. 70202136685 TLM

Alcaldía municipal
Garzón

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N° 2

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATO No.	000495 de 2024	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24		

ITEM	3.1	NIVELACION DE POZOS	UNIDAD	UN

REGISTRO FOTOGRÁFICO







LOCALIZACION	CANT	OBSERVACIONES	TOTAL
DIAGONAL 11 ENTRE CRA4E Y DIG10	1.0	K0+002	1.00
CARRERA 2 ENTRE CALLES 11 Y 14	3.0	INTERSECCIÓN CALLE 12, 13 Y 13A	3.00
CARRERA23A ENTRE CALLES 1 Y 2	4.0		4.00
INTERSECCIÓN CARRERA 4 ESTE CON CALLE 11	1.00	CALLE 11 ESQUINA	1.00

OBSERVACIONES:

TOTAL ACUMULADO	9.00
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	3.00
TOTAL POR COBRAR PRESENTE ACTA	6.00

LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 19202222845 CAU

WILMER RODRIGO RASSOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P. 70202136685 TLM

Alcaldía municipal
Garzón

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N° 2

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATO No.	000495 de 2024	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24		

ITEM	3.2	CONEXION DOMICILIARIA ACUEDUCTO EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE TUBERIA, COLLAR DE DERIVACION Y ACCESORIS DE CONEXIÓN. LONGITUD PROMEDIO 4 ML	UNIDAD	UN

REGISTRO FOTOGRÁFICO







LOCALIZACION	CANT	UBICACIÓN	TOTAL
DIAGONAL 11 ENTRE CRA4E Y DIG10	7.0		7.00
CARRERA 2 ENTRE CALLES 11 Y 14	5.0		5.00
CARRERA 3A ENTRE CALLES 11 Y 12	6.0		6.00
CARRERA23A ENTRE CALLES 1 Y 2	17.0		17.00
INTERSECCIÓN CARRERA 4 ESTE CON CALLE 11	7.00	CALLE 11 ESQUINA	7.00

OBSERVACIONES:

TOTAL ACUMULADO	42.00
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	18.00
TOTAL POR COBRAR PRESENTE ACTA	24.00

LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 19202222845 CAU

WILMER RODRIGO PASSOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P. 70202136685 TLM

Alcaldía Municipal
Garzón

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N° 2

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATO No.	000495 de 2024	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24		
ITEM 3.3	EXCAVACIONES VARIAS		

REGISTRO FOTOGRÁFICO





LOCALIZACION	CANTIDAD	ANCHO [m]	LONG. [m]	ALTO [m]	AREA [m2]	OBSERVACIONES	UNIDAD: M3 TOTAL
DIAGONAL 11 ENTRE CRA4E Y DIG10	1.0	0.20	37.04	0.20			1.48
INTERSECCIÓN CARRERA 4 ESTE CON CALLE 11	3.00	0.20	6.00	0.20			0.72
	1.00	0.20	10.00	0.20			0.40
CARRERA23A ENTRE CALLES 1 Y 2	1.00	0.20	8.40	0.20			0.34
ZI TRILLADORA BODEGA 2	1.00	16.00	2.00	0.30			9.60
ZI CHATARRERÍA LOS OVIEDO	1.00	5.00	2.00	0.35			3.50
ZI BODEGA JESÚS FERNANDEZ	1.00	4.20	2.00	0.50			4.20
ZI BODEGAS DIEGO FERNANDEZ	1.00	10.00	2.00	0.40			8.00
ZI PARQUEADERO TRILLADORA	1.00	5.00	2.00	0.40			4.00
ZI BODEGA TRILLADORA FRENTE A SUPER RECICLAJE	1.00	6.30	2.00	0.50			6.30
SOBREANCHOS	12.00			0.35	0.86		3.61
CARRERA23A ENTRE CALLES 1 Y 2 (M.D)	1.00	0.20	81.00	0.40			6.48
CARRERA23A ENTRE CALLES 1 Y 2 (M.I)	1.00	0.40	29.00	0.80			9.28
CARRERA23A ENTRE CALLES 1 Y 2 (M.I)	1.00	2.00	4.00	0.20			1.60

OBSERVACIONES:

TOTAL ACUMULADO	59.51
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	0.70
TOTAL POR COBRAR PRESENTE ACTA	58.81

LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 19202222845 CAU

WILMER RODRIGO PASSOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P. 70202136685 TLM


Alcaldía municipal
Garzón

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N° 2

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATO No.	000495 de 2024	INTERVENTOR	INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24		
ITEM -	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

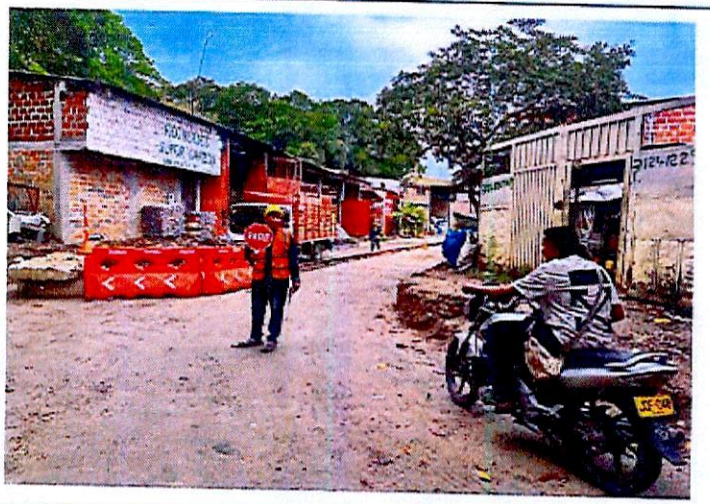

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	-
			V. UNITARIO	V. TOTAL
Barricada - Maletines plásticos de 2,00X1,40X0,50 M	UND	4	$ 460,122.00	$ 1,840,488.00
Señales vial tubulares base conica	UND	10	$ 47,424.00	$ 474,240.00
Cinta señalización "peligro" 10cm (Rollo 500m)	UND	3	$ 23,500.00	$ 70,500.00
	UND	2	$ 23,482.00	$ 46,964.00
	UND	1	$ 19,500.00	$ 19,500.00
Paletá pare y siga	UND	2	$ 20,428.00	$ 40,856.00
Señal temporal preventiva SP en tablero de lámina galvanizada calibre 16, con Adhesivos reflectivos laminados	UND	7	$ 335,000.00	$ 2,345,000.00
Chalecos reflectivos naranja	UND	6	$ 21,955.00	$ 131,730.00
Socialización del Plan de Manejo de Transito (folletos y charlas a la comunidad que habita en la zona de ejecución de la obra)	UND	4	$ 500,000.00	$ 2,000,000.00
Controladores viales x2 (Incluye factor prestacional)	UND	2.60	$ 5,060,895.58	$ 13,158,328.50

OBSERVACIONES:

TOTAL ACUMULADO	$ 20,127,606.50
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	$ -
TOTAL POR COBRAR PRESENTE ACTA	$ 20,127,606.50

LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 19202222845 CALI

WILMER RODRIGO PASSOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P. 70202136685 TLM

INGES GROUP

NIT: 800.086.627-9

ANEXO 2.
SOPORTE PLANILLAS CONTRATISTA DE OBRA

Calle 6c No. 24ª-53 Barrio: La Gaitana – Cel: 3043502527
Neiva / Huila / Colombia
Email: Ingespotrerillos@gmail.com

INGES GROUP

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901868224	7	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CARRERA 7 9 47	GARZON-HUILA	8332529	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	9482965248	9482965248	E	2025/03/07	2025/03/10	BANCO DE BOGOTA	3	$6,832,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	12198242	ANGULO VEGA HECTOR																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	77151982	ARANGO SALCEDO WILSON		X																25-14	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF32	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$290,700
3	CC	12192782	CARVAJAL TORRES ROGELIO		X																25-14	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF32	20	$949,000	$38,000	14-23	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
4	CC	1081404608	CASTRO MUÑOZ GERMAN DAVID	X	X																230301	20	$1,000,000	$160,000	EPS037	20	$1,000,000	$40,000	CCF32	20	$1,000,000	$40,000	14-23	20	$1,000,000	$69,600	20	$0	$0	Si	$309,600
5	CC	69006588	CHAMORRO BRAVO LUZ KARINA	X	X																230301	20	$1,000,000	$160,000	EPS010	20	$1,000,000	$40,000	CCF32	20	$1,000,000	$40,000	14-23	20	$1,000,000	$69,600	20	$0	$0	Si	$309,600
6	CC	1077865856	DIAZ ANGEL EDWIN ARLEY		X																231001	20	$949,000	$151,900	EPSIC3	20	$949,000	$38,000	CCF32	20	$949,000	$38,000	14-23	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
7	CC	12203043	GUTIERREZ JIMENEZ JOHN DREDY		X																231001	20	$949,000	$151,900	ESSC62	20	$949,000	$38,000	CCF32	20	$949,000	$38,000	14-23	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
8	CC	12194707	JIMENEZ ROA NELSON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	7710175	MOLANO CHAUX LEONARDO ANDRES		X																230201	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF32	20	$949,000	$38,000	14-23	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
10	CC	1077855674	MOLINA MONTES KARLA YUSERLI																		230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
11	CC	12196553	MUÑOZ VALDERRAMA YOVANI		X																230201	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF32	20	$949,000	$38,000	14-23	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
12	CC	1003965845	PERAFAN GUILLERMO ANDRES FELIPE		X																230301	20	$949,000	$151,900	ESSC62	20	$949,000	$38,000	CCF32	20	$949,000	$38,000	14-23	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
13	CC	1077866732	PERDOMO OLAYA EDILZON ANDRES																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
14	CC	1003965358	POLO ARIAS RICARDO ANDRES																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
15	CC	1077869305	RAMOS CHICO CRISTIAN CAMILO																		230301	30	$1,500,000	$240,000	ESSC62	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
16	CC	12188755	RIVERA PERDOMO ISMAEL	X	X																25-14	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF32	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$290,700
17	CC	12284240	RUIZ MALDONADO LEONARDO ANDRES	X	X																231001	20	$1,000,000	$160,000	EPS037	20	$1,000,000	$40,000	CCF32	20	$1,000,000	$40,000	14-23	20	$1,000,000	$69,600	20	$0	$0	Si	$309,600
18	CC	1007419865	SUAREZ CORTES LUIS ALEJANDRO		X																230301	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF32	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$290,700
19	CC	1193518517	VIGOYA LARA DARIO																		25-14	30	$1,738,000	$278,100	EPS005	30	$1,738,000	$69,600	CCF32	30	$1,738,000	$69,600	14-23	30	$1,738,000	$121,000	30	$0	$0	Si	$538,300
Total	**Afiliados(19)**																						$22,049,500	$3,528,600			$22,049,500	$882,600			$21,802,501	$872,700			$22,049,500	$1,535,200		$0	$0		$6,819,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901868224	7	CONSORCIO INGEVIAL GARZON 24	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CARRERA 7 9 47	GARZON-HUILA	8332529	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	9482965248	9482965248	E	2025/03/07	2025/03/10	BANCO DE BOGOTA	3	$6,832,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$3,528,600	$6,900	$0	$3,535,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$463,800	$900	$0	$464,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$973,800	$1,900	$0	$975,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,547,200	$3,000	$0	$1,550,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$543,800	$1,100	$0	$544,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,535,200	$2,900	$0	$1,538,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	19	$1,535,200	$2,900	$0	$1,538,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$872,700	$1,700	$0	$874,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	19	$872,700	$1,700	$0	$874,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	$882,600	$1,900	$0	$884,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$38,000	$100	$0	$38,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$136,000	$300	$0	$136,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$40,000	$100	$0	$40,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$365,000	$700	$0	$365,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$200	$0	$57,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$246,600	$500	$0	$247,100
TOTAL				**19**	**$6,819,100**	**$13,400**	**$0**	**$6,832,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18127821		ROBLES GUERRERO MIGUEL HORACIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 10 No. 4-51	MOCOA-PUTUMAYO	4204564	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1278586286	9481808999	I	2025/03/06	2025/02/19	BANCOLOMBIA	0	$1,063,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	18127821	ROBLES GUERRERO MIGUEL HORACIO																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	0	$0	$0	No	$1,063,800
Total Afiliados(1)																							$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$1,063,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,800	$0	$0	$208,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$208,800	$0	$0	$208,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$0	$0	$375,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$0	$0	$375,000
TOTAL				**1**	**$1,063,800**	**$0**	**$0**	**$1,063,800**

2025/02/19 01:57 PM

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9572257890 DV: 165545
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 11/03/2025 09:47:42
PAP: 900017
Nombre: LUISA
Apellido 1: GUZMAN
NUM PLANILLA: 8635273299
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 39614312
PERIODO: 202502
Referencia: 8635273299Valor: $276.800.00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	LUISA FERNANDA GUZMAN
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-39614312
SUCURSAL	007
FECHA PAGO	
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-39614312
NOMBRE EMPLEADO	LUISA FERNANDA GUZMAN ARAGON
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	8635273338
REFERENCIA PAGO(PIN)	8635273299
TIPO PLANILLA	I
PERÍODO PENSIÓN	2025-02
PERÍODO SALUD	2025-02
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1702001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	2025-02-01
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-02-20

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
X	1/02/25	X	20/02/25																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
20	949.000	0,1600000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
20	949.000	0,1250000	$ 118.700	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
20	949.000	0,0052200	$ 5.000	901868224

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 151.900	$ 118.700	$ 5.000	$ 0	$ 275.600

INGES GROUP

NIT: 800.086.627-9

ANEXO 3.
SOPORTE PLANILLAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Calle 6c No. 24ª-53 Barrio: La Gaitana – Cel: 3043502527
Neiva / Huila / Colombia
Email: Ingespotrerillos@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800086627	9	INGES GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR DEL HUILA	CL 7A 23 12	NEIVA-HUILA	8745263	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1310865841	9482684314	E	2025/03/07	2025/03/04	BANCOLOMBIA		$3,676,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	26430875	CARDOSO CARMEN	230201	19	$1,108,334	$177,400	EPS005	19	$1,108,334	$44,400	CCF32	19	$1,108,334	$44,400	14-23	19	$1,108,334	$5,800	19	$0	$0
2	CC	12116807	MANRIQUE MILLER	25-14	19	$1,266,667	$202,700	EPS037	19	$1,266,667	$50,700	CCF32	19	$1,266,667	$50,700	14-23	19	$1,266,667	$6,700	19	$0	$0
3	CC	1075257919	MONTEALEGRE BRAYHAN	25-14	19	$950,000	$152,000	EPS037	19	$950,000	$38,000	CCF32	19	$950,000	$38,000	14-23	19	$950,000	$5,000	19	$0	$0
4	CC	1026288854	NARVAEZ GINNA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
5	CC	36311206	PALACIOS LEIDY	230301	19	$1,140,000	$182,400	EPS005	19	$1,140,000	$45,600	CCF32	19	$1,140,000	$45,600	14-23	19	$1,140,000	$6,000	19	$0	$0
6	CC	7718630	PASSOS WILMER	230301	19	$2,216,667	$354,700	EPS005	19	$2,216,667	$88,700	CCF32	19	$2,216,667	$88,700	14-23	19	$2,216,667	$11,600	19	$0	$0
7	CC	1075222933	PEREZ CARLOS	25-14	19	$2,850,000	$456,000	EPS005	19	$2,850,000	$114,000	CCF32	19	$2,850,000	$114,000	14-23	19	$2,850,000	$14,900	19	$0	$0
8	CC	1075239008	RUIZ WILMER	231001	19	$1,108,334	$177,400	EPS037	19	$1,108,334	$44,400	CCF32	19	$1,108,334	$44,400	14-23	19	$1,108,334	$5,800	19	$0	$0
9	CC	1003994749	TOVAR ANDRES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
10	CC	1003805361	TOVAR JOE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(10)**					$14,987,002	$2,398,200			$14,987,002	$599,800			$14,987,002	$599,800			$14,987,002	$78,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$2,398,200	$0	$2,398,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$177,400	$0	$177,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,266,300	$0	$1,266,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$777,100	$0	$777,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$177,400	$0	$177,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$78,700	$0	$78,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$78,700	$0	$78,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$599,800	$0	$599,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	$599,800	$0	$599,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$599,800	$0	$599,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$133,100	$0	$133,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$466,700	$0	$466,700
TOTAL				**10**	**$3,676,500**	**$0**	**$3,676,500**

2025/03/04 12:21 PM

INGES GROUP

NIT: 800.086.627-9

Soporte de pago de seguridad social

Calle 6c No. 24ª-53 Barrio: La Gaitana – Cel: 3043502527
Neiva / Huila / Colombia
Email: Ingespotrerillos@gmail.com

INGES GROUP

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800086627	9	INGES GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR DEL HUILA	CL 7A 23 12	NEIVA-HUILA	8745263	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-02	2025-03	1310865841	9482684314	E	2025/03/07	2025/03/04	BANCOLOMBIA		$3,676,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	26430875	CARDOSO CARMEN	230201	19	$1,108,334	$177,400	EPS005	19	$1,108,334	$44,400	CCF32	19	$1,108,334	$44,400	14-23	19	$1,108,334	$5,800	19	$0	$0
2	CC	12116807	MANRIQUE MILLER	25-14	19	$1,266,667	$202,700	EPS037	19	$1,266,667	$50,700	CCF32	19	$1,266,667	$50,700	14-23	19	$1,266,667	$6,700	19	$0	$0
3	CC	1075257919	MONTEALEGRE BRAYHAN	25-14	19	$950,000	$152,000	EPS037	19	$950,000	$38,000	CCF32	19	$950,000	$38,000	14-23	19	$950,000	$5,000	19	$0	$0
4	CC	1026288854	NARVAEZ GINNA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
5	CC	36311206	PALACIOS LEIDY	230301	19	$1,140,000	$182,400	EPS005	19	$1,140,000	$45,600	CCF32	19	$1,140,000	$45,600	14-23	19	$1,140,000	$6,000	19	$0	$0
6	CC	7718630	PASSOS WILMER	230301	19	$2,216,667	$354,700	EPS005	19	$2,216,667	$88,700	CCF32	19	$2,216,667	$88,700	14-23	19	$2,216,667	$11,600	19	$0	$0
7	CC	1075222933	PEREZ CARLOS	25-14	19	$2,850,000	$456,000	EPS005	19	$2,850,000	$114,000	CCF32	19	$2,850,000	$114,000	14-23	19	$2,850,000	$14,900	19	$0	$0
8	CC	1075239008	RUIZ WILMER	231001	19	$1,108,334	$177,400	EPS037	19	$1,108,334	$44,400	CCF32	19	$1,108,334	$44,400	14-23	19	$1,108,334	$5,800	19	$0	$0
9	CC	1003994749	TOVAR ANDRES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
10	CC	1003805361	TOVAR JOE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(10)**					$14,987,002	$2,398,200			$14,987,002	$599,800			$14,987,002	$599,800			$14,987,002	$78,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$2,398,200	$0	$2,398,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$177,400	$0	$177,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,266,300	$0	$1,266,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$777,100	$0	$777,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$177,400	$0	$177,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$78,700	$0	$78,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$78,700	$0	$78,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$599,800	$0	$599,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	$599,800	$0	$599,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$599,800	$0	$599,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$133,100	$0	$133,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$466,700	$0	$466,700
TOTAL				**10**	**$3,676,500**	**$0**	**$3,676,500**

2025/03/04 12:21 PM

INGES GROUP

NIT: 800.086.627-9

Certificado de cumplimiento de seguridad social y aportes parafiscales

Calle 6c No. 24ª-53 Barrio: La Gaitana – Cel: 3043502527
Neiva / Huila / Colombia
Email: Ingespotrerillos@gmail.com

INGES GROUP

INGES GROUP

NIT: 800.086.627-9

CERTIFICADO PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

DIEGO FERNANDO BUSTOS ORTIZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.076.985.423 de Algeciras, en mi condición de contador de INGES GROUP S.A.S. identificada con el NIT 800.086.627-9, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2025.

DIEGO FERNANDO BUSTOS ORTIZ
C.C. 1.076.985.423 de Algeciras
CONTADOR PÚBLICO
TP 273419-T

Calle 6c No. 24ª-53 Barrio: La Gaitana – Cel: 3043502527
Neiva / Huila / Colombia
Email: Ingespotrerillos@gmail.com

INGES GROUP


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.076.985.423
BUSTOS ORTIZ
APELLIDOS
DIEGO FERNANDO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 20-MAR-1992
ALGECIRAS
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
17-FEB-2011 ALGECIRAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-1901300-00288240-M-1076985423-20110401
0026498337A 1
33570537

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

273419-T



DIEGO FERNANDO
BUSTOS ORTIZ
C.C. 1076985423
RES. INSCRIPCION 1457 DEL 26/08/2020
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

294252 307461

Identificación Plásticos S.A. 180942/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0075D3A0AEEBCE81

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO FERNANDO BUSTOS ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1076985423 de ALGECIRAS (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 273419-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
