INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO **No. 1988 de 2021**, AMBALEMA – TOLIMA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **JUNIO DE 2022**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVNECIA CIUDADANA, A TRAVES DE AL EJECUCION DE UNPROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CARRERA 5 CON CARRERA 4 ENTRE CALLES 11 Y CALLE 12, DEL BARRIO LA ESPERANZA AREA URBANA - AMBALEMA COORDENADAS: 4°46'54.54"O		
BENEFICIARIO:	MUNIICPIO DE AMBALEMA - TOLIMA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 1.250.000.000,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 1.250.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	11-NOVIEMBRE-2021		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30-NOV-2022		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	**YENIER HENAO MEJIA**		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	LAURA QUINTERO	11/11/2021	21/11/2021
	YENIER HENAO MEJIA	22/11/2021	VIGENTE
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	CAMILO GARCIA MEDINA	22/11/21	31/12/21
	CAMILO GARCIA MEDINA	18/01/22	31/03/2020
	DANIEL SUAREZ	1/04/2022	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	112121	11-NOVIEMBRE-2021	
	18822	18-ENERO-2022	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2-2021-058100	03/11/2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL			
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 580-994000069130	20-11-2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	20-11-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: 28/05/2022
	SEGUNDA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACION		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	POLIZA INICIAL ASURADORA SOLIDARIA N° 580 47 994000069130 ANEXO 1		
	1.CUMPLIMIENTO $250.000.000 DESDE 12/11/2021 HASTA 31/05/2023		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ 83.333.000

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41.667.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	
VALOR DE OBRA	$ 1.041.667.000
VALOR INTERVENTORÍA	$ 83.333.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**UN PRIMER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **$225.000.000 PESOS M/L.,** contra entrega de los siguientes productos: **a**. suscripción del acta de inicio. **b**. designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. **c**. aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del ministerio.	N/A	2021-12-07	$ 225.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	**UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **$820.000.000 PESOS M/L.,** contra entrega de los siguientes productos: **A**. lacertificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. **B**. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. **C**. La respectiva acta parcial de obraavalada por el interventor, y **D**. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%	DD/MM/AAAA	$ 820.000.000
ULTIMO DESEMBOLSO	**UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **$205.000.000 PESOS M/L.,** contra entrega de los siguientes productos: **A**. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: **1)** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; **2)** La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. **B**. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. **C**. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 205.000.000
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 225.000.000
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$0.00

3. PÓLIZA INICIAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	30/11/2022

PÓLIZA PRIMERA PRORROGA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130 ANEXO 1	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	31/05/2023

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y construcción de obra Sacúdete al parque tipo 1.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato 083 del 11 de Marzo del 2022	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA".		$1.125.000.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA Representante Legal JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ		NIT. 901573308-1 CC. 1.020.757.338
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	25/10/2022		5 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO.
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$1.125.000.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
PÓLIZA No.	61-44-101043338, 61-40-101016232		
FECHA DE LA PÓLIZA	DESDE 20/04/2022 HASTA 24/04/2022		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y construcción de obra Sacúdete al parque tipo 1.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato 087 del 18 de Marzo del 2022	"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA".		$125.000.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ		CC. 7.722.019
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	25/10/2022		5 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO.
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$125.000.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA No.	560-47-99-4000152241		
FECHA DE LA PÓLIZA	21/04/2022		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: JUNIO 2022	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		**N/A**
INFORME FINANCIERO	**X**	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	**X**	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	**X**	
OTROS	**X**	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

PERIODO: JUNIO DE 2022

- Que el 1 de junio de 2022, la supervisión del Ministerio del interior remite mediante correo electrónico a la administracion municipal de Ambalema – Tolima la solicitud de ampliación de la póliza del convenio interadministrativo 1988 de 2021 de acuerdo al otrosí N°1 correspondiente a la primera prorroga.

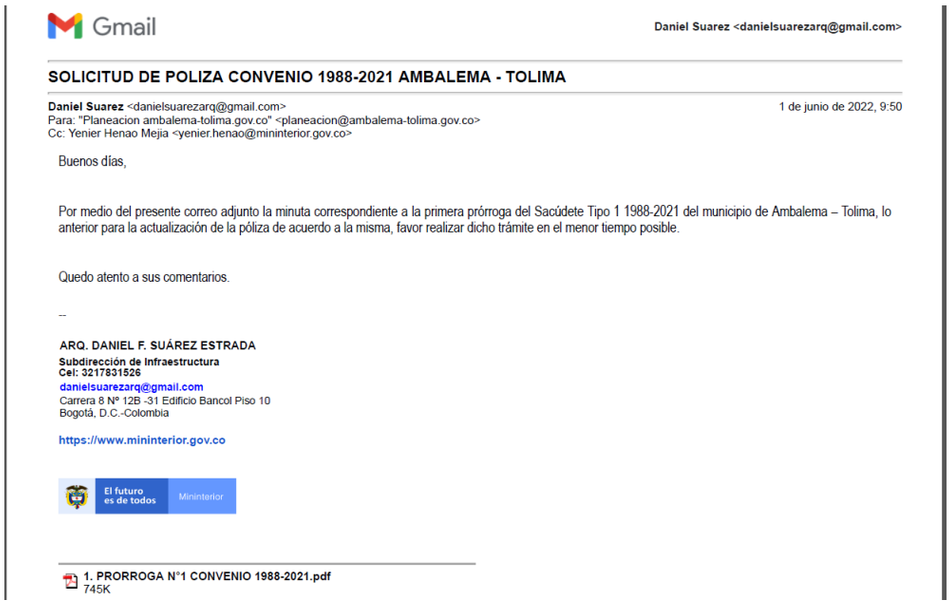

Gmail — Daniel Suarez <danielsuarezarq@gmail.com>

SOLICITUD DE POLIZA CONVENIO 1988-2021 AMBALEMA - TOLIMA

Daniel Suarez <danielsuarezarq@gmail.com> 1 de junio de 2022, 9:50
Para: "Planeacion ambalema-tolima.gov.co" <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>
Cc: Yenier Henao Mejia <yenier.henao@mininterior.gov.co>

Buenos días,

Por medio del presente correo adjunto la minuta correspondiente a la primera prórroga del Sacúdete Tipo 1 1988-2021 del municipio de Ambalema – Tolima, lo anterior para la actualización de la póliza de acuerdo a la misma, favor realizar dicho trámite en el menor tiempo posible.

Quedo atento a sus comentarios.

--


ARQ. DANIEL F. SUÁREZ ESTRADA
Subdirección de Infraestructura
Cel: 3217831526
danielsuarezarq@gmail.com
Carrera 8 Nº 12B -31 Edificio Bancol Piso 10
Bogotá, D.C.-Colombia

https://www.mininterior.gov.co

El futuro es de todos · Mininterior

1. PRORROGA N°1 CONVENIO 1988-2021.pdf
745K

- Que el 6 de junio de 2022, la administracion municipal de Ambalema – Tolima remite mediante correo electrónico a la supervisión del Ministerio del Interior como respuesta a la gestión realizada por la supervisión del Ministerio del Interior, la información actualizada del convenio interadministrativo 1988 de 2021 de acuerdo al inicio de la ejecución de los contratos derivados de Estudios, diseños, obra e interventoría de la misma del sacúdete al parque tipo 1 del municipio de Ambalema – Tolima.

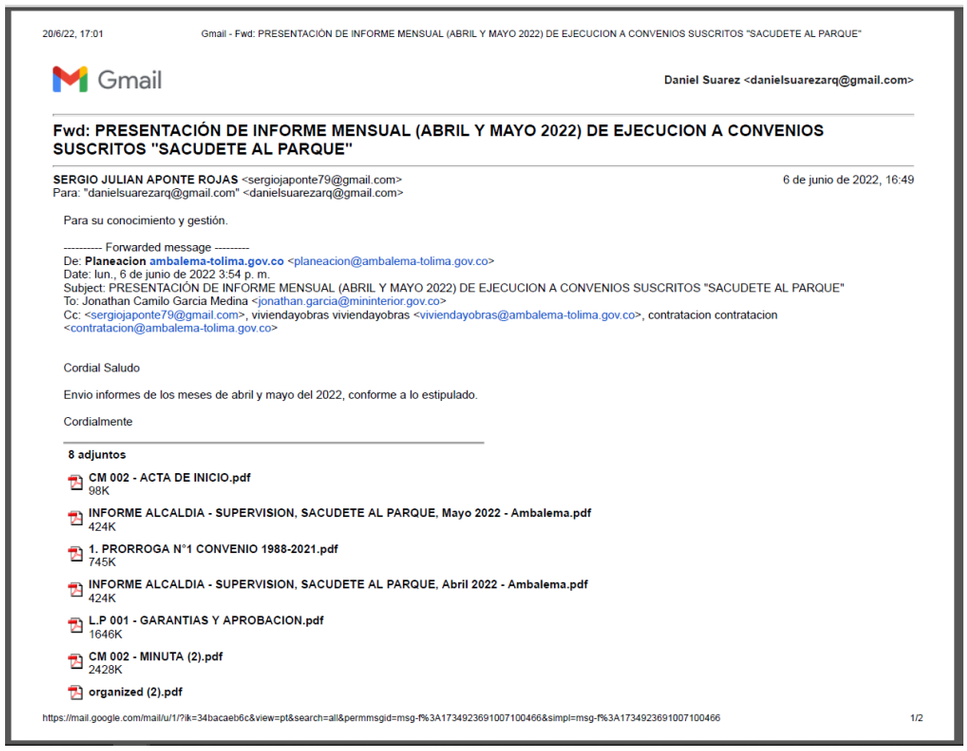

20/6/22, 17:01 Gmail - Fwd: PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL (ABRIL Y MAYO 2022) DE EJECUCION A CONVENIOS SUSCRITOS "SACUDETE AL PARQUE"

Gmail — Daniel Suarez <danielsuarezarq@gmail.com>

Fwd: PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL (ABRIL Y MAYO 2022) DE EJECUCION A CONVENIOS SUSCRITOS "SACUDETE AL PARQUE"

SERGIO JULIAN APONTE ROJAS <sergiojaponte79@gmail.com> 6 de junio de 2022, 16:49
Para: "danielsuarezarq@gmail.com" <danielsuarezarq@gmail.com>

Para su conocimiento y gestión.

---------- Forwarded message ---------
De: **Planeacion ambalema-tolima.gov.co** <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>
Date: lun., 6 de junio de 2022 3:54 p. m.
Subject: PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL (ABRIL Y MAYO 2022) DE EJECUCION A CONVENIOS SUSCRITOS "SACUDETE AL PARQUE"
To: Jonathan Camilo Garcia Medina <jonathan.garcia@mininterior.gov.co>
Cc: <sergiojaponte79@gmail.com>, viviendayobras viviendayobras <viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>, contratacion contratacion <contratacion@ambalema-tolima.gov.co>

Cordial Saludo

Envio informes de los meses de abril y mayo del 2022, conforme a lo estipulado.

Cordialmente

8 adjuntos

CM 002 - ACTA DE INICIO.pdf
98K

INFORME ALCALDIA - SUPERVISION, SACUDETE AL PARQUE, Mayo 2022 - Ambalema.pdf
424K

1. PRORROGA N°1 CONVENIO 1988-2021.pdf
745K

INFORME ALCALDIA - SUPERVISION, SACUDETE AL PARQUE, Abril 2022 - Ambalema.pdf
424K

L.P 001 - GARANTIAS Y APROBACION.pdf
1646K

CM 002 - MINUTA (2).pdf
2428K

organized (2).pdf

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=34bacaeb6c&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1734923691007100466&simpl=msg-f%3A1734923691007100466 1/2

- Que el 13 de junio de 2022, la administracion municipal de Ambalema – Tolima remite mediante correo electrónico a la supervisión del Ministerio del Interior la información solicitada frente al requerimiento realizado por parte de la Contraloría General de la Nación al Ministerio del Interior, mediante el cual se solicita la información actualizada del convenio respecto al avance del mismo.



7/2/23, 14:28 Correo: Daniel Felipe Suarez Estrada - Outlook

Re: SOLICITUD INFO CONTRALORIA CONVENIO 1988-2021 AMBALEMA - TOLIMA

Planeacion ambalema-tolima.gov.co <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>
Lun 13/06/2022 9:13
Para: Daniel Felipe Suarez Estrada <daniel.suarez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
CC: sergiojaponte79@gmail.com <sergiojaponte79@gmail.com>;viviendayobras viviendayobras <viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>

1 archivos adjuntos (21 MB)
Informe MININTERIOR.rar;

Cordial Saludo

Envío para el trámite a lugar, conforme a lo que se solicita, ya que no se pudo cargar a la carpeta compartida por ustedes.

Muchas gracias!!!


El vie, 10 jun 2022 a las 15:14, Daniel Felipe Suarez Estrada (<daniel.suarez@mininterior.gov.co>) escribió:

> Buenas tardes,
>
> Por medio del presente correo se solicita respetuosamente la siguiente información del convenio interadministrativo 1988-2021 de Ambalema - Tolima, la cual deberá de ser cargada al Drive compartido al correo de la secretaria de planeación a más tardar el día 11 de junio de 2022 sobre las 8:00 pm. Lo anterior, de acuerdo a la solicitud realizada por parte de la Contraloría al Ministerio del Interior.
>
> - Link del SECOP de los contratos derivados de Estudios, Diseños, Obra e Interventoría.
> - Informes mensuales de supervisión con sus respectivos anexos desde la suscripción del convenio interadministrativo.
> - Informes de Interventoría semanales y mensuales.
>
> Quedo atento a su respuesta.
>
> https://drive.google.com/drive/folders/1pF-br-EL9_pwBubaE-E__z8g1FdhAdhi?usp=sharing

--
SERGIO JULIAN APONTE ROJAS
Secretario de Planeación, Infraestructura y TICS

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkAGM0ZTEzMmQ3LTEyZDItNDg1Yi1iZDk4LTMxZWMwZWFiYjdiZQAQAFXRVt7ynpFBn%2F4yIvS0E0k%3D 1/2

- Que el 30 de junio de 2022, la supervisión del Ministerio del Interior remite mediante correo electrónico a la administracion municipal de Ambalema – Tolima el oficio con denominación OFI 2022-13696-SIN-4020, mediante el cual se realiza el requerimiento de la información actualizada del convenio y la gestión necesaria para la entrega de los Estudios y Diseños del sacúdete al parque tipo 1 del municipio de Ambalema – Tolima.

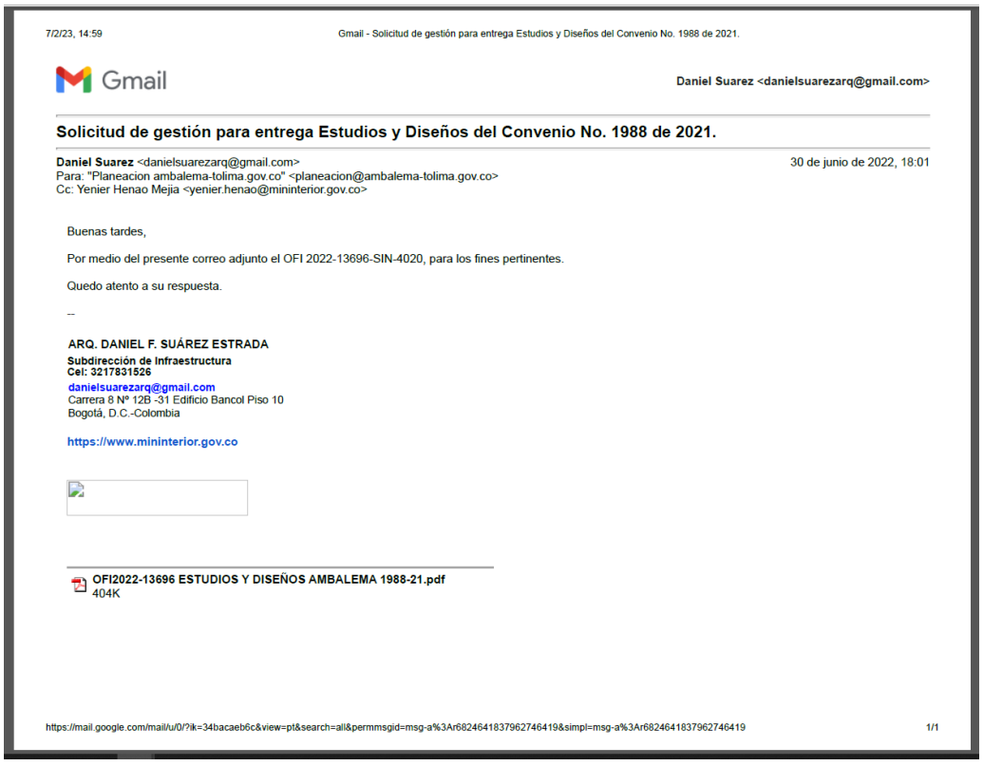

7/2/23, 14:59 Gmail - Solicitud de gestión para entrega Estudios y Diseños del Convenio No. 1988 de 2021.

Gmail **Daniel Suarez <danielsuarezarq@gmail.com>**

Solicitud de gestión para entrega Estudios y Diseños del Convenio No. 1988 de 2021.

Daniel Suarez <danielsuarezarq@gmail.com> 30 de junio de 2022, 18:01
Para: "Planeacion ambalema-tolima.gov.co" <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>
Cc: Yenier Henao Mejia <yenier.henao@mininterior.gov.co>

Buenas tardes,

Por medio del presente correo adjunto el OFI 2022-13696-SIN-4020, para los fines pertinentes.

Quedo atento a su respuesta.


--

ARQ. DANIEL F. SUÁREZ ESTRADA
Subdirección de Infraestructura
Cel: 3217831526
danielsuarezarq@gmail.com
Carrera 8 Nº 12B -31 Edificio Bancol Piso 10
Bogotá, D.C.-Colombia

https://www.mininterior.gov.co

OFI2022-13696 ESTUDIOS Y DISEÑOS AMBALEMA 1988-21.pdf
404K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=34bacaeb6c&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar6824641837962746419&simpl=msg-a%3Ar6824641837962746419 1/1

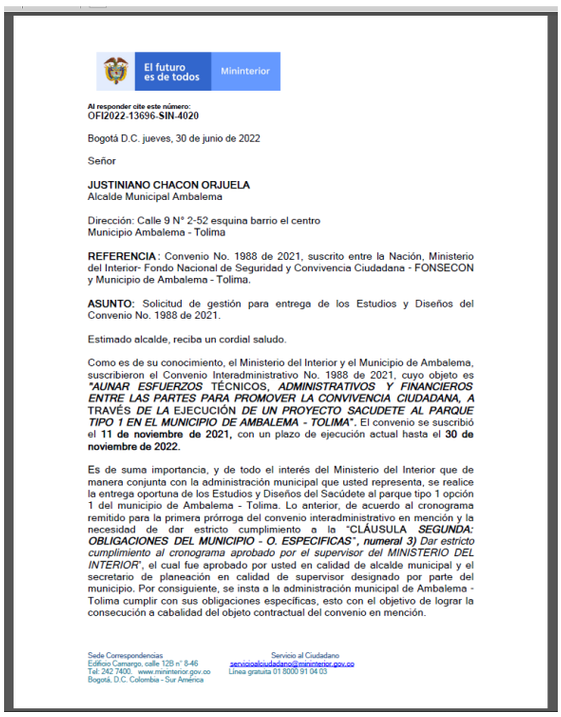

El futuro es de todos · Mininterior

Al responder cite este número:
OFI2022-13696-**SIN**-4020

Bogotá D.C. jueves, 30 de junio de 2022

Señor

JUSTINIANO CHACON ORJUELA
Alcalde Municipal Ambalema

Dirección: Calle 9 N° 2-52 esquina barrio el centro
Municipio Ambalema - Tolima

REFERENCIA: Convenio No. 1988 de 2021, suscrito entre la Nación, Ministerio del Interior- Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON y Municipio de Ambalema - Tolima.

ASUNTO: Solicitud de gestión para entrega de los Estudios y Diseños del Convenio No. 1988 de 2021.


Estimado alcalde, reciba un cordial saludo.

Como es de su conocimiento, el Ministerio del Interior y el Municipio de Ambalema, suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 1988 de 2021, cuyo objeto es "***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A*** TRAVÉS ***DE LA*** EJECUCIÓN ***DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA***". El convenio se suscribió el **11 de noviembre de 2021,** con un plazo de ejecución actual hasta el **30 de noviembre de 2022.**

Es de suma importancia, y de todo el interés del Ministerio del Interior que de manera conjunta con la administración municipal que usted representa, se realice la entrega oportuna de los Estudios y Diseños del Sacúdete al parque tipo 1 opción 1 del municipio de Ambalema - Tolima. Lo anterior, de acuerdo al cronograma remitido para la primera prórroga del convenio interadministrativo en mención y la necesidad de dar estricto cumplimiento a la "CLÁUSULA ***SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO - O. ESPECIFICAS", numeral 3)*** *Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR*", el cual fue aprobado por usted en calidad de alcalde municipal y el secretario de planeación en calidad de supervisor designado por parte del municipio. Por consiguiente, se insta a la administración municipal de Ambalema - Tolima cumplir con sus obligaciones específicas, esto con el objetivo de lograr la consecución a cabalidad del objeto contractual del convenio en mención.

Sede Correspondencias
Edificio Camargo, calle 12B n° 8-46
Tel: 242 7400. www.mininterior.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia - Sur América

Servicio al Ciudadano
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
Línea gratuita 01 8000 91 04 03

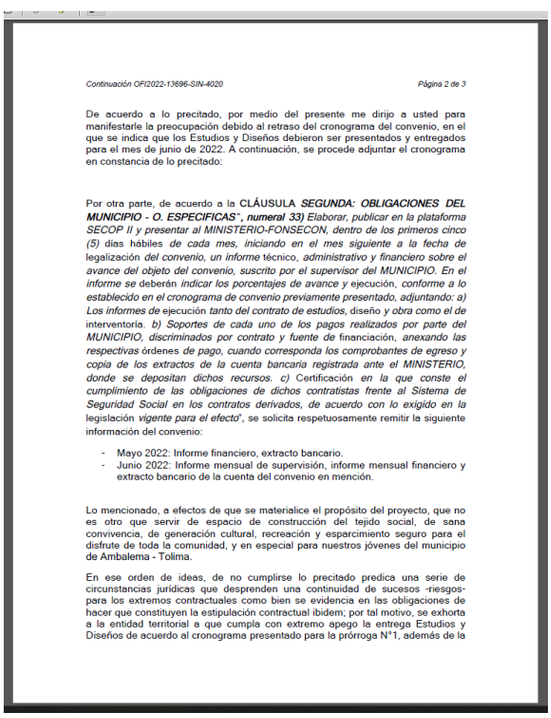

Continuación OFI2022-13696-SIN-4020 *Página 2 de 3*


De acuerdo a lo precitado, por medio del presente me dirijo a usted para manifestarle la preocupación debido al retraso del cronograma del convenio, en el que se indica que los Estudios y Diseños debieron ser presentados y entregados para el mes de junio de 2022. A continuación, se procede adjuntar el cronograma en constancia de lo precitado:

Por otra parte, de acuerdo a la CLÁUSULA ***SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO - O. ESPECIFICAS", numeral 33)*** *Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5)* días hábiles *de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de* legalización *del convenio, un informe* técnico, *administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se* deberán *indicar los porcentajes de avance y* ejecución, *conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de* ejecución *tanto del contrato de estudios,* diseño *y obra como el de* interventoría. *b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de* financiación, *anexando las respectivas* órdenes *de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c)* Certificación *en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la* legislación *vigente para el efecto*", se solicita respetuosamente remitir la siguiente información del convenio:

- Mayo 2022: Informe financiero, extracto bancario.
- Junio 2022: Informe mensual de supervisión, informe mensual financiero y extracto bancario de la cuenta del convenio en mención.

Lo mencionado, a efectos de que se materialice el propósito del proyecto, que no es otro que servir de espacio de construcción del tejido social, de sana convivencia, de generación cultural, recreación y esparcimiento seguro para el disfrute de toda la comunidad, y en especial para nuestros jóvenes del municipio de Ambalema - Tolima.

En ese orden de ideas, de no cumplirse lo precitado predica una serie de circunstancias jurídicas que desprenden una continuidad de sucesos -riesgos- para los extremos contractuales como bien se evidencia en las obligaciones de hacer que constituyen la estipulación contractual ibidem; por tal motivo, se exhorta a la entidad territorial a que cumpla con extremo apego la entrega Estudios y Diseños de acuerdo al cronograma presentado para la prórroga N°1, además de la

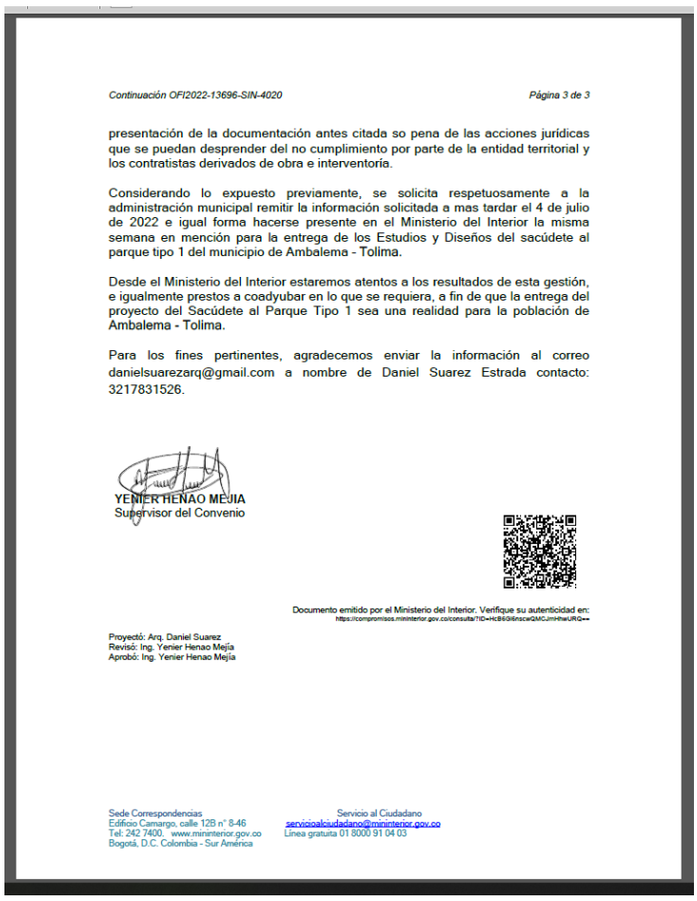

Continuación OFI2022-13696-SIN-4020 *Página 3 de 3*

presentación de la documentación antes citada so pena de las acciones jurídicas que se puedan desprender del no cumplimiento por parte de la entidad territorial y los contratistas derivados de obra e interventoría.

Considerando lo expuesto previamente, se solicita respetuosamente a la administración municipal remitir la información solicitada a mas tardar el 4 de julio de 2022 e igual forma hacerse presente en el Ministerio del Interior la misma semana en mención para la entrega de los Estudios y Diseños del sacúdete al parque tipo 1 del municipio de Ambalema - Tolima.

Desde el Ministerio del Interior estaremos atentos a los resultados de esta gestión, e igualmente prestos a coadyubar en lo que se requiera, a fin de que la entrega del proyecto del Sacúdete al Parque Tipo 1 sea una realidad para la población de Ambalema - Tolima.

Para los fines pertinentes, agradecemos enviar la información al correo danielsuarezarq@gmail.com a nombre de Daniel Suarez Estrada contacto: 3217831526.

YENIER HENAO MEJIA
Supervisor del Convenio

Documento emitido por el Ministerio del Interior. Verifique su autenticidad en:
https://compromisos.mininterior.gov.co/consulta/?ID=Hc86Gi6nscwQMCJmHhwURQ==

Proyectó: Arq. Daniel Suarez
Revisó: Ing. Yenier Henao Mejia
Aprobó: Ing. Yenier Henao Mejia

Sede Correspondencias
Edificio Camargo, calle 12B n° 8-46
Tel: 242 7400. www.mininterior.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia - Sur América

Servicio al Ciudadano
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
Línea gratuita 01 8000 91 04 03


- Para el mes de junio de 2022, la supervisión por parte del Ministerio del Interior mediante el oficio precitado, reitera a la administracion municipal la necesidad del estricto cumplimiento de las obligaciones especificas respecto a **3)** Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DELINTERIOR. **4)** Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual del Convenio, cumpliendo las normas técnicas necesarias para la correcta ejecución del mismo. **30)** Suministrar

oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.

- Para el mes de junio de 2022, por medio de comité periódicos las partes involucradas en el desarrollo de los Estudios, diseños y obra y grupo de WhatsApp se reporta el avance y cumplimiento de hitos en la entrega de los Estudios y Diseños del sacúdete al parque tipo del municipio de Ambalema – Tolima, el primero de ellos el cual corresponde al entregable arquitectónico se desarrollara las primeras semanas del mes de julio de 2022.

- La supervisión del municipio de Ambalema Tolima, remite al Ministerio del interior el informe mensual de supervisión y el extracto bancario de la cuenta del convenio donde se puede evidenciar la siguiente información:

  Valor desembolsado: $225.000.000,00
  Rendimientos financieros: $100.525,00
  Embargo: $42.524.519
  Saldo actual $182.576.006,00

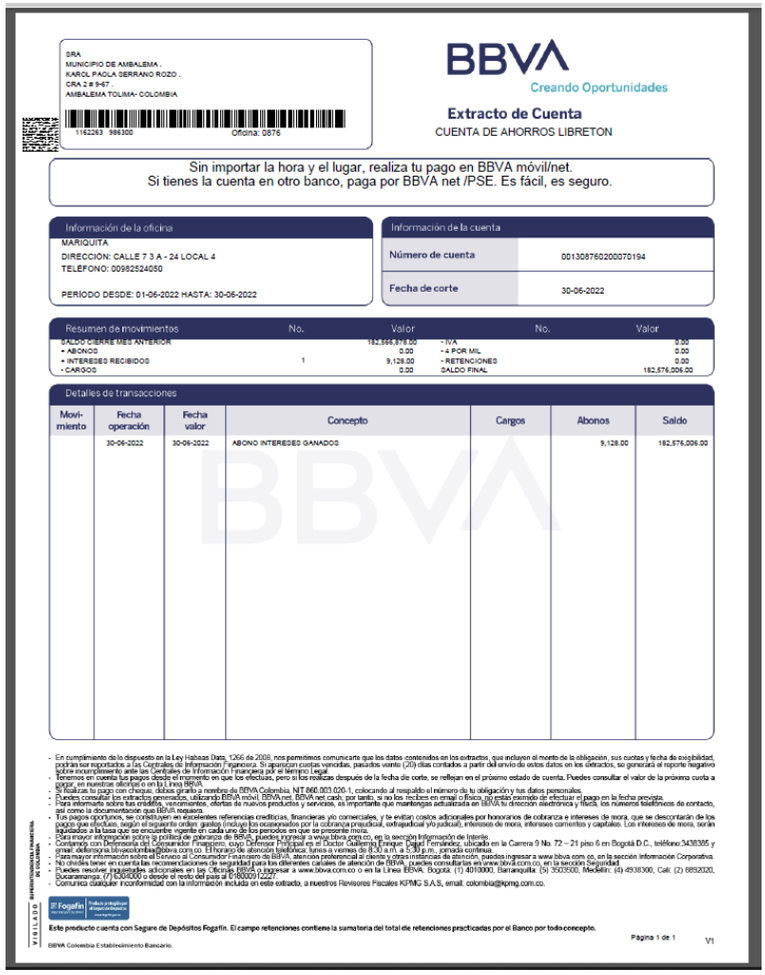

SRA
MUNICIPIO DE AMBALEMA .
KAROL PAOLA SERRANO ROZO .
CRA 2 # 9-67 .
AMBALEMA TOLIMA- COLOMBIA

1162283 986300 Oficina: 0876

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net.
Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina
MARIQUITA
DIRECCION: CALLE 7 3 A - 24 LOCAL 4
TELEFONO: 00982524050
PERIODO DESDE: 01-06-2022 HASTA: 30-06-2022

Información de la cuenta	
Número de cuenta	00130876020070194
Fecha de corte	30-06-2022

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		182,566,878.00	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	9,128.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	182,576,006.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	30-06-2022	30-06-2022	ABONO INTERESES GANADOS		9,128.00	182,576,006.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarle que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuentas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos sin los descuentos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el tiempo Legal.
- Tenemos en cuenta los pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si Realizas tu pago con cheque, dalos girados a nombre de BBVA Colombia. NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y fijada, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dagel Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono 3438585 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Defensor del Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para las diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA, llamar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000; Barranquilla: (5) 3503500; Medellín: (4) 4936300; Cali: (2) 8892020; Bucaramanga: (7) 6345000 o desde el resto del país al 018000122227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Fogafín — Todos tus depósitos amparados hasta $50 millones

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

Página 1 de 1 V1

De acuerdo a lo anterior, se solicita a la administracion municipal de Ambalema – Tolima adelantar el recurso necesario frente al embargo de la cuenta del convenio interadministrativo 1988 de 2021, toda vez que, la cuenta del convenio no es susceptible a este tipo de actuaciones, motivo por el cual se solicita que se genere el reintegro del recurso embargado en el menor tiempo posible.

- La administracion municipal de Ambalema – Tolima, informa y certifica la realización de mantenimiento de corte y limpieza del predio destinado a la obra del sacúdete de forma periódica.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

			DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

YENIER HENAO MEJIA **Supervisor Convenio No 1988 de 2021** Subdirección de Infraestructura Ministerio – FONSECON	**DANIEL SUAREZ ESTRADA** **Apoyo supervisión Convenio No 1988 de 2021** Subdirección de Infraestructura Ministerio – FONSECON

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO **No. 1988 de 2021**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES **DE JUNIO DE 2022**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVNECIA CIUDADANA, A TRAVES DE AL EJECUCION DE UNPROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 5 con Carrera 4 entre Calles 11 y Calle 12, del barrio la esperanza área urbana del Municipio de Ambalema Tolima Coordenadas: 4°46´59"N 74°45´47"W		
BENEFICIARIO:	AMBALEMA TOLIMA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$1.250.000.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 1.250.000.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	**10-11-2021**		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	**30-11-2022**		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	**SERGIO JULIÁN APONTE ROJAS – INGENIERO CIVIL, SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y TICS**		
SUPERVISORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
REGISTRO PRESUPUESTAL FONSECON			
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)			
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 127	21 de enero del 2022	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL			
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	11 de Noviembre de 2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	Prorroga No. 1 (Convenio)		INICIO: 31/05/2022
			HASTA: 30 de Noviembre de 2022
			INICIO:
			HASTA:
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si esnecesario)			INICIO:
	SUSPENSIÓN		HASTA:
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		HASTA:
	REINICIO		DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 20/05/2022		
	FECHA: 20/04/2022		
	FECHA: 20/11/2027		

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETEAL PARQUE TIPO 1 OPCION 1-MUNICIPO DE AMBALEMA TOLIMA	**$1.125.000.000.oo**
VALOR DE INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA, PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE COSNTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA	**$125.000.000.oo**
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	
VALOR DE OBRA TOTAL	**$1.125.000.000.oo**
VALOR INTERVENTORÍA	$125.000.000.oo
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$1.250.000.000.oo

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DEPAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. Cronograma contemplado en el # 2 de las obligacionesdel Municipio 2. Acta de Inicio 3. Certificado de s.s. Parafiscales 4. Certificado Cuenta de Ahorros 5. Asignación supervisión	NO APLICA	PENDIENTE	$ 225.000.000.oo
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME: 1				
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Seguros del Estado S.A

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
61-44-101043338	Cumplimiento del contrato, Pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales, Estabilidad y Calidad de la Obra y calidad del Servicio	$643.749.900	20/04/2022	20/11/2027
61-40-101016232	Predios Laborales y operaciones, contratistas y subcontratistas, Vehículos propios y no propios	$300.000.000	24/04/2022	24/11/2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato de Obra Publica	083 del 11 de Marzo del 2022	MIL CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE. ($1.125.000.000,oo)
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista de Obra Publica	**CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA NIT. 901573308-1, RL.**	

	JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ CC. 1.020.757.338		
Fecha de Acta de inicio del contrato de OBRA PUBLICA	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato Obra Publica	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**MIL CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE. ($1.125.000.000,oo)**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A		
PÓLIZA No.	61-44-101043338, 61-40-101016232		
FECHA DE LA PÓLIZA	20/04/2022, 24/04/2022		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato de Interventoría	087 del 18 de Marzo del 2022		**CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($125.000.000,oo)**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ, CC. 7.722.019		
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($125.000.000,oo)
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
PÓLIZA No.	560-47-99-4000152241		
FECHA DE LA PÓLIZA	21/04/2022		

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato de Obra Publica	083 del 11 de Marzo del 2022		MIL CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE. ($1.125.000.000,oo)
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA NIT. 901573308-1, RL. JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ CC. 1.020.757.338		
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)		DD/MM/AAAA	

Fecha de terminación del contrato	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		MIL CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE. ($1.125.000.000,oo)
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A	
PÓLIZA No.	61-44-101043338, 61-40-101016232	
FECHA DE LA PÓLIZA	20/04/2022, 24/04/2022	

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ, CC. 7.722.019		
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($125.000.000,oo)
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
PÓLIZA No.	560-47-99-4000152241		
FECHA DE LA PÓLIZA	21/04/2022		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

	SI	**NO**
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:		
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
INFORME FINANCIERO		
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		
OTROS		

1. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:												
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:											**PORCENTAJE (%)**	
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA												
% EJECUTADO DE OBRA												
% AVANCE DE OBRA	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**	**MES 11**	**MES 12**
	NA	NA	NA	NA	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
INFORME: **PERIODO: junio de 2022** **FECHA DE ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA: N/A** **VIGENCIA:**												

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el convenio de las actividades específicas correspondiente al mes de **Junio de 2022**, según lo pactado:

Se anexa

1) Postura de Valla informativa del proyecto
2) Mantenimientos de corte y limpieza del predio
3) Adjudicación del Contrato de Obra e Interventoría
4) Pólizas de Contrato de Obra e interventoría
5) Contratos de Obra e interventoría

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



2. **FECHAS DE VISITAS REALIZADAS A LA OBRA** (orden cronológico)

SUPERVISOR

OBSERVACIONES

1. **PUBLICACIÓN SECOP**

- https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-1-221801&g-recaptcha-response=03AGdBq25OxRu4GwrpaeTa56_XOjQ0zC0tYtD-7tnQ0KtDEZ5ppOzokSwramZhtXQV-vhHR68RMnrJV0jYArddpFirlcMpiSa5jNgIv-KZmiT8xvB-KoE2tuMNAuDuQYIQQAwUrLHiEaOW1MkZq05rxKnqPxdEhijrBXoDHL3hzJX3OHy5mnKeQmCAJcMjbcmvL35SwryE3zTwmKimrTIy3XUPQOZiV7Gd9gRdI7fEzAjHqQQJeQioJqf7Buw7BWiIzmSChcZio1tNBDPw2-fT1Rd3Xyg3kUMWTj8wxeDHykqtQWcLaNarZ7Ejhk0N1R0d2fT1ok3UHGMn-D9HaXBnqO-LaLdOkfbloRBwnH1vHt1NNKRMHiWlWguDQ_Jj8qmdE7Wye3xLsupYWsc-mDgaWTZZuwaNomMwUI1S74SFzfm41JcVor_14Q4dCh4DVKatYexpuTaA96w_0GdFKjsQM-cpHbtHFFC3sw

LP - 001 - 2022	Licitación Pública	Convocado	TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AMBALEMA	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA	Tolima : Ambalema	$1.125.000.000,00	

- https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-10-216872&g-recaptcha-response=03AGdBq25JLKHhSM9Gs6AjRrdMur4AjbQWjCKLqWOK3uJkCmGg0bmkXhH146lQJKnsCjp89J8L_KiZf4bA5w1pJgyce6uOETJVvorqKkboPXDszmwULKuaaf0EieQ3GkFvmxF5nz_1ooPAnq4y9cJMERoIlQLrEnTeXip9AbK6Xs45gKnec3IQmJmy2XXxnms21bvoY8VRNseMZ3VRliXLobm0YMbnMl9KUurI6X8COxlcfGMh0_whscuhd_VWr3zrCH2ygfU5tqyfb2TYq0ElTcZDVhxSDnybYgJYKfoQhNfslF0PxtSsPTVnTDruUkPn2GAuF9nOiz6VWS493brlWmmdI_njfd-gnXs8nAzNB5mXcLylfoDfVpaBYxHnWJapgvVU8EW8c_IszrsNB2Dx-MkBswsanX00Qg09Q8w19On1uVINAlOh3shI0bH7PdoxtlCy1mu7-eTp6dJ46ob-Lj_pmI0zeb3kxg

10 CM - 002 - 2022	Concurso de Méritos con Lista Corta	Convocado	TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AMBALEMA	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA	Tolima : Ambalema	$125.000.000,00	Fecha de Carga en el Sistema 15-FEB-22

SERGIO JULIAN APONTE ROJAS
Secretario de Planeacion, Infraestructura y TICS
Sepervisor Convenio No. 1988 de 2021Ambalema Tolima

CONVENIO 1988 DE 2021

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto Sacúdete al Parque Tipo 1 en el municipio de Ambalema – Tolima"

INFORME FINANCIERO DE MAYO A OCTUBRE DE 2022

MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA

PROYECTO (S): * ESTUDIOS Y DISEÑOS SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA
* INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, MUNICIPIO DE AMBALEMA – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

CUENTA (AHORROS) No: 876-070194 DEL BANCO: BBVA

VALOR CONVENIO			**$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO			**$ 0,00**
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 1	**$ 225.000.000,00**
		GIRO 2	**$ 0,00**
		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 225.000.000,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 876-070194 A LA FECHA (1) **$ 225.000.000,00** $ 225.000.000,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-001-2022 (Contrato 083)	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA	$ 1.125.000.000,00	$ 0,00	$ 1.125.000.000,00
C-002-2022 (Contrato 087 de 2022)	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ	$ 125.000.000,00	$ 0,00	$ 125.000.000,00
				$ 0,00
				$ 0,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1.250.000.000,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
						$ 0,00	$ 0,00
						$ 0,00	$ 0,00
						$ 0,00	$ 0,00
						$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)						**$ 0,00**	**$ 0,00**

OBSERVACION: Se presentó embargo por COLPENSIONES y Ministerio de Educación por valor de $ 42,524,519, recursos que se encuentra en reclamación por parte del Municipio para su respectiva devolución por corresponder a recursos inembargables

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2021	24.502,00
31/01/2022	30.386,00
28/02/2022	9.127,00
31/03/2022	9.127,00
29/04/2022	9.127,00
31/05/2022	**9.128,00**
30/06/2022	**9.128,00**
29/07/2022	9.129,00
31/08/2022	9.129,00
30/09/2022	9.130,00
31/10/2022	9.130,00
TOTAL (3)	**$ 137.043,00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------


FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 225.000.000,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS (6)	**$ 42.524.519,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 137.043,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 137.043,00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	
SALDO EN CAJA INCLUIDO RENDIMIENTOS	**$ 182.612.524,00**

OBSERVACIONES

FIRMA



KAROL PAOLA SERRANO ROZO

Secretaria de Hacienda y Tesorería

Ambalema - Tolima

* SE DEBEN ADJUNTAR COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES(FINAL DEL CONVENIO).

SRA
MUNICIPIO DE AMBALEMA .
KAROL PAOLA SERRANO ROZO .
CRA 2 # 9-67 .
AMBALEMA TOLIMA- COLOMBIA

1162263 986300 Oficina: 0876

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net.
Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

MARIQUITA
DIRECCIÓN: CALLE 7 3 A - 24 LOCAL 4
TELÉFONO: 00982524050

PERÍODO DESDE: 01-06-2022 HASTA: 30-06-2022

Información de la cuenta

Número de cuenta	001308760200070194
Fecha de corte	30-06-2022

Resumen de movimientos

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		182,566,878.00	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	9,128.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	182,576,006.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	30-06-2022	30-06-2022	ABONO INTERESES GANADOS		9,128.00	182,576,006.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

Gmail

Daniel Suarez <danielsuarezarq@gmail.com>

SOLICITUD DE POLIZA CONVENIO 1988-2021 AMBALEMA - TOLIMA

Daniel Suarez <danielsuarezarq@gmail.com> 1 de junio de 2022, 9:50
Para: "Planeacion ambalema-tolima.gov.co" <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>
Cc: Yenier Henao Mejia <yenier.henao@mininterior.gov.co>

Buenos días,

Por medio del presente correo adjunto la minuta correspondiente a la primera prórroga del Sacúdete Tipo 1 1988-2021 del municipio de Ambalema – Tolima, lo anterior para la actualización de la póliza de acuerdo a la misma, favor realizar dicho trámite en el menor tiempo posible.

Quedo atento a sus comentarios.

--

ARQ. DANIEL F. SUÁREZ ESTRADA
Subdirección de Infraestructura
Cel: 3217831526
danielsuarezarq@gmail.com
Carrera 8 Nº 12B -31 Edificio Bancol Piso 10
Bogotá, D.C.-Colombia

https://www.mininterior.gov.co

El futuro es de todos Mininterior

1. PRORROGA N°1 CONVENIO 1988-2021.pdf
745K

Gmail

Daniel Suarez <danielsuarezarq@gmail.com>

Fwd: PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL (ABRIL Y MAYO 2022) DE EJECUCION A CONVENIOS SUSCRITOS "SACUDETE AL PARQUE"

SERGIO JULIAN APONTE ROJAS <sergiojaponte79@gmail.com> 6 de junio de 2022, 16:49
Para: "danielsuarezarq@gmail.com" <danielsuarezarq@gmail.com>

Para su conocimiento y gestión.

---------- Forwarded message ---------
De: **Planeacion ambalema-tolima.gov.co** <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>
Date: lun., 6 de junio de 2022 3:54 p. m.
Subject: PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL (ABRIL Y MAYO 2022) DE EJECUCION A CONVENIOS SUSCRITOS "SACUDETE AL PARQUE"
To: Jonathan Camilo Garcia Medina <jonathan.garcia@mininterior.gov.co>
Cc: <sergiojaponte79@gmail.com>, viviendayobras viviendayobras <viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>, contratacion contratacion <contratacion@ambalema-tolima.gov.co>

Cordial Saludo

Envio informes de los meses de abril y mayo del 2022, conforme a lo estipulado.

Cordialmente

8 adjuntos

CM 002 - ACTA DE INICIO.pdf
98K

INFORME ALCALDIA - SUPERVISION, SACUDETE AL PARQUE, Mayo 2022 - Ambalema.pdf
424K

1. PRORROGA N°1 CONVENIO 1988-2021.pdf
745K

INFORME ALCALDIA - SUPERVISION, SACUDETE AL PARQUE, Abril 2022 - Ambalema.pdf
424K

L.P 001 - GARANTIAS Y APROBACION.pdf
1646K

CM 002 - MINUTA (2).pdf
2428K

organized (2).pdf

3391K

CM 002 - GARANTIAS.pdf
84K

Re: SOLICITUD INFO CONTRALORIA CONVENIO 1988-2021 AMBALEMA - TOLIMA

Planeacion ambalema-tolima.gov.co <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>

Lun 13/06/2022 9:13

Para: Daniel Felipe Suarez Estrada <daniel.suarez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

CC: sergiojaponte79@gmail.com <sergiojaponte79@gmail.com>;viviendayobras viviendayobras <viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>

1 archivos adjuntos (21 MB)

Informe MININTERIOR.rar;

Cordial Saludo

Envío para el trámite a lugar, conforme a lo que se solicita, ya que no se pudo cargar a la carpeta compartida por ustedes.

Muchas gracias!!!

El vie, 10 jun 2022 a las 15:14, Daniel Felipe Suarez Estrada (<daniel.suarez@mininterior.gov.co>) escribió:

> Buenas tardes,
>
> Por medio del presente correo se solicita respetuosamente la siguiente información del convenio interadministrativo 1988-2021 de Ambalema - Tolima, la cual deberá de ser cargada al Drive compartido al correo de la secretaria de planeación a más tardar el día 11 de junio de 2022 sobre las 8:00 pm. Lo anterior, de acuerdo a la solicitud realizada por parte de la Contraloría al Ministerio del Interior.
>
> - Link del SECOP de los contratos derivados de Estudios, Diseños, Obra e Interventoría.
> - Informes mensuales de supervisión con sus respectivos anexos desde la suscripción del convenio interadministrativo.
> - Informes de Interventoría semanales y mensuales.
>
> Quedo atento a su respuesta.
>
> https://drive.google.com/drive/folders/1pF-br-EL9_pwBubaE-E__z8g1FdhAdhi?usp=sharing

--

SERGIO JULIAN APONTE ROJAS

Secretario de Planeación, Infraestructura y TICS

Calle 9 N°2-52 Piso 2, Barrio Centro, Celular: 3167640245,
Web: www.ambalema-tolima.gov.co Código Postal 731001

Con el objetivo de brindar siempre un mejor servicio, lo invitamos a responder la siguiente encuesta de satisfacción relacionada con el servicio recibido por el área TICS de la alcaldía de Ambalema Tolima: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUWoAWfWRFzWoQU5ve_k0cRFvmn54CMM-ef5JlWr4IedPyg/viewform

Recuerde que estamos a su disposición, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico planeacion@ambalema-tolima.gov.co y Página Web: http://www.ambalema-tolima.gov.co

Los invitamos a visitar nuestras redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiaambalema

Twitter: https://twitter.com/AAmbalema

Sitio web: https://www.youtube.com/channel/UCS81omCphTJqr5HpTqSp-Sg?view_as=subscriber

Re: SOLICITUD DE POLIZA CONVENIO 1988-2021 AMBALEMA - TOLIMA

Planeacion ambalema-tolima.gov.co <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>

Vie 17/06/2022 12:47

Para: Daniel Felipe Suarez Estrada <daniel.suarez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

GRACIAS POR CONTACTARNOS!!!

El horario de RECEPCIÓN en este buzón electrónico es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., cualquier documento recibido con posterioridad, será radicado con fecha del siguiente día hábil, el único correo autorizado para recepción de memoriales es el institucional.

Con el objetivo de brindar siempre un mejor servicio, lo invitamos a responder la siguiente encuesta de satisfacción relacionada con el servicio recibido por el área TICS de la alcaldía de Ambalema Tolima: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUWoAWfWRFzWoQU5ve_k0cRFvmn54CMM-ef5JIWr4ledPyg/viewform

Igualmente puede enviar sus solicitudes a través de la pagina web de la Alcaldìa Municipal http://www.ambalema-tolima.gov.co/peticiones-quejas-reclamos

--

SERGIO JULIAN APONTE ROJAS

Secretario de Planeación, Infraestructura y TICS

Calle 9 N°2-52 Piso 2, Barrio Centro, Celular: 3167640245,

Web: www.ambalema-tolima.gov.co Código Postal 731001

Con el objetivo de brindar siempre un mejor servicio, lo invitamos a responder la siguiente encuesta de satisfacción relacionada con el servicio recibido por el área TICS de la alcaldía de Ambalema Tolima: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUWoAWfWRFzWoQU5ve_k0cRFvmn54CMM-ef5JIWr4ledPyg/viewform

Recuerde que estamos a su disposición, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico planeacion@ambalema-tolima.gov.co y Página Web: http://www.ambalema-tolima.gov.co

Los invitamos a visitar nuestras redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiaambalema

Twitter: https://twitter.com/AAmbalema

Sitio web: https://www.youtube.com/channel/UCS81omCphTJqr5HpTqSp-Sg?view_as=subscriber

Gmail

Daniel Suarez <danielsuarezarq@gmail.com>

Solicitud de gestión para entrega Estudios y Diseños del Convenio No. 1988 de 2021.

Daniel Suarez <danielsuarezarq@gmail.com> 30 de junio de 2022, 18:01
Para: "Planeacion ambalema-tolima.gov.co" <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>
Cc: Yenier Henao Mejia <yenier.henao@mininterior.gov.co>

Buenas tardes,

Por medio del presente correo adjunto el OFI 2022-13696-SIN-4020, para los fines pertinentes.

Quedo atento a su respuesta.

--

ARQ. DANIEL F. SUÁREZ ESTRADA
Subdirección de Infraestructura
Cel: 3217831526
danielsuarezarq@gmail.com
Carrera 8 Nº 12B -31 Edificio Bancol Piso 10
Bogotá, D.C.-Colombia

https://www.mininterior.gov.co



OFI2022-13696 ESTUDIOS Y DISEÑOS AMBALEMA 1988-21.pdf
404K

Al responder cite este número:
OFI2022-13696-SIN-4020

Bogotá D.C. jueves, 30 de junio de 2022

Señor

JUSTINIANO CHACON ORJUELA
Alcalde Municipal Ambalema

Dirección: Calle 9 N° 2-52 esquina barrio el centro
Municipio Ambalema – Tolima

REFERENCIA: Convenio No. 1988 de 2021, suscrito entre la Nación, Ministerio del Interior- Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON y Municipio de Ambalema – Tolima.

ASUNTO: Solicitud de gestión para entrega de los Estudios y Diseños del Convenio No. 1988 de 2021.

Estimado alcalde, reciba un cordial saludo.

Como es de su conocimiento, el Ministerio del Interior y el Municipio de Ambalema, suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 1988 de 2021, cuyo objeto es ***"AUNAR ESFUERZOS*** TÉCNICOS, ***ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A*** TRAVÉS ***DE LA*** EJECUCIÓN ***DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA".*** El convenio se suscribió el **11 de noviembre de 2021,** con un plazo de ejecución actual hasta el **30 de noviembre de 2022.**

Es de suma importancia, y de todo el interés del Ministerio del Interior que de manera conjunta con la administración municipal que usted representa, se realice la entrega oportuna de los Estudios y Diseños del Sacúdete al parque tipo 1 opción 1 del municipio de Ambalema - Tolima. Lo anterior, de acuerdo al cronograma remitido para la primera prórroga del convenio interadministrativo en mención y la necesidad de dar estricto cumplimiento a la "CLÁUSULA ***SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO – O. ESPECIFICAS", numeral 3)*** *Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR*", el cual fue aprobado por usted en calidad de alcalde municipal y el secretario de planeación en calidad de supervisor designado por parte del municipio. Por consiguiente, se insta a la administración municipal de Ambalema - Tolima cumplir con sus obligaciones específicas, esto con el objetivo de lograr la consecución a cabalidad del objeto contractual del convenio en mención.

De acuerdo a lo precitado, por medio del presente me dirijo a usted para manifestarle la preocupación debido al retraso del cronograma del convenio, en el que se indica que los Estudios y Diseños debieron ser presentados y entregados para el mes de junio de 2022. A continuación, se procede adjuntar el cronograma en constancia de lo precitado:

Por otra parte, de acuerdo a la CLÁUSULA ***SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO – O. ESPECIFICAS*****", numeral 33)** *Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5)* días hábiles *de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de* legalización *del convenio, un informe* técnico, *administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se* deberán *indicar los porcentajes de avance y* ejecución, *conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de* ejecución *tanto del contrato de estudios,* diseño *y obra como el de* interventoría. *b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de* financiación, *anexando las respectivas* órdenes *de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c)* Certificación *en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la* legislación *vigente para el efecto*", se solicita respetuosamente remitir la siguiente información del convenio:

- Mayo 2022: Informe financiero, extracto bancario.
- Junio 2022: Informe mensual de supervisión, informe mensual financiero y extracto bancario de la cuenta del convenio en mención.

Lo mencionado, a efectos de que se materialice el propósito del proyecto, que no es otro que servir de espacio de construcción del tejido social, de sana convivencia, de generación cultural, recreación y esparcimiento seguro para el disfrute de toda la comunidad, y en especial para nuestros jóvenes del municipio de Ambalema - Tolima.

En ese orden de ideas, de no cumplirse lo precitado predica una serie de circunstancias jurídicas que desprenden una continuidad de sucesos -riesgos- para los extremos contractuales como bien se evidencia en las obligaciones de hacer que constituyen la estipulación contractual ibidem; por tal motivo, se exhorta a la entidad territorial a que cumpla con extremo apego la entrega Estudios y Diseños de acuerdo al cronograma presentado para la prórroga N°1, además de la

presentación de la documentación antes citada so pena de las acciones jurídicas que se puedan desprender del no cumplimiento por parte de la entidad territorial y los contratistas derivados de obra e interventoría.

Considerando lo expuesto previamente, se solicita respetuosamente a la administración municipal remitir la información solicitada a mas tardar el 4 de julio de 2022 e igual forma hacerse presente en el Ministerio del Interior la misma semana en mención para la entrega de los Estudios y Diseños del sacúdete al parque tipo 1 del municipio de Ambalema – Tolima.

Desde el Ministerio del Interior estaremos atentos a los resultados de esta gestión, e igualmente prestos a coadyubar en lo que se requiera, a fin de que la entrega del proyecto del Sacúdete al Parque Tipo 1 sea una realidad para la población de Ambalema - Tolima.

Para los fines pertinentes, agradecemos enviar la información al correo danielsuarezarq@gmail.com a nombre de Daniel Suarez Estrada contacto: 3217831526.

YENIER HENAO MEJIA
Supervisor del Convenio

Documento emitido por el Ministerio del Interior. Verifique su autenticidad en:
https://compromisos.mininterior.gov.co/consulta/?ID=HcB6Gi6nscwQMCJmHhwURQ==

Proyectó: Arq. Daniel Suarez
Revisó: Ing. Yenier Henao Mejía
Aprobó: Ing. Yenier Henao Mejía
