| | | |
|---|---|---|
| El futuro es de todos · Mininterior | **FORMATO**<br>**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**<br>**ANEXO 3** | **Código: BS-P3-F3**<br>**Versión: 4**<br>**Vigente Desde: 17/12/2018** |

| |
|---|
| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON |
| CONVENIO **No. 1988 de 2021**, AMBALEMA – TOLIMA |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **SEPTIEMBRE DE 2022** |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | "ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVNECIA CIUDADANA, A TRAVES DE AL EJECUCION DE UNPROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA" | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:** (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | CARRERA 5 CON CARRERA 4 ENTRE CALLES 11 Y CALLE 12, DEL BARRIO LA ESPERANZA AREA URBANA - AMBALEMA COORDENADAS: 4°46'54.54"O | | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNIICPIO DE AMBALEMA - TOLIMA | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $ 1.250.000.000,00 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $ 0,00 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | | $ 1.250.000.000,00 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 11-NOVIEMBRE-2021 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 30-NOV-2022 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | **YENIER HENAO MEJIA** | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | LAURA QUINTERO | 11/11/2021 | 21/11/2021 |
| | YENIER HENAO MEJIA | 22/11/2021 | VIGENTE |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | CAMILO GARCIA MEDINA | 22/11/21 | 31/12/21 |
| | CAMILO GARCIA MEDINA | 18/01/22 | 31/03/2020 |
| | DANIEL SUAREZ | 1/04/2022 | ACTUAL |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | 112121 | 11-NOVIEMBRE-2021 | |
| | 18822 | 18-ENERO-2022 | |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | No. 2-2021-058100 | 03/11/2021 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No. 580-994000069130 | 20-11-2021 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 20-11-2021 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | | FECHA: 28/05/2022 |
| | SEGUNDA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACION | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | TERCERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** (Vigencia nueva del amparo) | POLIZA INICIAL ASURADORA SOLIDARIA N° 580 47 994000069130 ANEXO 1 | | |
| | 1.CUMPLIMIENTO $250.000.000 DESDE 12/11/2021 HASTA 31/05/2023 | | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | | $ 83.333.000 |

| | |
|---|---|
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 41.667.000 |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | |
| **VALOR DE OBRA** | $ 1.041.667.000 |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | $ 83.333.000 |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | **UN PRIMER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **$225.000.000 PESOS M/L.,** contra entrega de los siguientes productos: **a**. suscripción del acta de inicio. **b**. designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. **c**. aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del ministerio. | N/A | 2021-12-07 | $ 225.000.000 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | **UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **$820.000.000 PESOS M/L.,** contra entrega de los siguientes productos: **A**. lacertificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. **B**. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. **C**. La respectiva acta parcial de obraavalada por el interventor, y **D**. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. | 40% | DD/MM/AAAA | $ 820.000.000 |
| **ULTIMO DESEMBOLSO** | **UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **$205.000.000 PESOS M/L.,** contra entrega de los siguientes productos: **A**. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: **1)** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; **2)** La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. **B**. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. **C**. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado. | 100% | DD/MM/AAAA | $ 205.000.000 |
| **TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $ 225.000.000 |
| **TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $0.00 |

**3. PÓLIZA INICIAL CONVENIO/ CONTRATO**

**Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 580-994000069130 | Cumplimiento del contrato | 250.000.000 | 12/11/2021 | 30/11/2022 |

**PÓLIZA PRIMERA PRORROGA CONVENIO/ CONTRATO**

**Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 580-994000069130 ANEXO 1 | Cumplimiento del contrato | 250.000.000 | 12/11/2021 | 31/05/2023 |

**4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA**

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y construcción de obra Sacúdete al parque tipo 1.***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato** 083 del 11 de Marzo del 2022 | "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA". | | $1.125.000.000 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA<br><br>Representante Legal<br>JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ | | NIT. 901573308-1<br>CC. 1.020.757.338 |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 25/05/2022 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | SUSPENSIÓN N°1 | 22/07/2022 | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | 25/10/2022 | | 5 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO. |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $1.125.000.000 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A | | |
| **PÓLIZA No.** | 61-44-101043338, 61-40-101016232 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | DESDE 20/04/2022 HASTA 24/04/2022 | | |

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y construcción de obra Sacúdete al parque tipo 1.***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato** 087 del 18 de Marzo del 2022 | "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA". | | $125.000.000 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ | | CC. 7.722.019 |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 25/05/2022 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | SUSPENSIÓN N°1 | 22/07/2022 | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | 25/10/2022 | | 5 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO. |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $125.000.000 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | |
| **PÓLIZA No.** | 560-47-99-4000152241 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 21/04/2022 | | |

## 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: SEPTIEMBRE 2022 | **SI** | **NO** |
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | **N/A** |
| INFORME FINANCIERO | **X** | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | **X** | |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | **X** | |
| OTROS | **X** | |

## 6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **0%** |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | **0%** |


**JUSTIFICACION DE AVANCE MUNICIPIO**

*"En el mes de Septiembre de 2022 se continúan con las diferentes mesas técnicas con el Ministerio del Cultura , debido a que como ya se había especificado el bien objeto de intervención se encuentra enmarcado dentro del Área de Afectación del centro histórico del municipio de Ambalema – Tolima, por ende, presenta un nivel de intervención N°3, según resolución 0443 del 31 de Diciembre de 2021 (expedida por el Ministerio del Cultura), por ende, se debe tener una CONSERVACION DEL TIPO CONTEXTUAL (CC); así las cosas, el MINCULTURA exige su aprobación para intervención*

*del bien, lo que obliga a cargar el proyecto a la plataforma SIPA, con el fin de que dicho Ministerio pueda expedir la nombrada autorización; por lo que se inicia el proceso de cargue de documentación del Proyecto Sacúdete al parque a la plataforma especificada.*

*Teniendo en cuenta lo anterior, tanto el Contrato de obra como el de interventoría continúan suspendidos hasta tanto no se supere los motivos por los cuales dieron origen a la suspensión N°1 fechada el 22 de Julio de 2022.*

*Igualmente, La Administracion Municipal en representación del Señor Alcalde Justiniano Chacón Orjuela, inicia el estudio de alternativas de cierre financiero, para continuar con el proceso y desarrollo del Proyecto del Sacúdete al parque.*

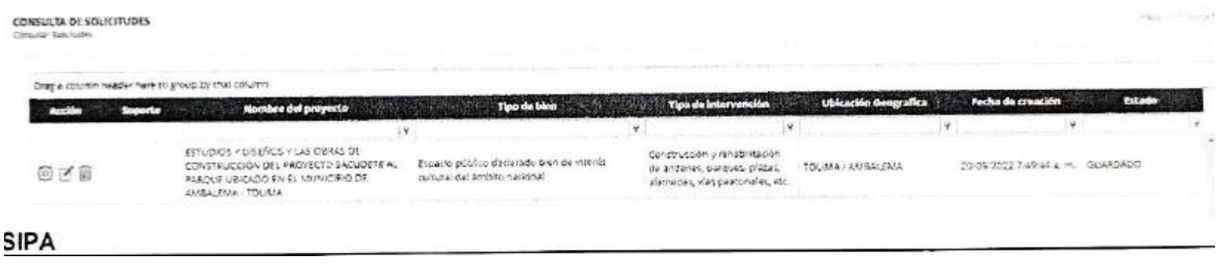


SIPA

**JUSTIFICACION DE AVANCE MINISTERIO**

- Que para el mes de septiembre de 2022, como lo informa la administracion municipal en su informe de supervisión, se adelantaron mesas técnicas las cuales tuvieron como resultado el cargue de la totalidad de la información de los Estudios y Diseños del Sacúdete al parque del municipio de Ambalema – Tolima a la plataforma SIPA, lo anterior, con el objetivo de que la misma sea revisada y aprobada en el menor tiempo posible para que posteriormente la administracion municipal expida la licencia de construcción, requisito indispensable para el recibo de los Estudios y Diseños por parte del Ministerio del Interior.

- De igual forma, como resultado de las gestiones realizadas por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, el alcalde Justiniano Chacón se compromete en la consecución del recurso adicional como resultado de la consultoría realizada para la construccion del Sacúdete al parque del municipio de Ambalema – Tolima.

- Aun así, para el mes de septiembre de 2022, la supervisión por parte del Ministerio del Interior reitera la necesidad del estricto cumplimiento de las obligaciones especificas respecto a "(…) ***CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO****: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones****: I. ESPECÍFICAS:3)*** *Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DELINTERIOR.* ***4)*** *Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual del Convenio, cumpliendo las normas técnicas necesarias para la correcta ejecución del mismo.* ***14)*** *Recibir y aprobar a satisfacción bajo su autonomía y responsabilidad, a través del supervisor del convenio por parte del MUNICIPIO, los estudios y diseños para la construcción de la obra, previa aprobación del interventor contratado por el MUNICIPIO para el efecto. El interventor deberá exigir al contratista la entrega de los paquetes originales producto de la consultoría con destino al MUNICIPIO y al MINISTERIO, y a su vez deberá conservar copia de los documentos y soportes que permitan evidenciar la ejecución de los estudios y diseños.* ***19)*** *Aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el MUNICIPIO a los contratos. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de que se inicie la ejecución las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.* ***33)*** *Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno*

*de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto (…)".*

- La supervisión del municipio de Ambalema Tolima, remite al Ministerio del interior el informe mensual de supervisión y el extracto bancario de la cuenta del convenio donde se puede evidenciar la siguiente información:

  Valor desembolsado: $225.000.000,00
  Rendimientos financieros: $127.913,00
  Embargo: $42.524.519
  Saldo actual $182.603.394,00

BBVA

**EXTRACTO EL LIBRETON**

ESPOR DICO

| FECHA OPER | CONCEPTO | F.VALOR | CARGOS | ABONOS |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2022 | ABONO INTERESES GANADOS | 30-09-2022 | | 9,130.00 |

**PERIODO: Desde** 01-09-2022 **Hasta** 30-09-2022

| TITULAR | Saldo anterior | Cargos | Abonos |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AMBALEMA | 182,594,264.00 | .00 | 9,130.00 |

Saldo promedio del mes 182,594,264.00 — Nuevo Saldo 182,603,394.00

| OFICINA | FECHA CORTE | CODIGO CUENTA CLIENTE | | | | HOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENTIDAD | OFICINA | D.C. | CUENTA | |
| AGENCIA MARIQUITA | 30-09-2022 | 0013 | 0876 | 90 | 0200070194 | 1 |

A la presente fecha, la supervisión de por parte del Ministerio del Interior hace nuevamente el llamado de atención a la administracion municipal de Ambalema – Tolima sobre la situacion de embargo presentada meses anteriores. De acuerdo a lo precitado se solicita nuevamente a la administración municipal adelantar las gestiones necesarias para reintegrar los recursos afectados por la situacion precitada.

- La administracion municipal de Ambalema – Tolima, continua informa y certificando la realización de mantenimiento de corte y limpieza del predio destinado a la obra del sacúdete de forma periódica.

- Para el mes de septiembre de 2022, la administracion municipal de Ambalema – Tolima continúa remitiendo mediante correo electrónico a la supervisión del Ministerio del Interior, el informe mensual de supervisión, el informe financiero, el extracto bancario de la cuenta del convenio. Es de tener en consideración que, a pesar de que continúan presentando retrasos en la remisión de la documentación, la administración municipal remite la información periódicamente.

## 7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

## 8. SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| **YENIER HENAO MEJIA**<br>**Supervisor Convenio No 1988 de 2021**<br>Subdirección de Infraestructura Ministerio – FONSECON | **DANIEL SUAREZ ESTRADA**<br>**Apoyo supervisión Convenio No 1988 de 2021**<br>Subdirección de Infraestructura Ministerio – FONSECON |

| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON |
|---|
| CONVENIO **No. 1988 de 2021** |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES **DE SEPTIEMBRE DE 2022** |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVNECIA CIUDADANA, A TRAVES DE AL EJECUCION DE UNPROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:** (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | Carrera 5 con Carrera 4 entre Calles 11 y Calle 12, del barrio la esperanza área urbana del Municipio de Ambalema Tolima<br><br>Coordenadas: 4°46´59"N 74°45´47"W | | |
| **BENEFICIARIO:** | AMBALEMA TOLIMA | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | $1.250.000.000 | |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | $ 0 | |
| | **TOTAL APORTES DEL CONVENIO** | $ 1.250.000.000 | |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | **10-11-2021** | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | **30-11-2022** | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | **ANDRES FELIPE PEREZ CRUSCO – INGENIERO CIVIL, SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y TICS** | | |
| **SUPERVISORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | | | |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL FONSECON** | | | |
| **CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | | | |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | | | |
| **CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | No. 127 | 21 de enero del 2022 | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | | | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 11 de Noviembre de 2021 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | Prorroga No. 1 (Convenio) | INICIO: 31/05/2022 | HASTA: 30 de Noviembre de 2022 |
| | | INICIO: | HASTA: |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si esnecesario) | SUSPENSIÓN No 1. (Obra e interventoría) | INICIO: 22/07/2022 | HASTA: hasta tanto no se superen dichos inconvenientes |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | HASTA: | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** (Vigencia nueva del amparo) | FECHA: 20/05/2022 | | |
| | FECHA: 20/04/2022 | | |

| | |
|---|---|
| | FECHA: 20/11/2027 |
| VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETEAL PARQUE TIPO 1 OPCION 1-MUNICIPO DE AMBALEMA TOLIMA | **$1.125.000.000.oo** |
| VALOR DE INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA, PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE COSNTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA | $125.000.000.oo |
| CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique) | |
| VALOR DE OBRA TOTAL | **$1.125.000.000.oo** |
| VALOR INTERVENTORÍA | $125.000.000.oo |
| VALOR ADICIONAL DE OBRA | $1.250.000.000.oo |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ *Convenio interadministrativo/ Contrato* (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DEPAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| PRIMER DESEMBOLSO | 1. Cronograma contemplado en el # 2 de las obligacionesdel Municipio<br>2. Acta de Inicio<br>3. Certificado de s.s. Parafiscales<br>4. Certificado Cuenta de Ahorros<br>5. Asignación supervisión | NO APLICA | PENDIENTE | $ 225.000.000.oo |
| TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME: 1 | | | | |
| TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada) | | | | |

## 3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

**Nombre Aseguradora: Seguros del Estado S.A**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 61-44-101043338 | Cumplimiento del contrato, Pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales, Estabilidad y Calidad de la Obra y calidad del Servicio | $643.749.900 | 20/04/2022 | 20/11/2027 |
| 61-40-101016232 | Predios Laborales y operaciones, contratistas y subcontratistas, Vehículos propios y no propios | $300.000.000 | 24/04/2022 | 24/11/2022 |

## 4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ *Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños*

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **No. del contrato de Obra Publica** | 083 del 11 de Marzo del 2022 | MIL CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE. ($1.125.000.000,oo) |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre contratista de Obra Publica** | **CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA NIT. 901573308-1, RL. JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ CC. 1.020.757.338** | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato de OBRA PUBLICA** | 25/05/2022 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN No. 01 | 22/07/2022 | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato Obra Publica** | Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | **MIL CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE. ($1.125.000.000,oo)** |
| **COMPAÑIA ASEGURADORA** | Seguros del Estado S.A | | |
| **PÓLIZA No.** | 61-44-101043338, 61-40-101016232 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 20/04/2022, 24/04/2022 | | |

➢ *Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños*

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| No. del contrato de Interventoría | 087 del 18 de Marzo del 2022 | | **CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($125.000.000,oo)** |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ, CC. 7.722.019 | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 25/05/2022 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN No. 1 | 22/07/2022 | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($125.000.000,oo) |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | Aseguradora Solidaria de Colombia | | |
| **PÓLIZA No.** | 560-47-99-4000152241 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 21/04/2022 | | |

➢ *Contrato de Ejecución de Obra*

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| No. del contrato de Obra Publica | 083 del 11 de Marzo del 2022 | MIL CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE. ($1.125.000.000,oo) |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA NIT. 901573308-1, RL. JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ CC. 1.020.757.338 | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 25/05/2022 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | | 22/07/2022 | |
| **Fecha de terminación del contrato** | Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | MIL CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE. ($1.125.000.000,oo) |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | Seguros del Estado S.A | | |
| **PÓLIZA No.** | 61-44-101043338, 61-40-101016232 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 20/04/2022, 24/04/2022 | | |

➢ *Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra*

| **DESCRIPCIÓN** | **OBJETO** | | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ, CC. 7.722.019 | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 25/05/2022 | | |
| **Prorrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN No. 1 | 22/07/2022 | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($125.000.000,oo) |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | Aseguradora Solidaria de Colombia | | |
| **PÓLIZA No.** | 560-47-99-4000152241 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 21/04/2022 | | |

**5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO**

| | **SI** | **NO** |
|---|---|---|
| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | | |
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | |
| INFORME FINANCIERO | | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | | |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | | |
| OTROS | | |

**1. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO**

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | | | | | | | | | | | **PORCENTAJE (%)** | |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | | | | | | | | | | | | |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | | | | | | | | | | | | |
| **% AVANCE DE OBRA** | **MES 1** | **MES 2** | **MES 3** | **MES 4** | **MES 5** | **MES 6** | **MES 7** | **MES 8** | **MES 9** | **MES 10** | **MES 11** | **MES 12** |
| | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | |
| **INFORME:**<br>**PERIODO: Septiembre de 2022**<br>**FECHA DE ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA: N/A**<br>**VIGENCIA:** | | | | | | | | | | | | |

**JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:** En el mes de septiembre de 2022 se continúan con las diferentes mesas técnicas con el Ministerio de Cultura, debido a que como ya se había especificado el bien objeto de intervención se encuentra enmarcado dentro del Área de Afectación del centro histórico del Municipio de Ambalema Tolima, por ende, presenta un nivel de intervención No. 3, según Resolución 0443 del 31 de Diciembre de 2021 (expedida por el Ministerio de Cultura), por ende, se debe tener una CONSERVACIÓN DEL TIPO CONTEXTUAL (CC); así las cosas, el MINCULTURA exige su aprobación para intervención del bien, lo que obliga a cargar el proyecto a la plataforma SIPA, con el fin de que dicho ministerio pueda expedir la nombrada autorización; por lo que se inicia el proceso de cargue de documentación del Proyecto del Sacúdete al parque a la Plataforma especificada.


Teniendo en cuenta lo anterior, tanto el Contrato de obra como el de interventoría continúa suspendido hasta tanto no se supere los motivos por los cuales dieron origen a la suspensión No. 01 fechada el 22 de Julio de 2022.

Igualmente, La Administración Municipal en representación del Señor Alcalde Justiniano Chacón Orjuela, inicia estudio de alternativas de cierre financiero, para continuar con el proceso y desarrollo del Proyecto del sacúdete al parque.

**Se anexa**

1) Postura de Valla informativa del proyecto
2) Mantenimientos de corte y limpieza del predio
3) Adjudicación del Contrato de Obra e Interventoría
4) Pólizas de Contrato de Obra e interventoría
5) Contratos de Obra e interventoría
6) Suspensiones de Obra e Interventoría

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**


CONSULTA DE SOLICITUDES
Consultar Solicitudes

Drag a column header here to group by that column

| Acción | Soporte | Nombre del proyecto | Tipo de bien | Tipo de intervención | Ubicación Geografica | Fecha de creación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA | Espacio público declarado bien de interés cultural del ámbito nacional | Construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, vías peatonales, etc. | TOLIMA / AMBALEMA | 20/09/2022 7:49:44 a. m. | GUARDADO |

**SIPA**

2. **FECHAS DE VISITAS REALIZADAS A LA OBRA** (orden cronológico)

**SUPERVISOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

**OBSERVACIONES**

1. **PUBLICACIÓN SECOP**

- https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-1-221801&g-recaptcha-response=03AGdBq25OxRu4GwrpaeTa56_XOjQ0zC0tYtD-7tnQ0KtDEZ5ppOzokSwramZhtXQV-vhHR68RMnrJV0jYArddpFirlcMpiSa5jNqIv-KZmiT8xvB-KoE2tuMNAuDuQYIQQAwUrLHiEaOW1MkZq05rxKnqPxdEhijrBXoDHL3hzJX3OHy5mnKeQmCAJcMjbcmvL35SwryE3zTwmKimrTIy3XUPQOZiV7Gd9gRdI7fEzAjHqQQJeQioJqf7Buw7BWilzmSChcZio1tNBDPw2-fT1Rd3Xyg3kUMWTj8wxeDHykqtQWcLaNarZ7Ejhk0N1R0d2fT1ok3UHGMn-D9HaXBnqO-LaLdOkfbloRBwnH1vHt1NNKRMHiWlWguDQ_Jj8gmdE7Wye3xLsupYWsc-mDgaWTZZuwaNomMwUI1S74SFzfm41JcVor_14Q4dCh4DVKatYexpuTaA96w_0GdFKjsQM-cpHbtHFFC3sw

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP - 001 - 2022 | Licitación Pública | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AMBALEMA | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA | Tolima : Ambalema | $1.125.000.000.00 |

- https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-10-216872&g-recaptcha-response=03AGdBq25JLKHhSM9Gs6AjRrdMur4AjbQWjCKLqWOK3uJkCmGg0bmkXhH146lQJKnsCjp89J8L_KiZf4bA5w1pJqyce6uOETJVvorqKkboPXDszmwULKuaaf0EieQ3GkFvmxF5nz_1ooPAnq4y9cJMERolIQLrEnTeXip9AbK6Xs45qKnec3lQmJmy2XXxnms21bvoY8VRNseMZ3VRliXLobm0YMbnMl9KUurl6X8COxlcfGMh0_whscuhd_VWr3zrCH2ygfU5tqyfb2TYq0ElTcZDVhxSDnybYgJYKfoQhNfslF0PxtSsPTVnTDruUkPn2GAuF9nOiz6VWS493brlWmmdl_njfd-qnXs8nAzNB5mXcLylfoDfVpaBYxHnWJapqvVU8EW8c_lszrsNB2Dx-MkBswsanX00Qq09Q8w19On1uVINAlOh3shI0bH7PdoxtlCy1mu7-eTp6dJ46ob-Lj_pml0zeb3kxg

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 CM - 002 - 2022 | Concurso de Méritos con Lista Corta | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AMBALEMA | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA | Tolima : Ambalema | $125.000.000.00 | Fecha de Carga en el Sistema 15-FEB-22 |

**Fecha de creación 05 de Octubre de 2022**

**ANDRES FELIPE PEREZ CRUSCO**
Secretario de Planeacion, Infraestructura y TICS
Sepervisor Convenio No. 1988 de 2021 Ambalema Tolima

**CONVENIO 1988 DE 2021**

**"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto Sacúdete al Parque Tipo 1 en el municipio de Ambalema – Tolima"**

**INFORME FINANCIERO DE MAYO A OCTUBRE DE 2022**

**MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA**

**PROYECTO (S):** * ESTUDIOS Y DISEÑOS SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA
* INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, MUNICIPIO DE AMBALEMA – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

CUENTA ( AHORROS) No: 876-070194 DEL BANCO: BBVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR CONVENIO** | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MUNICIPIO | | | **$ 0,00** |
| | **FECHA DE GIRO** | | |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | | GIRO 1 | **$ 225.000.000,00** |
| | | GIRO 2 | **$ 0,00** |
| | | GIRO 3 | $ 0,00 |
| | | GIRO 4 | $ 0,00 |
| | | **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR** | **$ 225.000.000,00** |

**VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 876-070194 A LA FECHA (1)** **$ 225.000.000,00** $ 225.000.000,00

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO |
|---|---|---|---|---|
| LP-001-2022 (Contrato 083) | CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA | $ 1.125.000.000,00 | $ 0,00 | $ 1.125.000.000,00 |
| C-002-2022 (Contrato 087 de 2022) | JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ | $ 125.000.000,00 | $ 0,00 | $ 125.000.000,00 |
| | | | | $ 0,00 |
| | | | | $ 0,00 |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 1.250.000.000,00** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | | **$ 0,00** | **$ 0,00** |

OBSERVACION: Se presentó embargo por COLPENSIONES y Ministerio de Educación por valor de $ 42,524,519, recursos que se encuentra en reclamación por parte del Municipio para su respectiva devolución por corresponder a recursos inembargables

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 31/12/2021 | 24.502,00 |
| 31/01/2022 | 30.386,00 |
| 28/02/2022 | 9.127,00 |
| 31/03/2022 | 9.127,00 |
| 29/04/2022 | 9.127,00 |
| 31/05/2022 | **9.128,00** |
| 30/06/2022 | **9.128,00** |
| 29/07/2022 | 9.129,00 |
| 31/08/2022 | 9.129,00 |
| 30/09/2022 | 9.130,00 |
| 31/10/2022 | 9.130,00 |
| | |
| | |
| **TOTAL (3)** | **$ 137.043,00** |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------**


| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL (4)** | **$ 0,00** | |

**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** **$ 225.000.000,00**

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** | **$ 0,00** |
| **OTROS CONCEPTOS (6)** | **$ 42.524.519,00** |
| **TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** | $ 137.043,00 |
| **TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** | $ 0,00 |
| **SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** | **$ 137.043,00** |
| **SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)** | |
| **SALDO EN CAJA INCLUIDO RENDIMIENTOS** | **$ 182.612.524,00** |

**OBSERVACIONES**

**FIRMA**



**KAROL PAOLA SERRANO ROZO**

Secretaria de Hacienda y Tesorería

Ambalema - Tolima

* SE DEBEN ADJUNTAR COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES(FINAL DEL CONVENIO).

BBVA

# EXTRACTO EL LIBRETON

ESPOR DICO

| FECHA OPER | CONCEPTO | F.VALOR | CARGOS | ABONOS |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2022 | ABONO INTERESES GANADOS | 30-09-2022 | | 9,130.00 |

**PERIODO: Desde** 01-09-2022 **Hasta** 30-09-2022

**TITULAR**
MUNICIPIO DE AMBALEMA

| Saldo anterior | Cargos | Abonos |
|---|---|---|
| 182,594,264.00 | .00 | 9,130.00 |

**Saldo promedio del mes** 182,594,264.00

**Nuevo Saldo** 182,603,394.00

| OFICINA | FECHA CORTE | CODIGO CUENTA CLIENTE | | | | HOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENTIDAD | OFICINA | D.C. | CUENTA | |
| AGENCIA MARIQUITA | 30-09-2022 | 0013 | 0876 | 90 | 0200070194 | 1 |
