INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO **No. 1988 de 2021**, AMBALEMA – TOLIMA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **DICIEMBRE DE 2022**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVNECIA CIUDADANA, A TRAVES DE AL EJECUCION DE UNPROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CARRERA 5 CON CARRERA 4 ENTRE CALLES 11 Y CALLE 12, DEL BARRIO LA ESPERANZA AREA URBANA - AMBALEMA COORDENADAS: 4°46'54.54"O		
BENEFICIARIO:	MUNIICPIO DE AMBALEMA - TOLIMA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 1.250.000.000,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 1.250.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	11-NOVIEMBRE-2021		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	31-05-2022	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO**	30-JUNIO-2023
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	**YENIER HENAO MEJIA**		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	LAURA QUINTERO	11/11/2021	21/11/2021
	YENIER HENAO MEJIA	22/11/2021	VIGENTE
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	CAMILO GARCIA MEDINA	22/11/21	31/12/21
	CAMILO GARCIA MEDINA	18/01/22	31/03/2020
	DANIEL SUAREZ	1/04/2022	30/09/2022
	DANIEL SUAREZ	08/11/2022	31/12/2022
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	112121	11-NOVIEMBRE-2021	
	18822	18-ENERO-2022	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2-2021-058100	03/11/2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL			
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 580-994000069130	20-11-2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	20-11-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: 28/05/2022
	SEGUNDA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACION		FECHA: 30/11/2022
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	POLIZA SEGUNDA PRORROGA Y PRIMERA MODIF. SOLIDARIA N° 580 47 994000069130 ANEXO 2		
	1.CUMPLIMIENTO $250.000.000 DESDE 12/11/2021 HASTA 31/12/2023		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ 83.333.000

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41.667.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	
VALOR DE OBRA	$ 1.041.667.000
VALOR INTERVENTORÍA	$ 83.333.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**UN PRIMER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **$225.000.000 PESOS M/L.,** contra entrega de los siguientes productos: **a**. suscripción del acta de inicio. **b**. designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. **c**. aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del ministerio.	N/A	2021-12-07	$ 225.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	**UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **$820.000.000 PESOS M/L.,** contra entrega de los siguientes productos: **A**. lacertificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. **B**. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. **C**. La respectiva acta parcial de obraavalada por el interventor, y **D**. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%	DD/MM/AAAA	$ 820.000.000
ULTIMO DESEMBOLSO	**UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **$205.000.000 PESOS M/L.,** contra entrega de los siguientes productos: **A**. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: **1)** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; **2)** La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. **B**. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. **C**. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 205.000.000
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 225.000.000
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$0.00

3. PÓLIZA INICIAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	30/11/2022

PÓLIZA PRIMERA PRORROGA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130 ANEXO 1	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	31/05/2023

PÓLIZA SEGUNDA PRORROGA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130 ANEXO 1	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	31/12/2023

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y construcción de obra Sacúdete al parque tipo 1.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato 083 del 11 de Marzo del 2022	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA".		$1.125.000.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA Representante Legal JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ		NIT. 901573308-1 CC. 1.020.757.338
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	22/07/2022	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	25/10/2022		5 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO.
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$1.125.000.000

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA No.	61-44-101043338, 61-40-101016232
FECHA DE LA PÓLIZA	DESDE 20/04/2022 HASTA 24/04/2022

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y construcción de obra Sacúdete al parque tipo 1.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato 087 del 18 de Marzo del 2022	"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA".		$125.000.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ		CC. 7.722.019
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	22/07/2022	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	25/10/2022		5 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO.
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$125.000.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA No.	560-47-99-4000152241		
FECHA DE LA PÓLIZA	21/04/2022		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: DICIEMBRE 2022	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		**N/A**
INFORME FINANCIERO	**X**	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$182.630.786	Corte: 31/12/2022
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS	X	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

JUSTIFICACION DE AVANCE MUNICIPIO

En el mes de diciembre de 2022, se continúan con las diferentes mesas técnicas con el Ministerio de Cultura, a causa del proceso de cargue de documentación del Proyecto del Sacúdete al parque a la Plataforma SIPA.

Se da respuesta del oficio D.A N° 169 por parte de la entidad del IGAC, y así mismo, se está a la espera de la respuesta a la solicitud de información solicitada a la entidad de CORTOLIMA el 31 de octubre de 2022.

Teniendo en cuenta lo anterior, tanto el Contrato de obra como el de interventoría continúa suspendido hasta tanto no se superen los motivos por los cuales dieron origen a la suspensión No. 01 fechada el 22 de Julio de 2022.

Se anexa
1) Oficio D.A N° 169 IGAC y Respuesta del IGAC, Certificado No. 2691-901822-87599-0
2) Solicitud concepto Autoridad Ambiental

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE AMBALEMA
NIT: 800.100.048-4
"Acciones para volver a creer"

D.A N° 169

Ambalema, 19 de diciembre de 2022

Señores
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
IGAC
Calle 13 No. 3a – 22
Ibagué Tolima

Ref: Certificado Catastral

Asunto: Solicitud

Respetados Señores;

De manera atenta, se solicita **CERTIFICADO CATASTRAL** del predio Ubicado en la Carrera 5 con Carrera 4 y Calle 11 con Calle 12 Barrio la Esperanza del Municipio de Ambalema Tolima, identificado con Ficha Catastral No. 730300101000000340001000000000 y Matricula Inmobiliaria No. 351-11076, lo anterior con el fin de adelantar trámites pertinentes ante el Ministerio de Cultura – MUNCULTURA, para autorización de intervención del bien en cuanto al desarrollo del Proyecto "**SACÚDETE AL PARQUE**" adelantado por el Ministerio del Interior.


Quedando atentos a su pronta gestión y positiva respuesta.

Cordialmente,

JUSTINIANO CHACON ORJUELA
Alcalde Municipal

Proyectó y Elaboró: Fadhy Niño Torres – Técnico Administrativo
Aprobó: Ing. Andrés F. Pérez C. – Sec. De Planeación, Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

"Acciones para Volver a Creer 2020 - 2023"
Calle 9 N° 2 – 52 Esquina, Palacio Municipal, Teléfono 3167640246
Ambalema – Tolima – Colombia
www.ambalema-tolima.gov.co – alcalde@ambalema-tolima.gov.co – contactenos@ambalema-tolima.gov.co – planeacion@ambalema-tolima.gov.co
Código Postal 731001 – Código DANE 73030

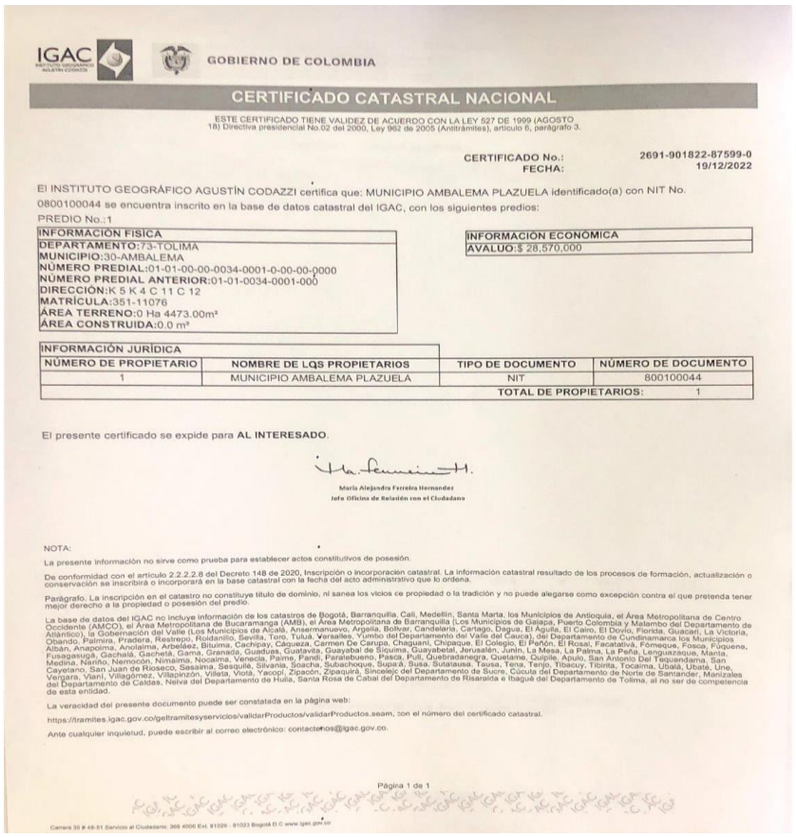

IGAC — GOBIERNO DE COLOMBIA

CERTIFICADO CATASTRAL NACIONAL

ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ DE ACUERDO CON LA LEY 527 DE 1999 (AGOSTO 18) Directiva presidencial No.02 del 2000, Ley 962 de 2005 (Anti trámites), artículo 6, parágrafo 3.

CERTIFICADO No.: 2691-901822-87599-0
FECHA: 19/12/2022

El INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI certifica que: MUNICIPIO AMBALEMA PLAZUELA identificado(a) con NIT No. 0800100044 se encuentra inscrito en la base de datos catastral del IGAC, con los siguientes predios:

PREDIO No.:1

INFORMACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO:73-TOLIMA
MUNICIPIO:30-AMBALEMA
NÚMERO PREDIAL:01-01-00-00-0034-0001-0-00-00-0000
NÚMERO PREDIAL ANTERIOR:01-01-0034-0001-000
DIRECCIÓN:K 5 K 4 C 11 C 12
MATRÍCULA:351-11076
ÁREA TERRENO:0 Ha 4473.00m²
ÁREA CONSTRUIDA:0.0 m²

INFORMACIÓN ECONÓMICA
AVALÚO:$ 28,570,000

INFORMACIÓN JURÍDICA

NÚMERO DE PROPIETARIO	NOMBRE DE LOS PROPIETARIOS	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO
1	MUNICIPIO AMBALEMA PLAZUELA	NIT	800100044
		TOTAL DE PROPIETARIOS:	1

El presente certificado se expide para **AL INTERESADO**.

María Alejandra Ferreira Hernandez
Jefe Oficina de Relación con el Ciudadano

NOTA:

La presente información no sirve como prueba para establecer actos constitutivos de posesión.

De conformidad con el artículo 2.2.2.2.8 del Decreto 148 de 2020, Inscripción o incorporación catastral. La información catastral resultado de los procesos de formación, actualización o conservación se inscribirá o incorporará en la base catastral con la fecha del acto administrativo que lo ordena.

Parágrafo. La inscripción en el catastro no constituye título de dominio, ni sanea los vicios de propiedad o la tradición y no puede alegarse como excepción contra el que pretenda tener mejor derecho a la propiedad o posesión del predio.

La base de datos del IGAC no incluye información de los catastros de Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Santa Marta, los Municipios de Antioquia, el Área Metropolitana de Centro Occidente (AMCO), el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), el Área Metropolitana de Barranquilla (Los Municipios de Galapa, Puerto Colombia y Malambo del Departamento de Atlántico), la Gobernación del Valle (Los Municipios de Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Candelaria, Cartago, Dagua, El Águila, El Cairo, El Dovio, Florida, Guacarí, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Roldanillo, Sevilla, Toro, Tuluá, Versalles, Yumbo del Departamento del Valle del Cauca), del Departamento de Cundinamarca los Municipios Albán, Anapoima, Anolaima, Arbeláez, Bituima, Cachipay, Cáqueza, Carmen De Carupa, Chaguaní, Chipaque, El Colegio, El Peñón, El Rosal, Facatativá, Fómeque, Fosca, Fúquene, Fusagasugá, Gachalá, Gachetá, Gama, Granada, Guaduas, Guatavita, Guayabal de Síquima, Guayabetal, Jerusalén, Junín, La Mesa, La Palma, La Peña, Lenguazaque, Manta, Medina, Nariño, Nemocón, Nimaima, Nocaima, Venecia, Paime, Pandi, Peralebueno, Pasca, Puli, Quebradanegra, Quetame, Quipile, Apulo, San Antonio Del Tequendama, San Cayetano, San Juan de Rioseco, Sasaima, Sesquilé, Silvania, Sopcha, Subachoque, Supatá, Susa, Sutatausa, Tausa, Tena, Tenjo, Tibacuy, Tibirita, Tocaima, Ubalá, Ubaté, Une, Vergara, Vianí, Villagómez, Villapinzón, Villeta, Viotá, Yacopí, Zipacón, Zipaquirá, Sincelejo del Departamento de Sucre, Cúcuta del Departamento de Norte de Santander, Manizales del Departamento de Caldas, Neiva del Departamento de Huila, Santa Rosa de Cabal del Departamento de Risaralda e Ibagué del Departamento de Tolima, al no ser de competencia de esta entidad.

La veracidad del presente documento puede ser constatada en la página web:

https://tramites.igac.gov.co/geltramitesyservicios/validarProductos/validarProductos.seam, con el número del certificado catastral.

Ante cualquier inquietud, puede escribir al correo electrónico: contactenos@igac.gov.co.

Página 1 de 1

Carrera 30 # 48-51 Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91029 - 91033 Bogotá D.C www.igac.gov.co

---

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE AMBALEMA
NIT: 800.100.048-4
"Acciones para volver a creer"

Ambalema Tolima, 31 de octubre de 2022

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA
CORTOLIMA
Av. Ferrocarril con 44 Esquina
Ibagué - Tolima

Asunto: Solicitud información

Comedidamente me dirijo a usted con el fin de solicitarle la siguiente información con destino al Convenio No. 1588 de Noviembre 10 de 2021, Suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Ambalema Tolima, cuyo objeto es "ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA", así:

Localización del proyecto: **Entre la Carrera 5 y Carrera 4 y Calle 11 y Calle 12, Ficha Catastral No. 730300101000000340001000000000, Matricula Inmobiliaria No. 351-11076, Barrio la Esperanza del municipio de Ambalema Tolima**

1. Se me informe que permisos y licencias se requieren para el desarrollo del Convenio.
2. Se me informe los sitios autorizados más cercanos al proyecto donde se puedan adquirir los materiales pétreos (Especificar Ubicación – Distancia de Acarreo).

La respuesta podrá ser enviada de manera física a la Calle 9 No. 2 – 52 Esquina, Segundo Piso, Barrio el Centro, palacio Municipal, Ambalema - Tolima, y/o de manera virtual a los correos electrónicos: planeacion@ambalema-tolima.gov.co, viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co, bancodeproyectos@ambalema-tolima.gov.co, contactenosplaneacion@ambalema-tolima.gov.co y ventanillaunica@ambalema-tolima.gov.co

Esperando una pronta respuesta.

Cordialmente,

JUSTINIANO CHACON ORJUELA
Alcalde Municipal

"Acciones para volver a Creer 2020 - 2023"
Calle 9 N° 2 – 52 Esquina, segundo piso. Palacio Municipal, Teléfono (57) (8) 2856549
Ambalema – Tolima – Colombia
www.ambalema-tolima.gov.co – planeacion@ambalema-tolima.gov.co
Código Postal 731001

JUSTIFICACION DE AVANCE MINISTERIO

- Que el 13 de diciembre de 2022, la supervisión del Ministerio del Interior remite mediante correo electrónico a la supervisión del Municipio de Ambalema – Tolima, la reiteración a la solicitud de actualización de póliza conforme al Otrosí N°2 segunda prorroga – primera modificación al convenio interadministrativo 1988 de 2021.



12/3/23, 10:28 Gmail - SOLICITUD DE POLIZA CONVENIO 1988-2021 AMBALEMA - TOLIMA

Gmail Daniel Suarez <danielsuarezarq@gmail.com>

SOLICITUD DE POLIZA CONVENIO 1988-2021 AMBALEMA - TOLIMA

Daniel Suarez <danielsuarezarq@gmail.com> 13 de diciembre de 2022, 13:32
Para: "Planeacion ambalema-tolima.gov.co" <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>
Cc: Yenier Henao Mejia <yenier.henao@mininterior.gov.co>, Angie Vannessa Venegas Serrano <angie.venegas@mininterior.gov.co>

Buenos días,

Por medio del presente correo adjunto la minuta correspondiente a la Segunda prórroga y Primera modificación del Sacúdete Tipo 1 1988-2021 del municipio de Ambalema – Tolima, lo anterior para la actualización de la póliza de acuerdo a la misma, favor realizar dicho trámite en el menor tiempo posible.

Quedo atento a sus comentarios.

--

ARQ. DANIEL F. SUÁREZ ESTRADA
Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana
Cel: 3217831526
danielsuarezarq@gmail.com
Carrera 8 Nº 12B -31 Edificio Bancol Piso 10
Bogotá, D.C.-Colombia

https://www.mininterior.gov.co

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=34bacaeb6c&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar1738467288978159178&simpl=msg-a%3Ar1738467288978159178 1/2

- Que para el mes de diciembre de 2022, se continúan realizando mesas técnicas y manteniendo comunicación constante entre las partes, lo anterior con el objetivo de realizar las gestiones por parte de cada una de las entidades para obtener la aprobación del Ministerio de Cultura frente a la Estudios y Diseños del Sacúdete al parque del Municipio de Ambalema – Tolima. Corolario de lo anterior, la administracion municipal informa para el mes de diciembre de 2022, continúan adelantando los tramites frente al instituto Agustín Codazzi y Cortolima para la consecución de los documentos requeridos por parte del Ministerio de Cultura para la aprobación de la solicitud realizada.


- Por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, se solicita respetuosamente a la administracion municipal de Ambalema – Tolima, dar celeridad a los procesos con el objetivo de poder tener la autorización precitada y por ende la licencia de construccion del proyecto Sacúdete al parque tipo 1 del municipio de Ambalema.

- Para el mes de diciembre de 2022, la supervisión por parte del Ministerio del Interior a pesar de que conocer el contexto bajo el cual se encuentra el convenio de Ambalema – Tolima le reitera la necesidad e importancia del cumplimiento de las obligaciones especificas respecto a "(…) ***CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO****: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones****: I. ESPECÍFICAS:3)*** *Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DELINTERIOR.* ***4)*** *Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual del Convenio, cumpliendo las normas técnicas necesarias para la correcta ejecución del mismo.* ***14)*** *Recibir y aprobar a satisfacción bajo su autonomía y responsabilidad, a través del supervisor del convenio por parte del MUNICIPIO, los estudios y diseños para la construcción de la obra, previa aprobación del interventor contratado por el MUNICIPIO para el efecto. El interventor deberá exigir al contratista la entrega de los paquetes originales producto de la consultoría con destino al MUNICIPIO y al MINISTERIO, y a su vez deberá*

conservar copia de los documentos y soportes que permitan evidenciar la ejecución de los estudios y diseños. ***19)*** *Aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el MUNICIPIO a los contratos. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de que se inicie la ejecución las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.* ***33)*** *Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto (…)".*

- La supervisión del municipio de Ambalema Tolima, remite al Ministerio del interior el informe mensual de supervisión y el extracto bancario de la cuenta del convenio donde se puede evidenciar la siguiente información:

  Valor desembolsado: $225.000.000,00
  Rendimientos financieros: $155.305,00
  Embargo: $42.524.519
  Saldo actual $182.630.786

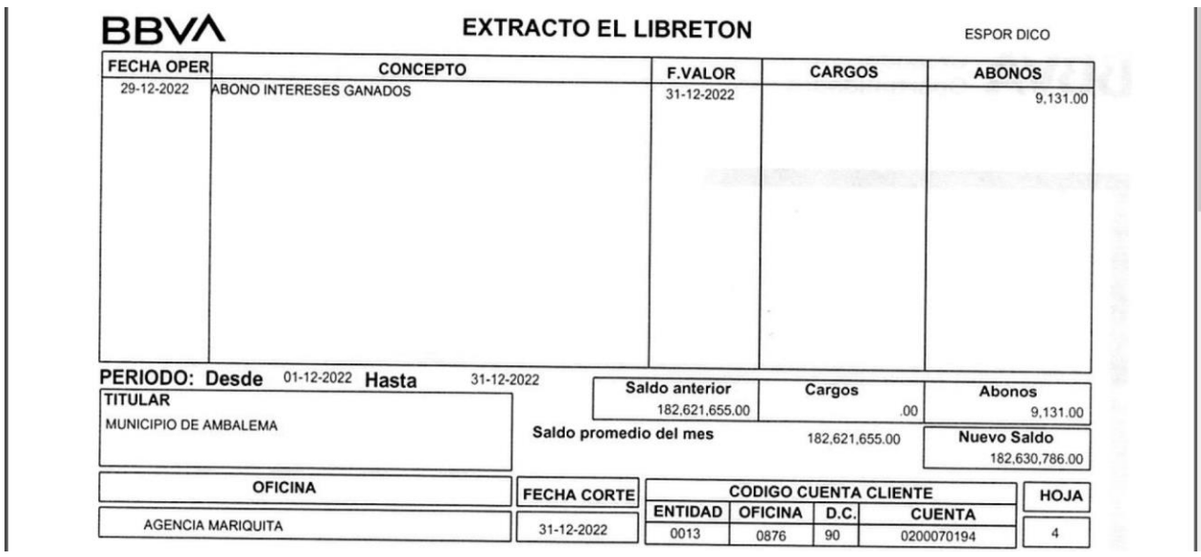

BBVA **EXTRACTO EL LIBRETON** ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
29-12-2022	ABONO INTERESES GANADOS	31-12-2022		9,131.00

PERIODO: Desde 01-12-2022 **Hasta** 31-12-2022

TITULAR	Saldo anterior	Cargos	Abonos
MUNICIPIO DE AMBALEMA	182,621,655.00	.00	9,131.00
Saldo promedio del mes	182,621,655.00		Nuevo Saldo 182,630,786.00


OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
AGENCIA MARIQUITA	31-12-2022	0013	0876	90	0200070194	4

A la presente fecha, la supervisión de por parte del Ministerio del Interior continúa haciendo el llamado de atención a la administracion municipal de Ambalema – Tolima sobre la situacion de embargo presentada meses anteriores. De acuerdo a lo precitado se solicita nuevamente a la administración municipal adelantar las gestiones necesarias para reintegrar los recursos afectados por la situacion precitada.

- La administracion municipal de Ambalema – Tolima, continua informa y certificando la realización de mantenimiento de corte y limpieza del predio destinado a la obra del sacúdete de forma periódica.

- Para el mes de diciembre de 2022, la supervisión del Ministerio del Interior y la secretaria de hacienda de la entidad territorial realizan una mesa técnica para el desarrollo del proceso de legalización de recursos del

convenio interadministrativo 1988 de 2021. Por otra parte, el municipio pone en conocimiento al Ministerio las acciones que adelanta para la reincorporación del recurso a la cuenta del convenio.

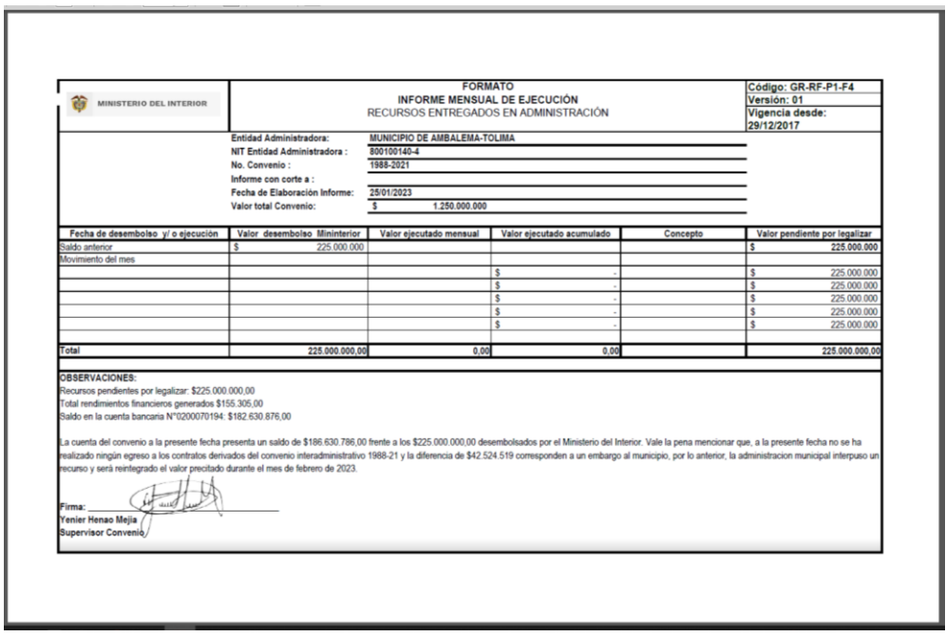

MINISTERIO DEL INTERIOR

FORMATO
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Código: GR-RF-P1-F4
Versión: 01
Vigencia desde: 29/12/2017

Entidad Administradora: MUNICIPIO DE AMBALEMA-TOLIMA
NIT Entidad Administradora : 800100140-4
No. Convenio : 1988-2021
Informe con corte a :
Fecha de Elaboración Informe: 25/01/2023
Valor total Convenio: $ 1.250.000.000

Fecha de desembolso y/ o ejecución	Valor desembolso Mininterior	Valor ejecutado mensual	Valor ejecutado acumulado	Concepto	Valor pendiente por legalizar
Saldo anterior	$ 225.000.000				$ 225.000.000
Movimiento del mes					
			$ -		$ 225.000.000
			$ -		$ 225.000.000
			$ -		$ 225.000.000
			$ -		$ 225.000.000
			$ -		$ 225.000.000
Total	225.000.000,00	0,00	0,00		225.000.000,00

OBSERVACIONES:
Recursos pendientes por legalizar: $225.000.000,00
Total rendimientos financieros generados $155.305,00
Saldo en la cuenta bancaria N°0200070194: $182.630.876,00

La cuenta del convenio a la presente fecha presenta un saldo de $186.630.786,00 frente a los $225.000.000,00 desembolsados por el Ministerio del Interior. Vale la pena mencionar que, a la presente fecha no se ha realizado ningún egreso a los contratos derivados del convenio interadministrativo 1988-21 y la diferencia de $42.524.519 corresponden a un embargo al municipio, por lo anterior, la administracion municipal interpuso un recurso y será reintegrado el valor precitado durante el mes de febrero de 2023.

Firma:
Yenier Henao Mejia
Supervisor Convenio

- Que para el mes de diciembre de 2022 la administración municipal de Ambalema – Tolima remite al Ministerio del Interior el informe mensual de supervisión, el informe mensual financiero y el extracto bancario de la cuenta del convenio. Es de tener en consideración que, a pesar de que continúan presentando retrasos en la remisión de la documentación, la administración municipal remite la información periódicamente.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

			DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

YENIER HENAO MEJIA **Supervisor Convenio No 1988 de 2021** Subdirección de Infraestructura Ministerio – FONSECON	**DANIEL SUAREZ ESTRADA** **Apoyo supervisión Convenio No 1988 de 2021** Subdirección de Infraestructura Ministerio – FONSECON

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO **No. 1988 de 2021**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES **DE DICIEMBRE DE 2022**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVNECIA CIUDADANA, A TRAVES DE AL EJECUCION DE UNPROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 5 con Carrera 4 entre Calles 11 y Calle 12, del barrio la esperanza área urbana del Municipio de Ambalema Tolima Coordenadas: 4°46´59"N 74°45´47"W		
BENEFICIARIO:	AMBALEMA TOLIMA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$1.250.000.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 1.250.000.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	**10-11-2021**		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	**30-11-2022**		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	**ANDRES FELIPE PEREZ CRUSCO – INGENIERO CIVIL, SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y TICS**		
SUPERVISORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
REGISTRO PRESUPUESTAL FONSECON			
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)			
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 127	21 de enero del 2022	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL			
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	11 de Diciembre de 2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	Prorroga No. 1 (Convenio)		INICIO: 31/05/2022
			HASTA: 30 de Noviembre de 2022
			INICIO:
			HASTA:
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN No 1. (Obra e interventoría)		INICIO: 22/07/2022
			HASTA: hasta tanto no se superen dichos inconvenientes
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		HASTA:
	REINICIO		DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 20/05/2022		
	FECHA: 20/04/2022		

	FECHA: 20/11/2027
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETEAL PARQUE TIPO 1 OPCION 1-MUNICIPO DE AMBALEMA TOLIMA	**$1.125.000.000.oo**
VALOR DE INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA, PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE COSNTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA	**$125.000.000.oo**
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	
VALOR DE OBRA TOTAL	**$1.125.000.000.oo**
VALOR INTERVENTORÍA	$125.000.000.oo
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$1.250.000.000.oo

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DEPAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. Cronograma contemplado en el # 2 de las obligaciones del Municipio 2. Acta de Inicio 3. Certificado de s.s. Parafiscales 4. Certificado Cuenta de Ahorros 5. Asignación supervisión	NO APLICA	PENDIENTE	$ 225.000.000.oo
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME: 1				
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Seguros del Estado S.A

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
61-44-101043338	Cumplimiento del contrato, Pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales, Estabilidad y Calidad de la Obra y calidad del Servicio	$643.749.900	20/04/2022	20/11/2027
61-40-101016232	Predios Laborales y operaciones, contratistas y subcontratistas, Vehículos propios y no propios	$300.000.000	24/04/2022	24/11/2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato de Obra Publica	083 del 11 de Marzo del 2022	MIL CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE. ($1.125.000.000,oo)
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00

Nombre contratista de Obra Publica	**CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA NIT. 901573308-1, RL. JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ CC. 1.020.757.338**		
Fecha de Acta de inicio del contrato de OBRA PUBLICA	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN No. 01	22/07/2022	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato Obra Publica	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**MIL CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE. ($1.125.000.000,oo)**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A		
PÓLIZA No.	61-44-101043338, 61-40-101016232		
FECHA DE LA PÓLIZA	20/04/2022, 24/04/2022		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato de Interventoría	087 del 18 de Marzo del 2022		**CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($125.000.000,oo)**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ, CC. 7.722.019		
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN No. 1	22/07/2022	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($125.000.000,oo)
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
PÓLIZA No.	560-47-99-4000152241		
FECHA DE LA PÓLIZA	21/04/2022		

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
No. del contrato de Obra Publica	083 del 11 de Marzo del 2022	MIL CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE. ($1.125.000.000,oo)
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA NIT. 901573308-1, RL. JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ CC. 1.020.757.338	
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022	

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)		22/07/2022	
Fecha de terminación del contrato	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			MIL CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE. ($1.125.000.000,oo)
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A		
PÓLIZA No.	61-44-101043338, 61-40-101016232		
FECHA DE LA PÓLIZA	20/04/2022, 24/04/2022		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ, CC. 7.722.019		
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN No. 1	22/07/2022	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($125.000.000,oo)
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
PÓLIZA No.	560-47-99-4000152241		
FECHA DE LA PÓLIZA	21/04/2022		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

	SI	**NO**
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:		
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
INFORME FINANCIERO		
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		
OTROS		

1. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:												
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:											**PORCENTAJE (%)**	
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA												
% EJECUTADO DE OBRA												
% AVANCE DE OBRA	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**	**MES 11**	**MES 12**
	NA	NA	NA	NA	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
INFORME: **PERIODO: Diciembre de 2022** **FECHA DE ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA: N/A** **VIGENCIA:**												

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: En el mes de Diciembre de 2022 se continúan con las diferentes mesas técnicas con el Ministerio de Cultura, a causa del proceso de cargue de documentación del Proyecto del Sacúdete al parque a la Plataforma SIPA.

Se da respuesta del oficio D.A N° 169 por parte de la entidad del IGAC, y así mismo, se está a la espera de la respuesta a la solicitud de información solicitada a la entidad de CORTOLIMA el 31 de octubre de 2022.

Teniendo en cuenta lo anterior, tanto el Contrato de obra como el de interventoría continúa suspendido hasta tanto no se superen los motivos por los cuales dieron origen a la suspensión No. 01 fechada el 22 de Julio de 2022.

Se anexa

1) Oficio D.A N° 169 IGAC y Respuesta del IGAC, Certificado No. 2691-901822-87599-0
2) Solicitud concepto Autoridad Ambiental

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE AMBALEMA
NIT: 800.100.048-4
"Acciones para volver a creer"

D.A N° 169

Ambalema, 19 de diciembre de 2022

Señores
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
IGAC
Calle 13 No. 3a – 22
Ibagué Tolima

Ref: Certificado Catastral

Asunto: Solicitud

Respetados Señores;

De manera atenta, se solicita **CERTIFICADO CATASTRAL** del predio Ubicado en la Carrera 5 con Carrera 4 y Calle 11 con Calle 12 Barrio la Esperanza del Municipio de Ambalema Tolima, identificado con Ficha Catastral No. 730300101000000340001000000000 y Matricula Inmobiliaria No. 351-11076, lo anterior con el fin de adelantar trámites pertinentes ante el Ministerio de Cultura – MUNCULTURA, para autorización de intervención del bien en cuanto al desarrollo del Proyecto "**SACÚDETE AL PARQUE**" adelantado por el Ministerio del Interior.

Quedando atentos a su pronta gestión y positiva respuesta.

Cordialmente,

JUSTINIANO CHACON ORJUELA
Alcalde Municipal

Proyectó y Elaboró: Fadhy Niño Torres – Técnico Administrativo
Aprobó: Ing. Andrés F. Pérez C. – Sec. De Planeación, Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

"Acciones para Volver a Creer 2020 - 2023"
Calle 9 N° 2 – 52 Esquina, Palacio Municipal, Teléfono 3167640245
Ambalema – Tolima – Colombia
www.ambalema-tolima.gov.co – alcalde@ambalema-tolima.gov.co – contactenos@ambalema-tolima.gov.co – planeacion@ambalema-tolima.gov.co
Código Postal 731001 – Código DANE 73030

IGAC INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

GOBIERNO DE COLOMBIA

CERTIFICADO CATASTRAL NACIONAL

ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ DE ACUERDO CON LA LEY 527 DE 1999 (AGOSTO 18) Directiva presidencial No.02 del 2000, Ley 962 de 2005 (Antitrámites), artículo 6, parágrafo 3.

CERTIFICADO No.: 2691-901822-87599-0
FECHA: 19/12/2022

El INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI certifica que: MUNICIPIO AMBALEMA PLAZUELA identificado(a) con NIT No. 0800100044 se encuentra inscrito en la base de datos catastral del IGAC, con los siguientes predios:

PREDIO No.:1

INFORMACIÓN FISICA
DEPARTAMENTO:73-TOLIMA
MUNICIPIO:30-AMBALEMA
NÚMERO PREDIAL:01-01-00-00-0034-0001-0-00-00-0000
NÚMERO PREDIAL ANTERIOR:01-01-0034-0001-000
DIRECCIÓN:K 5 K 4 C 11 C 12
MATRÍCULA:351-11076
ÁREA TERRENO:0 Ha 4473.00m²
ÁREA CONSTRUIDA:0.0 m²

INFORMACIÓN ECONÓMICA
AVALUO:$ 28,570,000

INFORMACIÓN JURIDICA			
NÚMERO DE PROPIETARIO	NOMBRE DE LOS PROPIETARIOS	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO
1	MUNICIPIO AMBALEMA PLAZUELA	NIT	800100044
		TOTAL DE PROPIETARIOS:	1

El presente certificado se expide para **AL INTERESADO**.

María Alejandra Ferreira Hernandez
Jefe Oficina de Relación con el Ciudadano

NOTA:

La presente información no sirve como prueba para establecer actos constitutivos de posesión.

De conformidad con el artículo 2.2.2.2.8 del Decreto 148 de 2020, Inscripción o incorporación catastral. La información catastral resultado de los procesos de formación, actualización o conservación se inscribirá o incorporará en la base catastral con la fecha del acto administrativo que lo ordena.

Parágrafo. La inscripción en el catastro no constituye título de dominio, ni sanea los vicios ce propiedad o la tradición y no puede alegarse como excepción contra el que pretenda tener mejor derecho a la propiedad o posesión del predio.

La base de datos del IGAC no incluye información de los catastros de Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Santa Marta, los Municipios de Antioquia, el Área Metropolitana de Centro Occidente (AMCO), el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), el Área Metropolitana de Barranquilla (Los Municipios de Galapa, Puerto Colombia y Malambo del Departamento de Atlántico), la Gobernación del Valle (Los Municipios de Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Candelaria, Cartago, Dagua, El Águila, El Cairo, El Dovio, Florida, Guacarí, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Roldanillo, Sevilla, Toro, Tuluá, Versalles, Yumbo del Departamento del Valle del Cauca), del Departamento de Cundinamarca los Municipios Albán, Anapoima, Anolaima, Arbeláez, Bituima, Cachipay, Cáqueza, Carmen De Carupa, Chaguaní, Chipaque, El Colegio, El Peñón, El Rosal, Facatativá, Fómeque, Fosca, Fúquene, Fusagasugá, Gachalá, Gachetá, Gama, Granada, Guaduas, Guatavita, Guayabal de Síquima, Guayabetal, Jerusalén, Junín, La Mesa, La Palma, La Peña, Lenguazaque, Manta, Medina, Nariño, Nemocón, Nimaima, Nocaima, Venecia, Paime, Pandi, Paratebueno, Pasca, Puli, Quebradanegra, Quetame, Quipile, Apulo, San Antonio Del Tequendama, San Cayetano, San Juan de Rioseco, Sasaima, Sesquilé, Silvania, Soacha, Subachoque, Supatá, Susa, Sutatausa, Tausa, Tena, Tenjo, Tibacuy, Tibirita, Tocaima, Ubalá, Ubaté, Une, Vergara, Viani, Villagómez, Villapinzón, Villeta, Viotá, Yacopí, Zipacón, Zipaquirá, Sincelejc del Departamento de Sucre, Cúcuta del Departamento de Norte de Santander, Manizales del Departamento de Caldas, Neiva del Departamento de Huila, Santa Rosa de Cabal del Departamento de Risaralda e Ibagué del Departamento de Tolima, al no ser de competencia de esta entidad.

La veracidad del presente documento puede ser constatada en la página web:

https://tramites.igac.gov.co/geltramitesyservicios/validarProductos/validarProductos.seam, con el número del certificado catastral.

Ante cualquier inquietud, puede escribir al correo electrónico: contactenos@igac.gov.co.

IGAC IGAC IGAC

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE AMBALEMA
NIT: 800.100.048-4
"Acciones para volver a creer"

Ambalema Tolima, 31 de octubre de 2022

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA
CORTOLIMA
Av. Ferrocarril con 44 Esquina
Ibagué - Tolima

Asunto: Solicitud información

Comedidamente me dirijo a usted con el fin de solicitarle la siguiente información con destino al **Convenio No. 1988 de Noviembre 10 de 2021, Suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Ambalema Tolima, cuyo objeto es "ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA", así:**

Localización del proyecto: **Entre la Carrera 5 y Carrera 4 y Calle 11 y Calle 12, Ficha Catastral No. 730300101000000340001000000000, Matrícula Inmobiliaria No. 351-11076, Barrio la Esperanza del municipio de Ambalema Tolima**

1. Se me informe que permisos y licencias se requieren para el desarrollo del Convenio.
2. Se me informe los sitios autorizados más cercanos al proyecto donde se puedan adquirir los materiales pétreos (Especificar Ubicación – Distancia de Acarreo).

La respuesta podrá ser enviada de manera física a la Calle 9 No. 2 – 52 Esquina, Segundo Piso, Barrio el Centro, palacio Municipal, Ambalema - Tolima, y/o de manera virtual a los correos electrónicos: planeacion@ambalema-tolima.gov.co, viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co, bancodeproyectos@ambalema-tolima.gov.co, contactenosplaneacion@ambalema-tolima.gov.co y ventanillaunica@ambalema-tolima.gov.co

Esperando una pronta respuesta.

Cordialmente,

JUSTINIANO CHACON ORJUELA
Alcalde Municipal

"Acciones para volver a Creer 2020 - 2023"
Calle 9 N° 2 – 52 Esquina, segundo piso. Palacio Municipal, Teléfono (57) (8) 2866549
Ambalema – Tolima – Colombia
www.ambalema-tolima.gov.co – planeacion@ambalema-tolima.gov.co
Código Postal 731001

2. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS A LA OBRA (orden cronológico)

SUPERVISOR

OBSERVACIONES

1. PUBLICACIÓN SECOP

- https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-1-221801&g-recaptcha-response=03AGdBq25OxRu4GwrpaeTa56_XOjQ0zC0tYtD-7tnQ0KtDEZ5ppOzokSwramZhtXQV-vhHR68RMnrJV0jYArddpFirlcMpiSa5jNqIv-KZmiT8xvB-KoE2tuMNAuDuQYIQQAwUrLHiEaOW1MkZq05rxKnqPxdEhijrBXoDHL3hzJX3OHy5mnKeQmCAJcMjbcmvL35SwryE3zTwmKimrTIy3XUPQOZiV7Gd9qRdI7fEzAjHqQQJeQioJqf7Buw7BWiIzmSChcZio1tNBDPw2-fT1Rd3Xyg3kUMWTj8wxeDHykqtQWcLaNarZ7Ejhk0N1R0d2fT1ok3UHGMn-D9HaXBnqO-LaLdOkfbloRBwnH1vHt1NNKRMHiWlWguDQ_Jj8qmdE7Wye3xLsupYWsc-mDgaWTZZuwaNomMwUI1S74SFzfm41JcVor_14Q4dCh4DVKatYexpuTaA96w_0GdFKjsQM-cpHbtHFFC3sw

LP - 001 - 2022	Licitación Pública	Convocado	TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AMBALEMA	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA	Tolima : Ambalema	$1.125.000.000,00	

- https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-10-216872&g-recaptcha-response=03AGdBq25JLKHhSM9Gs6AjRrdMur4AjbQWjCKLqWOK3uJkCmGg0bmkXhH146lQJKnsCjp89J8L_KiZf4bA5w1pJgyce6uOETJVvorqKkboPXDszmwULKuaaf0EieQ3GkFvmxF5nz_1ooPAnq4y9cJMERoIlQLrEnTeXip9AbK6Xs45gKnec3IQmJmy2XXxnms21bvoY8VRNseMZ3VRliXLobm0YMbnMl9KUurI6X8COxlcfGMh0_whscuhd_VWr3zrCH2ygfU5tqyfb2TYq0ElTcZDVhxSDnybYgJYKfoQhNfslF0PxtSsPTVnTDruUkPn2GAuF9nOiz6VWS493brlWmmdI_njfd-gnXs8nAzNB5mXcLylfoDfVpaBYxHnWJapgvVU8EW8c_IszrsNB2Dx-MkBswsanX00Qq09Q8w19On1uVINAlOh3shI0bH7PdoxtlCy1mu7-eTp6dJ46ob-Lj_pmI0zeb3kxg

10 CM - 002 - 2022	Concurso de Méritos con Lista Corta	Convocado	TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AMBALEMA	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA	Tolima : Ambalema	$125.000.000,00	Fecha de Carga en el Sistema 15-FEB-22

Fecha de creación 05 de Enero de 2023

Suspendido

ANDRES FELIPE PEREZ CRUSCO
Secretario de Planeación e Infraestructura y TICS
Supervisor
Convenio No. 1988 de 2021Ambalema Tolima

CONVENIO 1988 DE 2021

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto Sacúdete al Parque Tipo 1 en el municipio de Ambalema – Tolima"

INFORME FINANCIERO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA

PROYECTO (S): * ESTUDIOS Y DISEÑOS SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA
* INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, MUNICIPIO DE AMBALEMA – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

CUENTA (AHORROS) No: 876-070194 DEL BANCO: BBVA

VALOR CONVENIO		**$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR		**$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO		**$ 0,00**
	FECHA DE GIRO	
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	GIRO 1	**$ 225.000.000,00**
	GIRO 2	**$ 0,00**
	GIRO 3	$ 0,00
	GIRO 4	$ 0,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 225.000.000,00**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 876-070194 A LA FECHA (1)		**$ 225.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-001-2022 (Contrato 083)	CONSORCIO SACÚDETE AMBALEMA	$ 1.125.000.000,00	$ 0,00	$ 1.125.000.000,00

C-002-2022 (Contrato 087 de 2022)	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ	$ 125.000.000,00	$ 0,00	$ 125.000.000,00
				$ 0,00
				$ 0,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1.250.000.000,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
						$ 0,00	$ 0,00
						$ 0,00	$ 0,00
						$ 0,00	$ 0,00
						$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)						**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2021	24.502,00
31/01/2022	30.386,00
28/02/2022	9.127,00
31/03/2022	9.127,00
29/04/2022	9.127,00
31/05/2022	9.128,00
30/06/2022	9.128,00
29/07/2022	9.129,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS

31/08/2022	9.129,00
30/09/2022	9.130,00
31/10/2022	9.130,00
30/11/2022	9.131,00
31/12/2022	9.131,00
TOTAL (3)	**$ 155.305,00**

TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 225.000.000,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**

OTROS CONCEPTOS (6) **$ 42.524.519,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 155.305,00

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00


SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 155.305,00**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)

SALDO EN CAJA INCLUIDO RENDIMIENTOS **$ 182.630.786,00**

OBSERVACIONES

FIRMA



KAROL PAOLA SERRANO ROZO
Secretaria de Hacienda y Tesorería
Ambalema - Tolima

BBVA

EXTRACTO EL LIBRETON

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
29-12-2022	ABONO INTERESES GANADOS	31-12-2022		9,131.00

PERIODO: Desde 01-12-2022 **Hasta** 31-12-2022

TITULAR
MUNICIPIO DE AMBALEMA

Saldo anterior	Cargos	Abonos
182,621,655.00	.00	9,131.00

Saldo promedio del mes 182,621,655.00

Nuevo Saldo 182,630,786.00

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
AGENCIA MARIQUITA	31-12-2022	0013	0876	90	0200070194	4

MINISTERIO DEL INTERIOR	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN** RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	**Código: GR-RF-P1-F4** **Versión: 01** **Vigencia desde: 29/12/2017**

Entidad Administradora: MUNICIPIO DE AMBALEMA-TOLIMA
NIT Entidad Administradora : 800100140-4
No. Convenio : 1988-2021
Informe con corte a :
Fecha de Elaboración Informe: 25/01/2023
Valor total Convenio: $ 1.250.000.000

Fecha de desembolso y/ o ejecución	Valor desembolso Mininterior	Valor ejecutado mensual	Valor ejecutado acumulado	Concepto	Valor pendiente por legalizar
Saldo anterior	$ 225.000.000				**$ 225.000.000**
Movimiento del mes					
			$ -		$ 225.000.000
			$ -		$ 225.000.000
			$ -		$ 225.000.000
			$ -		$ 225.000.000
			$ -		$ 225.000.000
			$ -		$ 225.000.000
Total	**225.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**225.000.000,00**

OBSERVACIONES:
Recursos pendientes por legalizar: $225.000.000,00
Total rendimientos financieros generados $155.305,00
Saldo en la cuenta bancaria N°0200070194: $182.630.876,00

La cuenta del convenio a la presente fecha presenta un saldo de $186.630.786,00 frente a los $225.000.000,00 desembolsados por el Ministerio del Interior. Vale la pena mencionar que, a la presente fecha no se ha realizado ningún egreso a los contratos derivados del convenio interadministrativo 1988-21 y la diferencia de $42.524.519 corresponden a un embargo al municipio, por lo anterior, la administracion municipal interpuso un recurso y será reintegrado el valor precitado durante el mes de febrero de 2023.

Firma: _____
Yenier Henao Mejia
Supervisor Convenio

CONVENIO 1988 DE 2021

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto Sacúdete al Parque Tipo 1 en el municipio de Ambalema – Tolima"

INFORME FINANCIERO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA

PROYECTO (S): * ESTUDIOS Y DISEÑOS SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA
* INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, MUNICIPIO DE AMBALEMA – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

CUENTA (AHORROS) No: 876-070194 DEL BANCO: BBVA

VALOR CONVENIO		**$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR		**$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO		**$ 0,00**
	FECHA DE GIRO	
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	GIRO 1	**$ 225.000.000,00**
	GIRO 2	**$ 0,00**
	GIRO 3	$ 0,00
	GIRO 4	$ 0,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 225.000.000,00**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 876-070194 A LA FECHA (1)		**$ 225.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-001-2022 (Contrato 083)	CONSORCIO SACÚDETE AMBALEMA	$ 1.125.000.000,00	$ 0,00	$ 1.125.000.000,00

C-002-2022 (Contrato 087 de 2022)	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ	$ 125.000.000,00	$ 0,00	$ 125.000.000,00
				$ 0,00
				$ 0,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1.250.000.000,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
						$ 0,00	$ 0,00
						$ 0,00	$ 0,00
						$ 0,00	$ 0,00
						$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)						**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2021	24.502,00
31/01/2022	30.386,00
28/02/2022	9.127,00
31/03/2022	9.127,00
29/04/2022	9.127,00
31/05/2022	9.128,00
30/06/2022	9.128,00
29/07/2022	9.129,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS

31/08/2022	9.129,00
30/09/2022	9.130,00
31/10/2022	9.130,00
30/11/2022	9.131,00
31/12/2022	9.131,00
TOTAL (3)	**$ 155.305,00**

TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 225.000.000,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**

OTROS CONCEPTOS (6) **$ 42.524.519,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 155.305,00

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00


SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 155.305,00**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)

SALDO EN CAJA INCLUIDO RENDIMIENTOS **$ 182.630.786,00**

OBSERVACIONES

FIRMA



KAROL PAOLA SERRANO ROZO
Secretaria de Hacienda y Tesorería
Ambalema - Tolima

BBVA

EXTRACTO EL LIBRETON

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
29-12-2022	ABONO INTERESES GANADOS	31-12-2022		9,131.00

PERIODO: Desde 01-12-2022 **Hasta** 31-12-2022

TITULAR
MUNICIPIO DE AMBALEMA

Saldo anterior	Cargos	Abonos
182,621,655.00	.00	9,131.00

Saldo promedio del mes 182,621,655.00

Nuevo Saldo 182,630,786.00

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
AGENCIA MARIQUITA	31-12-2022	0013	0876	90	0200070194	4

Gmail

Daniel Suarez <danielsuarezarq@gmail.com>

SOLICITUD DE POLIZA CONVENIO 1988-2021 AMBALEMA - TOLIMA

Daniel Suarez <danielsuarezarq@gmail.com> 13 de diciembre de 2022, 13:32
Para: "Planeacion ambalema-tolima.gov.co" <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>
Cc: Yenier Henao Mejia <yenier.henao@mininterior.gov.co>, Angie Vannessa Venegas Serrano <angie.venegas@mininterior.gov.co>

Buenos días,

Por medio del presente correo adjunto la minuta correspondiente a la Segunda prórroga y Primera modificación del Sacúdete Tipo 1 1988-2021 del municipio de Ambalema – Tolima, lo anterior para la actualización de la póliza de acuerdo a la misma, favor realizar dicho trámite en el menor tiempo posible.

Quedo atento a sus comentarios.

--

ARQ. DANIEL F. SUÁREZ ESTRADA
Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana

Cel: 3217831526
danielsuarezarq@gmail.com
Carrera 8 Nº 12B -31 Edificio Bancol Piso 10
Bogotá, D.C.-Colombia

https://www.mininterior.gov.co



3. SEGUNDA PRORROGA - REPROGRAMACION 1988-21.pdf
423K
