INFORME TECNICO DE OBRA – FINAL

CONTRATO DE OBRA No. LP-SID-UAC-041-2023- LOTE 7- CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV." – LOTE 7.

ELABORADO POR: CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

CARTAGENA – BOLÍVAR

Tabla de contenido

INFORME TECNICO DE OBRA – FINAL 1
INTRODUCCIÓN 3
1. DATOS GENERALES 3
2. DATOS DEL CONTRATO 4
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS 4
4. PLAN DE TRABAJO 20
4.1 Plan de Calidad 20
4.1.1 Ensayos: 20
4.1.2 Maquinaria y Equipo: 20
4.1.3 Materiales 21
5 BALANCE FINANCIERO: MAYORES Y MENORES CANTIDADES 22
6 CONTROL FINANCIERO 28
7 CONTROL DE PERSONAL 28
8 VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 29
9 SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO. 30
10 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 34
11 REGISTRO FOTOGRAFICO 82
..... **¡Error! Marcador no definido.**
12 ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA 113
13 OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 113
- Recomendaciones 113
- Conclusiones 114

INTRODUCCIÓN

Este proyecto tuvo como objetivo detallar las actividades y especificaciones técnicas involucradas en la ejecución del proyecto de Rehabilitación de la Malla Vial Urbana del Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. - Fase IV (Lote 7). El proyecto se desarrolló bajo el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable, y abarcó la construcción de pavimento rígido, obras de urbanismo, obras de drenaje y la señalización correspondiente, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los diseños y especificaciones técnicas del contrato.

En términos generales, las obras incluyeron actividades como la localización, trazado y replanteo de la vía, corte y retiro de material sobrante, la conformación de la subrasante, y la instalación de concreto premezclado, así como el suministro y colocación de estructuras de drenaje. Además, se llevaron a cabo tareas de señalización vial, tanto vertical como horizontal, para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas de tránsito.

Cada actividad se ejecutó siguiendo los estándares técnicos de calidad y seguridad aplicables, asegurando la correcta implementación de las especificaciones y el uso de los materiales adecuados, tales como concreto reforzado y estructuras de acero de alta resistencia.

1. DATOS GENERALES

FECHA:	11/03/2025	INFORME	FINAL

PERIODO NO.	3	Del:	14/11/2023	Al:	11/03/2025

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. - FASE IV (LOTE 7)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	• Carrera 80A entre Calles 20B y 27, Alameda la Victoria • Calle 12 entre Carreras 56 (Corredor de Carga) y 57D, Nuevo Campestre • Calle 3C entre Carreras 58A y 58B, el Libertador • Ronda real • Calle 30D entre Carrera 71 y Calle 31, vía entre Centro Comercial la Plazuela y Shopping Center • Alameda la Victoria – tramo final entre Calle 20 y urbanización el Nogal.

	• Calle 30B entre carrera 68 y conjunto torres de la plazuela • Carrera 2 entre diagonal 32 y Troncal del caribe • Extensión Shopping - Calle 30Dentre Carrera 78 y troncal del caribe

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE:	Obra
CONTRATO NO.:	LP-SID-UAC-041-2023 LOTE 7
CONTRATISTA:	CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA NIT: 901.749.446-5
FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL:	47 DÍAS
FECHA DE INICIO:	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO ACTUALIZADO *(INCLUIDO PRORROGAS):*	1 AÑO Y 117 DÍAS
VALOR INICIAL:	SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($ 7.369.191.860,00) MCTE
VALOR ADICIONES:	TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DIEZ MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 3.680.010.128)
VALOR FINAL:	ONCE MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 11.049.201.988) M/ CTE

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se da la relación de las actividades constructivas realizadas por el Contratista de Obra CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA, durante la ejecución de todo el proyecto:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Carrera 80A entre Calles 20B y 27, Alameda la Victoria				
1,0	**1.PRELIMINARES**			**$493.095.198,67**
1,01	Localización, trazado y replanteo	m2	5387,15	$26.768.767,23
1,02	Cerramiento provisional de obra en polisombra, incluye estructura de soporte y mantenimiento durante la obra, h= 2,00mts	ml	786,00	$18.860.856,00
1,03	Demolición de andenes, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	617,90	$16.961.355,00
1,04	Demolición de bordillos, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	ml	1087,80	$11.642.723,40
1,07	Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	4366,37	$418.861.497,04
2,0	**2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTOS**			**$1.827.735.706,74**
2,01	Corte mecánico para área de calzada	m3	1227,14	$23.238.365,28
2,04	Excavación a maquina	m3	325,38	$11.292.638,28
2,06	Cargue, transporte y disposición final de material sobrante en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	m3	1915,56	$119.534.571,69
2,07	Conformación y compactación mecánica de subrasante	m2	3776,27	$21.079.127,98
2,08	Relleno piedra rajon	m3	171,36	$24.259.949,28
2,09	Relleno con material seleccionado triturado 3/4" a 1 1/2", debidamente compactado	m3	1310,37	$247.485.187,59

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Carrera 80A entre Calles 20B y 27, Alameda la Victoria				
2,12	Suministro y colocación de geotextil T-2400	m2	5087,92	$77.387.232,78
2,25	Pavimento en concreto rígido MR 42 - AC= 3 días, e=0,20 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,35 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	4371,90	$1.148.839.138,20
2,40	Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras	kg	7846,65	$88.580.838,62
2,41	Corte y sello de juntas de construcción con poliuretano	ml	1914,83	$66.038.657,04
3,0	**3. URBANISMO**			**$250.431.507,19**
3,01	Excavación manual para estructuras	m3	431,74	$13.569.156,46
3,02	Relleno con material seleccionado tipo zahorra	m3	256,77	$15.424.776,01
3,03	Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, e= 0,10 mts	m2	906,51	$96.099.713,58
3,04	Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones 0,15 x 0,20 mts, 2Ø3/8" +1Ø3/8" c.0,33 mts	ml	1079,70	$73.806.132,60
3,13	Rampas peatonal en concreto armado 3500psi, e=0,12m	m2	452,37	$51.531.728,55
5,0	**5. OBRAS DE DRENAJE**			**$45.503.367,00**
5,01	Inspección y reubicación de acometida alcantarillado y/o acueducto	ml	134,00	$5.064.932,00
5,02	Nivelación y reconstrucción de cámaras de inspección, incluye acero de refuerzo de 5/8"	un	14,00	$9.256.058,00
5,03	Nivelación y reconstrucción de registros sanitarios domiciliarios	un	1,00	$287.465,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Carrera 80A entre Calles 20B y 27, Alameda la Victoria				
5,08	Manejo de agua durante construccion con motobomba	hr	64,00	$30.894.912,00
6,0	**6. SEÑALIZACION**			**$93.030.298,00**
6,01	Señalización horizontal (líneas continuas)	ml	5254,00	$88.677.012,00
6,03	Suministro e instalación de señalización vertical	un	7,00	$4.353.286,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Calle 12 entre Carreras 56 (Corredor de Carga) y 57D, Nuevo Campestre				
1,0	**1.PRELIMINARES**			**$430.215.864,65**
1,01	Localización, trazado y replanteo	m2	5478,80	$27.224.138,32
1,02	Cerramiento provisional de obra en polisombra, incluye estructura de soporte y mantenimiento durante la obra, h= 2,00mts	ml	880,00	$21.116.528,84
1,03	Demolición de andenes, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	475,00	$13.038.750,00
1,04	Demolición de bordillos, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	ml	957,40	$10.247.052,20
1,07	Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	3735,21	$358.314.960,09
1,13	Demolición de estructura de alcantarilla, incluye retiro y disposición final	ml	9,60	$274.435,20

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Calle 12 entre Carreras 56 (Corredor de Carga) y 57D, Nuevo Campestre				
	de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental.			
2,0	**2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTOS**			**$1.767.731.261,12**
2,01	Corte mecánico para área de calzada	m3	1572,94	$29.786.787,55
2,06	Cargue, transporte y disposición final de material sobrante en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	m3	1870,22	$116.705.574,68
2,07	Conformación y compactación mecánica de subrasante	m2	3922,15	$21.893.452,46
2,09	Relleno con material seleccionado triturado 3/4" a 1 1/2", debidamente compactado	m3	1456,81	$275.144.175,20
2,12	Suministro y colocación de geotextil T-2400	m2	4135,11	$62.895.053,52
2,26	Pavimento en concreto rígido MR 42 - AC= 3 días, e=0,22 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,40 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,80m c/1,00m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	3922,15	$1.127.700.490,15
2,40	Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras	kg	7024,92	$79.304.371,55
2,41	Corte y sello de juntas de construcción con poliuretano	ml	1574,50	$54.301.356,00
3,0	**3. URBANISMO**			**$188.891.564,53**
3,01	Excavación manual para estructuras	m3	235,84	$7.412.231,07
3,02	Relleno con material seleccionado tipo zahorra	m3	139,06	$8.353.811,45

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Calle 12 entre Carreras 56 (Corredor de Carga) y 57D, Nuevo Campestre				
3,03	Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, e= 0,10 mts	m2	840,04	$89.053.480,44
3,04	Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones 0,15 x 0,20 mts, 2Ø3/8" +1Ø3/8" c.0,33 mts	ml	958,15	$65.497.217,70
3,13	Rampas peatonal en concreto armado 3500psi, e=0,12m	m2	144,38	$16.447.047,70
3,14	Rampas vehicular en concreto armado 3500psi, e=0,20m	m2	12,72	$2.127.776,16
4,0	**4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			**$6.143.755,30**
4,09	Cárcamo en concreto 4000PSI de 1,00 x 0,80 mts libre, incluye excavación, relleno con triturado, formaleta y mano de obra	ml	3,05	$6.143.755,30
5,0	**5. OBRAS DE DRENAJE**			**$7.295.814,00**
5,01	Inspección y reubicación de acometida alcantarillado y/o acueducto	ml	10,50	$396.879,00
5,02	Nivelación y reconstrucción de cámaras de inspección, incluye acero de refuerzo de 5/8"	un	10,00	$6.611.470,00
5,03	Nivelación y reconstrucción de registros sanitarios domiciliarios	un	1,00	$287.465,00
6,0	**6. SEÑALIZACION**			**$105.583.365,00**
6,01	Señalización horizontal (líneas continuas)	ml	4376,50	$73.866.567,00
6,03	Suministro e instalación de señalización vertical	un	51,00	$31.716.798,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Calle 3C entre Carreras 58A y 58B, el Libertador				
1,0	**1.PRELIMINARES**			**$14.075.008,70**
1,01	Localización, trazado y replanteo	m2	1436,65	$7.138.713,85
1,02	Cerramiento provisional de obra en polisombra, incluye estructura de soporte y mantenimiento durante la obra, h= 2,00mts	ml	220,10	$5.281.519,60
1,07	Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	17,25	$1.654.775,25
2,0	**2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTOS**			**$405.512.548,87**
2,01	Corte mecánico para área de calzada	m3	497,88	$9.428.334,62
2,04	Excavación a maquina	m3	112,36	$3.899.566,16
2,06	Cargue, transporte y disposición final de material sobrante en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	m3	709,88	$44.297.619,75
2,07	Conformación y compactación mecánica de subrasante	m2	1002,85	$5.597.908,70
2,09	Relleno con material seleccionado triturado 3/4" a 1 1/2", debidamente compactado	m3	300,86	$56.822.336,75
2,12	Suministro y colocación de geotextil T-2400	m2	1145,20	$17.418.492,00
2,22	Pavimento en concreto rígido MR 42 - normal, e=0,20 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,35 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	1014,30	$246.125.980,80

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Calle 3C entre Carreras 58A y 58B, el Libertador				
2,40	Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras	kg	528,37	$5.964.712,49
2,41	Corte y sello de juntas de construcción con poliuretano	ml	462,70	$15.957.597,60
3,0	**3. URBANISMO**			**$87.798.679,93**
3,01	Excavación manual para estructuras	m3	99,64	$3.131.491,27
3,02	Relleno con material seleccionado tipo zahorra	m3	49,82	$2.992.596,57
3,03	Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, e= 0,10 mts	m2	502,19	$53.237.664,09
3,04	Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones 0,15 x 0,20 mts, 2Ø3/8" +1Ø3/8" c.0,33 mts	ml	416,00	$28.436.928,00
5,0	**5. OBRAS DE DRENAJE**			**$6.416.322,60**
5,01	Inspección y reubicación de acometida alcantarillado y/o acueducto	ml	93,70	$3.541.672,60
5,03	Nivelación y reconstrucción de registros sanitarios domiciliarios	un	10,00	$2.874.650,00
6,0	**6. SEÑALIZACION**			**$34.228.584,00**
6,01	Señalización horizontal (líneas continuas)	ml	2028,00	$34.228.584,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Ronda real				
1,0	**1.PRELIMINARES**			**$37.101.189,07**
1,01	Localización, trazado y replanteo	m2	557,74	$2.771.410,06
1,02	Cerramiento provisional de obra en polisombra, incluye estructura de soporte y mantenimiento durante la obra, h= 2,00mts	ml	70,60	$1.694.117,60
1,05	Demolición de cunetas, incluye retiro y disposición final de material a sitio	ml	35,30	$808.440,60

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Ronda real				
	autorización por la Autoridad Ambiental			
1,07	Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	75,79	$7.270.458,91
1,08	Demolición de pavimento asfáltico, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m3	93,15	$24.556.761,90
2,0	**2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTOS**			**$268.335.997,10**
2,01	Corte mecánico para área de calzada	m3	252,40	$4.779.604,12
2,06	Cargue, transporte y disposición final de material sobrante en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	m3	271,47	$16.940.492,94
2,07	Conformación y compactación mecánica de subrasante	m2	504,79	$2.817.737,78
2,09	Relleno con material seleccionado triturado 3/4" a 1 1/2", debidamente compactado	m3	266,52	$50.335.888,51
2,12	Suministro y colocación de geotextil T-2400	m2	600,10	$9.127.521,00
2,27	Pavimento en concreto rígido MR 42 - AC= 3 días, e=0,25 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,45 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	522,44	$167.869.898,36
2,40	Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras	kg	792,80	$8.949.919,20

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Ronda real				
2,41	Corte y sello de juntas de construcción con poliuretano	ml	217,90	$7.514.935,20
3,0	**3. URBANISMO**			**$52.189.250,34**
3,01	Excavación manual para estructuras	m3	19,12	$601.001,05
3,02	Relleno con material seleccionado tipo zahorra	m3	14,65	$879.817,14
3,03	Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, e= 0,10 mts	m2	84,56	$8.964.608,19
3,04	Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones 0,15 x 0,20 mts, 2Ø3/8" +1Ø3/8" c.0,33 mts	ml	90,15	$6.162.473,70
3,13	Rampas peatonal en concreto armado 3500psi, e=0,12m	m2	312,35	$35.581.350,25

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Calle 30D entre Carrera 71 y Calle 31, vía entre Centro Comercial la Plazuela y Shopping Center				
1,0	**1.PRELIMINARES**			**$176.659.303,55**
1,01	Localización, trazado y replanteo	m2	1861,46	$9.249.594,74
1,02	Cerramiento provisional de obra en polisombra, incluye estructura de soporte y mantenimiento durante la obra, h= 2,00mts	ml	236,80	$5.682.252,80
1,03	Demolición de andenes, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	357,49	$9.813.100,50
1,04	Demolición de bordillos, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	ml	262,90	$2.813.818,70
1,07	Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	1554,28	$149.100.536,81
2,0	**2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTOS**			**$744.401.534,69**
2,01	Corte mecánico para área de calzada	m3	619,54	$11.732.304,73
2,06	Cargue, transporte y disposición final de material sobrante en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	m3	619,54	$38.660.784,69

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Calle 30D entre Carrera 71 y Calle 31, vía entre Centro Comercial la Plazuela y Shopping Center				
2,07	Conformación y compactación mecánica de subrasante	m2	1548,86	$8.645.736,52
2,09	Relleno con material seleccionado triturado 3/4" a 1 1/2", debidamente compactado	m3	619,54	$117.011.416,65
2,12	Suministro y colocación de geotextil T-2400	m2	1788,06	$27.196.392,60
2,25	Pavimento en concreto rígido MR 42 - AC= 3 días, e=0,20 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,35 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	56,00	$14.715.568,00
2,27	Pavimento en concreto rígido MR 42 - AC= 3 días, e=0,25 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,45 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	1537,23	$493.941.206,37
2,40	Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras	kg	1041,46	$11.757.041,94
2,41	Corte y sello de juntas de construcción con poliuretano	ml	601,40	$20.741.083,20
3,0	**3. URBANISMO**			**$61.362.217,18**
3,02	Relleno con material seleccionado tipo zahorra	m3	10,81	$649.389,13
3,03	Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, e= 0,10 mts	m2	368,75	$39.091.556,25
3,04	Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones 0,15 x 0,20 mts, 2Ø3/8" +1Ø3/8" c.0,33 mts	ml	275,90	$18.859.972,20
3,13	Rampas peatonal en concreto armado 3500psi, e=0,12m	m2	24,24	$2.761.299,60
5,0	**5. OBRAS DE DRENAJE**			**$17.074.069,00**
5,02	Nivelación y reconstrucción de cámaras de inspección, incluye acero de refuerzo de 5/8"	un	1,00	$661.147,00
5,08	Manejo de agua durante construccion con motobomba	hr	34,00	$16.412.922,00
6,0	**6. SEÑALIZACION**			**$27.030.117,00**
6,01	Señalización horizontal (líneas continuas)	ml	1601,50	$27.030.117,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Alameda la Victoria – tramo final entre Calle 20 y urbanización el Nogal.				
1,0	**1.PRELIMINARES**			**$33.684.174,00**
1,01	Localización, trazado y replanteo	m2	358,98	$1.783.771,62

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Alameda la Victoria – tramo final entre Calle 20 y urbanización el Nogal.				
1,02	Cerramiento provisional de obra en polisombra, incluye estructura de soporte y mantenimiento durante la obra, h= 2,00mts	ml	100,00	$2.399.551,16
1,03	Demolición de andenes, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	59,88	$1.643.706,00
1,04	Demolición de bordillos, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	ml	77,20	$826.271,60
1,07	Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	281,78	$27.030.873,62
2,0	**2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTOS**			**$116.197.848,10**
2,01	Corte mecánico para área de calzada	m3	86,25	$1.633.316,25
2,06	Cargue, transporte y disposición final de material sobrante en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	m3	117,94	$7.359.629,48
2,07	Conformación y compactación mecánica de subrasante	m2	287,51	$1.604.880,82
2,09	Relleno con material seleccionado triturado 3/4" a 1 1/2", debidamente compactado	m3	86,25	$16.289.778,75
2,12	Suministro y colocación de geotextil T-2400	m2	299,09	$4.549.158,90
2,25	Pavimento en concreto rígido MR 42 - AC= 3 días, e=0,20 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,35 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	287,51	$75.551.302,78
2,40	Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras	kg	474,88	$5.360.920,32
2,41	Corte y sello de juntas de construcción con poliuretano	ml	111,60	$3.848.860,80
3,0	**3. URBANISMO**			**$15.513.672,49**
3,01	Excavación manual para estructuras	m3	31,69	$995.985,01
3,02	Relleno con material seleccionado tipo zahorra	m3	10,65	$639.777,45
3,03	Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, e= 0,10 mts	m2	81,13	$8.600.672,43
3,04	Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones 0,15 x 0,20 mts, 2Ø3/8" +1Ø3/8" c.0,33 mts	ml	77,20	$5.277.237,60
5,0	**5. OBRAS DE DRENAJE**			**$4.827.330,00**
5,08	Manejo de agua durante construccion con motobomba	hr	10,00	$4.827.330,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Calle 30B entre carrera 68 y conjunto torres de la plazuela				
1,0	**1.PRELIMINARES**			**$215.733.694,56**
1,01	Localización, trazado y replanteo	m2	2407,00	$11.960.383,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Calle 30B entre carrera 68 y conjunto torres de la plazuela				
1,02	Cerramiento provisional de obra en polisombra, incluye estructura de soporte y mantenimiento durante la obra, h= 2,00mts	ml	560,90	$13.459.356,40
1,03	Demolición de andenes, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	507,73	$13.937.188,50
1,04	Demolición de bordillos, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	ml	506,20	$5.417.858,60
1,07	Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	1782,14	$170.958.908,06
2,0	**2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTOS**			**$688.251.883,12**
2,01	Corte mecánico para área de calzada	m3	518,88	$9.826.030,56
2,06	Cargue, transporte y disposición final de material sobrante en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	m3	573,35	$35.778.186,70
2,07	Conformación y compactación mecánica de subrasante	m2	1729,60	$9.654.627,20
2,09	Relleno con material seleccionado triturado 3/4" a 1 1/2", debidamente compactado	m3	518,88	$97.999.308,96
2,12	Suministro y colocación de geotextil T-2400	m2	2084,80	$31.709.808,00
2,25	Pavimento en concreto rígido MR 42 - AC= 3 días, e=0,20 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,35 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	1782,14	$468.307.184,92
2,40	Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras	kg	639,02	$7.213.896,78
2,41	Corte y sello de juntas de construcción con poliuretano	ml	805,00	$27.762.840,00
3,0	**3. URBANISMO**			**$94.753.110,42**
3,01	Excavación manual para estructuras	m3	54,47	$1.711.937,63
3,02	Relleno con material seleccionado tipo zahorra	m3	54,47	$3.272.176,31
3,03	Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, e= 0,10 mts	m2	420,83	$44.612.609,13
3,04	Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones 0,15 x 0,20 mts, 2Ø3/8" +1Ø3/8" c.0,33 mts	ml	433,20	$29.612.685,60
3,13	Rampas peatonal en concreto armado 3500psi, e=0,12m	m2	136,45	$15.543.701,75
6,0	**6. SEÑALIZACION**			**$44.907.299,19**
6,01	Señalización horizontal (líneas continuas)	ml	2660,70	$44.907.299,19

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Carrera 2 entre diagonal 32 y Troncal del caribe				
1,0	**1.PRELIMINARES**			**$270.244.933,17**
1,01	Localización, trazado y replanteo	m2	2923,20	$14.525.380,80
1,02	Cerramiento provisional de obra en polisombra, incluye estructura de soporte y mantenimiento durante la obra, h= 2,00mts	ml	740,80	$17.776.236,80
1,03	Demolición de andenes, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	617,25	$16.943.424,66
1,04	Demolición de bordillos, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	ml	627,72	$6.718.487,16
1,07	Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	2233,75	$214.281.403,75
2,0	**2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTOS**			**$889.634.092,52**
2,01	Corte mecánico para área de calzada	m3	670,13	$12.690.251,81
2,06	Cargue, transporte y disposición final de material sobrante en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	m3	735,05	$45.868.298,68
2,07	Conformación y compactación mecánica de subrasante	m2	2233,75	$12.468.792,50
2,09	Relleno con material seleccionado triturado 3/4" a 1 1/2", debidamente compactado	m3	670,13	$126.565.442,71
2,12	Suministro y colocación de geotextil T-2400	m2	2651,35	$40.327.033,50
2,25	Pavimento en concreto rígido MR 42 - AC= 3 días, e=0,20 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,35 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	2233,75	$586.980.357,50
2,40	Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras	kg	2833,21	$31.984.111,02

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Carrera 2 entre diagonal 32 y Troncal del caribe				
2,41	Corte y sello de juntas de construcción con poliuretano	ml	949,60	$32.749.804,80
3,0	**3. URBANISMO**			**$118.752.534,89**
3,01	Excavación manual para estructuras	m3	64,92	$2.040.475,34
3,02	Relleno con material seleccionado tipo zahorra	m3	64,92	$3.900.139,20
3,03	Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, e= 0,10 mts	m2	422,13	$44.750.561,24
3,04	Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones 0,15 x 0,20 mts, 2Ø3/8" +1Ø3/8" c.0,33 mts	ml	619,59	$42.353.933,22
3,13	Rampas peatonal en concreto armado 3500psi, e=0,12m	m2	225,67	$25.707.425,88
5,0	**5. OBRAS DE DRENAJE**			**$28.830.573,00**
5,01	Inspección y reubicación de acometida alcantarillado y/o acueducto	ml	155,00	$5.858.690,00
5,02	Nivelación y reconstrucción de cámaras de inspección, incluye acero de refuerzo de 5/8"	un	7,00	$4.628.029,00
5,08	Manejo de agua durante construccion con motobomba	hr	38,00	$18.343.854,00
6,0	**6. SEÑALIZACION**			**$59.174.666,09**
6,01	Señalización horizontal (líneas continuas)	ml	3211,25	$54.199.482,09
6,03	Suministro e instalación de señalización vertical	un	8,00	$4.975.184,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Extensión Shopping - Calle 30Dentre Carrera 78 y troncal del caribe				
1,0	**1.PRELIMINARES**			**$84.386.903,00**
1,01	Localización, trazado y replanteo	m2	946,56	$4.703.456,64
1,02	Cerramiento provisional de obra en polisombra, incluye estructura de soporte y mantenimiento durante la obra, h= 2,00mts	ml	212,60	$5.101.549,60
1,03	Demolición de andenes, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	204,50	$5.613.525,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Extensión Shopping - Calle 30Dentre Carrera 78 y troncal del caribe				
1,04	Demolición de bordillos, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	ml	202,00	$2.162.006,00
1,07	Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	696,41	$66.806.365,76
2,0	**2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTOS**			**$342.236.759,36**
2,01	Corte mecánico para área de calzada	m3	274,37	$5.195.704,54
2,06	Cargue, transporte y disposición final de material sobrante en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	m3	304,63	$19.009.700,98
2,07	Conformación y compactación mecánica de subrasante	m2	696,41	$3.887.386,86
2,09	Relleno con material seleccionado triturado 3/4" a 1 1/2", debidamente compactado	m3	274,37	$51.819.038,39
2,12	Suministro y colocación de geotextil T-2400	m2	835,01	$12.700.502,10
2,27	Pavimento en concreto rígido MR 42 - AC= 3 días, e=0,25 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,45 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	710,53	$228.308.299,27
2,40	Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras	kg	1043,91	$11.784.678,66
2,41	Corte y sello de juntas de construcción con poliuretano	ml	276,37	$9.531.448,56
3,0	**3. URBANISMO**			**$41.454.803,36**
3,01	Excavación manual para estructuras	m3	30,27	$951.198,69
3,02	Relleno con material seleccionado tipo zahorra	m3	22,49	$1.351.041,77
3,03	Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, e= 0,10 mts	m2	196,55	$20.836.462,05
3,04	Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones 0,15 x 0,20 mts, 2Ø3/8" +1Ø3/8" c.0,33 mts	ml	220,70	$15.086.610,60
3,13	Rampas peatonal en concreto armado 3500psi, e=0,12m	m2	28,35	$3.229.490,25

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Extensión Shopping - Calle 30Dentre Carrera 78 y troncal del caribe				
5,0	**5. OBRAS DE DRENAJE**			**$19.183.415,00**
5,02	Nivelación y reconstrucción de cámaras de inspección, incluye acero de refuerzo de 5/8"	un	2,00	$1.322.294,00
5,08	Manejo de agua durante construccion con motobomba	hr	37,00	$17.861.121,00

4. PLAN DE TRABAJO

4.1 Plan de Calidad

4.1.1 Ensayos:

En las obras de pavimentación del contrato, se realizaron ensayos de resistencia a la flexión del concreto para asegurar que el material utilizado cumple con los requisitos de resistencia. El procedimiento consistió en moldear vigas de concreto, que luego fueron sometidas a una carga en su tercio medio hasta que fallaron.

Este ensayo permitió evaluar la capacidad del concreto para resistir las tensiones que se generan durante el uso del pavimento, asegurando que la estructura sea adecuada para soportar el tránsito y las condiciones locales. Los resultados obtenidos fueron comparados con los valores establecidos en las especificaciones del proyecto para garantizar la calidad de la obra.

Anexo 1. Certificado de calidad Concretos utilizados en obra
Anexo 2. Resultado ensayos Concreto

4.1.2 Maquinaria y Equipo:

Durante la ejecución del proyecto se hizo uso de la siguiente maquinaria y equipos:

MAQUINA / EQUIPO	DESCRIPCIÓN
Pulidora 7”	Utilizada para corte de tuberías, acero.
Taladro	Utilizada para demoliciones de registros.
Vibrocompactador	Utilizado para compactar y estabilizar las capas suelo que conforman las capas de pavimento.
Minicargador	Utilizado para cargar o transportar materiales en áreas difícil acceso.
Retrocargador	Utilizado para realizar excavación en el terreno natural.
Cortadora de pavimento	Utilizada para realizar cortes de juntas de pavimento
Flota canal	Utilizado para darle acabado al concreto en la capa de rodadura

Cepillo texturizador	Utilizado para darle acabado al concreto en la capa de rodadura
Vibrador de Concreto	Utilizado para eliminar burbujas de aire en el concreto
Planta eléctrica	Utilizado para generar energía en los equipos
Fumigadora	Utilizado para aplicar antisol al concreto
Vibrocompactador tipo rana	Utilizado para compactar el relleno en los andenes
Tronzadora	Utilizada para realizar cortes de acero
Bomba sumergible	Utilizado para evacuar aguas
Taladro percutor	Utilizado para realizar anclajes y demoliciones
Sierra para madera	Utilizado para corte de listones y tablas

4.1.3 Materiales

Durante la ejecución del proyecto se hizo uso de los siguientes materiales:

MATERIALES	DESCRIPCIÓN
Geotextil	Utilizado para separar, filtrar, reforzar y drenar las capas del pavimento, evitando la mezcla de materiales como base y subbase granular.
Triturado 1”	Utilizado para relleno de subbase de placa de pavimento
Piedra Rajón	Utilizada para estabilizar el terreno natural en zonas con baja capacidad portante, mejorando las condiciones de soporte antes de la colocación de capas estructurales del pavimento.
Zahorra Fina	Utilizada para rellenar subbase de andenes
Acero	Utilizado para reforzar las placas especiales y armar las canastillas entre placas de pavimento.
Concreto MR 42	Utilizado para conformar la capa de rodadura del pavimento.
Concreto 3500 PSI	Utilizado para conformar las estructuras de concreto de andenes, rampas y bordillos.

Anexo 3. Certificados de calidad Materiales de Cantera
Anexo 4. Certificado de calidad Acero

5 BALANCE FINANCIERO: MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Durante la ejecución del proyecto no se identificaron ítems no previstos; sin embargo, se presentaron mayores y menores cantidades en algunos ítems del contrato. A continuación, se presenta el balance financiero resultante de las actividades ejecutadas.

CONTRATO DE OBRA No. LP-SID-UAC-041-2023 LOTE 4 CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV." – LOTE 7.

CONTRATO No: LP-SID-UAC-041-2023 - LOTE 7
CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA: CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA
INTERVENTORIA: INGEOCIM SAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 7.369.191.860,00
ADICIONAL : $ 3.680.010.128,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO: $ 11.049.201.988,00
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

BALANCE DE OBRA No. 1

MAYORES CANTIDADES:
MENORES CANTIDADES:

VALOR ANTERIOR: $ 7.369.191.860,00
VALOR ACTUALIZADO: $ 11.049.201.988,00
VALOR DIFERENCIA: $ 3.680.010.128,00
ADICIONAL $ 3.680.010.128,00
VALOR DIFERENCIA: $ -

CONTRACTUAL														
PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA						CONDICIONES ACTUALES			MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 1	
COD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR/ UNIT	V. TOTAL	CANT	VR/ UNIT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
1,0	**1.PRELIMINARES**				**$1.173.842.990**			**$1.755.195.906**		**$581.352.916**		**$0**		**$1.755.195.906**
1,01	Localización, trazado y replanteo	m2	12.870,06	$4.969,00	$63.951.308	21.357,54	$4.969,00	$106.125.616	8.487,48	$42.174.308,00	0,00	$0,00	21.357,54	$106.125.616
1,02	Cerramiento provisional de obra en polisombra, incluye estructura de soporte y mantenimiento durante la obra, h= 2,00mts	ml	3.370,54	$23.996,00	$80.879.478	3.807,80	$23.996,00	$91.371.969	437,26	$10.492.490,96	0,00	$0,00	3.807,80	$91.371.969
1,03	Demolición de andenes, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	1.663,15	$27.450,00	$45.653.468	2.839,75	$27.450,00	$77.951.138	1.176,60	$32.297.670,00	0,00	$0,00	2.839,75	$77.951.138
1,04	Demolición de bordillos, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	ml	2.783,90	$10.703,00	$29.796.082	3.721,22	$10.703,00	$39.828.218	937,32	$10.032.135,96	0,00	$0,00	3.721,22	$39.828.218
1,05	Demolición de cunetas, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	ml	0,00	$22.902,00	$0	35,30	$22.902,00	$808.441	35,30	$808.440,60	0,00	$0,00	35,30	$808.441
1,06	Demolición de muro en mamposteria, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	0,00	$29.761,00	$0	0,00	$29.761,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
1,07	Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	9.940,30	$95.929,00	$953.562.655	14.742,98	$95.929,00	$1.414.279.328	4.802,68	$460.716.673,44	0,00	$0,00	14.742,98	$1.414.279.328
1,08	Demolición de pavimento asfáltico, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m3	0,00	$263.626,00	$0	93,15	$263.626,00	$24.556.762	93,15	$24.556.761,90	0,00	$0,00	93,15	$24.556.762
1,09	Demolición de muros en concreto armado, espesor menor a 0,20m, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	0,00	$58.576,00	$0	0,00	$58.576,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
1,10	Demolición de estructuras en concreto armado, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m3	0,00	$262.515,00	$0	0,00	$262.515,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
1,11	Demolición de losa superior box coulvert, espesor variable, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	0,00	$63.459,00	$0	0,00	$63.459,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
1,12	Demolición de losa inferior estructura hidraulica, espesor menor a 0,20m, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	0,00	$48.459,00	$0	0,00	$48.459,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
1,13	Demolición de estructura de alcantarilla, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	ml	0,00	$28.587,00	$0	9,60	$28.587,00	$274.435	9,60	$274.435,20	0,00	$0,00	9,60	$274.435
1,14	Limpieza de tuberias, incluye cabrestante, retiro, limpieza del lodo y/o material extraido y disposicion final a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	ml	0,00	$40.675,00	$0	0,00	$40.675,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
1,15	Limpieza de fondo de canal, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	ml	0,00	$58.720,00	$0	0,00	$58.720,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
1,16	Limpieza de imbornales y sumideros, incluye retiro, limpieza del lodo y/o material extraido y disposicion final a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	ml	0,00	$62.897,00	$0	0,00	$62.897,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
1,17	Desmonte de tabletas de concreto y adoquines	m2	0,00	$25.664,00	$0	0,00	$25.664,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
1,18	Fresado de carpeta asfáltica, espesor variable, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	0,00	$24.127,00	$0	0,00	$24.127,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
1,19	Trasplante de arboles tipo I, altura menor a 5,00 m, traslado a 3,00 kms	und	0,00	$1.374.067,00	$0	0,00	$1.374.067,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
1,20	Trasplante de arboles tipo II, altura entre 5,10 y 10,00 m, traslado a 3,00 kms	und	0,00	$1.667.558,00	$0	0,00	$1.667.558,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0

COD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR/UNIT	V. TOTAL	CANT	VR/ UNIT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
1,0	**1.PRELIMINARES**				**$1.173.842.990**			**$1.755.195.906**		**$581.352.916**		**$0**		**$1.755.195.906**
1,21	Trasplante de arboles tipo I, altura mayor a 10,00 m, traslado a 3,00 kms	und	0,00	$1.810.491,00	$0	0,00	$1.810.491,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,0	**2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTOS**				**$4.752.028.731**			**$7.050.036.647**		**$2.347.483.088**		**-$49.475.171**		**$7.050.036.647**
2,01	Corte mecanico para área de calzada	m3	4.186,09	$18.937,00	$79.271.922	5.719,53	$18.937,00	$108.310.740	1.533,44	$29.038.817,67	0,00	$0,00	5.719,53	$108.310.740
2,02	Excavación manual para bacheos asfaltico	m3	0,00	$31.429,00	$0	0,00	$31.429,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,03	Excavación manual húmeda	m3	0,00	$31.687,00	$0	0,00	$31.687,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,04	Excavación a maquina	m3	300,00	$34.706,00	$10.411.800	437,74	$34.706,00	$15.192.204	137,74	$4.780.404,44	0,00	$0,00	437,74	$15.192.204
2,05	Entibado en madera (gatos, cerchas y tableros)	m2	0,00	$60.443,00	$0	0,00	$60.443,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,06	Cargue, transporte y disposición final de material sobrante en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	m3	6.722,84	$62.402,00	$419.518.509	7.117,64	$62.402,00	$444.154.971	394,80	$24.636.461,91	0,00	$0,00	7.117,64	$444.154.971
2,07	Conformación y compactacion mecanica de subrasante	m2	10.913,59	$5.582,00	$60.919.637	15.702,19	$5.582,00	$87.649.625	4.788,60	$26.729.987,53	0,00	$0,00	15.702,19	$87.649.625
2,08	Relleno piedra rajon	m3	358,66	$141.573,00	$50.776.569	171,36	$141.573,00	$24.259.949	0,00	$0,00	-187,30	-$26.516.619,47	171,36	$24.259.949
2,09	Relleno con material seleccionado triturado 3/4" a 1 1/2", debidamente compactado	m3	3.414,37	$188.867,00	$644.862.536	5.503,73	$188.867,00	$1.039.472.974	2.089,36	$394.610.437,43	0,00	$0,00	5.503,73	$1.039.472.974
2,10	Relleno con material areno gravoso	m3	0,00	$148.643,00	$0	0,00	$148.643,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,11	Relleno con material del sitio	m3	0,00	$13.994,00	$0	0,00	$13.994,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,12	Suministro y colocación de geotextil T-2400	m2	13.715,87	$15.210,00	$208.618.444	18.626,64	$15.210,00	$283.311.194	4.910,77	$74.692.750,86	0,00	$0,00	18.626,64	$283.311.194
2,13	Suministro y colocación de geotextil T-1800, para filtros	m2	0,00	$12.980,00	$0	0,00	$12.980,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,14	Relleno base mezcla de triturado calizo 3/4" y zahorra, proporción 1: 1	m3	0,00	$165.723,00	$0	0,00	$165.723,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,15	Relleno con zahorra estabilizada con cemento tipo I al 4% en peso	m3	0,00	$131.752,00	$0	0,00	$131.752,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,16	Pavimento en concreto rígido MR 40 - normal, e=0,20 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,35 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	0,00	$238.013,00	$0	0,00	$238.013,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,17	Pavimento en concreto rígido MR 40 - normal, e=0,22 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,40 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,80m c/1,00m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	0,00	$260.279,00	$0	0,00	$260.279,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,18	Pavimento en concreto rígido MR 40 - normal, e=0,25 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,45 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	0,00	$290.363,00	$0	0,00	$290.363,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,19	Pavimento en concreto rígido MR 40 - AC= 3 días, e=0,20 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,35 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	0,00	$258.134,00	$0	0,00	$258.134,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,20	Pavimento en concreto rígido MR 40 - AC= 3 días, e=0,22 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,40 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,80m c/1,00m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	0,00	$282.414,00	$0	0,00	$282.414,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,21	Pavimento en concreto rígido MR 40 - AC= 3 días, e=0,25 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,45 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	0,00	$315.515,00	$0	0,00	$315.515,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,22	Pavimento en concreto rígido MR 42 - normal, e=0,20 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,35 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	973,29	$242.656,00	$236.174.658	1.014,30	$242.656,00	$246.125.981	41,01	$9.951.322,56	0,00	$0,00	1.014,30	$246.125.981
2,23	Pavimento en concreto rígido MR 42 - normal, e=0,22 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,40 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,80m c/1,00m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	0,00	$265.387,00	$0	0,00	$265.387,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,24	Pavimento en concreto rígido MR 42 - normal, e=0,25 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,45 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	0,00	$296.167,00	$0	0,00	$296.167,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,25	Pavimento en concreto rígido MR 42 - AC= 3 días, e=0,20 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,35 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	4.535,32	$262.778,00	$1.191.781.268	8.731,30	$262.778,00	$2.294.393.551	4.195,98	$1.102.612.283,55	0,00	$0,00	8.731,30	$2.294.393.551
2,26	Pavimento en concreto rígido MR 42 - AC= 3 días, e=0,22 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,40 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,80m c/1,00m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	4.002,00	$287.521,00	$1.150.659.042	3.922,15	$287.521,00	$1.127.700.490	0,00	$0,00	-79,85	-$22.958.551,85	3.922,15	$1.127.700.490
2,27	Pavimento en concreto rígido MR 42 - AC= 3 días, e=0,25 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,45 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	1.402,98	$321.319,00	$450.804.131	2.770,20	$321.319,00	$890.117.894	1.367,22	$439.313.763,18	0,00	$0,00	2.770,20	$890.117.894

COD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR/ UNIT	V. TOTAL	CANT	VR/ UNIT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
1,0	**1.PRELIMINARES**				**$1.173.842.990**			**$1.755.195.906**		**$581.352.916**		**$0**		**$1.755.195.906**
2,28	Pavimento en concreto rígido MR 40 - AC= 7 días, e=0,20 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,35 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	0,00	$251.943,00	$0	0,00	$251.943,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,29	Pavimento en concreto rígido MR 40 - AC= 7 días, e=0,22 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,40 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,80m c/1,00m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	0,00	$275.603,00	$0	0,00	$275.603,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,30	Pavimento en concreto rígido MR 40 - AC= 7 días, e=0,25 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,45 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	0,00	$307.776,00	$0	0,00	$307.776,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,31	Pavimento en concreto rígido MR 42 - AC= 7 días, e=0,20 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,35 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	0,00	$256.587,00	$0	0,00	$256.587,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,32	Pavimento en concreto rígido MR 42 - AC= 7 días, e=0,22 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,40 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,80m c/1,00m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	0,00	$280.711,00	$0	0,00	$280.711,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,33	Pavimento en concreto rígido MR 42 - AC= 7 días, e=0,25 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,45 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	0,00	$313.580,00	$0	0,00	$313.580,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,34	Pavimento en Concreto Rígido MR 42 - AC 3 dias, con pigmento rojo y estampado e= 0,20 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,35 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico rieles y mano de obra	m2	0,00	$297.697,00	$0	0,00	$297.697,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,35	Pavimento en Concreto Rígido MR 42 - AC 7 dias, con pigmento rojo y estampado e= 0,20 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,35 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico rieles y mano de obra	m2	0,00	$291.505,00	$0	0,00	$291.505,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,36	Servicio de bombeo de concreto a obra	m3	0,00	$84.025,00	$0	0,00	$84.025,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,37	Suministro, colocacion, extendida y compactacion de mezcla asfaltica densa caliente MDC-19 tipo 60-70, incluye riego de liga e imprimación	m3	0,00	$1.136.312,00	$0	0,00	$1.136.312,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,38	Suministro, colocacion, extendida y compactacion de mezcla asfaltica densa caliente MDC-19 con cemento asfaltico modificado con polimeros (incluye riego de liga e imprimación)	m3	0,00	$1.473.254,00	$0	0,00	$1.473.254,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,39	Suministro, colocacion, extendida y compactacion de mezcla densa en frio con asfalto natural MAN-19 (incluye riego de liga e imprimación)	m3	0,00	$1.107.820,00	$0	0,00	$1.107.820,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
2,40	Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras	kg	9.295,00	$11.289,00	$104.931.255	22.225,22	$11.289,00	$250.900.491	12.930,22	$145.969.235,58	0,00	$0,00	22.225,22	$250.900.491
2,41	Corte y sello de juntas de construcción con poliuretano	ml	4.155,04	$34.488,00	$143.298.960	6.913,90	$34.488,00	$238.446.583	2.758,86	$95.147.622,80	0,00	$0,00	6.913,90	$238.446.583
3,0	**3. URBANISMO**				**$626.267.094**			**$911.146.827**		**$529.031.278**		**-$244.151.545**		**$911.146.827**
3,01	Excavación manual para estructuras	m3	391,29	$31.429,00	$12.297.979	967,69	$31.429,00	$30.413.529	576,40	$18.115.549,88	0,00	$0,00	967,69	$30.413.529
3,02	Relleno con material seleccionado tipo zahorra	m3	195,65	$60.073,00	$11.753.102	623,63	$60.073,00	$37.463.325	427,98	$25.710.222,76	0,00	$0,00	623,63	$37.463.325
3,03	Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, e= 0,10 mts	m2	1.956,47	$106.011,00	$207.407.341	3.822,69	$106.011,00	$405.247.190	1.866,22	$197.839.848,42	0,00	$0,00	3.822,69	$405.247.190
3,04	Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones 0,15 x 0,20 mts, 2Ø3/8" +1Ø3/8" c.0,33 mts	ml	1.820,66	$68.358,00	$124.456.676	4.170,59	$68.358,00	$285.093.191	2.349,93	$160.636.514,94	0,00	$0,00	4.170,59	$285.093.191
3,05	Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones 0,15 x 0,30 mts, 2Ø3/8" +1Ø3/8" c.0,33 mts	ml	0,00	$78.864,00	$0	0,00	$78.864,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
3,06	Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones 0,20 x 0,30 mts, 2Ø3/8" +1Ø3/8" c.0,33 mts	ml	1.255,24	$98.046,00	$123.071.261	0,00	$98.046,00	$0	0,00	$0,00	-1.255,24	-$123.071.261,04	0,00	$0
3,07	Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones 0,20 x 0,55 mts, 2Ø3/8" +1Ø3/8" c.0,33 mts	ml	0,00	$126.061,00	$0	0,00	$126.061,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
3,08	Construcción de Cunetas f'c = 4000psi, dimensiones 0,15 x 0,65 mts, acero de refuerzo 3Ø3/8"+1Ø3/8"c. 0,33 mts	ml	0,00	$132.335,00	$0	0,00	$132.335,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
3,09	Construcción de Cunetas f'c = 4000psi, dimensiones 0,20 x 0,65 mts, acero de refuerzo 3Ø3/8"+1Ø3/8"c. 0,33 mts	ml	0,00	$155.853,00	$0	0,00	$155.853,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
3,10	Muros en mamposteria nro 6	m2	0,00	$82.816,00	$0	0,00	$82.816,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
3,11	Muros en mamposteria dovelado nro 6	m2	0,00	$91.881,00	$0	0,00	$91.881,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
3,12	Pañete a muro, incluye filos	m2	0,00	$24.264,00	$0	0,00	$24.264,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
3,13	Rampas peatonal en concreto armado 3500psi, e=0,12m	m2	230,00	$113.915,00	$26.200.450	1.323,81	$113.915,00	$150.801.816	1.093,81	$124.601.366,15	0,00	$0,00	1.323,81	$150.801.816
3,14	Rampas vehicular en concreto armado 3500psi, e=0,20m	m2	0,00	$167.278,00	$0	12,72	$167.278,00	$2.127.776	12,72	$2.127.776,16	0,00	$0,00	12,72	$2.127.776

COD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR/ UNIT	V. TOTAL	CANT	VR/ UNIT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
1,0	**1.PRELIMINARES**				**$1.173.842.990**			**$1.755.195.906**		**$581.352.916**		**$0**		**$1.755.195.906**
3,15	Viga de confinamiento 0.10 x 0.25 m 4000 psi (incluye acero)	ml	0,00	$86.558,00	$0	0,00	$86.558,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
3,16	Viga de confinamiento 0.20 x 0.20 m 4000 psi para contenedor de raices (incluye refuerzo)	ml	0,00	$97.411,00	$0	0,00	$97.411,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
3,17	Suministro e instalacion de toperol gris 0.20 x 0.20m (Incluye dilataciones)	m2	0,00	$86.961,00	$0	0,00	$86.961,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
3,18	Suministro e instalacion de arboles de cañahuate, roble, campano o especies del bosque seco tropical de 1.00 a 1.70m de altura	und	0,00	$229.027,00	$0	0,00	$229.027,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
3,19	Suministro e instalacion de arena negra abonada para jardines (inlcuye transporte)	m3	0,00	$81.563,00	$0	0,00	$81.563,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
3,20	Suministro e instalacion de bancas tipo IDU prefabricadas sin espaldar de 1.80 x 0.60m	und	0,00	$1.079.316,00	$0	0,00	$1.079.316,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
3,21	Suministro e instalacion de estructura y canecas antivandalicas en perfileria galvanizada 1 1/4" con parales para anclaje al piso en una base de concreto de 3000 psi de 0.30 x 0.15m	und	0,00	$545.237,00	$0	0,00	$545.237,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
3,22	Suministro e instalacion de gramoquin en concreto	m2	0,00	$101.603,00	$0	0,00	$101.603,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
3,23	Excavacion manual para contenedor de raices	m3	0,00	$31.429,00	$0	0,00	$31.429,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
3,24	Suministro y relleno con material granulado para contenedor de raices	m3	0,00	$185.380,00	$0	0,00	$185.380,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
3,25	Construccion de contenedor de raices en bloque de concreto estructural No. 6	und	26,00	$4.656.934,00	$121.080.284	0,00	$4.656.934,00	$0	0,00	$0,00	-26,00	-$121.080.284,00	0,00	$0
3,26	Suministro e instalacion de paraderos tipo M-10 IDU	und	0,00	$13.130.402,00	$0	0,00	$13.130.402,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
4,0	**4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$0**			**$6.143.755**		**$6.143.755**		**$0**		**$6.143.755**
4,01	Concreto ciclópeo 60 / 40, espesor variable, de 4000psi	m3	0,00	$490.345,00	$0	0,00	$490.345,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
4,02	Suministro y colocación de concreto pobre 2500psi e=0,05m	m2	0,00	$41.118,00	$0	0,00	$41.118,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
4,03	Suministro y colocación de concreto f'c = 4000psi placa de fondo, placa de encoles y descoles	m3	0,00	$935.273,00	$0	0,00	$935.273,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
4,04	Suministro y colocación de concreto f'c = 4000psi para muros y aletas estructuras hidraulicas	m3	0,00	$1.023.457,00	$0	0,00	$1.023.457,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
4,05	Suministro y colocación de concreto f'c = 4000psi para placa superior con fibra tipo nylon 0,60 kg/m3, box coulvert, espesor de 0,20m	m3	0,00	$1.159.881,00	$0	0,00	$1.159.881,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
4,06	Suministro y colocación de concreto f'c = 4000psi para placa superior con fibra tipo nylon 0,60 kg/m3, box coulvert, espesor de 0,30m	m3	0,00	$1.191.537,00	$0	0,00	$1.191.537,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
4,07	Anclajes para estructuras, entre 1/2 y 5/8"	un	0,00	$24.280,00	$0	0,00	$24.280,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
4,08	Suministro y colocación de cinta de polivinilo O-22 de sika o similar	ml	0,00	$154.365,00	$0	0,00	$154.365,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
4,09	Cárcamo en concreto 4000PSI de 1,00 x 0,80 mts libre, incluye excavación, relleno con triturado, formaleta y mano de obra	ml	0,00	$2.014.346,00	$0	3,05	$2.014.346,00	$6.143.755	3,05	$6.143.755,30	0,00	$0,00	3,05	$6.143.755
4,10	Cárcamo de captación con rejillas reticulares de hierro 1,20 x 8,50 mts, incluye excavación, relleno con triturado, formaleta y mano de obra	m2	0,00	$2.235.099,00	$0	0,00	$2.235.099,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
4,11	Construccion de tapas para descoles de e=0,08m	m2	0,00	$195.488,00	$0	0,00	$195.488,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
4,12	Construccion de tapas para descoles de e=0,12m	m2	0,00	$237.773,00	$0	0,00	$237.773,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
4,13	Construcción de descole en concreto a=1,55 y h=variable	ml	0,00	$372.332,00	$0	0,00	$372.332,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
4,14	Construcción de descole en concreto a=0,50 y h=0,50	ml	0,00	$143.202,00	$0	0,00	$143.202,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
4,15	Reconstruccion apoyo muro descole, incluye retiro	un	0,00	$120.097,00	$0	0,00	$120.097,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
5,0	**5. OBRAS DE DRENAJE**				**$162.956.615**			**$129.130.891**		**$88.340.139**		**-$122.165.863**		**$129.130.891**
5,01	Inspección y reubicación de acometida alcantarillado y/o acueducto	ml	1.520,00	$37.798,00	$57.452.960	393,20	$37.798,00	$14.862.174	0,00	$0,00	-1.126,80	-$42.590.786,40	393,20	$14.862.174
5,02	Nivelación y reconstrucción de cámaras de inspección, incluye acero de refuerzo de 5/8"	un	57,00	$661.147,00	$37.685.379	34,00	$661.147,00	$22.478.998	0,00	$0,00	-23,00	-$15.206.381,00	34,00	$22.478.998
5,03	Nivelación y reconstrucción de registros sanitarios domiciliarios	un	170,00	$287.465,00	$48.869.050	12,00	$287.465,00	$3.449.580	0,00	$0,00	-158,00	-$45.419.470,00	12,00	$3.449.580
5,04	Reubicación de registros sanitarios domiciliarios	un	34,00	$372.239,00	$12.656.126	0,00	$372.239,00	$0	0,00	$0,00	-34,00	-$12.656.126,00	0,00	$0
5,05	Renivelacion de tapas de imbornales, incluye demolicion y reconstruir tapa de concreto	ml	15,00	$419.540,00	$6.293.100	0,00	$419.540,00	$0	0,00	$0,00	-15,00	-$6.293.100,00	0,00	$0
5,06	Suministro e instalacion de box coulvert prefabricado de 1,50 x 3,00 mts	un	0,00	$7.530.236,00	$0	0,00	$7.530.236,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
5,07	Suministro e instalación de tubería de aguas lluvias 24" PVC	ml	0,00	$696.963,00	$0	0,00	$696.963,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
5,08	Manejo de agua durante construccion con motobomba	hr	0,00	$482.733,00	$0	183,00	$482.733,00	$88.340.139	183,00	$88.340.139,00	0,00	$0,00	183,00	$88.340.139
6,0	**6. SEÑALIZACION**				**$98.136.689**			**$363.954.320**		**$266.150.643**		**-$333.012**		**$363.954.320**
6,01	Señalización horizontal (líneas continuas)	ml	4.615,65	$16.878,00	$77.902.941	19.131,95	$16.878,00	$322.909.052	14.516,30	$245.006.111,40	0,00	$0,00	19.131,95	$322.909.052
6,02	Señalización horizontal (líneas discontinuas)	ml	0,00	$14.772,00	$0	0,00	$14.772,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0

COD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR/ UNIT	V. TOTAL	CANT	VR/ UNIT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
1,0	**1.PRELIMINARES**				**$1.173.842.990**			**$1.755.195.906**		**$581.352.916**		**$0**		**$1.755.195.906**
6,03	Suministro e instalación de señalización vertical	un	32,00	$621.898,00	$19.900.736	66,00	$621.898,00	$41.045.268	34,00	$21.144.532,00	0,00	$0,00	66,00	$41.045.268
6,04	Flechas de piso	un	12,00	$27.751,00	$333.012	0,00	$27.751,00	$0	0,00	$0,00	-12,00	-$333.012,00	0,00	$0
7,0	**7. INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$0**			**$0**		**$0**		**$0**		**$0**
7,01	Desmonte de postes/estructuras primarias alineacion con herrajes	un	0,00	$742.384,00	$0	0,00	$742.384,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
7,02	Desmonte de postes/estructuras primarias angulos o anclajes con herrajes	un	0,00	$1.133.101,00	$0	0,00	$1.133.101,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
7,03	Desmonte de postes/estructuras secundarias con herrajes	un	0,00	$395.713,00	$0	0,00	$395.713,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
7,04	Reubicación e instalacion de postes existentes	un	0,00	$2.075.556,00	$0	0,00	$2.075.556,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
8,0	**8.ESTRUCTURA METALICA**				**$0**			**$0**		**$0**		**$0**		**$0**
8,01	Suministro e instalacion de baranda peatonal con pintura amarilla anticorrosiva, incluye viga de cimentacion de 0,30 x 0,30 m en concreto de 4000 psi y acero de refuerzo, platinas y pernos	ml	0,00	$786.389,00	$0	0,00	$786.389,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
8,02	Suministro e instalacion de baranda vehicular con pintura amarilla anticorrosiva, incluye viga de cimentacion de 0,30 x 0,30 m en concreto de 4000 psi y acero de refuerzo, platinas y pernos	ml	0,00	$1.348.446,00	$0	0,00	$1.348.446,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
8,03	Fabricación e instalación de rejilla para vía pública, fabricada en platina A-36 de 3/8" x 3" plegada. 3PG	m2	0,00	$3.035.252,00	$0	0,00	$3.035.252,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
8,04	Fabricación e instalación de rejilla para vía pública, fabricada en platina A-36 de 3/8" x 4" plegada. 3PG	m2	0,00	$3.368.190,00	$0	0,00	$3.368.190,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
8,05	Suministro e instalación de defensa metalica doble onda tipo flex-bean fabricada según norma AASTHO M-180	ml	0,00	$340.971,00	$0	0,00	$340.971,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 6.813.232.119**			**$ 10.215.608.346,89**		**$ 3.818.501.819,57**		**-$ 416.125.591,76**		**$ 10.215.608.346,89**

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 555.959.741**				
INSUMOS PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	0,40%	$ 27.252.928,48	$ 40.862.433,39	$ 15.274.007,28	-$ 1.664.502,37	$ 40.862.433,39
IMPACTO URBANO	2,63%	$ 179.188.004,73	$ 268.670.499,52	$ 100.426.597,85	-$ 10.944.103,06	$ 268.670.499,52
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	2,05%	$ 139.671.258,44	$ 209.419.971,11	$ 78.279.287,30	-$ 8.530.574,63	$ 209.419.971,11
CIERRE DE VIAS	3,08%	$ 209.847.549,27	$ 314.640.737,08	$ 117.609.856,04	-$ 12.816.668,23	$ 314.640.737,08
			$ 833.593.641,11	**$ 311.589.748,48**	**-$ 33.955.848,29**	**$ 833.593.641,11**
ADMINISTRACIÓN (A)	21,00%	$ 1.430.778.745,01	$ 1.650.213.656,04	$ 616.834.909,32	-$ 67.220.287,90	$ 1.650.213.656,04
IMPREVISTO (I)	4,00%	$ 272.529.284,76	$ 314.326.410,67	$ 117.492.363,68	-$ 12.803.864,36	$ 314.326.410,67
UTILIDAD (U)	5,00%	$ 340.661.605,95	$ 392.908.013,34	$ 146.865.454,60	-$ 16.004.830,45	$ 392.908.013,34
IVA SOBRE UTILIDAD (NO CALCULADO CONTRACTUALMENTE)	19,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		**$ 7.369.191.860**	**$ 11.049.201.988,00**	**$ 4.130.091.568,05**	**-$ 450.081.440,05**	**$ 11.049.201.988,00**

6 CONTROL FINANCIERO

El contrato tuvo un valor total de $ 11.049.201.988,00 compuesto por un valor inicial de $7.369.191.860,00 y una adición aprobada mediante Otrosí No.5, por $ 3.680.010.128,00

A continuación, se relacionan las facturas presentadas y los pagos realizados dentro del marco del contrato:

Acta	Factura No.	Fecha de Emisión	Periodo Facturado	Valor Facturado ($)	Porcentaje de periodo	valor acumulado
1	RU N° 6	8/03/2024	14/11/2023 a 14/02/2024	$ 1.473.838.372,00	20%	$ 1.473.838.372,00
2	RU N° 7	23/04/2024	15/02/2024 a 15/04/2024	$ 2.146.596.124,36	29,13%	$ 3.620.434.496,36
3	RU N°12	4/07/2024	16/04/2024 a 15/06/2024	$ 1.803.144.175,45	24,47%	$ 5.423.578.671,81
4	RU N°13	26/08/2024	16/06/2024 a 16/08/2024	$ 1.577.155.126,01	21,40%	$ 7.000.733.797,82
5	RU N°15	25/11/2024	16/08/2024 a 15/11/2024	$ 1.142.499.743,32	10,34%	$ 8.143.233.541,14
6	RU N° 19	9/12/2024	16/11/2024 a 10/12/2024	$ 1.140.127.508,70	10,32%	$ 9.283.361.049,84
7	RU N° 20	14/03/2025	11/12/2024 a 15/02/2025	$ 1.213.380.838,76	10,98%	**$ 10.496.741.888,60**

7 CONTROL DE PERSONAL

Se presentó el siguiente personal para la ejecución del proyecto, personal que fue aprobado por Interventoría.

CARGO POR DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN	CONDICIÓN	DEDICACIÓN SEGÚN TDR %
Director de Obra	Jaime Luis Martínez Pino	Ingeniero Civil	Mano de obra calificada/activo	100%
Residente de Obra	Orlando Javier Arroyo Fernández	Ingeniero Civil	Mano de obra calificada/activo	100%
Residente de Obra	Amaury Enrique Salas Madrigal	Ingeniero Civil	Mano de obra calificada/Retirado	100%
Residente de Obra	Remberto Monterroza Campo	Ingeniero Civil	Mano de obra calificada/Retirado	100%
Especialista en Vías – Asesor	Emiro Vanegas	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	10%-30%
Especialista Estructural– Asesor	Javier Herreras	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	10% - 30%
Ingeniero Ambiental	Gabriel Emilio Marriaga	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	10%-30%

CARGO POR DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN	CONDICIÓN	DEDICACIÓN SEGÚN TDR %
	Piñerez			
Profesional de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) O Profesional Técnico en Aseguramiento de Calidad	Yarlis Alvarez Buelvas	Tecnólogo en Salud Ocupacional	Mano de obra calificada/ activo	100%
Profesional de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) O Profesional Técnico en Aseguramiento de Calidad	María Isabel Cariaga Baldovino	Tecnólogo en Salud Ocupacional	Mano de obra calificada/ Retirada	100%
Profesional de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) O Profesional Técnico en Aseguramiento de Calidad	Yorsis Pastrana González	Tecnólogo en Salud Ocupacional	Mano de obra calificada/ Retirada	100%
Profesional Social	Mirleth Mercado	Trabajadora social	Mano de obra calificada/activo	50%

8 VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Consorcio Rehabilitación Urbana cumplió con el pago de todas planillas relacionadas a la seguridad social, de todos los meses en los cuales se llevó a cabo el proyecto.

9 SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg	Expedición
M-100210056	SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	13/09/2023 - 30/04/2024	$ 1.473.838.372	18/09/2023
M-100210056	SEGUROS MUNDIAL	Prestaciones sociales	13/09/2023 - 31/12/2026	$ 368.459.593	18/09/2023
M-100210056	SEGUROS MUNDIAL	Estabilidad de la obra	31/12/2023 - 31/12/2028	$ 1.473.838.372	18/09/2023
M-100046966	SEGUROS MUNDIAL	Amparo Basico - Predios, labores y operaciones	12/09/2023- 31/12/2023	$ 580.000.000	15/09/2023
M-100046966	SEGUROS MUNDIAL	Patronal	12/09/2023- 31/12/2023	$ 174.000.000	15/09/2023
M-100046966	SEGUROS MUNDIAL	Contratista y subcontratista	12/09/2023- 31/12/2023	$ 174.000.000	15/09/2023
M-100046966	SEGUROS MUNDIAL	Vehiculos propios y no propios	12/09/2023- 31/12/2023	$ 174.000.000	15/09/2023
M-100210056 Anexo 1	SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	13/09/2023 - 30/04/2024	$ 1.473.838.372	20/09/2023
M-100210056 Anexo 1	SEGUROS MUNDIAL	Prestaciones sociales	13/09/2023 - 31/12/2026	$ 368.459.593	20/09/2023
M-100210056 Anexo 1	SEGUROS MUNDIAL	Estabilidad de la obra	31/12/2023 - 31/12/2028	$ 1.473.838.372	20/09/2023
M-100046966 Anexo 1	SEGUROS MUNDIAL	Amparo Basico - Predios, labores y operaciones	12/09/2023- 31/12/2023	$ 580.000.000	20/09/2023
M-100046966 Anexo 1	SEGUROS MUNDIAL	Patronal	12/09/2023- 31/12/2023	$ 174.000.000	20/09/2023
M-100046966 Anexo 1	SEGUROS MUNDIAL	Contratista y subcontratista	12/09/2023- 31/12/2023	$ 174.000.000	20/09/2023
M-100046966 Anexo 1	SEGUROS MUNDIAL	Vehiculos propios y no propios	12/09/2023- 31/12/2023	$ 174.000.000	20/09/2023
M-100210056 Anexo 2	SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	14/11/2023 - 30/04/2024	$ 1.473.838.372	21/11/2023
M-100210056 Anexo 2	SEGUROS MUNDIAL	Prestaciones sociales	14/11/2023- 31/12/2026	$ 368.459.593	21/11/2023
M-100210056 Anexo 2	SEGUROS MUNDIAL	Estabilidad de la obra	31/12/2023- 31/12/2028	$ 1.473.838.372	21/11/2023
M-100046966 Anexo 2	SEGUROS MUNDIAL	Amparo Basico - Predios, labores y operaciones	14/11/2023- 03/03/2024	$ 580.000.000	14/11/2023

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg	Expedición
M-100046966 Anexo 2	SEGUROS MUNDIAL	Patronal	14/11/2023-03/03/2024	$ 174.000.000	14/11/2023
M-100046966 Anexo 2	SEGUROS MUNDIAL	Contratista y subcontratista	14/11/2023-03/03/2024	$ 174.000.000	14/11/2023
M-100046966 Anexo 2	SEGUROS MUNDIAL	Vehiculos propios y no propios	14/11/2023-03/03/2024	$ 174.000.000	14/11/2023
M-100210056 Anexo 3	SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	14/11/2023 - 30/04/2024	$ 1.473.838.372	27/11/2023
M-100210056 Anexo 3	SEGUROS MUNDIAL	Prestaciones sociales	14/11/2023-31/12/2026	$ 368.459.593	27/11/2023
M-100210056 Anexo 3	SEGUROS MUNDIAL	Estabilidad de la obra	31/12/2023-31/12/2028	$ 1.473.838.372	27/11/2023
M-100046966 Anexo 3	SEGUROS MUNDIAL	Amparo Basico - Predios, labores y operaciones	14/11/2023-03/03/2024	$ 580.000.000	27/11/2023
M-100046966 Anexo 3	SEGUROS MUNDIAL	Patronal	14/11/2023-03/03/2024	$ 174.000.000	27/11/2023
M-100046966 Anexo 3	SEGUROS MUNDIAL	Contratista y subcontratista	14/11/2023-03/03/2024	$ 174.000.000	27/11/2023
M-100046966 Anexo 3	SEGUROS MUNDIAL	Vehiculos propios y no propios	14/11/2023-03/03/2024	$ 174.000.000	27/11/2023
M-100210056 Anexo 4	SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	29/12/2023-17/05/2024	$ 1.473.838.372	26/01/2024
M-100210056 Anexo 4	SEGUROS MUNDIAL	Prestaciones sociales	29/12/2023-17/01/2027	$ 368.459.593	26/01/2024
M-100210056 Anexo 4	SEGUROS MUNDIAL	Estabilidad de la obra	17/01/2024-17/01/2029	$ 1.473.838.372	26/01/2024
M-100046966 Anexo 4	SEGUROS MUNDIAL	Amparo Basico - Predios, labores y operaciones	14/11/2023-20/03/2024	$ 580.000.000	29/01/2024
M-100046966 Anexo 4	SEGUROS MUNDIAL	Patronal	14/11/2023-20/03/2024	$ 174.000.000	29/01/2024
M-100046966 Anexo 4	SEGUROS MUNDIAL	Contratista y subcontratista	14/11/2023-20/03/2024	$ 174.000.000	29/01/2024
M-100046966 Anexo 4	SEGUROS MUNDIAL	Vehiculos propios y no propios	14/11/2023-20/03/2024	$ 174.000.000	29/01/2024
M-100210056 Anexo 5	SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	16/01/2024-17/06/2024	$ 1.473.838.372	1/02/2024
M-100210056 Anexo 5	SEGUROS MUNDIAL	Prestaciones sociales	16/01/2024-17/02/2027	$ 368.459.593	1/02/2024

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg	Expedición
M-100210056 Anexo 5	SEGUROS MUNDIAL	Estabilidad de la obra	17/02/2024-17/02/2029	$ 1.473.838.372	1/02/2024
M-100046966 Anexo 5	SEGUROS MUNDIAL	Amparo Basico - Predios, labores y operaciones	14/11/2023-20/04/2024	$ 580.000.000	2/02/2024
M-100046966 Anexo 5	SEGUROS MUNDIAL	Patronal	14/11/2023-20/04/2024	$ 174.000.000	2/02/2024
M-100046966 Anexo 5	SEGUROS MUNDIAL	Contratista y subcontratista	14/11/2023-20/04/2024	$ 174.000.000	2/02/2024
M-100046966 Anexo 5	SEGUROS MUNDIAL	Vehiculos propios y no propios	14/11/2023-20/04/2024	$ 174.000.000	2/02/2024
M-100210056 Anexo 6	SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	12/02/2024-30/08/2024	$ 1.473.838.372	20/02/2024
M-100210056 Anexo 6	SEGUROS MUNDIAL	Prestaciones sociales	12/02/2024-30/04/2027	$ 368.459.593	20/02/2024
M-100210056 Anexo 6	SEGUROS MUNDIAL	Estabilidad de la obra	30/04/2024-30/04/2029	$ 1.473.838.372	20/02/2024
M-100046966 Anexo 6	SEGUROS MUNDIAL	Amparo Basico - Predios, labores y operaciones	14/11/2023-30/06/2024	$ 650.000.000	20/02/2024
M-100046966 Anexo 6	SEGUROS MUNDIAL	Patronal	14/11/2023-30/06/2024	$ 195.000.000	20/02/2024
M-100046966 Anexo 6	SEGUROS MUNDIAL	Contratista y subcontratista	14/11/2023-30/06/2024	$ 195.000.000	20/02/2024
M-100046966 Anexo 6	SEGUROS MUNDIAL	Vehiculos propios y no propios	14/11/2023-30/06/2024	$ 195.000.000	20/02/2024
M-100210056 Anexo 7	SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	30/04/2024-29/10/2024	$ 1.473.838.372	6/05/2024
M-100210056 Anexo 7	SEGUROS MUNDIAL	Prestaciones sociales	30/04/2024-29/06/2027	$ 368.459.593	6/05/2024
M-100210056 Anexo 7	SEGUROS MUNDIAL	Estabilidad de la obra	13/09/2023-29/06/2029	$ 1.473.838.372	6/05/2024
M-100046966 Anexo 7	SEGUROS MUNDIAL	Amparo Basico - Predios, labores y operaciones	14/11/2023-29/08/2024	$ 650.000.000	6/05/2024
M-100046966 Anexo 7	SEGUROS MUNDIAL	Patronal	14/11/2023-29/08/2024	$ 195.000.000	6/05/2024
M-100046966 Anexo 7	SEGUROS MUNDIAL	Contratista y subcontratista	14/11/2023-29/08/2024	$ 195.000.000	6/05/2024
M-100046966 Anexo 7	SEGUROS MUNDIAL	Vehiculos propios y no propios	14/11/2023-29/08/2024	$ 195.000.000	6/05/2024

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg	Expedición
M-100210056 Anexo 8	SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	29/06/2024-28/12/2024	$ 1.473.838.372	2/07/2024
M-100210056 Anexo 8	SEGUROS MUNDIAL	Prestaciones sociales	29/06/2024-28/08/2027	$ 368.459.593	2/07/2024
M-100210056 Anexo 8	SEGUROS MUNDIAL	Estabilidad de la obra	28/08/2024-28/08/2029	$ 1.473.838.372	2/07/2024
M-100046966 Anexo 8	SEGUROS MUNDIAL	Amparo Basico - Predios, labores y operaciones	14/11/2023-28/10/2024	$ 650.000.000	2/07/2024
M-100046966 Anexo 8	SEGUROS MUNDIAL	Patronal	14/11/2023-28/10/2024	$ 195.000.000	2/07/2024
M-100046966 Anexo 8	SEGUROS MUNDIAL	Contratista y subcontratista	14/11/2023-28/10/2024	$ 195.000.000	2/07/2024
M-100046966 Anexo 8	SEGUROS MUNDIAL	Vehiculos propios y no propios	14/11/2023-28/10/2024	$ 195.000.000	2/07/2024
M-100210056 Anexo 9	SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	28/08/2024-28/02/2025	$ 2.209.840.397,60	2/09/2024
M-100210056 Anexo 9	SEGUROS MUNDIAL	Prestaciones sociales	28/08/2024-28/10/2027	$ 552.460.099,40	2/09/2024
M-100210056 Anexo 9	SEGUROS MUNDIAL	Estabilidad de la obra	28/10/2024-28/10/2029	$ 2.209.840.397,60	2/09/2024
M-100046966 Anexo 9	SEGUROS MUNDIAL	Amparo Basico - Predios, labores y operaciones	14/11/2023-28/01/2025	$ 650.000.000	2/09/2024
M-100046966 Anexo 9	SEGUROS MUNDIAL	Patronal	14/11/2023-28/01/2025	$ 195.000.000	2/09/2024
M-100046966 Anexo 9	SEGUROS MUNDIAL	Contratista y subcontratista	14/11/2023-28/01/2025	$ 195.000.000	2/09/2024
M-100046966 Anexo 9	SEGUROS MUNDIAL	Vehiculos propios y no propios	14/11/2023-28/01/2025	$ 195.000.000	2/09/2024
M-100210056 Anexo 10	SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	28/10/2024-27/04/2025	$ 2.209.840.397,60	29/10/2024
M-100210056 Anexo 10	SEGUROS MUNDIAL	Prestaciones sociales	28/10/2024-27/12/2027	$ 552.460.099,40	29/10/2024
M-100210056 Anexo 10	SEGUROS MUNDIAL	Estabilidad de la obra	27/12/2024-27/12/2029	$ 2.209.840.397,60	29/10/2024
M-100046966 Anexo 10	SEGUROS MUNDIAL	Amparo Basico - Predios, labores y operaciones	14/11/2023-27/02/2025	$ 650.000.000	29/10/2024
M-100046966 Anexo 10	SEGUROS MUNDIAL	Patronal	14/11/2023-27/02/2025	$ 195.000.000	29/10/2024

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg	Expedición
M-100046966 Anexo 10	SEGUROS MUNDIAL	Contratista y subcontratista	14/11/2023-27/02/2025	$ 195.000.000	29/10/2024
M-100046966 Anexo 10	SEGUROS MUNDIAL	Vehiculos propios y no propios	14/11/2023-27/02/2025	$ 195.000.000	29/10/2024
M-100210056 Anexo 11	SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	10/02/2025-11/07/2025	$ 2.209.840.397,60	17/02/2025
M-100210056 Anexo 11	SEGUROS MUNDIAL	Prestaciones sociales	10/02/2025-11/03/2028	$ 552.460.099,40	17/02/2025
M-100210056 Anexo 11	SEGUROS MUNDIAL	Estabilidad de la obra	11/03/2025-11/03/2030	$ 2.209.840.397,60	17/02/2025
M-100046966 Anexo 11	SEGUROS MUNDIAL	Amparo Basico - Predios, labores y operaciones	14/11/2023-11/05/2025	$ 711.750.000	17/02/2025
M-100046966 Anexo 11	SEGUROS MUNDIAL	Patronal	14/11/2023-11/05/2025	$ 195.000.000	17/02/2025
M-100046966 Anexo 11	SEGUROS MUNDIAL	Contratista y subcontratista	14/11/2023-11/05/2025	$ 195.000.000	17/02/2025
M-100046966 Anexo 11	SEGUROS MUNDIAL	Vehiculos propios y no propios	14/11/2023-11/05/2025	$ 195.000.000	17/02/2025

10 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Enviada.

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
9/10/2023	CE-001-2023	LP-SID-UAC-004-2023_LOTE 7_ CAMBIO REPRESENTANTE LEGAL	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
9/10/2023	CE-002-2023	LP-SID-UAC-004-2023_LOTE 7_ PLAN DE GESTION SOCIAL	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
10/10/2023	CE-003-2023	LP-SID-UAC-004-2023_LOTE 7_ PLAN DE CALIDAD	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
10/10/2023	CE-004-2023	LP-SID-UAC-004-2023_LOTE 7_ PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
10/10/2023	CE-005-2023	LP-SID-UAC-004-2023_LOTE 7_ ORGANIGRAMA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
13/10/2023	CE-006-2023	LP-SID-UAC-041-2023_LOTE 7_ MANUAL DE FUNCIONES	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
15/10/2023	CE-007-2023	LP-SID-UAC-041-2023_LOTE 7_RELACION MAQUINARIA MINIMA REQUERIDA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
15/10/2023	CE-008-2023	LP-SID-UAC-041-2023_LOTE 7_EQUIPO MINIMO DE TRABAJO	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
17/10/2023	RPTA EN CE-008-2023	HOJA DE VIDA MIRLETH MERCADO	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
18/10/2023	CE-009-2023	LP-SID-UAC-041-2023 – LOTE 7_HOJA DE VIDA DIRECTOR DE OBRA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
18/10/2023	CRU-LT7-010-2023	LP-SID-UAC-041-2023-LOTE 7_REVISION HOJA DE VIDA INGENIERO RESIDENTE Y DIRECTOR DE OBRA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
18/10/2023	CRU-LT7-011-2023	LP-SID-UAC-041-2023-LOTE 7_HOJAS DE VIDA INGENIERO ESPECIALISTA E INGENIERO AMBIENTAL.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
18/10/2023	CRU-LT7-012-2023	LP-SID-UAC-041-2023-LOTE 7_SOPORTES DE RELACION EQUIPOS MINIMOS OBLIGATORIOS	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
18/10/2023	CRU-LT7-013-2023	LP-SID-UAC-041-2023 LOTE 7_METODOLOGIA Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS A EMPLEAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
19/10/2023	CRU-LT7-014-2023	LP-SID-UAC-004-2023_LOTE 7_ PLAN DE GESTION SOCIAL	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
19/10/2023	CRU-LT7-015-2023	LP-SID-UAC-004-2023_LOTE 7_ PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
19/10/2023	CRU-LT7-016-2023	LP-SID-UAC-004-2023_LOTE 7_ PLAN DE CALIDAD	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
20/10/2023	CRU-LT7-017-2023	LP-SID-UAC-004-2023_LOTE 7_ CRONOGRAMA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
23/10/2023	CRU-LT7-018-2023	LP-SID-UAC-004-2023_LOTE 7_ ANALISIS APU´S	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
24/10/2023	CRU-LT7-019-2023	LP-SID-UAC-004-2023_LOTE 7_ PLAN MANEJO DE TRAFICO	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
25/10/2023	CRU-LT7-020-2023	LP-SID-UAC-041-2023_LOTE 7_ CRONOGRAMA ACTUALIZADO	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
			legal CRU	
25/10/2023	CRU-LT7-021-2023	LP-SID-UAC-041-2023_LOTE 7_Respuesta comunicado T-005-2023-019-OFC	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
26/10/2023	CRU-LT7-022-2023	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO- Calle 3C entre Carrera 58A y 58B, el libertador	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
26/10/2023	CRU-LT7-023-2023	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO- Calle 12 entre carreras 56 (corredor de carga) y 57D; Nuevo Campestre	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
26/10/2023	CRU-LT7-024-2023	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO- Calle 30D entre Carrera 71 y calle 31 via entre centro comercial la plazuela y Shopping Center	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
26/10/2023	CRU-LT7-025-2023	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO- Carrera 80A entre calles 20B y 27, Alameda la victoria	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
26/10/2023	CRU-LT7-026-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ RESPUESTA COMUNICADO T-005-2023-026-OFC- PMT RADICADOS	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
31/10/2023	CRU-LT7-027-2023	ACTA DE SOCIALIZACION INICIAL Y CONTROL DE ASISTENCIA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Profesional social INGEOCIM SAS
31/10/2023	CRU-LT7-028-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_INVITACION SOCIALIZACIÓN INICIAL NUEVO CAMPESTRE	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
31/10/2023	CRU-LT7-029-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_INVITACION SOCIALIZACIÓN INICIAL CENTRO COMERCIAL LA PLAZUELA Y SHOPPING CENTER	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
1/11/2023	CRU-LT7-030-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
8/11/2024	CRU-LT7-031-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_SOLICITUD DETALLE TRABAJOS ACUACAR	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	AGUAS DE CARTAGENA
10/11/2023	CRU-LT7-032-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ACTA DE SOCIALIZACION Y CONTROL DE ASISTENCIA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Profesional social INGEOCIM SAS
10/11/2023	CRU-LT7-033-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_RADICADO PIN GENERADOR LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
10/11/2023	CRU-LT7-034-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_PMT GENERAL RADICADO ANTE EL DATT Y FICHA TECNICA ALAMEDA LA VICTORIA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
13/11/2023	CRU-LT7-035-2023	PLIEGO DE CONDICIONES Y MINUTA DE CONTRATO LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	AGUAS DE CARTAGENA
13/11/2023	CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD CORRECCION CODIGO QR VALLA INFORMATIVA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Paula Ceballos
15/11/2023	CRU-LT7-036-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ NOTIFICACION INICIO DE OBRAS Y SOLICITUD	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	AGUAS DE CARTAGENA

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
		INFORMACION ACUACAR		
16/11/2023	CRU-LT7-037-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ NOTIFICACION INICIO DE OBRAS Y SOLICITUD INFORMACION AFINIA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	GRUPO EPM AFINIA
16/11/2023	CRU-LT7-038-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ NOTIFICACION INICIO DE OBRAS Y SOLICITUD INFORMACION SURTIGAS	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P.
16/11/2023	CRU-LT7-039-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ NOTIFICACION INICIO DE OBRAS Y SOLICITUD INFORMACION EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	telefonica tigo libertynet
19/11/2023	CRU-LT7-040-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_FICHA TECNICA NUEVO CAMPESTRE	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
22/11/2023	CRU-LT7-041-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_AFILIACIONES EMPLEADOS LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.
22/11/2023	CRU-LT7-042-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_POLIZAS ACTUALIZADAS	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
25/11/2023	CRU-LT7-043-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ACTUALIZACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
28/11/2023	CRU-LT7-044-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ACLARACION EQUIPO MINIMO DE TRABAJO	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
			legal CRU	
29/11/2023	CRU-LT7-045-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_OBSERVACIONES ACTA NO.1 DE PRIORIZACION 20 NOV 2023- RONDA REAL	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS SUPERVISION DEL CONTRATO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
30/11/2023	CRU-LT7-046-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_SOLICITUD DE INFORMACION DE INSTALACION TUBERIA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS AGUAS DE CARTAGENA
30/11/2023	CRU-LT7-047-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA INSTALACION DE PIEDRA RAJON	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
1/12/2023	CRU-LT7-048-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ESCOMBROS NUEVO CAMPESTRE	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
1/12/2023	CRU-LT7-049-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_AFILIACIONES PERSONAL NUEVO Y ANTIGUO	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.
10/12/2023	CRU-LT7-050-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_RESPUESTA A COMUNICADO T-005-2023-003-LT7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
10/12/2023	CRU-LT7-052-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_PLAN DE MANEJO DE TRAFICO Y FICHA TECNICA RONDA REAL	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
10/12/2023	CRU-LT7-053-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO PARA APROBACIÓN PIEDRA RAJON - ALAMEDA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
11/12/2023	CRU-LT7-054-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_PROFUNDIZACIÓN ACOMETIDA AGUAS RESIDUALES NUEVO CAMPESTRE	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	AGUAS DE CARTAGENA
11/12/2023	CRU-LT7-055-2023	PROFUNDIZACION ACOMETIDA ELECTRICA NUEVO CAMPESTRE- **RADICADO EN FISICO**	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	GRUPO EPM AFINIA
11/12/2023	CRU-LT7-057-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ENTREGA BALANCE LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
20/12/2023	CRU-LT7-058-2023	RPTA A SOLICITUD AFILIACIONES PERSONAL NUEVO Y ANTIGUO	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.
26/12/2023	CRU-LT7-059-2023	LISTADO ACTUALIZADO PERSONAL LOTE 7 – APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.
27/12/2023	CRU-LT7-060-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_Respuesta a comunicado T-005-2023-006-LT7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
27/12/2023	CRU-LT7-061-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_Respuesta a comunicado T-005-2023-002-LT7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
27/12/2023	CRU-LT7-062-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_Solicitud ampliación del plazo de ejecución del contrato de la referencia.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
			legal CRU	
27/12/2023	CRU-LT7-063-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_BALANCE ACTUALIZADO LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
27/12/2023	CORREO ELECTRONICO	INFORME MENSUAL SST LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.
29/12/2023	CRU-LT7-064-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_INFORME AMBIENTAL DICIEMBRE 2023	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Gustavo Gelis Amor Ingeniero ambiental / Interventoría.
17/01/2024	CRU-LT7-065-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_HOJA DE VIDA DE SUPERVISOR HSEQ LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
17/01/2024	CRU-LT7-066-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE PERMISOS	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
24/01/2024	CRU-LT7-067-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_NOTIFICACIÓN Y CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
24/01/2024	CRU-LT7-068-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_FICHA TECNICA ALAMEDA LA VICTORIA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
24/01/2024	CRU-LT7-069-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_FICHA TECNICA NUEVO CAMPESTRE	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
25/01/2024	CRU-LT7-070-2023	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_SOLICITUD DE APROBACIÓN PMT LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
25/01/2024	CRU-LT7-071-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_PLAN DE MANEJO DE TRAFICO Y FICHA TECNICA RONDA REAL	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
29/01/2024	CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD PIN GENERADOR - CONTRATO DE OBRA LP-SID-UAC-041-2023 LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Establecimiento Público Ambiental - EPA Cartagena
29/01/2024	CRU-LT7-072-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_FICHA TECNICA LIBERTADOR	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
31/01/2024	CORREO ELECTRONICO	INFORME SST MENSUAL ENERO	Yorsis Pastrana Profesional HSEQ/consorcio	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.
4/02/2024	CRU-LT7-075-2024	INFORME AMBIENTAL ENERO 2024 - LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Gustavo Gelis Amor Ingeniero ambiental / Interventoría.
8/02/2024	CRU-LT7-076-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_: RADICADO RENOVACIÓN PIN GENERADOR LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
9/02/2025	CRU-LT7-077-2024	ENTREGA DE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS LOTE 7 - **RADICADO EN FISICO**	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
10/02/2024	CRU-LT7-078-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_:SOLICITUD DETALLE TRABAJOS ACUACAR	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	AGUAS DE CARTAGENA

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
10/02/2024	CRU-LT7-079-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_:RESPUESTA A COMUNICADO T-005-2023-016-LTE7 DEL 29 DE ENERO 2024	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
10/02/2024	CRU-LT7-080-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_:Solicitud ampliación del plazo de ejecución del contrato de la referencia.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
13/02/2024	CRU-LT7-081-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_RADICADO EPA SOLICITUD VISITA TECNICA – ALAMEDA LA VICTORIA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Establecimiento Público Ambiental - EPA Cartagena
20/02/2024	CORREO ELECTRONICO	DOCUMENTACIÓN LOTE 7- contrato de obra pública LP - SID -UAC - 041-2023	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Juridicos - Secretaria de infraestructura
22/02/2024	CRU-LT2-082-2024	RESPUESTA OFICIO N° OECM 272-2024 RADICADO 13001-40-03-007-2020-00482-00	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
20/02/2024	CRU-LT7-083-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN OTRO SI N°2.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
24/02/2024	CRU-LT7-084-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ENTREGA DE MEMORIAS DE CALCULO LOTE 7- ACTA DE COBRO N°1	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
21/02/2024	CRU-LT7-085-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_RESPUESTA A COMUNICADO T-005-2023-017-LTE7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
21/02/2024	CORREO ELECTRONICO	POLIZAS CONTRATO LP-SID-UAC-041-2023 LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante	Juridicos - Secretaria de infraestructura

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
			legal CRU	
23/02/2024	CRU-LT2-084-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ENTREGA BALANCE N°2 – LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
4/03/2024	CRU-LT7-086-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_CRONOGRAMA ACTUALIZADO	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
4/03/2024	CRU-LT7-088-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_BALANCE ACTUALIZADO - MARZO 2024	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
5/03/2024	CRU-LT7-089-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_FICHA TECNICA SHOPPING CENTER LA PLAZUELA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
7/03/2024	CRU-LT7-090-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_RESPUESTA A COMUNICADO T-002-2024-022-LT7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
8/03/2024	CRU-LT7-091-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_DEFINICION DE INICIO TRABAJOS REPOSICION TUBERIA ALAMEDA LA VICTORIA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	AGUAS DE CARTAGENA
8/03/2024	CRU-LT7-092-2024	DEFINICION DE TRABAJOS MURO DE CONTENCION – EL LIBERTADOR	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
21/03/2024	CORREO ELECTRONICO	RELACION DE MATERIAL RECIBIDO - LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Gustavo Gelis Amor Ingeniero ambiental / Interventoría.

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
1/04/2024	CRU-LT7-093-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ENTREGA INFORME TECNICO FEBRERO 2024	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
9/04/2024	CRU-LT7-094-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_SEGURIDAD SOCIAL	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
9/04/2024	CRU-LT7-095-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_REPOSICIÓN DE TUBERÍA ACUEDUCTO – TRABAJOS ACUACAR ALAMEDA LA VICTORIA Y NUEVO CAMPESTRE	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos E Mojica Contreras Director de interventoría INGEOCIM S.A.S AGUAS DE CARTAGENA Cartagena, Colombia Santiago Solano Gerente JEHS
9/04/2024	CORREO ELECTRONICO	NFORME AMBIENTAL MARZO 2024 - LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Gustavo Gelis Amor Ingeniero ambiental / Interventoría.
9/04/2024	CRU-LT7-096-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_CONSTRUCCIÓN DE ANDENES NUEVO CAMPESTRE	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
10/04/2024	CRU-LT7-097-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_HOJA DE VIDA INGENIERO RESIDENTE LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
10/04/2024	CRU-LT7-098-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_Solicitud ampliación del plazo de ejecución del contrato de la referencia.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
11/04/2025	CRU-LT7-099-2024	IMPLEMENTACION PMT Y CERRAMIENTO PROVISIONAL FRENTE ALAMEDA K0+155 - K0+000.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	MAURICIO JOSE MARQUEZ Residente lote 7 - INGEOCIM S.A.S

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
15/04/2024	CRU-LT7-100-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ENTREGA DE BALANCE N° 3 – LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
19/04/2024	CRU-LT7-101-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ENTREGA INFORME TECNICO MARZO 2024	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
23/04/2024	CRU-LT7-102-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ENTREGA DE MEMORIAS DE CALCULO LOTE 7- ACTA N°2	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
3/05/2024	CRU-LT7-103-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_CONSTRUCCIÓN DE ANDENES FRENTE LIBERTADOR	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
6/05/2024	CRU-LT7-104-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN OTRO SI N°3.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
7/05/2024	CORREO ELECTRONICO	INFORME AMBIENTAL AMBIENTAL ABRIL 2024 - LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Gustavo Gelis Amor Ingeniero ambiental / Interventoría.
22/05/2024	CRU-LT7-105-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_CRONOGRAMA ACTUALIZADO	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
27/05/2024	CORREO ELECTRONICO	CERTIFICADOS RCD - NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024 LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Gustavo Gelis Amor Ingeniero ambiental / Interventoría.
5/06/2024	CRU-LT7-106-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ENTREGA INFORME TECNICO ABRIL 2024	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
7/06/2024	CRU-LT7-107-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_INVITACIÓN SOCIALIZACIÓN CENTRO COMERCIAL LA PLAZUELA Y SHOPPING CENTER	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
10/06/2024	CORREO ELECTRONICO	INFORME AMBIENTAL AMBIENTAL MAYO 2024 - LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Gustavo Gelis Amor Ingeniero ambiental / Interventoría.
12/06/2024	CRU-LT7-108-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_EXCUSAS INASISTENCIA A COMITÉ DIRECTOR DE OBRA Y TRABAJADORA SOCIAL	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
18/06/2024	CRU-LT7-109-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_Solicitud ampliación del plazo de ejecución del contrato de la referencia.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
18/06/2024	CRU-LT7-110-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_SOLICITUD DE ADICIONAL EN RECURSOS ECONOMICOS	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
23/06/2024	CRU-LT7-111-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ENTREGA DE MEMORIAS DE CALCULO LOTE 7- ACTA N°3	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
3/07/2024	CRU-LT7-112-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN OTRO SI N°4.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
5/07/2024	CRU-LT7-113-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_SOLICITUD CRONOGRAMA ENTREGA REDES DE ACUEDUCTO CAMPESTRE.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS AGUAS DE CARTAGENA

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
5/07/2024	CRU-LT7-114-2024	SOLICITUD CRONOGRAMA ENTREGA REDES DE ACUEDUCTO ALAMEDA LA VICTORIA.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS AGUAS DE CARTAGENA
12/07/2024	CRU-LT7-115-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_Respuesta comunicado T-002-2024-033-LT7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
12/07/2024	CORREO ELECTRONICO	INFORME AMBIENTAL AMBIENTAL JUNIO 2024 - LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Gustavo Gelis Amor Ingeniero ambiental / Interventoría.
15/07/2024	CRU-LT7-116-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_SEÑALIZACIÓN VERTICAL NUEVO CAMPESTRE	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
24/07/2024	CORREO ELECTRONICO	RECIBOS CARIBE VERDE Y RECIBOS DE MATERIAL MAYO 2024	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Gustavo Gelis Amor Ingeniero ambiental / Interventoría.
25/07/2024	CORREO ELECTRONICO	RECIBOS DE MATERIAL ABRIL Y JUNIO 2024 - LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Gustavo Gelis Amor Ingeniero ambiental / Interventoría.
3/08/2024	CRU-LT7-117-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_SOLICITUD DE ADICIONAL EN RECURSOS ECONOMICOS	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
22/08/2024	CORREO ELECTRONICO	RECIBOS CARIBE VERDE - JULIO 2024	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Gustavo Gelis Amor Ingeniero ambiental / Interventoría.
22/08/2024	CRU-LT7-119-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_HOJA DE VIDA DE SUPERVISOR HSEQ LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
			legal CRU	
23/08/2024	CRU-LT7-120-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ENTREGA DE MEMORIAS DE CALCULO LOTE 7- ACTA N°4	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
26/08/2024	CORREO ELECTRONICO	RPTA A SOLICITUD DE ENVIOS DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL LOTE 2 - LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.
28/08/2024	CORREO ELECTRONICO	ACTA DE RECIBO PQRS - ALAMEDA LA VICTORIA Mz J lote 4	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Luz Marina Molina Osorio/Cesar Molina- PROPIETARIA VIVIENDA
29/08/2024	CRU-LT7-121-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_REMISIÓN DE SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN NUEVO CAMPESTRE.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
2/09/2024	CRU-LT7-122-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ NOTIFICACION INICIO DE OBRAS Y SOLICITUD INFORMACION AFINIA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	GRUPO EPM AFINIA
2/09/2024	CRU-LT7-123-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ NOTIFICACION INICIO DE OBRAS Y SOLICITUD INFORMACION SURTIGAS	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P.
2/09/2024	CRU-LT7-124-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ NOTIFICACION INICIO DE OBRAS Y SOLICITUD INFORMACION EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	telefonica tigo libertynet
2/09/2024	CORREO ELECTRONICO	CERTIFICADOS AMBIENTALES - LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Gustavo Gelis Amor Ingeniero ambiental / Interventoría.

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
3/09/2024	CRU-LT7-125-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN OTRO SI N°5.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
4/09/2024	CRU-LT7-118-2024	NOTIFICACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA PARA TRÁMITE DE INCAPACIDAD	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	ROBER ENRIQUE CANTILLO JUNIELES CADENERO
7/09/2024	CRU-LT7-126-2024	RESPUESTA SURTI-S-2024-3380-CONSORCIO REHABILITACION URBANA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Javier Enrique Guillen Ibarra Ingeniero de Integridad Surtigas S.A. E.S.P
11/09/2024	CRU-LT7-127-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_INVITACIÓN SOCIALIZACIÓN - CRA. 2 ENTRE DIAG 32 Y AV. PEDRO DE HEREDIA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
11/09/2024	CRU-LT7-128-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_NOTIFICACION INICIO DE OBRAS Y SOLICITUD INFORMACION ACUACAR	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	AGUAS DE CARTAGENA
15/09/2024	CORREO ELECTRONICO	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ENTREGA INFORME TECNICO JULIO 2024	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
15/09/2024	CRU-LT7-129-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ENTREGA INFORME TECNICO AGOSTO 2024	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
18/09/2024	CRU-LT7-130-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_Respuesta comunicado T-005-2023-038-LT7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
18/09/2024	CORREO ELECTRONICO	INFORME AMBIENTAL AGOSTO 2024 - LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Gustavo Gelis Amor Ingeniero ambiental / Interventoría.

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
20/09/2024	CRU-LT7-133-2024	NOTIFICACION LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	EDIFICIO MENTA Atn. Sra. Dana Rodríguez Representante legal
20/09/2024	CRU-LT7-134-2024	NOTIFICACION LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	EDIFICIO BILBAO Atn. Sra. EVELING MARIA HANG Administradora
20/09/2024	CRU-LT7-135-2024	NOTIFICACION LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	COLEGIO BEVERLY HILLS Atn. Sra. Zulgei Puerta Coordinadora Administradora
24/09/2024	CRU-LT7-136-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_PLAN DE MANEJO DE TRAFICO CRA 2 ENTRE CALLE 31 Y DIAGONAL 32	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
25/09/2024	CRU-LT7-137-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_PLAN DE MANEJO DE TRAFICO CALLE 30B ENTRE CRA 78 Y CONJUNTO TORRES DE LA PLZAUELA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
25/09/2024	CRU-LT7-138-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_PLAN DE MANEJO DE TRAFICO CRA 80ª ENTRE CALLES 19 Y 20- ALAMEDA LA VICTORIA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
30/09/2024	CRU-LT7-141-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_INVITACIÓN SOCIALIZACIÓN - CALLE 30B ENTRE CRA 78 Y CONJUNTO TORRES DE LA PLAZUELA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
30/09/2024	CRU-LT7-142-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_RESPUESTA A COMUNICADO T-005-2023-041-LT7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
1/10/2024	CRU-LT7-143-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_RESPUESTA COMUNICADO T-005-2023-042-LT7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
			legal CRU	
3/10/2024	CRU-LT7-144-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_HOJA DE VIDA INGENIERO RESIDENTE	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
8/10/2024	CORREO ELECTRONICO	INFORME AMBIENTAL AMBIENTALSEPTIEMBRE 2024 - LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Gustavo Gelis Amor Ingeniero ambiental / Interventoría.
15/10/2024	CRU-LT7-145-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_Solicitud ampliación del plazo de ejecución del contrato de la referencia.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
15/10/2024	CRU-LT7-147-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_REMISIÓN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
17/10/2024	CORREO ELECTRONICO	AFILIACIÓN HSQ YARLIS ALVAREZ	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.
23/10/2024	CRU-LT7-148-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_NOTIFICACIÓN INICIO DE OBRA CRA. 2 ENTRE DIAG 32 Y TRONCAL DEL CARIBE.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
29/10/2024	CRU-LT7-149-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN OTRO SI N°6.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
30/10/2024	CRU-LT7-150-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_RESULTADO ESTUDIOS DE SUELO CALLES 22B Y 22C CON CRA.80ª - BARRIO ALAMEDA LA VICTORIA.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
30/10/2024	CRU-LT7-151-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ACLARACIÓN EQUIPO MINIMO LOTE 7.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
7/11/2024	CRU-LT7-152-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_INVITACIÓN SOCIALIZACIÓN - CALLE 30B ENTRE CRA 78 Y CONJUNTO TORRES DE LA PLAZUELA.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
15/11/2024	CRU-LT7-153-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_: BALANCE ACTUALIZADO.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
20/11/2024	CRU-LT7-154-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_:ENTREGA INFORME TECNICO SEPTIEMBRE 2024	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
21/11/2024	CRU-LT7-155-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_:ENTREGA INFORME TECNICO OCTUBRE 2024	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
21/11/2024	CRU-LT7-156-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_:SOLICITUD VISITA TECNICA Y PODA DE ARBOL – PLAZUELA.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA
22/11/2024	CRU-LT7-157-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_: ENTREGA DE MEMORIAS DE CALCULO LOTE 7- ACTA N°5	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
25/11/2024	CRU-LT7-158-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_: RESPUESTA COMUNICADO T-005-2023-048-LT7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
27/11/2024	CRU-LT7-159-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_:SOLICITUD APOYO TRANSITO - CALLE 30B ENTRE CRA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
		78 Y CONJUNTO TORRES DE LA PLAZUELA.		
27/11/2024	CRU-LT7-160-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_:SOLICITUD RESPUESTA FORMAL - ACOMETIDA ELECTRICA CALLE 30B ENTRE CRA 78 Y CONJUNTO TORRES DE LA PLAZUELA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	AFINIA Grupo epm
28/11/2024	CRU-LT7-161-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_:RESPUESTA COMUNICADO T-005-2023-047-LT7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
29/11/2024	CRU-LT7-162-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_:SOLICITUD VISITA TECNICA Y PODA DE ARBOL – PLAZUELA.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS CARTAGENA
29/11/2024	CRU-LT7-163-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_:SOLICITUD VISITA TECNICA Y PODA DE ARBOL – CONCEPCIÓN.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA
2/12/2024	CORREO ELECTRONICO	RECIBOS AMBIENTALES-OCTUBRE 2024- LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Gustavo Gelis Amor Ingeniero ambiental / Interventoría.
4/12/2024	CRU-LT7-168-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_:HOJA DE VIDA INGENIERO RESIDENTE	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
9/12/2024	CRU-LT7-169-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_:ENTREGA DE MEMORIAS DE CALCULO LOTE 7- ACTA N°6	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
9/12/2024	CORREO ELECTRONICO	INFORME AMBIENTAL AMBIENTAL NOVIEMBRE 2024 -LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Gustavo Gelis Amor Ingeniero ambiental / Interventoría.

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
10/12/2024	CRU-LT7-166-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_: Solicitud ampliación del plazo de ejecución del contrato de la referencia.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
19/12/2024	CRU-LT7-169-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_:SOLICITUD SUSPENSIÓN DEL CONTRATO EN REFERENCIA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
20/12/2024	CRU-LT7-171-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_:SOLICITUD SUSPENSIÓN DEL CONTRATO EN REFERENCIA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
27/12/2024	CRU-LT7-172-2024	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_:NOTIFICACIÓN ACTA DE SUSPENSIÓN	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
13/01/2025	CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD PIN GENERADOR - CONTRATO DE OBRA LP-SID-UAC-041-2023 LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA
16/01/2025	CORREO ELECTRONICO	INFORME AMBIENTAL DICIEMBRE 2024 - LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Gustavo Gelis Amor Ingeniero ambiental / Interventoría.
17/01/2025	CRU-LT7-173-2025	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_:SOLICITUD REINICIO DEL CONTRATO EN REFERENCIA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
21/01/2025	CORREO ELECTRONICO	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL TORRES DE LA PLAZUELA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.
29/01/2025	CRU-LT7-174-2025	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_:CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
17/02/2025	CRU-LT7-175-2025	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO Y OTROSI No. 07.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
24/02/2025	CORREO ELECTRONICO	PENDIENTES AMBIENTALES LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Gustavo Gelis Amor Ingeniero ambiental / Interventoría.
26/02/2025	CRU-LT7-176-2025	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_RADICADO RENOVACIÓN PIN GENERADOR LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
9/03/2025	CRU-LT7-178-2025	LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ENTREGA DE MEMORIAS DE CALCULO LOTE 7- ACTA N°7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Carlos Mojica Contreras Director de Interventoria INGEOCIM SAS
11/03/2025	CORREO ELECTRONICO	INFORME AMBIENTAL AMBIENTAL FEBRERO 2025 - LOTE 7	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU	Gustavo Gelis Amor Ingeniero ambiental / Interventoría.

Recibido.

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
18/10/2023	T-005-2023-015-OFC	Comunicado T-005-2023-015-OFC - Respuesta comunicados CE-016-2023 – Lote 2 y CE-006-2023 - CE-008-2023 Lote 7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
18/10/2023	T-005-2023-017-OFC	Comunicado T-005-2023-017-OFC - Tramité de generación PIN para la disposición y transporte de residuos de construcción ante el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena – EPA	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
23/10/2023	T-005-2023-019-OFC	Comunicado T-005-2023-019-OFC - Respuesta comunicados CRU-LT2-019-2023 - CRU-LT2-018-2023 - CRU-LT2-017-2023 - CRU-LT7-017-2023 - CRU-LT7-016-2023 – CRU-LT7-015-2023 – CRU-LT7-014-2023 – CRU-LT7-013-2023 – CRU-LT7-010-2023 - CRU-LT7-011-2023 - CRU-LT7-012-2023	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
24/10/2023	T-005-2023-022-OFC	Comunicado T-005-2023-022-OFC - Respuesta comunicados CRU-LT2-023-2023 - CRU-LT7-018-2023 - CRU-LT2-025-2023 - CRU-LT7-019-2023	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
25/10/2023	T-005-2023-026-OFC	Radicar el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) ante la entidad DATT.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
25/10/2023	EPA-OFI-006023-2023	Pin Generador Proyecto Contrato de obra pública No. Contrato de No. LP-SIDUAC-041- 2023 Ejecutar por El Sistema de Precios Unitarios Fijos y A Monto Agotable Las Actividades Necesarias para la Ejecución de las Obras de Rehabilitación de La Malla Vial Fa	ROBERTO JUNIOR GONZALEZ HERRERA Subdirector Técnico y Desarrollo Sostenible EPA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
26/10/2023	T-005-2023-028-OFC	Comunicado T-005-2023-028-OFC - Estado de avance documentos para inicio contrato No. LP-SID-UAC-041-2023	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS Atn: Ing. TEODOLINA GONZALEZ Atn: Ing. ADALBERTO PEREZ Supervisora Integral Contrato de Interventoría Supervisor Lote 7
2/11/2023	CORREO ELECTRONICO	Fwd: Renovación de Redes por pavimentación - LOTE 7 - Solicitud de información	Jorge Armando Agresott Melendez Jefe Control de Pérdidas Técnicas AGUAS DE CARTAGENA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
8/11/2023	CORREO ELECTRONICO	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO GENERAL LOTE 7	Karen Katherine Velazquez Rojano DATT	Luis Eduardo Pallares Laguna

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
				Representante legal CRU
16/11/2023	CORREO ELECTRONICO	Respuesta automática: LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ NOTIFICACION INICIO DE OBRAS Y SOLICITUD INFORMACION SURTIGAS	SURTIGAS S.A. E.S.P.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
16/11/2023	CORREO ELECTRONICO	Respuesta automática: LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ NOTIFICACION INICIO DE OBRAS Y SOLICITUD INFORMACION EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES	OLGA LUCIA FLOREZ PEREZ Telefonica	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
17/011/2023	T-005-2023-001	COMUNICADO T-005-2023-001-LT7 - Solicitud actualización de documentos.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
20/11/2023	T-005-2023-001-LT7	Comunicado T-005-2023-001-LT7 - ACTUALIZACIÓN PMA LOTE 7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
22/11/2023	AMC-OFI-0182563-2023	AMC-OFI-0182563-2023: Definición de priorización de proyectos a realizar en la ejecución del contrato No. LP-SID-UAC-41-2023-LOTE 7.	Secretaria de Infraestructura Cartagena	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
23/11/2023	T-005-2023-002-LT7	Comunicado T-005-2023-002-LT7 - Solicitud plan de contingencia y actualización cronograma de obra contrato LP-SID-UAC-041-2023	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
24/11/2023	CORREO ELECTRONICO	Fwd: Ubicación pasantes - Proyectos Malla Vial Fase IV	Jorge Armando Agresott Melendez Jefe Control de Pérdidas Técnicas AGUAS DE CARTAGENA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
25/11/2023	T-005-2023-003-LT7 T-005-2023-004-LT7 T-005-2023-005-LT7	COMUNICADO T-005-2023-003-LT7 - Falta de comisión topográfica.; COMUNICADO T-005-2023-004-LT7 - implementación de cerramientos; COMUNICADO T-005-2023-005-LT7 - Uso de dotacion	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
18/11/2023	CORREO ELECTRONICO	OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. - FASE IV"	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
28/11/2023	T-005-2023-006-LT7	COMUNICADO T-005-2023-006-LT7 - Observaciones ambientales.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
29/11/2023	T-005-2023-007	COMUNICADO T-005-2023-007-LT7 - Aprobación pólizas	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
29/11/2023	CORREO ELECTRONICO	actualizar prontamente lista de personal	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
30/11/2023	T-005-2023-008-LT7	COMUNICADO T-005-2023-008-LT7 - Aprobación personal	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
2/12/2023	CORREO ELECTRONICO	Re: LOTE 7_AFILIACIONES PERSONAL NUEVO Y ANTIGUO	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
4/12/2023	Código de radicado:EXT-AMC-23-0146541	PETICIÓN RECIBIDA CON REGISTRO EXT-AMC-23-0146541	notificaciones@cartagena.gov.co	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
4/12/2023	CORREO ELECTRONICO	RPTA A LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_SOLICITUD DE INFORMACION DE INSTALACION TUBERIA	Jorge Armando Agresott Melendez Jefe Control de Pérdidas Técnicas AGUAS DE CARTAGENA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
5/12/2023	CORREO ELECTRONICO	RELACION NOVEDAD DE AFILIACION	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
5/12/2023	CORREO ELECTRONICO	Carpeta de maquinaria en obra lote 7	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
11/12/2023	T-005-2023-009	COMUNICADO T-005-2023-009-LT7 - Remisión comunicado RONDA REAL	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
11/12/2023	CORREO ELECTRONICO	RADICADO PMT RONDA REAL	Karen Katherine Velazquez Rojano DATT	Luis Eduardo Pallares Laguna

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
				Representante legal CRU
13/12/2023	ACTA No. 002	ACTA DE COMITÉ No.2 - 4/12/2023	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
15/12/2023	T-005-2023-011-LT7	COMUNICADO T-005-2023-011-LT7 - Apremio No 1	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
15/12/2023	T-005-2023-010-LT7	COMUNICADO T-005-2023-010-LT7 - Respuesta instalación piedra rajón	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
18/12/2023	T-005-2023-012-LT7	COMUNICADO T-005-2023-012-LT7 - Aprobación PMA	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
18/12/2023	T-005-2023-013-LT7	COMUNICADO T-005-2023-013-LT7 - Reiteración OFICIO T-005-2023-006-LT7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
19/01/2024	T-005-2023-014-LTE7	COMUNICADO T-005-2023-014-LT7 - Aprobación HSE	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
29/12/2023	T-005-2023-056-OFC	Aval solicitud de prórroga contrato de obra N° LP-SID-UAC-041-2023 - LOTE 7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
23/01/2024	CORREO ELECTRONICO	Invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 4 FASE IV REHABILITACIÓN MALLA ... @ Mon Jan 29, 2024 8am - 11am (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
23/01/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 4 FASE IV REHABILITACIÓN MALLA ... @ Mon Jan 29, 2024 8am - 2pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
24/01/2024	CORREO ELECTRONICO	Seguridad social integral LOTE 7 / Requerimiento documentacion SST	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
24/01/2024	CORREO ELECTRONICO	Requerimiento contractual SST Interventoria	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
26/01/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 4 FASE IV REHABILITACIÓN MALLA ... @ Tue Jan 30, 2024 8am - 2pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
29/01/2024	T-005-2023-016-LTE7	Comunicado T-005-2023-016-LT7 - Solicitud de plan de acción para el cumplimiento del objeto contrato de obra No. LP-SID-UAC-041-2023	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
30/01/2024	Código de registro: EXT-AMC-24-0010399	RADICADO EPA	Atencion al Ciudadano Epa Cartagena	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
31/01/2024	T-005-2023-015-LT7	COMUNICADO T-005-2023-015-LT7 - Cesión económica	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
31/01/2024	CORREO ELECTRONICO	INFORME SST MENSUAL ENERO	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
6/02/2024	EPA-OFI-000209-2024	RENOVACIÓN PIN GENERADOR PROYECTO – Contrato de obra pública No. Contrato de No. LP-SID-UAC-041-2023 "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE	JAVIER ALFONSO PINEDA LOPEZ Subdirector Técnico y Desarrollo Sostenible EPA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
7/02/2024	T-005-2023-017-LTE7	Comunicado T-005-2023-017-LT7 - Solicitud informe mensual de actividades – CLAUSULA 10 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA contrato de obra No. LP-SID-UAC-041-2023	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
8/02/2024	ACTA No. 004	Acta de comité No. 4 - contratos de obra No. LP-SID-UAC-036-2023 y LP-SID-UAC-041-2023	Juan Sebastian Villamil Duarte GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S. Interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
9/02/2024	T-002-2024-018-LT7	Incumplimiento de Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad Social Integral.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
12/02/2024	T-002-2024-019-LT7	COMUNICADO T-005-2023-019-LT7 - Aval Cesión económica	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
13/02/2025	T-005-2023-075-OFC	COMUNICADO T-005-2023-075-OFC - Aval Prorroga No 2 - LOTE 7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
13/02/2024	Código de registro: EXT-AMC-24-0016782	RADICADO EPA	Atencion al Ciudadano Epa Cartagena	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
16/02/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 4 FASE IV REHABILITACIÓN MALLA ... @ Tue Feb 20, 2024 8am - 2pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
16/02/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 4 FASE IV REHABILITACIÓN MALLA ... @ Wed Feb 21, 2024 8am - 2pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
16/02/2024	CORREO ELECTRONICO	Re: Planilla de seguridad social certificado revisor fiscal	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	YORSIS PASTRANA GONZALEZ Profesional HSEQ/ CRU
17/02/2024	CORREO ELECTRONICO	Re: informe semana del 12 al 17 de febrero	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	YORSIS PASTRANA GONZALEZ Profesional HSEQ/ CRU
19/02/2024	T-005-2023-020-LT7	COMUNICADO T-005-2023-020-LT7 - Actualización Documentos Acorde a Otrosí No 2	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
19/02/2024	OFICIO No. OECM-272	ENVIO DE CORRESPONDENCIA RAD: 13001400300720200048200	LUZ ESTELA VASQUEZ GUTIERREZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO GRADO 5	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
20/02/2024	AMC-OFI-0014234-2024	AMC-OFI-0014234-2024 SOLICITUD CESION DERECHOS ECONOMICOS LP-SID-UAC-041-2023 LOTE 7	WILMER ENRIQUE IRIARTE RESTREPO Secretario de Infraestructura Distrital.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
26/02/2024	CORREO ELECTRONICO	Afiliaciones - Inducciones- Personal frente de Obra ampa del Amparo.	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
27/02/2025	CORREO ELECTRONICO	Cto LP-SID-UAC-041-2023 LOTE 7 - ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
28/02/2024	T-002-2024-021-LT7	Comunicado T-005-2023-021-LT7 - Apremio No.1 - Solicitud cronograma de actividades – CLAUSULA 10 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA literal E - Contrato de obra No. LP-SID-UAC-041-2023	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
1/03/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Fri Mar 8, 2024 8am - 2pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
4/03/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Thu Mar 7, 2024 8am - 2pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
6/03/2024	T-002-2024-022-LT7	Comunicado T-005-2023-022-LT7 - Respuesta comunicado CRU-LT7-086-2024 - CRONOGRAMA ACTUALIZADO	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
11/03/2024	T-002-2024-023-LT7	Respuesta comunicado CRU-LT7-082-2024-SOLICITUD VISITA TÉCNICA – ALAMEDA LA VICTORIA.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
12/03/2024	T-005-2023-024-LT7	Comunicado T-005-2023-024-LT7 - Revisión programa de obra – Ms Project remitido a través de comunicado CRU-LT7-090-2024	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
12/03/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Wed Mar 20, 2024 8am - 3pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
18/03/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Thu Mar 21, 2024 8am - 3pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
18/03/2024	T-005-2023-025-LT7	Respuesta a comunicado CRU-LT7-088-2024 – Balance de Obra Actualizado #2	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
19/03/2024	CORREO ELECTRONICO	PAZ Y SALVOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
19/03/2024	CORREO ELECTRONICO	Pagos de planillas de seguridad social integral	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
20/03/2024	T-005-2023-026-LT7	Comunicado T-005-2023-026-LT7 - Apremio No.1 – Incremento de rendimientos al interior del contrato de obra No. LP-SID-UAC-041-2023	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
21/03/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Thu Apr 4, 2024 8am - 3pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
26/03/2024	T-005-2023-027-LT7	Solicitud de entrega de documentos adicional y prórroga	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
2/04/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Thu Apr 4, 2024 8:15am - 3:15pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
3/04/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation with note: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Mon Apr 8, 2024 8am - 3pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
4/04/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Wed Apr 10, 2024 8am - 3pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
9/04/2024	CORREO ELECTRONICO	IMPLEMENTACION PMT Y CERRAMIENTO PROVISIONAL FRENTE ALAMEDA K0+155 - K0+000.	MAURICIO JOSE MARQUEZ Residente de Interventoría Fase IV – Lote 7.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
11/04/2024	CORREO ELECTRONICO	FICHAS TECNICAS -HOJA DE VIDA Y MTTO MAQUINARIAS PESADAS	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	YORSIS PASTRANA GONZALEZ Profesional HSEQ/ CRU
16/04/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Thu Apr 25, 2024 8am - 3pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
16/04/2024	CORREO ELECTRONICO	Requerimientos Interventoria HSE - Abril	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
17/04/2024	T-005-2024-104-OFC	Comunicado T-005-2023-104-OFC - AVAL ADICION Y PRORROGA LOTE 7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS Ing. Wilmer Iriarte Restrepo Secretario de Infraestructura Distrital Alcaldía distrital de Cartagena de Indias Ing. Teodolina Gonzalez Supervisora contrato de interventoría
19/04/2024	T-005-2023-028-LT7	Comunicado T-005-2023-028-LT7 - Aprobación Ingeniero Residente	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
22/04/2024	Oficio AMC-OFI-0041663-2024	AMC-OFI-0041663-2024 REMISION DERECHO DE PETICION SOBRE OBRAS EN NUEVO CAMPESTRE. EXT AMC-24-0044893	WILMER IRIARTE RESTREPO. Secretario de Infraestructura Distrital. Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
22/04/2024	Oficio AMC-OFI-0041736-2024	AMC-OFI-0041736-2024 Asunto: R.P. DERECHO DE PETICION SOBRE OBRAS EN NUEVO CAMPESTRE. EXT-AMC 24-0044893	WILMER IRIARTE RESTREPO. Secretario de Infraestructura Distrital. Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
25/04/2024	CORREO ELECTRONICO	RPTA LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ENTREGA DE MEMORIAS DE CALCULO LOTE 7- ACTA N°2	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
26/04/2024	T-005-2023-112-OFC	Comunicado T-005-2023-112-OFC - Recomendación de prórroga del contrato de obra No. LP-SID-UAC-041-2023 - LOTE 7.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS Ing. WILMER IRIARTE RESTREPO Ing. Teodolina González Secretario de Infraestructura Distrital Alcaldía distrital de Cartagena de Indias Supervisor contrato de interventoría
29/04/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Wed May 8, 2024 8am - 3pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
4/05/2024	T-005-2023-114-0FC -	Comunicado - T-005-2023-114-0FC - Identificación de RCD proveniente de excavaciones, acopio de materiales por parte la empresa de servicios públicos Aguas de Cartagena, ubicados en lote 7 en los frentes de obra ubicados en el barrio Alameda y Nuevo Campestre.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
6/05/2024	CORREO ELECTRONICO	Cronograma de Capacitaciones SST Actualizado	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
10/05/2024	T-002-2024-030-LT7	Comunicado - T-005-2023-030-LT7 - Solicitud actualización de documentos según otro sí N°3.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
14/05/2024	CORREO ELECTRONICO	Cumplimiento de Equipos de Prevencion y Atencion de Emergencias	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	YORSIS PASTRANA GONZALEZ Profesional HSEQ/ CRU
16/05/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Thu May 23, 2024 8am - 3pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
16/05/2024	CORREO ELECTRONICO	Fwd: Reboses de alcantarillado causados por obras de pavimentación en Alameda la Victoria	Fausto Javier Cortes Gandara Coordinador Alcantarillado AGUAS DE CARTAGENA	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
17/05/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Thu May 23, 2024 8am - 3pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
23/05/2024	CORREO ELECTRONICO	Avances de las obras de Sustitución de Acueducto por Pavimentación en los Barrios Alameda La Victoria y Nuevo Campestre	Dickson Willie Subgerente de Interventoría Aguas de Cartagena SA ESP	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
24/05/2024	ACTA DE REUNIÓN	ACTA DE REUNIÓN PARA SEGUIMIENTO DE TRABAJOS ACUEDUCTO ALAMEDA LA VICTORIA - 22 DE MAYO 2024	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
27/05/2024	CORREO ELECTRONICO	Actualizacion informe mensual SST - Items anexos de capacitaciones SST	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	YORSIS PASTRANA GONZALEZ Profesional HSEQ/ CRU
30/05/2024	CORREO ELECTRONICO	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA DOBELADO EN VIVIENDA CALLE 3C # 60C - 68, BARRIO EL LIBERTADOR.	MAURICIO JOSE MARQUEZ Residente de Interventoría Fase IV – Lote 7.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
7/06/2024	CORREO ELECTRONICO	Incumplimiento en PMT de frente de obra el libertador lote 7	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
20/06/2024	T-005-2023-139-OFC	COMUNICADO - T-005-2023-139-OFC - Aval solicitud de ampliación plazo de ejecución para el contrato de obra N° LP- SID-UAC-041-2023.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
25/06/2024	ACTA No. 0012	ACTA DE COMITE TECNICO 12 DE JUNIO 2024 LOTE 2 Y 7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
25/06/2025	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Tue Jul 2, 2024 8am - 3pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
28/06/2024	T-002-2024-032-LT7	Comunicado - T-005-2023-032-LT7 - Solicitud planos esquemáticos	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
29/06/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Thu Jul 4, 2024 8am - 3pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
3/07/2024	CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD DE INFORME DE INTERVENTORÍA	Eliécer Marimón Hernández Presidente JAC Alameda la Victoria	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
5/07/2024	T-005-2023-148-OFC	Comunicado - T-005-2023-148-OFC - Solicitud de intervención urgente y programación de trabajos pendientes por parte de ACUACAR. Contrato de obra pública No. LP-SID-UAC-041-2023 – LOTE 7.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
8/07/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Thu Jul 18, 2024 8am - 3pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
8/07/2024	T-002-2024-033-LT7	Comunicado - T-005-2023-033-LT7 - Solicitud actualización de documentos según otro sí N°4	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
10/07/2024	T-005-2023-034-LT7	Comunicado - T-005-2023-034-LT7 - Apremio No. 1 – Presunto incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA derivado del abandono de obra y bajos rendimientos en los frentes Alameda – La Victoria y en el Sector de Nuevo Campestre.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
11/07/2024	T-005-2023-153-OFC	Comunicado - T-005-2023-153-OFC - Aval solicitud de prórroga y adición al valor contrato de obra pública N° LP- SID-UAC-041-2023 Lote 7.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
12/07/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Wed Jul 17, 2024 8am - 3pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
16/07/2024	ACTA No. 0013	ACTA DE COMITE TECNICO 04 DE JULIO 2024 LOTE 2 Y 7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
17/07/2024	CORREO ELECTRONICO	Solicitud de pagos de seguridad social integral del periodo actual	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
22/07/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Tue Jul 23, 2024 8am - 3pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
22/07/2024	CORREO ELECTRONICO	Solicitud de reparación en inmueble ubicado en Urb. Alameda La Victoria Manzana N Lote 1, Casa #2	Asesorar inmobiliaria	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
23/07/2024	CORREO ELECTRONICO	ACTA DE REUNIÓN 08/07/24 PARA SEGUIMIENTO DE TRABAJOS ACUACAR ALAMEDA Y NUEVO CAMPESTRE	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
24/07/2024	CORREO ELECTRONICO	Solicitud de pagos de seguridad social integral del periodo actual	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
24/07/2024	CORREO ELECTRONICO	OBSTACULOS EN ANDENES Y ZONA PEATONAL EL LIBERTADOR.	MAURICIO JOSE MARQUEZ Residente de Interventoría Fase IV – Lote 7.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
31/07/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Fri Aug 9, 2024 8am - 3pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
5/08/2024	Oficio AMC-OFI-0097045-2024	AMC-OFI-0097045-2024 INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VÍAL CONFORME SENTENCIA DE TUTELA I.E BERTHA GEDEÓN DE BALADÍ - CONTRATO LP-6ID-UAC-041-2023. AMC-OFI-0093336-2024.	WILMER IRIARTE RESTREPO. Secretario de Infraestructura Distrital. Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
5/08/2024	CORREO ELECTRONICO	IMPLEMENTACION PMT Y CERRAMIENTO PROVISIONAL FRENTE ALAMEDA.	MAURICIO JOSE MARQUEZ Residente de Interventoría Fase IV – Lote 7.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
5/08/2024	T-005-2023-165-OFC	Comunicado T-005-2023-165-OFC - Alcance al comunicado T-005-2023-153-OFC Aval solicitud de adición al valor contrato de obra pública N° LP-SID-UAC-041-2023 Lote 7.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS Ing. WILMER IRIARTE RESTREPO Ing. Teodolina González Secretario de Infraestructura Distrital Alcaldía distrital de Cartagena de Indias Supervisor contrato de interventoría
7/08/2024	CORREO ELECTRONICO	Solicitud envio de oficio - Cambio de personal minimo HSE contrato lote 7	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
8/08/2024	ACTA No. 0014	ACTA DE COMITE TECNICO 25 DE JULIO 2024 LOTE 2 Y 7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
9/08/2024	CORREO ELECTRONICO	Fwd: Comparto 'FORMATO INFORME SEMANAL SST 2024 FASE IV ' con usted	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
16/08/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Thu Aug 22, 2024 8am - 3pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
17/08/2024	CORREO ELECTRONICO	Solicitud de gestión SST en obra Lote 7	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
21/08/2024	CORREO ELECTRONICO	Re: PREOPERACIONALES DE MAQUINARIAS E INSPECCIONES	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
21/08/2024	ACTA No. 0015	ACTA DE COMITE TECNICO 09 DE AGOSTO 2024 LOTE 2 Y 7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
22/08/2024	CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD DE ENVIOS DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL LOTE 2 - LOTE 7	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
26/08/2024	CORREO ELECTRONICO	ACTA PARCIAL N°4 - LOTE 7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
26/08/2024	T-005-2023-035-LT7	Comunicado - T-005-2023-035-LT7 - Respuesta comunicado CRU-LT7-119-2024 – Aprobación hoja de vida Supervisora HSEQ,.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
27/08/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Wed Sep 4, 2024 8am - 1pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
31/08/2024	CORREO ELECTRONICO	Solicitud requerimientos de seguridad y salud en el trabajo - Entrega de Dotacion de trabajo y EPP - LOTE 7	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
2/09/2024	CORREO ELECTRONICO	Incumplimiento envio de informe semanal lote 7	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
2/09/2024	CORREO ELECTRONICO	Respuesta automática: LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ NOTIFICACION INICIO DE OBRAS Y SOLICITUD INFORMACION SURTIGAS	SURTIGAS S.A. E.S.P.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
2/09/2024	CORREO ELECTRONICO	Respuesta NOTIFICACION INICIO DE OBRAS Y SOLICITUD INFORMACION EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES	Gerente Asociado de Operaciones y Mantenimiento Regional Cartagena Liberty Networks	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
2/09/2024	CORREO ELECTRONICO	Respuesta ACTA DE RECIBO PQRS - ALAMEDA LA VICTORIA Mz J lote 4	Propietaria	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
3/09/2024	CORREO ELECTRONICO	SURTI-S-2024-3380 ROTURA A LAS REDES DE DISTRIBUCION DE GAS DE LA EMPRESA SURTIGAS SA ESP - CONSORCIO REHABILITACION URBANA	SURTIGAS S.A. E.S.P.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
4/09/2024	CORREO ELECTRONICO	Re: INFORME MENSUAL AGOSTO - Documentos faltantes gestión de seguridad y salud en el trabajo	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
4/09/2024	CORREO ELECTRONICO	Solicitud de envío de novedades de afiliación del personal HSE nuevo en obra fase IV	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
4/09/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Fri Sep 6, 2024 8am - 1pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
6/09/2024	ACTA 0016	ACTA DE COMITE TECNICO 22 DE AGOSTO 2024 LOTE 2 Y 7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
11/09/2024	T-005-2023-037-LT7	Comunicado T-005-2023-037-LT7 - Solicitud de Información de Gestión Social	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
16/09/2024	T-005-2023-039-LT7	T-005-2023-039-LT7- Reiteración de comunicado T-005-2023-039-LT7. Solicitud de cronograma y programación de obra actualizada.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
16/09/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Thu Sep 19, 2024 8am - 1pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
17/09/2024	CORREO ELECTRONICO	Solicitud de envios de pagos de seguridad social integral - Periodo actual - Lote 2 y 7	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
17/09/2024	ACTA No. 0017	ACTA DE COMITE TECNICO 06 DE SEPTIEMBRE 2024 LOTE 2 Y 7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
18/09/2024	T-005-2023-040-LT7	T-005-2023-040-LT7 - Apremio No.1 en virtud del presunto incumplimiento al plan de seguridad y salud en el trabajo por parte del consorcio REHABILITACIÓN URBANA.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
18/09/2024	CORREO ELECTRONICO	PENDIENTES POR SUBSANAR EN CRA 80A ENTRE CLL 20B Y 27, ALAMEDA LA VICTORIA.	MAURICIO JOSE MARQUEZ Residente de Interventoría Fase IV – Lote 7.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
20/09/2024	T-005-2023-041-LT7	T-005-2023-041-LT7 - Disponibilidad del equipo mínimo requerido en campo y mal proceso constructivo.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
23/09/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Wed Oct 2, 2024 8am - 1pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
25/09/2024	CORREO ELECTRONICO	Respuesta a LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ENTREGA INFORME TECNICO JULIO 2024	MAURICIO JOSE MARQUEZ Residente de	Luis Eduardo Pallares Laguna

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
			Interventoría Fase IV – Lote 7.	Representante legal CRU
25/09/2024	CORREO ELECTRONICO	Respuesta a LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_ENTREGA INFORME TECNICO AGOSTO 2024	MAURICIO JOSE MARQUEZ Residente de Interventoría Fase IV – Lote 7.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
27/09/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Mon Sep 30, 2024 8am - 1pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
27/09/2024	T-005-2023-042-LT7	Comunicado T-005-2023-042-LT7-Apremio No.2 por los presuntos incumplimientos a las obligaciones contractuales adquiridas por parte del CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
1/10/2024	CORREO ELECTRONICO	Comunicado - Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
7/10/2024	T-005-2023-043-LT7	Comunicado T-005-2023-043-LT7 - Lineamientos para actas de cobro.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
7/10/2024	T-005-2023-044-LT7	Comunicado T-005-2023-044-LT7 - Apremio No.1 por incumplimiento al plan de calidad ofertado como factor de calidad.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
7/10/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Wed Oct 16, 2024 8am - 1pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
10/10/2024	CORREO ELECTRONICO	Solicitud de envio de Pagos de Seguridad Social Integral del Periodo Actual	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
16/10/2024	ACTA No. 0019	ACTA DE COMITE TECNICO 30 DE SEPTIEMBRE 2024 LOTE 2 Y 7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
18/10/2024	T-005-2023-045-LT7	Comunicado T-005-2023-045-LT7 - Respuesta comunicado CRU-LT7-144-2024 – Revisión hoja de vida ingeniero residente.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
28/10/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Thu Oct 31, 2024 8am - 1pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
30/10/2024	ACTA No. 0020	ACTA DE COMITE TECNICO 16 DE OCTUBRE 2024 LOTE 2 Y 7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
7/11/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Tue Nov 19, 2024 8am - 1pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
12/11/2024	T-005-2023-046-LT7	Comunicado T-005-2023-046-LT7 - Apremio No. 1 por presunto incumplimiento en la Disponibilidad del equipo mínimo requerido en el frente de obra Cra 2 entre Diag. 32 y AV Pedro de Heredia, La Concepción	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
13/11/2024	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDADES PENDIENTES EN TRAMO ADICIONAL ALAMEDA LA VICTORIA.	MAURICIO JOSE MARQUEZ Residente de Interventoría Fase IV – Lote 7.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
20/11/2024	T-005-2023-047-LT7	Comunicado T-005-2023-047-LT7 - Solicitud actualización y ajuste Cronograma, pólizas y demás documentos según otro sí N°6.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

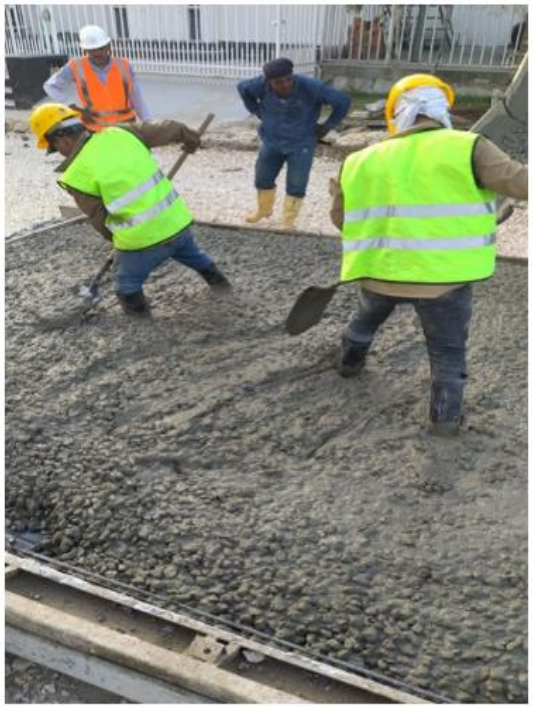
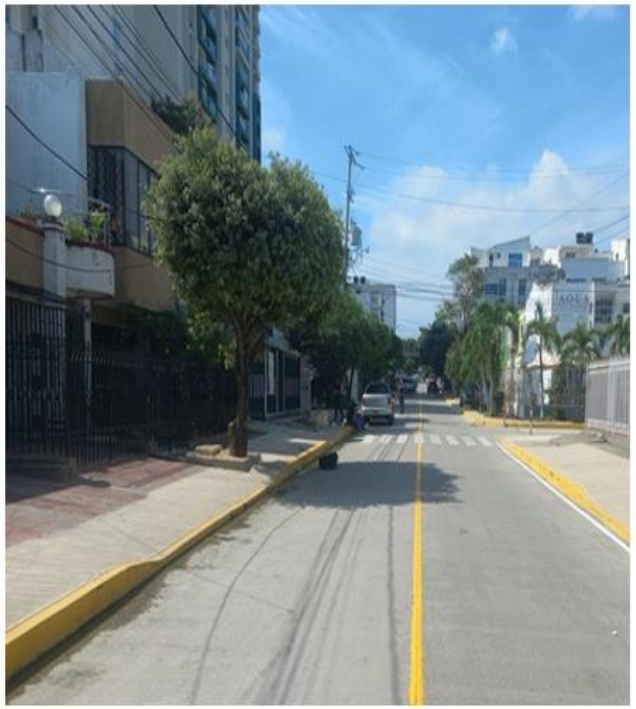
FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
22/11/2024	T-005-2023-048-LT7	Comunicado T-005-2023-048-LT7 -Incumplimiento en el envío de pagos de seguridad social y novedades de afiliación del personal.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
22/11/2024	Código de registro: EXT-AMC-24-0153930	Radicado EPA	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EPA Cartagena	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
25/11/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Tue Dec 3, 2024 8am - 1pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
25/11/2024	CORREO ELECTRONICO	Incumplimiento en las entregas de dotacion de trabajo y EPP al personal - LOTE 7- Frente de obra la concepcion	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
25/11/2024	CORREO ELECTRONICO	Rpta: ACTA PARCIAL No 5 CTO LP-SID-UAC-041-2023 LOTE 7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
25/11/2024	ACTA No. 0021	ACTA DE COMITE TECNICO 31 DE OCTUBRE 2024 LOTE 2 y 7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
26/11/2024	CORREO ELECTRONICO	GESTIÓN ANTE ESP PARA PROFUNDIZAR RED ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA EN CLL 30B ENTRE CRA 68 Y CONJUNTO TORRES LA PLAZUELA.	MAURICIO JOSE MARQUEZ Residente de Interventoría Fase IV – Lote 7.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
26/11/2024	ACTA No. 0022	ACTA DE COMITE TECNICO 15 DE NOVIEMBRE 2024 LOTE 2 y 7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
27/11/2024	CORREO ELECTRONICO	Respuesta automática: LP-SID-UAC-041-2023 _LOTE 7_:SOLICITUD APOYO TRANSITO - CALLE 30B ENTRE CRA 78 Y CONJUNTO TORRES DE LA PLAZUELA.	Informacion DATT	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

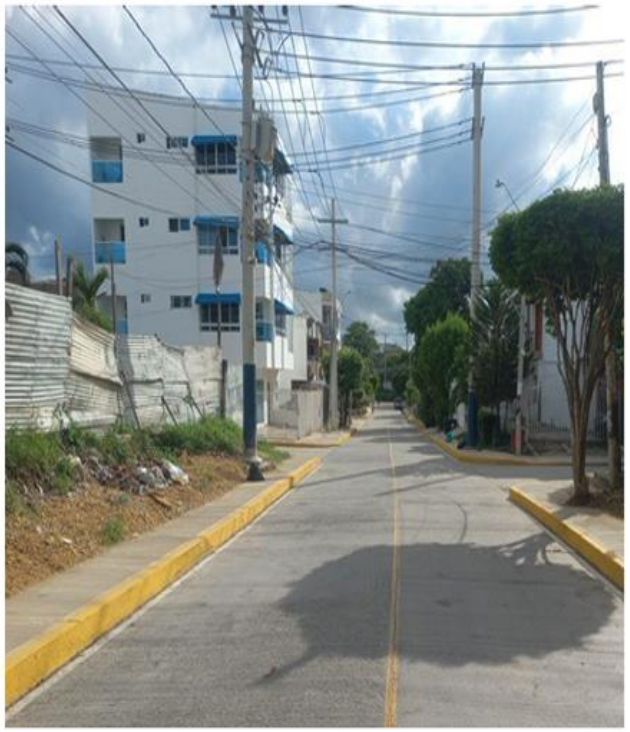
FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
27/11/2024	CORREO ELECTRONICO	CONTINUACIÓN ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EN EL RESTO DEL TRAMO DE LA CRA 2 ENTRE DIAG 32 Y AV PEDRO DE HEREDIA, LA CONCEPCIÓN.	MAURICIO JOSE MARQUEZ Residente de Interventoría Fase IV – Lote 7.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
28/11/2024	T-005-2023-049-LT7	Comunicado T-005-2023-049-LT7 -Incumplimiento en Afiliaciones de Personal Nuevo, Entrega de Dotación de Trabajo y EPP, y Documentación de Maquinaria en los Frentes de Trabajo.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
2/12/2024	CORREO ELECTRONICO	Detalles por corregir en el tramo K0+128,2 - K0+196,6 de la Carrera 2 entre Diagonal 32 y AV Pedro de Heredia, La Concepción.	MAURICIO JOSE MARQUEZ Residente de Interventoría Fase IV – Lote 7.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
3/12/2024	T-005-2023-050-LT7	Comunicado T-005-2023-050-LT7 - Apremio No 1 - Reiteración Comunicado No T-005-2023-049-LT7 - Incumplimiento en envió afiliaciones de Personal Nuevo, Entrega de Dotación de Trabajo y EPP, y Documentación de Maquinaria en los Frentes de Trabajo.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
4/12/2024	T-005-2023-051-LT7	Comunicado T-005-2023-051-LT7 - Apremio No. 2 por presunto incumplimiento en la Disponibilidad del equipo mínimo requerido (Residente de Obra y Topógrafo) en el Frente de obra de la Calle 30B entre Carrera 68 y Conjunto Torres de la Plazuela	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
10/12/2024	T-005-2023-052-LT7	Comunicado T-005-2023-052-LT7 - Respuesta comunicado CRU-LT7-168-2024 – Revisión hoja de vida ingeniero residente.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
10/12/2024	CORREO ELECTRONICO	Rpta: ACTA PARCIAL No 6 CTO LP-SID-UAC-041-2023 LOTE 7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

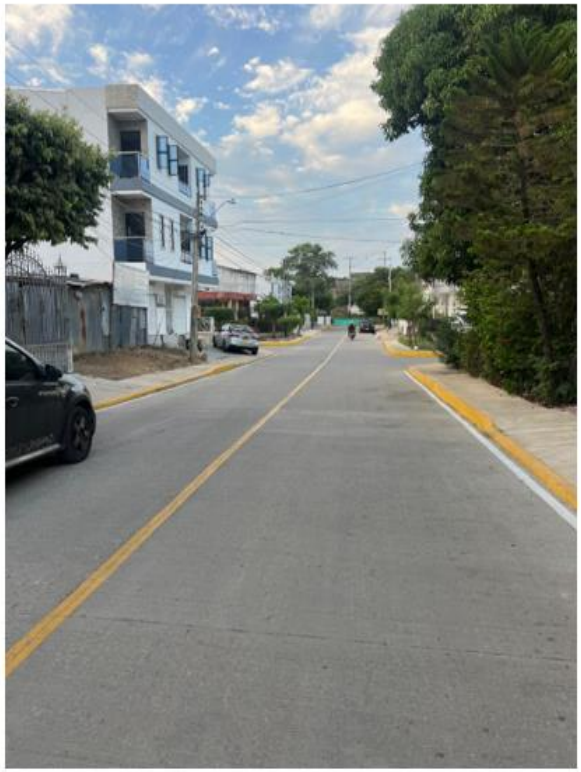
FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
10/12/2024	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL CTG @ Mon Dec 16, 2024 8am - 1pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
22/01/2025	CORREO ELECTRONICO	Re: PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL TORRES DE LA PLAZUELA	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
24/01/2025	T-005-2023-222-OFC	Comunicado T-005-2023-222-OFC - Aval solicitud de prorroga contrato de obra pública N° LP-SID-UAC-041-2023. LOTE 7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
28/01/2025	CORREO ELECTRONICO	Solicitud arreglo de Puerta de Ingreso Peatonal Edificio Portal de la Concepcion.	Maria Claudia Hernandez C Administrador	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
6/02/2025	CORREO ELECTRONICO	ACTA DE REINICIO CONTRATOS DE OBRA LOTE 2 Y LOTE 7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
6/02/2025	EPA-OFI-000436-2025	PIN GENERADOR PROYECTO “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL FASE IV – LOTE 7” - RESPUESTA EXT-AMC25-0003220	Subdireccion tecnica y de Desarrollo Sostenible Epa Cartagena	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
12/02/2025	T-005-2023-053-LT7	Comunicado T-005-2023-053-LT7 - Solicitud actualización de documentos según otro sí N°7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
19/02/2025	CORREO ELECTRONICO	Solicitud de Comprobantes de Pago y Novedades de Afiliación - LOTE 7	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
19/02/2025	CORREO ELECTRONICO	Updated invitation: COMITÉ DE SEGUIMIENTO FASE IV REHABILITACIÓN MALLA VIAL C... @ Thu Feb 27, 2025 8am - 1pm (GMT-5) (rehabilitacionurbanalote7@gmail.com)	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

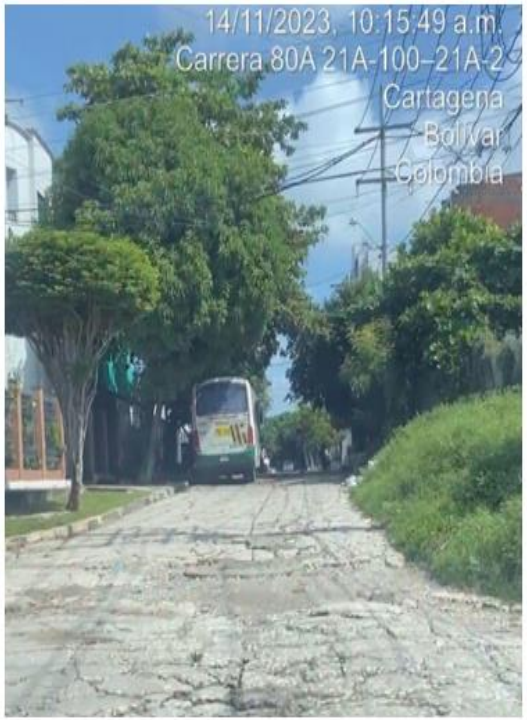
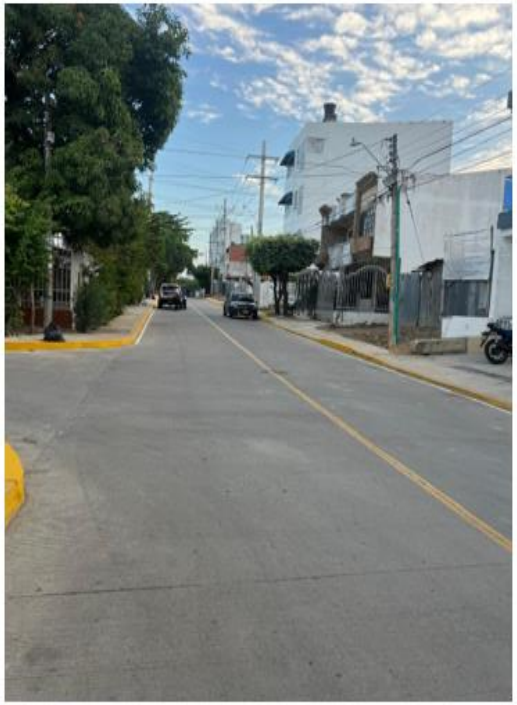
FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
26/02/2025	T-005-2023-054-LT7	Comunicado T-005-2023-054-LT7 - Documentación necesaria para acta de entrega y acta de liquidación.	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
3/03/2025	T-005-2023-231-OFC	Comunicado T-005-2023-231-OFC - Apremio No.1 – Notificación del presunto incumplimiento de la meta física contractual definida para el CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA al interior de los contratos de obra No. LP-SID-UAC-036-2023 y LP-SID-UAC-041-2023	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
11/03/2025	CORREO ELECTRONICO	Solicitud de Actualización de Informe Mensual Final de Gestión SST	Carolin Gómez de la Rosa Inspectora HSEQ / Interventoría.	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
11/03/2025	CORREO ELECTRONICO	Solicitud de reparación desagüe edificio vitrus,barrio la concepción	Nevis salazar Administradora Edificio Vitrus	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU
13/03/2025	CORREO ELECTRONICO	ACTA PARCIAL No 7 CTO LP-SID-UAC-041-2023 LOTE 7	CARLOS E MOJICA CONTRERAS Director de interventoría	Luis Eduardo Pallares Laguna Representante legal CRU

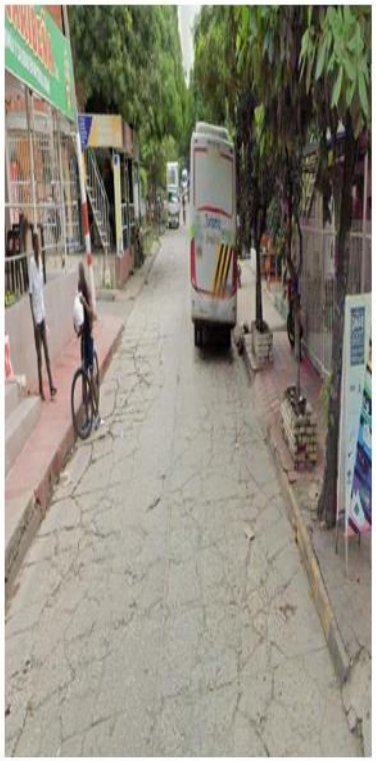
11 REGISTRO FOTOGRAFICO

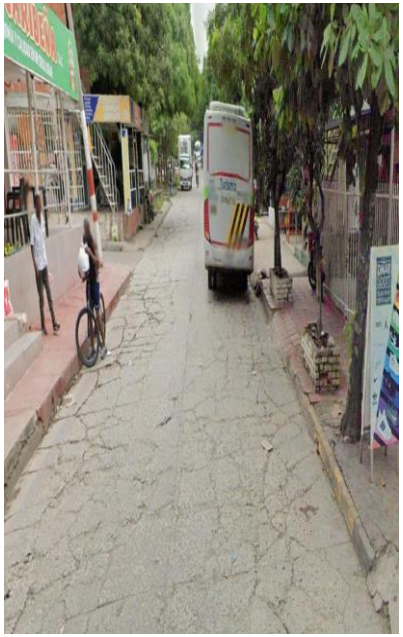
Carrera 80A entre Calles 20B y 27, Alameda la Victoria		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

Carrera 80A entre Calles 20B y 27, Alameda la Victoria		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

Carrera 80A entre Calles 20B y 27, Alameda la Victoria		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

Carrera 80A entre Calles 20B y 27, Alameda la Victoria		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

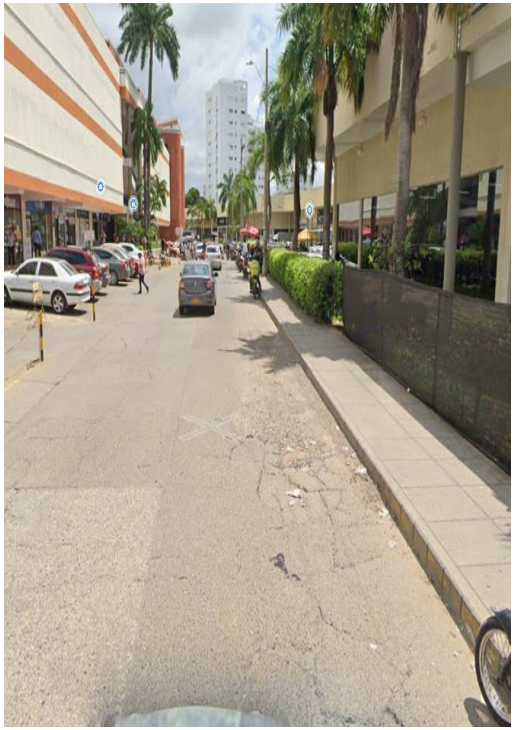
Calle 12 entre Carreras 56 (Corredor de Carga) y 57D, Nuevo Campestre		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

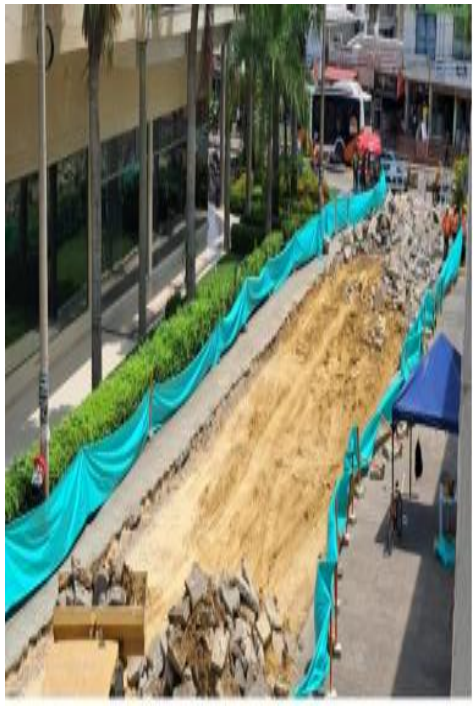
Calle 12 entre Carreras 56 (Corredor de Carga) y 57D, Nuevo Campestre		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

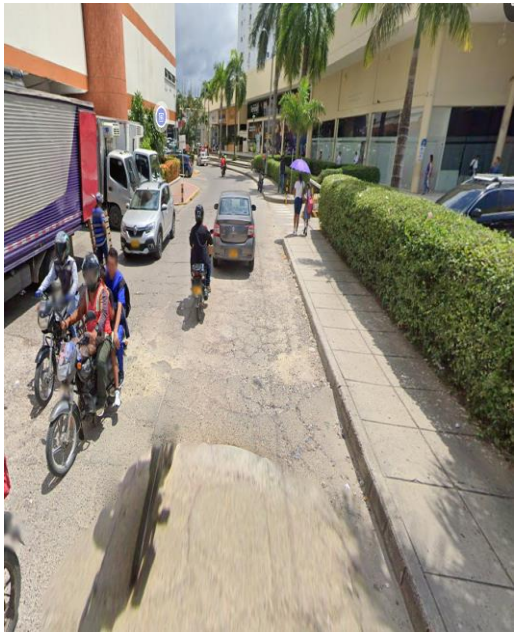
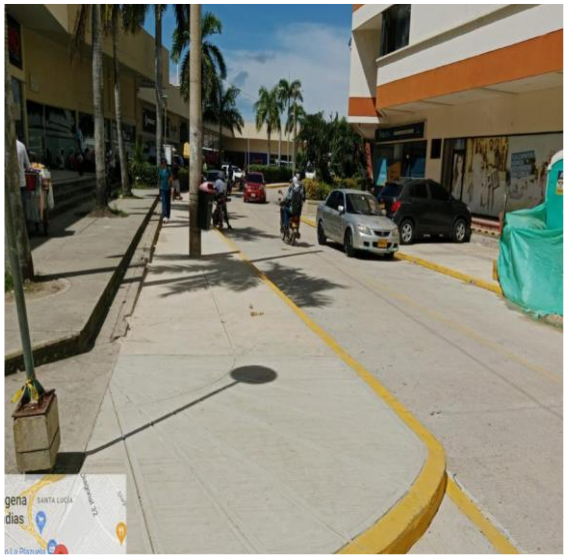
Calle 12 entre Carreras 56 (Corredor de Carga) y 57D, Nuevo Campestre		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

Calle 12 entre Carreras 56 (Corredor de Carga) y 57D, Nuevo Campestre		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

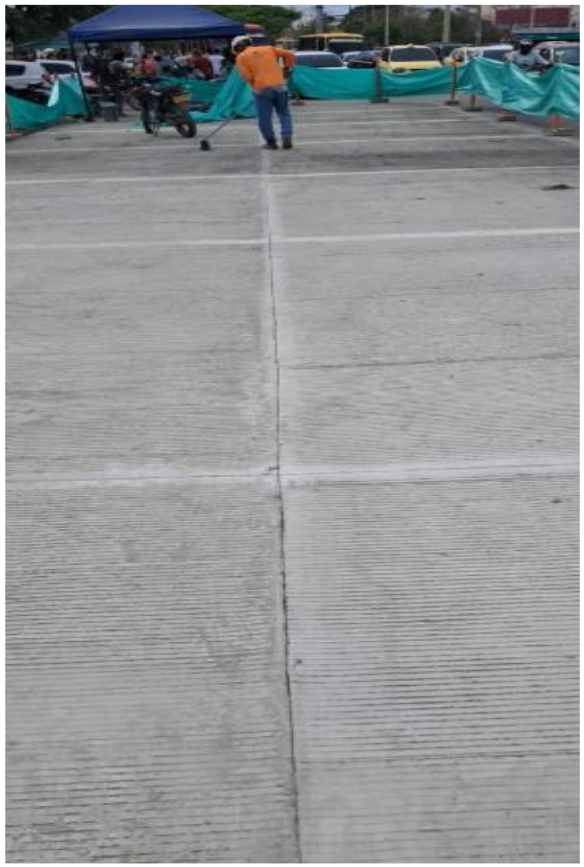
Calle 12 entre Carreras 56 (Corredor de Carga) y 57D, Nuevo Campestre		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

Calle 30D entre Carrera 71 y Calle 31, vía entre Centro Comercial la Plazuela y Shopping Center		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

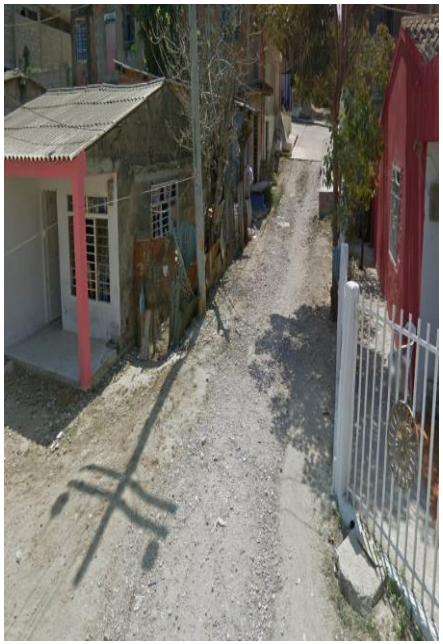
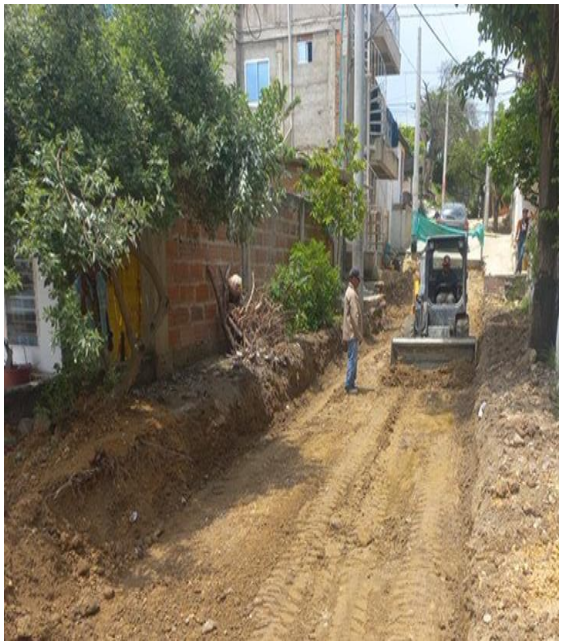
Calle 30D entre Carrera 71 y Calle 31, vía entre Centro Comercial la Plazuela y Shopping Center		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

Calle 30D entre Carrera 71 y Calle 31, vía entre Centro Comercial la Plazuela y Shopping Center		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

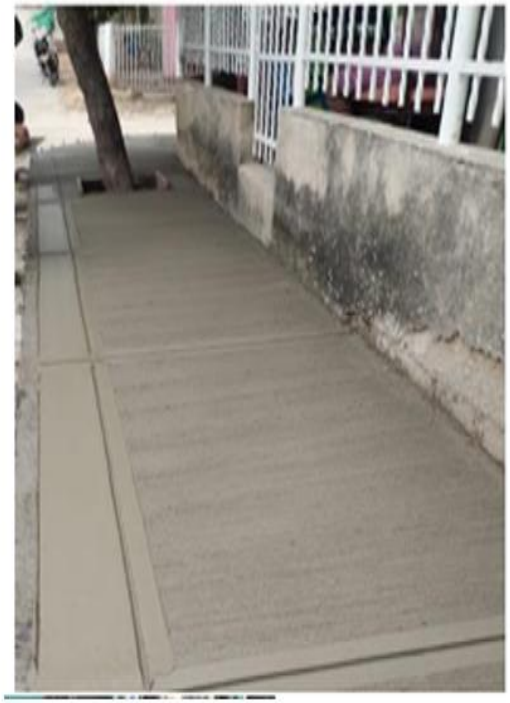
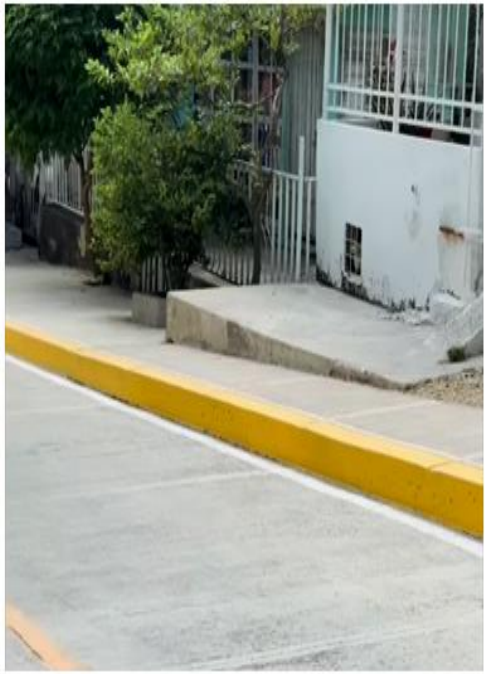
Ronda Real		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

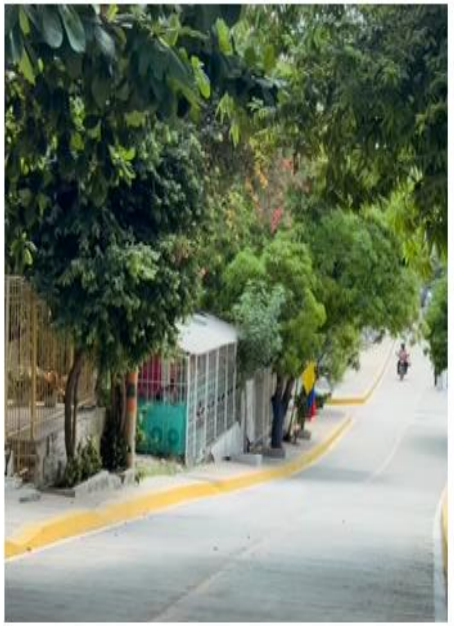
Ronda Real		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

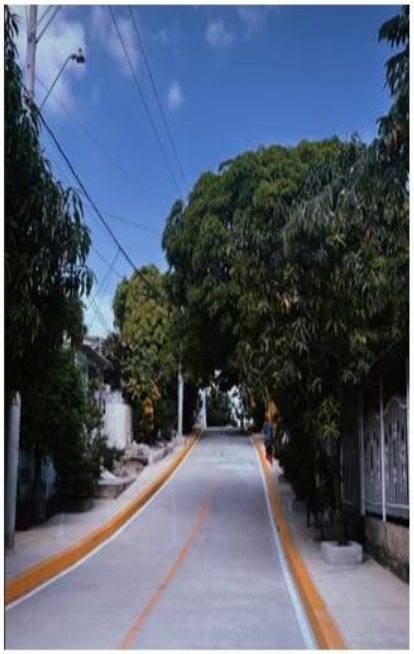
Ronda Real		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Calle 3C entre Carreras 58A y 58B, el Libertador		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

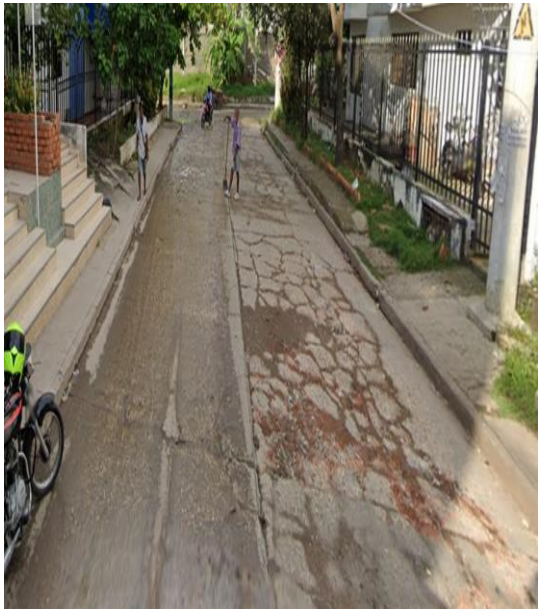
Calle 3C entre Carreras 58A y 58B, el Libertador		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

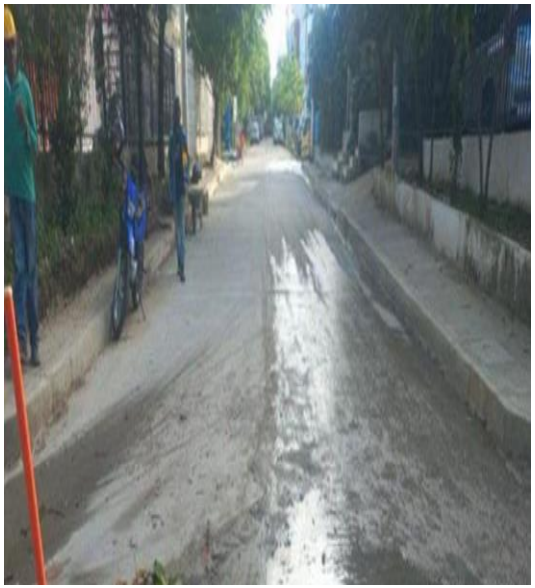
Calle 3C entre Carreras 58A y 58B, el Libertador		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Calle 3C entre Carreras 58A y 58B, el Libertador		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Calle 3C entre Carreras 58A y 58B, el Libertador		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Calle 3C entre Carreras 58A y 58B, el Libertador		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

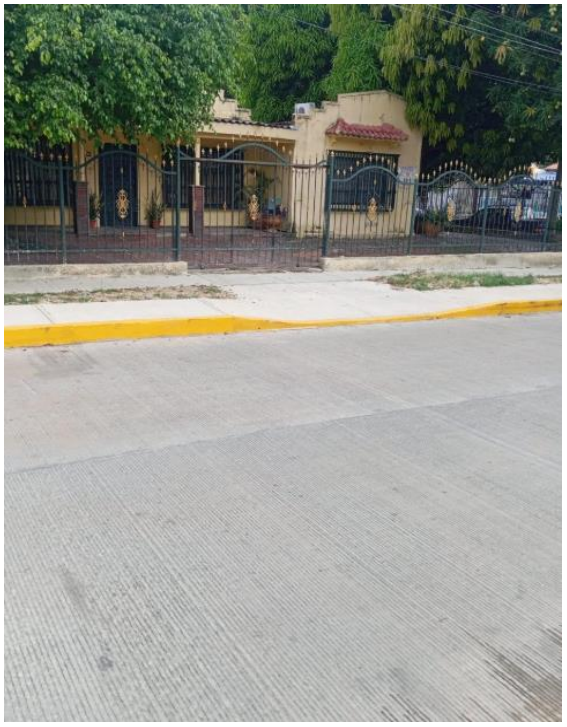
Tramo final Alameda la victoria -•Alameda la Victoria entre Calle 20 y urbanización el Nogal.		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

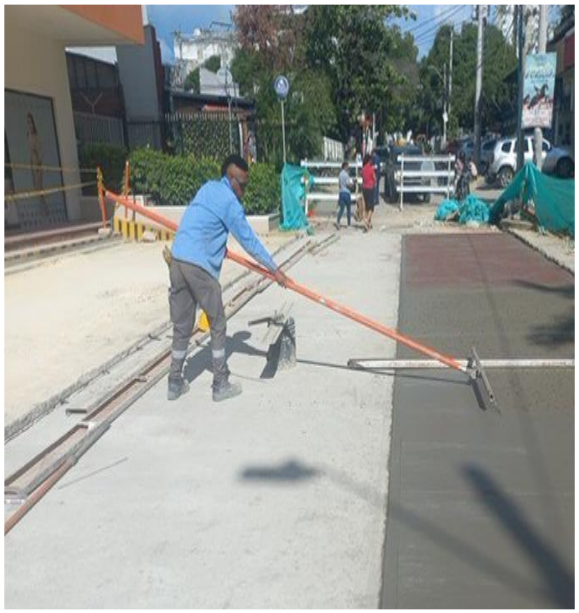
Tramo final Alameda la victoria -•Alameda la Victoria entre Calle 20 y urbanización el Nogal.		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Carrera 2 entre diagonal 32 y Troncal del caribe		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

Carrera 2 entre diagonal 32 y Troncal del caribe		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

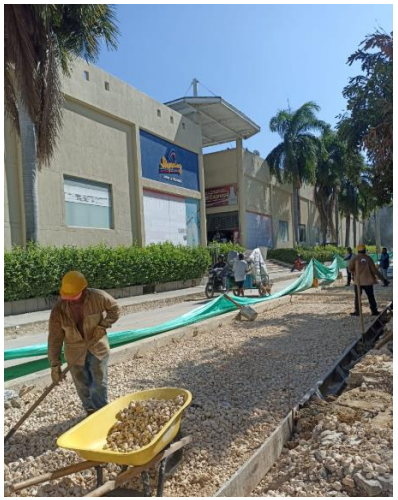
Carrera 2 entre diagonal 32 y Troncal del caribe		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Carrera 2 entre diagonal 32 y Troncal del caribe		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

Extensión Shopping - Calle 30Dentre Carrera 78 y troncal del caribe		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

Extensión Shopping - Calle 30Dentre Carrera 78 y troncal del caribe		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

Calle 30B entre carrera 68 y conjunto torres de la plazuela		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

Calle 30B entre carrera 68 y conjunto torres de la plazuela		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

12 ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

Durante la ejecución del contrato LP-SID-UAC-041-2023-lote 7, la Interventoría ha estado presente de manera permanente, ejerciendo sus funciones de supervisión, control y verificación para garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos, contractuales y normativos establecidos. Se ha llevado un seguimiento detallado de cada una de las actividades desarrolladas, asegurando la correcta de los trabajos conforme a los diseños y especificaciones aprobadas. Asimismo, se ha verificado de manera continua la entrega y actualización de la documentación requerida por parte del contratista para cada proceso constructivo, con el fin de mantener un adecuado registro técnico y administrativo del proyecto.

13 OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Durante la ejecución del proyecto de Malla Vial Lote 7, se intervinieron los tramos comprendidos en:

1. Calle 3C entre Carreras 58A y 58B, el Libertador
2. Calle 12 entre Carreras 56 (Corredor de Carga) y 57D, Nuevo Campestre
3. Carrera 80A entre Calles 20B y 27, Alameda la Victoria
4. Alameda la Victoria – tramo final entre Calle 20 y urbanización el Nogal .
5. Calle 30D entre Carrera 71 y Calle 31, vía entre Centro Comercial la Plazuela y Shopping Center
6. Calle 30B entre carrera 68 y conjunto torres de la plazuela
7. Carrera 2 entre diagonal 32 y Troncal del caribe
8. Extensión Shopping - Calle 30Dentre Carrera 78 y troncal del caribe
9. Ronda Real

En cada uno de estos tramos, se llevaron a cabo trabajos en la calzada, los andenes y bordillos, así como la respectiva señalización vial, cumpliendo con los parámetros técnicos y normativos establecidos en el contrato y en la normativa vigente.

Durante el desarrollo del proyecto, se presentaron contratiempos asociados a condiciones climáticas, logística de suministros y restricciones de movilidad, los cuales fueron gestionados a través de la implementación de estrategias de optimización de recursos y ampliación de jornadas laborales, garantizando el cumplimiento de los plazos contractuales.

- **Recomendaciones**
- Se recomienda realizar un seguimiento periódico al estado de la vía intervenida, con el fin de verificar su comportamiento y garantizar su durabilidad a largo plazo.

- Implementar un programa de mantenimiento preventivo que contemple inspecciones técnicas regulares para prevenir posibles deterioros prematuros.

- Socializar con la comunidad las buenas prácticas para la conservación del estado de la infraestructura vial y peatonal, promoviendo su uso adecuado.

- **Conclusiones**

El proyecto de Malla Vial Lote 7 ha sido ejecutado satisfactoriamente, cumpliendo con los objetivos establecidos en el contrato y en las especificaciones técnicas. Se logró intervenir con éxito los tramos viales asignados, superando los desafíos operativos presentados y optimizando los recursos disponibles. La correcta planificación y ejecución de las actividades permitió finalizar la obra dentro del plazo estipulado, asegurando la calidad estructural y funcional de la infraestructura intervenida. La señalización implementada en cada tramo contribuye a mejorar la seguridad vial, tanto para peatones como para conductores. En conclusión, el proyecto ha cumplido con los requerimientos técnicos y contractuales, entregando a la comunidad una infraestructura vial mejorada que contribuirá a la movilidad y seguridad del sector.

ANEXO 1: CERTFICADO DE CALIDAD CONCRETO

MIX CONCRETE	Resultados de ensayos de resistencia de Concretos	VERSION 1 Fecha de aprobación 1/04/2021

PLANTA: PUNTA CANA - CARTAGENA
CLIENTE: CONSORCIO REHABILITACION URBANA
MES: DICIEMBRE DE 2023
OBRA: ALAMEDA LA VICTORIA
FECHA DE EMISION: 15/02/2024

DATOS DE LA MUESTRA (TOMADOS DE LA REMISION)							Ensayos realizados bajo las normas NTC 396, NTC 454, NTC 550, NTC 673, NTC 2871, NSR 10					
							RESISTENCIA OBTENIDA (Mpa - MR)					
MUESTRA No.	REMISION	FECHA TOMA DE MUESTRA	FECHA DE LA ROTURA	ELEMENTO FUNDIDO	RESISTENCIA DE DISEÑO Mpa	TAMAÑO MUESTRA	3D	%	7D	%	28D	%
1	MC 19219	16/12/2023	20/12/2023	PAVIMENTO	4,2	45X15X15	4,27	102%				
2	MC 19229	19/12/2023	23/12/2023	PAVIMENTO	4,2	45X15X15	4,31	103%				
3	MC 19236	21/12/2023	26/12/2023	PAVIMENTO	4,2	45X15X15	4,21	100%				
4	MC 19246	26/12/2023	30/12/2023	PAVIMENTO	4,2	45X15X15	4,28	102%				

ELABORÓ

Oscar Lopez

Oscar Lopez

MC MIX CONCRETE	Resultados de ensayos de resistencia de Concretos	VERSION 1 Fecha de aprobación 1/04/2021

PLANTA: PUNTA CANA - CARTAGENA
CLIENTE: CONSORCIO REHABILITACION URBANA
MES: ENERO DE 2024
OBRA: ALAMEDA LA VICTORIA
FECHA DE EMISION: 15/02/2024

DATOS DE LA MUESTRA (TOMADOS DE LA REMISION)							Ensayos realizados bajo las normas NTC 396, NTC 454, NTC 550, NTC 673, NTC 2871, NSR 10					
							RESISTENCIA OBTENIDA (Mpa - MR)					
MUESTRA No.	REMISION	FECHA TOMA DE MUESTRA	FECHA DE LA ROTURA	ELEMENTO FUNDIDO	RESISTENCIA DE DISEÑO Mpa	TAMAÑO MUESTRA	3D	%	7D	%	28D	%
1	MC 19304	19/01/2024	23/01/2024	PAVIMENTO	4,2	45X15X15	4,31	103%				
2	MC 19307	20/01/2024	24/01/2024	PAVIMENTO	4,2	45X15X15	4,19	100%				
3	MC 19317	22/01/2024	26/01/2024	PAVIMENTO	4,2	45X15X15	4,21	100%				

ELABORÓ

Oscar Lopez

ANEXO 2: ENSAYOS CONCRETO

EV INGENIERIA S.A.S — **ENSAYOS A LA FLEXION DE VIGUETAS**

CONTRATANTE: CONSORCIO REHABILITACION URBANA

PROYECTO: CONTRATO LP-SID-UAC-041-2023 EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV- LOTE 7

LOCALIZACION: Alameda la Victoria, Cra 80ª entre Calle 20B y 27 — **INFORME N°1**

CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA DE ENSAYO
MEDIDAS MOLDE: **15CM X 15CM X 45CM**

REFERENCIA DE LA VIGUETA	ELEMENTO/ LOCALIZACION EN OBRA	FECHA (dd/mm/aa)		EDAD DEL CONCRETO (Dias)	CARGA DE ROTURA (lbs)	RESISTENCIA A COMPRESION/FLEXION	
		FUNDIDA	ENSAYO			lbs/pulg2	kg/cm2 M,R
V1 - Alameda	Carril izquierdo entre abcisa K0+367 a K0+395	16-dic-23	20-dic-23	3	7450	620,59	43,44
V2- Alameda	Carril izquierdo entre abcisa K0+367 a K0+395	16-dic-23	20-dic-23	3	7280	606,42	42,45
V3- Alameda	Carril izquierdo entre abcisa K0+367 a K0+395	16-dic-23	20-dic-23	3	7315	609,34	42,65
V4- Alameda	Carril izquierdo entre abcisa k0+395 a k0+431	19-dic-23	23-dic-23	3	7189	598,84	41,92
V5- Alameda	Carril izquierdo entre abcisa k0+395 a k0+431	19-dic-23	23-dic-23	3	7250	603,93	42,27
V6- Alameda	Carril izquierdo entre abcisa k0+395 a k0+431	19-dic-23	23-dic-23	3	7288	607,09	42,50
V7- Alameda	Carril derrecho entre abcisa k0+367 a k0+431	21-dic-23	26-dic-23	4	7367	613,67	42,96
V8- Alameda	Carril derrecho entre abcisa k0+367 a k0+431	21-dic-23	26-dic-23	4	7199	599,68	41,98
V9- Alameda	Carril derrecho entre abcisa k0+367 a k0+431	21-dic-23	26-dic-23	4	7283	606,67	42,47
V10- Alameda	Carril izquierdo entre abcisa k0+431 a k0+463	19-ene-24	24-ene-24	4	7205	600,18	42,01
V11- Alameda	Carril izquierdo entre abcisa k0+431 a k0+463	19-ene-24	24-ene-24	4	7214	600,93	42,06
V12- Alameda	Carril izquierdo entre abcisa k0+431 a k0+463	19-ene-24	24-ene-24	4	7219	601,34	42,09
V13- Alameda	Carril izquierdo entre abcisa k0+463 a k0+483	20-ene-24	24-ene-24	3	7225	601,84	42,13
V14- Alameda	Carril izquierdo entre abcisa k0+463 a k0+483	20-ene-24	24-ene-24	3	7298	607,92	42,55
V15- Alameda	Carril izquierdo entre abcisa k0+463 a k0+483	20-ene-24	24-ene-24	3	7200	599,76	41,98
V16- Alameda	Carril derecho entre abcisa k0+431 a k0+483	22-ene-24	26-ene-24	3	7297	607,84	42,55
V17- Alameda	Carril derecho entre abcisa k0+431 a k0+483	22-ene-24	26-ene-24	3	7208	600,43	42,03
V18- Alameda	Carril derecho entre abcisa k0+431 a k0+483	22-ene-24	26-ene-24	3	7307	608,67	42,61
V19- Alameda	Carril izquierdo entre abcisa k0+482 a k0+548	6-feb-24	10-feb-24	3	7228	602,09	42,15
V20- Alameda	Carril izquierdo entre abcisa k0+482 a k0+548	6-feb-24	10-feb-24	3	7305	608,51	42,60
V21- Alameda	Carril izquierdo entre abcisa k0+482 a k0+548	6-feb-24	10-feb-24	3	7216	601,09	42,08
V22- Alameda	Carril derecho entre abcisa k0+482 a k0+548	9-feb-24	13-feb-24	3	7280	606,42	42,45
V23- Alameda	Carril derecho entre abcisa k0+482 a k0+548	9-feb-24	13-feb-24	3	7375	614,34	43,00
V24- Alameda	Carril derecho entre abcisa k0+482 a k0+548	9-feb-24	13-feb-24	3	7390	615,59	43,09



EV INGENIERIA S.A.S

ENSAYOS A LA FLEXION DE VIGUETAS

CONTRATANTE : CONSORCIO REHABILITACION URBANA

PROYECTO: CONTRATO LP-SID-UAC-041-2023 EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV- LOTE 7

LOCALIZACION: Alameda la Victoria, Cra 80ª entre Calle 20B y 27

INFORME N°4

CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA DE ENSAYO
MEDIDAS MOLDE: 15CM X 15CM X 45CM

REFERENCIA DE LA VIGUETA	ELEMENTO/ LOCALIZACION EN OBRA	FECHA (dd/mm/aa)		EDAD DEL CONCRETO (Dias)	CARGA DE ROTURA (lbs)	RESISTENCIA A COMPRESION/FLEXION	
		FUNDIDA	ENSAYO			lbs/pulg2	kg/cm2 M,R
V88 - Alameda	Boca calle carril izquierdo Calle 22	19-jun-24	25-jun-24	6	7289	607,17	42,50
V89- Alameda	Boca calle carril izquierdo Calle 22	19-jun-24	25-jun-24	6	7320	609,76	42,68
V90- Alameda	Boca calle carril izquierdo Calle 22	19-jun-24	25-jun-24	6	7191	599,01	41,93
V91- Alameda	Boca calle carril derecho Calle 22B	21-jun-24	25-jun-24	4	7188	598,76	41,91
V92- Alameda	Boca calle carril derecho Calle 22B	21-jun-24	25-jun-24	4	7198	599,59	41,97
V93- Alameda	Boca calle carril derecho Calle 22B	21-jun-24	25-jun-24	4	7201	599,84	41,99
V94- Alameda	Boca calle carril izquierdo Calle 22B	22-jun-24	26-jun-24	4	7226	601,93	42,13
V95- Alameda	Boca calle carril izquierdo Calle 22B	22-jun-24	26-jun-24	4	7268	605,42	42,38
V96- Alameda	Boca calle carril izquierdo Calle 22B	22-jun-24	26-jun-24	4	7198	599,59	41,97
V97- Alameda	Boca calle carril izquierdo Calle 24	11-jul-24	16-jul-24	5	7331	610,67	42,75
V98- Alameda	Boca calle carril izquierdo Calle 24	11-jul-24	16-jul-24	5	7295	607,67	42,54
V99- Alameda	Boca calle carril izquierdo Calle 24	11-jul-24	16-jul-24	5	7209	600,51	42,04
V100- Alameda	Boca calle carril derecho Calle 24	12-jul-24	16-jul-24	4	7279	606,34	42,44
V101- Alameda	Boca calle carril derecho Calle 24	12-jul-24	16-jul-24	4	7199	599,68	41,98
V102- Alameda	Boca calle carril derecho Calle 24	12-jul-24	16-jul-24	4	7211	600,68	42,05
V103- Alameda	Radios de giro	22-jul-24	26-jul-24	4	7188	598,76	41,91
V104- Alameda	Radios de giro	22-jul-24	26-jul-24	4	7222	601,59	42,11
V105- Alameda	Radios de giro	22-jul-24	26-jul-24	4	7230	602,26	42,16
V106- Alameda	Radios de giro	24-jul-24	29-jul-24	5	7299	608,01	42,56
V107- Alameda	Radios de giro	24-jul-24	29-jul-24	5	7305	608,51	42,60
V108- Alameda	Radios de giro	24-jul-24	29-jul-24	5	7211	600,68	42,05
V109- Alameda	Boca calles y radios de giro	27-jul-24	31-jul-24	4	7295	607,67	42,54
V110- Alameda	Boca calles y radios de giro	27-jul-24	31-jul-24	4	7302	608,26	42,58
V111- Alameda	Boca calles y radios de giro	27-jul-24	31-jul-24	4	7189	598,84	41,92
V112- Alameda	Radios de giro calle 22B	29-jul-24	3-ago-24	5	7210	600,59	42,04
V113- Alameda	Radios de giro calle 22B	29-jul-24	3-ago-24	5	7155	596,01	41,72
V114- Alameda	Radios de giro calle 22B	29-jul-24	3-ago-24	5	7245	603,51	42,25
V115- Alameda	Radios de giro	30-jul-24	3-ago-24	4	7217	601,18	42,08
V116- Alameda	Radios de giro	30-jul-24	3-ago-24	4	7288	607,09	42,50
V117- Alameda	Radios de giro	30-jul-24	3-ago-24	4	7311	609,01	42,63
V118- Alameda	Radios de giro	1-ago-24	5-ago-24	4	7177	597,84	41,85
V119- Alameda	Radios de giro	1-ago-24	5-ago-24	4	7188	598,76	41,91
V120- Alameda	Radios de giro	1-ago-24	5-ago-24	4	7276	606,09	42,43
V121- Alameda	Boca calle 23 lado derecho Abcisa k0+205 / boca calle 25 lado derecho abcisa k0+100/ Boca calle calle 26 lado dcho Abcisa k0+050	8-ago-24	12-ago-24	4	7222	601,59	42,11
V122- Alameda	Boca calle 23 lado derecho Abcisa k0+205 / boca calle 25 lado derecho abcisa k0+100/ Boca calle calle 26 lado dcho Abcisa k0+050	8-ago-24	12-ago-24	4	7266	605,26	42,37
V123- Alameda	Boca calle 23 lado derecho Abcisa k0+205 / boca calle 25 lado derecho abcisa k0+100/ Boca calle calle 26 lado dcho Abcisa k0+050	8-ago-24	12-ago-24	4	7251	604,01	42,28

EMIRO VANEGAS

Pag 1 de 2

EV INGENIERIA S.A.S

ENSAYOS A LA FLEXION DE VIGUETAS

CONTRATANTE : CONSORCIO REHABILITACION URBANA

PROYECTO: CONTRATO LP-SID-UAC-041-2023 EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV- LOTE 7

LOCALIZACION: Alameda la Victoria, Cra 80ª entre Calle 20B y 27

INFORME N°4

CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA DE ENSAYO
MEDIDAS MOLDE: 15CM X 15CM X 45CM

REFERENCIA DE LA VIGUETA	ELEMENTO/ LOCALIZACION EN OBRA	FECHA (dd/mm/aa)		EDAD DEL CONCRETO (Dias)	CARGA DE ROTURA (lbs)	RESISTENCIA A COMPRESION/FLEXION	
		FUNDIDA	ENSAYO			lbs/pulg2	kg/cm2 M.R
V124- Alameda	Boca calle 23 lado izquierdo Abcisa k0+205 / boca calle 25 lado izquierdo abcisa k0+100/ Boca calle calle 26 lado izquierdo Abcisa k0+050	10-ago-24	14-ago-24	4	7188	598,76	41,91
V125- Alameda	Boca calle 23 lado izquierdo Abcisa k0+205 / boca calle 25 lado izquierdo abcisa k0+100/ Boca calle calle 26 lado izquierdo Abcisa k0+050	10-ago-24	14-ago-24	4	7198	599,59	41,97
V126- Alameda	Boca calle 23 lado izquierdo Abcisa k0+205 / boca calle 25 lado izquierdo abcisa k0+100/ Boca calle calle 26 lado izquierdo Abcisa k0+050	10-ago-24	14-ago-24	4	7230	602,26	42,16
V127- Alameda	Radios de giro calle 24-25 y 26 lado derecho	14-ago-24	20-ago-24	6	7189	598,84	41,92
V128- Alameda	Radios de giro calle 24-25 y 26 lado derecho	14-ago-24	20-ago-24	6	7325	610,17	42,71
V129- Alameda	Radios de giro calle 24-25 y 26 lado derecho	14-ago-24	20-ago-24	6	7256	604,42	42,31
V130- Alameda	Radios de giro	15-ago-24	20-ago-24	5	7221	601,51	42,11
V131- Alameda	Radios de giro	15-ago-24	20-ago-24	5	7280	606,42	42,45
V132- Alameda	Radios de giro	15-ago-24	20-ago-24	5	7180	598,09	41,87

EMIRO VANEGAS

Pag 2 de 2

EV INGENIERIA S.A.S — **ENSAYOS A LA FLEXION DE VIGUETAS**

CONTRATANTE: CONSORCIO REHABILITACION URBANA

PROYECTO: CONTRATO LP-SID-UAC-041-2023 EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV- LOTE 7

LOCALIZACION: Alameda la Victoria, Cra 80ª entre Calle 20B y 27 - Tramo final entre calle 20 y Urb nogal — **INFORME Nº5**

CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA DE ENSAYO
MEDIDAS MOLDE: 15CM X 15CM X 45CM
MEDIDA MOLDE CILINDRO: Diametro: 4 pulg - Altura: 8 pulg - Seccion Transversal: 12,57 pulg2

REFERENCIA DE LA VIGUETA	REFERENCIA DELCONCRETO - ELEMENTO	FECHA (dd/mm/aa)		EDAD DEL CONCRETO (Dias)	CARGA DE ROTURA (lb)	RESISTENCIA A COMPRESION/FLEXION	
		FUNDIDA	ENSAYO			lbs/pulg2 (PSI)	kg/cm2 MR
V124 - Alameda	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm - Anden/Rampa	23-ago-24	20-sep-24	28	45120	3589	251,26
V125 - Alameda	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm - Anden/Rampa	23-ago-24	20-sep-24	28	45099	3588	251,15
V126 - Alameda	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm - Anden/Rampa	23-ago-24	20-sep-24	28	45155	3592	251,46
V127- Alameda	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Anden/Rampa	24-ago-24	21-sep-24	28	45067	3585	250,97
V128- Alameda	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Anden/Rampa	24-ago-24	21-sep-24	28	46200	3675	257,28
V129- Alameda	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Anden/Rampa	24-ago-24	21-sep-24	28	44980	3578	250,49
V130- Alameda	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm - Anden/Rampa	27-ago-24	24-sep-24	28	44999	3580	250,59
V131- Alameda	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm - Anden/Rampa	27-ago-24	24-sep-24	28	45610	3628	253,99
V132- Alameda	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm - Anden/Rampa	27-ago-24	24-sep-24	28	45701	3636	254,50
V133- Alameda	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm- Via	30-ago-24	3-sep-24	4	7305	608,51	42,60
V134- Alameda	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm- Via	30-ago-24	3-sep-24	4	7311	609,01	42,63
V135- Alameda	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm- Via	30-ago-24	3-sep-24	4	7399	616,34	43,14
V136- Alameda	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm - Via tramo final	1-oct-24	5-oct-24	4	7280	606,42	42,45
V137- Alameda	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm - Via tramo final	1-oct-24	5-oct-24	4	7295	607,67	42,54
V138- Alameda	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm - Via tramo final	1-oct-24	5-oct-24	4	7297	607,84	42,55
V139- Alameda	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm - Anden/Rampa	5-oct-24	2-nov-24	28	44810	3565	249,54
V140- Alameda	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm - Anden/Rampa	5-oct-24	2-nov-24	28	44795	3564	249,46
V141- Alameda	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm - Anden/Rampa	5-oct-24	2-nov-24	28	44901	3572	250,05
V142- Alameda	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm - Via tramo final	21-oct-24	25-oct-24	4	7357	612,84	42,90
V143- Alameda	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm - Via tramo final	21-oct-24	25-oct-24	4	7365	613,50	42,95
V144- Alameda	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm - Via tramo final	21-oct-24	25-oct-24	4	7360	613,09	42,92
V145- Alameda	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm - Via tramo final	24-oct-24	29-oct-24	5	7410	617,25	43,21
V146- Alameda	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm - Via tramo final	24-oct-24	29-oct-24	5	7399	616,34	43,14
V147- Alameda	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm - Via tramo final	24-oct-24	29-oct-24	5	7408	617,09	43,20
V148- Alameda	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm - Via tramo final	24-oct-24	29-oct-24	5	7450	620,59	43,44
V149- Alameda	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm - Via tramo final	24-oct-24	29-oct-24	5	7482	623,25	43,63
V150- Alameda	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm - Via tramo final	24-oct-24	29-oct-24	5	7444	620,09	43,41
V151- Alameda	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm - Anden/Rampa	29-oct-24	26-nov-24	28	44690	3555	248,87
V152- Alameda	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm - Anden/Rampa	29-oct-24	26-nov-24	28	44710	3557	248,98
V153- Alameda	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm - Anden/Rampa	29-oct-24	26-nov-24	28	44900	3572	250,04
V154- Alameda	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm - Anden/Rampa	31-oct-24	28-nov-24	28	44780	3562	249,37
V155- Alameda	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm - Anden/Rampa	31-oct-24	28-nov-24	28	44690	3555	248,87
V156- Alameda	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm - Anden/Rampa	31-oct-24	28-nov-24	28	44570	3546	248,20
V157- Alameda	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm - Anden/Rampa	31-oct-24	28-nov-24	28	44680	3554	248,81
V158- Alameda	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm - Anden/Rampa	31-oct-24	28-nov-24	28	44560	3545	248,15
V159- Alameda	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm - Anden/Rampa	31-oct-24	28-nov-24	28	44540	3543	248,04

EMIRO VANEGAS

Pag 1 de 1

EV INGENIERIA S.A.S — **ENSAYOS A LA FLEXION DE VIGUETAS**

CONTRATANTE: CONSORCIO REHABILITACION URBANA

PROYECTO: CONTRATO LP-SID-UAC-041-2023 EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV-LOTE 7

LOCALIZACION: Nuevo Campestre, calle 12 entre Cra 56 y 57

INFORME Nº1

CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA DE ENSAYO
MEDIDAS MOLDE: 15CM X 15CM X 45CM

REFERENCIA DE LA VIGUETA	ELEMENTO/ LOCALIZACION EN OBRA	FECHA (dd/mm/aa)		EDAD DEL CONCRETO (Dias)	CARGA DE ROTURA (lbs)	RESISTENCIA A COMPRESION/FLEXION	
		FUNDIDA	ENSAYO			lbs/pulg2	kg/cm2 M.R
V1 - Nuevo Campestre	Carril izquierdo entre abcisa k0+445 a k0+509	28-dic-23	2-ene-24	4	7310	608,92	42,62
V2- Nuevo Campestre	Carril izquierdo entre abcisa k0+445 a k0+509	28-dic-23	2-ene-24	4	7215	601,01	42,07
V3- Nuevo Campestre	Carril izquierdo entre abcisa k0+445 a k0+509	28-dic-23	2-ene-24	4	7217	601,18	42,08
V4- Nuevo Campestre	Carril derecho entrre la abcisa k0+445 a k0+509	29-dic-23	2-ene-24	4	7210	600,59	42,04
V5- Nuevo Campestre	Carril derecho entrre la abcisa k0+445 a k0+509	29-dic-23	2-ene-24	4	7199	599,68	41,98
V6- Nuevo Campestre	Carril derecho entrre la abcisa k0+445 a k0+509	29-dic-23	2-ene-24	4	7300	608,09	42,57
V7- Nuevo Campestre	Carril izquierdo entre abcisa k0+509 a k0+538,10	28-ene-24	1-feb-24	3	7227	602,01	42,14
V8- Nuevo Campestre	Carril izquierdo entre abcisa k0+509 a k0+538,10	28-ene-24	1-feb-24	3	7250	603,93	42,27
V9- Nuevo Campestre	Carril izquierdo entre abcisa k0+509 a k0+538,10	28-ene-24	1-feb-24	3	7187	598,68	41,91
V10- Nuevo Campestre	Carril derecho entre abcisa k0+538,10 a k0+507,7	31-ene-24	5-feb-24	4	7178	597,93	41,85
V11- Nuevo Campestre	Carril derecho entre abcisa k0+538,10 a k0+507,7	31-ene-24	5-feb-24	4	7367	613,67	42,96
V12- Nuevo Campestre	Carril derecho entre abcisa k0+538,10 a k0+507,7	31-ene-24	5-feb-24	4	7233	602,51	42,18



EV INGENIERIA S.A.S

ENSAYOS A LA FLEXION DE VIGUETAS

CONTRATANTE : CONSORCIO REHABILITACION URBANA

PROYECTO: CONTRATO LP-SID-UAC-041-2023 EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV- LOTE 7

LOCALIZACION: Nuevo Campestre, calle 12 entre Cra 56 y Cra 57D

INFORME N°4

CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA DE ENSAYO
MEDIDAS MOLDE: 15CM X 15CM X 45CM

REFERENCIA DE LA VIGUETA	ELEMENTO/ LOCALIZACION EN OBRA	FECHA (dd/mm/aa)		EDAD DEL CONCRETO (Dias)	CARGA DE ROTURA (lbs)	RESISTENCIA A COMPRESION/FLEXION	
		FUNDIDA	ENSAYO			lbs/pulg2	kg/cm2 M,R
V64 - Nuevo Campestre	Carril izquierdo entre abcisa k0+000 a k0+040	19-jun-24	24-jun-24	5	7210	600,59	42,04
V65- Nuevo Campestre	Carril izquierdo entre abcisa k0+000 a k0+040	19-jun-24	24-jun-24	5	7215	601,01	42,07
V66- Nuevo Campestre	Carril izquierdo entre abcisa k0+000 a k0+040	19-jun-24	24-jun-24	5	7290	607,26	42,51
V67- Nuevo Campestre	Carril izquierdo entre abcisa k0+131,96 a k0+117,4	21-jun-24	25-jun-24	4	7351	612,34	42,86
V68- Nuevo Campestre	Carril izquierdo entre abcisa k0+131,96 a k0+117,4	21-jun-24	25-jun-24	4	7195	599,34	41,95
V69- Nuevo Campestre	Carril izquierdo entre abcisa k0+131,96 a k0+117,4	21-jun-24	25-jun-24	4	7280	606,42	42,45
V70-Nuevo Campestre	Carril derecho entre abcisa k0+000 a k0+040	24-jun-24	29-jun-24	5	7198	599,59	41,97
V71-Nuevo Campestre	Carril derecho entre abcisa k0+000 a k0+040	24-jun-24	29-jun-24	5	7250	603,93	42,27
V72-Nuevo Campestre	Carril derecho entre abcisa k0+000 a k0+040	24-jun-24	29-jun-24	5	7284	606,76	42,47
V73-Nuevo Campestre	Carril derecho entre abcisa k0+117,4 a k0+131,96	25-jun-24	29-jun-24	4	7295	607,67	42,54
V74-Nuevo Campestre	Carril derecho entre abcisa k0+117,4 a k0+131,96	25-jun-24	29-jun-24	4	7300	608,09	42,57
V75-Nuevo Campestre	Carril derecho entre abcisa k0+117,4 a k0+131,96	25-jun-24	29-jun-24	4	7199	599,68	41,98
V76-Nuevo Campestre	Carril derecho de la Cra 58A con calle 12	27-jun-24	2-jul-24	5	7215	601,01	42,07
V77-Nuevo Campestre	Carril derecho de la Cra 58A con calle 12	27-jun-24	2-jul-24	5	7210	600,59	42,04
V78-Nuevo Campestre	Carril derecho de la Cra 58A con calle 12	27-jun-24	2-jul-24	5	7217	601,18	42,08
V79-Nuevo Campestre	Carril izquierdo entre k0+000 al k0+024,50 (boca calle izquierda Cra 57C)	28-jun-24	2-jul-24	4	7180	598,09	41,87
V80-Nuevo Campestre	Carril izquierdo entre k0+000 al k0+024,50 (boca calle izquierda Cra 57C)	28-jun-24	2-jul-24	4	7233	602,51	42,18
V81-Nuevo Campestre	Carril izquierdo entre k0+000 al k0+024,50 (boca calle izquierda Cra 57C)	28-jun-24	2-jul-24	4	7400	616,42	43,15
V82-Nuevo Campestre	Radio de giro lado izquierdo y derecho Cra 57C	12-jul-24	16-jul-24	4	7155	596,01	41,72
V83-Nuevo Campestre	Radio de giro lado izquierdo y derecho Cra 57C	12-jul-24	16-jul-24	4	7240	603,09	42,22
V84-Nuevo Campestre	Radio de giro lado izquierdo y derecho Cra 57C	12-jul-24	16-jul-24	4	7395	616,00	43,12
V85-Nuevo Campestre	Boca calle lado derecho Abcisa k0+151 y K0+181	22-jul-24	27-jul-24	5	7180	598,09	41,87
V86-Nuevo Campestre	Boca calle lado derecho Abcisa k0+151 y K0+181	22-jul-24	27-jul-24	5	7219	601,34	42,09
V87-Nuevo Campestre	Boca calle lado derecho Abcisa k0+151 y K0+181	22-jul-24	27-jul-24	5	7377	614,50	43,02
V88-Nuevo Campestre	3 boca calles lado izquierdo k0+214 y k0+401,50 y lado derecho k0+248	23-jul-24	27-jul-24	4	7367	613,67	42,96
V89-Nuevo Campestre	3 boca calles lado izquierdo k0+214 y k0+401,50 y lado derecho k0+248	23-jul-24	27-jul-24	4	7287	607,01	42,49
V90-Nuevo Campestre	3 boca calles lado izquierdo k0+214 y k0+401,50 y lado derecho k0+248	23-jul-24	27-jul-24	4	7288	607,09	42,50
V91-Nuevo Campestre	Boca calle lado izquierdo Abcisa k0+277	24-jul-24	30-jul-24	6	7199	599,68	41,98
V92-Nuevo Campestre	Boca calle lado izquierdo Abcisa k0+277	24-jul-24	30-jul-24	6	7292	607,42	42,52
V93-Nuevo Campestre	Boca calle lado izquierdo Abcisa k0+277	24-jul-24	30-jul-24	6	7213	600,84	42,06
V94-Nuevo Campestre	Boca calle lado izquierdo Abcisa k0+375,50	25-jul-24	31-jul-24	6	7388	615,42	43,08
V95-Nuevo Campestre	Boca calle lado izquierdo Abcisa k0+375,50	25-jul-24	31-jul-24	6	7199	599,68	41,98
V96-Nuevo Campestre	Boca calle lado izquierdo Abcisa k0+375,50	25-jul-24	31-jul-24	6	7184	598,43	41,89
V97-Nuevo Campestre	Radio de giro con corredor de carga Abcisa k0+540 y boca calle lado izquierdo abcisa k0+336,50	30-jul-24	3-ago-24	4	7280	606,42	42,45

EMIRO VANEGAS

Pag 1 de 2

EV INGENIERIA S.A.S — **ENSAYOS A LA FLEXION DE VIGUETAS**

CONTRATANTE : CONSORCIO REHABILITACION URBANA

PROYECTO: CONTRATO LP-SID-UAC-041-2023 EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV-LOTE 7

LOCALIZACION: Nuevo Campestre, calle 12 entre Cra 56 y Cra 57D

INFORME N°4

CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA DE ENSAYO
MEDIDAS MOLDE: 15CM X 15CM X 45CM

REFERENCIA DE LA VIGUETA	ELEMENTO/ LOCALIZACION EN OBRA	FECHA (dd/mm/aa)		EDAD DEL CONCRETO (Dias)	CARGA DE ROTURA (lbs)	RESISTENCIA A COMPRESION/FLEXION	
		FUNDIDA	ENSAYO			lbs/pulg2	kg/cm2 M.R
V98 - Nuevo Campestre	Radio de giro con corredor de carga Abcisa k0+540 y boca calle lado izquierdo abcisa k0+336,50	30-jul-24	3-ago-24	4	7196	599,43	41,96
V99 - Nuevo Campestre	Radio de giro con corredor de carga Abcisa k0+540 y boca calle lado izquierdo abcisa k0+336,50	30-jul-24	3-ago-24	4	7292	607,42	42,52
V100 - Nuevo Campestre	Boca calle lado izquierdo abcisa k0+444	31-jul-24	5-ago-24	5	7380	614,75	43,03
V101 - Nuevo Campestre	Boca calle lado izquierdo abcisa k0+444	31-jul-24	5-ago-24	5	7288	607,09	42,50
V102- Nuevo Campestre	Boca calle lado izquierdo abcisa k0+444	31-jul-24	5-ago-24	5	7100	591,43	41,40
V103- Nuevo Campestre	Boca calle lado derecho abcisa k0+444	1-ago-24	5-ago-24	4	7267	605,34	42,37
V104- Nuevo Campestre	Boca calle lado derecho abcisa k0+444	1-ago-24	5-ago-24	4	7284	606,76	42,47
V105 - Nuevo Campestre	Boca calle lado derecho abcisa k0+444	1-ago-24	5-ago-24	4	7277	606,17	42,43
V106 - Nuevo Campestre	Boca calle lado izquierdo abcisa k0+246	3-ago-24	8-ago-24	5	7199	599,68	41,98
V107 - Nuevo Campestre	Boca calle lado izquierdo abcisa k0+246	3-ago-24	8-ago-24	5	7217	601,18	42,08
V108 - Nuevo Campestre	Boca calle lado izquierdo abcisa k0+246	3-ago-24	8-ago-24	5	7220	601,43	42,10

EMIRO VANEGAS

Pag 2 de 2

EV INGENIERIA S.A.S

ENSAYOS A LA FLEXION DE VIGUETAS

CONTRATANTE : CONSORCIO REHABILITACION URBANA

PROYECTO: CONTRATO LP-SID-UAC-041-2023 EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV- LOTE 7

LOCALIZACION: Calle 30D entre Cra 71 y Calle 31

INFORME N°4

CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA DE ENSAYO
MEDIDAS MOLDE: 15CM X 15CM X 45CM

REFERENCIA DE LA VIGUETA	ELEMENTO/ LOCALIZACION EN OBRA	FECHA (dd/mm/aa)		EDAD DEL CONCRETO (Dias)	CARGA DE ROTURA (lbs)	RESISTENCIA A COMPRESION/FLEXION	
		FUNDIDA	ENSAYO			lbs/pulg2	kg/cm2 M.R
V1- Shoping Center	Carril derecho k0+212,4 al k0+159	17-jul-24	22-jul-24	5	7199	599,68	41,98
V2- Shoping Center	Carril derecho k0+212,4 al k0+159	17-jul-24	22-jul-24	5	7217	601,18	42,08
V3- Shoping Center	Carril derecho k0+212,4 al k0+159	17-jul-24	22-jul-24	5	7321	609,84	42,69
V4- Shoping Center	Carril izquierdo k0+212,4 al k0+159	18-jul-24	22-jul-24	4	7283	606,67	42,47
V5- Shoping Center	Carril izquierdo k0+212,4 al k0+159	18-jul-24	22-jul-24	4	7371	614,00	42,98
V6- Shoping Center	Carril izquierdo k0+212,4 al k0+159	18-jul-24	22-jul-24	4	7283	606,67	42,47
V7- Shoping Center	Carril derecho k0+224,4 al k0+212,4	24-jul-24	29-jul-24	5	7292	607,42	42,52
V8- Shoping Center	Carril derecho k0+224,4 al k0+212,4	24-jul-24	29-jul-24	5	7340	611,42	42,80
V9- Shoping Center	Carril derecho k0+224,4 al k0+212,4	24-jul-24	29-jul-24	5	7345	611,84	42,83
V10- Shoping Center	Carril izquierdo k0+224,4 al k0+212,4	25-jul-24	29-jul-24	4	7194	599,26	41,95
V11- Shoping Center	Carril izquierdo k0+224,4 al k0+212,4	25-jul-24	29-jul-24	4	7410	617,25	43,21
V12- Shoping Center	Carril izquierdo k0+224,4 al k0+212,4	25-jul-24	29-jul-24	4	7358	612,92	42,90
V13- Shoping Center	Carril derecho k0+127 al k0+159	29-jul-24	3-ago-24	5	7222	601,59	42,11
V14- Shoping Center	Carril derecho k0+127 al k0+159	29-jul-24	3-ago-24	5	7231	602,34	42,16
V15- Shoping Center	Carril derecho k0+127 al k0+159	29-jul-24	3-ago-24	5	7510	625,58	43,79
V16- Shoping Center	Carril izquierdo k0+127 al k0+159	30-jul-24	3-ago-24	4	7243	603,34	42,23
V17- Shoping Center	Carril izquierdo k0+127 al k0+159	30-jul-24	3-ago-24	4	7199	599,68	41,98
V18- Shoping Center	Carril izquierdo k0+127 al k0+159	30-jul-24	3-ago-24	4	7224	601,76	42,12
V19- Shoping Center	Carril derecho k0+107 al k0+ 127	3-ago-24	8-ago-24	5	7522	626,58	43,86
V20- Shoping Center	Carril derecho k0+107 al k0+ 127	3-ago-24	8-ago-24	5	7311	609,01	42,63
V21- Shoping Center	Carril derecho k0+107 al k0+ 127	3-ago-24	8-ago-24	5	7218	601,26	42,09
V22- Shoping Center	Carril izquierdo k0+107 al k0+127	6-ago-24	10-ago-24	4	7336	611,09	42,78
V23- Shoping Center	Carril izquierdo k0+107 al k0+127	6-ago-24	10-ago-24	4	7201	599,84	41,99
V24- Shoping Center	Carril izquierdo k0+107 al k0+127	6-ago-24	10-ago-24	4	7317	609,51	42,67
V25- Shoping Center	Carril derecho k0+107 al k0+87	13-ago-24	17-ago-24	4	7318	609,59	42,67
V26- Shoping Center	Carril derecho k0+107 al k0+87	13-ago-24	17-ago-24	4	7318	609,59	42,67
V27- Shoping Center	Carril derecho k0+107 al k0+87	13-ago-24	17-ago-24	4	7176	597,76	41,84
V28- Shoping Center	Carril izquierdo k0+107 al k0+087	14-ago-24	20-ago-24	6	7333	610,84	42,76
V29- Shoping Center	Carril izquierdo k0+107 al k0+087	14-ago-24	20-ago-24	6	7184	598,43	41,89
V30- Shoping Center	Carril izquierdo k0+107 al k0+087	14-ago-24	20-ago-24	6	7243	603,34	42,23

EMIRO VANEGAS

Pag 1 de 1

EV INGENIERIA S.A.S

ENSAYOS A LA FLEXION DE VIGUETAS

CONTRATANTE : CONSORCIO REHABILITACION URBANA

PROYECTO: CONTRATO LP-SID-UAC-041-2023 EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV- LOTE 7

LOCALIZACION: Calle 30D entre Cra 71 y Calle 31 - Calle 30D entre Cra.78 y Troncal del Caribe

INFORME N°5

CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA DE ENSAYO
MEDIDAS MOLDE: 15CM X 15CM X 45CM
MEDIDA MOLDE CILINDRO: Diametro: 4 pulg - Altura: 8 pulg - Seccion Transversal: 12,57 pulg2

REFERENCIA DE LA VIGUETA	ELEMENTO/ LOCALIZACION EN OBRA	FECHA (dd/mm/aa)		EDAD DEL CONCRETO (Dias)	CARGA DE ROTURA (lbs)	RESISTENCIA A COMPRESION/FLEXION	
		FUNDIDA	ENSAYO			lbs/pulg2	kg/cm2 M.R
V31- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	22-ago-24	26-ago-24	4	7290	607,26	42,51
V32- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	22-ago-24	26-ago-24	4	7310	608,92	42,62
V33- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	22-ago-24	26-ago-24	4	7298	607,92	42,55
V35- Shopping Center	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Bomb	26-ago-24	23-sep-24	28	45102	3588	251,16
V36- Shopping Center	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Bomb	26-ago-24	23-sep-24	28	45160	3593	251,49
V37- Shopping Center	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Bomb	26-ago-24	23-sep-24	28	45210	3597	251,77
V38- Shopping Center	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Bomb	28-ago-24	25-sep-24	28	44987	3579	250,52
V39- Shopping Center	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Bomb	28-ago-24	25-sep-24	28	44510	3541	247,87
V40- Shopping Center	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Bomb	28-ago-24	25-sep-24	28	44610	3549	248,42
V41- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	21-sep-24	24-sep-24	3	7305	608,51	42,60
V42- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	21-sep-24	24-sep-24	3	7295	607,67	42,54
V43- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	21-sep-24	24-sep-24	3	7318	609,59	42,67
V44- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	23-sep-24	26-sep-24	3	7408	617,09	43,20
V45- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	23-sep-24	27-sep-24	4	7398	616,25	43,14
V46- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	23-sep-24	28-sep-24	5	7320	609,76	42,68
V47- Shopping Center	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Bomb	26-sep-24	24-oct-24	28	44087	3507	245,51
V48- Shopping Center	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Bomb	26-sep-24	24-oct-24	28	44150	3512	245,86
V49- Shopping Center	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Bomb	26-sep-24	24-oct-24	28	44210	3517	246,20
V50- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	28-sep-24	2-oct-24	4	7299	608,01	42,56
V51- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	28-sep-24	2-oct-24	4	7301	608,17	42,57
V52- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	28-sep-24	2-oct-24	4	7410	617,25	43,21

Pag 1 de 3

V53- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	1-oct-24	4-oct-24	3	7299	608,01	42,56
V54- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	1-oct-24	4-oct-24	3	7315	609,34	42,65
V55- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	1-oct-24	4-oct-24	3	7398	616,25	43,14
V56- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	8-oct-24	12-oct-24	4	7305	608,51	42,60
V57- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	8-oct-24	12-oct-24	4	7325	610,17	42,71
V58- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	8-oct-24	12-oct-24	4	7345	611,84	42,83
V59- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	9-oct-24	14-oct-24	5	7410	617,25	43,21
V60- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	9-oct-24	14-oct-24	5	7387	615,34	43,07
V61- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	9-oct-24	14-oct-24	5	7392	615,75	43,10
V62- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	15-oct-24	19-oct-24	4	7355	612,67	42,89
V63- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	15-oct-24	19-oct-24	4	7288	607,09	42,50
V64- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	15-oct-24	19-oct-24	4	7296	607,76	42,54
V65- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	1-nov-24	5-nov-24	4	7348	612,09	42,85
V66- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	1-nov-24	5-nov-24	4	7567	630,33	44,12
V67- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	1-nov-24	5-nov-24	4	7423	618,34	43,28
V68- Shopping Center	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Bomb	5-nov-24	3-dic-24	28	44560	3545	248,15
V69- Shopping Center	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Bomb	5-nov-24	3-dic-24	28	44610	3549	248,42
V70- Shopping Center	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Bomb	5-nov-24	3-dic-24	28	44711	3557	248,99
V71- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	6-nov-24	18-nov-24	12	7288	607,09	42,50
V72- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	6-nov-24	18-nov-24	12	7311	609,01	42,63
V73- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	6-nov-24	18-nov-24	12	7377	614,50	43,02
V75- Shopping Center	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Bomb	9-nov-24	9-dic-24	30	45123	3589,74	251,28
V76- Shopping Center	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Bomb	9-nov-24	9-dic-24	30	46098	3667,30	256,71
V77- Shopping Center	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Bomb	9-nov-24	9-dic-24	30	46104	3667,78	256,74
V78- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	2-dic-24	6-dic-24	4	7313	609,17	42,64
V79- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	2-dic-24	6-dic-24	4	7318	609,59	42,67
V80- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	2-dic-24	6-dic-24	4	7321	609,84	42,69
V81- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	4-dic-24	9-dic-24	5	7401	616,50	43,16
V82- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	4-dic-24	9-dic-24	5	7419	618,00	43,26
V83- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	4-dic-24	9-dic-24	5	7387	615,34	43,07
V84- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	5-dic-24	9-dic-24	4	7286	606,92	42,48

V85- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	5-dic-24	9-dic-24	4	7291	607,34	42,51
V86- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	5-dic-24	9-dic-24	4	7299	608,01	42,56
V87- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	11-dic-24	16-dic-24	5	7285	606,84	42,48
V88- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	11-dic-24	16-dic-24	5	7280	606,42	42,45
V89- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	11-dic-24	16-dic-24	5	7281	606,51	42,46
V90- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	12-dic-24	16-dic-24	4	7301	608,17	42,57
V91- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	12-dic-24	16-dic-24	4	7310	608,92	42,62
V92- Shopping Center	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm	12-dic-24	16-dic-24	4	7314	609,26	42,65
V93- Shopping Center	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Bomb	16-dic-24	13-ene-25	28	44998	3579,79	250,59
V94- Shopping Center	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Bomb	16-dic-24	13-ene-25	28	45123	3589,74	251,28
V95- Shopping Center	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Bomb	16-dic-24	13-ene-25	28	45180	3594,27	251,60
V96- Shopping Center	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Bomb	17-dic-24	14-ene-25	28	44678	3554	248,80
V97- Shopping Center	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Bomb	17-dic-24	14-ene-25	28	44685	3555	248,84
V98- Shopping Center	24,5 Mpa, Resist a 28 Dias, Asent 150 mm, Grava 19 mm Bomb	17-dic-24	14-ene-25	28	43998	3500	245,02

EMIRO VANEGAS

Pag 3 de 3

EV INGENIERIA S.A.S

ENSAYOS A LA FLEXION DE VIGUETAS

CONTRATANTE: CONSORCIO REHABILITACION URBANA

PROYECTO: CONTRATO LP-SID-UAC-041-2023 EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV- LOTE 7

LOCALIZACION: Carrera 2 entre Diag.32 y Troncal del Caribe - La Concepcion

INFORME Nº1

CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA DE ENSAYO
MEDIDAS MOLDE: 15CM X 15CM X 45CM

REFERENCIA DE LA VIGUETA	ELEMENTO/ LOCALIZACION EN OBRA	FECHA (dd/mm/aa)		EDAD DEL CONCRETO (Dias)	CARGA DE ROTURA (lbs)	RESISTENCIA A COMPRESION/FLEXION	
		FUNDIDA	ENSAYO			lbs/pulg2	kg/cm2 MR
V1 - Concepcion	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm- Via	23-dic-24	27-dic-24	4	7390	615,59	43,09
V2- Concepcion	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm- Via	23-dic-24	27-dic-24	4	7355	612,67	42,89
V3- Concepcion	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm- Via	23-dic-24	27-dic-24	4	7385	615,17	43,06
V4- Concepcion	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm- Via	23-dic-24	27-dic-24	4	7299	608,01	42,56
V5- Concepcion	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm- Via	23-dic-24	27-dic-24	4	7305	608,51	42,60
V6- Concepcion	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm- Via	23-dic-24	27-dic-24	4	7311	609,01	42,63
V7- Concepcion	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm- Via	26-dic-24	30-dic-24	4	7325	610,17	42,71
V8- Concepcion	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm- Via	26-dic-24	30-dic-24	4	7380	614,75	43,03
V9- Concepcion	MR 4,2 Mpa, Resist a 3 Dias, Asent 100 mm, Grava 25 mm- Via	26-dic-24	30-dic-24	4	7345	611,84	42,83

EMIRO VANEGAS

Pag 1 de 1

EV INGENIERIA S.A.S — **ENSAYOS A LA FLEXION DE VIGUETAS**

CONTRATANTE : CONSORCIO REHABILITACION URBANA

PROYECTO: CONTRATO LP-SID-UAC-041-2023 EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV- LOTE 7

LOCALIZACION: Calle 31, sector Ronda Real

INFORME N°1

CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA DE ENSAYO
MEDIDAS MOLDE: 15CM X 15CM X 45CM

REFERENCIA DE LA VIGUETA	ELEMENTO/ LOCALIZACION EN OBRA	FECHA (dd/mm/aa)		EDAD DEL CONCRETO (Dias)	CARGA DE ROTURA (lbs)	RESISTENCIA A COMPRESION/FLEXION	
		FUNDIDA	ENSAYO			lbs/pulg2	kg/cm2 M.R
V1 - Ronda Real	Carril izquierdo K0+005 a K0+027	28-dic-23	2-ene-24	4	7298	607,92	42,55
V2- Ronda Real	Carril izquierdo K0+005 a K0+027	28-dic-23	2-ene-24	4	7270	605,59	42,39
V3- Ronda Real	Carril izquierdo K0+005 a K0+027	28-dic-23	2-ene-24	4	7197	599,51	41,97
V4- Ronda Real	Carril derecho K0+005 a K0+027	29-dic-23	2-ene-24	3	7328	610,42	42,73
V5- Ronda Real	Carril derecho K0+005 a K0+027	29-dic-23	2-ene-24	3	7305	608,51	42,60
V6- Ronda Real	Carril derecho K0+005 a K0+027	29-dic-23	2-ene-24	3	7317	609,51	42,67

ENSAYOS PROVEEDOR CANTERA – AGRECAR

EV INGENIERIA S.A.S — **ENSAYO DE GRANULOMETRIA**

CONTRATANTE : CONSORCIO REHABILITACION URBANA — **MUESTRA:** GRAVA FACTURADA - PROCEDENCIA AGRECAR

PROYECTO: VIAS CARTAGENA LOTE 2 Y LOTE 7

LOCALIZACION: CANTERA AGRECAR — **FECHA:** OCTUBRE 2023

ANALISIS GRANULOMETRICO

	P1= 10000,00 grs		P2= 9990,00 grs
TAMIZ	PESO RET. (gr)	PORCENTAJE RET. (%)	PORCENTAJE PASA (%)
2"			
1 1/2"			
1"			
3/4"	1050,0	10,5	89,5
1/2"	5710,0	57,1	32,4
3/8"	2600,0	26,0	6,4
No. 4	600,0	6,0	0,4
No. 8	30,0	0,3	0,1
No. 40			
No. 100			
No. 200			
FONDO :	10,0	0,1	0,0
SUMATORI	10000,0	100,0	
ERROR :	0	Bien	

LIMITE LIQUIDO

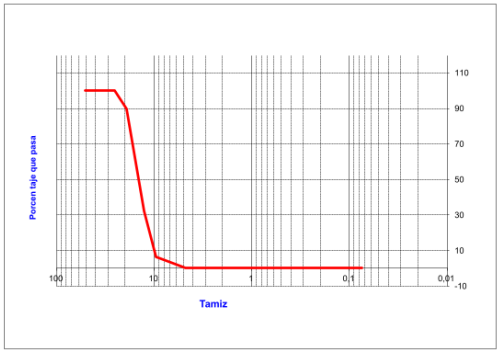
No. DE GOLPES				
RECIPIENTE No.				
PESO RECIP. + MAT. HUMEDO (gr)				
PESO RECIP. + MAT. SECO (gr)				
PESO DEL AGUA (gr)				
PESO DEL RECIPIENTE (gr)				
PESO DEL MATERIAL SECO (gr)				
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)				


LIMITE PLASTICO

RECIPIENTE No.				
PESO RECIP. + MAT. HUMEDO (gr)				
PESO RECIP. + MAT. SECO (gr)				
PESO DEL AGUA (gr)				
PESO DEL RECIPIENTE (gr)				
PESO DEL MATERIAL SECO (gr)				
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)				

INDICE DE GRUPO	0
A.A.S.H.O.	A-3
U.S.C.	GP
LIMITE LIQUIDO	0
LIMITE PLASTICO	0
IND. PLASTICIDAD	NP

ELABORO FECHA
REVISO FECHA
NOTA: *TAMAÑO MÁXIMO 1"* *TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 3/4"*





ENSAYOS PROVEEDOR CANTERA– AGM TRITURADOS – COLON

EV INGENIERIA S.A.S — **ENSAYO DE GRANULOMETRIA**

CONTRATANTE : CONSORCIO REHABILITACION URBANA — **MUESTRA:** TRITURADO CALIZO 3/4 " CANTERA COLON

PROYECTO: VIAS CARTAGENA LOTE 2 Y LOTE 7

LOCALIZACION: PLANTA COLON — **FECHA:** OCTUBRE 2023

ANALISIS GRANULOMETRICO

P1= 10000,00 grs		P2= 9950,00 grs	
TAMIZ	PESO RET. (gr)	PORCENTAJE RET. (%)	PORCENTAJE PASA (%)
2"			
1 1/2"			
1"			
3/4"	3170,0	31,7	68,3
1/2"	4720,0	47,2	21,1
3/8"	1550,0	15,5	5,6
No. 4	500,0	5,0	0,6
No. 8	10,0	0,1	0,5
No. 40			
No. 100			
No. 200			
FONDO :	50,0	0,5	0,0
SUMATORI	10000,0	100,0	
ERROR :	0	Bien	

LIMITE LIQUIDO

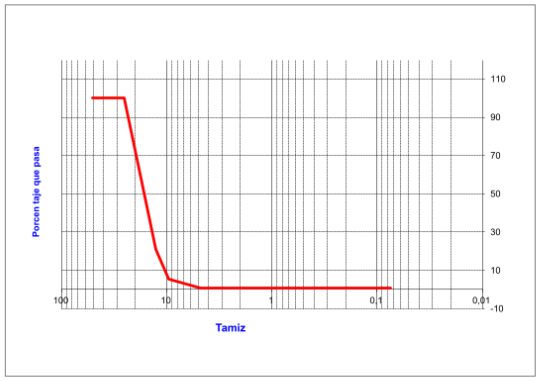
No. DE GOLPES				
RECIPIENTE No.				
PESO RECIP. + MAT. HUMEDO (gr)				
PESO RECIP. + MAT. SECO (gr)				
PESO DEL AGUA (gr)				
PESO DEL RECIPIENTE (gr)				
PESO DEL MATERIAL SECO (gr)				
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)				


LIMITE PLASTICO

RECIPIENTE No.				
PESO RECIP. + MAT. HUMEDO (gr)				
PESO RECIP. + MAT. SECO (gr)				
PESO DEL AGUA (gr)				
PESO DEL RECIPIENTE (gr)				
PESO DEL MATERIAL SECO (gr)				
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)				

INDICE DE GRUPO	0
A.A.S.H.O.	A-3
U.S.C.	GP
LIMITE LIQUIDO	0
LIMITE PLASTICO	0
IND. PLASTICIDAD	NP

ELABORO FECHA
REVISO FECHA
NOTA: *TAMAÑO MÁXIMO 1"* *TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 3/4"*





ENSAYOS PROVEEDOR CANTERA – CIMACO LTDA

WILLIAM VILLA PEREIRA
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN VIAS TERRESTRE


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO
INV E – 213 – 13

Localización CONSORCIO REHABILITACION URBANA — **Sondeo No.**
Descripción del suelo AGREGADO CALIZO — **Muestra No.**
Fecha 10 de octubre de 2023 — **Profundidad**

ANALISIS POR TAMIZADO

Peso de la Muestra Seca (P1) 3749,5 gr.
Peso de la muestra lavada por tamiz No. 200 seca (P2) 3742,7 gr.

Tamiz No.	D (mm.)	W Ret. (gr.)	% Ret.	% Ret. Acum.	% Pasa
3"	76,200	0,0	0,0	0,0	100,0
2½"	63,500	0,0	0,0	0,0	100,0
2"	50,800	0,0	0,0	0,0	100,0
1½"	38,100	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	25,400	2239,5	59,7	59,7	40,3
3/4"	19,050	1422,0	37,9	97,7	2,3
½"	12,700	73,7	2,0	99,6	0,4
3/8"	9,520	5,7	0,2	99,8	0,2
No. 4	4,760	1,8	0,0	99,8	0,2
FINOS		6,8	0,2	100,0	



WILLIAM VILLA PEREIRA
Ingeniero Civil

Olaya Herrera, Sector Once de Noviembre Calle San Antonio Tel. 6698165 - Fax. 6698221
e-mail: cesarhpereiracrespo@latinmail.com
Cartagena - Colombia

WILLIAM VILLA PEREIRA
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN VIAS TERRESTRE

RESISTENCIA DE LA DEGRADACION DE LOS AGRAGADOS DE TAMAÑO MENORES DE 37,5 mm (1 1/2") POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES
I.N.V. E-218 - 13

Cliente: CONSORCIO REHABILITACION URBANA Fecha : 10/10/2023
Proyecto: VIAS CARTAGENA LOTE 2 Y LOTE 7
Descripción de la Muestra : ROCA CALIZA
Localización : CANTERA CIMACO

Este ensayo se realiza a partículas para determinar el desgaste que sufre al ser colocado en una maquina que contiene un cilindro y a la cual se le añaden una cantidad de esferas dependiendo de la granulometría escogida

GRADACION=	A
PESO INICIAL =	5000
PESO FINAL =	3610
% DE DESGASTE =	27,8

PASA TAMIZ No.	RETENIDO SOBRE TAMIZ No.	500 REVOLUCIONES				1000 REVOLUCIONES		
		A	B	C	D	E	F	G
3"	2 1/2"					2500		
2 1/2"	2 "					2500		
2 "	1 1/2"					5000	5000	
1 1/2"	1 "	1250					5000	5000
1 "	3/4"	1250						5000
3/4"	1/2"	1250	2500					
1/2"	3/8"	1250	2500					
3/8"	No. 3			2500				
No. 3	No. 4			2500				
No. 4	No. 8				5000			
No. DE ESFERAS :		12	11	8	6	12	12	12




EL ENSAYOS ANTERIORES SE HACEN BAJO LAS NORMAS:
ICONTEC # 93, ASTM C535, INVIAS E 218

OBSERVACIONES: MATERIAL LIMPIO

WILLIAM VILLA PEREIRA
Ingeniero del Laboratorio

ANEXO 4: CERTIFICADO DE CALIDAD ACERO

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia. C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

Nº: 10008131580922

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
AGOFER CARTAGENA	**9007671892/40**	**OC 106613**	**11053136/000040**	**NTC161 AH-24 SAE1015**	**3.000**

COMPOSICION QUIMICA (%) — Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V
109000483	BAR LIS NTC 161 1" 6m	1726870101		0,15	0,49	0,009	0,033	0,12	0,24	0,09	0,09	0,03	0,002	0,001
Rangos de referencia según norma				0,1300 - 0,1800%	0,3000 - 0,6000%	máx 0,0400%	máx 0,0500%							

PROPIEDADES MECÁNICAS — Ensayo según método NTC3353 — **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	R.T/R.F	Diámet	Ovalid
109000483	BAR LIS NTC 161 1" 6m	1726870101	NA	287	426	31,1	3,881	BUENO	1,48	25,06	0,13
Rangos de referencia según norma				mín 235,0 MPa	mín 363,0 MPa	mín 18,00%	mín 3,742 kg/m		mín 1,100	24,80 - 26,00 mm	máx 0,60 mm

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

Gerdau Diaco certifica que para la producción de nuestro acero, el porcentaje de contenido reciclado mínimo post-consumo corresponde al 90%.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA. 23.05.2025

PAOLA KATHERIN MATEUS

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
CORREDOR DE CARGA PALERMO VIA PUERTO COREMAR, Barranquilla, Colombia. C.P - 477008

Nº: 70238131570007

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
AGOFER CARTAGENA	**9007662620/10**	**OC 106306**	**11038344/000010**	**NTC 2289**	**34.356**

COMPOSICION QUIMICA (%) — Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110007627	BAR COR NTC 2289 3/8" 6M IMP GG	2110302602	GR 60	0,27	0,82	0,019	0,027	0,21	0,27	0,06	0,12	0,01	0,002	0,003	0,43
110007627	BAR COR NTC 2289 3/8" 6M IMP GG	2110302802	GR 60	0,28	0,85	0,016	0,022	0,21	0,24	0,07	0,12	0,01	0,002	0,003	0,44
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS — Ensayo según método NTC3353 — **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa	Ángulo
110007627	BAR COR NTC 2289 3/8" 6M IMP GG	2110302602	3	464	607	1,31	18,2	0,548	OK	5,70	0,56	1,58	62
110007627	BAR COR NTC 2289 3/8" 6M IMP GG	2110302802	3	476	621	1,30	17,7	0,550	OK	5,66	0,58	1,67	61
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm	mín 45,0 deg

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

BARRANQUILLA. 07.05.2025


LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE


ALMASA	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-150
	FORMATO	VERSIÓN: 05
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO	FECHA: 2023-12-08

RECEPCIÓN MUESTRA	FECHA ENSAYO	FECHA DE IMPRESIÓN	REFERENCIA DEL PRODUCTO	ÍTEM	No. ENSAYO
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-20	MALLA ELECTRO XX-084 (4.0 x 4.0mm)15X15	254	MTF-0758

INFORMACIÓN GENERAL	
CLIENTE	AGOFER S A S
CIUDAD	Cartagena De Indias
No. FACTURA	87569
ORDEN DE PRODUCCIÓN	123676
COLADA	3103972
GRADO DE CALIDAD	5.5 / 1015
DIÁMETRO (mm)	4.00

Características de la malla (NTC 5806)	Mín.	Máx.	Resultado	¿Cumple?
Dimensión longitudinal (m)	5,94	6,06	5,96	Cumple
Dimensión transversal (m)	2,33	2,37	2,33	Cumple
Separación longitudinal (cm)	14,4	15,6	15,0	Cumple
Separación transversal (cm)	14,4	15,6	15,0	Cumple
Pelos longitudinales (mm)	62,0	88,0	75,0	Cumple
Pelos transversales (mm)	37,0	63,0	45,0	Cumple
Cuantía principal (cm²/ml)	0,84	No aplica	0,88	Cumple
Número de Varillas Longitudinales	16	17	16	Cumple
Número de Varillas Transversales	40	41	40	Cumple
Características del grafil (NTC 5806)	**Mín.**	**Máx.**	**Resultado**	**¿Cumple?**
Masa unitaria (gr/m)	93,06	104,94	94,00	Cumple
Espaciamiento de resaltes (mm)	4,62	7,24	5,15	Cumple
Altura promedio resaltes (mm)	0,16	No aplica	0,26	Cumple
Ángulo del resalte (°)	45	70	50	Cumple
Propiedades Mecánicas de la Malla (NTC 5806)	**Mín.**	**Máx.**	**Resultado**	**¿Cumple?**
Límite de fluencia (kgf/mm²)	49,46	No aplica	60,15	Cumple
Resistencia a tracción (kgf/mm²)	56,08	No aplica	61,62	Cumple
Esfuerzo cortante (N)	3 599	No aplica	58 114	Cumple





¡Importante! **Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a la norma NTC 5806:2019 y con el reglamento técnico aplicable a alambre de acero liso, grafilado y mallas electrosoldadas resolución 0277 de Febrero de 2015, La información de las propiedades mecánicas y dimensionales contenida en el presente reporte son valores promedio obtenidos de una muestra del lote especificado en este documento, los muestreos son realizados de acuerdo a lo establecido en el plan de calidad interno de Alambres y Mallas S.A. - ALMASA, cumpliendo con la norma antes mencionada y siguiendo los lineamientos descritos en la NTC 3353:2008**

Pedro de Jesús Rodríguez Chalarca	Pablo Cesar Tibocha Murcia
Elaboró	Aprobó
Sector Parque Ind. Malambo SA. PIMSA Km 3	

IPAC DITH Group

CERTIFICADO DE CALIDAD MATERIA PRIMA

CC FOR 21 Ver 05 09 22

Matriz:
Km. 10.5 vía Daule, Guayaquil. Ecuador
Teléfono: 593-4-2110260 Fax: 593-4-2110951
www.ipac-acero.com
Sistema de Gestión Certificado bajo normas ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004

Nº Certificado: 100000000044738
Documento #: 8500001087
Cliente: AGOFER SAS
Dirección: CALLE 12A N 38 - 45 BOGOTA - COLOMBIA
Observación: ODC 94318 DESP JUNIO
Código interno: AGOF C001 06 24

Nº Factura E.: 1300002435
Pedido: 1300002435
Fecha: 12/06/2024
P. NANDINA: 7306.61.00.000000;7306.30.99.000000;7216.61.00.000

Descripción de producto	Unidades/ Peso	Lote	Norma tolerancia	Calidad de material	Tipo material	No pedido interno	Colada Acero MP	Esf. Ts Ft (Mpa)	Esf. Ys Fy (Mpa)	% Elong
PERFIL ESTRUCT. CORREAS GB C. 305X80X19X1.50X6000 mm GB	72.000	8001499-01	NTE INEN 1623, NTC 5685,	ASTM A 653 CS B G90	GB	4800000607	JP365622F0D0HH00S	396	322	32

Descripción de producto	COMPOSICIÓN QUÍMICA %								TOLERANCIAS DIMENSIONALES mm				ATRIBUTOS/ENSAYOS					
	C	Mn	Si	S	P	Fe	Si eq	Ceq	Espesor (mm)	Medida A	Medida B	Escuadra	Flecha Transversal	Flecha Longitudinal	Torcedura	Asp. Galvanizado	Asp. Superficial	Rotulado
PERFIL ESTRUCT. CORREAS GB C. 305X80X19X1.50X6000 mm GB	0.032	0.26	0.013	0.017	0.019	99.659	0.06	0.08	-0.08+ 0.08	-1.50+ 1.50	-1.50+ 1.50	-2.00+ 2.00	+ 12.0	+ 12.0	+ 9.00	N/A	N/A	N/A

Observaciones:
LOS VALORES INDICADOS EN ESTE DOCUMENTO FUERON VALIDADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y LOS MISMOS SE GUARDAN EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑÍA.

MEDIDA A= Ancho de perfil
MEDIDA B= Altura de Perfil

1 MICRA ZINC = 7.14 g/m²
1Mpa.= 10.2 Kg./Cm2

G 60 / Z180 = 25.2 Micras ambas caras recubrimiento
G 90 / Z270 = 38.5 Micras ambas caras recubrimiento

Jonathan Campoverde
Responsable de calidad

IPAC DITH Group

CERTIFICADO DE CALIDAD MATERIA PRIMA

CC FOR 21 Ver 05 09 22

Matriz:
Km. 10.5 vía Daule, Guayaquil. Ecuador
Teléfono: 593-4-2110260 Fax: 593-4-2110951
www.ipac-acero.com
Sistema de Gestión Certificado bajo normas ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004

Nº Certificado: 100000000051435
Documento #: 8500001235
Cliente: AGOFER SAS
Dirección: CALLE 12A N 38 - 45 BOGOTA - COLOMBIA
Observación: ODC 94298 DESP JUNIO
Código interno: AGOF_C001_09_24

Nº Factura E.: 001002000027566
Pedido: 1300002655
Fecha: 06/09/2024
P. NANDINA: 7306.61.00.000000;7306.30.99.000000;7216.61.00.000

Descripción de producto	Unidades/ Peso	Lote	Norma tolerancia	Calidad de material	Tipo material	No pedido interno	Colada Acero MP	Esf. Ts Ft (Mpa)	Esf. Ys Fy (Mpa)	% Elong
ESTRUCT. CORREAS ESPECIALES										
C. 305X80X19X2.00X6000 mm GB	7.000	8001732-01	NTE INEN 1623, NTC 5685,	ASTM A 653 SS37 G90	GB	4800000690	JA403036LBD0HH00S	390	298	34
PERFIL ESTRUCT. CORREAS GB										
C. 220X80X19X1.50X6000 mm GB	5.000	8001533-01	NTE INEN 1623, NTC 5685,	ASTM A 653 CS B G90	GB	4800000607	JP365622F0D0HH00S	396	322	32
C. 220X80X19X2.00X6000 mm GB	6.000	8001531-01	NTE INEN 1623, NTC 5685,	ASTM A 653 CS B G90	GB	4800000607	JP365620F0D0HH00S	396	314	32
C. 305X80X19X1.50X6000 mm GB	2.000	8001734-01	NTE INEN 1623, NTC 5685,	ASTM A 653 CS B G90	GB	4800000632	JP403437F0D0HH00S	392	317	36

Descripción de producto	COMPOSICIÓN QUÍMICA %								TOLERANCIAS DIMENSIONALES mm				ATRIBUTOS/ENSAYOS					
	C	Mn	Si	S	P	Fe	Si eq	Ceq	Espesor (mm)	Medida A	Medida B	Escuadra	Flecha Transversal	Flecha Longitudinal	Torcedura	Asp. Galvanizado	Asp. Superficial	Rotulado
ESTRUCT. CORREAS ESPECIALES																		
C. 305X80X19X2.00X6000 mm GB	0.052	0.16	0.032	0.009	0.013	99.734	0.06	0.08	-0.10+ 0.10	-1.50+ 1.50	-1.50+ 1.50	-2.00+ 2.00	+ 12.0	+ 12.0	+ 9.00	N/A	N/A	N/A
PERFIL ESTRUCT. CORREAS GB																		
C. 220X80X19X1.50X6000 mm GB	0.032	0.26	0.013	0.017	0.019	99.659	0.06	0.08	-0.08+ 0.08	-1.50+ 1.50	-1.50+ 1.50	-2.00+ 2.00	+ 12.0	+ 12.0	+ 9.00	N/A	N/A	N/A
C. 220X80X19X2.00X6000 mm GB	0.032	0.26	0.013	0.017	0.017	99.661	0.06	0.08	-0.10+ 0.10	-1.50+ 1.50	-1.50+ 1.50	-2.00+ 2.00	+ 12.0	+ 12.0	+ 9.00	N/A	N/A	N/A
C. 305X80X19X1.50X6000 mm GB	0.044	0.17	0.047	0.013	0.013	99.713	0.08	0.08	-0.08+ 0.08	-1.50+ 1.50	-1.50+ 1.50	-2.00+ 2.00	+ 12.0	+ 12.0	+ 9.00	N/A	N/A	N/A

Observaciones:
LOS VALORES INDICADOS EN ESTE DOCUMENTO FUERON VALIDADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y LOS MISMOS SE GUARDAN EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑÍA.

MEDIDA A= Ancho de perfil
MEDIDA B= Altura de Perfil
1 MICRA ZINC = 7.14 g/m²
1Mpa.= 10.2 Kg./Cm2
G 60 / Z180 = 25.2 Micras ambas caras recubrimiento
G 90 / Z275 = 38.9 Micras ambas caras recubrimiento

Jonathan Campoverde
Responsable de calidad

GERDAU DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia. C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

Nº: 10008131382397

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
AGOFER CARTAGENA	**9007499917/100**	**OC91930**	**10881768/000100**	**NTC 1920-SAE 1015**	**4.000**

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415										
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V
109000521	PLT NTC 1920 2"x1/8" 6m	1726055901	GR 36	0,16	0,50	0,014	0,017	0,16	0,31	0,10	0,17	0,02	0,002	0,002
Rangos de referencia según norma				máx 0,2300%	máx 1,3500%	máx 0,0400%	máx 0,0500%	máx 0,4000%						

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	Alargamiento	Masa Lineal			Espeso	Ancho			
109000521	PLT NTC 1920 2"x1/8" 6m	1726055901	NA	363	499	24,9	1,233			3,24	50,15			
Rangos de referencia según norma				min 250,0 MPa	400,0 - 550,0 MPa	min 20,00%				3,00 - 3,36 mm	50,01 - 51,59 mm			

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

Gerdau Diaco certifica que para la producción de nuestro acero, el porcentaje de contenido reciclado mínimo post-consumo corresponde al 90%.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA. 26.03.2024

PAOLA KATHERIN MATEUS

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
CORREDOR DE CARGA PALERMO VIA PUERTO
COREMAR, Barranquilla, Colombia. C.P - 477008

Nº: 70238131568266

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
AGOFER CARTAGENA	**9007661008/20**	**OC 106306**	**11038344/000020**	**NTC 2289**	**34.964**

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110007646	BAR COR NTC 2289 1/2" 6M IMP GG	2110302402	GR 60	0,27	0,84	0,018	0,030	0,22	0,23	0,06	0,11	0,02	0,002	0,001	0,43
110007646	BAR COR NTC 2289 1/2" 6M IMP GG	2110303002	GR 60	0,27	0,83	0,016	0,030	0,20	0,24	0,07	0,10	0,02	0,002	0,001	0,42
110007646	BAR COR NTC 2289 1/2" 6M IMP GG	2110303102	GR 60	0,26	0,81	0,016	0,035	0,19	0,25	0,08	0,10	0,02	0,001	0,001	0,42
110007646	BAR COR NTC 2289 1/2" 6M IMP GG	2110303202	GR 60	0,28	0,84	0,014	0,036	0,20	0,26	0,08	0,10	0,02	0,002	0,001	0,44
110007646	BAR COR NTC 2289 1/2" 6M IMP GG	2110303302	GR 60	0,26	0,84	0,018	0,031	0,19	0,26	0,07	0,13	0,02	0,002	0,001	0,42
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa	Ángulo	
110007646	BAR COR NTC 2289 1/2" 6M IMP GG	2110302402	4	477	607	1,27	18,7	0,951	OK	8,13	0,91	2,63	58	
110007646	BAR COR NTC 2289 1/2" 6M IMP GG	2110303002	4	482	624	1,30	18,8	0,970	OK	8,10	0,78	2,70	58	
110007646	BAR COR NTC 2289 1/2" 6M IMP GG	2110303102	4	484	618	1,28	20,1	0,968	OK	8,13	0,82	2,78	58	
110007646	BAR COR NTC 2289 1/2" 6M IMP GG	2110303202	4	484	623	1,29	20,0	0,963	OK	8,14	0,84	2,76	57	
110007646	BAR COR NTC 2289 1/2" 6M IMP GG	2110303302	4	492	623	1,27	19,9	0,962	OK	8,20	0,86	2,70	58	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,934 kg/m		máx 8,90 mm	mín 0,51 mm	máx 4,90 mm	mín 45,0 deg	

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
CORREDOR DE CARGA PALERMO VIA PUERTO
COREMAR, Barranquilla, Colombia. C.P - 477008

Nº: 70238131568266

OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE CALIDAD
Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.	BARRANQUILLA. 25.04.2025 LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

ANEXO 5: PÓLIZAS APROBADAS

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.18 09:33:34 -05:00

Código de Seguridad: BVjPUtsEloXKRWhQMRwJxA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14830060	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	CENTRO DIAG. 30 N 30 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6411370
BENEFICIARIO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	CENTRO DIAG. 30 N 30 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6411370

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 70,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/09/2023	24:00 Horas Del 30/04/2024	1.473.838.372,00	2.228.928,17
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/09/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	368.459.593,00	2.919.411,35
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	1.473.838.372,00	14.754.535,37
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.316.136.337,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	19.902.874,89
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	19.902.874,89
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	3.783.028,23
TOTAL A PAGAR	$	23.693.703,12

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

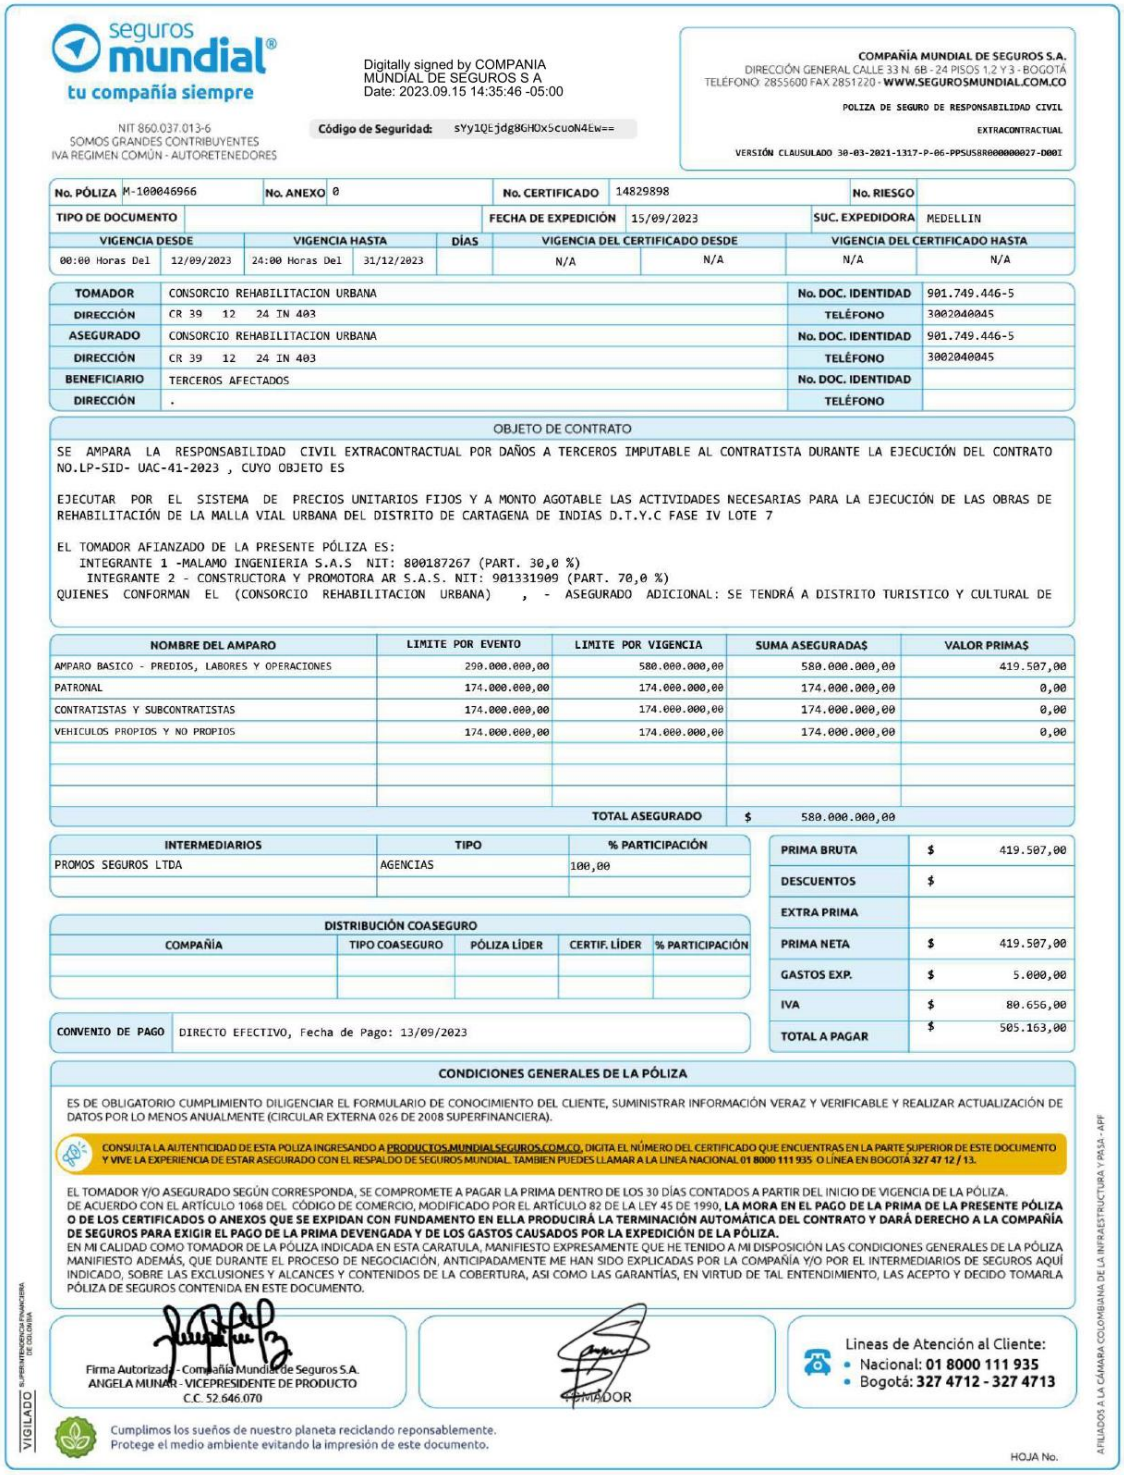
Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.15 14:35:46 -05:00

Código de Seguridad: sYy1QEjdg8GHOx5cuoN4Ew==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001

No. PÓLIZA	M-100046966	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14829898	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 70,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	290.000.000,00	580.000.000,00	580.000.000,00	419.507,00
PATRONAL	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 580.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	419.507,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	419.507,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	80.656,00
TOTAL A PAGAR	$	505.163,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

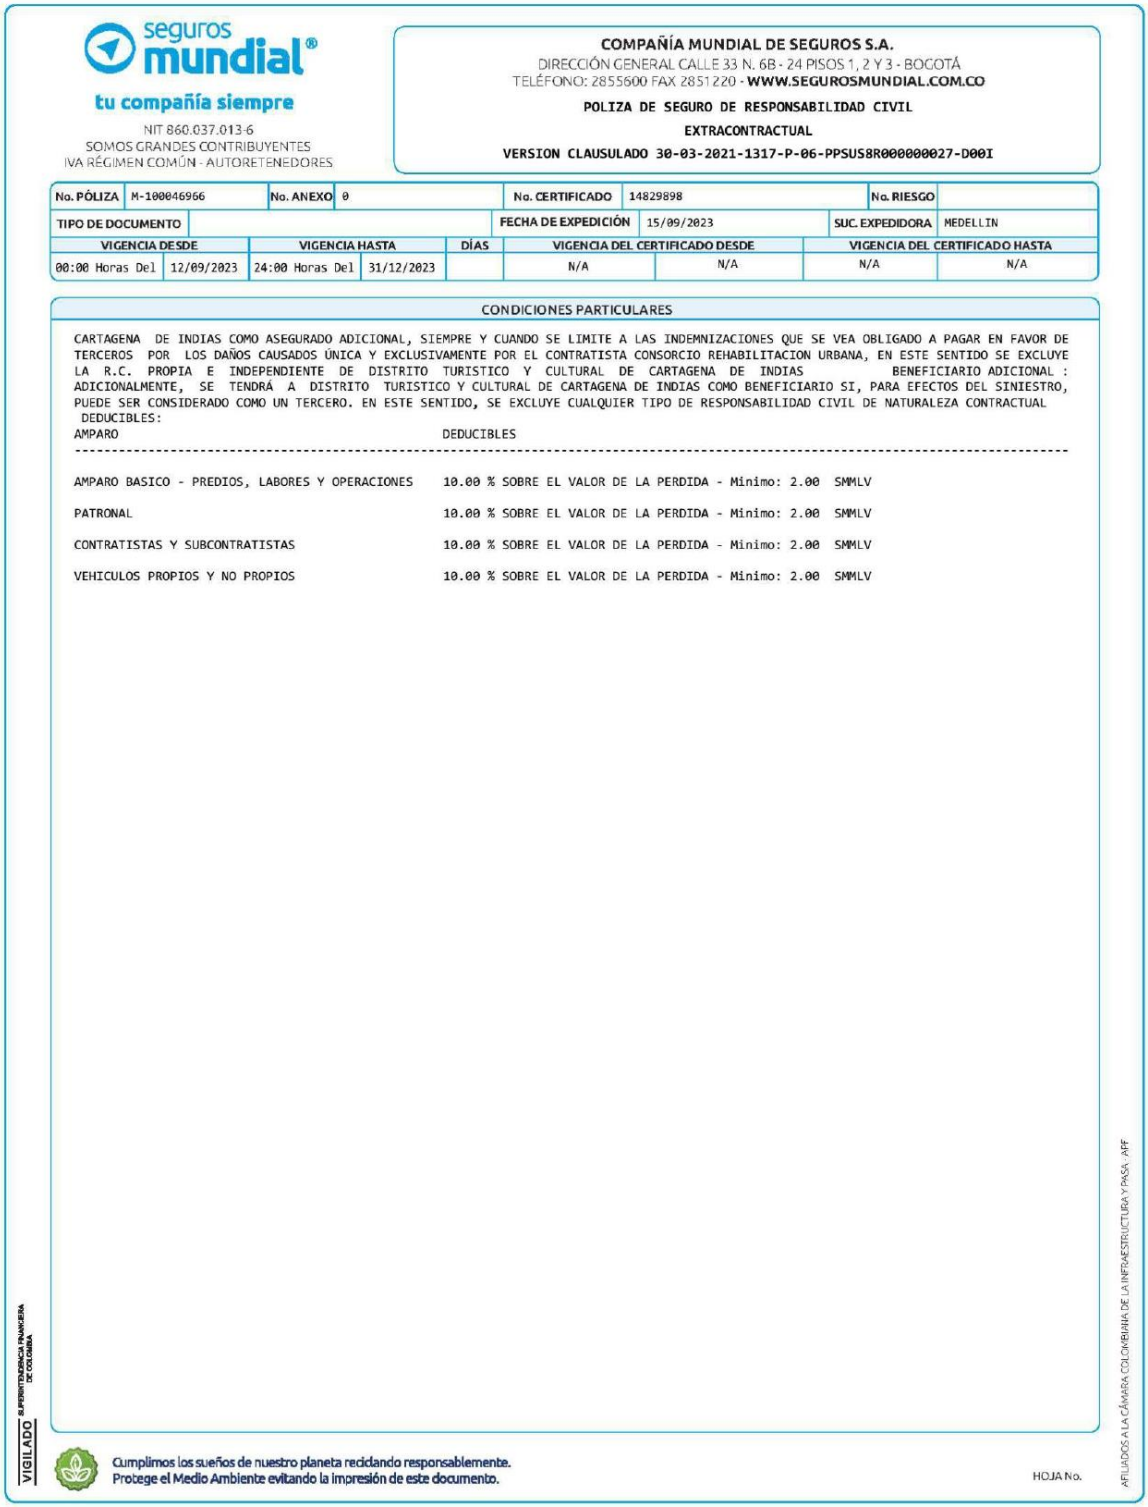
Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF



seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100046966	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14829898	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CARTAGENA DE INDIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACION URBANA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.20 12:30:20 -05:00

Código de Seguridad: f/218H+pl6DDFD1E6L/5Nw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	14830941	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	CENTRO DIAG. 30 N 30 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6411370
BENEFICIARIO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	CENTRO DIAG. 30 N 30 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6411370

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA CITADA, SE ACLARA QUE LA FECHA DE INICIO DE LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS ES 12/09/2023
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/09/2023	24:00 Horas Del 30/04/2024	1.473.838.372,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/09/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	368.459.593,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	1.473.838.372,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.316.136.337,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

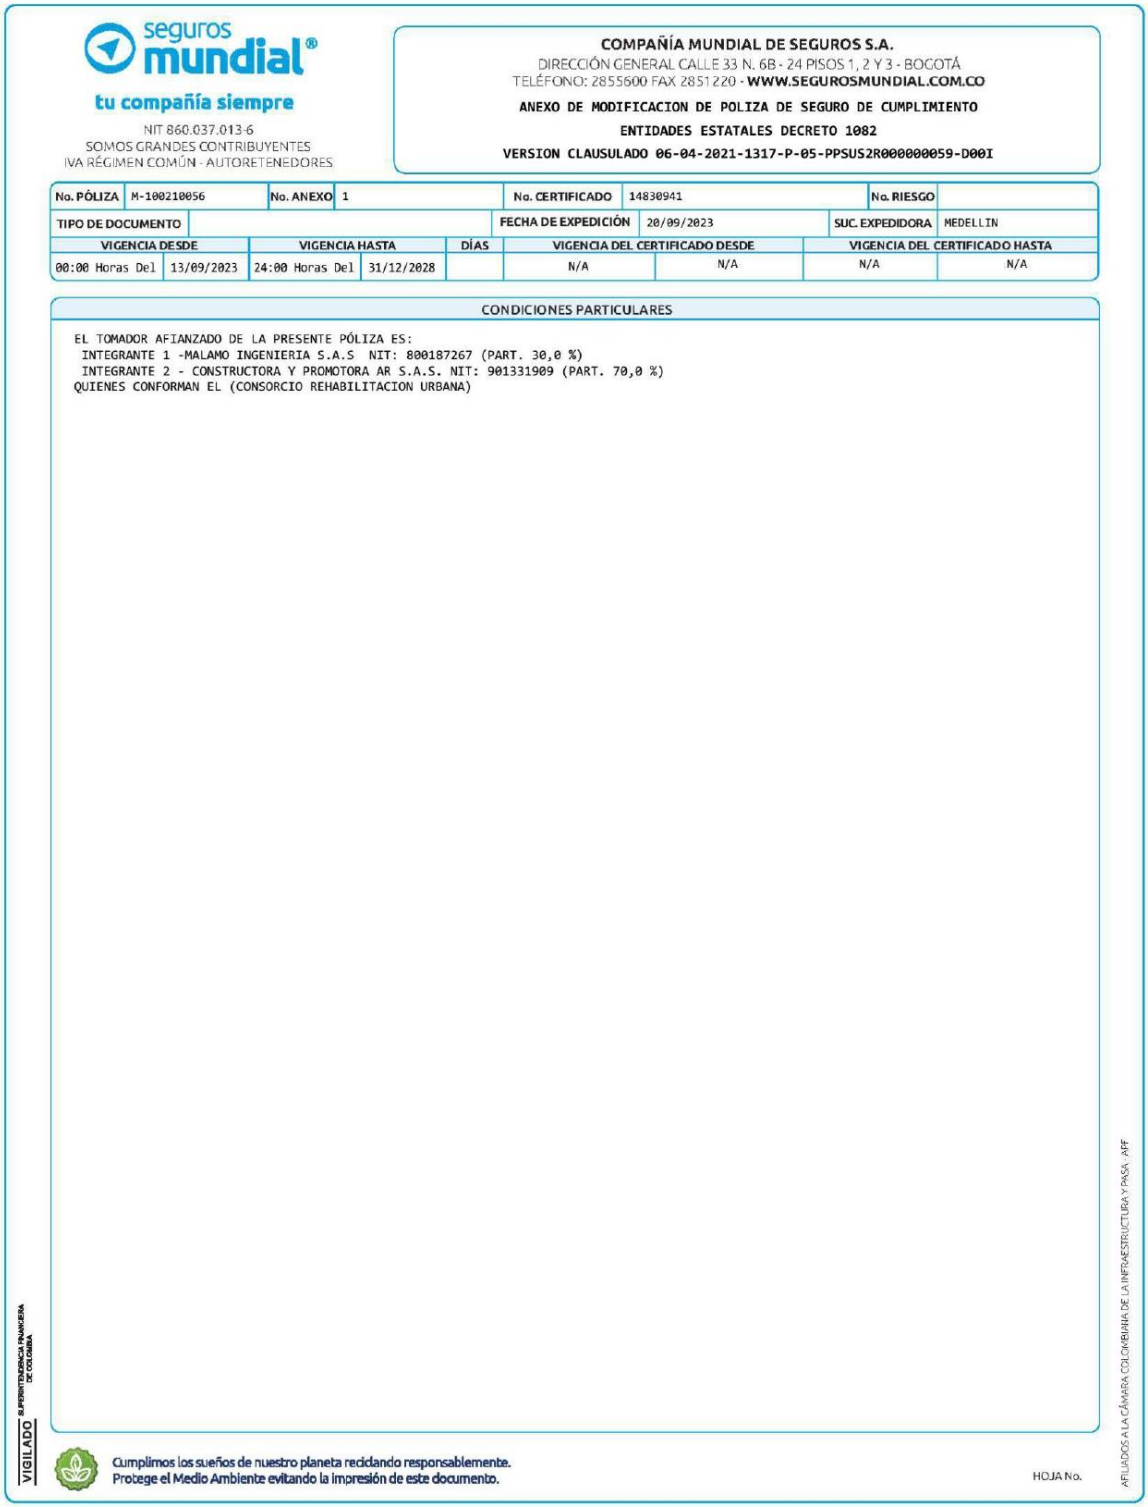
Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF



seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	14830941	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 70,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: UUd7zTAHcCnt82N22rLMXw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	14845830	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	31/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 30 NO. 30 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6643073
BENEFICIARIO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 30 NO. 30 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6643073

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO ACTA DE INICIO DE FECHA 14/11/2023, POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA LA VIGENCIA DE CADA UNO DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 14/11/2023	24:00 Horas Del 30/04/2024	1.473.838.372,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 14/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	368.459.593,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	1.473.838.372,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.316.136.337,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

LUIS EDUARDO PALLARES LAGUNA
C.C 73.184.532
REP. LEGAL
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	14845830	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	31/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO:
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 70,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: h8fPzrUrlamSeVgYsySYlA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100046966	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	14843901	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2023	24:00 Horas Del	03/03/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA CITADA, SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DEL CONTRATO LP-SID-UAC-041-2023- LOTE 7 , SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 14/11/2023.
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	290.000.000,00	580.000.000,00	580.000.000,00	419.507,00
PATRONAL	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 580.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	419.507,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	419.507,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	80.656,00
TOTAL A PAGAR	$	505.163,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 14/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

LUIS EDUARDO PALLARES LAGUNA
C.C 73.184.532
REP. LEGAL
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100046966	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	14843901	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2023	24:00 Horas Del	03/03/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 70,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACION URBANA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 0aGCG9yjOiLnEmJuqmfbEw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	14847549	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	31/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 30 NO. 30 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6643073
BENEFICIARIO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 30 NO. 30 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6643073

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA EL PORCENTAJE (%) DE PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS.

INTEGRANTE 1 - MALAMO INGENIERIA S.A.S. NIT: 800187267 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 30,0 %)

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP-SID- UAC-41-2023

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 14/11/2023	24:00 Horas Del 30/04/2024	1.473.838.372,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 14/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	368.459.593,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	1.473.838.372,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.316.136.337,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

LUIS EDUARDO PALLARES LAGUNA
C.C 73.184.532
REP. LEGAL
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	14847549	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	31/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

, CUYO OBJETO ES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 30,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 6ptSF4PbUYpjkMhRp+iDjw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100046966	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	14847445	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2023	24:00 Horas Del	03/03/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA EL PORCENTAJE (%) DE PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS.
INTEGRANTE 1 - MALAMO INGENIERIA S.A.S. NIT: 800187267 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 30,0 %)

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	290.000.000,00	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00
PATRONAL	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 580.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

LUIS EDUARDO PALLARES LAGUNA
C.C 73.184.532
REP. LEGAL
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100046966	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	14847445	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2023	24:00 Horas Del	03/03/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NO.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 30,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA) ,
- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACION URBANA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: NSKKNMmMhzKc+TxDFHdg9w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	14861291	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/01/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	17/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 30 NO. 30 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6643073
BENEFICIARIO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 30 NO. 30 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6643073

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO ACTA DE SUSPENSION NO. 1 DE FECHA 29/12/2023 Y DEL ACTA DE REINICIO 01-2024, DE FECHA 15/01/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A ACTUALIZAR LA VIGENCIA DE CADA UNO DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO:
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/12/2023	24:00 Horas Del 17/05/2024	1.473.838.372,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/12/2023	24:00 Horas Del 17/01/2027	368.459.593,00	41.186,72
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 17/01/2024	24:00 Horas Del 17/01/2029	1.473.838.372,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.316.136.337,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	41.186,72
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	41.186,72
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	7.825,48
TOTAL A PAGAR	$	49.012,20

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/01/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Luis Eduardo Pallares Laguna
C.C 73.184.532
REP. LEGAL
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	14861291	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/01/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	17/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 30,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 1vTtVkD9KdSF7spVBVEAng==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100646966	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	14861427	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/01/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2023	24:00 Horas Del	20/03/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO ACTA DE SUSPENSION NO. 1 DE FECHA 29/12/2023 Y DEL ACTA DE REINICIO 01 2024, DE FECHA 15/01/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A ACTUALIZAR LA VIGENCIA DE CADA UNO DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	290.000.000,00	580.000.000,00	580.000.000,00	64.832,88
PATRONAL	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 580.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	64.832,88
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	64.832,88
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	12.318,25
TOTAL A PAGAR	$	77.151,13

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/01/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Luis Eduardo Pallares Laguna
C.C 73.184.532
REP. LEGAL
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100046966	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	14861427	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/01/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2023	24:00 Horas Del	20/03/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 30,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA) ,
- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACION URBANA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACION URBANA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: aRzhQA2KtCDP/mBrzikrzA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	14862689	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	17/02/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 30 NO. 30 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6643073
BENEFICIARIO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 30 NO. 30 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6643073

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO OTROSÍ 01 AL CONTRATO No. LP-SID-UAC-041-2023 - LOTE 7, DE FECHA 16/01/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A PRORROGAR LA VIGENCIA DE LA POLIZA POR EL TERMINO DE UN (1) MES MAS, HASTA EL DIA 17/02/2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO:
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 16/01/2024	24:00 Horas Del 17/06/2024	1.473.838.372,00	300.420,75
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 16/01/2024	24:00 Horas Del 17/02/2027	368.459.593,00	75.105,19
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 17/02/2024	24:00 Horas Del 17/02/2029	1.473.838.372,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.316.136.337,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	375.525,94
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	375.525,94
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	71.349,93
TOTAL A PAGAR	$	446.875,87

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

LUIS EDUARDO PALLARES LAGUNA
C.C 73.184.532
REP. LEGAL
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	14862689	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	17/02/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 30,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: xZWpOWKF5EybwthpM9j/cw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100046966	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	14862758	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2023	24:00 Horas Del	20/04/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO OTROSÍ 01 AL CONTRATO No. LP-SID-UAC-041-2023 - LOTE 7, DE FECHA 16/01/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A PRORROGAR LA VIGENCIA DE LA POLIZA POR EL TERMINO DE UN (1) MES MAS.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	290.000.000,00	580.000.000,00	580.000.000,00	118.224,66
PATRONAL	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 580.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	118.224,66
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	118.224,66
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	22.462,69
TOTAL A PAGAR	$	140.687,35

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/01/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

LUIS EDUARDO PALLARES LAGUNA
C.C 73.184.532
REP. LEGAL
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100046966	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	14862758	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2023	24:00 Horas Del	20/04/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 30,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA) ,
- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACION URBANA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACION URBANA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: KKKQPbFOuB+MxJvg/m84QA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	14866681	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 30 NO. 30 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6643073
BENEFICIARIO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 30 NO. 30 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6643073

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL OTROSÍ 2 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SID-UAC-041-2023- LOTE 7 DE FECHA 12/02/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A PRORROGAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 30/04/2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO:
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 12/02/2024	24:00 Horas Del 30/08/2024	1.473.838.372,00	717.133,41
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 12/02/2024	24:00 Horas Del 30/04/2027	368.459.593,00	174.437,86
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 30/04/2029	1.473.838.372,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.316.136.337,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	891.571,27
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	891.571,27
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	169.398,54
TOTAL A PAGAR	$	1.060.969,81

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

LUIS EDUARDO PALLARES LAGUNA
C.C 73.184.532
REP. LEGAL
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	14866681	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 30,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: taJb8eJRAPRGIVALH3mktQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100046966	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	14866683	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL OTROSÍ 2 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SID-UAC-041-2023- LOTE 7 DE FECHA 12/02/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A PRORROGAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 30/04/2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	325.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	334.750,68
PATRONAL	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 650.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	334.750,68
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	334.750,68
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	63.602,63
TOTAL A PAGAR	$	398.353,31

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

LUIS EDUARDO PALLARES LAGUNA
C.C 73.184.532
REP. LEGAL
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100046966	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	14866683	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

No.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 30,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA) ,
- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACION URBANA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACION URBANA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: JYTL7YiUb6yifhLJ8h2Z2g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	14882412	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	29/06/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 30 NO. 30 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6643073
BENEFICIARIO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 30 NO. 30 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6643073

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-SID-UAC-041-2023 -LOTE 7- DE FECHA 30/04/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A PRORROGAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE 60 DIAS MAS, HASTA EL DIA 29/06/2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO:
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 29/10/2024	1.473.838.372,00	581.459,32
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 29/06/2027	368.459.593,00	145.364,88
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 29/06/2024	24:00 Horas Del 29/06/2029	1.473.838.372,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.316.136.337,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	726.824,20
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	726.824,20
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	138.096,60
TOTAL A PAGAR	$	864.920,80

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

LUIS EDUARDO PALLARES LAGUNA
C.C 73.184.532
REP. LEGAL
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	14882412	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	29/06/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 30,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: AM62gZjAUXQP27xYGB5tjg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100046966	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	14882413	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2023	24:00 Horas Del	29/08/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

VÁLIDOPOR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No. LP SID UAC 041 2023 LOTE 7 DE FECHA 30/04/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A PRORROGAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE 60 DIAS MAS, HASTA EL DIA 29/06/2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO:
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	325.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	256.438,36
PATRONAL	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 650.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	256.438,36
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	256.438,36
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	48.723,29
TOTAL A PAGAR	$	305.161,65

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

LUIS EDUARDO PALLARES LAGUNA
C.C 73.184.532
REP. LEGAL
TOMADOR

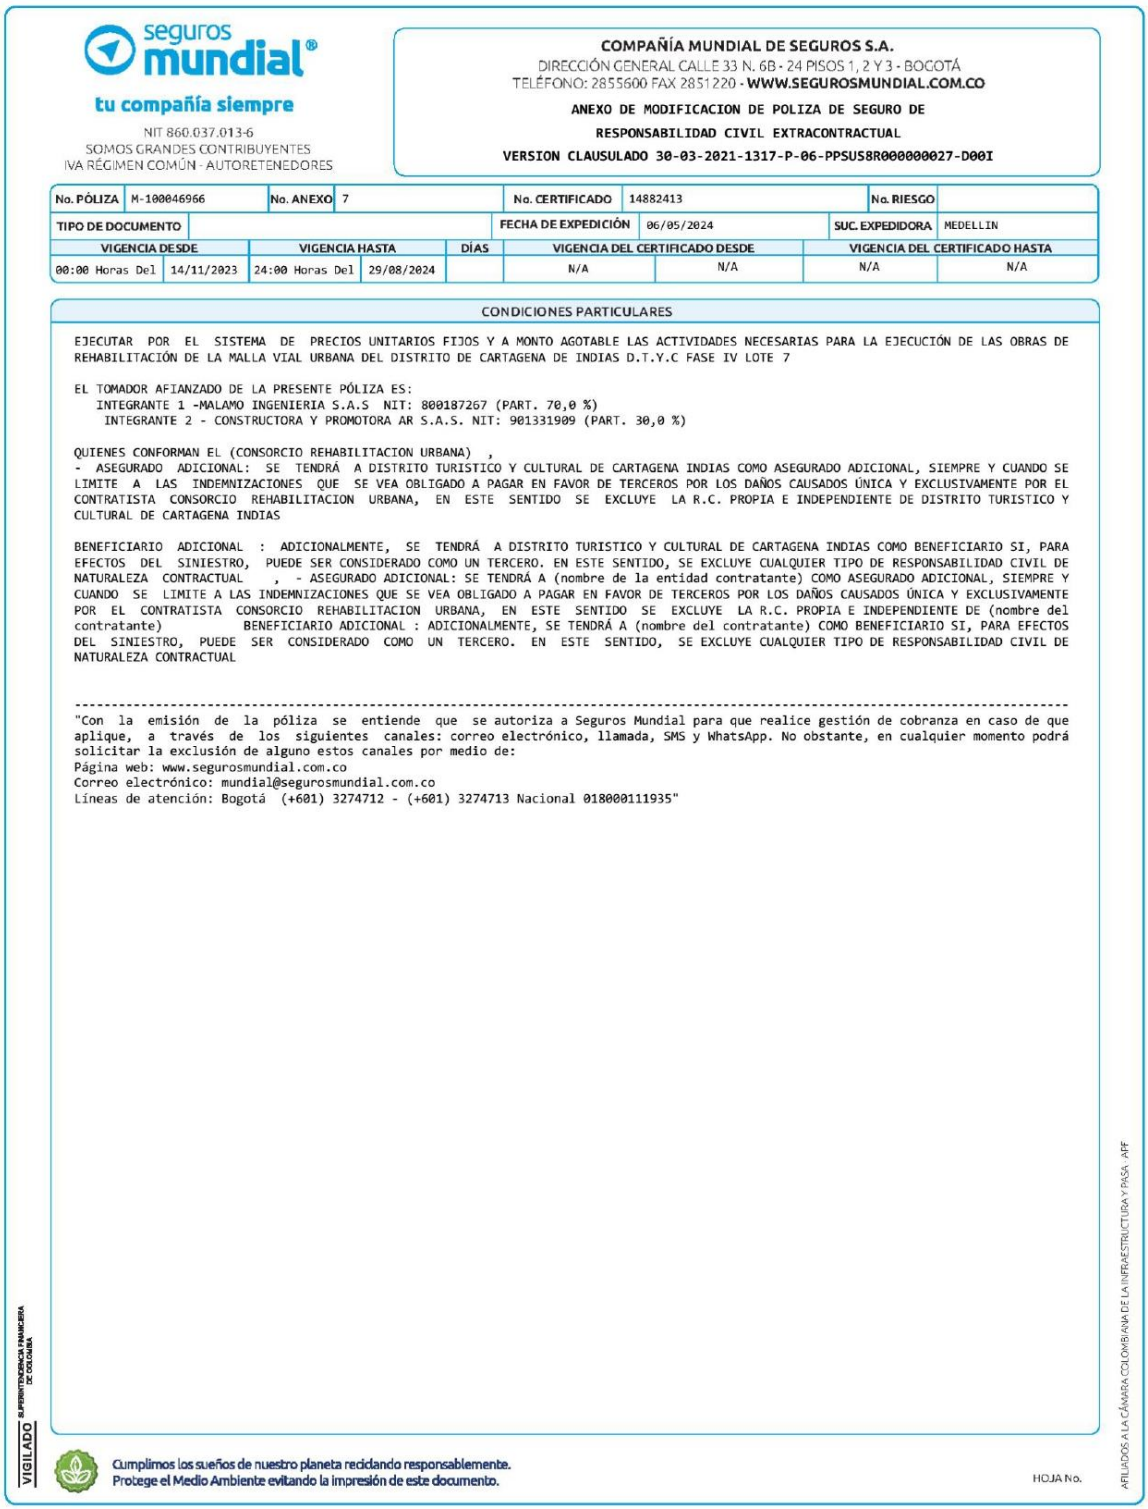
Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF



seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100046966	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	14882413	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/05/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2023	24:00 Horas Del	29/08/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 30,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA) ,
- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACION URBANA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACION URBANA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: /3Ifd43kSUpFbJ/mzuqpGQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	14895674	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	28/08/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 30 NO. 30 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6643073
BENEFICIARIO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 30 NO. 30 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6643073

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL OTROSÍ No. 4 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-SID-UAC-041-2023 -LOTE 7- DE FECHA 29/06/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A PRORROGAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE 60 DIAS MAS, HASTA EL DIA 28/08/2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO:
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/06/2024	24:00 Horas Del 28/12/2024	1.473.838.372,00	581.459,32
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/06/2024	24:00 Horas Del 28/08/2027	368.459.593,00	145.364,88
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 28/08/2024	24:00 Horas Del 28/08/2029	1.473.838.372,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.316.136.337,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	726.824,20
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	726.824,20
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	138.096,60
TOTAL A PAGAR	$	864.920,80

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

LUIS EDUARDO PALLARES LAGUNA
C.C 73.184.532
REP. LEGAL
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	14895674	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	28/08/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 30,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: il/HntRwPZunytmnS5ChGA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100046966	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	14895678	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2023	24:00 Horas Del	28/10/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL OTROSÍ No. 4 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-SID-UAC-041-2023 -LOTE 7- DE FECHA 29/06/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A PRORROGAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE 60 DIAS MAS, HASTA EL DIA 28/08/2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	325.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	256.438,36
PATRONAL	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 650.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	256.438,36
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	256.438,36
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	48.723,29
TOTAL A PAGAR	$	305.161,65

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

LUIS EDUARDO PALLARES LAGUNA
C.C 73.184.532
REP. LEGAL
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100046966	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	14895678	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2023	24:00 Horas Del	28/10/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 30,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA) ,
- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACION URBANA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACION URBANA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: XHLAJ9q6QDxwhbBwOEU+4g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	14911216	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	28/10/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 30 NO. 30 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6643073
BENEFICIARIO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 30 NO. 30 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6643073

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL OTROSÍ No. 5 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-SID-UAC-041-2023 -LOTE 7- DE FECHA 28/08/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A PRORROGAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE 2 MESES MAS, HASTA EL DIA 28/10/2024 Y A ADICIONAR AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE $3.680.010.128. VALOR TOTAL DEL CONTRATO $11.049.201.988.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO:
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/08/2024	24:00 Horas Del 28/02/2025	2.209.840.397,60	1.766.404,86
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 28/08/2024	24:00 Horas Del 28/10/2027	552.460.099,40	441.601,22
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 28/10/2024	24:00 Horas Del 28/10/2029	2.209.840.397,60	7.364.053,14
		TOTAL ASEGURADO	$ 4.972.140.894,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	9.572.059,22
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	9.572.059,22
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	1.818.691,25
TOTAL A PAGAR	$	11.390.750,47

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Luis Eduardo Pallares Laguna
C.C 73.184.532
REP. LEGAL
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	14911216	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	28/10/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 30,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: mpPp+OZvBWEs5eVLwAcZnw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100046966	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	14911217	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2023	24:00 Horas Del	28/01/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL OTROSÍ No. 5 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-SID-UAC-041-2023 -LOTE 7- DE FECHA 28/08/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A PRORROGAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE 2 MESES MAS, HASTA EL DIA 28/10/2024 Y A ADICIONAR AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE $3.680.010.128. VALOR TOTAL DEL CONTRATO $11.049.201.988.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	325.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	1.560.000,00
PATRONAL	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 650.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/09/2024	

PRIMA BRUTA	$	1.560.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.560.000,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	296.400,00
TOTAL A PAGAR	$	1.856.400,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Luis Eduardo Pallares Laguna
C.C: 73.184.532
Rep. Legal
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100046966	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	14911217	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2023	24:00 Horas Del	28/01/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO:
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 30,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA) ,
- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACION URBANA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACION URBANA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: aKq2wvD3RfMJLM5mP11fLQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	14925795	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	27/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	CENTRO DIAG 30 # 30 - 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6643073
BENEFICIARIO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	CENTRO DIAG 30 # 30 - 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6643073

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL OTROSÍ No. 6 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-SID-UAC-041-2023 -LOTE 7- DE FECHA 28/10/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A PRORROGAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE 2 MESES MAS, HASTA EL DIA 27/12/2024.
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
OBJETO:
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/10/2024	24:00 Horas Del 27/04/2025	2.209.840.397,60	842.766,53
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 28/10/2024	24:00 Horas Del 27/12/2027	552.460.099,40	217.956,86
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 27/12/2024	24:00 Horas Del 27/12/2029	2.209.840.397,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 4.972.140.894,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.060.723,39
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.060.723,39
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	201.537,44
TOTAL A PAGAR	$	1.262.260,83

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/10/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Luis Eduardo Pallares Laguna
c.c 73.184.532
Representante legal
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	14925795	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	27/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 30,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ogiZNCAVnLcjlXDBqPO+gQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100046966	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	14925799	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2023	24:00 Horas Del	27/02/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL OTROSÍ No. 6 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-SID-UAC-041-2023 -LOTE 7- DE FECHA 28/10/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A PRORROGAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE 2 MESES MAS, HASTA EL DIA 27/12/2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO:
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	325.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	1.560.000,00
PATRONAL	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 650.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.560.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.560.000,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	296.400,00
TOTAL A PAGAR	$	1.856.400,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/10/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Luis Eduardo Pallares Laguna
C.C: 73.184.532
Representante legal
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100046966	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	14925799	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2023	24:00 Horas Del	27/02/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 30,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA) ,
- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACION URBANA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACION URBANA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: mUn+T7GTG0eB2Qkc0Syi3g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	14954937	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	11/03/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	CENTRO DIAG 30 # 30 - 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6643073
BENEFICIARIO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.480.184-4
DIRECCIÓN	CENTRO DIAG 30 # 30 - 78 PLAZA ADUANA	**TELÉFONO**	6643073

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS ACTA DE REINICIO DE FECHA 10/02/2025 Y OTROSÍ No. 7 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-SID-UAC-041-2023 -LOTE 7 DE FECHA 11/02/2025 POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL DIA 11/03/2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO:
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 10/02/2025	24:00 Horas Del 11/07/2025	2.209.840.397,60	1.089.784,31
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 10/02/2025	24:00 Horas Del 11/03/2028	552.460.099,40	272.446,08
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 11/03/2025	24:00 Horas Del 11/03/2030	2.209.840.397,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 4.972.140.894,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.362.230,39
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.362.230,39
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	258.823,77
TOTAL A PAGAR	$	1.621.054,16

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 14/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Luis Eduardo Pallares Laguna
C.C 73.184.532
REP. LEGAL
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100210056	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	14954937	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	11/03/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 30,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: SjTzl6d4Q9bLHlvjEwEvWQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100046966	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	14954778	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2023	24:00 Horas Del	11/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
ASEGURADO	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.749.446-5
DIRECCIÓN	CR 39 12 24 IN 403	**TELÉFONO**	3002040045
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS ACTA DE REINICIO DE FECHA 10/02/2025 Y OTROSÍ No. 7 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-SID-UAC-041-2023 -LOTE 7 DE FECHA 11/02/2025 POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL DIA 11/03/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
OBJETO:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.LP-SID- UAC-41-2023 , CUYO OBJETO ES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	355.875.000,00	711.750.000,00	711.750.000,00	464.666,30
PATRONAL	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 711.750.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	464.666,30
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	464.666,30
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	88.286,60
TOTAL A PAGAR	$	552.952,90

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 14/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Luis Eduardo Pallares Laguna
C.C 73.184.532
Rep. legal
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100046966	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	14954778	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2023	24:00 Horas Del	11/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. NIT: 901331909 (PART. 30,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO REHABILITACION URBANA) ,
- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACION URBANA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA INDIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACION URBANA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

ANEXO 5: CERTIFICADO DE CALIDAD GEOTEXTIL

CALYPSO®
UN MUNDO DE SOLUCIONES

MIEMBRO DE
SPRADLING GROUP INC.

CERTIFICADO DE CALIDAD

Referencia:	TELA GEOTEXTIL 4X100M M2 (220 g)
Codigo:	BBP02553
Pedido:	A17756

Características	UM	Especificación	Resultado promedio
Ancho Tela	cm	400 ± 2	400,4
Masa por área	g/m2	220 ± 10%	217,0

Características	UM	Especificación Minima	Resultado Promedio Medición	NORMA
Resistencia a la Tensión trama	kgf/50mm	198,72	246,6	ASTM D 4632
	N/cm	390	483,8	
Resistencia a la Tensión Urdimbre	kgf/50mm	214,27	247,2	
	N/cm	420	485,0	

B/QUILLA: CLL 32 No 42- 48 PBX: 3403192-3403451 CEL: 312 5888597
SUC B/QUILLA: CALLE 53 No 46 – 133 PBX: 3443030-3850031-04 CEL: 3204884243
SUC. C/GENA: AV. DANIEL LEMAITRE No 10C – 22 PBX: 6644582 CEL: 3204884189
SUC. C/GENA 2: BOSQUE TRANSVERSAL 54 No. 27-204 PBX: 6445706 – 6445381 CEL: 3203444221
SUC. MONTERIA: CLL 36 No 5 – 52 PBX: 7820151 CEL: 3013592362
VALLEDUPAR: CRA 7A No 20B – 107 CEL: 3102154514
www.spradling.group / Email: calypso.barranquilla@spradling.group
