Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONSORCIO CARVI

OBJETO:	CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA

La Nación - Consejo Superior de la Judicatura– Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

CONTRATO No.	12-OBR009 DE 2024	**FECHA DE INICIO**	27 DE DICIEMBRE DE 2024	**VALOR INICIAL**	$ 1,889,339,990.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CARVI	**FECHA DE TERMINACION**	30 DE MAYO DE 2025	**VALOR ADICIONAL**	$ 222,188,954.29
REPRESENTANTE LEGAL	ALBA VIVIANA TORRES USECHE	**PLAZO INICIAL**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE	**VALOR TOTAL**	$ 2,111,528,944.29
INTERVENTOR	CONSORCIO JR	**PLAZO ADICIONAL**	5 MESES		
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS MARIA RUIZ PEREZ	**PLAZO FINAL**	5 MESES	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**	
SUPERVISOR	HERMES TOVAR CUELLAR	**FECHA DEL ACTA**	30 DE MAYO DE 2025		

I. OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE - ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N° 3		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACTA PARCIALES ANTERIORES		ACUMULADO TOTAL ACTAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR			CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**												
	PRELIMINARES												
1.1	Ajustes de diseño , memorias de cantidades y balance	M2	1012.4	$ 10,972.00	$ 11,107,504.20	1514.68	$ 16,619,119.43			1514.68	$ 16,619,119.43	1,514.68	$ 16,619,119.43
1.2	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios	ML	20	$ 17,875.00	$ 357,500.00	20.00	$ 357,500.00			20.00	$ 357,500.00	20.00	$ 357,500.00
	DESMONTES Y DEMOLICIONES												
1.3	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	15	$ 42,402.00	$ 636,030.00								
1.4	Desmonte divisiones baño. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	15	$ 23,750.00	$ 356,250.00	14.36	$ 341,145.00			14.36	$ 341,145.00	14.36	$ 341,145.00
1.5	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	300	$ 23,725.00	$ 7,117,500.00	430.98	$ 10,225,104.89			430.98	$ 10,225,104.89	430.98	$ 10,225,104.89
1.6	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	6	$ 48,140.00	$ 288,840.00	11.00	$ 529,540.00			11.00	$ 529,540.00	11.00	$ 529,540.00
1.7	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	66	$ 38,716.00	$ 2,555,256.00	24.00	$ 929,184.00			24.00	$ 929,184.00	24.00	$ 929,184.00
1.8	Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	1	$ 61,453.00	$ 61,453.00	57.00	$ 3,502,821.00			57.00	$ 3,502,821.00	57.00	$ 3,502,821.00
1.9	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2	140	$ 40,227.00	$ 5,631,780.00	421.07	$ 16,938,362.78			421.07	$ 16,938,362.78	421.07	$ 16,938,362.78
1.10	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	195	$ 39,432.00	$ 7,689,240.00	269.00	$ 10,607,208.00			269.00	$ 10,607,208.00	269.00	$ 10,607,208.00
1.11	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)	ML	120	$ 24,874.00	$ 2,984,880.00	89.96	$ 2,237,665.04			89.96	$ 2,237,665.04	89.96	$ 2,237,665.04
1.12	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	500	$ 7,634.00	$ 3,817,000.00	385.93	$ 2,946,189.62			385.93	$ 2,946,189.62	385.93	$ 2,946,189.62
1.13	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	120	$ 16,200.00	$ 1,944,000.00	401.00	$ 6,496,200.00			401.00	$ 6,496,200.00	401.00	$ 6,496,200.00
1.14	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	2500	$ 1,908.00	$ 4,770,000.00	3931.00	$ 7,500,348.00			3931.00	$ 7,500,348.00	3,931.00	$ 7,500,348.00
1.15	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte, trasiego necesarios y disposición final)	UN	2	$ 159,764.00	$ 319,528.00	6.00	$ 958,584.00			6.00	$ 958,584.00	6.00	$ 958,584.00
1.16	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición final)	UN	8	$ 14,090.00	$ 112,720.00								
1.17	Desmonte de Cielo Raso.	M2	1,012	$ 26,222.00	$ 26,545,841.70	1047.03	$ 27,455,126.26			1047.03	$ 27,455,126.26	1,047.03	$ 27,455,126.26
1.18	Desmonte de extractores en cielo raso. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1	$ 314,766.00	$ 314,766.00								
1.19	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	350	$ 32,753.00	$ 11,463,550.00	649.53	$ 21,274,056.09			649.53	$ 21,274,056.09	649.53	$ 21,274,056.09
1.20	Demolición de pañetes.	M2	50	$ 8,810.00	$ 440,500.00	47.64	$ 419,739.24			47.64	$ 419,739.24	47.64	$ 419,739.24
1.21	Demolición mortero de pisos e=+-5cm.	M2	55	$ 9,757.00	$ 540,928.08								
1.22	Demolición de Poceta aseo. (Incluye enchape, machones, equipos, trasiego y disposición final)	UN	1	$ 51,962.00	$ 51,962.00								
1.23	Demolición de enchapes Piso/Muro.	M2	66	$ 26,676.00	$ 1,772,353.44	1380.79	$ 36,834,079.42			1380.79	$ 36,834,079.42	1,380.79	$ 36,834,079.42
1.24	Demolición de Pisos baldosa granito y plantilla.	M2	50	$ 12,587.00	$ 629,350.00								
1.25	Demolición de guarda escoba.	ML	850	$ 5,488.00	$ 4,664,800.00	148.08	$ 812,663.04			148.08	$ 812,663.04	148.08	$ 812,663.04
1.26	Demolición Mesón en concreto.	M2	50	$ 29,884.00	$ 1,494,200.00								
1.27	Demolición de mesón en mármol.	ML	1	$ 24,659.00	$ 24,659.00								
1.28	Demolición de Dinteles en concreto.	ML	70	$ 20,430.00	$ 1,430,100.00								
1.29	Demolición muros en mampostería e=15cm.	M2	307.68	$ 42,619.00	$ 13,113,013.92	56.77	$ 2,419,651.11			56.77	$ 2,419,651.11	56.77	$ 2,419,651.11
1.30	Demolición muro mampostería ladrillo e=25 cm.	M2	1	$ 54,250.00	$ 54,250.00								
1.31	Demolición muro mampostería ladrillo e=40 cm.	M2	1	$ 76,751.00	$ 76,751.00								
1.32	Demolición de muro en fibrocemento.	M2	1	$ 36,342.00	$ 36,342.00								
1.33	Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes de estructura, accesorios, equipos)	M2	250	$ 32,897.00	$ 8,224,250.00	294.73	$ 9,695,880.85			294.73	$ 9,695,880.85	294.73	$ 9,695,880.85
1.34	Demolición de columnetas y viguetas en concreto reforzado.	ML	1	$ 22,666.00	$ 22,666.00								
1.35	Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso. (Incluye demolición, afinado, equipos, trasiego y disposición final)	UN	1	$ 284,890.00	$ 284,890.00								
1.36	Trasieqo, retiro y disposicion final de escombros y sobrantes.	M3	136.06	$ 157,410.00	$ 21,416,942.04	139.98	$ 22,034,454.58			139.98	$ 22,034,454.58	139.98	$ 22,034,454.58
2	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**												
2.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica flos, pintura)	M2	653.18	$ 137,904.00	$ 90,076,686.34	668.41	$ 92,176,136.83	19.96	$ 2,752,012.22	648.45	$ 89,424,124.61	668.41	$ 92,176,136.83
2.2	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica flos, pintura)	ML	1	$ 70,997.00	$ 70,997.00								
2.3	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica flos, pintura)	M2	1	$ 78,711.00	$ 78,711.00								
2.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica flos, pintura)	M2	1	$ 153,398.00	$ 153,398.00								
2.5	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica flos, pintura)	ML	1	$ 72,684.00	$ 72,684.00								
2.6	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm. Ancho <50 cm, con acabado pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica flos, pintura)	ML	1	$ 86,902.00	$ 86,902.00								
2.7	Aislamiento acústico interior tipo frescasa de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2	1	$ 25,600.00	$ 25,600.00								
3	**ALISTADO DE PISOS**												
3.1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	11	$ 48,307.00	$ 531,860.07	314.61	$ 15,197,961.88			314.61	$ 15,197,961.88	314.61	$ 15,197,961.88
4	**PAÑETES**												
4.1	Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	55	$ 38,635.00	$ 2,124,925.00	78.08	$ 3,016,756.02			78.08	$ 3,016,756.02	78.08	$ 3,016,756.02
4.2	Regata con pulidora en piso. (Incluye equipos)	ML	250	$ 42,398.00	$ 10,599,500.00								
4.3	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	ML	250	$ 32,244.00	$ 8,061,000.00								
5	**CIELO RASOS**												
5.1	Cielo raso en PVC. (Suministro e instalación. Incluye perfilería)	M2	1,012	$ 94,417.00	$ 95,583,049.95								
5.2	Rejilla para reventilacion en cielo raso de 60x60. (Suministro e instalación)	UN	20	$ 58,313.00	$ 1,166,260.00								
5.3	Ventana de inspección en cielo raso PVC. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN	6	$ 252,134.00	$ 1,512,804.00								
6	**ESTUCO Y PINTURA**												
6.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	50	$ 25,379.00	$ 1,268,950.00	2027.84	$ 51,464,655.16	81.72	$ 2,073,898.03	1946.13	$ 49,390,757.13	2,027.84	$ 51,464,655.16
6.2	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	50	$ 28,893.00	$ 1,444,650.00	2258.37	$ 65,251,191.03	351.86	$ 10,166,310.92	1906.51	$ 55,084,880.11	2,258.37	$ 65,251,191.03
7	**ENCHAPES Y ACABADOS**												
7.1	Suministro e instalación de piso SPC de click	M2	1,012	$ 161,585.00	$ 163,580,574.75								
7.2	Piso en Mármol. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida,cristalizada y brillada necesarios)	M2	102	$ 213,064.00	$ 21,636,649.20								
7.3	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, pulida, cristalizada y brillada)	M2	1	$ 36,127.00	$ 36,127.00								
7.4	Bocapuerta en Granito Pulido. (Incluye equipos, dilataciones, destroncado, pulido, cristalizado y brillado)	ML	26	$ 35,503.00	$ 923,078.00								
7.5	Cenefas en Granito Pulido franjas menores a 50 cm. (Incluye equipos, dilataciones, destroncado, pulido, cristalizado y brillado)	ML	1	$ 50,002.00	$ 50,002.00								
7.6	Guardaescoba en baldosa de granito. (Suministro e instalación. Incluye equipos)	ML	1	$ 24,332.00	$ 24,332.00								
7.7	Guardaescoba en Mármol. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	1	$ 106,312.00	$ 106,312.00								
7.8	Gravilla lavada para bocapuertas o cenefas. (Suministro e instalación)	ML	1	$ 30,760.00	$ 30,760.00								
7.9	Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)	M2	50	$ 87,112.00	$ 4,355,600.00								
7.10	Piso en cerámica Pizarra madera tangerine blanco 30.5x60 o similar	M2	1	$ 88,273.00	$ 88,273.00								
7.11	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	1	$ 20,816.00	$ 20,816.00								
7.12	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial (PEI V). (Suministro e instalación)	M2	1	$ 113,671.00	$ 113,671.00								
7.13	Piso en porcelanato sellado 56x56 o similar, tráfico comercial (PEI V). (Suministro e instalación)	M2	1	$ 95,628.00	$ 95,628.00								
7.14	Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	1	$ 37,822.00	$ 37,822.00								
7.15	Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)	ML	1	$ 39,040.00	$ 39,040.00								
7.16	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	55	$ 122,310.00	$ 6,780,866.40	47.64	$ 5,827,276.49	3.22	$ 393,348.96	44.43	$ 5,433,927.53	47.64	$ 5,827,276.49
7.17	Mesón en Granito pulido. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones y salpicadero necesarios)	ML	10	$ 94,914.00	$ 949,140.00								
7.18	Mesón en Granito SAN GABRIEL. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y salpicadero necesarios)	ML	4	$ 772,397.00	$ 3,089,588.00	3.00	$ 2,317,191.00	3.00	$ 2,317,191.00			3.00	$ 2,317,191.00
7.19	Mesón en Mármol CAFÉ PINTA. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y salpicadero necesarios)	ML	4	$ 487,126.00	$ 1,948,504.00								
7.20	Extractor de aire para baños axial 6", 110V, 43W. (Suministro e instalación)	UN	6	$ 193,103.00	$ 1,158,618.00								
7.21	Tope de piso para puerta. Medialuna satinado o similar (Suministro e instalación)	UN	46	$ 17,768.00	$ 817,328.00	59.00	$ 1,048,312.00	59.00	$ 1,048,312.00			59.00	$ 1,048,312.00
8	**CARPINTERIA MADERA**												

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONSORCIO CARVI

OBJETO:	CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA

La Nación - Consejo Superior de la Judicatura– Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

CONTRATO No.	12-OBR009 DE 2024	**FECHA DE INICIO**	27 DE DICIEMBRE DE 2024	**VALOR INICIAL**	$ 1,889,339,990.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CARVI	**FECHA DE TERMINACION**	30 DE MAYO DE 2025	**VALOR ADICIONAL**	$ 222,188,954.29
REPRESENTANTE LEGAL	ALBA VIVIANA TORRES USECHE	**PLAZO INICIAL**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE	**VALOR TOTAL**	$ 2,111,528,944.29
INTERVENTOR	CONSORCIO JR	**PLAZO ADICIONAL**	5 MESES		
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS MARIA RUIZ PEREZ	**PLAZO FINAL**	5 MESES	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**	
SUPERVISOR	HERMES TOVAR CUELLAR	**FECHA DEL ACTA**	30 DE MAYO DE 2025		

I. OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE - ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N° 3		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACTA PARCIALES ANTERIORES		ACUMULADO TOTAL ACTAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR			CANT	VALOR	CANT	VALOR
8.1	Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)	UN	1	$ 382,468.00	$ 382,468.00	18.00	$ 6,884,424.00	4.00	$ 1,529,872.00	14.00	$ 5,354,552.00	18.00	$ 6,884,424.00
8.2	Puerta en madera entamborada 0.80 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN	1	$ 759,627.00	$ 759,627.00								
8.3	Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN	1	$ 857,861.00	$ 857,861.00								
8.4	Puerta en madera entamborada 1.00 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN	4	$ 1,093,084.00	$ 4,372,336.00								
8.5	Mueble en madera tipo cocina. (bajo y alto). h=0,80 - 0.60m ancho=0,60 - 0,30 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	ML	13.62	$ 1,722,849.00	$ 23,465,203.38								
8.6	Suministro e instalación Puerta en madera entamborada. Incluye marco y montante en vidrio crudo.	M2	1	$ 412,577.00	$ 412,577.00								
9	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**												
	CERRADURAS												
9.1	Cerradura de manija para oficinas Ref. Fixser o equivalente (Suministro e instalación)	UN	46	$ 150,965.00	$ 6,944,390.00								
9.2	Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	8	$ 124,922.00	$ 999,376.00	16.00	$ 1,998,752.00	16.00	$ 1,998,752.00			16.00	$ 1,998,752.00
9.3	Cerradura acceso principal en puerta de vidrio templado. (Suministro e instalación)	UN	18	$ 430,076.00	$ 7,741,368.00								
	VIDRIOS Y ESPEJOS												
9.4	Puerta en vidrio templado e=10 mm, 0,90x2,00m. (Suministro e instalación. Incluye cerradura, herrajes, accesorios)	UN	18	$ 1,507,129.00	$ 27,128,322.00	59.00	$ 88,920,611.00	7.00	$ 10,549,903.00	52.00	$ 78,370,708.00	59.00	$ 88,920,611.00
9.5	Puerta acceso principal 1,00x3,10 en vidrio laminado 4+4 templado. (Suministro e instalación. Incluye bisagra de piso, cerradura y manija de acero inoxidable)	UN	18	$ 2,888,827.00	$ 51,998,886.00								
9.6	Vidrio templado e=10 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	155	$ 796,975.00	$ 123,531,125.00	113.35	$ 90,338,869.60	24.03	$ 19,154,258.06	89.32	$ 71,184,611.54	113.35	$ 90,338,869.60
9.7	Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	78	$ 64,515.00	$ 5,032,170.00		$ -						
9.8	Suministro e instalación de espejo flotante espesor 4 mm Biselado	M2	25.2	$ 403,287.00	$ 10,162,832.40								
10	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**												
10.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN	1	$ 64,781.00	$ 64,781.00								
10.2	Reinstalación Lavamanos existente.	UN	1	$ 41,904.00	$ 41,904.00								
10.3	Reinstalación Orinal existente.	UN	1	$ 51,447.00	$ 51,447.00								
10.4	Cambio acople sanitario. (Suministro e instalación)	UN	1	$ 12,513.00	$ 12,513.00								
10.5	Sanitario institucional antivandalico blanco de fluxómetro. Incluye válvula de descarga y asiento abierto (Suministro e instalación)	UN	6	$ 1,967,742.00	$ 11,806,452.00								
10.6	Lavamanos institucional de colgar blanco (Suministro e instalación)	UN	6	$ 686,181.00	$ 4,117,086.00								
10.7	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	6	$ 27,401.00	$ 164,406.00	2.00	$ 54,802.00	2.00	$ 54,802.00			2.00	$ 54,802.00
10.8	Tapa registro 20x20 cm en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	6	$ 39,489.00	$ 236,934.00								
10.9	Rejilla metálica con sosco 3x2". (Suministro e instalación)	UN	6	$ 32,187.00	$ 193,122.00		$ -						
10.10	Reilla metálica con sosco 5x3". (Suministro e instalación)	UN	1	$ 39,454.00	$ 39,454.00								
10.11	Rejillas para piso 20x20. (Suministro e instalación)	UN	1	$ 47,175.00	$ 47,175.00								
10.12	Grifería antivandálica para lavamanos tipo push pico largo. (Suministro e instalación)	UN	6	$ 668,245.00	$ 4,009,470.00	4.00	$ 2,672,980.00			4.00	$ 2,672,980.00	4.00	$ 2,672,980.00
11	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**												
11.1	Punto hidráulico PVCP 1/2" para sanitario. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	6	$ 38,169.00	$ 229,014.00								
11.2	Punto hidráulico para Lavamanos con válvula antivandálica. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	6	$ 77,816.00	$ 466,896.00								
11.3	Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	2	$ 43,617.00	$ 87,234.00								
11.4	Punto hidráulico 1/2" para orinal. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	2	$ 39,852.00	$ 79,704.00								
11.5	Punto hidráulico A.F. PVCP 3/4". Desde el codo en piso hasta la salida del muro. Incluye tubería, accesorios y recamara en HG.	UN	6	$ 109,724.00	$ 658,344.00								
11.6	Registro metálico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1	$ 73,997.00	$ 73,997.00								
12	**INSTALACIONES SANITARIAS**												
12.1	Redes PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios).	ML	25	$ 28,135.00	$ 703,375.00								
12.2	Redes PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	25	$ 48,046.00	$ 1,201,150.00								
12.3	Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	25	$ 65,217.00	$ 1,630,425.00								
12.4	Redes PVC Sanitaria 3" descolgada. (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	25	$ 147,308.00	$ 3,682,700.00								
12.5	Redes PVC Sanitaria 4" descolgada. (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ml	25	$ 96,391.00	$ 2,409,775.00								
12.6	Tubería PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación)	ML	25	$ 23,226.00	$ 580,650.00								
12.7	Tubería PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación)	ML	25	$ 33,804.00	$ 845,100.00								
12.8	Tubería PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación)	ML	25	$ 48,494.00	$ 1,212,350.00								
12.9	Accesorios PVC Sanitario 2". (Suministro e instalación)	UN	25	$ 10,491.00	$ 262,275.00								
12.10	Accesorios PVC Sanitario 3". (Suministro e instalación)	UN	25	$ 20,634.00	$ 515,850.00								
12.11	Accesorios PVC Sanitario 4". (Suministro e instalación)	UN	25	$ 37,064.00	$ 926,600.00								
12.12	Punto desague PVC Sanitario 2"	UN	6	$ 52,943.00	$ 317,658.00								
12.13	Punto desague PVC Sanitario 3"	UN	2	$ 74,931.00	$ 149,862.00								
12.14	Punto desague PVC Sanitario 4"	UN	6	$ 102,616.00	$ 615,696.00								
12.15	Salida sanitaria para lavamanos	UN	6	$ 110,358.00	$ 662,148.00								
12.16	Salida sanitaria para sanitario	UN	6	$ 155,377.00	$ 932,262.00								
12.17	Salida sanitaria para orinal	UN	2	$ 113,317.00	$ 226,634.00								
12.18	Salida sanitaria para poceta aseo	UN	2	$ 110,358.00	$ 220,716.00								
12.19	Salida sanitaria para lavaplatos	UN	2	$ 110,358.00	$ 220,716.00								
12.20	Sifón de piso PVC Sanitario 2"	UN	6	$ 79,981.00	$ 479,886.00								
12.21	Sifón de piso PVC Sanitario 3"	UN	6	$ 90,045.00	$ 540,270.00								
12.22	Sifón de piso PVC Sanitario 4"	UN	6	$ 93,695.00	$ 562,170.00								
13	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**												
	SALIDAS INTERRUPTORES												
13,1	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería , cable, aparato, accesorios 3m)	UN	55	$ 100,214.00	$ 5,511,770.00	68.00	$ 6,814,552.00	30.00	$ 3,006,420.00	38.00	$ 3,808,132.00	68.00	$ 6,814,552.00
13,2	Salida interruptor doble tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	5	$ 104,490.00	$ 522,450.00		$ -						
13,3	Salidas interruptor con sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1	$ 174,260.00	$ 174,260.00		$ -						
	SALIDAS TOMAS												
13,4	Salida toma 240v 20A. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	37	$ 166,397.00	$ 6,156,689.00		$ -						
13,5	Salida toma doble red normal 5-15 R. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	2	$ 138,959.00	$ 277,918.00		$ -						
13,6	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, canaleta, cable, toma, accesorios 3m)	UN	146	$ 149,469.00	$ 21,822,474.00	177.00	$ 26,456,013.00	65.00	$ 9,715,485.00	112.00	$ 16,740,528.00	177.00	$ 26,456,013.00
13,7	Salida toma doble PT GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	6	$ 213,929.00	$ 1,283,574.00		$ -						
13,8	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UN	146	$ 166,246.00	$ 24,271,916.00	191.00	$ 31,752,986.00	72.00	$ 11,969,712.00	119.00	$ 19,783,274.00	191.00	$ 31,752,986.00
13,9	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	155	$ 154,496.00	$ 23,946,880.00	350.00	$ 54,073,600.00	87.00	$ 13,441,152.00	263.00	$ 40,632,448.00	350.00	$ 54,073,600.00
13,10	Salida sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)	UN	8	$ 92,121.00	$ 736,968.00	22.00	$ 2,026,662.00	22.00	$ 2,026,662.00			22.00	$ 2,026,662.00
13,11	Suministro e Instalacion de UPS On Line Trifasica de 20 KVA con autonomía a plena carga de 5 Minutos	UN	2	$ 20,988,000.00	$ 41,976,000.00	2.00	$ 41,976,000.00			2.00	$ 41,976,000.00	2.00	$ 41,976,000.00
13,12	Suministro e Instalacion de Transferencia Manual para UPS de 20KVA. Incluye cofre y automaticos	UN	2	$ 841,500.00	$ 1,683,000.00	2.00	$ 1,683,000.00	2.00	$ 1,683,000.00			2.00	$ 1,683,000.00
13,13	Suministro e Instalacion de Acometida Electrica en cable de Cu 3x2+1x2+1x2, Incluye tubería, automatico totalizador y accesorios	ML	50	$ 138,600.00	$ 6,930,000.00	110.00	$ 15,246,000.00	110.00	$ 15,246,000.00			110.00	$ 15,246,000.00
13,14	Suministro e Instalacion de Tableros Electricos de 24 Circuitos Trifasicos C/P y Espacio para Totalizador. Incluye Tablero, Automaticos, Totalizador y Accesorios.	UN	4	$ 1,148,400.00	$ 4,593,600.00	4.00	$ 4,593,600.00			4.00	$ 4,593,600.00	4.00	$ 4,593,600.00
	LUMINARIAS												
13,15	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	195	$ 320,865.00	$ 62,568,675.00	245.00	$ 78,611,925.00	10.00	$ 3,208,650.00	235.00	$ 75,403,275.00	245.00	$ 78,611,925.00
13,16	Ajuste a los diseños red electrica, para la adecuacion redes electricas existentes incluyendo iluminacion, tomas normales y reguladas (por espacio de trabajo)	UN	1	$ 8,322,443.00	$ 8,322,443.00	2.00	$ 16,644,886.00			2.00	$ 16,644,886.00	2.00	$ 16,644,886.00
14	**INSTALACIÓN VOZ Y DATOS**												
	VOZ Y DATOS												
14,1	Ajuste a los diseños red de datos, (por espacio de trabajo)	UN	1	$ 8,322,443.00	$ 8,322,443.00	2.00	$ 16,644,886.00			2.00	$ 16,644,886.00	2.00	$ 16,644,886.00
14,2	Salida de punto de datos doble voz y datos incluye faceplate, RJ45, caja de octogonal, caja de montaje y accesorios, suministro y mano de obra CAT 6A	UN	151	$ 196,702.00	$ 29,702,002.00	160.00	$ 31,472,320.00	160.00	$ 31,472,320.00			160.00	$ 31,472,320.00
14,3	Cable UTP CATEGORÍA 6A. Incluye Suministro y tendido, accesorios de montaje	ML	10080	$ 5,640.00	$ 56,851,200.00	11860.25	$ 66,891,810.00	6860.25	$ 38,691,810.00	5000.00	$ 28,200,000.00	11,860.25	$ 66,891,810.00
14,4	Patch cords RJ45-RJ45 de 2 m. de longitud y flexibles categoría 6A, para conectar en el herraje. (Incluye Suministro e instalación, marcación en ambas puntas.)	UN	151	$ 33,344.00	$ 5,034,944.00	160.00	$ 5,335,040.00	160.00	$ 5,335,040.00			160.00	$ 5,335,040.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONSORCIO CARVI

OBJETO:	CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA						
La Nación - Consejo Superior de la Judicatura– Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva	**CONTRATO No.**	12-OBR009 DE 2024	**FECHA DE INICIO**	27 DE DICIEMBRE DE 2024	**VALOR INICIAL**	$	1,889,339,990.00
	CONTRATISTA	CONSORCIO CARVI	**FECHA DE TERMINACION**	30 DE MAYO DE 2025	**VALOR ADICIONAL**	$	222,188,954.29
	REPRESENTANTE LEGAL	ALBA VIVIANA TORRES USECHE	**PLAZO INICIAL**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE	**VALOR TOTAL**	$	2,111,528,944.29
	INTERVENTOR	CONSORCIO JR	**PLAZO ADICIONAL**	5 MESES			
	REPRESENTANTE LEGAL	JESUS MARIA RUIZ PEREZ	**PLAZO FINAL**	5 MESES	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**		
	SUPERVISOR	HERMES TOVAR CUELLAR	**FECHA DEL ACTA**	30 DE MAYO DE 2025			

I. OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE - ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N° 3		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACTA PARCIALES ANTERIORES		ACUMULADO TOTAL ACTAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR			CANT	VALOR	CANT	VALOR
14,5	Suministro e Instalacion de Rack de 40 RU de 210x80x80 Ranurado con Puertas Abatibles. Multitoma, Organizadores.	UN	1	$ 3,246,593.00	$ 3,246,593.00	2.00	$ 6,493,186.00	2.00	$ 6,493,186.00			2.00	$ 6,493,186.00
14,6	Suministro e Instalacion de SW de 24 puertos10/100/1000 capa 2 con 4 Puertos SFP ARUBA	UN	7	$ 1,435,500.00	$ 10,048,500.00	7.00	$ 10,048,500.00	7.00	$ 10,048,500.00			7.00	$ 10,048,500.00
14,7	Suministro e Instalacion de Bandeja Portacables Tipo Rejiban. (Incluye Accesorios de Sujeccion)	ML	110	$ 44,550.00	$ 4,900,500.00	159.00	$ 7,083,450.00	19.50	$ 868,725.00	139.50	$ 6,214,725.00	159.00	$ 7,083,450.00
14,8	Suministro e Instalacion de Canaleta Metalica 12x5 Blanca con Division y Pintura Electrostatica (Incluye Accesorios de Sujeccion)	ML	200	$ 54,450.00	$ 10,890,000.00	276.00	$ 15,028,200.00	86.20	$ 4,693,590.00	189.80	$ 10,334,610.00	276.00	$ 15,028,200.00
14,9	Suministro e Instalacion de Herraje de 24 Puertos. Incluye Jack	UN	17	$ 1,237,500.00	$ 21,037,500.00	14.00	$ 17,325,000.00	14.00	$ 17,325,000.00			14.00	$ 17,325,000.00
14,10	Suministro e Instalacion de Marquillas (Voz - Datos - Regulado - Normal)	UN	151	$ 2,970.00	$ 448,470.00	280.00	$ 831,600.00	280.00	$ 831,600.00			280.00	$ 831,600.00
14,11	Certificaciones de Puntos Cat 6a	UN	302	$ 14,850.00	$ 4,484,700.00	320.00	$ 4,752,000.00	320.00	$ 4,752,000.00			320.00	$ 4,752,000.00
15	**ASEO Y VARIOS**												
15.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	1,012	$ 3,123.00	$ 3,161,569.05	1514.68	$ 4,730,360.01	1514.68	$ 4,730,360.01			1,514.68	$ 4,730,360.01
15.2	Traslado de puestos de trabajo . (Incluye desmonte, traslado, reinstalación muebles, equipos, accesorios necesarios)	UN	50	$ 71,424.00	$ 3,571,200.00		$ -					0.00	$ -
15.3	Reubicación detector de movimiento. (Incluye instalación, accesorios)	UN	15	$ 46,145.00	$ 692,175.00		$ -					0.00	$ -
15.4	Señalización institucional espacios, acrílico + soportes acero inox. (Suministro e instalación)	UN	50	$ 68,564.00	$ 3,428,200.00	29.00	$ 1,988,356.00	29.00	$ 1,988,356.00			29.00	$ 1,988,356.00
NP	**NO PREVISTOS**												
NP 1	Suministro e instalacion de cielo raso en fibra mineral. incluve estructura de soporte	M2		$ 120,594.00	$ -	1159.03	$ 139,772,148.24	23.72	$ 2,860,911.76	1135.31	$ 136,911,236.48	1,159.03	$ 139,772,148.24
NP 2	Suministro e instalacion de ceramica formato 60 cm X 60 cm (incluye pegante y boquilla)	M2		$ 110,378.00	$ -	1545.16	$ 170,551,813.97	84.42	$ 9,318,651.61	1460.74	$ 161,233,162.36	1,545.16	$ 170,551,813.97
NP 3	Suministro e instalacion ventaneria en aluminio. incluve vidrio de seguridad 5mm	M2		$ 735,473.00	$ -	185.81	$ 136,656,767.18	41.71	$ 30,675,107.88	144.10	$ 105,981,659.30	185.81	$ 136,656,767.18
NP 4	Suministro e instalacion de orinal tipo push	UN		$ 1,727,027.00	$ -	3.00	$ 5,181,081.00			3.00	$ 5,181,081.00	3.00	$ 5,181,081.00
NP 5	Suministro e instalacion de sanitario	UN		$ 1,967,742.00	$ -	4.00	$ 7,870,968.00			4.00	$ 7,870,968.00	4.00	$ 7,870,968.00
NP 6	Suministro e instalacion de divisiones de baño en acero inoxidable	M2		$ 1,332,250.00	$ -	14.36	$ 19,136,439.00	14.36	$ 19,136,439.00			14.36	$ 19,136,439.00
NP 7	Suministro e instalacion de madera hasta 60 cm de ancho, para entrepaños o para atencion al publico tipo recepcion de documentos o para puertas abatibles, incluye lo necesario para su instalacion	ML		$ 153,670.00	$ -	79.85	$ 12,271,010.51	79.85	$ 12,271,010.51			79.85	$ 12,271,010.51
NP 8	Mamposteria en ladrillo hueco No. 5	M2		$ 68,951.00	$ -	15.22	$ 1,049,434.22	0.44	$ 30,338.44	14.78	$ 1,019,095.78	15.22	$ 1,049,434.22
NP 9	Guardaescoba en tableta ceramica altura hasta 10cm	ML		$ 24,597.00	$ -	1260.45	$ 31,003,288.65	282.26	$ 6,942,819.50	978.19	$ 24,060,469.15	1,260.45	$ 31,003,288.65
NP 10	Desmonte de aires acondicionados existentes	UN		$ 98,496.00	$ -	60.00	$ 5,909,760.00			60.00	$ 5,909,760.00	60.00	$ 5,909,760.00
NP 11	Suministro e instalación de panel led 18W	UN		$ 100,637.00	$ -	0.00	$ -					0.00	$ -
NP 12	Suministro e instalación lampara de emergencia tipo tortuga	UN		$ 181,210.00	$ -	93.00	$ 16,852,530.00	93.00	$ 16,852,530.00			93.00	$ 16,852,530.00
NP 13	Acometida electrica para sistema regulado 1 (3F # 6+1N # 6+1T #8)CU	ML		$ 100,860.00	$ -	110.00	$ 11,094,600.00	85.00	$ 8,573,100.00	25.00	$ 2,521,500.00	110.00	$ 11,094,600.00
NP 14	Suministro e instalación de tablero de 36 ctos con espacio para totalizador	UN		$ 1,845,085.13	$ -	4.00	$ 7,380,340.53			4.00	$ 7,380,340.53	4.00	$ 7,380,340.53
NP 15	Alimentación electrica para condensadora 2F#10CU+1T#12CU prom salida= 35m	ML		$ 39,900.00	$ -	369.99	$ 14,762,418.65	311.99	$ 12,448,219.41	58.00	$ 2,314,200.00	369.99	$ 14,762,419.41
NP 16	Alimentación de fibra optica entre rack ppal y rack piso 6	ML		$ 4,887.00	$ -	37.00	$ 180,819.00	37.00	$ 180,819.00			37.00	$ 180,819.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA				**$ 1,242,757,658.92**		**$ 1,676,481,892.29**		**$ 358,856,175.30**		**$ 1,317,625,717.74**		**$ 1,676,481,893.04**
	Administratración			19%	$ 236,123,955.00		$ 318,531,560.00		$ 68,182,673.31		$ 250,348,886.00		$ 318,531,559.68
	Imprevistos			1%	$ 12,427,577.00		$ 16,764,819.00		$ 3,588,561.75		$ 13,176,257.00		$ 16,764,818.93
	Utilidad			5%	$ 62,137,883.00		$ 83,824,095.00		$ 17,942,808.77		$ 65,881,286.00		$ 83,824,094.65
	IVA sobre Utilidad			19%	$ 11,806,198.00		$ 15,926,578.00		$ 3,409,133.67		$ 12,517,444.34		$ 15,926,577.98
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA				**$ 322,495,613.00**		**$ 435,047,052.00**		**$ 93,123,177.50**		**$ 341,923,873.34**		**$ 435,047,051.24**
	TOTAL COSTO DE OBRA				**$ 1,565,253,271.92**		**$ 2,111,528,944.29**		**$ 451,979,352.80**		**$ 1,659,549,591.08**		**$ 2,111,528,944.29**

II. MOBILIARIO

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE - ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N° 2		PRESENTE ACTA PARCIAL N° 02		ACTA PARCIAL N° 01		ACUMULADO ACTAS PARCIALES	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
16.1	**SILLA TIPO EJECUTIVA.** Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño..	UN	18	$ 690,564.00	$ 12,430,152.00								
16.2	**SILLA TIPO OPERATIVA.** Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN	45	$ 527,570.00	$ 23,740,650.00								
16.3	**PUESTO DE TRABAJO EN L TIPO JUEZ DE 1,80x1,50m.** Suministro e instalación de puesto de trabajo de 1.8m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 1,20m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro. El modulo adicional referenciado en los planos se cotizara por aparte. El modulo adicional descrito en el esquema se cotizara por aparte.	UN	18	$ 2,099,104.00	$ 37,783,872.00								
16.4	**PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m.** Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en madera/madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN	45	$ 1,875,311.00	$ 84,388,995.00								

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONSORCIO CARVI

OBJETO:	CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA

La Nación - Consejo Superior de la Judicatura– Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva	**CONTRATO No.**	12-OBR009 DE 2024	**FECHA DE INICIO**	27 DE DICIEMBRE DE 2024	**VALOR INICIAL**	$ 1,889,339,990.00
	CONTRATISTA	CONSORCIO CARVI	**FECHA DE TERMINACION**	30 DE MAYO DE 2025	**VALOR ADICIONAL**	$ 222,188,954.29
	REPRESENTANTE LEGAL	ALBA VIVIANA TORRES USECHE	**PLAZO INICIAL**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE	**VALOR TOTAL**	$ 2,111,528,944.29
	INTERVENTOR	CONSORCIO JR	**PLAZO ADICIONAL**	5 MESES		
	REPRESENTANTE LEGAL	JESUS MARIA RUIZ PEREZ	**PLAZO FINAL**	5 MESES	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**	
	SUPERVISOR	HERMES TOVAR CUELLAR	**FECHA DEL ACTA**	30 DE MAYO DE 2025		

I. OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE - ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N° 3		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACTA PARCIALES ANTERIORES		ACUMULADO TOTAL ACTAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR			CANT	VALOR	CANT	VALOR
16.5	**PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,50m.** Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.50 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera tablex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la superficie de trabajo, (PVC) de 30mm. Tendrán 4 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 4 rodachinas con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13b). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN	15	$ 1,577,727.00	$ 23,665,905.00								
16.6	**SILLA TIPO INTERLOCUTORA.** Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interno en malla. Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base o estructura patas en tubo cold rolled,el acabado será en paño hilat recubierto con scotch-Haggard espuma de alta densidad, combustión retardada El color se define en sitio con el supervisor despues de adjudicado NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN	40	$ 244,592.00	$ 9,783,680.00								
16.7	**MUEBLE ARCHIVADOR METÁLICO PARA IMPRESORA.** de 2 puertas de 0,90m de largo x 0,50m de ancho x 0,65m de alto con un entrepaño metalico interno reforzado,La superficie serán en madera tablex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F-8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Se estructura en lámina cold rolled calibre 18 tipo uña, 3 caras y por la parte frontal tendrá dos puertas con chapa u manija en cada puerta. Párales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña El entrepaño será cold rolled calibre 18 reforzado.	UN	14	$ 1,114,117.00	$ 15,597,638.00								
16.8	**PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m.** Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.	M2	1	$ 1,158,054.00	$ 1,158,054.00								
16.9	**MESA SALA DE JUNTAS 2,10x1,10m.** Suministro e instalación de mesa de juntas de 2.50m de largo x1,10m de ancho x 30cm de espesor. la superficie será en madera tablex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. la superficie sera redondeada en sus bordes en un radio de 0,40m. Llevara 2 costados, metalicos inspeccionales. Uniendo estos dos costados tendra una viga metalica inspeccionable pasa cables.llevara instalado 2 grommet a cada costado de la superficie, cada uno de ellos tendra una capacidad de 2 tomas normales, 4 tomas reguladas, 2 tomas voz y datos y 1 de video. incluira rodachinas de carga pesada con freno.	UN	1	$ 2,839,134.00	$ 2,839,134.00								
17.0	**UNIDAD DE ARCHIVO** compuesto por: archivador rodante de las siguientes caracteristicas: - 2 modulos fijos sencillos, cada modulo tendra 0.42 m de ancho x 1,00m de longitud, 2 modulos rodantes cada uno de 0.84 m de ancho x 1,00m de longitud (Cada modulo rodante tendra 2 unidades de consulta), puerta con su respectiva cerradura. Laterales y decorados Metálicos para encerrar en su totalidad el archivo SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE MANUAL - antivuelco. Fabricado en su totalidad en lámina importada cold rolled, laterales en calibre 16 y entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña), refuerzos en calibre 18, con sus respectivos tensores en platina de ½" x 1/8" en cruz. Terminados en pintura electrostática color a definir. La altura de los estantes será de 2.10, . La cantidad de entrepaños serán 6 unidades por modulo – estos incluyen piso y techo, se contaran con 5 espacios útiles por modulo. DESPLAZAMIENTO: Se realizara en rieles de hierro de 1 ½" x 3/16" sujetos con tornillo al piso, incluye rodamientos. En los costados de cada unidad de consulta, llevara una lamina metalica para evitar la caida de los expedientes.	UN	5	$ 11,481,313.00	$ 57,406,565.00								
17.1	**CORTINA**. Suministro e instalacion de Blackout color blanco: con un 70% de PVC y 30% de Fiberglass y filtro UV 100%, sistema enrollable manual, con mandos laterales en cadena plástica decorativa.	M2	1	$ 246,292.00	$ 246,292.00								
17.2	**ARCHIVADOR CARPETERO DOBLE METÁLICO.** tipo pesado para resistir expedientes con sistema antivuelco, superficie madera tablex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. De 0.90m de largo x 0,50m de fondo x 0,75 m de alto. Se estructurara en lámina cold rolled calibre 14 con dos gaveteros para carpetas.	UN	1	$ 1,650,943.00	$ 1,650,943.00								
17.3	**MESA REDONDA** r=0,50m. Suministro e instalación de mesa redonda de 0,50mt de radio, h= entre 0.72m y 0.75mt, la superficie será en madera tablex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, en la parte superior de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Los soportes serán en lámina cold rolled calibres 14 y 16, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática. La estructura estará conformado por un poste circular con 4 patas en lámina cold rolled calibre 18 y niveladores en sus cuatro patas.	UN	1	$ 967,898.00	$ 967,898.00								
17.4	**TÀNDEM TRES (3) PUESTOS**. asiento espaldar inyectados en plástico. Estructura en lámina de Cold Rolled calibre 16 , con pinturas en polvo de aplicación electrostática. Laterales en tubo de agua negra de 2" y base en lámina troquelada calibre 12 reforzado con platina de 1" x ¼" con niveladores de 3/8 ".	UN	1	$ 682,002.00	$ 682,002.00								
	SUBTOTAL COSTO MOBILIARIO				$ 272,341,780.00		$ -		$ -		$ -		$ -
	IVA			19%	$ 51,744,938.20		$ -		$ -		$ -		$ -
	TOTAL COSTO MOBILIARIO				**$ 324,086,718.20**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	I. TOTAL COSTO DE OBRA				**$ 1,565,253,271.92**		**$ 2,111,528,944.29**		**$ 451,979,352.80**		**$ 1,659,549,591.08**		**$ 2,111,528,944.29**
	II. TOTAL COSTO MOBILIARIO				**$ 324,086,718.20**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	TOTAL COSTO OBRA Y MOBILIARIO				**$ 1,889,339,990.00**		**$ 2,111,528,944.29**		**$ 451,979,352.80**		**$ 1,659,549,591.08**		**$ 2,111,528,944.29**

ALBA VIVIANA TORRES USECHE
RL CONSORCIO CARVI
CONTRATISTA DE OBRA

JESUS MARIA RUIZ PEREZ
RL CONSORCIO JR
INTERVENTOR


HERMES TOVAR CUELLAR
COORDINADOR DESAJ
SUPERVISOR

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024


OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.1**	**Ajustes de diseño , memorias de cantidades y balance**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**M2**

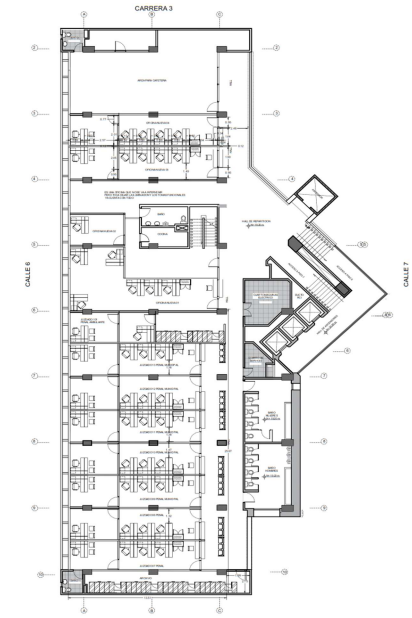

P7 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 5
ESCALA 1:100

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
ARCHIVO AL LADO DE OFICINA MAGISTRADO	2.00	14.34		28.68		1.00	28.68
	0.40	0.94		0.38		-3.00	-1.13
P6 OF 01	5.73	13.10	-	75.06	-	1.00	75.06
	0.24	0.94		0.23		-2.00	-0.45
	0.17	0.85		0.14		-1.00	-0.14
P6 OF 02	5.93	13.10		77.68		1.00	77.68
	0.24	0.94		0.23		-2.00	-0.45
	0.17	0.95		0.16		-3.00	-0.48
P6 OF 03	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P6 OF 04	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P6 OF 05	3.80	13.10		49.78		1.00	49.78
	2.10	5.05		10.61		1.00	10.61
	8.00	1.75		14.00		1.00	14.00
	1.50	4.10		6.15		1.00	6.15
	5.05	2.84		14.34		2.00	28.68
	2.10	7.93		16.65		1.00	16.65
	0.17	0.94		0.16		-6.00	-0.96
O6 OF 06	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P6 OF 07	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
ARCHIVO AL LADO JUZGADO	2.00	14.34		28.68		1.00	28.68
	0.40	0.94		0.38		-3.00	-1.13
							-
PISO 5 ARCHIVO AL LADO JUZGADO	2.00	14.34		28.68		1.00	28.68
	0.40	0.94		0.38		-2.00	-0.75

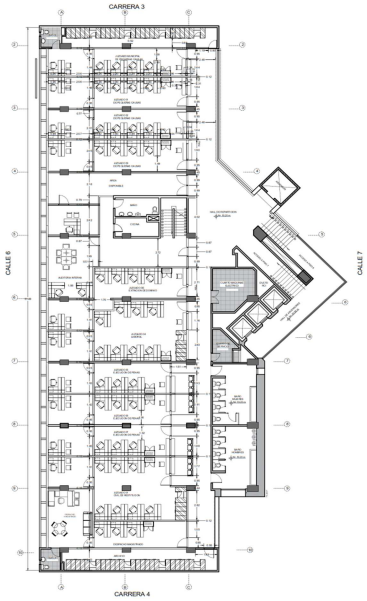

P8 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 6
ESCALA 1:100

P5 OF 01	5.65	13.10	-	74.02	-	1.00	74.02
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 OF 02	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 OF 03	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 OF 04	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 OF 05	3.80	13.10		49.78		1.00	49.78
	2.10	5.05		10.61		1.00	10.61
	8.00	1.75		14.00		1.00	14.00
	1.50	4.10		6.15		1.00	6.15
	5.05	2.84		14.34		1.00	14.34
	2.10	13.10		27.51		-1.00	-27.51
	0.17	0.94		0.16		-6.00	-0.96
P5 OF 06	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 OF 07	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
ARCHIVO AL LADO JUZGADO	2.00	14.34		28.68		1.00	28.68
	0.40	0.94		0.38		-3.00	-1.13
CORREDOR INGRESOS OFICINAS PISO 6	2.55	45.00		114.75		1.00	114.75
	4.40	1.80		7.92		1.00	7.92
	0.95	0.45		0.43		-8.00	-3.42
	10.20	5.25	-	26.78	-	1.00	26.78
CORREDOR INGRESOS OFICINAS PISO 5	2.55	45.00		114.75		1.00	114.75
	4.40	1.80		7.92		1.00	7.92
	0.95	0.45		0.43		-8.00	-3.42
	10.20	5.25	-	26.78	-	1.00	26.78
				-			-
BAÑO HOMBRE PISO 5	5.74	4.02		11.54		1.00	11.54
				-			-
						Subtotal	1,514.68
						Subtotal	
						TOTAL	**1,514.68**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.2**	**Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**ML**

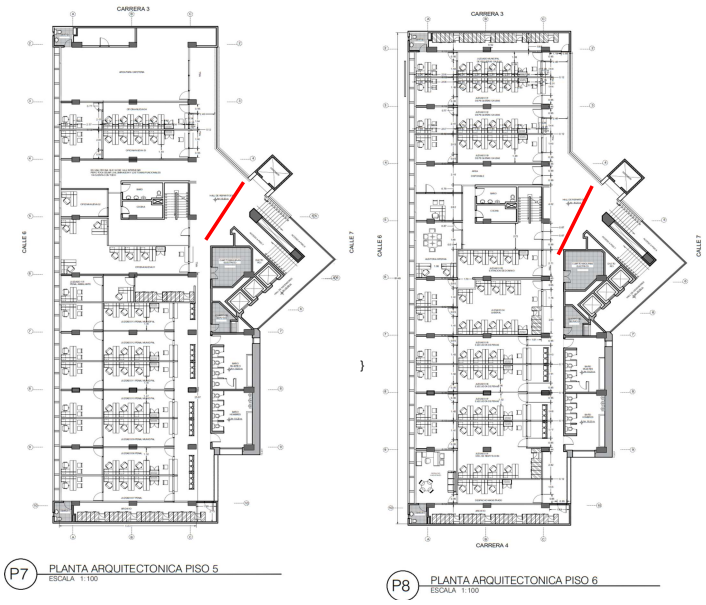

P7 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 5
ESCALA 1:100

P8 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 6
ESCALA 1:100

Localización	**Dimensiones**					**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Alto**	**Área**	**Volumen**		
CERRAMIENTO CORREDORES				20.00	-	1.00	20.00
							-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	20.00
						Subtotal	
						TOTAL	**20.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

1	PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES	1.4	Desmonte divisiones baño. (Incluye trasiego y disposición final)	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	M2



Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
BAÑO HOMBRES PISO 5	4.20		1.80	7.56		1.00	7.56
	1.26		1.80	2.27		3.00	6.80
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	14.36
						Subtotal	
						TOTAL	14.36

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024


OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

1	PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES	1.5	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	M2

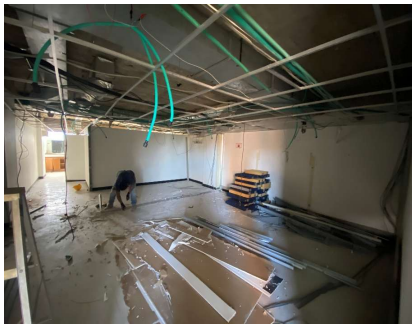



Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
P6 OF 01		2.60	2.25	5.85	-	1.00	5.85
		1.00	2.25	2.25		1.00	2.25
		2.60	2.25	5.85		1.00	5.85
		1.00	2.25	2.25		1.00	2.25
		2.60	2.25	5.85		1.00	5.85
		2.60	2.25	5.85		1.00	5.85
P6 OF 02		1.40	1.60	2.24		1.00	2.24
		2.40	2.25	5.40		1.00	5.40
		4.80	1.60	7.68		2.00	15.36
		0.60	1.60	0.96		1.00	0.96
P6 OF 03		3.00	2.25	6.75		1.00	6.75
		3.20	2.25	7.20		1.00	7.20
		3.37	2.25	7.58		1.00	7.58
		3.20	2.25	7.20		1.00	7.20
		1.60	1.60	2.56		4.00	10.24
		3.10	2.25	6.98		1.00	6.98
P6 OF 04		5.90	2.25	13.28		1.00	13.28
		4.50	2.25	10.13		1.00	10.13
P6 OF 05		13.60	2.25	30.60		1.00	30.60
P6 OF 06		3.70	2.25	8.33		1.00	8.33
		2.70	2.25	6.08		1.00	6.08
		5.50	2.25	12.38		1.00	12.38
		2.40	1.80	4.32		1.00	4.32
		4.77	2.25	10.73		1.00	10.73
P5 OF 01		3.40	2.20	7.48		1.00	7.48
		5.60	2.20	12.32		1.00	12.32
		3.10	1.65	5.12		1.00	5.12
		2.62	1.65	4.32		1.00	4.32
		0.32	1.65	0.53		1.00	0.53
		3.13	2.20	6.89		2.00	13.77

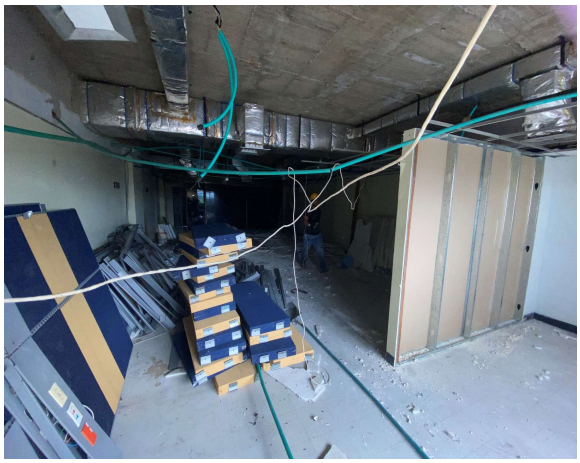

		2.52	2.20	5.54		1.00	5.54
P5 OF 02		3.10	2.20	6.82		2.00	13.64
		2.75	2.20	6.05		2.00	12.10
		1.50	1.50	2.25		2.00	4.50
		1.40	1.10	1.54		1.00	1.54
		0.35	1.50	0.53		1.00	0.53
		0.60	1.20	0.72		1.00	0.72
P5 OF 03		2.65	2.20	5.83		4.00	23.32
		3.00	2.20	6.60		4.00	26.40
		2.00	2.20	4.40		1.00	4.40
		1.50	1.50	2.25		1.00	2.25
P5 OF 04		2.45	2.20	5.39		1.00	5.39
		5.50	2.20	12.10		1.00	12.10
		3.03	2.20	6.67		3.00	20.00
		4.25	2.20	9.35		1.00	9.35
		1.54	1.63	2.51		2.00	5.02
		0.65	0.97	0.63		7.00	4.41
		1.85	1.63	3.02		1.00	3.02
		2.00	2.20	4.40		1.00	4.40
		2.50	1.93	4.83		1.00	4.83
P5 OF 05		2.95	2.20	6.49		1.00	6.49
		4.40	2.20	9.68		1.00	9.68
		1.00	2.20	2.20		1.00	2.20
		1.50	2.20	3.30		1.00	3.30
P5 OF 07		3.95	2.20	8.69		1.00	8.69
							-
						Subtotal	430.98
						Subtotal	
						TOTAL	**430.98**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.6**	**Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**

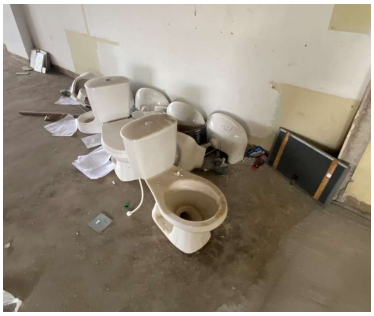

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
ORINALES						3.00	3.00
LAVAMANOS	-		-	-		4.00	4.00
SANITARIOS						4.00	4.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	11.00
						Subtotal	
						TOTAL	**11.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.7**	**Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**

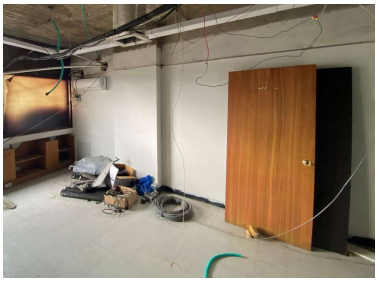

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
OFICINAS PISO 6						15.00	15.00
PISO 5	-		-	-		9.00	9.00
							-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
OBSERVACIONES:						**Subtotal**	24.00
						Subtotal	
						TOTAL	**24.00**

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.8**	**Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**



Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
OFICINAS PISO 6						34.00	34.00
OFICINAS PISO 5	-		-	-		23.00	23.00
							-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
					Subtotal		57.00
					Subtotal		
					TOTAL		**57.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

1	PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES	1.9	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	M2





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
P6 FRONTAL OF 1		5.50	2.90	15.95		1.00	15.95
P6 FRONTAL OF 2		5.50	2.90	15.95		1.00	15.95
P6 FRONTAL OF 3		5.50	2.90	15.95		1.00	15.95
P6 FRONTAL OF 4		5.50	2.90	15.95	-	1.00	15.95
P6 FRONTAL OF 5		3.60	2.90	10.44		1.00	10.44
P6 CORREDOR ESCALERAS EMERGENCIA		1.74	2.90	5.05		1.00	5.05
P6 FRONTAL OF 5		2.10	2.90	6.09		1.00	6.09
P6 FRONTAL OF 6		5.50	2.90	15.95		1.00	15.95
P6 FRONTAL OF 7		5.50	2.90	15.95		1.00	15.95
TRASERAS PISO 6		5.80	1.95	11.31		9.00	101.79
				-			-
P5 FRONTAL OF 1		5.50	2.90	15.95		1.00	15.95
P5 FRONTAL OF 2		5.50	2.90	15.95		1.00	15.95
P5 FRONTAL OF 3		5.50	2.90	15.95		1.00	15.95
P5 FRONTAL OF 4		5.50	2.90	15.95	-	1.00	15.95
TRASERAS PISO 5		5.80	1.95	11.31		7.00	79.17
		2.85	1.95	5.56		1.00	5.56
							-
P5 FRONTAL OF 5		3.60	2.90	10.44		1.00	10.44
P5 CORREDOR ESCALERAS EMERGENCIA		1.74	2.90	5.05		1.00	5.05
P5 FRONTAL OF 5 - 2		2.10	2.90	6.09		1.00	6.09
P5 FRONTAL OF 6		5.50	2.90	15.95		1.00	15.95
P5 FRONTAL OF 7		5.50	2.90	15.95		1.00	15.95
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	421.07
						Subtotal	
						TOTAL	421.07

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.10**	**Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**



Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
PISO 6				-	-	124.00	124.00
							-
PISO 5						145.00	145.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	269.00
						Subtotal	
						TOTAL	**269.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.11**	**Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**ML**

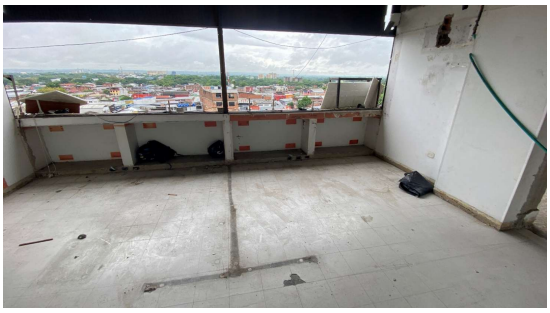



Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
P6 OF 01		5.65		-	-	1.00	5.65
P6 OF 02		5.85		-		1.00	5.85
P6 OF 03		5.85		-		1.00	5.85
P6 OF 04		5.85		-		1.00	5.85
P6 OF 05		11.49		-		1.00	11.49
P6 OF 06		5.85		-		1.00	5.85
P6 OF 07		5.85		-		1.00	5.85
				-			-
P6 OF 01		5.65		-	-	1.00	5.65
P6 OF 02		5.85		-		1.00	5.85
P6 OF 03		5.85		-		1.00	5.85
P6 OF 04		5.85		-		1.00	5.85
P6 OF 05		8.67		-		1.00	8.67
P6 OF 06		5.85		-		1.00	5.85
P6 OF 07		5.85		-		1.00	5.85
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	89.96
						Subtotal	
						TOTAL	**89.96**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.12**	**Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**ML**





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
OFICINAS PISO 6		223.22				1.00	223.22
				-			-
P5 OF 01		27.19		-		1.00	27.19
P5 OF 02		15.00		-		1.00	15.00
P5 0F 03		32.72		-		1.00	32.72
P5 OF 04		30.50		-		1.00	30.50
				-			-
P5 OF 5		15.00		-		1.00	15.00
P5 OF 6		32.79		-			-
P5 OF 7		42.30		-		1.00	42.30
				-			-
					Subtotal		385.93
					Subtotal		
					TOTAL		**385.93**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

1	PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES	1.13	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	UN





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
P6 OF 01				-	-	23.00	23.00
P6 OF 02				-		22.00	22.00
P6 OF 03				-		25.00	25.00
P6 OF 04				-		24.00	24.00
P6 OF 05				-		35.00	35.00
P6 OF 06				-		22.00	22.00
P6 OF 07				-		16.00	16.00
				-			-
P5 OF 01				-	-	22.00	22.00
P5 OF 02				-		32.00	32.00
P5 OF 03				-		27.00	27.00
P5 OF 04				-		57.00	57.00
P5 OF 05				-		28.00	28.00
P5 OF 06				-		30.00	30.00
P5 OF 07				-		38.00	38.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	401.00
						Subtotal	
						TOTAL	401.00

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.14**	**Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**ML**



Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
PISO 6		1,850.00				1.00	1,850.00
PISO 5		1,321.00				1.00	1,321.00
PISO 5 2		760.00				1.00	760.00
				-			-
				-			-
						Subtotal	3,931.00
						Subtotal	
						TOTAL	**3,931.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.15**	**Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte, trasiego necesarios y disposición final)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**





Localización	**Dimensiones**					**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Alto**	**Área**	**Volumen**		
PISO 6				-	-	4.00	4.00
PISO 5				-		2.00	2.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	6.00
						Subtotal	
						TOTAL	**6.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

1	PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES	1.17	Desmonte de Cielo Raso.	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	M2





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
P6 OF 01	7.65	1.20	-	9.18	-	1.00	9.18
	0.78	0.48		0.37		1.00	0.37
	0.17	0.85		0.14		-2.00	-0.29
	0.58	0.95		0.55		-2.00	-1.10
P6 OF 02	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P6 OF 03	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P6 OF 04	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
O6 OF 06	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P6 OF 07	5.65	13.20		74.58		1.00	74.58
	0.17	0.95		0.16		-2.00	-0.32
	4.85	2.02		9.80		1.00	9.80
	0.95	1.48		1.41		1.00	1.41
P6 OF 05	7.92	3.77		29.86		1.00	29.86
	5.85	5.00		29.25		1.00	29.25
	7.90	1.75		13.83		1.00	13.83
	8.19	1.50		12.29		1.00	12.29
	5.17	2.85		14.73		2.00	29.47
	2.45	2.10		5.15		1.00	5.15
	4.00	2.10		8.40		1.00	8.40
	0.17	0.95		0.16		-2.00	-0.32
CORREDOR P6	5.10	2.30		11.73		1.00	11.73
	2.30	0.67		1.54		2.00	3.08
	0.98	0.58		0.57		-1.00	-0.57
P5 OF 01	7.65	1.20	-	9.18	-	1.00	9.18
	0.78	0.48		0.37		1.00	0.37
	0.17	0.85		0.14		-2.00	-0.29
	0.58	0.95		0.55		-2.00	-1.10



P5 OF 02	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P5 OF 03	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P5 OF 04	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P5 OF 06	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P5 OF 07	5.65	13.20		74.58		1.00	74.58
	0.17	0.95		0.16		-2.00	-0.32
	4.85	2.02		9.80		1.00	9.80
	0.95	1.48		1.41		1.00	1.41
P5 OF 05	8.00	3.77		30.16		1.00	30.16
	5.85	5.00		29.25		1.00	29.25
	8.00	1.70		13.60		1.00	13.60
	3.00	1.50		4.50		1.00	4.50
	5.00	2.85		14.25		1.00	14.25
	0.17	0.95		0.16		-6.00	-0.97
CORREDOR P5	5.10	2.30		11.73		1.00	11.73
	2.30	0.67		1.54		2.00	3.08
	0.98	0.58		0.57		-1.00	-0.57
				-			-
						Subtotal	1,047.03
						Subtotal	
						TOTAL	**1,047.03**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

1	PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES	1.19	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt. (Incluye trasiego y disposición final)	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	ML





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
PISO 6		336.01	-	-	-	1.00	336.01
PISO 5		215.61				1.00	215.61
PISO 5 SEGUNDA MITAD		97.91				1.00	97.91
					-		-
						Subtotal	649.53
						Subtotal	
						TOTAL	649.53

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.20**	**Demolición de pañetes.**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**M2**



Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
BAÑO HOMBRES	5.40		2.40	12.96	-	1.00	12.96
	5.74		2.40	13.78		1.00	13.78
	0.34		2.40	0.82		1.00	0.82
	0.82		2.40	1.97		1.00	1.97
	4.02		2.40	9.65		1.00	9.65
	3.20		2.40	7.68		1.00	7.68
	1.30		2.40	3.12		1.30	4.06
	0.18		2.40	0.43		1.00	0.43
VENTANA	2.25		0.73	1.64		-1.00	-1.64
PUERTA	1.00		2.05	2.05		-1.00	-2.05
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	47.64
						Subtotal	
						TOTAL	**47.64**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

1	PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES	1.23	Demolición de enchapes Piso/Muro.	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	M2





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
P6 OF 01	7.65	1.20	-	9.18	-	1.00	9.18
	0.78	0.48		0.37		1.00	0.37
	0.17	0.85		0.14		-2.00	-0.29
	0.58	0.95		0.55		-2.00	-1.10
P6 OF 02	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P6 OF 03	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P6 OF 04	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
O6 OF 06	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P6 OF 07	5.65	13.20		74.58		1.00	74.58
	0.17	0.95		0.16		-2.00	-0.32
	4.85	2.02		9.80		1.00	9.80
	0.95	1.48		1.41		1.00	1.41
P6 OF 05	7.92	3.77		29.86		1.00	29.86
	5.85	5.00		29.25		1.00	29.25
	7.90	1.75		13.83		1.00	13.83
	8.19	1.50		12.29		1.00	12.29
	5.17	2.85		14.73		2.00	29.47
	2.45	2.10		5.15		1.00	5.15
	4.00	2.10		8.40		1.00	8.40
	0.17	0.95		0.16		-2.00	-0.32
P5 OF 01	7.65	1.20	-	9.18	-	1.00	9.18
	0.78	0.48		0.37		1.00	0.37
	0.17	0.85		0.14		-2.00	-0.29
	0.58	0.95		0.55		-2.00	-1.10
P5 OF 02	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P5 OF 03	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P5 OF 04	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P5 OF 06	5.85	13.20		77.22		1.00	77.22
	0.17	0.95		0.16		-4.00	-0.65
P5 OF 07	5.65	13.20		74.58		1.00	74.58
	0.17	0.95		0.16		-2.00	-0.32
	4.85	2.02		9.80		1.00	9.80
	0.95	1.48		1.41		1.00	1.41



P5 OF 05	8.00	3.77		30.16		1.00	30.16
	5.85	5.00		29.25		1.00	29.25
	8.00	1.70		13.60		1.00	13.60
	3.00	1.50		4.50		1.00	4.50
	5.00	2.85		14.25		1.00	14.25
	0.17	0.95		0.16		-6.00	-0.97
CORREDOR INGRESOS OFICINAS PISO 6	2.55	45.00		114.75		1.00	114.75
	4.40	1.80		7.92		1.00	7.92
	0.95	0.45		0.43		-8.00	-3.42
	10.20	5.25	-	26.78	-	1.00	26.78
CORREDOR INGRESOS OFICINAS PISO 5	2.55	45.00		114.75		1.00	114.75
	4.40	1.80		7.92		1.00	7.92
	0.95	0.45		0.43		-8.00	-3.42
	10.20	5.25	-	26.78	-	1.00	26.78
PAREDES BAÑO HOMBRES PISO 5	5.40		2.40	12.96	-	1.00	12.96
	5.74		2.40	13.78		1.00	13.78
	0.34		2.40	0.82		1.00	0.82
	0.82		2.40	1.97		1.00	1.97
	4.02		2.40	9.65		1.00	9.65
	3.20		2.40	7.68		1.00	7.68
	1.30		2.40	3.12		1.30	4.06
	0.18		2.40	0.43		1.00	0.43
VENTANA	2.25		0.73	1.64		-1.00	-1.64
PUERTA	1.00		2.05	2.05		-1.00	-2.05
PISO BAÑO HOMBES PISO 5	5.74	4.02		23.07		1.00	23.07
	0.82	0.34		0.28		-1.00	-0.28
	0.18	1.30		0.23		-1.00	-0.23
				-			-
						Subtotal	1,380.79
						Subtotal	
						TOTAL	**1,380.79**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

1	**PRELIMINARES**	**1.25**	**Demolición de guarda escoba.**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**ML**





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
CORREDORES PISO 6		74.04			-	1.00	74.04
CORREDORES PISO 5		74.04				1.00	74.04
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					-		-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
				-			-
						Subtotal	148.08
						Subtotal	
						TOTAL	**148.08**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

1	PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES	1.29	Demolición muros en mampostería e=15cm.	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	M2

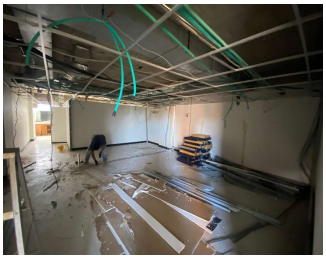





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
P6 OF 01	4.85		2.90	14.07	-	1.00	14.07
	3.06		2.90	8.87		1.00	8.87
	1.50		1.10	1.65		1.00	1.65
	1.50		0.85	1.28		2.00	2.55
	1.00		2.00	2.00		1.00	2.00
P6 OF 03	1.35		2.90	3.92		1.00	3.92
P6 OF 05	1.50		2.90	4.35		1.00	4.35
P6 OF 06	1.50		2.90	4.35		1.00	4.35
	1.50		0.85	1.28		1.00	1.28
	1.00		2.00	2.00		1.00	2.00
				-			-
PISO 5 OF 01, 02 Y 03	1.35		2.90	3.92		3.00	11.75
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

1	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**1.33**	**Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes de estructura, accesorios, equipos)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**M2**







Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
P6 OF 01		2.60	2.25	5.85	-	1.00	5.85
		3.10	2.25	6.98		6.00	41.85
P4 OF 02		4.20	2.25	9.45		3.00	28.35
P6 0F 03		2.80	2.25	6.30		3.00	18.90
P6 OF 04		4.20	2.25	9.45		1.00	9.45
		2.50	2.25	5.63		2.00	11.25
		2.10	2.25	4.73		2.00	9.45
		3.80	2.25	8.55		1.00	8.55
P6 OF 05		3.80	2.25	8.55		1.00	8.55
		2.80	2.25	6.30		1.00	6.30
		1.90	2.25	4.28		2.00	8.55
		1.50	2.25	3.38		1.00	3.38
P6 OF 06		2.25	2.25	5.06		3.00	15.19
		2.50	2.25	5.63		1.00	5.63
		2.30	2.25	5.18		1.00	5.18
		4.95	2.25	11.14		1.00	11.14
P6 OF 07		5.45	2.25	12.26		1.00	12.26
		2.60	2.25	5.85		1.00	5.85
		3.60	2.25	8.10		1.00	8.10
				-			-
P5 OF 06		2.87	2.20	6.31		3.00	18.94
		13.10	2.20	28.82		1.00	28.82
P5 OF 07		5.65	2.20	12.43		1.00	12.43
		3.20	2.20	7.04		1.00	7.04
		1.70	2.20	3.74		1.00	3.74
				-			-
						Subtotal	294.73
						Subtotal	
						TOTAL	**294.73**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

1	PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES	1.36	Trasiego, retiro y disposicion final de escombros y sobrantes.	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	M3





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
CIELO RASO			0.02	1,047.03	20.94	1.30	27.22
PAÑETES			0.03	47.64	1.43	1.30	1.86
ENCHAPES			0.03	1,380.79	41.42	1.30	53.85
MAMPOSTERIA			0.15	56.77	8.52	1.30	11.07
DRYWALL			0.12	294.73	35.37	1.30	45.98
				-	-		-
				-	-		-
				-	-		-
				-	-		-
				-	-		-
				-	-		-
				-	-		-
				-	-		-
				-	-		-
				-	-		-
				-	-		-
				-	-		-
				-	-		-
				-	-		-
				-	-		-
					-		-
					-		-
				-			-
						Subtotal	139.98
						Subtotal	
						TOTAL	139.98

OBSERVACIONES:

OBRA **CONSROCIO CARVI** ALBA VIVIANA TORRES USECHE REPRESENTANTE LEGAL	INTERVENTORÍA **CONSORCIO JR** JESUS MARIA RUIZ PEREZ REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

2	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO	2.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	M2









Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
archivo lado oficina magistrado		4.86	2.90	14.09		1.00	14.09
		3.09	2.00	6.18		1.00	6.18
		0.95	2.00	1.90		1.00	1.90
DESPACHO MASGISTRADO		9.04	2.90	26.22	-	1.00	26.22
		1.75	1.00	1.75		1.00	1.75
		2.72	0.30	0.82		1.00	0.82
		0.95	2.00	1.90		-1.00	-1.90
		5.60	2.90	16.24		1.00	16.24
OF JUZ 01 CIV DE RESTITUCION		11.70	2.90	33.93		1.00	33.93
		1.51	2.90	4.38		1.00	4.38
		2.91	2.90	8.44		1.00	8.44
		5.34	0.30	1.60		1.00	1.60
		1.81	1.00	1.81		1.00	1.81
		0.95	2.00	1.90		-1.00	-1.90
OF JUZ 07 EJECUCION DE PENAS		2.80	2.90	8.12		1.00	8.12
		1.82	1.00	1.82		1.00	1.82
		2.80	0.30	0.84		1.00	0.84
		0.95	2.00	1.90		-1.00	-1.90
OF JUZ 06 EJECUCION DE PENAS		11.67	2.90	33.84		1.00	33.84
		2.90	2.90	8.41		1.00	8.41
		1.78	1.00	1.78		1.00	1.78
		2.86	0.30	0.86		1.00	0.86
		0.95	2.00	1.90		-1.00	-1.90
OF JUZ 05 EJECUCION DE PENAS		2.81	2.90	8.15		1.00	8.15
		1.91	1.00	1.91		1.00	1.91
		2.86	0.30	0.86		1.00	0.86
		0.95	2.00	1.90		-1.00	-1.90
OF JUZ 04 LABORAL		4.18	2.90	12.12		1.00	12.12
		2.86	2.90	8.29		1.00	8.29
		1.83	1.00	1.83		1.00	1.83
		5.50	0.30	1.65		1.00	1.65
		0.95	2.00	1.90		-1.00	-1.90
OF JUZ DE EXTINCION		2.66	1.00	2.66		1.00	2.66
		2.85	2.90	8.27		1.00	8.27
		1.87	2.90	5.42		1.00	5.42
		1.00	2.90	2.90		1.00	2.90
		3.61	0.30	1.08		1.00	1.08
		0.95	2.00	1.90		-1.00	-1.90
AUDITORIA INTERNA		0.90	2.90	2.61		1.00	2.61
		3.86	2.90	11.19		1.00	11.19
ESPACIO LIBRE		2.82	2.90	8.18		1.00	8.18
		0.70	2.90	2.03		1.00	2.03
		1.48	2.90	4.29		1.00	4.29
		1.00	1.00	1.00		1.00	1.00
		1.95	0.30	0.59		1.00	0.59
		0.97	2.00	1.94		-1.00	-1.94
OF JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS		13.23	2.90	38.37		1.00	38.37
		1.72	1.00	1.72		1.00	1.72
		2.91	2.90	8.44		1.00	8.44
		2.68	0.30	0.80		1.00	0.80
		0.96	2.00	1.92		-1.00	-1.92
OF JUZ 02 PEQUEÑAS CAUSAS		2.82	2.90	8.18		1.00	8.18
		1.75	1.00	1.75		1.00	1.75
		2.70	0.30	0.81		1.00	0.81
		0.95	2.00	1.90		-1.00	-1.90
OF JUZ 01 PEQUEÑAS CAUSAS		13.21	2.90	38.31		1.00	38.31
		2.83	2.90	8.21		1.00	8.21
		1.63	1.00	1.63		1.00	1.63
		2.60	0.30	0.78		1.00	0.78
		0.95	2.00	1.90		-1.00	-1.90
OF JUZ MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS		2.70	2.90	7.83		1.00	7.83
		1.80	1.00	1.80		1.00	1.80
		2.75	0.30	0.83		1.00	0.83
		0.95	2.00	1.90		-1.00	-1.90
archivo lado juz municipal de pequeñas causas		4.85	2.90	14.07		1.00	14.07
PISO 5 ARCHIVO AL LADO JUZGADO		4.86	2.90	14.09		1.00	14.09
		1.77	1.00	1.77		1.00	1.77







P5 JUZ 07 PENAL		11.69	2.90	33.90		1.00	33.90
		2.74	2.05	5.62		1.00	5.62
		2.73	0.30	0.82		1.00	0.82
		0.95	2.00	1.90		-1.00	-1.90
P5 JUZ 06 PENAL		2.74	2.90	7.95		1.00	7.95
		1.79	1.00	1.79		1.00	1.79
		2.74	0.30	0.82		1.00	0.82
		0.95	2.00	1.90		-1.00	-1.90
P5 JUZ 09 PENAL MUNICIPAL		1.90	1.00	1.90		1.00	1.90
		11.71	2.90	33.96		1.00	33.96
		2.87	2.90	8.32		1.00	8.32
		2.85	0.30	0.86		1.00	0.86
		0.96	2.90	2.78		-1.00	-2.78
P5 JUZ 10 PENAL MUNICIPAL		2.86	2.90	8.29		1.00	8.29
		1.91	1.00	1.91		1.00	1.91
		2.87	0.30	0.86		1.00	0.86
		0.95	2.00	1.90		-1.00	-1.90
P5 JUZ 11 PENAL MUNICIPAL		11.71	2.90	33.96		1.00	33.96
		1.93	1.00	1.93		1.00	1.93
		2.87	2.90	8.32		1.00	8.32
		2.88	0.30	0.86		1.00	0.86
		0.96	2.00	1.92		-1.00	-1.92
P5 JUZ 12 PENAL MUNICIPAL		1.89	1.00	1.89		1.00	1.89
		2.85	2.90	8.27		1.00	8.27
		2.84	0.30	0.85		1.00	0.85
		0.96	2.00	1.92		-1.00	-1.92
P5 JUZ 13 PENAL MUNICIPAL		1.90	1.00	1.90		1.00	1.90
		13.25	2.90	38.43		1.00	38.43
		2.88	2.90	8.35		1.00	8.35
		2.87	0.30	0.86		1.00	0.86
		0.96	2.00	1.92		-1.00	-1.92
P5 JUZ 101 PENAL AMBULANTE		1.75	1.00	1.75		1.00	1.75
		2.70	2.90	7.83		1.00	7.83
		2.85	2.90	8.27		1.00	8.27
		0.96	2.00	1.92		-1.00	-1.92
		2.70	0.30	0.81		1.00	0.81
		0.87	2.00	1.74		-1.00	-1.74
P5 OF NUEVA 01 SALA TEC		3.62	0.30	1.09		1.00	1.09
		2.65	1.00	2.65		1.00	2.65
P5 OF NUEVA 02		2.84	2.90	8.24		1.00	8.24
		0.95	2.00	1.90		-1.00	-1.90
		1.50	2.90	4.35		1.00	4.35
		0.96	2.00	1.92		-1.00	-1.92
P5 OF NUEVA 03		13.26	2.90	38.45		1.00	38.45
		2.83	2.90	8.21		1.00	8.21
		1.67	1.00	1.67		1.00	1.67
		2.65	0.30	0.80		1.00	0.80
		0.95	2.00	1.90		-1.00	-1.90
P5 OF NUEVA 04		2.89	2.90	8.38		1.00	8.38
		1.78	1.00	1.78		1.00	1.78
		2.74	0.30	0.82		1.00	0.82
		0.95	2.00	1.90		-1.00	-1.90
P5 OF NUEVA 05		5.50	0.30	1.65		1.00	1.65
				-			
						Subtotal	668.41
						Subtotal	
						TOTAL	**668.41**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

3	**ALISTADO DE PISOS**	**3.10**	**Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**M2**





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
CORREDOR INGRESOS OFICINAS PISO 6	2.55	45.00		114.75		1.00	114.75
	4.40	1.80		7.92		1.00	7.92
	0.95	0.45		0.43		-8.00	-3.42
	10.20	5.25	-	26.78	-	1.00	26.78
CORREDOR INGRESOS OFICINAS PISO 5	2.55	45.00		114.75		1.00	114.75
	4.40	1.80		7.92		1.00	7.92
	0.95	0.45		0.43		-8.00	-3.42
	10.20	5.25	-	26.78	-	1.00	26.78
PISO BAÑO HOMBES PISO 5	5.74	4.02		23.07		1.00	23.07
	0.82	0.34		0.28		-1.00	-0.28
	0.18	1.30		0.23		-1.00	-0.23
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	314.61
						Subtotal	
						TOTAL	**314.61**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

4	**PAÑETES**	**4.10**	**Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**M2**



Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
BAÑO HOMBRES	5.40		2.40	12.96	-	1.00	12.96
	5.74		2.40	13.78		1.00	13.78
	0.34		2.40	0.82		1.00	0.82
	0.82		2.40	1.97		1.00	1.97
	4.02		2.40	9.65		1.00	9.65
	3.20		2.40	7.68		1.00	7.68
	1.30		2.40	3.12		1.30	4.06
	0.18		2.40	0.43		1.00	0.43
VENTANA	2.25		0.73	1.64		-1.00	-1.64
PUERTA	1.00		2.05	2.05		-1.00	-2.05
				-			-
VANOS CERRADOS DE PUERTAS	1.00		2.00	2.00		10.00	20.00
VANOS CERRADOS DE DUCTOS	0.50		0.30	0.15		44.00	6.60
	0.80		0.60	0.48		4.00	1.92
	0.60		0.40	0.24		8.00	1.92
				-			-
						Subtotal	78.08
						Subtotal	
						TOTAL	**78.08**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

6	ESTUCO Y PINTURA	6.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	M2





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
archivo lado oficina magistrado	13.05		2.60	33.93	-	1.00	33.93
	4.04		2.00	8.08		-1.00	-8.08
	0.95		2.00	1.90		-1.00	-1.90
DESPACHO MASGISTRADO	16.02		2.60	41.65	-	1.00	41.65
	5.60		0.82	4.59		1.00	4.59
	0.43		0.71	0.31	-	8.00	2.44
	5.15		0.40	2.06		1.00	2.06
	4.04		2.00	8.08		-1.00	-8.08
	0.80		2.00	1.60		-1.00	-1.60
	4.04		2.00	8.08		-1.00	-8.08
OF JUZ 01 CIV DE RESTITUCION	7.58		2.60	19.71		1.00	19.71
	2.92		0.94	2.74		1.00	2.74
	2.69		0.40	1.08		1.00	1.08
	0.40		0.71	0.28		4.00	1.14
OF JUZ 07 EJECUCION DE PENAS	9.61		2.60	24.99		1.00	24.99
	2.80		0.84	2.35		1.00	2.35
	2.69		0.40	1.08		1.00	1.08
	0.18		2.10	0.38		1.00	0.38
	0.42		0.71	0.30		4.00	1.19
OF JUZ 06 EJECUCION DE PENAS	12.37		2.60	32.16		1.00	32.16
	2.93		0.82	2.40		1.00	2.40
	2.67		0.41	1.09		1.00	1.09
	0.41		0.70	0.29		4.00	1.15
OF JUZ 05 EJECUCION DE PENAS	19.47		2.60	50.62		1.00	50.62
	2.76		0.82	2.26		1.00	2.26
	2.67		0.41	1.09		1.00	1.09
	0.41		0.70	0.29		4.00	1.15
OF JUZ 04 LABORAL	21.21		2.60	55.15		1.00	55.15
	2.92		0.82	2.39		1.00	2.39
	2.71		0.41	1.11		1.00	1.11
	0.41		0.71	0.29		4.00	1.16
OF JUZ DE EXTINCION	20.76		2.60	53.98		1.00	53.98
	2.82		0.83	2.34		1.00	2.34
	0.40		0.71	0.28		4.00	1.14
	2.70		0.40	1.08		1.00	1.08
CORREDOR EMERGENCIA	20.69		2.60	53.79		1.00	53.79
	0.80		2.00	1.60		-2.00	-3.20
	0.95		2.00	1.90		-1.00	-1.90
	2.32		2.15	4.99		-1.00	-4.99
AUDITORIA INTERNA	11.74		2.60	30.52		1.00	30.52
	5.83		0.82	4.78		1.00	4.78
	0.42		0.70	0.29		4.00	1.18
	5.33		0.40	2.13		1.00	2.13







ESPACIO LIBRE	35.96		2.60	93.50		3.00	280.49
	2.84		0.82	2.33		2.00	4.66
	0.40		7.00	2.80		8.00	22.40
	2.69		0.41	1.10		2.00	2.21
	1.90		0.80	1.52		-2.00	-3.04
OF JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS	13.98		2.60	36.35		1.00	36.35
	2.96		0.82	2.43		1.00	2.43
	2.71		0.40	1.08		1.00	1.08
	0.40		0.70	0.28		4.00	1.12
OF JUZ 02 PEQUEÑAS CAUSAS	14.14		2.60	36.76		1.00	36.76
	2.77		0.83	2.30		1.00	2.30
	0.40		0.70	0.28		4.00	1.12
	2.69		0.40	1.08		1.00	1.08
OF JUZ 01 PEQUEÑAS CAUSAS	14.06		2.60	36.56		1.00	36.56
	2.95		0.83	2.45		1.00	2.45
	2.59		0.40	1.04		1.00	1.04
	0.40		0.71	0.28		4.00	1.14
OF JUZ MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS	8.23		2.60	21.40		1.00	21.40
	2.00		0.85	1.70		-1.00	-1.70
	0.40	.	0.70	0.28		4.00	1.12
	2.66		0.83	2.21		1.00	2.21
	2.60		0.40	1.04		1.00	1.04
archivo lado juz municipal de pequeñas causas	28.97		2.60	75.32	-	1.00	75.32
	0.95		2.00	1.90		-1.00	-1.90
PISO 6 CUARTO TECNICO	15.44		2.87	44.31		1.00	44.31
	0.97		1.00	0.97		-1.00	-0.97
	1.10		0.20	0.22		-1.00	-0.22
	0.40		0.30	0.12		-1.00	-0.12
	0.77		0.56	0.43		-1.00	-0.43
	0.35		0.45	0.16		-1.00	-0.16
	0.25		0.30	0.08		-1.00	-0.08
	1.40		0.09	0.13		-1.00	-0.13
PAREDES CORREDORES DE INGRESO OFICINA P6	40.19		2.77	111.33		1.00	111.33
	0.96		2.03	1.95		-1.00	-1.95
	5.38		0.72	3.87		1.00	3.87
	0.99		1.92	1.90		-2.00	-3.80
	0.80		1.92	1.54		-1.00	-1.54
	1.38		1.92	2.65		-1.00	-2.65
	1.40		0.09	0.13		-1.00	-0.13
	0.46		0.69	0.32		-1.00	-0.32
	0.82		0.25	0.21		-1.00	-0.21
	1.03		0.81	0.83		-1.00	-0.83
	0.43		0.43	0.18		-1.00	-0.18
	0.46		0.40	0.18		-1.00	-0.18
	4.76		0.73	3.47		1.00	3.47
	10.60		0.73	7.74		1.00	7.74
	2.38		2.77	6.59		6.00	39.56
SUPERIOR INGRESOS OFICINAS PISO 6							
	15.68	1.50		11.76		1.00	11.76
							-
archivo lado juz 07 PENAL	19.20		2.60	49.92	-	1.00	49.92
	0.96		2.00	1.92		-1.00	-1.92
	4.95		0.15	0.74		1.00	0.74
OF JUZ 07 PENAL	8.26		2.60	21.48		1.00	21.48
	0.78		1.92	1.50		-1.00	-1.50
	2.75		0.82	2.26		1.00	2.26
	2.62		0.41	1.07		1.00	1.07
	0.40		0.71	0.28		4.00	1.14
OF JUZ 06 PENAL	12.38		2.60	32.19		1.00	32.19
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	2.74		0.82	2.25		1.00	2.25
	2.57		0.40	1.03		1.00	1.03
	0.39		0.70	0.27		4.00	1.09







OF JUZ 09 PENAL MUNICIPAL	12.45		2.60	32.37		1.00	32.37
	2.87		0.83	2.38		1.00	2.38
	0.40		0.71	0.28		4.00	1.14
	2.68		0.40	1.07		1.00	1.07
OF JUZ 10 PENAL MUNICIPAL	12.39		2.60	32.21		1.00	32.21
	2.85		0.83	2.37		1.00	2.37
	2.67		0.40	1.07		1.00	1.07
	0.40		0.70	0.28		4.00	1.12
OF JUZ 11 PENAL MUNICIPAL	12.44		2.60	32.34		1.00	32.34
	2.85		0.82	2.34		1.00	2.34
	2.68		0.40	1.07		1.00	1.07
	0.40		0.71	0.28		4.00	1.14
OF JUZ 12 PENAL MUNICIPAL	12.32		2.60	32.03		1.00	32.03
	2.84		0.84	2.39		1.00	2.39
	2.66		0.38	1.01		1.00	1.01
	0.38		0.71	0.27		4.00	1.08
OF JUZ 13 PENAL MUNICIPAL	12.47		2.60	32.42		1.00	32.42
	2.89		0.83	2.40		1.00	2.40
	2.71		0.38	1.03		1.00	1.03
	0.38		0.70	0.27		4.00	1.06
OF JUZ 01 AMBULANTE	13.97		2.60	36.32		1.00	36.32
	2.86		0.85	2.43		1.00	2.43
	2.68		0.40	1.07		1.00	1.07
	0.38		0.72	0.27		4.00	1.09
OF NUEVA 01 SALA TEC	24.79		2.60	64.45		1.00	64.45
	5.83		0.73	4.26		1.00	4.26
	5.38		0.38	2.04		1.00	2.04
	0.37		0.71	0.26		8.00	2.10
CORREDOR EMERGENCIA PISO 5	14.78		2.60	38.43		1.00	38.43
	2.34		2.04	4.77		-1.00	-4.77
	0.80		0.92	0.74		-1.00	-0.74
OF NUEVA 02 PISO 5	4.97		2.60	12.92		2.00	25.84
	2.83		0.83	2.35		1.00	2.35
	0.39		0.71	0.28		4.00	1.11
				-		8.00	-
OF NUEVA 03 PISO 5	14.01		2.60	36.43		1.00	36.43
	2.82		0.83	2.34		1.00	2.34
	2.69		0.39	1.05		1.00	1.05
	0.39		0.72	0.28		4.00	1.12
OF NUEVA 04 PISO 5	13.94		2.60	36.24		1.00	36.24
	2.90		0.84	2.44		1.00	2.44
	2.69		0.39	1.05		1.00	1.05
	0.38		0.72	0.27		4.00	1.09
OF NUEVA 05 PISO 5	14.14		2.60	36.76		1.00	36.76
	5.89		0.82	4.83		1.00	4.83
	5.24		0.38	1.99		1.00	1.99
	1.00		1.92	1.92		-1.00	-1.92
	15.07		2.60	39.18		1.00	39.18
	16.83		2.60	43.76		1.00	43.76
	1.00		1.90	1.90		-1.00	-1.90
	0.39		0.72	0.28		8.00	2.25
PAREDES CORREDORES DE INGRESO OFICINA P5	40.19		2.77	111.33		1.00	111.33
	0.96		2.03	1.95		-1.00	-1.95
	5.38		0.72	3.87		1.00	3.87
	0.99		1.92	1.90		-2.00	-3.80
	0.80		1.92	1.54		-1.00	-1.54
	1.38		1.92	2.65		-1.00	-2.65
	1.40		0.09	0.13		-1.00	-0.13
	0.46		0.69	0.32		-1.00	-0.32
	0.82		0.25	0.21		-1.00	-0.21
	1.03		0.81	0.83		-1.00	-0.83
	0.43		0.43	0.18		-1.00	-0.18
	0.46		0.40	0.18		-1.00	-0.18
	4.76		0.73	3.47		1.00	3.47
	10.60		0.73	7.74		1.00	7.74
	2.38		2.77	6.59		6.00	39.56
SUPERIOR INGRESOS OFICINAS PISO 5							
	15.68	1.50		11.76		1.00	11.76
							-

	PISO 5 CUARTO TECNICO	15.44		2.87	44.31		1.00	44.31
		0.97		1.00	0.97		-1.00	-0.97
		1.10		0.20	0.22		-1.00	-0.22
		0.40		0.30	0.12		-1.00	-0.12
		0.77		0.56	0.43		-1.00	-0.43
		0.35		0.45	0.16		-1.00	-0.16
		0.25		0.30	0.08		-1.00	-0.08
		1.40		0.09	0.13		-1.00	-0.13
					-			-
OBSERVACIONES:							**Subtotal**	2,027.84
							Subtotal	
							TOTAL	**2,027.84**

OBRA **CONSROCIO CARVI** ALBA VIVIANA TORRES USECHE REPRESENTANTE LEGAL	INTERVENTORÍA **CONSORCIO JR** JESUS MARIA RUIZ PEREZ REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

6	ESTUCO Y PINTURA	6.2	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	M2







Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
archivo lado oficina magistrado	13.05		2.60	33.93	-	1.00	33.93
	4.04		2.00	8.08		-1.00	-8.08
	0.95		2.00	1.90		-1.00	-1.90
DESPACHO MASGISTRADO	16.02		2.60	41.65	-	1.00	41.65
	5.60		0.82	4.59		1.00	4.59
	0.43		0.71	0.31	-	8.00	2.44
	5.15		0.40	2.06		1.00	2.06
	4.04		2.00	8.08		-1.00	-8.08
	0.80		2.00	1.60		-1.00	-1.60
	4.04		2.00	8.08		-1.00	-8.08
OF JUZ 01 CIV DE RESTITUCION	7.58		2.60	19.71		1.00	19.71
	2.92		0.94	2.74		1.00	2.74
	2.69		0.40	1.08		1.00	1.08
	0.40		0.71	0.28		4.00	1.14
OF JUZ 07 EJECUCION DE PENAS	9.61		2.60	24.99		1.00	24.99
	2.80		0.84	2.35		1.00	2.35
	2.69		0.40	1.08		1.00	1.08
	0.18		2.10	0.38		1.00	0.38
	0.42		0.71	0.30		4.00	1.19
OF JUZ 06 EJECUCION DE PENAS	12.37		2.60	32.16		1.00	32.16
	2.93		0.82	2.40		1.00	2.40
	2.67		0.41	1.09		1.00	1.09
	0.41		0.70	0.29		4.00	1.15
OF JUZ 05 EJECUCION DE PENAS	19.47		2.60	50.62		1.00	50.62
	2.76		0.82	2.26		1.00	2.26
	2.67		0.41	1.09		1.00	1.09
	0.41		0.70	0.29		4.00	1.15
OF JUZ 04 LABORAL	21.21		2.60	55.15		1.00	55.15
	2.92		0.82	2.39		1.00	2.39
	2.71		0.41	1.11		1.00	1.11
	0.41		0.71	0.29		4.00	1.16
OF JUZ DE EXTINCION	20.76		2.60	53.98		1.00	53.98
	2.82		0.83	2.34		1.00	2.34
	0.40		0.71	0.28		4.00	1.14
	2.70		0.40	1.08		1.00	1.08
CORREDOR EMERGENCIA	20.69		2.60	53.79		1.00	53.79
	0.80		2.00	1.60		-2.00	-3.20
	0.95		2.00	1.90		-1.00	-1.90
	2.32		2.15	4.99		-1.00	-4.99
AUDITORIA INTERNA	11.74		2.60	30.52		1.00	30.52
	5.83		0.82	4.78		1.00	4.78
	0.42		0.70	0.29		4.00	1.18
	5.33		0.40	2.13		1.00	2.13
ESPACIO LIBRE	35.96		2.60	93.50		3.00	280.49
	2.84		0.82	2.33		2.00	4.66
	0.40		7.00	2.80		8.00	22.40
	2.69		0.41	1.10		2.00	2.21
	1.90		0.80	1.52		-2.00	-3.04
OF JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS	13.98		2.60	36.35		1.00	36.35
	2.96		0.82	2.43		1.00	2.43
	2.71		0.40	1.08		1.00	1.08
	0.40		0.70	0.28		4.00	1.12
OF JUZ 02 PEQUEÑAS CAUSAS	14.14		2.60	36.76		1.00	36.76
	2.77		0.83	2.30		1.00	2.30
	0.40		0.70	0.28		4.00	1.12
	2.69		0.40	1.08		1.00	1.08
OF JUZ 01 PEQUEÑAS CAUSAS	14.06		2.60	36.56		1.00	36.56
	2.95		0.83	2.45		1.00	2.45
	2.59		0.40	1.04		1.00	1.04
	0.40		0.71	0.28		4.00	1.14







OF JUZ MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS	8.23		2.60	21.40		1.00	21.40
	2.00		0.85	1.70		-1.00	-1.70
	0.40	.	0.70	0.28		4.00	1.12
	2.66		0.83	2.21		1.00	2.21
	2.60		0.40	1.04		1.00	1.04
archivo lado juz municipal de pequeñas causas	28.97		2.60	75.32	-	1.00	75.32
	0.95		2.00	1.90		-1.00	-1.90
CUARTO TECNICO	15.44		2.87	44.31		1.00	44.31
	0.97		1.00	0.97		-1.00	-0.97
	1.10		0.20	0.22		-1.00	-0.22
	0.40		0.30	0.12		-1.00	-0.12
	0.77		0.56	0.43		-1.00	-0.43
	0.35		0.45	0.16		-1.00	-0.16
	0.25		0.30	0.08		-1.00	-0.08
	1.40		0.09	0.13		-1.00	-0.13
PAREDES CORREDORES DE INGRESO OFICINA P6	40.19		2.77	111.33		1.00	111.33
	0.96		2.03	1.95		-1.00	-1.95
	5.38		0.72	3.87		1.00	3.87
	0.99		1.92	1.90		-2.00	-3.80
	0.80		1.92	1.54		-1.00	-1.54
	1.38		1.92	2.65		-1.00	-2.65
	1.40		0.09	0.13		-1.00	-0.13
	0.46		0.69	0.32		-1.00	-0.32
	0.82		0.25	0.21		-1.00	-0.21
	1.03		0.81	0.83		-1.00	-0.83
	0.43		0.43	0.18		-1.00	-0.18
	0.46		0.40	0.18		-1.00	-0.18
	4.76		0.73	3.47		1.00	3.47
	10.60		0.73	7.74		1.00	7.74
	2.38		2.77	6.59		6.00	39.56
SUPERIOR INGRESOS OFICINAS PISO 6	1.80	47.40		85.32		1.00	85.32
	4.40	1.80		7.92		1.00	7.92
	0.95	0.45		0.43		-8.00	-3.42
	5.13	9.92	-	25.44	-	1.00	25.44
	15.68	1.50		11.76		1.00	11.76
							-
archivo lado juz 07 PENAL	19.20		2.60	49.92	-	1.00	49.92
	0.96		2.00	1.92		-1.00	-1.92
	4.95		0.15	0.74		1.00	0.74
OF JUZ 07 PENAL	8.26		2.60	21.48		1.00	21.48
	0.78		1.92	1.50		-1.00	-1.50
	2.75		0.82	2.26		1.00	2.26
	2.62		0.41	1.07		1.00	1.07
	0.40		0.71	0.28		4.00	1.14
OF JUZ 06 PENAL	12.38		2.60	32.19		1.00	32.19
	2.95		1.10	3.25		1.00	3.25
	2.74		0.82	2.25		1.00	2.25
	2.57		0.40	1.03		1.00	1.03
	0.39		0.70	0.27		4.00	1.09
OF JUZ 09 PENAL MUNICIPAL	12.45		2.60	32.37		1.00	32.37
	2.87		0.83	2.38		1.00	2.38
	0.40		0.71	0.28		4.00	1.14
	2.68		0.40	1.07		1.00	1.07
OF JUZ 10 PENAL MUNICIPAL	12.39		2.60	32.21		1.00	32.21
	2.85		0.83	2.37		1.00	2.37
	2.67		0.40	1.07		1.00	1.07
	0.40		0.70	0.28		4.00	1.12
OF JUZ 11 PENAL MUNICIPAL	12.44		2.60	32.34		1.00	32.34
	2.85		0.82	2.34		1.00	2.34
	2.68		0.40	1.07		1.00	1.07
	0.40		0.71	0.28		4.00	1.14
OF JUZ 12 PENAL MUNICIPAL	12.32		2.60	32.03		1.00	32.03
	2.84		0.84	2.39		1.00	2.39
	2.66		0.38	1.01		1.00	1.01
	0.38		0.71	0.27		4.00	1.08
OF JUZ 13 PENAL MUNICIPAL	12.47		2.60	32.42		1.00	32.42
	2.89		0.83	2.40		1.00	2.40
	2.71		0.38	1.03		1.00	1.03
	0.38		0.70	0.27		4.00	1.06
OF JUZ 01 AMBULANTE	13.97		2.60	36.32		1.00	36.32
	2.86		0.85	2.43		1.00	2.43
	2.68		0.40	1.07		1.00	1.07
	0.38		0.72	0.27		4.00	1.09
OF NUEVA 01 SALA TEC	24.79		2.60	64.45		1.00	64.45
	5.83		0.73	4.26		1.00	4.26
	5.38		0.38	2.04		1.00	2.04
	0.37		0.71	0.26		8.00	2.10







CORREDOR EMERGENCIA PISO 5	14.78		2.60	38.43		1.00	38.43
	2.34		2.04	4.77		-1.00	-4.77
	0.80		0.92	0.74		-1.00	-0.74
OF NUEVA 02 PISO 5	4.97		2.60	12.92		2.00	25.84
	2.83		0.83	2.35		1.00	2.35
	0.39		0.71	0.28		4.00	1.11
				-		8.00	-
OF NUEVA 03 PISO 5	14.01		2.60	36.43		1.00	36.43
	2.82		0.83	2.34		1.00	2.34
	2.69		0.39	1.05		1.00	1.05
	0.39		0.72	0.28		4.00	1.12
OF NUEVA 04 PISO 5	13.94		2.60	36.24		1.00	36.24
	2.90		0.84	2.44		1.00	2.44
	2.69		0.39	1.05		1.00	1.05
	0.38		0.72	0.27		4.00	1.09
OF NUEVA 05 PISO 5	14.14		2.60	36.76		1.00	36.76
	5.89		0.82	4.83		1.00	4.83
	5.24		0.38	1.99		1.00	1.99
	1.00		1.92	1.92		-1.00	-1.92
	15.07		2.60	39.18		1.00	39.18
	16.83		2.60	43.76		1.00	43.76
	1.00		1.90	1.90		-1.00	-1.90
	0.39		0.72	0.28		8.00	2.25
PAREDES CORREDORES DE INGRESO OFICINA P5	40.19		2.77	111.33		1.00	111.33
	0.96		2.03	1.95		-1.00	-1.95
	5.38		0.72	3.87		1.00	3.87
	0.99		1.92	1.90		-2.00	-3.80
	0.80		1.92	1.54		-1.00	-1.54
	1.38		1.92	2.65		-1.00	-2.65
	1.40		0.09	0.13		-1.00	-0.13
	0.46		0.69	0.32		-1.00	-0.32
	0.82		0.25	0.21		-1.00	-0.21
	1.03		0.81	0.83		-1.00	-0.83
	0.43		0.43	0.18		-1.00	-0.18
	0.46		0.40	0.18		-1.00	-0.18
	4.76		0.73	3.47		1.00	3.47
	10.60		0.73	7.74		1.00	7.74
	2.38		2.77	6.59		6.00	39.56
SUPERIOR INGRESOS OFICINAS PISO 5	1.80	47.40		85.32		1.00	85.32
	4.40	1.80		7.92		1.00	7.92
	0.95	0.45		0.43		-8.00	-3.42
	5.13	9.92	-	25.44	-	1.00	25.44
	15.68	1.50		11.76		1.00	11.76
							-
PISO 5 CUARTO TECNICO	15.44		2.87	44.31		1.00	44.31
	0.97		1.00	0.97		-1.00	-0.97
	1.10		0.20	0.22		-1.00	-0.22
	0.40		0.30	0.12		-1.00	-0.12
	0.77		0.56	0.43		-1.00	-0.43
	0.35		0.45	0.16		-1.00	-0.16
	0.25		0.30	0.08		-1.00	-0.08
	1.40		0.09	0.13		-1.00	-0.13
				-			-
						Subtotal	2,258.37
						Subtotal	
						TOTAL	**2,258.37**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL


CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

7	**ENCHAPES Y ACABADOS**	**7.16**	**Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**M2**

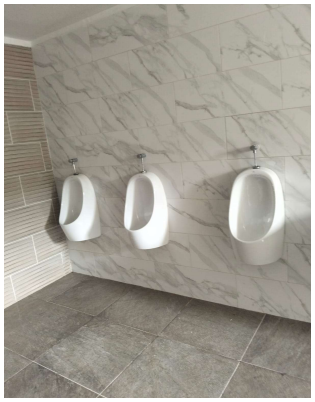

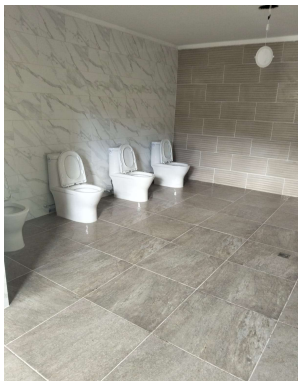

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
BAÑO HOMBRES	5.40		2.30	12.42	-	1.00	12.42
	5.74		2.30	13.20		1.00	13.20
	0.34		2.30	0.78		1.00	0.78
	0.82		2.30	1.89		1.00	1.89
	4.02		2.30	9.25		1.00	9.25
	3.20		2.30	7.36		1.00	7.36
	1.30		2.30	2.99		2.00	5.98
	0.20		2.30	0.46		1.00	0.46
VENTANA	2.25		0.73	1.64		-1.00	-1.64
PUERTA	1.00		2.05	2.05		-1.00	-2.05
				-			-
				-			-
						Subtotal	47.64
						Subtotal	
						TOTAL	**47.64**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

7	**ENCHAPES Y ACABADOS**	**7.18**	**Mesón en Granito SAN GABRIEL. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y salpicadero necesarios)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**ML**

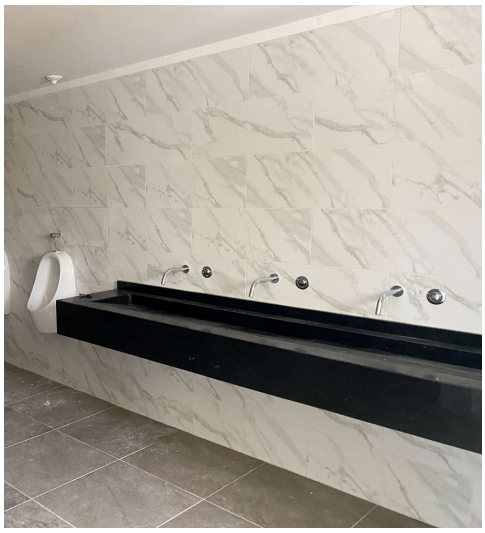

Localización	**Dimensiones**					**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Alto**	**Área**	**Volumen**		
BAÑO HOMBRES		3.00		-	-	1.00	3.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	3.00
						Subtotal	
						TOTAL	**3.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**


CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

7	**ENCHAPES Y ACABADOS**	**7.21**	**Tope de piso para puerta. Medialuna satinado o similar (Suministro e instalación)**	**UBICACIÓN**	
				UNIDAD	**UN**

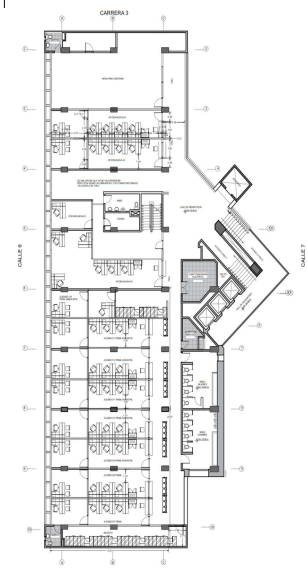

P7 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 5
ESCALA 1:100

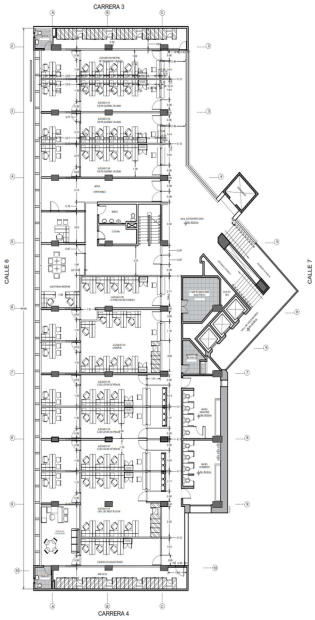

P8 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 6
ESCALA 1:100

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
archivo lado oficina magistrado			-	-	-	1.00	1.00
DESPACHO MASGISTRADO				-		2.00	2.00
OF JUZ 01 CIV DE RESTITUCION				-		2.00	2.00
OF JUZ 07 EJECUCION DE PENAS				-		2.00	2.00
OF JUZ 06 EJECUCION DE PENAS				-		2.00	2.00
OF JUZ 05 EJECUCION DE PENAS				-		2.00	2.00
OF JUZ 04 LABORAL				-		2.00	2.00
OF JUZ DE EXTINCIION				-		2.00	2.00
AUDITORIA INTERNA				-		1.00	1.00
AREA DISPONIBLE				-		2.00	2.00
				-		1.00	1.00
PISO 6 INGRESO ESCALERAS EMERGENCIA						1.00	1.00
OF JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS				-		2.00	2.00
OF JUZ 02 PEQUEÑAS CAUSAS				-		2.00	2.00
OF JUZ 01 PEQUEÑAS CAUSAS				-		2.00	2.00
OF JUZ MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS				-		2.00	2.00
archivo lado juz municipal de pequeñas causas				-		1.00	1.00
archivo lado juz 07 PENAL				-		1.00	1.00
OF JUZ 07 PENAL				-		2.00	2.00
OF JUZ 06 PENAL				-		2.00	2.00
OF JUZ 09 PENAL MUNICIPAL				-		2.00	2.00
OF JUZ 10 PENAL MUNICIPAL				-		2.00	2.00
OF JUZ 11 PENAL MUNICIPAL				-		2.00	2.00
OF JUZ 12 PENAL MUNICIPAL						2.00	2.00
OF JUZ 13 PENAL MUNICIPAL						2.00	2.00
OF JUZ 01 AMBULANTE						3.00	3.00
P5 OF NUEVA 01 SALA TEC				-		1.00	1.00
P5 OF NUEVA 02				-		1.00	1.00
P5 CORREDOR ESCALERAS EMERGANCIA				-		2.00	2.00
P5 OF 05 QUE NO SE INTERVNO				-		2.00	2.00
P5 OF NUEVA 03				-		2.00	2.00
P5 OF NUEVA 04				-		2.00	2.00
P4 OF 05 COMEDOR				-		2.00	2.00
				-			-
						Subtotal	59.00
						Subtotal	
						TOTAL	**59.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

8	**CARPINTERIA MADERA**	**8.1**	**Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**



Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
BAÑO DESPACHO MASGISTRADO				-		1.00	1.00
BAÑO OF JUZ MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS				-		1.00	1.00
BAÑO OF JUZ 07 PENAL				-		1.00	1.00
BAÑO COMEDOR PISO 5				-		2.00	2.00
PISO 6 BH						1.00	1.00
PISO 6 BM						1.00	1.00
PISO 6 CUARTO SERVICIO						1.00	1.00
PISO 6 CUARTO MAQUINAS						2.00	2.00
PISO 6 BAÑO CORREDOR EMERGENCIA						2.00	2.00
PISO 5 BH						1.00	1.00
PISO 5 BM						1.00	1.00
PISO 5 CUARTO SERVICIO						1.00	1.00
PISO 5 CUARTO MAQUINAS						2.00	2.00
PISO 5 BAÑO CORREDOR EMERGENCIA						1.00	1.00
				-			-
				-			-
						Subtotal	18.00
						Subtotal	
						TOTAL	**18.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

9	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**	**9.2**	**Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**



Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
BAÑO DESPACHO MASGISTRADO				-		1.00	1.00
BAÑO OF JUZ MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS				-		1.00	1.00
BAÑO OF JUZ 07 PENAL				-		1.00	1.00
BAÑO COMEDOR PISO 5				-		2.00	2.00
PISO 6 BH						1.00	1.00
PISO 6 BM						1.00	1.00
PISO 6 CUARTO SERVICIO						1.00	1.00
PISO 6 CUARTO MAQUINAS						1.00	1.00
PISO 6 BAÑO CORREDOR EMERGENCIA						2.00	2.00
PISO 5 BH						1.00	1.00
PISO 5 BM						1.00	1.00
PISO 5 CUARTO SERVICIO						1.00	1.00
PISO 5 CUARTO MAQUINAS						1.00	1.00
PISO 5 BAÑO CORREDOR EMERGENCIA						1.00	1.00
				-			-
				-			-
						Subtotal	16.00
						Subtotal	
						TOTAL	**16.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

9	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	9.4	Puerta en vidrio templado e=10 mm, 0,90x2,00m. (Suministro e instalación. Incluye cerradura, herrajes, accesorios)	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	UN





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
archivo lado oficina magistrado			-	-	-	1.00	1.00
DESPACHO MASGISTRADO				-		2.00	2.00
OF JUZ 01 CIV DE RESTITUCION				-		2.00	2.00
OF JUZ 07 EJECUCION DE PENAS				-		2.00	2.00
OF JUZ 06 EJECUCION DE PENAS				-		2.00	2.00
OF JUZ 05 EJECUCION DE PENAS				-		2.00	2.00
OF JUZ 04 LABORAL				-		2.00	2.00
OF JUZ DE EXTINCIION				-		2.00	2.00
AUDITORIA INTERNA				-		1.00	1.00
AREA DISPONIBLE				-		2.00	2.00
				-		1.00	1.00
PISO 6 INGRESO ESCALERAS EMERGENCIA						1.00	1.00
OF JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS				-		2.00	2.00
OF JUZ 02 PEQUEÑAS CAUSAS				-		2.00	2.00
OF JUZ 01 PEQUEÑAS CAUSAS				-		2.00	2.00
OF JUZ MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS				-		2.00	2.00
archivo lado juz municipal de pequeñas causas				-		1.00	1.00
archivo lado juz 07 PENAL				-		1.00	1.00
OF JUZ 07 PENAL				-		2.00	2.00
OF JUZ 06 PENAL				-		2.00	2.00
OF JUZ 09 PENAL MUNICIPAL				-		2.00	2.00
OF JUZ 10 PENAL MUNICIPAL				-		2.00	2.00
OF JUZ 11 PENAL MUNICIPAL				-		2.00	2.00
OF JUZ 12 PENAL MUNICIPAL						2.00	2.00
OF JUZ 13 PENAL MUNICIPAL						2.00	2.00
OF JUZ 01 AMBULANTE						3.00	3.00
P5 OF NUEVA 01 SALA TEC				-		1.00	1.00
P5 OF NUEVA 02				-		1.00	1.00
P5 CORREDOR ESCALERAS EMERGANCIA				-		2.00	2.00
P5 OF 05 QUE NO SE INTERVNO				-		2.00	2.00
P5 OF NUEVA 03				-		2.00	2.00
P5 OF NUEVA 04				-		2.00	2.00
P4 OF 05 COMEDOR				-		2.00	2.00
			-	-	-		-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	59.00
						Subtotal	
						TOTAL	59.00

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

9	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	9.6	Vidrio templado e=10 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	M2





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
archivo lado oficina magistrado			-	-	-		-
DESPACHO MASGISTRADO	1.75		1.54	2.70		1.00	2.70
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
OF JUZ 01 CIV DE RESTITUCION	2.57		2.57	6.60		1.00	6.60
	1.81		1.54	2.79		1.00	2.79
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
OF JUZ 07 EJECUCION DE PENAS	1.82		1.54	2.80		1.00	2.80
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
OF JUZ 06 EJECUCION DE PENAS	1.78		1.54	2.74		1.00	2.74
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
OF JUZ 05 EJECUCION DE PENAS	1.90		1.54	2.93		1.00	2.93
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
OF JUZ 04 LABORAL	1.84		1.54	2.83		1.00	2.83
	2.55		3.67	9.36		1.00	9.36
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
OF JUZ DE EXTINCIION	2.67		1.54	4.11		1.00	4.11
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
AUDITORIA INTERNA				-			-
ESPACIO LIBRE				-			-
P6 CORREDOR INGRESO ESCA EMERGENCIA	1.73		2.55	4.41		1.00	4.41
							-
CUARTO TECNICO	1.00		1.54	1.54		1.00	1.54
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
OF JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS	1.72		1.55	2.67		1.00	2.67
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
OF JUZ 02 PEQUEÑAS CAUSAS	1.74		1.55	2.70		1.00	2.70
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
OF JUZ 01 PEQUEÑAS CAUSAS	1.63		1.55	2.53		1.00	2.53
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53





OF JUZ MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS	1.80		1.55	2.79		1.00	2.79
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
archivo lado juz municipal de pequeñas causas				-			-
archivo lado juz 07 PENAL				-			-
OF JUZ 07 PENAL	1.79		1.55	2.77		1.00	2.77
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
OF JUZ 06 PENAL	1.79		1.55	2.77		1.00	2.77
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
OF JUZ 09 PENAL MUNICIPAL	1.79		1.55	2.77		1.00	2.77
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
OF JUZ 10 PENAL MUNICIPAL	1.79		1.55	2.77		1.00	2.77
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
OF JUZ 11 PENAL MUNICIPAL	1.79		1.55	2.77		1.00	2.77
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
OF JUZ 12 PENAL MUNICIPAL	1.79		1.55	2.77		1.00	2.77
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
OF JUZ 13 PENAL MUNICIPAL	1.79		1.55	2.77		1.00	2.77
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
OF JUZ 101 AMBULANTE	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
P5 CORREDOR INGRESO ESCA EMERGENCIA	1.73		2.55	4.41		1.00	4.41
P5 OF NUEVAS OF 5	2.70		1.55	4.19		1.00	4.19
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
P5 OF NUEVAS OF 06	1.70		1.55	2.64		1.00	2.64
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
P5 OF NUEVAS OF 06	1.70		1.55	2.64		1.00	2.64
	0.95		0.56	0.53		1.00	0.53
P5 OF NUEVAS OF 07	5.60		2.56	14.34		1.00	14.34
				-			-
						Subtotal	113.35
OBSERVACIONES:						**Subtotal**	
						TOTAL	**113.35**

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	13,1	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería , cable, aparato, accesorios 3m)	UBICACIÓN UNIDAD	NEIVA UN





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
archivo lado oficina magistrado						1.00	1.00
DESPACHO MASGISTRADO						3.00	3.00
OF JUZ 01 CIV DE RESTITUCION						2.00	2.00
OF JUZ 07 EJECUCION DE PENAS				-		2.00	2.00
OF JUZ 06 EJECUCION DE PENAS						2.00	2.00
OF JUZ 05 EJECUCION DE PENAS						2.00	2.00
OF JUZ 04 LABORAL						2.00	2.00
OF JUZ DE EXTINCIION						2.00	2.00
AUDITORIA INTERNA						1.00	1.00
ESPACIO LIBRE						2.00	2.00
							-
OF JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS						2.00	2.00
OF JUZ 02 PEQUEÑAS CAUSAS						2.00	2.00
OF JUZ 01 PEQUEÑAS CAUSAS						2.00	2.00
OF JUZ MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS						3.00	3.00
archivo lado juz municipal de pequeñas causas						1.00	1.00
PISO 6 CUARTO TENICO						1.00	1.00
PISO 6 CUARTO DE SERVICIO						1.00	1.00
PISO 6 BH						1.00	1.00



PISO 6 BM						1.00	1.00
BAÑOS CORREDOR EMERGENCIA				-		2.00	2.00
archivo lado JUZ 07 PENA				-		1.00	1.00
JUZ 07 PENAL				-		3.00	3.00
JUZ 06 PENAL				-		2.00	2.00
JUZ 09 PENAL MUNICIPAL						2.00	2.00
JUZ 10 PENAL MUNICIPAL						2.00	2.00
JUZ 11 PENAL MUNICIPAL						2.00	2.00
JUZ 12 PENAL MUNICIPAL						2.00	2.00
JUZ 13 PENAL MUNICIPAL						2.00	2.00
JUSZ 101 PENAL AMBULANTE				-		3.00	3.00
OFICINA NUEVA 01 P5				-		1.00	1.00
OF NUEVA 02 P5 Y CORREDOR				-		1.00	1.00
OF NUEVA 03 P5				-		2.00	2.00
OF NUEVA 04 P5						2.00	2.00
OF NUEVA 05 (CAFETERIA).						3.00	3.00
PISO 5 CUARTO TECNICO						1.00	1.00
PISO 5 CUARTO DE SERVICIO						1.00	1.00
PISO 5 BH						1.00	1.00
PISO 5 BM				-		1.00	1.00
PISO 5 BAÑO CORREDOR EMERGENCIA				-		1.00	1.00
				-			-
						Subtotal	68.00
						Subtotal	
						TOTAL	**68.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	13.6	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, canaleta, cable, toma, accesorios 3m)	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	UN





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
archivo lado oficina magistrado						-	-
DESPACHO MASGISTRADO						6.00	6.00
OF JUZ 01 CIV DE RESTITUCION						10.00	10.00
OF JUZ 07 EJECUCION DE PENAS				-		6.00	6.00
OF JUZ 06 EJECUCION DE PENAS						6.00	6.00
OF JUZ 05 EJECUCION DE PENAS						6.00	6.00
OF JUZ 04 LABORAL						11.00	11.00
OF JUZ DE EXTINCIION						7.00	7.00
AUDITORIA INTERNA						4.00	4.00
ESPACIO LIBRE						8.00	8.00
							-
OF JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS						7.00	7.00
OF JUZ 02 PEQUEÑAS CAUSAS						7.00	7.00
OF JUZ 01 PEQUEÑAS CAUSAS						7.00	7.00
OF JUZ MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS						7.00	7.00
archivo lado juz municipal de pequeñas causas						-	-
PISO 6 CUARTO TENICO						1.00	1.00
PISO 6 CUARTO DE SERVICIO							-
PISO 6 BH							-
PISO 6 BM							-
BAÑOS CORREDOR EMERGENCIA				-			-
archivo lado JUZ 07 PENA				-			-
JUZ 07 PENAL				-		6.00	6.00
JUZ 06 PENAL				-		6.00	6.00
JUZ 09 PENAL MUNICIPAL						6.00	6.00
JUZ 10 PENAL MUNICIPAL						6.00	6.00
JUZ 11 PENAL MUNICIPAL						6.00	6.00



JUZ 12 PENAL MUNICIPAL						6.00	6.00
JUZ 13 PENAL MUNICIPAL						6.00	6.00
JUSZ 101 PENAL AMBULANTE				-		3.00	3.00
OFICINA NUEVA 01 P5				-			-
OF NUEVA 02 P5 Y CORREDOR				-		2.00	2.00
OF NUEVA 03 P5				-		7.00	7.00
OF NUEVA 04 P5						7.00	7.00
OF NUEVA 05 (CAFETERIA).						22.00	22.00
PISO 5 CUARTO TECNICO						1.00	1.00
PISO 5 CUARTO DE SERVICIO							-
PISO 5 BH							-
PISO 5 BM				-			-
PISO 5 BAÑO CORREDOR EMERGENCIA				-			-
				-			-
						Subtotal	177.00
						Subtotal	
						TOTAL	**177.00**

OBSERVACIONES:

OBRA

CONSROCIO CARVI

ALBA VIVIANA TORRES USECHE

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA

CONSORCIO JR

JESUS MARIA RUIZ PEREZ

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	13.8	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	UN





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
						-	-
DESPACHO MASGISTRADO						6.00	6.00
OF JUZ 01 CIV DE RESTITUCION						10.00	10.00
OF JUZ 07 EJECUCION DE PENAS				-		6.00	6.00
OF JUZ 06 EJECUCION DE PENAS						6.00	6.00
OF JUZ 05 EJECUCION DE PENAS						6.00	6.00
OF JUZ 04 LABORAL						11.00	11.00
OF JUZ DE EXTINCIION						7.00	7.00
AUDITORIA INTERNA						4.00	4.00
ESPACIO LIBRE						8.00	8.00
							-
OF JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS						7.00	7.00
OF JUZ 02 PEQUEÑAS CAUSAS						7.00	7.00
OF JUZ 01 PEQUEÑAS CAUSAS						7.00	7.00
OF JUZ MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS						7.00	7.00
							-
PISO 6 CUARTO TENICO							-
PISO 6 CUARTO DE SERVICIO							-
PISO 6 BH							-
PISO 6 BM							-
BAÑOS CORREDOR EMERGENCIA				-			-
				-			-
JUZ 07 PENAL				-		6.00	6.00
JUZ 06 PENAL				-		6.00	6.00
JUZ 09 PENAL MUNICIPAL						6.00	6.00
JUZ 10 PENAL MUNICIPAL						6.00	6.00
JUZ 11 PENAL MUNICIPAL						6.00	6.00
JUZ 12 PENAL MUNICIPAL						6.00	6.00



JUZ 13 PENAL MUNICIPAL						6.00	6.00
JUSZ 101 PENAL AMBULANTE				-		3.00	3.00
OFICINA NUEVA 01 P5 SALA TEC				-		32.00	32.00
OF NUEVA 02 P5 Y CORREDOR				-		2.00	2.00
OF NUEVA 03 P5				-		7.00	7.00
OF NUEVA 04 P5						7.00	7.00
OF NUEVA 05 (CAFETERIA).						6.00	6.00
PISO 5 CUARTO TECNICO							-
PISO 5 CUARTO DE SERVICIO							-
PISO 5 BH							-
PISO 5 BM				-			-
PISO 5 BAÑO CORREDOR EMERGENCIA				-			-
						Subtotal	191.00
						Subtotal	
						TOTAL	**191.00**

OBSERVACIONES:

OBRA

CONSROCIO CARVI

ALBA VIVIANA TORRES USECHE

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA

CONSORCIO JR

JESUS MARIA RUIZ PEREZ

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	13.9	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	UN





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
archivo lado oficina magistrado						11.00	11.00
DESPACHO MASGISTRADO						10.00	10.00
OF JUZ 01 CIV DE RESTITUCION						13.00	13.00
OF JUZ 07 EJECUCION DE PENAS				-		7.00	7.00
OF JUZ 06 EJECUCION DE PENAS						7.00	7.00
OF JUZ 05 EJECUCION DE PENAS						7.00	7.00
OF JUZ 04 LABORAL						13.00	13.00
OF JUZ DE EXTINCIION						9.00	9.00
AUDITORIA INTERNA						4.00	4.00
ESPACIO LIBRE						11.00	11.00
CORREDOR						8.00	8.00
OF JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS						8.00	8.00
OF JUZ 02 PEQUEÑAS CAUSAS						8.00	8.00
OF JUZ 01 PEQUEÑAS CAUSAS						8.00	8.00
OF JUZ MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS						8.00	8.00
archivo lado juz municipal de pequeñas causas						11.00	11.00
PISO 6 CUARTO TENICO						4.00	4.00
PISO 6 CUARTO DE SERVICIO							-
PISO 6 BH							-
PISO 6 BM							-
BAÑOS CORREDOR EMERGENCIA				-		2.00	2.00
PISO 5 COOEDOR INGRESO						30.00	30.00
archivo lado JUZ 07 PENA				-		11.00	11.00
JUZ 07 PENAL				-		7.00	7.00
JUZ 06 PENAL				-		7.00	7.00
JUZ 09 PENAL MUNICIPAL						7.00	7.00
JUZ 10 PENAL MUNICIPAL						7.00	7.00
JUZ 11 PENAL MUNICIPAL						7.00	7.00
JUZ 12 PENAL MUNICIPAL						7.00	7.00



JUZ 13 PENAL MUNICIPAL						7.00	7.00
JUSZ 101 PENAL AMBULANTE				-		8.00	8.00
OFICINA NUEVA 01 P5 SALA TEC				-		11.00	11.00
CORREDOR						8.00	8.00
OF NUEVA 02 P5 Y CORREDOR				-		2.00	2.00
OF NUEVA 03 P5				-		8.00	8.00
OF NUEVA 04 P5						8.00	8.00
OF NUEVA 05 (CAFETERIA).						32.00	32.00
PISO 5 CUARTO TECNICO						4.00	4.00
PISO 5 CUARTO DE SERVICIO							-
PISO 5 BH							-
PISO 5 BM				-			-
PISO 5 BAÑO CORREDOR EMERGENCIA				-			-
PISO 5 CORREDOR PRINCIPAL						30.00	30.00
				-			-
						Subtotal	350.00
						Subtotal	
						TOTAL	**350.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024


CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	13.10	Salida sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	UN





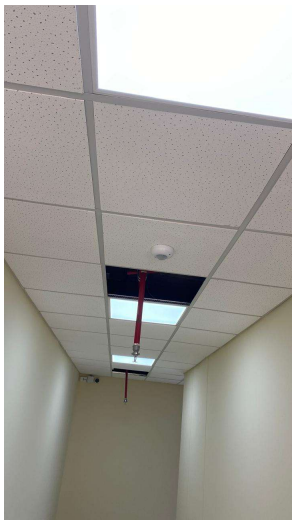

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
PISO 6						11.00	11.00
PISO 5						11.00	11.00
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	22.00
						Subtotal	
						TOTAL	22.00

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL


CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	13.11	Suministro e Instalacion de UPS On Line Trifasica de 20 KVA con autonomia a plena carga de 5 Minutos	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	UN



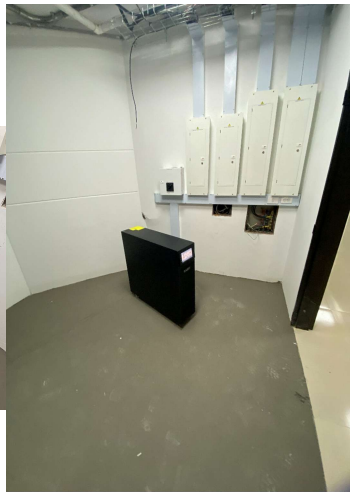

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
PISO 6						1.00	1.00
PISO 5						1.00	1.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-

OBSERVACIONES:

Subtotal	2.00
Subtotal	
TOTAL	2.00

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	13.12	Suministro e Instalacion de Transferencia Manual para UPS de 20KVA. Incluye cofre y automaticos	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	UN



Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
PISO 6						1.00	1.00
PISO 5						1.00	1.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	2.00
						Subtotal	
						TOTAL	2.00

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**


CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

13	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**13.13**	**Suministro e Instalacion de Acometida Electrica en cable de Cu 3x2+1x2+1x2, Incluye tuberia, automatico totalizador y accesorios**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**ML**

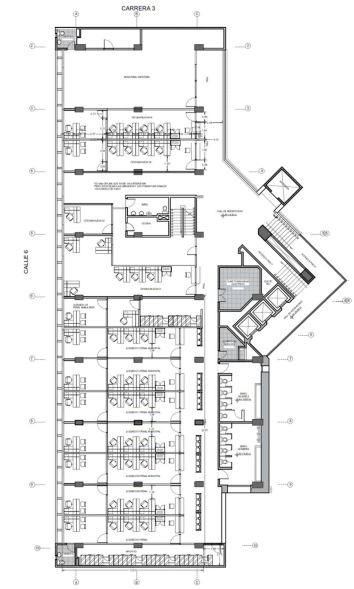

P7 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 5
ESCALA 1:100

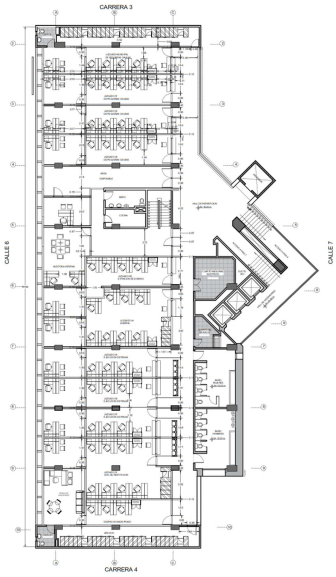

P8 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 6
ESCALA 1:100

Localización	**Dimensiones**					**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Alto**	**Área**	**Volumen**		
PISO 5		60.00				1.00	60.00
		50.00				1.00	50.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-

OBSERVACIONES:

Subtotal	110.00
Subtotal	
TOTAL	**110.00**

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL


CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	13.14	Suministro e Instalacion de Tableros Electricos de 24 Circuitos Trifasicos C/P y Espacio para Totalizador. Incluye Tablero, Automaticos, Totalizador y Accesorios.	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	UN

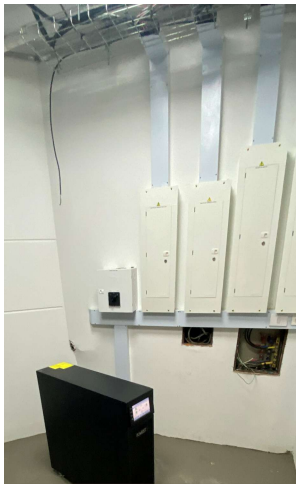

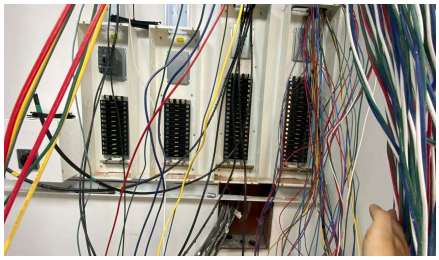

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
PISO 6						2.00	2.00
PISO 5						2.00	2.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-

OBSERVACIONES:

	Subtotal	4.00
	Subtotal	
	TOTAL	4.00

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	13.15	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	UN





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
ARCHIVO 1						7.00	7.00
DESPACHO MASGISTRADO						10.00	10.00
OF JUZ 01 CIV DE RESTITUCION						9.00	9.00
OF JUZ 07 EJECUCION DE PENAS				-		5.00	5.00
OF JUZ 06 EJECUCION DE PENAS						5.00	5.00
OF JUZ 05 EJECUCION DE PENAS						5.00	5.00
OF JUZ 04 LABORAL						10.00	10.00
OF JUZ DE EXTINCIION						7.00	7.00
AUDITORIA INTERNA						4.00	4.00
ESPACIO LIBRE						8.00	8.00
CORREDOR EMERGENCIA P6						5.00	5.00
BAÑOS CORREDOR EMERGENCIA						2.00	2.00
OF JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS						6.00	6.00
OF JUZ 02 PEQUEÑAS CAUSAS						6.00	6.00
OF JUZ 01 PEQUEÑAS CAUSAS						6.00	6.00
OF JUZ MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS						6.00	6.00
ARCHIVO 2						7.00	7.00
COOREEDOR PISO 6						19.00	19.00
PISO 6 CUARTO TENICO						2.00	2.00
ARCHIVO 1 P5				-		7.00	7.00
JUZ 07 PENAL				-		5.00	5.00
JUZ 06 PENAL				-		5.00	5.00
JUZ 09 PENAL MUNICIPAL						5.00	5.00
JUZ 10 PENAL MUNICIPAL						5.00	5.00
JUZ 11 PENAL MUNICIPAL						5.00	5.00
JUZ 12 PENAL MUNICIPAL						5.00	5.00
JUZ 13 PENAL MUNICIPAL						5.00	5.00
JUSZ 101 PENAL AMBULANTE				-		6.00	6.00
OFICINA NUEVA 01 P5 SALA TEC				-		8.00	8.00
OF NUEVA 02 P5 Y CORREDOR				-		2.00	2.00
OF NUEVA 03 P5				-		6.00	6.00
OF NUEVA 04 P5						6.00	6.00

	OF NUEVA 05 (CAFETERIA).						25.00	25.00
	PISO 5 CUARTO TECNICO						2.00	2.00
	CORREDIR PISO 5						19.00	19.00
								-
					-			-
OBSERVACIONES:							**Subtotal**	245.00
							Subtotal	
							TOTAL	**245.00**

OBRA

CONSROCIO CARVI

ALBA VIVIANA TORRES USECHE

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA

CONSORCIO JR

JESUS MARIA RUIZ PEREZ


REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**


CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

13	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**13.16**	**Ajuste a los diseños red electrica, para la adecuacion redes electricas existentes incluyendo iluminacion, tomas normales y reguladas (por espacio de trabajo)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**

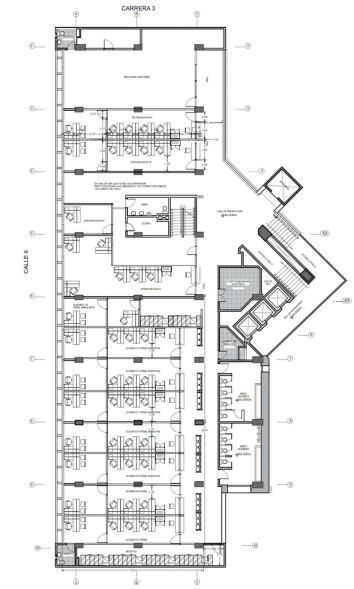

P7 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 5
ESCALA 1:100

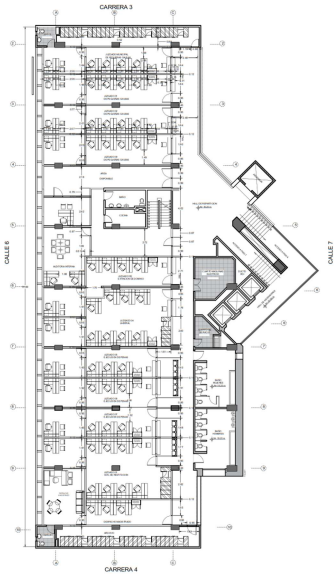

P8 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 6
ESCALA 1:100

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
PISO 5						1.00	1.00
PISO 6						1.00	1.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	2.00
						Subtotal	
						TOTAL	**2.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**


CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

14	**INSTALACIÓN VOZ Y DATOS**	**14.1**	**Ajuste a los diseños red de datos, (por espacio de trabajo)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**

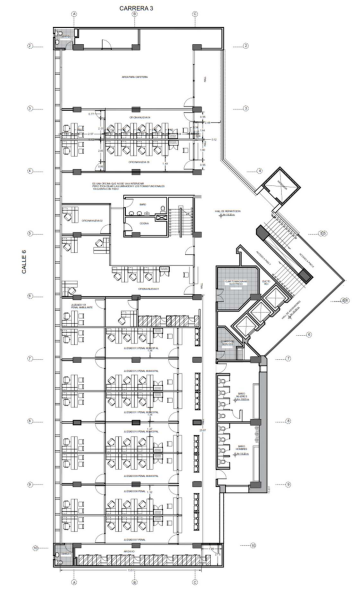

P7 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 5
ESCALA 1:100

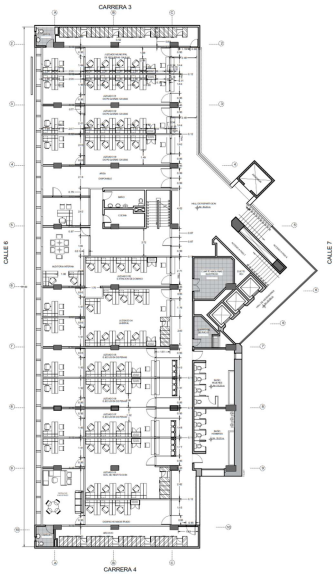

P8 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 6
ESCALA 1:100

Localización	**Dimensiones**					**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Alto**	**Área**	**Volumen**		
PISO 5						1.00	1.00
PISO 6						1.00	1.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-

OBSERVACIONES:

Subtotal	2.00
Subtotal	
TOTAL	**2.00**

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

14	INSTALACIÓN VOZ Y DATOS	14.2	Salida de punto de datos doble voz y datos incluye faceplate, RJ45, caja de octogonal, caja de montaje y accesorios, suministro y mano de obra CAT 6A	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	UN







Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
DESPACHO MASGISTRADO						6.00	6.00
OF JUZ 01 CIV DE RESTITUCION						10.00	10.00
OF JUZ 07 EJECUCION DE PENAS				-		6.00	6.00
OF JUZ 06 EJECUCION DE PENAS						6.00	6.00
OF JUZ 05 EJECUCION DE PENAS						6.00	6.00
OF JUZ 04 LABORAL						11.00	11.00
OF JUZ DE EXTINCIION						7.00	7.00
AUDITORIA INTERNA						4.00	4.00
ESPACIO LIBRE						8.00	8.00
							-
OF JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS						7.00	7.00
OF JUZ 02 PEQUEÑAS CAUSAS						7.00	7.00
OF JUZ 01 PEQUEÑAS CAUSAS						7.00	7.00
OF JUZ MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS						7.00	7.00
JUZ 07 PENAL				-		6.00	6.00
JUZ 06 PENAL				-		6.00	6.00
JUZ 09 PENAL MUNICIPAL						6.00	6.00
JUZ 10 PENAL MUNICIPAL						6.00	6.00
JUZ 11 PENAL MUNICIPAL						6.00	6.00
JUZ 12 PENAL MUNICIPAL						6.00	6.00
JUZ 13 PENAL MUNICIPAL						6.00	6.00
JUSZ 101 PENAL AMBULANTE				-		3.00	3.00
OFICINA NUEVA 01 P5 SALA TEC				-		1.00	1.00
OF NUEVA 02 P5 Y CORREDOR				-		2.00	2.00
OF NUEVA 03 P5				-		7.00	7.00
OF NUEVA 04 P5						7.00	7.00
OF NUEVA 05 (CAFETERIA).						6.00	6.00
				-			-
						Subtotal	160.00
						Subtotal	
						TOTAL	160.00

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

14	INSTALACIÓN VOZ Y DATOS	14.3	Cable UTP CATEGORÍA 6A. Incluye Suministro y tendido, accesorios de montaje	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	ML



Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
PISO 6		6,829.50				1.00	6,829.50
PISO 5		5,030.75				1.00	5,030.75
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	11,860.25
						Subtotal	
						TOTAL	11,860.25

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

14	**INSTALACIÓN VOZ Y DATOS**	**14.4**	**Patch cords RJ45-RJ45 de 2 m. de longitud y flexibles categoría 6A, para conectar en el herraje. (Incluye Suministro e instalación, marcación en ambas puntas.)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**

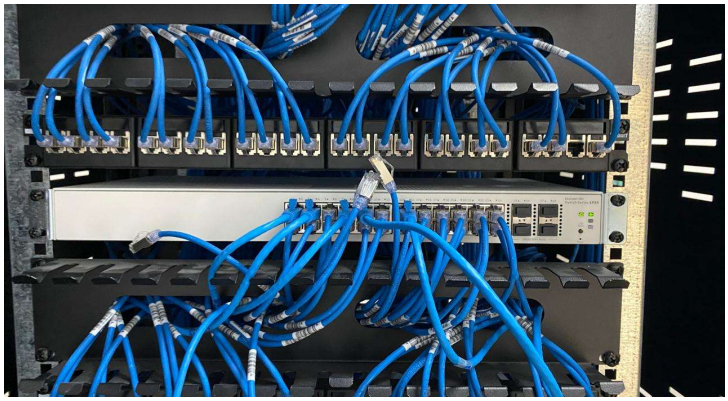

Localización	**Dimensiones**					**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Alto**	**Área**	**Volumen**		
PISO 5						92.00	92.00
PISO 6						68.00	68.00
							-
				-			-
				-			-
						Subtotal	160.00
						Subtotal	
						TOTAL	**160.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

14	INSTALACIÓN VOZ Y DATOS	14.5	Suministro e Instalacion de Rack de 40 RU de 210x80x80 Ranurado con Puertas Abatibles. Multitoma, Organizadores.	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	UN



Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
PISO 6						1.00	1.00
PISO 5						1.00	1.00
							-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
OBSERVACIONES:						Subtotal	2.00
						Subtotal	
						TOTAL	2.00

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

14	**INSTALACIÓN VOZ Y DATOS**	**14.6**	**Suministro e Instalacion de SW de 24 puertos10/100/1000 capa 2 con 4 Puertos SFP ARUBA**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**

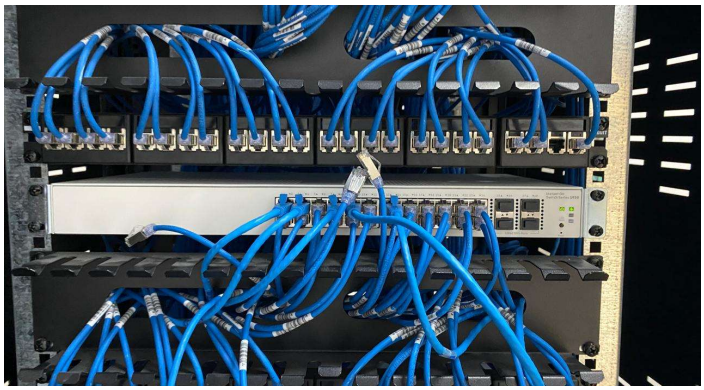

Localización	**Dimensiones**					**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Alto**	**Área**	**Volumen**		
PISO 5						3.00	3.00
PISO 6						4.00	4.00
				-			-
				-			-
						Subtotal	7.00
						Subtotal	
						TOTAL	**7.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL


CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

14	INSTALACIÓN VOZ Y DATOS	14.7	Suministro e Instalacion de Bandeja Portacbles Tipo Rejiban. (Incluye Accesorios de Sujeccion)	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	ML

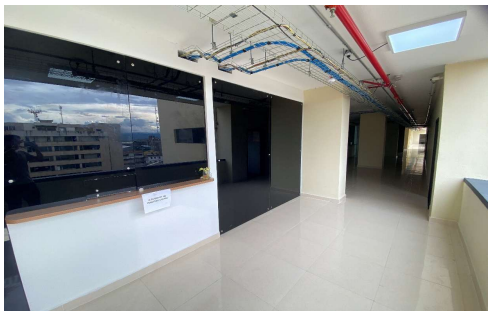

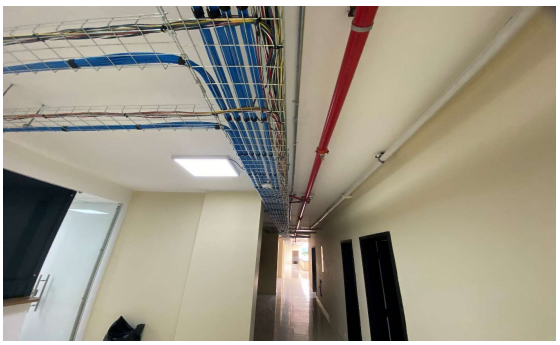

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
PISO 6 PRINCIPAL 40 CM		51.00				1.00	51.00
PISO 6 INGRESO OFICINA 20 CM		1.50				10.00	15.00
PISO 6 INGRESO OFICINA 20 CM		3.00				4.00	12.00
PISO 5 PRINCIPAL		51.00		-		1.00	51.00
PISO 5 INGRESO OFICINA 20 CM		1.50				6.00	9.00
PISO 5 INGRESO OFICINA 20 CM		3.00				7.00	21.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	159.00
						Subtotal	
						TOTAL	159.00

OBSERVACIONES:

OBRA **CONSROCIO CARVI** ALBA VIVIANA TORRES USECHE REPRESENTANTE LEGAL	INTERVENTORÍA **CONSORCIO JR** JESUS MARIA RUIZ PEREZ REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

14	**INSTALACIÓN VOZ Y DATOS**	**14.8**	**Suministro e Instalacion de Canaleta Metalica 12x5 Blanca con Division y Pintura Electrostatica (Incluye Accesorios de Sujeccion)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**ML**





Localización	**Dimensiones**					**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Alto**	**Área**	**Volumen**		
PISO 6						130.00	130.00
PISO 5						146.00	146.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-

OBSERVACIONES:

	Subtotal	276.00
	Subtotal	
	TOTAL	**276.00**

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

14	INSTALACIÓN VOZ Y DATOS	14.9	Suministro e Instalacion de Herraje de 24 Puertos. Incluye Jack	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	UN

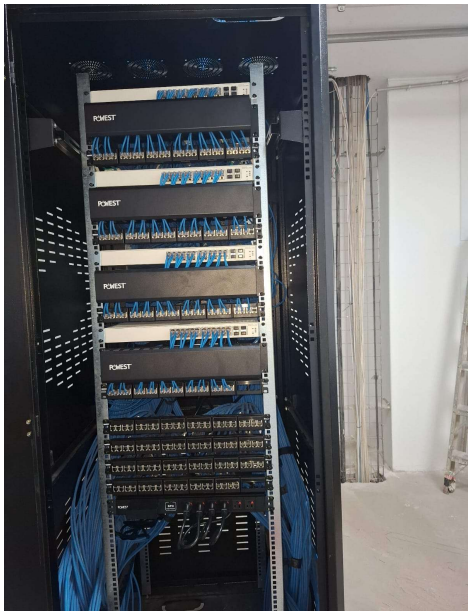

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
PISO 6						6.00	6.00
PISO 5						8.00	8.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-

OBSERVACIONES:

	Subtotal	14.00
	Subtotal	
	TOTAL	14.00

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

14	INSTALACIÓN VOZ Y DATOS	14.10	Suministro e Instalacion de Marquillas (Voz - Datos - Regulado - Normal)	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	UN





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
PISO 5 Y 6						280.00	280.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-

OBSERVACIONES:

Subtotal		280.00
Subtotal		
TOTAL		280.00

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL


CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

14	INSTALACIÓN VOZ Y DATOS	14.11	Certificaciones de Puntos Cat 6a	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	UN



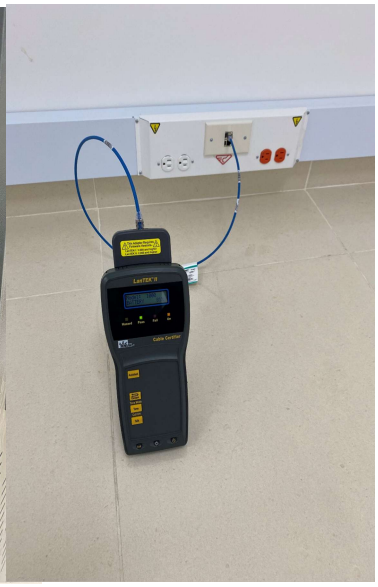

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
DATOS PISO 6						92.00	92.00
VOZ PISO 6						92.00	92.00
DATOS PISO 5						68.00	68.00
VOZ PISO 5				-		68.00	68.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	320.00
						Subtotal	
						TOTAL	320.00

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024


OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

15	**ASEO Y VARIOS**	**15.1**	**Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**M2**

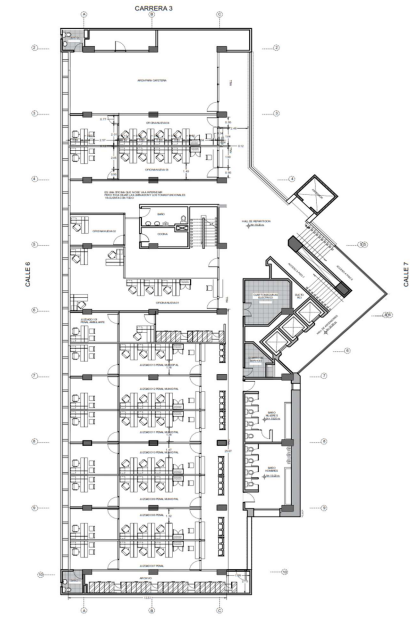

P7 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 5
ESCALA 1:100

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
ARCHIVO AL LADO DE OFICINA MAGISTRADO	2.00	14.34		28.68		1.00	28.68
	0.40	0.94		0.38		-3.00	-1.13
P6 OF 01	5.73	13.10	-	75.06	-	1.00	75.06
	0.24	0.94		0.23		-2.00	-0.45
	0.17	0.85		0.14		-1.00	-0.14
P6 OF 02	5.93	13.10		77.68		1.00	77.68
	0.24	0.94		0.23		-2.00	-0.45
	0.17	0.95		0.16		-3.00	-0.48
P6 OF 03	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P6 OF 04	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P6 OF 05	3.80	13.10		49.78		1.00	49.78
	2.10	5.05		10.61		1.00	10.61
	8.00	1.75		14.00		1.00	14.00
	1.50	4.10		6.15		1.00	6.15
	5.05	2.84		14.34		2.00	28.68
	2.10	7.93		16.65		1.00	16.65
	0.17	0.94		0.16		-6.00	-0.96
O6 OF 06	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P6 OF 07	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
ARCHIVO AL LADO JUZGADO	2.00	14.34		28.68		1.00	28.68
	0.40	0.94		0.38		-3.00	-1.13
							-
PISO 5 ARCHIVO AL LADO JUZGADO	2.00	14.34		28.68		1.00	28.68
	0.40	0.94		0.38		-2.00	-0.75

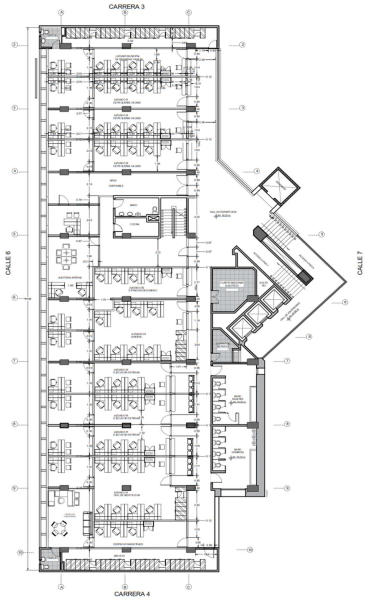

P8 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 6
ESCALA 1:100

P5 OF 01	5.65	13.10	-	74.02	-	1.00	74.02
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 OF 02	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 OF 03	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 OF 04	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 OF 05	3.80	13.10		49.78		1.00	49.78
	2.10	5.05		10.61		1.00	10.61
	8.00	1.75		14.00		1.00	14.00
	1.50	4.10		6.15		1.00	6.15
	5.05	2.84		14.34		1.00	14.34
	2.10	13.10		27.51		-1.00	-27.51
	0.17	0.94		0.16		-6.00	-0.96
P5 OF 06	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 OF 07	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
ARCHIVO AL LADO JUZGADO	2.00	14.34		28.68		1.00	28.68
	0.40	0.94		0.38		-3.00	-1.13
CORREDOR INGRESOS OFICINAS PISO 6	2.55	45.00		114.75		1.00	114.75
	4.40	1.80		7.92		1.00	7.92
	0.95	0.45		0.43		-8.00	-3.42
	10.20	5.25	-	26.78	-	1.00	26.78
CORREDOR INGRESOS OFICINAS PISO 5	2.55	45.00		114.75		1.00	114.75
	4.40	1.80		7.92		1.00	7.92
	0.95	0.45		0.43		-8.00	-3.42
	10.20	5.25	-	26.78	-	1.00	26.78
				-			-
BAÑO HOMBRE PISO 5	5.74	4.02		11.54		1.00	11.54
				-			-
						Subtotal	1,514.68
						Subtotal	
						TOTAL	**1,514.68**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**


CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

15	**ASEO Y VARIOS**	**15.3**	**Señalización institucional espacios, acrílico + soportes acero inox. (Suministro e instalación)**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**

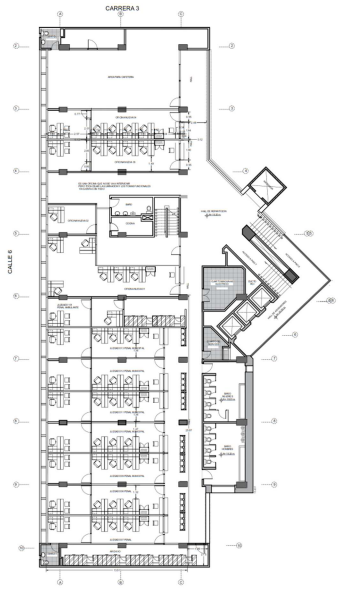

P7 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 5
ESCALA 1:100

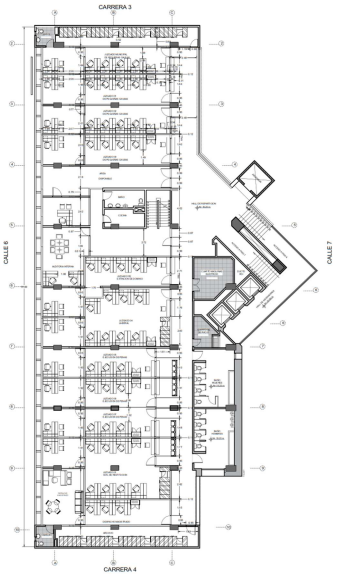

P8 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 6
ESCALA 1:100

Localización	**Dimensiones**					**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Alto**	**Área**	**Volumen**		
piso 5						16.00	16.00
piso 6						13.00	13.00
							-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	29.00
						Subtotal	
						TOTAL	**29.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

NP4	NO PREVISTOS	NP1	Suministro e instalacion de cielo raso en fibra mineral, incluye estructura de soporte	UBICACIÓN UNIDAD	M2







Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
ARCHIVO AL LADO OF MAGISTRADO	1.97	14.37		28.31		1.00	28.31
	0.40	0.94		0.38		-3.00	-1.13
P6 DESPACHO MAGISTRADO	2.72	8.92	-	24.26	-	1.00	24.26
	5.60	4.07		22.79		1.00	22.79
	0.17	0.85		0.14		-1.00	-0.14
P6 JUZ 01 CIVIL RESTITUCION	5.80	7.40	-	42.92	-	1.00	42.92
	1.50	2.94		4.41		1.00	4.41
	4.06	2.93		11.90		1.00	11.90
	0.48	0.94		0.45		-1.00	-0.45
	0.17	0.95		0.16		-1.00	-0.16
P6 UZ 07 EJECUCION DE PENAS	2.79	7.40		20.65		1.00	20.65
	2.81	4.06		11.41		1.00	11.41
	0.17	0.94		0.16		-1.00	-0.16
P6 JUZ 06 EJECUCION DE PENAS	2.90	7.40		21.46		1.00	21.46
	2.90	7.40		21.46		1.00	21.46
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
P6 JUZ 05 EJECUCION DE PENAS	2.82	7.40		20.87		1.00	20.87
	2.76	4.06		11.21		1.00	11.21
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
P6 JUZ 04 LABORAL	5.85	8.92		52.18		1.00	52.18
	2.93	4.06		11.90		1.00	11.90
	1.09	1.87		2.04		-1.00	-2.04
	0.17	0.94		0.16		-3.00	-0.48
P6 JUZ EXTINCION DE DOMINIO	3.77	8.87		33.44		1.00	33.44
	1.15	1.75		2.01		1.00	2.01
	2.85	4.08		11.63		1.00	11.63
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
P6 AUDITORIA INTERNA	5.84	4.12		24.06		1.00	24.06
	0.90	1.95		1.76		1.00	1.76
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
CORREDOR EMERGENCIA	8.00	1.73		13.84		1.00	13.84
	3.95	1.48		5.85		1.00	5.85
AREA DISPONIBLE	2.09	8.00		16.72		1.00	16.72
	2.84	5.05		14.34		1.00	14.34
	2.84	5.05		14.34		1.00	14.34
	0.17	0.94		0.16		-3.00	-0.48
P6 JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS	2.86	8.96		25.63		1.00	25.63
	2.95	4.06		11.98		1.00	11.98
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
P6 JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS Y 03 PEQUEÑAS CAUSAS	2.87	8.93		25.63		1.00	25.63
	2.86	4.06		11.61		1.00	11.61
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
P6 JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS	2.75	8.93		24.56		1.00	24.56
	2.86	4.05		11.58		1.00	11.58
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
P6 JUZ MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS	2.75	8.91		24.50		1.00	24.50
	2.68	4.07		10.91		1.00	10.91
ARCHIVO AL LADO JUZGADO	1.84	14.40		26.50		1.00	26.50
	0.15	4.85		0.73		1.00	0.73
	0.40	0.94		0.38		-3.00	-1.13
PISO 5 ARCHIVO AL LADO JUZGADO	1.89	14.37		27.16		1.00	27.16
	0.40	0.94		0.38		-3.00	-1.13
P5 JUZ 07 PENAL	2.74	4.04	-	11.07	-	1.00	11.07
	2.74	7.42		20.33		1.00	20.33
P5 JUZ 06 PENAL	2.74	7.41		20.30		1.00	20.30
	2.73	4.06		11.08		1.00	11.08





	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
P5 JUZ 09 PENAL MUNICIPAL	2.85	7.43		21.18		1.00	21.18
	2.88	4.05		11.66		1.00	11.66
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
P5 JUZ 10 PENAL MUNICIPAL	2.87	7.42		21.30		1.00	21.30
	2.83	4.05		11.46		1.00	11.46
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
P5 JUZ 11 PENAL MUNICIPAL	2.87	8.00		22.96		1.00	22.96
	2.85	3.46		9.86		1.00	9.86
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
P5 JUZ 12 PENAL MUNICIPAL	2.85	8.00		22.80		1.00	22.80
	2.85	3.46		9.86		1.00	9.86
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
P5 JUZ 13 PENAL MUNICIPAL	2.88	7.40		21.31		1.00	21.31
	2.88	4.06		11.69		1.00	11.69
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
P5 JUZ 101 PENAL AMBULANTE	2.87	5.21		14.95		1.00	14.95
	0.34	0.17		0.06		-1.00	-0.06
	2.87	3.06		8.78		1.00	8.78
	0.50	0.16		0.08		-1.00	-0.08
	2.84	4.06		11.53		1.00	11.53
	0.17	0.94		0.16		-1.00	-0.16
P5 OF NUEVA 01 SALA TEC	3.77	13.10		49.39		1.00	49.39
	2.07	4.93		10.21		1.00	10.21
	0.17	0.94		0.16		-3.00	-0.48
P5 CORREDOR EMERGENCIA	1.73	8.10		14.01		1.00	14.01
	2.95	1.48		4.37		1.00	4.37
P5 OF NUEVA 02	2.85	4.93		14.05		1.00	14.05
	0.17	0.94		0.16		-1.00	-0.16
P5 OF NUEVA 03	2.82	8.94		25.21		1.00	25.21
	2.83	4.05		11.46		1.00	11.46
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
P5 OF NUEVA 04	2.90	8.94		25.93		1.00	25.93
	2.90	4.04		11.72		1.00	11.72
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
P5 OF NUEVA 05 COMEDOR	5.60	13.15		73.64		1.00	73.64
	1.99	7.60		15.12		1.00	15.12
	0.17	1.81		0.31		-1.00	-0.31
	0.35	0.94		0.33		-1.00	-0.33
	1.84	6.55		12.05		1.00	12.05
	0.92	0.34		0.31		-1.00	-0.31
	0.77	0.37		0.28		-1.00	-0.28
	0.34	0.80		0.27		-1.00	-0.27
	1.00	0.20		0.20		-1.00	-0.20
				-			-
						Subtotal	1,159.03
						Subtotal	
						TOTAL	**1,159.03**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

NP	NO PREVISTOS	NP 2	Suministro e instalacion de ceramica formato 60 cm X 60 cm (incluye pegante y boquilla)	UBICACIÓN	
				UNIDAD	M2







Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
ARCHIVO AL LADO OF MAGISTRADO	2.10	14.37		30.18		1.00	30.18
	0.18	0.82		0.15		-1.00	-0.15
	0.40	0.94		0.38		-3.00	-1.13
P6 DESPACHO MAGISTRADO Y 1/2 JUZ 01 CIVIL RESTITUCION	5.60	13.23	-	74.09	-	1.00	74.09
	0.17	0.85		0.14		-1.00	-0.14
P6 1/2 JUZ 01 CIVIL RESTITUCION Y JUZ 07 EJECUCION DE PENAS	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	7.93	0.17		1.35		1.00	1.35
	0.48	0.94		0.45		-1.00	-0.45
	0.17	0.95		0.16		-3.00	-0.48
P6 JUZ 06 EJECUCION DE PENAS Y JUZ 05 EJECUCION DE PENAS	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P6 JUZ 04 LABORAL	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P6 JUZ EXTINCION DE DOMINIO Y AUDITORIA INTERNA	3.76	13.10		49.26		1.00	49.26
	2.07	5.02		10.39		1.00	10.39
	0.20	0.95		0.19		1.00	0.19
	0.17	0.94		0.16		-3.00	-0.48
CORREDOR EMERGENCIA	8.00	1.73		13.84		1.00	13.84
	1.48	3.95		5.85		1.00	5.85
AREA DISPONIBLE	5.17	2.84		14.68		1.00	14.68
	0.16	0.88		0.14		1.00	0.14
	2.84	5.17		14.68		1.00	14.68
	2.21	8.00		17.68		1.00	17.68
	0.17	0.94		0.16		-3.00	-0.48
P6 JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS Y 03 PEQUEÑAS CAUSAS	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P6 JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS Y MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS	5.60	13.10		73.36		1.00	73.36
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
ARCHIVO AL LADO JUZGADO	1.90	14.40		27.36		1.00	27.36
	0.12	4.85		0.58		1.00	0.58
	0.95	0.20		0.19		1.00	0.19
	0.40	0.94		0.38		-3.00	-1.13
CORREDOR INGRESOS OFICINAS PISO 6	2.44	47.40		115.66		1.00	115.66
	4.40	1.80		7.92		1.00	7.92
	0.95	0.45		0.43		-8.00	-3.42
	5.13	9.92	-	25.44	-	1.00	25.44
							-
PISO 5 ARCHIVO AL LADO JUZGADO	1.89	14.37		27.16		1.00	27.16
	0.15	4.86		0.73		1.00	0.73
	0.40	0.94		0.38		-3.00	-1.13
P5 JUZ 07 PENAL Y JUZ 06 PENAL	5.60	13.08	-	73.25	-	1.00	73.25
	0.17	0.94		0.16		-2.00	-0.32
P5 JUZ 09 PENAL MUNICIPAL Y JUZ 10 PENAL MUNICIPAL	5.85	13.07		76.46		1.00	76.46
	0.18	1.50		0.27		1.00	0.27
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 JUZ 11 PENAL MUNICIPAL Y JUZ 12 PENAL MUNICIPAL	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.18	1.50		0.27		1.00	0.27
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 JUZ 13 PENAL	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64



MUNICIPAL Y 101 PENAL AMBULANTE	0.18	1.50		0.27		1.00	0.27
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 OF NUEVA 01 SALA TEC	3.77	13.10		49.39		1.00	49.39
	2.07	4.93		10.21		1.00	10.21
	0.17	0.94		0.16		-3.00	-0.48
P5 CORREDOR EMERGENCIA	1.73	8.10		14.01		1.00	14.01
	2.95	1.48		4.37		1.00	4.37
P5 OF NUEVA 02	2.85	5.04		14.36		1.00	14.36
P5 OF NUEVA 03 Y 04	5.85	13.10		76.64		1.00	76.64
	0.17	0.94		0.16		-4.00	-0.64
P5 OF NUEVA 05 COMEDOR	5.68	13.15		74.69		1.00	74.69
	1.99	7.60		15.12		1.00	15.12
	0.17	1.81		0.31		-1.00	-0.31
	0.35	0.94		0.33		-1.00	-0.33
	1.84	6.55		12.05		1.00	12.05
	0.92	0.34		0.31		-1.00	-0.31
	0.77	0.37		0.28		-1.00	-0.28
	0.34	0.80		0.27		-1.00	-0.27
	1.00	0.20		0.20		-1.00	-0.20
CORREDOR INGRESOS OFICINAS PISO 6	2.44	47.40		115.66		1.00	115.66
	4.40	1.80		7.92		1.00	7.92
	0.95	0.45		0.43		-8.00	-3.42
	5.13	9.92	-	25.44	-	1.00	25.44
PISO BAÑO HOMBES PISO 5	6.09	4.02		24.48		1.00	24.48
	0.83	0.33		0.27		-1.00	-0.27
	0.19	1.30		0.25		-1.00	-0.25
				-			-
						Subtotal	1,545.16
						Subtotal	
						TOTAL	**1,545.16**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

NP	**NO PREVISTOS**	**NP 3**	**Suministro e instalacion ventaneria en aluminio, incluye vidrio de seguridad 5mm**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**M2**





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
P6 VENTANAS TRASERAS	47.40		1.96	92.90		1.00	92.90
P5 VENTANAS TRASERAS	47.40		1.96	92.90		1.00	92.90
			-	-	-		-
				-			-
						Subtotal	185.81
						Subtotal	
						TOTAL	**185.81**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

NO	**NO PREVISTOS**	**NP 4**	**Suministro e instalacion de orinal tipo push**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**



Localización	**Dimensiones**					**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Alto**	**Área**	**Volumen**		
ORINALES						3.00	3.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-

OBSERVACIONES:

Subtotal	3.00
Subtotal	
TOTAL	**3.00**

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

NO	**NO PREVISTOS**	**NP 5**	**Suministro e instalacion de sanitario**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**UN**

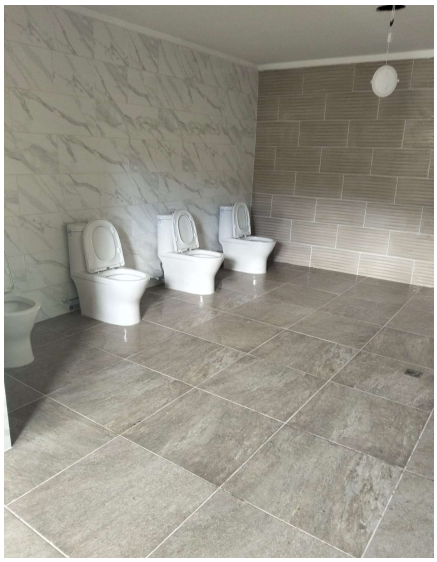

Localización	**Dimensiones**					**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Alto**	**Área**	**Volumen**		
SANITARIOS						4.00	4.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
OBSERVACIONES:						**Subtotal**	4.00
						Subtotal	
						TOTAL	**4.00**

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

NP	**NO PREVISTOS**	**NP 6**	**Suministro e instalacion de divisiones de baño en acero inoxidable**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**M2**





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
BAÑO HOMBRES PISO 5	4.20		1.80	7.56		1.00	7.56
	1.26		1.80	2.27		3.00	6.80
				-		1.00	-
				-		1.00	-
				-		1.00	-
				-			-
						Subtotal	14.36
						Subtotal	
						TOTAL	**14.36**

OBSERVACIONES:

OBRA

CONSROCIO CARVI

ALBA VIVIANA TORRES USECHE

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA

CONSORCIO JR

JESUS MARIA RUIZ PEREZ

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

NP	NO PREVISTOS	NP 7	Suministro e instalacion de madera hasta 60 cm de ancho, para entrepaños o para atencion al publico tipo recepcion de documentos o para puertas abatibles, inlcuye lo necesario para su instalacion	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	ML





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Largo Front	Largo Tras	Larto Total				
DESPACHO MASGISTRADO	1.75	5.15	6.90			1.00	5.15
OF JUZ 01 CIV DE RESTITUCION	1.81	2.69	4.50			1.00	2.69
OF JUZ 07 EJECUCION DE PENAS	1.82	2.69	4.51			1.00	2.69
OF JUZ 06 EJECUCION DE PENAS	1.78	2.67	4.45			1.00	2.67
OF JUZ 05 EJECUCION DE PENAS	1.91	2.67	4.58			1.00	2.67
OF JUZ 04 LABORAL	1.83	2.71	4.54			1.00	2.71
OF JUZ DE EXTINCION	2.66	2.70	5.36			1.00	2.70
AUDITORIA INTERNA		5.33	5.33			1.00	5.33
ESPACIO LIBRE	1.00	5.38	6.38			1.00	5.38
OF JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS	1.72	2.71	4.43			1.00	2.71
OF JUZ 02 PEQUEÑAS CAUSAS	1.75	2.69	4.44			1.00	2.69
OF JUZ 01 PEQUEÑAS CAUSAS	1.63	2.59	4.22			1.00	2.59
OF JUZ MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS	1.80	2.60	4.40			1.00	2.60
OF JUZ 07 PENAL	1.77	2.62	4.39			1.00	2.62
OF JUZ 06 PENAL	1.79	2.57	4.36			1.00	2.57
OF JUZ 09 PENAL MUNICIPAL	1.90	2.68	4.58			1.00	2.68
OF JUZ 10 PENAL MUNICIPAL	1.91	2.67	4.58			1.00	2.67
OF JUZ 11 PENAL MUNICIPAL	1.93	2.68	4.61			1.00	2.68
OF JUZ 12 PENAL MUNICIPAL	1.89	2.66	4.55			1.00	2.66
OF JUZ 13 PENAL MUNICIPAL	1.90	2.71	4.61			1.00	2.71
OF JUZ 01 AMBULANTE		2.68	2.68			1.00	2.68
OF NUEVA 01 SALA TEC	2.65	5.38	8.03			1.00	5.38
			-			1.00	-
OF NUEVA 03 PISO 5	1.67	2.69	4.36			1.00	2.69
OF NUEVA 04 PISO 5	1.78	2.69	4.47			1.00	2.69
OF NUEVA 05 PISO 5		5.24	5.24			1.00	5.24
			-				-
			-				-
			-				-
			-				-
			-				-
			-				-
			-				-
			-				-
			-				-
			-				-
						Subtotal	79.85
						Subtotal	
						TOTAL	79.85

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

	MEMORIAS DE CÁLCULO **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

NP	**NO PREVISTOS**	**NP 8**	**Mamposteria en ladrillo hueco No. 5**	**UBICACIÓN**	
				UNIDAD	**M2**





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
VANOS CERRADOS DE PUERTAS	1.00		2.00	2.00		5.00	10.00
VANOS CERRADOS DE DUCTOS	0.50		0.30	0.15		22.00	3.30
	0.80		0.60	0.48		2.00	0.96
	0.60		0.40	0.24		4.00	0.96
					-		-
						Subtotal	15.22
						Subtotal	
						TOTAL	**15.22**

OBSERVACIONES:

OBRA **CONSROCIO CARVI** ALBA VIVIANA TORRES USECHE REPRESENTANTE LEGAL	INTERVENTORÍA **CONSORCIO JR** JESUS MARIA RUIZ PEREZ REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

NP	NO PREVISTOS	NP 9	Guardaescoba en tableta ceramica altura hasta 10cm	UBICACIÓN	
				UNIDAD	ML





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
ARCHIVO AL LADO OF MAGISTRADO		33.10		-		1.00	33.10
P6 DESPACHO MAGISTRADO		40.62	-	-	-	1.00	40.62
P6 JUZ 01 CIVIL RESTITUCION		41.90	-	-	-	1.00	41.90
P6 UZ 07 EJECUCION DE PENAS		32.15		-		1.00	32.15
P6 JUZ 06 EJECUCION DE PENAS		32.15		-		1.00	32.15
P6 JUZ 05 EJECUCION DE PENAS		32.15		-		1.00	32.15
P6 JUZ 04 LABORAL		38.95		-		1.00	38.95
P6 JUZ EXTINCION DE DOMINIO		38.55		-		1.00	38.55
P6 AUDITORIA INTERNA		21.60		-		1.00	21.60
CORREDOR EMERGENCIA		19.70		-		1.00	19.70
AREA DISPONIBLE		46.32		-		1.00	46.32
P6 JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS		32.55		-		1.00	32.55
P6 JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS Y 03 PEQUEÑAS CAUSAS		32.55		-		1.00	32.55
P6 JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS		32.55		-		1.00	32.55
P6 JUZ MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS		32.55		-		1.00	32.55
ARCHIVO AL LADO JUZGADO		33.10		-		1.00	33.10
CORREDOR INGRESOS OFICINAS PISO 6		107.77		-		1.00	107.77
ARCHIVO LADO JUZ 07 PENAL		33.10		-		1.00	33.10



JUZ 07 PENAL		32.15		-		1.00	32.15
JUZ 06 PENAL		32.15		-		1.00	32.15
JUZ 09 PENAL MUNI		32.15		-		1.00	32.15
JUZ 10 PENAL MUNI		32.15		-		1.00	32.15
JUZ 11 PENAL MUNI		32.15		-		1.00	32.15
JUZ 12 PENAL MUNI		32.15		-		1.00	32.15
JUZ 13 PENAL MUNI		32.15		-		1.00	32.15
JUZ 101 AMBULANTE		38.55		-		1.00	38.55
OFICINA 01 NUEVA		21.60		-		1.00	21.60
CORREDOR DE EMERGENCIA		19.70		-		1.00	19.70
OFICIAN 01 NUEVA		46.32		-		1.00	46.32
OFICINA 03 NUEVA		32.55		-		1.00	32.55
OFICINA 04 NUEVA		32.55		-		1.00	32.55
OFICINA 05 NUEVA		55.00		-		1.00	55.00
CORREDOR		107.77		-		1.00	107.77
				-			-
						Subtotal	1,260.45
						Subtotal	
						TOTAL	**1,260.45**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

	MEMORIAS DE CÁLCULO **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

NP	**NO PREVISTOS**	**NP10**	**Desmonte de aires aconcionados existentes**	**UBICACIÓN**	
				UNIDAD	**UN**





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
PISO 6				-		32.00	32.00
PISO 5			-	-	-	28.00	28.00
				-			-
						Subtotal	60.00
						Subtotal	
						TOTAL	**60.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

NP	NO PREVISTOS	NP 12	Suministro e instalación lampara de emergencia tipo tortuga	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	UN





Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
ARCHIVO 1						4.00	4.00
DESPACHO MASGISTRADO						2.00	2.00
OF JUZ 01 CIV DE RESTITUCION						4.00	4.00
OF JUZ 07 EJECUCION DE PENAS				-		2.00	2.00
OF JUZ 06 EJECUCION DE PENAS						2.00	2.00
OF JUZ 05 EJECUCION DE PENAS						2.00	2.00
OF JUZ 04 LABORAL						4.00	4.00
OF JUZ DE EXTINCIION						2.00	2.00
AUDITORIA INTERNA							-
ESPACIO LIBRE						2.00	2.00
CORREDOR EMERGENCIA P6						3.00	3.00
BAÑOS CORREDOR EMERGENCIA							-
OF JUZ 09 PEQUEÑAS CAUSAS						2.00	2.00
OF JUZ 02 PEQUEÑAS CAUSAS						2.00	2.00
OF JUZ 01 PEQUEÑAS CAUSAS						2.00	2.00
OF JUZ MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS						2.00	2.00
ARCHIVO 2						2.00	2.00
COOREEDOR PISO 6						10.00	10.00
PISO 6 CUARTO TENICO						1.00	1.00
ARCHIVO 1 P5						4.00	4.00
JUZ 07 PENAL						2.00	2.00
JUZ 06 PENAL						2.00	2.00
JUZ 09 PENAL MUNICIPAL						2.00	2.00
JUZ 10 PENAL MUNICIPAL						2.00	2.00
JUZ 11 PENAL MUNICIPAL						2.00	2.00
JUZ 12 PENAL MUNICIPAL						2.00	2.00
JUZ 13 PENAL MUNICIPAL						2.00	2.00
JUSZ 101 PENAL AMBULANTE						3.00	3.00

	OFICINA NUEVA 01 P5 SALA TEC						3.00	3.00
	CORREDOR EMERGENCIA P5						3.00	3.00
	OF NUEVA 03 P5						2.00	2.00
	OF NUEVA 04 P5						2.00	2.00
	OF NUEVA 05 (CAFETERIA).						3.00	3.00
	PISO 5 CUARTO TECNICO						1.00	1.00
	CORREDIR PISO 5						10.00	10.00
					-			-
OBSERVACIONES:							**Subtotal**	93.00
							Subtotal	
							TOTAL	**93.00**

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**


CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

NP	**NO PREVISTOS**	**NP 13**	**Acometida electrica para sistema regulado 1 (3F # 6+1N # 6+1T #8)CU**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**ML**

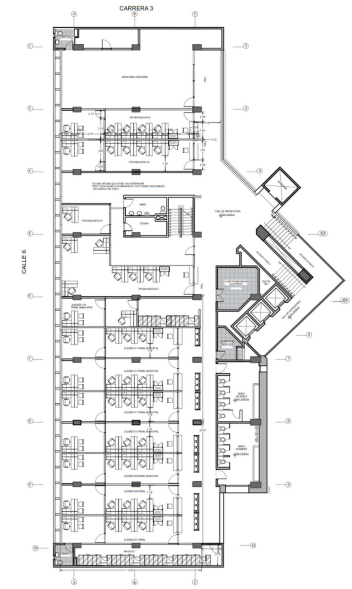

P7 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 5
ESCALA 1:100

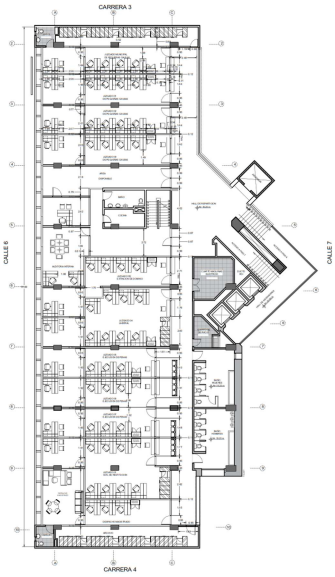

P8 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 6
ESCALA 1:100

Localización	**Dimensiones**					**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Alto**	**Área**	**Volumen**		
PISO 6		60.00				1.00	60.00
PISO 5		50.00				1.00	50.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-

OBSERVACIONES:

Subtotal	110.00
Subtotal	
TOTAL	**110.00**

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL


CONSORCIO CARVI	MEMORIAS DE CÁLCULO PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA	
	VERSIÓN: 1	Fecha: DIC-30-2024

CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"				
OBRA:	CONSORCIO CARVI	NIT O C.C.	901895769-3	CONTRATO	12-OBR009 DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO JR	NIT O C.C.	901900002-5	CONTRATO	12-SER040 DE 2024

NP	NO PREVISTOS	NP 14	Suministro e instalación de tablero de 36 ctos con espacio para totalizador	UBICACIÓN	NEIVA
				UNIDAD	UN

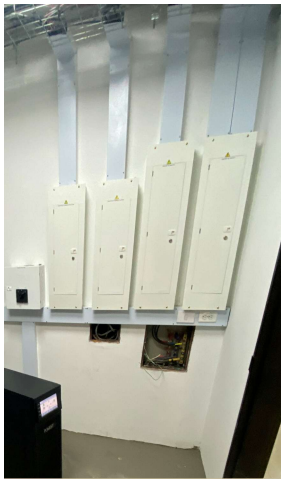

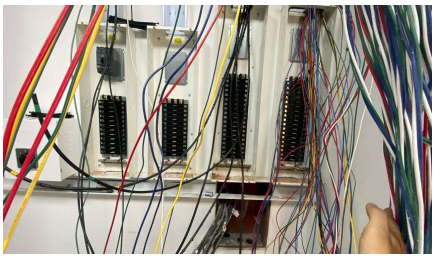

Localización	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Área	Volumen		
PISO 6						2.00	2.00
PISO 5						2.00	2.00
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	4.00
						Subtotal	
						TOTAL	4.00

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**


CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

NP	**NO PREVISTOS**	**NP 15**	**Alimentación electrica para condensadora 2F#10CU+1T#12CU prom salida= 35m**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**ML**

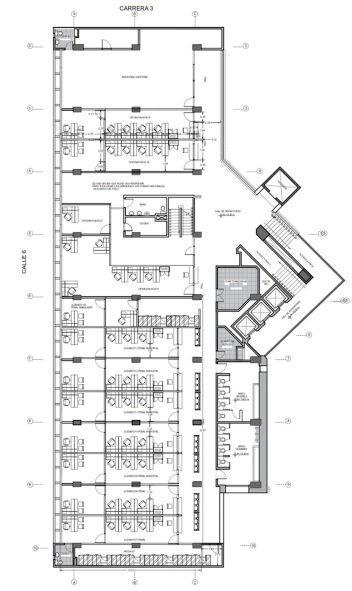

P7 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 5
ESCALA 1:100

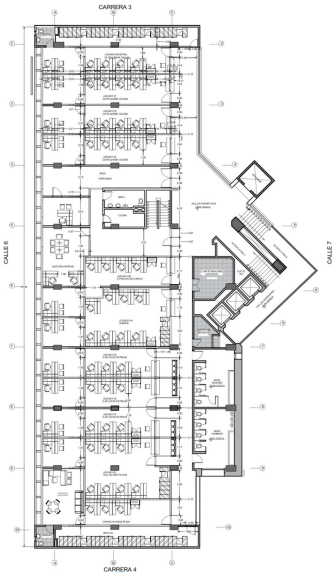

P8 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 6
ESCALA 1:100

Localización	**Dimensiones**					**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Alto**	**Área**	**Volumen**		
PISO 5		155.99				1.00	155.99
PISO 6		155.99				1.00	155.99
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	311.99
						Subtotal	
						TOTAL	**311.99**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CARVI	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **PROYECTO REMODELACION PALACIO DE JUSTICIA** **NEIVA - HUILA**	
	VERSIÓN: 1	**Fecha: DIC-30-2024**


CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PISOS QUINTO Y SEXTO DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA"**				
OBRA:	**CONSORCIO CARVI**	**NIT O C.C.**	**901895769-3**	**CONTRATO**	**12-OBR009 DE 2024**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO JR**	**NIT O C.C.**	**901900002-5**	**CONTRATO**	**12-SER040 DE 2024**

NP	**NO PREVISTOS**	**NP 16**	**Alimentación de fibra optica entre rack ppal y rack piso 6**	**UBICACIÓN**	**NEIVA**
				UNIDAD	**ML**

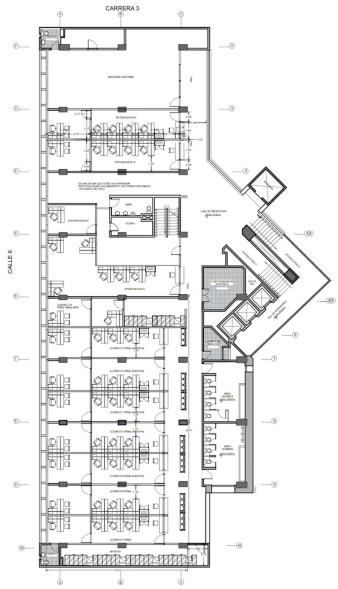

P7 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 5
ESCALA 1:100

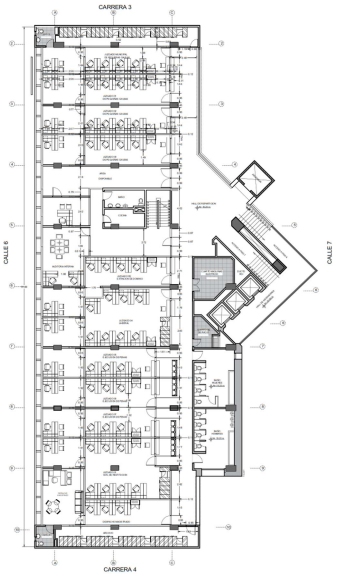

P8 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 6
ESCALA 1:100

Localización	**Dimensiones**					**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Largo**	**Alto**	**Área**	**Volumen**		
PISO 6		16.00				1.00	16.00
PISO 5		21.00				1.00	21.00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
						Subtotal	37.00
						Subtotal	
						TOTAL	**37.00**

OBSERVACIONES:

OBRA
CONSROCIO CARVI
ALBA VIVIANA TORRES USECHE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA
CONSORCIO JR
JESUS MARIA RUIZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
