Gobernación de Boyacá
Contratación
TRAMITADO
CARLOS SEBASTIAN APONTE ORTIZ
Fecha: 07/07/2025

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 0** |
| | | **CÓDIGO: A-AD-GC-F-020** |
| **INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA** | | **FECHA: 24/Jul/2019** |

PERIODO REPORTE DEL ____23-05-2025_____AL_06-06-2025_____ CONTRATO No. 2105-2025

REGISTRO BPyP No.: 202500000016912

FECHA INICIACIÓN_____ 07 DE MAYO DE 2025 FECHA TERMINACIÓN_____ 06 DE JUNIO DE 2025

CONTRATISTA: HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA INTERVENTOR: ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

| REPORTE DEL CONTRATISTA | | | REPORTE DEL INTERVENTOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ACTIVIDADES PACTADAS** | **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | **VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** | | | **OBSERVACIONES** |
| | | | **T** | **P** | **N** | |
| 1,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | 955,8 Kg | x | | | ACTIVIDAD EJECUTADA EN EL PRIMER INFORME DE AVANCE |
| 1,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6 | 145,46 m2 | x | | | ACTIVIDAD EJECUTADA EN EL PRIMER INFORME DE AVANCE |
| 1,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO | 14 ml | x | | | ACTIVIDAD EJECUTADA EN EL PRIMER INFORME DE AVANCE |
| 1,04 | LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM) | 104,01 m2 | x | | | LA CANTIDAD EJECUTADA ES MAYOR A LA CONTRACTUAL, TENIENDO EN CUENTA QUE SE INCLUYO LA HABITACION DE BODEGA O ADICIONAL, Y LA TAPA LOCALIZADA ENTRE LA CUBIERTA Y LA VIGA DE MADERA EN EL PASILLO. |
| 1,05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W | 9 und | x | | | LA CANTIDAD EJECUTADA ES MAYOR A LA CONTRACTUAL, DEBIDO A QUE SE INCLUYO EL PANEL LED PARA LA HABITACION DE BODEGA O ADICIONAL NO CONTEMPLADA INICIALMENTE. |
| 1,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE AWG 12 Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO) | 9 und | x | | | ACTIVIDAD EJECUTADA EN EL PRIMER INFORME DE AVANCE. |
| 1,07 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS | 161,62 m2 | x | | | LA CANTIDAD EJECUTADA ES MAYOR A LA CONTRACTUAL TENIENDO EN CUENTA QUE SE INTERVINIERON AREAS NO CONTEMPLADAS INICIALMENTE COMO LA TOTALIDAD DEL COMEDOR, SALA DE COMPUTO, PASILLO EXTERIOR, Y HABITACION ADICIONAL. |
| 2,01 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | 83,61 m3 | x | | | ACTIVIDAD EJECUTADA EN EL PRIMER INFORME DE AVANCE |
| 2,02 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) | 1043,70 kg | x | | | LA CANTIDAD EJECUTADA ES MAYOR A LA CONTRACTUAL, DEBIDO A QUE SE INCLUYO LA MALLA ELECTROSOLDADA PARA LAS PLACAS O BASES DE LOS ARCOS, NO CONTEMPLADO INICIALMENTE. |
| 2,03 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | 42,53 m3 | x | | | LA CANTIDAD EJECUTADA ES MAYOR A LA CONTRACTUAL, DEBIDO A QUE SE INCLUYÓ EL CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA LAS PLACAS O BASES DE LOS ARCOS, NO PROYECTADO INICIALMENTE |

Firma: _____
Nombre: ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA
CONTRATISTA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.

| CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA | BITACORA DE OBRA | F_P_01<br>VERSION: 1.0<br>PAGINA 1 DE |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| PERIODO REPORTADO | |
| No. DE FOLIO | |

| DATOS DEL CONTRATO | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | 2105-2025 |
| OBJETO | ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 30 DE ABRIL DE 2025 |
| CONTRATANTE | GOBERNACION DE BOYACA |
| CONTRATISTA | HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA C.C 1055228532 |
| SUPERVISOR (A) | ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA |
| VALOR CONTRATO | $ 93.463.900 |
| PLAZO DE EJECUCION | UN (01) MESES |
| FECHA ACTA DE INICIO | SIETE (07) DE MAYO DE 2025 |

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR | |
|---|---|
| 1 | **REALIZAR CUBIERTA EN LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE TOIBITA** |
| 1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO |
| 1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6 |
| 1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO |
| 1.4 | LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM) |
| 1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W |
| 1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE AWG 12 Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO) |
| 1.7 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS |
| | **REALIZAR PLACA PARA EL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL** |
| 2.1 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) |
| 2.2 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) |
| 2.3 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS |

**ANOTACIONES**

| No. | TIPO DE NOTA | FECHA | NOTAS Y CROQUIS |
|---|---|---|---|
| 15 | Sede: Toibita y sede principal<br>Clima: Soleado<br>Actividad: Suministro e instalación de techo PVC.<br>Personal: Residente y cuadrilla. | 23 DE MAYO DE 2025 | SEDE TOIBITA Y SEDE PRINCIPAL. |

Powered by CamScanner

| ANOTACIONES | | | |
|---|---|---|---|
| No. | TIPO DE NOTA | FECHA | NOTAS Y CROQUIS |
| 16 | Sede: Toibita y sede principal. Clima: Nublado Actividad: Nivelación manual cancha. Suministro e instalación de techo PVC, puntos electricos. | 24 DE MAYO DEL 2025 | SEDE TOIBITA Y SEDE PRINCIPAL PERSONAL: Residente y cuadrilla. |
| 17 | Sede: Toibita y sede principal Clima: Nublado Actividad: Nivelación manual cancha Suministro e instalación de techo PVC, puntos electricos Personal: Residente Y cuadrilla. | 26 DE MAYO DEL 2025 | SEDE TOIBITA T SEDE PRINCIPAL. |
| 18 | Sede: Toibita y sede principal. Clima: Lluvioso. Actividad: Nivelación manual cancha. Suministro e instalación de techo PVC, puntos electricos. Personal: Residente Y cuadrilla | 27 DE MAYO DEL 2025 | SEDE TOIBITA Y SEDE PRINCIPAL. |

Powered by CamScanner

| ANOTACIONES | | | |
|---|---|---|---|
| No. | TIPO DE NOTA | FECHA | NOTAS Y CROQUIS |
| 19 | Sede: Toibita y sede principal. Clima: Soleado Actividad: Toma de densidades. Instalación de bimperas y estuco y vinilo. Personal: Residente y cuadrilla. | 28 DE MAYO DEL 2025 | SEDE TOIBITA Y SEDE PRINCIPAL |
| 20 | Sede: Toibita y sede principal. Clima: Nublado Actividad: Instalación de malla y formaleta. Estuco y vinilo. Personal: Residente y cuadrilla. | 29 DE MAYO DEL 2025 | SEDE TOIBITA Y SEDE PRINCIPAL. |
| 21 | Sede: Toibita y sede principal. Clima: Nublado. Actividad: Instalación de malla y formaleta. Estuco y vinilo. Personal: Residente y cuadrilla | 30 DE MAYO DEL 2025 | SEDE TOIBITA Y SEDE PRINCIPAL |

Powered by CamScanner

| ANOTACIONES | | | |
|---|---|---|---|
| No. | TIPO DE NOTA | FECHA | NOTAS Y CROQUIS |
| 22 | Sede: Toibita y sede principal<br>Clima: Nublado<br>Actividad: Estuco y vinilo.<br>Suministro de materiales para concreto.<br>Personal: Residente y cuadrilla | 31 DE MAYO DE 2025 | SEDE TOIBITA Y SEDE PRINCIPAL |
| 23 | Sede: Sede principal.<br>Clima: Soleado<br>Actividad: Elaboración de concreto. Toma de cilindros.<br>Personal: Residente y cuadrilla. | 03 DE JUNIO DE 2025 | SEDE PRINCIPAL |
| 24 | Sede: Sede principal.<br>Clima: Soleado<br>Actividad: Elaboración de concreto. Toma de cilindros.<br>Personal: Residente y cuadrilla. | 04 DE JUNIO DEL 2025 | SEDE PRINCIPAL |

Powered by CamScanner

| ANOTACIONES | | | |
|---|---|---|---|
| No. | TIPO DE NOTA | FECHA | NOTAS Y CROQUIS |
| 25 | Sede: Sede principal<br>Clima: Soleado<br>Actividad: Elaboración de concreto. Toma de cilindros.<br>Personal: Residente y cuadrilla. | 05 DE JUNIO DEL 2025 | SEDE PRINCIPAL |
| 26 | Sede: Sede principal.<br>Clima: Soleado<br>Actividad: Elaboración de concreto, Toma de cilindros. Estuco y vinilo.<br>Personal: Residente y cuadrilla. | 06 DE JUNIO DEL 2025 | SEDE PRINCIPAL |

Powered by CamScanner

## REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE AVANCE 02

**REALIZAR CUBIERTA EN LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE TOIBITA**

ITEM 1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO










ITEM 1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6











ITEM 1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO





ITEM 1.4 LAMINA PANEL (PVC-FOIL ALUM)










ITEM 1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W












ITEM 1.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE AWG 12 Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)



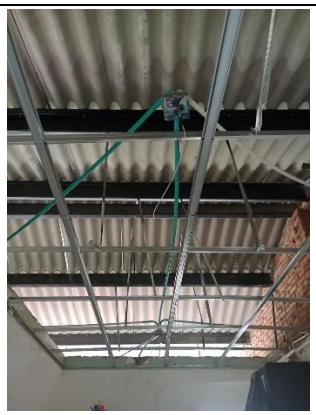

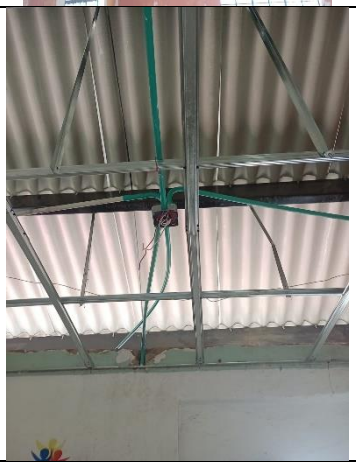




ITEM 1.7 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS







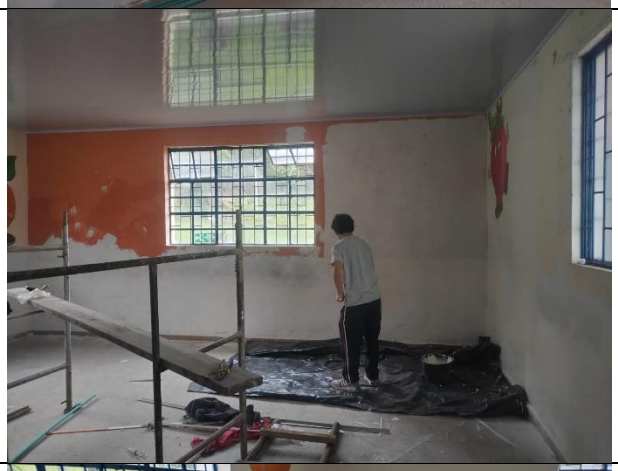









**REALIZAR PLACA PARA EL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL**

ITEM 2.1 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)








ITEM 2.2 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)













ITEM 2.3 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS























