COPIA NO CONTROLADA

INFORME PARCIAL	**x**	**INFORME FINAL**	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:	
1.1. INFORME No. 5	
1.2. PERÍODO DEL INFORME **(**Del) Día: 11 Mes: marzo Año: 2025 (Al) Día: 30 Mes: marzo Año: 2025	
1.3. CONTRATO: No. **055** de fecha **2024 UAEJPMP** **de 25 de octubre de 2024.**	
1.4. OBJETO: Adecuaciones a la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en las instalaciones del Batallón de A.S.P.C. No. 30 “GUASIMALES” – BAS30 ubicado en Cúcuta	
1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VENTURA	
1.6. CÉDULA O NIT: 901.550.907-2	**1.7. CORREO ELECTRÓNICO: obrabatalloncucuta@gmail.com**
1.8. DIRECCIÓN: CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512	**1.9. TELÉFONO:** 3105587676

1.10 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(incluir las adiciones, prórrogas, reducciones etc.)

TIPO	FECHA	VALOR DE LA OPERACIÓN	OBJETO
PRÓRROGA No.1	20-12-2024	N/A	Prórroga plazo de ejecución hasta el 10 de marzo.
ADICIÓN NO. 1	13-03-2025	$52.864.632	Modificar la cláusula segunda del contrato de obra No. 055-2024 UAEJPMP, en el sentido de definir como valor de este, la suma de MIL CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.014.790.669), incluido IVA, AIU, estampilla Pro-Universidad Nacional y demás Universidades Estatales de Colombia, y las demás erogaciones a que haya lugar con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCIÓN DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO
N/A				

CESIÓN SÍ [ ] NO [x] Día _____Mes _____ Año _____

1.11 FECHA DE INICIO: Día**:** 31 Mes: octubre Año: 2024

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato	[ ]	Registro presupuestal	[ ]
Aprobación de garantía	[x]	Acta de Inicio	[ ]

1.12. FECHA TERMINACIÓN*: (Aplica solo para el informe final)*

Día: 15 Mes: marzo Año: 2025

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):
NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN.

2.2. DEPENDENCIA: Grupo Administrativo

2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO
TEL: 6015169563

EXT. 1025

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: nixon.lopez@justiciamilitar.gov.co

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DESIGNADO (S):N/A

2.6. DEPENDENCIA: N/A	**2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO:** N/A
2.8. CORREO ELECTRÓNICO: N/A	

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Un valor inicia por la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($961.926.037,00) incluido IVA, AIU, estampilla Pro-Universidad Nacional y demás Universidades Estatales de Colombia, y las demás erogaciones a que haya lugar con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato; sin embargo, se adiciona un valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($52.864.632), incluido IVA, AIU, estampilla Pro-Universidad Nacional y demás Universidades Estatales de Colombia, y las demás erogaciones a que haya lugar con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por lo anterior, la suma contractual se define en **MIL CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.014.790.669)**, incluido IVA, AIU, estampilla Pro-Universidad Nacional y demás Universidades Estatales de Colombia, y las demás erogaciones a que haya lugar con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ [ ] NO [X]

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	No RADICADO	VALOR	No. CRP
N/A			
TOTAL			

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
135224	**25/10/2024**

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica). N/A

4.2. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA 46%

FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	% DE AVANCE FINANCIERO
0	$961.926.037,00	0$	$0	$961.926.037,00	0%
19/12/2025	$961.926.037,00	0$	$63,341,966.00	$898.584.071	6,6%
10/03/2025	$961.926.037,00	$63,341,966.00	$442.313.076	$456.270.995	46%
12/06/2025	$1.014.790.669	$505.655.042	$456.270.995	$52.864.632	94,8%
12/06/2025	$1.014.790.669	$961.926.037,00	$52.864.632	$0	100%

46 % DE AVANCE FINANCIERO

A la fecha de este informe, se ha pagado el valor correspondiente a las dos primeras actas parcial de obra, y se encuentra en trámite de pago la segunda acta de corte parcial.

4.3. ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA (%) 100%

La ejecución contractual que objeta la adecuación de los espacios para la conformación de un complejo de justicia y configuración de espacios funcionales para el normal ejercicio de las actividades que competen a los despachos judiciales, se ha llevado a cabo con un normal transcurso y en obediencia a las necesidades correspondientes requeridas por la adecuación misma, dando continuidad efectiva a las actividades tales como desmontes y demoliciones, replanteo en sitio, impermeabilizaciones, conformación de vanos, reestructuración de cubierta, refuerzo de muros existentes, instalación de cubierta, enchapes, instalación de cielo raso y carpintería metálica y en madera, instalación de muros divisorios en sistema seco y en vidrio, instalación de piso y redes en general. De esta manera se culmina la totalidad de la obra contratada.

4.4 DOCUMENTOS DE CERTIFICADO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

4.4.1 PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE LA PLANILLA DE PAGO POR CADA PAGO REALIZADO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	**N/A**

(Si no aplica colocar N/A)

4.4.2 PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación**: 12/06/2025**

Aporta certificación suscrita por la representante legal del consorcio y el contador público LUIS FRANCISCO BELTRAN HERNANDEZ acompañado de los soportes correspondientes.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	*SÍ*	*NO*	*EXPLIQUE*	*N/A*
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	*X*		*En cumplimiento y en ejecución del contrato.*	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.				*X*
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				*X*
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	*X*		*En cumplimiento y en ejecución del contrato.*	
Los bienes fueron ingresados al almacén				*X*
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				*X*
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				*X*

Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				*X*
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	*X*		*En cumplimiento y en ejecución del contrato.*	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	*X*			
Cumplimiento de las obligaciones contractuales	*X*		*De conformidad con lo establecido para la obra.*	
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato				*X*

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:

_____

_____

Nota**: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (**cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- *Soporte de recibo de ingreso a almacén.*
- *Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.*
- *Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.*
- *Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.*
- *Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.*

INFORMES ANEXOS: SI [X] ***NO*** [ ] ***N/A*** [ ]

Relación, tipo y detalle del informe:

1. *Acta parcial de obra No.4*
2. *Factura CVE-156*
3. *Consolidado de pago 3 y 4.pdf*

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ [X] NO [ ]

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***
El contratista cumplió con el objeto contractual y la ejecución de las obligaciones del mismo.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No._____ y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA	PENDIENTE POR EJECUTAR
N/A					

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, de los servicios prestados pactados en el **Contrato o Aceptación de Oferta** No. 055 de 2024 UAEJPMP

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final y se refiere a la calidad del servicio)*


MALO [ ] BUENO [X]

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***
El contratista da cumplimiento al objeto contractual mediante el normal desarrollo de la obra requerida.

OBSERVACIONES:

_____

_____

FIRMA RESPONSABLES	
 Supervisor (es)	
NOMBRE: Nixon Hernando López Perdigón	**CÉDULA: 1.014.207.567**
CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. (07/07/2025)	

"Este documento es propiedad de la UAE JPMP y No está autorizado su reproducción total o parcial"

COPIA NO CONTROLADA

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	Adquisición de Bienes y Servicios	CODIGO: ABS-FO-004
		Certificación recibo a satisfacción para pagos	VERSIÓN:002
			FECHA VIGENCIA:2024-04-30

GENERALIDADES

SEÑALE CON EQUIS (X) LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL.

[X] Contrato [ ] Orden de compra [ ] Servicios públicos

[ ] Aceptación de oferta [ ] Convenio [ ] Otros ¿Cuál? _____

No. **055-2024-UAEJPMP** Fecha: 25 – oct -2024 [ ] Vigencia Actual [X] Reserva Presupuestal

MODIFICACIONES

[X] Adicionado

Prorrogado [X] Cesión [ ] Otro ¿Cuál? _____

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO CONTRACTUAL, Y POR TANTO AUTORIZO EL TRAMITE DE PAGO DEL VALOR SEÑALADO EN ESTA CERTIFICACIÓN

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO: **CONSORCIO VENTURA**	
CÉDULA O NIT: **901.550.907-2**	
PERIODO A PAGAR: 11 marzo 2025 – 15 marzo de 2025	No. DEL PAGO **4**
VALOR A PAGAR (en letras y números): **CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($52.864.632)**	
Nos. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: No. CVE 156	FECHA: **12 DE JUNIO DE 2025**
NO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO A AFECTAR: **135224**	FECHA: **25 DE OCTUBRE DE 2024**
OBJETO CONTRACTUAL: **Adecuaciones a la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en las instalaciones del Batallón de A.S.P.C. No. 30 "GUASIMALES" – BAS30 ubicado en Cúcuta**	
FORMA DE PAGO (Según clausula forma de pago): **LA UNIDAD** pagará el valor total del contrato incluido AIU, IVA sobre utilidad y todos los demás costos directos e indirectos necesarios para su correcta ejecución (menos los descuentos de ley) al **CONTRATISTA**, en pagos mensuales parciales de acuerdo con las actas de recibo parcial de obra, conforme a los precios presentados en la oferta económica. Los pagos se realizarán en moneda legal colombiana a través de la Tesorería de **LA UNIDAD**, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago, así: 1) Certificación recibo a satisfacción para pagos. 2) Acta de corte de obra de los trabajos o actividades parciales o totalmente realizados, debidamente suscrito por el supervisor del contrato y el contratista. 3) Presentación de la factura de venta a través de la plataforma electrónica de contratación pública SECOP II y el cumplimiento del "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co) 4) Constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de sus trabajadores y de sus contratistas, mediante certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal, según sea el caso, exonerándose del mismo para aquellos casos que se encuentran contemplados en la ley; la certificación emitida por parte del revisor fiscal deberá acompañarse de la copia de la tarjeta profesional, la cédula de ciudadanía y el certificado de la Junta Central de Contadores con una fecha de emisión no mayor a noventa (90) días calendario. **PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA PARA PAGO**: Los pagos previstos en esta cláusula se realizarán en la cuenta de corriente No. 70564096480 de Bancolombia, la cual fue acreditada	

<table>
<tr><td colspan="4">mediante certificación bancaria del 02 de octubre de 2024, o en otra cuenta bancaria de la que sea titular EL CONTRATISTA y lo informe por escrito a LA UNIDAD con no menos de diez (10) días de anticipación a la presentación de la factura enviando la respectiva certificación bancaria en donde se acredite su apertura y titularidad. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporten en debida forma o se allegue el último de los documentos y aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación si la corrección no se hace dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes. Las demoras que se presente será responsabilidad del CONTRATISTA. PARÁGRAFO TERCERO: En virtud de lo dispuesto en la Ley 1697 de 2013, por la cual se Crea la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia, LA UNIDAD, retendrá de manera proporcional al pago o pagos realizados a EL CONTRATISTA, el porcentaje correspondiente a la contribución de estampilla definido en los artículos 8 y 9 de la mencionada Ley y otras a que haya lugar.</td></tr>
<tr><td colspan="4">PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DE MARZO DE 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">NOMBRE DEL SUPERVISOR: NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN</td></tr>
<tr><td colspan="4">No. CÉDULA: 1.014.207.567 de Bogotá</td></tr>
<tr><td colspan="2">CARGO:
PROFESIONAL DE DEFENSA</td><td colspan="2">DEPENDENCIA:
GRUPO ADMINISTRATIVO – SECRETARIA GENERAL</td></tr>
<tr><td>CORREO ELECTRÓNICO:
nixon.lopez@justiciamilitar.gov.co</td><td></td><td>TEL.
Ext.:</td><td>5169563
Ext. 1024</td></tr>
<tr><td colspan="4">Certifico que los soportes de pago se encuentran registrados en la plataforma SECOP II y el informe de supervisión entregado al área contractual.</td></tr>
<tr><td colspan="4">FIRMA DEL SUPERVISOR:  FECHA: 07 DE JULIO DE 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Verificación del Grupo de Contratos:

Documentos en SECOP II: ☐ Tienda Virtual radicado ☐</td></tr>
</table>

"Este documento es propiedad de la UAE JPMP y No está autorizado su reproducción total o parcial"

CONSORCIO VENTURA

Bogotá D.C., junio 12 de 2025 CV-UAEJPMP-023-2025

PARA:	JUAN CARLOS JAIMES ACERO. PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS. INTERVENTORÍA. REPRESENTANTE LEGAL. Nit. 901.835.570-9
DE:	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN. CONSORCIO VENTURA. CONTRATISTA. REPRESENTANTE LEGAL. Nit. 901.550.907-2
REFERENCIA:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL Y CONSORCIO VENTURA. OBJETO: CONTRATAR LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES" – BAS30 UBICADO EN CÚCUTA
ASUNTO:	ACTA CORTE DE OBRA No. 3

Respetuoso saludo,


De acuerdo con las obligaciones enmarcadas dentro de nuestro contrato y en cumplimiento a la CLÁUSULA TERCERA. – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO, nos permitimos anexar los siguientes documentos correspondientes al Acta Corte de Obra No. 3:

- Acta de Corte de Obra No. 3
- Factura Electrónica

CONSORCIO
VENTURA

- RUT CONSORCIO VENTURA
- Certificación Bancaria
- Certificación de pago Aportes Parafiscales
- Planillas de pago
- Memorias que justifican el pago

Cordialmente,



MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Representante Legal CONSORCIO VENTURA
Contratista

CONSORCIO VENTURA

CR 54 153 75 TO 2 AP 512

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 901550907 - 2
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764071894854 del 31/05/2024 al 31/05/2026
Habilita numeración de:
CVE-101 al CVE-200
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL Y CONSORCIO VENTURA. OBJETO: CONTRATAR LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 30 “GUASIMALES” – BAS30 UBICADO EN

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
NIT 900384997 - 1
Dirección: CARRERA 46 No.. 20C-1
Codigo Cliente UAEJPMP 900384997
Teléfono: 2834868
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. CVE155
Fecha de emisión: 12/06/2025 11:37:40 AM
Fecha de validación DIAN: 12/06/2025 11:43:35 AM
Fecha de vencimiento: 12/07/2025
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	C3-FACTURA1	CORTE DE OBRA No. 3	1,00	unidad	COP 390,776,803.00	COP 0.00			COP 390,776,803.00
2	AIU Administración	Administración	1,00	estándar	COP 39,077,680.00	COP 0.00			COP 39,077,680.00
3	AIU Imprevistos	Imprevistos	1,00	estándar	COP 7,815,536.32	COP 0.00			COP 7,815,536.32
4	AIU Utilidad	Utilidad	1,00	estándar	COP 15,631,072.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 15,631,072.00

Total de items: 4
Observaciones
#$15-21-00;055/2024UAEJPMP;nixon.lopez@justiciamilitar.gov.co#$

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Crédito

CONSORCIO VENTURA conformado por MARIA JOSE HERRERA GUZMAN con CC No. 52452955 y con 50% de participación y ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP S.A.S. con NIT 901340813-8 con 50% de participación ADMINISTRACION: 10% ; IMPREVISTOS: 2% ; UTILIDAD: 4% ; IVA SOBRE LA

Subtotal:	COP 453,301,091.32
IVA(19%)	COP 2,969,903.68

Impuestos:	COP 2,969,903.68
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 456,270,995.00
Neto a pagar	COP 456,270,995.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 21ada6cfe078359189f38d23406b8b8ec7f8827fc99b995b6ca1e6228e2f534e0f885f0af1b17952ea2b99d4c839770d

CONSORCIO VENTURA

CR 54 153 75 TO 2 AP 512

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 901550907 - 2
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764071894854 del 31/05/2024 al 31/05/2026
Habilita numeración de:
CVE-101 al CVE-200
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL Y CONSORCIO VENTURA. OBJETO: CONTRATAR LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 30 “GUASIMALES” – BAS30 UBICADO EN

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
NIT 900384997 - 1
Dirección: CARRERA 46 No.. 20C-1
Codigo Cliente UAEJPMP 900384997
Teléfono: 2834868
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. CVE156
Fecha de emisión: 12/06/2025 11:43:39 AM
Fecha de validación DIAN: 12/06/2025 11:47:31 AM
Fecha de vencimiento: 12/07/2025
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	C3-FACTURA2	CORTE DE OBRA No. 3	1,00	unidad	COP 45,276,321.00	COP 0.00			COP 45,276,321.00
2	AIU Administración	Administración	1,00	estándar	COP 4,527,632.00	COP 0.00			COP 4,527,632.00
3	AIU Imprevistos	Imprevistos	1,00	estándar	COP 905,525.93	COP 0.00			COP 905,525.93
4	AIU Utilidad	Utilidad	1,00	estándar	COP 1,811,053.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,811,053.00

Total de items: 4
Observaciones
#$15-21-00;055/2024UAEJPMP;nixon.lopez@justiciamilitar.gov.co#$

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Crédito

CONSORCIO VENTURA conformado por MARIA JOSE HERRERA GUZMAN con CC No. 52452955 y con 50% de participación y ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP S.A.S. con NIT 901340813-8 con 50% de participación ADMINISTRACION: 10% ; IMPREVISTOS: 2% ; UTILIDAD: 4% ; IVA SOBRE LA

Subtotal:	COP 52,520,531.93
IVA(19%)	COP 344,100.07

Impuestos:	COP 344,100.07
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 52,864,632.00
Neto a pagar	COP 52,864,632.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE f62008559f9154649e6ec19c8759bcd0e120ce8cd0fda264accfbdde8768317e1378f00a6b25694925f69d8e65236bfd

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141138716497

(415)7707212489984(8020) 000014113871649 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 0 9 0 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VENTURA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 54 153 75 TO 2 AP 512

42. Correo electrónico altavistacgsas@aol.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 5 5 8 7 6 7 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 2 1 1 2 1 3	4 2 9 0	2 0 2 1 1 2 1 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HERRERA GUZMAN MARIA JOSE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141138716497

(415)7707212489984(8020) **000014113871649 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 0 9 0 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 1 1 2 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 1 1 2 4	
81. Hasta	2 0 2 4 1 1 2 4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141138716497

(415)7707212489984(8020) **000014113871649 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 0 9 0 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 1 1 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 4 5 2 9 5 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERRERA	GUZMAN	MARIA	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 1 1 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 7 1 1 9 5 7 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERRERA	GUZMAN	LUIS	FELIPE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141138716497

(415)7707212489984(8020) **000014113871649 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 0 9 0 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 4 5 2 9 5 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERRERA	GUZMAN	MARIA	JOSE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
185,056,000		5 0 2 0 2 1 1 1 2 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 4 0 8 1 3	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
185,056,000		5 0 2 0 2 1 1 1 2 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764071894854

(415)7707212489984(8020) 001876407189485 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901550907	2				

11. Razón social
CONSORCIO VENTURA

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
CR 54 153 75 TO 2 AP 512

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-05-31 / 10:07:17 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres HERRERA GUZMAN MARIA JOSE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 52452955 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO VENTURA

997. Fecha formalización 2024-05-31 10:07:17

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764071894854

(415)7707212489984(8020) 001876407189485 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 5 0 9 0 7	2				

11. Razón social

CONSORCIO VENTURA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO VENTURA CR 54 153 75 TO 2 AP 512	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CVE	101	200	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Bogotá D.C., 12 de junio de 2025

Señores
A QUIEN LE INTERESE
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente CONSORCIO VENTURA identificado con NIT Nro. 9015509072, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 02-02-2022 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta Corriente	096481353	Activo	03/02/2022

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 12 días del mes de junio de 2025, en atención a la solicitud No. 790194730.

Cordialmente,



Gerencia de Servicio

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Itaú. Establecimiento bancario.

CONSORCIO VENTURA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, MARIA JOSE HERRERA GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 52.452.955 obrando como Representante Legal del CONSORCIO VENTURA, manifiesto bajo la gravedad del juramento que mi firma, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por esto conceptos.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 12 días del mes de junio de 2025.

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Representante Legal CONSORCIO VENTURA
CC. 52.452.955 de Bogotá

LUIS FRANCISCO BELTRAN HERNANDEZ
Contador Público
T.P. 54824-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

54824-T



LUIS FRANCISCO
BELTRAN HERNANDEZ
C.C. 3195231
RESOLUCION INSCRIPCION 135 FECHA 11/09/97
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente 00063363

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

011542

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **3.195.231**
BELTRAN HERNANDEZ
APELLIDOS
LUIS FRANCISCO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-MAR-1963**
TABIO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-MAY-1981 TABIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1527100-00181091-M-0003195231-20090926 0016586018A 1 30824997

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AFE0B5CA8F7F5265

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FRANCISCO BELTRAN HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 3195231 de TABIO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 54824-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@aol.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	07/04/2025	85648749	$322.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	6.000	0		0		0	5	100	0	6.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	12.000	0		0		0	5	100	0	12.100	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	12.000	0		0		0	5	100	0	12.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	6.000	0		0		0	5	100	0	6.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	30.000	0		0		0	5	100	0	30.100	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	12.000	0		0		0	5	100	0	12.100	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	12.000	0		0		0	5	100	0	12.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	53.200	0	0	0	0	5	200	0	53.400	7
230301	Porvenir	800224808-8	38.000	0	0	0	0	5	200	0	38.200	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	22.800	0	0	0	0	5	100	0	22.900	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	51.000				51.000	5	200	51.200			510	51.200	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	26.600	5	100	26.700	14
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	1.900	5	100	2.000	1

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA		Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@aol.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	07/04/2025	85648749	$322.800	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
15.000	5	100	15.100	15
ICBF				
22.500	5	100	22.600	15
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	90.000	90.700
Pensión	3	114.000	114.500
Riesgos Laborales	1	51.000	51.200
CCF	2	28.500	28.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	22.500	22.600
MEN	0	0	0
SENA	1	15.000	15.100
TOTALES	15	321.000	322.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA		Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@aol.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	07/04/2025	85648749	$322.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004804856	RAMIREZ CARRILLO DAIRON STIWAR	1	0			N	X																230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	6.000	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	47.450	1.000	1.500	0	0
2	CC	1026251053	ORJUELA CARRERO JHOAM MANUEL	1	0			N	X																230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS001	47.450	6.000	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	47.450	1.000	1.500	0	0
3	CC	1026267003	RAMIREZ FIGUEROA SANTOS EDUARDO	1	0			N	X																230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPSC34	47.450	6.000	14-23	47.450	5	3.400	CCF69	47.450	1.900	47.450	1.000	1.500	0	0
4	CC	1073599257	MARTIN GUERRERO JOSE ALCIDES	1	0			N	X																230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	6.000	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	47.450	1.000	1.500	0	0
5	CC	1077320582	AVILA RINCON NESTOR ENRIQUE	1	0			N	X																230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	6.000	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	47.450	1.000	1.500	0	0
6	CC	1093142064	MEDINA SALCEDO LUIS FELIPE	1	0			N	X																230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	6.000	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	47.450	1.000	1.500	0	0
7	CC	13481963	MORALES RUIZ JORGE ELIECER	1	0			N	X																230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	6.000	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	47.450	1.000	1.500	0	0
8	CC	37441623	PEREZ GRIMALDOS EDDY GISELA	1	0			N	X																230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	6.000	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	47.450	1.000	1.500	0	0
9	CC	79920871	GONZALEZ ORTIZ HAENZZ	1	0			N	X																230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	6.000	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	47.450	1.000	1.500	0	0
10	CC	79954942	GONZALEZ PIRAQUIVE WILLIAM EDILSON	1	0			N	X																25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPSC34	47.450	6.000	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	47.450	1.000	1.500	0	0
11	CC	88311594	HERNANDEZ ROPERO PEDRO ANTONIO	1	0			N	X																230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	6.000	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	47.450	1.000	1.500	0	0
12	PT	5841106	ANGEL VALERO CARIBAY DEL VALLE	1	0			N	X																230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	6.000	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	47.450	1.000	1.500	0	0
13	CC	1094427923	HERNANDEZ MONROY LUIS ALFREDO	1	0			N	X																25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	6.000	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	47.450	1.000	1.500	0	0
14	CC	1127387023	BARRETO EDGAR JOSE	1	0			N	X																230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	6.000	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	47.450	1.000	1.500	0	0
15	CC	1127656667	MORANTES MORA DEIVIN ADRIAN	1	0			N	X																25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	6.000	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	47.450	1.000	1.500	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901340813-8	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP SAS	CRA 54 NO 153 75 TORRE 2 APTO 512	3105587676	altavistacgsas@aol.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	07/04/2025	85649193	$18.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	6.000	0		0		0	4	100	0	6.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	7.600	0	0	0	0	4	100	0	7.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	300				300	4	100	400			3	400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.900	4	100	2.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.000	4	100	1.100	1
ICBF				
1.500	4	100	1.600	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	6.000	6.100
Pensión	1	7.600	7.700
Riesgos Laborales	1	300	400
CCF	1	1.900	2.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.500	1.600
MEN	0	0	0
SENA	1	1.000	1.100
TOTALES	6	18.300	18.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901340813-8	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP SAS	CRA 54 NO 153 75 TORRE 2 APTO 512	3105587676	altavistacgsas@aol.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	07/04/2025	85649193	$18.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiadio	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	13199229	MORANTES BALAGUERA REINALDO	1	0			N	X																230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	6.000	14-23	47.450	1	300	CCF24	47.450	1.900	47.450	1.000	1.500	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@aol.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	05/03/2025	84718884	$9.389.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	178.000	0		0		0	1	200	0	178.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	356.000	0		0		0	1	300	0	356.300	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	356.000	0		0		0	1	300	0	356.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	178.000	0		0		0	1	200	0	178.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	890.000	0		0		0	1	600	0	890.600	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	356.000	0		0		0	1	300	0	356.300	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	356.000	0		0		0	1	300	0	356.300	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.594.600	0	0	0	0	1	1.000	0	1.595.600	7
230301	Porvenir	800224808-8	1.139.000	0	0	0	0	1	800	0	1.139.800	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	683.400	0	0	0	0	1	500	0	683.900	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.486.500				1.486.500	1	1.000	1.487.500			14.865	1.487.500	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	746.700	1	500	747.200	14
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	57.000	1	100	57.100	1

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA		Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@aol.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	05/03/2025	84718884	$9.389.300	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
402.000	1	300	402.300	15
ICBF				
603.300	1	400	603.700	15
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2.670.000	2.672.200
Pensión	3	3.417.000	3.419.300
Riesgos Laborales	1	1.486.500	1.487.500
CCF	2	803.700	804.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	603.300	603.700
MEN	0	0	0
SENA	1	402.000	402.300
TOTALES	15	9.382.500	9.389.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA		Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@aol.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	05/03/2025	84718884	$9.389.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004804856	RAMIREZ CARRILLO DAIRON STIWAR	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	996.000	39.900	996.000	20.000	29.900	0	0
2	CC	1026251053	ORJUELA CARRERO JHOAM MANUEL	1	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
3	CC	1026267003	RAMIREZ FIGUEROA SANTOS EDUARDO	1	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
4	CC	1073599257	MARTIN GUERRERO JOSE ALCIDES	1	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
5	CC	1077320582	AVILA RINCON NESTOR ENRIQUE	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
6	CC	1093142064	MEDINA SALCEDO LUIS FELIPE	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
7	CC	13481963	MORALES RUIZ JORGE ELIECER	1	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
8	CC	37441623	PEREZ GRIMALDOS EDDY GISELA	1	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
9	CC	79920871	GONZALEZ ORTIZ HAENZZ	1	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
10	CC	79954942	GONZALEZ PIRAQUIVE WILLIAM EDILSON	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
11	CC	88311594	HERNANDEZ ROPERO PEDRO ANTONIO	1	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
12	PT	5841106	ANGEL VALERO CARIBAY DEL VALLE	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
13	CC	1094427923	HERNANDEZ MONROY LUIS ALFREDO	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	996.000	39.900	996.000	20.000	29.900	0	0
14	CC	1127387023	BARRETO EDGAR JOSE	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
15	CC	1127656667	MORANTES MORA DEIVIN ADRIAN	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	996.000	39.900	996.000	20.000	29.900	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901340813-8	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP SAS	CRA 54 NO 153 75 TORRE 2 APTO 512	3105587676	altavistacgsas@aol.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	05/03/2025	84719050	$503.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	39.900	0	0	39.900	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
20.000	0	0	20.000	1
ICBF				
29.900	0	0	29.900	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	39.900	39.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	29.900	29.900
MEN	0	0	0
SENA	1	20.000	20.000
TOTALES	6	503.100	503.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901340813-8	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP SAS	CRA 54 NO 153 75 TORRE 2 APTO 512	3105587676	altavistacgsas@aol.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	05/03/2025	84719050	$503.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	13199229	MORANTES BALAGUERA REINALDO	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	996.000	39.900	996.000	20.000	29.900	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL			
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	Código:	
CONSORCIO VENTURA	ACTA DE COBRO CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA	Versión:	VERSION No. 01
		Fecha:	30/10/2024

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 - CONSORCIO VENTURA.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLON DE A.S.P.C. No. 30 "GUASIMALES" - BAS39 UBICADO EN CUCUTA.		
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT:	901550907-2
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CONTRATO INTERVENTORIA No. 053-2024 - PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT:	901835570-9
FECHA DE CORTE	MARZO 15 DE 2025	CANTIDADES ADECUACIONES 2024 PALACIO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL CÚCUTA	
ACTA DE COBRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA No.	3		

1	OBRA CONTRATADA					BALANCE DE OBRA			CORTE DE OBRA - ACTA 1		CORTE DE OBRA - ACTA 2		PRESENTE CORTE DE OBRA - ACTA 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
NO.	ITEM	UND	CANT INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT + Y -	CANT REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL
	DEMOLICIONES Y DESMONTES															
1,01	Demolición y desmonte de cielo raso en lamina de yeso-cartón con su estructura, templetes, y todo lo implementado para su soporte. Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	m²	72,00	$ 31.832,00	$ 2.291.904,00	18,87	53,13	$ 1.691.094,00	53,13	$ 1.691.094,00	0,00	$ 140,06	-$ 0,00440	-$ 140,06	53,13	$ 1.691.234,00
1,02	Demolición y desmonte de cielo raso en esterilla de guadua, con yeso y estuco + estructura, templetes, y todo lo implementado para su soporte. Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	m²	107,00	$ 33.645,00	$ 3.600.015,00	69,80	37,20	$ 1.251.509,89	37,20	$ 1.251.510,00	0,00	$ -	$ -	$ -	37,20	$ 1.251.510,00
1,03	Desmonte y demolición de cubierta en teja de fibrocemento incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	m²	394,00	$ 38.868,00	$ 15.313.992,00	71,34	322,66	$ 12.541.187,75	322,66	$ 12.541.188,00	0,00	$ -	$ -	$ -	322,66	$ 12.541.188,00
1,04	Demolición muro en mampostería, Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	m²	192,00	$ 36.967,00	$ 7.097.664,00	74,52	117,48	$ 4.342.790,00	102,30	$ 3.781.631,00	13,34	$ 493.139,78	$ 1,84	$ 68.019,28	117,48	$ 4.342.790,00
1,05	Demolición de poyo de hasta 0,15m de altura, en mamposteria y/o concreto,incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	m²	4,00	$ 30.445,00	$ 121.780,00	-12,92	16,92	$ 515.179,63	4,00	$ 121.780,00	12,92	$ 393.399,63	$ -	$ -	16,92	$ 515.180,00
1,06	Demolición lineal de elementos estructurales VIGA Y/O COLUMNA en concreto armado de 3500 Psi, incluye acero de refuerzo + empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	m	21,00	$ 34.144,00	$ 717.024,00	21,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
1,07	Demolición de mesones en concreto + soportes verticales y horizontales + acabado , incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	m²	18,00	$ 32.276,00	$ 580.968,00	-8,65	26,65	$ 860.026,30	18,00	$ 580.968,00	8,65	$ 279.058,30	$ -	$ -	26,65	$ 860.026,00
1,08	Desmonte de luminarias existentes, incluye retiro y dispocición final certificada.	Un.	29,00	$ 28.834,00	$ 836.186,00	27,00	2,00	$ 57.668,00	2,00	$ 57.668,00	0,00	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 57.668,00
1,09	Desmonte de guardaescoba existente, incluye empaque, cargue, transporte y disposición final certificada.	m	152,00	$ 25.905,00	$ 3.937.560,00	18,62	133,38	$ 3.455.208,90	80,56	$ 2.086.907,00	52,82	$ 1.368.302,10	$ -	$ -	133,38	$ 3.455.209,00
1,10	Desmonte mobiliario fijo en madera, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	m²	20,00	$ 30.473,00	$ 609.460,00	6,20	13,80	$ 420.527,40	13,80	$ 420.527,00	0,00	$ -	$ -	$ -	13,80	$ 420.527,00
1,11	Desmonte de dispositivos electricos supendidos incluye soportes, aparatado, cancelación de punto electrico y todo lo correcto para su desinstalación + empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	Un.	8,00	$ 27.434,00	$ 219.472,00	5,00	3,00	$ 82.302,00	3,00	$ 82.302,00	0,00	$ -	$ -	$ -	3,00	$ 82.302,00
1,12	Desmonte de unidades sanitarias (inodoros, urinales, lavamanos) incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	Un.	18,00	$ 32.277,00	$ 580.986,00	6,00	12,00	$ 387.324,00	12,00	$ 387.324,00	0,00	$ -	$ -	$ -	12,00	$ 387.324,00
1,13	Desmonte de espejos incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	Glb.	2,00	$ 22.951,00	$ 45.902,00	1,00	1,00	$ 22.951,00	1,00	$ 22.951,00	0,00	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 22.951,00
1,14	Desmonte de divisiones metálicas de baños incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	Glb.	2,00	$ 40.258,00	$ 80.516,00	2,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
1,15	Demolición de enchapes tipo ceramico en muros, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	m²	247,00	$ 30.675,00	$ 7.576.725,00	114,47	132,53	$ 4.065.503,46	132,53	$ 4.065.503,00	0,00	$ -	$ -	$ -	132,53	$ 4.065.503,00
1,16	Demolición de enchapes tipo ceramico en pisos, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	m²	641,00	$ 30.675,00	$ 19.662.675,00	68,46	572,54	$ 17.562.575,54	534,64	$ 16.400.002,00	37,90	$ 1.162.573,30	$ -	$ -	572,54	$ 17.562.576,00
1,17	Realización de regatas para instalación de tuberia 3 x 1" desde punto 0 de datos y eléctricos hasta ubicación final, incluye empaque y disposición final certificada de los escombros.	m	50,00	$ 14.610,00	$ 730.500,00	50,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -

1	OBRA CONTRATADA					BALANCE DE OBRA			CORTE DE OBRA - ACTA 1		CORTE DE OBRA - ACTA 2		PRESENTE CORTE DE OBRA - ACTA 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
NO.	ITEM	UND	CANT INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT + Y -	CANT REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL
1,18	Cancelado de puntos hidraulicos y/o sanitarios, incluye tapones, pegante, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Un.	12,00	$ 11.410,00	$ 136.920,00	-1,00	13,00	$ 148.330,00	0,00	$ -	13,00	$ 148.330,00	$ -	$ -	13,00	$ 148.330,00
1,19	Placa en concreto 0,15m de 3000 psi, incluye malla electrosoldada 4mm 15 x 15, incluye excavación hasta 30cm, material de compactación tipo recebo B-400, debe dejarse el alistado con mortero autonivelante, para instalación del acabado. Plástico como impermeabilizante, formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m²	10,00	$ 63.384,00	$ 633.840,00	-5,25	15,25	$ 966.352,46	0,00	$ -	15,25	$ 966.352,46	$ -	$ -	15,25	$ 966.352,00
1,20	Limpieza, retiro de escombros, parchado de grietas con sellador tipo resina liquida de poliuretano o similar, alisado de superficies irregulares, limpieza de bajantes, nivelado de la placa para dar la pendiente hacia bajantes con mortero autonivelante reforzado con fibra de vidrio, aplicación de manto asfaltico con foil de aluminio, fijaciopn mediante brea liquida y aplicación de calor	m²	223,00	$ 22.022,00	$ 4.910.906,00	33,04	189,96	$ 4.183.365,19	58,46	$ 1.287.406,00	0,00	$ -	$ 131,50	$ 2.895.959,00	189,96	$ 4.183.365,00
1,21	Suministro e instalación de escalera de gato peldaños y soportes en tubo aguanegra de 1½", fijado al muro, piso, y placa superior mediante platina de ¼ y minimo 4 chazos de ½", incluye jaula de seguridad en platina de 1½ x ¼ + refuerzo en concreto tipo dado en muro de mampostería, peldaños cada 0,3m 0,75m de ancho	m	4,00	$ 391.788,00	$ 1.567.152,00	4,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
1,22	Suministro e instalacion de ventanas en aluminio 744, Anodizado, negro, vidrio laminado (espesor de pelicula transparente de 1 Milimetro) crudo 4+4 incoloro, rodachina española y cerradura de impacto. **Ventanas V1 - V2**	m²	40,00	$ 435.268,00	$ 17.410.720,00	6,66	33,34	$ 14.511.835,12	0,00	$ -	6,67	$ 2.903.237,56	$ 26,67	$ 11.608.597,56	33,34	$ 14.511.835,00
1,23	Suministro e instalacion de puerta metalica collrold de color negro calibre 22 totalmente lisa, con chapa de seguridad challenguer y marco metalico. **P-4**	m²	14,00	$ 679.959,00	$ 9.519.426,00	3,49	10,51	$ 7.149.088,93	0,00	$ -	2,10	$ 1.427.913,90	$ 8,41	$ 5.721.175,03	10,51	$ 7.149.089,00
1,24	Revoque de muro de fachada con acabado tipo esgrafiado texturizado o similar impermeabilizado, aplicado sobre pañete, incluye raspado de pintura existente, color blanco con zócalo negro de 0,90m de altura.	m²	426,00	$ 45.807,00	$ 19.513.782,00	79,99	346,01	$ 15.849.528,91	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 346,01	$ 15.849.529,00	346,01	$ 15.849.529,00
1,25	Suministro e instalación de estructura de cubierta en perfileria metalica 100x60mm + 90x40mm Y/O cerchas en acero corrugado, soldadura, dos capas de pintura anticorrosiva por todas sus caras, + pintura tipo esmalte aplicada en todas sus caras como acabado se incluyen tiras, correas, templetes, fijaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	m²	176,00	$ 23.810,00	$ 4.190.560,00	176,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
1,26	Suministro e instalación de teja en acero arquitectonica trapezoidal Cal.22 color blanco, incluye fijaciones, refuerzos, cortes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m²	533,00	$ 46.068,00	$ 24.554.244,00	137,20	395,80	$ 18.233.587,71	0,00	$ -	390,28	$ 17.979.419,04	$ 5,52	$ 254.169,36	395,80	$ 18.233.588,00
1,27	Caballete para teja trapezoidal, minimo 0,60m de ancho, color blanco incluye fijaciones, refuerzos, cortes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	90,00	$ 57.502,00	$ 5.175.180,00	90,00	0,00	$ -	0,00	$ -	20,60	$ 1.184.541,20	-$ 20,60	-$ 1.184.541,20	0,00	$ -
1,28	Suministro e instalacion de ventanas en aluminio 744, Anodizado, color a convenir, vidrio laminado (espesor de pelicula transparente de 1 Milimetro) crudo 3+3 incoloro, rodachina española y cerradura de impacto.	m²	51,00	$ 457.102,00	$ 23.312.202,00	51,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
1,29	Muro en Mamposteria de e:15 cm en Bloque #5, afirmado y pañetado pór ambas caras con mortero 1:3 incluye grapas de fijación a muros existentes, corte de acabado e instalado sobre placa estructural.	m²	286,00	$ 64.870,00	$ 18.552.820,00	77,96	208,04	$ 13.495.587,24	69,07	$ 4.480.636,00	138,97	$ 9.014.983,90	-$ 0,00	-$ 32,98	208,04	$ 13.495.587,00
1,30	Columneta de confinamiento en concreto 3000psi 0,25 x 0,12, con refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales, superior e inferior + flejes #2 cada 0,15cm. Incluye formaleta y todo lo necesarrio para su ejecución.	m	132,00	$ 84.455,00	$ 11.148.060,00	63,20	68,80	$ 5.810.504,00	30,00	$ 2.533.650,00	20,10	$ 1.697.545,50	$ 18,70	$ 1.579.308,50	68,80	$ 5.810.504,00
1,31	Vigueta de confinamiento en concreto 3000psi 0,25 x 0,12m + refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales horizontales + flejes #2@15cm, Incluye formaleta y todo lo necesarrio para su ejecución.	m	86,00	$ 92.010,00	$ 7.912.860,00	25,57	60,43	$ 5.560.164,30	26,70	$ 2.456.667,00	31,59	$ 2.906.595,90	$ 2,14	$ 196.901,40	60,43	$ 5.560.164,00
1,32	Pañete lineal de hasta 20cm de muros en mamposteria 1:3, incluye filos y dilataciones lineales	m	20,00	$ 27.739,00	$ 554.780,00	-47,60	67,60	$ 1.875.156,40	0,00	$ -	109,26	$ 3.030.763,14	-$ 41,66	-$ 1.155.606,74	67,60	$ 1.875.156,00
1,33	Suministro e instalación de estuco plastico sobre pañete de mortero en muros de mamposteria 3 manos X m²	m²	290,00	$ 21.441,00	$ 6.217.890,00	278,52	11,48	$ 246.142,68	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 11,48	$ 246.143,00	11,48	$ 246.143,00
1,34	Muro en lamina de yeso-cartón de e:12 cm. Dos caras de yeso-cartón de 1/2" + estructura en perfil canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 9, instalados cada 61 Cm. con fijaciones al piso, + cinta malla fibra de vidrio + aislamiento termoacùstico en lana de roca. incluye tratamiento de juntas, filos, y vanos con estucado general.	m²	204,00	$ 107.117,00	$ 21.851.868,00	45,97	158,03	$ 16.927.356,74	0,00	$ -	52,20	$ 5.591.507,40	$ 105,83	$ 11.335.849,11	158,03	$ 16.927.357,00
1,35	Lineal de muro en lamina de yeso-cartón de e:12 cm. hasta 0,61m. Dos caras de yeso-cartón de 1/2" + estructura en perfil canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 9, instalados cada 61 Cm. con fijaciones al piso, + cinta malla fibra de vidrio + aislamiento termoacústico en lana de roca. incluye tratamiento de juntas, filos, y vanos con estucado general.	m	105,00	$ 26.375,00	$ 2.769.375,00	64,37	40,63	$ 1.071.616,25	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 40,63	$ 1.071.616,00	40,63	$ 1.071.616,00
1,36	Remate de vanos y filos en muro de mamposteria, se debe dejar el afinado listo para la instalación del marco de puertas	m	16,00	$ 8.813,00	$ 141.008,00	-131,52	147,52	$ 1.300.093,76	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 147,52	$ 1.300.094,00	147,52	$ 1.300.094,00

1	OBRA CONTRATADA					BALANCE DE OBRA			CORTE DE OBRA - ACTA 1		CORTE DE OBRA - ACTA 2		PRESENTE CORTE DE OBRA - ACTA 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
NO.	ITEM	UND	CANT INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT + Y -	CANT REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL
1,37	Suministro e instalación de cielo raso en lamina de yeso-cartón, con estructura cada 61 cm, perfileria rolada calibre 24 viguetas y omegas, lámina de panel yeso de 1/2"; + cinta malla fibra de vidrio, cuelgas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento incluye tratamiento de juntas, filos, y vanos con estucado general. incluye vanos para tapas de inspección y luminarias.	m²	594,00	$ 76.869,00	$ 45.660.186,00	67,22	526,78	$ 40.492.873,10	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 526,78**	**$ 40.492.873,00**	**526,78**	**$ 40.492.873,00**
1,38	Refuerzo y conformado de vanos de cielorraso en perfil " T " 32mm X 24mm color blanco, fijado a estructura metálica o cuelgas a elemento estructural, incluye cortes, fijaciones , empastado y todo lo correcto para su instalación, y funcionamiento	m	221,00	$ 23.517,00	$ 5.197.257,00	-47,80	268,80	$ 6.321.369,60	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 268,80**	**$ 6.321.370,00**	**268,80**	**$ 6.321.370,00**
1,39	Suministro e instalación de tapas de inspección para cielorraso de 60 x 60 cm en lamina de fibrocemento de 8mm, con marco de refuerzo en ángulo de aluminio blanco, estucado y pintado, para dar acabado idéntico al cielo raso, incluye fijaciones, adhesivos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m²	4,00	$ 557.497,00	$ 2.229.988,00	1,84	2,16	$ 1.204.193,52	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 2,16**	**$ 1.204.194,00**	**2,16**	**$ 1.204.194,00**
1,40	Refuerzo y conformado de vanos en estructura metalica coldrolled tubo rectangular 90x50mm fijado a piso y estructura superior, incluye fijaciones, soldadura, dos manos de pintura anticorrosiva por todas sus caras, previo al conformado del muro, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	66,00	$ 23.517,00	$ 1.552.122,00	66,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ -**	**$ -**	**0,00**	**$ -**
1,41	Suministro e instalación de espejo.	m²	7,00	$ 66.891,00	$ 468.237,00	7,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ -**	**$ -**	**0,00**	**$ -**
1,42	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	m²	1161,00	$ 17.622,00	$ 20.459.142,00	282,52	878,48	$ 15.480.558,70	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 878,48**	**$ 15.480.559,00**	**878,48**	**$ 15.480.559,00**
1,43	Pintura interior en cieloraso, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	m²	594,00	$ 18.644,00	$ 11.074.536,00	67,22	526,78	$ 9.821.259,75	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 526,78**	**$ 9.821.260,00**	**526,78**	**$ 9.821.260,00**
1,44	Suministro e instalación enchape de pared en baldosa ceramica blanca formato 60x60cm, incluye pegante para ceramica, dilatadores plásticos, y emboquillado general.	m	189,00	$ 156.706,00	$ 29.617.434,00	104,04	84,96	$ 13.314.360,75	0,00	$ -	84,96	$ 13.313.741,76	**$ 0,00**	**$ 619,00**	**84,96**	**$ 13.314.361,00**
1,45	Suministro e instalación de wing curvo en aluminio crudo, para filos de muros en enchape. Incluye pegante, boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación	m	40,00	$ 34.000,00	$ 1.360.000,00	27,57	12,43	$ 422.620,00	0,00	$ -	12,43	$ 422.620,00	**$ -**	**$ -**	**12,43**	**$ 422.620,00**
1,46	Suministro e instalación enchape de piso en porcelanato formato 60x60cm, incluye pegante para porcelanato, dilatadores plásticos, y emboquillado general.	m	617,00	$ 156.706,00	$ 96.687.602,00	84,01	532,99	$ 83.523.338,18	0,00	$ -	499,18	$ 78.224.501,08	**$ 33,81**	**$ 5.298.836,86**	**532,99**	**$ 83.523.338,00**
1,47	Suministro e instalación de guarda escoba en porcelanato negro liso sin textura con altura de 10cm. Incluye pegante para porcelanato, o pegante epoxico tipo sicaflex o similar, incluye emboquillado en juntas y superior con remate de pintura color negro	m	464,00	$ 30.673,00	$ 14.232.272,00	35,67	428,33	$ 13.138.166,09	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 428,33**	**$ 13.138.166,00**	**428,33**	**$ 13.138.166,00**
1,48	Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, una pieza, color blanco, con asiento y tapa lacados, ahorrador de agua, tipo Sanitario corona Montecarlo Alongado Blanco Corona O SIMILAR. Con todos sus accesorios, instalación y llave registro metálica de entrada, sello de silicona, emboquillado, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Un.	6,00	$ 749.436,00	$ 4.496.616,00	2,00	4,00	$ 2.997.744,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.498.872,00	**$ 2,00**	**$ 1.498.872,00**	**4,00**	**$ 2.997.744,00**
1,49	Suministro e instalación lavamanos monocontrol de porcelana sanitaria, color blanco, de sobreponer en mesón, tipoLavamanos Sencillo De Empotrar 60.5X46.5X17 Cm O SIMILAR incluye grigferia monocontrol tipo Grifería corona Lavamanos Temporizador Diagonal Push O SIMILAR, sinfón con rejilla metalica, llave resgistro metálica de entrada, sello en silicona, flanche y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Un.	6,00	$ 275.964,00	$ 1.655.784,00	1,00	5,00	$ 1.379.820,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 5,00**	**$ 1.379.820,00**	**5,00**	**$ 1.379.820,00**
1,50	Suministro e instalación mesón de lavamanos en material petreo, incluye soportes salpicadero, perforaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	m²	8,00	$ 266.328,00	$ 2.130.624,00	8,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ -**	**$ -**	**0,00**	**$ -**
1,51	Suministro e instalación urinal linea institucional, Orinal Arrecife. Para Fluxómetro Blanco O SIMILAR. entrada superior, incluye grifería Grival orinal push antivandálica O SIMILAR, sifón con rejilla metálica sello de silicona, flanche, fijaciones en acero inoxidable 304, y todo lo correcto para su instalación y funcionamiento.	Un.	2,00	$ 726.395,00	$ 1.452.790,00	0,00	2,00	$ 1.452.790,00	0,00	$ -	1,00	$ 726.395,00	**$ 1,00**	**$ 726.395,00**	**2,00**	**$ 1.452.790,00**
1,52	Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable	Un.	2,00	$ 299.797,00	$ 599.594,00	0,00	2,00	$ 599.594,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 2,00**	**$ 599.594,00**	**2,00**	**$ 599.594,00**
1,53	Suministro e instalación de dispensador de jabón de empotrar en acero inoxidable (incluye accesorios de instalación y transporte)	Un.	2,00	$ 132.121,00	$ 264.242,00	0,00	2,00	$ 264.242,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 2,00**	**$ 264.242,00**	**2,00**	**$ 264.242,00**
1,54	Suministro e instalación de división en acero inoxidable 304 acabado cepillado o similar, incluye puerta con pestillo, fijaciones y anclajes a piso, pared y todos los necesarios en acero inoxidable 304	m²	20,00	$ 743.076,00	$ 14.861.520,00	7,01	12,99	$ 9.655.529,54	0,00	$ -	2,60	$ 1.930.511,45	**$ 10,40**	**$ 7.725.018,78**	**12,99**	**$ 9.655.530,00**
1,55	Poceta en mamposteria maciza, tipo tolete común, de 60cm x 60 cm de base x 75cm de altura, sobrepiso en concreto impermeabilizado de 10cm pegado y pañetado con mortero 1:3 impermeabilizado, enchapada con acabado identico al circUn.ante, incluclle win de aliminio en las esquinas y filos, grifería metálica tipo llave jardín,	Un.	1,00	$ 475.924,00	$ 475.924,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ -**	**$ -**	**0,00**	**$ -**
1,56	Regatas en mamposteria y/o concreto y derivación de punto hidraulico, incluye accesorios pegante, limpiador y todo lo correcto para su funcionamiento	m	25,00	$ 44.390,00	$ 1.109.750,00	0,00	25,00	$ 1.109.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 25,00**	**$ 1.109.750,00**	**25,00**	**$ 1.109.750,00**
1,57	Excavación, regatas en concreto y derivación a punto sanitario, incluye sifón, uniones y accesorios, pegante, limpiador y todo lo correcto para su funcionamiento	m	50,00	$ 72.411,00	$ 3.620.550,00	0,00	50,00	$ 3.620.550,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 50,00**	**$ 3.620.550,00**	**50,00**	**$ 3.620.550,00**
1,58	Suministro e instalación de divisiones en vidrio laminado 4+4, con perfileria en aluminio anodizado negro (marco en perfil tipo VP 3831 o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva (Sand blasting) tipo frost. **D-1**	m²	259,00	$ 670.933,00	$ 173.771.647,00	156,27	102,73	$ 68.924.947,09	0,00	$ -	20,55	$ 13.784.989,42	**$ 82,18**	**$ 55.139.957,67**	**102,73**	**$ 68.924.947,00**

1	OBRA CONTRATADA					BALANCE DE OBRA			CORTE DE OBRA - ACTA 1		CORTE DE OBRA - ACTA 2		PRESENTE CORTE DE OBRA - ACTA 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
NO.	ITEM	UND	CANT INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT + Y -	CANT REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL
1,59	Suministro e instalación de puertas en vidrio laminado 4+4, con perfileria en aluminio anodizado negro, proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva sand blasting tipo frost, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. **P-1**	m²	34,00	$ 813.671,00	$ 27.664.814,00	5,84	28,16	$ 22.912.975,36	0,00	$ -	5,63	$ 4.582.595,07	**$ 22,53**	**$ 18.330.380,29**	**28,16**	**$ 22.912.975,00**
1,60	Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10mm, portahoja o Zócalo de Puerta Vidrio 90mm S369 en aluminio anodizado negro superior e inferior incluye pelicula autoadhesiva sand blasting tipo frost, + portacerradura para vidrio, cerrojo llave-llave tipo yale o similar + quicios de vaiven fijados a piso + manijas de 0,60cm en acero inoxidable, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. dos hojas de 0,8 x 2,10. **P-5**	m²	4,00	$ 733.132,00	$ 2.932.528,00	-0,33	4,33	$ 3.171.748,97	0,00	$ -	0,87	$ 634.892,31	**$ 3,46**	**$ 2.536.856,28**	**4,33**	**$ 3.171.749,00**
1,61	Suministro e instalación poyo, en mamposteria maciza tipo tolete, ancho de 15cm, y altura de 25cm, fijado al piso de concreto, mortero de pega y pañete 1:3, afinado estucado y pintado.	m	69,00	$ 50.918,00	$ 3.513.342,00	21,26	47,75	$ 2.431.079,91	0,00	$ -	47,75	$ 2.431.334,50	**-$ 0,01**	**-$ 254,99**	**47,74**	**$ 2.431.080,00**
1,62	Suministro e instalación de pelicula sand blasting	m²	40,00	$ 94.112,00	$ 3.764.480,00	6,66	33,34	$ 3.137.694,08	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 33,34**	**$ 3.137.694,00**	**33,34**	**$ 3.137.694,00**
1,63	Suministro e instalación de puerta en lámina de dimensiones 0,8x 2,10 m en calibre 16, con bastidor y refuerzos interiores, doble lamina, bisagras de seguridad antipalanca minimo 4, acabado en pintura electroestatica. Incluye marco metalico empotrado a concreto + cerradura de seguridad tipo Cerrojo Seguridad 4 Pasadores 15mm Tipo Acero Ezcurra O SIMILAR + SEGUREX Kit Cerradura Entrada Principal Monticello 580 O SIMILAR. **P-3**	m²	2,00	$ 383.789,00	$ 767.578,00	0,02	1,98	$ 759.902,22	0,00	$ -	0,40	$ 151.980,44	**$ 1,58**	**$ 607.921,78**	**1,98**	**$ 759.902,00**
1,64	Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada, enchape en triplex 6mm okume, acabado en barniz transparente color wengue, con cerradura pomo en acero satin o similar. Marco completo en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto funcionamiento. **P-2**	m²	6,00	$ 350.142,00	$ 2.100.852,00	6,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ -**	**$ -**	**0,00**	**$ -**
1,65	Gabinete en lámina de aglomerado 18mm tipo RH con acabado fenólico, cantos en PVC rigido incluye puertas herrajes, entrepaños, patas metálicas niveladoras, fijaciones, y todo lo correcto para su funcionamiento.	m²	17,00	$ 523.752,00	$ 8.903.784,00	17,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ -**	**$ -**	**0,00**	**$ -**
1,66	Suministro e instalación de puerta en lámina cal. 18, con bastidor y refuerzos interiores, doble lamina, bisagras de seguridad antipalanca minimo 4, acabado en pintura electroestatica. Incluye marco metalico empotrado a concreto + cerradura de seguridad tipo Cerrojo Seguridad 4 Pasadores 15mm Acero Ezcurra O SIMILAR + SEGUREX Kit Cerradura Entrada Principal Monticello 580 O SIMILAR . **P-6**	Un.	1,00	$ 4.388.857,00	$ 4.388.857,00	0,00	1,00	$ 4.388.857,00	0,00	$ -	0,20	$ 877.771,40	**$ 0,80**	**$ 3.511.085,60**	**1,00**	**$ 4.388.857,00**
1,67	Suministro e instalación de luminaria tipo panel led cuadrada de 60x60 cm. de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable eléctrico libre de halógenos, toma aérea, clavija y todo lo correcto para su correcto funcionamiento e instalación.	Un.	120,00	$ 245.963,00	$ 29.515.560,00	7,00	113,00	$ 27.793.819,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 113,00**	**$ 27.793.819,00**	**113,00**	**$ 27.793.819,00**
1,68	Mantenimiento preventivo del transformador aéreo de 112,5kVA	Un.	1,00	$ 2.853.194,00	$ 2.853.194,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ -**	**$ -**	**0,00**	**$ -**
1,69	Suministro e instalación de acometida eléctrica en cables 3#2/OF+ 1#3/ON	m	150,00	$ 208.816,00	$ 31.322.400,00	107,00	43,00	$ 8.979.088,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 43,00**	**$ 8.979.088,00**	**43,00**	**$ 8.979.088,00**
1,70	Suministro e instalación de tubería de 3" PVC/IMC subterránea o aérea según la necesidad con sus respectivos accesorios	m	140,00	$ 39.436,00	$ 5.521.040,00	140,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ -**	**$ -**	**0,00**	**$ -**
1,71	Suministro e instalación de cajas de inspección en cumplimiento normativo en cemento bloque de concreto con tapa y manija	Un.	5,00	$ 380.269,00	$ 1.901.345,00	3,00	2,00	$ 760.538,00	0,00	$ -	2,00	$ 760.538,00	**$ -**	**$ -**	**2,00**	**$ 760.538,00**
1,72	Suministro e instalación de tablero tipo cofre de dimensiones minimas 80cm x 70cm x 40cm co barrajes de cobre de 250A	Un.	1,00	$ 798.115,00	$ 798.115,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ -**	**$ -**	**0,00**	**$ -**
1,73	Suministro e instalación de totalizador 3x150A graduable	Un.	1,00	$ 752.708,00	$ 752.708,00	0,00	1,00	$ 752.708,00	0,00	$ -	0,50	$ 376.354,00	**$ 0,50**	**$ 376.354,00**	**1,00**	**$ 752.708,00**
1,74	Suministro e instalación de totalizador 3x75A graduable	Un.	1,00	$ 302.495,00	$ 302.495,00	0,00	1,00	$ 302.495,00	0,00	$ -	0,50	$ 151.247,50	**$ 0,50**	**$ 151.247,50**	**1,00**	**$ 302.495,00**
1,75	Suministro e instalación de totalizador 3x50A fijo	Un.	1,00	$ 296.453,00	$ 296.453,00	0,00	1,00	$ 296.453,00	0,00	$ -	0,50	$ 148.226,50	**$ 0,50**	**$ 148.226,50**	**1,00**	**$ 296.453,00**
1,76	Suministro e instalación de llave de bypass tetrapolar de minimo 160A	Un.	1,00	$ 870.882,00	$ 870.882,00	0,00	1,00	$ 870.882,00	0,00	$ -	0,50	$ 435.441,00	**$ 0,50**	**$ 435.441,00**	**1,00**	**$ 870.882,00**
1,77	Suministro e instalación de DPS minimo de clase II (20/40kA)	Un.	1,00	$ 580.588,00	$ 580.588,00	0,00	1,00	$ 580.588,00	0,00	$ -	0,50	$ 290.294,00	**$ 0,50**	**$ 290.294,00**	**1,00**	**$ 580.588,00**
1,78	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 18 circuitos sin espacio para totalizador	Un.	1,00	$ 581.617,00	$ 581.617,00	0,00	1,00	$ 581.617,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 1,00**	**$ 581.617,00**	**1,00**	**$ 581.617,00**
1,79	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 42 circuitos sin espacio para totalizador	Un.	1,00	$ 1.303.752,00	$ 1.303.752,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ -**	**$ -**	**0,00**	**$ -**
1,80	Suministro e instalación de salida eléctrica bifásica L5-20 208V/220V para equipo de aire acondicionado	Un.	18,00	$ 177.262,00	$ 3.190.716,00	-5,00	23,00	$ 4.077.026,00	0,00	$ -	12,00	$ 2.127.144,00	**$ 11,00**	**$ 1.949.882,00**	**23,00**	**$ 4.077.026,00**
1,81	Sistema de puesta a tierra compuesto por tres (3) varillas de cobre de 2,4m cooperwell Cu/Fe, cable de cobre #2AWG y conectores con cumplimiento RETIE. Incluye alistamiento del terreno con gel y bentonita.	Un.	1,00	$ 5.018.052,00	$ 5.018.052,00	0,00	1,00	$ 5.018.052,00	0,00	$ -	0,50	$ 2.509.026,00	**$ 0,50**	**$ 2.509.026,00**	**1,00**	**$ 5.018.052,00**
1,82	Dotación de utiles de aseo NUEVOS, incluye: Escobas = 4Un. Traperos = 4Un. Cepillos para baño = 4Un. Bayetilla 0,8x1,0m = 12Un. Jabon tipo detergente en polvo = 9Kg. Cera para piso ceramico autobrillante = 9Gal. Desinfectate con cloro o legia = 9Gal. Limpiavidrios 500ml. = 10Un.	Glb.	1,00	$ 327.322,00	$ 327.322,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ -**	**$ -**	**0,00**	**$ -**

1	OBRA CONTRATADA					BALANCE DE OBRA			CORTE DE OBRA - ACTA 1		CORTE DE OBRA - ACTA 2		PRESENTE CORTE DE OBRA - ACTA 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
NO.	ITEM	UND	CANT INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT + Y -	CANT REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL
1,83	Pedestal para banderas dimensiones 0,8 x 1,6 h 0,40 en mamposteria maciza tipo tolete, afirmado y pañetado con mortero de pega 1:3, incluye dados en concreto pañetados, 0,40 x 0,40 h 0,20 X 2 + 0,40 x 0,40 h 0,40 X 1, con acabado estuco plástico para exteriores, y pintura premium para exteriores. + Tubos agua negra 2 ½ pulgadas, 2 x 3,50m y 1 x 4,50m, pintado con anticorrosivo, 2 manos, y como acabado pintura tipo esmalte color negro, las astas incluyen la polea superior, y argolla soldadadas y pintadas, la punta del asta incluye remate tipo bola de bronce o similar. INCLUYE EXCAVACIÓN Y SOBRECIMIENTO	Glb.	1,00	$ 3.845.040,00	$ 3.845.040,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
1,84	Suministro e instalación de señalización en acrílico de 4 mm y señal en vinilo según diseño de la Entidad en dimensiones de 15X30 cm	Un.	30,00	$ 61.278,00	$ 1.838.340,00	30,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
1,85	Aseo fino de obra - retoque de áreas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	Glb.	2,00	$ 969.180,00	$ 1.938.360,00	1,00	1,00	$ 969.180,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 1,00	$ 969.180,00	1,00	$ 969.180,00
SUBTOTAL					$ 823.848.953,00			$ 516.092.967,00		$ 54.249.714,00		$ 175.926.279,00		$ 285.916.976,00		$ 516.093.108,00
	ITEMS NO PREVISTOS DE OBRA															
NP01	Zapata en concreto de 21 MPA (3000 PSI) para columnas de confinamiento. (Incluye refuerzo).	M3	0,00	$ 1.009.274,00	$ -	-2,94	2,94	$ 2.971.302,66	0,0	$ -	2,94	$ 2.971.302,66	$ -	$ -	2,94	$ 2.971.303,00
NP02	Fundida de dados de 0,80x1,00mts en concreto ciclopeo de 2500psi para hincado de columnas metalicas, incluye excavacion h: 1.00mt.	M3	0,00	$ 572.676,00	$ -	-2,60	2,60	$ 1.488.957,60	0,00	$ -	2,60	$ 1.488.957,60	$ -	$ -	2,60	$ 1.488.958,00
NP03	Suministro e instalacion de Columnas de 4.80mts de altura (incluido la profundidad de anclaje al pedestal) en estructura metalica perfil C pareada de medidas 220x80x2.5mm, incluye tapa en lamina metalica lisa de 1/8 sobre la parte superior de la columna, soldadura, dos capas de pintura anticorrosiva por todas sus caras, + pintura tipo esmalte aplicada en todas sus caras como acabado final y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	0,00	$ 1.077.354,00	$ -	-2,00	2,00	$ 2.154.708,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.154.708,00	$ -	$ -	2,00	$ 2.154.708,00
NP04	Excavación, para vigas de cimentación de hasta 0,60mts de profundidad.	M3	0,00	$ 44.778,00	$ -	-12,83	12,83	$ 574.692,05	0,00	$ -	9,87	$ 441.958,86	$ 2,96	$ 132.732,88	12,83	$ 574.692,00
NP05	Suministro e instalacion de concreto de 2000 PSI para solado de viga de cimentación de 0,30 x 0,30mts.	M2	0,00	$ 30.530,00	$ -	-24,17	24,17	$ 737.910,10	0,00	$ -	24,17	$ 737.910,10	$ -	$ -	24,17	$ 737.910,00
NP06	Viga de cimentacion en concreto 3000psi 0,30 x 0,30m + refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales horizontales + flejes #2@15cm, Incluye formaleta y todo lo necesario para su ejecución.	M3	0,00	$ 763.447,00	$ -	-5,68	5,68	$ 4.337.598,95	0,00	$ -	5,68	$ 4.336.378,96	$ 0,00	$ 1.220,00	5,68	$ 4.337.599,00
NP07	Pañete de muros en mamposteria 1:3, incluye filos y dilataciones lineales	M2	0,00	$ 39.219,00	$ -	-156,75	156,75	$ 6.147.666,49	0,00	$ -	156,75	$ 6.147.578,25	$ 0,00	$ 88,00	156,75	$ 6.147.666,00
NP08	Placa en concreto de contrapiso con espesor promedio de 0,09m de 2500 psi, incluye malla electrosoldada 4mm 15 x 15.	M2	0,00	$ 70.197,00	$ -	-345,72	345,72	$ 24.268.481,23	0,00	$ -	351,84	$ 24.698.112,48	-$ 6,12	-$ 429.631,64	345,72	$ 24.268.481,00
NP09	Instalación de alistado de piso en mortero 1:3, H 4cm	M2	0,00	$ 32.729,00	$ -	-205,03	205,03	$ 6.710.349,14	0,00	$ -	164,65	$ 5.388.829,85	$ 40,38	$ 1.321.519,02	205,03	$ 6.710.349,00
NP10	Suministro e instalacion de puerta metalica collrold de color negro calibre 22 en celosia, con chapa de seguridad challenguer y marco metalico. **P-7**	M2	0,00	$ 689.209,00	$ -	-2,64	2,64	$ 1.819.511,76	0,00	$ -	0,53	$ 365.280,77	$ 2,11	$ 1.454.230,99	2,64	$ 1.819.512,00
NP11	Construccion de dinteles en concreto 3000psi 0,10 x 0,12m + refuerzo principal 2#4, anclado a elementos estructurales horizontales + flejes en S #2@15cm, Incluye formaleta y todo lo necesario para su ejecución.	M	0,00	$ 63.795,00	$ -	-38,45	38,45	$ 2.452.917,75	0,00	$ -	38,45	$ 2.452.917,75	$ -	$ -	38,45	$ 2.452.918,00
NP12	Desmonte de estructura metálica de cubierta.	M2	0,00	$ 41.348,00	$ -	-302,94	302,94	$ 12.525.963,12	0,00	$ -	302,94	$ 12.525.963,12	$ -	$ -	302,94	$ 12.525.963,00
NP13	Suministro e instalación de Perfil estructural 10x40x1,5 para cubierta.	M	0,00	$ 110.512,00	$ -	-456,02	456,02	$ 50.395.682,24	0,00	$ -	456,02	$ 50.395.682,24	$ -	$ -	456,02	$ 50.395.682,00
NP14	Instalación de estructura metálica de cubierta.	M2	0,00	$ 49.214,00	$ -	-265,75	265,75	$ 13.078.475,32	0,00	$ -	265,75	$ 13.078.620,50	-$ 0,00	-$ 146,00	265,75	$ 13.078.475,00
NP15	Suministro e instalación de punto y salida de interruptor sencillo (Incluye aparato (interruptor sencillo), tuberia PVC SCH40 tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado #12 libre de halógeno, caja plastica 5800, terminales de derivación) y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	0,00	$ 116.274,00	$ -	-31,00	31,00	$ 3.604.494,00	0,00	$ -	21,00	$ 2.441.754,00	$ 10,00	$ 1.162.740,00	31,00	$ 3.604.494,00
NP16	Suministro e instalación de punto y salida de tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, (Incluye aparato (tomacorriente GFCI), tuberia PVC SCH40 tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado #12 libre de halógeno, caja plastica 5800, terminales de derivación) y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	0,00	$ 266.242,00	$ -	-5,00	5,00	$ 1.331.210,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 5,00	$ 1.331.210,00	5,00	$ 1.331.210,00
NP17	Suministro e instalación de acometida electrica en conductores de cobre aislado 1x (No. 12 fase) + 1x (No.12 neutro) + 1x (No. 12 tierra) por tuberia PVC SCH40 tipo pesado 3/4". Incluye accesorios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	M	0,00	$ 95.182,00	$ -	-938,95	938,95	$ 89.371.138,90	0,00	$ -	265,00	$ 25.223.230,00	$ 673,95	$ 64.147.909,00	938,95	$ 89.371.139,00
NP18	Suministro e instalación de tablero tipo cofre de dimensiones minimas 90cm x 80cm x 40cm con barrajes de cobre de 250A	UND	0,00	$ 2.420.905,00	$ -	-1,00	1,00	$ 2.420.905,00	0,00	$ -	0,50	$ 1.210.452,50	$ 0,50	$ 1.210.452,50	1,00	$ 2.420.905,00
NP19	Suministro e instalación de Breaker monopolar 1 x 20 amp	UND	0,00	$ 24.156,00	$ -	-18,00	18,00	$ 434.808,00	0,00	$ -	8,00	$ 193.248,00	$ 10,00	$ 241.560,00	18,00	$ 434.808,00
NP20	Suministro e instalación de Breaker bipolar 2 x 20 amp	UND	0,00	$ 67.982,00	$ -	-23,00	23,00	$ 1.563.586,00	0,00	$ -	11,00	$ 747.802,00	$ 12,00	$ 815.784,00	23,00	$ 1.563.586,00
NP21	Suministro e instalación de acometida electrica en conductores de cobre aislado 1x (No. 12 fase) + 1x (No.12 neutro) + 1x (No. 12 tierra) por tuberia PVC SCH40 tipo pesado 1". Incluye accesorios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	M	0,00	$ 104.129,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
NP22	Suministro e instalación de Poste De Concreto Pretensado 12 Metros 1050 Kg	GLB	0,00	$ 8.476.551,00	$ -	-1,00	1,00	$ 8.476.551,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ 1,00	$ 8.476.551,00	1,00	$ 8.476.551,00

1	OBRA CONTRATADA					BALANCE DE OBRA			CORTE DE OBRA - ACTA 1		CORTE DE OBRA - ACTA 2		PRESENTE CORTE DE OBRA - ACTA 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
NO.	ITEM	UND	CANT INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT + Y -	CANT REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL
NP23	Suministro e instalación de Transformador trisfásico de 75 KVA 13200 / 227 / 220 V	GLB	0,00	$ 27.151.413,00	$ -	-1,00	1,00	$ 27.151.413,00	0,00	$ -	0,50	$ 13.575.706,50	**$ 0,50**	**$ 13.575.706,50**	**1,00**	**$ 27.151.413,00**
NP24	Suministro e instalación de puesta a tierra de alta tensión SPT CGB	GLB	0,00	$ 1.608.611,00	$ -	-1,00	1,00	$ 1.608.611,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 1,00**	**$ 1.608.611,00**	**1,00**	**$ 1.608.611,00**
NP25	Suministro e instalación de tubería galvanizada de 4" (incluye tubería, anclajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación)	m	0,00	$ 335.612,00	$ -	-6,00	6,00	$ 2.013.672,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 6,00**	**$ 2.013.672,00**	**6,00**	**$ 2.013.672,00**
NP26	Suministro e instalación de tubería de 4" PVC subterránea con sus respectivos accesorios (Incluye excavación)	M	0,00	$ 106.583,00	$ -	-50,20	50,20	$ 5.350.466,60	0,00	$ -	47,20	$ 5.030.717,60	**$ 3,00**	**$ 319.749,00**	**50,20**	**$ 5.350.467,00**
NP27	Suministro e instalación de medidor electrónico multitarifas activa y reactiva trifásico clase 0.5 rango de corriente de 2.5 / 10 A. Corriente básica (nominal) 5 A	UND	0,00	$ 4.063.899,00	$ -	-1,00	1,00	$ 4.063.899,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 1,00**	**$ 4.063.899,00**	**1,00**	**$ 4.063.899,00**
NP28	Suministro e instalación de medidor bifásico trifilar	UND	0,00	$ 1.239.535,00	$ -	-1,00	1,00	$ 1.239.535,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 1,00**	**$ 1.239.535,00**	**1,00**	**$ 1.239.535,00**
NP29	Suministro e instalación de acometida electrica subterranea en conductores de Aluminio THHW 2/0 AWG 8000 por tuberia PVC conduit tipo pesado 1" 1/4. Incluye accesorios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. Incluye excavación	M	0,00	$ 140.554,00	$ -	-45,00	45,00	$ 6.324.930,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 45,00**	**$ 6.324.930,00**	**45,00**	**$ 6.324.930,00**
NP30	Suministro e instalación de tablero bifasico de 12 circuitos 125 A	UND	0,00	$ 312.424,00	$ -	-1,00	1,00	$ 312.424,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 1,00**	**$ 312.424,00**	**1,00**	**$ 312.424,00**
NP31	Suministro e instalación de tablero tipo cofre de dimensiones minimas 120cm x 90cm x 40cm con barrajes de cobre de 400 A (Incluye totalizador de 280 - 400 Amp + totalizador de 200 Amp 50KA + totalizador de 125 Amp 25KA)	UND	0,00	$ 8.678.217,00	$ -	-1,00	1,00	$ 8.678.217,00	0,00	$ -	0,50	$ 4.339.108,50	**$ 0,50**	**$ 4.339.108,50**	**1,00**	**$ 8.678.217,00**
NP32	Estudios y diseños para proyecto eléctrico de la infraestructura física de la Justicia Penal Militar y Policial en Cúcuta. + servicio profesional de revisión y prueba de transformador, parrayos y red electrica en general instalados segùn diseño + tramitación de servicios públicos ante la empresa CENS Grupo EPM.	GLB	0,00	$ 5.563.000,00	$ -	-1,00	1,00	$ 5.563.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 1,00**	**$ 5.563.000,00**	**1,00**	**$ 5.563.000,00**
NP33	Tramite general sobre declaración de cumplimiento suscrita por el profesional competente, acompañada del aval de cumplimiento de la norma RETIE mediante dictamen de inspección. (Incluye certificación plena RETIE de distribución, transformación, uso final)	GLB	0,00	$ 10.200.000,00	$ -	-1,00	1,00	$ 10.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 1,00**	**$ 10.200.000,00**	**1,00**	**$ 10.200.000,00**
NP34	Desmonte de puertas y ventanas existentes, todo tamaño madera-metálicas. Incluido marco. (Incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados).	M2	0,00	$ 22.279,00	$ -	-26,56	26,56	$ 591.819,36	0,00	$ -	26,56	$ 591.730,24	**$ 0,00**	**$ 89,00**	**26,56**	**$ 591.819,00**
NP35	Construcción de vigas cinta en concreto 3000 psi de 10x10 cm (incluye formaletas, vibrado, curado y todo lo requerido para su correcta ejecución y funcionamiento).	M	0,00	$ 40.518,00	$ -	-49,42	49,42	$ 2.002.399,56	0,00	$ -	49,42	$ 2.002.399,56	**$ -**	**$ -**	**49,42**	**$ 2.002.400,00**
NP36	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada Cal 22, desarrollo 0,65mts (0,25X0,20X0,20X1mts). (Incluye accesorios y andamios).	M	0,00	$ 142.918,00	$ -	-25,50	25,50	$ 3.644.409,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 25,50**	**$ 3.644.409,00**	**25,50**	**$ 3.644.409,00**
NP37	Suministro e Instalacion de acometida electrica provisional en conductores de cobre aislado 2#8 (fase+neutro) por tuberia EMT 1/2". (Incluye, Caja metaliica de 50X50, Tablero de 6 circuitos, 2 Tomas Normales 110V, 2 tomas naranjas 110V, un totalizador 2X40 amp, un totalizador doble 2X20 amp + un totalizador 1 X20 Amp, con varilla de cobre + caja concreto para puesta a tierra y todo lo necesario para su buen funcionamiento).	GLB	0,00	$ 1.669.900,00	$ -	-1,00	1,00	$ 1.669.900,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.669.900,00	**$ -**	**$ -**	**1,00**	**$ 1.669.900,00**
NP38	Suministro e instalación de tapa de registro plastica 20X20cms.	UND	0,00	$ 29.480,00	$ -	-2,00	2,00	$ 58.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 2,00**	**$ 58.960,00**	**2,00**	**$ 58.960,00**
NP39	Limpieza de cajas de inspección existente (sondeo de tubería).	M2	0,00	$ 25.377,00	$ -	-1,00	1,00	$ 25.377,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 1,00**	**$ 25.377,00**	**1,00**	**$ 25.377,00**
NP40	Suministro e instalación tubería PVC ALL 4". Incluye accesorios.	M	0,00	$ 46.363,00	$ -	-5,70	5,70	$ 264.269,10	0,00	$ -	5,70	$ 264.269,10	**$ -**	**$ -**	**5,70**	**$ 264.269,00**
NP41	Canal amazonas 0,16x0,14x3,00mts. Incluye accesorios. (Incluye andamios).	M	0,00	$ 53.135,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ -**	**$ -**	**0,00**	**$ -**
NP42	Bajante en PVC blanco cuadrado externo liso. (Incluye accesorios y andamios).	M	0,00	$ 31.336,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ -**	**$ -**	**0,00**	**$ -**
NP43	Suministro e instalación tubería PVCS 3". Incluye accesorios.	M	0,00	$ 29.138,00	$ -	-41,00	41,00	$ 1.194.658,00	0,00	$ -	18,50	$ 539.053,00	**$ 22,50**	**$ 655.605,00**	**41,00**	**$ 1.194.658,00**
NP44	Suministro e instalación tubería PVCS 2". Incluye accesorios.	M	0,00	$ 19.944,00	$ -	-1,00	1,00	$ 19.944,00	0,00	$ -	1,00	$ 19.944,00	**$ -**	**$ -**	**1,00**	**$ 19.944,00**
NP45	Suministro e instalación de punto sanitario de 3". (Incluye accesorios y tubería hasta 1,50 mts).	UND	0,00	$ 85.791,00	$ -	-3,00	3,00	$ 257.373,00	0,00	$ -	2,00	$ 171.582,00	**$ 1,00**	**$ 85.791,00**	**3,00**	**$ 257.373,00**
NP46	Suministro e instalación de punto sanitario de 2". (Incluye accesorios y tubería hasta 1,50 mts).	UND	0,00	$ 68.082,00	$ -	-1,00	1,00	$ 68.082,00	0,00	$ -	1,00	$ 68.082,00	**$ -**	**$ -**	**1,00**	**$ 68.082,00**
NP47	Suministro e instalación tubería PVCP RDE 11 de 3/4''. Incluye accesorios.	M	0,00	$ 6.628,00	$ -	-42,50	42,50	$ 281.690,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 42,50**	**$ 281.690,00**	**42,50**	**$ 281.690,00**
NP48	Suministro e instalación de punto hidráulico de 3/4". (Incluye accesorios y tubería hasta 1,50 mts).	UND	0,00	$ 41.983,00	$ -	-2,00	2,00	$ 83.966,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 2,00**	**$ 83.966,00**	**2,00**	**$ 83.966,00**
NP49	Suministro e instalación de punto hidráulico 1/2". (Incluye accesorios y tubería hasta 1,50 mts).	UND	0,00	$ 37.388,00	$ -	-3,00	3,00	$ 112.164,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 3,00**	**$ 112.164,00**	**3,00**	**$ 112.164,00**
NP50	Suministro e instalación registro válvula de bola 3/4".	UND	0,00	$ 71.073,00	$ -	-2,00	2,00	$ 142.146,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 2,00**	**$ 142.146,00**	**2,00**	**$ 142.146,00**
NP51	Suministro e instalación cheque cortina sello metálico 3/4".	UND	0,00	$ 169.514,00	$ -	-1,00	1,00	$ 169.514,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 1,00**	**$ 169.514,00**	**1,00**	**$ 169.514,00**
NP52	Mediacaña en mortero 1:4 Impermeabilizado.	M	0,00	$ 9.266,00	$ -	-27,00	27,00	$ 250.182,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 27,00**	**$ 250.182,00**	**27,00**	**$ 250.182,00**
NP53	Afinado para cubierta con mortero 1:4, acabado con llana metálica.	M2	0,00	$ 24.136,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ -**	**$ -**	**0,00**	**$ -**

1	OBRA CONTRATADA					BALANCE DE OBRA			CORTE DE OBRA - ACTA 1		CORTE DE OBRA - ACTA 2		PRESENTE CORTE DE OBRA - ACTA 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
NO.	ITEM	UND	CANT INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT + Y -	CANT REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL	CANT EJECUT	VALOR PARCIAL
NP54	Suministro e instalación de filtro zanja de 0.4x0.6m. Incluye geotextil nt-1600s, grava1/2" y pases PVC, longitud max. 0.3m cada 3m. (Incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados).	M	0,00	$ 154.729,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
NP55	Suministro e instalación de tanque almacenamiento de 1000 lts tipo botella y todos sus accesorios para su buen funcionamiento.	UND	0,00	$ 1.090.531,00	$ -	-1,00	1,00	$ 1.090.531,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 1,00**	**$ 1.090.531,00**	**1,00**	**$ 1.090.531,00**
NP56	Suministro e instalación de reja metálica en tubo cuadrado de 1X1"X0,08MM, tipo banco. Incluye bisagras, marco, pasador, candado y protector de candado, terminada con anticorrosivo, pintada e instalada - verificar en obra medidas, ángulos y # de hojas. **P-8**	M2	0,00	$ 603.186,00	$ -	-12,60	12,60	$ 7.598.334,04	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 12,60**	**$ 7.598.334,00**	**12,60**	**$ 7.598.334,00**
NP57	Suministro e instalación de flanche con cinta impermeabilizante tapa goteras de 1,0 mm X 25 cm	M	0,00	$ 28.514,00	$ -	-5,80	5,80	$ 165.381,20	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 5,80**	**$ 165.381,00**	**5,80**	**$ 165.381,00**
NP58	Construcción de carcamo eléctrico en bloque #5 con pañete liso. Dimensiones 3,40X,50X,60cmts. (Incluye marco de 1" y tapa metálica en lámina de alfajor 1/8)	Glb	0,00	$ 980.625,00	$ -	-1,00	1,00	$ 980.625,00	0,00	$ -	0,50	$ 490.312,50	**$ 0,50**	**$ 490.312,50**	**1,00**	**$ 980.625,00**
NP59	Suministro e instalación de punto y salida de interruptor doble (Incluye aparato (interruptor doble), tubería PVC SCH40 tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado #12 libre de halógeno, caja plastica 5800, terminales de derivación) y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	0,00	$ 143.662,00	$ -	-8,00	8,00	$ 1.149.296,00	0,00	$ -	6,00	$ 861.972,00	**$ 2,00**	**$ 287.324,00**	**8,00**	**$ 1.149.296,00**
NP60	Suministro e instalación de punto y salida de interruptor triple (Incluye aparato (interruptor triple), tubería PVC SCH40 tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado #12 libre de halógeno, caja plastica 5800, terminales de derivación) y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	0,00	$ 148.662,00	$ -	-4,00	4,00	$ 594.648,00	0,00	$ -	6,00	$ 891.972,00	**-$ 2,00**	**-$ 297.324,00**	**4,00**	**$ 594.648,00**
NP61	Suministro e instalación de tablero eléctrico trifasico de 24 circuitos sin espacio para totalizador	UND	0,00	$ 649.945,00	$ -	-3,00	3,00	$ 1.949.835,00	0,00	$ -	1,50	$ 974.917,50	**$ 1,50**	**$ 974.917,50**	**3,00**	**$ 1.949.835,00**
NP62	Construcción de columna en concreto 3000 psi de 50x30 cm con refuerzo principal 6#5, anclado a elementos estructurales, superior e inferior + flejes #3 cada 0,15cm. (Incluye formaletas, vibrado, curado y todo lo requerido para su correcta ejecución y funcionamiento).	M	0,00	$ 280.728,00	$ -	-11,00	11,00	$ 3.088.008,00	0,00	$ -	11,00	$ 3.088.008,00	**$ -**	**$ -**	**11,00**	**$ 3.088.008,00**
NP63	Construcción de columna en concreto 3000 psi de 30x25 cm con refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales, superior e inferior + flejes #3 cada 0,15cm. (Incluye formaletas, vibrado, curado y todo lo requerido para su correcta ejecución y funcionamiento).	M	0,00	$ 170.722,00	$ -	-30,58	30,58	$ 5.220.678,76	0,00	$ -	30,58	$ 5.220.678,76	**$ -**	**$ -**	**30,58**	**$ 5.220.679,00**
NP64	Construcción de viga aérea en concreto 3000 psi de 30x25 cm con refuerzo principal 4#4 + flejes #3 cada 0,15cm. (Incluye formaletas, vibrado, curado y todo lo requerido para su correcta ejecución y funcionamiento).	M	0,00	$ 184.019,00	$ -	-16,95	16,95	$ 3.119.122,05	0,00	$ -	16,95	$ 3.119.122,05	**$ -**	**$ -**	**16,95**	**$ 3.119.122,00**
NP65	Circuito eléctrico trifásico en Cable de cobre No.8 THHN (3F No 8+1N No 8 + 1T No 8)	M	0,00	$ 45.481,00	$ -	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ -**	**$ -**	**0,00**	**$ -**
NP66	Circuito eléctrico trifásico en Cable de cobre No.6 THHN (3F No 6+1N No 6 + 1T No 6).	M	0,00	$ 62.291,00	$ -	-15,00	15,00	$ 934.365,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 15,00**	**$ 934.365,00**	**15,00**	**$ 934.365,00**
NP67	Circuito eléctrico trifásico en Cable Aislado No 2-0 AWG Cobre THHN	M	0,00	$ 244.891,00	$ -	-4,00	4,00	$ 979.564,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**$ 4,00**	**$ 979.564,00**	**4,00**	**$ 979.564,00**
NP68	Suministro e instalación de perfil estructural 40x40x2mm para fijación y amarre de tubería conduit SCH40 3/4" suspendida.	M	0,00	$ 55.111,00	$ -	-108,00	108,00	$ 5.951.988,00	0,00	$ -	54,00	$ 2.975.994,00	**$ 54,00**	**$ 2.975.994,00**	**108,00**	**$ 5.951.988,00**
					$ -			$ 353.032.306,00		**$ -**		**$ 202.896.157,00**		**$ 150.136.147,00**		**$ 353.032.306,00**

	Administracion	$ 0,10	$ 82.384.895,00		10%	$ 86.912.527,00	0,10	$ 5.424.971,00	**10%**	**$ 37.882.244,00**	**$ 0,10**	**$ 43.605.313,00**	10%	$ 86.912.528,00
	Imprevistos	$ 0,02	$ 16.476.979,00		2%	$ 17.382.505,00	0,02	$ 1.084.994,00	**2%**	**$ 7.576.449,00**	**$ 0,02**	**$ 8.721.062,00**	2%	$ 17.382.505,00
	Utilidad	$ 0,04	$ 32.953.958,00		4%	$ 34.765.011,00	0,04	$ 2.169.989,00	**4%**	**$ 15.152.897,00**	**$ 0,04**	**$ 17.442.125,00**	4%	$ 34.765.011,00
	IVA/Utilidad	$ 0,19	$ 6.261.252,00		19%	$ 6.605.352,00	0,19	$ 412.298,00	**19%**	**$ 2.879.050,00**	**$ 0,19**	**$ 3.314.004,00**	19%	$ 6.605.211,00
	GRAN TOTAL		$ 961.926.037,00			**$ 1.014.790.669,00**		**$ 63.341.966,00**		**$ 442.313.076,00**		**$ 509.135.627,00**		**$ 1.014.790.669,00**

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Representante Legal CONSORCIO VENTURA
CC. 52,452,955 de Bogotá

JUAN CARLOS JAIMES ACERO
Representante Legal PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
CC. No. 91.514.205 de Bucaramanga

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

CONSORCIO VENTURA


MEMORIAS CORTE #3 DE OBRA EJECUTADA

Código: 055-2024 UAEJPMP	Versión: 1	Página 1

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.01 Demolición y desmonte de cielo raso en lamina de yeso-cartón			M2
ESPACIO	LARGO	ANCHO	PARCIAL
A. Baño Hombres	3,40	3,27	11,12
B. Baño Mujeres	5,25	3,43	18,01
C. Pasillo Acceso	7,97	1,48	11,80
D. Oficina 1	3,85	3,17	12,20
SUBTOTAL AREA CANCELADA CORTE 01			53,12560
TOTAL AREA PROYECTADA EN ACTA			53,13000
TOTAL AREA AJUSTE DEL ITEM			-0,0044

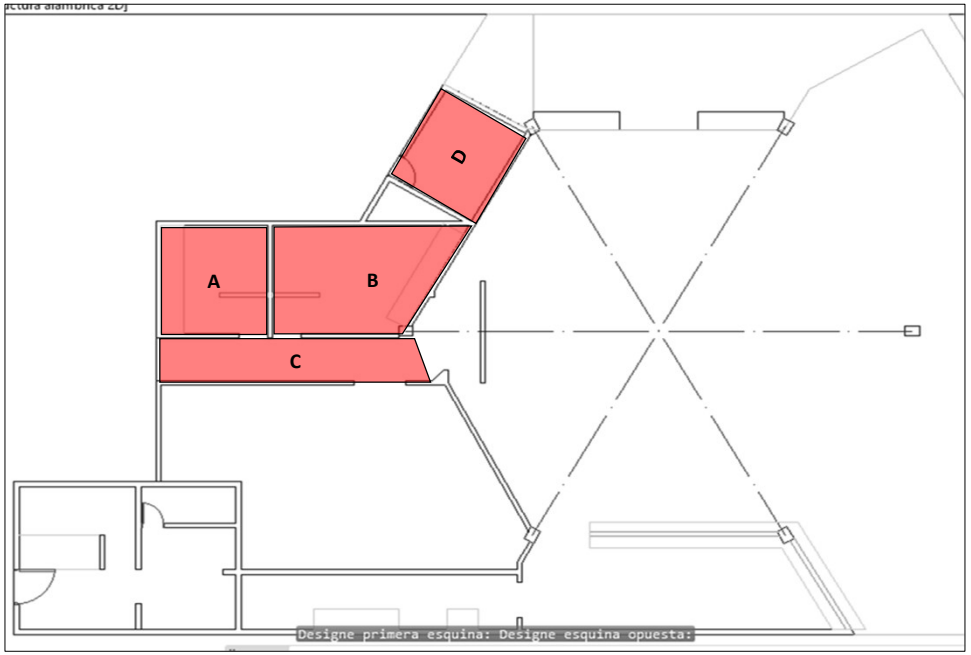


TOTAL AREA AJUSTE DEL ITEM	-0,0044

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.04 Demolición muro en mampostería, Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.				M2
ZONA	LARGO	ALTURA	DCTO	PARCIAL
A. APERTURA VANO	0,80	2,30	0,00	1,84
TOTAL AREA DEMOLIDA				1,84

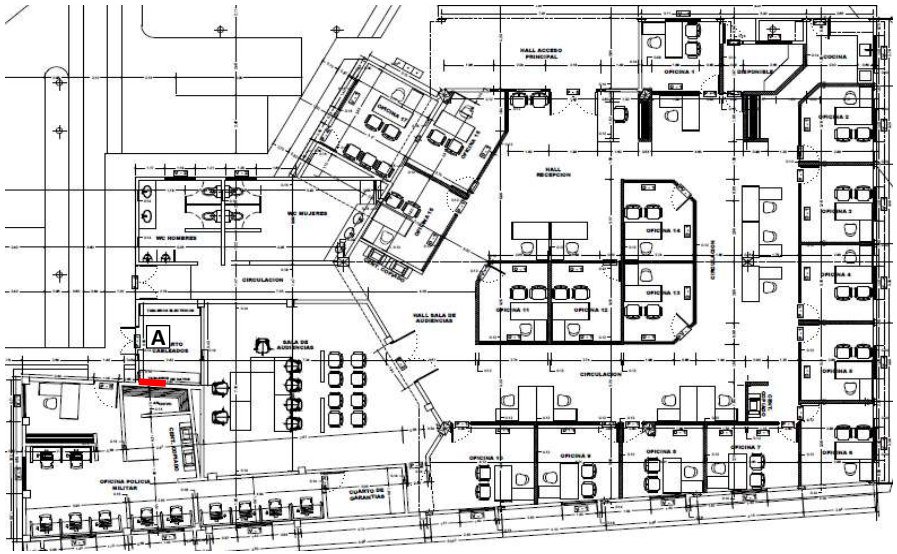


TOTAL AREA DEMOLIDA	1,84


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.20 Limpieza, retiro de escombros, parchado de grietas con sellador tipo resina liquida de poliuretano o similar, alisado de superficies irregulares, limpieza de bajantes, nivelado de la placa para dar la pendiente hacia bajantes con mortero autonivelante reforzado con fibra de vidrio, aplicación de manto asfaltico con foil de aluminio, fijaciopn mediante brea liquida y aplicación de calor			M2
ESPACIO	LARGO	ANCHO	PARCIAL
B.	8,98	6,60	59,27
C.	10,10	3,85	38,89
D.	8,65	2,05	17,73
E.	3,23	3,65	11,78
E1.	3,84		3,84
TOTAL AREA POR FACTURAR			131,50



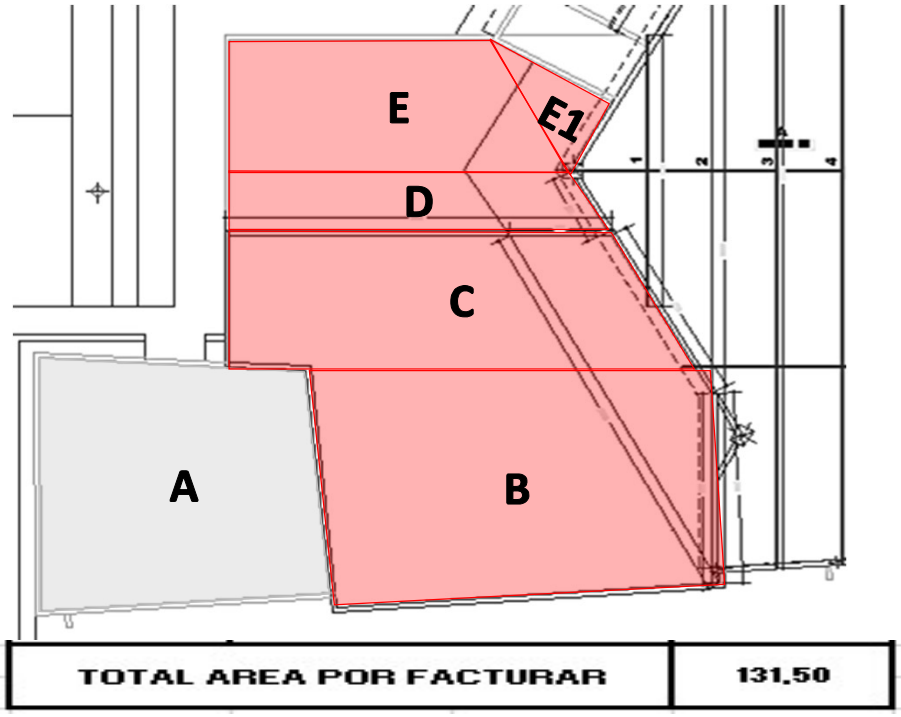

TOTAL AREA POR FACTURAR	131,50


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.			Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2			
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES / AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03 / 2025

DESCRIPCION

1.22 Suministro e instalacion de ventanas en aluminio 744, Anodizado, negro, vidrio laminado (espesor de película transparente de 1 Milimetro) crudo 4+4 incoloro, rodachina española y cerradura de impacto. Ventanas V1 - V2 — **M2**

ESPACIO	LARGO	ANCHO - AREA	CANT	PARCIAL
Oficina 1	1,40	1,30	1,00	1,82
Disponible	1,40	1,30	1,00	1,82
Oficina 2	1,40	1,30	1,00	1,82
Oficina 3	1,40	1,30	1,00	1,82
Oficina 4	1,40	1,30	1,00	1,82
Oficina 5	1,40	1,30	1,00	1,82
Oficina 6	1,40	1,30	1,00	1,82
Cocina	1,40	1,20	1,00	1,68
Oficina 7	1,40	1,30	1,00	1,82
Oficina 8	1,40	1,30	1,00	1,82
Oficina 9	1,40	1,30	1,00	1,82
Oficina 10	1,40	1,30	1,00	1,82
Oficina 17	1,40	1,30	1,00	1,82
Policia Judicial	1,40	1,30	5,00	9,10
Baños Hombres	1,20	0,30	1,00	0,36
Baños Mujeres	1,20	0,30	1,00	0,36
SUBTOTAL M2 VENTANERIA				**33,34**
PORCENTAJE CANCELADO CORTE 2			**20%**	**6,67**
PORCENTAJE FALTANTE A CANCELAR			**80%**	**26,67**

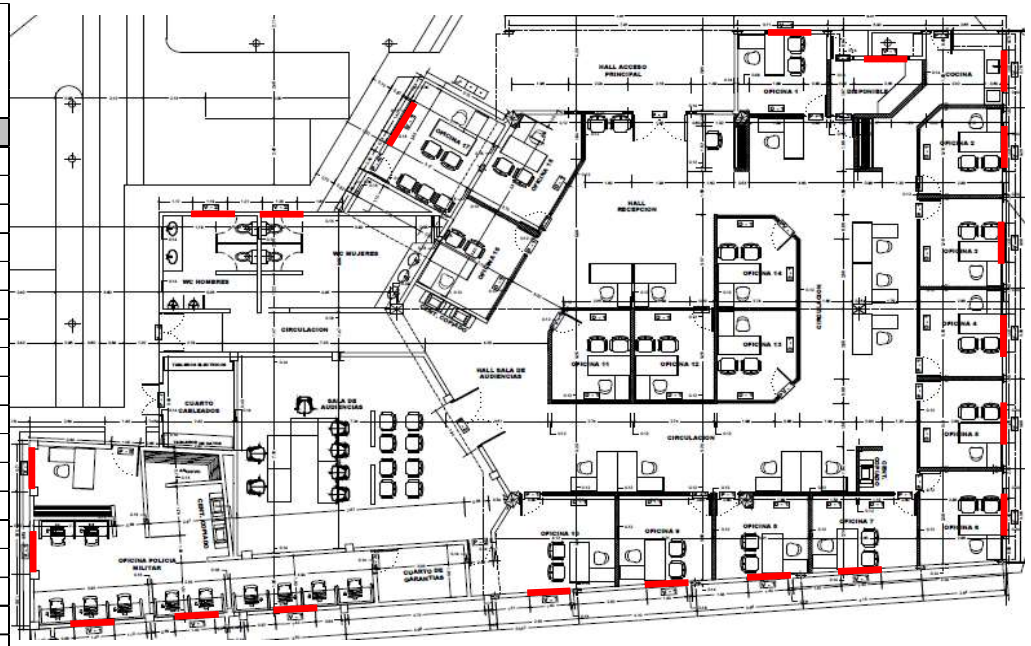


PORCENTAJE CANCELADO CORTE 2	**20%**	**6,67**
PORCENTAJE FALTANTE A CANCELAR	**80%**	**26,67**

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	**RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA**	**RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS**	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE	003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2			
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES / AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03 / 2025

DESCRIPCION

1.23 Suministro e instalacion de puerta metalica collrold de color negro calibre 22 totalmente lisa, con chapa de seguridad challenguer y marco metalico. P-4			M2
ESPACIO	**ANCHO**	**ALTURA**	**PARCIAL**
A. PASILLO	1,47	2,20	3,23
B. OFICINA 17	0,80	2,20	1,76
C. DISPONIBLE	0,80	2,20	1,76
D. COCINA	0,80	2,20	1,76
E. VIVIENDA ADJUNTA	1,00	2,00	2,00
SUBTOTAL M2 PUERTAS			10,51
PORCENTAJE CANCELADO ACTA 2		**20%**	**2,10**
PORCENTAJE FALTANTE A CANCELAR		**80%**	**8,41**





PORCENTAJE CANCELADO ACTA 2	**20%**	**2,10**
PORCENTAJE FALTANTE A CANCELAR	**80%**	**8,41**


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.			Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2			
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES / AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03 / 2025

DESCRIPCION

1.24 Revoque de muro de fachada con acabado tipo esgrafiado texturizado o similar impermeabilizado, aplicado sobre pañete, incluye raspado de pintura existente, color blanco con zócalo negro de 0,90m de altura. — M2

ESPACIO	LONG	ALTURA	DCTO	PARCIAL
TRAMO A	14,60	2,65	-5,46	33,23
	14,60	3,35		24,46
	6,20	4,70	-1,82	27,32
	6,20	1,30		4,03
	18,20	3,10	-5,46	50,96
TRAMO B	19,50	2,65	-10,78	40,90
TRAMO C	2,99	2,65	-1,76	6,16
	2,99	0,60		0,90
	0,98	0,30		0,29
	2,12	0,45		0,95
	1,25	3,25		4,06
TRAMO D	2,98	3,25	-3,58	6,11
	2,98	0,85		1,27
TRAMO E	3,65	4,10	-1,82	13,15
	3,65	0,70		1,28
	1,21	4,10		4,96
TRAMO F	2,98	3,25	-3,58	6,11
	2,98	0,85		1,27
TRAMO G	10,82	3,90	-4,33	37,88
	1,20	3,70		13,32
	9,56	0,50		4,78
TRAMO H	7,85	1,00		7,85
	3,55	1,45		2,57
	4,30	1,45		3,12
TRAMO I	3,14	1,00		3,14
TRAMO J	3,55	3,00		10,65
	3,55	0,85		1,51
TRAMO K	5,85	2,80	-4,82	11,56
SECCION DE CUBIERTA	6,05	1,35		8,16
	4,30	1,10		4,73
	4,40	1,00		4,40
	3,00	0,65		1,95
	6,00	0,50		3,00
TOTAL AREA REVOQUE TIPO ESGRAFIADO				346,01

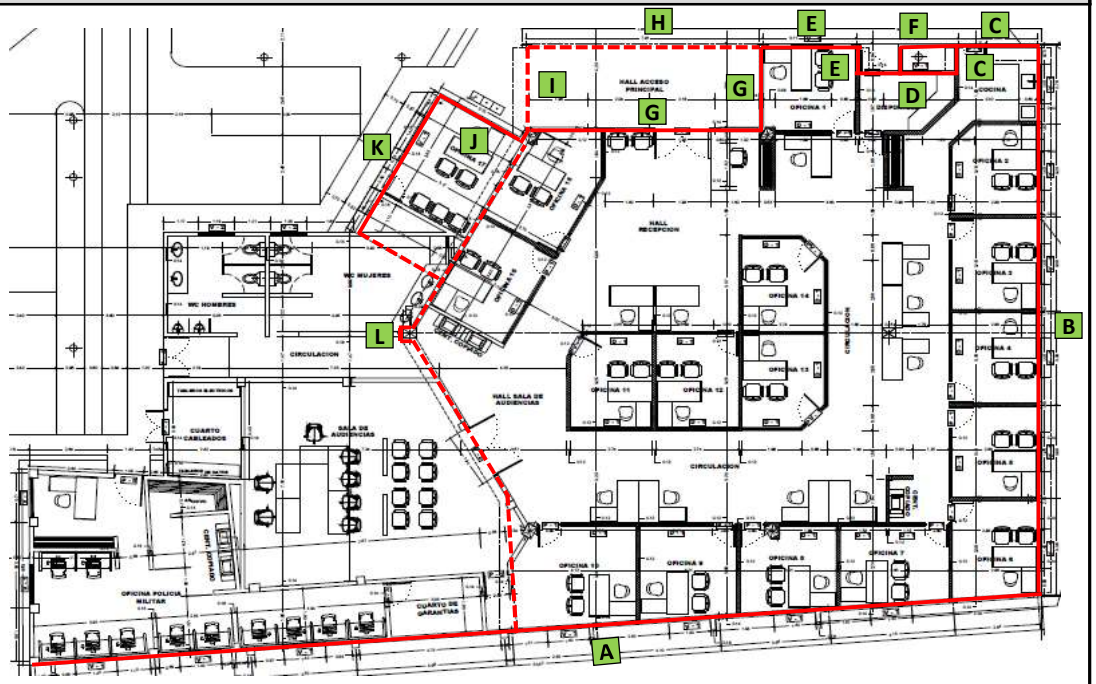


TOTAL AREA REVOQUE TIPO ESGRAFIADO	346,01

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.26 Suministro e instalación de teja en acero arquitectonica trapezoidal Cal.22 color blanco, incluye fijaciones, refuerzos, cortes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.			M2
ESPACIO	LARGO-AREA	ANCHO	PARCIAL
G	2,52	2,19	5,52
TOTAL M2 CUBIERTA TEJA ARQUITECTONICA			5,52

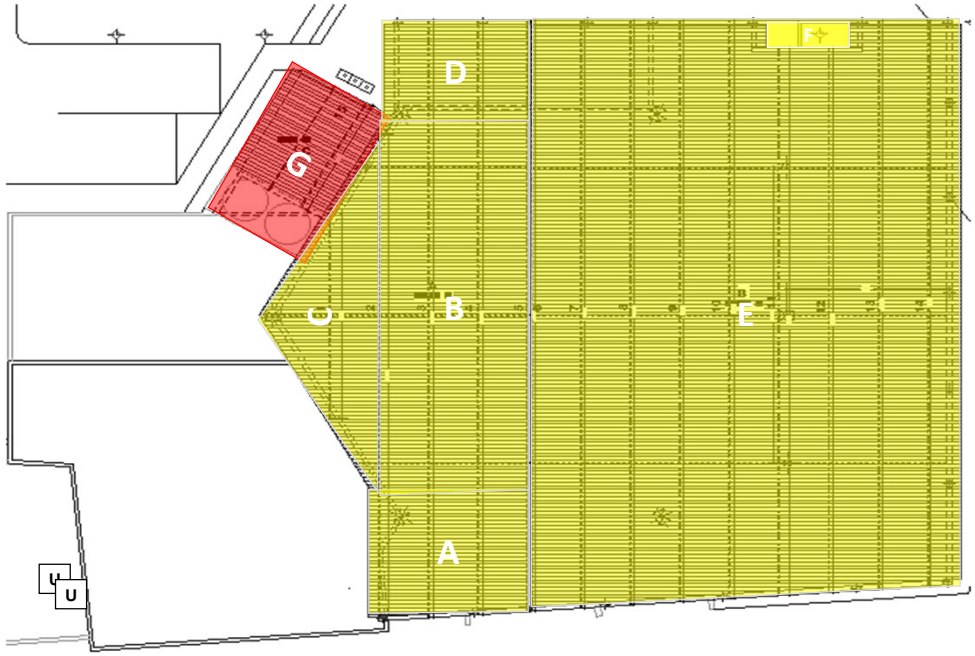

TOTAL M2 CUBIERTA TEJA ARQUITECTONICA	5,52

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.27 Caballete para teja trapezoidal, minimo 0,60m de ancho, color blanco incluye fijaciones, refuerzos, cortes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.			M
ESPACIO	**LARGO**	**ANCHO**	**PARCIAL**
CABALLETE	-20,60		-20,60
TOTAL M CABALLETE			**-20,60**



TOTAL M CABALLETE	-20,60

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025


DESCRIPCION

1.29 Muro en Mampostería de e:15 cm en Bloque #5, afirmado y pañetado pór ambas caras con mortero 1:3 incluye grapas de fijación a muros existentes, corte de acabado e instalado sobre placa estructural. — M2

TRAMO O ESPACIO	LARGO	ALTURA	DCTO	PARCIAL
A. Cierre Ventana	0,00	1,00		0,00
TOTAL M2 DE MAMPOSTERIA / CORTE NO. 3				0,00

TRAMO	LARGO	ALTURA	DCTO	PARCIAL
TRAMO - M1	6,97	2,90	0,00	20,21
TRAMO - M2	1,59	2,60	0,00	4,13
TRAMO - M3	1,43	2,00	0,00	2,86
TRAMO - M4	3,03	2,40	-1,82	5,45
TRAMO - M5	2,53	2,40	-1,82	4,25
TRAMO - M6	3,20	2,40	-1,82	5,86
TRAMO - M7	3,10	2,40	-1,82	5,62
TRAMO - M8	3,00	2,40	-1,82	5,38
TRAMO - M9	3,00	2,40	-1,82	5,38
TRAMO - M10	3,07	2,40	-1,82	5,55
TRAMO - M11	2,58	2,40	-1,82	4,37
TOTAL M2 DE MAMPOSTERIA / CORTE 1				69,07

TRAMO O ESPACIO	LARGO	ALTURA	DCTO	PARCIAL
A. Cierre Ventana	2,40	1,00	-1,20	1,20
B. Cierre Vano	0,57	0,40	0,00	0,23
C. Cierre Vano	1,20	0,40	0,00	0,48
D. Cierre Puerta	1,20	2,10	-1,16	1,36
E. Garantias	1,87	2,60	-1,98	2,88
F. Cierre vano	1,20	0,70	0,00	0,84
G. Garantias	1,85	2,60	0,00	4,81
H. Cierre vano	2,46	1,40	-1,40	2,04
I. Cocina	2,42	2,93	-2,73	4,35
	1,10	3,20	-0,44	3,08
J. Jardinera	2,00	0,40	0,00	0,80
	1,10	0,40	0,00	0,44
K. Disponible	3,05	3,63	-4,80	6,26
L. Oficina 1	3,05	4,50	-3,04	10,69
	2,95	4,90	-1,18	13,28
M. Fachada Ppal	4,00	5,28	-7,54	32,68
	3,53	5,20		
	0,35	2,18		
N. Portico Fachada Ppal	3,53	1,18	-1,67	7,38
	4,00	1,23		
	2,82	0,80	-0,42	1,83
Ñ.Cierre Ventana	2,00	1,00	0,00	2,00
O. Cierre Ventana	2,00	1,00	-1,40	0,60
P. Muros xa Cubierta	3,17	0,70	0,00	2,22
Q. Muros Cubierta	6,50	0,50	0,00	3,25
R. Muros Cubierta	5,50	0,55	0,00	3,03
S. Muros Cubierta	5,30	1,50	0,00	7,95
T. Muros Fachada Posterior	4,80	2,30	-4,78	25,31
	6,72	1,00		
	5,36	2,30		
TOTAL M2 DE MAMPOSTERIA / CORTE NO. 2				138,97

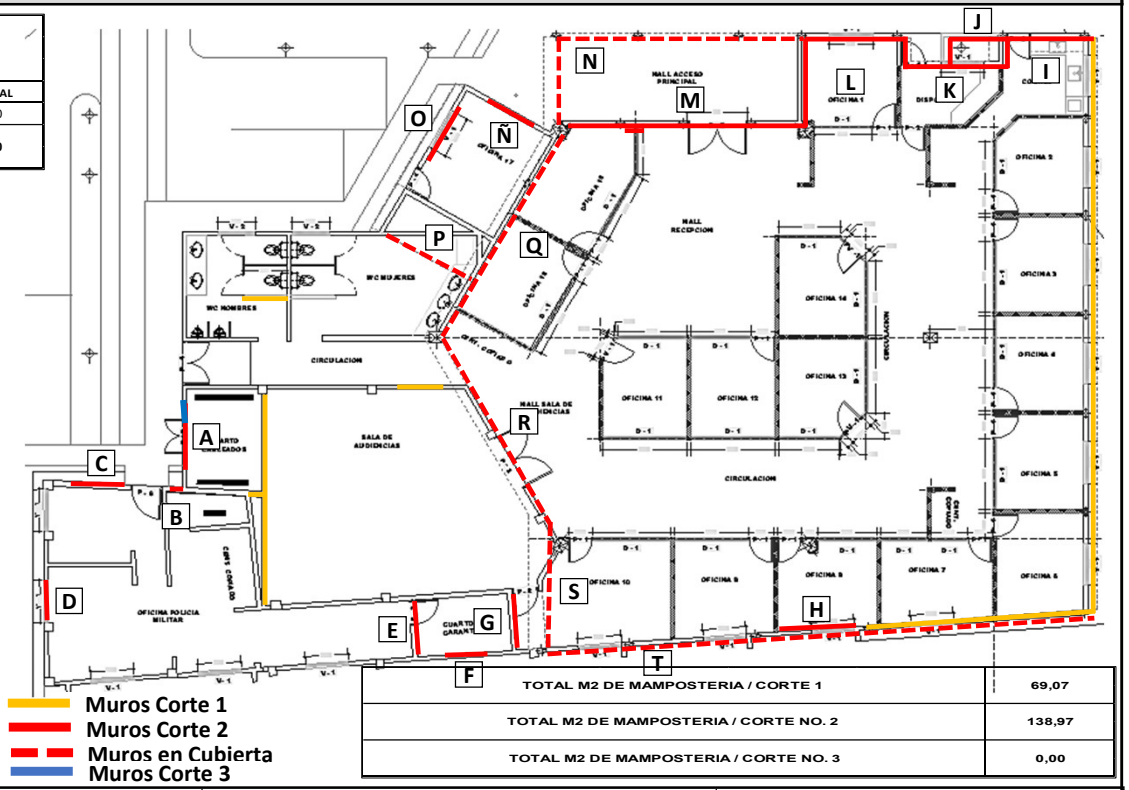

TOTAL M2 DE MAMPOSTERIA / CORTE 1	69,07
TOTAL M2 DE MAMPOSTERIA / CORTE NO. 2	138,97
TOTAL M2 DE MAMPOSTERIA / CORTE NO. 3	0,00

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025


DESCRIPCION

1.30 Columneta de confinamiento en concreto 3000psi 0,25 x 0,12, con refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales, superior e inferior + flejes #2 cada 0,15cm. Incluye formaleta y todo lo necesario para su ejecución. — M

TRAMO	LARGO	DCTO	ALTURA	PARCIAL
COLUMNETAS			18,70	18,70
TOTAL M DE COLUMNETAS CORTE NO. 3				18,70

TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTURA	PARCIAL
COLUMNETA - C1			3,40	3,40
COLUMNETA - C2			2,40	2,40
COLUMNETA - C3			2,40	2,40
COLUMNETA - C4			2,40	2,40
COLUMNETA - C5			2,40	2,40
COLUMNETA - C6			2,40	2,40
COLUMNETA - C7			2,40	2,40
COLUMNETA - C8			2,40	2,40
COLUMNETA - C9			2,40	2,40
COLUMNETA - C10			2,40	2,40
COLUMNETA - C11			5,00	5,00
TOTAL M DE COLUMNETAS CORTE NO. 1				30,00

TRAMO	ALTURA	DCTO	PAGADO	PARCIAL
COLUMNETA - C1	5,30	-0,30	-3,40	1,60
COLUMNETA - C2	5,35	-0,30	2,40	2,40
COLUMNETA - C3	4,40	-0,40	2,40	2,40
COLUMNETA - C4	3,30	-0,40	-2,40	0,50
COLUMNETA - C12	2,65	-0,25	0,00	2,40
COLUMNETA - C13	3,25	-0,40	0,00	2,85
COLUMNETA - C14	4,10	-0,40	0,00	3,70
COLUMNETA - C15	4,65	-0,40	0,00	4,25
TOTAL M DE COLUMNETAS CORTE NO. 2				20,10

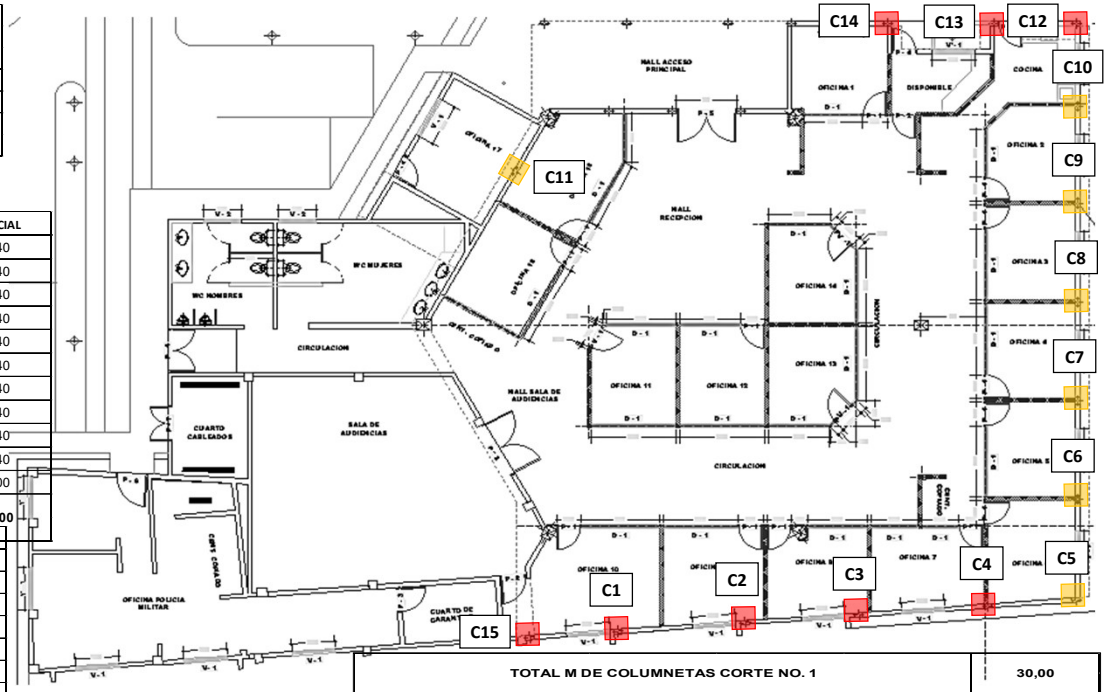

TOTAL M DE COLUMNETAS CORTE NO. 1	30,00
TOTAL M DE COLUMNETAS CORTE NO. 2	20,10
TOTAL M DE COLUMNETAS CORTE NO. 3	18,70

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025


DESCRIPCION

1.31 Vigueta de confinamiento en concreto 3000psi 0,25 x 0,12m + refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales horizontales + flejes #2@15cm, Incluye formaleta y todo lo necesarrio para su ejecución. — **M**

TRAMO	LARGO	CANT	PARCIAL
TRAMO 2	2,14	1,00	2,14
TOTAL M VIGUETA CONF. CORTE NO. 3			2,14

TRAMO	LARGO	CANT	PARCIAL
TRAMO 1	7,40	1,00	7,40
TRAMO 2	19,30	1,00	19,30
TOTAL M VIGUETA CONF. CORTE NO. 1			26,70

TRAMO	LARGO	CANT	PARCIAL
TRAMO 1	1,90	1,00	1,90
TRAMO 2	8,10	1,00	8,10
TRAMO 3	3,20	1,00	3,20
TRAMO 4	3,44	1,00	3,44
TRAMO 5	1,10	1,00	1,10
TRAMO 6	3,05	1,00	3,05
TRAMO 7	1,10	1,00	1,10
TRAMO 8	2,60	1,00	2,60
TRAMO 9	7,10	1,00	7,10
TOTAL M VIGUETA CONF. CORTE NO. 2			31,59

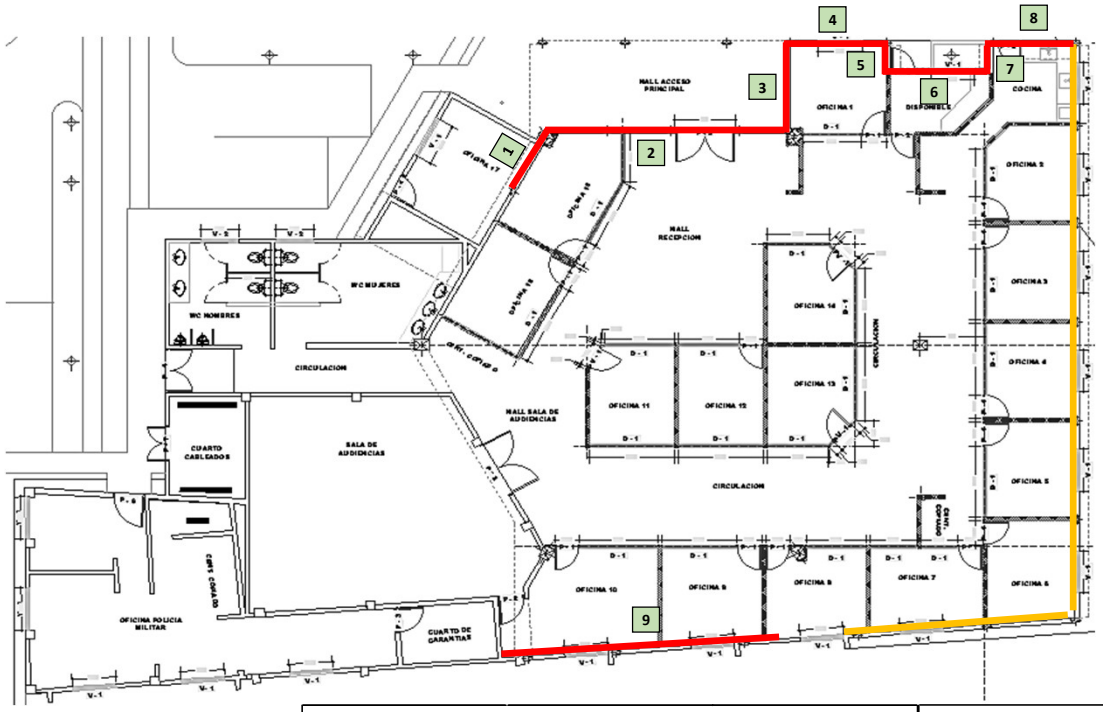

TOTAL M VIGUETA CONF. CORTE NO. 3	2,14

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	


PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.32 Pañete lineal de hasta 20cm de muros en mampostería 1:3, incluye filos y dilataciones lineales — M

COLUMNA	ALTURA	CANT	PARCIAL
COLUMNAS	-41,66		-41,66
TOTAL PAÑETES LINEALES CORTE NO. 3			-41,66

COLUMNA	ALTURA	CANT	PARCIAL
COLUMNA 1	3,75	1,00	3,75
COLUMNA 2	3,75	4,00	15,00
COLUMNA 3	3,75	4,00	15,00
COLUMNA 4	3,75	4,00	15,00
COLUMNA 5	2,20	3,00	6,60
COLUMNA 6	2,20	3,00	6,60
COLUMNA 7	2,20	3,00	6,60
COLUMNA 9	5,00	2,00	10,00
VIGA 1	7,92	1,00	7,92
	1,71	1,00	1,71
	2,95	1,00	2,95
	2,08	1,00	2,08
VIGA 2	2,83	2,00	5,66
VIGA 3	5,50	1,00	5,50
	1,98	1,00	1,98
	1,61	1,00	1,61
	1,30	1,00	1,30
TOTAL PAÑETES LINEALES CORTE NO. 2			109,26

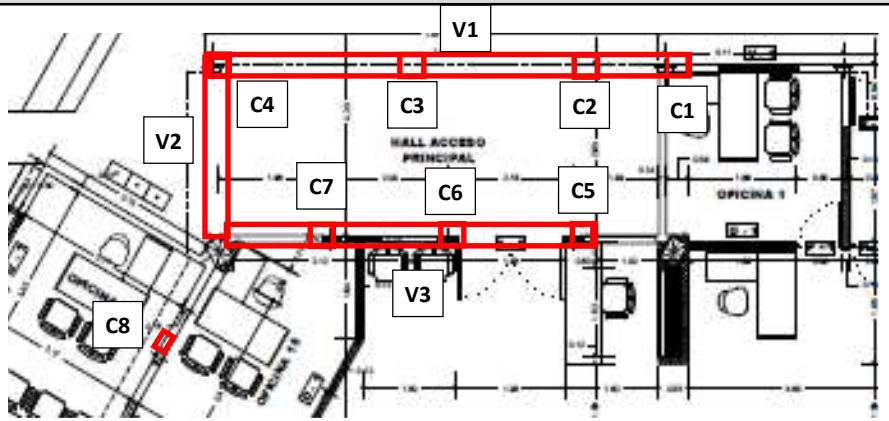




TOTAL PAÑETES LINEALES CORTE NO. 3	-41,66

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.33 Suministro e instalación de estuco plastico sobre pañete de mortero en muros de mampostería 3 manos X m²					M2
ESPACIO		LONG	ALTURA	DCTO	PARCIAL
TRAMO A - POLICIA JUDICIAL		14,00	2,39	-4,02	
		28,60	2,39	-9,26	
		9,95	2,39	-1,98	
		14,05	2,39	0,00	
TRAMO B - SALA DE AUDIENCIA		31,40	2,62	-6,05	
TRAMO C	C1	9,45	2,39	-3,69	
	C2	3,35	2,39	-1,82	
	C3	4,06	2,39	-1,82	
	C4	3,70	2,39	-1,82	
TRAMO D	D1	6,05	2,39	-1,82	
	D2	3,16	2,39	-1,82	
	D3	3,16	2,39	-1,82	
	D4	3,16	2,39	-1,82	
	D5	3,18	2,39	-1,82	
	D6	6,30	2,39	-3,58	11,48
TRAMO E	E1	7,55	2,39	-1,82	
	E2	3,00	2,39	-3,58	
TRAMO F		5,69	2,39	0,00	
TRAMO G		3,50	2,39	0,00	
TRAMO H	H1	5,70	2,39	-4,18	
	H2	0,60	2,39	0,00	
	H3	1,60	2,39	0,00	
	H4	5,95	2,39	-4,33	
	H5	1,30	2,39	0,00	
TRAMO I		14,04	2,39	-3,58	
TRAMO J		15,90	2,39	-0,76	
TRAMO K		8,01	2,80	-4,48	
TRAMO L		6,40	2,80	-0,72	
TRAMO M		5,15	2,80	-5,90	
TRAMO N		4,50	3,04	-2,20	
TRAMO Ñ		7,00	3,04	-3,64	
TOTAL AREA ESTUCO PLASTICO ACTA NO. 3					11,48

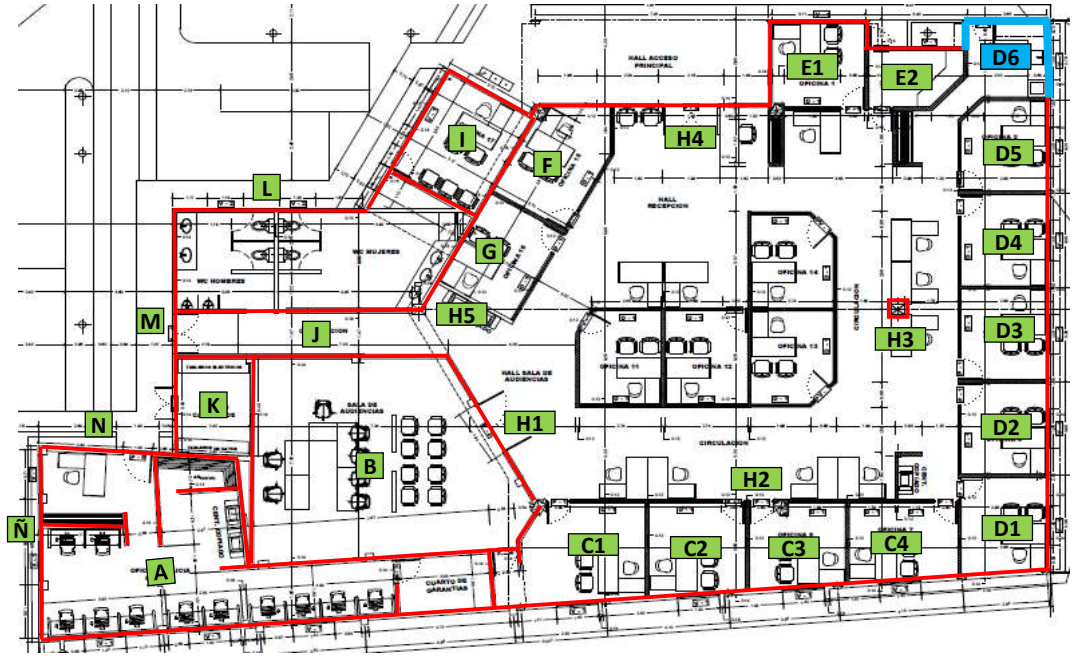

TOTAL AREA ESTUCO PLASTICO ACTA NO. 3	11,48

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

CONSORCIO VENTURA

MEMORIAS CORTE DE OBRA #3 EJECUTADA

Código: 055-2024 UAEJPMP	Versión: 1	Página 14

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025


DESCRIPCION

1.34 Muro en lamina de yeso-cartón de e:12 cm. Dos caras de yeso-cartón de 1/2" + estructura en perfil canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 9, instalados cada 61 Cm. con fijaciones al piso, + cinta malla fibra de vidrio + aislamiento termoacústico en lana de roca. incluye tratamiento de juntas, filos, y vanos con estucado general. — M2

ESPACIO	LARGO	ALTURA	PARCIAL
A. OFICINA 1	3,01	2,39	7,19
B. DISPONIBLE	3,46	2,39	8,27
C. OFICINA 2	3,59	2,39	8,58
D. OFICINA 3	3,10	2,39	7,41
E. OFICINA 4	2,95	2,39	7,04
F. OFICINA 5	2,97	2,39	7,09
H. OFICINA 7	2,71	2,39	6,48
I. OFICINA 8	2,89	2,39	6,91
J. OFICINA 9	3,20	2,39	7,65
K. OFICINA 10	3,37	2,39	8,05
M. OFICINA 12	3,30	2,39	7,89
N. OFICINA 13	3,30	2,39	7,89
Ñ. OFICINA 13	2,78	2,39	6,64
O. OFICINA 14	3,31	2,39	7,91
L. OFICINA 11	3,32	2,39	7,93
R. HALL RECEP	2,69	2,39	6,43
S. HALL COCINA	2,75	2,39	6,57
P. OFICINA 15	2,88	2,39	6,88
Q. OFICINA 16	2,88	2,39	6,88
G. OFICINA 6	2,94	2,39	7,03
T. C. COPIADO	2,51	2,39	6,00
U. POLICIAL	2,22	2,39	5,31

SUBTOTAL M2 MURO DRYWALL		158,03
PORCENT. CANCELADO ACTA 2	33%	52,20
PORCENT.A CANCELAR ACTA 3 - PASAN	67%	105,83

MUROS CANCELADOS 33% ACTA 2

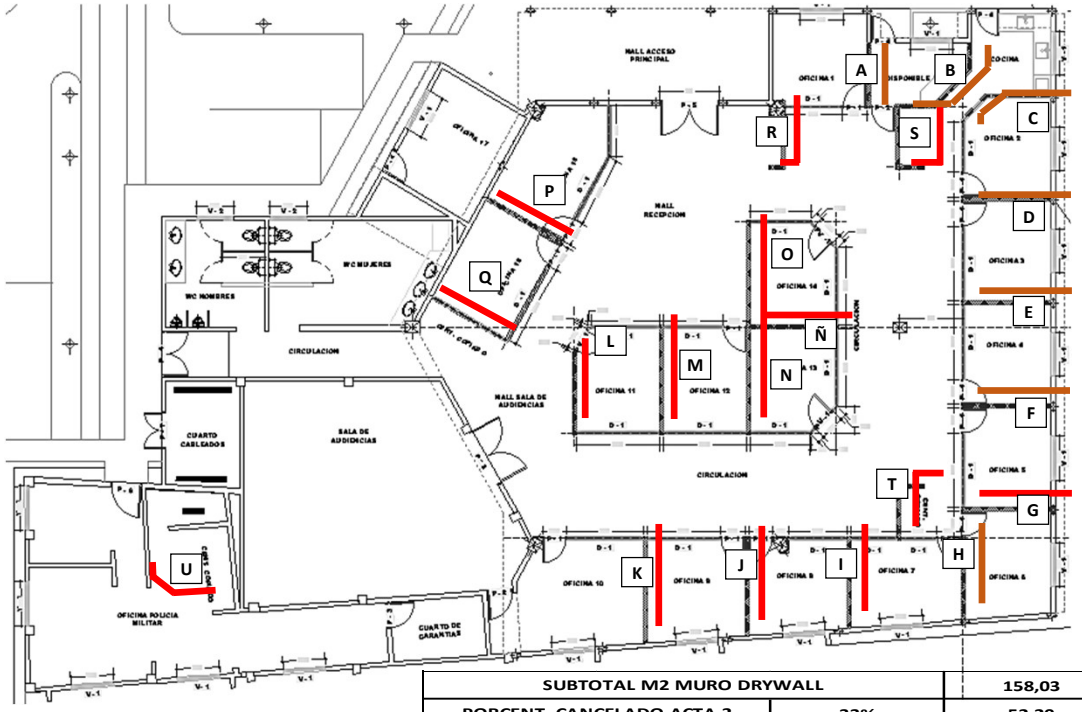

SUBTOTAL M2 MURO DRYWALL		158,03
PORCENT. CANCELADO ACTA 2	33%	52,20
PORCENT.A CANCELAR ACTA 3 - PASAN	67%	105,83

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	


PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.34 Muro en lamina de yeso-cartón de e:12 cm. Dos caras de yeso-cartón de 1/2" + estructura en perfil canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 9, instalados cada 61 Cm. con fijaciones al piso, + cinta malla fibra de vidrio + aislamiento termoacústico en lana de roca. incluye tratamiento de juntas, filos, y vanos con estucado general. — M2

ESPACIO	LARGO	ALTURA	PARCIAL
I. OFICINA 8	2,83	2,39	6,76
J. OFICINA 9	3,20	2,39	7,65
K. OFICINA 10	3,37	2,39	8,05
M. OFICINA 12	3,30	2,39	7,89
N. OFICINA 13	3,30	2,39	7,89
Ñ. OFICINA 13	2,78	2,39	6,64
O. OFICINA 14	3,31	2,39	7,91
L. OFICINA 11	3,32	2,39	7,93
R. HALL RECEP	2,69	2,39	6,43
S. HALL COCINA	2,75	2,39	6,57
P. OFICINA 15	2,88	2,39	6,88
Q. OFICINA 16	2,88	2,39	6,88
G. OFICINA 6	2,94	2,39	7,03
T. C. COPIADO	2,51	2,39	6,00
U. POLICIAL	2,22	2,39	5,31
SUBTOTAL M2 POR CANCELAR MURO DRYWALL			105,83
PORCENT. A CANCELAR ACTA 3 - VIENEN		67%	105,83
TOTAL A CANCELAR M2 MURO DRYWALL			105,83

MUROS CANCELADOS 33% ACTA 2

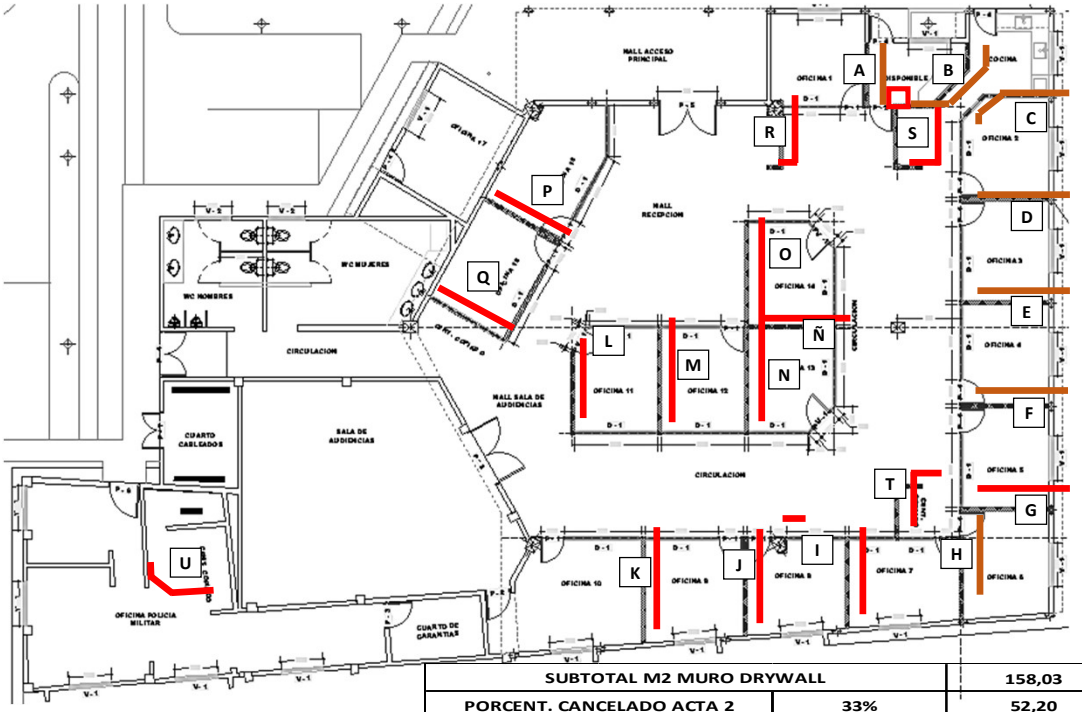

SUBTOTAL M2 MURO DRYWALL		158,03
PORCENT. CANCELADO ACTA 2	33%	52,20
PORCENT.A CANCELAR ACTA 3 - PASAN	67%	105,83


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.			Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2			
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES / AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03 / 2025

DESCRIPCION

1.35 Lineal de muro en lamina de yeso-cartón de e:12 cm. hasta 0,61m. Dos caras de yeso-cartón de 1/2" + estructura en perfil canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 9, instalados cada 61 Cm. con fijaciones al piso, + cinta malla fibra de vidrio + aislamiento termoacústico en lana de roca. incluye tratamiento de juntas, filos, y vanos con estucado general. — **M**

ESPACIO	LARGO	CANT	PARCIAL
A. RECEPCION	2,39	2,00	4,78
B. COCINA	2,39	3,00	7,17
C. C. COPIADO	2,39	4,00	9,56
D. OFICINA 8	2,39	2,00	4,78
E. OFICINA 10	2,39	2,00	4,78
F. OFICINA 11	2,39	4,00	9,56
TOTAL A CANCELAR M MURO DRYWALL			**40,63**

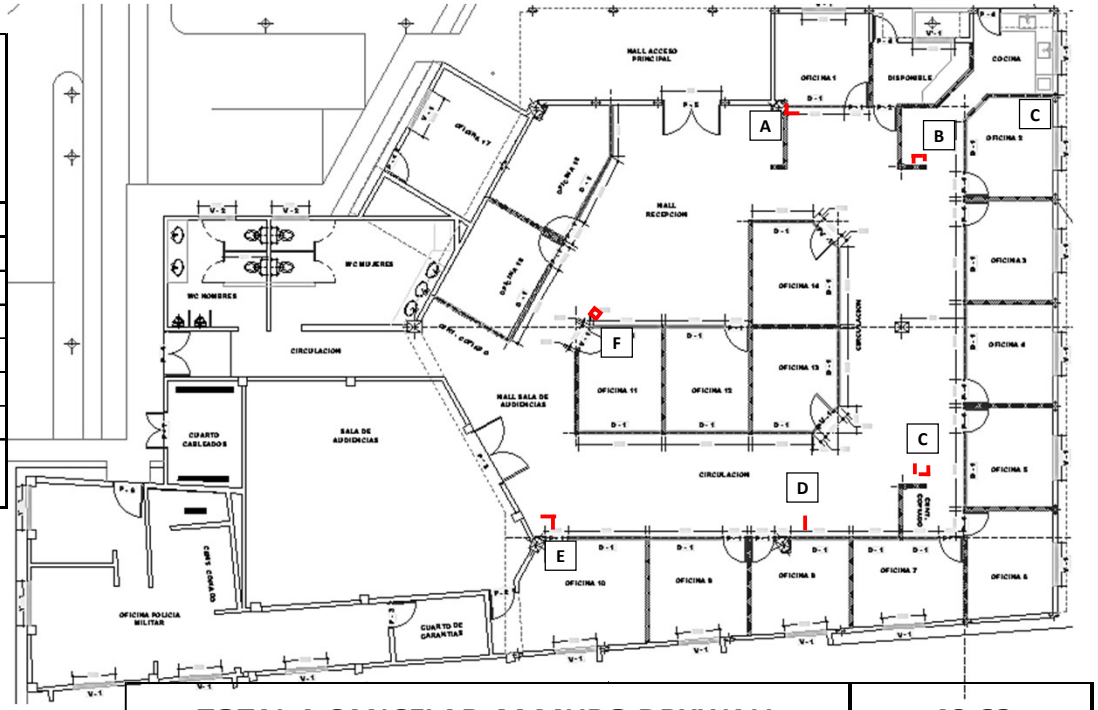


TOTAL A CANCELAR M MURO DRYWALL	40,63

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.36 Remate de vanos y filos en muro de mampostería, se debe dejar el afinado listo para la instalación del marco de puertas			M
ZONA	LONGITUDES	CANT	PARCIAL
OFICINA 1	5,40	1,00	5,40
DISPONIBLE	8,40	1,00	8,40
COCINA	10,60	1,00	10,60
OFICINA 2	5,40	1,00	5,40
OFICINA 3	5,40	1,00	5,40
OFICINA 4	5,40	1,00	5,40
OFICINA 5	5,40	1,00	5,40
OFICINA 6	5,40	1,00	5,40
OFICINA 7	5,40	1,00	5,40
OFICINA 8	5,40	1,00	5,40
OFICINA 9	5,40	1,00	5,40
OFICINA 10	5,40	1,00	5,40
OFICINA 17	10,60	1,00	10,60
POL JUDICIAL	5,40	5,00	27,00
	8,50	1,00	8,50
SALA AUDIENC	11,55	1,00	11,55
ACCESO A BAÑO	5,87	1,00	5,87
C CABLEADO	11,00	1,00	11,00
TOTAL M REMATE VANOS			147,52

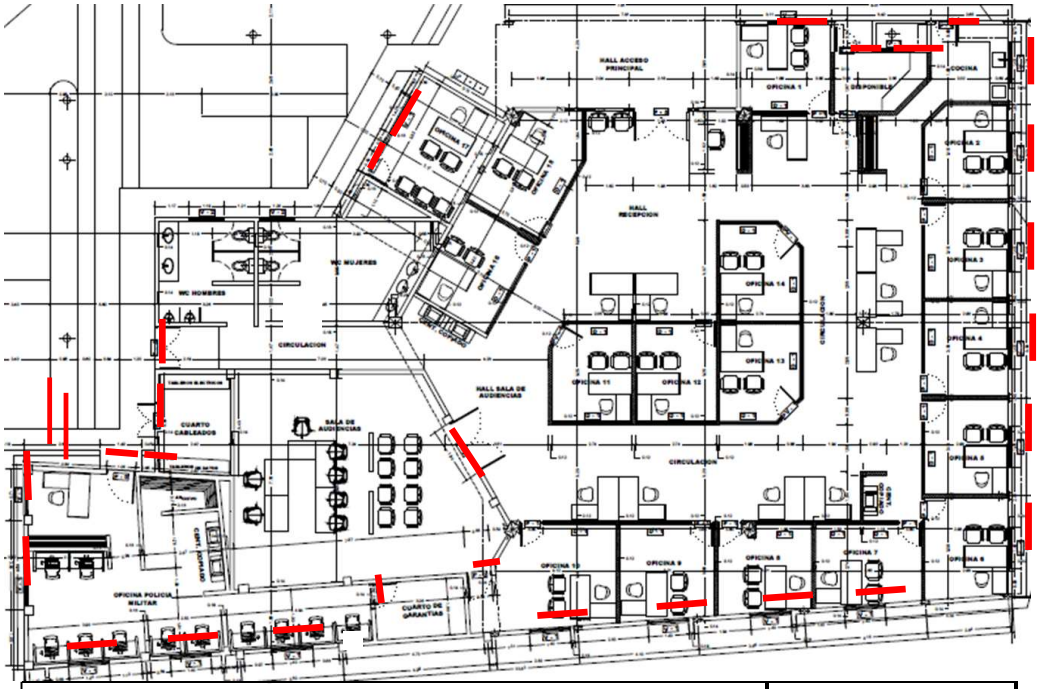


TOTAL M REMATE VANOS	147,52

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.37 Suministro e instalación de cielo raso en lamina de yeso-cartón, con estructura cada 61 cm, perfileria rolada calibre 24 viguetas y omegas, lámina de panel yeso de 1/2"; + cinta malla fibra de vidrio, cuelgas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento incluye tratamiento de juntas, filos, y vanos con estucado general. incluye vanos para tapas de inspección y luminarias.					M2
ESPACIO - TRAMO		LARGO	ANCHO - AREA	CANT	PARCIAL
A. WC HOMBRES		3,40	3,26	1,00	11,08
B. WC DAMAS		5,59	3,30	1,00	18,45
C. CIRCULACION BAÑOS		8,80	1,51	1,00	13,24
D. POLICIA JUDICIAL		6,65	6,15	1,00	40,83
D. CUARTO GARANTIAS		7,65	1,88	1,00	14,34
E. SALA AUDIENCIA		56,63		1,00	56,63
C1 a C4. OFICINAS Y CIRCULACIONES	C1	12,94		2,00	25,87
		13,99	13,75	1,00	192,36
	C2	19,25	2,91	1,00	56,01
	C3	6,24	2,93	1,00	18,28
	C4	17,26	3,02	1,00	52,04
		1,90	1,00	1,00	1,90
DCTO JARDINERA		-2,00	0,94	1,00	-1,88
F. HALL ACCESO		7,45	2,90	1,00	21,61
G. OFICINA 17		3,85	3,17	1,00	12,20
SUBTOTAL M2 INST CIELORASO					532,98
SE RESTAN MUROS					-6,21
TOTAL M2 INST CIELORASO					526,78

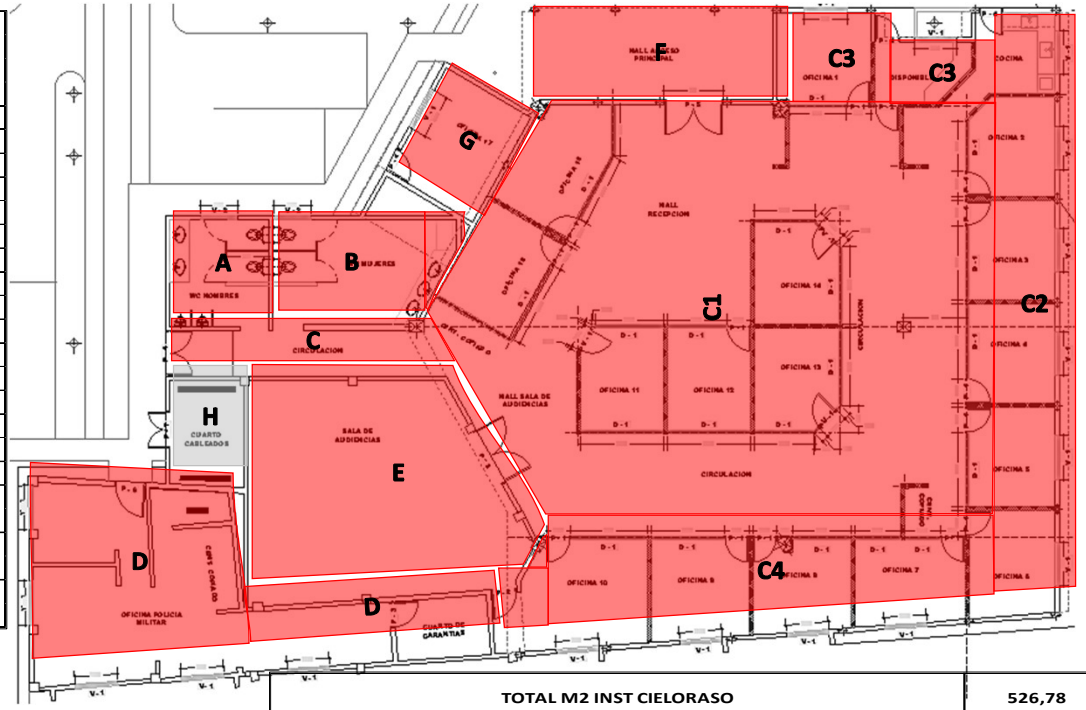

TOTAL M2 INST CIELORASO	526,78


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	


PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE	003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2			
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES / AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03 / 2025

DESCRIPCION

1.38 Refuerzo y conformado de vanos de cielorraso en perfil " T " 32mm X 24mm color blanco, fijado a estructura metálica o cuelgas a elemento estructural, incluye cortes, fijaciones , empastado y todo lo correcto para su instalación, y funcionamiento — **M**

ZONA	AREA	CANT	PARCIAL
BAÑO HOMBRES	2,40	3,00	7,20
BAÑO MUJERES	2,40	5,00	12,00
SALA AUDIENCIA	2,40	12,00	28,80
POL. JUDICIAL	2,40	17,00	40,80
OFICINA 1 al 17	2,40	34,00	81,60
HALL BAÑOS	2,40	3,00	7,20
HALLACCESO	2,40	3,00	7,20
CIRCULACIONES	2,40	22,00	52,80
C.COPIADO	2,40	1,00	2,40
COCINA	2,40	2,00	4,80
DISPONIBLE	2,40	2,00	4,80
C. CABLEADO	2,40	2,00	4,80
CASA ADJUNTA	2,40	6,00	14,40
TOTAL M REFUERZO EN T			**268,80**



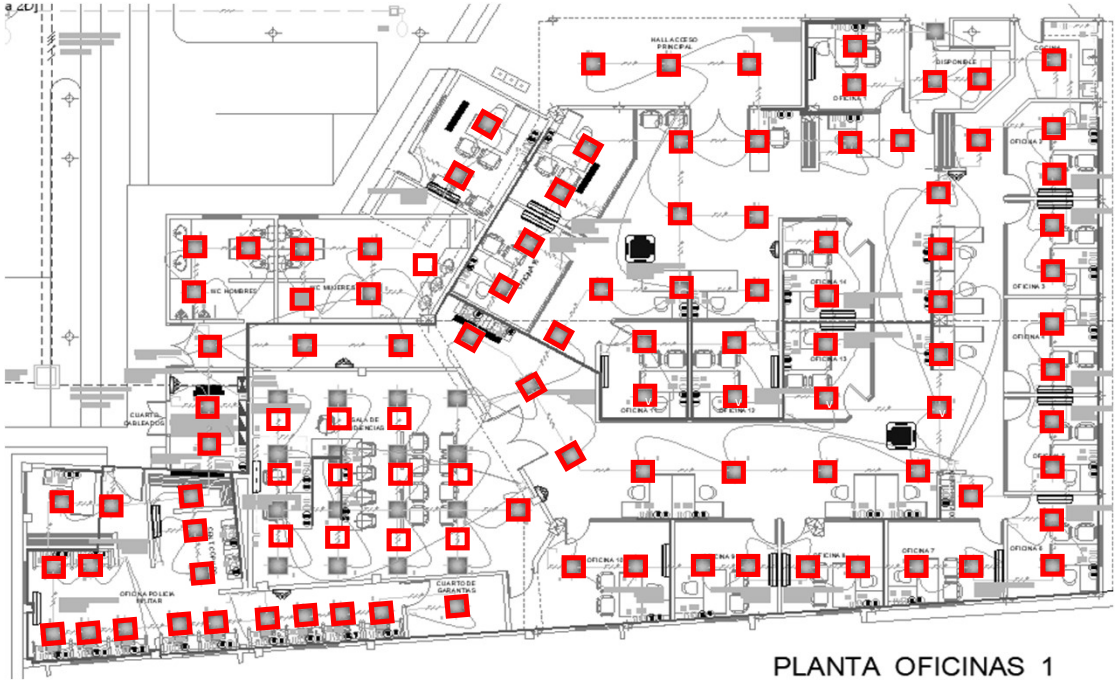

PLANTA OFICINAS 1


TOTAL M REFUERZO EN T	268,80

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.39 Suministro e instalación de tapas de inspección para cielorraso de 60 x 60 cm en lamina de fibrocemento de 8mm, con marco de refuerzo en ángulo de aluminio blanco, estucado y pintado, para dar acabado idéntico al cielo raso, incluye fijaciones, adhesivos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento			M2
ESPACIO	**AREA**	**CANT**	**PARCIAL**
A. SALA AUD.	0,36	1,00	0,36
B. OFICINA 10	0,36	1,00	0,36
C. OFICINA 6	0,36	1,00	0,36
D. OFICINA 14	0,36	1,00	0,36
E. OFICINA 4	0,36	1,00	0,36
F. SALA AUD.	0,36	1,00	0,36
TOTAL A CANCELAR TAPA REGISTRO			**2,16**

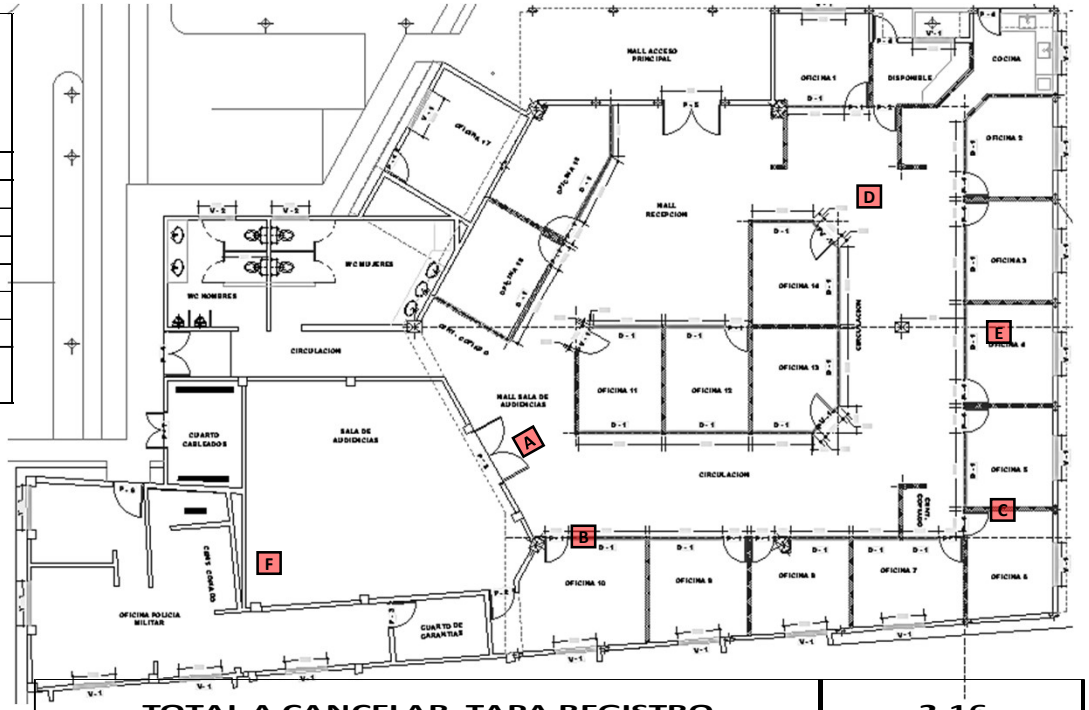


TOTAL A CANCELAR TAPA REGISTRO	2,16

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.			Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2			
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES / AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03 / 2025

DESCRIPCION

1.42 Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos				M2
ESPACIO	LONG	ALTURA	DCTO	PARCIAL
OFICINA 1 - A1	9,70	2,39	-1,82	21,36
DISPONIBLE - A2	9,28	2,39	-5,34	16,84
COCINA - A3	15,10	2,39	-3,58	32,51
OFICINA 2 - A4	10,10	2,39	-1,82	22,32
OFICINA 3 - A5	9,42	2,39	-1,82	20,69
OFICINA 4 - A6	9,31	2,39	-1,82	20,43
OFICINA 5 - A7	9,14	2,39	-1,82	20,02
OFICINA 6 - A8	11,85	2,39	-1,82	26,50
OFICINA 7 - B1	9,66	2,39	-1,82	21,27
OFICINA 8 - B2	11,17	2,39	-1,82	24,88
OFICINA 9 - B3	10,12	2,39	-1,82	22,37
OFICINA 10 - B4	14,12	2,39	-3,58	30,17
OFICINA 11 - C1	6,77	2,39	0,00	16,18
OFICINA 12 - C2	7,00	2,39	0,00	16,73
OFICINA 13 - C3	6,26	2,39	0,00	14,96
OFICINA 14 - C4	6,26	2,39	0,00	14,96
OFICINA 15 - C5	8,50	2,39	0,00	20,32
OFICINA 16 - C6	9,24	2,39	0,00	22,08
OFICINA 17 - C7	14,05	2,39	-3,58	30,00
CIRCULACIONES INTERNAS - D1	43,16	2,39	-10,27	92,89
PASILLO ACCESO BAÑOS - D2	16,18	2,39	-0,84	37,83
SALA DE AUDIENCIAS - E	32,40	2,60	-6,05	78,19
POLICIA JUDICIAL - F	73,30	2,39	-13,28	161,91
FACHADA POLICIA JUDICIAL - G	7,00	3,04	-3,64	17,64
FACHADA POLICIA JUDICIAL - H	4,50	3,06	-2,20	11,57
FACHADA BAÑOS - I	3,40	3,06	-2,64	7,76
	5,15	2,80	-3,23	11,19
FACHADA BAÑOS - J	6,40	2,80	-0,72	17,20
CUARTO CABLEADO - K	11,50	2,80	-4,49	27,71
TOTAL AREA PINTURA EN VINILO				878,48

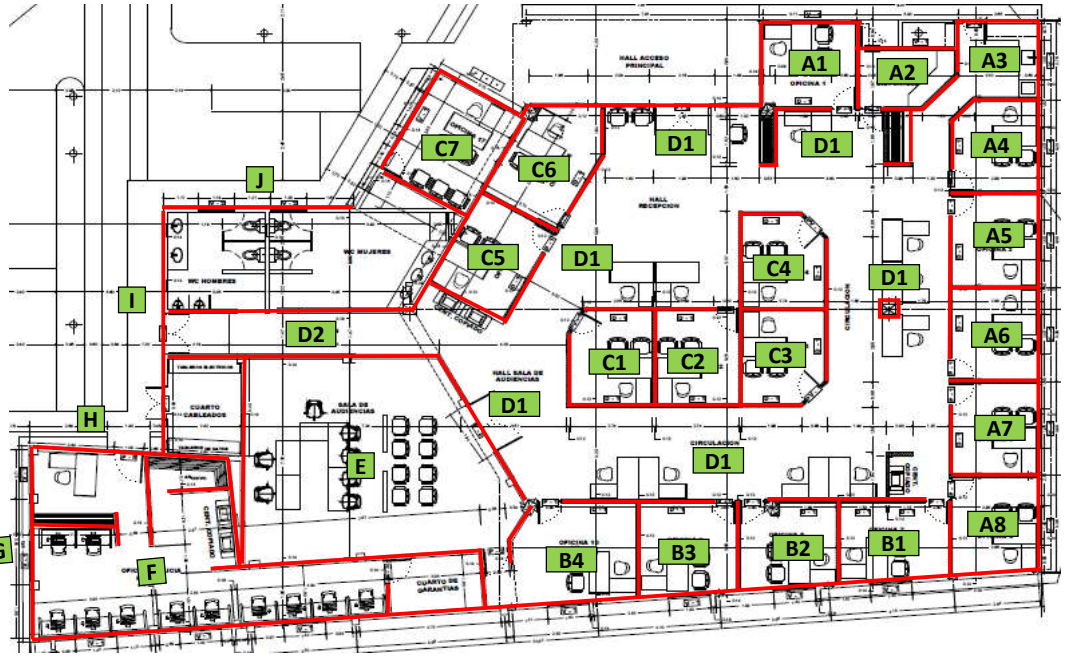


TOTAL AREA PINTURA EN VINILO	878,48

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.43 Pintura interior en cieloraso, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos					M2
ESPACIO - TRAMO		LARGO	ANCHO - AREA	CANT	PARCIAL
A. WC HOMBRES		3,40	3,26	1,00	11,08
B. WC DAMAS		5,59	3,30	1,00	18,45
C. CIRCULACION BAÑOS		8,80	1,51	1,00	13,24
D. POLICIA JUDICIAL		6,65	6,15	1,00	40,83
D. CUARTO GARANTIAS		7,65	1,88	1,00	14,34
E. SALA AUDIENCIA		56,63		1,00	56,63
C1 a C4. OFICINAS Y CIRCULACIONES		12,94		2,00	25,87
	C1	13,99	13,75	1,00	192,36
	C2	19,25	2,91	1,00	56,02
	C3	6,24	2,93	1,00	18,28
	C4	17,26	3,02	1,00	52,04
		1,90	1,00	1,00	1,90
DCTO JARDINERA		-2,00	0,94	1,00	-1,88
F. HALL ACCESO		7,45	2,90	1,00	21,61
G. OFICINA 17		3,85	3,17	1,00	12,20
TOTAL M2 PINTURA INTERIOR CIELORASO					532,98
SE RESTAN MUROS					-6,21
TOTAL M2 PINTURA INTERIOR CIELORASO					526,78

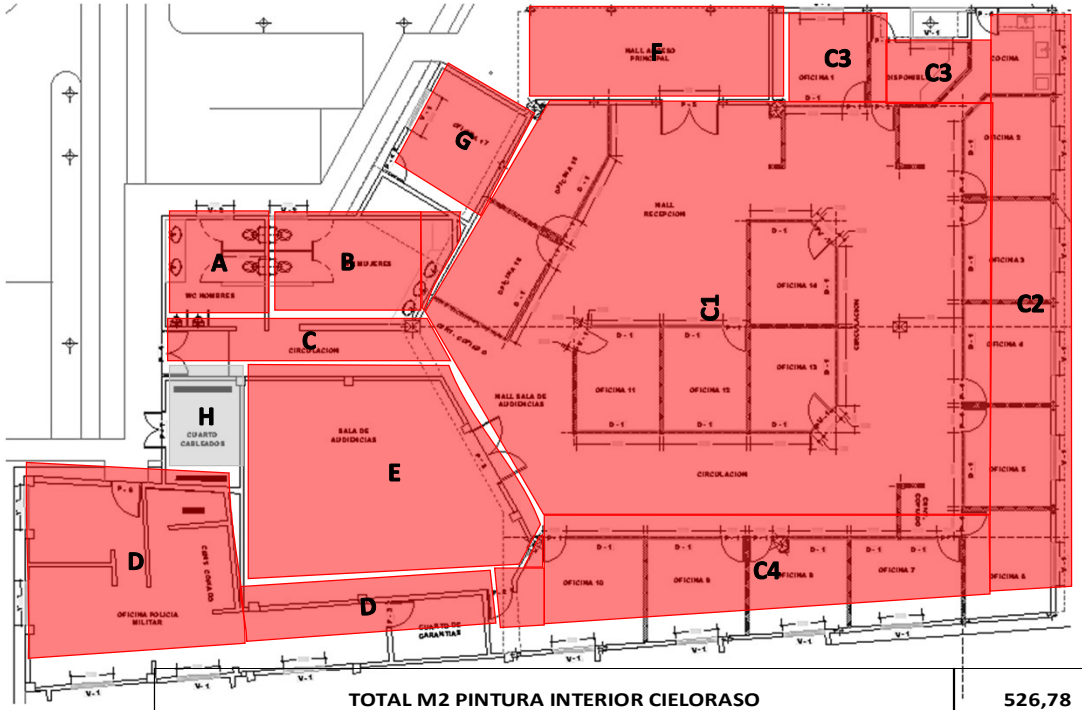

TOTAL M2 PINTURA INTERIOR CIELORASO	526,78

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	


PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.44 Suministro e instalación enchape de pared en baldosa ceramica blanca formato 60x60cm, incluye pegante para ceramica, dilatadores plásticos, y emboquillado general. — M2

ZONA		LARGO	ALTURA	CANT	PARCIAL
A. BAÑOS HOMBRES	1	0,0016	2,40	1,00	0,00
TOTAL AREA DE ENCHAPE CORTE NO. 3					0,0040

ZONA		LARGO	ALTURA	CANT	PARCIAL
A. BAÑOS HOMBRES	1	3,25	2,40	1,00	7,80
	2	1,96	2,40	2,00	9,41
	3	1,40	2,40	1,00	3,36
		0,12	2,40	1,00	0,29
		1,40	2,40	1,00	3,36
	4	1,43	2,40	1,00	3,43
	5	2,27	2,40	1,00	5,45
	6	3,38	2,40	1,00	8,11
MOCHETAS	7	0,59	0,89	2,00	1,05
LAVAMANOS		0,075	0,89	1,00	0,07
B. BAÑOS MUJERES	1	5,93	2,40	1,00	14,23
	2	1,00	2,40	1,00	2,40
	3	2,20	0,82	1,00	1,80
		0,47	0,95	1,00	0,45
		0,15	0,95	1,00	0,14
	4	3,44	2,40	1,00	8,26
	5	1,18	2,40	1,00	2,83
	6	1,43	2,40	1,00	3,43
		0,12	2,40	1,00	0,29
		1,43	2,40	1,00	3,43
	7	2,00	2,40	1,00	4,80
MOCHETAS	8	0,67	0,70	1,00	0,47
LAVAMANOS		0,15	0,70	1,00	0,11
TOTAL AREA DE ENCHAPE CORTE NO. 2					84,96

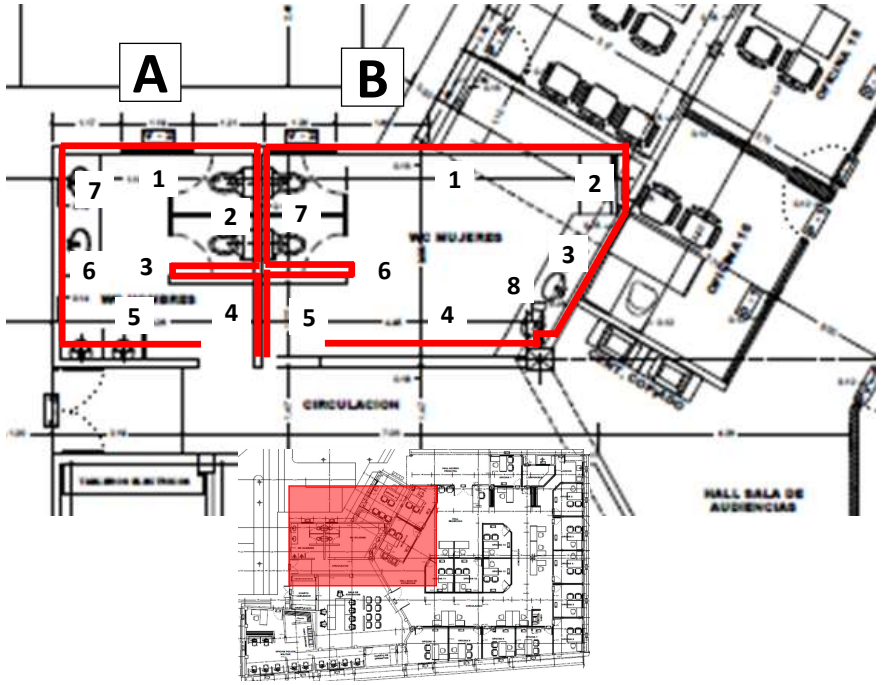


TOTAL AREA ENCHAPADA	84,96

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.46 Suministro e instalación enchape de piso en porcelanato formato 60x60cm, incluye pegante para porcelanato, dilatadores plásticos, y emboquillado general.	ESPACIO - TRAMO	LARGO	ANCHO - AREA	CANT	PARCIAL M
	F. HALL ACCESO	7,45	2,90	1,00	21,61
	G. OFICINA 17	3,85	3,17	1,00	12,20
			SUBTOTAL M PISO PORCELANATO		33,81

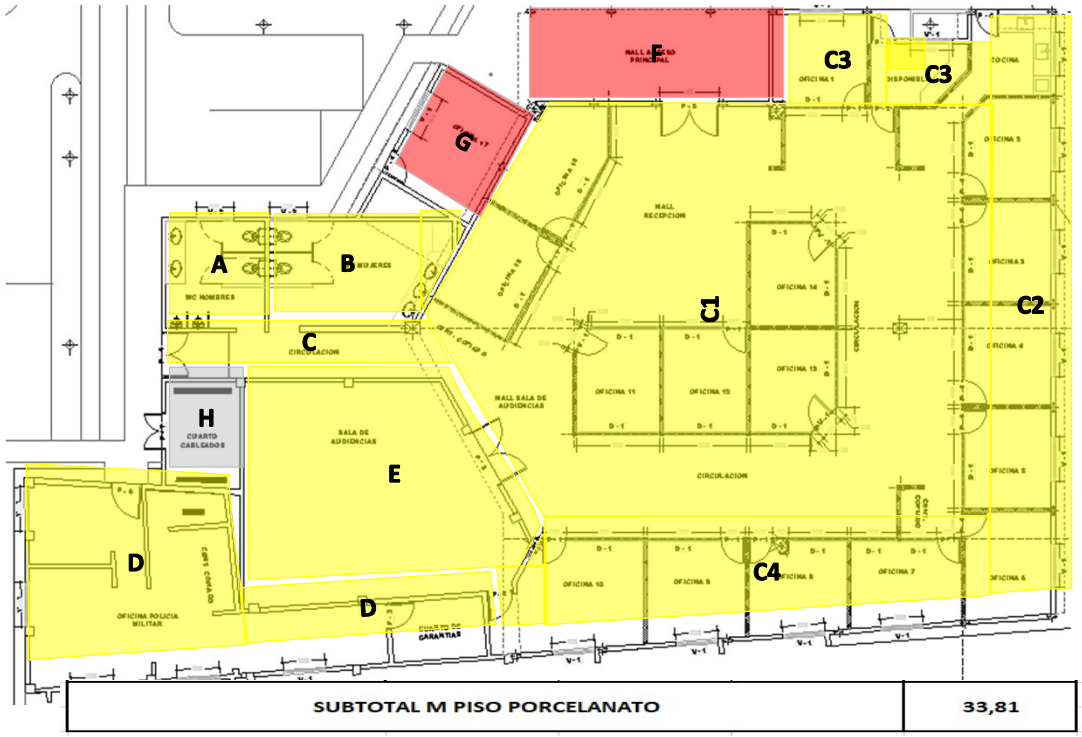

SUBTOTAL M PISO PORCELANATO	33,81


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.			Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2			
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES / AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03 / 2025

DESCRIPCION

1.47 Suministro e instalación de guarda escoba en porcelanato negro liso sin textura con altura de 10cm. Incluye pegante para porcelanato, o pegante epoxico tipo sicaflex o similar, incluye emboquillado en juntas y superior con remate de pintura color negro — **M**

ESPACIO	LONG	DCTO	PARCIAL
OFICINA 1 - A1	11,58	0,00	11,58
DISPONIBLE - A2	8,95	-1,60	7,35
COCINA - A3	16,15	-0,80	15,35
OFICINA 2 - A4	11,25	0,00	11,25
OFICINA 3 - A5	11,65	0,00	11,65
OFICINA 4 - A6	11,65	0,00	11,65
OFICINA 5 - A7	11,65	0,00	11,65
OFICINA 6 - A8	11,70	0,00	11,70
OFICINA 7 - B1	12,30	0,00	12,30
OFICINA 8 - B2	12,50	0,00	12,50
OFICINA 9 - B3	12,50	0,00	12,50
OFICINA 10 - B4	16,15	-0,85	15,30
OFICINA 11 - C1	11,65	0,00	11,65
OFICINA 12 - C2	11,65	0,00	11,65
OFICINA 13 - C3	11,10	0,00	11,10
OFICINA 14 - C4	11,10	0,00	11,10
OFICINA 15 - C5	12,25	0,00	12,25
OFICINA 16 - C6	11,95	0,00	11,95
OFICINA 17 - C7	14,05	-0,80	13,25
CIRCULACIONES INTERNAS - D1	101,75	-17,48	84,27
PASILLO ACCESO BAÑOS - D2	16,18	0,00	16,18
SALA DE AUDIENCIAS - E	32,40	-2,75	29,65
POLICIA JUDICIAL - F	72,30	-1,80	70,50
TOTAL M GUARDAESCOBA			**428,33**

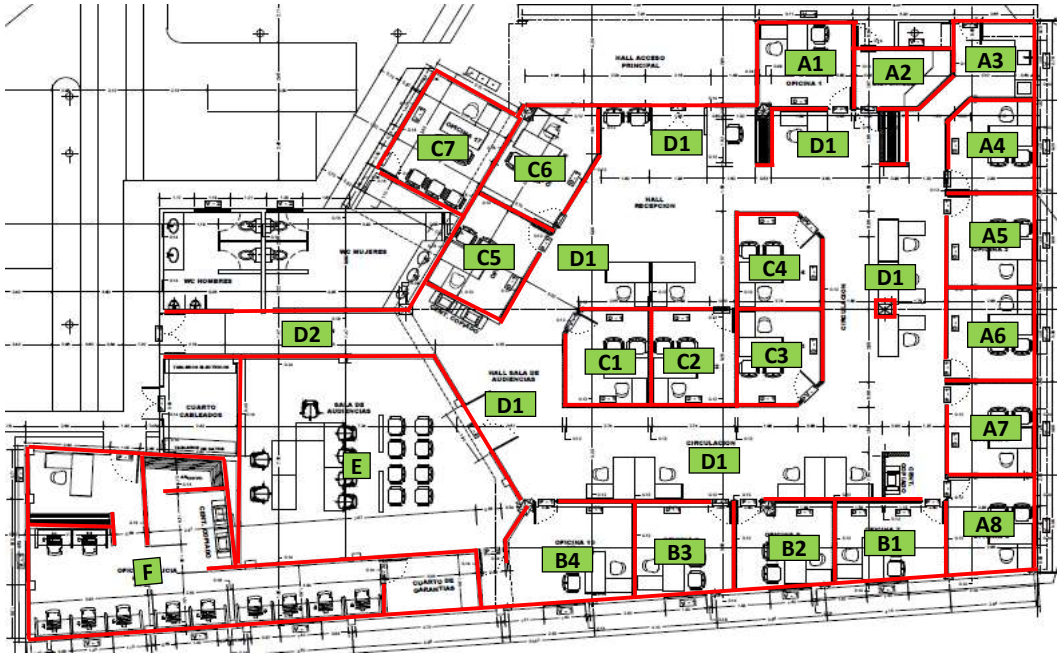


TOTAL M GUARDAESCOBA	428,33


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.48 Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, una pieza, color blanco, con asiento y tapa lacados, ahorrador de agua, tipo Sanitario corona Montecarlo Alongado Blanco Corona O SIMILAR. Con todos sus accesorios, instalación y llave registro metálica de entrada, sello de silicona, emboquillado, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento		UND
ESPACIO	**CANT**	**PARCIAL**
A. BAÑOS HOMBRES	2,00	2,00
B. BAÑOS MUJERES	2,00	2,00
SUBTOTAL INST INODOROS		4,00
% FACTURADO EN ACTA 2	**50%**	**2,00**
% POR FACTURAR ACTA 3	**50%**	**2,00**

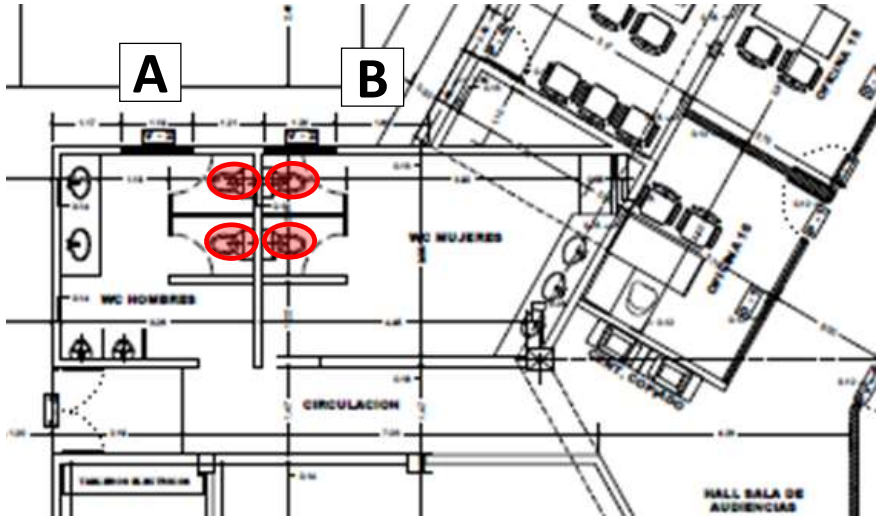




SUBTOTAL INST INODOROS		4,00
% FACTURADO EN ACTA 2	**50%**	**2,00**
% POR FACTURAR ACTA 3	**50%**	**2,00**


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE	003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2			
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES / AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03 / 2025

DESCRIPCION

1.49 Suministro e instalación lavamanos monocontrol de porcelana sanitaria, color blanco, de sobreponer en mesón, tipoLavamanos Sencillo De Empotrar 60.5X46.5X17 Cm O SIMILAR incluye grigferia monocontrol tipo Grifería corona Lavamanos Temporizador Diagonal Push O SIMILAR, sinfón con rejilla metalica, llave resgistro metálica de entrada, sello en silicona, flanche y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.u correcto funcionamiento		UND
ESPACIO	**CANT**	**PARCIAL**
A. BAÑOS HOMBRES	2,00	2,00
B. BAÑOS MUJERES	3,00	3,00
TOTAL INST LAVAMANOS		**5,00**

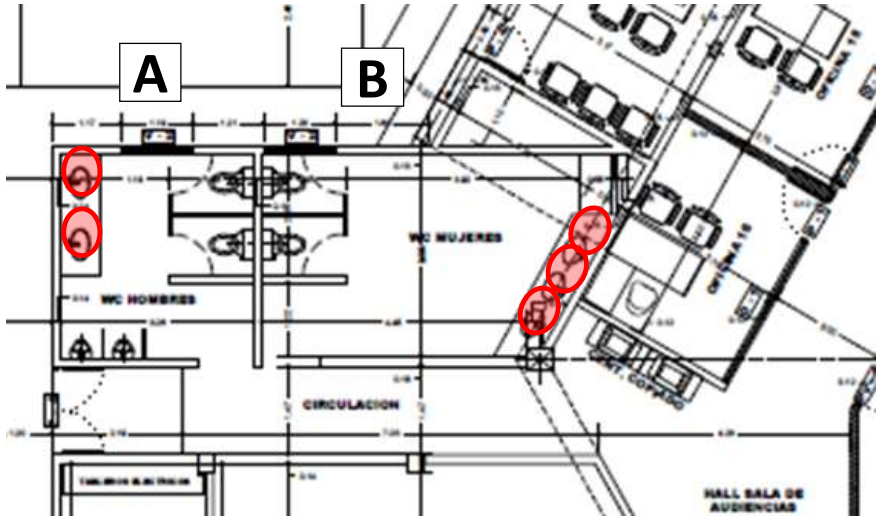




TOTAL INST LAVAMANOS	**5,00**


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.51 Suministro e instalación urinal linea institucional, Orinal Arrecife. Para Fluxómetro Blanco O SIMILAR. entrada superior, incluye grifería Grival orinal push antivandálica O SIMILAR, sifón con rejilla metálica sello de silicona, flanche, fijaciones en acero inoxidable 304, y todo lo correcto para su instalación y funcionamiento.		UND
ESPACIO	**CANT**	**PARCIAL**
A. BAÑOS HOMBRES	2,00	2,00
SUBTOTAL INST ORINAL		2,00
% FACTURADO EN ACTA 2	**50%**	**1,00**
% POR FACTURAR ACTA 3	**50%**	**1,00**

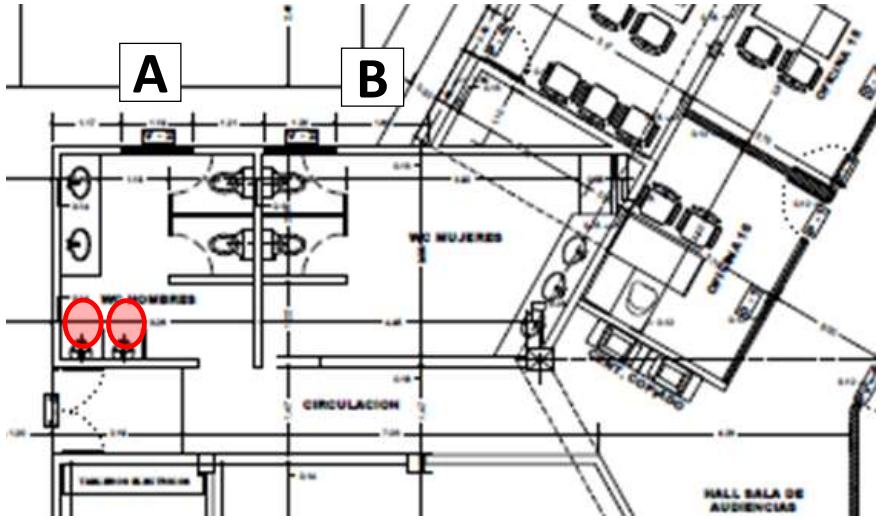




SUBTOTAL INST ORINAL		2,00
% FACTURADO EN ACTA 2	**50%**	**1,00**
% POR FACTURAR ACTA 3	**50%**	**1,00**


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.52 Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable		UND
ESPACIO	**CANT**	**PARCIAL**
A. BAÑOS HOMBRES	1,00	1,00
B. BAÑOS MUJERES	1,00	1,00
TOTAL INST DISP PAPEL		**2,00**

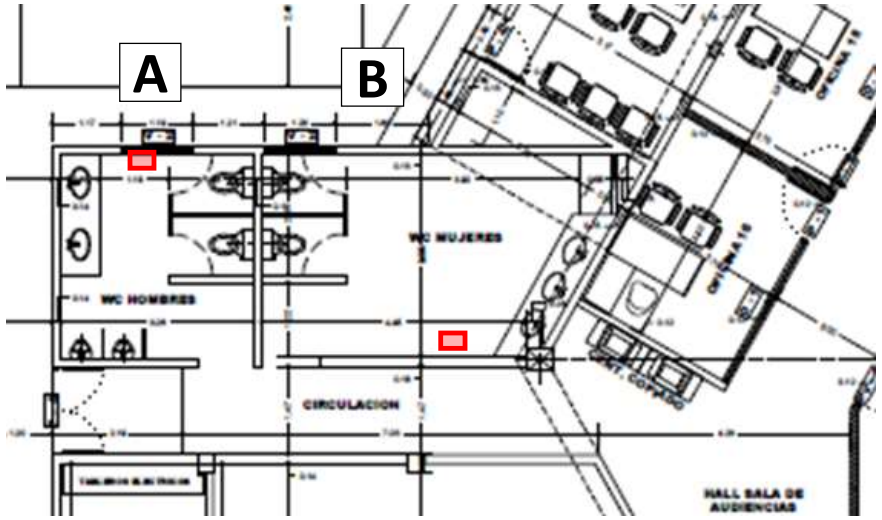




TOTAL INST DISP PAPEL	2,00


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.53 Suministro e instalación de dispensador de jabón de empotrar en acero inoxidable (incluye accesorios de instalación y transporte)		UND
ESPACIO	**CANT**	**PARCIAL**
A. BAÑOS HOMBRES	1,00	1,00
B. BAÑOS MUJERES	1,00	1,00
TOTAL INST DISP JABON		**2,00**

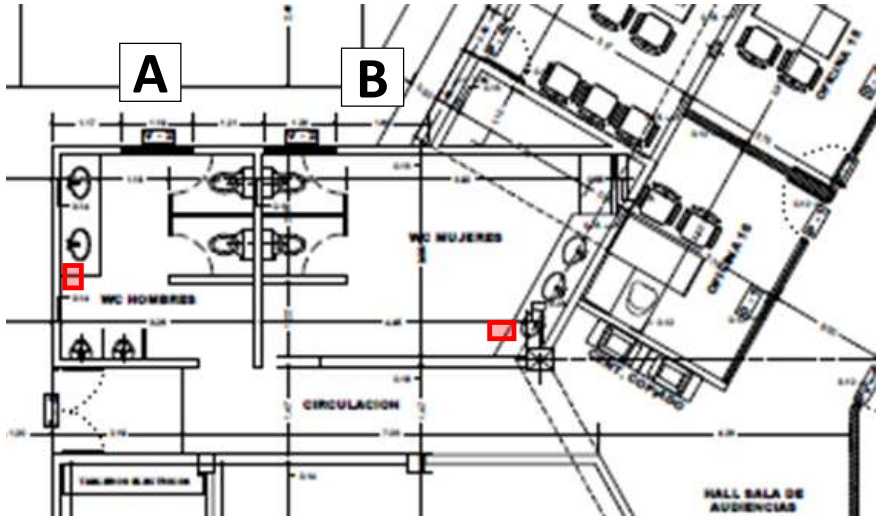




TOTAL INST DISP JABON	2,00


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.54 Suministro e instalación de división en acero inoxidable 304 acabado cepillado o similar, incluye puerta con pestilllo, fijaciones y anclajes a piso, pared y todos los necesarios en acero inoxidable 304				M2
ESPACIO	ANCHO	ALTURA	CANT	PARCIAL
A. BAÑOS HOMBRES	2,02	1,80	1,00	3,64
	1,41	1,80	1,00	2,54
	0,50	0,70	2,00	0,70
B. BAÑOS MUJERES	1,99	1,80	1,00	3,58
	1,41	1,80	1,00	2,54
SUBTOTAL INST DIVISIONES ACERO				12,99
% FACTURADO EN ACTA 2			20%	2,60
% POR FACTURAR EN ACTA 3			80%	10,39

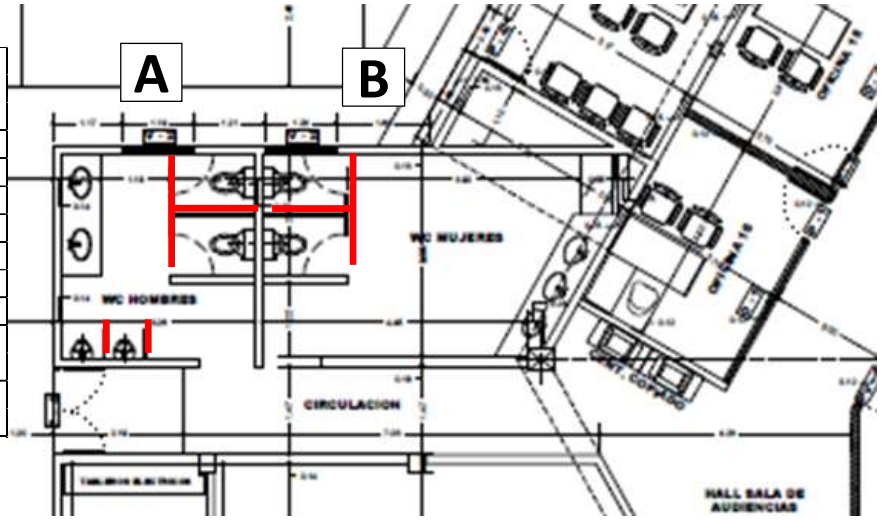




SUBTOTAL INST DIVISIONES ACERO		12,99
% FACTURADO EN ACTA 2	20%	2,60
% POR FACTURAR EN ACTA 3	80%	10,39

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE	003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2			
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES / AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03 / 2025

DESCRIPCION

1.56 Regatas en mampostería y/o concreto y derivación de punto hidraulico, incluye accesorios pegante, limpiador y todo lo correcto para su funcionamiento			M
ESPACIO	**LARGO**	**CANT**	**PARCIAL**
Oficina 1	0,60	1,00	0,60
Oficina 10	1,70	1,00	1,70
Oficina 17	1,40	1,00	1,40
Sala Audiencia	1,70	2,00	3,40
C. Cableado	1,20	1,00	1,20
Baño Hombres	1,30	1,00	1,30
Baños Mujeres	1,30	2,00	2,60
Pasillo Baños	1,20	1,00	1,20
Cocina	2,40	1,00	2,40
	1,90	1,00	1,90
Policia Judicial	1,30	4,00	5,20
	1,70	1,00	1,70
	0,40	1,00	0,40
TOTAL M REGATAS MAMPOSTERIA			**25,00**

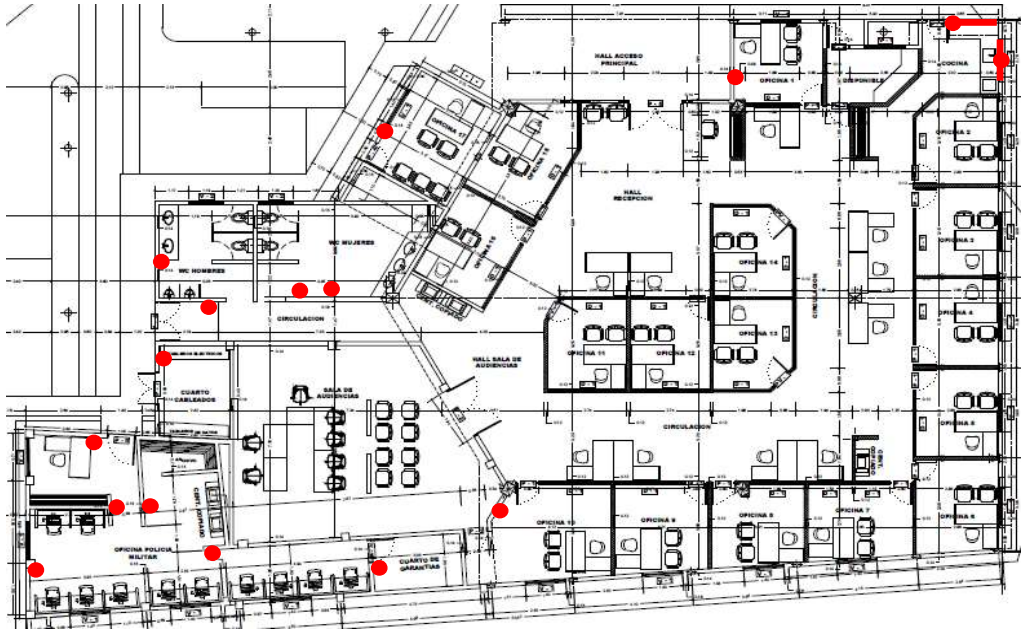


TOTAL M REGATAS MAMPOSTERIA	25,00

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.57 Excavación, regatas en concreto y derivación a punto sanitario, incluye sifón, uniones y accesorios, pegante, limpiador y todo lo correcto para su funcionamiento			M
ESPACIO	**LARGO**	**CANT**	**PARCIAL**
RED HIDRAULICA	23,50	1,00	23,50
RED SANITARIA	26,50	1,00	26,50
TOTAL M EXCAV REGATAS EN CONCRETO			**50,00**

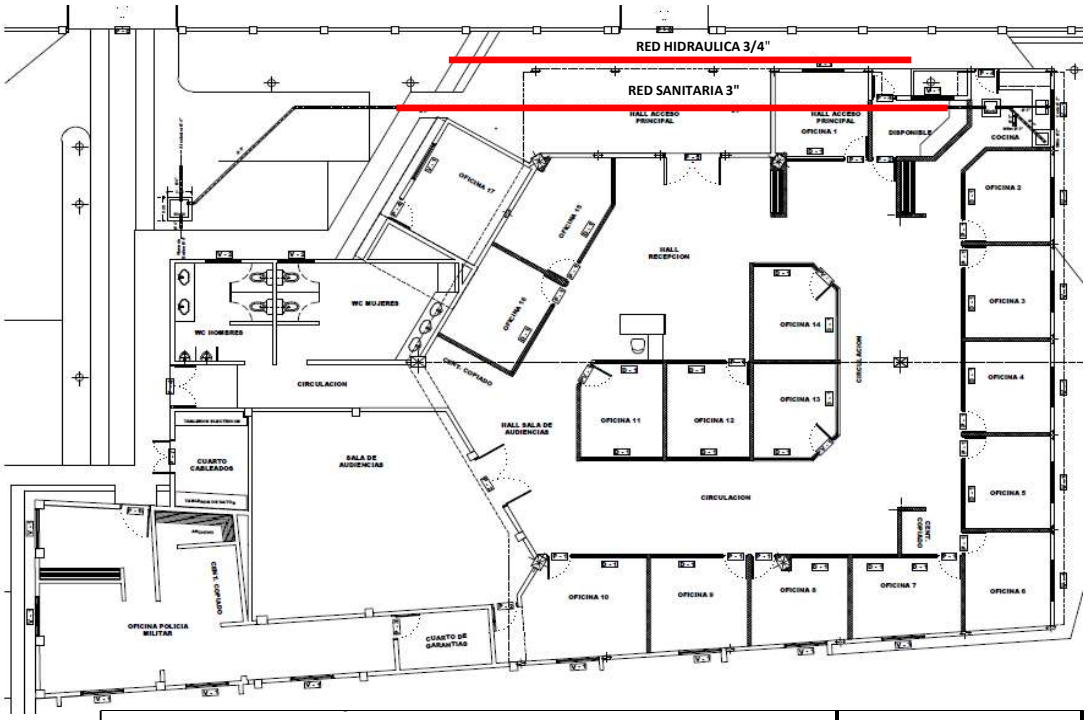

TOTAL M EXCAV REGATAS EN CONCRETO	50,00


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.			Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2			
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES / AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03 / 2025

DESCRIPCION

1.58 Suministro e instalación de divisiones en vidrio laminado 4+4, con perfilería en aluminio anodizado negro (marco en perfil tipo VP 3831 o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye película autoadhesiva (Sand blasting) tipo frost. D-1 — M2

ESPACIO	LARGO	ALTURA	CANT	PARCIAL
OFICINA 1	2,085	2,200	1,00	4,59
MONTANTE PUERTA	0,800	0,190	1,00	0,15
OFICINA 2	1,250	2,200	1,00	2,75
MONTANTE PUERTA	0,800	0,190	1,00	0,15
OFICINA 3	2,375	2,200	1,00	5,23
MONTANTE PUERTA	0,800	0,190	1,00	0,15
OFICINA 4	2,375	2,200	1,00	5,23
MONTANTE PUERTA	0,800	0,190	1,00	0,15
OFICINA 5	2,365	2,200	1,00	5,20
MONTANTE PUERTA	0,800	0,190	1,00	0,15
OFICINA 6	0,000	0,000	0,00	0,00
MONTANTE PUERTA	0,800	0,190	1,00	0,15
OFICINA 7	1,565	2,200	1,00	3,44
	1,185	2,200	1,00	2,61
MONTANTE PUERTA	0,800	0,190	1,00	0,15
OFICINA 8	1,890	2,200	1,00	4,16
MONTANTE PUERTA	0,800	0,190	1,00	0,15
OFICINA 9	2,495	2,200	1,00	5,49
MONTANTE PUERTA	0,800	0,190	1,00	0,15
OFICINA 10	2,240	2,200	1,00	4,93
MONTANTE PUERTA	0,800	0,190	1,00	0,15
OFICINA 11	2,720	2,200	1,00	5,98
	2,200	2,200	1,00	4,84
MONTANTE PUERTA	0,800	0,190	1,00	0,15
OFICINA 12	2,740	2,200	1,00	6,03
	1,930	2,200	1,00	4,25
MONTANTE PUERTA	0,800	0,190	1,00	0,15
OFICINA 13 - PV-1	1,970	2,200	1,00	4,33
	0,225	2,200	2,00	0,99
	2,485	2,200	1,00	5,47
MONTANTE PUERTA	0,800	0,190	1,00	0,15
OFICINA 14 - PV-1	1,970	2,200	1,00	4,33
	0,225	2,200	2,00	0,99
	2,485	2,200	1,00	5,47
MONTANTE PUERTA	0,800	0,190	1,00	0,15
OFICINA 15	1,780	2,200	1,00	3,92
	1,890	2,200	1,00	4,16
MONTANTE PUERTA	0,800	0,190	1,00	0,15
OFICINA 16	2,695	2,200	1,00	5,93
MONTANTE PUERTA	0,800	0,190	1,00	0,15
SUBTOTAL M2 DIVISIONES				102,73
% FACTURADO EN ACTA 2			20%	20,55
% POR FACTURAR EN ACTA 3			80%	82,18

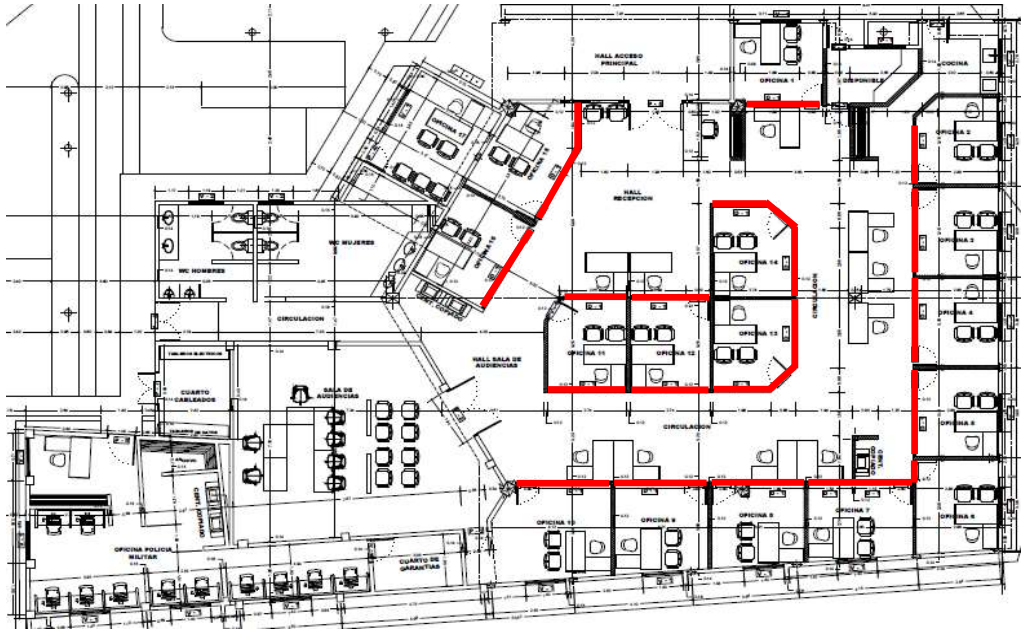


SUBTOTAL M2 DIVISIONES		102,73
% FACTURADO EN ACTA 2	20%	20,55
% POR FACTURAR EN ACTA 3	80%	82,18

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.59 Suministro e instalación de puertas en vidrio laminado 4+4, con perfileria en aluminio anodizado negro, proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva sand blasting tipo frost, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P-1	ESPACIO	Ancho	ALTURA	CANT	PARCIAL	M2
	OFICINA 1	0,80	2,20	1,00	1,76	
	OFICINA 2	0,80	2,20	1,00	1,76	
	OFICINA 3	0,80	2,20	1,00	1,76	
	OFICINA 4	0,80	2,20	1,00	1,76	
	OFICINA 5	0,80	2,20	1,00	1,76	
	OFICINA 6	0,80	2,20	1,00	1,76	
	OFICINA 7	0,80	2,20	1,00	1,76	
	OFICINA 8	0,80	2,20	1,00	1,76	
	OFICINA 9	0,80	2,20	1,00	1,76	
	OFICINA 10	0,80	2,20	1,00	1,76	
	OFICINA 11	0,80	2,20	1,00	1,76	
	OFICINA 12	0,80	2,20	1,00	1,76	
	OFICINA 13	0,80	2,20	1,00	1,76	
	OFICINA 14	0,80	2,20	1,00	1,76	
	OFICINA 15	0,80	2,20	1,00	1,76	
	OFICINA 16	0,80	2,20	1,00	1,76	
	SUBTOTAL M2 PUERTAS				28,16	
	% FACTURADO EN ACTA 2			20%	5,63	
	% POR FACTURAR EN ACTA 3			80%	22,53	

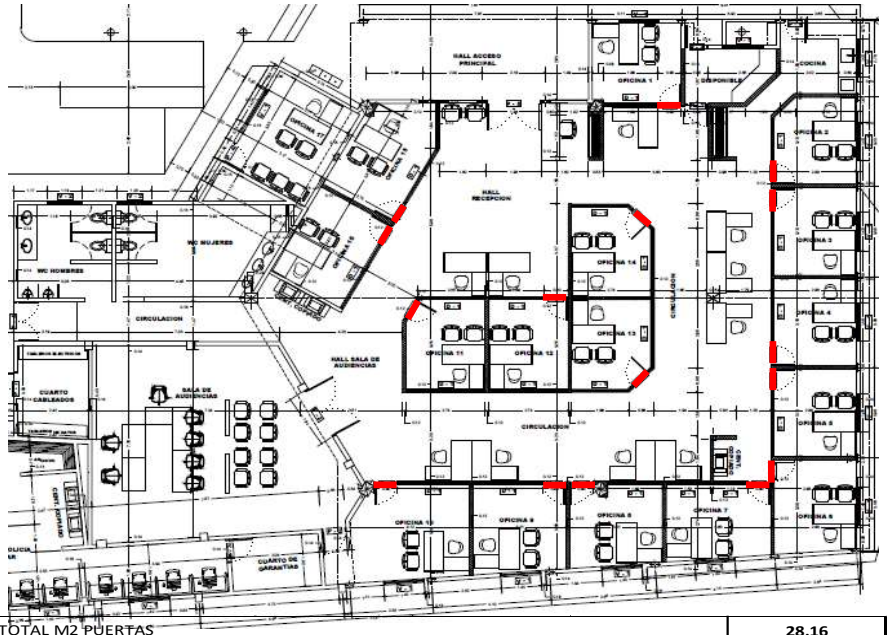


SUBTOTAL M2 PUERTAS		28,16
% FACTURADO EN ACTA 2	20%	5,63
% POR FACTURAR EN ACTA 3	80%	22,53


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.60 Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10mm, portahoja o Zócalo de Puerta Vidrio 90mm S369 en aluminio anodizado negro superior e inferior incluye pelicula autoadhesiva sand blasting tipo frost, + portacerradura para vidrio, cerrojo llave-llave tipo yale o similar + quicios de vaiven fijados a piso + manijas de 0,60cm en acero inoxidable, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. dos hojas de 0,8 x 2,10. P-5				M2
ESPACIO	Ancho	ALTURA	CANT	PARCIAL
ACCESO PRINCIPAL	1,980	2,185	1,00	4,33
SUBTOTAL M2 PUERTAS				4,33
% FACTURADO EN ACTA 2			20%	0,87
% POR FACTURAR EN ACTA 3			80%	3,46

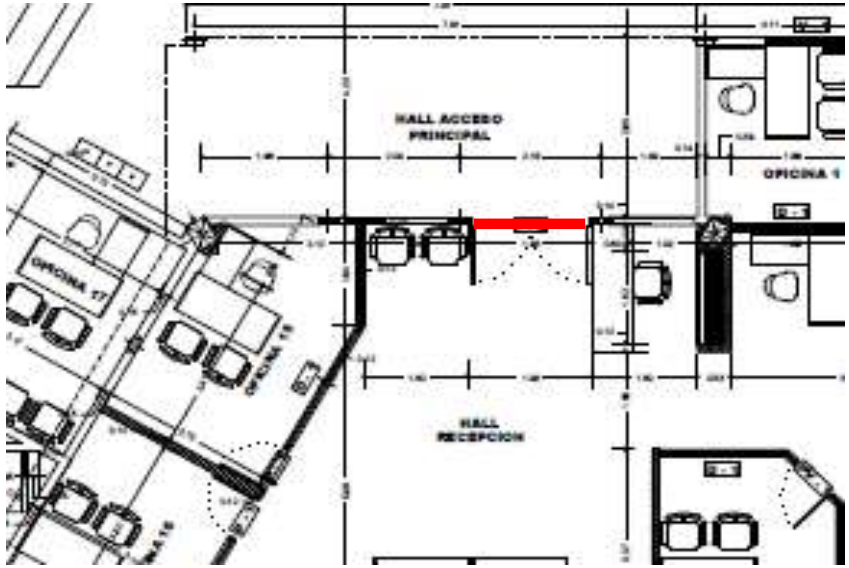

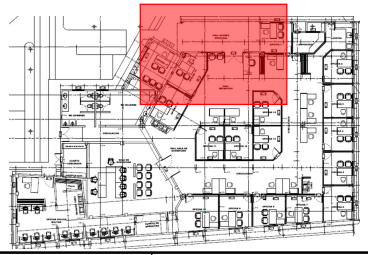

SUBTOTAL M2 PUERTAS		4,33
% FACTURADO EN ACTA 2	20%	0,87
% POR FACTURAR EN ACTA 3	80%	3,46

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	


PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.			Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2			
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES / AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03 / 2025

DESCRIPCION

1.61 Suministro e instalación poyo, en mampostería maciza tipo tolete, ancho de 15cm, y altura de 25cm, fijado al piso de concreto, mortero de pega y pañete 1:3, afinado estucado y pintado. — **M**

ESPACIO	LARGO	CANT	PARCIAL
OFICINA 1	-0,01	1,00	-0,01
TOTAL M POYOS ACTA NO. 3			-0,01

ESPACIO	LARGO	CANT	PARCIAL
OFICINA 1	2,10	1,00	2,10
OFICINA 2	1,30	1,00	1,30
OFICINA 3	2,44	1,00	2,44
OFICINA 4	2,44	1,00	2,44
OFICINA 5	2,51	1,00	2,51
OFICINA 6	0,00	0,00	0,00
OFICINA 7	2,95	1,00	2,95
OFICINA 8	3,10	1,00	3,10
OFICINA 9	2,56	1,00	2,56
OFICINA 10	2,27	1,00	2,27
OFICINA 11	1,98	1,00	1,98
	2,80	1,00	2,80
OFICINA 12	2,87	1,00	2,87
	1,98	1,00	1,98
OFICINA 13	2,05	1,00	2,05
	0,23	2,00	0,46
	2,52	1,00	2,52
OFICINA 14	2,05	1,00	2,05
	0,23	2,00	0,46
	2,52	1,00	2,52
OFICINA 15	1,80	1,00	1,80
	1,89	1,00	1,89
OFICINA 16	2,70	1,00	2,70
TOTAL M POYOS ACTA NO. 2			47,75

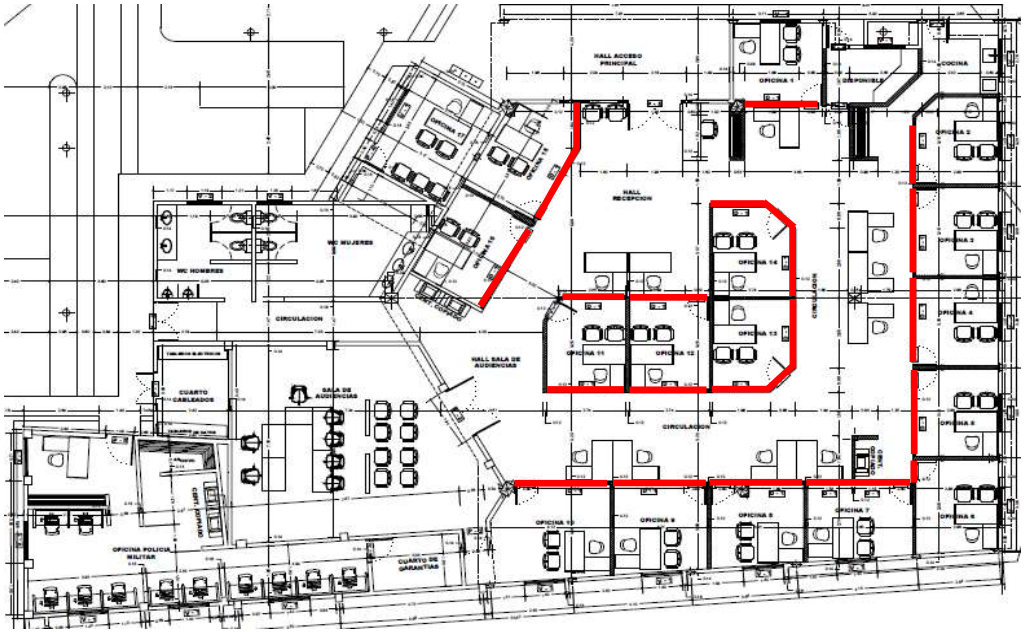


TOTAL M POYOS ACTA NO. 3	-0,01

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

M2	ESPACIO	LARGO	ANCHO - AREA	CANT	PARCIAL
1.62 Suministro e instalación de película sand blasting	Oficina 1	1,40	1,30	1,00	1,82
	Disponible	1,40	1,30	1,00	1,82
	Oficina 2	1,40	1,30	1,00	1,82
	Oficina 3	1,40	1,30	1,00	1,82
	Oficina 4	1,40	1,30	1,00	1,82
	Oficina 5	1,40	1,30	1,00	1,82
	Oficina 6	1,40	1,30	1,00	1,82
	Cocina	1,40	1,20	1,00	1,68
	Oficina 7	1,40	1,30	1,00	1,82
	Oficina 8	1,40	1,30	1,00	1,82
	Oficina 9	1,40	1,30	1,00	1,82
	Oficina 10	1,40	1,30	1,00	1,82
	Oficina 17	1,40	1,30	1,00	1,82
	Policia Judicial	1,40	1,30	5,00	9,10
	Baños Hombres	1,20	0,30	1,00	0,36
	Baños Mujeres	1,20	0,30	1,00	0,36
	TOTAL M2 PELICULA SNAD BLASTING				33,34

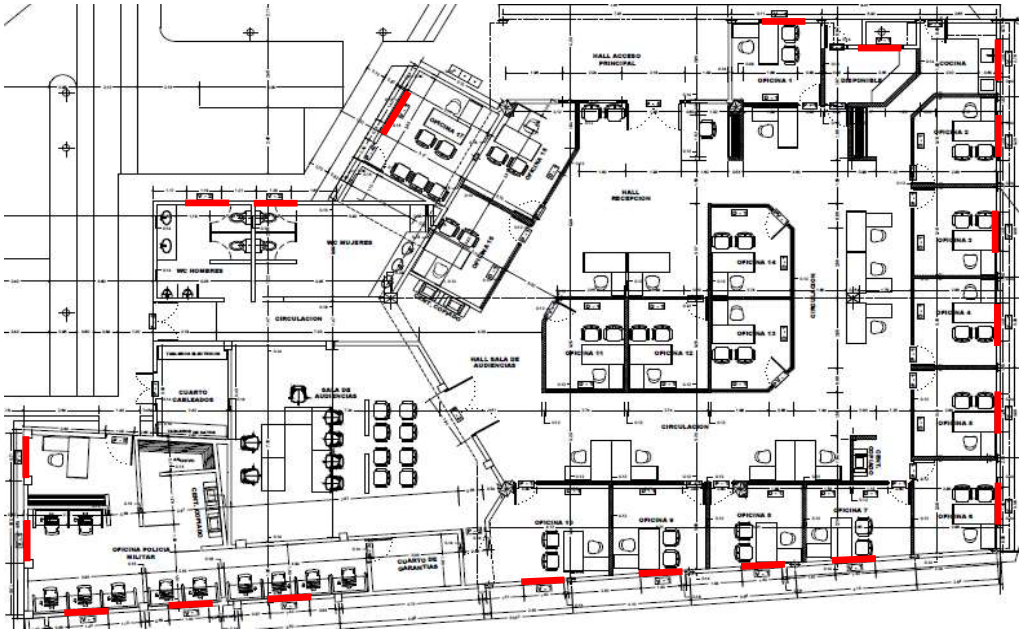


TOTAL M2 PELICULA SNAD BLASTING	33,34


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.63 Suministro e instalación de puerta en lámina de dimensiones 0,8x 2,10 m en calibre 16, con bastidor y refuerzos interiores, doble lamina, bisagras de seguridad antipalanca mínimo 4, acabado en pintura electroestatica. Incluye marco metalico empotrado a concreto + cerradura de seguridad tipo Cerrojo Seguridad 4 Pasadores 15mm Tipo Acero Ezcurra O SIMILAR + SEGUREX Kit Cerradura Entrada Principal Monticello 580 O SIMILAR. P-3				M2
ESPACIO	**Ancho**	**ALTURA**	**CANT**	**PARCIAL**
POLICIA JUDICIAL	0,90	2,20	1,00	1,98
SUBTOTAL M2 PUERTAS				1,98
% FACTURADO EN ACTA 2			20%	0,40
% POR FACTURAR EN ACTA 3			80%	1,58

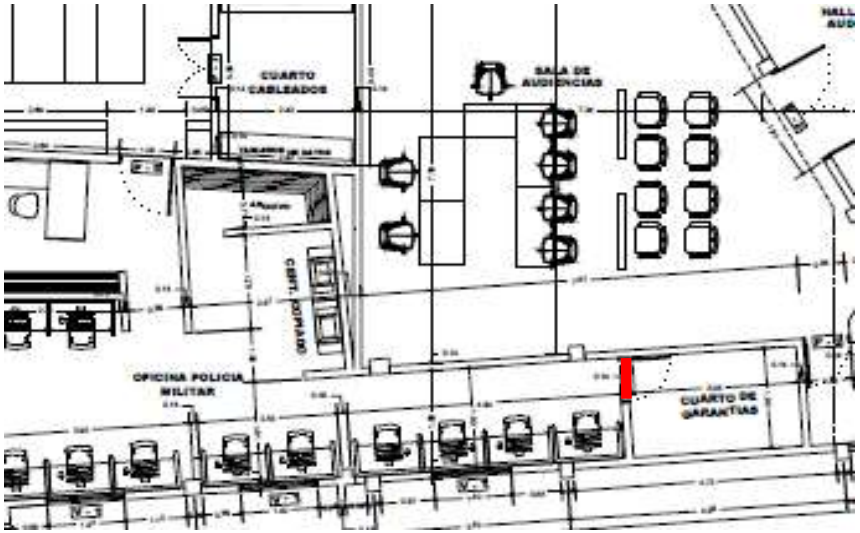




SUBTOTAL M2 PUERTAS		1,98
% FACTURADO EN ACTA 2	20%	0,40
% POR FACTURAR EN ACTA 3	80%	1,58


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.66 Suministro e instalación de puerta en lámina cal. 18, con bastidor y refuerzos interiores, doble lamina, bisagras de seguridad antipalanca minimo 4, acabado en pintura electroestatica. Incluye marco metalico empotrado a concreto + cerradura de seguridad tipo Cerrojo Seguridad 4 Pasadores 15mm Acero Ezcurra O SIMILAR + SEGUREX Kit Cerradura Entrada Principal Monticello 580 O SIMILAR P-6				UND
ESPACIO	**Ancho**	**ALTURA**	**CANT**	**PARCIAL**
POLICIA JUDICIAL	1,00	2,20	1,00	1,00
SUBTOTAL M2 PUERTAS				**1,00**
% FACTURADO EN ACTA 2			**20%**	**0,20**
% POR FACTURAR EN ACTA 3			**80%**	**0,80**

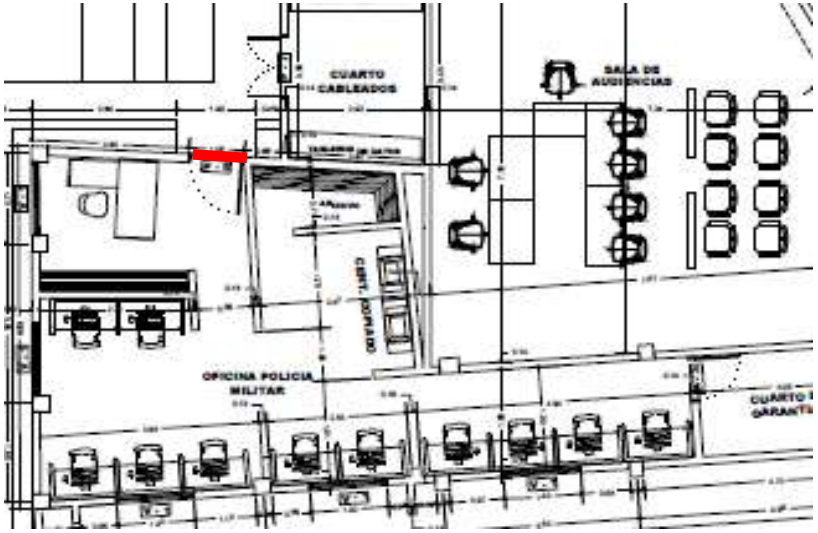



SUBTOTAL UND PUERTA		1,00
% FACTURADO EN ACTA 2	**20%**	**0,20**
% POR FACTURAR EN ACTA 3	**80%**	**0,80**


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	


PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE	003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2			
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES / AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03 / 2025

DESCRIPCION

1.67 Suministro e instalación de luminaria tipo panel led cuadrada de 60x60 cm. de 45vaf120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable eléctrico libre de halógenos, toma aérea, clavija y todo lo correcto para su correcto funcionamiento e instalación. — **UND**

ZONA	ALTURA	CANT	PARCIAL
BAÑO HOMBRES		3,00	3,00
BAÑO MUJERES		5,00	5,00
SALA AUDIENCIA		12,00	12,00
POL. JUDICIAL		17,00	17,00
OFICINA 1 al 17		34,00	34,00
HALLBAÑOS		3,00	3,00
HALL ACCESO		3,00	3,00
CIRCULACIONES		22,00	22,00
C.COPIADO		1,00	1,00
COCINA		2,00	2,00
DISPONIBLE		2,00	2,00
C. CABLEADO		2,00	2,00
CASA ADJUNTA		6,00	6,00
ZONA EXTERIOR (DISPONIBLE)		1,00	1,00
TOTAL UND LUMINARIA LED 60x60			**113,00**



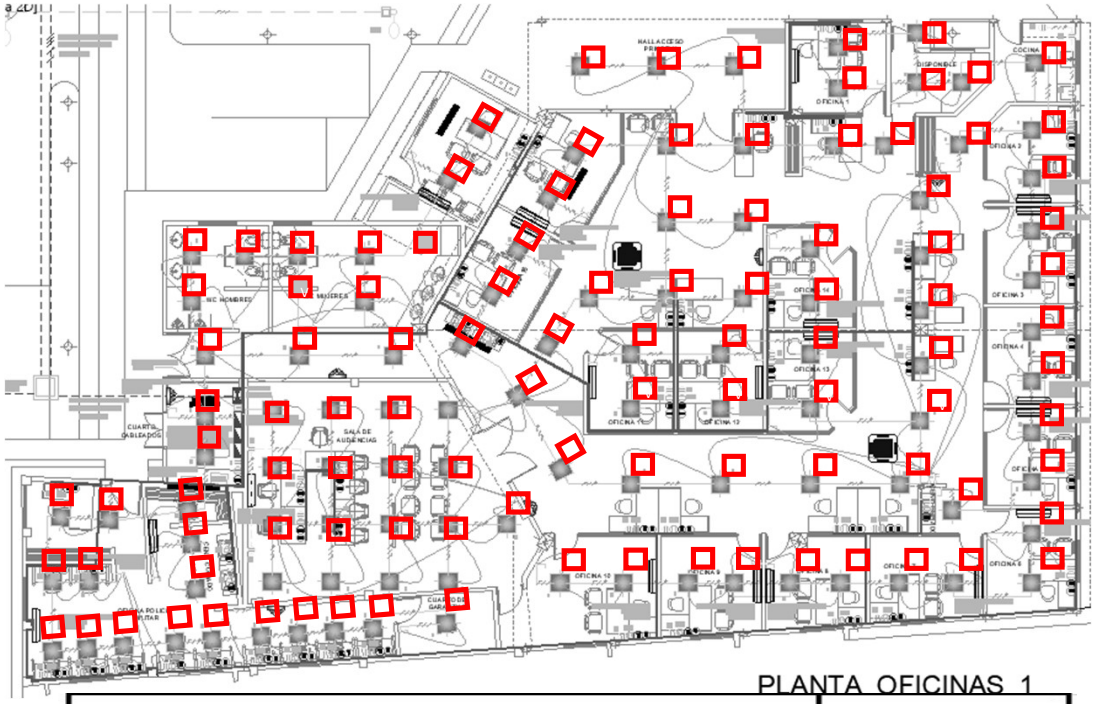

PLANTA OFICINAS 1


TOTAL UND LUMINARIA LED 60x60	113,00


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

POSTE

1.69 Suministro e instalación de acometida eléctrica en cables 3#2/0F+ 1#3/0N			M
DESCRIPCION	**LARGO**	**CANT**	**PARCIAL**
ACOMETIDA	43,00	1,00	43,00
TOTAL M ACOMETIDA			**43,00**



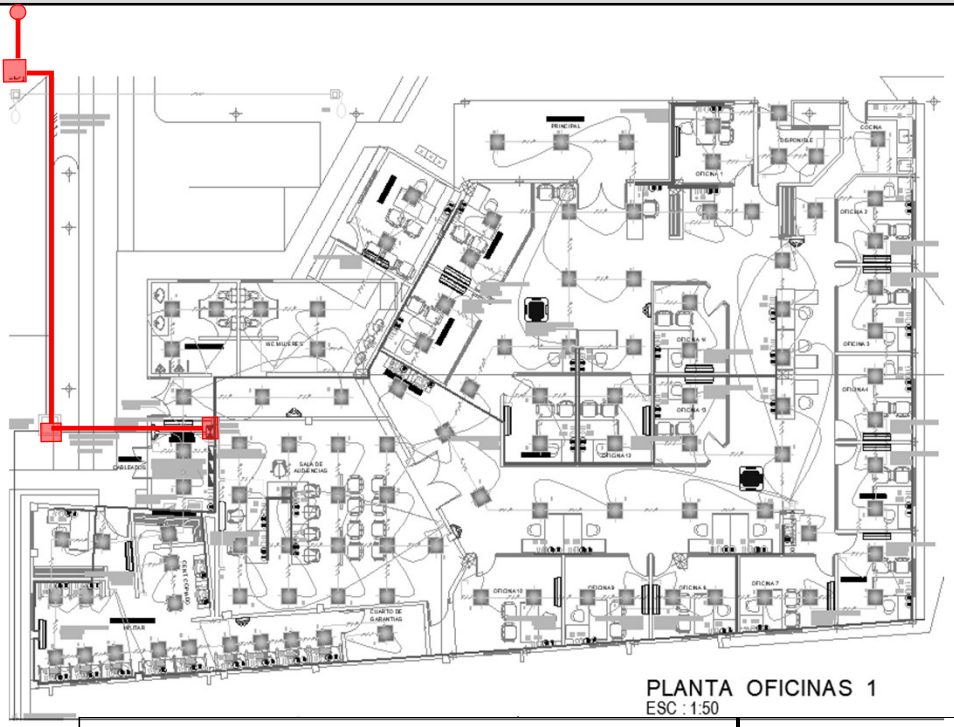


TOTAL M ACOMETIDA	43,00

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION



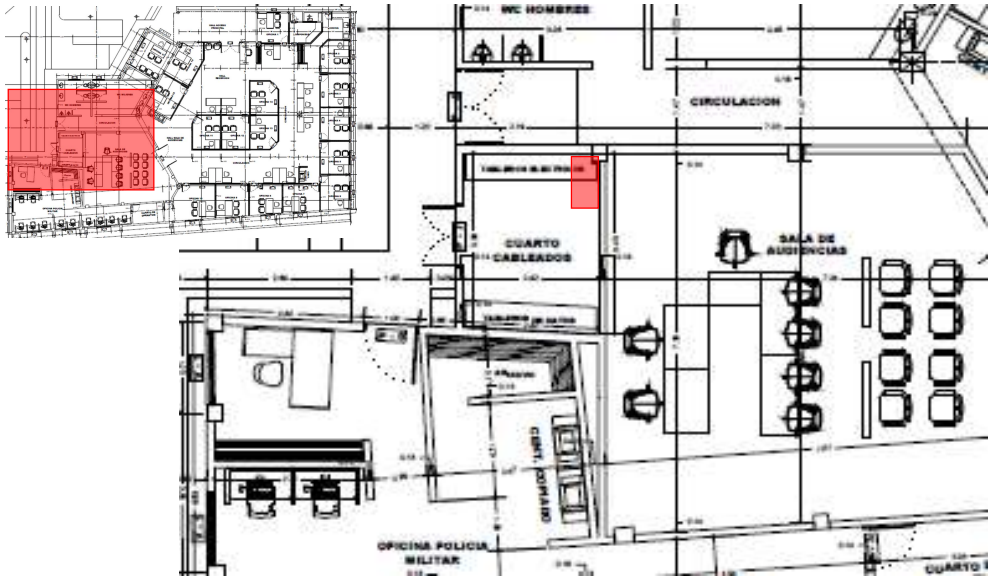

1.73 Suministro e instalación de totalizador 3x150A graduable			UND
ESPACIO	ALTURA	CANT	PARCIAL
CUARTO CABLEADO		1,00	1,00
SUBTOTAL TOTALIZADOR 3x150 A			1,00
% FACTURADO EN ACTA 2		50%	0,50
% POR FACTURAR EN ACTA 3		50%	0,50


SUBTOTAL TOTALIZADOR 3x150 A		1,00
% FACTURADO EN ACTA 2	50%	0,50
% POR FACTURAR EN ACTA 3	50%	0,50

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION



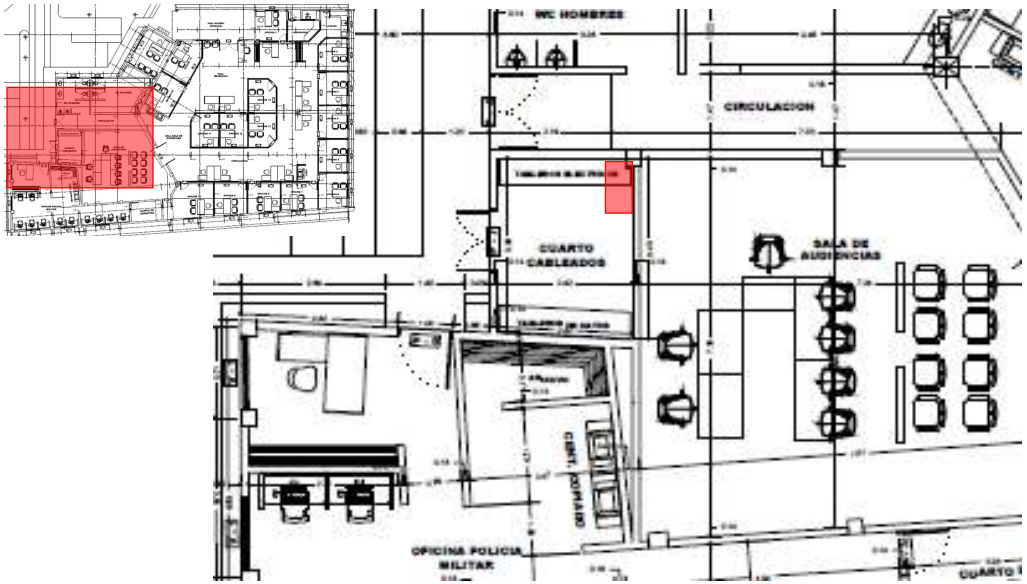

1.74 Suministro e instalación de totalizador 3x75A graduable			UND
ESPACIO	ALTURA	CANT	PARCIAL
CUARTO CABLEADO		1,00	1,00
SUBTOTAL TOTALIZADOR 3x75 A			1,00
% FACTURADO EN ACTA 2		50%	0,50
% POR FACTURAR EN ACTA 3		50%	0,50


SUBTOTAL TOTALIZADOR 3x75 A		1,00
% FACTURADO EN ACTA 2	50%	0,50
% POR FACTURAR EN ACTA 3	50%	0,50

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION



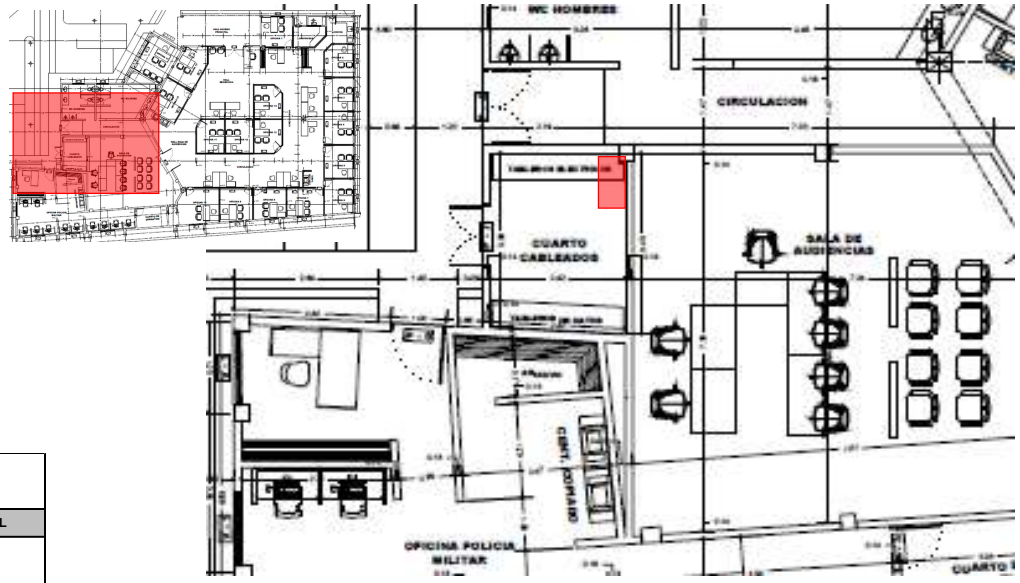

1.75 Suministro e instalación de totalizador 3x50A fijo			UND
ESPACIO	ALTURA	CANT	PARCIAL
CUARTO CABLEADO		1,00	1,00
SUBTOTAL TOTALIZADOR 3x50 A			1,00
% FACTURADO EN ACTA 2		50%	0,50
% POR FACTURAR EN ACTA 3		50%	0,50


SUBTOTAL TOTALIZADOR 3x50 A		1,00
% FACTURADO EN ACTA 2	50%	0,50
% POR FACTURAR EN ACTA 3	50%	0,50

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION



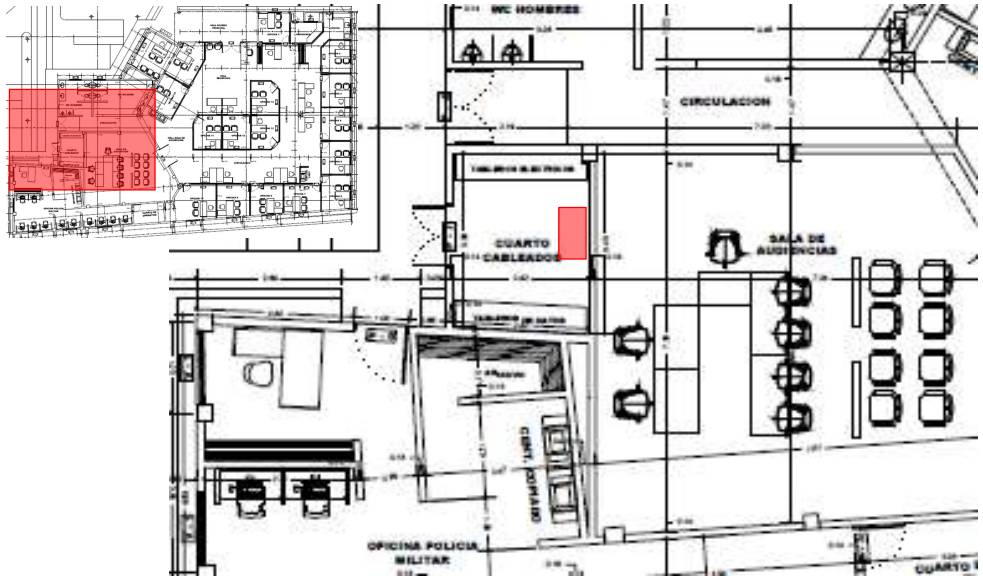

1.76 Suministro e instalación de llave de bypass tetrapolar de mínimo 160A			UND
ESPACIO	ALTURA	CANT	PARCIAL
CUARTO CABLEADO		1,00	1,00
SUBTOTAL LLAVE BYPASS			1,00
% FACTURADO EN ACTA 2		50%	0,50
% POR FACTURAR EN ACTA 3		50%	0,50


SUBTOTAL LLAVE BYPASS		1,00
% FACTURADO EN ACTA 2	50%	0,50
% POR FACTURAR EN ACTA 3	50%	0,50

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION



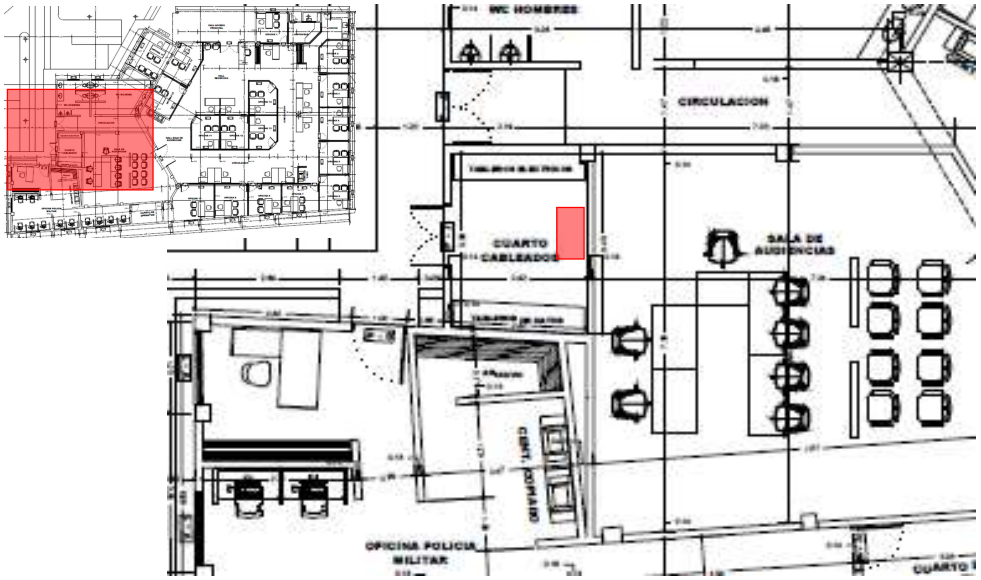

1.77 Suministro e instalación de DPS mínimo de clase II (20/40kA)			UND
ESPACIO	ALTURA	CANT	PARCIAL
CUARTO CABLEADO		1,00	1,00
SUBTOTAL DPS (20/40kA)			1,00
% FACTURADO EN ACTA 2		50%	0,50
% POR FACTURAR EN ACTA 3		50%	0,50


SUBTOTAL DPS (20/40kA)		1,00
% FACTURADO EN ACTA 2	50%	0,50
% POR FACTURAR EN ACTA 3	50%	0,50


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.78 Suministro e instalación de tablero eléctrico de 18 circuitos sin espacio para totalizador			UND
ESPACIO	**ALTURA**	**CANT**	**PARCIAL**
CUARTO CABLEADO		1,00	1,00
TOTAL TABLERO 18 CIRCUITOS			**1,00**



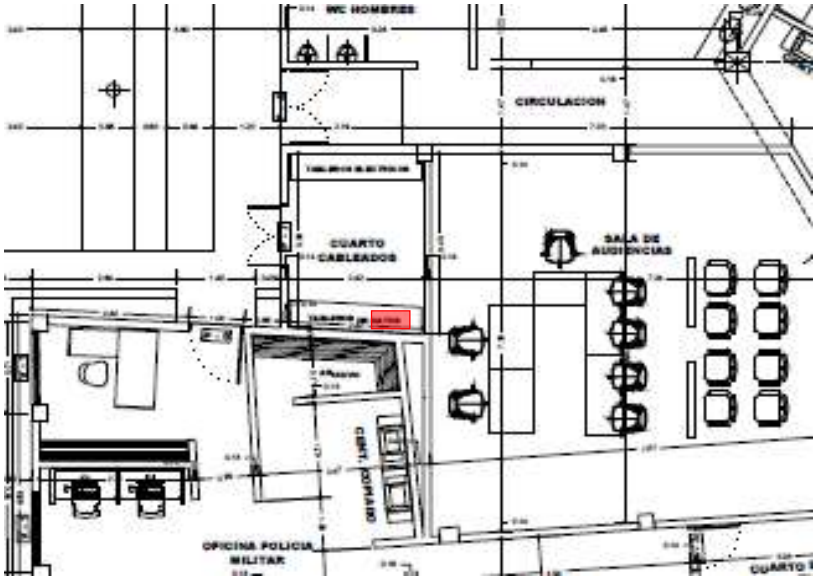

TOTAL TABLERO 18 CIRCUITOS	**1,00**


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	


PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE	003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2			
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES / AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03 / 2025

DESCRIPCION

1.80 Suministro e instalación de salida eléctrica bifásica L5-20 208V/220V para equipo de aire acondicionado — UND

ESPACIO	LARGO	CANT	PARCIAL
OFICINA 6		1,00	1,00
OFICINA 11		1,00	1,00
OFICINA 15		1,00	1,00
OFICINA 16		1,00	1,00
OFICINA 17		1,00	1,00
SALA AUDIENCIA		1,00	1,00
POLICIA JUDICIAL		1,00	1,00
C, CABLEADO		1,00	1,00
CIRCULACIONES		2,00	2,00
CASA ADJUNTA		1,00	1,00
TOTAL SALIDA ELECT BIFASICA			**11,00**



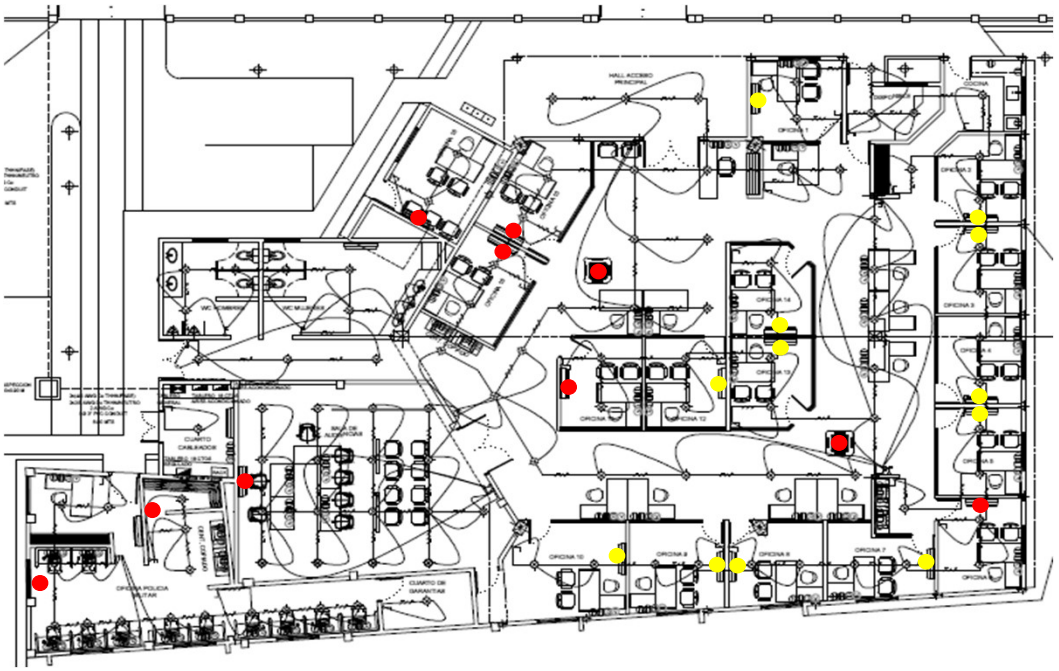


TOTAL SALIDA ELECT BIFASICA	**11,00**


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.81 Sistema de puesta a tierra compuesto por tres (3) varillas de cobre de 2,4m cooperwell Cu/Fe, cable de cobre #2AWG y conectores con cumplimiento RETIE. Incluye alistamiento del terreno con gel y bentonita.			UND
ESPACIO	**ALTURA**	**CANT**	**PARCIAL**
CUARTO CABLEADO		1,00	1,00
SUBTOTAL SISTEMA TIERRA			**1,00**
% FACTURADO EN ACTA 2		**50%**	**0,50**
% POR FACTURAR EN ACTA 3		**50%**	**0,50**



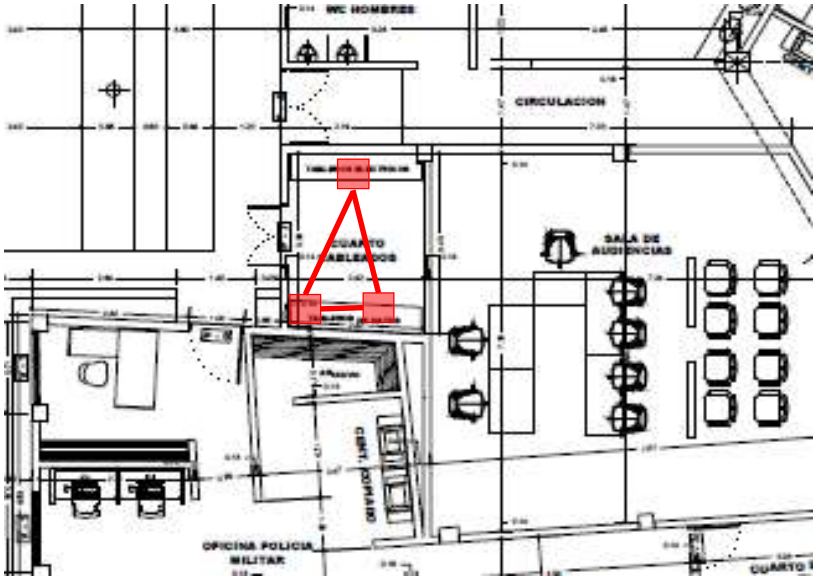


SUBTOTAL SISTEMA TIERRA		1,00
% FACTURADO EN ACTA 2	**50%**	**0,50**
% POR FACTURAR EN ACTA 3	**50%**	**0,50**

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

1.85 Aseo fino de obra - retoque de áreas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)		GLB
DESCRIPCION	**CANT**	**PARCIAL**
ASEO INICIAL DE OBRA	1,00	1,00
TOTAL ASEO FINO DE OBRA		**1,00**

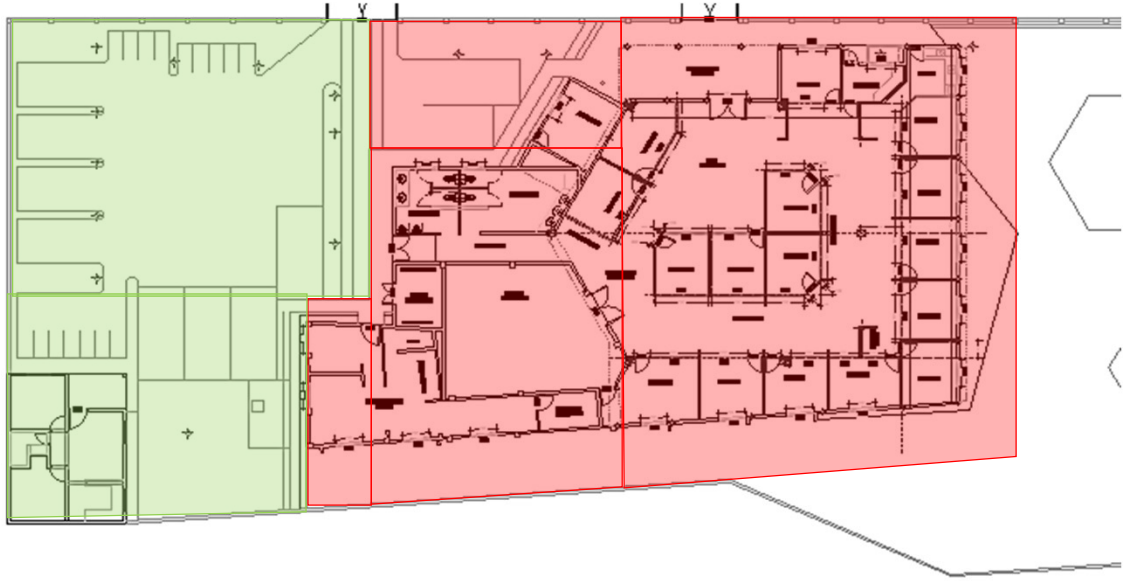


TOTAL ASEO FINO DE OBRA	1,00

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP04 Excavación, para vigas de cimentación de hasta 0,60mts de profundidad.					
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	PARCIAL	M3
RED HIDRAULICA	38,50	0,25	0,25	2,41	TOTAL M3 EXCAVACIONES
RED SANITARIA	7,50	0,25	0,30	0,56	
				2,96	

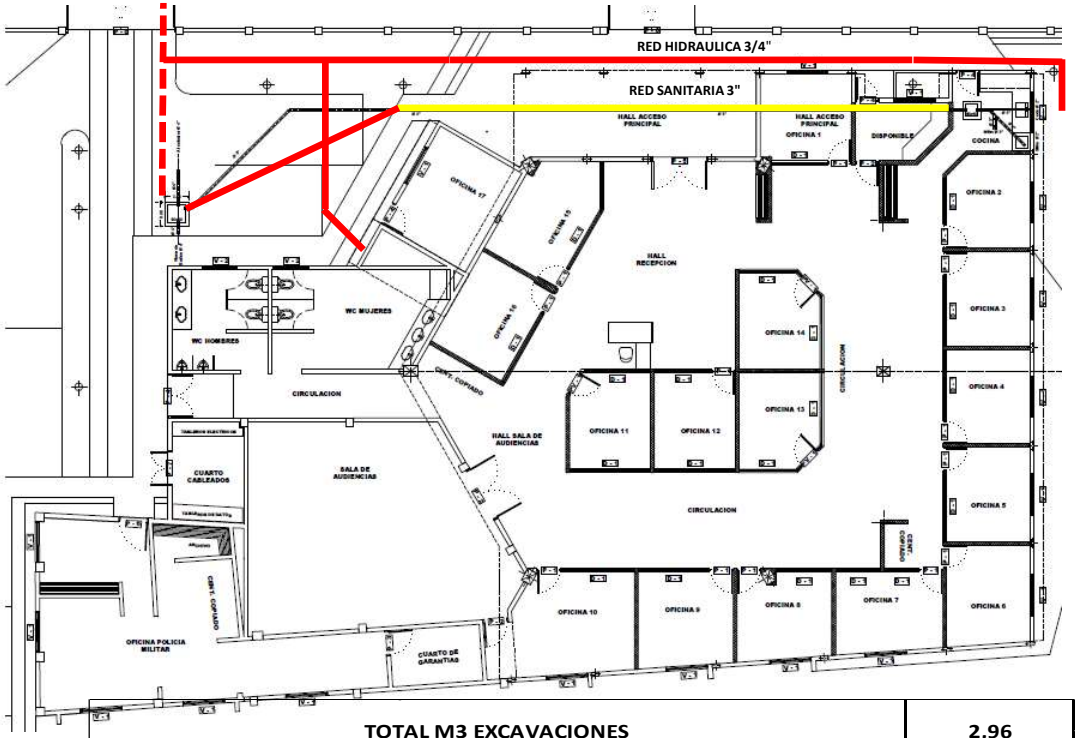

TOTAL M3 EXCAVACIONES	2,96


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP 06 Viga de cimentacion en concreto 3000psi 0,30 x 0,30m + refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales horizontales + flejes #2@15cm, Incluye formaleta y todo lo necesario para su ejecución.				M3
ESPACIO - TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTURA	PARCIAL
TRAMO A	0,02	0,30	0,30	0,00
TOTAL VIGA DE CIMENT. ACTA NO. 3				0,00

ESPACIO - TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTURA	PARCIAL
TRAMO A	3,15	0,30	0,30	0,28
TRAMO B	7,50	0,30	0,30	0,68
TRAMO C	3,15	0,30	0,30	0,28
TRAMO D	17,10	0,30	0,30	1,54
TRAMO E	1,10	0,30	0,30	0,10
TRAMO F	3,00	0,30	0,30	0,27
TRAMO G	1,10	0,30	0,30	0,10
TRAMO H	19,60	0,30	0,30	1,76
TRAMO I	7,40	0,30	0,30	0,67
TOTAL VIGA DE CIMENT. ACTA NO. 2				5,68

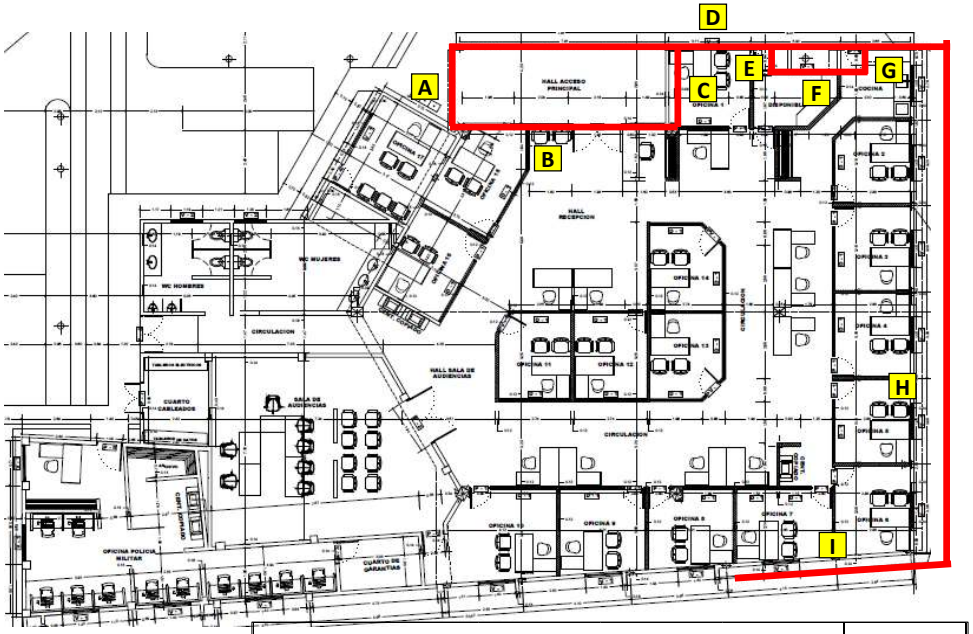

TOTAL VIGA DE CIMENT. ACTA NO. 2	5,68
TOTAL VIGA DE CIMENT. ACTA NO. 3	0,00
TOTAL VIGA DE CIMENTACIÓN	5,68


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP 07 Pañete de muros en mampostería 1:3, incluye filos y dilataciones lineales				M2
ESPACIO - TRAMO	LARGO	ALTURA	DCTO	PARCIAL
A. RECEPCION POLICIA JUD.	0,01	0,40	0,00	0,00
TOTAL PAÑETE ACTA NO. 3				0,00

ESPACIO - TRAMO	LARGO	ALTURA	DCTO	PARCIAL
A. RECEPCION POLICIA JUD.	2,36	0,40	0,00	0,94
B. CUARTO GARANTIAS	1,85	2,85	0,00	5,27
	6,20	2,55	0,00	15,81
	1,87	2,85	-1,98	3,35
D. POLICIA JUDICIAL	9,05	2,55	-1,82	21,26
E. WC HOMBRES	12,20	2,00	0,00	24,40
F. WC DAMAS	19,41	2,00	0,00	38,82
G. OFICINA 17	9,46	2,90	-3,58	23,85
	6,13	3,33	0,30	20,68
	0,63	3,75	0,00	2,36
TOTAL PAÑETE ACTA NO. 2				156,75

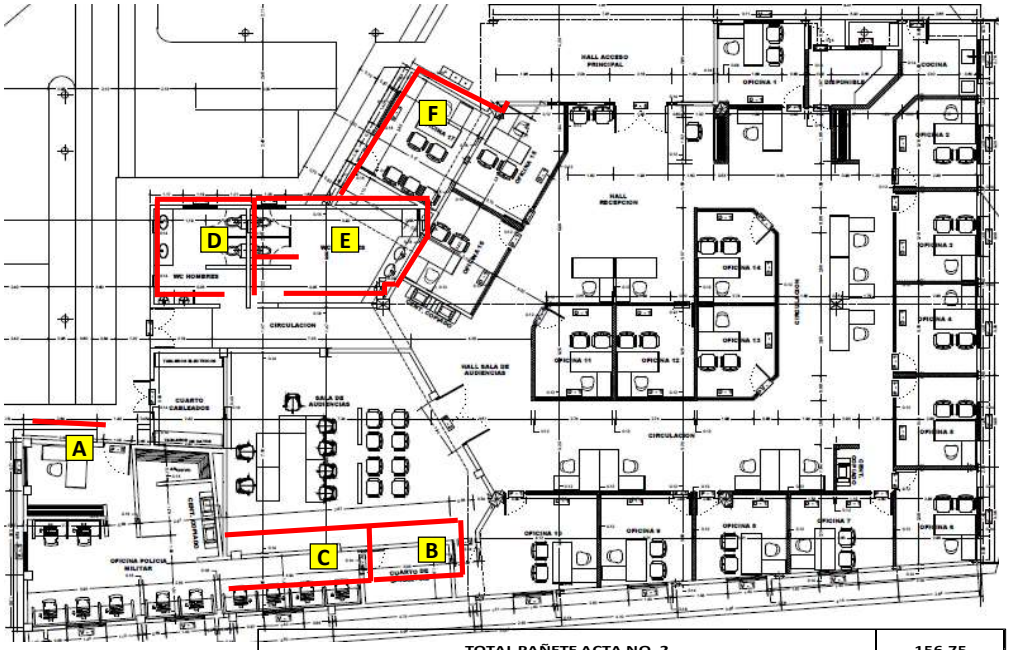

TOTAL PAÑETE ACTA NO. 2	156,75
TOTAL PAÑETE ACTA NO. 3	0,00
AREA TOTAL DE PAÑETE	156,75


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP.08 Placa en concreto de contrapiso con espesor promedio de 0,09m de 2500 psi, incluye malla electrosoldada 4mm 15 x 15.					M2
ESPACIO - TRAMO		LARGO	ANCHO - AREA	CANT	PARCIAL
C1 a C5. OFICINAS Y CIRCULACIONES	C1	-6,12		1,00	-6,12
TOTAL M2 PLACA DE CONCRETO 0.09 M ACTA NO. 3					-6,12

ESPACIO - TRAMO		LARGO	ANCHO - AREA	CANT	PARCIAL
A. CUARTO CABLEADO		3,37	2,42	1,00	8,16
B. CUARTO GARANTIAS		7,65	1,88	1,00	14,34
C1 a C5. OFICINAS Y CIRCULACIONES	C1	12,94		2,00	25,87
	C1	13,99	13,75	1,00	192,36
	C2	19,25	2,91	1,00	56,02
	C3	6,24	2,93	1,00	18,28
	C4	17,26	3,02	1,00	52,04
		1,90	1,00	1,00	1,90
DCTO JARDINERA		-2,00	0,94	1,00	-1,88
DCTO ITEM 1.19		-15,25		1,00	-15,25
TOTAL M2 PLACA DE CONCRETO 0.09 M ACTA NO. 2					351,84

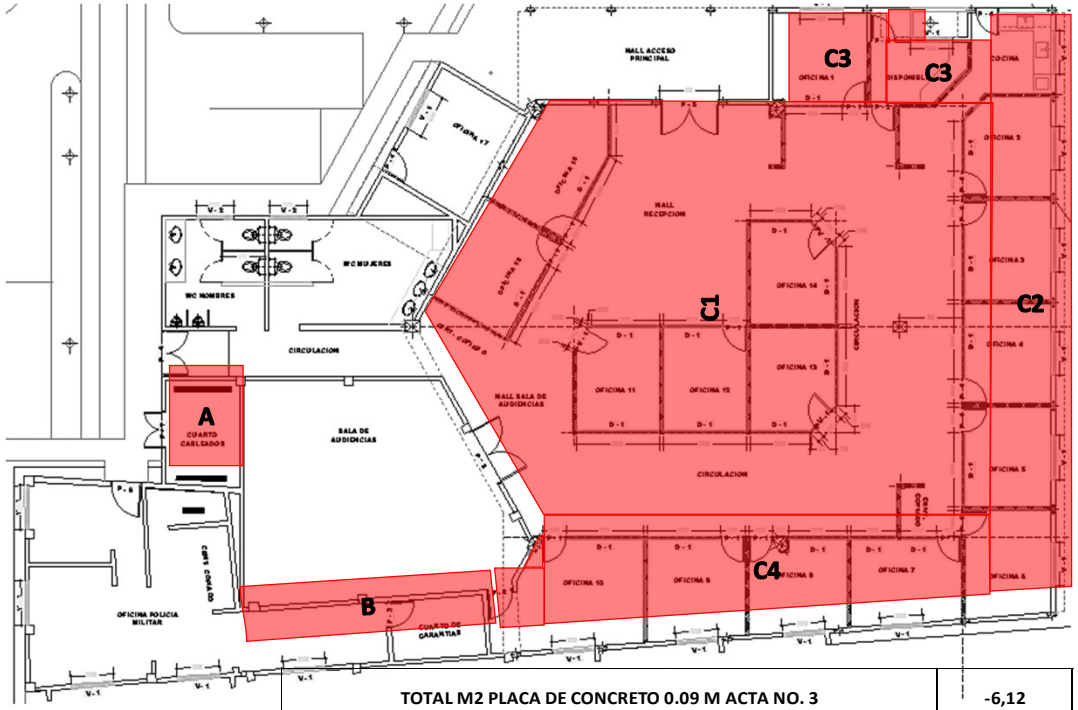


TOTAL M2 PLACA DE CONCRETO 0.09 M ACTA NO. 3	-6,12

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

M2		PARCIAL	12,20	9,23	11,80	7,15			40,38
NP.09 Instalación de alistado de piso en morterio 1:3, H 4cm	ESPACIO - TRAMO	CANT	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TOTAL M2 ALISTADO PISO CORTE NO. 3
		ANCHO - AREA	3,17	1,13	3,58	3,10	3,10	4,81	
		LARGO	3,85	8,20	3,30	2,31	14,09	12,30	
	G. OFICINA 17			H. HALL DE ACCESO		I. OFICINAS 2 A 6		J. OFICINAS 7 A 10	

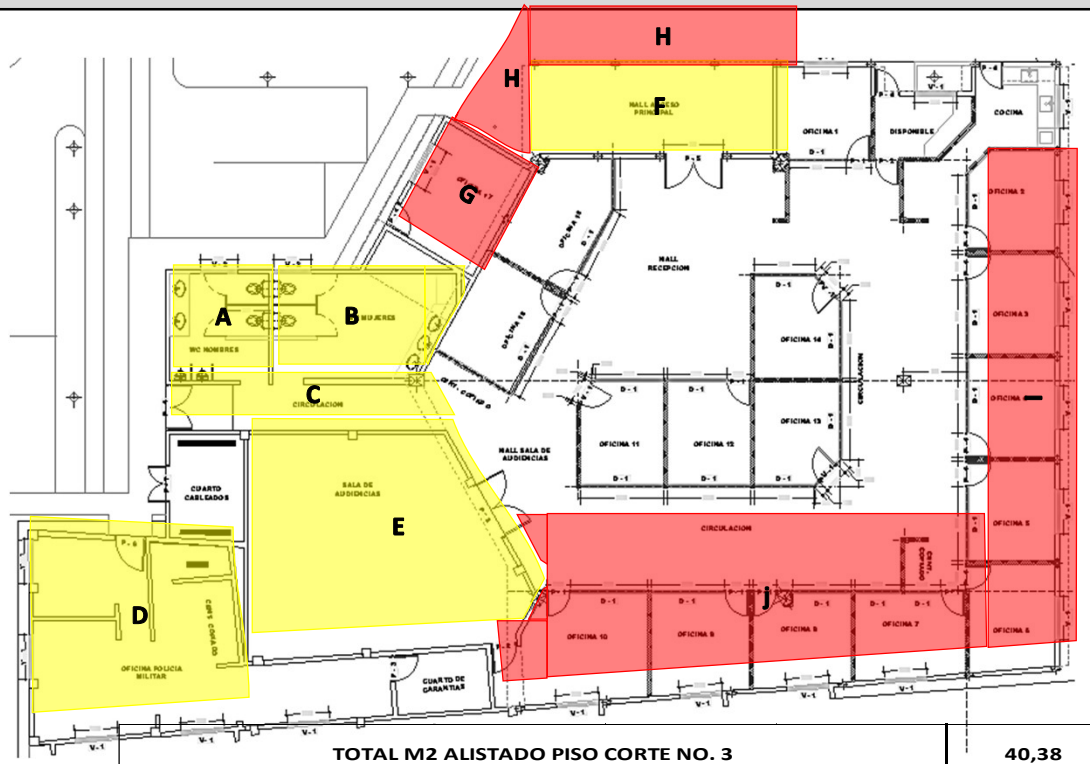

TOTAL M2 ALISTADO PISO CORTE NO. 3	40,38


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP.09 Instalación de alistado de piso en morterio 1:3, H 4cm				M2
ESPACIO - TRAMO	LARGO	ANCHO - AREA	CANT	PARCIAL
F. HALL ACCESO	0,00	3,13	1,00	0,00
TOTAL M2 ALISTADO PISO CORTE NO. 3				-0,003

ESPACIO - TRAMO	LARGO	ANCHO - AREA	CANT	PARCIAL
A. WC HOMBRES	3,40	3,26	1,00	11,08
B. WC DAMAS	5,59	3,30	1,00	18,45
C. CIRCULACION BAÑOS	8,80	1,51	1,00	13,24
D. POLICIA JUDICIAL	6,65	6,15	1,00	40,83
E. SALA AUDIENCIA	56,63		1,00	56,63
F. HALL ACCESO	7,80	3,13	1,00	24,41
G. OFICINA 17	3,85	3,17	0,00	0,00
TOTAL M2 ALISTADO PISO CORTE NO. 2				164,65

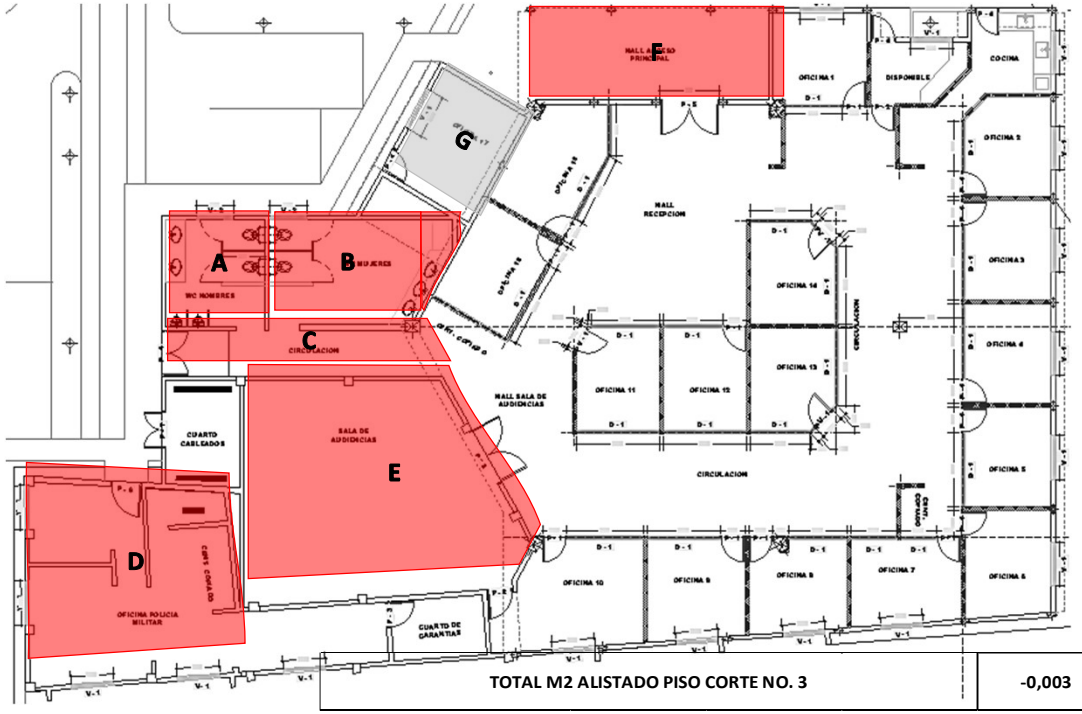


TOTAL M2 ALISTADO PISO CORTE NO. 3	-0,003

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP10 Suministro e instalacion de puerta metalica collrold de color negro calibre 22 en celosia, con chapa de seguridad challenguer y marco metalico. P-7			M2
ESPACIO	LARGO	ALTURA	PARCIAL
A. CUARTO CABLEADO	1,20	2,20	2,64
VALOR A CANCELAR		20%	0,53
% FACTURADO EN ACTA 2		20%	0,53
% POR FACTURAR EN ACTA 3		80%	2,11

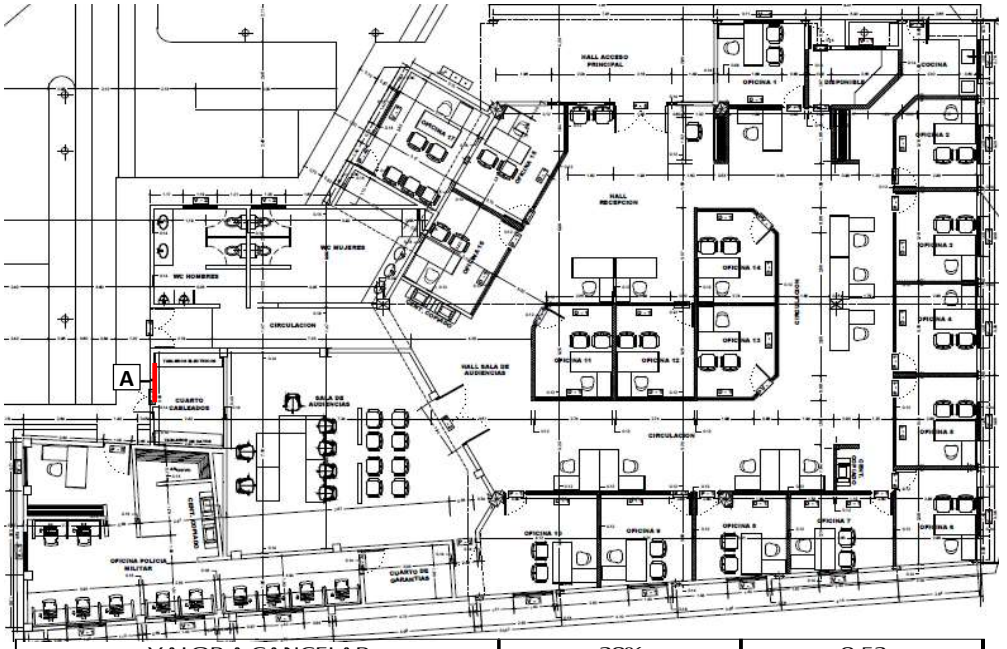

VALOR A CANCELAR	20%	0,53
% FACTURADO EN ACTA 2	20%	0,53
% POR FACTURAR EN ACTA 3	80%	2,11


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	


PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE	003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2			
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES / AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03 / 2025

DESCRIPCION

NP.15 Suministro e instalación de punto y salida de interruptor sencillo (Incluye aparato (interruptor sencillo), tuberia PVC SCH40 tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado #12 libre de halógeno, caja plastica 5800, terminales de derivación) y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.			UND
ESPACIO	**LARGO**	**CANT**	**PARCIAL**
OFICINAS 15 - 16		2,00	2,00
FRENTE OFIC 2 - 3 - 4 - 6		4,00	4,00
CASA ADJUNTA		4,00	4,00
TOTAL INTERRUP SENCILLO			**10,00**

TOTAL INTERRUP SENCILLO ACTA NO. 2	21,00
TOTAL INTERRUP SENCILLO ACTA NO. 3	10,00
TOTAL INTERRUP SENCILLO INSTALADO	31,00



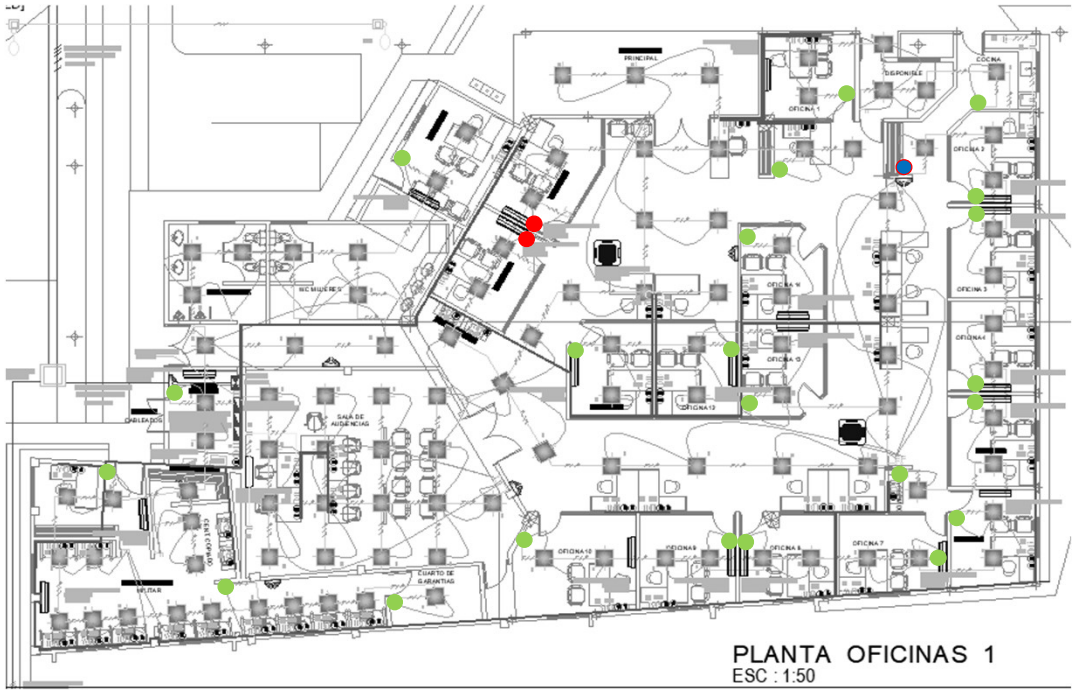


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	


PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP.16 Suministro e instalación de punto y salida de tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, (Incluye aparato (tomacorriente GFCI), tuberia PVC SCH40 tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado #12 libre de halógeno, caja plastica 5800, terminales de derivación) y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. — **UND**

ESPACIO	LARGO	CANT	PARCIAL
HALL COCINA		2,00	2,00
BAÑO HOMBRES		1,00	1,00
BAÑO MUJERES		1,00	1,00
CASA ADJUNTA		1,00	1,00
TOTAL TOMAS DOBLES GFCI			**5,00**



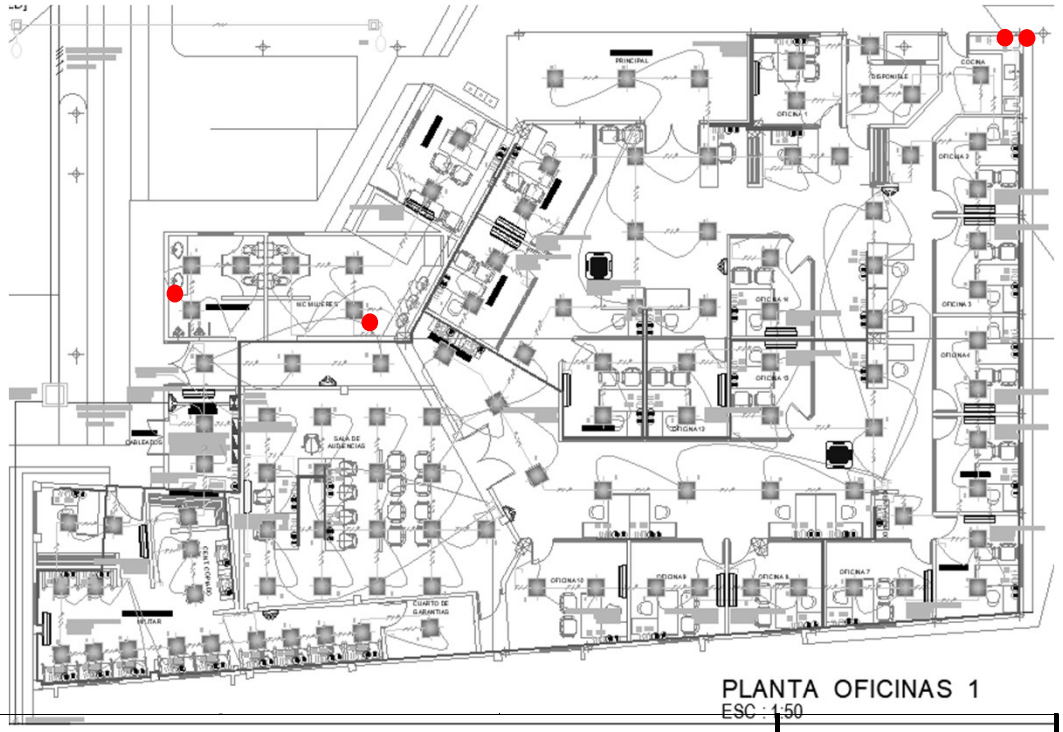

PLANTA OFICINAS 1
ESC : 1:50

TOTAL TOMAS DOBLES GFCI	5,00

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION


NP.17 Suministro e instalación de acometida electrica en conductores de cobre aislado 1x (No. 12 fase) + 1x (No.12 neutro) + 1x (No. 12 tierra) por tuberia PVC SCH40 tipo pesado 3/4". Incluye accesorios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	M

RED ELÉCTRICA GENERAL / ACOMETIDA PARA TOMACORRIENTES DE AIREA ACONDICIONADO

CIRCUITO	UBICACION	DISTANCIA
1,3 y 2,4 tablero No 1	Oficina No 2,3	45,4
5,7 y 6, 8 tablero No 1	Oficina No 4,5	38
9,11 y 10,12 tablero No 1	Oficina No6,7	38,2
13,15 y 14, 16 tablero No 1	Oficina No 8 y 9	29,22
17,19 tablero No 1	Oficina No 10	22,25
18,20 tablero No 1	Oficina No 1	24,8
2,4 tablero No 2	Oficina No 11	18,3
1,3 tablero No 2	Oficina No 12	9,2
21,23 y 22,24 tablero No 1	Oficina No 13 y 14	26,1
5,7 y 6,8 tablero No 2	Oficina No 15 y 16	25,5
9,11 tablero No 2	Oficina No 17	19,3
10, 12 tablero No 2	frente a oficina 7	24,4
13,15 tablero No 2	Entrada principal	13,85
17, 19 tablero No 2	Ofi policía militar	15,3
18,20 tablero No 2	Cuarto de rack	6,9
2,4 tablero bifásico	Oficina planta 2	0,8
Tomas GFCI	Cafetería (2)	23,95
Tomas GFCI	Baños (2)	17,6
Tomas GFCI	Oficina planta 2	0,5
TOTAL M ACOMETIDA TOMAS		399,57

RED ELÉCTRICA GENERAL / ACOMETIDA PARA LUMINARIAS

CIRCUITO	UBICACION	DISTANCIA
No 1	Acceso Hall	85,6
No 2	Pasillo / oficina 11 y 12 - 13 y 14	97,35
No 3	Oficina 1 - 2 - 3 - 4 - 5	114,25
No 4	Oficina Policia judicial	68,98
No 5	Hall de Baños	68,3
No 6	Audiencias	69,4
No 7	Oficina aledaña	35,5
TOTAL M ACOMETIDA LUMINARIAS		539,38

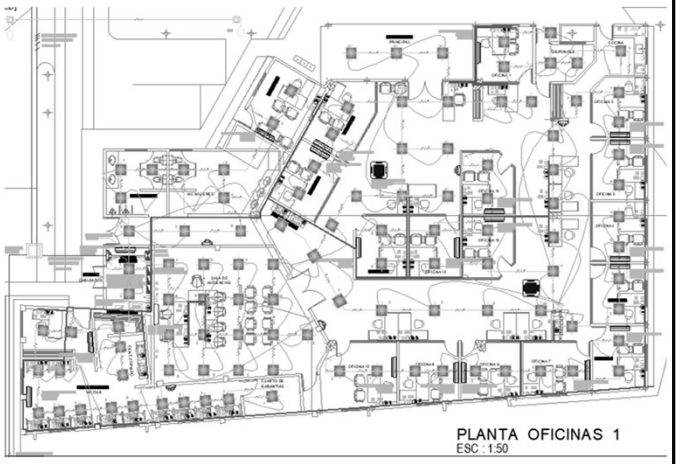


TOTAL M ACOMETIDA INST (TOMAS + LUMIN)	938,95	100%
CORTE NO. 2	265,00	28%
CORTE NO. 3 (PRESENTE ACTA)	673,95	72%
VALOR / PORCENTAJE TOTAL FACTURADO	938,95	100%

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP 18 Suministro e instalación de tablero tipo cofre de dimensiones mínimas 90cm x 80cm x 40cm con barrajes de cobre de 250A			UND
ESPACIO	ALTURA	CANT	PARCIAL
CUARTO CABLEADO		1,00	1,00
SUBTOTAL TABLERO TIPO COFRE			1,00
% FACTURADO EN ACTA 2		50%	0,50
% POR FACTURAR EN ACTA 3		50%	0,50

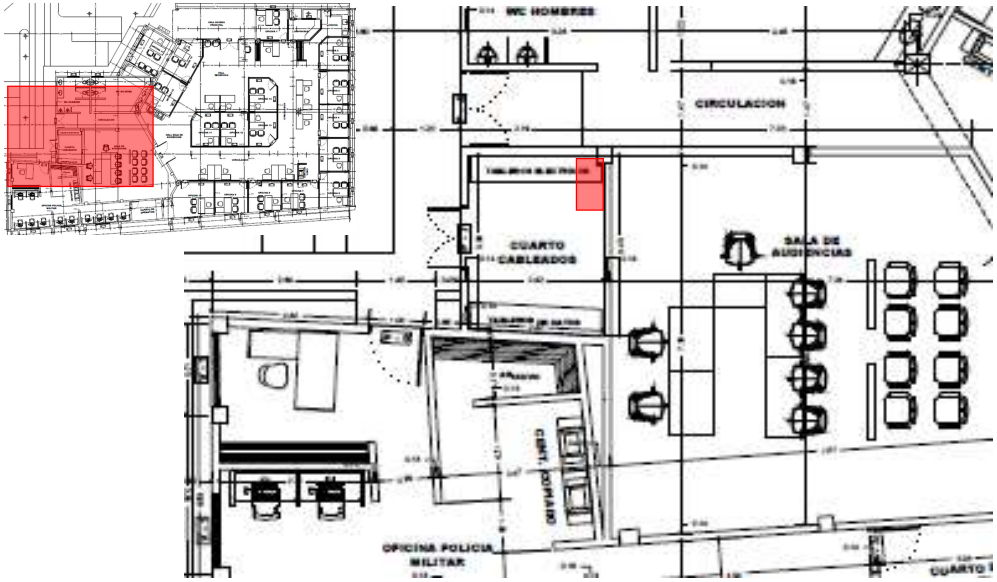


SUBTOTAL TABLERO TIPO COFRE		1,00
% FACTURADO EN ACTA 2	50%	0,50
% POR FACTURAR EN ACTA 3	50%	0,50


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	


PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP 19 Suministro e instalación de Breaker monopolar 1 x 20 amp			UND
ESPACIO	**ALTURA**	**CANT**	**PARCIAL**
CUARTO CABLEADO		16,00	16,00
OFICINA ADJUNTA		2,00	2,00
SUBTOTAL BREAKER 2x20Amp			**18,00**
FACTURADO EN ACTA 2			**8,00**
A FACTURAR EN EL PRESENTE CORTE			**10,00**

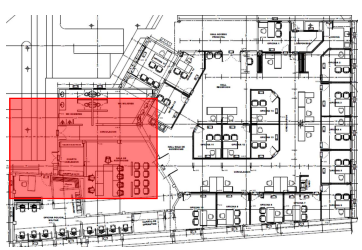



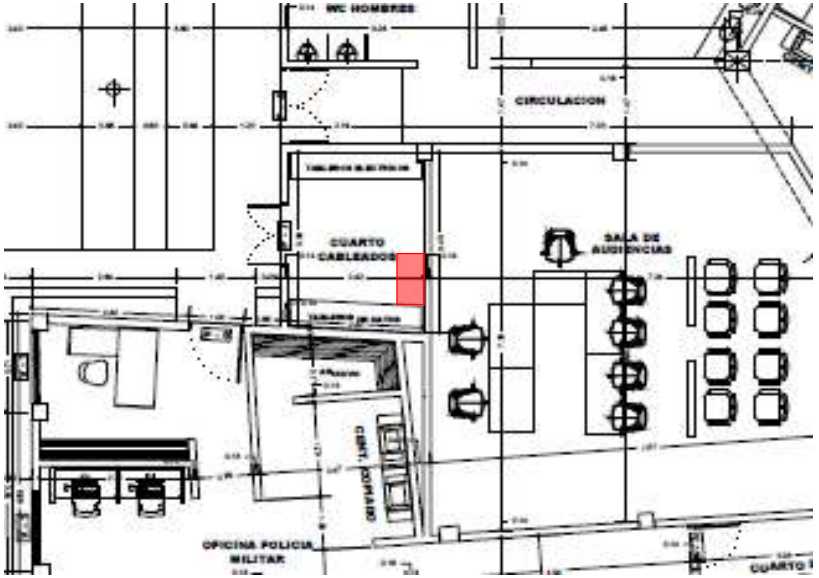


SUBTOTAL BREAKER 2x20Amp	**18,00**
FACTURADO EN ACTA 2	**8,00**
A FACTURAR EN EL PRESENTE CORTE	**10,00**


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	


PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP 20 Suministro e instalación de Breaker bipolar 2 x 20 amp		UND
ESPACIO	**CANT**	**PARCIAL**
CUARTO CABLEADO	22,00	22,00
OFICINA ADJUNTA	1,00	1,00
SUBTOTAL BREAKER 2x20Amp		**23,00**
FACTURADO EN ACTA 2		**11,00**
A FACTURAR EN EL PRESENTE CORTE		**12,00**





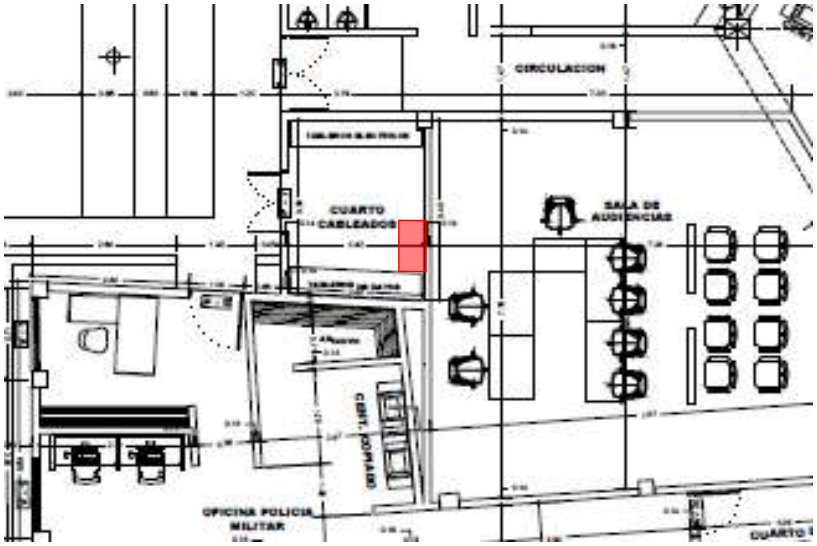

SUBTOTAL BREAKER 2x20Amp	**23,00**
FACTURADO EN ACTA 2	**11,00**
A FACTURAR EN EL PRESENTE CORTE	**12,00**


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP 22 Suministro e instalación de Poste De Concreto Pretensado 12 Metros 1050 Kg			GLB
ESPACIO	ALTURA	CANT	PARCIAL
ANDEN		1,00	1,00
TOTAL INST POSTE CONCRETO 1050 Kg			1,00



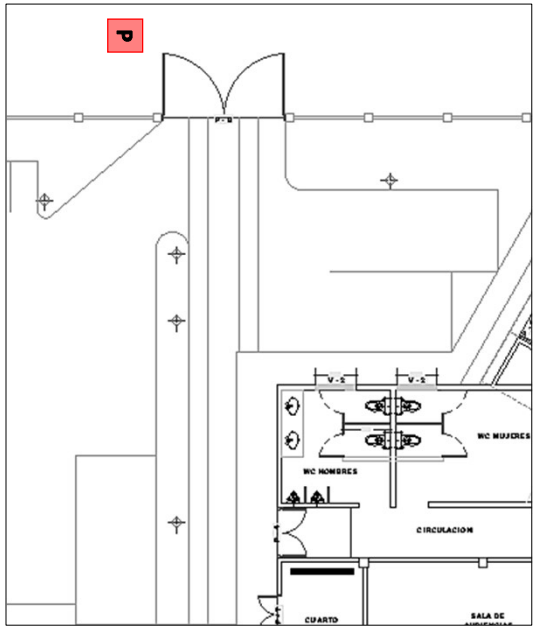

TOTAL INST POSTE CONCRETO 1050 Kg	1,00


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE	003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2			
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES / AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03 / 2025

DESCRIPCION

NP 23 Suministro e instalación de Transformador trisfásico de 75 KVA 13200 / 227 / 220 V			GLB
ESPACIO	ALTURA	CANT	PARCIAL
ANDEN		1,00	1,00
SUBTOTAL TRANSFORMADOR 75Kva			1,00
% FACTURADO EN ACTA 2		50%	0,50
% POR FACTURAR EN ACTA 3		50%	0,50



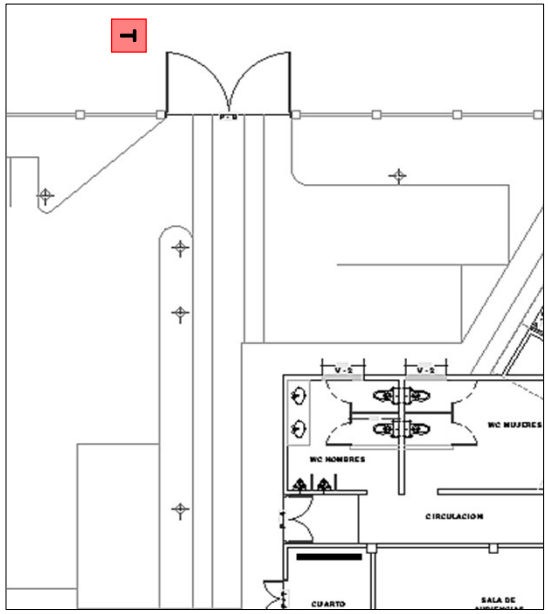


SUBTOTAL TRANSFORMADOR 75Kva		1,00
% FACTURADO EN ACTA 2	50%	0,50
% POR FACTURAR EN ACTA 3	50%	0,50


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP 24 Suministro e instalación de puesta a tierra de alta tensión SPT CGB			GLB
ESPACIO	**LONGITUD**	**CANT**	**PARCIAL**
ANDEN		1,00	1,00
TOTAL PUESTA A TIERRA ALTA TENSION			**1,00**

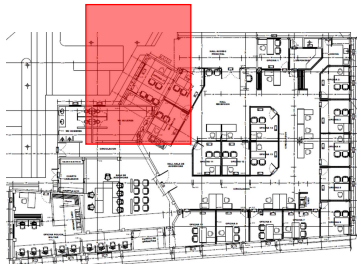

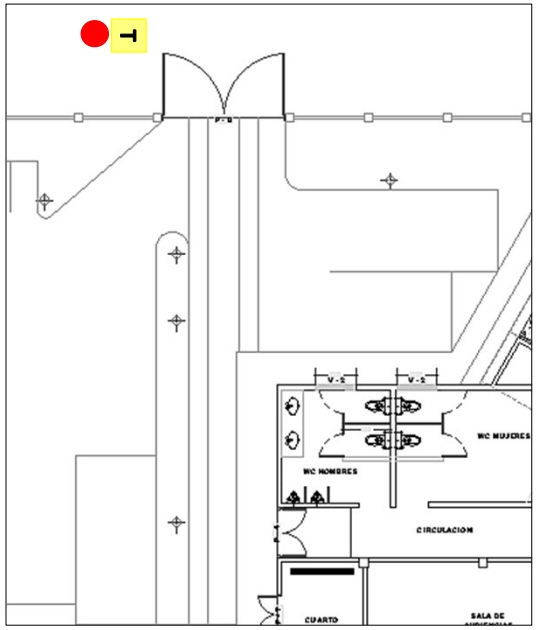


TOTAL PUESTA A TIERRA ALTA TENSION	1,00


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP 25 Suministro e instalación de tuberia galvanizada de 4" (incluye tubería, anclajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación)			M
ESPACIO	**LONGITUD**	**ALTURA**	**PARCIAL**
ANDEN		6,00	6,00
TOTAL M TUBERIA GALV 4"			**6,00**

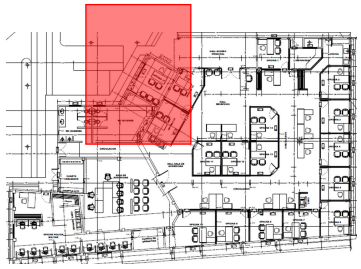

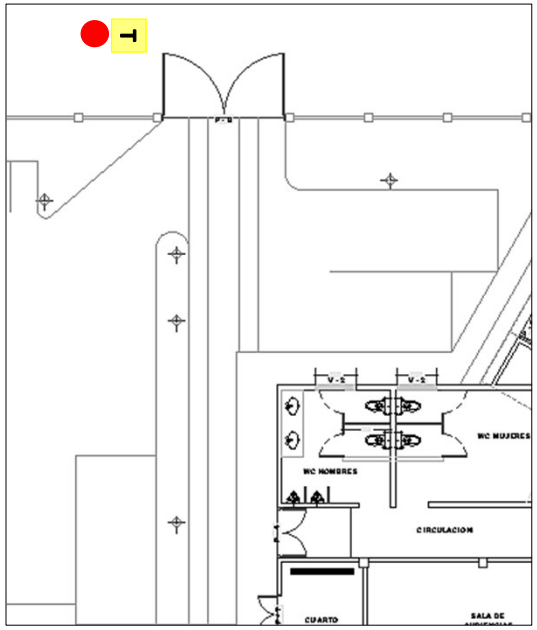

TOTAL M TUBERIA GALV 4"	**6,00**

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

NP26 Suministro e instalación de tubería de 4" PVC subterránea con sus respectivos accesorios (Incluye excavación)			M
DESCRIPCION	**LARGO**	**CANT**	**PARCIAL**
TUBERIA 4"	1,50	2,00	3,00
TOTAL M TUBERIA 4" PVC			**3,00**




TOTAL M TUBERIA 4" PVC	3,00


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP 27 Suministro e instalación de medidor electrónico multitarifas activa y reactiva trifásico clase 0.5 rango de corriente de 2.5 / 10 A. Corriente básica (nominal) 5 A			UND
ESPACIO	**LONGITUD**	**CANT**	**PARCIAL**
ANDEN		1,00	1,00
TOTAL MEDIDOR ELECT MULTITARIFA			**1,00**

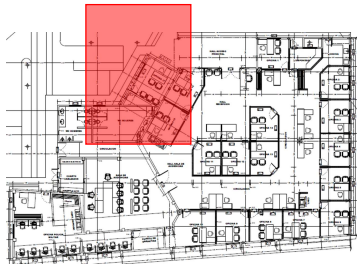

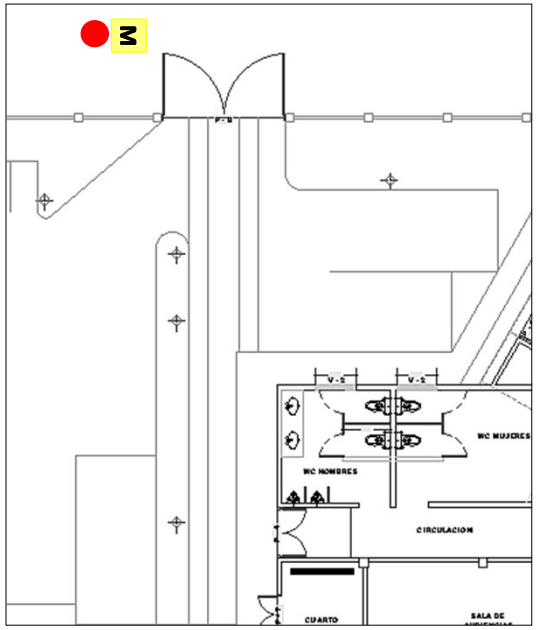


TOTAL MEDIDOR ELECT MULTITARIFA	1,00


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP 28 Suministro e instalación de medidor bifásico trifilar			UND
ESPACIO	**LONGITUD**	**CANT**	**PARCIAL**
ANDEN		1,00	1,00
TOTAL MEDIDOR BIFASICO TRIFILAR			**1,00**

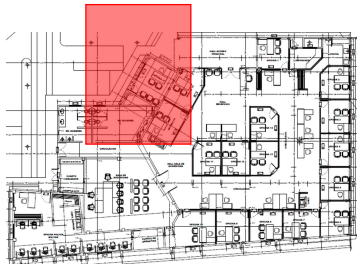

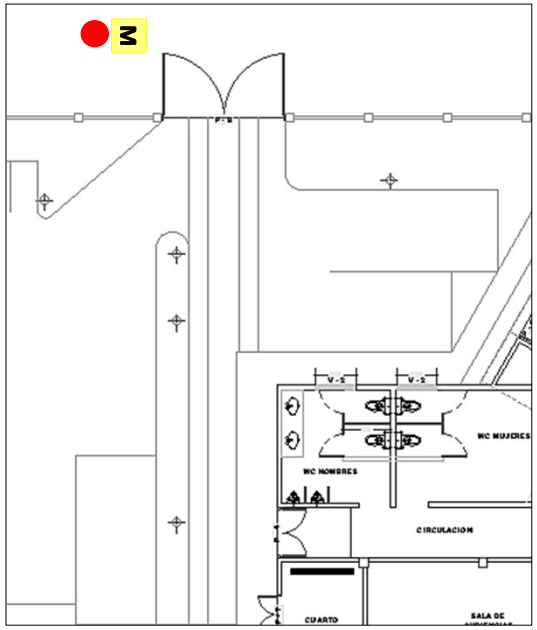


TOTAL MEDIDOR BIFASICO TRIFILAR	1,00


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

POSTE

NP.30 Suministro e instalación de tablero bifasico de 12 circuitos 125 A			UND
ESPACIO	**LARGO**	**CANT**	**PARCIAL**
CASA ADJUNTA		1,00	1,00
TOTAL INST TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS			**1,00**



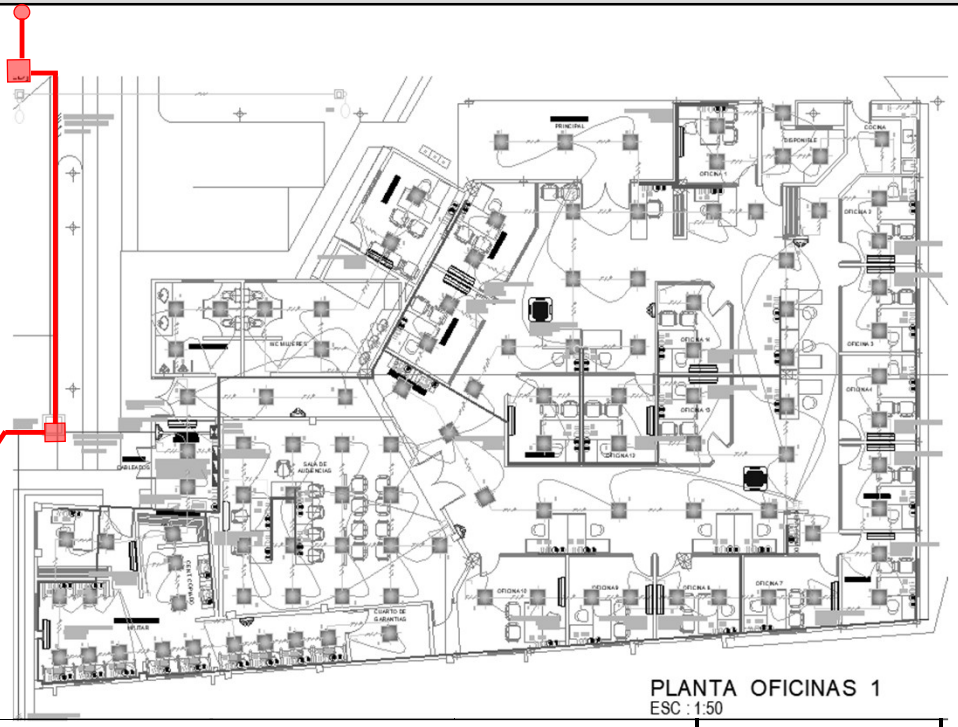

PLANTA OFICINAS 1
ESC : 1:50

TOTAL M ACOMETIDA	45,00


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP29 Suministro e instalación de acometida electrica subterranea en conductores de Aluminio THHW 2/0 AWG 8000 por tuberia PVC conduit tipo pesado 1" 1/4. Incluye accesorios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. Incluye excavación			M
DESCRIPCION	**LARGO**	**CANT**	**PARCIAL**
ACOMETIDA	45,00	1,00	45,00
	5,00		
TOTAL M ACOMETIDA			**45,00**



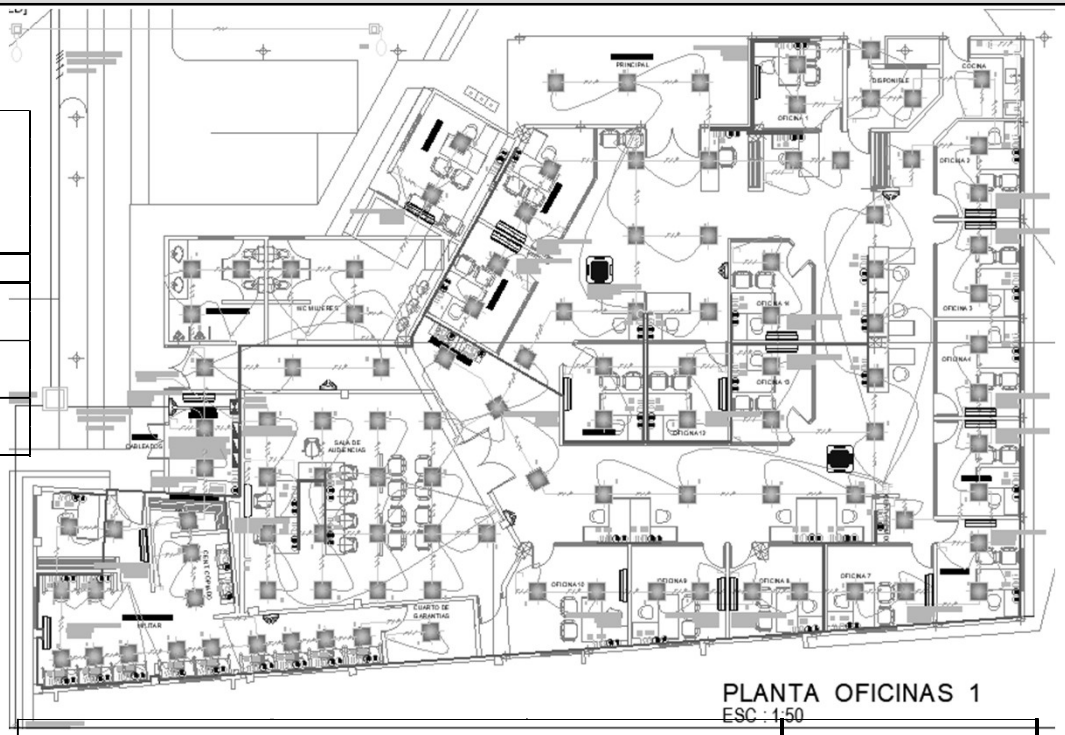

PLANTA OFICINAS 1
ESC : 1:50


TOTAL INST TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS	1,00


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP 31 Suministro e instalación de tablero tipo cofre de dimensiones mínimas 120cm x 90cm x 40cm con barrajes de cobre de 400 A (Incluye totalizador de 280 - 400 Amp + totalizador de 200 Amp 50KA + totalizador de 125 Amp 25KA)			UND
ESPACIO	ALTURA	CANT	PARCIAL
CUARTO CABLEADO		1,00	1,00
SUBTOTAL TABLERO TIPO COFRE			1,00
% FACTURADO EN ACTA 2		50%	0,50
% POR FACTURAR EN ACTA 3		50%	0,50



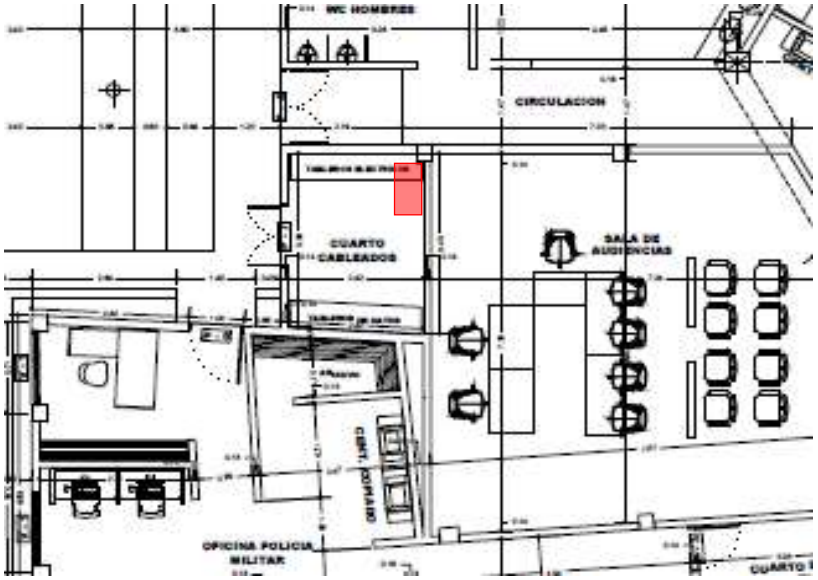


SUBTOTAL TABLERO TIPO COFRE		1,00
% FACTURADO EN ACTA 2	50%	0,50
% POR FACTURAR EN ACTA 3	50%	0,50


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	


PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP32 Estudios y diseños para proyecto eléctrico de la infraestructura física de la Justicia Penal Militar y Policial en Cúcuta. + servicio profesional de revisión y prueba de transformador, parrayos y red electrica en general instalados según diseño + tramitación de servicios públicos ante la empresa CENS Grupo EPM.			GLB
ESPACIO		CANT	PARCIAL
ESTUDIOS Y DESEÑO		1,00	1,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑO			1,00

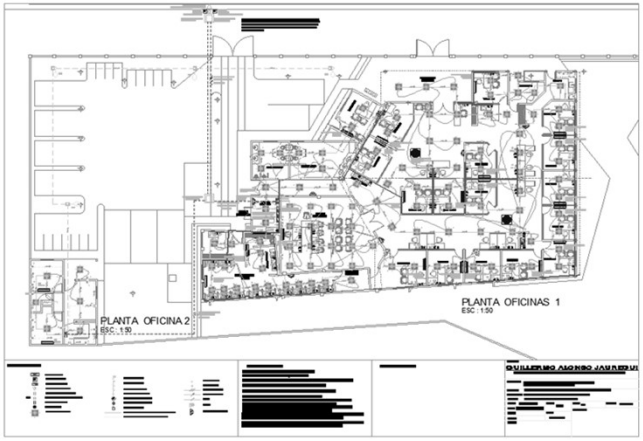

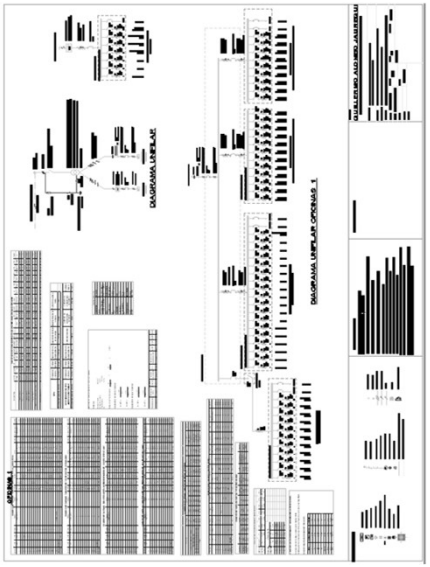

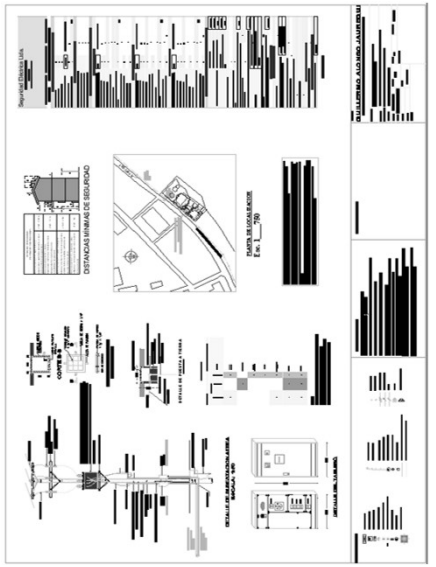

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑO	1,00

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE	003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2			
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES / AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03 / 2025

DESCRIPCION

Grupo epm

CENS

20 de Febrero de 2025

Señor(a)
JUAN CARLOS ARCINIEGAS SALCEDO
VIA AL PORTICO JUNTO AL BATALLON - SAN RAFAEL
Cúcuta - Norte de Santander
3153645157

ASUNTO: Revisión proyecto 75 KVA BATALLON

Recibida su solicitud de revisión de diseño identificado con el número de cuenta **1148468** y el número de solicitud **242D6561**, del proyecto del asunto, le informamos que el proyecto ha sido revisado sin observaciones.

Dirección del Proyecto: VIA AL PORTICO JUNTO AL BATALLON.
Municipio: Cúcuta.
Distribuidor Comercializador: JUAN CARLOS ARCINIEGAS.
Número de cuentas: 2.
Capacidad (KVA): 75.
Constructor: EJERCITO NACIONAL BRIGADA 30.

Observaciones: Proyecto se Registra con Visto Bueno para Interventoría e Interventoría de Obra de Conformidad con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente y la utilización de Estribos y grapas de conexión de acuerdo con los estimado por la Norma de CENS.Nota #02: Recuerde que para los servicios de portafolio y línea energizada se deben anexar los siguientes documentos de los DPS y contadores; facturas de compra, documentos de conformidad RETIE, pruebas de ruina vigentes y fotos de los elementos donde se evidencie el aterramiento en los casos que aplique.

La presente comunicación hace parte integral de la documentación del proyecto, para continuar con el procedimiento de vinculación del proyecto debe realizar la solicitud de interventoría a la infraestructura construida a través de los canales de atención disponible.

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS recuerda que la ejecución del proyecto, debe cumplir con el diseño avalado y cañirse a las normas de construcción vigentes de la empresa, las cuales se encuentran disponibles en nuestra página web, a través de siguiente enlace: https://www.cens.com.co/institucional/normas-y-especificaciones-tecnicas.

La vigencia de este documento es por un (1) año contados a partir de su fecha de emisión.

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS espera haber atendido satisfactoriamente su requerimiento, quedando atentos a las aclaraciones o precisiones que considere pertinentes.

Cordialmente,

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

FORMATO FACTIBILIDAD DEL SERVICIO - E2

1 - Información General

No. de solicitud de servicio: 242D6561 - 1148468
No. de factibilidad del Servicio: 1148468
Fecha de respuesta de factibilidad de servicio: 02/12/2024
Vigencia de la factibilidad en meses: 12
Fecha de vigencia de la factibilidad: 02/12/2026
Tipo de solicitud: Revalidación de la existente

2 - Conexión Aprobada

Carga aprobada en kVA: 75
Carga existente antes de la aprobada, en kVA: 0
Nivel de tensión Aprobado de la conexión: Nivel 2. Tensión mayor o igual a 1 kV y menor a 30 kV

Tipo de Proyecto:
Redes de Baja Tensión aérea: ( )
Redes de Baja Tensión subt.: (X)
Redes de Media Tensión aérea: ( )
Redes de Media Tensión subt.: ( )
Transformador en poste: (X)
Subestaciones: ( )
Alumbrado Público: ( )

Punto de Conexión:
Nombre de Circuito BT: No Circuito:
Nombre de Circuito MT: CIRCUITO BELC24 No Circuito: BELC24
Subestación de Potencia: SUBESTACION BELEN
Transformador de Distribución: BELC24
Distancia desde punto de conexión a la subestación de potencia (Km): 0,05
Número de Nodo o identificación del poste o apoyo donde se conectara: AMVE114
Nivel de cortocircuito trifásico (kA):
Nivel de cortocircuito monofásico (kA):
Ubicación georreferenciada WGS 84:
Longitud: Latitud: Altitud: m

Tipo y clase de carga aprobada

	Clase de carga		
Tipo de Carga	Monofásico	Bifásico	Trifásico
Residenciales	0	0	0
Comerciales	0	0	0
Industriales	0	0	0
Oficiales	0	0	1
Alumbrado Público	0	0	0
Otro	0	1	0
Provisional Obra	0	0	0
Total por clase de carga	0	1	1

Número total de cuentas	2

3 - Cronograma de entrada de cargas aprobado

4 - Documentos técnicos requeridos según tipo de conexión

Planos de diseño y construcción desde el punto de conexión hasta la frontera comercial que incluyan, cortes, plantas, arquitectura, distancias de seguridad y que cumplan con las normas de construcción del Operador de Red, normas colombianas e internacionales si se requiere.	(X)
Diseño de las subestaciones con sus respectivas protecciones, configuración de la conexión y cálculos de malla de puesta tierra.	(X)
Cálculo del dimensionamiento y regulación de tensión de los conductores de acuerdo con la carga solicitada.	(X)
Cálculo de la ocupación de ductos en caso de redes subterráneas	(X)
Cálculo de la cargabilidad de los transformadores de acuerdo con el cuadro de carga	(X)
Estudios de coordinación de protecciones si se requiere	( )
Estudio de calidad de potencia. La conexión de un nuevo cliente no debe generar sobretensiones, interrupciones de segundos, variaciones de frecuencia, distorsiones de armónicos y factor de potencia que afecten a otros clientes	( )
Estudios de campos electromagneticos cuando aplique, de acuerdo con normas ambientales o cuando aplique de acuerdo con el RETIE.	( )
Estudios mecánicos de estructuras para subestaciones MT/MT o cuando sea necesario.	( )
Dimensionamiento de equipos de medida, tales como transformadores de potencial y de corriente.	(X)
Diseño de armarios para el montaje y conexiones de medidores.	(X)
Diseño del sistema de medida indirecta, si la hay demás recomendaciones del comercializador	( )

5 - Observaciones Operador de Red

Empresa construye: Red media tensión: ( ) Transformador: ( ) Red de baja tensión: ( )
Particular construye: Red media tensión: ( ) Transformador: (X) Red de baja tensión: (X)
Aplica CBF: SI: (X) NO: ( )
Declaración de cumplimiento del RETIE: SI **Dictamen de Inspección:** SI **Documento de control de riesgo:** NO

Punto de derivación en media tensión trifásico proyectando el hincado de un poste de 12m 1050kgf y el montaje de un transformador de 75KVA para la conexión de 2 cuentas en baja tensión (1 trifásica semidirecta, 1 bifásica directa) será desde la red aérea de media tensión con nodo eléctrico cercano AMVE114 ubicado en las coordenadas X: 1173268, Y: 1361548.

CENS le autoriza la construcción de las redes de uso general, hasta el punto de conexión asignado, previo acuerdo entre las partes por medio de la formalización de un contrato de "Compra de Bien Futuro". Para lo anterior, se solicita presentar un proyecto de redes por medio de un profesional competente con matrícula profesional, a partir del punto marcado como "A" en el plano anexo, o a partir de los postes proyectados donde se instalarán las bajantes primarias o los transformadores de distribución y hasta los cuales CENS llevará la red primaria.

Tal proyecto deberá contar con los requisitos técnicos de presentación que se detallan en la norma técnica de CENS, en el vínculo Normatividad - Diseño y construcción www.cens.com.co, adicionalmente debe cumplir lo establecido en la resolución CREG 038 de 2014 "Codigo de Medida" y con el listado de cantidades de obra proyectadas hasta el punto de conexión asignado. Posteriormente, deberá ser entregado con copia de esta comunicación y los demás documentos requeridos para el trámite de aprobación del proyecto, en las oficinas de atención de CENS o mediante presentación virtual de los documentos del proyecto.

NP33 Tramite general sobre declaración de cumplimiento suscrita por el profesional competente, acompañada del aval de cumplimiento de la norma RETIE mediante dictamen de inspección. (Incluye certificación plena RETIE de distribución, transformación, uso final)			**GLB**
ESPACIO		**CANT**	**PARCIAL**
TRAMITES GENERALES		1,00	1,00
TOTAL TRAMITES GENERALES			**1,00**

TOTAL TRAMITES GENERALES	**1,00**


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	**RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA**	**RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS**	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP34 DESMONTE DE PUERTAS y VENTANAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA-METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)				M2
ESPACIO	LARGO	ANCHO	CANT	PARCIAL
B. Ventana cuarto cableado	0,00	1,00	1,00	0,00
TOTAL CORTE NO. 3				0,004

ESPACIO	LARGO	ANCHO	CANT	PARCIAL
A. Marcos de Puertas de baños	0,90	2,10	2,00	3,78
B. Ventana cuarto cableado	2,40	1,00	1,00	2,40
C. Ventana Cuarto ropas	1,20	1,00	1,00	1,20
D. ventaans Oficina 16	2,05	1,00	2,00	4,10
E. Marco puerta oficina 16	0,80	2,10	1,00	1,68
F. Puertas Policia judicial	0,95	2,60	1,00	2,47
	0,75	2,45	1,00	1,84
	0,97	2,60	1,00	2,52
	1,20	2,10	1,00	2,52
G. Puerta corredera bodega	1,59	2,55	1,00	4,05
H. Puertas rejas accesos	3,70	2,00	0,00	0,00
	2,90	2,00	0,00	0,00
G. Puerta Casa adjunta	1,00	2,05	0,00	0,00
TOTAL CORTE NO. 2				26,56

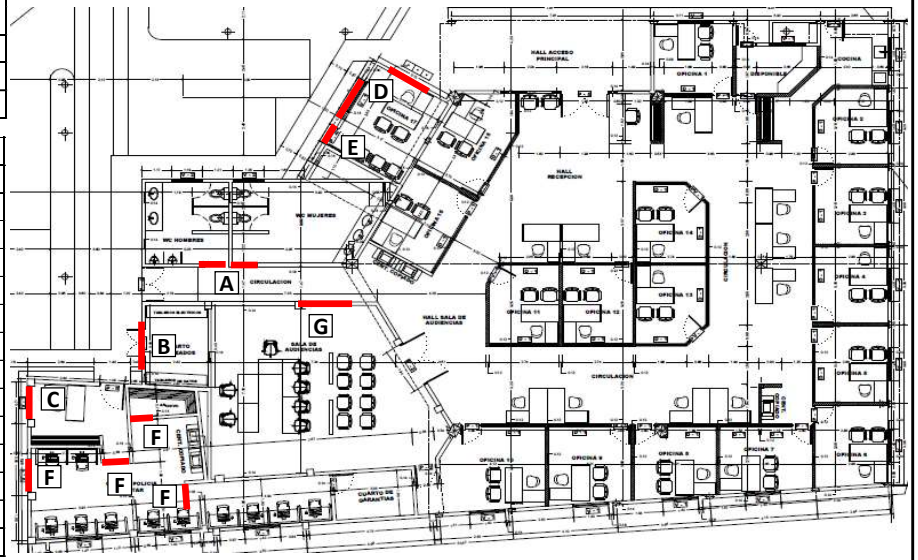


TOTAL CORTE NO. 3	0,004

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP 36 Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada Cal 22, desarrollo 0,65mts (0,25X0,20X0,20X1mts). (Incluye accesorios y andamios).			M
ESPACIO	**LARGO**	**CANT**	**PARCIAL**
FCHADA NORTE	19,70		19,70
OFICINA 17	5,80		5,80
SUBTOTAL M CANAL EN LAMINA GALV			**25,50**

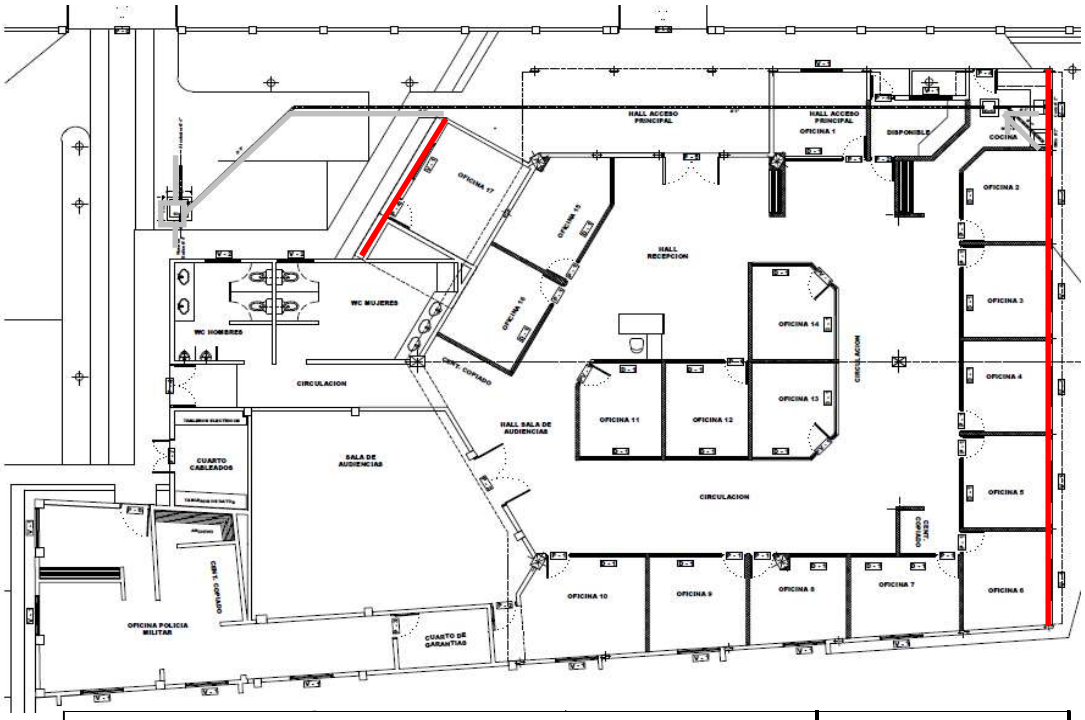


SUBTOTAL M CANAL EN LAMINA GALV	25,50


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP 38 Suministro e instalación de tapa de registro plastica 20X20cms.			UND
ESPACIO	LARGO	CANT	PARCIAL
BAÑO MUJERES		1,00	1,00
BAÑO HOMBRES		1,00	1,00
TOTAL TAPA REGISTRO 20x20			2,00



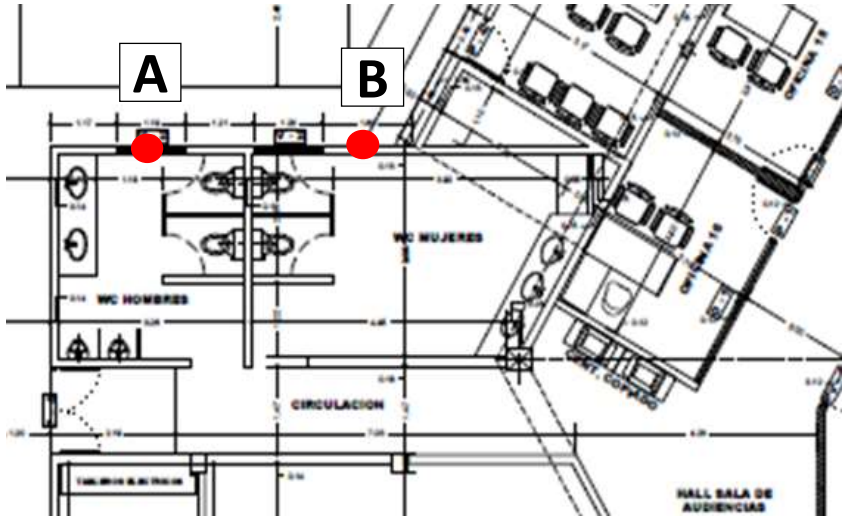


TOTAL TAPA REGISTRO 20x20	2,00


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP 39 Limpieza de cajas de inspección existente (sondeo de tubería).			M2
ESPACIO	**LARGO**	**ANCHO**	**PARCIAL**
CAJA INSPECCCION	1,00	1,00	1,00
SUBTOTAL M2 LIMPIEZA CAJA			1,00



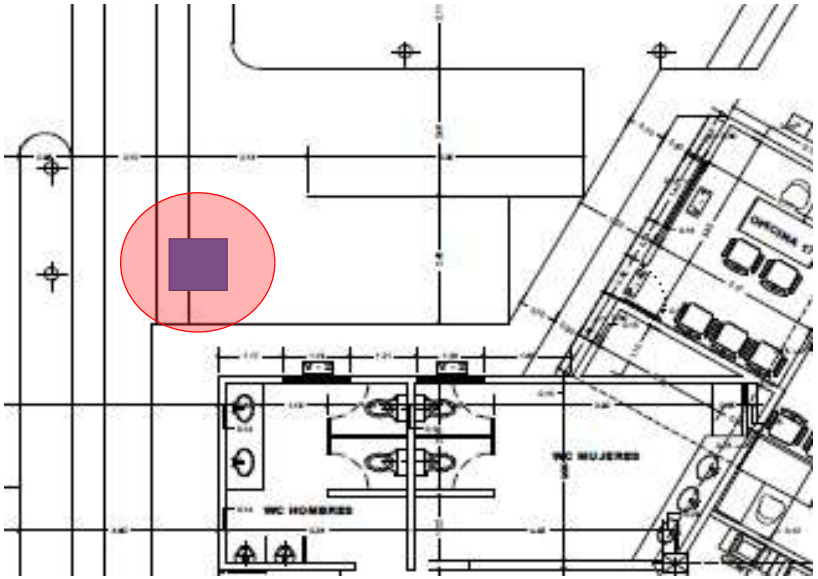


SUBTOTAL M2 LIMPIEZA CAJA	1,00

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.			Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2			
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES / AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03 / 2025

DESCRIPCION

NP 43 Suministro e instalación tubería PVCS 3". Incluye accesorios.			M
ESPACIO	**LARGO**	**CANT**	**PARCIAL**
TUBERIA PVCS 3"	7,50	1,00	7,50
A. BAJANTE 3"	2,70	1,00	2,70
B. BAJANTE 3"	3,00	3,00	9,00
C. BAJANTE 3"	3,30	1,00	3,30
TOTAL M TUBERIA PVCS 3"			**22,50**

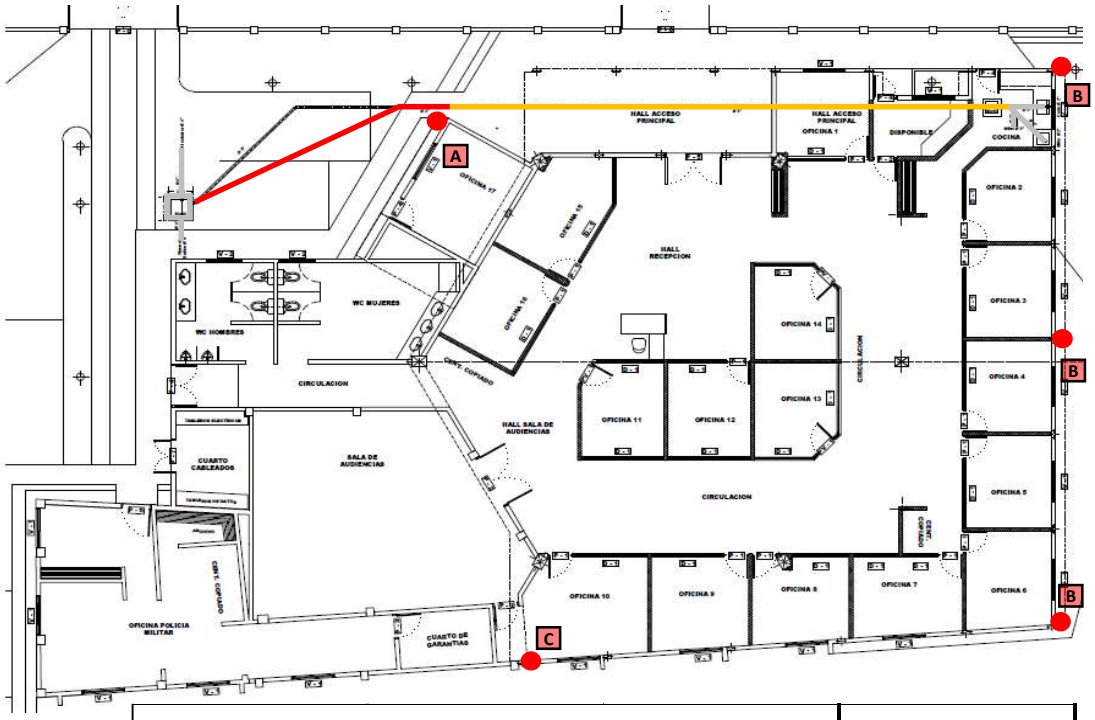

TOTAL M TUBERIA PVCS 3"	22,50


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP 45 Suministro e instalación de punto sanitario de 3". (Incluye accesorios y tubería hasta 1,50 mts).			UND
ESPACIO	**LARGO**	**CANT**	**PARCIAL**
EMPALME A CAJA INSPECCION		1,00	1,00
TOTAL PUNTO SANIT PVCS 3"			**1,00**



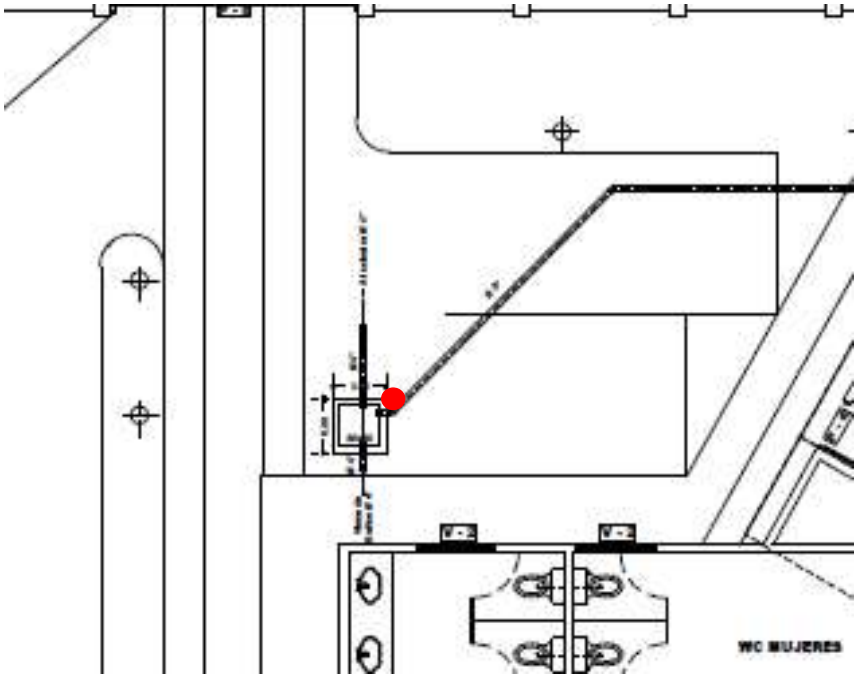


TOTAL PUNTO SANIT PVCS 3"	1,00

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

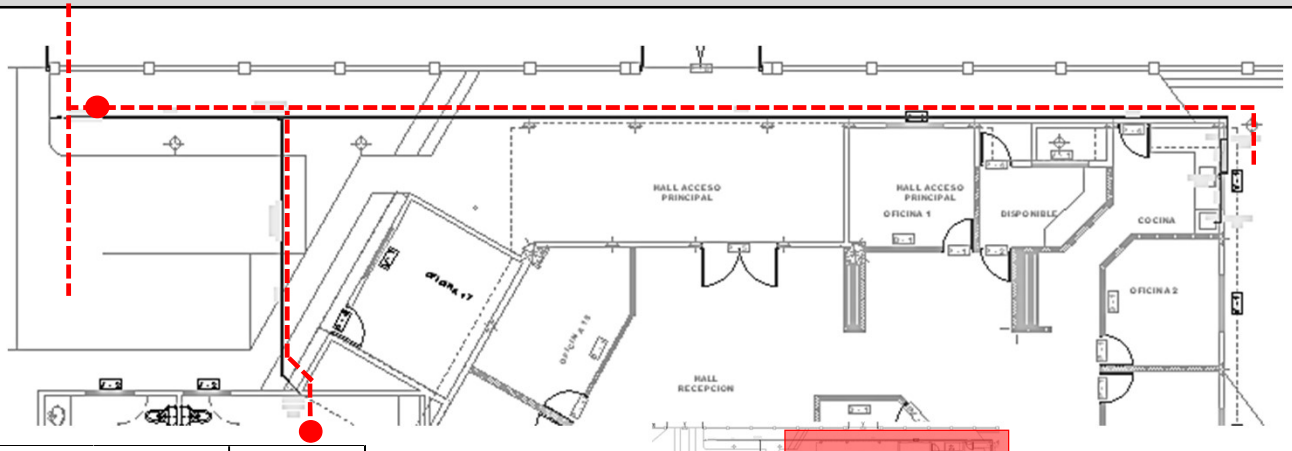


NP 47 Suministro e instalación tubería PVCP RDE 11 de 3/4''. Incluye accesorios.			M
ESPACIO	**LARGO**	**CANT**	**PARCIAL**
EMPALME A RED	30,50		30,50
EMPALME A TANQUE	12,00		12,00
TOTALTUBERIA PVCP 3/4"			**42,50**

TOTALTUBERIA PVCP 3/4"	**42,50**

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

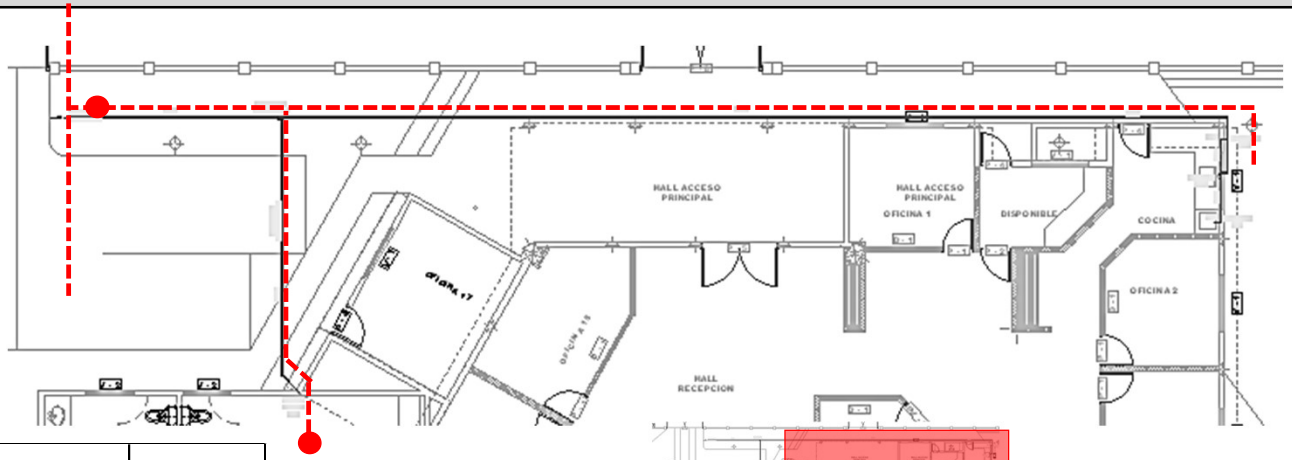

NP 48 Suministro e instalación de punto hidráulico de 3/4". (Incluye accesorios y tubería hasta 1,50 mts).			UND
ESPACIO	**LARGO**	**CANT**	**PARCIAL**
EMPALME A RED		1,00	1,00
EMPALME A TANQUE		1,00	1,00
TOTAL PUNTO HIDRAU 3/4"			**2,00**

TOTAL PUNTO HIDRAU 3/4"	2,00


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE	003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2			
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA / MES / AÑO	
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15 / 03 / 2025	

DESCRIPCION

NP 49 Suministro e instalación de punto hidráulico 1/2". (Incluye accesorios y tubería hasta 1,50 mts).			UND
ESPACIO	**LARGO**	**CANT**	**PARCIAL**
LAVAPLATOS		1,00	1,00
LLAVE MANGUERA		1,00	1,00
POCETA		1,00	1,00
TOTAL PUNTO HIDRAU PVC 1/2"			**3,00**



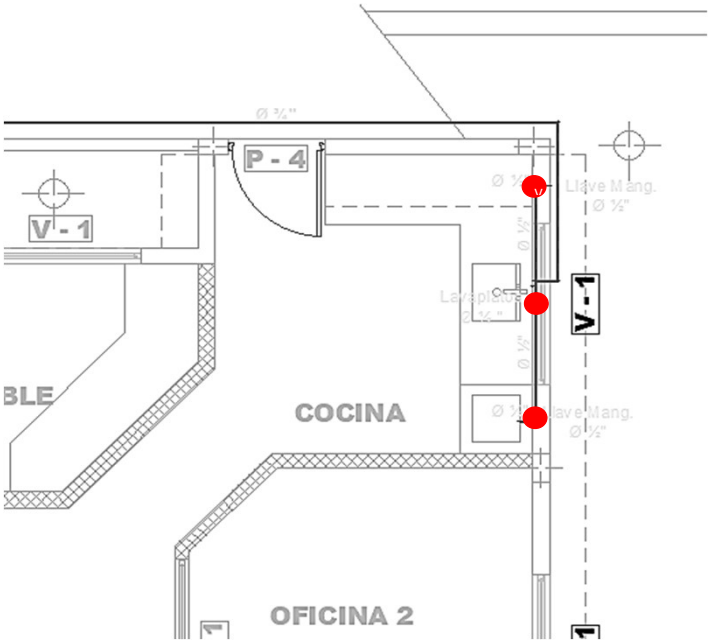


TOTAL PUNTO HIDRAU PVC 1/2"	3,00

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

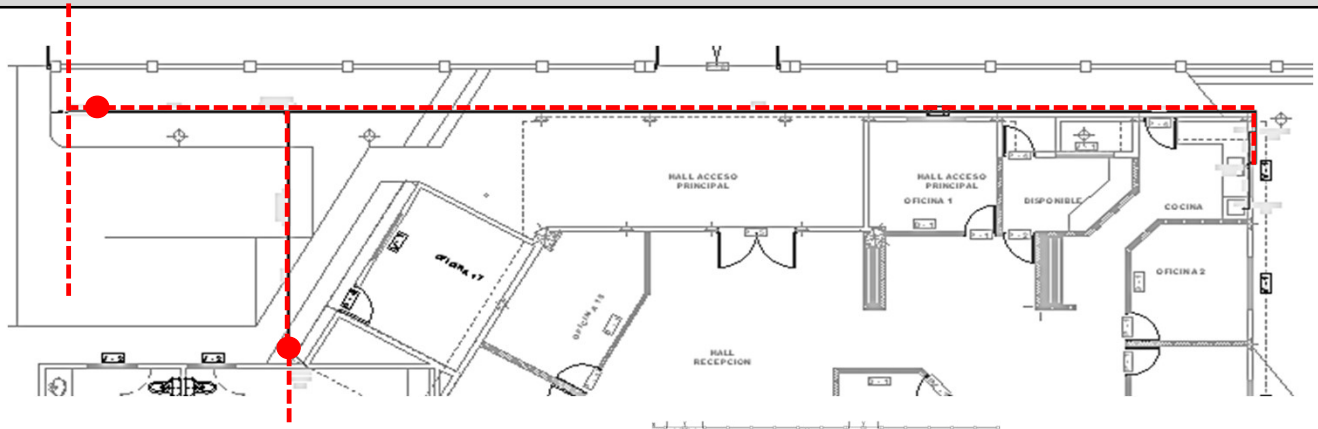

NP 50 Suministro e instalación registro válvula de bola 3/4".			UND
ESPACIO	**LARGO**	**CANT**	**PARCIAL**
EMPALME A RED		1,00	1,00
SALIDA TANQUE		1,00	1,00
TOTAL INST REGISTRO BOLA 3/4"			**2,00**



TOTAL INST REGISTRO BOLA 3/4"	2,00


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP 51 Suministro e instalación cheque cortina sello metálico 3/4".			UND
ESPACIO	**LARGO**	**CANT**	**PARCIAL**
EMPALME A RED		1,00	1,00
EMPALME A TANQUE		1,00	
TOTAL INST CHEQUE CORTINA PVC 3/4" / ACTA NO. 3			**1,00**



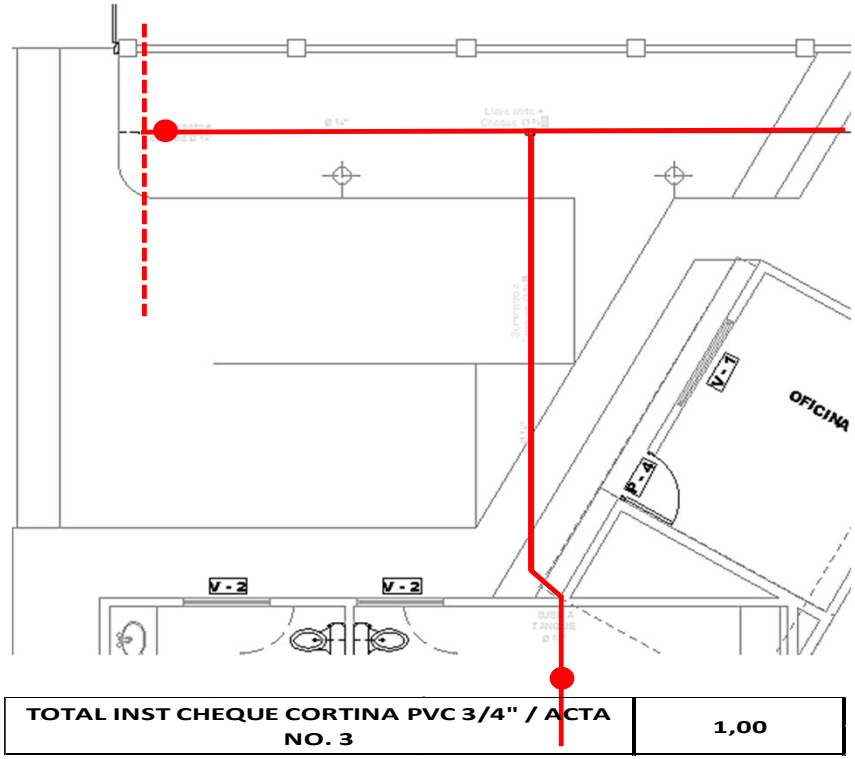


TOTAL INST CHEQUE CORTINA PVC 3/4" / ACTA NO. 3	1,00


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE	003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2			
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES / AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03 / 2025

DESCRIPCION

NP 52 Mediacaña en mortero 1:4 Impermeabilizado.			M
DESCRIPCION	**LARGO**	**CANT**	**PARCIAL**
MEDIACAÑA MORTERO	18,00		18,00
	9,00		9,00
TOTAL M MEDIACAÑA EN MORTERO			**27,00**



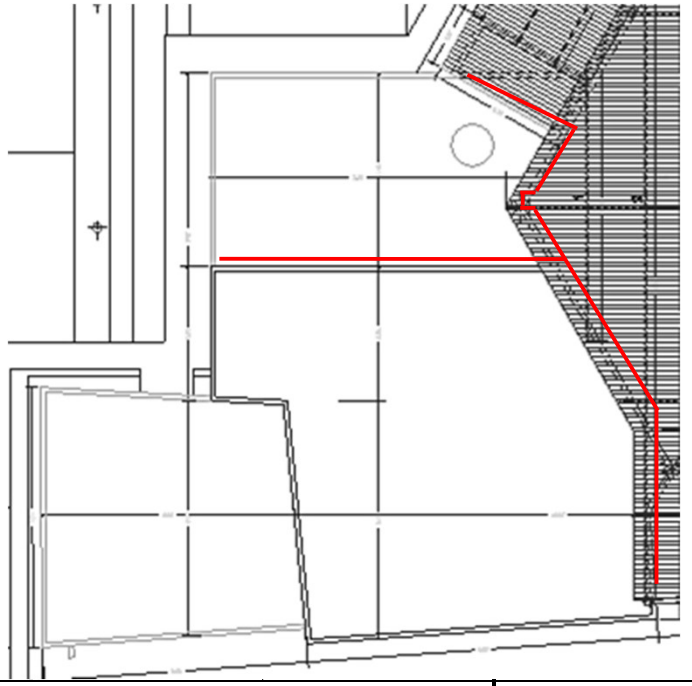

TOTAL M MEDIACAÑA EN MORTERO	**27,00**

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP 55 Suministro e instalación de tanque almacenamiento de 1000 lts tipo botella y todos sus accesorios para su buen funcionamiento.			UND
DESCRIPCION	**LARGO**	**CANT**	**PARCIAL**
INST TANQUE 1000 Lts		1,00	1,00
TOTAL INST TANQUE 1000 Lts			**1,00**



TOTAL INST TANQUE 1000 Lts	1,00


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP 56 Suministro e instalación de reja metálica en tubo cuadrado de 1X1"X0,08MM, tipo banco. Incluye bisagras, marco, pasador, candado y protector de candado, terminada con anticorrosivo, pintada e instalada - verificar en obra medidas, ángulos y # de hojas. P-8			M2
DESCRIPCION	**LARGO**	**ALTURA**	**PARCIAL**
REJA ACCESO VEHICULAR	3,65	1,90	6,94
REJA ACCESO PEATONAL	2,98	1,90	5,66
TOTAL M2 REJA MET			**12,60**



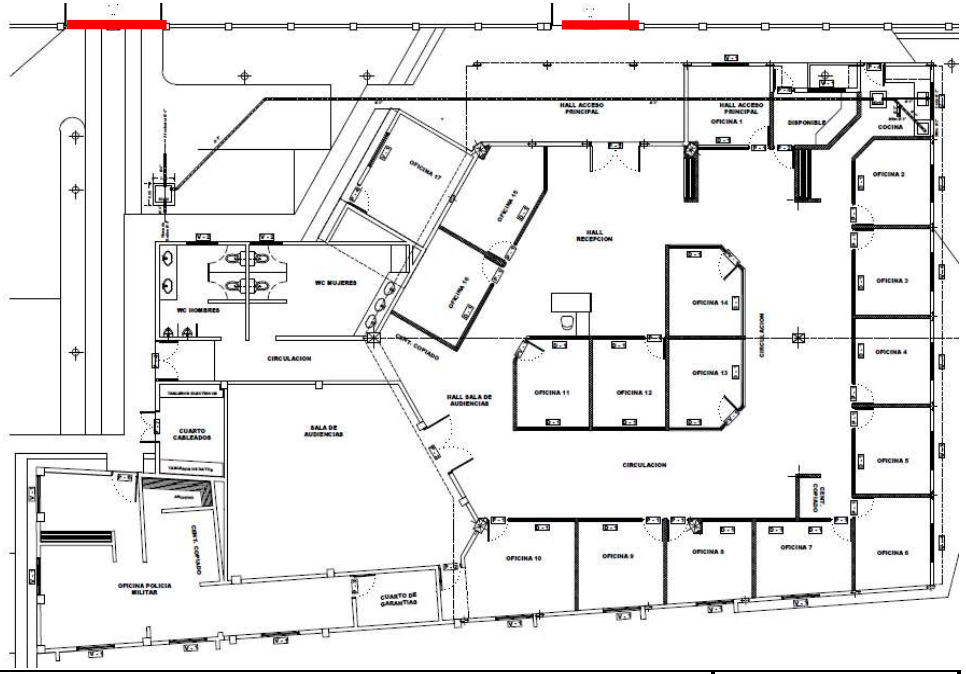


TOTAL M2 REJA MET	12,60

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP 57 Suministro e instalación de flanche con cinta impermeabilizante tapa goteras de 1,0 mm X 25 cm			M
DESCRIPCION	**LARGO**	**CANT**	**PARCIAL**
FLANCHE	5,80		5,80
TOTAL M FLANCHE			**5,80**

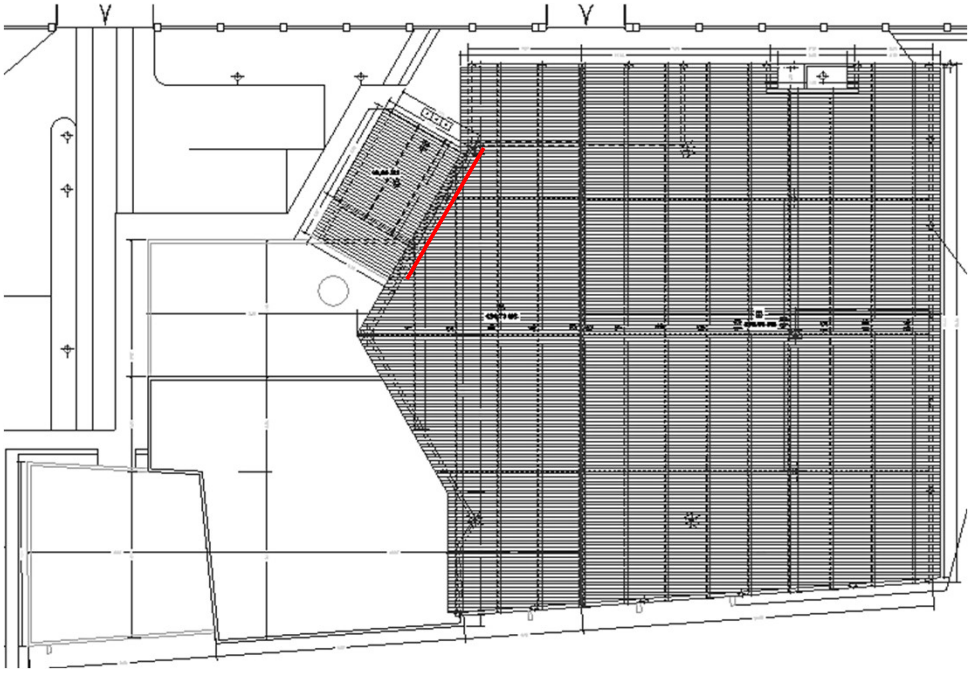


TOTAL M FLANCHE	**5,80**


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP 58 Construcción de carcamo eléctrico en bloque #5 con pañete liso. Dimensiones 3,40X,50X,60cmts. (Incluye marco de 1" y tapa metálica en lámina de alfajor 1/8)			GLB
ESPACIO	**ALTURA**	**CANT**	**PARCIAL**
CUARTO CABLEADO		1,00	1,00
SUBTOTAL CONSTRUCCION CARACAMO			**1,00**
PORCENTAJE CANCELADO ACTA 2		**50%**	**0,50**
PORCENTAJE A CANCELAR		**50%**	**0,50**



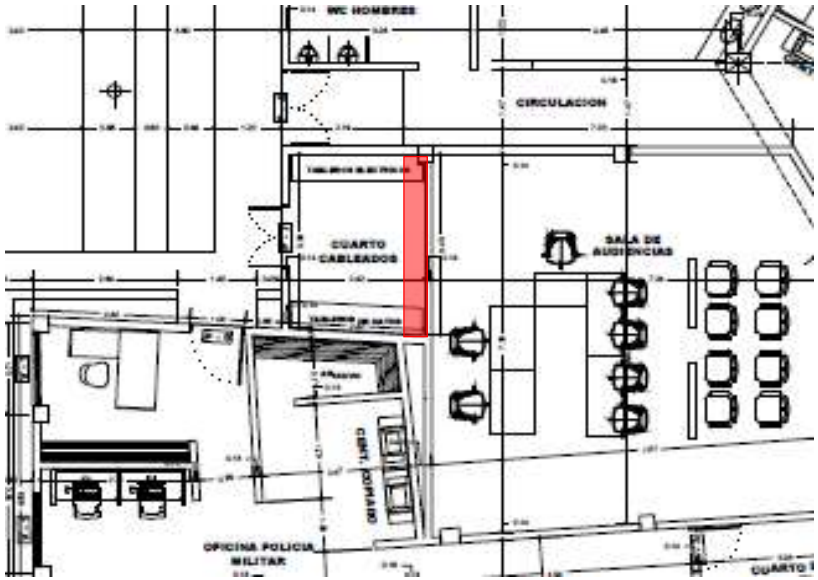

SUBTOTAL CONSTRUCCION CARACAMO		1,00
PORCENTAJE CANCELADO ACTA 2	**50%**	**0,50**
PORCENTAJE A CANCELAR	**50%**	**0,50**


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP.59 Suministro e instalación de punto y salida de interruptor doble (Incluye aparato (interruptor doble), tuberia PVC SCH40 tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado #12 libre de halógeno, caja plastica 5800, terminales de derivación) y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.			UND
ESPACIO	**LARGO**	**CANT**	**PARCIAL**
ACCESO PASILLO BAÑOS		1,00	1,00
CASA ADJUNTA		1,00	1,00
TOTAL INTERRUP DOBLE			**2,00**



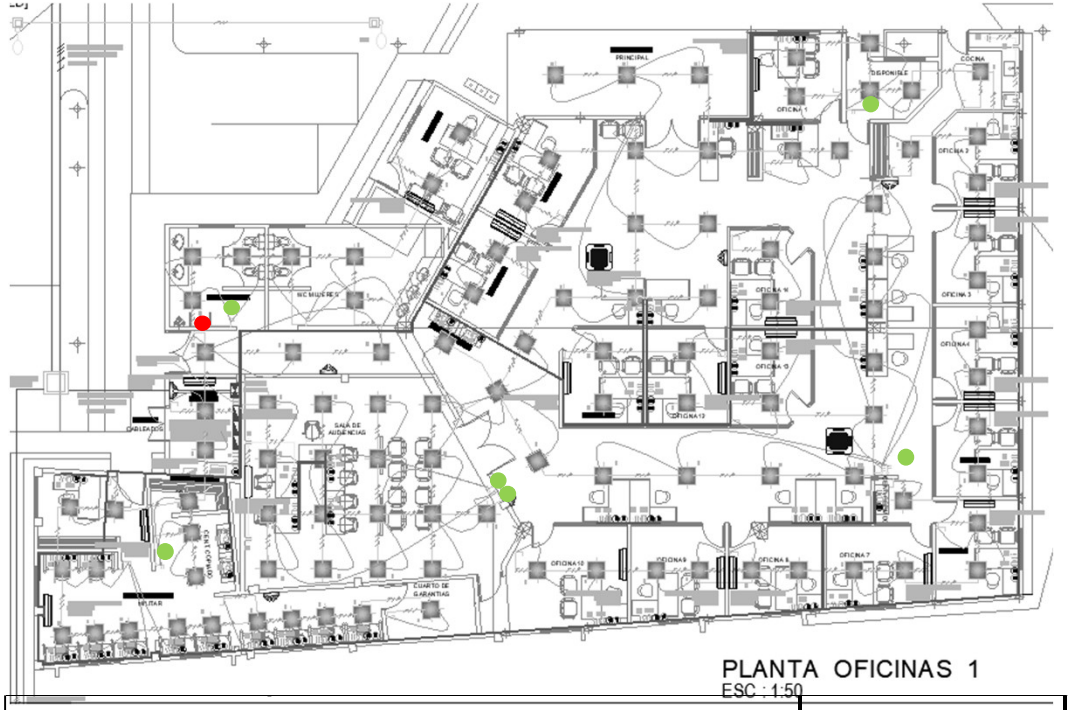

PLANTA OFICINAS 1
ESC : 1:50


TOTAL INTERRUP DOBLE	2,00

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE	003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2			
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES / AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03 / 2025

DESCRIPCION

NP.60 Suministro e instalación de punto y salida de interruptor triple (Incluye aparato (interruptor triple), tuberia PVC SCH40 tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado #12 libre de halógeno, caja plastica 5800, terminales de derivación) y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.			UND
ESPACIO	**LARGO**	**CANT**	**PARCIAL**
POLICIA JUDICIAL		1,00	1,00
SALA AUDIENC		1,00	1,00
WC DAMAS		1,00	1,00
C.COPIADO 1		1,00	1,00
COCINA		1,00	1,00
RECEPCION		1,00	1,00
TOTAL INTERRUP TRIPLE CORTE NO. 2			**6,00**
RECEPCION		-1,00	-1,00
COCINA		-1,00	-1,00
TOTAL INTERRUP TRIPLE CORTE NO. 3 (PRESENTE ACTA)			**-2,00**
TOTAL INTERRUP TRIPLE INSTALADO			**4,00**

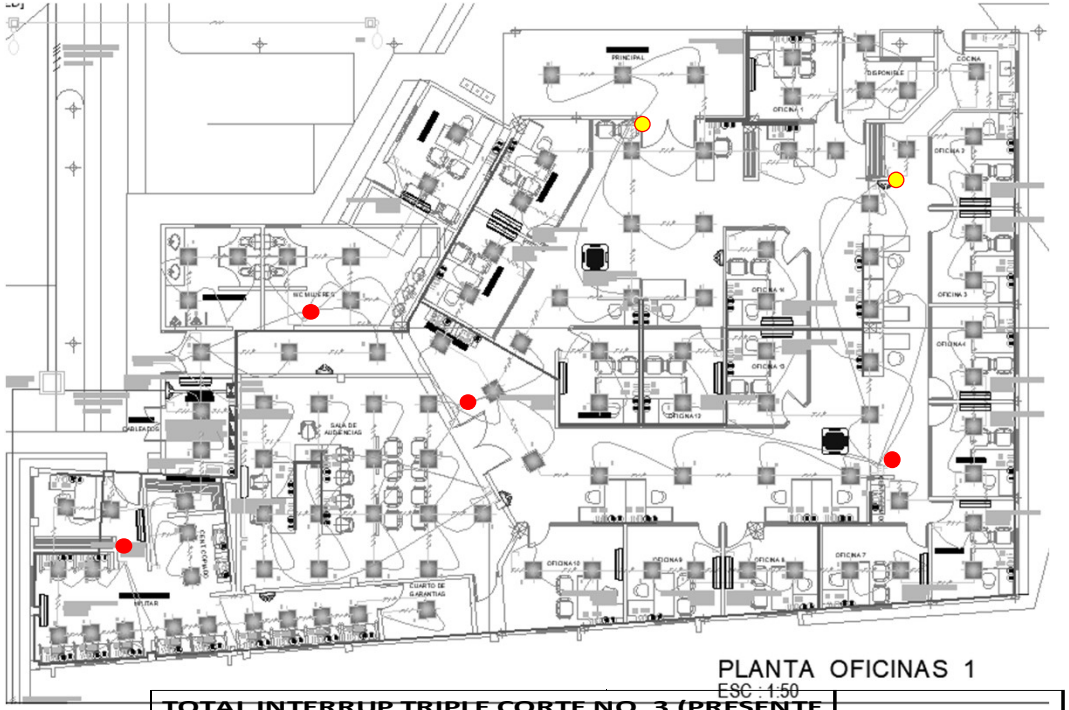

PLANTA OFICINAS 1
ESC : 1:50


TOTAL INTERRUP TRIPLE CORTE NO. 3 (PRESENTE ACTA)	-2,00

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP 61 Suministro e instalación de tablero eléctrico trifasico de 24 circuitos sin espacio para totalizador			UND
ESPACIO	**ALTURA**	**CANT**	**PARCIAL**
CUARTO CABLEADO		3,00	3,00
SUBTOTAL TABLERO 24 IRCUITOS			**3,00**
PORCENTAJE A CANCELAR ACTA 2		**50%**	**1,50**
PORCENTAJE X CANCELAR		**50%**	**1,50**

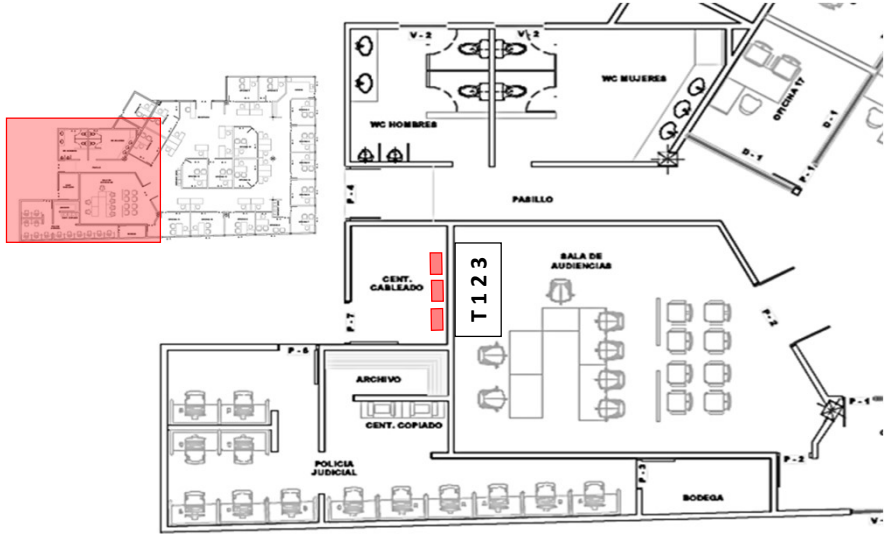


SUBTOTAL TABLERO 24 IRCUITOS		3,00
PORCENTAJE A CANCELAR ACTA 2	**50%**	**1,50**
PORCENTAJE X CANCELAR	**50%**	**1,50**


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION





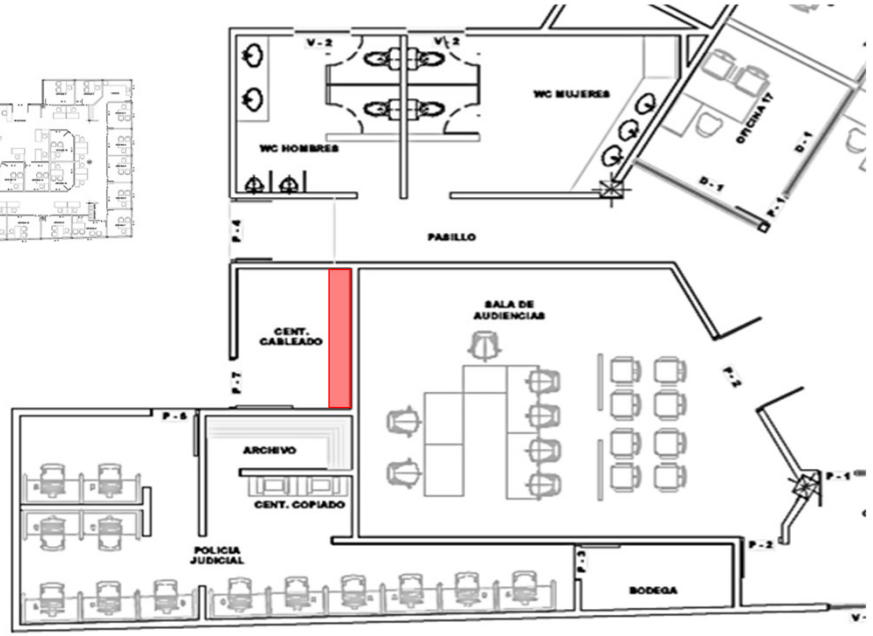


NP66 Circuito eléctrico trifásico en Cable de cobre No.6 THHN (3F No 6+1N No 6 + 1T No 6).			M
ESPACIO	**LONG**	**CANT**	**PARCIAL**
TG a TABLERO 1	15,00	1,00	15,00
TG a TABLERO 1	5,00	1,00	
TG a TABLERO 3	28,00	1,00	
TOTAL INSTALADO ACTA NO. 3			**15,00**

TOTAL INSTALADO ACTA NO. 3	15,00


ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION





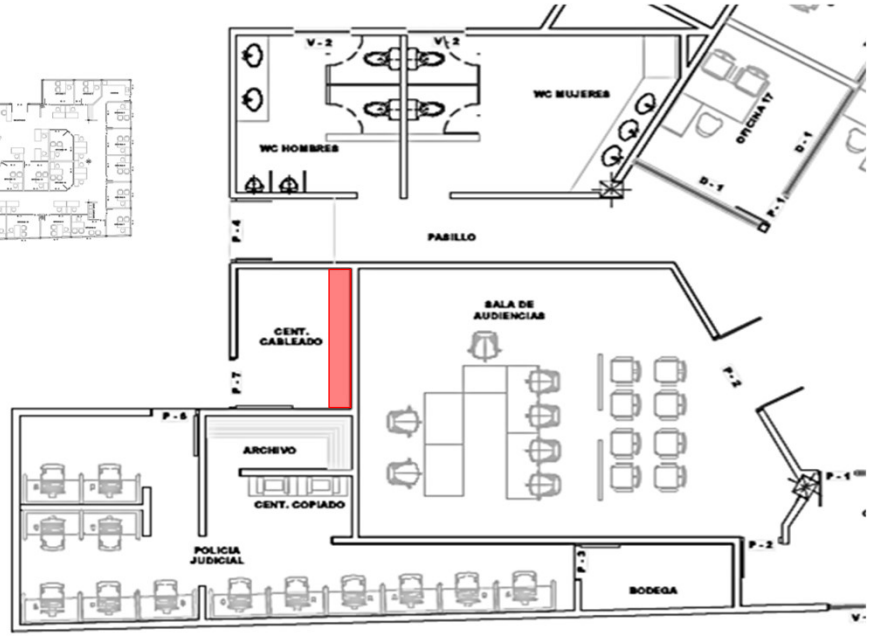

NP67 Circuito eléctrico trifásico en Cable Aislado No 2-0 AWG Cobre THHN.			M
TRAMO	**LARGO**	**CANT**	**PARCIAL**
TGRAL a TRANSF MANUAL	4,00	1,00	4,00
TOTAL INSTALADO			**4,00**

TOTAL INSTALADO	4,00

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	

PROYECTO	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA.				Nro. VALE		003
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT.	901.550.907-2				
INTERVENTORIA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NIT.	901.835.570-9	FECHA	DIA	MES	AÑO
CONTRATO Nro:	CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP				15	03	2025

DESCRIPCION

NP68 Suministro e instalación de perfil estructural 40x40x2mm para fijación y amarre de tubería conduit SCH40 3/4" suspendida.			M
TRAMO	LARGO	CANT	PARCIAL
INSTALADO	108,00	1,00	108,00
TOTAL INSTALADO			108,00
PORCENTAJE A CANCELAR		50%	54,00



TOTAL INSTALADO		108,00
PORCENTAJE A CANCELAR	50%	54,00

ELABORO:	CONTRATISTA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISOR
Arq. JORGE E MORALES RUIZ	RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA	RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	
