DATOS DE LA REUNIÓN	
Dependencia: Subdirección de Intermediación, Formalización y Regulación Empresarial. Subdirección de Abastecimiento Alimentario.	**Asunto:** Visita técnica verificación muestras físicas e impresos carpa de 3x3 _2x2, laterales y techos contrato 687 del 2025.
Fecha: 9 de junio del 2025	**Lugar:** Presencial - Avenida Boyacá # 64C-02 Unicarpas
Asistentes/Participantes: SIFRE(Lineth Panche Molina_Jarrisón Rodriguez Rueda_Jose Alejandro Ruiz Herrera) SAA(Hernando Augusto Méndez Parra) UT Gran Olan Capital (Edwin Ramírez) Unicarpas (Ramón Ayala_Edwin Ayala) Anexo: Listado de Asistencia	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Verificar la impresión de los artes y revisar las muestras físicas de las lonas y estructuras metálicas de las carpas armadas, asegurando el cumplimiento de los requerimientos técnicos y visuales establecidos por la entidad.

AGENDA DE LA REUNIÓN

1. Revisión de los artes impresos
2. Inspección de las muestras físicas
3. Verificación de las especificaciones técnicas
4. Observaciones y ajustes
5. Cierre, conclusiones y compromisos de la visita

DESARROLLO DE LA SESIÓN

La visita técnica inició a las 09:15 a.m. en las instalaciones del proveedor Unicarpas, ubicadas en la Avenida Boyacá #64C-02, en la localidad de Engativá, Bogotá. En el encuentro participaron los equipos técnicos de la Subdirección de Intermediación, Formalización y Regulación Empresarial, la Subdirección de Abastecimiento Alimentario, el contratista y su aliado estratégico.

Posteriormente, nos dirigimos a un parque cercano con el fin de revisar de forma tranquila y practica las muestras físicas de las carpas, incluyendo la estructura metálica (Dimensiones, acabados, color y estabilidad), la lona de los laterales y los techos (material, color, resistencia, impresos) y verificar su sistema de instalación, anclajes, mecanismos de sujeción y calidad general.

A continuación se realiza la descripción de los elementos y las observaciones identificadas durante la verificación:

CARPAS PAGODAS DE 3X3

Estructura Carpas 3x3:
El anclaje de las piezas hembra y macho se realizará mediante un sistema de ángulo, con el fin de garantizar mayor seguridad y durabilidad. Adicionalmente, el contratista modificará la diagonal y el cono para que coincidan con las medidas de las carpas disponibles en la bodega de la entidad. Así mismo, las piezas hembra, macho y las patas contarán con pines que permitirán asegurar y tensar adecuadamente las lonas de los laterales y techos. La totalidad de la estructura contará con recubrimiento de pintura electrostática, lo cual garantiza una mayor resistencia a la corrosión y un acabado uniforme, para finalizar el calibre de la estructura concuerda con la solicitada en las especificaciones técnicas. **Se aprueba iniciar con la producción**

Lonas Techos 3x3:
A la muestra física de la lona para techos se le instalaron dos (2) correas internas por cada lado, para un total de ocho (8) correas, las cuales permitirán tensar adecuadamente el techo y evitar el empozamiento de agua en la parte superior. Adicionalmente, la lona presentaba un buen sellado, así mismo en las esquinas y punta contaba con un refuerzo y excelentes acabados. El material utilizado es Superflex, lo que garantiza flexibilidad y resistencia.

Lonas Laterales 3x3:
La muestra física de los laterales presentada contaba únicamente con ojales. Tras la evaluación de ventajas y desventajas por parte del equipo técnico, la revisión de las especificaciones técnicas y en común acuerdo con el contratista, se acordó realizar ajustes: algunos ojales serán reemplazados por correas con riata, instalando un total de seis (6) por lateral, distribuidas dos (2) por cada lado del lateral y dos (2) ojales. Adicionalmente, las correas estarán cosidas y se les incorporará una chapeta, con el fin de garantizar mayor seguridad y resistencia.

Impresos Techos Mercados Campesinos 3x3: Se recibió muestra por parte del contratista y se aprueba la muestra, sin embargo, se requiere impresión de cenefa de acuerdo a anexo técnico, el cual estará ubicado únicamente en la cara frontal de la carpa. Se incluye en el Drive el arte correspondiente. **Se aprueba iniciar con la producción dando cumplimiento con la especificación anteriormente solicitada.**

Link Arte:

Impresos Laterales Mercados Campesinos 3x3: Se recibió muestra por parte del contratista y **Se aprueba iniciar con la producción.**

En cuanto a la impresión para los 85 laterales de Mercados campesinos la distribución será la siguiente:

- Lado izquierdo total 20 impresiones
- Lado derecho total 20 impresiones
- Lateral trasero total 45 impresiones

Ítem	Elemento	Cantidad
1	CARPA TIPO PAGODA SUPERFLEX ESTAMPADA 3X3	45
3	LATERALES PARA CARPA DE 3X3 MTS TIPO PAGODA SUPERFLEX ESTAMPADO	85

4	CARPA TIPO PAGODA DE 2X2 MTS A 4 AGUAS SUPERFLEX ESTAMPADO	10
7	SACOS ARENEROS CONTRAPESOS SUPERFLEX	120
11	MOBILIARIO ITINERANTE PRODUCTOS FRESCOS DESARMABLE	26
16	TECHO A 4 AGUAS PARA CARPA TIPO PAGODA 3X3	20

Impresos Techos Hecho en Bogotá 3x3: En relación con esta medida, en el marco de la estrategia *Hecho en Bogotá*, no se recibió muestra física por parte del contratista, No obstante esta debe ser similar al diseño solicitado para las carpas de 2x2.

Impresos Laterales Hecho en Bogotá 3x3: En relación con esta medida, en el marco de la estrategia *Hecho en Bogotá*, no se recibió muestra física por parte del contratista. No obstante esta debe ser similar a la muestra fisica y al diseño entregado por la entidad y presentado por el contratista para las carpas de 2x2, **Se aprueba iniciar con la producción.**

CARPAS PAGODAS DE 2X2

Estructura Carpas 2x2:
El anclaje de las piezas hembra y macho se realizará mediante un sistema de ángulo, con el fin de garantizar mayor seguridad y durabilidad. Así mismo, las piezas hembra, macho y las patas contarán con pines en su totalidad ocho (8) por carpa que permitirán asegurar y tensar adecuadamente los laterales y techos. La totalidad de la estructura contará con recubrimiento de pintura electrostática, lo cual garantiza una mayor resistencia a la corrosión y un acabado uniforme, para finalizar el calibre de la estructura concuerda con la solicitada en las especificaciones técnicas. **Se aprueba iniciar con la producción.**

Lonas Techo 2x2:
A la muestra física de la lona para techos se le instalao una (1) correa interna por cada lado, para un total de cuatro (4) correas, las cuales permitirán tensar adecuadamente el techo y evitar el empozamiento de agua en la parte superior. Adicionalmente, la lona presentaba un buen sellado, así mismo en las esquinas y punta contaba con un refuerzo y excelentes acabados. El material utilizado es Superflex, lo que garantiza flexibilidad y resistencia.

Lonas Laterales 2x2:
La muestra física de los laterales presentada contaba únicamente con ojales. Tras la evaluación de ventajas y desventajas por parte del equipo técnico, la revisión de las especificaciones técnicas y en común acuerdo con el contratista, se acordó realizar ajustes de la siguiente manera: algunos ojales serán reemplazados por correas con riata, instalando un total de cinco (5) por lateral, distribuidos de la siguiente manera: dos (2) en el lado derecho, dos (2) al lado izquierdo del lateral, uno (1) en la parte superior y dos (2) ojales en la parte superior y dos (2) al lado derecho e izquierdo. Adicionalmente, las correas estarán cosidas y se les incorporará una chapeta, con el fin de garantizar mayor seguridad y resistencia.

Impresos Techos Hecho en Bogotá 2x2: La muestra física del techo el arte y color no concuerda con el diseño y artes remitidos por la entidad, se solicita al contratista realizar una nueva muestra con el arte correcto. Se recuerda que el techo debe ser de color blanco con las cenefas que se enviaron de color azul, así mismo se debe tener en cuenta la distancia entre el borde del techo y los logos como el orden de los artes “A – B”.

Observación General: Por otro lado, el arte en el fondo azul se está corriendo, dejando un lineado blanco entre la tinta azul y la amarilla que es un error, caso que no se evidencia en los artes de los laterales de color.



Impresos Laterales Hecho en Bogotá 2x2: El arte azul y rosado quedó a full color, adicionalmente con excelentes terminaciones, con relación al logo con fondo blanco no se recibió muestra física por parte del contratista. **Se aprueba iniciar con la producción, aunque nos gustaria ver una muestra del lateral logo con fondo blanco, como esta en el arte.**

Impresos Techos Mercados Campesinos 2x2: En relación con esta medida, en el marco de la estrategia *de Mercados Campesinos*, no se recibió muestra física por parte del contratista, No obstante esta debe ser similar al diseño solicitado para las carpas de 3x3 solicitado por la subdirección. **Se aprueba iniciar con la producción**

La cantidad de carpas, techos y laterales requeridos por la estrategia **Hecho en Bogotá** se describen a continuación en la siguiente tabla:

Ítem	Elemento	Cantidad Total Proceso
1	Carpa Pagoda 3x3 Estampada	2
2	Lateral 3x3 Blanco	55
3	Lateral 3x3 Estampado	31
4	Carpa Pagoda 2x2 Estampada	2
5	Lateral 2x2 Blanco	80
6	Lateral 2x2 Estampado	60
16	Techo Carpa Pagoda 3x3 Estampado	30
17	Techo Carpa Pagoda 2x2 Estampado	60

Arte Laterales Estampados		
Logo Azul	Logo Rosado	Logo Blanco
		

Distribución de Laterales Por Arte					
Lateral 3x3 Estampado			Lateral 2x2 Estampado		
Logo Azul	Logo Rosado	Logo Blanco	Logo Azul	Logo Rosado	Logo Blanco
10	10	11	20	20	20

Se anexa registro fotografico de las muestras fisicas, verificadas en campo de la estructura, laterales, techos y diseños:

Registro Fotográfico Estructura	
	









Fuente: SDDE_SIFRE_SAA


Registro Fotográfico Lonas Techos, Laterales y Artes



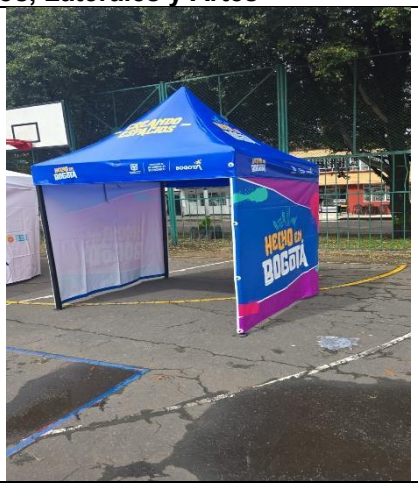

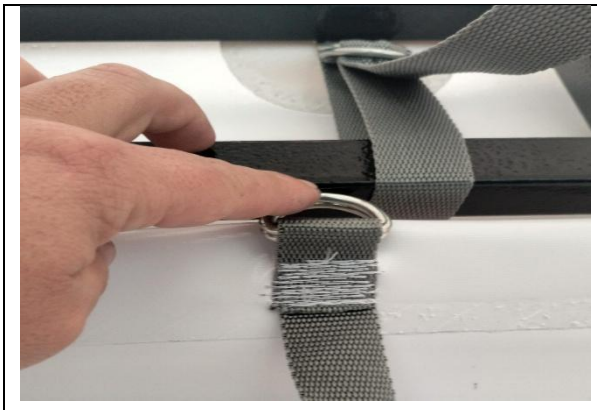



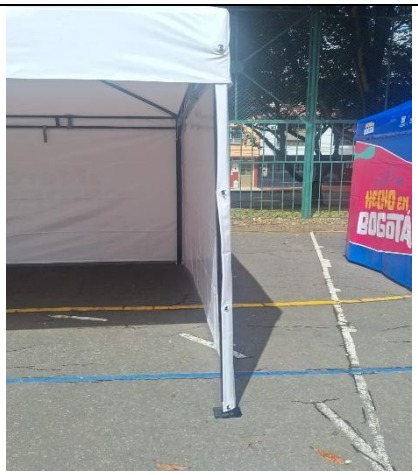








Fuente: SDDE_SIFRE_SAA

El contratista realizo la devolución de los elementos entregados el 5 de junio para muestra, dos hembras, dos machos y 3 espigos de 2x2, queda en su custodia 1 araña y 1 cono de 2x2, adicional a los elementos que se le remitiran.


Nota: *Se deja constancia de que la aprobación para el inicio de la producción de las carpas, laterales y techos no implica la aceptación final por parte de la entidad, la cual estará condicionada al cumplimiento de calidad exigidas para el bien.*

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN		
COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA CUMPLIMIENTO**
Entrega de muestras físicas: Se llevará al contratista una exhibidor de 6 puestos, una araña de 3x3, un cono de 3x3 y un para sol con su lona.	SDDE	11/06/2025
Acta con la aprobación de las muestras y Observaciones	SDDE	12/06/2025
Devolución de Muestras Fisicas al Contratista	SDDE	16/06/2025
Presentación de Muestra Fisica del Techo de 2x2 con el diseño aprobado por la entidad y Lateral blanco con Logo.	UT GRAN OLAN CAPITAL	Por Definir


En constancia de lo anterior firman:



Realizó
Nombre: Hernando Mendez
Cargo: Apoyó a la Supervisión contrato 687 Contratista SAA



Revisó
Nombre: Edwin Arley Ramírez Bohorquez
Cargo: Representante UT GRAN OLAN CAPITAL



Revisó
Nombre: Lineth Panche Molina
Cargo: Apoyó a la Supervisión contrato 687 Contratista SIFRE
