1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	Consorcio RC Deportivo
Informe de Actividades N.º	**02**
Periodo	Del 1 al 31 de mayo de 2025
Número del Contrato	6904-2024
Objeto:	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA
Plazo	Once (11) meses
Valor Total del Contrato	$ 26.111.451.383
Valor del Periodo del Informe	$ 3.144.670.645,00
Fecha de Inicio	Febrero 27 de 2025
Fecha de Terminación	Enero 26 de 2026
Proyecto	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA BPIN 2021660010056
Interventor	Consorcio Inter Coliseo 2024
Dependencia	Secretaria de Deportes



Ing. Hoover Fernando Ortiz Montoya
Representante Legal
Consorcio Inter Coliseo 2024 Municipio de Pereira



Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE OBRA

Version: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024

Objeto:
CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA

Fecha: del 01-05-2025 al 31-05-2025

Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO

Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024

Valor inicial: 26.111.451.383
Valor adición: 0,00
Valor total: 26.111.451.383

Valor Anticipo: 0,00
Fecha iniciación: 27/02/2025
Plazo:Once (11) meses
Fecha terminación: 26/01/2026
Fecha Suspension:
Fecha Reiniciacion:
Fecha Terminación Real:

ACTA DE OBRA 2

31-may-25

Valor: $ 3,144,670,645.00

Los tipos de modificación son:
+1 : adición

-1 : reducción

CONDICIONES GENERALES				CONTRATADO			MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTA-1		EJECUTADO PRESENTA ACTA -2		ACUMULADO	
Grupo	**Código**	**Item**	**Un**	**Cant.**	**Vr. Unit**	**Vr. Parcial**	**Tipo**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**
	1.1	**PRELIMINARES**				**30,109,825**			**-**		**20,604,879**		**-**		**20,604,879**
														0.00	-
	1.1.01	Localizacion replanteo obra arquitectonica	M2	7081.44	4,252	30,109,825			-	4846.00	20,604,879		-	4846.00	20,604,879
														0.00	-
		SUBTOTAL CAP 1,1 PRELIMINARES :				**30,109,825**			**-**		**20,604,879**		**-**	0.00	**20,604,879**
	1.2	**DEMONTES + DEMOLICIONES**				**74,851,837**			**-**		**38,150,710**		**3,309,200**	0.00	**41,459,911**
														0.00	-
	1.2.01	Desm. Tableros de baloncesto	UND	2	44,064	88,128			-	2.00	88,128	0.00	-	2.00	88,128
	1.2.02	Desmonte poste concreto	UND	3	102,642	307,926			-	3.00	307,926	0.00	-	3.00	307,926
	1.2.03	Corte de Arbol mas retiro (Incl. Raices)	UND	45	174,168	7,837,579			-	26.00	4,528,379	19.00	3,309,200	45.00	7,837,579
	1.2.04	Demol. Placa contrapiso canchas	M2	1863.43	17,555	32,712,652			-	968.50	17,002,089	0.00	-	968.50	17,002,089
	1.2.05	Demol. Graderia existente. Espesor 10-15cm.	M2	255.73	31,346	8,016,031			-	238.97	7,490,677	0.00	-	238.97	7,490,677
	1.2.06	Retiro material extraido de la excavacion. medido	M3	625.9	39,608	24,790,498			-	220.50	8,733,511	0.00	-	220.50	8,733,511
	1.2.07	Demol.camara de concreto profund hasta 3m +	UND	5	219,805	1,099,023			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
														0.00	-
		SUBTOTAL CAP. 1,2 DEMONTES + DEMOLICIONES :				**74,851,837**			**-**		**38,150,710**		**3,309,200**	0.00	**41,459,911**
	2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS**				**691,413,784**			**-**		**44,771,750**		**172,180,245**	0.00	**216,951,994**
														0.00	-
	2.01	Descapote maquina mas retiro. Prof 20cm	M2	5494.56	7,448	40,923,914			-	1436.57	10,699,686	1830.19	13,631,399	3266.76	24,331,085
	2.02	Excavacion a maquina sin retiro	M3	3491.68	8,066	28,164,450			-	677.91	5,468,131	1239.28	9,996,231	1917.19	15,464,361
	2.03	Excavacion manual.tierra seca h=1.8m(sr)	M3	3062.02	33,468	102,480,146			-	0.00	-	439.04	14,693,857	439.04	14,693,857
	2.04	Conform.compact.subrasante cbr=95	M2	5494.56	2,776	15,254,624			-	0.00	-	1590.24	4,415,006	1590.24	4,415,006
	2.05	Relleno roca muerta compac-cilindro + acarreo	M3	2225.34	69,866	155,475,103			-	0.00	-	901.29	62,969,254	901.29	62,969,254
	2.06	Sub base granular compactada al 100% del Próctor	M3	824.19	108,638	89,538,160			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	2.07	Retiro material extraido de la excavacion. medido	M3	6553.7	39,608	259,577,387			-	722.18	28,603,933	1678.32	66,474,498	2400.50	95,078,432
														0.00	-
		SUBTOTAL CAP. 2 EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS:				**691,413,784**			**-**		**44,771,750**		**172,180,245**	0.00	**216,951,994**
	3	**CIMENTACIONES**				**1,345,366,679**			**-**		**474,449,582**		**322,848,039**	0.00	**797,297,620**
														0.00	-
	3.01	Solado en concreto 1:3:5 2000 PSI-14 MPA.	M2	1559.48	34,999	54,580,196			-	0.00	-	643.68	22,528,120	643.68	22,528,120
	3.02	Zapata de cimentación de concreto armado.	M3	403.39	869,449	350,726,980			-	0.00	-	130.28	113,271,799	130.28	113,271,799
	3.03	Viga de cimentacion concreto 3000 psi Seccion	M3	124.10	935,672	116,116,925			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	3.04	Pedestal concreto 3000 psi. incluye formaleta	M3	62.21	858,941	53,434,701			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	3.05	Zarpas en concreto de 3000 psi. cimentacion muro	M3	242.42	735,455	178,288,997			-	0.00	-	144.62	106,361,500	144.62	106,361,500
	3.06	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KLS	79355.59	7,463	592,218,880			-	63574.85	474,449,582	10811.77	80,686,620	74386.62	555,136,201
														0.00	-
		SUBTOTAL CAP. 3 CIMENTACIONES:				**1,345,366,679**			**-**		**474,449,582**		**322,848,039**	0.00	**797,297,620**
	4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**1,922,257,686**			**-**		**-**		**481,654,124**	0.00	**481,654,123**
														0.00	-
	4.01	Columna concreto 4000 psi. acabado	M3	21.35	1,407,733	30,055,110			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	4.02	Concreto tremie para columnas metalicas 3000psi-	M3	211.90	667,995	141,548,072			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	4.03	Viga concreto aerea 4000 psi Acabado	M3	36.30	1,285,864	46,676,867			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	4.04	Viga concreto amarre muro 10-12x20cm	M3	15.04	1,441,836	21,685,214			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	4.05	Graderia en concreto 4000 psi e=10 Acabado	M3	95.22	1,322,005	125,881,331			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	4.06	Losa concreto 3000 psi maciza Espesor 15cm	M2	1964.28	168,108	330,211,390			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	4.07	Huellas en concreto 3000 psi sobre estructura	M3	4.80	1,165,851	5,596,086			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	4.08	Muro concreto 3000psi contencion: Altura 3m-a 5m	M3	272.86	937,076	255,690,648			-	0.00	-	15.31	14,346,639	15.31	14,346,639
	4.09	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KLS	77155.91	7,463	575,802,998			-	0.00	-	62617.83	467,307,485	62617.83	467,307,485
	4.10	Suministro e instalacion de ref malla electrosoldada	KLS	21607.08	9,754	210,756,072			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	4.11	Losa caseton esterilla e=46-50cm [torta]	M2	788.36	197,010	155,314,982			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	4.12	Escalera concreto 3000 psi	M3	18.16	1,268,663	23,038,916			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
														0.00	-

MFRANCOA-02460847224149-4453629-009387969-A

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE OBRA

Version: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024

Objeto:
CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA

Fecha: del 01-05-2025 al 31-05-2025

Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO

Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024

Valor inicial: 26.111.451.383
Valor adición: 0,00
Valor total: 26.111.451.383

Valor Anticipo: 0,00
Fecha iniciación: 27/02/2025
Plazo:Once (11) meses
Fecha terminación: 26/01/2026
Fecha Suspension:
Fecha Reiniciacion:
Fecha Terminación Real:

ACTA DE OBRA 2

31-may-25

Valor: $ 3,144,670,645.00

Los tipos de modificación son:
+1 : adición

-1 : reducción

CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO				MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTA-1		EJECUTADO PRESENTA ACTA -2		ACUMULADO	
Grupo	**Código**	**Item**	**Un**	**Cant.**	**Vr. Unit**	**Vr. Parcial**	**Tipo**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**
		SUBTOTAL CAP. 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO:				**1,922,257,686**			**-**		**-**		**481,654,124**	0.00	**481,654,123**
	5.1	**MAMPOSTERIAS**				**312,204,623**			**-**		**-**		**-**	0.00	**-**
														0.00	-
	5.1.01	Muro bloque concreto 12x19x39cm. Resistecia 13	M2	2230.96	126,123	281,375,074			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	5.1.02	suministro e instalacion de Lavatrapero	UND	1	247,677	247,677			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	5.1.03	Muro calado cemento 20x20 incluye refuerzo #2	M2	15	129,041	1,935,622			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	5.1.04	Matera en U concreto 3000psi [u] reforzado	ML	60.87	335,739	20,436,424			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	5.1.05	Banca concreto 3000 psi reforzado ancho 50cm	ML	60.87	134,875	8,209,826			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
														0.00	-
		SUBTOTAL CAP. 5,1 MAMPOSTERIAS:				**312,204,623**			**-**		**-**		**-**	0.00	**-**
	5.2	**SISTEMA LIVIANO EN SECO**				**39,892,905**			**-**		**-**		**-**	0.00	**-**
														0.00	-
	5.2.01	Estruc.muro panel [canal-paral] 93mm c24	M2	304.51	37,225	11,335,337			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	5.2.02	Muro 1-panel 13mm 1-panel 13mm RH. Incluye	M2	304.51	93,782	28,557,568			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
										0.00	-	0.00	-	0.00	-
		SUBTOTAL CAP. 5,2 SISTEMA LIVIANO EN SECO:				**39,892,905**			**-**		**-**		**-**	0.00	**-**
	6.1	**ESTRUCTURA METALICA**				**7,733,492,082**			**-**		**1,909,681,335**		**1,464,867,849**	0.00	**3,374,549,183**
														0.00	-
	6.1.01	Suministro e instalacion de estructura metalica	KLS	427446.60	18,092	7,733,492,082			-	105552.16	1,909,681,335	80966.37	1,464,867,849	186518.53	3,374,549,183
														0.00	-
		SUBTOTAL CAP. 6,1 ESTRUCTURA METALICA:				**7,733,492,082**			**-**		**1,909,681,335**		**1,464,867,849**	0.00	**3,374,549,183**
	12	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**1,085,331,940**			**-**		**172,968,675**		**-**	0.00	**172,968,673**
														0.00	
		SUMINISTRO Y MEDIDA DE ENERGIA DESDE												0.00	
	12.1	ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE EQUIPO DE	UND	1	2,109,182	2,109,182			-	1.00	2,109,182	0.00	-	1.00	2,109,182
	12.2	EQUIPOS PARA PROTECCIONES EN MEDIA	UND	1	3,303,816	3,303,816			-	1.00	3,303,816	0.00	-	1.00	3,303,816
	12.3	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ESTRUCTURA	UND	1	1,139,949	1,139,949			-	1.00	1,139,949	0.00	-	1.00	1,139,949
	12.4	CABLE ACSR SEMIASLADO 1/0 XLPE 15 KV	ML	12	68,303	819,637			-	12.00	819,637	0.00	-	12.00	819,637
	12.5	BAJANTE MEDIA TENSION EN POSTE	UND	2	3,234,531	6,469,062			-	2.00	6,469,062	0.00	-	2.00	6,469,062
	12.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES	JGO	2	1,343,680	2,687,360			-	1.00	1,343,680	0.00	-	1.00	1,343,680
	12.7	CANALIZACION PARA 13.2KV DESDE POSTE	ML	77	356,881	27,479,847			-	77.00	27,479,847	0.00	-	77.00	27,479,847
	12.8	CAMARA DE CABLEADO MT TIPO EEP CON	UND	4	2,231,436	8,925,743			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	12.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA	ML	72	279,886	20,151,795			-	72.00	20,151,795	0.00	-	72.00	20,151,795
		SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR												0.00	
	12.10	ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE	UND	1	6,518,885	6,518,885			-	1.00	6,518,885	0.00	-	1.00	6,518,885
	12.11	EQUIPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA 3	UND	1	4,688,682	4,688,682			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	12.12	TRANSFORMADOR CONVENCIONAL EN ACEITE	UND	1	26,817,596	26,817,596			-	1.00	26,817,596	0.00	-	1.00	26,817,596
	12.13	EQUIPOS PARA PROTECCIONES DE	UND	1	3,289,774	3,289,774			-	1.00	3,289,774	0.00	-	1.00	3,289,774
	12.14	MALLA TIERRA SUBESTACION COLISEO	UND	1	4,097,649	4,097,649			-	1.00	4,097,649	0.00	-	1.00	4,097,649
	12.15	MALLA CERRAMIENTO CON PUERTA altura 2,5	M2	52	230,057	11,962,964			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	12.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tablero con	UND	1	25,789,947	25,789,947			-	1.00	25,789,947	0.00	-	1.00	25,789,947
	12.17	PLANTA ELECTRICA CON CABINA INSONORA	UND	1	90,188,821	90,188,821			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	12.18	Acometida Principal Baja tension - 400A BT en	ML	55	863,096	47,470,293			-	44.00	37,976,234	0.00	-	44.00	37,976,234
	12.19	BAJANTE BAJA TENSION DE TRANSFORMADOR	UN	1	1,679,986	1,679,986			-	1.00	1,679,986	0.00	-	1.00	1,679,986
	12.20	TRAMO ACOMETIDA BT INTEMPERIE EN IMC	ML	6	365,636	2,193,817			-	6.00	2,193,817	0.00	-	6.00	2,193,817
	12.21	EXCAVACION EN TIERRA 1MPROF	M3	39	46,209	1,811,400			-	25.00	1,155,230	0.00	-	25.00	1,155,230
	12.22	DUCTOS PVC 2X4" DESDE TRANSFERENCIA	ML	50	63,259	3,162,945			-	10.00	632,589	0.00	-	10.00	632,589
	12.23	Construcción cámara de BT. Incluye localización,	UND	4.00	1,064,012	4,256,047			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	12.24	Suministro, transporte, hincada y aplomada de	UND	2.00	1,276,245	2,552,491			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	12.25	Suministro y montaje y conexionado de Luminaria	UND	2.00	787,551	1,575,102			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	12.26	UPS MONOFASICA 6 KVA CON BYPASS	UND	1.00	14,097,671	14,097,671			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	12.27	TABLERO GENERAL DE BT METALICO TIPO	UN	1.00	18,231,476	18,231,476			-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE OBRA

Version: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024	Fecha: del 01-05-2025 al 31-05-2025	Valor inicial: 26.111.451.383 Valor adición: 0,00 Valor total: 26.111.451.383
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**	Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO	Valor Anticipo: 0,00 Fecha iniciación: 27/02/2025 Plazo:Once (11) meses Fecha terminación: 26/01/2026 Fecha Suspension: Fecha Reiniciacion: Fecha Terminación Real:
Los tipos de modificación son: +1 : adición -1 : reducción	Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024	

ACTA DE OBRA 2

31-may-25

Valor: $ 3,144,670,645.00

CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO				MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTA-1		EJECUTADO PRESENTA ACTA -2		ACUMULADO	
Grupo	**Código**	**Item**	**Un**	**Cant.**	**Vr. Unit**	**Vr. Parcial**	**Tipo**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**
														0.00	
		Suma				$ 18,732,879,149			Costo Directo		$ 2,660,626,931		$ 2,444,859,457	0.00	$ 5,105,486,384
		A.U. 28,62%				$ 5,362,058,082			A.U		$ 761,571,994		$ 699,811,188	0.00	$ 1,461,383,181
		VALOR TOTAL				$ 24,094,937,231			VALOR TOTAL		$ 3,422,198,925		$ 3,144,670,645	0.00	$ 6,566,869,565
														0.00	
	B	**ITEMS POR FUERA DE AIU**				**1,694,549,707**					-		-	0.00	-
	1.1	Inspeccion Retie	UND	1	7,472,717	7,472,717					-		-	0.00	-
	1.2	Inspeccion RetiLAP	UND	1	10,690,201	10,690,201					-		-	0.00	-
	1.3	PLANOS AS BUILT REDES ELECTRICAS	UND	1	3,130,252	3,130,252					-		-	0.00	-
	2	GESTIONES Y TRAMITES ANTE EPP (NO INCLUYE PAGOS POR INTERVENTORIA, CORTES ENERGIA O SIMILARES)	UND	1	525,210	525,210					-		-	0.00	-
	3	PGIO Plan de gestion integral de la obra: PMA - PGS -PMT	UND	1	234,348,739	234,348,739					-		-	0.00	-
	4	Suministro e instalación de piso de madera desmontable / reutilizable con vida útil igual o superior a 5 años	M2	1855	775,408	1,438,382,588					-		-	0.00	-
						1,694,549,707					-		-	0.00	-
		Suma				$ 1,694,549,707			Costo Directo		$ -		$ -		$ -
		IVA 19%				$ 321,964,445			IVA		$ -		$ -		$ -
		TOTAL ITEMS POR FUERA DE AIU				$ 2,016,514,152			VALOR TOTAL		$ -		$ -		$ -
		TOTAL CONTRATO OBRA				$ 26,111,451,383.00					$ 3,422,198,925.00		$ 3,144,670,645.00		$ 6,566,869,565.09
									(-) Amortización anticipo obra ejecutada		$ -		$ -		
									(-) Amortización anticipo obra NO ejecutada		$ -		$ -	$	6,566,869,570
Son:									Neto acta		$ 3,422,198,925.00		$ 3,144,670,645.00		

BALANCE ANTICIPO			BALANCE CONTRATO			
VALOR ANTICIPO		$ -	Vr. contrato	$ 26,111,451,383	$ -	$ -
Vr. amortizaciiones actas anteriores	$ -		Vr. actas anteriores ACTA-1		$ 3,422,198,925	
Vr. amortización presente acta			Vr. presente ACTA-2		$ 3,144,670,645	
Saldo			Saldo		$ 19,544,581,813	
Sumas iguales	$ -	$ -	Sumas iguales	$ 26,111,451,383	$ 26,111,451,383	$ -

Interventor Ing Javier Rosero

Contratista Arq Otto Lozano

LA INTERVENTORIA DA FE QUE LOS ITEMS Y LAS CANTIDADES CANCELADAS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDEN AL OBJETO DEL CONTRATO HECHO POR LA ENTIDAD

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIPROPÓSITOS**	**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	**31**	**MM**	**5**	**AA**	**2025**	**CORTE N°**	**2**	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO

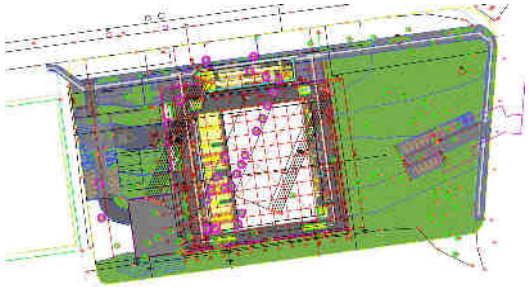
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4	**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9	**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**DEMONTES + DEMOLICIONES**	**ITEM / ACTIVIDAD**	1.2.03	Corte de Arbol mas retiro (Incl. Raices)	**UNID.**	UND	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**

ILUSTRACION







LINK:PLANO ARBOLES PDF

LINK:PLANO ARBOLES DWG

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	26.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	19.00	ACTA6	0.00	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**45.00**

Localización	**CANT**	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**	**Subtotal**	**Área total**
						26.00
ACTA-2						
Corte de Arboles y retiro	19.0	0.00	0.00		19.00	19.00
					0.00	19.00
Subtotal						19.00
ACUMULADO						45.00
TOTAL						**45.00**

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de **PEREIRA**

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017


DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPÓSITOS**	**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	**31**	**MM**	**5**	**AA**	**2025**	**CORTE N°**	**2**	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4	**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9	**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS**	**ITEM / ACTIVIDAD**	2.01	Descapote maquina mas retiro. Prof 20cm	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**

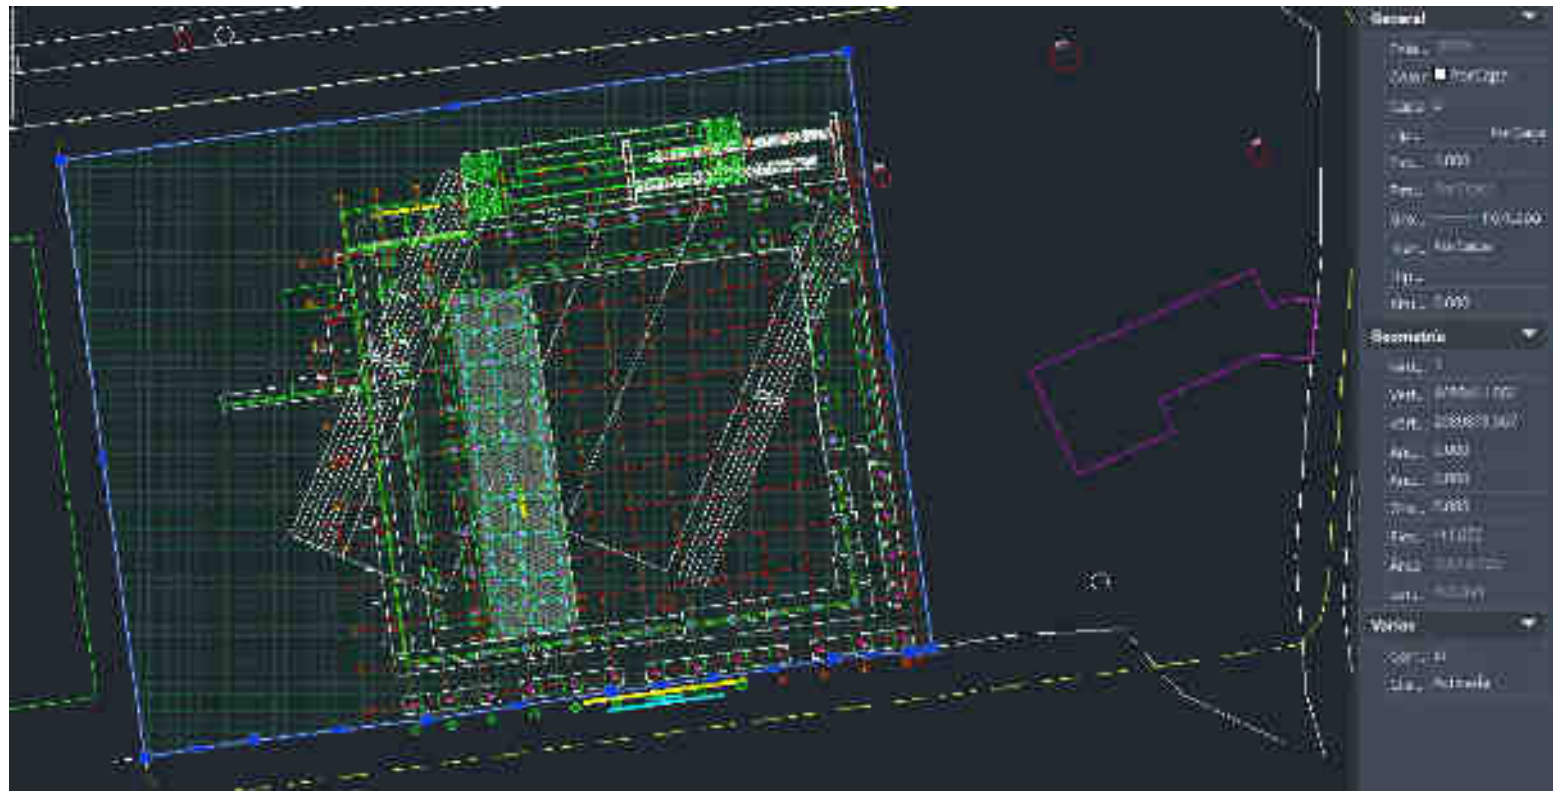ILUSTRACION







MEMORIAS DESCAPOTE\DESCAPOTE COLISEO.dwg

MEMORIAS DESCAPOTE\MEMORIA DESCAPOTE COLISEO.xlsx

Localización	**CANT**	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**	**Subtotal**	**Área total**
ACTA-2						
CANCHA 1 DESCONTAR	-1.0	58.10	17.00		-987.70	-987.70
GRADERIA 1 DESCONTAR	-1.0	56.14	8.21		-460.94	-1448.64
GRADERIA 2 DESCONTAR	-1.0	56.14	5.21		-292.49	-1741.13
CANCHA 2 DESCONTAR	-1.0	59.00	17.00		-1003.00	-2744.13
AREA DESCAPOTE CARTERA MENOS DESCAPOTE ACTA-1	60.00%	113.20	88.50		4574.32	1830.18
Subtotal						1,830.19
Vienen						3,266.76
TOTAL						**3,266.76**

OBSERVACIONES:	ACTA 1	1436.57	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	1830.18	ACTA6	0.00	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**3266.75**

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

MFRANCOA-02460847224149-4453629-009387969-A

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017


DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIPROPÓSITOS**	**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	31	**MM**	5	**AA**	2025	**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4	**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9	**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS**	**ITEM / ACTIVIDAD**	2.02	Excavacion a maquina sin retiro	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**

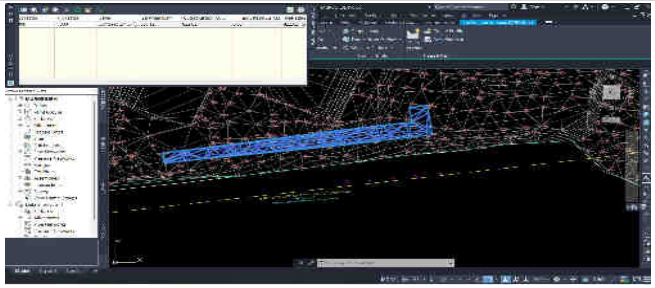ILUSTRACION







MEMORIA EXCAVACIONES\MUROS 1,2,3,4.csv

MEMORIA EXCAVACIONES\MUROS EJE K.dwg

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	677.91	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	1219.12	ACTA6	0.00	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**1897.02**

Localización	**CANT**	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**	**Subtotal**	**Volumen Total**
		ACTA-2				
MUROS EJE K M-1	1.0	11.82	3.15	3.05	113.56	113.56
MUROS EJE K M-2	1.0	30	3.4	2.86	291.72	405.28
MUROS EJE K M-3	1.0	12	4.6	3.18	175.54	580.82
MUROS EJE K M-4	1.0	20.01	4.65	2.92	271.70	852.51
MUROS EJE K M-5	1.0	6	3.55	3	63.90	916.41
terraceo eje 2, j-k	1.0	6.25	6.35	3.5	138.91	1055.32
terraceo eje 2, k-l	1.0	6.3	6.5	4	163.80	1219.12
MUROS EJE-14	1.0	7	3.6	0.8	20.16	1239.28
Subtotal						1,239.28
Vienen						1,917.19
TOTAL						**1,917.19**

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017


DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIPROPÓSITOS**	**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	31	**MM**	5	**AA**	2025	**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4	**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9	**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS**	**ITEM / ACTIVIDAD**	2.03	Excavacion manual.tierra seca h=1.8m(sr)	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**

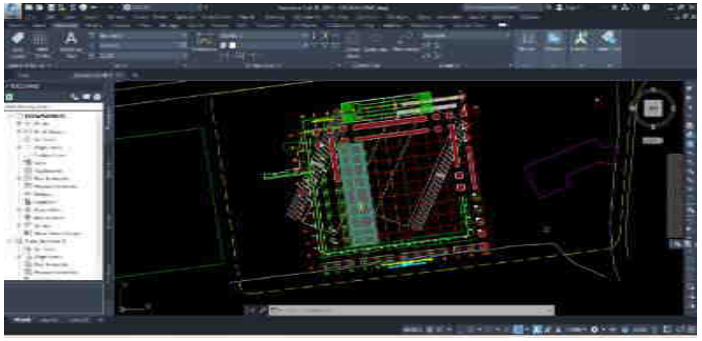ILUSTRACION









MEMORIA EXCAVACIONES

MEMORIA EXCAVACIONES\EXCAVACIONES.dwg

OBSERVACIONES:	ACTA 1	0.00	ACTA5	0.00		
	ACTA 2	439.04	ACTA6	0.00		
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**	
	ACTA 4	0.00			**439.04**	

Localización	**CANT**	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**	**Subtotal**	**Volumen Total**
ACTA-2						
A13		2.6	2.6	1.27	8.59	8.59
A12		2.6	2.6	1.27	8.59	17.17
A11		2.6	2.6	1.27	8.59	25.76
A10,A9,A8,A7,A6,A5		33	2.4	1.27	100.58	126.34
A4		2.6	2.6	1.27	8.59	134.92
A3		2.6	2.6	1.27	8.59	143.51
A2		2.6	2.6	1.27	8.59	152.10
B13		2	2	1.27	5.08	157.18
B12,C12,D12,E12		21	1.65	1.27	44.01	201.18
B11		2.6	2.6	1.27	8.59	209.77
B10,B9,B8,B7,B6,B5		33	1.65	1.27	69.15	278.92
B4		2.6	2.6	1.27	8.59	287.50
B3,C3,D3,E3		21	2.15	1.27	57.34	344.84
B2		2	2	1.27	5.08	349.92
C2		2	2	1.27	5.08	355.00
D2,E2,F2,G2		21	1.65	1.27	44.01	399.01
K2		2.6	2.6	1.27	8.59	407.59
L2		2.6	2.6	1.27	8.59	416.18
F3		3	3	1.27	11.43	427.61
G3		3	3	1.27	11.43	439.04
Subtotal						439.04
Vienen						439.04
TOTAL						**439.04**

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de **PEREIRA**

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017


DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPÓSITOS**	**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	


FECHA	**DD**	**31**	**MM**	**5**	**AA**	**2025**	**CORTE N°**	**2**	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4	**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9	**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS**	**ITEM / ACTIVIDAD**	2.04	Conform.compact.subrasante cbr=95	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**

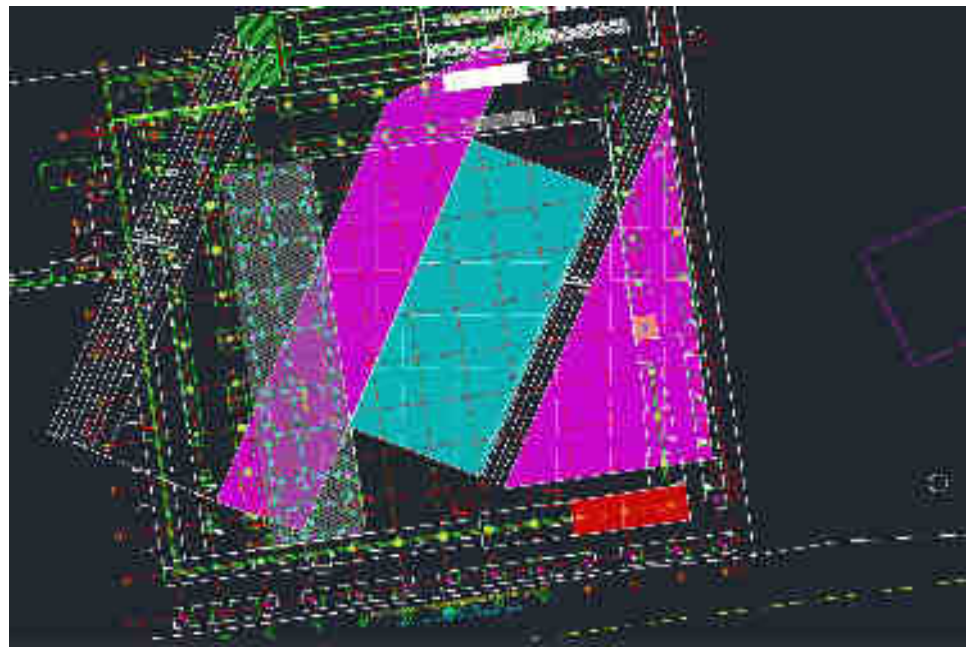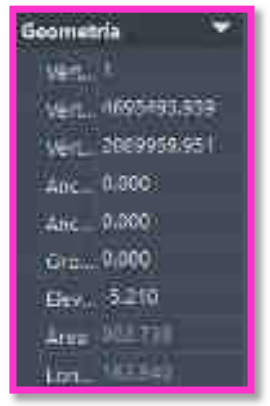ILUSTRACION











Localización	**CONV**	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**	**Subtotal**	**Area Total**
	ACTA-2					
EJE K-MURO 4 SUSTITUCIONES N -6.50		10.00	5.00		50.00	50.00
ZAPATA G 3 SUSTITUCIONES N - 1.50		3.00	3.00		9.00	59.00
ZONA PLATAFORMA DE COMPETENCIA COMPACTACION CANCHA DEMOLIDA CANCHA 1 N 0.00		48.50	15.00		727.50	786.50
COMPACTACION SUBRASANTE ENTRE CANCHAS N 0.00					803.74	1590.24
Subtotal						1590.24
Vienen						1590.24
TOTAL						**1,590.24**

OBSERVACIONES:	ACTA 1	0.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	1590.24	ACTA6	0.00	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**1590.24**

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

MFRANCOA-02460847224149-4453629-009387969-A

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIPROPOSITOS**	**CODIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	**31**	**MM**	**5**	**AA**	**2025**	**CORTE N°**	**2**	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO


OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4	**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9	**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS**	**ITEM / ACTIVIDAD**	2.05	Relleno roca muerta compac-cilindro + acarreo	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**

ILUSTRACION















MEMORIA RELLENO ROCA MUERTA

MEMORIA EXCAVACIONES\cartera excavacion -0.30.csv

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	0.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	901.29	ACTA6	0.00	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**901.29**

Localización	**CANT**	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**	**Subtotal**	**Volumen Total**
		ACTA-2				
EJE K-MURO 4 SUSTITUCIONES		10.00	5.00	0.70	35.00	35.00
ZAPATA G 3 SUSTITUCIONES		3.00	3.00	0.30	2.70	37.70
ZAPATA CORRIDA A ENTRE EJES 5 Y 6		6.7	2.40	0.60	9.65	47.35
ZAPATA CORRIDA B ENTRE EJES 5 Y 6		5.80	1.65	1.30	12.44	59.79
ZONA PLATAFORMA COLISEO		85.00	33.00	0.30	841.50	901.29
						901.29
					Subtotal	901.29
					Vienen	901.29
					TOTAL	**901.29**

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

MFRANCOA-02460847224149-4453629-009387969-A

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIPROPÓSITOS**	**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	**31**	**MM**	**5**	**AA**	**2025**	**CORTE N°**	**2**	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4	**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9	**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS**	**ITEM / ACTIVIDAD**	2.07	Retiro material extraido de la excavacion. medido en banco. Cargue maquina <=20km. incluye certificado RCD	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**

ILUSTRACION



Localización	**CANT**	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**	**Subtotal**	**Área total**
		ACTA-2				
MUROS EJE K M-1	1.0	11.82	3.15	3.05	113.56	113.57
MUROS EJE K M-2	1.0	30	3.4	2.86	291.72	405.29
MUROS EJE K M-3	1.0	12	4.6	3.18	175.54	580.83
MUROS EJE K M-4	1.0	20.01	4.65	2.92	271.70	852.53
MUROS EJE K M-5	1.0	6	3.55	3	63.90	916.43
A13	1.0	2.6	2.6	1.27	8.59	925.02
A12	1.0	2.6	2.6	1.27	8.59	933.61
A11	1.0	2.6	2.6	1.27	8.59	942.20
A10,A9,A8,A7,A6,A5	1.0	33	2.4	1.27	100.58	1042.79
A4	1.0	2.6	2.6	1.27	8.59	1051.38
A3	1.0	2.6	2.6	1.27	8.59	1059.97
A2	1.0	2.6	2.6	1.27	8.59	1068.56
B13	1.0	2	2	1.27	5.08	1073.64
B12,C12,D12,E12	1.0	21	1.65	1.27	44.01	1117.65
B11	1.0	2.6	2.6	1.27	8.59	1126.24
B10,B9,B8,B7,B6,B5	1.0	33	1.65	1.27	69.15	1195.40
B4	1.0	2.6	2.6	1.27	8.59	1203.99
B3,C3,D3,E3	1.0	21	2.15	1.27	57.34	1261.34
B2	1.0	2	2	1.27	5.08	1266.42
C2	1.0	2	2	1.27	5.08	1271.50
D2,E2,F2,G2	1.0	21	1.65	1.27	44.01	1315.51
K2	1.0	2.6	2.6	1.27	8.59	1324.10
L2	1.0	2.6	2.6	1.27	8.59	1332.69
F3	1.0	3	3	1.27	11.43	1344.12
G3	1.0	3	3	1.27	11.43	1355.55
MUROS EJE-14	1.0	7	3.6	0.8	20.16	1375.71
					Subtotal	1,375.71
					Vienen	2,097.79
					TOTAL	**2,097.79**

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	722.18	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	1375.71	ACTA6	0.00	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**2097.89**

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCION	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS**	**CODIGO**	
FECHA EMISION		**VERSION**	

FECHA	**DD**	**31**	**MM**	**5**	**AA**	**2025**	**CORTE N°**	**2**	**ELABORO**		CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**					
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4		**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9		**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**CIMENTACIONES**	**ITEM / ACTIVIDAD**	3.01	Solado en concreto 1:3:5 2000 PSI-14 MPA, manejabilidad blanda, preparado en obra y fundido con medios manuales. Esp 7cm	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**	

ILUSTRACION













Localización		**CANT**	**Ancho**	**Largo**		**Área total**
ACTA-2						
MURO M-1			3.15	11.82	37.23	37.23
MURO M-2			3.4	30	102.00	139.23
MURO M-3			4.6	12	55.20	194.43
MURO M-4			4.65	20.01	93.05	287.48
ZAPATA COMBINADA EJE 3			2.15	21	45.15	332.63
ZAPATA AISLADA F3			3	3	9.00	341.63
ZAPATA AISLADA G3			3	3	9.00	350.63
ZAPATA AISLADA A3			2.6	2.6	6.76	357.39
ZAPATA COMBINADA EJE 2			1.65	21	34.65	392.04
ZAPATA AISLADA A2			2.6	2.6	6.76	398.80
ZAPATA AISLADA B2			2	2	4.00	402.80
ZAPATA AISLADA C2			2	2	4.00	406.80
ZAPATA AISLADA A4			2.6	2.6	6.76	413.56
ZAPATA AISLADA B4			2.6	2.6	6.76	420.32
ZAPATA COMBINADA EJE A			2.4	33	79.20	499.52
ZAPATA COMBINADA EJE B			1.65	33	54.45	553.97
ZAPATA AISLADA K2			2.6	2.6	6.76	560.73
ZAPATA AISLADA L2			2.6	2.6	6.76	567.49
ZAPATA AISLADA A11			2.6	2.6	6.76	574.25
ZAPATA AISLADA A12			2.6	2.6	6.76	581.01
ZAPATA AISLADA A13			2.6	2.6	6.76	587.77
ZAPATA AISLADA B11			2.6	2.6	6.76	594.53
ZAPATA AISLADA B13			2	2	4.00	598.53
ZAPATA COMBINADA EJE 2			2.15	21	45.15	643.68
					Subtotal	643.68
					Vienen	643.68
					TOTAL	**643.68**

OBSERVACIONES:

ACTA 1	0.00	ACTA5	0.00		
ACTA 2	643.68	ACTA6	0.00		
ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**	
ACTA 4	0.00			**643.68**	

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

MFRANCOA-02460847224149-4453629-009387969-A

Alcaldía de **PEREIRA**

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIPROPÓSITOS**	**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	**31**	**MM**	**5**	**AA**	**2025**	**CORTE N°**	**2**	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4	**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9	**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**CIMENTACIONES**	**ITEM / ACTIVIDAD**	3.02	Zapata de cimentación de concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) El precio incluye el encofrado.	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**

ILUSTRACION



Localización	**Cant Elementos**	**Ancho**	**Alto**	**Longitud**		**Volumen Total**
ACTA-2						
ZAPATA COMBINADA EJE 3	1	2.15	0.5	21.00	22.58	22.58
ZAPATA AISLADA F3	1	3	0.5	3.00	4.50	27.08
ZAPATA AISLADA G3	1	3	0.5	3.00	4.50	31.58
ZAPATA AISLADA A3	1	2.6	0.5	2.60	3.38	34.96
ZAPATA COMBINADA EJE 2	1	1.65	0.35	21.00	12.13	47.08
ZAPATA AISLADA A2	1	2.6	0.5	2.60	3.38	50.46
ZAPATA AISLADA B2	1	2	0.5	2.00	2.00	52.46
ZAPATA AISLADA C2	1	2	0.5	2.00	2.00	54.46
ZAPATA AISLADA A4	1	2.6	0.5	2.60	3.38	57.84
ZAPATA AISLADA B4	1	2.6	0.5	2.60	3.38	61.22
ZAPATA COMBINADA EJE A	1	2.4	0.35	33.00	27.72	88.94
ZAPATA AISLADA K2	1	2.6	0.5	2.60	3.38	92.32
ZAPATA AISLADA L2	1	2.6	0.5	2.60	3.38	95.70
ZAPATA AISLADA A11	1	2.6	0.5	2.60	3.38	99.08
ZAPATA AISLADA A12	1	2.6	0.5	2.60	3.38	102.46
ZAPATA AISLADA A13	1	2.6	0.5	2.60	3.38	105.84
ZAPATA AISLADA B11	1	2.6	0.5	2.60	3.38	109.22
ZAPATA AISLADA B13	1	2	0.5	2.00	2.00	111.22
ZAPATA COMBINADA EJE B	1	1.65	0.35	33.00	19.06	130.28
Subtotal						130.28
Vienen						130.28
TOTAL						**130.28**

OBSERVACIONES:	ACTA 1	0.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	130.28	ACTA6	0.00	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**130.28**

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

MFRANCOA-02460847224149-4453629-009387969-A

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIPROPÓSITOS**	**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	**31**	**MM**	**5**	**AA**	**2025**	**CORTE N°**	**2**	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4			**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9			**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**CIMENTACIONES**	**ITEM / ACTIVIDAD**	='PRE-ACTA'!B53	Zarpas en concreto de 3000 psi. cimentacion muro de contencion	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**

ILUSTRACION







Localización		**Cant Elementos**	**Ancho**	**Alto**	**Longitud**		**Volumen Total**
		ACTA-2					
ZARPA MURO M-1		1	3.15	0.4	11.82	14.89	14.89
ZARPA MURO M-2		1	3.4	0.4	30.00	40.80	55.69
ZARPA MURO M-3		1	4.6	0.6	12.00	33.12	88.81
ZARPA MURO M-4		1	4.65	0.6	20.00	55.80	144.61
Subtotal							144.62
Vienen							144.62
TOTAL							**144.62**

OBSERVACIONES:					**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 1	0.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	144.62	ACTA6	0.00	
	ACTA 3	0.00			**144.62**
	ACTA 4	0.00			

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIPROPOSITOS**	**CODIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	31	**MM**	5	**AA**	2025	**CORTE Nº**	2	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO


OBJETO DEL CONTRATO C O

INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4	**Contrato Nº**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9	**Contrato Nº**	**6904-2024**


CAPÍTULO	**CIMENTACIONES**	**ITEM / ACTIVIDAD**	3.06	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa		**UNID.**	KLS		

ILUSTRACION











Localización	**% COMPRA ACTA-1**	**% SUMINISTRO ACTA-2**	**% INSTALACION ACTA-2**	**CANT**	**Subtotal**	**Peso Total**
ZAPATAS Y PEDESTALES						
ZAPATA COMBINADA EJE 3			0.0863	3828.77	330.42	330.42
ZAPATA AISLADA F3			0.0863	354.60	30.60	361.02
ZAPATA AISLADA G3			0.0863	354.60	30.60	391.63
ZAPATA AISLADA A3			0.0863	332.10	28.66	420.29
ZAPATA COMBINADA EJE 2			0.0863	3673.54	317.03	737.31
ZAPATA AISLADA A2			0.0863	252.16	21.76	759.07
ZAPATA AISLADA B2			0.0863	260.39	22.47	781.54
ZAPATA AISLADA C2			0.0863	260.39	22.47	804.02
ZAPATA AISLADA A4			0.0863	332.10	28.66	832.68
ZAPATA AISLADA B4			0.0863	252.16	21.76	854.44
ZAPATA COMBINADA EJE A			0.0863	8165.71	704.70	1559.14
ZAPATA AISLADA A11			0.0863	332.10	28.66	1587.80
ZAPATA AISLADA A12			0.0863	332.10	28.66	1616.46
ZAPATA AISLADA A13			0.0863	252.16	21.76	1638.22
ZAPATA AISLADA B11			0.0863	252.16	21.76	1659.98
ZAPATA AISLADA B13			0.0863	260.39	22.47	1682.45
ZAPATA AISLADA K2			0.0863	587.97	50.74	1733.19
ZAPATA AISLADA L2			0.0863	409.93	35.38	1768.57
ZAPATA COMBINADA EJE B			0.0863	4579.68	395.23	2163.80
ACERO COMPRADO CIMENTACION TOTAL	0.9064	0.0073		9464.78	8647.97	10811.77

LINK ORDENES DE COMPRA ACERO DE REFUERZO

















OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	63574.85	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	10811.77	ACTA6	0.00	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**74386.62**










Subtotal	10,811.77
Vienen	74,386.61
TOTAL	**10,811.77**

M.S. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZALEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA

ANEXO ACEROS

	LONGITUD		FIGURA		CANTIDAD	LONGITUD	PESO	TOTAL	RESUMEN	
MURO M1	11.82	1		#5	22	11.7	1.56	401.5		
		1		#5	20	11.7	1.56	365.0		
		2		#6	4	11.7	2.25	105.3	AUN NO	
		3		#6	158	4.5	2.25	1599.8	3480.8	TOTAL M-1
		4		#6	118	3	2.25	796.5		
		5		#7	8	4.44	3.042	108.1		
		6		#8	4	4.51	4	72.2		
		7		#3	12	0.82	0.56	5.5		
		7		#3	152	0.82	0.56	69.8		
		8		#3	3	2.72	0.56	4.6		
		8		#3	38	2.72	0.56	57.9		
		9		#3	60	1.72	0.56	57.8	AUN NO	
MURO M2	30			#5	20	12	1.56	374.4		
				#5	24	12	1.56	449.3		
				#5	20	9.5	1.56	296.4		
				#5	24	9.5	1.56	355.7		
				#5	20	8	1.56	249.6		
				#5	24	8	1.56	299.5		
				#5	20	4	1.56	124.8		
				#5	24	4	1.56	149.8		
				#8	112	5	4	2240.0		
				#6	4	12	2.25	108.0	AUN NO	
				#6	4	9.5	2.25	85.5	AUN NO	
				#6	4	8	2.25	72.0	AUN NO	
				#6	4	8	2.25	72.0	AUN NO	
				#6	300	3.15	2.25	2126.3		
				#6	340	5	2.25	3825.0		
				#3	150	1.72	0.56	144.5	AUN NO	
				#4	84	4.8	1	403.2		
				#3	126	3.6	0.56	254.0		12263.6

				#3	756	1.04	0.56	440.3		
				#4	504	1.34	1	675.4		
MURO M-3	12	1		#5	32	11.9	1.56	594.0	6824.5	TOTAL M-3
		1		#5	30	11.9	1.56	556.9		
		2		#6	28	11.9	2.25	749.7	AUN NO	
		3		#6	77	6	2.25	1039.5		
		4		#6	160	4.35	2.25	1566.0		
				#6	38	2	2.25	171.0		
		5		#4	636	1.34	1	852.2		
		6		#4	106	4.8	1	508.8		
		7		#3	60	1.72	0.56	57.8	AUN NO	
				#8	64	6	4	1536.0		
MURO M-4	20.01			#5	32	12	1.56	599.0		
								2064.9	AUN NO	
				#5	16	2.5	1.56	62.4		
				#5	16	3	1.56	74.9		
				#5	16	6	1.56	149.8	9269.3	TOTAL MURO M-4
				#5	16	9.5	1.56	237.1		
				#8	64	7	4	1792.0		
				#5	32	4.5	1.56	224.6		
				#8	162	4.5	4	2916.0		
				#8	66	7	4	1848.0		
				#6	4	12	2.25	108.0	AUN NO	
				#6	41	2.5	2.25	230.6		
				#6	66	6.9	2.25	1024.7		
				#3	102	1.72	0.56	98.2	AUN NO	
				#3	20	3.6	0.56	40.3		
				#3	120	1.04	0.56	69.9		
ZAPATA COMBINADA EJE 3	21	1		#4	168	4.12	1	692.2		
		2		#6	105	2.65	2.25	626.1		
				#7	22	6.4	3.042	428.3		
				#7	11	12	3.042	401.5		
				#4	12	9	1	108.0		
		5		#4	6	4.8	1	28.8		
		6		#4	168	1.7	1	285.6		
				#3	28	3.6	0.56	56.4		
				#3	168	1.04	0.56	97.8		
				#8	32	2.05	4	262.4		
				#4	24	4.8	1	115.2		
				#4	144	1.4	1	201.6		
				#8	64	2.05	4	524.8		
								3828.8		
ZAPATA COMBINADA EJE E		1		#4	174	4.12	1	716.9		
		2		#4	8	9.8	1	78.4		
		3		#4	8	12	1	96.0		
		4		#5	210	1.5	1.56	491.4		
		5		#5	12	12	2.25	324.0		
		6		#5	12	9.8	2.25	264.6		

ZAPATA COMBINADA EJE 2	21	7		#8	8	7.2	4	230.4		
		8		#8	12	12	4	576.0		
				#3	28	2.72	0.56	42.6		
				#3	112	0.84	0.56	52.7		
				#8	8	2.05	4	65.6		
				#7	16	1.97	3.042	95.9		
				#4	48	4	1	192.0		
				#4	96	1.24	1	119.0		
				#8	40	2.05	4	328.0		
								3673.5		
ZAPATA COMBINADA EJE A	33	1		#5	328	2.3	1.56	1176.9		
		2		#5	24	11.5	1.56	430.6		
		3		#5	12	12	1.56	224.6		
		4		#8	36	12	4	1728.0		
		5		#8	36	8.4	4	1209.6		
		6		#4	177	4.1	1	725.7		
				#4	177	1.65	1	292.1		
		7		#4	16	12	1	192.0		
		8		#4	8	10.8	1	86.4		
				#3	28	3.6	0.56	56.4		
				#3	168	1.04	0.56	97.8		
				#8	32	2.05	4	262.4		
				#4	48	4.8	1	230.4		
				#4	288	1.4	1	403.2		
				#8	128	2.05	4	1049.6		
								8165.7		
ZAPATA COMBINADA EJE B	33	1		#5	328	1.5	1.56	767.5		
		2		#5	24	11.5	1.56	430.6		
		3		#5	12	12	1.56	224.6		
		4		#8	16	12	4	768.0		
		5		#8	16	8.4	4	537.6		
		6		#4	16	12	1	192.0		
				#4	8	10.8	1	86.4		
				#4	183	3.7	1	677.1		
				#3	28	2.72	0.56	42.6		
				#3	112	0.84	0.56	52.7		
				#8	8	2.05	4	65.6		
				#7	16	1.97	3.042	95.9		
				#4	48	4	1	192.0		
				#4	96	1.24	1	119.0		
				#8	40	2.05	4	328.0		
								4579.7		
ZAPATA AISLADA A2	2,6 X 2,6			#6	22	2.5	2.25	123.8		
				#3	14	2.72	0.56	21.3		
				#3	56	0.84	0.56	26.3		
				#8	4	2.05	4	32.8		
				#7	8	1.97	3.042	47.9		
								252.2		
ZAPATA AISLADA B2	2 X 2			#5	36	2.35	1.56	132.0		
				#3	14	2.72	0.56	21.3		
				#3	56	0.84	0.56	26.3		
				#8	4	2.05	4	32.8		
				#7	8	1.97	3.042	47.9		
								260.4		
ZAPATA AISLADA C2	2 X 2			#5	36	2.35	1.56	132.0		
				#3	14	2.72	0.56	21.3		
				#3	56	0.84	0.56	26.3		
				#8	4	2.05	4	32.8		
				#7	8	1.97	3.042	47.9		
								260.4		
ZAPATA AISLADA A3	2,6 X 2,6			#6	22	2.5	2.25	123.8		
				#3	14	3.6	0.56	28.2		
				#3	84	1.04	0.56	48.9		
				#8	16	2.05	4	131.2		
								332.1		
ZAPATA AISLADA F3	3 X 3			#6	26	2.5	2.25	146.3		
				#3	14	3.6	0.56	28.2		
				#3	84	1.04	0.56	48.9		
				#8	16	2.05	4	131.2		
								354.6		
ZAPATA AISLADA G3	3 X 3			#6	26	2.5	2.25	146.3		
				#3	14	3.6	0.56	28.2		
				#3	84	1.04	0.56	48.9		
				#8	16	2.05	4	131.2		
								354.6		
ZAPATA AISLADA A4	2,6 X 2,6			#6	22	2.5	2.25	123.8		
				#3	14	3.6	0.56	28.2		
				#3	84	1.04	0.56	48.9		
				#8	16	2.05	4	131.2		
								332.1		
ZAPATA AISLADA B4	2,6 X 2,6			#6	22	2.5	2.25	123.8		
				#3	14	2.72	0.56	21.3		
				#3	56	0.84	0.56	26.3		
				#8	4	2.05	4	32.8		
				#7	8	1.97	3.042	47.9		
								252.2		
ZAPATA AISLADA A11	2,6 X 2,6			#6	22	2.5	2.25	123.8		
				#3	14	3.6	0.56	28.2		
				#3	84	1.04	0.56	48.9		
				#8	16	2.05	4	131.2		
								332.1		
ZAPATA AISLADA A12	2,6 X 2,6			#6	22	2.5	2.25	123.8		
				#3	14	3.6	0.56	28.2		
				#3	84	1.04	0.56	48.9		
				#8	16	2.05	4	131.2		
								332.1		
ZAPATA AISLADA A13	2,6 X 2,6			#6	22	2.5	2.25	123.8		
				#3	14	2.72	0.56	21.3		
				#3	56	0.84	0.56	26.3		
				#8	4	2.05	4	32.8		
				#7	8	1.97	3.042	47.9		
								252.2		
ZAPATA AISLADA B11	2,6 X 2,6			#6	22	2.5	2.25	123.8		
				#3	14	2.72	0.56	21.3		
				#3	56	0.84	0.56	26.3		
				#8	4	2.05	4	32.8		
				#7	8	1.97	3.042	47.9		
								252.2		
ZAPATA AISLADA B13	2 X 2			#5	36	2.35	1.56	132.0		
				#3	14	2.72	0.56	21.3		
				#3	56	0.84	0.56	26.3		
				#8	4	2.05	4	32.8		
				#7	8	1.97	3.042	47.9		
								260.4		
				#6	22	2.5	2.25	123.8		

ZAPATA AISLADA B11	2,6 X 2,6			#3	14	2.72	0.56	21.3		
				#3	56	0.84	0.56	26.3		
				#8	4	2.05	4	32.8		
				#7	8	1.97	3.042	47.9		
								252.2		
ZAPATA AISLADA L2	2,6 X 2,6			#6	22	2.5	2.25	123.8		
				#7	8	11	3.042	267.7		
				#4	4	2.2	1	8.8		
				#4	8	0.84	1	6.7		
				#4	4	0.74	1	3.0		
								409.9		
ZAPATA AISLADA K2	2,6 X 2,6			#6	44	2.5	2.25	247.5		
				#8	4	8.05	4	128.8		
				#7	8	7.95	3.042	193.5		
				#4	4	2.6	1	10.4		
				#3	16	0.87	0.56	7.8		
								588.0		

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN	AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83	FORMATO	
PROCESO	CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIPROPÓSITOS	CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	


FECHA	DD	31	MM	5	AA	2025	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	Nit o c.c.	901892584-4	Contrato N°	7120-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	Nit o c.c.	901889250-9	Contrato N°	6904-2024

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	ITEM / ACTIVIDAD	4.08	Muro concreto 3000psi contencion: Altura 3m-a 5m incluye formaleta	UNID.	M3	UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA

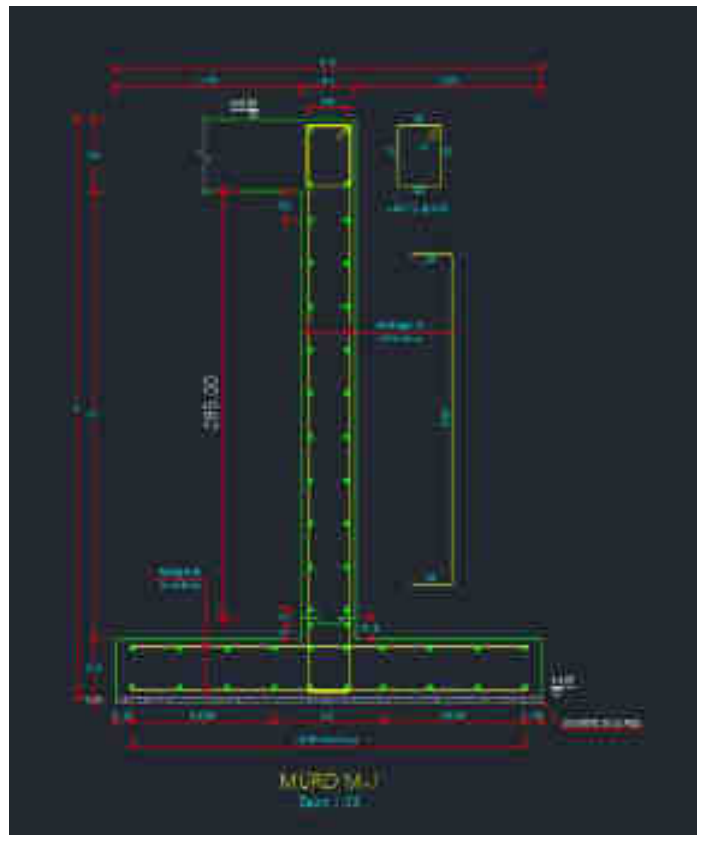ILUSTRACION





Localización	Cant Elementos	Ancho	Alto	Longitud		Volumen Total
ACTA-2						
MURO M-1 Long lateral eje 14	1	0.4	3.1	1.78	2.21	2.21
MURO M-1 Long eje K	1	0.4	3.1	9.34	11.58	13.79
Columna EJE 13	1	0.7	3.1	0.70	1.52	15.31
Subtotal						15.31
Vienen						15.31
TOTAL						**15.31**

OBSERVACIONES:	ACTA 1	0.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	15.31	ACTA6	0.00	
	ACTA 3	0.00			ACUMULADO ITEM
	ACTA 4	0.00			15.31

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

MFRANCOA-02460847224149-4453629-009387969-A

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIPROPOSITOS**	**CODIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	31	**MM**	5	**AA**	2025	**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	CO				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4	**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9	**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**ITEM / ACTIVIDAD**	4.09	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa		**UNID.**	KLS		

ILUSTRACION









Localización	**% COMPRA ACTA-2**	**%SUMINISTRO ACTA-2**	**% INSTALACION ACTA-2**	**CANT**	**Subtotal**	**Peso Total**
COMPRA ACERO DE	0.9064	0.0073		65525.0	59870.19	59870.19
MURO M-1			0.0863	3,480.8	300.39	60170.59
MURO M-2			0.0863	12,263.6	1058.35	61228.93
MURO M-3			0.0863	6,824.5	588.96	61817.89
MURO M-4			0.0863	9,269.3	799.94	62617.83

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	0.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	62617.83	ACTA6	0.00	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**62617.83**

Subtotal	62,617.83
Vienen	62,617.83
TOTAL	**62,617.83**

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

MFRANCOA-02460847224149-4453629-009387969-A

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS**	**CODIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	31	**MM**	5	**AA**	2025	**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4				**Contrato N°**	**7120-2024**
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9				**Contrato N°**	**6904-2024**

CAPÍTULO	**ESTRUCTURA METALICA**	**ITEM / ACTIVIDAD**	6.1.01	Suministro e instalacion de estructura metalica compuesta de tubulares estructurales. incluye: preparación de superficies y aplicación de anticorrosivo epoxico y pintura de protección (acabado) siguiendo los requerimientos de la norma SCCP. adicionalmente, la fabricación se realizará bajo las normas AISC.	**UNID.**	KG	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**

ILUSTRACION







Localización	**% COMPRA**	**% SUM**	**% INSTALACION**	**CANT**	**Longitud**	**Peso x m**	**peso x unid**	**Subtotal**	**Área total**
		ACTA-2							
TUB ESTRUCT RED 2.1/2" X 3MM	0.5055	0.2071		37	1.00	1.00	31.02	817.88	817.88
TUB ESTRUCT RED 6.1/4"X 6mm	0.5055	0.2071		8	1.00	1.00	144.06	821.26	1639.14
TUBO 24" XS A53 X12M	0.5055	0.2071		49	1.00	1.00	2243.27	78328.99	79968.13
PLATINAS DE ANCLAJE TIPO 1 D=0,60M			0.2874	7.00		55.49	388.43	111.63	80079.76
PLATINAS DE ANCLAJE TIPO2 D=0,82M			0.2874	7.00			0.00	0.00	80079.76
PLATINAS DE ANCLAJE TIPO3 D=0,70M			0.2874	6.00		96.67	580.02	166.70	80246.46
PLATINAS DE ANCLAJE TIPO4 D=0,85M			0.2874	6.00		142.54	855.24	245.80	80492.26
PERNOS F1554 GR 105 RECTO DE 1.3/8-			0.2874	60.00		8.71	522.60	150.20	80642.45
PERNOS F1554 GR 105 RECTO DE 1.3/8-			0.2874	36.00		12.29	442.44	127.16	80769.61
PERNOS F1554 GR 55 RECTO DE 1.1/4-8			0.2874	84.00		7.32	614.88	176.72	80946.33
PERNOS F1554 GR 55 RECTO DE 1 "-8 X			0.2874	42.00		1.66	69.72	20.04	80966.36

MEMORIAS EST MET ACTA-2

MEMORIAS EST MET ACTA-2\anclajes.pdf

OBSERVACIONES:

ACTA 1	105552.16	ACTA5	0.00	
ACTA 2	80966.36	ACTA6	0.00	
ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
ACTA 4	0.00			**186518.52**

Subtotal	80,966.37
Vienen	186,518.53
TOTAL	**80,966.37**

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA
