Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial

Unidad Administrativa

CONTRATO DE OBRA No.	CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024		
OBJETO:	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio		
ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 3		**FECHA:**	13/06/2025

CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	**VR. INICIAL OBRA**	**: $ 2,945,313,493.00**	**LOCALIZACIÓN**	: PALACIO DE JUSTICIA VILLAVICENCIO
	ARMELCO SAS - (50%)	**VR. ADICIONAL No. 1**	**: $ 298,497,863.49**	**FECHA INICIO**	: 04/09/2024
	INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S - (50%)	**VR. ADICIONAL No.2**	**: $ 1,284,446,156.06**	**PLAZO INICIAL**	: 31/12/2024
NIT	901.863.382-1	**VR. TOTAL**	**: $ 4,528,257,512.55**	**ADICIONAL EN PLAZO No. 1**	: 60 dias
DIRECCIÓN	CALLE 9 #4-19 OFICINA 603			**ADICIONAL EN PLAZO No. 2**	: 45 dias
TELÉFONO	315.848.7874	**ANTICIPO**	**: $ 0.00**	**ADICIONAL EN PLAZO No. 3**	15 dias
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERCONSULTORES			**ADICIONAL EN PLAZO No. 4**	8 dias
				ADICIONAL EN PLAZO No. 5	120 dias
		SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	**: $ 0.00**	**PLAZO TOTAL**	: 12 meses
NIT	901.450.714-9	**TOTAL AMORTIZADO**	**: $ 0.00**	**FECHA SUSPENSIÓN No.**	: N/A
DIRECCIÓN	CR 11 # 147-76 AP 301 Bogotá DC	**SALDO POR LEGALIZAR**	**: $ 0.00**	**FECHA REINICIACIÓN No.**	: N/A
TELÉFONO	3115130393 - 3106181398			**FECHA TERMINACIÓN ACTUAL**	: 06/09/2025

ACTA PARCIAL No.3

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OBRA EJECUTADA								
COMPONENTE DE OBRA														
ÍTEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.
I	CAMBIO DE CUBIERTA TORRE B													
1.00	PRELIMINARES				$ 103,228,769.02		$ 112,430,963.91		$ 32,695,395.42		$ 16,405,318.10		$ 49,100,713.52	
1.01	Ajuste de diseños estructural, redes eléctricas, aguas lluvias e hidrosanitarias. Incluye planos as built	Glb	1.00	$ 13,876,112.00	$ 13,876,112.00	1.00	$ 13,876,112.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
1.02	Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	850.00	$ 15,983.00	$ 13,585,550.00	1,081.79	$ 17,290,249.57	641.36	$ 10,250,856.88	333.70	$ 5,333,527.10	975.06	$ 15,584,383.98	90%
1.03	Desmonte de cubierta existente canaleta 90. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	880.00	$ 31,386.00	$ 27,619,680.00	944.76	$ 29,652,237.36	500.39	$ 15,705,240.54		$ -	500.39	$ 15,705,240.54	53%
1.04	Desmonte de puntos de iluminación para lámparas existentes, incluye desmonte de tubería, cableado, aparatos eléctricos. Retiro y disposición a sitios autorizados	Und	215.00	$ 31,611.00	$ 6,796,365.00	260.00	$ 8,218,860.00	70.00	$ 2,212,770.00	104.00	$ 3,287,544.00	174.00	$ 5,500,314.00	67%
1.05	Desmonte de canaleta o ductería existente, incluye desconexión y retiro de cableado.	ml	360.00	$ 28,304.00	$ 10,189,440.00	424.74	$ 12,021,840.96	105.00	$ 2,971,920.00	245.00	$ 6,934,480.00	350.00	$ 9,906,400.00	82%
1.06	Desmonte de tablero de 12 circuitos TWS	Und	2.00	$ 349,575.00	$ 699,150.00	2.00	$ 699,150.00	0.00	$ -	1.00	$ 349,575.00	1.00	$ 349,575.00	50%
1.07	Desmonte de tablero de 24 circuito TWP	Und	2.00	$ 500,192.00	$ 1,000,384.00	2.00	$ 1,000,384.00	0.00	$ -	1.00	$ 500,192.00	1.00	$ 500,192.00	50%
1.08	Cerramiento provisional en muro 1 cara lamina fibrocemento 6 mm, incluye estructura cal 26, plástico interior, acabado cara exterior (estuco 3 manos de pintura) y media caña pvc	m2	8.00	$ 194,326.00	$ 1,554,608.00	20.00	$ 3,886,520.00	8.00	$ 1,554,608.00		$ -	8.00	$ 1,554,608.00	40%
1.09	Desmonte y reinstalación de puertas en madera o en aluminio, incluye desmonte de marco y accesorios, retiro a punto de acopio de la entidad	Und	40.00	$ 53,047.00	$ 2,121,880.00	0.00	$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
1.10	Desmonte y reinstalación de aires acondicionados, incluye desmonte y montaje de condensadoras, protección de equipos y traslados de equipos a punto de acopio de la entidad, mantenimiento de equipos, cableado y tubería de conexión a puntos eléctricos	Und	34.00	$ 681,083.00	$ 23,156,822.00	34.00	$ 23,156,822.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0%
1.11	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de ventanas aluminio, incluye desmonte de marco y accesorios, retiro a punto de acopio de la entidad	m2	20.34	$ 61,853.00	$ 1,258,090.02	20.34	$ 1,258,090.02	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0%
1.12	Desmonte y reinstalación de Cámaras de seguridad existentes, incluye conexión al circuito cerrado de TV.	Und	6.00	$ 228,448.00	$ 1,370,688.00	6.00	$ 1,370,688.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
2.00	CUBIERTA				$ 757,208,987.60		$ 1,366,739,685.90		$ 527,879,146.40		$ 68,419,438.46		$ 596,298,584.85	
2.01	Suministro e instalación flanche lámina galvanizada cal.22 A=0,40m anclado a muro. Incluye cinta bituminosa autoadhesiva Sika Multiseal o similar 0.10x10m.	ml	100.00	$ 62,279.00	$ 6,227,900.00	150.51	$ 9,373,612.29	80.57	$ 5,017,819.03		$ -	80.57	$ 5,017,819.03	54%
2.02	Mantenimiento e impermeabilización de viga canal con manto asfáltico (emulsión asfáltica, primera capa manto de 2,2mm, segunda capa manto foil aluminio de 3,2 mm y aluminol) para viga canal	ml	200.00	$ 108,912.00	$ 21,782,400.00	331.00	$ 36,049,872.00	135.78	$ 14,788,071.36	120.00	$ 13,069,440.00	255.78	$ 27,857,511.36	77%
2.03	Suministro e instalación cubierta tipo Sandwich cal 26 prepintada, incluye poliuretano 38mm densidad 35-38 KG/M. clips de fijación, tornillos autoperforantes, remate 0,30 en lámina cal 26 x 2.44 ml	m2	950.00	$ 297,074.00	$ 282,220,300.00	950.00	$ 282,220,300.00	661.10	$ 196,395,621.40	127.40	$ 37,847,227.60	788.50	$ 234,242,849.00	83%
2.04	Acero estructural ASTM A500-Grado C. (incluye pernos, platinas y anclaje, suministro, montaje y pintura)	Kg	8,707.04	$ 32,724.00	$ 284,929,176.96	25,843.11	$ 845,689,931.64	6278.51	$ 205,457,961.24		$ -	6,278.51	$ 205,457,961.24	24%
2.05	Suministro e instalación de cielo raso PVC (incluye estructura metálica y rejillas de ventilación)	m2	880.00	$ 119,651.00	$ 105,292,880.00	1,036.45	$ 124,012,278.95	459.16	$ 54,938,953.16	120.93	$ 14,469,395.43	580.09	$ 69,408,348.59	56%
2.06	Pintura vinilo tipo 1 sobre muro interior 3 manos (Alta calidad). Incluye estuco, resane pañete muros interiores mort 1:4 Impermeabilizado, filos y dilataciones	m2	1,393.20	$ 28,511.00	$ 39,721,525.20	1,393.20	$ 39,721,525.20	882.89	$ 25,172,076.79		$ -	882.89	$ 25,172,076.79	63%
2.07	Suministro e instalación (emulsión asfáltica, primera capa manto de 2,2mm, segunda capa manto foil aluminio de 3,2 mm y aluminol) para remates de cubierta en muro	m2	116.64	$ 146,046.00	$ 17,034,805.44	203.17	$ 29,672,165.82	178.77	$ 26,108,643.42	20.77	$ 3,033,375.42	199.54	$ 29,142,018.84	98%
3.00	RED ELÉCTRICA				$ 223,917,250.63		$ 294,799,403.63		$ 44,116,395.00		$ 90,711,556.95		$ 134,827,951.95	
3.01	Suministro e instalación bandeja porta cable tipo malla ancho 30 cm; incluye anclajes, accesorios, clips de conexión y puesta a tierra para su correcto funcionamiento	ml	155.00	$ 148,701.00	$ 23,048,655.00	155.00	$ 23,048,655.00	0.00	$ -	55.95	$ 8,319,820.95	55.95	$ 8,319,820.95	36%
3.02	Tablero de 12 circuitos TWS	Und	2.00	$ 1,255,310.00	$ 2,510,620.00	2.00	$ 2,510,620.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,255,310.00	1.00	$ 1,255,310.00	50%
3.03	Tablero de 24 circuito TWP	Und	2.00	$ 1,995,229.00	$ 3,990,458.00	2.00	$ 3,990,458.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,995,229.00	1.00	$ 1,995,229.00	50%
3.04	Suministro e instalación lámpara Led Panel 60x60cm 40w Vida Útil: 30.000 horas. Incluye accesorios y cableado de instalación, clavija, marco en aluminio para su correcto funcionamiento.	Und	189.00	$ 208,657.00	$ 39,436,173.00	244.00	$ 50,912,308.00	111.00	$ 23,160,927.00	11.00	$ 2,295,227.00	122.00	$ 25,456,154.00	50%
3.05	Salida eléctrica para punto de iluminación, incluye caja, tubería, cableado, toma y demás accesorios para su correcto funcionamiento 3m.	Und	189.00	$ 188,788.00	$ 35,680,932.00	294.00	$ 55,503,672.00	111.00	$ 20,955,468.00	78.00	$ 14,725,464.00	189.00	$ 35,680,932.00	64%
3.06	Suministro e instalación de lámpara de evacuación de emergencia. Incluye anclajes, soportes y todos los accesorios para su correcta instalación.	Und	12.00	$ 191,105.00	$ 2,293,260.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
3.07	Suministro e instalación de lámpara de emergencia con batería de respaldo. Incluye anclajes, soportes y todos los accesorios para su correcta instalación	Und	14.00	$ 230,224.00	$ 3,223,136.00	46.00	$ 10,590,304.00	0.00	$ -	14.00	$ 3,223,136.00	14.00	$ 3,223,136.00	30%
3.08	Suministro e instalación de toma normal incluye salida en tubería SCH 40 y cable # 12 libre de halógenos 3m	Und	116.00	$ 177,347.00	$ 20,572,252.00	239.00	$ 42,385,933.00	0.00	$ -	41.00	$ 7,271,227.00	41.00	$ 7,271,227.00	17%
3.09	Suministro e instalación de toma regulado incluye salida en tubería SCH 40 y cable # 12 libre de halógenos 3m	Und	115.00	$ 176,387.00	$ 20,284,505.00	180.00	$ 31,749,660.00	0.00	$ -	41.00	$ 7,231,867.00	41.00	$ 7,231,867.00	23%
3.10	Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluye salida en tubería SCH 40 y cable # 12 libre de halógenos	Und	43.00	$ 136,726.00	$ 5,879,218.00	52.00	$ 7,109,752.00	0.00	$ -	39.00	$ 5,332,314.00	39.00	$ 5,332,314.00	75%
3.11	Suministro e instalación de interruptor doble, incluye salida en tubería SCH 40 y cable # 12 libre de halógenos	Und	13.00	$ 152,022.00	$ 1,976,286.00	13.00	$ 1,976,286.00	0.00	$ -	5.00	$ 760,110.00	5.00	$ 760,110.00	38%
3.12	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico incluye totalizador y protecciones	Und	2.00	$ 2,339,654.00	$ 4,679,308.00	2.00	$ 4,679,308.00	0.00	$ -	1.00	$ 2,339,654.00	1.00	$ 2,339,654.00	50%
3.13	Suministro e instalación acometida eléctrica para tableros en lineas (3#6+1#6+1#6) incluye regata y resane	ML	228.00	$ 83,986.00	$ 19,148,808.00	228.00	$ 19,148,808.00	0.00	$ -	180.00	$ 15,117,480.00	180.00	$ 15,117,480.00	79%
3.14	Suministro e instalación acometida eléctrica para tableros en lineas (3#4+1#4+1#6) incluye regata y resane	ML	114.00	$ 124,648.00	$ 14,209,872.00	114.00	$ 14,209,872.00	0.00	$ -	60.00	$ 7,478,880.00	60.00	$ 7,478,880.00	53%
3.15	Suministro e instalación de toma bifásico, incluye salida en tubería SCH 40 y cable # 10 libre de halógenos 3m	Und	34.00	$ 184,678.00	$ 6,279,052.00	34.00	$ 6,279,052.00	0.00	$ -	11.00	$ 2,031,458.00	11.00	$ 2,031,458.00	32%
3.16	Suministro e instalación acometida eléctrica para circuitos de iluminación, tomas normales y regulados sobre bandeja eléctrica Cable libre de halógenos calibre 12 AWG(1#12+1#12+1#12) hasta 3ml incluye regata y resane	ml	921.17	$ 15,087.00	$ 13,897,691.79	921.17	$ 13,897,691.79	0.00	$ -	500.00	$ 7,543,500.00	500.00	$ 7,543,500.00	54%
3.17	Suministro e instalación acometida eléctrica para circuitos de aire acondicionado Cable libre de halógenos calibre 10 AWG (1#10+1#10+1#10). hasta 3ml incluye regata y resane	ml	341.17	$ 19,952.00	$ 6,807,023.84	341.17	$ 6,807,023.84	0.00	$ -	190.00	$ 3,790,880.00	190.00	$ 3,790,880.00	56%
4.0	RED AGUAS LLUVIAS				$ 8,781,928.00		$ 17,807,660.00		$ -		$ 632,187.00		$ 632,187.00	
4.01	Revisión de punto aguas lluvias (prueba de taponamiento con sonda eléctrica) y adecuación de bajantes	Und	6.00	$ 210,729.00	$ 1,264,374.00	6.00	$ 1,264,374.00	0.00	$ -	3.00	$ 632,187.00	3.00	$ 632,187.00	50%
4.02	Suministro e instalación de rejillas con cuello para bajantes	Und	6.00	$ 67,251.00	$ 403,506.00	6.00	$ 403,506.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
4.03	Perforación pase de tubería 4"/canaleta en muros y placa en concreto. (Incluye demolición, afinado, trasiego y disposición final)	Und	4.00	$ 46,320.00	$ 185,280.00	4.00	$ 185,280.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
4.04	Suministro e Instalación Tubería aguas lluvias 4", incluye soporte y accesorios de fijación	ML	60.80	$ 113,960.00	$ 6,928,768.00	140.00	$ 15,954,400.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
II	IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS													
5	FACHADAS				$ 900,503,300.00		$ 786,261,383.96		$ 704,445,647.45		$ -		$ 704,445,647.45	
5.01	Hidrolavado de limpieza de pisos, senderos, muros de terrazas, antepechos y fachada con hidrojet 1700 PSI	m2	12,000.00	$ 6,288.00	$ 75,456,000.00	12,061.55	$ 75,843,026.40	10778.65	$ 67,776,151.20		$ -	10,778.65	$ 67,776,151.20	89%
5.02	Demolición manual de enchape muros de terrazas, antepechos y fachadas. Incluye la demolición de pañete e=0,05 y retiro y disposición a sitios autorizados	m2	700.00	$ 13,769.00	$ 9,638,300.00	50.00	$ 688,450.00	24.88	$ 342,572.72		$ -	24.88	$ 342,572.72	50%
5.03	Pañete muro exterior y culatas, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	m2	1,200.00	$ 27,188.00	$ 32,625,600.00	70.00	$ 1,903,160.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
5.04	Sellador sistema hidrofóbico fachada aplicación sistema sika transparente 10 o similar 3 manos. Incluye andamios, equipos, hidrofugo, preparación de la superficie, limpiador rinse sika o similar	m2	12,000.00	$ 48,474.00	$ 581,688,000.00	11,436.55	$ 554,375,324.70	10299.26	$ 499,246,329.24		$ -	10,299.26	$ 499,246,329.24	90%
5.05	Suministro e instalación de enchape fachaleta arcilla existente, incluye andamios, equipos, corte, emboquillada con pegacor y todos los elementos para su correcta instalación	m2	700.00	$ 61,902.00	$ 43,331,400.00	50.00	$ 3,095,100.00	24.88	$ 1,540,121.76		$ -	24.88	$ 1,540,121.76	50%
5.06	Pintura barniz sobre muro fachada. Incluye andamios, equipos, filos y dilataciones	m2	12,000.00	$ 13,147.00	$ 157,764,000.00	11,436.55	$ 150,356,322.85	10309.61	$ 135,540,472.53		$ -	10,309.61	$ 135,540,472.53	90%
III	REMODELACIÓN DE BAÑOS													
6.0	BATERÍAS SANITARIAS				$ 201,653,830.75		$ 237,537,889.98		$ 90,307,003.16		$ 103,437,522.97		$ 193,744,526.13	
6.01	Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	249.42	$ 15,983.00	$ 3,986,479.86	249.42	$ 3,986,479.86	0.00	$ -	62.80	$ 1,003,732.40	62.80	$ 1,003,732.40	25%
6.02	Desmonte divisiones baños. Incluye retiro y disposición final en sitios autorizados.	m2	77.69	$ 27,737.00	$ 2,154,887.53	205.68	$ 5,704,946.16	102.84	$ 2,852,528.55	47.11	$ 1,306,690.07	149.95	$ 4,159,218.62	73%
6.03	Demolición manual placa aligerada concreto reforzado hasta e= 0,25m. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	200.82	$ 105,186.00	$ 21,123,452.52	200.82	$ 21,123,452.52	47.52	$ 4,998,438.72	38.17	$ 4,014,949.62	85.69	$ 9,013,388.34	43%
6.04	Demolición de enchape piso y pared existente. Incluye retiro y disposición final en sitios autorizados.	m2	500.73	$ 26,810.00	$ 13,424,571.30	1,003.23	$ 26,896,596.30	378.07	$ 10,136,056.70	348.73	$ 9,349,451.30	726.80	$ 19,485,508.00	72%
6.05	Juego de incrustaciones blanco	Jgo	17.00	$ 77,721.00	$ 1,321,257.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
6.06	Suministro e instalación de sanitario incluye grifería tipo push, tubería, accesorios de instalación, desmonte y retiro de sanitario existente y disposición final en sitios autorizados.	Und	38.00	$ 1,341,702.00	$ 50,984,676.00	60.00	$ 80,502,120.00	32.00	$ 42,934,464.00	23.00	$ 30,859,146.00	55.00	$ 73,793,610.00	92%
6.07	Suministro e instalación de orinal incluye grifería tipo push, tubería, accesorios de instalación, desmonte y retiro de orinal existente y disposición final en sitios autorizados.	Und	13.00	$ 1,131,189.00	$ 14,705,457.00	8.00	$ 9,049,512.00	3.00	$ 3,393,567.00	5.00	$ 5,655,945.00	8.00	$ 9,049,512.00	100%
6.08	Suministro e instalación lavamanos cerámica sobreponer incluye tubería, grifería tipo push en acero inoxidable y accesorios de instalación, desmonte y retiro de lavamanos existente y disposición final en sitios autorizados.	Und	34.00	$ 442,486.00	$ 15,044,524.00	33.00	$ 14,602,038.00	18.00	$ 7,964,748.00	15.00	$ 6,637,290.00	33.00	$ 14,602,038.00	100%
6.09	Mesones en granito natural para lavamanos incluye (salpicadero 8cm. Faldón 10cm)	ml	29.20	$ 569,244.00	$ 16,621,924.80	29.20	$ 16,621,924.80	0.00	$ -	26.46	$ 15,062,196.24	26.46	$ 15,062,196.24	91%
6.10	Suministro e instalación espejo flotante biselado 4mm. Incluye desmonte de espejo existente y disposición final en sitios autorizados.	m2	17.52	$ 126,470.00	$ 2,215,754.40	28.00	$ 3,541,160.00	0.00	$ -	19.02	$ 2,405,459.40	19.02	$ 2,405,459.40	68%
6.11	Mortero de nivelación (contrapiso) E= 1 a 4 cm	m2	249.42	$ 29,477.00	$ 7,352,153.34	249.42	$ 7,352,153.34	86.47	$ 2,548,876.19	68.82	$ 2,028,607.14	155.29	$ 4,577,483.33	62%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OBRA EJECUTADA								
COMPONENTE DE OBRA														
ÍTEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.
6.12	Suministro e instalación lámpara Led Panel 60x60cm 40w Vida Útil: 30.000 horas. Incluye accesorios y cableado de instalación, clavija, marco en aluminio para su correcto funcionamiento.	Und	111.00	$ 208,657.00	$ 23,160,927.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
6.13	Suministro e instalación tubería sanitaria 4" PVC; Incluye accesorios(Yee,Codos 45, 90°, Tee,uniones, codos,silla, limp. Y soldad.) y elementos de fijación	ml	60.00	$ 113,960.00	$ 6,837,600.00	265.00	$ 30,199,400.00	60.00	$ 6,837,600.00	161.53	$ 18,407,958.80	221.53	$ 25,245,558.80	84%
6.14	Suministro e instalación de Punto de desagüe o sanitario en PVC 4". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	Pto	38.00	$ 129,068.00	$ 4,904,584.00	54.00	$ 6,969,672.00	31.00	$ 4,001,108.00	7.00	$ 903,476.00	38.00	$ 4,904,584.00	70%
6.15	Suministro e instalación de Punto de desagüe lavamanos en PVC 2". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	Pto	34.00	$ 138,083.00	$ 4,694,822.00	37.00	$ 5,109,071.00	18.00	$ 2,485,494.00	16.00	$ 2,209,328.00	34.00	$ 4,694,822.00	92%
6.16	Salida sanitaria sifón de piso 2" (incluye suministro e instalación rejilla)	Pto	9.00	$ 131,949.00	$ 1,187,541.00	32.00	$ 4,222,368.00	9.00	$ 1,187,541.00	22.00	$ 2,902,878.00	31.00	$ 4,090,419.00	97%
6.17	Suministro e instalación de Punto de desagüe orinal en PVC 2". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	Pto	13.00	$ 138,083.00	$ 1,795,079.00	12.00	$ 1,656,996.00	7.00	$ 966,581.00	5.00	$ 690,415.00	12.00	$ 1,656,996.00	100%
6.18	Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 6" Incluye accesorios(Yee,Codos 45, 90°, Tee,uniones, codos,silla, limp. Y soldad.) y elementos de fijación	ml	60.00	$ 168,969.00	$ 10,138,140.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
7.0	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 154,317,365.49**		**$ 241,043,152.80**		**$ 116,043,884.29**		**$ 65,673,243.48**		**$ 181,717,127.78**	
7.01	Puerta en aluminio, marco en aluminio 3x1, hoja un En aluminio entamborada color natural + vidrio Incoloro 4mm sandblasting cortinado 2cm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija marca yale o Similar.Incluye desmonte puerta existente	Und	18.00	$ 466,579.00	$ 8,398,422.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
7.02	Divisiones de baño, divisores, parales y puertas elaboradas en acero inoxidable calibre 20-22 tipo 304 satinado	m2	77.69	$ 697,706.00	$ 54,204,779.14	180.00	$ 125,587,080.00	102.84	$ 71,752,085.04	40.70	$ 28,396,634.20	143.54	$ 100,148,719.24	80%
7.03	Suministro e instalación de ventana en aluminio corredizo, con marco y vidrio 4mm, incluye accesorios de instalación	m2	22.50	$ 384,503.00	$ 8,651,317.50	22.50	$ 8,651,317.50	0.00	$ -	6.30	$ 2,422,368.90	6.30	$ 2,422,368.90	28%
7.04	Suministro e instalación de enchape cerámico para piso y pared incluye wines, afinado pegacor y boquilla. (Formato según especificación técnica)	m2	500.73	$ 75,750.00	$ 37,930,297.50	770.98	$ 58,401,735.00	332.08	$ 25,155,060.00	275.88	$ 20,897,910.00	607.96	$ 46,052,970.00	79%
7.05	Suministro e instalación de cielo raso PVC 8mm (incluye estructura metálica y rejillas de ventilación)	m2	249.42	$ 119,651.00	$ 29,843,352.42	249.42	$ 29,843,352.42	86.47	$ 10,346,221.97	70.08	$ 8,385,142.08	156.55	$ 18,731,364.05	63%
7.06	Pañete muro interior y culatas, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	m2	500.73	$ 26,002.00	$ 13,019,981.46	575.53	$ 14,964,931.06	257.29	$ 6,690,054.58	207.77	$ 5,402,435.54	465.06	$ 12,092,490.12	81%
7.07	Pintura vinilo tipo 1 sobre muro interior 3 manos (Alta calidad). Incluye estuco, filos y dilataciones	m2	82.43	$ 27,529.00	$ 2,269,215.47	130.58	$ 3,594,736.82	76.30	$ 2,100,462.70	6.13	$ 168,752.77	82.43	$ 2,269,215.47	63%
8.0	**RED HIDRÁULICA**				**$ 52,056,578.00**		**$ 12,718,036.00**		**$ -**		**$ 6,044,801.12**		**$ 6,044,801.12**	
8.01	Suministro e instalacion de Equipo hidroflo con tanque de diafragma, bomba centrifuga incluye accesorios, válvulas, 2 electrobombas, tanque, base metalica, manometro, presostato, maguera flexible, conexión 5 vias,flotador (5,5 HP, 3450 RPM, 220V, 50/70 PSI 60HZ) y tablero de control	und	2.00	$ 20,667,777.00	$ 41,335,554.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
8.02	Tubería PVCP RDE 21 2" suministro e instalación	ml	72.00	$ 37,824.00	$ 2,723,328.00	288.00	$ 10,893,312.00	0.00	$ -	112.88	$ 4,269,573.12	112.88	$ 4,269,573.12	39%
8.03	Tubería PVCP RDE 21 1-1/2" suministro e instalación	ml	64.00	$ 26,745.00	$ 1,711,680.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
8.04	Tubería PVCP RDE 21 1-1/4" suministro e instalación	ml	48.00	$ 22,362.00	$ 1,073,376.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
8.05	Tubería PVCP RDE 21 1" suministro e instalación	ml	128.00	$ 20,158.00	$ 2,580,224.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
8.06	Accesorio PVCP 3/4" suministro e instalación	und	34.00	$ 4,559.00	$ 155,006.00	100.00	$ 455,900.00	0.00	$ -	100.00	$ 455,900.00	100.00	$ 455,900.00	100%
8.07	Accesorio PVCP 1/2" suministro e instalación	und	34.00	$ 3,127.00	$ 106,318.00	240.00	$ 750,480.00	0.00	$ -	240.00	$ 750,480.00	240.00	$ 750,480.00	100%
8.08	Accesorio PVCP 1" suministro e instalación	und	170.00	$ 6,098.00	$ 1,036,660.00	4.00	$ 24,392.00	0.00	$ -	4.00	$ 24,392.00	4.00	$ 24,392.00	100%
8.09	Accesorio PVCP 1-1/4" suministro e instalación	und	32.00	$ 11,148.00	$ 356,736.00	0.00	$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
8.10	Accesorio PVCP 1-1/2" suministro e instalación	und	32.00	$ 11,962.00	$ 383,744.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
8.11	Accesorio PVCP 2" suministro e instalación	und	24.00	$ 24,748.00	$ 593,952.00	24.00	$ 593,952.00	0.00	$ -	22.00	$ 544,456.00	22.00	$ 544,456.00	92%
9.0	**RED SANITARIA**				**$ 19,599,605.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
9.01	Suministro e instalación tubería sanitaria 4" PVC; Incluye accesorios(Yee,Codos 45, 90°, Tee,uniones, codos,silla, limp. Y soldad.) y elementos de fijación	ML	72.00	$ 113,960.00	$ 8,205,120.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
9.02	Suministro e instalación de Punto de desagüe o sanitario en PVC 4". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	Pto	38.00	$ 129,068.00	$ 4,904,584.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
9.03	Suministro e instalación de Punto de desagüe en PVC 2". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	Pto	47.00	$ 138,083.00	$ 6,489,901.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
IV	**CONEXIONES**													
10.	**CUBIERTA CONEXIONES**				**$ 171,421,545.66**		**$ 70,867,333.30**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
10.01	Suministro e instalación de domo en cubierta en policarbonato incluye canal en lámina galvanizada calibre 20, LD=0.60, soporte, estructura y todos los elementos de fijación. Retiro del existente.	m2	205.58	$ 485,086.00	$ 99,723,979.88	97.20	$ 47,150,359.20	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
10.02	Suministro e instalación (emulsión asfáltica, primera capa manto de 2,2mm, segunda capa manto foil aluminio de 3,2 mm y aluminol) para remates de cubierta en muro	m2	123.35	$ 146,046.00	$ 18,014,774.10	123.35	$ 18,014,774.10	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
10.03	Pintura vinilo tipo 1 sobre muro interior 3 manos (Alta calidad). Incluye estuco, resane pañete muros interiores mort 1:4 Impermeabilizado, filos y dilataciones	m2	1,882.88	$ 28,511.00	$ 53,682,791.68	200.00	$ 5,702,200.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
V	**SEGURIDAD**													
11	**PUERTAS AUTOMÁTICAS**				**$ 46,195,882.00**		**$ 46,195,882.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
11.01	Suministro e instalación de puerta automática en vidrio templado de 10mm incoloro con zócalo inferior en aluminio. Dimensiones 1.70X2.00h. Cabezal para puerta automática avanti 4200 de 4.2 metros de longitud para una hoja hasta 2 metros de longitud y 100 kilos de peso. Incluye acometida e instalaciones eléctricas, dos sensores de presencia y movimiento dos controles selector de funciones 110 o 220 vol y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Desmonte de puerta automática existente con disposición en sitios autorizados	Und	2.00	$ 23,097,941.00	$ 46,195,882.00	2.00	$ 46,195,882.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12	**GARITA PARQUEADERO**				**$ 18,856,959.60**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
12.01	Demolición placa en concreto e=0.10m-0.15m. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	1.80	$ 176,889.00	$ 318,400.20	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.02	Demolición de muros en mamposteria. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	12.40	$ 12,859.00	$ 159,451.60	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.03	Excavación manual en material común, incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m3	0.64	$ 47,116.00	$ 30,154.24	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.04	Relleno material seleccionado tamaño max. 2"	m3	5.00	$ 60,642.00	$ 303,210.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.05	Zapata en concreto20.7mpa(3000psi) mezcla en obra.suministro y construcción	m3	0.07	$ 881,692.00	$ 61,718.44	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.06	Viga en concreto 20.7mpa (3000psi) mezcla en obra.suministro y construcción	m3	0.48	$ 921,530.00	$ 442,334.40	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.07	Placa de contrapiso en Concreto impermeabilizado 20.7mpa (3000psi) mezcla en obra. Suministro y construcción	m3	0.80	$ 840,900.00	$ 672,720.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.08	Columna en concreto 20.7 mpa (3000psi) mezcla en obra.suministro y construcción	m3	0.40	$ 1,036,735.00	$ 414,694.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.09	Viga aérea en concreto 20.7mpa(3000psi) mezcla en obra.suministro y construcción	m3	0.48	$ 1,013,397.00	$ 486,430.56	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.10	Dinteles en concreto 17.2mpa(2500psi)mezcla en obra.suministro y construcción	m3	1.00	$ 1,147,773.00	$ 1,147,773.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.11	Acero de refuerzo fy=4200 mpa (4200 kg/cm2, g60) incluye suministro, figurado, armado, colocación y amarre, zapata, vigas, columnas y placas	Kg	229.00	$ 7,551.00	$ 1,729,179.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.12	Muro en bloque flexa no. 5, 0.12x0.20x0.30 m (mortero tipo s 1:3)	m2	24.00	$ 47,148.00	$ 1,131,552.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.13	Pañete muro exterior y culatas, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	m2	24.00	$ 27,188.00	$ 652,512.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.14	Pañete muro interior y culatas, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	m2	21.60	$ 26,002.00	$ 561,643.20	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.15	Suministro e instalación de enchape fachaleta arcilla existente, incluye andamios, equipos, corte, embocquillada con pegacor y todos los elementos para su correcta instalación	m2	24.00	$ 61,902.00	$ 1,485,648.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.16	Pintura vinilo tipo 1 s/muro (alta calidad) 3 manos	m2	21.60	$ 10,867.00	$ 234,727.20	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.17	Suministro e instalación de enchape cerámico para piso y pared incluye wines, afinado pegacor y boquilla. (Formato según especificación técnica)	m2	9.98	$ 75,750.00	$ 755,985.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.18	Placa de cubierta en concreto impermeabilizado 27.6 Mpa (4000 PSI). E=0,10m Incluye lámina stell deck cal 18 y malla electrosoldada	m2	8.00	$ 223,814.00	$ 1,790,512.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.19	Suministro e instalación (emulsión asfáltica, primera capa manto de 2,2mm, segunda capa manto foil aluminio de 3,2 mm y aluminol) para remates de cubierta en muro	m2	10.56	$ 146,046.00	$ 1,542,245.76	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.20	Suministro e instalación de cielo raso PVC (incluye estructura metálica y rejillas de ventilación)	m2	8.00	$ 119,651.00	$ 957,208.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.21	Suministro e instalación lámpara Led Panel 60x60cm 40w Vida Útil: 30.000 horas. Incluye accesorios y cableado de instalación, clavija, marco en aluminio para su correcto funcionamiento.	Und	2.00	$ 208,657.00	$ 417,314.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.22	Suministro e instalación tubería sanitaria 4" PVC; Incluye accesorios(Yee,Codos 45, 90°, Tee,uniones, codos,silla, limp. Y soldad.) y elementos de fijación	ml	8.00	$ 113,960.00	$ 911,680.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.23	Suministro e instalación de Punto de desagüe o sanitario en PVC 4". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	Pto	1.00	$ 129,068.00	$ 129,068.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.24	Suministro e instalación de Punto de desagüe lavamanos en PVC 2". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	Pto	1.00	$ 138,083.00	$ 138,083.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.25	Salida sanitaria sifón de piso 2" (incluye suministro e instalación rejilla)	Pto	1.00	$ 131,949.00	$ 131,949.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.26	Suministro e instalación lavamanos cerámica sobreponer incluye tubería, grifería tipo push en acero inoxidable y accesorios de instalación, desmonte y retiro de lavamanos existente y disposición final en sitios autorizados.	und	1.00	$ 442,486.00	$ 442,486.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.27	Suministro e instalación de sanitario incluye grifería tipo push, tubería, accesorios de instalación, desmonte y retiro de sanitario existente y disposición final en sitios autorizados.	und	1.00	$ 1,341,702.00	$ 1,341,702.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.28	Puerta en aluminio, marco en aluminio 3x1, hoja un En aluminio entamborada color natural + vidrio Incoloro 4mm sandblasting cortinado 2cm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija marca yale o Similar.Incluye desmonte puerta existente	Und	1.00	$ 466,579.00	$ 466,579.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
VI	**REPARACIONES LOCATIVAS Y DAÑOS POR SISMO**													
13	**PRELIMINARES**				**$ 32,657,684.56**		**$ 28,935,777.09**		**$ -**		**$ 1,074,904.56**		**$ 1,074,904.56**	
13.01	Demolición manual pañete muros. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	1,136.00	$ 11,169.00	$ 12,687,984.00	898.81	$ 10,038,808.89	0.00	$ -	96.24	$ 1,074,904.56	96.24	$ 1,074,904.56	11%
13.02	Demolición manual pañete bajo placa. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	750.00	$ 13,795.00	$ 10,346,250.00	565.40	$ 7,799,693.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
13.03	Demolición de muros en mamposteria. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	103.00	$ 12,859.00	$ 1,324,477.00	112.32	$ 1,444,322.88	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
13.04	Demolición de enchape piso y pared existente. Incluye retiro y disposición final en sitios autorizados.	m2	44.00	$ 26,810.00	$ 1,179,640.00	44.00	$ 1,179,640.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
13.05	Desmonte y reinstalación manejadora aire acondicionado. Incluye todos los soportes y anclajes para su correcto funcionamiento	und	4.00	$ 440,209.00	$ 1,760,836.00	4.00	$ 1,760,836.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					OBRA EJECUTADA								
COMPONENTE DE OBRA					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL		
ÍTEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.
13.06	Desmonte y reinstalación de lámparas (60x60 cm). Incluye todos los soportes y anclajes para su correcto funcionamiento	Und	22.00	$ 43,809.00	$ 963,798.00	22.00	$ 963,798.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
13.07	Desmonte y reinstalación de ventana en aluminio con vidrio. Incluye todos los soportes y accesorios para su correcta instalación	m2	46.08	$ 25,357.00	$ 1,168,450.56	46.08	$ 1,168,450.56	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
13.08	Desmonte y reinstalación de Gabinete red contra incendios (80X100cm)	Und	2.00	$ 171,087.00	$ 342,174.00	2.00	$ 342,174.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
13.09	Desmonte y reinstalación interruptor eléctrico	Und	2.00	$ 28,355.00	$ 56,710.00	2.00	$ 56,710.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
13.10	Desmonte y reinstalación punto eléctrico regulado	Und	6.00	$ 30,168.00	$ 181,008.00	6.00	$ 181,008.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
13.11	Desmonte y reinstalación de puertas en madera o en aluminio, incluye desmonte de marco y accesorios, retiro a punto de acopio de la entidad	Und	21.00	$ 53,047.00	$ 1,113,987.00	26.00	$ 1,379,222.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
13.12	Desmonte y reinstalación mesón atención a público	ml	12.00	$ 116,818.00	$ 1,401,816.00	21.32	$ 2,490,559.76	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
13.13	Desmonte y reinstalación partantes y cámara web	Und	2.00	$ 65,277.00	$ 130,554.00	2.00	$ 130,554.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
14	PISOS, MUROS Y ACABADOS				$ 185,166,016.20		$ 260,091,682.89		$ 227,250.00		$ 70,442,860.46		$ 70,670,110.46	
14.01	Suministro e instalación de cielo raso PVC (incluye estructura metálica y rejillas de ventilación)	m2	40.00	$ 119,651.00	$ 4,786,040.00	40.00	$ 4,786,040.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
14.02	Suministro e instalación de enchape cerámico para piso y pared incluye wines, afinado pegacor y boquilla. (Formato según especificación técnica)	m2	12.00	$ 75,750.00	$ 909,000.00	12.00	$ 909,000.00	3.00	$ 227,250.00		$ -	3.00	$ 227,250.00	25%
14.03	Muro en bloque flexa no. 5, 0.12x0.20x0.30 m (mortero tipo s 1:3)	m2	103.00	$ 47,148.00	$ 4,856,244.00	107.80	$ 5,082,554.40	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
14.04	Pañete liso bajo placa, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	m2	750.00	$ 32,922.00	$ 24,691,500.00	325.00	$ 10,699,650.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
14.05	Pañete muro exterior y culatas, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	m2	1,285.00	$ 27,188.00	$ 34,936,580.00	1,285.00	$ 34,936,580.00	0.00	$ -	190.33	$ 5,174,692.04	190.33	$ 5,174,692.04	15%
14.06	Suministro e instalación de estuco plástico	m2	2,835.00	$ 22,096.00	$ 62,642,160.00	5,534.00	$ 122,279,264.00	0.00	$ -	2,224.55	$ 49,153,656.80	2,224.55	$ 49,153,656.80	40%
14.07	Pintura vinilo tipo 1 sinuro (alta calidad) 3 manos	m2	2,835.00	$ 10,867.00	$ 30,807,945.00	7,190.97	$ 78,144,270.99	0.00	$ -	1,482.89	$ 16,114,511.62	1,482.89	$ 16,114,511.62	21%
14.08	Piso en granito pulido incluye destronque y pulida	m2	44.00	$ 245,840.00	$ 10,816,960.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
14.09	Suministro e instalación juntas elastoméricas rampa de conexión entre torres. Incluye anclajes y todo lo necesario para su correcta instalación	ml	15.00	$ 137,779.00	$ 2,066,685.00	15.00	$ 2,066,685.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
14.10	Suministro e instalación de vidrio transparente liso 5mm	m2	12.60	$ 94,257.00	$ 1,187,638.20	12.60	$ 1,187,638.20	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
14.11	Puerta en aluminio, marco en aluminio 3x1, hoja un En aluminio entamborada color natural + vidrio Incoloro 4mm sandblasting cortinado 2cm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija marca yale o Similar.Incluye desmonte puerta existente	Und	16.00	$ 466,579.00	$ 7,465,264.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
VII	ZONAS EXTERIORES													
15	PAISAJISMO				$ 48,293,050.00		$ 29,718,800.00		$ -		$ -		$ -	
15.01	Suministro e instalación de paisajismo tipo tropical (Según especificación técnica)	m2	650.00	$ 74,297.00	$ 48,293,050.00	400.00	$ 29,718,800.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
VIII	CERTIFICACIONES ELECTRICAS				$ 21,454,740.00		$ 23,948,892.00		$ -		$ 15,635,052.00		$ 15,635,052.00	
16.01	Certificación RETILAP iluminación	m2	189.00	$ 30,792.00	$ 5,819,688.00	270.00	$ 8,313,840.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
16.02	Estudio fotométrico iluminación	m2	1.00	$ 15,635,052.00	$ 15,635,052.00	1.00	$ 15,635,052.00	0.00	$ -	1.00	$ 15,635,052.00	1.00	$ 15,635,052.00	100%
ITEM	ITEM NO PREVISTOS							CANT.						
					$ -		$ 999,161,079.72		$ 104,207,578.82		$ 497,799,246.35		$ 602,006,825.17	
NP 01	Demolición manual de mortero de nivelación Incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	M2		$ 21,959.0055	$ -	159.29	$ 3,497,849.99	86.47	$ 1,898,795.21	69.74	$ 1,531,421.04	156.21	$ 3,430,216.25	98%
NP 02	Desmonte de puntos electricos tomas, interruptores, incluye desmonte de tubería, cableado, aparatos eléctricos. Incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	UND		$ 22,105.6695	$ -	352.00	$ 7,781,195.66	140.00	$ 3,094,793.73	167.00	$ 3,691,646.81	307.00	$ 6,786,440.54	87%
NP 03	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	UND		$ 34,900.7940	$ -	229.00	$ 7,992,281.83	100.00	$ 3,490,079.40	129.00	$ 4,502,202.43	229.00	$ 7,992,281.83	100%
NP 04	Desmonte de meson en concreto, incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	UND		$ 56,278.3815	$ -	20.00	$ 1,125,567.63	8.00	$ 450,227.05	5.00	$ 281,391.91	13.00	$ 731,618.96	65%
NP 05	Desmonte de ducto flexible en aluminio,incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	ML		$ 30,093.6195	$ -	139.00	$ 4,183,013.11	75.00	$ 2,257,021.46	64.00	$ 1,925,991.65	139.00	$ 4,183,013.11	100%
NP 06	Desmonte de manejadoras de aire acondionado	UND		$ 242,907.0120	$ -	9.00	$ 2,186,163.11	6.00	$ 1,457,442.07	3.00	$ 728,721.04	9.00	$ 2,186,163.11	100%
NP 07	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoria 6, ponchado del cable y marcación	UND		$ 227,651.3370	$ -	208.00	$ 47,351,478.10	0.00	$ -	80.00	$ 18,212,106.96	80.00	$ 18,212,106.96	38%
NP 08	Suministro e instalacion de cable utp cat 6A	ML		$ 14,971.5135	$ -	5,355.00	$ 80,172,454.79	2457.00	$ 36,785,008.67	1,300.00	$ 19,462,967.55	3,757.00	$ 56,247,976.22	70%
NP 09	Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 2 m	M2		$ 62,222.2020	$ -	184.00	$ 11,448,885.17	0.00	$ -	80.00	$ 4,977,776.16	80.00	$ 4,977,776.16	43%
NP 10	Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 1 m	M2		$ 66,434.8635	$ -	184.00	$ 12,224,014.88	0.00	$ -	80.00	$ 5,314,789.08	80.00	$ 5,314,789.08	43%
NP 11	Salida tomacorriente doble tipo GFCI en tubo pvc 1/2"	UND		$ 279,901.6965	$ -	35.00	$ 9,796,559.38	0.00	$ -	31.00	$ 8,676,952.59	31.00	$ 8,676,952.59	89%
NP 12	Suministro e instalacion de soporte en hierro con angulo de 1 1/2"X1/8" para unidad condensadora de aire acondicionado.	Und		$ 275,696.8920	$ -	12.00	$ 3,308,362.70	0.00	$ -	9.00	$ 2,481,272.03	9.00	$ 2,481,272.03	75%
NP 13	Suministro e instalacion de boquilla sobre dilataciones de fachaleta donde corresponda, fachada Incluye andamios, equipos	ML		$ 21,335.6835	$ -	2,500.00	$ 53,339,208.75	2500.00	$ 53,339,208.75		$ -	2,500.00	$ 53,339,208.75	100%
NP 14	Remocion de grafiiti sobre fachadas	M2		$ 71,750.1240	$ -	35.00	$ 2,511,254.34	20.00	$ 1,435,002.48	15.00	$ 1,076,251.86	35.00	$ 2,511,254.34	100%
NP 15	Diseño, suministro e instalacion de ducteria de aire acondicionado lamina de poliisocianurato (PirAlum). Incluye soporte en rangulo 1 "x 1/8" y varilla roscada 1/4".	M2		$ 601,778.11		160.00	$ 96,284,497.60		$ -	78.00	$ 46,938,692.58	78.00	$ 46,938,692.58	49%
NP 16	Instalacion de aire acondicionado de hasta 24,000 BTU.Incluye instalacion de la unidad interior y exterior. No incluye ningún material.	UND		$ 662,875.45		12.00	$ 7,954,505.40		$ -	9.00	$ 5,965,879.05	9.00	$ 5,965,879.05	75%
NP 17	Suministro e instalacion de Bomba de condensado tipo tanque 220V para aires acondicionado hasta de 24.000 BTU. Incluye soporte para la unidad.	UND		$ 741,256.88		13.00	$ 9,636,339.44		$ -	9.00	$ 6,671,311.92	9.00	$ 6,671,311.92	69%
NP 18	Suministro e instalacion de Manguera transparente para drenaje para bomba condensadora tipo tanque o similar.	ML		$ 13,902.96		68.00	$ 945,401.28		$ -	40.50	$ 563,069.88	40.50	$ 563,069.88	60%
NP 19	Instalacion de aire acondicionado de hasta 60,000 BTU.Incluye instalacion de la unidad interior y exterior. No incluye ningún material.	UND		$ 869,105.98		7.00	$ 6,083,741.86		$ -	2.00	$ 1,738,211.96	2.00	$ 1,738,211.96	29%
NP 20	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo Minisplit. Incluye Limpieza de la unidad interior, Retiro y limpieza de los filtros de aire, aletas del intercambiador de calor, revisión y limpieza del drenaje, Inspección y limpieza del ventilador interior y Limpieza de la unidad exterior (condensadora).	UND		$ 374,661.05		21.00	$ 7,867,882.05		$ -	9.00	$ 3,371,949.45	9.00	$ 3,371,949.45	43%
NP 21	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo piso techo. Incluye Limpieza de la unidad interior, Retiro y limpieza de los filtros de aire, aletas del intercambiador de calor, revisión y limpieza del drenaje, Inspección y limpieza del ventilador interior y Limpieza de la unidad exterior (condensadora).	UND		$ 500,247.33		3.00	$ 1,500,741.99		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
NP 22	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex en aires acondicionados de hasta 12.000 BTU	ML		$ 167,431.36		30.00	$ 5,022,940.80		$ -	30.00	$ 5,022,940.80	30.00	$ 5,022,940.80	100%
NP 23	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex en aires acondicionados de desde 18.000 BTU hasta 24.000 BTU	ML		$ 207,261.11		327.00	$ 67,774,382.97		$ -	327.00	$ 67,774,382.97	327.00	$ 67,774,382.97	100%
NP 24	Suministro e instalacion de Rejilla de suministro 12x12 de cuatro vias en aluminio. Incluye tornilleria para su instalacion, no incluye damper	UND		$ 369,161.15		28.00	$ 10,336,512.20		$ -	8.00	$ 2,953,289.20	8.00	$ 2,953,289.20	29%
NP 25	Suministro e instalacion de Rejilla de retorno 18x18 de cuatro vias en aluminio. Incluye tornilleria para su instalacion, no incluye damper	UND		$ 511,078.21		12.00	$ 6,132,938.52		$ -		$ -		$ -	0%
NP 26	Suministro e instalacion de cable encauchetado para potencia 4x14	ML		$ 19,460.48		473.40	$ 9,212,591.23		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
NP 27	Suministro e instalacion de cable encauchetado para potencia 3x12	ML		$ 20,659.98		280.00	$ 5,784,794.40		$ -	250.00	$ 5,164,995.00	250.00	$ 5,164,995.00	89%
NP 28	Suministro e instalación de gas refrigerante para aires acondicionado. Incluye el cargue de gas refrigerante adecuado (según especificaciones del equipo), garantizando una presión óptima para el correcto funcionamiento del sistema. La instalación contempla verificación de fugas, ajuste de presiones y pruebas de rendimiento para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro	LB		$ 92,791.17		56.00	$ 5,196,305.52		$ -	20.00	$ 1,855,823.40	20.00	$ 1,855,823.40	36%
NP 29	Desmonte de manto asfáltico, Incluye retiro y disposicion final	M2		$ 28,281.27		285.79	$ 8,082,504.15		$ -	200.00	$ 5,656,254.00	200.00	$ 5,656,254.00	70%
NP 30	Suministro e instalacion de tuberia PVC 2" liviana red de ventilacion, incluye accesorios	ML		$ 29,112.80		191.00	$ 5,560,544.80		$ -	151.00	$ 4,396,032.80	151.00	$ 4,396,032.80	79%
NP 31	Suministro e instalacion de tuberia pvc presion 3/4". No incluye accesorios.	ML		$ 15,896.02		201.50	$ 3,203,048.03		$ -	190.17	$ 3,022,946.12	190.17	$ 3,022,946.12	94%
NP 32	Suministro e instalacion de tuberia pvc presion 1/2". No incluye accesorios	ML		$ 16,595.29		71.82	$ 1,191,873.73		$ -	37.60	$ 623,982.90	37.60	$ 623,982.90	52%
NP 33	Suministro e instalacion de Tapa en Lámina Galvanizada y aluminio 60X60 Tipo palanca	UND		$ 235,678.57		10.00	$ 2,356,785.70		$ -	10.00	$ 2,356,785.70	10.00	$ 2,356,785.70	100%
NP 34	Suministro e instalacion de registro de bola metalico 2"	UND		$ 291,668.86		4.00	$ 1,166,675.44		$ -	4.00	$ 1,166,675.44	4.00	$ 1,166,675.44	100%
NP 35	Suministro e instalacion de Registro de bola metalico 1"	UND		$ 222,871.66		15.00	$ 3,343,074.90		$ -	6.00	$ 1,337,229.96	6.00	$ 1,337,229.96	40%
NP 36	Suministro e instalacion de Registro de bola metalico 3/4"	UND		$ 162,372.76		15.00	$ 2,435,591.40		$ -	15.00	$ 2,435,591.40	15.00	$ 2,435,591.40	100%
NP 37	Suministro e instalacion de Registro de bola metalico 1/2	UND		$ 112,166.53		60.00	$ 6,729,991.80		$ -	2.00	$ 224,333.06	2.00	$ 224,333.06	3%
NP 38	Suministro e instalacion de Punto hidráulico pvc de 1/2". Incluye accesorios y 3 metros de tuberia	UND		$ 96,312.42		107.00	$ 10,305,428.94		$ -	99.00	$ 9,534,929.58	99.00	$ 9,534,929.58	93%
NP 39	Suministro e instalcion de Mueble para lavamanos 55 cm x 60 cm (axh)	UND		$ 633,031.94		8.00	$ 5,064,255.52		$ -	4.00	$ 2,532,127.76	4.00	$ 2,532,127.76	50%
NP 40	Suministro e instalacion de guardaescobas en areas comunes en ceramica h: 8 cm. incluye pintura en esmalte.	ML		$ 43,513.38		113.50	$ 4,938,768.63		$ -	29.00	$ 1,261,888.02	29.00	$ 1,261,888.02	26%
NP 41	Media caña en mortero impermeabilizado 1:3. (Incluye impermeabilizante integral)	ML		$ 38,474.42		75.00	$ 2,885,581.50		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
NP 42	Suministro e instalacion de grifería lavamanos alta monocontrol	UND		$ 425,889.99		8.00	$ 3,407,119.92		$ -	4.00	$ 1,703,559.96	4.00	$ 1,703,559.96	50%
NP 43	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer cuadrado slim blanco 37 x 37, incluye accesorios de instalación.	UND		$ 633,338.37		8.00	$ 5,066,706.96		$ -	4.00	$ 2,533,353.48	4.00	$ 2,533,353.48	50%
NP 44	Desmonte de aparato sanitario. Incluye disposicion final.	UND		$ 32,279.18		110.00	$ 3,550,709.80		$ -	110.00	$ 3,550,709.80	110.00	$ 3,550,709.80	100%
NP 45	Suministro es instalacion de puerta marco en aluminio color anolock, hoja un En vidrio Incoloro 4mm sandblasting cortinado 2cm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura tipo pomo, Incluye desmonte puerta existente.	M2		$ 991,284.95		100.92	$ 100,040,477.15		$ -	61.73	$ 61,192,019.96	61.73	$ 61,192,019.96	61%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OBRA EJECUTADA								
COMPONENTE DE OBRA														
ÍTEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.
NP 46	Suministro e instalación de puerta en madera entamborada, con marco en aluminio y chapa tipo manija, incluye desmonte puerta existente	M2		$ 905,643.65		13.64	$ 12,352,979.39		$ -	12.20	$ 11,048,852.53	12.20	$ 11,048,852.53	89%
NP 47	Suministro e instalacion de Panel led empotrar 12W	UND		$ 49,431.01		30.00	$ 1,482,930.30		$ -	30.00	$ 1,482,930.30	30.00	$ 1,482,930.30	100%
NP 48	Suministro e instalacion de Panel led empotrar 24W	UND		$ 71,027.28		23.00	$ 1,633,627.44		$ -	23.00	$ 1,633,627.44	23.00	$ 1,633,627.44	100%
NP 49	Suministro e instalacion de Equipo hidrofo con tanque hidroacumulador vertical de 200 litros, 2 electrobombas (2 HP, 3450 RPM, 220V, 40/60 PSI 60HZ) incluye accesorios y tablero de control.	UND		$ 20,527,306.89		2.00	$ 41,054,613.78		$ -	2.00	$ 41,054,613.78	2.00	$ 41,054,613.78	100%
NP 50	Suministro e instalacion de pelicula sand blasting tipo frost. (Suministro e instalación)	M2		$ 77,552.52		22.00	$ 1,706,155.44		$ -	21.31	$ 1,652,644.20	21.31	$ 1,652,644.20	97%
NP 51	Suministro e instalación de tubería de cobre para aire acondicionado 40.000 BTU con rubatex con cinta	ML		$ 225,617.68		175.00	$ 39,483,094.00		$ -	120.00	$ 27,074,121.60	120.00	$ 27,074,121.60	69%
NP 52	Aplicación de pintura en esmalte sobre guardaescobas	ML		$ 12,912.98		640.00	$ 8,264,307.20		$ -	346.00	$ 4,467,891.08	346.00	$ 4,467,891.08	54%
NP 53	Suministro e instalacion de cerrojo o chapa de seguridad	UND		$ 204,609.38		12.00	$ 2,455,312.56		$ -	7.00	$ 1,432,265.66	7.00	$ 1,432,265.66	58%
NP 54	Suministro e instalacion de ventana en aluminio tipo rejilla incluye desmonte de ventanas existente.	M2		$ 1,382,825.45		10.40	$ 14,381,384.68		$ -	9.53	$ 13,178,326.54	9.53	$ 13,178,326.54	92%
NP 55	Suministro e instalacion de puerta metalica en cold rolled cal 18 con fijo superior en marco metalico y vidrio incoloro 4mm y chapa tipo pomo, incluye desmonte de puerta existente.	M2		$ 1,472,370.37		2.17	$ 3,195,043.70		$ -	2.17	$ 3,195,043.70	2.17	$ 3,195,043.70	100%
NP 56	Suministro e instalacion de cubierta con teja UPVC 2mm, incluye accesorios para su correcta instalacion	M2		$ 211,032.47		381.50	$ 80,508,887.31		$ -					
NP 57	Desmonte de puertas en madera o en aluminio, incluye desmonte de marco y accesorios, retiro a punto de acopio de la entidad	M2		$ 38,560.85		140.40	$ 5,413,943.34		$ -	99.85	$ 3,850,300.87	99.85	$ 3,850,300.87	71%
NP 58	Desmonte de aires acondicionados, incluye desmonte y traslados de equipos a punto de acopio de la entidad	UND		$ 249,593.32		1.00	$ 249,593.32		$ -	1.00	$ 249,593.32	1.00	$ 249,593.32	100%
NP 59	Desmonte de ventanas en aluminio, incluye desmonte de marco y accesorios, retiro a punto de acopio de la entidad	M2		$ 16,131.73		9.60	$ 154,864.61		$ -					
NP 60	Suministro e instalacion de barra de seguridad en U pleggable para baño en acero inoxidable.	UND		$ 1,120,092.61		2.00	$ 2,240,185.22		$ -	1.00	$ 1,120,092.61	1.00	$ 1,120,092.61	50%
NP 61	Suministro e instalacion de barra de seguridad recta para baño en acero inoxidable.	UND		$ 343,074.60		2.00	$ 686,149.20		$ -	1.00	$ 343,074.60	1.00	$ 343,074.60	50%
NP 62	Suministro e instalacion de barra de seguridad en L para baño en acero inoxidable.	UND		$ 1,013,542.52		1.00	$ 1,013,542.52		$ -	1.00	$ 1,013,542.52	1.00	$ 1,013,542.52	100%
NP 63	Suministro e instalacion de medidor para agua de 1-1/2" R-400 Q3-16.0 M3/H. IP-68. ultra sonico	UND		$ 10,550,724.00		2.00	$ 21,101,448.00		$ -	2.00	$ 21,101,448.00	2.00	$ 21,101,448.00	100%
NP 64	Suministro e instalación de Bombas de 2HP de potencia con motor trifásico a 220-440 voltios, succión y descarga de 1 1/2" y tablero de control arranque directo	UND		$ 19,744,210.17		2.00	$ 39,488,420.34		$ -	2.00	$ 39,488,420.34	2.00	$ 39,488,420.34	100%
NP 65	Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada cal. 22	ML		$ 231,874.47		36.60	$ 8,486,605.60		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
NP 66	Suministro e instalación de apoyos tipo ménsula para el soporte de estructuras metálicas, asegurando su correcta fijación y cumplimiento de las especificaciones técnicas.	UND		$ 1,706,590.16		25.00	$ 42,664,754.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
NP 67	Desmonte controlado de cubierta existente para alturas mayores a 12 m. Incluye desmonte de estructura metalica existente.	M2		$ 57,215.98		265.00	$ 15,162,234.70		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
ÍTEM		UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALES		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 3		ACUMULADO TOTAL		
						CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					$ 2,945,313,493.00		$ 4,528,257,513.55		$ 1,619,922,300.76		$ 936,276,131.25		$ 2,556,198,432.01	56.45%

RESUMEN EJECUTIVO DEL COMPONENTE OBRA

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALES	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ACTUAL	% EJEC.
SUBTOTAL COSTO DIRECTO			$ 2,249,189,380.00	$ 3,458,004,974.55	$ 1,237,054,067.00	$ 714,987,500.00	$ 1,952,041,567.00	56.45%
ADMINISTRACION		22.00%	$ 494,821,664.00	$ 760,761,094.00	$ 272,151,894.00	$ 157,297,250.00	$ 429,449,144.00	
IMPREVISTO		3.00%	$ 67,475,681.00	$ 103,740,149.00	$ 37,111,622.00	$ 21,449,625.00	$ 58,561,247.00	
UTILIDAD		5.00%	$ 112,459,469.00	$ 172,900,248.00	$ 61,852,704.00	$ 35,749,375.00	$ 97,602,079.00	
IVA SOBRE UTILIDAD		19.00%	$ 21,367,299.00	$ 32,851,047.00	$ 11,752,013.76	$ 6,792,381.25	$ 18,544,395.01	
COSTO TOTAL INDIRECTOS			$ 2,945,313,493.00	$ 4,528,257,512.55	$ 1,619,922,300.76	$ 936,276,131.25	$ 2,556,198,432.01	56.45%

ING. FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
Director de Obra
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
CONTRATISTA

ING. LUCRECIA LOPEZ AROCA
Director de Obra
CONSORCIO INTERCONSULTORES
INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
1.02	Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	333.70


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
501	5.94	3.40				20.20
502	6.57	6.94				45.60
	0.93	3.01				2.80
503	6.75	7.89				53.26
504	6.75	7.89				53.26
505	6.75	7.89				53.26
506	4.64	6.69				31.04
	0.93	4.81				4.47
507	6.73	6.41				43.14
	0.88	6.46				5.68
508	6.73	3.12				21.00
Subtotal						**333.70**
CANTIDAD TOTAL						**333.70**


ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO







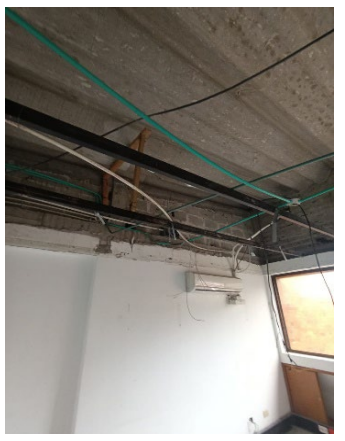

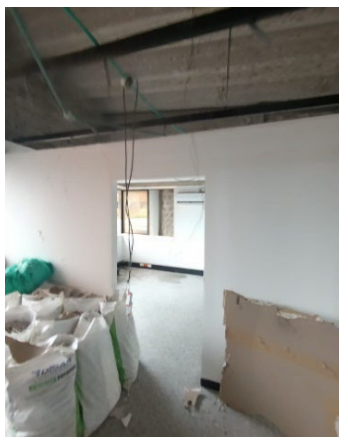

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total	
1.04	Desmonte de puntos de iluminación para lámparas existentes, incluye desmonte de tubería, cableado, aparatos eléctricos. Retiro y disposición a sitios autorizados	Und	104.00	


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OFICINA 501				8.00		8.00	
OFICINA 502				11.00		11.00	
OFICINA 503				11.00		11.00	
OFICINA 504				11.00		11.00	
OFICINA 505				11.00		11.00	
OFICINA 506				11.00		11.00	
OFICINA 507				14.00		14.00	
OFICINA 508				8.00		8.00	
BAÑOS TORRE A PISO 1				3.00		3.00	
BAÑOS TORRE A PISO 2				4.00		4.00	
BAÑOS TORRE A PISO 3				4.00		4.00	
BAÑOS TORRE A PISO 4				4.00		4.00	
BAÑOS TORRE A PISO 5				4.00		4.00	



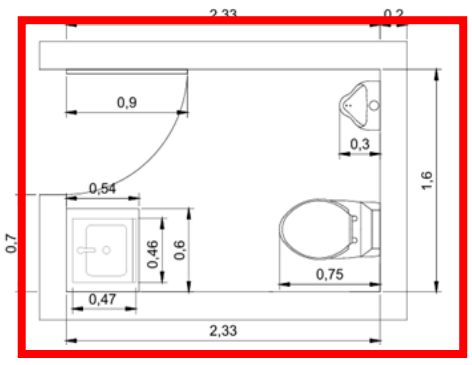

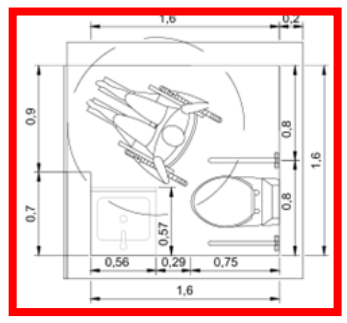

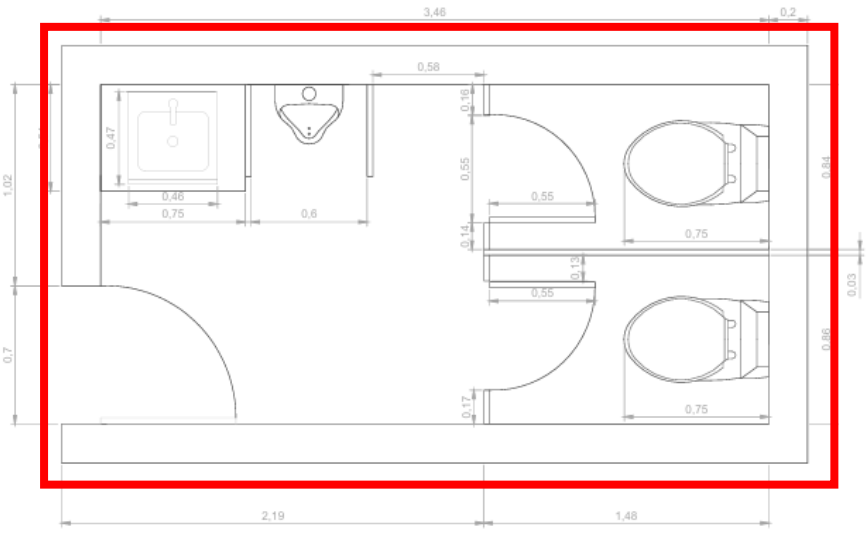

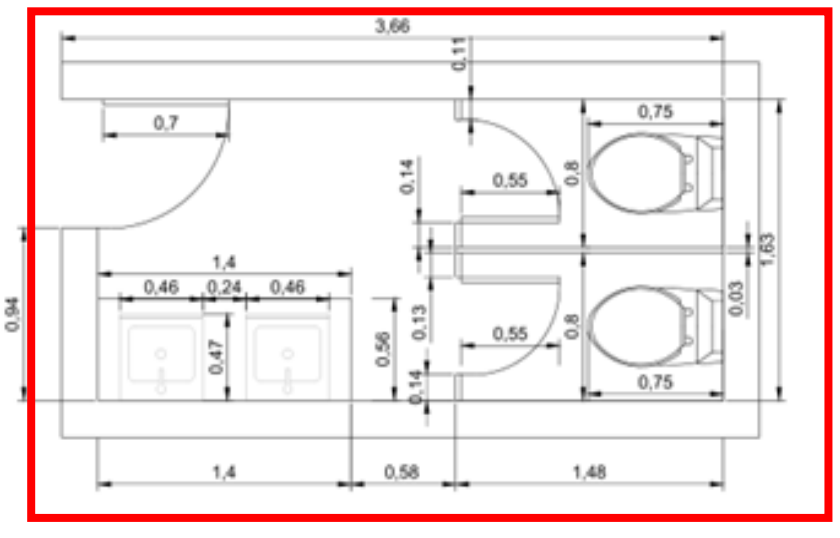

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia




CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total	
1.04	Desmonte de puntos de iluminación para lámparas existentes, incluye desmonte de tubería, cableado, aparatos eléctricos. Retiro y disposición a sitios autorizados	Und	104.00	

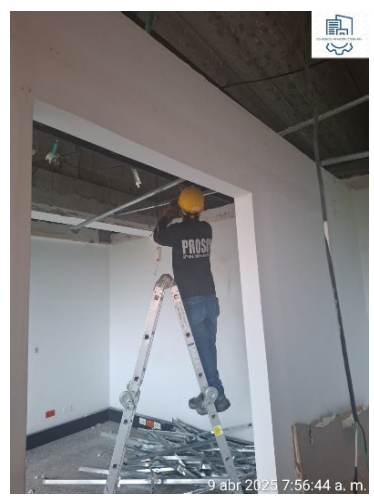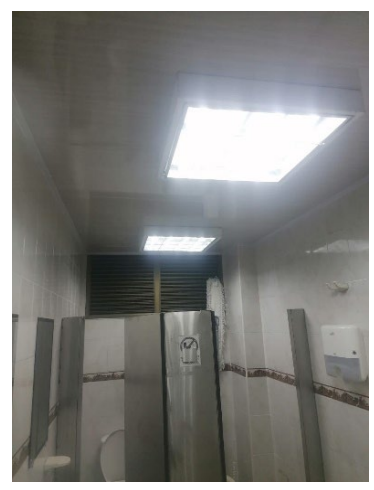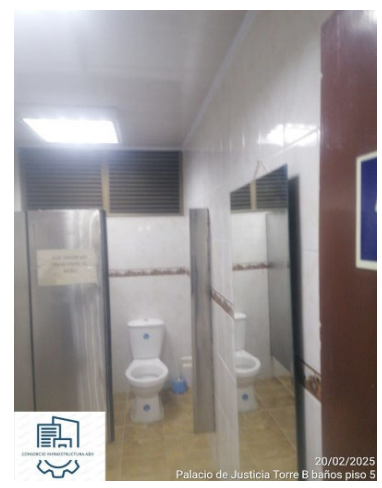LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
							   
Subtotal						104.00	
CANTIDAD TOTAL						104.00	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA	**ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
1.05	Desmonte de canaleta o ductería existente, incluye desconexión y retiro de cableado.	ml	245.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OFICINA 501	8.00	4.20				8.00	
OFICINA 502	48.00					48.00	
OFICINA 503	42.00					42.00	
OFICINA 504	40.00					40.00	
OFICINA 505	39.00					39.00	
OFICINA 506	45.00					45.00	
OFICINA 507	15.00					15.00	
OFICINA 508	8.00					8.00	

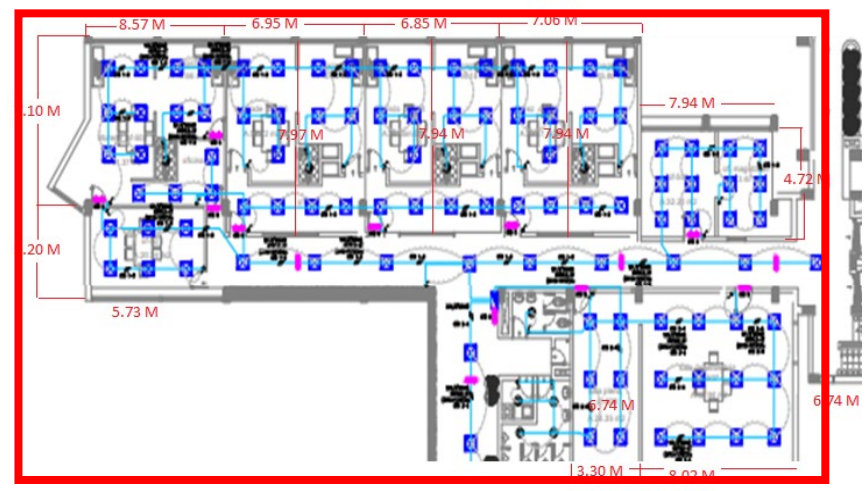









Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
1.05	Desmonte de canaleta o ductería existente, incluye desconexión y retiro de cableado.	ml	245.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
							 
Subtotal						245.00	
CANTIDAD TOTAL						245.00	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
1.06	Desmonte de tablero de 12 circuitos TWS	Und	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
TORRE B PISO 5 ALA A				**1.00**		**1.00**	
Subtotal						**1.00**	
CANTIDAD TOTAL						**1.00**	

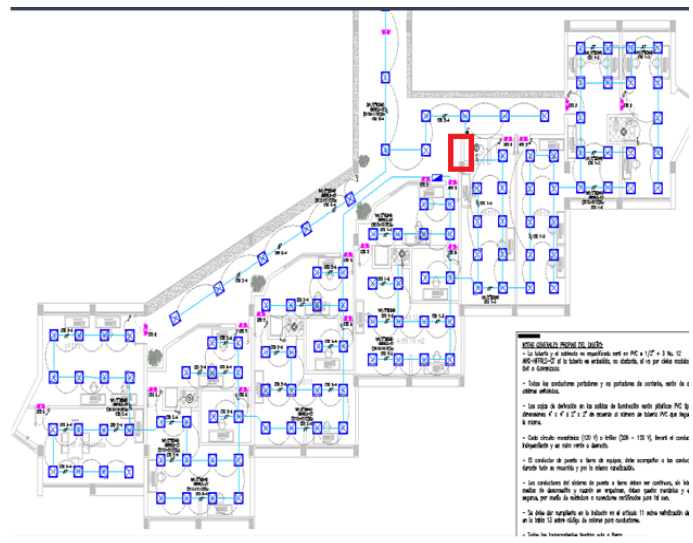



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
1.07	Desmonte de tablero de 24 circuito TWP	Und	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
TORRE B PISO 5 ALA A				1.00		1.00
Subtotal						1.00
CANTIDAD TOTAL						1.00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

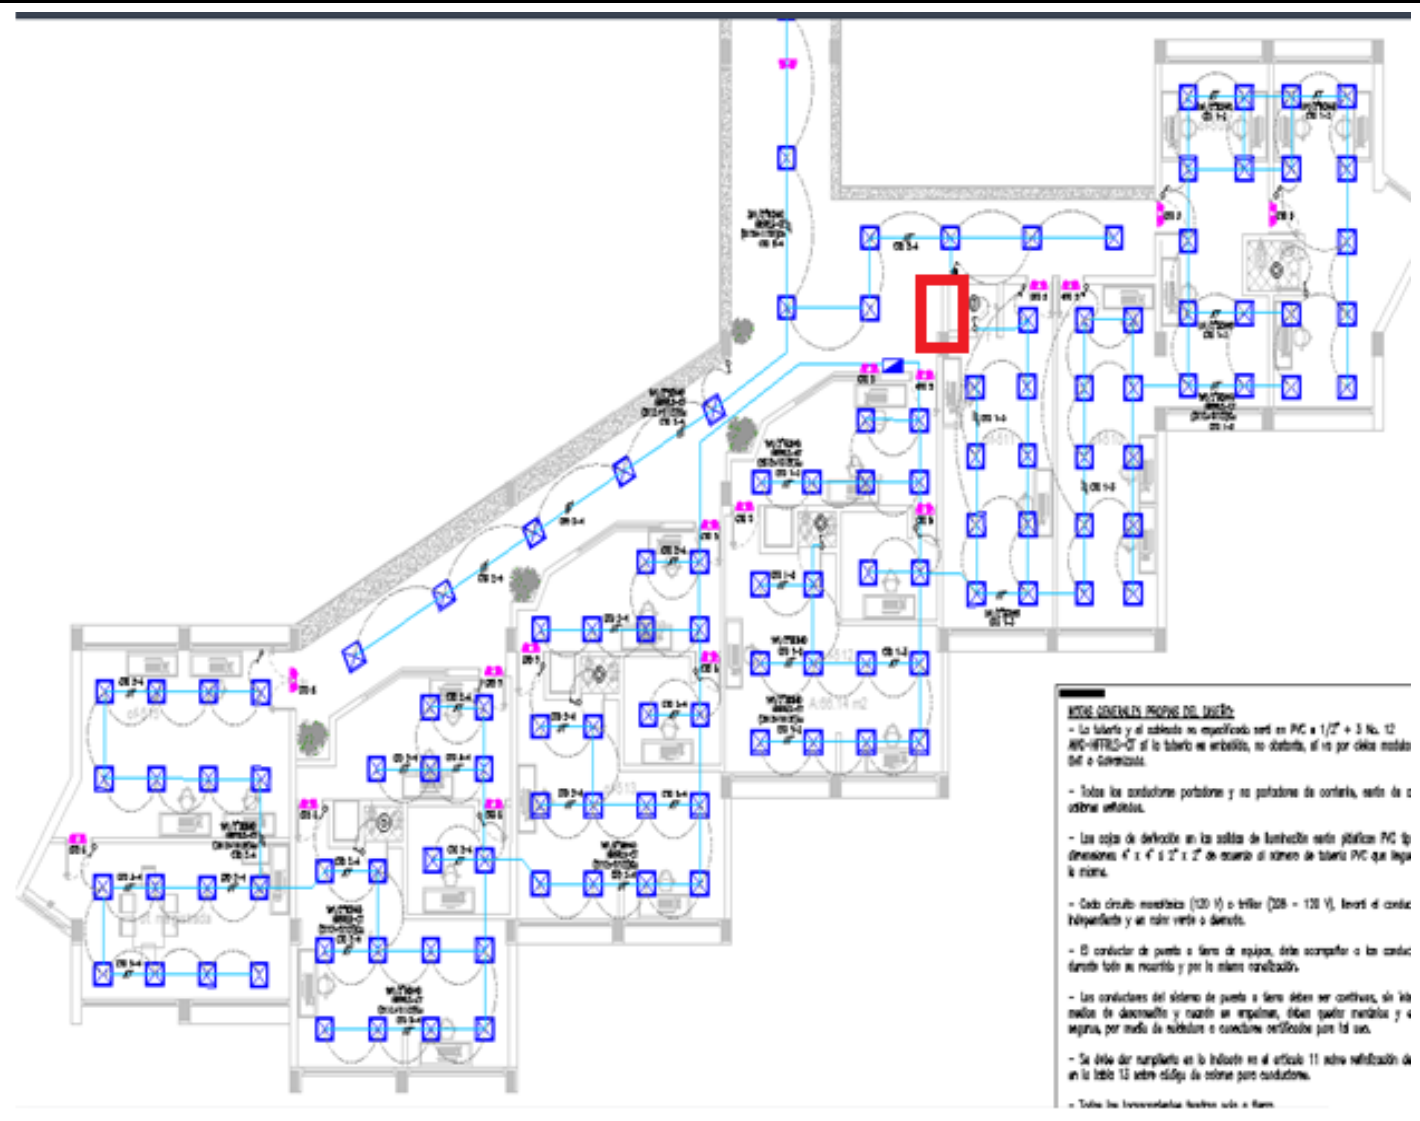



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
2.02	Mantenimiento e impermeabilización de viga canal con manto asfáltico (emulsión asfáltica, primera capa manto de 2,2mm, segunda capa manto foil aluminio de 3,2 mm y aluminol) para viga canal	ml	120.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
CUBIERTA TORRE B TERRAZA MUROS PERIMETRALES GOTERO	16.80	1.00				16.80	
	7.00	1.00				7.00	
	9.40	1.00				9.40	
	2.15	1.00				2.15	
	7.35	1.00				7.35	
	7.70	1.00				7.70	
	3.93	1.00				3.93	
	7.05	1.00				7.05	
	3.60	1.00				3.60	
	7.00	1.00				7.00	
	3.36	1.00				3.36	
	7.50	1.00				7.50	
	7.06	1.00				7.06	
	5.60	1.00				5.60	
	9.40	1.00				9.40	
	7.40	1.00				7.40	
	7.70	1.00				7.70	







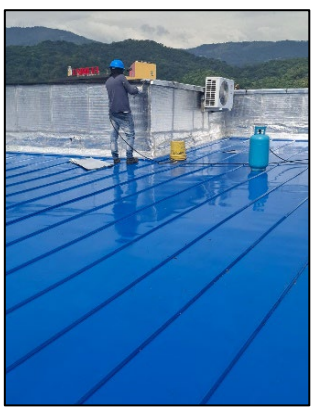



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
2.02	Mantenimiento e impermeabilización de viga canal con manto asfáltico (emulsión asfáltica, primera capa manto de 2,2mm, segunda capa manto foil aluminio de 3,2 mm y aluminol) para viga canal	ml	120.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
							
Subtotal						**120.00**	
CANTIDAD TOTAL						**120.00**	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
2.03	Suministro e instalación cubierta tipo Sandwich cal 26 prepintada. Incluye poliuretano 38mm densidad 35-38 KG/M#, clips de fijación, tornillos autoperforantes, remate 0,30 en lámina cal 26 x 2.44 ml	m2	127.40

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
SUMINISTRO	15.93	8.00				127.40	
Subtotal						127.40	
CANTIDAD TOTAL						127.40	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA	**ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
2.05	Suministro e instalación de cielo raso PVC (incluye estructura metálica y rejillas de ventilación)	m2	120.93

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
PASILOS A1 TORRE B ALA A-A1	10.24	3.19				32.67	
PASILOS A1 TORRE B ALA A-A2	15.72	2.88				45.27	
PASILLO	5.20	3.49				18.15	
OFICINA 514	3.55	7.00				24.84	

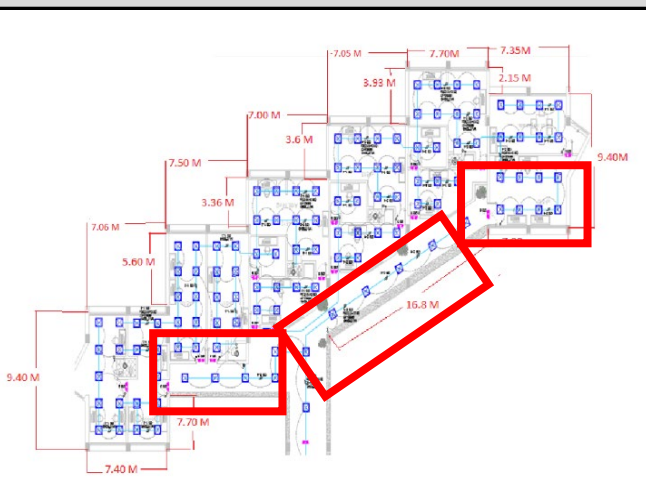

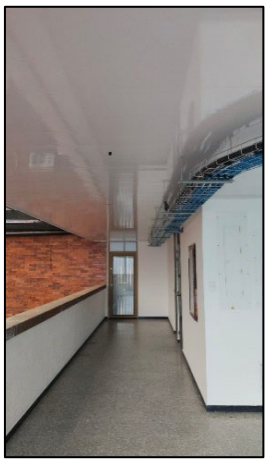

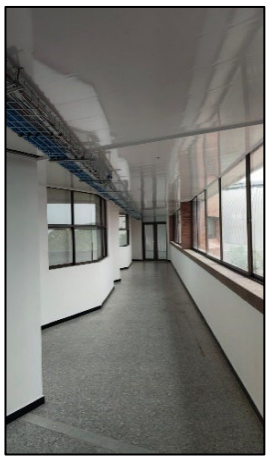



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
2.05	Suministro e instalación de cielo raso PVC (incluye estructura metálica y rejillas de ventilación)	m2	120.93

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
Subtotal						120.93
CANTIDAD TOTAL						120.93

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
2.07	Suministro e instalación (emulsión asfáltica, primera capa manto de 2,2mm, segunda capa manto foil aluminio de 3,2 mm y aluminol) para remates de cubierta en muro	m2	20.77


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	ANCHO	MEDIA			
TORRE B BLOQUE 1						
SECCIÓN PLACA DE PISO CBUIERTA ZONA 1	13.15	1.00				13.15
ANTEPECHO ZONA DE CUBIERTA (COLOR MORADO)	23.10	0.33				7.62
					Subtotal	20.77
					CANTIDAD TOTAL	20.77

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANTA TERRAZA TORRE B BLOQUE 1

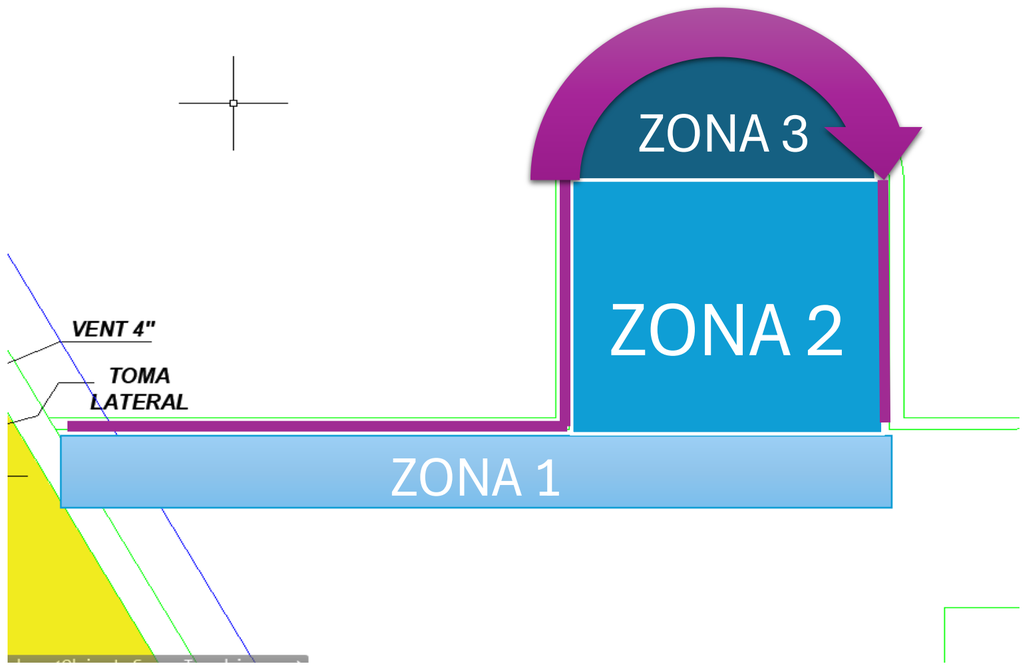



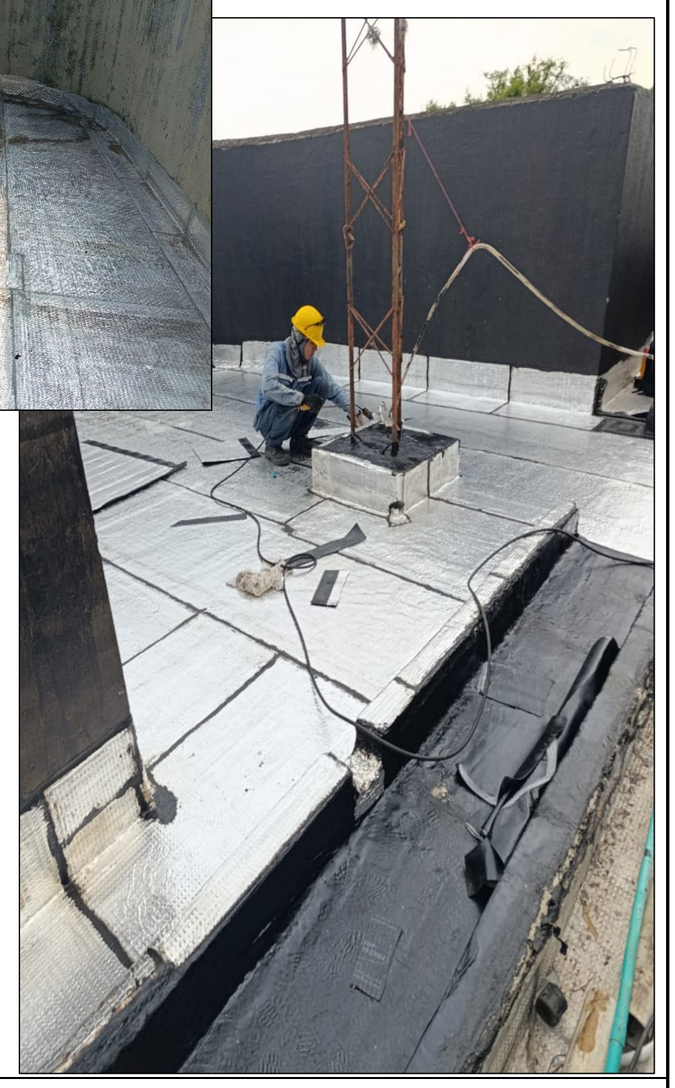

OBSERVACIONES:

ING. FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.01	Suministro e instalación bandeja porta cable tipo malla ancho 30 cm; incluye anclajes, accesorios, clips de conexión y puesta a tierra para su correcto funcionamiento	ml	55.95

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
PASILOS A1 TORRE B ALA A-A1	19.90					19.90
PASILOS A1 TORRE B ALA A-A2	8.52					8.52
PASILOS A1 TORRE B ALA A-A2	2.60					2.60
PASILOS BAÑOS TORRE B	21.73					21.73
RAT	2.20					2.20
SOTANO	1.00					1.00
Subtotal						55.95
CANTIDAD TOTAL						55.95

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

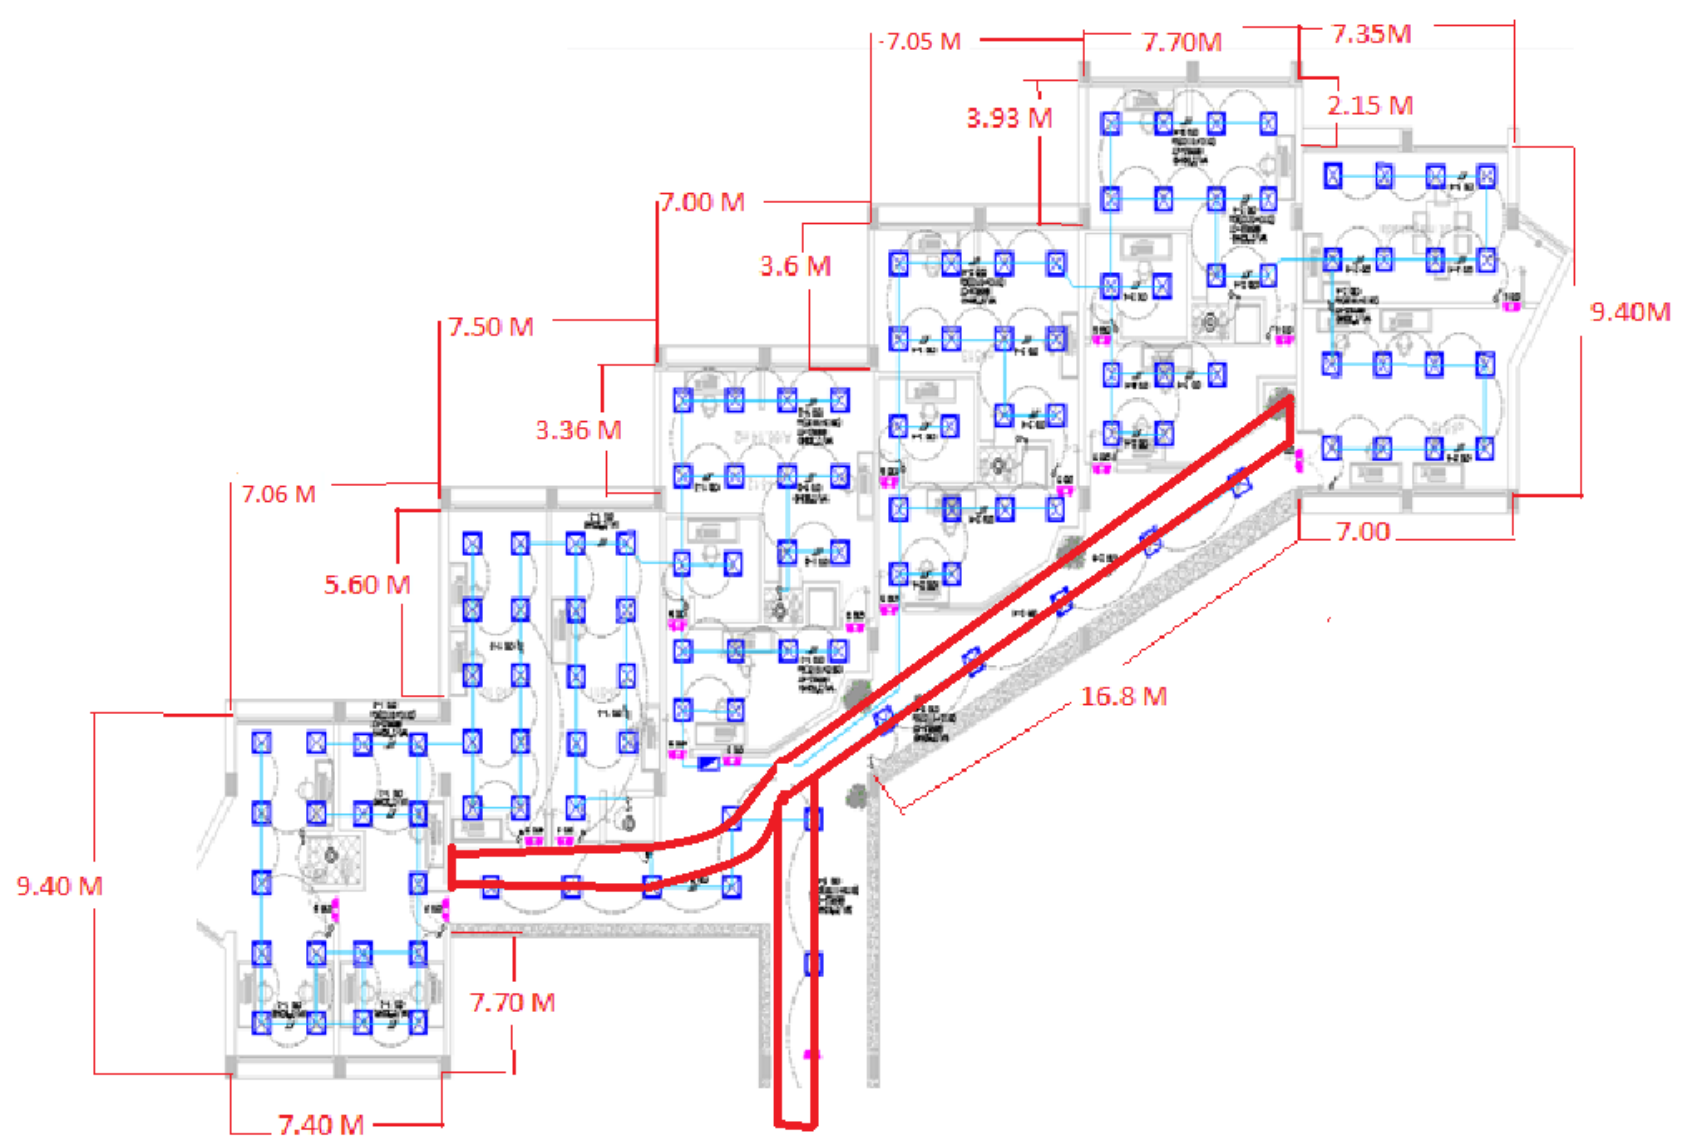

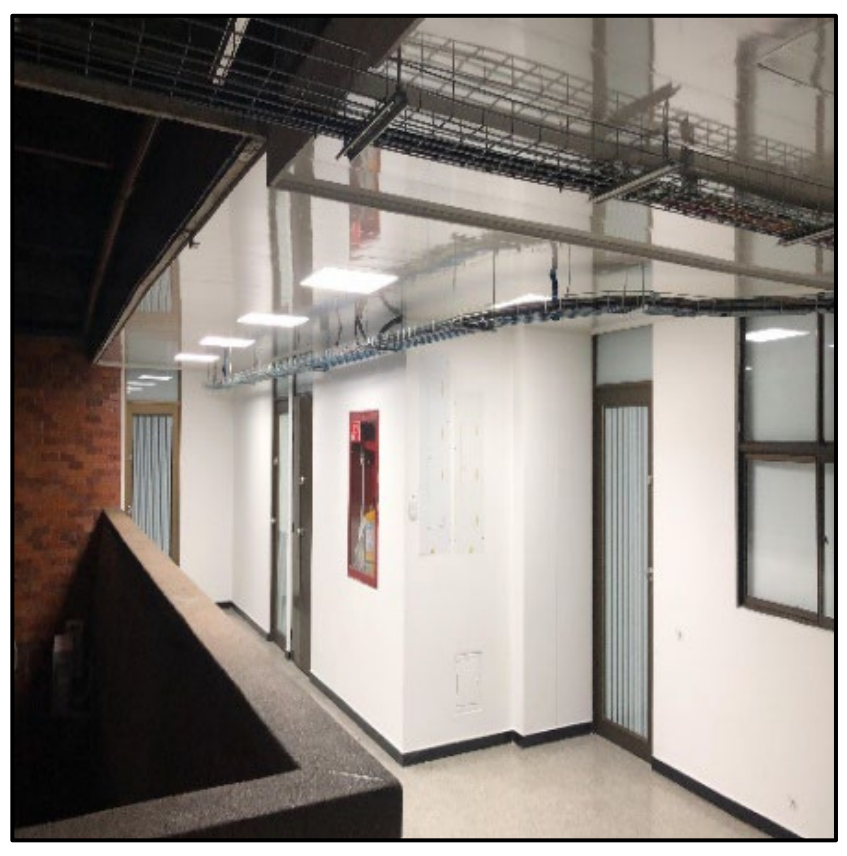







SOTANO 1 METRO.

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA	ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.02	Tablero de 12 circuitos TWS	Und	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
PASILOS A1 TORRE B ALA A				1.00		1.00
Subtotal						1.00
CANTIDAD TOTAL						1.00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

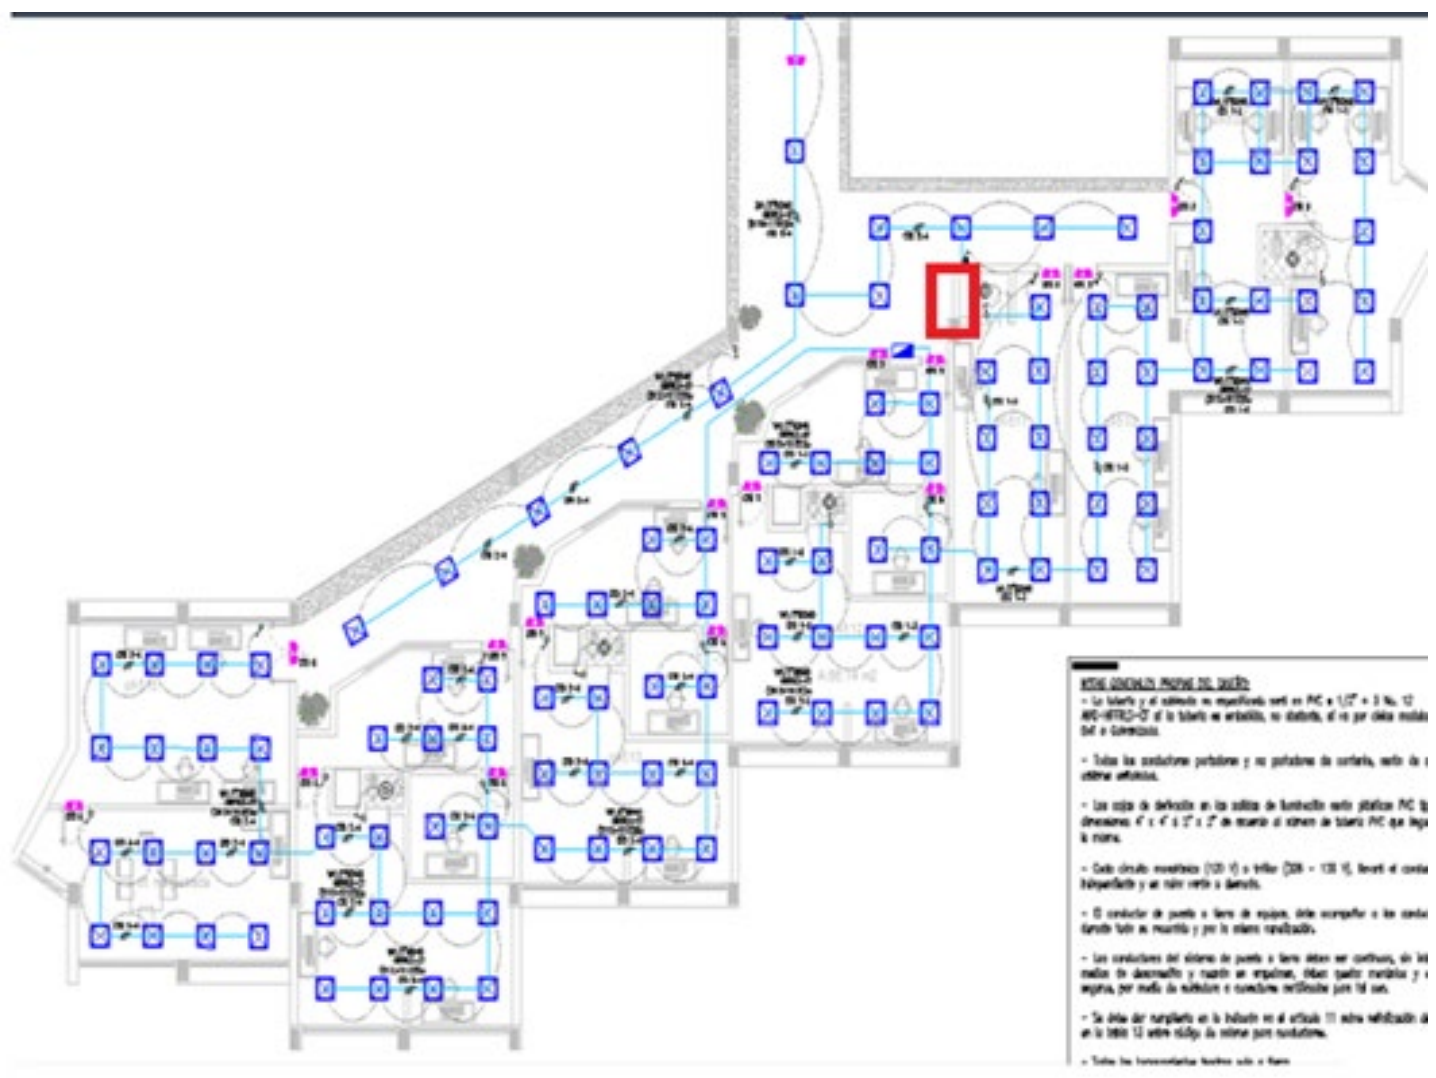



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.03	Tablero de 24 circuito TWP	Und	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
PASILOS A1 TORRE B ALA A				1.00		1.00
Subtotal						1.00
CANTIDAD TOTAL						1.00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

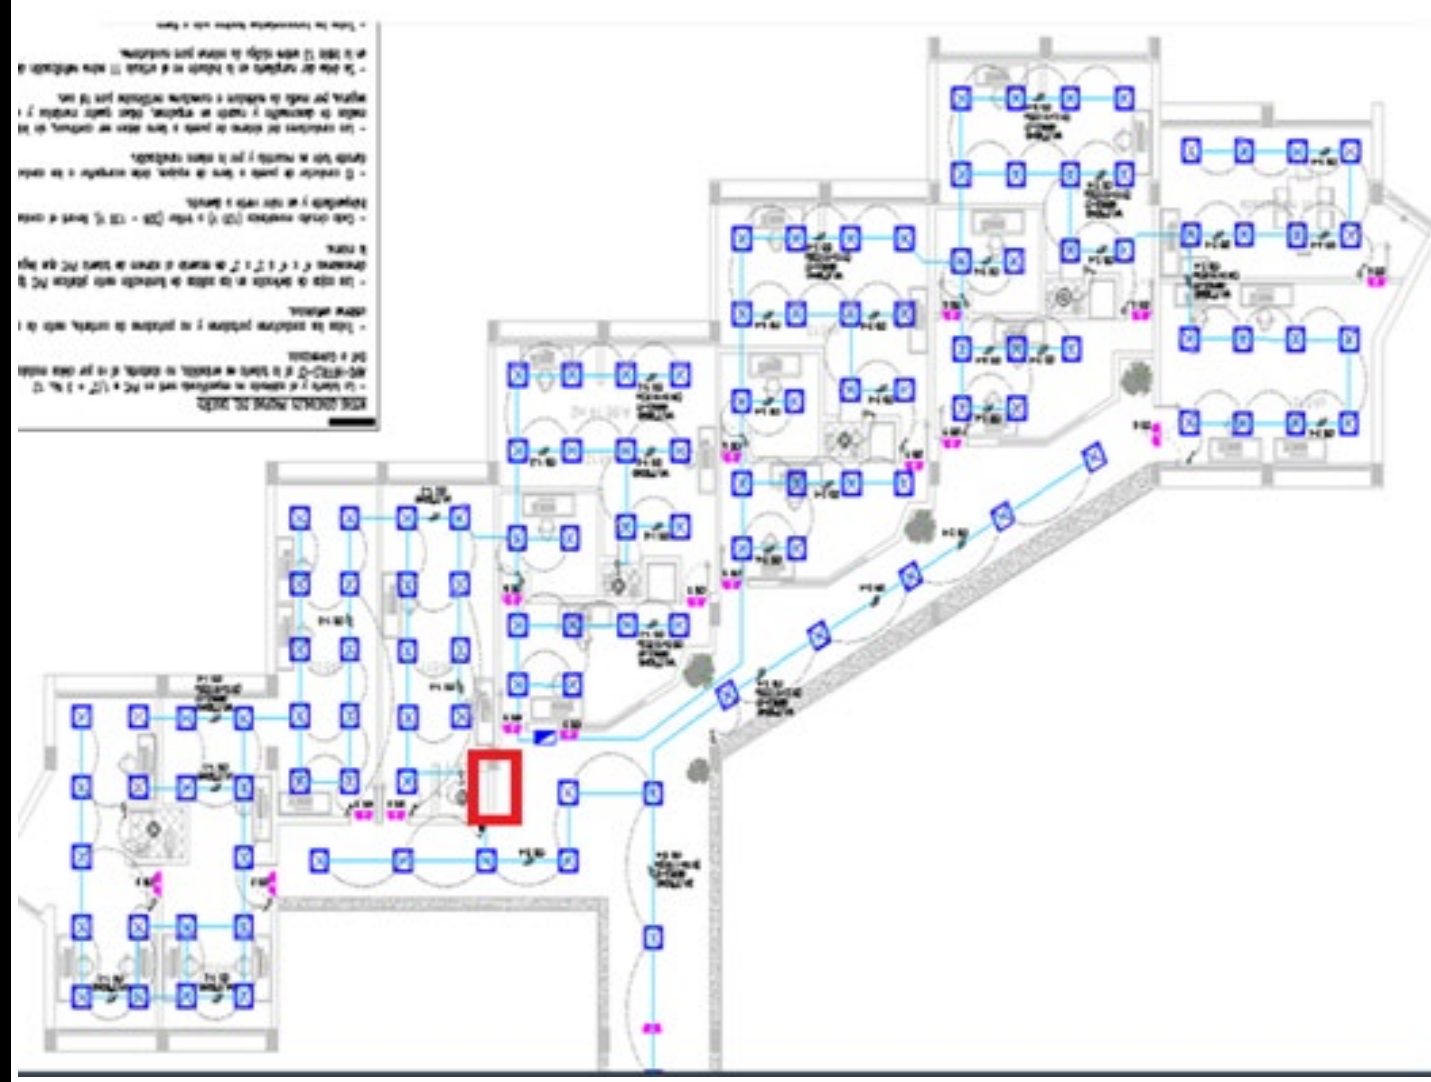





OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.04	Suministro e instalación lámpara Led Panel 60x60cm 40w Vida Útil: 30.000 horas. Incluye accesorios y cableado de instalación, clavija, marco en aluminio para su correcto funcionamiento.	Und	11.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
PASILLO TORRE B ALA A					**11**	**11.00**
Subtotal						**11.00**
CANTIDAD TOTAL						**11.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

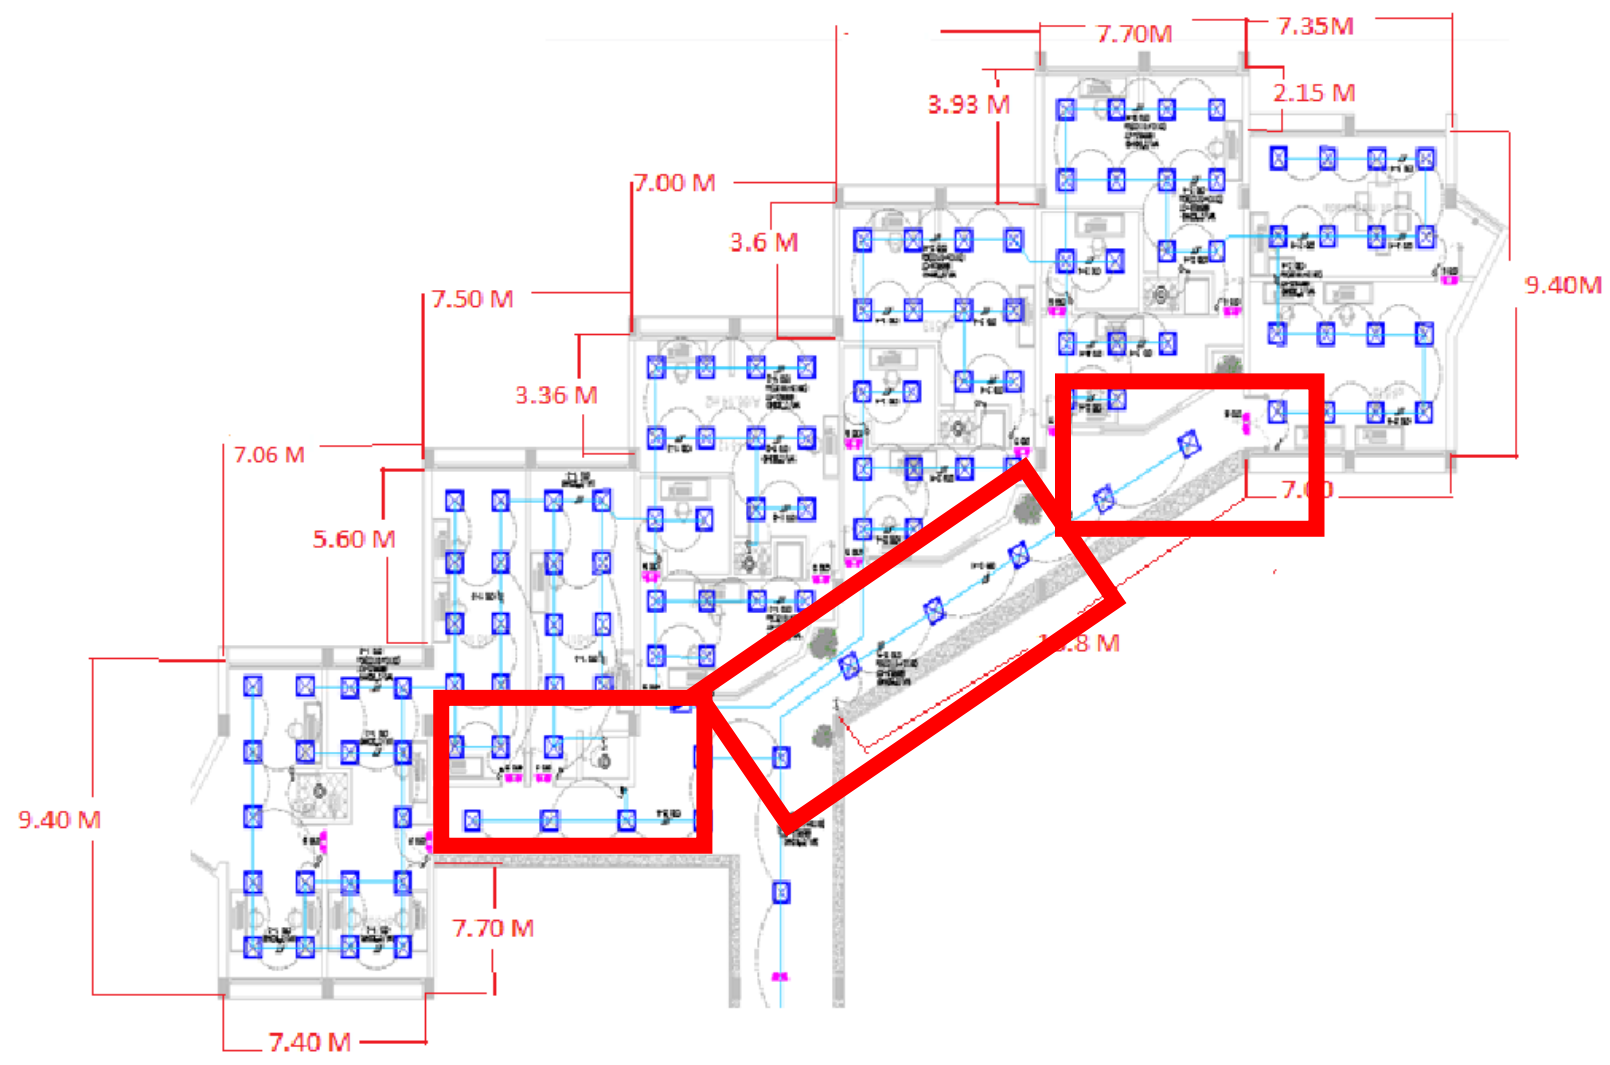

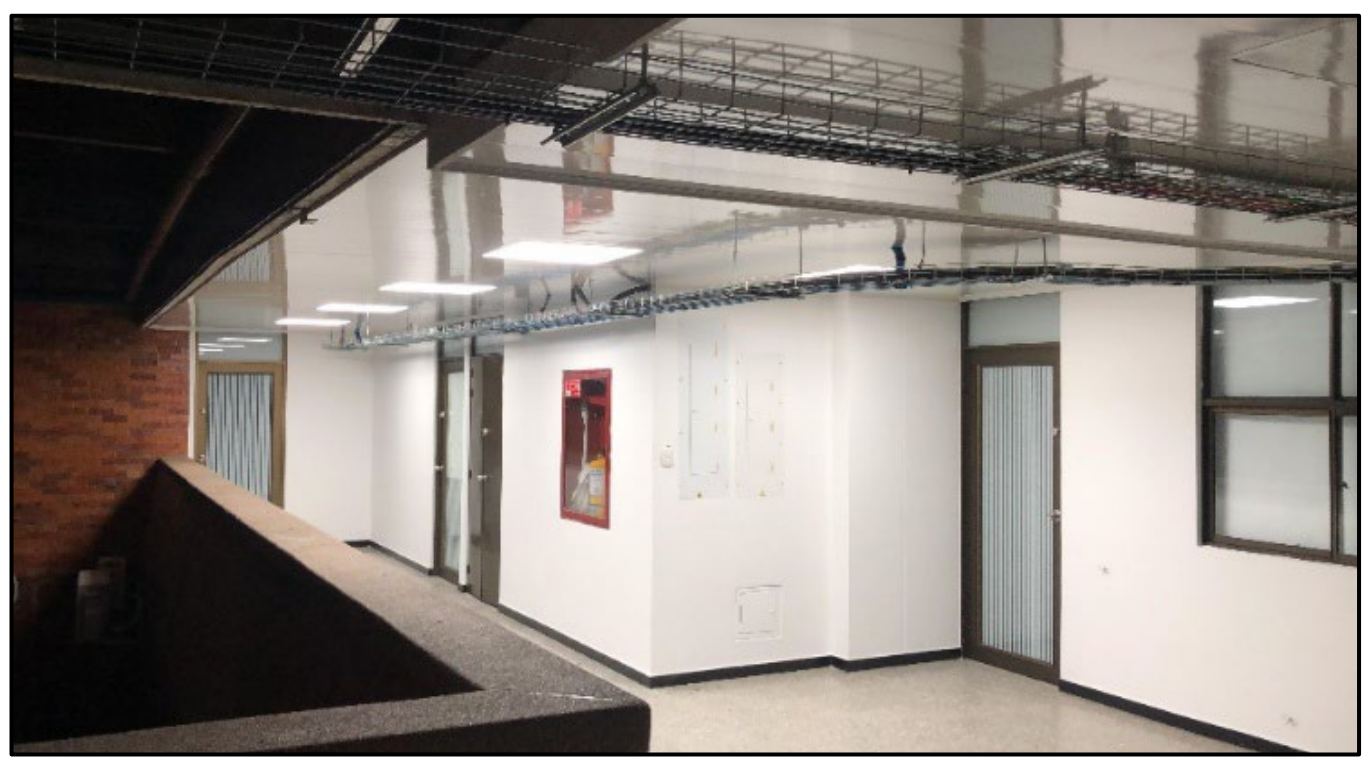



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia






CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.05	Salida eléctrica para punto de iluminación, incluye caja, tubería, cableado, toma y demás accesorios para su correcto funcionamiento 3m.	Und	78.00

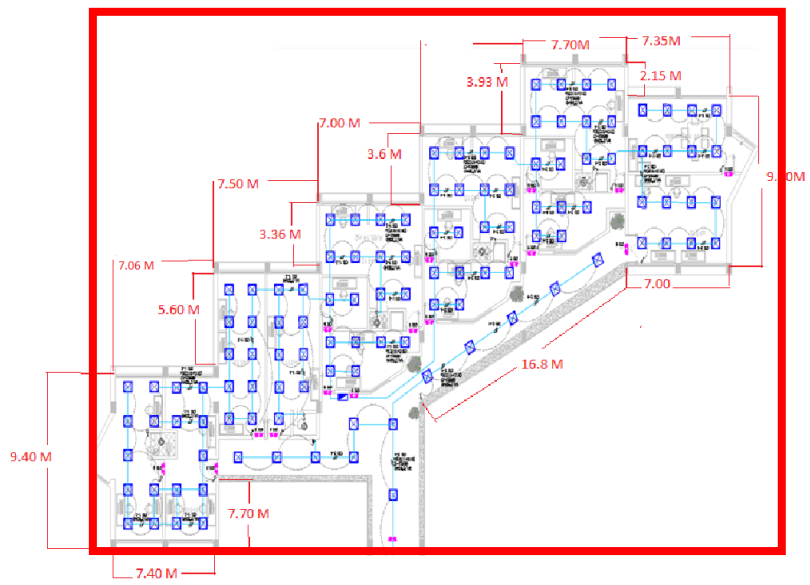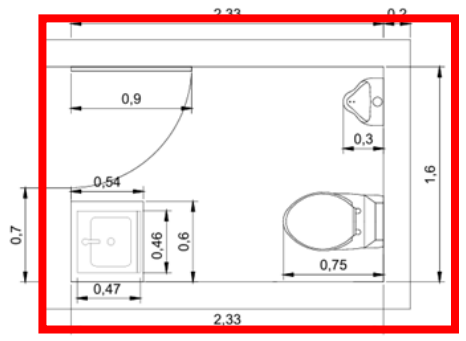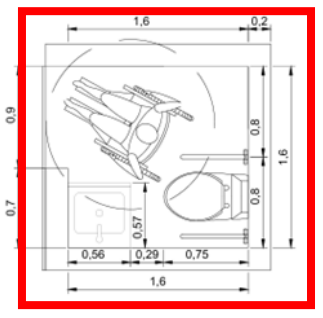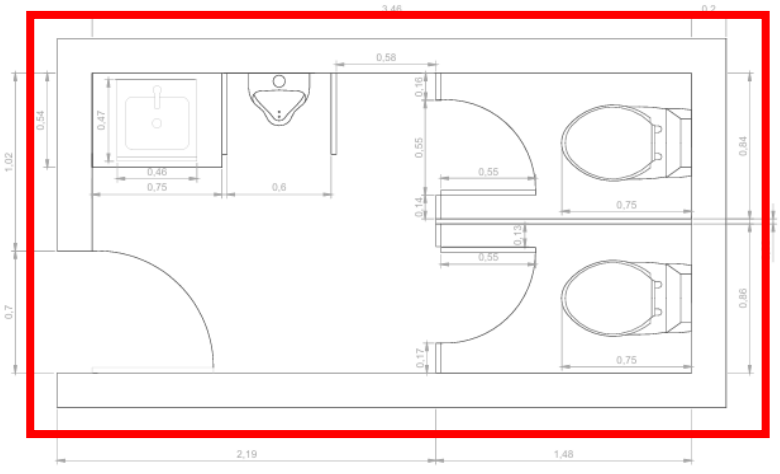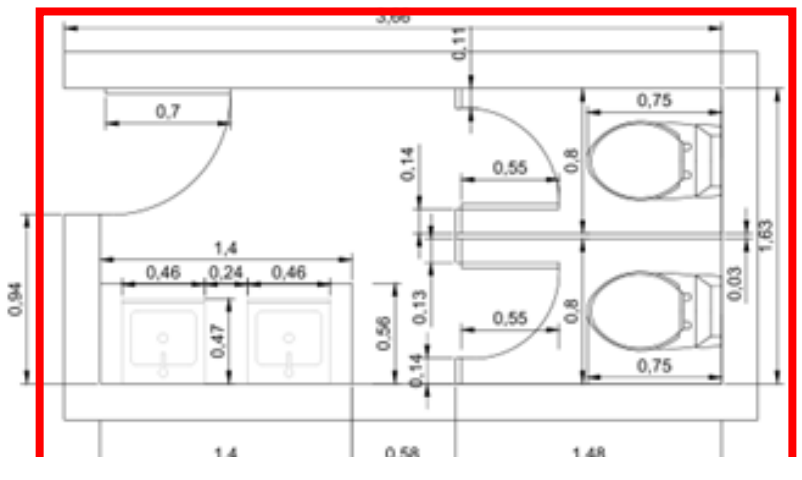LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
PASILLO TORRE B ALA A					12	12.00	
OFICINA 509 LAMPARA DE EMERGENCIA					2	2.00	
OFICINA 510 LAMPARA DE EMERGENCIA					2	2.00	
RACK LAMPARA DE EMERGENCIA					1	1.00	
OFICINA 512 LAMPARA DE EMERGENCIA					3	3.00	
OFICINA 513 LAMPARA DE EMERGENCIA					3	3.00	
OFICINA 514 LAMPARA DE EMERGENCIA					3	3.00	
OFICINA 515 LAMPARA DE EMERGENCIA					2	2.00	
PASILLO TORRE B ALA A LAMPARA DE EMERGENCIA					0	0.00	
BAÑOS TORRE A PISO 1					3	3.00	
BAÑOS TORRE A PISO 2					4	4.00	
BAÑOS TORRE A PISO 3					4	4.00	
BAÑOS TORRE A PISO 4					4	4.00	
BAÑOS TORRE A PISO 5					4	4.00	
BAÑOS TORRE B PISO 1					8	8.00	
BAÑOS TORRE B PISO 2					7	7.00	
BAÑOS TORRE B PISO 3					4	4.00	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.05	Salida eléctrica para punto de iluminación, incluye caja, tubería, cableado, toma y demás accesorios para su correcto funcionamiento 3m.	Und	78.00


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE B PISO 4					4	4.00	
BAÑOS TORRE B PISO 5					4	4.00	
COCINAS					4	4.00	

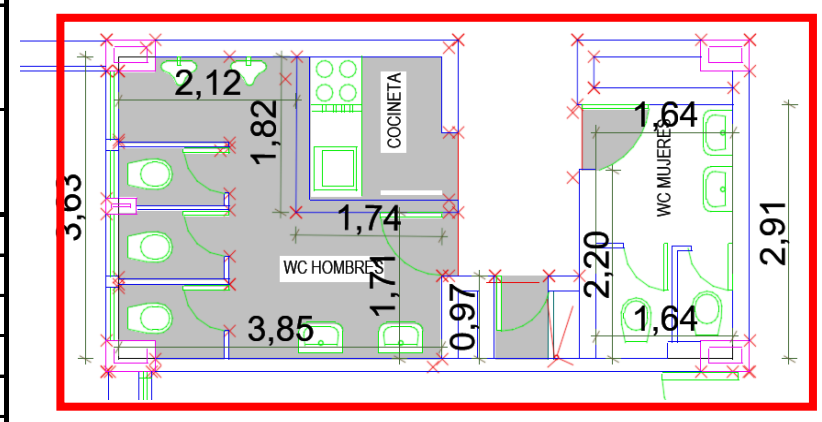







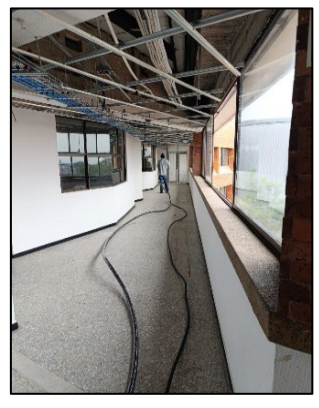

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.05	Salida eléctrica para punto de iluminación, incluye caja, tubería, cableado, toma y demás accesorios para su correcto funcionamiento 3m.	Und	78.00

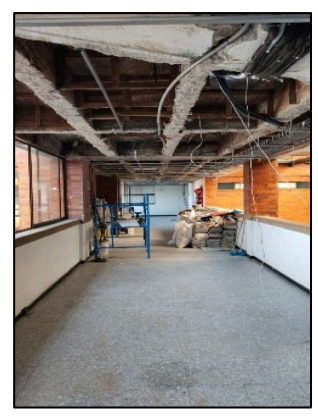LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
							 
Subtotal						78.00	
CANTIDAD TOTAL						78.00	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.07	Suministro e instalación de lámpara de emergencia con batería de respaldo. Incluye anclajes, soportes y todos los accesorios para su correcta instalación	Und	14.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OFICINA 509 LAMPARA DE EMERGENCIA					2	2.00	
OFICINA 510 LAMPARA DE EMERGENCIA					2	2.00	
OFICINA 512 LAMPARA DE EMERGENCIA					3	3.00	
OFICINA 513 LAMPARA DE EMERGENCIA					3	3.00	
OFICINA 514 LAMPARA DE EMERGENCIA					3	3.00	
OFICINA 515 LAMPARA DE EMERGENCIA					1	1.00	
Subtotal						14.00	
CANTIDAD TOTAL						14.00	

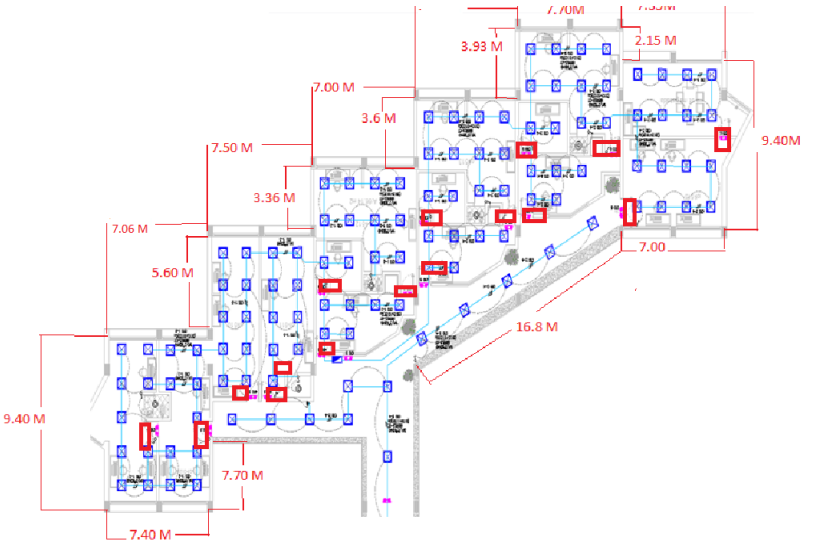



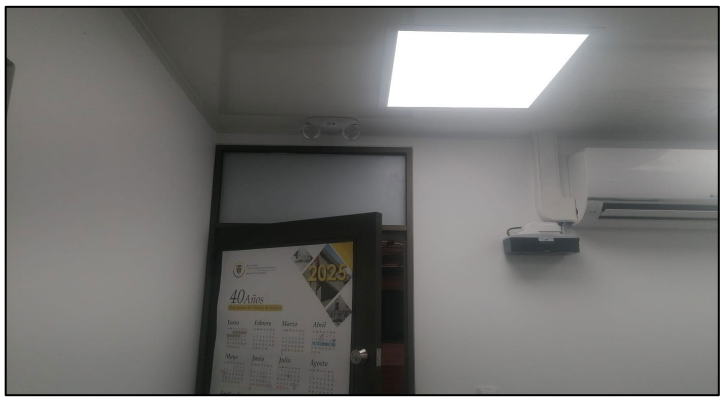

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.08	Suministro e instalación de toma normal incluye salida en tubería ScH 40 y cable # 12 libre de halógenos 3m	Und	41.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OFICINA 509				7.00		7.00	
OFICINA 510				7.00		7.00	
RACK				1.00		1.00	
OFICINA 512				7.00		7.00	
OFICINA 513				7.00		7.00	
OFICINA 514				7.00		7.00	
OFICINA 515				5.00		5.00	

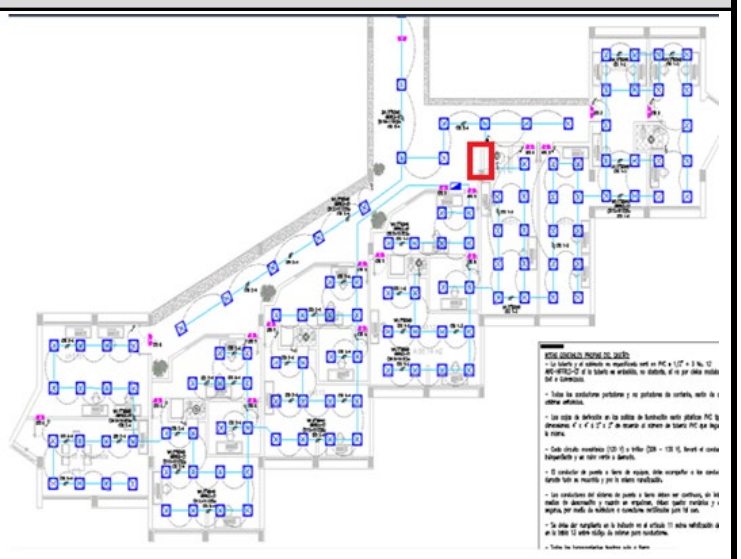

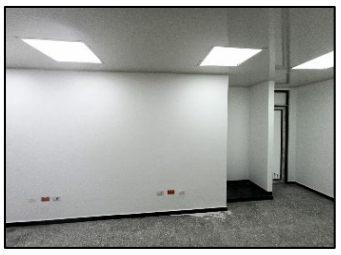







Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.08	Suministro e instalación de toma normal incluye salida en tubería ScH 40 y cable # 12 libre de halógenos 3m	Und	41.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						41.00	
CANTIDAD TOTAL						41.00	

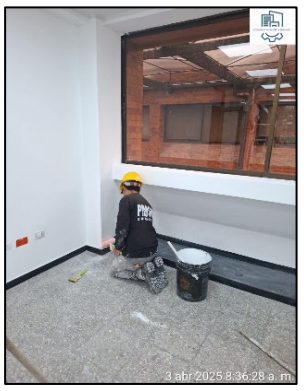



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.09	Suministro e instalación de toma regulado incluye salida en tubería ScH 40 y cable # 12 libre de halógenos 3m	Und	41.00


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OFICINA 509				7.00		7.00	
OFICINA 510				7.00		7.00	
Rack				1.00		1.00	
OFICINA 512				7.00		7.00	
OFICINA 513				7.00		7.00	
OFICINA 514				7.00		7.00	
OFICINA 515				5.00		5.00	

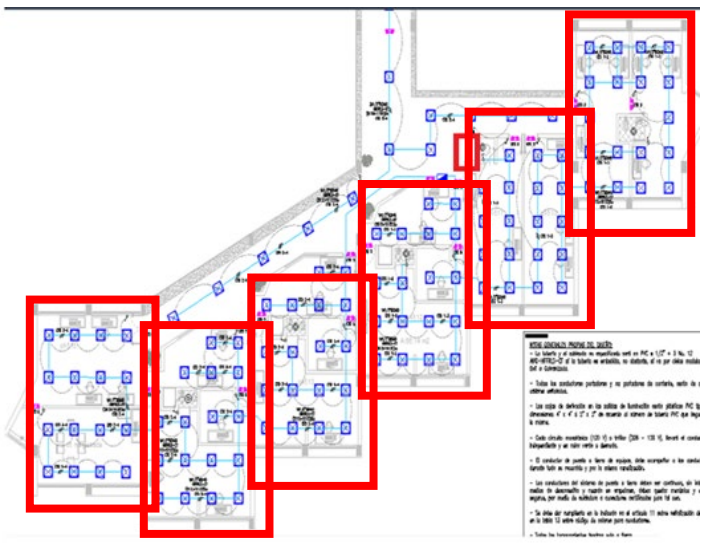



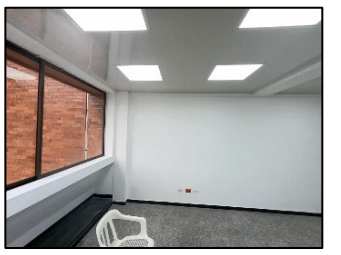



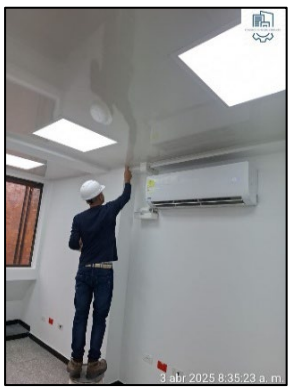

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.09	Suministro e instalación de toma regulado incluye salida en tubería ScH 40 y cable # 12 libre de halógenos 3m	Und	41.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						41.00	
CANTIDAD TOTAL						41.00	



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.10	Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluye salida en tubería ScH 40 y cable # 12 libre de halógenos	Und	39.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OFICINA 509				1.00		1.00	
RACK				0.00		0.00	
OFICINA 512				4.00		4.00	
OFICINA 513				4.00		4.00	
OFICINA 514				4.00		4.00	
PASILOS ALA A				3.00		3.00	
BAÑOS TORRE A PISO 1				3.00		3.00	
BAÑOS TORRE A PISO 2				2.00		2.00	
BAÑOS TORRE A PISO 3				2.00		2.00	
BAÑOS TORRE A PISO 4				2.00		2.00	
BAÑOS TORRE A PISO 5				2.00		2.00	
BAÑOS TORRE B PISO 1				2.00		2.00	
BAÑOS TORRE B PISO 2				4.00		4.00	
BAÑOS TORRE B PISO 3				2.00		2.00	
BAÑOS TORRE B PISO 4				2.00		2.00	

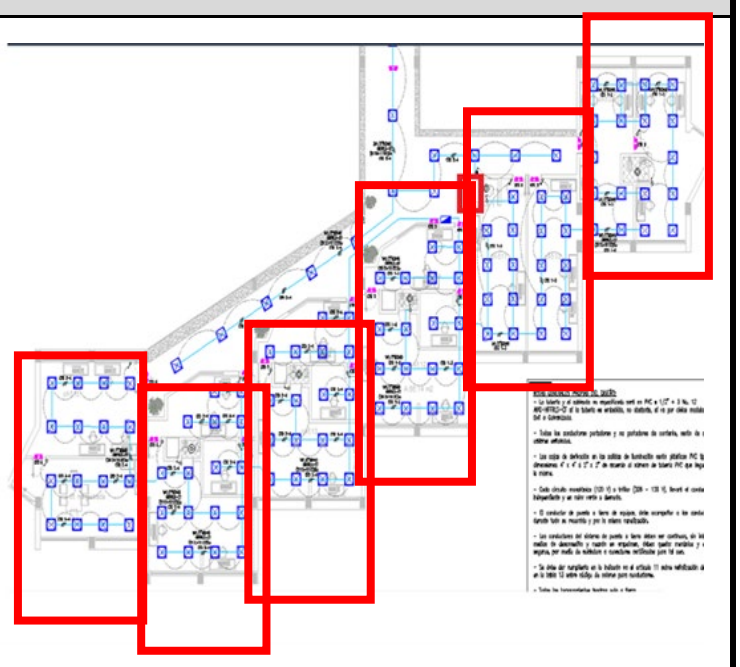





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.10	Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluye salida en tubería ScH 40 y cable # 12 libre de halógenos	Und	39.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE B PISO 5				2.00		2.00	
Subtotal						39.00	
CANTIDAD TOTAL						39.00	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.11	Suministro e instalación de interruptor doble, incluye salida en tubería ScH 40 y cable # 12 libre de halógenos	Und	5.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
OFICINA 509				**2.00**		**2.00**
OFICINA 510				**2.00**		**2.00**
OFICINA 515				**1.00**		**1.00**
Subtotal						**5.00**
CANTIDAD TOTAL						**5.00**


ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

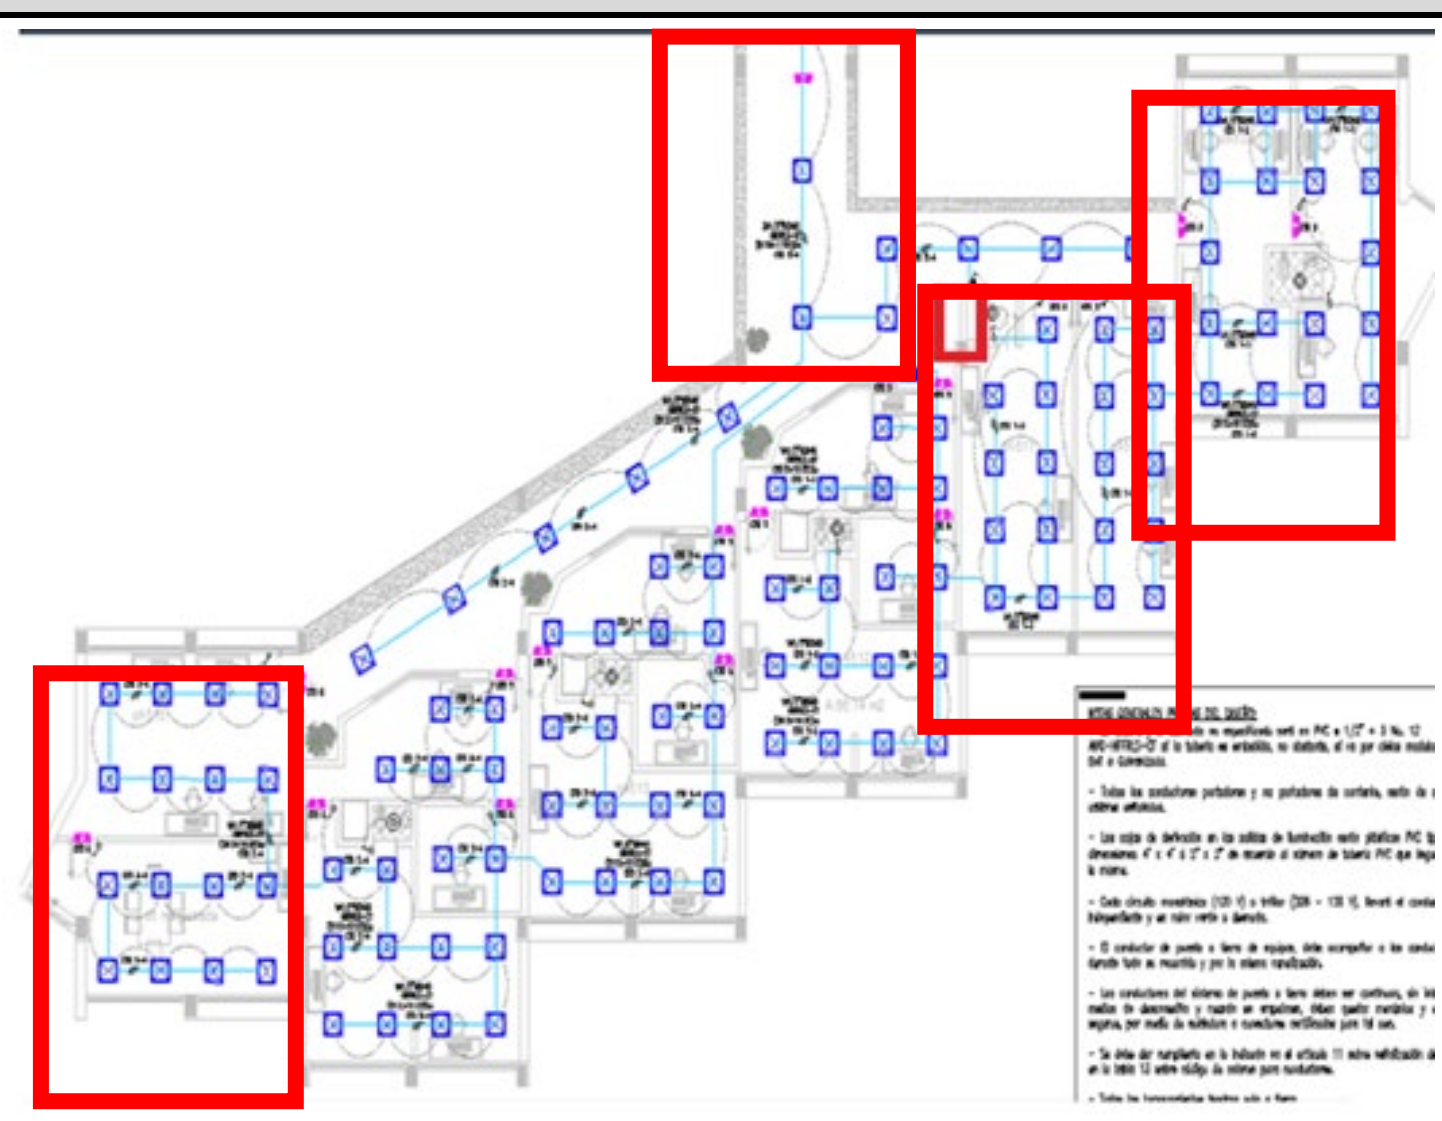







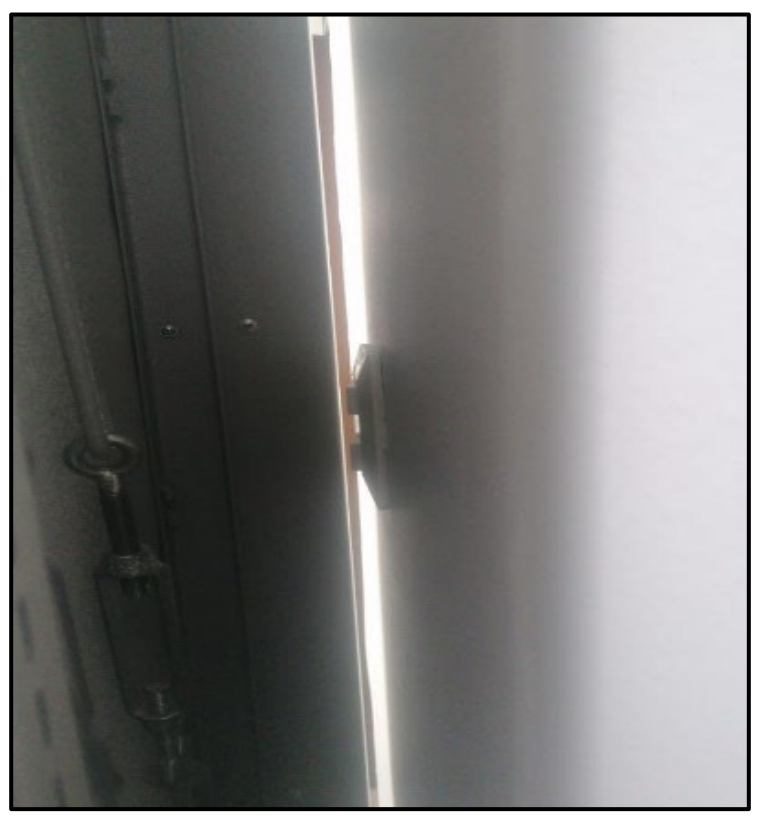

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA	**ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.12	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico incluye totalizador y protecciones	Und	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
PASILOS A1 TORRE B ALA A				**1.00**		**1.00**
Subtotal						**1.00**
CANTIDAD TOTAL						**1.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

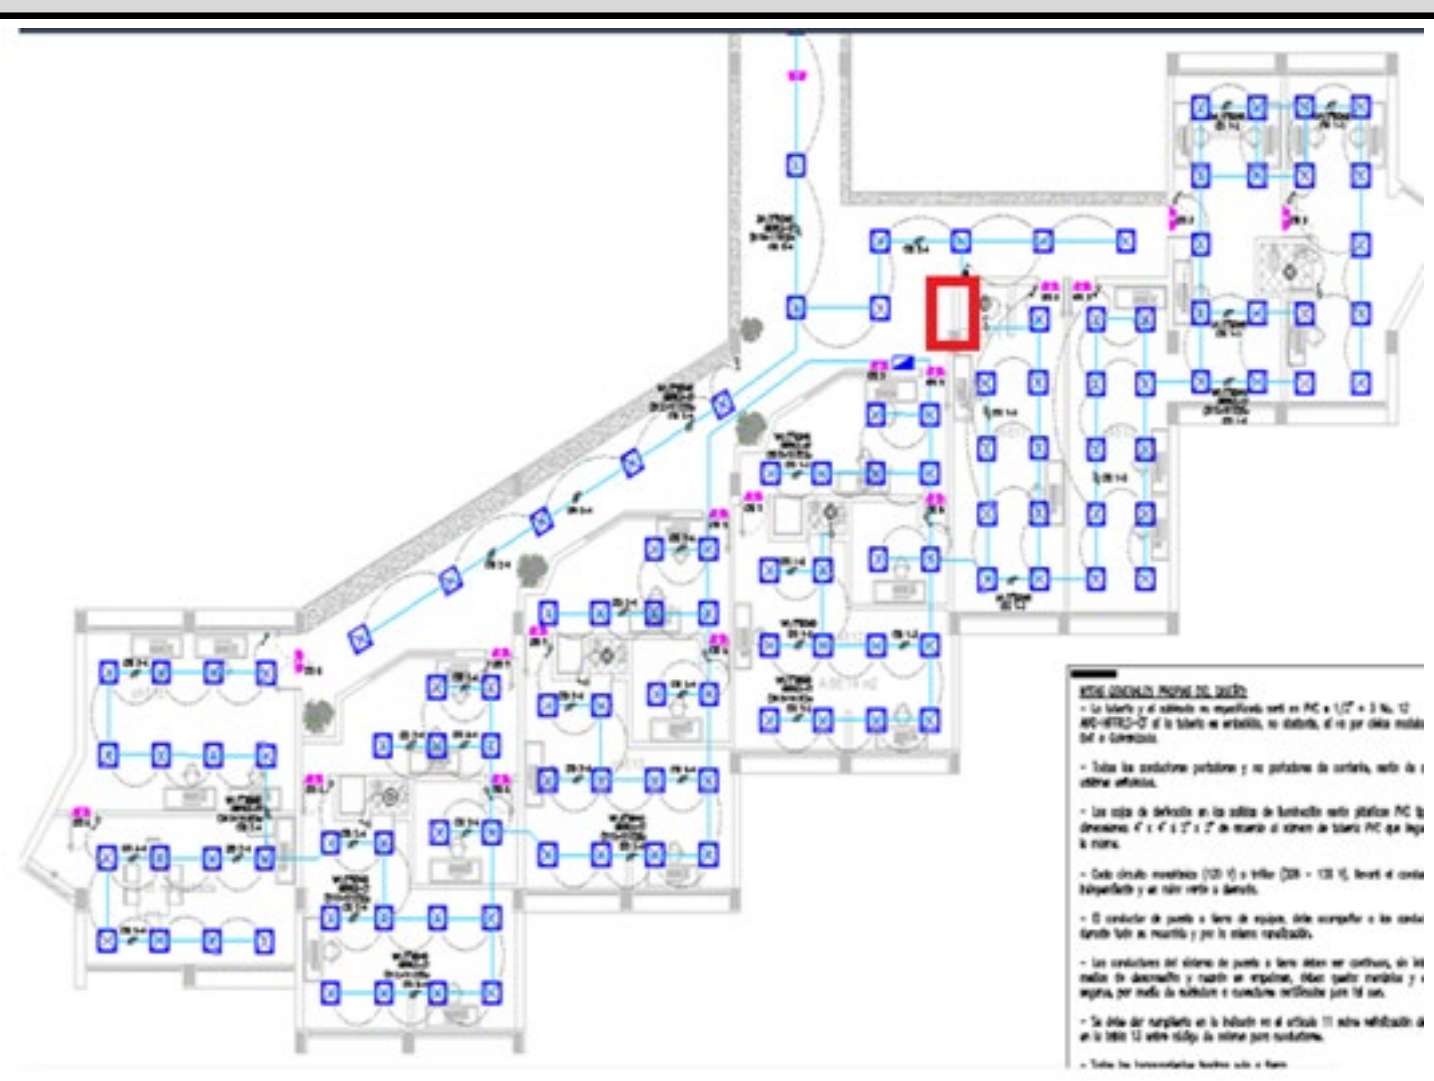





OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.13	Suministro e instalación acometida eléctrica para tableros en líneas (3#6+1#6+1#8) incluye regata y resane	ML	180.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
PASILOS A1 TORRE B ALA A	**180.00**					**180.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

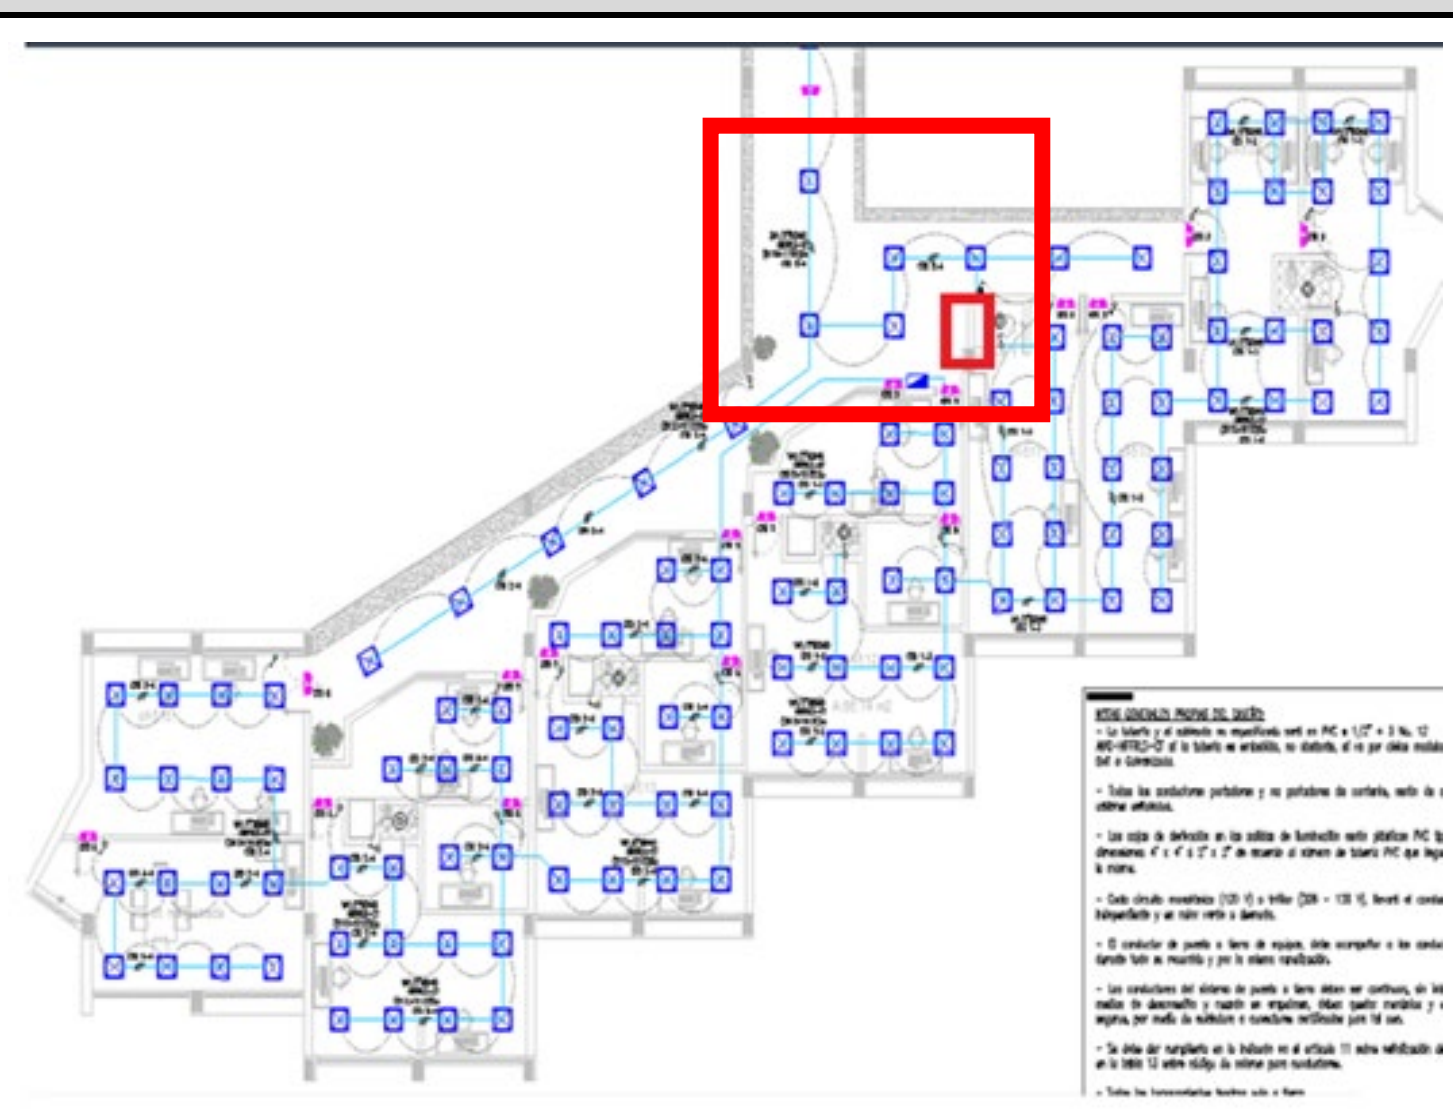

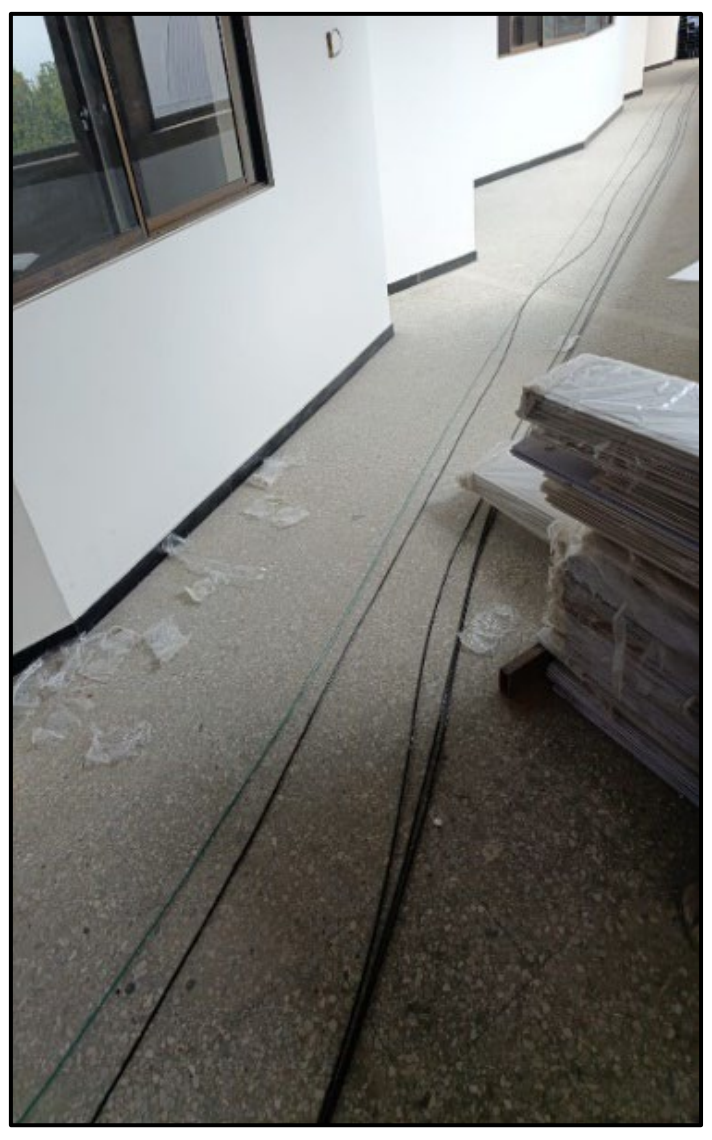



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.13	Suministro e instalación acometida eléctrica para tableros en líneas (3#6+1#6+1#8) incluye regata y resane	ML	180.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						180.00	
CANTIDAD TOTAL						180.00	

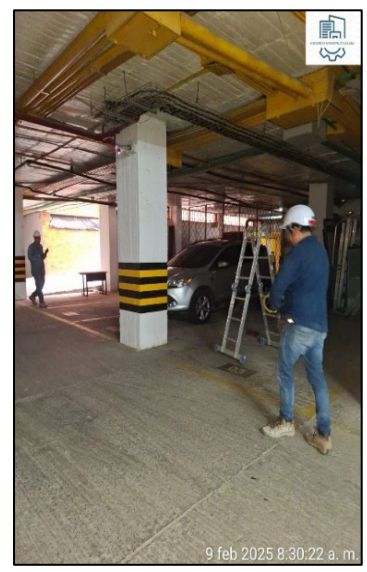

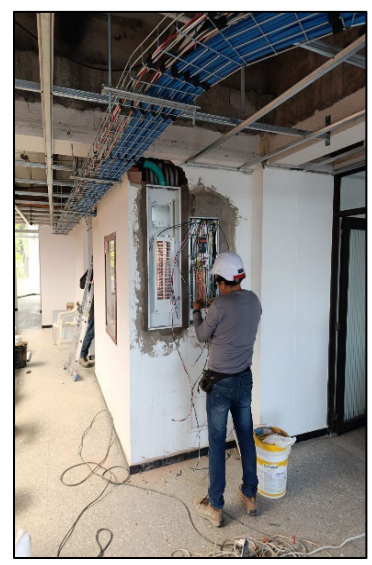

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.14	Suministro e instalación acometida eléctrica para tableros en líneas (3#4+1#4+1#6) incluye regata y resane	ML	60.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
PASILOS A1 TORRE B ALA A	**60.00**					**60.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

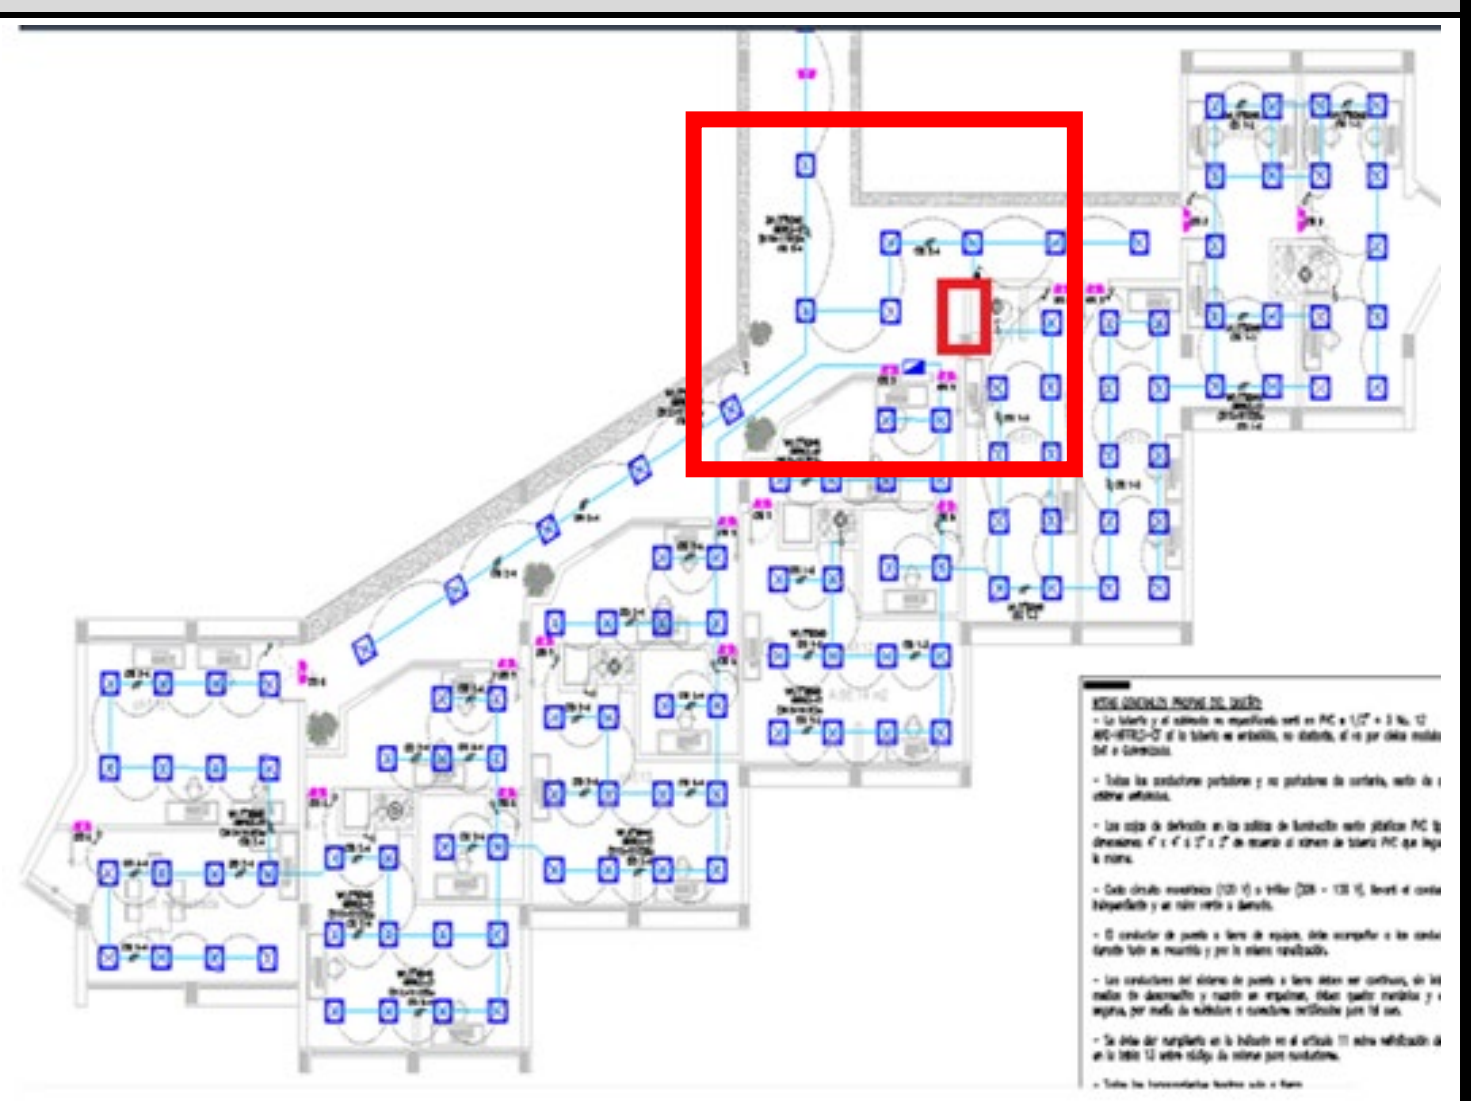

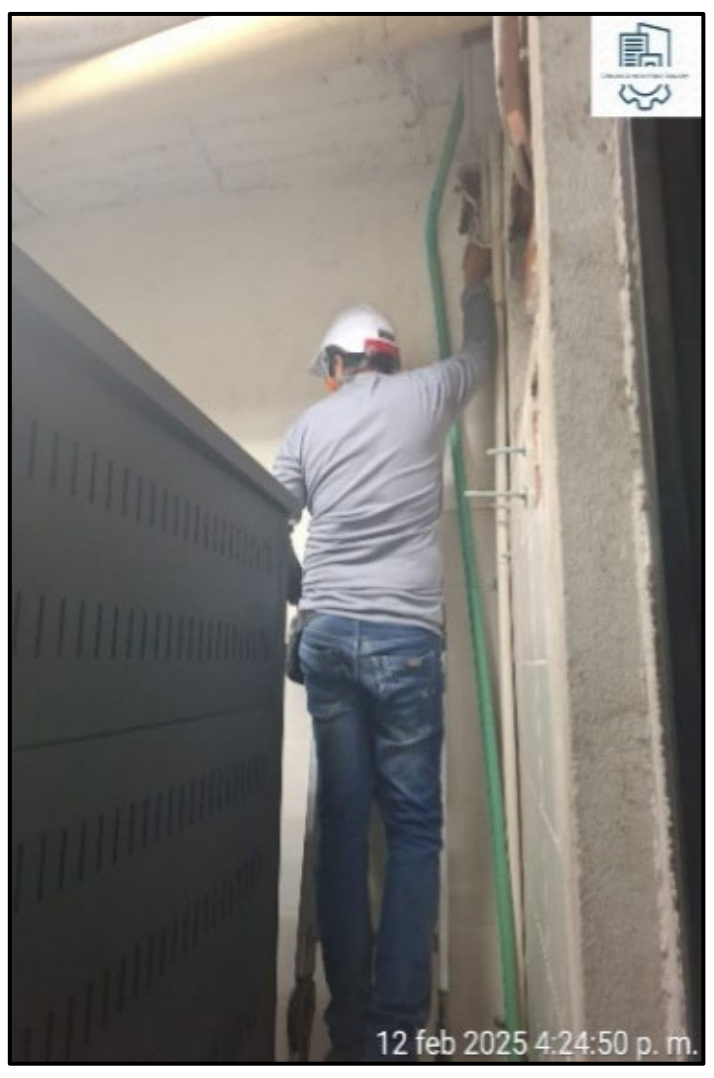

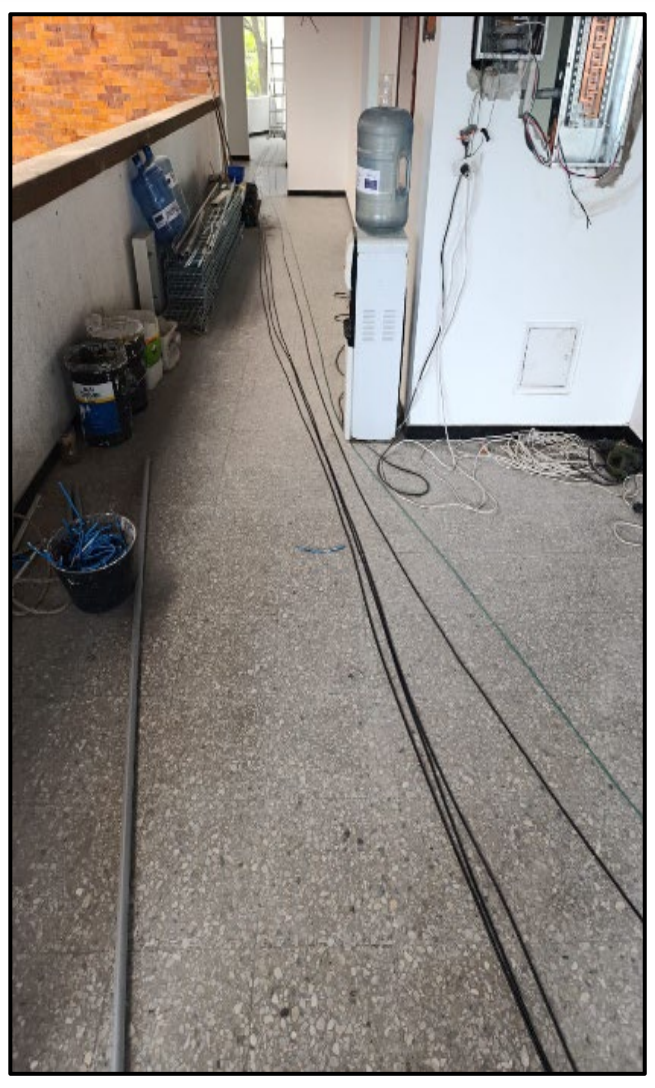





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.14	Suministro e instalación acometida eléctrica para tableros en líneas (3#4+1#4+1#6) incluye regata y resane	ML	60.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						**60.00**	
CANTIDAD TOTAL						**60.00**	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.15	Suministro e instalación de toma bifásico, incluye salida en tubería ScH 40 y cable # 10 libre de halógenos 3m	Und	11.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
PASILOS A1 TORRE B ALA A				**11.00**		**11.00**
Subtotal						**11.00**
CANTIDAD TOTAL						**11.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia



CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.16	Suministro e instalación acometida eléctrica para circuitos de iluminación, tomas normales y regulados sobre bandeja eléctrica Cable libre de halógenos calibre 12 AWG(1#12+1#12+1#12) hasta 3ml incluye regata y resane	ml	500.00

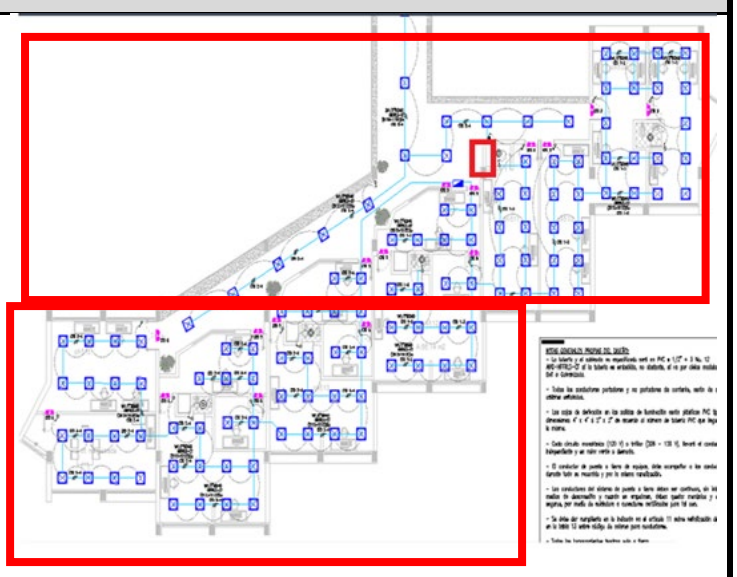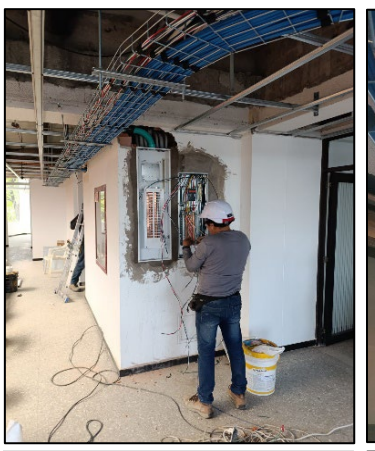LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
PASILOS A1 TORRE B ALA A	500.00					500.00	
							
							
Subtotal						500.00	
CANTIDAD TOTAL						500.00	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.17	Suministro e instalación acometida eléctrica para circuitos de aire acondicionado Cable libre de halógenos calibre 10 AWG (1#10+1#10+1#10). hasta 3ml incluye regata y resane	ml	190.00


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
PASILOS A1 TORRE B ALA A	**190.00**					**190.00**


ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO







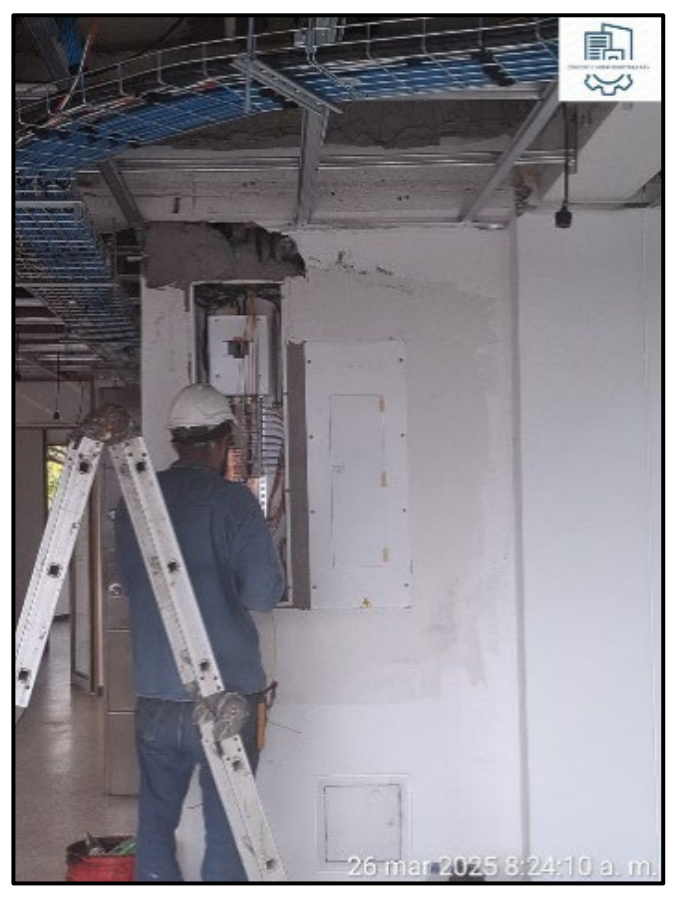

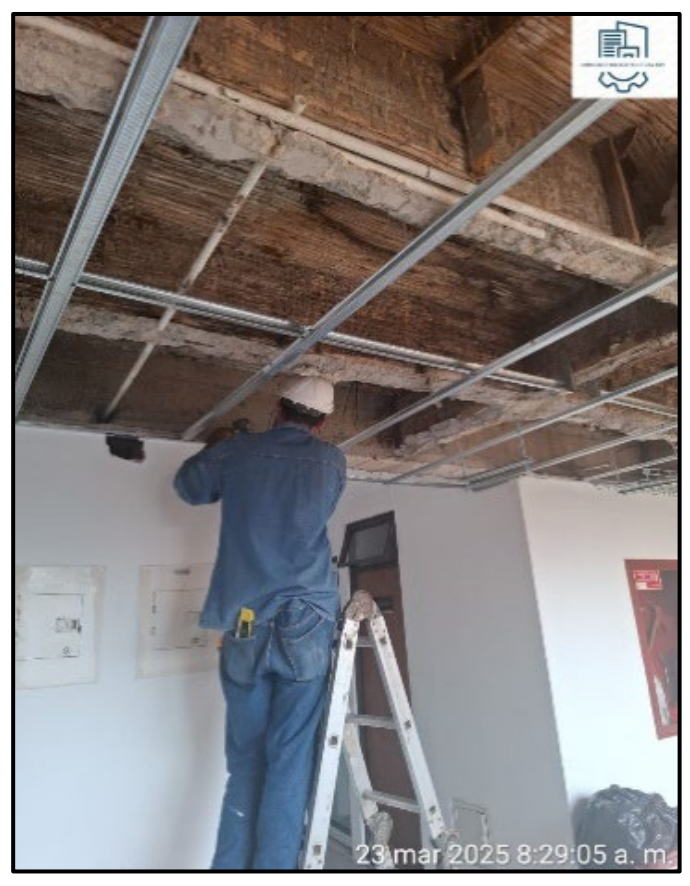

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
3.17	Suministro e instalación acometida eléctrica para circuitos de aire acondicionado Cable libre de halógenos calibre 10 AWG (1#10+1#10+1#10). hasta 3ml incluye regata y resane	ml	190.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						190.00	
CANTIDAD TOTAL						190.00	



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
4.01	Revisión de punto aguas lluvias (prueba de taponamiento con sonda eléctrica) y adecuación de bajantes	Und	3.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
CUBIERTA TORRE B ALA A					3	3.00
Subtotal						3.00
CANTIDAD TOTAL						3.00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

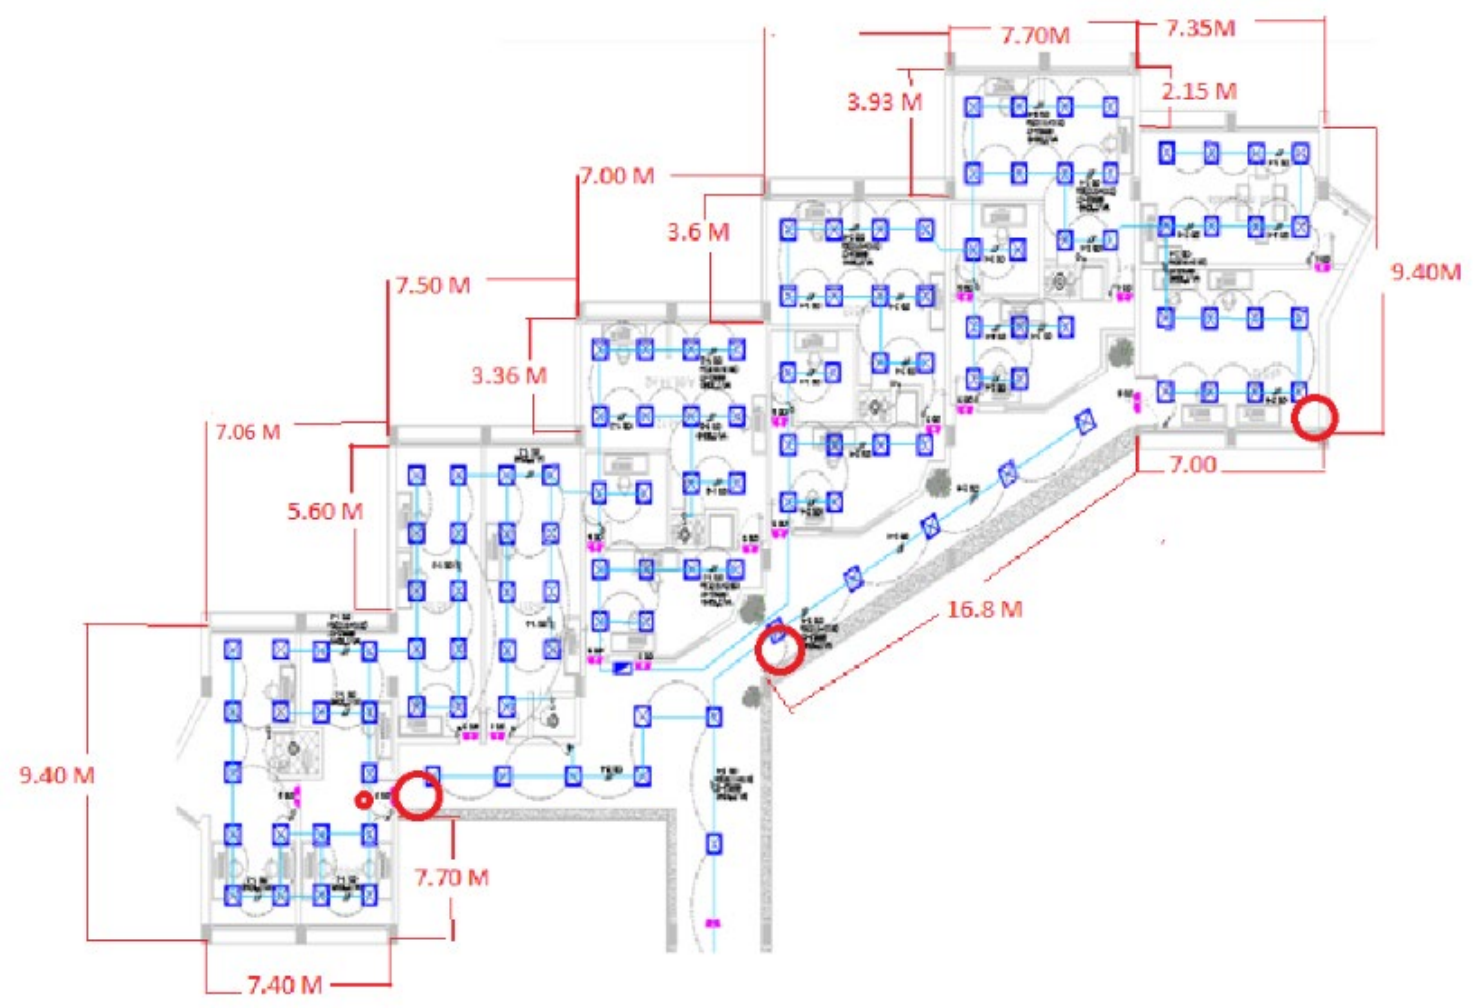





OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA	**ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.01	Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	62.80

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 3 HOMBRES	3.46	1.72				5.95	
BAÑOS TORRE A PISO 3 MUJERES	3.46	1.63				5.64	
BAÑOS TORRE A PISO 4 HOMBRES	3.46	1.72				5.95	
BAÑOS TORRE A PISO 4 MUJERES	3.46	1.63				5.64	
BAÑOS TORRE A PISO 5 HOMBRES	3.46	1.72				5.95	
BAÑOS TORRE A PISO 5 MUJERES	3.46	1.63				5.64	
BAÑOS MAGISTRADOS 5 PISTO TORRE B ALA B	1.61	1.02			4	6.57	
BAÑOS MAGISTRADOS 5 PISTO TORRE B ALA A	1.64	1.09			4	7.15	
BAÑOS TORRE B HOMBRES	2.22	1.64			1	3.64	
BAÑOS TORRE B MUJERES	2.12	3.63			1	7.70	
BAÑOS TORRE B MUJERES	1.74	1.71			1	2.98	

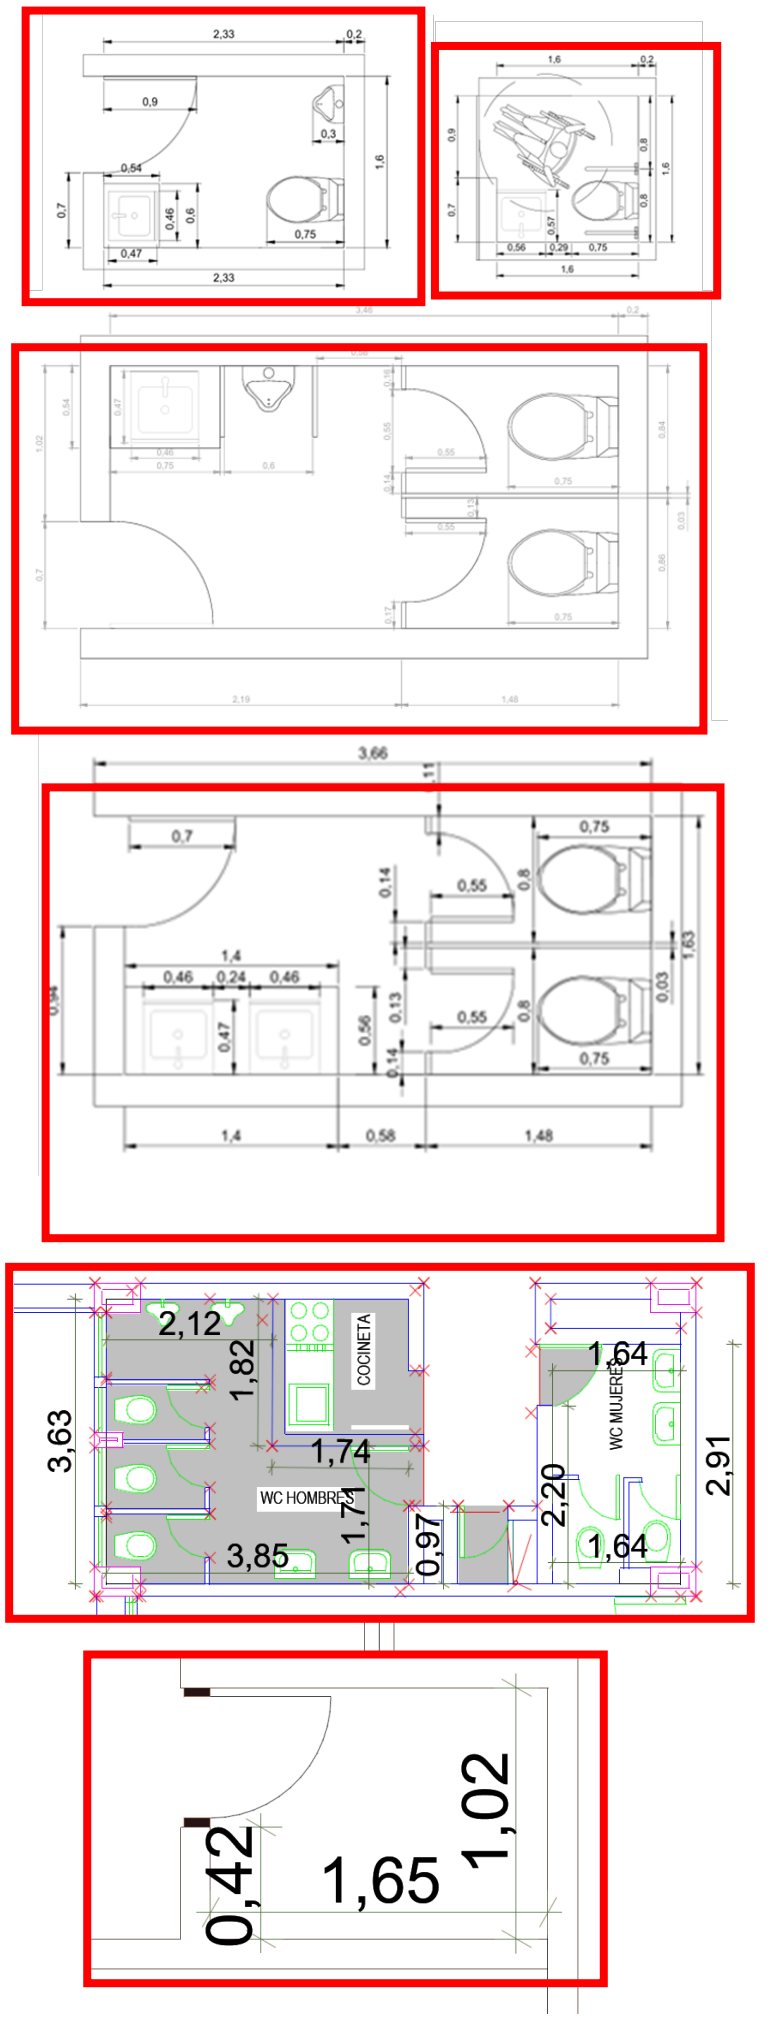

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.01	Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	62.80

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
Subtotal						62.80
CANTIDAD TOTAL						62.80

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO





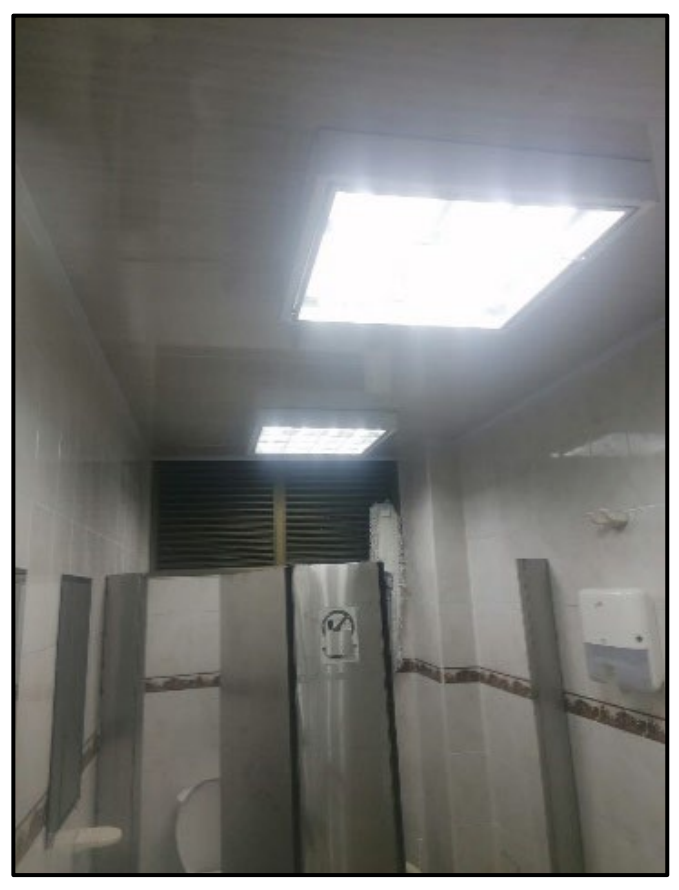



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.02	Desmonte divisiones baños. Incluye retiro y disposición final en sitios autorizados.	m2	47.11

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	Ancho				
BAÑOS TORRE A PISO 1	0.47	1.78				0.84	
BAÑOS TORRE A HOMBRES 2 A 5 PISO	1.72	1.80			4	12.38	
	1.30	1.80			4	9.36	
	0.70	1.20			4	3.36	
BAÑOS TORRE A MUJERES 2 A 5	1.64	1.80			4	11.81	
	1.30	1.80			4	9.36	

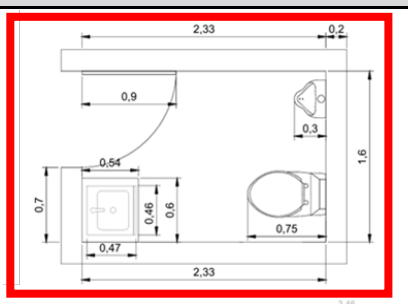


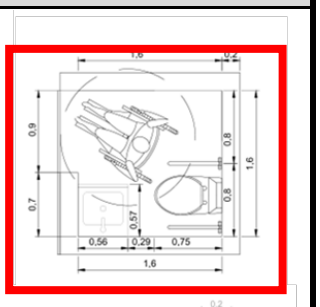

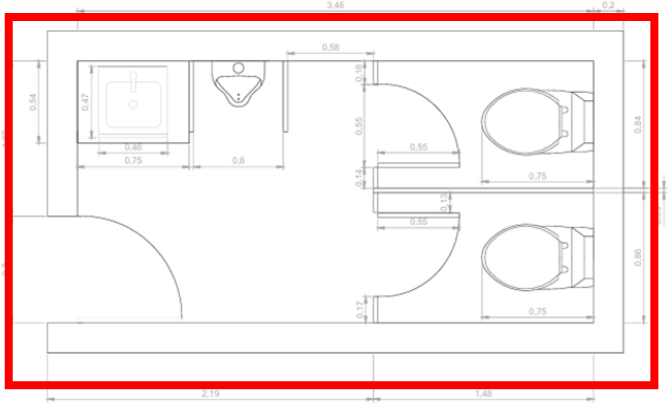

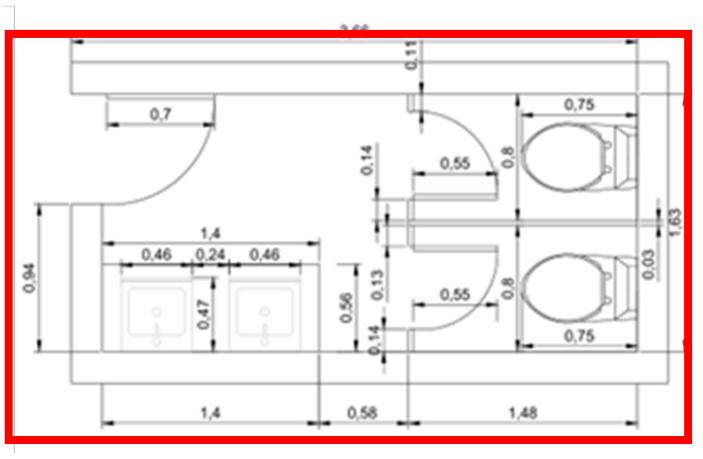



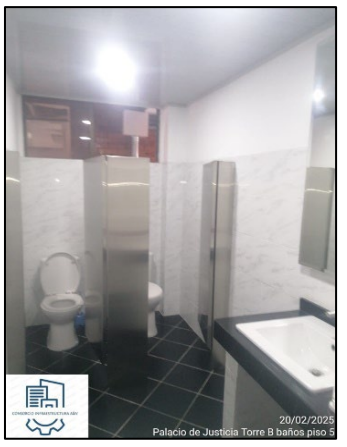

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.02	Desmonte divisiones baños. Incluye retiro y disposición final en sitios autorizados.	m2	47.11

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	Ancho			
Subtotal						47.11
CANTIDAD TOTAL						47.11

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

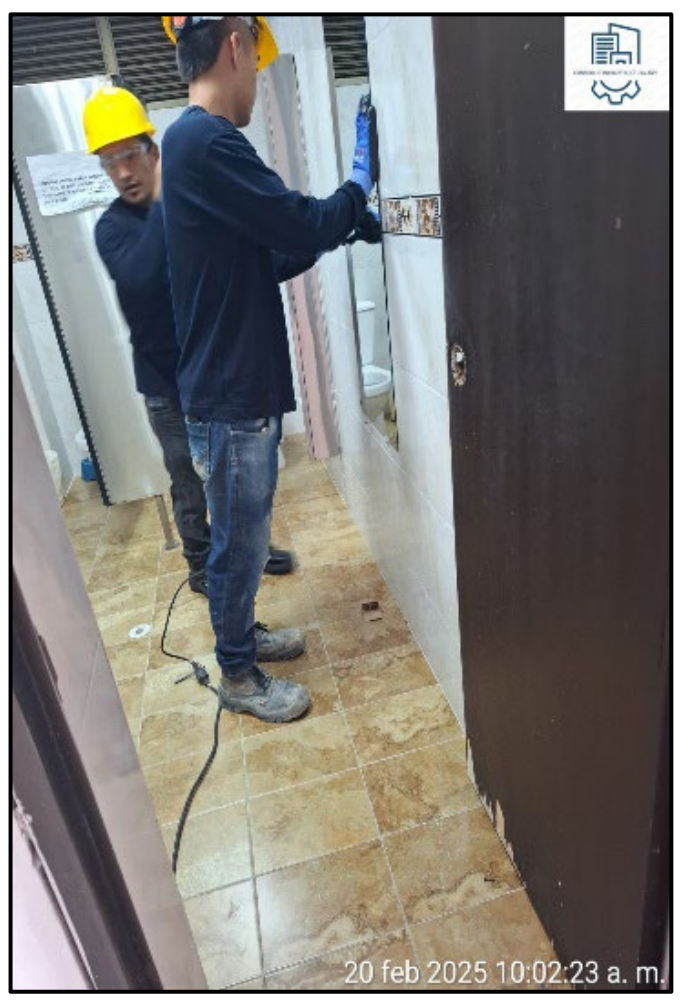



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad		Cantidad total
6.03	Demolición manual placa aligerada concreto reforzado hasta e= 0,25m. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2		38.17

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 1 A1	2.08	1.62				3.37	
BAÑOS TORRE A PISO 1 A2	1.60	1.60				2.56	
BAÑOS TORRE A PISO 1 A3	2.33	1.60				3.73	
BAÑOS TORRE A PISO 2 A1	0.60	0.60			10	3.60	
BAÑOS TORRE A PISO 2 A2	2.50	0.60			2	3.00	
BAÑOS TORRE A PISO 3 A1	0.60	0.60			10	3.60	
BAÑOS TORRE A PISO 3 A2	2.50	0.60			2	3.00	
BAÑOS TORRE A PISO 4 A1	0.60	0.60			10	3.60	
BAÑOS TORRE A PISO 4 A2	2.50	0.60			2	3.00	
BAÑOS TORRE A PISO 5 A1	0.60	0.60			10	3.60	
BAÑOS TORRE A PISO 5 A2	2.50	0.60			2	3.00	
BAÑOS TORRE CAJON DE DUCTO	0.80	0.66			4	2.11	

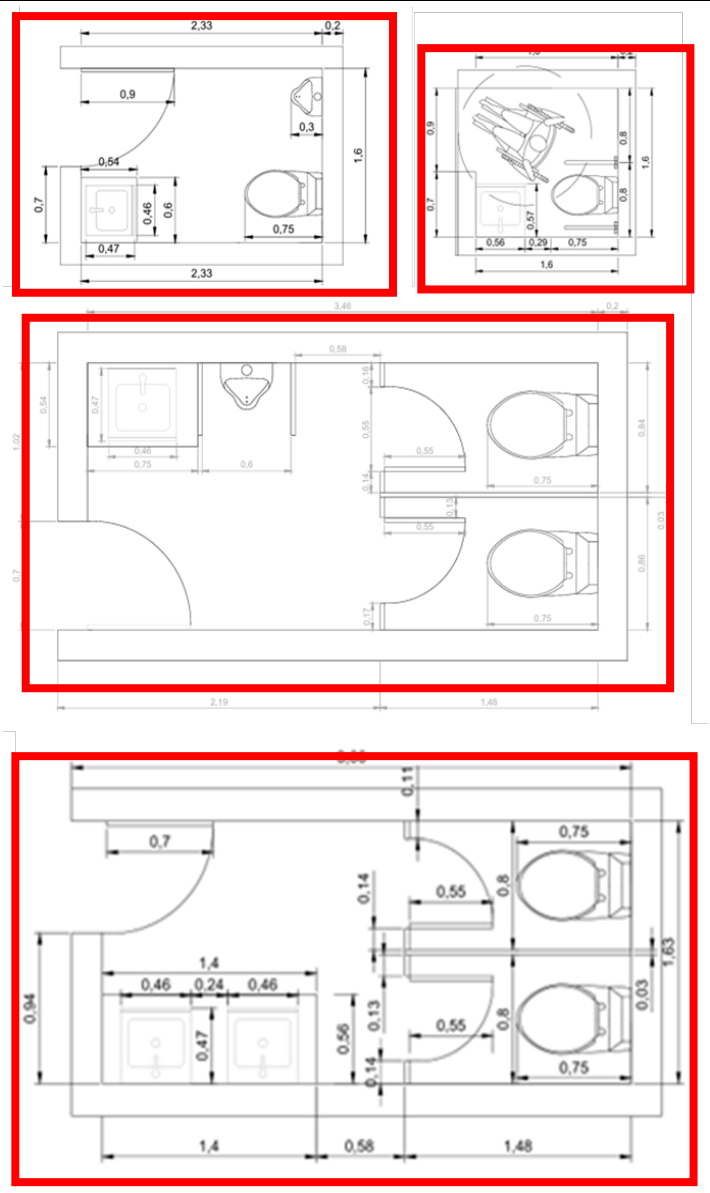





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad		Cantidad total
6.03	Demolición manual placa aligerada concreto reforzado hasta e= 0,25m. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2		38.17

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						38.17	
CANTIDAD TOTAL						38.17	





OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia





CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.04	Demolición de enchape piso y pared existente. Incluye retiro y disposición final en sitios autorizados.	m2	348.73

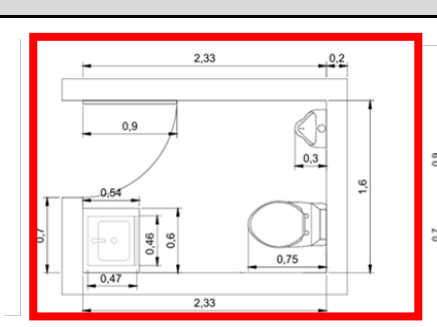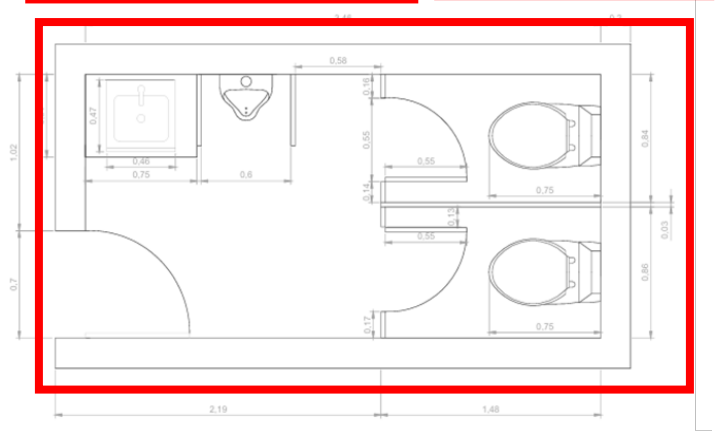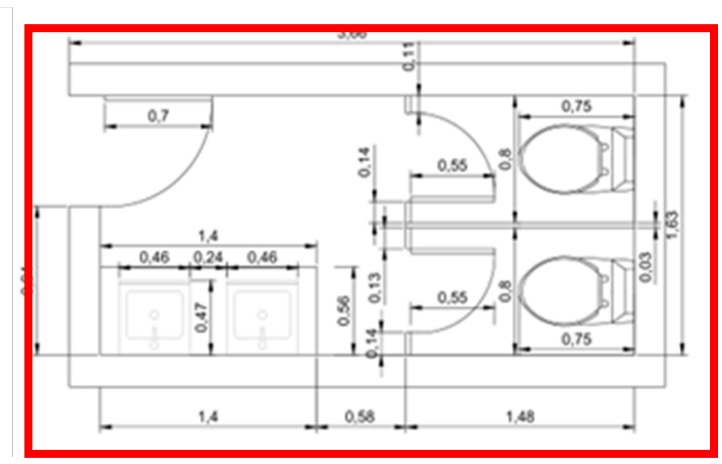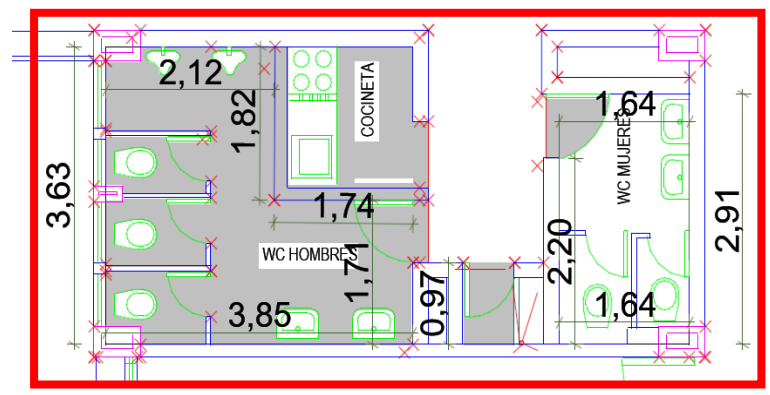LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 5 MUJERES MUROS	8.56	2.50			1	21.40	
	0.94	2.50			1	2.35	
BAÑOS TORRE A PISO 5 MUJERES PISO	3.46	1.64			1	5.67	
BAÑOS TORRE A PISO 5 HOMBRES MUROS	8.92	2.50			1	22.30	
	1.06	2.50			1	2.65	
BAÑOS TORRE A PISO 5 HOMBRES PISO	3.46	1.72			1	5.95	
BAÑOS TORRE A PISO 4 MUJERES MUROS	8.56	2.50			1	21.40	
	0.94	2.50			1	2.35	
BAÑOS TORRE A PISO 4 MUJERES PISO	3.46	1.64			1	5.67	
BAÑOS TORRE A PISO 4 HOMBRES MUROS	8.92	2.50			1	22.30	
	1.06	2.50			1	2.65	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.04	Demolición de enchape piso y pared existente. Incluye retiro y disposición final en sitios autorizados.	m2	348.73

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 4 HOMBRES PISO	3.46	1.72			1	5.95	
BAÑOS TORRE A PISO 3 MUJERES MUROS	8.56	2.50			1	21.40	
	0.94	2.50			1	2.35	
BAÑOS TORRE A PISO 3 MUJERES PISO	3.46	1.64			1	5.67	
BAÑOS TORRE A PISO 3 HOMBRES MUROS	8.92	2.50			1	22.30	
	1.06	2.50			1	2.65	
BAÑOS TORRE A PISO 3 HOMBRES PISO	3.46	1.72			1	5.95	
BAÑOS TORRE A PISO 2 MUJERES MUROS	8.56	2.50			1	21.40	
	0.94	2.50			1	2.35	
BAÑOS TORRE A PISO 2 MUJERES PISO	3.46	1.64			1	5.67	
BAÑOS TORRE A PISO 2 HOMBRES MUROS	8.92	2.50			1	22.30	
	1.06	2.50			1	2.65	

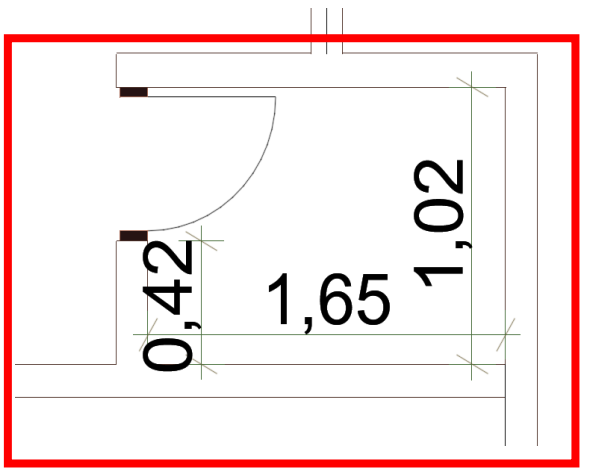









Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia



CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.04	Demolición de enchape piso y pared existente. Incluye retiro y disposición final en sitios autorizados.	m2	348.73

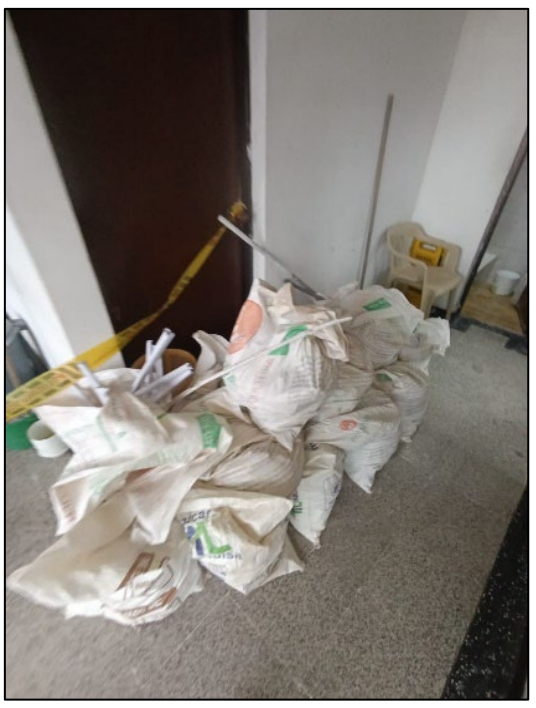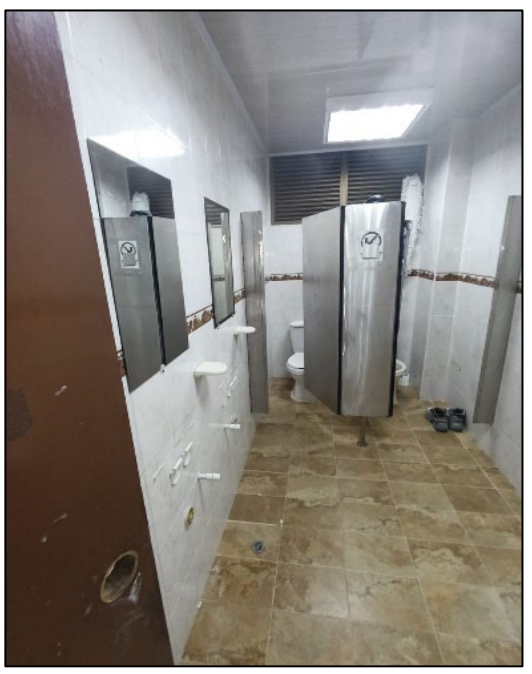LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 2 HOMBRES PISO	3.46	1.72			1	5.95	
BAÑOS TORRE A PISO 1 MUJERES MUROS	6.70	2.50			1	16.75	
BAÑOS TORRE A PISO 1 MUJERES PISO	2.08	1.62			1	3.37	
BAÑOS TORRE A PISO 1 DISCAPACITADOS MUROS	6.96	2.5			1	17.40	
BAÑOS TORRE A PISO 1 DISCAPACITADOS PISO	2.33	1.6			1	3.73	
BAÑOS TORRE A PISO 1 HOMBRES MUROS	5.58	2.50			1	13.95	
BAÑOS TORRE A PISO 1 HOMBRES PISO	1.60	1.60			1	2.56	
BAÑO TORRE B PISO 5 OF 512 MUROS	4.63	1.80				8.33	
BAÑO TORRE B PISO 5 OF 512 PISO	1.60	1.00				1.60	
BAÑO TORRE B PISO 5 OF 502 MUROS	4.63	1.80				8.33	
BAÑO TORRE B PISO 5 OF 502 PISO	1.60	1.00				1.60	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.04	Demolición de enchape piso y pared existente. Incluye retiro y disposición final en sitios autorizados.	m2	348.73

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑO TORRE B PISO 5 OF 503 MUROS	4.63	1.80				8.33	
BAÑO TORRE B PISO 5 OF 503 PISO	1.60	1.00				1.60	
BAÑO TORRE B PISO 5 OF 504 MUROS	4.63	1.80				8.33	
BAÑO TORRE B PISO 5 OF 504 PISO	1.60	1.00				1.60	
BAÑO TORRE B PISO 5 OF 505 MUROS	4.63	1.80				8.33	
BAÑO TORRE B PISO 5 OF 505 PISO	1.60	1.00				1.60	
Subtotal						348.73	
CANTIDAD TOTAL						348.73	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.06	Suministro e instalación de sanitario incluye grifería tipo push, tubería, accesorios de instalación, desmonte y retiro de sanitario existente y disposición final en sitios autorizados.	Und	23.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 1					3	3.00	
BAÑOS TORRE A PISO 2					4	4.00	
BAÑOS TORRE A PISO 3					4	4.00	
BAÑOS TORRE A PISO 4					4	4.00	
BAÑOS TORRE A PISO 5					4	4.00	
BAÑOS TORRE B PISO 5 OF 509					1	1.00	
BAÑOS TORRE B PISO 5 OF 512					1	1.00	
BAÑOS TORRE B PISO 5 OF 513					1	1.00	
BAÑOS TORRE B PISO 5 OF 514					1	1.00	

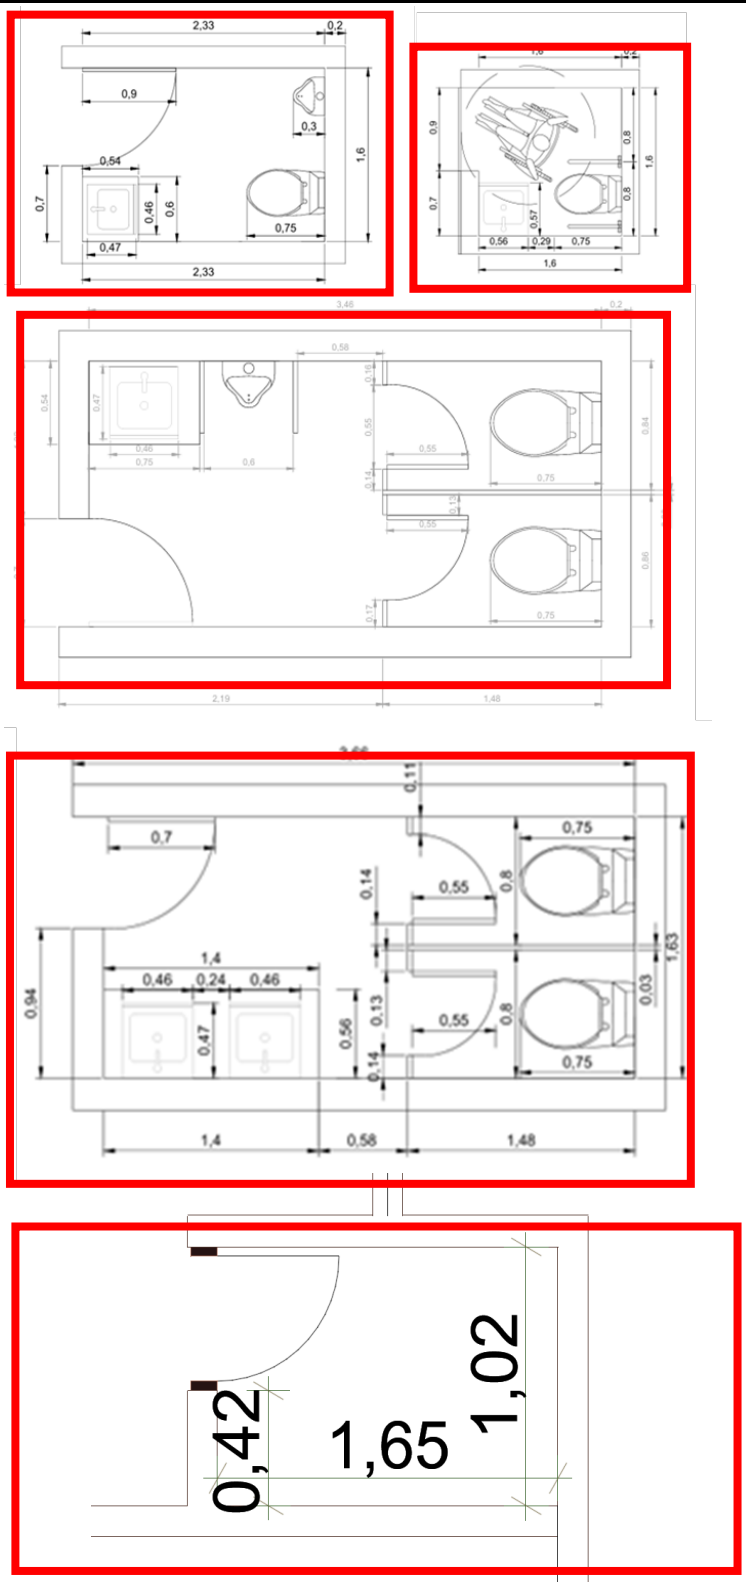

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.06	Suministro e instalación de sanitario incluye grifería tipo push, tubería, accesorios de instalación, desmonte y retiro de sanitario existente y disposición final en sitios autorizados.	Und	23.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						23.00	
CANTIDAD TOTAL						23.00	



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.07	Suministro e instalación de orinal incluye grifería tipo push, tubería, accesorios de instalación, desmonte y retiro de orinal existente y disposición final en sitios autorizados.	Und	5.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 1					1	1.00	
BAÑOS TORRE A PISO 2					1	1.00	
BAÑOS TORRE A PISO 3					1	1.00	
BAÑOS TORRE A PISO 4					1	1.00	
BAÑOS TORRE A PISO 5					1	1.00	

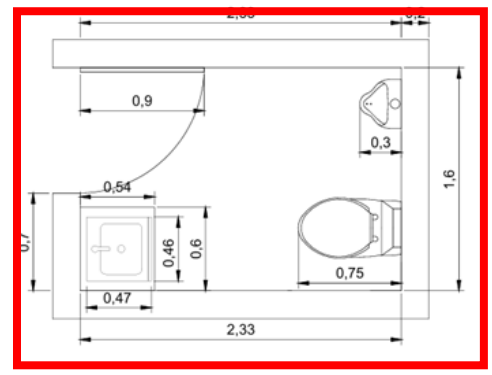

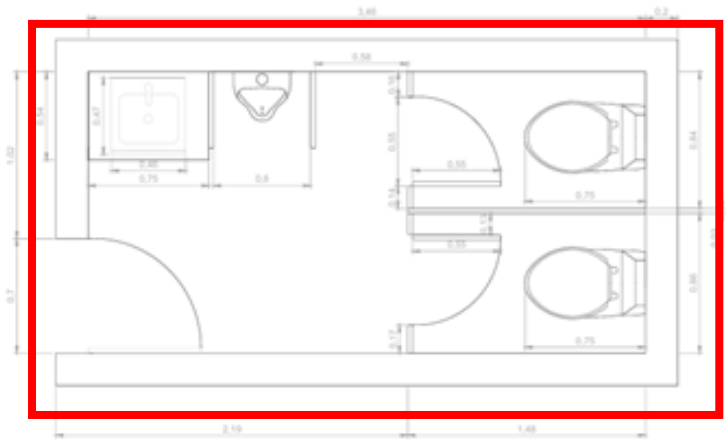

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.07	Suministro e instalación de orinal incluye grifería tipo push, tubería, accesorios de instalación, desmonte y retiro de orinal existente y disposición final en sitios autorizados.	Und	5.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						**5.00**	
CANTIDAD TOTAL						**5.00**	



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.08	Suministro e instalación lavamanos cerámica sobreponer incluye tubería, grifería tipo push en acero inoxidable y accesorios de instalación, desmonte y retiro de lavamanos existente y disposición final en sitios autorizados.	Und	15.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 1					3	3.00	
BAÑOS TORRE A PISO 2					3	3.00	
BAÑOS TORRE A PISO 3					3	3.00	
BAÑOS TORRE A PISO 4					3	3.00	
BAÑOS TORRE A PISO 5					3	3.00	

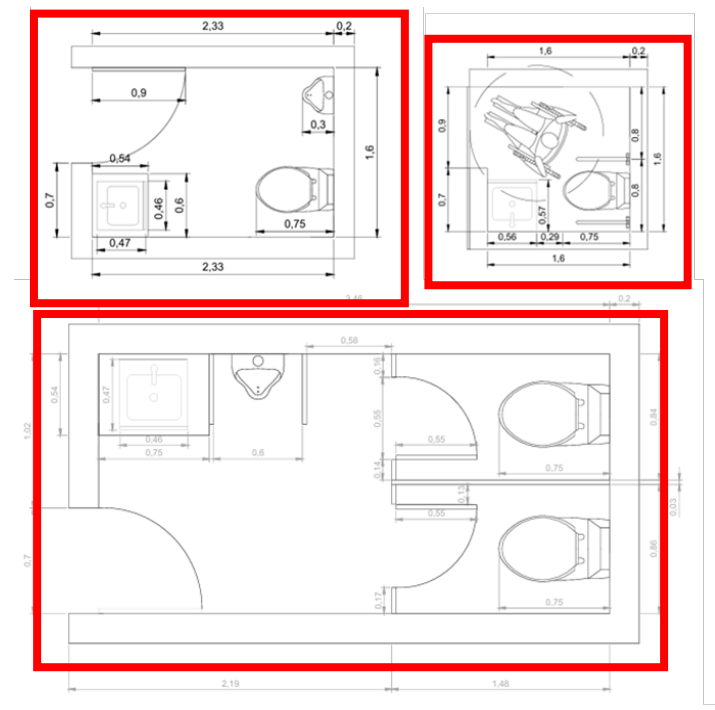

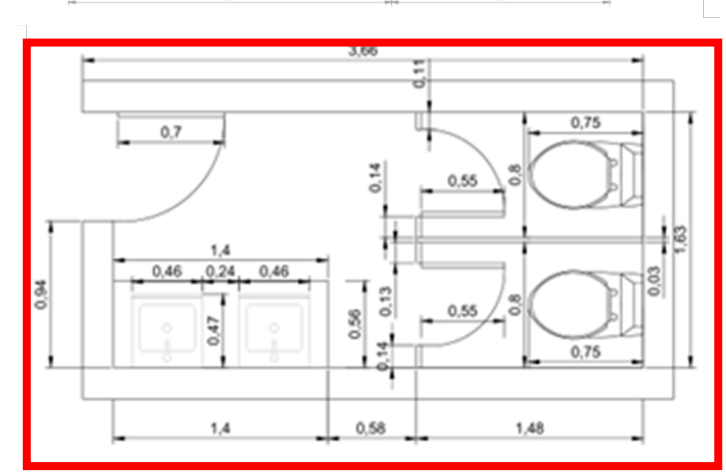





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.08	Suministro e instalación lavamanos cerámica sobreponer incluye tubería, grifería tipo push en acero inoxidable y accesorios de instalación, desmonte y retiro de lavamanos existente y disposición final en sitios autorizados.	Und	15.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						**15.00**	
CANTIDAD TOTAL						**15.00**	



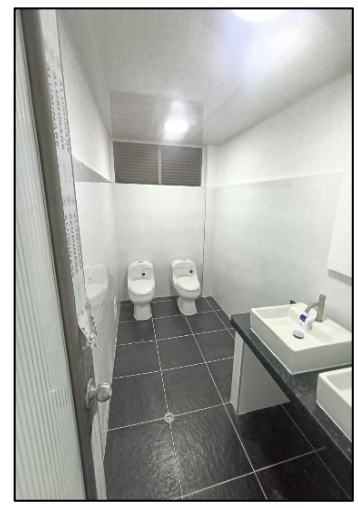

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.09	Mesones en granito natural para lavamanos incluye (salpicadero 8cm. Faldón 10cm)	ml	26.46

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 1	0.60				3	1.80	
BAÑOS TORRE A PISO 2-5 HOMBRES	0.76				4	3.04	
BAÑOS TORRE A PISO 2-5 MUJERES	1.40				4	5.60	
BAÑOS TORRE B PISO 1	1.27				2	2.54	
BAÑOS TORRE B PISO 2-5 MUJERES	1.63				4	6.52	
BAÑOS TORRE B PISO 2-5 HOMBRES	0.72				4	2.88	
BAÑOS TORRE B PISO 2 AUX	0.80				2	1.60	
BAÑOS MAGISTRADOS TORRE B PISO 5	0.62				4	2.48	

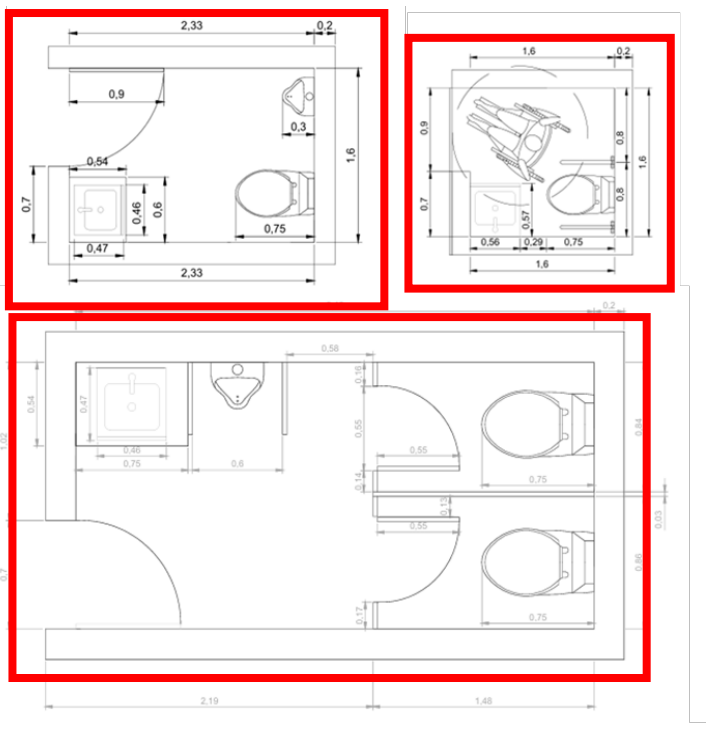

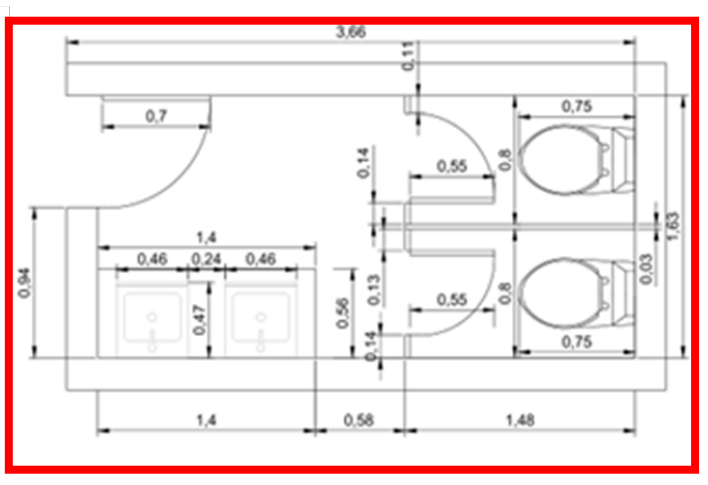

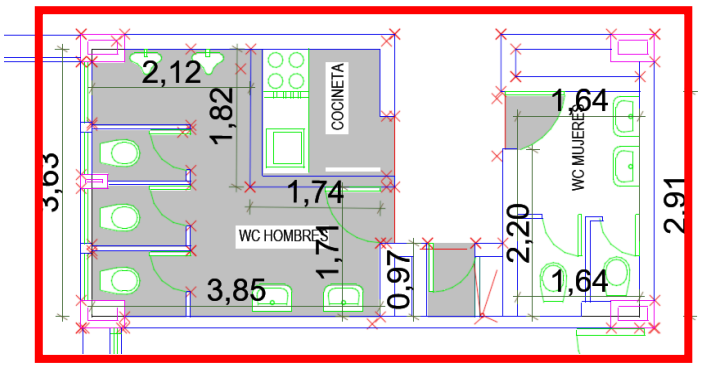

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.09	Mesones en granito natural para lavamanos incluye (salpicadero 8cm. Faldón 10cm)	ml	26.46

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
		Largo	Alto	MEDIA			


ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

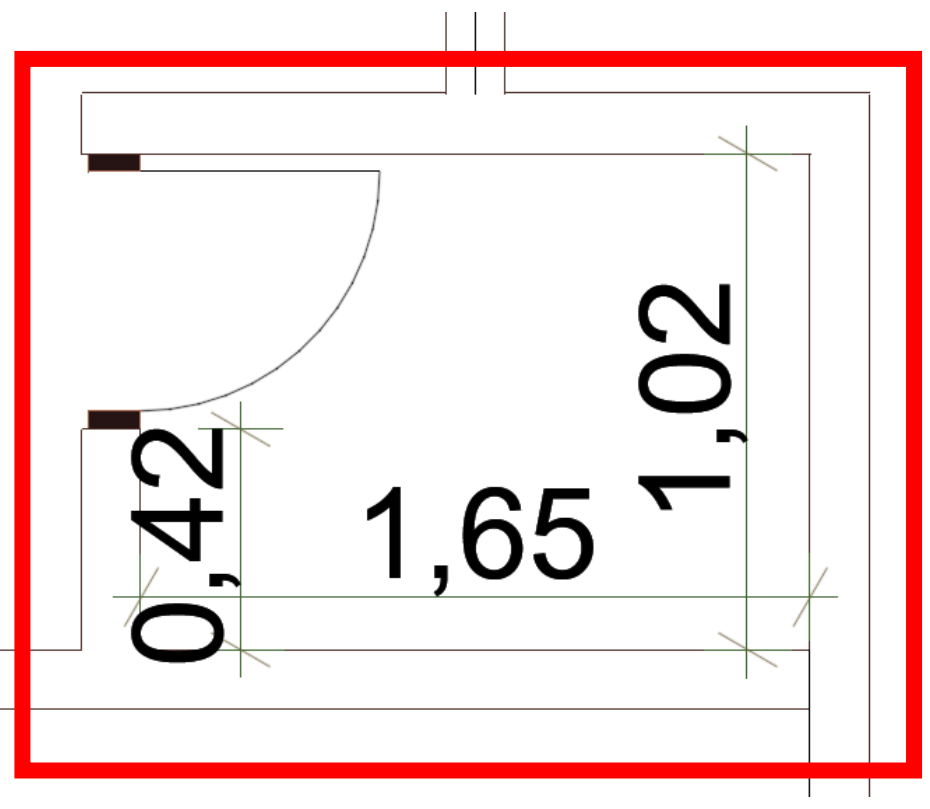

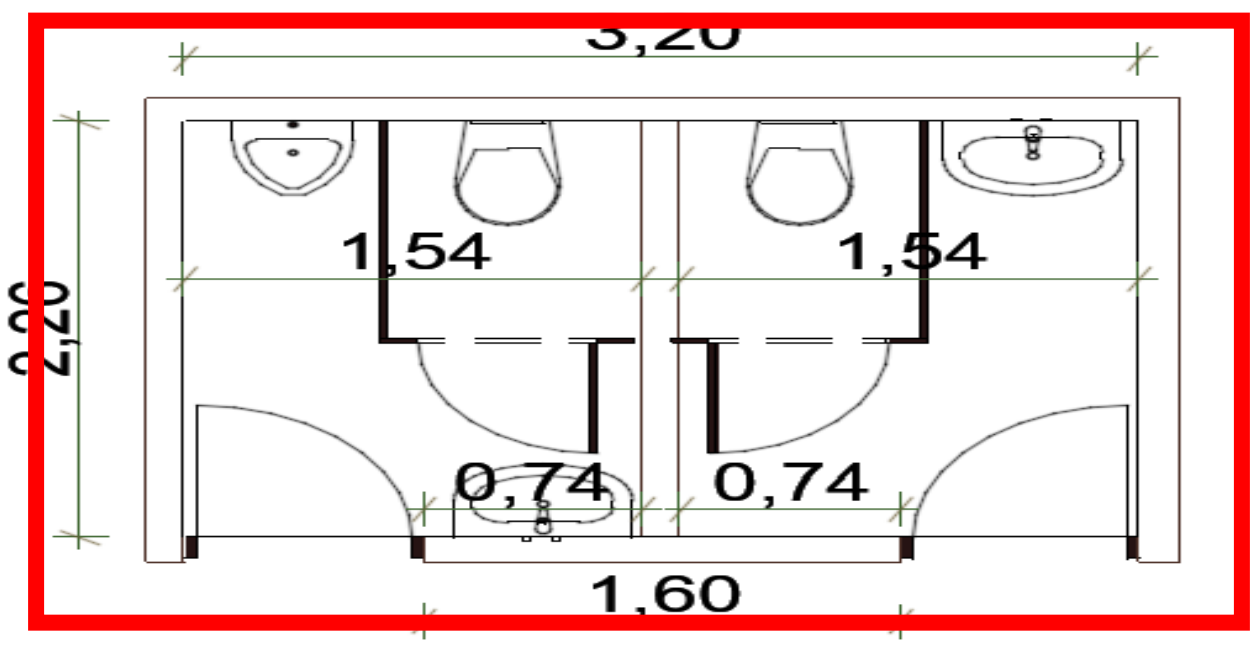

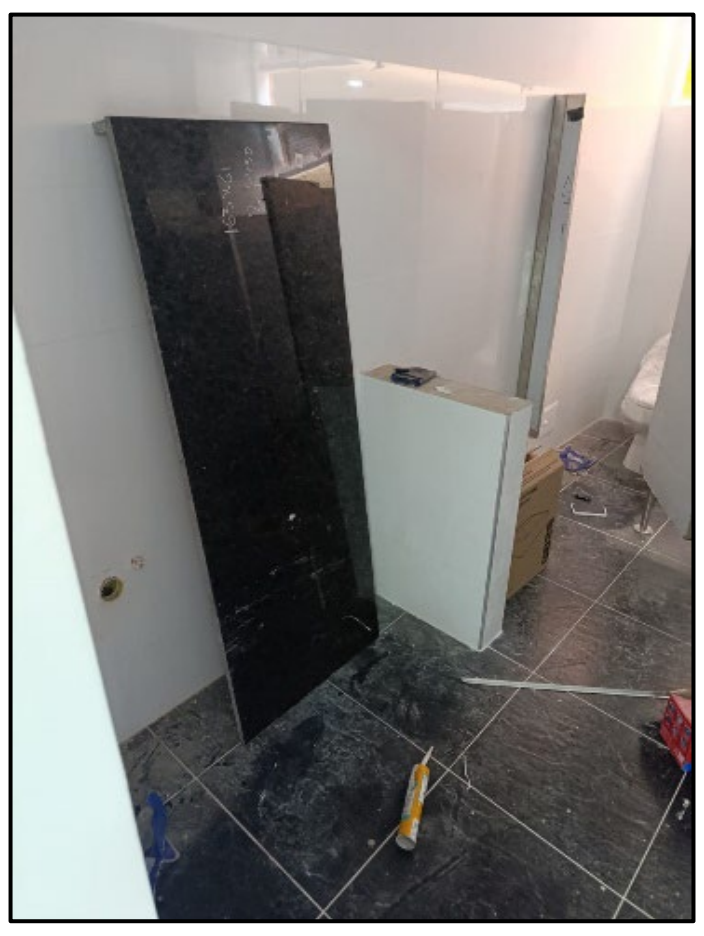



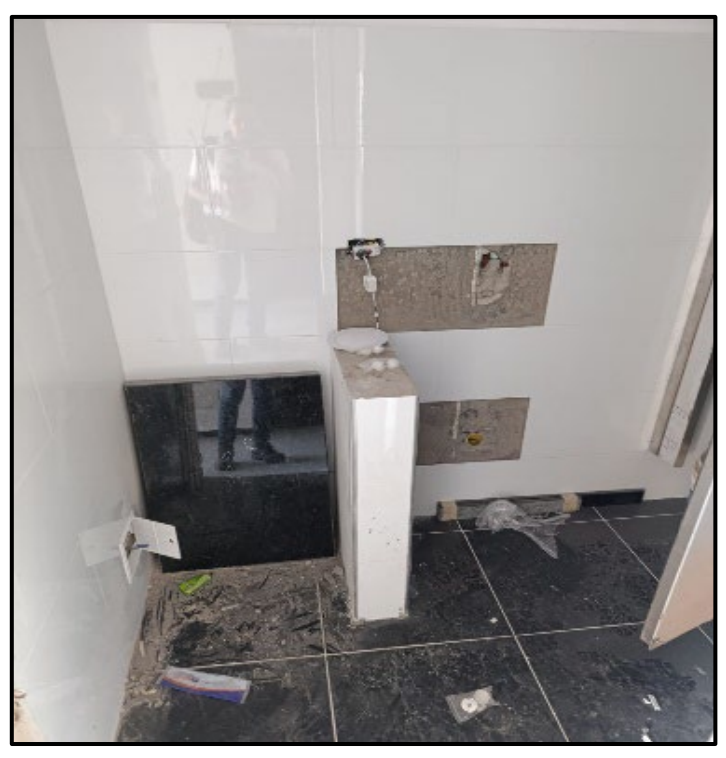



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.09	Mesones en granito natural para lavamanos incluye (salpicadero 8cm. Faldón 10cm)	ml	26.46

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
		Largo	Alto	MEDIA				
								 
Subtotal							26.46	
CANTIDAD TOTAL							26.46	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.10	Suministro e instalación espejo flotante biselado 4mm. Incluye desmonte de espejo existente y disposición final en sitios autorizados.	m2	19.02

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE B PISO 1 HOMBRES	1.18	0.70			1	0.826	
BAÑOS TORRE B PISO 1 MUJERES	1.15	0.70			1	0.805	
BAÑOS TORRE B PISO 2-5 HOMBRES	0.57	0.70			4	1.596	
BAÑOS TORRE B PISO 2 HOMBRES AUX	0.60	0.80			4	1.92	
BAÑOS TORRE B PISO 2-5 MUJERES	1.58	0.70			4	4.424	
BAÑOS TORRE B PISO 2 HOMBRES AUX	0.77	0.80			1	0.616	
BAÑOS TORRE A PISO 1 HOMBRES	1.18	0.70			1	0.826	
BAÑOS TORRE AQ PISO 1 MUJERES	0.50	0.70			1	0.35	
BAÑOS TORRE a PISO 1 hombres	0.50	0.70			1	0.35	
BAÑOS TORRE A PISO 1 DISCAPACITADO	0.50	0.70			1	0.35	
BAÑOS TORRE A PISO 2-5 HOMBRES	0.60	0.70			4	1.68	
BAÑOS TORRE A 2-5 MUJERES	1.20	0.70			4	3.36	
OFINAS 5 PISO	0.60	0.80			4	1.92	

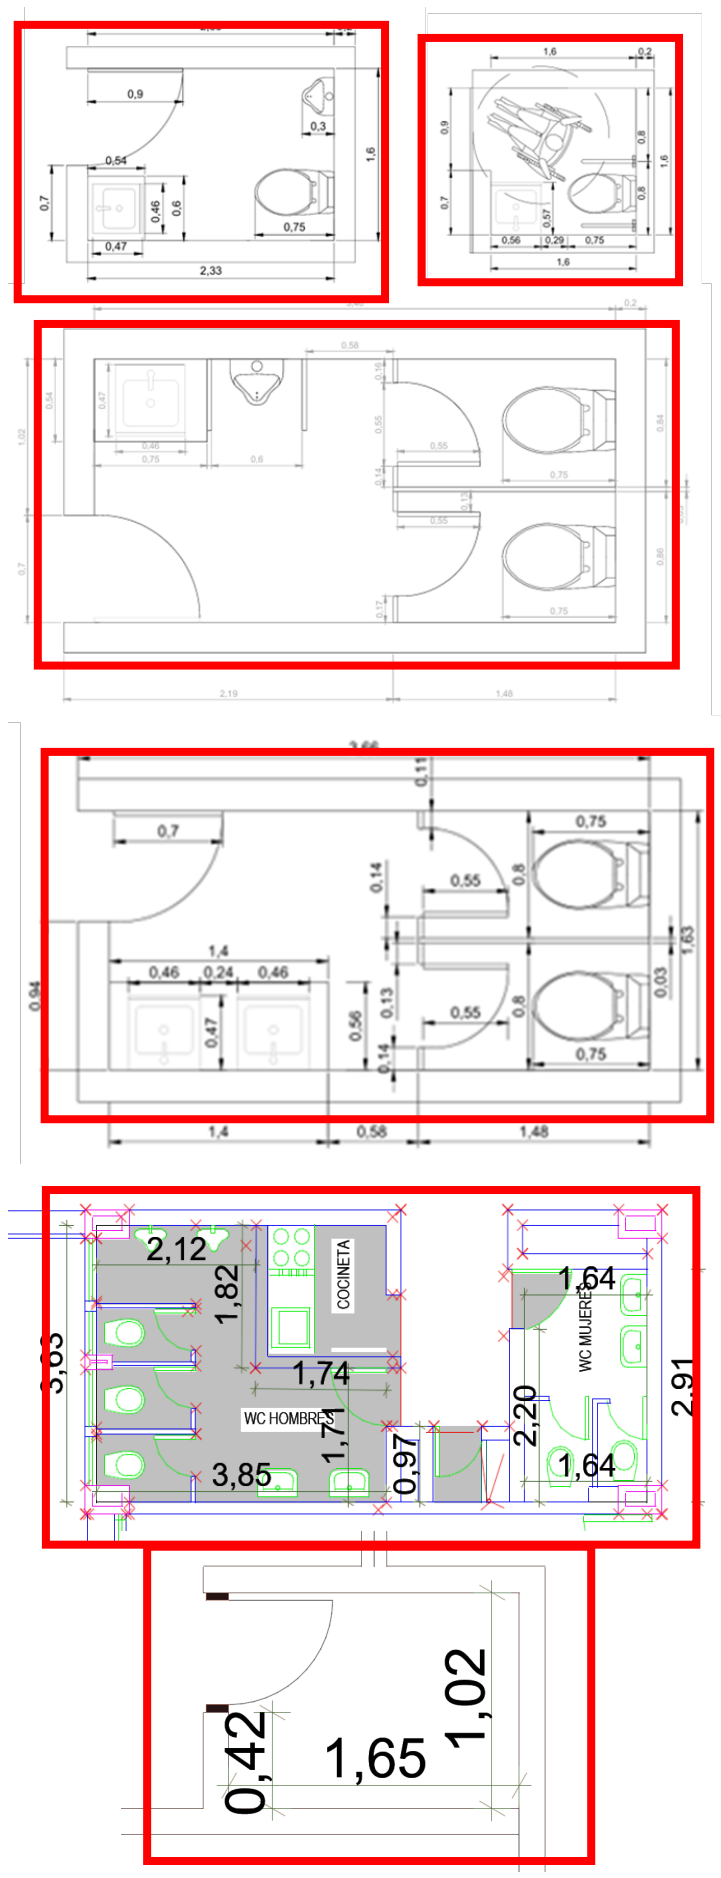

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.10	Suministro e instalación espejo flotante biselado 4mm. Incluye desmonte de espejo existente y disposición final en sitios autorizados.	m2	19.02

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

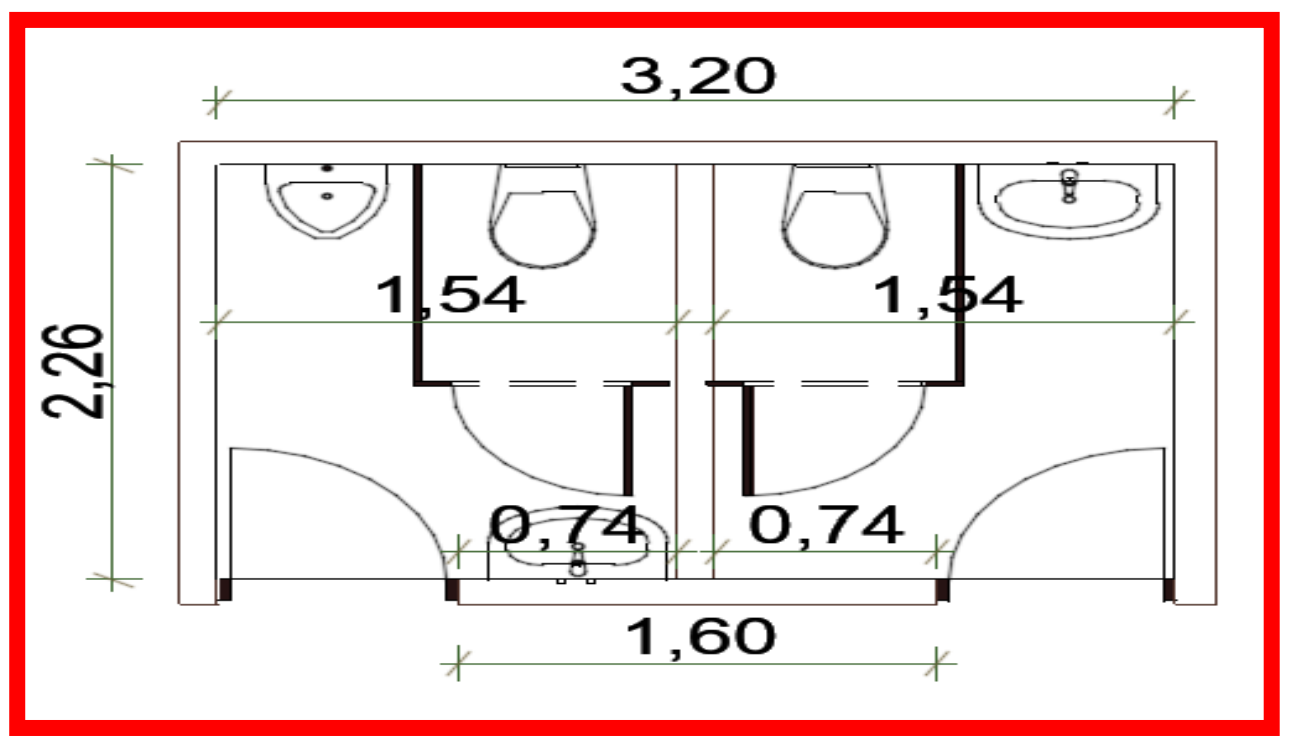



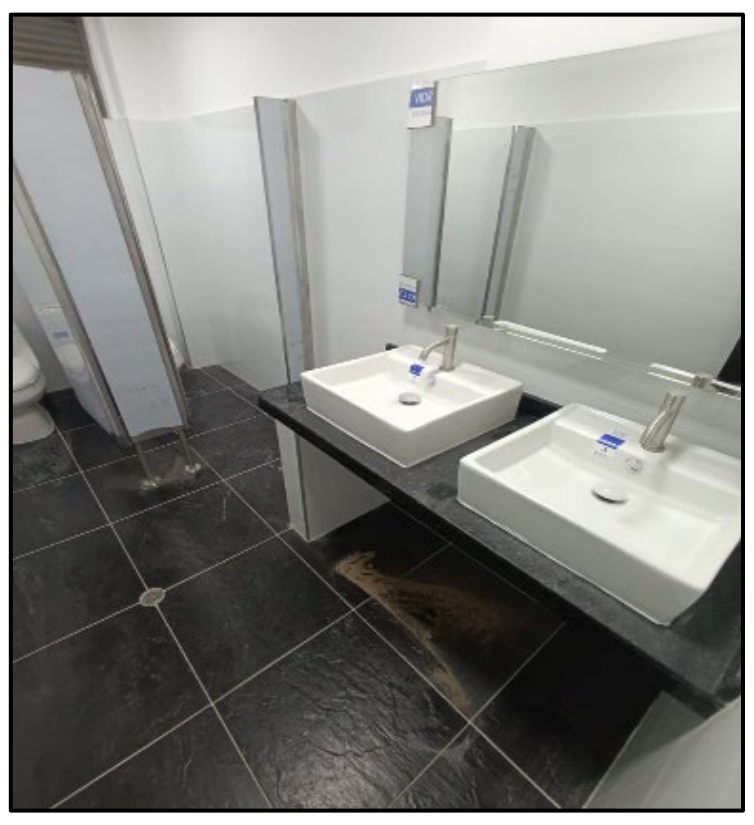


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.10	Suministro e instalación espejo flotante biselado 4mm. Incluye desmonte de espejo existente y disposición final en sitios autorizados.	m2	19.02

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						19.02	
CANTIDAD TOTAL						19.02	



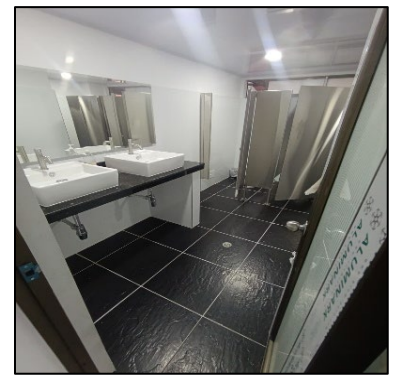

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.11	Mortero de nivelación (contrapiso) E= 1 a 4 cm	m2	68.82

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 1 PISOS HOMBRES	2.08	1.62				3.37	
BAÑOS TORRE A PISO 1 PISOS DISCAPACITADOS	1.60	1.60				2.56	
BAÑOS TORRE A PISO 1 PISOS MUJERES	2.33	1.60				3.73	
BAÑOS TORRE A PISO 2 AL 5 PISOS MUJERES	3.46	1.72			4	23.80	
BAÑOS TORRE A PISO 2 AL 5 PISOS HOMBRES	3.46	1.63			4	22.56	
BAÑOS MAGISTRADOS TORRE B PISO 5 ALA A	1.60	1.00			4	6.40	
BAÑOS MAGISTRADOS TORRE B PISO 5 ALA B	1.60	1.00			4	6.40	

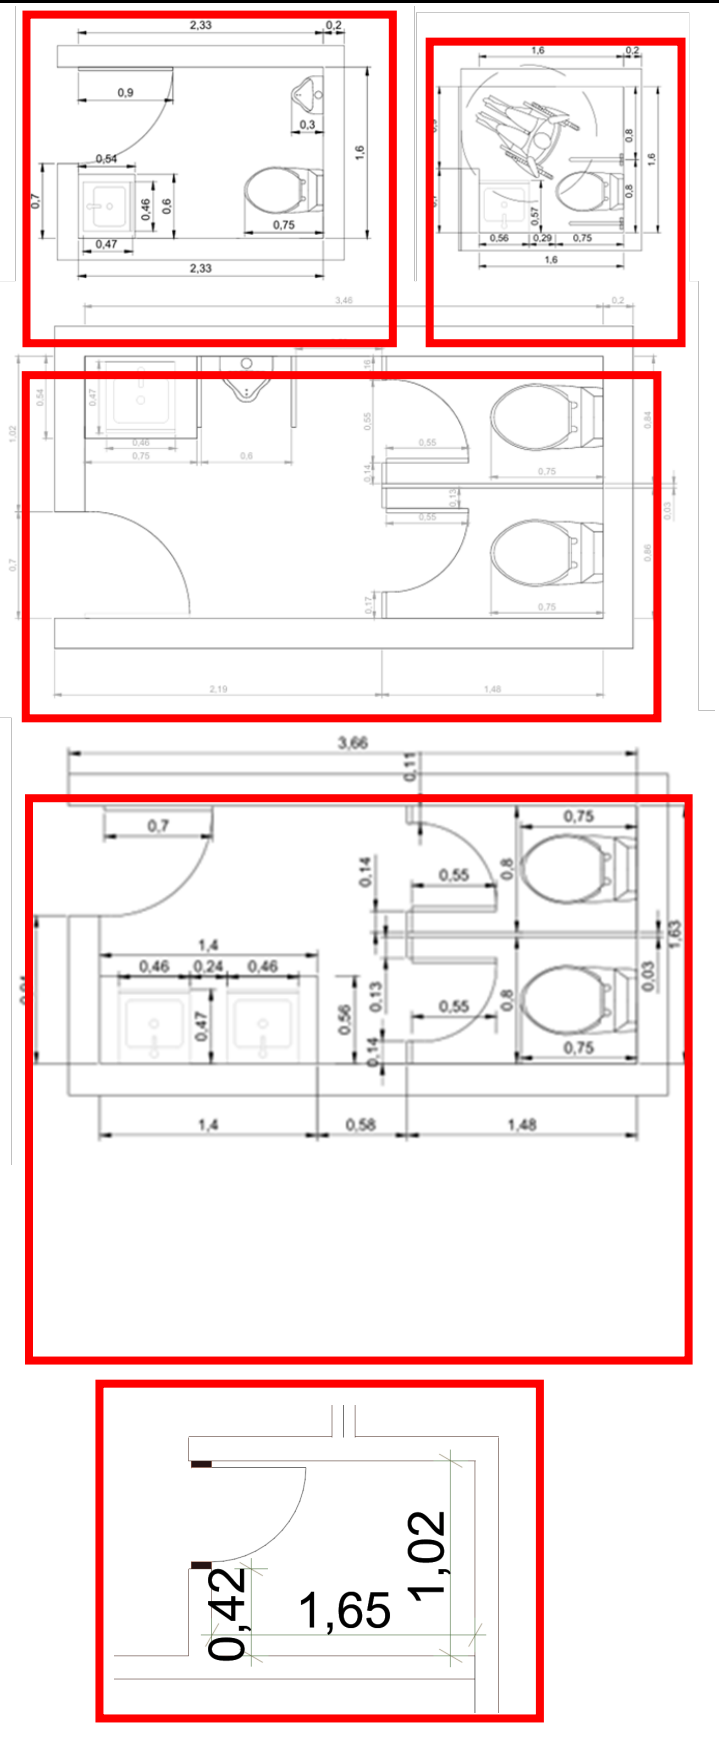

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.11	Mortero de nivelación (contrapiso) E= 1 a 4 cm	m2	68.82

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
Subtotal						68.82
CANTIDAD TOTAL						68.82

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.13	Suministro e instalación tubería sanitaria 4" PVC; Incluye accesorios(Yee,Codos 45, 90°, Tee,uniones, codos,silla, limp. Y soldad.) y elementos de fijación	ml	161.53

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS HOMBRES TORRE B DEL PISO 5 AL 2	1.80			1.00	4	7.20	
	1.85			1.00	4	7.40	
	1.70			1.00	4	6.80	
BAÑOS HOMBRES TORRE A DEL PISO 5 AL 2	6.82			1.00	4	27.28	
BAÑOS MUJERES TORRE A DEL PISO 5 AL 2	8.38			1.00	4	33.52	
BAÑO PISO 1 TORRE A	4.5			1.00	Baño hombre	4.50	
	6.7			1.00	Baño mujer	6.70	
	4.13			1.00	Baño discapacitados	4.13	
RAMAL VERTICAL PRINCIPAL TORRE A	20.00			1.00		20.00	
RAMAL VERTICAL PRINCIPAL TORRE B	22.00			2.00		44.00	

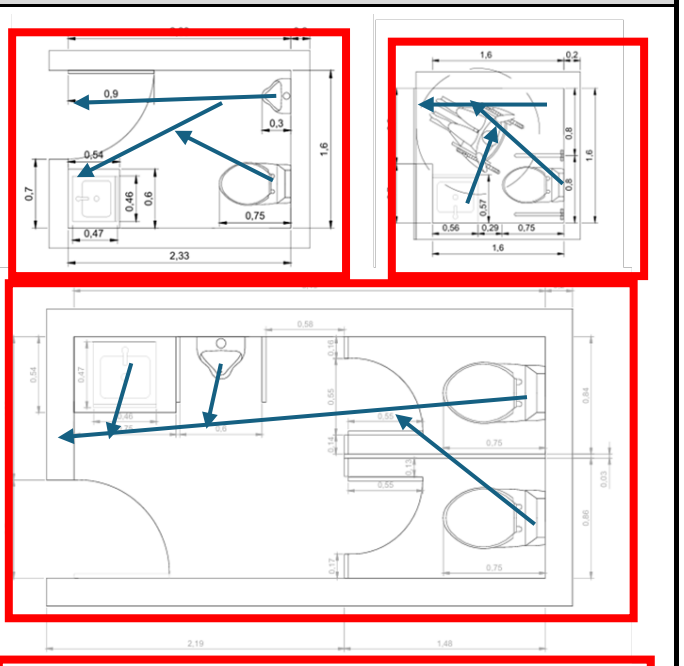

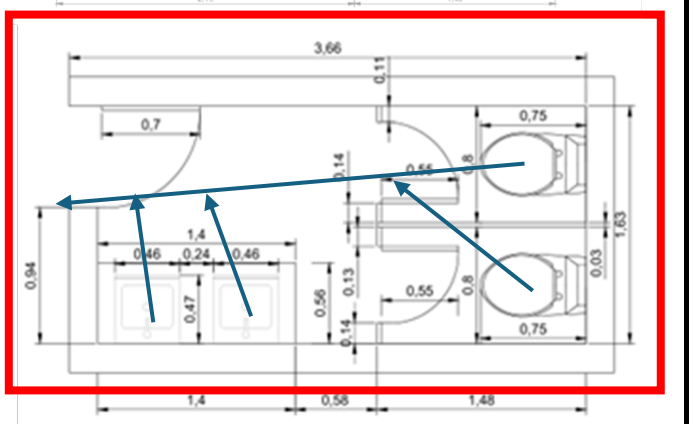

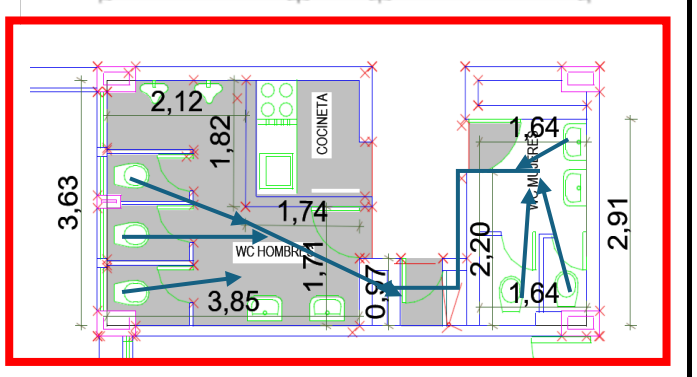





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia



CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.13	Suministro e instalación tubería sanitaria 4" PVC; Incluye accesorios(Yee,Codos 45, 90°, Tee,uniones, codos,silla, limp. Y soldad.) y elementos de fijación	ml	161.53

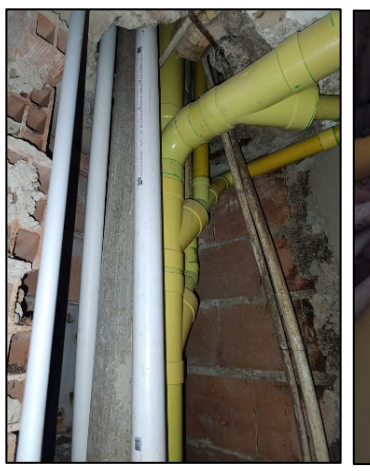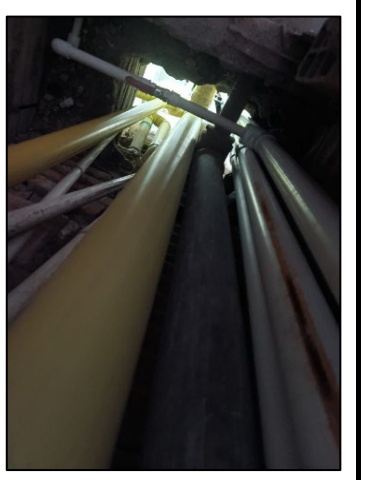LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
							 
Subtotal						161.53	
CANTIDAD TOTAL						161.53	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.14	Suministro e instalación de Punto de desagüe o sanitario en PVC 4". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	Pto	7.00


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 1 PISOS					3	3.00	
BAÑOS TORRE A PISO 5					4	4.00	

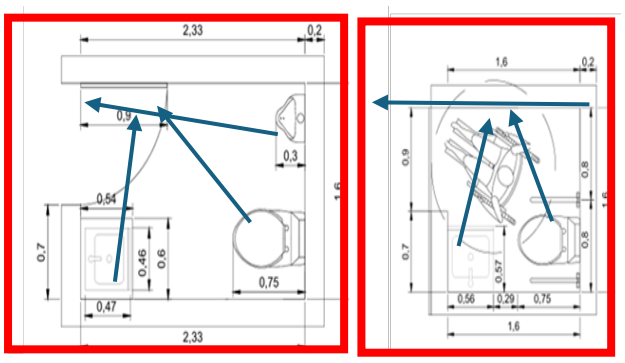







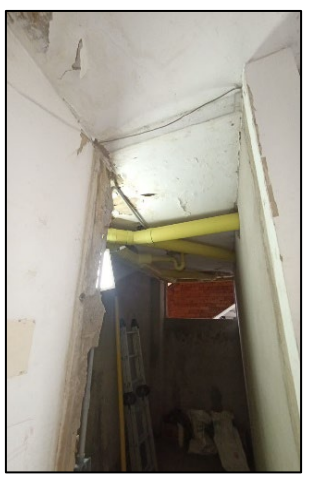

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.14	Suministro e instalación de Punto de desagüe o sanitario en PVC 4". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	Pto	7.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
							
Subtotal						7.00	
CANTIDAD TOTAL						7.00	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.15	Suministro e instalación de Punto de desagüe lavamanos en PVC 2". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	Pto	16.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 1 PISOS					**3**	**3.00**	
BAÑOS TORRE A PISO 2 AL 5 PISOS	PISO 5				**3**	**3.00**	
	PISO 4				**3**	**3.00**	
	PISO 3				**3**	**3.00**	
	PISO 2				**3**	**3.00**	
BAÑOS MAGISTRADOS TORRE B PISO 5					**1**	**1.00**	

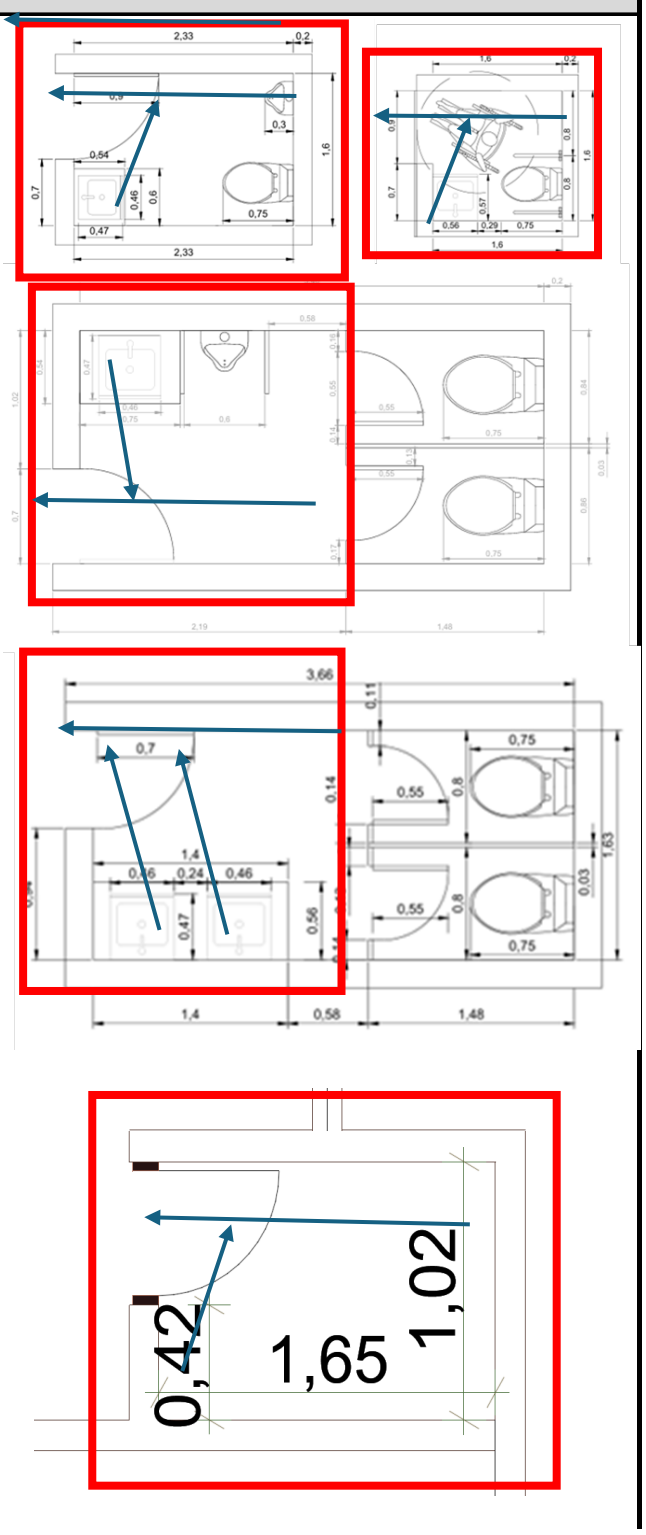

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.15	Suministro e instalación de Punto de desagüe lavamanos en PVC 2". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	Pto	16.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						**16.00**	
CANTIDAD TOTAL						**16.00**	



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.16	Salida sanitaria sifón de piso 2" (incluye suministro e instalación rejilla)	Pto	22.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 1	BAÑO HOMBRE				**1**	**1.00**	
	BAÑO MUJER				**1**	**1.00**	
	BAÑO AUXILIAR				**1**	**1.00**	
BAÑOS TORRE A PISO 2 AL 5 PISO	PISO 5				**2**	**2.00**	
	PISO 4				**2**	**2.00**	
	PISO 3				**2**	**2.00**	
	PISO 2				**2**	**2.00**	
BAÑOS MAGISTRADOS TORRE B PISO 5	OFICINA 510				**1**	**1.00**	
	OFICINA 512				**1**	**1.00**	
	OFICINA 513				**1**	**1.00**	
	OFICINA 514				**1**	**1.00**	
BAÑOS TORRE B PISO 1	BAÑO HOMBRE				**1**	**1.00**	
	BAÑO MUJERES				**1**	**1.00**	
TORRE B PISO 2	BAÑO HOMBRE				**1**	**1.00**	
	BAÑO MUJER				**1**	**1.00**	
	COCINETA				**1**	**1.00**	
	BAÑO AUX. HOMBRE				**1**	**1.00**	
	BAÑO AUX MUJER				**1**	**1.00**	

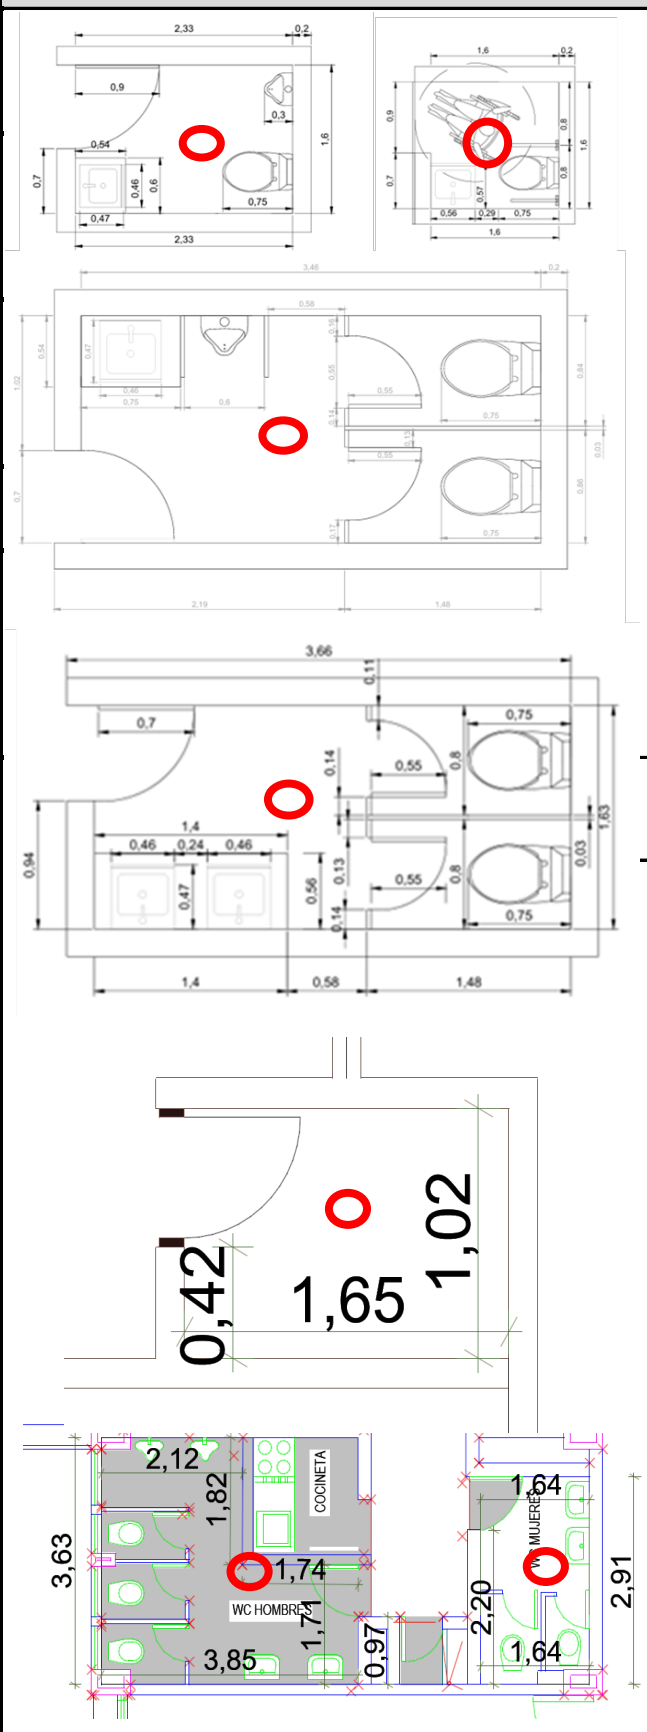

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.16	Salida sanitaria sifón de piso 2" (incluye suministro e instalación rejilla)	Pto	22.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				

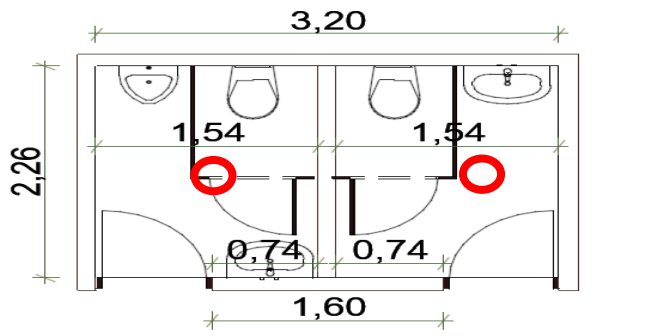

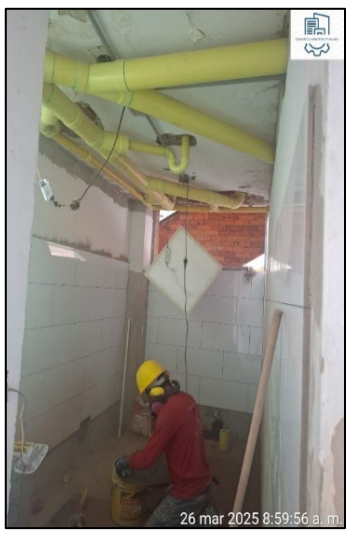

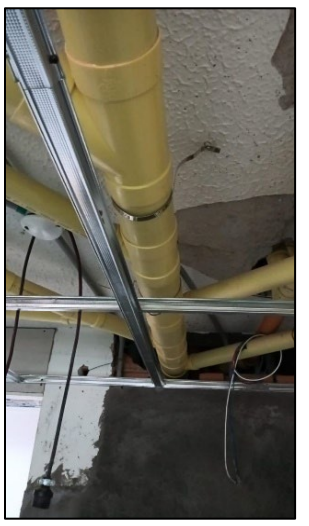

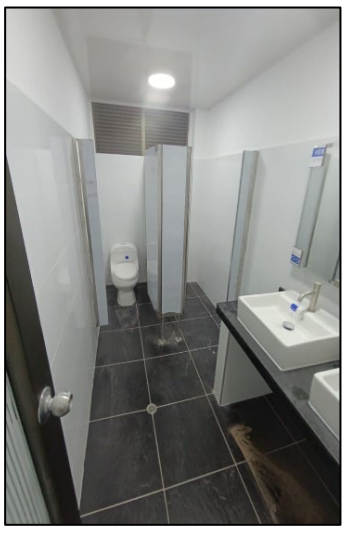



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.16	Salida sanitaria sifón de piso 2" (incluye suministro e instalación rejilla)	Pto	22.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						**22.00**	
CANTIDAD TOTAL						**22.00**	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.17	Suministro e instalación de Punto de desagüe orinal en PVC 2". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	Pto	5.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 1					1	1.00	
BAÑOS TORRE A PISO 2					1	1.00	
BAÑOS TORRE A PISO 3					1	1.00	
BAÑOS TORRE A PISO 4					1	1.00	
BAÑOS TORRE A PISO 5					1	1.00	
Subtotal						5.00	
CANTIDAD TOTAL						5.00	

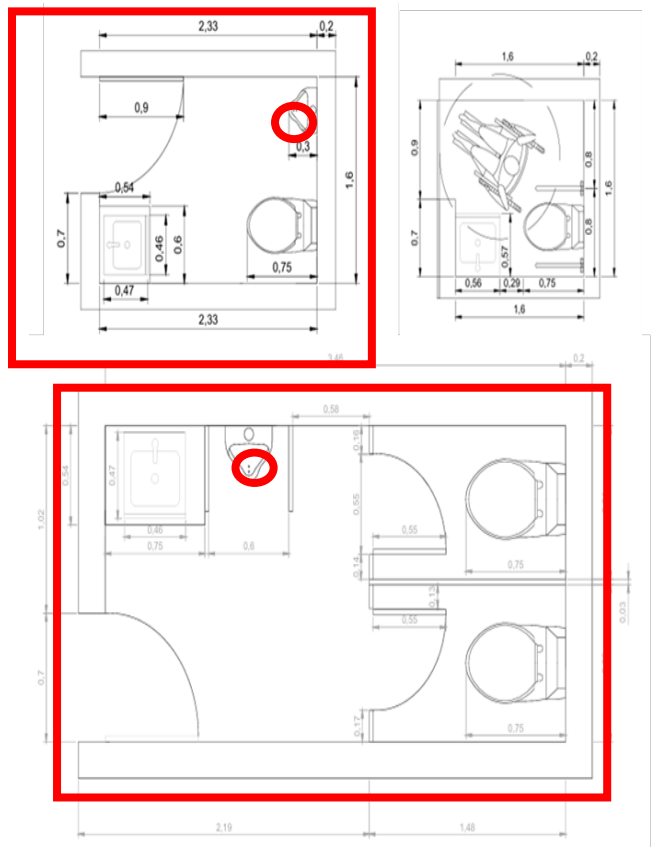





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.17	Suministro e instalación de Punto de desagüe orinal en PVC 2". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	Pto	5.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
7.02	Divisiones de baño, divisores, parales y puertas elaboradas en acero inoxidable calibre 20-22 tipo 304 satinado	m2	40.70


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS HOMBRES TORRE A PISO 1	0.40	0.90		1.00		**0.36**	
BAÑOS HOMBRES TORRE A PISO 2	1.49	1.48		1.00		**2.21**	
	1.68	1.48		1.00		**2.48**	
	0.40	0.90		2.00		**0.72**	
BAÑOS MUJERES TORRE A PISO 2	1.67	1.48		1.00		**2.46**	
	1.49	1.48		1.00		**2.20**	
BAÑOS HOMBRES TORRE A PISO 3	1.74	1.48		1.00		**2.57**	
	1.49	1.48		1.00		**2.21**	
	0.40	0.90		2.00		**0.72**	
BAÑOS MUJERES TORRE A PISO 3	1.64	1.48		1.00		**2.43**	
	1.48	1.48		1.00		**2.19**	
BAÑOS HOMBRES TORRE A PISO 4	1.74	1.48		1.00		**2.58**	
	1.48	1.48		1.00		**2.19**	
	0.40	0.90		2.00		**0.72**	
BAÑOS MUJERES TORRE A PISO 4	1.64	1.48		1.00		**2.41**	
	1.49	1.48		1.00		**2.20**	
BAÑOS HOMBRES TORRE A PISO 5	1.49	1.48		1.00		**2.21**	
	1.72	1.48		1.00		**2.54**	
	0.40	0.90		2.00		**0.72**	
BAÑOS MUJERES TORRE A PISO 5	1.64	1.48		1.00		**2.41**	
	1.49	1.48		1.00		**2.20**	

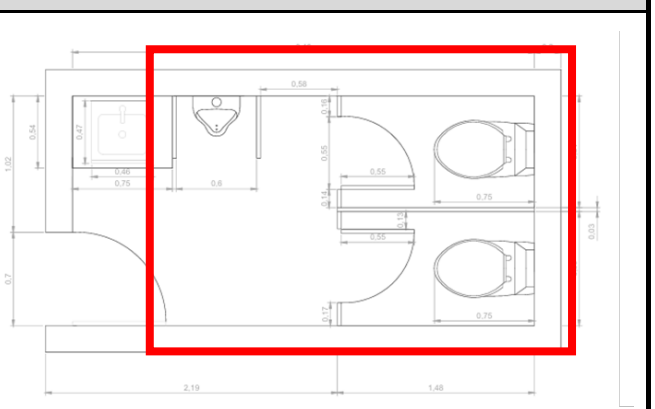

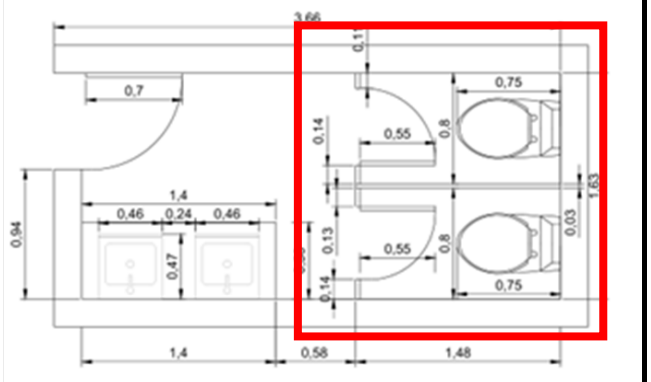





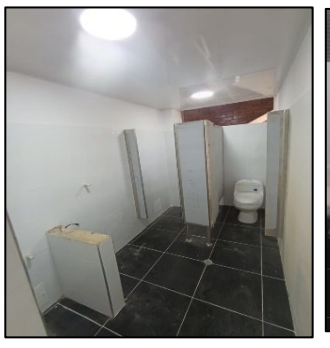



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
7.02	Divisiones de baño, divisores, parales y puertas elaboradas en acero inoxidable calibre 20-22 tipo 304 satinado	m2	40.70

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
Subtotal						40.70
CANTIDAD TOTAL						40.70

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
7.03	Suministro e instalación de ventana en aluminio corredizo, con marco y vidrio 4mm, incluye accesorios de instalación	m2	6.30

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE B PISO 1 AL 5	3.40	0.33			5	5.61	
BAÑOS AUXILIARES SEGUNDO PISO TORRE B	0.73	0.47			2	0.69	

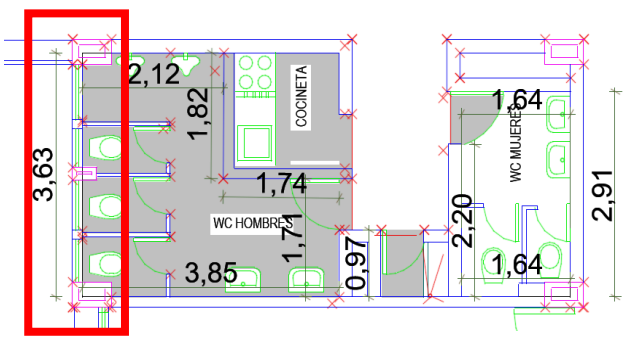

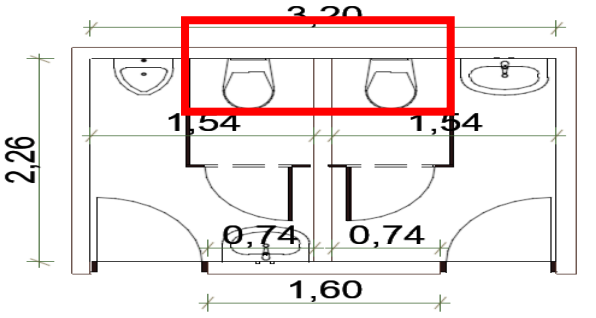



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
7.03	Suministro e instalación de ventana en aluminio corredizo, con marco y vidrio 4mm, incluye accesorios de instalación	m2	6.30

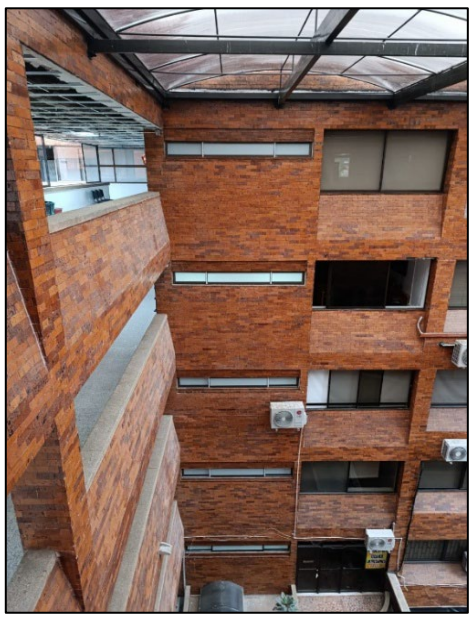LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
							
					Subtotal	6.30	
					CANTIDAD TOTAL	6.30	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
7.04	Suministro e instalación de enchape cerámico para piso y pared incluye wines, afinado pegacor y boquilla. (Formato según especificación técnica)	m2	275.88

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OF 509 MUROS	4.63	1.80		1	BAÑOS OFICINAS MAGISTRADOS PISO 5 TORRE B	8.33	
OF 509 PISOS	1.61	1.02		1		1.64	
OF 512MUROS	4.63	1.80		1		8.33	
OF 512 PISOS	1.61	1.02		1		1.64	
OF 513 MUROS	4.63	1.80		1		8.33	
OF 513 PISOS	1.61	1.02		1		1.64	
OF 514 MUROS	4.63	1.80		1		8.33	
OF 514 PISOS	1.61	1.02		1		1.64	
ENCHAPE PARED BAÑO MUJERES TORRE A DEL PISO 5 AL PISO 2	3.52	1.8		4		25.34	
	1.62	1.8		4		11.66	
	3.52	1.8		4		25.34	
	0.95	1.8		4		6.84	
ENCHAPE PISO BAÑO MUJERES TORRE A DEL PISO 5 AL PISO 2	3.52	1.62		4		22.81	
ENCHAPES PARED BAÑO HOMBRES TORRE A PISO 5 AL PISO 2	3.52	1.8		4		25.34	
	1.72	1.8		4		12.38	
	3.24	1.8		4		23.33	
	1.06	1.8		4		7.63	
	0.28	1.8		4		2.02	
ENCHAPE PISO BAÑOS HOMBRES TORRE A DEL PISO 5 AL PISO 2	3.24	1.72		4		22.29	
	0.66	0.28		4		0.74	
ENCHAPE PISO BAÑOS HOMBRES TORRE A DEL PISO 1	2.33	1.56		1		3.63	
ENCHAPE PARED BAÑOS HOMBRES TORRE A DEL PISO 1	2.33	1.8		1		4.19	
	1.56	1.8		1		2.81	
	2.33	1.8		1		4.19	
	0.685	1.8		1		1.23	

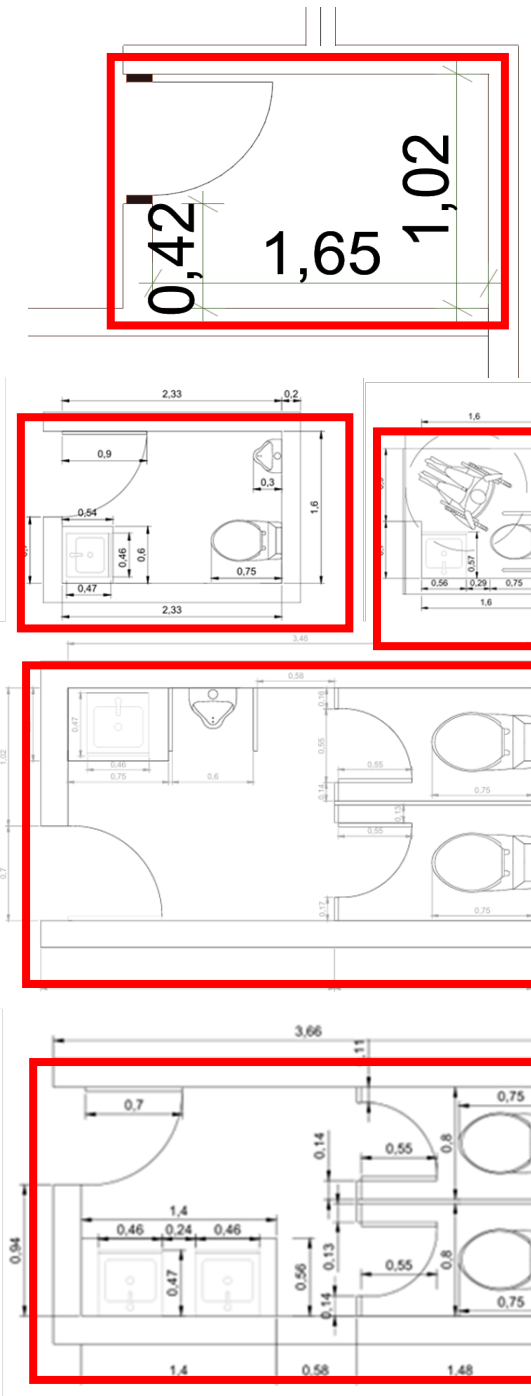

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
7.04	Suministro e instalación de enchape cerámico para piso y pared incluye wines, afinado pegacor y boquilla. (Formato según especificación técnica)	m2	275.88

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
ENCHAPE PISO BAÑOS MUJERES TORRE A DEL PISO 1	1.595	1.495		1		2.38
	0.66	0.545		1		0.36
ENCHAPE PARED BAÑOS MUJERES TORRE A DEL PISO 1	1.495	1.8		1		2.69
	1.595	1.8		1		2.87
	2.03	1.8		1		3.65
	0.545	1.8		1		0.98
	0.935	1.8		1		1.68
ENCHAPE PISO BAÑOS DISCAPACITADOS TORRE A DEL PISO 1	1.55	1.51		1		2.34
	1.01	0.2		1		0.20
ENCHAPE PARED BAÑOS DISCAPACITADOS TORRE A DEL PISO 1	0.25	1.8		1		0.45
	0.41	1.8		1		0.74
	1.47	1.8		1		2.65
	1.585	1.8		1		2.85
	1.56	1.8		1		2.81
	0.25	1.8		1		0.45
	0.16	1.8		1		0.29
COCINETA TORRE B PISO 5 AL 2	1.13	1.5		4		6.78
					Subtotal	275.88
					CANTIDAD TOTAL	275.88

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
7.05	Suministro e instalación de cielo raso PVC 8mm (incluye estructura metálica y rejillas de ventilación)	m2	70.08

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑO TORRE A PISO 1 MUJERES	1.595	1.495		1.00		2.38	
	0.66	0.545		1.00		0.36	
BAÑOS TORRE A PISO 1 DISCAPACITADOS	1.55	1.52		1.00		2.35	
BAÑOS TORRE A PISO 1 HOMBRES	2.33	1.56		1.00		3.63	
BAÑOS OF 509	1.61	1.02		1.00	BAÑOS MAGISTRADOS TORRE B PISO 5	1.64	
BAÑOS OF 512	1.61	1.02		1.00		1.64	
BAÑOS OF 513	1.61	1.02		1.00		1.64	
BAÑOS OF 514	1.61	1.02		1.00		1.64	
BAÑO MUJERES TORRE A DEL PISO 5 AL PISO 2	3.52	1.62		4.00		22.81	
BAÑOS HOMBRES TORRE A DEL PISO 5 AL PISO 2	3.24	1.72		4.00		22.29	
	0.66	0.28		4.00		0.74	
COCINETA TORRE B PISO 5 AL 2	1.49	1.5		4.00		8.94	

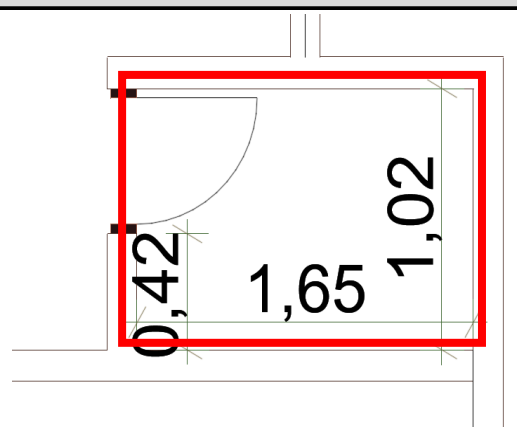

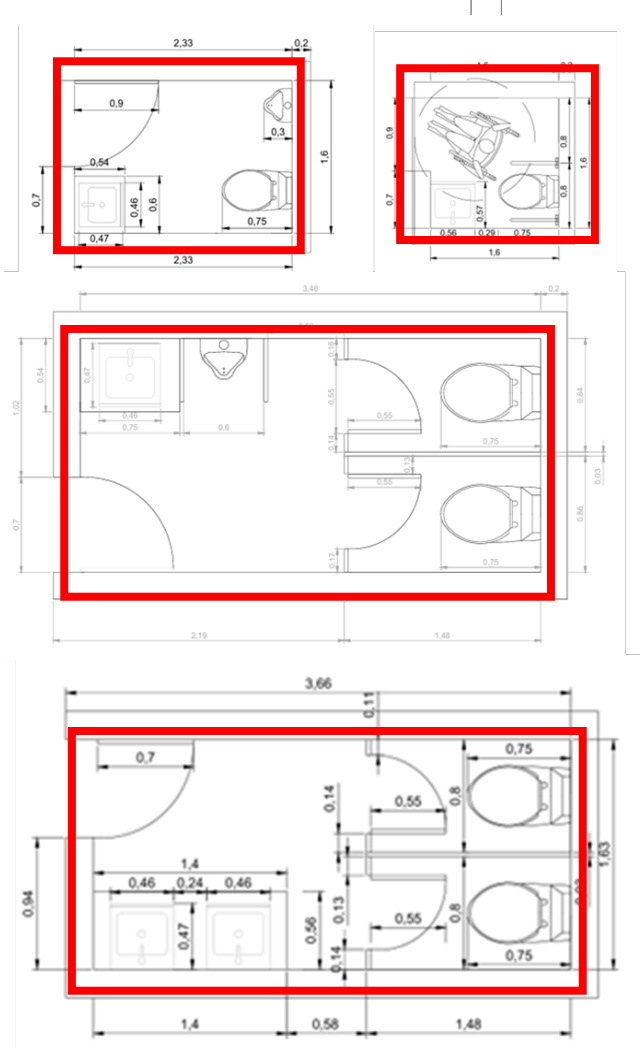

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio




B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
7.05	Suministro e instalación de cielo raso PVC 8mm (incluye estructura metálica y rejillas de ventilación)	m2	70.08

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
Subtotal						70.08
CANTIDAD TOTAL						70.08

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

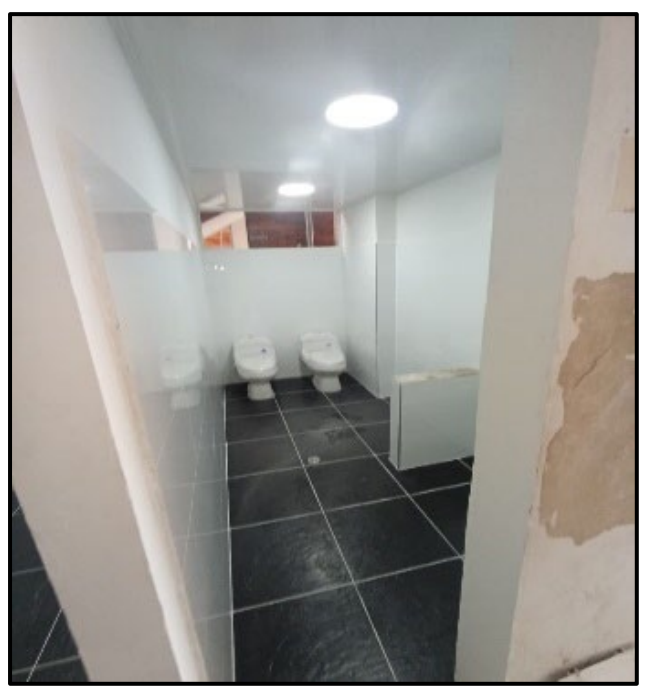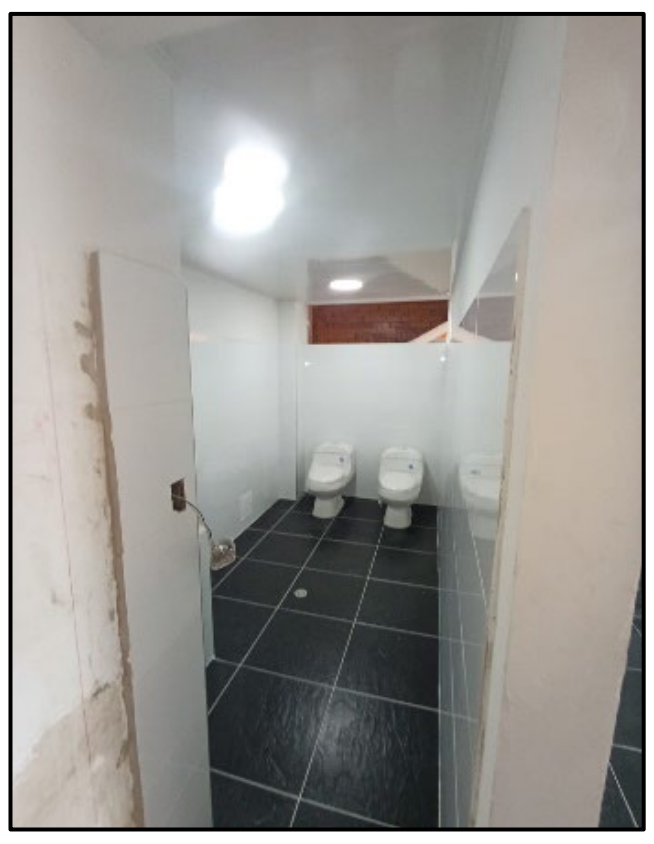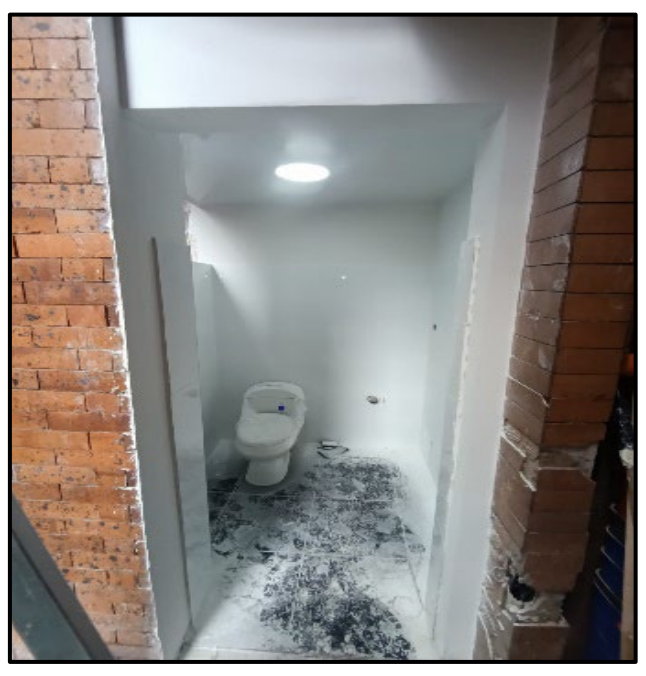

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia




CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
7.06	Pañete muro interior y culatas, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	m2	207.77

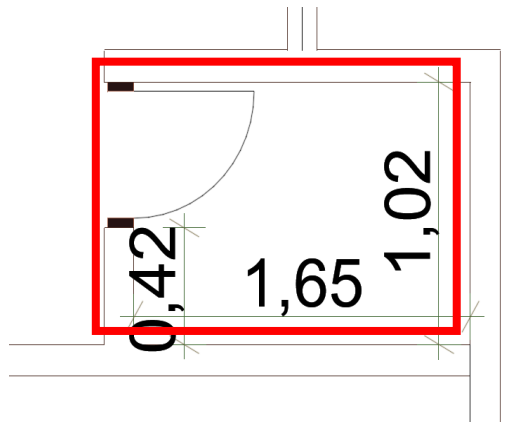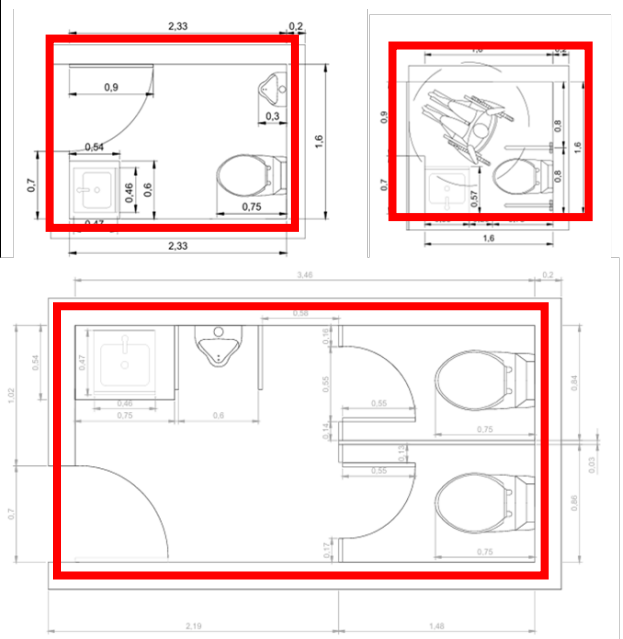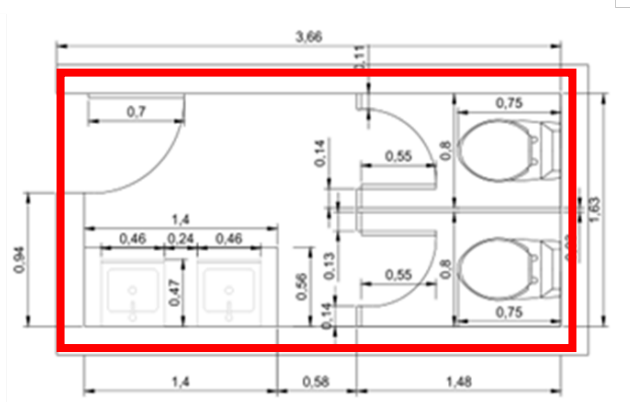LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OF 509 MUROS	4.63	1.80		1.00	OFICINAS MAGISTRADOS TORRE B PISO 5	8.33	
OF 512MUROS	4.63	1.80		1.00		8.33	
OF 513 MUROS	4.63	1.80		1.00		8.33	
OF 514 MUROS	4.63	1.80		1.00		8.33	
PARED BAÑO MUJERES TORRE A DEL PISO 5 AL PISO 2	3.52	1.80		4.00		25.34	
	1.62	1.80		4.00		11.66	
	3.52	1.80		4.00		25.34	
	0.95	1.80		4.00		6.84	
PARED BAÑO HOMBRES TORRE A PISO 5 AL PISO 2	3.52	1.80		4.00		25.34	
	1.72	1.80		4.00		12.38	
	3.24	1.80		4.00		23.33	
	1.06	1.80		4.00		7.63	
	0.28	1.80		4.00		2.02	
PARED BAÑOS HOMBRES TORRE A DEL PISO 1	2.33	1.80		1.00		4.19	
	1.56	1.80		1.00		2.81	
	2.33	1.80		1.00		4.19	
	0.685	1.80		1.00		1.23	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO



Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
7.06	Pañete muro interior y culatas, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	m2	207.77

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
PARED BAÑOS MUJERES TORRE A DEL PISO 1	1.495	1.80		1.00		2.69	
	1.595	1.80		1.00		2.87	
	2.03	1.80		1.00		3.65	
	0.545	1.80		1.00		0.98	
	0.935	1.80		1.00		1.68	
PARED BAÑOS DISCAPACITADOS TORRE A DEL PISO 1	0.25	1.80		1.00		0.45	
	0.41	1.80		1.00		0.74	
	1.47	1.80		1.00		2.65	
	1.585	1.80		1.00		2.85	
	1.56	1.80		1.00		2.81	
	0.25	1.80		1.00		0.45	
	0.16	1.80		1.00		0.29	
Subtotal						**207.77**	
CANTIDAD TOTAL						**207.77**	

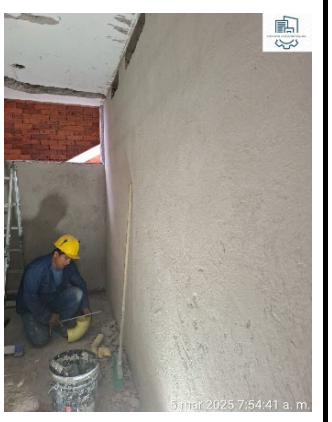OBSERVACIONES:

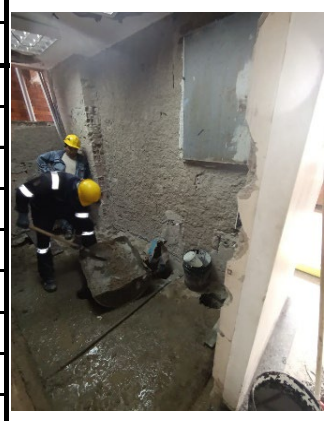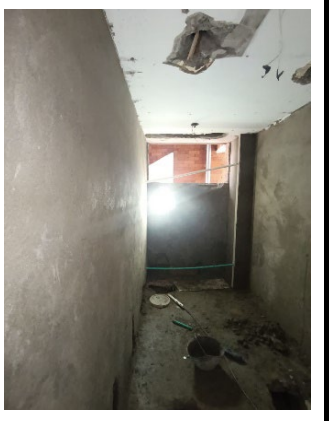ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
7.07	Pintura vinilo tipo 1 sobre muro interior 3 manos (Alta calidad). Incluye estuco, filos y dilataciones	m2	6.13


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
OF 509 MUROS	4.63	0.60		1.00	OFICINAS MAGISTRADOS TORRE B PISO 5	2.78
OF 512MUROS	4.63	0.60		1.00		2.78
OF 513 MUROS	0.96	0.60		1.00		0.58


ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

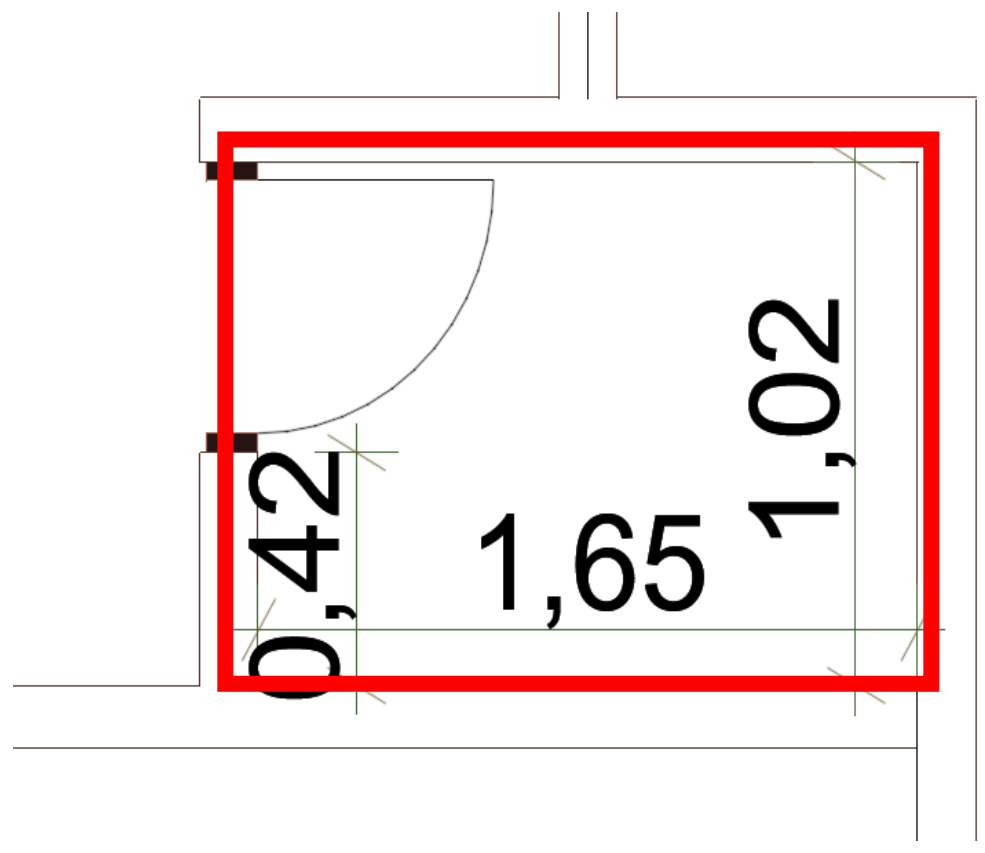

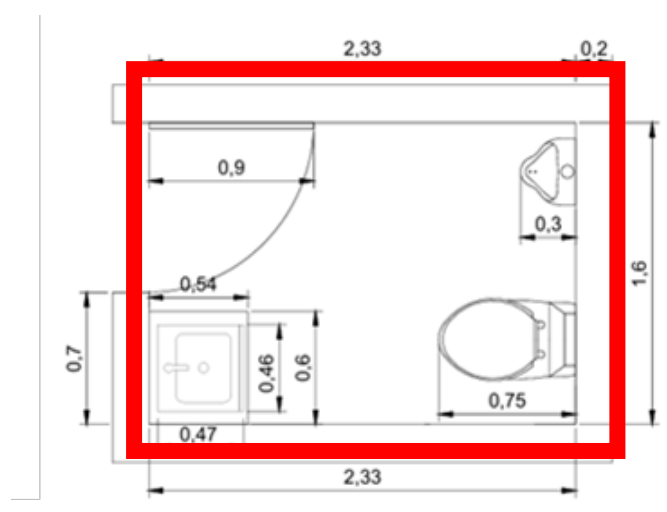

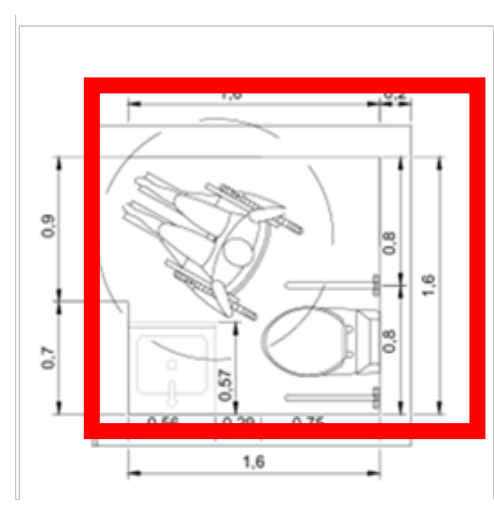

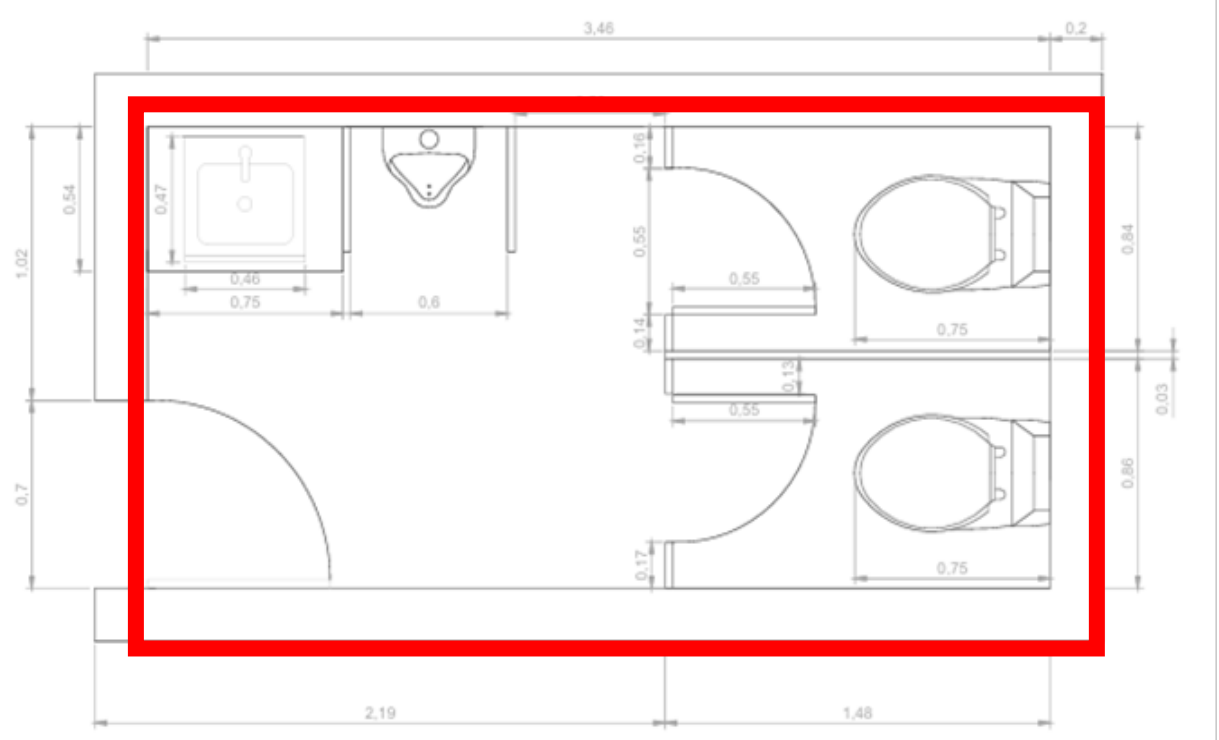

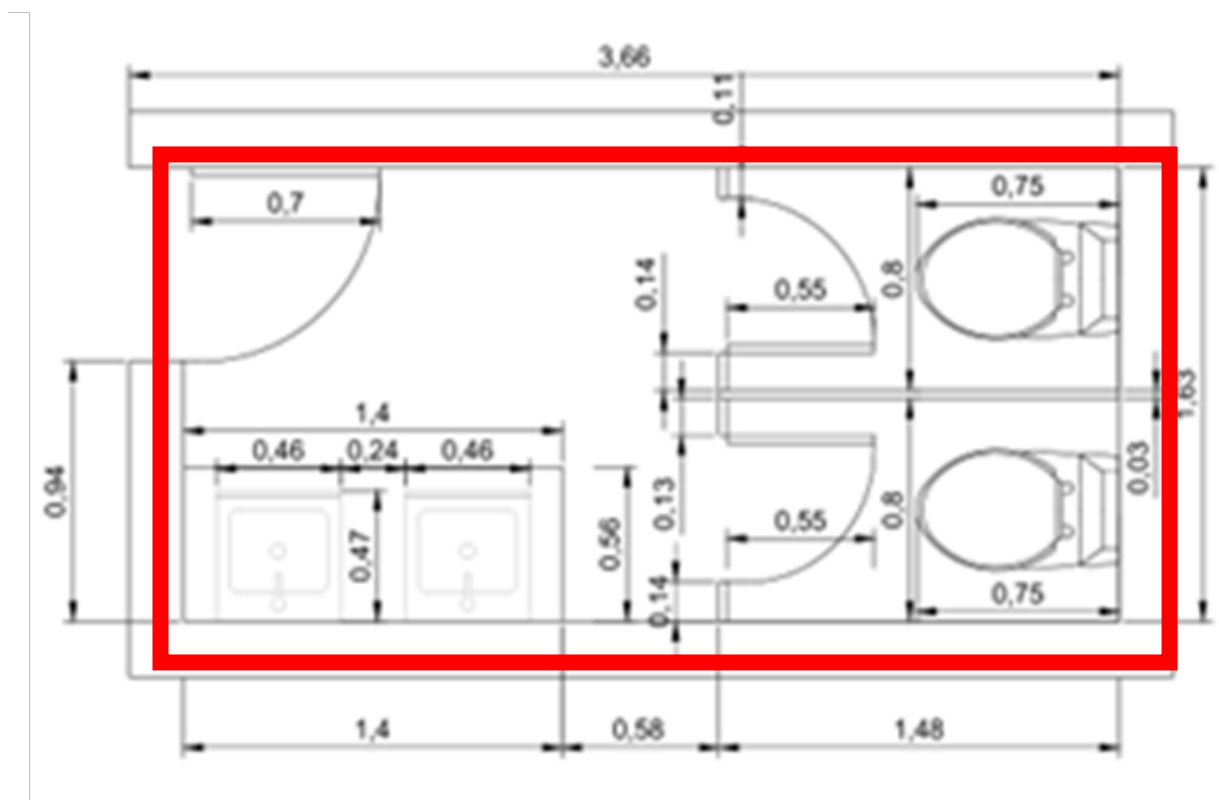

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
7.07	Pintura vinilo tipo 1 sobre muro interior 3 manos (Alta calidad). Incluye estuco, filos y dilataciones	m2	6.13


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
Subtotal						**6.13**
CANTIDAD TOTAL						**6.13**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO



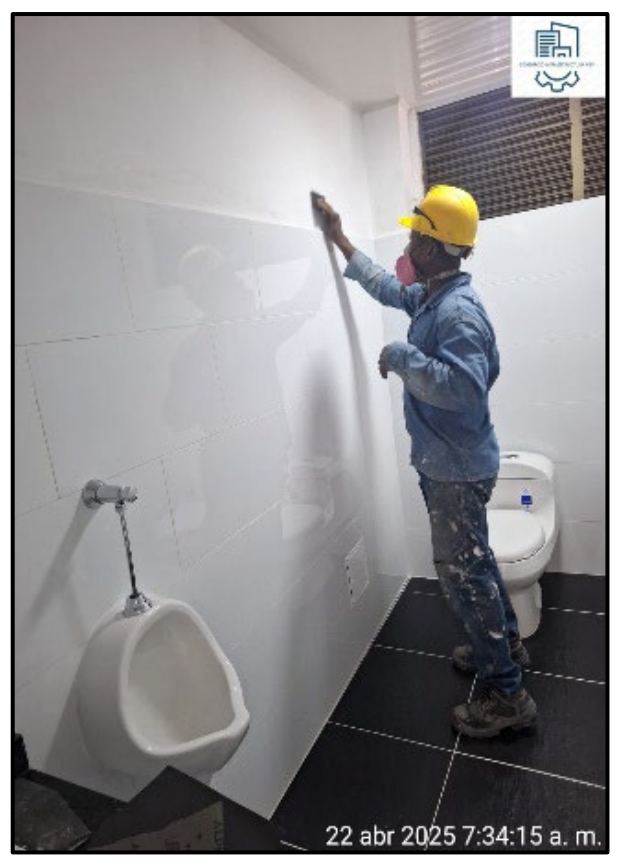

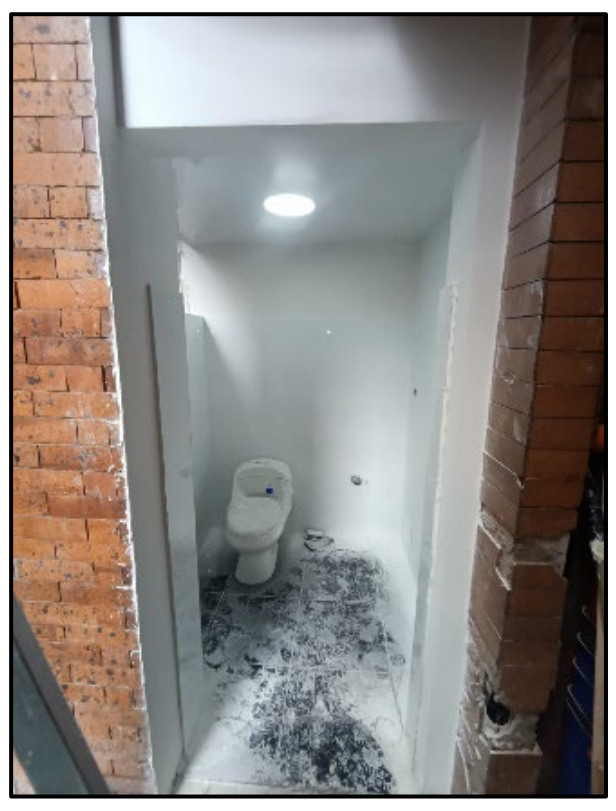

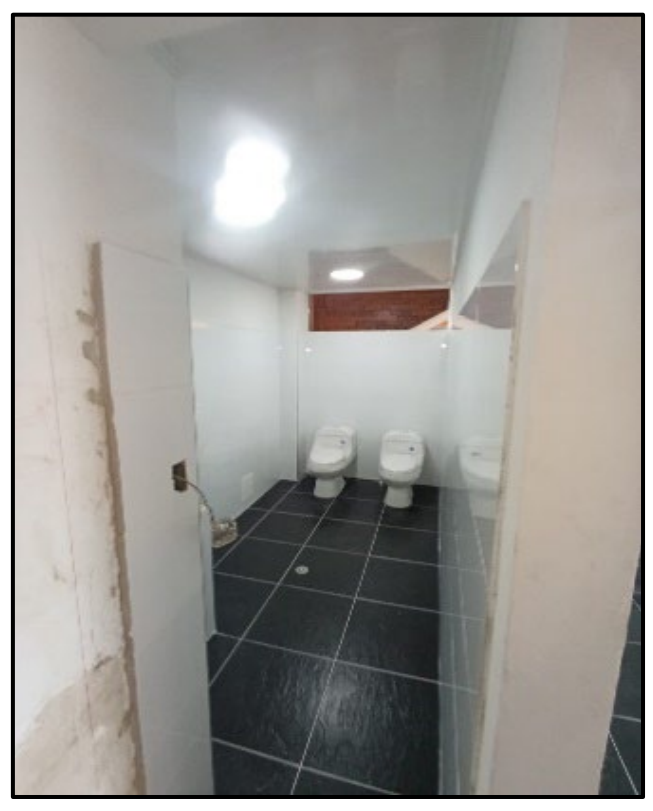

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia





CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
8.02	Tubería PVCP RDE 21 2" suministro e instalación	ml	112.88

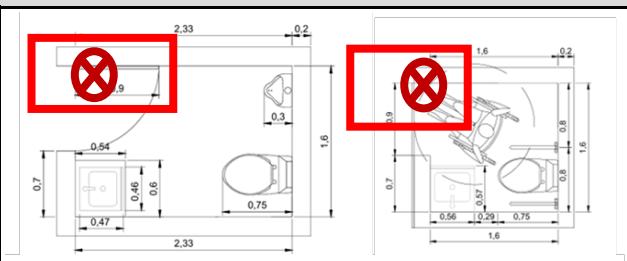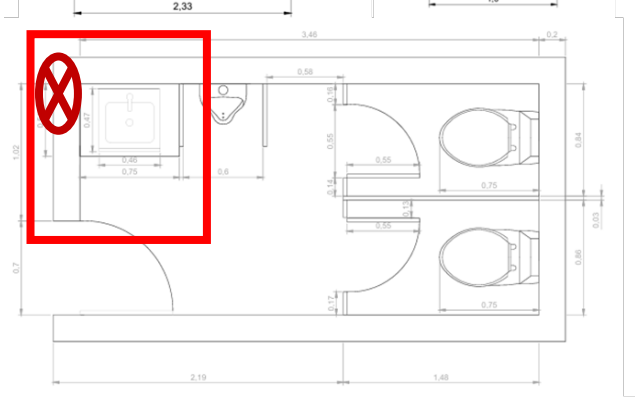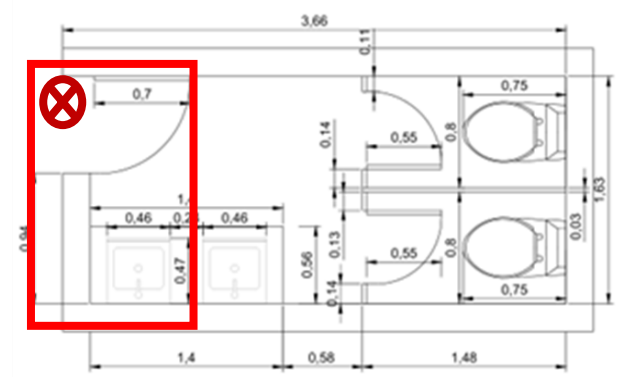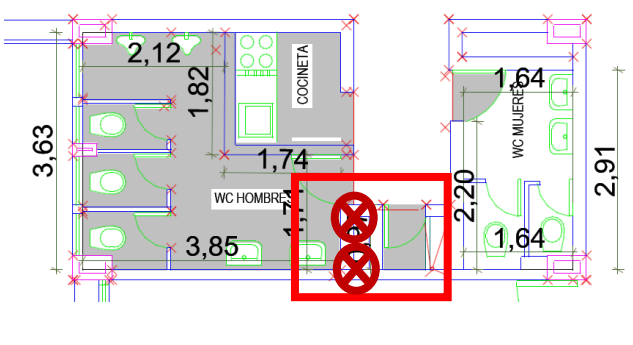LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
SUMINISTRO A TANQUE EN CUBIERTA TORRE B	9.00			1.00		9.00	
	2.00					2.00	
	17.90					17.90	
	2.00					2.00	
BAJANTE DISTRIBUCIÓN 5, 4 Y 3 PISO TORRE B	12.74			1.00		12.74	
BAJANTE DISTRIBUCIÓN 2 Y 1 PISO TORRE B	19.90			1.00		19.90	
SUMINISTRO A TANQUE EN CUBIERTA TORRE A	21.18			1.00		21.18	
BAJANTE DISTRIBUCIÓN 5, 4 Y 3 PISO TORRE A	10.56			1.00		10.56	
BAJANTE DISTRIBUCIÓN 2 Y 1 PISO TORRE A	17.60			1.00		17.60	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
8.02	Tubería PVCP RDE 21 2" suministro e instalación	ml	112.88

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						112.88	
CANTIDAD TOTAL						112.88	



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
8.06	Accesorio PVCP 3/4" suministro e instalación	und	100.00


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE B PISO 5				28.00		28.00	
BAÑOS TORRE B PISO 4				28.00		28.00	
BAÑOS TORRE B PISO 3				28.00		28.00	
BAÑOS TORRE B PISO 2				16.00		16.00	

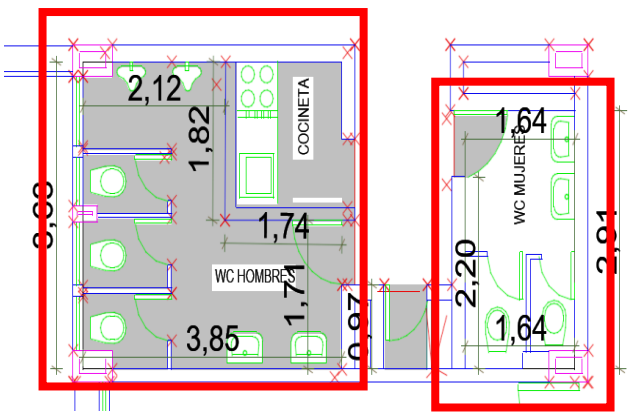

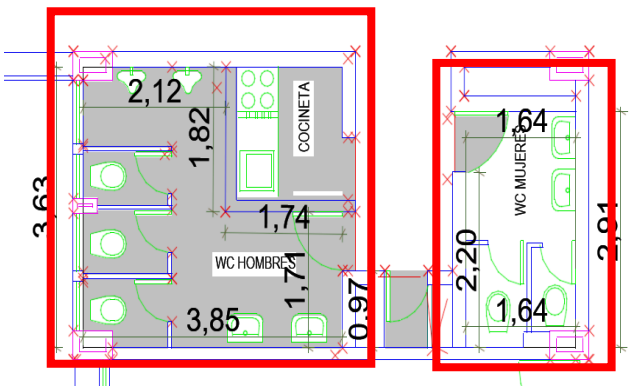

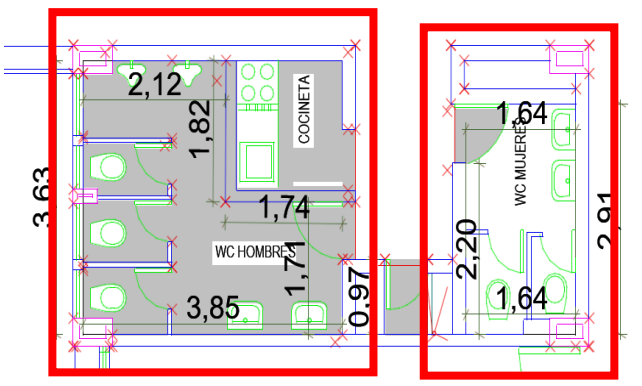



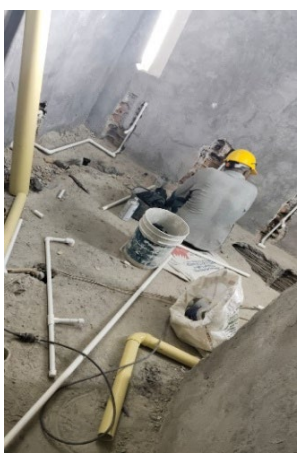

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
8.06	Accesorio PVCP 3/4" suministro e instalación	und	100.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
Subtotal						**100.00**
CANTIDAD TOTAL						**100.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO





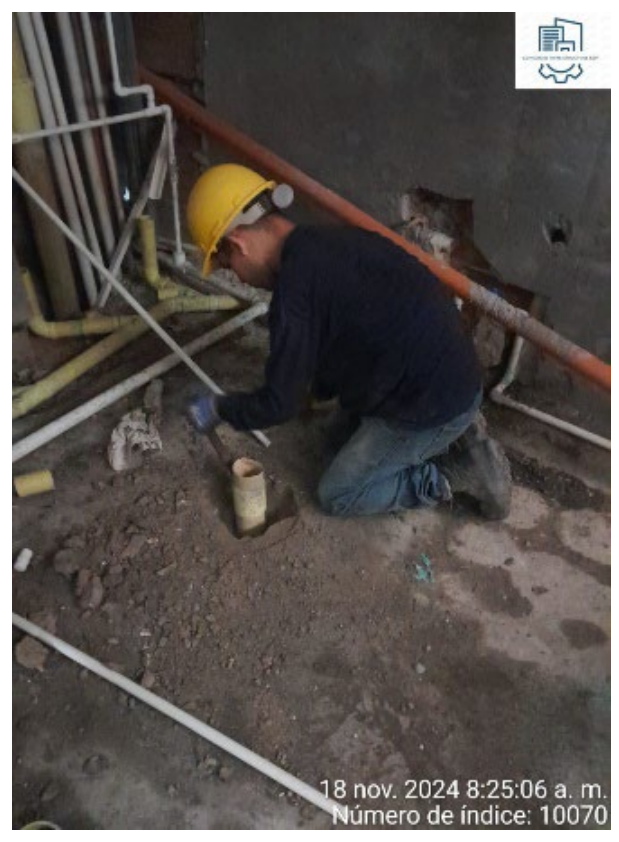

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
8.07	Accesorio PVCP 1/2" suministro e instalación	und	240.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE B PISO 5				27.00		27.00	
BAÑOS MAGISTRADOS PISO 5 TORRE B				24.00		24.00	
BAÑOS TORRE B PISO 4				27.00		27.00	
BAÑOS TORRE B PISO 3				27.00		27.00	
BAÑOS TORRE B PISO 2				43.00		43.00	
BAÑOS TORRE B PISO 1				35.00		35.00	
BAÑOS TORRE A PISO 1				22.00		22.00	
BAÑOS TORRE A PISO 2				25.00		25.00	
BAÑOS TORRE A PISO 3				10.00		10.00	

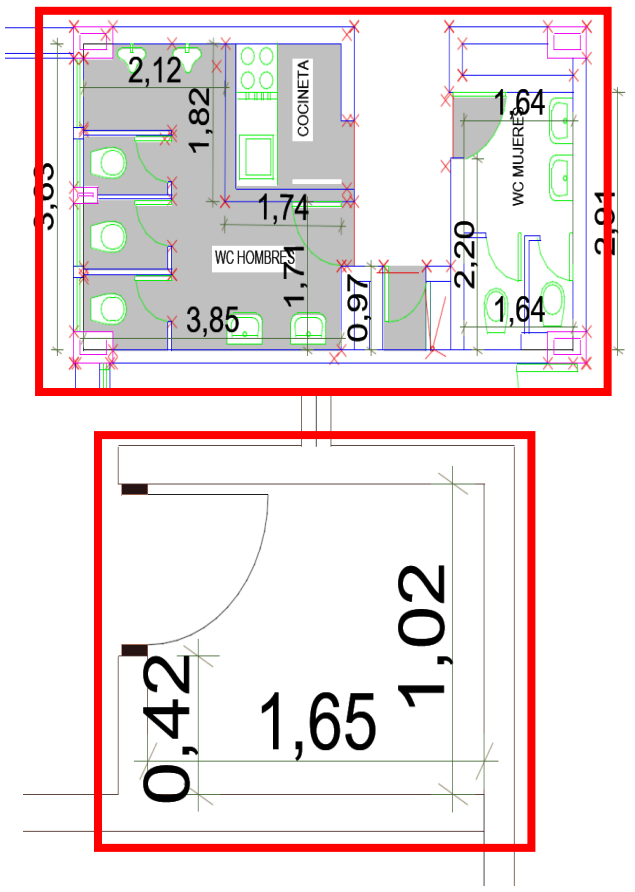

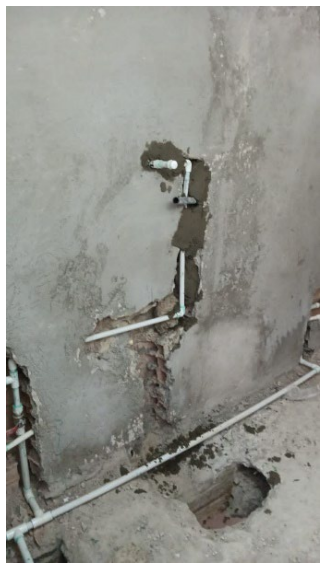

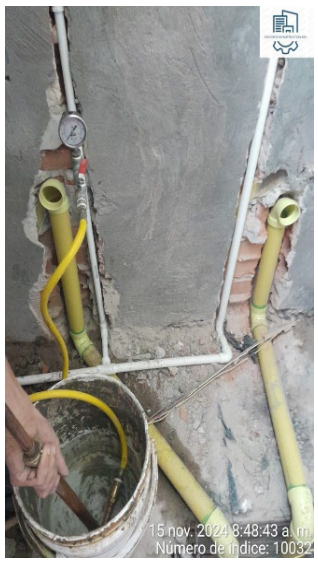

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
8.07	Accesorio PVCP 1/2" suministro e instalación	und	240.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
Subtotal						240.00
CANTIDAD TOTAL						240.00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

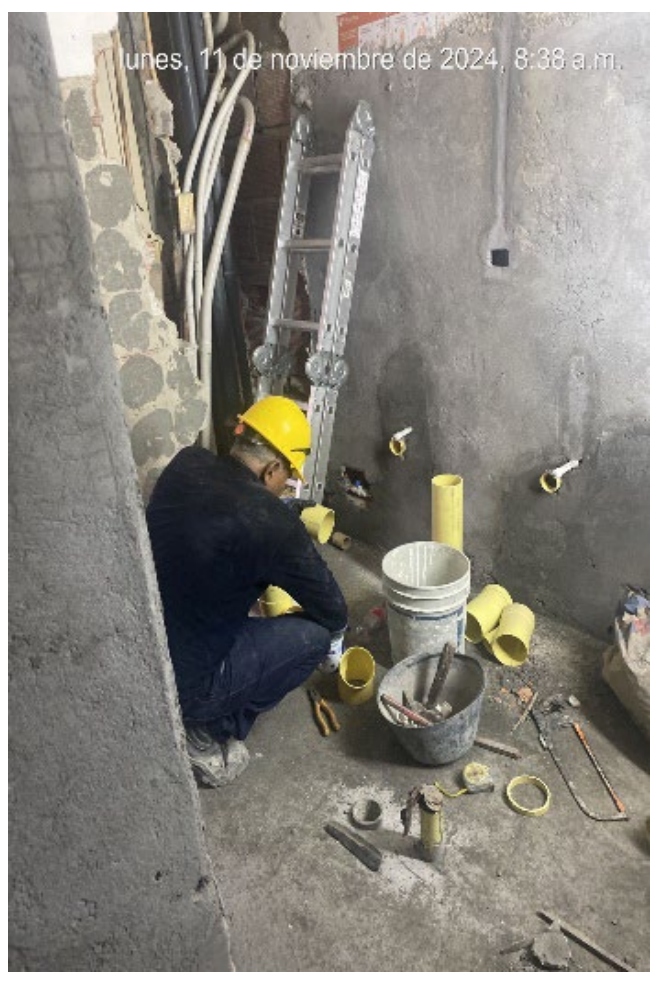



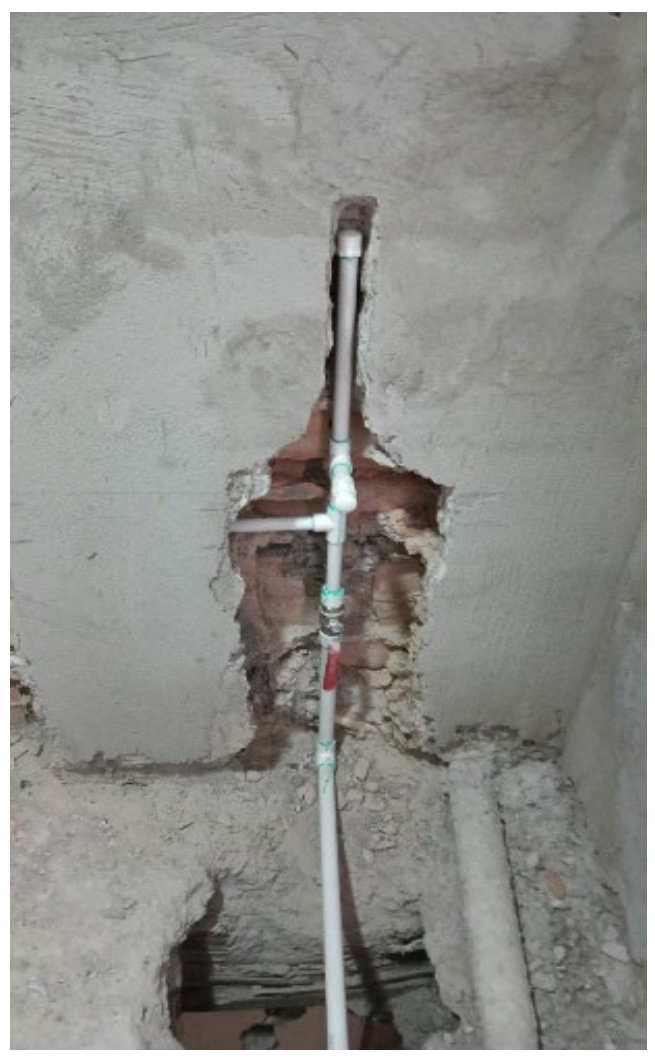

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
8.08	Accesorio PVCP 1" suministro e instalación	und	4.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑO TORRE B PISO 5				2.00	1	2.00	
BAÑO TORRE B PISO 4				2.00	1	2.00	

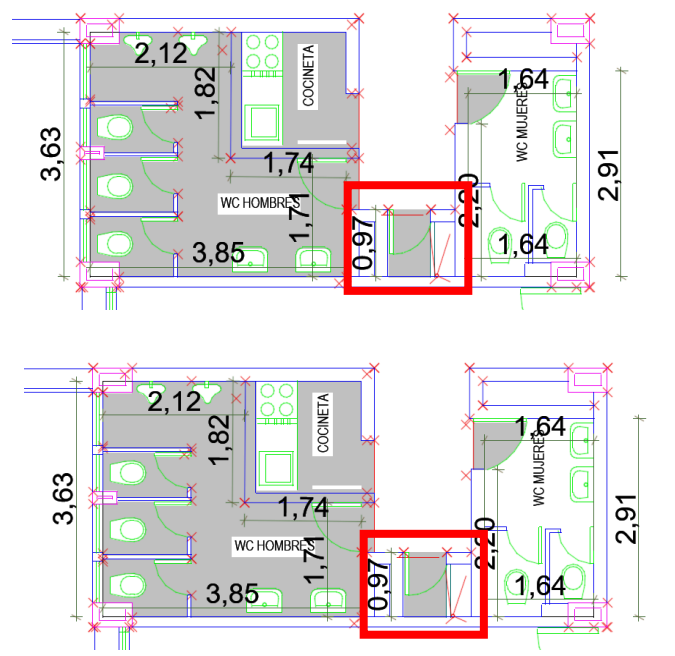

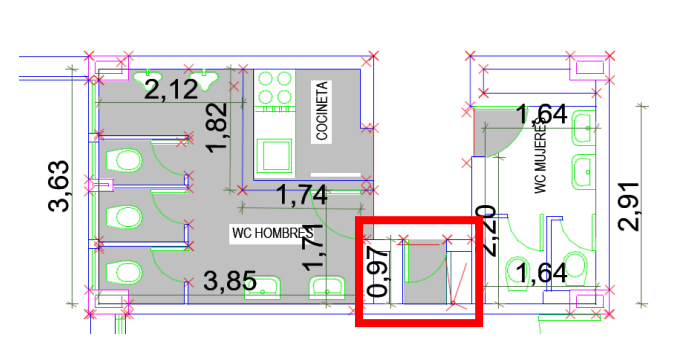

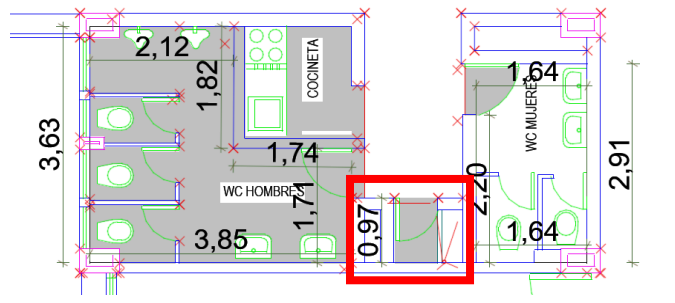



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
8.08	Accesorio PVCP 1" suministro e instalación	und	4.00

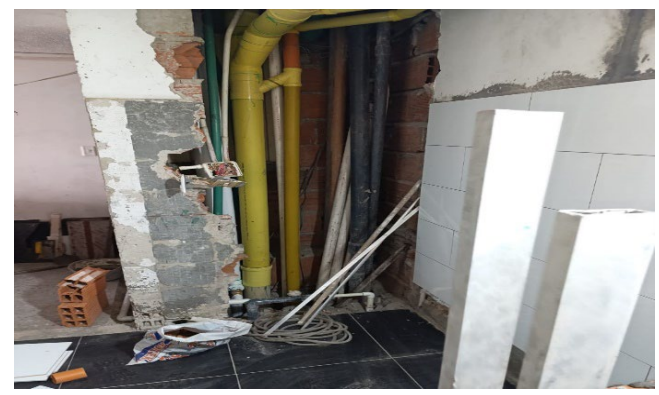LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
							
Subtotal						**4.00**	
CANTIDAD TOTAL						**4.00**	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA	**ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CONSORCIO INTERCONSULTORES

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
8.11	Accesorio PVCP 2" suministro e instalación	und	22.00


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
BAÑOS TORRE B Y TORRE A				22.00	1	22.00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

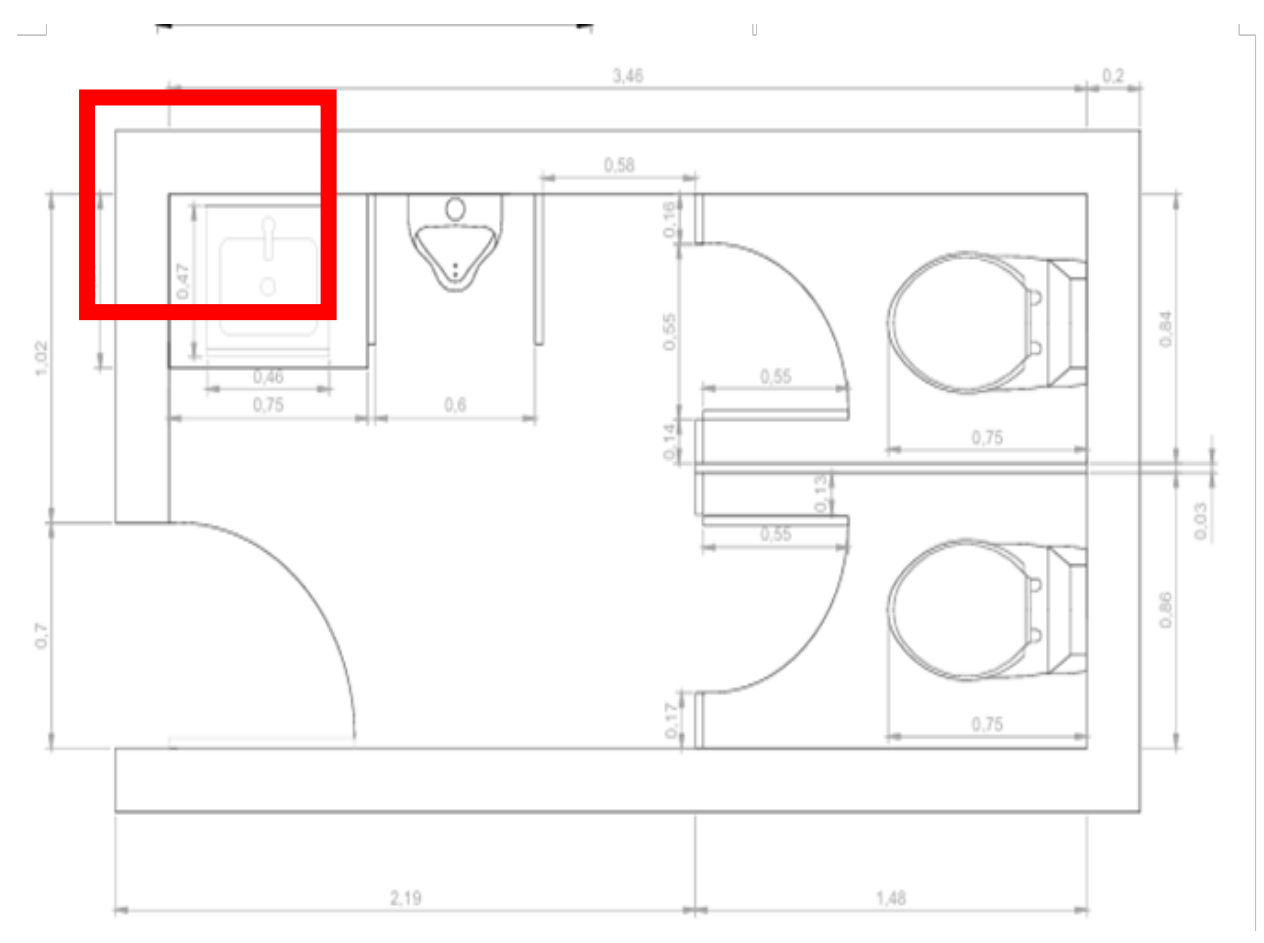

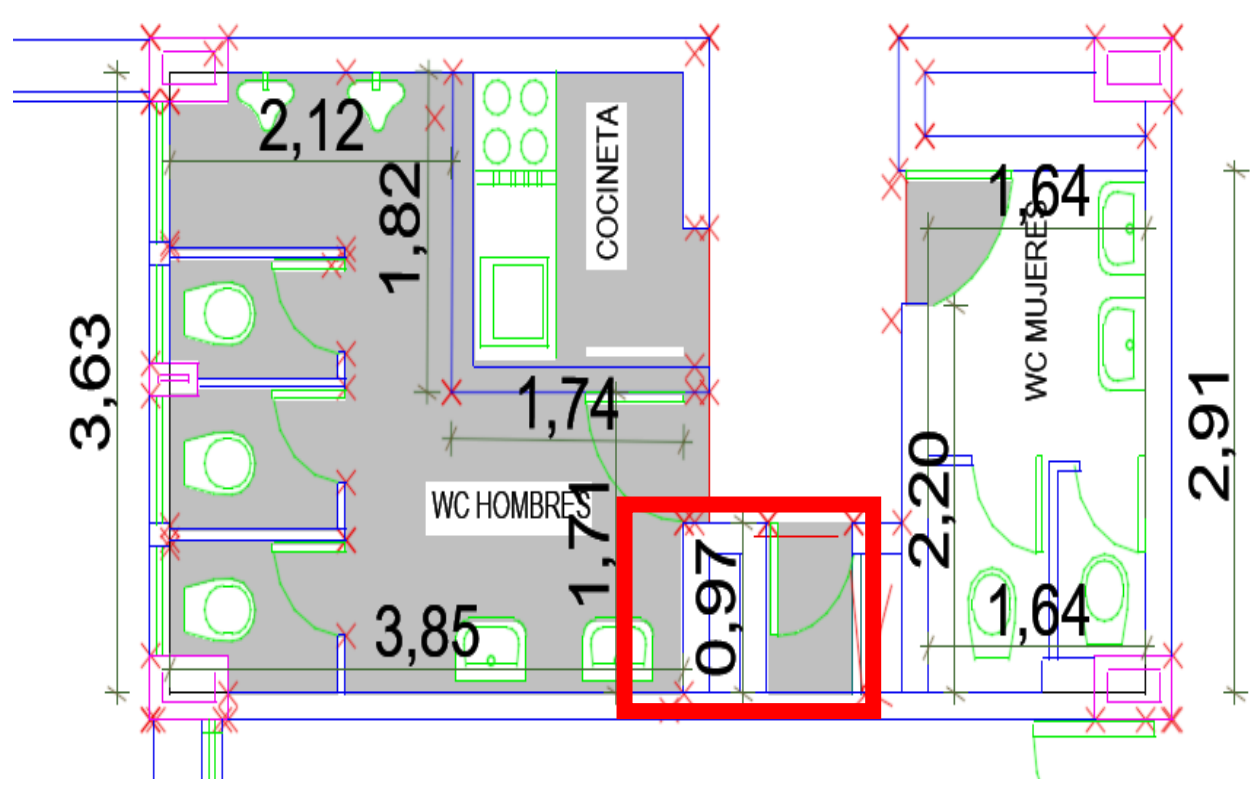



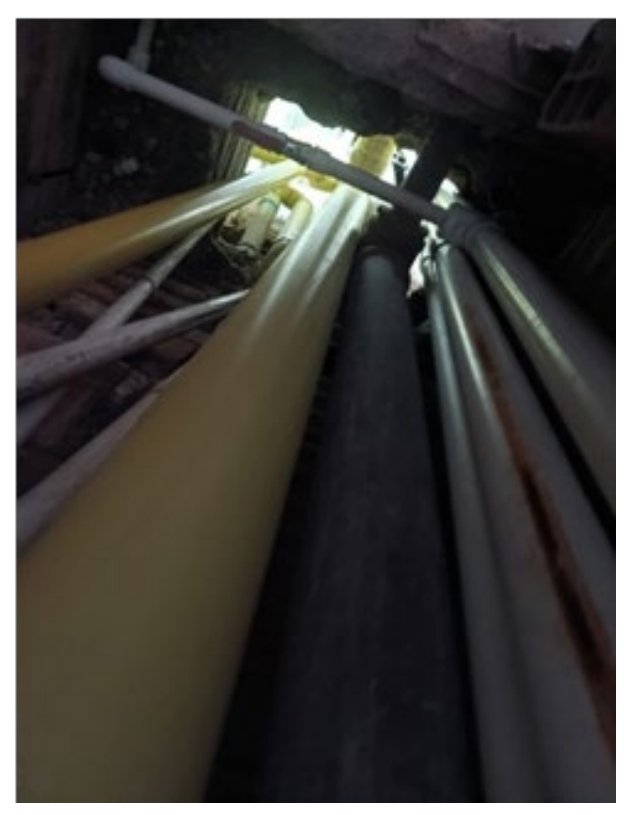

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
8.11	Accesorio PVCP 2" suministro e instalación	und	22.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
							 
Subtotal						22.00	
CANTIDAD TOTAL						22.00	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
13.01	Demolición manual pañete muros. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	m2	96.24

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OFICINA 101 TORRE A	9.00	2.60				23.40	
PISO 5 PASILLO ASCENSOR	2.50	0.50			3	3.75	
	6.42	0.50				3.21	
PISO 4 PASILLO ASCENSOR	2.50	0.50			3	3.75	
	4.68	0.50				2.34	
PISO 3 PASILLO ASCENSOR	2.50	0.50			3	3.75	
	4.45	0.50				2.23	
PISO 2 PASILLO ASCENSOR	2.50	0.50			3	3.75	
	3.79	0.50				1.90	
PISO 1 PASILLO ASCENSOR	2.50	0.50			3	3.75	
	4.91	0.50				2.45	
OFICINA 408	2.00	1.00				2.00	
PASILLO	2.50	0.60				1.50	
OFICINA 308	3.00	0.40				1.20	
PASILLO	1.00	0.60				0.60	
OFICINA 210	2.50	0.70				1.75	
ANTEPECHOS PISO 4, 3 Y 2 TORRE A	9.20	0.70			3	19.32	
	3.80	0.57			3	6.50	
ANTEPECHOS PISO 4 TORRE B	9.20	0.70			1	6.44	
	3.80	0.70			1	2.66	




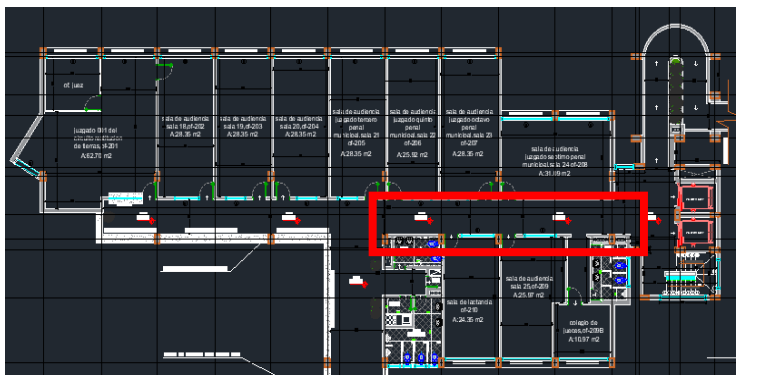

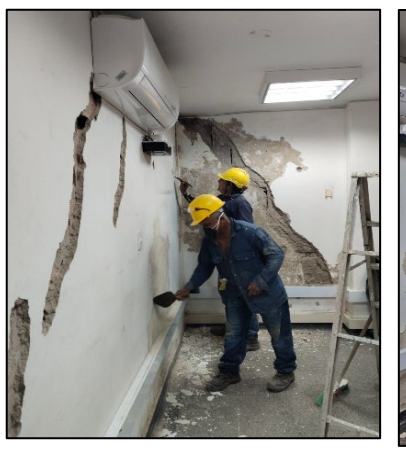

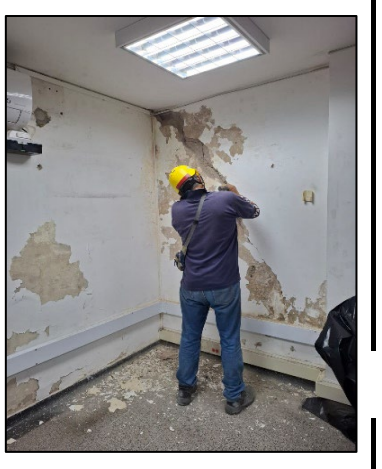



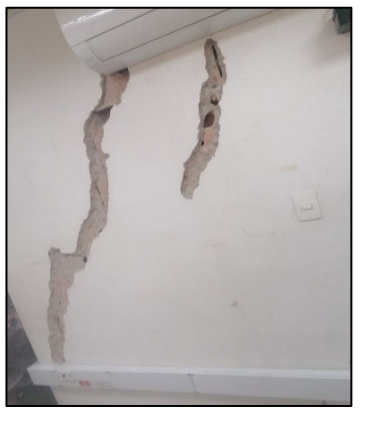

Subtotal						**96.24**
CANTIDAD TOTAL						**96.24**





OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.05	Pañete muro exterior y culatas, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	m2	190.33

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
ANTEPECHOS Y PASILLOS EXTERNOS TORRE A PISO 2	21.45	0.90				19.31	
	9.25	0.90				8.33	
	3.85	0.90				3.47	
	0.79	1.59				1.26	
	0.79	1.50				1.19	
	0.39	1.50				0.59	
	0.75	1.59				1.19	
	0.75	1.59				1.19	
	1.03	1.59				1.64	
	0.70	2.45				1.72	
	0.37	1.59				0.59	
	16.57	0.90				14.91	
ANTEPECHOS Y PASILLOS EXTERNOS TORRE A PISO 3	21.45	0.90				19.31	
	9.25	0.90				8.33	
	3.85	0.90				3.47	
	0.79	1.59				1.26	
	0.79	1.50				1.19	
	0.39	1.50				0.59	
	0.75	1.59				1.19	
	0.75	1.59				1.19	
	1.03	1.59				1.64	
	0.70	2.45				1.72	
	0.37	1.59				0.59	
	16.57	0.90				14.91	
	1.80	0.95				1.71	
ANTEPECHOS Y PASILLOS EXTERNOS TORRE A PISO 4	21.45	0.90				19.31	
	9.25	0.90				8.33	
	3.85	0.90				3.47	
	0.79	1.59				1.26	
	0.79	1.50				1.19	
	0.39	1.50				0.59	
	0.75	1.59				1.19	
	0.75	1.59				1.19	
	1.03	1.59				1.64	
	0.70	2.45				1.72	
	0.37	1.59				0.59	
	16.57	0.90				14.91	
	14.25	0.86				12.26	
	2.40	0.70				1.68	
	9.20	0.70				6.44	
	3.80	0.57				2.17	



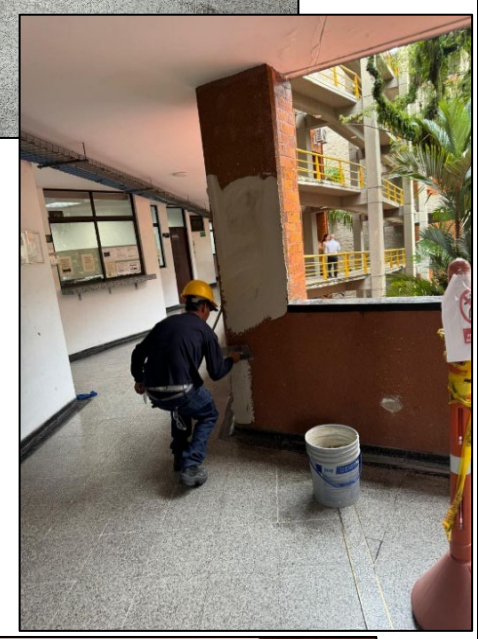



Subtotal	**190.33**	
CANTIDAD TOTAL	**190.33**	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA	**ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.06	Suministro e instalación de estuco plástico	m2	2224.55

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
oficina 101 torre A	11.00	2.60				28.60	
PISO 5 PASILLO ASCENSOR	0.35	3.74			1	1.31	
	0.97	3.74			1	3.63	
	4.54	3.74			1	16.98	
	0.98	3.74			1	3.67	
	0.53	2.56			1	1.36	
	0.21	3.46			1	0.73	
	1.74	3.46			1	6.02	
	2.02	3.46			1	6.99	
	1.18	1.79			1	2.11	
	0.34	2.56			1	0.87	
	6.51	3.74			1	24.35	
	-1.93	2.40			1	-4.63	
	-0.87	2.12			2	-3.69	
PISO 4 PASILLO ASCENSOR	4.54	2.50			1	11.35	
	0.48	2.50			1	1.20	
	1.95	2.78			1	5.42	
	2.02	2.78			1	5.62	
	0.32	2.50			1	0.80	
	5.17	2.50			1	12.93	
	0.45	2.50			1	1.13	
	-1.94	2.50			1	-4.85	
	-0.87	2.12			2	-3.69	
PISO 3 PASILLO ASCENSOR	0.95	2.50			1	2.38	
	4.54	2.50			1	11.35	
	1.45	2.50			1	3.63	
	1.92	2.83			1	5.43	
	2.03	2.79			1	5.66	
	0.33	2.50			1	0.83	
	5.14	2.50			1	12.85	
	-2.00	2.48			1	-4.96	
	-0.87	2.12			2	-3.69	
PISO 2 PASILLO ASCENSOR	1.28	2.50			1	3.20	
	0.86	2.50			1	2.15	
	1.12	2.50			1	2.80	
	3.74	2.50			1	9.35	
	2.40	2.77			1	6.65	
	2.01	2.75			1	5.53	
	0.34	2.50			1	0.85	
	5.14	2.50			1	12.85	
	-1.04	1.11			1	-1.15	
	-0.87	2.12			2	-3.69	



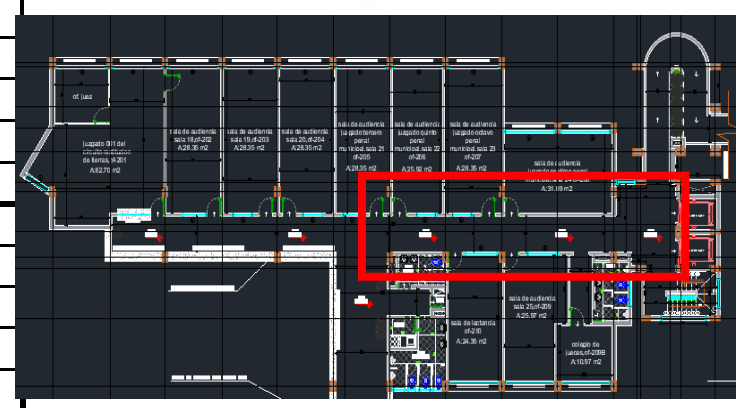

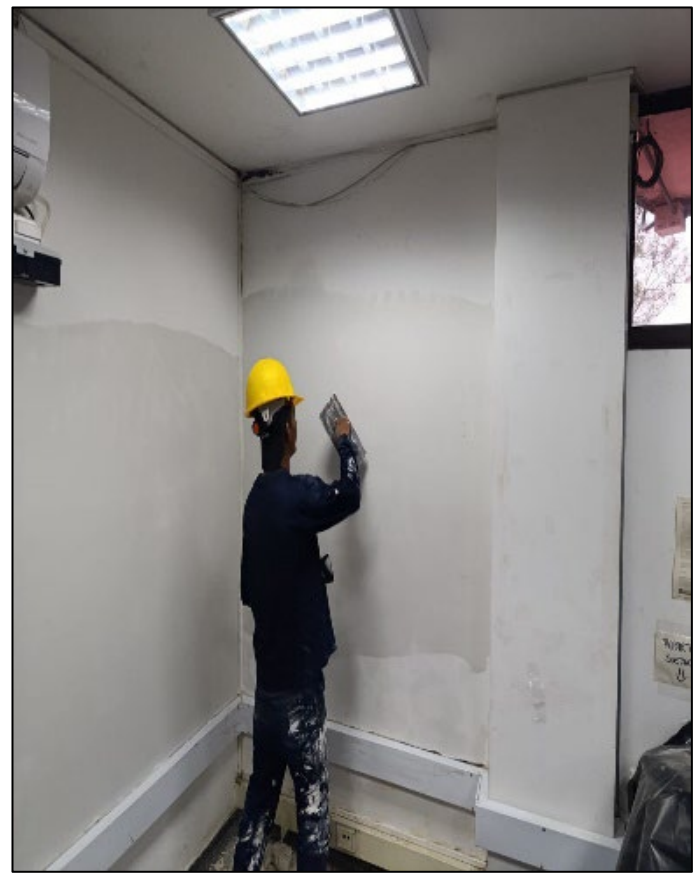

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.06	Suministro e instalación de estuco plástico	m2	2224.55

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
PISO 1 PASILLO ASCENSOR	3.18	2.50			1	7.95
	2.80	2.50			1	7.00
	2.40	2.79			1	6.70
	3.03	2.76			1	8.36
	5.14	2.50			1	12.85
	-0.87	2.12			2	-3.69
OFICINA 408	2.00	1.50			1	3.00
	6.60	2.44			1	16.10
PASILLO	3.94	2.44			1	9.61
OFICINA 308	2.00	1.00			1	2.00
	2.75	2.44			1	6.71
	6.60	2.44			1	16.10
	1.72	3.20			1	5.50
PASILLO	8.26	2.44			1	20.15
OFICINA 210	7.62	2.44			1	18.59
DESCUENTO PAPEL TAPIZ OFICINA 210	-2.00	1.00			1	-2.00
PASILLO	3.95	2.44			1	9.64
ANTEPECHOS Y PASILLOS EXTERNOS TORRE A PISO 2	21.45	0.90				19.31
	9.25	0.90				8.33
	3.85	0.90				3.47
	0.79	1.59				1.26
	0.79	1.50				1.19
	0.39	1.50				0.59
	0.75	1.59				1.19
	0.75	1.59				1.19
	1.03	1.59				1.64
	0.70	2.45				1.72
	0.37	1.59				0.59
	16.57	0.90				14.91
PASILLOS TORRE A PISO 1	22.46	2.44				54.80
	18.50	2.44				45.14
	12.40	2.44				30.26
	4.35	2.44				10.61
	6.50	2.44				15.86
	8.45	2.44				20.62
	6.49	2.44				15.84
	4.56	2.44				11.13
	4.76	2.44				11.61
PASILLOS TORRE A PISO 2	22.46	2.44				54.80
	18.50	2.44				45.14
	12.40	2.44				30.26
	4.35	2.44				10.61
	6.50	2.44				15.86

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.06	Suministro e instalación de estuco plástico	m2	2224.55

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
A PISO 2	8.45	2.44				20.62	
	6.49	2.44				15.84	
	4.56	2.44				11.13	
	4.76	2.44				11.61	
PASILLOS TORRE A PISO 3	22.46	2.44				54.80	
	18.50	2.44				45.14	
	12.40	2.44				30.26	
	4.35	2.44				10.61	
	6.50	2.44				15.86	
	8.45	2.44				20.62	
	6.49	2.44				15.84	
	4.56	2.44				11.13	
	4.76	2.44				11.61	
PASILLOS TORRE A PISO 4	22.46	2.44				54.80	
	18.50	2.44				45.14	
	12.40	2.44				30.26	
	4.35	2.44				10.61	
	6.50	2.44				15.86	
	8.45	2.44				20.62	
	6.49	2.44				15.84	
	4.56	2.44				11.13	
	4.76	2.44				11.61	
PASILLOS TORRE A PISO 5	22.46	2.44				54.80	
	18.50	2.44				45.14	
	12.40	2.44				30.26	
	4.35	2.44				10.61	
	6.50	2.44				15.86	
	8.45	2.44				20.62	
	6.49	2.44				15.84	
	4.56	2.44				11.13	
	4.76	2.44				11.61	
ANTEPECHOS EXTERNOS TORRE A PISO 3	21.45	0.90				19.31	
	9.25	0.90				8.33	
	3.85	0.90				3.47	
	0.79	1.59				1.26	
	0.79	1.50				1.19	
	0.39	1.50				0.59	
	0.75	1.59				1.19	
	0.75	1.59				1.19	
	1.03	1.59				1.64	
	0.70	2.45				1.72	
	0.37	1.59				0.59	
	16.57	0.90				14.91	
	1.80	0.95				1.71	
	21.45	0.90				19.31	
	9.25	0.90				8.33	
	3.85	0.90				3.47	

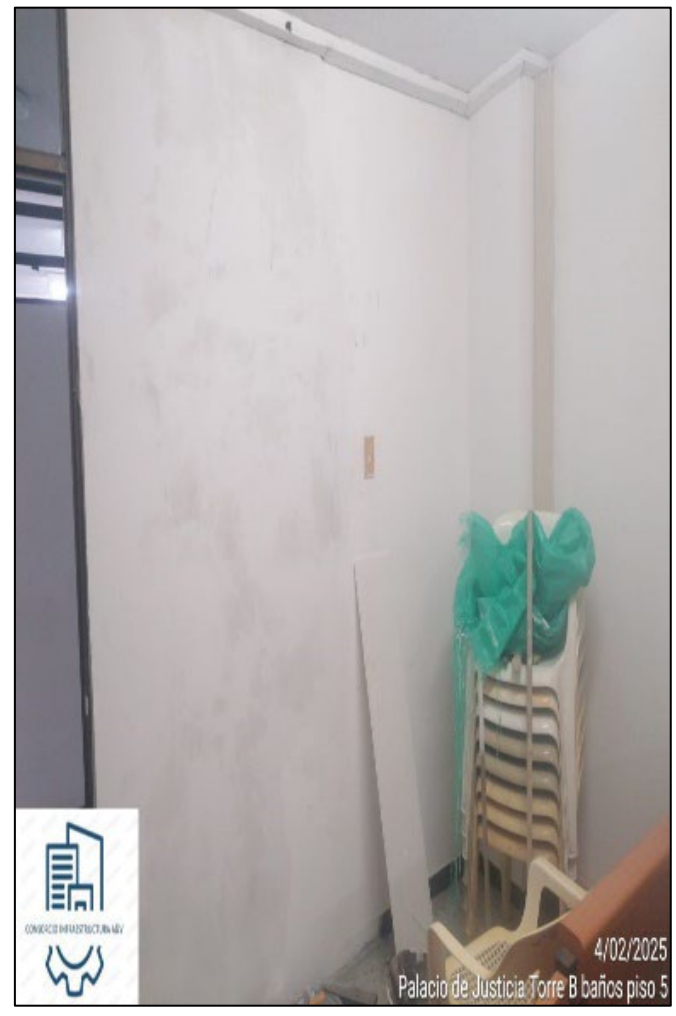

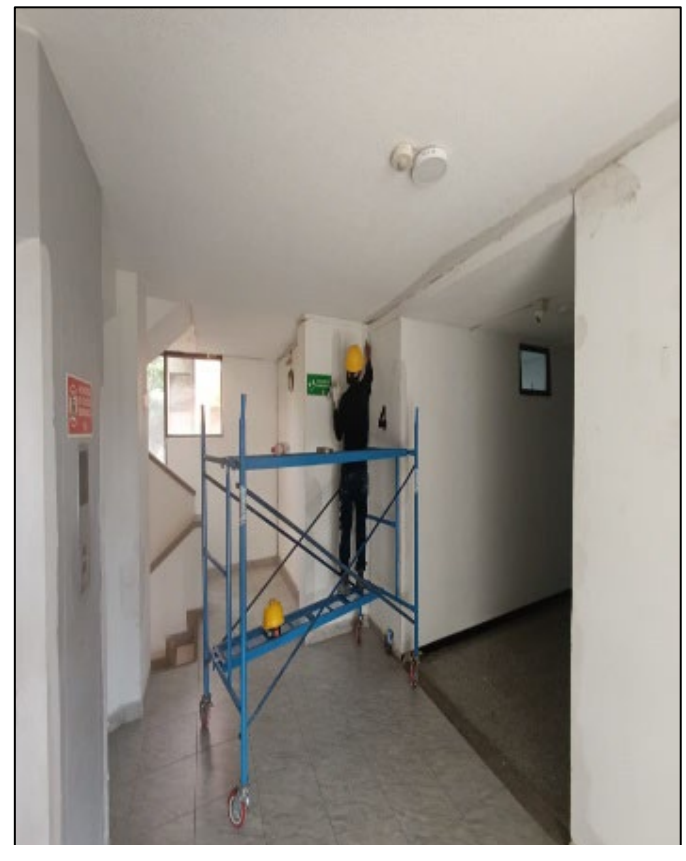

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.06	Suministro e instalación de estuco plástico	m2	2224.55

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
ANTEPECHOS EXTERNOS TORRE A PISO 4	0.79	1.59				1.26	
	0.79	1.50				1.19	
	0.39	1.50				0.59	
	0.75	1.59				1.19	
	0.75	1.59				1.19	
	1.03	1.59				1.64	
	0.70	2.45				1.72	
	0.37	1.59				0.59	
	16.57	0.90				14.91	
	14.25	0.86				12.26	
	2.40	0.70				1.68	
	9.20	0.70				6.44	
	3.80	0.57				2.17	
ANTEPECHOS PISO QUINTO TORRE A	21.45	0.90				19.31	
	9.25	0.90				8.33	
	3.85	0.90				3.47	
	0.79	1.59				1.26	
	0.79	1.50				1.19	
	0.39	1.50				0.59	
	0.75	1.59				1.19	
	0.75	1.59				1.19	
	1.03	1.59				1.64	
	0.70	2.45				1.72	
	0.37	1.59				0.59	
	16.57	0.90				14.91	
	14.25	0.86				12.26	
	2.40	0.70				1.68	
	9.20	0.70				6.44	
	3.80	0.57				2.17	
ESCALERA PUNTO FIJO ASCENSORES	2.80	3.90			5	54.60	
	1.60	2.80			5	22.40	
	2.50	3.70			5	46.25	
	3.80	1.65			5	31.35	
	1.00	-0.80			5	-4.00	
	1.50	-0.85			5	-6.38	
	1.10	-0.90			5	-4.95	
	1.10	3.70			5	20.35	
	1.20	0.40			5	2.40	
	1.00	0.45			5	2.25	
	1.50	0.20			5	1.50	
	2.45	0.20			5	2.45	
	1.40	0.45			5	3.15	
	2.00	0.20			5	2.00	
	2.45	0.20			5	2.45	
	2.45	0.20			5	2.45	
	1.00	0.20			3	0.60	



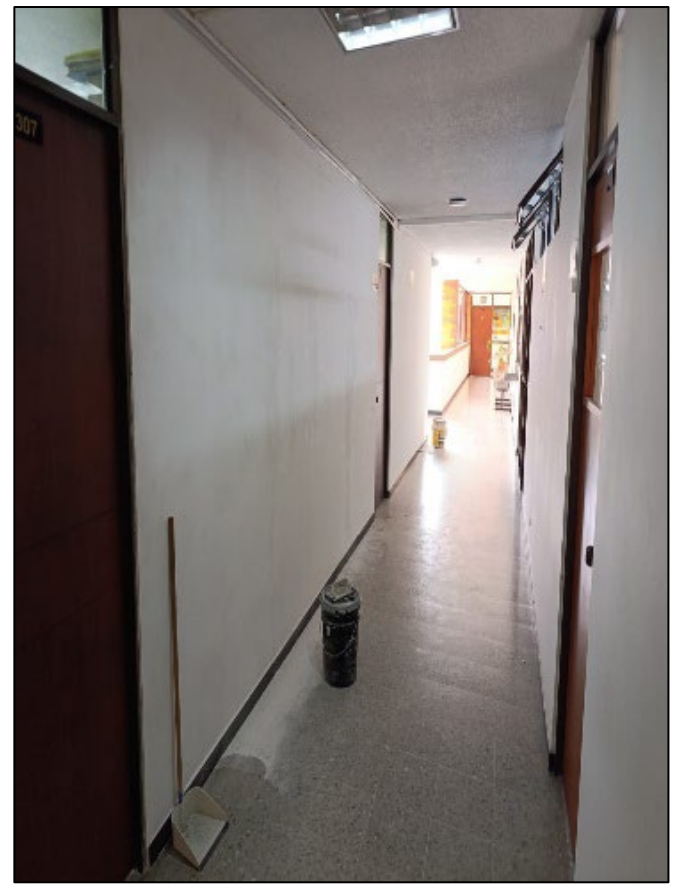

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.06	Suministro e instalación de estuco plástico	m2	2224.55

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
	1.00	0.20			5	1.00	
	2.45	2.40			5	29.40	
	1.50	2.40			5	18.00	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.06	Suministro e instalación de estuco plástico	m2	2224.55

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
ANTEPECHOS INTERNOS PISO 5	16.03	1.20				19.24	
	8.33	1.20				10.00	
	8.30	1.20				9.96	
	10.77	1.20				12.92	
	10.61	1.20				12.73	
	11.57	1.20				13.88	
ANTEPECHOS INTERNOS PISO 4	16.03	1.20				19.24	
	8.33	1.20				10.00	
	8.30	1.20				9.96	
	10.77	1.20				12.92	
	10.61	1.20				12.73	
	11.57	1.20				13.88	
ANTEPECHOS INTERNOS PISO 3	16.03	1.20				19.24	
	8.33	1.20				10.00	
	8.30	1.20				9.96	
	10.77	1.20				12.92	
	10.61	1.20				12.73	
	11.57	1.20				13.88	
ANTEPECHOS INTERNOS PISO 2	16.03	1.20				19.24	
	8.33	1.20				10.00	
	8.30	1.20				9.96	
	10.77	1.20				12.92	
	10.61	1.20				12.73	
	11.57	1.20				13.88	
Subtotal						**2224.55**	
CANTIDAD TOTAL						**2224.55**	



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.07	Pintura vinilo tipo 1 s/muro (alta calidad) 3 manos	m2	1482.89

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
oficina 101 torre A	11.00	2.60				28.60	
PISO 5 PASILLO ASCENSOR	0.35	3.74			1	1.31	
	0.97	3.74			1	3.63	
	4.54	3.74			1	16.98	
	0.98	3.74			1	3.67	
	0.53	2.56			1	1.36	
	0.21	3.46			1	0.73	
	1.74	3.46			1	6.02	
	2.02	3.46			1	6.99	
	1.18	1.79			1	2.11	
	0.34	2.56			1	0.87	
	6.51	3.74			1	24.35	
	-1.93	2.40			1	-4.63	
	-0.87	2.12			2	-3.69	
PISO 4 PASILLO ASCENSOR	4.54	2.50			1	11.35	
	0.48	2.50			1	1.20	
	1.95	2.78			1	5.42	
	2.02	2.78			1	5.62	
	0.32	2.50			1	0.80	
	5.17	2.50			1	12.93	
	0.45	2.50			1	1.13	
	-1.94	2.50			1	-4.85	
	-0.87	2.12			2	-3.69	
PISO 3 PASILLO ASCENSOR	0.95	2.50			1	2.38	
	4.54	2.50			1	11.35	
	1.45	2.50			1	3.63	
	1.92	2.83			1	5.43	
	2.03	2.79			1	5.66	
	0.33	2.50			1	0.83	
	5.14	2.50			1	12.85	
	-2.00	2.48			1	-4.96	
	-0.87	2.12			2	-3.69	
PISO 2 PASILLO ASCENSOR	1.28	2.50			1	3.20	
	0.86	2.50			1	2.15	
	1.12	2.50			1	2.80	
	3.74	2.50			1	9.35	
	2.40	2.77			1	6.65	
	2.01	2.75			1	5.53	
	0.34	2.50			1	0.85	
	5.14	2.50			1	12.85	
	-1.04	1.11			1	-1.15	
	-0.87	2.12			2	-3.69	

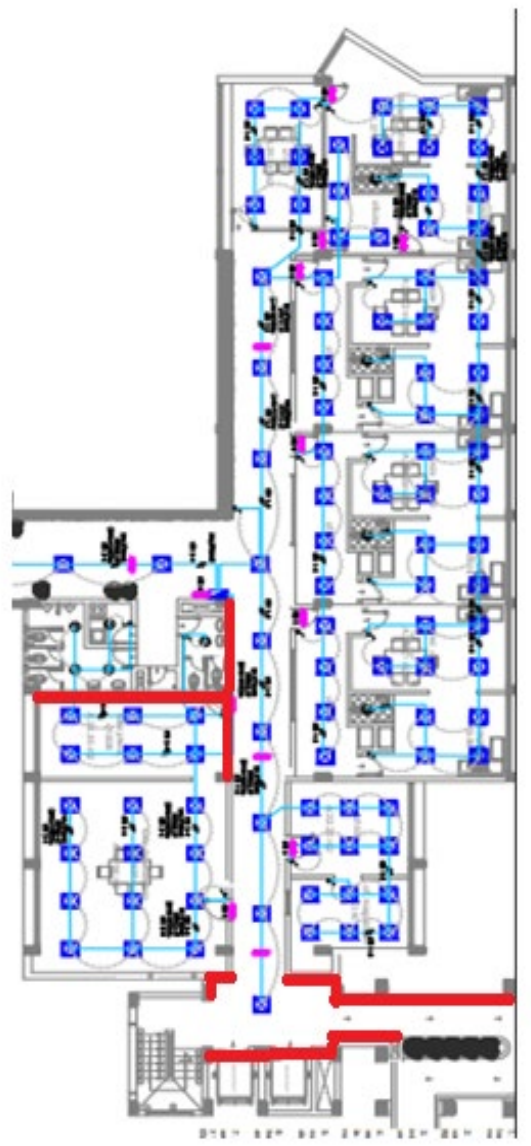




PISO 1 PASILLO ASCENSOR	3.18	2.50			1	7.95
	2.80	2.50			1	7.00
	2.40	2.79			1	6.70
	3.03	2.76			1	8.36
	5.14	2.50			1	12.85
	-0.87	2.12			2	-3.69
OFICINA 408	2.00	1.50			1	3.00
	6.60	2.44			1	16.10
PASILLO	3.94	2.44			1	9.61
OFICINA 308	2.00	1.00			1	2.00
	2.75	2.44			1	6.71
	6.60	2.44			1	16.10
	1.72	3.20			1	5.50
PASILLO	8.26	2.44			1	20.15
OFICINA 210	7.62	2.44			1	18.59
DESCUENTO PAPEL TAPIZ OFICINA 210	-2.00	1.00			1	-2.00
PASILLOS TORRE A PISO 1	22.46	2.44				54.80
	18.50	2.44				45.14
	12.40	2.44				30.26
	4.35	2.44				10.61
	6.50	2.44				15.86
	8.45	2.44				20.62
	6.49	2.44				15.84
	4.56	2.44				11.13
	4.76	2.44				11.61
PASILLOS TORRE A PISO 2	22.46	2.44				54.80
	18.50	2.44				45.14
	12.40	2.44				30.26
	4.35	2.44				10.61
	6.50	2.44				15.86
	8.45	2.44				20.62
	6.49	2.44				15.84
	4.56	2.44				11.13
	4.76	2.44				11.61
PASILLOS TORRE A PISO 3	22.46	2.44				54.80
	18.50	2.44				45.14
	12.40	2.44				30.26
	4.35	2.44				10.61
	6.50	2.44				15.86
	8.45	2.44				20.62
	6.49	2.44				15.84
	4.56	2.44				11.13
	4.76	2.44				11.61
PASILLOS TORRE A PISO 4	22.46	2.44				54.80
	18.50	2.44				45.14
	12.40	2.44				30.26
	4.35	2.44				10.61
	6.50	2.44				15.86
	8.45	2.44				20.62
	6.49	2.44				15.84
	4.56	2.44				11.13
	4.76	2.44				11.61
PASILLOS TORRE A PISO 5	22.46	2.44				54.80
	18.50	2.44				45.14
	12.40	2.44				30.26
	4.35	2.44				10.61
	6.50	2.44				15.86
	8.45	2.44				20.62
	6.49	2.44				15.84
	4.56	2.44				11.13
	4.76	2.44				11.61
PASILLO	3.95	2.44			1	9.64



ANTEPECHOS Y PASILLOS EXTERNOS TORRE A PISO 2	21.45	0.90				19.31
	9.25	0.90				8.33
	3.85	0.90				3.47
	0.79	1.59				1.26
	0.79	1.50				1.19
	0.39	1.50				0.59
	0.75	1.59				1.19
	0.75	1.59				1.19
	1.03	1.59				1.64
	0.70	2.45				1.72
	0.37	1.59				0.59
	16.57	0.90				14.91
ANTEPECHOS Y PASILLOS EXTERNOS TORRE A PISO 3	21.45	0.90				19.31
	9.25	0.90				8.33
	3.85	0.90				3.47
	0.79	1.59				1.26
	0.79	1.50				1.19
	0.39	1.50				0.59
	0.75	1.59				1.19
	0.75	1.59				1.19
	1.03	1.59				1.64
	0.70	2.45				1.72
	0.37	1.59				0.59
	16.57	0.90				14.91
	1.80	0.95				1.71
ANTEPECHOS Y PASILLOS EXTERNOS TORRE A PISO 4	21.45	0.90				19.31
	9.25	0.90				8.33
	3.85	0.90				3.47
	0.79	1.59				1.26
	0.79	1.50				1.19
	0.39	1.50				0.59
	0.75	1.59				1.19
	0.75	1.59				1.19
	1.03	1.59				1.64
	0.70	2.45				1.72
	0.37	1.59				0.59
	16.57	0.90				14.91
	14.25	0.86				12.26
	2.40	0.70				1.68
	9.20	0.70				6.44
	3.80	0.57				2.17
ANTEPECHOS PISO QUINTO TORRE A	21.45	0.90				19.31
	9.25	0.90				8.33
	3.85	0.90				3.47
	0.79	1.59				1.26
	0.79	1.50				1.19
	0.39	1.50				0.59
	0.75	1.59				1.19
	0.75	1.59				1.19
	1.03	1.59				1.64
	0.70	2.45				1.72
	0.37	1.59				0.59
	16.57	0.90				14.91
	14.25	0.86				12.26
	2.40	0.70				1.68
	9.20	0.70				6.44
	3.80	0.57				2.17



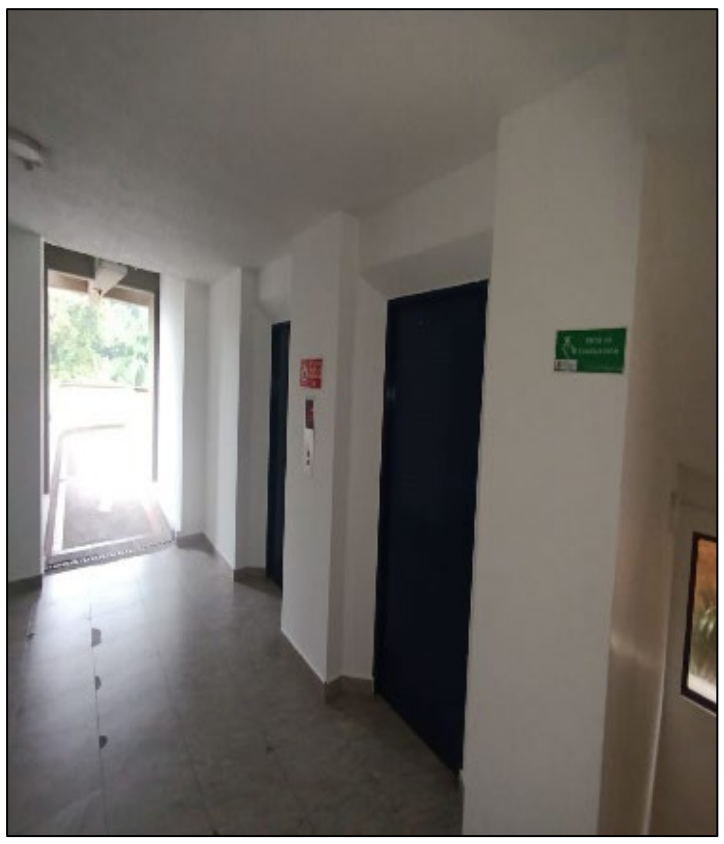

	2.80	3.90			5	54.60
	1.60	2.80			5	22.40
	2.50	3.70			5	46.25
	3.80	1.65			5	31.35
	1.00	-0.80			5	-4.00
	1.50	-0.85			5	-6.38
	1.10	-0.90			5	-4.95
	1.10	3.70			5	20.35
	1.20	0.40			5	2.40
ESCALERA PUNTO FIJO ASCENSORES	1.00	0.45			5	2.25
	1.50	0.20			5	1.50
	2.45	0.20			5	2.45
	1.40	0.45			5	3.15
	2.00	0.20			5	2.00
	2.45	0.20			5	2.45
	2.45	0.20			5	2.45
	1.00	0.20			3	0.60
	1.00	0.20			5	1.00
	2.45	2.40			5	29.40
	1.50	2.40			5	18.00
	16.03	1.20				19.24
	8.33	1.20				10.00
ANTEPECHOS INTERNOS PISO 5	8.30	1.20				9.96
	10.77	1.20				12.92
	10.61	1.20				12.73
	11.57	1.20				13.88
	16.03	1.20				19.24
	8.33	1.20				10.00
ANTEPECHOS INTERNOS PISO 4	8.30	1.20				9.96
	10.77	1.20				12.92
	10.61	1.20				12.73
	11.57	1.20				13.88
	16.03	1.20				19.24
	8.33	1.20				10.00
ANTEPECHOS INTERNOS PISO 3	8.30	1.20				9.96
	10.77	1.20				12.92
	10.61	1.20				12.73
	11.57	1.20				13.88
	16.03	1.20				19.24
	8.33	1.20				10.00
ANTEPECHOS INTERNOS PISO 2	8.30	1.20				9.96
	10.77	1.20				12.92
	10.61	1.20				12.73
	11.57	1.20				13.88
Subtotal						**2224.55**
CANTIDAD TOTAL						**1482.89**





66.66%

OBSERVACIONES:

ESTA CANTIDAD PRESENTADA EN ESTA MEMORIA de 2224.55 m2, SE COBRARÁ EL 66.66% CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE MANOS DE PINTURA EN EL BLOQUE A, ADICIONALMENTE LA ULTIMA MANO DE PINTURA NO HA REALIZADO POR PETICIÓN DE LA SUPERVISIÓN.

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.02	Estudio fotométrico iluminación	UND	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
ESTUDIO ENGENERAL				1.00		1.00	
Subtotal						1.00	
CANTIDAD TOTAL						1.00	

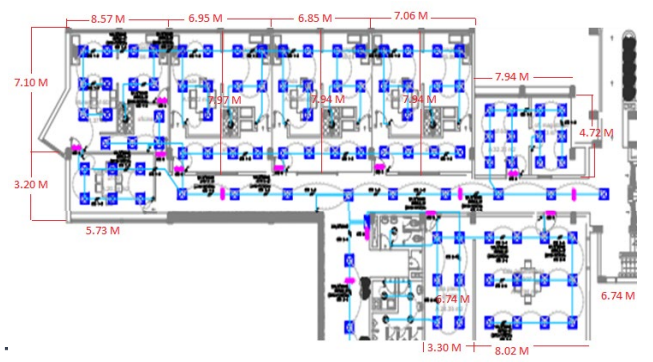

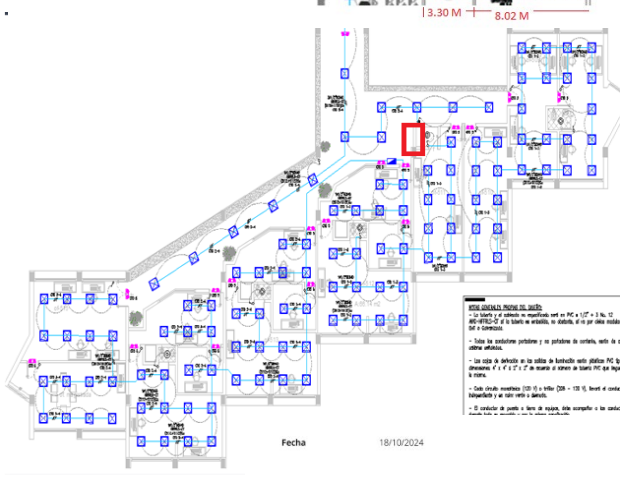

DIALux

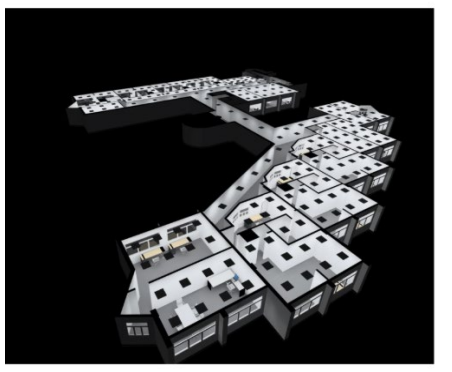

ESTUDIO DE ILUMINACION TORRE B PALACIO DE JUSTICIA VILLAVICENCIO - META

Los cálculos realizados se hicieron en base a la tabla 3.2.2.6.a Requisitos de iluminación de ambientes, áreas de trabajo, tarea visual y actividades en interiores

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 01	Demolición manual de mortero de nivelación Incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	M2	69.74

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 1 PISOS	2.08	1.62				3.37	
BAÑOS TORRE A PISO 1 PISOS	1.60	1.60				2.56	
BAÑOS TORRE A PISO 1 PISOS	2.33	1.60				3.73	
BAÑOS TORRE A PISO 2 PISOS	3.46	1.72				5.95	
BAÑOS TORRE A PISO 2 PISOS	3.46	1.63				5.64	
BAÑOS TORRE A PISO 3 HOMBRES	3.46	1.72				5.95	
BAÑOS TORRE A PISO 3 MUJERES	3.46	1.63				5.64	
BAÑOS TORRE A PISO 4 HOMBRES	3.46	1.72				5.95	
BAÑOS TORRE A PISO 4 MUJERES	3.46	1.63				5.64	
BAÑOS TORRE A PISO 5 HOMBRES	3.46	1.72				5.95	
BAÑOS TORRE A PISO 5 MUJERES	3.46	1.63				5.64	
BAÑOS MAGISTRADOS 5 PISO TORRE B ALA B	1.61	1.02			4	6.57	
BAÑOS MAGISTRADOS 5 PISO TORRE B ALA A	1.64	1.09			4	7.15	

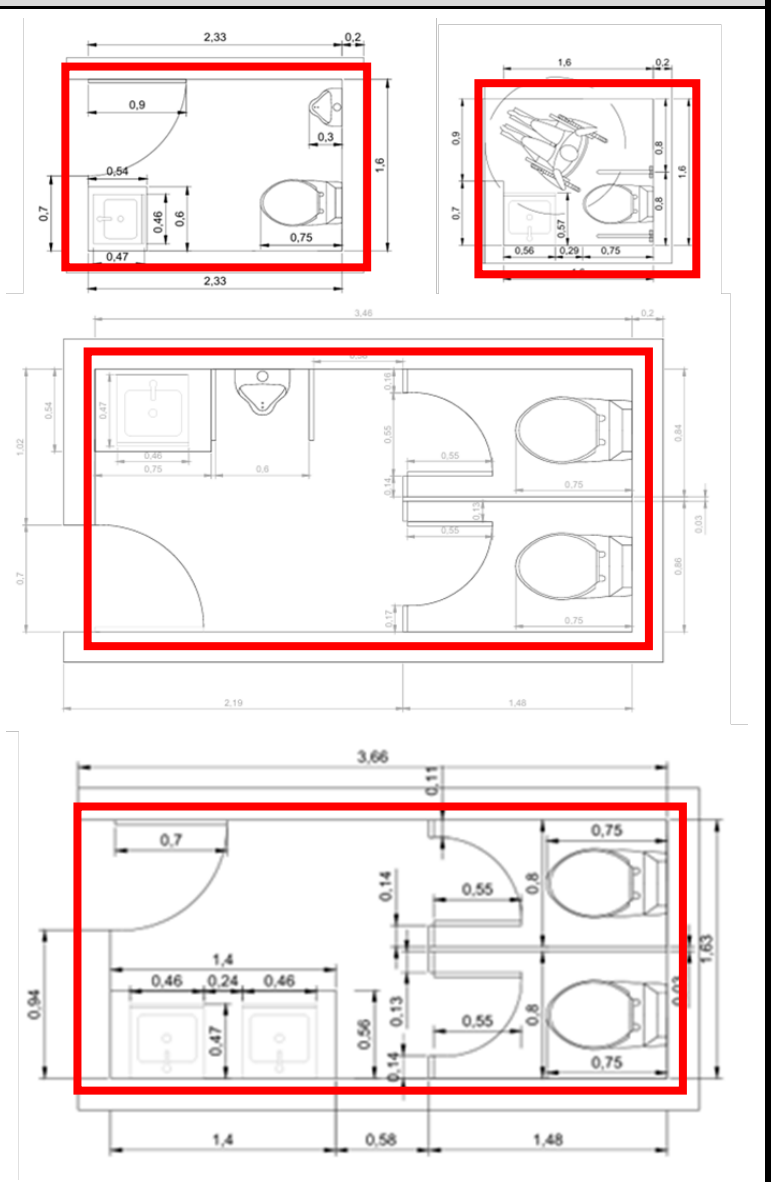

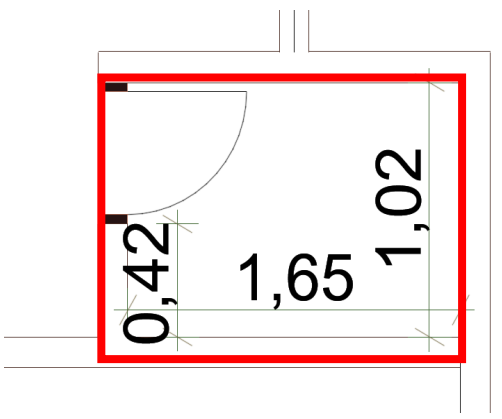

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 01	Demolición manual de mortero de nivelación Incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	M2	69.74

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
Subtotal						69.74
CANTIDAD TOTAL						69.74

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 02	Desmonte de puntos electricos tomas, interruptores, incluye desmonte de tubería, cableado, aparatos eléctricos. Incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	UND	167.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OFICINA INCLUYE BAÑO 501	NORMAL				2	2.00	
	REGULADA				1	1.00	
	VOZ Y DATOS				2	2.00	
	INTERRUPTOR				1	1.00	
OFICINA INCLUYE BAÑO 502	NORMAL				6	6.00	
	REGULADA				6	6.00	
	VOZ Y DATOS				6	6.00	
	INTERRUPTOR				4	4.00	
OFICINA INCLUYE BAÑO 503	NORMAL				6	6.00	
	REGULADA				6	6.00	
	VOZ Y DATOS				6	6.00	
	INTERRUPTOR				6	6.00	
OFICINA INCLUYE BAÑO 504	NORMAL				6	6.00	
	REGULADA				6	6.00	
	VOZ Y DATOS				6	6.00	
	INTERRUPTOR				6	6.00	
OFICINA INCLUYE BAÑO 505	NORMAL				6	6.00	
	REGULADA				6	6.00	
	VOZ Y DATOS				6	6.00	
	INTERRUPTOR				6	6.00	
OFICINA INCLUYE BAÑO 506	NORMAL				8	8.00	
	REGULADA				8	8.00	
	VOZ Y DATOS				8	8.00	
	INTERRUPTOR				2	2.00	
OFICINA INCLUYE BAÑO 507	NORMAL				2	2.00	
	REGULADA				1	1.00	
	VOZ Y DATOS				2	2.00	
	INTERRUPTOR				2	2.00	
OFICINA INCLUYE BAÑO 508	NORMAL				3	3.00	
	REGULADA				2	2.00	
	VOZ Y DATOS				1	1.00	
	INTERRUPTOR				1	1.00	
PASILLO TORRE B ALA B	NORMAL				6	6.00	

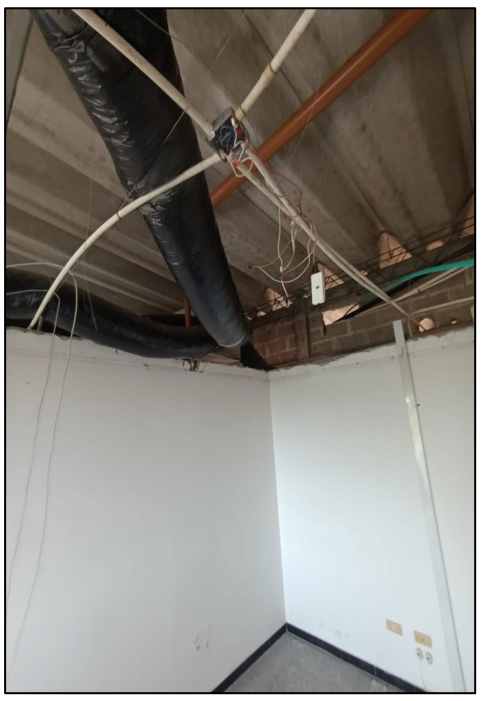



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 02	Desmonte de puntos electricos tomas, interruptores, incluye desmonte de tubería, cableado, aparatos eléctricos. Incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	UND	167.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS MUJERES TORRE A PISO 1	NORMAL				1	1.00	
	INTERRUPTOR				1	1.00	
BAÑOS HOMBRES TORRE A PISO 1	NORMAL				1	1.00	
	INTERRUPTOR				1	1.00	
BAÑOS DISCAPACITADOSTORRE A PISO 1	NORMAL				0	0.00	
	INTERRUPTOR				1	1.00	
BAÑOS HOMBRES TORRE A PISO 2	NORMAL				1	1.00	
	INTERRUPTOR				1	1.00	
BAÑOS MUJERES TORRE A PISO 2	NORMAL				1	1.00	
	INTERRUPTOR				1	1.00	
BAÑOS HOMBRES TORRE A PISO 3	NORMAL				1	1.00	
	INTERRUPTOR				1	1.00	
BAÑOS MUJERES TORRE A PISO 3	NORMAL				1	1.00	
	INTERRUPTOR				1	1.00	
BAÑOS HOMBRES TORRE A PISO 4	NORMAL				1	1.00	
	INTERRUPTOR				1	1.00	
BAÑOS MUJERES TORRE A PISO 4	NORMAL				1	1.00	
	INTERRUPTOR				1	1.00	
BAÑOS HOMBRES TORRE A PISO 5	NORMAL				1	1.00	
	INTERRUPTOR				1	1.00	
BAÑOS MUJERES TORRE A PISO 5	NORMAL				1	1.00	
	INTERRUPTOR				1	1.00	
Subtotal						**167.00**	
CANTIDAD TOTAL						**167.00**	

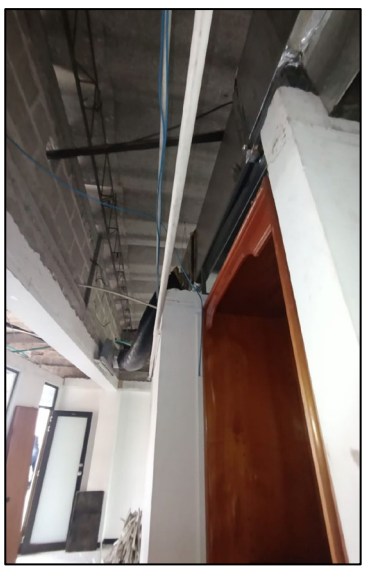



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 03	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	UND	129.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 1	SANITARIAS				12	12.00	
	HIDRAULICAS				7	7.00	
BAÑOS TORRE A PISO 2	SANITARIAS				14	14.00	
	HIDRAULICAS				8	8.00	
BAÑOS TORRE A PISO 3	SANITARIAS				14	14.00	
	HIDRAULICAS				8	8.00	
BAÑOS TORRE A PISO 4	SANITARIAS				13	13.00	
	HIDRAULICAS				8	8.00	
BAÑOS TORRE A PISO 5	SANITARIAS				12	12.00	
	HIDRAULICAS				8	8.00	
BAÑO OFICINA 502	SANITARIAS				3	3.00	
	HIDRAULICAS				2	2.00	
BAÑO OFICINA 503	SANITARIAS				3	3.00	
	HIDRAULICAS				2	2.00	
BAÑO OFICINA 504	SANITARIAS				3	3.00	
	HIDRAULICAS				2	2.00	
BAÑO OFICINA 505	SANITARIAS				3	3.00	
	HIDRAULICAS				2	2.00	
BAÑOS PISO 1 TORRE B	SANITARIAS				5	5.00	

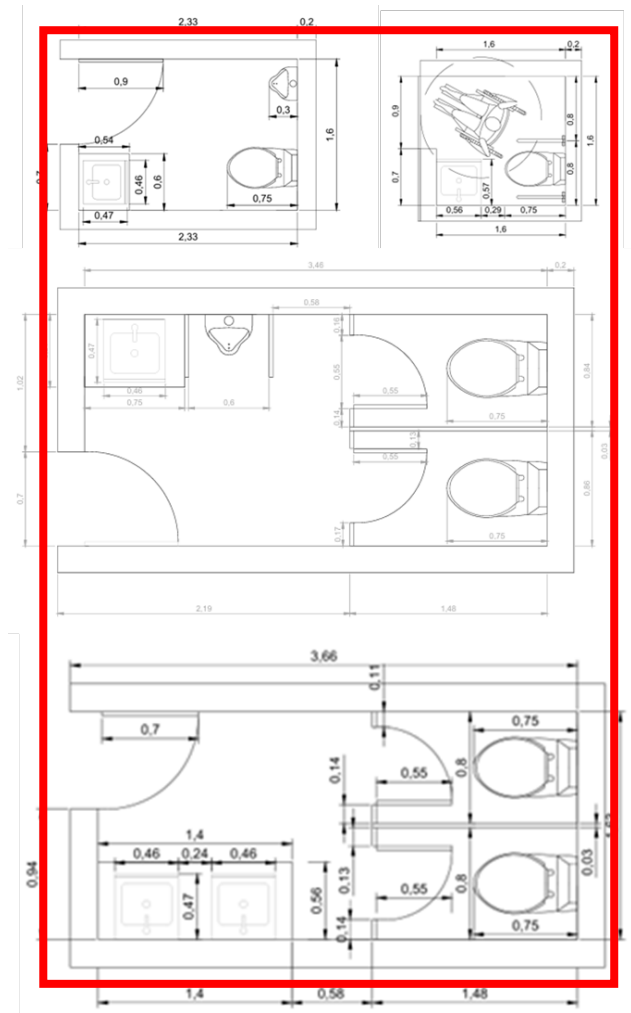

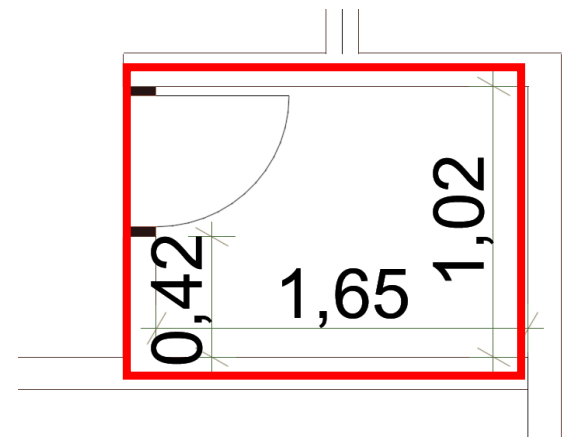

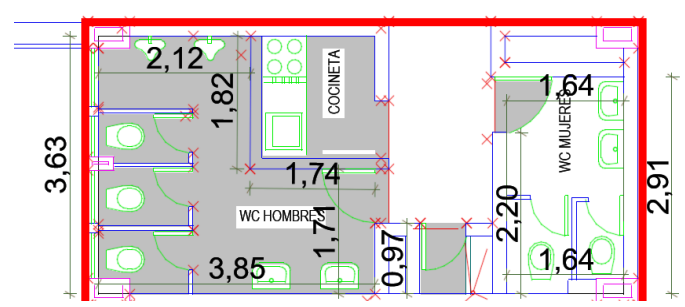

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 03	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	UND	129.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
							

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 03	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	UND	129.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				





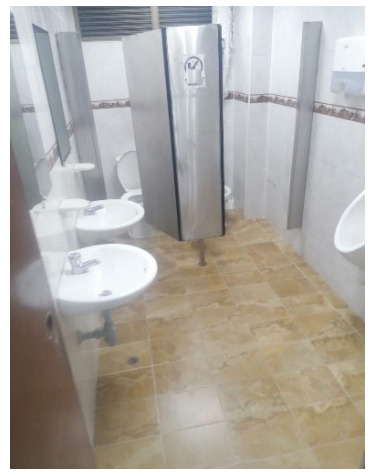

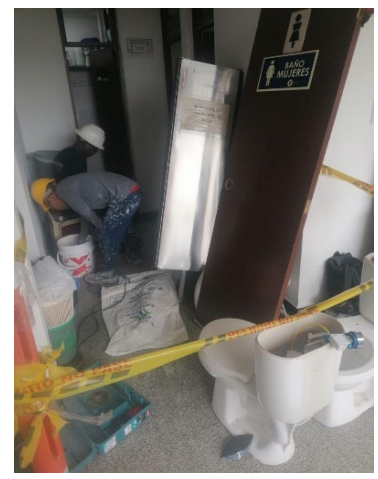

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 03	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	UND	129.00

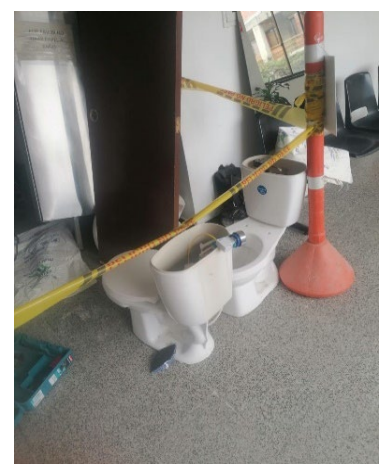LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
							
Subtotal						**129.00**	
CANTIDAD TOTAL						**129.00**	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 04	Desmonte de meson en concreto, incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	UND	5.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 5					2.00	2.00	
BAÑO OFICINA 502					1.00	1.00	
BAÑO TORRE B QUINTO PISO					2.00	2.00	

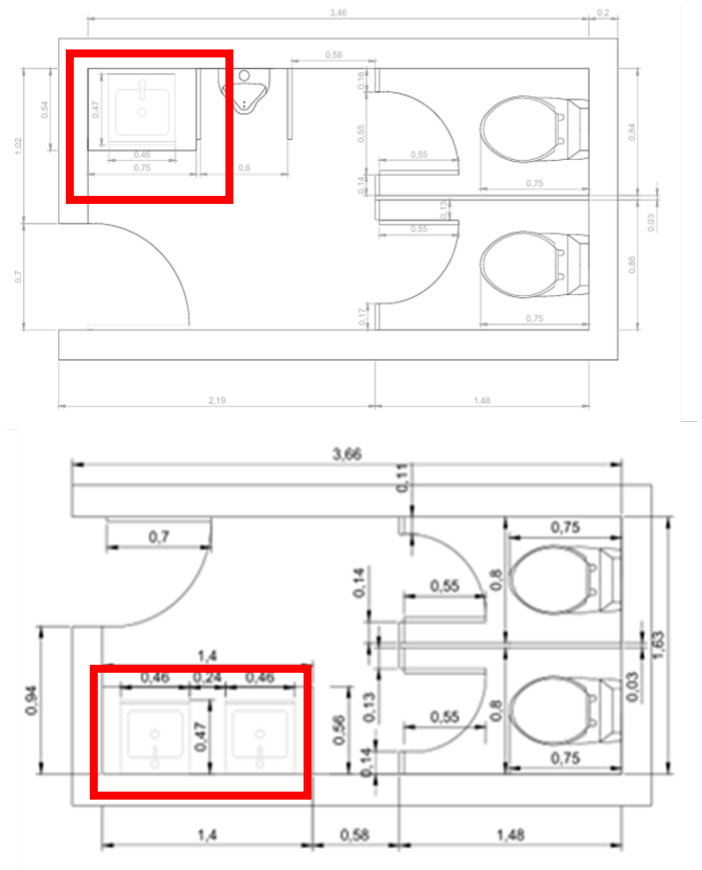

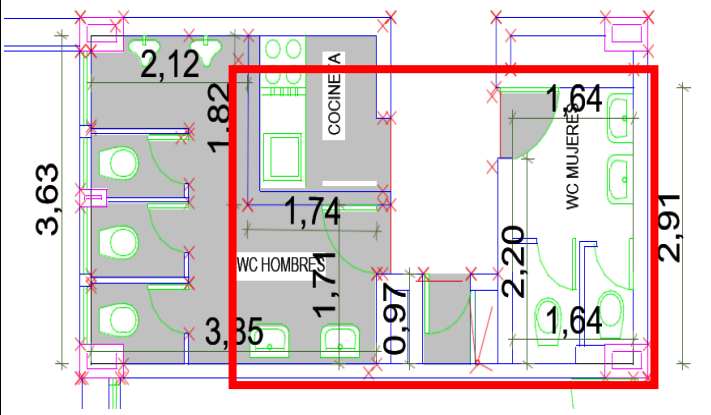

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 04	Desmonte de meson en concreto, incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	UND	5.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
Subtotal						5.00
CANTIDAD TOTAL						5.00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO



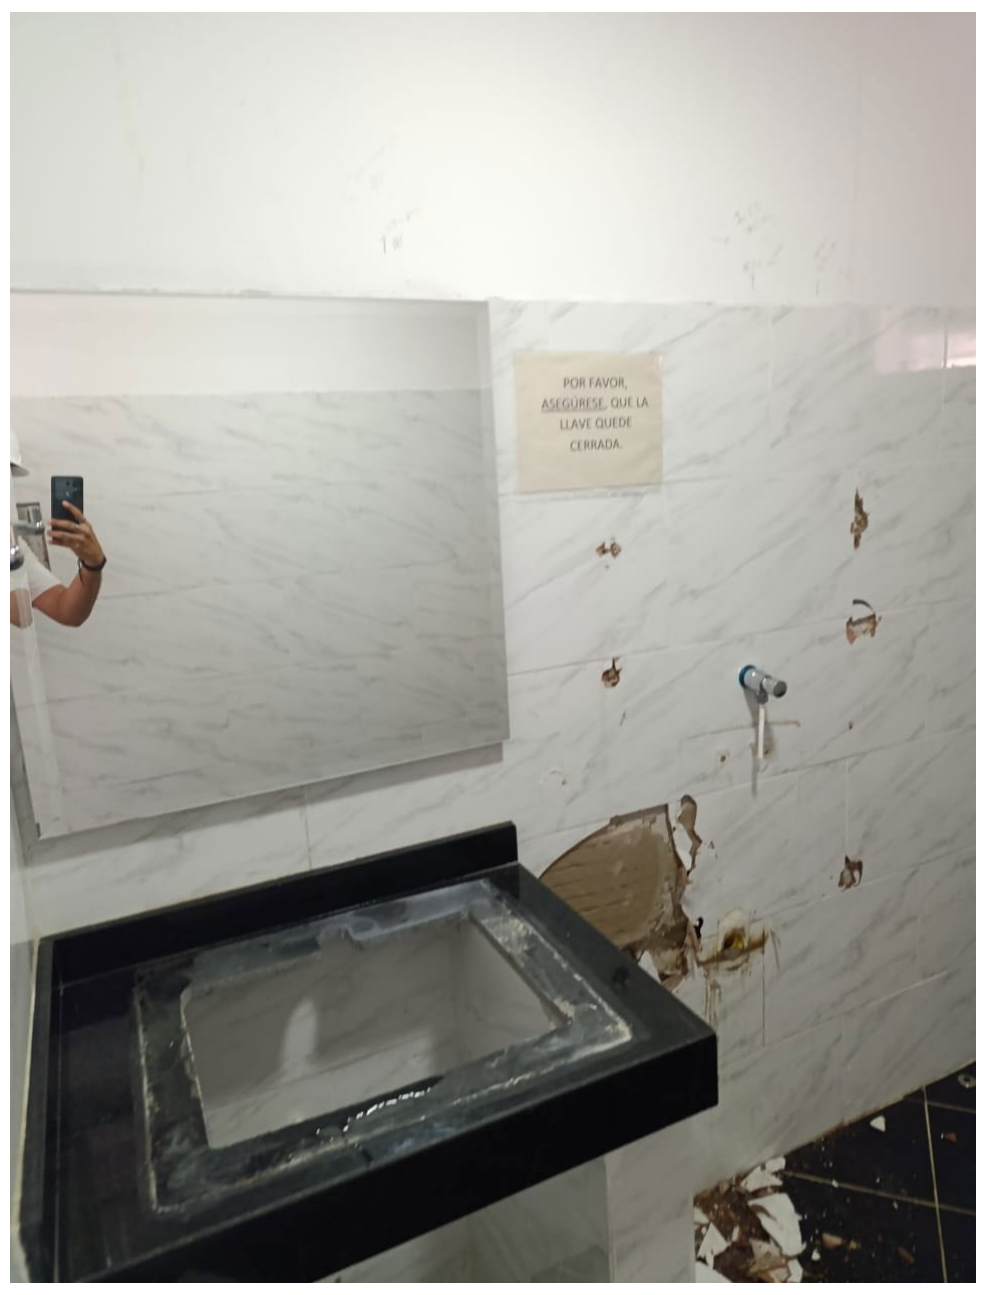

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 05	Desmonte de ducto flexible en aluminio,incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	ML	64.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
OF 502	2.00			6.00		12.00
OF 503	2.00			7.00		14.00
OF 504	2.00			7.00		14.00
OF 505	2.00			6.00		12.00
OF 507	2.00			6.00		12.00
						0.00
Subtotal						**64.00**
CANTIDAD TOTAL						**64.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

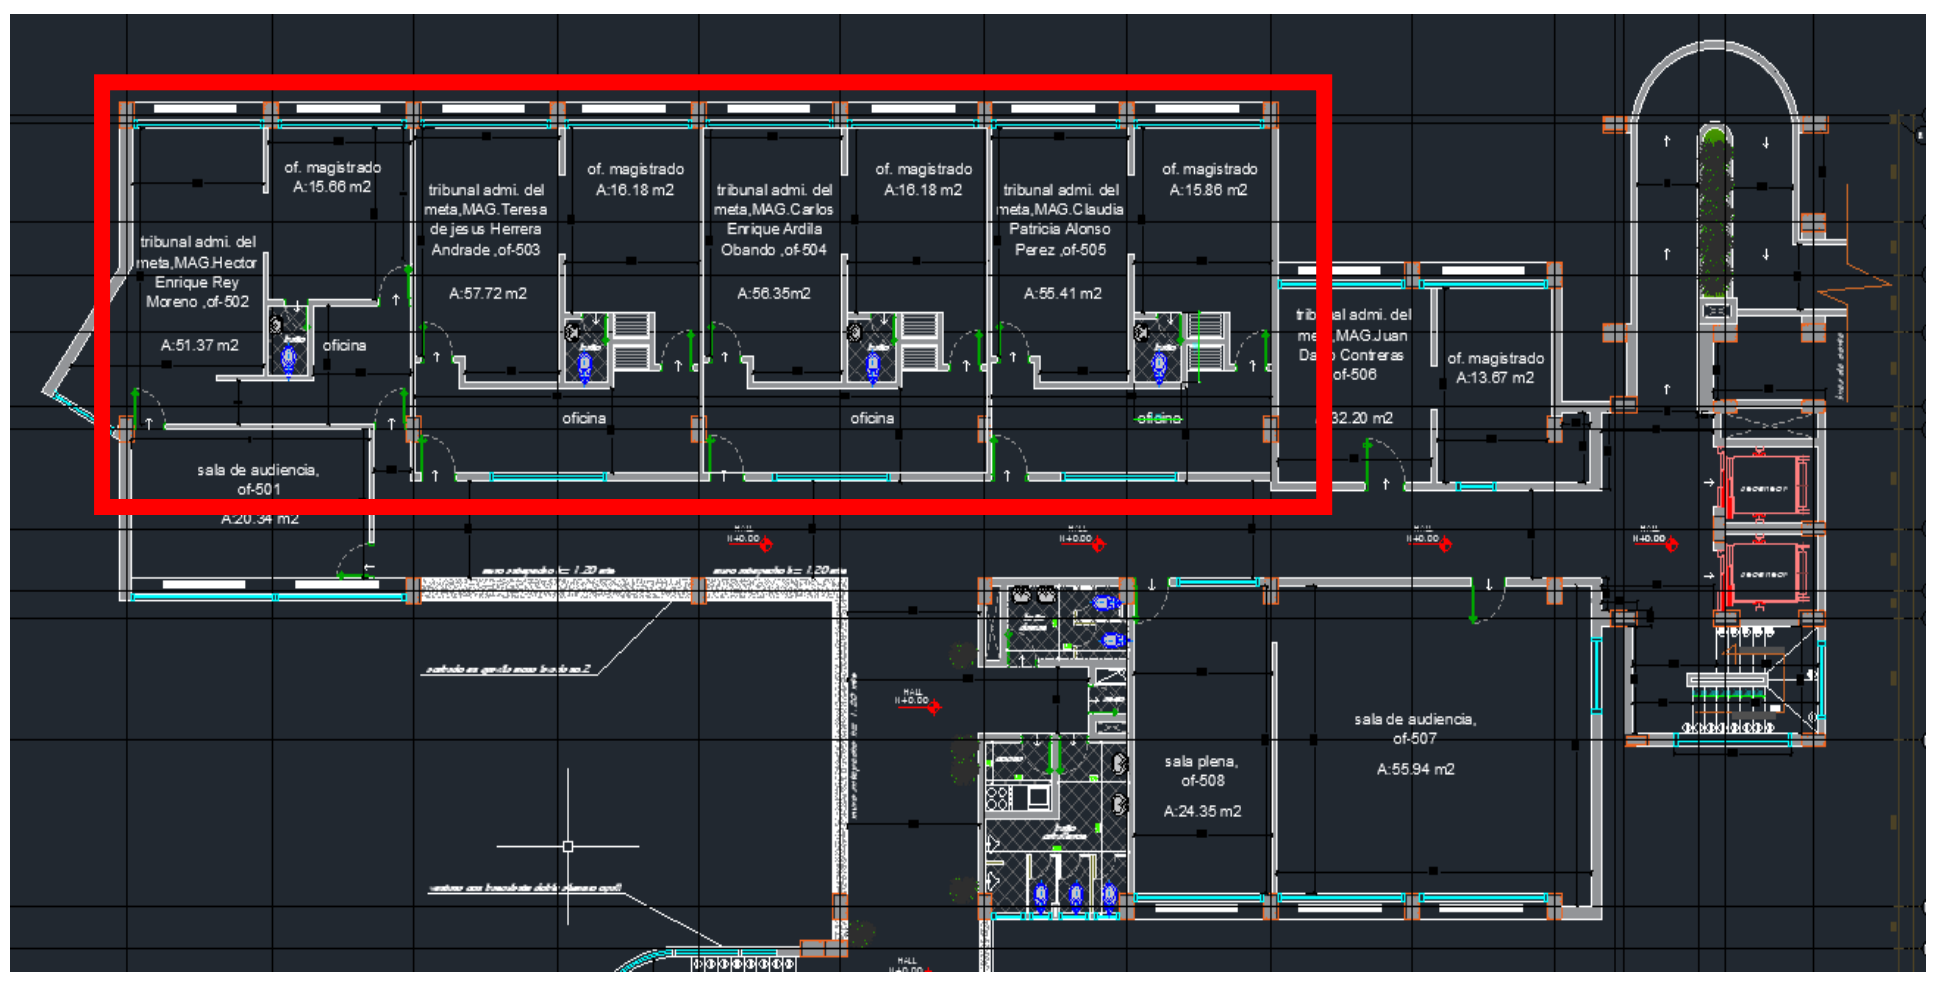





OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA	**ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 06	Desmonte de manejadoras de aire acondionado	UND	3.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
OFICINA 512					2	2.00
OFICINA 513					1	1.00
Subtotal						**3.00**
CANTIDAD TOTAL						**3.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

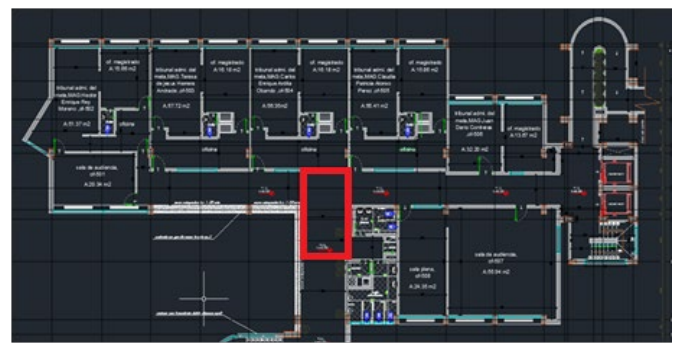

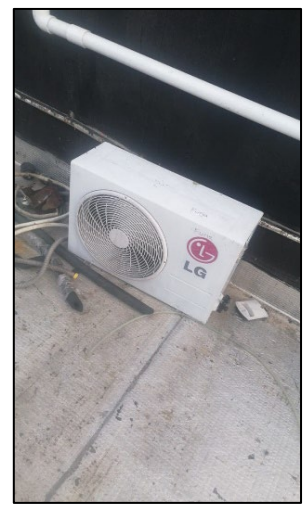



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 07	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoria 6, ponchado del cable y marcación	UND	80.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
OF 509					14	14.00
OF 510					14	14.00
OF 512					16	16.00
OF 513					16	16.00
OF 514					16	16.00
OF 515					4	4.00
Subtotal						**80.00**
CANTIDAD TOTAL						**80.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

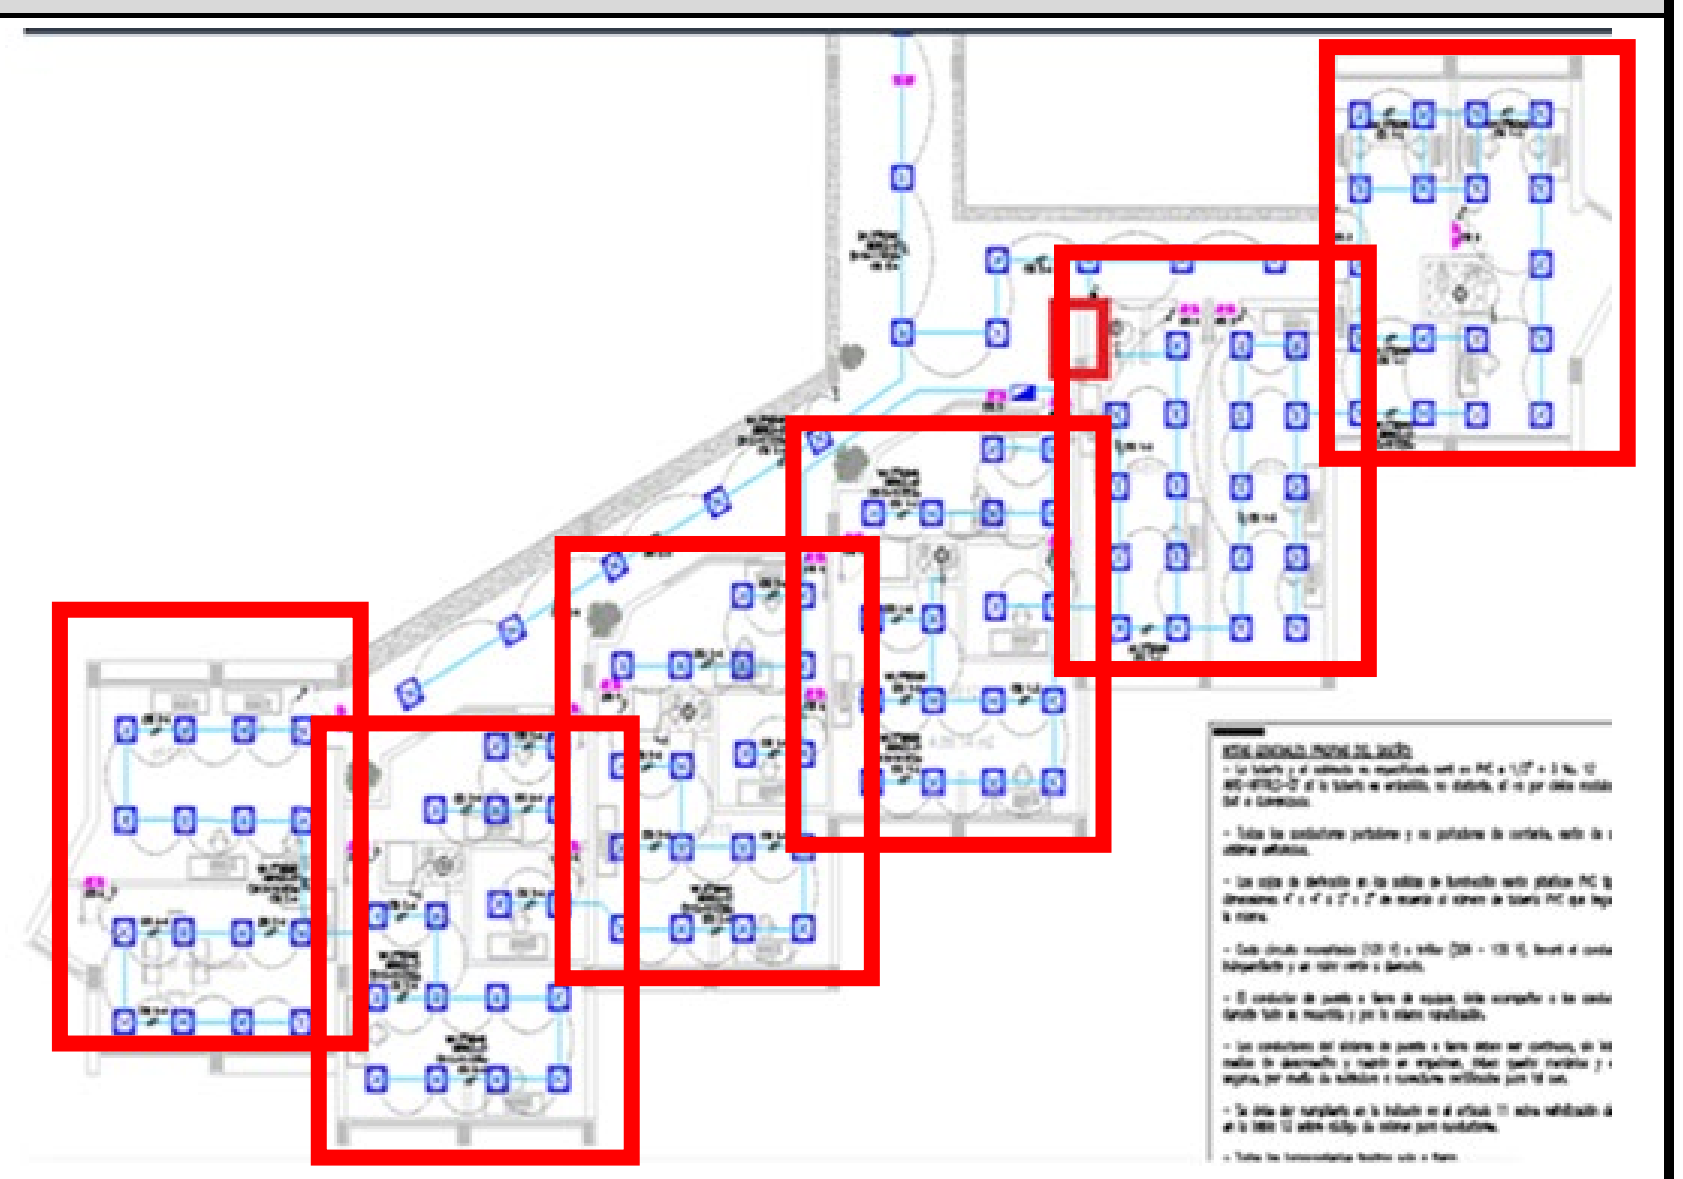









OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 08	Suministro e instalacion de cable utp cat 6A	ML	1300.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
SUMINISTRO DE CABLE UTP	1300.00					1300.00
Subtotal						**1300.00**
CANTIDAD TOTAL						**1300.00**


ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

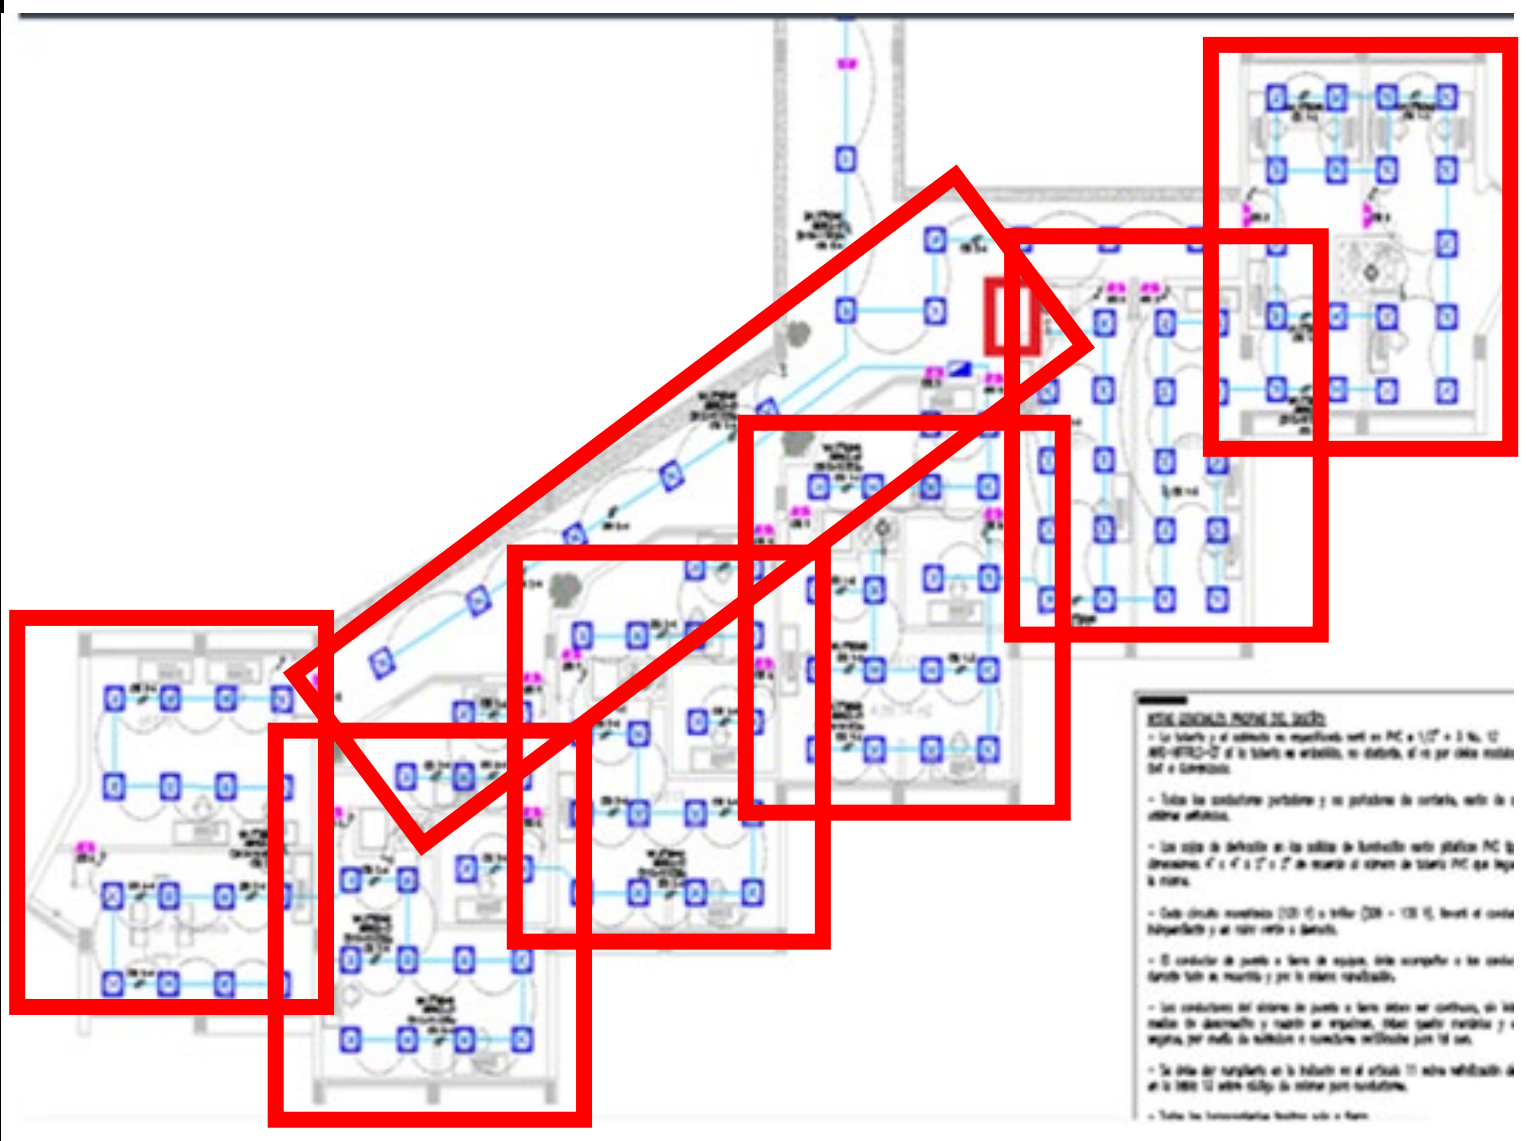







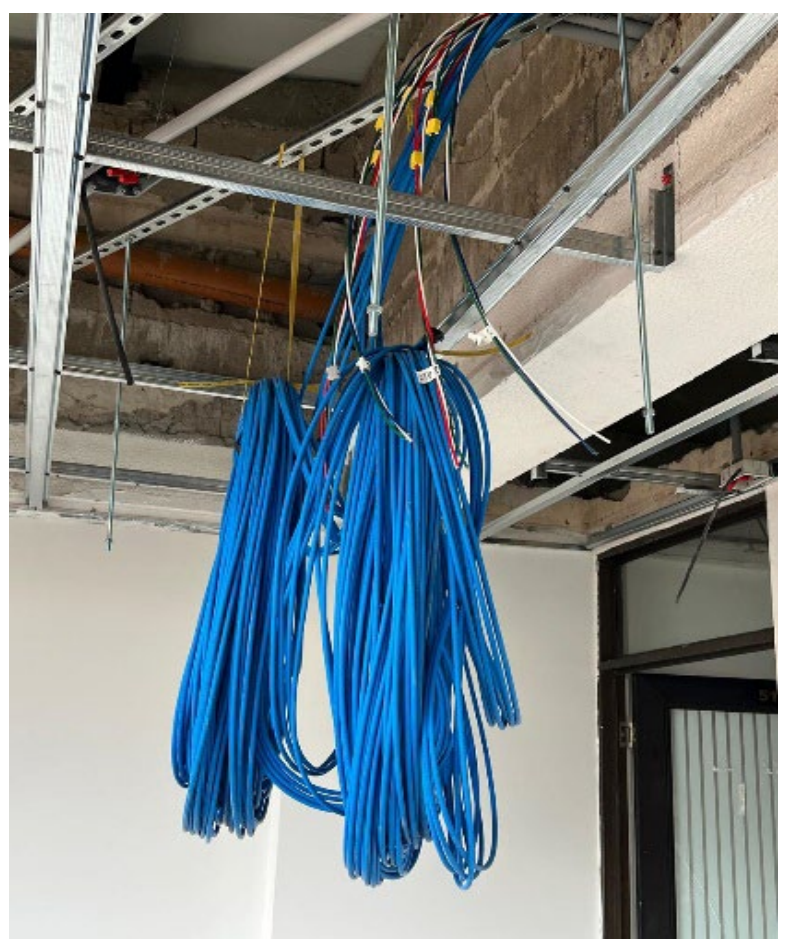

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 09	Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 2 m	UND	80.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
OF 509					14	14.00
OF 510					14	14.00
OF 512					16	16.00
OF 513					16	16.00
OF 514					16	16.00
OF 515					4	4.00
Subtotal						**80.00**
CANTIDAD TOTAL						**80.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

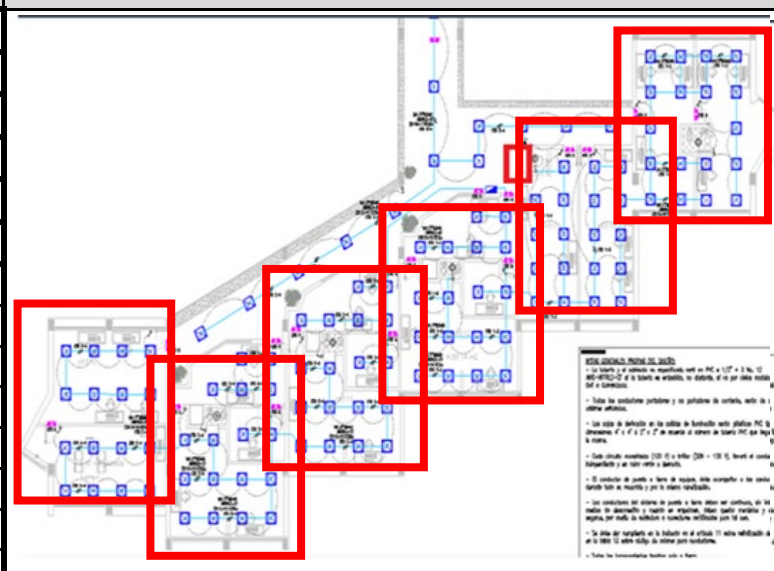



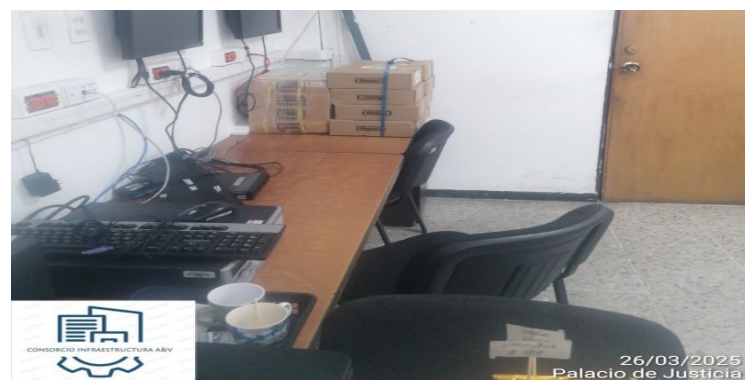

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 10	Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 1 m	UND	80.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
OF 509					14	14.00
OF 510					14	14.00
OF 512					16	16.00
OF 513					16	16.00
OF 514					16	16.00
OF 515					4	4.00
Subtotal						**80.00**
CANTIDAD TOTAL						**80.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

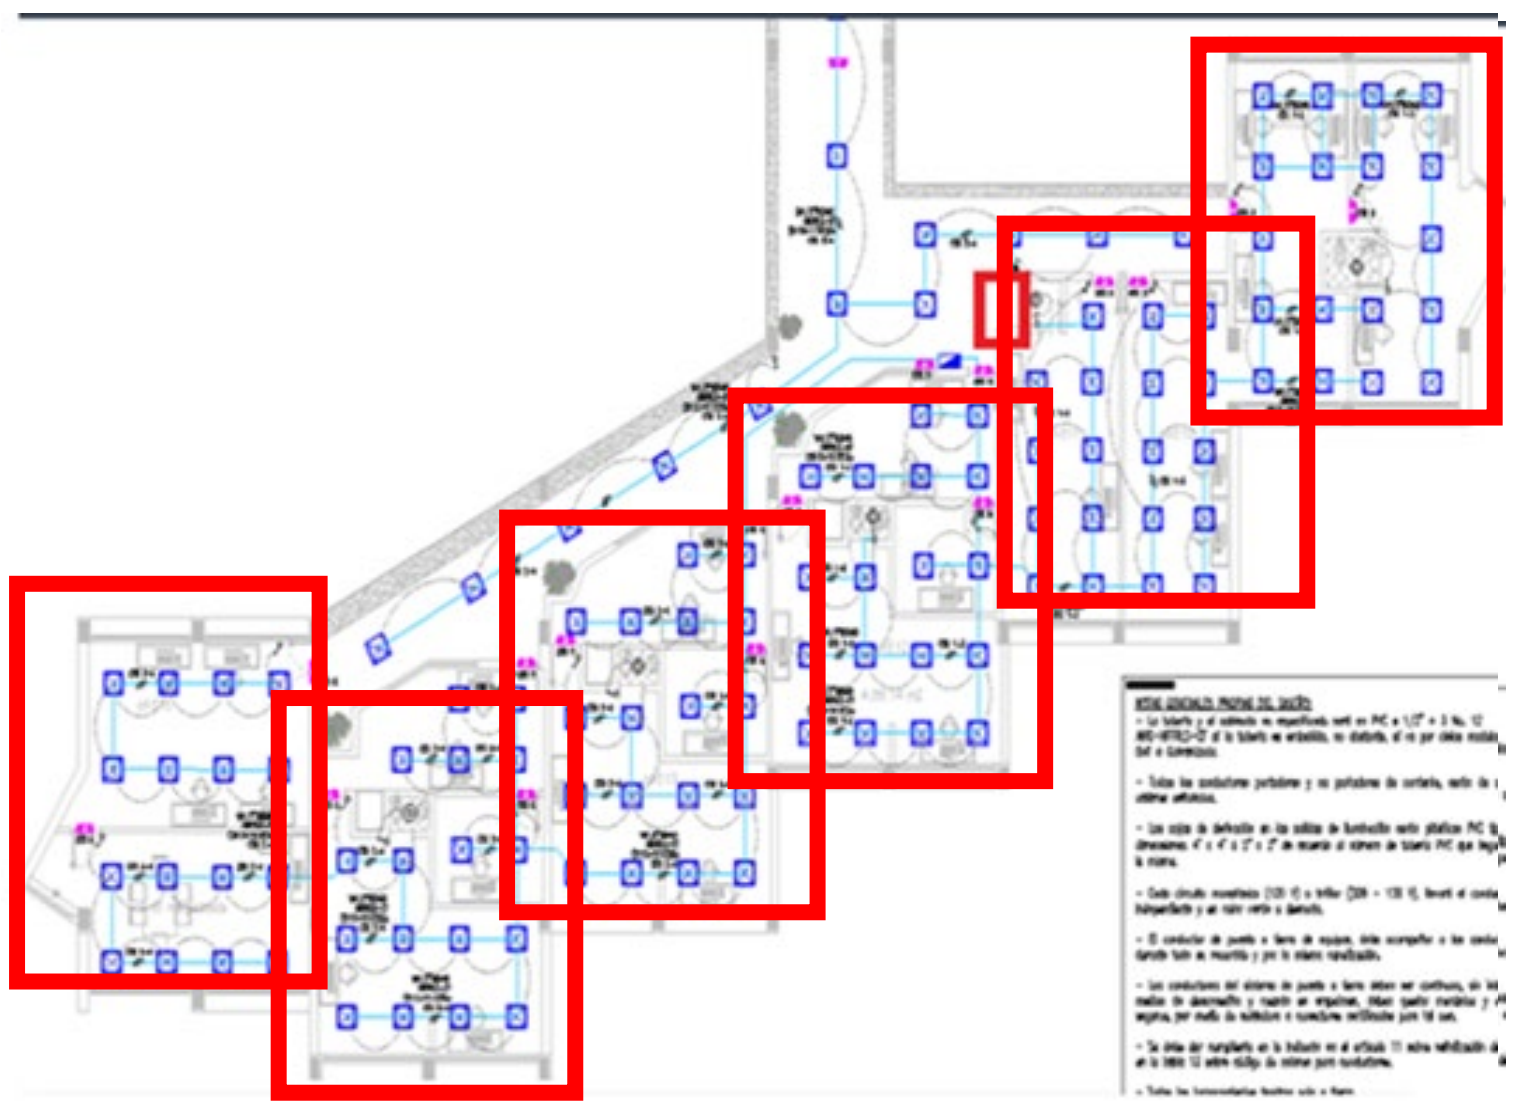



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 11	Salida tomacorriente doble tipo GFCI en tubo pvc 1/2"	UND	31.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OFICINA 509					1	1.00	
OFICINA 512					1	1.00	
OFICINA 513					1	1.00	
OFICINA 514					1	1.00	
BAÑOS TORRE A PISO 1					3	3.00	
BAÑOS TORRE A PISO 2					2	2.00	
BAÑOS TORRE A PISO 3					2	2.00	
BAÑOS TORRE A PISO 4					2	2.00	
BAÑOS TORRE A PISO 5					2	2.00	
BAÑOS TORRE B PISO 1					4	4.00	
BAÑOS TORRE B PISO 2					3	3.00	
BAÑOS TORRE B PISO 3					3	3.00	
BAÑOS TORRE B PISO 4					3	3.00	
BAÑOS TORRE B PISO 5					3	3.00	

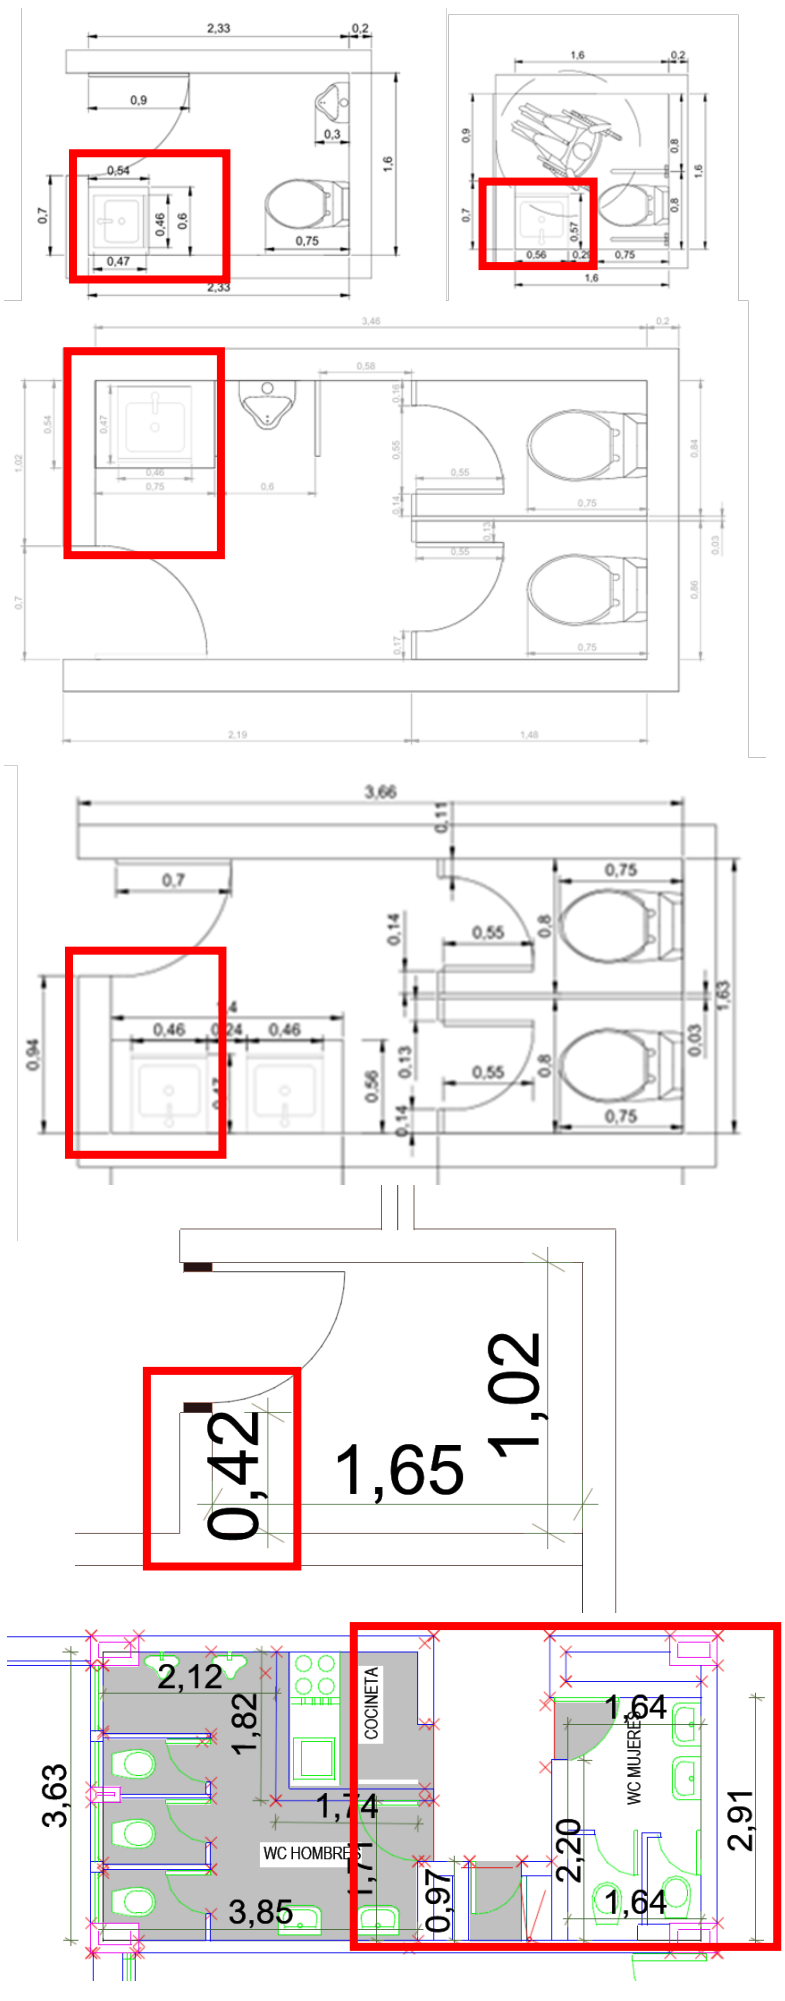

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 11	Salida tomacorriente doble tipo GFCI en tubo pvc 1/2"	UND	31.00

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
		Largo	Alto	MEDIA			
Subtotal							31.00
CANTIDAD TOTAL							31.00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

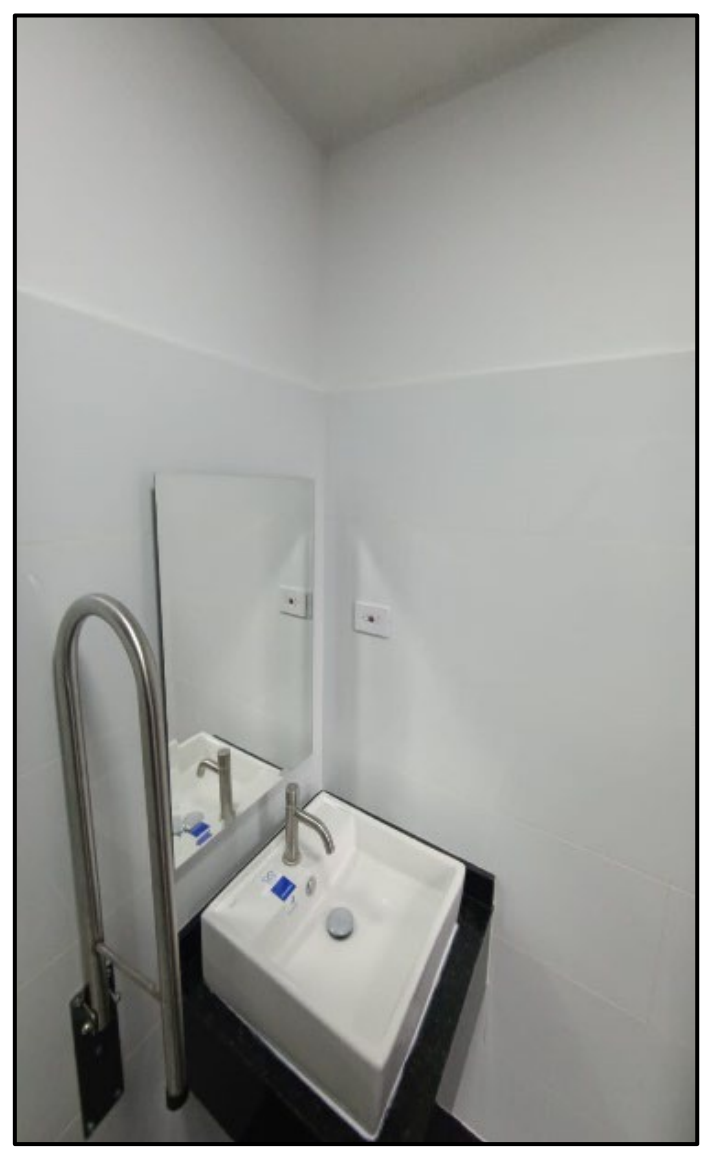

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 12	Suministro e instalacion de soporte en hierro con angulo de 1 1/2"X1/8" para unidad condensadora de aire acondicionado.	UND	9.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
UNIDADES CONDENSADORAS EN CUBIERTA ALA A				9.00		9.00	

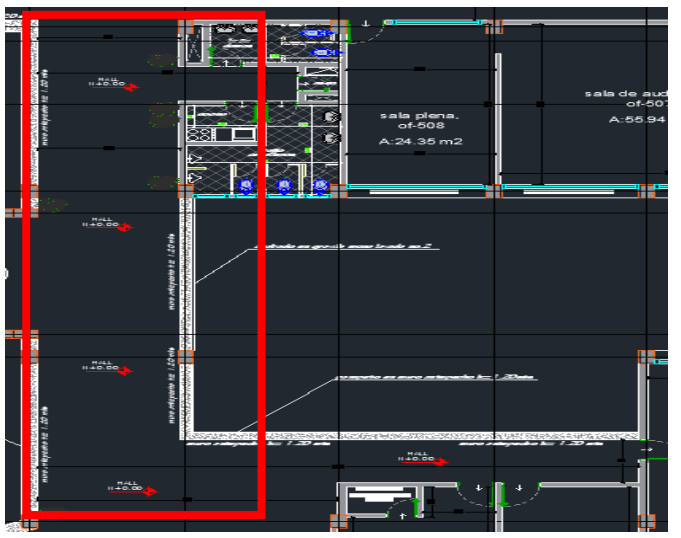









Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 12	Suministro e instalacion de soporte en hierro con angulo de 1 1/2"X1/8" para unidad condensadora de aire acondicionado.	UND	9.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						**9.00**	
CANTIDAD TOTAL						**9.00**	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 14	Remocion de graffiti sobre fachadas	M2	15.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
TORRE B	3.00	1.00			3	9.00	
TORRE A	3.00	1.00			2	6.00	
Subtotal						**15.00**	
CANTIDAD TOTAL						**15.00**	









OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA	**ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 15	Diseño, suministro e instalacion de ducteria de aire acondicionado lamina de poliisocianurato (PirAlum). Incluye soporte en rangulo 1 "x 1/8" y varilla roscada 1/4".	M2	78.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
OF 513	39.00	1.00				39.00
OF 514	39.00	1.00				39.00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO





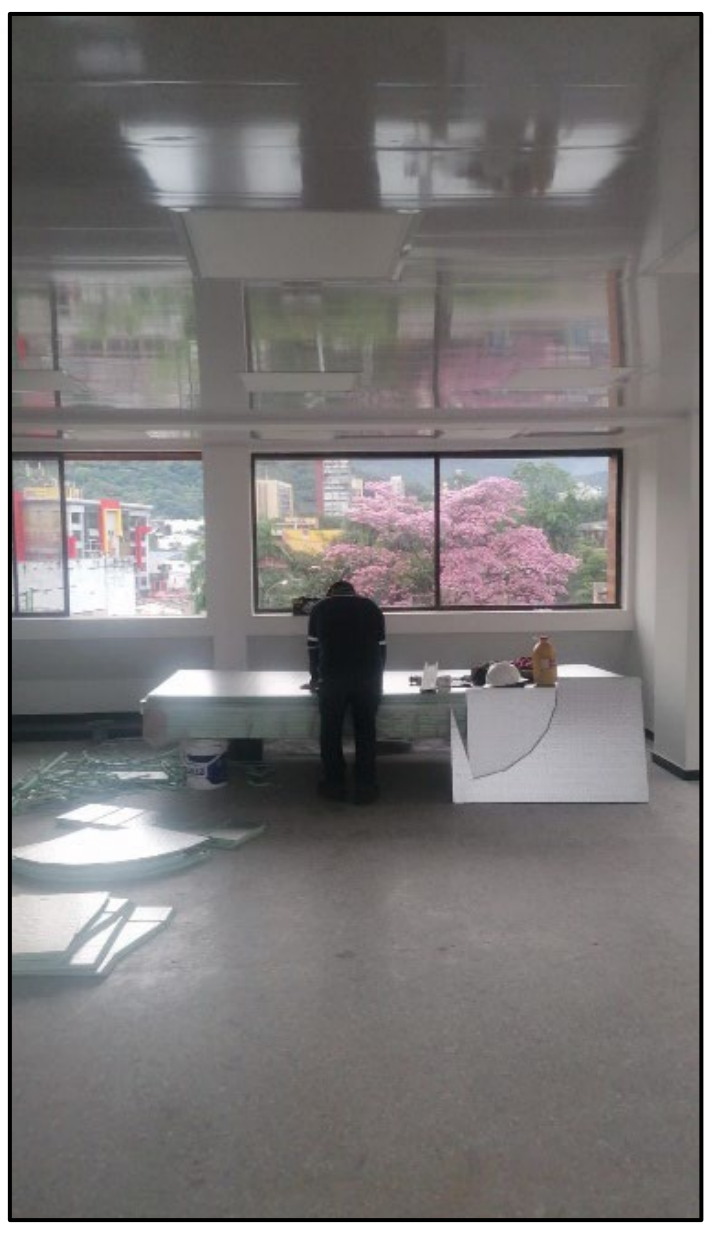

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 15	Diseño, suministro e instalacion de ducteria de aire acondicionado lamina de poliisocianurato (PirAlum). Incluye soporte en rangulo 1 "x 1/8" y varilla roscada 1/4".	M2	78.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
							
Subtotal						78.00	
CANTIDAD TOTAL						78.00	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 16	Instalacion de aire acondicionado de hasta 24,000 BTU.Incluye instalacion de la unidad interior y exterior. No incluye ningún material.	UND	9.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OF 509				2.00		2.00	
OF 510				2.00		2.00	
OF 512				2.00		2.00	
OF 515				2.00		2.00	
RACK				1.00		1.00	

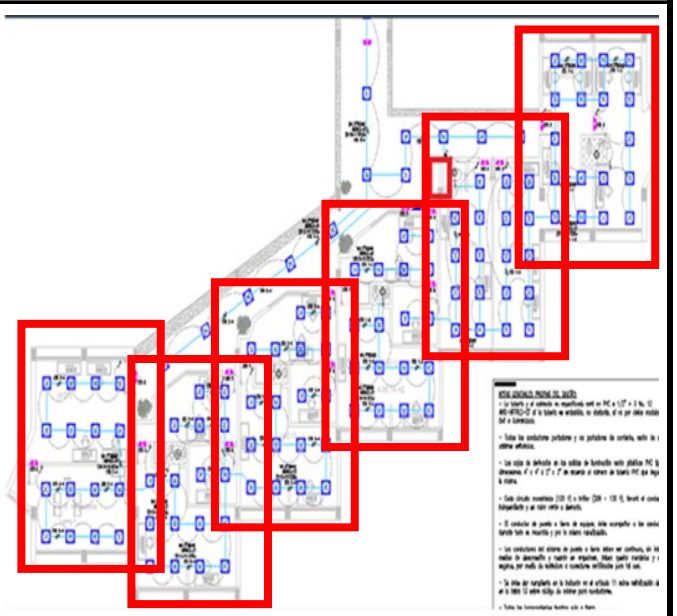









Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 16	Instalacion de aire acondicionado de hasta 24,000 BTU.Incluye instalacion de la unidad interior y exterior. No incluye ningún material.	UND	9.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						**9.00**	
CANTIDAD TOTAL						**9.00**	



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 17	Suministro e instalacion de Bomba de condensado tipo tanque 220V para aires acondicionado hasta de 24.000 BTU. Incluye soporte para la unidad.	UND	9.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OF 509				2.00		2.00	
OF 510				2.00		2.00	
OF 512				2.00		2.00	
OF 515				2.00		2.00	
RACK				1.00		1.00	

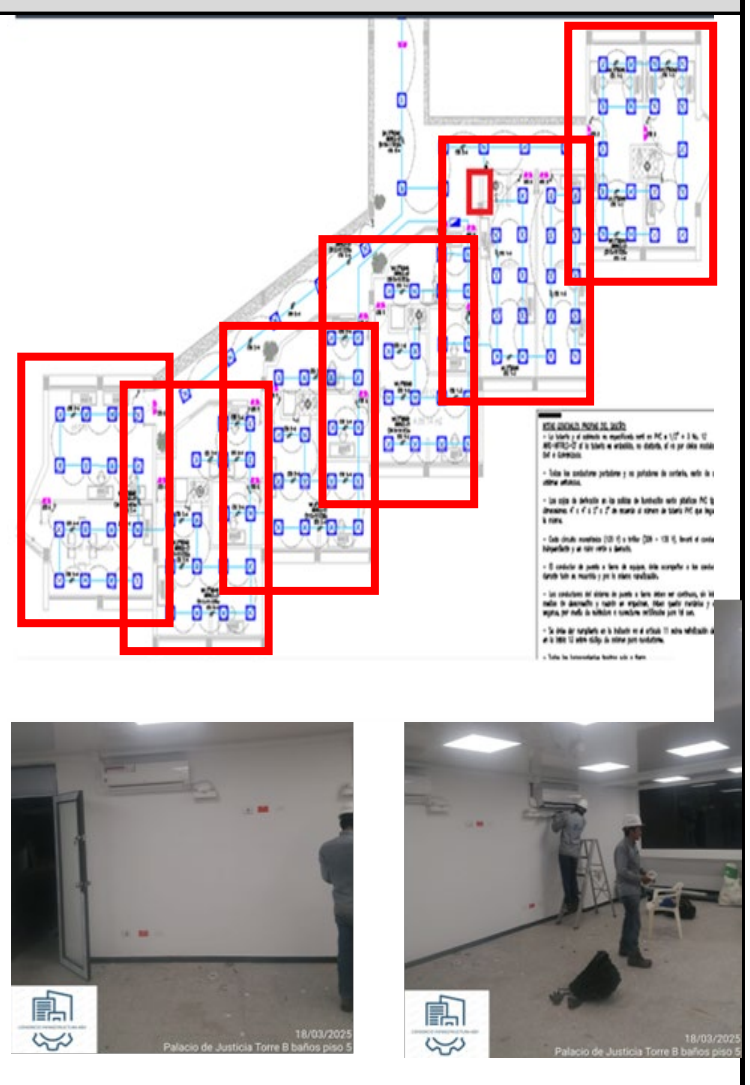

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 17	Suministro e instalacion de Bomba de condensado tipo tanque 220V para aires acondicionado hasta de 24.000 BTU. Incluye soporte para la unidad.	UND	9.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						9.00	
CANTIDAD TOTAL						9.00	



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 18	Suministro e instalacion de Manguera transparente para drenaje para bomba condensadora tipo tanque o similar.	ML	40.50

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
OFICINA 509	4.50				2.00	9.00
OFICINA 510	4.50				2.00	9.00
OFICINA 512	4.50				2.00	9.00
OFICINA 515	4.50				2.00	9.00
RACK	4.50				1.00	4.50

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

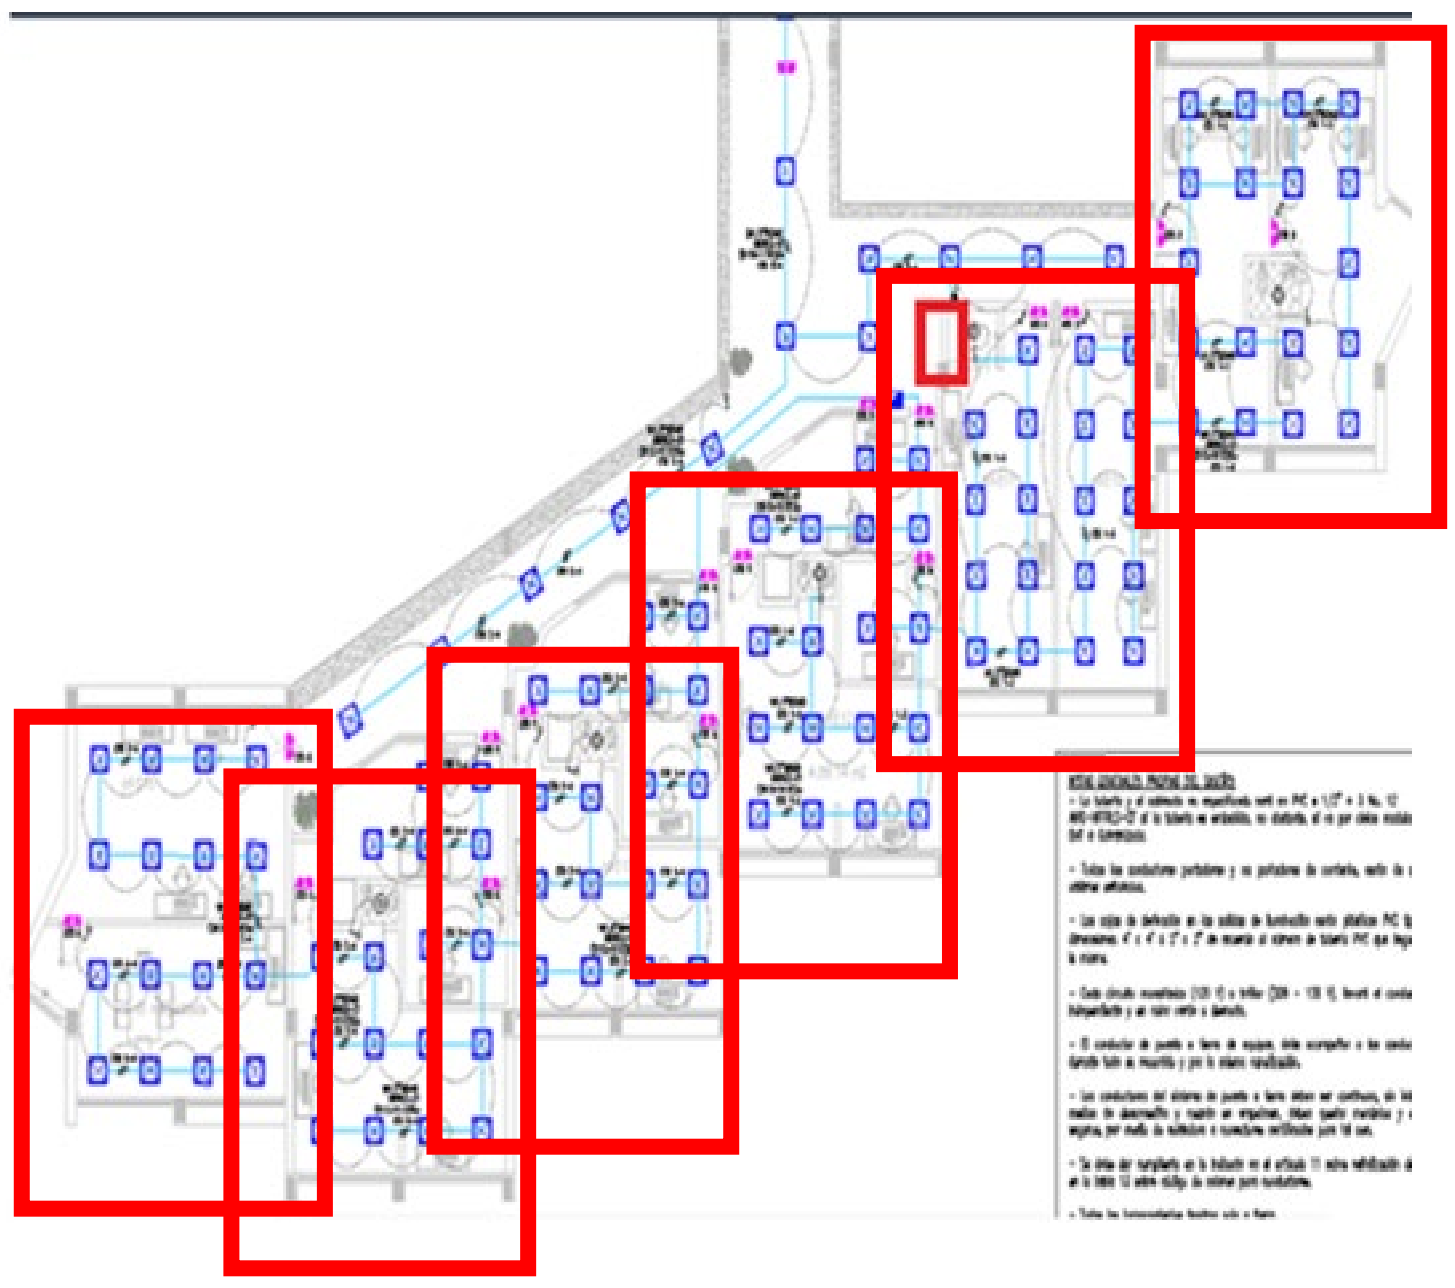





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 18	Suministro e instalacion de Manguera transparente para drenaje para bomba condensadora tipo tanque o similar.	ML	40.50

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						**40.50**	
CANTIDAD TOTAL						**40.50**	



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad		Cantidad total
NP 19	Instalacion de aire acondicionado de hasta 60,000 BTU.Incluye instalacion de la unidad interior y exterior. No incluye ningún material.	UND		2.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OF 513					1	1.00	
OF 514					1	1.00	

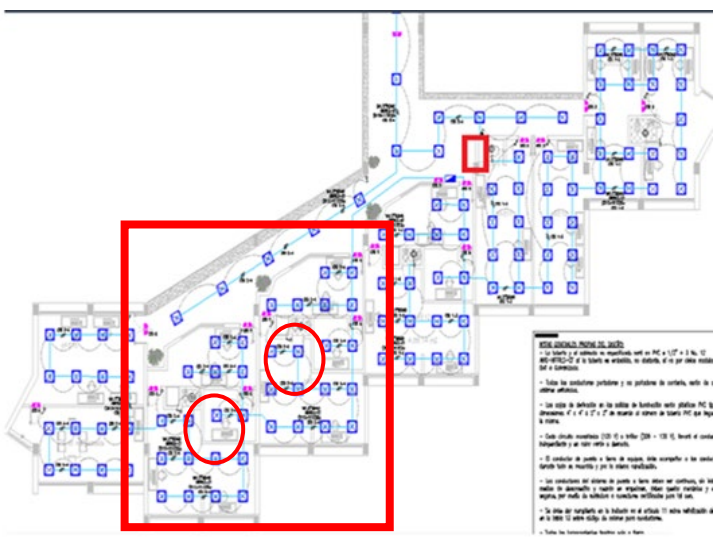





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad		Cantidad total
NP 19	Instalacion de aire acondicionado de hasta 60,000 BTU.Incluye instalacion de la unidad interior y exterior. No incluye ningún material.	UND		2.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						2.00	
CANTIDAD TOTAL						2.00	


OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 20	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo Minisplit. Incluye Limpieza de la unidad interior, Retiro y limpieza de los filtros de aire, aletas del intercambiador de calor, revisión y limpieza del drenaje, Inspección y limpieza del ventilador interior y Limpieza de la unidad exterior (condensadora).	UND	9.00


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OF 509				2.00		2.00	
OF 510				2.00		2.00	
OF 512				2.00		2.00	
OF 515				2.00		2.00	
RACK				1.00		1.00	

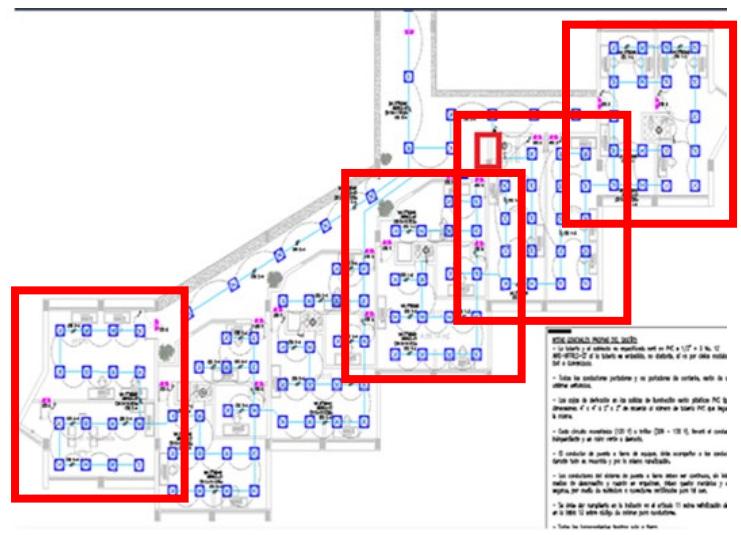







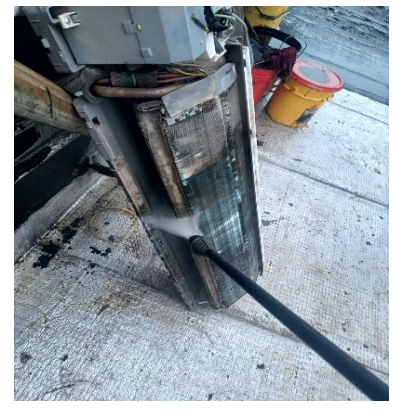

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 20	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo Minisplit. Incluye Limpieza de la unidad interior, Retiro y limpieza de los filtros de aire, aletas del intercambiador de calor, revisión y limpieza del drenaje, Inspección y limpieza del ventilador interior y Limpieza de la unidad exterior (condensadora).	UND	9.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						9.00	
CANTIDAD TOTAL						9.00	



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 22	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex en aires acondicionados de hasta 12.000 BTU	ML	30.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
RACK	15.00				2	30.00	

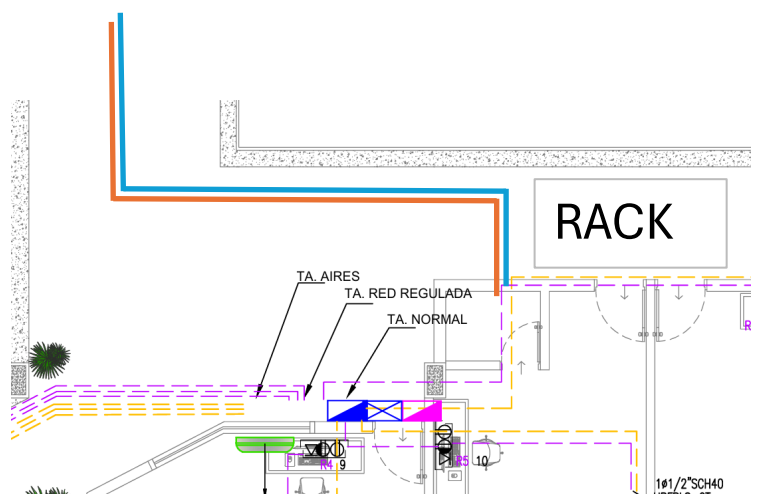





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 22	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex en aires acondicionados de hasta 12.000 BTU	ML	30.00

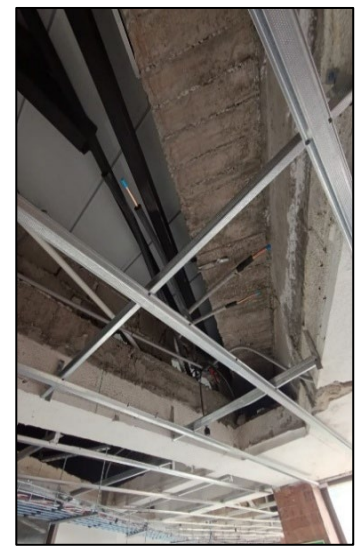LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
							 
Subtotal						30.00	
CANTIDAD TOTAL						30.00	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 23	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex en aires acondicionados de desde 18.000 BTU hasta 24.000 BTU	ML	327.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OFICINA 509	20.00				2	40.00	
	26.00				2	52.00	
OFICINA 510	18.00				2	36.00	
OFICINA 512	24.00				2	48.00	
	15.00				2	30.00	
OFICINA 515	30.00				2	60.00	
	30.50				2	61.00	

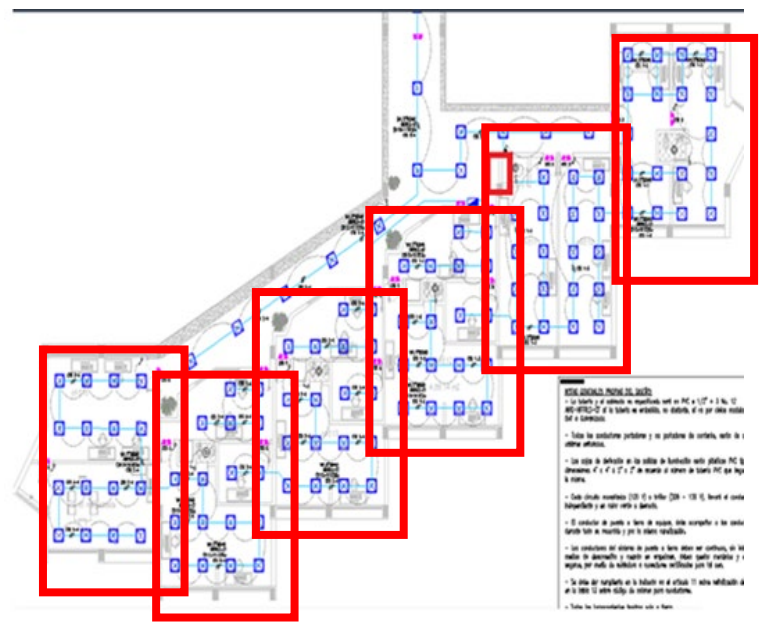





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 23	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex en aires acondicionados de desde 18.000 BTU hasta 24.000 BTU	ML	327.00

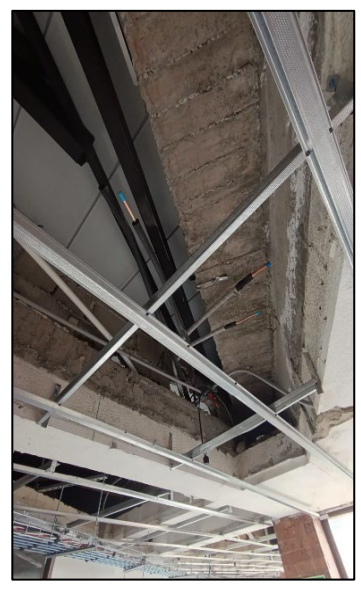LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
							 
Subtotal						327.00	
CANTIDAD TOTAL						327.00	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 24	Suministro e instalacion de Rejilla de suministro 12x12 de cuatro vias en aluminio. Incluye tornilleria para su instalacion, no incluye damper	UND	8.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
OF 513				4.00		4.00
OF 514				4.00		4.00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO



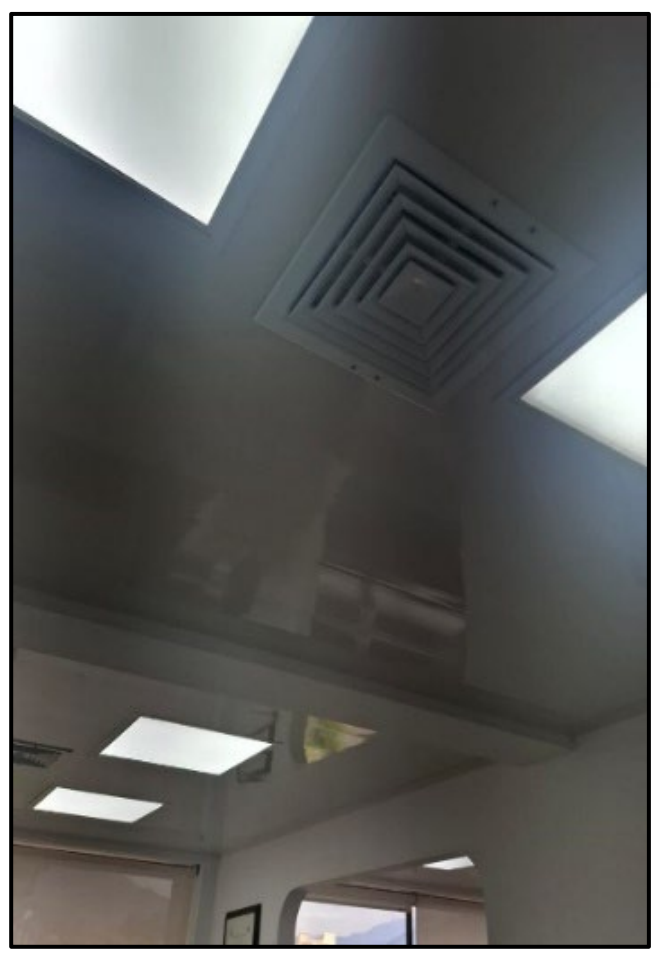



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 24	Suministro e instalacion de Rejilla de suministro 12x12 de cuatro vias en aluminio. Incluye tornilleria para su instalacion, no incluye damper	UND	8.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						**8.00**	
CANTIDAD TOTAL						**8.00**	



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad		Cantidad total
NP 27	Suministro e instalacion de cable encauchetado para potencia 3x12	ML		250.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OFICINA 509	21.00					21.00	
	26.00					26.00	
OFICINA 510	19.00					19.00	
OFICINA 512	25.00					25.00	
	16.00					16.00	
OFICINA 513	30.00					30.00	
OFICINA 514	34.00					34.00	
OFICINA 515	31.00					31.00	
	32.00					32.00	
RACK	16.00					16.00	

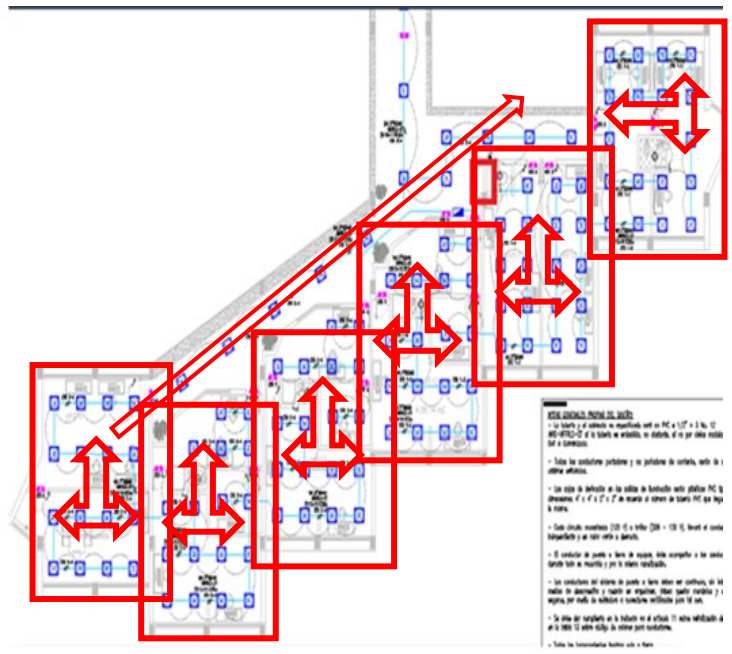





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad		Cantidad total
NP 27	Suministro e instalacion de cable encauchetado para potencia 3x12	ML		250.00

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
		Largo	Alto	MEDIA				
								 
Subtotal							250.00	
CANTIDAD TOTAL							250.00	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 28	Suministro e instalación de gas refrigerante para aires acondicionado. Incluye el cargue de gas refrigerante adecuado (según especificaciones del equipo), garantizando una presión óptima para el correcto funcionamiento del sistema. La instalación contempla verificación de fugas, ajuste de presiones y pruebas de rendimiento para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro	LB	20.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OFICINA 509				2.00		2.00	
OFICINA 510				2.00		2.00	
OFICINA 512				2.00		2.00	
OFICINA 513				5.00		5.00	
OFICINA 514				5.00		5.00	
OFICINA 515				2.00		2.00	
RACK				2.00		2.00	
Subtotal						20.00	
CANTIDAD TOTAL						20.00	

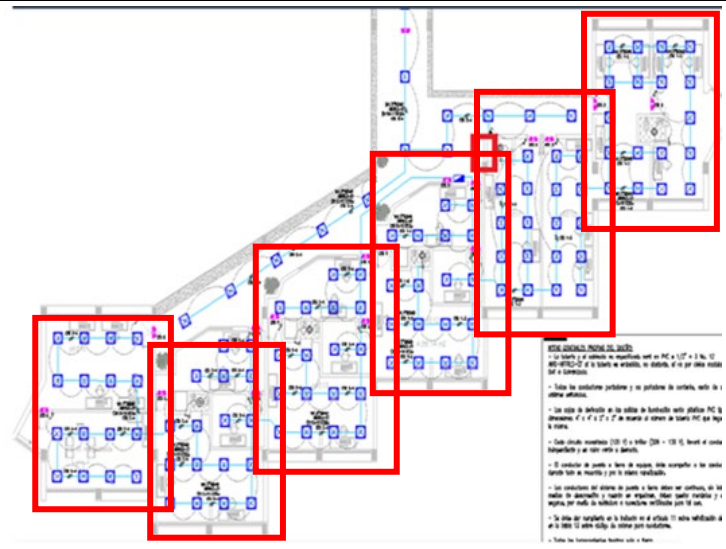



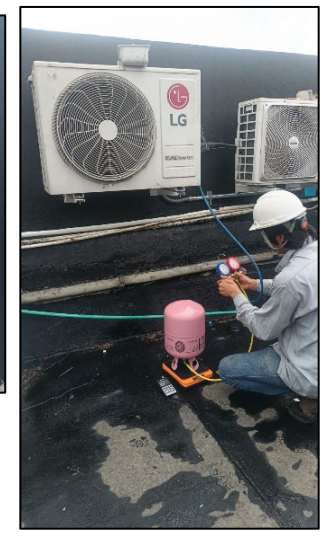

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 29	Desmonte de manto asfáltico, Incluye retiro y disposicion final	M2	200.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
TORRE B TERRAZA CENTRAL	9.00	7.02				63.20	
TORRE B LATERALES	114.00	1.20				136.80	

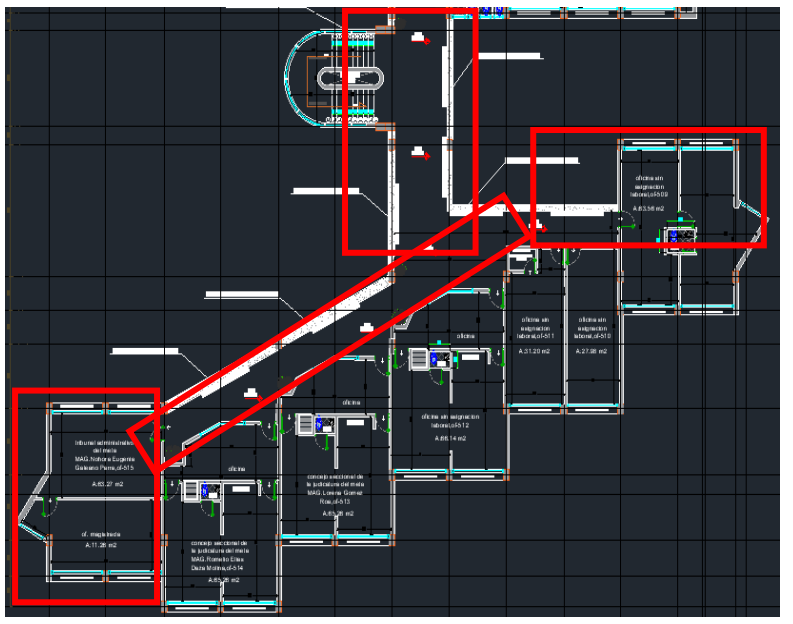

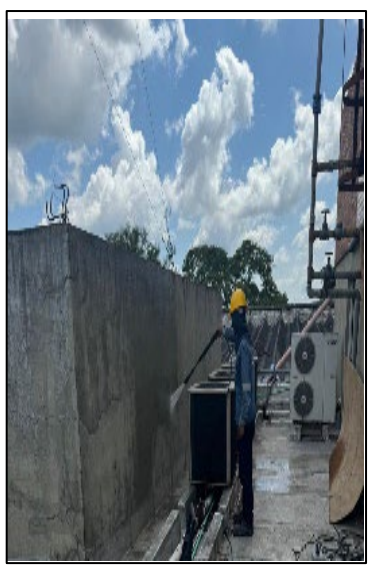



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 29	Desmonte de manto asfáltico, Incluye retiro y disposicion final	M2	200.00

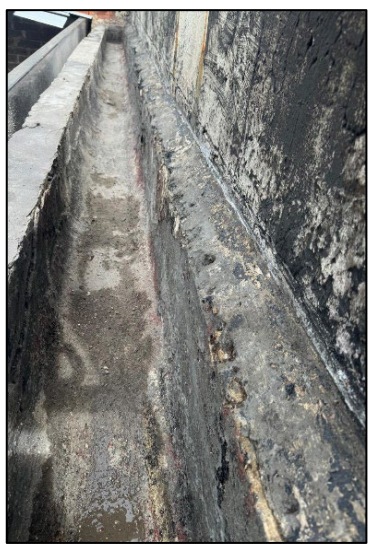LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
							 
Subtotal						**200.00**	
CANTIDAD TOTAL						**200.00**	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 30	Suministro e instalacion de tuberia PVC 2" liviana red de ventilacion, incluye accesorios	ML	151.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OF 509	8.00					8.00	
OF 512	8.00					8.00	
OF 513	8.00					8.00	
OF 514	8.00					8.00	
BAÑOS TORRE A PISO 1	8.00					8.00	
BAÑOS TORRE A PISO 2	8.00					8.00	
BAÑOS TORRE A PISO 3	8.00					8.00	
BAÑOS TORRE A PISO 4	8.00					8.00	
BAÑOS TORRE A PISO 5	8.00					8.00	
BAÑOS TORRE B PISO 1	8.00					8.00	
BAÑOS TORRE B PISO 2	8.00					8.00	
BAÑOS TORRE B PISO 3	8.00					8.00	
BAÑOS TORRE B PISO 4	8.00					8.00	
BAÑOS TORRE B PISO 5	8.00					8.00	
TUBERIA VERTICALES TORRE A	19.50					19.50	
TUBERIA VERTICALES TORRE B	19.50					19.50	

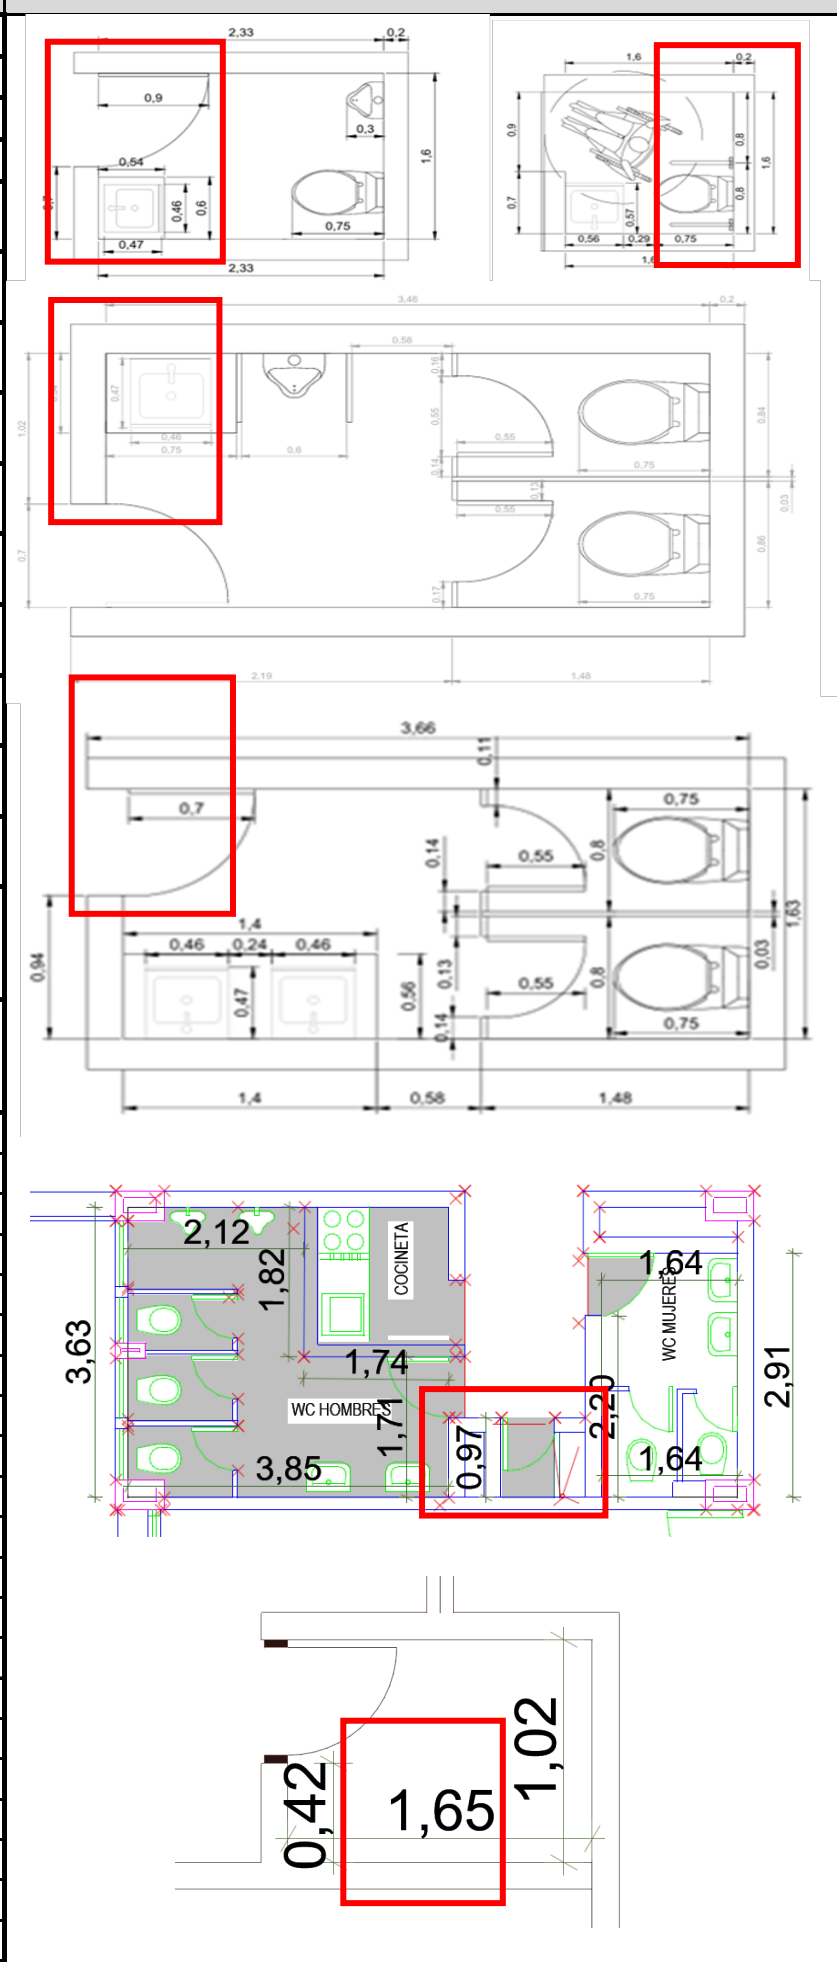

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 30	Suministro e instalacion de tuberia PVC 2" liviana red de ventilacion, incluye accesorios	ML	151.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
Subtotal						151.00
CANTIDAD TOTAL						151.00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 31	Suministro e instalacion de tuberia pvc presion 3/4". No incluye accesorios.	ML	190.17

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OF 509	5.00					5.00	
OF 512	5.00					5.00	
OF 513	5.00					5.00	
OF 514	5.00					5.00	
BAÑOS TORRE A PISO 1	12.61					12.61	
BAÑOS TORRE A PISO 2	14.74					14.74	
BAÑOS TORRE A PISO 3	14.74					14.74	
BAÑOS TORRE A PISO 4	14.74					14.74	
BAÑOS TORRE A PISO 5	14.74					14.74	
BAÑOS TORRE B PISO 1	15.56					15.56	
BAÑOS TORRE B PISO 2	20.76					20.76	
BAÑOS TORRE B PISO 3	20.76					20.76	
BAÑOS TORRE B PISO 4	20.76					20.76	
BAÑOS TORRE B PISO 5	20.76					20.76	

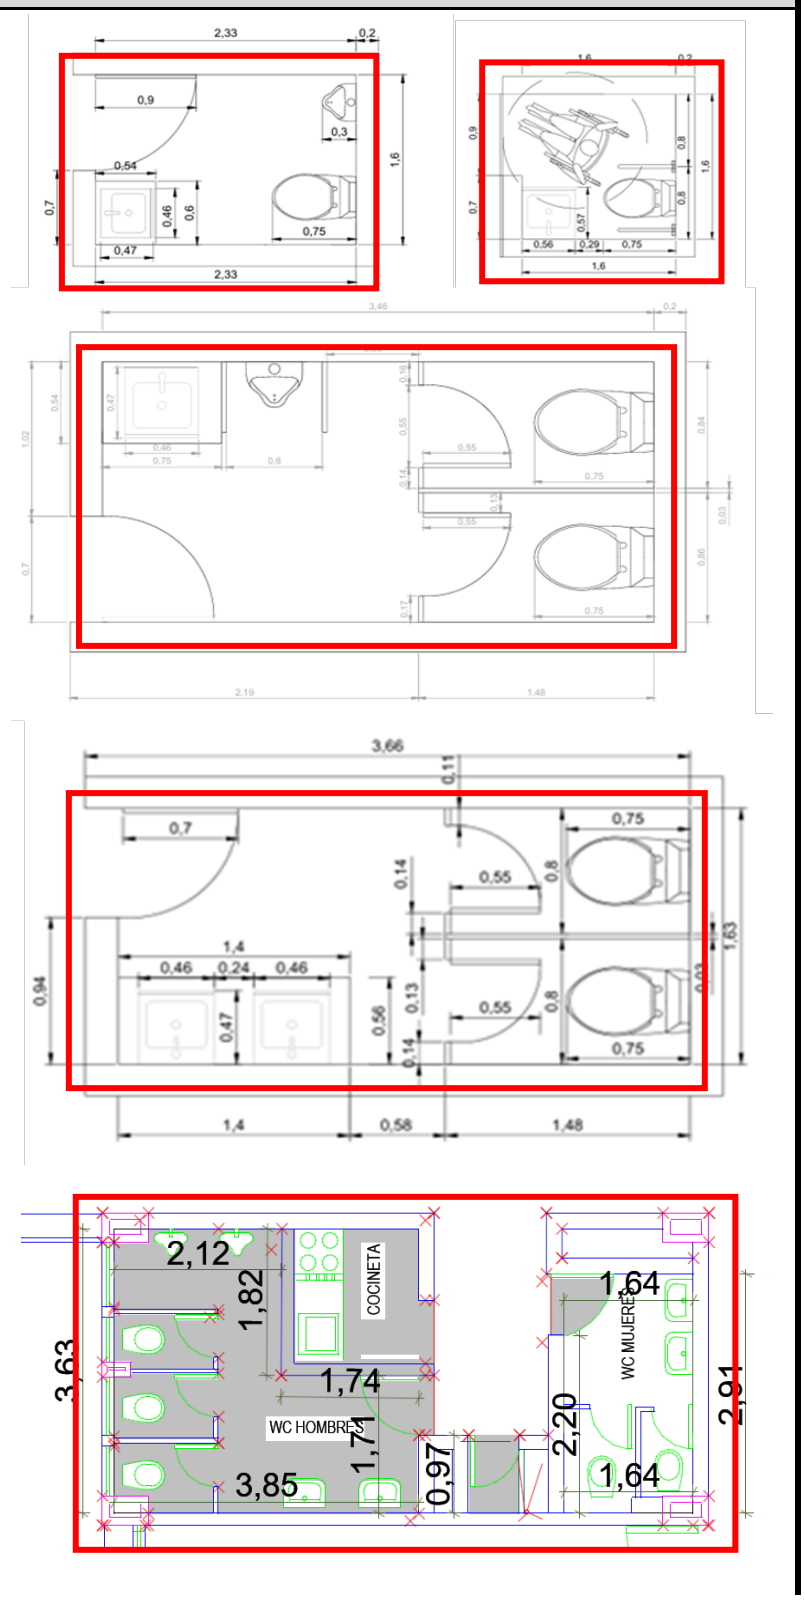

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 31	Suministro e instalacion de tuberia pvc presion 3/4". No incluye accesorios.	ML	190.17

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
Subtotal						190.17
CANTIDAD TOTAL						190.17

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

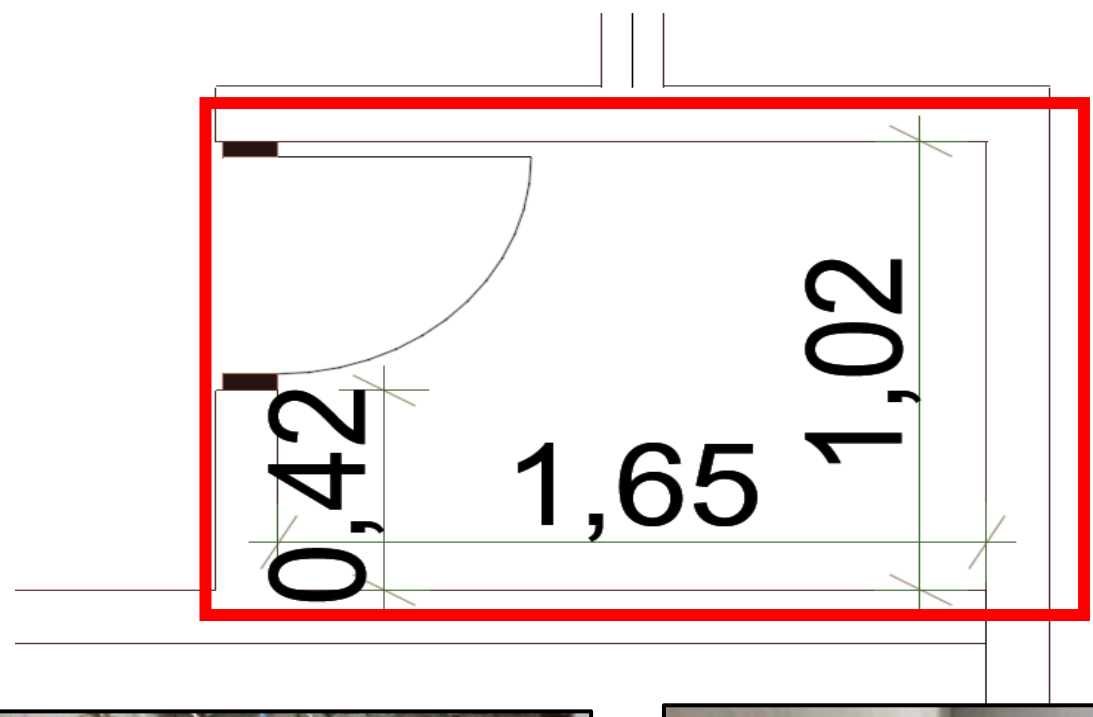



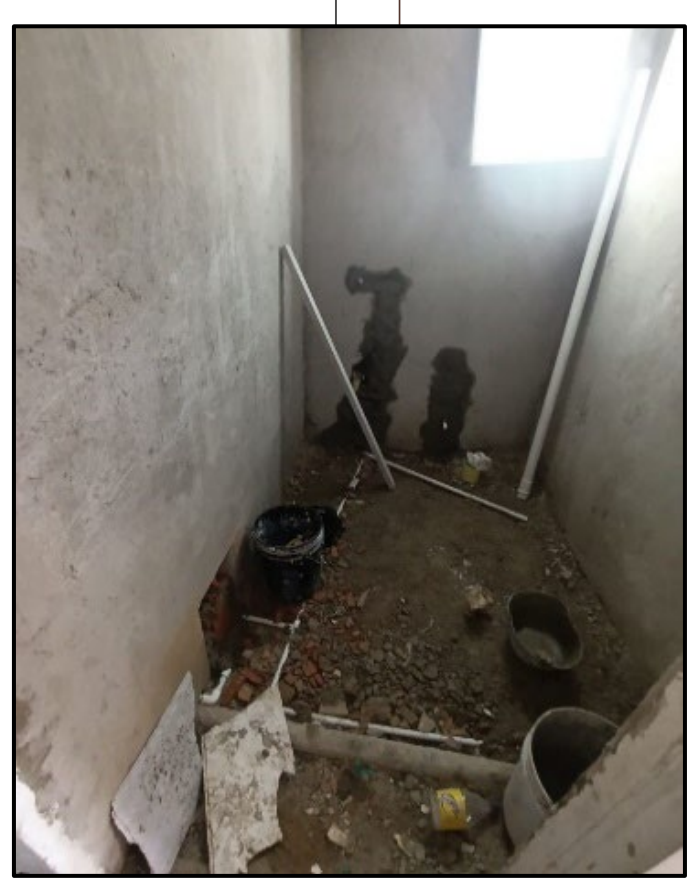





OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA	**ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 32	Suministro e instalacion de tuberia pvc presion 1/2". No incluye accesorios	ML	37.60

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OF 509	0.80					0.80	
OF 512	0.80					0.80	
OF 513	0.80					0.80	
OF 514	0.80					0.80	
BAÑOS TORRE A PISO 1	2.80					2.80	
BAÑOS TORRE A PISO 2	3.20					3.20	
BAÑOS TORRE A PISO 3	3.20					3.20	
BAÑOS TORRE A PISO 4	3.20					3.20	
BAÑOS TORRE A PISO 5	3.20					3.20	
BAÑOS TORRE B PISO 1	4.60					4.60	
BAÑOS TORRE B PISO 2	3.00					3.00	
BAÑOS AUXILIARES TORRE B PISO 2	2.20					2.20	
BAÑOS TORRE B PISO 3	3.00					3.00	
BAÑOS TORRE B PISO 4	3.00					3.00	
BAÑOS TORRE B PISO 5	3.00					3.00	

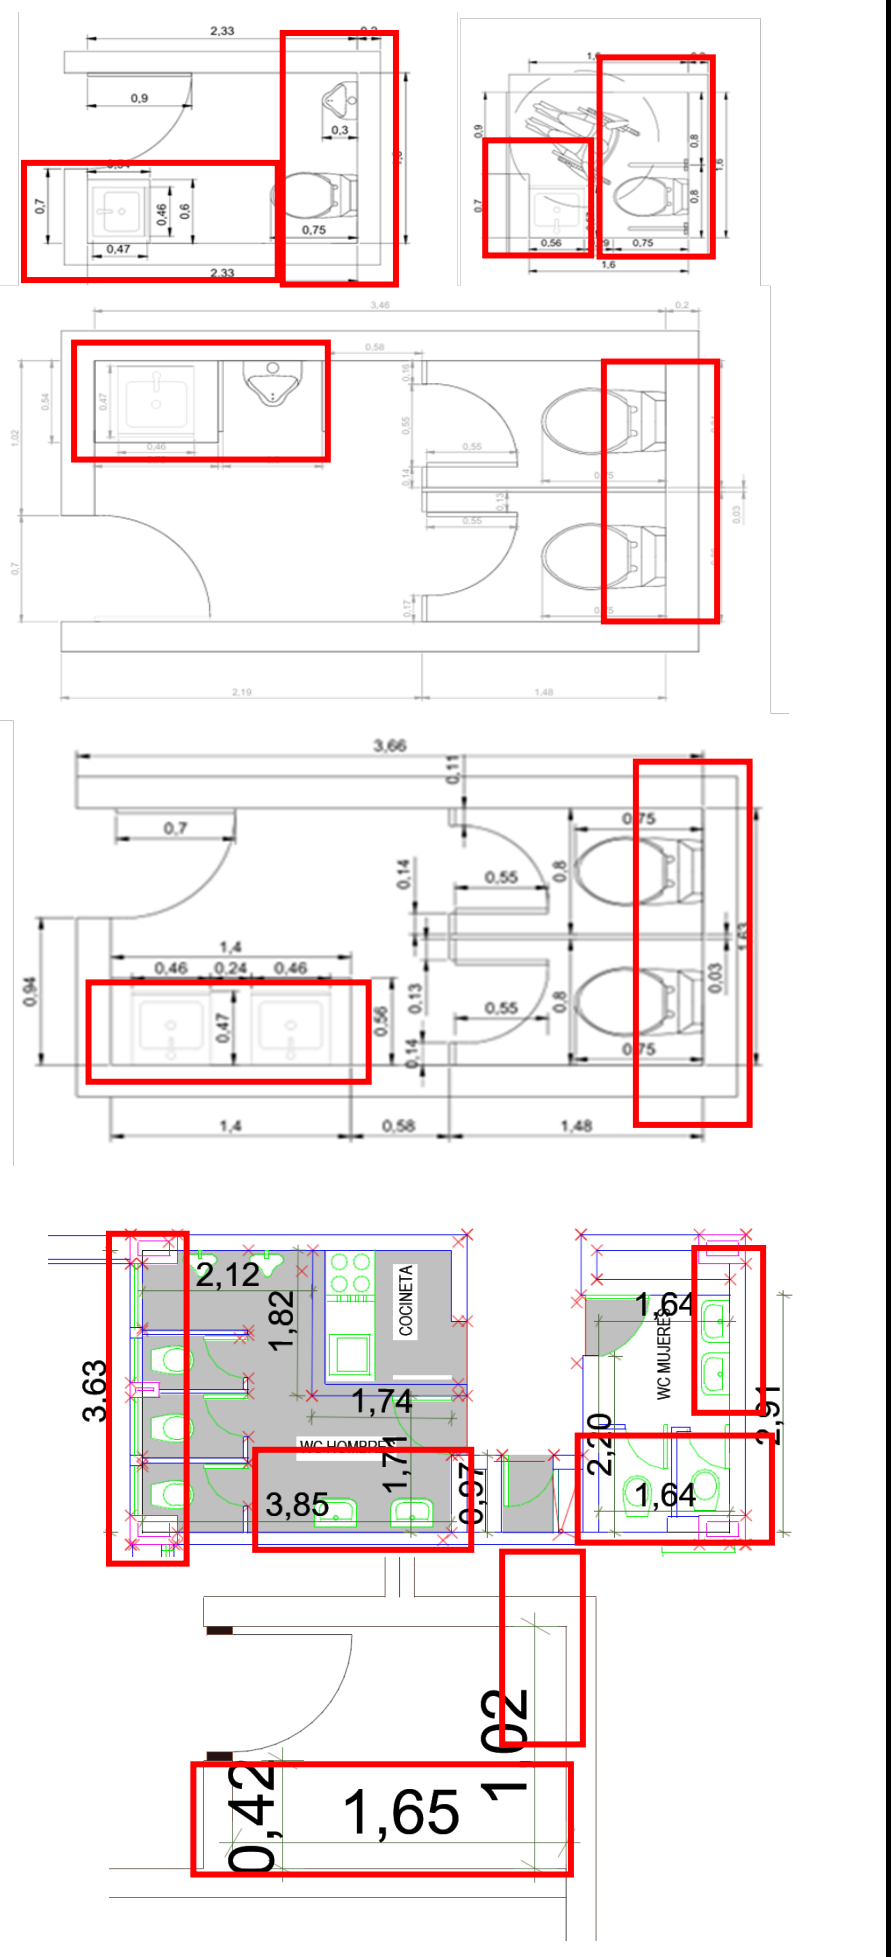

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO



Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 32	Suministro e instalacion de tuberia pvc presion 1/2". No incluye accesorios	ML	37.60

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						37.60	
CANTIDAD TOTAL						37.60	

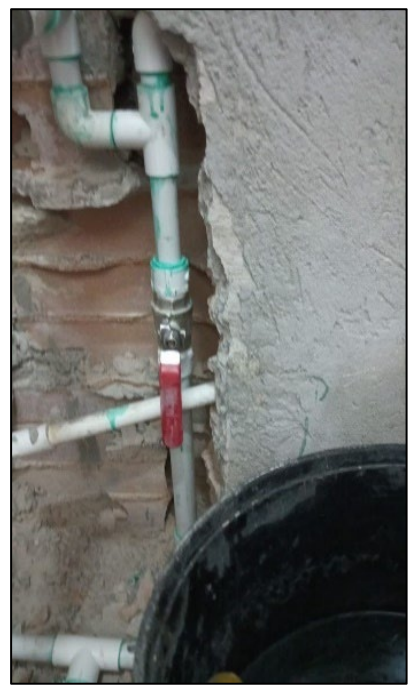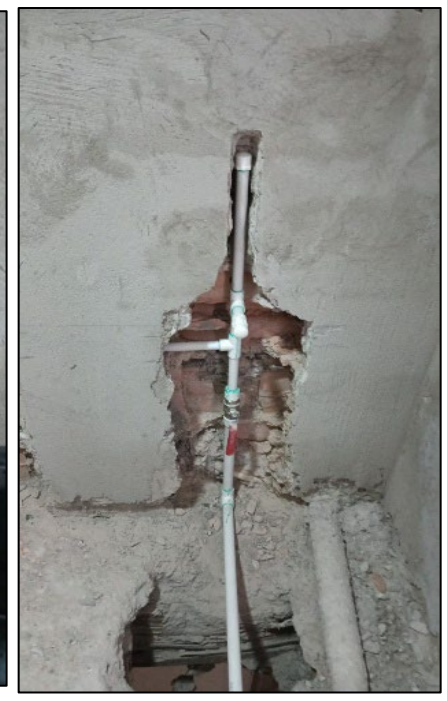

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA	**ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 33	Suministro e instalacion de Tapa en Lámina Galvanizada y aluminio 60X60 Tipo palanca	UND	10.00


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 1				1.00		1.00	
BAÑOS TORRE A PISO 2				1.00		1.00	
BAÑOS TORRE A PISO 3				1.00		1.00	
BAÑOS TORRE A PISO 4				1.00		1.00	
BAÑOS TORRE A PISO 5				1.00		1.00	
BAÑOS TORRE B PISO 1				1.00		1.00	
BAÑOS TORRE B PISO 2				1.00		1.00	
BAÑOS TORRE B PISO 3				1.00		1.00	
BAÑOS TORRE B PISO 4				1.00		1.00	
BAÑOS TORRE B PISO 5				1.00		1.00	

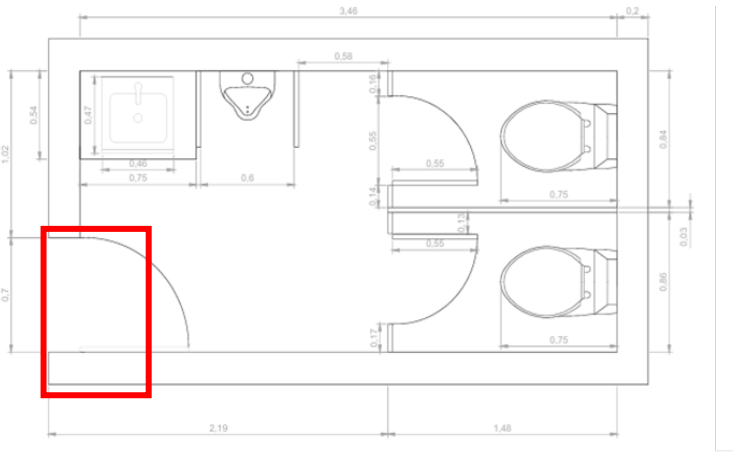


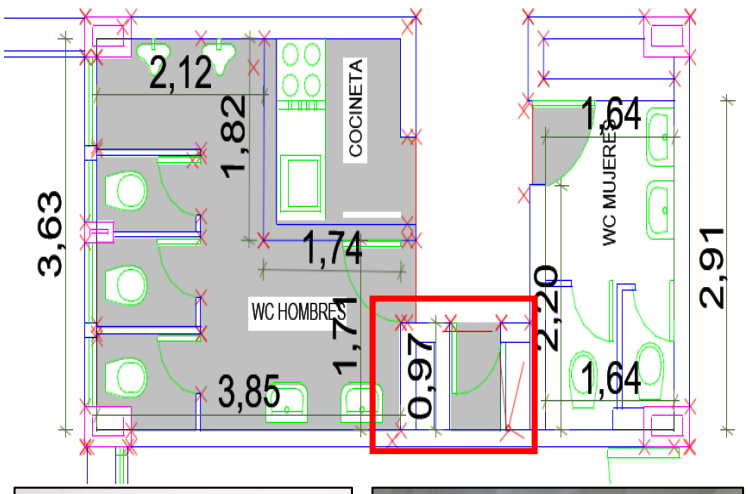





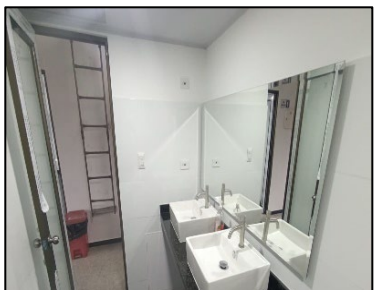

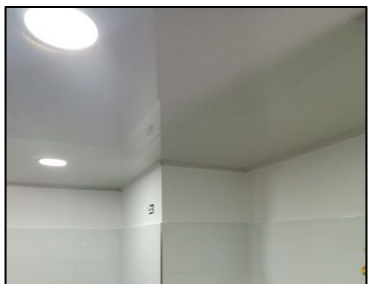

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 33	Suministro e instalacion de Tapa en Lámina Galvanizada y aluminio 60X60 Tipo palanca	UND	10.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
							 
Subtotal						10.00	
CANTIDAD TOTAL						10.00	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 34	Suministro e instalacion de registro de bola metalico 2"	UND	4.00


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A				2.00		2.00	
BAÑOS TORRE B				2.00		2.00	

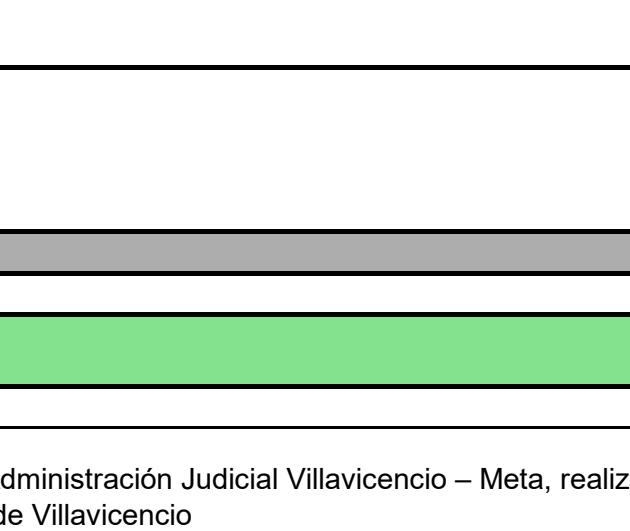


TORRE B



TORRE A

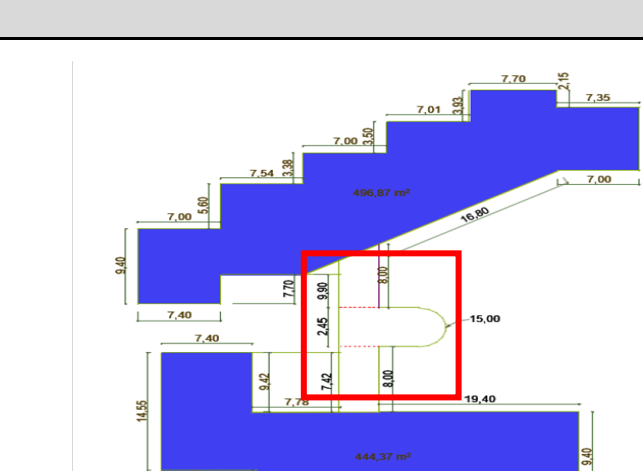

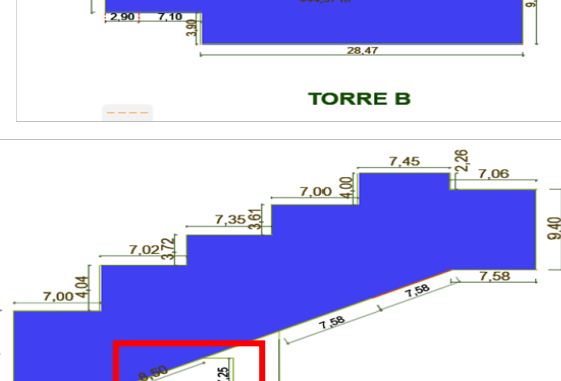

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 34	Suministro e instalacion de registro de bola metalico 2"	UND	4.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						4.00	
CANTIDAD TOTAL						4.00	



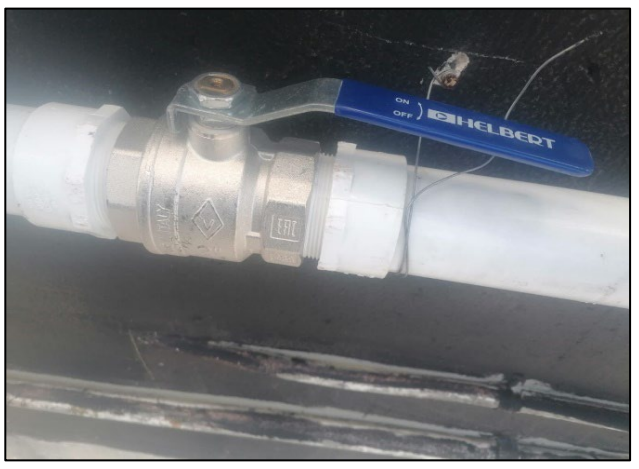

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 35	Suministro e instalacion de Registro de bola metalico 1"	UND	6.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE B PISO 1				2.00		2.00	
BAÑOS TORRE B PISO 2				1.00		1.00	
BAÑOS TORRE B PISO 3				1.00		1.00	
BAÑOS TORRE B PISO 4				1.00		1.00	
BAÑOS TORRE B PISO 5				1.00		1.00	
Subtotal						6.00	
CANTIDAD TOTAL						6.00	

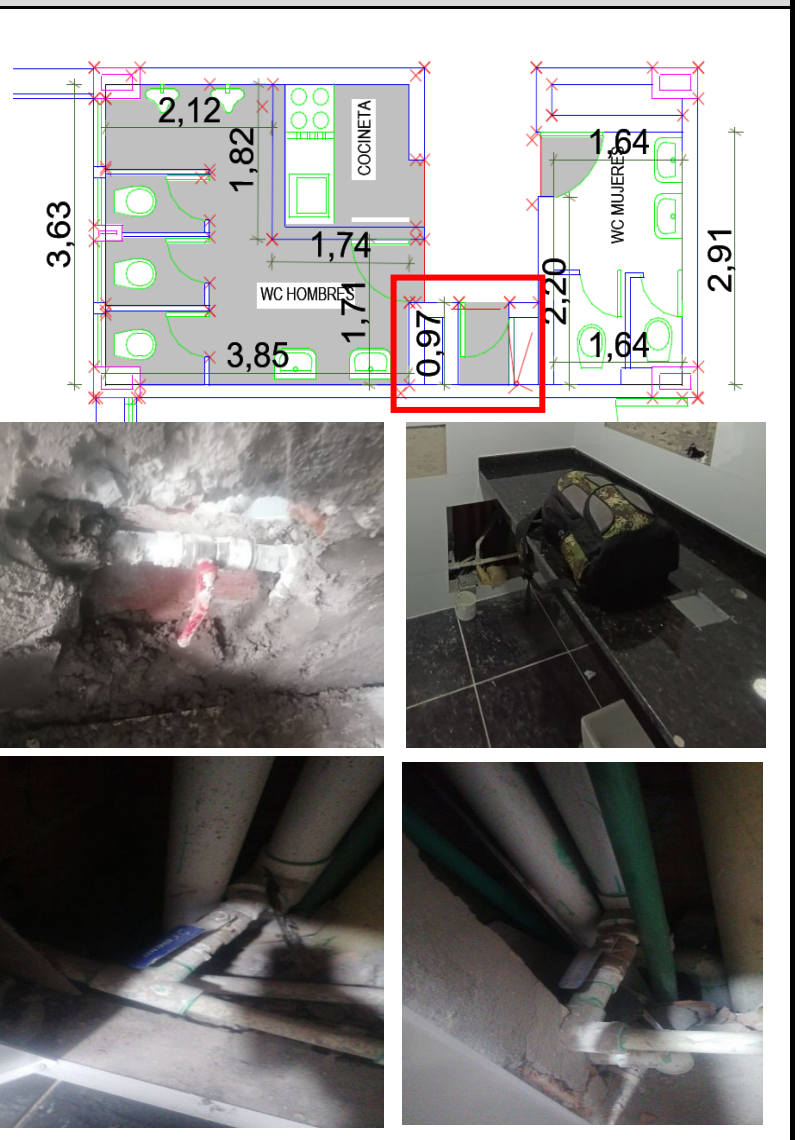

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA	**ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 36	Suministro e instalacion de Registro de bola metalico 3/4"	UND	15.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 2				5.00		5.00	
BAÑOS TORRE A PISO 3				5.00		5.00	
BAÑOS TORRE A PISO 4				5.00		5.00	

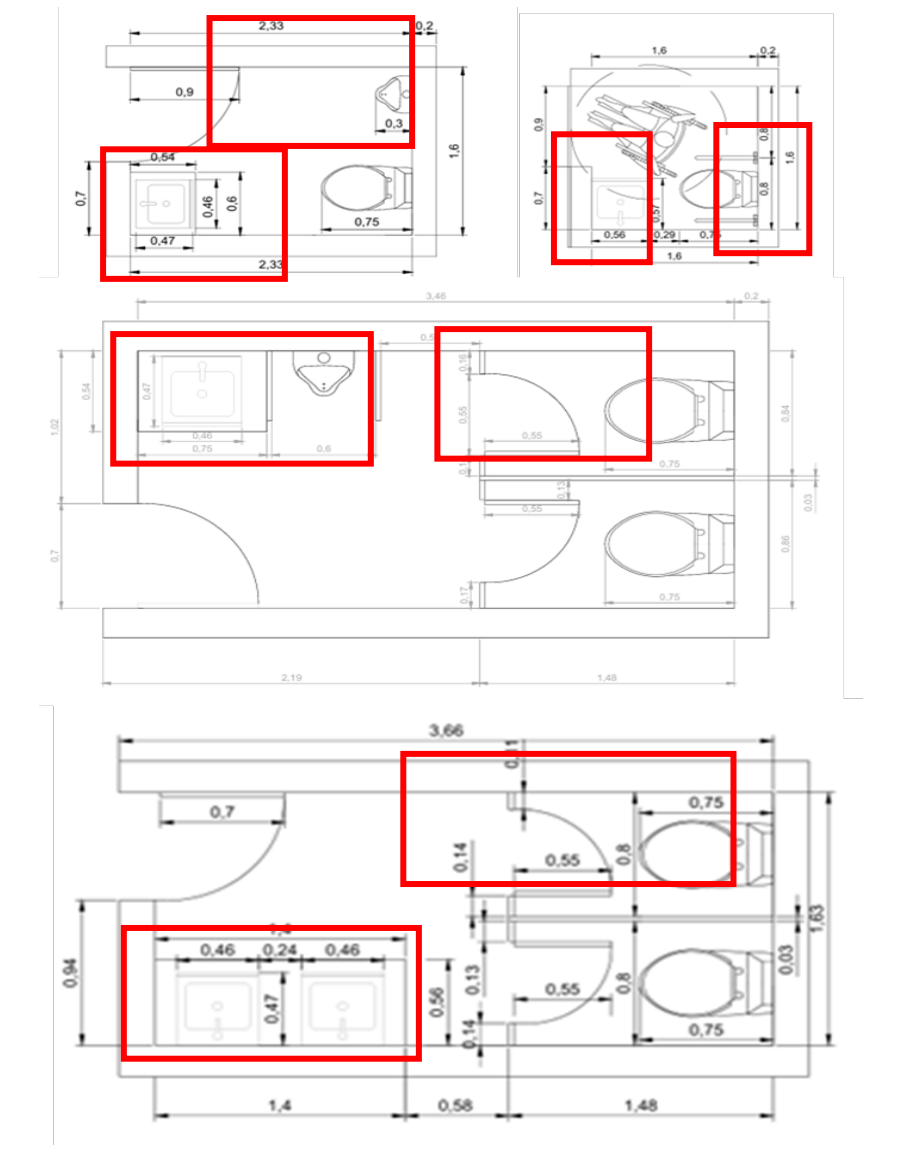





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 36	Suministro e instalacion de Registro de bola metalico 3/4"	UND	15.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
							 
Subtotal						15.00	
CANTIDAD TOTAL						15.00	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 37	Suministro e instalacion de Registro de bola metalico 1/2	UND	2.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
OFICINA 502				1.00		1.00
OFICINA 503				1.00		1.00
Subtotal						**2.00**
CANTIDAD TOTAL						**2.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

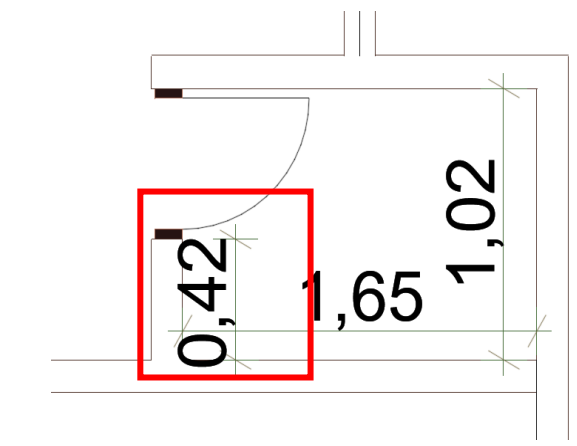







OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 38	Suministro e instalacion de Punto hidráulico pvc de 1/2". Incluye accesorios y 3 metros de tuberia	UND	99.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 1					7	7.00	
BAÑOS TORRE A PISO 2					8	8.00	
BAÑOS TORRE A PISO 3					8	8.00	
BAÑOS TORRE A PISO 4					8	8.00	
BAÑOS TORRE A PISO 5					8	8.00	
BAÑOS TORRE B PISO 1					11	11.00	
BAÑOS TORRE B PISO 2					9	9.00	
BAÑOS TORRE B PISO 3					9	9.00	
BAÑOS TORRE B PISO 4					9	9.00	
BAÑOS TORRE B PISO 5					9	9.00	
BAÑOS TORRE B PISO 2 AUX					5	5.00	
OFICINA 509					2	2.00	
OFICINA 512					2	2.00	
OFICINA 513					2	2.00	
OFICINA 514					2	2.00	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 38	Suministro e instalacion de Punto hidráulico pvc de 1/2". Incluye accesorios y 3 metros de tuberia	UND	99.00

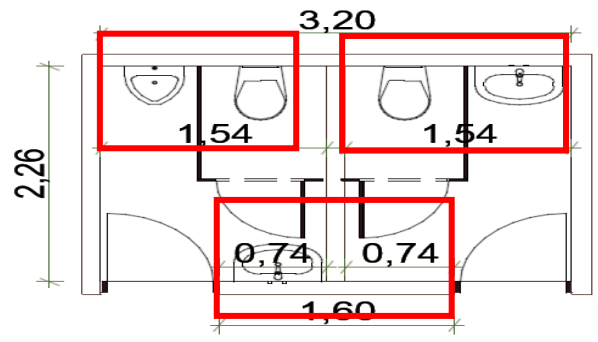LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
		Largo	Alto	MEDIA				
								
								   
						Subtotal	99.00	
						CANTIDAD TOTAL	99.00	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA	**ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 39	Suminstro e instalcion de Mueble para lavamanos 55 cm x 60 cm (axh)	UND	4.00


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
OFICINA 509				1.00		1.00
OFICINA 512				1.00		1.00
OFICINA 513				1.00		1.00
OFICINA 514				1.00		1.00
Subtotal						4.00
CANTIDAD TOTAL						4.00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

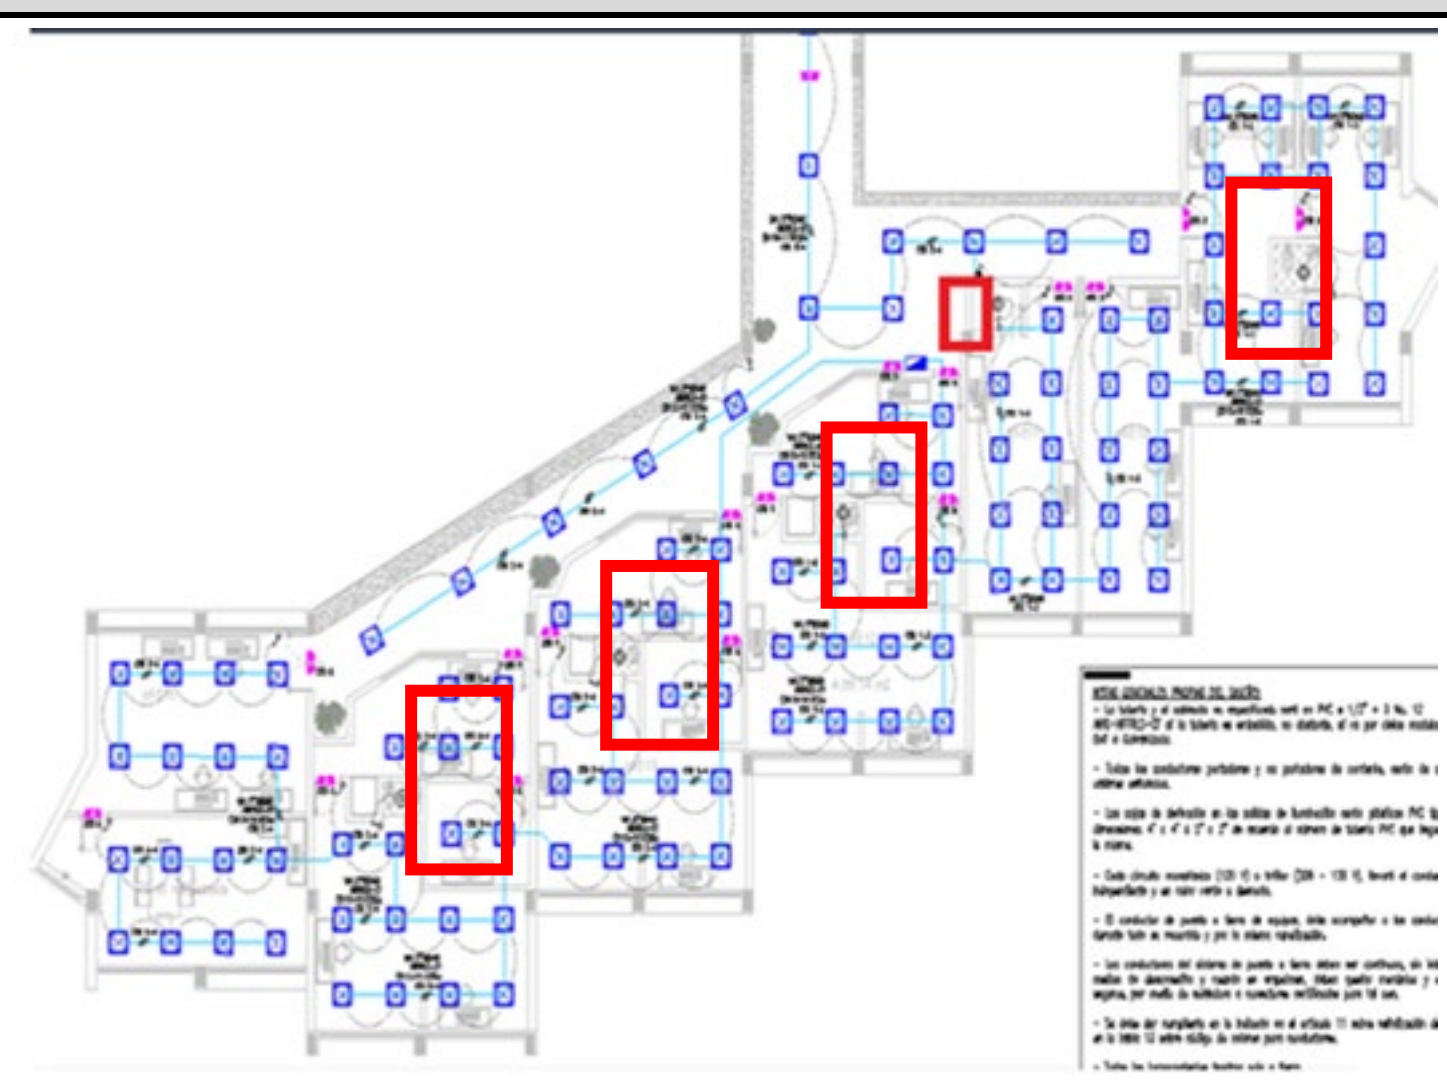

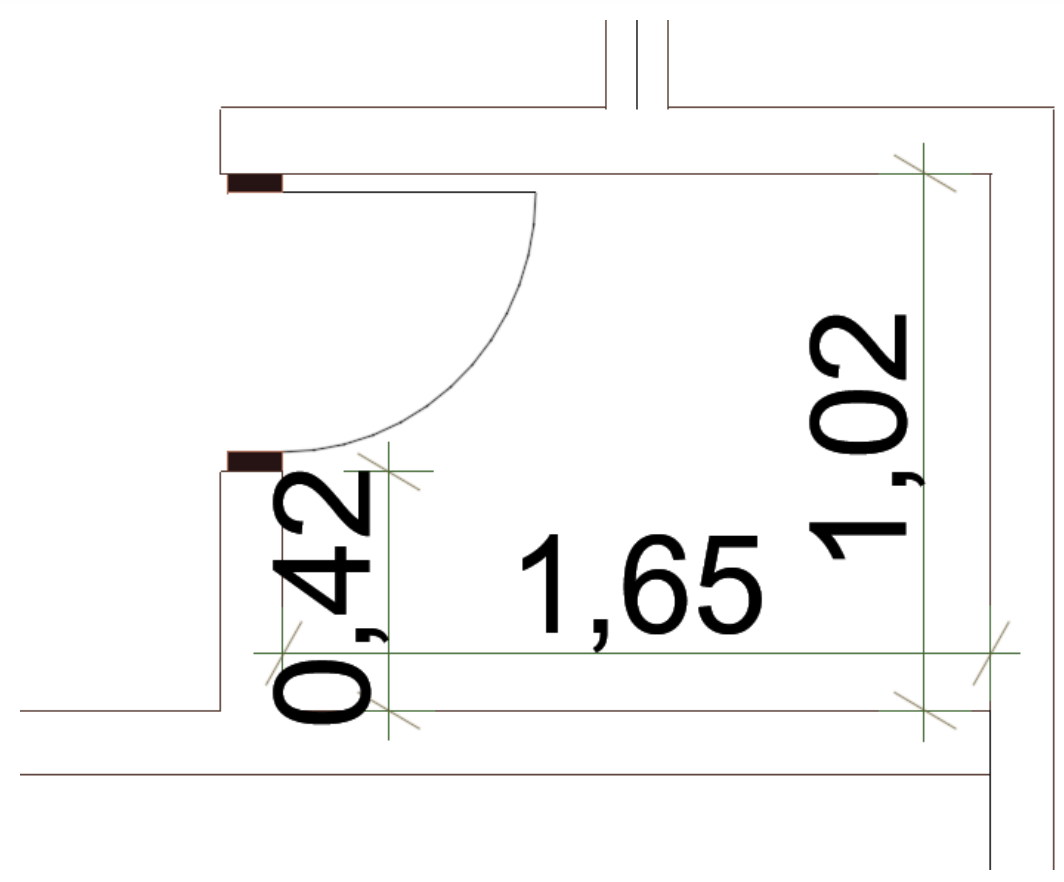

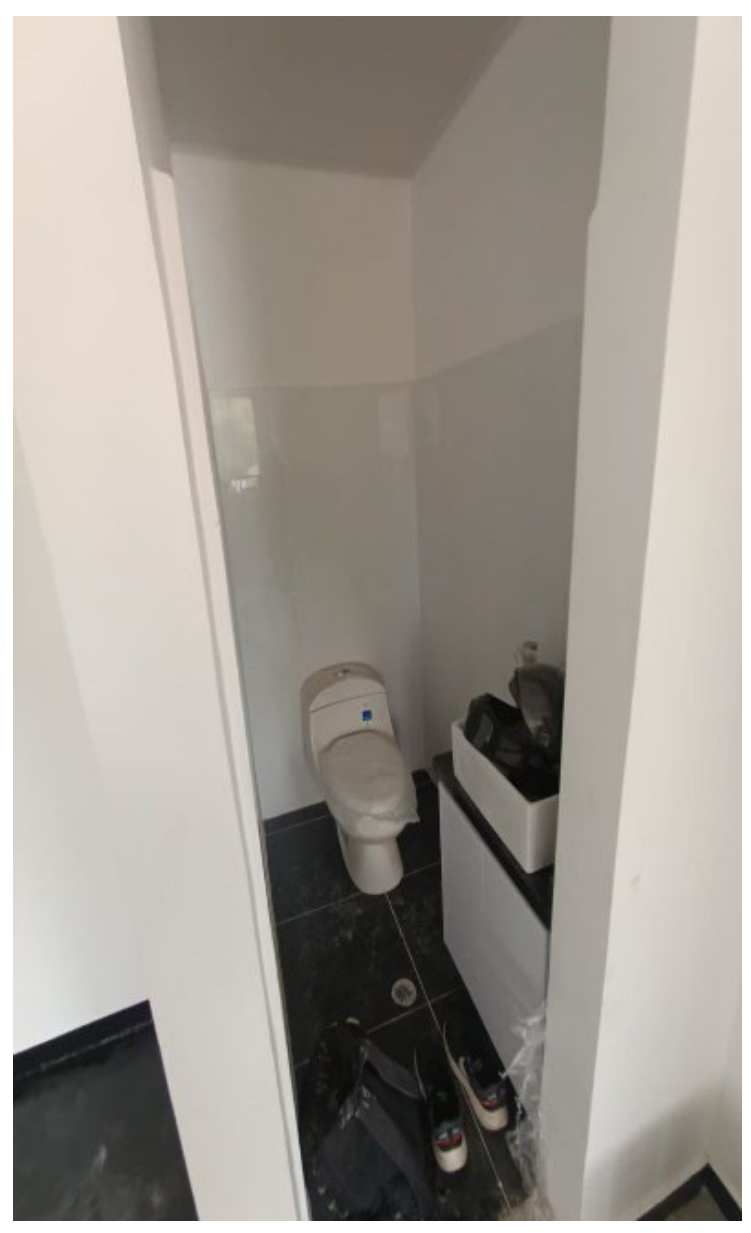

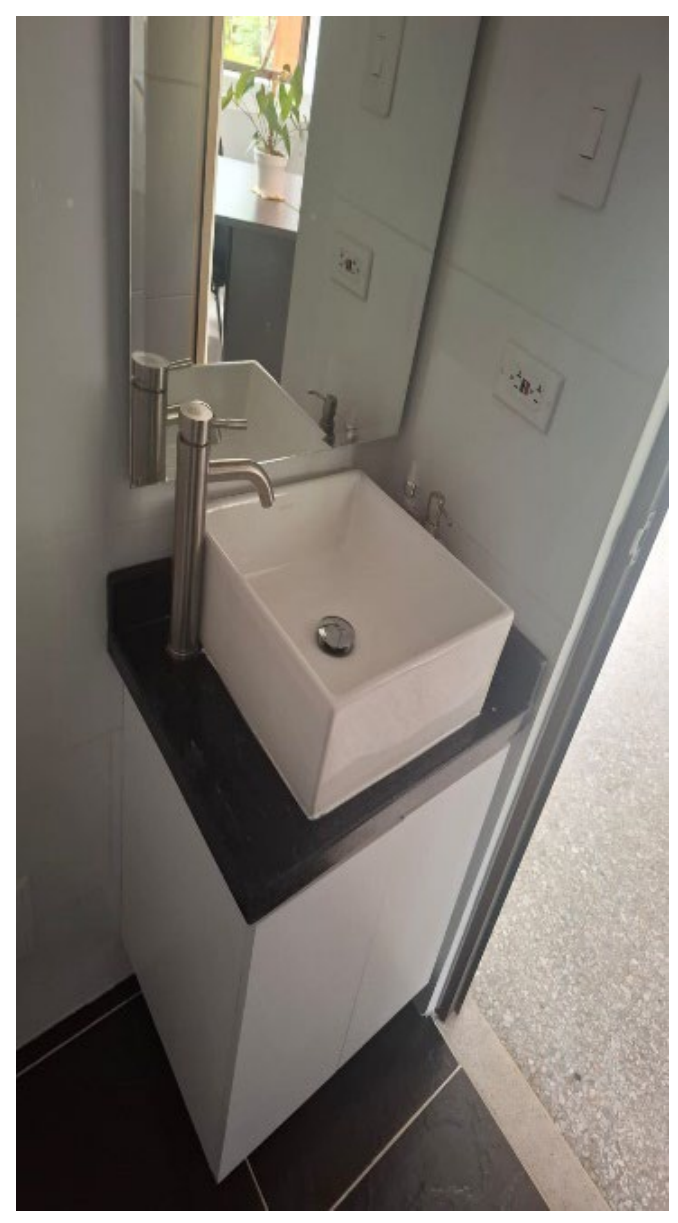

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 39	Suminstro e instalcion de Mueble para lavamanos 55 cm x 60 cm (axh)	UND	4.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OBSERVACIONES:							

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 40	Suministro e instalacion de guardaescobas en areas comunes en ceramica h: 8 cm. incluye pintura en esmalte.	ML	29.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OF 509	4.00					4.00	
OF 510	5.00					5.00	
OF 511	3.00					3.00	
OF 512	5.00					5.00	
OF 513	5.00					5.00	
OF 514	3.00					3.00	
OF 515	4.00					4.00	

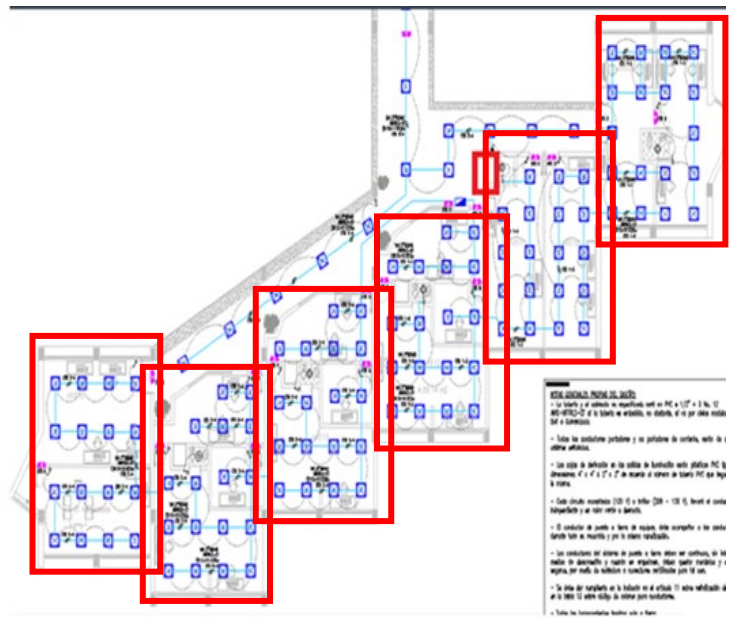





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 40	Suministro e instalacion de guardaescobas en areas comunes en ceramica h: 8 cm. incluye pintura en esmalte.	ML	29.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						**29.00**	
CANTIDAD TOTAL						**29.00**	



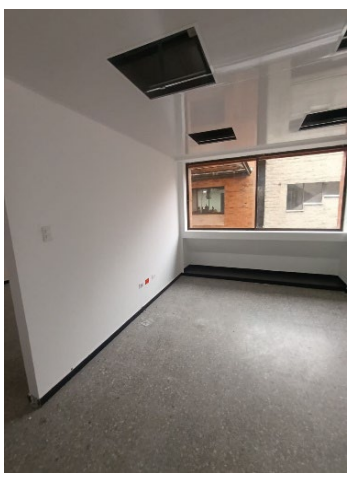

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 42	Suministro e instalacion de griferia lavamanos alta monocontrol	UND	4.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
OFICINA 509				1.00		1.00
OFICINA 512				1.00		1.00
OFICINA 513				1.00		1.00
OFICINA 514				1.00		1.00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

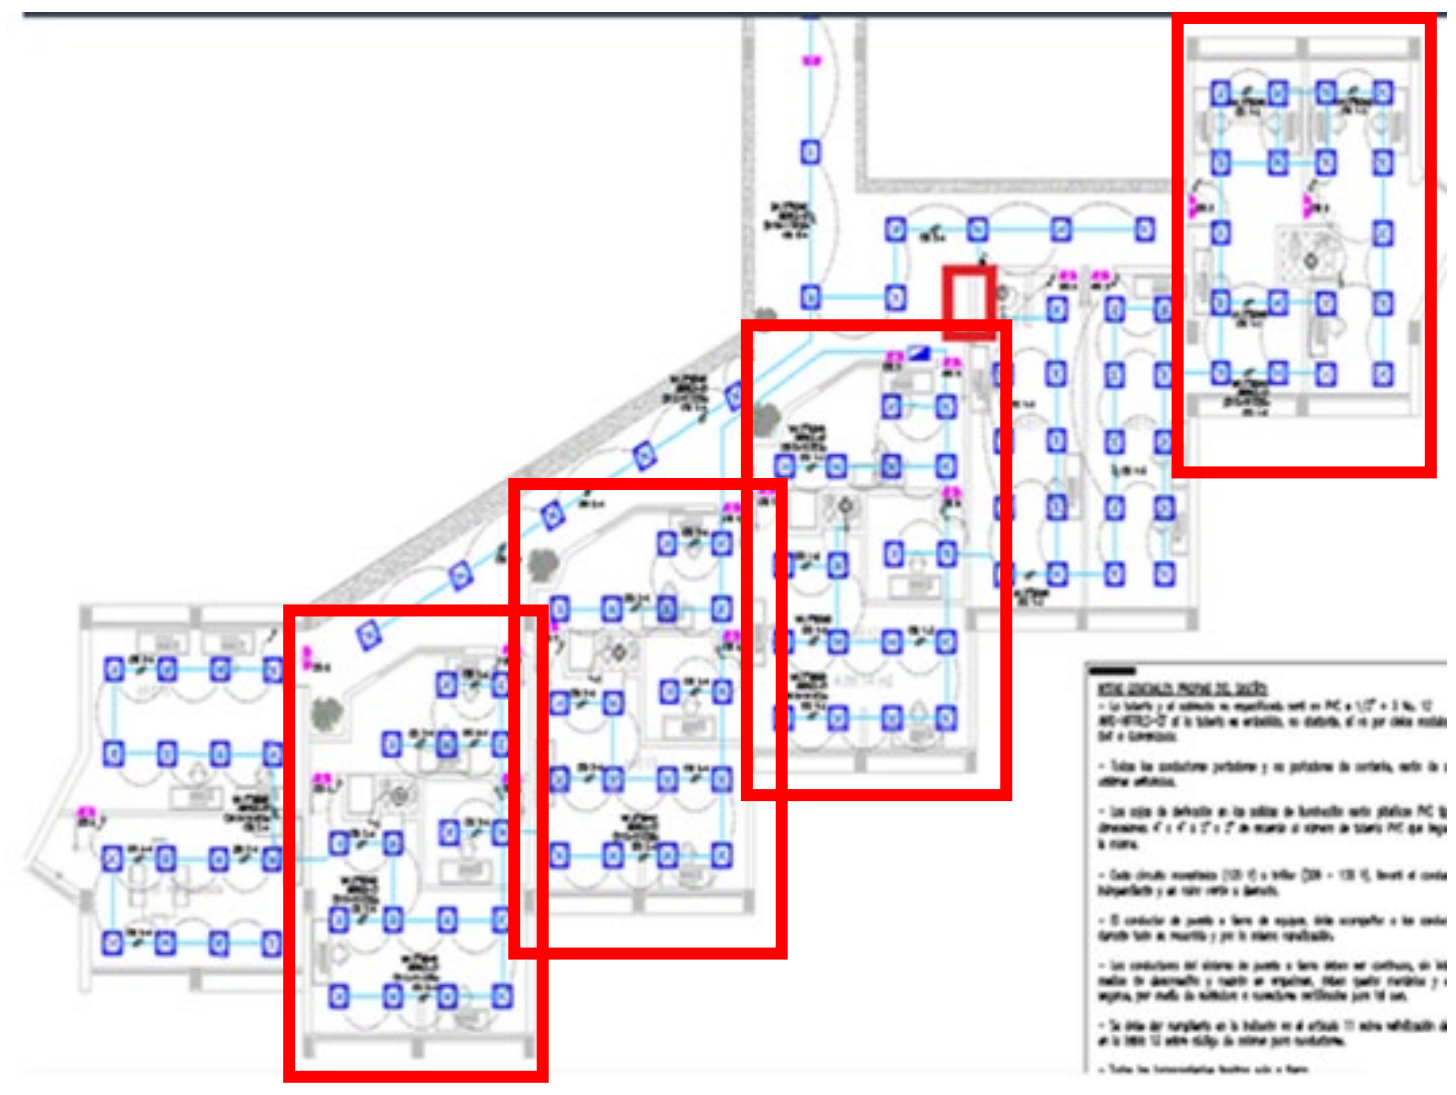

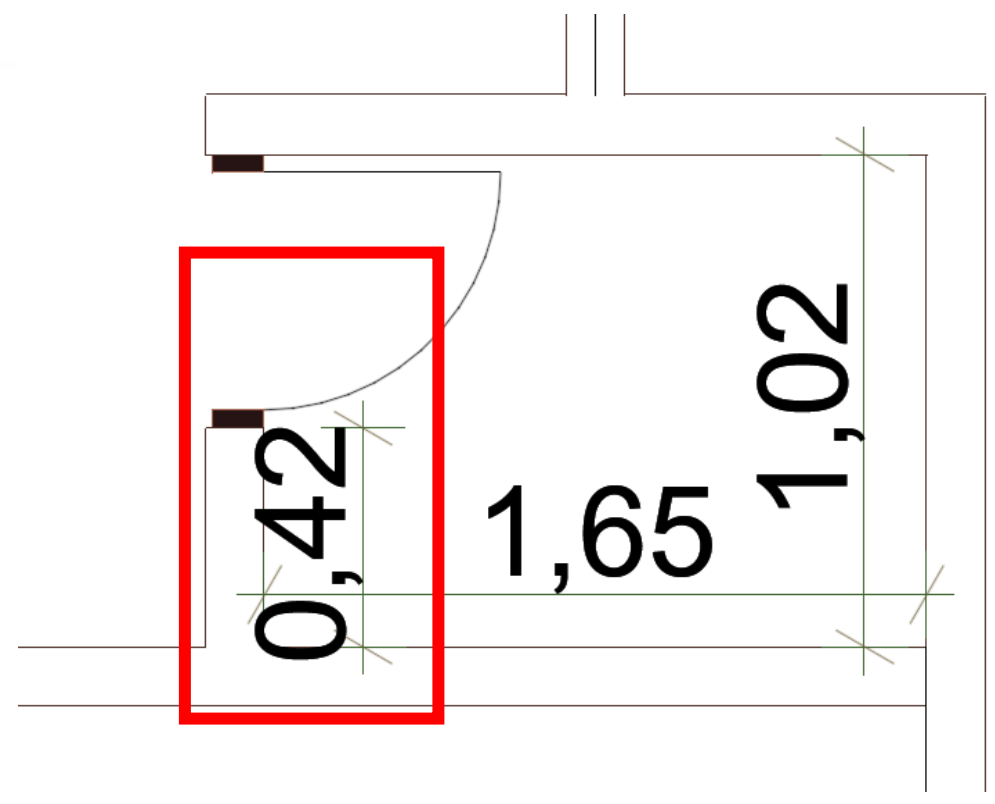

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 42	Suministro e instalacion de griferia lavamanos alta monocontrol	UND	4.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						4.00	
CANTIDAD TOTAL						4.00	



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 43	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer cuadrado slim blanco 37 x 37, incluye accesorios de instalación.	UND	4.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
OF 509				1.00		1.00
OF 512				1.00		1.00
OF 513				1.00		1.00
OF 514				1.00		1.00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

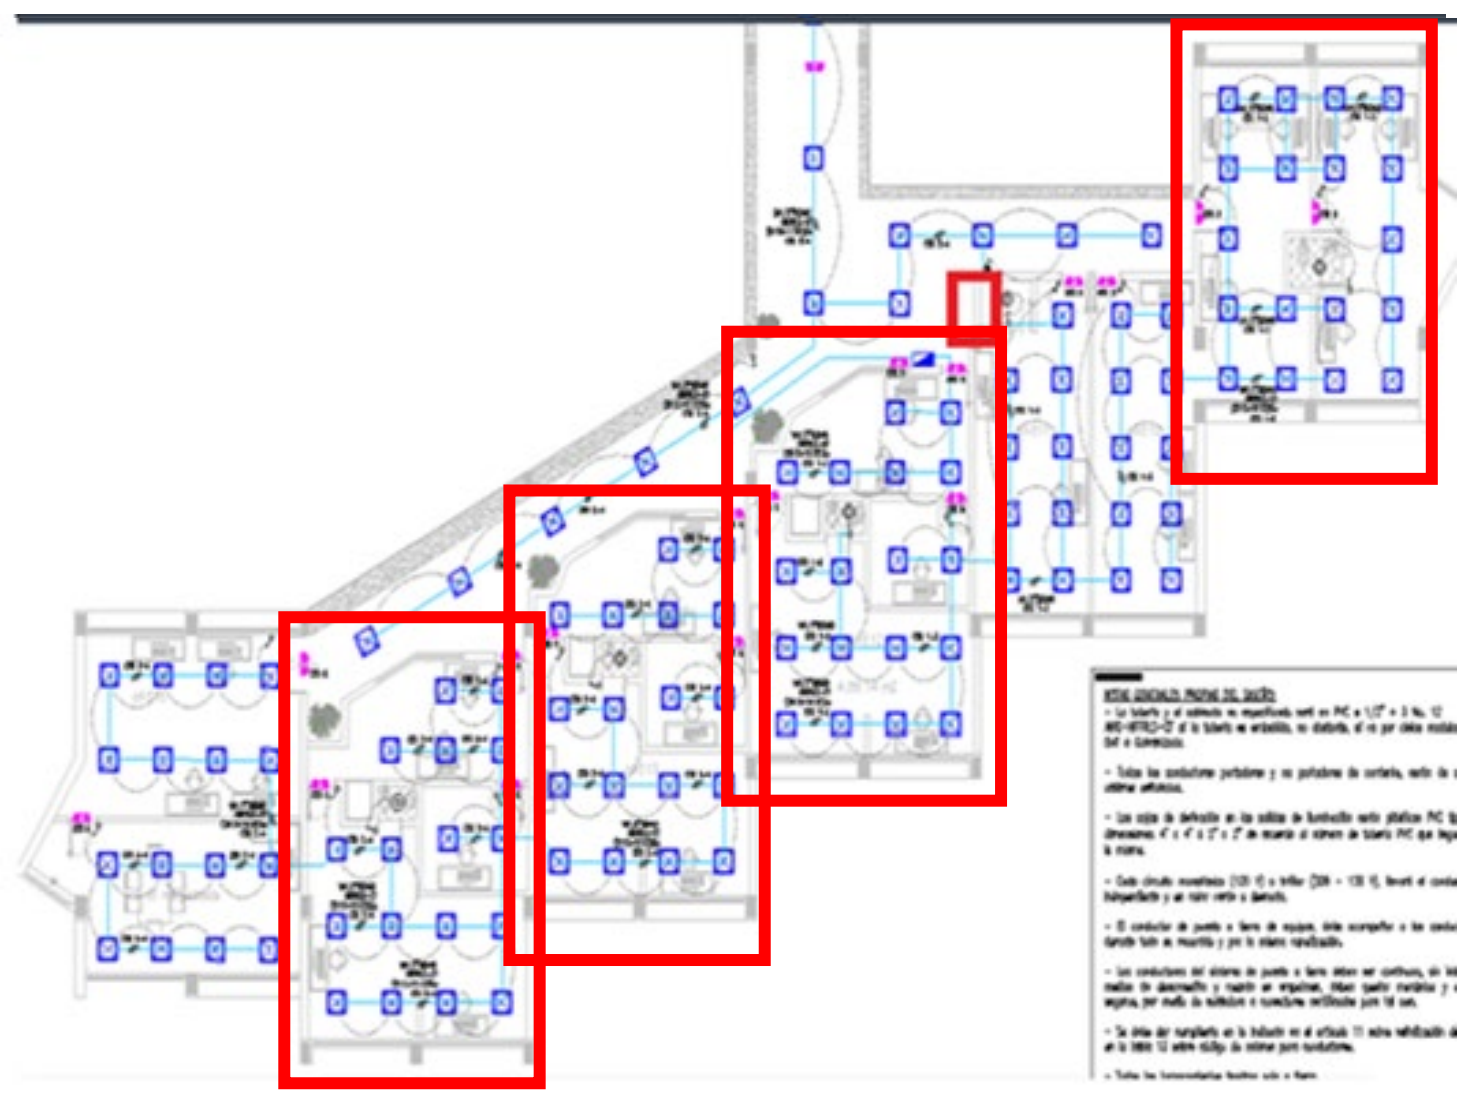

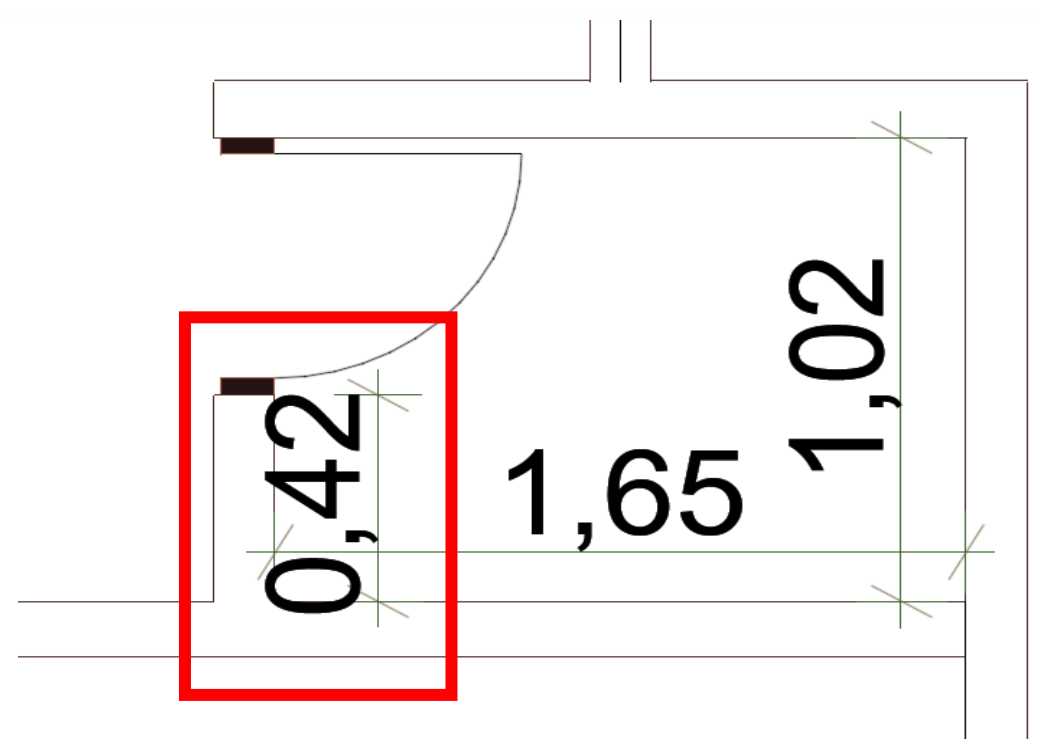

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 43	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer cuadrado slim blanco 37 x 37, incluye accesorios de instalación.	UND	4.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
Subtotal						**4.00**
CANTIDAD TOTAL						**4.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

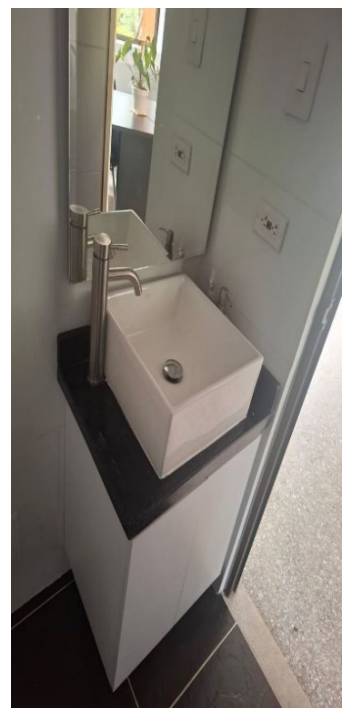



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 44	Desmonte de aparato sanitario. Incluye disposicion final.	UND	110.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 1				7.00		7.00	
BAÑOS TORRE A PISO 2				11.00		11.00	
BAÑOS TORRE A PISO 3				11.00		11.00	
BAÑOS TORRE A PISO 4				10.00		10.00	
BAÑOS TORRE A PISO 5				8.00		8.00	
BAÑOS TORRE B PISO 1				8.00		8.00	
BAÑOS TORRE B PISO 2				9.00		9.00	
BAÑOS TORRE B PISO 3				8.00		8.00	
BAÑOS TORRE B PISO 4				9.00		9.00	
BAÑOS TORRE B PISO 5				8.00		8.00	
BAÑOS TORRE B PISO 2 AUX				5.00		5.00	
OFICINA 502				2.00		2.00	
OFICINA 503				2.00		2.00	
OFICINA 504				2.00		2.00	
OFICINA 505				2.00		2.00	
OFICINA 509				2.00		2.00	
OFICINA 512				2.00		2.00	
OFICINA 513				2.00		2.00	
OFICINA 514				2.00		2.00	

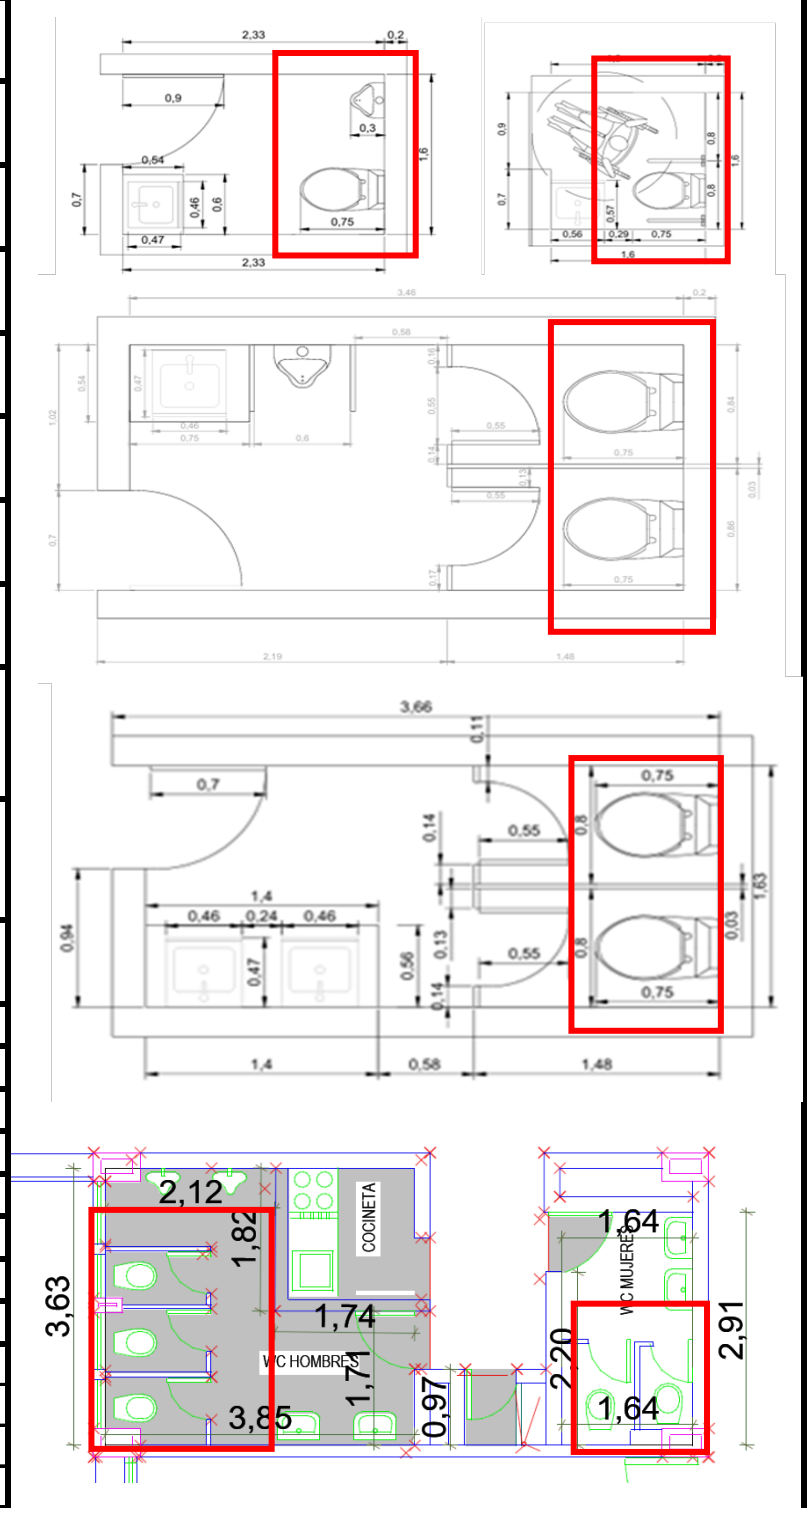

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 44	Desmonte de aparato sanitario. Incluye disposicion final.	UND	110.00


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
Subtotal						110.00
CANTIDAD TOTAL						110.00


ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

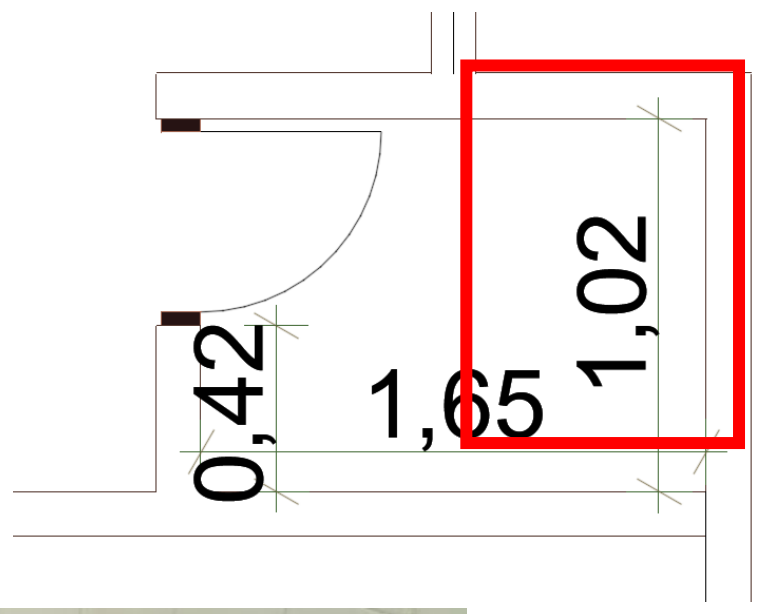





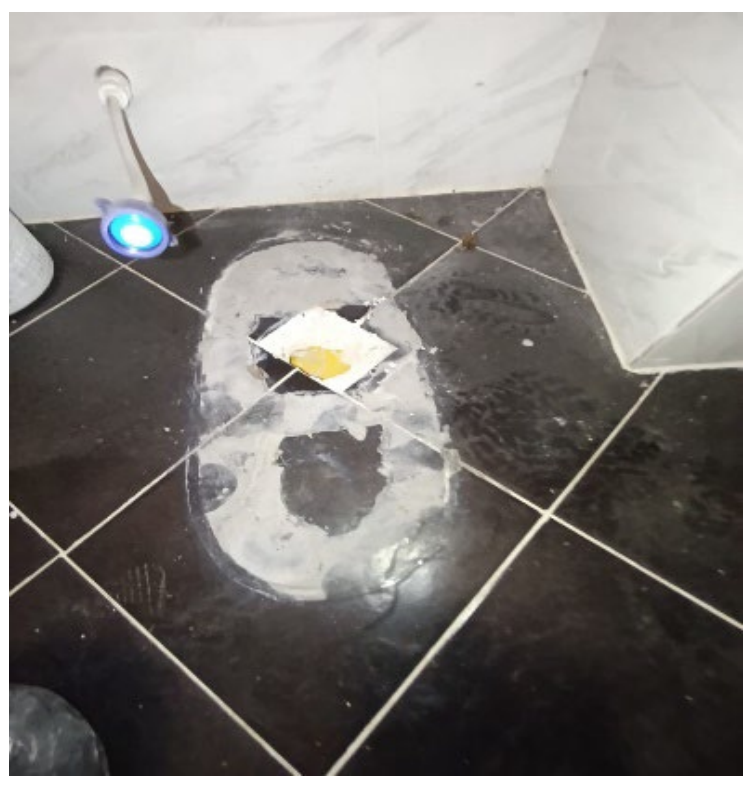

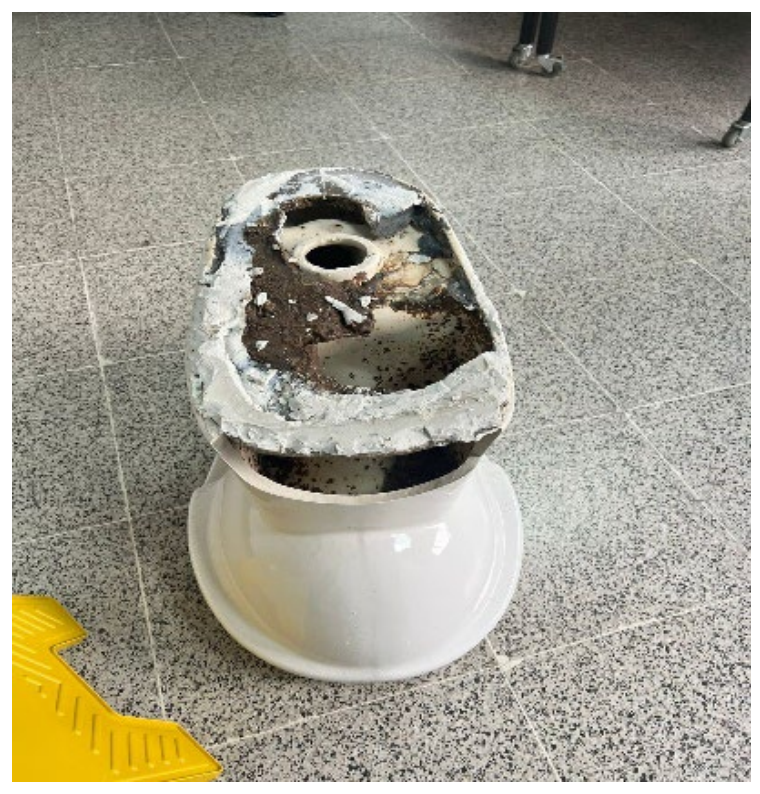

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA	**ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad		Cantidad total
NP 45	Suministro es instalacion de puerta marco en aluminio color anolock, hoja un En vidrio Incoloro 4mm sandblasting cortinado 2cm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura tipo pomo, Incluye desmonte puerta existente.	M2		61.73

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 1	0.74	2.05			1	1.51	
BAÑOS TORRE A PISO 2	0.685	2.15			1	1.47	
	0.695	2.15			1	1.49	
BAÑOS TORRE A PISO 3	0.70	2.15			1	1.51	
	0.70	2.15			1	1.51	
BAÑOS TORRE A PISO 4	0.585	2.15			1	1.26	
	0.70	2.15			1	1.51	
BAÑOS TORRE A PISO 5	0.69	2.15			1	1.48	
	0.71	2.15			1	1.53	
BAÑOS TORRE B PISO 1	0.88	2.15			2	3.78	
BAÑOS TORRE B PISO 2	0.70	2.15			2	3.01	
BAÑOS TORRE B PISO 3	0.70	2.15			2	3.01	
BAÑOS TORRE B PISO 4	0.70	2.15			2	3.01	
BAÑOS TORRE B PISO 5	0.70	2.15			2	3.01	
BAÑOS TORRE B PISO 2 AUX	0.70	2.15			2	3.01	
OF 509	0.80	2.43				1.94	
OF 509	0.90	2.42				2.18	
OF 510	0.90	2.42				2.18	
OF 510	0.90	2.11				1.90	
OF 512	0.80	2.42				1.94	
OF 512	0.77	2.42				1.86	
OF 512	0.89	2.40				2.14	
OF 513	0.80	2.42				1.94	
OF 513	0.77	2.42				1.86	
OF 513	0.90	2.40				2.16	
OF 514	0.78	2.41				1.88	

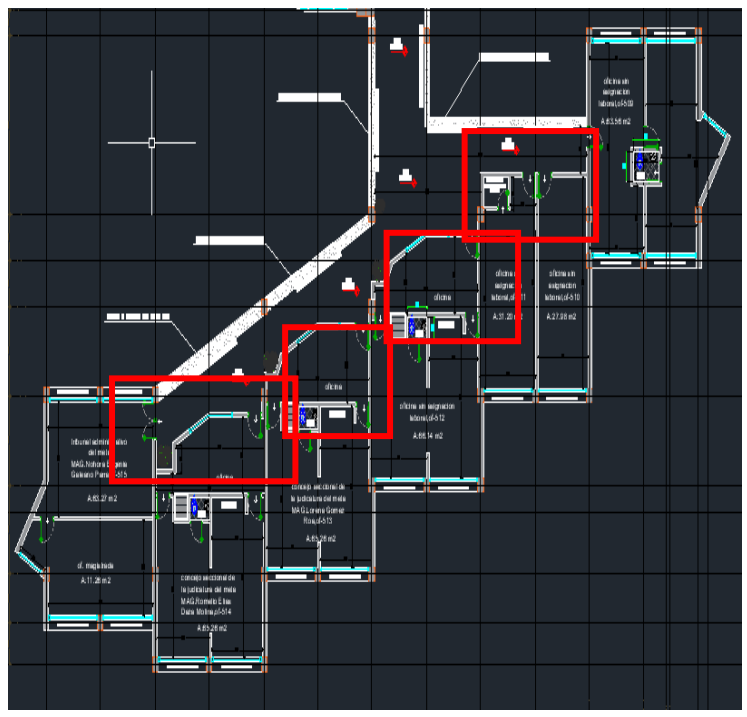

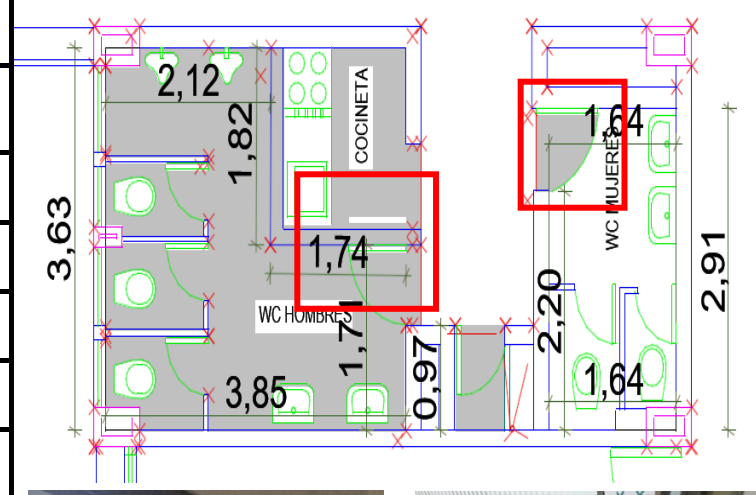





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad		Cantidad total
NP 45	Suministro es instalacion de puerta marco en aluminio color anolock, hoja un En vidrio Incoloro 4mm sandblasting cortinado 2cm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura tipo pomo, Incluye desmonte puerta existente.	M2		61.73

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OF 514	0.79	2.41				1.90	 
OF 514	0.90	2.40				2.16	
OF 515	1.49	2.42				3.61	
Subtotal						61.73	
CANTIDAD TOTAL						61.73	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 46	Suministro e instalación de puerta en madera entamborada, con marco en aluminio y chapa tipo manija, incluye desmonte puerta existente	M2	12.20

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OFICINA 509	0.68	2.50				1.70	
OFICINA 512	0.68	2.50				1.70	
OFICINA 513	0.69	2.50				1.72	
OFICINA 514	0.68	2.50				1.70	
BAÑOS PRIMER PISO TORRE A	0.895	2.160				1.93	
	0.695	2.160				1.50	
	0.900	2.160				1.94	

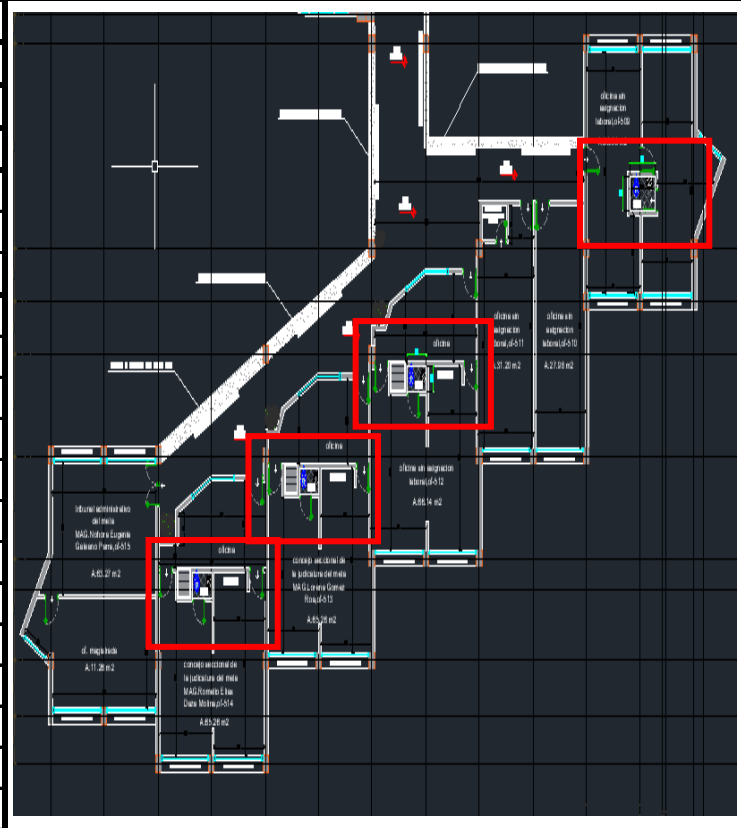

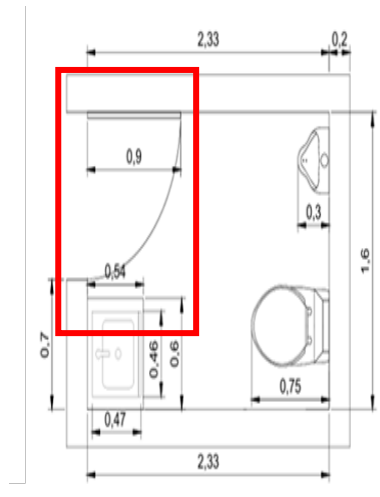

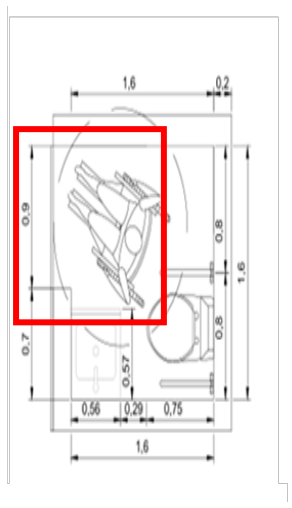

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio




B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 46	Suministro e instalación de puerta en madera entamborada, con marco en aluminio y chapa tipo manija, incluye desmonte puerta existente	M2	12.20

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
Subtotal						12.20
CANTIDAD TOTAL						12.20

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

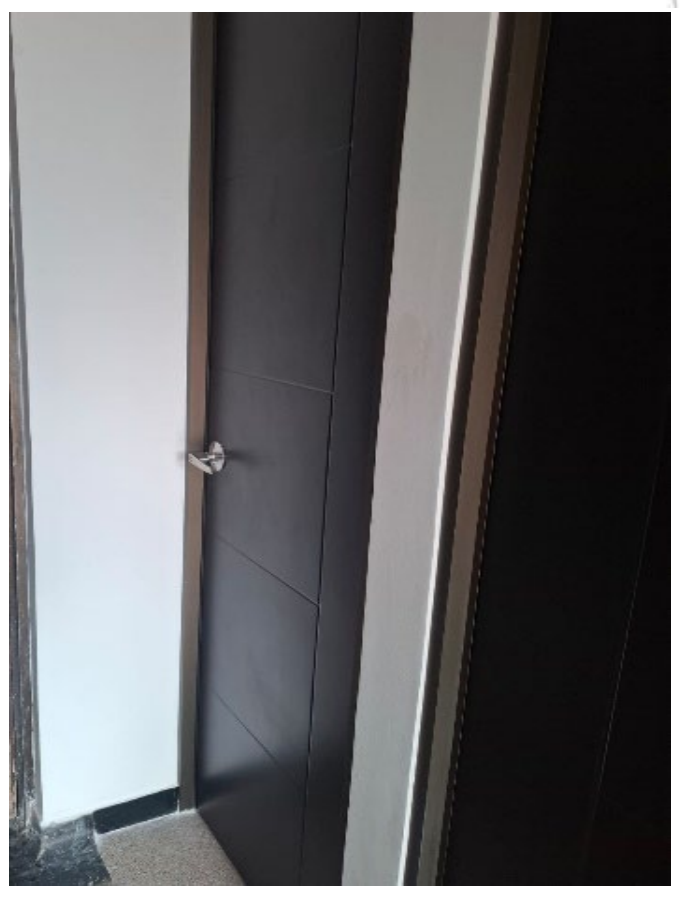

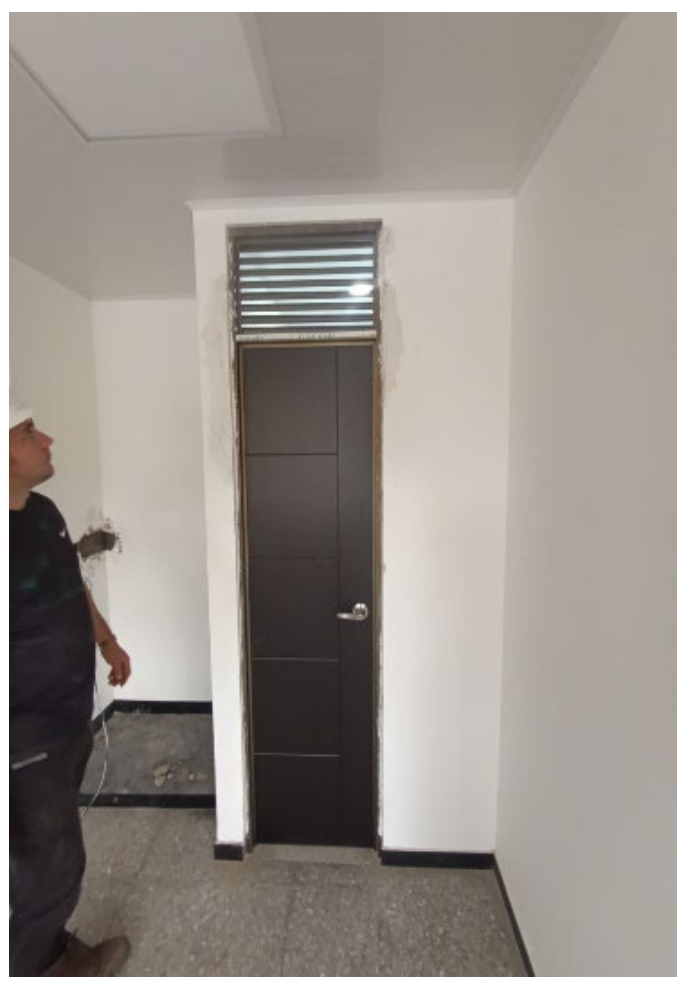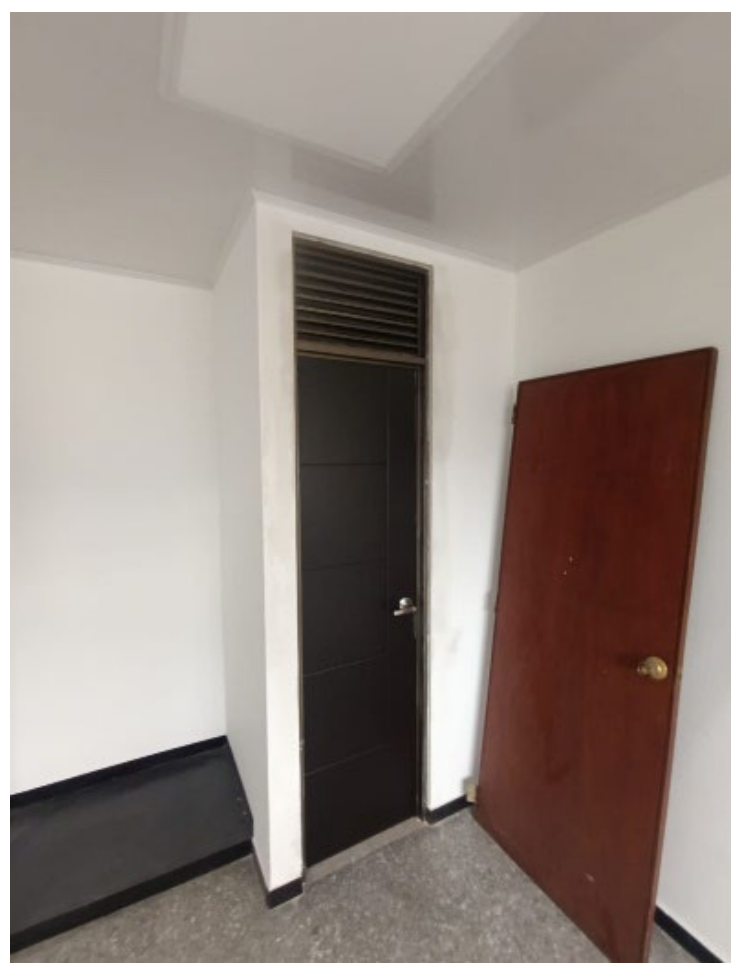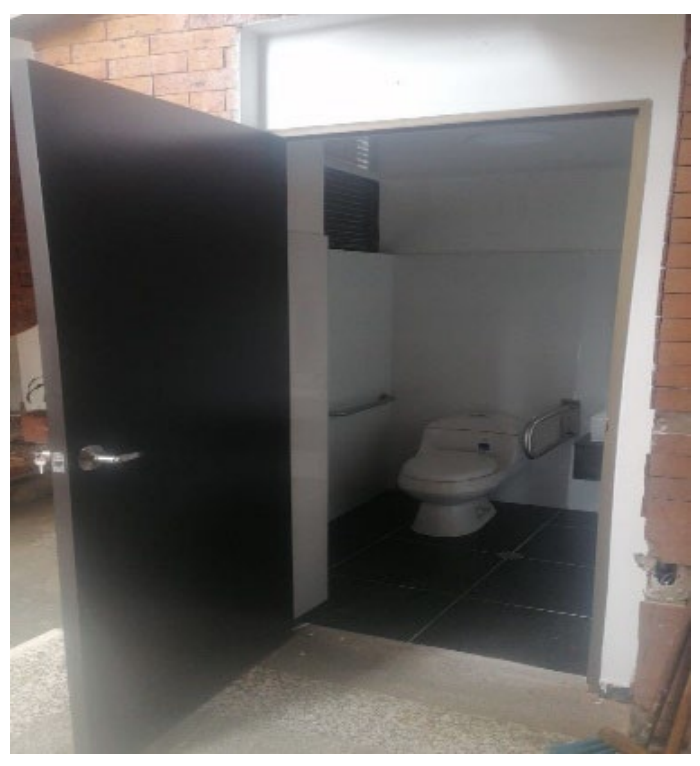
OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 47	Suministro e instalacion de Panel led empotrar 12W	UND	30.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE B PISO 1				8.00		8.00	
BAÑOS TORRE B PISO 2				4.00		4.00	
BAÑOS TORRE B PISO 3				4.00		4.00	
BAÑOS TORRE B PISO 4				4.00		4.00	
BAÑOS TORRE B PISO 5				4.00		4.00	
BAÑOS TORRE B PISO 2 AUX				2.00		2.00	
OF 509				1.00		1.00	
OF 512				1.00		1.00	
OF 513				1.00		1.00	
OF 514				1.00		1.00	

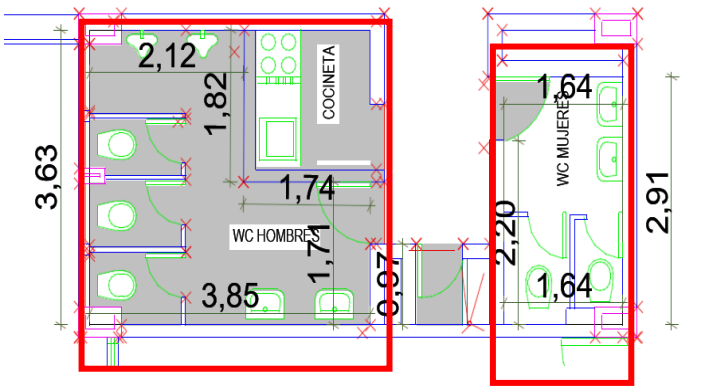

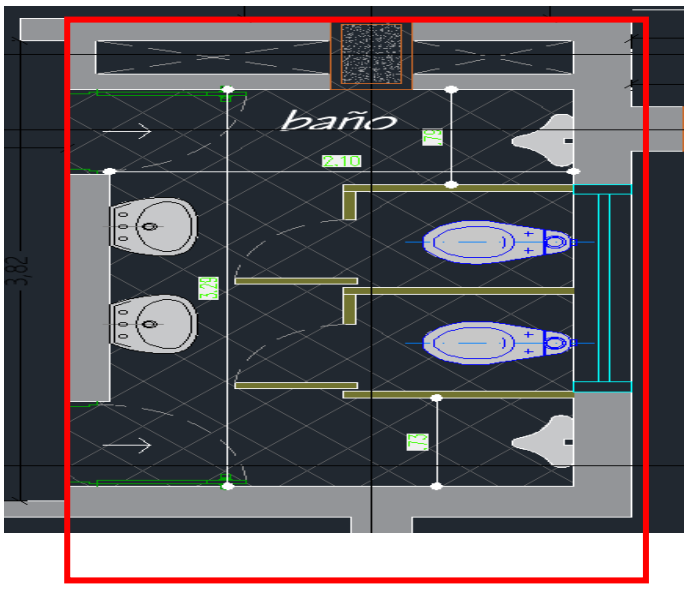

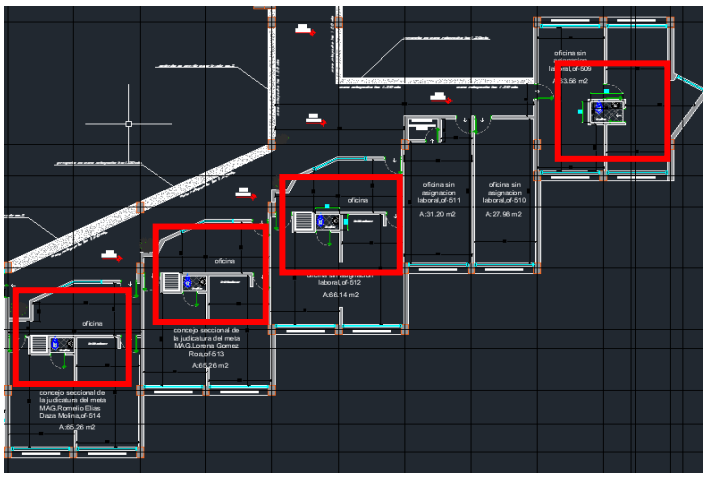

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia





CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 47	Suministro e instalacion de Panel led empotrar 12W	UND	30.00

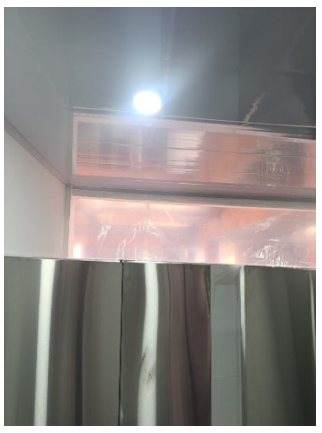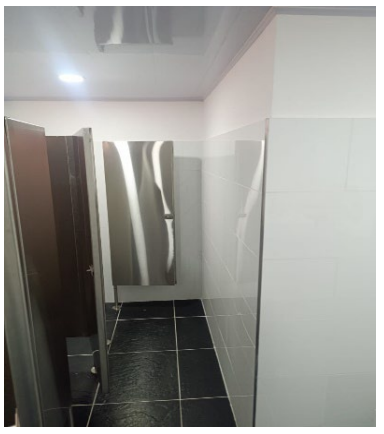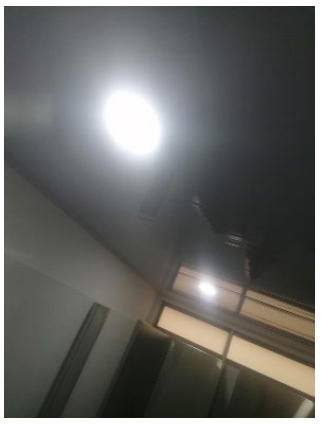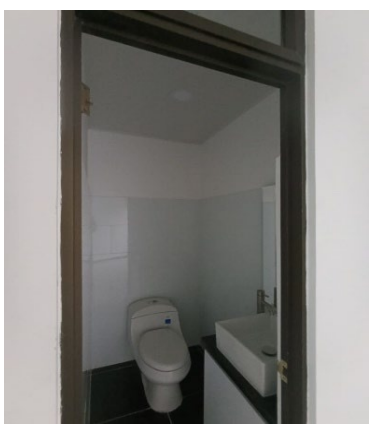LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
							   
Subtotal						30.00	
CANTIDAD TOTAL						30.00	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 48	Suministro e instalacion de Panel led empotrar 24W	UND	23.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 1				3.00		3.00	
BAÑOS TORRE A PISO 2				4.00		4.00	
BAÑOS TORRE A PISO 3				4.00		4.00	
BAÑOS TORRE A PISO 4				4.00		4.00	
BAÑOS TORRE A PISO 5				4.00		4.00	
BAÑOS TORRE B PISO 2				1.00		1.00	
BAÑOS TORRE B PISO 3				1.00		1.00	
BAÑOS TORRE B PISO 4				1.00		1.00	
BAÑOS TORRE B PISO 5				1.00		1.00	

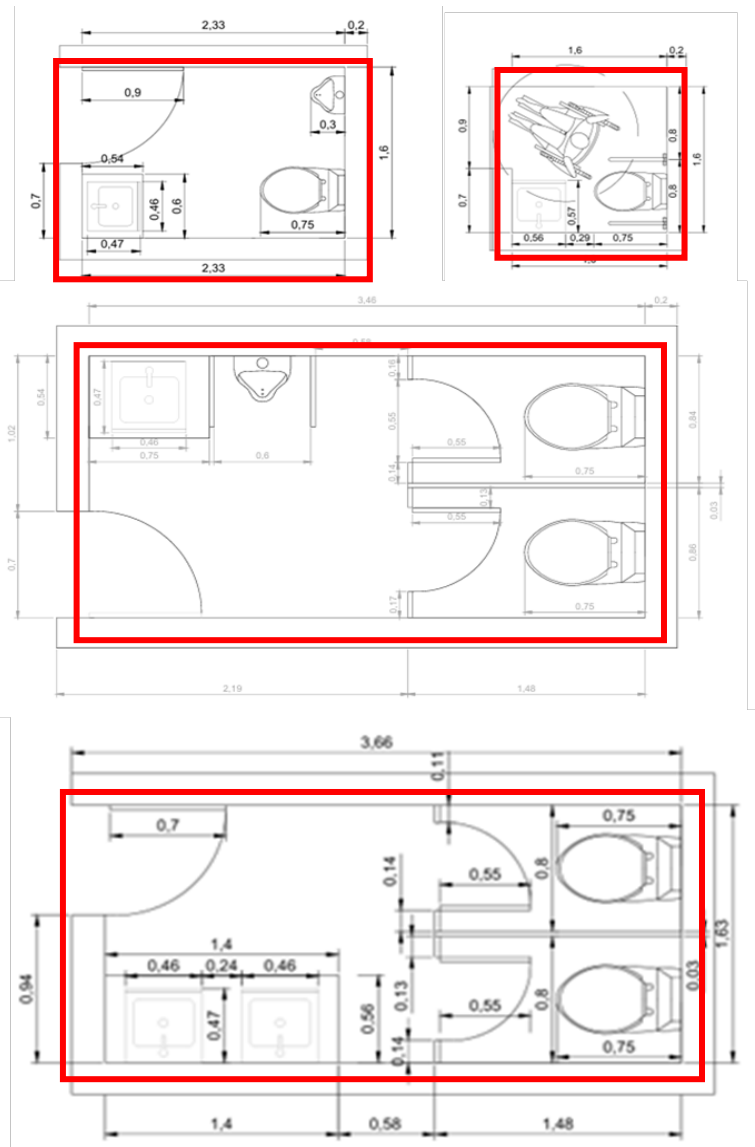



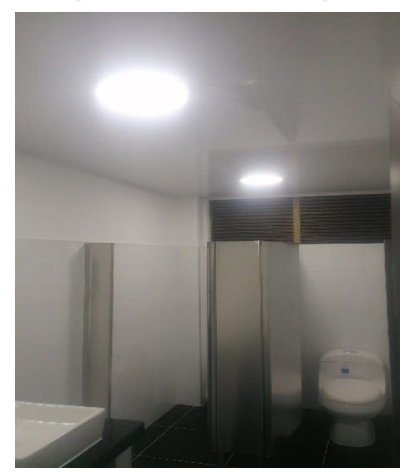

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 48	Suministro e instalacion de Panel led empotrar 24W	UND	23.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						23.00	
CANTIDAD TOTAL						23.00	





OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 49	Suministro e instalacion de Equipo hidroflo con tanque hidroacumulador vertical de 200 litros, 2 electrobombas (2 HP, 3450 RPM, 220V, 40/60 PSI 60HZ) incluye	UND	2.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
CUBIERTA TORRE B				1.00		1.00
CUBIERTA TORRE A				1.00		1.00
Subtotal						**2.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 49	Suministro e instalacion de Equipo hidroflo con tanque hidroacumulador vertical de 200 litros, 2 electrobombas (2 HP, 3450 RPM, 220V, 40/60 PSI 60HZ) incluye	UND	2.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
CANTIDAD TOTAL						2.00	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 50	Suministro e instalacion de pelicula sand blasting tipo frost. (Suministro e instalación)	M2	40.83

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE B PISO 1	0.47	1.95				0.92	
	0.46	1.94				0.89	
BAÑOS TORRE B PISO 2	0.47	1.95				0.92	
	0.46	1.94				0.89	
BAÑOS TORRE B PISO 3	0.47	1.95				0.92	
	0.46	1.94				0.89	
BAÑOS TORRE B PISO 4	0.47	1.95				0.92	
	0.46	1.94				0.89	
BAÑOS TORRE B PISO 5	0.47	1.95				0.92	
	0.46	1.94				0.89	
VENTANAS BAÑOS TORRE B	3.14	0.04				0.13	
BAÑOS TORRE B PISO 2 AUX	0.47	1.95			1	0.92	
	0.46	1.94			1	0.89	
BAÑOS TORRE B PISO 2 AUX	0.40	0.45			2	0.36	
BAÑOS TORRE A PISO 2	0.475	1.935				0.92	
	0.475	1.935				0.92	
BAÑOS TORRE A PISO 3	0.475	1.935				0.92	
	0.475	1.935				0.92	
BAÑOS TORRE A PISO 4	0.475	1.935				0.92	
	0.355	1.935				0.69	
BAÑOS TORRE A PISO 5	0.475	1.935				0.92	
	0.475	1.935				0.92	
OFICINA 509	0.575	1.840		PUERTA INT	1	1.06	
	0.755	0.345		VENTANA INT	1	0.26	
	0.675	1.840		PUERTA EXT	1	1.24	
	0.335	0.850		VENTANA EXT	1	0.28	

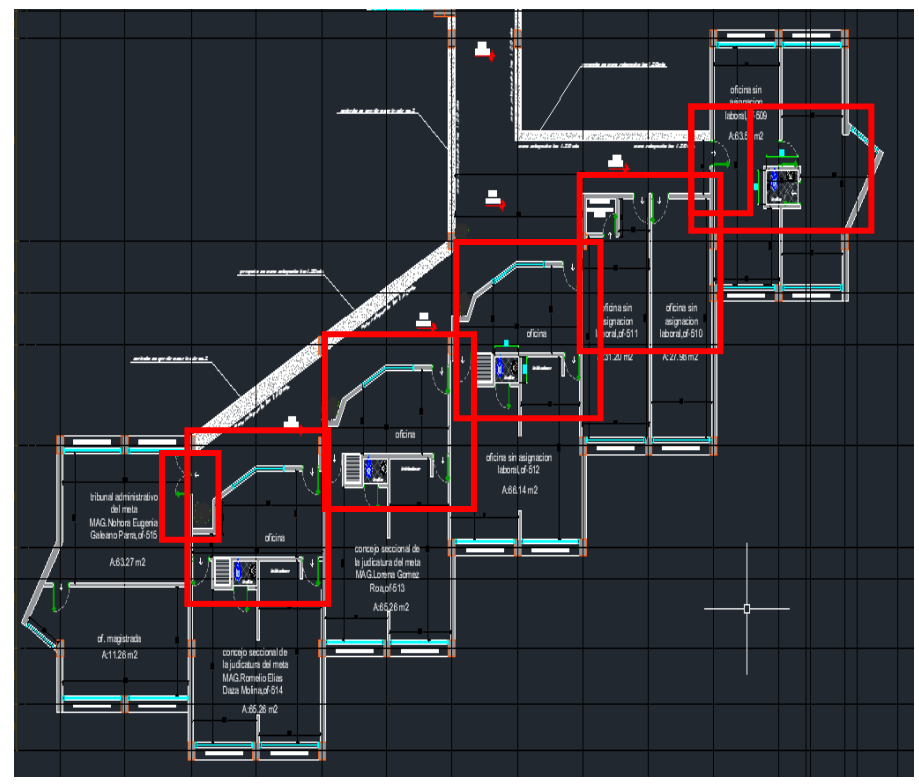

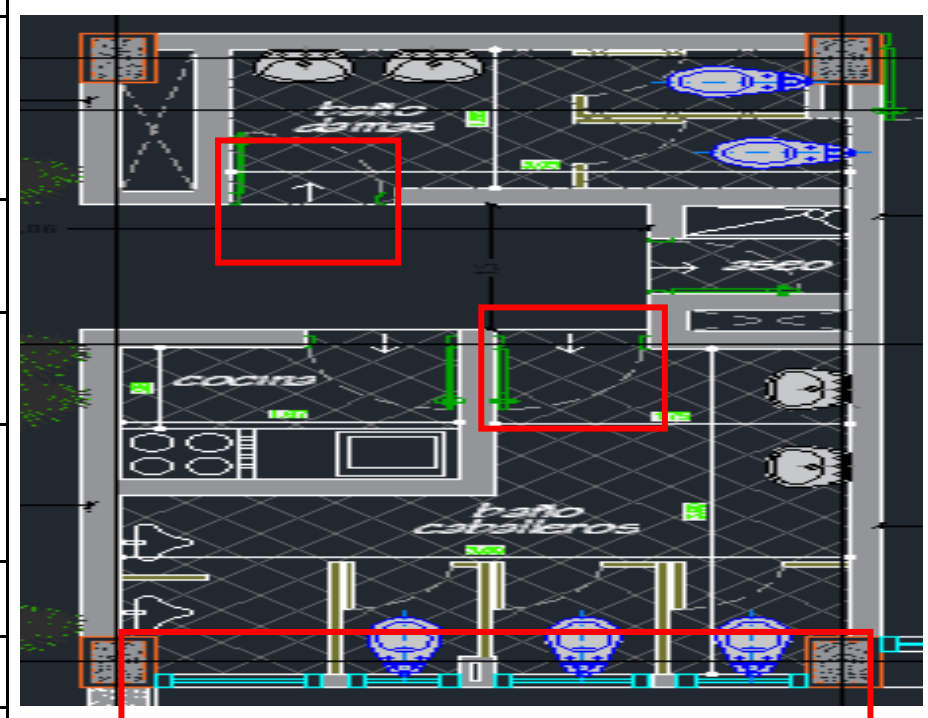

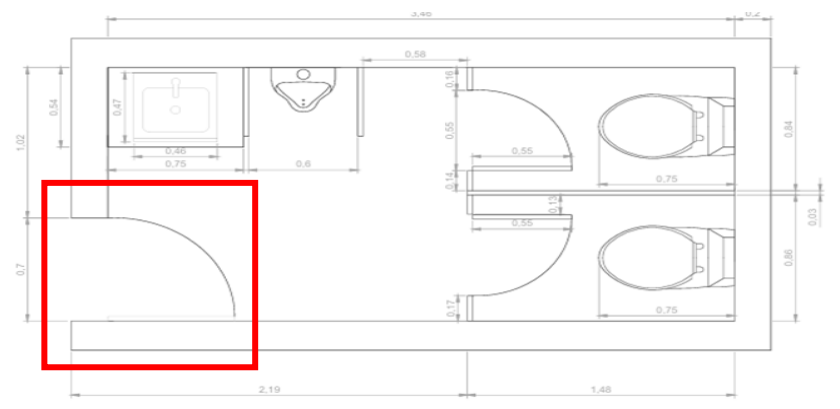

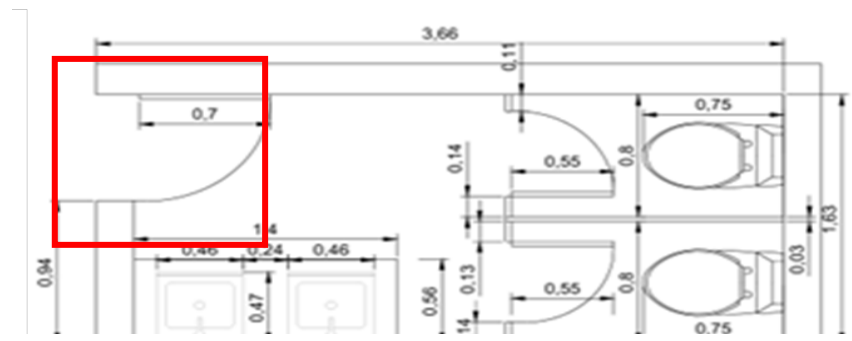

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 50	Suministro e instalacion de pelicula sand blasting tipo frost. (Suministro e instalación)	M2	40.83

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
							

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 50	Suministro e instalacion de pelicula sand blasting tipo frost. (Suministro e instalación)	M2	40.83

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
Subtotal						21.31
CANTIDAD TOTAL						21.31

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO













OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 51	Suministro e instalación de tubería de cobre para aire acondicoonado 60.000 BTU con rubatex con cinta	ML	120.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OFICINA 513	28.00			2.00		56.00	
OFICINA 514	32.00			2.00		64.00	

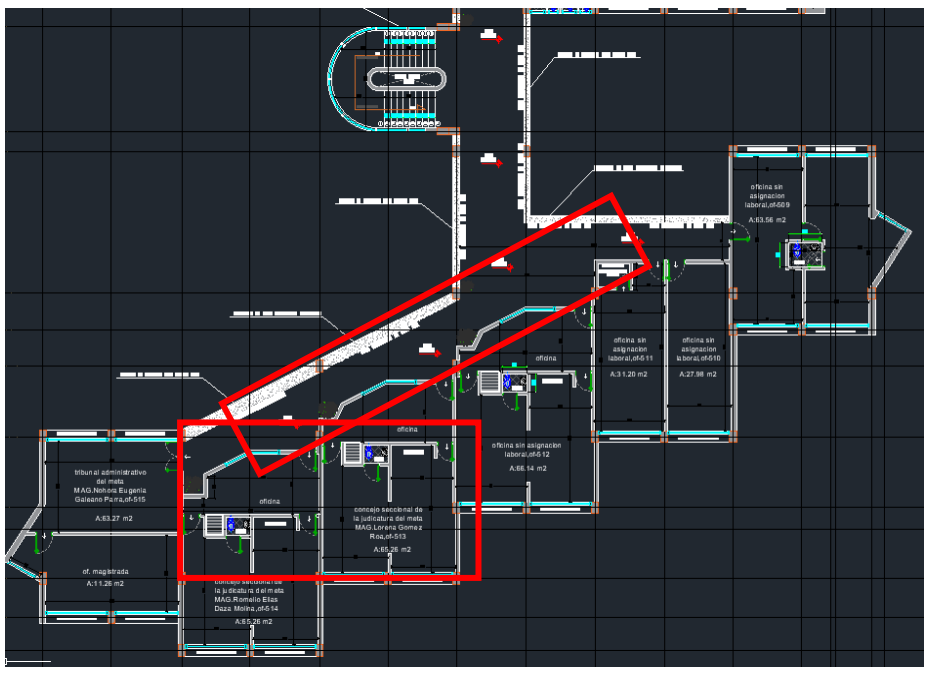









Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 51	Suministro e instalación de tubería de cobre para aire acondicoonado 60.000 BTU con rubatex con cinta	ML	120.00

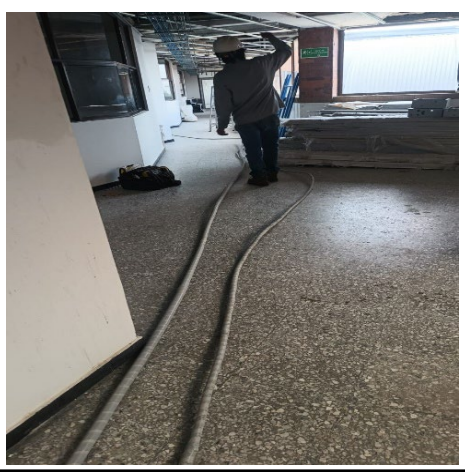LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
							 
Subtotal						120.00	
CANTIDAD TOTAL						120.00	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 52	Aplicación de pintura en esmalte sobre guardaescobas	ML	346.00


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OFICINA 509	52.00					52.00	
OFICINA 510	52.00					52.00	
OFICINA 512	52.00					52.00	
OFICINA 513	52.00					52.00	
OFICINA 514	52.00					52.00	
OFICINA 515	52.00					52.00	
PASILLO ALA A TORRE B	34.00					34.00	

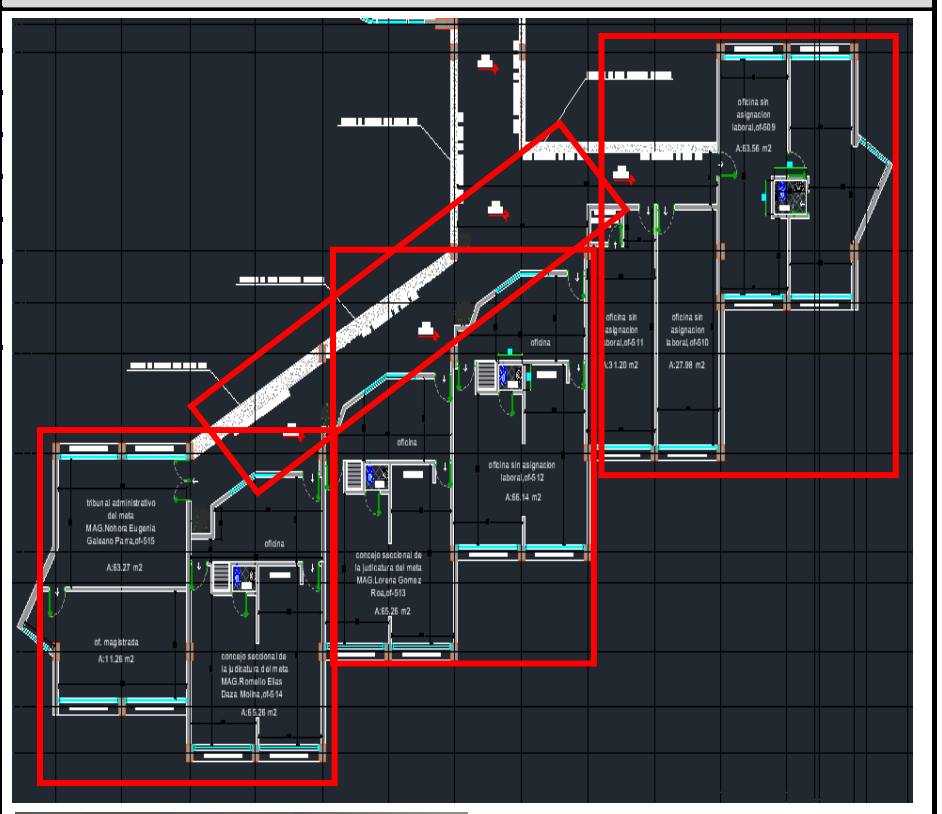







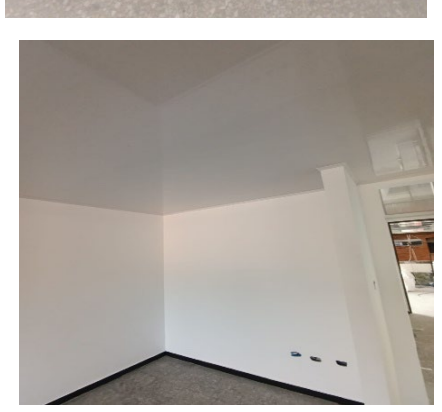

Subtotal						**346.00**
CANTIDAD TOTAL						**346.00**



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 53	Suministro e instalacion de cerrojo o chapa de seguridad	UND	7.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OF 509				1.00		1.00	
OF 510				1.00		1.00	
RACK				1.00		1.00	
OF 512				1.00		1.00	
OF 513				1.00		1.00	
OF 514				1.00		1.00	
OF 515				1.00		1.00	

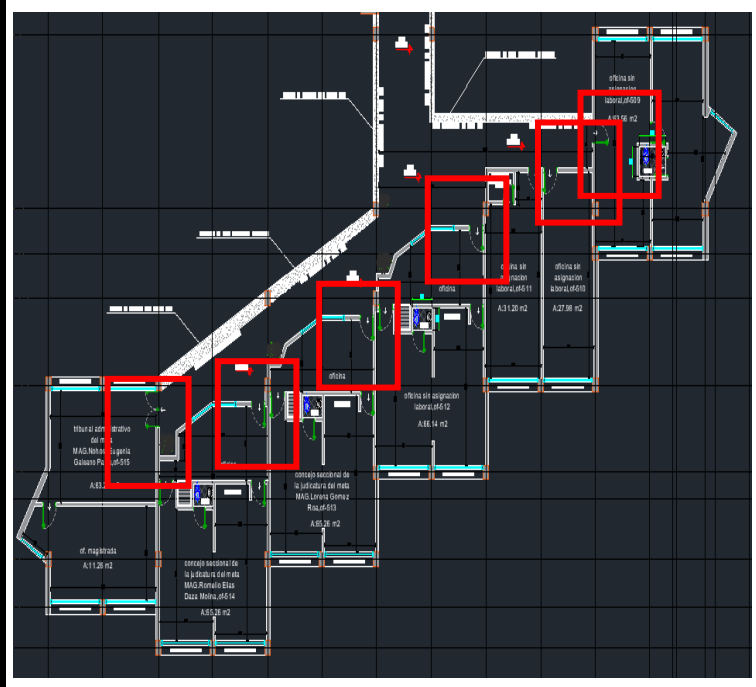


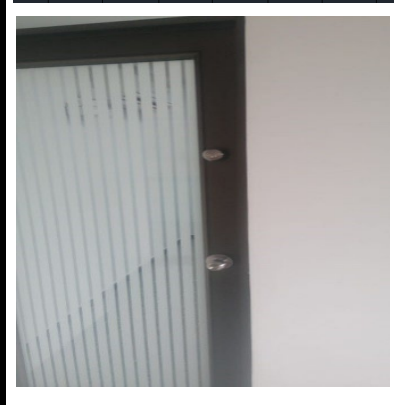



Subtotal						**7.00**
CANTIDAD TOTAL						**7.00**



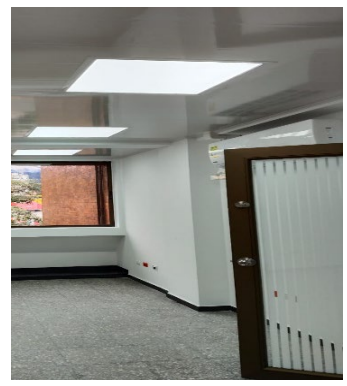

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 54	Suministro e instalacion de ventana en aluminio tipo rejilla incluye desmonte de ventanas existente.	M2	9.53

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 2	1.41	0.74			2	2.09	
BAÑOS TORRE A PISO 3	1.41	0.74			2	2.09	
BAÑOS TORRE A PISO 4	1.41	0.74			2	2.09	
BAÑOS TORRE A PISO 5	1.41	0.74			2	2.09	
BAÑOS TORRE A PISO 1	1.60	0.74			1	1.18	

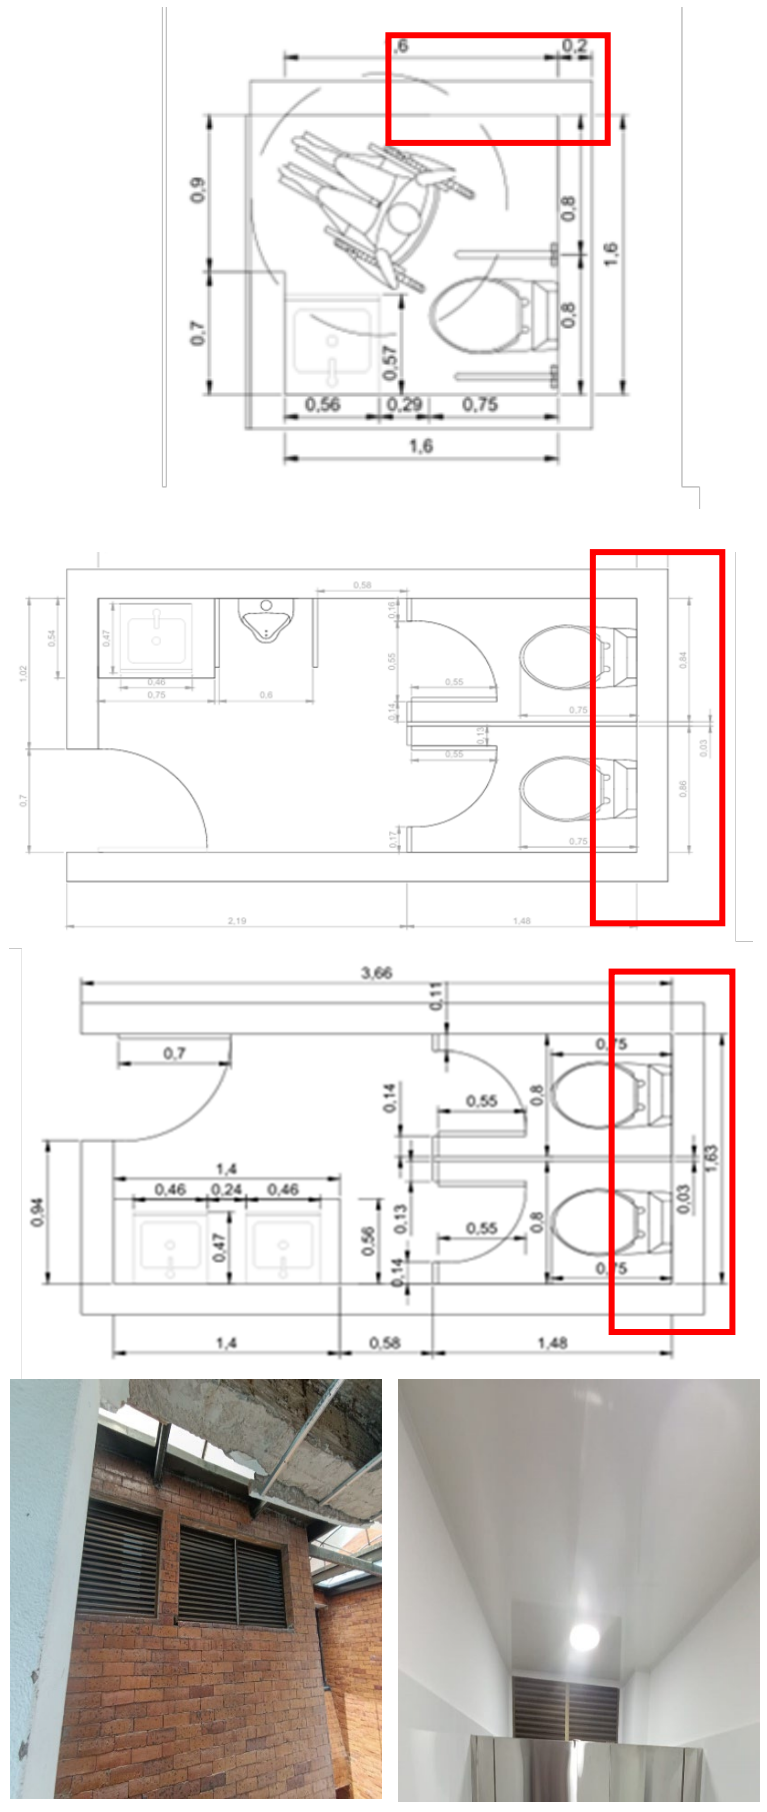

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 54	Suministro e instalacion de ventana en aluminio tipo rejilla incluye desmonte de ventanas existente.	M2	9.53

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
Subtotal						9.53
CANTIDAD TOTAL						9.53

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO



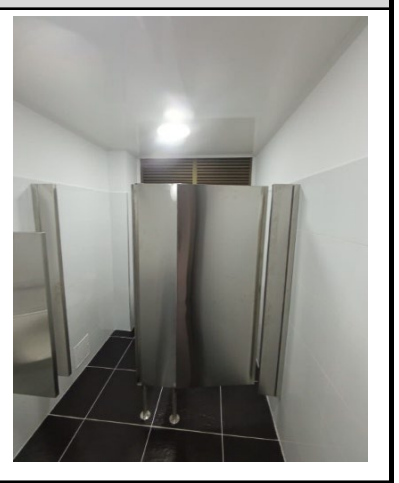

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 55	Suministro e instalacion de puerta metalica en cold rolled cal 18 con fijo superior en marco metalico y vidrio incoloro 4mm y chapa tipo pomo, incluye desmonte de puerta existente.	M2	2.17

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
RACK	0.89	2.44		1.00		2.17
Subtotal						2.17
CANTIDAD TOTAL						2.17

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

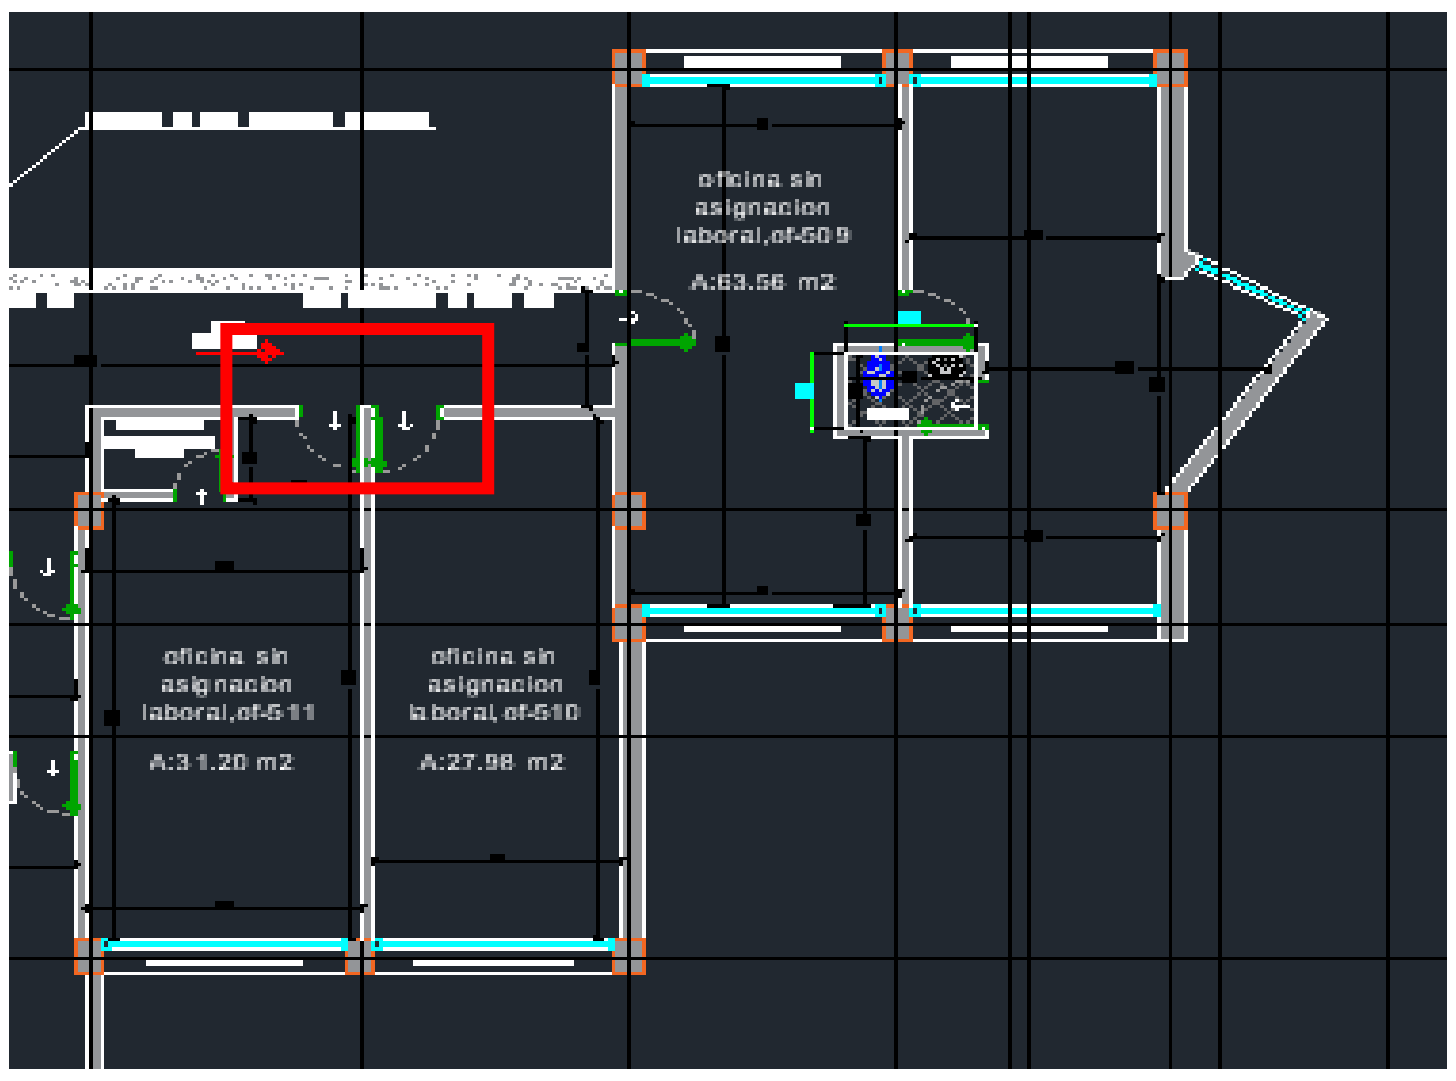



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad		Cantidad total
NP 45	Desmonte de puertas en madera o en aluminio, incluye desmonte de marco y accesorios, retiro a punto de acopio de la entidad	M2		99.85

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑOS TORRE A PISO 1	0.74	2.05			1	1.51	
BAÑOS TORRE A PISO 2	0.685	2.15			1	1.47	
	0.695	2.15			1	1.49	
BAÑOS TORRE A PISO 3	0.70	2.15			1	1.51	
	0.70	2.15			1	1.51	
BAÑOS TORRE A PISO 4	0.585	2.15			1	1.26	
	0.70	2.15			1	1.51	
BAÑOS TORRE A PISO 5	0.69	2.15			1	1.48	
	0.71	2.15			1	1.53	
BAÑOS TORRE B PISO 1	0.88	2.15			2	3.78	
BAÑOS TORRE B PISO 2	0.70	2.15			2	3.01	
BAÑOS TORRE B PISO 3	0.70	2.15			2	3.01	
BAÑOS TORRE B PISO 4	0.70	2.15			2	3.01	
BAÑOS TORRE B PISO 5	0.70	2.15			2	3.01	
BAÑOS TORRE B PISO 2 AUX	0.70	2.15			2	3.01	
PUERTAS DE ALUMINIO							
OF 509	0.80	2.43				1.94	
OF 509	0.90	2.42				2.18	
OF 510	0.90	2.42				2.18	
OF 510	0.90	2.11				1.90	
OF 512	0.80	2.42				1.94	
OF 512	0.77	2.42				1.86	
OF 512	0.89	2.40				2.14	





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO


Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad		Cantidad total
NP 45	Desmonte de puertas en madera o en aluminio, incluye desmonte de marco y accesorios, retiro a punto de acopio de la entidad	M2		99.85

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
OF 513	0.80	2.42				1.94	
OF 513	0.77	2.42				1.86	
OF 513	0.90	2.40				2.16	
OF 514	0.78	2.41				1.88	
OF 514	0.79	2.41				1.90	
OF 514	0.90	2.40				2.16	
OF 515	1.49	2.42				3.61	
OF 502	0.80	2.43				1.94	
OF 502	0.90	2.42				2.18	
OF 503	0.90	2.42				2.18	
OF 503	0.90	2.11				1.90	
OF 504	0.80	2.42				1.94	
OF 504	0.77	2.42				1.86	
OF 505	0.89	2.40				2.14	
OF 505	0.80	2.42				1.94	
OF 506	0.77	2.42				1.86	
OF 507	0.90	2.42				2.18	
OF 507	0.90	2.42				2.18	
OF 508	0.90	2.42				2.18	
PUERTAS DE MADERA							
OFICINA 509	0.68	2.50				1.70	
OFICINA 512	0.68	2.50				1.70	
OFICINA 513	0.69	2.50				1.72	
OFICINA 514	0.68	2.50				1.70	
OFICINA 502	0.69	2.50				1.72	
OFICINA 503	0.68	2.50				1.70	
OFICINA 504	0.68	2.50				1.70	
OFICINA 505	0.69	2.50				1.72	



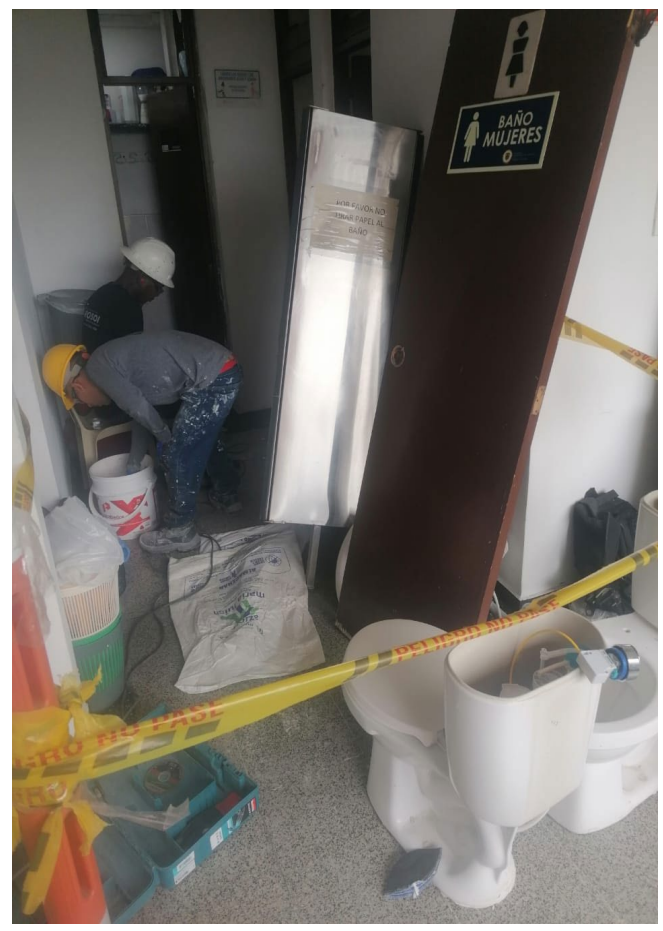

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad		Cantidad total
NP 45	Desmonte de puertas en madera o en aluminio, incluye desmonte de marco y accesorios, retiro a punto de acopio de la entidad	M2		99.85

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
Subtotal						99.85	
CANTIDAD TOTAL						99.85	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 58	Desmonte de aires acondicionados, incluye desmonte y traslados de equipos a punto de acopio de la entidad	UND	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
OFICINA 506				1.00		1.00
Subtotal						1.00
CANTIDAD TOTAL						1.00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Fabian Castañeda

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 60	Suministro e instalacion de barra de seguridad en U plegable para baño en acero inoxidable.	UND	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑO TORRE A PRIMER PISO				1.00		1.00	
Subtotal						**1.00**	
CANTIDAD TOTAL						**1.00**	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 61	Suministro e instalacion de barra de seguridad recta para baño en acero inoxidable.	UND	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
BAÑO TORRE A PRIMER PISO				1.00		1.00	
Subtotal						1.00	
CANTIDAD TOTAL						1.00	

OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 62	Suministro e instalacion de barra de seguridad en L para baño en acero inoxidable.	UND	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
BAÑO TORRE B PRIMER PISO				1.00		1.00
Subtotal						1.00
CANTIDAD TOTAL						1.00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024


OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 63	Suministro e instalacion de medidor para agua de 1-1/2" R-400 Q3-16.0 M3/H, IP-68, ultra sonico	UND	2.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Alto	MEDIA				
PUNTO FIJO CONTADORES				2.00		2.00	

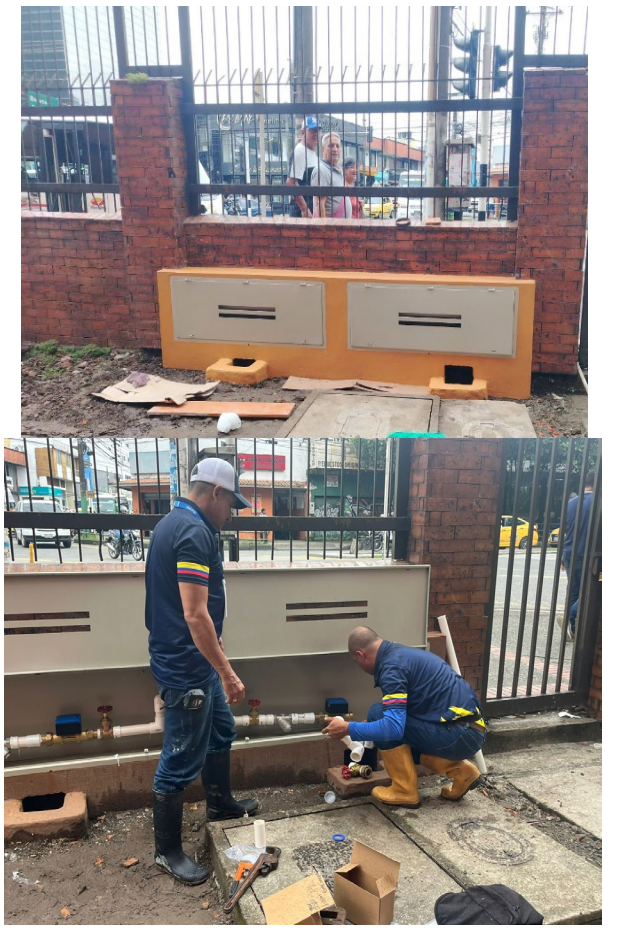

Subtotal						**2.00**
CANTIDAD TOTAL						**2.00**



OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
NP 64	Suministro e instalación de Bombas de 2HP de potencia con motor trifásico a 220-440 voltios, succión y descarga de 1 1/2" y tablero de control arranque directo.	UND	2.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Alto	MEDIA			
BOMBAS SOTANO TORRE B				1.00		1.00
BOMBAS CUARTO BOMBEO TORRE A				1.00		1.00
Subtotal						**2.00**
CANTIDAD TOTAL						**2.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

ING.FABIAN CAMILO CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCONSULTORES
