Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-FR-F001
		VERSIÓN		2
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORMACIÓN GENERAL	5	3	2024

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	3283-2024
OBJETO	
INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA.	

FECHA DE CONTRATO	30/12/2024
PLAZO DE EJECUCION	12 MESES sin que supere 31 de diciembre 2025
FECHA DE INICIO	31/12/2024
FECHA DE FINALIZACION	30/12/2025
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENCIÓN	

CONTRATISTA				
CONSORCIO INTERVAL PCI-PC				
C.C.		NIT	X	901901746-0
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				7112
REGIMEN DE VENTAS				RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA	
CARGO	DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA
DEPENDENCIA	SECRETARIA MOVILIDAD
CORREO	edinson.velasquez@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	4
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2025
VALOR DEL PAGO	18.419.503,70
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
Dieciocho millones cuatrocientos diecinueve mil quinientos tres pesos con setenta centavos	
N° FACTURA	PCI-5

CUENTA BANCARIA	282599349		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	12.827.191,67
FEBRERO	12.827.191,67
MARZO	12.827.191,67
ABRIL	12.827.191,67
MAYO	12.827.191,67
JUNIO	12.827.191,67
JULIO	12.827.191,67
AGOSTO	12.827.191,67
SEPTIEMBRE	12.827.191,67
OCTUBRE	12.827.191,67
NOVIEMBRE	12.827.191,67
DICIEMBRE	12.827.191,63
REZAGO	
TOTAL	**153.926.300,00**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		RESERVA 2024
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

A Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F002	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	3283-2024
OBJETO	
INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA.	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	4
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	3248	FECHA	23/07/2024
RUBRO		VALOR	
0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.008.85999 - 2		153.926.300	

CRP			
NUMERO	6646	FECHA	31/12/2024
RUBRO		VALOR	
0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.008.85999 2		153.926.300	

CDP			
NUMERO	9	FECHA	2/01/2025
RUBRO		VALOR	
0112 - V.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.008.85999 - 2		153.926.300,00	

CRP			
NUMERO	9	FECHA	2/01/2025
RUBRO		VALOR	
0112 - V.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.008.85999 2		153.926.300,00	

CDP RESERVA			
NUMERO	3248	FECHA	23/07/2024
RUBRO		VALOR	
0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.008.8599 9 - 2		**153.926.300,00**	

CRP RESERVA			
NUMERO	6646	FECHA	31/12/2024
RUBRO		VALOR	
0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.008.85999 - 2		**153.926.300,00**	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	153.926.300,00
ADICION 1	153.926.300,00
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	307.852.600,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	35.092.879,50		35.092.879,50
ACTA PARCIAL 2	15.480.344,30		15.480.344,30
ACTA PARCIAL 3	65.702.372,20		65.702.372,20
ACTA PARCIAL 4	18.419.503,70		18.419.503,70
ACTA PARCIAL 5			-
ACTA PARCIAL 6			-
ACTA PARCIAL 7			-
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	134.695.099,70	-	134.695.099,70

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	134.695.099,70
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	134.695.099,70

POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	173.157.500,30

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F003	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN	5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	3283-2024
OBJETO	
INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA.	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	4
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	CERTIFICADO
PERIODO	
PLANILLA	
I.B.C.	
APORTE	

PENSION	
ENTIDAD	CERTIFICADO
PERIODO	
PLANILLA	
I.B.C.	
APORTE	

ARL	
ENTIDAD	CERTIFICADO
PERIODO	
PLANILLA	
I.B.C.	
APORTE	

CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVAL PCI-PC	
C.C. O NIT	901901746-0	
E-MAIL	financieromovilidadsoacha@gmail.com	
TELEFONO	3108532746	FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el: Junio de 2025

SUPERVISOR	EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA	
CARGO	DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA	
DEPENDENCIA	SECRETARIA MOVILIDAD	
E-MAIL	edinson.velasquez@alcaldiasoacha.gov.co	
TELEFONO	3002905470	FIRMA

11

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	Formato unico de pago	3
2	Informe de Ejecución	1
3	Informe de Supervisión	2
4	Planilla de Aportes Seguridad Social	1
5	certificado revisor fiscal	1
6	rut	1
7	certificaion bancaria	1

N.	ANEXO	FOLIOS
8	polizas	6
9	fotocopia tarjeta prosional revisor fiscal	1
10	certificado antecedentes revisor fiscal	1
11	fotocopia cedula representante legal	1
12	acta de inicio	1
13	CD. Evidencias	1

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA identificado con C.C. No. 7.227.602 de Duitama, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO INTERVIAL PCI-PC** identificado con **NIT. 901901746-0**, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por el consorcio correspondientes al mes de mayo de 2025 se encuentra al día, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, ANGELA PAOLA GOMEZ ROJAS, Identificada con cedula de ciudadanía No 1.052.397.277 de Duitama y tarjeta profesional No.256046-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público del **CONSORCIO INTERVIAL PCI PC** identificado con **NIT. 901901746-0**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por el consorcio correspondientes al mes de mayo de 2025 se encuentra al día, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Duitama a los cuatro (04) días del mes de junio de 2025.

PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
C.C. No 7.227.602 de Duitama
R.L. CONSORCIO INTERVIAL PCI PC
NIT. 901.901746-0

ANGELA PAOLA GOMEZ ROJAS
Contador Público
M.P. 256046-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0145460146F0CA44

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGELA PAOLA GOMEZ ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1052397277 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 256046-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

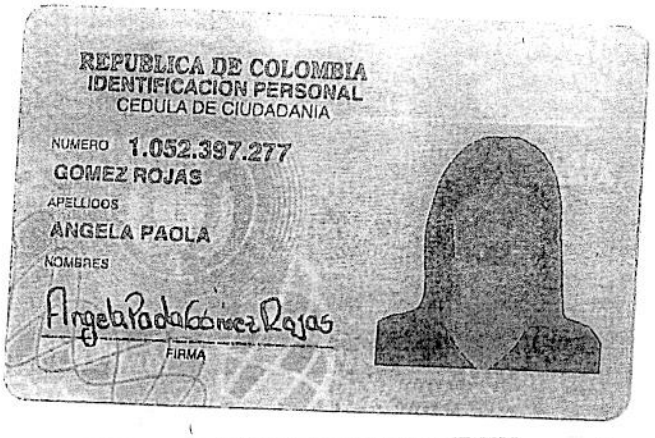

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.052.397.277
GOMEZ ROJAS
APELLIDOS
ANGELA PAOLA
NOMBRES

Angela Paola Gómez Rojas
FIRMA

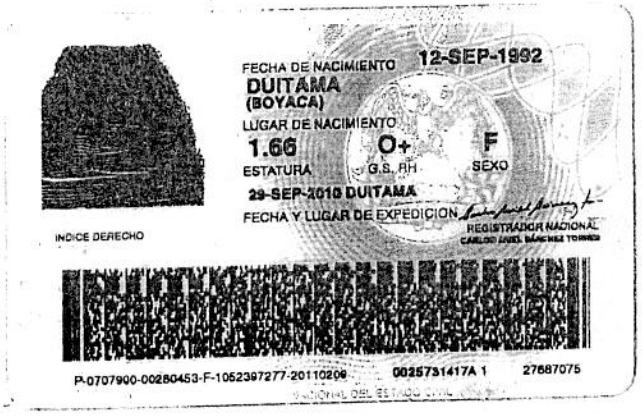

FECHA DE NACIMIENTO 12-SEP-1992
DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
29-SEP-2010 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-0707900-00280453-F-1052397277-20110209 0025731417A 1 27687075




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

256046-T

ANGELA PAOLA
GOMEZ ROJAS
C.C. 1052397277
RES. INSCRIPCION 174 DEL 29/03/2019
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

265256 285853

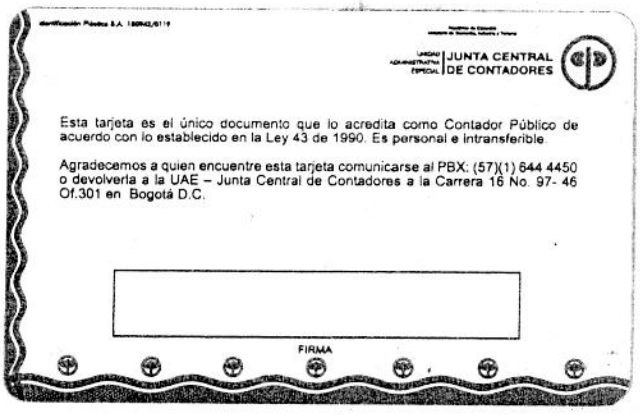

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F004	
Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	8	4	2024

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion DD	MM	AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext
	06	2025	NOMBRE EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA	3002905470

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC. / Nit
CONSORCIO INTERVAL PCI-PC	901901746-0

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No
x			30/12/2024	3283-2024

Fecha de Inicio	31/12/2024	Plazo de ejecucion	12 MESES sin que supere 31 de diciembre 2025

OBJETO CONTRACTUAL

INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
23/05/2025	22/06/2025	4

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en el contrato	Se presenta mediantes seguimiento y control de ejecución	se anexa en CD
Asegurar que el contratista en la ejecución del contrato se ciña a los plazoa, terminos, condiciones tecnicas y demas condiciones pactadas	Se presenta en informe mensual	se anexa en CD
mantener permanente comunicación con el contratista y con el municipio de soacha	Se anexa comunicación mediantes correspondencia enviada y recibida	se anexa en CD
Proponer porque no se generen conflictos entre la spartes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias	Se realiza mediacion mediantes comites y recorridos de obra.	se anexa en CD
Estudiar y emitir los conceptos del caso ante las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista , o cuando el municipio de soacha lo requiera	Se anexa comunicación mediantes correspondencia enviada y recibida	se anexa en CD
Revisar las solicitudes de adición de dinero y entiempo requeridos por el contatista y emitir un concepto al respecto	Se realiza mediante revision a modificatorias	se anexa en CD
informar al municipio de Soacha cundinamarca sobre los incumplimientos del contratista con el fin que la entidad tome las medidas sancionatorias del caso y realices las reclamaciones a que haya lugar	Se realiza mediante comites de obra y correspondencia	se anexa en CD
velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustiificadamente	Se realiza mediante seguimiento de obra	se anexa en CD
garantizar que el contratista presenta la totalidad de los documentos exigidos por el municipio de soacha- cundinamarca para proceder con la liquidación del contrato, asi como el contratista mantenga actualizadas las vigencias de las garantias contractuales y post contractuales	Se realiza mediante revision de informes y actas presentadas	N/A

CONSORCIO INTERVAL PCI-PC

C.C 901901746-0

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificacion de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA

C.C.79.988.891

Firma del Supervisor

DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA

edinson.velasquez@alcaldiasoacha.gov.co

17

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F005	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	5	4	2024

SECRETARIA MOVILIDAD

I. INFORMACION DE SUPERVISION			
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor		Teléfono o Ext.
DD MM AA	NOMBRE:EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA		3002905470
/06/2025	DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA		
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION			
	Nombre:		
	Cargo:		

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
Nombre o Razon social del contratista.		CC. / Nit
CONSORCIO INTERVAL PCI-PC		901901746-0
IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha:**	**Contrato No.**
X	30/12/2024	3283-2024
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
31/12/2024	12 MESES sin que supere 31 de diciembre 2025	
OBJETO		
INTERVENTORIA PARA EL PROCESO DE SENALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSITO Y SEMAFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA.		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
23/05/2025	22/06/2025	4

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en el contrato	CUMPLE
Proponer porque no se generen conflictos entre la spartes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias	CUMPLE
Estudiar y emitir los conceptos del caso ante las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista , o cuando el municipio de soacha lo requiera	CUMPLE
Revisar las solicitudes de adición de dinero y entiempo requeridos por el contatista y emitir un concepto al respecto	CUMPLE
informar al municipio de Soacha cundinamarca sobre los incumplimientos del contratista con el fin que la entidad tome las medidas sancionatorias del caso y realices las reclamaciones a que haya lugar	CUMPLE
velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustiificadamente	CUMPLE
garantizar que el contratista presenta la totalidad de los documentos exigidos por el municipio de soacha- cundinamarca para proceder con la liquidación del contrato, asi como el contratista mantenga actualizadas las vigencias de las garantias contractuales y post contractuales	CUMPLE

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fuerón verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA
DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA
C.C.79.988.891
SECRETARIA MOVILIDAD

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2025

ACTA No: 4

AMORTIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTROS N° 3283-2024 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA.

N° CTO	N° CRP	RUBRO PRESUPUESTAL	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6	ACTA 7	ACTA 8	ACTA 9	VALOR A LIBERAR
3283-2024	6646-2024	0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.008.85999 - 2	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	153.926.300,00	35.092.879,50	15.480.344,30	65.702.372,20	18.419.503,70	-	-	-			19.231.200,30
	9-2025	0112 - V.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.008.85999 - 2		153.926.300,00								-	-	153.926.300,00
TOTALES				307.852.600,00	35.092.879,50	15.480.344,30	65.702.372,20						-	173.157.500,30

Edinson Jair Velasquez Acosta
DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA
SECRETARIA MOVILIDAD

Proyecto : Cristian Castaño Cto 0057-2025 Profesional Financiero Esp.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
22b1e94b8718cd7f8db445dbb8aaf74c12ec3074e68d8c2575d0238d74d5ccdf8f746065ddf8df087e5893c393174a6d

Número de Factura: PCI-5
Fecha de Emisión: 26/06/2025
Fecha de Vencimiento: 25/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC
Nombre Comercial: CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC
Nit del Emisor: 901901746
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Duitama
Dirección: CR 15 16 A 14 OF 408
Teléfono / Móvil: 3144119353
Correo: pedrocorredor.contabilidad@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SOACHA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800094755
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: CALLE 13 7 30
Teléfono / Móvil: 3143175165
Correo: sehacienda@alcaldiasoacha.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	Acta No 4 Periodo del 23 de mayo al 22 de junio 2025 CTO 3283 DE 2024 INTERV PARA EL PROCESO DE SENALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL TRANSITO Y SEMAFOROS EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA	NIU	1,00	$ 15.478.574,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.940.929,16	19.00			$ 15.478.574,54

Notas Finales

MIEMBROS DEL CONSORCIO:
PC PROYECCION E INGENIERIA SAS 50% NIT 901757531-7
GERMAN ALONSO PUENTES GORDO 30% CC 7162821
JORGE WILLAN CORZO GARCIA 10% CC 5689243
INCORDIS SAS 10% NIT 900869939-5
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/06/2025 08:53:56
Documento validado por la DIAN:
26/06/2025 08:53:57
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	15478574.54
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15478574.54
IVA	2940929.16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2940929.16
Total neto factura (=)	18419503.7
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 18419503.7

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	15.478.574,54
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.478.574,54
IVA	2.940.929,16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.940.929,16
Total neto factura (=)	18.419.503,70
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 18.419.503,70

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764089137099 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-02-19

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

Vigencia Fiscal 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 6646

Fecha de Compromiso: 31 de diciembre de 2024

Beneficiario CONSORCIO INTERVAL PCI-PC **Nit:** 901901746 - 0

No. C.D.P. 3248 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 23 de julio de 2024

Tipo de Compromiso Interventorias

Contrato 3283-2024 **Fecha:** 30/12/2024 **Vence:** 31/12/2024

Objeto: CONTRATO 3283/2024 - INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA. BMP2024257540059.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Armonizacion-Inversión		
Recurso Propio-Libre Destinacion ORDINARIO		
0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.008.8 5999 - 2	Otros servicios de apoyo n.c.p.	$ 153.926.300,00
	Clasificadores 2408038-85999-215425754-1.2.1.0.00-0-0 153.926.300,00	
	Total Compromiso	$153.926.300,00

Programación de PAC*	
Mes	Valor Programación
Diciembre	$153.926.300,00
Valor Total	$153.926.300,00

ALFREDO DIAZ
Director de Presupuesto

Elaboró: DOMALPICA

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARÍA DE HACIENDA
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
Dirección de Presupuesto
RECIBIDO
31 DIC 2024
HORA:
FIRMA:

NUMERO:	2024SMJ0054	FECHA:	30/12/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE:
SECRETARÍA DE MOVILIDAD ✓

Tipo de documento que origina el compromiso

Contrato	X
Convenio	
Resolución	
Servicio Público	
Nomina	
Otro	

Cual? _____

INFORMACION DEL COMPROMISO

BENEFICIARIO	CC - NIT
CONSORCIO INTERVIAL PCI-PC ✓	901901746-0 ✓

DOCUMENTO SOPORTE	FECHA
CONTRATO 3283 -2024 ✓	30 DE DICIEMBRE DE 2024 ✓
CDP	**FECHA**
3248 ✓	23/07/2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	RECURSO	VALOR
0132 A-2-3-2-4-08-333-02-2-3-2-02-0-2-008-85999-2	Otros servicios de apoyo n.c.p. ✓	ORDINARIO (2) ✓	$ 153.926.300,00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			**$ 153.926.300,00** ✓

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

PROGRAMACION DE CAJA

Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	153.926.300,00
Total	$ 153.926.300,00

OBJETO DEL CRP

INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA. BMP2024257540059 ✓

OBSERVACIONES

ANDRES HERNANDO LAÑAS ROMERO
SECRETARIO DE MOVILIDAD

Proyectó: Cristian Castaño Cto 1785-2024 ✓

ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO DE LA SOLICITUD

	APROBADA
	NO APROBADA

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CONSTANCIA DE ENTREGA	
DEVOLUCION	**CRP**
	6641

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC identificado(a) con NITPJ 9019017460 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 282599349 desde el 23 de enero de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 23 de enero de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2025

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 9

NIT. 800094755
CALLE 13 7-30
7305500

NOM_NIVEL

Fecha de Expedición: 02 enero 2025 **Prórrogas:** 0

Fecha de Vencimiento: 31 diciembre 2025

Solicitante: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Objeto: INTERVENTORIA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL TRANSITO Y SEMAFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA. BMP2024257540059.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
Código	**Descripción**	**Valor**
Gastos-Inversión		
0112 - V.2.3.24.08.038.02.2-3.2.02 .02.008.85999 -2	Otros servicios de apoyo n.c.p. **Recurso Propio-Libre Destinación** ORDINARIO	$ 153.926.300,00
	TOTAL CERTIFICADO	$ 153.926.300,00

ALFREDO DIAZ
Director de Presupuesto

Elaboró: ADIAZ

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CODIGO	GF01-P02-F01
SOACHA		VERSION	1.0
	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA APROBACION	06/12/2021

NÚMERO:	SM099	FECHA:	02 de enero de 2025	RADICADO:
DEPENDENCIA SOLICITANTE:				
SECRETARÍA DE MOVILIDAD SM099				
IDENTIFICACION DEL GASTO				

Funcionamiento	
Inversión	X
Servicio de la deuda	

I. FICHA BPIN - MGA: (EXCLUSIVO PARA RECURSOS DE INVERSIÓN).					
PROGRAMA DE INVERSIÓN:	Prestación de servicios de transporte público de pasajeros				
CÓDIGO BANCO:	BPIN2024257540059		FECHA ACTUALIZACIÓN:		20-12-2024
CODIGO SECTOR	24	CODIGO DEL PROGRAMA	2408	CODIGO PRODUCTO	2408038
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE SOACHA				
OBJETIVO (S) ESPECÍFICO DEL BPIN:	Implementar la estrategia de seguridad vial en la Ciudad de Soacha				
ACTIVIDAD (ES) DEL BPIN A AFECTAR:	Ejecutar la interventoria de los procesos de señalización vial en la ciudad de Soacha a través de una empresa con experiencia				

CODIGO	NOMBRE RUBRO	RECURSO	CPC	VALOR
0112 - V.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.008.85999 - 2	Otros servicios de apoyo n.c.p.	2	85999	$153.926.300,00
TOTAL DISPONIBILIDAD				$153.926.300,00

VALOR EN LETRAS:	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP
INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA. SM099

ANDRES HERNANDO LAÑAS ROMERO
SECRETARIO DE MOVILIDAD

ESTADO DE LA SOLICITUD	
	APROBADA
	NO APROBADA

INFORMACION DEL CDP	
FECHA	
NÚMERO	

DIRECCION DE PRESUPUESTO

CAUSAL DE DEVOLUCION	
CODIGO	DESCRIPCION

CONSTANCIA DE ENTREGA	
DEVOLUCION	CDP

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 9

NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

Fecha de Compromiso: 2 de enero de 2025

Beneficiario CONSORCIO INTERVAL PCI-PC **Nit:** 901901746 - 0

No. C.D.P. 9 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 02 de enero de 2025

Tipo de Compromiso Interventorias

Contrato 3283 **Fecha:** 30/12/2024 **Vence:** 31/12/2025

Objeto: CONTRATO 3283/2024 - INTERVENTORIA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL TRANSITO Y SEMAFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA. BMP2024257540059.

IMPUTACION PRESUPUESTAL		
Código	**Descripción**	**Valor**
Gastos-Inversión		
Recurso Propio-Libre Destinación ORDINARIO		
0112 - V.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.008. 85999 - 2	Otros servicios de apoyo n.c.p.	$ 153.926.300,00

Total Compromiso $153.926.300,00

Programación de PAC*	
Mes	Valor Programación
Enero	$12.827.191,67
Febrero	12.827.191,67
Marzo	12.827.191,67
Abril	12.827.191,67
Mayo	12.827.191,67
Junio	12.827.191,67
Julio	12.827.191,67
Agosto	12.827.191,67
Septiembre	12.827.191,67
Octubre	12.827.191,67
Noviembre	12.827.191,67
Diciembre	12.827.191,63
Valor Total	$153.926.300,00

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 9

NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

ALFREDO DIAZ
Director de Presupuesto

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARÍA DE HACIENDA
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
Dirección [illegible]
RECIBIDO
02 ENE 2025

NUMERO:	2025SM0099	FECHA:	2/01/2025

HORA:
FIRMA:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Tipo de documento que origina el compromiso

Contrato	X
Convenio	
Resolución	
Servicio Publico	
Nomina	
Otro	

Cual? _____

INFORMACION DEL COMPROMISO

BENEFICIARIO	CC - NIT
CONSORCIO INTERVIAL PCI-PC	901901746-0

DOCUMENTO SOPORTE	FECHA
CONTRATO 3283 -2024	30 DE DICIEMBRE DE 2024
CDP	FECHA
	2/01/2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	RECURSO	VALOR
O112 V.2.3.24.08.038.02.2.3.2.01.0 2.006.85999 - 2	Otros servicios de apoyo n.c.p.	ORDINARIO (2)	$ 153.926.300,00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			$ 153.926.300,00

VALOR EN LETRAS:	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

PROGRAMACION DE CAJA

Enero	12.827.191,67
Febrero	12.827.191,67
Marzo	12.827.191,67
Abril	12.827.191,67
Mayo	12.827.191,67
Junio	12.827.191,67
Julio	12.827.191,67
Agosto	12.827.191,67
Septiembre	12.827.191,67
Octubre	12.827.191,67
Noviembre	12.827.191,67
Diciembre	12.827.191,63
Total	$ 153.926.300,00

OBJETO DEL CRP

INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA. BMP2024257540059

OBSERVACIONES

ANDRES HERNANDO LAÑAS ROMERO
SECRETARIO DE MOVILIDAD

ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA DIRECCION DE PRESUPUESTO

ESTADO DE LA SOLICITUD

	APROBADA
	NO APROBADA

DIRECCION DE PRESUPUESTO

CONSTANCIA DE ENTREGA

DEVOLUCION	CRP

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

INFORME MENSUAL 5.

PERIODO: 23 MAYO A 22 DE JUNIO DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA-CUNDINAMARCA

CONTRATO: 3283 DE 2024



INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC

NIT: 901901746-0

Carrera 15 # 16 A - 14 Oficina 408 Duitama-Boyacá Tel: (608) 7651948 Cel.: 3144119353 Email: corredorbecerra@yahoo.com.mx

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

REVISIONES

Realizado por: Yeimy Lorena Dueñas C. C.C. 1.052.404.333 Cargo: Residente de interventoría	
Presentado por: Pedro José Corredor C.C. 7.227.602 Cargo: Director de interventoría	
Aprobado por: Edinson Velasquez Cargo: Supervisor del contrato	

CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES

PRESENTADO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
28-06-2025	Informe mensual y de ejecución 5	Estado inicial

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5
2. ACTIVIDADES CONTRACTUALES 6
2.2. Modificatorio No.1 9
2.1. Actividades ejecutadas. 10
2.2. Recorridos realizados para verificación de estado de pintura a resaltos intervenidos 14
2.3. Afectación de lluvias. 15
3. PERSONAL DE INTRVENTORIA 15
3.1. Personal de obra 16
4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO 17
CONCLUSIONES 19

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Resumen contrato 5
Tabla 2. Actividades contractuales 9
Tabla 3. Actividades contractuales 10
Tabla 4. Cantidades ejecutadas 13
Tabla 5. Diseños a tramos realizados 13
Tabla 6. Personal de interventoría 16
Tabla 7. Personal de Contratista 16
Tabla 8. Personal de obra 16
Tabla 9. Correspondencia enviada 17
Tabla 10. Correspondencia Recibida 17
Tabla 11. Resumen actas de comité 18
Tabla 12. Puntos aprobados para diseño 18

INTRODUCCIÓN

Conforme a la documentación que se debe presentar en el desarrollo del proyecto, se tiene previsto la presentación de informes mensuales, siguiendo el objeto del contrato de ´´INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA-CUNDINAMARCA´´.

Dentro de las actividades realizadas este segundo mes, se realizaron actividades administrativas dentro de las cuales se encuentra asistencia de comités, recorridos a tramos a intervenir y revisión documental presentada por el contratista como lo es revisión a PMT, plan de calidad, ítems no previstos.

1.1. Resumen general del contrato.

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No.	3282 de 2024
CONTRATO DE INTERV No.	3283 de 2024
OBJETO	"IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA"
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PINWATER
R.L	Mauro Andres Gonzales
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC
R.L	Pedro Jose Corredor Becerra
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES
ACTA DE INICIO	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025

Tabla 1. Resumen contrato

2. ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Dentro de las actividades a ejecutar contractualmente, se tienen los siguientes ítems:

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.
		GENERAL	PARTICULAR		
				SEÑALES VERTICALES	
	1			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI, CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, DUPLEX, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.	UND
	2			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.	UND
	3			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, CON PLAQUETA, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.	UND
	4			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,40X0,95METROS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO.	UND
	5			RETIRO Y TRASLADO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE CIMENTACIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024, AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE (TRASLADO DE LA SEÑAL AL SITIO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD).	UND

	6			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46, SP-46A, SP-48, SP-49A, SP-59, SP-59A Y SP-80, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.	UND
	7			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46B Y SP-59B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.	UND
	8			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47 Y SP-47A, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.	UND
	9			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.	UND
	10			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SR-38 Y SR-39 CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO TIPO RECTÁNGULO DE 75X25CM, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO CON PEDESTAL.	UND
				DEMARCACIONES	
	11			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS, ANCHO=12 CMS. NORMA NTC 4744 Y NTC 1360.	ML
	12			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4744 Y NTC 1360.	M2
	13			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ANCHO 15 CMS, PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN.	ML

	14			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN.	M2
	15			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1).	UND
	16			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS SOLARES.	UND
	17			SUMINISTRO Y ANCLAJE DE ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO, DIÁMETRO MÍNIMO 10 CM Y ALTURA MÁXIMA 2,0 CM DE ALTURA CON UN ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM (NTC 4745) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	UND
	18			SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO TRASPASABLE EN RESINA POLIÉSTER DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO (TIPO PIRAMIDAL, LARGO 40 CM, ANCHO DE 15 CM Y ALTURA MÍNIMA DE 8 CM DE ACUERDO CON LA FIGURA 5-6 DE LA RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 2024). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	UND
	19			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADOR TUBULAR SIMPLE (HITO) CONSTRUIDO EN MATERIAL SINTÉTICO FLEXIBLE CON TRES FRANJAS DE 7,5 CM EN PAPEL REFLECTIVO BLANCO TIPO IV O SUPERIOR, ALTURA MÍNIMA 70 CM, DIÁMETRO MÍNIMO DE 8 CM (NTC 6107-4) INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	UND
	20			SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCADOR DE OBSTÁCULO VERTICAL, TIPO MARCADOR DOBLE, TAMAÑO 90 X 45CMS, TABLERO LAMINA GALVANIZADA, REFLECTIVIDAD TIPO IV O SUPERIOR.	UND
	21			SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCADOR DE OBSTÁCULO VERTICAL, TIPO MARCADOR SENCILLO, TAMAÑO 90 X 30CMS, TABLERO LAMINA GALVANIZADA, REFLECTIVIDAD TIPO IV O SUPERIOR.	UND
	22			SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSA METALICA, INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS.	ML
	23			DEMOLICION PAVIMENTO, Emax=variable (NCLUYE: CORTE, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM).	M3
	24			CONCRETOS f´c =3500 PSI (INCLUYE ADITIVOS, ACERO, SELLANTE Y ALAMBRE DE AMARRE).	M3

	25			RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-60 (anteriormente CRR-1).	M2
	26			RESALTO U ONDULACION (REDUCTOR DE VELOCIDAD) ASFALTO EN FRIO.	M3
	27			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PARA CICLO-INFRAESTRUCTURA SRC, SPC, SIC CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 45X45CMS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO IV Y POSTE DE TUBO REDONDO O CUADRADO.	UND
	28			SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PARA CICLO-INFRAESTRUCTURA SRC, SPC, SIC CON TABLERO DOBLE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 45X45CMS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO IV Y POSTE DE TUBO REDONDO O CUADRADO.	UND
	29			REALIZAR MANTENIMIENTO MEDIANTE HIDROLAVADO PARA LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LOS PUENTES PEATONALES.	ML
	30			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SANDBLASTING, ANTICORROSIVO Y PINTURA PARA LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LOS PUENTES PEATONALES.	M2
	31			DISEÑO DE MURALES HORIZONTALES Y DEMÁS ELEMENTOS ASOCIADOS AL URBANISMO TÁCTICO.	M2
	32			INSTALACIÓN Y APLICACIÓN DE MURALES HORIZONTALES Y DEMÁS ELEMENTOS ASOCIADOS AL URBANISMO TÁCTICO.	M2

Tabla 2. Actividades contractuales

2.2. Modificatorio No.1

Atendiendo a las necesidades del proyecto surge la necesidad de realizar un modificatorio en donde se incluyen los siguientes ítems:

ITEM NP	ITEM	UNIDAD	VALOR
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFFITI PARA SEÑALES VERTICALES	m2	$ 143.980

2	ELABORACION DE DISEÑOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR, DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO, INCLUYE ZONAS VERDES, PARQUES Y AREAS CONSTRUIDAS	Ha	$ 2.261.000
3	ELABORACION DE DISEÑOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL , VERTºICAL , SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR , DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO , ETC, DISEÑO POR CALZADA DE CICLORUTA Y POR CARRIL VEHICULAR	km/carril	$ 3.843.700
4	RETIRO DE DISPOSITIVOS (BORDILLOS NO TRANSPASABLES)	unidad	$ 33.122
5	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO NO TRASPASABLE EN CONCRETO DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO. INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN. (80X20X15)	unidad	$ 291.175
6	CONSTRUCCIÓN DE BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD HASTA 2 CM ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA, ADHESIVO CON ANCHO MAXIMO DE 25 CM	m2	$ 225.456
7	BORRADO DE MARCA VIAL CON EQUIPO ESPECIALIZADO	m2	$ 72.068
8	HIDROLAVADO (Incluye equipo especializado, suministro de agua, herramienta menor y todos los elementos necesarios)	unidad	$ 8.294
9	RETIRO DE DISPOSITIVOS (HITOS)	unidad	$ 13.458
10	RETIRO DE DISPOSITIVOS (TACHAS Y ESTOPEROLES)	unidad	$ 2.902

Tabla 3. Actividades contractuales

2.1. Actividades ejecutadas.

Conforme a las actividades contractuales se presenta la intervención en 30 puntos en actividades de demarcación de resaltos, de los cuales se muestra las siguientes cantidades y se presentan las

memorias de cantidades como anexo 01, así mismo según el desarrollo de actividades según las condiciones climáticas algunos días no se pudieron realizar actividades por las fuertes lluvias:

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS, ANCHO=12 CMS. NORMA NTC 4744 Y NTC 1360.	ML	786,46	$ 6.951,00	$ 5.466.683,00
	12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4744 Y NTC 1360.	M2	617,11	$ 53.919,00	$ 33.273.954,00
	13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ANCHO 15 CMS, PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN.	ML	786,46	$ 4.266,00	$ 3.355.038,00

	14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN.	M2	639,32	$ 38.634,00	$ 24.699.489,00
	15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1).	UND	980,00	$ 24.151,00	$ 23.667.980,00
	16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS SOLARES.	UND	318,00	$ 164.690,00	$ 52.371.420,00
Subtotal						$ 142.834.564,00
		ITEMS NO PREVISTOS				
	NP-02	ELABORACION DE DISEÑOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR, DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO, INCLUYE ZONAS VERDES, PARQUES Y AREAS CONSTRUIDAS	HA	6,75	$ 2.261.000,00	$ 15.261.750,00

	NP-03	ELABORACION DE DISEÑOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL , VERTºICAL , SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR , DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO , ETC, DISEÑO POR CALZADA DE CICLORUTA Y POR CARRIL VEHICULAR	KM/CARRIL	6,79	$ 3.843.700,00	$ 26.098.723,00
Subtotal						$ 41.360.473,00
SUBTOTAL OBRAS						$ 184.195.037,00

Tabla 4. Cantidades ejecutadas

El avance de ejecución es de $184.195.037,00 que representa el 43,65%, para la ejecución del 23 de mayo al 22 de junio, adicional a actividades de ejecución en el presente contrato se realizaron diseños en los siguientes tramos, según directrices de la secretaria de movilidad:

	DISEÑO
1	Cra 9 Entre calle 15 y 24
2	Carrera 12 desde calle 4c hasta av san maron
3	Calle 1 hasta calle 6 este - Carrera 5 hasta carrera 8
4	Carrera 3 calle 30 a 30c
5	Carrera 1 calle 30 a 30c
6	Carrera 4 este de calle 30 a calle 33
7	Carrera 6 a este calle 30 a calle 33
	TOTAL

Tabla 5. Diseños a tramos realizados

2.2. Recorridos realizados para verificación de estado de pintura a resaltos intervenidos

Atendiendo a las solicitudes de la secretaria de movilidad y realizando la supervisión a los resaltos intervenidos, teniendo en cuenta la matriz de garantía, se realizó recorrido junto con el contratista y técnico de Pintuco, en donde se verificaron los puntos y el estado de la pintura, teniendo los siguientes hallazgos:

Presencia de contaminación:

Algunos resaltos intervenidos presentan altos niveles de contaminación por lo que esto se ve reflejado en el punto dando un mayor desgaste en la pintura, así mismo se recuerda que uno de las variables a la hora de aplicar la matriz de garantía en cada punto es el tema de la contaminación.

Estado del resalto:

Algunos resaltos no se encuentran en sus mejores condiciones, debido a que presentan fisuras tanto longitudinales como transversales, debido a su grado alto de severidad se pueden considerar como fisuras, también se evidencia exposiciones de refuerzo y fenómeno de cabezas duras es decir los gruesos son expuestos en el resalto sin presencia de finos, lo que hace que la pintura que se aplica no se adhiera al resalto ya que esta adhiere directamente a los finos.

Altura de los resaltos

Normativamente según el manual de señalización en el numeral ***5.5.1.2. Resalto parabólico o circular*** este tipo de resaltos tienen una altura entre 5 y 10 cm y una longitud mínima de 2 m, teniendo en cuenta que en la demarcación de algunos puntos se encontraron, resaltos que superan los 10cm de altura lo que puede ocasionar que algunos vehículos que transiten puedan generar una marca de frenado, situación que se evidencia en algunos puntos visitados, así mismo esto no puede ser atribuido a desgaste de la pintura.

Una vez realizada la visita, se hicieron las observaciones técnicas al contratista en donde se hizo repinte de algunos puntos, por parte del contratista, teniendo en espera algunos puntos que tienen alto nivel de contaminación.

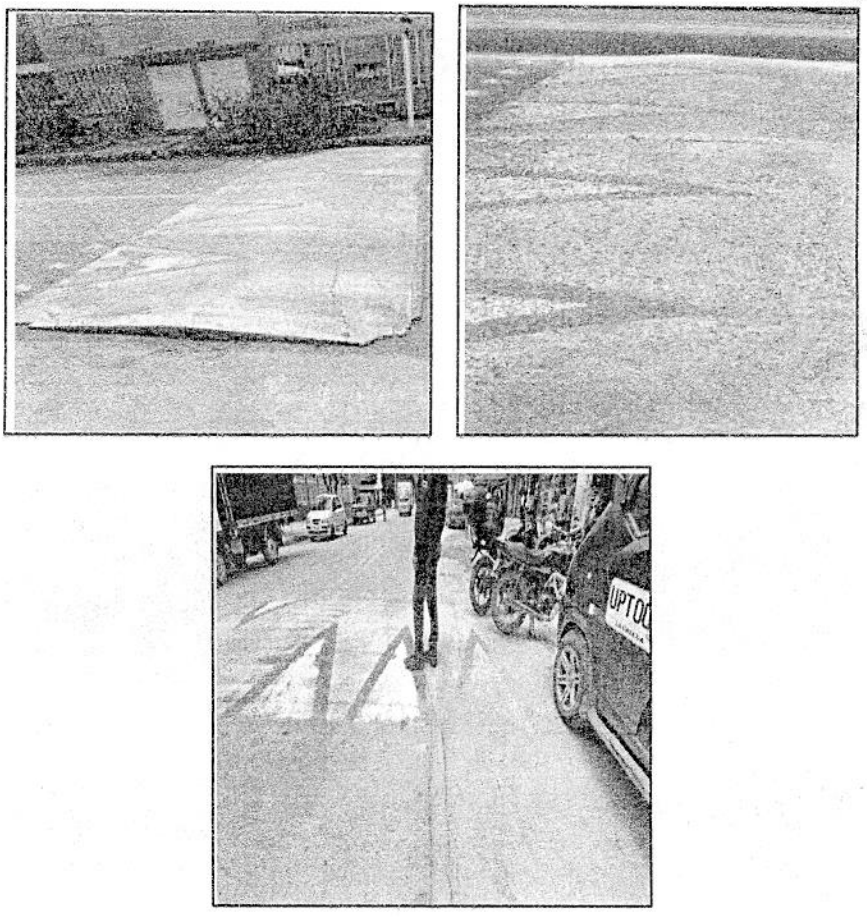


Ilustración 1. Registro recorrido realizado

2.3. Afectación de lluvias.

A pesar que se han presentado fuertes lluvias en el municipio de Soacha, esto no ha afectado en gran porcentaje la ejecución de actividades, ya que el rendimiento no se ha visto interrumpido en gran parte de los días, teniendo así continuidad en el desarrollo del proyecto.

3. PERSONAL DE INTRVENTORIA

Conforme a los requerimientos del presente proyecto se relaciona a continuación el personal de interventoría, como anexo No. 03 se presentan las planillas de seguridad social:

NOMBRE	CARGO	No. PLANILLA
PEDRO JOSE CORREDOR	DIRECTOR	9487485907
OTTO ALDEMAR MEDINA	ESP. TRANSITO	87237113
RAMON DE JESUS MANRIQUE	ESP. PAVIMENTOS	8636436698
YEIMY LORENA DUEÑAS	RESIDENTE	9486574122

Tabla 6. Personal de interventoría

3.1. Personal de obra

Se relaciona el personal de obra presente en este proyecto, como anexo No. 04 se presentan las planillas de seguridad social del contratista, algunas personas no tienen planilla de seguridad social ya que se presenta mes vencido, por lo que se anexan certificaciones de afiliaciones, las personas que no tengan planilla se anexara los certificados de afiliación ya que es personal nuevo y no cumple el mes laborando.:

NOMBRE	CARGO	Planilla No.
MARIA VIRGINIA ROCHA	ESP. EN TRANSITO	9483383323
CAROL NATALIA LOPEZ	AUX. DE RESIDENTE	9483383323
ANDRES ESTEBAN ORJUELA	AUX. DE RESIDENTE	9483383323
MAURICIO FERNANDO LAVERDE	DIRECTOR DE OBRA	9483383323
JULIAN EDUARDO ROLDAN G.	ING. RESIDENTE DE OBRA	7971488039
DONOVAN JAHIR OHORQUEZ	COORDINADOR DE OBRA	9483383323
MAURICIO PATIÑO	URBANISTA	9483383323

Tabla 7. Personal de Contratista

NOMBRE	IDENTIFICACCIÓN	Planilla No.
John Jairo Andrade	1085938001	7975708920
Richard Paz	98399401	7975708920
Oscar Mesa	14623357	7975708920
Sneider plata	1024503410	7975708920
Michael Londoño	1143978947	7975708920
Luis Edwwin Plata g.	1107043749	7975708920

Tabla 8. Personal de obra

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

De acuerdo al seguimiento al proyecto se adjunta la correspondencia enviada y recibida que se relaciona en la tabla siguiente, se adjunta como anexo 5 y 6:

FECHA	ASUNTO	CONSECUTIVO	DIRIGIDO A
24/05/2025	Costos proyectados cuantificación de cantidades	OF-INT-3283-2024-048	Secretaria de movilidad / U.T. pinwater
25/05/2025	Observ. Repinte resalto	OF-INT-3283-2024-049	U.T. pinwater
30/05/2025	Radicación de cuenta 3	OF-INT-3283-2024-050	Secretaria de movilidad
6/06/2025	Observacion. diseños	OF-INT-3283-2024-051	U.T. pinwater
6/06/2025	Entrega de retiros	OF-INT-3283-2024-052	Secretaria de movilidad
9/06/2025	Observ. A puntos según recorrido	OF-INT-3283-2024-053	Secretaria de movilidad / U.T. pinwater
10/06/2025	Puntos con observaciones	OF-INT-3283-2024-054	Secretaria de movilidad
13/06/2025	Viabilidad tecnica	OF-INT-3283-2024-055	Secretaria de movilidad / U.T. pinwater
17/06/2025	Entrega de balance	OF-INT-3283-2024-056	Secretaria de movilidad

Tabla 9. Correspondencia enviada

FECHA	ASUNTO	CONSECUTIVO	DE
27/05/2025	Solicitud de garantias	N.A.	Secretaria de movilidad
09/06/2025	Visita de resalto de garantias	0041/PW	U.T. pinwater
11/06/2025	Respuesta oficio OF-INT-3283-2024-054	0042/PW	U.T. pinwater

Tabla 10. Correspondencia Recibida

Así mismo se presenta como anexo No. 07 Se presenta las actas de comité que se han realizado en el mes de abril, así mismo el día 4 de junio se realizó comité extra ordinario en instalaciones de la

alcaldía, en donde se aprobó por parte del alcalde la intervención de los puntos que se muestran en la tabla No. 11, así mimos como anexo No. 08 se encuentra la presentación realizada para comité ectraordinario.

Como parte de seguimiento se anexan el control de materiales utilizados y la certificación de retiro de sobrantes de pintura o pegantes.

ACTA	FECHA
30/04/2025	Acta 7
04/06/2025	Acta 8

Tabla 11. Resumen actas de comité

	DISEÑO
1	Cra 9 Entre calle 15 y 24
2	Carrera 3 calle 30 a 30c
3	Carrera 1 calle 30 a 30c
4	Carrera 4 este de calle 30 a calle 33
5	Carrera 6 a este calle 30 a calle 33

Tabla 12. Puntos aprobados para diseño

CONCLUSIONES

- En la ejecución de obra que se tiene para este mes se ha realizado el acompañamiento por parte de esta interventoría al contratista, participando así en la supervisión y toma de decisiones.
- Como anexo se ara acta de entrega de los puntos intervenidos por el contratista, realizando las medidas de cuantificación con el residente encargado.
- El avance de ejecución es de $184.195.037,00 que representa el 43,65%, para la ejecución del 23 de mayo al 22 de junio

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 00. APROBACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
ANEXO 01. CANTIDADES DE OBRA
ANEXO 02. MATRIZ DE GARANTIA
ANEXO 03. SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA
ANEXO 04. SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA
ANEXO 05. CORRESPONDENCIA ENVIADA
ANEXO 06. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ANEXO 07. ACTAS DE COMITÉ
ANEXO 08 CONTROL DE CALIDAD
ANEXO 09 BITACORA DE OBRA

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

Duitama, 26 de junio de 2025

Señores,

SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SOACHA
Ing. EDISON JAIR VELASQUEZ ACOSTA
Carrera 9-133, Cl. 13 #9-1 Soacha, Cundinamarca

REF: CTO 3283 DE 2024 "INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA"

Cordial saludo,

A continuación, se relacionan las cantidades ejecutadas y conciliadas junto con el contratista, que corresponde desde el 23 de mayo al 22 de junio de 2025, siendo este un valor de $184.195.037,00 que representa el 5,98%.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS, ANCHO=12 CMS. NORMA NTC 4744 Y NTC 1360.	ML	786,46	$ 6.951,00	$ 5.466.683,00

Carrera 15 # 16 A - 14 Oficina 408 Duitama-Boyacá Tel: (608) 7651948 Cel.: 3144119353 Email: corredorbecerra@yahoo.com.mx

	12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4744 Y NTC 1360.	M2	617,11	$ 53.919,00	$ 33.273.954,00
	13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ANCHO 15 CMS, PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN.	ML	786,46	$ 4.266,00	$ 3.355.038,00
	14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN.	M2	639,32	$ 38.634,00	$ 24.699.489,00
	15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD	UND	980,00	$ 24.151,00	$ 23.667.980,00

		LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1).				
	16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS SOLARES.	UND	318,00	$ 164.690,00	$ 52.371.420,00
Subtotal						$ 142.834.564,00
		ITEMS NO PREVISTOS				
	NP-02	ELABORACION DE DISEÑOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR, DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO, INCLUYE ZONAS VERDES, PARQUES Y AREAS CONSTRUIDAS	HA	6,75	$ 2.261.000,00	$ 15.261.750,00
	NP-03	ELABORACION DE DISEÑOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL , VERTºICAL , SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR , DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO , ETC, DISEÑO POR CALZADA DE CICLORUTA Y POR CARRIL VEHICULAR	KM/CARRIL	6,79	$ 3.843.700,00	$ 26.098.723,00
Subtotal						$ 41.360.473,00

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

SUBTOTAL OBRAS	$ 184.195.037,00

Agradecemos la atención prestada.

Quedamos atentos a su respuesta

Atentamente,

PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
C.C. 7.227.602 DE DUITAMA
R/L CONSORCIO INTERVIAL PCI-IC

Carrera 15 # 16 A - 14 Oficina 408 Duitama-Boyacá Tel: (608) 7651948 Cel.: 3144119353 Email: corredorbecerra@yahoo.com.mx
