Dánes

·SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERÍA·

TÉCNICA

Dirección: Calle 18 No. 34A-41 **Teléfono:** 877 21 87
Móvil: 312 379 4221
E-mail: danesingenieros@gmail.com
NEIVA | COLOMBIA

EL INTERVENTOR

H A C E C O N S T A R:

El Interventor, certifica que la documentación presentada para la solicitud de **ACTA PARCIAL No. 1 PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CLPIH383 DE 2023**, *cuyo objeto es la* **"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION, PARA LA VEREDA LOS ANDES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"**, *en donde se puede verificar que ha cumplido con todos los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales para la ejecución del contrato, de acuerdo a la información suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA, en donde fue revisada y avalada por la interventoría; en lo que corresponde a la solicitud y trámite para el pago del Acta Parcial No. 1 del periodo del 16 de Noviembre de 2023 al 20 de Diciembre de 2023 y del 12 de Noviembre de 2024 al 20 de Enero de 2025, por un valor correspondiente de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($461.971.834,89) M/CTE, me permito indicar que la descripción de los ítem, las cantidades de obra, valores unitarios y valor total, corresponden a lo ejecutado encontrándose plenamente soportado en las memorias de cantidades de obra las cuales están tomadas de acuerdo a los diseños y conservan el objeto, alcance y la localización del mismo. Es por ello que las cantidades y la calidad de las obras, consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes la cuantificaron y constataron en el terreno; para lo cual anexó los siguientes documentos:*

para lo cual anexó los siguientes documentos:

No.	DOCUMENTOS	FOLIO
1	*Oficio Radicado Contratista de Obra e Interventoria.*	
2	*Documento FURC.*	
3	*Formato Certificado de Cumplimiento Infraestructura.*	
4	*Registro Único Tributario - RUT*	
5	*Acta Parcial de Obra*	
6	*Memorias de Cantidades de Obra. - DIH-CGID-F95*	
7	*Acta Parcial de Obra*	
8	*Certificación de Encontrarse al dia en Pagos de Aportes Seguridad Social y Aportes Parafiscales -*	

9	*Planilla de Pago de Salud, Pensión y ARL - Por cada mes:* *e. Certificado verificación de pago de seguridad social realizado por el Interventor.*	
10	*Informe Parcial de Interventoría*	
11	*Informe Parcial de Obra.*	
12	*Bitácora de obra*	

A la fecha el porcentaje ejecutado de obra acumulado para el Acta No. 01 es del 81.24511010474840% del 100% contratado.

Por lo anterior se le puede dar el trámite respectivo al Acta No. 1, del periodo del 16 de Noviembre de 2023 al 20 de Diciembre de 2023 y del 12 de Noviembre de 2024 al 20 de Enero de 2025, presentada por DANES INGENIEROS S.A.S.

Para constancia se firma a los veinticuatro (24) días del mes de Enero de 2025.

FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
R.L. CONSORCIO WF
Interventoría contrato CLPIH383 DE 2023

EL SUPERVISOR

H A C E C O N S T A R:

El Supervisor, certifica que la documentación presentada por el ejecutor del contrato de obra No. ***CLPIH383*** *de fecha* ***2023****", cuyo objeto es la "****CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN, PARA LA VEREDA LOS ANDES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN – DEPARTAMENTO DEL HUILA****", en donde se puede verificar que ha cumplido con todos los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales para la ejecución del contrato, de acuerdo a la información suministrada por el* ***CONTRATISTA DE INTERVENTORIA,*** *en donde fue revisada y avalada por el interventor; en lo que corresponde a la solicitud y trámite para el pago Parcial No.* ***01*** *de fecha* ***20 de enero de 2025,*** *correspondiente al periodo del 16 de noviembre de 2023 al 20 de diciembre de 2023 y del 12 de noviembre del 2024 al 20 de enero de 2025, por un valor de* ***CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($461.971.834,89)*** *me permito indicar que la descripción de los ítem, las cantidades de obra, valores unitarios y valor total, corresponden a o ejecutado encontrándose plenamente soportado en las memorias de cantidades de obra las cuales están tomadas de acuerdo a los diseños y conservan el objeto, alcance y la localización del mismo. Es por ello que las cantidades y la calidad de las obras, consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista de Obra e Interventoría quienes la cuantificaron y constataron en el terreno; para lo cual anexó los siguientes documentos:*

No.	Documento	folio
1	*Oficio radicado contratista de Obra e Interventoría*	
2	*Documento FURC.*	
3	*Formato Certificado de Cumplimiento Infraestructura*	
4	*Registro Unico Tributario - RUT*	
5	*Acta Parcial de Obra – DIH-CGID-F22*	
6	*Memorias de Cantidades de Obra. - DIH-CGID-F95*	
7	*Acta Parcial de Obra – DIH-CGID-F27*	
8	*Certificación de Encontrarse al día en Pagos de Aportes Seguridad Social y Aportes Parafiscales*	

9	*Planilla de Pago de Salud, Pensión y ARL - Por cada mes*	
	Certificado verificación de pago de seguridad social realizado por el Interventor.	
10	*Informe Parcial de Interventoria.*	
11	*Informe Parcial de Obra. – DIH-CGID-F28*	
12	*Bitacora de obra.*	

A la fecha el porcentaje ejecutado de obra acumulado para el Acta No. 01 es del 81.24511010474840 % del 100% contratado.

Por lo anterior se le puede dar el trámite respectivo al Acta No. 01 de fecha veinte (20) de enero de 2025, presentada por DANES INGENIEROS S.A.S.

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2025.

Juan F. Alarcón Q.

JUAN FELIPE ALARCON QUIROGA
Apoyo a la Supervisión

(Versión actas parciales)

NIT. 901.769.619-8

CONSORCIO WF

Neiva, 19 de marzo de 2025.

SANAND. WF42023-036

Doctor
FELIPE VICTORIA BARRAGAN
Director
Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila - INDERHUILA
Ciudad

REFERENCIA: *CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CLPIH383 DE 2023, Que tiene por objeto: "CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION, PARA LA VEREDA LOS ANDES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA".*

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO DEL ACTA PARCIAL No. 1, DEL CONTRATO EN REFERENCIA DE ACUERDO AL OFICIO DE DEVOLUCION No. IH 2-2025-0337 Del 18 de Marzo de 2025.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir nuevamente los documentos revisados, avalados y aprobados por parte de la INTERVENTORIA, para el Cobro de Acta Parcial No. 1 del Contrato de Obra Pública No. CLPIH383 DE 2023.

1. Oficio Radicado Contratista de Obra e Interventoría.
2. Documento FURC.
3. Formato Certificado de Cumplimiento Infraestructura.
4. Copia de Registros Presupuestales.
5. Acta de Inicio.
6. Cuenta de cobro (No responsable de IVA) o Factura Electrónica.
7. Certificación Cuenta Bancaria para consignar.
8. Registro Único Tributario - RUT (Consorcio y de los integrantes del Consorcio).
9. Contrato (Primera acta parcial).
10. Póliza debidamente aprobada - solo si no se ha cobrado anticipo.

CONSORCIO WF

11. Otro si (Cuando Aplique).
12. Póliza Otro si debidamente aprobada. (Cuando Aplique).
13. Actas de Suspensión.
14. Actas de Reiniciación - Anexar Póliza de Ampliación.
15. Acta Parcial de Obra - (firma R.L Contratista e R.L Interventor)
16. Memorias de Cantidades de Obra. - DIH-CGID-F95 (firma Director, Residente de obra y Director, Residente de Interventoría)
17. Acta Parcial de Obra (firma R.L Contratista e R.L Interventor, Vo.Bo Supervisor, VoBo Apoyo Supervisión y Asesor Jurídico Externo INDERHUILA)
18. Certificación de Encontrarse al día en Pagos de Aportes Seguridad Social y Aportes Parafiscales - (firma revisora fiscal si está obligado o sino por el R.L)
19. Planilla de Pago de Salud, Pensión y ARL – Periodo correspondiente.
20. Certificado verificación de pago de seguridad social realizado por el Interventor.
21. Informe Parcial de Interventoría. (firma Interventor y Vo.Bo. Apoyo Supervisión)
22. Informe Parcial de Obra. (firma Contratista e Interventor)
23. Bitácora de obra. (firma director, Residente de obra y Director, Residente de Interventoría)

Atentamente,

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO P.
Representante Legal

C.C. Arq. JUAN FELIPE ALARCON Q. – Apoyo a la supervisión

Carrera 4 No. 9-25 Oficina 507 Edificio Diego de Ospina
Teléfono: 608 8668020
Correo Electrónico: consorciowf23@gmail.com
Neiva - Huila

CONSORCIO WF

Neiva, 20 de enero de 2025.

CERTIFICADO DE INTERVENTORÍA

El suscrito, **FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.711.430 de Neiva, actuando en calidad de representante legal del CONSORCIO WF en adelante interventor del contrato de obra No. CLPIH383 de 2023 con objeto **"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA"**, suscrito entre DANES INGENIEROS S.A.S identificado con Nit. 900.219.918-2 y el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA RECREACION FISICA Y EL APROVECHAMIENTO. DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA – INDERHUILA con Nit 813.005.578-7, me permito CERTIFICAR: Que, una vez realizada la correspondiente verificación técnica, administrativa y financiera, se efectuó la **revisión y aprobación del Acta Parcial No. 1**, por la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 461.971.834,89) M/CTE correspondiente al periodo comprendido DEL 16/11/2023 AL 20/12/2023 Y DEL 12/11/2024 – 20/01/2025, suscrita el día 20 de enero de 2025 en la cual se constata el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

Las cantidades de obra ejecutadas durante dicho periodo fueron revisadas y verificadas conforme a los diseños, especificaciones técnicas, y el cronograma de ejecución establecido en el contrato, encontrándose debidamente soportadas y ajustadas a lo pactado contractualmente.

Este certificado se expide a los veinte (20) días del mes de enero de 2025.

Atentamente,

FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
R.L. CONSORCIO WF
Interventor del Contrato de Obra No. CLPIH383 DE 2023

INDERHUILA	FORMATO	CODIGO	PA-GF-F02
		Versión:	002
	FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS FURC	VIGENCIA	feb-22

Diligenciar Únicamente a Computador

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	CONTRATO DE OBRA					Nro	CLPIH383-2023		Fecha:	16	11	2023
Proveedor	DANES INGENIEROS S.A.S					NIT	X	C.C.		No.	900.219.918-2	
Dirección:	CALLE 4 # 7-78 APTO. 301			Correo Electronico	danesingenieros@gmail.com		Teléfonos		3152052190			
Establecer si es Secop I o II			secop I		secop II	X	Código del contrato por Secop II		CLPIH383 DE 2023			
Cesión de contrato :	Si	No	x	Nombre del cedente			NIT		C.C.		No.	
Aporte a pensiones voluntarias	Si	No		Aporte cuenta AFC			Entidad donde realiza el Aporte					
Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión Vol.							Banco					

2- Información para Pago Electrónico

Cuenta Bancaria	380103788	Banco	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	SI	X	No	Autoretenedor de Renta	NO	Contribuyente de Renta	SI	Código actividad ICA del Municipio de Neiva	4290
Gran Contribuyente	SÍ		No X	Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004	

4- Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL	
Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	CUATRO (4) Meses previa suscripción acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución, y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal 2025.
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos mediante acta(s) de recibo parcial de obra aprobadas por el interventor de acuerdo al avance de la obra hasta el noventa por ciento (90%) las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado, de acuerdo con la disponibilidad del PAC, previa amortización del anticipo, y el diez por ciento (10%) restante, a la terminación de la obra contratada, previa entrega y recibo a satisfacción por parte de la interventoría y de la Administración y suscripción del acta de liquidación del contrato. En caso de no haberse amortizado en su totalidad el saldo se amortizará en el acta de liquidación.

Fecha de Inicio	16	11	2023	Adición	SI	Adición No.	1	Fecha	27	12	2024	Valor adición $ 62,065,242
Valor compromiso inicial	$ 506,549,699			Valor adición(es)	$ 62,065,242			Valor total compromiso	$ 568,614,941			

5- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	1	Periodo:	De	Fecha	16	11	2023
							A:	Fecha	20	01	2025

Anticipo	X	% Anticipo	25	Valor Anticipo	$ 126,637,424.75

Entrada a Almacén No		Fecha Entrada				Valor Entrada	
Otros		Cual:					

6- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
NOVIEMBRE DEL 2023	$ 257,300	$ 934,200	$ 233,600	9460090325
DICIEMBRE DEL 2023	$ 254,600	$ 926,000	$ 232,000	9461784678
NOVIEMBRE DEL 2024	$ 361,100	$ 1,213,700	$ 414,200	9478621046, 9478913722, 9480094007, 9478285730
DICIEMBRE DEL 2024	$ 2,737,400	$ 7,297,000	$ 4,431,900	9480094655, 9479812982

8- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Número del CDP	Número del RP	Código de la Fuente de Financiación y denominación del recurso	Valor pendiente por Ejecutar	Valor Ejecutado
2023000615	2023000637	2.3.2.02.02.005 - Servicios de la construcción. FUENTE: 150103-21- RECURSOS PROPIOS TRASLADO	$ 506,549,699	
2024000463	2024000484	2.3.2.02.02.005 - Construcción y Servicios de la construcción. FUENTE: 141247- RB TASA AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	$ 379,912,274	$ 126,637,424.75
2024000725	2024000757	2.3.2.02.02.005 - Construcción y Servicios de la construcción. FUENTE: 141245-R.B ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL	$ 62,065,242	
2025000263	2025000252	2.3 2 02.02.005 -Construcción y servicios de la construcción FUENTE: 15003-8-VIGENCIAS EXPIRADAS - RB TASA AL DEPORTE Y RECREACIÓN	$ 33,433,398	$ 346,478,876.17

Valor a cobrar en pesos $	$ 461,971,834.89	Valor a cobrar en letras	CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

8- Autorización del pago:

Declaración: Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el Contratista certifican que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP 2 si aplica). Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Departamento del Huila.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Unicamente Secretarios, Directores o Líderes de Grupo)
DANES INGENIERIA S.A.S. R.L NÉSTOR RODRIGO HERRO	R.L FAIVER PERDOMO P.	FELIPE VICTORIA BARRAGAN SUPERVISOR INDERHUILA

10- Firmas de aprobación de pagos por parte de Contabilidad y Tesorería

visto bueno Contabilidad (Firma y fecha)	Firma de aprobación de Tesorería con fecha de aprobación

11- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14745108653

(415)7707212489984(8020) 000001474510865 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 1 9 9 1 8	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DANES INGENIEROS S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 1 ESTE 77 05 AP 201

42. Correo electrónico danesingenieros@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 2 0 5 2 1 9 0	3 2 1 2 3 7 5 4 5 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 8 0 5 2 4	4 1 1 2	2 0 0 8 0 5 2 4		4 2 1 0	4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 03 - 03 / 09 : 46: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre FIERRO LOSADA NESTOR RODRIGO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-03-2021 09:47:20AM

DOCUMENTO SIN VALIDEZ COMERCIAL

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14745108653

(415)7707212489984(8020) 000001474510865 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 1 9 9 1 8	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1
73. Fecha	2 0 0 8 0 5 2 1	2 0 1 1 1 2 1 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 8 0 5 2 4	2 0 1 1 1 2 1 9
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 8 6 2 6 5	1 8 6 2 6 5
78. Departamento	4 1	4 1
79. Ciudad/Municipio	2 3	2 3
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 8 0 5 2 1	
81. Hasta	2 4 5 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14745108653

(415)7707212489984(8020) 000001474510865 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 1 9 9 1 8	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 8 0 5 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 7 1 9 3 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FIERRO	LOSADA	NESTOR	RODRIGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 8 0 5 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 7 2 3 6 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARANGO	SOTO	DANIEL	RICARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CONTROLADA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14745108653

(415)7707212489984(8020) 000001474510865 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 1 9 9 1 8	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 7 1 9 3 6 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FIERRO	LOSADA	NESTOR	RODRIGO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5,000,000	5 0	2 0 0 8 0 5 2 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 1 7 2 3 6 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARANGO	SOTO	DANIEL	RICARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5,000,000	5 0	2 0 0 8 0 5 2 4	2 0 2 1 0 2 0 4

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14745108653

(415)7707212489984(8020) 000001474510865 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 1 9 9 1 8	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadania 1 3	7 6 9 5 9 3 0		8 1 1 5 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BUENDIA	MEDINA	JOHN	JAIRO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 5 2 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CONTROLADA DOCUMENTO

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	DIH-CGID-F32
		Versión:	2
	PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Fecha de Aprobacion:	
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		12/09/2023

CONTRATO DE OBRA:	No:	CLPIH383 DE 2023				
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"					
VALOR CONTRACTUAL:	$ 506.549.699,00	ACTA DE INICIO:	16 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 62.065.242,00					
VALOR TOTAL:	$ 568.614.941,00	ACTA DESUSPENSION 01:	21 de diciembre de 2023			
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 126.637.424,75					
PLAZO:	3 MESES	ACTA DE REINICIACION 01:	12 de noviembre de 2024			
PLAZO ADICIONAL 1:	1 MES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	20 de enero de 2025	1		
PLAZO TOTAL:	4 MESES					
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S	R.L NESTOR RODRIGO FIERRO LOSADA		VALOR PRESENTE ACTA:	$ 461.971.834,89	
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	R.L FAIVER PERDOMO POLANIA		VALOR POR PAGAR:	$ 346.478.876,17	

CONDICIONES CONTRACTUALES						OTROSI No. 2 FECHA 27/12/2024			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
1												
1,1	ACTIVIDADES PRELIMINARES											
1.01	Localización y replanteo.	M2	632,32	$ 3.549,00	$ 2.244.104,00	733,21	$ 3.549,00	$ 2.602.162,29	733,21	$ 2.602.162,29	733,21	$ 2.602.162,29
1.02	Demolición de cuneta existente.	ML	62,80	$ 7.544,00	$ 473.763,00	60,80	$ 7.544,00	$ 458.675,20				
1.03	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	2,40	$ 26.210,00	$ 62.904,00	27,97	$ 26.210,00	$ 733.093,70				
1.04	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	2,10	$ 20.804,00	$ 43.688,00	0,00	$ 20.804,00	$ 0,00				
1.05	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2,00	$ 116.413,00	$ 232.826,00	2,00	$ 116.413,00	$ 232.826,00	2,00	$ 232.826,00	2,00	$ 232.826,00
1.06	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	204,04	$ 45.880,00	$ 9.361.355,00	280,23	$ 45.880,00	$ 12.856.952,40	280,23	$ 12.856.952,40	280,23	$ 12.856.952,40
1.07	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	152,02	$ 83.626,00	$ 12.712.825,00	102,30	$ 83.626,00	$ 8.554.939,80	102,30	$ 8.554.939,80	102,30	$ 8.554.939,80
Subtotal					$ 25.131.465,00			$ 25.488.649,38		$ 24.246.880,49		$ 24.246.880,49
2												
2,1	CIMENTACIÓN											
2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	63,82	$ 33.922,00	$ 2.164.902,00	21,60	$ 33.922,00	$ 732.715,20	21,60	$ 732.715,20	21,60	$ 732.715,20
2.02	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zoga	M3	21,66	$ 359.045,00	$ 7.776.915,00	29,94	$ 359.045,00	$ 10.749.807,30	29,94	$ 10.749.807,30	29,94	$ 10.749.807,30
2.03	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	26,71	$ 617.415,00	$ 16.491.155,00	38,92	$ 617.415,00	$ 24.029.791,80	38,92	$ 24.029.791,80	38,92	$ 24.029.791,80
2.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	1698,00	$ 7.097,00	$ 12.050.706,00	2.789,00	$ 7.097,00	$ 19.793.533,00	2.789,00	$ 19.793.533,00	2.789,00	$ 19.793.533,00
2.05	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	8,20	$ 740.066,00	$ 6.068.541,00	11,20	$ 740.066,00	$ 8.288.739,20	11,20	$ 8.288.739,20	11,20	$ 8.288.739,20
2.06	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	612,00	$ 7.097,00	$ 4.343.364,00	1.029,20	$ 7.097,00	$ 7.304.232,40	1.029,20	$ 7.304.232,40	1.029,20	$ 7.304.232,40
Subtotal					$ 48.895.583,00			$ 70.898.818,90		$ 70.898.818,90		$ 70.898.818,90
3												
3,1	ESTRUCTURA EN CONCRETO											
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	14,00	$ 918.378,00	$ 12.857.292,00	16,72	$ 918.378,00	$ 15.355.280,16	16,72	$ 15.355.280,16	16,72	$ 15.355.280,16
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	3491,00	$ 7.097,00	$ 24.775.627,00	2.955,17	$ 7.097,00	$ 20.972.841,49	2.955,17	$ 20.972.841,49	2.955,17	$ 20.972.841,49
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	17,00	$ 1.002.201,00	$ 17.037.417,00	16,37	$ 1.002.201,00	$ 16.406.030,37	16,37	$ 16.406.030,37	16,37	$ 16.406.030,37

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	DIH-CGID-F32
		Versión:	2
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Fecha de Aprobación:	
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	12/09/2023	

CONTRATO DE OBRA:	No:	CLPIH383 DE 2023					
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"						
VALOR CONTRACTUAL:	$ 506.549.699,00	ACTA DE INICIO:	16 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL			
VALOR ADICIONAL 1:	$ 62.065.242,00						
VALOR TOTAL:	$ 568.614.941,00	ACTA DESUSPENSION 01:	21 de diciembre de 2023				
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 126.637.424,75						
PLAZO:	3 MESES	ACTA DE REINICIACIÓN 01:	12 de noviembre de 2024				
PLAZO ADICIONAL 1:	1 MES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	20 de enero de 2025	1			
PLAZO TOTAL:	4 MESES						
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S	R.L NESTOR RODRIGO FIERRO LOSADA		VALOR PRESENTE ACTA:		$ 461.971.834,89	
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	R.L FAIVER PERDOMO POLANIA		VALOR POR PAGAR:		$ 346.478.876,17	

CONDICIONES CONTRACTUALES						OTROSI No. 2 FECHA: 27/12/2024			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	1756,00	$ 7.097,00	$ 12.462.332,00	2.096,44	$ 7.097,00	$ 14.878.434,68	2.096,44	$ 14.878.434,68	2.096,44	$ 14.878.434,68
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	57,76	$ 40.240,00	$ 2.324.262,00	60,80	$ 40.240,00	$ 2.446.592,00	60,80	$ 2.446.592,00	60,80	$ 2.446.592,00
Subtotal					**$ 69.456.930,00**			**$ 70.059.178,70**		**$ 70.059.178,70**		**$ 70.059.178,70**
4												
4,1	**CUBIERTA**											
4.01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 20, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	670,93	$ 285.939,00	$ 191.845.053,00	690,38	$ 285.939,00	$ 197.406.566,82	690,38	$ 197.406.566,82	690,38	$ 197.406.566,82
Subtotal					**$ 191.845.053,00**			**$ 197.406.566,82**		**$ 197.406.566,82**		**$ 197.406.566,82**
5												
5,1	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**											
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.758,00	$ 4.689.797,00	317,78	$ 14.758,00	$ 4.689.797,24				
5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2,00	$ 3.700.895,00	$ 7.401.790,00	2,00	$ 3.700.895,00	$ 7.401.790,00				
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	2,40	$ 84.509,00	$ 202.822,00	27,97	$ 84.509,00	$ 2.363.547,71				
5.04	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	62,80	$ 83.629,00	$ 5.251.901,00	62,80	$ 83.629,00	$ 5.251.901,20				
NP-5.05	Rejillas prefabricadas para cunetas.	ML		$ 159.779,00		60,80	$ 159.779,00	$ 9.714.563,20				
Subtotal					**$ 17.546.310,00**			**$ 29.421.599,35**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
6												
6,1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**											
6.01	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	63,20	$ 79.932,00	$ 5.051.702,00	63,20	$ 79.932,00	$ 5.051.702,40				
6.02	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	20,60	$ 106.806,00	$ 2.200.204,00	20,60	$ 106.806,00	$ 2.200.203,60				

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	DIH-COID-F12
		Versión:	2
	PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Fecha de Aprobacion:	
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	12/09/2023	

CONTRATO DE OBRA:	No:	CLPIH383 DE 2023					
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"						
VALOR CONTRACTUAL:	$ 506.549.899,00	ACTA DE INICIO:	16 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL			
VALOR ADICIONAL 1:	$ 62.065.242,00						
VALOR TOTAL:	$ 568.614.941,00	ACTA DESUSPENSION 01:	21 de diciembre de 2023				
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 126.637.424,75						
PLAZO:	3 MESES	ACTA DE REINICIACION 01:	12 de noviembre de 2024				
PLAZO ADICIONAL 1:	1 MES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	20 de enero de 2025	1			
PLAZO TOTAL:	4 MESES						
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S	R.L NESTOR RODRIGO FIERRO LOSADA		VALOR PRESENTE ACTA:		$ 461.971.834,89	
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	R.L FAIVER PERDOMO POLANIA		VALOR POR PAGAR:		$ 346.478.876,17	

	CONDICIONES CONTRACTUALES					OTROSI No. 2 FECHA: 27/12/2024			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
6.03	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	30,00	$ 218.470,00	$ 6.554.100,00	30,00	$ 218.470,00	$ 6.554.100,00				
6.04	Caja de inspeccion en concreto de F'c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2,00	$ 349.057,00	$ 698.114,00	2,00	$ 349.057,00	$ 698.114,00				
Subtotal					$ 14.504.120,00			$ 14.504.120,00		$ 0,00		$ 0,00
7												
7,1	INSTALACIONES ELECTRICAS											
7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UND	2,00	$ 292.572,00	$ 585.144,00	3,00	$ 292.572,00	$ 877.716,00	3,00	$ 877.716,00	3,00	$ 877.716,00
7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3,00	$ 637.202,00	$ 1.911.606,00	3,00	$ 637.202,00	$ 1.911.606,00				
7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	5,12	$ 45.880,00	$ 234.906,00	5,12	$ 45.880,00	$ 234.905,60				
7.04	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	32,00	$ 49.210,00	$ 1.574.720,00	32,00	$ 49.210,00	$ 1.574.720,00				
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2,00	$ 303.693,00	$ 607.386,00	2,00	$ 303.693,00	$ 607.386,00				
7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2,00	$ 281.525,00	$ 563.050,00	2,00	$ 281.525,00	$ 563.050,00				
7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	$ 1.014.120,00	$ 1.014.120,00	1,00	$ 1.014.120,00	$ 1.014.120,00				
7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	$ 4.688.701,00	$ 4.688.701,00	1,00	$ 4.688.701,00	$ 4.688.701,00				
7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	16,00	$ 88.300,00	$ 1.412.800,00	35,00	$ 88.300,00	$ 3.090.500,00				
7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12,00	$ 367.987,00	$ 4.415.844,00	12,00	$ 367.987,00	$ 4.415.844,00				
7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60,00	$ 57.998,00	$ 3.479.880,00	102,80	$ 57.998,00	$ 5.962.194,40				
7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	$ 1.016.078,00	$ 12.192.936,00	12,00	$ 1.016.078,00	$ 12.192.936,00				
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 972.420,00	$ 972.420,00	1,00	$ 972.420,00	$ 972.420,00				

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	DIH-OGID-F22
		Versión:	2
	PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Fecha de Aprobación:	
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	12/09/2023	

CONTRATO DE OBRA:	No:	CLPIH383 DE 2023					
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"						
VALOR CONTRACTUAL:	$ 506.549.699,00	ACTA DE INICIO:	16 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL			
VALOR ADICIONAL 1:	$ 62.065.242,00						
VALOR TOTAL:	$ 568.614.941,00	ACTA DESUSPENSION 01:	21 de diciembre de 2023				
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 126.637.424,75						
PLAZO:	3 MESES	ACTA DE REINICIACION 01:	12 de noviembre de 2024				
PLAZO ADICIONAL 1:	1 MES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	20 de enero de 2025	1			
PLAZO TOTAL:	4 MESES						
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S	R.L NESTOR RODRIGO FIERRO LOSADA		VALOR PRESENTE ACTA:		$ 461.971.834,89	
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	R.L FAIVER PERDOMO POLANIA		VALOR POR PAGAR:		$ 346.478.876,17	

CONDICIONES CONTRACTUALES						OTROSI No. 2 FECHA: 27/12/2024			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
7.14	Suministro e Instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 1.032.612,00	$ 1.032.612,00	1,00	$ 1.032.612,00	$ 1.032.612,00				
NP-7.15	Reubicación de postes eléctricos en concreto	UND		$ 968.000,00		2,00	$ 968.000,00	$ 1.936.000,00				
Subtotal					$ 34.686.125,00			$ 41.074.711,00		$ 877.716,00		$ 877.716,00
8												
8,1	TRANSPORTE											
8.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	2760,15	$ 1.150,00	$ 3.174.173,00	5.294,18	$ 1.150,00	$ 6.088.307,00	5.294,18	$ 6.088.307,00	5.294,18	$ 6.088.307,00
Subtotal					$ 3.174.173,00			$ 6.088.307,00		$ 6.088.307,00		$ 6.088.307,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 405.239.759,00			$ 454.891.951,00		$ 369.577.467,91		$ 369.577.467,91
	Administración	20%			$ 81.047.952,00			$ 90.978.390,00		$ 73.915.493,58		$ 73.915.493,58
	Imprevistos	1%			$ 4.052.398,00			$ 4.548.920,00		$ 3.695.774,68		$ 3.695.774,68
	Utilidad	4%			$ 16.209.590,00			$ 18.195.678,00		$ 14.783.098,72		$ 14.783.098,72
	VALOR TOTAL				$ 506.549.699,00			$ 568.614.941,00		$ 461.971.834,89		$ 461.971.834,89
	AMORTIZACION ANTICIPO			25%	$ 126.637.424,75					$ 115.492.958,72		$ 115.492.958,72
	VALOR TOTAL MENOS (-) AMORTIZACION DE ANTICIPO									$ 346.478.876,17		$ 346.478.876,17
	% AVANCE DE OBRA									81,24511010474840%		81,24511010474840%

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE.

DANES INGENIEROS S.A.S.
R.L. ING. NESTOR RODRIGO FIERRO LOSADA
CONTRATISTA


CONSORCIO WF
R.L. ING. FAIVER PERDOMO P.
INTERVENTOR

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código:	[illegible]
			Versión:	1
			Fecha de Aprobación:	[illegible]
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH383 DE 2023
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustín		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S.		No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		

CAPÍTULO:	1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD:	M2
ITEM:	1.01	Localización y replanteo		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

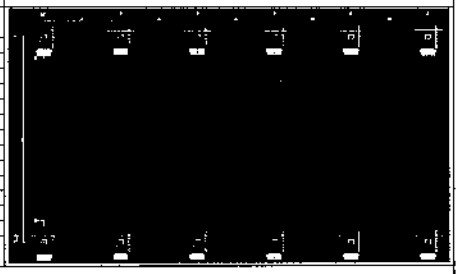DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	Nº ELEMENTOS	Medida Total	ESQUEMAS:
Área de intervención para realizar la localización y replanteo		33.30	22.70		1.00	733.21	
TOTAL						733.21	

Observaciones:	SE MIDE EL ÁREA DESDE EL EXTREMO DE LAS ZAPATAS ESQUINERAS.

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Vo.Bo. ING JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER GILBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR RODRIGO PIERRO LOSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING FARLER PERDOMO P.
R.L CONSORCIO WF


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIR-GSIP-F05
			Versión	1
			Fecha de Aprobación	12/01/2023
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDÉS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:		CLPIH 383 DE 2023	
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin	PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra	
CONTRATISTA:	DÁNES INGENIEROS S.A.S	Desde:	16/11/2023	No. 1	
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta:	20/01/2025		

CAPÍTULO:	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD:	M2
ITEM:	1.01	Localización y replanteo.		

REGISTRO FOTOGRAFICO






Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno

V.B. Bo. ING. JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR RODRIGUEZ FIERRO LOSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING FARVER PERDOMO P.
RL CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: [illegible]
			Versión: [illegible]
			Fecha de Aprobación: [illegible]
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Página: [illegible]


OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH383 DE 2023
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S.		No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		

CAPÍTULO:	1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD:	UND
ITEM:	1.05	Desmonte marcos canchas existentes.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Marcos de Canchas					2 no	2.00
	TOTAL					2.00

ESQUEMAS:



Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

VALENTINA JORAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


ING NESTOR RAMIRO FIERRO LOSADA
DIRECTOR DE OBRA


ING FALBER PERDOMO P.
R.L. CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	[illegible]
			Versión	1
			Fecha de Aprobación	[illegible]
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		No. CONTRATO:	CLPIH 383 DE 2023	
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustín		PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DÁNES INGENIEROS S.A.S		Desde:	16/11/2023	No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		Hasta:	20/01/2025	
CAPÍTULO:	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD:		UND
ITEM:	1.05	Desmonte marcos canchas existentes			

REGISTRO FOTOGRAFICO

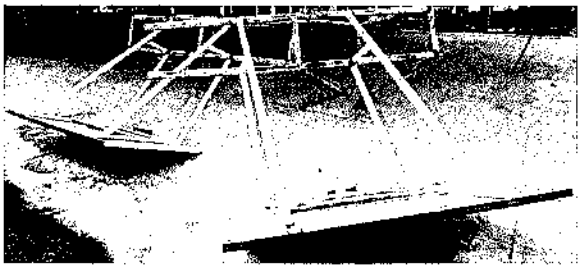

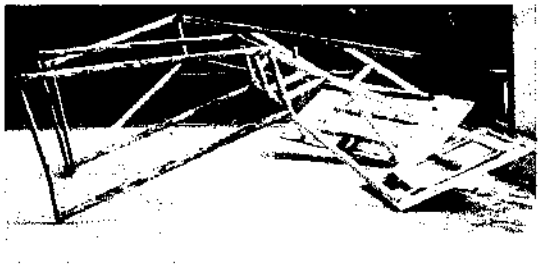

Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

JOSE BRAYAN SEBASTIAN ROJAS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAIME HUMBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR [illegible] RIVERO LOSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING FAIVER PERDOMO P.
R.L CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-FOR15-758
			Versión	1
			Fecha de Aprobación	13/07/2023
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			


OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH383 DE 2023
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S.		No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		

CAPÍTULO:	1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD:	M3
ITEM:	1.06	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	Nº ELEMENTOS	Medida Total
ZAPATAS A1, A6, B1, B6	2.30	2.30	2.50	4	52.90
ZAPATAS A2, B2, A3, B3, A4, B4, A5, B5	2.20	2.20	2.50	8	96.80
VIGA CIMENTACIÓN (A1-A2) (A6-A5) (B1-B2) (B6-B5)	3.25	0.40	0.50	4	2.60
VIGA CIMENTACIÓN (A2-A3) (A3-A4) (A4-A5) (B2-B3) (B3-B4) (B4-B5)	3.80	0.40	0.50	6	4.56
EXCAVACIÓN POR ENCIMA DEL NIVEL DE LA PLACA EN LAS ZAPATAS A1, A6, B1, B6	1.30	1.30	0.70	4	14.81
EXCAVACIÓN POR ENCIMA DEL NIVEL DE LA PLACA EN LAS ZAPATAS A2, B2, A3, B3, A4, B4, A5, B5	1.20	1.20	1.50	8	33.08
EXCAVACIÓN POR ENCIMA DEL NIVEL DE LA PLACA EN LAS VIGA CIMENTACIÓN (A1-A2) (A6-A5) (B1-B2) (B6-B5)	3.25	0.40	1.50	4	9.20
EXCAVACIÓN POR ENCIMA DEL NIVEL DE LA PLACA EN LAS VIGA CIMENTACIÓN (A2-A3) (A3-A4) (A4-A5) (B2-B3) (B3-B4) (B4-B5)	3.80	0.40	1.50	6	13.68
EXCAVACION DE CANUELA	60.10	0.45	0.38	1	10.31
CAMILLAS	0.94	0.94	0.70	2	1.24
Descargue de agua lluvias 6" Y 8"	32.50	0.60	0.80	1	15.65
TOTAL					280.23

ESQUEMAS:

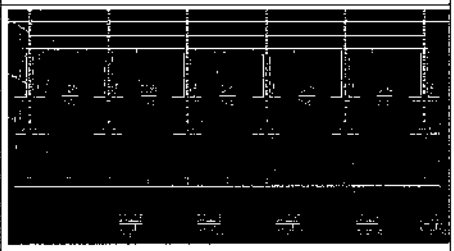

Observaciones:	LA PLACA DEL POLIDEPORTIVO QUEDA ENTERRADA CON RESPECTO A SUS LINDEROS LO QUE GENERA UN AUMENTO EN LA EXPACACIONES DE LA CIMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA.

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno

ING. JOHAN SEBASTIAN ACOSTA PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING NESTOR RODRIGUEZ PEDROSA
DIRECTOR DE OBRA

ING RONVER PERDOMO P.
R.L CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIR-FO-F05
			Versión: 1
			Fecha de aprobación: 12/09/2023
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		No. CONTRATO:	CLPIH 383 DE 2023	
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin		PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DÁNES INGENIEROS S.A.S		Desde:	16/11/2023	No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		Hasta:	20/01/2025	
CAPÍTULO:	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		UNIDAD:	M3
ITEM:	1.06	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.			

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno

V.B.B. ING. JOSE SEBASTIAN RIOS PALACIOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR ADRIAN FERNANDEZ SOSA
DIRECTOR DE OBRA

ING JAVIER PERDOMO P.
R.L CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTICN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÒN - MIPG	INDERHUILA	Código:	Dir-GOBY-15
			Versión:	1
			Fecha de Aprobación:	
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			12/07/2023

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH383 DE 2023
LOCALIZACION:	Polideportivo principal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S.		No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		

CAPÍTULO:	1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD:	M3
ITEM:	1.07	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total	ESQUEMAS:
EXCAVACIONES							
ZAPATAS A1, A6, B1, B6		2.70	2.70	2.53	4	52.90	
ZAPATAS A2, B2, A3, B3, A4, B4, A5, B5		2.85	2.85	2.53	8	96.80	
VIGA CIMENTACION (A1-A2) (A6-A5) (B1-B2) (B6-B5)		4.75	0.40	0.50	4	3.80	
VIGA CIMENTACIÓN (A2-A3) (A3-A4) (A4-A5) (B2-B3) (B3-B4) (B4-B5)		3.80	0.40	0.50	6	4.56	
EXCAVACION DE CANUELA		60.10	0.46	0.38	1	10.51	
CAMILAS		0.94	0.94	0.70	2	1.24	
Descargue de aguas lluvias 6" Y 8"		52.60	0.50	0.80	1	15.65	
(-) CONCRETO DE ESTRUCTURA							
A1, A6, B1, B6							
CICLOPEO		-2.70	2.70	0.53	4	-30.58	
CONCRETO ZAPATAS		-2.50	2.50	0.65	4	-37.75	
PEDESTAL		-0.65	0.65	0.65	4	-1.33	
COLUMNA		-0.50	0.45	0.40	4	-0.16	
VIGA CIMENTACION (A1-A2) (A5-A6) (B1-B2) (B5-B6)		-3.75	0.40	0.50	4	3.00	
A2, B2, A3, B3, A4, B4, A5, B5							
CICLOPEO		-2.70	2.70	0.50	8	-18.36	
CONCRETO ZAPATAS		-2.70	2.70	0.65	8	-25.37	
PEDESTAL		-0.65	0.65	0.65	8	-2.65	
COLUMNA		-0.50	0.45	0.40	8	-0.72	
VIGA CIMENTACION (A2-A3) (A3-A4) (A4-A5) (B2-B3) (B3-B4) (B4-B5)		-1.80	0.40	0.50	6	-4.56	
TUBOS SANITARIOS		LARGO		AREA			
TUBERIA DE 6"		-20.50		0.031		-0.64	
TUBERIA DE 8"		-12.30		0.048		-0.22	
TOTAL						102.30	

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Vo.Bo. ING JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAIRO ANIBAL TORALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR RODRIGUEZ PEREZ LOSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING FARVER PERDOMO P.
R.L CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		INDERHUILA	Código: DIF-GG12 Fte
				Versión: 1
				Fecha de Aprobación: 17/03/2023
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		No. CONTRATO:	CLPIH 383 DE 2023	
LOCALIZACION:	Polideportivo principal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin		PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DÁNES INGENIEROS S.A.S		Desde:	16/11/2023	No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		Hasta:	20/01/2025	
CAPÍTULO:	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		UNIDAD:	M3
ITEM:	1,07	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.			

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Vo.Bo. ING JOHAN SEBASTIAN LOS RALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HERMIDEYO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR RAMIREZ GARCIA PULGARIN
DIRECTOR DE OBRA

ING FANER PERDOMO P.
REPCONSORCIO WF


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código:	[illegible]
			Versión:	1
			Fecha de Aprobación:	10/03/2023
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH383 DE 2023
LOCALIZACION:	Polideportivo prioipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S.		No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		
CAPÍTULO:	2.1 CIMENTACIÓN	UNIDAD:	M2
ITEM:	2.01 Solado en concreto de limpieza 2000 PSI, e= 0.05 mts		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	Nº ELEMENTOS	Medida Total
VIGA CIMENTACIÓN (A1-A2) (A5-A6) (B1-B2) (B5-B6)	5.40	0.40		4	8.64
VIGA CIMENTACIÓN (A2-A3) (A3-A4) (A4-A5) (B2-B3) (B3-B4) (B4-B5)	5.40	0.40		6	12.96
TOTAL					21.60

ESQUEMAS:



Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno

ING. JHAN SEBASTIAN PEÑALOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR MAURICIO HIERRO LOSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING PEDRO PERDOMO P.
R. CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código:	DIT-GC-D-F35
			Versión:	1
			Fecha de Aprobación:	
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			13/09/2023

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		No. CONTRATO:	GLPIH 383 DE 2023	
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin		PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S		Desde:	16/11/2023	No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		Hasta:	20/01/2025	

CAPÍTULO:	2.1	CIMENTACIÓN	UNIDAD:	M2
ITEM:	2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts		

REGISTRO FOTOGRAFICO







Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. JHONATHAN SEBASTIAN MONTES PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR FRANCISCO HERRERA OSSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING FAIVER PERDOMO P.
R.L CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Codigo	DES-GGE-F01
			Version	1
			Fecha	13/09/2023
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			


OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH383 DE 2023
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustín		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S.		No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		

CAPÍTULO:	2.1	CIMENTACIÓN	UNIDAD:	M3
ITEM:	2.02	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zoga		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
ZAPATAS A1, A5, B1, B5		2.30	2.30	0.50	4	10.58
ZAPATAS A2, B2, A3, B3, A4, B4, A5, B5		2.20	2.30	0.50	8	18.36
TOTAL						29.94

ESQUEMAS:

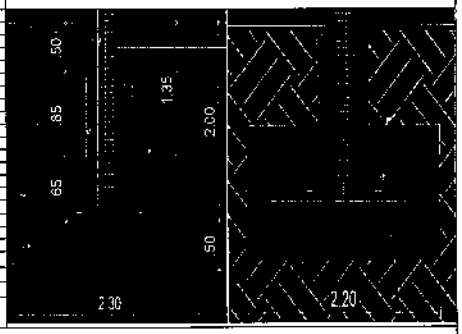

Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e Interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno

ING. JHOJAN SEBASTIAN CERVALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


ING NESTOR RODOLFO PERROCOSADA
DIRECTOR DE OBRA


ING. RIVER PERDOMO P.
R.L. CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código:	[illegible]
			Versión:	1
			Fecha de Aprobación:	13/02/2023
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		No. CONTRATO:	CLPIH 383 DE 2023	
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustín		PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S		Desde:	15/11/2023	No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		Hasta:	20/01/2025	
CAPÍTULO:	2.1	CIMENTACIÓN		UNIDAD:	M3
ITEM:	2.02	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zoga			

REGISTRO FOTOGRÁFICO

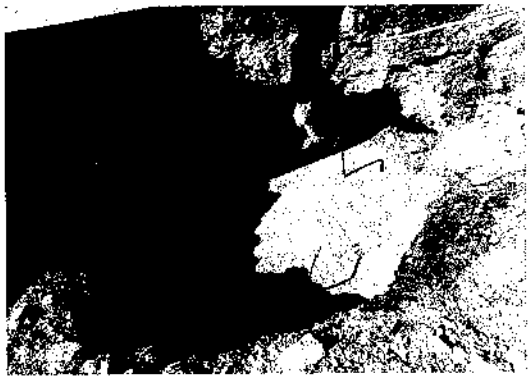

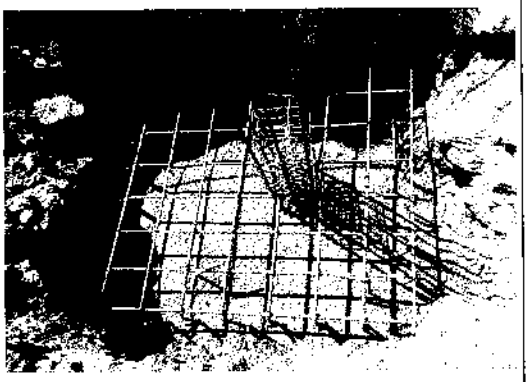

Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Vo.Bo. ING JOHAN SEBASTIAN DE PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO DIRADO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR RICARDO HERRERA LOSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING FAIVER PERDOMO P.
R.L.C.ONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIR-GOTIB-F04
			Versión	1
			Fecha de Aprobación	13/02/2023
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH383 DE 2023
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustín		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S.		No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		

CAPÍTULO:	2.1	CIMENTACIÓN	UNIDAD:	M3
ITEM:	2.03	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.		


PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR - prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
ZAPATAS A1, A6, B1, B6		2.30	2.30	0.65	4	13.75
ZAPATAS A2, B2, A3, B3, A4, B4, A5, B5		2.20	2.20	0.55	8	25.17

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		INDERHUILA	Codigo: [illegible]
				Versión: 1
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			Fecha de Aprobacion: 12/09/2023

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		No. CONTRATO:	CLPIH 383 DE 2023	
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municiplo de San Agustin		PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DÁNES INGENIEROS S.A.S		Desde:	16/11/2023	No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		Hasta:	20/01/2025	
CAPÍTULO:	2.1	CIMENTACIÓN		UNIDAD:	M3
ITEM:	2.03	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.			

REGISTRO FOTOGRAFICO

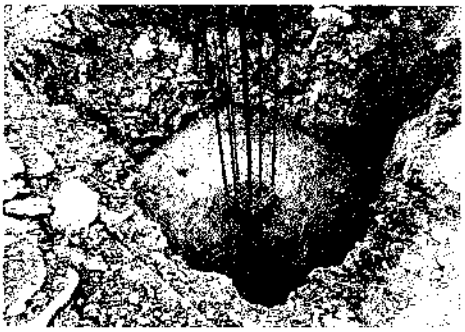





Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. DIEGO [illegible] SEBASTIAN RIOS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR [illegible] ARENAS OSSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING FARIER PERDOMO P.
R.L CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código:	[illegible]
			Versión:	1
			Fecha de Aprobación:	[illegible]
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Página:	[illegible]


OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH383 DE 2023
LOCALIZACION:	Polideportivo principal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S.		No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		

CAPÍTULO:	2.1	CIMENTACIÓN	UNIDAD:	KG
ITEM:	2.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Ø varilla	No. de Barras	Long	Peso (kg/m)	Nº ELEMENTOS	Peso Total (Kg)
ZAPATAS A1, A5, D1, D5	3/4"	18.00	3.14	2.240	4.00	376.42
ZAPATAS A1, A5, B1, B5	3/4"	13.00	3.10	2.240	4.00	499.07
ZAPATAS A2, B2, A3, B3, A4, B4, A5, B5	3/4"	14.00	3.04	2.240	8.00	871.85
ZAPATAS A2, B2, A3, B3, A4, B4, A5, B5	3/4"	16.00	3.06	2.240	8.00	880.16
CONECTORES DE CIMENTACION	1/2"	4.00	0.70	1.000	32.00	90.40
TOTAL						2,598.00

ESQUEMAS:



Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno

PEDRO [illegible] CARDENAS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER [illegible] GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


ING NESTOR [illegible] HERRERA
DIRECTOR DE OBRA


ING FAIVER PERDOMO P.
R.L CONSORCIO WF


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - M'PG	INDERHUILA	Código: D-[illegible]-F01
			Versión: 1
			Fecha de Aprobación:
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		12/03/2025

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		No. CONTRATO:	CLPIH 383 DE 2023	
LOCALIZACION:	Polideportivo principal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin		PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DÁNES INGENIEROS S.A.S		Desde:	16/11/2023	No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		Hasta:	20/01/2025	
CAPÍTULO:	2.1	CIMENTACIÓN		UNIDAD:	KG
ITEM:	2.04	Acero de refuerzo Fy=60,000 P.S.I. zapatas			

REGISTRO FOTOGRAFICO

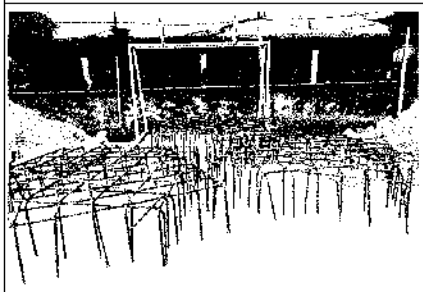

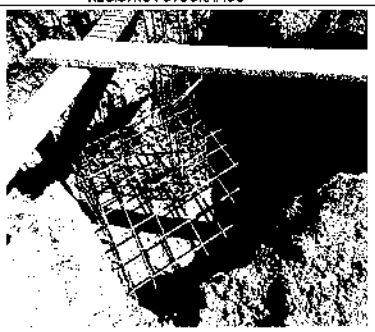

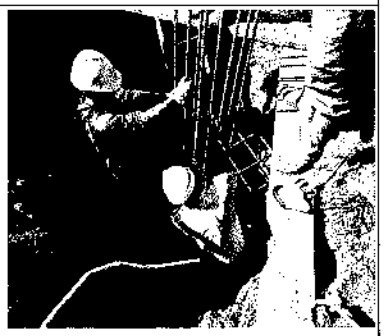

Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. JHON SEBASTIAN RIOS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR JAIR CARREÑO LOSADA
DIRECTOR DE OBRA


ING FAIVER PERDOMO P.
R.L CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	[illegible]
			Versión:	1
			Fecha de Aprobación:	[illegible]
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		[illegible]	

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH383 DE 2023
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S.		No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		

CAPÍTULO:	2.1	CIMENTACIÓN	UNIDAD:	M3
ITEM:	2,05	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI, Ver diseño		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total	ESQUEMAS:
VIGA CIMENTACIÓN (A1-A2) (A5-A6) (B1-B2) (B5-B6)		5.60	0.40	0.50	4.00	4.48	
VIGA CIMENTACIÓN (A2-A3) (A3-A4) (A4-A5) (B2-B3) (B3-B4) (B4-B5)		5.60	0.40	0.50	4.00	6.72	
TOTAL						11.20	

Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno

Vo Bo. ING JOHN JAIRO ANDRIOS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO CIRO LDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR JUAN [illegible] OSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING FAINER PERDOMO P.
R.L. CONSORCIO WF


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIF-GCID-Pr1
			Versión:	1
			Fecha de Aprobación	
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		17-03-2017	

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH 383 DE 2023	
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin	PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DÁNES INGENIEROS S.A.S	Desde:	16/11/2023	No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta:	20/01/2025	

CAPÍTULO:	2.1	CIMENTACIÓN	UNIDAD:	M3
ITEM:	2.05	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño		

REGISTRO FOTOGRAFICO



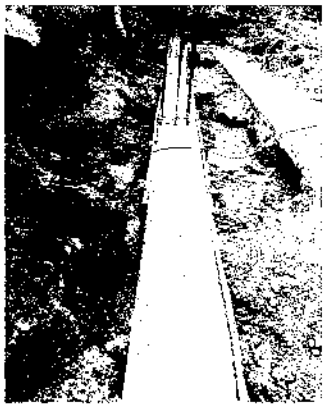



Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

VO.BO ING JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR RODRIGO PERRO LOSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING FAIVER PERDOMO P.
R.L CONSORCIO WF


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: F-H-COID-026
			Versión: 1
			Fecha de Aprobación:
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		17/08/2023

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	GLPIH363 DE 2023
LOCALIZACION:	Polideportivo principal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustín		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S.		0
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		
CAPÍTULO:	2.1 CIMENTACIÓN	UNIDAD:	KG
ITEM:	2.06 Acero de refuerzo Fyr60.000 P.S.L viga de cimentación		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	UBICACIÓN	Ø varilla	No. de Barras	Long	Peso (kg/m)	N° ELEMENTOS	PÉRDIDAS	Peso Total (Kg)
VIGA CIMENTACIÓN (A1-A2) (A5-A6) (B1-B2) (B5-B6) (A2-A3) (A4-A5) (A1-A4) (A5-A8) (B1-B4) (B5-B8) (B4-B5)	Inferior	3/8	5.00	4.15	0.560	1.00	2.00	69.54
	SUPERIOR	3/8	8.00	2.10	0.560	4.00	2.00	268.57
	SUPERIOR	3/8	5.00	2.00	0.560	1.00	2.00	56.23
	MEDIO CP	3/8	3.00	2.55	0.560	1.00	2.00	29.67
	INTERIOR	3/8	5.00	6.90	0.560	4.00	2.00	276.24
	INTERIOR	3/8	5.00	5.25	0.560	1.00	2.00	49.14
	INTERMEDIO	1/2	3.00	5.00	1.000	5.00	2.00	330.00
	INTERMEDIO	1/2	2.00	4.00	1.000	1.00	1.00	13.20
	ESTRIBOS	3/8	332.00	3.44	0.560	2.00	2.00	321.73
TOTAL								1,824.20

ESQUEMAS:



Observaciones:	EL DESPERDICIO CONTEMPLADO LO ESTABLECE LA MISMA ENTIDAD EN LOS DISEÑOS APORTADOS

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el lleno

ING. JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR RODRIGO PEREZ LOSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING FAIVER PERDOMO P.
R.L CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		INDERHUILA	Código	GIE-FOR-[illegible]
				Versión	[illegible]
				Fecha de Aprobación	[illegible]
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		No. CONTRATO:	CLPIH 383 DE 2023	
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin		PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DÁNES INGENIEROS S.A.S		Desde:	16/11/2023	No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		Hasta:	20/01/2025	
CAPÍTULO:	2.1	CIMENTACIÓN		UNIDAD:	KG
ITEM:	2.06	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación			

REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

V0.Bo. ING JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO CIRA LOZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR RICARDO HERAS LOSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING FAVIER PERDOMO P.
R.L CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código:	[illegible]
			Versión:	1
			Fecha de Aprobación:	[illegible]
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH383 DE 2023
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S.		No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		
CAPÍTULO: 3.1	ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD:	M3
ITEM: 3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO


DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Columnas A1, A2, A3, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6	3.90	0.40	0.45	12.00	12.74
Pedestales A1, A2, A5, A4, A3, A6, B1, B2, B7, B4, B5, B7	0.85	0.63	0.65	12.00	3.98


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIR-CGR-F05
			Versión	4
			Fecha de Aprobación	
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			13/03/2023

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH 383 DE 2023		
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin	PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra	
CONTRATISTA:	DÁNES INGENIEROS S.A.S	Desde:	16/11/2023	No. 1	
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta:	20/01/2025		

CAPÍTULO:	3.1	ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD:	M3
ITEM:	3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

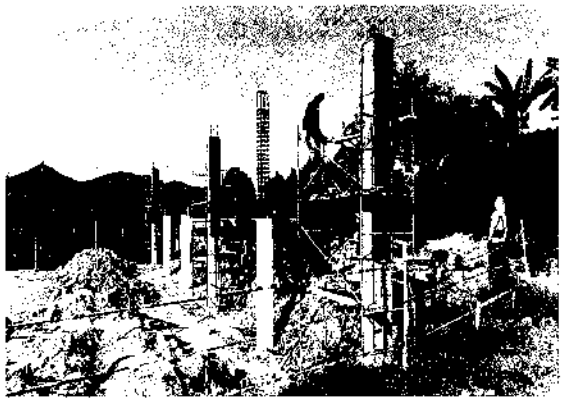

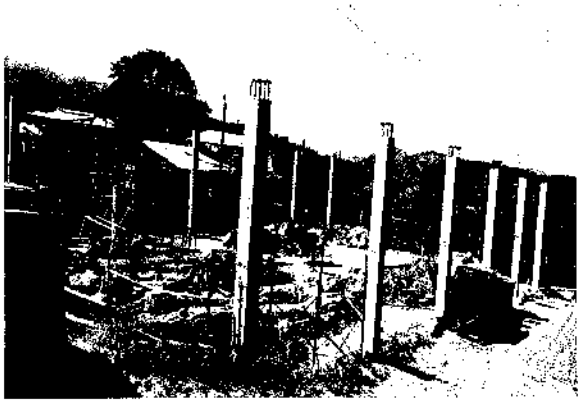

Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e Interventor quienes las cumplieron y constataron en el terreno.

Vo.Bo.ING JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO PERALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR RODRIGO HERRERA LOSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING FAIVER PERDOMO P.
R.L CONSORCIO WF


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Codigo: DIS-COD-F01
			Version: 1
			Fecha de Aprobacion:
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		17/09/2013

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH383 DE 2023
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S.		0
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		
CAPÍTULO:	3.1 ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD:	KG
ITEM:	3.02 Acero de refuerzo Fy=60,000 P.S.I. columnas		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Ø varilla	No. de Barras	Long.	Peso (kg/m)	Nº ELEMENTOS	PORTICOS	Peso Total (Kg)
Columnas A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6	3/8"	4.00	5.35	2.250	6.00	2.00	556.20
	3/8"	4.00	3.35	2.560	6.00	2.00	385.63
	3/4"	4.00	4.05	2.250	6.00	2.00	437.40
	5/8"	4.00	3.95	1.360	6.00	2.00	295.78
	3/8"	75.00	2.35	0.560	6.00	2.00	761.04
	3/8"	35.00	0.54	0.560	6.00	2.00	272.16
	3/8"	75.00	0.42	0.560	6.00	2.00	246.38
TOTAL							2,955.57

ESQUEMAS:



Observaciones:	EL DESPERDICIO CONTEMPLADO LO ESTABLECE LA MISMA ENTIDAD EN LOS DISEÑOS APORTADOS

NOTA. Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

VoBo. ING JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO OBREGALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR MAURICIO PEREZ LOSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING FAVER PERDOMO P.
R. L. CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código:	EIH-GCID-F34
			Versión:	1
			Fecha de Aprobación:	19/01/2024
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN – DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH 383 DE 2023	
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin	PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DÁNES INGENIEROS S.A.S	Desde:	16/11/2023	No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta:	20/01/2025	

CAPÍTULO:	3.1	ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD:	KG
ITEM:	3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas		

REGISTRO FOTOGRAFICO






Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

V°B°. ING JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING NESTOR RODRIGO FISTRALOSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO CIFUENTES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING FAIVER PERDOMO P.
R.L CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	D-H-CGID-F35
			Versión:	1
			Fecha de Aprobación:	13/03/2023
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH383 DE 2023	
LOCALIZACIÓN:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustín		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra	
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S.		No. 1	
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF			
CAPÍTULO:	3.1	ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD:	M3
ÍTEM:	3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Viga canal Eje A1 - M y Eje B1 - B6	33.80	0.40	0.40	2.00	9.73
Aleta Inclinada	39.80	0.25	0.64	2.00	4.51
Aleta Vertical	39.40	0.20	0.30	2.00	1.83
TOTAL					16.37

ESQUEMAS:



Observaciones:	AUNQUE EN EL DETALLE DE LA VIGA AEREA SE ESTABLECE PARA ESTA UN ANCHO DE 40CM, POR TEMAS CONSTRUCTIVOS DEL ENCOFRADO DE LA MISMA SE DEBE CONSTRUIR DE 45CM, YA QUE ESE ES EL ANCHO CON EL QUE VIENE LA COLUMNA.

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Vo.Bo. ING. JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO ISRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR ALBEIRO PERDOMO
DIRECTOR DE OBRA

ING FAIVER PERDOMO P.
R.L CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código:	DIR-GCIR-F05
			Versión:	1
			Fecha de Aprobación:	
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			12/09/2013

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		No. CONTRATO:	CLPIN 383 DE 2023	
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin		PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S		Desde:	16/11/2023	No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		Hasta:	20/01/2025	
CAPÍTULO:	3.1	ESTRUCTURA EN CONCRETO		UNIDAD:	M3
ITEM:	3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.			

REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Vo.Bo. ING JORAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO GRANADO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR RODRIGO PEREZ LOSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING FAIVER PERDOMO P.
R.L CONSORCIO WF


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIR-GCID-F11
			Versión:	1
			Fecha de Aplicación	
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		12/09/2023	

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH383 DE 2023
LOCALIZACION:	Polideportivo principal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S.		e
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		
CAPÍTULO:	3.1 ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD:	KG
ITEM:	3.04 Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	UBICACIÓN	Ø varilla	No. de Barras	Long	Peso (kg/m)	Nº ELEMENTOS	PORTICOS	Peso Total (Kg)
VIGA AÉREA	SUPERIOR	1/2"	4.00	5.40	1.000	1.00	2.00	43.20
	SUPERIOR	1/2"	4.00	6.95	1.000	4.00	2.00	222.40
	SUPERIOR	1/2"	4.00	2.30	1.000	1.00	2.00	36.80
	INFERIOR	1/2"	4.00	2.10	1.000	1.00	2.00	33.60
	INTERIOR	1/2"	4.00	6.25	1.000	4.00	2.00	200.00
	INFERIOR	1/2"	4.00	5.40	1.000	1.00	2.00	43.20
	ESTRIBOS	3/8"	376.00	1.44	0.560	1.00	2.00	603.38
ALETA VERTICAL	SUP-INFE	3/8"	5.00	6.10	0.560	4.00	2.00	136.64
	TRASLAPO	3/8"	4.00	1.20	0.560	4.00	2.00	21.50
ALETA INCLINADA	SUP-INFE	3/8"	5.00	6.10	0.560	4.00	2.00	204.56
	TRASLAPO	3/8"	4.00	1.20	0.560	4.00	2.00	32.26
AGUAS ESPECIAL	ESPECIAL	3/8"	264.00	2.68	0.560	1.00	2.00	793.72
TOTAL								2.695.46

ESQUEMAS:

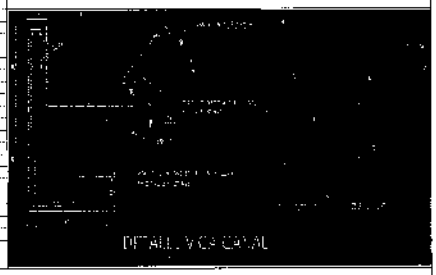

Observaciones:		

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR LEONARDO HERRERA LOSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING. [illegible]
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING FAVER PERDOMO P.
R L CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DE-FOR-501
			Versión	1
			Fecha de Aprobación	
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			12/05/2022

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		No. CONTRATO:	CLPIH 383 DE 2023	
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin		PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DÁNES INGENIEROS S.A.S		Desde:	16/11/2023	No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		Hasta:	20/01/2025	
CAPÍTULO:	3.1	ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD:	KG	
ITEM:	3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal			

REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING.BG. ING JOHAN ALEXIS CARTAGENA PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR RODRIGO PEÑA OSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING FAIVER PERDOMO P.
R L CONSORCIO WF


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DI-FOGID-F05
			Versión	1
			Fecha de Aprobación	
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			13/07/2020

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN – DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIM383 DE 2023	
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin			Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S.			No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF			
CAPÍTULO:	3.1	ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD:	M2
ITEM:	3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	Nº ELEMENTOS	Medida Total
Area del manto viga canal		20.40	1.00		2.00	40.80
TOTAL						80,80

ESQUEMAS:



Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno

Vo.Bo. ING. JOHAN SEBATIAN RIOS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR RODRIGO MORENO OCHOA
DIRECTOR DE OBRA

ING FABIAN PERDOMO P.
R L CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código:	GI-xx-xxx-xxx
			Versión:	1
			Fecha de Aprobación:	12/03/2025
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH 383 DE 2023	
LOCALIZACIÓN:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin	PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S	Desde:	16/11/2023	No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta:	20/01/2025	

CAPÍTULO:	3.1	ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD:	M2
ITEM:	3.04	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.		

REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Vo.Bo. ING JOHAN SEBATIAN RIOS GALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR RODRIGO CERRO LOSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING JAVIER PERDOMO P.
R. LEGAL CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIR-COD-F26
			Versión:	1
			Fecha de Aprobación:	
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH383 DE 2023
LOCALIZACION:	Polideportivo principal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustín		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S.		No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		

CAPÍTULO:	4.1	CUBIERTA	UNIDAD:	M2
ITEM:	4.1.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 20, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total	ESQUEMAS:
Area de la cubierta		30.40	22.71			690.38	
TOTAL						690,38	

Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Vo.Bo. ING JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. [illegible] ROBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


ING NESTOR RODRIGO [illegible] LOAIZA
DIRECTOR DE OBRA

ING RIVER PERDOMO P.
R.L CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	FT-GOBT-[illegible]
			Versión	1
			Fecha de Aprobación	
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		12/09/2023	

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		No. CONTRATO:	CLPIH 383 DE 2023	
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin		PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DÁNES INGENIEROS S.A.S		Desde:	16/11/2023	No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		Hasta:	20/01/2025	
CAPÍTULO:	4.1	CUBIERTA		UNIDAD:	M2
ITEM:	4.1.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 20, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro pollester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.			

REGISTRO FOTOGRAFICO

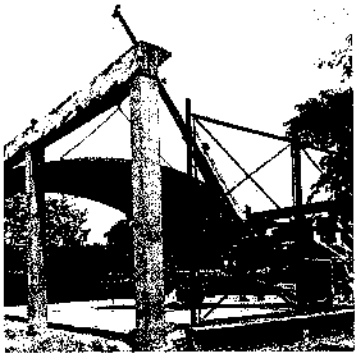



Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

V.B.Bo. ING JOHAN SEBATIAN RIOS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR ALFONSO TIERRO LOSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING FAIVER PERDOMO P.
R.L CONSORCIO WF


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH.CGTD.F06
			Versión:	1
			Fecha de Aprobación:	
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		17/08/2023	

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH383 DE 2023
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S.		No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		
CAPÍTULO:	7.1 INSTALACIONES ELECTRICAS	UNIDAD:	UND
ITEM:	7.1.1 Desmonte de Postes de Iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Postes del Costado Sur					2.00	2.00
Postes del Costado Norte					1.00	1.00
TOTAL						3.00

ESQUEMAS:



Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Vo.Bo. ING JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER GUILLERMO ARGOTY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR RODRIGO PEREZ LOSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING FARMER PERDOMO P.
R.L CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DAC-GGD-F05
			Versión: 1
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Fecha de Aprobación: 13/Dic/2023

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA		No. CONTRATO:	CLPIH 383 DE 2023	
LOCALIZACION:	Polideportivo principal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin		PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DÁNES INGENIEROS S.A.S		Desde:	16/11/2023	No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		Hasta:	20/01/2025	
CAPÍTULO:	7.1	INSTALACIONES ELECTRICAS		UNIDAD:	UND
ITEM:	7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.			

REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno

ING. JOHAN SEBASTIAN RICO PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAIMER HUMBERTO OVALLE
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR RODRIGO TORRO LOSADA
DIRECTOR DE OBRA

ING BRYNER PERDOMO P.
RL CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Codigo: DIH-CGID-F55
			Version: 5
			Fecha de Aprobacion: 12/09/2023
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH383 DE 2023
LOCALIZACION:	Polideportivo principal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S.		No. 01
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF		
CAPÍTULO: 8.1	TRASPORTE	UNIDAD:	M3-KM
ITEM: 8.01	Transporte de materiales petreos		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	CONCRETO M3	ARENA M3	GRAVILLA M3	PIEDRA M3	DESPERDICIO 10%	DISTANCIA (KM)	TOTAL (M3-KM)
MATER A 25 CONCRETO 2500 PSI PARA VIGUETAS (0.60m3 arena - 0.64m3 grava)	22.40	24.33	19.82				
MATERIALES CONCRETO 2500 PSI PARA COLUMNETAS (0.46m3 arena - 0.96m3 grava)	29.94	8.82	17.63	32.58			
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS (0.57m3 arena - 0,84m3 grava)	58.80	32.34	37.69				
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI VIGA CIMENTACION (0.57m3 arena - 0.84m3 grava)	22.40	8.68	9.41				
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS (0.57m3 arena - 0.84mC. grava)	52.80	8.59	22.90				
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI VIGA CANAL (0.57m3 arena - 0,84m3 grava)	33.00	20.63	35.06				
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI PLACA DE PISO (0.57m3 arena - 0,84m3 grava)	1.43	2.04	1.33				
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI PARA CAÑUELA Y CASILLAS (0.57 m3 arena - 0,84 m3 grava)	6.30	3.33	3.21				
TOTAL ARENA		75.35			7.52	24.00	1,988.04
TOTAL GRAVA			154.21		11.33	24.00	2,996.97
TOTAL PIEDRA				32.58	1.30	24.00	320.23
TOTAL							5,294.13

ESQUEMAS:



Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Vo.Bo. ING JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER HUMBERTO GRIJALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR DARIO HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA

ING PALMER PERDOMO P.
R.L CONSORCIO WF

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	[illegible]
			Versión	1
			Fecha de Aprobación	[illegible]
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH 383 DE 2023	
LOCALIZACION:	Polideportivo pricipal De la vereda Los Andes Municipio de San Agustin	PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Acta de Recibo Parcial de Obra
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S	Desde:	16/11/2023	No. 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta:	20/01/2025	

CAPÍTULO:	8.1	TRASPORTE	M3-KM
ITEM:	8.01	Transporte de materiales petreos	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

V0.Bo. ING JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
RESIDENTE DE OBRA

ING JAVIER NORBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING NESTOR [illegible]
DIRECTOR DE OBRA

ING FAIVER PERDOMO P.
R.L CONSORCIO WF

1. DESCRIPCIÓN GENERAL						
X CONTRATO:	*OBRA: X /CONSULTORIA:____/INTERVENTORIA:___ –*		**No:**	*CLPI H383*	**AÑO**	*2023*
___CONVENIO:						

CONTRATANTE:	*INDERHUILA*			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	DANES INGENIEROS S.A.S		
	NIT O CC:	900.219.918-2		
	DIRECCIÒN:	CR 1 ESTE 77 05 AP 201	**CEL:**	3152052190
	CIUDAD:	BOGOTÁ D.C.		
	REPRESENTANTE LEGAL:	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA		
	CC:	7.719.364 DE NEIVA		
OBJETO:	***CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA***			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.** 2023000637 **FECHA (dd/mm/aaaa):** *27/10/2023* **No.** 2024000484 **FECHA (dd/mm/aaaa):** *30/09/2024* **No.** 2024000757 **FECHA (dd/mm/aaaa):** *27/12/2024*			
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO INICIAL:	$506.549.699			
	Valor en Letras: *QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA*			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	**Nombre: INDERHUILA**			
	Valor ($): $506.549.699			
	Valor en Letras: QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA.			
VALOR ADICIONAL:	**Nº1**	**OTROSI No. 01 FECHA: 28/12/2023 MODIFICACIÓN CLÁUSULA 6 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**		
	Nº2	**OTROSÍ NO. 02 FECHA: 27/12/2024 VALOR: $ 62.065.242**		
VALOR TOTAL:	**QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 568.614.941) M/CTE.**			
PLAZO INICIAL:	*El plazo estimado para la ejecución del contrato será de TRES (03) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal o hasta el 29 de Diciembre de 2023.*			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	**OTROSÍ No. 01 FECHA: 12/11/2024 MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 - PLAZO DEL CONTRATO- CAMBIO DE VIGENCIA.**		
	Nº2	**OTROSÍ No. 02 FECHA: 27/12/2024 MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 - PLAZO DEL CONTRATO- PRORROGA DE UN (1) MES.**		

PLAZO TOTAL:	*El plazo estimado para la ejecución del contrato será de **CUATRO (04) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución, y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal 2025.*		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aaaa)	*16/11/2023*		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aaaa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	21/12/2023
		REINICIACIÒN	12/11/2024
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	N.A.
		REINICIACIÒN	N.A.
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	N.A.
		REINICIACIÒN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aaaa)	*05/02/2025*		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)	*20/01/2025*		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)	*DEL 16/11/2023 AL 20/12/2023 Y DEL 12/11/2024 – 20/01/2025.*		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**FELIPE VICTORIA BARRAGÁN**	
	EN CALIDAD DE:	*DIRECTOR INDERHUILA - SUPERVISOR*	
	NOMBRE:	**JUAN FELIPE ALARCON QUIROGA**	
	EN CALIDAD DE:	*APOYO A LA SUPERVISION INDERHUILA*	
	NOMBRE:	***NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA***	
	EN CALIDAD DE:	*CONTRATISTA - R.L DANES INGENIEROS SAS*	
	NOMBRE:	***FAIVER PERDOMO POLANIA***	
	EN CALIDAD DE:	*INTERVENTOR - RL. CONSORCIO WF*	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTAS	VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO	SALDO
1. Valor Contrato	*27/10/2023*		$ 506.549.699	
2. Anticipo	*20/12/2024*	$126.637.424,75		
3. Valor Adicional No. 1 Otrosí No. 02	*27/12/2024*		$ 62.065.242	
4. Acta Parcial No.1	*20/01/2025*	$ 461.971.834,89		$ 106.643.106,11
5. Amortización Acta Parcial No. 1	*20/01/2025*	$ 115.492.958,72		$ 11.144.466,03

TOTAL VALOR ACTAS	**$ 461.971.834,89**	**$ 568.614.941**	**$ 106.643.106,11**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que la empresa **DANES INGENIEROS S.A.S.**, representada legalmente por el Ingeniero **NESTOR RODRIGO FIERRO LOSADA** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas adjuntas al documento soporte del Acta Parcial No.01, Números de planillas 9460090325, 9461784678, 9478621046, 9478913722, 9480094007, 9478285730, 9480094655, 9479812982.

4. RECIBO A SATISFACIÒN

1. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) se indica que la administración podrá corregir *errores formales* contenidos en los actos administrativos, así *"**Corrección de Errores Formales**. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda".*

2. Que, a efectos de evitar ambigüedades que puedan generar confusiones y malas interpretaciones en el presente proceso contractual, se hace necesario ACLARAR las fechas de suscripción y numeración de los siguientes documentos que por error de digitación se consignaron erróneamente:

    a. Que, en el Acta de Justificación No.01 y en el Acta Suspensión No.01 quedaron relacionadas dos fechas distintas de suscripción en los documentos, por lo que, se aclara que la fecha correcta corresponde al 21 de diciembre del 2023.
    b. Que, en el Otrosí N°01 de fecha 28 de diciembre del 2023 y Otrosí N°01 suscrito el 12 de noviembre del 2024 quedaron con la misma numeración. Por consiguiente, es pertinente señalar que en el expediente contractual existen dos (2) otrosíes suscritos con fecha diferente, pero con igual número. Aclarando, que dicho error de transcripción no altera el alcance del objeto contractual.

3. Que, durante la ejecución del Contrato de Obra N°CLPIH383 del 2023 se autorizó el siguiente pago: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. ($ 461.971.834,89), correspondiente al (primer) pago parcial del periodo del dieciséis (16) de noviembre del 2023 al veinte (20) de diciembre del 2023 y del doce (12) de noviembre del 2024 al veinte (20) de enero de 2025.

4. Por lo anterior, se hace necesario realizar una amortización de anticipo correspondiente al 25%, por el valor CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 115.492.958,72 M/CTE).

5. Que, las cantidades y la calidad de las obras realizadas, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

6. Que, las obras han sido ejecutadas de acuerdo a las especificaciones técnicas, planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios conforme a las actividades del contrato de Obra.

7. Que, las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo y con base en la Cláusula 6 Apropiación presupuestal – Forma de pago- del Contrato de Obra N°CLPIH383 de 2023, por lo que, se aprueba la presente acta parcial que corresponde al 81.24511010474840 % del valor total del contrato.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron, en Neiva (H) a los ***Veinte (20) días del mes de enero de 2025***.

FELIPE VICTORIA BARRAGÁN
Director INDERHUILA

JUAN FELIPE ALARCON QUIROGA
Apoyo a la Supervisión INDERHUILA

NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA
R.L DANES INGENIEROS S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

FAIVER PERDOMO POLANÍA
R.L. CONSORCIO WF
INTERVENTOR CONTRATO

Vo. Bo. DANIELA RIVERA GARCIA
Abogada - contratista GID INDERHUILA

Vo. Bo. JAIME ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ
Abogado - contratista INDERHUILA

aportes en línea

nilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	41212054	9460090325	E	2023/12/06	2023/12/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,658,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL NEIVA (6 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: PERSONAL ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
1	CC	7719364	PIERRO HESTOR																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
2	CC	36067241	MEDINA SANDRA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (4 Afiliados)																						$3,518,667	$563,000			$3,518,667	$140,800			$3,518,667	$140,800			$3,518,667		$245,100		$0	$0		$1,089,700
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)																						$3,518,667	$563,000			$3,518,667	$140,800			$3,518,667	$140,800			$3,518,667		$245,100		$0	$0		$1,089,700
3	CC	1080187924	AVILA NICOLAS																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	CC	1075288329	COSADA DIVA																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
5	CC	1075306422	TRUJILLO NICOLAS																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
6	CC	1075263391	YOSA DIEGO		X															23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF32	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
Total		**Afiliados(6)**																				$5,838,667	$934,200			$5,838,667	$233,600			$5,838,667	$233,600			$5,838,667		$257,300		$0	$0		$1,658,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	41212054	9460090325	E	2023/12/06	2023/12/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,658,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$934,200	$0	$0	$934,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$748,600	$0	$0	$748,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$257,300	$0	$0	$257,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$257,300	$0	$0	$257,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$233,600	$0	$0	$233,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	6	$233,600	$0	$0	$233,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$233,600	$0	$0	$233,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$187,200	$0	$0	$187,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				6	$1,658,700	$0	$0	$1,658,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	94107710	9461784678	E	2024/01/05	2024/01/19	BANCO DE OCCIDENTE	14	$1,667,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NEIVA (SAUCES)																							$2,320,000	$278,400			$2,320,000	$278,400			$2,320,000	$278,400			$2,320,000		$278,400		$0	$0		$835,200
Centro de Trabajo: PERSONAL ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
1	CC	7719364	PIERRO NESTOR																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
2	CC	36067241	MEDINA SANDRA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (3 Afiliados)																							$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$1,077,600
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)																							$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$1,077,600
3	CC	1080187924	AVILA NICOLAS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	CC	1075280329	LOSADA DIVA		X																230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
5	CC	1075306422	TRUJILLO NICOLAS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total Afiliados(5)																							$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000		$254,600		$0	$0		$1,646,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	94107710	9461784678	E	2024/01/05	2024/01/19	BANCO DE OCCIDENTE	14	$1,667,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$928,000	$11,800	$0	$939,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$742,400	$9,400	$0	$751,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$2,400	$0	$188,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$254,600	$3,300	$0	$257,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$254,600	$3,300	$0	$257,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$232,000	$3,000	$0	$235,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$232,000	$3,000	$0	$235,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$232,000	$3,000	$0	$235,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$185,600	$2,400	$0	$188,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$600	$0	$47,000
TOTAL				5	$1,646,600	$21,100	$0	$1,667,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	03173028	9478621046 *	E	2024/12/05	2024/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	4	$814,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
[illegible]							[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
Centro de Trabajo: PERSONAL ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC	7719364	FIERRO NESTOR		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	36067241	MEDINA SANDRA		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (1 Afiliados)							$563,334	$90,200			$563,334	$22,600			$563,334	$22,600			$563,334	$39,300		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)							$563,334	$90,200			$563,334	$22,600			$563,334	$22,600			$563,334	$39,300		$0	$0
3	CC	12137587	TOVAR JOSE		230301	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF32	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**						$3,163,334	$506,200			$3,163,334	$126,600			$3,163,334	$126,600			$3,163,334	$52,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	28871045	9478913722	E	2024/12/05	2024/12/16	BANCO DE OCCIDENTE	11	$460,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Planilla NEIVA (5 Afiliados)						$1,473,335	$235,900			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$102,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (5 Afiliados)						$1,473,335	$235,900			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$102,900		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)						$1,473,335	$235,900			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$102,900		$0	$0
1	CC	1082772137	ARCOS ROBINSON	230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
2	CC	1082772716	ARCOS WILIAN	230301	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF32	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
3	CC	1082774946	HOYOS JORGE	230301	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF32	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0
4	CC	1061986149	QUIÑONEZ SILVIO	230201	8	$346,667	$55,500	ESSC62	8	$346,667	$13,900	CCF32	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
5	CC	1061985531	SAMBONI EMIRO	230301	8	$346,667	$55,500	ESSC62	8	$346,667	$13,900	CCF32	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$1,473,335	$235,900			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$102,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	32850641	94800940D7	E	2024/12/05	2025/01/09	BANCO DE OCCIDENTE	35	$522,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
[redacted]																					
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (2 Afiliados)					$1,646,668	$263,600			$1,646,668	$66,000			$1,646,668	$66,000			$1,646,668	$114,800		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)					$1,646,668	$263,600			$1,646,668	$66,000			$1,646,668	$66,000			$1,646,668	$114,800		$0	$0
1	CC	80926744	JIMENEZ WILMAR	230301	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF32	19	$823,334	$33,000	14-15	19	$823,334	$57,400	19	$0	$0
2	CC	1075220858	LOPEZ CRISTIAN	230201	19	$823,334	$131,800	EPS005	19	$823,334	$33,000	CCF32	19	$823,334	$33,000	14-15	19	$823,334	$57,400	19	$0	$0
Total Afiliados(2)						$1,646,668	$263,600			$1,646,668	$66,000			$1,646,668	$66,000			$1,646,668	$114,800		$0	$0

2025/01/09 04:22 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	32850641	9480094007	E	2024/12/05	2025/01/09	BANCO DE OCCIDENTE	35	$522,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$263,600	$6,200	$0	$269,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$131,800	$3,100	$0	$134,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$131,800	$3,100	$0	$134,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,800	$2,700	$0	$117,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$114,800	$2,700	$0	$117,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$66,000	$1,600	$0	$67,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	$66,000	$1,600	$0	$67,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$66,000	$1,600	$0	$67,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$33,000	$800	$0	$33,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$33,000	$800	$0	$33,800
TOTAL				2	$510,400	$12,100	$0	$522,500

2025/01/09 04:22 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057304693		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1129348867	9478285730	I	2024/12/20	2024/12/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$461,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
1	CC	1057304693	RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
Total Afiliados(1)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057304693		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1129348867	9478285730	I	2024/12/20	2024/12/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$461,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTALES				1	$461,000	$0	$0	$461,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	32850249	9480094655	E	2025/01/08	2025/01/09	BANCO DE OCCIDENTE	1	$2,693,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
[illegible]																						
Centro de Trabajo: PERSONAL ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC	7719364	FIERRO NESTOR	23031	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	36067241	MEDINA SANDRA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (9 Afiliados)						$6,630,002	$1,061,000			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$461,800		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (9 Afiliados)						$6,630,002	$1,061,000			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$461,800		$0	$0
3	CC	1082772137	ARCOS ROBINSON	23031	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
4	CC	1082772746	ARCOS WILIAN	23031	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF32	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
5	CC	1082774946	HOYOS JORGE	23031	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
6	CC	80926744	JIMENEZ WILMAR	23031	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	1075220858	LOPEZ CRISTIAN	23021	30	$1,300,000	$208,000	EPS006	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	7705022	MARTINEZ CARLOS	23021	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	1061986149	QUIÑONEZ SILVIO	23021	6	$260,000	$41,600	ESSC62	6	$260,000	$10,400	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
10	CC	1061985531	SAMBONI EMIRO	23031	5	$216,667	$34,700	ESSC62	5	$216,667	$8,700	CCF32	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
11	CC	12137587	TOVAR JOSE	23031	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$9,230,002	$1,477,000			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$475,400		$0	$0

2025/01/09 04:20 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057304693		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1165312149	9479812982	I	2025/01/23	2025/01/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$12,174,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$32,500,000	$5,850,000			$32,500,000	$4,062,500														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$32,500,000**	$5,850,000			$32,500,000	$4,062,500			$0	$0			**$32,500,000**		**$2,262,000**				**$12,174,500**
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$32,500,000	$5,850,000			$32,500,000	$4,062,500			$0	$0			$32,500,000		$2,262,000				$12,174,500
1	CC	1057304693	RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN																	23030 1	30	$32,500,000	$5,850,000	EPS010	30	$32,500,000	$4,062,500		0	$0	$0	14-11	30	$32,500,000	6.960%	$2,262,000	0	$0	$0	No	$12,174,500
Total	**Afiliados(1)**																					$32,500,000	$5,850,000			$32,500,000	$4,062,500			$0	$0			$32,500,000		$2,262,000				$12,174,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057304693		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1165312149	9479812982	I	2025/01/23	2025/01/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$12,174,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS A FAVOR INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,850,000	$0	$0	$5,850,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$5,850,000	$0	$0	$5,850,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,262,000	$0	$0	$2,262,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$2,262,000	$0	$0	$2,262,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,062,500	$0	$0	$4,062,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$4,062,500	$0	$0	$4,062,500
TOTAL				1	$12,174,500	$0	$0	$12,174,500

EL INTERVENTOR

H A C E C O N S T A R:

El Interventor, certifica que el informe presentado por el ejecutor del contrato No. ***CLPIH383 DE 2023****, cuyo objeto es la "****CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION, PARA LA VEREDA LOS ANDES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA****", cumple con los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales del contrato, de acuerdo a la información suministrada por el* ***CONTRATISTA DE OBRA,*** *en donde fue revisada y avalada por la interventoria; así mismo se certifica que la interventoria revisó y verifico las planillas de seguridad social del contratista de obra No. 9460090325, 9461784678, 9478621046, 9478913722, 9480094007, 9478285730, 9480094655, 9479812982, relacionadas en el informe de Interventoria mes a mes del periodo comprendido del del 16 de Noviembre de 2023 al 20 de Diciembre de 2023 y del 12 de Noviembre de 2024 al 20 de Enero de 2025.*

Para constancia se firma a los veinticuatro (24) días del mes de Enero de 2025.

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
R.L. CONSORCIO WF
Interventoria

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES.

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Para dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, El suscrito **JOHN JAIRO BUENDÍA MEDINA** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.695.930 de Neiva y tarjeta profesional No. 81150-T, en mi calidad de Revisor Fiscal de **DANES INGENIEROS SAS** con NIT. 900.219.918-2 Bajo la gravedad de juramento manifiesto, que se ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en Salud, pensiones, riesgos laborales correspondientes a todos sus Empleados vinculados por contrato de trabajo, pagados durante los últimos 6 meses, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas promotoras de salud—EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales —ARL.

De conformidad con lo estipulado el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, que adiciona el artículo 114 -1 del estatuto tributario, en concordancia con los artículos 31 y 35 de la ley 1607 de 2012, manifiesto bajo la gravedad de juramento que me encuentro inmerso en la exoneración de aportes parafiscales (SENA e ICBF) y seguridad social en salud.

En constancia de lo anterior, se firma en Neiva Huila a los veinte (20) días del mes de enero del año 2025.

JOHN JAIRO BUENDIA MEDINA
C.C. 7.695.930 de Neiva
T.P. 81150-T

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 7.693.930

BUENDIA MEDINA

APELLIDOS

JOHN JAIRO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 26-JUN-1974

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA


O+
G.S RH

M
SEXO

09-SEP-1992 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00193492-M-0007693930-20091026 0017456895A 1 6670175353


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
61150-T
JOHN JAIRO
BUENDIA MEDINA
C.C.
RES. JUNTA INSCRIPCION 143 FECHA 08/11/01
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
98/10

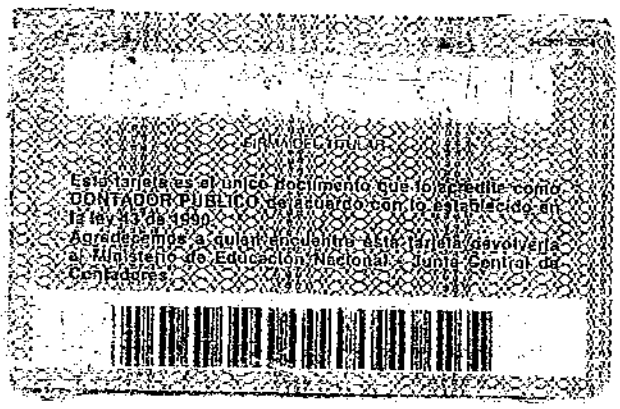
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 4 A F 3 3 A 3 2 6 1 2 6 4 3 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHN JAIRO BUENDIA MEDINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7695930 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 81150-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5CAZ86BDB041Z4E3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHN JAIRO BUENDIA MEDINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7695930 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 81150-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIHCM420 DE 2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1

PARCIAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA."**

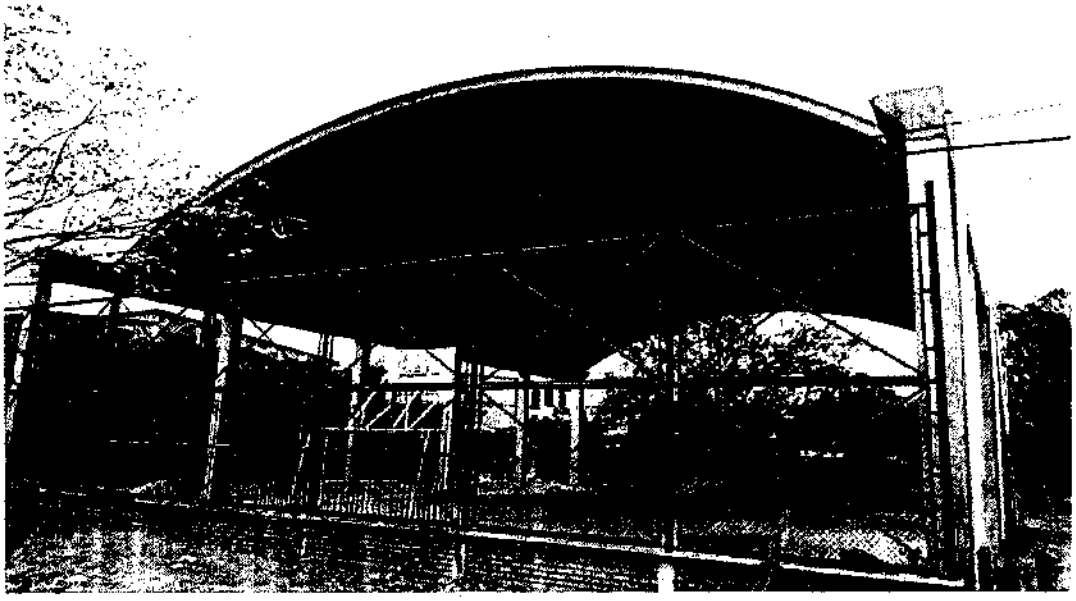

MUNICIPIO: **SAN AGUSTIN**

DEPARTAMENTO: **HUILA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIHCM420 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO WF.


APOYO A LA SUPERVISIÓN	JUAN FELIPE ALARCÓN QUIROGA	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATO No.	CIHCM420 DE 2023		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PERIODO DEL INFORME**	DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO 2025.
CONTRATISTA	CONSORCIO WF	**NIT:**	901.769.619 - 8.
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430 DE NEIVA
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	09 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
FECHA DE SUSPENSION 1:	26 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE REINICIO 1:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
OTROSÍ No.1: 24/09/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO- VIGENCIA FISCAL.		
OTROSÍ No.2: 12/11/2024	Prórroga: VEINTE (20) DÍAS.		
OTROSÍ No.3: 02/12/2024	**Prórroga:** UN (1) MES-. **Adicional:** DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 12.573.718,00) M/CTE.		
OTROSÍ No.4: 27/12/2024	Prórroga: UN (1) MES- y TRES (3) DIAS.		
PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS.		

PLAZO TOTAL:	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($ 88.657.430,00) M/CTE.		
VALOR ADICIONAL:	DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 12.573.718,00) M/CTE.		
VALOR TOTAL:	CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 101.231.148) M/CTE		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.	CLPIH383 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**PERIODO DEL INFORME**	DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO 2025.
CONTRATISTA	DANES INGENIEROS S.A.S	**NIT:**	900.219.918-2
REPRESENTANTE LEGAL:	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	**C.C:**	7.719.364 DE NEIVA (H)
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	01 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	21 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA ACTA DE REINICIO No.1:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024		
OTROSÍ N°1: 12/11/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO – VIGENCIA FISCAL.		
OTROSÍ N°2: 27/12/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO – PRÓRROGA DE UN (01) MES. MODIFICACIÓN CLÁUSULA 5 VALOR DEL CONTRATO – VALOR ADICIONAL DE SESENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($62.065.242,00) M/CTE.		
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES.		

PLAZO TOTAL:	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
VALOR INICIAL:	$ 506.549.699		
VALOR ADICIONAL:	$ 62.065.242,00		
VALOR TOTAL:	$ 568.614.941,00		
INTERVENTOR:	CONSOCIO WF	**NIT:**	901.769.619-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANÍA	**C.C:**	7.711.430 DE NEIVA (H)

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Cubierta Autoportante con Iluminación para la Vereda Los Andes de la Zona Rural del Municipio San Agustín - Departamento Del Huila

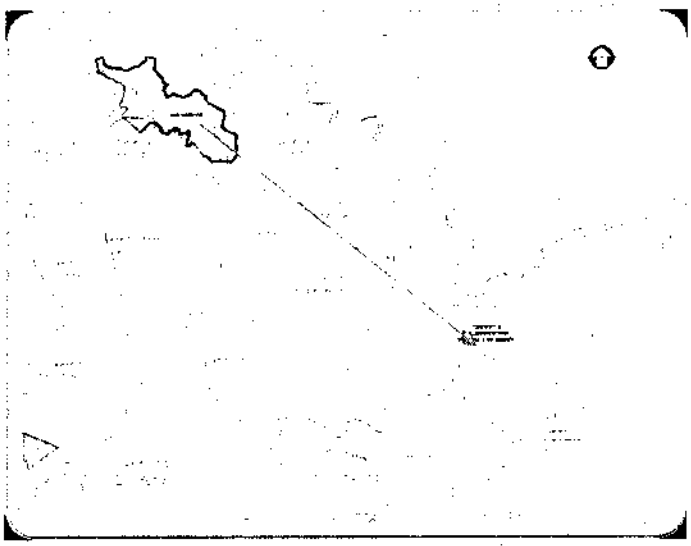

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La misión del INDERHUILA es generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en los procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del Departamento del Huila, por medio de la masificación, la promoción y el apoyo a la práctica deportiva.

En consecuencia, de lo anterior se requiere la adecuación locativa de los terrenos existentes para llevar a cabo la CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA; lo permitirán a la población realizar las prácticas deportivas, que van a contribuir con la mejora de la calidad de vida de las personas que acuden a estos escenarios recreo deportivos. Se resalta que este tipo de obras contribuyen a minimizar el déficit de espacios deportivos que existe en el Departamento del Huila.

El objetivo principal es promover la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre hacia el desarrollo humano integral; donde se promuevan y estimulen los valores para la convivencia, participación, disminución de la violencia, y construcción de! tejido social: apoyado en estrategias que beneficien los habitantes de la ciudad para fortalecer el desarrollo del deporte la recreación y la educación física, con la implementación de programas orientados a' la construcción de tejido social y convivencia ciudadana en la totalidad de la población Huilense con una infraestructura deportiva técnicamente adecuada, desarrollando acciones articuladas entre sí, que mejoren la calidad de vida de todas y todos los habitantes del Departamento del Huila, bajo los principios de sostenibilidad ambiental, participación ciudadana, democracia, equidad e inclusión de personas con movilidad reducida y respeto por las libertades individuales y que permitan posicionar al Departamento en el contexto regional, nacional y mundial, en concordancia con las Políticas Departamentales y Nacionales.

Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecución de las obras de construcción de las cubiertas en el Departamento del Huila.

El proyecto contempla un área a intervenir de 632,32 m², en la que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 20 en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz, para el polideportivo ubicado en la vereda Los Andes del Municipio de San Agustín – Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; el polideportivo corresponde a estructura de cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con sistema autoportante, sostenida con columnas en concreto de 3.00 PSI. El sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3.000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras atienden lo establecido en la NORMA SISMORRESISTENTE de 2010 – NSR-10.

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- ACTIVIDADES PRELIMINARES
- CIMENTACIÓN
- ESTRUCTURA EN CONCRETO
- CUBIERTA
- ACABADOS – PLACA DE CONCRETO
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- TRANSPORTE

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

Durante el periodo evaluado, la interventoría supervisó, verificó y coordinó las actividades adelantadas por el contratista, las cuales se concentraron en la formalización y ordenamiento contractual, la adecuación del terreno y el desarrollo de actividades preliminares. Estas acciones han sido ejecutadas conforme a los lineamientos establecidos y han permitido sentar las bases para el inicio de la fase constructiva del proyecto, tal como se detalla en el presente informe.

PERIODO: NOVIEMBRE DEL 16 AL 30 DE 2023

SEMANA (16-18 NOVIEMBRE)

Se revisan los diseños en compañía del contratista de obra.
El contratista adelanta trabajos de consecución y organización de documentación del proyecto, análisis de especificaciones técnicas, y revisión de planos.

Una vez revisados los planos estructurales de la obra "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E2" el contratista encontró que la cota y despieces de las columnas no coincide con la mostrada en el plano "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E3" como corte de la estructura, lo que conllevaría a que el despiece del hierro establecido para una altura de columna no sea la que realmente se vaya a construir. Por lo tanto, se requiere una aclaración por parte del diseñador estructural en este caso.

SEMANA (20-25 NOVIEMBRE)

Se realiza visita de inspección al sitio de ejecución del proyecto. Se cuenta con acompañamiento de la comunidad y se realiza la instalación de la Valla Informativa en la vereda los andes con la información correspondiente.

El contratista de acuerdo a la visita de obra realizada el 22 de Noviembre de 2023, se evidencia que la implantación del proyecto generará una afectación en la vía principal del casco urbano de la vereda, ya que dicha se encuentra ubicada en un costado colindante con el polideportivo, donde en el momento de realizar la excavación de la cimentación de la estructura, dicha vía se perdería ya que se requeriría hacer un corte al talud afectado la huella de la ruta.

Igualmente se pudo evidenciar en la visita que se debe considerar la adecuación de una vía de acceso al costado occidental del proyecto para poder acceder con una retroexcavadora sobre llantas y por esa misma vía retirar el material de excavación proveniente del talud de ese costado ya que el sitio de la obra se encuentra rodeado por viviendas y una escuela y por el polideportivo no pueden transitar estos equipos ya que afectarían la placa existente.

Así también, en el mismo costado occidental se encuentra una vivienda que cuya construcción se verá afectada en el momento de la realización de las actividades de excavación para las zapatas de la estructura, situación que quedó plasmada en la socialización del proyecto ante la comunidad que debe ser solucionada para poder darle arranque al proyecto.

SEMANA (27-30 NOVIEMBRE)

Se realiza comité de obra el 30 de Noviembre de 2023 en las instalaciones del INDERHUILA, donde se hicieron presentes el contratista, la interventoría, el ingeniero apoyo a la supervisión por parte del INDERHUILA y analizadas las circunstancias

expuestas en el oficio de observaciones se decide invitar a dicha reunión al Ing. Calculista del proyecto, quien concluye que se debe modificar el diseño estructural de la cubierta cambiando de zapatas concéntricas a zapatas excéntricas para tratar de minimizar las actividades adicionales en obra que esto requeriría estando de acuerdo el contratista y la interventoría.

El contratista inicia la consecución y organización de documentos para solicitar el desembolso del anticipo del contrato, teniendo en cuenta que plazo para presentación de documentos es hasta el 05 de Diciembre de 2023.

PERIODO: DICIEMBRE DEL 1 AL 21 DE 2023

SEMANA (1-2 DICIEMBRE)

El 1 de Diciembre el contratista solicita suspensión del contrato de obra, debido a que es necesario realizar unas modificaciones al diseño estructural establecido inicialmente, lo que conlleva a más tiempo sin poder arrancar las actividades de obra, ya que a la fecha llevamos trascurridos 16 días sin ejecutar actividades de obra.

SEMANA (04-09 DICIEMBRE)

El 4 de Diciembre de 2023, la interventoría a cargo del presente proyecto remite a la ENTIDAD INDERHUILA, oficio radicado por el CONTRATISTA DANES INGENIERIA SAS, REITERANDO LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. CLPIH383 de 2023.

Se continua con la consecución de documentos requeridos para la radicación del anticipo de obra.

El 7 de Diciembre de 2023, bajo radicado IH 2-2023-1581 la entidad INDERHUILA da traslado al oficio IH1-2023-4225, para dar solución a la petición presentada por el contratista de obra y la interventoría.

Esta interventoría el 9 de diciembre de 2023, solicita nuevamente la revisión de los diseños estructurales de la cimentación de la estructura de cubierta autoportante, para la Vereda Los Andes zona rural del municipio de San Agustín – departamento del Huila, debido a que se han realizado reuniones con el contratista y la supervisión, en las cuales por parte de esta interventoría considera necesario la revisión y ajuste de esta cimentación, debido a que al realizar la implantación afecta una vía paralela al sitio donde se va a construir las zapatas, además al efectuar la revisión de los aceros, se encontró diferencias en los despieces de los planos E2 y E3 (Estru San Agustín-Vereda Los Andes).

SEMANA (11- 16 DICIEMBRE)

EL 15 de diciembre de 2023, bajo el radicado SANAND. WF42023-006, y recibido por la entidad con No. IH1-2023-4445 la Interventoría aprueba la solicitud de suspensión del contrato de obra No. CLPIH383-2023 por los motivos expuestos con anterioridad por parte del CONTRATISTA, debido a que a la fecha la entidad no ha dado respuesta, a los oficios anteriores.

Adicional a eso y en revisión conjunta de la implantación del proyecto en el área se evidencia la necesidad de realizar mayores cantidades de localización y replanteo por lo cual se suspende la ejecución de dicha actividad hasta tanto se realice la aprobación de mayores y menores cantidades de obra.

SEMANA (18- 21 DICIEMBRE)

En espera por parte de la entidad INDERHUILA que dé respuesta a las observaciones presentadas o suspenda el contrato de obra.

El 21 de Diciembre se efectúa acta de justificación y suspensión del contrato de obra No. CLPIH383-2023.

PERIODO: NOVIEMBRE DEL 12 AL 30 DE 2024

La comunidad en cabeza del presidente de la Junta de Acción Comunal, lograron no solo obtener los permisos que se requerían de los propietarios de los predios que se afectaban con la obra, sino que realizaron las gestiones necesarias para que se adecuaran los espacios que obstaculizaban las excavaciones de la cimentación, retirando el material de los taludes de los costados del polideportivo permitiendo tener el área necesaria para ejecutar el proyecto.

Además, se realizaron visitas periódicas por parte del presidente de la Junta de Acción Comunal y de varios habitantes de la vereda, llevando a cabo una constante vigilancia durante la ejecución de la obra.

La interventoría, en calidad de ente supervisor, aprobó y superviso los siguientes puntos para la correcta ejecución del contrato:

- Delimitación del área de la obra, con el fin de evitar afectaciones y accidentes para las personas y mascotas que transitan cerca al polideportivo, sobre todo teniendo en cuenta que esta la escuela veredal y la Capilla a la cual acuden bastantes personas.
- Se informó a la comunidad del cierre de la vía por el tiempo que dure la construcción, ya que el área de la vía es la única donde se pueden acopiar los materiales pétreos que se necesitan.
- Se puso a disposición de la obra, personal de la zona interesado en trabajar en la construcción.

PERIODO: DICIEMBRE DEL 1 AL 31 DE 2024

se realizan visitas periódicas por parte del presidente de la Junta de Acción Comunal y diferentes habitantes de la vereda, realizando constante vigilancia durante la ejecución de la obra.

Se mantienen las zonas seguras que se acordaron con la comunidad, se mantiene la señalización de prevención dentro de la obra y se mantienen las visitas por parte de la comunidad chequeando el buen desempeño y avance del ahora

Que le informó a la comunidad que se mantiene abierta la convocatoria para el personal de ayudante obra que quiere participar en la construcción de la cubierta el contratista aún necesita personal y que se acerque los que están interesados

Por último y no menos importante la comunidad sabe que el buen desarrollo de la obra les está mejorando las condiciones de vida a toda la población por ello viven muy agradecidos por el gran avance que ha tenido la obra más aun cuando tenemos una temporada fuerte de invierno.

PERIODO: DICIEMBRE DEL 1 AL 20 DE 2025

Se mantienen las zonas seguras que se acordaron con la comunidad, se mantiene la señalización de prevención dentro de la obra y se mantienen las visitas por parte de la comunidad chequeando el buen desempeño y avance del ahora.

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	16/11/2023			
Suspensión No. 1	21/12/2023	35		
Reiniciación No. 1	12/11/2024		327	05/01/2025
Otrosí No. 01	12/11/2024			
Otrosí No. 02	27/12/2024			05/02/2025
TERMINACIÓN Cto.	05/02/2025	85		
TOTAL DÍAS		**120**	**327**	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
	CLPIH383-2023	
ACTA DE INICIO		16/11/2023
ACTA DE VEEDURIA		07/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.01 – SUSPENSIÓN 1	1	21/12/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.01	1	21/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.02 - REINICIO 1	2	12/11/2024
ACTA DE REINICIO No. 01	1	12/11/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.03 OTROSÍ No.01	3	12/11/2024
OTROSÍ No.01	1	12/11/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.04 OTROSÍ No.02	4	27/12/2024
OTROSÍ No.02	2	27/12/2024

8. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

a). **Obligaciones de Carácter General**	La interventoría, en calidad de ente supervisor, gestiono, reviso y aprobó los siguientes puntos: 1. Se presentó al InderHuila el personal técnico de interventoría Director y Residente. 2. Se he realizado la entrega de documentación en papel reciclado. 3. Se realizó afiliación y pago de seguridad social (Salud, Pensión y riesgos). 4. Se verifico la localización de los trabajos y condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato.

	5. Se realiza revisión conjunta de los planos y especificaciones técnicas del contrato de obra. 6. Durante el periodo de inicio se realizó el cambio de equipo de trabajo propuesto en la interventoría. El cual fue entregado a la entidad con sus respectivos anexos. 7. Se suscribió con el contratista de obra el acta de inicio, el cual fue tramitada ante el Inderhuila. 8. Se realizó revisión de pólizas de acuerdo al acta de inicio del contratista de obra, el cual se tramitó a la entidad para su aprobación. 9. La interventoría cuenta con oficina en la carrera 4# 9-25 oficina 507. 10. Una vez suscrito el contrato de interventoría se realizaron los pagos correspondientes a la legalización del contrato y estampillas correspondientes a la Gobernación del Huila el día 9 de noviembre de 2023. 11. Se continua con la revisión conjunta de los planos y especificaciones técnicas del contrato de obra. 12. Por medio de Oficio SANAND. WF42023-003, se solicita al contratista los documentos del proyecto, según obligaciones del contratista. 13. Se solicita al contratista hacer entrega de la documentación requerida para el desembolso del anticipo de obra, antes del 5 de Diciembre de 2023. 14. Se realiza acta de socialización del proyecto el día 7 de Diciembre de 2023 15. El día 21 de Diciembre de 2023 se suscribe acta e Justificación y Suspensión 1 al contrato de obra pública No. CLPIH383 DE 2023. 16. Suscripción de acta de justificación para el reinicio No.1 17. Suscripción acta de reinicio No. 01. 18. Actualización de pólizas según acta de reinicio No. 01. 19. Se Realiza la aprobación de la reprogramación de Obra presentada por el contratista. 20. Se remite al supervisor cambio de Director y Residente de Interventoría, para su debida aprobación. 21. Suscripción de acta de justificación no. 4 para otrosí No.2 balance de mayores y menores cantidades de obra, adicional y prorroga de 1 mes más de ejecución. 22. Suscripción otrosí No. 2. 23. Actualización de pólizas según otrosí no. 2. 24. Cambio de Residente Siso por CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CORDOBA 25. La interventoría informa el cambio de personal de interventoría de una obra a la otra. 26. Se verifica pago aportes de seguridad social del personal durante todos los periodos
b). **Actividades administrativas**	Se verifica el personal del contratista de obra, tiempo de dedicación y se solicita al contratista los pagos de seguridad social o afiliaciones del personal Noviembre 2023

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO
NESTOR RODRIGO LOSADA	Director de Obra
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Sin equipos que requieran seguimiento y control a la fecha.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Solo se han realizado actividades administrativas.
CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	Planilla relacionada NRO. DE PLANILLA 9460090325 PENSION: $934.200 SALUD: $233.600 ARL: $257.300 CCF: $233.600
	DICIEMBRE 6 DE 2023

1. La interventoría reviso y suscribió el acta de inicio celebrados entre el contratista de obra, interventoría y entidad el día 16 de noviembre de 2023, Se hace visita de obra inicial el 22 de Noviembre de 2023 y se realiza la instalación de la Valla Informativa en la vereda los andes con la información correspondiente, así mismo se realiza acta de comité de obra el día 30 de Noviembre de 2023; durante el mes ejecutado no se suscribieron demás actas y/o documentos.
2. Durante el mes se presentaron observaciones a los diseños de los planos estructurales y se solicita primera solicitud de suspensión por parte del contratista.
3. Se realizó la revisión de las vigencias de las pólizas del contrato de obra las cuales fueron remitidas a la entidad.
4. la interventoría deja constancia que el contratista de obra no entrega soportes de afiliación del personal en obra y el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional de Entrega de dotación, alegando que no ha podido iniciar las actividades y, por lo tanto, no ha realizado ninguna actividad contractual.

Diciembre 2023

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO
NESTOR RODRIGO LOSADA	Director de Obra
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Sin equipos que requieran seguimiento y control a la fecha.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Solo se han realizado actividades admirativas.
CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	Planilla relacionada NRO. DE PLANILLA 9461784678 PENSION: $ 185.600

	SALUD: $ 46.400 ARL: $6.100 CCF: $46.400
	ENERO 19 DE 2024

1. El 7 de diciembre de 2023, La Interventoría, junto con el contratista de obra y el apoyo a la supervisión, suscriben acta de concertación y socialización de inicio de obra y acta de conformación de veeduría ciudadana.
2. Durante el mes se siguen presentando las observaciones a los diseños de los planos estructurales y se solicita nuevamente solicitud de suspensión debido a que a la fecha la entidad no ha dado respuesta.
3. La interventoría deja constancia que el contratista de obra no entrega soportes de afiliación del personal en obra y el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional de Entrega de dotación, alegando que no ha podido iniciar las actividades y, por lo tanto, no ha realizado ninguna actividad contractual.

Noviembre 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	Director De Obra
WILMAR ARMANDO JIMÉNEZ MARULANDA	Coordinador de Obra
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	Residente De Obra
CRISTIAN CAMILO LÓPEZ	Residente Siso
JOSÉ ALBEIRO TOVAR GÓMEZ	Maestro De Obra
SILVIO QUIÑONEZ SAMBONI	Ayudante De Obra
EMIRO SAMBONI MUÑOZ	Ayudante De Obra
ROBINSON ARCOS TORRES	Ayudante De Obra
WILLIAM ESTIVEN ARCOS HOYOS	Ayudante De Obra
JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	Ayudante De Obra
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Se realizo revisión y seguimiento y control a equipos.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Se realiza seguimiento de materiales, diseños de mezcla caracterización de recebo.

CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	$208.000	$52.000	$6.600	$52.000	EXONERADO	9478621946	2024/12/09
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	$208.000	$162.500	$90.500	$0.00	EXONERADO	9478285730	2024/12/16
WILMAR ARMANDO JIMÉNEZ MARULANDA	$131.800	$33.000	$57.400	$33.000	EXONERADO	9480094007	2025/01/09
CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CORDOBA	$131.800	$33.000	$57.400	$33.000	EXONERADO	9480094007	2025/01/09
JOSÉ ALBEIRO TOVAR GÓMEZ	90.800	$22.600	$39.300	$22.600	EXONERADO	9478621946	2024/12/09
SILVIO QUIÑONEZ SAMBONI	$55.500	$13.900	$24.200	$13.900	EXONERADO	9478913722	2024/12/16
EMIRO SAMBONI MUÑOZ	$55.500	$13.900	$24.200	$13.900	EXONERADO	9478913722	2024/12/16
ROBINSON ARCOS TORRES	$46.600	$12.200	$21.200	$12.200	EXONERADO	9478913722	2024/12/16
WILLIAM ESTIVEN ARCOS HOYOS	$55.500	$13.900	$24.200	$13.900	EXONERADO	9478913722	2024/12/16
JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	$20.800	$5.200	$9.100	$5.200	EXONERADO	9478913722	2024/12/16

Diciembre 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	Director De Obra
WILMAR ARMANDO JIMÉNEZ MARULANDA	Coordinador de obra
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	Residente De Obra
CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CORDOBA	Residente Siso

JOSÉ ALBEIRO TOVAR GÓMEZ	Maestro De Obra
SILVIO QUIÑONEZ SAMBONI	Ayudante De Obra
EMIRO SAMBONI MUÑOZ	Ayudante De Obra
ROBINSON ARCOS TORRES	Ayudante De Obra
WILLIAM ESTIVEN ARCOS HOYOS	Ayudante De Obra
JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	Ayudante De Obra
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Se realizo revisión y seguimiento y control a equipos.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Se realiza seguimiento de materiales, diseños de mezcla caracterización de recebo, arena, gravilla.

CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

DICIEMBRE 2024							
PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
NESTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	$208.000	$52.000	$6.800	$52.000	EXONERADO	9490094655	2025/01/09
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	$5.850.000	$4.062.500	$2.262.000	$0.00	EXONERADO	9479812982	2025/01/02
WILMAR ARMANDO JIMÉNEZ	$208.000	$52.000	$90.500	$52.000	EXONERADO	9490094655	2025/01/09
CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CORDOBA	$208.000	$52.000	$90.500	$52.000	EXONERADO	9490094655	2025/01/09
JOSE ALBEIRO TOVAR GOMEZ	$208.000	$52.000	$90.500	$52.000	EXONERADO	9490094655	2025/01/09
SILVIO QUIÑONEZ SAMBONI	$41.600	$10.400	$18.100	$10.400	EXONERADO	9490094655	2025/01/09
EMIRO SAMBONI MUÑOZ	$34.700	$8.700	$15.100	$8.700	EXONERADO	9490094655	2025/01/09
ROBINSON ARCOS TORRES	$49.600	$12.200	$21.200	$12.200	EXONERADO	9490094655	2025/01/09
WILLIAM ESTIVEN ARCOS HOYOS	$55.500	$13.900	$24.200	$13.900	EXONERADO	9490094655	2025/01/09
JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	$49.600	$12.200	$21.200	$12.200	EXONERADO	9490094655	2025/01/09

se verifica en obra el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional. Entrega de dotación y afiliaciones del personal.

Enero 2025

	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL / **CARGO**
	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA. — Director De Obra
	WILMAR ARMANDO JIMÉNEZ — Coordinador de obra
	JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO — Residente De Obra aux.
	CRISTIAN CAMILO LÓPEZ — Residente Siso
	JOSÉ ALBEIRO TOVAR GÓMEZ — Maestro De Obra
	SILVIO QUIÑONEZ SAMBONI — Ayudante De Obra
	EMIRO SAMBONI MUÑOZ — Ayudante De Obra
	ROBINSON ARCOS TORRES — Ayudante De Obra
	WILLIAM ESTIVEN ARCOS HOYOS — Ayudante De Obra
	JORGE ARMANDO HOYOS PAZ — Ayudante De Obra
	OSCAR IVÁN GUALÍ CUELLAR — Ayudante De Obra
	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS — Se realizo revisión y seguimiento y control a equipos.
	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES — Se realiza seguimiento de materiales, calidad cubierta
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL No aporta pagos de planillas de seguridad social 1.
c.) **Actividades operativas**	Noviembre y Diciembre 2023 1. No se llevaron a cabo debido a las inconsistencias encontradas en los diseños de los planos estructurales y en la implantación del proyecto. Noviembre 2024 <u>ACTIVIDADES PRELIMINARES</u> - Ubicación de bodega para materiales - Convocatoria y contratación de personal para la obra - Traslado de equipos, maquinaria, herramienta menor, y materiales para dar inicio a las actividades previstas en la obra

- Localización y replanteo del proyecto en el área destinada para su ejecución (trazado y verificación de niveles)
- Excavación para la construcción de la cimentación del proyecto. Se logran realizar 11 de los 12 puntos de excavación (A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B3, B4, B5, B6), ya que en el punto B2, se encontró una roca que debe ser destruida con máquina tipo demoledor.

CIMENTACIÓN

- Instalación de concreto ciclópeo en los niveles y dimensiones indicadas en los planos estructurales del proyecto. Se instala en 11 de los 12 puntos previstos para la cimentación de las columnas (A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B3, B4, B5, B6), el punto B2 es donde se ubica la roca.
- Instalación de las barras de transferencia que se ubican durante la fundición del concreto ciclópeo.
- Armado de acero para todas las zapatas (A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6). El acero fue figurado previamente conforme a los planos del proyecto y es armado en el sitio de la obra.

TRANSPORTE

- Transporte de materiales pétreos: Se realiza el transporte de los materiales pétreos necesarios para la fundición del concreto ciclópeo para la cimentación, y se acopia parte del material pétreo para la posterior fundición de las zapatas.
- Se verifican los procedimientos de concreto del contratista, dosificaciones y material pétreo utilizado en la actividad
- Se evidencia en obra la necesidad de realizar acta de modificación de mayores y menores cantidades, por lo cual se inician actividades de balanceo de cantidades de obra

Diciembre 2024

ACTIVIDADES PRELIMINARES

- Chequeo de la calidad de los materiales para las actividades propias de la obra
- Chequeo de la Localización y replanteo del proyecto en el área destinada para su ejecución (trazado y verificación de niveles)
- Medición y revisión de las excavaciones para la construcción de la cimentación del proyecto.
- Revisión y medición del relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.

CIMENTACIÓN

- Control de calidad y medición de la fundición del Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts. Luego de realizar las excavaciones para la construcción de las vigas de cimentación de los ejes A y B, se instala concreto de limpieza en el suelo para luego proceder con la instalación de los aceros que componen los elementos

	- Control y medición de la Instalación de concreto ciclópeo en los niveles y dimensiones indicadas en los planos estructurales del proyecto en el punto B2 en donde se ubicaba la roca, junto con las barras de transferencia. - Control y medición de la Construcción de zapatas en concreto 210 kg/cm² -3000 PSI, y Acero de refuerzo Fy=60.000 PSI para zapatas. Se instala, sobre el concreto ciclópeo, cada una de las parrillas en acero que conforman el refuerzo de las zapatas en todos los puntos que hacen parte de la estructura de la obra (A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6); luego, se realiza la fundición de todas las zapatas siguiendo los diseños establecidos en los planos estructurales aprobados para el proyecto; se hace uso de vibrador eléctrico para concreto con el fin de eliminar el aire o vacíos existentes dentro de la mezcla y así lograr una mayor compactación de la misma. En las zapatas, se dejan los aceros de arranque para los pedestales y columnas que conforman la estructura de la cubierta. - Chequeo y medición de la Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI, y Acero de refuerzo Fy=60.000 PSI para viga de cimentación. Se realiza el armado del acero que conforma la viga de cimentación del EJE A y EJE B (incluyendo los flejes), siguiendo los diseños estructurales para tal fin. Luego se procede a verter concreto hasta alcanzar las dimensiones de la viga (0.50 X 0.45 M), haciendo uso del vibrador eléctrico para concreto con el fin de eliminar el aire o vacíos existentes dentro de la mezcla y así lograr una mayor compactación de la misma. <u>ESTRUCTURA EN CONCRETO SE LE REALIZA EL SEGUIMIENTO Y MEDICION A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES</u> - Construcción de columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI, y Acero de refuerzo Fy=60.000 PSI para columnas. Se amarran flejes y ganchos a las varillas de arranque y se conforman los pedestales; se instalan las formaletas metálicas de 0.60x0.65 para fundir los pedestales comuna altura de 0.85 metros. Luego de construir la viga de cimentación, se amarran flejes y ganchos para las columnas, siguiendo los planos estructurales del proyecto; luego se procede a instalar formaletas metálicas de 0.40x0.45, y a verter el concreto hasta alcanzar la altura de diseño. Se hace uso del vibrador eléctrico para concreto con el fin de eliminar el aire o vacíos existentes dentro de la mezcla y así lograr una mayor compactación de la misma; luego se procede a retirar la formaleta. - Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI, y Acero de refuerzo Fy=60.000 PSI para viga canal. Se realiza el armado de la estructura de soporte para la formaleta de la viga canal, utilizando gatos, cerchas y camillas; luego, se realiza el armado del acero que conforma la viga canal del **EJE A** (incluyendo flejes de la viga y aceros para la pestaña del canal), siguiendo los diseños estructurales para tal fin. Seguidamente, se instala formaleta en madera dando forma a la viga canal, de acuerdo a los diseños; finalmente, se vierte el concreto haciendo uso del vibrador eléctrico para concreto con el fin de eliminar el aire o vacíos existentes dentro de la mezcla y así lograr una mayor compactación de la misma. Al concreto se le adiciona acelerante SikaSet **L**, con el fin de disminuir el tiempo de curado; luego se procede a retirar la formaleta y la estructura que lo soporta.

REVISION A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- Desmonte de Postes de iluminación; Incluye retiro de luminarias, cableado y demolición de machón en concreto. En el sitio de obra se encontraban 3 postes de iluminación que obstruían los procesos constructivos de la obra, los cuales fueron retirados del sitio, junto con sus accesorios y cableado.

CONTROL AL TRANSPORTE

- Transporte de materiales pétreos. Se realiza el transporte de los materiales pétreos necesarios para la fundición de las zapatas, vigas de cimentación, columnas, viga canal, y se acopia el material pétreo para la posterior fundición de la placa de piso, cañuelas y cajillas.

Enero 2025

CIMENTACIÓN

-Se realiza la fundición de las 12 zapatas (A1 al A6 y B1 al B6) y de las vigas de cimentación de los ejes A y B, lo anterior en concreto de 3000 psi.

ESTRUCTURA EN CONCRETO

-Se realiza el armado e instalación del acero de refuerzo para las 12 columnas de la estructura de cubierta (A1 al A6 y B1 al B6).
-Se realiza el encofrado en formaleta metálica de las columnas y se procede a realiza la fundición de las 12 columnas en concreto de 3000 psi mezclado en sitio.
-Se realiza el armado e instalación del acero de refuerzo para las 2 viga canales de los ejes A y B de la estructura de cubierta.
-Se realiza el encofrado y fundición de las 2 viga canales de los ejes A y B de la estructura de cubierta, en concreto de 3000 psi mezclado en sitio.
-Se realiza la instalación del manto zeta en la 2 viga canales de los ejes A y B para garantizar la impermeabilización de dicha estructura.

CUBIERTA

-Se realiza el montaje e instalación de la cubierta en teja autoportante a base de lámina acero cal.20, en paneles engargolados lateralmente sobre la viga canal, con acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

	-Se realiza el desmonte de 3 postes en concreto existentes de la red eléctrica e iluminación. TRANSPORTE - Transporte de materiales pétreos: Se realiza el transporte de los materiales pétreos necesarios para la fundición del concreto ciclópeo para la cimentación, y se acopia parte del material pétreo para la posterior fundición de las zapatas
d). **Actividades Logísticos.**	Noviembre 2023 1. Se hace seguimiento a las observaciones presentadas en los planos "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E2" el contratista encontró que la cota y despieces de las columnas no coincide con la mostrada en el plano "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E3". Diciembre 2023 1. Se continúa haciendo seguimiento a las observaciones presentadas en los planos "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E2" el contratista encontró que la cota y despieces de las columnas no coincide con la mostrada en el plano "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E3". Noviembre 2024 1. Se realiza reinicio de actividades el 12 de Noviembre de 2024. 2. Se realiza la revisión diaria de los avances de la bitácora de obra. 3. Se realiza la medición de las actividades realizadas en la ejecución del contrato 4. Se realizó la revisión de las vigencias de las pólizas del contrato de obra las cuales fueron remitidas a la entidad y cargadas al SECOP II. 5. Se verificó en obra el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional. 6. Se realizó comité de obra el día 29 de Noviembre de 2024 , Mediante el cual se expone actividades logísticas y administrativas realizadas. Diciembre 2024 1. Se realiza la revisión diaria de los avances de la bitácora de obra. 2. Se realiza la medición de las actividades realizadas en la ejecución del contrato 3. Se realizó la revisión de las vigencias de las pólizas del contrato de obra las cuales fueron remitidas a la entidad y cargadas al SECOP II. 4. Se verificó en obra el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional. 5. se verifica en obra el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional. Entrega de dotación y afiliaciones del personal. 6. Se realizaron comités de obra donde se expone actividades logísticas y administrativas realizadas.

	7. Se aprueba balance de obra de mayores y menores cantidades de Obra.
e). **Obligaciones de Carácter Ambiental.**	1. Se solicita el plan de Manejo ambiental al contratista para verificar su cumplimiento en obra, el contratista no hizo entrega del plan de manejo ambiental, debido a que no ha podido iniciar actividades. 2. se realiza la entrega por parte del contratista de las licencias ambientales de los materiales pétreos. 3. Se realiza seguimiento al sistema de gestión y sistema de seguridad y salud en el trabajo
f). **Actividades Financieras.**	1. Se realiza la solicitud del plan de anticipo y la documentación requerida para la gestión del anticipo al contratista de obra para el inicio del proceso de aprobación y gestión por parte de la interventoría. 2. Se realiza la solicitud del plan de anticipo y la documentación requerida para la gestión del anticipo al contratista de obra para el inicio del proceso de aprobación y gestión por parte de la interventoría. 3. El contratista realiza nuevamente trámite para cobro del anticipo de obra. 4. El contratista recibe el pago del Anticipo por parte de la entidad, el 27/11/2024. 5. Se inician actividades de proyección de acta parcial de obra. 6. Se proyecta acta parcial para cobro de obra e interventoría.
g). **Actividades Jurídicos.**	1. Se constata de manera permanente el estado de las pólizas y garantías constituidas por el contratista, en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar su concordancia con lo pactado en el Contrato de obra, sus anexos y modificaciones, prórroga y adiciones y exigir el cumplimiento de sus obligaciones al respecto.

CONTRATO DE OBRA

Póliza legalización del CONTRATO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	0	02/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815	0	02/11/2023	01/11/2023	20/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	1	22/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo fina	5 años desde acta de recibo final

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018615	1	22/11/2023	01/11/2023	20/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO No. 1:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	2	20/11/2024	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	10/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	10/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	10/01/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018615	2	20/11/2024	01/11/2023	24/01/2025

Póliza actualizada x Otrosi 02 Prorroga y Adicion valor:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-10105169 1	3	29/01/2025	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	10/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	10/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	10/01/2026
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-10101851 5	3	21/11/2024	01/11/2023	04/02/2025

Póliza actualizada x Otrosí 02 Prorroga y Adicion valor:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-10105169 1	4	29/01/2025	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	13/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	13/08/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	10/02/2026
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-10101881 5	4	29/01/2026	01/11/2023	04/03/2025

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA (DANES INGENIEROS S.A.S)

CLAUSULA 7. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL DEL CONTRATISTA

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.	El contratista de obra cumplió con el porcentaje mínimo exigido de la mano de obra no calificada.
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre	el contratista dio cumplimiento a la obligación de destinar, como mínimo, el cinco por ciento (5%) del valor de la ejecución del contrato a la provisión de bienes o servicios por parte de sujetos de especial protección constitucional, tales como personas de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.

otros definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera.	

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	El contratista dio pleno cumplimiento a las condiciones establecidas.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	el contratista ejecutó el objeto contractual conforme a los estándares exigidos, cumpliendo con los requisitos técnicos y de calidad establecidos.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	El contratista garantizó la calidad del servicio conforme a lo estipulado en el Anexo Técnico y los demás documentos contractuales.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	El contratista reportó de manera oportuna las situaciones relevantes que surgieron durante la ejecución del contrato.
5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable	El contratista no utilizó productos que contuvieran asbesto, cumpliendo con la normativa vigente en materia de salud pública.
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	El contratista de obra presentó los soportes requeridos dentro de los tiempos establecidos en el cronograma contractual.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.	El contratista de obra identificó y reportó oportunamente las oportunidades de mejora en su plan de trabajo.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.	El contratista aplicó acciones concretas para la inclusión de mano de obra local en el desarrollo del proyecto.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	El contratista de obra cumplió sin observaciones con lo establecido en el Pacto de Transparencia.
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.	El contratista de obra informó de manera oportuna cuando se identificaron nuevos riesgos durante la ejecución del proyecto.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.	El contratista de obra comunicó adecuadamente cualquier hecho relevante relacionado con el desarrollo de las actividades contractuales.

12. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	El contratista de obra implementó las medidas de seguridad necesarias y proporcionó la dotación adecuada de Elementos de Protección Personal (EPP) al personal a cargo.
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	El contratista de obra presentó la información conforme a lo requerido por la supervisión y los lineamientos del contrato.
14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	El contratista de obra cumplió con sus deberes contractuales sin que se registraran incumplimientos.
15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	El contratista no presentó hechos que constituyeran incumplimientos, dando cumplimiento al deber de información.
16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista [o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales].	No se presentaron situaciones relevantes, y el contratista de obra cumplió con su deber de informar en todo momento.
17. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) dias hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	El contratista de obra entregó el plan correspondiente dentro del plazo establecido y conforme a las normas NTC ISO aplicables.
18. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad	El contratista de obra ejecutó las actividades conforme al diseño previamente analizado y aprobado por la interventoría.

19. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico.	El contratista de obra implementó prácticas sostenibles en concordancia con lo previsto en los documentos contractuales.
20. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.	El contratista de obra realizó la compra de bienes conforme a los requisitos establecidos.
21. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.	El contratista de obra informó oportunamente y facilitó la verificación correspondiente por parte de la supervisión.
22. Incorporar como mínimo el cuarenta (40%), sin perjuicio de incluir uno superior de personal Colombiano para el cumplimiento de contrato.	El contratista de obra cumplió con el porcentaje mínimo exigido en la contratación de personal nacional, según lo establecido en el contrato.

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

A). Obligaciones de Carácter General

1. Cumplir el objeto del contrato, ejecutar y entregar las obras contratadas en el plazo estipulado, conforme a los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción.	Sí, el contratista de obra ejecutó y entregó la obra contratada dentro del plazo estipulado, conforme a los criterios de calidad exigibles, los diseños, planos y especificaciones de construcción.
2. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecución de la obra.	Sí, el contratista de obra adoptó las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas, los bienes o el medio ambiente durante la ejecución de la obra.
3. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 – adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra.	Sí, el contratista de obra cumplió con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los correspondientes al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las Cajas de Compensación Familiar de sus empleados, lo cual se evidencia en las planillas de seguridad aportadas.

4.	Velar por que EL INDERHUILA se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se hayan requeridas para la ejecución del contrato.	Se mantiene indemne al INDERHUILA de cualquier responsabilidad civil y penal.
5.	Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993.	El contratista de obra ha cumplido cabalmente con todas las obligaciones derivadas del presente contrato, sin que se haya presentado ningún incumplimiento, hecho u omisión imputable que haya causado daño o perjuicio a la entidad. Por lo tanto, no existen motivos para responsabilidad civil o penal conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993.
6.	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	El contratista de obra se compromete a asumir cualquier daño causado a terceros o al personal contratado durante la ejecución del contrato.
7.	Asumir el pago de los tributos y los demás gastos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	a la fecha, el contratista de obra ha realizado el pago de todos los tributos y gastos requeridos dentro del proyecto.
8.	Incluir en sus costos indirectos el costo de la Valla de la Obra de acuerdo a los parámetros establecidos por Inderhuila	Si, el contratista de obra garantizó la instalación y mantenimiento de la valla de la obra desde el inicio del proyecto hasta el final de la misma.
9.	Previo a la suscripción del Acta de Inicio y al otorgamiento del anticipo, presentar a la Interventoría y Supervisión, el análisis de precios unitarios y el desglose del AIU, suscrito y debidamente firmado por el Representante Legal. Adicional la entidad entregara lista de chequeo para el otorgamiento del anticipo.	el contratista de obra cumplió con la presentación de toda la documentación requerida para el cobro del anticipo.
10.	El contratista deberá desarrollar teniendo en cuenta los lineamientos técnicos expuestos en el procedimiento contractual de obra pública y las normas técnicas que la regulan así: "Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE"; Norma NSR 2010 "Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente"; Normatividad de Protección Contra Caídas en Trabajo en Alturas "Resolución No. 1178 de 2017"; NTC 1700 Higiene y Seguridad "Medidas de Seguridad en Edificaciones – Medios de Evacuación"; Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico "RAS"	El contratista de obra cumplió conforme a los diseños y especificaciones entregados por la entidad, y en estricto cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.

11. Constituir una fiducia dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, requisito indispensable para el desembolso de los recursos que constituyen el Anticipo.	El contratista cumplió con la apertura de la Fiducia, como parte de los requisitos para el cobro del anticipo.

B). Obligaciones Relacionadas con el Personal Requerido para la Ejecución del Objeto Contractual

1. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida por El Inderhuila. En todo caso, El Contratista deberá garantizar el tiempo de dedicación de los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual.	El contratista de obra cumplió con la vinculación del personal ofrecido y requerido durante la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en los documentos contractuales.
2. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.	Si, se cuenta con una oficina central, para el soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable
3. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un cincuenta por ciento (50%) del personal no calificado, a personas de la región.	El contratista de obra contrató personal de la región, dando prioridad a trabajadores del municipio de San Agustín, Huila, en cumplimiento de los lineamientos establecidos para la inclusión de mano de obra local.
4. Mantener permanentemente al frente de las obras al director de obra propuesto para decidir, con el interventor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución del proyecto.	Sí, estuvieron presentes en la obra tanto el director de obra como el interventor, conforme a la disponibilidad y dedicación requerida en el contrato.
5. Presentar para la aprobación por parte de la Interventoría, previo a la suscripción del Acta de Inicio, las hojas de vida del personal mínimo solicitado en los documentos tipo – pliego de condiciones; igualmente, obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, que deberá cumplir con el perfil	El contratista de obra presentó, previo a la suscripción del acta de inicio, las hojas de vida del personal mínimo requerido, conforme a lo establecido en los documentos tipo – pliego de condiciones.

	profesional exigido en el los documentos tipo - pliego de condiciones.	
6.	Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra y garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y el Inderhuila.	El contratista de obra cumplió con la obligación correspondiente a el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a los trabajadores y personal contratado durante la ejecución del contrato.
7.	Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra.	el contratista de obra cumplió con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como con los correspondientes al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las Cajas de Compensación Familiar, lo cual se evidencia en las planillas de seguridad social aportadas.
8.	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Inderhuila, por causa o con ocasión del contrato.	Se mantiene indemne al INDERHUILA frente a cualquier reclamación judicial o extrajudicial por parte de empleados, subcontratistas o terceros relacionados con la ejecución del contrato.
9.	Afiliar a todo el personal directo al nivel de riesgo que corresponda (I, II, III, IV y V) según su ocupación en la obra y verificar la afiliación y el nivel de riesgo de todos los subcontratistas que se requieran durante la ejecución de la obra.	El contratista de obra afilió al personal vinculado al nivel de riesgo requerido, de acuerdo con la naturaleza de las labores desempeñadas en la obra.

C). Obligaciones Relacionadas con la Adecuación del Lugar de la Obra.

1.	Obtener la prestación de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario.	El contratista de obra cumplió con el mantenimiento de la prestación de los servicios públicos provisionales durante la ejecución de la obra.
2.	Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.	El contratista cumplió con el pago de los servicios públicos derivados del consumo necesario para la ejecución del objeto contractual, así como con los costos asociados a las adecuaciones de redes requeridas para la obtención del servicio.
3.	Ubicar la señalización preventiva necesaria para la segura circulación de los personales de obra, vecinos y terceros.	El contratista de obra instaló cerramiento en lona verde durante la ejecución del contrato, así como toda la señalización requerida para garantizar la circulación segura del personal de obra y de la población en general.

D). Obligaciones Relacionadas con los Equipos, Herramientas, Maquinaria y Materiales de Construcción.

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios	EL contratista de obra cumplió con la disposición de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la correcta ejecución del proyecto.
2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada del proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.	El contratista suministró oportunamente los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas establecidas en el cronograma contractual.
3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.	Sí, el contratista de obra utilizó materiales y elementos de buena calidad, lo cual se encuentra debidamente soportado con los certificados entregados en los informes mensuales.

E). Obligaciones Relacionadas con la Ejecución de la Obra.

1. Entregar a satisfacción en funcionamiento y de acuerdo a las especificaciones técnicas de conformidad con los estudios previos, los documentos tipo - pliego de condiciones y la propuesta presentada la obra objeto del contrato.	El contrato se encuentra en proceso de ejecución.
2. Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de la obra contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo deberá tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.	El contratista de obra cumplió con todos los procedimientos técnicos adecuados para la construcción y protección de la obra, previniendo cualquier daño o deterioro. Asimismo, se tomaron las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad en general.
3. Aceptar las órdenes impartidas por el Interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesarias para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras.	Se mantuvo comunicación permanente con el contratista para la toma de decisiones relacionadas con modificaciones de procedimientos, equipos de construcción y aplicación de medidas que garantizaran la calidad y correcta ejecución de la obra.

4. Cumplir con todas las normas vigentes en cuanto manejo ambiental se refiere, como lo es el manejo de escombros de acuerdo a normatividad de la autoridad ambiental respectiva, señalización de seguridad para el área de influencia de la obra y planes de manejo tráfico requeridos por la Secretaría de Movilidad correspondiente.	Desde el inicio de la obra, se socializo con la comunidad y la secretaria de planeación del municipio para el respectivo manejo de escombros, asi mismo se relaciona el aspecto ambiental en el informe HSEQ presentados mes a mes por el contratista.	
5. Cumplir con la normatividad vigente a nivel nacional y departamental y municipal para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad competente.	El contratista de obra cumplió con la movilización de maquinaria, contando con toda la documentación requerida y vigente.	
6. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente. Como garantía de lo anterior el contratista entregará al Inderhuila, antes de la suscripción del acta de iniciación de las obras, los permisos ambientales de las personas o empresas cuyos servicios utilizará durante la ejecución del contrato. Esta documentación deberá ser actualizada cuando el Inderhuila lo requiera. Nota: El contratista no podrá en marco de la ejecución contractual subcontratar totalmente las actividades pactadas. Parágrafo: la subcontratación como figura aplicable a los contratos de obra, supone la existencia de un vínculo autónomo e independiente entre el contratista principal y el subcontratista, en el cual, el indehuila no tendrá participación o incidencia alguno más allá de la vigilancia y control general de la ejecución contractual.	El contratista de obra garantizó que todos sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicios contaran con las licencias, permisos y requisitos exigidos por la normatividad vigente, asegurando el cumplimiento legal en cada etapa de la ejecución del contrato.	
7. Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a ejecutar y controlar el presupuesto de tal manera que no sobre pase el presupuesto pactado por parte y total del contrato.	Se realizó el control financiero de manera semanal, estricta y precisa durante la ejecución de las obras. Aunque se presentó un adicional en valor, este fue tramitado y aprobado conforme a los procedimientos contractuales y normativos vigentes.	
8. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y o documentos necesarios para el desarrollo del contrato proyectados por la Interventoría.	Se cumplió, tramitando y suscribiendo las actas de acuerdo a cada estado de la ejecución del contrato.	
9. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato por parte del Interventor, el Inderhuila o la comunidad se originen dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de los mismos	El contratista de obra dio respuesta oportuna a la correspondencia oficial recibida durante el desarrollo del contrato.	

10. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecución de las mismas.	El contratista de obra suministró oportunamente las muestras de materiales a utilizar, para realizar los análisis de laboratorio requeridos, garantizando así el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos.
11. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Inderhuila, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público, entre otros.	N/A
12. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.	Durante la ejecución de la obra, se realizaron labores de limpieza de forma frecuente.
13. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención donde se ejecute la obra.	N/A
14. Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al presente contrato de obra, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.	Durante la ejecución del contrato no se presentó ningún daño o deterioro atribuible a las actividades desarrolladas.
15. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de estabilidad de la obra.	Durante la ejecución del contrato no se presentó ningún daño o deterioro atribuible a las actividades desarrolladas.
16. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o el Inderhuila, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.	N/A
17. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra; manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual y; dotación de calzado y vestido de labor y	El contratista de obra cumplió con la entrega de dotación al inicio y reinicio de la obra. Igualmente, durante la ejecución del contrato se entregaron los elementos de protección personal (EPP) requeridos al personal.

documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.	
18. El contratista deberá acogerse a los lineamientos establecidos en el plan de implantación, insumo fundamental, para la funcionalidad y manejo del espacio público y en general del proyecto con su entorno	El proyecto fue ejecutado conforme a las especificaciones técnicas y diseños entregados por la entidad contratante.
19. Una vez la obra se encuentre ejecutada, el contratista deberá gestionar todas las actividades conducentes a la obtención del RETIE, garantizando su estado y funcionalidad.	El contrato se encuentra en proceso de ejecución.
20. El contratista garantizará los estudios y gestionará las actividades conducentes a la obtención del RETILAP, los estudios que se planteen se harán de acuerdo a las lámparas y/o suministros relacionados en la propuesta de los diseños; para su respectiva modificación deberá contar con el aval del Inderhuila, del profesional del diseño y de los profesionales competentes en la materia.	N/A

F). Aspectos ambientales

1. El objeto del proyecto analizado se llevara a cabo con las tecnologías a nivel nacional par al construcción de obras, deberá ceñirse a las especificaciones que para el caso amerita; debe tenerse en cuenta que la incorporación de tecnologías avanzadas y la minimización del impacto ambiental, son algunos de los factores de terminantes para el desarrollo del proyecto, por ello se deben ofrecer soluciones combinadas de prevención y control sin olvidar la responsabilidad ambiental.	El contratista de obra aplicó prácticas sostenibles durante la ejecución del proyecto, utilizando materiales que minimizan los impactos negativos sobre el medio ambiente, en cumplimiento con las políticas ambientales establecidas en el contrato.
2. Si en el desarrollo de las actividades propias de los proyectos constructivos se requiere el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, se debe solicitar permisos, concesiones, autorizaciones o licencias a que haya lugar, acorde con la normatividad ambiental vigente, ante las autoridades Competentes de acuerdo a los establecidos en el decreto 2811 de 74 condigo nacional de recursos renovables y de la protección al medio ambiente ley 99 de 93 y sus decretos reglamentarios.	N/A

3.	Es obligación del interventor realizar el control y seguimiento a la obra, la normatividad aplicable, y las obligaciones derivadas de la obtención de permisos, la ejecución de medidas de compensación, programas y obras, debe ser simultaneas a la ejecución de las obras del contrato. El contratista se obliga a aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por la autoridad ambiental competente, como soporte del formato de cierre ambiental.	La interventoría cumplió con el control y seguimiento a la obra, verificando el cumplimiento de la normatividad aplicable, así como las obligaciones derivadas de la obtención de permisos, la ejecución de medidas de compensación, programas y obras.
4.	La entidad se obliga a exigir el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras, bajo criterio de respeto al entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan.	Las prácticas en campo se realizaron bajo criterios técnicos y ambientales.
5.	Es su responsabilidad exigir el estricto cumplimiento de los aspectos ambientales que debe corresponder al objeto y alcance de la obra y se convierte en el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte de la interventoría. Con el objeto de definir el adecuado manejo ambiental, enmarcado en el cumplimento de la normatividad ambiental vigente se requiere contemplar la prevención, el control, manejo y mitigación de los impactos ambientales de la obra en la construcción y mantenimiento de los tratamientos de las aguas residuales domésticas, incluyendo planes de seguimiento, evaluación y monitoreo de contingencia.	El contratista entrego los planes y reportes requeridos, incluyendo cronogramas y soportes para el seguimiento.
6.	La ejecución del proyecto se obliga a utilizar procesos, practicas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar reducir o controlar, la generación emisión o descargas de cualquier tipo de contaminante o residuo con el fin de reducir impactos ambientales adversos. Por tal motivo deberá tenerse en cuenta los permisos, que, en cada caso de ser necesario, deben tramitarse ante la autoridad ambiental, como son: de ser necesario intervenir alguna espacie arbórea se debe solicitar el correspondiente permiso de aprovechamiento forestal	Se implementaron prácticas para control de polvo, ruido y residuos.
7.	Cuando se pretenda trabajar en horarios adicionales se deberá tramitar permiso para operación de equipos de contracción y demolición generadores de ruido ambiental. Si se requiere la instalación de vallas publicitarias adicionales a las reglamentarias se deberá tramitar el permiso para la instalación de publicidad visual exterior.	No se trabajó en horarios adicionales durante la ejecución del contrato, por lo que no fue necesario tramitar permisos para la operación de equipos de construcción o demolición generadores de ruido ambiental ni para la instalación de vallas publicitarias adicionales.

8.	Se requiere que le ejecutor del proyecto tenga en cuenta los lineamientos de la autoridad ambiental competente en el manejo de recurso arbóreo, en la descripción de las técnicas a emplear para la reforestación y/o revegetación de la zona intervenida, indicando las especies a utilizar, métodos y características de siembra, tamaño de las plantas	N/A
9.	El manejo ambiental de la obra, incluye la articulación especial y temporal de las medidas de manejo de cada uno de los impactos a ser generados por el desarrollo de la misma, así como los costos de ejecución y un cronograma de actividades articulado con el de ejecución general de la obra, el manejo ambiental debe consultarse con los grupos de interés y la comunidad involucrada a fin de precisar las medidas y demás acciones o proyectos inherentes.	Se realizaron actividades de socialización y consulta a la comunidad
10.	Las directrices del manejo ambiental de la obra tendientes a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales, deben considerar los siguientes aspectos: Gestión social: se deben elaborar las medidas o estrategias dirigidas a instruir y lograr la participación de las autoridades, organizaciones comunitarias, y usuarios en general en la conservación y mantenimiento de la infraestructura de la obra delimitación del área de influencia de la obra, construcción o adecuación del campamento (oficina, casino, depósito de materiales, infraestructura), transporte de personal, insumos y materiales, operación y mantenimiento de maquinaria y equipos, control de emisión atmosférica y ruido; manejo de excavaciones y control de la sedimentación, manejo de residuos sólidos, materiales de obra y sobrantes de construcción, volumen, transporte, almacenamiento y disposición final: Es necesario presentar un certificado, constancia o contrato de manejo de residuos sólidos, específicamente escombros, esquemas de desvío y señalización de los mismos, de acuerdo con la importancia de las vías obstaculizadas por la construcción de las redes y cómo se vayan desarrollando las obras, elaboradas de antemano y concertadas con la autoridad de tránsito competente. Protección de ecosistemas: medida de protección sobre cuerpos de agua intervenidos y sus zonas de ronda, manejo, preservación y compensación ambiental, aprovechamiento forestal: Para la vegetación a removerse, se debe hacer el correspondiente inventario forestal, siguiendo las recomendaciones de la autoridad ambiental competente, proponiendo el plan de aprovechamiento y repoblación de	N/A

la zona afectada. Se debe indicar y especificar en un plano las especies arbóreas a sembrar, la zona verde a engramar, entre más.	
11. Control de vertimientos: manejo de suelos y control de erosión, cumplimiento de normas de higiene, salud ocupacional y seguridad industrial, instalación de valla y avisos de obra, manejo de servicios públicos, manejo de tránsito peatonal.	El contratista cumplió con las medidas de control y seguridad integral.
12. La entidad exigirá la colocación de la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de tránsito. Actividades que deberán cumplir de conformidad con lo establecido en el manual de señalización. Dispositivo para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia y en la resolución No 046 y 114 del 2013, expedida por el Ministerio de Transporte. Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que se tenga.	Se aplicó el manual de señalización previsto para el desarrollo de las actividades.


G). Aspectos de información

1. Absolver las observaciones y requerimientos realizados por el supervisor delegado por el INDERHUILA, las que realicen los órganos de control y las autoridades locales.	El contratista de obra dio respuesta oportuna y debidamente documentada a las observaciones recibidas.
2. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría, el avance de cada uno de los frentes de trabajo, de cada una de las actividades programadas, cantidades de obra ejecutada, registros fotográficos, resultados de los ensayos de material y demás pruebas realizadas, fotocopia de la bitácora o libro de obra, resumen de las actividades realizadas en el periodo relación de personal empleado en la ejecución de la obra, informe de seguridad industrial, informe de manejo ambiental, informe de manejo de inversión del anticipo con los respectivos soportes, actualización del programa de ejecución de obra, acreditación de pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social	El contratista presentó los informes mensuales con todos los soportes requeridos, los cuales fueron aprobados por la interventoría.
3. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría que contenga un resumen de actividades	El contrato se encuentra en ejecución.

y desarrollo de la obra junto con la documentación técnica.	
4. Llevar una bitácora de obra en el que se registren todos los acontecimientos ocurridos y decisiones adoptadas en la ejecución de los trabajos, así como de las ordenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la vista de funcionarios que tenga que ver con el proyecto, etc.. de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra, Este registro debe encontrarse debidamente foliado y firmado por el director de obra, el residente y el director de interventoría, al cual tendrán acceso cuando así lo requieran los delegados del INDERHUILA.	La bitácora de obra cumple con las condiciones técnicas de acuerdo con la programación detallada de la obra.
5. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación	El contrato se encuentra en ejecución.
6. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato por parte del interventor, el Inderhuila o la comunidad, se originen dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de los mismos.	El contratista dio respuesta oportuna a todos los requerimientos dentro del plazo establecido.
7. Presentar para aprobación por parte del Interventor dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio, los documentos relacionados con el AIU, fiducia o patrimonio autónomo para la correcta inversión o manejo del anticipo, plan de inversión del anticipo y Cronograma de trabajo.	El contrista cumplió con la presentación oportuna de los documentos requeridos para aprobación, dentro del plazo establecido.
8. Asumir el pago de los tributos y los demás gastos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	No se reportaron gastos adicionales asociados a tributos u otros conceptos durante la ejecución del contrato.


En mi calidad de interventor del contrato de obra No. CLPIH383 DE 2023, y con base en la verificación técnica, administrativa y financiera efectuada, certifico que el contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales correspondientes al periodo comprendido entre el 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO 2025 han sido revisadas, verificadas y aprobadas conforme a las especificaciones pactadas en el contrato.

9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

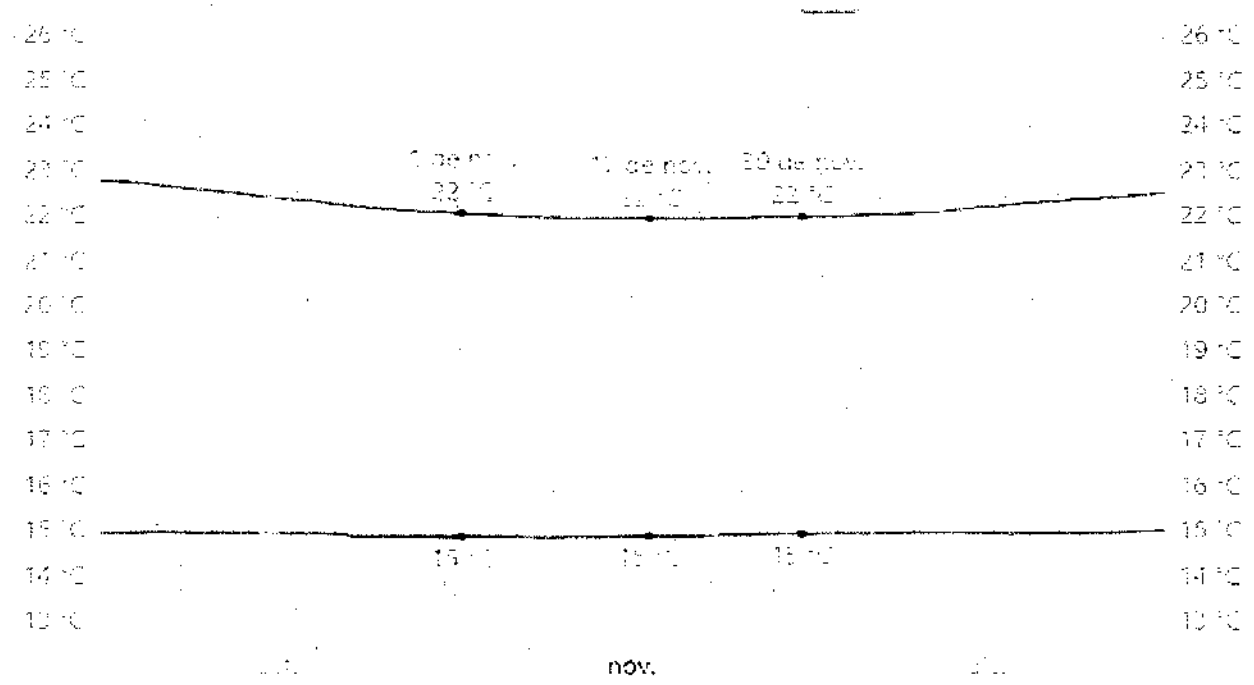


Diciembre 2023

Temperatura máxima y mínima promedio en el invierno en San Agustín

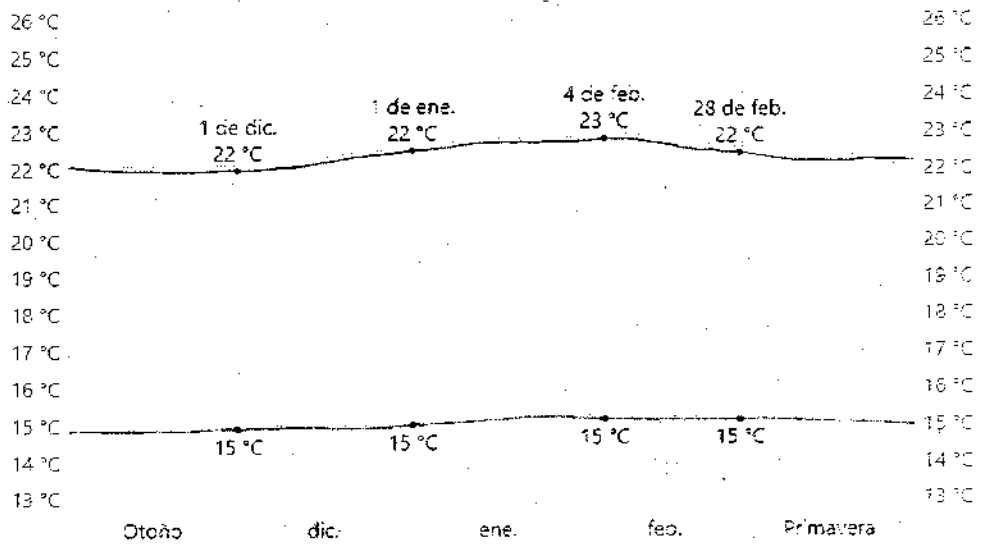

Noviembre 2024


La temperatura máxima y mínima promedio en noviembre en San Agustín

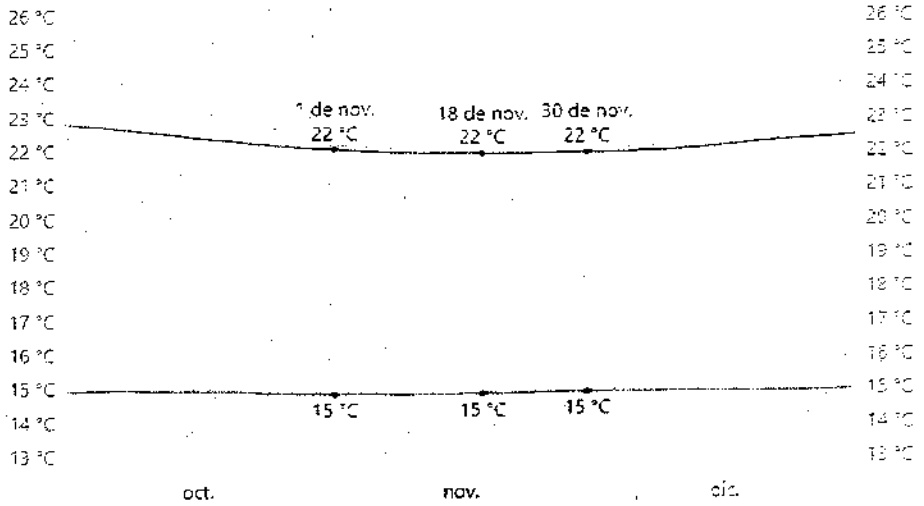

La temperatura máxima (línea roja) y la temperatura mínima (línea azul) promedio diaria con las bandas de los percentiles 25° a 75°, y 10° a 90°. Las líneas delgadas punteadas son las temperaturas promedio percibidas correspondientes.

Diciembre 2024


La temperatura máxima y mínima promedio en diciembre en San Agustín

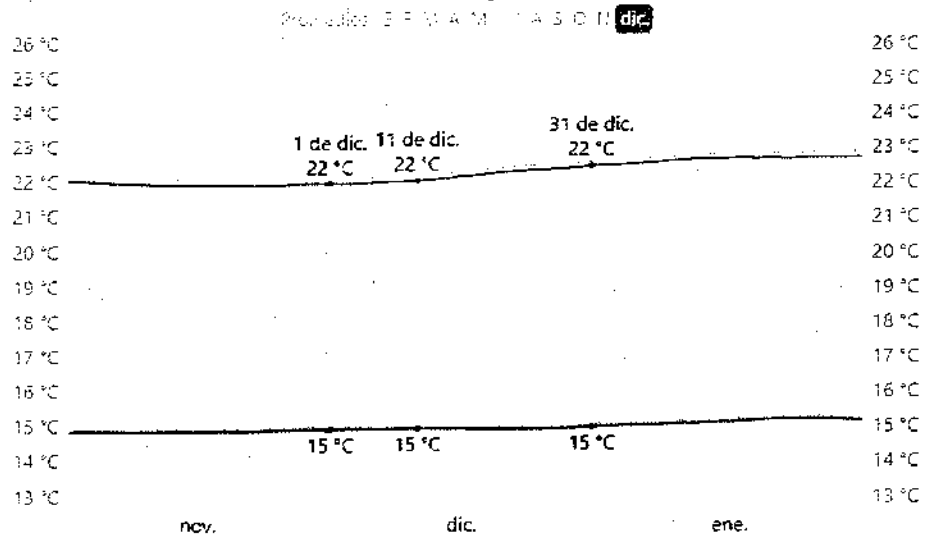

La temperatura máxima (línea roja) y la temperatura mínima (línea azul) promedio diaria con las bandas de los percentiles 25° a 75°, y 10° a 90°. Las líneas delgadas punteadas son las temperaturas promedio percibidas correspondientes.

Enero 2025

La temperatura máxima y mínima promedio en enero en San Agustín

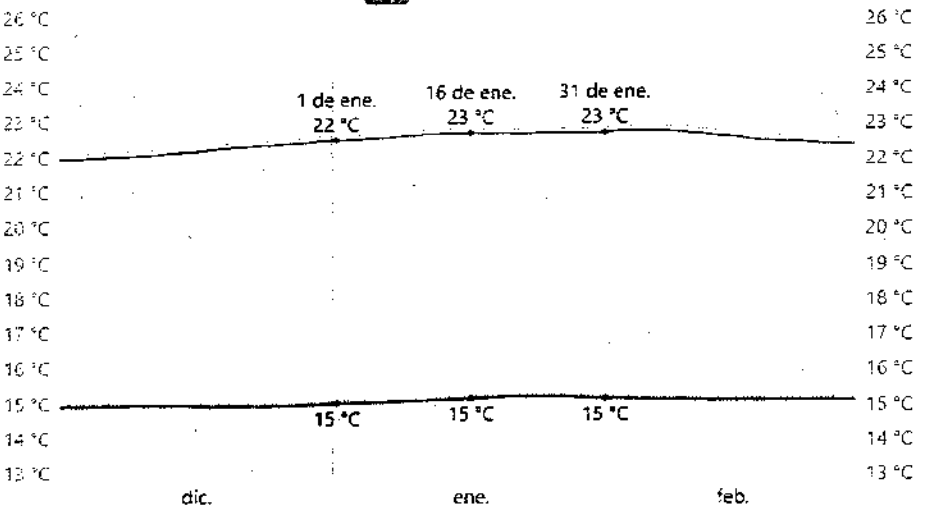

La temperatura máxima (línea roja) y la temperatura mínima (línea azul) promedio diaria con las bandas de los percentiles 25° a 75°, y 10° a 90°. Las líneas delgadas punteadas son las temperaturas promedio percibidas correspondientes.

10. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	2500 PSI y 3000 PSI	
Diseños de mezcla para base.	N/A	
Compresión simple al concreto.	3000 PSI	
Ensayo de compactación de campo	N/A	

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio de INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
CONCRETOS ZAPATAS EJE A3-B2	07/12/2024	14/12/2024	X			2100 PSI	2319 PSI	CUMPLE
		14/12/2024	X			2100 PSI	2294 PSI	
		21/12/2024		X		2700 PSI	2853 PSI	
		21/12/2024		X		2700 PSI	2776 PSI	
		04/01/2025			X	3000 PSI	3407 PSI	
		04/01/2025			X	3000 PSI	3518 PSI	
CONCRETO PEDESTAL EJE A4-B3	10/12/2024	17/12/2024	X			2100 PSI	2190 PSI	CUMPLE
		17/12/2024	X			2100 PSI	2222 PSI	
		24/12/2024		X		2700 PSI	2705 PSI	
		24/12/2024		X		2700 PSI	2774 PSI	
		07/01/2025			X	3000 PSI	3117 PSI	
		24/12/2024			X	3000 PSI	3158 PSI	

CONCRETOS VIGA DE CIMENTACIÓN EJE A	12/12/2024	19/12/2024	X			2100 PSI	2135 PSI	CUMPLE
		19/12/2024	X			2100 PSI	2098 PSI	
		26/12/2024		X		2700 PSI	2742 PSI	
		26/12/2024		X		2700 PSI	2781 PSI	
		09/01/2025			X	3000 PSI	3149 PSI	
		09/01/2025			X	3000 PSI	3217 PSI	
CONCRETOS VIGA DE CIMENTACIÓN EJE B	13/12/2024	20/12/2024	X			2100 PSI	2153 PSI	CUMPLE
		20/12/2024	X			2100 PSI	2201 PSI	
		27/12/2024		X		2700 PSI	2866 PSI	
		27/12/2024		X		2700 PSI	2912 PSI	
		10/01/2025			X	3000 PSI	3302 PSI	
		10/01/2025			X	3000 PSI	3254 PSI	
CONCRETOS COLUMNA EJE A	19/12/2024	26/12/2024	X			2100 PSI	2135 PSI	CUMPLE
		26/12/2024	X			2100 PSI	2214 PSI	
		02/01/2025		X		2700 PSI	2781 PSI	
		02/01/2025		X		2700 PSI	2829 PSI	
		16/01/2025			X	3000 PSI	3162 PSI	
		16/01/2025			X	3000 PSI	3267 PSI	
CONCRETOS COLUMNA EJE B	20/12/2024	27/12/2024	X			2100 PSI	2227 PSI	CUMPLE
		27/12/2024	X			2100 PSI	2242 PSI	
		03/01/2025		X		2700 PSI	2774 PSI	
		03/01/2025		X		2700 PSI	2790 PSI	
		17/01/2025			X	3000 PSI	3296 PSI	
		17/01/2025			X	3000 PSI	3237 PSI	
CONCRETOS VIGA CANAL EJE A	27/12/2024	03/01/2025	X			2100 PSI	2209 PSI	CUMPLE
		03/01/2025	X			2100 PSI	2186 PSI	
		10/01/2025		X		2700 PSI	2744 PSI	
		10/01/2025		X		2700 PSI	2774 PSI	
		24/01/2025			X	3000 PSI	3138 PSI	
		24/01/2025			X	3000 PSI	3149 PSI	
CONCRETOS VIGA CANAL EJE B	10/01/2025	17/01/2025	X			2100 PSI	2238 PSI	CUMPLE
		17/01/2025	X			2100 PSI	2212 PSI	
		24/01/2025		X		2700 PSI	2792 PSI	
		24/01/2025		X		2700 PSI	2763 PSI	

Control Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por el CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
ZAPATAS EJE A	07/12/2024	14/12/2024	X			2100 PSI	2109 PSI	CUMPLE
		21/12/2024		X		2700 PSI	2746 PSI	
		04/01/2025			X	3000 PSI	3124 PSI	
ZAPATAS EJE B	07/12/2024	14/12/2024	X			2100 PSI	2087 PSI	CUMPLE
		21/12/2024		X		2700 PSI	2761 PSI	
		04/01/2025			X	3000 PSI	3087 PSI	
VIGA DE CIMENTACIÓN EJE A	12/12/2024	19/12/2024	X			2100 PSI	2300 PSI	CUMPLE
		26/12/2024		X		2700 PSI	2744 PSI	
		09/01/2025			X	3000 PSI	3094 PSI	
VIGA DE CIMENTACIÓN EJE B	13/12/2024	20/12/2024	X			2100 PSI	2291 PSI	CUMPLE
		27/12/2024		X		2700 PSI	2737 PSI	
		10/01/2025			X	3000 PSI	3113 PSI	
PEDESTAL COLUMNA EJE A	10/12/2024	17/12/2024	X			2100 PSI	2110 PSI	CUMPLE
		24/12/2024		X		2700 PSI	2784 PSI	
		07/01/2025			X	3000 PSI	3114 PSI	
PEDESTAL COLUMNA EJE B	10/12/2024	17/12/2024	X			2100 PSI	2097 PSI	CUMPLE
		24/12/2024		X		2700 PSI	2723 PSI	
		07/01/2025			X	3000 PSI	3060 PSI	
COLUMNA EJE A	19/12/2024	26/12/2024	X			2100 PSI	2291 PSI	CUMPLE
		02/01/2025		X		2700 PSI	2745 PSI	
		16/01/2025			X	3000 PSI	3107 PSI	
COLUMNA EJE B	20/12/2024	27/12/2024	X			2100 PSI	2272 PSI	CUMPLE
		03/01/2025		X		2700 PSI	2719 PSI	
		17/01/2025			X	3000 PSI	3076 PSI	
VIGA CANAL EJE A	27/12/2024	03/01/2025	X			2100 PSI	2258 PSI	CUMPLE
		10/01/2025		X		2700 PSI	2721 PSI	
VIGA CANAL EJE B	10/01/2025	17/01/2025	X			2100 PSI	2273 PSI	CUMPLE

11. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha** (dd/mm/aaaa)	**Valor Acta**	**Amortización**	**Valor pagado**
Valor Anticipo (25%)		**N/A**		**N/A**
Acta Parcial No. 1		$	$	$
Acta Recibo Final No.2		$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 88.657.430,00	$ 12.573.718,00	$101.231.148,00	$	$ 101.231.148,00
CONTRATO DE OBRA				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha** (dd/mm/aaaa)	**Valor Acta**	**Amortización**	**Valor pagado**
Valor Anticipo (25%)	20/12/2024	$ 126.637.424,75		$ 126.637.424,75
ADICION 01	27/12/2024	$ 62.065.242		$
Acta Parcial No. 1	En tramitep	$ 461.971.834,89	$115.492.958,72	$346.478.876,17
Acta Recibo Final No.2		$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 506.549.699	$ 62.065.242	$ 568.614.941	$461.971.834,89	$106.643.106,11

12. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
30-11-2023	INDERHUILA	ACTA DE COMITÉ DE OBRA N 01 (SE ADJUNTA)
29/11/2024	NEIVA	REVISION DE AVANCE DE OBRA, VERIFICACION DE CONDICIONES PARA SUSPENSION DE OBRA.
27/12/2024	INDERHUILA	ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO. 4 PARA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y CREACIÓN DE ÍTEMS NUEVOS Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. CLPIH383 DE 2023, LA CUAL PERMITIÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL OTROSÍ NO. 02.
13/01/2024	OBRA	REVISION DE AVANCE DE OBRA, PROYECCCION PARCIAL 1

13. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 0)	03/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso No. 0)	03/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 1)	22/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso No. 1)	22/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 2)	20/11/2024	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso No. 2)	20/11/2024	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (del 16 de noviembre de 2023 al 21 de diciembre de 2023 y del 12 de noviembre al 20 de enero 2025.)	20/01/2025	S. N	FÍSICO
Actas de comités (periodo del (del 16 de noviembre de 2023 al 21 de diciembre de 2023 y del 12 de noviembre al 20 de enero 2025.)	20/01/2025	S. N	FÍSICO
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del (del 16 de noviembre de 2023 al 21 de diciembre de 2023 y del 12 de noviembre al 20 de enero 2025.)	20/01/2025	S. N	FÍSICO
Registros de ensayos de calidad (periodo del (del 16 de noviembre de 2023 al 21 de diciembre de 2023 y del 12 de noviembre al 20 de enero 2025.)	20/01/2025	S. N	FÍSICO
Registro fotográfico (periodo del (del 16 de noviembre de 2023 al 21 de diciembre de 2023 y del 12 de noviembre al 20 de enero 2025.)	20/01/2025	S. N	FÍSICO

14. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoria)

CONTRATO DE INTERVENTORIA

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
NOVIEMBRE 2023			
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	7.711.430	CONSORCIADO	PRESTACIÓN DE SERVICIO
JOSE WILMER CHILITO	76.320.749	CONSORCIADO	PRESTACIÓN DE SERVICIO
CRISTIAN FABIAN JUNCO AVILA	1.012.354.706	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
JAIME ANDRES CELIS FLORIANO	12.241.491	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
INGRID YOMARA DELGADO RAMOS	1.075.277.887	SECRETARIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
DICIEMBRE 2023			
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	7.711.430	CONSORCIADO	PRESTACIÓN DE SERVICIO
JOSE WILMER CHILITO	76.320.749	CONSORCIADO	PRESTACIÓN DE SERVICIO
CRISTIAN FABIAN JUNCO AVILA	1.012.354.706	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
JAIME ANDRES CELIS FLORIANO	12.241.491	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	7.711.430	CONSORCIADO	PRESTACIÓN DE SERVICIO
NOVIEMBRE 2024			
JOSE WILMER CHILITO	76.320.749	CONSORCIADO	CONTRATO POR OBRA O LABOR
FAIVER EDUARDO POLANIA	7711430	CONSORCIADO Y DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONTRATO POR OBRA O LABOR
JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ	1083886304	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONTRATO POR OBRA O LABOR

INGRID DELGADO	1075277887	SECRETARIA	POR OBRA O LABOR
DICIEMBRE 2024			
JOSE WILMER CHILITO	76.320.749	CONSORCIADO	CONTRATO POR OBRA O LABOR
FAIVER EDUARDO POLANIA	7711430	CONSORCIADO	CONTRATO POR OBRA O LABOR
JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ	1083886304	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONTRATO POR OBRA O LABOR
ENERO 2025			
JOSE WILMER CHILITO	76.320.749	CONSORCIADO	CONTRATO POR OBRA O LABOR
FAIVER EDUARDO POLANIA	7711430	CONSORCIADO	CONTRATO POR OBRA O LABOR
JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ	1083886304	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONTRATO POR OBRA O LABOR

15. RELACIÓN DE PAGOS (OBRA)

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
Anticipo	S.N	27/11/2025

16. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
NOVIEMBRE 2023							
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	516.400	403.500	16.900	N/A	N/A	7907135823 7908240442	06/12/2023 14/12/2023
JOSE WILMER CHILITO	185.600	145.000	80.800	N/A	N/A	945943094	30/01/2024
CRISTIAN FABIAN JUNCO AVILA	220.000	55.000	95.700	55.000	N/A	1066183901	20/02/2024
YINA CARIME POLANIA LEIVA	120.000	30.000	52.200	30.000	N/A	1066183901	20/02/2024
INGRID YOMARA DELGADO RAMOS	185.600	46.400	6.100	46.400	N/A	4528232357	24/11/2023

DICIEMBRE 2023							
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	185.600	145.000	28.300	N/A	N/A	7907245981 7920151961	06/02/2024 21/03/2024
JOSE WILMER CHILITO	185.600	145.000	80.800	N/A	N/A	9460969549	29/01/2024
CRISTIAN FABIAN JUNCO AVILA	381.400	95.400	165.900	95.000	N/A	1066184523	20/02/2024
YINA CARIME POLANIA LEIVA	252.000	63.000	109.700	63.000	N/A	1066184523	20/02/2024
INGRID YOMARA DELGADO RAMOS	185.600	46.400	6.100	46.400	N/A	7916968501	28/02/2024
NOVIEMBRE 2024							
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	$562.900	$439.800	$85.700	N/A	N/A	7952398177	07/12/2024
JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ	$224.000	$175.000	$34.200	N/A	N/A	9477420769	10/12/2024
INGRID DELGADO	$208000	$52000	$6800	$52000	N/A	7952398150	08/12/2024
DICIEMBRE 2024							
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	$562.900	$439.800	$85.700	N/A	N/A	7960837716	07/01/2025
JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ	$224.000	$175.000	$34.200	N/A	N/A	9480271962	14/01/2025
ENERO 2025							
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	$562.900	$439.800	$85.700	N/A	N/A	7960848319	07/02/2025
JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ	$227.800	$178.000	$34.700	N/A	N/A	941044995	30/01/2025

17. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

LEGALIZACION DEL CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010096	0	09/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	0	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	09/11/2023	09/02/2024

POLIZA ANULADA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	1	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Calidad del Servicio	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	1	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	09/11/2023	09/02/2024

PÓLIZA ACTUALIZADA – INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	2	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	16/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	16/02/2027
				Calidad del Servicio	16/02/2024	16/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	2	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	16/11/2023	16/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010098	3	28/09/2024	Cumplimiento del contrato	17/09/2024	17/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/09/2024	17/11/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2024	17/11/2029

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	3	28/09/2024	16/11/2023	17/11/2024

Póliza actualizada X OTROSI 1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010098	4	28/09/2024	Cumplimiento del contrato	17/09/2024	17/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/09/2024	17/11/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2024	17/11/2029

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	4	28/09/2024	16/11/2023	17/11/2024

Póliza actualizada x OTROSI 2:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010098	5	02/12/2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	07/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	07/12/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07/11/2024	07/12/2029

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	5	02/12/2024	16/11/2023	07/12/2024

Póliza actualizada x OTROSI 3:


PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010898	6	18/12/2024	Cumplimiento del contrato	02/12/2024	07/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	02/12/2024	07/01/2028
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07/01/2025	07/01/2030
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	6	18/12/2024	16/11/2023	07/01/2025	


Póliza actualizada x OTROSI 4:


PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010898	7	22/01/2025	Cumplimiento del contrato	27/12/2024	10/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	27/12/2024	10/12/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/02/2025	10/02/2030
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	7	22/01/2025	16/11/2023	10/02/2025	

18. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (Describir el contenido del plano)	19. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Vista de obra e instalación de valla

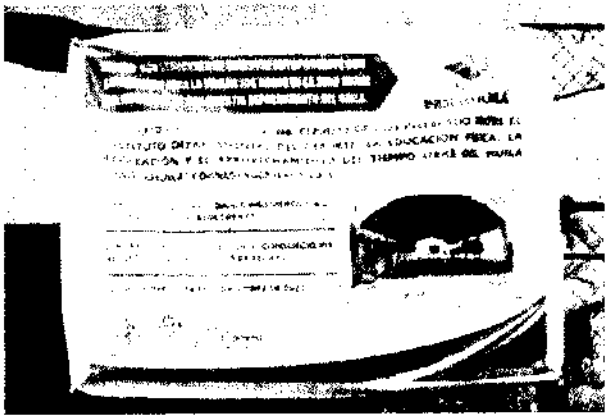

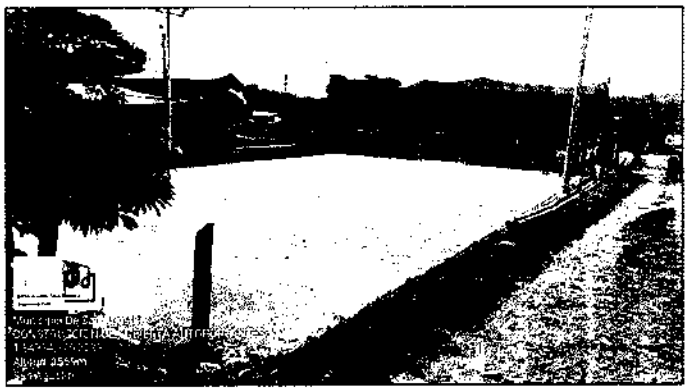

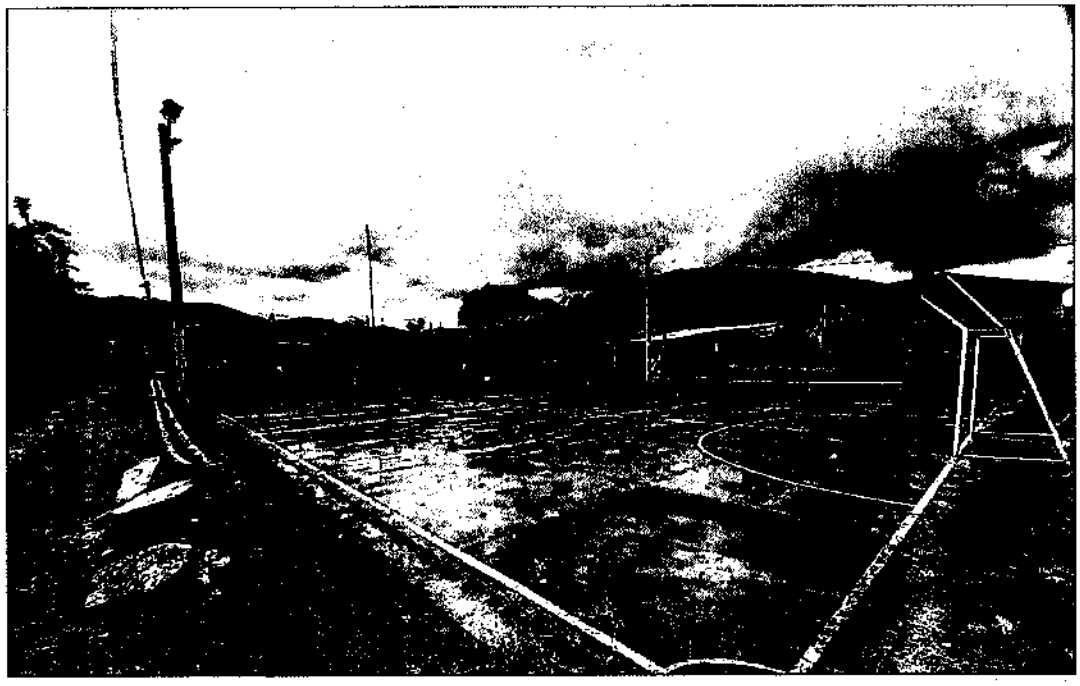



Concertación y socialización de obra, Elección de Veeduría Ciudadana




PRELIMINARES

Localización y replanteo

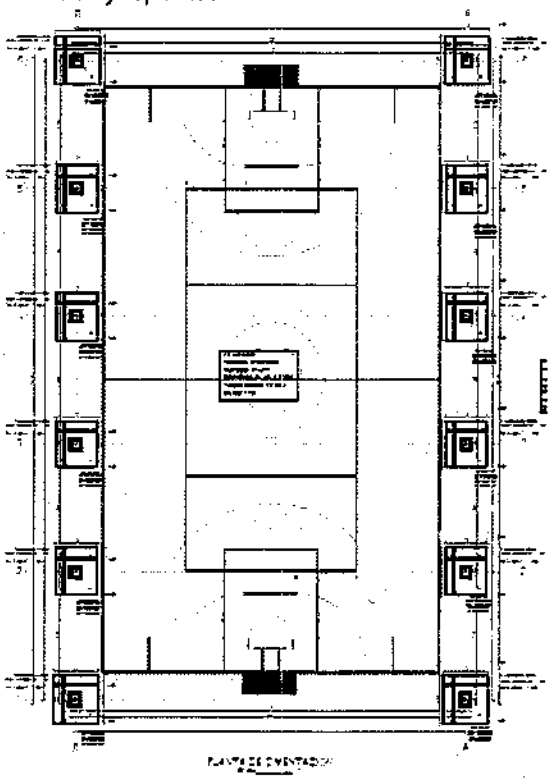

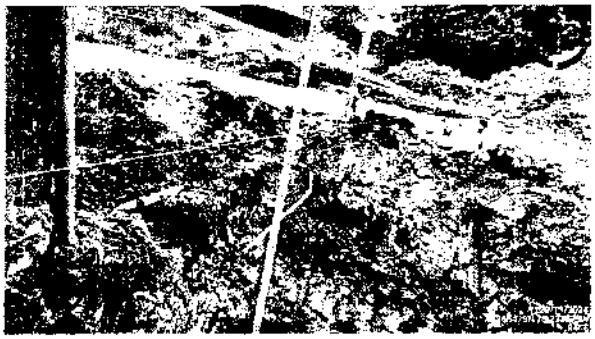



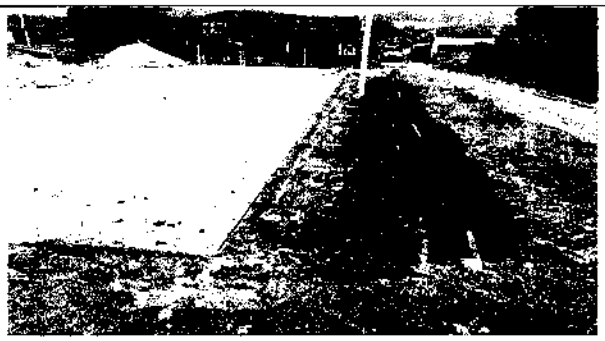


Terminación Excavación manual donde se encontraba la roca (punto B2)








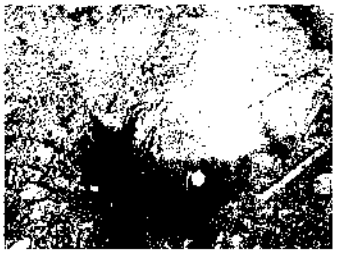

Excavación manual para construcción de cimentación

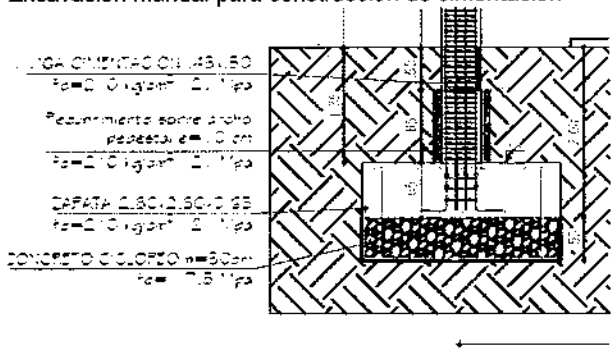





Excavación para vigas de cimentación	   
Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente, para la cimentación	 




CIMENTACIÓN


Construcción de zapatas (aceros y concreto ciclópeo)

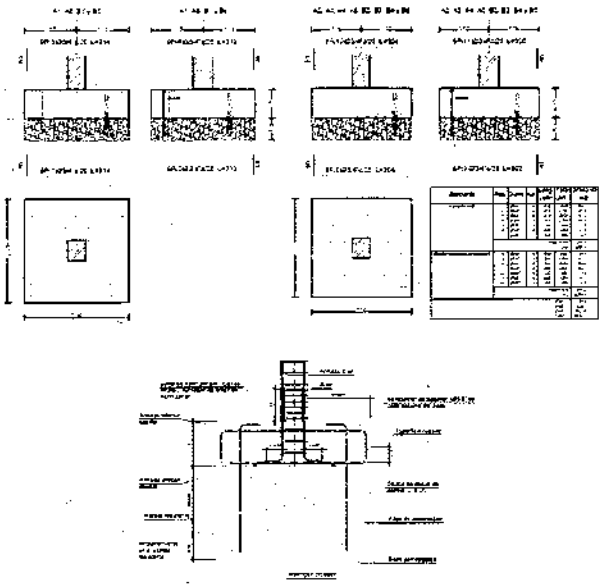


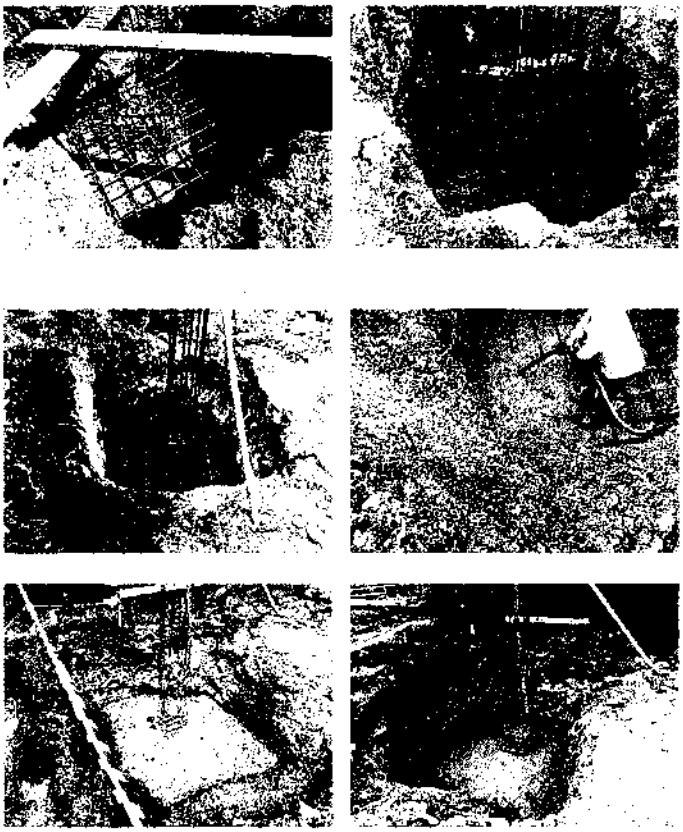

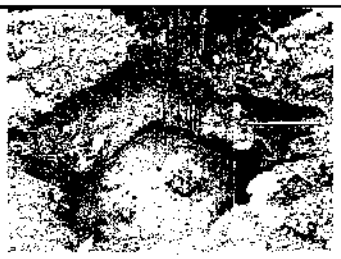




Construcción de pedestales (acero y concreto)

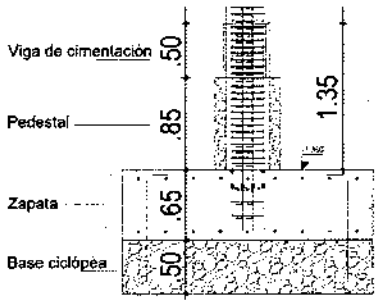

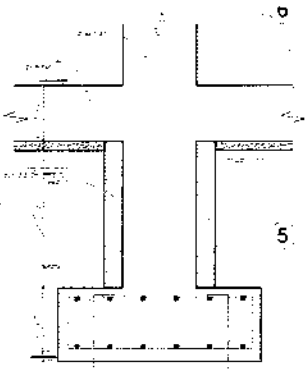




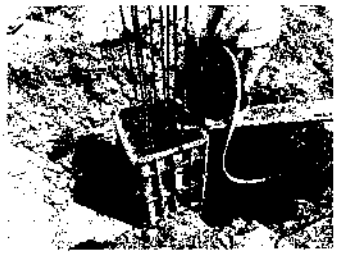




Solado de limpieza para vigas de cimentación




Construcción viga de cimentación (aceros y concreto)

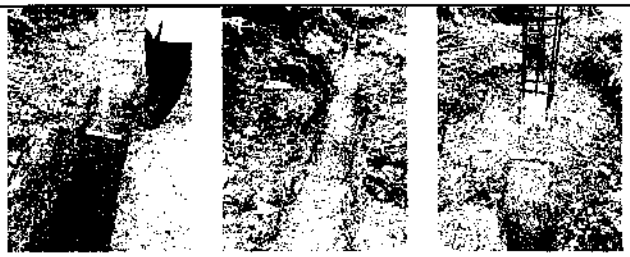

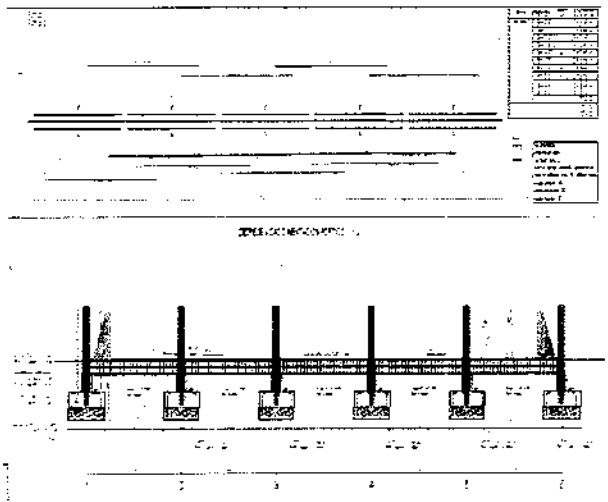


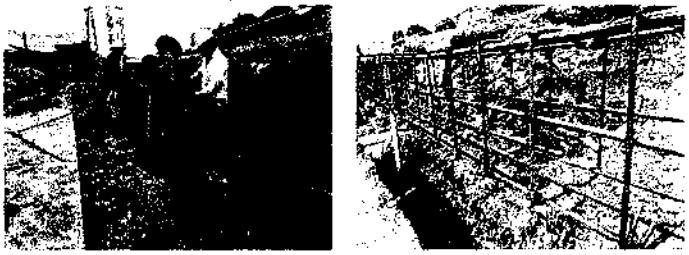




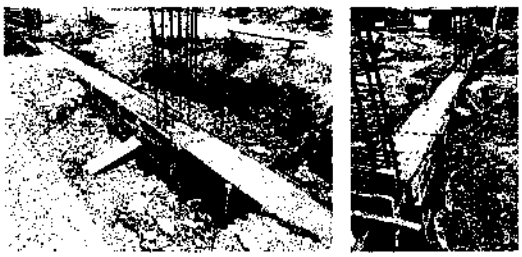

Construcción de columnas en concreto (aceros y concreto)

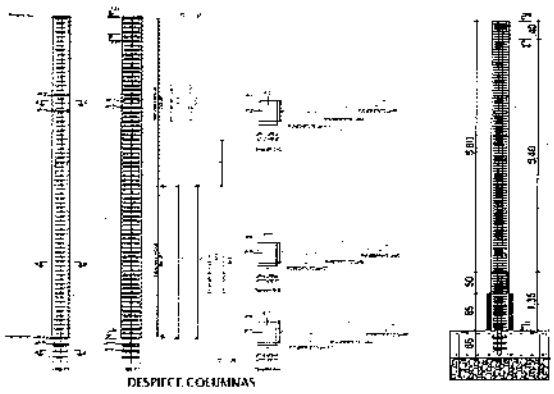


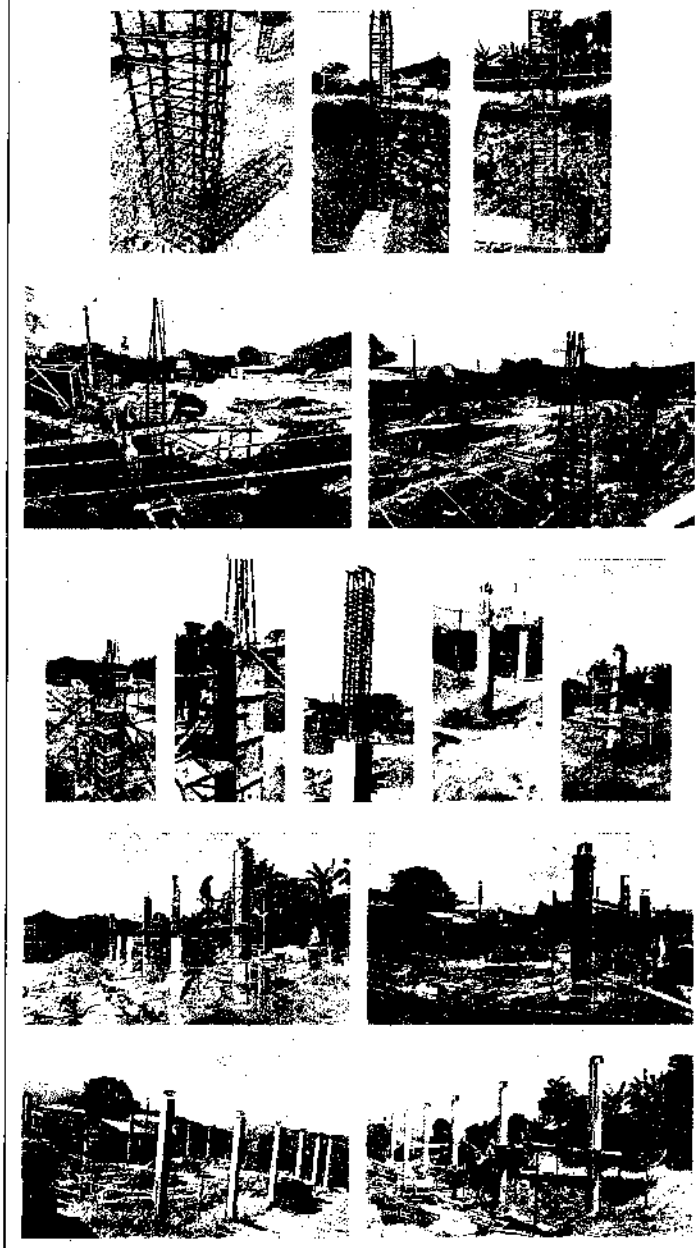



Construcción de vigas canal Eje A (aceros y concreto)













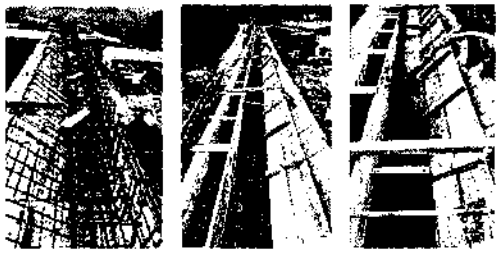

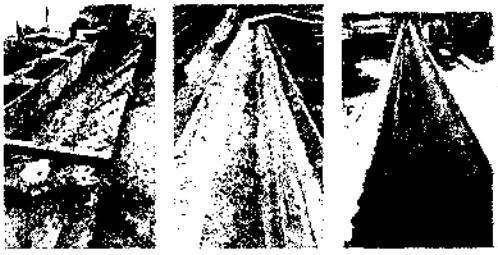





INSTALACIONES ELÉCTRICAS


Desmonte de Postes de iluminación



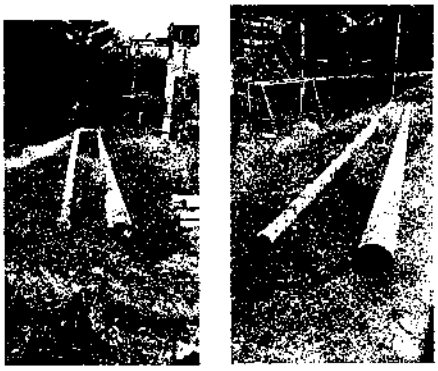

Transporte de materiales

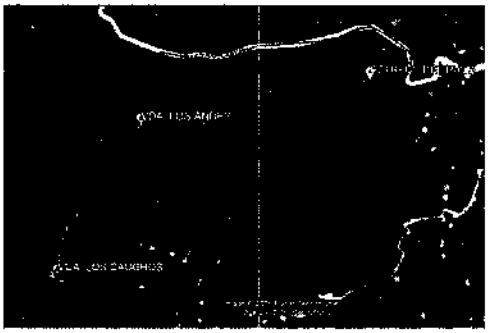

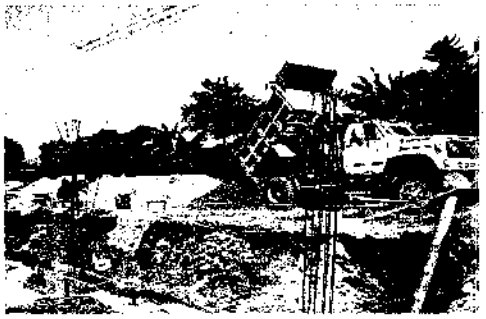







20. DIAGRAMA Y AVANCE DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ NO. 02						OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	VR/UNIT	CANT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
1									
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES								
1.01	Localización y replanteo.	M2	$ 3,549.00	733.21	$ 2,602,162.29	733.21	$ 2,602,162.29	733.21	$ 2,602,162.29
1.02	Demolición cuneta existente	ML	$ 7,544.00	60.80	$ 458,675.20				
1.03	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	$ 26,210.00	27.97	$ 733,093.70				
1.04	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	$ 20,804.00	0.00	$ 0.00				
1.05	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	$ 116,413.00	2.00	$ 232,826.00	2.00	$ 232,826.00	2.00	$ 232,826.00
1.06	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	$ 45,880.00	280.23	$ 12,856,952.40	280.23	$ 12,856,952.40	280.23	$ 12,856,952.40
1.07	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	$ 83,626.00	102.30	$ 8,554,939.80	102.30	$ 8,554,939.80	102.30	$ 8,554,939.80
Subtotal					$ 25,438,649.10		$ 24,246,880.49		$ 24,246,880.49
2									
2.1	CIMENTACIÓN								
2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	$ 33,922.00	21.60	$ 732,715.20	21.60	$ 732,715.20	21.60	$ 732,715.20
2.02	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zoga	M3	$ 359,045.00	29.94	$ 10,749,807.30	29.94	$ 10,749,807.30	29.94	$ 10,749,807.30
2.03	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	$ 617,415.00	38.92	$ 24,029,791.80	38.92	$ 24,029,791.80	38.92	$ 24,029,791.80

2.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	$ 7,097.00	2,789.00	$ 19,793,533.00	2,789.00	$ 19,793,533.00	2,789.00	$ 19,793,533.00
2.05	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	$ 740,066.00	11.20	$ 8,288,739.20	11.20	$ 8,288,739.20	11.20	$ 8,288,739.20
2.06	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	$ 7,097.00	1,029.20	$ 7,304,232.40	1,029.20	$ 7,304,232.40	1,029.20	$ 7,304,232.40
Subtotal					**$ 70,898,818.90**		**$ 70,898,818.90**		**$ 70,898,818.90**
3									
3.1	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**								
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	$ 918,378.00	16.72	$ 15,355,280.16	16.72	$ 15,355,280.16	16.72	$ 15,355,280.16
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	$ 7,097.00	2,955.17	$ 20,972,841.49	2,955.17	$ 20,972,841.49	2,955.17	$ 20,972,841.49
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	$ 1,002,201.00	16.37	$ 16,406,030.37	16.37	$ 16,406,030.37	16.37	$ 16,406,030.37
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	$ 7,097.00	2,096.44	$ 14,878,434.68	2,096.44	$ 14,878,434.68	2,096.44	$ 14,878,434.68
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	$ 40,240.00	60.80	$ 2,446,592.00	60.80	$ 2,446,592.00	60.80	$ 2,446,592.00
Subtotal					**$ 70,059,178.70**		**$ 70,059,178.70**		**$ 70,059,178.70**
4									
4.1	**CUBIERTA**								
4.01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 20, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	$ 285,939.00	690.38	$ 197,406,566.82	690.38	$ 197,406,566.82	690.38	$ 197,406,566.82
Subtotal					**$ 197,406,566.82**		**$ 197,406,566.82**		**$ 197,406,566.82**
5									
5.1	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**								

5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	$ 14,758.00	317.78	$ 4,689,797.24				
5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	$ 3,700,895.00	2.00	$ 7,401,790.00				
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	$ 84,509.00	27.97	$ 2,363,547.71				
5.04	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	$ 83,629.00	62.80	$ 5,251,901.20				
NP-5.05	Rejillas prefabricadas para cunetas.	ML	$ 159,779.00	60.80	$ 9,714,563.20				
Subtotal					**$ 29,421,599.35**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
6									
6.1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**								
6.01	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	$ 79,932.00	63.20	$ 5,051,702.40				
6.02	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	$ 106,806.00	20.60	$ 2,200,203.60				
6.03	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	$ 218,470.00	30.00	$ 6,554,100.00				
6.04	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	$ 349,057.00	2.00	$ 698,114.00				
Subtotal					**$ 14,504,120.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
7									

7.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**								
7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UND	$ 292,572.00	3.00	$ 877,716.00	3.00	$ 877,716.00	3.00	$ 877,716.00
7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	$ 637,202.00	3.00	$ 1,911,606.00				
7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	$ 45,880.00	5.12	$ 234,905.60				
7.04	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	$ 49,210.00	32.00	$ 1,574,720.00				
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	$ 303,693.00	2.00	$ 607,386.00				
7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	$ 281,525.00	2.00	$ 563,050.00				
7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	$ 1,014,120.00	1.00	$ 1,014,120.00				
7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	$ 4,688,701.00	1.00	$ 4,688,701.00				
7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	$ 88,300.00	35.00	$ 3,090,500.00				
7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	$ 367,987.00	12.00	$ 4,415,844.00				
7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	$ 57,998.00	102.80	$ 5,962,194.40				
7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	$ 1,016,078.00	12.00	$ 12,192,936.00				
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	$ 972,420.00	1.00	$ 972,420.00				

7.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	$ 1,032,612.00	1.00	$ 1,032,612.00				
NP-7.15	Reubicación de postes eléctricos en concreto	UND	$ 968,000.00	2.00	$ 1,936,000.00				
Subtotal					**$ 41,074,711.00**		**$ 877,716.00**		**$ 877,716.00**
8									
8.1	**TRANSPORTE**								
8.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	$ 1,150.00	5,294.18	$ 6,088,307.00	5,294.18	$ 6,088,307.00	5,294.18	$ 6,088,307.00
Subtotal					**$ 6,088,307.00**		**$ 6,088,307.00**		**$ 6,088,307.00**
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 454,891,951.00**		**$ 369,577,467,91**		**$ 369,577,467,91**
	Administración	20%			$ 90,978,390.00		$ 73,915,493,58		$ 73,915,493,58
	Imprevistos	1%			$ 4,548,920.00		$ 3,695,774,68		$ 3,695,774,68
	Utilidad	4%			$ 18,195,678.00		$ 14,783,098,72		$ 14,783,098,72
	VALOR TOTAL				**$ 568,614,941.00**		**$ 461,971,834,89**		**$ 461,971,834,89**

	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	**25%**			**$ 115.492.958,72**		**$ 115.492.958,72**
	VALOR TOTAL MENOS (-) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO				**$ 346.478.876,17**		**$ 346.478.876,17**
	% AVANCE DE OBRA				**81.24511010474840%**		**81.24511010474840%**

CONSORCIO WF
ING.JAVIER HUMBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DANES INGENIEROS SAS
ING. NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA
DIRECTOR DE OBRA

21. ANEXOS

- RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO.
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA INTERVENTORIA REALIZADO POR EL APOYO A AL SUPERVISION (Vo.Bo. Apoyo Supervisión).

ING. FAVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	30-01-2025	**ARQ. JUAN FELIPE ALARCÓN QUIROGA**
FIRMA ORIGINAL **CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	FECHA DE ENTREGA	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo APOYO A LA SUPERVISIÓN**

AOLAB INGENIERIAS SAS-ORDEN DE SERVICIO

AOLAB INGENIERIAS SAS
calle 76 # 1ª bis -33
puertas del edén
Neiv-Huila
3115955822
ingenieriadesuelosaolab@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO 08-1224

NOMBRE DEL CLIENTE	CONSORCIO W F	**NÚMERO DE PEDIDO**	08-1224
TELÉFONO DEL CLIENTE	316 5373582	**ID DE CLIENTE**	901769619-8
CORREO ELECTRÓNICO DEL	consorciowf23@gmail.com	**PEDIDO RECIBIDO POR**	AOLAB INGENIERIAS SAS

TRABAJO DESCRIPCIÓN	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA
COMENTARIOS ADICIONALES	MUESTRAS DE CONCRETO-MUNICIPIO SAN AGUSTIN -LOS ANDES

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y LA MANO DE OBRA	Ingreso de muestras	fechas de fundicion	resistencia (psi)
CONCRETOS ZAPATAS A3-B2	12/12/2024	7/12/2024	3000
CONCRETOS PEDESTAL A4-B3	15/12/2024	10/12/2024	3000
CONCRETO VIGA CIMENTACIÓN EJE A	17/12/2024	12/12/2024	3000
CONCRETO VIGA CIMENTACIÓN EJE B	18/12/2024	13/12/2024	3000
CONCRETO COLUMNAS EJE A	24/12/2024	19/12/2024	3000
CONCRETO COLUMNAS EJE B	25/12/2024	20/12/2024	3000
CONCRETO VIGA CANAL EJE A	1/01/2025	27/12/2024	3000
CONCRETO VIGA CANAL EJE B	11/01/2025	10/01/2025	3000

Cordialmente

AOLAB INGENIERÍA DE LABORATORIO

COORDINADOR DE LABORATORIO

AOLAB INGENIERIAS SAS

INFORME DEL ENSAYO COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS

CLIENTE:

CONSORCIO WF

PROYECTO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA".

LOCALIZACION:

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES – DEPARTAMENTO DEL HUILA

DICIEMBRE DEL 2024

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1º bis -33 puertas del edén /3115955822

AOLAB INGENIERIAS SAS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA	CONSORCIO WF
PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES
FECHA EMISION INFORME	DICIEMBRE DEL 2024

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	%de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
12/12/2024	07/12/2024	1	10,00	20,00	125,6	7	14/12/2024	2319	77%	2	3000	CONCRETOS ZAPATAS A3-B2
	07/12/2024		10,00	20,00	124,2	7	14/12/2024	2294	76%	4	3000	
	07/12/2024		10,00	20,00	154,5	14	21/12/2024	2853	95%	3	3000	
	07/12/2024		10,00	20,00	150,3	14	21/12/2024	2776	93%	5	3000	
	07/12/2024		10,00	20,00		28	04/01/2025	0	0%		3000	
	07/12/2024		10,00	20,00		28	04/01/2025	0	0%		3000	

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1º bis -33 puertas del edén /3115955822

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA	CONSORCIO WF
PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES
FECHA EMISION INFORME:	DICIEMBRE DEL 2024

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Días)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	%de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
17/12/2024	12/12/2024	3	10,00	20,00	115,6	7	19/12/2024	2135	71%	4	3000	CONCRETOS VIGA CIMENTACION EJE A
	12/12/2024		10,00	20,00	113,6	7	19/12/2024	2098	70%	5	3000	
	12/12/2024		10,00	20,00	148,5	14	26/12/2024	2742	91%	4	3000	
	12/12/2024		10,00	20,00	150,6	14	26/12/2024	2781	93%	4	3000	
	12/12/2024		10,00	20,00		28	09/01/2025	0	0%		3000	
	12/12/2024		10,00	20,00		28	09/01/2025	0	0%		3000	

AOLAB INGENIERIAS SAS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA	CONSORCIO WF
PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES
FECHA EMISION INFORME:	DICIEMBRE DEL 2024

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	%de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
15/12/2024	10/12/2024	2	10,00	20,00	118,6	7	17/12/2024	2190	73%	4	3000	CONCRETOS PEDESTAL A4-B3
	10/12/2024		10,00	20,00	120,3	7	17/12/2024	2222	74%	4	3000	
	10/12/2024		10,00	20,00	146,5	14	24/12/2024	2705	90%	4	3000	
	10/12/2024		10,00	20,00	150,2	14	24/12/2024	2774	92%	5	3000	
	10/12/2024		10,00	20,00		28	07/01/2025	0	0%		3000	
	10/12/2024		10,00	20,00		28	07/01/2025	0	0%		3000	

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1ª bis -33 puertas del edén /3115955822

AOLAB INGENIERIAS SAS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA CONSORCIO WF


PROYECTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA

UBICACIÓN MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES

FECHA EMISION INFORME: DICIEMBRE DEL 2024

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	%de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
25/12/2024	20/12/2024	6	10,00	20,00	120,6	7	27/12/2024	2227	74%	4	3000	CONCRETOS COLUMNAS EJE B
	20/12/2024		10,00	20,00	121,4	7	27/12/2024	2242	75%	5	3000	
	20/12/2024		10,00	20,00		14	03/01/2025	0	0%		3000	
	20/12/2024		10,00	20,00		14	03/01/2025	0	0%		3000	
	20/12/2024		10,00	20,00		28	17/01/2025	0	0%		3000	
	20/12/2024		10,00	20,00		28	17/01/2025	0	0%		3000	

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS HAN SIDO TOMADAS POR EL CLIENTE Y TRANSPORTADAS POR LABORATORIO. EL COMPORTAMIENTO PARA UN CONCRETO CONVENCIONAL (SIN ADITIVO) SERA: A LOS 1d= 15% 3d= 40% 7d= 70% 14d= 90% 28d= 100% CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%

CALCULO
JEFE DE LABORATORIO

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1º bis -33 puertas del edén /3115955822

AOLAB INGENIERIAS SAS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA CONSORCIO WF

PROYECTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA

UBICACIÓN MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES

FECHA EMISION INFORME DICIEMBRE DEL 2024

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
18/12/2024	13/12/2024	4	10,00	20,00	116,6	7	20/12/2024	2153	72%	4	3000	CONCRETOS VIGA CIMENTACION EJE B
	13/12/2024		10,00	20,00	119,2	7	20/12/2024	2201	73%	5	3000	
	13/12/2024		10,00	20,00	155,2	14	27/12/2024	2866	96%	4	3000	
	13/12/2024		10,00	20,00	157,7	14	27/12/2024	2912	97%	5	3000	
	13/12/2024		10,00	20,00		28	10/01/2025	0	0%		3000	
	13/12/2024		10,00	20,00		28	10/01/2025	0	0%		3000	

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1º bis -33 puertas del edén /3115955822

AOLAB INGENIERIAS SAS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA	CONSORCIO WF
PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES
FECHA EMISION INFORME	DICIEMBRE DEL 2024

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	%de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
24/12/2024	19/12/2024	5	10,00	20,00	115,6	7	26/12/2024	2135	71%	5	3000	CONCRETOS COLUMNAS EJE A
	19/12/2024		10,00	20,00	119,9	7	26/12/2024	2214	74%	5	3000	
	19/12/2024		10,00	20,00		14	02/01/2025	0	0%		3000	
	19/12/2024		10,00	20,00		14	02/01/2025	0	0%		3000	
	19/12/2024		10,00	20,00		28	16/01/2025	0	0%		3000	
	19/12/2024		10,00	20,00		28	16/01/2025	0	0%		3000	

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0][1] Inscripción

4. Número de formulario 14972266463

(415)7707212489984(8020) 000001497226646 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 7 7 9 0	6	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
AOLAB INGENIERIA SAS BIC

36. Nombre comercial	37. Sig.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 76 1 A 33

42. Correo electrónico INGENIERIADESUELOSAOLAB@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 6 9 9 5 7 0 3	3 1 1 5 9 5 5 8 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 1 0 5	7 1 2 0	2 0 2 4 0 1 0 5	4 2 1 0	4 2 9 0		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	1	4	4	2	4	7	4	8	5	5																

14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 15 / 07 : 07: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PERAFAN ORDOÑEZ OSCAR ESTEBAN
985. Cargo REPRESENTANTE

Fecha generación documento PDF: 20-05-2024 04:17:41PM

DOCUMENTO ELECTRÓNICO CERTIFICADO SIN COSTO

INFORME DEL ENSAYO COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS

CLIENTE:

CONSORCIO WF

PROYECTO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA".

LOCALIZACION:

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES – DEPARTAMENTO DEL HUILA

ENERO DEL 2025

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1º bis -33 puertas del edén /3115955822

AOLAB INGENIERIAS SAS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA CONSORCIO WF

PROYECTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA

UBICACIÓN MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES

FECHA EMISION INFORME: ENERO DEL 2025

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	%de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
12/12/2024	07/12/2024	1	10,00	20,00	125,6	7	14/12/2024	2319	77%	2	3000	CONCRETOS ZAPATAS A3-B2
	07/12/2024		10,00	20,00	124,2	7	14/12/2024	2294	76%	4	3000	
	07/12/2024		10,00	20,00	154,5	14	21/12/2024	2853	95%	3	3000	
	07/12/2024		10,00	20,00	150,3	14	21/12/2024	2776	93%	5	3000	
	07/12/2024		10,00	20,00	184,5	28	04/01/2025	3407	114%	5	3000	
	07/12/2024		10,00	20,00	190,5	28	04/01/2025	3518	117%	3	3000	

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1º bis -33 puertas del edén /3115955822

AOLAB INGENIERIAS SAS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA	CONSORCIO WF
PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES
FECHA EMISION INFORME	ENERO DEL 2025

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Días)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	%de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
17/12/2024	12/12/2024	3	10,00	20,00	115,6	7	19/12/2024	2135	71%	4	3000	CONCRETOS VIGA CIMENTACION EJE A
	12/12/2024		10,00	20,00	113,6	7	19/12/2024	2098	70%	5	3000	
	12/12/2024		10,00	20,00	148,5	14	26/12/2024	2742	91%	4	3000	
	12/12/2024		10,00	20,00	150,6	14	26/12/2024	2781	93%	4	3000	
	12/12/2024		10,00	20,00	170,5	28	09/01/2025	3149	105%	5	3000	
	12/12/2024		10,00	20,00	174,2	28	09/01/2025	3217	107%	4	3000	

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1º bis -33 puertas del edén /3115955822

AOLAB INGENIERIAS SAS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA	CONSORCIO WF
PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES
FECHA EMISION INFORME	ENERO DEL 2025

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
15/12/2024	10/12/2024	2	10,00	20,00	118,6	7	17/12/2024	2190	73%	4	3000	CONCRETOS PEDESTAL A4-B3
	10/12/2024		10,00	20,00	120,3	7	17/12/2024	2222	74%	4	3000	
	10/12/2024		10,00	20,00	146,5	14	24/12/2024	2705	90%	4	3000	
	10/12/2024		10,00	20,00	150,2	14	24/12/2024	2774	92%	5	3000	
	10/12/2024		10,00	20,00	168,8	28	07/01/2025	3117	104%	4	3000	
	10/12/2024		10,00	20,00	171,0	28	07/01/2025	3158	105%	4	3000	

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1º bis -33 puertas del edén /3115955822

AOLAB INGENIERIAS SAS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA CONSORCIO WF

PROYECTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA

UBICACIÓN MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES

FECHA EMISION INFORME: ENERO DEL 2025

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Días)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
18/12/2024	13/12/2024	4	10,00	20,00	116,6	7	20/12/2024	2153	72%	4	3000	CONCRETOS VIGA CIMENTACION EJE B
	13/12/2024		10,00	20,00	119,2	7	20/12/2024	2201	73%	5	3000	
	13/12/2024		10,00	20,00	155,2	14	27/12/2024	2866	96%	4	3000	
	13/12/2024		10,00	20,00	157,7	14	27/12/2024	2912	97%	5	3000	
	13/12/2024		10,00	20,00	178,8	28	10/01/2025	3302	110%	5	3000	
	13/12/2024		10,00	20,00	176,2	28	10/01/2025	3254	108%	4	3000	

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1º bis -33 puertas del edén /3115955822

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA	CONSORCIO WF
PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES
FECHA EMISION INFORME:	ENERO DEL 2025

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	%de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
24/12/2024	19/12/2024	5	10,00	20,00	115,6	7	26/12/2024	2135	71%	5	3000	CONCRETOS COLUMNAS EJE A
	19/12/2024		10,00	20,00	119,9	7	26/12/2024	2214	74%	5	3000	
	19/12/2024		10,00	20,00	150,6	14	02/01/2025	2781	93%	3	3000	
	19/12/2024		10,00	20,00	153,2	14	02/01/2025	2829	94%	3	3000	
	19/12/2024		10,00	20,00	171,2	28	16/01/2025	3162	105%	5	3000	
	19/12/2024		10,00	20,00	176,9	28	16/01/2025	3267	109%	4	3000	

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA	CONSORCIO WF
PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES
FECHA EMISION INFORME	ENERO DEL 2025

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	%de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
25/12/2024	20/12/2024	6	10,00	20,00	120,6	7	27/12/2024	2227	74%	4	3000	CONCRETOS COLUMNAS EJE B
	20/12/2024		10,00	20,00	121,4	7	27/12/2024	2242	75%	5	3000	
	20/12/2024		10,00	20,00	150,2	14	03/01/2025	2774	92%	4	3000	
	20/12/2024		10,00	20,00	151,1	14	03/01/2025	2790	93%	5	3000	
	20/12/2024		10,00	20,00	178,5	28	17/01/2025	3296	110%	4	3000	
	20/12/2024		10,00	20,00	175,3	28	17/01/2025	3237	108%	3	3000	

AOLAB INGENIERIAS SAS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA CONSORCIO WF


PROYECTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA

UBICACIÓN MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES

FECHA EMISION INFORME: ENERO DEL 2025

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Días)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	%de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
01/01/2025	27/12/2024	7	10,00	20,00	119,6	7	03/01/2025	2209	74%	3	3000	CONCRETOS VIGA CANAL EJE A
	27/12/2024		10,00	20,00	118,4	7	03/01/2025	2186	73%	5	3000	
	27/12/2024		10,00	20,00	148,6	14	10/01/2025	2744	91%	4	3000	
	27/12/2024		10,00	20,00	150,2	14	10/01/2025	2774	92%	5	3000	
	27/12/2024		10,00	20,00	169,9	28	24/01/2025	3138	105%	4	3000	
	27/12/2024		10,00	20,00	170,5	28	24/01/2025	3149	105%	4	3000	

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS HAN SIDO TOMADAS POR EL CLIENTE Y TRANSPORTADAS POR LABORATORIO. EL COMPORTAMIENTO PARA UN CONCRETO CONVENCIONAL (SIN ADITIVO) SERA: A LOS 1d= 15%; 3d= 40%; 7d= 70%; 14d= 90%; 28d= 100% CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%

CALCULO
JEFE DE LABORATORIO

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1ª bis -33 puertas del edén /3115955822

AOLAB INGENIERIAS SAS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA	CONSORCIO WF
PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES
FECHA EMISION INFORME	ENERO DEL 2025

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	%de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
11/01/2025	10/01/2025	1	10,00	20,00	121,2	7	17/01/2025	2238	75%	3	3000	CONCRETOS VIGA CANAL EJE B
	10/01/2025		10,00	20,00	119,8	7	17/01/2025	2212	74%	4	3000	
	10/01/2025		10,00	20,00	151,2	14	24/01/2025	2792	93%	4	3000	
	10/01/2025		10,00	20,00	149,6	14	24/01/2025	2763	92%	3	3000	
	10/01/2025		10,00	20,00		28	07/02/2025	0	0%		3000	
	10/01/2025		10,00	20,00		28	07/02/2025	0	0%		3000	

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1º bis -33 puertas del edén /3115955822

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELEFONO:	8888020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	79052404442	TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	339574117
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	79071258623	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA	2023/12/06

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:										$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16.900	$ 16.900	$ 100	$ 0	$ 17.000
SUBTOTALES:									$ 16.900	$ 100	$ 0	$ 17.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			RAVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 607	TELÉFONO:	8668920
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	75071358823	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	322323251

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROYECCION	1	$ 516.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.400	$ 0	$ 516.400
SUBTOTALES:										$ 516.400	$ 0	$ 516.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 403.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.500	$ 0	$ 0	$ 403.500
SUBTOTALES:													$ 403.500	$ 0	$ 0	$ 403.500

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	EXONERADO	INFORMA TRIBUTARIA	IHS	IGE	IRL	SLN	VAC	LMA	VST	SUS	INC	VACO	VCT	VSP	COR	TDE	TAE	TDP	TAP	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD							ARP							PARAFISCALES										
																													ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 7711430	RAVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	02-DEPEND		$ 3.227.300				NO																				230201-PROYECCION	30	$ 3.227.300	$ 516.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 516.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.227.300	$ 403.500	$ 0	$ 403.500					$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 919.900

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76320749		JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA	INDEPENDIENTE	JOSE WILMER CHILITO RIVADENERIA	CRA 8 CL25N BL G AP 305	POPAYAN-CAUCA	3122879619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	424567176	9459437094	I	2023/12/11	2024/01/30	NEQUI	50	$428,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JOSE WILMER CHILITO RIVADENERIA (1 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																																								
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$411,400
1	CC	76320749	CHILITO JOSE																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000		D	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Total		**Afiliados(1**																				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$411,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76320749		JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA	INDEPENDIENTE	JOSE WILMER CHILITO RIVADENERIA	CRA 8 CL25N BL G AP 305	POPAYAN-CAUCA	3122879619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	424567176	9459437094	I	2023/12/11	2024/01/30	NEQUI	50	$428,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$8,500	$0	$193,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$8,500	$0	$193,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$ 80,800	$4,800	$0	$84,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$ 80,800	$4,800	$0	$84,300
EPS (ADMNISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$4,200	$0	$149,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	EPS018	805,001,157	2	1	$145,000	$4,200	$0	$149,500
TOTAL				**1**	**$411,400**	**$17,500**	**$0**	**$428,900**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-20, 09:14:22 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1066183901

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

Fecha limite de pago: 2023-12-06

PAGADA 20/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO WF				
Documento	NI901769619	**Dirección**	CR 4 #9 - 25 OFICINA 507		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8668020		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	3
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	**Identificación**	CC7711430		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ATP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1083886304	GIRALDO JIMENEZ JAVIER HUMBERTO	01	00	X															0	15	15	15		PORVENIR	$ 1.125.000	$ 180.000	EPS SANITAS	$ 1.125.000	$ 45.000	ARL SURA	$ 1.125.000	$ 78.300	COMFAMILIAR HUILA	$ 1.125.000	$ 45.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.300
CC 1012354706	JUNCO AVILA CRISTIAN FABIAN	01	00	X															0	15	15	15		COLFONDOS	$ 1.375.000	$ 220.000	EPS SANITAS	$ 1.375.000	$ 55.000	ARL SURA	$ 1.375.000	$ 95.700	COMFAMILIAR HUILA	$ 1.375.000	$ 55.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.700
CC 1079174293	POLANIA LEIVA YINA CARIME	01	00	X															0	10	10	10		PORVENIR	$ 750.000	$ 120.000	EPS SANITAS	$ 750.000	$ 30.000	ARL SURA	$ 750.000	$ 52.200	COMFAMILIAR HUILA	$ 750.000	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades (Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 3.250.000	$ 3.250.000	$ 3.250.000	$ 3.250.000	$ 520.000	$ 0	$ 0	$ 130.000	$ 226.200	$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.006.200	$ 42.400	$ 1.048.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8688020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4528232357	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/11/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	807419

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 396.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.000	$ 0	$ 396.000
SUBTOTALES:										$ 396.000	$ 0	$ 396.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 72.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 23.200
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 26.300
SUBTOTALES:													$ 122.200	$ 0	$ 0	$ 122.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 136.100	$ 136.100	$ 0	$ 0	$ 136.100
SUBTOTALES:									$ 136.100	$ 0	$ 0	$ 136.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	2	$ 52.600	$ 0	$ 52.600
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 69.600	$ 0	$ 69.600
SUBTOTALES:			$ 122.200	$ 0	$ 122.200

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	SUS	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP					CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1075277687	DELGADO RAMOS INGRID TOMARA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230901-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.160.000	7711430	$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1075248851	RAMIREZ PARRA MARCOL ESNEYDER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI		17															230901-PORVENIR	17	$ 657.334	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 105.200	EPS005-SANITAS S.A.	17	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 26.300	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	17	$ 657.334	7711430	$ 45.600	17	$ 657.334	CCF13-COMFACA	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1075305865	SAENZ DIAZ JONATHAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI		17															230901-PORVENIR	17	$ 657.334	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 105.200	NUEVA EPS CM	17	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 26.300	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	17	$ 657.334	7711430	$ 45.600	17	$ 657.334	CCF13-COMFACA	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 12118879	CARDOZO ANDRADE JAIME	DEPEND	NO APLICA COTIZANTE EDAD	$ 1.160.000	FIJO			SI		15																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 23.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	15	$ 580.000	7711430	$ 40.400	15	$ 580.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 778.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 S 25 OF 507	TELEFONO:	8688220
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACION:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7907245981	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			27		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/02/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	440940648

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201 - PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.800	$ 0	$ 185.600	$ 4.800	$ 190.200
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 4.800	$ 190.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 3.600	$ 0	$ 145.000	$ 3.600	$ 0	$ 148.600
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 3.600	$ 0	$ 148.600

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																											PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN.	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES.	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	1077111430	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	INDEPEND	-	$ 3.227.500				NO									01-30									230201 - PROTECCION	30	$ 1.180.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.180.000	$ 148.000	$ 0	$ 148.000					$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 338,800

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8686000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	79201519 61	TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	71		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/03/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	527574577
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	79079245961	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2024/02/08

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:										$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28,500	$ 28,300	$ 1,800	$ 0	$ 30,100
SUBTOTALES:									$ 28,300	$ 1,800	$ 0	$ 30,100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | SEGURIDAD SOCIAL

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IDP
3	CC 7711430	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	1-DEPEND		$ 3,227,300			NO								X 01-30								
2	CC 7711430	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	3-INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3,227,300			NO								C 01-30								
1	CC 7711430	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	3-INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3,227,300			NO								R 01-30								

Nº	ADMIN	DÍAS COT	ISC	COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
3	230201-PROTECCION	30	$ 1,160,000	$ 165,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165,600
2	230201-PROTECCION	30	$ 1,160,000	$ 165,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165,600
1	230201-PROTECCION	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0

Nº	ADMIN	DÍAS COT	ISC	COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	ISC	CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	DÍAS EXT	ISC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
3	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1,160,000	$ 7711430	$ 28,300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
1	EPS037-NUEVA EPS	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1,160,000	$ 7711430	$ 28,300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 30,100

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76320749		JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA	INDEPENDIENTE	JOSE WILMER CHILITO RIVADENERIA	CRA 8 CL25N BL G AP 305	POPAYAN-CAUCA	3122879619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	420212118	9460969549	I	2024/01/11	2024/01/29	NEQUI	18	$417,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JOSE WILMER CHILITO RIVADENERIA (1 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																																									
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$411,400
1	CC	76320749	CHILITO JOSE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Total			**Afiliados(1**																				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$411,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76320749		JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA	INDEPENDIENTE	JOSE WILMER CHILITO RIVADENERIA	CRA 8 CL25N BL G AP 305	POPAYAN-CAUCA	3122879619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	420212118	9460969549	I	2024/01/11	2024/01/29	NEQUI	18	$417,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$3,000	$0	$188,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$3,000	$0	$188,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$ 80,800	$1,800	$0	$82,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$ 80,800	$1,800	$0	$82,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,600	$0	$146,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	EPS018	805,001,157	2	1	$145,000	$1,600	$0	$146,600
TOTAL				**1**	**$411,400**	**$6,400**	**$0**	**$417,800**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-20, 09:41:50 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS, **Número Planilla:** 1066184523

Periodo Cotización: diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** enero de 2024

Fecha límite de pago: 2024-01-05

PAGADA 20/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO WF				
Documento	NI901769619	**Dirección**	CR 4 #9 - 25 OFICINA 507		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8668020		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	3
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	**Identificación**	CC7711430		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1083686304	GIRALDO JIMENEZ JAVIER HUMBERTO	01	00		X														0	25	25	25	25	PORVENIR	$ 1.950.000	$ 312.000	EPS SANITAS	$ 1.950.000	$ 78.000	ARL SURA	$ 1.950.000	$ 135.600	COMFAMILIAR HUILA	$ 1.950.000	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.600
CC 1018554706	JUNCO AVILA CRISTIAN FABIAN	01	00		X														8	25	25	25	25	COLFONDOS	$ 2.383.334	$ 381.400	EPS SANITAS	$ 2.383.334	$ 95.400	ARL SURA	$ 2.383.334	$ 165.900	COMFAMILIAR HUILA	$ 2.383.334	$ 95.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 738.100
CC 1079174293	POLANIA LEIVA YINA CARIME	01	00		X														6	21	21	21	21	PORVENIR	$ 1.575.000	$ 252.000	EPS SANITAS	$ 1.575.000	$ 63.000	ARL SURA	$ 1.575.000	$ 109.200	COMFAMILIAR HUILA	$ 1.575.000	$ 63.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 487.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 5.908.334	$ 5.908.334	$ 5.908.334	$ 5.908.334	$ 945.400	$ 0	$ 0	$ 236.400	$ 411.400	$ 236.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.829.600	$ 33.000	$ 1.862.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8659320
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7318568501		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	45				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/28		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		490405939

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.200	$ 0	$ 185.600	$ 8.200	$ 193.800
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 8.200	$ 193.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 6.500	$ 0	$ 145.000	$ 6.500	$ 0	$ 151.500
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 6.500	$ 0	$ 151.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 300	$ 0	$ 6.400
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 300	$ 0	$ 6.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 46.400	$ 2.100	$ 48.500
SUBTOTALES:			$ 46.400	$ 2.100	$ 48.500

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 34.800	$ 1.600	$ 36.400
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 23.200	$ 1.100	$ 24.300
SUBTOTALES:			$ 58.000	$ 2.700	$ 60.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES INA | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8668826
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7952398177	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN.	110687304S

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.900	$ 0	$ 562.900
SUBTOTALES:										$ 562.900	$ 0	$ 562.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 439.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.800	$ 0	$ 0	$ 439.800
SUBTOTALES:													$ 439.800	$ 0	$ 0	$ 439.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 85.700	$ 85.700	$ 0	$ 0	$ 85.700
SUBTOTALES:									$ 85.700	$ 0	$ 0	$ 85.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083886304		GIRALDO JIMENEZ JAVIER HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA LLANOGRANDE	PITALITO-HUILA	8361000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1114826050	9477420769	I	2024/12/03	2024/12/10	BANCOLOMBIA	7	$435,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$34,200		$0	$0		$433,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$34,200		$0	$0		$433,200
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (1 Afiliados)																					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$34,200		$0	$0		$433,200
1	CC	1083886304 GIRALDO JAVIER																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	2.436%	$34,200	0	$0	$0	No	$433,200
Total	**Afiliados(1)**																					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$34,200		$0	$0		$433,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083886304		GIRALDO JIMENEZ JAVIER HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA LLANOGRANDE	PITALITO-HUILA	8361000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1114826050	9477420769	I	2024/12/03	2024/12/10	BANCOLOMBIA	7	$435,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$1,100	$0	$225,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$1,100	$0	$225,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,200	$200	$0	$34,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,200	$200	$0	$34,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$900	$0	$175,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$175,000	$900	$0	$175,900
TOTAL				1	$433,200	$2,200	$0	$435,400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PREVIO AL PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8668020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			795239815D	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			855825442 3

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 241.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.600	$ 0	$ 241.600
SUBTOTALES:										$ 241.600	$ 0	$ 241.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 60.400
SUBTOTALES:													$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 60.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 21.500	$ 21.500	$ 0	$ 0	$ 21.500
SUBTOTALES:									$ 21.500	$ 0	$ 0	$ 21.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 60.400	$ 0	$ 60.400
SUBTOTALES:			$ 60.400	$ 0	$ 60.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES								
																														PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIA MAYOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1075277887	DILLARD RAMOS NOHD YOMARA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	7711430	$ 5.800	30	$ 1.300.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1075174235	POLANIA ESTUPIÑAN CARIME	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO			SI	01	03															230301-PORVENIR	3	$ 210.000	$ 33.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 33.600	EPS005-SANITAS S.A	3	$ 210.000	$ 8.400	$ 0	$ 8.400	14-11 - ARL SURA	3	$ 210.000	7711430	$ 14.700	3	$ 210.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 383.900

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FARVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8668020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y afines
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7960837716	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/01/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1279685153

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.900	$ 0	$ 562.900
SUBTOTALES:										$ 562.900	$ 0	$ 562.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 439.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.800	$ 0	$ 0	$ 439.800
SUBTOTALES:													$ 439.800	$ 0	$ 0	$ 439.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 85.700	$ 85.700	$ 0	$ 0	$ 85.700
SUBTOTALES:									$ 85.700	$ 0	$ 0	$ 85.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD								ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ING	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 7711430	PERDOMO POLANIA FARVER EDUARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 3.517.650				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 3.517.650	$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 562.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.517.650	$ 439.800	$ 0	$ 439.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.517.650	7711430	$ 85.700	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.088.400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083886304		GIRALDO JIMENEZ JAVIER HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA LLANOGRANDE	PITALITO-HUILA	8361000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1192057565	9480271962	I	2025/01/03	2025/01/14	BANCOLOMBIA	11	$436,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$34,200		$0	$0		$433,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$34,200		$0	$0		$433,200
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$34,200		$0	$0		$433,200
1	CC	1083886304 GIRALDO JAVIER		X																23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	2.436%	$34,200	0	$0	$0	No	$433,200
Total	**Afiliados(1)**																					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$34,200		$0	$0		$433,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083886304		GIRALDO JIMENEZ JAVIER HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA LLANOGRANDE	PITALITO-HUILA	8361000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1192057565	9480271962	I	2025/01/03	2025/01/14	BANCOLOMBIA	11	$436,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$1,600	$0	$225,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$1,600	$0	$225,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,200	$300	$0	$34,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,200	$300	$0	$34,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$1,300	$0	$176,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$175,000	$1,300	$0	$176,300
TOTAL					$433,200	$3,200	$0	$436,400

2025/01/13 09:19 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELEFONO:	8668020
TIPO APORTANTE:	68-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7960848319	TIPO DE PLANILLA:					I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD		MES	enero AÑO		2025
		D						
		2025/02/07						1471622116

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201 - PROTECCION	1	$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.900	$ 0	$ 562.900
SUBTOTALES:										$ 562.900	$ 0	$ 562.900

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 439.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.800	$ 0	$ 0	$ 439.800
SUBTOTALES:													$ 439.800	$ 0	$ 0	$ 439.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 85.700	$ 85.700	$ 0	$ 0	$ 85.700
SUBTOTALES:									$ 85.700	$ 0	$ 0	$ 85.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083886304		GIRALDO JIMENEZ JAVIER HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA LLANOGRANDE	PITALITO-HUILA	8361000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1229014186	9481044995	1	2025/02/04	2025/01/30	BANCOLOMBIA	0	$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
1	CC	1083886304	GIRALDO JAVIER	X																23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083886304		GIRALDO JIMENEZ JAVIER HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA LLANOGRANDE	PITALITO-HUILA	8361000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1229014186	9481044995	1	2025/02/04	2025/01/30	BANCOLOMBIA	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

CONTRATO DE OBRA No. CLPIH383 de 2023


INFORME DE OBRA No. 1

PARCIAL [X] FINAL [ ]

Objeto Contrato:

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA



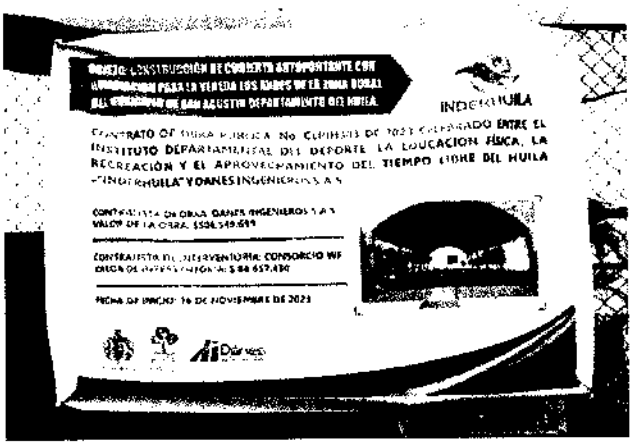

MUNICIPIO: SAN AGUSTÍN


DEPARTAMENTO: HUILA

CONTRATO DE OBRA No. CLPIH383 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y DANES INGENIEROS S.A.S

APOYO A LA SUPERVISIÓN	*JUAN FELIPE ALARCON QUIROGA*	***ENTIDAD***	*INDERHUILA*
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	*CLPIH383 DE 2023*		
OBJETO	*CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA*	***PERIODO DEL INFORME***	*Entre el 16 de noviembre de 2023 al 20 de diciembre de 2023 y del 12 de noviembre de 2024 al 20 de enero de 2025.*
CONTRATISTA	*DANES INGENIEROS S.A.S*	***NIT:***	*900.219.918-2*
REPRESENTANTE LEGAL:	*NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA*	***C.C:***	*7.719.364*
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	*01/11/2023*		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	*16/11/2023*		
PLAZO INICIAL	*El plazo estimado para la ejecución del contrato será de TRES (03) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal o hasta el 29 de Diciembre de 2023.*		
PLAZO ADICIONAL:	***N°1***	***OTROSI NO. 01 FECHA: 12/11/2024 CAMBIO VIGENCIA***	
	N°2	***OTROSI NO. 02 FECHA: 27/12/2024 ADICIONAL 1 MES***	
ACTA DE SUSPENSIÓN 1:	*21/12/2023*		
ACTA DE REINICIO 1:	*12/11/2024*		
PLAZO TOTAL:	*El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución, y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal 2025.*		
VALOR INICIAL:	*$506.549.699*		
VALOR ADICIONAL *(SI APLICA):*	***N°1***	***OTROSÍ NO. 02 FECHA: 27/12/2024 VALOR: $62.065.242***	
VALOR TOTAL:	*$568.614.941*		
FECHA DE TERMINACIÓN:	*05/02/2025*		
INTERVENTOR:	*CONSORCIO WF*	***NIT:***	*901.769.619*
REPRESENTANTE LEGAL:	*FAIVER PERDOMO POLANIA*	***C.C:***	*7.711.430*

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

VEREDA LOS ANDES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA

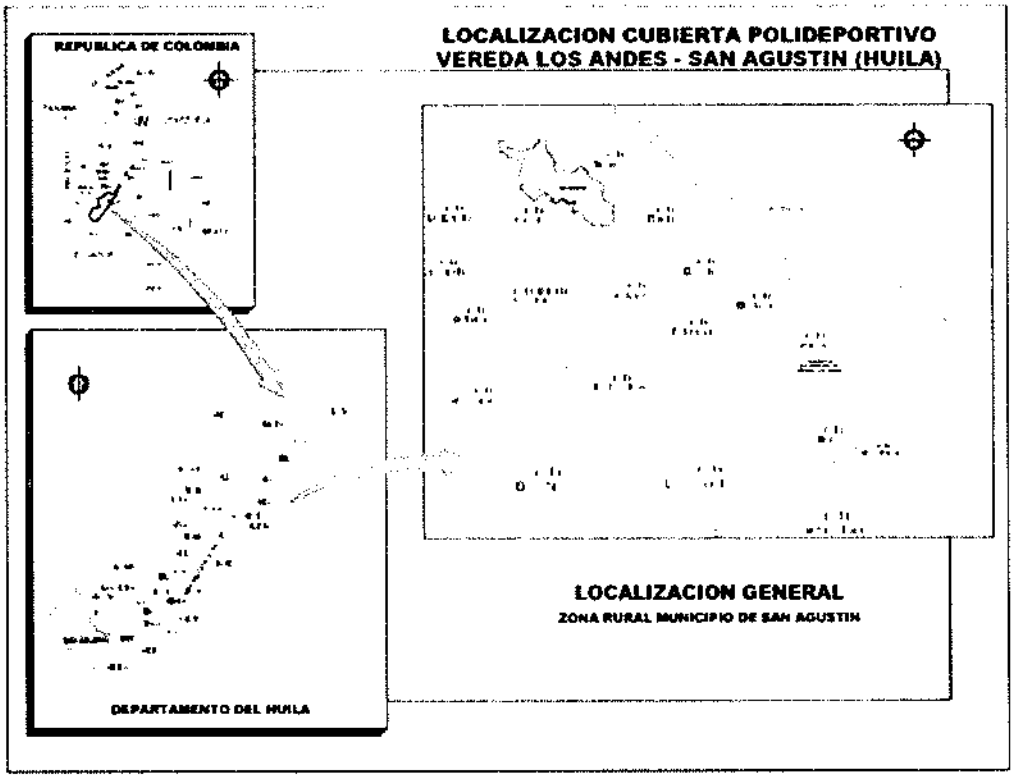

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto arquitectónico contempla un área a intervenir de 632,32 m², en la que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 20 en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz, para el polideportivo ubicado en la vereda Los Andes del Municipio de San Agustín – Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; el polideportivo corresponde a estructura de cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con sistema autoportante, sostenida con columnas en concreto de 3.00 PSI. El sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3.000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras atienden lo establecido en la NORMA SISMORRESISTENTE de 2010 – NSR-10.

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- *ACTIVIDADES PRELIMINARES*
- *CIMENTACIÓN*
- *ESTRUCTURA EN CONCRETO*
- *CUBIERTA*
- *ACABADOS – PLACA DE CONCRETO*
- *INSTALACIONES HIDROSANITARIAS*
- *INSTALACIONES ELÉCTRICAS*
- *TRANSPORTE*

4. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

La comunidad en cabeza del presidente de la Junta de Acción Comunal, lograron no solo obtener los permisos que se requerían de los propietarios de los predios que se afectaban con la obra, sino que realizaron las gestiones necesarias para que se adecuaran los espacios que obstaculizaban las excavaciones de la cimentación, retirando el material de los taludes de los costados del polideportivo permitiendo tener el área necesaria para ejecutar el proyecto.

Por otro lado, se realizan visitas periódicas por parte del presidente de la Junta de Acción Comunal y diferentes habitantes de la vereda, realizando constante vigilancia durante la ejecución de la obra.

Se proponen y acuerdan los siguientes puntos para la ejecución del contrato:

- *Delimitación del área de la obra, con el fin de evitar afectaciones y accidentes para las personas y mascotas que transitan cerca al polideportivo, sobre todo teniendo en cuenta que esta la escuela veredal y la Capilla a la cual acuden bastantes personas.*
- *Se informó a la comunidad del cierre de la vía por el tiempo que dure la construcción, ya que el área de la vía es la única donde se pueden acopiar los materiales pétreos que se necesitan.*
- *Se puso a disposición de la obra, personal de la zona interesado en trabajar en la construcción.*

5. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	*16/11/2023*			
Suspensión No. 1	*21/12/2023*	*35*		
Reiniciación No. 1	*12/11/2024*		*327*	*05/01/2025*
Otrosí No. 01	*12/11/2024*			
Otrosí No. 02	*27/12/2024*			*05/02/2025*
TERMINACIÓN Cto.	*05/02/2025*	*85*		
TOTAL DIAS		**120**	**327**	


6. ACTAS *(Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)*

Tipo de Acta	*No.*	*Fecha*
Inicio		*16/11/2023*
Justificación de Suspensión	*1*	*21/12/2023*
Suspensión	*1*	*21/12/2023*
Justificación para el Reinicio	*2*	*12/112024*
Justificación Otrosí No. 01	*3*	*12/11/2024*
Reinicio	*1*	*12/11/2024*
Justificación Otrosí No. 02	*4*	*27/12/2024*


7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


*a). **Actividades administrativas***	*- Entrega de pólizas para legalización del contrato, conforme a lo establecido en la CLÁUSULA 18 – GARANTÍAS, del contrato de obra* *- Suscripción del acta de inicio* *- Entrega de pólizas actualizadas por el acta de inicio del contrato* *- Suscripción de acta de justificación para la suspensión No.1* *- Suscripción acta de suspensión No. 01.* *- Suscripción de acta de justificación para el reinicio No.1* *- Suscripción acta de reinicio No. 01.* *- Actualización de pólizas según acta de reinicio No. 01.* *- Capacitaciones en obra* *- Pago aportes de seguridad social del personal*
*b.) **Actividades operativas***	*Se recibe de parte de la entidad contratante la siguiente documentación:* • *Plano A-01-Implantación San Agustín-Vereda Los Andes* • *Plano Elec San Agustín-Vereda Los Andes* • *Plano Estru San Agustín-Vereda Los Andes* • *Plano HS-01-Aguas lluvias San Agustín-Vereda Los Andes* • *Plano L-01-Localización San Agustín-Vereda Los Andes* *Una vez revisados los documentos, se encuentran las siguientes observaciones estructurales:* *En el plano "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E2" encontramos que la cota y despieces de las columnas no coincide con la mostrada en el plano "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E3" como corte de la estructura, lo que conllevaría a queel despiece del hierro establecido para una*


altura de columna no sea la que realmente se vaya a construir. Por lo tanto, se requiere una aclaración por parte deldiseñador estructural en este caso.

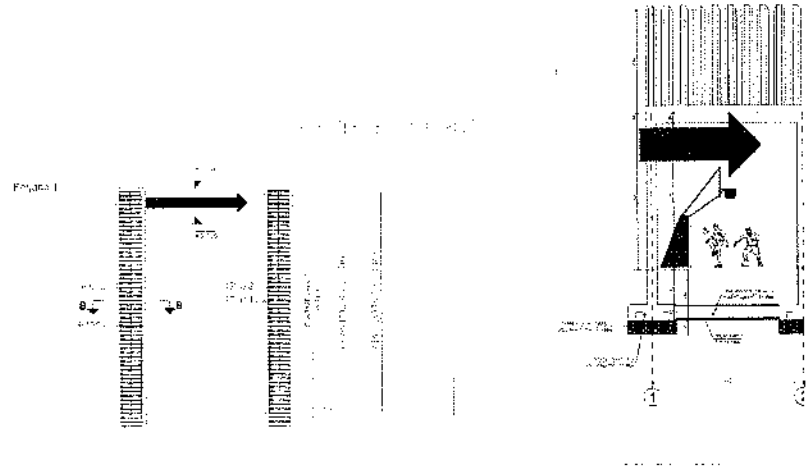

También se evidencio mediante una visita realizada el día 22 de noviembre del presente año, que la implantación del proyecto generará una afectación en la vía principal del casco urbano de la vereda, ya que dicha se encuentra ubicada en un costado colindante con el polideportivo, donde en el momento de realizar la excavación de la cimentación de la estructura, dicha vía se perdería ya que se requeriría hacer un corte al talud afectado la huella de la ruta.

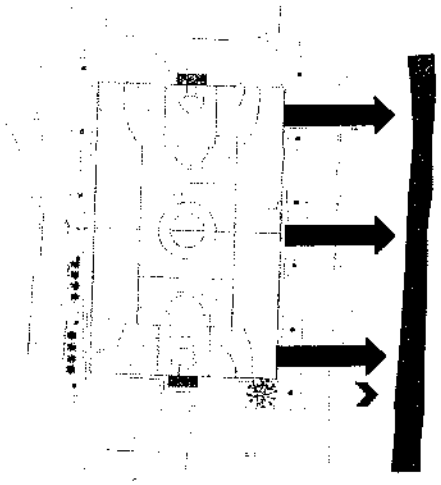


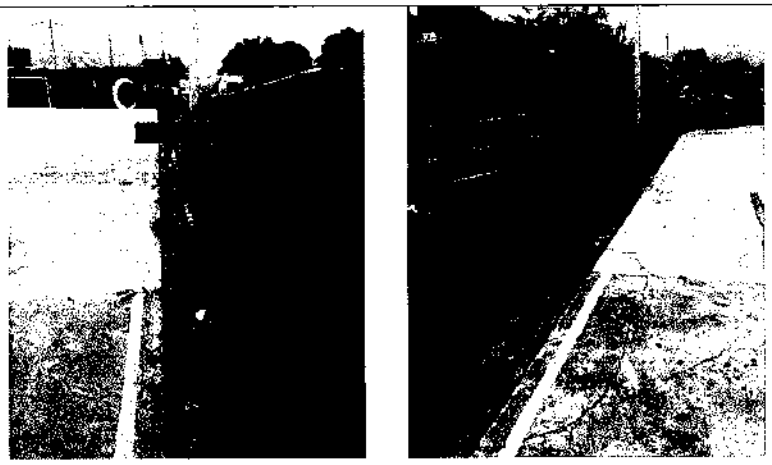

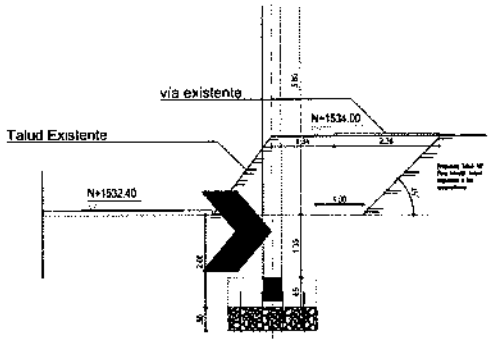


1-A

Igualmente se pudo evidenciar en la visita que se debe considerar la adecuación de una vía de acceso al costado occidental del proyecto para poder acceder con una retroexcavadora sobre llantas y por esa misma vía retirar el material de excavación proveniente del talud de ese costado ya que el sitio de la obra se encuentra rodeado por viviendas y una escuela y por el polideportivo no pueden transitar estos equipos ya que afectarían la placa existente.

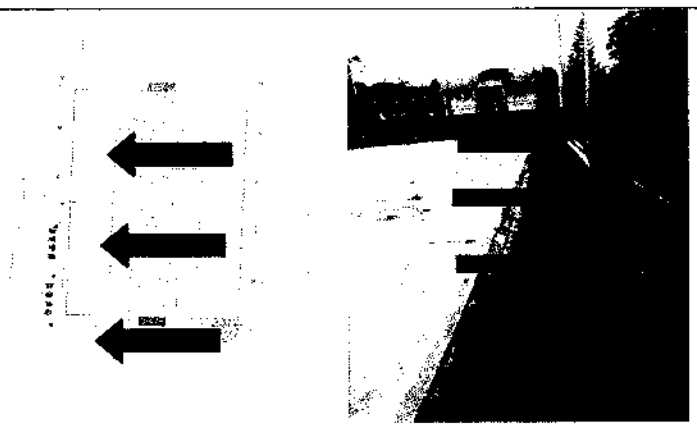

Así también, en el mismo costado occidental se encuentra una vivienda que cuya construcción se verá afectada en el momento de la realización de las actividades de excavación para las zapatas de la estructura, situación que quedó plasmada en la socialización del proyecto ante la comunidad que debe ser solucionada para poder darle arranque al proyecto.

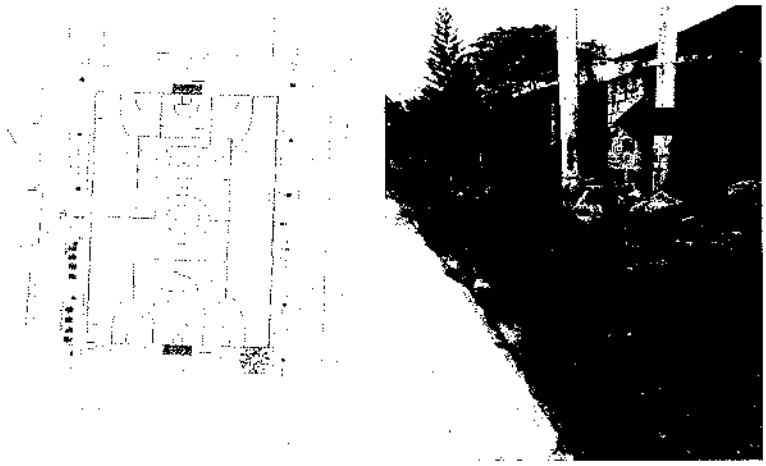

Se envío el respectivo informe a la interventoría y a la entidad contratante de las observaciones encontradas, dichos análisis fueron revisadas por parte del ente interventor solicitando a su vez un comité técnico con el apoyo a la supervisión por parte del INDERHUILA, en donde fueran expuestas las observaciones encontradas en los planos juntos con otras observaciones encontradas en el sitio de la obra, el INDERHUILA.

La Entidad contratante una vez revisó la información presentada por el contratista y avalado por al interventoria, procedió a autorizar la suspensión del contrato de obra por un lapso de 45 días calendarios y/o hasta que se superen las situaciones que dieron lugar a la suspensión, teniendo en cuenta que para cumplir con el objeto del contrato se deben tener aprobados los ajustes a los

	diseños estructurales y la comunidad cuente con los permisos necesarios para llevar a cabo todas las actividades de la obra. *También se realiza la instalación de la valla respectiva del contrato en el sitio de la obra.* *ACTIVIDADES PRELIMINARES* *- Ubicación de bodega para materiales* *- Convocatoria y contratación de personal para la obra* *- Traslado de equipos, maquinaria, herramienta menor, y materiales para dar inicio a las actividades previstas en la obra* *- Localización y replanteo del proyecto en el área destinada para su ejecución (trazado y verificación de niveles)* *- Excavación para la construcción de la cimentación del proyecto. Se logran realizar 11 de los 12 puntos de excavación (A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B3, B4, B5, B6), ya que en el punto B2, se encontró una roca que debe ser destruida con máquina tipo demoledor.* *CIMENTACIÓN* *- Instalación de concreto ciclópeo en los niveles y dimensiones indicadas en los planos estructurales del proyecto. Se instala en 11 de los 12 puntos previstos para la cimentación de las columnas (A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B3, B4, B5, B6), el punto B2 es donde se ubica la roca.* *- Instalación de las barras de transferencia que se ubican durante la fundición del concreto ciclópeo.* *- Armado de acero para todas las zapatas (A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6) y vigas de cimentación del eje A y B. El acero fue figurado previamente conforme a los planos del proyecto y es armado en el sitio de la obra.* *-Se realiza la fundición de las 12 zapatas (A1 al A6 y B1 al B6) y de las vigas de cimentación de los ejes A y B, lo anterior en concreto de 3000 psi.* *ESTRUCTURA EN CONCRETO* *-Se realiza el armado e instalación del acero de refuerzo para las 12 columnas de la estructura de cubierta (A1 al A6 y B1 al B6).* *-Se realiza el encofrado en formaleta metálica de las columnas y se procede a realiza la fundición de las 12 columnas en concreto de 3000 psi mezclado en sitio.* *-Se realiza el armado e instalación del acero de refuerzo para las 2 viga canales de los ejes A y B de la estructura de cubierta.* *-Se realiza el encofrado y fundición de las 2 viga canales de los ejes A y B de la estructura de cubierta, en concreto de 3000 psi mezclado en sitio.* *-Se realiza la instalación del manto zeta en la 2 viga canales de los ejes A y B para garantizar la impermeabilización de dicha estructura.*

CUBIERTA

-Se realiza el montaje e instalación de la cubierta en teja autoportante a base de lámina acero cal.20, en paneles engargolados lateralmente sobre la viga canal, con acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

-Se realiza el desmonte de 3 postes en concreto existentes de la red eléctrica e iluminación.

TRANSPORTE

- Transporte de materiales pétreos: Se realiza el transporte de los materiales pétreos necesarios para la fundición del concreto ciclópeo para la cimentación, y se acopia parte del material pétreo para la posterior fundición de las zapatas

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

El clima durante el periodo de ejecución del presente informe (mes de noviembre de 2024) ha sido principalmente lluvioso con precipitaciones moderadas dada la ubicación del proyecto, que han afectado el rendimiento en actividades de excavación manual para la cimentación. Se anexa formato de estado del tiempo para el periodo.

CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

MES: DICIEMBRE - 2024 CONTRATO No. CLF-H393-2024 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA


CONTRATISTA: DANES INGENIEROS S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DICIEMBRE DE 2024

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Clase de tiempo																															
Seco	14	24	10	24	21	16	17	16	12	22	24	18	21	12	20	19	11	17	16	22	23	21	8	20	16	15	15	9	16	11	10
Lluvias moderadas	8	0	13	0	1	6	9	5	6	2	0	5	2	8	4	4	10	5	6	2	0	3	11	4	5	6	4	12	7	13	8
Lluvias fuertes	2	0	4	0	2	2	4	1	2	0	0	1	1	4	0	1	3	2	2	0	1	0	5	0	2	3	1	3	1	3	9

NOTA: EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

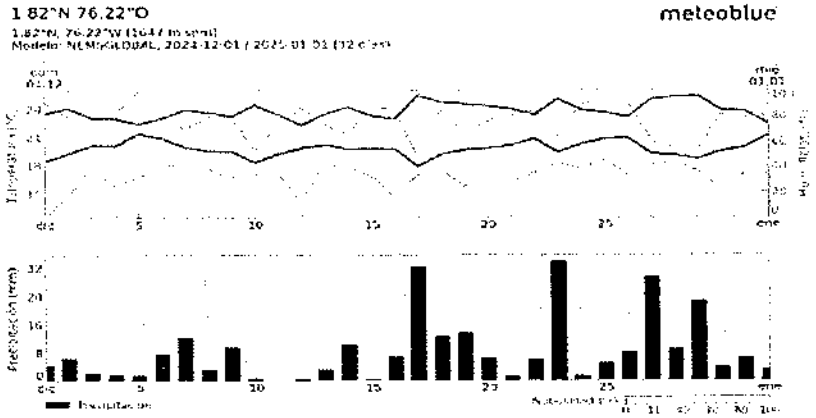

CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

MES ENERO - 2025 CONTRATO No. CLIP-H391-2024 PROYECTO CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - DEPARTAMENTO DEL HUILA


CONTRATISTA DANES INGENIEROS S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

ENERO DE 2025

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Clase de tiempo																															
Seco	16	15	14	13	16	9	24	19	21	24	18	24	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Lluvias moderadas	5	5	7	6	8	11	0	3	3	0	4	0	3																		
Lluvias intensas	3	4	3	5	2	4	0	2	3	0	2	0	0																		

NOTA: EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR CADA CLASE DE TIEMPO

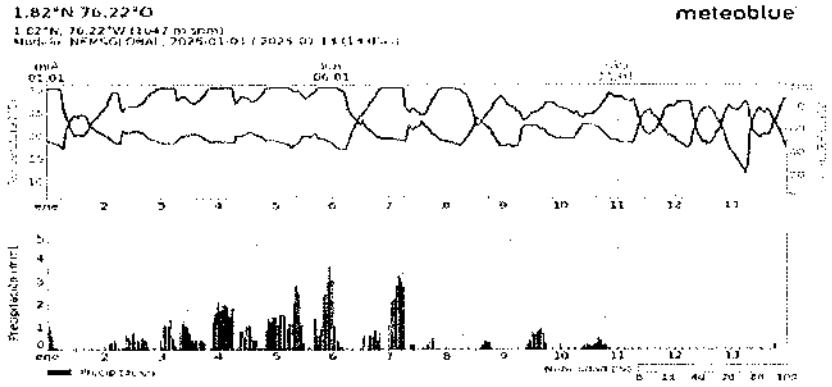

9. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	*Resistencia concreto*	*Relación volumétrica concreto*
Diseños de mezcla para los concretos.	*2.500 PSI y 3.000 PSI*	
Diseños de mezcla para base.	*N.A.*	*N.A.*
Compresión simple al concreto.	*3.000 PSI*	
Ensayo de compactación de campo	*N.A.*	

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
ZAPATAS EJE A	07/12/2024	14/12/2024	X			3000 PSI	2109 PSI	
		21/12/2024		X		3000 PSI	2746 PSI	
		04/01/2025			X	3000 PSI	3124 PSI	CUMPLE
ZAPATAS EJE B	07/12/2024	14/12/2024	X			3000 PSI	2087 PSI	
		21/12/2024		X		3000 PSI	2761 PSI	
		04/01/2025			X	3000 PSI	3087 PSI	CUMPLE
VIGA DE CIMENTACIÓN EJE A	12/12/2024	19/12/2024	X			3000 PSI	2300 PSI	
		26/12/2024		X		3000 PSI	2744 PSI	
		09/01/2025			X	3000 PSI	3094 PSI	CUMPLE
VIGA DE CIMENTACIÓN EJE B	13/12/2024	20/12/2024	X			3000 PSI	2291 PSI	
		27/12/2024		X		3000 PSI	2737 PSI	
		10/01/2025			X	3000 PSI	3113 PSI	CUMPLE
PEDESTAL COLUMNA EJE A	10/12/2024	17/12/2024	X			3000 PSI	2110 PSI	
		24/12/2024		X		3000 PSI	2784 PSI	

		07/01/2025			X	3000 PSI	3114 PSI	CUMPLE
PEDESTAL COLUMNA EJE B	10/12/2024	17/12/2024	X			3000 PSI	2097 PSI	
		24/12/2024		X		3000 PSI	2723 PSI	
		07/01/2025			X	3000 PSI	3060 PSI	CUMPLE
COLUMNA EJE A	19/12/2024	26/12/2024	X			3000 PSI	2291 PSI	
		02/01/2025		X		3000 PSI	2745 PSI	
		16/01/2025			X	3000 PSI	3107 PSI	CUMPLE
COLUMNA EJE B	20/12/2024	27/12/2024	X			3000 PSI	2272 PSI	
		03/01/2025		X		3000 PSI	2719 PSI	
		17/01/2025			X	3000 PSI	3076 PSI	CUMPLE
VIGA CANAL EJE A	27/12/2024	03/01/2025	X			3000 PSI	2258 PSI	
		10/01/2025		X		3000 PSI	2721 PSI	
VIGA CANAL EJE B	10/01/2025	17/01/2025	X			3000 PSI	2273 PSI	

10. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor	Amortización	Valor pagado
Valor Contrato	27/10/2023	$506.549.699		
Valor Anticipo (25%)	27/11/2024	$126.637424,75		$126.637424,75
Valor Adicional 1	27/12/2024	$62.065.242		
Acta Parcial No. 1	20/01/2025	$461.971.834,89	$115.492.958,72	$346.478.876,17
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$506.549.699	$62.065.242	$568.614.941	$461.971.834,89	$106.643.106,11

11. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	*Lugar*	*Resultado del Comité* (Describir)
22/11/2023	Vereda Los Andes – San Agustín	Socializar con la interventoría, las observaciones halladas por el contratista en campo al momento de realizar la localización del proyecto, y los hallazgos en unas mayores y menores cantidades de obra que surgen al momento de revisar los planos y confrontar las cantidades con lo plasmado en el presupuesto de obra.
21/12/2023	INDER HUILA	Debatir la justificación de la solicitud de suspensión de la obra, dado los hallazgos encontrados por parte del contratista en campo y en los documentos técnicos del proyecto (presupuesto y memorias de cantidades), los cuales fueron avalados por la interventoría, y que requieren ajustes o modificaciones estructurales por parte del diseñador. En esta reunión se suscribe Acta de Suspensión de obra No. 1.

12. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	*FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD* (dd/mm/aaaa)	*No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)*	*FORMATO (Físico/Digital)*
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 0)	03/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso No. 0)	03/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 1)	22/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso No. 1)	22/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 2)	20/11/2024	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso No. 2)	20/11/2024	S. N	FÍSICO Y DIGITAL

13. RELACION DE PERSONAL (Profesional y Mano de obra)

NOMBRE YAPELLIDOS	*No. IDENTIFICACIÓN*	*CARGO*	*MODALIDAD DE CONTRATACION*
NOVIEMBRE 2023			
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	C.C. 7.719.364	DIRECTOR DE OBRA	INDEFINIDO

DICIEMBRE 2023			
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	*C.C. 7.719.364*	*DIRECTOR DE OBRA*	*INDEFINIDO*
NOVIEMBRE 2024			
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	*C.C. 7.719.364*	*DIRECTOR DE OBRA*	*INDEFINIDO*
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	*C.C. 1.057.304.693*	*RESIDENTE DE OBRA*	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES*
WILMAR ARMANDO JIMÉNEZ MARULANDA	*C.C. 80.926.744*	*COORDINADOR*	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES*
CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CORDOBA	*C.C. 1.075.220.858*	*RESIDENTE SISO*	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES*
JOSÉ ALBEIRO TOVAR GÓMEZ	*C.C. 12.137.587*	*MAESTRO DE OBRA*	*CONTRATO OBRA LABOR*
SILVIO QUIÑONEZ SAMBONI	*C.C. 1.061.986.149*	*AYUDANTE DE OBRA*	*CONTRATO OBRA LABOR*
EMIRO SAMBONI MUÑOZ	*C.C. 1.061.985.551*	*AYUDANTE DE OBRA*	*CONTRATO OBRA LABOR*
ROBINSON ARCOS TORRES	*C.C. 1.082.772.137*	*AYUDANTE DE OBRA*	*CONTRATO OBRA LABOR*
WILLIAM ESTIVEN ARCOS HOYOS	*C.C. 1.082.772.716*	*AYUDANTE DE OBRA*	*CONTRATO OBRA LABOR*
JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	*C.C. 1.082.774.946*	*AYUDANTE DE OBRA*	*CONTRATO OBRA LABOR*
DICIEMBRE 2024			
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	*C.C. 7.719.364*	*DIRECTOR DE OBRA*	*INDEFINIDO*
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	*C.C. 1.057.304.693*	*RESIDENTE DE OBRA*	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES*
WILMAR ARMANDO JIMÉNEZ MARULANDA	*C.C. 80.926.744*	*COORDINADOR*	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES*
CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CORDOBA	*C.C. 1.075.220.858*	*RESIDENTE SISO*	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES*
JOSÉ ALBEIRO TOVAR GÓMEZ	*C.C. 12.137.587*	*MAESTRO DE OBRA*	*CONTRATO OBRA LABOR*
SILVIO QUIÑONEZ SAMBONI	*C.C. 1.061.986.149*	*AYUDANTE DE OBRA*	*CONTRATO OBRA LABOR*
EMIRO SAMBONI MUÑOZ	*C.C. 1.061.985.551*	*AYUDANTE DE OBRA*	*CONTRATO OBRA LABOR*
ROBINSON ARCOS TORRES	*C.C. 1.082.772.137*	*AYUDANTE DE OBRA*	*CONTRATO OBRA LABOR*

WILLIAM ESTIVEN ARCOS HOYOS	*C.C. 1.082.772.716*	*AYUDANTE DE OBRA*	*CONTRATO OBRA LABOR*
JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	*C.C. 1.082.774.946*	*AYUDANTE DE OBRA*	*CONTRATO OBRA LABOR*

14. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	*No. COMPROBANTE*	*FECHA*
Anticipo	*2024001679*	*20/12/2024*

15. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

NOVIEMBRE 2023

PERSONAL	*PENSIÓN*	*SALUD*	*ARL*	*CCF*	*PARAFISCALES*	*N° PLANILLA*	*FECHA DE PAGO*
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	*$185.600*	*$46.400*	*$6.100*	*$46.400*	*EXONERADO*	*9460090325*	*2023/12/06*

DICIEMBRE 2023

PERSONAL	*PENSIÓN*	*SALUD*	*ARL*	*CCF*	*PARAFISCALES*	*N° PLANILLA*	*FECHA DE PAGO*
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	*$185.600*	*$46.400*	*$6.100*	*$46.400*	*EXONERADO*	*9461784678*	*2024/01/19*

NOVIEMBRE 2024

PERSONAL	*PENSIÓN*	*SALUD*	*ARL*	*CCF*	*PARAFISCALES*	*N° PLANILLA*	*FECHA DE PAGO*
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	*$208.000*	*$52.000*	*$6.800*	*$52.000*	*EXONERADO*	*9478621046*	*2024/12/09*
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	*$208.000*	*$162.500*	*$90.500*	*$0.00*	*EXONERADO*	*9478285730*	*2024/12/16*
WILMAR ARMANDO JIMÉNEZ MARULANDA	*$131.800*	*$33.000*	*$57.400*	*$33.000*	*EXONERADO*	*9480094007*	*2025/01/09*
CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CORDOBA	*$131.800*	*$33.000*	*$57.400*	*$33.000*	*EXONERADO*	*9480094007*	*2025/01/09*
JOSÉ ALBEIRO	*90.800*	*$22.600*	*$39.300*	*$22.600*	*EXONERADO*	*9478621046*	*2024/12/09*

TOVAR GÓMEZ							
SILVIO QUIÑONEZ SAMBONI	$55.500	$13.900	$24.200	$13.900	EXONERADO	9478913722	2024/12/16
EMIRO SAMBONI MUÑOZ	$55.500	$13.900	$24.200	$13.900	EXONERADO	9478913722	2024/12/16
ROBINSON ARCOS TORRES	$48.600	$12.200	$21.200	$12.200	EXONERADO	9478913722	2024/12/16
WILLIAM ESTIVEN ARCOS HOYOS	$55.500	$13.900	$24.200	$13.900	EXONERADO	9478913722	2024/12/16
JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	$20.800	$5.200	$9.100	$5.200	EXONERADO	9478913722	2024/12/16
DICIEMBRE 2024							
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**N° PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	$208.000	$52.000	$6.800	$52.000	EXONERADO	9480094655	2025/01/09
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	$5.850.000	$4.062.500	$2.262.000	$0.00	EXONERADO	9479812982	2025/01/02
WILMAR ARMANDO JIMÉNEZ	$208.000	$52.000	$90.500	$52.000	EXONERADO	9480094655	2025/01/09
CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CORDOBA	$208.000	$52.000	$90.500	$52.000	EXONERADO	9480094655	2025/01/09
JOSÉ ALBEIRO TOVAR GÓMEZ	$208.000	$52.000	$90.500	$52.000	EXONERADO	9480094655	2025/01/09
SILVIO QUIÑONEZ SAMBONI	$41.600	$10.400	$18.100	$10.400	EXONERADO	9480094655	2025/01/09
EMIRO SAMBONI MUÑOZ	$34.700	$8.700	$15.100	$8.700	EXONERADO	9480094655	2025/01/09

ROBINSON ARCOS TORRES	$48.600	$12.200	$21.200	$12.200	EXONERADO	9480094655	2025/01/09
WILLIAM ESTIVEN ARCOS HOYOS	$55.500	$13.900	24.200	$13.900	EXONERADO	9480094655	2025/01/09
JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	$48.600	$12.200	$21.200	$12.200	EXONERADO	9480094655	2025/01/09

16. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO *(Relacionar todas las actualizaciones)*

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-10105169 1	0	02/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL *(Relacionar todas las actualizaciones)*

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-10101881 5	0	02/11/2023	01/11/2023	20/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO *(Relacionar todas las actualizaciones)*

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-10105169 1	1	22/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL *(Relacionar todas las actualizaciones)*

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)

SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-10101881 5	1	22/11/2023	01/11/2023	20/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO NO.01:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-10105169 1	2	20/11/2024	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	10/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	10/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	10/01/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-10101881 5	2	20/11/2024	01/11/2023	24/01/2025

Póliza actualizada x Otrosi 02 Prorroga y Adicion valor:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-10105169 1	3	29/01/2025	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	10/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	10/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	10/01/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-10101881 5	3	21/11/2024	01/11/2023	04/02/2025

Póliza actualizada x Otrosi 02 Prorroga y Adicion valor:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-10105169 1	4	29/01/2025	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	10/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	10/08/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	10/02/2028


				Estabilidad y Calidad de Obras	*Acta de recibo final*	*5 años desde acta de recibo final*

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL *(Relacionar todas las actualizaciones)*

ASEGURADORA	*No.*	*ENDOSO*	*FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)*	*VIGENCIA*	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	*HASTA (dd/mm/aaaa)*
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	*61-40-10101881 5*	*4*	*29/01/2026*	*01/11/2023*	*04/03/2025*


17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

18. REGISTRO FOTOGRÁFICO

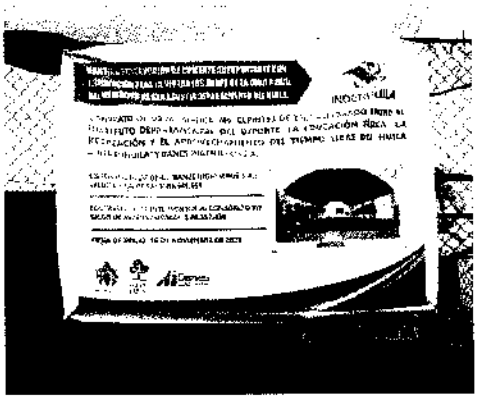


PRELIMINARES

Localización y replanteo

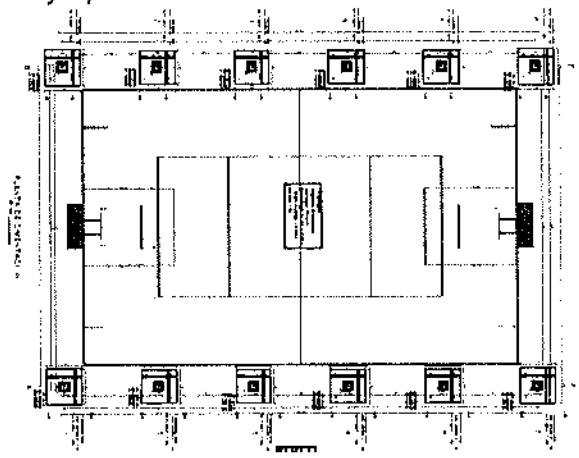



Excavación manual para construcción de cimentación

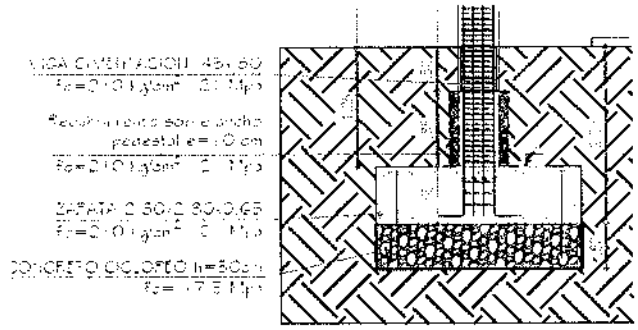














Roca encontrada en la excavación





Concreto ciclópeo, con barras de transferencia (Φ5/8")

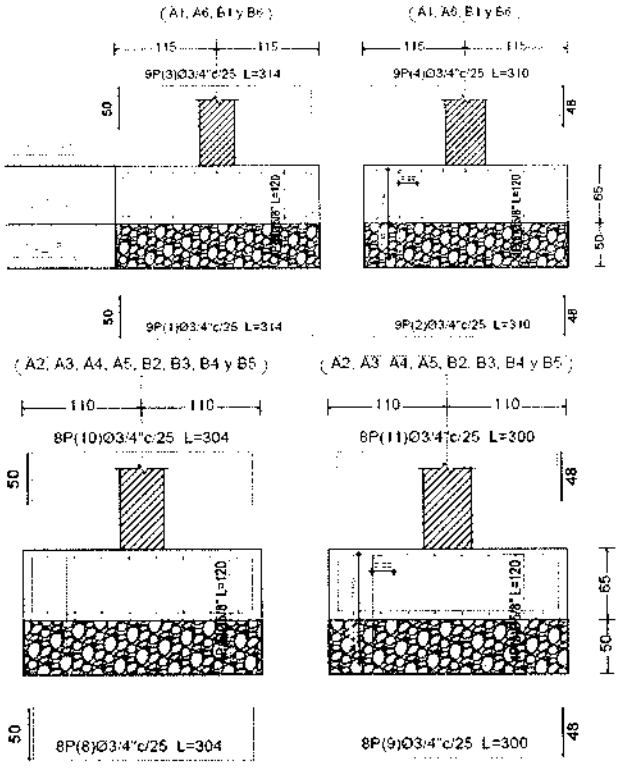





Armado de acero para zapatas

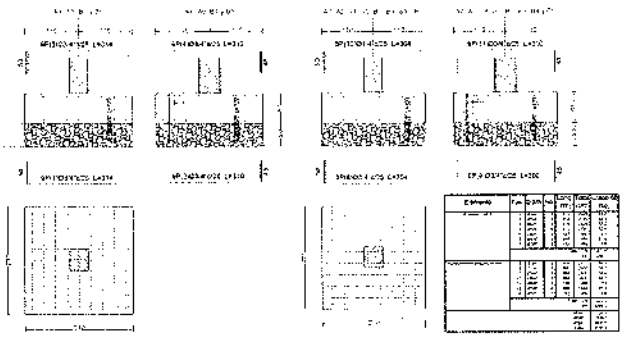

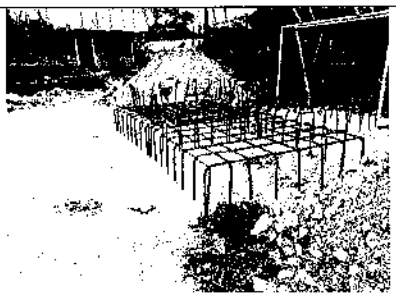

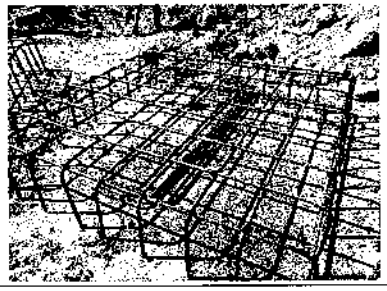


-Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación

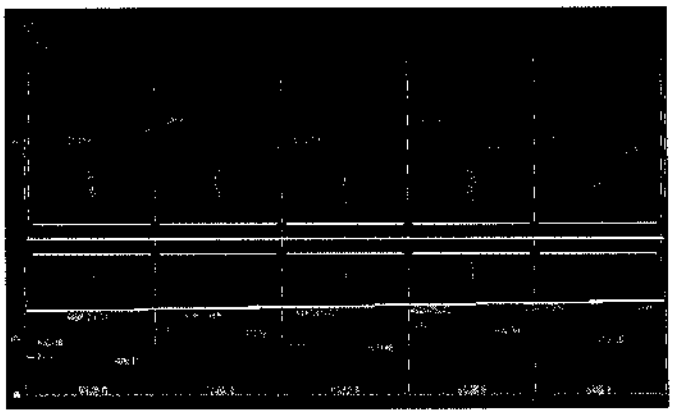






-Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI

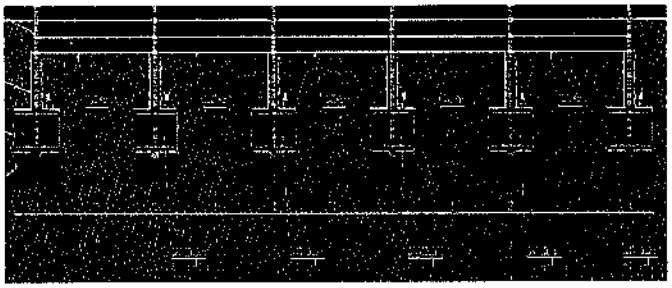

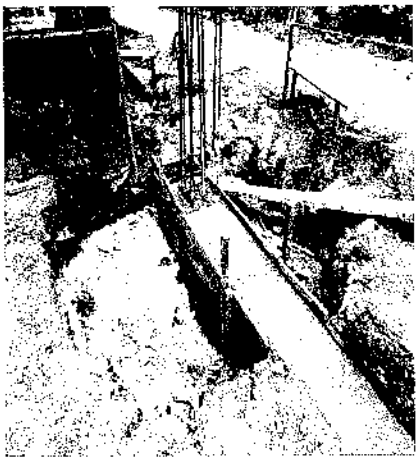



-Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas










-Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.




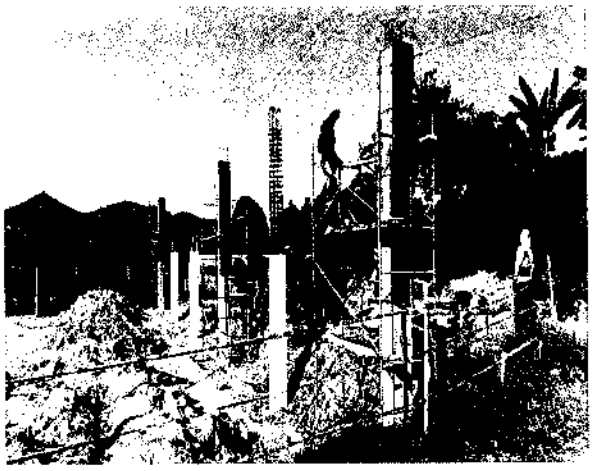


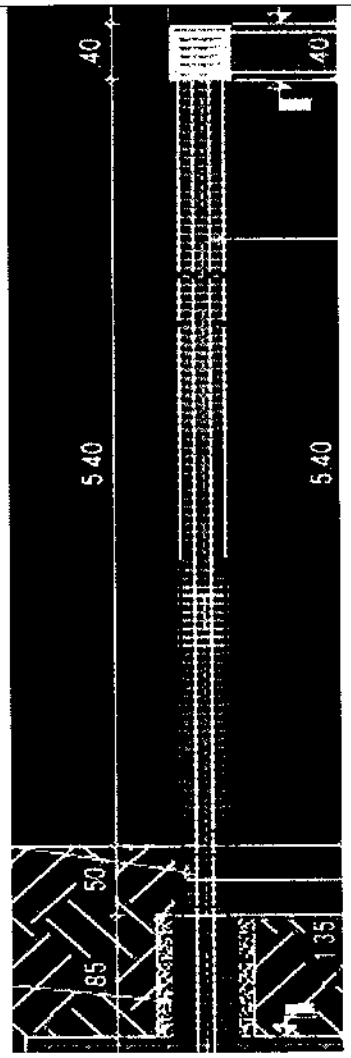
40
40
5 40
5 40
50
85
1 35

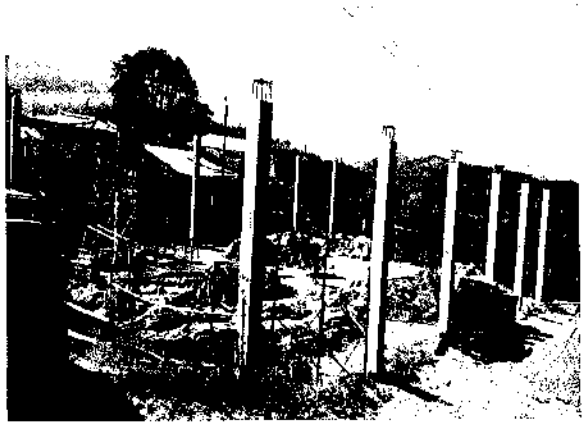


-Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal

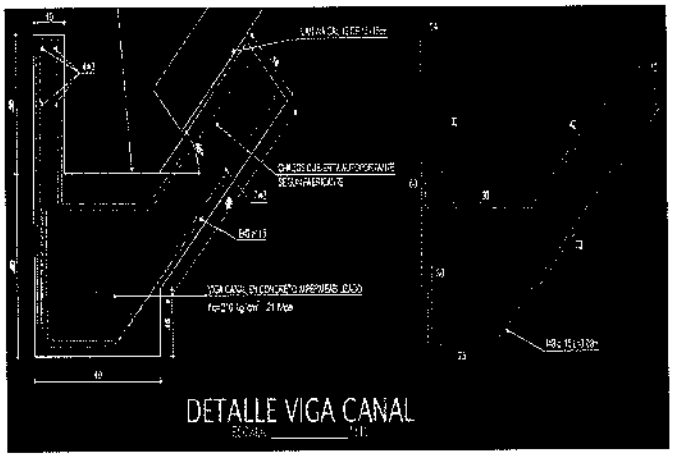

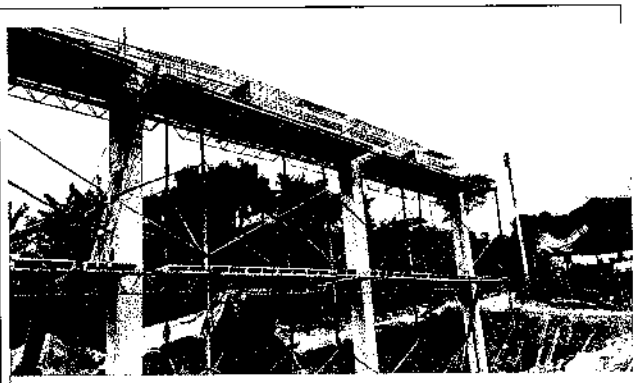




-Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.

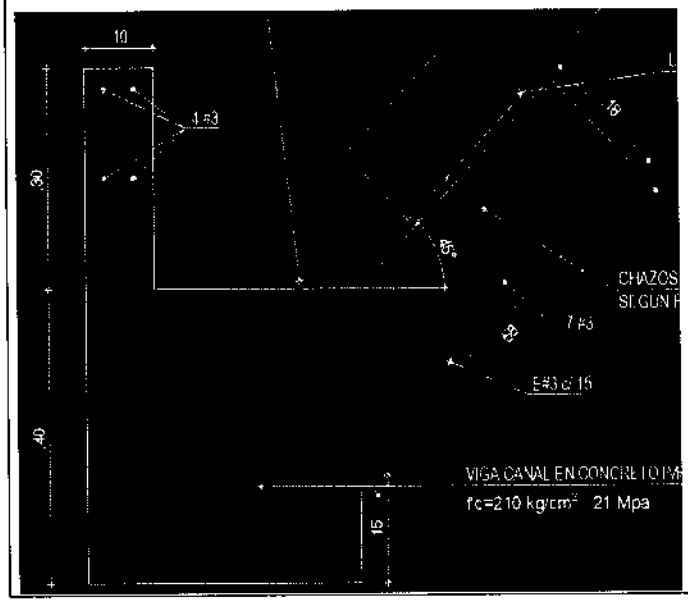




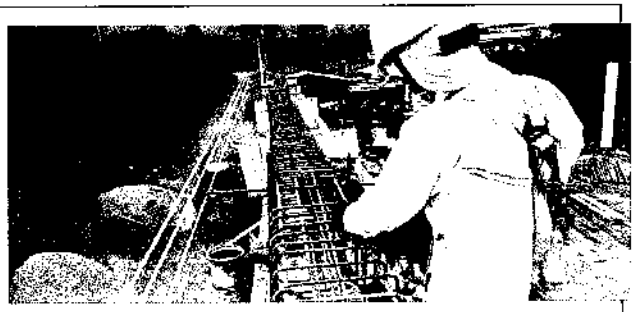






- *Suministro e instalación de manto zetal viga canal.*






CUBIERTA

- Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 20, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.

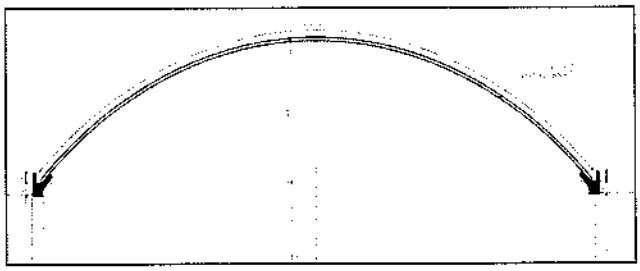

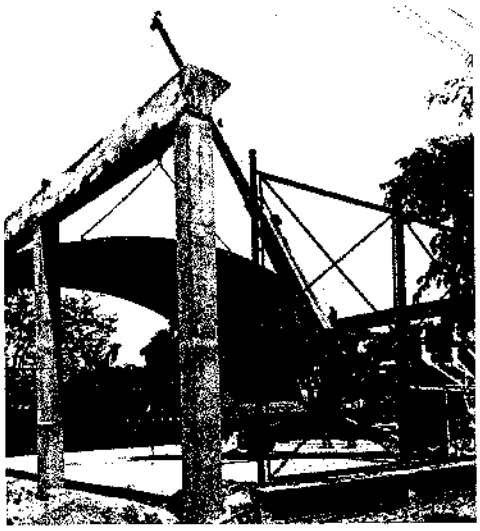





INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.



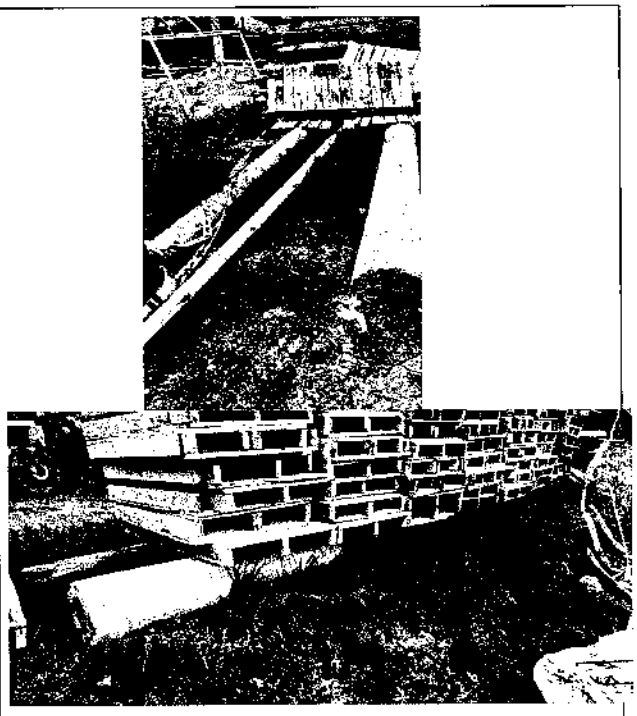

-Transporte de materiales pétreos

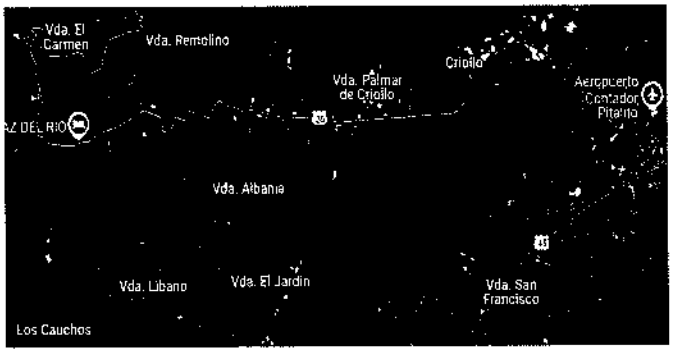





11. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS									
CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSI NO. 02						OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	VR/UNIT	CANT.	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
1									
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES								
1.01	Localización y replanteo.	M2	$ 3,549.00	733.21	$ 2,602,162.29	733.21	$ 2,602,162.29	733.21	$ 2,602,162.29
1.02	Demolición cuneta existente	ML	$ 7,544.00	60.80	$ 458,675.20				
1.03	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	$ 26,210.00	27.97	$ 733,093.70				
1.04	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	$ 20,804.00	0.00	$ 0.00				
1.05	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	$ 116,413.00	2.00	$ 232,826.00	2.00	$ 232,826.00	2.00	$ 232,826.00
1.06	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	$ 45,880.00	280.23	$ 12,856,952.40	280.23	$ 12,856,952.40	280.23	$ 12,856,952.40
1.07	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	$ 83,626.00	102.30	$ 8,554,939.80	102.30	$ 8,554,939.80	102.30	$ 8,554,939.80
Subtotal					**$ 25,438,649.10**		**$ 24,246,880.49**		**$ 24,246,880.49**
2									
2.1	CIMENTACIÓN								
2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	$ 33,922.00	21.60	$ 732,715.20	21.60	$ 732,715.20	21.60	$ 732,715.20
2.02	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zoga	M3	$ 359,045.00	29.94	$ 10,749,807.30	29.94	$ 10,749,807.30	29.94	$ 10,749,807.30
2.03	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	$ 617,415.00	38.92	$ 24,029,791.80	38.92	$ 24,029,791.80	38.92	$ 24,029,791.80

2.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	$ 7,097.00	2,789.00	$ 19,793,533.00	2,789.00	$ 19,793,533.00	2,789.00	$ 19,793,533.00
2.05	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	$ 740,066.00	11.20	$ 8,288,739.20	11.20	$ 8,288,739.20	11.20	$ 8,288,739.20
2.06	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	$ 7,097.00	1,029.20	$ 7,304,232.40	1,029.20	$ 7,304,232.40	1,029.20	$ 7,304,232.40
Subtotal					**$ 70,898,818.90**		**$ 70,898,818.90**		**$ 70,898,818.90**
3									
3.1	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**								
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	$ 918,378.00	16.72	$ 15,355,280.16	16.72	$ 15,355,280.16	16.72	$ 15,355,280.16
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	$ 7,097.00	2,955.17	$ 20,972,841.49	2,955.17	$ 20,972,841.49	2,955.17	$ 20,972,841.49
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	$ 1,002,201.00	16.37	$ 16,406,030.37	16.37	$ 16,406,030.37	16.37	$ 16,406,030.37
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	$ 7,097.00	2,096.44	$ 14,878,434.68	2,096.44	$ 14,878,434.68	2,096.44	$ 14,878,434.68
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	$ 40,240.00	60.80	$ 2,446,592.00	60.80	$ 2,446,592.00	60.80	$ 2,446,592.00
Subtotal					**$ 70,059,178.70**		**$ 70,059,178.70**		**$ 70,059,178.70**
4									
4.1	**CUBIERTA**								
4.01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 20, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	$ 285,939.00	690.38	$ 197,406,566.82	690.38	$ 197,406,566.82	690.38	$ 197,406,566.82
Subtotal					**$ 197,406,566.82**		**$ 197,406,566.82**		**$ 197,406,566.82**
5									
5.1	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**								

5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	$ 14,758.00	317.78	$ 4,689,797.24				
5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	$ 3,700,895.00	2.00	$ 7,401,790.00				
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	$ 84,509.00	27.97	$ 2,363,547.71				
5.04	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	$ 83,629.00	62.80	$ 5,251,901.20				
NP-5.05	Rejillas prefabricadas para cunetas.	ML	$ 159,779.00	60.80	$ 9,714,563.20				
Subtotal					**$ 29,421,599.35**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
6									
6.1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**								
6.01	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	$ 79,932.00	63.20	$ 5,051,702.40				
6.02	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	$ 106,806.00	20.60	$ 2,200,203.60				
6.03	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	$ 218,470.00	30.00	$ 6,554,100.00				
6.04	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	$ 349,057.00	2.00	$ 698,114.00				
Subtotal					**$ 14,504,120.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
7									

7.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**								
7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UND	$ 292,572.00	3.00	$ 877,716.00	3.00	$ 877,716.00	3.00	$ 877,716.00
7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	$ 637,202.00	3.00	$ 1,911,606.00				
7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	$ 45,880.00	5.12	$ 234,905.60				
7.04	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	$ 49,210.00	32.00	$ 1,574,720.00				
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	$ 303,693.00	2.00	$ 607,386.00				
7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	$ 281,525.00	2.00	$ 563,050.00				
7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	$ 1,014,120.00	1.00	$ 1,014,120.00				
7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	$ 4,688,701.00	1.00	$ 4,688,701.00				
7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	$ 88,300.00	35.00	$ 3,090,500.00				
7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	$ 367,987.00	12.00	$ 4,415,844.00				
7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	$ 57,998.00	102.80	$ 5,962,194.40				
7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	$ 1,016,078.00	12.00	$ 12,192,936.00				
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	$ 972,420.00	1.00	$ 972,420.00				

7.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	$ 1,032,612.00	1.00	$ 1,032,612.00				
NP-7.15	Reubicación de postes eléctricos en concreto	UND	$ 968,000.00	2.00	$ 1,936,000.00				
Subtotal					**$ 41,074,711.00**		**$ 877,716.00**		**$ 877,716.00**
8									
8.1	**TRANSPORTE**								
8.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	$ 1,150.00	5,294.18	$ 6,088,307.00	5,294.18	$ 6,088,307.00	5,294.18	$ 6,088,307.00
Subtotal					**$ 6,088,307.00**		**$ 6,088,307.00**		**$ 6,088,307.00**
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 454,891,951.00**		**$ 369,577,467,91**		**$ 369,577,467,91**
	Administración	20%			$ 90,978,390.00		$ 73,915,493,58		$ 73,915,493,58
	Imprevistos	1%		-	$ 4,548,920.00		$ 3,695,774,68		$ 3,695,774,68
	Utilidad	4%			$ 18,195,678.00		$ 14,783,098,72		$ 14,783,098,72
	VALOR TOTAL				**$ 568,614,941.00**		**$ 461,971,834,89**		**$ 461,971,834,89**
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	**25%**					**$ 115.492.958,72**		**$ 115.492.958,72**
	VALOR TOTAL MENOS (-) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO						**$ 346.478.876,17**		**$ 346.478.876,17**
	% AVANCE DE OBRA						**81.24511010474840%**		**81.24511010474840%**

CONSORCIO WF
ING. JAVIER HUMBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DANES INGENIEROS SAS
ING. NESTOR RODRIGO FIERRO LOSADA
DIRECTOR DE OBRA

20. ANEXOS

- INFORMES HSEQ.
- RESULTADO DE ENSAYOS Y PRUEBA DE LABORATORIO.
- MEMORIAS DE CALCULO ACTA PARCIAL NO. 01.
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA REALIZADO POR EL INTERVENTOR (Vo.Bo. Interventor).

ING. NÉSTOR RODRIGO FIERRO L	(20/01/2025)	ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE OBRA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo INTERVENTORIA**

INFORME No. 1

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST

Contrato de obra No.

CLPIH383 DE 2023

Periodo:

DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Objeto Contrato:

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN – DEPARTAMENTO DEL HUILA"

REVISÓ Y APROBÓ	
FIRMA	
NOMBRE	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA
CARGO	Director de Obra
ELABORÓ	
FIRMA	
NOMBRE	CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CÓRDOBA
CARGO	Residente SISO

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 6
2.1 OBJETIVO GENERAL 6
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
3. CONTRATO DE OBRA 7
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9
6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 10
6.1 AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL (EPS, ARL, AFP) 10
6.2 EXÁMENES MEDICO OCUPACIONALES 12
6.3 INDUCCIONES EN SST 12
6.4 ENTREGA DE EPP 13
6.5 CHARLAS PREOPERACIONALES 13
6.6 DILIGENCIAMIENTO DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - ATS 14
6.7 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 15
7. ANEXOS 18

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información del contrato de obra 7
Tabla 2. Personal vinculado al proyecto 11
Tabla 3. Charlas preoperacionales 14

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del área de intervención 8

Ilustración 2. Panorámica Polideportivo Vda. Los Andes – San Agustín, antes de la Intervención 8

Ilustración 3. Entrega de EPP a personal de obra 13

Ilustración 4. Charlas pre operacionales a personal de obra 14

1. INTRODUCCIÓN

Este documento se presenta para dar cumplimiento a la normatividad contractual en lo correspondiente a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el proyecto de la *"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA".*

El informe mensual No. 1 corresponde al periodo comprendido entre el 12 y el 30 de noviembre de 2024. Allí se presentan las generalidades de la gestión adelantada referente a las medidas de manejo implementadas en el periodo de ejecución de las obras.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar los registros de cumplimiento a los compromisos establecidos en el aspecto de seguridad y salud en el trabajo, por la empresa DANES INGENIEROS S.A.S de acuerdo al contrato de obra No. CLPIH383 de 2023 cuyo objeto es: *"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN – DEPARTAMENTO DEL HUILA"*, durante el periodo comprendido entre el 12 y el 30 de noviembre de 2024.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

✓ Describir las actividades de SST que se desarrollaron durante el periodo, las cuales se encuentran dividas por componentes.
✓ Generar registros que evidencien el cumplimiento de las actividades SST por parte del contratista de obra.
✓ Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente referente a la seguridad y salud en el trabajo.

3. CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

En la tabla 1 se incluye la información general del contrato de obra:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CLPIH383 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**PERIODO DEL INFORME**	Del 12 al 30 de noviembre de 2024
CONTRATISTA	DANES INGENIEROS S.A.S	**NIT:**	900.219.918-2
REPRESENTANTE LEGAL:	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	**C.C:**	7.719.364 DE NEIVA (H)
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	01/11/2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16/11/2023		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N.A.		
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES		
VALOR INICIAL:	$ 506.549.699		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N.A.		
VALOR TOTAL:	$ 506.549.699		
INTERVENTOR:	CONSOCIO WF	**NIT:**	901.769.619-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANÍA	**C.C:**	7.711.430 DE NEIVA (H)

Tabla 1. Información del contrato de obra

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en la vereda Los Andes zona rural del municipio de San Agustín – Departamento del Huila.

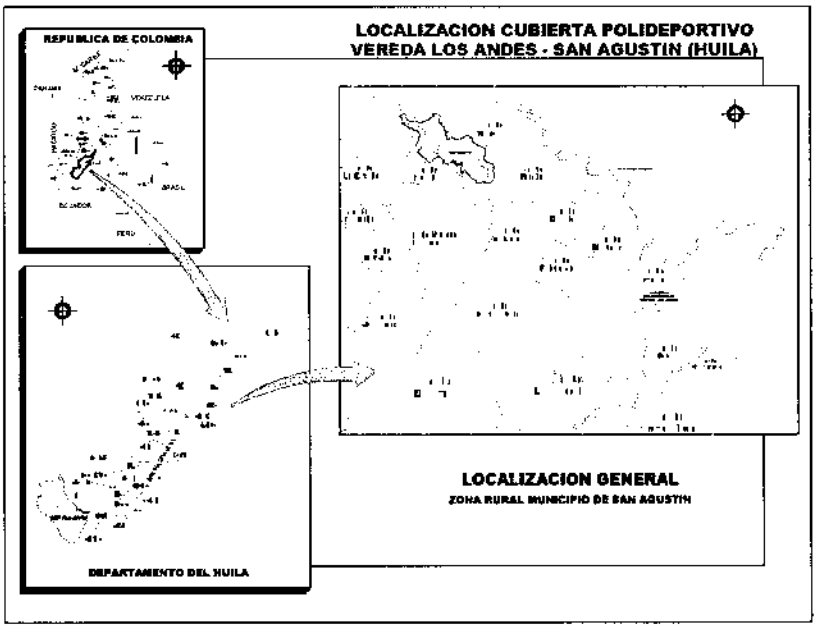


Ilustración 1. Localización del área de intervención



Ilustración 2. Panorámica Polideportivo Vda. Los Andes – San Agustín, antes de la Intervención

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto arquitectónico contempla un área a intervenir de 632,32 m2, en la que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 20 en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz, para el polideportivo ubicado en la vereda Los Andes del Municipio de San Agustín – Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; el polideportivo corresponde a estructura de cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con sistema autoportante, sostenida con columnas en concreto de 3.00 PSI. El sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3.000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras atienden lo establecido en la NORMA SISMORRESISTENTE de 2010 – NSR-10.

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- Actividades preliminares
- Cimentación
- Estructura en concreto
- Cubierta
- Acabados – placa de concreto
- Instalaciones hidrosanitarias
- Instalaciones eléctricas
- Transporte

6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO

DANES INGENIEROS S.A.S ha implemento el Sistema de Gestión de Seguridad y la Salud en el Trabajo SG- SST de la obra civil cuyo objeto es: la *"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN – DEPARTAMENTO DEL HUILA"*, con los lineamientos establecidos en el **Decreto 1072 del 2015.**

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

DANES INGENIEROS S.A.S aborda la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).

Para la implementación del SG-SST la empresa elaboró los siguientes documentos según normatividad aplicable y se adapta al tamaño y características del Proyecto.

- Política y Objetivos Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST.
- Política de no alcohol, no drogas y no tabaquismo.
- Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
- Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Subprogramas de Seguridad y Salud.

Las medidas, actividades y controles SST implementadas en la etapa constructiva son:

6.1 AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL (EPS, ARL, AFP)

De conformidad con la Ley 100 de 1993, DANES INGENIEROS S.A.S da cumplimiento con la

realización de la afiliación a la seguridad social al momento de la contratación del personal igualmente se hace el seguimiento al personal subcontratista que inicie labores solicitando certificados de pagos y verificando oportunamente la afiliación a EPS, AFP y ARL.

Durante el periodo del 12 al 30 de noviembre de 2024, se realizaron afiliaciones a la seguridad social y también se dio cumplimiento con el pago a la seguridad social del personal administrativo y operativo vinculado al proyecto. (Anexo 1. Pago de la seguridad social).

A continuación, se relaciona el personal activo de MOC y MONC del periodo reportado:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CÉDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	PENSIÓN
1	Néstor Rodrigo Fierro Losada	7.719.364	Director de Obra	12/11/2024	SURA	Nueva EPS	Porvenir
2	Johan Sebastián Rios Palacio	1.057.304.693	Residente de Obra	12/11/2024	SURA	SURA	Porvenir
3	Wilmar Armando Jiménez Marulanda	80.826.744	Coordinador	12/11/2024	SURA	Nueva EPS	Porvenir
4	Cristian Camilo López Córdoba	1.075.220.858	Residente SST	12/11/2024	SURA	Sanitas	Protección
5	José Albeiro Tovar Gómez	12.137.587	Maestro	12/11/2024	SURA	Nueva EPS	Porvenir
6	Silvio Quiñonez Samboni	1.061.986.149	Ayudante	13/11/2024	SURA	Asmet Salud	Protección
7	Emiro Samboni Muñoz	1.061.985.551	Ayudante	18/11/2024	SURA	Asmet Salud	Porvenir
8	Robinson Arcos Torres	1.082.772.137	Ayudante	18/11/2024	SURA	Nueva EPS	Porvenir
9	Jorge Armando Hoyos Paz	1.082.774.946	Ayudante	18/11/2024	SURA	Nueva EPS	Porvenir

Tabla 2. Personal vinculado al proyecto

Teniendo en cuenta la información suministrada anteriormente, durante el periodo del 12 al 30 de noviembre de 2024, ingresaron un total de 9 trabajadores, de los cuales 5 trabajadores son MONC y 4 trabajadores son MOC. Es de resaltar que el personal vinculado al proyecto se encuentra afiliado a EPS, ARL Y AFP.

6.2 EXÁMENES MEDICO OCUPACIONALES

De conformidad a la Resolución 2346 del 2007 "Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales (...)". Por lo tanto, DANES INGENIEROS S.A.S., ha realizado los exámenes médicos ocupacionales de ingreso al personal contratado.

Estos exámenes médicos ocupacionales se determinan según las funciones y/o actividades que desempeñara el trabajador y lo establece un Profesiograma para perfiles de cargos según el riesgo ocupacional.

Durante el periodo del 12 al 30 de noviembre de 2024 se realizaron un total de 9 exámenes médicos ocupacionales de ingreso. (Anexo 2. Exámenes ocupacionales)

6.3 INDUCCIONES EN SST

DANES INGENIEROS S.A.S., realizó inducciones en SST a todo el personal contratado durante la etapa de inicio y de construcción vinculados al Proyecto, además se realiza la Notificación de riesgos al cual estarán expuestos en toda la ejecución de sus labores y el desarrollo de la misma. (Anexo 3. Inducciones)

Los temas que se abordan en la inducción se describen a continuación:

1. Políticas en SST, Políticas para el no consumo de tabaco, alcohol y drogas.
2. Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
3. Entidades que conforman la seguridad social.
4. Actividad económica.
5. Peligros y riesgos asociados a la actividad económica.
6. Obligaciones del empleador y de los trabajadores.
7. Incidentes, accidentes de trabajos, actos y condiciones inseguras y enfermedades laborales.
8. Como reportar un accidente de trabajo.
9. Clasificación de agentes de riesgos.
10. Elementos de protección personal EPP.
11. Prevención y respuestas ante una emergencia (Brigadas de emergencias).
12. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral.
13. Plan de manejo ambiental implementado para la obra.
14. Políticas de igualdad salarial, protocolo de perspectiva de género.

6.4 ENTREGA DE EPP

DANES INGENIEROS S.A.S implementa una Matriz de EPP por Cargos/Actividades, donde facilita la identificación de los EPP que requieren cada uno de los trabajadores según las funciones y/o actividades que desarrollaran. Permitiendo así eliminar y/o minimizar los Factores de riesgos de Seguridad o de Higiene a los que estén expuestos.

Para el periodo del 12 al 30 de noviembre de 2024 se realizó entrega de los elementos de protección personal al personal contratado. (Anexo 4. Entrega de EPP).



Ilustración 3. Entrega de EPP a personal de obra

6.5 CHARLAS PREOPERACIONALES

Las charlas pre operacionales son uno de los medios más eficaces para corregir las prácticas de trabajo incorrectas y formar una conciencia en prevención de accidentes, tanto en el trabajo como fuera de este.

Por este motivo el DANES INGENIEROS S.A.S realizó Charlas Pre operacionales o de seguridad previo al inicio de las actividades. Sensibilizando, Concienciando e inculcando una cultura de autocuidado; evitando actos y condiciones inseguras lo cual permite mitigar los accidentes, incidentes y enfermedades laborales abarcando temas de Seguridad y Salud en el trabajo.

A continuación, se relaciona las charlas pre operacionales programadas y realizadas para el periodo del 12 al 30 de noviembre de 2024, cuyos soportes se anexan en el Anexo 5. Charlas preoperacionales.

TEMAS A TRATAR	RESPONSABLE	FECHA
Uso de los EPP	SISO	19/11/2024
Importancia del Autocuidado	SISO	22/11/2024
Importancia de delimitar el área de trabajo	SISO	25/11/2024
Orden y aseo en el lugar de trabajo	SISO	28/11/2024

Tabla 3. Charlas preoperacionales





Ilustración 4. Charlas pre operacionales a personal de obra

6.6 DILIGENCIAMIENTO DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - ATS

Durante el presente periodo, se requirieron los siguientes Análisis de Seguridad en el Trabajo para las actividades desarrolladas y que se adjuntan en el Anexo 6. Análisis de Trabajo

Seguro.

ATS – Excavación manual para cimentación.
ATS – Fundición de concreto ciclópeo para cimentación.

6.7 INDICADORES DE SEGUIMIENTO

- **Accidentes Laborales Presentados en el Periodo:** Para el periodo del 12 al 30 de noviembre de 2024, no se presentaron accidentes laborales dentro del proyecto.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Número de empleados accidentados al mes / Número total de empleados al mes) * 100
	0/9*100=0%

- **No. de días perdidos por AL:** En el periodo del 12 al 30 de noviembre de 2024, no se presentaron días perdidos por Accidentes Laborales.

- **No. de días perdidos por enfermedad común:** En el periodo del 12 al 30 de noviembre de 2024, no se presentaron incapacidades por enfermedad común, el personal se encuentra en buenas condiciones de salud.

- **No. de días perdidos por enfermedad laboral:** En el periodo del 12 al 30 de noviembre de 2024, no se presentaron incapacidades por enfermedad laboral.

- **Tasa de accidentalidad:** En el periodo del 12 al 30 de noviembre de 2024, la tasa de accidentalidad fue cero.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Número de accidentes de trabajo / Número de trabajadores) * 100
	0/9*100=0%

- **Hora de hombres trabajadas:** Se determina que: Durante el periodo del 12 al 30 de noviembre de 2024 se trabajó 16 días hábiles, de los cuales de lunes a viernes tuvieron

jornada laboral de 8 horas diarias y los sábados 4 horas laborales, lo que corresponde a que se tuvo 1.116 HHT.

ÍTEM	No. TRABAJADORES	No. DÍAS	HORAS	TOTAL
HHT	9	16	124	1.116

- **Índice de Frecuencia AT:** Durante el periodo del 12 al 30 de noviembre de 2024, se reportaron 1862 HHT, para ese mismo periodo no se presentaron accidentes de trabajo.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Número total de AT en el mes / Número HHT en el mes) * 100
	0/1.116*100= 0%

- **Índice de severidad AT:** De las 1.116 HHT reportadas, no se presentaron días perdidos de ninguna índole.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Número de días perdidos y cargados por AT en el mes / Número HHT en el mes) * 100
	0/1.116*100= 0%

- **Índice lesiones incapacitantes de AT:** El índice de lesión incapacitante es 0, ya que no se presentaron incapacidades durante el periodo.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	IF * IS / 1000
	0*0/1000=0%

- **Tasa de ausentismo general:** Durante el periodo se laboraron 1.116 Horas hombres trabajadas, no hubo días perdidos por enfermedad común, accidentes de trabajo, enfermedad profesional o permisos.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Número de días perdidos por (EC + AT + EP + permisos / Numero HHT mes) * 100
	0+0+0+0/1.116*100=0%

- **Capacitaciones:** La participaron en las charlas pre operacionales fue del 100% del personal contratado en el periodo para el proyecto.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Número de empleados que asisten a charlas realizadas / Número total de empleados) * 100
	9/9 * 100= 100%

- **Entrega de los elementos de protección personal:** Se hizo entrega de los EPP a todo el personal vinculado al proyecto, cumpliendo con el 100% del indicador.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Número de entrega de EPP nuevos y/o reposición / Número total de trabajadores) * 100
	9/9 * 100 = 100%

- **Afiliaciones:** Se dio cumplimiento en su totalidad con las afiliaciones al Sistema de seguridad social.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social / Número total de empleados laborando) * 100
	9/9 * 100 = 100%

7. ANEXOS

ANEXO 1. Pago de seguridad social

aportes en línea

P lla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	94107710	9461784678	E	2024/01/05	2024/01/19	BANCO DE OCCIDENTE	14	$1,667,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	cde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
TOTAL AFILIADOS																						$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000		$254,600			$5,800,000			$1,646,600
Centro de Trabajo: PERSONAL ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200			$0	$0		$569,000
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200			$0	$0		$569,000
1	CC	7719364	FIERRO NESTOR																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,400	30	$0	$0	Si	$284,500
2	CC	36067241	MEDINA SANDRA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,400	30	$0	$0	Si	$284,500
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (3 Afiliados)																						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000		$242,400			$0	$0		$1,077,600
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)																						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000		$242,400			$0	$0		$1,077,600
3	CC	1080187924	AVILA NICOLAS																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
4	CC	1075280329	LOSADA DIVA		X															23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	1075306422	TRUJILLO NICOLAS																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total	**Afiliados(5)**																					$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000		$254,600			$0	$0		$1,646,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	94107710	9461784678	E	2024/01/05	2024/01/19	BANCO DE OCCIDENTE	14	$1,667,700

RESUMEN DE PAGO

TIPO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$928,000	$11,800	$0	$939,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$742,400	$9,400	$0	$751,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$2,400	$0	$188,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$254,600	$3,300	$0	$257,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$254,600	$3,300	$0	$257,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$232,000	$3,000	$0	$235,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$232,000	$3,000	$0	$235,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$232,000	$3,000	$0	$235,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$185,600	$2,400	$0	$188,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$600	$0	$47,000
TOTAL				5	$1,646,600	$21,100	$0	$1,667,700

2024/03/11 09:45 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	03173028	9478621046	E	2024/12/05	2024/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	4	$814,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		$0	
Centro de Trabajo: PERSONAL ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC	7719364	FIERRO NESTOR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	36067241	MEDINA SANDRA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (1 Afiliados)					$563,334	$90,200			$563,334	$22,600			$563,334	$22,600			$563,334	$39,300		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$563,334	$90,200			$563,334	$22,600			$563,334	$22,600			$563,334	$39,300		$0	$0
3	CC	12137587	TOVAR JOSE	230301	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF32	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**					$3,163,334	$506,200			$3,163,334	$126,600			$3,163,334	$126,600			$3,163,334	$52,900		$0	$0

2024/12/09 10:18 AM

aportes en línea

P. .illa Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057304693		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1129348867	9478285730	I	2024/12/20	2024/12/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$461,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
1	CC	1057304693	RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
Total Afiliados(1)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057304693		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1129348867	9478285730	I	2024/12/20	2024/12/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$461,000

RESUMEN DE PAGO

TIPO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$461,000	$0	$0	$461,000

2025/05/19 08:03 PM

aportes en línea

Resumen eneral de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	28871045	9478913722	E	2024/12/05	2024/12/16	BANCO DE OCCIDENTE	11	$460,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
[illegible]						[illegible]	$235,900			$1,473,335	$59,100			[illegible]	$59,100			[illegible]	$102,900		[illegible]	[illegible]
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (5 Afiliados)						$1,473,335	$235,900			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$102,900		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)						$1,473,335	$235,900			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$102,900		$0	$0
1	CC	1082772137	ARCOS ROBINSON	230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
2	CC	1082772716	ARCOS WILIAN	230301	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF32	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
3	CC	1082774946	HOYOS JORGE	230301	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF32	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0
4	CC	1061986149	QUIÑONEZ SILVIO	230201	8	$346,667	$55,500	ESSC62	8	$346,667	$13,900	CCF32	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
5	CC	1061985531	SAMBONI EMIRO	230301	8	$346,667	$55,500	ESSC62	8	$346,667	$13,900	CCF32	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$1,473,335	$235,900			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$102,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen neral de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	28871045	9478913722	E	2024/12/05	2024/12/16	BANCO DE OCCIDENTE	11	$460,800

RESUMEN DE PAGO

NIT-CC	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$235,900	$1,900	$0	$237,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$180,400	$1,400	$0	$181,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$55,500	$500	$0	$56,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$102,900	$800	$0	$103,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$102,900	$800	$0	$103,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$59,100	$500	$0	$59,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$59,100	$500	$0	$59,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$59,100	$600	$0	$59,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$27,800	$300	$0	$28,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$31,300	$300	$0	$31,600
TOTAL				5	$457,000	$3,800	$0	$460,800

aportes en línea

Resumen neral de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	32650641	9480094007	E	2024/12/05	2025/01/09	BANCO DE OCCIDENTE	35	$522,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: NEIVA (Principal)					$1,646,668	$263,600			$1,646,668	$66,000			$1,646,668	$66,000			$1,646,668	$114,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (2 Afiliados)					$1,646,668	$263,600			$1,646,668	$66,000			$1,646,668	$66,000			$1,646,668	$114,800		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)					$1,646,668	$263,600			$1,646,668	$66,000			$1,646,668	$66,000			$1,646,668	$114,800		$0	$0
1	CC	80926744	JIMENEZ WILMAR	230301	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF32	19	$823,334	$33,000	14-11	19	$823,334	$57,400	19	$0	$0
2	CC	1075220858	LOPEZ CRISTIAN	230201	19	$823,334	$131,800	EPS005	19	$823,334	$33,000	CCF32	19	$823,334	$33,000	14-11	19	$823,334	$57,400	19	$0	$0
Total		**Afiliados(2)**				$1,646,668	$263,600			$1,646,668	$66,000			$1,646,668	$66,000			$1,646,668	$114,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen general de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	32850641	9480094007	E	2024/12/05	2025/01/09	BANCO DE OCCIDENTE	35	$522,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$263,600	$6,200	$0	$269,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$131,800	$3,100	$0	$134,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$131,800	$3,100	$0	$134,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,800	$2,700	$0	$117,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$114,800	$2,700	$0	$117,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$66,000	$1,600	$0	$67,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	$66,000	$1,600	$0	$67,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$66,000	$1,600	$0	$67,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$33,000	$800	$0	$33,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$33,000	$800	$0	$33,800
TOTAL				2	$510,400	$12,100	$0	$522,500

2025/01/09 04:22 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	32850249	9480094655	E	2025/01/08	2025/01/09	BANCO DE OCCIDENTE	1	$2,693,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]						$9,230,002	$1,477,000			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$475,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC	7719364	FIERRO NESTOR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	38067241	MEDINA SANDRA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (9 Afiliados)						$6,630,002	$1,061,000			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$461,800		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (9 Afiliados)						$6,630,002	$1,061,000			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$461,800		$0	$0
3	CC	1082772137	ARCOS ROBINSON	230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
4	CC	1082772716	ARCOS WILIAN	230301	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF32	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
5	CC	1082774946	HOYOS JORGE	230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
6	CC	80926744	JIMENEZ WILMAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	1075220858	LOPEZ CRISTIAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	7705022	MARTINEZ CARLOS	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	1061986149	QUINDNÉZ SILVIO	230201	6	$260,000	$41,600	ESSC62	6	$260,000	$10,400	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
10	CC	1061985531	SAMBONI EMIRO	230301	5	$216,667	$34,700	ESSC62	5	$216,667	$8,700	CCF32	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
11	CC	12137587	TOVAR JOSÉ	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$9,230,002	$1,477,000			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$475,400		$0	$0

aportes en línea

P illa Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057304693		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1165312149	9479812982	I	2025/01/23	2025/01/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$12,174,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	fri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (Afiliados)																							$32,500,000	$5,850,000			$32,500,000	$4,062,500			$0	$0			$32,500,000		$2,262,000					$12,174,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$32,500,000	$5,850,000			$32,500,000	$4,062,500			$0	$0			$32,500,000		$2,262,000					$12,174,500
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																							$32,500,000	$5,850,000			$32,500,000	$4,062,500			$0	$0			$32,500,000		$2,262,000					$12,174,500
1	CC	1057304693	RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN																		230301	30	$32,500,000	$5,850,000	EPS010	30	$32,500,000	$4,062,500		0	$0	$0	14-11	30	$32,500,000	6.960%	$2,262,000	0	$0	$0	No	$12,174,500
Total			**Afiliados(1)**																				$32,500,000	$5,850,000			$32,500,000	$4,062,500			$0	$0			$32,500,000		$2,262,000					$12,174,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057304693		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1165312149	9479812982	I	2025/01/23	2025/01/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$12,174,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,850,000	$0	$0	$5,850,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$5,850,000	$0	$0	$5,850,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,262,000	$0	$0	$2,262,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$2,262,000	$0	$0	$2,262,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,062,500	$0	$0	$4,062,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$4,062,500	$0	$0	$4,062,500
TOTAL				1	$12,174,500	$0	$0	$12,174,500

2025/05/19 08:05 PM

ANEXO 2. Exámenes ocupacionales de ingreso

I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL

Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo 867 del 2021
CÓDIGO DE HABILITACIÓN SECRETARIA DE SALUD DPTAL: 41 001 01 37 201

CERTIFICADO MEDICO LABORAL B114083

Sede de atención: NEIVA :: Ciudad de atención: NEIVA :: Fecha de atención: 2024-11-07 15:56 :: Fecha de impresión: 2024-11-07 (901219918-2)



Datos de la Empresa:

RAZÓN SOCIAL:	DANES INGENIEROS S.A.S	TELEFONOS:	3118510824
DIRECCIÓN:	CR 5 15 01	PROFESIOGRAMA:	No
NIT:	900219918-2	Ciudad:	NEIVA - HUILA
EMPRESA MISIÓN:	DANES INGENIEROS S.A.S		

Datos del Usuario:

NOMBRE:	NESTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	IDENTIFICACION:	CC 7.719.364
DIRECCIÓN:	CALLE 18 #33A-41 NEIVA	EDAD:	40 AÑOS
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA	GÉNERO:	MASCULINO
DOMINANCIA:	DIESTRO	TELEFONOS:	3152052190
TIPO DE EXAMEN:	PERIODICO	ESTADO CIVIL:	CASADO(A)

Servicios Realizados

Las recomendaciones medicas se definieron con base a los resultados de los siguientes exámenes practicados:

CONSULTA MEDICO OCUPACIONAL
- ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR

CONSULTA DE VISIOMETRIA
CONSULTA DE AUDIOMETRIA ADULTO

Recomendaciones Preventivas para el trabajador

HIGIENE POSTURAL EN EL PUESTO DE TRABAJO
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DURANTE LA JORNADA LABORAL.
REALIZAR LAVADO DE MANOS AL MENOS UNA VEZ CADA 3 HORAS CON MUCHA AGUA Y JABÓN MÍNIMO POR 20 SEGUNDO
EVITAR TOCARSE LOS OJOS, LA NARIZ O LA BOCA Y EL CUELLO CON LAS MANOS SIN LAVAR.
APLICAR EL CÓDIGO DE ETIQUETA RESPIRATORIA.
MANTENGA AL MENOS 2 METRO DE DISTANCIA ENTRE USTED Y LAS DEMÁS PERSONAS.
USO DE TAPABOCAS DE MANERA CONTINUA PARA LABORAR.
PROCURE TENER ILUMINADA Y VENTILADA DE FORMA NATURAL SU VIVIENDA.
NO SALUDE CON BESO, NI ABRAZO, NI DE LA MANO A NINGUNA PERSONA.
REPORTE A SU EMPLEADOR SI PRESENTA SÍNTOMAS DE ALARMA PARA COVID-19.
MANTENGA SEPARADA LA ROPA DE TRABAJO DE LAS PRENDAS DE USO EXTRALABORAL.

Conducta Medico Laboral para el Cargo

CONDICIONES ADECUADAS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO

Conducta Médico para Énfasis Osteomuscular — EVALUACIÓN SATISFACTORIA ASOCIADA AL ÉNFASIS

Observaciones Laborales

NINGUNA

Consentimiento Informado y Autorización para Tratamiento de Datos Personales

Autorizo a I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL, a realizar en mi examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), registrado(s) en este documento. El (la) Profesional de la Salud abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido oportunidad de analizar el propósito,los beneficios, la interpretación, las recomendaciones, las limitaciones y riesgos del examen medico y/o paraclinico(s) ocupacional(es), a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de los exámenes.

Entiendo que la realización de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que se realizara el(los) examen(es). Las respuestas dadas por mi en este(os) examen(es) está(n) completa(s) y verídica(s). Autorizo a I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL para que suministre las personas o entidades contempladas en la misma legislación la información contenida en estos exámenes. Finalmente manifiesto que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento para la realización de los exámenes médicos.

Así mismo notifico que la I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL me informo que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.10, Numeral 1, debo procurar el cuidado integral de mi salud, por lo anterior debo acoger y dar tratamiento a las recomendaciones y restricciones dadas por el medico laboral durante la consulta medica y las emitida en este documento, las cuales estarán sujetas al seguimiento y control periódico.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con mi firma manifiesto que he sido informado por SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRADA S.A.S al respecto del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO ASEGURA QUE SE REALICE LA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE. Verifique la autenticidad del presente documento en nuestro portal virtual para empresas www.ipscdo.com.co o comuníquese con nuestra línea telefónica (8) 872 02 05.

Edith Yohana Correa

EDITH YOHANA CORREA VARGAS
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
TARJETA PROFESIONAL No. RM 55208192 // LIC SST P

NESTOR RODRIGO FIERRO LOSADA
C.C. 7.719.364
PACIENTE



DR. ALFONSO BENAVIDES SUAREZ
MEDICO-ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
R.M Registro Médico No. 972/1997 - I.S.O 1180 DE 2022

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 14-11-2024

NOMBRE Y APELLIDO: JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO **C.C No: 1057304693**

CARGO: INGENIERO RESIDENTE **DEPENDENCIA:** **EDAD: 36 AÑOS**

EMPRESA: DANES INGENIEROS SAS **DIRECCION: VDA. LOS ANDES - SAN AGUSTIN**

EXAMENES PRACTICADOS

EXAMENES	
EVALUACIÓN MEDICO OCUPACIONAL	☑
OPTOMETRIA	☑
AUDIOMETRIA	☑
RX	☐
OTROS LABORATORIOS	☑
VERTIGO-MANIOBRAS	☑
ESPIROMETRIA	☐
ESPACIOS CONFINADOS	☐
PSICOLOGIA	☐

LABORATORIO: NORMAL: GLUCOSA, COLESTEROL TOTAL,TRIGLICERIDOS

RAYOS X: NO REALIZO

OPTOMETRIA: NORMAL

FONO AUDIOLOGIA: NORMAL

VERTIGO - MANIOBRAS: POSITIVO [ ] NEGATIVO [X]

EXAMEN A REALIZAR DE INGRESO / PERIODICO / EGRESO

APTO PARA EL CARGO: SIN PATOLOGIA APARENTE [X] CON PATOLOGIA QUE NO LIMITA SU LABOR: [ ]

APTO CON RESTRICCION [ ] MOTIVO:

APTO PARA MANIPULAR ALIMENTOS [ ] MOTIVO:

APLAZADO [ ] MOTIVO:

RECOMENDACIÓN: AL EXAMEN DE INGRESO, SE VALORA EL PACIENTE EN MENCIÓN POR MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL, CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR, AL EXAMEN FISICO GENERAL POR ORGANOS Y SISTEMAS, CARDIOVASCULAR, NEUROLOGICO, PULMONAR: NORMAL. NO PRESENTA SIGNOS, NI SINTOMAS PARA VIRUS COVID-19. USO DE EPP. APTO PARA LABORAR COMO: OBRAS, MANEJO ADECUADO DE CARGAS Y LABORES EN ALTURAS. EMPRESA: DANES INGENIEROS SAS. NOTA: SE APLICA VACUNA TOXOIDE ANTITETANICA LOTE: 220800222B

EXAMEN PERIODICO

PERIODICO: PUEDE CONTINUAR CON SU LABOR [ ]

SE SUGIERE REUBICACIÓN LABORAL TEMPORAL [ ] PERMANENTE [ ] REASIGNAR TAREAS [ ]

OTROS

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS [X] NO APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS [ ]

EXAMEN DE EGRESO

SATISFACTORIO [ ] NO SATISFACTORIO [ ] MOTIVO:

SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL SI [ ] NO [ ]

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

REMISION A E.P.S	[ ]	INICIO DE ACTIVIDAD FISICA	[ ]
CONTINUAR A A.R.P	[ ]	DEJAR DE FUMAR	[ ]
SEGUIMIENTO CASO POR A.R.P	[ ]	REDUCIR CONSUMO DE ALCOHOL	[ ]
CONTROL DE PESO	[ ]		

Incluir en SVE								
	VISUAL	☐	AUDITIVO	☐	RESPIRATORIO	☐	ERGONOMICO	☐
	CARDIOVASCULAR	☐	PSICOLABORAL	☐	BIOLOGICO	☐	QUIMICO	☐

DR. ALFONSO BENAVIDES S.
MEDICO GENERAL
Especialista en Salud Ocupacional
R.M. 972/97 - I.S.O 1180/2022

FIRMA DEL MEDICO
REGISTRO 972/97
ISO 1180/2022

FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C. No: 1082158693

PREVENZA IPS S.A.S.
Profesionales Líderes en la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIT 900369512-9
Calle 10 N.3-27 Local 201 centro, Neiva
Cel. 3173780679 - Tel. 8719366 - 8714570
E-mail. prevenzaips.sas2@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 17.341

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
08 DÍA	11 MES	2024 AÑO	NEIVA (HUILA, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
DANES INGENIEROS S.A.S	DANES INGENIEROS S.A.S

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
LOPEZ CORDOBA CRISTIAN CAMILO	MASCULINO	37 AÑOS	Tipo: CC	Número: 1075220858

Cargo
PROFESIONAL RESIDENTE EN SALUD OCUPACIONAL

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL
APTO (SIN PATOLOGÍAS EVIDENTES; CUMPLE CON LOS CRITERIOS MÉDICOS PARA EL CARGO)

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRÍA	✓	VISIOMETRIA	✓
EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL INGRESO ENFASIS OSTEOMUSCULAR	✓		

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR SATISFACTORIO.

RECOMENDACIONES AL TRABAJADOR: HACER PAUSAS ACTIVAS, HIGIENE POSTURAL, USO ADECUADO DE EPP, ADOPTAR HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, REALIZAR LAS TAREAS SEGÚN LAS NORMAS Y PROTOCOLOS DE LA EMPRESA PARA PREVENIR ACCIDENTES LABORALES.

SE DILIGENCIA FORMATO DE IDENTIFICACION DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 19. NO CUENTA CON CONDICIONES DE ALTO RIESGO PARA COVID 19 SEGÚN CIRCULAR 030 DE 2020. NO REFIERE SÍNTOMAS ASOCIADOS A COVID19 EN ÚLTIMOS 14 DÍAS, NI CONTACTOS ESTRECHOS. SE RECOMIENDA ADOPTAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR COVID 19 TALES COMO LAVADO DE MANOS MÍNIMO CADA 3 HORAS, USO DE TAPABOCAS CONSTANTEMENTE, DISTANCIAMIENTO FÍSICO RESPONSABLE, ENTRE OTROS.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mi en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico	Aspirante o Trabajador
Firma: Carlos Murcia R.	Firma:
Nombre: MURCIA ROJAS CARLOS ESNEIDER	Nombre: CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CÓRDOBA
R. M.: 41 426/2011 L.S.O.: 1221/2016	CC: 1075220858

Software para el sector salud - www.biofile.com.co

PREVENZA IPS S.A.S.
Profesionales Líderes en la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIT. 900369512-9
Calle 10 N.3-27 Local 201 centro, Neiva
Cel. 3173780679 - Tel. 8719366 - 8714570
E-mail. prevenzaips.sas2@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 17.325

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
07 DÍA	11 MES	2024 AÑO	NEIVA (HUILA, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
DANES INGENIEROS S.A.S	DANES INGENIEROS S.A.S

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
TOVAR JOSE ALBEIRO	MASCULINO	56 AÑOS MESES 9 DÍAS	Tipo: CC	Número: 12137587

Cargo
MAESTRO DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL
APTO (SIN PATOLOGÍAS EVIDENTES; CUMPLE CON LOS CRITERIOS MÉDICOS PARA EL CARGO)

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRÍA ✓	VISIOMETRIA ✓
EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL INGRESO ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR SATISFACTORIO.

RECOMENDACIONES AL TRABAJADOR: HACER PAUSAS ACTIVAS, HIGIENE POSTURAL, USO ADECUADO DE EPP, ADOPTAR HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, REALIZAR LAS TAREAS SEGÚN LAS NORMAS Y PROTOCOLOS DE LA EMPRESA PARA PREVENIR ACCIDENTES LABORALES.

SE DILIGENCIA FORMATO DE IDENTIFICACION DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 19. NO CUENTA CON CONDICIONES DE ALTO RIESGO PARA COVID 19 SEGÚN CIRCULAR 030 DE 2020. NO REFIERE SÍNTOMAS ASOCIADOS A COVID19 EN ÚLTIMOS 14 DÍAS, NI CONTACTOS ESTRECHOS. SE RECOMIENDA ADOPTAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR COVID 19 TALES COMO LAVADO DE MANOS MÍNIMO CADA 3 HORAS, USO DE TAPABOCAS CONSTANTEMENTE, DISTANCIAMIENTO FÍSICO RESPONSABLE, ENTRE OTROS.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico	Aspirante o Trabajador
Firma: Carlos Murcia R.	Firma: Jose Albeiro Tovar G
Nombre: MURCIA ROJAS CARLOS ESNEIDER	Nombre: JOSE ALBEIRO TOVAR
R. M.: 41 426/2011 L.S.O.: 1221/2016	CC: 12137587

Software para el sector salud - www.biofile.com.co



DR. ALFONSO BENAVIDES SUAREZ
MEDICO-ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
R.M Registro Médico No. 972/1997 - I.S.O 1180 DE 2022

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 12-11-2024

NOMBRE Y APELLIDO: SILVIO QUIÑONEZ SAMBONI **C.C No: 1061986149**

CARGO: AYUDANTE DE OBRA **DEPENDENCIA:** **EDAD: 35 AÑOS**

EMPRESA: DANES INGENIEROS SAS **DIRECCION: VDA. LOS ANDES - SAN AGUSTIN**

EXAMENES PRACTICADOS

EXAMENES	
EVALUACIÓN MEDICO OCUPACIONAL	☑
OPTOMETRIA	☑
AUDIOMETRIA	☑
RX	☐
OTROS LABORATORIOS	☑
VERTIGO-MANIOBRAS	☑
ESPIROMETRIA	☐
ESPACIOS CONFINADOS	☐
PSICOLOGIA	☐

LABORATORIO: NORMAL: GLUCOSA, COLESTEROL TOTAL,TRIGLICERIDOS

RAYOS X: NO REALIZO

OPTOMETRIA: NORMAL

FONO AUDIOLOGIA: NORMAL

VERTIGO - MANIOBRAS: POSITIVO [ ] NEGATIVO [X]

EXAMEN A REALIZAR DE INGRESO / PERIODICO / EGRESO

APTO PARA EL CARGO: SIN PATOLOGIA APARENTE [X] CON PATOLOGIA QUE NO LIMITA SU LABOR: [ ]

APTO CON RESTRICCION [ ] MOTIVO:

APTO PARA MANIPULAR ALIMENTOS [ ] MOTIVO:

APLAZADO [ ] MOTIVO:

RECOMENDACIÓN: AL EXAMEN DE INGRESO, SE VALORA EL PACIENTE EN MENCIÓN POR MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL, CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR, AL EXAMEN FISICO GENERAL POR ORGANOS Y SISTEMAS, CARDIOVASCULAR, NEUROLOGICO, PULMONAR: NORMAL. NO PRESENTA SIGNOS, NI SINTOMAS PARA VIRUS COVID-19. USO DE EPP. APTO PARA LABORAR COMO: OBRAS, MANEJO ADECUADO DE CARGAS Y LABORES EN ALTURAS. EMPRESA: DANES INGENIEROS SAS. NOTA: SE APLICA VACUNA TOXOIDE ANTITETANICA LOTE: 220800222A

EXAMEN PERIODICO

PERIODICO: PUEDE CONTINUAR CON SU LABOR [ ]

SE SUGIERE REUBICACIÓN LABORAL TEMPORAL [ ] PERMANENTE [ ] REASIGNAR TAREAS [ ]

OTROS

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS [X] NO APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS [ ]

EXAMEN DE EGRESO

SATISFACTORIO [ ] NO SATISFACTORIO [ ] MOTIVO:

SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL SI [ ] NO [ ]

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

REMISION A E.P.S	[ ]	INICIO DE ACTIVIDAD FISICA	[ ]
CONTINUAR A A.R.P	[ ]	DEJAR DE FUMAR	[ ]
SEGUIMIENTO CASO POR A.R.P	[ ]	REDUCIR CONSUMO DE ALCOHOL	[ ]
CONTROL DE PESO	[ ]		

Incluir	VISUAL	☐	AUDITIVO	☐	RESPIRATORIO	☐	ERGONOMICO	☐
en SVE	CARDIOVASCULAR	☐	PSICOLABORAL	☐	BIOLOGICO	☐	QUIMICO	☐

DR. ALFONSO BENAVIDES S.
MEDICO GENERAL
Especialista en Salud Ocupacional
R.M. 972/97 ISO 1180/2022

FIRMA MEDICO
REGISTRO 972/97
ISO 1180/2022

Silvio Quiñones

FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C. No: 1061986149



DR. ALFONSO BENAVIDES SUAREZ
MEDICO-ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
R.M Registro Médico No. 972/1997 - I.S.O 1180 DE 2022

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 14-11-2024

NOMBRE Y APELLIDO: EMIRO SAMBONI MUÑOZ **C.C No: 1061985531**

CARGO: AYUDANTE DE OBRA **DEPENDENCIA:** **EDAD: 18 AÑOS**

EMPRESA: DANES INGENIEROS SAS **DIRECCION: VDA. LOS ANDES - SAN AGUSTIN**

EXAMENES PRACTICADOS

EXAMENES	
EVALUACIÓN MEDICO OCUPACIONAL	☑
OPTOMETRIA	☑
AUDIOMETRIA	☑
RX	☐
OTROS LABORATORIOS	☑
VERTIGO-MANIOBRAS	☑
ESPIROMETRIA	☐
ESPACIOS CONFINADOS	☐
PSICOLOGIA	☐

LABORATORIO: NORMAL: GLUCOSA, COLESTEROL TOTAL,TRIGLICERIDOS

RAYOS X: NO REALIZO

OPTOMETRIA: NORMAL

FONO AUDIOLOGIA: NORMAL

VERTIGO - MANIOBRAS: POSITIVO [ ] NEGATIVO [X]

EXAMEN A REALIZAR DE INGRESO / PERIODICO / EGRESO

APTO PARA EL CARGO: SIN PATOLOGIA APARENTE [X] CON PATOLOGIA QUE NO LIMITA SU LABOR: [ ]

APTO CON RESTRICCION [ ] MOTIVO:

APTO PARA MANIPULAR ALIMENTOS [ ] MOTIVO:

APLAZADO [ ] MOTIVO:

RECOMENDACIÓN: AL EXAMEN DE INGRESO, SE VALORA EL PACIENTE EN MENCIÓN POR MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL, CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR, AL EXAMEN FISICO GENERAL POR ORGANOS Y SISTEMAS, CARDIOVASCULAR, NEUROLOGICO, PULMONAR: NORMAL. NO PRESENTA SIGNOS, NI SINTOMAS PARA VIRUS COVID-19. USO DE EPP. APTO PARA LABORAR COMO: OBRAS, MANEJO ADECUADO DE CARGAS Y LABORES EN ALTURAS. EMPRESA: DANES INGENIEROS SAS. NOTA: SE APLICA VACUNA TOXOIDE ANTITETANICA LOTE: 2208002228

EXAMEN PERIODICO

PERIODICO: PUEDE CONTINUAR CON SU LABOR [ ]

SE SUGIERE REUBICACIÓN LABORAL TEMPORAL [ ] PERMANENTE [ ] REASIGNAR TAREAS [ ]

OTROS

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS [X] NO APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS [ ]

EXAMEN DE EGRESO

SATISFACTORIO [ ] NO SATISFACTORIO [ ] MOTIVO:

SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL SI [ ] NO [ ]

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

REMISION A E.P.S	[ ]	INICIO DE ACTIVIDAD FISICA	[ ]
CONTINUAR A A.R.P	[ ]	DEJAR DE FUMAR	[ ]
SEGUIMIENTO CASO POR A.R.P	[ ]	REDUCIR CONSUMO DE ALCOHOL	[ ]
CONTROL DE PESO	[ ]		

Incluir en SVE								
	VISUAL	☐	AUDITIVO	☐	RESPIRATORIO	☐	ERGONOMICO	☐
	CARDIOVASCULAR	☐	PSICOLABORAL	☐	BIOLOGICO	☐	QUIMICO	☐

DR. ALFONSO BENAVIDES S.
MEDICO GENERAL
Especialista en Salud Ocupacional
R.M. 972/97 - I.S.O 1180/2022

FIRMA DEL MEDICO
REGISTRO 972/97
ISO 1180/2022

emiro Samboni Muñoz

FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C. No: 1061985531



DR. ALFONSO BENAVIDES SUAREZ
MEDICO-ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
R.M Registro Médico No. 972/1997 - I.S.O 1180 DE 2022

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 14-11-2024

NOMBRE Y APELLIDO: ROBINSON ARCOS TORRES **C.C No: 1082772137**

CARGO: AYUDANTE DE OBRA **DEPENDENCIA:** **EDAD: 39 AÑOS**

EMPRESA: DANES INGENIEROS SAS **DIRECCION: VDA. LOS ANDES - SAN AGUSTIN**

EXAMENES PRACTICADOS

EXAMENES	
EVALUACIÓN MEDICO OCUPACIONAL	☑
OPTOMETRIA	☑
AUDIOMETRIA	☑
RX	☐
OTROS LABORATORIOS	☑
VERTIGO-MANIOBRAS	☑
ESPIROMETRIA	☐
ESPACIOS CONFINADOS	☐
PSICOLOGIA	☐

LABORATORIO: NORMAL; GLUCOSA, COLESTEROL TOTAL,TRIGLICERIDOS

RAYOS X: NO REALIZO

OPTOMETRIA: NORMAL

FONO AUDIOLOGIA: NORMAL

VERTIGO - MANIOBRAS: POSITIVO [ ] NEGATIVO [X]

EXAMEN A REALIZAR DE INGRESO / PERIODICO / EGRESO

APTO PARA EL CARGO: SIN PATOLOGIA APARENTE [X] CON PATOLOGIA QUE NO LIMITA SU LABOR: [ ]

APTO CON RESTRICCION [ ] MOTIVO:

APTO PARA MANIPULAR ALIMENTOS [ ] MOTIVO:

APLAZADO [ ] MOTIVO:

RECOMENDACIÓN: AL EXAMEN DE INGRESO, SE VALORA EL PACIENTE EN MENCIÓN POR MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL, CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR, AL EXAMEN FISICO GENERAL POR ORGANOS Y SISTEMAS, CARDIOVASCULAR, NEUROLOGICO, PULMONAR: NORMAL. NO PRESENTA SIGNOS, NI SINTOMAS PARA VIRUS COVID-19. USO DE EPP. APTO PARA LABORAR COMO: OBRAS, MANEJO ADECUADO DE CARGAS Y LABORES EN ALTURAS. EMPRESA: DANES INGENIEROS SAS. NOTA: SE APLICA VACUNA TOXOIDE ANTITETANICA LOTE: 220800222B

EXAMEN PERIODICO

PERIODICO: PUEDE CONTINUAR CON SU LABOR [ ]

SE SUGIERE REUBICACIÓN LABORAL TEMPORAL [ ] PERMANENTE [ ] REASIGNAR TAREAS [ ]

OTROS

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS [X] NO APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS [ ]

EXAMEN DE EGRESO

SATISFACTORIO [ ] NO SATISFACTORIO [ ] MOTIVO:

SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL SI [ ] NO [ ]

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

REMISION A E.P.S	[ ]	INICIO DE ACTIVIDAD FISICA	[ ]
CONTINUAR A A.R.P	[ ]	DEJAR DE FUMAR	[ ]
SEGUIMIENTO CASO POR A.R.P	[ ]	REDUCIR CONSUMO DE ALCOHOL	[ ]
CONTROL DE PESO	[ ]		

Incluir								
en SVE	VISUAL	☐	AUDITIVO	☐	RESPIRATORIO	☐	ERGONOMICO	☐
	CARDIOVASCULAR	☐	PSICOLABORAL	☐	BIOLOGICO	☐	QUIMICO	☐

DR. ALFONSO BENAVIDES S.
MEDICO GENERAL
Especialista en Salud Ocupacional
R.M. 972/97 ISO 1180/2022

FIRMA DEL MEDICO
REGISTRO 972/97
ISO 1180/2022

ROBINSON ARCOS

FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C. No: 1082772137



DR. ALFONSO BENAVIDES SUAREZ
MEDICO-ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
R.M Registro Médico No. 972/1997 - I.S.O 1180 DE 2022

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 14-11-2024

NOMBRE Y APELLIDO: JORGE ARMANDO HOYOS PAZ **C.C No: 1082774946**

CARGO: AYUDANTE DE OBRA **DEPENDENCIA:** **EDAD: 35 AÑOS**

EMPRESA: DANES INGENIEROS SAS **DIRECCION: VDA. LOS ANDES - SAN AGUSTIN**

EXAMENES PRACTICADOS

EXAMENES	
EVALUACIÓN MEDICO OCUPACIONAL	☑
OPTOMETRIA	☑
AUDIOMETRIA	☑
RX	☐
OTROS LABORATORIOS	☑
VERTIGO-MANIOBRAS	☑
ESPIROMETRIA	☐
ESPACIOS CONFINADOS	☐
PSICOLOGIA	☐

LABORATORIO: NORMAL: GLUCOSA, COLESTEROL TOTAL,TRIGLICERIDOS

RAYOS X: NO REALIZO

OPTOMETRIA: NORMAL

FONO AUDIOLOGIA: NORMAL

VERTIGO - MANIOBRAS: POSITIVO [ ] NEGATIVO [X]

EXAMEN A REALIZAR DE INGRESO / PERIODICO / EGRESO

APTO PARA EL CARGO: SIN PATOLOGIA APARENTE [X] CON PATOLOGIA QUE NO LIMITA SU LABOR: [ ]

APTO CON RESTRICCION [ ] MOTIVO:

APTO PARA MANIPULAR ALIMENTOS [ ] MOTIVO:

APLAZADO [ ] MOTIVO:

RECOMENDACIÓN: AL EXAMEN DE INGRESO, SE VALORA EL PACIENTE EN MENCIÓN POR MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL, CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR, AL EXAMEN FISICO GENERAL POR ORGANOS Y SISTEMAS, CARDIOVASCULAR, NEUROLOGICO, PULMONAR: NORMAL. NO PRESENTA SIGNOS, NI SINTOMAS PARA VIRUS COVID-19. USO DE EPP. APTO PARA LABORAR COMO: OBRAS, MANEJO ADECUADO DE CARGAS Y LABORES EN ALTURAS. EMPRESA: DANES INGENIEROS SAS. NOTA: SE APLICA VACUNA TOXOIDE ANTITETANICA LOTE: 220800222B

EXAMEN PERIODICO

PERIODICO: PUEDE CONTINUAR CON SU LABOR [ ]

SE SUGIERE REUBICACIÓN LABORAL TEMPORAL [ ] PERMANENTE [ ] REASIGNAR TAREAS [ ]

OTROS

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS [X] NO APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS [ ]

EXAMEN DE EGRESO

SATISFACTORIO [ ] NO SATISFACTORIO [ ] MOTIVO:

SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL SI [ ] NO [ ]

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

REMISION A E.P.S	[ ]	INICIO DE ACTIVIDAD FISICA	[ ]
CONTINUAR A A.R.P	[ ]	DEJAR DE FUMAR	[ ]
SEGUIMIENTO CASO POR A.R.P	[ ]	REDUCIR CONSUMO DE ALCOHOL	[ ]
CONTROL DE PESO	[ ]		

Incluir en SVE								
	VISUAL	☐	AUDITIVO	☐	RESPIRATORIO	☐	ERGONOMICO	☐
	CARDIOVASCULAR	☐	PSICOLABORAL	☐	BIOLOGICO	☐	QUIMICO	☐

DR. ALFONSO BENAVIDES S.
MEDICO GENERAL
Especialista en Salud Ocupacional
R.M. 972/97 ISO 1180/2022

FIRMA DEL MEDICO
REGISTRO 972/97
ISO 1180/2022

Jorge Hoyos

FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C. No: 1082774946

ANEXO 3. Inducciones

	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	FECHA	VERSION
Dánes		2 DE AGOSTO DE 2023	01
		CODIGO	FT-SST-015

FORMATO DE INDUCCIÓN

NOMBRE: Johan Sebastian Rios Palacio

CARGO: Ingeniero Residente.

AREA O SECCIÓN: Cobertura Polideportivo Vda. Las Brisas.

PROCESO	TEMAS	RESPONSABLE
1. INDUCCIÓN GENERAL	Políticas SST	ING. AMBIENTAL
	Política ambiental	ING. AMBIENTAL
	Política seguridad vial	ING. AMBIENTAL
	Política prevención acoso laboral	ING. AMBIENTAL
	Política control cigarrillo, alcohol drogas	ING. AMBIENTAL
	Plan de manejo ambiental	ING. AMBIENTAL
2. INDUCCIÓN AL CARGO O AREA DE TRABAJO	Funciones	JEFE INMEDIATO
	Lugar de trabajo	JEFE INMEDIATO
	Horario laboral	JEFE INMEDIATO
3. ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO AL CARGO U OFICIO	Inducción de 1 día	JEFE INMEDIATO

Trabajador y/o Contratista
C.C. 1053046893

Responsable de Inducción
C.C. 1075220858

Dánes	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	FECHA	VERSION
		2 DE AGOSTO DE 2023	01
		CODIGO	FT-SST-015

FORMATO DE INDUCCIÓN

NOMBRE: Wilmer Armando Jimenez Montañez

CARGO: Ingeniero Residente de obra

AREA O SECCIÓN: Cancha Polideportiva Vda. los Andes- San Agustin.

PROCESO	TEMAS	RESPONSABLE
1. INDUCCIÓN GENERAL	Politicas SST	ING. AMBIENTAL
	Política ambiental	ING. AMBIENTAL
	Política seguridad vial	ING. AMBIENTAL
	Política prevención acoso laboral	ING. AMBIENTAL
	Política control cigarrillo, alcohol drogas	ING. AMBIENTAL
	Plan de manejo ambiental	ING. AMBIENTAL
2. INDUCCIÓN AL CARGO O AREA DE TRABAJO	Funciones	JEFE INMEDIATO
	Lugar de trabajo	JEFE INMEDIATO
	Horario laboral	JEFE INMEDIATO
3. ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO AL CARGO U OFICIO	Inducción de 1 día	JEFE INMEDIATO

Trabajador y/o Contratista
C.C. 80 820.744

Responsable de Inducción
C.C. 1.075.220.838

Powered by CamScanner

Dánes	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	FECHA	VERSION
		2 DE AGOSTO DE 2023	01
		CODIGO	FT-SST-015

FORMATO DE INDUCCIÓN		
NOMBRE: Jose Albeiro Tovar Gómez		
CARGO: Maestro de obra		
AREA O SECCIÓN: Cubierta Polideportivo Vda. Los Andes - San Agustin		
PROCESO	**TEMAS**	**RESPONSABLE**
1. INDUCCIÓN GENERAL	Políticas SST	ING. AMBIENTAL
	Política ambiental	ING. AMBIENTAL
	Política seguridad vial	ING. AMBIENTAL
	Política prevención acoso laboral	ING. AMBIENTAL
	Política control cigarrillo, alcohol drogas	ING. AMBIENTAL
	Plan de manejo ambiental	ING. AMBIENTAL
2. INDUCCIÓN AL CARGO O AREA DE TRABAJO	Funciones	JEFE INMEDIATO
	Lugar de trabajo	JEFE INMEDIATO
	Horario laboral	JEFE INMEDIATO
3. ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO AL CARGO U OFICIO	Inducción de 1 día	JEFE INMEDIATO

Jose Albeiro Tovar G
Trabajador y/o Contratista
C.C. 12.137.587. Neiva

Responsable de Inducción
C.C. 1.075.220.858

Powered by CamScanner

Dánes	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	FECHA	VERSION
		2 DE AGOSTO DE 2023	01
		CODIGO	FT-SST-015

FORMATO DE INDUCCIÓN		
NOMBRE: Silvio Quiñones Samban		
CARGO: Ayudante de obra.		
AREA O SECCIÓN: Construcción Cubierta Polideportivo Los Andes- San Agustín		
PROCESO	**TEMAS**	**RESPONSABLE**
1. INDUCCIÓN GENERAL	Políticas SST	ING. AMBIENTAL
	Política ambiental	ING. AMBIENTAL
	Política seguridad vial	ING. AMBIENTAL
	Política prevención acoso laboral	ING. AMBIENTAL
	Política control cigarrillo, alcohol drogas	ING. AMBIENTAL
	Plan de manejo ambiental	ING. AMBIENTAL
2. INDUCCIÓN AL CARGO O AREA DE TRABAJO	Funciones	JEFE INMEDIATO
	Lugar de trabajo	JEFE INMEDIATO
	Horario laboral	JEFE INMEDIATO
3. ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO AL CARGO U OFICIO	Inducción de 1 día	JEFE INMEDIATO

Silvio Quiñones
Trabajador y/o Contratista
C.C. 1.061.986.149

Responsable de Inducción
C.C. 1.075.220.858

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	FECHA	VERSION
Dánes		2 DE AGOSTO DE 2023	01
		CODIGO	FT-SST-015

FORMATO DE INDUCCIÓN		
NOMBRE: Emiro Samboni Muñoz		
CARGO: Ayudante de Obra		
AREA O SECCIÓN: Cubierta Vda. los Andes San Agustin		
PROCESO	**TEMAS**	**RESPONSABLE**
1. INDUCCIÓN GENERAL	Políticas SST	ING. AMBIENTAL
	Política ambiental	ING. AMBIENTAL
	Política seguridad vial	ING. AMBIENTAL
	Política prevención acoso laboral	ING. AMBIENTAL
	Política control cigarrillo, alcohol drogas	ING. AMBIENTAL
	Plan de manejo ambiental	ING. AMBIENTAL
2. INDUCCIÓN AL CARGO O AREA DE TRABAJO	Funciones	JEFE INMEDIATO
	Lugar de trabajo	JEFE INMEDIATO
	Horario laboral	JEFE INMEDIATO
3. ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO AL CARGO U OFICIO	Inducción de 1 día	JEFE INMEDIATO

emiro Samboni Muñoz
Trabajador y/o Contratista
C.C. 1.061.985.531

Responsable de Inducción
C.C. 1.075.220.958

Powered by CamScanner

Dánes	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	FECHA	VERSION
		21 DE AGOSTO DE 2023	01
		CODIGO	FT-SST-015

FORMATO DE INDUCCIÓN

NOMBRE: Robinson Arcos Torres

CARGO: Ayudante de obras

AREA O SECCIÓN: Cubierta Polideportivo Vda los Andes - San Agustin

PROCESO	TEMAS	RESPONSABLE
1. INDUCCIÓN GENERAL	Politicas SST	ING. AMBIENTAL
	Política ambiental	ING. AMBIENTAL
	Política seguridad vial	ING. AMBIENTAL
	Política prevención acoso laboral	ING. AMBIENTAL
	Política control cigarrillo, alcohol drogas	ING. AMBIENTAL
	Plan de manejo ambiental	ING. AMBIENTAL
2. INDUCCIÓN AL CARGO O AREA DE TRABAJO	Funciones	JEFE INMEDIATO
	Lugar de trabajo	JEFE INMEDIATO
	Horario laboral	JEFE INMEDIATO
3. ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO AL CARGO U OFICIO	Inducción de 1 día	JEFE INMEDIATO

ROBINSON ARCOS
Trabajador y/o Contratista
C.C. 1082772137

Responsable de Inducción
C.C. 1.015.220.858

Powered by CamScanner

Dánes	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	FECHA	VERSION
		2 DE AGOSTO DE 2023	01
		CODIGO	FT-SST-015

FORMATO DE INDUCCIÓN		
NOMBRE: Jorge Armando Hoyos Paz		
CARGO: Ayudante de obra		
AREA O SECCIÓN: Cubierta Polideportivo Vda. los Andes. San Agustin		
PROCESO	**TEMAS**	**RESPONSABLE**
1. INDUCCIÓN GENERAL	Políticas SST	ING. AMBIENTAL
	Política ambiental	ING. AMBIENTAL
	Política seguridad vial	ING. AMBIENTAL
	Política prevención acoso laboral	ING. AMBIENTAL
	Política control cigarrillo, alcohol drogas	ING. AMBIENTAL
	Plan de manejo ambiental	ING. AMBIENTAL
2. INDUCCIÓN AL CARGO O AREA DE TRABAJO	Funciones	JEFE INMEDIATO
	Lugar de trabajo	JEFE INMEDIATO
	Horario laboral	JEFE INMEDIATO
3. ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO AL CARGO U OFICIO	Inducción de 1 día	JEFE INMEDIATO

Jorge Hoyos
Trabajador y/o Contratista
C.C. 1.082.776.946

Responsable de Inducción
C.C. 1.075.220.858

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	FECHA	VERSION
Dánes		2 DE AGOSTO DE 2023	01
		CODIGO	FT-SST-015

FORMATO DE INDUCCIÓN		
NOMBRE: Cristian Andres Pena Cerezo		
CARGO: Conductor Volquetas.		
AREA O SECCIÓN:		
PROCESO	**TEMAS**	**RESPONSABLE**
1. INDUCCIÓN GENERAL	Políticas SST	ING. AMBIENTAL
	Política ambiental	ING. AMBIENTAL
	Política seguridad vial	ING. AMBIENTAL
	Política prevención acoso laboral	ING. AMBIENTAL
	Política control cigarrillo, alcohol drogas	ING. AMBIENTAL
	Plan de manejo ambiental	ING. AMBIENTAL
2. INDUCCIÓN AL CARGO O AREA DE TRABAJO	Funciones	JEFE INMEDIATO
	Lugar de trabajo	JEFE INMEDIATO
	Horario laboral	JEFE INMEDIATO
3. ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO AL CARGO U OFICIO	Inducción de 1 día	JEFE INMEDIATO

Cristian Pena.
Trabajador y/o Contratista
C.C. 1032158693

Responsable de Inducción
C.C. 1.075.220.958

Powered by CamScanner

ANEXO 4. Entrega de EPP

Danes

ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION

CODIGO: DC-REG-4.4.1-03
PAGINA: 1 DE 1

Nombre del Trabajador: Jose Alberto Tovar Gomez **Cargo:** Maestro de obra **Proceso:** Obra

Empresa: DANES INGENIEROS S.A.S **Proyecto:** CONSTRUCCIÓN CUBIERTA AUTOPORTANTE VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H)

Elementos de Protección Personal

Fecha de entrega	CABEZA		OJOS				CARA		OÍDOS		RESPIRATORIA					MANOS								PIES/PIERNAS			CUERPO				TRABAJOS ALTURA		Firma:
	Casco Dieléctrico	Casco con Barboquejo	Gafas de Seguridad Incoloras	Gafas de Seguridad Oscuras	Gafas de Soldador	Gafas de Seguridad Prescripción	Careta Soldador	Careta para Esmeril	Protector Auditivo Tipo Copa	Protector Auditivo Tipo Inserción	Respirador Purificador de Aire	Respirador para material particulado mayor a 5micras	Respirador para material particulado menor a 5micras	Vapores orgánicos	Vapores orgánicos y gases ácidos	Guantes Resistentes al Corte	Guantes de Nitrilo	Guantes para soldador	Carnaza	Manga Larga	Guantes de Caucho Industrial	Guantes de Nitrilo	Guantes Dieléctricos	Botas seguridad con puntera Dieléctrica	Botas Caucho con Puntera Metálica	Botas Dieléctricas	Overol de Algodón	Overol en Jean	Chaqueta en Jean	Overol de Alta Visibilidad	Eslinga		
12/11/2024	X					X			X			X					X						X					X				
27/11/2024						X						X				X																

Diligencie en la casillas el numero de elementos entregados.

NOTA: Identifique aquí EPP que no estén en el listado:

ELABORA

Nombre: Cristian Camilo López

Fecha: 12/11/24

Firma:

Notas: 1. Una vez recibida la compra, se entregan a los trabajadores los EPP quienes firman en señal de recibido conforme y compromiso de utilizarlos adecuadamente.
2. Con la firma de recibido de estos elementos, "Acepta que ha recibido los EPP adecuados y se compromete a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás disposiciones legales vigentes"

VERSION 7: FEBRERO 23 DE 2017

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION	CODIGO: UC-REG-4.4.1-03 PAGINA: 1 DE 1

Nombre del Trabajador: Silvio Quintero Sanchez **Cargo:** Ayudante de obra **Proceso:** Obra

Empresa: DANES INGENIEROS S.A.S **Proyecto:** CONSTRUCCIÓN CUBIERTA AUTOPORTANTE VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTIN (H)

| Fecha de entrega | Elementos de Protección Personal | | |

	ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION	CODIGO: UC-REG-4.4.1-03 PAGINA: 1 DE 1

Nombre del Trabajador: Emiro Samboni Muñoz **Cargo:** Ayudante de obra **Proceso:** Obra.

Empresa: DANES INGENIEROS S.A.S **Proyecto:** CONSTRUCCIÓN CUBIERTA AUTOPORTANTE VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H)

Elementos de Protección Personal

Fecha de entrega	CABEZA: Casco Dieléctrico	CABEZA: Casco con Barbuquejo	OJOS: Gafas De Seguridad Transparentes	OJOS: Careta de soldador	OJOS: Careta de Esmeriar	OJOS: Monogafas	OJOS: Gafas de seguridad lentes oscuros	CARA: Careta soldador	CARA: Visor protector de Cuello	CARA: Careta Para Esmeriar	OÍDOS: Protector Auditivo Tipo Fajón	OÍDOS: Protector Auditivo Tipo Copa	RESPIRATORIA: Respirador Humos Metálicos	RESPIRATORIA: Respirador Vapores Solventes	RESPIRATORIA: Respirador para material Particulado (Incluye Sucio)	Gases y Vapores: Mascara para gases organicos	Gases y Vapores: Cartuchos y Filtros para gases acidos	Gases y Vapores: Cartuchos y Filtros para Mercurio	MANOS: Guantes Resistentes al Corte	MANOS: Guantes de nitrilo o neopreno largos	MANOS: Guantes para soldador	MANOS: Carnaza	MANOS: Manga punzo	MANOS: Guante de caucho Industrial	MANOS: Guante de nitrilo	MANOS: Guantes dieléctricos	PIES/PIERNAS: Botas seguridad con punta reforzada Dieléctrica	PIES/PIERNAS: Botas Caucho con punta reforzada	PIES/PIERNAS: Botas de seguridad	PIES/PIERNAS: Botas de seguridad Dieléctricas	CUERPO: Overol en carnaza o Soldador	CUERPO: Overol de caucho	CUERPO: Chaqueta y pantalon en Jean	CUERPO: Overol de tela Drokasa antifluido	CUERPO: Delantal Para Soldador	CUERPO: Delantal reflectivo	CUERPO: Arnes	TRABAJOS ALTURA: Eslinga: Arnes de Seguridad	TRABAJOS ALTURA: Eslinga: Eslinga	TRABAJOS ALTURA: Eslinga: Conector	TRABAJOS ALTURA: Eslinga: Absorbedor de energia	TRABAJOS ALTURA: Eslinga: Mosqueton	TRABAJOS ALTURA: Eslinga: Linea de vida	Firmas: Acepto que he recibido los EPP adecuados y me comprometo a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás disposiciones legales vigentes.
19/11/2024	X						X				X			X						X								X											Emiro Samboni

Diligencie en la casillas el numero de elementos entregados.

NOTA: Identifique aqui EPP que no estén en el listado:

ELABORA

Nombre: Cristian Camilo Lopez

Fecha: 19/11/24

Firma:

Notas: 1. Una vez recibida la compra, se entregan a los trabajadores los EPP quienes firman en señal de recibido conforme y compromiso de utilizarlos adecuadamente.
2. Con la firma de recibido de estos elementos, "Acepta que ha recibido los EPP adecuados y se compromete a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás disposiciones legales vigentes".

VERSIÓN 2- FEBRERO 23 DE 2017

Powered by CamScanner

Danes	ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION	CODIGO: UC-REG-4.4.1-03 PAGINA: 1 DE 1

Nombre del Trabajador: Jorge Armando Hoyos Paz **Cargo:** Ayudante de obra **Proceso:** Obra

Empresa: DANES INGENIEROS S.A.S **Proyecto:** CONSTRUCCIÓN CUBIERTA AUTOPORTANTE VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H)

Elementos de Protección Personal

Fecha de entrega	CABEZA: Casco Ordinario	CABEZA: Casco con Barbuquejo	OJOS: Gafas De Seguridad Transparentes	OJOS: Careta de Soldador	OJOS: Careta de Esmeriler	OJOS: Monogafas	OJOS: Gafas de seguridad lentes oscuros	CARA: Careta Acetato	CARA: Malla protector de cuello	CARA: Careta Para Esmeriler	OÍDOS: Protector Auditivo Tipo Tapón	OÍDOS: Protector Auditivo Tipo Copa	RESPIRATORIA: Respirador Humos Metálicos	RESPIRATORIA: Respiradores desechables	RESPIRATORIA: Respirador para material particulado (mascara Sencilla)	RESPIRATORIA: Gases y Vapores: Vapores orgánicos	RESPIRATORIA: Gases y Vapores: Vapores orgánicos y gases ácidos	RESPIRATORIA: Gases y Vapores: Químicos y partículas en spray	MANOS: Guante Recubierto en Nitrilo	MANOS: Soldador o reforzado tangra	MANOS: Guantes para soldador	MANOS: Carnaza	MANOS: Malla punta	MANOS: Guante de caucho industrial	MANOS: Guantes de nitrilo	MANOS: Guantes dieléctrico	PIES/PIERNAS: Bota seguridad con puntera reforzada punta	PIES/PIERNAS: Bota Caucho con puntera reforzada	PIES/PIERNAS: Dieléctrico	PIES/PIERNAS: Bota de seguridad dieléctrica	CUERPO: Overol en Carnaza o Antiacido	CUERPO: Chaqueta de cuero	CUERPO: Chaqueta y pantalon en jean	CUERPO: Overol de dos piezas en tela	CUERPO: Delantal Carnaza	CUERPO: Delantal Antiacido	CUERPO: Mangas	TRABAJOS ALTURA: Eslinga: Arnés Seguridad	TRABAJOS ALTURA: Eslinga: Eslinga Posicionamiento	TRABAJOS ALTURA: Eslinga: Conector Ojo Ojo	TRABAJOS ALTURA: Eslinga: Absorbedor de energía	TRABAJOS ALTURA: Eslinga: Línea de vida autoretractil	Firma: Acepto que he recibido los EPP adecuados y me comprometo a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Articulo III, Decreto 1295 de 1994 y demás disposiciones legales vigentes.
19/11/24	X					X					X			X						X								X					X								Jorge Hoyos

Diligencie en la casillas el numero de elementos entregados.

NOTA: Identifique aquí EPP que no estén en el listado:

ELABORA

Nombre: Cristian Camilo Lopez

Fecha: 18/11/24

Firma:

Notas: 1. Una vez recibida la compra, se entregan a los trabajadores los EPP quienes firman en señal de recibido conforme y compromiso de utilizarlos adecuadamente.
2. Con la firma de recibido de estos elementos, "Acepta que ha recibido los EPP adecuados y se compromete a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Articulo III, Decreto 1295 de 1994 y demas disposiciones legales vigentes".

VERSIÓN 1 FEBRERO 23 DE 2017

Powered by CamScanner

Diraco	ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION	CODIGO: UC-REQ-4.4.1-03 PAGINA: 1 DE 1

Nombre del Trabajador: Cristian Andres Roa Cuaji **Cargo:** Conductor Volqueta **Proceso:** obra.

Empresa: DANES INGENIEROS S.A.S **Proyecto:** CONSTRUCCIÓN CUBIERTA AUTOPORTANTE VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H)

| Fecha de entrega | Elementos de Protección Personal | | |

ANEXO 5. Charlas pre operacionales

	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Código:	FT-SST-016
Dánes		Código:	2/08/2023
	DANES INGENIEROS S.A.S	Versión	1

OBJETO DE DIVULGACION O REUNION	Lugar	DD	MM	AA
Charla preoperacional	Polideportivo los Andes	19	11	24

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		Uso de los EPP.
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Hector Pedraza Ibarra Granada	1.119.3[illegible]	Practica Obra	
2	Johan Sebastian Rios Pabon	1053[illegible]	Residente Obra	
3	Cristian Camilo Lopez C	1053[illegible]	Residente SST	
4	Jose Alberto Torres G.	1233[illegible]	Practica	
5	Carlos Caballero	1064[illegible]	Ayudante	
6	Edwin Alexander Cardona	1064[illegible]	Ayudante	
7	Jorge Armando Reyes	1[illegible]	Ayudante	
8	Yulieth Nicol Arias Jaimes	1082[illegible]	Ayudante	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Cristian Camilo Lopez	Firma

	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Código:	FT-SST-016
Danes		Código:	2/08/2023
	DANES INGENIEROS S.A.S	Versión	1

OBJETO DE DIVULGACIÓN O REUNION	Lugar	DD	MM	AA
Charla precoperacional	Polideportivo Los Andes	22	11	24

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? Importancia del autocuidado
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Julian Sebastian Rios Pabon	1053.288.682	Residente Obra	
2	Nestor Rodrigo Lasso Cerada	1.119.361.	Operador Obra	
3	Cristian Camilo Lopez C	1053.806.438	Residente SST	
4	Jose Alberto Jaramillo G	1243.837	Maestro	
5	Carlos Andres [illegible]	1061.695.851	Oficial	
6	Julian Alexander Cardona	1061.691.19	Ayudante	
7	Jorge Arnulfo Reyes	1.5.27.774.446	Ayudante	
8	Sebastian Rios Jaramillo	1053.793.153	Ayudante	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Cristian Camilo Lopez	Firma:

	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Código:	FT-SST-016
Dánes		Código:	2/08/2023
	DANES INGENIEROS S.A.S	Versión	1

OBJETO DE DIVULGACION O REUNION	Lugar	DD	MM	AA
Importancia Charla Preoperacional	Polideportivo los Andes	25	11	24

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		Importancia de delimitar el área de trabajo.
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jaber Sebastian Rios Cabrera	1053868612	Residente Obra	
2	Nestor Rodrigo Tuta Cerveda	1.119.369.[illegible]	Director Obra	
3	Cristian Camilo Lopez C.	1053.[illegible]	Residente SST	
4	Jose Alberto Lopez G.	12137871	Maestro	
5	Jhon Alexander Tambo	1004161419	Ayudante	
6	Sebastian Rios Tuta	1053773131	Ayudante	
7	Jorge Armando Vargas	1052774446	Ayudante	
8	Cristian Castiblanco	1071[illegible]	Ayudante	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Cristian Camilo Lopez	

	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Código:	FT-SST-016
Danes		Código:	2/08/2023
	DANES INGENIEROS S.A.S	Versión	1

OBJETO DE DIVULGACION O REUNIÓN	Lugar	DD	MM	AA
Charla Pre operacional	Polideportivo Los Andes	28	11	24

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? Orden y aseo en el lugar de trabajo
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jaboo Sebastian Ros Cabeo	(05)208.69.3	Residente Obra	
2	Nestor Rodrigo Tuta Cesada	1.119.3641.	Director Obra	
3	Gustavo Camilo Lopez C	(05) 210.838	Residente SST	
4	Jose Alberto Lopez C	(243) 87	Maestro	
5	Diana Catalina Sanabria	1049166119	Oficial de	
6	Fabian Mateo Lopez	(08)7733	Ayudante	
7	Jorge Ricardo Lopez	1052774446	Ayudante	
8	Carlos Daniel [illegible]	1076[illegible]	Ayudante	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Gustavo Camilo Lopez	

ANEXO 6. Análisis de Trabajo Seguro – ATS

Dánes	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATOS N°:	FT-SST-094
	☑ SG-SST	
FORMATO DE ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Fecha: Julio 30/2021	
	Versión: 001	
	Página 1 de 1	

ACTIVIDAD/TAREA: Excavación manual para cimentación

INSTALACION / LOCACION / SECCION: Polideportivo Villa los Arcos

AREA: Obra.

FECHA: 18/11/2024

AST N°: 01

Página 1 de 1

N°	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	QUE PUEDE FALLAR / PELIGROS / RIESGOS	QUE PUEDE PASAR / CONSECUENCIAS			COMO EVITAR EL INCIDENTE / BARRERAS EXISTENTES	C	P	R	BARRERAS ADICIONALES
			PERSONA	EQUIPO	AMBIENTE					
1	Alistar herramientas, materiales, transporte	Caida al mismo nivel	Golpes, Lesiones	Daños, humanos	/	Sendero libre de obstáculos		X		Señalización de área
2	Identificar el frente y área de trabajo.	Caida de materiales y herramientas	Golpes, Atrapamiento		/	Señalizar área de excavación		X		
3	Toma de niveles	Riesgo ergonómico Caida al mismo nivel	Lesiones, Caidas		/	Calistenia, uso de elementos, posturas		X		
4	Abertura de huecos	Riesgo ergonómico Caida al mismo nivel	Lesiones, Caidas		/	Retiro material de la excavación		X		Entibado en huecos
5	Izaje y transp. E material	Riesgo Físico: Caida de material	Lesiones, Atrapamiento		/	Herramientas en buen estado		X		
6	Orden y aseo	Caida al mismo nivel.	Golpes, Lesiones		/	Señalizar área de trabajo - Desperdicios		X		
7										
8										
9										
10										

QUE HACER SI ALGO FALLA:
Dar aviso al supervisor, prestar primeros Auxilios, en caso de accidente trasladar al Hospital más cercano.

EL SUPERVISOR ES:
Jox Albeiro Tovar - Maestro de obra.

SOLICITANTE: Jox Albeiro Tovar

APROBÓ:

PORTADOR: Maestro de obra

RESPONSABLE AUTORIDAD DEL AREA:

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Código: FT-SST-094
			Fecha de modificación: Julio 30/2021

Powered by CamScanner

Dánes	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATOS N°:	FT-SST-094
	☑ SG-SST	
FORMATO DE ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 30/2021
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

ACTIVIDAD/TAREA: Fundición Concreto ciclópeo para cimentación						INSTALACION / LOCACION / SECCION: Polideportivo Vda. las Arbolitas - San Agustín				
AREA: Obra.			FECHA: 23/11/2024			AST N°: 02	Página 1 de 1			
N°	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	QUE PUEDE FALLAR / PELIGROS / RIESGOS	QUE PUEDE PASAR / CONSECUENCIAS			COMO EVITAR EL INCIDENTE / BARRERAS EXISTENTES	C	P	R	BARRERAS ADICIONALES
			PERSONA	EQUIPO	AMBIENTE					
1	Ingreso al área habitual de trabajo, herramientas y material	Caída al mismo nivel - físico - salud ocupacional	Lesiones Golpes			Señalización área Uso EPP.		X		
2	Armado de formaletas	Machucones, caídas	Lesiones Golpes			Uso EPP Orden y Aseo		X		
3	Fundida	Locativo, cargas, químico	Lesiones Golpes			Hidratación Uso EPP.		X		
4	Orden y Aseo	Físico, locativo, caída	Golpes, Lesiones			Señalización áreas Uso EPP		X		
5										
6										
7										
8										
9										
10										

QUE HACER SI ALGO FALLA:	EL SUPERVISOR ES:
Dar aviso al supervisor, prestar primeros Auxilios; en caso de requerir, trasladar al centro hospitalario más cercano	Jose Albeiro Tovar – Maestro de Obra

SOLICITANTE:	APROBO:	PORTADOR:	RESPONSABLE O AUTORIDAD DEL AREA:
Jose Albeiro Tovar	John Sebastian Ruiz	Maestro de obra.	John Sebastian Ruiz

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Código: FT-SST-094
			Fecha de modificación: Julio 30/2021

Powered by CamScanner

INFORME No. 2

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST

Contrato de obra No.

CLPIH383 DE 2023

Periodo:

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Objeto Contrato:

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN – DEPARTAMENTO DEL HUILA"


REVISÓ Y APROBÓ	
FIRMA	
NOMBRE	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA
CARGO	Director de Obra
ELABORÓ	
FIRMA	
NOMBRE	CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CÓRDOBA
CARGO	Residente SISO

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 5
2.1 OBJETIVO GENERAL 5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
3. CONTRATO DE OBRA 6
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 6
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8
6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 9
6.1 AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL (EPS, ARL, AFP) 9
6.2 EXÁMENES MEDICO OCUPACIONALES 11
6.3 INDUCCIONES EN SST 11
6.4 ENTREGA DE EPP 12
6.5 CHARLAS PREOPERACIONALES 12
6.6 DILIGENCIAMIENTO DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - ATS 13
6.7 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 14
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 17
8.ANEXOS 19

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información del contrato de obra 6
Tabla 2. Personal vinculado al proyecto 10
Tabla 3. Charlas preoperacionales 13

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del área de intervención 7
Ilustración 2. Panorámica Polideportivo Vda. Los Andes – San Agustín, antes de la Intervención 7
Ilustración 3. Entrega de EPP a personal de obra 12
Ilustración 4. Charlas pre operacionales a personal de obra 13

1. INTRODUCCIÓN

Este documento se presenta para dar cumplimiento a la normatividad contractual en lo correspondiente a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el proyecto de la *"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA".*

El informe mensual No. 2 corresponde al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de diciembre de 2024. Allí se presentan las generalidades de la gestión adelantada referente a las medidas de manejo implementadas en el periodo de ejecución de las obras.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar los registros de cumplimiento a los compromisos establecidos en el aspecto de seguridad y salud en el trabajo, por la empresa DANES INGENIEROS S.A.S de acuerdo al contrato de obra No. CLPIH383 de 2023 cuyo objeto es: *"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN – DEPARTAMENTO DEL HUILA"*, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de diciembre de 2024.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

✓ Describir las actividades de SST que se desarrollaron durante el periodo, las cuales se encuentran divididas por componentes.
✓ Generar registros que evidencien el cumplimiento de las actividades SST por parte del contratista de obra.
✓ Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente referente a la seguridad y salud en el trabajo.

3. CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

En la tabla 1 se incluye la información general del contrato de obra:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CLPIH383 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**PERIODO DEL INFORME**	Del 01 al 31 de diciembre de 2024.
CONTRATISTA	DANES INGENIEROS S.A.S	**NIT:**	900.219.918-2
REPRESENTANTE LEGAL:	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	**C.C:**	7.719.364 DE NEIVA (H)
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	01/11/2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16/11/2023		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (27/12/2024):	UN (01) MES.		
PLAZO TOTAL:	CUATRO (04) MESES		
VALOR INICIAL:	$ 506.549.699		
VALOR ADICIONAL (27/12/2024):	$ 62.065.242		
VALOR TOTAL:	$ 568.614.941		
INTERVENTOR:	CONSOCIO WF	**NIT:**	901.769.619-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANÍA	**C.C:**	7.711.430 DE NEIVA (H)

Tabla 1. Información del contrato de obra

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en la vereda Los Andes zona rural del municipio de San Agustín – Departamento del Huila.

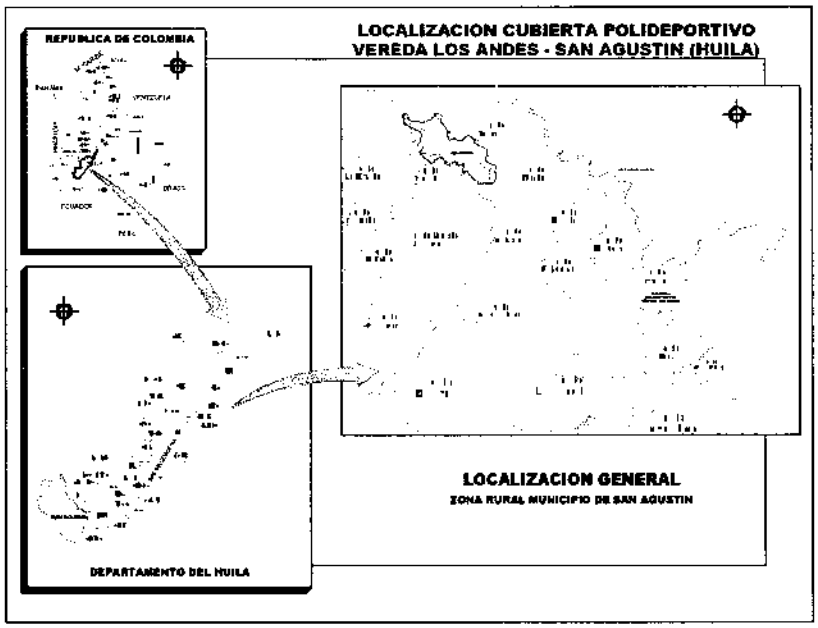


Ilustración 1. Localización del área de intervención



Ilustración 2. Panorámica Polideportivo Vda. Los Andes – San Agustín, antes de la Intervención

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto arquitectónico contempla un área a intervenir de 632,32 m2, en la que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 20 en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz, para el polideportivo ubicado en la vereda Los Andes del Municipio de San Agustín – Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; el polideportivo corresponde a estructura de cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con sistema autoportante, sostenida con columnas en concreto de 3.00 PSI. El sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3.000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras atienden lo establecido en la NORMA SISMORRESISTENTE de 2010 – NSR-10.

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- Actividades preliminares
- Cimentación
- Estructura en concreto
- Cubierta
- Acabados – placa de concreto
- Instalaciones hidrosanitarias
- Instalaciones eléctricas
- Transporte

6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO

DANES INGENIEROS S.A.S ha implemento el Sistema de Gestión de Seguridad y la Salud en el Trabajo SG- SST de la obra civil cuyo objeto es: la *"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN – DEPARTAMENTO DEL HUILA"*, con los lineamientos establecidos en el **Decreto 1072 del 2015.**

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

DANES INGENIEROS S.A.S aborda la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).

Para la implementación del SG-SST la empresa elaboró los siguientes documentos según normatividad aplicable y se adapta al tamaño y características del Proyecto.

- Política y Objetivos Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST.
- Política de no alcohol, no drogas y no tabaquismo.
- Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
- Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Subprogramas de Seguridad y Salud.

Las medidas, actividades y controles SST implementadas en la etapa constructiva son:

6.1 AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL (EPS, ARL, AFP)

De conformidad con la Ley 100 de 1993, DANES INGENIEROS S.A.S da cumplimiento con la

realización de la afiliación a la seguridad social al momento de la contratación del personal igualmente se hace el seguimiento al personal subcontratista que inicie labores solicitando certificados de pagos y verificando oportunamente la afiliación a EPS, AFP y ARL.

Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024, se realizaron afiliaciones a la seguridad social y también se dio cumplimiento con el pago a la seguridad social del personal administrativo y operativo vinculado al proyecto. (Anexo 1. Pago de la seguridad social).

A continuación, se relaciona el personal activo de MOC y MONC del periodo reportado:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CÉDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	PENSIÓN
1	Néstor Rodrigo Fierro Losada	7.719.364	Director de Obra	12/11/2024	SURA	Nueva EPS	Porvenir
2	Wilmar Armando Jiménez Marulanda	80.826.744	Coordinador	12/11/2024	SURA	Nueva EPS	Porvenir
3	Johan Sebastián Ríos Palacio	1.057.304.693	Residente de Obra	12/11/2024	SURA	SURA	Porvenir
4	Cristian Camilo López Córdoba	1.075.220.858	Residente SST	12/11/2024	SURA	Sanitas	Protección
5	José Albeiro Tovar Gómez	12.137.587	Maestro	12/11/2024	SURA	Nueva EPS	Porvenir
6	Silvio Quiñonez Samboni	1.061.986.149	Ayudante	13/11/2024	SURA	Asmet Salud	Protección
7	Emiro Samboni Muñoz	1.061.985.551	Ayudante	18/11/2024	SURA	Asmet Salud	Porvenir
8	Robinson Arcos Torres	1.082.772.137	Ayudante	18/11/2024	SURA	Nueva EPS	Porvenir
9	Jorge Armando Hoyos Paz	1.082.774.946	Ayudante	18/11/2024	SURA	Nueva EPS	Porvenir

Tabla 2. Personal vinculado al proyecto

Teniendo en cuenta la información suministrada anteriormente, durante el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024, se mantienen un total de 9 trabajadores, de los cuales 5 trabajadores son MONC y 4 trabajadores son MOC. Es de resaltar que el personal vinculado al proyecto se encuentra afiliado a EPS, ARL Y AFP.

6.2 EXÁMENES MEDICO OCUPACIONALES

De conformidad a la Resolución 2346 del 2007 "Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales (...)". Por lo tanto, DANES INGENIEROS S.A.S., ha realizado los exámenes médicos ocupacionales de ingreso al personal contratado.

Estos exámenes médicos ocupacionales se determinan según las funciones y/o actividades que desempeñara el trabajador y lo establece un Profesiograma para perfiles de cargos según el riesgo ocupacional.
Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024 no se realizaron exámenes médicos ocupacionales de ingreso, ya que el personal que laboró en dicho periodo es el mismo que el que ingresó en noviembre.

6.3 INDUCCIONES EN SST

DANES INGENIEROS S.A.S., realizó inducciones en SST a todo el personal contratado durante la etapa de inicio y de construcción vinculados al Proyecto, además se realiza la Notificación de riesgos al cual estarán expuestos en toda la ejecución de sus labores y el desarrollo de la misma. (Anexo 3. Inducciones)

Los temas que se abordan en la inducción se describen a continuación:

1. Políticas en SST, Políticas para el no consumo de tabaco, alcohol y drogas.
2. Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
3. Entidades que conforman la seguridad social.
4. Actividad económica.
5. Peligros y riesgos asociados a la actividad económica.
6. Obligaciones del empleador y de los trabajadores.
7. Incidentes, accidentes de trabajos, actos y condiciones inseguras y enfermedades laborales.
8. Como reportar un accidente de trabajo.
9. Clasificación de agentes de riesgos.
10. Elementos de protección personal EPP.
11. Prevención y respuestas ante una emergencia (Brigadas de emergencias).
12. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral.
13. Plan de manejo ambiental implementado para la obra.
14. Políticas de igualdad salarial, protocolo de perspectiva de género.

6.4 ENTREGA DE EPP

DANES INGENIEROS S.A.S implementa una Matriz de EPP por Cargos/Actividades, donde facilita la identificación de los EPP que requieren cada uno de los trabajadores según las funciones y/o actividades que desarrollaran. Permitiendo así eliminar y/o minimizar los Factores de riesgos de Seguridad o de Higiene a los que estén expuestos.

Para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024 se realizó renovación de los elementos de protección personal que presentan desgaste o no son aptos para continuar usando, al personal contratado. (Anexo 4. Entrega de EPP).



Ilustración 3. Entrega de EPP a personal de obra

6.5 CHARLAS PREOPERACIONALES

Las charlas pre operacionales son uno de los medios más eficaces para corregir las prácticas de trabajo incorrectas y formar una conciencia en prevención de accidentes, tanto en el trabajo como fuera de este.

Por este motivo el DANES INGENIEROS S.A.S realizó Charlas Pre operacionales o de seguridad previo al inicio de las actividades. Sensibilizando, Concienciando e inculcando una cultura de autocuidado; evitando actos y condiciones inseguras lo cual permite mitigar los accidentes,

incidentes y enfermedades laborales abarcando temas de Seguridad y Salud en el trabajo.
A continuación, se relaciona las charlas pre operacionales programadas y realizadas para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024, cuyos soportes se anexan en el Anexo 5. Charlas preoperacionales.

TEMAS A TRATAR	RESPONSABLE	FECHA
Uso de los EPP	SISO	02/12/2024
Importancia del Autocuidado	SISO	05/12/2024
Importancia de delimitar el área de trabajo	SISO	09/12/2024
Orden y aseo en el lugar de trabajo	SISO	12/12/2024

Tabla 3. Charlas preoperacionales



Ilustración 4. Charlas pre operacionales a personal de obra

6.6 DILIGENCIAMIENTO DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - ATS

Durante el presente periodo, se requirieron los siguientes Análisis de Seguridad en el Trabajo para las actividades desarrolladas y que se adjuntan en el Anexo 6. Análisis de Trabajo Seguro.

ATS - Fundición de concreto para zapatas y vigas de cimentación.
ATS - Fundición de concreto para columnas.
ATS - Fundición de concreto para viga canal.

6.7 INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• **Accidentes Laborales Presentados en el Periodo:** Para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024, no se presentaron accidentes laborales dentro del proyecto.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Número de empleados accidentados al mes / Número total de empleados al mes) * 100
	0/9*100=0%

• **No. de días perdidos por AL:** En el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024, no se presentaron días perdidos por Accidentes Laborales.

• **No. de días perdidos por enfermedad común:** En el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024, no se presentaron incapacidades por enfermedad común, el personal se encuentra en buenas condiciones de salud.

• **No. de días perdidos por enfermedad laboral:** En el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024, no se presentaron incapacidades por enfermedad laboral.

• **Tasa de accidentalidad:** En el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024, la tasa de accidentalidad fue cero.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Número de accidentes de trabajo / Número de trabajadores) * 100
	0/9*100=0%

• **Hora de hombres trabajadas:** Se determina que: Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024 se trabajó 22 días hábiles, de los cuales de lunes a viernes tuvieron

jornada laboral de 8 horas diarias y los sábados 4 horas laborales, lo que corresponde a que se tuvo 1116 HHT.

ÍTEM	No. TRABAJADORES	No. DÍAS Jornada Completa	No. DÍAS Media Jornada	HORAS	TOTAL
HHT	9	22	4	124	1.116

- **Índice de Frecuencia AT:** Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024, se reportaron 1116 HHT, para ese mismo periodo no se presentaron accidentes de trabajo.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Número total de AT en el mes / Número HHT en el mes) * 100
	0/1116*100= 0%

- **Índice de severidad AT:** De las 1536 HHT reportadas, no se presentaron días perdidos de ninguna índole.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Número de días perdidos y cargados por AT en el mes / Número HHT en el mes) * 100
	0/1116*100= 0%

- **Índice lesiones incapacitantes de AT:** El índice de lesión incapacitante es 0, ya que no se presentaron incapacidades durante el periodo.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	IF * IS / 1000
	0*0/1000=0%

- **Tasa de ausentismo general:** Durante el periodo se laboraron 1536 Horas hombres trabajadas, no hubo días perdidos por enfermedad común, accidentes de trabajo, enfermedad profesional o permisos.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Número de días perdidos por (EC + AT + EP + permisos / Numero HHT mes) * 100
	0+0+0+0/1116*100=0%

- **Capacitaciones:** La participación en las charlas pre operacionales fue del 100% del personal contratado en el periodo para el proyecto.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Número de empleados que asisten a charlas realizadas / Número total de empleados) * 100
	9/9 * 100= 100%


- **Entrega de los elementos de protección personal:** Se hizo entrega de los EPP a todo el personal vinculado al proyecto, cumpliendo con el 100% del indicador.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Número de entrega de EPP nuevos y/o reposición / Número total de trabajadores) * 100
	9/9* 100 = 100%

- **Afiliaciones:** Se dio cumplimiento en su totalidad con las afiliaciones al Sistema de seguridad social.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social / Número total de empleados laborando) * 100
	9/9 * 100 = 100%

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

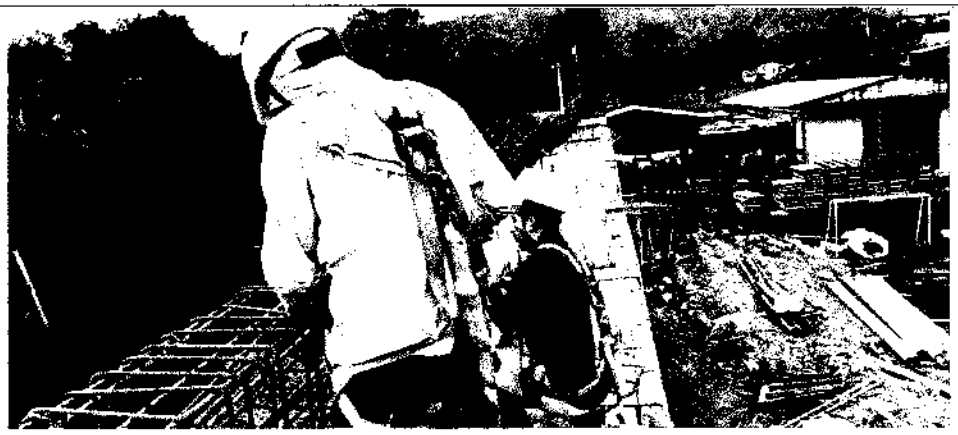

















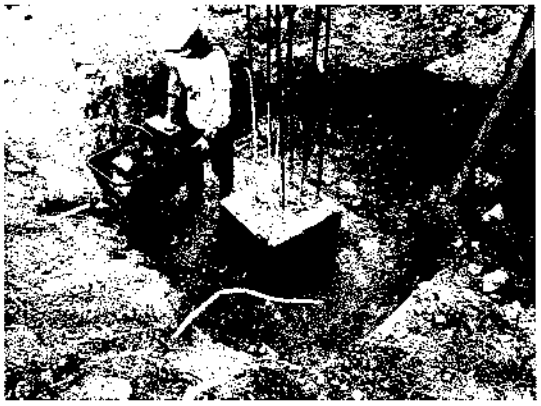



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057304693		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1129348867	9478285730	I	2024/12/20	2024/12/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$461,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
1	CC	1057304693	RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.9603	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057304693		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1129348867	9478285730	I	2024/12/20	2024/12/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$461,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$461,000	$0	$0	$461,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	32850249	9480094655	E	2025/01/08	2025/01/09	BANCO DE OCCIDENTE	1	$2,693,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: NEIVA (11 Afiliados)						$9,230,002	$1,477,000			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$475,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC	7719364	FIERRO NESTOR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	36067241	MEDINA SANDRA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (9 Afiliados)						$6,630,002	$1,061,000			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$461,800		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (9 Afiliados)						$6,630,002	$1,061,000			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$461,800		$0	$0
3	CC	1082772137	ARCOS ROBINSON	230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
4	CC	1082772716	ARCOS WILIAN	230301	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF32	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
5	CC	1082774946	HOYOS JORGE	230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
6	CC	80926744	JIMENEZ WILMAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	1075226858	LOPEZ CRISTIAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	7705022	MARTINEZ CARLOS	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	1061986149	QUIÑONEZ SILVIO	230201	6	$260,000	$41,600	ESSC62	6	$260,000	$10,400	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
10	CC	1061985531	SAMBONI EMIRO	230301	5	$216,667	$34,700	ESSC62	5	$216,667	$8,700	CCF32	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
11	CC	12137587	TOVAR JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$9,230,002	$1,477,000			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$475,400		$0	$0

2025/01/09 04:20 PM

aportes en línea

Resumen eneral de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	32850249	9480094655	E	2025/01/08	2025/01/09	BANCO DE OCCIDENTE	1	$2,693,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,477,000	$1,100	$0	$1,478,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$200	$0	$208,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$811,400	$600	$0	$812,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$457,600	$300	$0	$457,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$475,400	$300	$0	$475,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$475,400	$300	$0	$475,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$369,400	$300	$0	$369,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	$369,400	$300	$0	$369,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$369,400	$400	$0	$369,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$19,100	$100	$0	$19,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$298,300	$200	$0	$298,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$100	$0	$52,100
TOTAL				11	$2,691,200	$2,100	$0	$2,693,300

2025/01/09 04:20 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057304693		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1165312149	9479812982	I	2025/01/23	2025/01/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$12,174,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	Irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$32,500,000	$5,850,000			$32,500,000	$4,062,500			$0	$0			$32,500,000		$2,262,000		$0	$0		$12,174,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$32,500,000	$5,850,000			$32,500,000	$4,062,500			$0	$0			$32,500,000		$2,262,000		$0	$0		$12,174,500
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$32,500,000	$5,850,000			$32,500,000	$4,062,500			$0	$0			$32,500,000		$2,262,000		$0	$0		$12,174,500
1	CC	1057304693	RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN																	23030 1	30	$32,500,000	$5,850,000	EPS010	30	$32,500,000	$4,062,500		0	$0	$0	14-11	30	$32,500,000	6.960%	$2,262,000	0	$0	$0	No	$12,174,500
Total Afiliados(1)																						$32,500,000	$5,850,000			$32,500,000	$4,062,500			$0	$0			$32,500,000		$2,262,000		$0	$0		$12,174,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057304693		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1165312149	9479812982	I	2025/01/23	2025/01/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$12,174,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,850,000	$0	$0	$5,850,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$5,850,000	$0	$0	$5,850,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,262,000	$0	$0	$2,262,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$2,262,000	$0	$0	$2,262,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,062,500	$0	$0	$4,062,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$4,062,500	$0	$0	$4,062,500
TOTAL				1	$12,174,500	$0	$0	$12,174,500

2025/05/19 08:05 PM

ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION

CODIGO: UC-REG-4.4.1-03
PAGINA: 1 DE 1

Nombre del Trabajador: José Albeno Tovar Cargo: Maestro de obra Proceso: Obra

Empresa: DANES INGENIEROS S.A.S Proyecto: CONSTRUCCIÓN CUBIERTA AUTOPORTANTE VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H)

Elementos de Protección Personal

Fecha de entrega	CABEZA		OJOS					CARA			OÍDOS		RESPIRATORIA					MANOS							PIES/PIERNAS			CUERPO							TRABAJOS ALTURA					Firma: Acepto que he recibido los EPP adecuados y me comprometo a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás disposiones legales vigentes.
	Casco Dieléctrico	Casco con Barbuquejo	Gafas De Seguridad transparentes	Careta de soldador	Careta de Esmeril	Monogafas	Gafas de seguridad lentes oscuros	Careta soldador	Monge protector de cuero	Careta Para Esmerilar	Protector Auditivo Tipo Copa	Protector Auditivo Tipo Tapón	Respirador Humos Metálicos	Respiradores desechables	Respirador para material particulado (Polvo y Sílice)	Gases y Vapores	Vapores orgánicos	Guante Neopreno en Nitrilo	Manguera soldador largos	Guantes para soldador	Carnaza	Hilaza puntos	Guante de cuero Industrial	Guante de nitrilo	Guantes de Badanas	Botas Seguridad con puntera reforzada	Botas Caucho con puntera reforzada	Calzado dieléctrico	Bota de seguridad caña alta	Overall en carnaza o Jaquets	Overol de cuerpo entero Confeccionado	Chaqueta y pantalón en jean	Overol de dos piezas en dril	Impermeable chaqueta pantalón con material	Chaleco reflectivo	Mangas Coolmax(Ventiladas)	Kits Seguridad multipropósito	Eslinga	Posicionamiento	Ret-ros en V con absorbedor de energía	Ubicadores	Frenos	Línea de Vida con Cuerda	
12-12-2024			X											X					X		X														X	X	X	X	X	X	Jose Albeno Tovar
17-12-2024														X					X		X																				Jose Albeno Tovar

Diligencie en la casillas el numero de elementos entregados.

NOTA: Identifique aquí EPP que no estén en el listado:

ELABORA

Nombre: Cristian Camilo Lopez

Fecha: 12/12/2024

Firma:

Notas: 1. Una vez recibida la compra, se entregan a los trabajadores los EPP quienes firman en señal de recibido conforme y compromiso de utilizarlos adecuadamente.
2. Con la firma de recibido de estos elementos, "Acepta que ha recibido los EPP adecuados y se compromete a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás disposiones legales vigentes".

Danes

ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION

CODIGO: UC-REG-4.4.1-03
PAGINA: 1 DE 1

Nombre del Trabajador: Silvio Quiñones Santana Cargo: Ayudante Proceso: Obra

Empresa: DANES INGENIEROS S.A.S Proyecto: CONSTRUCCIÓN CUBIERTA AUTOPORTANTE VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H)

| Fecha de entrega | Elementos de Protección Personal | | |

Danes	ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION	CODIGO: UC-REG-4.4.1-03 PAGINA: 1 DE 1

Nombre del Trabajador: Emiro Samboni Muñoz Cargo: Ayudante Proceso: obra

Empresa: DANES INGENIEROS S.A.S Proyecto: CONSTRUCCIÓN CUBIERTA AUTOPORTANTE VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H)

| Fecha de entrega | Elementos de Protección Personal | | |

Danes	**ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION**	CODIGO: UC-REG-4.4.1-03 PAGINA: 1 DE 1

Nombre del Trabajador: Robinson Arcos Torres Cargo: Ayudante Proceso: Obra

Empresa: DANES INGENIEROS S.A.S Proyecto: CONSTRUCCIÓN CUBIERTA AUTOPORTANTE VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H)

Elementos de Protección Personal

Fecha de entrega	CABEZA		OJOS					CARA			OÍDOS		RESPIRATORIA					MANOS						PIES/PIERNAS			CUERPO						TRABAJOS ALTURA					Firma: Acepto que he recibido los EPP adecuados y me comprometo a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás disposiciones legales vigentes.
	Casco Dieléctrico	Casco con Barboquejo	Gafas De Seguridad Transparentes	Careta de soldador	Careta de Esmeriar	Monogafas	Gafas de seguridad lentes oscuros	Careta soldador	Monga protector de cuello	Careta Para Esmeriar	Protector Auditivo Tipo Fijo	Protector Auditivo Tipo Copa	Respirador Mixtos Mediacara	Respiradores desechables	Respirador para material particulado (máscara facial)	Vapores orgánicos	Vapores orgánicos y gases ácidos	Químicos y pinturas en spray	Guante Resistente en Nitrilo	Tenaza o ingeniero Tipo	Guantes para soldador	Carnaza	Mangas puntos	Guante de caucho Industrial	Guante de nitrilo	Guantes de Médico	Botas seguridad con puntera reforzada suela	Botas Caucha con puntera reforzada	Calzado de fútbol	Bota de seguridad caña alta	Overall en carnaza o Vaqueta	Overol de cuerpo entero Con reflectivo	Chaqueta y pantalón en jean	Overol de dos piezas jardín	Impermeable chaqueta y pantalón con material	Chaleco reflectivo	Mangas (Carnaza/Vaqueta)	Arnés Seguridad multipropósito	Eslinga Posicionamiento	Eslinga en Y con absorbedor de energía	Preseguros	Firma	Línea de Vida certificada	
12-12-2024			X											X						X		X																ROBINSON ARCOS
12-12-2024														X						X		X																ROBINSON ARCOS

DANES	**ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION**	CODIGO: UC-REG-4.4.1-03 PAGINA: 1 DE 1

Nombre del Trabajador: Jorge Armando Hoyos Cargo: Ayudante Proceso: Obra.

Empresa: DANES INGENIEROS S.A.S Proyecto: CONSTRUCCIÓN CUBIERTA AUTOPORTANTE VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H)

Elementos de Protección Personal

Fecha de entrega	CABEZA		OJOS					CARA			OÍDOS		RESPIRATORIA					MANOS							PIES/PIERNAS				CUERPO						TRABAJOS ALTURA						Firma: Acepto que he recibido los EPP adecuados y me comprometo a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás disposiones legales vigentes.
	Casco Dieléctrico	Casco con Barbuquejo	Gafas De Seguridad Transparentes	Careta de soldador	Careta de Esmerilar	Monogafas	Gafas de seguridad Lentes oscuros	Careta soldador	Malla protectora de cuello	Careta Para Esmerilar	Protector Auditivo Tipo Tapón	Protector Auditivo Tipo Copa	Respirador Humos Metálicos	Respirador desechables	Respirador para material particulado (indique Sílice)	Vapores orgánicos	Vapores orgánicos y gases ácidos	Químicos y pinturas en spray	Guante Recubierto en Nitrilo	Manguito o Ingerido Largo	Guantes para soldador	Carnaza	Hilaza puntos	Guante de cuero Individual	Guante de nitrilo	Guantes de dieléctrico	Botas sapatillas con puntera reforzada suela	Botas Caucho con puntera reforzada	Calzado dieléctrico	Bota de seguridad caña alta	Overol en carnaza o Vaqueta	Overol de cuerpo entero Con reflectivo	Chaqueta y pantalón en jean	Overol de dos piezas en dril	Impermeable chaqueta y pantalón con material	Chaleco reflectivo	Mangas Carnaza/Vaqueta	Arnés Seguridad multipropósito	Eslinga	Posicionamiento	Eslinga en Y con absorbedor de energía	Mosquetones	Frenos	Línea de Vida retráctil	
12-12-2024			X										X							X		X													X	X			X	X	X	Jorge Hoyos
17-12-2024													X							2		2																				Jorge Hoyos

Diligencie en la casillas el numero de elementos entregados.

NOTA: Identifique aquí EPP que no estén en el listado:

ELABORA

Nombre: Cristian Camilo Lopez

Fecha: 12-12-2024

Firma:

Notas: 1. Una vez recibida la compra, se entregan a los trabajadores los EPP quienes firman en señal de recibido conforme y compromiso de utilizarlos adecuadamente.
2. Con la firma de recibido de estos elementos, "Acepta que ha recibido los EPP adecuados y se compromete a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás disposiones legales vigentes".

	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Código:	FT-SST-016
Dánes		Código:	2/08/2023
	DANES INGENIEROS S.A.S	Versión	1

OBJETO DE DIVULGACION O REUNIÓN	Lugar	DD	MM	AA
Charla Preoperacional	Cabrera Vda. Los Andes	02	12	24

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Uso EPP
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jaban Sebastian Rios Pabon	(05) 304.09.7	Residente Obra	
2	Nestor Rodrigo Tierro Cesada	7.719.364	Orestor Obra	
3	Cristian Camilo Lopez C.	(05) 216.958	Residente SST	
4	Jose Alberto Lopez G.	12.137.37	Maestro	
5	Jhon Alexander Sanbon	1064176119	Oficial	
6	Robinson Arcos Tirado	1064779131	Ayudante	
7	Jorge Armando Lopez	1122374446	Ayudante	
8	Cesar Graterol	1064655051	Ayudante	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Cristian Camilo Lopez	

	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Código:	FT-SST-016
Dánes		Código:	2/08/2023
	DANES INGENIEROS S.A.S	Versión	1

OBJETO DE DIVULGACION O REUNIÓN	Lugar	DD	MM	AA
Charla Prepracional	Cabrera Vda. Los Andes.	05	12	24

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? Importancia del diligenciado.
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Johan Sebastian Rios Palacio	1.059.309.693	Residente Obra	
2	Wader Rodrigo Tierro Cerveda	7.719.364	Director Obra	
3	Cristian Camilo Lopez C.	1.015.210.358	Residente SST	
4	Diego Alberto Lopez G.	1.037.637	Maestro	
5	Jhon Alexander Sanboni	1.014.261.19	Ayudante	
6	Robinson Arce Tovar	1.082.113.33	Ayudante	
7	Diego Armando Vargas	1.022.374.146	Ayudante	
8	Cristian Sanabria	1.014.[illegible]	Ayudante	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Cristian Camilo López	

	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Código:	FT-SST-016
Danes		Código:	2/08/2023
	DANES INGENIEROS S.A.S	Versión	1

OBJETO DE DIVULGACION O REUNION	Lugar	DD	MM	AA
Charla Pre operacional	Abierta Vda. Los Robles	09	12	24

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? Importancia de delimitar el área de trabajo
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Nestor Mongo Tierro Cesada	7.119.364.	Director Obra	
2	Johan Sebastian Rios Palacio	1.053.304.693	Residente Obra	
3	Cristian Camilo Lopez C.	1.013.210.358	Residente SST	
4	Jose Alberto Lopez G.	1.213.287	Maestro	
5	Diana Catalina Sanboni	1.047.161.19	Ayudante	
6	Robinson Arcos Tovar	1.087.111.331	Ayudante	
7	Jorge Arnulfo Lopez	1.211.374.146	Ayudante	
8	Cristian Sanabria	1.013.655.351	Ayudante	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Cristian Camilo Lopez	

	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Código:	FT-SST-016
Dánes		Código:	2/08/2023
	DANES INGENIEROS S.A.S	Versión	1

OBJETO DE DIVULGACION O REUNION	Lugar	DD	MM	AA
Charla Pre operacional	Cabecera Vda. Los Arboles	12	12	24

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? Orden y aseo en el lugar de trabajo
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Victor Rodrigo Fierro Cesada	7.119.364	Director Obra	
2	Johan Sebastian Rios Palacio	1.053.804.693	Residente Obra	
3	Cristian Camilo Lopez C.	1.035.[illegible]	Residente SST	
4	Jorge Alberto Lenguas G.	12.137.381	Electrico	
5	Julian Alexander Sanboni	1.014.261.19	Ayudante	
6	Robinson Arcos Tenes	1.08.[illegible]	Ayudante	
7	Jorge Armando Vargas	12.[illegible]	Ayudante	
8	Cristian Saldarriaga	1.[illegible]	Ayudante	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Cristian Camilo Lopez	

Dánes	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-094
	☑ SG-SST	
FORMATO DE ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 30/2021
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

ACTIVIDAD/TAREA: Fundición de concreto para zapatas y vigas Centenario — INSTALACION / LOCACION / SECCION: Alcantarillado Los Andes

AREA: Obra — FECHA: 06/12/24 — AST N°: 03 — Página 1 de 1

Nº	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	QUE PUEDE FALLAR / PELIGROS / RIESGOS	QUE PUEDE PASAR / CONSECUENCIAS: PERSONA	EQUIPO	AMBIENTE	COMO EVITAR EL INCIDENTE / BARRERAS EXISTENTES	C	P	R	BARRERAS ADICIONALES
1	Ingreso al area de excavación y alistamiento	Caida de objetos desde nivel de piso	Lesiones golpes			Delimitar e señalizar el area, uso EPP.		X		
2	Armado de formaleta	Machucones, cortes.	Heridas, golpes			Uso de EPP, Gestion correcta herramientas		X		
3	Fundición	Vibrador, Cargas, Ruido	Lesiones golpes			Uso EPP		X		
4	Orden y Aseo	Ruido, Vibración, Caida	Golpes Cortes			Capacitar, uso EPP		X		
5										
6										
7										
8										
9										
10										

QUE HACER SI ALGO FALLA: Informar de manera inmediata al supervisor, prestar primeros auxilios, en caso de ser necesario trasladar al centro hospitalario mas cercano.

EL SUPERVISOR ES:

SOLICITANTE: Jose Alberto Tarazona — APROBO: Juan Sebastian Ruiz — PORTADOR: Maestro de obra — RESPONSABLE O AUTORIDAD DEL AREA: Juan Sebastian Ruiz

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Código: FT-SST-094
			Fecha de modificación: Julio 30/2021

Dánes	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-094
	☑ SG-SST	
FORMATO DE ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Fecha: Julio 30/2021	
	Versión: 001	
	Página 1 de 1	

ACTIVIDAD/TAREA: Fundición de concreto para columna y viga — INSTALACION / LOCACION / SECCION: Los Andes

AREA: Obra. — FECHA: 12/12/2024 — AST N°: 04 — Página 1 de 1

N°	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	QUE PUEDE FALLAR / PELIGROS / RIESGOS	QUE PUEDE PASAR / CONSECUENCIAS			COMO EVITAR EL INCIDENTE / BARRERAS EXISTENTES	C	P	R	BARRERAS ADICIONALES
			PERSONA	EQUIPO	AMBIENTE					
1	Ingreso al area de fundida y alistamiento	Caida, golpes, cortes	Lesiones			Uso EPP y los equipamiento		X		
2	Armado de encofrado	Caida de altura, golpes, cortes	Lesiones			Uso EPP y charla antes de iniciar		X		
3	fundición	golpes, lesiones, caida	Golpes, lesiones			Uso EPP y cuidado		X		
4	Orden y aseo	Golpes, locativo, caida	Lesiones			Uso EPP,		X		
5										
6										
7										
8										
9										
10										

QUE HACER SI ALGO FALLA: Por auxilio al operario, pedir primeros auxilios, en caso de requerir, trasladar al centro hospitalario mas cercano

EL SUPERVISOR ES:

SOLICITANTE: Jose Alfredo Torres — APROBO: — PORTADOR: Nestor Cora — RESPONSABLE O AUTORIDAD DEL AREA:

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Código: FT-SST-094
			Fecha de modificación: Julio 30/2021

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO		RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E 410 - 13 / NTC 673	VERSION N° 1 FECHA VERSION: 23/07/2023 CÓD: FOS-M16-F13

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA **PERIODO:** 7/12/2024 AL 4/01/2025

SOLICITANTE: DANES INGENIEROS S.A.S **NIT:** 900.219.918 - 2 **DIRECCION:** VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H) **INFORME** 1 **FECHA** 4/01/2025

CILINDRO Nº	ELEMENTO FUNDIDO	ABCISA ELEMENTO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ROTURA	DIAS	RESISTENCIA DE DISEÑO		EDAD (Dias) (digitar x para muestra a ir para test/go)				DIAMETRO MUESTRA		LONGITUD MUESTRA		PESO (g)		CARGA APLICADA		TIPO DE FALLA	AREA MUESTRA		VOLUMEN		DENSIDAD		RESISTENCIA OBTENIDA		PORCENTAJE ALCANZADO	RESISTENCIA ESPERADA		PORCENTAJE ESPERADO	ASCENTAMIENTO (SLUMP)	OBSERVACIONES DE LA MUESTRA
						(Psi)	(Mpa)	3	7	14	28	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(g)	(Kg)	(Lbf)	(kN)		(mm2)	(in2)	(mm3)	(in3)	(Kg/m3)	(lb/ft3)	(Mpa)	(PSI)		(Mpa)	(PSI)		(in)	
	ZAPATAS	A3 - B2	7/12/2024	14/12/2024	7	3000	20.67					99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	23578	104.9	S.D	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2294.4	143.2	14.54	2109	71%	14.5	2100.0			
				14/12/2024	7		20.67					99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	24474	108.9	S.D	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2294.4	143.2	14.39	2087	70%	14.5	2100.0			
				21/12/2024	14		20.67					99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	28107	125.0	S.D	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2295.1	143.2	18.54	2745	92%	19.6	2700.0			
				21/12/2024	14		20.67					99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	28499	126.8	S.D	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2295.7	143.3	19.01	2761	95%	19.6	2700.0			
				4/01/2025	28		20.67					99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	32172	143.1	S.D	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2295.4	143.3	21.29	3087	103%	20.7	3000.0			
				4/01/2025	28		20.67					99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	34154	151.9	S.D	7697.7	11.9	1541235.2	94.4	2294.4	143.2	21.54	3124	105%	20.7	3000.0			

OBSERVACIONES: RESISTENCIA % (3 DIAS 40% - 7 DIAS 70% - 14 DIAS 90% - 28 DIAS 100%) Según norma técnica 500-630-13 (INVIAS-13)(NTC 321)

La muestra de concreto de nomenclatura CR M pertenece al codigo interno del laboratorio para la identificación de las muestra.

INFORME No.1 MUESTRA TOMADAS EN SITU Y TRANSPORTADAS AL LABORATORIO CENTRAL POR EL CLIENTE







MANUEL ANDRES ESCARRANO
LABORATORISTA

Calle 25 c #10-07 barrio Lara Bonilla - Pitalito Huila /Correo electronico: Laboratoriofesaguilera@gmail.com

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E 410 - 13 / NTC 673

VERSIÓN Nº 2
FECHA VERSIÓN: 15/02/2023
CLE-FES-m1(673)

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA

PERÍODO: 10/12/2024 AL 07/01/2025

SOLICITANTE: DANES INGENIEROS S.A.S

NIT: 900.219.918 - 2

DIRECCION: VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H)

INFORME 2 FECHA 31/12/2024

CILINDRO Nº	ELEMENTO FUNDIDO	ABCISA ELEMENTO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ROTURA	DIAS	RESISTENCIA DE DISEÑO		EDAD (Días) (digitar x para muestra a ensayar para cada edad)				DIAMETRO MUESTRA		LONGITUD MUESTRA		PESO (g)		CARGA APLICADA		TIPO DE FALLA	AREA MUESTRA		VOLUMEN		DENSIDAD		RESISTENCIA OBTENIDA		PORCENTAJE ALCANZADO	RESISTENCIA ESPERADA		PORCENTAJE ESPERADO	ASCENTAMIENTO (SLUMP)	OBSERVACIONES DE LA MUESTRA
						(Psi)	(Mpa)	3	7	14	28	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(g)	(Kg)	(Lbf)	(KN)		(mm2)	(in2)	(mm3)	(in3)	(Kg/m3)	(lb/ft3)	(Mpa)	(PSI)		(Mpa)	(PSI)		(in)	
	PEDESTAL	A4 - 53	10/12/2024	17/12/2024	7	3000	20.67					99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	23785	105.8	5.0	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2294.3	143.2	14.55	2110	71%	14.5	2100.0			
				17/12/2024	7		20.67					99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	24362	108.3	5.0	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2294.1	143.2	14.46	2097	70%	14.5	2100.0			
				24/12/2024	14		20.67					99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	29021	130.4	2.0	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2295.7	143.3	19.2	2784	95%	18.6	2700.0			
				24/12/2024	14		20.67					99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	26675	128.9	5.0	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2295.3	143.3	16.78	2723	91%	18.6	2700.0			
				07/01/2025	28		20.67					99.0	3.9	201.0	7.9	3552.0	3.55	33735	150.0	3.0	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2296.5	143.4	21.47	3114	104%	20.7	3000.0			
				07/01/2025	28		20.67					99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	35128	156.3	2.0	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2295.7	143.4	21.10	3060	102%	20.7	3000.0			

OBSERVACIONES: RESISTENCIA % (3 DIAS 40% - 7 DIAS 70% - 14 DIAS 90% - 28 DIAS 100%) Según norma técnica 500330-13 (INVE-AS-13/NTC 321)

La muestra de concreto de nomenclatura CR # pertenecen al codigo interno del laboratorio para la identificación de las muestra

INFORME No.1 MUESTRA TOMADAS EN SITU Y TRANSPORTADAS AL LABORATORIO CENTRAL POR EL CLIENTE

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Serv.Lab Ingeniería Laboratorio	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO INV E - 410	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

CLIENTE	DANES INGENIEROS SAS	ORDEN DE SERVICIO	SL-2412-24
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	FECHA REPORTE	10 DE ENERO DE 2025
LOCALIZACION	VEREDA LOS ANDES, SAN AGUSTÍN - HUILA		

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	DESCRIPCION	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO PSI	FECHA		EDAD ROTURA (DÍAS)	FUERZA LB	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - Psi	
					TOMA	ROTURA				OBTENIDA (PSI)	% REFERIDA DISEÑO
1	VIGA DE CIMENTACIÓN EJE A	EJE A	4 PULG	3000	12-dic-24	19-dic-24	7	27995	10.00	2300.33	76.68%
2	VIGA DE CIMENTACIÓN EJE A	EJE A	4 PULG	3000	12-dic-24	26-dic-24	14	33359	10.00	2744.37	91.48%
3	VIGA DE CIMENTACIÓN EJE A	EJE A	4 PULG	3000	12-dic-24	9-ene-25	28	37665	10.00	3094.91	103.16%
4	VIGA DE CIMENTACIÓN EJE B	EJE B	4 PULG	3000	13-dic-24	20-dic-24	7	27636	10.00	2271.37	75.38%
5	VIGA DE CIMENTACIÓN EJE B	EJE B	4 PULG	3000	13-dic-24	27-dic-24	14	33312	10.00	2737.22	91.24%
6	VIGA DE CIMENTACIÓN EJE B	EJE B	4 PULG	3000	13-dic-24	10-ene-25	28	37859	10.00	3113.31	103.78%

OBSERV.: LAS MUESTRAS (CILINDROS) SON TOMADOS, CURADOS Y TRANSPORTADOS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas

REVISA:

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por

Cliente
Serv. Lab Ingeniería — X

Las muestras tomadas por el cliente al término de 28 días cumplen con la resistencia a compresión f'c mínima requerida 3000 psi.

GEOT. JOSE YERNEY SOLARTE SOLARTE MAT. 1951600199CAU

Laboratorio Calle 31 No. 7 - 59 Tel (8) 8644059
email servlab.ing@hotmail.com Neiva - Huila

Serv.Lab Ingeniería Laboratorio	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO INV E - 410	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

CLIENTE	DANES INGENIEROS SAS	ORDEN DE SERVICIO	SL-3612-24
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	FECHA REPORTE	17 DE ENERO DE 2025
LOCALIZACION	VEREDA LOS ANDES, SAN AGUSTÍN - HUILA		

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	DESCRIPCION	LOCALIZACION	SLUMP	Fc DISEÑO P.S.I.	FECHA		EDAD ROTURA (DIAS)	FUERZA LB	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI	
					TOMA	ROTURA				OBTENIDA (PSI)	% REFERIDA DISEÑO
1	COLUMNA EJE A	EJE A	4 PULG	3000	19-dic-24	26-dic-24	7	27655	10.00	2291.23	76.38%
2	COLUMNA EJE A	EJE A	4 PULG	3000	19-dic-24	2-ene-25	14	33412	10.00	2745.44	91.51%
3	COLUMNA EJE A	EJE A	4 PULG	3000	19-dic-24	16-ene-25	28	37822	10.00	3107.81	103.59%
4	COLUMNA EJE B	EJE B	4 PULG	3000	20-dic-24	27-dic-24	7	27652	10.00	2272.97	75.77%
5	COLUMNA EJE B	EJE B	4 PULG	3000	20-dic-24	3-ene-25	14	33102	10.00	2719.97	90.67%
6	COLUMNA EJE B	EJE B	4 PULG	3000	20-dic-24	17-ene-25	28	37442	10.00	3076.58	102.55%
7	VIGA CANAL EJE A	EJE A	4 PULG	3000	27-dic-24	3-ene-25	7	27485	10.00	2258.42	75.28%
8	VIGA CANAL EJE A	EJE A	4 PULG	3000	27-dic-24	10-ene-25	14	33117	10.00	2721.20	90.71%
9	VIGA CANAL EJE B	EJE B	4 PULG	3000	10-ene-25	17-ene-25	7	27668	10.00	2273.48	75.78%

OBSERV.: LAS MUESTRAS (CILINDROS) SON TOMADOS, CURADOS Y TRANSPORTADOS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas

REVISA:

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por

Cliente
Serv. Lab Ingeniería — X

Las muestras tomadas por el cliente al término de 28 d'as cumplen con la resistencia a compresión f'c mínima requerida 3000 psi

GEOT. JOSE HENRY SOLARTE SOLARTE MAT. 19516001990CAU

Laboratorio Calle 31 No 7 - 59 Tel (8) 8644050
email serv lab ing@hotmail.com Neiva - Huila

BITACORA DE OBRA


OBJETO: "CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA"

CONTRATO: DE OBRA No. CLPIH383 DE 2023

CONTRATISTA: DANES INGENIEROS SAS
R/L NESTOR RODRIGO FIERRO COSADA

CONTRATANTE: INDERHUILA

INTERVENTOR: CONSORCIO W.F.
R/L. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA

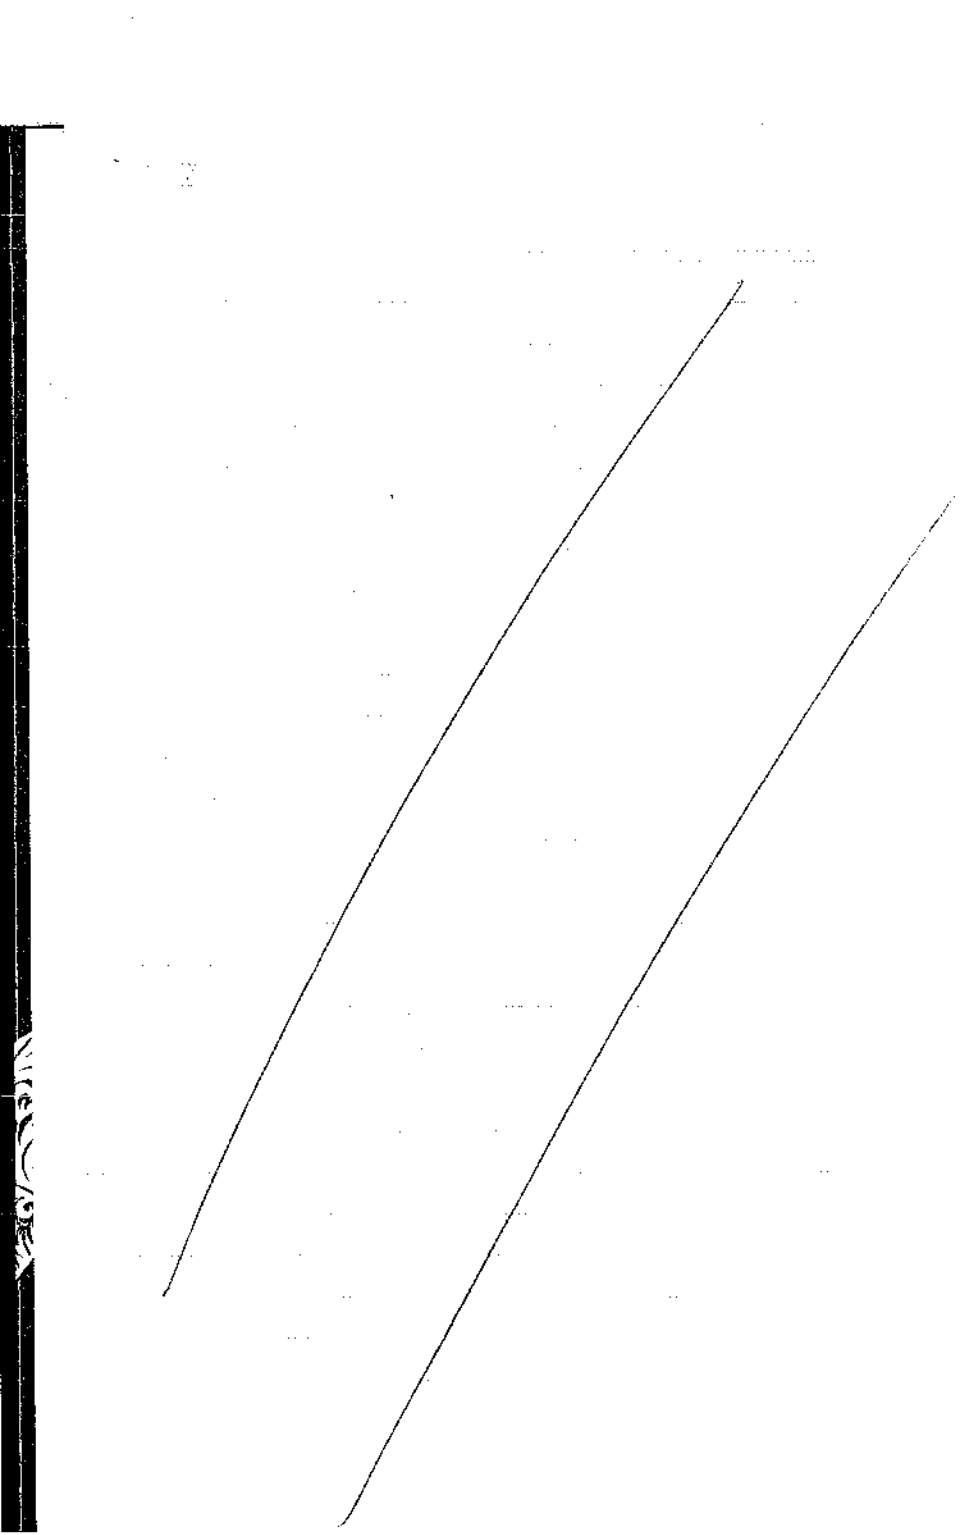

16/11/2023 Se firma acta de inicio al contrato y con ello empieza formalmente la ejecución del contrato. Inicialmente se realiza revisión a los documentos técnicos entregados por la entidad contratante y la interventoría.

Contratista Interventor

17 al 19/11/2023 Se continúa con la revisión a los documentos técnicos del proyecto y a las actividades logísticas para dar inicio a la obra física.

Contratista Interventor

20 al 26/11/2023 En este periodo, y con la revisión de los documentos técnicos, se realiza visita al sitio de la obra (22/11/23), donde se pudo verificar inconsistencias entre los documentos y lo hallado en el terreno, luego de realizarse la localización y replanteo en el lugar. Hechos encontrados como: * Cotas y dispersión de las columnas, no coinciden con los planos; * la implantación del proyecto genera afectación a la vía vehicular existente, la cual se interviene al momento de realizar las excavaciones para las

de los propietarios de los predios afectados, cuyos documentos deben ser tramitados por la comunidad. No se adelantan actividades de obra en este periodo. El tiempo en la zona es lluvioso. Se realiza la instalación de la valla informativa de la obra

Contratista Interventor

27/11/2023 al 03/12/2023 Con los hallazgos encontrados en el sitio de obra a través de las visitas técnicas realizadas, y con la revisión de los documentos entregados, se genera comunicación a la interventoría informando sobre lo encontrado, y se solicita se aclaren todos y cada uno de ellos, con el fin de dar inicio a las actividades físicas de ejecución, o suspender el contrato hasta tanto se tenga claridad de todo. No hay ejecución física en la obra para este periodo.

Contratista Interventor

04 al 10/12/2023 Durante este periodo NO se adelantan actividades físicas en el sitio de la obra, y se está atento a las actividades propias de la obra.

Contratista Interventor

11 al 17/12/2023 Luego de varias técnicas, la interventoría avala y corrobora los hallazgos encontrados por el contratista, y considera la necesidad de la suspensión del contrato, toda vez que se requiere un tiempo prudencial para que el diseñador y el profesional estructural del proyecto, aclaren o ajusten los diseños iniciales del proyecto; además, se necesitan los permisos de los propietarios que se van a ver afectados por la construcción y para ello la comunidad debe socializar y obtener dichos permisos con esas personas. Todo lo anterior, se consolida en oficio que envía la interventoría al INDERHUILA el 14/12/2023. No hay avance físico en el lugar de la obra, y se queda a la espera de la respuesta por parte de la Entidad contratante frente a la solicitud de suspensión elevada.

Contratista Interventor

No hay ejecución física en el lugar de obra.

Contratista

Interventor

26/12/2023 El INDERMUEBLES junto con el personal profesional de apoyo de la Entidad, en conjunto con el contratista y el interventor de obra, suscriben Acta de Suspensión No.01 al contrato de obra y con ello se espera que se atiendan, revisen y/o modifiquen si fuere necesario, todas y cada una de las observaciones informadas por el contratista y verificadas y avaladas por la interventoría. La suspensión se da por 45 días y/o hasta que se superen los inconvenientes que dieron lugar a esta suspensión.

Contratista

Interventor

12/11/2024 Reinicio de obra.

Tiempo: Seco todo el día

Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesionales SISO, maestro de obra.

Máq. y equipo: Aún no llegan a obra, solo herramienta menor

Actividades: Luego de superar los inconvenientes que llevaron a la suspensión de la obra, ésta es reiniciada, y de esta manera se reactivan las actividades contractuales. El día de hoy se socializan los aspectos logísticos y de personal que llegan a la obra.

Contratista - Residente Coordinador

Interventor

13/11/2024 Tiempo: Seco todo el día.

Personal: Ing. Residente de obra e interventoría, profesionales SST, maestro de obra, 1 ayudante.

Máq. y equipo: Aún no llegan a obra, solo herramienta menor

Actividades: Se continúa con actividades logísticas y administrativas, tales como: Convocatoria para contratar personal y proveedores locales, aunque por estar en época de cosecha de café, es un poco complicado. Se realizo la localización y replanteo del sitio de la obra, y se trazan algunos ejes. Se abre sitio para bodega de materiales.

14/11/2024 Tiempo: Lluvias moderadas en la mañana, tarde nublado.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesionales SST, maestro de obras, 1 ayudante.
Máq. y equipo: Herramienta menor, madera, puntillas.
Actividades: Se toman niveles y terminan de trazar los ejes del proyecto, se corrobora que todo esté conforme a los planos entregados. Se realiza acercamiento con el presidente de la JAC, con el fin de lograr concretar la contratación de personal. Se instala cinta reflectiva para demarcar la zona de obras.

Contratista-Residente
Coordinador

15/11/2024 Tiempo: Lluvias moderadas en la tarde, mañana nublado.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, maestro de obra, 1 ayudante.
Máq. y equipo: Herramienta menor, madera, cal, puntillas.
Actividades: Con cal se demarcan los sitios donde van las excavaciones para la cimentación de la estructura de la cubierta, se identifican los postes de energía que deben ser reubicados ya que afectan las excavaciones, se logra adelantar la contratación para el suministro del material pétreo y de recebo necesario para la obra. Las excavaciones a realizar, no afectan la vía ni las viviendas aledañas, gracias a las actividades que socializó y realizó la comunidad.

16/11/2024 Tiempo: Lluvias moderadas en la madrugada, seco el resto del
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesionales SST, maestro de obra, 1 ayudante.
Máq. y equipo: Herramienta menor, madera, puntillas.
Actividades: Gracias a la concertación realizada y a la colaboración del presidente de la JAC, se logra concretar 4 personas para trabajar en el proyecto, las cuales iniciarán el próximo lunes. El día de hoy las actividades se limitan a orden y aseo del sitio de obra.

Contratista-Residente
Coordinador

18/11/2024 Tiempo: Soleado todo el día.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 4 ayudantes, 1 conductor volqueta.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora para concreto, 1 taladro demoledor, 1 vibrador eléctrico para concreto, herramienta menor.
Actividades: Se da inicio a las actividades de excavación para la cimentación del proyecto, labor que se realiza de manera manual con picos, palas y barras; sin embargo, las fuertes lluvias de la noche anterior dificultan y retrasan la actividad. Se llevan a laboratorio, muestras de la grava y la arena a utilizar en la obra, con el fin de elaborar el diseño de mezclas; de igual manera se lleva muestra del recebo para su caracterización. Llegan 1 volqueta y equipos varios a la obra, como también concreto.

19/11/2024 Tiempo: Lluvias moderadas y fuertes en la tarde.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 4 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora para concreto, 1 fisuladora demoledor, 1 vibrador eléctrico, herramienta menor.
Actividades: Se da continuidad a la excavación manual en los puntos de la cimentación, siguiendo los planos de diseño. Lluvias fuertes en la tarde, provocan suspensión de las actividades.

Contratista - Residente coordinador

20/11/2024 Tiempo: Soleado en la mañana y nublado en la tarde.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 4 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora para concreto, 1 fisuladora demoledor, 1 vibrador eléctrico, herramienta menor.
Actividades: Las excavaciones manuales para la cimentación, continúan el día de hoy, con un rendimiento adecuado gracias a las buenas condiciones climáticas presentadas. Se inicia el suministro y transporte de material pétreo (grava y arena) necesarios para la obra. Además, es suministrada y transportada piedra requerida para el concreto ciclópeo de mejoramiento de suelo.

21/11/2024 Tiempo: Nublado en la mañana, lluvias moderadas en tarde noche
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 4 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora para concreto, 1 demoledor 1 vibrador eléctrico, herramienta menor.
Actividades: La excavación para la cimentación, alcanza su profundidad de diseño en los primeros dos puntos de la obra (A6, A4). Se continúa con la excavación y aunque el clima no es el mejor, se logran dar continuidad. El día de hoy llega concreto a la obra. Se hace retiro de material de la excavación.

Contratista - Residente coordinador

22/11/2024 Tiempo: Lluvias leves en la mañana, tarde soleada.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 4 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora para concreto, 1 demoledor 1 vibrador eléctrico, herramienta menor.
Actividades: Se continúa con las excavaciones para la cimentación del proyecto. Algunos puntos (B5 y B3), presentan rocas de gran tamaño que deben ser partidas con el demoledor eléctrico, esto disminuye el rendimiento de la actividad. Hoy se suministra y transporta piedra y arena.

23/11/2024 Tiempo: Mañana soleada, tarde con lluvias leves a moderadas.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 4 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora para concreto, 1 demoledor eléctrico, 1 vibrador eléctrico, herramienta menor.
Actividades: En el fin de evitar que posible derrumbes provocados por las lluvias que se presentan, se instala concreto ciclópeo en dos puntos (A6, A4), conforme a los diseños, embebiendo en instalado en él, los aceros de transferencia en cada uno de ellos. Se da continuidad con las demás excavaciones y se hace retiro del material de la excavación.

Contratista - Residente coordinación

Interventoría.

25/11/2024 Tiempo: Nublado en la mañana, soleado en la tarde.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora de concreto, 1 demoledor, 1 vibrador eléctrico, herramienta menor.
Actividades: Ingresa un nuevo ayudante a la cuadrilla de la obra, y con ello, se logran terminar tres puntos más en profundidad de excavación. (A3, A5 y B6). En estos puntos, se instala concreto ciclópeo y se instalan los aceros de transferencia, conforme a los diseños de la obra. Se continúa con las demás excavaciones.

26/11/2024 Tiempo: Soleado todo el día, lluvias en la noche.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora para concreto, 1 demoledor, 1 vibrador eléctrico, herramienta menor.
Actividades: Se continúa con las excavaciones para la cimentación y se logran profundidades de diseño en dos puntos más (A2 y B4), donde se instala concreto ciclópeo y se embeben los aceros de transferencia de acuerdo a los diseños. Se suministra y transporta arena, y se recibe todo el acero figurado para las estructuras del proyecto.

Contratista - Residente coordinación

Interventoría.

27/11/2024 Tiempo: Lluvias leves en la mañana, nublado el resto del día.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora para concreto, 1 demoledor, 1 vibrador eléctrico, herramienta menor.
Actividades: Pocas de gran tamaño continúan apareciendo en el punto B5, las cuales son partidas con el demoledor, esto retrasa el buen rendimiento en estas actividades. Se terminan los puntos A1 y B3, los cuales se instala concreto ciclópeo con los aceros de transferencia. Se da inicio al armado de las parrillas para la

28/11/2024 Tiempo: Día nublado en la mañana y soleado en la tarde.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora para concreto, 1 demoledor, 1 vibrador para concreto, herramienta menor.
Actividades: Se continúa con las excavaciones en los puntos faltantes del proyecto. El armado de parrillas de acero para las zapatas, es otra actividad realizada.

Contratista – Residente coordinador

Interventoría

29/11/2024 Tiempo: 1 horas lluvias en la madrugada y nublados en la mañana.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora para concreto, 1 demoledor, 1 vibrador eléctrico, herramienta menor.
Actividades: Las lluvias impiden desarrollar actividades por varias horas en el día, y provocan algunos derrumbes en las excavaciones realizadas en los puntos B1, B2, A4, A1, que deben ser retirados. Se realiza armado de parrillas para las zapatas; los aceros para las zapatas de 2,20x2,20, son distribuidos equidistantes en cada sentido, aumentando la distancia entre aceros establecida en los planos; se realizó consulta al diseñador estructural y a la interventoría, quienes avalan esa distribución resaltando la importancia de mantener el mismo número de varillas y se dejaron en ambos sentidos

30/11/2024 Tiempo: 1 horas nubladas en la madrugada, soleado en el día
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora para concreto, 1 demoledor, 1 vibrador eléctrico, herramienta menor
Actividades: Se terminan otros dos puntos de excavación para cimentación (B1 y B2), en los cuales es instalado concreto ciclópeo con sus respectivos barones de transferencia. Queda pendiente un punto (B5), en el cual las rocas de gran tamaño siguen siendo demolidas con el demoledor, este proceso retrasa la terminación de todas las excavaciones para la cimentación. Se da continuidad al armado de parrillas para zapatas.

Contratista – Residente coordinador

Interventoría

02/12/2024 Tiempo: Soleado en la mañana, nublado en la tarde.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora para concreto, 1 demoledor, 1 vibrador eléctrico, herramienta menor.
Actividades: Con demoledor, se continúa la destrucción y retiro de roca en el punto B5 para alcanzar la profundidad de diseño de la cimentación. Se continúa con el armado de parrillas para las zapatas.

03/12/2024 Tiempo: Fuertes lluvias en la madrugada y durante el día.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 motobomba, 1 vibrador eléctrico, herramienta menor.
Actividades: Las lluvias presentadas durante todo el día, no permitieron que se adelantaran actividades en la obra. Esto provoca un atraso al cronograma propuesto

Contratista - Residente de obra

Interventoría

04/12/2024. Tiempo: Nublado en la mañana y soleado en la tarde.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 motobomba, 1 vibrador, 1 vibrador eléctrico, herramienta menor.
Actividades: Se logra alcanzar la profundidad de diseño del punto B5 para la cimentación, quedando listo para verter el concreto ciclópeo. Todos los puntos lluvias del día anterior, se proyectaron derrumbes en 6 huecos para cimentación los cuales fue necesario empezar a retirar, quedando pendientes 2 puntos de ellos.

05/12/2024 Tiempo: Soleado en el día con lluvias en la noche.
Personal: Ing residente de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 motobomba, 1 vibrador, 1 vibrador para concreto, herramienta menor.
Actividades: Se vierte concreto ciclópeo y se instalan las barras de transferencia en el punto B5. Se da inicio a la instalación de parrillas de acero para zapatas en cada punto de la cimentación, y se instalan junto con ellas, los aceros de arranque para pedestales y columnas, de acuerdo a los diseños. Se termina el retiro de derrumbes de los puntos pendientes.

Contratista - Residente de obra

Interventoría

06/12/2024 Tiempo: Lluvias moderadas en el día y fuertes en la noche.
Personal: Ing residente de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 motobomba, 1 vibrador eléctrico, herramienta menor.
Actividades: Se terminan de instalar los aceros para zapatas y los aceros de arranque para pedestales y columnas en cada punto de la cimentación de la estructura, dejando todo listo para la fundición de las zapatas el día de mañana. Se suministra y transporta material pétreo para la fundición de las zapatas.

07/12/2024 Tiempo: Lluvias moderadas en el día y lluvias fuertes en la noche
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 motobomba, 1 demoledor, 1 vibrador para concreto, herramienta menor y 1 canguro.
Actividades: A pesar de las lluvias, se logran fundir las 12 zapatas que conforman la cimentación de la estructura, manteniendo las dimensiones establecidas en los planos estructurales. Se realizan toma de muestras al concreto fundido "in situ" y fundido en la fundición de las zapatas, con el fin de determinar en la bonanza la calidad y resistencia del concreto utilizado. Se transporta y suministra material pétreo.

Contratista - Residente coordinador

Interventoría

09/12/2024 Tiempo: Lluvias moderadas en la tarde y fuertes en la noche.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 motobomba, 1 demoledor, 1 vibrador para concreto, herramienta menor, 1 canguro.
Actividades: Se fraguan las vigas de cimentación en el terreno y se da inicio a las excavaciones restantes. Las lluvias impiden realizar un trabajo continuo, afectando el rendimiento de las actividades. Llega cemento a la obra.

10/12/2024 Tiempo: Lluvias leves en la mañana y soleado resto del día.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 motobomba, 1 demoledor, 1 vibrador para concreto, herramienta menor, formaletas metálicas.
Actividades: Las lluvias provocan inundaciones en algunos puntos de las zapatas, que son evacuadas por el personal de la obra. Se amarran los flejes para los pedestales de cada punto y se instalan formaletas metálicas para fundir los pedestales que conforman la estructura de la cubierta. Transporte de material para rellenos.

Contratista - Residente coordinador

Interventoría

11/12/2024 Tiempo: Soleado en la mañana y nublado en la tarde
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 motobomba, 1 demoledor, 1 vibrador para concreto, formaletas metálicas, herramienta menor, 1 canguro.
Actividades: Se retiran las formaletas metálicas de los pedestales y se inician los rellenos con material de cantera el cual es compactado con saltarina o canguro. Se da inicio al armado del acero que conforma la viga de cimentación, y se instala concreto de limpieza en el eje A donde se fundirá la viga de cimentación. Se transporta y suministra material pétreo.

12/12/2024 Tiempo: Día soleado y lluvias en la noche.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 1 conductor, 5 ayudantes.
Máq. y Equipo: 1 volqueta, 1 motobomba, 1 vibrador para concreto, 1 canguro, herramienta menor.
Actividades: Se terminan de instalar y armar los aceros de la viga de cimentación del Eje A, luego se procede a verter concreto y se logra fundir toda la viga, se hace uso del vibrador para eliminar los vacíos. Se realizan los rellenos compactado en el eje B y se instala el concreto de limpieza para la viga de cimentación. Se da inicio al armado de los aceros para la viga del eje B. Se toman muestras al concreto utilizado en la viga del Eje A, para su control de calidad.

Contratista – Residente coordinador

Interventoría

13/12/2024 Tiempo: Día soleado, lluvias en la noche.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 1 conductor, 5 ayudantes
Maq. y Equipo: 1 volqueta, 1 motobomba, 1 dumpler, 1 vibrador para concreto, 1 canguro, herramienta menor.
Actividades: Se terminan de armar los aceros de la viga del Eje B, y luego se vierte concreto para empezar la viga de cimentación guardando las especificaciones del diseño. Se realiza toma de muestras del concreto utilizado en el fin de llevar el control de calidad del mismo.

14/12/2024 Tiempo: Fuertes y moderadas lluvias durante el día.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y Equipo: 1 volqueta, 1 motobomba, 1 dumpler, 1 vibrador para concreto, 1 canguro, herramienta menor.
Actividades: NO se adelantaron actividades de obra, debido a las fuertes lluvias que cayeron en el sitio de la obra, las actividades se limitan a orden y aseo

Contratista – Residente coordinador

Interventoría

16/12/2024 Tiempo: Lluvias leves y esporádicas todo el día.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor
Máq. y Equipo: 1 volqueta, 1 motobomba, 1 dumpler, 1 vibrador para concreto, 1 canguro, herramienta menor; formaleta metálica, andamios.
Actividades: Se instalan aceros (Viga y gaveteo) en las vanillas de las columnas de la sección más baja, se hace uso de andamios y equipo para trabajo en alturas para los trabajadores. Se suministra concreto, para las actividades en la obra.

Contratista – Residente coordinador

Interventoría

17/12/2024 Tiempo: Lluvias en la madrugada y nublado y muy
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesionales SST,
1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 vibrador, 1 cizalla, 1 dobla
para concreto, herramienta menor, formaletas metálicas, andamios.
Actividades: Se continúa con el amarre de flejes y grapas a
los aceros de las columnas; además, se instalan, aseguran y
anclan formaletas metálicas de 3 metros de 6 columnas y se
dejan listas para su fundición el día de mañana.

Contratista – Residente coordinador

18/12/2024 Tiempo: Lluvias leves en la tarde y fuertes en la noche.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST,
1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 vibrador, 1 vibrador,
herramienta menor, formaletas metálicas, andamios.
Actividades: Se instalan las formaletas en las otras 6 columnas
en su primer tramo y se funden hasta alcanzar una altura de
2,60 metros en 8 columnas. Se amarra acero para dar continuidad
a las columnas, de acuerdo a lo establecido en los diseños
del proyecto. Se suministra y transporta material pétreo para
la obra.

19/12/2024. Tiempo: Nublado en el día, lluvias en la noche.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST,
1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 vibrador, 1 vibrador
para concreto, herramienta menor, formaletas metálicas, andamios.
Actividades: Se retiran las formaletas de las columnas
fundidas y se instalan en la sección más alta de las
columnas que ya tienen amarrado el acero, se funden las
partes bajas de las columnas pedidas, y se terminan de
amarrar los aceros de la parte alta de todas las columnas. Se
realiza toma del concreto pedido, con el fin de verificar la
calidad y resistencia.

Contratista – Residente coordinador

20/12/2024. Tiempo: Soleado en el día, lluvias en la noche.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST
1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 vibrador, 1 vibrador
para concreto, herramienta menor, formaletas metálicas, andamios.
Actividades: Se retiran las formaletas de las columnas fundidas
y se instalan en las secciones superiores de las columnas faltantes
las cuales son fundidas con concreto, y como en todas las
fundiciones, se hace uso del vibrador para concreto. Se realiza
toma de muestras del concreto pedido para ser llevado al
laboratorio. Se inicia el traslado de elementos para estructura de

21/12/2024 Tiempo: Soleado todo el día
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipos: 1 volqueta, 1 motobomba, 1 demoledor, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, formaletas metálicas, gatos, cerchas, camillas.
Actividades: Se retiran las formaletas metálicas de las columnas y se da paso a la instalación de la estructura de soporte de las formaletas para la construcción de las vigas aéreas. Se continua el traslado de concreto para la construcción de las vigas aéreas.
Se realiza jornada de orden y aseo.

Contratista - Residente. recorrido

Interventoría.

23/12/2024 Tiempo: Lluvias leves y esporádicas durante el día.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipos: 1 volqueta, 1 motobomba, 1 demoledor, 1 vibrador, herramienta menor, formaletas, andamios, gatos, cerchas, camillas, madera.
Actividades: Se da continuidad a instalación y construcción de la estructura de soporte para las vigas aéreas, haciendo uso de los gatos, cerchas y camillas, asegurando su estabilidad para evitar fallas al momento de fundir. Se logra terminar la estructura de 1 eje y se instalan aceros que conforman la viga.

24/12/2024 Tiempo: Soleado en las mañanas y lluvias leves en la tarde
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipos: 1 volqueta, 1 motobomba, 1 demoledor, 1 vibrador para concreto, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, camillas, madera.
Actividades: Se continua con la instalación de aceros de la viga aérea del eje A, amarrando flejes y aceros que conforman la viga canal, siguiendo lo estipulado en los planos estructurales. Se suministra material pétreo para la fundición de la viga. Se trabaja medio jornada para dar espacio al personal de compartir la navidad con sus familias.

Contratista - Residente coordinador

Interventoría

26/12/24 Tiempo: Día soleado y lluvias en la noche
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipos: 1 volqueta, 1 motobomba, 1 demoledor, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, camillas, madera.
Actividades: El personal se concentra en terminar de amarrar el acero de la viga canal del eje A, y en armar y asegurar toda la formaleta, dejando listo para su fundición el día de mañana.
Se transporta material pétreo para fundición.

27/12/2024 Tiempo: Soleado en el día, lluvias en la noche.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor, (5 ayudantes adicionales)
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 vibrador, 1 desmoldeador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, canillas, madera.
Actividades: luego de verificar la estabilidad y seguridad de la estructura y la formaleta que conforma toda la viga canal del eje A, se procede a fundir monolíticamente toda la viga con el muro y aleta del canal; fue necesario la colaboración de 5 ayudantes adicionales. Se hace uso del vibrador para concreto, y se toman muestras al concreto preparado para verificando trabajabilidad y asegurar su calidad.

Contratista - Residente coordinador

Interventoría

28/12/2024 Tiempo: Soleado en la mañana, lluvias en tarde y noche.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 desmoldeador, 1 vibrador, herramienta menor, gatos, cerchas, andamios, canillas, madera.
Actividades: El personal se dedica a culminar la estructura para la construcción de la viga canal del Eje B, haciendo uso de los gatos, cerchas y canillas. Se realiza jornada de orden y aseo.

30/12/2024 Tiempo: Lluvias esporádicas durante el día y noche.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 desmoldeador, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, canillas, andamios.
Actividades: Las lluvias impiden que se desarrollen las actividades en normalidad; sin embargo, se continúa con la construcción de la estructura de la viga canal del Eje B, pero no se logra culminar mucho. El personal sale a receso de fin de año y se cita a laborar para el próximo 02 de enero de 2025.

Contratista - Residente coordinador

Interventoría

02/01/2025 Tiempo: Día nublado, lluvias en la tarde y noche.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 desmoldeador, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, canillas, madera.
Actividades: Se continúa con la instalación de la estructura soporte para la construcción de la viga canal del Eje B. Se suministra y transporta material pétreo para la obra.

03/01/2025 Tiempo: Lluvias en la mañana y tarde nubosidad.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 demoledor, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, camillas, madera.
Actividades: Dadas las lluvias que se presentaron la noche anterior y la madrugada del día, las actividades realizadas en la construcción de la estructura para la viga canal, no son las mejores. Poco se logró avanzar en esa actividad.

Contratista – Residente coordinador

Interventoría

04/01/2025 Tiempo: Lluvias fuertes y leves todo el día.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 demoledor, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, camillas, madera.
Actividades: El día de hoy NO se adelantaron actividades de obra dadas las fuertes lluvias presentadas y el riesgo que se corre al realizar trabajos en altura con clima lluvioso. Se realiza jornada de orden y aseo.

07/01/2025 Tiempo: Día soleado y nubosidad en la tarde.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 demoledor, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, camillas, madera.
Actividades: Se continúa con la instalación de la estructura para la viga canal del eje B, logrando terminarla, amarrarla y nivelarla, se retira madera de formaleta del muro y aleta del canal del Eje A. Se inicia el armado de acero de la viga canal del Eje B

Contratista – Residente coordinador

Interventoría

08/01/2025 Tiempo: Lluvias leves en la tarde y fuertes en la noche.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SS 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 demoledor, 1 vibrador herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, camillas, madera
Actividades: Se instalan y amarran los aceros de la viga canal del Eje B, logrando armar tanto la viga como el muro y aleta del canal, se inicia la instalación de la madera y camillas que conforman la viga canal para su posterior fundición.

09/01/2025 Tiempo: Día soleado, lluvias leves en la tarde-noche.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 demoledor, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, camillas, madera.
Actividades: Las camillas y la madera, es instalada y conforman la formaleta de la viga canal del eje B; se rectifican medidas y se ajusta toda la estructura quedando lista para proceder a fundir el día de mañana. Se transporta material pétreo para la fundición.

Contratista - Residente coordinador

Interventoría

10/01/2025 Tiempo: Nibado en la mañana, soleado en la tarde.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor. (5 ayudantes adicionales)
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 demoledor, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, camillas, madera.
Actividades: Se revisa la seguridad y estabilidad de la estructura y la formaleta instalada para viga canal del Eje B, luego se vierte el concreto fundiendo monolíticamente todo el elemento, haciendo uso del vibrador para retirar los vacíos en el concreto. Es necesario contar con la colaboración de 5 obreros adicionales. Se toman muestras al concreto producido y es llevado al laboratorio para verificar su control y resistencia. Se retira adicionalmente en el concreto con el

11/01/2025 Tiempo: Mañana soleada, tarde de lluvias
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 demoledor, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, camillas, madera.
Actividades: Se retiran parte de las camillas que conforman la formaleta del Eje A, en el fin de ir desencofrando esa viga. Se realiza jornada de orden y aseo.

Contratista - Residente coordinador

Interventoría

13/01/2025 Tiempo: Lluvias leves en la madrugada, resto del día soleado y seco.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 demoledor, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, camillas, madera.
Actividades: Se realiza el retiro de formaleta y estructura de soporte de la viga canal del Eje A, adicional, se retira madera de formaleta de muros y losa de la viga canal del Eje B. Se programa el equipo y personal para la instalación de la cubierta, el cual llegará mañana a empezar a fabricar o moldear las láminas que conforman la cubierta.

18/01/2025 Tiempo: Lluvias en la noche, día soleado

Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor, cuadrilla instalación cubierta.

Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 amoladora, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, 1 grúa, dobladora para lámina, herramientas para instalación de cubierta.

Actividades: En la viga canal del Eje B, se instala el material que impermeabiliza el elemento estructural, se da inicio a la instalación de las láminas que conforman la cubierta, las cuales son instaladas con la grúa y asegurados a las vigas mediante pernos por la cuadrilla de instalación.

Contratista - Residente coordinador

Interventoría

19/01/2025 Tiempo: Soleado en el día, lluvias leves en la noche.

Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor, cuadrilla instalación cubierta.

Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 amoladora, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, 1 grúa, dobladora para lámina, herramienta para instalación de cubierta.

Actividades: Se da continuidad a la instalación de las láminas de la cubierta, labor realizada con la grúa; el personal asegura las láminas en las vigas dejando conformada la cubierta anteriormente.

20/01/2025 Tiempo: Día soleado.

Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor, cuadrilla instalación cubierta.

Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 amoladora, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, 1 grúa, dobladora para lámina, herramienta para instalación de cubierta.

Actividades: Se termina la instalación de todos los elementos de la cubierta, quedando cubierta el área estipulada en los diseños, con los materiales y recomendaciones dadas en las especificaciones técnicas. Se adelantan actividades preliminares para dar inicio a la iluminación del polideportivo

Contratista - Residente coordinador

Interventoría

21/01/2025 Tiempo: Día soleado.

Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor, cuadrilla eléctrica.

Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 grúa, herramienta menor, andamios, 1 amoladora, 1 vibrador.

Actividades: La cuadrilla eléctrica realiza la instalación de los postes eléctricos en un lugar seguro y que no afecte el desarrollo de las actividades del escenario deportivo; esta labor es realizada con la grúa que aún se encuentra en el sitio luego de instalar la cubierta. También, se realizó la demolición de los cuartos existentes con el fin de dar paso a la construcción de los nuevos camerinos

14/01/2025 Tiempo: Día soleado, tiempo seco.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor, personal para cubierta. (8 personas)
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 amoladora, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, correas, camillas, dobladora, grúa, herramientas para instalación cubierta.
Actividades: Se instala el material para impermeabilizar la viga canal del Eje A; en horas de la tarde llega el personal y equipos que instalarán la cubierta del polideportivo y se adelanta la logística necesaria para esta actividad.

Contratista - Residente coordinador

Interventoría

15/01/2025 Tiempo: Día soleado, tiempo seco.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor, cuadrilla instalación cubierta.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 amoladora, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, correas, camillas, 1 grúa, dobladora para lámina, herramientas para instalación de cubierta.
Actividades: Se inicia el retiro de camillas que conforman la formaleta de la viga canal del Eje B. El personal que instalará la cubierta del polideportivo, instala sus equipos y herramientas, dejando todo preparado para iniciar 5-5 labores el día siguiente. Se suben a la obra material de formaleta.

16-01-2025 Tiempo: Día soleado, tiempo seco.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor, cuadrilla instalación cubierta.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 amoladora, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, correas, camillas, 1 grúa, dobladora para láminas, herramienta para instalación de cubierta.
Actividades: Se realiza el retiro de la formaleta y de la estructura de soporte de la viga canal del Eje B. El personal que instalará la cubierta, inicia actividades, doblando y formando los elementos que conformarán la cubierta del polideportivo.

Contratista - Residente coordinador

Interventoría

17/01/2025 Tiempo: Lluvias leves en la madrugada, seco el resto del día.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor, cuadrilla instalación cubierta.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 amoladora, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, 1 grúa, dobladora para lámina, herramientas para instalación de cubierta.
Actividades: Se continúa con las actividades de doblado y construcción de los elementos en lámina que conforman la cubierta autoportante del polideportivo. Se termina de retirar todo el material de formaleta de la viga canal en el Eje B y es retirado de la obra.
