TIPO DE INFORME:

Informe Parcial: __X___ Informe Final: _____

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

- ***Modalidades de Selección:***
  Contratación Directa: _____ Mínima Cuantía: __X___ Concurso de Méritos: _____
  Selección Abreviada: _____ Licitación Pública: _____
- ***Modalidades Laborales / Tipo de Contrato:***
  Contrato a Termino Fijo: _____ Contrato por Prestación de Servicios: __X___
  Contrato Ocasional: _____ Contrato a Término Indefinido: _____

---

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Nota 1: (Diligenciar el cuadro con la información del contrato y acta de inicio)

Contrato	**2025-025**			
Contratista	**TULIO FERNEY CEBALLOS MONTOYA**			
Identificación NIT/CC	1.113.311.986	Expedida en:	Sevilla Valle del Cauca	
Objeto del Contrato	Operación de maquinaria amarilla y equipo pesado, motoniveladora y retroexcavadora para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial rural del municipio de Caicedonia Valle.			
Plazo de Ejecución	10 meses			
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	0000058	Fecha de C.D.P. AAAA/MM/DD	2025/01/22	
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	0000277	Fecha de R.P. AAAA/MM/DD	2025/02/28	
Valor del Contrato	Contrato Inicial	$29.150.000		
	Adición 1	$		
	Adición 2	$		
	Adición 3	$		
	Total	$29.150.000		
Código CIUU Contratista|	4923 (Transporte de Carga por carretera)			
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio	
Marzo 01 de 2025	Diciembre 31 de 2025	No Aplica	No Aplica	

Nota 2: (Diligenciar la información que aplique o sino colocar No Aplica)

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

Nota 1: (Diligenciar una breve descripción de la o las modificaciones que se realizan, si aplica o sino colocar No Aplica)

Documento	Fecha de Suscripción (AAA/MM/DD)	Prórroga del Plazo (Meses y/o días)	Adición Valor ($)	Observaciones
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

3. ***ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:***

Nota 1: (Realizar una descripción breve sobre el comportamiento financiero durante la ejecución del contrato)

Descripción	Valor
Valor del Contrato Inicial	$ 29.150.000
Adición No. 1	$
Adición No. 2	$
Adición No. 3	$
Valor Total del Contrato	$ 29.150.000
Valor Primer Pago Parcial	$ 2.915.000
Valor Segundo Pago Parcial	$ 2.915.000
Valor a Pagar en el Presente Informe	$ 2.915.000
No. Factura Pagar con el Presente Informe	DSO449
Valor Ejecutado del Contrato	$ 5.830.000
Valor por Ejecutar	$ 20.450.000
Observaciones sobre la Parte Financiera, si existen.	

4. ***INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:***

Nota 1: (Realizar una descripción breve sobre el comportamiento del contrato, los avances, los imprevistos o el retraso si aplica)

Se atendieron necesidades de mantenimiento y recuperación de la red vial rural, la cual es fundamental para garantizar la movilidad segura y eficiente en el municipio. A través de la operación de maquinaria pesada, se buscó intervenir vías afectadas por el uso constante, las condiciones climáticas que fueron extremadamente fuertes ocasionando fuertes deslizamiento de tierra y la falta de infraestructura adecuada.

Durante su ejecución, el contratista desarrolló actividades contempladas en el objeto contractual como la operación de maquinaria, apoyo en labores de obra civil, instalación de señalización, uso de elementos de protección, mantenimiento de equipos y adecuación de zonas de trabajo.

Las intervenciones se realizaron en distintos sectores del municipio, incluyendo vías rurales como El Crucero, Limones, San Gerardo Bajo, vía Barragán, Montegrande, La Leona, Costa Rica, La Delfina, vía el Mirador, Bosque Bajo, El Frontino, así como zonas urbanas como el barrio Zuñiga, Calle 9 entre carreras 9 y 10, Carrera 18 entre calles 18 y 19, calle 17 carrera 17. Se llevaron a cabo trabajos de limpieza, conformación de vías, remoción de derrumbes, desbroce, nivelación de terreno, evacuación de material vegetal y aplicación de material de relleno, entre otros.

Gracias a estas acciones, se logró mejorar la transitabilidad en puntos críticos del municipio, facilitando el acceso de los habitantes a diferentes sectores y fortaleciendo la infraestructura vial de la zona rural y urbana. Además, debido a la fuerte ola invernal que afectó la región, se logró

intervenir oportunamente algunas vías terciarias que se encontraban bloqueadas por deslizamientos de tierra, restableciendo el paso y garantizando la movilidad de las comunidades afectadas.

CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR

N	Actividades del Contrato / Ficha Técnica	Actividad para el Seguimiento	Evidencias de Cumplimiento	Ponderación %	Valor Equivalente	Porcentaje Ejecutado por Actividad	¿Cumple o No?
1	Realizar la operación de maquinaria y equipo para cumplir con la programación establecida por la Secretaría de Obras Públicas.	Operar la maquinaria amarilla, para realizar las actividades que sirvan para el mejoramiento de las Vías Municipal	Hacer entrega de un (1) informe de cumplimiento de la ejecución de tareas ***operando la maquinaria***, soportado con registro fotográfico.	72%	$18.900.000	21.6%	Cumple
2	Apoyar con mano de obra las diferentes actividades que desarrolle la Secretaría de Obras Públicas.	Brindar apoyo a los compañeros de la oficina de obras públicas, con mano de obra, para que se realicen las actividades de mejoramiento vial.	Incluir en el informe de seguimiento ***una sección*** que indique el cumplimiento de las tareas ***realizadas a mano***, que sirven para el mejoramiento de las Vías del Municipio. *(Aportar Registro fotográfico)*	9%	$2.624.400	3%	Cumple
3	Instalar los accesorios necesarios para la realización de distintos tipos de obras que permitan la señalización y delimitación segura del área a intervenir, de igual manera instalar utilizar los elementos de protección personal.	Realizar actividades, que sirvan de aporte a la prevención y seguridad para el desempeño de las labores, tanto en la máquina, como en su entorno.	Incluir en el informe de seguimiento **una sección** que indique el cumplimiento de las tareas realizadas sobre ***prevención y seguridad*** que haya realizado con el cumplimiento de las labores en las vías.	4.5%	$2.355.300	2.7%	Cumple
4	Realizar las comprobaciones previas al uso, efectuar las tareas rutinarias de mantenimiento de maquinaria pesada y asegurarse de que el equipo se usa de manera segura y eficiente, siguiendo las normas y los procedimientos adecuados.	Verificar el estado diario de la maquinaria y reportar las novedades encontradas al supervisor.	Incluir en el informe de seguimiento una sección que indique, ***el estado y las novedades encontradas en la maquinaria.***	4.5%	$2.355.300	2.7%	Cumple
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y % DE AVANCE				**90%**	**$29.150.000**	**30%**	**Cumple**

NOTA 2: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. ***REGISTRO DE EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD:***

Al contratista se le realizó el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

ACTIVIDAD 1:

- *Realizar la operación de maquinaria y equipo para cumplir con la programación establecida por la Secretaría de Obras Públicas.*

PRODUCTO

Durante el periodo reciente, el municipio de Caicedonia, se vio fuertemente afectado por una intensa ola invernal que provocó múltiples deslizamientos de tierra, especialmente en la zona rural. Estas emergencias naturales ocasionaron el bloqueo de diversas vías terciarias, afectando gravemente la movilidad de las comunidades campesinas y limitando su acceso a servicios básicos, centros educativos, puestos de salud y vías principales de comercialización agrícola.

Ante esta situación, fue necesario priorizar e implementar una serie de actividades orientadas a la rehabilitación y despeje de las vías afectadas. Las intervenciones incluyeron la remoción de material vegetal y rocoso, la estabilización de taludes y la adecuación de pasos provisionales para garantizar la transitabilidad en los sectores más críticos. Estas acciones no solo permitieron restablecer el acceso a las veredas aisladas, sino también mitigar los riesgos asociados a nuevos deslizamientos, salvaguardando la integridad de los habitantes y fortaleciendo la infraestructura vial del municipio en el contexto de una emergencia climática.

El uso de maquinaria como la motoniveladora y la retroexcavadora fue esencial para ejecutar las tareas con la eficiencia y precisión requeridas, garantizando el cumplimiento de los objetivos del contrato y respondiendo a las necesidades priorizadas por la administración municipal.


- Ampliación de la vía retirando deslizamientos que afectaban la movilidad del sector..
  Sector: Desde Caicedonia al crucero, samaria hasta limones.





- Conformación con la motoniveladora aproximadamente 3 cuadras.
  Sector: Barrio Zúñiga en la carrera 8.



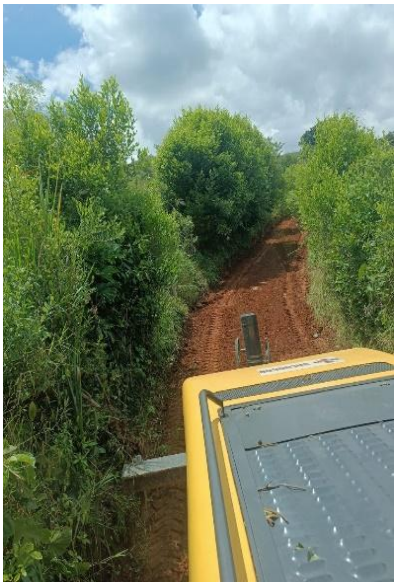

- Conformación luego que abrieran paso en el derrumbe que hay en el lugar, se echaron 9 viajes de roca muerta para hacer lleno y que se evacue con más facilidad el agua que aflora y dar viabilidad a los vehículos con más facilidad.
  Sector: Vía San Gerardo Bajo.





- Habilitación del paso a un carril en el derrumbe que se encuentra en la vía.
  Sector: Vía al Crucero.






- Retiro de deslizamiento que afectaba media vía dificultando el tránsito vehicular. **Sector: Vía Barragán.**







- Se habilitó la vía cordoneando un deslizamiento que obstaculizaba la vía.
  Sector: Vía Montegrande.





- Remoción de tres (3) deslizamientos.
  Sector: La Leona.





- Limpieza de deslizamiento de lodo y tierra con la motoniveladora en 3 ocasiones en el transcurso del mes y se echo un viaje de roca muerta de 7m^3 en el lugar.
  Sector: Costa Rica.






- Ampliación del paso en un deslizamiento en el lugar en el cual hay pérdida de banca que dificultaba el paso vehicular.
  Sector Vuelta del Borracho




- Retiro 7m^3 de escombros repartidos en tres sectores del pueblo (calle 9 entre carreras 9 y 10, carrera 18 entre calles 18 y 19 y calle 17 entre carrera 17).
  Sector: Caicedonia.





- Realización de batea con la motoniveladora y se esparcieron dos viajes (14m^3) de roca muerta y escombros para mejorar el tránsito en un hundimiento que presenta la vía.
  Sector: La Rivera.





- Se regaron dos viajes de roca muerta (14m^3) en la entrada y las primeras dos curvas iniciando de la parte baja de la carretera alterna.
  Sector: La Delfina.





- Se destapo una obra que estaba colmatada de palos y piedras.
  Sector: Vía el Mirador.




- Se Habilitó paso por un costado de la banca que se hundió se removió los árboles de limón swingle, se echó material de rio en el lugar y se removieron las losas de concreto en la parte afectada.
  Sector: Placa huellas vía el Crucero.





- Se desbasuró conformo y rego material roca muerta en los puntos más críticos.
  Sector: Rivera hasta la escuela de San Gerardo Bajo.





- Se realizo un recorrido ampliando sitios con deslizamientos para mejorar la movilidad vehicular.
  Sector: Desde el club, bosque bajo, jardín de maría, frontino a salir al crucero.





ACTIVIDAD 2:

- *Apoyar con mano de obra las diferentes actividades que desarrolle la Secretaría de Obras Públicas*.

PRODUCTO

En el marco del cumplimiento del contrato y según las directrices de la Secretaría de Obras Públicas, el contratista ha brindado apoyo con mano de obra en diversas actividades operativas y logísticas requeridas para el desarrollo de obras de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial y urbana del municipio.

Estas acciones han permitido agilizar los procesos ejecutados por la Secretaría, mejorar las condiciones de seguridad en las áreas intervenidas y contribuir de manera efectiva a la continuidad de los trabajos programados, demostrando disposición, cumplimiento y compromiso por parte del contratista en el desarrollo de sus funciones de apoyo operativo.

Se apoyó con la limpieza de dos cunetas para canalizar agua que se estaba saliendo a la vía.







ACTIVIDAD 3:
Instalar los accesorios necesarios para la realización de distintos tipos de obras que permitan la señalización y delimitación segura del área a intervenir, de igual manera instalar utilizar los elementos de protección personal.

PRODUCTO
el contratista ha dado cumplimiento a las actividades relacionadas con la seguridad operativa y el adecuado manejo de la maquinaria pesada, contribuyendo así al desarrollo eficiente y seguro de las intervenciones realizadas por la Secretaría de Obras Públicas.

En primer lugar, se ha llevado a cabo la instalación de accesorios y elementos necesarios para la señalización y delimitación segura de las zonas de trabajo, lo cual ha permitido informar y proteger tanto a los trabajadores como a la comunidad, garantizando un entorno controlado durante la ejecución de las obras. De igual manera, el contratista ha utilizado de forma permanente los elementos de protección personal (EPP) requeridos para la operación de maquinaria pesada, tales como casco, guantes, botas, etc, cumpliendo con los protocolos establecidos y minimizando los riesgos asociados a su labor. Asimismo, se ha promovido en todo momento una actitud de autocuidado, evidenciada en la ejecución consciente y responsable de las tareas asignadas, priorizando la seguridad propia y la de su entorno laboral. Esto incluye prácticas de prevención, atención a las condiciones del terreno y cumplimiento de las recomendaciones técnicas.

Finalmente, el contratista se ha encargado de verificar que las zonas de trabajo se mantengan despejadas y funcionales, permitiendo el libre tránsito de los equipos, la visibilidad adecuada y el desarrollo sin contratiempos de las actividades, lo cual ha sido clave para el cumplimiento oportuno de los objetivos del contrato.





ACTIVIDAD 4:

Realizar las comprobaciones previas al uso, efectuar las tareas rutinarias de mantenimiento de maquinaria pesada y asegurarse de que el equipo se usa de manera segura y eficiente, siguiendo las normas y los procedimientos adecuados.

PRODUCTO

Con estas actividades realizadas por el contratista permite asegurar que la maquinaria se mantenga en condiciones óptimas de funcionamiento, previniendo fallas mecánicas, accidentes y retrasos en la ejecución de las actividades programadas. Además, contribuyen al uso eficiente, seguro y responsable del equipo, lo cual es indispensable para desarrollar las tareas de mantenimiento vial de manera continua y efectiva.
En ese sentido, dichas acciones no solo están alineadas con el objeto del contrato, sino que son inherentes a su correcta ejecución, toda vez que el rendimiento y disponibilidad del equipo dependen directamente de su estado técnico y operativo.

El contratista realizó Mantenimiento Preventivo de motoniveladora y retroexcavadora. se realizó inspección pre operativa diariamente de la Retroexcavadora Cat 416E y la Motoniveladora New Holland RG140b antes de cada labor y se realizó mantenimiento preventivo semanal (4 veces en el mes) con engrase a partes móviles, limpieza, verificación de pernos y tornillos con correcto ajuste y calibración de aire a las llantas de los equipos. (Se realizo mantenimiento programado a la Motoniveladora New Holland RG140B a las 1675 horas.)







6. ***NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO:***

Durante el presente período **NO** se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.
(En caso contrario describir la situación y las acciones desarrolladas por la supervisión)

7. ***CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES***,

(Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Durante el periodo de tiempo ejecutado del presente contrato y como soporte para el periodo cobrado por el contratista, se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, de acuerdo a los anexos aportados con el informe presentado por el mismo.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.

Número de Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
4601441493	27 de mayo de 2025	$407.400
Sumatoria Total de las Planillas		

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

8. ***RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISORIA:***

Durante lo que va transcurrido de la ejecución del presente contrato, la Supervisoría ha realizado las siguientes actividades, que aportan al cumplimiento de las obligaciones adquiridas.


1. Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada a la ejecución del contrato, en físico y digital (plataforma SECOP)
2. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
3. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
4. Elaboración del Informe de Supervisoría, como soporte para el pago.
5. Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

Las actividades ejecutadas y presentadas por el contratista, durante el periodo de tiempo enunciado en el informe de cumplimiento presentado, así mismo que las evidencias aportadas y en conjunto con el seguimiento desarrollado por la supervisoría, establecen que a la fecha de este informe se ha cumplido el contrato No. 025 de 2025 en un avance aproximado de **30%** y tal como lo establece la Clausula Sexta del contrato, se aprueba para el pago parcial por un valor de **$2.915.000 (Dos millones novecientos quince mil pesos moneda corriente).**

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Caicedonia, Valle del Cauca, a los cuatro (04) días del mes de junio de 2025.



CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO
Secretario de Obras Publicas
Supervisor

Proyectó: Yaqueline Ramírez Moreno – Contratista Apoyo a la Gestión
Reviso y Aprobó: Carlos Alberto Quintero Quiceno – Secretario de Obras Públicas
