FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL- AEROCIVIL**			**FECHA:**	7/6/2025
Semana No	**53**	**Del :**	1/6/2025	AL:	7/6/2025
Plazo Total		558	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		367	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		65,77%			
Nombre del Supervisor :		Gisell Sánchez Pastrana			

OBJETO DEL CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO TOLÚ.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,23%	75,06%	(%) Ejecutado	0,23%	81,28%
Valor programado ($)	$ 4.553.360,00	$ 1.498.566.443,00	Valor ejecutado ($)	$ 4.561.275,35	$ 1.622.728.239,86
			Evaluación	Porcentaje Adelanto	6,22%
				Valor Adelanto	$ 124.161.796,86

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	ABILE SAS	Contratista:	CONSORCIO SERVINC-BETMAF 2024
Contrato No:	23001186 H4 DE 2023	Contrato No:	23001301 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 1.996.500.065	Valor Inicial:	$ 1.117.574.559
Valor Actualizado al modificatorio :	NA	Valor Actualizado al modificatorio :	NA
Valor actualizado 2:	NA	Valor actualizado 2:	NA
Plazo inicial:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025	Plazo inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo actualizado:	NA	Plazo actualizado:	NA
Fecha de iniciación:	5-jun-24	Fecha de iniciación:	5-jun-24
Fecha de vencimiento:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025	Fecha de vencimiento:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Modificatorio No. Prórroga No.	NA	Modificatorio No. Prórroga No.	NA
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	NA	Fecha de Terminación Según Prórroga No.	NA
Suspensión No.	NA	Suspensión No.	NA
Periodo de Suspensión No.	NA	Periodo de Suspensión No.	NA
Levantamiento de la suspensión No.	NA	Levantamiento de la suspensión No.	NA
Nueva fecha de terminación	NA	Nueva fecha de terminación	NA
Valor total actual del contrato	$ 1.996.500.065	Valor total actual del contrato	$ 1.117.574.559

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se tramita informe semanal No. 52. Se revisa Plan de Trabajo propuesto por Contratista y se realizan observaciones. Se entrega informe mensual de Interventoría. Se hace gestión de firmas para actas de comité pasadas.

OBRAS LADO TIERRA

SE REPORTA LAS SIGUIENTES ACTIVADES DURANTE LA SEMANA :

-DESMONTE CIELO RASO DRYWALL (23,4 M²) [SALA DE ABORDAJE II]
-SERVICIO DE JARDINERÍA (0,35 HA) [ZONAS VERDES CASETA DE COMBUSTIBLE- OFICINA DE VIGILANCIA]
-POR LA BMA SE REPORTA SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DIGITAL 3F-4H CALIBRADO [CASETA DE COMBUSTIBLE], SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 45 M DE CABLE #12 [OFICINA APOYO A GERENCIA], SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 3 BREAKER ENCHUFABLE DE 3X50A [CASETA DE COMBUSTIBLE], 2 SALIDA PARA TOMA 110V [OFICINA APOYO A GERENCIA], DEMOLICIÓN MORTERO DE NIVELACIÓN (14,4 M²) [LOSA -ENTRADA PRINCIPAL].




Actividades de jardinería/rocería



Actividades de jardinería



Desmonte de Drywall



Demolición losa y modulación bloques



Instalación salidas eléctricas



Instalación medidor Caseta de Combustible



Desmonte de Drywall



Instalación medidor Caseta de Combustible

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

AVANCE DE OBRA:
Se presenta un avance acumulado de 81,28% en la ejecución de las actividades.

-DESMONTE CIELO RASO DRYWALL (23,4 M²) [SALA DE ABORDAJE II]
-SERVICIO DE JARDINERÍA (0,35 HA) [ZONAS VERDES CASETA DE COMBUSTIBLE- OFICINA DE VIGILANCIA]
-POR LA BMA SE REPORTA SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DIGITAL 3F-4H CALIBRADO [CASETA DE COMBUSTIBLE], SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 45 M DE CABLE #12 [OFICINA APOYO A GERENCIA], SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 3 BREAKER ENCHUFABLE DE 3X50A [CASETA DE COMBUSTIBLE], 2 SALIDA PARA TOMA 110V [OFICINA APOYO A GERENCIA], DEMOLICIÓN MORTERO DE NIVELACIÓN (14,4 M²) [LOSA -ENTRADA PRINCIPAL]

Se avanza en modulación de bloques cordón losa.


FINANCIERO:
Se realizó desembolso del anticipo.
Se aprueba por parte de Interventoría el acta parcial de obra No. 01, por un valor de $ 23.200.454 y acta No. 02 por un valor de $ 47.602.415; acta No. 03 por un valor de $ 75.183.934; acta No. 04 por un valor de $ 42.348.675; acta No. 05 por un valor de $64.720.146; acta No. 06 por un valor de $ 264.538.180, acta No. 07 por un valor de $ 610.682.692, acta No. 08 por un valor de $229.391.077 y acta No. 09 por un valor de $74.588.067, para un acumulado total de 71,74% del proyecto.

AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas:
Se desarrolla la adecuada disposición de residuos. Se hace seguimiento a informes mensuales.


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
-Se hace uso de elementos de protección personal.
-Se realizan charlas diarias de 5 minutos en temas de seguridad y salud en el trabajo.
-El contratista realiza registro documental a través de formatos de su empresa (ATS, permisos de trabajo, inspecciones de equipos utilizados en la semana a la guadaña.)
-En la semana reportada no se presentaron accidentes laborales.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORÍA

Personal de Interventoría	6
Personal del Contratista	8
Total Personal en Obra	14

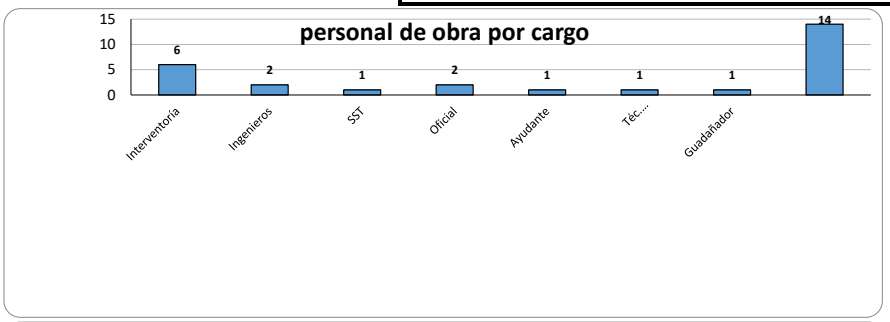

En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.

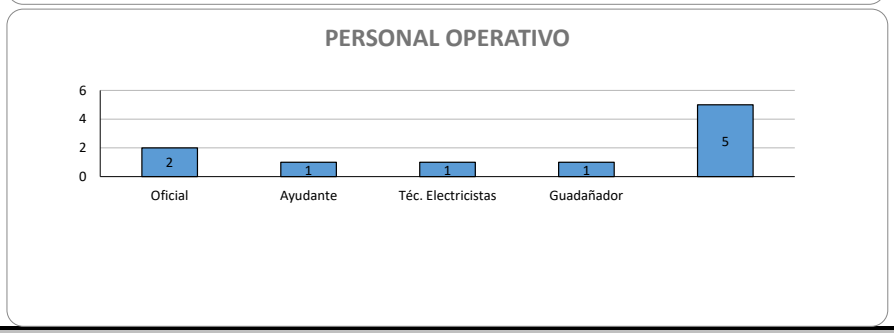

En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

EQUIPOS MENORES

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
GUADAÑADORA		1	
ESCALERA		2	
ANDAMIOS		0	
HIDRO LAVADORA		1	
PULIDORA		2	
TALADROS		2	
Total Equipos		8	

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	05/06/2024 - 04/07/2024	$ 23.200.454,00
2	05/07/2024 - 04/08/2024	$ 47.602.415,00
3	05/08/2024 - 04/09/2025	$ 75.183.934,00
4	05/09/2024 - 04/10/2025	$ 42.348.675,00
5	05/10/2024 - 04/11/2025	$ 64.720.146,00
6	05/11/2024 - 04/12/2025	$ 264.538.180,00
7	05/12/2024 - 31/12/2025	$ 610.682.692,00
8	01/01/2025 - 31/01/2025	$ 229.391.077,00
9	01/02/2025 - 28/02/2025	$ 74.588.067,00
Total Acumulado	**$ 1.432.255.640,00**	

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 1.996.500.065,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 1.432.255.640,00
% Avance facturado Acumulado
71,74%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	05/06/2024 - 04/07/2024	$ 42.800.730,00
2	05/07/2024 - 04/08/2024	$ 37.046.902,00
3	05/08/2024 - 04/09/2024	$ 41.812.759,00
4	05/09/2024 - 04/10/2024	$ 45.105.296,00
5	05/10/2024 - 04/11/2024	$ 50.666.541,00
6	05/11/2024 - 04/12/2024	$ 72.106.411,00
7	05/12/2024 - 12/31/2024	$ 114.934.236,00
8	01/01/2025 - 31/01/2025	$ 83.367.190,00
Total Acumulado	**$ 487.840.065,00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 1.117.574.559,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 487.840.065,00
% Avance facturado Acumulado
43,65%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	ISMAEL MAFIOLY RODRIGUEZ
