AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 8

AIRRIO
CONSORCIO

Riohacha, Guajira
MARZO DE 2025

HOJA DE CONTROL:	
Contrato:	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).**
Cliente:	AERONÁUTICA CIVIL
Referencia:	Contrato No. 23001282 H3 DE 2023
Productos:	INFORME MENSUAL No.8
Folios	Informe contiene 1754 folios

RENUNCIA:

Este documento fue desarrollado por el CONSORCIO AIR RIO contemplado dentro del desarrollo del contrato de interventoría integral al mejoramiento de las plataformas de viraje, franjas de seguridad, sistema de drenaje; y mejoramiento y construcción de calles de rodaje del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF). La información contenida en este informe es de carácter estrictamente confidencial.

DATOS DEL DOCUMENTO	
Título del documento	Informe Mensual No. 8
Código del documento	INF-MN-08
Revisión No.	Revisión 1

Este documento ha sido revisado y aprobado como se indica abajo. Las modificaciones realizadas se describen a continuación en el índice de modificaciones. Por favor destruir todas las revisiones previas.

ÍNDICE DE ENVÍOS Y MODIFICACIONES

Revisión No.	Fecha	Sección modificada	Observaciones
1	08/04/25	N/A	Envío revisión entidad

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

Elaboró **Consorcio AIR RIO**	Nombre/Cargo	Oscar Villarreal / Residente de Interventoría
	Firma	
Elaboró **Consorcio AIR RIO**	Nombre/Cargo	Santiago Páez / Director de Interventoría
	Firma	

TABLA DE CONTENIDO

- **CONTENIDO**

1. INTRODUCCIÓN 8

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO. 9
2.1 LOCALIZACIÓN 9
2.2 OBJETIVOS Y ALCANCES 10
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 10

3 INFORMACIÓN general de los contratos de obra e interventoría. 18
3.1 INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA 18
3.2 ESTADO LEGAL CONTRATO DE OBRA 18
3.2.1 Pólizas de Garantía 18
3.3 INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 19
3.4 ESTADO LEGAL CONTRATO INTERVENTORÍA 20
3.4.1 Resumen Pólizas Interventoría 20

4 CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 22
4.1 PROGRAMACIÓN MENSUAL, ACTIVIDADES, PRESUPUESTO Y BALANCE: 22
4.2 CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA: 22
5.1 CUMPLIMIENTO DE LAS GESTIONES POR DISCIPLINA A CARGO DE LA INTERVENTORÍA: 24
5.2 COMITÉS Y AVANCES POR COMPROMISO: 24
5.3 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS AL CONTRATO DE OBRA. 25
6.1 AVANCE ACTIVIDADES DE OBRA 25
6.1.1 ACTIVIDADES DE CAMPO. 25
6.1.2 Estudios y Diseños. 28
6.1.2.1 Bitácora de Obra 28
6.1.3 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 29
6.2 GRÁFICA AVANCE FÍSICO CONTRATO DE OBRA 30

6.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO. 31
6.3.1 Informes Interventoría 31
6.3.2 ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DENTRO DE LO PROGRAMADO. .. 32
6.4 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. 32
6.4.1 PERSONAL OBRA. 32
6.4.2 PERSONAL INTERVENTORÍA. 34
6.4.3 MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS OBRA. 35
6.4.4 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS INTERVENTORÍA. 36
6.5 CONTROL DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA. 36
6.6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 36
6.7 CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO. 37
6.8 RESUMEN CONTROL A LA GESTIÓN 37
7.1 Ensayos 37
7.1.1 Análisis de resultados de los ensayos de laboratorio. 37
7.2 Informe revisión de control técnico de materiales, especificaciones y control de obra. 38
7.3 Programación de ensayos y laboratorios para el siguiente periodo. 38
8.1 Cuadro de control ejecutado Vs programado. 39
8.2 SOPORTE ACTAS DE PAGO 39
8.3 GRÁFICA PRESUPUESTAL. 39
8.4 CUADRO CONTROL DE PAGOS. 39
8.4.1 CUADRO CONTROL DE PAGOS OBRA. 39
8.5 CUADRO CONTROL DE PAGOS INTERVENTORÍA. 40
9.1 CONCLUSIONES COMPONENTE TÉCNICO 40
9.2 CONCLUSIONES COMPONENTE ADMINISTRATIVO 41
9.3 CONCLUSIONES COMPONENTE FINANCIERO 41
9.4 CONCLUSIONES PROGRAMACIÓN DE OBRA 42
9.5 CONCLUSIONES COMPONENTE PMA 43
9.6 ALCANCE DE SEGUROS 43
9.7 ALCANCE EVALUACIÓN DE RIESGOS. 43
9.8 ALCANCE CONTABLE DURANTE EL PERIODO. 44
9.9 OTROS PROBLEMAS DE GESTIÓN. 44
10.1 RELACIÓN PERSONAL OBRA. 44
10.2 RELACIÓN PERSONAL INTERVENTORÍA. 44
10.3 RELACIÓN EQUIPOS. 44

10.4 ORDENES DE TRABAJO. 44
10.5 MATERIALES EN OBRA Y PROGRAMADOS PARA EL LABOR. 45
12.1 GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 49
12.2 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA. 49
12.3 LIBRO DE OBRA. 49
12.4 CERTIFICACIONES Y FICHAS TÉCNICAS. 49
12.4.1 CERTIFICADOS CALIBRACIÓN CONTRATISTA DE OBRA. 49
12.4.2 CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN INTERVENTORÍA. 50
13.1 EJECUTADO MES VENCIDO PLAN DE CARGAS. 50
14. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE GERENCIA. 51
14.1 SEGUIMIENTO DE GESTIÓN Y CONTROL TRABAJO. 51
14.2 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO. 51
14.3 INFORME CONTROL DE CAMBIOS. 51
14.4 INFORME DE VALIDACIÓN Y CONTROL DE ALCANCE. 51
14.5 INFORME DE CONTROL DE CRONOGRAMA. 51
14.6 INFORME DE CONTROL DE COSTOS. 51
14.7 INFORME DE CONTROL DE LA CALIDAD. 52
14.8 INFORME SEGUIMIENTO COMUNICACIONES 54
14.9 INFORME SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS. 54
14.10 INFORME DE GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS. 55
15. ANEXOS 56
15.1 ANEXO 1 – INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 57
15.2 ANEXO 2 – ACTAS DE COMITÉ 73
15.3 ANEXO 3 – FORMATO ESTADO DEL TIEMPO 90
15.4 ANEXO 4 – CONTROL DE CORRESPONDENCIA DEL PROYECTO 92
15.5 ANEXO 5 – CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. 98
15.6 ANEXO 6 – REGISTRO FOTOGRÁFICO 502
15.7 ANEXO 7 – CRONOGRAMA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 517
15.8 ANEXO 8 – PÓLIZAS 521
15.9 ANEXO 9 – COPIA BITÁCORA DE OBRA 553
15.10 ANEXO 10 – INFORME AMBIENTAL Y SST 565
15.11 ANEXO 11 –FORMATO CONTROL PERSONAL 1310
15.12 ANEXO 12 –FORMATO CONTROL EQUIPOS 1313

15.13 ANEXO 13 – CERTIFICADOS Y FICHAS TÉCNICAS. 1315
15.14 ANEXO 14 – INFORME MENSUAL NO. 8 CONTRATISTA DE OBRA1326
15.15 ANEXO 15. – CRONOGRAMA INTERVENTORÍA. 1364
15.16 ANEXO 16. – INFORME NO. 8 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS.....1380
15.17 ANEXO 17 – CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO. 1446
15.18 ANEXO 18 – ANTICIPO.....1462
15.19 ANEXO 19 – ACTA DE OBRA. 1466
15.20 ANEXO 20 – PLANO TOPOGRÁFICO PREDIOS. 1682
15.21 ANEXO 21 – INFORME SOCIAL 1684

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Localización general 10
Figura 2. Inspección de Campo Inicial. 11
Figura 3. Mejoramiento calle de rodaje Alfa 13
Figura 4. Calle de Rodaje Bravo 14
Figura 5. Cabecera 28 15
Figura 6. Cabecera 10 16
Figura 7. Franja de Seguridad 17
Figura 8. Localización drenajes 18
Figura 9. Nube Puntos Topografía. 30
Figura 10. Exploración de los Apiques. 32
Figura 11. Ubicación Apiques. 33

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1 Temperatura Aeropuerto Riohacha 36
Gráfica 2 Precipitación Aeropuerto Riohacha 36
Gráfica 3 Dirección Viento Aeropuerto Riohacha 36
Gráfica 4 Esquema avance físico Contrato de obra. 37

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Resumen contrato de obra 19
Tabla 2. Pólizas Cumplimiento Suscripción contrato Contratista 20
Tabla 3. Pólizas Cumplimiento Acta Inicio Contratista 20
Tabla 4. Resumen contrato Interventoría 20
Tabla 5. Pólizas Interventoría Cumplimiento Suscripción del contrato. 21
Tabla 6. Pólizas RCE Suscripción del contrato. 22
Tabla 7. Pólizas Interventoría Cumplimiento Acta de Inicio. 22
Tabla 8. Pólizas RCE Acta de Inicio. 22
Tabla 9. Avance del contrato de obra. 23
Tabla 10. Matriz radicación Trámites 24
Tabla 11. Comités Técnicos Mensuales. 25
Tabla 12. Relación de informes semanales Interventoría 38
Tabla 13. Relación Informes Mensuales. 39
Tabla 14. Hojas de vida presentadas por el contratista a la interventoría 39
Tabla 15. Personal de interventoría 41
Tabla 16. Equipo exigido por el contratista en etapa de construcción 41
Tabla 17. Equipo Contratista 42
Tabla 18. Equipos de interventoría 42
Tabla 19. Seguimiento físico a la etapa de construcción. 43
Tabla 20. Resumen ensayos laboratorio contratista de obra. 44
Tabla 21. Cronograma ensayos laboratorio contratista de obra. 44
Tabla 20. Resumen ensayos laboratorio contratista de obra. 44
Tabla 21. Cronograma ensayos laboratorio contratista de obra. 44

1. INTRODUCCIÓN

Este documento se enmarca dentro del contrato No. 23001282 H3 de 2023, suscrito entre el Consorcio AIR RIO y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, mediante Concurso de Méritos Abierto, por medio del cual se designó al Consorcio AIR RIO como consultor para llevar a cabo la “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)".

Mediante el presente informe se muestra el avance general de los estudios y diseños ejecutados dentro de la etapa de construcción en desarrollo del contrato de interventoría y una relación detallada de las actividades en torno al proyecto durante el periodo, las cuales corresponden a los aspectos de revisión y apropiación de los diseños que se vienen ejecutando, esto con el objeto de mantener informado y actualizado del estado del proyecto a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL – AERO CIVIL.


2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO.

2.1 LOCALIZACIÓN

El aeropuerto Almirante Padilla se encuentra ubicado en la ciudad de Riohacha, también llamada Süchiimma, es un municipio colombiano, capital del departamento de La Guajira. Es la cabecera del municipio homónimo, el cual tiene una extensión de 3.120 km², 226.715 habitantes al año 2024; está conformado por 15 corregimientos y 8 resguardos indígenas.

Está ubicada al nororiente de la Costa Atlántica colombiana, a orillas del mar caribe y en la desembocadura del Río Ranchería, formado por la Sierra Nevada de Santa Marta al occidente.

Figura 1. Localización general

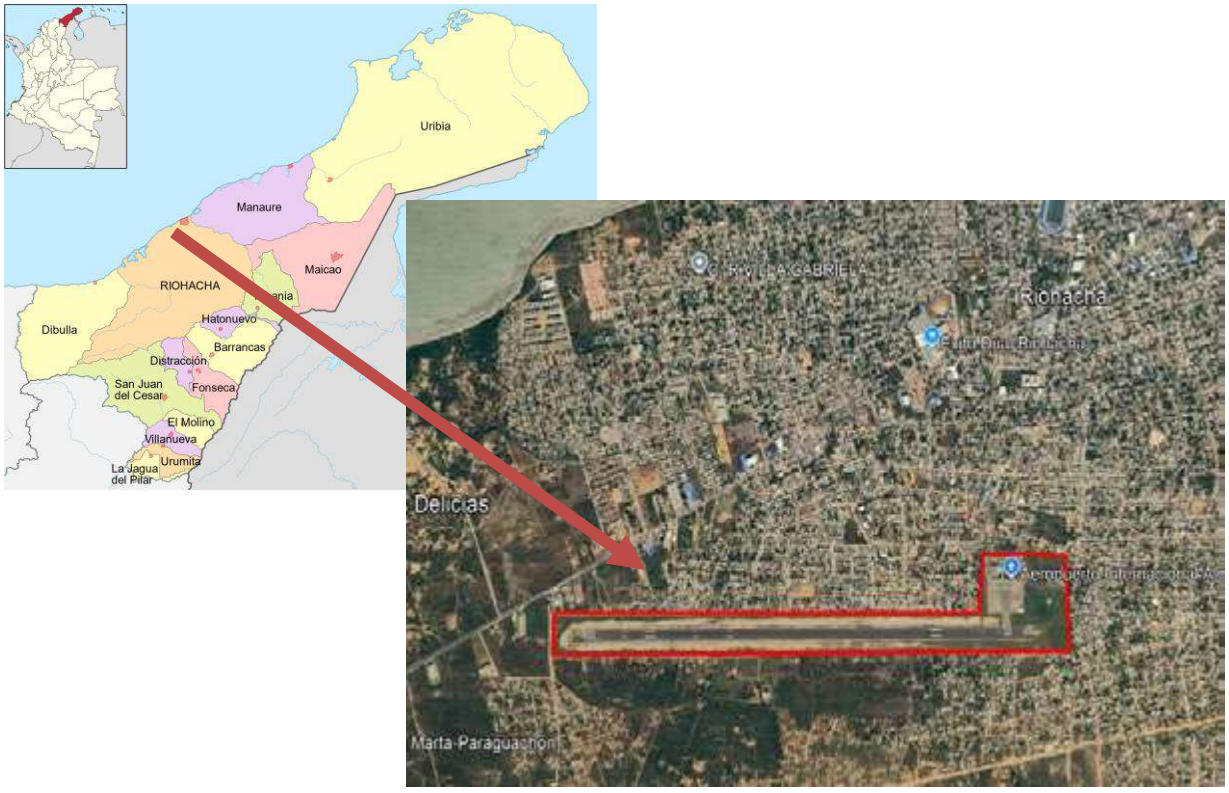

Fuente: Wikipedia/Google.

2.2 OBJETIVOS Y ALCANCES

El proyecto contempla su desarrollo en toda el área que compete al lado aire del aeropuerto de Riohacha, en el lado aire donde se tendrá la intervención de las calles de rodaje, franjas de seguridad, las plataformas de viraje y los drenajes longitudinales, puesto que debido a su constante funcionamiento ha incrementado su deterioro, es por esto que se desarrollara una rehabilitación de la calle de rodaje existente, construcción de la nueva calle de rodaje bravo, el mejoramiento de las plataformas de viraje y franjas de seguridad. Además, se contempla el cambio del sistema de drenaje dado que en épocas de altas precipitaciones en la ciudad presentan dificultades operacionales para el aeropuerto después de las lloviznas.

Figura 2. Inspección de Campo Inicial.



Fuente: Propia.

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El alcance del proyecto implica que hay zonas del Aeropuerto en el lado aire, que requieren intervención urgente y necesaria para poder seguir prestando los servicios, entre ellos se encuentra que en las zonas de seguridad se presentan sectores en los cuales se debe ofrecer la nivelación de franjas de seguridad, mejoramiento de plataformas de viraje, y mejoramiento y construcción de calles de rodaje; también es importante realizar la construcción de canales con el fin de

garantizar el óptimo drenaje de aguas lluvias en eventos de precipitación y no poner en riesgo la operación del aeropuerto por este aspecto.

Teniendo en cuenta la consecución de lo mencionado, la Aeronáutica Civil busca proyectar el proceso de contratación e intervención del aeropuerto Almirante Padilla por medio de la metodología de mejoramiento como solución a las patologías del aeropuerto y que refiere a mejoramiento de las zonas de seguridad, mejoramiento de la calle de rodaje alfa, así como la construcción de la calle de rodaje Bravo. Adicionalmente, las obras incluyen ampliación del área de cabecera 28, Mejoramiento de Plataforma de viraje cabecera 10, y, mejoramiento del sistema de drenaje, proyectando captar y disponer del agua de escorrentía bajo criterios ambientales, económicos y que generen beneficio a la comunidad.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la entidad debe propender por la seguridad operacional y la prestación eficiente de estos servicios a los usuarios, mediante inversiones acordes con las necesidades de calidad de los servicios.

Por lo anterior, la contratación del presente proyecto comprende las actividades de revisar, apropiar, ajustar, actualizar y/o complementar los Estudios y Diseños existentes de los contratos de consultoría No. 18001611 H3 - 2018 y No. 18001651 H3 - 2018; y realizar las obras de: mejoramiento de las plataformas de viraje, de las zonas de seguridad, del sistema de drenaje, y mejoramiento y construcción de las calles de rodaje, y demás obras complementarias. Cabe aclarar que en lo que corresponde a estudios y diseños, no se deberá realizar diseños fuera del objeto del presente proyecto, por lo tanto, el valor del mismo será asumido por cuenta y riesgo del contratista de obra.

2.3.1 Mejoramiento de Calle de Rodaje Existente (Alfa).


Trabajos de campo

- Topografía
- Estudios de suelo

Trabajos de oficina

- Verificación de cumplimiento sobre diseño de pavimentos.
- Verificación de cumplimiento sobre diseño geométrico.
- Verificación de cumplimiento sobre diseño de señalización existente.

Figura 3. Mejoramiento calle de rodaje Alfa

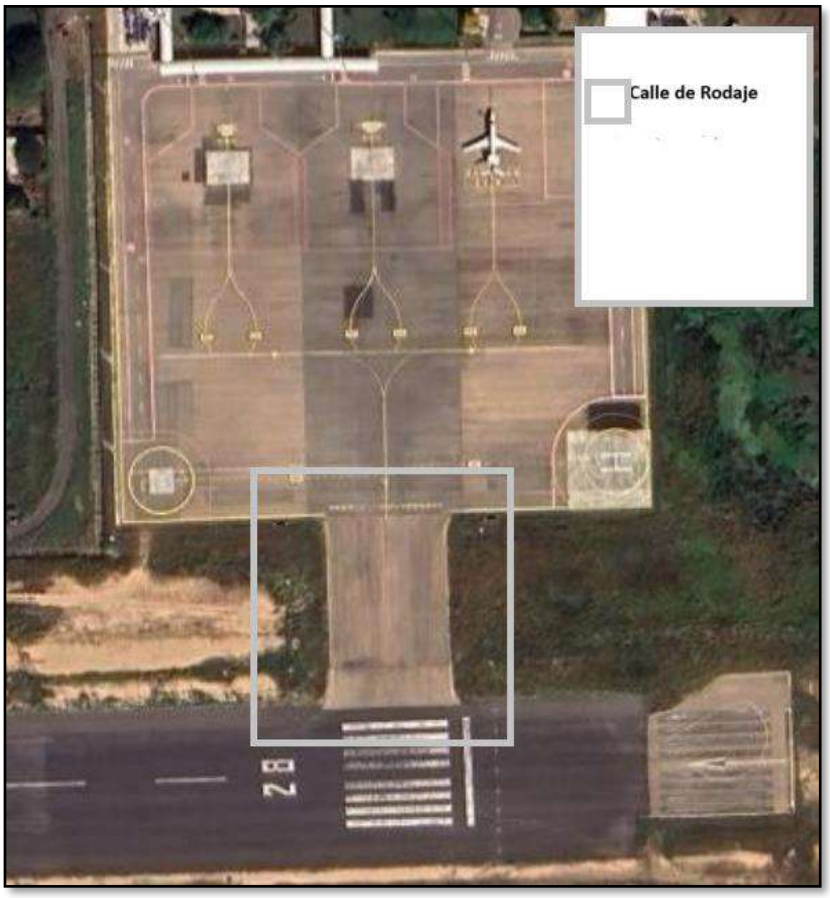

Fuente: Google.

AJUSTADO POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.3.2 Construcción de Calle de Rodaje Bravo.

Trabajos de campo

- Topografía
- Estudios de suelos

Trabajos de oficina

- Verificación de cumplimiento sobre diseño de pavimentos
- Verificación de cumplimiento sobre diseño geométrico.
- Verificación de cumplimiento sobre diseño de Señalización.

Figura 4. Calle de Rodaje Bravo



Fuente: Google.

AJUSTADO POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.3.3 Mejoramiento Plataforma de Viraje – Cabecera 28.

Trabajos de campo

- Topografía
- Estudios de suelo

Trabajos de oficina

- Verificación de cumplimiento sobre diseño de pavimentos
- Verificación de cumplimiento sobre diseño geométrico

Figura 5. Cabecera 28



Fuente: Google.

AJUSTADO POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.3.4 Adecuación Plataforma Viraje – Cabecera 10

Trabajos de campo

- Topografía
- Estudios de suelo

Trabajos de oficina

- Verificación de cumplimiento sobre diseño de pavimentos
- Verificación de cumplimiento sobre diseño geométrico

Figura 6. Cabecera 10



Fuente: Google.

AJUSTADO POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

.

2.3.5 Adecuación Franja de Seguridad.

Trabajos de campo

- Topografía.
- Ensayos de laboratorio sobre las capas extendidas y compactadas sobre el perímetro.

Trabajos de oficina

- Verificación de pendiente de diseño de la zona en intervención.
- Ajuste de cantidades de obra.

Figura 7. Franja de Seguridad



Fuente: Google.

AJUSTADO POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.3.6 Construcción de nuevos drenajes.

Trabajos de campo

- Topografía.
- Estudio de Suelos.

Trabajos de oficina

- Diseño Hidráulico
- Cálculo de caudales de diseño.
- Cálculo de precipitaciones y escorrentías que abarcan un volumen para el aeropuerto.
- Recolección de información primaria y secundaria para hacer los cálculos respectivos.

Figura 8. Localización drenajes



Fuente: Google.

AJUSTADO POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

3.1 INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

Las labores del contratista iniciaron el día 01 de agosto de 2024, según acta de inicio, y tienen una duración hasta el día 31 de julio de 2026.

Tabla 1. Resumen contrato de obra

CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 DE 2023.	
"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"	
Constructor	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Integrantes	INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA (40%) RG INGENIERÍA SAS (40%) IMCCA SAS (20%)
Representante Legal	Gildardo Chavarro
Firma del contrato	30/05/2024
Fecha Acta de Inicio de Obra	01/08/2024
Plazo de Ejecución	2 años
Fecha Finalización Contrato	31/07/2026
Otrosí	No Aplica
Valor Anticipo	$11.884.371.800,00
Valor del Contrato	$56.738.847.471,00

3.2 ESTADO LEGAL CONTRATO DE OBRA

3.2.1 Pólizas de Garantía

A continuación, se presenta un resumen de las pólizas de garantía que se tienen vigentes para el contrato de obra. El cumplimiento de las coberturas y vigencias fueron verificadas en su momento, encontrando estas acorde a los requerimientos contractuales.

Tabla 2. Pólizas Cumplimiento Suscripción contrato Contratista

Tomador	Consorcio INFRAESTRUCTURA RIOHACHA		
Beneficiario	Unidad administrativa especial de Aeronáutica Civil Aero civil		
Aseguradora	Nacional de Seguros		
N° de Póliza	400056081 calidad y 400056083 RCE		
Garantía	**Vigencia**		**Valor asegurado**
Buen manejo de anticipo	31/05/2024	30/03/2027	11.884.371.800.00
Cumplimiento del contrato	31/05/2024	30/03/2027	17.021.654.241.30
Pago de Salarios	31/05/2024	30/11/2029	5.673.884.747.10
Estabilidad y calidad de la Obra	30/11/2026	30/11/2031	17.021.654.241.30
Calidad del servicio	30/11/2026	30/11/2028	17.021.654.241.30
Responsabilidad Civil Extracontractual	31/05/2024	30/11/2026	2.836.942.374,00

Aprobadas en el SECOP II el 05 de julio de 2024.

Tabla 3. Pólizas Cumplimiento Acta Inicio Contratista

Tomador	Consorcio INFRAESTRUCTURA RIOHACHA		
Beneficiario	Unidad administrativa especial de Aeronáutica Civil Aero civil		
Aseguradora	Nacional de Seguros		
N° de Póliza	400056081 calidad y 400056083 RCE		
Garantía	**Vigencia**		**Valor asegurado**
Buen manejo de anticipo	01/08/2024	31/05/2027	11.884.371.800.00
Cumplimiento del contrato	01/08/2024	31/05/2027	17.021.654.241.30
Pago de Salarios	01/08/2024	31/01/2030	5.673.884.747.10
Estabilidad y calidad de la Obra	30/01/2027	31/01/2032	17.021.654.241.30
Calidad del servicio	30/01/2027	31/01/2029	17.021.654.241.30
Responsabilidad Civil Extracontractual	01/08/2024	31/01/2027	2.836.942.374,00

Aprobadas en el SECOP II el 13 de septiembre de 2024.

3.3 INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Las labores de la Interventoría iniciaron el día 01 de agosto de 2024, según acta de inicio, y tienen una duración hasta el día 31 de julio de 2026.

Tabla 4. Resumen contrato Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 23001282-H3 DE 2023.
" REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"

Interventor	CONSORCIO AIR-RIO
Integrantes	Incoplan S.A. (90 %) Intercsa Sucursal Colombia (10%)
Representante Legal	Santiago Páez Talero
Firma del contrato	31/05/2024
Fecha Acta de Inicio de Obra	01/08/2024
Plazo de Ejecución	30 Meses
Fecha Finalización Contrato	31/07/2026
Otro sí	No Aplica
Valor Anticipo	No existe anticipo
Valor del Contrato	$ 7.724.841.670

3.4 ESTADO LEGAL CONTRATO INTERVENTORÍA

3.4.1 Resumen Pólizas Interventoría

El interventor, consorcio AIR-RIO, constituyeron las siguientes pólizas representadas en la siguiente tabla:

Tabla 5. Pólizas Interventoría Cumplimiento Suscripción del contrato.

Tomador	CONSORCIO AIR-RIO			
Beneficiario	Unidad administrativa especial de Aeronáutica Civil Aero civil			
Aseguradora	Nacional de Seguros			
Nº de Póliza	400055844 cumplimiento y 400055837 RCE			
Garantía	**Cobertura**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
Cumplimiento del Contrato	400055844	23/05/2024	30/11/2026	2.317.452.501.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	400055844	23/05/2024	31/07/2029	1.544.968.334.00
CALIDAD DEL SERVICIO	400055844	31/07/2026	31/07/2031	1.544.968.334.00

Aprobada Plataforma SECOP II el 7 de junio de 2024.

Tabla 6. Pólizas RCE Suscripción del contrato.

Tomador	CONSORCIO AIR-RIO			
Beneficiario	Unidad administrativa especial de Aeronáutica Civil Aero civil			
Aseguradora	Nacional de Seguros			
Nº de Póliza	400055844 cumplimiento y 400055837 RCE			
Garantía	**Cobertura**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**	**Garantía**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	400055837	23/5/2024	31/7/2026	650.000.000,00

Aprobada Plataforma SECOP II el 7 de junio de 2024.

Tabla 7. Pólizas Interventoría Cumplimiento Acta de Inicio.

Tomador	CONSORCIO AIR-RIO			
Beneficiario	Unidad administrativa especial de Aeronáutica Civil Aero civil			
Aseguradora	Nacional de Seguros			
Nº de Póliza	400055844 cumplimiento y 400055837 RCE			
Garantía	**Cobertura**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
Cumplimiento del Contrato	400055844	01/08/2024	01/06/2027	2.317.452.501.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	400055844	01/08/2024	01/02/2030	1.544.968.334.00
CALIDAD DEL SERVICIO	400055844	01/02/2027	01/02/2032	1.544.968.334.00

Aprobada Plataforma SECOP II el 29 de octubre de 2024.

Tabla 8. Pólizas RCE Acta de Inicio.

Tomador	CONSORCIO AIR-RIO			
Beneficiario	Unidad administrativa especial de Aeronáutica Civil Aero civil			
Aseguradora	Nacional de Seguros			
Nº de Póliza	400055844 cumplimiento y 400055837 RCE			
Garantía	**Cobertura**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**	**Garantía**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	400055837	01/08/2024	01/2/2027	650.000.000,00

Aprobada Plataforma SECOP II el 29 de octubre de 2024.

4 CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

4.1 PROGRAMACIÓN MENSUAL, ACTIVIDADES, PRESUPUESTO Y BALANCE:

El contratista de obra continua con el desarrollo las actividades del mes anterior tales como: cargue de material desde centro acopio ubicado en el lote No1 hasta sitio de disposición, descapote, extendida de material importado, humectación y limpieza manual sobre el borde de la pista, actividades ejecutadas referente a las zonas de trabajo ubicadas en la franja de seguridad costado Norte y Sur de la pista, adicionalmente el contratista inicia la construcción de la estructura de bodega sobre el lote No1, predio ubicado en zona occidental a la cabecera 10 (Ver anexo 20 – plano de predios), con el propósito de poder avanzar en la etapa de construcción de acuerdo a los diseños entregados hasta el presente periodo.

4.2 CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA:

A la fecha se informa el presupuesto y balance detallado de la etapa de construcción, El cual refleja el avance financiero y físico del proyecto. A continuación, se describe el avance del mismo.

Tabla 9. Avance del contrato de obra.

Valor contractual (contratista)	$ 56.738.847.471,00

Descripción	Programado acumulado	Ejecutado acumulado
Ejecutado	$ 4.503.903.295	$ 6.182.235.515
Porcentaje avance acumulado	7,94%	10,90%

Ver flujo de inversión de obra - anexo No. 7.

5. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO:

A la fecha el contratista de obra ha presentado los siguientes documentos para revisión y aprobación de la interventoría que son los siguientes:

Tabla 10. Matriz radicación Trámites

Documento	Radicado mediante oficio	Fecha de radicación	Estado
Plan de seguridad operacional de la obra	INFRH-T-001-2024	31/07/2024	Aprobado por la Aero civil el día 18 de agosto de 2024.
Plan detallado de trabajo	INFRH-T-003-2024	08/08/2024	Remitido a la Aero civil mediante radicado 2024162000115819 del día 10 de septiembre dando aprobación.
Plan de la Calidad	INFRH-T-004-2024	08/08/2024	Remitido a la Aero civil mediante radicado 2024162000115794 del día 10 de septiembre dando aprobación.
Programa de generación de empleo	INFRH-T-005-2024	08/08/2024	Radicado a la entidad mediante consecutivo 2024162000115823 del 10 de septiembre de 2024.
Programa de gerencia del contrato	INFRH-T-006-2024	12/08/2024	Aprobado mediante radicado 2024-486-RÍO-3682 del 11 de diciembre de 2024, radicado Aero civil 2024162000156121.
Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	INFRH-T-007-2024	16/08/2024	Aprobado por la Interventoría mediante radicado Aero civil 2024162000118627 del 17 de septiembre de 2024.
Plan de Gestión Social	INFRH-T-008-2024	16/10/2024	Aprobado mediante radicado 2024-486-RÍO-3682 del 11 de diciembre de 2024, radicado Aero civil 2024162000156121.
Metodología Apropiación de Estudios y Diseños	INFRH-T-033-2024	23/10/2024	Aprobado mediante radicado 2024-486-RÍO-3682 del 11 de diciembre de 2024, radicado Aero civil 2024162000156121.
Plan de Manejo Ambiental V2	INFRH-T-062-2024	03/12/2024	Aprobado mediante radicado 2024-486-RÍO-3682 del 11 de diciembre de 2024, radicado Aero civil 2024162000156121.

5.1 CUMPLIMIENTO DE LAS GESTIONES POR DISCIPLINA A CARGO DE LA INTERVENTORÍA:

A la fecha el contratista de obra ha enviado los planes y programas necesarios evidenciados en la **tabla 10** del presente informe.

5.2 COMITÉS Y AVANCES POR COMPROMISO:

Durante el presente mes se presentó el siguiente comité técnicos:

Tabla 11. Comités Técnicos Mensuales.

No.	Área	Fecha de Comité	Compromisos
015	Técnica	12/Marzo/2025	Entrega de los diseños hidráulicos
			Reunión Urgente Ambiental
			Entrega de NP's con documentación completa.
			Inicio cabecera 10
			Enviar a la Aerocivil informe de las gestiones y comunicados con CORPOGUAJIRA
003	Ambiental	12/Marzo/2025	Radicar ajustes de las fichas del PMA para aprobación por parte de la interventoría
			Revisión de las observaciones de los informes ambientales
004	Ambiental	26/Marzo/2025	Justificación del cambio menor del PMA del aeropuerto Almirante Padilla acuerdo a lo establecido en el decreto 1076.
			El contratista deberá enviar un documento PAGA que describa las actividades y los impactos ambientales relacionados con la construcción del tanque de tormentas
			La interventoría deberá revisar y aprobar el documento de actividades constructivas que el contratista envíe
002	Social	31/Marzo/2025	Preparar la logística de la socialización del proyecto.
			Socialización del proyecto "Realizar el mejoramiento de las plataformas de viraje, franjas de seguridad, sistema de drenaje, mejoramiento y construcción de calles de rodaje del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha"
001	Social	21/Marzo/2025	Concertar la fecha de la socialización de la obra con las comunidades del Área de Influencia Directa del proyecto
			Habilitar el punto de servicio de atención a la comunidad
			Habilitar dos buzones de sugerencias
			Habilitar dos carteleras informativas

			Identificar y definir los barrios que serán impactados de manera directa por las obras del proyecto
			Entrega de los informes mensuales
			Realizar un comité social cada 15 días

Ver anexo 2 actas de comité.

5.3 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS AL CONTRATO DE OBRA.

Durante el presente periodo se confirma por parte de la entidad la adquisición de lote No 6 por ello se realiza el respectivo recorrido de reconocimiento del mismo, para tener en cuenta el descole y conducción final de la tubería a instalar dentro del proyecto.

6. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

6.1 AVANCE ACTIVIDADES DE OBRA.

6.1.1 ACTIVIDADES DE CAMPO.

Se presenta a continuación un resumen de las obras más relevantes ejecutadas durante el mes:

- Cargue de material importado centro de acopio hacia franjas de seguridad.
- Descargue de material importado franja de seguridad costado norte.
- Extendida de material importado y sellado franja de seguridad note de pista.
- Sellado de material importado con cilindro franja de seguridad costado norte.
- Control de material de lleno franja de seguridad norte.
- Descapote y extendida de material importado franja costado norte de pista.
- Control y nivelación de material extendido en la franja del costado norte (Comisión topografía).
- Humectación de las franjas de seguridad y zonas de recorrido de las volquetas.
- Retiro de material sobrante en hombro y pista costado norte.
- Construcción de bodega para acopiar herramientas y materiales.
- Limpieza manual del borde de pista en la franja del costado sur.

ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
TOPOGRAFÍA Se realizó la verificación del lleno extendido sobre la franja de seguridad norte con respecto a las pendientes establecidas en los planos topográficos. Adicionalmente se continua con la inspección del material importado con el cual se está realizando el lleno en las franjas de seguridad.	
Actividades de obra Se dio continuidad a las actividades preliminares de construcción orientadas al aseguramiento de la seguridad operacional, las cuales incluyen la adecuación de la franja de seguridad desde el borde de la pista hasta el límite exterior de las cajas de seguridad del borde de la pista. Durante este mes, dichas actividades se desarrollaron en el costado norte de la pista. Las labores realizadas incluyeron explanaciones	

ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
enfocadas en la conformación de la franja de seguridad, así como la ejecución de rellenos localizados para garantizar la estabilidad y uniformidad de la misma.	
Se realizaron actividades descargue de material franja de seguridad de costado norte, extendida del mismo con motoniveladora y sellado con vibrocompactador.	   

ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Se realizo la construcción de bodega para copio de herramientas y materiales.	

6.1.2 Estudios y Diseños.

Se realizo la entregara los siguientes volúmenes: Topográfico, Geotécnico y Pavimentos, Franja de Seguridad.

Los componentes de diseño geométrico cabecera 10 y 28, mejoramientos de franjas de seguridad de la pista cabecera 10 y 28, no presentan modificaciones durante el periodo, en cuanto al diseño hidráulico el contratista se encuentra trabajando en las adecuaciones de acuerdo la adquisición del Lote No 6.


6.1.2.1 Bitácora de Obra

Se estableció y suscribió la bitácora de obra correspondiente al área técnica del proyecto, en donde se han venido reportando diariamente los aspectos relevantes considerados por el Contratista y la Interventoría de todas las actividades llevadas a cabo en obra. En el anexo 9 se presenta copia de dicho documento.


6.1.3 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En el transcurso del periodo de reporte se presentó un estado del tiempo seco, tal como se muestra en el siguiente gráfico, y como se detalla en el anexo 3 correspondiente al formato de control de clima que lleva la interventoría.


Grafica 1 Temperatura Aeropuerto Riohacha

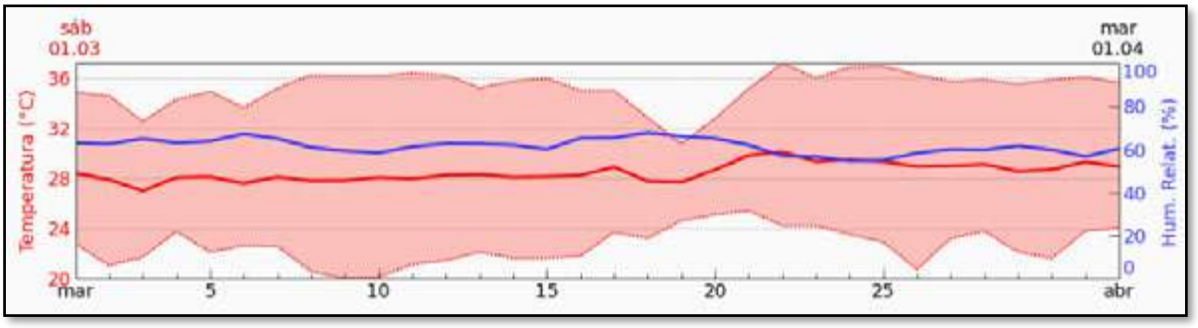

Gráfica 2 Precipitación Aeropuerto Riohacha

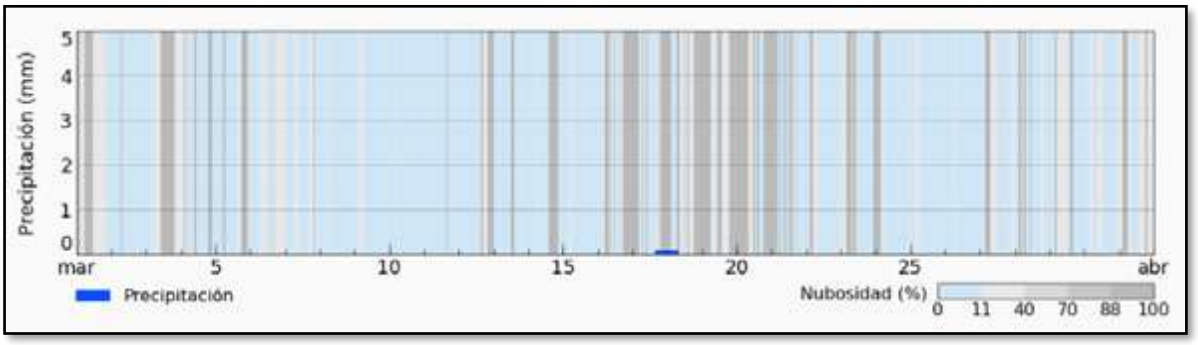


Gráfica 3 Dirección Viento Aeropuerto Riohacha

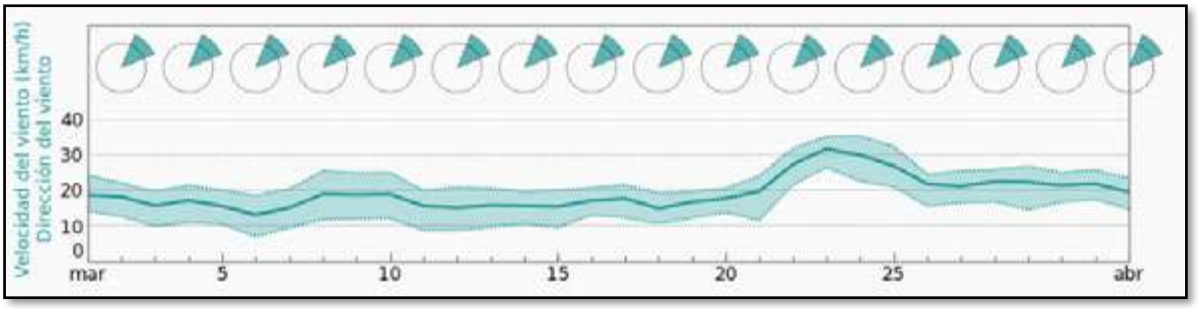


6.2 GRÁFICA AVANCE FÍSICO CONTRATO DE OBRA.

A continuación, se presente el esquema del avance físico de la obra:

Gráfica 4 Esquema avance físico Contrato de obra.

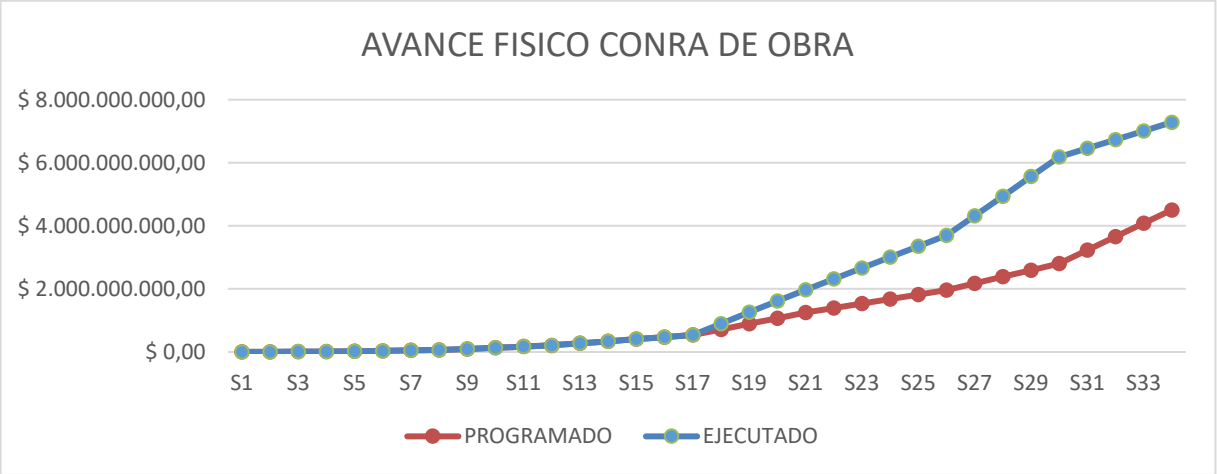

Gráfica 5 Esquema avance financiero Contrato de obra.

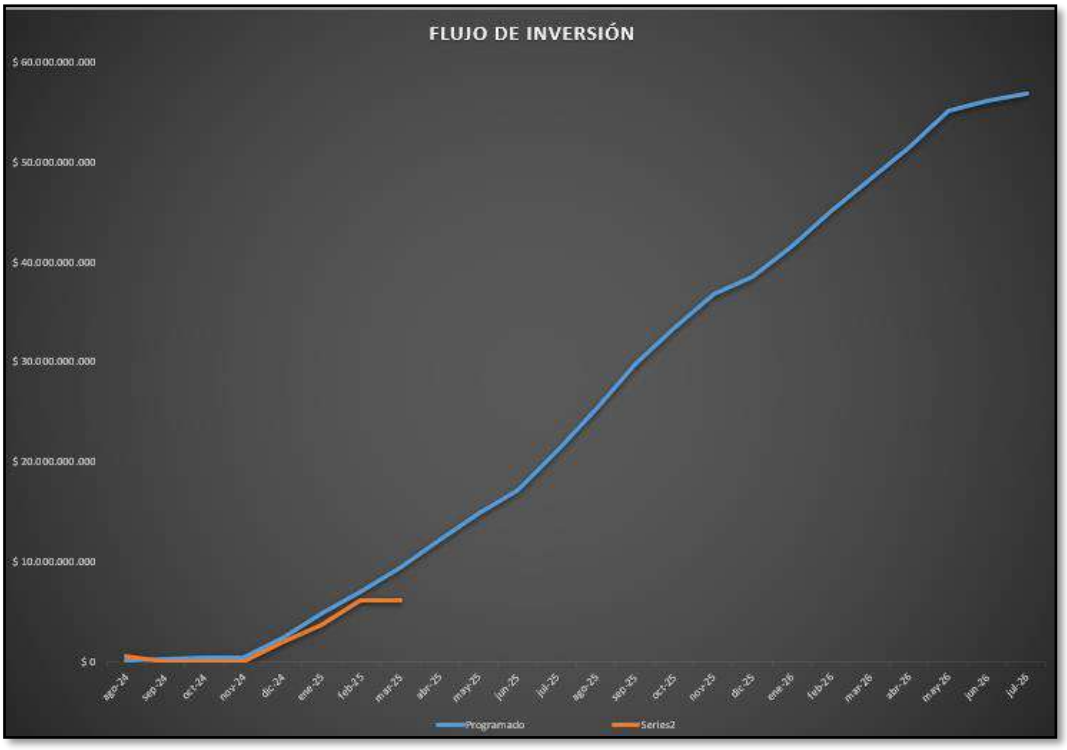

6.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

- Verificación de suficiencia y detalles de los estudios técnicos.
- Levantamiento topográfico de las zonas intervenidas.
- Seguimiento al estado financiero del contrato de obra.
- Revisión de obligaciones contractuales y requerimientos de los siguientes componentes: ambiental, SST y social.
- Revisión de la documentación del personal de obra.
- Visita canteras del proyecto.
- Revisión ensayos de laboratorio suministrados por el contratista en los informes mensuales No. 6 No 7.

6.3.1 Informes Interventoría

Mediante la presentación de informes semanales y mensuales, la interventoría ha mantenido informado a la Aerocivil, de todas las actividades realizadas en desarrollo del contrato, registrando allí el estado de avance que se presenta en cada uno de los componentes del proyecto. A continuación, se relacionan los informes semanales del periodo y mensuales acumulados presentados por la interventoría.

Tabla 12. Relación de informes semanales Interventoría

Informe	Periodo	Aprobado
Informe Semanal Interventoría N.º 31	01 de marzo de 2025 al 07 de marzo de 2025.	No
Informe Semanal Interventoría N.º 32	08 de marzo de 2025 al 14 de marzo de 2025.	No
Informe Semanal Interventoría N.º 33	15 de marzo de 2025 al 21 de marzo de 2025.	No
Informe Semanal Interventoría N.º 34	22 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2025.	No

Con respecto a los informes mensuales a la fecha se tienen los siguientes:

Tabla 13. Relación de Informes Mensuales.

Informe	Periodo
Informe Mensual Interventoría N.º 1	1 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024.
Informe Mensual Interventoría N.º 2	1 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024.
Informe Mensual Interventoría N.º 3	1 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024
Informe Mensual Interventoría N.º 4	1 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024
Informe Mensual Interventoría N.º 5	1 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024.
Informe Mensual Interventoría N.º 6	1 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025.
Informe Mensual Interventoría N.º 7	1 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2025.

6.3.2 ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DENTRO DE LO PROGRAMADO.

A la fecha según la ejecución del informe, se informa que no se encuentran actividades sin programar.

6.4 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.

6.4.1 PERSONAL OBRA.

El contratista a partir de la fecha del acta de inicio vinculó el personal requerido para la ejecución de las actividades iniciales del contrato, este personal se encuentra desarrollando las tareas correspondientes a la ejecución de la obra, en las siguientes tablas se detallan el personal contratado por contratista e interventoría, tabla 14 y 15 respectivamente.

Tabla 14. Hojas de vida presentadas por el contratista a la interventoría

Profesional ofrecido para el cargo	Nombre	Dedicación Estimada (%)	
		Fase de pre construcción	Fase de Construcción
		Mes 1 a Mes 4	Mes 5 hasta Finalizar
Director de Obra	Víctor Daniel Castro	30%	100%
Coordinador Técnico de Obra	Juan Carlos Serna	0%	100%
Residente de Obra	Juan Carlos Pérez	0%	100%
Ingeniero Auxiliar	Elis Arango pastrana	100%	100%
Ingeniero Ambiental	Eliana Maria Gomez Sanchez	40%	100%
Inspector SISOMA	Duvan Elias Montenegro Calderon	0%	100%
Profesional Social	Mildrey Lorena Pinilla	0%	100%
Profesional en gerencia de proyectos	David Felipe Alonso Jimenez	0%	100%
Especialista aeroportuario o aeropistas	Pedro José Mora Grandas	50%	20%
Especialista en Hidráulica	Roberto Jaimes	100%	40%
Especialista en Pavimentos	Pedro José Mora Grandas	40%	20%
Especialista en Geotécnia	Melquicedec Cantor Bello	50%	25%
Especialista en Diseño Geométrico	Carlos Javier González	50%	25%
Especialista en costos, presupuestos y programación	Diego Alexander Osorio Muriel	80%	0%
Especialista en Electromecánico o eléctrico		0%	25%
Topógrafo	Ariel Duván Robayo	100%	50%

Profesional ofrecido para el cargo	Nombre	Dedicación Estimada (%)	
		Fase de pre construcción	Fase de Construcción
		Mes 1 a Mes 4	Mes 5 hasta Finalizar
Cadenero 1	Alfonso Morales Esteban	100%	50%
Cadenero 2	Carlos Andrés Corredor Cano	100%	50%

6.4.2 PERSONAL INTERVENTORÍA.

La interventoría a partir de la fecha del acta de inicio vinculó el personal requerido para la ejecución de las actividades iniciales del contrato y adicionalmente puso en funcionamiento las instalaciones de la oficina destinada para el proyecto. El personal que se encuentra desarrollando tareas de interventoría se relacionan a continuación:

Tabla 15. Personal de interventoría

Cargo	Nombre
Director de Interventoría	Santiago Páez Talero.
Residente de Interventoría	Oscar Villarreal Silva.
Residente Ambiental	Diana Marcela niño Santamaria.
Especialista en Pavimentos	Luis Francisco Montes Buritaca.
Residente de Interventoría 2	Andrés Felipe Villamil.
Especialista Hidráulico	Ricardo Bejarano.
Profesional de Costos	Jorge Iván Arias López.
Auxiliar Administrativo	Yerlis Ramos.
Topógrafo	Deyber Eduardo Flórez Caballero.
Cadenero 1	Nelson Camilo Guerra Novoa.
Cadenero 2	Danilo Alberto Campos Barros.
Especialista Aeroportuario	Jaime Balagero Melo.
Especialista en Diseño Geométrico	Rafael Armando Carreño Mojica.
Especialista en Geotecnia	Martha Elena Morales Guevara.
Inspector SISOMA	Oswaldo Martínez Vega.

6.4.3 MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS OBRA.

El contratista a la fecha presenta la siguiente maquinaria:

Tabla 16. Equipo exigido por el contratista en etapa de construcción

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Excavadora Hidráulica de oruga	2	0	
Retrocargador de neumáticos	2	0	
Fresadora asfalto	1	0	
Volquetas de 15 m3	4	2	En actividades de obra
Vibro compactador	2	1	En actividades de obra
Motoniveladora	2	1	En actividades de obra
Carrotanque	1	1	En actividades de obra
Terminadora de asfalto con sensores	1	0	
Equipo para mezcla de concreto	1	0	
Equipo Topográfico de Alta Precisión	1	1	En uso
Hidrolavadora	1	0	
Mini cargadora con accesorios	1	1	En actividades de obra
Camioneta con platón	1	1	En uso
Luminaria	0	1	En uso
Total Maquinaría	**20**	**9**	

La cual a continuación se encuentra detallada en la siguiente tabla:

Tabla 17. Equipo Contratista

Tipo de Maquina/Equipo	Cant.	Marca
Volqueta	1	MARK
Volqueta	1	CHEVROLET
Vibrocompactador	1	BOMAC
Minicargador	1	CATERPILLAR 236
Motoniveladora	1	KOMATSU
Carrotanque	1	INTERNATIONAL

Tipo de Maquina/Equipo	Cant.	Marca
Estación total Topografía	1	South – NTS-362R8
GNSS RKT	1	EFIX F7/F4
NIVEL DE PRECISIÓN	1	SOUTH NL - 32
Camioneta con platón	1	TURBO NPR
Luminaria	1	ATLAS COPCO

6.4.4 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS INTERVENTORÍA.

El equipo que se ha venido utilizando en las actividades de la interventoría corresponde a una oficina adaptada en la carrera 15 No. 25-24 en la ciudad de Riohacha, La Guajira, dotada de equipos de cómputo, impresora, cámara, equipo de topografía y vehículo. A continuación, se relacionan los equipos más relevantes con que cuenta la interventoría para el desarrollo de las actividades.

Tabla 18. Equipos de interventoría

EQUIPO	CANT.	MARCA
Estación total Topografía	1	South – NTS-362R8
Nivel automático de Topografía	1	Ruide – RLC 32
Vehículo	1	JMC
Computadores	3	Varias
Impresoras	1	HP

6.5 CONTROL DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

El control del personal de la interventoría se encuentra dentro del numeral 6.4.2, se informa que el personal asignado trabajó con la dedicación estimada dentro del contrato.

6.6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Según el contrato de obra No. 23001282-H3 DE 2023, cuyo objeto es realizar la interventoría integral al mejoramiento de las plataformas de viraje, franjas de seguridad, sistema de drenaje; y mejoramiento y construcción de calles de rodaje del aeropuerto almirante padilla de riohacha (vf), se consideran los cobros mediante

actas parciales presentadas mensualmente y distribuidas uniformemente durante la etapa de construcción.

De acuerdo a la anterior apreciación referente a las actas parciales, la interventoría realizó el corte de obra correspondiente a los avances durante el periodo y se encuentra a la espera que el contratista entregue la documentación para firmas por parte de la dirección de la interventoría y así continuar con el proceso del respectivo pago de las actividades ejecutadas durante el presente mes.

6.7 CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO.

Al cierre el contrato de obra tiene el siguiente avance financiero:

Tabla 19. Seguimiento financiero a la etapa de construcción.

Descripción	Programado	Ejecutado acumulado
Ejecutado	$ 4.503.903.295	$ 6.182.235.515
Porcentaje avance	7,94%	10,90%

6.8 RESUMEN CONTROL A LA GESTIÓN

En el anexo 5 se evidencia los comunicados de la gestión elaborada por la interventoría.

7. LABORATORIOS Y ENSAYOS.

7.1 Ensayos

A la fecha, se han realizado ensayos de caracterización de los estudios y diseños, además del material de relleno que se ha instalado en la fecha.

7.1.1 Análisis de resultados de los ensayos de laboratorio.

En la siguiente tabla se evidencia el resumen de los ensayos de laboratorio:

Tabla 20. Resumen ensayos laboratorio contratista de obra.

No	Nombre ensayo	Cumple
1	Tamaño máximo, mm	SI

2	% que pasa tamiz no. 10 (2 mm) en masa, máximo	SI
3	% que pasa tamiz 75 µm (no.200) en masa máximo	SI
5	Índice de plasticidad, máximo (%)	SI
6	Densidad máxima Seca	SI
7	CBR de laboratorio, mínimo (%)	SI
8	contenido de sales solubles máximo (%)	SI
9	Granulometría %	SI
10	Limite liquido %	SI
11	índice de plasticidad %	SI
12	densidad aparente - Proctor	SI
13	Equivalente de arena, mínimo	SI
14	Densidad en campo	SI

7.2 Informe revisión de control técnico de materiales, especificaciones y control de obra.

Dentro del anexo No. 17, cuadro control de ensayos de laboratorio, se evidencia el cumplimiento de las especificaciones de los materiales que se han suministrado en el presente mes por parte del contratista de obra.

7.3 Programación de ensayos y laboratorios para el siguiente periodo.

La programación de los ensayos de laboratorio del contratista es el siguiente:

Tabla 21. Cronograma ensayos laboratorio contratista de obra.

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
					1	2
					Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Festivo
3	4	5	6	7	8	9

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Festivo
10	11	12	13	14	15	16
Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Festivo
17	18	19	20	21	22	23
Ensayo de compactación, CBR yclasificación	Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Festivo
24	25	26	27	28	29	30
Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Ensayo de compactación, CBR y clasificación	Festivo
31						
Ensayo de compactación, CBR y clasificación						

8. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

8.1 Cuadro de control ejecutado Vs programado.

Este cuadro se puede analizar en el numeral 6.7.

8.2 SOPORTE ACTAS DE PAGO

En el anexo 19 se evidencian las actas de pago del contratista del presente periodo.

8.3 GRÁFICA PRESUPUESTAL.

Este gráfico se puede ver en el numeral 6.2.

8.4 CUADRO CONTROL DE PAGOS.

8.4.1 CUADRO CONTROL DE PAGOS OBRA.

A la fecha se tiene el cuadro de control de pagos del contrato de obra:

Tabla 22. Facturado contratista.

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	Agosto 2024-noviembre 2024	$536.680.480,00
2	Diciembre 2024	$1.439.542.701,00
3	Enero 2025	$1.716.544.936,00
4	Febrero	$ 2.489.467.398,00
Total, Acumulado		**$6.182.235.515,00**

8.5 CUADRO CONTROL DE PAGOS INTERVENTORÍA.

A la fecha se tiene el cuadro de control de pagos del contrato de interventoría:

Tabla 23. Facturado Interventoría.

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	01 agosto de 2024 a 31 octubre de 2024	$253,394,614.00
2	01 noviembre de 2024 a 30 noviembre de 2024	$530,691,722.00
3	01 diciembre de 2024 a 31 diciembre de 2024	$ 222,004,157.00
4	01 enero de 2025 a 31 enero de 2025	$ 201,578,596.00
Total, Acumulado		$1.207.669.089,00

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 CONCLUSIONES COMPONENTE TÉCNICO

Interventoría mantiene un constante acompañamiento a la revisión de los estudios y diseños, la atención oportuna por parte del contratista a las observaciones y recomendaciones realizadas por la interventoría.

Los especialistas de la interventoría han realizado el debido acompañamiento a los procedimientos que se tienen ejecutados en el proyecto, emitiendo sus inquietudes mediante correos electrónicos, lo cual ha sido de gran beneficio puesto que han subsanado las observaciones emitidas por esta interventoría.

Se ha evidenciado las actividades de obra orientadas al aseguramiento de la seguridad operacional, hasta el 13 de abril del presente mes, tales como la adecuación de la franja de seguridad tanto en el costado sur como en el norte, además de la ejecución de explanaciones en estas zonas para conformación de la misma.
El contratista se encuentra realizando los ajustes del diseño hidráulico de acuerdo a las observaciones emitidas por el especialista hidráulico de la interventoría durante el periodo.

9.2 CONCLUSIONES COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría realiza un acompañamiento constante al Contratista en las actividades administrativas y trámites que se están desarrollando en torno a la ejecución del proyecto, adicionalmente, los respectivos planes y programas se encuentran radicados a la Aerocivil.

9.3 CONCLUSIONES COMPONENTE FINANCIERO

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($56.738.847.471) M/CTE, distribuido por vigencias fiscales, así: El contratista recibe un anticipo con la suma de $11.884.371.800,00, correspondiente a la vigencia del año 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la constitución de la fiducia o patrimonio autónomo.

la entidad contratante AEROCIVIL procede a trasladar el excedente de las vigencias futuras para el año 2025 de acuerdo al valor de la reserva presupuestal.

Por lo que las vigencias presupuestales quedan distribuidas de la siguiente manera:

Vigencia	Presupuesto por Vigencia
2024	$35.169.627.086,00
2025	$21.265.831.138,00
2026	$ 303.389.247,00

Donde a la fecha de corte de este informe se tiene un saldo facturado de $ 6.182.235.515, valor pagado al contratista de $ 4.018.453.085 más un anticipo de $11.884.371.800, lo que da un giro total por parte de la entidad de $ 15.902.824.885, quedando un saldo pendiente de $ 38.672.240.156 por facturar para cumplir con las vigencias contractuales.

Tabla 24. Relación de amortización de acta.

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Valor total facturado	Valor a pagar con amortización
1	Agosto 2024-noviembre 2024	$536.680.480,00	$ 348.842.312,00
2	Diciembre 2024	$1.439.542.701,00	$ 935.702.756
3	Enero 2025	$1.716.544.936,00	$ 1.115.754.208,00
4	Febrero 2025	$ 2.489.467.398,00	$ 1.618.153.809,00
Total, Acumulado		**$6.182.235.515,00**	**$ 4.018.453.085**

Tabla 25. Relación Pagos al contratista.

Descripción	Rubros	Giro total por parte de la entidad hasta presente mes
Anticipo	$11.884.371.800	$ 15.902.824.885
Acumulado pagado por actas hasta presente mes	$ 4.018.453.085	

Teniendo en cuenta los pagos recibidos y la programación de obra vigente (ver anexo 7) se realiza la siguiente proyección financiera hasta el presente año

Tabla 26. Proyección financiera.

VALOR ACOMULADO HASTA PRESENTE MES		$ 6.182.235.515
MES	**PROYECCIÓN FINANCIERA MENSUAL**	**PROYECCIÓN FINANCIERA ACUMULADA**
MARZO	$ 1.696.859.141	$ 1.696.859.141
ABRIL	$ 996.136.316	$ 2.692.995.458
MAYO	$ 2.763.044.920	$ 5.456.040.377
JUNIO	$ 892.133.972	$ 6.348.174.349
JULIO	$ 5.250.254.554	$ 11.598.428.904
AGOSTO	$ 4.981.061.088	$ 16.579.489.992
SEPTIEMBRE	$ 5.045.481.095	$ 21.624.971.087

OCTUBRE	$ 4.881.104.627	$ 26.506.075.715
NOVIEMBRE	$ 4.722.234.871	$ 31.228.310.586
DICIEMBRE	$ 5.855.995.255	$ 37.084.305.841

VIGENCIA A EJEUCTAR HASTA DICIEMBRE DE 2025	$ 43.266.541.356,00

9.4 CONCLUSIONES PROGRAMACIÓN DE OBRA

A la fecha el contratista no ha radicado la programación de obra definitiva, se está a la espera de que se culminen los diseños hidráulicos definitivos, además, al igual que la actualización de la programación de obra en Project debidamente diligenciada, que informe de la ruta crítica real, predecesoras y sucesoras de las actividades contractuales.

9.5 CONCLUSIONES COMPONENTE PMA

Durante el periodo evaluado, se ha verificado que el contratista ha implementado diversas acciones para mitigar impactos ambientales, incluyendo medidas de control de material particulado, disposición adecuada de residuos y cumplimiento de los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Se han llevado a cabo comités y mesas de trabajo, logrando avances en la gestión de trámites ambientales y la aprobación de documentos clave, como el PMA.

Como resultado de la reunión del 26 de marzo, se definieron las responsabilidades del contratista respecto a la justificación del cambio menor al PMA y la presentación del Documento PAGA para las obras del tanque de tormentas, Actualmente, el contratista ha cumplido con la elaboración del documento de justificación del cambio menor, quedando a la espera de revisión por parte de la interventoría.

Se han identificado afectaciones ambientales, particularmente en relación con la dispersión de material particulado debido a condiciones climáticas adversas. Sin embargo, el contratista ha adoptado medidas de mitigación, como la humectación de las zonas intervenidas.

Se ha verificado la entrega periódica de informes ambientales por parte del contratista, lo que permite mantener un control adecuado sobre las actividades realizadas y garantizar la alineación con la normativa ambiental vigente.

9.6 ALCANCE DE SEGUROS

A la fecha el contratista tiene las pólizas aprobadas de la última actualización (acta de Inicio) desde el 13 de septiembre de 2024, mientras que la interventoría las tiene aprobadas desde el 29 de octubre de 2024. No se han realizado modificaciones contractuales.

9.7 ALCANCE EVALUACIÓN DE RIESGOS.

Dentro del Anexo 16, se evidencia el análisis de la gestión del riesgo del contrato de obra.

9.8 ALCANCE CONTABLE DURANTE EL PERIODO.

Durante el presente mes el contratista de obra ha presentado las siguientes facturas a la entidad:

ACTA	FACTURA	VALOR
4	No. FE 5	$ 2,489,467,397.56

9.9 OTROS PROBLEMAS DE GESTIÓN.

La interventoría recibe las observaciones de acuerdo a la documentación referentes al acta del periodo del mes anterior, realiza las respectivas correcciones y se encuentra en tramite para la viabilización del mismo.

10. FORMATOS DE CONTROL

10.1 RELACIÓN PERSONAL OBRA.

La relación de personal a la fecha se encuentra dentro del numeral 6.4.1.

10.2RELACIÓN PERSONAL INTERVENTORÍA.

La relación de personal a la fecha se encuentra dentro del numeral 6.4.2.

10.3RELACIÓN EQUIPOS.

La relación de equipos a la fecha se encuentra dentro del numeral 6.4.3.

10.4 ORDENES DE TRABAJO.

Durante el presente mes el contratista realizo la ejecución de las actividades contempladas en el siguiente plan de trabajo:

Tabla 24. PROGRAMACIÓN CONTRATISTA PRESENTE MES.

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
					1	2
					Rellenos Extendida de material y sellado de material costado norte	festivo
3	4	5	6	7	8	9
Rellenos franja de seguridad costado norte	Rellenos franja de seguridad costado norte	Rellenos franja de seguridad costado norte	Rellenos franja de seguridad costado norte	Rellenos franja de seguridad costado norte	Rellenos franja de seguridad costado norte	festivo
10	11	12	13	14	15	16
Rellenos franja de seguridad costado norte	Rocería manual cabecera 28	Rellenos franja de seguridad costado norte	Descapote franja de seguridad norte tercera tira.	Rellenos franja de seguridad costado norte	Rellenos franja de seguridad costado norte	festivo
17	18	19	20	21	22	23
Descargue de material franja costado norte	Extendida de material y sellado de material	Extendida de material y sellado de material	Control y niveles de material extendido franja norte.	Rellenos Extendida de material y sellado de material	Rellenos Extendida de material y sellado de material	festivo
24	25	26	27	28	29	30
Rocería manual en canales de desagües costado norte.	Humectación franja de seguridad costado norte.	Construcción bodega para almacenamiento de materiales.	Construcción bodega para almacenamiento de materiales.	Compactación y sello material extendido en franja de seguridad costado norte	Compactación y sello material extendido en franja de seguridad costado norte	Compactación y sello material extendido en franja de seguridad costado norte
31						

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Compactación y sello material extendido en franja de seguridad costado norte						

10.5 MATERIALES EN OBRA Y PROGRAMADOS PARA EL LABOR.

Se hace seguimiento a la programación semanal que envía el contratista de obra a las actividades de construcción que se van a desarrollar durante el transcurso de la obra.

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Tabla 25. Registro fotográfico.



Cargue de material a transportar desde centro de acopio a la franja de seguridad



Descargue de material y extendida franja costado norte.



Sellado de material costado franja norte.



Humectación de material franja de seguridad norte.



Control de lleno franja costado norte (comisión topografía).



Limpieza manual de material en borde de pista norte.



Verificación de ancho franja costado sur.

12. GESTIÓN CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO CON SOPORTES.

12.1 GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

En el anexo No. 4 se muestra el estado de la correspondencia enviada al correo oficial de la interventoría.

12.2 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.

A continuación, las actas de comité de obra se evidencian dentro del numeral 5.2 COMITÉS Y AVANCES POR COMPROMISO.

12.3 LIBRO DE OBRA.

En el anexo No. 9 se presenta el libro de obra.

12.4 CERTIFICACIONES Y FICHAS TÉCNICAS.

12.4.1 CERTIFICADOS CALIBRACIÓN CONTRATISTA DE OBRA.

En el anexo No. 13, la descripción de los equipos del contratista se encuentra dentro de la Tabla 17. Equipo Contratista.

12.4.2 CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN INTERVENTORÍA.

En el anexo No.13, la descripción de los equipos de la interventoría se encuentra dentro de la Tabla 18. Equipos de interventoría.

13. PLAN DE CARGAS DE LA INTERVENTORÍA.

13.1 EJECUTADO MES VENCIDO PLAN DE CARGAS.

A la fecha la interventoría lleva el siguiente avance:

Tabla 25. AVANCE PLAN DE CARGAS INTERVENTORÍA.

	Programado	Ejecutado	Observación
Valor (etapa de preconstrucción)	592.960.000,00	592.960.000,00	Valor equivalente al monto ejecutado y programados durante la etapa de preconstrucción
Porcentaje ejecutado con respecto al valor contractual (etapa de preconstrucción)	7,68%	7,68%	Porcentaje equivalente al monto ejecutado y programados durante

			la etapa de preconstrucción
Valor ejecutado (etapa de construcción hasta el presente mes)	$201,578,596.00	$201,578,596.00	Valor mensual ejecutado de la última acta aprobada
Porcentaje ejecutado (etapa de construcción presente mes)	2,61%	2,61%	Porcentaje ejecutado mensual de la última acta aprobada
Valor ejecutado acumulado hasta el presente mes	$1.207.669.089	$1.207.669.089	Valor ejecutado acumulada hasta la ultima acta aprobada
Porcentaje ejecutado hasta el presente mes con respecto al contrato de interventoría	15,63%	15,63%	Porcentaje ejecutado acumulada hasta la última acta aprobada

14. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE GERENCIA.

14.1 SEGUIMIENTO DE GESTIÓN Y CONTROL TRABAJO.

Una vez revisado el anexo técnico del contratista de obra, el contratista realiza la entrega de planes y programas a la interventoría, tal como se relaciona en la **tabla 10 (Matriz radicación Trámites)** del presente informe.

14.2 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO.

Durante el periodo se realiza el comité de seguimiento donde se revisaron las actividades pertinentes para los ajustes necesarios al diseño hidráulico y la verificación y actualización de los componentes ambientales.

14.3 INFORME CONTROL DE CAMBIOS.

A la fecha no se han presentado cambios en el proyecto. Se está a la espera de que el contratista entregue el presupuesto definitivo con los ítems no previstos para verificar las metas físicas del contrato de obra.

14.4 INFORME DE VALIDACIÓN Y CONTROL DE ALCANCE.

Se realiza el seguimiento de metas físicas ejecutadas hasta la fecha y durante el periodo tal como se muestra en el anexo 19 (acta de obra). Sin embargo, es importante mencionar que, la inclusión del lote 6 representa modificaciones en las redes de conducción, volumen hidráulico inicial y la adecuación de una vía adicional dentro del nuevo predio colindante.

14.5 INFORME DE CONTROL DE CRONOGRAMA.

A la fecha el contratista ha ejecutado las actividades planeadas que están dentro de su plan de trabajo de la etapa de construcción.

14.6 INFORME DE CONTROL DE COSTOS.

De acuerdo con las actas parciales de obra el contratista ha ejecutado los siguientes rubros:

Tabla 28. Resumen contable del contrato de obra.

Cobro	Factura	Valor acta	Valor Anticipo	Valor Después Amortización
1	FE 3	$ 536.680.480,00	$187.838.168,00	$ 348.842.312,00
2	FE 2	$ 1.439.542.701,00	$503.839.945,00	$ 935.702.756,00
3	FE 4	$ 1,716,544,936,00	$600.790.728,00	$ 1.115.754.208,00
4	FE 5	$ 2,489,467,398,00	$871.313.589,00	$ 1.618.153.809,00
Total cobrado		$ 6.182.235.515,00	$2.163.782.430,00	$ 4.018.453.085,00
Total proyecto		$56.738.847.471,00	$11.884.371.800,00	$44.854.475.671,00
Pendiente Proyecto		$50.556.611.956,00	$9.720.589.370,00	$40.836.022.586,00
Porcentaje Avance		10,90%	18,21%	8,96%

Tabla 29. Resumen contable del contrato de Interventoría.

Cobro	Factura	Valor acta
1	FE 1	$ 253.394.614,00
2	FE 4	$ 530.691.722,00
3	FE 5	$ 222.004.157,00
4	FE 6	$ 201.578.596,00
Total cobrado		$ 1.207.669.089,00

Total proyecto	$ 7.724.841.670,00
Pendiente Proyecto	$ 6.517.172.581,00
Porcentaje Avance	15,63%

14.7 INFORME DE CONTROL DE LA CALIDAD.

De acuerdo al seguimiento de la correspondencia se informa que se está llevando el control de la comunicación entre contratista, interventoría y Aerocivil tal como se muestra dentro del Anexo No. 4. Adicionalmente, en el Anexo 17 se lleva el control de ensayos y se hace la descripción de los ensayos elaborados al material de relleno que se ha implementado para atender la emergencia de seguridad operacional en la franja de seguridad. Adicionalmente se muestra un resumen de los ensayos de laboratorio elaborados por el contratista de obra en la siguiente tabla:

Tabla 29. Ensayos elaborados presente mes contratista de obra.

1. MATERIAL IMPORTADO				
No. Consecutivo	**Nombre Descripción / ensayo**	**Norma**	**Rango de cumplimiento**	**Resultado del Ensayo**
1.1	Tamaño máximo, mm	INVE-123	(Dmáx ≤ 100 mm) según la norma INV E-123.	50,8 mm
1.2	% que pasa tamiz no. 10 (2 mm) en masa, máximo	INVE-123	(PP10 < 80 %) según la norma INV E-123.	31,70%
1.3	% que pasa tamiz 75 µm (no.200) en masa máximo	INVE-123	(PP200 < 25 %) según la norma INV E-123.	14,10%
1.4	Limite líquido, máximo (%)	INVE-125	(LL < 40 %), según la norma INV E-125 (Figura 220-1).	25,56%

1. MATERIAL IMPORTADO				
No. Consecutivo	**Nombre Descripción / ensayo**	**Norma**	**Rango de cumplimiento**	**Resultado del Ensayo**
1.5	Índice de plasticidad, máximo (%)	INVE-125	(IP < 10 %), según las normas INV E-125 e INV E-126 (Figura 220-1).	8,29%
1.6	CBR de laboratorio, mínimo (%)	INVE-148	(CBR ≥ 3), según la norma INV E-148.	72,53%
1.7	Contenido de sales solubles máximo (%)	E-158	Max: 0,2%	0,15%
2. MATERIAL DE CANTERA LA MILAGROSA, CUESTECITAS				
2.1	Granulometría % (ver resultados por tamizados en anexo 17 control de laboratorio)	ASTM C117 ASTM C136	2" (50 mm) ± 0 - 100	100%
2.2	Limite liquido %	ASTM D4318	MAX 25	18,83%
2.3	Índice de plasticidad %	ASTM D4318	MAX 5	2,85%
2.4	Densidad aparente - Proctor	ASTMD C29	>1,120 gr/cm3	2,269 gr/cm3 H: 6,4%
2.5	Equivalente de arena, mínimo.	E-133	MIN 30%	34%
2.6	Resistencia de material (F) - CBR (%)	E-133	MIN 30%	99,90%

14.8 INFORME SEGUIMIENTO COMUNICACIONES.

Dentro del anexo No. 4 se encuentra una tabla que hace el seguimiento a las comunicaciones emitidas tanto el contratista como la interventoría durante el presente mes.

14.9 INFORME SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS.

En el anexo 16 se evidencia el seguimiento a la matriz de riesgos en el presente mes.

14.10 INFORME DE GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS.

A la fecha ni al contratista ni a la interventoría han llegado partes interesadas para participar en este proyecto.

15. ANEXOS

Anexo 1 – Informes semanales de interventoría
Anexo 2 – Actas de comité
Anexo 3 – Formato estado del tiempo
Anexo 4 – Control de correspondencia del proyecto.
Anexo 5 – Correspondencia enviada y recibida por parte de la interventoría.
Anexo 6 – Registro fotográfico
Anexo 7 – Cronograma etapa de construcción
Anexo 8 – Pólizas
Anexo 9 – Copia bitácora de obra
Anexo 10 – Informe ambiental y SST
Anexo 11 –Formato Control Personal
Anexo 12 –Formato Control Equipos
Anexo 13 – Certificados y Fichas Técnicas.
Anexo 14 – Informe Mensual NO. 8 contratista de obra.
Anexo 15. – Cronograma Interventoría.
Anexo 16. – Informe No. 8 Seguimiento a la matriz de riesgos.
Anexo 17 – Control de ensayos de laboratorio.
Anexo 18 – Anticipo.
Anexo 19 – Acta de Obra.
Anexo 20 – Plano topográfico predios.
Anexo 21 – Informe social.

15.1 ANEXO 1 – INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 4

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA — **FECHA:** 8/03/2025

Semana No. 31 — **Del :** 1/03/2025 — AL: 7/03/2025

Plazo Total	730	días
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	219	días
Porcentaje del tiempo transcurrido(%)	**30,00%**	

Nombre del Supervisor : ALDEMAR PINZÓN

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

CONTRATO No. 23001170 H4 de 2023
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA

VALOR FISICO PROGRAMDO	Semanal	Acumulado	VALOR FISICIO EJECUTADO	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,75%	5,69%	**(%) Ejecutado**	0,00%	10,90%
Valor programado ($)	**$ 424.214.785,35**	**$ 3.231.258.939**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 0,00**	**$ 6.182.235.515**
			Evaluación — **Porcentaje Adelanto**		5,20%
			Valor Adelanto		**$ 2.950.976.576**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	Contratista:	CONSORCIO AIR RIO
Contrato No:	23001170 H4 de 2023	Contrato No:	23001282 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 56.738.847.471	Valor Inicial:	$ 7.724.841.670
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 56.738.847.471	Valor Actualizado al modificatorio :	$ 7.724.841.670
Valor actualizado 2:	$ 56.738.847.471	Valor actualizado 2:	$ 7.724.841.670
Plazo inicial:	31/7/2026	Plazo inicial:	31/7/2026
Plazo actualizado:	31/7/2026	Plazo actualizado:	31/7/2026
Fecha de iniciación:	1/8/2024	Fecha de iniciación:	1/8/2024
Fecha de vencimiento:	31/7/2026	Fecha de vencimiento:	31/7/2026
Modificatorio No. Prórroga No.	No Aplica	Modificatorio No. Prórroga No.	No aplica
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	No Aplica	Fecha de Terminación Según Prórroga No.	No aplica
Suspensión No.	No Aplica	Suspensión No.	No aplica
Periodo de Suspensión No.	No Aplica	Periodo de Suspensión No.	No aplica
Levantamiento de la suspensión No.	No Aplica	Levantamiento de la suspensión No.	No aplica
Nueva fecha de terminación	31/7/2026	Nueva fecha de terminación	31/7/2026
Valor total actual del contrato	$ 56.738.847.471	Valor total actual del contrato	$ 7.724.841.670

Continúan colas labores programadas para la semana como:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Informes Mensuales N° 4 V2: Actualmente, la interventoría está en proceso de revisión de las observaciones emitidas por la entidad el 25 de febrero de 2025, correspondientes al informe mensual N° 4 V2, radicado el 16 de febrero de 2025 bajo el comunicado 2025-786-RIO-0425.
Radicación de Acta N° 03, la Factura FE 4: se encuentra en proceso de corrección de las observaciones recibidas por la entidad el 26 de febrero de 2025, respecto a la lista de cheque del Acta N° 03, la Factura FE 4, correspondientes al CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023, Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF), Contratista Infraestructura Riohacha, se radicaron mediante el comunicado 2024-486-RIO-0506 del 21 de febrero de 2025. seguidamente la entidad emite requerimiento el día 6 de marzo de 2025.
Radicación de Acta N° 04, la Factura FE 5: Se radica Acta 04, Factura FE 5, CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023, Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF) mediante comunicado 2025-486-RIO-0604 el día 5 marzo de 2025. y se reciben observaciones el día 6 de marzo de la entidad. se recibe requerimiento por parte de la entidad el 6 de marzo de 2025, por lo que se procede a radicar las subsanaciones mediante comunicado 2025-486-RIO-0656 el día 7 de marzo de 2025.

ACTIVIDADES DE OBRA LADO AIRE

Debido a las festividades (Carnavales) programados por la alcaldía del municipio no se ejecuto obra los días 3 y 4 de marzo del presente año; además lo días 5, 6, 7 no se laboro en actividades propias de obra según contrato (no se conoce los motivos), al igual en centro de acopio de material (lote recientemente adquirido por la Aerocivil) no presento acopio del materia granular de préstamo para las actividades de relleno para las franjas de seguridad de la pista. Además el contratista de obra emite comunicado informando de no actividades de obra.
POR LO ANTERIOR NO SE GENERO REGISTRO FOTOGRAFICO REFERENTE A LA OBRA.

FINANCIERO:

*Según los gastos causados por parte de los contratistas tanto de obra como de interventoría se obtiene un avance de obra causado del 10,90%, equivalente a $ 6.182.235.515,00; ver tabla avance financiero según contrato de obra. Y por parte de la interventoría presenta un avance causado del 15,63% equivalente a $1.207.669.089,00; ver tabla avance financiero interventoría.

AMBIENTAL:


AMBIENTAL:
*Durante el periodo, en cuanto a la gestión ambiental, se llevó a cabo la humectación de la vía. Se evidenció que, a la fecha, se vienen realizando actividades de humectación en la zona de entrada y salida de las volquetas que transportan el material (terraplén), con una frecuencia de 2 a 3 veces al día. Estas acciones tienen como propósito mitigar las emisiones de material particulado al aire, contribuyendo a la prevención y mitigación de posibles afectaciones tanto a los transeúntes como a la comunidad aledaña.
Se informa sobre los siguientes avances:
*Gestión de Permisos Ambientales: Se ha iniciado un análisis exhaustivo para identificar y gestionar los permisos ambientales requeridos para la intervención del nuevo predio, en estricto cumplimiento con los requisitos establecidos por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), autoridad ambiental competente.
*Medidas Preventivas Adicionales:
*Gestión Ambiental:
Mediante el comunicado 2024-486-RIO-0582, emitido el 3 de marzo de 2025, la interventoría convocó a una mesa de trabajo con la contratista para revisar y ajustar conjuntamente el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Asimismo, en la misma fecha, a través del comunicado 2024-486-RIO-0580, se solicitaron a la contratista los informes ambientales correspondientes al mes de febrero.
Posteriormente, el 5 de marzo de 2025, la interventoría emitió el comunicado 2025-486-RIO-0611 en respuesta al comunicado INFRH-AMB-002-2025, referente a las gestiones que deben realizarse antes del inicio de las actividades de obra, conforme a lo estipulado en las especificaciones técnicas.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

El día 01 de marzo del 2025 solo se realizaron actividades de inducción al personal, no hubo trabajos en obra.

PERSONAL OBRA

Personal de Interventoría	**9**
Personal del Contratista	**29**
Total Personal en Obra	**38**

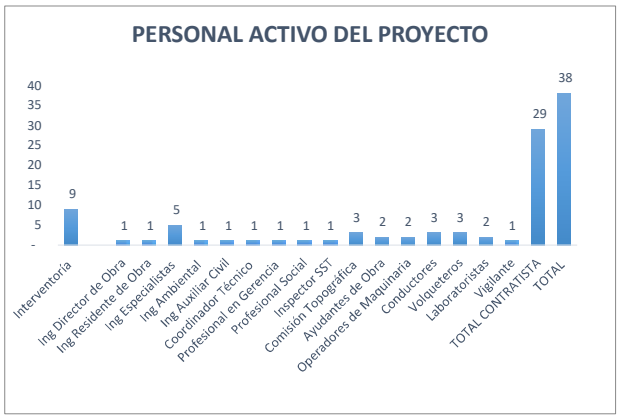



EMPLEOS GENERADOS

Empleos Directos	**32**
Empleos Indirectos	**6**

POBLACIÓN BENEFICIADA

La población beneficiada por el proyecto es la del departamento de La Guajira, la cual está proyectada para el año 2024 en aproximadamente 1.057.252 personas, según datos del DANE.

BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES

Según el anexo técnico del contrato de obra, los beneficios técnicos incluyen la seguridad operacional, lo que garantiza un entorno más seguro para las operaciones aéreas, reduciendo riesgos y accidentes. Por su parte, los beneficios a nivel social, implican el impulso al desarrollo regional, por medio del fomento del turismo, el comercio y el intercambio cultural en Riohacha y La Guajira, generando nuevas oportunidades económicas para las comunidades locales.

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Excavadora Hidráulica de oruga	2	0	
Retrocargador de neumáticos	2	0	
Fresadora asfalto	1	0	
Volquetas de 15 m3	4	4	inoperativa
Vibro compactador	2	1	inoperativa
Motoniveladora	2	1	inoperativa
Carrotanque	1	1	inoperativa
Terminadora de asfalto con sensores	1	1	inoperativa
Equipo para mezcla de concreto	1	1	inoperativa
Equipo Topográfico de Alta Precisión	1	1	inoperativa
Hidro lavadora	1	0	inoperativa
Minicargador con accesorios	1	1	inoperativa
Camioneta con platón	1	1	inoperativa
Luminaria (planta estadio)	0	2	inoperativa
Total Maquinaria	**20**	**14**	

AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	01/08/2024 al 30/11/2024	$ 536.680.480,00
2	01/12/2024 al 31/12/2024	$ 1.439.542.701,00
3	01/01/2025 al 31/01/2025	$ 1.716.544.936,00
4	01/02/2025 al 28/02/2025	$ 2.489.467.398,00
5		
6		
7		
8		
13		
14		
15		
Total Acumulado	**$ 6.182.235.515,00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 56.738.847.471,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 6.182.235.515,00
% Avance facturado Acumulado
10,90%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	01/08/2024 al 30/09/2024	$ 253.394.614,00
2	01/10/2024 al 30/11/2024	$ 530.691.722,00
3	01/12/2024 al 31/12/2024	$ 222.004.157,00
4	01/01/2025 al 31/01/2025	$ 201.578.596,00
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	**$ 1.207.669.089,00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato interventoría
$7.724.841.670,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$1.207.669.089,00
% Avance facturado Acumulado
15,63%

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1, En esta semana no hubo actividades de obras desconociéndose los motivos, lo cual genera preocupación ya que no llegaran a cumplir con las metas establecidas (vigencias futuras) planteadas por la AEROCIVIL. 2, Urgente definir los lineamientos a seguir con respecto a los requerimientos ambientales necesarios para incorporar el nuevo lote del costado occidental al proyecto. 3, Urgente entregar los diseños de la red hidráulica pluvial incorporando el sistema al nuevo lote, además de entregar el balance con los mayores y menores cantidades adicionando las actividades no previstas, también se debe programar nuevamente la obra adicionando las cantidades no previstas y los cambios por mayores y memores cantidades en "Project debidamente realizado y en Excel". 4, Se le recomienda al contratista de obra que debe tener en cuenta los valores de las vigencias futuras en la programación de obra ya que deberá ejecutar aproximadamente $3.500.000.000 de pesos mensuales en el presente año. 5, Programación de obra contractual: no se tiene una programación de obra en Project debidamente diligenciado que informe de la ruta critica, predecesoras y sucesoras de las actividades contractuales.	 **SANTIAGO PAEZ TALERO**

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: 1 de 4**

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA — **FECHA:** 15/03/2025

Semana No.	32	**Del :**	8/03/2025	AL:	14/03/2025

Plazo Total	730	días
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	226	días
Porcentaje del tiempo transcurrido(%)	**30,96%**	

Nombre del Supervisor : ALDEMAR PINZÓN

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

CONTRATO No. 23001170 H4 de 2023
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA

VALOR FISICO PROGRAMDO	**Semanal**	**Acumulado**	**VALOR FISICIO EJECUTADO**	**Semanal**	**Acumulado**
(%) Programado	0,75%	6,44%	**(%) Ejecutado**	0,02%	10,92%
Valor programado ($)	**$ 424.214.785,35**	**$ 3.655.473.724**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 11.347.769,49**	**$ 6.193.583.285**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	4,47%
				Valor Adelanto	**$ 2.538.109.560**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	Contratista:	CONSORCIO AIR RIO
Contrato No:	23001170 H4 de 2023	Contrato No:	23001282 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 56.738.847.471	Valor Inicial:	$ 7.724.841.670
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 56.738.847.471	Valor Actualizado al modificatorio :	$ 7.724.841.670
Valor actualizado 2:	$ 56.738.847.471	Valor actualizado 2:	$ 7.724.841.670
Plazo inicial:	31/7/2026	Plazo inicial:	31/7/2026
Plazo actualizado:	31/7/2026	Plazo actualizado:	31/7/2026
Fecha de iniciación:	1/8/2024	Fecha de iniciación:	1/8/2024
Fecha de vencimiento:	31/7/2026	Fecha de vencimiento:	31/7/2026
Modificatorio No. Prórroga No.	No Aplica	Modificatorio No. Prórroga No.	No aplica
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	No Aplica	Fecha de Terminación Según Prórroga No.	No aplica
Suspensión No.	No Aplica	Suspensión No.	No aplica
Periodo de Suspensión No.	No Aplica	Periodo de Suspensión No.	No aplica
Levantamiento de la suspensión No.	No Aplica	Levantamiento de la suspensión No.	No aplica
Nueva fecha de terminación	31/7/2026	Nueva fecha de terminación	31/7/2026
Valor total actual del contrato	$ 56.738.847.471	Valor total actual del contrato	$ 7.724.841.670

Continúan colas labores programadas para la semana como:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Radicación de Acta Ni 03, la Factura FE 4: se emite las correcciones mediante comunicado 2025-486-RIO-0713 el 14 de marzo de 2025.
Radicación de Acta Ni 04, la Factura FE 5: se recibe indicaciones por parte de la entidad el 12 de marzo de 2025, referente a la acta Ni 4 radicada mediate comunicado 2025-486-RIO-0656 el día 7 de marzo de 2025.
Comité técnico: el día 12 de marzo se realiza comité técnico en instalaciones de la Aerocivil en Bogotá, se trataron temas ambientales y del estado actual de los diseños adecuando el proyecto al lote recientemente integrado al proyecto costado occidental de la cabecera 10.
Informes semanales: Se radica informe semanal Ni 22 mediante comunicado 2025-486-RIO-0668 el día 10 de marzo de 2025. En la misma fecha se recibe la aprobación por la entidad mediate correo electrónico.

ACTIVIDADES DE OBRA LADO AIRE

* Se inician actividades a partir del día 13 de marzo con acopio de material granular en el lote nuevo costado occidental de la cabecera 10.
* Continúan actividades con traslado del material acopiado en el lote a la franja de seguridad del costado norte de la pista, además se extiende el material granular importado a completar 34m de ancho en el costado norte de la pista,.
* Continúan trabajos de compactación y sellado del material extendido en el costado norte de la pista y se revisa con topografía tanto niveles como anchos extendidos a 34m.costado norte de pista.
* Aseo y retiro de materia sobrante tanto en borde de pista como tapas correspondientes a las cajas de inspección de las luces de borde y papi del costado norte de pista.

FINANCIERO:

*Según los gastos causados por parte de los contratistas tanto de obra como de interventoría se obtiene un avance de obra causado del 10,90%, equivalente a $ 6.182.235.515,00; ver tabla avance financiero según contrato de obra. Y por parte de la interventoría presenta un avance causado del 19,05% equivalente a $1.471.437.529,00; ver tabla avance financiero interventoría.

AMBIENTAL:


Durante el periodo, en cuanto a la gestión ambiental, se llevó a cabo la humectación de la vía. Se evidenció que, a la fecha, se vienen realizando actividades de humectación en la zona de entrada y salida de las volquetas que transportan el material (terraplén), con una frecuencia de 2 a 3 veces al día. Estas acciones tienen como propósito mitigar las emisiones de material particulado al aire, contribuyendo a la prevención y mitigación de posibles afectaciones tanto a los transeúntes como a la comunidad aledaña.
Se informa sobre los siguientes avances:
*Gestión de Permisos Ambientales: Se ha iniciado un análisis exhaustivo para identificar y gestionar los permisos ambientales requeridos para la intervención del nuevo predio, en estricto cumplimiento con los requisitos establecidos por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), autoridad ambiental competente.
*Medidas Preventivas Adicionales:
Gestión Ambiental:
Mediante el comunicado 2024-486-RIO-0580, emitido el 3 de marzo de 2025, la interventoría convocó a una mesa de trabajo con la contratista para revisar y ajustar conjuntamente el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Esta reunión se llevó a cabo el 12 de marzo de 2025, durante la cual se realizaron los ajustes necesarios para la aprobación del documento. A partir de esto, la contratista envió el 14 de marzo de 2025, el comunicado INFRH-AMB-003-2025 con el PMA actualizado.
El 5 de marzo de 2025, la interventoría emitió el comunicado 2025-486-RIO-0611 en respuesta al comunicado INFRH-AMB-002-2025, el cual esta relacionado con las gestiones a realizar antes del inicio de las actividades de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta por parte de la contratista.
Adicionalmente, a través del comunicado 2024-486-RIO-0669, el día 10 de marzo de 2025 se presentaron observaciones a la contratista, solicitando la elaboración de un informe ambiental mensual. Este informe debe ser complementado con la inclusión de la totalidad de soportes y evidencias de las actividades reportadas.


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Se revisan afiliaciones al sistema de seguridad social en el trabajo del personal de obra. también se revisan los elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo, continúan revisiones de las condiciones laborales del personal en obra cumpliendo con el plan SST. Se generan actividades de inducción y comportamiento al personal en obra.

PERSONAL OBRA

Personal de Interventoría	**9**
Personal del Contratista	**29**
Total Personal en Obra	**38**

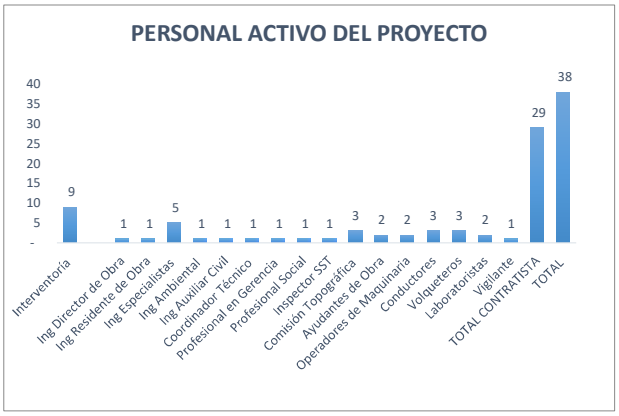

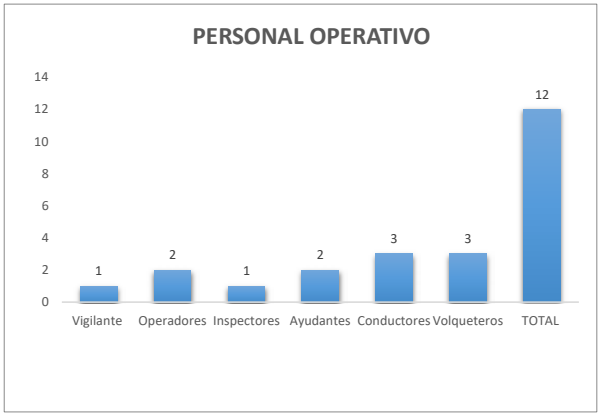

EMPLEOS GENERADOS

Empleos Directos	**32**
Empleos Indirectos	**6**

POBLACIÓN BENEFICIADA

La población beneficiada por el proyecto es la del departamento de La Guajira, la cual está proyectada para el año 2024 en aproximadamente 1.057.252 personas, según datos del DANE.

BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES

Según el anexo técnico del contrato de obra, los beneficios técnicos incluyen la seguridad operacional, lo que implica una mejora en el nivel de servicio de las operaciones aeronáuticas dentro del aeropuerto. Este mejoramiento conlleva a un aumento en la demanda, generando así mayores ingresos por turismo en la región.

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Excavadora Hidráulica de oruga	2	0	
Retrocargador de neumáticos	2	0	
Fresadora asfalto	1	0	
Volquetas de 15 m3	4	4	Activo
Vibro compactador	2	1	Activo
Motoniveladora	2	1	Activo
Carrotanque	1	1	Activo
Terminadora de asfalto con sensores	1	1	inoperativa
Equipo para mezcla de concreto	1	1	inoperativa
Equipo Topográfico de Alta Precisión	1	1	Activo
Hidro lavadora	1	0	
Minicargador con accesorios	1	1	Activo
Camioneta con platón	1	1	Activo
Luminaria	0	2	Activo
Total Maquinaria	**20**	**14**	

AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	01/08/2024 al 30/11/2024	$ 536.680.480,00
2	01/12/2024 al 31/12/2024	$ 1.439.542.701,00
3	01/01/2025 al 31/01/2025	$ 1.716.544.936,00
4	01/02/2025 al 28/02/2025	$ 2.489.467.398,00
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado		$ 6.182.235.515,00

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 56.738.847.471,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 6.182.235.515,00
% Avance facturado Acumulado
10,90%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoria No.	Periodo	Costo Total
1	01/08/2024 al 30/09/2024	$ 253.394.614,00
2	01/10/2024 al 30/11/2024	$ 530.691.722,00
3	01/12/2024 al 31/12/2024	$ 222.004.157,00
4	01/01/2025 al 31/01/2025	$ 201.578.596,00
5	01/02/2025 al 28/02/2025	$ 263.768.440,00
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado		$ 1.471.437.529,00

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato interventoria
$7.724.841.670,00
Valor facturado Contrato Interventoria
$1.471.437.529,00
% Avance facturado Acumulado
19,05%

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descargue de material franja costado norte



Descapote franja de seguridad norte tercera tira



Extendida de material importado franja norte



Sellado de material importado franja costado norte



Extendida de material franja seguridad total 38m norte



Inducción de seguridad en el trabajo personal contratista de obra



Control y niveles de material extendido franja norte pista



Control de niveles franja de seguridad costado norte pista

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1, Se reinician actividades el día 17 de marzo. 2, Urgente definir los lineamientos a seguir con respecto a los requerimientos ambientales necesarios para incorporar el nuevo lote del costado occidental al proyecto. 3, Urgente entregar los diseños de la red hidráulica pluvial incorporando el sistema al nuevo lote, además de entregar el balance con los mayores y menores cantidades adicionando las actividades no previstas, también se debe programar nuevamente la obra adicionando las cantidades no previstas y los cambios por mayores y memores cantidades en (Project debidamente realizado y Excel), 4, Se le recomienda al contratista de obra que debe tener en cuenta los valores de las vigencias futuras en la programación de obra ya que deberá ejecutar aproximadamente $3.500.000.000 de pesos mensuales en el presente año. 5, Programación de obra contractual: no se tiene una programación de obra en Project debidamente diligenciado que informe de la ruta critica, predecesoras y sucesoras de las actividades contractuales.	SANTIAGO PAEZ TALERO

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: 1 de 4**

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA **FECHA:** 22/03/2025

Semana No. 33 **Del :** 15/03/2025 AL: 21/03/2025

Plazo Total	730	días
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	233	días
Porcentaje del tiempo transcurrido(%)	**31,92%**	

Nombre del Supervisor : ALDEMAR PINZÓN

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

CONTRATO No. 23001170 H4 de 2023
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA

VALOR FISICO PROGRAMDO	**Semanal**	**Acumulado**	**VALOR FISICIO EJECUTADO**	**Semanal**	**Acumulado**
(%) Programado	0,75%	7,19%	**(%) Ejecutado**	0,98%	11,90%
Valor programado ($)	**$ 424.214.785,35**	**$ 4.079.688.510**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 556.040.705,22**	**$ 6.749.623.990**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	4,71%
				Valor Adelanto	**$ 2.669.935.480**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	Contratista:	CONSORCIO AIR RIO
Contrato No:	23001170 H4 de 2023	Contrato No:	23001282 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 56.738.847.471	Valor Inicial:	$ 7.724.841.670
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 56.738.847.471	Valor Actualizado al modificatorio :	$ 7.724.841.670
Valor actualizado 2:	$ 56.738.847.471	Valor actualizado 2:	$ 7.724.841.670
Plazo inicial:	31/7/2026	Plazo inicial:	31/7/2026
Plazo actualizado:	31/7/2026	Plazo actualizado:	31/7/2026
Fecha de iniciación:	1/8/2024	Fecha de iniciación:	1/8/2024
Fecha de vencimiento:	31/7/2026	Fecha de vencimiento:	31/7/2026
Modificatorio No. Prórroga No.	No Aplica	Modificatorio No. Prórroga No.	No aplica
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	No Aplica	Fecha de Terminación Según Prórroga No.	No aplica
Suspensión No.	No Aplica	Suspensión No.	No aplica
Periodo de Suspensión No.	No Aplica	Periodo de Suspensión No.	No aplica
Levantamiento de la suspensión No.	No Aplica	Levantamiento de la suspensión No.	No aplica
Nueva fecha de terminación	31/7/2026	Nueva fecha de terminación	31/7/2026
Valor total actual del contrato	$ 56.738.847.471	Valor total actual del contrato	$ 7.724.841.670

Continúan colas labores programadas para la semana como:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Radicación de Acta N° 03, la Factura FE 4: Se encuentra en tramite el Acta N° 3 radicado mediante comunicado 2025-486-RIO-0713 el 14 de marzo de 2025.
Radicación de Acta N° 04, la Factura FE 5: Se reciben observaciones por parte de la entidad el 12 de marzo de 2025, referente a la acta N° 4 radicada mediate comunicado 2025-486-RIO-0656 el día 7 de marzo de 2025.
Informes semanales: Se radica informe semanal N° 22 mediante comunicado 2025-486-RIO-0668 el día 10 de marzo de 2025. En la misma fecha se recibe la aprobación por la entidad mediate correo electrónico.
Plan de Acción Social: El 17 de marzo de 2025, se remitió a la Aerocivil el Plan de Gestión Social de la interventoría mediante el comunicado 2025-486-RÍO-0730 y radicado 2025192030032765.

ACTIVIDADES DE OBRA LADO AIRE

* se realizan trabajos de humectación de las franjas de seguridad y zonas de recorrido de la volquetas.
* Continúan actividades con traslado del material acopiado en el lote a la franja de seguridad del costado norte de la pista, además se extiende el material granular importado costado norte de la pista,.
* Continúan trabajos de compactación y sellado del material extendido en el costado norte de la pista.
* Siguen trabajos de topografía midiendo tanto niveles como áreas y longitudes del material extendido
* Aseo y retiro de materia sobrante tanto en borde de pista como tapas correspondientes a las cajas de inspección de las luces de borde y papi del costado norte de pista.

FINANCIERO:

*Según los gastos causados por parte de los contratistas tanto de obra como de interventoría se obtiene un avance de obra causado del 10,90%, equivalente a $ 6.182.235.515,00; ver tabla avance financiero según contrato de obra. Y por parte de la interventoría presenta un avance causado del 19,05% equivalente a $1.471.437.529,00; ver tabla avance financiero interventoría.

AMBIENTAL:


Durante el periodo, en cuanto a la gestión ambiental, se llevó a cabo la humectación de la vía. Se evidenció que, a la fecha, se vienen realizando actividades de humectación en la zona de entrada y salida de las volquetas que transportan el material (terraplén), con una frecuencia de 2 a 3 veces al día. Estas acciones tienen como propósito mitigar las emisiones de material particulado al aire, contribuyendo a la prevención y mitigación de posibles afectaciones tanto a los transeúntes como a la comunidad aledaña. Se informa sobre los siguientes avances:
*Gestión de Permisos Ambientales: Se ha iniciado un análisis exhaustivo para identificar y gestionar los permisos ambientales requeridos para la intervención del nuevo predio, en estricto cumplimiento con los requisitos establecidos por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), autoridad ambiental competente.
*Medidas Preventivas Adicionales:
Gestión Ambiental: El 19 de marzo de 2025, la interventoría, mediante el comunicado 2025-486-RIO-0755, respondió al comunicado INFRH-AMB-003-2025 adjuntando el Plan de Manejo Ambiental (PMA) actualizado y otorgando su aprobación al documento.
Por otra parte, el 5 de marzo de 2025, la interventoría emitió el comunicado 2025-486-RIO-0583 en respuesta al comunicado INFRH-AMB-002-2025, relacionado con las gestiones que deben adelantarse antes del inicio de las actividades de obra, según lo establecido en las especificaciones técnicas. A la fecha, no se ha recibido respuesta por parte de la contratista.
Asimismo, el 17 de marzo de 2025, la contratista remitió el comunicado INFRH-AMB-005-2025, en el cual presentó el informe ambiental solicitado por la interventoría mediante el comunicado 2024-486-RIO-0669, emitido el 10 de marzo de 2025.


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Se revisan afiliaciones al sistema de seguridad social en el trabajo del personal de obra. también se revisan los elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo, continúan revisiones de las condiciones laborales del personal en obra cumpliendo con el plan SST. Se generan actividades de inducción y comportamiento al personal en obra.

PERSONAL OBRA

Personal de Interventoría	**9**
Personal del Contratista	**29**
Total Personal en Obra	**38**

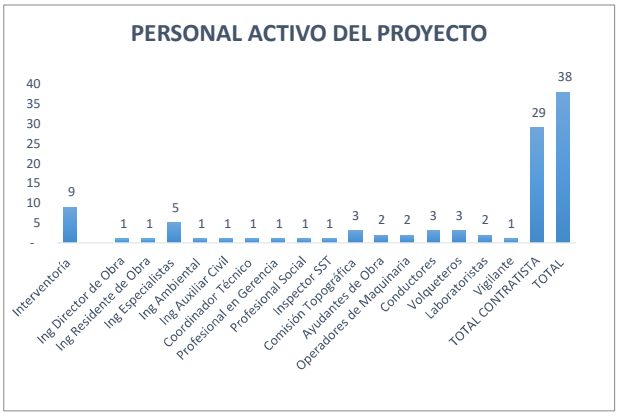

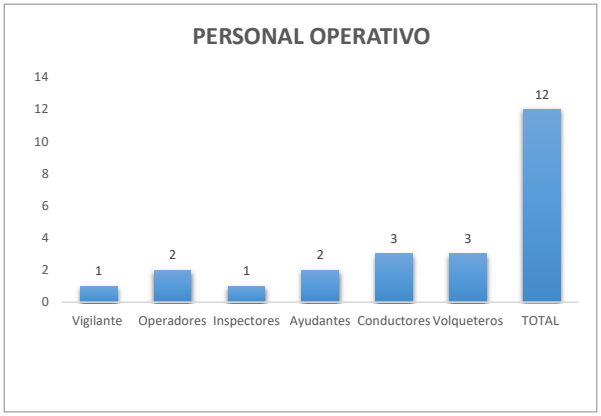

EMPLEOS GENERADOS

Empleos Directos	**32**
Empleos Indirectos	**6**

POBLACIÓN BENEFICIADA

La población beneficiada por el proyecto es la del departamento de La Guajira, la cual está proyectada para el año 2024 en aproximadamente 1.057.252 personas, según datos del DANE.

BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES

Según el anexo técnico del contrato de obra, las mejoras técnicas del proyecto contempladas en el contrato, permiten que el aeropuerto pueda ampliar su cobertura, atrayendo más aerolíneas y ofreciendo mayor confort a los viajeros, visitantes y empresas, mejorando la frecuencia del pasajeros y la atención de los mismos. Por su parte, a nivel social, la optimización del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha-La Guajira, puede posicionar al departamento como un emblema de progreso y desarrollo para la comunidad, fortaleciendo su sentido de identidad y orgullo regional.

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Excavadora Hidráulica de oruga	2	0	
Retrocargador de neumáticos	2	0	
Fresadora asfalto	1	0	
Volquetas de 15 m3	4	4	Activo
Vibro compactador	2	1	Activo
Motoniveladora	2	1	En Taller
Carrotanque	1	1	Activo
Terminadora de asfalto con sensores	1	1	inoperativa
Equipo para mezcla de concreto	1	1	inoperativa
Equipo Topográfico de Alta Precisión	1	1	Activo
Hidro lavadora	1	0	
Minicargador con accesorios	1	1	Activo
Camioneta con platón	1	1	Activo
Luminaria	0	2	Activo
Total Maquinaria	**20**	**14**	

AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	01/08/2024 al 30/11/2024	$ 536.680.480,00
2	01/12/2024 al 31/12/2024	$ 1.439.542.701,00
3	01/01/2025 al 31/01/2025	$ 1.716.544.936,00
4	01/02/2025 al 28/02/2025	$ 2.489.467.398,00
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	**$ 6.182.235.515,00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 56.738.847.471,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 6.182.235.515,00
% Avance facturado Acumulado
10,90%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	01/08/2024 al 30/09/2024	$ 253.394.614,00
2	01/10/2024 al 30/11/2024	$ 530.691.722,00
3	01/12/2024 al 31/12/2024	$ 222.004.157,00
4	01/01/2025 al 31/01/2025	$ 201.578.596,00
5	01/02/2025 al 28/02/2025	$ 263.768.440,00
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	**$ 1.471.437.529,00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato interventoría
$7.724.841.670,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$1.471.437.529,00
% Avance facturado Acumulado
19,05%

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descargue de material franja costado norte



Extendido de material tercera hilera costado norte en franja de seguridad



limpieza de material sobrante en hombro de la pista costado norte



Extendido de material importado franja costado norte



Compactación y sello material extendido en franja de seguridad costado norte



Cargue de material a transportar desde centro de acopio a la franja de seguridad



Extendido de material granular importado costado norte tercera hilera



Niveles y extendida de material franja norte

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1 Urgente definir los lineamientos a seguir con respecto a los requerimientos ambientales necesarios para incorporar el nuevo lote del costado occidental al proyecto. 2, Se le recomienda al contratista de obra que debe tener en cuenta los valores de las vigencias futuras en la programación de obra ya que deberá ejecutar aproximadamente $3.500.000.000 de pesos mensuales en el presente año. 3,Urgente entregar los diseños de la red hidráulica pluvial incorporando el sistema al nuevo lote, además de entregar el balance con los mayores y menores cantidades adicionando las actividades no previstas, también se debe programar nuevamente la obra adicionando las cantidades no previstas y los cambios por mayores y minores cantidades en (Project debidamente realizado y Excel), 4, A la fecha se evidencian ítems que no se les a dado inicio a pesar que están programados para la fecha del presente informe. 5, Programación de obra contractual: no se tiene una programación de obra en Project debidamente diligenciado que informe de la ruta critica, predecesoras y sucesoras de las actividades contractuales.	INCOPLAN S.A. **SANTIAGO PAEZ TALERO**

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: 1 de 4**

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA — **FECHA:** 1/04/2025

Semana No. 34 — **Del :** 22/03/2025 — AL: 31/03/2025

Plazo Total	730	días
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	243	días
Porcentaje del tiempo transcurrido(%)	**33,29%**	

Nombre del Supervisor : ALDEMAR PINZÓN

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

CONTRATO No. 23001170 H4 de 2023
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA

VALOR FISICO PROGRAMDO	Semanal	Acumulado	VALOR FISICIO EJECUTADO	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,75%	7,94%	**(%) Ejecutado**	0,94%	12,84%
Valor programado ($)	**$ 424.214.785,35**	**$ 4.503.903.295**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 534.634.043,29**	**$ 7.284.258.033**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	4,90%
				Valor Adelanto	**$ 2.780.354.738**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	Contratista:	CONSORCIO AIR RIO
Contrato No:	23001170 H4 de 2023	Contrato No:	23001282 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 56.738.847.471	Valor Inicial:	$ 7.724.841.670
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 56.738.847.471	Valor Actualizado al modificatorio :	$ 7.724.841.670
Valor actualizado 2:	$ 56.738.847.471	Valor actualizado 2:	$ 7.724.841.670
Plazo inicial:	31/7/2026	Plazo inicial:	31/7/2026
Plazo actualizado:	31/7/2026	Plazo actualizado:	31/7/2026
Fecha de iniciación:	1/8/2024	Fecha de iniciación:	1/8/2024
Fecha de vencimiento:	31/7/2026	Fecha de vencimiento:	31/7/2026
Modificatorio No. Prórroga No.	No Aplica	Modificatorio No. Prórroga No.	No aplica
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	No Aplica	Fecha de Terminación Según Prórroga No.	No aplica
Suspensión No.	No Aplica	Suspensión No.	No aplica
Periodo de Suspensión No.	No Aplica	Periodo de Suspensión No.	No aplica
Levantamiento de la suspensión No.	No Aplica	Levantamiento de la suspensión No.	No aplica
Nueva fecha de terminación	31/7/2026	Nueva fecha de terminación	31/7/2026
Valor total actual del contrato	$ 56.738.847.471	Valor total actual del contrato	$ 7.724.841.670

Continúan colas labores programadas para la semana como:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Acta N° 03 y Factura FE 4: El Acta N° 03, correspondiente a la Factura FE 4, fue radicada el 14 de marzo de 2025 mediante el Comunicado 2025-486-RIO-0713. Actualmente, se encuentra en trámite.
Acta N° 04 y Factura FE 5: El Acta N° 04, correspondiente a la Factura FE 5, fue radicada el 25 de marzo de 2025 mediante el Comunicado 024-486-RIO-0817, presentando observaciones. El día 31 de marzo de 025 se recibió comunicación de la entidad notificando que la factura asociada se encuentra en estado de trámite.
Informes Semanales: Los informes semanales correspondientes a los periodos 23 al 26 fueron aprobados por la entidad el 25 de marzo de 2025. Estos informes fueron radicados previamente el 22 de marzo de 2025 mediante el Comunicado 2025-486-RIO-0800.
Los informes semanales correspondientes a los periodos 27, 28, 29 y 30 fueron radicados el 28 de marzo de 2025 y recibieron la aprobación de la entidad el 31 de marzo de 2025.
Informe Mensual: El Informe Mensual N° 5 fue radicado el 31 de marzo de 2025 mediante el Comunicado 2025-486-RIO-0861.

ACTIVIDADES DE OBRA LADO AIRE

* actividades de levantamiento topográfico en el lote recientemente adquirido por la Aerocivil , además por visita de los jurídicos de la Aerocivil solicitan levantar predios pendientes por compra para determinar las ares reales de los lotes que se están negociando.
*Construcción de bodega para acopiar herramientas y materiales susceptibles de robo.
* Rocería manual en canales y limpieza de los mismos en el costado norte de la pista.
* Cargue de material centro de acopio hacia franja de seguridad costado norte
* Continua Extendida de material tercera hilera para un total de 34m. ancho franja de seguridad costado norte
* Sellado de material importado de seguridad costado de norte
* Retiro de material sobrante en hombro e pista constado norte
* Humectación franja de seguridad costado norte

FINANCIERO:

*Según los gastos causados por parte de los contratistas tanto de obra como de interventoría se obtiene un avance de obra causado del 10,90%, equivalente a $ 6.182.235.515,00; ver tabla avance financiero según contrato de obra. Y por parte de la interventoría presenta un avance causado del 19,05% equivalente a $1.471.437.529,00; ver tabla avance financiero interventoría.

AMBIENTAL:


*Durante el periodo, en cuanto a la gestión ambiental, sigue a cabo la humectación de la vía. Se evidenció que, a la fecha, se vienen realizando actividades de humectación en la zona de entrada y salida de las volquetas que transportan el material (terraplén), con una frecuencia de 2 a 3 veces al día. Estas acciones tienen como propósito mitigar las emisiones de material particulado al aire, contribuyendo a la prevención y mitigación de posibles afectaciones tanto a los transeúntes como a la comunidad aledaña. Se informa sobre los siguientes avances:
*Gestión de Permisos Ambientales: Se ha iniciado un análisis exhaustivo para identificar y gestionar los permisos ambientales requeridos para la intervención del nuevo predio, en estricto cumplimiento con los requisitos establecidos por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), autoridad ambiental competente.
*Medidas Preventivas Adicionales:
-Gestión Ambiental: El pasado 26 de marzo se llevó a cabo una reunión con la Aerocivil, en la cual se indicó que el contratista debía realizar las gestiones necesarias para efectuar un cambio menor al PMA del Aeropuerto Almirante Padilla. Posteriormente, el contratista el 28 de marzo envió el comunicado INFRH-AMB-010-2025 en respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0611, emitido el 5 de marzo, donde incluyendo el informe correspondiente al cambio menor, así mismo la interventoría el 31 de marzo emitió el comunicado 2025-486-RIO-0872. en el que se expusieron observaciones sobre el informe. Actualmente, se está a la espera de que el contratista dé respuesta a dichas observaciones.


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Se revisan afiliaciones al sistema de seguridad social en el trabajo del personal de obra. también se revisan los elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo, continúan revisiones de las condiciones laborales del personal en obra cumpliendo con el plan SST. Se generan actividades de inducción y comportamiento al personal en obra.

PERSONAL OBRA

Personal de Interventoría	**9**
Personal del Contratista	**31**
Total Personal en Obra	**40**

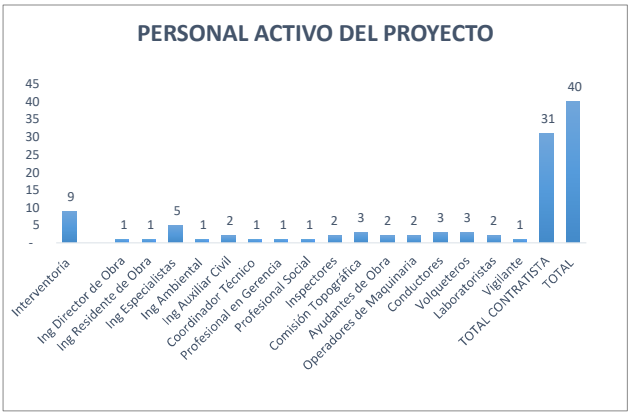

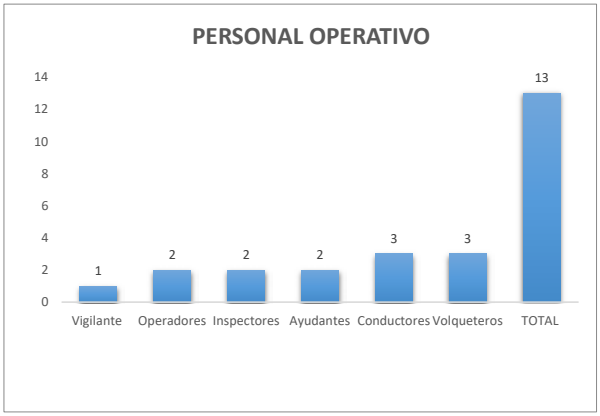

EMPLEOS GENERADOS

Empleos Directos	**34**
Empleos Indirectos	**6**

POBLACIÓN BENEFICIADA

La población beneficiada por el proyecto es la del departamento de La Guajira, la cual está proyectada para el año 2024 en aproximadamente 1.057.252 personas, según datos del DANE.

BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES

Según el anexo técnico del contrato de obra, los beneficios técnicos incluyen la seguridad operacional, lo que garantiza un entorno más seguro para las operaciones aéreas, reduciendo riesgos y accidentes. Por su parte, los beneficios a nivel social, implican el impulso al desarrollo regional, por medio del fomento del turismo, el comercio y el intercambio cultural en Riohacha y La Guajira, generando nuevas oportunidades económicas para las comunidades locales.

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Excavadora Hidráulica de oruga	2	0	
Retrocargador de neumáticos	2	0	
Fresadora asfalto	1	0	
Volquetas de 15 m3	4	4	Activo
Vibro compactador	2	1	Activo
Motoniveladora	2	1	En taller
Carrotanque	1	1	Activo
Terminadora de asfalto con sensores	1	1	inoperativa
Equipo para mezcla de concreto	1	1	inoperativa
Equipo Topográfico de Alta Precisión	1	1	Activo
Hidro lavadora	1		
Minicargador con accesorios	1	1	Activo
Camioneta con platón	1	1	Activo
Luminaria	0	2	Activo
Total Maquinaria	**20**	**14**	

AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	01/08/2024 al 30/11/2024	$ 536.680.480,00
2	01/12/2024 al 31/12/2024	$ 1.439.542.701,00
3	01/01/2025 al 31/01/2025	$ 1.716.544.936,00
4	01/02/2025 al 28/02/2025	$ 2.489.467.398,00
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	**$ 6.182.235.515,00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 56.738.847.471,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 6.182.235.515,00
% Avance facturado Acumulado
10,90%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoria No.	Periodo	Costo Total
1	01/08/2024 al 30/09/2024	$ 253.394.614,00
2	01/10/2024 al 30/11/2024	$ 530.691.722,00
3	01/12/2024 al 31/12/2024	$ 222.004.157,00
4	01/01/2025 al 31/01/2025	$ 201.578.596,00
5	01/02/2025 al 28/02/2025	$ 263.768.440,00
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	**$ 1.471.437.529,00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato interventoría
$7.724.841.670,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$1.471.437.529,00
% Avance facturado Acumulado
19,05%

REGISTRO FOTOGRAFICO



Rocería manual en canales de desagües costado norte



Deterioro cerramiento provisional en lotes adquirido por la AEROCIVIL



Levantamiento topográfico de linderos lotes



construcción bodega para almacenamiento de materiales



Humectación Franja de seguridad costado norte



Franja de seguridad costado sur



Extendida de material importado franja costado norte



Sellado de material importado franja de seguridad norte

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
* Programación de obra contractual: no se tiene una programación de obra en Project debidamente diligenciado que informe de la ruta critica, predecesoras y sucesoras de las actividades contractuales. * Permisos Ambientales Lote AEROCIVIL: Es urgente definir y gestionar todos los aspectos relacionados con los permisos ambientales del lote recientemente adquiridos por la AEROCIVIL. La demora en estos trámites podría impactar significativamente el cronograma general. * Entrega de Diseños hidráulicos Drenaje: Se requiere con urgencia la entrega de los diseños definitivos que incorporan el sistema de drenaje pluvial y/o hidráulico del aeródromo y el nuevo lote. Además, consideramos que la futura adquisición del lote # 06 sería de gran ayuda para optimizar el desarrollo de este sistema. * Ítems No Previstos y Programación: Se requiere urgentemente la identificación y entrega de los ítems no previstos que surjan de los nuevos diseños y ajustes necesarios. Así mismo, solicitamos la actualización de la programación de obra que incorpora estos cambios. * A la fecha se evidencian ítems y/o actividades programadas para este periodo que no han dado inicio ocasionando un atraso en la programación de obra. *Se le recomienda al contratista de obra que debe tener en cuenta los valores de las vigencias futuras en la programación de obra ya que deberá ejecutar aproximadamente $3.500.000.000 de pesos mensuales en el presente año.	INCOPLAN **SANTIAGO PÁEZ TALERO**

15.2 ANEXO 2 – ACTAS DE COMITÉ

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NÚMERO DE ACTA: **0015**

ÁREA:	***Técnica y Ambiental***		**PROCESO:**	**Contrato de Obra 23001170 H4 de 2023**	
TEMA DE LA REUNIÓN:	**Estado actual de los diseños y gestión ambiental PMA lote**				
LUGAR:	**Oficina de la AEROCIVIL**				
FECHA:	**Marzo 12 de 2025**	**HORA INICIO:**	**10:00 am.**	**HORA FINAL:**	**12:00 m.**

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Comité Semanal No. 15 Contrato de referencia.

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Verificación de quórum.
2. Varios.
3. Planes de acción (Generación de compromisos).

IV. TEMAS A TRATAR EN LA REUNIÓN:

A. Estado actual adecuación de los diseños hidráulicos al lote.
B. Gestión ambiental adecuación lote al PMA del aeropuerto.

V. DESARROLLO.

A1. Se presenta una explicación al análisis del sistema hidráulico en áreas de seguridad detallando la implementación de colectores subterráneos, un tanque de tormentas y la red de drenaje que optimizará la evacuación de aguas pluviales del aeródromo. Se analizan las condiciones actuales, las alternativas evaluadas y la solución propuesta.

A2. Colectores Subterráneos

- Se plantea el uso de colectores enterrados en sustitución de canales abiertos, garantizando mejor eficiencia hidráulica y menor impacto visual y estructural.
- La solución contempla pendientes de 2 a 2.5 por mil en todo el trayecto.

- El caudal de diseño para la tormenta de cinco años es de 3.8 m³/s.

A3. Tanque de Tormentas

- Capacidad de almacenamiento: 3,800 m³.
- Permite compensar las crecidas y reducir el caudal de descarga a 2 m³/s.
- Se incorpora un desarenador en la entrada para reducir la acumulación de sedimentos y facilitar el mantenimiento.

A4. Distribución de Colectores

- Se diseñan colectores con diámetros progresivos:
- Inicio: 500 mm
- Intermedio: 700 mm
- Final: 900 mm
- En la parte media de la pista se convierte en una doble conducción de 900 mm.

A5. Alternativa de Canal Abierto por "interventoría"

- Propuesta para reducir costos en la sección posterior a la franja de seguridad.
- Canal diseñado para evitar reboses y garantizar el flujo continuo.
- Cambiar el tipo de tubería a una de menor costo después de la cabecera 10 y hasta entregar al tanque de tormentas.

A3. Factores de Diseño y Justificación

- Seguridad aeronáutica: Se evita obstrucción en la franja de seguridad y se mantiene la operatividad de la pista.
- Optimización hidráulica: Se han realizado simulaciones con ecuaciones de flujo no permanente, verificando que los conductos trabajan dentro de los límites permisibles.
- Costo-beneficio: Se prioriza el uso de colectores enterrados hasta la franja de seguridad y un canal abierto y/o cambio de tipo de tuberías posterior para reducir costos de obra y mantenimiento.

A4. Alcance del Proyecto

- El sistema diseñado tiene como finalidad:
- Recolectar y conducir las aguas pluviales mediante colectores subterráneos.
- Regular las crecidas con un tanque de tormentas.
- Evitar afectaciones en la infraestructura aeroportuaria y áreas aledañas.

A5. INCIO DE OBRAS DE LA CABECERA 10

- Se tiene previsto iniciar la próxima semana los trabajos relacionados con la llave de giro y/o zona de la cabecera 10 costado occidental de la pista según diseños avalados por la interventoría.

B. Gestión ambiental

Para poder obtener los permisos ambientales ante la corporación (Corpoguajira) y poder adecuar el lote al PMA existente se sugiere la implementación de un pequeño PAGA, y mantener la propuesta en el que no se van a generar actividades que impactan ambientalmente el sector, debido a que las obras a implementar son subterráneas además de la construcción de un tanque tormentas el cual no genera una contaminación visual

ni afecta los suelos por el tipo de construcción a emplear, además son obras de carácter imprevistas y que ambientalmente solucionan las inundaciones en el aeropuerto y áreas vecinas.

VII PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega de los diseños hidráulicos	Contratista	17 de marzo de 2025
2	Reunión urgente ambiental	Contratista, interventoría y Aerocivil	18 de marzo de 2025
3	Entrega de NP's con documentación completa.	Contratista e interventoría	21 de marzo de 2025
4	Inicio cabecera 10	Contratista	21 de marzo de 2025
5	Enviar a la Aerocivil informe de las gestiones y comunicados con CORPOGUAJIRA	Contratista e interventoría	21 de marzo de 2025

VII. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de Riohacha a los doce (12) días del mes de marzo del año 2025, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Andrés Arboleda	Director de infraestructura Aerocivil	
Aldemar Pinzón	Supervisor Contrato Riohacha, Aerocivil.	
Diana Cagua	Auxiliar de supervisión Aerocivil	
Víctor Daniel castro	Director de obra contratista	
Roberto Jaimes	Especialista hidráulico contratista	
Santiago Páez	Director de Interventoría	
Oscar Villarreal	Residente interventoría	

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NÚMERO DE ACTA: **003**

ÁREA:	*Técnica ambiental*		**PROCESO:**	**Contrato de Obra 23001170 H4 de 2023**	
TEMA DE LA REUNIÓN:	**Comité seguimiento a las fichas del PMA**				
LUGAR:	**Oficina Consorcio Air Rio (Riohacha)**				
FECHA:	**12 marzo de 2025**	**HORA INICIO:**	**10:00 am**	**HORA FINAL:**	**11:00 am**

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

comité de seguimiento a las fichas ambientales

III. AGENDA:

Orden del Día:
PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)
1. Mesa de trabajo entre la interventoría y el contratista para la entrega de ajustes de las fichas del PMA.

IV. TEMAS A TRATAR EN LA REUNIÓN:

1. **Ajustes a las fichas del Plan de manejo ambiental.**

V. DESARROLLO.

5.1 Ajustes y modificaciones a las fichas del PMA

La ingeniera de la contratista presenta las fichas del PMA con los ajustes, comenzando por la identificación de los impactos y las medidas que se aplicarán en cada programa.
La ingeniera Diana, de la interventoría, sugiere los siguientes ajustes a las fichas presentadas:

- En las señalizaciones, aclarar que, de acuerdo con el reglamento aeronáutico, todas las intervenciones en las calles de rodaje y plataformas se realizan en horario nocturno y que no se pueden instalar señalizaciones.
- Especificar el manejo de los residuos sólidos sobrantes de la construcción, como los de excavación y los RCD. Gestionar con el área técnica las cantidades estimadas de obras

contractuales y contar con un gestor autorizado, registrado ante la corporación, como gestor de RCD. Proponer un manejo para estos residuos y determinar el porcentaje que puede ser reutilizado.

- En la ficha paisajística, se menciona que en la franja de seguridad se realiza rocería donde existe una capa vegetal. Proponer un manejo adecuado para esta capa vegetal. Además, incluir la disposición final en la ficha paisajística. Se propone que la interventoría realice seguimiento.
- En el manejo de material de construcción, agregar que, en caso de que "La Milagrosa" esté cerrada, se podrá buscar otra fuente de materiales, previa aprobación de la interventoría.
- Respecto al manejo de agua potable, adjuntar soportes de la compra de agua por bloque y solicitar un oficio al proveedor donde se certifique que está autorizado para vender agua en bloque.
- Agregar el alquiler de baños portátiles en la ficha de desmantelamiento de instalaciones temporales y campamentos. Aclarar que los residuos domésticos generados por el personal del campamento serán manejados mediante unidades portátiles y que este mismo procedimiento se aplicará en los diferentes frentes de obra. Incluir un indicador de seguimiento.

Al final de la mesa de trabajo, queda en manos de la contratista realizar los ajustes, radicar los soportes y anexos necesarios para que la interventoría emita el concepto de aprobación.
Por otro lado, la ingeniera de la interventoría mencionó que los informes 6 y 7 tienen observaciones, por lo que solicita realizar los ajustes pertinentes e incluir todas las fichas implementadas en cada periodo correspondiente de los informes.

VII PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Radicar ajustes de las fichas del PMA para aprobación por parte de la interventoría	contratista	marzo de 2025
2	Revisión de las observaciones de los informes ambientales	contratista	marzo de 2025

VII. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de Riohacha a los doce (12) días del mes de marzo del año 2025, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Diana niño	Residente ambiental de Interventoría	
Eliana Gómez	Residente ambiental de contratista	
María José Polo	Auxiliar ambiental de interventoría	

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NÚMERO DE ACTA: 004

ÁREA:	*Técnica ambiental*		**PROCESO:**	Contrato de Obra 23001170 H4 de 2023	
TEMA DE LA REUNIÓN:	Comité seguimiento a los trámites ambientales				
LUGAR:	Videoconferencia				
FECHA:	26 de marzo de 2025	**HORA INICIO:**	2:30 pm	**HORA FINAL:**	3:30 pm

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Comité de seguimiento ambiental

III. AGENDA:

Orden del Día:
PLANES DE ACCIÓN

1. El contratista deberá enviar el documento requerido para notificar a la autoridad ambiental sobre las intervenciones en el aeropuerto.
2. El contratista deberá enviar un documento PAGA que describa las actividades y los impactos ambientales relacionados con la construcción del tanque de tormentas.
3. El contratista deberá radicar Justificación del cambio menor del plan de manejo ambiental que incluya las fichas de evaluación de impactos.
4. El contratista deberá proporcionar información sobre las actividades constructivas que se realizarán en el nuevo predio adquirido por Aerocivil.
5. La interventoría deberá revisar y aprobar el documento de actividades constructivas que el contratista envíe.

IV. TEMAS A TRATAR EN LA REUNIÓN:

1. Coordinación entre el contratista, la interventoría y la autoridad ambiental
2. Requisitos y permisos necesarios para las obras en el nuevo predio adquirido por Aerocivil.

3. **Proceso de notificación a la autoridad ambiental sobre las intervenciones planificadas.**
4. **Evaluación de impactos ambientales relacionados con la construcción**

V. DESARROLLO.

Se abordaron aspectos claves relacionados con la construcción del tanque de tormentas y su alineación con el plan de manejo ambiental. Se destacó la necesidad de obtener un concepto favorable de la corporación para avanzar, asegurando que el diseño del tanque prevenga infiltraciones. Se acordó definir un plan de acción para gestionar los procedimientos ambientales requeridos y se mencionó la necesidad de solicitar un cambio menor en el plan de manejo ambiental, que será revisado por el grupo de gestión ambiental.

Se discutió la urgencia de recibir un documento del contratista para notificar a la autoridad ambiental sobre las intervenciones en el aeropuerto, enfatizando la importancia de cumplir con esta formalidad para evitar sanciones. Se propuso que el contratista envíe un documento detallando las actividades a realizar y la evaluación de impactos, contrastando estas con el plan de manejo ambiental y elaborar un informe sobre cambios menores, el cual debe ser enviado a supervisión en un plazo de cinco días hábiles, y se desarrolló un plazo para recibir la información del contratista para su revisión.

5.1 Revisión del Plan de Manejo Ambiental para la Construcción del Tanque de Tormentas

Andrés Arboleda Salazar explicó que la reunión busca definir el procedimiento ambiental necesario para la construcción del tanque de tormentas en el predio adquirido por Aerocivil. Santiago Páez Talero mencionó que se espera un concepto de Corpoguajira sobre la intervención, que debe garantizar que el tanque no cause infiltraciones. Diana Niño subrayó la importancia de establecer un plan de ruta para iniciar las obras.

5.2 Documentación y Requerimientos Ambientales para Contratos en Riohacha

Santiago Páez Talero solicitó al contratista la entrega inmediata de un documento que notifique a la autoridad ambiental sobre las obras planificadas en el aeropuerto, incluyendo la construcción de drenajes y la afectación de árboles. Diana Marcela Cagua Castillo recordó la importancia de que la ingeniera Elsa estuviera presente para informar sobre trámites previos con Corpoguajira.

5.3 Discusión sobre el Plan de Manejo Ambiental y Actividades Constructivas

Eliana Consorcio infraestructura, mencionó que se deben presentar fichas de manejo y control ambiental para las obras fuera del lote actual, indicando que no es necesario un plan de manejo

ambiental formal. Magda Lorena Aguilar sugirió que el contratista envíe un documento con las actividades y la evaluación de impactos, mientras que Andrés Arboleda destacó la necesidad de contrastar estas actividades con el plan de manejo ambiental y solicitar un documento adicional para las obras que no están cubiertas por dicho plan.

5.4 Revisión de Solicitudes y Compromisos Ambientales

La reunión abordó la solicitud del 11 de marzo relacionada con el cumplimiento de requisitos ambientales. Diana Marcela Cagua Castillo explicó que se requiere la intervención para la elaboración de un informe sobre cambios menores en el proyecto, el cual debe ser enviado a la supervisión del contrato. Se acordó que la información debe ser revisada y aprobada rápidamente para su envío a Aerocivil.

VII. Compromisos:

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Justificación del cambio menor del PMA del aeropuerto Almirante Padilla acuerdo a lo establecido en el decreto 1076.	Contratista	28 Marzo de 2025
2	El contratista deberá enviar un documento PAGA que describa las actividades y los impactos ambientales relacionados con la construcción del tanque de tormentas	Contratista	02 De abril de 2025
3	La interventoría deberá revisar y aprobar el documento de actividades constructivas que el contratista envíe	Interventoría	Abril de 2025

VII. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de Riohacha a los trece (26) días del mes de marzo del año 2025, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Santiago Páez	Representante legal/Director consorcio Air Rio	

Diana niño	Residente ambiental de Interventoría	
Oscar Villareal	Residente consorcio Air Rio	
Eliana Gómez	Residente ambiental contratista	
Juan Carlos Pérez	Residente de obra	
Andrés Arboleda	Secretario de Servicios Aeroportuarios	
Magda Lorena Aguilar	Contratista Dirección de Servicios Aeroportuarios	
Diana Marcela Cagua	Contratista Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias	
Aldemar Pinzon	Supervisor contrato de obra/ Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias	
Alba Lucia Riapira	Profesional Aeronáutico II/ Dirección General	
César Rosado	Director general Ambiental	Cesar Alberto Rosado
Gerardo Jaimes	Contratista / Secretaria de Servicios Aeroportuarios	
Katherine Luna	Contratista / Dirección General	
Maria Jose Polo	Auxiliar ambiental de interventoría	Maria Polo

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NÚMERO DE ACTA: **001**

ÁREA:	**Social**		**PROCESO:**	**Contrato de Obra 23001170 H4 de 2023**	
TEMA DE LA REUNIÓN:	**Presentación del Área Social de la contratista y acuerdo para el inicio de actividades.**				
LUGAR:	**Virtual**				
FECHA:	**21 de marzo de 2025**	**HORA INICIO:**	**09:32 a.m**	**HORA FINAL:**	**10:08 a.m**

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Comité Social No. 1 Presentación del Área Social de la contratista y acuerdo para el inicio de actividades.

III. AGENDA:

Orden del Día:
1. Presentación de la Auxiliar social de la contratista.
2. Actividades del área social.
3. Planes de acción (Generación de compromisos).

IV. TEMAS A TRATAR EN LA REUNIÓN:

1. Inicio de las actividades del área social.

V. DESARROLLO.

5.1 Presentación de la auxiliar social de la contratista.

El área social de la contratista Consorcio Infraestructura Riohacha, presenta a la auxiliar social Kenis Cotes, quien asumirá la responsabilidad de liderar los procesos y coordinar las actividades asignadas al área social.

5.2 Socialización de la obra.

La interventoría solicita concertar la fecha de la socialización de la obra con las comunidades del Área de Influencia Directa del proyecto, reconociendo la importancia que implica mantener informada a la comunidad sobre el avance del proyecto, permitiendo fortalecer las relaciones con la comunidad, asegurando un impacto positivo tanto para los beneficiarios como para quienes desarrollan el proyecto.

5.3 Habilitar puntos de atención, buzón de sugerencia y carteleras informativas.

El contratista se compromete a habilitar el punto de servicio de atención a la comunidad en las oficinas. Además, se compromete a habilitar dos buzones de sugerencias y dos carteleras informativas, en los siguientes puntos, el primero en las oficinas de la contratista y el segundo en el actual punto de acopio.

5.4 Definir cuales son los barrios que se van a intervenir.

La interventoría solicita identificar y definir los barrios que serán impactados de manera directa por las obras del proyecto, garantizando así una planificación más precisa y una gestión adecuada de las comunidades involucradas.

5.5 Informes.

La interventoría requiere que los informes mensuales del área social sean entregados dentro de los primeros dos días de cada mes, asegurando una adecuada gestión y seguimiento de las actividades realizadas.

5.6 Formatos del plan de Gestión Social.

Se llevó a cabo una revisión de los formatos del plan de gestión social, durante la cual se brindaron recomendaciones orientadas a optimizar la gestión y asegurar una mayor eficiencia en el uso de dichos formatos.

5.7 Informar con anticipación las actividades planteadas por la contratista.

La interventoría solicita a la contratista informar con anticipación las actividades a desarrollar, con el objetivo de realizar el respectivo acompañamiento y seguimiento.

5.8 Comité social cada 15 días.

Se acuerda entre las partes realizar un comité social cada 15 días**.**

VI PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No	Actividad	Responsable
1	Concertar la fecha de la socialización de la obra con las comunidades del Área de Influencia Directa del proyecto	Contratista
2	Habilitar el punto de servicio de atención a la comunidad	Contratista
3	Habilitar dos buzones de sugerencias	Contratista
4	Habilitar dos carteleras informativas	Contratista
5	Identificar y definir los barrios que serán impactados de manera directa por las obras del proyecto	Contratista e Interventoría
6	Entrega de los informes mensuales	Contratista
7	Realizar un comité social cada 15 días	Contratista e Interventoría

VII. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de Riohacha el veintiuno (21) de marzo del año 2025, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
María Carolina Gómez A.	Residente social de Interventoría	M.C. Gómez G.
Kenis Cotes Suárez.	Auxiliar social de la contratista	Kenis Cotes
Anyi Paola Cortes Gómez.	Auxiliar social de Interventoría	AnyiCortes6.

Powered by CamScanner

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NÚMERO DE ACTA: 002

ÁREA:	**Social**		**PROCESO:**	**Contrato de Obra 23001170 H4 de 2023**	
TEMA DE LA REUNIÓN:	**Socialización del proyecto "Realizar el mejoramiento de las plataformas de viraje, franjas de seguridad, sistema de drenaje, mejoramiento y construcción de calles de rodaje del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha.".**				
LUGAR:	**Virtual**				
FECHA:	**31 de marzo de 2025**	**HORA INICIO:**	**09:00 a.m.**	**HORA FINAL:**	**09:28 a.m.**

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Comité Social No. 2. Definir la estrategia adecuada para socializar el proyecto ante la comunidad y entidades beneficiadas.

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Definir la población objeto de la socialización.
2. Definir fecha para el desarrollo de la socialización.
3. Planes de acción (Generación de compromisos).

IV. TEMAS A TRATAR EN LA REUNIÓN:

1. Desarrollo de la socialización del proyecto "Realizar el mejoramiento de las plataformas de viraje, franjas de seguridad, sistema de drenaje, mejoramiento y construcción de calles de rodaje del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha."

Powered by CamScanner

V. DESARROLLO.

5.1 Definir la población objeto de la socialización.

En acuerdo entre el contratista e interventoría, la población objeto de la socialización corresponden a las Juntas de Acción Comunal de los barrios aledaños al aeropuerto, las entidades, gremios o asociaciones que desarrollan actividades económicas entorno al Aeropuerto y que se ven directamente beneficiados con la ejecución del proyecto.

5.2 Actividades previas a la socialización del proyecto.

En acuerdo entre el contratista e interventoría, las actividades a realizar previas a la socialización corresponden a:

- Identificación de la población objeto de la socialización.
- Creación y entrega de oficios o volantes de invitación a la socialización.
- Preparación del contenido a presentar.
- Gestionar lugar para el desarrollo de la reunión.
- Definir la plantilla para las presentaciones.

5.3 Definir fecha para el desarrollo de la socialización

El contratista se compromete a desarrollar la socialización el 25 del mes de abril del 2025.

VI PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No	Actividad	Responsable	Fecha de cumplimientos
1	Preparar la logística de la socialización del proyecto.	Contratista	18/03/2025
2	Socialización del proyecto "Realizar el mejoramiento de las plataformas de viraje, franjas de seguridad, sistema de drenaje, mejoramiento y construcción de calles de rodaje del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha"	Contratista	25/03/2025

Powered by CamScanner

VII. FIRMAS:

Para constancia, se firma en la Ciudad de Riohacha el treinta y uno (31) de marzo del año 2025, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
María Carolina Gómez A.	Residente social de Interventoría	
Anyi Paola Cortes Gómez	Auxiliar social de Interventoría	
Kenis Cotes Suarez	Auxiliar social del contratista	
Juan Carlos Pérez	Residente de obra.	

Powered by CamScanner

15.3 ANEXO 3 – FORMATO ESTADO DEL TIEMPO

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	REPORTE DE CONDICIONES CLIMÁTICAS CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023																															Código: CIR-F-03
	DESDE:									01 DE MARZO DE 2025																				**HASTA**			28 DE MARZO DE 2025	
	PERIODO:												**MARZO DE 2025**																				
DESCRIPCION	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**22**	**23**	**24**	
	S	**D**	**L**	**MA**	**MI**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**MA**	**MI**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**MA**	**MI**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**MA**	**MI**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**Total**
Seco	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24			24	24	24	24				552
Lluvias moderadas	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				0
Lluvias intensas	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				0
Total	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24			24	24	24	24				552

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA

OBSERVACIONES: Durante el mes de marzo no se presentaron lluvias, por lo que se pudieron realizar los trabajos con normalidad.

Firma: _____

Nombre: JUAN CARLOS PÉREZ ROSALES

Residente de Obra

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

15.4 ANEXO 4 – CONTROL DE CORRESPONDENCIA DEL PROYECTO.

CONTRATO 23001282 H3 DE 2023: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

REGISTRO CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	No. RADICADO	No. FOLIO	ANEXO	CD ANEXO	REMITE	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESPECIALIDAD - TEMA
03/03/2025	Correo electronico	2	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1kxI7xRFlseg2WSfOEKNrEeDxALgef91z?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	2024-486-RIO-0580 Solicitud Informes Ambientales	2024-486-RIO-0580 Solicitud Informes Ambientales
03/03/2025	Correo electronico	3	LINK	https://drive.google.com/file/d/128In5J3mG3IKzR6FsE5DYNtYjr9CYgNN/view?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	COMUNICADO 2025-486-RIO-0582 Respuesta a COMUNICADO No. INFRH-T-076-2025 Reiteración a observaciones frente al plan de manejo ambiental	Respuesta a COMUNICADO No. INFRH-T-076-2025 Reiteración a observaciones frente al plan de manejo ambiental
05/03/2025	Correo electronico	168	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1DV_Z-BF6xkeHZubgOWSJHU-qG9ac59YX?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	AEROCIVIL	Comunicado 2025-486-RIO-0604 Radicación de Acta 04, Factura FE 5, CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023, Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF).	Comunicado 2025-486-RIO-0604 Radicación de Acta 04, Factura FE 5, CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023, Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF).
05/03/2025	Correo electronico	7	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1P8XzNjoKKjH1kjVBIXeMyU-RZ6hgAW58?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	2025-486-RIO-0620 REMITE RESPUESTA AL COMUNICADO No. INFRH-T-086-2025 CUYO OBJETO ES DISEÑO PAVIMENTO PLATAFORMA DE VIRAJE 10-28.	2025-486-RIO-0620 REMITE RESPUESTA AL COMUNICADO No. INFRH-T-086-2025 CUYO OBJETO ES DISEÑO PAVIMENTO PLATAFORMA DE VIRAJE 10-28.
07/03/2025	Correo electronico	188	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1CmUiJgCmIDs2xNPbcXMVEGOZobkwyWvT?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	AEROCIVIL	RV: 2025-486-RIO-0656 Radicación de Acta 04, Factura FE 5, CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023, Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF). Contratista Infraestructura Riohacha	RV: 2025-486-RIO-0656 Radicación de Acta 04, Factura FE 5, CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023, Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF). Contratista Infraestructura Riohacha
10/03/2025	Correo electronico	7	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1RAbdA5cY8o3XW5oLBnEQFiwYvyUI8h5d?usp=sharing	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	AEROCIVIL	2025-486-RIO-0663 Envío de informe semanal No. 30	2025-486-RIO-0663 Envío de informe semanal No. 30
10/03/2025	Correo electronico	7	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1zt0Izuv9LcU4mXKMph6b2LRy6LNUxpMA?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	AEROCIVIL	2025-486-RIO-0668 remisión de informe semanal No. 22 con observaciones 3 de marzo	2025-486-RIO-0668 remisión de informe semanal No. 22 con observaciones 3 de marzo
10/03/2025	Correo electronico	1	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1gJlNOS2yRoluSzTsVMV1x7BZrVDs4okg?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	2025-486-RIO-0669 Observaciones Informe Ambiental No 7	2025-486-RIO-0669 Observaciones Informe Ambiental No 7
14/03/2025	Correo electronico	135	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1nBjtLtHT6WQj6ttJl6zyktzqVW6i87VQ?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	AEROCIVIL	Comunicado 2025-486-RIO-0713 Radicación de Acta 03, Factura FE 4, CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023, Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF). Contratista Infraestructura	Comunicado 2025-486-RIO-0713 Radicación de Acta 03, Factura FE 4, CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023, Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF). Contratista Infraestructura
17/03/2025	Correo electronico	30	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1YdSt0y_JAcde7IlhGgA6ZCxYrkwpgvI6?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	AEROCIVIL	2025-486-RÍO-0730, Remisión Plan de Acción de Interventoría, contrato 23001282 H3 DE 2023	2025-486-RÍO-0730, Remisión Plan de Acción de Interventoría, contrato 23001282 H3 DE 2023
18/03/2025	Correo electronico	26	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1cSXxi2G-gUxwkZlXPcFfNaPpAEC8NwZN?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	AEROCIVIL	2025-486-RÍO-0729, Remisión Plan de Gestión Social para el contrato 23001170 H4 de 2023	2025-486-RÍO-0729, Remisión Plan de Gestión Social para el contrato 23001170 H4 de 2023
18/03/2025	Correo electronico	800	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1et9cXDjHXlUMHMzaZsepRzdyOav985fn?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	AEROCIVIL	2025-486-RIO-0752 Informe Mensual interventoría No. 4	2025-486-RIO-0752 Informe Mensual interventoría No. 4

19/03/2025	Correo electronico	1	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1KmUmM-8mfs8OdUqAipZiNLGtM9M4WPUA?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	2025-486-RIO-0755, Respuesta al comunicado No. INFRH-AMB-003-2025, Aprobación del plan de manejo ambiental (PMA) para el contrato 23001170 H4 de 2023.	2025-486-RIO-0755, Respuesta al comunicado No. INFRH-AMB-003-2025, Aprobación del plan de manejo ambiental (PMA) para el contrato 23001170 H4 de 2023.
21/03/2025	Correo electronico	1	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1nPATGPP83Z4xB_XhRAzQ4X0flUgdO36w?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	AEROCIVIL	2025-486-RIO-0758 Remisión Plan de manejo ambiental (PMA) para el contrato 23001170 H4 de 2023.	2025-486-RIO-0758 Remisión Plan de manejo ambiental (PMA) para el contrato 23001170 H4 de 2023.
21/03/2025	Correo electronico	9	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1ugkcGJLk3rqyTHTKMLCOVMbY1KhCKFvh?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	AEROCIVIL	Comunicado 2025-486-RIO-0800 Remisión de informe semanales del 23 al 26	Comunicado 2025-486-RIO-0800 Remisión de informe semanales del 23 al 26
25/03/2025	Correo electronico	188	LINK	https://drive.google.com/file/d/18yLWPVPM8xpaZFqZ8HZF2eNLDfud-2ey/view?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	AEROCIVIL	2025-486-RIO-0817Radicación de Acta 04, Factura FE 5, CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023, Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF). Contratista Infraestructura Riohacha	Radicación de Acta 04, Factura FE 5, CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023, Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF). Contratista Infraestructura Riohacha
27/03/2025	Correo electronico	2	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1AQWEacRvfTc3ds_E92Cr4jj2XK7Kx05e?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	Comunicado 2025-486-RIO-0839 Reiteración Tramites ambientales	Comunicado 2025-486-RIO-0839 Reiteración Tramites ambientales
27/03/2025	Correo electronico	2	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1Cm54VcpHNo2PiPibBqMvqso_5Ubhftl8?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	Comunicado No. 2025-486-RIO-0850 Asunto: Solicitud de requerimiento "petición Representante Cristian Avendaño ID 1628884	Comunicado No. 2025-486-RIO-0850 Asunto: Solicitud de requerimiento "petición Representante Cristian Avendaño ID 1628884
27/03/2025	Correo electronico	1	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/15nV48plg32InaZ9sjN3-Xm34NG5fC_3J?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	Comunicado No. 2025-486-RIO-0854 Solicitud para la implementación de medidas de mitigación de impacto ambiental por material particulado y arrastre de sedimentos.	Comunicado No. 2025-486-RIO-0854 Solicitud para la implementación de medidas de mitigación de impacto ambiental por material particulado y arrastre de sedimentos.
28/03/2025	Correo electronico	1	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1WR-coSCBTJzf5dZvHpkUym16n2s5x0pr?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	2025-486-RIO-0859 Novedad: Vertimiento Vecinal de Aguas Servidas en Canal del Costado Sur del Aeropuerto	2025-486-RIO-0859 Novedad: Vertimiento Vecinal de Aguas Servidas en Canal del Costado Sur del Aeropuerto
28/03/2025	Correo electronico	1	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1jo7LIREWOOlfroclL5QfmDeQDMTHfNwM?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	2025-486-RIO-0865 Preocupación por bajos rendimientos en ejecución de obra y retraso en inicio de actividades programadas	2025-486-RIO-0865 Preocupación por bajos rendimientos en ejecución de obra y retraso en inicio de actividades programadas
28/03/2025	Correo electronico	3	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/11IY-4PYcjkH9WFlmEb9VP0NFTqMoekeB?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	AEROCIVIL	2025-486-RIO-0863 Entrega de informe mensual No. 5	2025-486-RIO-0863 Entrega de informe mensual No. 5
28/03/2025	Correo electronico	6	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1PCs6CnDfIC4ma5v3_bR7IGtd_-arvZKZ?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	AEROCIVIL	2025-486-RIO-0861 Remisión de informes semanales 27, 28, 29 y 30	2025-486-RIO-0861 Remisión de informes semanales 27, 28, 29 y 30
31/03/2025	Correo electronico	3	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1s6qQGRRuEArLqUe19fUqxrIOcGdtO511?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	Comunicado No. 2025-486-RIO-0872 Revisión Cambio Menor. Respuesta al Comunicado No. INFRH-AMB-010-2025	Comunicado No. 2025-486-RIO-0872 Revisión Cambio Menor. Respuesta al Comunicado No. INFRH-AMB-010-2025
14/03/2025	Correo electronico	1	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1aT4vLOrVN66ebaLXf_oSfS0Hnk39jBlc?usp=drive_link	INTERVENTORIA ROHACHA	SANTIAGO PAEZ	AEROCIVIL	Comunicado 2025-489-RIO-1033 PERMISO PERSONAL AIR RIO	Comunicado 2025-489-RIO-1033 PERMISO PERSONAL AIR RIO

	CONTRATO 23001282 H3 DE 2023: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

REGISTRO CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	No. RADICADO	No. FOLIO	ANEXO	CD ANEXO	REMITE	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESPECIALIDAD - TEMA
03/03/2025	Correo electróncio	2	lik	https://drive.google.com/drive/folders/18lA1veZRcD2ipzq2QD2eQ5zhH8RKuAa1?usp=drive_link	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	COMUNICADO No. INFRH-T-090-2025 - INFORME ACTIVIDADES DE OBRA	COMUNICADO No. INFRH-T-090-2025 - INFORME ACTIVIDADES DE OBRA
03/03/2025	Correo electróncio	188	link	https://drive.google.com/file/d/1bgsZEZ_lWyZ199yJSz2x0HBesk1hxToH/view?usp=drive_link	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	YAMILL MONTENEGRO CALDERON	CONSORCIO AIR RIO	RADICACION OFICIO CIR-AEROCIVIL-ADMON-015-2024: ASUNTO: ENVÍO DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITEDE PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL NO.4	RADICACION OFICIO CIR-AEROCIVIL-ADMON-015-2024: ASUNTO: ENVÍO DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITEDE PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL NO.5
08/03/2025	Correo electróncio	37	link	https://drive.google.com/file/d/1bgsZEZ_lWyZ199yJSz2x0HBesk1hxToH/view?usp=drive_link	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	COMUNICADO No. INFRH-T-091-2025 - INFORME MENSUAL No. 07	COMUNICADO No. INFRH-T-091-2025 - INFORME MENSUAL No. 08
09/03/2025	Correo electróncio	45	link		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	COMUNICADO No. INFRH-T-092-2025 - ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS	COMUNICADO No. INFRH-T-092-2025 - ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS
10/03/2025	Correo electróncio	37	link	https://drive.google.com/drive/folders/13C70wU1KKEkjbuoz-SDbbbBIA0CSLOwh?usp=drive_link	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	COMUNICADO No. INFRH-T-093-2025 - Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3486 – cuyo asunto es: Respuesta al COMUNICADO INFRH-T-048-2024 del 15 de noviembre de 2024 observaciones informe mensual No. 3. y COMUNICADO 2024-486-RIO-0484 de fecha 20 de enero del 2025, cuyo asunto es: Solicitud de respuesta al Comunicado 2024-486-RÍO-3486 observaciones informe mensual N° 3	COMUNICADO No. INFRH-T-093-2025 - Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3486 – cuyo asunto es: Respuesta al COMUNICADO INFRH-T-048-2024 del 15 de noviembre de 2024 observaciones informe mensual No. 3. y COMUNICADO 2024-486-RIO-0484 de fecha 20 de enero del 2025, cuyo asunto es: Solicitud de respuesta al Comunicado 2024-486-RÍO-3486 observaciones informe mensual N° 4
10/03/2025	Correo electróncio	4	link	https://drive.google.com/file/d/1KM03fUmG1wYWdcKunCHjJERosw-ytVaW/view?usp=drive_link	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	COMUNICADO No. INFRH-T-094-2025 - Respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0443 Solicitud, Relación mano de obra calificada y no calificada.	COMUNICADO No. INFRH-T-094-2025 - Respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0443 Solicitud, Relación mano de obra calificada y no calificada.

12/03/2025	Correo electróncio	150	link	https://drive.google.com/drive/folders/187FgivaDxhwuRtUKuZADQnhpKVxwtlIE?usp=drive_link	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	COMUNICADO No. INFRH-T-095-2025 - Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-0484 defecha 20 de enero del 2025, cuyo asunto es: Solicitud de respuesta alComunicado 2024-486-RÍO-3486 observaciones informe mensual N° 3, 4,5 y 6	COMUNICADO No. INFRH-T-095-2025 - Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-0484 defecha 20 de enero del 2025, cuyo asunto es: Solicitud de respuesta alComunicado 2024-486-RÍO-3486 observaciones informe mensual N° 3, 4,5 y 7
12/03/2025	Correo electróncio	29	link	https://drive.google.com/drive/folders/1k0YzRJwccEyfF_tsmixKzT87QLfkd195?usp=drive_link	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	COMUNICADO No. INFRH-T-096-2025 - Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3223	COMUNICADO No. INFRH-T-096-2025 - Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3224
12/03/2025	Correo electróncio	123	link	https://drive.google.com/drive/folders/1KFi3RtRjQc_CdjrPBLS9RM_46W8k79JM?usp=drive_link	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	COMUNICADO No. INFRH-T-097-2025 - Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3445, cuyo asunto es: Respuesta al comunicado INFRH-T-021-2024 del 16 de septiembre de 2024 observaciones al programa de gerencia.	COMUNICADO No. INFRH-T-097-2025 - Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3445, cuyo asunto es: Respuesta al comunicado INFRH-T-021-2024 del 16 de septiembre de 2024 observaciones al programa de gerencia.
13/03/2025	Correo electróncio	32	link		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	COMUNICADO No. INFRH-T-098-2025 - Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3476	COMUNICADO No. INFRH-T-098-2025 - Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3476
13/03/2025	Correo electróncio	532	link	https://drive.google.com/drive/folders/14RVg3C0-qwLEpGbjJ1sruj8-ttQKP_TG?usp=drive_link	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	COMUNICADO No. INFRH-T-099-2025 - Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3476	COMUNICADO No. INFRH-T-099-2025 - Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3476
14/03/2025	Correo electróncio	9	link	https://drive.google.com/drive/folders/1rV2hK6cE5bu3R7FgEHvrhQRtmJ69MDxU?usp=drive_link	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	COMUNICADO No. INFRH-T-100-2025 - Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3809, cuyo asunto es: Respuesta comunicado INFRH-T-065-2024 cuyo asunto es Programa De Obra – Flujo De Inversión	COMUNICADO No. INFRH-T-100-2025 - Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3809, cuyo asunto es: Respuesta comunicado INFRH-T-065-2024 cuyo asunto es Programa De Obra – Flujo De Inversión
14/03/2025	Correo electróncio	1	link	https://drive.google.com/drive/folders/15TW_XldWbeKL2wqsiTYVzo4nS3K1vPMW?usp=drive_link	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	COMUNICADO No. INFRH-T-101-2025 - Respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0292	COMUNICADO No. INFRH-T-101-2025 - Respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0292
14/03/2025	Correo electróncio	1	link	https://drive.google.com/drive/folders/1i99wrtYcuWMnedlZyfoqUxChpFsX1bao?usp=drive_link	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	COMUNICADO No. INFRH-T-102-2025 - Respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0154	COMUNICADO No. INFRH-T-102-2025 - Respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0154
14/03/2025	Correo electróncio	1	link	https://drive.google.com/drive/folders/1X0OcgJWwo80sNaovmgsfX_HqWB1VxQPE?usp=drive_link	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	COMUNICADO No. INFRH-T-103-2025 - Respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0500	COMUNICADO No. INFRH-T-103-2025 - Respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0500

14/03/2025	Correo electróncio	3	LINK	https://drive.google.com/drive/folders/1--hOOwl5udMUcu9paMiOllHU7Qiv-hia?usp=drive_link	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	COMUNICADO INFRH-AMB-003-2025 - Reiterando respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3745, observaciones frente al plan de manejo ambiental del proyecto de mejoramiento al aeropuerto Almirante de Riohacha	COMUNICADO INFRH-AMB-003-2025 - Reiterando respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3745, observaciones frente al plan de manejo ambiental del proyecto de mejoramiento al aeropuerto Almirante de Riohacha
17/03/2025	Correo electróncio	21	link	https://drive.google.com/drive/folders/1xdcCkPQF87JBkh3zevBuqzK5vqukIf_I?usp=drive_link	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	COMUNICADO No. INFRH-AMB-004-2025 - Respuesta a reiteración a observaciones frente al plan de manejo ambiental – COMUNICADO 2024-486-RIO-0582	COMUNICADO No. INFRH-AMB-004-2025 - Respuesta a reiteración a observaciones frente al plan de manejo ambiental – COMUNICADO 2024-486-RIO-0582
17/03/2025	Correo electróncio	16	link	https://drive.google.com/drive/folders/19AlSzVqtPJF61oKfrlKY1cV5K3K0FTgR?usp=drive_link	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	COMUNICADO No. INFRH-AMB-005-2025 - Respuesta a solicitud Informes Ambientales – COMUNICADO 2024-486-RÍO-0580	COMUNICADO No. INFRH-AMB-005-2025 - Respuesta a solicitud Informes Ambientales – COMUNICADO 2024-486-RÍO-0580
19/03/2025	Correo electróncio	1	link	https://drive.google.com/drive/folders/1fr8ezqtSg4FvGsVoA63D4tcstftgq59E?usp=drive_link	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	COMUNICADO No. INFRH-T-104-2025 - Respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0420, cuyo asunto es: SolicitudProfesional Socia	COMUNICADO No. INFRH-T-104-2025 - Respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0420, cuyo asunto es: SolicitudProfesional Socia
19/03/2025	Correo electróncio	1	link	https://drive.google.com/drive/folders/14n16tSl2cXhZxxPTOJaiWkerjo5VCHEJ?usp=drive_link	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	COMUNICADO No. INFRH-T-105-2025 - Respuesta al comunicado 2025-486-RÍO-0335	COMUNICADO No. INFRH-T-105-2025 - Respuesta al comunicado 2025-486-RÍO-0335
19/03/2025	Correo electróncio	1	link	https://drive.google.com/drive/folders/13g9gybgcl8PR7r36q-X7At3uDzR9CNUL?usp=drive_link	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	Solicitud de Permiso Aeroportuario No.24	Solicitud de Permiso Aeroportuario No.24
19/03/2025	Correo electróncio	2	link	https://drive.google.com/drive/folders/1tdDXMm8w-CdO0h5e2GQjp2HdThORA9nd?usp=drive_link	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	COMUNICADO No. INFRH-T-106-2025 - Respuesta al comunicado 2025-486-RÍO-0113, cuyo asunto es: “Solicitud de laboratorios del mes de diciembre.”	COMUNICADO No. INFRH-T-106-2025 - Respuesta al comunicado 2025-486-RÍO-0113, cuyo asunto es: “Solicitud de laboratorios del mes de diciembre.”
21/03/2025	Correo electróncio	3	link	https://drive.google.com/drive/folders/1CW-g_rLR7T37uqzuRQGgq8tbkgPgRSac?usp=drive_link	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	VICTOR DANIEL CASTRO	CONSORCIO AIR RIO	COMUNICADO No. INFRH-AMB-008-2025 - Respuesta a los Comunicados No. 2024-486-RIO-0587, 2024-486-RIO-0669, 2024-486-RIO-0733	COMUNICADO No. INFRH-AMB-008-2025 - Respuesta a los Comunicados No. 2024-486-RIO-0587, 2024-486-RIO-0669, 2024-486-RIO-0733

15.5 ANEXO 5 – CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 03 de marzo de 2025 **2024-486-RIO-0580**

Al contestar citar este código

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Atn. TIBER GILDARDO CHAVARRO M.
Representante Legal
Carrera 67 # 167 - 61
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Solicitud Informes Ambientales

Cordial saludo,

De acuerdo con los requerimientos contractuales, se solicita al contratista que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la recepción de la presente comunicación, remita los informes ambientales correspondientes a los meses de febrero de 2025 (Informe 7).

Los informes deberán incluir las gestiones y actividades ejecutadas durante los períodos mencionados, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, Numeral 12.

AIR RIO
CONSORCIO

INFORMES AMBIENTALES MENSUALES.

El CONTRATISTA deberá realizar un informe ambiental mensual a la Interventoría, el cual debe ser un capítulo del informe mensual de obra/mejoramiento, en el que se reflejen las actividades que en materia ambiental se hayan desarrollado, las evidencias, registros y las medidas implementadas, de acuerdo con los indicadores de seguimiento consignados en el instrumento de manejo ambiental presentado y aprobado por la interventoría.

Deberá contener como mínimo la siguiente información:

- Resumen.
- Periodo Reportado.
- Descripción del contrato.
- Resumen de Fichas Ambientales (Nombre - Código)
- Resumen de permisos, trámites y gestiones realizadas ante Autoridades Ambientales.
- Resumen de relación de Actas de Comité, Oficios y Correspondencia de temas Ambientales desarrollada durante el periodo (Contratista - Interventoría - Aerocivil).
- Presentación de Fichas Ambientales (Implementadas y no Implementadas en el periodo). En la presentación de las fichas ambientales se detallarán las actividades desarrolladas, evidencias de avances de acuerdo con los indicadores aprobados, acciones y medidas implementadas en el periodo de reporte.
- Resumen de Indicadores. Deberá presentarse una tabla en la que se identifiquen los indicadores de forma resumida de acuerdo con la ficha ambiental que corresponda. los indicadores que no reporten cumplimientos del 100% en el periodo, deberán tener una justificación que sustente la realidad de la situación presentada.
- Tabla resumen de situaciones de emergencia y contingencias tomadas durante el periodo.
- Anexos. Se presentarán las evidencias documentales que sean necesarias para respaldar los avances presentados y acciones ejecutadas durante el periodo reportado.

Para los meses posteriores, se requiere que este informe sea remitido dentro del plazo contractual establecido y acordado con la interventoría.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: D.M.N
Anexo: No Aplica.

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

INCOPLAN intecsa

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 03 de marzo de 2025 **2024-486-RIO-0582**

Al contestar citar este código

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Atn. TIBER GILDARDO CHAVARRO M.
Representante Legal
Carrera 67 # 167 - 61
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta a COMUNICADO No. INFRH-T-076-2025 Reiteración a observaciones frente al plan de manejo ambiental

Observaciones PMA -

Respetado Ingeniero,

Revisada la versión 2 del documento PMA entregado mediante el comunicado del asunto, se evidencia que no fueron atendidas la totalidad de las observaciones realizadas por la interventoría, por lo tanto, se convoca a mesa de trabajo el día miércoles 05 de marzo a las 2:30 pm con el fin de revisar y ajustar el documento conjuntamente.

Link de la reunión:

🗓️ 2025-03-05 a las 14:30

🔗https://whereby.com/sala1-incoplan

Cordialmente,

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

INCOPLAN intecsa



SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: D.M.N
Anexo: No Aplica.

AIRRIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 5 de marzo de 2025

2024-486-RIO-0594
Al contestar citar este código

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL
Atn. ALDEMAR PINZON.
Supervisor del Contrato
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: **Radicación de Acta 04, Factura FE 5, CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023, Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF)**. **Contratista Infraestructura Riohacha.**

Cordial saludo,

De manera atenta, remitimos la documentación para el trámite de pago del Acta de Recibo Parcial No.4 correspondiente al periodo del 1 al 28 de Febrero de 2025, para su información y fines pertinentes.

DOCUMENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	
Factura ELECTRONICA SE ENVIA A SIIF NACION CUANDO ESTE APROBADA LA CUENTA	1			
Acta Resumen Parcial	1			
Liquidación Iva	1			
Acta Excel Presupuesto de Costos	4			
Certificación Cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de servicios	1			
Certificación de la factura Por interventoría en Obra	1			
Certificación de la factura Por Supervisor en Interventoría			X	
Certificación del Uso del anticipo por la interventoría en Obra	1			
Certificación del Uso del anticipo por EL Supervisor a la interventoría			X	
Certificación de los Aportes a Parafiscales x La interventoría en Obra	1			
Certificación de los Aportes a Parafiscales por el Supervisor en interventoría			X	
Nota Aclaratoria como se calculó el cobro del acta de Interventoría			x	
Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de Obra en cuentas de obra con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación DE Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales	13			

DOCUMENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	
Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de interventoría en cuentas de interventoría con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación de Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales			X	
Fotocopias de las Planillas de Pagos Parafiscales del periodo facturado	14			
Certificación Bancaria	1			
Certificación Rut Dian	20			
Certificación de la consignación de los rendimientos Financieros a la entidad Cuando hay Anticipo	2			
Oficio remisorio del Acta a Cobrar	2			
Pantallazo del SECOP Evidenciando el cargue de las cuentas en el numeral 7 Ejecución del contrato / Plan de Pagos A partir de la Segunda Cuenta	1			
Para la primera cuenta de Interventoría la Designación del Supervisor firmada			X	
Documentos de Acuerdo a lo que dice el contrato				
LAS FIRMAS EN LAS ACTAS DE ACUERDO AL ULTIMO MANUAL DE CONTRATACION				
Anexo Memorias o Informes Según el Caso al final de los documentos o PDF aparte.	X			
Para la Primera Y Ultima Cuenta (Acta de recibo Final) Anexar Contrato, Acta de Inicio, CDP, RP, Aprobación de Garantías y Documentos Contractuales que se Presenten en el Contrato			X	
Si es acta de recibo final se requiere anexar el formato 65 acta de recibo final con Aprobación de Garantías y Pólizas Actualizadas.			X	

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: O.V.S
Anexo: Acta 03 y Factura electrónica FE 4 con soportes .

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 05 de marzo de 2025

2024-486-RÍO-0620
Al contestar citar este código

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Atn. VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA
Representante Legal
Carrera 67 # 167 - 61
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: REMITE RESPUESTA AL COMUNICADO No. INFRH-T-086-2025 CUYO OBJETO ES DISEÑO PAVIMENTO PLATAFORMA DE VIRAJE 10-28.

Cordial saludo,

Por medio del presente correo, envío el documento correspondiente a la revisión del comunicado No. INFRH-T-086-2025- Atención a las observaciones al Diseño de Pavimentos Plataforma de Viraje 10-28, comunicado PYG-335-0002-1224 – Comunicado 2024-486-RÍO-0335.

Quedo atenta a cualquier inquietud que pueda surgir y agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: EVA.
Anexo: ANEXO DOCUMENTO CON OBSERVACIONES .

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

AIRRIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 7 de marzo de 2025

2024-486-RIO-0656
Al contestar citar este código

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL
Atn. ALDEMAR PINZON.
Supervisor del Contrato
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: **Radicación de Acta 04, Factura FE 5, CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023, Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF)**. **Contratista Infraestructura Riohacha.**

Cordial saludo,

De manera atenta, remitimos la documentación para el trámite de pago del Acta de Recibo Parcial No.4 correspondiente al periodo del 1 al 28 de Febrero de 2025, para su información y fines pertinentes.

DOCUMENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	
Factura ELECTRONICA SE ENVIA A SIIF NACION CUANDO ESTE APROBADA LA CUENTA	1			
Acta Resumen Parcial	1			
Liquidación Iva	1			
Acta Excel Presupuesto de Costos	4			
Certificación Cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de servicios	1			
Certificación de la factura Por interventoría en Obra	1			
Certificación de la factura Por Supervisor en Interventoría			X	
Certificación del Uso del anticipo por la interventoría en Obra	1			
Certificación del Uso del anticipo por EL Supervisor a la interventoría			X	
Certificación de los Aportes a Parafiscales x La interventoría en Obra	1			
Certificación de los Aportes a Parafiscales por el Supervisor en interventoría			X	
Nota Aclaratoria como se calculó el cobro del acta de Interventoría			x	
Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de Obra en cuentas de obra con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación DE Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales	13			

AIR RIO
CONSORCIO

DOCUMENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	
Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de interventoría en cuentas de interventoría con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación de Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales			X	
Fotocopias de las Planillas de Pagos Parafiscales del periodo facturado	14			
Certificación Bancaria	1			
Certificación Rut Dian	20			
Certificación de la consignación de los rendimientos Financieros a la entidad Cuando hay Anticipo	2			
Oficio remisorio del Acta a Cobrar	2			
Pantallazo del SECOP Evidenciando el cargue de las cuentas en el numeral 7 Ejecución del contrato / Plan de Pagos A partir de la Segunda Cuenta	1			
Para la primera cuenta de Interventoría la Designación del Supervisor firmada			X	
Documentos de Acuerdo a lo que dice el contrato				
LAS FIRMAS EN LAS ACTAS DE ACUERDO AL ULTIMO MANUAL DE CONTRATACION				
Anexo Memorias o Informes Según el Caso al final de los documentos o PDF aparte.	X			
Para la Primera Y Ultima Cuenta (Acta de recibo Final) Anexar Contrato, Acta de Inicio, CDP, RP, Aprobación de Garantías y Documentos Contractuales que se Presenten en el Contrato			X	
Si es acta de recibo final se requiere anexar el formato 65 acta de recibo final con Aprobación de Garantías y Pólizas Actualizadas.			X	

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: O.V.S
Anexo: Acta 03 y Factura electrónica FE 4 con soportes .

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 10 marzo 2025

2025-486-RÍO-0663
Al contestar citar este código

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL
Atn. ALDEMAR PINZON.
Supervisor del Contrato
Avenida el Dorado No. 103 -15
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Envío de informe semanal No. 30

Cordial saludo,

Por medio de la presente, procedo a radicar el informe semanal No. 30, En el informe se detallan las actividades realizadas, avances alcanzados y situaciones relevantes ocurridas durante dicho periodo.

Quedamos atentos a sus comentarios o solicitudes de información adicional que consideren necesarias.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: EVA.
Anexo: informe semanal 30.

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

INCOPLAN intecsa

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 10 marzo 2025

2025-486-RÍO-0668
Al contestar citar este código

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL
Atn. ALDEMAR PINZON.
Supervisor del Contrato
Avenida el Dorado No. 103 -15
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: remisión de informe semanal No. 22 con observaciones 3 de marzo

Cordial saludo,

Por medio de la presente, procedo a radicar nuevamente el informe semanal No.22 con las observaciones del día 3 de marzo, En el informe se detallan las actividades realizadas, avances alcanzados y situaciones relevantes ocurridas durante dicho periodo.

Quedamos atentos a sus comentarios o solicitudes de información adicional que consideren necesarias.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: EVA.
Anexo: informe semanal 30.

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

INCOPLAN intecsa

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 10 de marzo de 2025 **2024-486-RIO-0669**

Al contestar citar este código

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Atn. TIBER GILDARDO CHAVARRO M.
Representante Legal
Carrera 67 # 167 - 61
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Observaciones Informe Ambiental No. 7

Respetado Ingeniero,

Revisado el reporte de las actividades de gestión ambiental presentado en el Capítulo 7 del informe de obra, se debe tener en cuenta lo establecido en el anexo técnico, numeral 12:

> *El CONTRATISTA deberá realizar un informe ambiental mensual a la Interventoría, el cual debe ser un capítulo del informe mensual de obra/mejoramiento, en el que se reflejen las actividades que en materia ambiental se hayan desarrollado, las evidencias, registros y las medidas implementadas, de acuerdo con los indicadores de seguimiento consignados en el instrumento de manejo ambiental presentado y aprobado por la interventoría.*

Por lo tanto, el informe presentado se debe complementar incluyendo la totalidad de los soportes y evidencias de las actividades reportadas tales como:

- Manejo de Materiales de Construcción: adjuntar la certificación del proveedor autorizado, con el volumen utilizado en el frente de obra en el período.

- Adjuntar copia de recibo de entrega de los RS al gestor autorizado

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

INCOPLAN intecsa

- Adjuntar certificado o acuerdo comercial con proveedor de agua de uso industrial.

- Incluir los indicadores de seguimiento de cada ficha para soportar el % de avance

- Registro fotografico y evidencia de las actividades realizadas

Se adjunta a la presente el informe con observaciones en modo comentario.

Cordialmente,



SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: DMNS.
Anexo: INFORME DE OBRA AMBIENTAL No. 07 v2

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

AIRRIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2025

2024-486-RIO-0713
Al contestar citar este código

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL
Atn. ALDEMAR PINZON.
Supervisor del Contrato
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: **Alcance al Radicado 2024-486-Río-0594, Radicación de Acta 03, Factura FE 4, CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023, Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF)**. **Contratista Infraestructura Riohacha.**

Cordial saludo,

De manera atenta, remitimos la documentación para el trámite de pago del Acta de Recibo Parcial No.3 correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero de 2025, para su información y fines pertinentes.

DOCUMENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	
Factura ELECTRONICA SE ENVIA A SIIF NACION CUANDO ESTE APROBADA LA CUENTA	1			
Acta Resumen Parcial	1			
Liquidación Iva	1			
Acta Excel Presupuesto de Costos	4			
Certificación Cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de servicios	1			
Certificación de la factura Por interventoría en Obra	1			
Certificación de la factura Por Supervisor en Interventoría			X	
Certificación del Uso del anticipo por la interventoría en Obra	1			
Certificación del Uso del anticipo por EL Supervisor a la interventoría			X	
Certificación de los Aportes a Parafiscales x La interventoría en Obra	1			
Certificación de los Aportes a Parafiscales por el Supervisor en interventoría			X	
Nota Aclaratoria como se calculó el cobro del acta de Interventoría			x	
Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de Obra en cuentas de obra con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación DE Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales	13			

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

DOCUMENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	
Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de interventoría en cuentas de interventoría con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación de Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales			X	
Fotocopias de las Planillas de Pagos Parafiscales del periodo facturado	14			
Certificación Bancaria	1			
Certificación Rut Dian	20			
Certificación de la consignación de los rendimientos Financieros a la entidad Cuando hay Anticipo	2			
Oficio remisorio del Acta a Cobrar	2			
Pantallazo del SECOP Evidenciando el cargue de las cuentas en el numeral 7 Ejecución del contrato / Plan de Pagos A partir de la Segunda Cuenta	1			
Para la primera cuenta de Interventoría la Designación del Supervisor firmada			X	
Documentos de Acuerdo a lo que dice el contrato				
LAS FIRMAS EN LAS ACTAS DE ACUERDO AL ULTIMO MANUAL DE CONTRATACION				
Anexo Memorias o Informes Según el Caso al final de los documentos o PDF aparte.	X			
Para la Primera Y Ultima Cuenta (Acta de recibo Final) Anexar Contrato, Acta de Inicio, CDP, RP, Aprobación de Garantías y Documentos Contractuales que se Presenten en el Contrato			X	
Si es acta de recibo final se requiere anexar el formato 65 acta de recibo final con Aprobación de Garantías y Pólizas Actualizadas.			X	

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: O.V.S
Anexo: Acta 03 y Factura electrónica FE 4 con soportes .

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayericate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
NIT 901.831.724-8
CRA 49 91 76
Tel: (601) 6353245
Bogotá - Colombia
controlproyectos@grupoymc.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(601) 2963456 - Ext. 000
Dirección	AV CL 26 103-15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/01/2025, 18:01
Expedición	27/01/2025, 18:01
Vencimiento	26/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAGO ACTA PARCIAL NO.3 del periodo de enero de 2025 en la ejecución del CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023 OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF). INTEGRANTES CONSORCIO: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA NIT.901831724-8 INTEGRANTES: Infraestructura Nacional Ltda. 900.055.521-7 40% RG INGENIERIA SAS NIT.834.000.377-7 40% IMCCA SAS NIT.901.538.098-1 20%	1.00	1,310,839,966.00	12,452,979.68	1,323,292,945.68

Total items: 1

Valor en Letras: Mil setecientos dieciseis millones quinientos cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y cinco pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-26 por $ 1,716,544,935.48

Total Bruto	1,310,839,966.00
Administración 24.00%	314,601,591.84
Imprevistos 1.00%	13,108,399.66
Utilidad 5.00%	65,541,998.30
IVA 19%	12,452,979.68
Total a Pagar	1,716,544,935.48

Observaciones: TRANSFERENCIA BANCARIA: BANCO DE BOGOTA CTA AHORROS No.380840371 TITULAR CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA NIT.901.831.724-8

#S24-12-00-000;23001170 H4 DE 2023;aldemar.pinzon@aerocivil.gov.co#S

Se remite factura a correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085033524 aprobado en 20241209 prefijo FE desde el número 1 al 70 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6.9
CUFE: a9a405a75864a9f1e89c0db50548b6152d4d52bf69aa191c743ab4e97f13021b0832158141833190ce318fdf2b608c0f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **RESUMEN** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**		
	Clave: MSER-7.0-12-008	**Versión: 02**	**Fecha de aprobación: 31/07/2023**

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	**CONTRATO: 23001170 H4 de 2023** **OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)** **AEROPUERTO: ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA** **PLAZO INICIAL: TREINTA (30) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026** **FECHA DE INICIACIÓN: 01/08/2024** **FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2026** **PLAZO FINAL: 31/07/2026**	**VALOR INICIAL:** **$ 56.738.847.471,00** **VALOR ADICIONAL:** **$ 0,00** **VALOR FINAL :** **$ 56.738.847.471,00**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 03** **CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA **INTERVENTOR:** CONSORCIO AIR RIO **SUPERVISOR:** ALDEMAR PINZÓN

El día 31 de ENERO de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto ALMIRANTE PADILLA de la Ciudad de RIOHACHA, el Ingeniero TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ, en representación del contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA y el ingeniero SANTIAGO PAEZ TALERO, en representación de la Interventoría CONSORCIO AIR RIO, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 01 de ENERO al 31 de ENERO de 2025, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor inicial contrato		56.738.847.471,00
2.Valor modificación No.1		0,00
3. Valor total del contrato (1+2)		56.738.847.471,00
4. Valor pagado del anticipo %	20,95%	11.884.371.800,00
5. Valor que resta por pagar (3-4)		44.854.475.671,00
6. Valor presente acta		1.716.544.936,00
7. Valor amortizado en la presente a	35,00%	600.790.728,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		1.115.754.208,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		1.284.545.068,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		691.678.113,00
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		14.284.671.076,00
12. Saldo por pagar del presente contrato		42.454.176.395,00
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		10.591.902.959,00
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**6,51%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1- C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Mantenimiento	-
2- C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Obra	-
3- C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Adquisición equipos	-
4- C-2403-0600-28-52104E-2403002-02	Rehabilitación y/o mejoramiento	1.115.754.208
TOTAL		**1.115.754.208**

AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-28-52104E-2403002-02	Rehabilitación y/o mejoramiento	600.790.728

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

SANTIAGO PAEZ TALERO
CONSORCIO AIR RIO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	LIQUIDACION IVA ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3		
	Clave: MSER-7.0-12-009	**Versión: 02**	**Fecha de aprobación:** 31/07/2023

CONTRATO No.	**23001170 H4 de 2023**	
INTERVENTOR:	**CONSORCIO AIR RIO**	
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$1.704.091.956,00
Porcentaje estimado para el A.I.U.		30%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	1.310.839.966,00	$1.310.839.966,00
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		$65.541.998,00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		$12.452.980,00
COSTO TOTAL BRUTO DISEÑOS		$0,00
IVA DISEÑOS 19% estimado para el IVA		$0,00
COSTO TOTAL BRUTO TRANSPORTE DE MAQUINARIA		$0,00
IVA TRANSPORTE DE MAQUINARIA 1% estimado para el IVA		$0,00
TOTAL IVA		**$12.452.980,00**

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

SANTIAGO PAEZ TALERO
CONSORCIO AIR RIO
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 03			PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
			Enero de 2025	25/01/2025
CONTRATO:	23001170 H4 de 2023	OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	R/L: TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO AIR RIO	R/L: SANTIAGO PAEZ TALERO	1/08/2024	31/07/2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 03	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$56.738.847.471,00.00 incluido AIU e IVA sobre Utilidad	$ 56.738.847.471,00	$ 1.976.223.181,00	$ 1.716.544.936,00	$ 3.692.768.117,00	$ 53.046.079.354,00	93,49%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 03		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**															
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	219.003,97	$ 1.223,00	$267.841.855,00	219.003,97	$267.841.855,00	43.089,00	$52.697.847,00	19.428,00	$23.760.444,00	62.517,00	$76.458.291,00	156.486,97	$191.383.564,00	71%
	SUBTOTAL				**$267.841.855,00**		**$267.841.855,00**		**$52.697.847,00**		**$23.760.444,00**		**$76.458.291,00**		**$191.383.564,00**	
2	**MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE RODAJE EXISTENTE**															
2.1	**DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN**															
2.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE	M3	1.739,00	$ 12.650,00	$21.998.350,00	1.739,00	$21.998.350,00							1.739,00	$21.998.350,00	100%
2.2	**CAPAS GRANULARES**															
2.2.1	SUBBASE GRANULAR (FAA P-154), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	663,00	$ 190.000,00	$125.970.000,00	663,00	$125.970.000,00							663,00	$125.970.000,00	100%
2.2.2	BASE GRANULAR (FAA P-209), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	332,00	$ 250.000,00	$83.000.000,00	332,00	$83.000.000,00							332,00	$83.000.000,00	100%
2.3	**PAVIMENTO**															
2.3.1	LOSA EN CONCRETO (FAA P-501), SUMINSTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA	M3	564,00	$ 1.020.000,00	$575.280.000,00	564,00	$575.280.000,00							564,00	$575.280.000,00	100%
	SUBTOTAL				**$806.248.350,00**		**$806.248.350,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$806.248.350,00**	
3	**CONSTRUCCIÓN CALLE DE RODAJE BRAVO**															
3.1	**EXCAVACIÓN**															
3.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE	M3	2.385,00	$ 12.650,00	$30.170.250,00	2.385,00	$30.170.250,00							2.385,00	$30.170.250,00	100%
3.2	**CAPAS GRANULARES**															
3.2.1	SUBBASE GRANULAR (FAA P-154), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	1.412,00	$ 190.000,00	$268.280.000,00	1.412,00	$268.280.000,00							1.412,00	$268.280.000,00	100%
3.2.2	BASE GRANULAR (FAA P-209), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	706,00	$ 250.000,00	$176.500.000,00	706,00	$176.500.000,00							706,00	$176.500.000,00	100%
3.3	**PAVIMENTO**															
3.3.1	LOSA EN CONCRETO (FAA P-501), SUMINSTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA	M3	1.201,00	$ 1.020.000,00	$1.225.020.000,00	1.201,00	$1.225.020.000,00							1.201,00	$1.225.020.000,00	100%
	SUBTOTAL				**$1.699.970.250,00**		**$1.699.970.250,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$1.699.970.250,00**	
4	**MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE - CABECERA 28**															
4.1	**DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN**															
4.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE	M3	915,00	$ 12.650,00	$11.574.750,00	915,00	$11.574.750,00							915,00	$11.574.750,00	100%
4.2	**CAPAS GRANULARES**															
4.2.1	SUBBASE GRANULAR (FAA P-154), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	420,00	$ 190.000,00	$79.800.000,00	420,00	$79.800.000,00							420,00	$79.800.000,00	100%
4.2.2	BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO (FAA P-304), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	210,00	$ 295.000,00	$61.950.000,00	210,00	$61.950.000,00							210,00	$61.950.000,00	100%
4.3	**PAVIMENTO**															
4.3.1	LOSA EN CONCRETO (FAA P-501), SUMINSTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA	M3	357,00	$ 1.020.000,00	$364.140.000,00	357,00	$364.140.000,00							357,00	$364.140.000,00	100%
	SUBTOTAL				**$517.464.750,00**		**$517.464.750,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$517.464.750,00**	
5	**ADECUACIÓN PLATAFORMA DE VIRAJE - CABECERA 10**															
5.1	**DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN**															
5.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE	M3	3.046,00	$ 12.650,00	$38.531.900,00	3.046,00	$38.531.900,00							3.046,00	$38.531.900,00	100%
5.2	**CAPAS GRANULARES**															
5.2.1	SUBBASE GRANULAR (FAA P-154), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	1.304,00	$ 190.000,00	$247.760.000,00	1.304,00	$247.760.000,00							1.304,00	$247.760.000,00	100%
5.2.2	BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO (FAA P-304), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	652,00	$ 295.000,00	$192.340.000,00	652,00	$192.340.000,00							652,00	$192.340.000,00	100%
5.3	**PAVIMENTO**															
5.3.1	LOSA EN CONCRETO (FAA P-501), SUMINSTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA	M3	1.108,00	$ 1.020.000,00	$1.130.160.000,00	1.108,00	$1.130.160.000,00							1.108,00	$1.130.160.000,00	100%
	SUBTOTAL				**$1.608.791.900,00**		**$1.608.791.900,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$1.608.791.900,00**	
6	**ADECUACIÓN FRANJA**															
6.1	DESMONTE Y REINSTALACIÓN LUCES PAPI	UND	2,00	$ 18.561.950,00	$37.123.900,00	2,00	$37.123.900,00							2,00	$37.123.900,00	100%
6.2	DESCAPOTE DE CAPA DE TIERRA VEGETAL 0,30 M ESPESOR	M3	1.906,41	$ 7.759,00	$14.791.835,00	1.906,41	$14.791.835,00							1.906,41	$14.791.835,00	100%
6.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE	M3	104.455,72	$ 12.650,00	$1.321.364.858,00	104.455,72	$1.321.364.858,00							104.455,72	$1.321.364.858,00	100%
6.4	COMPACTACIÓN Y REFINO DE FONDO DE EXCAVACIÓN	M2	208.911,43	$ 1.724,00	$360.163.305,00	208.911,43	$360.163.305,00	43.089,00	$74.285.436,00	19.428,00	$33.493.872,00	62.517,00	$107.779.308,00	146.394,43	$252.383.997,00	70%
6.5	RELLENOS LOCALIZADOS (EXCAVACIÓN EN SITIO)	M3	73.119,00	$ 27.250,00	$1.992.492.750,00	73.119,00	$1.992.492.750,00							73.119,00	$1.992.492.750,00	100%
6.6	RELLENOS LOCALIZADOS CON MATERIAL IMPORTADO	M3	92.232,42	$ 118.500,00	$10.929.541.770,00	92.232,42	$10.929.541.770,00	6.160,00	$729.960.000,00	7.790,80	$923.209.800,00	13.950,80	$1.653.169.800,00	78.281,62	$9.276.371.970,00	85%

	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 03			PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
			Enero de 2025	25/01/2025
CONTRATO:	23001170 H4 de 2023	OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	R/L: TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO AIR RIO	R/L: SANTIAGO PAEZ TALERO	1/08/2024	31/07/2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 03	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$56.738.847.471,00.00 incluido AIU e IVA sobre Utilidad	$ 56.738.847.471,00	$ 1.976.223.181,00	$ 1.716.544.936,00	$ 3.692.768.117,00	$ 53.046.079.354,00	93,49%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 03		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
6.7	TERRAPLÉN CON MATERIAL NUEVO	M3	41.782,29	$ 97.700,00	$4.082.129.733,00	41.782,29	$4.082.129.733,00							41.782,29	$4.082.129.733,00	100%
6.8	CAPA DE TIERRA VEGETAL	M3	26.544,21	$ 11.226,00	$297.985.301,00	26.544,21	$297.985.301,00							26.544,21	$297.985.301,00	100%
6.9	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN Y DEPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (5 KM)	M3xKM	365.595,00	$ 1.081,00	$395.208.195,00	365.595,00	$395.208.195,00							365.595,00	$395.208.195,00	100%
6.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA (37 KM)	M3xKM	4.958.544,00	$ 1.040,00	$5.156.885.760,00	4.958.544,00	$5.156.885.760,00	550.150,00	$572.156.000,00	695.796,00	$723.627.840,00	1.245.946,00	$1.295.783.840,00	3.712.598,00	$3.861.101.920,00	75%
	SUBTOTAL				**$24.587.687.407,00**		**$24.587.687.407,00**		**$1.376.401.436,00**		**$1.680.331.512,00**		**$3.056.732.948,00**		**$21.530.954.459,00**	
7	**DRENAJE**															
7.1	**MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA DRENAJE**															
7.1.1	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA DRENAJE CON CARGA SOBRE CAMIÓN	M3	46.986,32	$ 12.650,00	$594.376.948,00	46.986,32	$594.376.948,00							46.986,32	$594.376.948,00	100%
7.1.2	RELLENO DRENAJE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	29.571,57	$ 11.135,00	$329.279.432,00	29.571,57	$329.279.432,00							29.571,57	$329.279.432,00	100%
7.1.3	CAMA DE APOYO (ARENA DE RÍO)	M3	3.846,57	$ 107.635,00	$414.025.562,00	3.846,57	$414.025.562,00							3.846,57	$414.025.562,00	100%
7.2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA TANQUE TORMENTA**															
7.2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE	M3	14.841,99	$ 12.650,00	$187.751.174,00	14.841,99	$187.751.174,00							14.841,99	$187.751.174,00	100%
7.2.2	RELLENO TANQUE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	4.055,18	$ 11.140,00	$45.174.705,00	4.055,18	$45.174.705,00							4.055,18	$45.174.705,00	100%
7.3	**COLECTORES CANALES Y CAJAS**															
7.3.1	COMPACTACIÓN DE EXCAVACIÓN	M	5.003,50	$ 4.598,00	$23.006.093,00	5.003,50	$23.006.093,00							5.003,50	$23.006.093,00	100%
7.3.2	CÁRCAMO DE CONCRETO F'C=280 KG/CM2, REFORZADA CON ACERO F'Y=4200 KG/CM2	M	3.880,00	$ 500.000,00	$1.940.000.000,00	3.880,00	$1.940.000.000,00							3.880,00	$1.940.000.000,00	100%
7.3.3	COLECTORES DE CONCRETO 400MM (CLASE III)	M	1.027,50	$ 276.738,00	$284.348.295,00	1.027,50	$284.348.295,00							1.027,50	$284.348.295,00	100%
7.3.4	COLECTORES DE CONCRETO 600MM (CLASE III)	M	247,00	$ 595.174,00	$147.007.978,00	247,00	$147.007.978,00							247,00	$147.007.978,00	100%
7.3.5	COLECTORES DE CONCRETO 900MM (CLASE III)	M	150,00	$ 949.786,00	$142.467.900,00	150,00	$142.467.900,00							150,00	$142.467.900,00	100%
7.3.6	COLECTORES DE CONCRETO 1000MM (CLASE III)	M	351,50	$ 1.125.312,00	$395.547.168,00	351,50	$395.547.168,00							351,50	$395.547.168,00	100%
7.3.7	COLECTORES DE CONCRETO 1100MM (CLASE III)	M	650,00	$ 1.029.239,00	$669.005.350,00	650,00	$669.005.350,00							650,00	$669.005.350,00	100%
7.3.8	COLECTORES DE CONCRETO 1200MM (CLASE III)	M	848,00	$ 1.337.330,00	$1.134.055.840,00	848,00	$1.134.055.840,00							848,00	$1.134.055.840,00	100%
7.3.9	COLECTORES DE CONCRETO 1300MM (CLASE III)	M	650,00	$ 1.505.829,00	$978.788.850,00	650,00	$978.788.850,00							650,00	$978.788.850,00	100%
7.3.10	COLECTORES DE CONCRETO 1400MM (CLASE III)	M	1.079,50	$ 1.660.456,00	$1.792.462.252,00	1.079,50	$1.792.462.252,00							1.079,50	$1.792.462.252,00	100%
7.3.11	TAPA/REJILLA DE FUNDICIÓN 1X1 (TIPO TRAMEX O SIMILAR NO ESTRUCTURAL)	UND	1,00	$ 1.263.940,00	$1.263.940,00	1,00	$1.263.940,00							1,00	$1.263.940,00	100%
7.3.12	CANAL DE CONCRETO REFORZADO F'C=210 KG/CM2 EJECUTADO IN SITU (BASE 1.50 M, ALTURA 0.80 M, TALUD 1H:2V, ESPESOR 0.15 M)	M	123,00	$ 657.435,00	$80.864.505,00	123,00	$80.864.505,00							123,00	$80.864.505,00	100%
7.3.13	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1X1 (TIPO 1)	UND	4,00	$ 6.551.044,00	$26.204.176,00	4,00	$26.204.176,00							4,00	$26.204.176,00	100%
7.3.14	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1,5X1,5 (TIPO 3) CON HUECO EN LA SOLERA	UND	146,00	$ 6.393.467,00	$933.446.182,00	146,00	$933.446.182,00							146,00	$933.446.182,00	100%
7.3.15	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1,5X1,5 (TIPO 2)	UND	41,00	$ 9.446.069,00	$387.288.829,00	41,00	$387.288.829,00							41,00	$387.288.829,00	100%
7.3.16	REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CARGA DE ROTURA 400 KN	M	3.920,00	$ 1.100.000,00	$4.312.000.000,00	3.920,00	$4.312.000.000,00							3.920,00	$4.312.000.000,00	100%
7.3.17	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1.70X1.50 (TIPO 4) CON HUECO EN LA SOLERA	UND	34,00	$ 9.234.034,00	$313.957.156,00	34,00	$313.957.156,00							34,00	$313.957.156,00	100%
7.3.18	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1.70X1.70 (TIPO 5)	UND	2,00	$ 10.712.023,00	$21.424.046,00	2,00	$21.424.046,00							2,00	$21.424.046,00	100%
7.3.19	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1.00X1.00 (TIPO 6)	UND	1,00	$ 1.783.250,00	$1.783.250,00	1,00	$1.783.250,00							1,00	$1.783.250,00	100%
7.3.20	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 2.00X1.50 (TIPO 7)	UND	1,00	$ 8.616.101,00	$8.616.101,00	1,00	$8.616.101,00							1,00	$8.616.101,00	100%
7.3.21	LOSA DE PROTECCIÓN DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ENTRE CÁRCAMO Y COLECTOR PARA RECUBRIMIENTOS Hs0.30 M	M3	1.232,73	$ 797.000,00	$982.485.810,00	1.232,73	$982.485.810,00							1.232,73	$982.485.810,00	100%
7.3.22	CONCRETO DE LIMPIEZA BAJO SOLERA DE CAJAS DE REGISTRO	M3	117,65	$ 546.850,00	$64.336.903,00	117,65	$64.336.903,00							117,65	$64.336.903,00	100%
7.4	**TANQUE DE TORMENTAS IN SITU, COLUMNA DE GRAVA Y PSH**															
7.4.1	CAMA DE APOYO (GRAVA FILTRANTE) TANQUE DE TORMENTA	M3	2.268,00	$ 142.033,00	$322.130.844,00	2.268,00	$322.130.844,00							2.268,00	$322.130.844,00	100%
7.4.2	TANQUE DE TORMENTAS MEDIANTE GEO-CELDA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS	M3	8.291,00	$ 702.000,00	$5.820.282.000,00	8.291,00	$5.820.282.000,00							8.291,00	$5.820.282.000,00	100%
7.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE SEPARADORA DE HIDROCARBUROS	UND	1,00	$ 383.920.866,00	$383.920.866,00	1,00	$383.920.866,00							1,00	$383.920.866,00	100%
7.4.4	CAJA ENTRADA TANQUE DE TORMENTA	UND	2,00	$ 39.806.688,00	$79.613.376,00	2,00	$79.613.376,00							2,00	$79.613.376,00	100%
7.4.5	COLUMNAS DE GRAVA	M	3.200,00	$ 635.000,00	$2.032.000.000,00	3.200,00	$2.032.000.000,00							3.200,00	$2.032.000.000,00	100%
7.4.6	CAMA DE APOYO (ARENA DE RÍO) TANQUES DE TORMENTA	M3	227,00	$ 107.636,00	$24.433.372,00	227,00	$24.433.372,00							227,00	$24.433.372,00	100%
7.4.7	CAJA DE INSPECCION TANQUE GEOCELDAS	UND	12,00	$ 5.336.124,00	$64.033.488,00	12,00	$64.033.488,00							12,00	$64.033.488,00	100%

	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 03			PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
			Enero de 2025	25/01/2025
CONTRATO:	23001170 H4 de 2023	OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	R/L: TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO AIR RIO	R/L: SANTIAGO PAEZ TALERO	1/08/2024	31/07/2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 03	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$56.738.847.471,00.00 incluido AIU e IVA sobre Utilidad	$ 56.738.847.471,00	$ 1.976.223.181,00	$ 1.716.544.936,00	$ 3.692.768.117,00	$ 53.046.079.354,00	93,49%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 03		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
7.5	INSTALACIONES					0,00	$0,00									
7.5.1	TENDIDO DE TUBERÍA BIAXIAL PVC 12"	M	108,00	$ 436.552,00	$47.147.616,00	108,00	$47.147.616,00							108,00	$47.147.616,00	100%
7.5.2	TENDIDO DE TUBERÍA BIAXIAL PVC 18"	M	280,00	$ 900.000,00	$252.000.000,00	280,00	$252.000.000,00							280,00	$252.000.000,00	100%
7.5.3	EXCAVACIÓN DE ZANJA CON CARGA SOBRE CAMIÓN	M3	734,49	$ 12.650,00	$9.291.299,00	734,49	$9.291.299,00							734,49	$9.291.299,00	100%
7.5.4	CAMA DE APOYO (ARENA DE RÍO)	M3	57,76	$ 107.635,00	$6.216.998,00	57,76	$6.216.998,00							57,76	$6.216.998,00	100%
7.5.5	RELLENO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	720,88	$ 11.135,00	$8.026.999,00	720,88	$8.026.999,00							720,88	$8.026.999,00	100%
	SUBTOTAL				$25.260.065.303,00		$25.260.065.303,00		$0,00		$0,00		$0,00		$25.260.065.303,00	
8	ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS															
8.1	VIA PERIMETRAL															
8.1.1	MEJORAMIENTO VIA PERIMETRAL, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	1.583,30	$ 68.584,00	$108.589.047,00	1.583,30	$108.589.047,00							1.583,30	$108.589.047,00	100%
8.1.2	SUBBASE GRANULAR (INVIAS 320), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	2.701,30	$ 198.000,00	$534.857.400,00	2.701,30	$534.857.400,00							2.701,30	$534.857.400,00	100%
8.2	TRANSPORTE					0,00	$0,00									
8.2.1	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3xKM	49.262,68	$ 1.518,00	$74.780.741,00	49.262,68	$74.780.741,00							49.262,68	$74.780.741,00	100%
	SUBTOTAL				$718.227.188,00		$718.227.188,00		$0,00		$0,00		$0,00		$718.227.188,00	
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)				55.466.297.003,00		55.466.297.003,00		1.429.099.283,00		$1.704.091.956,00		$3.133.191.239,00		$52.333.105.764,00	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				$ 42.666.382.310,00		$ 42.666.382.310,00		$ 1.099.307.141,00		$1.310.839.966,00		$2.410.147.107,00		$40.256.235.203,00	
	ADMINISTRACIÓN			24%	$ 10.239.931.754,00		$ 10.239.931.754,00		$ 263.833.714,00		$314.601.592,00		$578.435.306,00		$9.661.496.449,00	
	IMPREVISTOS			1%	$ 426.663.823,00		$ 426.663.823,00		$ 10.993.071,00		$13.108.400,00		$24.101.471,00		$402.562.352,00	
	UTILIDAD			5%	$ 2.133.319.116,00		$ 2.133.319.116,00		$ 54.965.357,00		$65.541.998,00		$120.507.355,00		$2.012.811.760,00	
	VALOR TOTAL AIU			30%	$ 12.799.914.693,00		$ 12.799.914.693,00		$ 329.792.142,00		$393.251.990,00		$723.044.132,00		$12.076.870.561,00	
	IVA			19%	$ 405.330.632,00		$ 405.330.632,00		$ 10.443.418,00		$12.452.980,00		$22.896.398,00		$382.434.234,00	
	A. SUBTOTAL OBRAS				$55.871.627.635,00		55.871.627.635,00		1.439.542.701,00		$1.716.544.936,00		$3.156.087.637,00		$52.715.539.998,00	
	BOLSA DE MONTO AGOTABLE															
9	FONDO DE COMPENSACIONES	BMA	1,00	$ 867.219.836,00	$ 867.219.836,00		$ 867.219.836,00	0,62	$536.680.480,00	0,00	$0,00	0,62	$536.680.480,00	0,38	$330.539.356,00	38%
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				$867.219.836,00		$867.219.836,00		$536.680.480,00		$0,00		$536.680.480,00		$330.539.356,00	
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (NO APLICA)															
	C. SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS															
	TOTAL PRESENTE ACTA				$ 56.738.847.471,00		$ 56.738.847.471,00		$ 1.976.223.181,00		$1.716.544.936,00		$3.692.768.117,00		$53.046.079.354,00	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$56.738.847.471,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100,00%	$56.738.847.471,00
VALOR DE ANTICIPO	20,95%	$11.884.371.800,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	3,48%	$1.976.223.181,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	35,00%	$691.678.113,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	3,03%	$1.716.544.936,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	35,00%	$600.790.728,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	1,97%	$1.115.754.208,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	6,51%	$3.692.768.117,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	35,00%	$1.292.468.841,00
SALDO POR EJECUTAR	93,49%	$53.046.079.354,00
SALDO POR AMORTIZAR	89,12%	$10.591.902.959,00

VALOR TOTAL EN LETRAS MIL SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES:

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

SANTIAGO PAEZ TALERO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

SANTIAGO PAEZ TALERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO AIR RIO

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento (DD / MM / AAAA): 20 / Febrero / 2025

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA**
NIT/CC No.: **901.831.724-8**

Información Contractual

Contrato No.: 23001170 H4 de 2023

Objeto del contrato: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Fecha de suscripción: 30 / may / 2024 (DD / MM / AAAA) — Fecha de terminación: 31 / jul / 2026 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 56.738.847.471,00		$ 1.976.223.181,00	$ 54.762.624.290,00

Información para pago

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☑ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☐ OTRO:

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	4	27-ene-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 11.884.371.800,00
Valor total amortizado a la fecha	$ 691.678.113,00
Amortización presente pago	$ 600.790.728,00
Saldo pendiente de amortizar	$ 10.591.902.959,00

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:
Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 380840371
Nombre entidad bancaria: BANCO DE BOGOTA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Reserva Presupuestal

No. Compromiso presupuestal / RP 157424	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA)** *Descontar amortización
C-2403-0600-28-52104E-2403002-02	$ 1.115.754.208,00
Total a pagar:	**$ 1.115.754.208,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA)** *Descontar amortización
Total a pagar:	**$ -**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:		Firma:	
Nombre:	SANTIAGO PAEZ TALERO	Nombre:	
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL	Cargo:	
Dependencia:	CONSORCIO AIR RIO	Dependencia:	

OBSERVACIONES

CERTIFICACION

Bogotá, 20 de febrero de 2025


Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra No. 23001170 H4 de 2023

Objeto: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Yo SANTIAGO PAEZ TALERO, identificado con la cédula de ciudadanía No 80.882.815 de Bogotá, como representante legal del CONSORCIO AIR RIO, en calidad de INTERVENTOR del Contrato de obra No. 23001170 H4 de 2023, CERTIFICO que el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 03, por un valor total de MIL SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.716.544.936,00) M/CTE., y que la factura No. FE-4 de fecha 27 de enero de 2025, corresponde al corte parcial de obra No.3 del contrato cuyo objeto es REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF), que fue Recibida a satisfacción en el período de enero de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma en Bogotá el día 20 de febrero de 2025.



SANTIAGO PAEZ TALERO
C.C. No. 80.882.815 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO AIR RIO
INTERVENTOR

CERTIFICACION

Bogotá, D.C. febrero 20 de 2025

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra No. 23001170 H4 de 2023

Objeto: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Yo SANTIAGO PAEZ TALERO, identificado con la cédula de ciudadanía No 80.882.815 de Bogotá, como representante legal del CONSORCIO AIR RIO, en calidad de INTERVENTOR del Contrato de obra No. 23001170H4 de 2023, suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL y el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA cuyo objeto es REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF), CERTIFICO, que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA en calidad de contratista de obra, ha cumplido con el buen manejo y correcta inversión del anticipo por valor de $11.884.371.800,00, el cual equivale al 20,94% del valor del contrato, establecido así:

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	PROGRAMACION INICIAL	%	VALOR REPROGRAMADO MODIFICACION	%
1	Logìstica - transporte de materiales y equipos	$ 2.139.186.923	18%	$ 3.505.374.000	29%
2	Materiales	$ 6.369.810.005	54%	$ 4.000.000.000	34%
3	Compra maquinaria	$ 1.700.000.000	14%	$ 1.700.000.000	14%
4	Mano de obra	$ 1.200.000.000	10%	$ 2.600.000.000	22%
5	Combustible y lubricantes	$ 475.374.872	4%	$ 78.997.800	1%
	TOTALES	$ 11.884.371.800	100%	**$ 11.884.371.801**	**100%**

Para el período de enero de 2025 (Acta parcial de obra No.3) se efectuaron 13 desembolsos de la cuenta del Anticipo del contratista desde Fiduciaria Bogotá, correspondientes a las órdenes Nos.12 a la 24, las cuales se encuentran consolidadas en el resumen del Plan de Inversión del Anticipo que a continuación se registra, con un total de 24 desembolsos realizados a la fecha, dentro del manejo del Anticipo del contrato, a saber:

RESUMEN PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - ORDENES 1 A 24						
ÍTEM	COMPONENTE DEL GASTO	VALOR REPROGRAMADO PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO (MODIFICACION 2)	ACUMULADO DESEMBOLSOS ORDENES Nos.1 -11	RESUMEN DESEMBOLSOS PERIODO: ENERO 2025 ORDENES Nos.12-24	RESUMEN DESEMBOLSOS 1 - 24	SALDO POR EJECUTAR
1	**Logìstica - transporte de materiales y equipos**	$ 3.505.374.000	$ 1.705.374.000	$ 1.162.945.000	$ 2.868.319.000	$ 637.055.000
2	**Materiales**	$ 4.000.000.000	$ 263.250.000	$ 1.480.188.056	$ 1.743.438.056	$ 2.256.561.944
3	**Compra maquinaria**	$ 1.700.000.000	$ 103.611.883		$ 103.611.883	$ 1.596.388.118
4	**Mano de obra**	$ 2.600.000.000	$ 715.091.988	$ 655.285.975	$ 1.370.377.963	$ 1.229.622.037
5	**Combustible y lubricantes**	$ 78.997.800	$ 19.980.000	$ -	$ 19.980.000	$ 59.017.800
	SALDOS TOTALES	$ 11.884.371.800	$ 2.807.307.871	**$ 3.298.419.031**	$ 6.105.726.902	**$ 5.778.644.899**

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
C.C. No. 80.882.815 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO AIR RIO
INTERVENTOR

CERTIFICACION

Bogotá D.C., febrero 20 de 2025

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra No. 23001170 H4 de 2023

Objeto: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Yo SANTIAGO PAEZ TALERO, identificado con la cédula de ciudadanía No 80.882.815 de Bogotá D.C, como representante legal del CONSORCIO AIR RIO, en calidad de INTERVENTOR del Contrato de obra No. 23001170 H4 de 2023, suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL y el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA cuyo objeto es REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF), **CERTIFICO que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA** de acuerdo a los soportes y certificaciones entregadas, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales de enero de 2025, señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia de lo anterior se firma en Bogotá el día 20 de febrero de 2025.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
C.C. No. 80.882.815 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO AIR RIO

CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023
OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON identificado con C.C. No. 79.512.143 de Bogotá, en mi condición de representante legal del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA identificado con NIT.901.831.724-8, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición del presente certificado y cuando a ello hubiere lugar; en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, D.C., a los 20 días del mes de febrero de 2025.

Atentamente,



YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

AURA LIBIA RAMIREZ RAMIREZ, identificada con C.C. No. 30.288.022, y con Tarjeta Profesional No. 40528-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de RG INGENIERIA SAS identificada con Nit 834.000.377-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÀ, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, D.C., a los 14 días del mes de febrero de 2025.



NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: AURA LIBIA RAMIREZ RAMIREZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 3 9 0 3 A 5 4 0 A 2 B 7 8 4 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AURA LIBIA RAMIREZ RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30288022 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 40528-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

40528-T

AURA LIBIA
RAMIREZ RAMIREZ
C.C. 30288022
RESOLUCION INSCRIPCION 068 FECHA 13/10/94
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

000047703

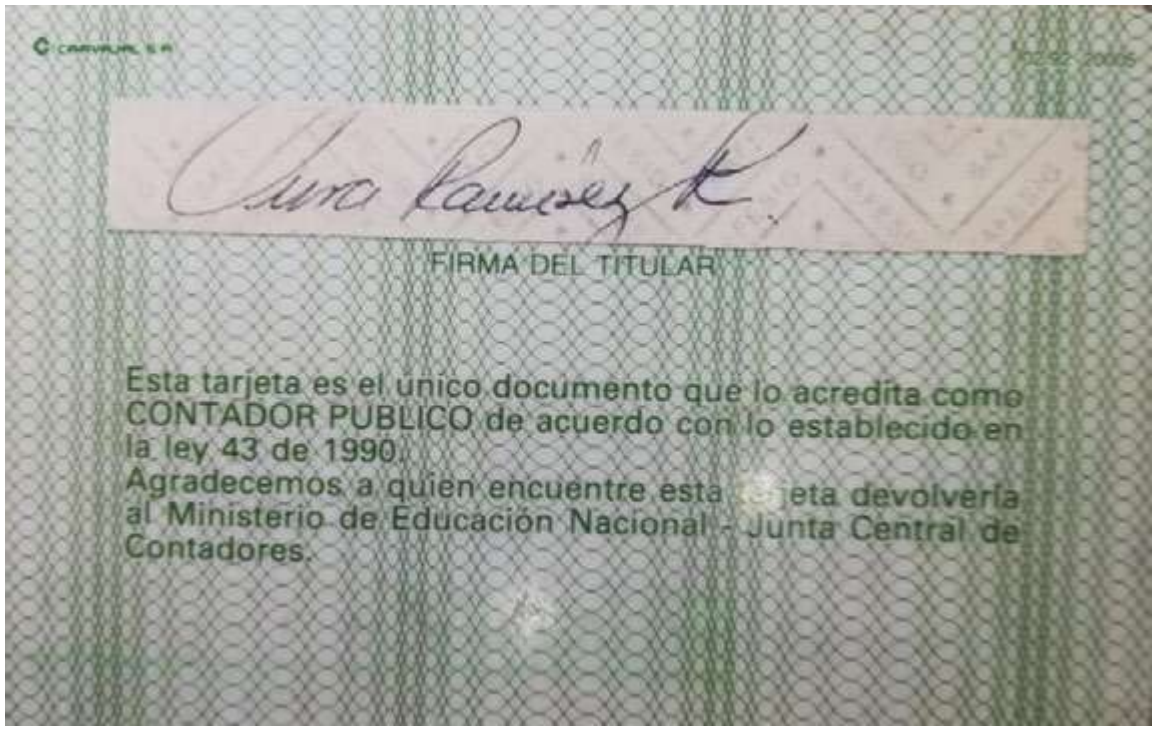

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1963
MANZANARES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
14-DIC-1981 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
30288022
NUMERO
RAMIREZ RAMIREZ
APELLIDOS
AURA LIBIA
NOMBRES
FIRMA

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Paola Andrea Malagon Niño identificado con cedula 63.539.126, y con tarjeta profesional No. 235252-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisora fiscal de IMCCA SAS identificada con NIT 901.538.098-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes alas Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 16 días del mes de febrero de 2025.

Paola Andrea Malagon Niño
Revisora fiscal
CC. 63.539.126 de Bucaramanga
TP. 235252-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B967BE5F5AC15702

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAOLA ANDREA MALAGON NIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63539126 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 235252-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

235252-T

PAOLA ANDREA
MALAGON NIÑO
C.C. 63539126
RES. INSCRIPCION 947 DEL 04/12/2017
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

240949 258528



Identificación Plástica S.A. 170014/0113

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63539126

MALAGON NIÑO
APELLIDOS

PAOLA ANDREA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1983
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

31-MAY-2001 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-2700100-59096572-F-0063539126-20011208 03790 01341A 01 118933091

La Suscrita Revisora Fiscal

de

INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA.
NIT. 900.055.521-7

CERTIFICA

Que a la fecha y durante los últimos seis meses la empresa INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA. Identificada con NIT.900.055.521-7 ha realizado el pago de los salarios y los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a parafiscales correspondientes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje dando cumplimiento a la Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002.

La presente certificación se expide el día (12) del mes de febrero de 2025.

Atentamente,

SANDRA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
REVISORA FISCAL
C.C.52.804.277 de Bogotá TP.194933-7

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6306870D53C210DA1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA GONZALEZ MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52804277 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 194933-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.804.277
GONZALEZ MARTINEZ
APELLIDOS
SANDRA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1981
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-NOV-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00647661-F 0052804277-20141126 0041384987A 3 1483136308

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

194933-T



SANDRA
GONZALEZ MARTINEZ
C.C. 52804277
RESOLUCION INSCRIPCION 1364 FECHA 24/09/2014
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 207175

186329

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 646 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 98 No. 9A - 27 Bogota D.C.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901831724-8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	CRA 67 nO. 167-61 OFIC 509	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	13/01/2025	83335570	$10.336.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	100.000	0		0		0	4	300	0	100.300	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	225.400	0		0		0	4	600	0	226.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	116.500	0		0		0	4	300	0	116.800	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	64.200	0		0		0	4	200	0	64.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	190.500	0		0		0	4	500	0	191.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	282.500	0		0		0	4	800	0	283.300	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	128.000	0		0		0	4	400	0	128.400	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	125.300	0		0		0	4	400	0	125.700	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	100.000	0		0		0	4	300	0	100.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	500.900	0	0	0	0	4	1.300	0	502.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.908.000	0	0	0	0	4	9.800	0	3.917.800	11
231001	Colfondos	800227940-6	400.000	0	0	0	0	4	1.100	0	401.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	518.800	0	0	0	0	4	1.300	0	520.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.317.700				2.317.700	4	5.800	2.323.500			23.177	2.323.500	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF30	Caja Fliar La Guajira	892115006-5	1.332.400	4	3.400	1.335.800	15

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901831724-8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA		CRA 67 nO. 167-61 OFIC 509	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	13/01/2025	83335570	$10.336.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	1.332.400	1.336.200
Pensión	4	5.327.700	5.341.200
Riesgos Laborales	1	2.317.700	2.323.500
CCF	1	1.332.400	1.335.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	10.310.200	10.336.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901831724-8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA		CRA 67 nO. 167-61 OFIC 509	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	13/01/2025	83335570	$10.336.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006615156	ANGULO FONTALVO VICTOR MANUEL	1	0			S								X								230301	1.610.587	257.700	0	0	0	0	EPS005	1.610.587	64.500	14-11	1.610.587	5	112.100	CCF30	1.610.587	64.500	0	0	0	0	0
2	CC	1020799254	GONZALEZ ROBAYO RAFAEL	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF30	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1052396873	CORREDOR CANO CARLOS ANDRES	1	0			S								X								230301	1.604.652	256.800	0	0	0	0	EPS037	1.604.652	64.200	14-11	1.604.652	5	111.700	CCF30	1.604.652	64.200	0	0	0	0	0
4	CC	1071915149	VERA RODRIGUEZ OSCAR MAURICIO	1	0			S								X								230301	2.246.478	359.500	0	0	0	0	EPS017	2.246.478	89.900	14-11	2.246.478	5	156.400	CCF30	2.246.478	89.900	0	0	0	0	0
5	CC	1095913270	MORALES ESTEBAN ALFONSO	1	0			S								X								230301	1.604.652	256.800	0	0	0	0	EPS010	1.604.652	64.200	14-11	1.604.652	5	111.700	CCF30	1.604.652	64.200	0	0	0	0	0
6	CC	1102361348	ROBAYO LARA ARIEL DUVAN	1	0			S								X								230301	1.592.782	254.900	0	0	0	0	EPS037	1.592.782	63.800	14-11	1.592.782	5	110.900	CCF30	1.592.782	63.800	0	0	0	0	0
7	CC	81740284	TORRES GUARIN JULIO	1	0			S								X								25-14	1.608.043	257.300	0	0	0	0	EPS041	1.608.043	64.400	14-11	1.608.043	5	112.000	CCF30	1.608.043	64.400	0	0	0	0	0
8	CC	84007762	RODRIGUEZ OJEDA ROGER RAFAEL	1	0			S								X								230301	3.861.565	617.900	0	0	0	0	EPS037	3.861.565	154.500	14-11	3.861.565	5	268.800	CCF30	3.861.565	154.500	0	0	0	0	0
9	CC	84080207	CEBALLOS MARTINEZ ELDER ENRIQUE	1	0			S								X								25-14	1.634.326	261.500	0	0	0	0	EPS002	1.634.326	65.400	14-11	1.634.326	5	113.800	CCF30	1.634.326	65.400	0	0	0	0	0
10	CC	8643449	ESCORCIA RODRIGUEZ SAMIR ANTONIO	1	0			S								X								230201	3.130.435	500.900	0	0	0	0	ESSC24	3.130.435	125.300	14-11	3.130.435	5	217.900	CCF30	3.130.435	125.300	0	0	0	0	0
11	CC	91287950	BARRERA HERNANDO HERNANDEZ	1	0			S																230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	MIN001	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF30	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
12	CC	92190949	PEREZ ROSALES JUAN CARLOS	1	0			S																230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS002	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	5	278.400	CCF30	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
13	CC	1121296720	RODRIGUEZ GOMEZ VICTOR JAIME	1	0			S								X								230301	1.588.826	254.300	0	0	0	0	EPS041	1.588.826	63.600	14-11	1.588.826	5	110.600	CCF30	1.588.826	63.600	0	0	0	0	0
14	CC	3144427	CRUZ MORENO HENRRY LEONARDO	1	0			S								X								230301	2.512.543	402.100	0	0	0	0	EPS017	2.512.543	100.600	14-11	2.512.543	5	174.900	CCF30	2.512.543	100.600	0	0	0	0	0
15	CC	79311998	CHAVARRO MUÑOZ TIBER GILDARDO	1	0			S																231001	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS001	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF30	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901831724-8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	CRA 67 nO. 167-61 OFIC 509	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	Y	04/02/2025	83441269	$503.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	495.500				495.500	26	8.200	503.700			4.955	503.700	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	26	0	0	0
ICBF				
0	26	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	495.500	503.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	495.500	503.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901831724-8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA		CRA 67 nO. 167-61 OFIC 509	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	Y	04/02/2025	83441269	$503.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10524225	CASTRO SALAZAR VICTOR DANIEL	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	19272831	MORA GRANDAS PEDRO JOSE	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	19371269	CANTOR BELLO MELQUICEDEC	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	6773087	GONZALEZ VERGARA CARLOS JAVIER	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	79471549	JAIMES SILVA ROBERTO ANDERSON	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **YAMILL ALONSO MONTENEGRO**, identificada con **NI** número **79512143**, aportó por **DIEGO ALEXANDER OSORIO MURIEL** identificado(a) con **CC** número **94406535** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 12 - 2024 y 01 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$5,300,000	0.16000	$848,000	$26,500	$26,500	Diciembre - 2024	83337316	15/01/2025	Si
14-11	ARL SURA	1															0		30	$5,300,000	0.06960	$368,900	$0	$0	Diciembre - 2024	83337316	15/01/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$5,300,000	0.04000	$212,000	$0	$0	Diciembre - 2024	83337316	15/01/2025	Si
EPS002	Salud Total EPS	1															0		30	$5,300,000	0.04000	$212,000	$0	$0	Enero - 2025	83337316	15/01/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **3** días del mes **Febrero** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10524225	VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR	CRA 49 91 76	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	04/02/2025	83853227	$412.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	178.000	0		0		0	26	3.000	0	181.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	26	3.800	0	231.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	26	0	0	0
ICBF				
0	26	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	181.000
Pensión	1	227.800	231.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	412.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	10524225	VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR		CRA 49 91 76	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	04/02/2025	83853227	$412.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10524225	CASTRO SALAZAR VICTOR DANIEL	3	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	19371269
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MELQUICEDEC CANTOR BELLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 70 A BIS 104 71	TELÉFONO:	6243324
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7954293380**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1161583661

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.750.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.750.000	$ 0	$ 0	$ 1.750.000
SUBTOTALES:													**$ 1.750.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.750.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 73.100	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 73.100
SUBTOTALES:									**$ 73.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 73.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 19371269	CANTOR BELLO MELQUICEDEC	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PENS VEJ ACT	$ 2.000.000				NO									01-31												$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 14.000.000	$ 1.750.000	$ 0	$ 1.750.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 14.000.000	19371269	$ 73.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.823.100**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6773087
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS JAVIER GONZALEZ VERGARA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 63 NO. 22A-41 AP 607	TELÉFONO:	9065312
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7953728189**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1195634226

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 986.000	$ 0	$ 0	$ 30.900	$ 30.900	$ 0	$ 0	$ 1.047.800	$ 0	$ 1.047.800
SUBTOTALES:										**$ 1.047.800**	**$ 0**	**$ 1.047.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 770.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 770.300	$ 0	$ 0	$ 770.300
SUBTOTALES:													**$ 770.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 770.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 6773087	GONZALEZ VERGARA CARLOS JAVIER	INDEPEND		$ 6.162.100				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.162.100	$ 986.000	$ 30.900	$ 30.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.047.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 6.162.100	$ 770.300	$ 0	$ 770.300			$ 0		$ 0		$ 0	$ 0			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.818.100**

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79471549	ROBERTO ANDERSON JAIMES SILVA	Carrera 15 No 16 - 00 casa 88	3158318673	robertoajaimes@gamil.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	08/01/2025	82967848	$618.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	48.800				48.800	0	0	48.800			488	48.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	48.800	48.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	618.800	618.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79471549	ROBERTO ANDERSON JAIMES SILVA	Carrera 15 No 16 - 00 casa 88	3158318673	robertoajaimes@gamil.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	08/01/2025	82967848	$618.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79471549	JAIMES SILVA ROBERTO ANDERSON	57	0			N																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	250.000	14-23	2.000.000	3	48.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901274707	2	AEROTYP INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TECNICO	Carrera 7 C BIS No. 139-18 ofic 609	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4779822	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1167840306	9479744577	E	2025/01/03	2025/01/02	BANCOLOMBIA	0	$523,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TECNICO (1 Afiliados)					$0	$0			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$243,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)					$0	$0			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$243,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$243,600		$0	$0
1	CC	19272831 MORA PEDRO		0	$0	$0	EPS008	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$0	$0			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$243,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901274707	2	AEROTYP INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TECNICO	Carrera 7 C BIS No. 139-18 ofic 609	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4779822	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1167840306	9479744577	E	2025/01/03	2025/01/02	BANCOLOMBIA	0	$523,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,600	$0	$0	$243,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$243,600	$0	$0	$243,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,000	$0	$0	$140,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$140,000	$0	$0	$140,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,000	$0	$0	$140,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$140,000	$0	$0	$140,000
TOTAL				**1**	**$523,600**	**$0**	**$0**	**$523,600**

Banco de Bogotá


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA identificado(a) con NITPJ 9018317248 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 380840371 desde el 20 de mayo de 2024, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 20 de mayo de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141039807923

(415)7707212489984(8020) 000014103980792 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 1 7 2 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 67 167 61 OF 509

42. Correo electrónico infraestructuranacional@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 4 7 6 8 4 6 2	3 1 6 6 2 2 9 8 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 5 0 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 15 / 16 : 57: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MONTENEGRO CALDERON YAMILL ALONSO

985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141039807923

(415)7707212489984(8020) **000014103980792 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 1 7 2 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 1 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 1 1 2	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141039807923

(415)7707212489984(8020) **000014103980792 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 1 7 2 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 1 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 1 2 1 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MONTENEGRO	CALDERON	YAMILL	ALONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 3 1 1 9 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CHAVARRO	MUÑOZ	TIBER	GILDARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141039807923

(415)7707212489984(8020) **000014103980792 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 1 7 2 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 4 0 0 0 3 7 7	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: RG INGENIERIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 0 1 1 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 5 5 5 2 1	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 0 1 1 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 3 8 0 9 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: IMCCA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 4 0 1 1 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14814939639

(415)7707212489984(8020) 000001481493963 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 3 7 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
RG INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CRA 67 NO 167 61 OF 509 CENTRO EMPRESARIAL COLINA OFFICE PARK

42. Correo electrónico rg.ingsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 3 8 2 3 0 2 7	6 0 1 4 7 6 8 4 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 5 1 2 3 1	4 9 2 3	2 0 1 0 0 3 0 1		7 7 3 0	4 2 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	2 1	4 2	4 8	5 2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
21- Declarar ingreso o salida del país de d
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3	2 2																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 02 - 25 / 16 : 21: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CHAVARRO MUÑOZ TIBER GILDARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14814939639

(415)7707212489984(8020) **000001481493963 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 3 7 7	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 6 6 7	3 8
73. Fecha	1 9 9 5 1 0 3 1	2 0 1 6 0 3 0 1
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 8 0 6 0 3	2 0 1 6 0 7 0 6
77. No. Matrícula mercantil	6 3 6 8 0 4	8 7 3 5 2 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 5 1 0 3 1	2 0 1 6 0 3 0 1
81. Hasta	2 0 1 0 1 0 3 1	2 0 5 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14814939639

(415)7707212489984(8020) 000001481493963 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 3 7 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 3 1 1 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 3 1 1 9 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CHAVARRO	MUÑOZ	TIBER	GILDARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 3 1 1 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 0 8 5 8 7 6 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROBAYO	HURTADO	ROCIO	DEL PILAR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14814939639

(415)7707212489984(8020) 000001481493963 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 3 7 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	2 0 8 5 8 7 6 6		COLOMBIA 1 6 9	ROBAYO	HURTADO	ROCIO	DEL PILAR		182,000,000	4 5 . 5	1 9 9 5 1 0 3 1	
2	Cédula de Ciudada 1 3	9 1 0 9 1 8 0 2 6 7 3		COLOMBIA 1 6 9	CHAVARRO	ROBAYO	CATHERIN			25,000,000	6 . 2 5	1 9 9 5 1 0 3 1	
3	Cédula de Ciudada 1 3	7 9 3 1 1 9 9 8		COLOMBIA 1 6 9	CHAVARRO	MUÑOZ	TIBER	GILDARDO		193,000,000	4 8 . 2 5	2 0 0 5 0 2 1 0	
4													
5													

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14814939639

(415)7707212489984(8020) **000001481493963 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 3 7 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 0 2 8 8 0 2 2		4 0 5 2 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RAMIREZ	RAMIREZ	AURA	LIBIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 1 2 0 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 5 4 6 3 3 4 3		2 4 5 4 7 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LOPEZ	DIAZ	EDWIN	ANTONIO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 8 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14814939639

(415)7707212489984(8020) **000001481493963 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 3 7 7	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangi 7 7 3 0	

162. Nombre del establecimiento: RG INGENIERIA S.A.S

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 67 167 61 OF 509

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 1 7 6 8 9 1	2 0 0 2 0 4 2 4	
168. Teléfono: 4 7 6 8 4 6 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14812964672

(415)7707212489984(8020) 000001481296467 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 5 5 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INFRANAL

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 49 91 76 BRR LA CASTELLANA

42. Correo electrónico facturacion@grupoymc.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 9 1 6 1 3 9	6 0 1 6 3 5 3 2 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 5 1 1 1 6	7 1 1 2	2 0 2 1 0 1 0 4		4 3 1 1	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 02 - 16 / 14 : 36: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MONTENEGRO CALDERON YAMILL ALONSO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 16-02-2022 02:36:48PM

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14812964672

(415)7707212489984(8020) **000001481296467 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 5 5 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	2 8 3 6	
73. Fecha	2 0 0 5 1 1 1 5	
74. Número de notaría	1 1	
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 5 1 1 1 8	
77. No. Matrícula mercantil	1 5 4 8 3 9 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 5 1 1 1 5	
81. Hasta	2 0 2 5 1 1 1 5	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14812964672

(415)7707212489984(8020) **000001481296467 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 5 5 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 5 1 1 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 1 2 1 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MONTENEGRO	CALDERON	YAMILL	ALONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 7 1 0 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 0 1 9 6 4 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CORTES	CORREDOR	EMILIA	PATRICIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14812964672

(415)7707212489984(8020) **000001481296467 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 5 5 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 0 1 9 6 4 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CORTES	CORREDOR	EMILIA	PATRICIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
40,000,000	4 0	2 0 0 5 1 1 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 5 1 2 1 4 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MONTENEGRO	CALDERON	YAMILL	ALONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
60,000,000	6 0	2 0 0 5 1 1 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14812964672

(415)7707212489984(8020) **000001481296467 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 5 5 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 8 0 4 2 7 7		1 9 4 9 3 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GONZALEZ	MARTINEZ	SANDRA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 6 0 4 2 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 2 9 1 5 4 1		1 3 5 1 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
TRIANA	OTALORA	WILSON	ENRIQUE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 0 5 1 1 1 5

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14812964672

(415)7707212489984(8020) **000001481296467 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 5 5 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2	

162. Nombre del establecimiento: INFRAESTRUCTURAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 49 91 76 BRR LA CASTELLANA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 5 4 8 5 2 0	2 0 0 5 1 1 1 5	
168. Teléfono: 6 3 5 3 2 4 5	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14918286884

(415)7707212489984(8020) 000001491828688 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 8 0 9 8	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
IMCCA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CL 36 27 71 OF 810 ED MILLENIUM

42. Correo electrónico sa.sanchez46@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 6 7 8 2 4 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 1 1 0 2							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	8	5	2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 03 / 11 : 58: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ MANTILLA SANTIAGO ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918286884

(415)7707212489984(8020) **000001491828688 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 8 0 9 8	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 1 1 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 1 1 0 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 6 0 4 9 5 1	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 1 1 0 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918286884

(415)7707212489984(8020) **000001491828688 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 8 0 9 8	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 1 1 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 8 6 8 2 1 6 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	MANTILLA	SANTIAGO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918286884

(415)7707212489984(8020) **000001491828688 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 8 0 9 8	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 5 3 9 1 2 6		2 3 5 2 5 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MALAGON	NIÑO	PAOLA	ANDREA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 4 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Consulta Soportes de Tramite de Operación en Fiduciaria	Fiduciaria Bogotá
Negocio	121404
Fecha del Movimiento / Pago	9/01/2025
Descripción Titular	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Valor de la Operación	$ 1.925.150,00
Cuenta de Pago / Recaudadora (Origen)	003065638
Identificación Beneficiario	899999059
Nombre Beneficiario	TESORO NACIONAL AEROCIVIL
Concepto	GIRO DE RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2024
Tipo de cuenta de Destino	AHORROS
Nombre del Banco	BANCO OCCIDENTE
Número de Cuenta de Beneficiario	221800287
Estado del pago	PAGADA

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025020101CD3178745772



51459 489-2373

FIDUBOGOTA SA PA CONS INFRA RIOHACHA
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1154
51459

FECHA EXTRACTO **Enero - Enero 2025**
Desde: Enero 01 Hasta: Enero 31
Cuenta Número: 003065638
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 365
Cod. Origen: 1154
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**9,066,201,782.00**
Total 000001 Abonos:	13,193,676.00
Total 000012 Cargos:	-3,300,378,991.00
Total IVA:	-6,615.00
Total 4x1000 GMF:	-13,201,543.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,925,150.00
Saldo Final:	**5,767,733,459.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/12	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	1,925,150.00	9,068,126,932.00
09/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	-1,925,150.00	9,066,201,782.00
09/01	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	-4,440.00	9,066,197,342.00
09/01	GT08	Cargo IVA	Bogota	GERENCIA PYME 11		-844.00	9,066,196,498.00
09/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GERENCIA PYME 11		-7,722.00	9,066,188,776.00
20/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Consorcio Infraestructura Metro	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	13,193,676.00	9,079,382,452.00
20/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	-342,793,980.00	8,736,588,472.00
20/01	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	-8,880.00	8,736,579,592.00
20/01	GT08	Cargo IVA	Bogota	GERENCIA PYME 11		-1,687.00	8,736,577,905.00
20/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GERENCIA PYME 11		-1,371,219.00	8,735,206,686.00
21/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	-1,459,772,995.00	7,275,433,691.00
21/01	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	-4,440.00	7,275,429,251.00
21/01	GT08	Cargo IVA	Bogota	GERENCIA PYME 11		-844.00	7,275,428,407.00
21/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GERENCIA PYME 11		-5,839,113.00	7,269,589,294.00
22/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	-279,600,000.00	6,989,989,294.00
22/01	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	-8,170.00	6,989,981,124.00
22/01	GT08	Cargo IVA	Bogota	GERENCIA PYME 11		-1,552.00	6,989,979,572.00
22/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GERENCIA PYME 11		-1,118,439.00	6,988,861,133.00
27/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	-15,664,000.00	6,973,197,133.00
27/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	-1,200,588,056.00	5,772,609,077.00
27/01	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	-4,440.00	5,772,604,637.00
27/01	GT08	Cargo IVA	Bogota	GERENCIA PYME 11		-844.00	5,772,603,793.00
27/01	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	-4,440.00	5,772,599,353.00
27/01	GT08	Cargo IVA	Bogota	GERENCIA PYME 11		-844.00	5,772,598,509.00
27/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GERENCIA PYME 11		-4,865,050.00	5,767,733,459.00
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3329101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles SAS NIT 860.028.580-2

CIR-AEROCIVIL-ADMON-013-2024

SEÑORES
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL -AEROCIVIL
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 DE 2023, cuyo objeto es: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

ASUNTO: ENVÍO DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL NO.3

Respetados señores:

Cordial saludo.

De manera atenta, remitimos la documentación para el trámite de pago del Acta de Recibo Parcial No.3 correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero de 2025, para su información y fines pertinentes.

DOCUMENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	
Factura ELECTRONICA SE ENVIA A SIIF NACION CUANDO ESTE APROBADA LA CUENTA	1			
Acta Resumen Parcial	1			
Liquidación Iva	1			
Acta Excel Presupuesto de Costos	4			
Certificación Cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de servicios	1			
Certificación de la factura Por interventoría en Obra	1			
Certificación de la factura Por Supervisor en Interventoría			X	
Certificación del Uso del anticipo por la interventoría en Obra	1			
Certificación del Uso del anticipo por EL Supervisor a la interventoría			X	
Certificación de los Aportes a Parafiscales x La interventoría en Obra	1			
Certificación de los Aportes a Parafiscales por el Supervisor en interventoría			X	
Nota Aclaratoria como se calculó el cobro del acta de Interventoría			x	
Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de Obra en cuentas de obra con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación DE Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales	13			

DOCUMENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	
Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de interventoría en cuentas de interventoría con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación de Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales			X	
Fotocopias de las Planillas de Pagos Parafiscales del periodo facturado	14			
Certificación Bancaria	1			
Certificación Rut Dian	20			
Certificación de la consignación de los rendimientos Financieros a la entidad Cuando hay Anticipo	2			
Oficio remisorio del Acta a Cobrar	2			
Pantallazo del SECOP Evidenciando el cargue de las cuentas en el numeral 7 Ejecución del contrato / Plan de Pagos A partir de la Segunda Cuenta				
Para la primera cuenta de Interventoría la Designación del Supervisor firmada			X	
Documentos de Acuerdo a lo que dice el contrato				
LAS FIRMAS EN LAS ACTAS DE ACUERDO AL ULTIMO MANUAL DE CONTRATACION				
Anexo Memorias o Informes Según el Caso al final de los documentos o PDF aparte.	75			
Para la Primera Y Ultima Cuenta (Acta de recibo Final) Anexar Contrato, Acta de Inicio, CDP, RP, Aprobación de Garantías y Documentos Contractuales que se Presenten en el Contrato			X	
Si es acta de recibo final se requiere anexar el formato 65 acta de recibo final con Aprobación de Garantías y Pólizas Actualizadas.			X	

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente,



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
YAMILL MONTENEGRO CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL S

C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO: Mónica Román


Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ver contrato
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Pago 001
FE-3
12/04/2024 10:24:00 AM
12/04/2024 12:00:00 PM
536.680.460 COP
Pagado
Detalle
Pago 002
FE-2
12/03/2024 12:53:00 PM
12/03/2024 12:00:00 PM
1.439.542.701,14 COP
Pagado
Detalle
Crear

AERONÁUTICA CIVIL	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA**	**MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA** **ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**	HOJA: 1 DE 1 VERSION 1.0

OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"

FASE/ETAPA:		CONSTRUCCIÓN	**CONTRATANTE:** AERONAUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES		**CONSTRUCTOR:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	**CONTRATO DE OBRA No.** 23001170 H4 de 2023
CAPITULO: 1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**INTERVENTOR:** CONSORCIO AIR RIO	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 23001282 H3 de 2023
ITEM: **1.1**	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO**		**UNIDAD:** M2

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA	DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIOÓN	longitud (m)	ancho (m)	espesor (m)	área (m2)	CANT ELEM	TOTAL
	Costado Norte de la Pista Acta No.2				19.250,00		19.250,00
	Costado Sur de la Pista Acta No.2				23.839,00		23.839,00
	Costado Norte de la Pista Acta No.3				19.428,00		19.428,00

OBSERVACIONES:	CANTIDAD REPORTADA A LA FECHA: **62.517,00**
	CANTIDAD REPORTADA ACTAS ANTERIORES: 43.089,00
	CANTIDAD A REPORTAR PRESENTE ACTA : **19.428,00**

OSCAR VILLARREAL CONSORCIO AIR RIO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**DEYBER FLOREZ** CONSORCIO AIR RIO TOPÓGRAFO	**JUAN CARLOS PÉREZ ROSALES** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA RESIDENTE DE OBRA	**ARIEL DUVÁN ROBAYO LARA** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA TOPÓGRAFO

AERONÁUTICA CIVIL	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA**	**MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA** **ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**	HOJA: 1 DE 1 VERSION 1.0

OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"

FASE/ETAPA:		CONSTRUCCIÓN	**CONTRATANTE:** AERONAUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES		**CONSTRUCTOR:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	**CONTRATO DE OBRA No.** 23001170 H4 de 2023
CAPITULO: 6	**ADECUACIÓN FRANJA**	**INTERVENTOR:** CONSORCIO AIR RIO	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 23001282 H3 de 2023
ITEM: 6.4	**COMPACTACIÓN Y REFINO DE FONDO DE EXCAVACIÓN**		**UNIDAD:** M2

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIOÓN	longitud (m)	ancho (m)	espesor (m)	área (m2)	CANT ELEM	TOTAL
Costado Norte de la Pista Acta No.2	1.762,60			19.250,00		19.250,00
Costado Sur de la Pista Acta No.2	1.900,00			23.839,00		23.839,00
Costado Norte de la Pista Acta No.3	1.762,60			19.428,00		19.428,00

OBSERVACIONES:

CANTIDAD REPORTADA A LA FECHA:	**62.517,00**
CANTIDAD REPORTADA ACTAS ANTERIORES	43.089,00
CANTIDAD A REPORTAR PRESENTE ACTA :	**19.428,00**

OSCAR VILLARREAL CONSORCIO AIR RIO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**DEYBER FLOREZ** CONSORCIO AIR RIO TOPÓGRAFO	**JUAN CARLOS PÉREZ ROSALES** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA RESIDENTE DE OBRA	**ARIEL DUVÁN ROBAYO LARA** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA TOPÓGRAFO

AERONAUTICA CIVIL	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA**	**MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA** **ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**	HOJA: 1 DE 1 VERSION 1.0

OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"

FASE/ETAPA:		CONSTRUCCIÓN	**CONTRATANTE:** AERONAUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES		**CONSTRUCTOR:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	**CONTRATO DE OBRA No.** 23001170 H4 de 2023
CAPITULO: 6	**ADECUACIÓN FRANJA**	**INTERVENTOR:** CONSORCIO AIR RIO	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 23001282 H3 de 2023
ITEM: 6.6	**RELLENOS LOCALIZADOS CON MATERIAL IMPORTADO**		**UNIDAD:** M3

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA	DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIOÓN	longitud (m)	ancho (m)	espesor (m)	VOLUMEN (m3)	CANT ELEM	TOTAL
	Costado Norte de la Pista Acta No.2	1.762,60			3.380,00		3.380,00
	Costado Sur de la Pista Acta No.2	1.900,00			2.780,00		2.780,00
	Costado Norte de la Pista Acta No.3	1.762,60			7.790,80		7.790,80

OBSERVACIONES:

CANTIDAD REPORTADA A LA FECHA:	**13.950,80**
CANTIDAD REPORTADA ACTAS ANTERIORES	6.160,00
CANTIDAD A REPORTAR PRESENTE ACTA :	**7.790,80**

OSCAR VILLARREAL CONSORCIO AIR RIO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**DEYBER FLOREZ** CONSORCIO AIR RIO TOPÓGRAFO	**JUAN CARLOS PÉREZ ROSALES** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA RESIDENTE DE OBRA	**ARIEL DUVAN ROBAYO LARA** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA TOPÓGRAFO

AERONAUTICA CIVIL	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA**	**MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA** **ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**	HOJA: 1 DE 1 VERSION 1.0

OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"

FASE/ETAPA:	PRIMERA FASE	**CONTRATANTE:** AERONAUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSTRUCTOR:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	**CONTRATO DE OBRA No.** 23001170 H4 de 2023
CAPITULO: 6 **ADECUACIÓN FRANJA**	**INTERVENTOR:** CONSORCIO AIR RIO	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 23001282 H3 de 2023
ITEM: 6.10	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA (37 KM)**	**UNIDAD:** M3xKM

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIOÓN	longitud (m)	ancho (m)	espesor (m)	VOLUMEN (m3)	EXPANSION (%)	DISTANCIA (KM)	TOTAL
Costado Norte de la Pista Acta No.2	1.762,60			3.380,00	1,30	68,70	301.868,00
Costado Sur de la Pista Acta No.2	1.900,00			2.780,00	1,30	68,70	248.282,00
Costado Norte de la Pista Acta No.3	1.762,60			7.790,80	1,30	68,70	695.796,00

OBSERVACIONES:
La unidad de medida será el metro cúbico-kilómetro (m3 -km). La medida corresponderá al número de metros cúbicos, aproximado al metro cúbico completo, medido en su posición original, y multiplicado por la distancia de transporte expresada en kilómetros, con aproximación al décimo de kilómetro.
Fuente de Mterial CUESTECITAS – Corregimiento de CUESTECITAS, Jurisdicción de Municipio de Riohacha - Distancia 68,70 Km.

CANTIDAD REPORTADA A LA FECHA:	**1.245.946,00**
CANTIDAD REPORTADA ACTAS ANTERIORES:	550.150,00
CANTIDAD A REPORTAR PRESENTE ACTA :	**695.796,00**

OSCAR VILLARREAL CONSORCIO AIR RIO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**DEYBER FLOREZ** CONSORCIO AIR RIO TOPÓGRAFO	**JUAN CARLOS PÉREZ ROSALES** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA RESIDENTE DE OBRA	**ARIEL DUVAN ROBAYO LARA** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA TOPÓGRAFO

ANEXOS

CAPITULO 1

ACTIVIDADES PRELIMINARES


ITEM 1.1

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

CARTERA TOPOGRÁFICA AREA DE RELLENO FRANJA NORTE			
PUNTO	NORTE	ESTE	DESCRIPCIÓN
1	1766696,916	1124599,1	LIM_RELLENO
2	1766685,955	1124599,473	LIM_RELLENO
3	1766715,886	1125479,396	LIM_RELLENO
4	1766745,96	1126363,495	LIM_RELLENO
5	1766756,956	1126363,11	LIM_RELLENO
6	1766726,949	1125480,831	LIM_RELLENO

AREAS Y VOLUMENES RELLENO FRANJA NORTE

ÁREAS Y VOLUMENES DE RELLENO		
	ÁREA (m²)	VOLUMEN (m³)
RELLENO NORTE	19428,2	7790,81

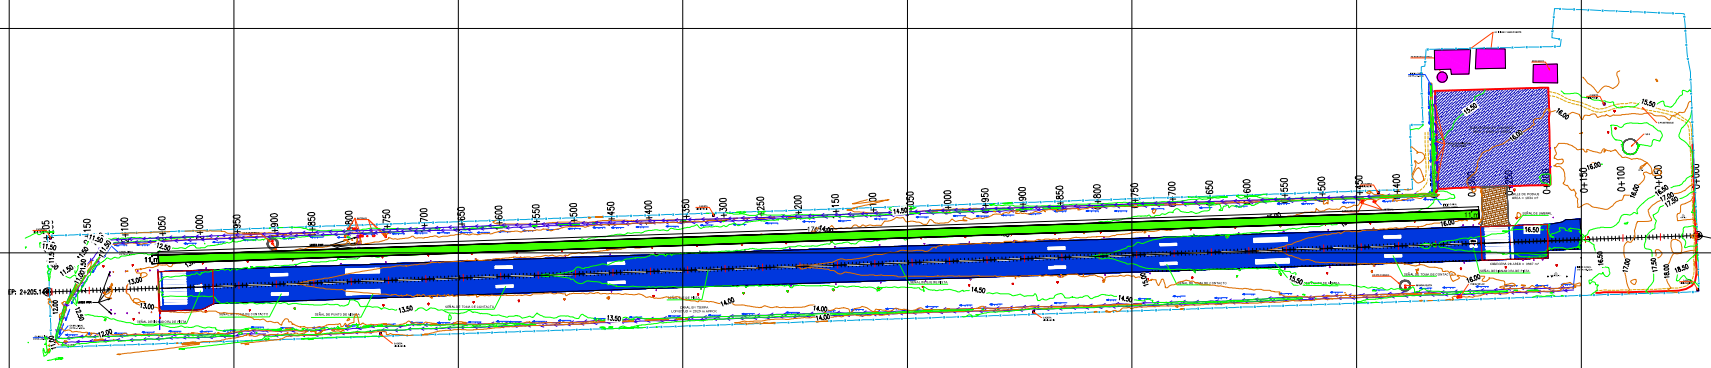

1:2500 0 50 100 150 200 250 m. METROS

CUADRO DE COORDENADAS VERTICES AMARRE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA
GPS1	1766813.095	1126579.773	16.019
GPS2	11766749.588	1126636.418	18.202

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
CLAVE: MAUTA-S-D-H2077 VERSIÓN: 01 FECHA: 23/01/2024

UBICACIÓN PROYECTO:
AEROPUERTO "ALMIRANTE PADILLA"- SIGLA OACI SKRH - ARP"
MUNICIPIO RIOHACHA DEPARTAMENTO LA GUAJIRA

PROYECTO:
Realizar el mejoramiento de las plataformas de viraje,franjas de seguridad, sistema de drenaje; y mejoramiento y construcción de calles de rodaje del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF)-

CONTIENE: PLANO GENERAL PISTA Y AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA

N° CONTRATO: 23001170 - H4 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
DIRECTOR DEL PROYECTO: VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR
N° MATRICULA PROFESIONAL 25353-33553 CND
INGENIERO CIVIL

N° CONTRATO INTERVENTORÍA: 23001282- H3 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO AIR RIO
DIRECTOR DEL PROYECTO: SANTIAGO PAEZ TALERO
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. SANTIAGO PAEZ TALERO
N° MATRICULA PROFESIONAL 25353-89972 CND
INGENIERO CIVIL

SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANDRES ARBOLEDA SALAZAR
REVISO SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
REVISO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA CENTRO SUR, NOROCCIDENTE, NORTE ORIENTE, OCCIDENTE - ORIENTE
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. CESAR AUGUSTO DELGADO CARRILLO
REVISO COORDINADOR DE GRUPO INFRAESTRUCTURA
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ALDEMAR PINZÓN
VOBO. ING. GESTACIÓN CONTRATO AEROMANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANGELA INES PAEZ PIÑEROS
REVISO DIRECTOR DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. JAIME CORTES GUERRERO
REVISO COORDINADOR GRUPO GESTIÓN DE AEROPUERTOS - EAGA

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. OSCAR ALBERTO NIETO ALVARADO
DIRECTOR DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

INSPECTORES- DIRECCIÓN DE AUTORIDAD SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO EDGAR AUGUSTO URRUTIA FERNANDEZ
ESPECIALIDAD EN INFRAESTRUCTURA - EAGA
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO CARLOS MAURICIO GUEVARA BARZALDO
ESPECIALIDAD EN OPERACIONES - EAGA

N° PLANO: 1 DE 47 ESCALA: 1:3000
CÓDIGO REFERENCIA: 2024-10-20-01-PG_SKRH-ARP-001

NOTA TÉCNICA:

DATUM	MAGNA-SIRGAS
ELIPSOIDE	WGS 84 - GRS 80
SISTEMA DE COORDENADAS	PLANAS GAUSS KRUGER
ORIGEN DE COORDENADA	ORIGEN-BOGOTA
ONDULACIÓN GEOIDAL	NIL

DECLINACIÓN MAGNETICA: ARP/API 8°35' W VARIACIÓN MAGNETICA AÑO:00°10' W/ 2024

DATOS DEL PROYECTO:

RWY	DIMENSIONES (m)	CAT. DE APROX.	AERONAVE DE DISEÑO	PAVIMENTO	CLASIFICACIÓN DE LA PISTA
10 / 28	PISTA: 1900.00 X 45.00	C	A320	ASFALTO	D
	FRANJA: 2120.00 X 150.00	C			

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (m/ft)
10	11°31'33.30" N	72°56'07.38"O	12.1/40
ARP			
28	11°31'35.10" N	72°55'04.75"O	15.2/50





CONVENCIONES :

CONVENCIONES GENERALES
- CERRAMIENTO
- CERCA
- PARAMENTO
- CANAL
- POSTE ENERGÍA
- VÉRTICE GPS
- CAJA DE ENERGÍA
- LUCES GUÍA
- PISTA EN ASFALTO
- CALLE DE RODAJE
- PISO EN CONCRETO
- CONSTRUCCIÓN

NOTAS TECNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO
10 / 10 / 2024	Memoria técnica de georreferenciación - Ing.Duván Robayo	# 1 Anexo

NOMBRE ARCHIVO: 1.TOPOGRAFIA_AEROPUERTO_RIOHACHA.dwg (Autocad versión 2013)

CAPITULO 6
ADECUACIÓN DE FRANJA


ITEM 6.4

COMPACTACIÓN Y REFINO DE FONDO DE EXCAVACIÓN

CARTERA TOPOGRÁFICA AREA DE COMPACTACION Y REFINO			
PUNTO	NORTE	ESTE	DESCRIPCIÓN
1	1766696,916	1124599,1	LIM_RELLENO
2	1766685,955	1124599,473	LIM_RELLENO
3	1766715,886	1125479,396	LIM_RELLENO
4	1766745,96	1126363,495	LIM_RELLENO
5	1766756,956	1126363,11	LIM_RELLENO
6	1766726,949	1125480,831	LIM_RELLENO

AREAS Y VOLUMENES RELLENO FRANJA NORTE

ÁREAS Y VOLUMENES DE RELLENO		
	ÁREA (m²)	VOLUMEN (m³)
RELLENO NORTE	19428,2	7790,81

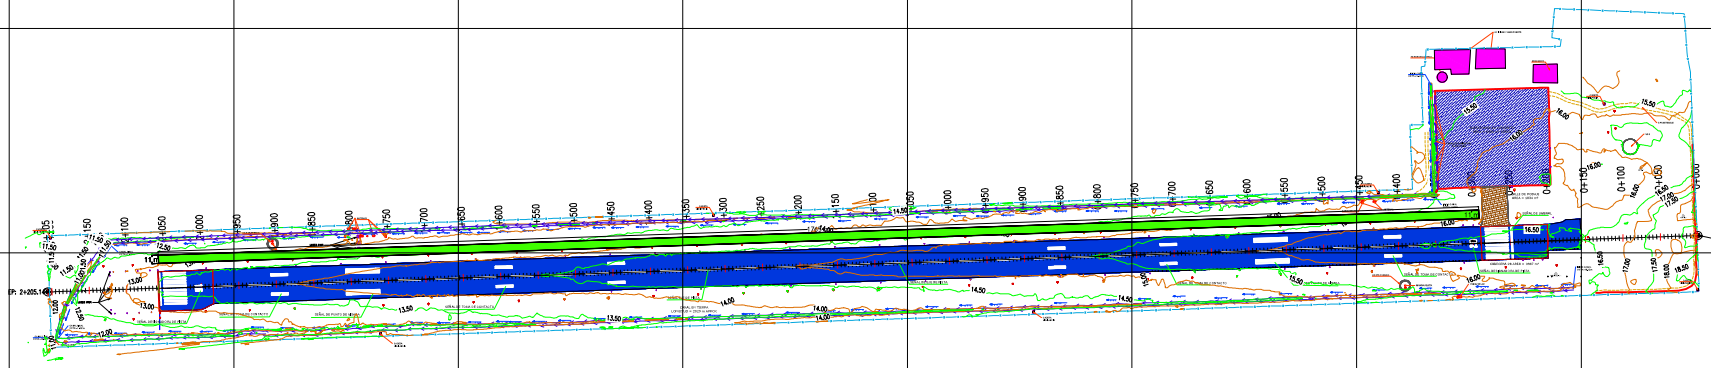

CUADRO DE COORDENADAS VERTICES AMARRE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA
GPS1	1766813.095	1126579.773	16.019
GPS2	11766749.588	1126636.418	18.202

1:2500 0 50 100 150 200 250 m. METROS

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
CLAVE: MAUTA-S-DI-24077 VERSIÓN: 01 FECHA: 23/01/2024

UBICACIÓN PROYECTO:
AEROPUERTO "ALMIRANTE PADILLA"- SIGLA OACI SKRH - ARP"
MUNICIPIO RIOHACHA DEPARTAMENTO LA GUAJIRA

PROYECTO:
Realizar el mejoramiento de las plataformas de viraje,franjas de seguridad, sistema de drenaje; y mejoramiento y construcción de calles de rodaje del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF)-

CONTIENE: PLANO GENERAL PISTA Y AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA

N° CONTRATO: 23001170 - H4 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
DIRECTOR DEL PROYECTO: VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR
N° MATRICULA PROFESIONAL 25202-33553 CND
INGENIERO CIVIL

N° CONTRATO INTERVENTORÍA: 23001282- H3 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO AIR RIO
DIRECTOR DEL PROYECTO: SANTIAGO PAEZ TALERO
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. SANTIAGO PAEZ TALERO
N° MATRICULA PROFESIONAL 25202-80972 CND
INGENIERO CIVIL

SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANDRES ARBOLEDA SALAZAR
REVISO SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
REVISO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA CENTRO SUR, NOROCCIDENTE, NORTE ORIENTE, OCCIDENTE - ORIENTE
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. CESAR AUGUSTO DELGADO CARRILLO
REVISO COORDINADOR DE GRUPO INFRAESTRUCTURA
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ALDEMAR PINZÓN
VOBO. ING. SUPERVISOR CONTRATO AERONAUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANGELA INES PAEZ PIÑEROS
REVISO DIRECTOR DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. JAIME CORTES GUERRERO
REVISO COORDINADOR GRUPO GESTIÓN DE AEROPUERTOS - ESA

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. OSCAR ALBERTO NIETO ALVARADO
DIRECTOR DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

INSPECTORES- DIRECCIÓN DE AUTORIDAD SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ESP. EDGAR AUGUSTO URRUTIA FERNANDEZ
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA - ESA
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ESP. CARLOS MAURICIO GUEVARA BARZALDO
ESPECIALISTA EN OPERACIONES - ESA

N° PLANO: 1 DE 47 ESCALA: 1:3000
CÓDIGO REFERENCIA: 2024-10-20-01-PG_SKRH-ARP-001

NOTA TÉCNICA:

DATUM	MAGNA-SIRGAS		
ELIPSOIDE	WGS 84 - GRS 80		
SISTEMA DE COORDENADAS	PLANAS GAUSS KRUGER		
ORIGEN DE COORDENADA	ORIGEN-BOGOTA		
ONDULACIÓN GEOIDAL	NIL		

DECLINACIÓN MAGNETICA: ARP/API 8°35' W VARIACIÓN MAGNETICA AÑO:00' 10" W/ 2024

DATOS DEL PROYECTO:

RWY	DIMENSIONES (m)	CAT. DE APROX.	AERONAVE DE DISEÑO	PAVIMENTO	CLASIFICACIÓN DE APROXIMACIÓN
10 / 28	PISTA: 1900.00 X 45.00	C	A320	ASFALTO	D
	FRANJA: 2120.00 X 150.00	C			

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (m/ft)
10	11°31'33.30" N	72°56'07.38"O	12.1/40
ARP			
28	11°31'35.10" N	72°55'04.75"O	15.2/50


DEPTO. LA GUAJIRA


DEPTO. DE LA GUAJIRA

CONVENCIONES :

CONVENCIONES GENERALES
- CERRAMIENTO
- CERCA
- PARAMENTO
- CANAL
- PISTA EN ASFALTO
- PISO EN CONCRETO
- POSTE ENERGÍA
- VÉRTICE GPS
- CAJA DE ENERGÍA
- LUCES GUÍA
- CALLE DE RODAJE
- CONSTRUCCIÓN

NOTAS TECNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO
10 / 10 / 2024	Memoria técnica de georreferenciación - Ing.Duván Robayo	# 1 Anexo

NOMBRE ARCHIVO: 1.TOPOGRAFIA_AEROPUERTO_RIOHACHA.dwg (Autocad versión 2013)

ITEM 6.6

RELLENOS LOCALIZADOS CON MATERIAL IMPORTADO

CARTERAS FRANJA DE SEGURIDAD NORTE

CARTERA TOPOGRÁFICA DESCAPOTE FRANJA NORTE				
PUNTO	**NORTE**	**ESTE**	**ALTURA**	**DESCRIPCIÓN**
1	1766687,122	1124596,265	12,818	DESCAPOTE
2	1766693,007	1124596,149	12,658	DESCAPOTE
3	1766698,706	1124596,307	12,442	DESCAPOTE
4	1766739,583	1126276,997	15,740	DESCAPOTE
5	1766745,637	1126276,535	15,698	DESCAPOTE
6	1766752,266	1126276,504	15,486	DESCAPOTE
7	1766758,965	1126276,016	15,316	DESCAPOTE
8	1766757,524	1126271,225	15,391	DESCAPOTE
9	1766750,98	1126271,696	15,500	DESCAPOTE
10	1766745,198	1126271,823	15,74	DESCAPOTE
11	1766740,636	1126267,381	15,700	DESCAPOTE
12	1766747,348	1126266,969	15,535	DESCAPOTE
13	1766754,471	1126266,596	15,424	DESCAPOTE
14	1766758,738	1126261,616	15,282	DESCAPOTE
15	1766751,276	1126262,064	15,464	DESCAPOTE
16	1766744,086	1126262,28	15,582	DESCAPOTE
17	1766740,49	1126257,806	15,616	DESCAPOTE
18	1766747,804	1126257,525	15,467	DESCAPOTE
19	1766755,076	1126257,153	15,268	DESCAPOTE
20	1766758,089	1126251,887	15,275	DESCAPOTE
21	1766750,118	1126252,363	15,481	DESCAPOTE
22	1766743,454	1126252,774	15,582	DESCAPOTE
23	1766737,55	1126253,125	15,747	DESCAPOTE
24	1766740,075	1126248,316	15,657	DESCAPOTE
25	1766746,697	1126247,531	15,548	DESCAPOTE
26	1766753,759	1126247,164	15,356	DESCAPOTE
27	1766751,976	1126242,478	15,374	DESCAPOTE
28	1766744,422	1126242,77	15,621	DESCAPOTE
29	1766739,005	1126242,989	15,827	DESCAPOTE
30	1766740,165	1126238,722	15,692	DESCAPOTE
31	1766747,142	1126238,263	15,51	DESCAPOTE
32	1766754,195	1126237,64	15,382	DESCAPOTE
33	1766757,206	1126232,807	15,235	DESCAPOTE
34	1766750,402	1126233,296	15,361	DESCAPOTE
35	1766742,637	1126233,999	15,548	DESCAPOTE
36	1766739,468	1126229,362	15,662	DESCAPOTE
37	1766746,22	1126228,58	15,452	DESCAPOTE
38	1766753,568	1126228,009	15,277	DESCAPOTE
39	1766752,352	1126223,591	15,272	DESCAPOTE
40	1766746,317	1126224,154	15,441	DESCAPOTE
41	1766739,914	1126224,558	15,622	DESCAPOTE

42	1766739,125	1126220,299	15,561	DESCAPOTE
43	1766745,691	1126219,525	15,408	DESCAPOTE
44	1766753,217	1126218,777	15,216	DESCAPOTE
45	1766752,426	1126216,439	15,205	DESCAPOTE
46	1766745,437	1126216,564	15,395	DESCAPOTE
47	1766739,282	1126216,624	15,583	DESCAPOTE
48	1766740,614	1126212,284	15,518	DESCAPOTE
49	1766747,844	1126211,717	15,409	DESCAPOTE
50	1766754,558	1126211,474	15,154	DESCAPOTE
51	1766756,912	1126206,502	15,081	DESCAPOTE
52	1766749,759	1126206,872	15,264	DESCAPOTE
53	1766741,556	1126207,001	15,458	DESCAPOTE
54	1766738,591	1126202,613	15,551	DESCAPOTE
55	1766744,732	1126202,2	15,385	DESCAPOTE
56	1766753,854	1126201,499	15,164	DESCAPOTE
57	1766757,028	1126196,71	15,082	DESCAPOTE
58	1766749,894	1126196,982	15,298	DESCAPOTE
59	1766742,871	1126197,216	15,451	DESCAPOTE
60	1766737,62	1126197,536	15,574	DESCAPOTE
61	1766738,443	1126193,323	15,657	DESCAPOTE
62	1766744,805	1126192,999	15,394	DESCAPOTE
63	1766752,585	1126192,42	15,188	DESCAPOTE
64	1766756,08	1126186,875	15,034	DESCAPOTE
65	1766747,352	1126187,732	15,335	DESCAPOTE
66	1766740,094	1126188,398	15,502	DESCAPOTE
67	1766738,018	1126184,037	15,552	DESCAPOTE
68	1766744,307	1126183,558	15,355	DESCAPOTE
69	1766750,84	1126182,909	15,158	DESCAPOTE
70	1766755,213	1126177,225	15,012	DESCAPOTE
71	1766747,222	1126178,042	15,232	DESCAPOTE
72	1766740,997	1126178,583	15,386	DESCAPOTE
73	1766737,65	1126174,517	15,491	DESCAPOTE
74	1766745,318	1126173,424	15,233	DESCAPOTE
75	1766753,19	1126172,825	15,039	DESCAPOTE
76	1766755,941	1126167,014	14,984	DESCAPOTE
77	1766747,687	1126168,209	15,175	DESCAPOTE
78	1766742,215	1126169,292	14,82	DESCAPOTE
79	1766737,183	1126166,007	15,491	DESCAPOTE
80	1766744,806	1126165,115	15,274	DESCAPOTE
81	1766753,191	1126163,414	15,023	DESCAPOTE
82	1766754,971	1126158,524	14,974	DESCAPOTE
83	1766747,437	1126159,688	15,182	DESCAPOTE
84	1766739,946	1126160,634	15,373	DESCAPOTE
85	1766686,824	1124599,87	12,838	DESCAPOTE

86	1766693,471	1124599,921	12,661	DESCAPOTE
87	1766701,965	1124600,622	12,459	DESCAPOTE
88	1766699,07	1124605,157	12,591	DESCAPOTE
89	1766691,759	1124604,681	12,72	DESCAPOTE
90	1766684,586	1124604,238	12,9	DESCAPOTE
91	1766686,508	1124608,956	12,849	DESCAPOTE
92	1766693,868	1124609,308	12,669	DESCAPOTE
93	1766701,39	1124609,744	12,539	DESCAPOTE
94	1766700,825	1124614,837	12,596	DESCAPOTE
95	1766694,36	1124614,694	12,438	DESCAPOTE
96	1766686,066	1124614,398	12,567	DESCAPOTE
97	1766686,824	1124618,948	12,872	DESCAPOTE
98	1766693,722	1124618,839	12,687	DESCAPOTE
99	1766701,261	1124619,441	12,586	DESCAPOTE
100	1766700,592	1124624,179	12,6	DESCAPOTE
101	1766692,328	1124623,588	12,784	DESCAPOTE
102	1766684,951	1124623,424	12,995	DESCAPOTE
103	1766686,732	1124628,152	12,933	DESCAPOTE
104	1766694,496	1124628,869	12,759	DESCAPOTE
105	1766701,771	1124629,404	12,611	DESCAPOTE
106	1766688,849	1124633,399	12,897	DESCAPOTE
107	1766696,91	1124634,688	12,687	DESCAPOTE
108	1766702,106	1124639,06	12,546	DESCAPOTE
109	1766693,794	1124638,35	12,752	DESCAPOTE
110	1766686,614	1124637,922	12,937	DESCAPOTE
111	1766688,608	1124643,598	12,902	DESCAPOTE
112	1766696,496	1124644,227	12,706	DESCAPOTE
113	1766700,878	1124649,032	12,597	DESCAPOTE
114	1766693,554	1124648,711	12,818	DESCAPOTE
115	1766686,835	1124647,846	13,046	DESCAPOTE
116	1766687,174	1124652,292	13,012	DESCAPOTE
117	1766695,025	1124653,196	12,778	DESCAPOTE
118	1766702,288	1124654,878	12,551	DESCAPOTE
119	1766703,848	1124658,896	12,529	DESCAPOTE
120	1766696,92	1124658,104	12,73	DESCAPOTE
121	1766690,158	1124657,368	12,919	DESCAPOTE
122	1766686,729	1124660,535	13,028	DESCAPOTE
123	1766693,916	1124660,902	12,824	DESCAPOTE
124	1766700,268	1124660,947	12,648	DESCAPOTE
125	1766703,455	1124664,633	12,592	DESCAPOTE
126	1766696,362	1124664,742	12,76	DESCAPOTE
127	1766688,462	1124664,773	12,985	DESCAPOTE
128	1766687,297	1124669,763	13,03	DESCAPOTE
129	1766694,756	1124670,149	12,85	DESCAPOTE

130	1766701,642	1124669,622	12,67	DESCAPOTE
131	1766697,763	1124674,592	12,766	DESCAPOTE
132	1766690,986	1124675,149	13,014	DESCAPOTE
133	1766688,244	1124679,661	13,011	DESCAPOTE
134	1766695,898	1124679,6	12,848	DESCAPOTE
135	1766703,756	1124679,284	12,669	DESCAPOTE
136	1766702,006	1124684,509	12,724	DESCAPOTE
137	1766694,053	1124684,396	12,898	DESCAPOTE
138	1766686,406	1124684,37	13,096	DESCAPOTE
139	1766687,936	1124688,744	13,074	DESCAPOTE
140	1766695,084	1124688,613	12,883	DESCAPOTE
141	1766702,74	1124688,848	12,733	DESCAPOTE
142	1766702,739	1124693,596	12,748	DESCAPOTE
143	1766695,047	1124693,552	12,895	DESCAPOTE
144	1766688,118	1124693,779	13,069	DESCAPOTE
145	1766687,634	1124698,139	13,088	DESCAPOTE
146	1766695,114	1124697,964	12,918	DESCAPOTE
147	1766701,831	1124698,626	12,781	DESCAPOTE
148	1766704,403	1124703,541	12,752	DESCAPOTE
149	1766697,468	1124703,466	12,894	DESCAPOTE
150	1766691,441	1124703,355	12,974	DESCAPOTE
151	1766688,828	1124708,827	13,074	DESCAPOTE
152	1766696,093	1124708,543	12,9	DESCAPOTE
153	1766703,65	1124708,105	12,788	DESCAPOTE
154	1766704,37	1124713,467	12,798	DESCAPOTE
155	1766697,06	1124713,398	12,935	DESCAPOTE
156	1766689,122	1124713,578	13,116	DESCAPOTE
157	1766687,801	1124718,629	13,185	DESCAPOTE
158	1766690,764	1124718,938	13,18	DESCAPOTE
159	1766697,696	1124718,826	12,909	DESCAPOTE
160	1766704,911	1124718,929	12,731	DESCAPOTE
161	1766699,919	1124723,614	12,836	DESCAPOTE
162	1766692,801	1124723,444	13,051	DESCAPOTE
163	1766689,025	1124727,535	13,186	DESCAPOTE
164	1766696,483	1124727,75	12,972	DESCAPOTE
165	1766703,632	1124727,893	12,829	DESCAPOTE
166	1766699,914	1124732,741	12,895	DESCAPOTE
167	1766693,284	1124732,553	13,094	DESCAPOTE
168	1766687,83	1124732,088	13,215	DESCAPOTE
169	1766690,495	1124737,881	13,133	DESCAPOTE
170	1766697,922	1124737,601	12,96	DESCAPOTE
171	1766705,432	1124737,81	12,85	DESCAPOTE
172	1766704,656	1124743,072	12,873	DESCAPOTE
173	1766697,562	1124742,645	12,994	DESCAPOTE

174	1766690,097	1124742,362	13,161	DESCAPOTE
175	1766689,536	1124747,268	13,219	DESCAPOTE
176	1766695,964	1124747,548	13,031	DESCAPOTE
177	1766703,657	1124747,439	12,87	DESCAPOTE
178	1766703,52	1124752,198	12,942	DESCAPOTE
179	1766690,781	1124751,722	13,187	DESCAPOTE
180	1766733,33	1125922,765	14,805	DESCAPOTE
181	1766741,205	1125923,291	14,6	DESCAPOTE
182	1766748,138	1125923,677	14,508	DESCAPOTE
183	1766747,31	1125928,93	14,482	DESCAPOTE
184	1766740,325	1125928,653	14,623	DESCAPOTE
185	1766733,654	1125927,906	14,8	DESCAPOTE
186	1766732,617	1125933,143	14,834	DESCAPOTE
187	1766739,107	1125933,225	14,682	DESCAPOTE
188	1766747,425	1125933,501	14,502	DESCAPOTE
189	1766747,976	1125939,26	14,491	DESCAPOTE
190	1766740,102	1125938,663	14,66	DESCAPOTE
191	1766734,307	1125938,257	14,841	DESCAPOTE
192	1766734,489	1125942,971	14,834	DESCAPOTE
193	1766742,456	1125943,364	14,658	DESCAPOTE
194	1766749,581	1125943,815	14,469	DESCAPOTE
195	1766747,629	1125948,995	14,591	DESCAPOTE
196	1766740,163	1125948,381	14,728	DESCAPOTE
197	1766732,371	1125947,718	14,855	DESCAPOTE
198	1766732,855	1125952,801	14,839	DESCAPOTE
199	1766740,396	1125953,172	14,708	DESCAPOTE
200	1766747,508	1125953,493	14,556	DESCAPOTE
201	1766749,941	1125958,553	14,499	DESCAPOTE
202	1766743,959	1125958,196	14,623	DESCAPOTE
203	1766737,016	1125957,695	14,79	DESCAPOTE
204	1766730,909	1125957,49	15,03	DESCAPOTE
205	1766733,836	1125963,004	14,886	DESCAPOTE
206	1766740,969	1125963,619	14,76	DESCAPOTE
207	1766747,444	1125964,124	14,612	DESCAPOTE
208	1766743,424	1125968,94	14,667	DESCAPOTE
209	1766736,364	1125968,468	14,829	DESCAPOTE
210	1766732,872	1125972,851	14,939	DESCAPOTE
211	1766742,254	1125973,637	14,769	DESCAPOTE
212	1766749,634	1125973,887	14,54	DESCAPOTE
213	1766747,801	1125978,886	14,534	DESCAPOTE
214	1766738,775	1125978,67	14,804	DESCAPOTE
215	1766731,105	1125978,25	14,999	DESCAPOTE
216	1766733,945	1125983,583	14,91	DESCAPOTE
217	1766742,296	1125984,012	14,728	DESCAPOTE

218	1766749,19	1125989,227	14,584	DESCAPOTE
219	1766740,722	1125988,777	14,813	DESCAPOTE
220	1766733,637	1125988,586	14,953	DESCAPOTE
221	1766733,62	1125993,86	14,957	DESCAPOTE
222	1766742,09	1125994,331	14,763	DESCAPOTE
223	1766748,529	1125994,325	14,711	DESCAPOTE
224	1766748,472	1125998,938	14,614	DESCAPOTE
225	1766740,808	1125999,206	14,804	DESCAPOTE
226	1766733,161	1125999,015	15,034	DESCAPOTE
227	1766733,129	1126004,006	15,012	DESCAPOTE
228	1766740,067	1126004,168	14,934	DESCAPOTE
229	1766747,585	1126004,263	14,613	DESCAPOTE
230	1766748,648	1126009,463	14,646	DESCAPOTE
231	1766740,189	1126009,296	14,82	DESCAPOTE
232	1766731,635	1126008,908	15,006	DESCAPOTE
233	1766732,973	1126014,883	15,06	DESCAPOTE
234	1766741,558	1126014,577	14,833	DESCAPOTE
235	1766749,32	1126014,506	14,736	DESCAPOTE
236	1766749,422	1126019,406	14,652	DESCAPOTE
237	1766733,117	1126018,863	15,128	DESCAPOTE
238	1766734,96	1126024,638	14,965	DESCAPOTE
239	1766743,884	1126025,261	14,812	DESCAPOTE
240	1766748,688	1126029,38	14,687	DESCAPOTE
241	1766740,189	1126029,182	14,849	DESCAPOTE
242	1766732,878	1126028,943	15,069	DESCAPOTE
243	1766735,548	1126035,362	14,988	DESCAPOTE
244	1766742,794	1126034,889	14,857	DESCAPOTE
245	1766750,206	1126034,79	14,647	DESCAPOTE
246	1766751,436	1126039,657	14,655	DESCAPOTE
247	1766744,162	1126039,512	14,864	DESCAPOTE
248	1766733,827	1126039,537	15,099	DESCAPOTE
249	1766734,656	1126044,492	15,15	DESCAPOTE
250	1766742,506	1126044,541	14,857	DESCAPOTE
251	1766750,614	1126044,497	14,681	DESCAPOTE
252	1766749,069	1126049,914	14,765	DESCAPOTE
253	1766740,664	1126049,357	14,93	DESCAPOTE
254	1766734,418	1126049,238	15,107	DESCAPOTE
255	1766735,495	1126054,461	15,139	DESCAPOTE
256	1766742,872	1126054,694	14,92	DESCAPOTE
257	1766751,254	1126054,742	14,722	DESCAPOTE
258	1766750,811	1126059,546	14,723	DESCAPOTE
259	1766743,298	1126059,453	14,85	DESCAPOTE
260	1766736,053	1126059,49	15,083	DESCAPOTE
261	1766734,918	1126064,77	15,131	DESCAPOTE

262	1766742,644	1126065,099	14,952	DESCAPOTE
263	1766750,228	1126065,022	14,77	DESCAPOTE
264	1766749,888	1126070,136	14,799	DESCAPOTE
265	1766741,882	1126069,788	14,965	DESCAPOTE
266	1766734,635	1126069,79	15,136	DESCAPOTE
267	1766736,536	1126075,376	15,112	DESCAPOTE
268	1766745,758	1126075,254	14,964	DESCAPOTE
269	1766753,075	1126074,528	14,791	DESCAPOTE
270	1766749,863	1126079,488	14,842	DESCAPOTE
271	1766741,92	1126079,708	15,017	DESCAPOTE
272	1766734,306	1126080,175	15,197	DESCAPOTE
273	1766735,486	1126085,412	15,231	DESCAPOTE
274	1766744,164	1126085,509	15,01	DESCAPOTE
275	1766752,745	1126084,872	14,814	DESCAPOTE
276	1766751,404	1126089,971	14,891	DESCAPOTE
277	1766742,683	1126089,874	15,064	DESCAPOTE
278	1766735,16	1126089,985	15,285	DESCAPOTE
279	1766737,428	1126095,564	15,2	DESCAPOTE
280	1766744,854	1126095,515	15,043	DESCAPOTE
281	1766751,289	1126095,68	14,887	DESCAPOTE
282	1766749,847	1126100,394	14,912	DESCAPOTE
283	1766741,366	1126100,602	15,086	DESCAPOTE
284	1766734,038	1126100,815	15,286	DESCAPOTE
285	1766737,137	1126104,835	15,191	DESCAPOTE
286	1766744,719	1126104,638	15,022	DESCAPOTE
287	1766753,226	1126104,558	14,807	DESCAPOTE
288	1766751,252	1126109,075	14,893	DESCAPOTE
289	1766742,625	1126109,214	15,106	DESCAPOTE
290	1766734,454	1126109,485	15,352	DESCAPOTE
291	1766736,38	1126114,858	15,354	DESCAPOTE
292	1766743,895	1126114,962	15,075	DESCAPOTE
293	1766752,32	1126114,688	14,847	DESCAPOTE
294	1766750,566	1126119,687	14,947	DESCAPOTE
295	1766743,626	1126119,407	15,119	DESCAPOTE
296	1766737,406	1126119,454	15,291	DESCAPOTE
297	1766737,248	1126125,699	15,346	DESCAPOTE
298	1766744,374	1126126,087	15,107	DESCAPOTE
299	1766752,114	1126125,432	14,945	DESCAPOTE
300	1766753,119	1126131,367	14,962	DESCAPOTE
301	1766744,488	1126131,111	15,126	DESCAPOTE
302	1766738,336	1126130,936	15,229	DESCAPOTE
303	1766737,268	1126135,414	15,322	DESCAPOTE
304	1766744,408	1126135,816	15,168	DESCAPOTE
305	1766752,459	1126135,244	14,973	DESCAPOTE

306	1766751,706	1126140,239	15	DESCAPOTE
307	1766744,482	1126140,01	15,156	DESCAPOTE
308	1766737,163	1126140,696	15,367	DESCAPOTE
309	1766737,46	1126147,052	15,352	DESCAPOTE
310	1766745,569	1126146,806	15,166	DESCAPOTE
311	1766752,792	1126146,386	14,983	DESCAPOTE
312	1766754,39	1126150,796	14,954	DESCAPOTE
313	1766747,07	1126151,162	15,174	DESCAPOTE
314	1766738,364	1126151,315	15,341	DESCAPOTE
315	1766738,712	1126157,263	15,395	DESCAPOTE
316	1766746,63	1126157,468	15,206	DESCAPOTE
317	1766754,617	1126156,629	14,958	DESCAPOTE
318	1766690,696	1124756,649	13,168	DESCAPOTE
319	1766699,788	1124757,024	12,975	DESCAPOTE
320	1766706,766	1124762,297	12,837	DESCAPOTE
321	1766699,226	1124762,073	12,974	DESCAPOTE
322	1766692,452	1124762,012	13,115	DESCAPOTE
323	1766689,764	1124761,749	13,209	DESCAPOTE
324	1766690,224	1124766,246	13,235	DESCAPOTE
325	1766698,555	1124766,537	13,019	DESCAPOTE
326	1766706,31	1124767,149	12,857	DESCAPOTE
327	1766705,363	1124772,206	12,865	DESCAPOTE
328	1766697,854	1124771,416	13,048	DESCAPOTE
329	1766690,402	1124770,937	13,226	DESCAPOTE
330	1766690,026	1124775,266	13,219	DESCAPOTE
331	1766698,53	1124775,891	13,02	DESCAPOTE
332	1766706,478	1124776,672	12,853	DESCAPOTE
333	1766703,501	1124778,949	12,919	DESCAPOTE
334	1766695,173	1124778,867	13,076	DESCAPOTE
335	1766690,048	1124779,064	13,257	DESCAPOTE
336	1766690,733	1124783,923	13,258	DESCAPOTE
337	1766698,224	1124783,908	13,056	DESCAPOTE
338	1766706,09	1124784,04	12,908	DESCAPOTE
339	1766705,462	1124789,009	12,944	DESCAPOTE
340	1766697,555	1124788,896	13,083	DESCAPOTE
341	1766690,508	1124788,914	13,297	DESCAPOTE
342	1766690,371	1124793,013	13,325	DESCAPOTE
343	1766700,181	1124793,41	13,043	DESCAPOTE
344	1766706,831	1124798,664	12,94	DESCAPOTE
345	1766698,955	1124798,242	13,089	DESCAPOTE
346	1766691,521	1124798,244	13,334	DESCAPOTE
347	1766691,457	1124803,647	13,317	DESCAPOTE
348	1766698,45	1124803,943	13,115	DESCAPOTE
349	1766704,726	1124804,045	13	DESCAPOTE

350	1766707,774	1124808,316	12,931	DESCAPOTE
351	1766700,239	1124807,928	13,075	DESCAPOTE
352	1766693,599	1124807,954	13,242	DESCAPOTE
353	1766691,868	1124813,614	13,298	DESCAPOTE
354	1766699,313	1124813,462	13,124	DESCAPOTE
355	1766706,036	1124813,43	12,974	DESCAPOTE
356	1766706,124	1124818,256	12,971	DESCAPOTE
357	1766697,873	1124818,237	13,164	DESCAPOTE
358	1766691,802	1124818,703	13,307	DESCAPOTE
359	1766692,189	1124822,948	13,281	DESCAPOTE
360	1766699,643	1124823,279	13,111	DESCAPOTE
361	1766707,445	1124823,107	12,958	DESCAPOTE
362	1766707,159	1124828,365	13,002	DESCAPOTE
363	1766698,667	1124828,051	13,128	DESCAPOTE
364	1766691,953	1124827,772	13,349	DESCAPOTE
365	1766691,96	1124833,746	13,342	DESCAPOTE
366	1766698,489	1124833,783	13,143	DESCAPOTE
367	1766705,583	1124833,699	13,021	DESCAPOTE
368	1766707,036	1124838,233	13,035	DESCAPOTE
369	1766699,137	1124837,876	13,145	DESCAPOTE
370	1766692,235	1124837,899	13,367	DESCAPOTE
371	1766691,76	1124842,058	13,425	DESCAPOTE
372	1766699,549	1124842,446	13,166	DESCAPOTE
373	1766707,503	1124842,76	13,006	DESCAPOTE
374	1766708,385	1124847,961	13,012	DESCAPOTE
375	1766700,441	1124847,335	13,152	DESCAPOTE
376	1766692,732	1124847,342	13,394	DESCAPOTE
377	1766692,344	1124852,015	13,427	DESCAPOTE
378	1766700,422	1124852,233	13,164	DESCAPOTE
379	1766708,831	1124852,29	12,988	DESCAPOTE
380	1766709,622	1124857,026	12,959	DESCAPOTE
381	1766703,119	1124857,22	13,151	DESCAPOTE
382	1766696,768	1124857,368	13,298	DESCAPOTE
383	1766692,927	1124857,075	13,408	DESCAPOTE
384	1766694,324	1124861,871	13,372	DESCAPOTE
385	1766701,042	1124861,997	13,188	DESCAPOTE
386	1766708,711	1124862,115	13,001	DESCAPOTE
387	1766707,218	1124866,366	13,048	DESCAPOTE
388	1766703,903	1124866,21	13,126	DESCAPOTE
389	1766699,315	1124866,003	13,239	DESCAPOTE
390	1766695,508	1124865,955	13,401	DESCAPOTE
391	1766691,293	1124865,882	13,46	DESCAPOTE
392	1766693,948	1124870,172	13,462	DESCAPOTE
393	1766700,851	1124870,864	13,214	DESCAPOTE

394	1766707,549	1124871,14	13,051	DESCAPOTE
395	1766708,439	1124876,488	13,047	DESCAPOTE
396	1766701,583	1124876,13	13,211	DESCAPOTE
397	1766693,706	1124875,405	13,496	DESCAPOTE
398	1766694,058	1124880,224	13,5	DESCAPOTE
399	1766700,856	1124880,474	13,251	DESCAPOTE
400	1766708,715	1124880,742	13,052	DESCAPOTE
401	1766707,717	1124882,9	13,112	DESCAPOTE
402	1766701,837	1124882,909	13,259	DESCAPOTE
403	1766696,638	1124882,809	13,367	DESCAPOTE
404	1766694,176	1124887,753	13,48	DESCAPOTE
405	1766701,128	1124887,634	13,3	DESCAPOTE
406	1766707,503	1124887,463	13,109	DESCAPOTE
407	1766704,84	1124892,71	13,193	DESCAPOTE
408	1766696,169	1124892,23	13,359	DESCAPOTE
409	1766693,647	1124897,405	13,493	DESCAPOTE
410	1766701,305	1124898,148	13,281	DESCAPOTE
411	1766708,437	1124898,537	13,122	DESCAPOTE
412	1766710,724	1124902,782	13,102	DESCAPOTE
413	1766703,908	1124902,354	13,222	DESCAPOTE
414	1766696,422	1124902,356	13,394	DESCAPOTE
415	1766694,702	1124907,748	13,503	DESCAPOTE
416	1766702,903	1124907,687	13,278	DESCAPOTE
417	1766711,757	1124907,877	13,092	DESCAPOTE
418	1766704,23	1124912,429	13,264	DESCAPOTE
419	1766696,488	1124912,48	13,442	DESCAPOTE
420	1766694,441	1124918,245	13,534	DESCAPOTE
421	1766700,503	1124917,959	13,387	DESCAPOTE
422	1766708,776	1124918,325	13,19	DESCAPOTE
423	1766710,266	1124923,613	13,194	DESCAPOTE
424	1766701,234	1124923,486	13,391	DESCAPOTE
425	1766694,631	1124923,235	13,563	DESCAPOTE
426	1766696,089	1124929,004	13,506	DESCAPOTE
427	1766704,372	1124928,603	13,296	DESCAPOTE
428	1766710,544	1124933,446	13,195	DESCAPOTE
429	1766702,712	1124933,427	13,339	DESCAPOTE
430	1766695,522	1124933,672	13,484	DESCAPOTE
431	1766695,683	1124939,036	13,539	DESCAPOTE
432	1766704,788	1124938,854	13,29	DESCAPOTE
433	1766712,219	1124943,684	13,157	DESCAPOTE
434	1766703,753	1124943,654	13,324	DESCAPOTE
435	1766695,878	1124943,733	13,532	DESCAPOTE
436	1766696,457	1124949,035	13,531	DESCAPOTE
437	1766704,438	1124949,379	13,313	DESCAPOTE

438	1766709,186	1124953,755	13,249	DESCAPOTE
439	1766701,032	1124954,038	13,426	DESCAPOTE
440	1766696,096	1124954,211	13,551	DESCAPOTE
441	1766696,746	1124959,126	13,524	DESCAPOTE
442	1766703,278	1124958,937	13,403	DESCAPOTE
443	1766711,207	1124958,904	13,201	DESCAPOTE
444	1766712,832	1124964,518	13,175	DESCAPOTE
445	1766703,528	1124964,294	13,406	DESCAPOTE
446	1766696,728	1124964,692	13,541	DESCAPOTE
447	1766697,16	1124970,204	13,517	DESCAPOTE
448	1766704,807	1124969,657	13,365	DESCAPOTE
449	1766711,647	1124969,439	13,19	DESCAPOTE
450	1766711,967	1124973,99	13,189	DESCAPOTE
451	1766703,982	1124974,454	13,387	DESCAPOTE
452	1766696,823	1124974,724	13,569	DESCAPOTE
453	1766697,993	1124980,245	13,534	DESCAPOTE
454	1766704,877	1124979,862	13,378	DESCAPOTE
455	1766713,305	1124979,205	13,144	DESCAPOTE
456	1766711,515	1124984,596	13,205	DESCAPOTE
457	1766703,593	1124984,891	13,431	DESCAPOTE
458	1766696,915	1124985,278	13,584	DESCAPOTE
459	1766697,921	1124991,375	13,55	DESCAPOTE
460	1766705,396	1124991,042	13,38	DESCAPOTE
461	1766713,863	1124990,368	13,146	DESCAPOTE
462	1766711,266	1124995,14	13,248	DESCAPOTE
463	1766703,304	1124995,417	13,418	DESCAPOTE
464	1766697,418	1124995,567	13,595	DESCAPOTE
465	1766703,627	1125001,049	13,563	DESCAPOTE
466	1766712,551	1125000,522	13,234	DESCAPOTE
467	1766710,621	1125005,671	13,305	DESCAPOTE
468	1766702,428	1125005,991	13,493	DESCAPOTE
469	1766698,286	1125006,196	13,638	DESCAPOTE
470	1766698,554	1125011,834	13,626	DESCAPOTE
471	1766706,659	1125011,293	13,408	DESCAPOTE
472	1766714,73	1125010,713	13,186	DESCAPOTE
473	1766711,75	1125015,657	13,289	DESCAPOTE
474	1766703,771	1125016,091	13,485	DESCAPOTE
475	1766698,275	1125016,512	13,663	DESCAPOTE
476	1766705,382	1125021,955	13,428	DESCAPOTE
477	1766713,465	1125021,046	13,255	DESCAPOTE
478	1766715,812	1125026,192	13,216	DESCAPOTE
479	1766708,854	1125026,547	13,39	DESCAPOTE
480	1766702,559	1125027,033	13,539	DESCAPOTE
481	1766698,978	1125032,834	13,589	DESCAPOTE

482	1766705,706	1125032,513	13,442	DESCAPOTE
483	1766713,825	1125032,323	13,29	DESCAPOTE
484	1766715,831	1125038,599	13,243	DESCAPOTE
485	1766708,12	1125038,52	13,433	DESCAPOTE
486	1766701,791	1125038,138	13,502	DESCAPOTE
487	1766698,471	1125038,354	13,622	DESCAPOTE
488	1766700,027	1125043,886	13,61	DESCAPOTE
489	1766706,698	1125043,329	13,464	DESCAPOTE
490	1766714,797	1125043,306	13,296	DESCAPOTE
491	1766715,842	1125049,31	13,268	DESCAPOTE
492	1766708,567	1125048,885	13,436	DESCAPOTE
493	1766700,591	1125048,928	13,585	DESCAPOTE
494	1766699,754	1125053,767	13,619	DESCAPOTE
495	1766709,107	1125053,354	13,435	DESCAPOTE
496	1766717,52	1125053,123	13,221	DESCAPOTE
497	1766715,472	1125058,47	13,302	DESCAPOTE
498	1766706,545	1125058,294	13,511	DESCAPOTE
499	1766699,462	1125058,222	13,683	DESCAPOTE
500	1766700,153	1125063,779	13,647	DESCAPOTE
501	1766706,944	1125063,842	13,492	DESCAPOTE
502	1766713,778	1125063,734	13,364	DESCAPOTE
503	1766717,082	1125069,112	13,289	DESCAPOTE
504	1766707,573	1125068,838	13,455	DESCAPOTE
505	1766700,02	1125068,969	13,662	DESCAPOTE
506	1766700,652	1125074,311	13,61	DESCAPOTE
507	1766707,157	1125074,129	13,489	DESCAPOTE
508	1766714,962	1125074,013	13,332	DESCAPOTE
509	1766716,942	1125079,023	13,318	DESCAPOTE
510	1766709,633	1125079,372	13,435	DESCAPOTE
511	1766702,398	1125079,533	13,601	DESCAPOTE
512	1766702,334	1125084,178	13,558	DESCAPOTE
513	1766711,191	1125084,127	13,387	DESCAPOTE
514	1766714,594	1125089,629	13,316	DESCAPOTE
515	1766708,105	1125089,533	13,533	DESCAPOTE
516	1766701,117	1125089,584	13,661	DESCAPOTE
517	1766701,18	1125095,071	13,655	DESCAPOTE
518	1766709,143	1125094,849	13,494	DESCAPOTE
519	1766716,106	1125094,689	13,27	DESCAPOTE
520	1766718,307	1125099,763	13,252	DESCAPOTE
521	1766710,114	1125099,66	13,443	DESCAPOTE
522	1766702,503	1125099,881	13,614	DESCAPOTE
523	1766702,179	1125105,418	13,661	DESCAPOTE
524	1766710,09	1125105,055	13,477	DESCAPOTE
525	1766716,373	1125104,65	13,302	DESCAPOTE

526	1766715,711	1125110,201	13,37	DESCAPOTE
527	1766708,248	1125110,13	13,445	DESCAPOTE
528	1766701,389	1125110,46	13,686	DESCAPOTE
529	1766701,835	1125115,513	13,72	DESCAPOTE
530	1766709,455	1125115,221	13,502	DESCAPOTE
531	1766717,355	1125114,899	13,3	DESCAPOTE
532	1766715,403	1125120,296	13,419	DESCAPOTE
533	1766708,089	1125120,422	13,575	DESCAPOTE
534	1766701,704	1125120,37	13,734	DESCAPOTE
535	1766702,544	1125125,066	13,71	DESCAPOTE
536	1766710,522	1125125,069	13,532	DESCAPOTE
537	1766718,417	1125124,879	13,351	DESCAPOTE
538	1766719,523	1125130,112	13,342	DESCAPOTE
539	1766711,295	1125130,458	13,459	DESCAPOTE
540	1766703,099	1125130,539	13,692	DESCAPOTE
541	1766703,362	1125135,504	13,666	DESCAPOTE
542	1766711,779	1125135	13,462	DESCAPOTE
543	1766719,209	1125134,833	13,316	DESCAPOTE
544	1766719,35	1125139,956	13,36	DESCAPOTE
545	1766712,815	1125139,824	13,459	DESCAPOTE
546	1766704,902	1125140,442	13,646	DESCAPOTE
547	1766703,522	1125145,504	13,703	DESCAPOTE
548	1766712,75	1125144,944	13,501	DESCAPOTE
549	1766720,461	1125144,597	13,303	DESCAPOTE
550	1766719,387	1125150,322	13,315	DESCAPOTE
551	1766711,957	1125150,706	13,482	DESCAPOTE
552	1766703,672	1125150,906	13,71	DESCAPOTE
553	1766704,087	1125155,886	13,736	DESCAPOTE
554	1766713,396	1125155,513	13,506	DESCAPOTE
555	1766719,373	1125160,66	13,392	DESCAPOTE
556	1766711,044	1125160,869	13,557	DESCAPOTE
557	1766703,102	1125160,892	13,832	DESCAPOTE
558	1766704,458	1125166,358	13,744	DESCAPOTE
559	1766711,169	1125165,654	13,624	DESCAPOTE
560	1766718,443	1125165,202	13,447	DESCAPOTE
561	1766718,042	1125170,578	13,408	DESCAPOTE
562	1766709,476	1125171,002	13,585	DESCAPOTE
563	1766702,897	1125171,433	13,86	DESCAPOTE
564	1766704,174	1125176,589	13,813	DESCAPOTE
565	1766712,688	1125175,89	13,629	DESCAPOTE
566	1766721,242	1125175,393	13,394	DESCAPOTE
567	1766719,99	1125180,499	13,439	DESCAPOTE
568	1766711,118	1125181,039	13,66	DESCAPOTE
569	1766703,444	1125181,62	13,881	DESCAPOTE

570	1766710,133	1125187,127	13,707	DESCAPOTE
571	1766720,678	1125186,192	13,456	DESCAPOTE
572	1766717,289	1125191,886	13,545	DESCAPOTE
573	1766708,521	1125192,402	13,752	DESCAPOTE
574	1766703,304	1125192,805	13,922	DESCAPOTE
575	1766704,27	1125198,56	13,911	DESCAPOTE
576	1766709,28	1125197,621	13,766	DESCAPOTE
577	1766718,424	1125196,489	13,52	DESCAPOTE
578	1766719,014	1125201,928	13,535	DESCAPOTE
579	1766710,755	1125202,64	13,751	DESCAPOTE
580	1766704,675	1125203,324	13,926	DESCAPOTE
581	1766704,921	1125208,509	13,926	DESCAPOTE
582	1766712,847	1125207,363	13,698	DESCAPOTE
583	1766722,076	1125206,412	13,477	DESCAPOTE
584	1766720,907	1125211,311	13,556	DESCAPOTE
585	1766713,348	1125211,853	13,77	DESCAPOTE
586	1766706,09	1125212,553	13,879	DESCAPOTE
587	1766704,661	1125218,33	13,956	DESCAPOTE
588	1766712,891	1125217,36	13,77	DESCAPOTE
589	1766719,897	1125216,59	13,618	DESCAPOTE
590	1766720,08	1125221,406	13,576	DESCAPOTE
591	1766711,178	1125222,822	13,817	DESCAPOTE
592	1766704,852	1125223,335	13,979	DESCAPOTE
593	1766706,199	1125228,625	13,996	DESCAPOTE
594	1766715,478	1125227,277	13,712	DESCAPOTE
595	1766717,526	1125231,79	13,674	DESCAPOTE
596	1766709,773	1125232,602	13,883	DESCAPOTE
597	1766704,911	1125233,074	14,018	DESCAPOTE
598	1766707,309	1125238,333	13,897	DESCAPOTE
599	1766717,136	1125236,979	13,689	DESCAPOTE
600	1766722,225	1125241,321	13,543	DESCAPOTE
601	1766714,243	1125242,161	13,771	DESCAPOTE
602	1766707,076	1125243,094	13,921	DESCAPOTE
603	1766706,376	1125248,657	13,994	DESCAPOTE
604	1766713,411	1125247,595	13,783	DESCAPOTE
605	1766721,702	1125246,489	13,595	DESCAPOTE
606	1766720,255	1125249,202	13,652	DESCAPOTE
607	1766711,315	1125249,297	13,851	DESCAPOTE
608	1766704,595	1125249,311	14,05	DESCAPOTE
609	1766707,331	1125254,07	14,005	DESCAPOTE
610	1766715,318	1125254,133	13,814	DESCAPOTE
611	1766717,01	1125259,456	13,774	DESCAPOTE
612	1766710,063	1125259,499	13,917	DESCAPOTE
613	1766705,413	1125259,732	14,066	DESCAPOTE

614	1766705,695	1125264,272	14,111	DESCAPOTE
615	1766714,605	1125263,994	13,831	DESCAPOTE
616	1766723,159	1125264,047	13,602	DESCAPOTE
617	1766720,867	1125269,337	13,719	DESCAPOTE
618	1766713,685	1125269,371	13,887	DESCAPOTE
619	1766707,134	1125269,665	14,075	DESCAPOTE
620	1766708,346	1125274,636	13,985	DESCAPOTE
621	1766716,435	1125274,509	13,749	DESCAPOTE
622	1766724,121	1125274,347	13,595	DESCAPOTE
623	1766722,49	1125279,554	13,652	DESCAPOTE
624	1766714,691	1125279,918	13,852	DESCAPOTE
625	1766707,265	1125279,581	14,102	DESCAPOTE
626	1766708,498	1125284,116	14,036	DESCAPOTE
627	1766715,821	1125284,239	13,854	DESCAPOTE
628	1766723,388	1125284,074	13,673	DESCAPOTE
629	1766721,096	1125289,332	13,753	DESCAPOTE
630	1766713,413	1125289,207	13,899	DESCAPOTE
631	1766707,021	1125288,995	14,159	DESCAPOTE
632	1766708,104	1125293,6	14,113	DESCAPOTE
633	1766716,193	1125293,931	13,834	DESCAPOTE
634	1766720,498	1125298,845	13,735	DESCAPOTE
635	1766713,068	1125298,812	13,897	DESCAPOTE
636	1766707,552	1125298,879	14,114	DESCAPOTE
637	1766708,484	1125303,433	14,04	DESCAPOTE
638	1766715,964	1125303,422	13,843	DESCAPOTE
639	1766723,832	1125303,631	13,687	DESCAPOTE
640	1766722,858	1125308,873	13,71	DESCAPOTE
641	1766714,401	1125308,87	13,902	DESCAPOTE
642	1766708,403	1125308,601	14,115	DESCAPOTE
643	1766708,578	1125313,979	14,116	DESCAPOTE
644	1766717,128	1125313,793	13,854	DESCAPOTE
645	1766722,051	1125319,368	13,773	DESCAPOTE
646	1766713,168	1125319,456	14,085	DESCAPOTE
647	1766708,183	1125319,343	14,187	DESCAPOTE
648	1766710,639	1125323,965	14,006	DESCAPOTE
649	1766719,857	1125323,898	13,779	DESCAPOTE
650	1766725,035	1125328,902	13,705	DESCAPOTE
651	1766717,386	1125328,75	13,893	DESCAPOTE
652	1766710,038	1125328,646	14,055	DESCAPOTE
653	1766709,871	1125334,352	14,062	DESCAPOTE
654	1766717,593	1125334,248	13,88	DESCAPOTE
655	1766725,636	1125334,359	13,656	DESCAPOTE
656	1766722,294	1125339,061	13,738	DESCAPOTE
657	1766714,125	1125338,814	13,949	DESCAPOTE

658	1766708,248	1125338,691	14,122	DESCAPOTE
659	1766710,093	1125343,891	14,097	DESCAPOTE
660	1766717,975	1125344,345	13,882	DESCAPOTE
661	1766725,718	1125344,58	13,714	DESCAPOTE
662	1766723,723	1125348,976	13,707	DESCAPOTE
663	1766715,844	1125348,739	13,924	DESCAPOTE
664	1766709,347	1125348,796	14,125	DESCAPOTE
665	1766709,141	1125354,046	14,148	DESCAPOTE
666	1766716,166	1125354,452	13,98	DESCAPOTE
667	1766724,13	1125354,536	13,778	DESCAPOTE
668	1766725,091	1125358,927	13,73	DESCAPOTE
669	1766716,811	1125358,893	13,925	DESCAPOTE
670	1766709,677	1125359,003	14,144	DESCAPOTE
671	1766709,009	1125364,352	14,149	DESCAPOTE
672	1766716,528	1125364,429	14,057	DESCAPOTE
673	1766725,67	1125364,117	13,736	DESCAPOTE
674	1766724,649	1125369,6	13,77	DESCAPOTE
675	1766716,262	1125369,205	14,024	DESCAPOTE
676	1766709,149	1125369,475	14,191	DESCAPOTE
677	1766710,529	1125374,292	14,175	DESCAPOTE
678	1766718,866	1125374,592	13,952	DESCAPOTE
679	1766727,756	1125374,256	13,679	DESCAPOTE
680	1766725,403	1125379,016	13,759	DESCAPOTE
681	1766717,539	1125378,778	13,978	DESCAPOTE
682	1766712,448	1125379,023	14,121	DESCAPOTE
683	1766708,407	1125378,96	14,233	DESCAPOTE
684	1766714,441	1125384,6	14,104	DESCAPOTE
685	1766722,819	1125384,534	13,914	DESCAPOTE
686	1766726,825	1125389,05	13,867	DESCAPOTE
687	1766718,844	1125389,004	14,029	DESCAPOTE
688	1766711,384	1125388,808	14,274	DESCAPOTE
689	1766712,11	1125394,433	14,226	DESCAPOTE
690	1766719,159	1125394,267	14,019	DESCAPOTE
691	1766726,633	1125394,426	13,891	DESCAPOTE
692	1766727,971	1125399,349	13,852	DESCAPOTE
693	1766719,877	1125399,161	14,024	DESCAPOTE
694	1766712,161	1125399,312	14,213	DESCAPOTE
695	1766713,604	1125404,806	14,136	DESCAPOTE
696	1766719,92	1125404,63	14,122	DESCAPOTE
697	1766727,867	1125404,469	13,845	DESCAPOTE
698	1766724,421	1125409,473	13,883	DESCAPOTE
699	1766717,066	1125409,315	14,079	DESCAPOTE
700	1766711	1125409,361	14,247	DESCAPOTE
701	1766713,416	1125413,977	14,183	DESCAPOTE

702	1766721,776	1125413,867	13,942	DESCAPOTE
703	1766729,114	1125413,991	13,795	DESCAPOTE
704	1766727,966	1125418,94	13,786	DESCAPOTE
705	1766720,848	1125419,013	13,992	DESCAPOTE
706	1766715,69	1125419,012	14,095	DESCAPOTE
707	1766711,069	1125418,948	14,241	DESCAPOTE
708	1766713,526	1125424,239	14,235	DESCAPOTE
709	1766722,178	1125424,109	13,954	DESCAPOTE
710	1766730,29	1125424,199	13,742	DESCAPOTE
711	1766724,15	1125429,527	13,902	DESCAPOTE
712	1766715,951	1125429,314	14,083	DESCAPOTE
713	1766714,4	1125434,399	14,174	DESCAPOTE
714	1766721,707	1125434,338	14,001	DESCAPOTE
715	1766730,558	1125434,325	13,794	DESCAPOTE
716	1766728,393	1125439,033	13,836	DESCAPOTE
717	1766720,554	1125439,03	14,016	DESCAPOTE
718	1766712,914	1125439,043	14,234	DESCAPOTE
719	1766713,772	1125443,973	14,246	DESCAPOTE
720	1766721,681	1125443,961	14	DESCAPOTE
721	1766729,962	1125444,055	13,815	DESCAPOTE
722	1766727,729	1125448,933	13,872	DESCAPOTE
723	1766719,575	1125448,716	14,055	DESCAPOTE
724	1766712,187	1125448,469	14,27	DESCAPOTE
725	1766714,286	1125453,493	14,271	DESCAPOTE
726	1766722,717	1125453,952	14,012	DESCAPOTE
727	1766731,15	1125453,766	13,818	DESCAPOTE
728	1766728,653	1125458,323	13,874	DESCAPOTE
729	1766719,584	1125458,375	14,088	DESCAPOTE
730	1766712,76	1125458,399	14,241	DESCAPOTE
731	1766714,551	1125463,426	14,19	DESCAPOTE
732	1766723,902	1125463,719	14,029	DESCAPOTE
733	1766733,187	1125463,877	13,77	DESCAPOTE
734	1766725,955	1125468,518	13,934	DESCAPOTE
735	1766718,334	1125468,31	14,121	DESCAPOTE
736	1766712,354	1125468,415	14,289	DESCAPOTE
737	1766714,82	1125473,068	14,249	DESCAPOTE
738	1766724,086	1125473,452	14,084	DESCAPOTE
739	1766732,664	1125473,803	13,839	DESCAPOTE
740	1766716,669	1125478,752	14,21	DESCAPOTE
741	1766725,725	1125478,436	14,01	DESCAPOTE
742	1766728,462	1125484,026	13,988	DESCAPOTE
743	1766719,575	1125484,01	14,185	DESCAPOTE
744	1766712,893	1125483,931	14,358	DESCAPOTE
745	1766716,217	1125488,952	14,291	DESCAPOTE

746	1766724,084	1125488,788	14,098	DESCAPOTE
747	1766728,217	1125493,827	14,01	DESCAPOTE
748	1766720,961	1125493,746	14,215	DESCAPOTE
749	1766714,871	1125493,885	14,359	DESCAPOTE
750	1766716,693	1125499,039	14,288	DESCAPOTE
751	1766724,291	1125498,953	14,227	DESCAPOTE
752	1766731,765	1125498,939	14,055	DESCAPOTE
753	1766728,174	1125504,217	14,04	DESCAPOTE
754	1766719,309	1125504,06	14,228	DESCAPOTE
755	1766719,305	1125509,477	14,268	DESCAPOTE
756	1766728,126	1125509,333	14,05	DESCAPOTE
757	1766729,453	1125514,18	14,042	DESCAPOTE
758	1766721,221	1125514,285	14,205	DESCAPOTE
759	1766714,608	1125514,447	14,405	DESCAPOTE
760	1766716,802	1125519,961	14,377	DESCAPOTE
761	1766725,115	1125519,407	14,109	DESCAPOTE
762	1766728,122	1125524,738	14,054	DESCAPOTE
763	1766719,373	1125524,681	14,293	DESCAPOTE
764	1766719,046	1125530,534	14,337	DESCAPOTE
765	1766727,282	1125530,212	14,074	DESCAPOTE
766	1766731,3	1125535,217	14,021	DESCAPOTE
767	1766723,969	1125535,228	14,221	DESCAPOTE
768	1766716,548	1125535,307	14,425	DESCAPOTE
769	1766716,729	1125540,689	14,455	DESCAPOTE
770	1766724,78	1125540,547	14,229	DESCAPOTE
771	1766732,508	1125540,323	14,03	DESCAPOTE
772	1766729,98	1125545,293	14,084	DESCAPOTE
773	1766722,071	1125545,554	14,294	DESCAPOTE
774	1766716,483	1125545,642	14,418	DESCAPOTE
775	1766718,793	1125550,8	14,341	DESCAPOTE
776	1766726,588	1125550,511	14,188	DESCAPOTE
777	1766734,275	1125550,175	14,034	DESCAPOTE
778	1766732,915	1125555,199	14,041	DESCAPOTE
779	1766725,135	1125555,417	14,229	DESCAPOTE
780	1766717,82	1125555,766	14,405	DESCAPOTE
781	1766718,003	1125560,813	14,402	DESCAPOTE
782	1766725,823	1125560,624	14,172	DESCAPOTE
783	1766734,447	1125560,153	14,012	DESCAPOTE
784	1766732,445	1125565,205	14,039	DESCAPOTE
785	1766725,25	1125565,532	14,225	DESCAPOTE
786	1766718,686	1125565,673	14,415	DESCAPOTE
787	1766719,336	1125570,551	14,386	DESCAPOTE
788	1766726,823	1125570,309	14,245	DESCAPOTE
789	1766733,968	1125570,018	14,174	DESCAPOTE

790	1766732,829	1125575,375	14,083	DESCAPOTE
791	1766724,332	1125575,416	14,334	DESCAPOTE
792	1766717,721	1125575,581	14,532	DESCAPOTE
793	1766717,898	1125581,362	14,56	DESCAPOTE
794	1766727,23	1125581,058	14,281	DESCAPOTE
795	1766735,654	1125580,651	14,243	DESCAPOTE
796	1766730,795	1125585,567	14,276	DESCAPOTE
797	1766722,157	1125586,032	14,442	DESCAPOTE
798	1766716,535	1125586,311	14,68	DESCAPOTE
799	1766719,907	1125591,608	14,529	DESCAPOTE
800	1766726,923	1125590,868	14,382	DESCAPOTE
801	1766735,325	1125590,574	14,184	DESCAPOTE
802	1766728,837	1125596,02	14,167	DESCAPOTE
803	1766720,752	1125596,476	14,341	DESCAPOTE
804	1766719,82	1125602,113	14,431	DESCAPOTE
805	1766726,482	1125601,762	14,221	DESCAPOTE
806	1766726,743	1125731,78	14,433	DESCAPOTE
807	1766732,846	1125731,619	14,356	DESCAPOTE
808	1766738,466	1125731,279	14,28	DESCAPOTE
809	1766726,427	1125726,792	14,44	DESCAPOTE
810	1766732,935	1125726,727	14,341	DESCAPOTE
811	1766739,583	1125726,204	14,198	DESCAPOTE
812	1766726,164	1125737,191	14,518	DESCAPOTE
813	1766733,556	1125736,794	14,344	DESCAPOTE
814	1766741,929	1125736,409	14,142	DESCAPOTE
815	1766724,971	1125742,323	14,54	DESCAPOTE
816	1766733,266	1125741,627	14,356	DESCAPOTE
817	1766743,165	1125741,06	14,111	DESCAPOTE
818	1766737,444	1125747,094	14,267	DESCAPOTE
819	1766728,969	1125747,383	14,476	DESCAPOTE
820	1766721,72	1125747,631	14,667	DESCAPOTE
821	1766725,809	1125752,582	14,557	DESCAPOTE
822	1766734,829	1125752,268	14,376	DESCAPOTE
823	1766744,036	1125751,772	14,19	DESCAPOTE
824	1766738,14	1125757,172	14,328	DESCAPOTE
825	1766729,873	1125757,722	14,489	DESCAPOTE
826	1766722,574	1125758,131	14,652	DESCAPOTE
827	1766726,285	1125763,082	14,54	DESCAPOTE
828	1766734,411	1125762,387	14,369	DESCAPOTE
829	1766742,987	1125762,123	14,099	DESCAPOTE
830	1766736,122	1125767,477	14,353	DESCAPOTE
831	1766727,819	1125767,964	14,525	DESCAPOTE
832	1766728,914	1125773,097	14,505	DESCAPOTE
833	1766737,393	1125772,51	14,322	DESCAPOTE

834	1766736,982	1125777,562	14,35	DESCAPOTE
835	1766728,651	1125778,122	14,542	DESCAPOTE
836	1766727,586	1125783,311	14,578	DESCAPOTE
837	1766736,076	1125782,439	14,407	DESCAPOTE
838	1766743,305	1125786,899	14,178	DESCAPOTE
839	1766734,117	1125787,868	14,463	DESCAPOTE
840	1766726,274	1125788,556	14,657	DESCAPOTE
841	1766727,506	1125793,915	14,584	DESCAPOTE
842	1766735,923	1125793,395	14,372	DESCAPOTE
843	1766744,75	1125791,966	14,109	DESCAPOTE
844	1766744,985	1125797,014	14,147	DESCAPOTE
845	1766736,175	1125798,222	14,405	DESCAPOTE
846	1766727,116	1125798,851	14,633	DESCAPOTE
847	1766729,704	1125804,486	14,548	DESCAPOTE
848	1766737,635	1125804,364	14,354	DESCAPOTE
849	1766744,372	1125807,393	14,147	DESCAPOTE
850	1766734,715	1125808,721	14,401	DESCAPOTE
851	1766728,158	1125809,158	14,597	DESCAPOTE
852	1766728,485	1125814,413	14,604	DESCAPOTE
853	1766737,347	1125813,335	14,348	DESCAPOTE
854	1766745,585	1125812,565	14,273	DESCAPOTE
855	1766746,687	1125817,284	14,165	DESCAPOTE
856	1766737,389	1125818,377	14,415	DESCAPOTE
857	1766727,739	1125819,639	14,658	DESCAPOTE
858	1766728,831	1125825,06	14,621	DESCAPOTE
859	1766736,083	1125823,775	14,452	DESCAPOTE
860	1766743,917	1125822,95	14,323	DESCAPOTE
861	1766740,366	1125828,63	14,33	DESCAPOTE
862	1766731,946	1125829,611	14,527	DESCAPOTE
863	1766725,599	1125830,233	14,768	DESCAPOTE
864	1766726,202	1125835,666	14,957	DESCAPOTE
865	1766735,566	1125834,214	14,476	DESCAPOTE
866	1766744,6	1125833,07	14,249	DESCAPOTE
867	1766746,972	1125835,585	14,212	DESCAPOTE
868	1766738,231	1125836,008	14,42	DESCAPOTE
869	1766731,281	1125836,43	14,586	DESCAPOTE
870	1766730,213	1125841,707	14,631	DESCAPOTE
871	1766740,261	1125841,126	14,386	DESCAPOTE
872	1766747,741	1125840,893	14,243	DESCAPOTE
873	1766747,533	1125846,057	14,256	DESCAPOTE
874	1766740,257	1125846,137	14,418	DESCAPOTE
875	1766732,895	1125846,514	14,574	DESCAPOTE
876	1766729,328	1125852,384	14,654	DESCAPOTE
877	1766737,992	1125851,539	14,485	DESCAPOTE

878	1766745,999	1125851,225	14,293	DESCAPOTE
879	1766749,177	1125856,276	14,259	DESCAPOTE
880	1766740,256	1125856,842	14,47	DESCAPOTE
881	1766732,003	1125857,342	14,605	DESCAPOTE
882	1766724,209	1125858,129	14,809	DESCAPOTE
883	1766729,59	1125863,043	14,649	DESCAPOTE
884	1766737,587	1125862,583	14,506	DESCAPOTE
885	1766746,606	1125861,907	14,356	DESCAPOTE
886	1766747,438	1125866,747	14,352	DESCAPOTE
887	1766740,057	1125867,577	14,477	DESCAPOTE
888	1766731,331	1125868,527	14,626	DESCAPOTE
889	1766731,559	1125874,581	14,645	DESCAPOTE
890	1766739,566	1125873,546	14,517	DESCAPOTE
891	1766746,879	1125872,688	14,325	DESCAPOTE
892	1766746,345	1125875,789	14,374	DESCAPOTE
893	1766736,872	1125875,582	14,587	DESCAPOTE
894	1766728,916	1125875,582	14,79	DESCAPOTE
895	1766729,34	1125880,783	14,764	DESCAPOTE
896	1766738,433	1125880,891	14,564	DESCAPOTE
897	1766748,275	1125880,611	14,304	DESCAPOTE
898	1766747,74	1125885,812	14,352	DESCAPOTE
899	1766738,668	1125885,91	14,57	DESCAPOTE
900	1766729,277	1125886,446	14,758	DESCAPOTE
901	1766729,73	1125893,049	14,763	DESCAPOTE
902	1766739,676	1125892,014	14,634	DESCAPOTE
903	1766748,286	1125891,519	14,368	DESCAPOTE
904	1766747,826	1125896,742	14,405	DESCAPOTE
905	1766738,963	1125897,105	14,652	DESCAPOTE
906	1766729,916	1125897,64	14,811	DESCAPOTE
907	1766730,368	1125903,483	14,825	DESCAPOTE
908	1766739,7	1125902,36	14,633	DESCAPOTE
909	1766750,703	1125901,555	14,385	DESCAPOTE
910	1766749,61	1125907,01	14,425	DESCAPOTE
911	1766740,756	1125907,803	14,642	DESCAPOTE
912	1766731,169	1125908,438	14,791	DESCAPOTE
913	1766731,129	1125913,517	14,813	DESCAPOTE
914	1766739,709	1125912,949	14,641	DESCAPOTE
915	1766747,739	1125912,168	14,471	DESCAPOTE
916	1766747,404	1125916,929	14,493	DESCAPOTE
917	1766737,927	1125917,701	14,725	DESCAPOTE
918	1766731,105	1125918,05	14,904	DESCAPOTE
919	1766727,937	1125918,819	15,005	DESCAPOTE
920	1766736,432	1125919,197	14,756	DESCAPOTE
921	1766746,728	1125919,566	14,488	DESCAPOTE

922	1766730,515	1125721,106	14,457	DESCAPOTE
923	1766739,51	1125721,317	14,23	DESCAPOTE
924	1766740,959	1125715,655	14,163	DESCAPOTE
925	1766732,326	1125716,071	14,316	DESCAPOTE
926	1766724,59	1125716,078	14,534	DESCAPOTE
927	1766723,579	1125711,247	14,492	DESCAPOTE
928	1766732,86	1125711,004	14,289	DESCAPOTE
929	1766742,142	1125710,734	14,105	DESCAPOTE
930	1766740,815	1125705,97	14,115	DESCAPOTE
931	1766732,442	1125705,953	14,297	DESCAPOTE
932	1766723,79	1125705,904	14,491	DESCAPOTE
933	1766725,426	1125701,33	14,443	DESCAPOTE
934	1766734,973	1125701,442	14,224	DESCAPOTE
935	1766731,482	1125695,447	14,275	DESCAPOTE
936	1766722,601	1125695,891	14,542	DESCAPOTE
937	1766723,914	1125690,369	14,467	DESCAPOTE
938	1766732,134	1125690,24	14,25	DESCAPOTE
939	1766731,857	1125685,147	14,246	DESCAPOTE
940	1766723,296	1125685,166	14,408	DESCAPOTE
941	1766724,993	1125680,438	14,381	DESCAPOTE
942	1766734,229	1125680,353	14,151	DESCAPOTE
943	1766735,736	1125675,105	14,121	DESCAPOTE
944	1766726,749	1125675,296	14,32	DESCAPOTE
945	1766720,054	1125675,34	14,487	DESCAPOTE
946	1766725,27	1125670,048	14,356	DESCAPOTE
947	1766734,315	1125669,86	14,155	DESCAPOTE
948	1766728,657	1125664,815	14,259	DESCAPOTE
949	1766720,188	1125664,896	14,501	DESCAPOTE
950	1766721,428	1125659,557	14,439	DESCAPOTE
951	1766731,403	1125659,647	14,198	DESCAPOTE
952	1766729,768	1125654,729	14,194	DESCAPOTE
953	1766721,015	1125654,811	14,454	DESCAPOTE
954	1766722,64	1125649,268	14,353	DESCAPOTE
955	1766731,631	1125649,218	14,109	DESCAPOTE
956	1766734,622	1125644,311	14,064	DESCAPOTE
957	1766725,738	1125644,452	14,281	DESCAPOTE
958	1766719,15	1125644,583	14,49	DESCAPOTE
959	1766721,969	1125643,396	14,4	DESCAPOTE
960	1766733,995	1125642,173	14,078	DESCAPOTE
961	1766733,1	1125637,039	14,149	DESCAPOTE
962	1766724,291	1125638,197	14,338	DESCAPOTE
963	1766724,391	1125632,825	14,353	DESCAPOTE
964	1766733,721	1125631,875	14,111	DESCAPOTE
965	1766734,455	1125626,56	14,044	DESCAPOTE

966	1766725,081	1125627,575	14,332	DESCAPOTE
967	1766717,558	1125628,486	14,535	DESCAPOTE
968	1766721,584	1125623,027	14,388	DESCAPOTE
969	1766730,904	1125621,912	14,13	DESCAPOTE
970	1766729,448	1125617,168	14,221	DESCAPOTE
971	1766720,586	1125617,647	14,456	DESCAPOTE
972	1766721,659	1125612,269	14,429	DESCAPOTE
973	1766731,574	1125611,643	14,181	DESCAPOTE
974	1766728,335	1125606,776	14,25	DESCAPOTE
975	1766721,503	1125607,315	14,424	DESCAPOTE
976	1766735,481	1125600,976	14,095	DESCAPOTE
977	1766740,449	1126281,676	15,755	DESCAPOTE
978	1766748,039	1126281,518	15,637	DESCAPOTE
979	1766754,33	1126281,159	15,439	DESCAPOTE
980	1766758,132	1126286,831	15,44	DESCAPOTE
981	1766749,183	1126286,699	15,638	DESCAPOTE
982	1766741,894	1126286,878	15,791	DESCAPOTE
983	1766743,027	1126293,803	15,866	DESCAPOTE
984	1766751,513	1126294,245	15,67	DESCAPOTE
985	1766752,941	1126299,603	15,685	DESCAPOTE
986	1766745,522	1126299,15	15,813	DESCAPOTE
987	1766739,384	1126298,784	15,919	DESCAPOTE
988	1766742,669	1126304,381	15,888	DESCAPOTE
989	1766750,191	1126304,405	15,798	DESCAPOTE
990	1766756,266	1126304,517	15,803	DESCAPOTE
991	1766755,903	1126309,944	15,682	DESCAPOTE
992	1766747,598	1126310,006	15,823	DESCAPOTE
993	1766747,264	1126316,204	15,854	DESCAPOTE
994	1766755,027	1126315,932	15,711	DESCAPOTE
995	1766756,757	1126321,399	15,684	DESCAPOTE
996	1766748,386	1126321,715	15,863	DESCAPOTE
997	1766747,687	1126328,343	15,879	DESCAPOTE
998	1766755,831	1126328,099	15,715	DESCAPOTE
999	1766753,101	1126333,031	15,827	DESCAPOTE
1000	1766744,485	1126332,997	15,903	DESCAPOTE
1001	1766743,19	1126338,702	15,981	DESCAPOTE
1002	1766750,616	1126338,435	15,876	DESCAPOTE
1003	1766758,236	1126338,336	15,762	DESCAPOTE
1004	1766755,51	1126344,655	15,796	DESCAPOTE
1005	1766746,111	1126344,865	15,914	DESCAPOTE
1006	1766747,077	1126351,253	16,023	DESCAPOTE
1007	1766753,804	1126350,93	15,861	DESCAPOTE
1008	1766758,052	1126356,306	15,774	DESCAPOTE
1009	1766750,581	1126356,444	15,893	DESCAPOTE

1010	1766745,93	1126356,332	15,923	DESCAPOTE
1011	1766748,33	1126362,236	15,895	DESCAPOTE
1012	1766757,996	1126361,552	15,793	DESCAPOTE
1013	1766700	1124598,755	12,4659	DESCAPOTE
1014	1766701,014	1124628,738	12,6222	DESCAPOTE
1015	1766702,027	1124658,721	12,5821	DESCAPOTE
1016	1766703,041	1124688,703	12,7231	DESCAPOTE
1017	1766704,055	1124718,686	12,7544	DESCAPOTE
1018	1766705,069	1124748,669	12,8891	DESCAPOTE
1019	1766706,082	1124778,652	12,8728	DESCAPOTE
1020	1766707,096	1124808,635	12,9446	DESCAPOTE
1021	1766708,11	1124838,618	13,0036	DESCAPOTE
1022	1766709,124	1124868,601	13,1175	DESCAPOTE
1023	1766710,138	1124898,584	13,0813	DESCAPOTE
1024	1766711,151	1124928,566	13,1573	DESCAPOTE
1025	1766712,165	1124958,549	13,1732	DESCAPOTE
1026	1766713,179	1124988,532	13,1633	DESCAPOTE
1027	1766714,193	1125018,515	13,2265	DESCAPOTE
1028	1766715,206	1125048,498	13,2832	DESCAPOTE
1029	1766716,22	1125078,481	13,3276	DESCAPOTE
1030	1766717,234	1125108,464	13,2978	DESCAPOTE
1031	1766718,248	1125138,446	13,3633	DESCAPOTE
1032	1766719,261	1125168,429	13,3956	DESCAPOTE
1033	1766720,275	1125198,412	13,4829	DESCAPOTE
1034	1766721,289	1125228,395	13,5797	DESCAPOTE
1035	1766722,303	1125258,378	13,6394	DESCAPOTE
1036	1766723,316	1125288,361	13,6834	DESCAPOTE
1037	1766724,33	1125318,344	13,7141	DESCAPOTE
1038	1766725,344	1125348,327	13,6755	DESCAPOTE
1039	1766726,358	1125378,309	13,732	DESCAPOTE
1040	1766727,371	1125408,292	13,8282	DESCAPOTE
1041	1766728,385	1125438,275	13,8376	DESCAPOTE
1042	1766729,399	1125468,258	13,8576	DESCAPOTE
1043	1766730,413	1125498,241	14,0688	DESCAPOTE
1044	1766731,426	1125528,224	14,0524	DESCAPOTE
1045	1766732,44	1125558,207	14,0495	DESCAPOTE
1046	1766733,454	1125588,189	14,2223	DESCAPOTE
1047	1766734,468	1125618,172	14,0941	DESCAPOTE
1048	1766735,481	1125648,155	14,0331	DESCAPOTE
1049	1766736,495	1125678,138	14,0993	DESCAPOTE
1050	1766737,509	1125708,121	14,1875	DESCAPOTE
1051	1766738,523	1125738,104	14,2258	DESCAPOTE
1052	1766739,536	1125768,087	14,2563	DESCAPOTE
1053	1766740,55	1125798,07	14,2763	DESCAPOTE

1054	1766741,564	1125828,052	14,3133	DESCAPOTE
1055	1766742,578	1125858,035	14,424	DESCAPOTE
1056	1766743,591	1125888,018	14,4829	DESCAPOTE
1057	1766744,605	1125918,001	14,5545	DESCAPOTE
1058	1766745,619	1125947,984	14,6234	DESCAPOTE
1059	1766746,633	1125977,967	14,581	DESCAPOTE
1060	1766747,646	1126007,95	14,6508	DESCAPOTE
1061	1766748,66	1126037,932	14,7198	DESCAPOTE
1062	1766749,674	1126067,915	14,7951	DESCAPOTE
1063	1766750,688	1126097,898	14,8967	DESCAPOTE
1064	1766751,701	1126127,881	14,9679	DESCAPOTE
1065	1766752,715	1126157,864	15,023	DESCAPOTE
1066	1766753,729	1126187,847	15,1199	DESCAPOTE
1067	1766754,743	1126217,83	15,1915	DESCAPOTE
1068	1766755,756	1126247,813	15,3001	DESCAPOTE
1069	1766756,77	1126277,795	15,3735	DESCAPOTE
1070	1766757,784	1126307,778	15,7074	DESCAPOTE
1071	1766758,798	1126337,761	15,7467	DESCAPOTE
1072	1766755,312	1126363,504	15,8254	DESCAPOTE
1073	1766743,207	1126345,29	15,9501	DESCAPOTE
1074	1766742,193	1126315,307	15,9174	DESCAPOTE
1075	1766741,179	1126285,324	15,7863	DESCAPOTE
1076	1766740,165	1126255,341	15,6501	DESCAPOTE
1077	1766739,151	1126225,358	15,6517	DESCAPOTE
1078	1766738,137	1126195,375	15,6142	DESCAPOTE
1079	1766737,123	1126165,392	15,4917	DESCAPOTE
1080	1766736,109	1126135,41	15,3723	DESCAPOTE
1081	1766735,094	1126105,427	15,2732	DESCAPOTE
1082	1766734,08	1126075,444	15,2144	DESCAPOTE
1083	1766733,066	1126045,461	15,1906	DESCAPOTE
1084	1766732,052	1126015,478	15,0957	DESCAPOTE
1085	1766731,038	1125985,495	15,0173	DESCAPOTE
1086	1766730,024	1125955,512	15,0195	DESCAPOTE
1087	1766729,01	1125925,53	14,9296	DESCAPOTE
1088	1766727,996	1125895,547	14,8537	DESCAPOTE
1089	1766726,982	1125865,564	14,7262	DESCAPOTE
1090	1766725,967	1125835,581	14,9428	DESCAPOTE
1091	1766724,953	1125805,598	14,6885	DESCAPOTE
1092	1766723,939	1125775,615	14,6658	DESCAPOTE
1093	1766722,925	1125745,632	14,6198	DESCAPOTE
1094	1766721,911	1125715,65	14,5905	DESCAPOTE
1095	1766720,897	1125685,667	14,4962	DESCAPOTE
1096	1766719,883	1125655,684	14,5028	DESCAPOTE
1097	1766718,869	1125625,701	14,4843	DESCAPOTE

1098	1766717,855	1125595,718	14,4543	DESCAPOTE
1099	1766716,84	1125565,735	14,4631	DESCAPOTE
1100	1766715,826	1125535,752	14,4399	DESCAPOTE
1101	1766714,812	1125505,77	14,3656	DESCAPOTE
1102	1766713,798	1125475,787	14,2848	DESCAPOTE
1103	1766712,784	1125445,804	14,2678	DESCAPOTE
1104	1766711,77	1125415,821	14,2283	DESCAPOTE
1105	1766710,756	1125385,838	14,24	DESCAPOTE
1106	1766709,742	1125355,855	14,1368	DESCAPOTE
1107	1766708,727	1125325,872	14,094	DESCAPOTE
1108	1766707,713	1125295,89	14,1186	DESCAPOTE
1109	1766706,699	1125265,907	14,0823	DESCAPOTE
1110	1766705,685	1125235,924	13,9768	DESCAPOTE
1111	1766704,671	1125205,941	13,9299	DESCAPOTE
1112	1766703,657	1125175,958	13,8332	DESCAPOTE
1113	1766702,643	1125145,975	13,7404	DESCAPOTE
1114	1766701,629	1125115,992	13,7281	DESCAPOTE
1115	1766700,615	1125086,01	13,6459	DESCAPOTE
1116	1766699,6	1125056,027	13,6517	DESCAPOTE
1117	1766698,586	1125026,044	13,6423	DESCAPOTE
1118	1766697,572	1124996,061	13,5998	DESCAPOTE
1119	1766696,558	1124966,078	13,5439	DESCAPOTE
1120	1766695,544	1124936,095	13,5108	DESCAPOTE
1121	1766694,53	1124906,113	13,4944	DESCAPOTE
1122	1766693,516	1124876,13	13,5045	DESCAPOTE
1123	1766692,502	1124846,147	13,4013	DESCAPOTE
1124	1766691,488	1124816,164	13,3149	DESCAPOTE
1125	1766690,473	1124786,181	13,2808	DESCAPOTE
1126	1766689,459	1124756,198	13,2062	DESCAPOTE
1127	1766688,445	1124726,215	13,195	DESCAPOTE
1128	1766687,431	1124696,233	13,0929	DESCAPOTE
1129	1766686,417	1124666,25	13,0419	DESCAPOTE
1130	1766685,403	1124636,267	12,9755	DESCAPOTE
1131	1766684,389	1124606,284	12,9142	DESCAPOTE
1132	1766700,023	1124598,114	12,4503	DESCAPOTE
1133	1766705,712	1124755,817	12,941	DESCAPOTE
1134	1766704,623	1124752,11	12,916	DESCAPOTE
1135	1766684,437	1124596,58	12,883	DESCAPOTE
1136	1766743,894	1126363,975	15,948	DESCAPOTE
1137	1766757,348	1126363,932	15,855	DESCAPOTE

CARTERA TOPOGRÁFICA RELLENO FRANJA NORTE				
PUNTO	**NORTE**	**ESTE**	**ALTURA**	**DESCRIPCIÓN**
1	1766745,962	1126363,485	16,228	RELLENO NORTE
2	1766745,792	1126358,488	16,221	RELLENO NORTE
3	1766745,622	1126353,491	16,214	RELLENO NORTE
4	1766745,452	1126348,494	16,207	RELLENO NORTE
5	1766745,282	1126343,497	16,200	RELLENO NORTE
6	1766745,112	1126338,5	16,193	RELLENO NORTE
7	1766744,942	1126333,503	16,186	RELLENO NORTE
8	1766744,772	1126328,505	16,178	RELLENO NORTE
9	1766744,602	1126323,508	16,171	RELLENO NORTE
10	1766744,432	1126318,511	16,164	RELLENO NORTE
11	1766744,262	1126313,514	16,157	RELLENO NORTE
12	1766744,092	1126308,517	16,150	RELLENO NORTE
13	1766743,922	1126303,52	16,143	RELLENO NORTE
14	1766743,752	1126298,523	16,136	RELLENO NORTE
15	1766743,582	1126293,526	16,129	RELLENO NORTE
16	1766743,413	1126288,529	16,121	RELLENO NORTE
17	1766743,243	1126283,531	16,114	RELLENO NORTE
18	1766743,073	1126278,534	16,107	RELLENO NORTE
19	1766742,903	1126273,537	16,100	RELLENO NORTE
20	1766742,733	1126268,54	16,093	RELLENO NORTE
21	1766742,563	1126263,543	16,086	RELLENO NORTE
22	1766742,393	1126258,546	16,079	RELLENO NORTE
23	1766742,223	1126253,549	16,071	RELLENO NORTE
24	1766742,053	1126248,552	16,064	RELLENO NORTE
25	1766741,883	1126243,555	16,055	RELLENO NORTE
26	1766741,713	1126238,557	16,046	RELLENO NORTE
27	1766741,543	1126233,56	16,035	RELLENO NORTE
28	1766741,373	1126228,563	16,024	RELLENO NORTE
29	1766741,203	1126223,566	16,012	RELLENO NORTE
30	1766741,033	1126218,569	15,999	RELLENO NORTE
31	1766740,863	1126213,572	15,986	RELLENO NORTE
32	1766740,693	1126208,575	15,971	RELLENO NORTE
33	1766740,523	1126203,578	15,956	RELLENO NORTE
34	1766740,353	1126198,581	15,94	RELLENO NORTE
35	1766740,183	1126193,583	15,924	RELLENO NORTE
36	1766740,013	1126188,586	15,908	RELLENO NORTE
37	1766739,843	1126183,589	15,892	RELLENO NORTE
38	1766739,673	1126178,592	15,875	RELLENO NORTE
39	1766739,503	1126173,595	15,859	RELLENO NORTE
40	1766739,333	1126168,598	15,843	RELLENO NORTE
41	1766739,163	1126163,601	15,827	RELLENO NORTE
42	1766738,993	1126158,604	15,811	RELLENO NORTE
43	1766738,823	1126153,607	15,795	RELLENO NORTE
44	1766738,653	1126148,609	15,779	RELLENO NORTE
45	1766738,483	1126143,612	15,763	RELLENO NORTE
46	1766738,313	1126138,615	15,747	RELLENO NORTE
47	1766738,143	1126133,618	15,731	RELLENO NORTE
48	1766737,973	1126128,621	15,714	RELLENO NORTE
49	1766737,803	1126123,624	15,698	RELLENO NORTE
50	1766737,633	1126118,627	15,682	RELLENO NORTE
51	1766737,463	1126113,63	15,666	RELLENO NORTE
52	1766737,293	1126108,633	15,651	RELLENO NORTE
53	1766737,123	1126103,636	15,637	RELLENO NORTE
54	1766736,953	1126098,638	15,624	RELLENO NORTE
55	1766736,783	1126093,641	15,611	RELLENO NORTE

56	1766736,613	1126088,644	15,599	RELLENO NORTE
57	1766736,443	1126083,647	15,588	RELLENO NORTE
58	1766736,273	1126078,65	15,578	RELLENO NORTE
59	1766736,103	1126073,653	15,568	RELLENO NORTE
60	1766735,933	1126068,656	15,558	RELLENO NORTE
61	1766735,763	1126063,659	15,548	RELLENO NORTE
62	1766735,593	1126058,662	15,538	RELLENO NORTE
63	1766735,423	1126053,664	15,528	RELLENO NORTE
64	1766735,253	1126048,667	15,518	RELLENO NORTE
65	1766735,083	1126043,67	15,508	RELLENO NORTE
66	1766734,914	1126038,673	15,498	RELLENO NORTE
67	1766734,744	1126033,676	15,488	RELLENO NORTE
68	1766734,574	1126028,679	15,479	RELLENO NORTE
69	1766734,404	1126023,682	15,469	RELLENO NORTE
70	1766734,234	1126018,685	15,459	RELLENO NORTE
71	1766734,064	1126013,688	15,449	RELLENO NORTE
72	1766733,894	1126008,69	15,439	RELLENO NORTE
73	1766733,724	1126003,693	15,429	RELLENO NORTE
74	1766733,554	1125998,696	15,419	RELLENO NORTE
75	1766733,384	1125993,699	15,409	RELLENO NORTE
76	1766733,214	1125988,702	15,399	RELLENO NORTE
77	1766733,044	1125983,705	15,389	RELLENO NORTE
78	1766732,874	1125978,708	15,379	RELLENO NORTE
79	1766732,704	1125973,711	15,369	RELLENO NORTE
80	1766732,534	1125968,714	15,359	RELLENO NORTE
81	1766732,364	1125963,716	15,349	RELLENO NORTE
82	1766732,194	1125958,719	15,34	RELLENO NORTE
83	1766732,024	1125953,722	15,33	RELLENO NORTE
84	1766731,854	1125948,725	15,32	RELLENO NORTE
85	1766731,684	1125943,728	15,31	RELLENO NORTE
86	1766731,514	1125938,731	15,3	RELLENO NORTE
87	1766731,344	1125933,734	15,29	RELLENO NORTE
88	1766731,174	1125928,737	15,28	RELLENO NORTE
89	1766731,004	1125923,74	15,27	RELLENO NORTE
90	1766730,834	1125918,742	15,26	RELLENO NORTE
91	1766730,664	1125913,745	15,25	RELLENO NORTE
92	1766730,494	1125908,748	15,24	RELLENO NORTE
93	1766730,324	1125903,751	15,23	RELLENO NORTE
94	1766730,154	1125898,754	15,22	RELLENO NORTE
95	1766729,984	1125893,757	15,21	RELLENO NORTE
96	1766729,814	1125888,76	15,201	RELLENO NORTE
97	1766729,644	1125883,763	15,191	RELLENO NORTE
98	1766729,474	1125878,766	15,181	RELLENO NORTE
99	1766729,304	1125873,768	15,171	RELLENO NORTE
100	1766729,134	1125868,771	15,161	RELLENO NORTE
101	1766728,964	1125863,774	15,151	RELLENO NORTE
102	1766728,794	1125858,777	15,141	RELLENO NORTE
103	1766728,624	1125853,78	15,131	RELLENO NORTE
104	1766728,454	1125848,783	15,121	RELLENO NORTE
105	1766728,284	1125843,786	15,111	RELLENO NORTE
106	1766728,114	1125838,789	15,101	RELLENO NORTE
107	1766727,944	1125833,792	15,092	RELLENO NORTE
108	1766727,774	1125828,794	15,084	RELLENO NORTE
109	1766727,604	1125823,797	15,077	RELLENO NORTE
110	1766727,434	1125818,8	15,07	RELLENO NORTE
111	1766727,264	1125813,803	15,064	RELLENO NORTE
112	1766727,094	1125808,806	15,058	RELLENO NORTE
113	1766726,924	1125803,809	15,052	RELLENO NORTE

114	1766726,754	1125798,812	15,046	RELLENO NORTE
115	1766726,584	1125793,815	15,04	RELLENO NORTE
116	1766726,414	1125788,818	15,034	RELLENO NORTE
117	1766726,245	1125783,82	15,028	RELLENO NORTE
118	1766726,075	1125778,823	15,022	RELLENO NORTE
119	1766725,905	1125773,826	15,016	RELLENO NORTE
120	1766725,735	1125768,829	15,01	RELLENO NORTE
121	1766725,565	1125763,832	15,004	RELLENO NORTE
122	1766725,395	1125758,835	14,998	RELLENO NORTE
123	1766725,225	1125753,838	14,991	RELLENO NORTE
124	1766725,055	1125748,841	14,985	RELLENO NORTE
125	1766724,885	1125743,844	14,979	RELLENO NORTE
126	1766724,715	1125738,846	14,973	RELLENO NORTE
127	1766724,545	1125733,849	14,967	RELLENO NORTE
128	1766724,375	1125728,852	14,961	RELLENO NORTE
129	1766724,205	1125723,855	14,955	RELLENO NORTE
130	1766724,035	1125718,858	14,949	RELLENO NORTE
131	1766723,865	1125713,861	14,943	RELLENO NORTE
132	1766723,695	1125708,864	14,937	RELLENO NORTE
133	1766723,525	1125703,867	14,931	RELLENO NORTE
134	1766723,355	1125698,87	14,925	RELLENO NORTE
135	1766723,185	1125693,872	14,919	RELLENO NORTE
136	1766723,015	1125688,875	14,913	RELLENO NORTE
137	1766722,845	1125683,878	14,907	RELLENO NORTE
138	1766722,675	1125678,881	14,901	RELLENO NORTE
139	1766722,505	1125673,884	14,895	RELLENO NORTE
140	1766722,335	1125668,887	14,889	RELLENO NORTE
141	1766722,165	1125663,89	14,883	RELLENO NORTE
142	1766721,995	1125658,893	14,877	RELLENO NORTE
143	1766721,825	1125653,896	14,87	RELLENO NORTE
144	1766721,655	1125648,899	14,864	RELLENO NORTE
145	1766721,485	1125643,901	14,858	RELLENO NORTE
146	1766721,315	1125638,904	14,852	RELLENO NORTE
147	1766721,145	1125633,907	14,846	RELLENO NORTE
148	1766720,975	1125628,91	14,84	RELLENO NORTE
149	1766720,805	1125623,913	14,834	RELLENO NORTE
150	1766720,635	1125618,916	14,828	RELLENO NORTE
151	1766720,465	1125613,919	14,822	RELLENO NORTE
152	1766720,295	1125608,922	14,816	RELLENO NORTE
153	1766720,125	1125603,925	14,81	RELLENO NORTE
154	1766719,955	1125598,927	14,804	RELLENO NORTE
155	1766719,785	1125593,93	14,798	RELLENO NORTE
156	1766719,615	1125588,933	14,792	RELLENO NORTE
157	1766719,445	1125583,936	14,786	RELLENO NORTE
158	1766719,275	1125578,939	14,78	RELLENO NORTE
159	1766719,105	1125573,942	14,774	RELLENO NORTE
160	1766718,935	1125568,945	14,768	RELLENO NORTE
161	1766718,765	1125563,948	14,762	RELLENO NORTE
162	1766718,595	1125558,951	14,756	RELLENO NORTE
163	1766718,425	1125553,953	14,749	RELLENO NORTE
164	1766718,255	1125548,956	14,743	RELLENO NORTE
165	1766718,085	1125543,959	14,737	RELLENO NORTE
166	1766717,915	1125538,962	14,731	RELLENO NORTE
167	1766717,746	1125533,965	14,725	RELLENO NORTE
168	1766717,576	1125528,968	14,719	RELLENO NORTE
169	1766717,406	1125523,971	14,713	RELLENO NORTE
170	1766717,236	1125518,974	14,707	RELLENO NORTE
171	1766717,066	1125513,977	14,701	RELLENO NORTE

172	1766716,896	1125508,979	14,695	RELLENO NORTE
173	1766716,726	1125503,982	14,689	RELLENO NORTE
174	1766716,556	1125498,985	14,683	RELLENO NORTE
175	1766716,386	1125493,988	14,677	RELLENO NORTE
176	1766716,216	1125488,991	14,671	RELLENO NORTE
177	1766716,046	1125483,994	14,665	RELLENO NORTE
178	1766715,876	1125478,997	14,659	RELLENO NORTE
179	1766715,706	1125474	14,653	RELLENO NORTE
180	1766715,536	1125469,003	14,647	RELLENO NORTE
181	1766715,366	1125464,005	14,641	RELLENO NORTE
182	1766715,196	1125459,008	14,635	RELLENO NORTE
183	1766715,026	1125454,011	14,628	RELLENO NORTE
184	1766714,856	1125449,014	14,622	RELLENO NORTE
185	1766714,686	1125444,017	14,616	RELLENO NORTE
186	1766714,516	1125439,02	14,61	RELLENO NORTE
187	1766714,346	1125434,023	14,604	RELLENO NORTE
188	1766714,176	1125429,026	14,598	RELLENO NORTE
189	1766714,006	1125424,029	14,592	RELLENO NORTE
190	1766713,836	1125419,031	14,586	RELLENO NORTE
191	1766713,666	1125414,034	14,58	RELLENO NORTE
192	1766713,496	1125409,037	14,574	RELLENO NORTE
193	1766713,326	1125404,04	14,568	RELLENO NORTE
194	1766713,156	1125399,043	14,562	RELLENO NORTE
195	1766712,986	1125394,046	14,556	RELLENO NORTE
196	1766712,816	1125389,049	14,55	RELLENO NORTE
197	1766712,646	1125384,052	14,544	RELLENO NORTE
198	1766712,476	1125379,055	14,538	RELLENO NORTE
199	1766712,306	1125374,057	14,532	RELLENO NORTE
200	1766712,136	1125369,06	14,526	RELLENO NORTE
201	1766711,966	1125364,063	14,52	RELLENO NORTE
202	1766711,796	1125359,066	14,513	RELLENO NORTE
203	1766711,626	1125354,069	14,507	RELLENO NORTE
204	1766711,456	1125349,072	14,501	RELLENO NORTE
205	1766711,286	1125344,075	14,495	RELLENO NORTE
206	1766711,116	1125339,078	14,489	RELLENO NORTE
207	1766710,946	1125334,081	14,483	RELLENO NORTE
208	1766710,776	1125329,083	14,477	RELLENO NORTE
209	1766710,606	1125324,086	14,471	RELLENO NORTE
210	1766710,436	1125319,089	14,465	RELLENO NORTE
211	1766710,266	1125314,092	14,457	RELLENO NORTE
212	1766710,096	1125309,095	14,449	RELLENO NORTE
213	1766709,926	1125304,098	14,441	RELLENO NORTE
214	1766709,756	1125299,101	14,432	RELLENO NORTE
215	1766709,586	1125294,104	14,423	RELLENO NORTE
216	1766709,416	1125289,107	14,414	RELLENO NORTE
217	1766709,246	1125284,109	14,405	RELLENO NORTE
218	1766709,077	1125279,112	14,396	RELLENO NORTE
219	1766708,907	1125274,115	14,387	RELLENO NORTE
220	1766708,737	1125269,118	14,378	RELLENO NORTE
221	1766708,567	1125264,121	14,369	RELLENO NORTE
222	1766708,397	1125259,124	14,36	RELLENO NORTE
223	1766708,227	1125254,127	14,351	RELLENO NORTE
224	1766708,057	1125249,13	14,342	RELLENO NORTE
225	1766707,887	1125244,133	14,333	RELLENO NORTE
226	1766707,717	1125239,136	14,324	RELLENO NORTE
227	1766707,547	1125234,138	14,315	RELLENO NORTE
228	1766707,377	1125229,141	14,306	RELLENO NORTE
229	1766707,207	1125224,144	14,297	RELLENO NORTE

230	1766707,037	1125219,147	14,288	RELLENO NORTE
231	1766706,867	1125214,15	14,279	RELLENO NORTE
232	1766706,697	1125209,153	14,27	RELLENO NORTE
233	1766706,527	1125204,156	14,261	RELLENO NORTE
234	1766706,357	1125199,159	14,252	RELLENO NORTE
235	1766706,187	1125194,162	14,243	RELLENO NORTE
236	1766706,017	1125189,164	14,234	RELLENO NORTE
237	1766705,847	1125184,167	14,225	RELLENO NORTE
238	1766705,677	1125179,17	14,216	RELLENO NORTE
239	1766705,507	1125174,173	14,207	RELLENO NORTE
240	1766705,337	1125169,176	14,198	RELLENO NORTE
241	1766705,167	1125164,179	14,189	RELLENO NORTE
242	1766704,997	1125159,182	14,18	RELLENO NORTE
243	1766704,827	1125154,185	14,171	RELLENO NORTE
244	1766704,657	1125149,188	14,162	RELLENO NORTE
245	1766704,487	1125144,19	14,153	RELLENO NORTE
246	1766704,317	1125139,193	14,144	RELLENO NORTE
247	1766704,147	1125134,196	14,136	RELLENO NORTE
248	1766703,977	1125129,199	14,127	RELLENO NORTE
249	1766703,807	1125124,202	14,118	RELLENO NORTE
250	1766703,637	1125119,205	14,109	RELLENO NORTE
251	1766703,467	1125114,208	14,1	RELLENO NORTE
252	1766703,297	1125109,211	14,091	RELLENO NORTE
253	1766703,127	1125104,214	14,084	RELLENO NORTE
254	1766702,957	1125099,216	14,077	RELLENO NORTE
255	1766702,787	1125094,219	14,07	RELLENO NORTE
256	1766702,617	1125089,222	14,064	RELLENO NORTE
257	1766702,447	1125084,225	14,058	RELLENO NORTE
258	1766702,277	1125079,228	14,052	RELLENO NORTE
259	1766702,107	1125074,231	14,045	RELLENO NORTE
260	1766701,937	1125069,234	14,039	RELLENO NORTE
261	1766701,767	1125064,237	14,033	RELLENO NORTE
262	1766701,597	1125059,24	14,026	RELLENO NORTE
263	1766701,427	1125054,242	14,02	RELLENO NORTE
264	1766701,257	1125049,245	14,014	RELLENO NORTE
265	1766701,087	1125044,248	14,008	RELLENO NORTE
266	1766700,917	1125039,251	14,001	RELLENO NORTE
267	1766700,747	1125034,254	13,995	RELLENO NORTE
268	1766700,578	1125029,257	13,989	RELLENO NORTE
269	1766700,408	1125024,26	13,983	RELLENO NORTE
270	1766700,238	1125019,263	13,976	RELLENO NORTE
271	1766700,068	1125014,266	13,97	RELLENO NORTE
272	1766699,898	1125009,268	13,964	RELLENO NORTE
273	1766699,728	1125004,271	13,958	RELLENO NORTE
274	1766699,558	1124999,274	13,951	RELLENO NORTE
275	1766699,388	1124994,277	13,945	RELLENO NORTE
276	1766699,218	1124989,28	13,939	RELLENO NORTE
277	1766699,048	1124984,283	13,933	RELLENO NORTE
278	1766698,878	1124979,286	13,926	RELLENO NORTE
279	1766698,708	1124974,289	13,92	RELLENO NORTE
280	1766698,538	1124969,292	13,914	RELLENO NORTE
281	1766698,368	1124964,294	13,908	RELLENO NORTE
282	1766698,198	1124959,297	13,901	RELLENO NORTE
283	1766698,028	1124954,3	13,895	RELLENO NORTE
284	1766697,858	1124949,303	13,889	RELLENO NORTE
285	1766697,688	1124944,306	13,883	RELLENO NORTE
286	1766697,518	1124939,309	13,876	RELLENO NORTE
287	1766697,348	1124934,312	13,87	RELLENO NORTE

288	1766697,178	1124929,315	13,864	RELLENO NORTE
289	1766697,008	1124924,318	13,858	RELLENO NORTE
290	1766696,838	1124919,32	13,851	RELLENO NORTE
291	1766696,668	1124914,323	13,845	RELLENO NORTE
292	1766696,498	1124909,326	13,839	RELLENO NORTE
293	1766696,328	1124904,329	13,833	RELLENO NORTE
294	1766696,158	1124899,332	13,826	RELLENO NORTE
295	1766695,988	1124894,335	13,82	RELLENO NORTE
296	1766695,818	1124889,338	13,814	RELLENO NORTE
297	1766695,648	1124884,341	13,807	RELLENO NORTE
298	1766695,478	1124879,344	13,801	RELLENO NORTE
299	1766695,308	1124874,346	13,794	RELLENO NORTE
300	1766695,138	1124869,349	13,786	RELLENO NORTE
301	1766694,968	1124864,352	13,778	RELLENO NORTE
302	1766694,798	1124859,355	13,768	RELLENO NORTE
303	1766694,628	1124854,358	13,758	RELLENO NORTE
304	1766694,458	1124849,361	13,748	RELLENO NORTE
305	1766694,288	1124844,364	13,737	RELLENO NORTE
306	1766694,118	1124839,367	13,727	RELLENO NORTE
307	1766693,948	1124834,37	13,716	RELLENO NORTE
308	1766693,778	1124829,372	13,706	RELLENO NORTE
309	1766693,608	1124824,375	13,696	RELLENO NORTE
310	1766693,438	1124819,378	13,685	RELLENO NORTE
311	1766693,268	1124814,381	13,675	RELLENO NORTE
312	1766693,098	1124809,384	13,665	RELLENO NORTE
313	1766692,928	1124804,387	13,654	RELLENO NORTE
314	1766692,758	1124799,39	13,644	RELLENO NORTE
315	1766692,588	1124794,393	13,634	RELLENO NORTE
316	1766692,418	1124789,396	13,623	RELLENO NORTE
317	1766692,248	1124784,399	13,613	RELLENO NORTE
318	1766692,079	1124779,401	13,602	RELLENO NORTE
319	1766691,909	1124774,404	13,592	RELLENO NORTE
320	1766691,739	1124769,407	13,582	RELLENO NORTE
321	1766691,569	1124764,41	13,571	RELLENO NORTE
322	1766691,399	1124759,413	13,561	RELLENO NORTE
323	1766691,229	1124754,416	13,551	RELLENO NORTE
324	1766691,059	1124749,419	13,54	RELLENO NORTE
325	1766690,889	1124744,422	13,53	RELLENO NORTE
326	1766690,719	1124739,425	13,52	RELLENO NORTE
327	1766690,549	1124734,427	13,509	RELLENO NORTE
328	1766690,379	1124729,43	13,499	RELLENO NORTE
329	1766690,209	1124724,433	13,488	RELLENO NORTE
330	1766690,039	1124719,436	13,478	RELLENO NORTE
331	1766689,869	1124714,439	13,468	RELLENO NORTE
332	1766689,699	1124709,442	13,457	RELLENO NORTE
333	1766689,529	1124704,445	13,447	RELLENO NORTE
334	1766689,359	1124699,448	13,437	RELLENO NORTE
335	1766689,189	1124694,451	13,426	RELLENO NORTE
336	1766689,019	1124689,453	13,416	RELLENO NORTE
337	1766688,849	1124684,456	13,406	RELLENO NORTE
338	1766688,679	1124679,459	13,395	RELLENO NORTE
339	1766688,509	1124674,462	13,385	RELLENO NORTE
340	1766688,475	1124673,463	13,383	RELLENO NORTE
341	1766688,339	1124669,465	13,374	RELLENO NORTE
342	1766688,169	1124664,468	13,364	RELLENO NORTE
343	1766687,999	1124659,471	13,354	RELLENO NORTE
344	1766687,829	1124654,474	13,343	RELLENO NORTE
345	1766687,659	1124649,477	13,333	RELLENO NORTE

346	1766687,489	1124644,479	13,323	RELLENO NORTE
347	1766687,319	1124639,482	13,312	RELLENO NORTE
348	1766687,149	1124634,485	13,302	RELLENO NORTE
349	1766686,979	1124629,488	13,292	RELLENO NORTE
350	1766686,809	1124624,491	13,281	RELLENO NORTE
351	1766686,639	1124619,494	13,271	RELLENO NORTE
352	1766686,469	1124614,497	13,26	RELLENO NORTE
353	1766686,299	1124609,5	13,25	RELLENO NORTE
354	1766686,129	1124604,503	13,24	RELLENO NORTE
355	1766685,959	1124599,505	13,229	RELLENO NORTE
356	1766756,956	1126363,111	16,0917	RELLENO NORTE
357	1766756,616	1126353,117	15,962	RELLENO NORTE
358	1766756,276	1126343,123	15,9248	RELLENO NORTE
359	1766755,936	1126333,128	15,9108	RELLENO NORTE
360	1766755,596	1126323,134	15,8961	RELLENO NORTE
361	1766755,256	1126313,14	15,8821	RELLENO NORTE
362	1766754,916	1126303,146	15,8678	RELLENO NORTE
363	1766754,576	1126293,151	15,8538	RELLENO NORTE
364	1766754,236	1126283,157	15,8391	RELLENO NORTE
365	1766753,896	1126273,163	15,8251	RELLENO NORTE
366	1766753,556	1126263,169	15,811	RELLENO NORTE
367	1766753,217	1126253,175	15,796	RELLENO NORTE
368	1766752,877	1126243,18	15,78	RELLENO NORTE
369	1766752,537	1126233,186	15,76	RELLENO NORTE
370	1766752,197	1126223,192	15,737	RELLENO NORTE
371	1766751,857	1126213,198	15,711	RELLENO NORTE
372	1766751,517	1126203,204	15,681	RELLENO NORTE
373	1766751,177	1126193,209	15,649	RELLENO NORTE
374	1766750,837	1126183,215	15,617	RELLENO NORTE
375	1766750,497	1126173,221	15,584	RELLENO NORTE
376	1766750,157	1126163,227	15,552	RELLENO NORTE
377	1766749,817	1126153,232	15,52	RELLENO NORTE
378	1766749,477	1126143,238	15,488	RELLENO NORTE
379	1766749,137	1126133,244	15,456	RELLENO NORTE
380	1766748,797	1126123,25	15,423	RELLENO NORTE
381	1766748,457	1126113,256	15,3913	RELLENO NORTE
382	1766748,117	1126103,261	15,362	RELLENO NORTE
383	1766747,777	1126093,267	15,336	RELLENO NORTE
384	1766747,437	1126083,273	15,3131	RELLENO NORTE
385	1766747,097	1126073,279	15,2929	RELLENO NORTE
386	1766746,757	1126063,284	15,2729	RELLENO NORTE
387	1766746,417	1126053,29	15,253	RELLENO NORTE
388	1766746,077	1126043,296	15,2331	RELLENO NORTE
389	1766745,737	1126033,302	15,2132	RELLENO NORTE
390	1766745,397	1126023,308	15,1939	RELLENO NORTE
391	1766745,057	1126013,313	15,174	RELLENO NORTE
392	1766744,717	1126003,319	15,1541	RELLENO NORTE
393	1766744,377	1125993,325	15,1341	RELLENO NORTE
394	1766744,037	1125983,331	15,1139	RELLENO NORTE
395	1766743,697	1125973,336	15,094	RELLENO NORTE
396	1766743,357	1125963,342	15,0741	RELLENO NORTE
397	1766743,017	1125953,348	15,0549	RELLENO NORTE
398	1766742,677	1125943,354	15,0349	RELLENO NORTE
399	1766742,337	1125933,36	15,015	RELLENO NORTE
400	1766741,997	1125923,365	14,995	RELLENO NORTE
401	1766741,657	1125913,371	14,9751	RELLENO NORTE
402	1766741,317	1125903,377	14,9552	RELLENO NORTE
403	1766740,977	1125893,383	14,9352	RELLENO NORTE

404	1766740,637	1125883,388	14,916	RELLENO NORTE
405	1766740,297	1125873,394	14,8958	RELLENO NORTE
406	1766739,957	1125863,4	14,8759	RELLENO NORTE
407	1766739,617	1125853,406	14,856	RELLENO NORTE
408	1766739,277	1125843,412	14,836	RELLENO NORTE
409	1766738,937	1125833,417	14,8171	RELLENO NORTE
410	1766738,597	1125823,423	14,802	RELLENO NORTE
411	1766738,257	1125813,429	14,789	RELLENO NORTE
412	1766737,917	1125803,435	14,777	RELLENO NORTE
413	1766737,577	1125793,441	14,765	RELLENO NORTE
414	1766737,237	1125783,446	14,753	RELLENO NORTE
415	1766736,897	1125773,452	14,741	RELLENO NORTE
416	1766736,557	1125763,458	14,729	RELLENO NORTE
417	1766736,217	1125753,464	14,7162	RELLENO NORTE
418	1766735,877	1125743,469	14,7042	RELLENO NORTE
419	1766735,537	1125733,475	14,6922	RELLENO NORTE
420	1766735,197	1125723,481	14,6802	RELLENO NORTE
421	1766734,857	1125713,487	14,6682	RELLENO NORTE
422	1766734,517	1125703,493	14,6562	RELLENO NORTE
423	1766734,177	1125693,498	14,6439	RELLENO NORTE
424	1766733,837	1125683,504	14,6318	RELLENO NORTE
425	1766733,497	1125673,51	14,6198	RELLENO NORTE
426	1766733,158	1125663,516	14,6078	RELLENO NORTE
427	1766732,818	1125653,521	14,5951	RELLENO NORTE
428	1766732,478	1125643,527	14,5831	RELLENO NORTE
429	1766732,138	1125633,533	14,571	RELLENO NORTE
430	1766731,798	1125623,539	14,559	RELLENO NORTE
431	1766731,458	1125613,545	14,5469	RELLENO NORTE
432	1766731,118	1125603,55	14,5351	RELLENO NORTE
433	1766730,778	1125593,556	14,5231	RELLENO NORTE
434	1766730,438	1125583,562	14,511	RELLENO NORTE
435	1766730,098	1125573,568	14,4989	RELLENO NORTE
436	1766729,758	1125563,573	14,4869	RELLENO NORTE
437	1766729,418	1125553,579	14,4741	RELLENO NORTE
438	1766729,078	1125543,585	14,462	RELLENO NORTE
439	1766728,738	1125533,591	14,4503	RELLENO NORTE
440	1766728,398	1125523,597	14,4382	RELLENO NORTE
441	1766728,058	1125513,602	14,4261	RELLENO NORTE
442	1766727,718	1125503,608	14,4141	RELLENO NORTE
443	1766727,378	1125493,614	14,402	RELLENO NORTE
444	1766727,038	1125483,62	14,3899	RELLENO NORTE
445	1766726,698	1125473,626	14,3779	RELLENO NORTE
446	1766726,358	1125463,631	14,3658	RELLENO NORTE
447	1766726,018	1125453,637	14,3533	RELLENO NORTE
448	1766725,678	1125443,643	14,3412	RELLENO NORTE
449	1766725,338	1125433,649	14,3292	RELLENO NORTE
450	1766724,998	1125423,654	14,3171	RELLENO NORTE
451	1766724,658	1125413,66	14,3051	RELLENO NORTE
452	1766724,318	1125403,666	14,2931	RELLENO NORTE
453	1766723,978	1125393,672	14,2809	RELLENO NORTE
454	1766723,638	1125383,678	14,269	RELLENO NORTE
455	1766723,298	1125373,683	14,2571	RELLENO NORTE
456	1766722,958	1125363,689	14,2449	RELLENO NORTE
457	1766722,618	1125353,695	14,2322	RELLENO NORTE
458	1766722,278	1125343,701	14,2203	RELLENO NORTE
459	1766721,938	1125333,706	14,2081	RELLENO NORTE
460	1766721,598	1125323,712	14,1961	RELLENO NORTE
461	1766721,258	1125313,718	14,1822	RELLENO NORTE

462	1766720,918	1125303,724	14,166	RELLENO NORTE
463	1766720,578	1125293,73	14,1481	RELLENO NORTE
464	1766720,238	1125283,735	14,1299	RELLENO NORTE
465	1766719,898	1125273,741	14,1119	RELLENO NORTE
466	1766719,558	1125263,747	14,094	RELLENO NORTE
467	1766719,218	1125253,753	14,0761	RELLENO NORTE
468	1766718,878	1125243,758	14,0582	RELLENO NORTE
469	1766718,538	1125233,764	14,04	RELLENO NORTE
470	1766718,198	1125223,77	14,022	RELLENO NORTE
471	1766717,858	1125213,776	14,0042	RELLENO NORTE
472	1766717,518	1125203,782	13,9862	RELLENO NORTE
473	1766717,178	1125193,787	13,9681	RELLENO NORTE
474	1766716,838	1125183,793	13,9501	RELLENO NORTE
475	1766716,498	1125173,799	13,9321	RELLENO NORTE
476	1766716,158	1125163,805	13,9143	RELLENO NORTE
477	1766715,818	1125153,811	13,8963	RELLENO NORTE
478	1766715,478	1125143,816	13,8782	RELLENO NORTE
479	1766715,138	1125133,822	13,8609	RELLENO NORTE
480	1766714,798	1125123,828	13,8429	RELLENO NORTE
481	1766714,458	1125113,834	13,8248	RELLENO NORTE
482	1766714,118	1125103,839	13,8091	RELLENO NORTE
483	1766713,778	1125093,845	13,795	RELLENO NORTE
484	1766713,438	1125083,851	13,783	RELLENO NORTE
485	1766713,099	1125073,857	13,7702	RELLENO NORTE
486	1766712,759	1125063,863	13,7579	RELLENO NORTE
487	1766712,419	1125053,868	13,7452	RELLENO NORTE
488	1766712,079	1125043,874	13,7328	RELLENO NORTE
489	1766711,739	1125033,88	13,7201	RELLENO NORTE
490	1766711,399	1125023,886	13,7081	RELLENO NORTE
491	1766711,059	1125013,891	13,695	RELLENO NORTE
492	1766710,719	1125003,897	13,683	RELLENO NORTE
493	1766710,379	1124993,903	13,6702	RELLENO NORTE
494	1766710,039	1124983,909	13,6581	RELLENO NORTE
495	1766709,699	1124973,915	13,6451	RELLENO NORTE
496	1766709,359	1124963,92	13,6329	RELLENO NORTE
497	1766709,019	1124953,926	13,62	RELLENO NORTE
498	1766708,679	1124943,932	13,6078	RELLENO NORTE
499	1766708,339	1124933,938	13,5952	RELLENO NORTE
500	1766707,999	1124923,943	13,583	RELLENO NORTE
501	1766707,659	1124913,949	13,5701	RELLENO NORTE
502	1766707,319	1124903,955	13,5579	RELLENO NORTE
503	1766706,979	1124893,961	13,545	RELLENO NORTE
504	1766706,639	1124883,967	13,5321	RELLENO NORTE
505	1766706,299	1124873,972	13,5192	RELLENO NORTE
506	1766705,959	1124863,978	13,503	RELLENO NORTE
507	1766705,619	1124853,984	13,4831	RELLENO NORTE
508	1766705,279	1124843,99	13,4621	RELLENO NORTE
509	1766704,939	1124833,996	13,4412	RELLENO NORTE
510	1766704,599	1124824,001	13,421	RELLENO NORTE
511	1766704,259	1124814,007	13,4001	RELLENO NORTE
512	1766703,919	1124804,013	13,3792	RELLENO NORTE
513	1766703,579	1124794,019	13,3589	RELLENO NORTE
514	1766703,239	1124784,024	13,3381	RELLENO NORTE
515	1766702,899	1124774,03	13,3171	RELLENO NORTE
516	1766702,559	1124764,036	13,2963	RELLENO NORTE
517	1766702,219	1124754,042	13,276	RELLENO NORTE
518	1766701,879	1124744,048	13,2552	RELLENO NORTE
519	1766701,539	1124734,053	13,2341	RELLENO NORTE

520	1766701,199	1124724,059	13,2133	RELLENO NORTE
521	1766700,859	1124714,065	13,193	RELLENO NORTE
522	1766700,519	1124704,071	13,1722	RELLENO NORTE
523	1766700,179	1124694,076	13,1511	RELLENO NORTE
524	1766699,839	1124684,082	13,1311	RELLENO NORTE
525	1766699,499	1124674,088	13,11	RELLENO NORTE
526	1766699,159	1124664,094	13,0892	RELLENO NORTE
527	1766698,819	1124654,1	13,0682	RELLENO NORTE
528	1766698,479	1124644,105	13,0481	RELLENO NORTE
529	1766698,139	1124634,111	13,027	RELLENO NORTE
530	1766697,799	1124624,117	13,0063	RELLENO NORTE
531	1766697,459	1124614,123	12,9852	RELLENO NORTE
532	1766697,119	1124604,128	12,9651	RELLENO NORTE
533	1766696,949	1124599,13	12,9541	RELLENO NORTE
534	1766753,342	1126363,234	16,1365	RELLENO NORTE
535	1766753,002	1126353,24	16,0448	RELLENO NORTE
536	1766752,662	1126343,246	16,0153	RELLENO NORTE
537	1766752,322	1126333,251	16,0013	RELLENO NORTE
538	1766751,982	1126323,257	15,9865	RELLENO NORTE
539	1766751,642	1126313,263	15,9725	RELLENO NORTE
540	1766751,302	1126303,269	15,9583	RELLENO NORTE
541	1766750,962	1126293,274	15,9443	RELLENO NORTE
542	1766750,622	1126283,28	15,9295	RELLENO NORTE
543	1766750,282	1126273,286	15,9155	RELLENO NORTE
544	1766749,942	1126263,292	15,9014	RELLENO NORTE
545	1766749,602	1126253,298	15,8864	RELLENO NORTE
546	1766749,262	1126243,303	15,8704	RELLENO NORTE
547	1766748,922	1126233,309	15,8504	RELLENO NORTE
548	1766748,582	1126223,315	15,8274	RELLENO NORTE
549	1766748,242	1126213,321	15,8014	RELLENO NORTE
550	1766747,902	1126203,326	15,7714	RELLENO NORTE
551	1766747,562	1126193,332	15,7394	RELLENO NORTE
552	1766747,222	1126183,338	15,7074	RELLENO NORTE
553	1766746,882	1126173,344	15,6744	RELLENO NORTE
554	1766746,542	1126163,35	15,6424	RELLENO NORTE
555	1766746,202	1126153,355	15,6104	RELLENO NORTE
556	1766745,862	1126143,361	15,5784	RELLENO NORTE
557	1766745,523	1126133,367	15,5464	RELLENO NORTE
558	1766745,183	1126123,373	15,5134	RELLENO NORTE
559	1766744,843	1126113,378	15,4816	RELLENO NORTE
560	1766744,503	1126103,384	15,4524	RELLENO NORTE
561	1766744,163	1126093,39	15,4264	RELLENO NORTE
562	1766743,823	1126083,396	15,4035	RELLENO NORTE
563	1766743,483	1126073,402	15,3833	RELLENO NORTE
564	1766743,143	1126063,407	15,3634	RELLENO NORTE
565	1766742,803	1126053,413	15,3434	RELLENO NORTE
566	1766742,463	1126043,419	15,3235	RELLENO NORTE
567	1766742,123	1126033,425	15,3035	RELLENO NORTE
568	1766741,783	1126023,431	15,2844	RELLENO NORTE
569	1766741,443	1126013,436	15,2644	RELLENO NORTE
570	1766741,103	1126003,442	15,2445	RELLENO NORTE
571	1766740,763	1125993,448	15,2245	RELLENO NORTE
572	1766740,423	1125983,454	15,2044	RELLENO NORTE
573	1766740,083	1125973,459	15,1844	RELLENO NORTE
574	1766739,743	1125963,465	15,1645	RELLENO NORTE
575	1766739,403	1125953,471	15,1453	RELLENO NORTE
576	1766739,063	1125943,477	15,1254	RELLENO NORTE
577	1766738,723	1125933,483	15,1054	RELLENO NORTE

578	1766738,383	1125923,488	15,0854	RELLENO NORTE
579	1766738,043	1125913,494	15,0655	RELLENO NORTE
580	1766737,703	1125903,5	15,0455	RELLENO NORTE
581	1766737,363	1125893,506	15,0256	RELLENO NORTE
582	1766737,023	1125883,511	15,0064	RELLENO NORTE
583	1766736,683	1125873,517	14,9863	RELLENO NORTE
584	1766736,343	1125863,523	14,9663	RELLENO NORTE
585	1766736,003	1125853,529	14,9464	RELLENO NORTE
586	1766735,663	1125843,535	14,9264	RELLENO NORTE
587	1766735,323	1125833,54	14,9075	RELLENO NORTE
588	1766734,983	1125823,546	14,8924	RELLENO NORTE
589	1766734,643	1125813,552	14,8794	RELLENO NORTE
590	1766734,303	1125803,558	14,8674	RELLENO NORTE
591	1766733,963	1125793,563	14,8554	RELLENO NORTE
592	1766733,623	1125783,569	14,8434	RELLENO NORTE
593	1766733,283	1125773,575	14,8314	RELLENO NORTE
594	1766732,943	1125763,581	14,8194	RELLENO NORTE
595	1766732,603	1125753,587	14,8066	RELLENO NORTE
596	1766732,263	1125743,592	14,7946	RELLENO NORTE
597	1766731,923	1125733,598	14,7826	RELLENO NORTE
598	1766731,583	1125723,604	14,7705	RELLENO NORTE
599	1766731,243	1125713,61	14,7585	RELLENO NORTE
600	1766730,903	1125703,616	14,7465	RELLENO NORTE
601	1766730,563	1125693,621	14,7343	RELLENO NORTE
602	1766730,223	1125683,627	14,7223	RELLENO NORTE
603	1766729,883	1125673,633	14,7103	RELLENO NORTE
604	1766729,543	1125663,639	14,6983	RELLENO NORTE
605	1766729,203	1125653,644	14,6855	RELLENO NORTE
606	1766728,863	1125643,65	14,6735	RELLENO NORTE
607	1766728,523	1125633,656	14,6614	RELLENO NORTE
608	1766728,183	1125623,662	14,6494	RELLENO NORTE
609	1766727,843	1125613,668	14,6374	RELLENO NORTE
610	1766727,503	1125603,673	14,6255	RELLENO NORTE
611	1766727,163	1125593,679	14,6135	RELLENO NORTE
612	1766726,823	1125583,685	14,6014	RELLENO NORTE
613	1766726,483	1125573,691	14,5894	RELLENO NORTE
614	1766726,143	1125563,696	14,5773	RELLENO NORTE
615	1766725,803	1125553,702	14,5645	RELLENO NORTE
616	1766725,463	1125543,708	14,5524	RELLENO NORTE
617	1766725,124	1125533,714	14,5406	RELLENO NORTE
618	1766724,784	1125523,72	14,5286	RELLENO NORTE
619	1766724,444	1125513,725	14,5165	RELLENO NORTE
620	1766724,104	1125503,731	14,5045	RELLENO NORTE
621	1766723,764	1125493,737	14,4924	RELLENO NORTE
622	1766723,424	1125483,743	14,4804	RELLENO NORTE
623	1766723,084	1125473,748	14,4683	RELLENO NORTE
624	1766722,744	1125463,754	14,4563	RELLENO NORTE
625	1766722,404	1125453,76	14,4436	RELLENO NORTE
626	1766722,064	1125443,766	14,4316	RELLENO NORTE
627	1766721,724	1125433,772	14,4195	RELLENO NORTE
628	1766721,384	1125423,777	14,4075	RELLENO NORTE
629	1766721,044	1125413,783	14,3955	RELLENO NORTE
630	1766720,704	1125403,789	14,3835	RELLENO NORTE
631	1766720,364	1125393,795	14,3714	RELLENO NORTE
632	1766720,024	1125383,801	14,3594	RELLENO NORTE
633	1766719,684	1125373,806	14,3475	RELLENO NORTE
634	1766719,344	1125363,812	14,3353	RELLENO NORTE
635	1766719,004	1125353,818	14,3226	RELLENO NORTE

636	1766718,664	1125343,824	14,3106	RELLENO NORTE
637	1766718,324	1125333,829	14,2985	RELLENO NORTE
638	1766717,984	1125323,835	14,2865	RELLENO NORTE
639	1766717,644	1125313,841	14,2726	RELLENO NORTE
640	1766717,304	1125303,847	14,2564	RELLENO NORTE
641	1766716,964	1125293,853	14,2385	RELLENO NORTE
642	1766716,624	1125283,858	14,2203	RELLENO NORTE
643	1766716,284	1125273,864	14,2024	RELLENO NORTE
644	1766715,944	1125263,87	14,1844	RELLENO NORTE
645	1766715,604	1125253,876	14,1665	RELLENO NORTE
646	1766715,264	1125243,881	14,1485	RELLENO NORTE
647	1766714,924	1125233,887	14,1304	RELLENO NORTE
648	1766714,584	1125223,893	14,1124	RELLENO NORTE
649	1766714,244	1125213,899	14,0946	RELLENO NORTE
650	1766713,904	1125203,905	14,0765	RELLENO NORTE
651	1766713,564	1125193,91	14,0585	RELLENO NORTE
652	1766713,224	1125183,916	14,0405	RELLENO NORTE
653	1766712,884	1125173,922	14,0225	RELLENO NORTE
654	1766712,544	1125163,928	14,0046	RELLENO NORTE
655	1766712,204	1125153,933	13,9866	RELLENO NORTE
656	1766711,864	1125143,939	13,9686	RELLENO NORTE
657	1766711,524	1125133,945	13,9514	RELLENO NORTE
658	1766711,184	1125123,951	13,9333	RELLENO NORTE
659	1766710,844	1125113,957	13,9153	RELLENO NORTE
660	1766710,504	1125103,962	13,8995	RELLENO NORTE
661	1766710,164	1125093,968	13,8854	RELLENO NORTE
662	1766709,824	1125083,974	13,8734	RELLENO NORTE
663	1766709,484	1125073,98	13,8606	RELLENO NORTE
664	1766709,144	1125063,986	13,8484	RELLENO NORTE
665	1766708,804	1125053,991	13,8355	RELLENO NORTE
666	1766708,464	1125043,997	13,8233	RELLENO NORTE
667	1766708,124	1125034,003	13,8105	RELLENO NORTE
668	1766707,784	1125024,009	13,7985	RELLENO NORTE
669	1766707,444	1125014,014	13,7855	RELLENO NORTE
670	1766707,104	1125004,02	13,7734	RELLENO NORTE
671	1766706,764	1124994,026	13,7606	RELLENO NORTE
672	1766706,424	1124984,032	13,7485	RELLENO NORTE
673	1766706,084	1124974,038	13,7355	RELLENO NORTE
674	1766705,744	1124964,043	13,7234	RELLENO NORTE
675	1766705,404	1124954,049	13,7105	RELLENO NORTE
676	1766705,065	1124944,055	13,6983	RELLENO NORTE
677	1766704,725	1124934,061	13,6856	RELLENO NORTE
678	1766704,385	1124924,066	13,6734	RELLENO NORTE
679	1766704,045	1124914,072	13,6605	RELLENO NORTE
680	1766703,705	1124904,078	13,6484	RELLENO NORTE
681	1766703,365	1124894,084	13,6354	RELLENO NORTE
682	1766703,025	1124884,09	13,6225	RELLENO NORTE
683	1766702,685	1124874,095	13,6095	RELLENO NORTE
684	1766702,345	1124864,101	13,5934	RELLENO NORTE
685	1766702,005	1124854,107	13,5735	RELLENO NORTE
686	1766701,665	1124844,113	13,5525	RELLENO NORTE
687	1766701,325	1124834,118	13,5316	RELLENO NORTE
688	1766700,985	1124824,124	13,5115	RELLENO NORTE
689	1766700,645	1124814,13	13,4905	RELLENO NORTE
690	1766700,305	1124804,136	13,4696	RELLENO NORTE
691	1766699,965	1124794,142	13,4494	RELLENO NORTE
692	1766699,625	1124784,147	13,4285	RELLENO NORTE
693	1766699,285	1124774,153	13,4075	RELLENO NORTE


694	1766698,945	1124764,159	13,3867	RELLENO NORTE
695	1766698,605	1124754,165	13,3664	RELLENO NORTE
696	1766698,265	1124744,171	13,3456	RELLENO NORTE
697	1766697,925	1124734,176	13,3245	RELLENO NORTE
698	1766697,585	1124724,182	13,3037	RELLENO NORTE
699	1766697,245	1124714,188	13,2834	RELLENO NORTE
700	1766696,905	1124704,194	13,2626	RELLENO NORTE
701	1766696,565	1124694,199	13,2415	RELLENO NORTE
702	1766696,225	1124684,205	13,2215	RELLENO NORTE
703	1766695,885	1124674,211	13,2004	RELLENO NORTE
704	1766695,545	1124664,217	13,1796	RELLENO NORTE
705	1766695,205	1124654,223	13,1585	RELLENO NORTE
706	1766694,865	1124644,228	13,1385	RELLENO NORTE
707	1766694,525	1124634,234	13,1175	RELLENO NORTE
708	1766694,185	1124624,24	13,0966	RELLENO NORTE
709	1766693,845	1124614,246	13,0756	RELLENO NORTE
710	1766693,505	1124604,251	13,0555	RELLENO NORTE
711	1766693,335	1124599,254	13,0445	RELLENO NORTE
712	1766750,239	1126363,34	16,175	RELLENO NORTE
713	1766749,899	1126353,345	16,116	RELLENO NORTE
714	1766749,559	1126343,351	16,093	RELLENO NORTE
715	1766749,219	1126333,357	16,079	RELLENO NORTE
716	1766748,879	1126323,363	16,0641	RELLENO NORTE
717	1766748,539	1126313,368	16,0501	RELLENO NORTE
718	1766748,199	1126303,374	16,036	RELLENO NORTE
719	1766747,859	1126293,38	16,022	RELLENO NORTE
720	1766747,519	1126283,386	16,0071	RELLENO NORTE
721	1766747,179	1126273,392	15,9931	RELLENO NORTE
722	1766746,839	1126263,397	15,9791	RELLENO NORTE
723	1766746,499	1126253,403	15,964	RELLENO NORTE
724	1766746,159	1126243,409	15,948	RELLENO NORTE
725	1766745,819	1126233,415	15,928	RELLENO NORTE
726	1766745,479	1126223,42	15,905	RELLENO NORTE
727	1766745,139	1126213,426	15,879	RELLENO NORTE
728	1766744,799	1126203,432	15,849	RELLENO NORTE
729	1766744,459	1126193,438	15,817	RELLENO NORTE
730	1766744,119	1126183,444	15,785	RELLENO NORTE
731	1766743,779	1126173,449	15,752	RELLENO NORTE
732	1766743,439	1126163,455	15,72	RELLENO NORTE
733	1766743,099	1126153,461	15,688	RELLENO NORTE
734	1766742,759	1126143,467	15,656	RELLENO NORTE
735	1766742,419	1126133,473	15,624	RELLENO NORTE
736	1766742,079	1126123,478	15,591	RELLENO NORTE
737	1766741,739	1126113,484	15,5591	RELLENO NORTE
738	1766741,399	1126103,49	15,53	RELLENO NORTE
739	1766741,059	1126093,496	15,504	RELLENO NORTE
740	1766740,719	1126083,501	15,4811	RELLENO NORTE
741	1766740,379	1126073,507	15,461	RELLENO NORTE
742	1766740,039	1126063,513	15,441	RELLENO NORTE
743	1766739,699	1126053,519	15,421	RELLENO NORTE
744	1766739,359	1126043,525	15,4011	RELLENO NORTE
745	1766739,019	1126033,53	15,3811	RELLENO NORTE
746	1766738,679	1126023,536	15,362	RELLENO NORTE
747	1766738,339	1126013,542	15,342	RELLENO NORTE
748	1766737,999	1126003,548	15,3221	RELLENO NORTE
749	1766737,659	1125993,553	15,3021	RELLENO NORTE
750	1766737,32	1125983,559	15,282	RELLENO NORTE
751	1766736,98	1125973,565	15,262	RELLENO NORTE

752	1766736,64	1125963,571	15,2421	RELLENO NORTE
753	1766736,3	1125953,577	15,223	RELLENO NORTE
754	1766735,96	1125943,582	15,203	RELLENO NORTE
755	1766735,62	1125933,588	15,183	RELLENO NORTE
756	1766735,28	1125923,594	15,1631	RELLENO NORTE
757	1766734,94	1125913,6	15,1431	RELLENO NORTE
758	1766734,6	1125903,605	15,1231	RELLENO NORTE
759	1766734,26	1125893,611	15,1031	RELLENO NORTE
760	1766733,92	1125883,617	15,0841	RELLENO NORTE
761	1766733,58	1125873,623	15,064	RELLENO NORTE
762	1766733,24	1125863,629	15,044	RELLENO NORTE
763	1766732,9	1125853,634	15,024	RELLENO NORTE
764	1766732,56	1125843,64	15,004	RELLENO NORTE
765	1766732,22	1125833,646	14,9851	RELLENO NORTE
766	1766731,88	1125823,652	14,9701	RELLENO NORTE
767	1766731,54	1125813,658	14,9571	RELLENO NORTE
768	1766731,2	1125803,663	14,945	RELLENO NORTE
769	1766730,86	1125793,669	14,933	RELLENO NORTE
770	1766730,52	1125783,675	14,9211	RELLENO NORTE
771	1766730,18	1125773,681	14,9091	RELLENO NORTE
772	1766729,84	1125763,686	14,897	RELLENO NORTE
773	1766729,5	1125753,692	14,8841	RELLENO NORTE
774	1766729,16	1125743,698	14,8721	RELLENO NORTE
775	1766728,82	1125733,704	14,8601	RELLENO NORTE
776	1766728,48	1125723,71	14,8481	RELLENO NORTE
777	1766728,14	1125713,715	14,8361	RELLENO NORTE
778	1766727,8	1125703,721	14,8241	RELLENO NORTE
779	1766727,46	1125693,727	14,812	RELLENO NORTE
780	1766727,12	1125683,733	14,8	RELLENO NORTE
781	1766726,78	1125673,738	14,788	RELLENO NORTE
782	1766726,44	1125663,744	14,776	RELLENO NORTE
783	1766726,1	1125653,75	14,7631	RELLENO NORTE
784	1766725,76	1125643,756	14,7511	RELLENO NORTE
785	1766725,42	1125633,762	14,7391	RELLENO NORTE
786	1766725,08	1125623,767	14,727	RELLENO NORTE
787	1766724,74	1125613,773	14,715	RELLENO NORTE
788	1766724,4	1125603,779	14,7031	RELLENO NORTE
789	1766724,06	1125593,785	14,6911	RELLENO NORTE
790	1766723,72	1125583,79	14,6791	RELLENO NORTE
791	1766723,38	1125573,796	14,667	RELLENO NORTE
792	1766723,04	1125563,802	14,655	RELLENO NORTE
793	1766722,7	1125553,808	14,6421	RELLENO NORTE
794	1766722,36	1125543,814	14,6301	RELLENO NORTE
795	1766722,02	1125533,819	14,6182	RELLENO NORTE
796	1766721,68	1125523,825	14,6061	RELLENO NORTE
797	1766721,34	1125513,831	14,5941	RELLENO NORTE
798	1766721	1125503,837	14,5821	RELLENO NORTE
799	1766720,66	1125493,843	14,5701	RELLENO NORTE
800	1766720,32	1125483,848	14,558	RELLENO NORTE
801	1766719,98	1125473,854	14,546	RELLENO NORTE
802	1766719,64	1125463,86	14,534	RELLENO NORTE
803	1766719,3	1125453,866	14,5212	RELLENO NORTE
804	1766718,96	1125443,871	14,5092	RELLENO NORTE
805	1766718,62	1125433,877	14,4971	RELLENO NORTE
806	1766718,28	1125423,883	14,4851	RELLENO NORTE
807	1766717,94	1125413,889	14,4731	RELLENO NORTE
808	1766717,6	1125403,895	14,4611	RELLENO NORTE
809	1766717,261	1125393,9	14,449	RELLENO NORTE

810	1766716,921	1125383,906	14,4371	RELLENO NORTE
811	1766716,581	1125373,912	14,4251	RELLENO NORTE
812	1766716,241	1125363,918	14,413	RELLENO NORTE
813	1766715,901	1125353,923	14,4001	RELLENO NORTE
814	1766715,561	1125343,929	14,3882	RELLENO NORTE
815	1766715,221	1125333,935	14,3761	RELLENO NORTE
816	1766714,881	1125323,941	14,3641	RELLENO NORTE
817	1766714,541	1125313,947	14,3501	RELLENO NORTE
818	1766714,201	1125303,952	14,3341	RELLENO NORTE
819	1766713,861	1125293,958	14,3161	RELLENO NORTE
820	1766713,521	1125283,964	14,298	RELLENO NORTE
821	1766713,181	1125273,97	14,2801	RELLENO NORTE
822	1766712,841	1125263,975	14,2621	RELLENO NORTE
823	1766712,501	1125253,981	14,2441	RELLENO NORTE
824	1766712,161	1125243,987	14,2261	RELLENO NORTE
825	1766711,821	1125233,993	14,2081	RELLENO NORTE
826	1766711,481	1125223,999	14,1901	RELLENO NORTE
827	1766711,141	1125214,004	14,1721	RELLENO NORTE
828	1766710,801	1125204,01	14,1541	RELLENO NORTE
829	1766710,461	1125194,016	14,1361	RELLENO NORTE
830	1766710,121	1125184,022	14,1181	RELLENO NORTE
831	1766709,781	1125174,027	14,1001	RELLENO NORTE
832	1766709,441	1125164,033	14,0822	RELLENO NORTE
833	1766709,101	1125154,039	14,0642	RELLENO NORTE
834	1766708,761	1125144,045	14,0462	RELLENO NORTE
835	1766708,421	1125134,051	14,029	RELLENO NORTE
836	1766708,081	1125124,056	14,011	RELLENO NORTE
837	1766707,741	1125114,062	13,993	RELLENO NORTE
838	1766707,401	1125104,068	13,9771	RELLENO NORTE
839	1766707,061	1125094,074	13,9631	RELLENO NORTE
840	1766706,721	1125084,08	13,9511	RELLENO NORTE
841	1766706,381	1125074,085	13,9382	RELLENO NORTE
842	1766706,041	1125064,091	13,926	RELLENO NORTE
843	1766705,701	1125054,097	13,9131	RELLENO NORTE
844	1766705,361	1125044,103	13,901	RELLENO NORTE
845	1766705,021	1125034,108	13,8881	RELLENO NORTE
846	1766704,681	1125024,114	13,8761	RELLENO NORTE
847	1766704,341	1125014,12	13,8631	RELLENO NORTE
848	1766704,001	1125004,126	13,8511	RELLENO NORTE
849	1766703,661	1124994,132	13,8382	RELLENO NORTE
850	1766703,321	1124984,137	13,8261	RELLENO NORTE
851	1766702,981	1124974,143	13,8131	RELLENO NORTE
852	1766702,641	1124964,149	13,8011	RELLENO NORTE
853	1766702,301	1124954,155	13,7881	RELLENO NORTE
854	1766701,961	1124944,16	13,776	RELLENO NORTE
855	1766701,621	1124934,166	13,7632	RELLENO NORTE
856	1766701,281	1124924,172	13,7511	RELLENO NORTE
857	1766700,941	1124914,178	13,7381	RELLENO NORTE
858	1766700,601	1124904,184	13,726	RELLENO NORTE
859	1766700,261	1124894,189	13,7131	RELLENO NORTE
860	1766699,921	1124884,195	13,7001	RELLENO NORTE
861	1766699,581	1124874,201	13,6871	RELLENO NORTE
862	1766699,241	1124864,207	13,6711	RELLENO NORTE
863	1766698,901	1124854,212	13,6511	RELLENO NORTE
864	1766698,561	1124844,218	13,6301	RELLENO NORTE
865	1766698,221	1124834,224	13,6092	RELLENO NORTE
866	1766697,881	1124824,23	13,5891	RELLENO NORTE
867	1766697,541	1124814,236	13,5681	RELLENO NORTE

868	1766697,201	1124804,241	13,5472	RELLENO NORTE
869	1766696,862	1124794,247	13,527	RELLENO NORTE
870	1766696,522	1124784,253	13,5061	RELLENO NORTE
871	1766696,182	1124774,259	13,4851	RELLENO NORTE
872	1766695,842	1124764,265	13,4642	RELLENO NORTE
873	1766695,502	1124754,27	13,4441	RELLENO NORTE
874	1766695,162	1124744,276	13,4232	RELLENO NORTE
875	1766694,822	1124734,282	13,4021	RELLENO NORTE
876	1766694,482	1124724,288	13,3812	RELLENO NORTE
877	1766694,142	1124714,293	13,3611	RELLENO NORTE
878	1766693,802	1124704,299	13,3402	RELLENO NORTE
879	1766693,462	1124694,305	13,3191	RELLENO NORTE
880	1766693,122	1124684,311	13,2991	RELLENO NORTE
881	1766692,782	1124674,317	13,2781	RELLENO NORTE
882	1766692,442	1124664,322	13,2572	RELLENO NORTE
883	1766692,102	1124654,328	13,2362	RELLENO NORTE
884	1766691,762	1124644,334	13,2161	RELLENO NORTE
885	1766691,422	1124634,34	13,1951	RELLENO NORTE
886	1766691,082	1124624,345	13,1742	RELLENO NORTE
887	1766690,742	1124614,351	13,1532	RELLENO NORTE
888	1766690,402	1124604,357	13,1331	RELLENO NORTE
889	1766690,232	1124599,359	13,1221	RELLENO NORTE

SECCIONES TRANSVERSALES VOLUMEN RELLENO 2 FRANJA NORTE
K0+300 - K0+800

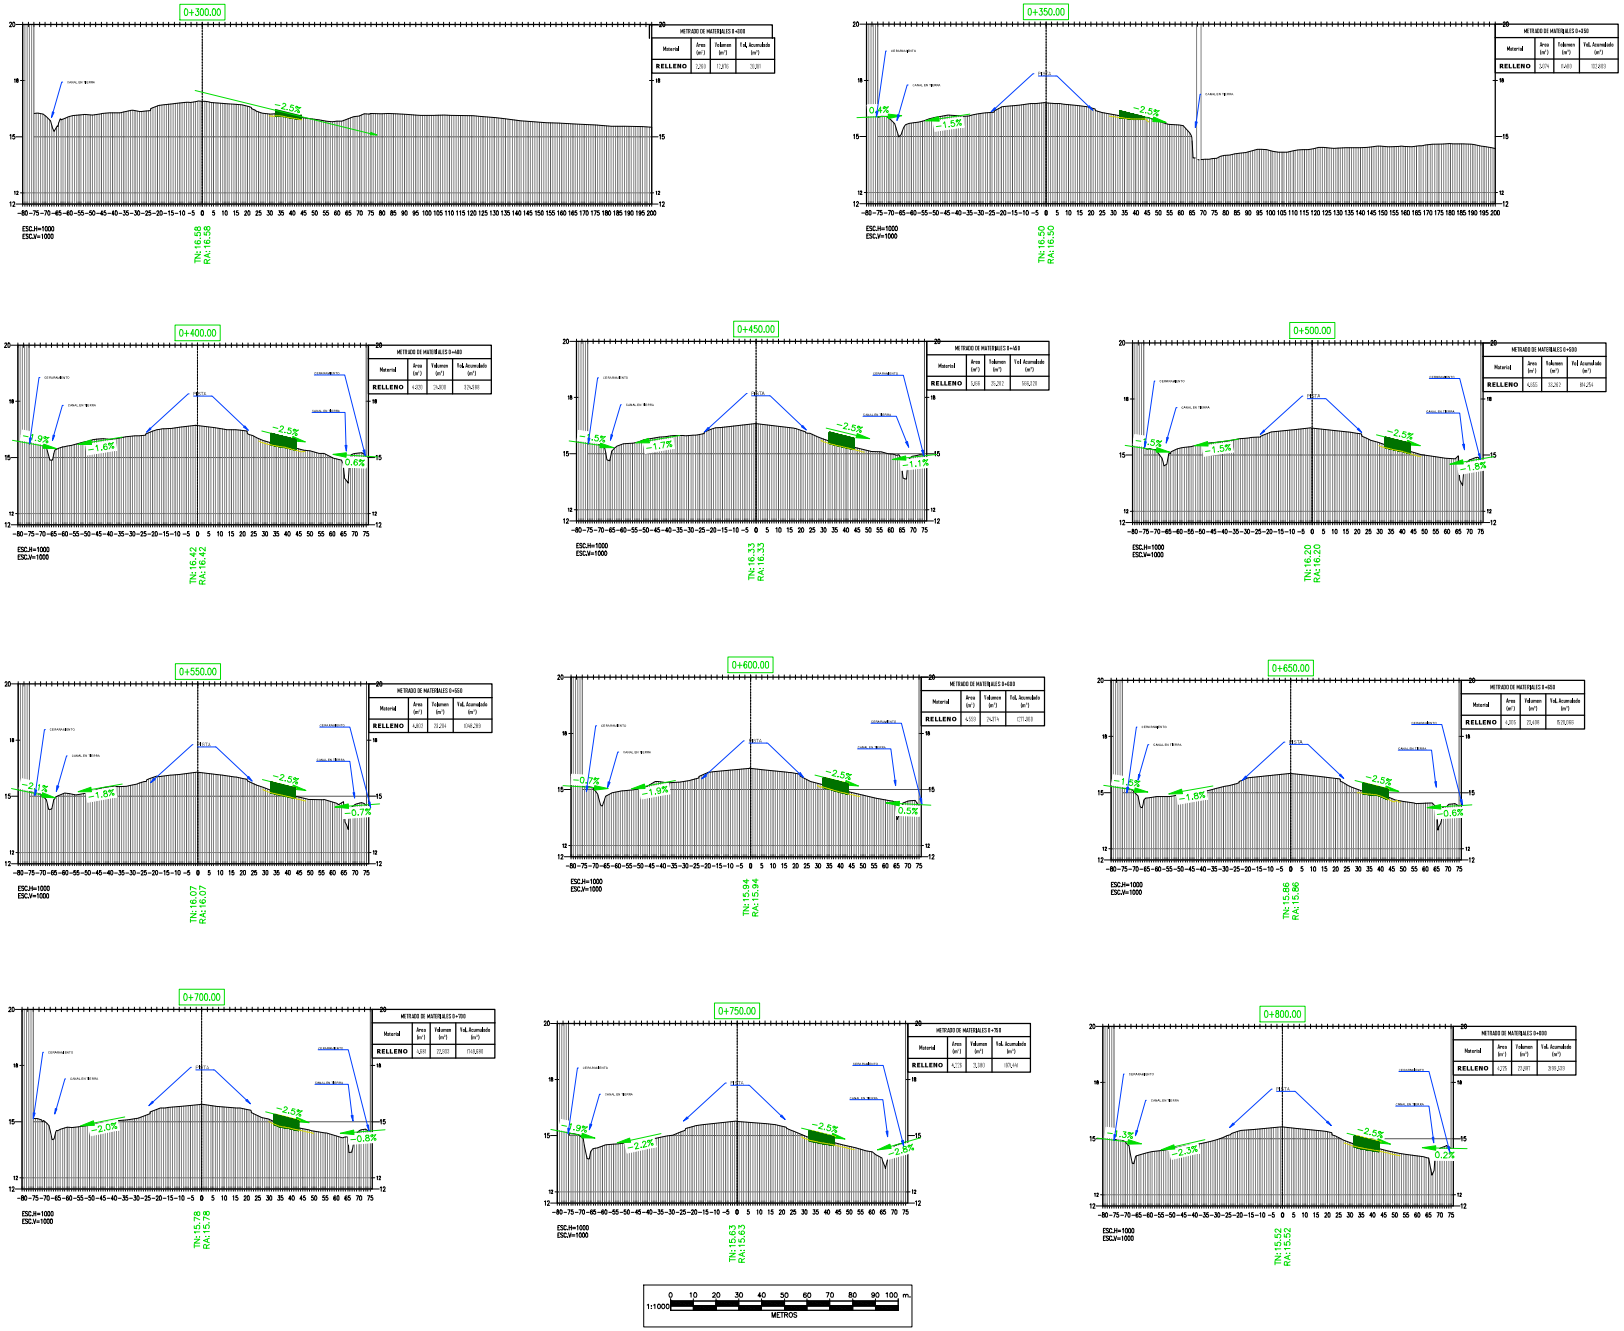

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
CLAVE: BUAC/A-043-677 VERSIÓN: 01 FECHA: 23/01/2024

UBICACIÓN PROYECTO:
AEROPUERTO "ALMIRANTE PADILLA"- SIGLA OACI SKRH - ARP"
MUNICIPIO RIOHACHA DEPARTAMENTO LA GUAJIRA

PROYECTO:
Realizar el mejoramiento de las plataformas de viraje,franjas de seguridad, sistema de drenaje; y mejoramiento y construcción de calles de rodaje del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF)-

CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES AEROPUERTO
K0+000 + K0+040

N° CONTRATO: 23001170 - H4 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
DIRECTOR DEL PROYECTO: VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR
N° MATRICULA PROFESIONAL 25202-39553 CND
INGENIERO CIVIL

N° CONTRATO INTERVENTORIA: 23001282- H3 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO AJR RIO
DIRECTOR DEL PROYECTO: SANTIAGO PAEZ TALERO
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. SANTIAGO PAEZ TALERO
N° MATRICULA PROFESIONAL 25202-49972 CND
INGENIERO CIVIL

SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANDRES ARBOLEDA SALAZAR
PERFIL SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
PERFIL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA CENTRO SUR -NOROCCIDENTE- NORTE ORIENTE- OCCIDENTE - ORIENTE
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. CESAR AUGUSTO DELGADO CARRILLO
PERFIL COORDINADOR DE GRUPO INFRAESTRUCTURA
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ALDEMAR PINZÓN
PERFIL PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANGELA INES PAEZ PIÑEROS
PERFIL DIRECTOR DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING JAIME CORTES GUERRERO
PERFIL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO GESTIÓN DE AEROPUERTOS - OMA

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. OSCAR ALBERTO NIETO ALVARADO
DIRECTOR DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

INSPECTORES- DIRECCIÓN DE AUTORIDAD SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO EDGAR AUGUSTO URRUTIA FERNANDEZ
ESPECIALIDAD EN INFRAESTRUCTURA - OACA
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO
ESPECIALIDAD EN OPERACIONES - OACA

N° PLANO: 8 DE 47 ESCALA: 1:1000
CÓDIGO REFERENCIA: 2024-10-20-01-SEC_SKRH-ARP-008

NOTA TÉCNICA:

DATUM		MAGNA-SIRGAS	
ELIPSOIDE		WGS 84 - GRS 80	
SISTEMA DE COORDENADAS		PLANAS GAUSS KRÜGER	
ORIGEN DE COORDENADA		ORIGEN-BOGOTA	
ONDULACIÓN GEOIDAL		H1L	

DECLINACIÓN MAGNETICA: ARP/API 8° 35' W VARIACIÓN MAGNETICA AÑO:00' 10' W/ 2024

DATOS DEL PROYECTO:

RWY	DIMENSIONES (m)	CLT DE APOYO	AERONAVE DE DISEÑO	MATERIAL	CLASE DE REFERENCIA AEROPUERTO
10 / 28	PISTA: 1900.00 X 45.00 PRANJA: 2120.00 X 150.00	6 6	A320	ASFALTO FLEXIBLE/ASFALTO	D

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (GMS)	LONGITUD (GMS)	ELEVACIÓN (m/ft)
10	11°31'33.30" N	72°56' 07.38"O	12.1/40
ARP			
28	11°31'35.10" N	72°55' 04.75"O	15.2/50





CONVENCIONES :

CONVENCIONES GENERALES

CERRAMIENTO	POSTE ENERGÍA
CERCA	VÉRTICE GPS
PARAMENTO	CAJA DE ENERGÍA
CANAL	LUCES GUÍA
PISTA EN ASFALTO	CALLE DE RODAJE
PISO EN CONCRETO	CONSTRUCCIÓN


NOTAS TECNICAS DE ACLARACIÓN


FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO
10 / 10 / 2024	Memoria técnica de georreferenciación - Ing.Duván Robayo	# 1 Anexo


NOMBRE ARCHIVO: 1.TOPOGRAFIA_AEROPUERTO_RIOHACHA.dwg (Autocad versión 2013)


SECCIONES TRANSVERSALES VOLUMEN RELLENO 2 FRANJA NORTE


K0+850 - K1+400

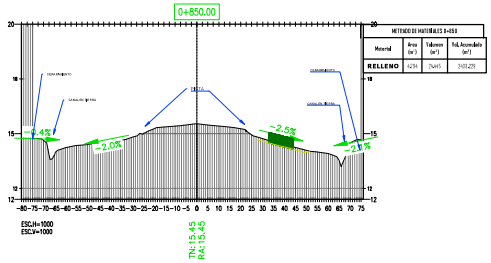


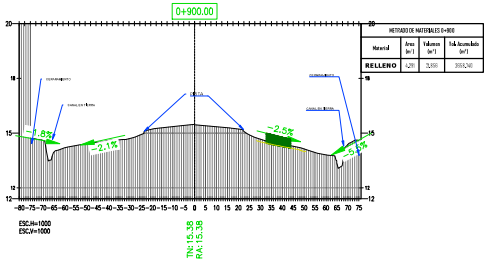


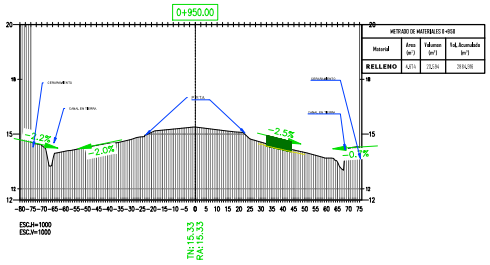


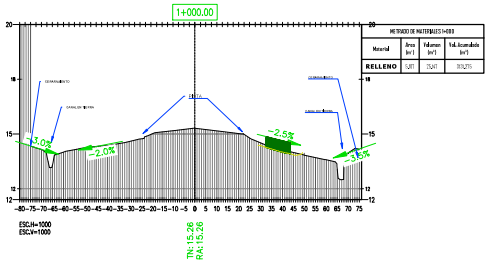


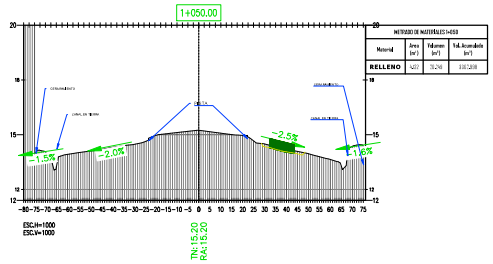


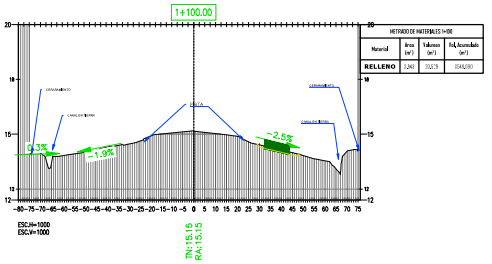


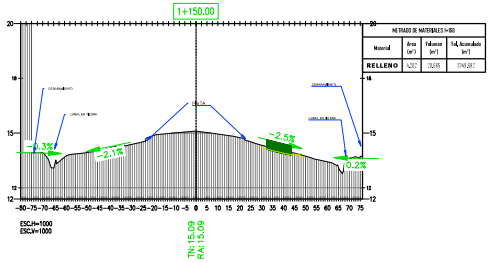


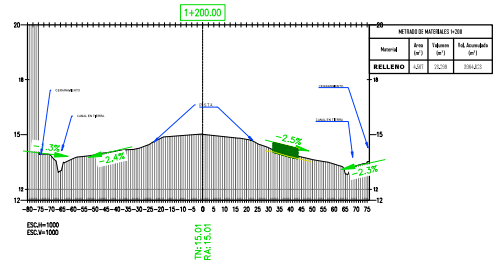


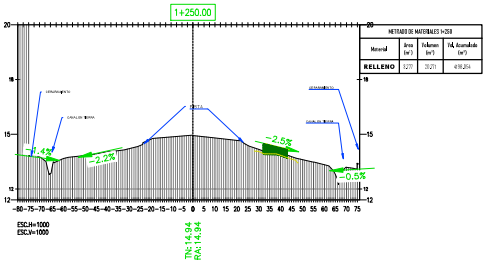

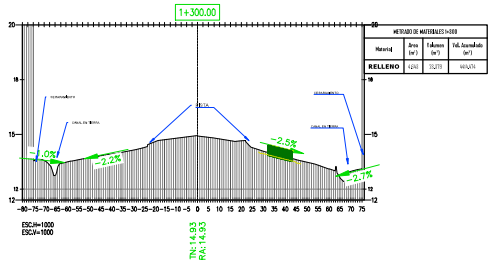

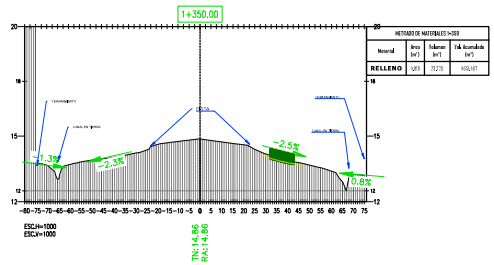

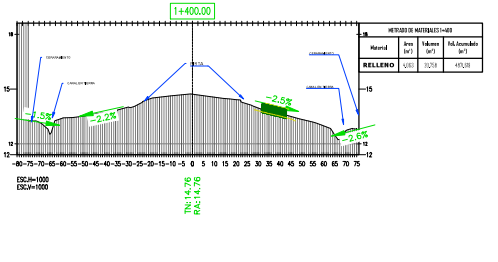



MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
CLAVE: RAC/14.5.14.177 VERSIÓN: 01 FECHA: 23/09/2014

UBICACIÓN PROYECTO:

AEROPUERTO "ALMIRANTE PADILLA"- SIGLA OACI SKRH - ARP"
MUNICIPIO RIOHACHA DEPARTAMENTO LA GUAJIRA

PROYECTO:

Realizar el mejoramiento de las plataformas de viraje,franjas de seguridad, sistema de drenaje; y mejoramiento y construcción de calles de rodaje del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF)-

CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES AEROPUERTO
K0+045 + K0+080

N° CONTRATO: 23001170 - H4 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
DIRECTOR DEL PROYECTO: VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR
N° MATRICULA PROFESIONAL 25202-49972 CND
INGENIERO CIVIL

N° CONTRATO INTERVENTORIA: 23001282- H3 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO AJR RIO
DIRECTOR DEL PROYECTO: SANTIAGO PAEZ TALERO

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. SANTIAGO PAEZ TALERO
N° MATRICULA PROFESIONAL 25202-49972 CND
INGENIERO CIVIL

SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANDRES ARBOLEDA SALAZAR
PERFIL SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
PERFIL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA CENTRO SUR, NOROCCIDENTE, NORTE ORIENTE, OCCIDENTE - ORIENTE

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. CESAR AUGUSTO DELGADO CARRILLO
PERFIL COORDINADOR DE GRUPO INFRAESTRUCTURA

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ALDEMAR PINZÓN
PERFIL INGENIERO CONTRATO AEROPORTUARIO

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANGELA INES PAEZ PIÑEROS
PERFIL DIRECTOR DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. JAIME CORTES GUERRERO
PERFIL COORDINADOR GRUPO GESTIÓN DE SEGURIDAD - OSA

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. OSCAR ALBERTO NIETO ALVARADO
DIRECTOR DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

INSPECTORES- DIRECCIÓN DE AUTORIDAD SERVICIOS AEROPORTUARIOS

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO EDGAR AUGUSTO URRUTIA FERNANDEZ
ESPECIALIDAD EN INFRAESTRUCTURA - CARA

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO CARLOS MAURICIO OLIVEIRA BARACALDO
ESPECIALIDAD EN OPERACIONES - CARA

N° PLANO: 9 DE 47 ESCALA: 1:1000

CÓDIGO REFERENCIA: 2024-10-20-01-SEC_SKRH-ARP-009

NOTA TÉCNICA:

DATUM	MAGNA-SIRGAS
ELIPSOIDE	WGS 84 - GRS 80
SISTEMA DE COORDENADAS	PLANAS GAUSS KRÜGER
ORIGEN DE COORDENADA	ORIGEN-BOGOTA
ONDULACIÓN GEOIDAL	HSL

DECLINACIÓN MAGNETICA: ARP/APJ 8°35' W VARIACIÓN MAGNETICA AÑO:00° 10' W / 2024

DATOS DEL PROYECTO:

RWY	DIMENSIONES (m)	CAT DE AERON	AERONAVE DE DISEÑO	RESISTENCIA	CLASE DE REFERENCIA AEROPUERTO
10 / 28	PISTA: 1900.00 X 45.00	6	A320	ASFALTO PCN 90/F/B/X/T	D
	PRANJA: 2120.00 X 150.00	6			

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (GMS)	LONGITUD (GMS)	ELEVACIÓN (m/ft)
10	11°31'33.30" N	72°56' 07.38" O	12.1/40
ARP			
28	11°31'35.10" N	72°55' 04.75" O	15.2/50





CONVENCIONES :

CONVENCIONES GENERALES


- CERRAMIENTO
- CERCA
- PARAMENTO
- CANAL
- PISTA EN ASFALTO
- PISO EN CONCRETO
- POSTE ENERGÍA
- GPS-X VÉRTICE GPS
- CAJA DE ENERGÍA
- LUCES GUÍA
- CALLE DE RODAJE
- CONSTRUCCIÓN


NOTAS TECNICAS DE ACLARACIÓN


FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO
10 / 10 / 2024	Memoria técnica de georreferenciación - Ing.Duván Robayo	# 1 Anexo


NOMBRE ARCHIVO: 1.TOPOGRAFIA_AEROPUERTO_RIOHACHA.dwg (Autocad versión 2013)


SECCIONES TRANSVERSALES VOLUMEN RELLENO 2 FRANJA NORTE
K1+450 - K2+055



































MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
CLAVE: RIACA-A-14-077 VERSIÓN: 01 FECHA: 23/09/2024

UBICACIÓN PROYECTO:
AEROPUERTO "ALMIRANTE PADILLA"- SIGLA OACI SKRH - ARP"
MUNICIPIO RIOHACHA DEPARTAMENTO LA GUAJIRA

PROYECTO:
Realizar el mejoramiento de las plataformas de viraje,franjas de seguridad, sistema de drenaje; y mejoramiento y construcción de calles de rodaje del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF)-

CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES AEROPUERTO
K0+085 + K0+120

N° CONTRATO: 23001170 - H4 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
DIRECTOR DEL PROYECTO: VÍCTOR DANIEL CASTRO SALAZAR
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. VÍCTOR DANIEL CASTRO SALAZAR
N° MATRÍCULA PROFESIONAL 25202-23553 CND
INGENIERO CIVIL

N° CONTRATO INTERVENTORIA: 23001282- H3 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO AJR RIO
DIRECTOR DEL PROYECTO: SANTIAGO PAEZ TALERO
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. SANTIAGO PAEZ TALERO
N° MATRÍCULA PROFESIONAL 25202-409772 CND
INGENIERO CIVIL

SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANDRES ARBOLEDA SALAZAR
PERFIL SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
PERFIL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA CENTRO SUR -NOROCCIDENTE- NORTE ORIENTE- OCCIDENTE - ORIENTE
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. CESAR AUGUSTO DELGADO CARRILLO
PERFIL COORDINADOR DE GRUPO INFRAESTRUCTURA
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ALDEMAR PINZÓN
PERFIL INGENIERO CONTRATO AEROPORTUARIO

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANGELA INES PAEZ PIÑEROS
PERFIL DIRECTOR DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. JAIME CORTES GUERRERO
PERFIL DIRECTOR GRUPO GESTIÓN DE AEROPUERTO - OMA

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. OSCAR ALBERTO NIETO ALVARADO
DIRECTOR DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

INSPECTORES- DIRECCIÓN DE AUTORIDAD SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO EDGAR AUGUSTO URRUTIA FERNANDEZ
ESPECIALIDAD EN INFRAESTRUCTURA - CIVIL
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO
ESPECIALIDAD EN OPERACIONES - CIVIL

N° PLANO: 10 DE 47 ESCALA: 1:1000
CÓDIGO REFERENCIA: 2024-10-20-01-SEC_SKRH-ARP-010

NOTA TÉCNICA:
DATUM MAGNA-SIRGAS
ELIPSOIDE WGS 84 - GRS 80
SISTEMA DE COORDENADAS PLANAS GAUSS KRÜGER
ORÍGEN DE COORDENADA ORÍGEN-BOGOTA
ONDULACIÓN GEOIDAL HSL

DECLINACIÓN MAGNETICA: ARP/APJ 8° 35' W VARIACIÓN MAGNETICA AÑO:00° 10' W/ 2024

DATOS DEL PROYECTO:

RWY	DIMENSIONES (m)	CAT DE AERON	AERONAVE DE DISEÑO	MATERIAL DE PISTA	CLASE DE REFUERZO PERMISIBLE
10 / 28	PISTA: 1900.00 X 45.00 PRANJA: 2120.00 X 150.00	B	A320	ASFALTO	D

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (m/ft)
10	11°31'33.30" N	72°56' 07.38"O	12.1/40
ARP			
28	11°31'35.10" N	72°55' 04.75"O	15.2/50





CONVENCIONES :

CONVENCIONES GENERALES
- CERRAMIENTO
- CERCA
- PARAMENTO
- CANAL
- POSTE ENERGIA
- GPS-X VÉRTICE GPS
- CAJA DE ENERGIA
- LUCES GUIA
- PISTA EN ASFALTO
- CALLE DE RODAJE
- PISO EN CONCRETO
- CONSTRUCCIÓN

NOTAS TECNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO
10 / 10 / 2024	Memoria técnica de georreferenciación - Ing.Duván Robayo	# 1 Anexo

NOMBRE ARCHIVO: 1.TOPOGRAFIA_AEROPUERTO_RIOHACHA.dwg (Autocad versión 2013)

Volume Report

Project: C:\Users\ARIEL\OneDrive\Documentos\ESTUDIO TOPOGRAFICO AEROPUERTO RIOHACHA\DWG\CONTROL DE OBRA\ACTA 3\TOPOGRAFIA_AEROPUERTO_RIOHACHA_TN.dwg

Alignment: ALINEAMIENTO_PISTA

Sample Line Group: SECCIONES TRANSVERSALES PISTA TOTAL

Start Sta: 0+295.000

End Sta: 2+205.000

Station	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)	Reusable Volume (Cu.m.)	Fill Area (Sq.m.)	Fill Volume (Cu.m.)	Cum. Cut Vol. (Cu.m.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.m.)	Cum. Fill Vol. (Cu.m.)	Cum. Net Vol. (Cu.m.)
0+300.000	0.00	0.00	0.00	2.26	12.88	0.00	0.00	20.10	-20.10
0+305.000	0.00	0.00	0.00	1.93	10.47	0.00	0.00	30.57	-30.57
0+310.000	0.00	0.00	0.00	2.32	10.62	0.00	0.00	41.19	-41.19
0+315.000	0.00	0.00	0.00	2.05	10.91	0.00	0.00	52.10	-52.10
0+320.000	0.00	0.00	0.00	2.15	10.50	0.00	0.00	62.61	-62.61
0+325.000	0.00	0.00	0.00	2.32	11.19	0.00	0.00	73.79	-73.79
0+330.000	0.00	0.00	0.00	2.35	11.67	0.00	0.00	85.47	-85.47
0+335.000	0.00	0.00	0.00	2.33	11.70	0.00	0.00	97.16	-97.16
0+340.000	0.00	0.00	0.00	2.44	11.93	0.00	0.00	109.09	-109.09
0+345.000	0.00	0.00	0.00	2.49	12.32	0.00	0.00	121.41	-121.41
0+350.000	0.00	0.00	0.00	2.07	11.40	0.00	0.00	132.81	-132.81
0+355.000	0.00	0.00	0.00	2.71	11.96	0.00	0.00	144.77	-144.77
0+360.000	0.00	0.00	0.00	2.94	14.13	0.00	0.00	158.90	-158.90
0+365.000	0.00	0.00	0.00	3.39	15.83	0.00	0.00	174.73	-174.73
0+370.000	0.00	0.00	0.00	3.88	18.18	0.00	0.00	192.91	-192.91
0+375.000	0.00	0.00	0.00	4.07	19.89	0.00	0.00	212.79	-212.79
0+380.000	0.00	0.00	0.00	4.00	20.19	0.00	0.00	232.98	-232.98
0+385.000	0.00	0.00	0.00	4.21	20.53	0.00	0.00	253.50	-253.50
0+390.000	0.00	0.00	0.00	4.69	22.25	0.00	0.00	275.76	-275.76
0+395.000	0.00	0.00	0.00	5.04	24.33	0.00	0.00	300.09	-300.09
0+400.000	0.00	0.00	0.00	4.92	24.90	0.00	0.00	324.99	-324.99
0+405.000	0.00	0.00	0.00	4.53	23.64	0.00	0.00	348.63	-348.63
0+410.000	0.00	0.00	0.00	4.42	22.38	0.00	0.00	371.00	-371.00
0+415.000	0.00	0.00	0.00	4.32	21.84	0.00	0.00	392.84	-392.84
0+420.000	0.00	0.00	0.00	4.83	22.89	0.00	0.00	415.73	-415.73
0+425.000	0.00	0.00	0.00	4.90	24.35	0.00	0.00	440.08	-440.08
0+430.000	0.00	0.00	0.00	4.92	24.55	0.00	0.00	464.63	-464.63
0+435.000	0.00	0.00	0.00	5.27	25.47	0.00	0.00	490.10	-490.10
0+440.000	0.00	0.00	0.00	5.11	25.96	0.00	0.00	516.06	-516.06
0+445.000	0.00	0.00	0.00	4.92	25.06	0.00	0.00	541.12	-541.12

0+450.000	0.00	0.00	0.00	5.17	25.20	0.00	0.00	566.32	-566.32
0+455.000	0.00	0.00	0.00	4.77	24.85	0.00	0.00	591.17	-591.17
0+460.000	0.00	0.00	0.00	4.42	22.98	0.00	0.00	614.15	-614.15
0+465.000	0.00	0.00	0.00	4.41	22.06	0.00	0.00	636.20	-636.20
0+470.000	0.00	0.00	0.00	4.62	22.58	0.00	0.00	658.78	-658.78
0+475.000	0.00	0.00	0.00	4.92	23.86	0.00	0.00	682.64	-682.64
0+480.000	0.00	0.00	0.00	5.11	25.08	0.00	0.00	707.72	-707.72
0+485.000	0.00	0.00	0.00	7.14	30.63	0.00	0.00	738.36	-738.36
0+490.000	0.00	0.00	0.00	4.63	29.43	0.00	0.00	767.79	-767.79
0+495.000	0.00	0.00	0.00	4.65	23.20	0.00	0.00	790.99	-790.99
0+500.000	0.00	0.00	0.00	4.65	23.26	0.00	0.00	814.25	-814.25
0+505.000	0.00	0.00	0.00	4.74	23.49	0.00	0.00	837.74	-837.74
0+510.000	0.00	0.00	0.00	4.82	23.91	0.00	0.00	861.66	-861.66
0+515.000	0.00	0.00	0.00	4.77	23.97	0.00	0.00	885.63	-885.63
0+520.000	0.00	0.00	0.00	4.70	23.66	0.00	0.00	909.30	-909.30
0+525.000	0.00	0.00	0.00	4.90	24.00	0.00	0.00	933.30	-933.30
0+530.000	0.00	0.00	0.00	4.57	23.68	0.00	0.00	956.97	-956.97
0+535.000	0.00	0.00	0.00	4.53	22.76	0.00	0.00	979.73	-979.73
0+540.000	0.00	0.00	0.00	4.56	22.74	0.00	0.00	1002.47	-1002.47
0+545.000	0.00	0.00	0.00	4.48	22.61	0.00	0.00	1025.08	-1025.08
0+550.000	0.00	0.00	0.00	4.80	23.20	0.00	0.00	1048.29	-1048.29
0+555.000	0.00	0.00	0.00	4.60	23.50	0.00	0.00	1071.78	-1071.78
0+560.000	0.00	0.00	0.00	4.22	22.03	0.00	0.00	1093.82	-1093.82
0+565.000	0.00	0.00	0.00	4.13	20.87	0.00	0.00	1114.69	-1114.69
0+570.000	0.00	0.00	0.00	4.31	21.11	0.00	0.00	1135.80	-1135.80
0+575.000	0.00	0.00	0.00	4.63	22.37	0.00	0.00	1158.17	-1158.17
0+580.000	0.00	0.00	0.00	4.50	22.85	0.00	0.00	1181.02	-1181.02
0+585.000	0.00	0.00	0.00	4.90	23.51	0.00	0.00	1204.52	-1204.52
0+590.000	0.00	0.00	0.00	4.77	24.17	0.00	0.00	1228.69	-1228.69
0+595.000	0.00	0.00	0.00	5.19	24.90	0.00	0.00	1253.59	-1253.59
0+600.000	0.00	0.00	0.00	4.56	24.37	0.00	0.00	1277.96	-1277.96
0+605.000	0.00	0.00	0.00	4.84	23.51	0.00	0.00	1301.47	-1301.47
0+610.000	0.00	0.00	0.00	4.80	24.10	0.00	0.00	1325.57	-1325.57
0+615.000	0.00	0.00	0.00	4.60	23.50	0.00	0.00	1349.07	-1349.07
0+620.000	0.00	0.00	0.00	5.02	24.05	0.00	0.00	1373.11	-1373.11
0+625.000	0.00	0.00	0.00	5.23	25.61	0.00	0.00	1398.72	-1398.72
0+630.000	0.00	0.00	0.00	5.01	25.60	0.00	0.00	1424.33	-1424.33
0+635.000	0.00	0.00	0.00	4.81	24.56	0.00	0.00	1448.88	-1448.88
0+640.000	0.00	0.00	0.00	4.62	23.58	0.00	0.00	1472.46	-1472.46
0+645.000	0.00	0.00	0.00	5.06	24.20	0.00	0.00	1496.66	-1496.66

0+650.000	0.00	0.00	0.00	4.30	23.41	0.00	0.00	1520.07	-1520.07
0+655.000	0.00	0.00	0.00	4.57	22.18	0.00	0.00	1542.25	-1542.25
0+660.000	0.00	0.00	0.00	4.77	23.35	0.00	0.00	1565.60	-1565.60
0+665.000	0.00	0.00	0.00	4.58	23.39	0.00	0.00	1589.00	-1589.00
0+670.000	0.00	0.00	0.00	4.80	23.45	0.00	0.00	1612.44	-1612.44
0+675.000	0.00	0.00	0.00	4.78	23.93	0.00	0.00	1636.38	-1636.38
0+680.000	0.00	0.00	0.00	4.42	22.98	0.00	0.00	1659.36	-1659.36
0+685.000	0.00	0.00	0.00	4.60	22.54	0.00	0.00	1681.90	-1681.90
0+690.000	0.00	0.00	0.00	4.42	22.56	0.00	0.00	1704.46	-1704.46
0+695.000	0.00	0.00	0.00	4.49	22.29	0.00	0.00	1726.75	-1726.75
0+700.000	0.00	0.00	0.00	4.68	22.93	0.00	0.00	1749.68	-1749.68
0+705.000	0.00	0.00	0.00	4.57	23.13	0.00	0.00	1772.81	-1772.81
0+710.000	0.00	0.00	0.00	4.42	22.49	0.00	0.00	1795.30	-1795.30
0+715.000	0.00	0.00	0.00	4.55	22.42	0.00	0.00	1817.73	-1817.73
0+720.000	0.00	0.00	0.00	4.53	22.68	0.00	0.00	1840.41	-1840.41
0+725.000	0.00	0.00	0.00	4.60	22.83	0.00	0.00	1863.24	-1863.24
0+730.000	0.00	0.00	0.00	4.53	22.84	0.00	0.00	1886.08	-1886.08
0+735.000	0.00	0.00	0.00	4.11	21.60	0.00	0.00	1907.68	-1907.68
0+740.000	0.00	0.00	0.00	4.26	20.92	0.00	0.00	1928.60	-1928.60
0+745.000	0.00	0.00	0.00	4.33	21.46	0.00	0.00	1950.06	-1950.06
0+750.000	0.00	0.00	0.00	4.23	21.38	0.00	0.00	1971.44	-1971.44
0+755.000	0.00	0.00	0.00	4.10	20.81	0.00	0.00	1992.25	-1992.25
0+760.000	0.00	0.00	0.00	4.20	20.74	0.00	0.00	2012.99	-2012.99
0+765.000	0.00	0.00	0.00	4.44	21.61	0.00	0.00	2034.60	-2034.60
0+770.000	0.00	0.00	0.00	4.57	22.53	0.00	0.00	2057.14	-2057.14
0+775.000	0.00	0.00	0.00	4.50	22.69	0.00	0.00	2079.82	-2079.82
0+780.000	0.00	0.00	0.00	4.68	22.95	0.00	0.00	2102.78	-2102.78
0+785.000	0.00	0.00	0.00	4.87	23.86	0.00	0.00	2126.64	-2126.64
0+790.000	0.00	0.00	0.00	4.95	24.55	0.00	0.00	2151.19	-2151.19
0+795.000	0.00	0.00	0.00	4.83	24.46	0.00	0.00	2175.65	-2175.65
0+800.000	0.00	0.00	0.00	4.72	23.89	0.00	0.00	2199.54	-2199.54
0+805.000	0.00	0.00	0.00	4.68	23.51	0.00	0.00	2223.04	-2223.04
0+810.000	0.00	0.00	0.00	4.63	23.27	0.00	0.00	2246.31	-2246.31
0+815.000	0.00	0.00	0.00	4.54	22.93	0.00	0.00	2269.24	-2269.24
0+820.000	0.00	0.00	0.00	4.45	22.47	0.00	0.00	2291.71	-2291.71
0+825.000	0.00	0.00	0.00	4.81	23.14	0.00	0.00	2314.85	-2314.85
0+830.000	0.00	0.00	0.00	4.64	23.61	0.00	0.00	2338.46	-2338.46
0+835.000	0.00	0.00	0.00	4.48	22.78	0.00	0.00	2361.24	-2361.24
0+840.000	0.00	0.00	0.00	4.78	23.13	0.00	0.00	2384.38	-2384.38
0+845.000	0.00	0.00	0.00	4.98	24.41	0.00	0.00	2408.78	-2408.78

0+850.000	0.00	0.00	0.00	4.79	24.45	0.00	0.00	2433.23	-2433.23
0+855.000	0.00	0.00	0.00	4.53	23.32	0.00	0.00	2456.55	-2456.55
0+860.000	0.00	0.00	0.00	4.67	23.02	0.00	0.00	2479.56	-2479.56
0+865.000	0.00	0.00	0.00	4.38	22.65	0.00	0.00	2502.21	-2502.21
0+870.000	0.00	0.00	0.00	4.30	21.72	0.00	0.00	2523.93	-2523.93
0+875.000	0.00	0.00	0.00	4.40	21.76	0.00	0.00	2545.68	-2545.68
0+880.000	0.00	0.00	0.00	4.59	22.47	0.00	0.00	2568.15	-2568.15
0+885.000	0.00	0.00	0.00	4.59	22.94	0.00	0.00	2591.09	-2591.09
0+890.000	0.00	0.00	0.00	4.64	23.07	0.00	0.00	2614.16	-2614.16
0+895.000	0.00	0.00	0.00	4.45	22.72	0.00	0.00	2636.88	-2636.88
0+900.000	0.00	0.00	0.00	4.29	21.86	0.00	0.00	2658.74	-2658.74
0+905.000	0.00	0.00	0.00	4.39	21.69	0.00	0.00	2680.43	-2680.43
0+910.000	0.00	0.00	0.00	4.53	22.30	0.00	0.00	2702.73	-2702.73
0+915.000	0.00	0.00	0.00	4.55	22.72	0.00	0.00	2725.45	-2725.45
0+920.000	0.00	0.00	0.00	4.66	23.04	0.00	0.00	2748.49	-2748.49
0+925.000	0.00	0.00	0.00	4.73	23.47	0.00	0.00	2771.96	-2771.96
0+930.000	0.00	0.00	0.00	4.51	23.08	0.00	0.00	2795.04	-2795.04
0+935.000	0.00	0.00	0.00	4.11	21.55	0.00	0.00	2816.59	-2816.59
0+940.000	0.00	0.00	0.00	4.51	21.55	0.00	0.00	2838.14	-2838.14
0+945.000	0.00	0.00	0.00	4.76	23.18	0.00	0.00	2861.32	-2861.32
0+950.000	0.00	0.00	0.00	4.67	23.59	0.00	0.00	2884.92	-2884.92
0+955.000	0.00	0.00	0.00	4.71	23.47	0.00	0.00	2908.39	-2908.39
0+960.000	0.00	0.00	0.00	4.67	23.46	0.00	0.00	2931.85	-2931.85
0+965.000	0.00	0.00	0.00	4.76	23.58	0.00	0.00	2955.43	-2955.43
0+970.000	0.00	0.00	0.00	5.08	24.61	0.00	0.00	2980.04	-2980.04
0+975.000	0.00	0.00	0.00	5.12	25.50	0.00	0.00	3005.55	-3005.55
0+980.000	0.00	0.00	0.00	5.12	25.60	0.00	0.00	3031.15	-3031.15
0+985.000	0.00	0.00	0.00	4.99	25.26	0.00	0.00	3056.41	-3056.41
0+990.000	0.00	0.00	0.00	4.98	24.90	0.00	0.00	3081.31	-3081.31
0+995.000	0.00	0.00	0.00	4.95	24.82	0.00	0.00	3106.13	-3106.13
1+000.000	0.00	0.00	0.00	5.11	25.15	0.00	0.00	3131.27	-3131.27
1+005.000	0.00	0.00	0.00	5.41	26.31	0.00	0.00	3157.58	-3157.58
1+010.000	0.00	0.00	0.00	5.18	26.49	0.00	0.00	3184.07	-3184.07
1+015.000	0.00	0.00	0.00	4.89	25.17	0.00	0.00	3209.24	-3209.24
1+020.000	0.00	0.00	0.00	4.56	23.63	0.00	0.00	3232.87	-3232.87
1+025.000	0.00	0.00	0.00	4.49	22.63	0.00	0.00	3255.50	-3255.50
1+030.000	0.00	0.00	0.00	4.65	22.85	0.00	0.00	3278.36	-3278.36
1+035.000	0.00	0.00	0.00	4.48	22.84	0.00	0.00	3301.20	-3301.20
1+040.000	0.00	0.00	0.00	4.08	21.42	0.00	0.00	3322.62	-3322.62
1+045.000	0.00	0.00	0.00	3.97	20.13	0.00	0.00	3342.75	-3342.75

1+050.000	0.00	0.00	0.00	4.13	20.25	0.00	0.00	3363.00	-3363.00
1+055.000	0.00	0.00	0.00	4.53	21.66	0.00	0.00	3384.66	-3384.66
1+060.000	0.00	0.00	0.00	4.19	21.81	0.00	0.00	3406.47	-3406.47
1+065.000	0.00	0.00	0.00	2.69	17.20	0.00	0.00	3423.67	-3423.67
1+070.000	0.00	0.00	0.00	2.91	14.01	0.00	0.00	3437.68	-3437.68
1+075.000	0.00	0.00	0.00	3.22	15.33	0.00	0.00	3453.00	-3453.00
1+080.000	0.00	0.00	0.00	3.48	16.74	0.00	0.00	3469.74	-3469.74
1+085.000	0.00	0.00	0.00	3.78	18.14	0.00	0.00	3487.88	-3487.88
1+090.000	0.00	0.00	0.00	4.11	19.73	0.00	0.00	3507.61	-3507.61
1+095.000	0.00	0.00	0.00	4.27	20.96	0.00	0.00	3528.56	-3528.56
1+100.000	0.00	0.00	0.00	3.94	20.53	0.00	0.00	3549.09	-3549.09
1+105.000	0.00	0.00	0.00	4.00	19.86	0.00	0.00	3568.95	-3568.95
1+110.000	0.00	0.00	0.00	3.85	19.63	0.00	0.00	3588.58	-3588.58
1+115.000	0.00	0.00	0.00	3.63	18.70	0.00	0.00	3607.29	-3607.29
1+120.000	0.00	0.00	0.00	3.86	18.72	0.00	0.00	3626.01	-3626.01
1+125.000	0.00	0.00	0.00	4.13	19.97	0.00	0.00	3645.98	-3645.98
1+130.000	0.00	0.00	0.00	4.17	20.75	0.00	0.00	3666.72	-3666.72
1+135.000	0.00	0.00	0.00	4.18	20.86	0.00	0.00	3687.58	-3687.58
1+140.000	0.00	0.00	0.00	4.17	20.86	0.00	0.00	3708.44	-3708.44
1+145.000	0.00	0.00	0.00	4.06	20.58	0.00	0.00	3729.02	-3729.02
1+150.000	0.00	0.00	0.00	4.20	20.66	0.00	0.00	3749.68	-3749.68
1+155.000	0.00	0.00	0.00	3.56	19.40	0.00	0.00	3769.09	-3769.09
1+160.000	0.00	0.00	0.00	3.80	18.40	0.00	0.00	3787.48	-3787.48
1+165.000	0.00	0.00	0.00	4.08	19.70	0.00	0.00	3807.18	-3807.18
1+170.000	0.00	0.00	0.00	4.21	20.73	0.00	0.00	3827.92	-3827.92
1+175.000	0.00	0.00	0.00	4.47	21.70	0.00	0.00	3849.61	-3849.61
1+180.000	0.00	0.00	0.00	4.30	21.91	0.00	0.00	3871.52	-3871.52
1+185.000	0.00	0.00	0.00	4.70	22.48	0.00	0.00	3894.01	-3894.01
1+190.000	0.00	0.00	0.00	4.74	23.59	0.00	0.00	3917.60	-3917.60
1+195.000	0.00	0.00	0.00	4.75	23.73	0.00	0.00	3941.32	-3941.32
1+200.000	0.00	0.00	0.00	4.57	23.30	0.00	0.00	3964.62	-3964.62
1+205.000	0.00	0.00	0.00	4.73	23.25	0.00	0.00	3987.88	-3987.88
1+210.000	0.00	0.00	0.00	4.72	23.65	0.00	0.00	4011.52	-4011.52
1+215.000	0.00	0.00	0.00	4.75	23.69	0.00	0.00	4035.22	-4035.22
1+220.000	0.00	0.00	0.00	4.68	23.58	0.00	0.00	4058.80	-4058.80
1+225.000	0.00	0.00	0.00	4.97	24.11	0.00	0.00	4082.91	-4082.91
1+230.000	0.00	0.00	0.00	4.67	24.09	0.00	0.00	4107.01	-4107.01
1+235.000	0.00	0.00	0.00	4.73	23.52	0.00	0.00	4130.52	-4130.52
1+240.000	0.00	0.00	0.00	4.72	23.64	0.00	0.00	4154.16	-4154.16
1+245.000	0.00	0.00	0.00	4.53	23.13	0.00	0.00	4177.28	-4177.28

1+250.000	0.00	0.00	0.00	3.78	20.77	0.00	0.00	4198.05	-4198.05
1+255.000	0.00	0.00	0.00	4.10	19.70	0.00	0.00	4217.76	-4217.76
1+260.000	0.00	0.00	0.00	4.06	20.41	0.00	0.00	4238.17	-4238.17
1+265.000	0.00	0.00	0.00	3.94	19.99	0.00	0.00	4258.15	-4258.15
1+270.000	0.00	0.00	0.00	4.21	20.36	0.00	0.00	4278.51	-4278.51
1+275.000	0.00	0.00	0.00	4.65	22.15	0.00	0.00	4300.67	-4300.67
1+280.000	0.00	0.00	0.00	4.62	23.19	0.00	0.00	4323.86	-4323.86
1+285.000	0.00	0.00	0.00	4.54	22.90	0.00	0.00	4346.76	-4346.76
1+290.000	0.00	0.00	0.00	4.24	21.95	0.00	0.00	4368.71	-4368.71
1+295.000	0.00	0.00	0.00	4.71	22.38	0.00	0.00	4391.10	-4391.10
1+300.000	0.00	0.00	0.00	4.64	23.38	0.00	0.00	4414.47	-4414.47
1+305.000	0.00	0.00	0.00	5.04	24.20	0.00	0.00	4438.68	-4438.68
1+310.000	0.00	0.00	0.00	4.91	24.87	0.00	0.00	4463.54	-4463.54
1+315.000	0.00	0.00	0.00	5.06	24.92	0.00	0.00	4488.47	-4488.47
1+320.000	0.00	0.00	0.00	4.92	24.95	0.00	0.00	4513.42	-4513.42
1+325.000	0.00	0.00	0.00	4.70	24.05	0.00	0.00	4537.47	-4537.47
1+330.000	0.00	0.00	0.00	4.96	24.14	0.00	0.00	4561.61	-4561.61
1+335.000	0.00	0.00	0.00	4.00	22.39	0.00	0.00	4584.01	-4584.01
1+340.000	0.00	0.00	0.00	4.40	20.99	0.00	0.00	4605.00	-4605.00
1+345.000	0.00	0.00	0.00	4.68	22.69	0.00	0.00	4627.69	-4627.69
1+350.000	0.00	0.00	0.00	4.81	23.72	0.00	0.00	4651.41	-4651.41
1+355.000	0.00	0.00	0.00	4.84	24.13	0.00	0.00	4675.53	-4675.53
1+360.000	0.00	0.00	0.00	4.54	23.45	0.00	0.00	4698.98	-4698.98
1+365.000	0.00	0.00	0.00	4.34	22.20	0.00	0.00	4721.19	-4721.19
1+370.000	0.00	0.00	0.00	4.28	21.56	0.00	0.00	4742.75	-4742.75
1+375.000	0.00	0.00	0.00	4.35	21.59	0.00	0.00	4764.34	-4764.34
1+380.000	0.00	0.00	0.00	4.77	22.81	0.00	0.00	4787.15	-4787.15
1+385.000	0.00	0.00	0.00	4.12	22.22	0.00	0.00	4809.37	-4809.37
1+390.000	0.00	0.00	0.00	4.12	20.59	0.00	0.00	4829.97	-4829.97
1+395.000	0.00	0.00	0.00	4.24	20.90	0.00	0.00	4850.86	-4850.86
1+400.000	0.00	0.00	0.00	4.06	20.76	0.00	0.00	4871.62	-4871.62
1+405.000	0.00	0.00	0.00	4.33	20.99	0.00	0.00	4892.61	-4892.61
1+410.000	0.00	0.00	0.00	4.55	22.20	0.00	0.00	4914.81	-4914.81
1+415.000	0.00	0.00	0.00	4.51	22.64	0.00	0.00	4937.45	-4937.45
1+420.000	0.00	0.00	0.00	4.33	22.09	0.00	0.00	4959.54	-4959.54
1+425.000	0.00	0.00	0.00	4.13	21.13	0.00	0.00	4980.67	-4980.67
1+430.000	0.00	0.00	0.00	4.14	20.66	0.00	0.00	5001.33	-5001.33
1+435.000	0.00	0.00	0.00	4.17	20.76	0.00	0.00	5022.09	-5022.09
1+440.000	0.00	0.00	0.00	4.05	20.54	0.00	0.00	5042.63	-5042.63
1+445.000	0.00	0.00	0.00	4.26	20.77	0.00	0.00	5063.40	-5063.40

1+450.000	0.00	0.00	0.00	4.45	21.77	0.00	0.00	5085.18	-5085.18
1+455.000	0.00	0.00	0.00	4.46	22.27	0.00	0.00	5107.45	-5107.45
1+460.000	0.00	0.00	0.00	4.56	22.55	0.00	0.00	5130.00	-5130.00
1+465.000	0.00	0.00	0.00	4.59	22.88	0.00	0.00	5152.88	-5152.88
1+470.000	0.00	0.00	0.00	4.56	22.88	0.00	0.00	5175.76	-5175.76
1+475.000	0.00	0.00	0.00	4.63	22.99	0.00	0.00	5198.74	-5198.74
1+480.000	0.00	0.00	0.00	4.69	23.30	0.00	0.00	5222.04	-5222.04
1+485.000	0.00	0.00	0.00	5.36	25.13	0.00	0.00	5247.17	-5247.17
1+490.000	0.00	0.00	0.00	4.79	25.39	0.00	0.00	5272.56	-5272.56
1+495.000	0.00	0.00	0.00	5.02	24.54	0.00	0.00	5297.09	-5297.09
1+500.000	0.00	0.00	0.00	5.05	25.18	0.00	0.00	5322.28	-5322.28
1+505.000	0.00	0.00	0.00	5.42	26.17	0.00	0.00	5348.45	-5348.45
1+510.000	0.00	0.00	0.00	5.06	26.19	0.00	0.00	5374.65	-5374.65
1+515.000	0.00	0.00	0.00	5.23	25.73	0.00	0.00	5400.37	-5400.37
1+520.000	0.00	0.00	0.00	5.33	26.41	0.00	0.00	5426.78	-5426.78
1+525.000	0.00	0.00	0.00	5.20	26.32	0.00	0.00	5453.10	-5453.10
1+530.000	0.00	0.00	0.00	4.69	24.72	0.00	0.00	5477.82	-5477.82
1+535.000	0.00	0.00	0.00	4.61	23.25	0.00	0.00	5501.07	-5501.07
1+540.000	0.00	0.00	0.00	4.90	23.78	0.00	0.00	5524.85	-5524.85
1+545.000	0.00	0.00	0.00	5.37	25.67	0.00	0.00	5550.51	-5550.51
1+550.000	0.00	0.00	0.00	4.87	25.60	0.00	0.00	5576.11	-5576.11
1+555.000	0.00	0.00	0.00	5.06	24.82	0.00	0.00	5600.93	-5600.93
1+560.000	0.00	0.00	0.00	4.81	24.67	0.00	0.00	5625.60	-5625.60
1+565.000	0.00	0.00	0.00	4.60	23.52	0.00	0.00	5649.12	-5649.12
1+570.000	0.00	0.00	0.00	5.03	24.06	0.00	0.00	5673.18	-5673.18
1+575.000	0.00	0.00	0.00	4.87	24.74	0.00	0.00	5697.92	-5697.92
1+580.000	0.00	0.00	0.00	4.73	24.00	0.00	0.00	5721.92	-5721.92
1+585.000	0.00	0.00	0.00	4.70	23.58	0.00	0.00	5745.50	-5745.50
1+590.000	0.00	0.00	0.00	4.51	23.03	0.00	0.00	5768.53	-5768.53
1+595.000	0.00	0.00	0.00	4.32	22.07	0.00	0.00	5790.60	-5790.60
1+600.000	0.00	0.00	0.00	4.40	21.80	0.00	0.00	5812.40	-5812.40
1+605.000	0.00	0.00	0.00	4.49	22.23	0.00	0.00	5834.63	-5834.63
1+610.000	0.00	0.00	0.00	4.45	22.35	0.00	0.00	5856.98	-5856.98
1+615.000	0.00	0.00	0.00	4.54	22.47	0.00	0.00	5879.46	-5879.46
1+620.000	0.00	0.00	0.00	4.62	22.89	0.00	0.00	5902.35	-5902.35
1+625.000	0.00	0.00	0.00	4.49	22.78	0.00	0.00	5925.12	-5925.12
1+630.000	0.00	0.00	0.00	4.38	22.18	0.00	0.00	5947.30	-5947.30
1+635.000	0.00	0.00	0.00	4.48	22.15	0.00	0.00	5969.45	-5969.45
1+640.000	0.00	0.00	0.00	4.30	21.96	0.00	0.00	5991.41	-5991.41
1+645.000	0.00	0.00	0.00	4.30	21.50	0.00	0.00	6012.91	-6012.91

1+650.000	0.00	0.00	0.00	4.19	21.21	0.00	0.00	6034.12	-6034.12
1+655.000	0.00	0.00	0.00	3.64	19.56	0.00	0.00	6053.68	-6053.68
1+660.000	0.00	0.00	0.00	4.60	20.60	0.00	0.00	6074.28	-6074.28
1+665.000	0.00	0.00	0.00	4.55	22.88	0.00	0.00	6097.16	-6097.16
1+670.000	0.00	0.00	0.00	4.40	22.37	0.00	0.00	6119.53	-6119.53
1+675.000	0.00	0.00	0.00	4.47	22.17	0.00	0.00	6141.69	-6141.69
1+680.000	0.00	0.00	0.00	4.42	22.22	0.00	0.00	6163.92	-6163.92
1+685.000	0.00	0.00	0.00	4.44	22.15	0.00	0.00	6186.07	-6186.07
1+690.000	0.00	0.00	0.00	4.22	21.65	0.00	0.00	6207.72	-6207.72
1+695.000	0.00	0.00	0.00	4.18	21.00	0.00	0.00	6228.72	-6228.72
1+700.000	0.00	0.00	0.00	4.20	20.95	0.00	0.00	6249.67	-6249.67
1+705.000	0.00	0.00	0.00	4.37	21.43	0.00	0.00	6271.10	-6271.10
1+710.000	0.00	0.00	0.00	4.39	21.89	0.00	0.00	6292.99	-6292.99
1+715.000	0.00	0.00	0.00	4.35	21.84	0.00	0.00	6314.83	-6314.83
1+720.000	0.00	0.00	0.00	4.28	21.58	0.00	0.00	6336.41	-6336.41
1+725.000	0.00	0.00	0.00	4.23	21.28	0.00	0.00	6357.68	-6357.68
1+730.000	0.00	0.00	0.00	4.01	20.59	0.00	0.00	6378.28	-6378.28
1+735.000	0.00	0.00	0.00	3.98	19.98	0.00	0.00	6398.26	-6398.26
1+740.000	0.00	0.00	0.00	4.17	20.38	0.00	0.00	6418.64	-6418.64
1+745.000	0.00	0.00	0.00	4.32	21.24	0.00	0.00	6439.88	-6439.88
1+750.000	0.00	0.00	0.00	4.42	21.85	0.00	0.00	6461.73	-6461.73
1+755.000	0.00	0.00	0.00	4.58	22.49	0.00	0.00	6484.22	-6484.22
1+760.000	0.00	0.00	0.00	4.57	22.86	0.00	0.00	6507.08	-6507.08
1+765.000	0.00	0.00	0.00	4.47	22.58	0.00	0.00	6529.66	-6529.66
1+770.000	0.00	0.00	0.00	4.31	21.94	0.00	0.00	6551.61	-6551.61
1+775.000	0.00	0.00	0.00	4.46	21.92	0.00	0.00	6573.53	-6573.53
1+780.000	0.00	0.00	0.00	4.51	22.42	0.00	0.00	6595.95	-6595.95
1+785.000	0.00	0.00	0.00	4.58	22.72	0.00	0.00	6618.67	-6618.67
1+790.000	0.00	0.00	0.00	4.64	23.04	0.00	0.00	6641.71	-6641.71
1+795.000	0.00	0.00	0.00	4.64	23.18	0.00	0.00	6664.89	-6664.89
1+800.000	0.00	0.00	0.00	4.57	23.02	0.00	0.00	6687.90	-6687.90
1+805.000	0.00	0.00	0.00	4.66	23.07	0.00	0.00	6710.97	-6710.97
1+810.000	0.00	0.00	0.00	4.63	23.23	0.00	0.00	6734.20	-6734.20
1+815.000	0.00	0.00	0.00	4.57	23.01	0.00	0.00	6757.21	-6757.21
1+820.000	0.00	0.00	0.00	4.77	23.37	0.00	0.00	6780.58	-6780.58
1+825.000	0.00	0.00	0.00	4.77	23.87	0.00	0.00	6804.45	-6804.45
1+830.000	0.00	0.00	0.00	4.72	23.74	0.00	0.00	6828.19	-6828.19
1+835.000	0.00	0.00	0.00	4.60	23.31	0.00	0.00	6851.51	-6851.51
1+840.000	0.00	0.00	0.00	4.42	22.54	0.00	0.00	6874.05	-6874.05
1+845.000	0.00	0.00	0.00	4.41	22.06	0.00	0.00	6896.11	-6896.11

1+850.000	0.00	0.00	0.00	4.33	21.85	0.00	0.00	6917.95	-6917.95
1+855.000	0.00	0.00	0.00	4.17	21.24	0.00	0.00	6939.19	-6939.19
1+860.000	0.00	0.00	0.00	4.16	20.82	0.00	0.00	6960.01	-6960.01
1+865.000	0.00	0.00	0.00	4.30	21.15	0.00	0.00	6981.16	-6981.16
1+870.000	0.00	0.00	0.00	4.33	21.58	0.00	0.00	7002.74	-7002.74
1+875.000	0.00	0.00	0.00	4.57	22.25	0.00	0.00	7024.99	-7024.99
1+880.000	0.00	0.00	0.00	4.52	22.71	0.00	0.00	7047.69	-7047.69
1+885.000	0.00	0.00	0.00	4.25	21.93	0.00	0.00	7069.62	-7069.62
1+890.000	0.00	0.00	0.00	4.25	21.26	0.00	0.00	7090.88	-7090.88
1+895.000	0.00	0.00	0.00	4.39	21.60	0.00	0.00	7112.48	-7112.48
1+900.000	0.00	0.00	0.00	4.07	21.16	0.00	0.00	7133.64	-7133.64
1+900.000	0.00	0.00	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00	7133.64	-7133.64
1+905.000	0.00	0.00	0.00	3.97	20.11	0.00	0.00	7153.75	-7153.75
1+910.000	0.00	0.00	0.00	4.07	20.10	0.00	0.00	7173.85	-7173.85
1+915.000	0.00	0.00	0.00	4.04	20.29	0.00	0.00	7194.14	-7194.14
1+920.000	0.00	0.00	0.00	4.02	20.15	0.00	0.00	7214.29	-7214.29
1+925.000	0.00	0.00	0.00	3.93	19.86	0.00	0.00	7234.15	-7234.15
1+930.000	0.00	0.00	0.00	4.11	20.08	0.00	0.00	7254.24	-7254.24
1+935.000	0.00	0.00	0.00	3.93	20.09	0.00	0.00	7274.33	-7274.33
1+940.000	0.00	0.00	0.00	3.71	19.11	0.00	0.00	7293.44	-7293.44
1+945.000	0.00	0.00	0.00	4.09	19.52	0.00	0.00	7312.96	-7312.96
1+950.000	0.00	0.00	0.00	4.23	20.82	0.00	0.00	7333.79	-7333.79
1+955.000	0.00	0.00	0.00	4.15	20.96	0.00	0.00	7354.74	-7354.74
1+960.000	0.00	0.00	0.00	4.09	20.60	0.00	0.00	7375.34	-7375.34
1+965.000	0.00	0.00	0.00	4.09	20.46	0.00	0.00	7395.80	-7395.80
1+970.000	0.00	0.00	0.00	4.09	20.46	0.00	0.00	7416.26	-7416.26
1+975.000	0.00	0.00	0.00	4.13	20.55	0.00	0.00	7436.82	-7436.82
1+980.000	0.00	0.00	0.00	3.89	20.04	0.00	0.00	7456.86	-7456.86
1+985.000	0.00	0.00	0.00	4.02	19.76	0.00	0.00	7476.62	-7476.62
1+990.000	0.00	0.00	0.00	4.24	20.64	0.00	0.00	7497.26	-7497.26
1+995.000	0.00	0.00	0.00	4.23	21.17	0.00	0.00	7518.42	-7518.42
2+000.000	0.00	0.00	0.00	4.19	21.05	0.00	0.00	7539.48	-7539.48
2+005.000	0.00	0.00	0.00	4.04	20.59	0.00	0.00	7560.06	-7560.06
2+010.000	0.00	0.00	0.00	4.17	20.52	0.00	0.00	7580.59	-7580.59
2+015.000	0.00	0.00	0.00	4.32	21.23	0.00	0.00	7601.81	-7601.81
2+020.000	0.00	0.00	0.00	4.14	21.15	0.00	0.00	7622.96	-7622.96
2+025.000	0.00	0.00	0.00	3.87	20.02	0.00	0.00	7642.99	-7642.99
2+030.000	0.00	0.00	0.00	3.86	19.33	0.00	0.00	7662.32	-7662.32
2+035.000	0.00	0.00	0.00	4.18	20.11	0.00	0.00	7682.43	-7682.43
2+040.000	0.00	0.00	0.00	6.19	25.94	0.00	0.00	7708.36	-7708.36

2+045.000	0.00	0.00	0.00	5.09	28.21	0.00	0.00	7736.58	-7736.58
2+050.000	0.00	0.00	0.00	4.12	23.02	0.00	0.00	7759.60	-7759.60
2+055.000	0.00	0.00	0.00	4.15	20.66	0.00	0.00	7780.26	-7780.26
2+060.000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+065.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+070.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+075.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+080.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+085.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+090.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+095.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+100.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+105.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+110.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+115.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+120.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+125.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+130.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+135.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+140.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+145.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+150.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+155.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+160.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+165.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+170.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+175.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+180.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+185.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+190.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+195.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+200.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7790.63	-7790.63
2+205.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**7790.63**	-7790.63

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 1 4 de abril de 2025

2024-486-RIO-1033
Al contestar citar este código

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL
Atn. MARIA GEINER PRADA GUZMAN.
Gerente Aeropuerto Almirante Padilla
Riohacha

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: **Autorización Permisos de ingreso Ingeniero auxiliar Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF)**.

Cordial saludo,

Con el fin de realizar el trámite de permiso aeroportuario del personal que trabaja durante la ejecución del contrato del asunto, adjunto se remiten los documentos del siguiente personal.

NOMBRE	C.C.	CARGO	PERMANENCIA
SOTO HERNANDEZ JAVIER AUGUSTO	11188639536	INGENIERO AUXILIAR	1 año

De antemano agradecemos su atención y colaboración para realizar el respectivo trámite.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: Y.R.T.
Anexo: Formatos, C.C y planilla parafiscales.

aeropuertos de oriente	**SOLICITUD DE PERMISO AEROPORTUARIO PARA PERSONAS**	Código: GS-R-06 Versión: 12 Tipo de documento: Formato Fecha de aprobación: 2024/03/01

NOMBRE DEL AEROPUERTO:	AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA	**SOLICITUD No:**	
CIUDAD:	RIOHACHA	**FECHA:**	14/04/2025 AAAA

TIPO DE PERMISO: ☐ PERMANENTE ☐ TEMPORAL **TIPO DE SOLICITUD:** X NUEVA ☐ RENOVACIÓN ☐ REEXPEDICIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES:	JAVIER AUGUSTO	**APELLIDOS:**	SOTO HERNANDEZ
TIPO DE DOCUMENTO:	X C.C. ☐ T.I. ☐ R.C. ☐ C.E. ☐ PASAPORTE	**N° DE IDENTIFICACIÓN :**	1.118.863.953
DIRECCIÓN RESIDENCIA:	CALLE 28 # 14A -124	**TELÉFONO FIJO O CELULAR:**	3023505314
TIPO DE SANGRE Y RH	0+	**EPS:** NUEVA EPS	**ARL:** POSITIVA

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES E INFORMACIÓN PERSONAL A CARGO DE AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S

POR PARTE DE LA CONCESIONARIA		POR PARTE DE LA POLICÍA AEROPORTUARIA		**FIRMA:**
FECHA: DÍA:		MES:	AÑO:	

DATOS DE LA EMPRESA QUE AVALA LA SOLICITUD

NOMBRE:	CONSORCIO AIR RIO		
DIRECCIÓN:	CALLE 70 BIS 4-60 BOGOTA	**TELÉFONO:**	3013498178
VIGENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO DEL SOLICITANTE:	3 MESES	**TIEMPO EN LA EMPRESA :**	12 DIAS
CARGO:	INGENIERO AUXILIAR		
FUNCIÓN A REALIZAR EN EL AEROPUERTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).		

ÁREA (S) DE TRÁNSITO SOLICITADA (S):	PÚBLICA:	X	RESTRINGIDA CONCESIONADA	X	RESTRINGIDA AEROCIVIL:	X
DESCRIBA EL ÁREA:						

AREAS ASIGNADAS	T, BN, BI, SN, SI, P, EI, TW, PI, CA, PE, TE, OH, PP, PR, EC, H, ZP, HB, MF, AP

FECHA EXPEDICION		**FECHA VENCIMIENTO**	

ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR PARTE DEL SOLICITANTE Y DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE AVALA LA SOLICITUD EN CUMPLIMIENTO RAC 160

Acepto y me responsabilizo del cumplimiento de todas las disposiciones de Seguridad de la Aviación Civil dispuestas por la Concesión Aeropuertos de Oriente S.A.S., en cuanto al uso y porte del permiso de acceso a areas restringidas, dando cumplimiento a la Seguridad de la Aviación Civil - RAC 160, Manual de Operaciones Aeroportuarias y demás normas que apliquen.

El permiso será de uso personal e intransferible y solo podrá ser utilizado para los fines requeridos en las áreas autorizadas, portándolo siempre en lugar visible, a la altura del toráx o como brazalete.

aeropuertos de oriente	**SOLICITUD DE PERMISO AEROPORTUARIO PARA PERSONAS**	Código: GS-R-06 Versión: 12 Tipo de documento: Formato Fecha de aprobación: 2024/03/01

Como empleador certifico estar al día con todos los aportes parafiscales del solicitante entregados en físico al aeropuerto. En el caso de sufrir un accidente o incidente y no contar con dichos documentos vigentes, el aeropuerto no se hará responsable de los hechos que no sean directamente de su competencia.

El permiso que se otorgue, es de propiedad de Aeropuertos de Oriente S.A.S; en caso de uso indebido podrá ser retenido por los empleados de la Concesión, asignados a labores AVSEC u Operaciones, tal y como lo establece en el RAC 160. Sin perjuicio de las medidas ordinarias que puedan ser aplicadas, el uso indebido de la identificación será sancionada con multas de acuerdo con RAC 13. Debo hacer devolución del permiso que se expida, bien sea al término de su vigencia o de la relación laboral o finalizada labor para lo cual fue expedido.

En caso de extravío, pérdida o hurto etc., del permiso , debo reportar inmediatamente el hecho a la Dirección del Área Concesionada u Oficina de Seguridad del Aeropuerto, para que se desactive el mismo, igualmente denunciaré el caso ante la autoridad competente en un lapso no mayor a 48 horas siguientes del hecho, igualmente remitiré copia del denuncio a la Oficina de Seguridad del Aeropuerto.

Cualquier enmendadura o alteración que llegare a tener el permiso Aeroportuario, invalida el mismo y me hará acreedor a la sanción correspondiente.

Como solicitantes y para todos los efectos legales bajo la gravedad del juramento, certificamos que la información registrada en el presente documento es veraz y que hemos leído detenidamente las responsabilidades que se derivan de esta solicitud.

Sawer A. Soto H.	
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE	**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE QUE AVALA ESTA SOLICITUO**

APROBADO JEFE AVSEC		**OBSERVACIONES**	

VERIFICA DOCUMENTOS		NOMBRE	**FIRMA**		
REQUERIMIENTOS SST	☐ SI ☐ NO	CONVALIDÓ	**PASE AEROPORTUARIO**	☐ SI ☐ NO	CONVALIDÓ
SENSIBILIZACIÓN AVSEC	☐ SI ☐ NO	CONVALIDÓ	**CAPACITACION DE PUENTES**	☐ SI ☐ NO	CONVALIDÓ
AUTORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES :			☐ SI ☐ NO		

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y del decreto 1377 de 2013, le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos personales es Aeropuertos de Oriente S.A.S. (ADO). Por tal razón, usted acepta que sus datos sean almacenados y autoriza expresamente a ADO para utilizarlos dentro del proceso de identificación Aeroportuaria y control de acceso de los aeropuertos de la RED, por un periodo de 10 años o hasta que usted solicite a ADO la eliminación o supresión de su información.
Le informamos que como titular de los datos tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar, suprimir o revocar su autorización. Conozca nuestras Políticas en el sitio web www.aerooriente.com.co. Cualquier petición, queja o reclamo relacionado con la protección de sus datos personales puede presentarse en el correo electrónico contacto@aerooriente.com.co

ANEXOS OBLIGATORIOS A LA SOLICITUD DE PERMISO AEROPORTUARIO

1. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía o Pasaporte, (los menores de edad tarjeta de identidad o registro civil y permiso de trabajo del Ministerio de Protección Social) (Legible)
2. Para efectos de la expedición del permiso de acceso a áreas restringidas de un aeropuerto, el Representante Legal o Autoridad de la empresa o entidad solicitante, debe suscribir la solicitud en donde claramente certifique que el funcionario o empleado desarrolla labores en dichas áreas en forma permanente y en caso de que se presente su indebida utilización, acarreará las sanciones determinadas por la autoridad aeronáutica.
3. Fotocopia de la Planilla de Pago del mes reciente de ARL y EPS, en caso de estar recién afiliado copia del formato de afiliación (legible)
4. Toda persona que desempeñe labores de seguridad privada (Supervisores, vigilantes y escoltas) en las instalaciones del aeropuerto de manera permanente, debe anexar la captura de pantalla desde la página web de la SIVP-Superintendencia de Vigilancia Privada, que avala la habilitación para prestar el servicio.
5. Cuando la persona para la que se solicita el permiso tenga la calidad de extranjero, debe presentar la Visa de trabajo expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Consulado del país de origen. Cuando aplique de acuerdo a los requisitos Migratorios
6. Verificación de antecedentes judiciales por medio electrónico (verificaciónConcesionario) o el expedido por la Policía Aeroportuaria
7. Recibo de pago del permiso aeroportuario o carta de cargo para clientes con crédito de Aeropuertos De Oriente S.A.S.
8. Los funcionarios públicos que cumplan funciones en el Aeropuerto, deben diligenciar el FORMATO SOLICITUD DE PERMISO AEROPORTUARIO PARA PERSONAS, copia de la cedula de ciudadanía, copia del carnet institucional y se le debe verificar los antecedentes judiciales

aeropuertos de oriente OPERADO POR KAC	SOLICITUD PASE AEROPORTUARIO (P.A)	Código: SO-R-32
		Versión: 02
		Tipo Documento: Formato
		Fecha de aprobación: 2018/04/20

TIPO DE SOLICITUD							
POR PRIMERA VEZ		POR RENOVACIÓN		POR ACTUALIZACIÓN		POR PERDIDA	

NOMBRE DEL CONDUCTOR / OPERADOR:	SOTO HERNANDEZ JAVIER AUGUSTO
No. CEDULA DE CIUDADANÍA:	1.118.863.953
No. LICENCIA CONDUCCIÓN:	1.118.863.953
CATEGORÍA LICENCIA:	B1
FECHA VENCIMIENTO LICENCIA:	22/10/2031
EMPRESA SOLICITANTE:	CONSORCIO AIR RIO/ AERONAUTICA CIVIL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL COMPAÑÍA:	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA EN PLATAFORMA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

NOTA: El solicitante garantiza que el conductor/operador se encuentra debidamente capacitado y familiarizado con la operación del vehículo o equipo correspondiente.

ANEXOS: En la página 2 se encuentra el listado de documentos que deben de adjuntarse a la presente solicitud; sin embargo el diligenciamiento debe ser llevado a cabo por el personal de Aeropuerto de Oriente S.A.S.

_____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (SOLICITANTE)

_____

RECIBE AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S

aeropuertos de oriente OPERADO POR KAC	SOLICITUD PASE AEROPORTUARIO (P.A)	Código: SO-R-32
		Versión: 02
		Tipo Documento: Formato
		Fecha de aprobación: 2018/04/20

ESPACIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO EXLCLUSIVO DE AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S		
DOCUMENTOS	**SI**	**NO**
Constancia de Calificación de Manejo de Equipos y vehículos		
Fotocopia Cedula de Ciudadanía	X	
Fotocopia de la licencia de conducción (vigente según la categoría) o documento que lo habilite para la operación de determinados equipos.	X	
Prueba de Pase Aeroportuario.		

OBSERVACIONES:

Fecha de Expedición del P.A.:		**Expedido por:**	
		Nombre:	
Fecha de Vencimiento del P.A.:		**Cargo:**	
		Firma	


Revisado Por:		**Aprobado Por:**	
Nombre:		**Nombre:**	
Cargo:	Jefe de Operaciones de Terminal y Plataforma	**Cargo:**	Dirección/ Administración Área Concesionada
Firma		**Firma**	


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.118.863.953
SOTO HERNANDEZ
APELLIDOS
JAVIER AUGUSTO
NOMBRES
Javier A. Soto H.
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 29-MAR-1997
BARRANCAS
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
06-ABR-2015 RIOHACHA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
P-4800100-00706656-M-1118863953-20150520
0044170009A 1
44128766


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
Libertad y Orden
No. 1118863953
NOMBRE
JAVIER AUGUSTO SOTO HERNANDEZ
FECHA DE NACIMIENTO
29-03-1997
SANGRE Rh
O+
FECHA DE EXPEDICIÓN
22-10-2021
RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEyTTO COPACABANA


CATEGORIAS AUTORIZADAS
CATEGORIA
CLASE DE VEHICULO
VIGENCIA
SERVICIO
B1
AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS
22-10-2031
PARTICULAR
ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC02005063913

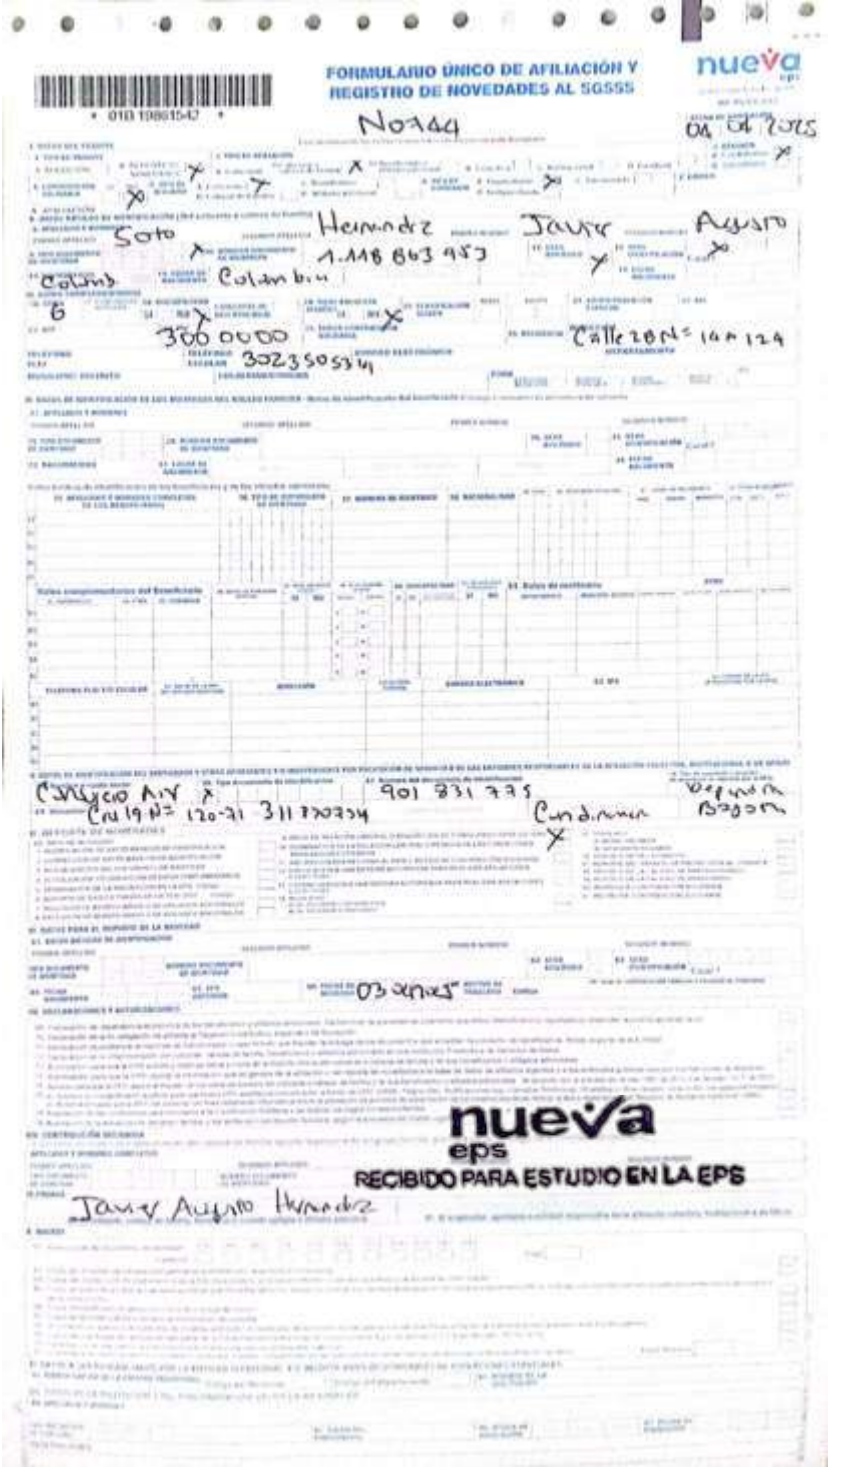
FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps

No744

04 04 2025

Soto

Hernandez

Javier

Augusto

1.118 863 957

Colombia

Colombia

300 0000

3023505314

Calle 28N # 14A 129

Calle 19 # 120-21

311 7707234

901 831 735

Bogotá

03 años

nueva eps

RECIBIDO PARA ESTUDIO EN LA EPS

Javier Augusto Hernandez

Powered by CamScanner

Medellín, 02 de April de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO AIR RIO.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000003 AIR RIO		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1118863953	SOTO HERNANDEZ JAVIERAUGUSTO	03/04/2025		4191c255	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/04/2025 13:54:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.29.200.203, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Riohacha, 08 de Abril 2025

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO
CERTIFICA

Que el(la) señor(a) SOTO HERNANDEZ JAVIER AUGUSTO cédula No. 1118863953 se encuentra registrado en nuestra corporación con un estado ACTIVO a la fecha, presentando la siguiente trayectoria:

NIT	RAZON SOCIAL	FECHA INSCRIPCION	FECHA RETIRO
901769504	ROTULA ARQUITECTURA Y INGENIERIA S.A.S	2024-09-12	2024-09-30
901831775	CONSORCIO AIR RIO	2025-04-02	

Esta certificacion se expide en RIOHACHA a solicitud del interesado, para los fines pertinentes.

Atentamente,

JORGE EDUARDO PEREZ SMIT
JEFE DE LA DIVISIÓN SUBSIDIO FAMILIAR

VIGILADO SuperSubsidio

Sede Administrativa
Calle 13 No. 8 - 175
PBX: 7270204 Fax: 7272416 - 7286655 - 7286656
www. comfaguajira.com
Riohacha - La Guajira

Bogotá D.C., 17 de marzo de 2025

2025-486-RÍO-0730
Al contestar citar este código

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL
Atn. ALDEMAR PINZON.
Supervisor del Contrato
Avenida el Dorado No. 103 -15
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Remisión Plan de Acción de Interventoría, contrato 23001282 H3 DE 2023.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la firma interventora Consorcio Air Río, se remite a la Aeronáutica Civil el Plan de Acción de Interventoría, bajo el cual se proponen los objetivos a trabajar durante el desarrollo del contrato No. **23001282 H3 DE 2023.** Lo anterior para su revisión y fines pertinentes respecto al asunto del presente.

Agradecemos su amable atención.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO

Elaboró: C.G A.
Anexo: Plan de Acción de Interventoría.

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel.
3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogotá, D.C.

Bogotá D.C., 17 de marzo de 2025

2025-486-RÍO-0729
Al contestar citar este código

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL
Atn. ALDEMAR PINZON.
Supervisor del Contrato
Avenida el Dorado No. 103 -15
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Remisión Plan de Gestión Social para el contrato 23001170 H4 de 2023.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la firma interventora Consorcio Air Río, se remite a la Aeronáutica Civil el Plan de Gestión Social por parte del contratista de obra Consorcio Infraestructura Riohacha identificado con el No. 23001170 H4 de 2023**.** Dicho Plan de Gestión social ya fue revisado y aprobado por la firma interventora Air Río. Lo anterior para su revisión y fines pertinentes respecto al asunto del presente.

Agradecemos su amable atención.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO

Elaboró: C.G.A.
Anexo: Plan de Gestión Social de la Contratista.

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel.
3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogotá, D.C.

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C.,18 de marzo de 2025

2025-486-RIO-0752
Al contestar citar este código

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL
Atn. ALDEMAR PINZON.
Supervisor del Contrato
Avenida el Dorado No. 103 -15
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: **Remisión informe de Interventoría No. 4**

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato 23001282 H3 de 2023. Se envía informe mensual N° 4, correspondiente al mes de noviembre de 2024.

Quedamos atentos a sus comentarios o solicitudes de información adicional que consideren necesarias.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: O.V.S.
Anexo: informes compilados con sus anexos.

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel.
3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

INCOPLAN intecsa

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2025

2025-486-RIO-0755
Al contestar citar este código

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Atn. TIBER GILDARDO CHAVARRO M.
Representante Legal
Carrera 67 # 167 - 61
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta al comunicado No. INFRH-AMB-003-2025, aprobación del plan de manejo ambiental (PMA) para el contrato 23001170 H4 de 2023.

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente, se informa al contratista que la interventoría aprueba el Plan de manejo ambiental (PMA), del proyecto de mejoramiento al aeropuerto Almirante de Riohacha, el cual se recibe a conformidad de acuerdo a los lineamientos establecidos.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: M.J.P.M
Anexo: N/A

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

INCOPLAN intecsa

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 21 de marzo de 2025

2025-486-RIO-0758
Al contestar citar este código

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL
Atn. ALDEMAR PINZON.
Representante Legal
Carrera 67 # 167 - 61
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Remisión del Plan de manejo ambiental (PMA) actualizado, para el contrato 23001170 H4 de 2023.

Cordial saludo,

Se da alcance al oficio del Plan De Manejo Ambiental (PMA), mediante el cual la interventoría envío versión uno (1) del documento aprobado en el mes de Diciembre del 2024, el cual fue nuevamente revisado y actualizado a los requerimientos propios del proyecto.

Cordialmente,



SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: M.J.P.M
Anexo: Plan De Manejo Ambiental

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 21 de marzo de 2025

2025-486-RÍO-0800
Al contestar citar este código

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL
Atn. ALDEMAR PINZON.
Supervisor del Contrato
Avenida el Dorado No. 103 -15
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Remisión de informe semanales No. 23, 24, 25 y 26 correspondientes al mes de enero de 2025.

Cordial saludo,

De acuerdo con nuestras obligaciones contractuales, se informa que en el presente comunicado van allegados los informes semanales N° 23, 24, 25 y 26 correspondientes al mes de enero de 2025

Quedamos atentos a sus comentarios o solicitudes de información adicional que consideren necesarias.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: O.V.S.
Anexo: informes N° 22, 24, 25 y 26.

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel.
3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

INCOPLAN intecsa

AIRRIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 25 de marzo de 2025

2024-486-RIO-0817
Al contestar citar este código

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL
Atn. ALDEMAR PINZON.
Supervisor del Contrato
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: **Radicación de Acta 04, Factura FE 5, CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023, Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF)**. **Contratista Infraestructura Riohacha.**

Cordial saludo,

De manera atenta, remitimos la documentación para el trámite de pago del Acta de Recibo Parcial No.4 correspondiente al periodo del 1 al 28 de Febrero de 2025, para su información y fines pertinentes.

DOCUMENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	
Factura ELECTRONICA SE ENVIA A SIIF NACION CUANDO ESTE APROBADA LA CUENTA	1			
Acta Resumen Parcial	1			
Liquidación Iva	1			
Acta Excel Presupuesto de Costos	4			
Certificación Cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de servicios	1			
Certificación de la factura Por interventoría en Obra	1			
Certificación de la factura Por Supervisor en Interventoría			X	
Certificación del Uso del anticipo por la interventoría en Obra	1			
Certificación del Uso del anticipo por EL Supervisor a la interventoría			X	
Certificación de los Aportes a Parafiscales x La interventoría en Obra	1			
Certificación de los Aportes a Parafiscales por el Supervisor en interventoría			X	
Nota Aclaratoria como se calculó el cobro del acta de Interventoría			x	
Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de Obra en cuentas de obra con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación DE Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales	13			

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

INCOPLAN intecsa

DOCUMENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	
Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de interventoría en cuentas de interventoría con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación de Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales			X	
Fotocopias de las Planillas de Pagos Parafiscales del periodo facturado	14			
Certificación Bancaria	1			
Certificación Rut Dian	20			
Certificación de la consignación de los rendimientos Financieros a la entidad Cuando hay Anticipo	2			
Oficio remisorio del Acta a Cobrar	2			
Pantallazo del SECOP Evidenciando el cargue de las cuentas en el numeral 7 Ejecución del contrato / Plan de Pagos A partir de la Segunda Cuenta	1			
Para la primera cuenta de Interventoría la Designación del Supervisor firmada			X	
Documentos de Acuerdo a lo que dice el contrato				
LAS FIRMAS EN LAS ACTAS DE ACUERDO AL ULTIMO MANUAL DE CONTRATACION				
Anexo Memorias o Informes Según el Caso al final de los documentos o PDF aparte.	X			
Para la Primera Y Ultima Cuenta (Acta de recibo Final) Anexar Contrato, Acta de Inicio, CDP, RP, Aprobación de Garantías y Documentos Contractuales que se Presenten en el Contrato			X	
Si es acta de recibo final se requiere anexar el formato 65 acta de recibo final con Aprobación de Garantías y Pólizas Actualizadas.			X	

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: O.V.S
Anexo: Acta 04 y Factura electrónica FE 5 con soportes .

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
NIT 901.831.724-8
CRA 49 91 76
Tel: (601) 6353245
Bogotá - Colombia
controlproyectos@grupoymc.com

Factura electrónica de venta
No. FE 5

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(601) 2963456 - Ext. 000
Dirección	AV CL 26 103-15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/03/2025, 18:02
Expedición	03/03/2025, 18:02
Vencimiento	02/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAGO ACTA PARCIAL NO.4 del periodo de febrero de 2025 en la ejecución del CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023 OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF). INTEGRANTES CONSORCIO: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA NIT.901831724-8 INTEGRANTES: INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA. NIT.900.055.521-7 (40%) RG INGENIERIA SAS NIT.834.000.377-7 (40%) IMCCA SAS NIT.901.538.098-1 (20%)	1.00	1,901,082,396.00	18,060,282.76	1,919,142,678.76

Total items: 1

Valor en Letras: Dos mil cuatrocientos ochenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y siete mil trescientos noventa y siete pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

Total Bruto	1,901,082,396.00
Administración 24.00%	456,259,775.04
Imprevistos 1.00%	19,010,823.96
Utilidad 5.00%	95,054,119.80
IVA 19%	18,060,282.76
Total a Pagar	2,489,467,397.56

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-02 por $ 2,489,467,397.56

Observaciones: TRANSFERENCIA BANCARIA: BANCO DE BOGOTA CTA AHORROS No.380840371 TITULAR CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA NIT.901.831.724-8

#S24-12-00-000;23001170 H4 DE 2023;aldemar.pinzon@aerocivil.gov.co#S

Se remite factura a correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085033524 aprobado en 20241209 prefijo FE desde el número 1 al 70 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6.9
CUFE: 4f5d594f0d86367cb7d79ecfb27148f01dd26ee5b36fed252f84cd9f3ff644c29d419f2b25b3eb0e161317bf082d5864

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

RESUMEN
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-008	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	**CONTRATO: 23001170 H4 de 2023** **OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)** **AEROPUERTO: ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA** **PLAZO INICIAL: TREINTA (30) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026** **FECHA DE INICIACIÓN: 01/08/2024** **FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2026** **PLAZO FINAL: 31/07/2026**	**VALOR INICIAL:** **$ 56.738.847.471,00** **VALOR ADICIONAL:** **$ 0,00** **VALOR FINAL :** **$ 56.738.847.471,00**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 04** **CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA **INTERVENTOR:** CONSORCIO AIR RIO **SUPERVISOR:** ALDEMAR PINZÓN

El día 28 de FEBRERO de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto ALMIRANTE PADILLA de la Ciudad de RIOHACHA, el Ingeniero TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ, en representación del contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA y el ingeniero SANTIAGO PAEZ TALERO, en representación de la Interventoría CONSORCIO AIR RIO, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 01 y el 28 de FEBRERO de 2025, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor inicial contrato		56.738.847.471,00
2.Valor modificación No.1		0,00
3. Valor total del contrato (1+2)		56.738.847.471,00
4. Valor pagado del anticipo %	20,95%	11.884.371.800,00
5. Valor que resta por pagar (3-4)		44.854.475.671,00
6. Valor presente acta		2.489.467.398,00
7. Valor amortizado en la presente a	35,00%	871.313.589,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		1.618.153.809,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		2.400.299.276,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		1.292.468.841,00
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		15.902.824.885,0
12. Saldo por pagar del presente contrato		40.836.022.586,0
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		9.720.589.370,00
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**10,90%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

	RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1-	C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Mantenimiento	-
2-	C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Obra	-
3-	C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Adquisición equipos	-
4-	C-2403-0600-28-52104E-2403002-02	Rehabilitación y/o mejoramiento	1.618.153.809
TOTAL			**1.618.153.809**

AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-28-52104E-2403002-02	Rehabilitación y/o mejoramiento	871.313.589

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

SANTIAGO PAEZ TALERO
CONSORCIO AIR RIO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	LIQUIDACION IVA **ACTA DE RECIBO PARCIAL No.4**		
	Clave: MSER-7.0-12-009	**Versión: 02**	**Fecha de aprobación:** 31/07/2023

CONTRATO No.	**23001170 H4 de 2023**	
INTERVENTOR:	**CONSORCIO AIR RIO**	
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$2.471.407.115,00
Porcentaje estimado para el A.I.U.		30%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	1.901.082.396,00	$1.901.082.396,00
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		$95.054.120,00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		$18.060.283,00
COSTO TOTAL BRUTO DISEÑOS		$0,00
IVA DISEÑOS 19% estimado para el IVA		$0,00
COSTO TOTAL BRUTO TRANSPORTE DE MAQUINARIA		$0,00
IVA TRANSPORTE DE MAQUINARIA 1% estimado para el IVA		$0,00
TOTAL IVA		**$18.060.283,00**

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

SANTIAGO PAEZ TALERO
CONSORCIO AIR RIO
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 04			PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
			Febrero de 2025	25/02/2025
CONTRATO:	23001170 H4 de 2023	OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	R/L: TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO AIR RIO	R/L: SANTIAGO PAEZ TALERO	1/08/2024	31/07/2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 04	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$56.738.847.471,00.00 incluido AIU e IVA sobre Utilidad	$ 56.738.847.471,00	$ 3.692.768.117,00	$ 2.489.467.398,00	$ 6.182.235.515,00	$ 50.556.611.956,00	89,10%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 04		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**															
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	219.003,97	$ 1.223,00	$267.841.855,00	219.003,97	$267.841.855,00	62.517,00	$76.458.291,00	31.305,00	$38.286.015,00	93.822,00	$114.744.306,00	125.181,97	$153.097.549,00	57%
	SUBTOTAL				**$267.841.855,00**		**$267.841.855,00**		**$76.458.291,00**		**$38.286.015,00**		**$114.744.306,00**		**$153.097.549,00**	
2	**MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE RODAJE EXISTENTE**															
2.1	**DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN**															
2.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE	M3	1.739,00	$ 12.650,00	$21.998.350,00	1.739,00	$21.998.350,00							1.739,00	$21.998.350,00	100%
2.2	**CAPAS GRANULARES**															
2.2.1	SUBBASE GRANULAR (FAA P-154), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	663,00	$ 190.000,00	$125.970.000,00	663,00	$125.970.000,00							663,00	$125.970.000,00	100%
2.2.2	BASE GRANULAR (FAA P-209), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	332,00	$ 250.000,00	$83.000.000,00	332,00	$83.000.000,00							332,00	$83.000.000,00	100%
2.3	**PAVIMENTO**															
2.3.1	LOSA EN CONCRETO (FAA P-501), SUMINSTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA	M3	564,00	$ 1.020.000,00	$575.280.000,00	564,00	$575.280.000,00							564,00	$575.280.000,00	100%
	SUBTOTAL				**$806.248.350,00**		**$806.248.350,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$806.248.350,00**	
3	**CONSTRUCCIÓN CALLE DE RODAJE BRAVO**															
3.1	**EXCAVACIÓN**															
3.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE	M3	2.385,00	$ 12.650,00	$30.170.250,00	2.385,00	$30.170.250,00							2.385,00	$30.170.250,00	100%
3.2	**CAPAS GRANULARES**															
3.2.1	SUBBASE GRANULAR (FAA P-154), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	1.412,00	$ 190.000,00	$268.280.000,00	1.412,00	$268.280.000,00							1.412,00	$268.280.000,00	100%
3.2.2	BASE GRANULAR (FAA P-209), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	706,00	$ 250.000,00	$176.500.000,00	706,00	$176.500.000,00							706,00	$176.500.000,00	100%
3.3	**PAVIMENTO**															
3.3.1	LOSA EN CONCRETO (FAA P-501), SUMINSTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA	M3	1.201,00	$ 1.020.000,00	$1.225.020.000,00	1.201,00	$1.225.020.000,00							1.201,00	$1.225.020.000,00	100%
	SUBTOTAL				**$1.699.970.250,00**		**$1.699.970.250,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$1.699.970.250,00**	
4	**MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE - CABECERA 28**															
4.1	**DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN**															
4.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE	M3	915,00	$ 12.650,00	$11.574.750,00	915,00	$11.574.750,00							915,00	$11.574.750,00	100%
4.2	**CAPAS GRANULARES**															
4.2.1	SUBBASE GRANULAR (FAA P-154), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	420,00	$ 190.000,00	$79.800.000,00	420,00	$79.800.000,00							420,00	$79.800.000,00	100%
4.2.2	BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO (FAA P-304), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	210,00	$ 295.000,00	$61.950.000,00	210,00	$61.950.000,00							210,00	$61.950.000,00	100%
4.3	**PAVIMENTO**															
4.3.1	LOSA EN CONCRETO (FAA P-501), SUMINSTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA	M3	357,00	$ 1.020.000,00	$364.140.000,00	357,00	$364.140.000,00							357,00	$364.140.000,00	100%
	SUBTOTAL				**$517.464.750,00**		**$517.464.750,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$517.464.750,00**	
5	**ADECUACIÓN PLATAFORMA DE VIRAJE - CABECERA 10**															
5.1	**DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN**															
5.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE	M3	3.046,00	$ 12.650,00	$38.531.900,00	3.046,00	$38.531.900,00							3.046,00	$38.531.900,00	100%
5.2	**CAPAS GRANULARES**															
5.2.1	SUBBASE GRANULAR (FAA P-154), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	1.304,00	$ 190.000,00	$247.760.000,00	1.304,00	$247.760.000,00							1.304,00	$247.760.000,00	100%
5.2.2	BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO (FAA P-304), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	652,00	$ 295.000,00	$192.340.000,00	652,00	$192.340.000,00							652,00	$192.340.000,00	100%
5.3	**PAVIMENTO**															
5.3.1	LOSA EN CONCRETO (FAA P-501), SUMINSTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA	M3	1.108,00	$ 1.020.000,00	$1.130.160.000,00	1.108,00	$1.130.160.000,00							1.108,00	$1.130.160.000,00	100%
	SUBTOTAL				**$1.608.791.900,00**		**$1.608.791.900,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$1.608.791.900,00**	
6	**ADECUACIÓN FRANJA**															
6.1	DESMONTE Y REINSTALACIÓN LUCES PAPI	UND	2,00	$ 18.561.950,00	$37.123.900,00	2,00	$37.123.900,00							2,00	$37.123.900,00	100%
6.2	DESCAPOTE DE CAPA DE TIERRA VEGETAL 0,30 M ESPESOR	M3	1.906,41	$ 7.759,00	$14.791.835,00	1.906,41	$14.791.835,00							1.906,41	$14.791.835,00	100%
6.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE	M3	104.455,72	$ 12.650,00	$1.321.364.858,00	104.455,72	$1.321.364.858,00							104.455,72	$1.321.364.858,00	100%
6.4	COMPACTACIÓN Y REFINO DE FONDO DE EXCAVACIÓN	M2	208.911,43	$ 1.724,00	$360.163.305,00	208.911,43	$360.163.305,00	62.517,00	$107.779.308,00	31.305,00	$53.969.820,00	93.822,00	$161.749.128,00	115.089,43	$198.414.177,00	55%
6.5	RELLENOS LOCALIZADOS (EXCAVACIÓN EN SITIO)	M3	73.119,00	$ 27.250,00	$1.992.492.750,00	73.119,00	$1.992.492.750,00							73.119,00	$1.992.492.750,00	100%
6.6	RELLENOS LOCALIZADOS CON MATERIAL IMPORTADO	M3	92.232,42	$ 118.500,00	$10.929.541.770,00	92.232,42	$10.929.541.770,00	13.950,80	$1.653.169.800,00	11.255,20	$1.333.741.200,00	25.206,00	$2.986.911.000,00	67.026,42	$7.942.630.770,00	73%

	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 04			PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
			Febrero de 2025	25/02/2025
CONTRATO:	23001170 H4 de 2023	**OBJETO:** "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	R/L: TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO AIR RIO	R/L: SANTIAGO PAEZ TALERO	1/08/2024	31/07/2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 04	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$56.738.847.471,00.00 incluido AIU e IVA sobre Utilidad	**$ 56.738.847.471,00**	**$ 3.692.768.117,00**	**$ 2.489.467.398,00**	**$ 6.182.235.515,00**	**$ 50.556.611.956,00**	**89,10%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 04		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
6.7	TERRAPLÉN CON MATERIAL NUEVO	M3	41.782,29	$ 97.700,00	$4.082.129.733,00	41.782,29	$4.082.129.733,00							41.782,29	$4.082.129.733,00	100%
6.8	CAPA DE TIERRA VEGETAL	M3	26.544,21	$ 11.226,00	$297.985.301,00	26.544,21	$297.985.301,00							26.544,21	$297.985.301,00	100%
6.9	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN Y DEPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (5 KM)	M3xKM	365.595,00	$ 1.081,00	$395.208.195,00	365.595,00	$395.208.195,00							365.595,00	$395.208.195,00	100%
6.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA (37 KM)	M3xKM	4.958.544,00	$ 1.040,00	$5.156.885.760,00	4.958.544,00	$5.156.885.760,00	1.245.946,00	$1.295.783.840,00	1.005.202,00	$1.045.410.080,00	2.251.148,00	$2.341.193.920,00	2.707.396,00	$2.815.691.840,00	55%
	SUBTOTAL				**$24.587.687.407,00**		**$24.587.687.407,00**		**$3.056.732.948,00**		**$2.433.121.100,00**		**$5.489.854.048,00**		**$19.097.833.359,00**	
7	**DRENAJE**															
7.1	**MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA DRENAJE**															
7.1.1	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA DRENAJE CON CARGA SOBRE CAMIÓN	M3	46.986,32	$ 12.650,00	$594.376.948,00	46.986,32	$594.376.948,00							46.986,32	$594.376.948,00	100%
7.1.2	RELLENO DRENAJE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	29.571,57	$ 11.135,00	$329.279.432,00	29.571,57	$329.279.432,00							29.571,57	$329.279.432,00	100%
7.1.3	CAMA DE APOYO (ARENA DE RÍO)	M3	3.846,57	$ 107.635,00	$414.025.562,00	3.846,57	$414.025.562,00							3.846,57	$414.025.562,00	100%
7.2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA TANQUE TORMENTA**															
7.2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE	M3	14.841,99	$ 12.650,00	$187.751.174,00	14.841,99	$187.751.174,00							14.841,99	$187.751.174,00	100%
7.2.2	RELLENO TANQUE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	4.055,18	$ 11.140,00	$45.174.705,00	4.055,18	$45.174.705,00							4.055,18	$45.174.705,00	100%
7.3	**COLECTORES CANALES Y CAJAS**															
7.3.1	COMPACTACIÓN DE EXCAVACIÓN	M	5.003,50	$ 4.598,00	$23.006.093,00	5.003,50	$23.006.093,00							5.003,50	$23.006.093,00	100%
7.3.2	CÁRCAMO DE CONCRETO F'C=280 KG/CM2, REFORZADA CON ACERO F'Y=4200 KG/CM2	M	3.880,00	$ 500.000,00	$1.940.000.000,00	3.880,00	$1.940.000.000,00							3.880,00	$1.940.000.000,00	100%
7.3.3	COLECTORES DE CONCRETO 400MM (CLASE III)	M	1.027,50	$ 276.738,00	$284.348.295,00	1.027,50	$284.348.295,00							1.027,50	$284.348.295,00	100%
7.3.4	COLECTORES DE CONCRETO 600MM (CLASE III)	M	247,00	$ 595.174,00	$147.007.978,00	247,00	$147.007.978,00							247,00	$147.007.978,00	100%
7.3.5	COLECTORES DE CONCRETO 900MM (CLASE III)	M	150,00	$ 949.786,00	$142.467.900,00	150,00	$142.467.900,00							150,00	$142.467.900,00	100%
7.3.6	COLECTORES DE CONCRETO 1000MM (CLASE III)	M	351,50	$ 1.125.312,00	$395.547.168,00	351,50	$395.547.168,00							351,50	$395.547.168,00	100%
7.3.7	COLECTORES DE CONCRETO 1100MM (CLASE III)	M	650,00	$ 1.029.239,00	$669.005.350,00	650,00	$669.005.350,00							650,00	$669.005.350,00	100%
7.3.8	COLECTORES DE CONCRETO 1200MM (CLASE III)	M	848,00	$ 1.337.330,00	$1.134.055.840,00	848,00	$1.134.055.840,00							848,00	$1.134.055.840,00	100%
7.3.9	COLECTORES DE CONCRETO 1300MM (CLASE III)	M	650,00	$ 1.505.829,00	$978.788.850,00	650,00	$978.788.850,00							650,00	$978.788.850,00	100%
7.3.10	COLECTORES DE CONCRETO 1400MM (CLASE III)	M	1.079,50	$ 1.660.456,00	$1.792.462.252,00	1.079,50	$1.792.462.252,00							1.079,50	$1.792.462.252,00	100%
7.3.11	TAPA/REJILLA DE FUNDICIÓN 1X1 (TIPO TRAMEX O SIMILAR NO ESTRUCTURAL)	UND	1,00	$ 1.263.940,00	$1.263.940,00	1,00	$1.263.940,00							1,00	$1.263.940,00	100%
7.3.12	CANAL DE CONCRETO REFORZADO F'C=210 KG/CM2 EJECUTADO IN SITU (BASE 1.50 M, ALTURA 0.80 M, TALUD 1H:2V, ESPESOR 0.15 M)	M	123,00	$ 657.435,00	$80.864.505,00	123,00	$80.864.505,00							123,00	$80.864.505,00	100%
7.3.13	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1X1 (TIPO 1)	UND	4,00	$ 6.551.044,00	$26.204.176,00	4,00	$26.204.176,00							4,00	$26.204.176,00	100%
7.3.14	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1,5X1,5 (TIPO 3) CON HUECO EN LA SOLERA	UND	146,00	$ 6.393.467,00	$933.446.182,00	146,00	$933.446.182,00							146,00	$933.446.182,00	100%
7.3.15	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1,5X1,5 (TIPO 2)	UND	41,00	$ 9.446.069,00	$387.288.829,00	41,00	$387.288.829,00							41,00	$387.288.829,00	100%
7.3.16	REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CARGA DE ROTURA 400 KN	M	3.920,00	$ 1.100.000,00	$4.312.000.000,00	3.920,00	$4.312.000.000,00							3.920,00	$4.312.000.000,00	100%
7.3.17	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1.70X1.50 (TIPO 4) CON HUECO EN LA SOLERA	UND	34,00	$ 9.234.034,00	$313.957.156,00	34,00	$313.957.156,00							34,00	$313.957.156,00	100%
7.3.18	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1.70X1.70 (TIPO 5)	UND	2,00	$ 10.712.023,00	$21.424.046,00	2,00	$21.424.046,00							2,00	$21.424.046,00	100%
7.3.19	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1.00X1.00 (TIPO 6)	UND	1,00	$ 1.783.250,00	$1.783.250,00	1,00	$1.783.250,00							1,00	$1.783.250,00	100%
7.3.20	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 2.00X1.50 (TIPO 7)	UND	1,00	$ 8.616.101,00	$8.616.101,00	1,00	$8.616.101,00							1,00	$8.616.101,00	100%
7.3.21	LOSA DE PROTECCIÓN DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ENTRE CÁRCAMO Y COLECTOR PARA RECUBRIMIENTOS H≤0.30 M	M3	1.232,73	$ 797.000,00	$982.485.810,00	1.232,73	$982.485.810,00							1.232,73	$982.485.810,00	100%
7.3.22	CONCRETO DE LIMPIEZA BAJO SOLERA DE CAJAS DE REGISTRO	M3	117,65	$ 546.850,00	$64.336.903,00	117,65	$64.336.903,00							117,65	$64.336.903,00	100%
7.4	**TANQUE DE TORMENTAS IN SITU, COLUMNA DE GRAVA Y PSH**															
7.4.1	CAMA DE APOYO (GRAVA FILTRANTE) TANQUE DE TORMENTA	M3	2.268,00	$ 142.033,00	$322.130.844,00	2.268,00	$322.130.844,00							2.268,00	$322.130.844,00	100%
7.4.2	TANQUE DE TORMENTAS MEDIANTE GEO-CELDA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS	M3	8.291,00	$ 702.000,00	$5.820.282.000,00	8.291,00	$5.820.282.000,00							8.291,00	$5.820.282.000,00	100%
7.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE SEPARADORA DE HIDROCARBUROS	UND	1,00	$ 383.920.866,00	$383.920.866,00	1,00	$383.920.866,00							1,00	$383.920.866,00	100%
7.4.4	CAJA ENTRADA TANQUE DE TORMENTA	UND	2,00	$ 39.806.688,00	$79.613.376,00	2,00	$79.613.376,00							2,00	$79.613.376,00	100%
7.4.5	COLUMNAS DE GRAVA	M	3.200,00	$ 635.000,00	$2.032.000.000,00	3.200,00	$2.032.000.000,00							3.200,00	$2.032.000.000,00	100%
7.4.6	CAMA DE APOYO (ARENA DE RÍO) TANQUES DE TORMENTA	M3	227,00	$ 107.636,00	$24.433.372,00	227,00	$24.433.372,00							227,00	$24.433.372,00	100%
7.4.7	CAJA DE INSPECCION TANQUE GEOCELDAS	UND	12,00	$ 5.336.124,00	$64.033.488,00	12,00	$64.033.488,00							12,00	$64.033.488,00	100%

	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 04			PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
			Febrero de 2025	25/02/2025
CONTRATO:	23001170 H4 de 2023	OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	R/L: TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO AIR RIO	R/L: SANTIAGO PAEZ TALERO	1/08/2024	31/07/2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 04	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$56.738.847.471,00.00 incluido AIU e IVA sobre Utilidad	$ 56.738.847.471,00	$ 3.692.768.117,00	$ 2.489.467.398,00	$ 6.182.235.515,00	$ 50.556.611.956,00	89,10%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 04		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
7.5	**INSTALACIONES**					0,00	$0,00									
7.5.1	TENDIDO DE TUBERÍA BIAXIAL PVC 12"	M	108,00	$ 436.552,00	$47.147.616,00	108,00	$47.147.616,00							108,00	$47.147.616,00	100%
7.5.2	TENDIDO DE TUBERÍA BIAXIAL PVC 18"	M	280,00	$ 900.000,00	$252.000.000,00	280,00	$252.000.000,00							280,00	$252.000.000,00	100%
7.5.3	EXCAVACIÓN DE ZANJA CON CARGA SOBRE CAMIÓN	M3	734,49	$ 12.650,00	$9.291.299,00	734,49	$9.291.299,00							734,49	$9.291.299,00	100%
7.5.4	CAMA DE APOYO (ARENA DE RÍO)	M3	57,76	$ 107.635,00	$6.216.998,00	57,76	$6.216.998,00							57,76	$6.216.998,00	100%
7.5.5	RELLENO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	720,88	$ 11.135,00	$8.026.999,00	720,88	$8.026.999,00							720,88	$8.026.999,00	100%
	SUBTOTAL				**$25.260.065.303,00**		**$25.260.065.303,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$25.260.065.303,00**	
8	**ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS**															
8.1	**VIA PERIMETRAL**															
8.1.1	MEJORAMIENTO VIA PERIMETRAL, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	1.583,30	$ 68.584,00	$108.589.047,00	1.583,30	$108.589.047,00							1.583,30	$108.589.047,00	100%
8.1.2	SUBBASE GRANULAR (INVIAS 320), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	2.701,30	$ 198.000,00	$534.857.400,00	2.701,30	$534.857.400,00							2.701,30	$534.857.400,00	100%
8.2	**TRANSPORTE**					0,00	$0,00									
8.2.1	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3xKM	49.262,68	$ 1.518,00	$74.780.741,00	49.262,68	$74.780.741,00							49.262,68	$74.780.741,00	100%
	SUBTOTAL				**$718.227.188,00**		**$718.227.188,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$718.227.188,00**	
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)				**55.466.297.003,00**		**55.466.297.003,00**		**3.133.191.239,00**		**$2.471.407.115,00**		**$5.604.598.354,00**		**$49.861.698.649,00**	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 42.666.382.310,00**		**$ 42.666.382.310,00**		**$ 2.410.147.107,00**		**$1.901.082.396,00**		**$4.311.229.503,00**		**$38.355.152.807,00**	
	ADMINISTRACIÓN			24%	$ 10.239.931.754,00		$ 10.239.931.754,00		$ 578.435.306,00		$456.259.775,00		$1.034.695.081,00		$9.205.236.673,00	
	IMPREVISTOS			1%	$ 426.663.823,00		$ 426.663.823,00		$ 24.101.471,00		$19.010.824,00		$43.112.295,00		$383.551.528,00	
	UTILIDAD			5%	$ 2.133.319.116,00		$ 2.133.319.116,00		$ 120.507.355,00		$95.054.120,00		$215.561.475,00		$1.917.757.641,00	
	VALOR TOTAL AIU			30%	$ 12.799.914.693,00		$ 12.799.914.693,00		$ 723.044.132,00		$570.324.719,00		$1.293.368.851,00		$11.506.545.842,00	
	IVA			19%	$ 405.330.632,00		$ 405.330.632,00		$ 22.896.398,00		$18.060.283,00		$40.956.681,00		$364.373.951,00	
	A. SUBTOTAL OBRAS				**$55.871.627.635,00**		**55.871.627.635,00**		**3.156.087.637,00**		**$2.489.467.398,00**		**$5.645.555.035,00**		**$50.226.072.600,00**	
	BOLSA DE MONTO AGOTABLE															
9	**FONDO DE COMPENSACIONES**	BMA	1,00	$ 867.219.836,00	$ 867.219.836,00		$ 867.219.836,00	0,62	$536.680.480,00	0,00	$0,00	0,62	$536.680.480,00	0,38	$330.539.356,00	38%
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$867.219.836,00**		**$867.219.836,00**		**$536.680.480,00**		**$0,00**		**$536.680.480,00**		**$330.539.356,00**	
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (NO APLICA)															
	C. SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS															
	TOTAL PRESENTE ACTA				**$ 56.738.847.471,00**		**$ 56.738.847.471,00**		**$ 3.692.768.117,00**		**$2.489.467.398,00**		**$6.182.235.515,00**		**$50.556.611.956,00**	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$56.738.847.471,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100,00%	$56.738.847.471,00
VALOR DE ANTICIPO	20,95%	$11.884.371.800,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	6,51%	$3.692.768.117,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	35,00%	$1.292.468.841,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	4,39%	$2.489.467.398,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	35,00%	$871.313.589,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	2,85%	$1.618.153.809,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	10,90%	$6.182.235.515,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	35,00%	$2.163.782.430,00
SALDO POR EJECUTAR	89,10%	$50.556.611.956,00
SALDO POR AMORTIZAR	81,79%	$9.720.589.370,00

VALOR TOTAL EN LETRAS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES:

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

SANTIAGO PAEZ TALERO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

SANTIAGO PAEZ TALERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO AIR RIO

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD **03** / MM **Marzo** / AAAA **2025**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA**
NIT/CC No.: **901.831.724-8**

Información Contractual

Contrato No.: 23001170 H4 de 2023
Objeto del contrato: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Fecha de suscripción: 30 / may / 2024 (DD / MM / AAAA) — Fecha de terminación: 31 / jul / 2026 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 56.738.847.471,00		$ 1.976.223.181,00	$ 54.762.624.290,00

Información para pago

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☑ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☐ OTRO:

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	5	03-mar-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 11.884.371.800,00
Valor total amortizado a la fecha	$ 1.292.468.841,00
Amortización presente pago	$ 871.313.589,00
Saldo pendiente de amortizar	$ 9.720.589.370,00

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso
Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 380840371
Nombre entidad bancaria: BANCO DE BOGOTA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Reserva Presupuestal

No. Compromiso presupuestal / RP 157424	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA)** *Descontar amortización
C-2403-0600-28-52104E-2403002-02	$ 1.618.153.809,00
Total a pagar:	**$ 1.618.153.809,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA)** *Descontar amortización
Total a pagar:	**$ -**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

Firma:		Firma:	
Nombre:	SANTIAGO PAEZ TALERO	Nombre:	
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL	Cargo:	
Dependencia:	CONSORCIO AIR RIO	Dependencia:	

OBSERVACIONES

CERTIFICACION

Bogotá, 3 de marzo de 2025

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra No. 23001170 H4 de 2023

Objeto: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Yo SANTIAGO PAEZ TALERO, identificado con la cédula de ciudadanía No 80.882.815 de Bogotá, como representante legal del CONSORCIO AIR RIO, en calidad de INTERVENTOR del Contrato de obra No. 23001170 H4 de 2023, CERTIFICO que el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 04, por un valor total de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.489.467.398,00) M/CTE., y que la factura No. FE-5 de fecha 03 de marzo de 2025, corresponde al corte parcial de obra No.4 del contrato cuyo objeto es REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF), que fue Recibida a satisfacción en el período de febrero de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma en Bogotá el día 03 de marzo de 2025.



Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

SANTIAGO PAEZ TALERO
C.C. No. 80.882.815 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO AIR RIO
INTERVENTOR

CERTIFICACION

Bogotá, D.C. 3 de marzo de 2025

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra No. 23001170 H4 de 2023

Objeto: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Yo SANTIAGO PAEZ TALERO, identificado con la cédula de ciudadanía No 80.882.815 de Bogotá, como representante legal del CONSORCIO AIR RIO, en calidad de INTERVENTOR del Contrato de obra No. 23001170H4 de 2023, suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL y el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA cuyo objeto es REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF), CERTIFICO, que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA en calidad de contratista de obra, ha cumplido con el buen manejo y correcta inversión del anticipo por valor de $11.884.371.800,00, el cual equivale al 20,94% del valor del contrato, establecido así:

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	PROGRAMACION INICIAL	%	VALOR REPROGRAMADO MODIFICACION	%
1	Logìstica - transporte de materiales y equipos	$ 2.139.186.923	18%	$ 3.505.374.000	29%
2	Materiales	$ 6.369.810.005	54%	$ 4.000.000.000	34%
3	Compra maquinaria	$ 1.700.000.000	14%	$ 1.700.000.000	14%
4	Mano de obra	$ 1.200.000.000	10%	$ 2.600.000.000	22%
5	Combustible y lubricantes	$ 475.374.872	4%	$ 78.997.800	1%
	TOTALES	$ 11.884.371.800	100%	**$ 11.884.371.801**	**100%**

Para el período de febrero de 2025 correspondiente al Acta parcial de obra No.4 no se efectuaron desembolsos de la cuenta del Anticipo del contratista desde Fiduciaria Bogotá. Por lo cual, a la fecha, se presenta el estado actual del manejo del anticipo, con un total de 24 desembolsos realizados a la fecha a saber:

RESUMEN PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - ORDENES 1 A 24						
ÍTEM	COMPONENTE DEL GASTO	VALOR REPROGRAMADO PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO (MODIFICACION 2)	ACUMULADO DESEMBOLSOS ORDENES Nos.1 -11	RESUMEN DESEMBOLSOS PERIODO: ENERO 2025 ORDENES Nos.12-24	RESUMEN DESEMBOLSOS 1 - 24	SALDO POR EJECUTAR
1	**Logìstica - transporte de materiales y equipos**	$ 3.505.374.000	$ 1.705.374.000	$ 1.162.945.000	$ 2.868.319.000	$ 637.055.000
2	**Materiales**	$ 4.000.000.000	$ 263.250.000	$ 1.480.188.056	$ 1.743.438.056	$ 2.256.561.944
3	**Compra maquinaria**	$ 1.700.000.000	$ 103.611.883		$ 103.611.883	$ 1.596.388.118
4	**Mano de obra**	$ 2.600.000.000	$ 715.091.988	$ 655.285.975	$ 1.370.377.963	$ 1.229.622.037
5	**Combustible y lubricantes**	$ 78.997.800	$ 19.980.000	$ -	$ 19.980.000	$ 59.017.800
	SALDOS TOTALES	$ 11.884.371.800	$ 2.807.307.871	**$ 3.298.419.031**	$ 6.105.726.902	**$ 5.778.644.899**

Cordialmente

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

SANTIAGO PAEZ TALERO
C.C. No. 80.882.815 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO AIR RIO
INTERVENTOR

CERTIFICACION

Bogotá D.C., 3 de marzo de 2025

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra No. 23001170 H4 de 2023

Objeto: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Yo SANTIAGO PAEZ TALERO, identificado con la cédula de ciudadanía No 80.882.815 de Bogotá D.C, como representante legal del CONSORCIO AIR RIO, en calidad de INTERVENTOR del Contrato de obra No. 23001170 H4 de 2023, suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL y el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA cuyo objeto es REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF), **CERTIFICO que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA** de acuerdo a los soportes y certificaciones entregadas, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales de febrero de 2025, señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia de lo anterior se firma en Bogotá el día 3 de marzo de 2025

Cordialmente



Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

SANTIAGO PAEZ TALERO
C.C. No. 80.882.815 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO AIR RIO

CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023
OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON identificado con C.C. No. 79.512.143 de Bogotá, en mi condición de representante legal del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA identificado con NIT.901.831.724-8, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los salarios y los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición del presente certificado y cuando a ello hubiere lugar; en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, D.C., a los 03 días del mes de marzo de 2025.

Atentamente,



YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

AURA LIBIA RAMIREZ RAMIREZ, identificada con C.C. No. 30.288.022, y con Tarjeta Profesional No. 40528-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de RG INGENIERIA SAS identificada con Nit 834.000.377-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÀ, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los salarios y los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, D.C., a los 03 días del mes de marzo de 2025.



NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: AURA LIBIA RAMIREZ RAMIREZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 3 9 0 3 A 5 4 0 A 2 B 7 8 4 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AURA LIBIA RAMIREZ RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30288022 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 40528-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

40528-T

AURA LIBIA
RAMIREZ RAMIREZ
C.C. 30288022
RESOLUCION INSCRIPCION 068 FECHA 13/10/94
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

00047703



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1963
MANZANARES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
14-DIC-1981 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 30288022
RAMIREZ RAMIREZ
APELLIDOS
AURA LIBIA
NOMBRES
FIRMA

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Paola Andrea Malagon Niño identificado con cedula 63.539.126, y con tarjeta profesional No. 235252-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisora fiscal de IMCCA SAS identificada con NIT 901.538.098-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los salarios y los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes alas Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 16 días del mes de marzo de 2025.

Paola Andrea Malagon Niño
Revisora fiscal
CC. 63.539.126 de Bucaramanga
TP. 235252-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B967BE5F5AC1572Z

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAOLA ANDREA MALAGON NIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63539126 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 235252-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

235252-T

PAOLA ANDREA
MALAGON NIÑO
C.C. 63539126
RES. INSCRIPCION 947 DEL 04/12/2017
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

240949 258528

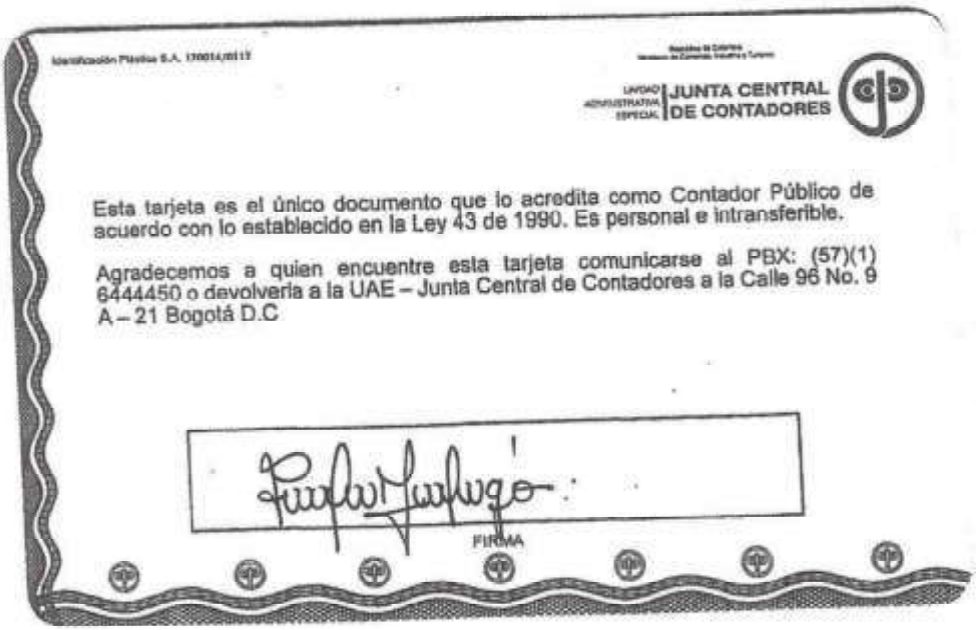

Identificación Plastiva S.A. 170014/0113

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63539126

MALAGON NIÑO
APELLIDOS

PAOLA ANDREA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1983
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

31-MAY-2001 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-2700100-59096572-F-0063539126-20011208 03790 01341A 01 118933091

La Suscrita Revisora Fiscal

de

INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA.
NIT. 900.055.521-7

CERTIFICA

Que a la fecha y durante los últimos seis meses la empresa INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA. Identificada con NIT.900.055.521-7 ha realizado el pago de los salarios y los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a parafiscales correspondientes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje dando cumplimiento a la Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002.

La presente certificación se expide el día (12) del mes de marzo de 2025.

Atentamente,

SANDRA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
REVISORA FISCAL
C.C.52.804.277 de Bogotá TP.194933-7

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6306870053C210A1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA GONZALEZ MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52804277 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 194933-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.804.277

GONZALEZ MARTINEZ

APELLIDOS

SANDRA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1981

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-NOV-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00647661-F 0052804277-20141126 0041384987A 3 1483136308

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

194933-T



SANDRA
GONZALEZ MARTINEZ
C.C. 52804277

RESOLUCION INSCRIPCION 1364 FECHA 24/09/2014

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 207175

186325

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901831724-8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	CRA 67 nO. 167-61 OFIC 509	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	21/02/2025	84193143	$12.314.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	100.000	0		0		0	14	1.000	0	101.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	324.000	0		0		0	14	3.100	0	327.100	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	186.900	0		0		0	14	1.800	0	188.700	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	71.400	0		0		0	14	700	0	72.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	208.100	0		0		0	14	2.000	0	210.100	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	320.700	0		0		0	14	3.000	0	323.700	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	143.700	0		0		0	14	1.400	0	145.100	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	121.400	0		0		0	14	1.200	0	122.600	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	100.000	0		0		0	14	1.000	0	101.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	485.300	0	0	0	0	14	4.600	0	489.900	1
230301	Porvenir	800224808-8	4.842.600	0	0	0	0	14	45.100	0	4.887.700	14
231001	Colfondos	800227940-6	400.000	0	0	0	0	14	3.800	0	403.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	574.700	0	0	0	0	14	5.400	0	580.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.742.200				2.742.200	14	25.500	2.767.700			27.422	2.767.700	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF30	Caja Fliar La Guajira	892115006-5	1.579.100	14	14.700	1.593.800	18

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901831724-8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	CRA 67 nO. 167-61 OFIC 509	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	21/02/2025	84193143	$12.314.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	1.576.200	1.591.400
Pensión	4	6.302.600	6.361.500
Riesgos Laborales	1	2.742.200	2.767.700
CCF	1	1.579.100	1.593.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	12.200.100	12.314.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901831724-8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA		CRA 67 nO. 167-61 OFIC 509	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					18	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-02	2025-01	E	21/02/2025	84193143	$12.314.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estomado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1006615156	ANGULO FONTALVO VICTOR MANUEL	1	0			S								X								230301	1.840.646	294.600	0	0	0	0	EPS005	1.840.646	73.700	14-11	1.840.646	5	128.200	CCF30	1.840.646	73.700	0	0	0	0	0
2	CC	1020799254	GONZALEZ ROBAYO RAFAEL	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF30	118.625	4.800	0	0	0	0	0
3	CC	1052396873	CORREDOR CANO CARLOS ANDRES	1	0			S								X									230301	1.796.395	287.500	0	0	0	0	EPS037	1.796.395	71.900	14-11	1.796.395	5	125.100	CCF30	1.796.395	71.900	0	0	0	0	0
4	CC	1071915149	VERA RODRIGUEZ OSCAR MAURICIO	1	0			S								X									230301	2.662.045	426.000	0	0	0	0	EPS017	2.662.045	106.500	14-11	2.662.045	5	185.300	CCF30	2.662.045	106.500	0	0	0	0	0
5	CC	1095913270	MORALES ESTEBAN ALFONSO	1	0			S								X									230301	1.783.088	285.300	0	0	0	0	EPS010	1.783.088	71.400	14-11	1.783.088	5	124.200	CCF30	1.783.088	71.400	0	0	0	0	0
6	CC	1102361348	ROBAYO LARA ARIEL DUVAN	1	0			S								X									230301	1.776.590	284.300	0	0	0	0	EPS037	1.776.590	71.100	14-11	1.776.590	5	123.700	CCF30	1.776.590	71.100	0	0	0	0	0
7	CC	1118813605	MORA SIERRA CRISTIAN ELIECER	1	0			S	X							X									230301	1.476.623	236.300	0	0	0	0	EPS005	1.476.623	59.100	14-11	1.476.623	5	102.800	CCF30	1.476.623	59.100	0	0	0	0	0
8	CC	1118873533	ARAUJO PASTRANA ELIS JOSE	1	0			S	X																230301	1.303.334	208.600	0	0	0	0	EPS005	1.303.334	52.200	14-11	1.303.334	5	90.800	CCF30	1.303.334	52.200	0	0	0	0	0
9	CC	1121296720	RODRIGUEZ GOMEZ VICTOR JAIME	1	0			S								X									230301	1.944.005	311.100	0	0	0	0	EPS041	1.944.005	77.800	14-11	1.944.005	5	135.400	CCF30	1.944.005	77.800	0	0	0	0	0
10	CC	3144427	CRUZ MORENO HENRRY LEONARDO	1	0			S								X									230301	2.538.153	406.200	0	0	0	0	EPS017	2.538.153	101.600	14-11	2.538.153	5	176.700	CCF30	2.538.153	101.600	0	0	0	0	0
11	CC	49781236	GOMEZ SANCHEZ ELIANA MARIA	1	0			S	X																230301	2.153.334	344.600	0	0	0	0	EPS002	2.153.334	86.200	14-11	2.153.334	5	149.900	CCF30	2.153.334	86.200	0	0	0	0	0
12	CC	79311998	CHAVARRO MUÑOZ TIBER GILDARDO	1	0			S																	231001	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS001	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF30	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
13	CC	81740284	TORRES GUARIN JULIO	1	0			S								X									25-14	1.647.371	263.600	0	0	0	0	EPS041	1.647.371	65.900	14-11	1.647.371	5	114.700	CCF30	1.647.371	65.900	0	0	0	0	0
14	CC	84007762	RODRIGUEZ OJEDA ROGER RAFAEL	1	0			S								X									230301	4.440.435	710.500	0	0	0	0	EPS037	4.440.435	177.700	14-11	4.440.435	5	309.100	CCF30	4.440.435	177.700	0	0	0	0	0
15	CC	84080207	CEBALLOS MARTINEZ ELDER ENRIQUE	1	0			S								X									25-14	1.944.006	311.100	0	0	0	0	EPS002	1.944.006	77.800	14-11	1.944.006	5	135.400	CCF30	1.944.006	77.800	0	0	0	0	0
16	CC	8643449	ESCORCIA RODRIGUEZ SAMIR ANTONIO	1	0			S								X									230201	3.032.609	485.300	0	0	0	0	ESSC24	3.032.609	121.400	14-11	3.032.609	5	211.100	CCF30	3.032.609	121.400	0	0	0	0	0
17	CC	91287950	BARRERA HERNANDO HERNANDEZ	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	MIN001	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF30	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
18	CC	92190949	PEREZ ROSALES JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS002	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	5	278.400	CCF30	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901274707	2	AEROTYP INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TECNICO	Carrera 7 C BIS No. 139-18 ofic 609	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4779822	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1241407212	9481301013	E	2025/02/04	2025/02/04	BANCOLOMBIA	0	$523,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TECNICO (1 Afiliados)					$0	$0			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$243,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)					$0	$0			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$243,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$243,600		$0	$0
1	CC 19272831	MORA PEDRO		0	$0	$0	EPS008	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$0	$0			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$243,600		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901274707	2	AEROTYP INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TECNICO	Carrera 7 C BIS No. 139-18 ofic 609	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4779822	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1241407212	9481301013	E	2025/02/04	2025/02/04	BANCOLOMBIA	0	$523,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,600	$0	$0	$243,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$243,600	$0	$0	$243,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,000	$0	$0	$140,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$140,000	$0	$0	$140,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,000	$0	$0	$140,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$140,000	$0	$0	$140,000
TOTAL				**1**	**$523,600**	**$0**	**$0**	**$523,600**

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **YAMILL ALONSO MONTENEGRO**, identificada con **NI** número **79512143**, aportó por **MILDREY LORENA PINILLA GALINDO** identificado(a) con **CC** número **1018409894** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2025 y 02 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1															0		23	$3,833,334	0.06960	$266,900	$0	$0	Enero - 2025	84192567	20/02/2025	Si
14-11	ARL SURA	1										X					0		2	$333,334	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2025	84192567	20/02/2025	Si
14-11	ARL SURA	1												X			0		5	$833,334	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2025	84192567	20/02/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		23	$3,833,334	0.04000	$153,400	$0	$0	Enero - 2025	84192567	20/02/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1										X					0		2	$333,334	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2025	84192567	20/02/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												X			0		5	$833,334	0.04000	$33,400	$0	$0	Enero - 2025	84192567	20/02/2025	Si
230301	Porvenir	1															0		23	$3,833,334	0.16000	$613,400	$0	$0	Enero - 2025	84192567	20/02/2025	Si
230301	Porvenir	1										X					0		2	$333,334	0.16000	$53,400	$0	$0	Enero - 2025	84192567	20/02/2025	Si
230301	Porvenir	1												X			0		5	$833,334	0.16000	$133,400	$0	$0	Enero - 2025	84192567	20/02/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		23	$3,833,334	0.04000	$153,400	$0	$0	Febrero - 2025	84192567	20/02/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1										X					0		2	$333,334	0.04000	$13,400	$0	$0	Febrero - 2025	84192567	20/02/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1												X			0		5	$833,334	0.04000	$33,400	$0	$0	Febrero - 2025	84192567	20/02/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **20** días del mes **Febrero**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **YAMILL ALONSO MONTENEGRO**, identificada con **NI** número **79512143**, aportó por **DIEGO ALEXANDER OSORIO MURIEL** identificado(a) con **CC** número **94406535** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2025 y 02 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		17	$3,003,334	0.16000	$480,600	$0	$0	Enero - 2025	84192567	20/02/2025	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1												X			0		13	$2,296,667	0.16000	$367,500	$0	$0	Enero - 2025	84192567	20/02/2025	Si
14-11	ARL SURA	1															0		17	$3,003,334	0.06960	$209,100	$0	$0	Enero - 2025	84192567	20/02/2025	Si
14-11	ARL SURA	1												X			0		13	$2,296,667	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2025	84192567	20/02/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		17	$3,003,334	0.04000	$120,200	$0	$0	Enero - 2025	84192567	20/02/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												X			0		13	$2,296,667	0.04000	$91,900	$0	$0	Enero - 2025	84192567	20/02/2025	Si
EPS002	Salud Total EPS	1															0		17	$3,003,334	0.04000	$120,200	$0	$0	Febrero - 2025	84192567	20/02/2025	Si
EPS002	Salud Total EPS	1												X			0		13	$2,296,667	0.04000	$91,900	$0	$0	Febrero - 2025	84192567	20/02/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **20** días del mes **Febrero**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA**, identificada con **NI** número **900055521**, aportó por **JUAN CARLOS SERNA GARCIA** identificado(a) con **CC** número **80410771** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2025 y 02 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1												X			0		7	$3,103,333	0.12500	$388,000	$0	$0	Febrero - 2025	83965775	06/02/2025	No
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1															0		23	$10,196,666	0.12500	$1,274,600	$0	$0	Febrero - 2025	83965775	06/02/2025	No
14-11	ARL SURA	1												X			0		7	$3,103,333	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2025	83965775	06/02/2025	No
14-11	ARL SURA	1															0		23	$10,196,666	0.06960	$709,700	$0	$0	Enero - 2025	83965775	06/02/2025	No
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												X			0		7	$3,103,333	0.04000	$124,200	$0	$0	Enero - 2025	83965775	06/02/2025	No
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		23	$10,196,666	0.04000	$407,900	$0	$0	Enero - 2025	83965775	06/02/2025	No
230301	Porvenir	1												X			0		7	$3,103,333	0.16000	$496,600	$15,600	$15,600	Enero - 2025	83965775	06/02/2025	No
230301	Porvenir	1															0		23	$10,196,666	0.16000	$1,631,500	$51,000	$51,000	Enero - 2025	83965775	06/02/2025	No

PAGADA

El presente certificado se expide a los **20** días del mes **Febrero**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA**, identificada con **NI** número **900055521**, aportó por **DUVAN ELIAS MONTENEGRO CALDERON** identificado(a) con **CC** número **79632567** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2025 y 02 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1							X								0		30	$6,200,000	0.16000	$992,000	$31,000	$31,000	Enero - 2025	83965775	06/02/2025	Si
14-11	ARL SURA	1							X								0		30	$6,200,000	0.06960	$431,600	$0	$0	Enero - 2025	83965775	06/02/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1							X								0		30	$6,200,000	0.04000	$248,000	$0	$0	Enero - 2025	83965775	06/02/2025	Si
EPS008	Compensar EPS	1							X								0		30	$6,200,000	0.04000	$248,000	$0	$0	Febrero - 2025	83965775	06/02/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **20** días del mes **Febrero**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA**, identificada con **NI** número **900055521**, aportó por **DAVID FELIPE ALFONSO JIMENEZ** identificado(a) con **CC** número **1030573500** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2025 y 02 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1							X								0		30	$5,000,000	0.04000	$200,000	$0	$0	Febrero - 2025	83965775	06/02/2025	Si
14-11	ARL SURA	1							X								0		30	$5,000,000	0.06960	$348,000	$0	$0	Enero - 2025	83965775	06/02/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1							X								0		30	$5,000,000	0.04000	$200,000	$0	$0	Enero - 2025	83965775	06/02/2025	Si
231001	Colfondos	1							X								0		30	$5,000,000	0.16000	$800,000	$0	$0	Enero - 2025	83965775	06/02/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **20** días del mes **Febrero**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901831724-8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	CRA 67 nO. 167-61 OFIC 509	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	Y	21/02/2025	84296805	$500.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	495.500				495.500	14	4.700	500.200			4.955	500.200	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	495.500	500.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	495.500	500.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901831724-8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA		CRA 67 nO. 167-61 OFIC 509	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					5	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-01	2025-01	Y	21/02/2025	84296805	$500.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estomando**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	10524225	CASTRO SALAZAR VICTOR DANIEL	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	19272831	MORA GRANDAS PEDRO JOSE	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	19371269	CANTOR BELLO MELQUICEDEC	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	6773087	GONZALEZ VERGARA CARLOS JAVIER	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	79471549	JAIMES SILVA ROBERTO ANDERSON	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10524225	VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR	CRA 49 91 76	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	21/02/2025	83853303	$409.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	178.000	0		0		0	14	1.700	0	179.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	14	2.200	0	230.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	179.700
Pensión	1	227.800	230.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	409.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	10524225	VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR		CRA 49 91 76	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	21/02/2025	83853303	$409.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10524225	CASTRO SALAZAR VICTOR DANIEL	3	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6773087
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS JAVIER GONZALEZ VERGARA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 63 NO. 22A-41 AP 607	TELÉFONO:	9065312
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7957105607**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/02/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1276045795

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 1.082.200	$ 0	$ 0	$ 33.900	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 1.150.000	$ 0	$ 1.150.000
SUBTOTALES:										**$ 1.150.000**	**$ 0**	**$ 1.150.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 845.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 845.500	$ 0	$ 0	$ 845.500
SUBTOTALES:													**$ 845.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 845.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN									SALUD							ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 6773087	GONZALEZ VERGARA CARLOS JAVIER	INDEPEND		$ 6.162.100				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.763.700	$ 1.082.200	$ 33.900	$ 33.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.150.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 6.763.700	$ 845.500	$ 0	$ 845.500			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.995.500**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	19371269
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MELQUICEDEC CANTOR BELLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 70 A BIS 104 71	TELÉFONO:	6243324
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7958282618**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/02/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1297947314

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:													**$ 250.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.500	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 10.500
SUBTOTALES:									**$ 10.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 19371269	CANTOR BELLO MELQUICEDEC	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PENS VEJ ACT	$ 2.000.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000	19371269	$ 10.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 260.500**

Planilla Pagada

Banco de Bogotá


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA identificado(a) con NITPJ 9018317248 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 380840371 desde el 20 de mayo de 2024, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 20 de mayo de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141039807923

(415)7707212489984(8020) 000014103980792 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 1 7 2 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 67 167 61 OF 509

42. Correo electrónico infraestructuranacional@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 4 7 6 8 4 6 2	3 1 6 6 2 2 9 8 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 5 0 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 15 / 16 : 57: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MONTENEGRO CALDERON YAMILL ALONSO

985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141039807923

(415)7707212489984(8020) **000014103980792 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 1 7 2 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 1 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 1 1 2	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141039807923

(415)7707212489984(8020) **000014103980792 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 1 7 2 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 1 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 1 2 1 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MONTENEGRO	CALDERON	YAMILL	ALONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 3 1 1 9 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CHAVARRO	MUÑOZ	TIBER	GILDARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141039807923

(415)7707212489984(8020) **000014103980792 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 1 7 2 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 4 0 0 0 3 7 7	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: RG INGENIERIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 0 1 1 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 5 5 5 2 1	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 0 1 1 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 3 8 0 9 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: IMCCA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 4 0 1 1 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14812964672

(415)7707212489984(8020) 000001481296467 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 5 5 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INFRANAL

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 49 91 76 BRR LA CASTELLANA

42. Correo electrónico facturacion@grupoymc.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 9 1 6 1 3 9	6 0 1 6 3 5 3 2 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 5 1 1 1 6	7 1 1 2	2 0 2 1 0 1 0 4		4 3 1 1	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 02 - 16 / 14 : 36: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MONTENEGRO CALDERON YAMILL ALONSO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 16-02-2022 02:36:48PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14812964672

(415)7707212489984(8020) **000001481296467 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 5 5 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	2 8 3 6	
73. Fecha	2 0 0 5 1 1 1 5	
74. Número de notaría	1 1	
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 5 1 1 1 8	
77. No. Matrícula mercantil	1 5 4 8 3 9 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 5 1 1 1 5	
81. Hasta	2 0 2 5 1 1 1 5	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14812964672

(415)7707212489984(8020) **000001481296467 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 5 5 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 5 1 1 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 1 2 1 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MONTENEGRO	CALDERON	YAMILL	ALONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 7 1 0 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 0 1 9 6 4 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CORTES	CORREDOR	EMILIA	PATRICIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14812964672

(415)7707212489984(8020) **000001481296467 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 5 5 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 0 1 9 6 4 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CORTES	CORREDOR	EMILIA	PATRICIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
40,000,000	4 0	2 0 0 5 1 1 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 5 1 2 1 4 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MONTENEGRO	CALDERON	YAMILL	ALONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
60,000,000	6 0	2 0 0 5 1 1 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14812964672

(415)7707212489984(8020) **000001481296467 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 5 5 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 8 0 4 2 7 7		1 9 4 9 3 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GONZALEZ	MARTINEZ	SANDRA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 6 0 4 2 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 2 9 1 5 4 1		1 3 5 1 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
TRIANA	OTALORA	WILSON	ENRIQUE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 0 5 1 1 1 5

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14812964672

(415)7707212489984(8020) **000001481296467 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 5 5 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2	

162. Nombre del establecimiento: INFRAESTRUCTURAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 49 91 76 BRR LA CASTELLANA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 5 4 8 5 2 0	2 0 0 5 1 1 1 5	
168. Teléfono: 6 3 5 3 2 4 5	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14814939639

(415)7707212489984(8020) 000001481493963 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 3 7 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
RG INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CRA 67 NO 167 61 OF 509 CENTRO EMPRESARIAL COLINA OFFICE PARK

42. Correo electrónico rg.ingsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 3 8 2 3 0 2 7	6 0 1 4 7 6 8 4 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 5 1 2 3 1	4 9 2 3	2 0 1 0 0 3 0 1	7 7 3 0	4 2 1 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	2 1	4 2	4 8	5 2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
21- Declarar ingreso o salida del país de d
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3	2 2																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 02 - 25 / 16 : 21: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CHAVARRO MUÑOZ TIBER GILDARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14814939639

(415)7707212489984(8020) **000001481493963 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 3 7 7	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 6 6 7	3 8
73. Fecha	1 9 9 5 1 0 3 1	2 0 1 6 0 3 0 1
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 8 0 6 0 3	2 0 1 6 0 7 0 6
77. No. Matrícula mercantil	6 3 6 8 0 4	8 7 3 5 2 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 5 1 0 3 1	2 0 1 6 0 3 0 1
81. Hasta	2 0 1 0 1 0 3 1	2 0 5 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14814939639

(415)7707212489984(8020) **000001481493963 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 3 7 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 3 1 1 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 3 1 1 9 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CHAVARRO	MUÑOZ	TIBER	GILDARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 3 1 1 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 0 8 5 8 7 6 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROBAYO	HURTADO	ROCIO	DEL PILAR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14814939639

(415)7707212489984(8020) **000001481493963 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 3 7 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	2 0 8 5 8 7 6 6		COLOMBIA 1 6 9	ROBAYO	HURTADO	ROCIO	DEL PILAR		182,000,000	4 5 . 5	1 9 9 5 1 0 3 1	
2	Cédula de Ciudada 1 3	9 1 0 9 1 8 0 2 6 7 3		COLOMBIA 1 6 9	CHAVARRO	ROBAYO	CATHERIN			25,000,000	6 . 2 5	1 9 9 5 1 0 3 1	
3	Cédula de Ciudada 1 3	7 9 3 1 1 9 9 8		COLOMBIA 1 6 9	CHAVARRO	MUÑOZ	TIBER	GILDARDO		193,000,000	4 8 . 2 5	2 0 0 5 0 2 1 0	
4													
5													

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14814939639

(415)7707212489984(8020) **000001481493963 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 3 7 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 0 2 8 8 0 2 2		4 0 5 2 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RAMIREZ	RAMIREZ	AURA	LIBIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 1 2 0 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 5 4 6 3 3 4 3		2 4 5 4 7 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LOPEZ	DIAZ	EDWIN	ANTONIO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 8 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14814939639

(415)7707212489984(8020) **000001481493963 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 3 7 7	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangi 7 7 3 0	

162. Nombre del establecimiento: RG INGENIERIA S.A.S

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 67 167 61 OF 509

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 1 7 6 8 9 1	2 0 0 2 0 4 2 4	
168. Teléfono: 4 7 6 8 4 6 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14918286884

(415)7707212489984(8020) 000001491828688 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 8 0 9 8	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
IMCCA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CL 36 27 71 OF 810 ED MILLENIUM

42. Correo electrónico sa.sanchez46@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 6 7 8 2 4 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 1 1 0 2							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 03 / 11 : 58: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ MANTILLA SANTIAGO ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918286884

(415)7707212489984(8020) **000001491828688 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 8 0 9 8	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 1 1 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 1 1 0 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 6 0 4 9 5 1	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 1 1 0 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918286884

(415)7707212489984(8020) **000001491828688 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 8 0 9 8	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 1 1 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 8 6 8 2 1 6 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	MANTILLA	SANTIAGO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918286884

(415)7707212489984(8020) **000001491828688 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 8 0 9 8	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 5 3 9 1 2 6		2 3 5 2 5 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MALAGON	NIÑO	PAOLA	ANDREA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 4 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Consulta Soportes de Tramite de Operación en Fiduciaria	Fiduciaria Bogotá
Negocio	121404
Fecha del Movimiento / Pago	7/02/2025
Descripción Titular	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Valor de la Operación	$ 7,285,371.00
Cuenta de Pago / Recaudadora (Origen)	003065638
Identificación Beneficiario	899999059
Nombre Beneficiario	TESORO NACIONAL AEROCIVIL
Concepto	GIRO DE RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2025
Tipo de cuenta de Destino	AHORROS
Nombre del Banco	BANCO OCCIDENTE
Número de Cuenta de Beneficiario	221800287
Estado del pago	PAGADA

Resumen de la información de las operaciones (Negocio: 121404 - Fecha inicio: 01/01/2025 - Fecha fin: 28/02/2025)

NUMERO DE SOLICITUD PORTAL	NUMERO DE SOLICITUD BPM	NUMERO DE OPERACIÓN	FECHA RADICACIÓN	TIPOLOGÍA	ESTADO	VALOR BRUTO	VALOR IVA	VALOR NETO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS	NUMERO DE DOCUMENTO	FORMA DE PAGO	BANCO	CUENTA/ ENCARGO/ OBLIGACION/ PLANILLA	VALOR INSTRUCCIÓN	CARGA IMPOSITIVA	FECHA RADICACIÓN INSTRUCCIÓN
300028	636246	672298	2025-01-24 13:35:42.684	GIRO	Radicada	$1.200.588.056,00	$0,00	$1.200.588.056,00	1	ACO SOLUCIONES DE DRENAJE SAS	900662139	TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO BOGOTA	049230493	$1.200.588.056,00	N	2025-01-24 13:35:42.684
299826	636247	672126	2025-01-24 13:37:35.817	GIRO	Radicada	$15.664.000,00	$0,00	$15.664.000,00	1	JUAN CARLOS PEREZ ROSALES	92190949	TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO BOGOTA	084119445	$15.664.000,00	N	2025-01-24 13:37:35.817
299173	634141	670973	2025-01-17 19:12:55.182	GIRO	Radicada	$282.453.600,00	$0,00	$282.453.600,00	1	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	800194297	TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO BOGOTA	000729293	$282.453.600,00	N	2025-01-17 19:12:55.182
299171	634144	670971	2025-01-17 19:18:28.03	GIRO	Radicada	$10.800.000,00	$0,00	$10.800.000,00	1	ROBERTO ANDERSON JAIMES SILVA	79471549	TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA	462400018299	$10.800.000,00	N	2025-01-17 19:18:28.03
299167	634145	670968	2025-01-17 19:19:42.556	GIRO	Radicada	$7.352.900,00	$0,00	$7.352.900,00	1	VISPI GESTIONES INTEGRALES SAS	900764953	TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCOLOMBIA	52630244129	$7.352.900,00	N	2025-01-17 19:19:42.556
299165	634142	670966	2025-01-17 19:15:26.794	GIRO	Radicada	$1.108.000.000,00	$0,00	$1.108.000.000,00	1	PAIM DE COLOMBIA SAS	900814131	TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCOLOMBIA	58200000277	$1.108.000.000,00	N	2025-01-17 19:15:26.794
299164	634148	670965	2025-01-17 19:23:24.734	GIRO	Radicada	$279.600.000,00	$0,00	$279.600.000,00	1	PAIM DE COLOMBIA SAS	900814131	TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCOLOMBIA	58200000277	$279.600.000,00	N	2025-01-17 19:23:24.734
299157	634153	670963	2025-01-17 19:29:03.003	GIRO	Radicada	$14.240.000,00	$0,00	$14.240.000,00	1	LUIS ANDRES MARTINEZ CHAPARRO	91455953	TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA	488402628454	$14.240.000,00	N	2025-01-17 19:29:03.003
299155	634150	670957	2025-01-17 19:25:32.543	GIRO	Radicada	$205.251.095,00	$0,00	$205.251.095,00	1	PAIM DE COLOMBIA SAS	900814131	TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCOLOMBIA	58200000277	$205.251.095,00	N	2025-01-17 19:25:32.543
299152		670952		GIRO	Eliminada	$282.453.600,00	$0,00	$282.453.600,00	1	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	800194297	TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO BOGOTA	000729293	$282.453.600,00	N	
299148	634152	670949	2025-01-17 19:27:54.171	GIRO	Radicada	$1.200.588.056,00	$0,00	$1.200.588.056,00	1	ACO SOLUCIONES DE DRENAJE SAS	900662139	TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO BOGOTA	049230493	$1.200.588.056,00	N	2025-01-17 19:27:54.171
299112		670916		GIRO	Eliminada	$1.200.588.056,00	$0,00	$1.200.588.056,00	1	ACO SOLUCIONES DE DRENAJE SAS	900662139	TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO BOGOTA	049230493	$1.200.588.056,00	N	
299106	634147	670902	2025-01-17 19:21:57.49	GIRO	Radicada	$59.184.000,00	$0,00	$59.184.000,00	1	AEROTYP INGENIEROS SAS	901274707	TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCOLOMBIA	16800044573	$59.184.000,00	N	2025-01-17 19:21:57.49
299097	634149	670897	2025-01-17 19:24:29.454	GIRO	Radicada	$60.340.380,00	$0,00	$60.340.380,00	1	R7 INGENIERIA SAS	901372705	TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO BOGOTA	174194449	$60.340.380,00	N	2025-01-17 19:24:29.454
299091	634151	670873	2025-01-17 19:26:40.111	GIRO	Radicada	$23.265.000,00	$0,00	$23.265.000,00	1	ENGICOL SAS	900454032	TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO OCCIDENTE	251059069	$23.265.000,00	N	2025-01-17 19:26:40.111
299065	634146	670836	2025-01-17 19:20:51.498	GIRO	Radicada	$15.664.000,00	$0,00	$15.664.000,00	1	JUAN CARLOS PEREZ ROSALES	92190949	TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO DE BOGOTA NASSAU	084065978	$15.664.000,00	N	2025-01-17 19:20:51.498
299054	634143	670829	2025-01-17 19:17:06.248	GIRO	Radicada	$31.680.000,00	$0,00	$31.680.000,00	1	HERNANDO HERNANDEZ BARRERA	91287950	TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCOLOMBIA	23790408349	$31.680.000,00	N	2025-01-17 19:17:06.248
299039		670823		GIRO	Eliminada	$23.265.000,00	$0,00	$23.265.000,00	1	ENGICOL SAS	900454032	TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO OCCIDENTE	251059069	$23.265.000,00	N	

Bogotá, 3 de marzo de 2025

CIR-AEROCIVIL-ADMON-016-2024

SEÑORES
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 DE 2023, cuyo objeto es: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

ASUNTO: ENVÍO DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL NO.4

Respetados señores:

Cordial saludo.

De manera atenta, remitimos la documentación para el trámite de pago del Acta de Recibo Parcial No.4 correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero de 2025, para su información y fines pertinentes.

DOCUMENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	
Factura ELECTRONICA SE ENVIA A SIIF NACION CUANDO ESTE APROBADA LA CUENTA	1			
Acta Resumen Parcial	1			
Liquidación Iva	1			
Acta Excel Presupuesto de Costos	3			
Certificación Cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de servicios	1			
Certificación de la factura Por interventoría en Obra	1			
Certificación de la factura Por Supervisor en Interventoría			X	
Certificación del Uso del anticipo por la interventoría en Obra	1			
Certificación del Uso del anticipo por EL Supervisor a la interventoría			X	
Certificación de los Aportes a Parafiscales x La interventoría en Obra	1			
Certificación de los Aportes a Parafiscales por el Supervisor en interventoría			X	
Nota Aclaratoria como se calculó el cobro del acta de Interventoría			X	
Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de Obra en cuentas de obra con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación DE Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales	13			

DOCUMENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	
Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de interventoría en cuentas de interventoría con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación de Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales			X	
Fotocopias de las Planillas de Pagos Parafiscales del periodo facturado	16			
Certificación Bancaria	1			
Certificación Rut Dian	20			
Certificación de la consignación de los rendimientos Financieros a la entidad Cuando hay Anticipo	2			
Oficio remisorio del Acta a Cobrar	2			
Pantallazo del SECOP Evidenciando el cargue de las cuentas en el numeral 7 Ejecución del contrato / Plan de Pagos A partir de la Segunda Cuenta	1			
Para la primera cuenta de Interventoría la Designación del Supervisor firmada			X	
Documentos de Acuerdo a lo que dice el contrato				
LAS FIRMAS EN LAS ACTAS DE ACUERDO AL ULTIMO MANUAL DE CONTRATACION				
Anexo Memorias o Informes Según el Caso al final de los documentos o PDF aparte.	X			
Para la Primera Y Ultima Cuenta (Acta de recibo Final) Anexar Contrato, Acta de Inicio, CDP, RP, Aprobación de Garantías y Documentos Contractuales que se Presenten en el Contrato			X	
Si es acta de recibo final se requiere anexar el formato 65 acta de recibo final con Aprobación de Garantías y Pólizas Actualizadas.			X	

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente,



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
YAMILL MONTENEGRO CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL S

C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO: Mónica Román


Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Ver contrato
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Sí
No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Pago 001
FE-3
Pagado
Detalle
Pago 002
FE-2
12/23/2024 12:53:00 PM
12/23/2024 12:00:00 PM
1,439,542,701.14 COP
Pagado
Detalle
Crear

MEMORIAS

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA**	**MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA** **ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4**	HOJA: 1 DE 1 VERSION 1.0

OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"

FASE/ETAPA:		CONSTRUCCIÓN	**CONTRATANTE:** AERONAUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES		**CONSTRUCTOR:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	**CONTRATO DE OBRA No.** 23001170 H4 de 2023
CAPITULO: 1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**INTERVENTOR:** CONSORCIO AIR RIO	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 23001282 H3 de 2023
ITEM: **1.1**	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO**		**UNIDAD:** M2

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA	DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIOÓN	longitud (m)	ancho (m)	espesor (m)	área (m2)	CANT ELEM	TOTAL
	Costado Norte de la Pista Acta No.2				19.250,00		19.250,00
	Costado Norte de la Pista Acta No.3				19.428,00		19.428,00
	Costado Sur de la Pista Acta No.4				55.144,00		55.144,00

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACUMULADA ACTUAL:	**93.822,00**
	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA ANTERIOR:	62.517,00
	CANTIDAD PRESENTE ACTA :	**31.305,00**

OSCAR VILLARREAL CONSORCIO AIR RIO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**DEYBER FLOREZ** CONSORCIO AIR RIO TOPÓGRAFO	**JUAN CARLOS PÉREZ ROSALES** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA RESIDENTE DE OBRA	**ARIEL DUVÁN ROBAYO LARA** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA TOPÓGRAFO

AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4	HOJA: 1 DE 1 VERSION 1.0

OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"

FASE/ETAPA:		CONSTRUCCIÓN	**CONTRATANTE:** AERONAUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES		**CONSTRUCTOR:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	**CONTRATO DE OBRA No.** 23001170 H4 de 2023
CAPITULO: 6	**ADECUACIÓN FRANJA**	**INTERVENTOR:** CONSORCIO AIR RIO	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 23001282 H3 de 2023
ITEM: 6.4	**COMPACTACIÓN Y REFINO DE FONDO DE EXCAVACIÓN**		**UNIDAD:** M2

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA	DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIOÓN	longitud (m)	ancho (m)	espesor (m)	área (m2)	CANT ELEM	TOTAL
	Costado Norte de la Pista Acta No.2	1.762,60			19.250,00		19.250,00
	Costado Norte de la Pista Acta No.3	1.762,60			19.428,00		19.428,00
	Costado Sur de la Pista Acta No.4	1.900,00			55.144,00		55.144,00

OBSERVACIONES:

CANTIDAD ACUMULADA ACTUAL:	**93.822,00**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA ANTERIOR:	62.517,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA :	**31.305,00**

OSCAR VILLARREAL CONSORCIO AIR RIO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**DEYBER FLOREZ** CONSORCIO AIR RIO TOPÓGRAFO	**JUAN CARLOS PÉREZ ROSALES** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA RESIDENTE DE OBRA	**ARIEL DUVÁN ROBAYO LARA** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA TOPÓGRAFO

AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4	HOJA: 1 DE 1 VERSION 1.0

OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"

FASE/ETAPA:		CONSTRUCCIÓN	**CONTRATANTE:** AERONAUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES		**CONSTRUCTOR:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	**CONTRATO DE OBRA No.** 23001170 H4 de 2023
CAPITULO: 6	**ADECUACIÓN FRANJA**	**INTERVENTOR:** CONSORCIO AIR RIO	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 23001282 H3 de 2023
ITEM: 6.6	**RELLENOS LOCALIZADOS CON MATERIAL IMPORTADO**		**UNIDAD:** M3

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA	DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIOÓN	longitud (m)	ancho (m)	espesor (m)	VOLUMEN (m3)	CANT ELEM	TOTAL
	Costado Norte de la Pista Acta No.2	1.762,60			3.380,00		3.380,00
	Costado Norte de la Pista Acta No.3	1.762,60			7.790,80		7.790,80
	Costado Sur de la Pista Acta No.4	1.900,00			14.035,20		14.035,20

OBSERVACIONES:

CANTIDAD ACUMULADA ACTUAL:	**25.206,00**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA ANTERIOR:	13.950,80
CANTIDAD PRESENTE ACTA :	**11.255,20**

OSCAR VILLARREAL CONSORCIO AIR RIO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**DEYBER FLOREZ** CONSORCIO AIR RIO TOPÓGRAFO	**JUAN CARLOS PÉREZ ROSALES** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA RESIDENTE DE OBRA	**ARIEL DUVAN ROBAYO LARA** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA TOPÓGRAFO

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA**	**MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA** **ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4**	HOJA: 1 DE 1 VERSION 1.0
		OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"	

FASE/ETAPA:		PRIMERA FASE	**CONTRATANTE:** AERONAUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES		**CONSTRUCTOR:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	**CONTRATO DE OBRA No.** 23001170 H4 de 2023
CAPITULO: 6	**ADECUACIÓN FRANJA**	**INTERVENTOR:** CONSORCIO AIR RIO	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 23001282 H3 de 2023
ITEM: **6.10**	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA (37 KM)**		**UNIDAD:** M3xKM

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIOÓN	longitud (m)	ancho (m)	espesor (m)	VOLUMEN (m3)	EXPANSION (%)	DISTANCIA (KM)	TOTAL
Costado Norte de la Pista Acta No.2	1.762,60			3.380,00	1,30	68,70	301.868,00
Costado Norte de la Pista Acta No.3	1.762,60			7.790,80	1,30	68,70	695.796,00
Costado Sur de la Pista Acta No.4	1.900,00			14.035,20	1,30	68,70	1.253.484,00

OBSERVACIONES:
La unidad de medida será el metro cúbico-kilómetro (m3 -km). La medida corresponderá al número de metros cúbicos, aproximado al metro cúbico completo, medido en su posición original, y multiplicado por la distancia de transporte expresada en kilómetros, con aproximación al décimo de kilómetro.
Fuente de Mterial CUESTECITAS – Corregimiento de CUESTECITAS, Jurisdicción de Municipio de Riohacha - Distancia 68,70 Km.

CANTIDAD ACUMULADA ACTUAL:	**2.251.148,00**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA ANTERIOR:	1.245.946,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA :	**1.005.202,00**

OSCAR VILLARREAL CONSORCIO AIR RIO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**DEYBER FLOREZ** CONSORCIO AIR RIO TOPÓGRAFO	**JUAN CARLOS PÉREZ ROSALES** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA RESIDENTE DE OBRA	**ARIEL DUVÁN ROBAYO LARA** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA TOPÓGRAFO

ANEXOS

CAPITULO 1

ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM 1.1


LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

CARTERA DE ÁREA DE RELLENO 55144 m²			
PUNTO	**NORTE**	**ESTE**	**DESCRIPCIÓN**
1	1766599.704	1124601.556	VERTICE
2	1766622.031	1124601.139	VERTICE
3	1766624.198	1124656.871	VERTICE
4	1766632.167	1124673.353	VERTICE
5	1766664.457	1125613.345	VERTICE
6	1766693.279	1126455.540	VERTICE
7	1766663.284	1126455.560	VERTICE
8	1766643.600	1125881.563	VERTICE

1124400.000 1124700.000 1125000.000 1125300.000 1125600.000 1125900.000 1126200.000 1126500.000

1767600.000 1767300.000 1767000.000 1766700.000 1766400.000 1766100.000 1765800.000

PLANTA ÁREA DE RELLENO FRANJA DE SEGURIDAD COSTADO SUR 55144 m²

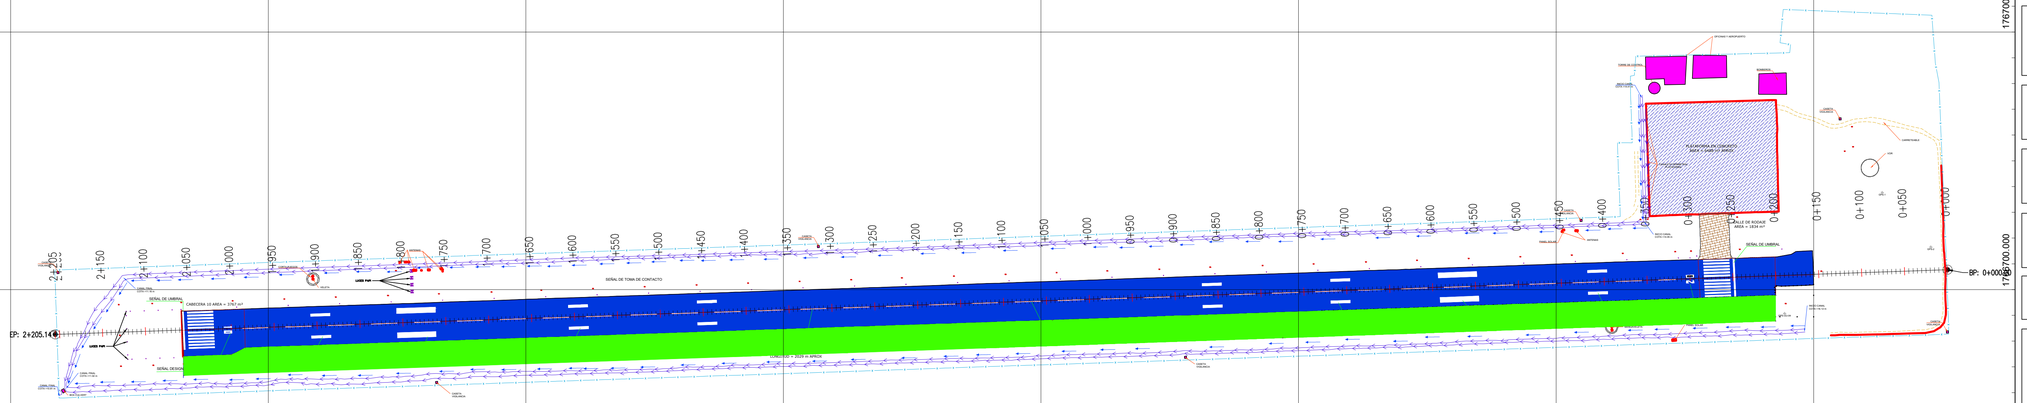
EP: 2+205.14
EP: 0+000.00
SEÑAL DE UMBRAL
CABECERA 10 ARIDA = 2162 m/f
LUCES PAR
SEÑAL DE TOMA DE CONTACTO
CONTACTO = 2028 m ARIDA
SEÑAL DESIGN
CONOS VIALES
CANAL TRIANGULAR
CANAL RECTANGULAR
CERRAMIENTO
CERCA
PARAMENTO
CANAL
SEÑALIZACIÓN VERTICAL
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
CALLE DE RODAJE
ESTACIONAMIENTO
TERMINAL
TORRE DE CONTROL
HANGARES
CASETA DE VIGILANCIA
CASETA DE BOMBAS
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
TANQUE ELEVADO
PLANTA DE TRATAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO
ESTACIÓN DE BOMBEO
ESTACIÓN METEOROLÓGICA
ESTACIÓN DE RADIO AYUDAS
ESTACIÓN DE RADIO COMUNICACIONES
ESTACIÓN DE RADIO NAVEGACIÓN
ESTACIÓN DE RADIO VIGILANCIA
ESTACIÓN DE RADIO ENLACE
ESTACIÓN DE RADIO TRANSMISIÓN
ESTACIÓN DE RADIO RECEPCIÓN
ESTACIÓN DE RADIO TRANSMISIÓN Y


ITEM 6.4

COMPACTACIÓN Y REFINO DE FONDO DE EXCAVACIÓN

CARTERA DE COMPACTACION Y REFINO DE FONDO DE EXCAVACION			
PUNTO	**NORTE**	**ESTE**	**DESCRIPCIÓN**
1	1766599.704	1124601.556	VERTICE
2	1766622.031	1124601.139	VERTICE
3	1766624.198	1124656.871	VERTICE
4	1766632.167	1124673.353	VERTICE
5	1766664.457	1125613.345	VERTICE
6	1766693.279	1126455.540	VERTICE
7	1766663.284	1126455.560	VERTICE
8	1766643.600	1125881.563	VERTICE

AREAS Y VOLUMENES RELLENO FRANJA SUR
FEBRERO 2025

ÁREAS Y VOLUMENES DE RELLENO		
	ÁREA(m²)	VOLUMEN (m³)
RELLENO SUR	55144	14035,19

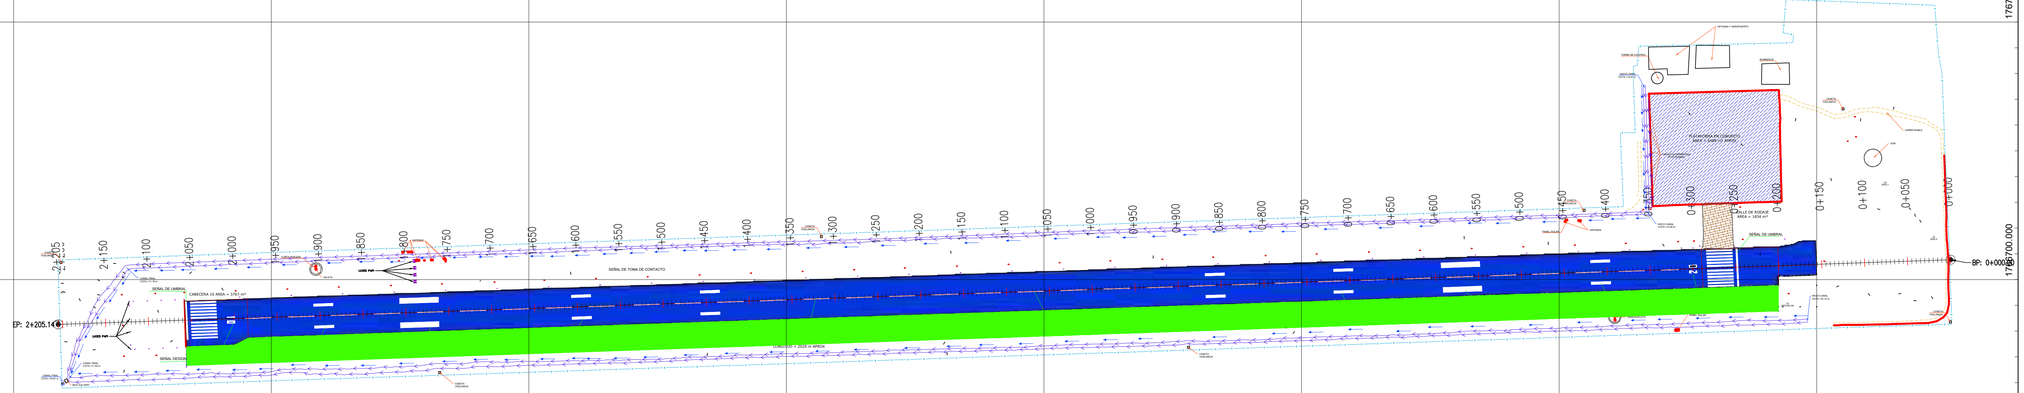

1:2500 — 0 50 100 150 200 250 m. — METROS

CUADRO DE COORDENADAS VERTICES AMARRE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA
GPS1	1766813.095	1126579.773	16.019
GPS2	11766749.588	1126636.418	18.202

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
CLAVE: MAUT-5.0-12-077 VERSIÓN: 01 FECHA: 23/01/2024

UBICACIÓN PROYECTO:
AEROPUERTO "ALMIRANTE PADILLA"- SIGLA OACI SKRH - ARP"
MUNICIPIO RIOHACHA DEPARTAMENTO LA GUAJIRA

PROYECTO:
Realizar el mejoramiento de las plataformas de viraje,franjas de seguridad, sistema de drenaje; y mejoramiento y construcción de calles de rodaje del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF)-

CONTIENE:
PLANO GENERAL PISTA Y AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA

N° CONTRATO: 23001170 - H4 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
DIRECTOR DEL PROYECTO: VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR
N° MATRICULA PROFESIONAL 25202-33553 CND
INGENIERIA CIVIL

N° CONTRATO INTERVENTORIA: 23001282- H3 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO AIR RIO
DIRECTOR DEL PROYECTO: SANTIAGO PAEZ TALERO
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. SANTIAGO PAEZ TALERO
N° MATRICULA PROFESIONAL 25203-40972 CND
INGENIERO CIVIL

SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANDRES ARBOLEDA SALAZAR
REVISÓ SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
REVISÓ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA CENTRO SUR NOROCCIDENTE; NORTE ORIENTE; OCCIDENTE - ORIENTE
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. CESAR AUGUSTO DELGADO CARRILLO
REVISÓ COORDINADOR DE GRUPO INFRAESTRUCTURA
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ALDEMAR PINZÓN
REVISÓ. ING.SUPERVISOR CONTRATO AERONAUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANGELA INES PAEZ PIÑEROS
REVISÓ DIRECTOR DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. JAIME CORTES GUERRERO
REVISÓ COORDINADOR GRUPO GESTIÓN DE AERODRÓMOS - DOA

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. OSCAR ALBERTO NIETO ALVARADO
DIRECTOR DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

INSPECTORES- DIRECCIÓN DE AUTORIDAD SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO EDGAR AUGUSTO URRUTIA FERNANDEZ
ESPECIALIDAD EN INFRAESTRUCTURA - DAGA
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO
ESPECIALIDAD EN OPERACIONES- DAGA

N° PLANO: 1 DE 47 ESCALA: 1:3000
CÓDIGO REFERENCIA: 2024-10-20-01-PG_SKRH-ARP-001

NOTA TÉCNICA:

DATUM	MAGNA-SIRGAS
ELIPSOIDE	WGS 84 - GRS 80
SISTEMA DE COORDENADAS	PLANAS GAUSS KRÜGER
ORIGEN DE COORDENADA	ORIGEN-BOGOTA
ONDULACIÓN GEOIDAL	NIL

DECLINACIÓN MAGNETICA: ARP/API 8°35' W VARIACIÓN MAGNETICA AÑO:00°10' W/ 2024

DATOS DEL PROYECTO:

RWY	DIMENSIONES (m)	CAT DE APROX.	AERONAVE DE DISEÑO	RESISTENCIA	CLAVE DE REFERENCIA AERODROMO
10 / 28	PISTA: 1900.00 X 45.00	6	A320	ASFALTO PCN 96/F/B/X/T	D
	FRANJA: 2120.00 X 150.00	6			

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (m/ft)
10	11°31'33.30" N	72°56'07.38"O	12.1/40
ARP			
28	11°31'35.10" N	72°55'04.75"O	15.2/50



DEPTO. LA GUAJIRA


DEPTO. DE LA GUAJIRA

CONVENCIONES :

CONVENCIONES GENERALES

xx CERRAMIENTO	POSTE ENERGÍA
CERCA	GPS-X VÉRTICE GPS
PARAMENTO	CAJA DE ENERGÍA
CANAL	LUCES GUÍA
PISTA EN ASFALTO	CALLE DE RODAJE
PISO EN CONCRETO	CONSTRUCCIÓN

NOTAS TECNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO
19 / 10 / 2024	**Memoria técnica de georreferenciación** - Ing.Duván Robayo	**# 1 Anexo**

NOMBRE ARCHIVO: 1.TOPOGRAFIA_AEROPUERTO_RIOHACHA.dwg (Autocad versión 2013)

ITEM 6.6

RELLENOS LOCALIZADOS CON MATERIAL IMPORTADO

CARTERAS FRANJA DE SEGURIDAD NORTE

CARTERA RELLENO ZONA SUR 30 metros				
PUNTO	**NORTE**	**ESTE**	**COTA**	**DESCRIPCIÓN**
1	1766612,033	1124601,326	13,0489	RELLENO_SUR
2	1766602,035	1124601,512	12,7976	RELLENO_SUR
3	1766599,967	1124609,22	12,7618	RELLENO_SUR
4	1766600,31	1124619,214	12,7822	RELLENO_SUR
5	1766600,652	1124629,208	12,8031	RELLENO_SUR
6	1766600,995	1124639,202	12,824	RELLENO_SUR
7	1766601,338	1124649,197	12,8449	RELLENO_SUR
8	1766601,68	1124659,191	12,8654	RELLENO_SUR
9	1766602,023	1124669,185	12,8863	RELLENO_SUR
10	1766602,366	1124679,179	12,9072	RELLENO_SUR
11	1766602,709	1124689,173	12,9281	RELLENO_SUR
12	1766603,051	1124699,167	12,9486	RELLENO_SUR
13	1766603,394	1124709,161	12,9695	RELLENO_SUR
14	1766603,737	1124719,155	12,9904	RELLENO_SUR
15	1766604,08	1124729,15	13,0108	RELLENO_SUR
16	1766604,422	1124739,144	13,0317	RELLENO_SUR
17	1766604,765	1124749,138	13,0528	RELLENO_SUR
18	1766605,108	1124759,132	13,0737	RELLENO_SUR
19	1766605,451	1124769,126	13,0943	RELLENO_SUR
20	1766605,793	1124779,12	13,1148	RELLENO_SUR
21	1766606,136	1124789,114	13,1361	RELLENO_SUR
22	1766606,479	1124799,108	13,1569	RELLENO_SUR
23	1766606,821	1124809,103	13,1776	RELLENO_SUR
24	1766607,164	1124819,097	13,1981	RELLENO_SUR
25	1766607,507	1124829,091	13,2189	RELLENO_SUR
26	1766607,85	1124839,085	13,2401	RELLENO_SUR
27	1766608,192	1124849,079	13,2609	RELLENO_SUR
28	1766608,535	1124859,073	13,2813	RELLENO_SUR
29	1766608,878	1124869,067	13,3005	RELLENO_SUR
30	1766609,221	1124879,061	13,3164	RELLENO_SUR
31	1766609,563	1124889,056	13,3297	RELLENO_SUR
32	1766609,906	1124899,05	13,3422	RELLENO_SUR
33	1766610,249	1124909,044	13,355	RELLENO_SUR
34	1766610,592	1124919,038	13,3673	RELLENO_SUR
35	1766610,934	1124929,032	13,3804	RELLENO_SUR
36	1766611,277	1124939,026	13,3925	RELLENO_SUR
37	1766611,62	1124949,02	13,4056	RELLENO_SUR
38	1766611,962	1124959,014	13,4178	RELLENO_SUR
39	1766612,305	1124969,009	13,4304	RELLENO_SUR
40	1766612,648	1124979,003	13,443	RELLENO_SUR
41	1766612,991	1124988,997	13,4557	RELLENO_SUR

42	1766613,333	1124998,991	13,4683	RELLENO_SUR
43	1766613,676	1125008,985	13,4809	RELLENO_SUR
44	1766614,019	1125018,979	13,493	RELLENO_SUR
45	1766614,362	1125028,973	13,5061	RELLENO_SUR
46	1766614,704	1125038,967	13,5183	RELLENO_SUR
47	1766615,047	1125048,962	13,5314	RELLENO_SUR
48	1766615,39	1125058,956	13,5435	RELLENO_SUR
49	1766615,733	1125068,95	13,5561	RELLENO_SUR
50	1766616,075	1125078,944	13,5691	RELLENO_SUR
51	1766616,418	1125088,938	13,5814	RELLENO_SUR
52	1766616,761	1125098,932	13,5944	RELLENO_SUR
53	1766617,103	1125108,926	13,608	RELLENO_SUR
54	1766617,446	1125118,92	13,6248	RELLENO_SUR
55	1766617,789	1125128,915	13,643	RELLENO_SUR
56	1766618,132	1125138,909	13,6602	RELLENO_SUR
57	1766618,474	1125148,903	13,6782	RELLENO_SUR
58	1766618,817	1125158,897	13,6963	RELLENO_SUR
59	1766619,16	1125168,891	13,7145	RELLENO_SUR
60	1766619,503	1125178,885	13,7326	RELLENO_SUR
61	1766619,845	1125188,879	13,7508	RELLENO_SUR
62	1766620,188	1125198,873	13,7684	RELLENO_SUR
63	1766620,531	1125208,868	13,7865	RELLENO_SUR
64	1766620,873	1125218,862	13,8047	RELLENO_SUR
65	1766621,216	1125228,856	13,8228	RELLENO_SUR
66	1766621,559	1125238,85	13,841	RELLENO_SUR
67	1766621,902	1125248,844	13,8586	RELLENO_SUR
68	1766622,244	1125258,838	13,8768	RELLENO_SUR
69	1766622,587	1125268,832	13,8949	RELLENO_SUR
70	1766622,93	1125278,826	13,9131	RELLENO_SUR
71	1766623,273	1125288,821	13,9312	RELLENO_SUR
72	1766623,615	1125298,815	13,9488	RELLENO_SUR
73	1766623,958	1125308,809	13,9666	RELLENO_SUR
74	1766624,301	1125318,803	13,9833	RELLENO_SUR
75	1766624,644	1125328,797	13,9962	RELLENO_SUR
76	1766624,986	1125338,791	14,0084	RELLENO_SUR
77	1766625,329	1125348,785	14,0205	RELLENO_SUR
78	1766625,672	1125358,779	14,0326	RELLENO_SUR
79	1766626,014	1125368,774	14,0452	RELLENO_SUR
80	1766626,357	1125378,768	14,0577	RELLENO_SUR
81	1766626,7	1125388,762	14,0697	RELLENO_SUR
82	1766627,043	1125398,756	14,0818	RELLENO_SUR
83	1766627,385	1125408,75	14,0938	RELLENO_SUR
84	1766627,728	1125418,744	14,1059	RELLENO_SUR
85	1766628,071	1125428,738	14,1179	RELLENO_SUR

86	1766628,414	1125438,732	14,1303	RELLENO_SUR
87	1766628,756	1125448,727	14,1425	RELLENO_SUR
88	1766629,099	1125458,721	14,1545	RELLENO_SUR
89	1766629,442	1125468,715	14,1671	RELLENO_SUR
90	1766629,785	1125478,709	14,1791	RELLENO_SUR
91	1766630,127	1125488,703	14,1912	RELLENO_SUR
92	1766630,47	1125498,697	14,2032	RELLENO_SUR
93	1766630,813	1125508,691	14,2158	RELLENO_SUR
94	1766631,155	1125518,685	14,2278	RELLENO_SUR
95	1766631,498	1125528,68	14,2398	RELLENO_SUR
96	1766631,841	1125538,674	14,2519	RELLENO_SUR
97	1766632,184	1125548,668	14,2639	RELLENO_SUR
98	1766632,526	1125558,662	14,276	RELLENO_SUR
99	1766632,869	1125568,656	14,2889	RELLENO_SUR
100	1766633,212	1125578,65	14,301	RELLENO_SUR
101	1766633,555	1125588,644	14,3131	RELLENO_SUR
102	1766633,897	1125598,638	14,3251	RELLENO_SUR
103	1766634,24	1125608,633	14,3372	RELLENO_SUR
104	1766634,583	1125618,627	14,3493	RELLENO_SUR
105	1766634,926	1125628,621	14,3614	RELLENO_SUR
106	1766635,268	1125638,615	14,3735	RELLENO_SUR
107	1766635,611	1125648,609	14,3856	RELLENO_SUR
108	1766635,954	1125658,603	14,3981	RELLENO_SUR
109	1766636,296	1125668,597	14,4103	RELLENO_SUR
110	1766636,639	1125678,591	14,4224	RELLENO_SUR
111	1766636,982	1125688,586	14,4345	RELLENO_SUR
112	1766637,325	1125698,58	14,4466	RELLENO_SUR
113	1766637,667	1125708,574	14,4587	RELLENO_SUR
114	1766638,01	1125718,568	14,4708	RELLENO_SUR
115	1766638,353	1125728,562	14,483	RELLENO_SUR
116	1766638,696	1125738,556	14,495	RELLENO_SUR
117	1766639,038	1125748,55	14,5077	RELLENO_SUR
118	1766639,381	1125758,544	14,5201	RELLENO_SUR
119	1766639,724	1125768,539	14,5324	RELLENO_SUR
120	1766640,066	1125778,533	14,5445	RELLENO_SUR
121	1766640,409	1125788,527	14,5566	RELLENO_SUR
122	1766640,752	1125798,521	14,5687	RELLENO_SUR
123	1766641,095	1125808,515	14,5808	RELLENO_SUR
124	1766641,437	1125818,509	14,5929	RELLENO_SUR
125	1766641,78	1125828,503	14,6062	RELLENO_SUR
126	1766642,123	1125838,497	14,6221	RELLENO_SUR
127	1766642,466	1125848,492	14,6415	RELLENO_SUR
128	1766642,808	1125858,486	14,6615	RELLENO_SUR
129	1766643,151	1125868,48	14,6815	RELLENO_SUR

130	1766643,494	1125878,474	14,7016	RELLENO_SUR
131	1766643,837	1125888,468	14,7216	RELLENO_SUR
132	1766644,179	1125898,462	14,7407	RELLENO_SUR
133	1766644,522	1125908,456	14,7607	RELLENO_SUR
134	1766644,865	1125918,45	14,7808	RELLENO_SUR
135	1766645,207	1125928,445	14,8008	RELLENO_SUR
136	1766645,55	1125938,439	14,8209	RELLENO_SUR
137	1766645,893	1125948,433	14,8409	RELLENO_SUR
138	1766646,236	1125958,427	14,8609	RELLENO_SUR
139	1766646,578	1125968,421	14,8805	RELLENO_SUR
140	1766646,921	1125978,415	14,9005	RELLENO_SUR
141	1766647,264	1125988,409	14,9206	RELLENO_SUR
142	1766647,607	1125998,403	14,9403	RELLENO_SUR
143	1766647,949	1126008,398	14,9602	RELLENO_SUR
144	1766648,292	1126018,392	14,9802	RELLENO_SUR
145	1766648,635	1126028,386	15,0003	RELLENO_SUR
146	1766648,978	1126038,38	15,0198	RELLENO_SUR
147	1766649,32	1126048,374	15,0398	RELLENO_SUR
148	1766649,663	1126058,368	15,0598	RELLENO_SUR
149	1766650,006	1126068,362	15,0798	RELLENO_SUR
150	1766650,348	1126078,356	15,0998	RELLENO_SUR
151	1766650,691	1126088,351	15,1202	RELLENO_SUR
152	1766651,034	1126098,345	15,1439	RELLENO_SUR
153	1766651,377	1126108,339	15,1708	RELLENO_SUR
154	1766651,719	1126118,333	15,2005	RELLENO_SUR
155	1766652,062	1126128,327	15,2326	RELLENO_SUR
156	1766652,405	1126138,321	15,2654	RELLENO_SUR
157	1766652,748	1126148,315	15,2976	RELLENO_SUR
158	1766653,09	1126158,309	15,3296	RELLENO_SUR
159	1766653,433	1126168,304	15,3616	RELLENO_SUR
160	1766653,776	1126178,298	15,3941	RELLENO_SUR
161	1766654,119	1126188,292	15,4266	RELLENO_SUR
162	1766654,461	1126198,286	15,4587	RELLENO_SUR
163	1766654,804	1126208,28	15,4907	RELLENO_SUR
164	1766655,147	1126218,274	15,52	RELLENO_SUR
165	1766655,489	1126228,268	15,5458	RELLENO_SUR
166	1766655,832	1126238,262	15,5681	RELLENO_SUR
167	1766656,175	1126248,257	15,5877	RELLENO_SUR
168	1766656,518	1126258,251	15,6035	RELLENO_SUR
169	1766656,86	1126268,245	15,6181	RELLENO_SUR
170	1766657,203	1126278,239	15,6324	RELLENO_SUR
171	1766657,546	1126288,233	15,6466	RELLENO_SUR
172	1766657,889	1126298,227	15,6611	RELLENO_SUR
173	1766658,231	1126308,221	15,6755	RELLENO_SUR

174	1766658,574	1126318,215	15,6896	RELLENO_SUR
175	1766658,917	1126328,21	15,7036	RELLENO_SUR
176	1766659,26	1126338,204	15,7186	RELLENO_SUR
177	1766659,602	1126348,198	15,7326	RELLENO_SUR
178	1766659,945	1126358,192	15,747	RELLENO_SUR
179	1766660,288	1126368,186	15,7611	RELLENO_SUR
180	1766660,63	1126378,18	15,7757	RELLENO_SUR
181	1766660,973	1126388,174	15,79	RELLENO_SUR
182	1766661,316	1126398,168	15,8042	RELLENO_SUR
183	1766661,659	1126408,163	15,8182	RELLENO_SUR
184	1766662,001	1126418,157	15,8332	RELLENO_SUR
185	1766662,344	1126428,151	15,8472	RELLENO_SUR
186	1766662,687	1126438,145	15,8612	RELLENO_SUR
187	1766663,03	1126448,139	15,8757	RELLENO_SUR
188	1766663,284	1126455,56	15,8865	RELLENO_SUR
189	1766610,868	1124601,347	13,0196	RELLENO_SUR
190	1766611,19	1124611,342	13,0454	RELLENO_SUR
191	1766611,513	1124621,337	13,0657	RELLENO_SUR
192	1766611,836	1124631,332	13,0862	RELLENO_SUR
193	1766612,158	1124641,326	13,1061	RELLENO_SUR
194	1766612,481	1124651,321	13,1266	RELLENO_SUR
195	1766612,804	1124661,316	13,147	RELLENO_SUR
196	1766613,126	1124671,311	13,1668	RELLENO_SUR
197	1766613,449	1124681,306	13,1873	RELLENO_SUR
198	1766613,772	1124691,3	13,2078	RELLENO_SUR
199	1766614,094	1124701,295	13,2282	RELLENO_SUR
200	1766614,417	1124711,29	13,248	RELLENO_SUR
201	1766614,74	1124721,285	13,2686	RELLENO_SUR
202	1766615,062	1124731,28	13,2889	RELLENO_SUR
203	1766615,385	1124741,274	13,3094	RELLENO_SUR
204	1766615,708	1124751,269	13,3294	RELLENO_SUR
205	1766616,031	1124761,264	13,3499	RELLENO_SUR
206	1766616,353	1124771,259	13,3703	RELLENO_SUR
207	1766616,676	1124781,254	13,39	RELLENO_SUR
208	1766616,999	1124791,248	13,4107	RELLENO_SUR
209	1766617,321	1124801,243	13,4311	RELLENO_SUR
210	1766617,644	1124811,238	13,4516	RELLENO_SUR
211	1766617,967	1124821,233	13,4713	RELLENO_SUR
212	1766618,289	1124831,228	13,4918	RELLENO_SUR
213	1766618,612	1124841,222	13,5124	RELLENO_SUR
214	1766618,935	1124851,217	13,5328	RELLENO_SUR
215	1766619,257	1124861,212	13,5525	RELLENO_SUR
216	1766619,58	1124871,207	13,5704	RELLENO_SUR
217	1766619,903	1124881,201	13,5851	RELLENO_SUR

218	1766620,225	1124891,196	13,5977	RELLENO_SUR
219	1766620,548	1124901,191	13,6094	RELLENO_SUR
220	1766620,871	1124911,186	13,6218	RELLENO_SUR
221	1766621,193	1124921,181	13,6335	RELLENO_SUR
222	1766621,516	1124931,175	13,646	RELLENO_SUR
223	1766621,839	1124941,17	13,6576	RELLENO_SUR
224	1766622,162	1124951,165	13,6702	RELLENO_SUR
225	1766622,484	1124961,16	13,6818	RELLENO_SUR
226	1766622,807	1124971,155	13,6943	RELLENO_SUR
227	1766623,13	1124981,149	13,706	RELLENO_SUR
228	1766623,452	1124991,144	13,7184	RELLENO_SUR
229	1766623,775	1125001,139	13,7302	RELLENO_SUR
230	1766624,098	1125011,134	13,7426	RELLENO_SUR
231	1766624,42	1125021,129	13,7543	RELLENO_SUR
232	1766624,743	1125031,123	13,7668	RELLENO_SUR
233	1766625,066	1125041,118	13,7784	RELLENO_SUR
234	1766625,388	1125051,113	13,7909	RELLENO_SUR
235	1766625,711	1125061,108	13,8025	RELLENO_SUR
236	1766626,034	1125071,103	13,815	RELLENO_SUR
237	1766626,356	1125081,097	13,8275	RELLENO_SUR
238	1766626,679	1125091,092	13,8391	RELLENO_SUR
239	1766627,002	1125101,087	13,8517	RELLENO_SUR
240	1766627,325	1125111,082	13,8652	RELLENO_SUR
241	1766627,647	1125121,077	13,8824	RELLENO_SUR
242	1766627,97	1125131,071	13,9	RELLENO_SUR
243	1766628,293	1125141,066	13,9166	RELLENO_SUR
244	1766628,615	1125151,061	13,9342	RELLENO_SUR
245	1766628,938	1125161,056	13,9518	RELLENO_SUR
246	1766629,261	1125171,05	13,9694	RELLENO_SUR
247	1766629,583	1125181,045	13,987	RELLENO_SUR
248	1766629,906	1125191,04	14,0045	RELLENO_SUR
249	1766630,229	1125201,035	14,022	RELLENO_SUR
250	1766630,551	1125211,03	14,0396	RELLENO_SUR
251	1766630,874	1125221,024	14,0572	RELLENO_SUR
252	1766631,197	1125231,019	14,0748	RELLENO_SUR
253	1766631,519	1125241,014	14,0924	RELLENO_SUR
254	1766631,842	1125251,009	14,1098	RELLENO_SUR
255	1766632,165	1125261,004	14,1274	RELLENO_SUR
256	1766632,488	1125270,998	14,145	RELLENO_SUR
257	1766632,81	1125280,993	14,1626	RELLENO_SUR
258	1766633,133	1125290,988	14,1802	RELLENO_SUR
259	1766633,456	1125300,983	14,1975	RELLENO_SUR
260	1766633,778	1125310,978	14,2144	RELLENO_SUR
261	1766634,101	1125320,972	14,23	RELLENO_SUR

262	1766634,424	1125330,967	14,2418	RELLENO_SUR
263	1766634,746	1125340,962	14,2534	RELLENO_SUR
264	1766635,069	1125350,957	14,265	RELLENO_SUR
265	1766635,392	1125360,952	14,2766	RELLENO_SUR
266	1766635,714	1125370,946	14,2889	RELLENO_SUR
267	1766636,037	1125380,941	14,3007	RELLENO_SUR
268	1766636,36	1125390,936	14,3122	RELLENO_SUR
269	1766636,682	1125400,931	14,3238	RELLENO_SUR
270	1766637,005	1125410,925	14,3354	RELLENO_SUR
271	1766637,328	1125420,92	14,3469	RELLENO_SUR
272	1766637,651	1125430,915	14,3585	RELLENO_SUR
273	1766637,973	1125440,91	14,3703	RELLENO_SUR
274	1766638,296	1125450,905	14,3818	RELLENO_SUR
275	1766638,619	1125460,899	14,394	RELLENO_SUR
276	1766638,941	1125470,894	14,4057	RELLENO_SUR
277	1766639,264	1125480,889	14,4172	RELLENO_SUR
278	1766639,587	1125490,884	14,4288	RELLENO_SUR
279	1766639,909	1125500,879	14,4403	RELLENO_SUR
280	1766640,232	1125510,873	14,4522	RELLENO_SUR
281	1766640,555	1125520,868	14,4637	RELLENO_SUR
282	1766640,877	1125530,863	14,4753	RELLENO_SUR
283	1766641,2	1125540,858	14,4868	RELLENO_SUR
284	1766641,523	1125550,853	14,4984	RELLENO_SUR
285	1766641,845	1125560,847	14,5105	RELLENO_SUR
286	1766642,168	1125570,842	14,5225	RELLENO_SUR
287	1766642,491	1125580,837	14,534	RELLENO_SUR
288	1766642,814	1125590,832	14,5456	RELLENO_SUR
289	1766643,136	1125600,827	14,5571	RELLENO_SUR
290	1766643,459	1125610,821	14,5687	RELLENO_SUR
291	1766643,782	1125620,816	14,5803	RELLENO_SUR
292	1766644,104	1125630,811	14,5919	RELLENO_SUR
293	1766644,427	1125640,806	14,6035	RELLENO_SUR
294	1766644,75	1125650,801	14,6151	RELLENO_SUR
295	1766645,072	1125660,795	14,6274	RELLENO_SUR
296	1766645,395	1125670,79	14,639	RELLENO_SUR
297	1766645,718	1125680,785	14,6505	RELLENO_SUR
298	1766646,04	1125690,78	14,6621	RELLENO_SUR
299	1766646,363	1125700,774	14,6737	RELLENO_SUR
300	1766646,686	1125710,769	14,6853	RELLENO_SUR
301	1766647,008	1125720,764	14,6969	RELLENO_SUR
302	1766647,331	1125730,759	14,7085	RELLENO_SUR
303	1766647,654	1125740,754	14,7201	RELLENO_SUR
304	1766647,976	1125750,748	14,7319	RELLENO_SUR
305	1766648,299	1125760,743	14,7442	RELLENO_SUR

306	1766648,622	1125770,738	14,7558	RELLENO_SUR
307	1766648,945	1125780,733	14,7674	RELLENO_SUR
308	1766649,267	1125790,728	14,779	RELLENO_SUR
309	1766649,59	1125800,722	14,7906	RELLENO_SUR
310	1766649,913	1125810,717	14,8022	RELLENO_SUR
311	1766650,235	1125820,712	14,8137	RELLENO_SUR
312	1766650,558	1125830,707	14,8272	RELLENO_SUR
313	1766650,881	1125840,702	14,8434	RELLENO_SUR
314	1766651,203	1125850,696	14,8628	RELLENO_SUR
315	1766651,526	1125860,691	14,8824	RELLENO_SUR
316	1766651,849	1125870,686	14,902	RELLENO_SUR
317	1766652,171	1125880,681	14,9215	RELLENO_SUR
318	1766652,494	1125890,676	14,9411	RELLENO_SUR
319	1766652,817	1125900,67	14,9596	RELLENO_SUR
320	1766653,139	1125910,665	14,9792	RELLENO_SUR
321	1766653,462	1125920,66	14,9987	RELLENO_SUR
322	1766653,785	1125930,655	15,0183	RELLENO_SUR
323	1766654,108	1125940,649	15,0378	RELLENO_SUR
324	1766654,43	1125950,644	15,0574	RELLENO_SUR
325	1766654,753	1125960,639	15,0769	RELLENO_SUR
326	1766655,076	1125970,634	15,0958	RELLENO_SUR
327	1766655,398	1125980,629	15,1153	RELLENO_SUR
328	1766655,721	1125990,623	15,1349	RELLENO_SUR
329	1766656,044	1126000,618	15,1542	RELLENO_SUR
330	1766656,366	1126010,613	15,1737	RELLENO_SUR
331	1766656,689	1126020,608	15,1933	RELLENO_SUR
332	1766657,012	1126030,603	15,2128	RELLENO_SUR
333	1766657,334	1126040,597	15,2316	RELLENO_SUR
334	1766657,657	1126050,592	15,2512	RELLENO_SUR
335	1766657,98	1126060,587	15,2707	RELLENO_SUR
336	1766658,302	1126070,582	15,2903	RELLENO_SUR
337	1766658,625	1126080,577	15,3098	RELLENO_SUR
338	1766658,948	1126090,571	15,3302	RELLENO_SUR
339	1766659,271	1126100,566	15,3544	RELLENO_SUR
340	1766659,593	1126110,561	15,3811	RELLENO_SUR
341	1766659,916	1126120,556	15,4114	RELLENO_SUR
342	1766660,239	1126130,551	15,4429	RELLENO_SUR
343	1766660,561	1126140,545	15,4754	RELLENO_SUR
344	1766660,884	1126150,54	15,507	RELLENO_SUR
345	1766661,207	1126160,535	15,5385	RELLENO_SUR
346	1766661,529	1126170,53	15,57	RELLENO_SUR
347	1766661,852	1126180,524	15,6019	RELLENO_SUR
348	1766662,175	1126190,519	15,6341	RELLENO_SUR
349	1766662,497	1126200,514	15,6657	RELLENO_SUR

350	1766662,82	1126210,509	15,6966	RELLENO_SUR
351	1766663,143	1126220,504	15,7244	RELLENO_SUR
352	1766663,465	1126230,498	15,7491	RELLENO_SUR
353	1766663,788	1126240,493	15,7705	RELLENO_SUR
354	1766664,111	1126250,488	15,7886	RELLENO_SUR
355	1766664,434	1126260,483	15,8033	RELLENO_SUR
356	1766664,756	1126270,478	15,817	RELLENO_SUR
357	1766665,079	1126280,472	15,8308	RELLENO_SUR
358	1766665,402	1126290,467	15,8443	RELLENO_SUR
359	1766665,724	1126300,462	15,8586	RELLENO_SUR
360	1766666,047	1126310,457	15,8724	RELLENO_SUR
361	1766666,37	1126320,452	15,8859	RELLENO_SUR
362	1766666,692	1126330,446	15,8995	RELLENO_SUR
363	1766667,015	1126340,441	15,914	RELLENO_SUR
364	1766667,338	1126350,436	15,9275	RELLENO_SUR
365	1766667,66	1126360,431	15,9414	RELLENO_SUR
366	1766667,983	1126370,426	15,9549	RELLENO_SUR
367	1766668,306	1126380,42	15,9691	RELLENO_SUR
368	1766668,628	1126390,415	15,983	RELLENO_SUR
369	1766668,951	1126400,41	15,9965	RELLENO_SUR
370	1766669,274	1126410,405	16,0103	RELLENO_SUR
371	1766669,597	1126420,4	16,0246	RELLENO_SUR
372	1766669,919	1126430,394	16,0381	RELLENO_SUR
373	1766670,242	1126440,389	16,0516	RELLENO_SUR
374	1766670,565	1126450,384	16,0655	RELLENO_SUR
375	1766670,732	1126455,56	16,0731	RELLENO_SUR
376	1766626,606	1124673,399	13,4403	RELLENO_SUR
377	1766626,935	1124683,393	13,4609	RELLENO_SUR
378	1766627,265	1124693,388	13,4814	RELLENO_SUR
379	1766627,594	1124703,382	13,5023	RELLENO_SUR
380	1766627,924	1124713,377	13,5226	RELLENO_SUR
381	1766628,253	1124723,371	13,5431	RELLENO_SUR
382	1766628,583	1124733,366	13,5639	RELLENO_SUR
383	1766628,912	1124743,361	13,5848	RELLENO_SUR
384	1766629,242	1124753,355	13,6051	RELLENO_SUR
385	1766629,571	1124763,35	13,6256	RELLENO_SUR
386	1766629,901	1124773,344	13,6464	RELLENO_SUR
387	1766630,23	1124783,339	13,6667	RELLENO_SUR
388	1766630,56	1124793,333	13,6876	RELLENO_SUR
389	1766630,889	1124803,328	13,7081	RELLENO_SUR
390	1766631,219	1124813,323	13,7289	RELLENO_SUR
391	1766631,548	1124823,317	13,7492	RELLENO_SUR
392	1766631,878	1124833,312	13,7697	RELLENO_SUR
393	1766632,208	1124843,306	13,7906	RELLENO_SUR

394	1766632,537	1124853,301	13,8114	RELLENO_SUR
395	1766632,867	1124863,295	13,8313	RELLENO_SUR
396	1766633,196	1124873,29	13,8484	RELLENO_SUR
397	1766633,526	1124883,285	13,8626	RELLENO_SUR
398	1766633,855	1124893,279	13,8755	RELLENO_SUR
399	1766634,185	1124903,274	13,8877	RELLENO_SUR
400	1766634,514	1124913,268	13,9002	RELLENO_SUR
401	1766634,844	1124923,263	13,9125	RELLENO_SUR
402	1766635,173	1124933,257	13,925	RELLENO_SUR
403	1766635,503	1124943,252	13,9372	RELLENO_SUR
404	1766635,832	1124953,246	13,9497	RELLENO_SUR
405	1766636,162	1124963,241	13,962	RELLENO_SUR
406	1766636,491	1124973,236	13,9745	RELLENO_SUR
407	1766636,821	1124983,23	13,9867	RELLENO_SUR
408	1766637,15	1124993,225	13,9992	RELLENO_SUR
409	1766637,48	1125003,219	14,0115	RELLENO_SUR
410	1766637,809	1125013,214	14,024	RELLENO_SUR
411	1766638,139	1125023,208	14,0362	RELLENO_SUR
412	1766638,468	1125033,203	14,0487	RELLENO_SUR
413	1766638,798	1125043,198	14,061	RELLENO_SUR
414	1766639,127	1125053,192	14,0735	RELLENO_SUR
415	1766639,457	1125063,187	14,0857	RELLENO_SUR
416	1766639,786	1125073,181	14,0982	RELLENO_SUR
417	1766640,116	1125083,176	14,1111	RELLENO_SUR
418	1766640,445	1125093,17	14,123	RELLENO_SUR
419	1766640,775	1125103,165	14,1362	RELLENO_SUR
420	1766641,104	1125113,16	14,1508	RELLENO_SUR
421	1766641,434	1125123,154	14,1687	RELLENO_SUR
422	1766641,763	1125133,149	14,1866	RELLENO_SUR
423	1766642,093	1125143,143	14,2034	RELLENO_SUR
424	1766642,422	1125153,138	14,2213	RELLENO_SUR
425	1766642,752	1125163,132	14,2392	RELLENO_SUR
426	1766643,082	1125173,127	14,2571	RELLENO_SUR
427	1766643,411	1125183,122	14,2749	RELLENO_SUR
428	1766643,741	1125193,116	14,2928	RELLENO_SUR
429	1766644,07	1125203,111	14,3107	RELLENO_SUR
430	1766644,4	1125213,105	14,3285	RELLENO_SUR
431	1766644,729	1125223,1	14,3464	RELLENO_SUR
432	1766645,059	1125233,094	14,3643	RELLENO_SUR
433	1766645,388	1125243,089	14,3822	RELLENO_SUR
434	1766645,718	1125253,084	14,4001	RELLENO_SUR
435	1766646,047	1125263,078	14,4179	RELLENO_SUR
436	1766646,377	1125273,073	14,4358	RELLENO_SUR
437	1766646,706	1125283,067	14,4537	RELLENO_SUR

438	1766647,036	1125293,062	14,4715	RELLENO_SUR
439	1766647,365	1125303,056	14,4894	RELLENO_SUR
440	1766647,695	1125313,051	14,5059	RELLENO_SUR
441	1766648,024	1125323,046	14,5211	RELLENO_SUR
442	1766648,354	1125333,04	14,5329	RELLENO_SUR
443	1766648,683	1125343,035	14,5448	RELLENO_SUR
444	1766649,013	1125353,029	14,5567	RELLENO_SUR
445	1766649,342	1125363,024	14,5689	RELLENO_SUR
446	1766649,672	1125373,018	14,5814	RELLENO_SUR
447	1766650,001	1125383,013	14,5933	RELLENO_SUR
448	1766650,331	1125393,008	14,6052	RELLENO_SUR
449	1766650,66	1125403,002	14,6171	RELLENO_SUR
450	1766650,99	1125412,997	14,6289	RELLENO_SUR
451	1766651,319	1125422,991	14,6408	RELLENO_SUR
452	1766651,649	1125432,986	14,6527	RELLENO_SUR
453	1766651,978	1125442,98	14,6646	RELLENO_SUR
454	1766652,308	1125452,975	14,6764	RELLENO_SUR
455	1766652,637	1125462,97	14,6893	RELLENO_SUR
456	1766652,967	1125472,964	14,7012	RELLENO_SUR
457	1766653,297	1125482,959	14,7131	RELLENO_SUR
458	1766653,626	1125492,953	14,7249	RELLENO_SUR
459	1766653,956	1125502,948	14,7368	RELLENO_SUR
460	1766654,285	1125512,942	14,7487	RELLENO_SUR
461	1766654,615	1125522,937	14,7606	RELLENO_SUR
462	1766654,944	1125532,932	14,7724	RELLENO_SUR
463	1766655,274	1125542,926	14,7843	RELLENO_SUR
464	1766655,603	1125552,921	14,7962	RELLENO_SUR
465	1766655,933	1125562,915	14,8091	RELLENO_SUR
466	1766656,262	1125572,91	14,8209	RELLENO_SUR
467	1766656,592	1125582,904	14,8328	RELLENO_SUR
468	1766656,921	1125592,899	14,8447	RELLENO_SUR
469	1766657,251	1125602,894	14,8566	RELLENO_SUR
470	1766657,58	1125612,888	14,8684	RELLENO_SUR
471	1766657,91	1125622,883	14,8803	RELLENO_SUR
472	1766658,239	1125632,877	14,8922	RELLENO_SUR
473	1766658,569	1125642,872	14,9041	RELLENO_SUR
474	1766681,891	1126450,714	16,349	RELLENO_SUR
475	1766681,721	1126445,717	16,342	RELLENO_SUR
476	1766681,551	1126440,72	16,335	RELLENO_SUR
477	1766681,381	1126435,722	16,328	RELLENO_SUR
478	1766681,211	1126430,725	16,321	RELLENO_SUR
479	1766681,041	1126425,728	16,314	RELLENO_SUR
480	1766680,871	1126420,731	16,307	RELLENO_SUR
481	1766680,701	1126415,734	16,3	RELLENO_SUR

482	1766680,531	1126410,737	16,292	RELLENO_SUR
483	1766680,463	1126408,738	16,29	RELLENO_SUR
484	1766680,361	1126405,74	16,285	RELLENO_SUR
485	1766680,191	1126400,743	16,278	RELLENO_SUR
486	1766680,021	1126395,746	16,271	RELLENO_SUR
487	1766679,851	1126390,748	16,264	RELLENO_SUR
488	1766679,681	1126385,751	16,257	RELLENO_SUR
489	1766679,511	1126380,754	16,25	RELLENO_SUR
490	1766679,341	1126375,757	16,243	RELLENO_SUR
491	1766679,171	1126370,76	16,235	RELLENO_SUR
492	1766679,001	1126365,763	16,228	RELLENO_SUR
493	1766678,831	1126360,766	16,221	RELLENO_SUR
494	1766678,661	1126355,769	16,214	RELLENO_SUR
495	1766678,491	1126350,772	16,207	RELLENO_SUR
496	1766678,321	1126345,775	16,2	RELLENO_SUR
497	1766678,151	1126340,777	16,193	RELLENO_SUR
498	1766677,981	1126335,78	16,186	RELLENO_SUR
499	1766677,811	1126330,783	16,178	RELLENO_SUR
500	1766677,641	1126325,786	16,171	RELLENO_SUR
501	1766677,471	1126320,789	16,164	RELLENO_SUR
502	1766677,301	1126315,792	16,157	RELLENO_SUR
503	1766677,131	1126310,795	16,15	RELLENO_SUR
504	1766676,961	1126305,798	16,143	RELLENO_SUR
505	1766676,791	1126300,801	16,136	RELLENO_SUR
506	1766676,621	1126295,803	16,129	RELLENO_SUR
507	1766676,451	1126290,806	16,121	RELLENO_SUR
508	1766676,281	1126285,809	16,114	RELLENO_SUR
509	1766676,111	1126280,812	16,107	RELLENO_SUR
510	1766675,941	1126275,815	16,1	RELLENO_SUR
511	1766675,771	1126270,818	16,093	RELLENO_SUR
512	1766675,601	1126265,821	16,086	RELLENO_SUR
513	1766675,431	1126260,824	16,079	RELLENO_SUR
514	1766675,261	1126255,827	16,071	RELLENO_SUR
515	1766675,091	1126250,829	16,064	RELLENO_SUR
516	1766674,921	1126245,832	16,055	RELLENO_SUR
517	1766674,751	1126240,835	16,046	RELLENO_SUR
518	1766674,581	1126235,838	16,035	RELLENO_SUR
519	1766674,411	1126230,841	16,024	RELLENO_SUR
520	1766674,242	1126225,844	16,012	RELLENO_SUR
521	1766674,072	1126220,847	15,999	RELLENO_SUR
522	1766673,902	1126215,85	15,986	RELLENO_SUR
523	1766673,732	1126210,853	15,971	RELLENO_SUR
524	1766673,562	1126205,855	15,956	RELLENO_SUR
525	1766673,392	1126200,858	15,94	RELLENO_SUR

526	1766673,222	1126195,861	15,924	RELLENO_SUR
527	1766673,052	1126190,864	15,908	RELLENO_SUR
528	1766672,882	1126185,867	15,892	RELLENO_SUR
529	1766672,712	1126180,87	15,875	RELLENO_SUR
530	1766672,542	1126175,873	15,859	RELLENO_SUR
531	1766672,372	1126170,876	15,843	RELLENO_SUR
532	1766672,202	1126165,879	15,827	RELLENO_SUR
533	1766672,032	1126160,881	15,811	RELLENO_SUR
534	1766671,862	1126155,884	15,795	RELLENO_SUR
535	1766671,692	1126150,887	15,779	RELLENO_SUR
536	1766671,522	1126145,89	15,763	RELLENO_SUR
537	1766671,352	1126140,893	15,747	RELLENO_SUR
538	1766671,182	1126135,896	15,731	RELLENO_SUR
539	1766671,012	1126130,899	15,714	RELLENO_SUR
540	1766670,842	1126125,902	15,698	RELLENO_SUR
541	1766670,672	1126120,905	15,682	RELLENO_SUR
542	1766670,502	1126115,907	15,666	RELLENO_SUR
543	1766670,332	1126110,91	15,651	RELLENO_SUR
544	1766670,162	1126105,913	15,637	RELLENO_SUR
545	1766669,992	1126100,916	15,624	RELLENO_SUR
546	1766669,822	1126095,919	15,611	RELLENO_SUR
547	1766669,652	1126090,922	15,599	RELLENO_SUR
548	1766669,482	1126085,925	15,588	RELLENO_SUR
549	1766669,312	1126080,928	15,578	RELLENO_SUR
550	1766669,142	1126075,931	15,568	RELLENO_SUR
551	1766668,972	1126070,933	15,558	RELLENO_SUR
552	1766668,802	1126065,936	15,548	RELLENO_SUR
553	1766668,632	1126060,939	15,538	RELLENO_SUR
554	1766668,462	1126055,942	15,528	RELLENO_SUR
555	1766668,292	1126050,945	15,518	RELLENO_SUR
556	1766668,122	1126045,948	15,508	RELLENO_SUR
557	1766667,952	1126040,951	15,498	RELLENO_SUR
558	1766667,782	1126035,954	15,488	RELLENO_SUR
559	1766667,612	1126030,957	15,479	RELLENO_SUR
560	1766667,442	1126025,959	15,469	RELLENO_SUR
561	1766667,272	1126020,962	15,459	RELLENO_SUR
562	1766667,102	1126015,965	15,449	RELLENO_SUR
563	1766666,932	1126010,968	15,439	RELLENO_SUR
564	1766666,762	1126005,971	15,429	RELLENO_SUR
565	1766666,592	1126000,974	15,419	RELLENO_SUR
566	1766666,422	1125995,977	15,409	RELLENO_SUR
567	1766666,252	1125990,98	15,399	RELLENO_SUR
568	1766666,082	1125985,983	15,389	RELLENO_SUR
569	1766665,912	1125980,985	15,379	RELLENO_SUR

570	1766665,742	1125975,988	15,369	RELLENO_SUR
571	1766665,573	1125970,991	15,359	RELLENO_SUR
572	1766665,403	1125965,994	15,349	RELLENO_SUR
573	1766665,233	1125960,997	15,34	RELLENO_SUR
574	1766665,063	1125956	15,33	RELLENO_SUR
575	1766664,893	1125951,003	15,32	RELLENO_SUR
576	1766664,723	1125946,006	15,31	RELLENO_SUR
577	1766664,553	1125941,009	15,3	RELLENO_SUR
578	1766664,383	1125936,012	15,29	RELLENO_SUR
579	1766664,213	1125931,014	15,28	RELLENO_SUR
580	1766664,043	1125926,017	15,27	RELLENO_SUR
581	1766663,873	1125921,02	15,26	RELLENO_SUR
582	1766663,703	1125916,023	15,25	RELLENO_SUR
583	1766663,533	1125911,026	15,24	RELLENO_SUR
584	1766663,363	1125906,029	15,23	RELLENO_SUR
585	1766663,193	1125901,032	15,22	RELLENO_SUR
586	1766663,023	1125896,035	15,21	RELLENO_SUR
587	1766662,853	1125891,038	15,201	RELLENO_SUR
588	1766662,683	1125886,04	15,191	RELLENO_SUR
589	1766662,513	1125881,043	15,181	RELLENO_SUR
590	1766662,343	1125876,046	15,171	RELLENO_SUR
591	1766662,173	1125871,049	15,161	RELLENO_SUR
592	1766662,003	1125866,052	15,151	RELLENO_SUR
593	1766661,833	1125861,055	15,141	RELLENO_SUR
594	1766661,663	1125856,058	15,131	RELLENO_SUR
595	1766661,493	1125851,061	15,121	RELLENO_SUR
596	1766661,323	1125846,064	15,111	RELLENO_SUR
597	1766661,153	1125841,066	15,101	RELLENO_SUR
598	1766660,983	1125836,069	15,092	RELLENO_SUR
599	1766660,813	1125831,072	15,084	RELLENO_SUR
600	1766660,643	1125826,075	15,077	RELLENO_SUR
601	1766660,473	1125821,078	15,07	RELLENO_SUR
602	1766660,303	1125816,081	15,064	RELLENO_SUR
603	1766660,133	1125811,084	15,058	RELLENO_SUR
604	1766659,963	1125806,087	15,052	RELLENO_SUR
605	1766659,793	1125801,09	15,046	RELLENO_SUR
606	1766659,623	1125796,092	15,04	RELLENO_SUR
607	1766659,453	1125791,095	15,034	RELLENO_SUR
608	1766659,283	1125786,098	15,028	RELLENO_SUR
609	1766659,113	1125781,101	15,022	RELLENO_SUR
610	1766658,943	1125776,104	15,016	RELLENO_SUR
611	1766658,773	1125771,107	15,01	RELLENO_SUR
612	1766658,603	1125766,11	15,004	RELLENO_SUR
613	1766658,433	1125761,113	14,998	RELLENO_SUR

614	1766658,263	1125756,116	14,991	RELLENO_SUR
615	1766658,093	1125751,118	14,985	RELLENO_SUR
616	1766657,923	1125746,121	14,979	RELLENO_SUR
617	1766657,753	1125741,124	14,973	RELLENO_SUR
618	1766657,583	1125736,127	14,967	RELLENO_SUR
619	1766657,413	1125731,13	14,961	RELLENO_SUR
620	1766657,243	1125726,133	14,955	RELLENO_SUR
621	1766657,074	1125721,136	14,949	RELLENO_SUR
622	1766656,904	1125716,139	14,943	RELLENO_SUR
623	1766656,734	1125711,142	14,937	RELLENO_SUR
624	1766656,564	1125706,144	14,931	RELLENO_SUR
625	1766656,394	1125701,147	14,925	RELLENO_SUR
626	1766656,224	1125696,15	14,919	RELLENO_SUR
627	1766656,054	1125691,153	14,913	RELLENO_SUR
628	1766655,884	1125686,156	14,907	RELLENO_SUR
629	1766655,714	1125681,159	14,901	RELLENO_SUR
630	1766655,544	1125676,162	14,895	RELLENO_SUR
631	1766655,374	1125671,165	14,889	RELLENO_SUR
632	1766655,204	1125666,168	14,883	RELLENO_SUR
633	1766655,034	1125661,17	14,877	RELLENO_SUR
634	1766654,864	1125656,173	14,87	RELLENO_SUR
635	1766654,694	1125651,176	14,864	RELLENO_SUR
636	1766654,524	1125646,179	14,858	RELLENO_SUR
637	1766654,354	1125641,182	14,852	RELLENO_SUR
638	1766654,184	1125636,185	14,846	RELLENO_SUR
639	1766654,014	1125631,188	14,84	RELLENO_SUR
640	1766653,844	1125626,191	14,834	RELLENO_SUR
641	1766653,674	1125621,194	14,828	RELLENO_SUR
642	1766653,504	1125616,196	14,822	RELLENO_SUR
643	1766653,334	1125611,199	14,816	RELLENO_SUR
644	1766653,164	1125606,202	14,81	RELLENO_SUR
645	1766652,994	1125601,205	14,804	RELLENO_SUR
646	1766652,824	1125596,208	14,798	RELLENO_SUR
647	1766652,654	1125591,211	14,792	RELLENO_SUR
648	1766652,484	1125586,214	14,786	RELLENO_SUR
649	1766652,314	1125581,217	14,78	RELLENO_SUR
650	1766652,144	1125576,22	14,774	RELLENO_SUR
651	1766651,974	1125571,222	14,768	RELLENO_SUR
652	1766651,804	1125566,225	14,762	RELLENO_SUR
653	1766651,634	1125561,228	14,756	RELLENO_SUR
654	1766651,464	1125556,231	14,749	RELLENO_SUR
655	1766651,294	1125551,234	14,743	RELLENO_SUR
656	1766651,124	1125546,237	14,737	RELLENO_SUR
657	1766650,954	1125541,24	14,731	RELLENO_SUR

658	1766650,784	1125536,243	14,725	RELLENO_SUR
659	1766650,614	1125531,246	14,719	RELLENO_SUR
660	1766650,444	1125526,248	14,713	RELLENO_SUR
661	1766650,274	1125521,251	14,707	RELLENO_SUR
662	1766650,104	1125516,254	14,701	RELLENO_SUR
663	1766649,934	1125511,257	14,695	RELLENO_SUR
664	1766649,764	1125506,26	14,689	RELLENO_SUR
665	1766649,594	1125501,263	14,683	RELLENO_SUR
666	1766649,424	1125496,266	14,677	RELLENO_SUR
667	1766649,254	1125491,269	14,671	RELLENO_SUR
668	1766649,084	1125486,272	14,665	RELLENO_SUR
669	1766648,914	1125481,275	14,659	RELLENO_SUR
670	1766648,744	1125476,277	14,653	RELLENO_SUR
671	1766648,574	1125471,28	14,647	RELLENO_SUR
672	1766648,405	1125466,283	14,641	RELLENO_SUR
673	1766648,235	1125461,286	14,635	RELLENO_SUR
674	1766648,065	1125456,289	14,628	RELLENO_SUR
675	1766647,895	1125451,292	14,622	RELLENO_SUR
676	1766647,725	1125446,295	14,616	RELLENO_SUR
677	1766647,555	1125441,298	14,61	RELLENO_SUR
678	1766647,385	1125436,301	14,604	RELLENO_SUR
679	1766647,215	1125431,303	14,598	RELLENO_SUR
680	1766647,045	1125426,306	14,592	RELLENO_SUR
681	1766646,875	1125421,309	14,586	RELLENO_SUR
682	1766646,705	1125416,312	14,58	RELLENO_SUR
683	1766646,535	1125411,315	14,574	RELLENO_SUR
684	1766646,365	1125406,318	14,568	RELLENO_SUR
685	1766646,195	1125401,321	14,562	RELLENO_SUR
686	1766646,025	1125396,324	14,556	RELLENO_SUR
687	1766645,855	1125391,327	14,55	RELLENO_SUR
688	1766645,685	1125386,329	14,544	RELLENO_SUR
689	1766645,515	1125381,332	14,538	RELLENO_SUR
690	1766645,345	1125376,335	14,532	RELLENO_SUR
691	1766645,175	1125371,338	14,526	RELLENO_SUR
692	1766645,005	1125366,341	14,52	RELLENO_SUR
693	1766644,835	1125361,344	14,513	RELLENO_SUR
694	1766644,665	1125356,347	14,507	RELLENO_SUR
695	1766644,495	1125351,35	14,501	RELLENO_SUR
696	1766644,325	1125346,353	14,495	RELLENO_SUR
697	1766644,155	1125341,355	14,489	RELLENO_SUR
698	1766643,985	1125336,358	14,483	RELLENO_SUR
699	1766643,815	1125331,361	14,477	RELLENO_SUR
700	1766643,645	1125326,364	14,471	RELLENO_SUR
701	1766643,475	1125321,367	14,465	RELLENO_SUR

702	1766643,305	1125316,37	14,457	RELLENO_SUR
703	1766643,135	1125311,373	14,449	RELLENO_SUR
704	1766642,965	1125306,376	14,441	RELLENO_SUR
705	1766642,795	1125301,379	14,432	RELLENO_SUR
706	1766642,625	1125296,381	14,423	RELLENO_SUR
707	1766642,455	1125291,384	14,414	RELLENO_SUR
708	1766642,285	1125286,387	14,405	RELLENO_SUR
709	1766642,115	1125281,39	14,396	RELLENO_SUR
710	1766641,945	1125276,393	14,387	RELLENO_SUR
711	1766641,775	1125271,396	14,378	RELLENO_SUR
712	1766641,605	1125266,399	14,369	RELLENO_SUR
713	1766641,435	1125261,402	14,36	RELLENO_SUR
714	1766641,265	1125256,405	14,351	RELLENO_SUR
715	1766641,095	1125251,407	14,342	RELLENO_SUR
716	1766640,925	1125246,41	14,333	RELLENO_SUR
717	1766640,755	1125241,413	14,324	RELLENO_SUR
718	1766640,585	1125236,416	14,315	RELLENO_SUR
719	1766640,415	1125231,419	14,306	RELLENO_SUR
720	1766640,245	1125226,422	14,297	RELLENO_SUR
721	1766640,075	1125221,425	14,288	RELLENO_SUR
722	1766639,906	1125216,428	14,279	RELLENO_SUR
723	1766639,736	1125211,431	14,27	RELLENO_SUR
724	1766639,566	1125206,433	14,261	RELLENO_SUR
725	1766639,396	1125201,436	14,252	RELLENO_SUR
726	1766639,226	1125196,439	14,243	RELLENO_SUR
727	1766639,056	1125191,442	14,234	RELLENO_SUR
728	1766638,886	1125186,445	14,225	RELLENO_SUR
729	1766638,716	1125181,448	14,216	RELLENO_SUR
730	1766638,546	1125176,451	14,207	RELLENO_SUR
731	1766638,376	1125171,454	14,198	RELLENO_SUR
732	1766638,206	1125166,457	14,189	RELLENO_SUR
733	1766638,036	1125161,459	14,18	RELLENO_SUR
734	1766637,866	1125156,462	14,171	RELLENO_SUR
735	1766637,696	1125151,465	14,162	RELLENO_SUR
736	1766637,526	1125146,468	14,153	RELLENO_SUR
737	1766637,356	1125141,471	14,144	RELLENO_SUR
738	1766637,186	1125136,474	14,136	RELLENO_SUR
739	1766637,016	1125131,477	14,127	RELLENO_SUR
740	1766636,846	1125126,48	14,118	RELLENO_SUR
741	1766636,676	1125121,483	14,109	RELLENO_SUR
742	1766636,506	1125116,485	14,1	RELLENO_SUR
743	1766636,336	1125111,488	14,091	RELLENO_SUR
744	1766636,166	1125106,491	14,084	RELLENO_SUR
745	1766635,996	1125101,494	14,077	RELLENO_SUR

746	1766635,826	1125096,497	14,07	RELLENO_SUR
747	1766635,656	1125091,5	14,064	RELLENO_SUR
748	1766635,486	1125086,503	14,058	RELLENO_SUR
749	1766635,316	1125081,506	14,052	RELLENO_SUR
750	1766635,146	1125076,509	14,045	RELLENO_SUR
751	1766634,976	1125071,512	14,039	RELLENO_SUR
752	1766634,806	1125066,514	14,033	RELLENO_SUR
753	1766634,636	1125061,517	14,026	RELLENO_SUR
754	1766634,466	1125056,52	14,02	RELLENO_SUR
755	1766634,296	1125051,523	14,014	RELLENO_SUR
756	1766634,126	1125046,526	14,008	RELLENO_SUR
757	1766633,956	1125041,529	14,001	RELLENO_SUR
758	1766633,786	1125036,532	13,995	RELLENO_SUR
759	1766633,616	1125031,535	13,989	RELLENO_SUR
760	1766633,446	1125026,538	13,983	RELLENO_SUR
761	1766633,276	1125021,54	13,976	RELLENO_SUR
762	1766633,106	1125016,543	13,97	RELLENO_SUR
763	1766632,936	1125011,546	13,964	RELLENO_SUR
764	1766632,766	1125006,549	13,958	RELLENO_SUR
765	1766632,596	1125001,552	13,951	RELLENO_SUR
766	1766632,426	1124996,555	13,945	RELLENO_SUR
767	1766632,256	1124991,558	13,939	RELLENO_SUR
768	1766632,086	1124986,561	13,933	RELLENO_SUR
769	1766631,916	1124981,564	13,926	RELLENO_SUR
770	1766631,746	1124976,566	13,92	RELLENO_SUR
771	1766631,576	1124971,569	13,914	RELLENO_SUR
772	1766631,406	1124966,572	13,908	RELLENO_SUR
773	1766631,237	1124961,575	13,901	RELLENO_SUR
774	1766631,067	1124956,578	13,895	RELLENO_SUR
775	1766630,897	1124951,581	13,889	RELLENO_SUR
776	1766630,727	1124946,584	13,883	RELLENO_SUR
777	1766630,557	1124941,587	13,876	RELLENO_SUR
778	1766630,387	1124936,59	13,87	RELLENO_SUR
779	1766630,217	1124931,592	13,864	RELLENO_SUR
780	1766630,047	1124926,595	13,858	RELLENO_SUR
781	1766629,877	1124921,598	13,851	RELLENO_SUR
782	1766629,707	1124916,601	13,845	RELLENO_SUR
783	1766629,537	1124911,604	13,839	RELLENO_SUR
784	1766629,367	1124906,607	13,833	RELLENO_SUR
785	1766629,197	1124901,61	13,826	RELLENO_SUR
786	1766629,027	1124896,613	13,82	RELLENO_SUR
787	1766628,857	1124891,616	13,814	RELLENO_SUR
788	1766628,687	1124886,618	13,807	RELLENO_SUR
789	1766628,517	1124881,621	13,801	RELLENO_SUR

790	1766628,347	1124876,624	13,794	RELLENO_SUR
791	1766628,177	1124871,627	13,786	RELLENO_SUR
792	1766628,007	1124866,63	13,778	RELLENO_SUR
793	1766627,837	1124861,633	13,768	RELLENO_SUR
794	1766627,667	1124856,636	13,758	RELLENO_SUR
795	1766627,497	1124851,639	13,748	RELLENO_SUR
796	1766627,327	1124846,642	13,737	RELLENO_SUR
797	1766627,157	1124841,644	13,727	RELLENO_SUR
798	1766626,987	1124836,647	13,716	RELLENO_SUR
799	1766626,817	1124831,65	13,706	RELLENO_SUR
800	1766626,647	1124826,653	13,696	RELLENO_SUR
801	1766626,477	1124821,656	13,685	RELLENO_SUR
802	1766626,307	1124816,659	13,675	RELLENO_SUR
803	1766626,137	1124811,662	13,665	RELLENO_SUR
804	1766625,967	1124806,665	13,654	RELLENO_SUR
805	1766625,797	1124801,668	13,644	RELLENO_SUR
806	1766625,627	1124796,67	13,634	RELLENO_SUR
807	1766625,457	1124791,673	13,623	RELLENO_SUR
808	1766625,287	1124786,676	13,613	RELLENO_SUR
809	1766625,117	1124781,679	13,602	RELLENO_SUR
810	1766624,947	1124776,682	13,592	RELLENO_SUR
811	1766624,777	1124771,685	13,582	RELLENO_SUR
812	1766624,607	1124766,688	13,571	RELLENO_SUR
813	1766624,437	1124761,691	13,561	RELLENO_SUR
814	1766624,267	1124756,694	13,551	RELLENO_SUR
815	1766624,097	1124751,696	13,54	RELLENO_SUR
816	1766623,927	1124746,699	13,53	RELLENO_SUR
817	1766623,757	1124741,702	13,52	RELLENO_SUR
818	1766623,587	1124736,705	13,509	RELLENO_SUR
819	1766623,417	1124731,708	13,499	RELLENO_SUR
820	1766623,247	1124726,711	13,488	RELLENO_SUR
821	1766623,077	1124721,714	13,478	RELLENO_SUR
822	1766622,907	1124716,717	13,468	RELLENO_SUR
823	1766622,738	1124711,72	13,457	RELLENO_SUR
824	1766622,568	1124706,722	13,447	RELLENO_SUR
825	1766622,398	1124701,725	13,437	RELLENO_SUR
826	1766622,228	1124696,728	13,426	RELLENO_SUR
827	1766622,058	1124691,731	13,416	RELLENO_SUR
828	1766621,888	1124686,734	13,406	RELLENO_SUR
829	1766621,718	1124681,737	13,395	RELLENO_SUR
830	1766621,548	1124676,74	13,385	RELLENO_SUR
831	1766621,514	1124675,74	13,383	RELLENO_SUR
832	1766621,378	1124671,743	13,374	RELLENO_SUR
833	1766621,208	1124666,746	13,364	RELLENO_SUR

834	1766621,038	1124661,748	13,354	RELLENO_SUR
835	1766620,868	1124656,751	13,343	RELLENO_SUR
836	1766620,698	1124651,754	13,333	RELLENO_SUR
837	1766620,528	1124646,757	13,323	RELLENO_SUR
838	1766620,358	1124641,76	13,312	RELLENO_SUR
839	1766620,188	1124636,763	13,302	RELLENO_SUR
840	1766620,018	1124631,766	13,292	RELLENO_SUR
841	1766619,848	1124626,769	13,281	RELLENO_SUR
842	1766619,678	1124621,772	13,271	RELLENO_SUR
843	1766619,508	1124616,775	13,26	RELLENO_SUR
844	1766619,338	1124611,777	13,25	RELLENO_SUR
845	1766619,168	1124606,78	13,24	RELLENO_SUR
846	1766618,998	1124601,783	13,229	RELLENO_SUR
847	1766658,898	1125652,866	14,9159	RELLENO_SUR
848	1766659,228	1125662,861	14,9288	RELLENO_SUR
849	1766659,557	1125672,855	14,9407	RELLENO_SUR
850	1766659,887	1125682,85	14,9526	RELLENO_SUR
851	1766660,216	1125692,845	14,9644	RELLENO_SUR
852	1766660,546	1125702,839	14,9763	RELLENO_SUR
853	1766660,875	1125712,834	14,9882	RELLENO_SUR
854	1766661,205	1125722,828	15,0001	RELLENO_SUR
855	1766661,534	1125732,823	15,0119	RELLENO_SUR
856	1766661,864	1125742,817	15,0238	RELLENO_SUR
857	1766662,193	1125752,812	15,0357	RELLENO_SUR
858	1766662,523	1125762,807	15,0486	RELLENO_SUR
859	1766662,852	1125772,801	15,0604	RELLENO_SUR
860	1766663,182	1125782,796	15,0723	RELLENO_SUR
861	1766663,512	1125792,79	15,0842	RELLENO_SUR
862	1766663,841	1125802,785	15,0961	RELLENO_SUR
863	1766664,171	1125812,779	15,1079	RELLENO_SUR
864	1766664,5	1125822,774	15,1202	RELLENO_SUR
865	1766664,83	1125832,769	15,1344	RELLENO_SUR
866	1766665,159	1125842,763	15,152	RELLENO_SUR
867	1766665,489	1125852,758	15,1719	RELLENO_SUR
868	1766665,818	1125862,752	15,1918	RELLENO_SUR
869	1766666,148	1125872,747	15,2116	RELLENO_SUR
870	1766666,477	1125882,741	15,2315	RELLENO_SUR
871	1766666,807	1125892,736	15,251	RELLENO_SUR
872	1766667,136	1125902,731	15,2703	RELLENO_SUR
873	1766667,466	1125912,725	15,2901	RELLENO_SUR
874	1766667,795	1125922,72	15,31	RELLENO_SUR
875	1766668,125	1125932,714	15,3299	RELLENO_SUR
876	1766668,454	1125942,709	15,3498	RELLENO_SUR
877	1766668,784	1125952,703	15,3696	RELLENO_SUR

878	1766669,113	1125962,698	15,3891	RELLENO_SUR
879	1766669,443	1125972,693	15,4084	RELLENO_SUR
880	1766669,772	1125982,687	15,4283	RELLENO_SUR
881	1766670,102	1125992,682	15,4481	RELLENO_SUR
882	1766670,431	1126002,676	15,468	RELLENO_SUR
883	1766670,761	1126012,671	15,4879	RELLENO_SUR
884	1766671,09	1126022,665	15,5078	RELLENO_SUR
885	1766671,42	1126032,66	15,5273	RELLENO_SUR
886	1766671,749	1126042,655	15,5465	RELLENO_SUR
887	1766672,079	1126052,649	15,5664	RELLENO_SUR
888	1766672,408	1126062,644	15,5863	RELLENO_SUR
889	1766672,738	1126072,638	15,6061	RELLENO_SUR
890	1766673,067	1126082,633	15,626	RELLENO_SUR
891	1766673,397	1126092,627	15,6476	RELLENO_SUR
892	1766673,726	1126102,622	15,6729	RELLENO_SUR
893	1766674,056	1126112,617	15,7005	RELLENO_SUR
894	1766674,386	1126122,611	15,7317	RELLENO_SUR
895	1766674,715	1126132,606	15,7639	RELLENO_SUR
896	1766675,045	1126142,6	15,7965	RELLENO_SUR
897	1766675,374	1126152,595	15,8283	RELLENO_SUR
898	1766675,704	1126162,589	15,8602	RELLENO_SUR
899	1766676,033	1126172,584	15,8921	RELLENO_SUR
900	1766676,363	1126182,579	15,9243	RELLENO_SUR
901	1766676,692	1126192,573	15,9568	RELLENO_SUR
902	1766677,022	1126202,568	15,9887	RELLENO_SUR
903	1766677,351	1126212,562	16,0192	RELLENO_SUR
904	1766677,681	1126222,557	16,0463	RELLENO_SUR
905	1766678,01	1126232,551	16,0705	RELLENO_SUR
906	1766678,34	1126242,546	16,0916	RELLENO_SUR
907	1766693,054	1126455,337	16,489	RELLENO_SUR
908	1766692,884	1126450,34	16,481	RELLENO_SUR
909	1766692,714	1126445,343	16,474	RELLENO_SUR
910	1766692,544	1126440,346	16,467	RELLENO_SUR
911	1766692,374	1126435,349	16,46	RELLENO_SUR
912	1766692,204	1126430,351	16,453	RELLENO_SUR
913	1766692,034	1126425,354	16,446	RELLENO_SUR
914	1766691,864	1126420,357	16,439	RELLENO_SUR
915	1766691,694	1126415,36	16,432	RELLENO_SUR
916	1766691,524	1126410,363	16,424	RELLENO_SUR
917	1766691,456	1126408,364	16,422	RELLENO_SUR
918	1766691,354	1126405,366	16,417	RELLENO_SUR
919	1766691,184	1126400,369	16,41	RELLENO_SUR
920	1766691,014	1126395,372	16,403	RELLENO_SUR
921	1766690,844	1126390,375	16,396	RELLENO_SUR

922	1766690,675	1126385,377	16,389	RELLENO_SUR
923	1766690,505	1126380,38	16,382	RELLENO_SUR
924	1766690,335	1126375,383	16,375	RELLENO_SUR
925	1766690,165	1126370,386	16,367	RELLENO_SUR
926	1766689,995	1126365,389	16,36	RELLENO_SUR
927	1766689,825	1126360,392	16,353	RELLENO_SUR
928	1766689,655	1126355,395	16,346	RELLENO_SUR
929	1766689,485	1126350,398	16,339	RELLENO_SUR
930	1766689,315	1126345,401	16,332	RELLENO_SUR
931	1766689,145	1126340,403	16,325	RELLENO_SUR
932	1766688,975	1126335,406	16,318	RELLENO_SUR
933	1766688,805	1126330,409	16,31	RELLENO_SUR
934	1766688,635	1126325,412	16,303	RELLENO_SUR
935	1766688,465	1126320,415	16,296	RELLENO_SUR
936	1766688,295	1126315,418	16,289	RELLENO_SUR
937	1766688,125	1126310,421	16,282	RELLENO_SUR
938	1766687,955	1126305,424	16,275	RELLENO_SUR
939	1766687,785	1126300,427	16,268	RELLENO_SUR
940	1766687,615	1126295,429	16,261	RELLENO_SUR
941	1766687,445	1126290,432	16,253	RELLENO_SUR
942	1766687,275	1126285,435	16,246	RELLENO_SUR
943	1766687,105	1126280,438	16,239	RELLENO_SUR
944	1766686,935	1126275,441	16,232	RELLENO_SUR
945	1766686,765	1126270,444	16,225	RELLENO_SUR
946	1766686,595	1126265,447	16,218	RELLENO_SUR
947	1766686,425	1126260,45	16,211	RELLENO_SUR
948	1766686,255	1126255,453	16,203	RELLENO_SUR
949	1766686,085	1126250,455	16,196	RELLENO_SUR
950	1766685,915	1126245,458	16,187	RELLENO_SUR
951	1766685,745	1126240,461	16,178	RELLENO_SUR
952	1766685,575	1126235,464	16,167	RELLENO_SUR
953	1766685,405	1126230,467	16,156	RELLENO_SUR
954	1766685,235	1126225,47	16,144	RELLENO_SUR
955	1766685,065	1126220,473	16,131	RELLENO_SUR
956	1766684,895	1126215,476	16,118	RELLENO_SUR
957	1766684,725	1126210,479	16,103	RELLENO_SUR
958	1766684,555	1126205,481	16,088	RELLENO_SUR
959	1766684,385	1126200,484	16,072	RELLENO_SUR
960	1766684,215	1126195,487	16,056	RELLENO_SUR
961	1766684,045	1126190,49	16,04	RELLENO_SUR
962	1766683,875	1126185,493	16,024	RELLENO_SUR
963	1766683,705	1126180,496	16,007	RELLENO_SUR
964	1766683,535	1126175,499	15,991	RELLENO_SUR
965	1766683,365	1126170,502	15,975	RELLENO_SUR

966	1766683,195	1126165,505	15,959	RELLENO_SUR
967	1766683,025	1126160,507	15,943	RELLENO_SUR
968	1766682,855	1126155,51	15,927	RELLENO_SUR
969	1766682,685	1126150,513	15,911	RELLENO_SUR
970	1766682,515	1126145,516	15,895	RELLENO_SUR
971	1766682,345	1126140,519	15,879	RELLENO_SUR
972	1766682,175	1126135,522	15,863	RELLENO_SUR
973	1766682,006	1126130,525	15,846	RELLENO_SUR
974	1766681,836	1126125,528	15,83	RELLENO_SUR
975	1766681,666	1126120,531	15,814	RELLENO_SUR
976	1766681,496	1126115,534	15,798	RELLENO_SUR
977	1766681,326	1126110,536	15,783	RELLENO_SUR
978	1766681,156	1126105,539	15,769	RELLENO_SUR
979	1766680,986	1126100,542	15,756	RELLENO_SUR
980	1766680,816	1126095,545	15,743	RELLENO_SUR
981	1766680,646	1126090,548	15,731	RELLENO_SUR
982	1766680,476	1126085,551	15,72	RELLENO_SUR
983	1766680,306	1126080,554	15,71	RELLENO_SUR
984	1766680,136	1126075,557	15,7	RELLENO_SUR
985	1766679,966	1126070,56	15,69	RELLENO_SUR
986	1766679,796	1126065,562	15,68	RELLENO_SUR
987	1766679,626	1126060,565	15,67	RELLENO_SUR
988	1766679,456	1126055,568	15,66	RELLENO_SUR
989	1766679,286	1126050,571	15,65	RELLENO_SUR
990	1766679,116	1126045,574	15,64	RELLENO_SUR
991	1766678,946	1126040,577	15,63	RELLENO_SUR
992	1766678,776	1126035,58	15,62	RELLENO_SUR
993	1766678,606	1126030,583	15,611	RELLENO_SUR
994	1766678,436	1126025,586	15,601	RELLENO_SUR
995	1766678,266	1126020,588	15,591	RELLENO_SUR
996	1766678,096	1126015,591	15,581	RELLENO_SUR
997	1766677,926	1126010,594	15,571	RELLENO_SUR
998	1766677,756	1126005,597	15,561	RELLENO_SUR
999	1766677,586	1126000,6	15,551	RELLENO_SUR
1000	1766677,416	1125995,603	15,541	RELLENO_SUR
1001	1766677,246	1125990,606	15,531	RELLENO_SUR
1002	1766677,076	1125985,609	15,521	RELLENO_SUR
1003	1766676,906	1125980,612	15,511	RELLENO_SUR
1004	1766676,736	1125975,614	15,501	RELLENO_SUR
1005	1766676,566	1125970,617	15,491	RELLENO_SUR
1006	1766676,396	1125965,62	15,481	RELLENO_SUR
1007	1766676,226	1125960,623	15,472	RELLENO_SUR
1008	1766676,056	1125955,626	15,462	RELLENO_SUR
1009	1766675,886	1125950,629	15,452	RELLENO_SUR

1010	1766675,716	1125945,632	15,442	RELLENO_SUR
1011	1766675,546	1125940,635	15,432	RELLENO_SUR
1012	1766675,376	1125935,638	15,422	RELLENO_SUR
1013	1766675,206	1125930,64	15,412	RELLENO_SUR
1014	1766675,036	1125925,643	15,402	RELLENO_SUR
1015	1766674,866	1125920,646	15,392	RELLENO_SUR
1016	1766674,696	1125915,649	15,382	RELLENO_SUR
1017	1766674,526	1125910,652	15,372	RELLENO_SUR
1018	1766674,356	1125905,655	15,362	RELLENO_SUR
1019	1766674,186	1125900,658	15,352	RELLENO_SUR
1020	1766674,016	1125895,661	15,342	RELLENO_SUR
1021	1766673,846	1125890,664	15,333	RELLENO_SUR
1022	1766673,676	1125885,666	15,323	RELLENO_SUR
1023	1766673,507	1125880,669	15,313	RELLENO_SUR
1024	1766673,337	1125875,672	15,303	RELLENO_SUR
1025	1766673,167	1125870,675	15,293	RELLENO_SUR
1026	1766672,997	1125865,678	15,283	RELLENO_SUR
1027	1766672,827	1125860,681	15,273	RELLENO_SUR
1028	1766672,657	1125855,684	15,263	RELLENO_SUR
1029	1766672,487	1125850,687	15,253	RELLENO_SUR
1030	1766672,317	1125845,69	15,243	RELLENO_SUR
1031	1766672,147	1125840,692	15,233	RELLENO_SUR
1032	1766671,977	1125835,695	15,224	RELLENO_SUR
1033	1766671,807	1125830,698	15,216	RELLENO_SUR
1034	1766671,637	1125825,701	15,209	RELLENO_SUR
1035	1766671,467	1125820,704	15,202	RELLENO_SUR
1036	1766671,297	1125815,707	15,196	RELLENO_SUR
1037	1766671,127	1125810,71	15,19	RELLENO_SUR
1038	1766670,957	1125805,713	15,184	RELLENO_SUR
1039	1766670,787	1125800,716	15,178	RELLENO_SUR
1040	1766670,617	1125795,718	15,172	RELLENO_SUR
1041	1766670,447	1125790,721	15,166	RELLENO_SUR
1042	1766670,277	1125785,724	15,16	RELLENO_SUR
1043	1766670,107	1125780,727	15,154	RELLENO_SUR
1044	1766669,937	1125775,73	15,148	RELLENO_SUR
1045	1766669,767	1125770,733	15,142	RELLENO_SUR
1046	1766669,597	1125765,736	15,136	RELLENO_SUR
1047	1766669,427	1125760,739	15,13	RELLENO_SUR
1048	1766669,257	1125755,742	15,123	RELLENO_SUR
1049	1766669,087	1125750,744	15,117	RELLENO_SUR
1050	1766668,917	1125745,747	15,111	RELLENO_SUR
1051	1766668,747	1125740,75	15,105	RELLENO_SUR
1052	1766668,577	1125735,753	15,099	RELLENO_SUR
1053	1766668,407	1125730,756	15,093	RELLENO_SUR

1054	1766668,237	1125725,759	15,087	RELLENO_SUR
1055	1766668,067	1125720,762	15,081	RELLENO_SUR
1056	1766667,897	1125715,765	15,075	RELLENO_SUR
1057	1766667,727	1125710,768	15,069	RELLENO_SUR
1058	1766667,557	1125705,77	15,063	RELLENO_SUR
1059	1766667,387	1125700,773	15,057	RELLENO_SUR
1060	1766667,217	1125695,776	15,051	RELLENO_SUR
1061	1766667,047	1125690,779	15,045	RELLENO_SUR
1062	1766666,877	1125685,782	15,039	RELLENO_SUR
1063	1766666,707	1125680,785	15,033	RELLENO_SUR
1064	1766666,537	1125675,788	15,027	RELLENO_SUR
1065	1766666,367	1125670,791	15,021	RELLENO_SUR
1066	1766666,197	1125665,794	15,015	RELLENO_SUR
1067	1766666,027	1125660,797	15,009	RELLENO_SUR
1068	1766665,857	1125655,799	15,002	RELLENO_SUR
1069	1766665,687	1125650,802	14,996	RELLENO_SUR
1070	1766665,517	1125645,805	14,99	RELLENO_SUR
1071	1766665,347	1125640,808	14,984	RELLENO_SUR
1072	1766665,177	1125635,811	14,978	RELLENO_SUR
1073	1766665,008	1125630,814	14,972	RELLENO_SUR
1074	1766664,838	1125625,817	14,966	RELLENO_SUR
1075	1766664,668	1125620,82	14,96	RELLENO_SUR
1076	1766664,498	1125615,823	14,954	RELLENO_SUR
1077	1766664,328	1125610,825	14,948	RELLENO_SUR
1078	1766664,158	1125605,828	14,942	RELLENO_SUR
1079	1766663,988	1125600,831	14,936	RELLENO_SUR
1080	1766663,818	1125595,834	14,93	RELLENO_SUR
1081	1766663,648	1125590,837	14,924	RELLENO_SUR
1082	1766663,478	1125585,84	14,918	RELLENO_SUR
1083	1766663,308	1125580,843	14,912	RELLENO_SUR
1084	1766663,138	1125575,846	14,906	RELLENO_SUR
1085	1766662,968	1125570,849	14,9	RELLENO_SUR
1086	1766662,798	1125565,851	14,894	RELLENO_SUR
1087	1766662,628	1125560,854	14,888	RELLENO_SUR
1088	1766662,458	1125555,857	14,881	RELLENO_SUR
1089	1766662,288	1125550,86	14,875	RELLENO_SUR
1090	1766662,118	1125545,863	14,869	RELLENO_SUR
1091	1766661,948	1125540,866	14,863	RELLENO_SUR
1092	1766661,778	1125535,869	14,857	RELLENO_SUR
1093	1766661,608	1125530,872	14,851	RELLENO_SUR
1094	1766661,438	1125525,875	14,845	RELLENO_SUR
1095	1766661,268	1125520,877	14,839	RELLENO_SUR
1096	1766661,098	1125515,88	14,833	RELLENO_SUR
1097	1766660,928	1125510,883	14,827	RELLENO_SUR

1098	1766660,758	1125505,886	14,821	RELLENO_SUR
1099	1766660,588	1125500,889	14,815	RELLENO_SUR
1100	1766660,418	1125495,892	14,809	RELLENO_SUR
1101	1766660,248	1125490,895	14,803	RELLENO_SUR
1102	1766660,078	1125485,898	14,797	RELLENO_SUR
1103	1766659,908	1125480,901	14,791	RELLENO_SUR
1104	1766659,738	1125475,903	14,785	RELLENO_SUR
1105	1766659,568	1125470,906	14,779	RELLENO_SUR
1106	1766659,398	1125465,909	14,773	RELLENO_SUR
1107	1766659,228	1125460,912	14,767	RELLENO_SUR
1108	1766659,058	1125455,915	14,76	RELLENO_SUR
1109	1766658,888	1125450,918	14,754	RELLENO_SUR
1110	1766658,718	1125445,921	14,748	RELLENO_SUR
1111	1766658,548	1125440,924	14,742	RELLENO_SUR
1112	1766658,378	1125435,927	14,736	RELLENO_SUR
1113	1766658,208	1125430,929	14,73	RELLENO_SUR
1114	1766658,038	1125425,932	14,724	RELLENO_SUR
1115	1766657,868	1125420,935	14,718	RELLENO_SUR
1116	1766657,698	1125415,938	14,712	RELLENO_SUR
1117	1766657,528	1125410,941	14,706	RELLENO_SUR
1118	1766657,358	1125405,944	14,7	RELLENO_SUR
1119	1766657,188	1125400,947	14,694	RELLENO_SUR
1120	1766657,018	1125395,95	14,688	RELLENO_SUR
1121	1766656,848	1125390,953	14,682	RELLENO_SUR
1122	1766656,678	1125385,955	14,676	RELLENO_SUR
1123	1766656,508	1125380,958	14,67	RELLENO_SUR
1124	1766656,339	1125375,961	14,664	RELLENO_SUR
1125	1766656,169	1125370,964	14,658	RELLENO_SUR
1126	1766655,999	1125365,967	14,652	RELLENO_SUR
1127	1766655,829	1125360,97	14,645	RELLENO_SUR
1128	1766655,659	1125355,973	14,639	RELLENO_SUR
1129	1766655,489	1125350,976	14,633	RELLENO_SUR
1130	1766655,319	1125345,979	14,627	RELLENO_SUR
1131	1766655,149	1125340,981	14,621	RELLENO_SUR
1132	1766654,979	1125335,984	14,615	RELLENO_SUR
1133	1766654,809	1125330,987	14,609	RELLENO_SUR
1134	1766654,639	1125325,99	14,603	RELLENO_SUR
1135	1766654,469	1125320,993	14,597	RELLENO_SUR
1136	1766654,299	1125315,996	14,589	RELLENO_SUR
1137	1766654,129	1125310,999	14,581	RELLENO_SUR
1138	1766653,959	1125306,002	14,573	RELLENO_SUR
1139	1766653,789	1125301,005	14,564	RELLENO_SUR
1140	1766653,619	1125296,007	14,555	RELLENO_SUR
1141	1766653,449	1125291,01	14,546	RELLENO_SUR

1142	1766653,279	1125286,013	14,537	RELLENO_SUR
1143	1766653,109	1125281,016	14,528	RELLENO_SUR
1144	1766652,939	1125276,019	14,519	RELLENO_SUR
1145	1766652,769	1125271,022	14,51	RELLENO_SUR
1146	1766652,599	1125266,025	14,501	RELLENO_SUR
1147	1766652,429	1125261,028	14,492	RELLENO_SUR
1148	1766652,259	1125256,031	14,483	RELLENO_SUR
1149	1766652,089	1125251,033	14,474	RELLENO_SUR
1150	1766651,919	1125246,036	14,465	RELLENO_SUR
1151	1766651,749	1125241,039	14,456	RELLENO_SUR
1152	1766651,579	1125236,042	14,447	RELLENO_SUR
1153	1766651,409	1125231,045	14,438	RELLENO_SUR
1154	1766651,239	1125226,048	14,429	RELLENO_SUR
1155	1766651,069	1125221,051	14,42	RELLENO_SUR
1156	1766650,899	1125216,054	14,411	RELLENO_SUR
1157	1766650,729	1125211,057	14,402	RELLENO_SUR
1158	1766650,559	1125206,06	14,393	RELLENO_SUR
1159	1766650,389	1125201,062	14,384	RELLENO_SUR
1160	1766650,219	1125196,065	14,375	RELLENO_SUR
1161	1766650,049	1125191,068	14,366	RELLENO_SUR
1162	1766649,879	1125186,071	14,357	RELLENO_SUR
1163	1766649,709	1125181,074	14,348	RELLENO_SUR
1164	1766649,539	1125176,077	14,339	RELLENO_SUR
1165	1766649,369	1125171,08	14,33	RELLENO_SUR
1166	1766649,199	1125166,083	14,321	RELLENO_SUR
1167	1766649,029	1125161,086	14,312	RELLENO_SUR
1168	1766648,859	1125156,088	14,303	RELLENO_SUR
1169	1766648,689	1125151,091	14,294	RELLENO_SUR
1170	1766648,519	1125146,094	14,285	RELLENO_SUR
1171	1766648,349	1125141,097	14,276	RELLENO_SUR
1172	1766648,179	1125136,1	14,268	RELLENO_SUR
1173	1766648,009	1125131,103	14,259	RELLENO_SUR
1174	1766647,84	1125126,106	14,25	RELLENO_SUR
1175	1766647,67	1125121,109	14,241	RELLENO_SUR
1176	1766647,5	1125116,112	14,232	RELLENO_SUR
1177	1766647,33	1125111,114	14,223	RELLENO_SUR
1178	1766647,16	1125106,117	14,216	RELLENO_SUR
1179	1766646,99	1125101,12	14,209	RELLENO_SUR
1180	1766646,82	1125096,123	14,202	RELLENO_SUR
1181	1766646,65	1125091,126	14,196	RELLENO_SUR
1182	1766646,48	1125086,129	14,19	RELLENO_SUR
1183	1766646,31	1125081,132	14,184	RELLENO_SUR
1184	1766646,14	1125076,135	14,177	RELLENO_SUR
1185	1766645,97	1125071,138	14,171	RELLENO_SUR

1186	1766645,8	1125066,14	14,165	RELLENO_SUR
1187	1766645,63	1125061,143	14,158	RELLENO_SUR
1188	1766645,46	1125056,146	14,152	RELLENO_SUR
1189	1766645,29	1125051,149	14,146	RELLENO_SUR
1190	1766645,12	1125046,152	14,14	RELLENO_SUR
1191	1766644,95	1125041,155	14,133	RELLENO_SUR
1192	1766644,78	1125036,158	14,127	RELLENO_SUR
1193	1766644,61	1125031,161	14,121	RELLENO_SUR
1194	1766644,44	1125026,164	14,115	RELLENO_SUR
1195	1766644,27	1125021,166	14,108	RELLENO_SUR
1196	1766644,1	1125016,169	14,102	RELLENO_SUR
1197	1766643,93	1125011,172	14,096	RELLENO_SUR
1198	1766643,76	1125006,175	14,09	RELLENO_SUR
1199	1766643,59	1125001,178	14,083	RELLENO_SUR
1200	1766643,42	1124996,181	14,077	RELLENO_SUR
1201	1766643,25	1124991,184	14,071	RELLENO_SUR
1202	1766643,08	1124986,187	14,065	RELLENO_SUR
1203	1766642,91	1124981,19	14,058	RELLENO_SUR
1204	1766642,74	1124976,192	14,052	RELLENO_SUR
1205	1766642,57	1124971,195	14,046	RELLENO_SUR
1206	1766642,4	1124966,198	14,04	RELLENO_SUR
1207	1766642,23	1124961,201	14,033	RELLENO_SUR
1208	1766642,06	1124956,204	14,027	RELLENO_SUR
1209	1766641,89	1124951,207	14,021	RELLENO_SUR
1210	1766641,72	1124946,21	14,015	RELLENO_SUR
1211	1766641,55	1124941,213	14,008	RELLENO_SUR
1212	1766641,38	1124936,216	14,002	RELLENO_SUR
1213	1766641,21	1124931,218	13,996	RELLENO_SUR
1214	1766641,04	1124926,221	13,99	RELLENO_SUR
1215	1766640,87	1124921,224	13,983	RELLENO_SUR
1216	1766640,7	1124916,227	13,977	RELLENO_SUR
1217	1766640,53	1124911,23	13,971	RELLENO_SUR
1218	1766640,36	1124906,233	13,965	RELLENO_SUR
1219	1766640,19	1124901,236	13,958	RELLENO_SUR
1220	1766640,02	1124896,239	13,952	RELLENO_SUR
1221	1766639,85	1124891,242	13,946	RELLENO_SUR
1222	1766639,68	1124886,244	13,939	RELLENO_SUR
1223	1766639,51	1124881,247	13,933	RELLENO_SUR
1224	1766639,34	1124876,25	13,926	RELLENO_SUR
1225	1766639,171	1124871,253	13,918	RELLENO_SUR
1226	1766639,001	1124866,256	13,91	RELLENO_SUR
1227	1766638,831	1124861,259	13,9	RELLENO_SUR
1228	1766638,661	1124856,262	13,89	RELLENO_SUR
1229	1766638,491	1124851,265	13,88	RELLENO_SUR

1230	1766638,321	1124846,268	13,869	RELLENO_SUR
1231	1766638,151	1124841,27	13,859	RELLENO_SUR
1232	1766637,981	1124836,273	13,848	RELLENO_SUR
1233	1766637,811	1124831,276	13,838	RELLENO_SUR
1234	1766637,641	1124826,279	13,828	RELLENO_SUR
1235	1766637,471	1124821,282	13,817	RELLENO_SUR
1236	1766637,301	1124816,285	13,807	RELLENO_SUR
1237	1766637,131	1124811,288	13,797	RELLENO_SUR
1238	1766636,961	1124806,291	13,786	RELLENO_SUR
1239	1766636,791	1124801,294	13,776	RELLENO_SUR
1240	1766636,621	1124796,297	13,766	RELLENO_SUR
1241	1766636,451	1124791,299	13,755	RELLENO_SUR
1242	1766636,281	1124786,302	13,745	RELLENO_SUR
1243	1766636,111	1124781,305	13,734	RELLENO_SUR
1244	1766635,941	1124776,308	13,724	RELLENO_SUR
1245	1766635,771	1124771,311	13,714	RELLENO_SUR
1246	1766635,601	1124766,314	13,703	RELLENO_SUR
1247	1766635,431	1124761,317	13,693	RELLENO_SUR
1248	1766635,261	1124756,32	13,683	RELLENO_SUR
1249	1766635,091	1124751,323	13,672	RELLENO_SUR
1250	1766634,921	1124746,325	13,662	RELLENO_SUR
1251	1766634,751	1124741,328	13,652	RELLENO_SUR
1252	1766634,581	1124736,331	13,641	RELLENO_SUR
1253	1766634,411	1124731,334	13,631	RELLENO_SUR
1254	1766634,241	1124726,337	13,62	RELLENO_SUR
1255	1766634,071	1124721,34	13,61	RELLENO_SUR
1256	1766633,901	1124716,343	13,6	RELLENO_SUR
1257	1766633,731	1124711,346	13,589	RELLENO_SUR
1258	1766633,561	1124706,349	13,579	RELLENO_SUR
1259	1766633,391	1124701,351	13,569	RELLENO_SUR
1260	1766633,221	1124696,354	13,558	RELLENO_SUR
1261	1766633,051	1124691,357	13,548	RELLENO_SUR
1262	1766632,881	1124686,36	13,538	RELLENO_SUR
1263	1766632,711	1124681,363	13,527	RELLENO_SUR
1264	1766632,541	1124676,366	13,517	RELLENO_SUR
1265	1766632,507	1124675,366	13,515	RELLENO_SUR
1266	1766631,264	1124671,406	13,493	RELLENO_SUR
1267	1766628,645	1124666,493	13,453	RELLENO_SUR
1268	1766626,025	1124661,579	13,414	RELLENO_SUR
1269	1766623,916	1124656,648	13,38	RELLENO_SUR
1270	1766623,746	1124651,651	13,37	RELLENO_SUR
1271	1766623,575	1124646,654	13,359	RELLENO_SUR
1272	1766623,405	1124641,656	13,349	RELLENO_SUR
1273	1766623,234	1124636,659	13,338	RELLENO_SUR

1274	1766623,064	1124631,662	13,328	RELLENO_SUR
1275	1766622,894	1124626,665	13,318	RELLENO_SUR
1276	1766622,723	1124621,668	13,307	RELLENO_SUR
1277	1766622,553	1124616,671	13,297	RELLENO_SUR
1278	1766622,383	1124611,674	13,287	RELLENO_SUR
1279	1766622,212	1124606,677	13,276	RELLENO_SUR
1280	1766622,042	1124601,68	13,266	RELLENO_SUR
1281	1766678,669	1126252,541	16,1088	RELLENO_SUR
1282	1766678,999	1126262,535	16,1237	RELLENO_SUR
1283	1766679,328	1126272,53	16,1375	RELLENO_SUR
1284	1766679,658	1126282,524	16,1514	RELLENO_SUR
1285	1766679,987	1126292,519	16,1656	RELLENO_SUR
1286	1766680,317	1126302,513	16,1801	RELLENO_SUR
1287	1766680,646	1126312,508	16,194	RELLENO_SUR
1288	1766680,976	1126322,503	16,2079	RELLENO_SUR
1289	1766681,305	1126332,497	16,2221	RELLENO_SUR
1290	1766681,635	1126342,492	16,2366	RELLENO_SUR
1291	1766681,964	1126352,486	16,2505	RELLENO_SUR
1292	1766682,294	1126362,481	16,2644	RELLENO_SUR
1293	1766682,623	1126372,475	16,2786	RELLENO_SUR
1294	1766682,953	1126382,47	16,2931	RELLENO_SUR
1295	1766683,282	1126392,465	16,307	RELLENO_SUR
1296	1766683,612	1126402,459	16,3209	RELLENO_SUR
1297	1766683,941	1126412,454	16,3351	RELLENO_SUR
1298	1766684,271	1126422,448	16,3496	RELLENO_SUR
1299	1766684,601	1126432,443	16,3635	RELLENO_SUR
1300	1766684,93	1126442,437	16,3774	RELLENO_SUR
1301	1766685,26	1126452,432	16,3916	RELLENO_SUR
1302	1766685,362	1126455,537	16,3966	RELLENO_SUR
1303	1766599,704	1124601,556	12,739	RELLENO_SUR
1304	1766676,258	1126455,56	16,2115	RELLENO_SUR
1305	1766675,927	1126445,565	16,197	RELLENO_SUR
1306	1766675,597	1126435,571	16,1831	RELLENO_SUR
1307	1766675,267	1126425,576	16,1694	RELLENO_SUR
1308	1766674,937	1126415,582	16,1556	RELLENO_SUR
1309	1766674,607	1126405,587	16,1409	RELLENO_SUR
1310	1766674,277	1126395,593	16,1272	RELLENO_SUR
1311	1766673,947	1126385,598	16,1133	RELLENO_SUR
1312	1766673,617	1126375,604	16,0995	RELLENO_SUR
1313	1766673,287	1126365,609	16,085	RELLENO_SUR
1314	1766672,956	1126355,615	16,0711	RELLENO_SUR
1315	1766672,626	1126345,62	16,0573	RELLENO_SUR
1316	1766672,296	1126335,625	16,0435	RELLENO_SUR
1317	1766671,966	1126325,631	16,0289	RELLENO_SUR

1318	1766671,636	1126315,636	16,0151	RELLENO_SUR
1319	1766671,306	1126305,642	16,0012	RELLENO_SUR
1320	1766670,976	1126295,647	15,9874	RELLENO_SUR
1321	1766670,646	1126285,653	15,9729	RELLENO_SUR
1322	1766670,316	1126275,658	15,959	RELLENO_SUR
1323	1766669,986	1126265,664	15,9453	RELLENO_SUR
1324	1766669,655	1126255,669	15,9307	RELLENO_SUR
1325	1766669,325	1126245,674	15,9147	RELLENO_SUR
1326	1766668,995	1126235,68	15,8948	RELLENO_SUR
1327	1766668,665	1126225,685	15,8719	RELLENO_SUR
1328	1766668,335	1126215,691	15,8459	RELLENO_SUR
1329	1766668,005	1126205,696	15,8161	RELLENO_SUR
1330	1766667,675	1126195,702	15,7844	RELLENO_SUR
1331	1766667,345	1126185,707	15,7525	RELLENO_SUR
1332	1766667,015	1126175,713	15,72	RELLENO_SUR
1333	1766666,684	1126165,718	15,6881	RELLENO_SUR
1334	1766666,354	1126155,724	15,6564	RELLENO_SUR
1335	1766666,024	1126145,729	15,6247	RELLENO_SUR
1336	1766665,694	1126135,734	15,5927	RELLENO_SUR
1337	1766665,364	1126125,74	15,5602	RELLENO_SUR
1338	1766665,034	1126115,745	15,5285	RELLENO_SUR
1339	1766664,704	1126105,751	15,4999	RELLENO_SUR
1340	1766664,374	1126095,756	15,4741	RELLENO_SUR
1341	1766664,044	1126085,762	15,4515	RELLENO_SUR
1342	1766663,713	1126075,767	15,4318	RELLENO_SUR
1343	1766663,383	1126065,773	15,412	RELLENO_SUR
1344	1766663,053	1126055,778	15,3923	RELLENO_SUR
1345	1766662,723	1126045,783	15,3726	RELLENO_SUR
1346	1766662,393	1126035,789	15,3529	RELLENO_SUR
1347	1766662,063	1126025,794	15,334	RELLENO_SUR
1348	1766661,733	1126015,8	15,3142	RELLENO_SUR
1349	1766661,403	1126005,805	15,2945	RELLENO_SUR
1350	1766661,073	1125995,811	15,2749	RELLENO_SUR
1351	1766660,743	1125985,816	15,2551	RELLENO_SUR
1352	1766660,412	1125975,822	15,2354	RELLENO_SUR
1353	1766660,082	1125965,827	15,2157	RELLENO_SUR
1354	1766659,752	1125955,833	15,1967	RELLENO_SUR
1355	1766659,422	1125945,838	15,177	RELLENO_SUR
1356	1766659,092	1125935,843	15,1572	RELLENO_SUR
1357	1766658,762	1125925,849	15,1375	RELLENO_SUR
1358	1766658,432	1125915,854	15,1177	RELLENO_SUR
1359	1766658,102	1125905,86	15,098	RELLENO_SUR
1360	1766657,772	1125895,865	15,0783	RELLENO_SUR
1361	1766657,441	1125885,871	15,0595	RELLENO_SUR

1362	1766657,111	1125875,876	15,0397	RELLENO_SUR
1363	1766656,781	1125865,882	15,02	RELLENO_SUR
1364	1766656,451	1125855,887	15,0003	RELLENO_SUR
1365	1766656,121	1125845,892	14,9805	RELLENO_SUR
1366	1766655,791	1125835,898	14,9619	RELLENO_SUR
1367	1766655,461	1125825,903	14,9472	RELLENO_SUR
1368	1766655,131	1125815,909	14,9345	RELLENO_SUR
1369	1766654,801	1125805,914	14,9228	RELLENO_SUR
1370	1766654,471	1125795,92	14,911	RELLENO_SUR
1371	1766654,14	1125785,925	14,8992	RELLENO_SUR
1372	1766653,81	1125775,931	14,8875	RELLENO_SUR
1373	1766653,48	1125765,936	14,8757	RELLENO_SUR
1374	1766653,15	1125755,942	14,8631	RELLENO_SUR
1375	1766652,82	1125745,947	14,8513	RELLENO_SUR
1376	1766652,49	1125735,952	14,8394	RELLENO_SUR
1377	1766652,16	1125725,958	14,8277	RELLENO_SUR
1378	1766651,83	1125715,963	14,8159	RELLENO_SUR
1379	1766651,5	1125705,969	14,8041	RELLENO_SUR
1380	1766651,169	1125695,974	14,7924	RELLENO_SUR
1381	1766650,839	1125685,98	14,7806	RELLENO_SUR
1382	1766650,509	1125675,985	14,7689	RELLENO_SUR
1383	1766650,179	1125665,991	14,7571	RELLENO_SUR
1384	1766649,849	1125655,996	14,7445	RELLENO_SUR
1385	1766649,519	1125646,001	14,7327	RELLENO_SUR
1386	1766649,189	1125636,007	14,7209	RELLENO_SUR
1387	1766648,859	1125626,012	14,7092	RELLENO_SUR
1388	1766648,529	1125616,018	14,6974	RELLENO_SUR
1389	1766648,199	1125606,023	14,6857	RELLENO_SUR
1390	1766647,868	1125596,029	14,6739	RELLENO_SUR
1391	1766647,538	1125586,034	14,6622	RELLENO_SUR
1392	1766647,208	1125576,04	14,6504	RELLENO_SUR
1393	1766646,878	1125566,045	14,6385	RELLENO_SUR
1394	1766646,548	1125556,051	14,6259	RELLENO_SUR
1395	1766646,218	1125546,056	14,6142	RELLENO_SUR
1396	1766645,888	1125536,061	14,6024	RELLENO_SUR
1397	1766645,558	1125526,067	14,5907	RELLENO_SUR
1398	1766645,228	1125516,072	14,5789	RELLENO_SUR
1399	1766644,897	1125506,078	14,5672	RELLENO_SUR
1400	1766644,567	1125496,083	14,5553	RELLENO_SUR
1401	1766644,237	1125486,089	14,5436	RELLENO_SUR
1402	1766643,907	1125476,094	14,5318	RELLENO_SUR
1403	1766643,577	1125466,1	14,5201	RELLENO_SUR
1404	1766643,247	1125456,105	14,5074	RELLENO_SUR
1405	1766642,917	1125446,11	14,4957	RELLENO_SUR

1406	1766642,587	1125436,116	14,4838	RELLENO_SUR
1407	1766642,257	1125426,121	14,4721	RELLENO_SUR
1408	1766641,927	1125416,127	14,4603	RELLENO_SUR
1409	1766641,596	1125406,132	14,4486	RELLENO_SUR
1410	1766641,266	1125396,138	14,4368	RELLENO_SUR
1411	1766640,936	1125386,143	14,4251	RELLENO_SUR
1412	1766640,606	1125376,149	14,4134	RELLENO_SUR
1413	1766640,276	1125366,154	14,4014	RELLENO_SUR
1414	1766639,946	1125356,16	14,3889	RELLENO_SUR
1415	1766639,616	1125346,165	14,3771	RELLENO_SUR
1416	1766639,286	1125336,17	14,3653	RELLENO_SUR
1417	1766638,956	1125326,176	14,3535	RELLENO_SUR
1418	1766638,625	1125316,181	14,3398	RELLENO_SUR
1419	1766638,295	1125306,187	14,3238	RELLENO_SUR
1420	1766637,965	1125296,192	14,3061	RELLENO_SUR
1421	1766637,635	1125286,198	14,2884	RELLENO_SUR
1422	1766637,305	1125276,203	14,2706	RELLENO_SUR
1423	1766636,975	1125266,209	14,2528	RELLENO_SUR
1424	1766636,645	1125256,214	14,2351	RELLENO_SUR
1425	1766636,315	1125246,219	14,2174	RELLENO_SUR
1426	1766635,985	1125236,225	14,1996	RELLENO_SUR
1427	1766635,654	1125226,23	14,1819	RELLENO_SUR
1428	1766635,324	1125216,236	14,1641	RELLENO_SUR
1429	1766634,994	1125206,241	14,1463	RELLENO_SUR
1430	1766634,664	1125196,247	14,1285	RELLENO_SUR
1431	1766634,334	1125186,252	14,1109	RELLENO_SUR
1432	1766634,004	1125176,258	14,0931	RELLENO_SUR
1433	1766633,674	1125166,263	14,0753	RELLENO_SUR
1434	1766633,344	1125156,269	14,0576	RELLENO_SUR
1435	1766633,014	1125146,274	14,0398	RELLENO_SUR
1436	1766632,684	1125136,279	14,023	RELLENO_SUR
1437	1766632,353	1125126,285	14,0053	RELLENO_SUR
1438	1766632,023	1125116,29	13,9876	RELLENO_SUR
1439	1766631,693	1125106,296	13,9719	RELLENO_SUR
1440	1766631,363	1125096,301	13,9582	RELLENO_SUR
1441	1766631,033	1125086,307	13,9464	RELLENO_SUR
1442	1766630,703	1125076,312	13,9338	RELLENO_SUR
1443	1766630,373	1125066,318	13,9219	RELLENO_SUR
1444	1766630,043	1125056,323	13,9092	RELLENO_SUR
1445	1766629,713	1125046,328	13,8974	RELLENO_SUR
1446	1766629,382	1125036,334	13,8847	RELLENO_SUR
1447	1766629,052	1125026,339	13,8729	RELLENO_SUR
1448	1766628,722	1125016,345	13,8602	RELLENO_SUR
1449	1766628,392	1125006,35	13,8484	RELLENO_SUR

1450	1766628,062	1124996,356	13,8357	RELLENO_SUR
1451	1766627,732	1124986,361	13,8239	RELLENO_SUR
1452	1766627,402	1124976,367	13,8112	RELLENO_SUR
1453	1766627,072	1124966,372	13,7994	RELLENO_SUR
1454	1766626,742	1124956,378	13,7867	RELLENO_SUR
1455	1766626,412	1124946,383	13,7749	RELLENO_SUR
1456	1766626,081	1124936,388	13,7622	RELLENO_SUR
1457	1766625,751	1124926,394	13,7504	RELLENO_SUR
1458	1766625,421	1124916,399	13,7376	RELLENO_SUR
1459	1766625,091	1124906,405	13,7258	RELLENO_SUR
1460	1766624,761	1124896,41	13,7131	RELLENO_SUR
1461	1766624,431	1124886,416	13,7004	RELLENO_SUR
1462	1766624,101	1124876,421	13,6875	RELLENO_SUR
1463	1766623,771	1124866,427	13,6716	RELLENO_SUR
1464	1766623,441	1124856,432	13,6518	RELLENO_SUR
1465	1766623,11	1124846,437	13,6311	RELLENO_SUR
1466	1766622,78	1124836,443	13,6104	RELLENO_SUR
1467	1766622,45	1124826,448	13,5905	RELLENO_SUR
1468	1766622,12	1124816,454	13,5698	RELLENO_SUR
1469	1766621,79	1124806,459	13,5491	RELLENO_SUR
1470	1766621,46	1124796,465	13,5293	RELLENO_SUR
1471	1766621,13	1124786,47	13,5086	RELLENO_SUR
1472	1766620,8	1124776,476	13,4878	RELLENO_SUR
1473	1766620,47	1124766,481	13,4671	RELLENO_SUR
1474	1766620,14	1124756,487	13,4473	RELLENO_SUR
1475	1766619,809	1124746,492	13,4265	RELLENO_SUR
1476	1766619,479	1124736,497	13,4059	RELLENO_SUR
1477	1766619,149	1124726,503	13,3852	RELLENO_SUR
1478	1766618,819	1124716,508	13,3653	RELLENO_SUR
1479	1766618,489	1124706,514	13,3446	RELLENO_SUR
1480	1766618,159	1124696,519	13,3239	RELLENO_SUR
1481	1766617,829	1124686,525	13,304	RELLENO_SUR
1482	1766617,499	1124676,53	13,2833	RELLENO_SUR
1483	1766617,169	1124666,536	13,2626	RELLENO_SUR
1484	1766616,838	1124656,541	13,2419	RELLENO_SUR
1485	1766616,508	1124646,546	13,222	RELLENO_SUR
1486	1766616,178	1124636,552	13,2013	RELLENO_SUR
1487	1766615,848	1124626,557	13,1806	RELLENO_SUR
1488	1766615,518	1124616,563	13,1599	RELLENO_SUR
1489	1766615,188	1124606,568	13,14	RELLENO_SUR

CARTERA DESCAPOTE SUR MARGEN 30 metros				
PUNTO	**NORTE**	**ESTE**	**COTA**	**DESCRIPCIÓN**
1	1766684,672	1126264,244	15,939	DESCAPOTE
2	1766681,46	1126263,969	15,924	DESCAPOTE
3	1766677,492	1126264,009	15,891	DESCAPOTE
4	1766673,505	1126264,255	15,794	DESCAPOTE
5	1766669,963	1126264,393	15,802	DESCAPOTE
6	1766666,33	1126264,294	15,728	DESCAPOTE
7	1766663,69	1126264,286	15,679	DESCAPOTE
8	1766662,151	1126269,445	15,648	DESCAPOTE
9	1766659,017	1126270,468	15,579	DESCAPOTE
10	1766656,201	1126271,084	15,515	DESCAPOTE
11	1766653,731	1126259,039	15,49	DESCAPOTE
12	1766655,868	1126257,278	15,553	DESCAPOTE
13	1766661,228	1126259,17	15,65	DESCAPOTE
14	1766656,539	1126265,018	15,499	DESCAPOTE
15	1766653,626	1126264,377	15,469	DESCAPOTE
16	1766652,752	1126139,837	15,373	DESCAPOTE
17	1766658,28	1126139,405	15,411	DESCAPOTE
18	1766663,984	1126139,089	15,463	DESCAPOTE
19	1766668,981	1126138,711	15,545	DESCAPOTE
20	1766673,483	1126138,434	15,622	DESCAPOTE
21	1766678,436	1126137,946	15,64	DESCAPOTE
22	1766668,836	1126143,249	15,536	DESCAPOTE
23	1766668,844	1126143,261	15,536	DESCAPOTE
24	1766663,907	1126143,41	15,496	DESCAPOTE
25	1766658,473	1126143,056	15,435	DESCAPOTE
26	1766652,182	1126144,195	15,378	DESCAPOTE
27	1766652,521	1126149,916	15,357	DESCAPOTE
28	1766658,16	1126149,569	15,417	DESCAPOTE
29	1766663,819	1126149,388	15,523	DESCAPOTE
30	1766669,531	1126149,139	15,61	DESCAPOTE
31	1766674,817	1126148,829	15,663	DESCAPOTE
32	1766678,551	1126148,642	15,694	DESCAPOTE
33	1766678,927	1126153,64	15,702	DESCAPOTE
34	1766673,923	1126153,758	15,662	DESCAPOTE
35	1766667,932	1126153,997	15,557	DESCAPOTE
36	1766661,591	1126154,245	15,484	DESCAPOTE
37	1766655,888	1126154,484	15,413	DESCAPOTE
38	1766651,733	1126154,633	15,315	DESCAPOTE
39	1766652,148	1126159,984	15,326	DESCAPOTE

40	1766657,725	1126159,963	15,454	DESCAPOTE
41	1766663,002	1126159,783	15,52	DESCAPOTE
42	1766669,005	1126159,339	15,575	DESCAPOTE
43	1766673,669	1126159,084	15,672	DESCAPOTE
44	1766676,743	1126158,878	15,697	DESCAPOTE
45	1766679,209	1126158,865	15,734	DESCAPOTE
46	1766679,481	1126163,726	15,734	DESCAPOTE
47	1766674,317	1126163,757	15,655	DESCAPOTE
48	1766669,923	1126164,137	15,572	DESCAPOTE
49	1766664,262	1126164,072	15,521	DESCAPOTE
50	1766658,779	1126164,3	15,495	DESCAPOTE
51	1766653,719	1126164,652	15,393	DESCAPOTE
52	1766653,923	1126169,699	15,308	DESCAPOTE
53	1766660,336	1126169,186	15,491	DESCAPOTE
54	1766666,072	1126168,84	15,519	DESCAPOTE
55	1766671,498	1126168,712	15,612	DESCAPOTE
56	1766676,626	1126168,386	15,695	DESCAPOTE
57	1766679,557	1126168,234	15,724	DESCAPOTE
58	1766679,998	1126173,562	15,721	DESCAPOTE
59	1766674,596	1126173,762	15,671	DESCAPOTE
60	1766669,241	1126174,107	15,619	DESCAPOTE
61	1766664,204	1126174,417	15,523	DESCAPOTE
62	1766659,135	1126174,068	15,484	DESCAPOTE
63	1766654,132	1126174,308	15,347	DESCAPOTE
64	1766654,507	1126180,101	15,379	DESCAPOTE
65	1766659,995	1126179,929	15,508	DESCAPOTE
66	1766665,172	1126179,55	15,585	DESCAPOTE
67	1766670,636	1126178,908	15,625	DESCAPOTE
68	1766676,111	1126178,675	15,688	DESCAPOTE
69	1766679,946	1126178,373	15,722	DESCAPOTE
70	1766680,177	1126183,742	15,741	DESCAPOTE
71	1766675,504	1126183,744	15,685	DESCAPOTE
72	1766670,479	1126183,886	15,628	DESCAPOTE
73	1766665,295	1126184,34	15,618	DESCAPOTE
74	1766660,636	1126184,668	15,513	DESCAPOTE
75	1766656,161	1126184,859	15,419	DESCAPOTE
76	1766653,753	1126190,807	15,325	DESCAPOTE
77	1766658,418	1126190,869	15,468	DESCAPOTE
78	1766663,94	1126190,531	15,612	DESCAPOTE
79	1766669,392	1126190,349	15,674	DESCAPOTE
80	1766674,287	1126190,134	15,746	DESCAPOTE
81	1766678,216	1126189,92	15,732	DESCAPOTE
82	1766680,359	1126189,808	15,716	DESCAPOTE
83	1766680,514	1126195,104	15,735	DESCAPOTE

84	1766675,768	1126194,752	15,753	DESCAPOTE
85	1766671,036	1126195,034	15,705	DESCAPOTE
86	1766666,196	1126195,439	15,673	DESCAPOTE
87	1766661,034	1126195,394	15,528	DESCAPOTE
88	1766656,162	1126195,224	15,437	DESCAPOTE
89	1766652,089	1126195,149	15,31	DESCAPOTE
90	1766652,641	1126199,855	15,355	DESCAPOTE
91	1766657,084	1126199,688	15,477	DESCAPOTE
92	1766662,483	1126199,814	15,606	DESCAPOTE
93	1766668,05	1126199,808	15,701	DESCAPOTE
94	1766672,472	1126199,889	15,713	DESCAPOTE
95	1766677,037	1126199,958	15,779	DESCAPOTE
96	1766680,377	1126199,968	15,75	DESCAPOTE
97	1766680,689	1126205,502	15,766	DESCAPOTE
98	1766675,617	1126205,191	15,733	DESCAPOTE
99	1766669,89	1126205,285	15,732	DESCAPOTE
100	1766665,059	1126205,385	15,674	DESCAPOTE
101	1766660,482	1126205,341	15,591	DESCAPOTE
102	1766656,162	1126205,402	15,49	DESCAPOTE
103	1766654,724	1126210,1	15,431	DESCAPOTE
104	1766658,95	1126210,042	15,599	DESCAPOTE
105	1766664,361	1126210,248	15,68	DESCAPOTE
106	1766669,994	1126210,316	15,734	DESCAPOTE
107	1766674,602	1126210,478	15,758	DESCAPOTE
108	1766677,78	1126210,594	15,747	DESCAPOTE
109	1766680,87	1126210,624	15,779	DESCAPOTE
110	1766681,033	1126215,989	15,821	DESCAPOTE
111	1766675,982	1126215,867	15,774	DESCAPOTE
112	1766671,082	1126216,119	15,715	DESCAPOTE
113	1766664,415	1126216,43	15,635	DESCAPOTE
114	1766658,753	1126216,005	15,605	DESCAPOTE
115	1766652,828	1126215,686	15,439	DESCAPOTE
116	1766653,866	1126220,003	15,428	DESCAPOTE
117	1766659,449	1126220,238	15,596	DESCAPOTE
118	1766664,927	1126220,261	15,64	DESCAPOTE
119	1766670,168	1126220,295	15,731	DESCAPOTE
120	1766673,868	1126220,28	15,738	DESCAPOTE
121	1766676,744	1126220,236	15,784	DESCAPOTE
122	1766678,95	1126220,164	15,808	DESCAPOTE
123	1766681,061	1126220,144	15,828	DESCAPOTE
124	1766680,96	1126225,417	15,824	DESCAPOTE
125	1766676,806	1126225,584	15,779	DESCAPOTE
126	1766672,161	1126225,72	15,763	DESCAPOTE
127	1766667,56	1126225,796	15,688	DESCAPOTE

128	1766662,89	1126225,532	15,619	DESCAPOTE
129	1766658,427	1126225,142	15,576	DESCAPOTE
130	1766653,159	1126225,204	15,422	DESCAPOTE
131	1766656,229	1126229,53	15,507	DESCAPOTE
132	1766661,633	1126229,433	15,596	DESCAPOTE
133	1766667,346	1126229,442	15,688	DESCAPOTE
134	1766672,676	1126229,468	15,766	DESCAPOTE
135	1766677,493	1126229,416	15,807	DESCAPOTE
136	1766681,245	1126229,298	15,813	DESCAPOTE
137	1766681,715	1126234,776	15,845	DESCAPOTE
138	1766675,989	1126235,076	15,835	DESCAPOTE
139	1766670,405	1126235,269	15,719	DESCAPOTE
140	1766665,554	1126235,51	15,618	DESCAPOTE
141	1766660,042	1126235,68	15,591	DESCAPOTE
142	1766654,916	1126235,817	15,453	DESCAPOTE
143	1766655,65	1126240,825	15,505	DESCAPOTE
144	1766660,676	1126240,722	15,591	DESCAPOTE
145	1766665,693	1126240,733	15,633	DESCAPOTE
146	1766670,635	1126240,605	15,768	DESCAPOTE
147	1766675,564	1126240,508	15,808	DESCAPOTE
148	1766679,935	1126240,506	15,837	DESCAPOTE
149	1766682,034	1126240,401	15,863	DESCAPOTE
150	1766682,305	1126246,009	15,878	DESCAPOTE
151	1766676,638	1126245,907	15,86	DESCAPOTE
152	1766671,128	1126246,256	15,771	DESCAPOTE
153	1766665,719	1126245,891	15,677	DESCAPOTE
154	1766659,567	1126245,968	15,621	DESCAPOTE
155	1766652,777	1126245,879	15,442	DESCAPOTE
156	1766654,596	1126250,22	15,506	DESCAPOTE
157	1766659,941	1126250,339	15,648	DESCAPOTE
158	1766666,082	1126250,389	15,707	DESCAPOTE
159	1766670,774	1126250,374	15,731	DESCAPOTE
160	1766676,07	1126250,375	15,847	DESCAPOTE
161	1766679,309	1126250,516	15,895	DESCAPOTE
162	1766682,235	1126250,454	15,904	DESCAPOTE
163	1766682,451	1126255,724	15,902	DESCAPOTE
164	1766676,731	1126256,02	15,849	DESCAPOTE
165	1766671,013	1126255,429	15,741	DESCAPOTE
166	1766666,638	1126255,243	15,77	DESCAPOTE
167	1766662,188	1126254,946	15,722	DESCAPOTE
168	1766656,406	1126255,175	15,606	DESCAPOTE
169	1766663,539	1126260,218	15,758	DESCAPOTE
170	1766668,714	1126260,318	15,77	DESCAPOTE
171	1766674,456	1126260,221	15,803	DESCAPOTE

172	1766679,467	1126260,161	15,896	DESCAPOTE
173	1766682,459	1126260,137	15,929	DESCAPOTE
174	1766673,23	1126428,116	16,04	DESCAPOTE
175	1766669,032	1126427,989	15,992	DESCAPOTE
176	1766664,651	1126427,75	16,011	DESCAPOTE
177	1766659,293	1126427,696	15,993	DESCAPOTE
178	1766661,713	1126433,676	15,994	DESCAPOTE
179	1766665,626	1126433,073	16,01	DESCAPOTE
180	1766670,551	1126432,642	16,019	DESCAPOTE
181	1766675,893	1126432,377	16,193	DESCAPOTE
182	1766680,644	1126432,154	16,178	DESCAPOTE
183	1766684,32	1126431,688	16,18	DESCAPOTE
184	1766687,351	1126431,638	16,12	DESCAPOTE
185	1766692,321	1126431,365	16,213	DESCAPOTE
186	1766692,544	1126436,179	16,257	DESCAPOTE
187	1766688,735	1126436,297	16,175	DESCAPOTE
188	1766683,524	1126436,458	16,224	DESCAPOTE
189	1766677,355	1126436,95	16,243	DESCAPOTE
190	1766671,524	1126437,567	16,1	DESCAPOTE
191	1766666,398	1126437,947	16,054	DESCAPOTE
192	1766661,66	1126438,585	16,01	DESCAPOTE
193	1766659,761	1126444,417	15,965	DESCAPOTE
194	1766664,706	1126443,9	16,028	DESCAPOTE
195	1766670,13	1126443,399	16,097	DESCAPOTE
196	1766675,678	1126443,138	16,195	DESCAPOTE
197	1766681,353	1126442,744	16,262	DESCAPOTE
198	1766685,652	1126442,525	16,219	DESCAPOTE
199	1766688,132	1126442,484	16,158	DESCAPOTE
200	1766692,765	1126442,156	16,257	DESCAPOTE
201	1766692,885	1126446,95	16,287	DESCAPOTE
202	1766689,123	1126447,354	16,175	DESCAPOTE
203	1766683,797	1126447,851	16,296	DESCAPOTE
204	1766677,427	1126448,113	16,212	DESCAPOTE
205	1766647,862	1125261,109	14,129	DESCAPOTE
206	1766643,948	1125261,392	14,058	DESCAPOTE
207	1766640,536	1125261,616	13,956	DESCAPOTE
208	1766635,024	1125261,772	13,883	DESCAPOTE
209	1766629,255	1125262,181	13,808	DESCAPOTE
210	1766623,453	1125262,456	13,728	DESCAPOTE
211	1766619,448	1125268,637	13,698	DESCAPOTE
212	1766625,504	1125268,561	13,761	DESCAPOTE
213	1766631,031	1125268,471	13,834	DESCAPOTE
214	1766637,477	1125268,466	13,907	DESCAPOTE
215	1766643,267	1125268,473	14,016	DESCAPOTE

216	1766645,014	1125268,564	14,056	DESCAPOTE
217	1766648,394	1125268,609	14,159	DESCAPOTE
218	1766648,871	1125273,545	14,162	DESCAPOTE
219	1766644,169	1125273,638	14,007	DESCAPOTE
220	1766638,899	1125273,688	13,92	DESCAPOTE
221	1766632,884	1125273,856	13,84	DESCAPOTE
222	1766627,335	1125273,862	13,754	DESCAPOTE
223	1766621,708	1125273,973	13,708	DESCAPOTE
224	1766619,86	1125278,85	13,667	DESCAPOTE
225	1766625,604	1125278,712	13,744	DESCAPOTE
226	1766630,886	1125278,513	13,824	DESCAPOTE
227	1766636,733	1125278,415	13,881	DESCAPOTE
228	1766642,02	1125278,375	13,95	DESCAPOTE
229	1766645,994	1125278,408	14,078	DESCAPOTE
230	1766649,446	1125278,237	14,209	DESCAPOTE
231	1766649,048	1125282,996	14,179	DESCAPOTE
232	1766645,983	1125282,975	14,064	DESCAPOTE
233	1766641,217	1125283,224	13,958	DESCAPOTE
234	1766636,163	1125283,347	13,874	DESCAPOTE
235	1766630,803	1125283,43	13,818	DESCAPOTE
236	1766625,421	1125283,907	13,75	DESCAPOTE
237	1766620,49	1125283,838	13,703	DESCAPOTE
238	1766619,576	1125289,225	13,701	DESCAPOTE
239	1766624,662	1125289,159	13,75	DESCAPOTE
240	1766630,322	1125289,031	13,788	DESCAPOTE
241	1766636,008	1125289,023	13,866	DESCAPOTE
242	1766637,746	1125288,956	13,899	DESCAPOTE
243	1766642,412	1125288,743	13,963	DESCAPOTE
244	1766645,7	1125288,595	14,068	DESCAPOTE
245	1766649,691	1125288,51	14,254	DESCAPOTE
246	1766649,82	1125293,026	14,245	DESCAPOTE
247	1766645,036	1125293,059	14,02	DESCAPOTE
248	1766640,041	1125293,396	13,915	DESCAPOTE
249	1766633,869	1125293,335	13,862	DESCAPOTE
250	1766628,448	1125293,494	13,814	DESCAPOTE
251	1766622,437	1125293,765	13,78	DESCAPOTE
252	1766625,983	1125299,594	13,808	DESCAPOTE
253	1766631,621	1125299,462	13,885	DESCAPOTE
254	1766637,914	1125299,373	13,935	DESCAPOTE
255	1766643,216	1125299,37	14,024	DESCAPOTE
256	1766646,512	1125299,3	14,1	DESCAPOTE
257	1766649,821	1125299,32	14,215	DESCAPOTE
258	1766649,484	1125304,209	14,198	DESCAPOTE
259	1766643,553	1125303,981	14,059	DESCAPOTE

260	1766638,257	1125304,362	13,954	DESCAPOTE
261	1766632,369	1125304,96	13,895	DESCAPOTE
262	1766627,15	1125305,207	13,842	DESCAPOTE
263	1766621,98	1125305,23	13,764	DESCAPOTE
264	1766625,218	1125310,152	13,803	DESCAPOTE
265	1766631,129	1125310,233	13,883	DESCAPOTE
266	1766635,516	1125310,108	13,93	DESCAPOTE
267	1766640,934	1125310,186	14,035	DESCAPOTE
268	1766644,951	1125310,016	14,102	DESCAPOTE
269	1766649,701	1125309,966	14,182	DESCAPOTE
270	1766649,622	1125315,375	14,148	DESCAPOTE
271	1766644,82	1125315,365	14,091	DESCAPOTE
272	1766641,248	1125315,577	14,031	DESCAPOTE
273	1766636,268	1125315,37	13,946	DESCAPOTE
274	1766632,699	1125315,508	13,889	DESCAPOTE
275	1766627,799	1125315,796	13,842	DESCAPOTE
276	1766622,953	1125315,942	13,768	DESCAPOTE
277	1766624,723	1125320,824	13,787	DESCAPOTE
278	1766628,293	1125321,119	13,834	DESCAPOTE
279	1766633,308	1125321,102	13,9	DESCAPOTE
280	1766638,084	1125321,133	13,972	DESCAPOTE
281	1766642,559	1125320,981	14,041	DESCAPOTE
282	1766646,825	1125320,717	14,091	DESCAPOTE
283	1766650,425	1125320,791	14,171	DESCAPOTE
284	1766651,769	1125326,026	14,234	DESCAPOTE
285	1766646,123	1125326,421	14,098	DESCAPOTE
286	1766640,763	1125326,254	14,008	DESCAPOTE
287	1766635,768	1125326,435	13,948	DESCAPOTE
288	1766629,863	1125326,708	13,832	DESCAPOTE
289	1766625,65	1125326,938	13,78	DESCAPOTE
290	1766621,408	1125327,163	13,745	DESCAPOTE
291	1766625,5	1125331,132	13,795	DESCAPOTE
292	1766631,239	1125331,037	13,86	DESCAPOTE
293	1766637,121	1125330,849	13,977	DESCAPOTE
294	1766642,638	1125330,605	14,035	DESCAPOTE
295	1766647,642	1125330,511	14,135	DESCAPOTE
296	1766652,164	1125330,252	14,247	DESCAPOTE
297	1766651,263	1125335,396	14,211	DESCAPOTE
298	1766645,539	1125335,117	14,141	DESCAPOTE
299	1766639,551	1125335,037	14,013	DESCAPOTE
300	1766633,953	1125335,087	13,93	DESCAPOTE
301	1766628,633	1125335,293	13,847	DESCAPOTE
302	1766623,19	1125335,367	13,771	DESCAPOTE
303	1766626,427	1125340,082	13,839	DESCAPOTE

304	1766631,717	1125340,092	13,909	DESCAPOTE
305	1766637,163	1125340,203	13,969	DESCAPOTE
306	1766642,731	1125340,246	14,068	DESCAPOTE
307	1766647,616	1125340,281	14,152	DESCAPOTE
308	1766651,975	1125340,179	14,26	DESCAPOTE
309	1766650,313	1125344,762	14,21	DESCAPOTE
310	1766645,27	1125344,957	14,14	DESCAPOTE
311	1766638,726	1125345,244	14,029	DESCAPOTE
312	1766633,614	1125345,497	13,948	DESCAPOTE
313	1766627,47	1125345,548	13,859	DESCAPOTE
314	1766622,46	1125345,41	13,783	DESCAPOTE
315	1766622,081	1125351,379	13,746	DESCAPOTE
316	1766627,472	1125351,075	13,863	DESCAPOTE
317	1766633,217	1125351,117	13,959	DESCAPOTE
318	1766638,841	1125351,144	14,017	DESCAPOTE
319	1766643,684	1125350,99	14,074	DESCAPOTE
320	1766648,335	1125350,829	14,191	DESCAPOTE
321	1766652,612	1125350,8	14,298	DESCAPOTE
322	1766672,976	1125984,22	15,177	DESCAPOTE
323	1766668,006	1125984,31	15,103	DESCAPOTE
324	1766663,347	1125984,31	14,985	DESCAPOTE
325	1766657,258	1125984,691	14,902	DESCAPOTE
326	1766652,058	1125984,927	14,843	DESCAPOTE
327	1766646,688	1125984,921	14,746	DESCAPOTE
328	1766646,753	1125980,221	14,729	DESCAPOTE
329	1766652,561	1125980,321	14,843	DESCAPOTE
330	1766658,838	1125980,244	14,871	DESCAPOTE
331	1766664,811	1125980,263	14,992	DESCAPOTE
332	1766669,065	1125980,233	15,063	DESCAPOTE
333	1766673,382	1125980,353	15,209	DESCAPOTE
334	1766672,095	1125976,412	15,114	DESCAPOTE
335	1766665,9	1125976,267	14,98	DESCAPOTE
336	1766659,636	1125976,192	14,902	DESCAPOTE
337	1766653,63	1125976,092	14,851	DESCAPOTE
338	1766647,981	1125975,969	14,792	DESCAPOTE
339	1766645,988	1125971,623	14,714	DESCAPOTE
340	1766652,123	1125971,688	14,788	DESCAPOTE
341	1766657,911	1125971,884	14,862	DESCAPOTE
342	1766664,177	1125972,185	14,948	DESCAPOTE
343	1766670,238	1125972,474	15,022	DESCAPOTE
344	1766674,868	1125972,663	15,211	DESCAPOTE
345	1766671,787	1125967,131	15,068	DESCAPOTE
346	1766666,287	1125966,984	14,975	DESCAPOTE
347	1766660,956	1125966,826	14,933	DESCAPOTE

348	1766655,527	1125966,662	14,839	DESCAPOTE
349	1766649,655	1125966,521	14,788	DESCAPOTE
350	1766644,438	1125966,35	14,709	DESCAPOTE
351	1766646,578	1125961,103	14,723	DESCAPOTE
352	1766652,762	1125961,319	14,825	DESCAPOTE
353	1766659,339	1125961,545	14,929	DESCAPOTE
354	1766665,952	1125961,764	14,985	DESCAPOTE
355	1766671,291	1125962,019	15,084	DESCAPOTE
356	1766673,984	1125962,023	15,177	DESCAPOTE
357	1766671,14	1125956,869	15,105	DESCAPOTE
358	1766666,025	1125956,721	15,023	DESCAPOTE
359	1766659,986	1125956,549	14,974	DESCAPOTE
360	1766653,712	1125956,413	14,885	DESCAPOTE
361	1766647,675	1125956,231	14,766	DESCAPOTE
362	1766645,887	1125951,011	14,751	DESCAPOTE
363	1766652,201	1125951,096	14,884	DESCAPOTE
364	1766658,503	1125951,37	14,965	DESCAPOTE
365	1766665,196	1125951,447	15,027	DESCAPOTE
366	1766670,99	1125951,413	15,114	DESCAPOTE
367	1766674,231	1125951,459	15,234	DESCAPOTE
368	1766671,601	1125946,092	15,111	DESCAPOTE
369	1766665,844	1125946,097	15,02	DESCAPOTE
370	1766659,981	1125946,046	14,985	DESCAPOTE
371	1766654,122	1125946,009	14,96	DESCAPOTE
372	1766647,855	1125945,906	14,791	DESCAPOTE
373	1766642,205	1125945,883	14,703	DESCAPOTE
374	1766645,974	1125940,664	14,749	DESCAPOTE
375	1766652,009	1125940,756	14,888	DESCAPOTE
376	1766658,453	1125940,637	14,893	DESCAPOTE
377	1766665,059	1125940,663	14,94	DESCAPOTE
378	1766670,858	1125940,71	15,064	DESCAPOTE
379	1766674,178	1125940,701	15,21	DESCAPOTE
380	1766670,936	1125935,115	15,065	DESCAPOTE
381	1766666,051	1125935,154	14,977	DESCAPOTE
382	1766660,736	1125935,204	14,973	DESCAPOTE
383	1766655,215	1125935,292	14,932	DESCAPOTE
384	1766650,059	1125935,309	14,807	DESCAPOTE
385	1766644,148	1125935,414	14,689	DESCAPOTE
386	1766643,804	1125930,596	14,653	DESCAPOTE
387	1766649,426	1125930,795	14,732	DESCAPOTE
388	1766656,126	1125930,892	14,883	DESCAPOTE
389	1766662,861	1125930,714	14,924	DESCAPOTE
390	1766667,951	1125930,75	15,008	DESCAPOTE
391	1766672,653	1125930,722	15,147	DESCAPOTE

392	1766669,883	1125926,833	15,01	DESCAPOTE
393	1766663,381	1125926,736	14,921	DESCAPOTE
394	1766659,237	1125926,699	14,893	DESCAPOTE
395	1766654,646	1125926,585	14,827	DESCAPOTE
396	1766649,58	1125926,339	14,691	DESCAPOTE
397	1766644,586	1125926,252	14,655	DESCAPOTE
398	1766644,937	1125921,037	14,58	DESCAPOTE
399	1766649,743	1125921,284	14,651	DESCAPOTE
400	1766655,126	1125921,407	14,79	DESCAPOTE
401	1766659,621	1125921,495	14,666	DESCAPOTE
402	1766660,843	1125921,649	14,876	DESCAPOTE
403	1766663,465	1125921,797	14,966	DESCAPOTE
404	1766666,217	1125921,874	14,996	DESCAPOTE
405	1766670,594	1125921,991	15,07	DESCAPOTE
406	1766673,154	1125922,253	15,171	DESCAPOTE
407	1766669,913	1125916,248	14,998	DESCAPOTE
408	1766664,26	1125916,236	14,923	DESCAPOTE
409	1766658,544	1125916,208	14,796	DESCAPOTE
410	1766653,141	1125915,975	14,69	DESCAPOTE
411	1766648,082	1125916,096	14,634	DESCAPOTE
412	1766643,245	1125916,062	14,555	DESCAPOTE
413	1766644,14	1125910,139	14,571	DESCAPOTE
414	1766650,556	1125910,041	14,647	DESCAPOTE
415	1766656,382	1125910,1	14,742	DESCAPOTE
416	1766662,794	1125910,165	14,85	DESCAPOTE
417	1766667,27	1125910,078	14,923	DESCAPOTE
418	1766671,532	1125909,975	15,093	DESCAPOTE
419	1766670,356	1125904,412	14,989	DESCAPOTE
420	1766665,748	1125904,682	14,924	DESCAPOTE
421	1766660,78	1125904,849	14,816	DESCAPOTE
422	1766655,101	1125904,785	14,743	DESCAPOTE
423	1766650,643	1125904,913	14,662	DESCAPOTE
424	1766644,686	1125905,067	14,562	DESCAPOTE
425	1766643,054	1125900,211	14,545	DESCAPOTE
426	1766649,507	1125900,041	14,656	DESCAPOTE
427	1766655,402	1125899,957	14,749	DESCAPOTE
428	1766661,735	1125899,654	14,823	DESCAPOTE
429	1766667,154	1125899,573	14,868	DESCAPOTE
430	1766670,868	1125899,37	15,024	DESCAPOTE
431	1766669,156	1125893,587	14,883	DESCAPOTE
432	1766663,759	1125893,602	14,787	DESCAPOTE
433	1766658,539	1125893,679	14,757	DESCAPOTE
434	1766653,324	1125893,911	14,715	DESCAPOTE
435	1766647,31	1125894,401	14,63	DESCAPOTE

436	1766642,402	1125894,694	14,548	DESCAPOTE
437	1766644,112	1125889,8	14,595	DESCAPOTE
438	1766650,181	1125889,607	14,647	DESCAPOTE
439	1766656,286	1125889,616	14,684	DESCAPOTE
440	1766661,951	1125889,642	14,778	DESCAPOTE
441	1766666,952	1125889,489	14,856	DESCAPOTE
442	1766670,641	1125889,328	15,015	DESCAPOTE
443	1766669,606	1125884,448	14,925	DESCAPOTE
444	1766664,545	1125884,703	14,827	DESCAPOTE
445	1766658,732	1125884,996	14,741	DESCAPOTE
446	1766653,851	1125885,038	14,627	DESCAPOTE
447	1766648,784	1125885,307	14,614	DESCAPOTE
448	1766643,318	1125884,911	14,5	DESCAPOTE
449	1766642,974	1125880,278	14,464	DESCAPOTE
450	1766649,267	1125880,265	14,601	DESCAPOTE
451	1766654,77	1125880,016	14,709	DESCAPOTE
452	1766660,803	1125879,751	14,782	DESCAPOTE
453	1766666,292	1125879,786	14,861	DESCAPOTE
454	1766670,706	1125879,621	15,014	DESCAPOTE
455	1766669,102	1125874,366	14,939	DESCAPOTE
456	1766663,498	1125874,828	14,834	DESCAPOTE
457	1766658,206	1125874,857	14,76	DESCAPOTE
458	1766651,687	1125875,152	14,641	DESCAPOTE
459	1766645,597	1125875,014	14,481	DESCAPOTE
460	1766641,688	1125874,723	14,431	DESCAPOTE
461	1766642,44	1125870,256	14,415	DESCAPOTE
462	1766648,444	1125870,183	14,585	DESCAPOTE
463	1766654,957	1125869,955	14,661	DESCAPOTE
464	1766660,264	1125869,903	14,766	DESCAPOTE
465	1766665,547	1125869,845	14,842	DESCAPOTE
466	1766670,344	1125869,672	15,009	DESCAPOTE
467	1766669,056	1125864,55	14,994	DESCAPOTE
468	1766663,835	1125864,458	14,84	DESCAPOTE
469	1766658,897	1125864,615	14,719	DESCAPOTE
470	1766653,71	1125864,8	14,656	DESCAPOTE
471	1766648,35	1125864,854	14,53	DESCAPOTE
472	1766643,091	1125864,793	14,427	DESCAPOTE
473	1766641,154	1125860,088	14,383	DESCAPOTE
474	1766647,3	1125860,096	14,492	DESCAPOTE
475	1766653,198	1125859,983	14,617	DESCAPOTE
476	1766658,286	1125859,932	14,685	DESCAPOTE
477	1766663,961	1125859,826	14,814	DESCAPOTE
478	1766669,313	1125859,906	15,006	DESCAPOTE
479	1766668,961	1125854,748	14,96	DESCAPOTE

480	1766664,006	1125855,033	14,814	DESCAPOTE
481	1766659,419	1125855,209	14,72	DESCAPOTE
482	1766654,563	1125855,115	14,675	DESCAPOTE
483	1766650,058	1125855,027	14,591	DESCAPOTE
484	1766645,472	1125855,004	14,487	DESCAPOTE
485	1766639,588	1125855,497	14,401	DESCAPOTE
486	1766642,325	1125850,137	14,462	DESCAPOTE
487	1766648,097	1125849,918	14,525	DESCAPOTE
488	1766653,904	1125849,894	14,632	DESCAPOTE
489	1766659,436	1125849,734	14,725	DESCAPOTE
490	1766664,597	1125849,751	14,783	DESCAPOTE
491	1766668,26	1125849,713	14,854	DESCAPOTE
492	1766667,98	1125844,54	14,833	DESCAPOTE
493	1766662,835	1125844,676	14,792	DESCAPOTE
494	1766657,679	1125844,972	14,663	DESCAPOTE
495	1766652,603	1125844,816	14,585	DESCAPOTE
496	1766647,698	1125844,854	14,5	DESCAPOTE
497	1766643,33	1125845,251	14,5	DESCAPOTE
498	1766639,34	1125845,364	14,46	DESCAPOTE
499	1766641,374	1125840,386	14,416	DESCAPOTE
500	1766646,657	1125840,263	14,513	DESCAPOTE
501	1766651,851	1125840,304	14,536	DESCAPOTE
502	1766657,422	1125840,054	14,643	DESCAPOTE
503	1766662,472	1125840,002	14,702	DESCAPOTE
504	1766666,617	1125839,875	14,784	DESCAPOTE
505	1766669,411	1125839,771	14,993	DESCAPOTE
506	1766667,946	1125834,854	14,931	DESCAPOTE
507	1766663,462	1125835,19	14,756	DESCAPOTE
508	1766658,412	1125835,49	14,703	DESCAPOTE
509	1766652,021	1125835,464	14,594	DESCAPOTE
510	1766645,859	1125835,092	14,491	DESCAPOTE
511	1766639,619	1125835,309	14,411	DESCAPOTE
512	1766642,591	1125830,81	14,494	DESCAPOTE
513	1766648,806	1125831,03	14,564	DESCAPOTE
514	1766656,553	1125830,76	14,653	DESCAPOTE
515	1766662,776	1125830,745	14,764	DESCAPOTE
516	1766668,029	1125830,832	14,917	DESCAPOTE
517	1766667,951	1125825,843	14,871	DESCAPOTE
518	1766661,834	1125825,724	14,677	DESCAPOTE
519	1766655,533	1125825,965	14,632	DESCAPOTE
520	1766650,348	1125825,915	14,57	DESCAPOTE
521	1766645,811	1125825,899	14,496	DESCAPOTE
522	1766641,061	1125825,619	14,505	DESCAPOTE
523	1766641,051	1125820,319	14,438	DESCAPOTE

524	1766647,007	1125820,379	14,542	DESCAPOTE
525	1766652,04	1125820,448	14,552	DESCAPOTE
526	1766657,255	1125820,44	14,633	DESCAPOTE
527	1766662,51	1125820,451	14,717	DESCAPOTE
528	1766666,946	1125820,531	14,768	DESCAPOTE
529	1766666,947	1125815,211	14,858	DESCAPOTE
530	1766661,28	1125814,933	14,693	DESCAPOTE
531	1766655,92	1125815,114	14,647	DESCAPOTE
532	1766650,008	1125815,197	14,547	DESCAPOTE
533	1766644,726	1125815,498	14,49	DESCAPOTE
534	1766638,264	1125815,554	14,425	DESCAPOTE
535	1766640,221	1125810,385	14,443	DESCAPOTE
536	1766646,107	1125810,527	14,506	DESCAPOTE
537	1766651,538	1125810,452	14,589	DESCAPOTE
538	1766657,483	1125810,424	14,655	DESCAPOTE
539	1766663,305	1125810,472	14,76	DESCAPOTE
540	1766667,51	1125810,319	14,889	DESCAPOTE
541	1766666,145	1125804,95	14,81	DESCAPOTE
542	1766660,628	1125805,201	14,616	DESCAPOTE
543	1766654,778	1125805,567	14,564	DESCAPOTE
544	1766646,873	1125805,238	14,462	DESCAPOTE
545	1766641,959	1125805,238	14,377	DESCAPOTE
546	1766636,987	1125805,184	14,354	DESCAPOTE
547	1766641,223	1125800,716	14,383	DESCAPOTE
548	1766646,412	1125800,661	14,468	DESCAPOTE
549	1766652,354	1125800,594	14,555	DESCAPOTE
550	1766657,443	1125800,495	14,646	DESCAPOTE
551	1766662,51	1125800,309	14,671	DESCAPOTE
552	1766667,333	1125800,229	14,855	DESCAPOTE
553	1766669,299	1125800,3	14,928	DESCAPOTE
554	1766665,474	1125794,61	14,844	DESCAPOTE
555	1766660,123	1125794,782	14,728	DESCAPOTE
556	1766654,095	1125795,189	14,683	DESCAPOTE
557	1766648,299	1125795,467	14,537	DESCAPOTE
558	1766643,415	1125795,306	14,463	DESCAPOTE
559	1766637,604	1125795,456	14,426	DESCAPOTE
560	1766639,515	1125790,482	14,442	DESCAPOTE
561	1766645,235	1125790,457	14,494	DESCAPOTE
562	1766651,392	1125790,485	14,647	DESCAPOTE
563	1766657,019	1125790,438	14,732	DESCAPOTE
564	1766662,157	1125790,528	14,764	DESCAPOTE
565	1766666,905	1125790,343	14,887	DESCAPOTE
566	1766664,642	1125785,248	14,804	DESCAPOTE
567	1766659,056	1125785,154	14,672	DESCAPOTE

568	1766652,942	1125784,922	14,637	DESCAPOTE
569	1766646,303	1125785,241	14,527	DESCAPOTE
570	1766640,338	1125785,222	14,481	DESCAPOTE
571	1766639,343	1125780,609	14,454	DESCAPOTE
572	1766645,522	1125780,587	14,511	DESCAPOTE
573	1766651,557	1125780,299	14,589	DESCAPOTE
574	1766657,42	1125780,349	14,628	DESCAPOTE
575	1766662,86	1125780,123	14,729	DESCAPOTE
576	1766667,243	1125780,057	14,924	DESCAPOTE
577	1766664,373	1125775,019	14,779	DESCAPOTE
578	1766659,11	1125775,486	14,626	DESCAPOTE
579	1766653,556	1125775,241	14,539	DESCAPOTE
580	1766648,165	1125775,121	14,524	DESCAPOTE
581	1766642,766	1125775,208	14,475	DESCAPOTE
582	1766637,305	1125775,762	14,471	DESCAPOTE
583	1766640,972	1125770,596	14,409	DESCAPOTE
584	1766647,081	1125770,348	14,452	DESCAPOTE
585	1766653,023	1125770,166	14,498	DESCAPOTE
586	1766658,352	1125769,97	14,625	DESCAPOTE
587	1766663,58	1125769,718	14,715	DESCAPOTE
588	1766667,376	1125769,619	14,825	DESCAPOTE
589	1766666,198	1125764,655	14,733	DESCAPOTE
590	1766660,995	1125764,605	14,638	DESCAPOTE
591	1766655,24	1125764,59	14,612	DESCAPOTE
592	1766649,977	1125764,727	14,54	DESCAPOTE
593	1766644,722	1125764,858	14,474	DESCAPOTE
594	1766639,854	1125764,836	14,389	DESCAPOTE
595	1766639,271	1125760,669	14,38	DESCAPOTE
596	1766643,79	1125760,706	14,459	DESCAPOTE
597	1766648,901	1125760,601	14,54	DESCAPOTE
598	1766653,243	1125760,626	14,68	DESCAPOTE
599	1766657,446	1125760,649	14,641	DESCAPOTE
600	1766661,798	1125760,57	14,663	DESCAPOTE
601	1766665,86	1125760,495	14,773	DESCAPOTE
602	1766665,021	1125755,509	14,758	DESCAPOTE
603	1766660,644	1125755,518	14,646	DESCAPOTE
604	1766655,952	1125755,458	14,608	DESCAPOTE
605	1766651,345	1125755,879	14,532	DESCAPOTE
606	1766646,3	1125756,241	14,508	DESCAPOTE
607	1766641,268	1125756,176	14,427	DESCAPOTE
608	1766635,527	1125755,791	14,321	DESCAPOTE
609	1766637,72	1125750,346	14,304	DESCAPOTE
610	1766642,87	1125750,465	14,411	DESCAPOTE
611	1766648,51	1125750,427	14,496	DESCAPOTE

612	1766654,121	1125750,538	14,574	DESCAPOTE
613	1766659,67	1125750,485	14,646	DESCAPOTE
614	1766663,914	1125750,474	14,711	DESCAPOTE
615	1766667,103	1125750,328	14,855	DESCAPOTE
616	1766664,823	1125745,204	14,77	DESCAPOTE
617	1766659,773	1125745,549	14,675	DESCAPOTE
618	1766654,79	1125745,513	14,611	DESCAPOTE
619	1766649,481	1125745,605	14,521	DESCAPOTE
620	1766643,978	1125745,715	14,449	DESCAPOTE
621	1766638,734	1125745,581	14,326	DESCAPOTE
622	1766637,003	1125740,745	14,303	DESCAPOTE
623	1766641,715	1125740,533	14,424	DESCAPOTE
624	1766646,269	1125740,445	14,489	DESCAPOTE
625	1766650,893	1125740,38	14,529	DESCAPOTE
626	1766654,949	1125740,409	14,61	DESCAPOTE
627	1766657,597	1125740,461	14,635	DESCAPOTE
628	1766659,625	1125740,568	14,695	DESCAPOTE
629	1766662,602	1125740,445	14,718	DESCAPOTE
630	1766665,664	1125740,533	14,826	DESCAPOTE
631	1766662,201	1125735,341	14,683	DESCAPOTE
632	1766655,829	1125735,255	14,609	DESCAPOTE
633	1766649,262	1125735,288	14,51	DESCAPOTE
634	1766642,222	1125735,491	14,391	DESCAPOTE
635	1766635,873	1125735,797	14,278	DESCAPOTE
636	1766634,466	1125730,339	14,307	DESCAPOTE
637	1766641,433	1125730,003	14,38	DESCAPOTE
638	1766648,434	1125729,859	14,49	DESCAPOTE
639	1766654,545	1125729,833	14,579	DESCAPOTE
640	1766661,191	1125729,599	14,677	DESCAPOTE
641	1766665,467	1125729,49	14,794	DESCAPOTE
642	1766665,828	1125724,139	14,819	DESCAPOTE
643	1766659,297	1125724,616	14,643	DESCAPOTE
644	1766652,775	1125725,234	14,552	DESCAPOTE
645	1766645,723	1125724,836	14,448	DESCAPOTE
646	1766638,53	1125725,062	14,296	DESCAPOTE
647	1766639,341	1125720,105	14,315	DESCAPOTE
648	1766645,85	1125719,776	14,429	DESCAPOTE
649	1766652,091	1125719,485	14,53	DESCAPOTE
650	1766659,069	1125719,265	14,669	DESCAPOTE
651	1766664,827	1125718,982	14,804	DESCAPOTE
652	1766664,936	1125713,534	14,806	DESCAPOTE
653	1766658,563	1125713,911	14,646	DESCAPOTE
654	1766651,583	1125714,165	14,505	DESCAPOTE
655	1766644,984	1125714,508	14,434	DESCAPOTE

656	1766637,55	1125714,881	14,283	DESCAPOTE
657	1766633,574	1125709,707	14,198	DESCAPOTE
658	1766641,365	1125709,363	14,34	DESCAPOTE
659	1766649,01	1125709,148	14,49	DESCAPOTE
660	1766656,391	1125708,869	14,567	DESCAPOTE
661	1766662,15	1125708,625	14,705	DESCAPOTE
662	1766665,067	1125708,359	14,804	DESCAPOTE
663	1766659,19	1125702,898	14,671	DESCAPOTE
664	1766651,298	1125703,381	14,503	DESCAPOTE
665	1766644,04	1125703,89	14,404	DESCAPOTE
666	1766635,497	1125704,463	14,227	DESCAPOTE
667	1766639,054	1125699,467	14,305	DESCAPOTE
668	1766646,393	1125698,997	14,419	DESCAPOTE
669	1766652,786	1125698,346	14,469	DESCAPOTE
670	1766659,135	1125697,785	14,621	DESCAPOTE
671	1766664,995	1125697,3	14,783	DESCAPOTE
672	1766664,824	1125691,207	14,75	DESCAPOTE
673	1766657,151	1125691,985	14,592	DESCAPOTE
674	1766649,321	1125692,691	14,426	DESCAPOTE
675	1766642,001	1125693,346	14,313	DESCAPOTE
676	1766634,751	1125694,042	14,223	DESCAPOTE
677	1766634,306	1125688,75	14,227	DESCAPOTE
678	1766641,007	1125687,755	14,323	DESCAPOTE
679	1766648,342	1125687,087	14,413	DESCAPOTE
680	1766655,36	1125686,354	14,517	DESCAPOTE
681	1766661,588	1125685,947	14,655	DESCAPOTE
682	1766664,321	1125685,754	14,737	DESCAPOTE
683	1766664,369	1125679,681	14,751	DESCAPOTE
684	1766658,423	1125680,351	14,602	DESCAPOTE
685	1766650,709	1125681,268	14,455	DESCAPOTE
686	1766643,101	1125682,319	14,36	DESCAPOTE
687	1766636,213	1125683,135	14,271	DESCAPOTE
688	1766632,688	1125675,203	14,233	DESCAPOTE
689	1766640,577	1125674,666	14,337	DESCAPOTE
690	1766648,092	1125674,341	14,417	DESCAPOTE
691	1766655,68	1125674,155	14,515	DESCAPOTE
692	1766663,296	1125673,84	14,72	DESCAPOTE
693	1766663,324	1125667,605	14,692	DESCAPOTE
694	1766657,601	1125667,896	14,582	DESCAPOTE
695	1766649,55	1125667,966	14,462	DESCAPOTE
696	1766641,785	1125669,407	14,374	DESCAPOTE
697	1766635,203	1125669,736	14,273	DESCAPOTE
698	1766632,432	1125664,211	14,211	DESCAPOTE
699	1766639,831	1125663,716	14,334	DESCAPOTE

700	1766648,45	1125663,189	14,422	DESCAPOTE
701	1766656,216	1125662,835	14,553	DESCAPOTE
702	1766662,915	1125662,517	14,697	DESCAPOTE
703	1766662,994	1125656,579	14,696	DESCAPOTE
704	1766656,805	1125656,754	14,54	DESCAPOTE
705	1766649,851	1125657,527	14,422	DESCAPOTE
706	1766643,453	1125658,095	14,371	DESCAPOTE
707	1766636,301	1125658,744	14,274	DESCAPOTE
708	1766632,36	1125654,168	14,189	DESCAPOTE
709	1766640,254	1125653,309	14,338	DESCAPOTE
710	1766647,987	1125652,291	14,4	DESCAPOTE
711	1766655,99	1125651,419	14,512	DESCAPOTE
712	1766662,811	1125650,801	14,705	DESCAPOTE
713	1766662,952	1125645,124	14,682	DESCAPOTE
714	1766656,007	1125645,838	14,562	DESCAPOTE
715	1766647,648	1125646,862	14,396	DESCAPOTE
716	1766640,339	1125647,723	14,321	DESCAPOTE
717	1766632,189	1125648,688	14,166	DESCAPOTE
718	1766631,221	1125640,169	14,146	DESCAPOTE
719	1766638,747	1125639,801	14,289	DESCAPOTE
720	1766646,516	1125639,152	14,408	DESCAPOTE
721	1766653,534	1125638,955	14,487	DESCAPOTE
722	1766661,079	1125638,498	14,624	DESCAPOTE
723	1766663,481	1125638,157	14,679	DESCAPOTE
724	1766662,99	1125632,705	14,683	DESCAPOTE
725	1766655,418	1125633,34	14,537	DESCAPOTE
726	1766648,327	1125633,864	14,407	DESCAPOTE
727	1766640,919	1125634,309	14,335	DESCAPOTE
728	1766633,8	1125634,688	14,182	DESCAPOTE
729	1766631,758	1125629,839	14,143	DESCAPOTE
730	1766639,164	1125629,191	14,28	DESCAPOTE
731	1766646,688	1125628,562	14,373	DESCAPOTE
732	1766654,947	1125628,125	14,504	DESCAPOTE
733	1766662,337	1125627,625	14,635	DESCAPOTE
734	1766662,15	1125621,142	14,597	DESCAPOTE
735	1766654,237	1125622,15	14,431	DESCAPOTE
736	1766646,549	1125622,597	14,369	DESCAPOTE
737	1766638,817	1125623,447	14,255	DESCAPOTE
738	1766631,041	1125624,138	14,105	DESCAPOTE
739	1766632,013	1125615,654	14,132	DESCAPOTE
740	1766639,394	1125615,482	14,224	DESCAPOTE
741	1766646,767	1125615,401	14,356	DESCAPOTE
742	1766654,932	1125615,379	14,459	DESCAPOTE
743	1766660,024	1125615,406	14,531	DESCAPOTE

744	1766662,376	1125615,364	14,629	DESCAPOTE
745	1766662,309	1125609,202	14,596	DESCAPOTE
746	1766655,306	1125609,528	14,473	DESCAPOTE
747	1766648,607	1125610,083	14,385	DESCAPOTE
748	1766641,466	1125609,956	14,243	DESCAPOTE
749	1766633,654	1125610,166	14,144	DESCAPOTE
750	1766630,183	1125605,209	14,075	DESCAPOTE
751	1766638,248	1125605,072	14,188	DESCAPOTE
752	1766645,36	1125604,737	14,309	DESCAPOTE
753	1766652,401	1125604,575	14,42	DESCAPOTE
754	1766659,875	1125604,139	14,52	DESCAPOTE
755	1766659,905	1125598,157	14,544	DESCAPOTE
756	1766652,349	1125598,487	14,417	DESCAPOTE
757	1766644,571	1125598,882	14,282	DESCAPOTE
758	1766636,578	1125599,245	14,241	DESCAPOTE
759	1766629,31	1125599,796	14,061	DESCAPOTE
760	1766629,498	1125594,868	14,038	DESCAPOTE
761	1766636,612	1125594,661	14,18	DESCAPOTE
762	1766644,1	1125594,348	14,288	DESCAPOTE
763	1766651,309	1125593,781	14,401	DESCAPOTE
764	1766656,761	1125593,317	14,47	DESCAPOTE
765	1766660,991	1125592,839	14,579	DESCAPOTE
766	1766661,271	1125587,476	14,62	DESCAPOTE
767	1766655,096	1125587,544	14,458	DESCAPOTE
768	1766647,544	1125588,007	14,38	DESCAPOTE
769	1766640,112	1125588,956	14,267	DESCAPOTE
770	1766632,108	1125589,493	14,062	DESCAPOTE
771	1766629,601	1125584,67	14,025	DESCAPOTE
772	1766637,683	1125583,898	14,211	DESCAPOTE
773	1766644,795	1125583,273	14,327	DESCAPOTE
774	1766651,151	1125582,726	14,399	DESCAPOTE
775	1766657,634	1125582,385	14,478	DESCAPOTE
776	1766657,923	1125576,891	14,487	DESCAPOTE
777	1766651,814	1125577,653	14,419	DESCAPOTE
778	1766643,5	1125578,116	14,289	DESCAPOTE
779	1766635,948	1125578,774	14,219	DESCAPOTE
780	1766633,978	1125573,358	14,115	DESCAPOTE
781	1766640,747	1125572,912	14,235	DESCAPOTE
782	1766648,188	1125572,464	14,383	DESCAPOTE
783	1766654,207	1125572,163	14,441	DESCAPOTE
784	1766659,406	1125571,687	14,543	DESCAPOTE
785	1766660,001	1125565,643	14,549	DESCAPOTE
786	1766653,177	1125566,01	14,432	DESCAPOTE
787	1766645,872	1125567,042	14,346	DESCAPOTE

788	1766639,383	1125567,753	14,143	DESCAPOTE
789	1766630,868	1125568,681	14,079	DESCAPOTE
790	1766635,106	1125563,173	14,134	DESCAPOTE
791	1766642,455	1125562,344	14,249	DESCAPOTE
792	1766647,91	1125561,685	14,36	DESCAPOTE
793	1766651,339	1125561,422	14,386	DESCAPOTE
794	1766654,117	1125561,261	14,435	DESCAPOTE
795	1766659,245	1125560,424	14,546	DESCAPOTE
796	1766659,7	1125554,79	14,594	DESCAPOTE
797	1766653,153	1125555,773	14,448	DESCAPOTE
798	1766647,321	1125556,451	14,346	DESCAPOTE
799	1766640,675	1125557,306	14,203	DESCAPOTE
800	1766634,063	1125558,003	14,086	DESCAPOTE
801	1766627,931	1125558,699	14,004	DESCAPOTE
802	1766628,421	1125553,858	13,983	DESCAPOTE
803	1766635,393	1125552,969	14,073	DESCAPOTE
804	1766642,634	1125552,193	14,179	DESCAPOTE
805	1766650,807	1125551,153	14,342	DESCAPOTE
806	1766657,864	1125550,02	14,535	DESCAPOTE
807	1766658,496	1125543,421	14,512	DESCAPOTE
808	1766652,574	1125543,53	14,411	DESCAPOTE
809	1766646,363	1125543,959	14,288	DESCAPOTE
810	1766640,154	1125544,241	14,123	DESCAPOTE
811	1766633,733	1125544,644	13,997	DESCAPOTE
812	1766632,481	1125538,983	13,975	DESCAPOTE
813	1766640,215	1125538,694	14,142	DESCAPOTE
814	1766647,031	1125538,448	14,304	DESCAPOTE
815	1766653,929	1125538,225	14,445	DESCAPOTE
816	1766658,254	1125537,81	14,518	DESCAPOTE
817	1766658,951	1125531,621	14,557	DESCAPOTE
818	1766653,551	1125531,828	14,397	DESCAPOTE
819	1766647,073	1125532,312	14,305	DESCAPOTE
820	1766641,884	1125532,809	14,183	DESCAPOTE
821	1766634,983	1125533,529	14,056	DESCAPOTE
822	1766628,356	1125534,24	13,967	DESCAPOTE
823	1766627,494	1125528,752	13,97	DESCAPOTE
824	1766634,697	1125528,098	14,068	DESCAPOTE
825	1766641,387	1125527,451	14,179	DESCAPOTE
826	1766648,484	1125526,641	14,336	DESCAPOTE
827	1766653,88	1125525,836	14,408	DESCAPOTE
828	1766657,73	1125525,523	14,493	DESCAPOTE
829	1766658,226	1125518,866	14,537	DESCAPOTE
830	1766652,169	1125519,787	14,388	DESCAPOTE
831	1766645,726	1125520,713	14,338	DESCAPOTE

832	1766639,247	1125521,668	14,151	DESCAPOTE
833	1766632,399	1125522,625	14,061	DESCAPOTE
834	1766626,76	1125514,876	13,944	DESCAPOTE
835	1766635,041	1125514,492	14,065	DESCAPOTE
836	1766641,622	1125514,386	14,183	DESCAPOTE
837	1766647,627	1125514,216	14,343	DESCAPOTE
838	1766653,52	1125513,6	14,396	DESCAPOTE
839	1766657,977	1125513,07	14,493	DESCAPOTE
840	1766658,181	1125507,626	14,499	DESCAPOTE
841	1766652,739	1125507,874	14,385	DESCAPOTE
842	1766647,083	1125508,381	14,338	DESCAPOTE
843	1766640,237	1125508,84	14,141	DESCAPOTE
844	1766633,434	1125509,306	14,053	DESCAPOTE
845	1766626,324	1125509,793	13,967	DESCAPOTE
846	1766626,302	1125504,404	13,946	DESCAPOTE
847	1766633,039	1125504,028	14,027	DESCAPOTE
848	1766639,487	1125503,716	14,106	DESCAPOTE
849	1766645,89	1125502,98	14,289	DESCAPOTE
850	1766652,268	1125502,476	14,379	DESCAPOTE
851	1766657,364	1125502,107	14,478	DESCAPOTE
852	1766657,917	1125496,944	14,494	DESCAPOTE
853	1766652,156	1125497,372	14,363	DESCAPOTE
854	1766645,801	1125498,056	14,29	DESCAPOTE
855	1766639,8	1125498,412	14,109	DESCAPOTE
856	1766632,833	1125499,077	14,038	DESCAPOTE
857	1766626,992	1125499,507	13,981	DESCAPOTE
858	1766626,438	1125494,211	14,006	DESCAPOTE
859	1766632,33	1125493,354	14,016	DESCAPOTE
860	1766638,731	1125492,781	14,07	DESCAPOTE
861	1766644,913	1125492,423	14,249	DESCAPOTE
862	1766652,164	1125491,605	14,334	DESCAPOTE
863	1766657,5	1125491,075	14,468	DESCAPOTE
864	1766657,127	1125484,562	14,466	DESCAPOTE
865	1766650,288	1125484,762	14,296	DESCAPOTE
866	1766643,192	1125485,53	14,196	DESCAPOTE
867	1766635,667	1125487,076	14,052	DESCAPOTE
868	1766628,353	1125488,137	14,028	DESCAPOTE
869	1766625,935	1125483,636	13,957	DESCAPOTE
870	1766632,819	1125482,482	13,997	DESCAPOTE
871	1766640,352	1125481,098	14,104	DESCAPOTE
872	1766647,357	1125479,697	14,276	DESCAPOTE
873	1766652,355	1125478,863	14,329	DESCAPOTE
874	1766656,375	1125478,439	14,46	DESCAPOTE
875	1766656,615	1125471,545	14,462	DESCAPOTE

876	1766650,262	1125472,016	14,275	DESCAPOTE
877	1766643,503	1125472,746	14,214	DESCAPOTE
878	1766636,402	1125473,836	14,022	DESCAPOTE
879	1766629,655	1125474,32	13,931	DESCAPOTE
880	1766625,843	1125468,773	13,897	DESCAPOTE
881	1766633,481	1125467,719	13,978	DESCAPOTE
882	1766640,459	1125466,888	14,119	DESCAPOTE
883	1766647,236	1125466,507	14,255	DESCAPOTE
884	1766652,442	1125466,291	14,298	DESCAPOTE
885	1766657,052	1125465,869	14,477	DESCAPOTE
886	1766657,19	1125459,97	14,472	DESCAPOTE
887	1766651,056	1125460,289	14,26	DESCAPOTE
888	1766645,119	1125461,025	14,215	DESCAPOTE
889	1766638,713	1125461,953	14,1	DESCAPOTE
890	1766632,334	1125462,928	13,985	DESCAPOTE
891	1766625,434	1125463,607	13,911	DESCAPOTE
892	1766624,753	1125458,262	13,91	DESCAPOTE
893	1766631,119	1125457,338	13,982	DESCAPOTE
894	1766637,244	1125456,567	14,11	DESCAPOTE
895	1766643,726	1125455,738	14,213	DESCAPOTE
896	1766650,192	1125455,097	14,268	DESCAPOTE
897	1766655,524	1125454,389	14,381	DESCAPOTE
898	1766655,396	1125447,829	14,415	DESCAPOTE
899	1766650,2	1125448,234	14,288	DESCAPOTE
900	1766643,318	1125448,792	14,194	DESCAPOTE
901	1766636,493	1125449,217	14,111	DESCAPOTE
902	1766630,296	1125449,707	13,976	DESCAPOTE
903	1766624,446	1125450,005	13,909	DESCAPOTE
904	1766624,778	1125444,554	13,914	DESCAPOTE
905	1766631,453	1125443,751	14,002	DESCAPOTE
906	1766639,092	1125442,974	14,126	DESCAPOTE
907	1766645,774	1125442,453	14,227	DESCAPOTE
908	1766651,549	1125441,856	14,306	DESCAPOTE
909	1766655,369	1125441,426	14,403	DESCAPOTE
910	1766655,545	1125436,012	14,436	DESCAPOTE
911	1766650,256	1125436,814	14,291	DESCAPOTE
912	1766643,503	1125437,652	14,198	DESCAPOTE
913	1766636,955	1125438,368	14,101	DESCAPOTE
914	1766630,6	1125438,725	13,993	DESCAPOTE
915	1766623,866	1125439,188	13,9	DESCAPOTE
916	1766624,502	1125430,597	13,891	DESCAPOTE
917	1766631,262	1125430,384	14,035	DESCAPOTE
918	1766637,724	1125430,293	14,087	DESCAPOTE
919	1766643,403	1125430,443	14,209	DESCAPOTE

920	1766648,845	1125430,758	14,278	DESCAPOTE
921	1766654,764	1125430,798	14,385	DESCAPOTE
922	1766655,167	1125425,135	14,417	DESCAPOTE
923	1766648,406	1125425,317	14,274	DESCAPOTE
924	1766641,53	1125425,282	14,151	DESCAPOTE
925	1766634,898	1125425,112	14,059	DESCAPOTE
926	1766628,705	1125425,305	13,952	DESCAPOTE
927	1766623,119	1125425,409	13,854	DESCAPOTE
928	1766622,778	1125420,208	13,868	DESCAPOTE
929	1766628,778	1125419,99	13,971	DESCAPOTE
930	1766634,93	1125419,736	14,031	DESCAPOTE
931	1766641,596	1125419,782	14,144	DESCAPOTE
932	1766647,704	1125419,647	14,218	DESCAPOTE
933	1766654,473	1125419,369	14,377	DESCAPOTE
934	1766654,749	1125413,697	14,386	DESCAPOTE
935	1766649,252	1125413,995	14,241	DESCAPOTE
936	1766642,71	1125414,75	14,172	DESCAPOTE
937	1766636,815	1125414,884	14,046	DESCAPOTE
938	1766629,607	1125414,83	13,965	DESCAPOTE
939	1766622,861	1125415,074	13,878	DESCAPOTE
940	1766622,526	1125409,605	13,864	DESCAPOTE
941	1766629,202	1125409,338	13,937	DESCAPOTE
942	1766635,975	1125409,054	14,028	DESCAPOTE
943	1766642,271	1125408,349	14,15	DESCAPOTE
944	1766648,75	1125407,287	14,217	DESCAPOTE
945	1766654,816	1125406,916	14,365	DESCAPOTE
946	1766654,729	1125400,77	14,367	DESCAPOTE
947	1766648,494	1125401,428	14,223	DESCAPOTE
948	1766640,831	1125402,223	14,125	DESCAPOTE
949	1766634,31	1125402,82	14,044	DESCAPOTE
950	1766627,926	1125403,373	13,954	DESCAPOTE
951	1766622,71	1125399,438	13,868	DESCAPOTE
952	1766628,454	1125398,381	13,959	DESCAPOTE
953	1766633,981	1125396,901	14,046	DESCAPOTE
954	1766640,475	1125396,091	14,165	DESCAPOTE
955	1766645,585	1125395,68	14,217	DESCAPOTE
956	1766652,527	1125394,835	14,301	DESCAPOTE
957	1766652,969	1125388,357	14,318	DESCAPOTE
958	1766646,958	1125388,465	14,23	DESCAPOTE
959	1766640,151	1125389,365	14,156	DESCAPOTE
960	1766633,824	1125389,637	14,018	DESCAPOTE
961	1766626,234	1125389,819	13,901	DESCAPOTE
962	1766628,037	1125384,862	13,918	DESCAPOTE
963	1766634,282	1125384,468	14,022	DESCAPOTE

964	1766640,915	1125384,109	14,154	DESCAPOTE
965	1766647,035	1125383,773	14,237	DESCAPOTE
966	1766652,87	1125383,339	14,341	DESCAPOTE
967	1766653,305	1125377,504	14,364	DESCAPOTE
968	1766647,631	1125377,59	14,238	DESCAPOTE
969	1766640,856	1125378,324	14,162	DESCAPOTE
970	1766634,095	1125378,936	13,995	DESCAPOTE
971	1766627,462	1125379,343	13,891	DESCAPOTE
972	1766626,76	1125374,463	13,872	DESCAPOTE
973	1766633,398	1125374,075	13,998	DESCAPOTE
974	1766639,438	1125373,517	14,133	DESCAPOTE
975	1766645,928	1125372,977	14,213	DESCAPOTE
976	1766652,631	1125372,707	14,291	DESCAPOTE
977	1766652,843	1125364,934	14,314	DESCAPOTE
978	1766647,028	1125365,972	14,191	DESCAPOTE
979	1766640,568	1125367,073	14,128	DESCAPOTE
980	1766633,894	1125367,973	13,997	DESCAPOTE
981	1766626,977	1125368,666	13,869	DESCAPOTE
982	1766626,268	1125361,853	13,841	DESCAPOTE
983	1766631,415	1125361,395	13,852	DESCAPOTE
984	1766639,422	1125360,608	14,053	DESCAPOTE
985	1766645,971	1125360,138	14,148	DESCAPOTE
986	1766652,164	1125359,671	14,273	DESCAPOTE
987	1766652,168	1125355,742	14,269	DESCAPOTE
988	1766645,851	1125356,602	14,154	DESCAPOTE
989	1766640,038	1125357,111	14,033	DESCAPOTE
990	1766633,448	1125357,301	13,949	DESCAPOTE
991	1766626,877	1125357,384	13,827	DESCAPOTE
992	1766647,514	1125256,349	14,096	DESCAPOTE
993	1766640,689	1125256,673	13,919	DESCAPOTE
994	1766633,508	1125257,047	13,839	DESCAPOTE
995	1766626,668	1125257,635	13,707	DESCAPOTE
996	1766620,444	1125258,171	13,63	DESCAPOTE
997	1766617,876	1125253,043	13,595	DESCAPOTE
998	1766623,159	1125252,551	13,643	DESCAPOTE
999	1766629,355	1125252,279	13,702	DESCAPOTE
1000	1766635,224	1125251,899	13,814	DESCAPOTE
1001	1766642,394	1125251,57	13,981	DESCAPOTE
1002	1766648,453	1125250,97	14,132	DESCAPOTE
1003	1766649,251	1125245,77	14,162	DESCAPOTE
1004	1766643,511	1125246,156	13,934	DESCAPOTE
1005	1766634,962	1125246,893	13,793	DESCAPOTE
1006	1766628,058	1125247,449	13,679	DESCAPOTE
1007	1766621,167	1125247,999	13,594	DESCAPOTE

1008	1766618,799	1125243,243	13,55	DESCAPOTE
1009	1766625,177	1125242,909	13,648	DESCAPOTE
1010	1766631,923	1125242,382	13,766	DESCAPOTE
1011	1766637,967	1125241,895	13,849	DESCAPOTE
1012	1766644,442	1125241,431	13,909	DESCAPOTE
1013	1766648,642	1125241,442	14,098	DESCAPOTE
1014	1766648,828	1125236,441	14,103	DESCAPOTE
1015	1766642,798	1125237,112	13,892	DESCAPOTE
1016	1766636,664	1125237,189	13,847	DESCAPOTE
1017	1766630,33	1125237,632	13,766	DESCAPOTE
1018	1766623,522	1125238,066	13,632	DESCAPOTE
1019	1766622,756	1125233,124	13,596	DESCAPOTE
1020	1766629,982	1125232,568	13,752	DESCAPOTE
1021	1766636,529	1125232,014	13,839	DESCAPOTE
1022	1766643,536	1125231,577	13,917	DESCAPOTE
1023	1766648,464	1125231,286	14,078	DESCAPOTE
1024	1766648,783	1125227,263	14,097	DESCAPOTE
1025	1766637,785	1125227,699	13,87	DESCAPOTE
1026	1766630,603	1125228,122	13,774	DESCAPOTE
1027	1766621,6	1125228,601	13,609	DESCAPOTE
1028	1766617,432	1125224,107	13,578	DESCAPOTE
1029	1766623,59	1125223,796	13,612	DESCAPOTE
1030	1766630,522	1125223,663	13,749	DESCAPOTE
1031	1766636,721	1125223,549	13,821	DESCAPOTE
1032	1766643,147	1125223,367	13,867	DESCAPOTE
1033	1766648,059	1125223,138	14,041	DESCAPOTE
1034	1766648,244	1125218,541	14,091	DESCAPOTE
1035	1766642,82	1125219,102	13,887	DESCAPOTE
1036	1766635,914	1125218,751	13,816	DESCAPOTE
1037	1766628,426	1125218,918	13,72	DESCAPOTE
1038	1766621,502	1125219,061	13,597	DESCAPOTE
1039	1766621,711	1125214,325	13,574	DESCAPOTE
1040	1766627,994	1125214,352	13,688	DESCAPOTE
1041	1766633,614	1125214,279	13,778	DESCAPOTE
1042	1766639,51	1125214,363	13,821	DESCAPOTE
1043	1766645,087	1125214,396	13,919	DESCAPOTE
1044	1766647,641	1125214,259	14,043	DESCAPOTE
1045	1766647,775	1125209,217	14,028	DESCAPOTE
1046	1766642,114	1125209,242	13,836	DESCAPOTE
1047	1766636,18	1125209,304	13,802	DESCAPOTE
1048	1766630,201	1125209,344	13,682	DESCAPOTE
1049	1766623,733	1125209,417	13,611	DESCAPOTE
1050	1766617,142	1125209,469	13,46	DESCAPOTE
1051	1766623,021	1125204,664	13,572	DESCAPOTE

1052	1766628,891	1125204,77	13,663	DESCAPOTE
1053	1766635,126	1125204,828	13,768	DESCAPOTE
1054	1766641,905	1125204,728	13,853	DESCAPOTE
1055	1766647,258	1125204,543	13,987	DESCAPOTE
1056	1766647,266	1125199,494	14,014	DESCAPOTE
1057	1766642,276	1125199,677	13,825	DESCAPOTE
1058	1766636,024	1125199,94	13,763	DESCAPOTE
1059	1766628,88	1125199,508	13,658	DESCAPOTE
1060	1766621,247	1125199,558	13,546	DESCAPOTE
1061	1766616,466	1125194,547	13,52	DESCAPOTE
1062	1766623,336	1125194,644	13,555	DESCAPOTE
1063	1766630,312	1125194,8	13,628	DESCAPOTE
1064	1766637,687	1125194,792	13,784	DESCAPOTE
1065	1766644,613	1125195,073	13,893	DESCAPOTE
1066	1766648,222	1125195,147	14,049	DESCAPOTE
1067	1766648,238	1125190,228	14,031	DESCAPOTE
1068	1766641,778	1125190,401	13,837	DESCAPOTE
1069	1766634,669	1125190,098	13,743	DESCAPOTE
1070	1766627,217	1125190,032	13,588	DESCAPOTE
1071	1766620,866	1125189,952	13,525	DESCAPOTE
1072	1766620,78	1125185,243	13,5	DESCAPOTE
1073	1766626,684	1125185,625	13,584	DESCAPOTE
1074	1766633,874	1125185,839	13,689	DESCAPOTE
1075	1766640,707	1125185,763	13,77	DESCAPOTE
1076	1766646,427	1125185,761	13,911	DESCAPOTE
1077	1766646,596	1125181,085	13,971	DESCAPOTE
1078	1766639,57	1125180,724	13,741	DESCAPOTE
1079	1766632,161	1125180,574	13,646	DESCAPOTE
1080	1766625,74	1125180,358	13,555	DESCAPOTE
1081	1766618,69	1125180,146	13,523	DESCAPOTE
1082	1766620,178	1125175,242	13,482	DESCAPOTE
1083	1766626,715	1125175,33	13,561	DESCAPOTE
1084	1766633,323	1125175,988	13,658	DESCAPOTE
1085	1766640,936	1125176,083	13,771	DESCAPOTE
1086	1766646,373	1125175,964	13,932	DESCAPOTE
1087	1766646,494	1125171,491	14,006	DESCAPOTE
1088	1766640,812	1125171,624	13,721	DESCAPOTE
1089	1766634,736	1125171,571	13,702	DESCAPOTE
1090	1766628,805	1125170,694	13,578	DESCAPOTE
1091	1766622,381	1125170,923	13,548	DESCAPOTE
1092	1766616,799	1125170,834	13,467	DESCAPOTE
1093	1766619,156	1125165,584	13,456	DESCAPOTE
1094	1766626,035	1125166,192	13,539	DESCAPOTE
1095	1766632,84	1125166,53	13,681	DESCAPOTE

1096	1766639,217	1125166,578	13,713	DESCAPOTE
1097	1766646,03	1125166,82	13,933	DESCAPOTE
1098	1766646,282	1125162,64	13,96	DESCAPOTE
1099	1766640,311	1125161,988	13,762	DESCAPOTE
1100	1766633,642	1125161,569	13,718	DESCAPOTE
1101	1766626,397	1125161,357	13,573	DESCAPOTE
1102	1766619,965	1125160,972	13,51	DESCAPOTE
1103	1766618,675	1125156,244	13,493	DESCAPOTE
1104	1766625,635	1125156,706	13,549	DESCAPOTE
1105	1766632,093	1125157,073	13,675	DESCAPOTE
1106	1766639,007	1125157,494	13,768	DESCAPOTE
1107	1766643,925	1125157,982	13,859	DESCAPOTE
1108	1766646,533	1125158,07	13,989	DESCAPOTE
1109	1766646,43	1125153,555	13,955	DESCAPOTE
1110	1766640,859	1125153,297	13,783	DESCAPOTE
1111	1766633,927	1125152,423	13,698	DESCAPOTE
1112	1766626,991	1125152,409	13,606	DESCAPOTE
1113	1766620,683	1125151,808	13,511	DESCAPOTE
1114	1766619,201	1125146,541	13,497	DESCAPOTE
1115	1766625,269	1125146,547	13,59	DESCAPOTE
1116	1766631,907	1125147,317	13,678	DESCAPOTE
1117	1766637,809	1125147,823	13,742	DESCAPOTE
1118	1766644,505	1125148,377	13,919	DESCAPOTE
1119	1766645,13	1125143,258	13,928	DESCAPOTE
1120	1766639,514	1125142,916	13,77	DESCAPOTE
1121	1766632,822	1125142,438	13,707	DESCAPOTE
1122	1766626,552	1125141,93	13,625	DESCAPOTE
1123	1766619,565	1125141,422	13,513	DESCAPOTE
1124	1766618,609	1125136,395	13,494	DESCAPOTE
1125	1766624,718	1125137,055	13,591	DESCAPOTE
1126	1766633,657	1125137,615	13,697	DESCAPOTE
1127	1766641,341	1125138,054	13,777	DESCAPOTE
1128	1766645,734	1125138,25	13,946	DESCAPOTE
1129	1766646,03	1125133,467	13,921	DESCAPOTE
1130	1766640,864	1125133,145	13,765	DESCAPOTE
1131	1766636,057	1125133,026	13,7	DESCAPOTE
1132	1766629,217	1125132,173	13,658	DESCAPOTE
1133	1766622,502	1125131,67	13,581	DESCAPOTE
1134	1766615,641	1125131,147	13,476	DESCAPOTE
1135	1766619,084	1125126,66	13,507	DESCAPOTE
1136	1766626,7	1125127,212	13,601	DESCAPOTE
1137	1766633,853	1125127,684	13,693	DESCAPOTE
1138	1766639,809	1125128,101	13,755	DESCAPOTE
1139	1766645,596	1125122,715	13,897	DESCAPOTE

1140	1766640,082	1125122,066	13,771	DESCAPOTE
1141	1766634,33	1125121,867	13,697	DESCAPOTE
1142	1766626,931	1125121,443	13,569	DESCAPOTE
1143	1766621,159	1125121,058	13,541	DESCAPOTE
1144	1766614,664	1125115,485	13,452	DESCAPOTE
1145	1766621,502	1125116,079	13,509	DESCAPOTE
1146	1766627,574	1125116,178	13,565	DESCAPOTE
1147	1766634,369	1125116,586	13,697	DESCAPOTE
1148	1766641,363	1125116,934	13,786	DESCAPOTE
1149	1766644,816	1125117,093	13,886	DESCAPOTE
1150	1766645,235	1125111,214	13,937	DESCAPOTE
1151	1766640,387	1125111,212	13,745	DESCAPOTE
1152	1766634,819	1125110,977	13,698	DESCAPOTE
1153	1766627,914	1125110,767	13,595	DESCAPOTE
1154	1766621,047	1125110,577	13,522	DESCAPOTE
1155	1766614,189	1125110,347	13,401	DESCAPOTE
1156	1766617,271	1125105,2	13,408	DESCAPOTE
1157	1766624,348	1125105,398	13,506	DESCAPOTE
1158	1766630,203	1125105,336	13,606	DESCAPOTE
1159	1766636,471	1125105,468	13,683	DESCAPOTE
1160	1766643,204	1125105,496	13,851	DESCAPOTE
1161	1766643,577	1125003,465	13,922	DESCAPOTE
1162	1766643,455	1124998,121	13,943	DESCAPOTE
1163	1766642,192	1125099,658	13,836	DESCAPOTE
1164	1766635,25	1125099,632	13,754	DESCAPOTE
1165	1766628,1	1125099,693	13,642	DESCAPOTE
1166	1766620,199	1125099,527	13,525	DESCAPOTE
1167	1766612,425	1125099,645	13,421	DESCAPOTE
1168	1766613,34	1125095,02	13,413	DESCAPOTE
1169	1766619,815	1125095,042	13,51	DESCAPOTE
1170	1766627,438	1125094,941	13,523	DESCAPOTE
1171	1766634,603	1125095,201	13,726	DESCAPOTE
1172	1766641,207	1125095,08	13,82	DESCAPOTE
1173	1766644,101	1125095,115	14,028	DESCAPOTE
1174	1766644,465	1125090,196	13,963	DESCAPOTE
1175	1766637,643	1125090,169	13,737	DESCAPOTE
1176	1766629,908	1125090,056	13,662	DESCAPOTE
1177	1766622,131	1125089,991	13,531	DESCAPOTE
1178	1766615,137	1125089,916	13,463	DESCAPOTE
1179	1766612,415	1125085,082	13,434	DESCAPOTE
1180	1766619,896	1125084,925	13,515	DESCAPOTE
1181	1766627,245	1125085,319	13,616	DESCAPOTE
1182	1766634,389	1125085,357	13,697	DESCAPOTE
1183	1766641,406	1125085,394	13,829	DESCAPOTE

1184	1766642,157	1125080,343	13,89	DESCAPOTE
1185	1766637,212	1125080,208	13,791	DESCAPOTE
1186	1766633,854	1125080,287	13,687	DESCAPOTE
1187	1766627,179	1125080,255	13,634	DESCAPOTE
1188	1766620,326	1125080,14	13,499	DESCAPOTE
1189	1766611,923	1125080,223	13,389	DESCAPOTE
1190	1766614,366	1125074,917	13,418	DESCAPOTE
1191	1766621,529	1125075,308	13,535	DESCAPOTE
1192	1766627,866	1125075,147	13,641	DESCAPOTE
1193	1766633,854	1125075,185	13,723	DESCAPOTE
1194	1766641,654	1125075,411	13,86	DESCAPOTE
1195	1766642,747	1125070,098	13,926	DESCAPOTE
1196	1766635,668	1125070,172	13,745	DESCAPOTE
1197	1766628,545	1125070,133	13,644	DESCAPOTE
1198	1766620,441	1125070,121	13,539	DESCAPOTE
1199	1766613,488	1125069,909	13,399	DESCAPOTE
1200	1766610,475	1125064,959	13,387	DESCAPOTE
1201	1766617,233	1125064,622	13,49	DESCAPOTE
1202	1766624,112	1125064,589	13,593	DESCAPOTE
1203	1766630,992	1125064,672	13,671	DESCAPOTE
1204	1766637,641	1125064,584	13,762	DESCAPOTE
1205	1766641,855	1125064,522	13,877	DESCAPOTE
1206	1766642,2	1125059,418	13,898	DESCAPOTE
1207	1766635,768	1125059,346	13,73	DESCAPOTE
1208	1766628,042	1125059,57	13,643	DESCAPOTE
1209	1766620,81	1125059,629	13,539	DESCAPOTE
1210	1766612,014	1125059,565	13,382	DESCAPOTE
1211	1766610,907	1125054,583	13,337	DESCAPOTE
1212	1766617,827	1125055,089	13,458	DESCAPOTE
1213	1766625,483	1125054,716	13,603	DESCAPOTE
1214	1766632,662	1125054,209	13,706	DESCAPOTE
1215	1766639,298	1125054,096	13,803	DESCAPOTE
1216	1766641,648	1125054,146	13,878	DESCAPOTE
1217	1766642,053	1125049,164	13,905	DESCAPOTE
1218	1766634,955	1125049,306	13,716	DESCAPOTE
1219	1766627,682	1125049,403	13,658	DESCAPOTE
1220	1766620,535	1125049,534	13,521	DESCAPOTE
1221	1766613,627	1125049,535	13,376	DESCAPOTE
1222	1766615,592	1125044,534	13,422	DESCAPOTE
1223	1766621,826	1125044,409	13,545	DESCAPOTE
1224	1766628,879	1125044,455	13,699	DESCAPOTE
1225	1766636,142	1125044,285	13,738	DESCAPOTE
1226	1766641,354	1125044,251	13,856	DESCAPOTE
1227	1766641,787	1125039,297	13,9	DESCAPOTE

1228	1766635,233	1125039,585	13,757	DESCAPOTE
1229	1766627,548	1125039,361	13,646	DESCAPOTE
1230	1766620,465	1125039,448	13,463	DESCAPOTE
1231	1766612,453	1125039,73	13,371	DESCAPOTE
1232	1766614,632	1125034,744	13,383	DESCAPOTE
1233	1766621,589	1125034,483	13,48	DESCAPOTE
1234	1766628,761	1125034,533	13,642	DESCAPOTE
1235	1766635,653	1125034,392	13,717	DESCAPOTE
1236	1766640,359	1125034,373	13,85	DESCAPOTE
1237	1766641,639	1125029,181	13,884	DESCAPOTE
1238	1766635,162	1125029,19	13,746	DESCAPOTE
1239	1766629,385	1125029,345	13,638	DESCAPOTE
1240	1766624,821	1125029,274	13,541	DESCAPOTE
1241	1766617,837	1125029,28	13,421	DESCAPOTE
1242	1766610,667	1125024,85	13,329	DESCAPOTE
1243	1766616,511	1125024,474	13,371	DESCAPOTE
1244	1766624,689	1125024,267	13,512	DESCAPOTE
1245	1766632,019	1125024,308	13,653	DESCAPOTE
1246	1766637,916	1125024,195	13,762	DESCAPOTE
1247	1766641,393	1125024,232	13,876	DESCAPOTE
1248	1766641,649	1125019,64	13,88	DESCAPOTE
1249	1766635,121	1125019,885	13,716	DESCAPOTE
1250	1766632,588	1125019,742	13,645	DESCAPOTE
1251	1766626,348	1125019,537	13,559	DESCAPOTE
1252	1766619,654	1125019,504	13,42	DESCAPOTE
1253	1766612,776	1125019,59	13,323	DESCAPOTE
1254	1766610,28	1125014,632	13,305	DESCAPOTE
1255	1766618,175	1125014,414	13,334	DESCAPOTE
1256	1766626,429	1125014,48	13,51	DESCAPOTE
1257	1766633,972	1125014,611	13,688	DESCAPOTE
1258	1766639,485	1125014,576	13,807	DESCAPOTE
1259	1766640,094	1125008,844	13,841	DESCAPOTE
1260	1766633,591	1125008,814	13,666	DESCAPOTE
1261	1766627,569	1125009,25	13,562	DESCAPOTE
1262	1766618,873	1125009,162	13,41	DESCAPOTE
1263	1766611,277	1125009,382	13,283	DESCAPOTE
1264	1766615,208	1125004,1	13,346	DESCAPOTE
1265	1766621,842	1125003,81	13,491	DESCAPOTE
1266	1766628,713	1125003,806	13,579	DESCAPOTE
1267	1766636,199	1125003,439	13,75	DESCAPOTE
1268	1766640,219	1125003,337	13,865	DESCAPOTE
1269	1766640,356	1124997,922	13,868	DESCAPOTE
1270	1766634,694	1124998,472	13,71	DESCAPOTE
1271	1766628,236	1124998,581	13,592	DESCAPOTE

1272	1766622,456	1124999,044	13,503	DESCAPOTE
1273	1766614,806	1124999,073	13,368	DESCAPOTE
1274	1766616,692	1124993,655	13,386	DESCAPOTE
1275	1766623,06	1124993,371	13,514	DESCAPOTE
1276	1766629,985	1124993,302	13,628	DESCAPOTE
1277	1766636,236	1124992,993	13,715	DESCAPOTE
1278	1766640,03	1124992,922	13,823	DESCAPOTE
1279	1766640,061	1124987,628	13,831	DESCAPOTE
1280	1766633,131	1124987,487	13,686	DESCAPOTE
1281	1766626,203	1124988,168	13,557	DESCAPOTE
1282	1766618,952	1124988,381	13,431	DESCAPOTE
1283	1766610,93	1124988,593	13,477	DESCAPOTE
1284	1766608,716	1124983,705	13,297	DESCAPOTE
1285	1766615,669	1124983,56	13,349	DESCAPOTE
1286	1766622,905	1124983,437	13,469	DESCAPOTE
1287	1766631,57	1124982,935	13,607	DESCAPOTE
1288	1766638,56	1124982,719	13,8	DESCAPOTE
1289	1766639,061	1124977,446	13,827	DESCAPOTE
1290	1766632,484	1124977,403	13,621	DESCAPOTE
1291	1766624,666	1124978,184	13,45	DESCAPOTE
1292	1766616,292	1124978,516	13,309	DESCAPOTE
1293	1766609,999	1124978,848	13,278	DESCAPOTE
1294	1766606,833	1124973,162	13,222	DESCAPOTE
1295	1766612,641	1124973,436	13,354	DESCAPOTE
1296	1766618,331	1124973,004	13,364	DESCAPOTE
1297	1766625,171	1124972,943	13,467	DESCAPOTE
1298	1766633,567	1124972,776	13,589	DESCAPOTE
1299	1766638,828	1124972,538	13,855	DESCAPOTE
1300	1766639,174	1124966,647	13,826	DESCAPOTE
1301	1766633,097	1124967,088	13,578	DESCAPOTE
1302	1766627,899	1124967,441	13,478	DESCAPOTE
1303	1766621,344	1124968,118	13,343	DESCAPOTE
1304	1766615,157	1124968,511	13,26	DESCAPOTE
1305	1766609,562	1124969,123	13,253	DESCAPOTE
1306	1766610,299	1124963,993	13,282	DESCAPOTE
1307	1766617,654	1124963,234	13,281	DESCAPOTE
1308	1766624,336	1124962,441	13,398	DESCAPOTE
1309	1766631,714	1124961,847	13,546	DESCAPOTE
1310	1766638,493	1124961,21	13,805	DESCAPOTE
1311	1766638,743	1124956,127	13,799	DESCAPOTE
1312	1766632,139	1124956,605	13,578	DESCAPOTE
1313	1766625,786	1124957,522	13,495	DESCAPOTE
1314	1766618,531	1124957,362	13,35	DESCAPOTE
1315	1766610,269	1124957,98	13,264	DESCAPOTE

1316	1766607,235	1124958,303	13,166	DESCAPOTE
1317	1766606,953	1124958,381	12,761	DESCAPOTE
1318	1766608,55	1124952,963	13,201	DESCAPOTE
1319	1766615,967	1124952,541	13,323	DESCAPOTE
1320	1766623,456	1124952,148	13,385	DESCAPOTE
1321	1766630,226	1124951,424	13,51	DESCAPOTE
1322	1766637,008	1124950,911	13,695	DESCAPOTE
1323	1766637,199	1124945,548	13,727	DESCAPOTE
1324	1766632,117	1124945,963	13,578	DESCAPOTE
1325	1766624,721	1124946,551	13,418	DESCAPOTE
1326	1766617,862	1124947,178	13,341	DESCAPOTE
1327	1766609,943	1124947,84	13,227	DESCAPOTE
1328	1766607,025	1124943,174	13,126	DESCAPOTE
1329	1766613,08	1124942,782	13,253	DESCAPOTE
1330	1766620,02	1124942,124	13,368	DESCAPOTE
1331	1766626,939	1124941,367	13,58	DESCAPOTE
1332	1766634,286	1124940,85	13,646	DESCAPOTE
1333	1766637,348	1124940,539	13,686	DESCAPOTE
1334	1766637,625	1124935,083	13,707	DESCAPOTE
1335	1766631,138	1124935,711	13,488	DESCAPOTE
1336	1766623,949	1124936,485	13,415	DESCAPOTE
1337	1766616,869	1124937,114	13,302	DESCAPOTE
1338	1766609,923	1124937,805	13,182	DESCAPOTE
1339	1766611,54	1124932,927	13,219	DESCAPOTE
1340	1766618,301	1124932,277	13,319	DESCAPOTE
1341	1766624,716	1124931,424	13,433	DESCAPOTE
1342	1766632,004	1124930,67	13,564	DESCAPOTE
1343	1766636,981	1124930,12	13,694	DESCAPOTE
1344	1766637,562	1124925,084	13,703	DESCAPOTE
1345	1766631,07	1124925,487	13,508	DESCAPOTE
1346	1766624,464	1124926,372	13,45	DESCAPOTE
1347	1766618,211	1124927,022	13,341	DESCAPOTE
1348	1766611,273	1124927,698	13,198	DESCAPOTE
1349	1766607,668	1124923,532	13,17	DESCAPOTE
1350	1766613,454	1124923,14	13,263	DESCAPOTE
1351	1766620,393	1124922,63	13,292	DESCAPOTE
1352	1766628,072	1124921,329	13,494	DESCAPOTE
1353	1766636,056	1124920,21	13,621	DESCAPOTE
1354	1766636,372	1124914,839	13,66	DESCAPOTE
1355	1766630,143	1124916,019	13,515	DESCAPOTE
1356	1766623,019	1124916,407	13,436	DESCAPOTE
1357	1766614,942	1124917,244	13,287	DESCAPOTE
1358	1766607,535	1124918,036	13,185	DESCAPOTE
1359	1766606,908	1124913,613	13,149	DESCAPOTE

1360	1766614,456	1124912,739	13,303	DESCAPOTE
1361	1766621,364	1124911,659	13,399	DESCAPOTE
1362	1766628,451	1124910,984	13,486	DESCAPOTE
1363	1766635,585	1124910,069	13,617	DESCAPOTE
1364	1766636,049	1124905,002	13,638	DESCAPOTE
1365	1766629,627	1124905,542	13,477	DESCAPOTE
1366	1766622,758	1124906,171	13,422	DESCAPOTE
1367	1766616,472	1124906,835	13,309	DESCAPOTE
1368	1766609,599	1124907,479	13,186	DESCAPOTE
1369	1766606,748	1124903,574	13,197	DESCAPOTE
1370	1766612,886	1124902,757	13,244	DESCAPOTE
1371	1766619,639	1124901,909	13,34	DESCAPOTE
1372	1766626,664	1124901,121	13,44	DESCAPOTE
1373	1766632,346	1124900,583	13,565	DESCAPOTE
1374	1766636,635	1124900,215	13,708	DESCAPOTE
1375	1766636,343	1124894,632	13,674	DESCAPOTE
1376	1766630,149	1124895,385	13,512	DESCAPOTE
1377	1766622,707	1124896,288	13,381	DESCAPOTE
1378	1766615,802	1124897,465	13,298	DESCAPOTE
1379	1766607,821	1124897,782	13,189	DESCAPOTE
1380	1766611,201	1124892,466	13,222	DESCAPOTE
1381	1766617,445	1124891,887	13,253	DESCAPOTE
1382	1766625,341	1124890,931	13,382	DESCAPOTE
1383	1766632,914	1124890,261	13,572	DESCAPOTE
1384	1766636,584	1124889,883	13,719	DESCAPOTE
1385	1766636,357	1124884,5	13,697	DESCAPOTE
1386	1766630,401	1124885,195	13,499	DESCAPOTE
1387	1766623,372	1124885,754	13,366	DESCAPOTE
1388	1766616,389	1124886,859	13,333	DESCAPOTE
1389	1766608,683	1124887,827	13,197	DESCAPOTE
1390	1766608,737	1124882,585	13,139	DESCAPOTE
1391	1766615,287	1124881,746	13,312	DESCAPOTE
1392	1766621,182	1124880,943	13,313	DESCAPOTE
1393	1766626,519	1124880,48	13,392	DESCAPOTE
1394	1766633,257	1124879,831	13,553	DESCAPOTE
1395	1766634,814	1124874,678	13,593	DESCAPOTE
1396	1766629,721	1124875,228	13,477	DESCAPOTE
1397	1766623,46	1124875,841	13,265	DESCAPOTE
1398	1766616,294	1124876,776	13,307	DESCAPOTE
1399	1766609,788	1124877,531	13,204	DESCAPOTE
1400	1766605,927	1124872,12	12,903	DESCAPOTE
1401	1766606,459	1124871,999	13,103	DESCAPOTE
1402	1766612,19	1124871,459	13,226	DESCAPOTE
1403	1766619,009	1124870,931	13,311	DESCAPOTE

1404	1766625,898	1124870,385	13,391	DESCAPOTE
1405	1766631,864	1124869,922	13,509	DESCAPOTE
1406	1766636,042	1124868,512	13,637	DESCAPOTE
1407	1766630,612	1124868,865	13,485	DESCAPOTE
1408	1766623,84	1124868,663	13,355	DESCAPOTE
1409	1766617,774	1124868,851	13,298	DESCAPOTE
1410	1766611,263	1124869,088	13,213	DESCAPOTE
1411	1766633,692	1124863,221	13,288	DESCAPOTE
1412	1766625,754	1124863,755	13,132	DESCAPOTE
1413	1766618,903	1124863,553	12,964	DESCAPOTE
1414	1766611,538	1124863,688	12,701	DESCAPOTE
1415	1766603,482	1124859,209	12,296	DESCAPOTE
1416	1766607,546	1124859,249	13,077	DESCAPOTE
1417	1766614,851	1124858,565	13,143	DESCAPOTE
1418	1766621,988	1124858,375	13,185	DESCAPOTE
1419	1766627,885	1124858,304	13,149	DESCAPOTE
1420	1766633,643	1124858,004	13,202	DESCAPOTE
1421	1766636,223	1124857,731	13,239	DESCAPOTE
1422	1766636,061	1124852,519	13,594	DESCAPOTE
1423	1766630,801	1124853,005	13,433	DESCAPOTE
1424	1766624,421	1124853,026	13,333	DESCAPOTE
1425	1766617,418	1124853,343	13,084	DESCAPOTE
1426	1766611,527	1124853,604	12,903	DESCAPOTE
1427	1766605,747	1124853,842	13,042	DESCAPOTE
1428	1766608,055	1124849,198	12,968	DESCAPOTE
1429	1766615,008	1124848,415	13,201	DESCAPOTE
1430	1766620,731	1124848,012	13,291	DESCAPOTE
1431	1766626,897	1124847,95	13,381	DESCAPOTE
1432	1766630,509	1124847,544	13,475	DESCAPOTE
1433	1766635,05	1124847,237	13,545	DESCAPOTE
1434	1766635,263	1124842,224	13,447	DESCAPOTE
1435	1766630,435	1124842,478	13,462	DESCAPOTE
1436	1766625,252	1124842,715	13,387	DESCAPOTE
1437	1766619,137	1124843,087	13,277	DESCAPOTE
1438	1766612,8	1124843,285	13,187	DESCAPOTE
1439	1766606,413	1124843,489	13,041	DESCAPOTE
1440	1766604,129	1124838,925	12,932	DESCAPOTE
1441	1766610,078	1124838,596	13,043	DESCAPOTE
1442	1766616,506	1124838,518	13,004	DESCAPOTE
1443	1766623,979	1124838,083	13,333	DESCAPOTE
1444	1766629,878	1124838,064	13,408	DESCAPOTE
1445	1766634,85	1124837,754	13,531	DESCAPOTE
1446	1766635,254	1124833,118	13,55	DESCAPOTE
1447	1766629,9	1124832,996	13,423	DESCAPOTE

1448	1766624,346	1124833,542	13,348	DESCAPOTE
1449	1766617,924	1124833,777	13,234	DESCAPOTE
1450	1766611,25	1124833,966	13,127	DESCAPOTE
1451	1766604,164	1124834,205	12,938	DESCAPOTE
1452	1766606,472	1124829,114	13,027	DESCAPOTE
1453	1766613,006	1124829,021	13,155	DESCAPOTE
1454	1766619,654	1124828,788	13,249	DESCAPOTE
1455	1766625,522	1124828,313	13,343	DESCAPOTE
1456	1766630,157	1124828,315	13,426	DESCAPOTE
1457	1766635,139	1124828,163	13,535	DESCAPOTE
1458	1766635,293	1124823,301	13,594	DESCAPOTE
1459	1766629,911	1124823,332	13,386	DESCAPOTE
1460	1766624,107	1124823,568	13,337	DESCAPOTE
1461	1766618,487	1124823,752	13,232	DESCAPOTE
1462	1766611,761	1124824,002	13,125	DESCAPOTE
1463	1766605,275	1124824,235	12,993	DESCAPOTE
1464	1766607,437	1124818,765	13,042	DESCAPOTE
1465	1766614,208	1124818,957	13,213	DESCAPOTE
1466	1766621,079	1124818,414	13,358	DESCAPOTE
1467	1766626,03	1124818,151	13,38	DESCAPOTE
1468	1766629,572	1124818,001	13,403	DESCAPOTE
1469	1766634,053	1124817,989	13,582	DESCAPOTE
1470	1766635,087	1124813,161	13,591	DESCAPOTE
1471	1766629,353	1124813,279	13,409	DESCAPOTE
1472	1766622,339	1124813,635	13,339	DESCAPOTE
1473	1766615,41	1124813,923	13,269	DESCAPOTE
1474	1766608,211	1124814,019	13,083	DESCAPOTE
1475	1766602,012	1124814,242	12,967	DESCAPOTE
1476	1766605,395	1124808,869	13,056	DESCAPOTE
1477	1766613,35	1124808,712	13,206	DESCAPOTE
1478	1766620,835	1124808,35	13,285	DESCAPOTE
1479	1766625,721	1124808,319	13,347	DESCAPOTE
1480	1766628,73	1124808,177	13,387	DESCAPOTE
1481	1766633,921	1124807,943	13,549	DESCAPOTE
1482	1766634,336	1124802,8	13,562	DESCAPOTE
1483	1766628,767	1124803,271	13,372	DESCAPOTE
1484	1766623,019	1124803,4	13,296	DESCAPOTE
1485	1766617,825	1124803,532	13,238	DESCAPOTE
1486	1766611,583	1124803,871	13,171	DESCAPOTE
1487	1766604,379	1124804,109	13,009	DESCAPOTE
1488	1766605,132	1124799,141	13,057	DESCAPOTE
1489	1766610,944	1124798,843	13,189	DESCAPOTE
1490	1766617,876	1124798,432	13,255	DESCAPOTE
1491	1766624,836	1124797,904	13,269	DESCAPOTE

1492	1766628,994	1124798,047	13,345	DESCAPOTE
1493	1766633,481	1124798,172	13,535	DESCAPOTE
1494	1766633,888	1124792,754	13,556	DESCAPOTE
1495	1766628	1124792,931	13,308	DESCAPOTE
1496	1766620,881	1124793,244	13,243	DESCAPOTE
1497	1766613,994	1124793,519	13,199	DESCAPOTE
1498	1766607,243	1124793,889	13,102	DESCAPOTE
1499	1766607,723	1124788,965	13,075	DESCAPOTE
1500	1766613,994	1124788,723	13,182	DESCAPOTE
1501	1766619,774	1124788,205	13,205	DESCAPOTE
1502	1766624,956	1124787,671	13,269	DESCAPOTE
1503	1766629,852	1124787,801	13,367	DESCAPOTE
1504	1766632,842	1124787,625	13,494	DESCAPOTE
1505	1766632,266	1124782,499	13,418	DESCAPOTE
1506	1766626,747	1124782,493	13,271	DESCAPOTE
1507	1766620,679	1124783,16	13,195	DESCAPOTE
1508	1766613,937	1124783,294	13,126	DESCAPOTE
1509	1766608,059	1124783,559	13,095	DESCAPOTE
1510	1766601,728	1124784,013	12,922	DESCAPOTE
1511	1766600,711	1124779,458	12,865	DESCAPOTE
1512	1766605,529	1124779,165	12,95	DESCAPOTE
1513	1766611,472	1124778,395	12,996	DESCAPOTE
1514	1766618,124	1124777,935	13,059	DESCAPOTE
1515	1766626,764	1124777,666	13,282	DESCAPOTE
1516	1766631,985	1124777,324	13,433	DESCAPOTE
1517	1766632,57	1124772,701	13,492	DESCAPOTE
1518	1766626,668	1124773,146	13,299	DESCAPOTE
1519	1766619,486	1124773,283	13,193	DESCAPOTE
1520	1766612,814	1124773,631	13,059	DESCAPOTE
1521	1766605,762	1124773,945	12,896	DESCAPOTE
1522	1766601,669	1124774,122	12,912	DESCAPOTE
1523	1766604,683	1124769,402	12,526	DESCAPOTE
1524	1766614,163	1124768,965	13,076	DESCAPOTE
1525	1766622,051	1124768,538	13,231	DESCAPOTE
1526	1766626,061	1124768,376	13,272	DESCAPOTE
1527	1766630,851	1124768,044	13,205	DESCAPOTE
1528	1766632,419	1124762,661	13,439	DESCAPOTE
1529	1766626,35	1124763,506	13,261	DESCAPOTE
1530	1766620,897	1124763,78	13,199	DESCAPOTE
1531	1766613,533	1124763,457	13,079	DESCAPOTE
1532	1766606,568	1124763,673	13,027	DESCAPOTE
1533	1766600,094	1124763,982	12,846	DESCAPOTE
1534	1766605,569	1124758,625	12,908	DESCAPOTE
1535	1766612,628	1124758,547	13,038	DESCAPOTE

1536	1766621,064	1124758,04	13,189	DESCAPOTE
1537	1766626,25	1124757,661	13,277	DESCAPOTE
1538	1766631,534	1124757,683	13,345	DESCAPOTE
1539	1766632,125	1124753,322	13,412	DESCAPOTE
1540	1766626,273	1124753,593	13,27	DESCAPOTE
1541	1766619,57	1124753,694	13,171	DESCAPOTE
1542	1766613,727	1124753,775	13,051	DESCAPOTE
1543	1766607,003	1124754,024	12,94	DESCAPOTE
1544	1766601,097	1124754,218	12,846	DESCAPOTE
1545	1766603,872	1124749,366	12,886	DESCAPOTE
1546	1766610,655	1124749,134	12,965	DESCAPOTE
1547	1766617,537	1124748,657	13,126	DESCAPOTE
1548	1766623,774	1124748,159	13,143	DESCAPOTE
1549	1766631,328	1124748,086	13,379	DESCAPOTE
1550	1766631,162	1124743,54	13,33	DESCAPOTE
1551	1766625,563	1124743,534	13,262	DESCAPOTE
1552	1766619,323	1124743,813	13,132	DESCAPOTE
1553	1766612,202	1124744,554	12,99	DESCAPOTE
1554	1766604,006	1124744,761	12,885	DESCAPOTE
1555	1766603,131	1124739,437	12,839	DESCAPOTE
1556	1766611,294	1124739,276	12,931	DESCAPOTE
1557	1766619,004	1124738,874	13,129	DESCAPOTE
1558	1766625,679	1124738,536	13,256	DESCAPOTE
1559	1766631,311	1124738,737	13,406	DESCAPOTE
1560	1766631,639	1124734,384	13,42	DESCAPOTE
1561	1766624,66	1124734,539	13,236	DESCAPOTE
1562	1766617,853	1124735,019	13,143	DESCAPOTE
1563	1766609,476	1124734,549	12,906	DESCAPOTE
1564	1766601,153	1124734,584	12,808	DESCAPOTE
1565	1766606,479	1124730,277	12,825	DESCAPOTE
1566	1766614,287	1124729,708	13,013	DESCAPOTE
1567	1766621,16	1124729,308	13,107	DESCAPOTE
1568	1766627,397	1124729,975	13,328	DESCAPOTE
1569	1766630,569	1124729,665	13,377	DESCAPOTE
1570	1766630,558	1124725,126	13,364	DESCAPOTE
1571	1766624,799	1124725,344	13,2	DESCAPOTE
1572	1766617,273	1124725,649	12,995	DESCAPOTE
1573	1766608,421	1124725,061	12,885	DESCAPOTE
1574	1766601,19	1124724,737	12,697	DESCAPOTE
1575	1766599,57	1124720,127	12,614	DESCAPOTE
1576	1766607,115	1124720,045	12,742	DESCAPOTE
1577	1766614,535	1124719,984	12,94	DESCAPOTE
1578	1766621,408	1124720,288	13,113	DESCAPOTE
1579	1766630,06	1124720,335	13,32	DESCAPOTE

1580	1766628,947	1124667,06	13,106	DESCAPOTE
1581	1766626,22	1124661,773	13,023	DESCAPOTE
1582	1766624,198	1124656,871	12,983	DESCAPOTE
1583	1766623,742	1124651,491	13,004	DESCAPOTE
1584	1766623,543	1124645,893	13,009	DESCAPOTE
1585	1766623,348	1124640,745	13,065	DESCAPOTE
1586	1766623,227	1124635,36	13,099	DESCAPOTE
1587	1766623,014	1124630,289	13,024	DESCAPOTE
1588	1766622,889	1124625,569	13,022	DESCAPOTE
1589	1766622,776	1124620,904	13,028	DESCAPOTE
1590	1766622,493	1124616,112	13	DESCAPOTE
1591	1766622,375	1124611,375	12,954	DESCAPOTE
1592	1766622,174	1124606,344	12,916	DESCAPOTE
1593	1766622,031	1124601,139	12,852	DESCAPOTE
1594	1766628,926	1124715,794	13,245	DESCAPOTE
1595	1766622,618	1124715,528	13,13	DESCAPOTE
1596	1766615,37	1124715,422	12,923	DESCAPOTE
1597	1766608,936	1124715,371	12,796	DESCAPOTE
1598	1766602,013	1124715,384	12,675	DESCAPOTE
1599	1766602,242	1124710,254	12,665	DESCAPOTE
1600	1766609,108	1124710,801	12,793	DESCAPOTE
1601	1766615,73	1124711,121	12,902	DESCAPOTE
1602	1766622,166	1124711,166	13,088	DESCAPOTE
1603	1766627,768	1124711,257	13,196	DESCAPOTE
1604	1766630,245	1124711,23	13,344	DESCAPOTE
1605	1766630,008	1124706,22	13,308	DESCAPOTE
1606	1766624,144	1124705,991	13,081	DESCAPOTE
1607	1766617,891	1124705,775	12,919	DESCAPOTE
1608	1766611,565	1124705,76	12,797	DESCAPOTE
1609	1766604,711	1124705,507	12,711	DESCAPOTE
1610	1766601,776	1124700,262	12,576	DESCAPOTE
1611	1766608,712	1124700,617	12,717	DESCAPOTE
1612	1766615,35	1124700,927	12,857	DESCAPOTE
1613	1766621,459	1124701,114	13,003	DESCAPOTE
1614	1766626,202	1124701,401	13,146	DESCAPOTE
1615	1766630,328	1124701,667	13,308	DESCAPOTE
1616	1766630,417	1124696,906	13,313	DESCAPOTE
1617	1766624,722	1124696,755	13,104	DESCAPOTE
1618	1766618,662	1124696,77	12,919	DESCAPOTE
1619	1766612,821	1124696,156	12,794	DESCAPOTE
1620	1766605,525	1124695,837	12,643	DESCAPOTE
1621	1766605,928	1124690,631	12,641	DESCAPOTE
1622	1766612,603	1124691,39	12,775	DESCAPOTE
1623	1766619,434	1124691,699	12,942	DESCAPOTE

1624	1766625,5	1124692,187	13,11	DESCAPOTE
1625	1766629,281	1124692,386	13,249	DESCAPOTE
1626	1766629,607	1124686,732	13,218	DESCAPOTE
1627	1766623,654	1124686,681	13,03	DESCAPOTE
1628	1766617,042	1124686,225	12,858	DESCAPOTE
1629	1766610,681	1124685,992	12,724	DESCAPOTE
1630	1766602,586	1124685,655	12,566	DESCAPOTE
1631	1766603,249	1124680,539	12,544	DESCAPOTE
1632	1766610,169	1124680,881	12,694	DESCAPOTE
1633	1766616,481	1124681,06	12,815	DESCAPOTE
1634	1766623,49	1124681,179	13,074	DESCAPOTE
1635	1766629,25	1124681,172	13,195	DESCAPOTE
1636	1766629,551	1124676,204	13,204	DESCAPOTE
1637	1766623,815	1124676,138	12,993	DESCAPOTE
1638	1766617,736	1124675,892	12,81	DESCAPOTE
1639	1766612,159	1124675,776	12,724	DESCAPOTE
1640	1766605,838	1124675,437	12,59	DESCAPOTE
1641	1766598,999	1124675,298	12,42	DESCAPOTE
1642	1766598,66	1124670,821	12,404	DESCAPOTE
1643	1766605,174	1124670,902	12,56	DESCAPOTE
1644	1766611,668	1124671,099	12,693	DESCAPOTE
1645	1766618,422	1124671,422	12,827	DESCAPOTE
1646	1766623,134	1124671,557	12,971	DESCAPOTE
1647	1766627,557	1124671,758	13,113	DESCAPOTE
1648	1766624,722	1124666,591	13,015	DESCAPOTE
1649	1766618,321	1124666,809	12,828	DESCAPOTE
1650	1766611,294	1124666,278	12,689	DESCAPOTE
1651	1766604,819	1124665,935	12,54	DESCAPOTE
1652	1766597,965	1124665,61	12,365	DESCAPOTE
1653	1766600,607	1124660,595	12,48	DESCAPOTE
1654	1766608,564	1124661,39	12,634	DESCAPOTE
1655	1766615,516	1124661,219	12,781	DESCAPOTE
1656	1766620,909	1124661,781	12,881	DESCAPOTE
1657	1766623,994	1124661,675	12,959	DESCAPOTE
1658	1766620,349	1124656,822	12,877	DESCAPOTE
1659	1766614,643	1124656,475	12,774	DESCAPOTE
1660	1766609,096	1124656,185	12,636	DESCAPOTE
1661	1766602,049	1124655,849	12,465	DESCAPOTE
1662	1766597,345	1124650,478	12,298	DESCAPOTE
1663	1766603,688	1124650,958	12,467	DESCAPOTE
1664	1766610,318	1124651,486	12,668	DESCAPOTE
1665	1766616,561	1124651,79	12,81	DESCAPOTE
1666	1766619,642	1124651,991	12,877	DESCAPOTE
1667	1766620,276	1124646,007	12,91	DESCAPOTE

1668	1766614,486	1124645,61	12,775	DESCAPOTE
1669	1766607,964	1124645,461	12,626	DESCAPOTE
1670	1766601,467	1124645,359	12,466	DESCAPOTE
1671	1766597,243	1124640,35	12,339	DESCAPOTE
1672	1766604,071	1124640,39	12,549	DESCAPOTE
1673	1766611,593	1124640,594	12,706	DESCAPOTE
1674	1766618,927	1124640,764	12,855	DESCAPOTE
1675	1766620,453	1124635,354	12,954	DESCAPOTE
1676	1766614,069	1124635,375	12,748	DESCAPOTE
1677	1766608,371	1124635,271	12,638	DESCAPOTE
1678	1766602,568	1124635,178	12,489	DESCAPOTE
1679	1766597,19	1124629,997	12,339	DESCAPOTE
1680	1766603,465	1124629,933	12,464	DESCAPOTE
1681	1766610,739	1124630,164	12,658	DESCAPOTE
1682	1766617,41	1124630,268	12,802	DESCAPOTE
1683	1766619,718	1124630,307	12,906	DESCAPOTE
1684	1766619,901	1124625,411	12,914	DESCAPOTE
1685	1766614,318	1124625,559	12,774	DESCAPOTE
1686	1766607,528	1124625,492	12,632	DESCAPOTE
1687	1766600,606	1124625,134	12,428	DESCAPOTE
1688	1766599,891	1124620,365	12,428	DESCAPOTE
1689	1766606,071	1124620,586	12,569	DESCAPOTE
1690	1766614,228	1124620,601	12,732	DESCAPOTE
1691	1766618,872	1124620,603	12,831	DESCAPOTE
1692	1766619,368	1124616,008	12,874	DESCAPOTE
1693	1766613,371	1124615,72	12,671	DESCAPOTE
1694	1766607,181	1124615,692	12,564	DESCAPOTE
1695	1766600,944	1124615,463	12,457	DESCAPOTE
1696	1766604,098	1124610,617	12,498	DESCAPOTE
1697	1766611,32	1124610,828	12,604	DESCAPOTE
1698	1766617,823	1124611,151	12,77	DESCAPOTE
1699	1766618,595	1124606,244	12,825	DESCAPOTE
1700	1766611,359	1124606,001	12,608	DESCAPOTE
1701	1766603,078	1124605,629	12,451	DESCAPOTE
1702	1766595,425	1124605,443	12,217	DESCAPOTE
1703	1766599,199	1124600,46	12,339	DESCAPOTE
1704	1766608,477	1124600,62	12,523	DESCAPOTE
1705	1766615,352	1124601,118	12,736	DESCAPOTE
1706	1766619	1124601,182	12,726	DESCAPOTE
1707	1766621,09	1124601,238	12,806	DESCAPOTE
1708	1766686,521	1126264,28	15,958	DESCAPOTE
1709	1766677,123	1125987,391	15,359	DESCAPOTE
1710	1766677,35	1125992,811	15,408	DESCAPOTE
1711	1766677,451	1125997,493	15,38	DESCAPOTE

1712	1766677,68	1126002,957	15,391	DESCAPOTE
1713	1766677,892	1126008,109	15,375	DESCAPOTE
1714	1766678,042	1126013,536	15,362	DESCAPOTE
1715	1766678,105	1126018,543	15,378	DESCAPOTE
1716	1766678,275	1126023,833	15,39	DESCAPOTE
1717	1766678,466	1126029,029	15,386	DESCAPOTE
1718	1766678,715	1126034,425	15,428	DESCAPOTE
1719	1766678,926	1126039,565	15,445	DESCAPOTE
1720	1766679,087	1126045,584	15,439	DESCAPOTE
1721	1766679,286	1126050,446	15,446	DESCAPOTE
1722	1766679,506	1126056,297	15,459	DESCAPOTE
1723	1766679,704	1126061,319	15,455	DESCAPOTE
1724	1766679,807	1126066,458	15,472	DESCAPOTE
1725	1766679,966	1126071,451	15,47	DESCAPOTE
1726	1766680,183	1126077,26	15,471	DESCAPOTE
1727	1766680,419	1126082,754	15,502	DESCAPOTE
1728	1766680,595	1126088,051	15,505	DESCAPOTE
1729	1766680,732	1126091,579	15,526	DESCAPOTE
1730	1766680,887	1126096,022	15,56	DESCAPOTE
1731	1766681,048	1126099,657	15,572	DESCAPOTE
1732	1766681,245	1126104,206	15,594	DESCAPOTE
1733	1766681,407	1126108,367	15,6	DESCAPOTE
1734	1766681,472	1126112,486	15,589	DESCAPOTE
1735	1766681,703	1126117,184	15,619	DESCAPOTE
1736	1766681,789	1126121,354	15,632	DESCAPOTE
1737	1766681,987	1126126,821	15,654	DESCAPOTE
1738	1766682,121	1126131,58	15,665	DESCAPOTE
1739	1766682,307	1126137,694	15,654	DESCAPOTE
1740	1766682,544	1126142,436	15,705	DESCAPOTE
1741	1766682,762	1126148,35	15,715	DESCAPOTE
1742	1766682,924	1126153,529	15,735	DESCAPOTE
1743	1766682,998	1126156,045	15,739	DESCAPOTE
1744	1766683,084	1126158,694	15,747	DESCAPOTE
1745	1766683,216	1126163,477	15,747	DESCAPOTE
1746	1766683,38	1126168,039	15,759	DESCAPOTE
1747	1766683,51	1126173,11	15,76	DESCAPOTE
1748	1766683,729	1126178,104	15,788	DESCAPOTE
1749	1766683,766	1126183,454	15,763	DESCAPOTE
1750	1766683,996	1126189,686	15,798	DESCAPOTE
1751	1766684,176	1126194,925	15,797	DESCAPOTE
1752	1766684,365	1126200,041	15,827	DESCAPOTE
1753	1766684,582	1126205,256	15,855	DESCAPOTE
1754	1766684,716	1126210,445	15,816	DESCAPOTE
1755	1766684,967	1126215,849	15,86	DESCAPOTE

1756	1766685,075	1126220,285	15,844	DESCAPOTE
1757	1766685,247	1126225,458	15,867	DESCAPOTE
1758	1766685,421	1126229,401	15,888	DESCAPOTE
1759	1766685,626	1126234,655	15,896	DESCAPOTE
1760	1766685,875	1126240,306	15,925	DESCAPOTE
1761	1766685,976	1126246,111	15,925	DESCAPOTE
1762	1766686,069	1126250,627	15,933	DESCAPOTE
1763	1766686,188	1126255,444	15,932	DESCAPOTE
1764	1766686,377	1126259,984	15,93	DESCAPOTE
1765	1766686,656	1126269,389	15,952	DESCAPOTE
1766	1766686,867	1126274,012	15,979	DESCAPOTE
1767	1766687,028	1126279,313	15,981	DESCAPOTE
1768	1766687,15	1126284,604	16,001	DESCAPOTE
1769	1766687,357	1126289,584	16,025	DESCAPOTE
1770	1766687,664	1126294,815	16,006	DESCAPOTE
1771	1766687,752	1126299,779	16,033	DESCAPOTE
1772	1766687,904	1126304,479	16,013	DESCAPOTE
1773	1766688,107	1126309,889	16,022	DESCAPOTE
1774	1766688,17	1126314,451	16,032	DESCAPOTE
1775	1766688,431	1126319,128	16,053	DESCAPOTE
1776	1766688,618	1126323,649	16,054	DESCAPOTE
1777	1766688,664	1126328,952	16,044	DESCAPOTE
1778	1766688,803	1126332,309	16,042	DESCAPOTE
1779	1766689,039	1126337,166	16,064	DESCAPOTE
1780	1766689,165	1126341,604	16,09	DESCAPOTE
1781	1766689,31	1126346,351	16,106	DESCAPOTE
1782	1766689,464	1126350,871	16,113	DESCAPOTE
1783	1766689,64	1126355,557	16,092	DESCAPOTE
1784	1766689,778	1126360,115	16,138	DESCAPOTE
1785	1766689,953	1126364,582	16,126	DESCAPOTE
1786	1766690,295	1126370,757	16,158	DESCAPOTE
1787	1766690,398	1126376,252	16,13	DESCAPOTE
1788	1766690,564	1126380,534	16,132	DESCAPOTE
1789	1766690,741	1126385,778	16,137	DESCAPOTE
1790	1766690,975	1126390,605	16,157	DESCAPOTE
1791	1766691,117	1126395,678	16,145	DESCAPOTE
1792	1766691,261	1126401,053	16,15	DESCAPOTE
1793	1766691,449	1126406,03	16,17	DESCAPOTE
1794	1766691,579	1126411,323	16,185	DESCAPOTE
1795	1766652,543	1125260,545	14,293	DESCAPOTE
1796	1766652,766	1125268,412	14,318	DESCAPOTE
1797	1766652,929	1125274,161	14,31	DESCAPOTE
1798	1766653,041	1125278,072	14,314	DESCAPOTE
1799	1766653,213	1125282,837	14,335	DESCAPOTE

1800	1766653,289	1125288,208	14,329	DESCAPOTE
1801	1766653,547	1125292,765	14,33	DESCAPOTE
1802	1766653,725	1125299,07	14,342	DESCAPOTE
1803	1766653,83	1125303,866	14,342	DESCAPOTE
1804	1766654,06	1125309,92	14,35	DESCAPOTE
1805	1766654,309	1125315,242	14,332	DESCAPOTE
1806	1766654,324	1125320,61	14,342	DESCAPOTE
1807	1766654,639	1125325,73	14,349	DESCAPOTE
1808	1766654,781	1125330,119	14,352	DESCAPOTE
1809	1766655,026	1125335,247	14,367	DESCAPOTE
1810	1766655,204	1125340,064	14,369	DESCAPOTE
1811	1766655,329	1125344,825	14,359	DESCAPOTE
1812	1766655,51	1125350,759	14,367	DESCAPOTE
1813	1766677,102	1125984,051	15,392	DESCAPOTE
1814	1766676,887	1125980,3	15,348	DESCAPOTE
1815	1766676,726	1125976,447	15,303	DESCAPOTE
1816	1766676,615	1125972,735	15,319	DESCAPOTE
1817	1766676,499	1125967,324	15,296	DESCAPOTE
1818	1766676,178	1125961,975	15,297	DESCAPOTE
1819	1766676,077	1125956,927	15,29	DESCAPOTE
1820	1766675,951	1125951,48	15,299	DESCAPOTE
1821	1766675,803	1125946,222	15,271	DESCAPOTE
1822	1766675,619	1125940,664	15,261	DESCAPOTE
1823	1766675,454	1125935,046	15,257	DESCAPOTE
1824	1766675,272	1125930,775	15,231	DESCAPOTE
1825	1766675,11	1125927,133	15,224	DESCAPOTE
1826	1766674,983	1125922,318	15,2	DESCAPOTE
1827	1766674,794	1125916,245	15,197	DESCAPOTE
1828	1766674,46	1125909,906	15,189	DESCAPOTE
1829	1766674,345	1125904,432	15,16	DESCAPOTE
1830	1766674,157	1125899,26	15,137	DESCAPOTE
1831	1766673,962	1125893,416	15,136	DESCAPOTE
1832	1766673,872	1125889,09	15,153	DESCAPOTE
1833	1766673,672	1125884,181	15,085	DESCAPOTE
1834	1766673,495	1125879,535	15,099	DESCAPOTE
1835	1766673,359	1125874,163	15,076	DESCAPOTE
1836	1766673,074	1125869,616	15,071	DESCAPOTE
1837	1766672,944	1125864,271	15,066	DESCAPOTE
1838	1766672,832	1125859,824	15,086	DESCAPOTE
1839	1766672,673	1125854,738	15,039	DESCAPOTE
1840	1766672,446	1125849,573	15,007	DESCAPOTE
1841	1766672,292	1125844,49	15,046	DESCAPOTE
1842	1766672,086	1125839,788	15,072	DESCAPOTE
1843	1766671,935	1125834,966	14,942	DESCAPOTE

1844	1766671,797	1125830,71	15,014	DESCAPOTE
1845	1766671,596	1125825,911	14,928	DESCAPOTE
1846	1766671,302	1125820,39	14,922	DESCAPOTE
1847	1766671,202	1125815,025	14,932	DESCAPOTE
1848	1766671,094	1125810,158	14,992	DESCAPOTE
1849	1766670,912	1125804,973	14,927	DESCAPOTE
1850	1766670,759	1125800,213	14,962	DESCAPOTE
1851	1766670,588	1125794,783	14,971	DESCAPOTE
1852	1766670,291	1125790,369	14,96	DESCAPOTE
1853	1766670,362	1125785,165	14,941	DESCAPOTE
1854	1766669,944	1125779,924	14,955	DESCAPOTE
1855	1766669,851	1125775,129	14,927	DESCAPOTE
1856	1766669,663	1125769,443	14,892	DESCAPOTE
1857	1766669,554	1125764,415	14,867	DESCAPOTE
1858	1766669,298	1125760,348	14,895	DESCAPOTE
1859	1766669,32	1125755,53	14,934	DESCAPOTE
1860	1766669,105	1125750,37	14,956	DESCAPOTE
1861	1766668,912	1125745,019	14,953	DESCAPOTE
1862	1766668,547	1125740,445	14,898	DESCAPOTE
1863	1766668,544	1125735,232	14,886	DESCAPOTE
1864	1766668,376	1125729,45	14,859	DESCAPOTE
1865	1766668,189	1125724,053	14,873	DESCAPOTE
1866	1766668	1125718,703	14,87	DESCAPOTE
1867	1766667,782	1125713,125	14,841	DESCAPOTE
1868	1766667,563	1125707,628	14,822	DESCAPOTE
1869	1766667,443	1125702,179	14,853	DESCAPOTE
1870	1766667,253	1125696,566	14,823	DESCAPOTE
1871	1766667,119	1125690,979	14,813	DESCAPOTE
1872	1766666,874	1125684,989	14,803	DESCAPOTE
1873	1766666,613	1125678,997	14,783	DESCAPOTE
1874	1766666,423	1125673,237	14,791	DESCAPOTE
1875	1766666,263	1125667,424	14,763	DESCAPOTE
1876	1766666,005	1125661,877	14,762	DESCAPOTE
1877	1766665,822	1125655,867	14,74	DESCAPOTE
1878	1766665,634	1125650,163	14,758	DESCAPOTE
1879	1766665,441	1125644,257	14,709	DESCAPOTE
1880	1766665,249	1125638,35	14,727	DESCAPOTE
1881	1766665,079	1125632,673	14,692	DESCAPOTE
1882	1766664,933	1125627,032	14,71	DESCAPOTE
1883	1766664,678	1125621,079	14,676	DESCAPOTE
1884	1766664,517	1125615,283	14,698	DESCAPOTE
1885	1766664,329	1125609,204	14,693	DESCAPOTE
1886	1766664,138	1125603,42	14,681	DESCAPOTE
1887	1766663,92	1125597,761	14,662	DESCAPOTE

1888	1766663,679	1125592,488	14,669	DESCAPOTE
1889	1766663,412	1125586,929	14,706	DESCAPOTE
1890	1766663,128	1125576,223	14,65	DESCAPOTE
1891	1766662,971	1125570,667	14,672	DESCAPOTE
1892	1766662,752	1125565,185	14,628	DESCAPOTE
1893	1766662,648	1125559,618	14,679	DESCAPOTE
1894	1766662,406	1125554,305	14,672	DESCAPOTE
1895	1766662,212	1125548,889	14,66	DESCAPOTE
1896	1766661,971	1125543,046	14,657	DESCAPOTE
1897	1766661,779	1125537,016	14,631	DESCAPOTE
1898	1766661,525	1125530,82	14,644	DESCAPOTE
1899	1766661,371	1125524,249	14,648	DESCAPOTE
1900	1766661,277	1125518,31	14,687	DESCAPOTE
1901	1766660,997	1125512,736	14,587	DESCAPOTE
1902	1766660,771	1125507,358	14,572	DESCAPOTE
1903	1766660,613	1125501,776	14,583	DESCAPOTE
1904	1766660,399	1125496,361	14,558	DESCAPOTE
1905	1766660,132	1125490,009	14,564	DESCAPOTE
1906	1766659,927	1125483,506	14,561	DESCAPOTE
1907	1766659,773	1125477,676	14,535	DESCAPOTE
1908	1766659,562	1125471,112	14,541	DESCAPOTE
1909	1766659,371	1125465,205	14,521	DESCAPOTE
1910	1766659,169	1125459,323	14,55	DESCAPOTE
1911	1766658,886	1125452,789	14,543	DESCAPOTE
1912	1766658,702	1125446,958	14,498	DESCAPOTE
1913	1766658,52	1125441,33	14,476	DESCAPOTE
1914	1766658,394	1125435,972	14,523	DESCAPOTE
1915	1766658,259	1125430,538	14,486	DESCAPOTE
1916	1766658,036	1125424,866	14,502	DESCAPOTE
1917	1766657,793	1125419,282	14,476	DESCAPOTE
1918	1766657,625	1125413,403	14,497	DESCAPOTE
1919	1766657,392	1125406,849	14,472	DESCAPOTE
1920	1766657,189	1125400,865	14,458	DESCAPOTE
1921	1766656,966	1125394,252	14,475	DESCAPOTE
1922	1766656,798	1125388,066	14,478	DESCAPOTE
1923	1766656,596	1125382,384	14,455	DESCAPOTE
1924	1766656,462	1125376,915	14,464	DESCAPOTE
1925	1766656,24	1125371,168	14,471	DESCAPOTE
1926	1766656,074	1125365,149	14,452	DESCAPOTE
1927	1766655,836	1125359,778	14,374	DESCAPOTE
1928	1766655,759	1125355,998	14,374	DESCAPOTE
1929	1766652,321	1125255,527	14,281	DESCAPOTE
1930	1766652,139	1125250,561	14,313	DESCAPOTE
1931	1766651,936	1125245,537	14,267	DESCAPOTE

1932	1766651,751	1125240,897	14,248	DESCAPOTE
1933	1766651,625	1125236,296	14,233	DESCAPOTE
1934	1766651,478	1125231,237	14,24	DESCAPOTE
1935	1766651,293	1125227,315	14,234	DESCAPOTE
1936	1766651,161	1125222,916	14,261	DESCAPOTE
1937	1766650,92	1125218,37	14,228	DESCAPOTE
1938	1766650,83	1125213,594	14,239	DESCAPOTE
1939	1766650,648	1125208,859	14,214	DESCAPOTE
1940	1766650,469	1125204,332	14,19	DESCAPOTE
1941	1766650,278	1125199,637	14,158	DESCAPOTE
1942	1766650,119	1125194,869	14,16	DESCAPOTE
1943	1766650,006	1125190,236	14,139	DESCAPOTE
1944	1766649,812	1125185,884	14,132	DESCAPOTE
1945	1766649,647	1125181,15	14,162	DESCAPOTE
1946	1766649,482	1125176,353	14,134	DESCAPOTE
1947	1766649,309	1125171,586	14,111	DESCAPOTE
1948	1766649,108	1125167,027	14,107	DESCAPOTE
1949	1766649,054	1125162,615	14,111	DESCAPOTE
1950	1766648,927	1125158,186	14,075	DESCAPOTE
1951	1766648,795	1125153,781	14,067	DESCAPOTE
1952	1766648,564	1125148,572	14,085	DESCAPOTE
1953	1766648,431	1125143,542	14,061	DESCAPOTE
1954	1766648,246	1125138,69	14,057	DESCAPOTE
1955	1766648,023	1125133,727	14,046	DESCAPOTE
1956	1766647,853	1125128,28	14,037	DESCAPOTE
1957	1766647,614	1125122,349	13,997	DESCAPOTE
1958	1766647,516	1125117,002	13,991	DESCAPOTE
1959	1766647,285	1125111,311	13,998	DESCAPOTE
1960	1766647,078	1125105,631	14,037	DESCAPOTE
1961	1766646,881	1125099,732	14,007	DESCAPOTE
1962	1766646,665	1125095,056	14,002	DESCAPOTE
1963	1766646,574	1125090,333	13,978	DESCAPOTE
1964	1766660,525	1125500,713	14,59	DESCAPOTE
1965	1766646,372	1125085,561	14,008	DESCAPOTE
1966	1766646,193	1125080,381	14,017	DESCAPOTE
1967	1766645,985	1125075,278	14,056	DESCAPOTE
1968	1766645,882	1125070,122	13,997	DESCAPOTE
1969	1766645,668	1125064,257	14,006	DESCAPOTE
1970	1766645,526	1125059,257	13,997	DESCAPOTE
1971	1766645,234	1125054,094	14,044	DESCAPOTE
1972	1766645,222	1125049,318	14,008	DESCAPOTE
1973	1766645,027	1125044,397	13,996	DESCAPOTE
1974	1766644,753	1125039,459	14,005	DESCAPOTE
1975	1766644,573	1125034,285	14,001	DESCAPOTE

1976	1766644,428	1125029,277	13,99	DESCAPOTE
1977	1766644,287	1125024,367	13,96	DESCAPOTE
1978	1766644,154	1125019,501	13,974	DESCAPOTE
1979	1766643,985	1125014,278	13,986	DESCAPOTE
1980	1766643,721	1125008,703	13,942	DESCAPOTE
1981	1766643,271	1124992,662	13,92	DESCAPOTE
1982	1766643,075	1124987,296	13,885	DESCAPOTE
1983	1766642,863	1124982,269	13,905	DESCAPOTE
1984	1766642,702	1124977,149	13,955	DESCAPOTE
1985	1766642,563	1124972,061	13,873	DESCAPOTE
1986	1766642,49	1124966,696	13,912	DESCAPOTE
1987	1766642,21	1124961,04	13,924	DESCAPOTE
1988	1766641,967	1124955,663	13,846	DESCAPOTE
1989	1766641,692	1124950,154	13,849	DESCAPOTE
1990	1766641,61	1124945,153	13,815	DESCAPOTE
1991	1766641,478	1124939,865	13,839	DESCAPOTE
1992	1766641,205	1124934,682	13,839	DESCAPOTE
1993	1766641,116	1124929,648	13,807	DESCAPOTE
1994	1766640,921	1124924,512	13,836	DESCAPOTE
1995	1766640,702	1124919,205	13,821	DESCAPOTE
1996	1766640,552	1124914,287	13,826	DESCAPOTE
1997	1766640,446	1124909,319	13,82	DESCAPOTE
1998	1766640,305	1124904,32	13,814	DESCAPOTE
1999	1766640,123	1124899,723	13,814	DESCAPOTE
2000	1766639,87	1124894,396	13,786	DESCAPOTE
2001	1766639,767	1124889,598	13,815	DESCAPOTE
2002	1766639,623	1124884,329	13,777	DESCAPOTE
2003	1766639,384	1124879,064	13,757	DESCAPOTE
2004	1766639,163	1124873,838	13,745	DESCAPOTE
2005	1766638,931	1124868,376	13,691	DESCAPOTE
2006	1766638,78	1124863,19	13,716	DESCAPOTE
2007	1766638,561	1124857,844	13,784	DESCAPOTE
2008	1766638,446	1124852,584	13,699	DESCAPOTE
2009	1766638,202	1124847,194	13,703	DESCAPOTE
2010	1766638,09	1124842,224	13,68	DESCAPOTE
2011	1766637,896	1124837,609	13,677	DESCAPOTE
2012	1766637,755	1124832,825	13,684	DESCAPOTE
2013	1766637,549	1124827,907	13,67	DESCAPOTE
2014	1766637,367	1124823,062	13,688	DESCAPOTE
2015	1766637,215	1124818,016	13,722	DESCAPOTE
2016	1766637,041	1124813,192	13,711	DESCAPOTE
2017	1766636,902	1124808,047	13,693	DESCAPOTE
2018	1766636,702	1124802,869	13,641	DESCAPOTE
2019	1766636,466	1124797,76	13,705	DESCAPOTE

2020	1766636,315	1124792,599	13,652	DESCAPOTE
2021	1766636,205	1124787,263	13,627	DESCAPOTE
2022	1766635,964	1124782,02	13,648	DESCAPOTE
2023	1766635,867	1124777,397	13,672	DESCAPOTE
2024	1766635,618	1124772,631	13,604	DESCAPOTE
2025	1766635,522	1124767,747	13,617	DESCAPOTE
2026	1766635,32	1124763,052	13,584	DESCAPOTE
2027	1766635,092	1124757,949	13,536	DESCAPOTE
2028	1766634,885	1124752,937	13,523	DESCAPOTE
2029	1766634,731	1124748,27	13,507	DESCAPOTE
2030	1766634,601	1124743,689	13,511	DESCAPOTE
2031	1766634,508	1124739,194	13,556	DESCAPOTE
2032	1766634,297	1124734,574	13,495	DESCAPOTE
2033	1766634,202	1124729,993	13,538	DESCAPOTE
2034	1766634,018	1124725,323	13,461	DESCAPOTE
2035	1766633,735	1124720,584	13,454	DESCAPOTE
2036	1766633,65	1124715,61	13,527	DESCAPOTE
2037	1766633,515	1124711,006	13,471	DESCAPOTE
2038	1766633,319	1124706,217	13,44	DESCAPOTE
2039	1766633,24	1124701,751	13,421	DESCAPOTE
2040	1766633,108	1124697,101	13,39	DESCAPOTE
2041	1766632,891	1124692,497	13,418	DESCAPOTE
2042	1766632,653	1124686,694	13,363	DESCAPOTE
2043	1766632,443	1124681,042	13,344	DESCAPOTE
2044	1766632,276	1124676,052	13,283	DESCAPOTE
2045	1766632,161	1124673,204	13,235	DESCAPOTE
2046	1766631,744	1124672,307	13,206	DESCAPOTE
2047	1766645,618	1125989,258	14,76	DESCAPOTE
2048	1766651,392	1125988,78	14,832	DESCAPOTE
2049	1766656,879	1125988,614	14,913	DESCAPOTE
2050	1766662,259	1125988,225	14,965	DESCAPOTE
2051	1766667,663	1125987,923	15,097	DESCAPOTE
2052	1766672,995	1125987,642	15,192	DESCAPOTE
2053	1766674,782	1125984,246	15,274	DESCAPOTE
2054	1766674,594	1125984,337	15,279	DESCAPOTE
2055	1766674,424	1125984,185	15,261	DESCAPOTE
2056	1766674,583	1125983,99	15,273	DESCAPOTE
2057	1766667,5	1125981,041	15,037	DESCAPOTE
2058	1766666,37	1125981,072	14,989	DESCAPOTE
2059	1766666,313	1125979,918	15,013	DESCAPOTE
2060	1766667,434	1125979,868	15,043	DESCAPOTE
2061	1766671,99	1125993,081	15,169	DESCAPOTE
2062	1766666,602	1125993,413	15,071	DESCAPOTE
2063	1766661,185	1125993,929	14,99	DESCAPOTE

2064	1766655,514	1125994,312	14,921	DESCAPOTE
2065	1766649,796	1125994,838	14,818	DESCAPOTE
2066	1766644,321	1125995,41	14,76	DESCAPOTE
2067	1766646,934	1125999,489	14,711	DESCAPOTE
2068	1766652,414	1125999,109	14,874	DESCAPOTE
2069	1766658,207	1125998,771	14,952	DESCAPOTE
2070	1766663,875	1125998,413	15,064	DESCAPOTE
2071	1766669,637	1125998,022	15,163	DESCAPOTE
2072	1766673,016	1125997,763	15,221	DESCAPOTE
2073	1766673,085	1126003,437	15,241	DESCAPOTE
2074	1766667,725	1126003,656	15,124	DESCAPOTE
2075	1766661,933	1126003,916	15,03	DESCAPOTE
2076	1766656,81	1126004,077	14,939	DESCAPOTE
2077	1766651,056	1126004,28	14,852	DESCAPOTE
2078	1766645,61	1126004,63	14,734	DESCAPOTE
2079	1766647,738	1126009,43	14,771	DESCAPOTE
2080	1766652,685	1126009,175	14,887	DESCAPOTE
2081	1766657,779	1126009,056	14,952	DESCAPOTE
2082	1766663,237	1126008,832	15,001	DESCAPOTE
2083	1766668,611	1126008,503	15,152	DESCAPOTE
2084	1766673,399	1126008,312	15,25	DESCAPOTE
2085	1766673,322	1126013,867	15,247	DESCAPOTE
2086	1766667,363	1126014,045	15,07	DESCAPOTE
2087	1766661,633	1126014,054	14,98	DESCAPOTE
2088	1766656,193	1126014,412	14,948	DESCAPOTE
2089	1766650,743	1126014,623	14,835	DESCAPOTE
2090	1766646,264	1126014,739	14,746	DESCAPOTE
2091	1766646,405	1126019,105	14,759	DESCAPOTE
2092	1766651,981	1126019,13	14,897	DESCAPOTE
2093	1766656,977	1126019,133	14,955	DESCAPOTE
2094	1766662,573	1126019,137	15,021	DESCAPOTE
2095	1766668,149	1126018,946	15,109	DESCAPOTE
2096	1766673,579	1126018,749	15,252	DESCAPOTE
2097	1766673,144	1126023,955	15,214	DESCAPOTE
2098	1766667,1	1126024,188	15,093	DESCAPOTE
2099	1766661,487	1126024,397	14,969	DESCAPOTE
2100	1766655,433	1126024,771	14,954	DESCAPOTE
2101	1766650,47	1126024,987	14,885	DESCAPOTE
2102	1766645,213	1126025,053	14,799	DESCAPOTE
2103	1766647,3	1126029,925	14,825	DESCAPOTE
2104	1766652,978	1126029,816	14,93	DESCAPOTE
2105	1766659,31	1126029,645	15,07	DESCAPOTE
2106	1766665,029	1126029,54	15,164	DESCAPOTE
2107	1766669,867	1126029,376	15,157	DESCAPOTE

2108	1766674,609	1126029,16	15,259	DESCAPOTE
2109	1766674,815	1126034,486	15,285	DESCAPOTE
2110	1766669,539	1126034,907	15,225	DESCAPOTE
2111	1766664,031	1126035,043	15,221	DESCAPOTE
2112	1766658,589	1126035,287	15,11	DESCAPOTE
2113	1766653,051	1126035,409	14,938	DESCAPOTE
2114	1766647,7	1126035,391	14,854	DESCAPOTE
2115	1766648,121	1126039,935	14,862	DESCAPOTE
2116	1766653,711	1126039,897	14,959	DESCAPOTE
2117	1766659,653	1126039,753	15,197	DESCAPOTE
2118	1766665,535	1126039,687	15,295	DESCAPOTE
2119	1766671,293	1126039,562	15,239	DESCAPOTE
2120	1766675,603	1126039,546	15,334	DESCAPOTE
2121	1766675,131	1126045,665	15,314	DESCAPOTE
2122	1766669,133	1126045,637	15,231	DESCAPOTE
2123	1766664,142	1126045,69	15,297	DESCAPOTE
2124	1766658,898	1126045,67	15,196	DESCAPOTE
2125	1766653,513	1126045,793	14,971	DESCAPOTE
2126	1766648,169	1126045,767	14,847	DESCAPOTE
2127	1766648,631	1126050,339	14,884	DESCAPOTE
2128	1766653,94	1126050,322	14,962	DESCAPOTE
2129	1766659,667	1126050,282	15,225	DESCAPOTE
2130	1766665,061	1126050,333	15,249	DESCAPOTE
2131	1766669,746	1126050,381	15,215	DESCAPOTE
2132	1766675,133	1126050,428	15,319	DESCAPOTE
2133	1766675,515	1126056,587	15,338	DESCAPOTE
2134	1766670,433	1126056,561	15,257	DESCAPOTE
2135	1766665,585	1126056,792	15,235	DESCAPOTE
2136	1766660,372	1126056,655	15,304	DESCAPOTE
2137	1766655,624	1126056,83	15,031	DESCAPOTE
2138	1766650,75	1126057,244	14,925	DESCAPOTE
2139	1766648,378	1126061,323	14,908	DESCAPOTE
2140	1766653,924	1126061,365	14,984	DESCAPOTE
2141	1766659,468	1126061,364	15,257	DESCAPOTE
2142	1766665,249	1126061,457	15,27	DESCAPOTE
2143	1766670,769	1126061,627	15,265	DESCAPOTE
2144	1766674,878	1126061,435	15,331	DESCAPOTE
2145	1766675,844	1126066,42	15,347	DESCAPOTE
2146	1766670,576	1126066,605	15,267	DESCAPOTE
2147	1766665,184	1126066,906	15,293	DESCAPOTE
2148	1766659,635	1126067,106	15,22	DESCAPOTE
2149	1766654,113	1126067,021	14,994	DESCAPOTE
2150	1766648,129	1126067,09	14,882	DESCAPOTE
2151	1766648,163	1126071,199	14,873	DESCAPOTE

2152	1766653,405	1126071,184	14,986	DESCAPOTE
2153	1766659,044	1126071,339	15,206	DESCAPOTE
2154	1766664,515	1126071,345	15,282	DESCAPOTE
2155	1766669,846	1126071,489	15,251	DESCAPOTE
2156	1766674,246	1126071,455	15,307	DESCAPOTE
2157	1766675,786	1126071,378	15,349	DESCAPOTE
2158	1766675,291	1126077,284	15,328	DESCAPOTE
2159	1766669,778	1126076,934	15,233	DESCAPOTE
2160	1766664,808	1126077,004	15,257	DESCAPOTE
2161	1766660,134	1126076,96	15,181	DESCAPOTE
2162	1766654,75	1126077,15	15,038	DESCAPOTE
2163	1766649,482	1126076,682	14,932	DESCAPOTE
2164	1766648,256	1126081,07	14,899	DESCAPOTE
2165	1766652,966	1126081,507	15,009	DESCAPOTE
2166	1766658,216	1126081,89	15,137	DESCAPOTE
2167	1766663,657	1126082,117	15,268	DESCAPOTE
2168	1766668,722	1126082,369	15,194	DESCAPOTE
2169	1766673,688	1126082,684	15,289	DESCAPOTE
2170	1766677,022	1126082,875	15,376	DESCAPOTE
2171	1766675,696	1126087,527	15,366	DESCAPOTE
2172	1766671,523	1126087,48	15,289	DESCAPOTE
2173	1766666,097	1126087,092	15,281	DESCAPOTE
2174	1766660,967	1126086,674	15,27	DESCAPOTE
2175	1766655,285	1126086,629	15,066	DESCAPOTE
2176	1766649,961	1126086,206	14,953	DESCAPOTE
2177	1766647,606	1126090,35	14,933	DESCAPOTE
2178	1766652,347	1126090,413	14,995	DESCAPOTE
2179	1766657,501	1126090,613	15,159	DESCAPOTE
2180	1766662,158	1126090,767	15,274	DESCAPOTE
2181	1766667,682	1126091,15	15,294	DESCAPOTE
2182	1766673,283	1126091,465	15,319	DESCAPOTE
2183	1766676,981	1126091,525	15,406	DESCAPOTE
2184	1766676,751	1126095,996	15,417	DESCAPOTE
2185	1766672,19	1126095,618	15,346	DESCAPOTE
2186	1766666,422	1126095,234	15,339	DESCAPOTE
2187	1766661,704	1126095,661	15,28	DESCAPOTE
2188	1766656,714	1126095,842	15,072	DESCAPOTE
2189	1766651,447	1126095,638	15,001	DESCAPOTE
2190	1766648,263	1126099,807	14,962	DESCAPOTE
2191	1766652,861	1126099,853	15,024	DESCAPOTE
2192	1766657,843	1126099,983	15,13	DESCAPOTE
2193	1766662,905	1126100,153	15,311	DESCAPOTE
2194	1766667,722	1126100,084	15,322	DESCAPOTE
2195	1766672,685	1126099,891	15,347	DESCAPOTE

2196	1766676,791	1126099,64	15,441	DESCAPOTE
2197	1766677,086	1126104,512	15,477	DESCAPOTE
2198	1766671,718	1126104,394	15,353	DESCAPOTE
2199	1766666,918	1126104,537	15,395	DESCAPOTE
2200	1766661,071	1126104,665	15,282	DESCAPOTE
2201	1766654,429	1126104,837	15,051	DESCAPOTE
2202	1766650,049	1126104,952	14,986	DESCAPOTE
2203	1766650,019	1126109,685	15	DESCAPOTE
2204	1766655,347	1126109,44	15,112	DESCAPOTE
2205	1766660,834	1126109,238	15,296	DESCAPOTE
2206	1766667,53	1126108,833	15,388	DESCAPOTE
2207	1766672,825	1126108,584	15,396	DESCAPOTE
2208	1766677,26	1126108,204	15,479	DESCAPOTE
2209	1766676,919	1126112,55	15,476	DESCAPOTE
2210	1766672,01	1126112,878	15,447	DESCAPOTE
2211	1766666,362	1126113,005	15,381	DESCAPOTE
2212	1766660,864	1126113,239	15,334	DESCAPOTE
2213	1766655,214	1126113,686	15,158	DESCAPOTE
2214	1766649,834	1126114,169	15,101	DESCAPOTE
2215	1766649,996	1126119,401	15,182	DESCAPOTE
2216	1766654,825	1126119,239	15,258	DESCAPOTE
2217	1766659,963	1126118,823	15,352	DESCAPOTE
2218	1766665,711	1126118,527	15,478	DESCAPOTE
2219	1766672,176	1126118,113	15,419	DESCAPOTE
2220	1766677	1126117,677	15,491	DESCAPOTE
2221	1766678,278	1126117,468	15,518	DESCAPOTE
2222	1766677,792	1126121,299	15,536	DESCAPOTE
2223	1766672,268	1126121,64	15,5	DESCAPOTE
2224	1766670,218	1126121,803	15,5	DESCAPOTE
2225	1766665,857	1126122,005	15,498	DESCAPOTE
2226	1766662,661	1126122,122	15,44	DESCAPOTE
2227	1766657,307	1126123,146	15,346	DESCAPOTE
2228	1766653,942	1126123,439	15,27	DESCAPOTE
2229	1766649,539	1126123,664	15,18	DESCAPOTE
2230	1766650,374	1126129,106	15,247	DESCAPOTE
2231	1766655,962	1126128,606	15,332	DESCAPOTE
2232	1766660,985	1126128,048	15,438	DESCAPOTE
2233	1766666,13	1126127,432	15,496	DESCAPOTE
2234	1766671,389	1126127,238	15,513	DESCAPOTE
2235	1766675,725	1126126,923	15,565	DESCAPOTE
2236	1766678,36	1126126,948	15,608	DESCAPOTE
2237	1766678,524	1126132,078	15,629	DESCAPOTE
2238	1766673,569	1126132,63	15,571	DESCAPOTE
2239	1766668,132	1126132,647	15,52	DESCAPOTE

2240	1766661,739	1126133,015	15,493	DESCAPOTE
2241	1766655,966	1126133,632	15,399	DESCAPOTE
2242	1766649,869	1126134,035	15,265	DESCAPOTE
2243	1766682,749	1126269,48	15,929	DESCAPOTE
2244	1766677,871	1126269,385	15,856	DESCAPOTE
2245	1766672,979	1126269,899	15,802	DESCAPOTE
2246	1766668,654	1126269,606	15,776	DESCAPOTE
2247	1766663,263	1126269,846	15,654	DESCAPOTE
2248	1766654,187	1126275,041	15,429	DESCAPOTE
2249	1766660,066	1126274,826	15,601	DESCAPOTE
2250	1766665,885	1126274,652	15,703	DESCAPOTE
2251	1766671,689	1126274,507	15,827	DESCAPOTE
2252	1766676,798	1126274,323	15,778	DESCAPOTE
2253	1766680,179	1126274,211	15,879	DESCAPOTE
2254	1766683,181	1126274,129	15,94	DESCAPOTE
2255	1766682,75	1126279,172	15,942	DESCAPOTE
2256	1766678,172	1126279,531	15,78	DESCAPOTE
2257	1766673,363	1126279,503	15,836	DESCAPOTE
2258	1766668,17	1126279,758	15,812	DESCAPOTE
2259	1766662,958	1126279,499	15,662	DESCAPOTE
2260	1766658,063	1126279,832	15,527	DESCAPOTE
2261	1766653,171	1126280,009	15,486	DESCAPOTE
2262	1766653,451	1126285,061	15,486	DESCAPOTE
2263	1766658,395	1126284,902	15,593	DESCAPOTE
2264	1766663,623	1126284,82	15,716	DESCAPOTE
2265	1766669,235	1126284,669	15,783	DESCAPOTE
2266	1766674,607	1126284,555	15,811	DESCAPOTE
2267	1766679,538	1126284,6	15,867	DESCAPOTE
2268	1766683,685	1126284,642	15,919	DESCAPOTE
2269	1766683,876	1126290,209	15,943	DESCAPOTE
2270	1766678,744	1126289,843	15,858	DESCAPOTE
2271	1766673,847	1126289,943	15,767	DESCAPOTE
2272	1766669,073	1126289,858	15,773	DESCAPOTE
2273	1766664,095	1126289,795	15,695	DESCAPOTE
2274	1766658,877	1126290,286	15,622	DESCAPOTE
2275	1766654,166	1126290,498	15,472	DESCAPOTE
2276	1766654,076	1126295,136	15,53	DESCAPOTE
2277	1766659,535	1126294,96	15,638	DESCAPOTE
2278	1766664,858	1126294,819	15,781	DESCAPOTE
2279	1766670,178	1126294,796	15,723	DESCAPOTE
2280	1766675,975	1126294,625	15,821	DESCAPOTE
2281	1766680,613	1126294,622	15,931	DESCAPOTE
2282	1766683,501	1126294,755	15,957	DESCAPOTE
2283	1766683,78	1126300,28	15,989	DESCAPOTE

2284	1766678,437	1126299,727	15,899	DESCAPOTE
2285	1766673,749	1126299,926	15,829	DESCAPOTE
2286	1766669,266	1126300,236	15,833	DESCAPOTE
2287	1766664,54	1126300,411	15,799	DESCAPOTE
2288	1766659,847	1126300,509	15,652	DESCAPOTE
2289	1766654,905	1126300,522	15,552	DESCAPOTE
2290	1766657,93	1126305,449	15,662	DESCAPOTE
2291	1766663,278	1126305,238	15,795	DESCAPOTE
2292	1766668,775	1126305,029	15,894	DESCAPOTE
2293	1766673,517	1126304,804	15,86	DESCAPOTE
2294	1766677,971	1126304,617	15,89	DESCAPOTE
2295	1766677,98	1126304,588	15,888	DESCAPOTE
2296	1766681,877	1126304,614	15,956	DESCAPOTE
2297	1766684,337	1126304,526	15,983	DESCAPOTE
2298	1766684,168	1126309,553	15,995	DESCAPOTE
2299	1766679,698	1126310,224	15,944	DESCAPOTE
2300	1766675,102	1126310,125	15,807	DESCAPOTE
2301	1766670,698	1126310,01	15,876	DESCAPOTE
2302	1766665,862	1126310,29	15,886	DESCAPOTE
2303	1766660,281	1126310,255	15,78	DESCAPOTE
2304	1766655,661	1126310,209	15,611	DESCAPOTE
2305	1766658,19	1126314,871	15,753	DESCAPOTE
2306	1766663,424	1126314,886	15,908	DESCAPOTE
2307	1766669,133	1126314,786	15,877	DESCAPOTE
2308	1766674,308	1126314,589	15,931	DESCAPOTE
2309	1766679,47	1126314,506	15,964	DESCAPOTE
2310	1766683,993	1126314,466	15,989	DESCAPOTE
2311	1766684,826	1126314,581	15,981	DESCAPOTE
2312	1766684,08	1126319,15	15,984	DESCAPOTE
2313	1766679,166	1126319,498	15,984	DESCAPOTE
2314	1766674,51	1126319,859	15,928	DESCAPOTE
2315	1766669,44	1126319,301	15,894	DESCAPOTE
2316	1766664,527	1126319,738	15,905	DESCAPOTE
2317	1766660,234	1126319,811	15,846	DESCAPOTE
2318	1766659,048	1126324,731	15,872	DESCAPOTE
2319	1766665,099	1126324,479	15,925	DESCAPOTE
2320	1766670,917	1126324,295	15,929	DESCAPOTE
2321	1766676,311	1126323,964	15,952	DESCAPOTE
2322	1766681,426	1126323,751	16,03	DESCAPOTE
2323	1766685,046	1126323,712	16,006	DESCAPOTE
2324	1766685,232	1126329,001	16,004	DESCAPOTE
2325	1766680,614	1126329,228	16,04	DESCAPOTE
2326	1766676,533	1126329,176	15,998	DESCAPOTE
2327	1766672,63	1126329,456	15,915	DESCAPOTE

2328	1766667,501	1126329,687	15,97	DESCAPOTE
2329	1766662,923	1126329,489	15,954	DESCAPOTE
2330	1766658,657	1126329,717	15,878	DESCAPOTE
2331	1766657,57	1126333,942	15,82	DESCAPOTE
2332	1766661,507	1126333,548	15,879	DESCAPOTE
2333	1766666,359	1126333,197	16,001	DESCAPOTE
2334	1766670,687	1126332,826	15,945	DESCAPOTE
2335	1766675,098	1126332,451	16	DESCAPOTE
2336	1766679,674	1126332,45	16,039	DESCAPOTE
2337	1766682,818	1126332,439	16,027	DESCAPOTE
2338	1766685,106	1126332,261	15,976	DESCAPOTE
2339	1766685,387	1126337,288	15,996	DESCAPOTE
2340	1766680,736	1126337,206	16,08	DESCAPOTE
2341	1766676,707	1126337,686	16,055	DESCAPOTE
2342	1766671,832	1126337,722	15,952	DESCAPOTE
2343	1766666,696	1126338,409	15,925	DESCAPOTE
2344	1766661,325	1126338,896	15,845	DESCAPOTE
2345	1766656,501	1126339,363	15,806	DESCAPOTE
2346	1766656,422	1126339,363	15,801	DESCAPOTE
2347	1766657,597	1126344,1	15,853	DESCAPOTE
2348	1766661,871	1126343,575	15,867	DESCAPOTE
2349	1766666,632	1126343,027	15,918	DESCAPOTE
2350	1766671,207	1126342,675	15,96	DESCAPOTE
2351	1766675,852	1126342,352	16,054	DESCAPOTE
2352	1766680,515	1126342,121	16,076	DESCAPOTE
2353	1766684,631	1126341,811	16,05	DESCAPOTE
2354	1766684,486	1126346,675	16,047	DESCAPOTE
2355	1766679,813	1126347,008	16,11	DESCAPOTE
2356	1766675,01	1126347,735	16,004	DESCAPOTE
2357	1766670,36	1126348,054	15,98	DESCAPOTE
2358	1766665,965	1126348,324	15,934	DESCAPOTE
2359	1766662,142	1126348,486	15,892	DESCAPOTE
2360	1766657,115	1126348,736	15,833	DESCAPOTE
2361	1766658,333	1126354,006	15,908	DESCAPOTE
2362	1766663,637	1126352,931	15,926	DESCAPOTE
2363	1766668,06	1126352,316	15,995	DESCAPOTE
2364	1766672,962	1126351,853	16,022	DESCAPOTE
2365	1766678,126	1126351,81	16,063	DESCAPOTE
2366	1766681,661	1126351,449	16,102	DESCAPOTE
2367	1766684,689	1126351,213	16,057	DESCAPOTE
2368	1766685,614	1126355,623	16,054	DESCAPOTE
2369	1766681,758	1126355,969	16,119	DESCAPOTE
2370	1766676,542	1126356,772	16,001	DESCAPOTE
2371	1766672,579	1126357,211	16,005	DESCAPOTE


2372	1766668,167	1126357,781	15,973	DESCAPOTE
2373	1766663,911	1126358,177	15,896	DESCAPOTE
2374	1766659,885	1126358,615	15,932	DESCAPOTE
2375	1766658,096	1126363,315	15,935	DESCAPOTE
2376	1766661,89	1126362,543	15,923	DESCAPOTE
2377	1766666,041	1126361,916	15,899	DESCAPOTE
2378	1766670,206	1126361,479	15,964	DESCAPOTE
2379	1766674,91	1126361,123	15,991	DESCAPOTE
2380	1766679,611	1126360,884	16,131	DESCAPOTE
2381	1766683,192	1126360,627	16,093	DESCAPOTE
2382	1766685,389	1126360,429	16,067	DESCAPOTE
2383	1766685,747	1126364,984	16,065	DESCAPOTE
2384	1766680,719	1126365,436	16,114	DESCAPOTE
2385	1766676,55	1126365,975	16,05	DESCAPOTE
2386	1766672,261	1126366,11	16,041	DESCAPOTE
2387	1766667,815	1126366,739	15,918	DESCAPOTE
2388	1766662,68	1126367,691	15,94	DESCAPOTE
2389	1766658,242	1126368,295	15,922	DESCAPOTE
2390	1766659,2	1126373,712	15,892	DESCAPOTE
2391	1766663,525	1126373,158	15,962	DESCAPOTE
2392	1766668,544	1126372,579	15,948	DESCAPOTE
2393	1766673,764	1126372,163	15,988	DESCAPOTE
2394	1766677,813	1126371,722	16,039	DESCAPOTE
2395	1766681,889	1126371,338	16,105	DESCAPOTE
2396	1766685,69	1126371,065	16,087	DESCAPOTE
2397	1766686,264	1126376,71	16,086	DESCAPOTE
2398	1766682,214	1126376,749	16,055	DESCAPOTE
2399	1766676,389	1126377,519	16,009	DESCAPOTE
2400	1766670,399	1126377,879	15,968	DESCAPOTE
2401	1766665,937	1126378,178	15,937	DESCAPOTE
2402	1766660,121	1126378,345	15,857	DESCAPOTE
2403	1766659,049	1126383,349	15,874	DESCAPOTE
2404	1766662,935	1126382,864	15,919	DESCAPOTE
2405	1766667,403	1126382,322	15,948	DESCAPOTE
2406	1766672,692	1126381,742	16,003	DESCAPOTE
2407	1766677,103	1126381,284	16,024	DESCAPOTE
2408	1766681,557	1126381,077	16,065	DESCAPOTE
2409	1766686,051	1126380,667	16,068	DESCAPOTE
2410	1766686,266	1126385,912	16,057	DESCAPOTE
2411	1766682,084	1126386,497	16,099	DESCAPOTE
2412	1766678,023	1126386,883	16,062	DESCAPOTE
2413	1766672,475	1126387,235	16,038	DESCAPOTE
2414	1766668,01	1126387,568	15,969	DESCAPOTE
2415	1766663,296	1126387,985	15,933	DESCAPOTE

2416	1766659,073	1126388,386	15,939	DESCAPOTE
2417	1766659,63	1126393,864	15,914	DESCAPOTE
2418	1766664,537	1126393,25	15,953	DESCAPOTE
2419	1766669,192	1126392,644	15,992	DESCAPOTE
2420	1766673,692	1126391,959	16,043	DESCAPOTE
2421	1766678,032	1126391,467	16,082	DESCAPOTE
2422	1766682,969	1126391,152	16,106	DESCAPOTE
2423	1766686,712	1126390,867	16,068	DESCAPOTE
2424	1766687,064	1126396,046	16,064	DESCAPOTE
2425	1766682,078	1126396,265	16,132	DESCAPOTE
2426	1766676,24	1126397,31	16,074	DESCAPOTE
2427	1766672,63	1126397,501	16,051	DESCAPOTE
2428	1766667,564	1126397,777	15,978	DESCAPOTE
2429	1766662,436	1126398,54	15,948	DESCAPOTE
2430	1766661,039	1126403,154	15,965	DESCAPOTE
2431	1766665,708	1126402,681	15,975	DESCAPOTE
2432	1766670,652	1126402,221	16,023	DESCAPOTE
2433	1766675,523	1126401,465	16,066	DESCAPOTE
2434	1766679,511	1126402,159	16,146	DESCAPOTE
2435	1766682,42	1126401,856	16,189	DESCAPOTE
2436	1766686,537	1126401,582	16,073	DESCAPOTE
2437	1766686,632	1126406,553	16,089	DESCAPOTE
2438	1766682,514	1126406,661	16,173	DESCAPOTE
2439	1766677,65	1126406,682	16,057	DESCAPOTE
2440	1766672,573	1126407,101	16,039	DESCAPOTE
2441	1766667,596	1126407,918	16,003	DESCAPOTE
2442	1766662,587	1126408,256	15,986	DESCAPOTE
2443	1766659,699	1126413,686	15,978	DESCAPOTE
2444	1766663,928	1126413,394	16,015	DESCAPOTE
2445	1766668,242	1126412,907	16,001	DESCAPOTE
2446	1766672,448	1126412,603	16,043	DESCAPOTE
2447	1766678,715	1126412,019	16,071	DESCAPOTE
2448	1766683,14	1126411,891	16,137	DESCAPOTE
2449	1766686,891	1126411,621	16,072	DESCAPOTE
2450	1766691,808	1126416,414	16,211	DESCAPOTE
2451	1766687,129	1126416,443	16,145	DESCAPOTE
2452	1766681,999	1126416,81	16,117	DESCAPOTE
2453	1766676,544	1126417,605	16,047	DESCAPOTE
2454	1766671,721	1126418,3	16,017	DESCAPOTE
2455	1766666,745	1126418,712	15,974	DESCAPOTE
2456	1766661,539	1126419,36	16,025	DESCAPOTE
2457	1766659,774	1126424,174	15,981	DESCAPOTE
2458	1766664,672	1126423,715	15,999	DESCAPOTE
2459	1766669,314	1126423,222	15,985	DESCAPOTE

2460	1766674,681	1126422,753	16,042	DESCAPOTE
2461	1766679,293	1126422,193	16,103	DESCAPOTE
2462	1766683,038	1126422,022	16,144	DESCAPOTE
2463	1766686,789	1126421,948	16,103	DESCAPOTE
2464	1766692,015	1126421,588	16,209	DESCAPOTE
2465	1766692,129	1126426,44	16,216	DESCAPOTE
2466	1766687,54	1126426,889	16,133	DESCAPOTE
2467	1766682,556	1126427,01	16,137	DESCAPOTE
2468	1766677,868	1126427,358	16,125	DESCAPOTE
2469	1766672,701	1126448,444	16,166	DESCAPOTE
2470	1766668,23	1126448,636	16,096	DESCAPOTE
2471	1766662,812	1126448,878	16,037	DESCAPOTE
2472	1766660,971	1126453,945	16,017	DESCAPOTE
2473	1766664,568	1126453,841	16,1	DESCAPOTE
2474	1766669,807	1126453,349	16,141	DESCAPOTE
2475	1766675,117	1126452,902	16,199	DESCAPOTE
2476	1766680,4	1126452,622	16,25	DESCAPOTE
2477	1766684,57	1126452,278	16,28	DESCAPOTE
2478	1766688,313	1126452,079	16,176	DESCAPOTE
2479	1766692,97	1126451,73	16,263	DESCAPOTE
2480	1766693,061	1126454,644	16,194	DESCAPOTE
2481	1766693,284	1126455,56	16,191	DESCAPOTE
2482	1766693,168	1126456,715	16,147	DESCAPOTE
2483	1766688,806	1126456,617	16,188	DESCAPOTE
2484	1766684,724	1126457,109	16,248	DESCAPOTE
2485	1766679,851	1126457,509	16,208	DESCAPOTE
2486	1766676,176	1126457,427	16,203	DESCAPOTE
2487	1766670,896	1126458,088	16,148	DESCAPOTE
2488	1766665,868	1126458,336	16,1	DESCAPOTE
2489	1766661,356	1126458,631	16,033	DESCAPOTE

AREAS Y VOLUMENES RELLENO FRANJA SUR
FEBRERO 2025

ÁREAS Y VOLUMENES DE RELLENO		
	ÁREA(m²)	VOLUMEN (m³)
RELLENO SUR	55144	14035,19

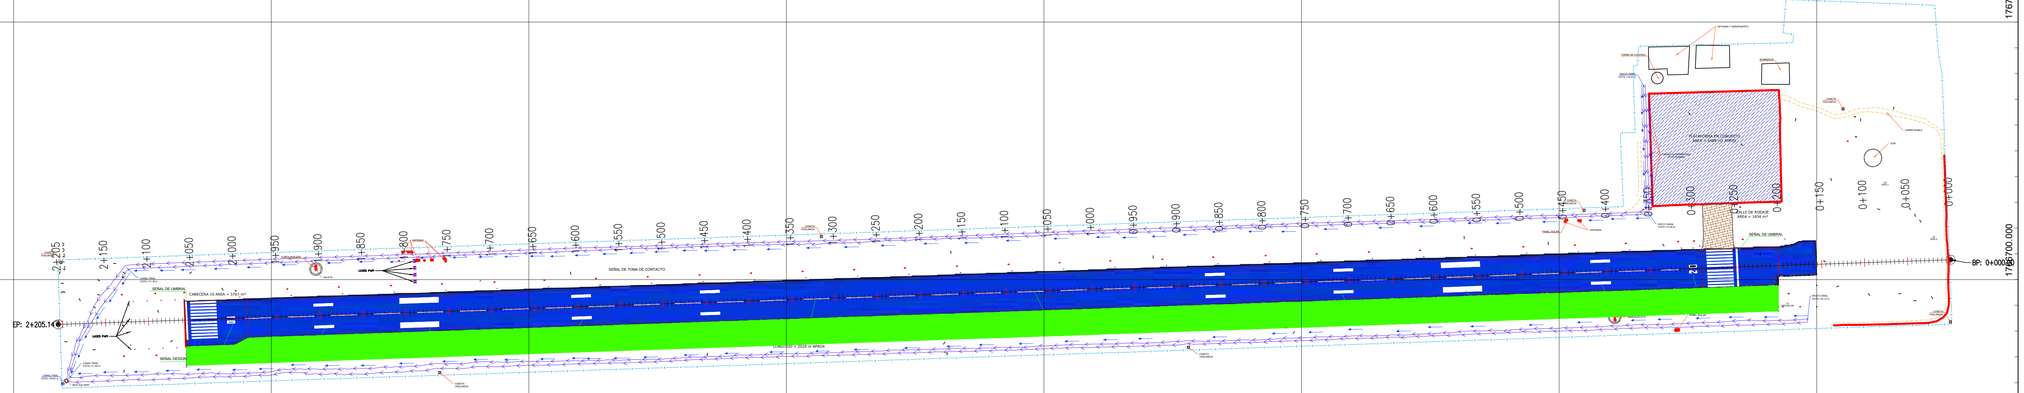

CUADRO DE COORDENADAS VERTICES AMARRE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA
GPS1	1766813.095	1126579.773	16.019
GPS2	11766749.588	1126636.418	18.202

1:2500 0 50 100 150 200 250 m.
METROS

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
CLAVE: MAUT-5.0-12-077 VERSIÓN: 01 FECHA: 23/01/2024

UBICACIÓN PROYECTO:
AEROPUERTO "ALMIRANTE PADILLA"- SIGLA OACI SKRH - ARP"
MUNICIPIO RIOHACHA DEPARTAMENTO LA GUAJIRA

PROYECTO:
Realizar el mejoramiento de las plataformas de viraje,franjas de seguridad, sistema de drenaje; y mejoramiento y construcción de calles de rodaje del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF)-

CONTIENE:
PLANO GENERAL PISTA Y AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA

N° CONTRATO: 23001170 - H4 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
DIRECTOR DEL PROYECTO: VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR
N° MATRICULA PROFESIONAL 25202-33553 CND
INGENIERIA CIVIL

N° CONTRATO INTERVENTORIA: 23001282- H3 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO AIR RIO
DIRECTOR DEL PROYECTO: SANTIAGO PAEZ TALERO
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. SANTIAGO PAEZ TALERO
N° MATRICULA PROFESIONAL 25203-40972 CND
INGENIERO CIVIL

SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANDRES ARBOLEDA SALAZAR
REVISÓ SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
REVISÓ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA CENTRO SUR NOROCCIDENTE; NORTE ORIENTE; OCCIDENTE - ORIENTE
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. CESAR AUGUSTO DELGADO CARRILLO
REVISÓ COORDINADOR DE GRUPO INFRAESTRUCTURA
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ALDEMAR PINZÓN
REVISÓ. ING.SUPERVISOR CONTRATO AERONAUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANGELA INES PAEZ PIÑEROS
REVISÓ DIRECTOR DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. JAIME CORTES GUERRERO
REVISÓ COORDINADOR GRUPO GESTIÓN DE AERODRÓMOS - DOA

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. OSCAR ALBERTO NIETO ALVARADO
DIRECTOR DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

INSPECTORES- DIRECCIÓN DE AUTORIDAD SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO EDGAR AUGUSTO URRUTIA FERNANDEZ
ESPECIALIDAD EN INFRAESTRUCTURA - DAGA
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO
ESPECIALIDAD EN OPERACIONES- DAGA

N° PLANO: 1 DE 47 ESCALA: 1:3000
CÓDIGO REFERENCIA: 2024-10-20-01-PG_SKRH-ARP-001

NOTA TÉCNICA:

DATUM	MAGNA-SIRGAS
ELIPSOIDE	WGS 84 - GRS 80
SISTEMA DE COORDENADAS	PLANAS GAUSS KRÜGER
ORIGEN DE COORDENADA	ORIGEN-BOGOTA
ONDULACIÓN GEOIDAL	NIL

DECLINACIÓN MAGNETICA: ARP/API 8°35' W VARIACIÓN MAGNETICA AÑO:00°10' W/ 2024

DATOS DEL PROYECTO:

RWY	DIMENSIONES (m)	CAT DE APROX.	AERONAVE DE DISEÑO	RESISTENCIA	CLAVE DE REFERENCIA AERODROMO
10 / 28	PISTA: 1900.00 X 45.00	6	A320	ASFALTO PCN 96/F/B/X/T	D
	FRANJA: 2120.00 X 150.00	6			

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (m/ft)
10	11°31'33.30" N	72°56'07.38"O	12.1/40
ARP			
28	11°31'35.10" N	72°55'04.75"O	15.2/50



DEPTO. LA GUAJIRA


DEPTO. DE LA GUAJIRA

CONVENCIONES :

CONVENCIONES GENERALES
- xx CERRAMIENTO
- CERCA
- PARAMENTO
- CANAL
- PISTA EN ASFALTO
- PISO EN CONCRETO
- POSTE ENERGÍA
- GPS-X VÉRTICE GPS
- CAJA DE ENERGÍA
- LUCES GUÍA
- CALLE DE RODAJE
- CONSTRUCCIÓN


NOTAS TECNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO
19 / 10 / 2024	**Memoria técnica de georreferenciación** - Ing.Duván Robayo	# 1 Anexo


NOMBRE ARCHIVO: 1.TOPOGRAFIA_AEROPUERTO_RIOHACHA.dwg (Autocad versión 2013)

SECCIONES TRANSVERSALES MOVIMIENTO DE TIERA FEBRERO 2025


K0+205 - K0+655

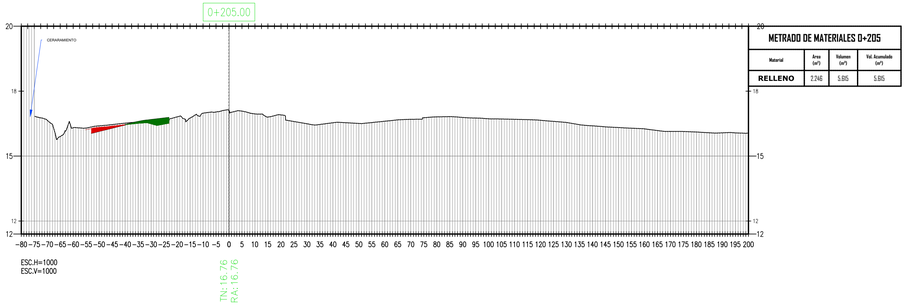


METRADO DE MATERIALES 0+205			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	2.746	5.815	5.815

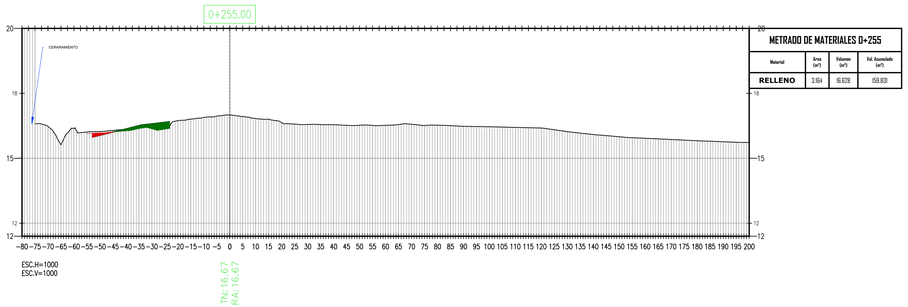


METRADO DE MATERIALES 0+255			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	3.184	16.628	159.831

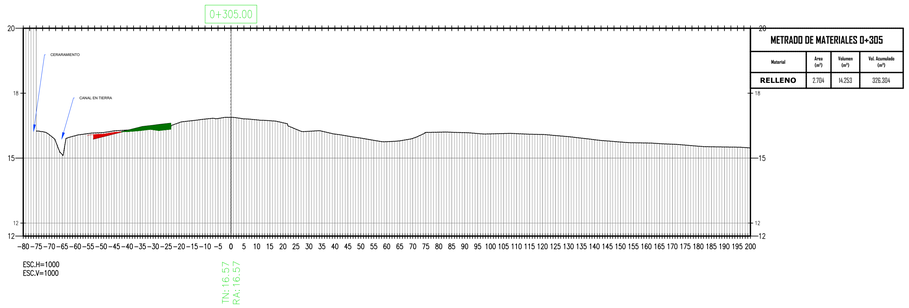


METRADO DE MATERIALES 0+305			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	2.704	14.253	3276.304

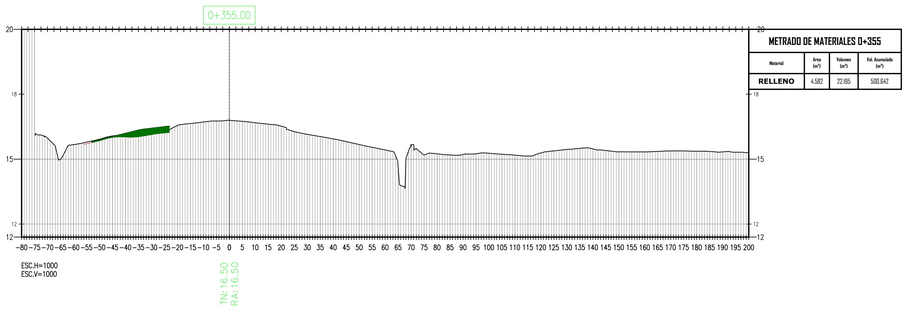


METRADO DE MATERIALES 0+355			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	4.582	22.055	5181.847

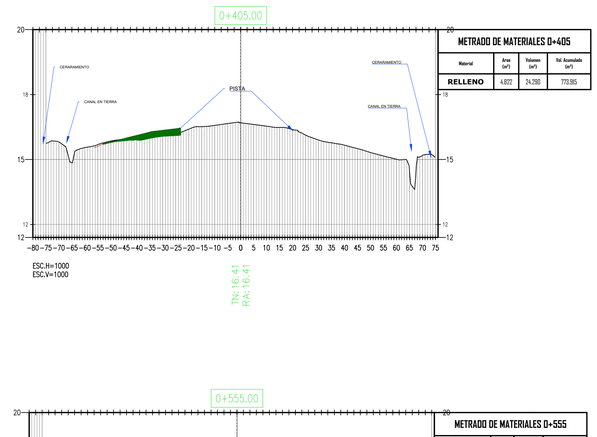


METRADO DE MATERIALES 0+405			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	4.872	24.298	7731.915

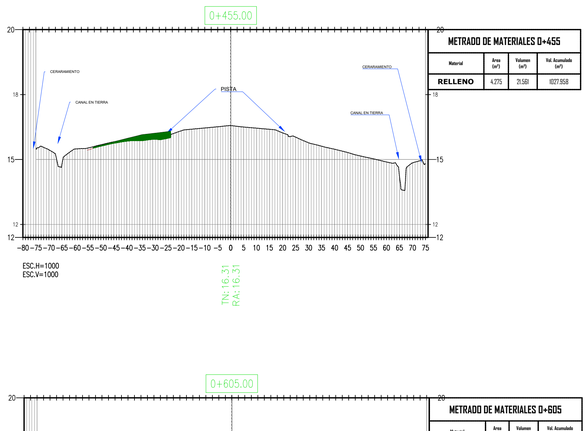


METRADO DE MATERIALES 0+455			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	4.775	23.581	10277.858

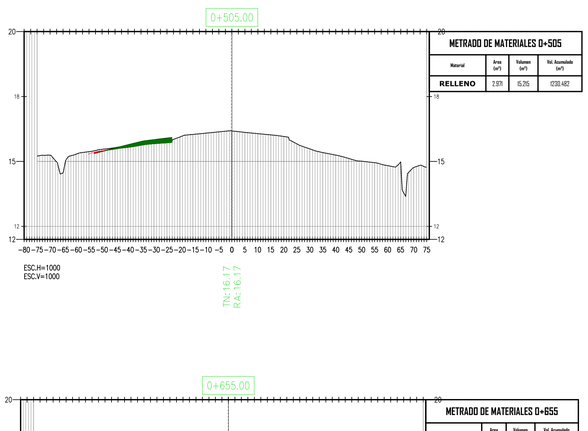


METRADO DE MATERIALES 0+505			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	2.871	15.215	12738.482

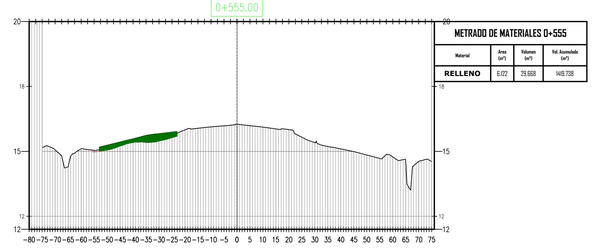

METRADO DE MATERIALES 0+555			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	0.172	29.858	14615.738

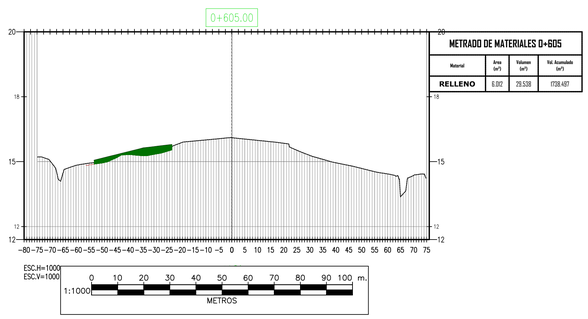

METRADO DE MATERIALES 0+605			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	0.092	29.538	17238.497

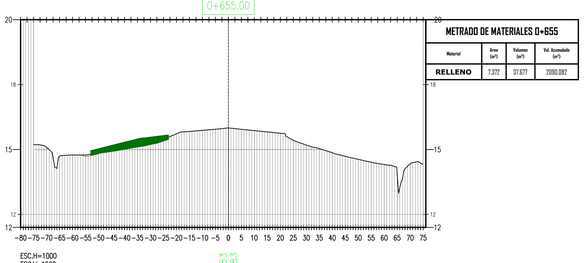

METRADO DE MATERIALES 0+655			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	7.372	37.877	20080.080

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
CLAVE: MAUT-5.0-12-077 VERSIÓN: 01 FECHA: 23/01/2024

UBICACIÓN PROYECTO:

AEROPUERTO "ALMIRANTE PADILLA"- SIGLA OACI SKRH - ARP"
MUNICIPIO RIOHACHA DEPARTAMENTO LA GUAJIRA

PROYECTO:
Realizar el mejoramiento de las plataformas de viraje,franjas de seguridad, sistema de drenaje; y mejoramiento y construcción de calles de rodaje del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF)-

CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES AEROPUERTO
K0+205 + K0+655

N° CONTRATO: 23001170 - H4 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
DIRECTOR DEL PROYECTO: VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR
N° MATRICULA PROFESIONAL 25202-33553 CND
INGENIERIA CIVIL

N° CONTRATO INTERVENTORIA: 23001282- H3 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO AIR RIO
DIRECTOR DEL PROYECTO: SANTIAGO PAEZ TALERO

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. SANTIAGO PAEZ TALERO
N° MATRICULA PROFESIONAL 25202-40972 CND
INGENIERO CIVIL

SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANDRES ARBOLEDA SALAZAR
REVISO SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
REVISO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA CENTRO SUR NOROCCIDENTE; NORTE ORIENTE; OCCIDENTE - ORIENTE

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING.CESAR AUGUSTO DELGADO CARRILLO
REVISO COORDINADOR DE GRUPO INFRAESTRUCTURA

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ALDEMAR PINZÓN
REVISO. ING.SUPERVISOR CONTRATO AERONAUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING.ANGELA INES PAEZ PIÑEROS
REVISO DIRECTOR DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING.JAIME CORTES GUERRERO
REVISO COORDINADOR GRUPO GESTIÓN DE AERODRÓMOS - DOA

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. OSCAR ALBERTO NIETO ALVARADO
DIRECTOR DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

INSPECTORES- DIRECCIÓN DE AUTORIDAD SERVICIOS AEROPORTUARIOS

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO EDGAR AUGUSTO URRUTIA FERNANDEZ
ESPECIALIDAD EN INFRAESTRUCTURA - DAGA

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO
ESPECIALIDAD EN OPERACIONES- DAGA

N° PLANO: 8 DE 47 ESCALA: 1:1000

CÓDIGO REFERENCIA: 2024-10-20-01-SEC_SKRH-ARP-008

NOTA TÉCNICA:

DATUM	MAGNA-SIRGAS
ELIPSOIDE	WGS 84 - GRS 80
SISTEMA DE COORDENADAS	PLANAS GAUSS KRÜGER
ORIGEN DE COORDENADA	ORIGEN-BOGOTA
ONDULACIÓN GEOIDAL	NIL

DECLINACIÓN MAGNETICA: ARP/API 8°35' W VARIACIÓN MAGNETICA AÑO:00°10' W/ 2024

DATOS DEL PROYECTO:

RWY	DIMENSIONES (m)	CAT DE APROX.	AERONAVE DE DISEÑO	RESISTENCIA	CLAVE DE REFERENCIA AEROPUERTO
10 / 28	PISTA: 1900.00 X 45.00	6	A320	ASFALTO PCN 96/F/B/X/T	D
	FRANJA: 2120.00 X 150.00	6			

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (m/ft)
10	11°31'33.30" N	72°56'07.38"O	12.1/40
ARP			
28	11°31'35.10" N	72°55'04.75"O	15.2/50



DEPTO. LA GUAJIRA



DEPTO. DE LA GUAJIRA

CONVENCIONES :

CONVENCIONES GENERALES


- CERRAMIENTO
- CERCA
- PARAMENTO
- CANAL
- PISTA EN ASFALTO
- PISO EN CONCRETO
- POSTE ENERGÍA
- VÉRTICE GPS
- CAJA DE ENERGÍA
- LUCES GUÍA
- CALLE DE RODAJE
- CONSTRUCCIÓN


NOTAS TECNICAS DE ACLARACIÓN


FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO
19 / 10 / 2024	**Memoria técnica de georreferenciación** - Ing.Duván Robayo	# 1 **Anexo**


NOMBRE ARCHIVO: 1.TOPOGRAFIA_AEROPUERTO_RIOHACHA.dwg (Autocad versión 2013)


SECCIONES TRANSVERSALES MOVIMIENTO DE TIERA FEBRERO 2025
K0+755 - K1+305

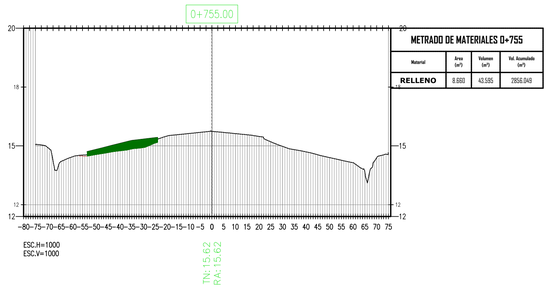


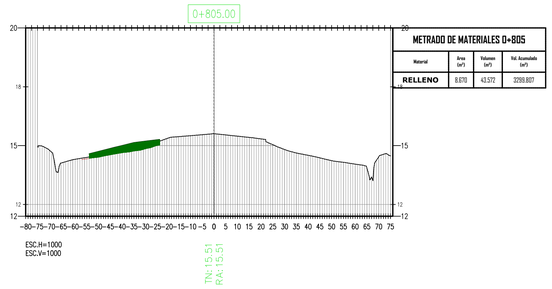


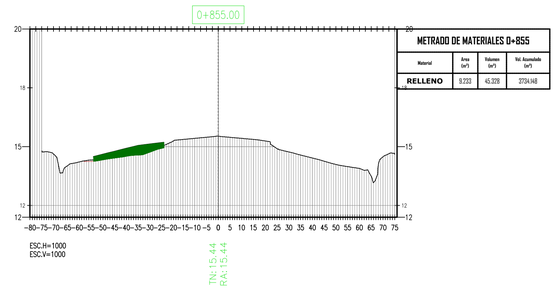


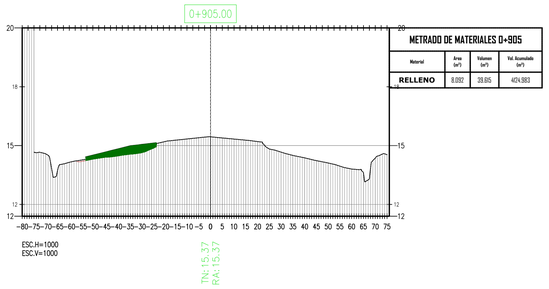


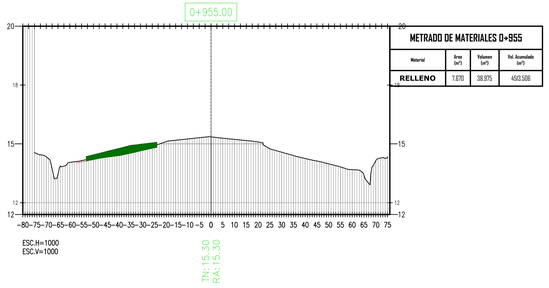


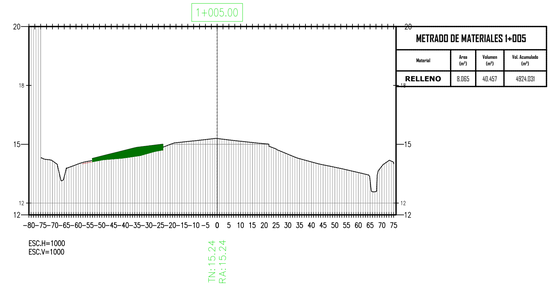


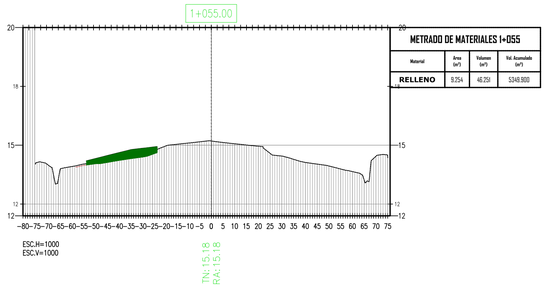


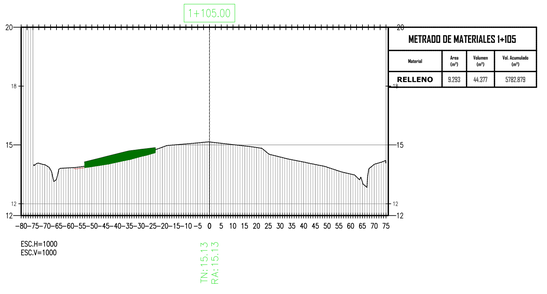


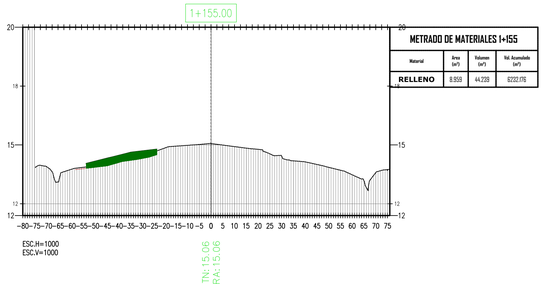

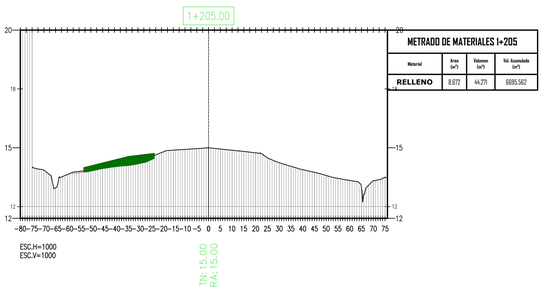

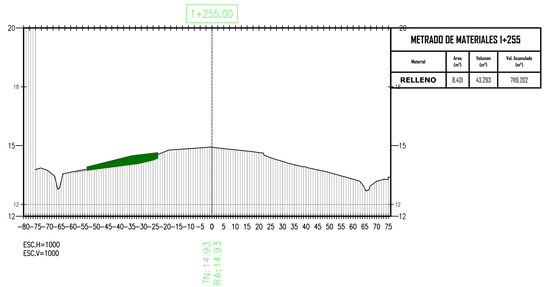

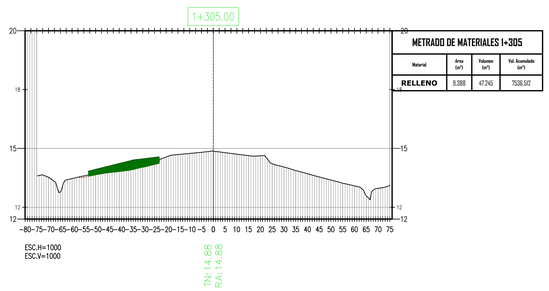



MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
CLAVE: MAUT-5.0-12-077 VERSIÓN: 01 FECHA: 23/01/2024

UBICACIÓN PROYECTO:
AEROPUERTO "ALMIRANTE PADILLA"- SIGLA OACI SKRH - ARP"
MUNICIPIO RIOHACHA DEPARTAMENTO LA GUAJIRA

PROYECTO:
Realizar el mejoramiento de las plataformas de viraje,franjas de seguridad, sistema de drenaje; y mejoramiento y construcción de calles de rodaje del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF)-

CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES AEROPUERTO K0+755 + K1+305

N° CONTRATO: 23001170 - H4 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
DIRECTOR DEL PROYECTO: VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR
N° MATRICULA PROFESIONAL 25202-33553 CND
INGENIERIA CIVIL

N° CONTRATO INTERVENTORIA: 23001282- H3 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO AIR RIO
DIRECTOR DEL PROYECTO: SANTIAGO PAEZ TALERO

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. SANTIAGO PAEZ TALERO
N° MATRICULA PROFESIONAL 25202-40972 CND
INGENIERO CIVIL

SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANDRES ARBOLEDA SALAZAR
REVISO SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
REVISO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA CENTRO SUR NOROCCIDENTE; NORTE ORIENTE; OCCIDENTE - ORIENTE
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING.CESAR AUGUSTO DELGADO CARRILLO
REVISO COORDINADOR DE GRUPO INFRAESTRUCTURA
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ALDEMAR PINZÓN
REVISO. ING.SUPERVISOR CONTRATO AERONAUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING.ANGELA INES PAEZ PIÑEROS
REVISO DIRECTOR DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING.JAIME CORTES GUERRERO
REVISO COORDINADOR GRUPO GESTIÓN DE AERÓDROMOS - DOA

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. OSCAR ALBERTO NIETO ALVARADO
DIRECTOR DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

INSPECTORES- DIRECCIÓN DE AUTORIDAD SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO EDGAR AUGUSTO URRUTIA FERNANDEZ
ESPECIALIDAD EN INFRAESTRUCTURA - DAGA
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO
ESPECIALIDAD EN OPERACIONES- DAGA

N° PLANO: 9 DE 47 ESCALA: 1:1000
CÓDIGO REFERENCIA: 2024-10-20-01-SEC_SKRH-ARP-009

NOTA TÉCNICA:

DATUM	MAGNA-SIRGAS
ELIPSOIDE	WGS 84 - GRS 80
SISTEMA DE COORDENADAS	PLANAS GAUSS KRÜGER
ORIGEN DE COORDENADA	ORIGEN-BOGOTA
ONDULACIÓN GEOIDAL	NIL

DECLINACIÓN MAGNETICA: ARP/API 8°35' W VARIACIÓN MAGNETICA AÑO:00°10' W/ 2024

DATOS DEL PROYECTO:

RWY	DIMENSIONES (m)	CAT DE APROX.	AERONAVE DE DISEÑO	RESISTENCIA	CLAVE DE REFERENCIA AEROPUERTO
10 / 28	PISTA: 1900.00 X 45.00	6	A320	ASFALTO PCN 96/F/B/X/T	D
	FRANJA: 2120.00 X 150.00	6			

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (m/ft)
10	11°31'33.30" N	72°56'07.38"O	12.1/40
ARP			
28	11°31'35.10" N	72°55'04.75"O	15.2/50



DEPTO. LA GUAJIRA


DEPTO. DE LA GUAJIRA

CONVENCIONES :

CONVENCIONES GENERALES
- CERRAMIENTO (xx)
- CERCA
- PARAMENTO
- CANAL
- PISTA EN ASFALTO
- PISO EN CONCRETO
- POSTE ENERGÍA
- VÉRTICE GPS (GPS-X)
- CAJA DE ENERGÍA
- LUCES GUÍA
- CALLE DE RODAJE
- CONSTRUCCIÓN


NOTAS TECNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO
19 / 10 / 2024	Memoria técnica de georreferenciación - Ing Duván Robayo	# 1 Anexo


NOMBRE ARCHIVO: 1.TOPOGRAFIA_AEROPUERTO_RIOHACHA.dwg (Autocad versión 2013)

SECCIONES TRANSVERSALES MOVIMIENTO DE TIERA FEBRERO 2025


K1+355 - K1+905

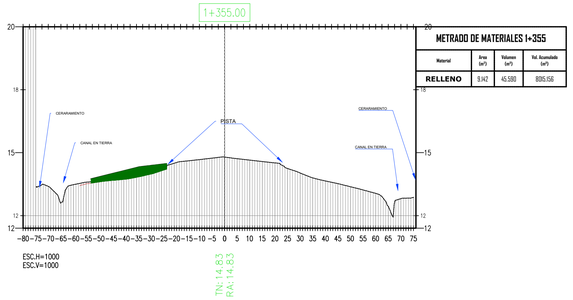


METRADO DE MATERIALES 1+355			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	9.142	45.589	8395.156

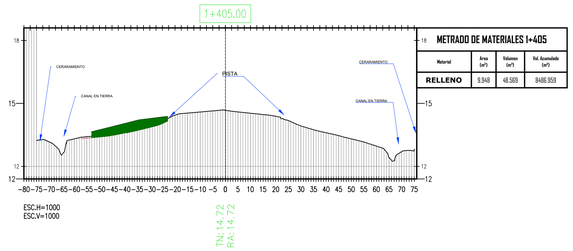


METRADO DE MATERIALES 1+405			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	9.948	48.589	8486.959

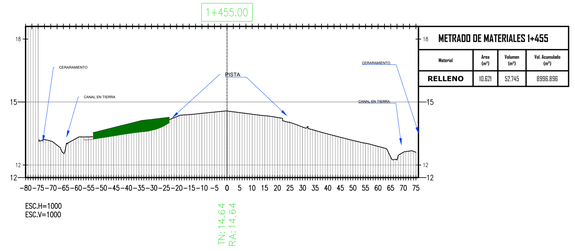


METRADO DE MATERIALES 1+455			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	10.829	52.745	8598.898

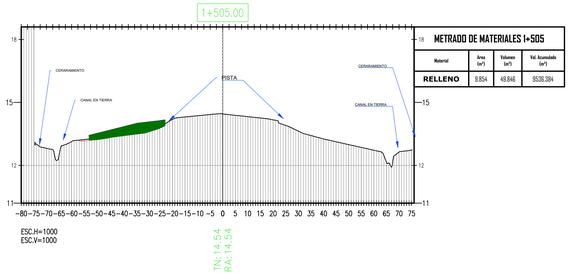


METRADO DE MATERIALES 1+505			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	9.854	49.848	8536.384

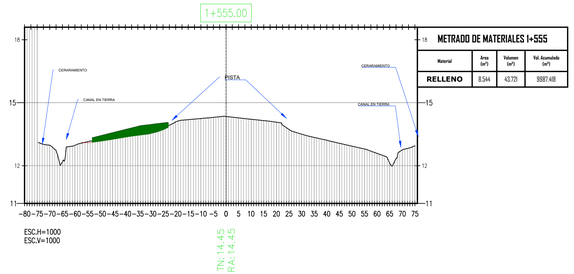


METRADO DE MATERIALES 1+555			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	8.544	43.721	8587.418

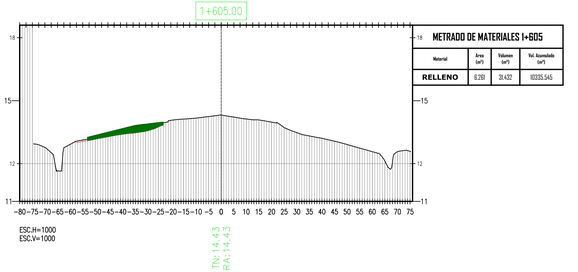


METRADO DE MATERIALES 1+605			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	9.730	39.422	10335.545

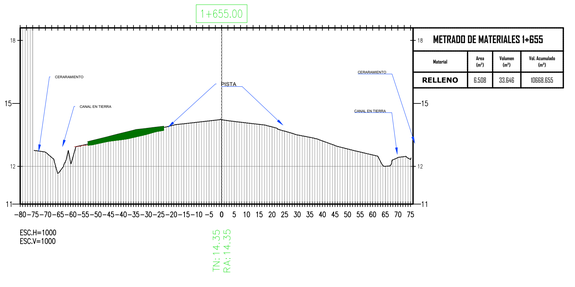


METRADO DE MATERIALES 1+655			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	8.508	33.640	10068.655

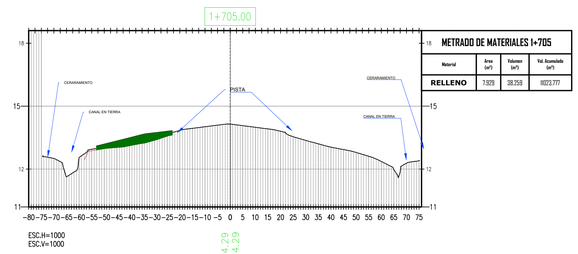


METRADO DE MATERIALES 1+705			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	7.929	38.259	10223.277




METRADO DE MATERIALES 1+755			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	7.457	37.478	10470.020

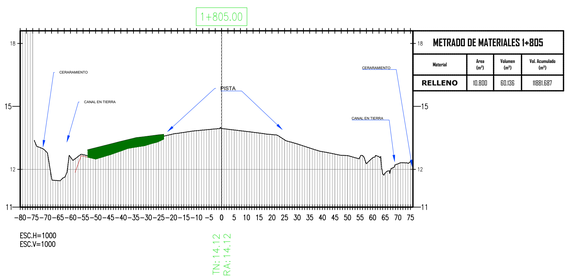


METRADO DE MATERIALES 1+805			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	10.8000	50.126	10881.687

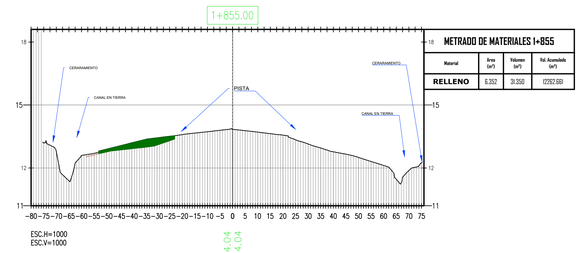

METRADO DE MATERIALES 1+855			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	8.352	31.358	12782.683

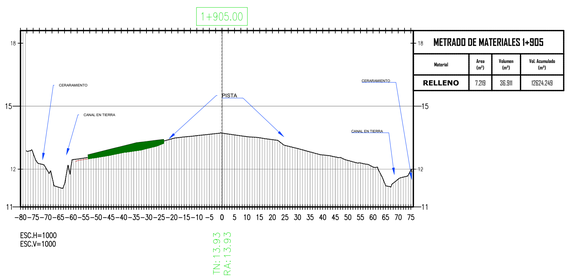

METRADO DE MATERIALES 1+905			
Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	7.298	36.861	12924.743



MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
CLAVE: MAUT-5.0-12-077 VERSIÓN: 01 FECHA: 23/01/2024

UBICACIÓN PROYECTO:

AEROPUERTO "ALMIRANTE PADILLA"- SIGLA OACI SKRH - ARP"
MUNICIPIO RIOHACHA DEPARTAMENTO LA GUAJIRA

PROYECTO:
Realizar el mejoramiento de las plataformas de viraje,franjas de seguridad, sistema de drenaje; y mejoramiento y construcción de calles de rodaje del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF)-

CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES AEROPUERTO K1+355 + K1+905

N° CONTRATO: 23001170 - H4 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
DIRECTOR DEL PROYECTO: VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR
N° MATRICULA PROFESIONAL 25202-33553 CND
INGENIERIA CIVIL

N° CONTRATO INTERVENTORIA: 23001282- H3 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO AIR RIO
DIRECTOR DEL PROYECTO: SANTIAGO PAEZ TALERO

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. SANTIAGO PAEZ TALERO
N° MATRICULA PROFESIONAL 25202-407972 CND
INGENIERO CIVIL

SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANDRES ARBOLEDA SALAZAR
REVISO SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
REVISO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA CENTRO SUR NOROCCIDENTE; NORTE ORIENTE; OCCIDENTE - ORIENTE
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. CESAR AUGUSTO DELGADO CARRILLO
REVISO COORDINADOR DE GRUPO INFRAESTRUCTURA
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ALDEMAR PINZON
REVISO. ING. SUPERVISOR CONTRATO AERONAUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANGELA INES PAEZ PIÑEROS
REVISO DIRECTOR DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. JAIME CORTES GUERRERO
REVISO COORDINADOR GRUPO GESTIÓN DE AERÓDROMOS - DOA

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. OSCAR ALBERTO NIETO ALVARADO
DIRECTOR DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

INSPECTORES- DIRECCIÓN DE AUTORIDAD SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO EDGAR AUGUSTO URRUTIA FERNANDEZ
ESPECIALIDAD EN INFRAESTRUCTURA - DAGA
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO
ESPECIALIDAD EN OPERACIONES - DAGA

N° PLANO: 10 DE 47 ESCALA: 1:1000
CÓDIGO REFERENCIA: 2024-10-20-01-SEC_SKRH-ARP-010

NOTA TÉCNICA:

DATUM	MAGNA-SIRGAS
ELIPSOIDE	WGS 84 - GRS 80
SISTEMA DE COORDENADAS	PLANAS GAUSS KRÜGER
ORIGEN DE COORDENADA	ORIGEN-BOGOTA
ONDULACIÓN GEOIDAL	NIL


DECLINACIÓN MAGNETICA: ARP/API 8°35' W VARIACIÓN MAGNETICA AÑO:00°10' W/ 2024

DATOS DEL PROYECTO:

RWY	DIMENSIONES (m)	CAT DE APROX.	AERONAVE DE DISEÑO	RESISTENCIA	CLAVE DE REFERENCIA AERONAVE
10 / 28	PISTA: 1900.00 X 45.00	6	A320	ASFALTO PCN 96/F/B/X/T	D
	FRANJA: 2120.00 X 150.00	6			

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (m/ft)
10	11°31'33.30" N	72°56'07.38"O	12.1/40
ARP			
28	11°31'35.10" N	72°55'04.75"O	15.2/50



DEPTO. LA GUAJIRA



DEPTO. DE LA GUAJIRA

CONVENCIONES :

CONVENCIONES GENERALES

- CERRAMIENTO
- CERCA
- PARAMENTO
- CANAL
- PISTA EN ASFALTO
- PISO EN CONCRETO
- POSTE ENERGÍA
- VÉRTICE GPS
- CAJA DE ENERGÍA
- LUCES GUÍA
- CALLE DE RODAJE
- CONSTRUCCIÓN


NOTAS TECNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO
19 / 10 / 2024	**Memoria técnica de georreferenciación** - Ing Duván Robayo	# 1 **Anexo**

NOMBRE ARCHIVO: 1.TOPOGRAFIA_AEROPUERTO_RIOHACHA.dwg (Autocad versión 2013)


SECCIONES TRANSVERSALES MOVIMIENTO DE TIERA FEBRERO 2025

K1+955 - K2+060

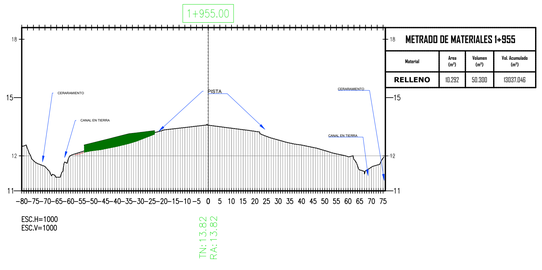


METRADO DE MATERIALES 1+955

Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	10.257	50.300	130337.040

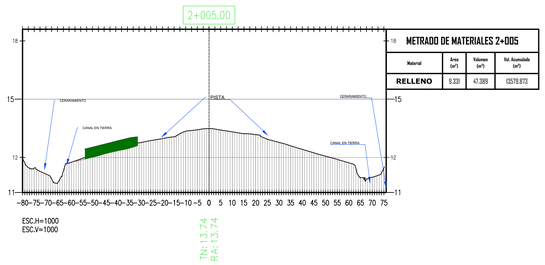


METRADO DE MATERIALES 2+005

Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	9.331	47.389	130378.873

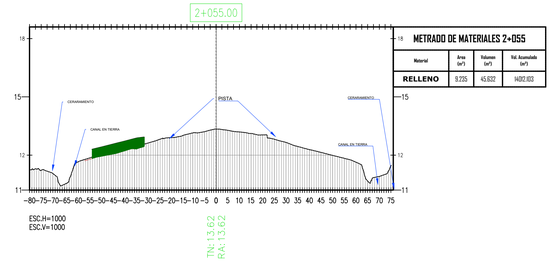


METRADO DE MATERIALES 2+055

Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	9.235	43.632	140021.003

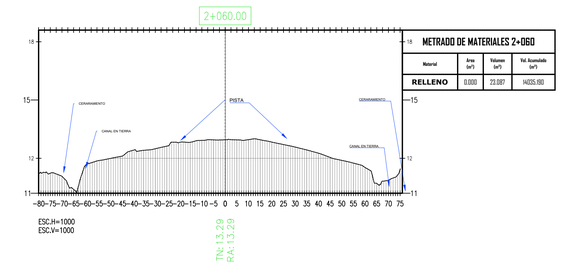

METRADO DE MATERIALES 2+060

Material	Area (m²)	Volumen (m³)	Vol. Acumulado (m³)
RELLENO	0.000	22.087	140255.190



MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
CLAVE: MAUT-5.0-12-077 VERSIÓN: 01 FECHA: 23/01/2024

UBICACIÓN PROYECTO:

AEROPUERTO "ALMIRANTE PADILLA"- SIGLA OACI SKRH - ARP"
MUNICIPIO RIOHACHA DEPARTAMENTO LA GUAJIRA

PROYECTO:
Realizar el mejoramiento de las plataformas de viraje,franjas de seguridad, sistema de drenaje; y mejoramiento y construcción de calles de rodaje del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF)-

CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES AEROPUERTO
K1+955 + K2+060

N° CONTRATO: 23001170 - H4 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
DIRECTOR DEL PROYECTO: VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR
N° MATRICULA PROFESIONAL 25202-33553 CND
INGENIERIA CIVIL

N° CONTRATO INTERVENTORIA: 23001282- H3 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO AIR RIO
DIRECTOR DEL PROYECTO: SANTIAGO PAEZ TALERO

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. SANTIAGO PAEZ TALERO
N° MATRICULA PROFESIONAL 25202-40972 CND
INGENIERO CIVIL

SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANDRES ARBOLEDA SALAZAR
REVISO SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
REVISO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA CENTRO SUR NOROCCIDENTE; NORTE ORIENTE; OCCIDENTE - ORIENTE
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING.CESAR AUGUSTO DELGADO CARRILLO
REVISO COORDINADOR DE GRUPO INFRAESTRUCTURA
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ALDEMAR PINZÓN
REVISO. ING.SUPERVISOR CONTRATO AERONAUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING.ANGELA INES PAEZ PIÑEROS
REVISO DIRECTOR DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING.JAIME CORTES GUERRERO
REVISO COORDINADOR GRUPO GESTIÓN DE AERÓDROMOS - DOA

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. OSCAR ALBERTO NIETO ALVARADO
DIRECTOR DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

INSPECTORES- DIRECCIÓN DE AUTORIDAD SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO EDGAR AUGUSTO URRUTIA FERNANDEZ
ESPECIALIDAD EN INFRAESTRUCTURA - DAGA
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO
ESPECIALIDAD EN OPERACIONES- DAGA

N° PLANO: 11 DE 47 ESCALA: 1:1000
CÓDIGO REFERENCIA: 2024-10-20-01-SEC_SKRH-ARP-011

NOTA TÉCNICA:

DATUM	MAGNA-SIRGAS
ELIPSOIDE	WGS 84 - GRS 80
SISTEMA DE COORDENADAS	PLANAS GAUSS KRÜGER
ORIGEN DE COORDENADA	ORIGEN-BOGOTA
ONDULACIÓN GEOIDAL	NIL

DECLINACIÓN MAGNETICA: ARP/API 8°35' W VARIACIÓN MAGNETICA AÑO:00°10' W/ 2024

DATOS DEL PROYECTO:

RWY	DIMENSIONES (m)	CAT DE APROX.	AERONAVE DE DISEÑO	RESISTENCIA	CLAVE DE REFERENCIA AERÓDROMO
10 / 28	PISTA: 1900.00 X 45.00	6	A320	ASFALTO PCN 96/F/B/X/T	D
	FRANJA: 2120.00 X 150.00	6			

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (m/ft)
10	11°31'33.30" N	72°56'07.38"O	12.1/40
ARP			
28	11°31'35.10" N	72°55'04.75"O	15.2/50



DEPTO. LA GUAJIRA



DEPTO. DE LA GUAJIRA

CONVENCIONES :

CONVENCIONES GENERALES

CERRAMIENTO	POSTE ENERGIA
CERCA	GPS-X VÉRTICE GPS
PARAMENTO	CAJA DE ENERGIA
CANAL	LUCES GUIA
PISTA EN ASFALTO	CALLE DE RODAJE
PISO EN CONCRETO	CONSTRUCCIÓN

NOTAS TECNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO
19 / 10 / 2024	Memoria técnica de georreferenciación - Ing.Duván Robayo	# 1 Anexo

NOMBRE ARCHIVO: 1.TOPOGRAFIA_AEROPUERTO_RIOHACHA.dwg (Autocad versión 2013)

REPORTE VOLUMEN FEBRERO 2025

Alignment: ALINEAMIENTO_PISTA

Sample Line Group: SECCIONES TRANSVERSALES PISTA TOTAL

Start Sta: 0+000.000

End Sta: 2+205.000

Station	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)	Reusable Volume (Cu.m.)	Fill Area (Sq.m.)	Fill Volume (Cu.m.)	Cum. Cut Vol. (Cu.m.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.m.)	Cum. Fill Vol. (Cu.m.)	Cum. Net Vol. (Cu.m.)
0+205.000	1.23	3.08	3.08	2.25	5.61	3.08	3.08	5.61	-2.53
0+210.000	0.99	5.55	5.55	2.11	10.90	8.63	8.63	16.52	-7.88
0+215.000	0.81	4.51	4.51	2.25	10.92	13.15	13.15	27.44	-14.29
0+220.000	0.86	4.18	4.18	2.21	11.15	17.33	17.33	38.59	-21.26
0+225.000	0.47	3.33	3.33	2.96	12.92	20.66	20.66	51.51	-30.85
0+230.000	0.49	2.42	2.42	3.69	16.64	23.08	23.08	68.14	-45.06
0+235.000	0.48	2.45	2.45	3.92	19.03	25.53	25.53	87.17	-61.64
0+240.000	0.54	2.56	2.56	3.74	19.14	28.08	28.08	106.31	-78.23
0+245.000	0.66	2.99	2.99	3.76	18.76	31.07	31.07	125.07	-94.00
0+250.000	0.63	3.20	3.20	3.49	18.13	34.27	34.27	143.20	-108.93
0+255.000	0.56	2.96	2.96	3.16	16.63	37.24	37.24	159.83	-122.59
0+260.000	0.49	2.64	2.64	3.38	16.35	39.87	39.87	176.19	-136.31
0+265.000	0.49	2.45	2.45	3.44	17.05	42.32	42.32	193.24	-150.92
0+270.000	0.47	2.38	2.38	3.49	17.34	44.70	44.70	210.58	-165.88
0+275.000	0.39	2.15	2.15	3.80	18.23	46.85	46.85	228.81	-181.96
0+280.000	0.37	1.91	1.91	3.84	19.09	48.76	48.76	247.90	-199.14
0+285.000	0.64	2.53	2.53	3.42	18.15	51.29	51.29	266.04	-214.75
0+290.000	0.60	3.10	3.10	3.00	16.04	54.39	54.39	282.09	-227.70
0+295.000	0.53	2.82	2.82	3.00	14.98	57.21	57.21	297.07	-239.86
0+300.000	0.66	2.97	2.97	3.00	14.98	60.18	60.18	312.05	-251.87
0+305.000	0.86	3.79	3.79	2.70	14.25	63.96	63.96	326.30	-262.34
0+310.000	0.60	3.63	3.63	2.80	13.75	67.60	67.60	340.05	-272.46
0+315.000	0.47	2.67	2.67	2.82	14.03	70.26	70.26	354.08	-283.82
0+320.000	0.51	2.45	2.45	3.09	14.78	72.71	72.71	368.86	-296.15
0+325.000	1.02	3.83	3.83	3.29	15.96	76.53	76.53	384.82	-308.29
0+330.000	1.05	5.18	5.18	3.43	16.80	81.71	81.71	401.63	-319.91
0+335.000	0.76	4.52	4.52	3.56	17.47	86.23	86.23	419.10	-332.87
0+340.000	0.64	3.50	3.50	3.77	18.31	89.73	89.73	437.41	-347.68
0+345.000	0.48	2.81	2.81	4.18	19.86	92.54	92.54	457.27	-364.73

0+350.000	0.12	1.49	1.49	4.30	21.18	94.03	94.03	478.45	-384.42
0+355.000	0.00	0.29	0.29	4.58	22.20	94.32	94.32	500.64	-406.32
0+360.000	0.00	0.00	0.00	5.28	24.66	94.32	94.32	525.30	-430.98
0+365.000	0.00	0.00	0.00	5.92	28.00	94.32	94.32	553.31	-458.98
0+370.000	0.00	0.00	0.00	5.87	29.48	94.32	94.32	582.79	-488.47
0+375.000	0.00	0.00	0.00	5.72	28.99	94.32	94.32	611.77	-517.45
0+380.000	0.00	0.00	0.00	5.83	28.88	94.32	94.32	640.65	-546.33
0+385.000	0.00	0.00	0.00	5.79	29.07	94.32	94.32	669.72	-575.40
0+390.000	0.00	0.00	0.00	5.49	28.22	94.32	94.32	697.94	-603.62
0+395.000	0.00	0.00	0.00	5.14	26.59	94.32	94.32	724.53	-630.21
0+400.000	0.00	0.00	0.00	4.89	25.09	94.32	94.32	749.63	-655.30
0+405.000	0.00	0.00	0.00	4.82	24.29	94.32	94.32	773.92	-679.59
0+410.000	0.00	0.00	0.00	5.08	24.76	94.32	94.32	798.67	-704.35
0+415.000	0.00	0.00	0.00	5.51	26.49	94.32	94.32	825.16	-730.84
0+420.000	0.00	0.00	0.00	5.75	28.16	94.32	94.32	853.32	-758.99
0+425.000	0.00	0.00	0.00	5.62	28.42	94.32	94.32	881.74	-787.42
0+430.000	0.00	0.00	0.00	5.39	27.53	94.32	94.32	909.27	-814.95
0+435.000	0.00	0.00	0.00	5.17	26.41	94.32	94.32	935.68	-841.36
0+440.000	0.00	0.00	0.00	4.85	25.05	94.32	94.32	960.73	-866.41
0+445.000	0.00	0.00	0.00	4.54	23.46	94.32	94.32	984.19	-889.86
0+450.000	0.00	0.00	0.00	4.35	22.21	94.32	94.32	1006.40	-912.07
0+455.000	0.00	0.00	0.00	4.27	21.56	94.32	94.32	1027.96	-933.64
0+460.000	0.00	0.00	0.00	4.35	21.57	94.32	94.32	1049.52	-955.20
0+465.000	0.00	0.00	0.00	4.41	21.89	94.32	94.32	1071.42	-977.09
0+470.000	0.00	0.00	0.00	4.41	22.03	94.32	94.32	1093.45	-999.13
0+475.000	0.00	0.00	0.00	4.50	22.28	94.32	94.32	1115.73	-1021.41
0+480.000	0.00	0.00	0.00	4.29	21.98	94.32	94.32	1137.71	-1043.39
0+485.000	0.00	0.00	0.00	4.29	21.44	94.32	94.32	1159.15	-1064.83
0+490.000	0.00	0.00	0.00	4.10	20.98	94.32	94.32	1180.13	-1085.81
0+495.000	0.09	0.24	0.24	3.42	18.80	94.56	94.56	1198.93	-1104.37
0+500.000	0.07	0.40	0.40	3.11	16.34	94.96	94.96	1215.27	-1120.31
0+505.000	0.11	0.45	0.45	2.97	15.21	95.41	95.41	1230.48	-1135.07
0+510.000	0.18	0.72	0.72	2.81	14.45	96.13	96.13	1244.93	-1148.80
0+515.000	0.31	1.21	1.21	2.99	14.50	97.35	97.35	1259.42	-1162.08
0+520.000	0.31	1.55	1.55	3.06	15.12	98.90	98.90	1274.54	-1175.65
0+525.000	0.35	1.66	1.66	2.81	14.67	100.55	100.55	1289.21	-1188.66
0+530.000	0.06	1.04	1.04	3.06	14.69	101.59	101.59	1303.91	-1202.31
0+535.000	0.01	0.20	0.20	3.25	15.78	101.79	101.79	1319.68	-1217.90
0+540.000	0.00	0.03	0.03	4.36	19.03	101.82	101.82	1338.71	-1236.89
0+545.000	0.00	0.00	0.00	5.22	23.95	101.82	101.82	1362.66	-1260.84

0+550.000	0.00	0.00	0.00	5.75	27.41	101.82	101.82	1390.07	-1288.25
0+555.000	0.00	0.00	0.00	6.12	29.67	101.82	101.82	1419.74	-1317.92
0+560.000	0.00	0.00	0.00	6.33	31.14	101.82	101.82	1450.88	-1349.06
0+565.000	0.00	0.00	0.00	6.47	32.00	101.82	101.82	1482.88	-1381.06
0+570.000	0.00	0.00	0.00	6.50	32.42	101.82	101.82	1515.30	-1413.48
0+575.000	0.00	0.00	0.00	7.19	34.23	101.82	101.82	1549.53	-1447.71
0+580.000	0.00	0.00	0.00	7.00	35.47	101.82	101.82	1585.00	-1483.18
0+585.000	0.00	0.00	0.00	6.46	33.64	101.82	101.82	1618.64	-1516.82
0+590.000	0.00	0.00	0.00	6.13	31.47	101.82	101.82	1650.11	-1548.29
0+595.000	0.00	0.00	0.00	5.81	29.83	101.82	101.82	1679.94	-1578.12
0+600.000	0.00	0.00	0.00	5.80	29.02	101.82	101.82	1708.96	-1607.14
0+605.000	0.00	0.00	0.00	6.01	29.54	101.82	101.82	1738.50	-1636.68
0+610.000	0.00	0.00	0.00	5.74	29.39	101.82	101.82	1767.88	-1666.06
0+615.000	0.00	0.00	0.00	5.51	28.13	101.82	101.82	1796.01	-1694.19
0+620.000	0.00	0.00	0.00	5.84	28.37	101.82	101.82	1824.38	-1722.56
0+625.000	0.00	0.00	0.00	6.65	31.24	101.82	101.82	1855.62	-1753.80
0+630.000	0.00	0.00	0.00	7.68	35.84	101.82	101.82	1891.46	-1789.63
0+635.000	0.00	0.00	0.00	8.24	39.81	101.82	101.82	1931.26	-1829.44
0+640.000	0.00	0.00	0.00	8.09	40.83	101.82	101.82	1972.10	-1870.27
0+645.000	0.00	0.00	0.00	8.17	40.65	101.82	101.82	2012.74	-1910.92
0+650.000	0.00	0.00	0.00	7.70	39.66	101.82	101.82	2052.41	-1950.58
0+655.000	0.00	0.00	0.00	7.37	37.68	101.82	101.82	2090.08	-1988.26
0+660.000	0.00	0.00	0.00	7.37	36.86	101.82	101.82	2126.94	-2025.12
0+665.000	0.00	0.00	0.00	7.54	37.27	101.82	101.82	2164.22	-2062.40
0+670.000	0.00	0.00	0.00	7.77	38.26	101.82	101.82	2202.48	-2100.65
0+675.000	0.00	0.00	0.00	8.15	39.78	101.82	101.82	2242.25	-2140.43
0+680.000	0.00	0.00	0.00	8.44	41.46	101.82	101.82	2283.72	-2181.90
0+685.000	0.00	0.00	0.00	8.96	43.50	101.82	101.82	2327.21	-2225.39
0+690.000	0.00	0.00	0.00	8.58	43.85	101.82	101.82	2371.06	-2269.24
0+695.000	0.00	0.00	0.00	7.97	41.39	101.82	101.82	2412.45	-2310.63
0+700.000	0.00	0.00	0.00	6.95	37.30	101.82	101.82	2449.75	-2347.93
0+705.000	0.00	0.00	0.00	6.21	32.89	101.82	101.82	2482.64	-2380.82
0+710.000	0.00	0.00	0.00	5.85	30.15	101.82	101.82	2512.79	-2410.97
0+715.000	0.00	0.00	0.00	6.47	30.82	101.82	101.82	2543.61	-2441.79
0+720.000	0.00	0.00	0.00	6.45	32.30	101.82	101.82	2575.91	-2474.08
0+725.000	0.00	0.00	0.00	6.76	33.03	101.82	101.82	2608.93	-2507.11
0+730.000	0.00	0.00	0.00	7.52	35.71	101.82	101.82	2644.64	-2542.82
0+735.000	0.00	0.00	0.00	8.06	38.94	101.82	101.82	2683.58	-2581.76
0+740.000	0.00	0.00	0.00	8.57	41.56	101.82	101.82	2725.14	-2623.32
0+745.000	0.00	0.00	0.00	8.79	43.39	101.82	101.82	2768.54	-2666.72

0+750.000	0.00	0.00	0.00	8.78	43.92	101.82	101.82	2812.45	-2710.63
0+755.000	0.00	0.00	0.00	8.66	43.59	101.82	101.82	2856.05	-2754.23
0+760.000	0.00	0.00	0.00	8.85	43.77	101.82	101.82	2899.82	-2798.00
0+765.000	0.00	0.00	0.00	9.05	44.74	101.82	101.82	2944.56	-2842.74
0+770.000	0.00	0.00	0.00	9.19	45.60	101.82	101.82	2990.15	-2888.33
0+775.000	0.00	0.00	0.00	9.14	45.84	101.82	101.82	3035.99	-2934.17
0+780.000	0.00	0.00	0.00	8.78	44.81	101.82	101.82	3080.80	-2978.98
0+785.000	0.00	0.00	0.00	8.82	44.00	101.82	101.82	3124.80	-3022.98
0+790.000	0.00	0.00	0.00	8.66	43.71	101.82	101.82	3168.51	-3066.69
0+795.000	0.00	0.00	0.00	8.83	43.74	101.82	101.82	3212.25	-3110.43
0+800.000	0.00	0.00	0.00	8.76	43.98	101.82	101.82	3256.23	-3154.41
0+805.000	0.00	0.00	0.00	8.67	43.57	101.82	101.82	3299.81	-3197.99
0+810.000	0.00	0.00	0.00	8.95	44.05	101.82	101.82	3343.86	-3242.03
0+815.000	0.00	0.00	0.00	9.10	45.12	101.82	101.82	3388.98	-3287.15
0+820.000	0.00	0.00	0.00	8.79	44.73	101.82	101.82	3433.71	-3331.89
0+825.000	0.00	0.00	0.00	8.06	42.14	101.82	101.82	3475.85	-3374.03
0+830.000	0.00	0.00	0.00	8.50	41.42	101.82	101.82	3517.27	-3415.44
0+835.000	0.00	0.00	0.00	8.98	43.72	101.82	101.82	3560.98	-3459.16
0+840.000	0.00	0.00	0.00	8.53	43.78	101.82	101.82	3604.76	-3502.94
0+845.000	0.00	0.00	0.00	8.10	41.57	101.82	101.82	3646.33	-3544.51
0+850.000	0.00	0.00	0.00	8.90	42.49	101.82	101.82	3688.82	-3587.00
0+855.000	0.00	0.00	0.00	9.23	45.33	101.82	101.82	3734.15	-3632.33
0+860.000	0.00	0.00	0.00	7.94	42.93	101.82	101.82	3777.08	-3675.26
0+865.000	0.00	0.00	0.00	6.74	36.69	101.82	101.82	3813.77	-3711.95
0+870.000	0.00	0.00	0.00	6.83	33.90	101.82	101.82	3847.67	-3745.85
0+875.000	0.00	0.00	0.00	7.18	35.01	101.82	101.82	3882.68	-3780.86
0+880.000	0.00	0.00	0.00	7.73	37.28	101.82	101.82	3919.96	-3818.14
0+885.000	0.00	0.00	0.00	8.55	40.70	101.82	101.82	3960.66	-3858.84
0+890.000	0.00	0.00	0.00	8.80	43.37	101.82	101.82	4004.03	-3902.20
0+895.000	0.00	0.00	0.00	7.99	41.98	101.82	101.82	4046.00	-3944.18
0+900.000	0.00	0.00	0.00	7.75	39.36	101.82	101.82	4085.37	-3983.55
0+905.000	0.00	0.00	0.00	8.09	39.62	101.82	101.82	4124.98	-4023.16
0+910.000	0.00	0.00	0.00	7.84	39.82	101.82	101.82	4164.80	-4062.98
0+915.000	0.00	0.00	0.00	7.43	38.15	101.82	101.82	4202.95	-4101.13
0+920.000	0.00	0.00	0.00	7.66	37.71	101.82	101.82	4240.66	-4138.84
0+925.000	0.00	0.00	0.00	7.89	38.87	101.82	101.82	4279.53	-4177.71
0+930.000	0.00	0.00	0.00	7.83	39.31	101.82	101.82	4318.85	-4217.03
0+935.000	0.00	0.00	0.00	7.74	38.93	101.82	101.82	4357.77	-4255.95
0+940.000	0.00	0.00	0.00	7.71	38.61	101.82	101.82	4396.38	-4294.56
0+945.000	0.00	0.00	0.00	7.82	38.81	101.82	101.82	4435.19	-4333.37

0+950.000	0.00	0.00	0.00	7.92	39.34	101.82	101.82	4474.53	-4372.71
0+955.000	0.00	0.00	0.00	7.67	38.97	101.82	101.82	4513.51	-4411.68
0+960.000	0.00	0.00	0.00	8.49	40.39	101.82	101.82	4553.90	-4452.07
0+965.000	0.00	0.00	0.00	8.64	42.83	101.82	101.82	4596.72	-4494.90
0+970.000	0.00	0.00	0.00	8.70	43.36	101.82	101.82	4640.08	-4538.26
0+975.000	0.00	0.00	0.00	8.35	42.62	101.82	101.82	4682.70	-4580.88
0+980.000	0.00	0.00	0.00	8.24	41.46	101.82	101.82	4724.16	-4622.34
0+985.000	0.00	0.00	0.00	8.07	40.78	101.82	101.82	4764.93	-4663.11
0+990.000	0.00	0.00	0.00	7.73	39.52	101.82	101.82	4804.46	-4702.63
0+995.000	0.00	0.00	0.00	7.90	39.08	101.82	101.82	4843.53	-4741.71
1+000.000	0.00	0.00	0.00	8.12	40.04	101.82	101.82	4883.57	-4781.75
1+005.000	0.00	0.00	0.00	8.06	40.46	101.82	101.82	4924.03	-4822.21
1+010.000	0.00	0.00	0.00	7.91	39.95	101.82	101.82	4963.98	-4862.16
1+015.000	0.00	0.00	0.00	7.91	39.57	101.82	101.82	5003.55	-4901.73
1+020.000	0.00	0.00	0.00	7.90	39.54	101.82	101.82	5043.09	-4941.26
1+025.000	0.00	0.00	0.00	7.86	39.41	101.82	101.82	5082.49	-4980.67
1+030.000	0.00	0.00	0.00	8.39	40.63	101.82	101.82	5123.13	-5021.30
1+035.000	0.00	0.00	0.00	8.98	43.43	101.82	101.82	5166.56	-5064.74
1+040.000	0.00	0.00	0.00	9.16	45.37	101.82	101.82	5211.92	-5110.10
1+045.000	0.00	0.00	0.00	9.14	45.76	101.82	101.82	5257.68	-5155.86
1+050.000	0.00	0.00	0.00	9.25	45.97	101.82	101.82	5303.65	-5201.83
1+055.000	0.00	0.00	0.00	9.25	46.25	101.82	101.82	5349.90	-5248.08
1+060.000	0.00	0.00	0.00	8.86	45.28	101.82	101.82	5395.18	-5293.36
1+065.000	0.00	0.00	0.00	8.91	44.41	101.82	101.82	5439.58	-5337.76
1+070.000	0.00	0.00	0.00	8.24	42.85	101.82	101.82	5482.44	-5380.62
1+075.000	0.00	0.00	0.00	8.54	41.94	101.82	101.82	5524.37	-5422.55
1+080.000	0.00	0.00	0.00	8.40	42.35	101.82	101.82	5566.72	-5464.90
1+085.000	0.00	0.00	0.00	8.52	42.30	101.82	101.82	5609.02	-5507.20
1+090.000	0.00	0.00	0.00	8.81	43.31	101.82	101.82	5652.33	-5550.51
1+095.000	0.00	0.00	0.00	8.60	43.52	101.82	101.82	5695.86	-5594.04
1+100.000	0.00	0.00	0.00	8.46	42.64	101.82	101.82	5738.50	-5636.68
1+105.000	0.00	0.00	0.00	9.29	44.38	101.82	101.82	5782.88	-5681.06
1+110.000	0.00	0.00	0.00	9.56	47.14	101.82	101.82	5830.02	-5728.20
1+115.000	0.00	0.00	0.00	9.52	47.71	101.82	101.82	5877.73	-5775.91
1+120.000	0.00	0.00	0.00	9.31	47.07	101.82	101.82	5924.81	-5822.98
1+125.000	0.00	0.00	0.00	9.12	46.09	101.82	101.82	5970.89	-5869.07
1+130.000	0.00	0.00	0.00	8.97	45.22	101.82	101.82	6016.12	-5914.30
1+135.000	0.00	0.00	0.00	8.37	43.34	101.82	101.82	6059.46	-5957.64
1+140.000	0.00	0.00	0.00	8.34	41.78	101.82	101.82	6101.24	-5999.42
1+145.000	0.00	0.00	0.00	8.80	42.86	101.82	101.82	6144.10	-6042.28

1+150.000	0.00	0.00	0.00	8.74	43.84	101.82	101.82	6187.94	-6086.12
1+155.000	0.00	0.00	0.00	8.96	44.24	101.82	101.82	6232.18	-6130.36
1+160.000	0.00	0.00	0.00	8.92	44.69	101.82	101.82	6276.87	-6175.05
1+165.000	0.00	0.00	0.00	9.35	45.66	101.82	101.82	6322.53	-6220.71
1+170.000	0.00	0.00	0.00	9.17	46.28	101.82	101.82	6368.81	-6266.99
1+175.000	0.00	0.00	0.00	9.37	46.34	101.82	101.82	6415.15	-6313.32
1+180.000	0.00	0.00	0.00	9.49	47.14	101.82	101.82	6462.29	-6360.47
1+185.000	0.00	0.00	0.00	9.50	47.48	101.82	101.82	6509.77	-6407.94
1+190.000	0.00	0.00	0.00	9.60	47.76	101.82	101.82	6557.53	-6455.70
1+195.000	0.00	0.00	0.00	9.43	47.59	101.82	101.82	6605.11	-6503.29
1+200.000	0.00	0.00	0.00	9.04	46.18	101.82	101.82	6651.29	-6549.47
1+205.000	0.00	0.00	0.00	8.67	44.27	101.82	101.82	6695.56	-6593.74
1+210.000	0.00	0.00	0.00	8.48	42.87	101.82	101.82	6738.43	-6636.61
1+215.000	0.00	0.00	0.00	8.60	42.70	101.82	101.82	6781.13	-6679.31
1+220.000	0.00	0.00	0.00	8.26	42.16	101.82	101.82	6823.29	-6721.47
1+225.000	0.00	0.00	0.00	8.17	41.07	101.82	101.82	6864.35	-6762.53
1+230.000	0.00	0.00	0.00	8.10	40.66	101.82	101.82	6905.02	-6803.20
1+235.000	0.00	0.00	0.00	8.34	41.09	101.82	101.82	6946.11	-6844.29
1+240.000	0.00	0.00	0.00	8.65	42.48	101.82	101.82	6988.59	-6886.77
1+245.000	0.00	0.00	0.00	8.69	43.37	101.82	101.82	7031.96	-6930.14
1+250.000	0.00	0.00	0.00	8.89	43.95	101.82	101.82	7075.91	-6974.09
1+255.000	0.00	0.00	0.00	8.43	43.29	101.82	101.82	7119.20	-7017.38
1+260.000	0.00	0.00	0.00	8.01	41.10	101.82	101.82	7160.30	-7058.48
1+265.000	0.00	0.00	0.00	7.86	39.66	101.82	101.82	7199.96	-7098.14
1+270.000	0.00	0.00	0.00	7.87	39.32	101.82	101.82	7239.28	-7137.46
1+275.000	0.00	0.00	0.00	7.88	39.38	101.82	101.82	7278.65	-7176.83
1+280.000	0.00	0.00	0.00	7.85	39.33	101.82	101.82	7317.98	-7216.16
1+285.000	0.00	0.00	0.00	8.02	39.69	101.82	101.82	7357.68	-7255.86
1+290.000	0.00	0.00	0.00	8.30	40.80	101.82	101.82	7398.48	-7296.66
1+295.000	0.00	0.00	0.00	9.26	43.88	101.82	101.82	7442.35	-7340.53
1+300.000	0.00	0.00	0.00	9.51	46.91	101.82	101.82	7489.27	-7387.45
1+305.000	0.00	0.00	0.00	9.39	47.25	101.82	101.82	7536.51	-7434.69
1+310.000	0.00	0.00	0.00	9.25	46.58	101.82	101.82	7583.10	-7481.28
1+315.000	0.00	0.00	0.00	9.38	46.56	101.82	101.82	7629.66	-7527.84
1+320.000	0.00	0.00	0.00	9.56	47.35	101.82	101.82	7677.01	-7575.19
1+325.000	0.00	0.00	0.00	9.82	48.46	101.82	101.82	7725.47	-7623.65
1+330.000	0.00	0.00	0.00	10.08	49.74	101.82	101.82	7775.22	-7673.39
1+335.000	0.00	0.00	0.00	10.05	50.31	101.82	101.82	7825.53	-7723.70
1+340.000	0.00	0.00	0.00	9.83	49.69	101.82	101.82	7875.21	-7773.39
1+345.000	0.00	0.00	0.00	9.41	48.09	101.82	101.82	7923.31	-7821.49

1+350.000	0.00	0.00	0.00	9.09	46.26	101.82	101.82	7969.57	-7867.74
1+355.000	0.00	0.00	0.00	9.14	45.59	101.82	101.82	8015.16	-7913.33
1+360.000	0.00	0.00	0.00	9.36	46.25	101.82	101.82	8061.41	-7959.59
1+365.000	0.00	0.00	0.00	9.77	47.83	101.82	101.82	8109.24	-8007.41
1+370.000	0.00	0.00	0.00	9.85	49.06	101.82	101.82	8158.30	-8056.48
1+375.000	0.00	0.00	0.00	9.71	48.91	101.82	101.82	8207.21	-8105.39
1+380.000	0.00	0.00	0.00	9.62	48.34	101.82	101.82	8255.56	-8153.74
1+385.000	0.00	0.00	0.00	9.46	47.72	101.82	101.82	8303.28	-8201.46
1+390.000	0.00	0.00	0.00	8.85	45.79	101.82	101.82	8349.07	-8247.25
1+395.000	0.00	0.00	0.00	8.70	43.88	101.82	101.82	8392.94	-8291.12
1+400.000	0.00	0.00	0.00	9.48	45.45	101.82	101.82	8438.39	-8336.57
1+405.000	0.00	0.00	0.00	9.95	48.57	101.82	101.82	8486.96	-8385.14
1+410.000	0.00	0.00	0.00	10.41	50.90	101.82	101.82	8537.86	-8436.04
1+415.000	0.00	0.00	0.00	10.59	52.51	101.82	101.82	8590.37	-8488.55
1+420.000	0.00	0.00	0.00	10.18	51.92	101.82	101.82	8642.29	-8540.47
1+425.000	0.00	0.00	0.00	10.09	50.68	101.82	101.82	8692.97	-8591.14
1+430.000	0.00	0.00	0.00	9.67	49.42	101.82	101.82	8742.38	-8640.56
1+435.000	0.00	0.00	0.00	10.17	49.60	101.82	101.82	8791.99	-8690.17
1+440.000	0.00	0.00	0.00	9.82	49.98	101.82	101.82	8841.96	-8740.14
1+445.000	0.00	0.00	0.00	10.29	50.28	101.82	101.82	8892.24	-8790.42
1+450.000	0.00	0.00	0.00	10.48	51.91	101.82	101.82	8944.15	-8842.33
1+455.000	0.00	0.00	0.00	10.62	52.74	101.82	101.82	8996.90	-8895.08
1+460.000	0.00	0.00	0.00	10.75	53.43	101.82	101.82	9050.33	-8948.50
1+465.000	0.00	0.00	0.00	10.85	54.00	101.82	101.82	9104.32	-9002.50
1+470.000	0.00	0.00	0.00	11.11	54.91	101.82	101.82	9159.23	-9057.41
1+475.000	0.00	0.00	0.00	11.19	55.75	101.82	101.82	9214.98	-9113.16
1+480.000	0.00	0.00	0.00	11.23	56.05	101.82	101.82	9271.03	-9169.21
1+485.000	0.00	0.00	0.00	11.10	55.83	101.82	101.82	9326.86	-9225.04
1+490.000	0.00	0.00	0.00	10.97	55.18	101.82	101.82	9382.04	-9280.22
1+495.000	0.00	0.00	0.00	10.37	53.36	101.82	101.82	9435.40	-9333.58
1+500.000	0.00	0.00	0.00	10.08	51.14	101.82	101.82	9486.54	-9384.72
1+505.000	0.00	0.00	0.00	9.85	49.85	101.82	101.82	9536.38	-9434.56
1+510.000	0.00	0.00	0.00	9.30	47.88	101.82	101.82	9584.27	-9482.44
1+515.000	0.00	0.00	0.00	9.01	45.76	101.82	101.82	9630.03	-9528.21
1+520.000	0.00	0.00	0.00	9.15	45.40	101.82	101.82	9675.43	-9573.60
1+525.000	0.00	0.00	0.00	9.03	45.45	101.82	101.82	9720.88	-9619.06
1+530.000	0.00	0.00	0.00	8.79	44.54	101.82	101.82	9765.42	-9663.60
1+535.000	0.00	0.00	0.00	8.96	44.36	101.82	101.82	9809.77	-9707.95
1+540.000	0.00	0.00	0.00	9.04	45.00	101.82	101.82	9854.77	-9752.95
1+545.000	0.00	0.00	0.00	8.79	44.58	101.82	101.82	9899.35	-9797.53

1+550.000	0.00	0.00	0.00	8.94	44.34	101.82	101.82	9943.70	-9841.88
1+555.000	0.00	0.00	0.00	8.54	43.72	101.82	101.82	9987.42	-9885.60
1+560.000	0.00	0.00	0.00	7.39	39.84	101.82	101.82	10027.26	-9925.44
1+565.000	0.00	0.00	0.00	7.80	37.99	101.82	101.82	10065.26	-9963.43
1+570.000	0.00	0.00	0.00	7.40	38.02	101.82	101.82	10103.27	-10001.45
1+575.000	0.00	0.00	0.00	7.17	36.42	101.82	101.82	10139.70	-10037.88
1+580.000	0.00	0.00	0.00	6.78	34.86	101.82	101.82	10174.56	-10072.73
1+585.000	0.00	0.00	0.00	6.54	33.29	101.82	101.82	10207.85	-10106.03
1+590.000	0.00	0.00	0.00	6.42	32.40	101.82	101.82	10240.25	-10138.43
1+595.000	0.00	0.00	0.00	6.40	32.07	101.82	101.82	10272.32	-10170.50
1+600.000	0.00	0.00	0.00	6.31	31.79	101.82	101.82	10304.11	-10202.29
1+605.000	0.00	0.00	0.00	6.26	31.43	101.82	101.82	10335.54	-10233.72
1+610.000	0.00	0.00	0.00	6.05	30.77	101.82	101.82	10366.31	-10264.49
1+615.000	0.00	0.00	0.00	5.91	29.88	101.82	101.82	10396.19	-10294.37
1+620.000	0.00	0.00	0.00	6.18	30.22	101.82	101.82	10426.41	-10324.59
1+625.000	0.00	0.00	0.00	6.56	31.86	101.82	101.82	10458.27	-10356.45
1+630.000	0.00	0.00	0.00	6.63	32.98	101.82	101.82	10491.25	-10389.43
1+635.000	0.00	0.00	0.00	7.16	34.48	101.82	101.82	10525.73	-10423.91
1+640.000	0.00	0.00	0.00	7.26	36.04	101.82	101.82	10561.77	-10459.95
1+645.000	0.00	0.00	0.00	7.54	37.00	101.82	101.82	10598.78	-10496.95
1+650.000	0.00	0.00	0.00	6.95	36.23	101.82	101.82	10635.01	-10533.19
1+655.000	0.00	0.00	0.00	6.51	33.65	101.82	101.82	10668.65	-10566.83
1+660.000	0.00	0.00	0.00	6.17	31.69	101.82	101.82	10700.35	-10598.53
1+665.000	0.00	0.00	0.00	6.27	31.10	101.82	101.82	10731.45	-10629.63
1+670.000	0.00	0.00	0.00	5.86	30.34	101.83	101.83	10761.79	-10659.97
1+675.000	0.00	0.00	0.00	6.87	31.83	101.83	101.83	10793.62	-10691.79
1+680.000	0.00	0.00	0.00	7.38	35.63	101.83	101.83	10829.25	-10727.42
1+685.000	0.00	0.00	0.00	7.28	36.65	101.83	101.83	10865.90	-10764.07
1+690.000	0.00	0.00	0.00	8.37	39.12	101.83	101.83	10905.02	-10803.19
1+695.000	0.00	0.00	0.00	8.23	41.49	101.83	101.83	10946.51	-10844.68
1+700.000	0.00	0.00	0.00	7.37	39.01	101.83	101.83	10985.52	-10883.69
1+705.000	0.00	0.00	0.00	7.93	38.26	101.83	101.83	11023.78	-10921.95
1+710.000	0.00	0.00	0.00	7.89	39.55	101.83	101.83	11063.33	-10961.50
1+715.000	0.00	0.00	0.00	7.27	37.91	101.83	101.83	11101.23	-10999.41
1+720.000	0.00	0.00	0.00	7.85	37.80	101.83	101.83	11139.04	-11037.21
1+725.000	0.00	0.00	0.00	8.06	39.78	101.83	101.83	11178.82	-11076.99
1+730.000	0.00	0.00	0.00	7.80	39.67	101.83	101.83	11218.49	-11116.66
1+735.000	0.00	0.00	0.00	8.19	39.99	101.83	101.83	11258.48	-11156.65
1+740.000	0.00	0.00	0.00	7.61	39.50	101.83	101.83	11297.97	-11196.14
1+745.000	0.00	0.00	0.00	7.28	37.22	101.83	101.83	11335.19	-11233.37

1+750.000	0.00	0.00	0.00	7.49	36.94	101.83	101.83	11372.13	-11270.30
1+755.000	0.00	0.00	0.00	7.50	37.48	101.83	101.83	11409.61	-11307.78
1+760.000	0.00	0.00	0.00	7.32	37.03	101.83	101.83	11446.64	-11344.81
1+765.000	0.00	0.00	0.00	7.76	37.68	101.83	101.83	11484.32	-11382.49
1+770.000	0.00	0.00	0.00	7.38	37.84	101.83	101.83	11522.16	-11420.33
1+775.000	0.00	0.00	0.00	7.59	37.42	101.83	101.83	11559.58	-11457.75
1+780.000	0.00	0.00	0.00	7.97	38.88	101.83	101.83	11598.45	-11496.63
1+785.000	0.00	0.00	0.00	7.97	39.83	101.83	101.83	11638.28	-11536.45
1+790.000	0.00	0.00	0.00	9.18	42.86	101.83	101.83	11681.15	-11579.32
1+795.000	0.00	0.00	0.00	16.86	65.11	101.83	101.83	11746.26	-11644.43
1+800.000	0.00	0.00	0.00	13.25	75.29	101.83	101.83	11821.55	-11719.72
1+805.000	0.00	0.00	0.00	10.80	60.14	101.83	101.83	11881.69	-11779.86
1+810.000	0.00	0.00	0.00	8.44	48.10	101.83	101.83	11929.79	-11827.96
1+815.000	0.00	0.00	0.00	7.93	40.93	101.83	101.83	11970.71	-11868.88
1+820.000	0.00	0.00	0.00	9.86	44.49	101.83	101.83	12015.20	-11913.37
1+825.000	0.00	0.00	0.00	7.80	44.15	101.83	101.83	12059.35	-11957.52
1+830.000	0.00	0.00	0.00	7.84	39.09	101.83	101.83	12098.44	-11996.61
1+835.000	0.00	0.00	0.00	7.43	38.18	101.83	101.83	12136.62	-12034.79
1+840.000	0.00	0.00	0.00	6.14	33.92	101.83	101.83	12170.53	-12068.70
1+845.000	0.00	0.00	0.00	5.99	30.33	101.83	101.83	12200.86	-12099.03
1+850.000	0.00	0.00	0.00	6.19	30.45	101.83	101.83	12231.31	-12129.48
1+855.000	0.00	0.00	0.00	6.35	31.35	101.83	101.83	12262.66	-12160.83
1+860.000	0.00	0.00	0.00	6.11	31.15	101.83	101.83	12293.81	-12191.98
1+865.000	0.00	0.00	0.00	6.31	31.04	101.83	101.83	12324.85	-12223.02
1+870.000	0.00	0.00	0.00	6.65	32.38	101.83	101.83	12357.23	-12255.40
1+875.000	0.00	0.00	0.00	7.09	34.33	101.83	101.83	12391.56	-12289.73
1+880.000	0.00	0.00	0.00	8.44	38.81	101.83	101.83	12430.37	-12328.54
1+885.000	0.00	0.00	0.00	7.34	39.45	101.83	101.83	12469.82	-12367.99
1+890.000	0.00	0.00	0.00	9.26	41.50	101.83	101.83	12511.32	-12409.49
1+895.000	0.00	0.00	0.00	6.80	40.15	101.83	101.83	12551.47	-12449.64
1+900.000	0.00	0.00	0.00	7.55	35.87	101.83	101.83	12587.34	-12485.51
1+900.000	0.00	0.00	0.00	7.55	0.00	101.83	101.83	12587.34	-12485.51
1+905.000	0.00	0.00	0.00	7.22	36.91	101.83	101.83	12624.25	-12522.42
1+910.000	0.00	0.00	0.00	7.81	37.58	101.83	101.83	12661.83	-12560.00
1+915.000	0.00	0.00	0.00	7.49	38.25	101.83	101.83	12700.07	-12598.24
1+920.000	0.00	0.00	0.00	7.29	36.95	101.83	101.83	12737.02	-12635.19
1+925.000	0.00	0.00	0.00	7.02	35.78	101.83	101.83	12772.80	-12670.97
1+930.000	0.00	0.00	0.00	7.77	36.96	101.83	101.83	12809.76	-12707.93
1+935.000	0.00	0.00	0.00	8.36	40.31	101.83	101.83	12850.08	-12748.25
1+940.000	0.00	0.00	0.00	9.00	43.40	101.83	101.83	12893.48	-12791.65

1+945.000	0.00	0.00	0.00	9.24	45.60	101.83	101.83	12939.08	-12837.25
1+950.000	0.00	0.00	0.00	9.83	47.67	101.83	101.83	12986.75	-12884.92
1+955.000	0.00	0.00	0.00	10.29	50.30	101.83	101.83	13037.05	-12935.22
1+960.000	0.00	0.00	0.00	10.57	52.16	101.83	101.83	13089.20	-12987.37
1+965.000	0.00	0.00	0.00	10.60	52.93	101.83	101.83	13142.14	-13040.31
1+970.000	0.00	0.00	0.00	11.03	54.09	101.83	101.83	13196.22	-13094.39
1+975.000	0.00	0.00	0.00	11.08	55.29	101.83	101.83	13251.51	-13149.68
1+980.000	0.00	0.00	0.00	11.67	56.89	101.83	101.83	13308.40	-13206.57
1+985.000	0.00	0.00	0.00	12.06	59.34	101.83	101.83	13367.74	-13265.91
1+990.000	0.00	0.00	0.00	11.50	58.91	101.83	101.83	13426.64	-13324.82
1+995.000	0.00	0.00	0.00	10.61	55.26	101.83	101.83	13481.91	-13380.08
2+000.000	0.00	0.00	0.00	9.62	50.57	101.83	101.83	13532.48	-13430.65
2+005.000	0.00	0.00	0.00	9.33	47.39	101.83	101.83	13579.87	-13478.04
2+010.000	0.00	0.00	0.00	8.99	45.80	101.83	101.83	13625.67	-13523.84
2+015.000	0.00	0.00	0.00	8.50	43.73	101.83	101.83	13669.40	-13567.57
2+020.000	0.00	0.00	0.00	8.31	42.02	101.83	101.83	13711.42	-13609.59
2+025.000	0.00	0.00	0.00	8.45	41.89	101.83	101.83	13753.31	-13651.48
2+030.000	0.00	0.00	0.00	8.52	42.43	101.83	101.83	13795.73	-13693.90
2+035.000	0.00	0.00	0.00	8.14	41.64	101.83	101.83	13837.37	-13735.54
2+040.000	0.00	0.00	0.00	8.39	41.31	101.83	101.83	13878.68	-13776.85
2+045.000	0.00	0.00	0.00	8.85	43.11	101.83	101.83	13921.79	-13819.96
2+050.000	0.00	0.00	0.00	9.02	44.68	101.83	101.83	13966.47	-13864.64
2+055.000	0.00	0.00	0.00	9.23	45.63	101.83	101.83	14012.10	-13910.27
2+060.000	0.00	0.00	0.00	0.00	23.09	101.83	101.83	14035.19	

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2025

2024-486-RIO-0839
Al contestar citar este código

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Atn. TIBER GILDARDO CHAVARRO M.
Representante Legal
Carrera 67 # 167 - 61
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Reiteración Trámites y Gestiones Ambientales oficio 2024-486-RIO-0611

Cordial saludo,

El Decreto 1076 de 2015 establece, en su artículo correspondiente, el listado de las obras que pueden considerarse como un cambio menor, dentro de las cuáles se encuentran algunas de las establecidas al interior del aeropuerto en el contrato de obra, así:

"…artículo 2.2.2.6.1.6 del decreto 1076 de 2015,

8, b. Obras civiles:

i. Remodelación o actualización de canales, drenajes superficiales o subsuperficiales, trampas de grasas, trampas de arena, y otros complementarios de obras de drenajes, box, descoles, encoles.

ii. Remodelación de plataformas, calles de rodaje y pistas, así como mejoras estructurales, mejoras en carpetas de rodadura y ampliaciones menores de secciones transversales.

iii. Mejoras o actualización de nivelación y secciones de zonas de franjas de pista, franjas de calles de rodaje, márgenes de pista y calles de rodaje, zonas de seguridad de plataforma.

c. Infraestructura física:

i. Remodelación o actualización de redes de alcantarillado de aguas servidas o aguas lluvias, sistemas de piscinas de oxidación, sumideros y su infraestructura complementaria.

9. Construcción de nuevas calles de rodaje (calles de acceso a puestos de estacionamiento de aeronaves, calles de rodaje en plataforma y calles de salida rápida) y ampliación de calles

de rodaje (calles de acceso a puestos de estacionamiento de aeronaves, calles de rodaje en plataforma y calles de salida rápida) …"

Sin embargo, el mismo artículo establece que, **previo a la ejecución de las actividades descritas**, el titular de la Licencia Ambiental o del Plan de Manejo Ambiental de cada proyecto, obra o actividad deberá presentar un informe a la Autoridad Ambiental, con el propósito de ser incluido en el expediente de las actividades a ejecutar. Este informe será utilizado en el proceso de seguimiento y control ambiental según lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto 2820 de 2010 (o la norma que lo modifique o sustituya), y deberá contener la siguiente información:

1. Descripción de la actividad, incluyendo planos o mapas de localización y su respectiva geo-referenciación.
2. Justificación de que la actividad a desarrollar no generará nuevos impactos ambientales, tal como se establece en la Ley 1682 de 2013 y el artículo 1 del presente decreto.

Por lo tanto, de acuerdo a la reunión sostenida con la Aerocivil del día de hoy, se reitera al contratista la solicitud realizada mediante los oficios 2024-486-RIO-3069 del 29 de octubre de 2024, 2025-486-RIO-0428 y en la mesa de trabajo del 09 de diciembre de 2024, sobre la necesidad de realizar el análisis y las gestiones necesarias, de acuerdo con la normativa ambiental vigente (Decreto 1076 de 2015) y conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas, en el numeral 3.7.16 sobre Manejo Ambiental y en el numeral 3.7.16.1 del Anexo Técnico del contrato para las actividades de obra según el alcance contractual.

Las fechas acordadas son:

Viernes 28 de marzo de 2025: Justificación del cambio menor de acuerdo a lo establecido en el decreto 1076.

Miércoles 2 de abril: Documento PAGA para las obras del tanque de tormentas.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: DMNS

AIRRIO
CONSORCIO

Bogotá D.C.,27 de febrero de 2025

2025-486-RÍO-0850
Al contestar citar este código

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Atn. TIBER GILDARDO CHAVARRO M.
Representante Legal
Carrera 67 # 167 - 61
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Solicitud de requerimiento "petición Representante Cristian Avendaño ID 1628884"

Cordial saludo,

Por directriz de la Directora, se solicita de manera urgente, allegar la información del representante adjunta en los siguientes ítems:

o) Allegar copia del desembolso del pago del anticipo.
p) Sírvase rendir un informe sobre la inversión de dicho anticipo por parte del contratista.
q) Sírvase allegar los respectivos informes de cumplimiento presentados por el contratista.

Lo anterior, por favor para el día de hoy. Gracias.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayericate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

INCOPLAN intecsa

Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró:M.J.P.M
Anexo:RTA DP CRISTIAN AVENDANŽO.

AIRRIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2025

2025-486-RÍO-0854
Al contestar citar este código

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Atn. TIBER GILDARDO CHAVARRO M.
Representante Legal
Carrera 67 # 167 - 61
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Solicitud para la implementación de medidas de mitigación de impacto ambiental por material particulado y arrastre de sedimentos.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito solicitar formalmente la implementación de medidas de mitigación orientadas a reducir el impacto ambiental asociado al material particulado y el arrastre de sedimentos generado por la maquinaria que se encuentra operando en la zona.

Considerando la importancia de proteger la salud de los operarios, las comunidades cercanas y el buen desarrollo del proyecto, es esencial desarrollar estrategias específicas que permitan disminuir dichos efectos. Acción recomendada:

La estabilización de áreas intervenidas para minimizar la erosión.

A continuación se presenta evidencia del material particulado:

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

INCOPLAN intecsa





Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2025

2025-486-RIO-0859
Al contestar citar este código

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL
Atn. MARIA GEINER PRADA GUZMAN.
Gerente Aeropuerto Almirante Padilla
Riohacha

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: **Novedad: Vertimiento de Aguas Servidas en Canal del Costado Sur del Aeropuerto**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, informamos que durante labores de supervisión nocturna de la interventoría, realizadas el 27 de marzo, se observó el vertimiento de aguas servidas provenientes de una vivienda vecina ubicada en el costado sur del aeropuerto hacia el canal interno que conduce las aguas lluvias del mismo. Al abordar al residente de la vivienda, este manifestó que la acción se debía a una problemática interna y que la evacuación al canal era la única opción que consideraban viable para la disposición de dichas aguas.

Es importante aclarar que no se tomaron evidencias fotográficas en el momento; sin embargo, se informó de lo acontecido a los vigilantes del aeropuerto que realizaban el recorrido. Por otra parte, el día de hoy se mantendrá la atención para documentar debidamente la situación en caso de que se repita.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: O.V.S.

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerricate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

Riohacha Guajira, 28 de marzo de 2025.

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Atn. ING. VICTOR DANIEL CASTRO.
Director de obra
Carrera 67 # 167 - 61
Bogotá D.C.

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: **Preocupación por bajos rendimientos en ejecución de obra y retraso en inicio de actividades programadas - Solicitud de información.**

Un cordial saludo,

Con el fin de manifestar la preocupación de la intervención con respecto a los rendimientos en la ejecución de la obra presentada en las dos últimas semanas del presente mes, se informa que no se ejecutaron obras durante la segunda semana. Además, en la tercera semana los rendimientos de ejecución fueron muy bajos.

Además, en la programación de obra vigente y avalada por la interventoría, se evidencia que en el mes de marzo deben iniciarse las obras correspondientes a los siguientes capítulos:

- CONSTRUCCIÓN CALLE DE RODAJE BRAVO
- MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 28
- DRENAJE
- CONSTRUCCIÓN CANALES Y CAJAS
- COLECTORES DE HORMIGÓN

Sin embargo, a la fecha no hay evidencia del inicio de dichas actividades.

Por lo anterior, se les recuerda el compromiso de cumplir con la programación de obra y, lo más importante, con la programación de las vigencias futuras establecidas por la AEROCIVIL. Para poder cumplir con dichas vigencias futuras, se debería ejecutar mensualmente un valor aproximado de $3.500.000.000 (tres mil quinientos millones de pesos). No obstante, a la fecha se evidencia que no se cumplirá con este compromiso, tal como se ha señalado en los diferentes comités de seguimiento de obra.

Agradecemos nos informe sobre las razones de los bajos rendimientos en la ejecución de las obras, así como sobre el estado de las actividades relacionadas con la adecuación de los diseños al lote recientemente adquirido por la AEROCIVIL e incorporado al proyecto.

Por otra parte, durante la reciente visita de los jurídicos de la AEROCIVIL, se solicitó el levantamiento topográfico (planos) de las áreas vecinas al lote adquirido para iniciar el proceso de compra de nuevos lotes e incorporar así las áreas necesarias para la ejecución del proyecto. A la fecha, esta información no ha sido entregada a la interventoría.

Agradecemos su colaboración.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: O.V.S.
Anexo: No Aplica.

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 28 de marzo de 2025

2025-486-RÍO-0863
Al contestar citar este código

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL
Atn. ALDEMAR PINZON.
Supervisor del Contrato
Avenida el Dorado No. 103 -15
Bogotá
Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Entrega de informe mensual No. 5

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito informarle que procederé a radicar el Informe mensual No. 5, en el cual se detallan las actividades realizadas, avances alcanzados y situaciones relevantes ocurridas durante dicho periodo.

Quedamos atentos a sus comentarios o solicitudes de información adicional que consideren necesarias.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: O.V.S.
Anexo: Informe mensual No.

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayeli.cate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

INCOPLAN intecsa

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 28 de marzo de 2025

2025-486-RÍO-0861
Al contestar citar este código

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL
Atn. ALDEMAR PINZON.
Supervisor del Contrato
Avenida el Dorado No. 103 -15
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: **Remisión de Informes semanales No 27, 28, 29, y 30**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito informarle que procederé a radicar los Informes Semanales correspondientes a los números 27, 28, 29 y 30.

En estos documentos se detallan las actividades realizadas, los avances alcanzados y las situaciones relevantes ocurridas durante el periodo cubierto por dichos informes.

Agradezco de antemano su atención y quedo a su disposición para cualquier comentario o requerimiento adicional.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: O.V.S..
Anexo: Informes Semanales No.27, 28, 29 y 30.

AIRRIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 31 de Marzo de 2025

2025-486-RIO-0872
Al contestar citar este código

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Atn. TIBER GILDARDO CHAVARRO M.
Representante Legal
Carrera 67 # 167 - 61
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Revisión Cambio Menor. Respuesta al Comunicado No. INFRH-AMB-010-2025.

Cordial saludo,

De acuerdo con lo solicitado, se remite adjunto para su revisión y ajuste el documento de Justificación de Cambio Menor. Si bien se menciona que las obras no generan cambios en el área de influencia, zonificación ambiental ni riesgos, es necesario que esta afirmación quede claramente justificada. En este sentido, cada criterio del cambio menor debe ser debidamente respaldado y sustentado mediante el análisis comparativo de las obras proyectadas frente a lo que está contemplado en el PMA aprobado del aeropuerto.

Por otro lado, en la descripción del proyecto no debe limitarse a listar las actividades de obra, sino que debe incluir una descripción detallada de en qué consiste el proyecto, como, por ejemplo, las características técnicas de la calle de rodaje que se va a construir.

Cordialmente,

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

INCOPLAN intecsa

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: DMNS
Anexo: Informe de solicitud de cambio menor conforme al Decreto 1076 de 2015.

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

Bogotá, D.C., 03 de marzo de 2025

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-T-090-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: INFORME ACTIVIDADES DE OBRA

Cordial Saludo;

Por medio del presente comunicado y teniendo en cuenta los dispuesto en el Decreto No. 011-2025 del 07 de febrero de 2025, por el cual se da apertura a las fiestas del Precarnaval y Carnaval de Riohacha año 2025 y se dictan otras disposiciones, en lo referente entre otras a:

- *ARTICULO PRIMERO: Ordena la apertura de los Carnavales del 28 de febrero al 04 de marzo de 2025*
- *ATICULO CUARTO: USO DE VIAS Y DEL ESPACIO PUBLICO PARA EL EJERCICIO DE MANIFEESTACIONES CULTURALES, A RTISTICAS Y TRADICIONALES DEL CARNAVAL DE RIOHACHA: permitir de manera excepcional y temporal el uso de vías y espacio público adyacente a todos aquellos eventos, actos festivos y lúdicos que se realicen durante la temporada del Carnaval de Riohacha*

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la firma Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA, informa que NO se laborará en desarrollo del contrato de obra No. 23001170 H4 de 2023, los días 03 y 04 de marzo, toda vez que no se podrá realizar el desplazamiento por las vías del municipio de materiales y/o vehículos requeridos para el normal desarrollo de la obra.

Adicionalmente los días 03 y 04 de marzo de 2025, fueron proclamados días cívico para el Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, siendo requerido por los trabajadores de la zona su derecho a participación a dichas festividades

Cordialmente,

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA
C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO: V.D.C.

Bogotá, 3 de marzo de 2025

CIR-AEROCIVIL-ADMON-015-2024

SEÑORES
CONSORCIO AIR RIO
ATN: ING. SANTIAGO PAEZ TALERO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 DE 2023, cuyo objeto es: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

ASUNTO: ENVÍO DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL NO.4

Respetados señores:

Cordial saludo.

De manera atenta, remitimos la documentación para el trámite de pago del Acta de Recibo Parcial No.4 correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero de 2025, para su información y fines pertinentes.

DOCUMENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	
Factura ELECTRONICA SE ENVIA A SIIF NACION CUANDO ESTE APROBADA LA CUENTA	1			
Acta Resumen Parcial	1			
Liquidación Iva	1			
Acta Excel Presupuesto de Costos	3			
Certificación Cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de servicios	1			
Certificación de la factura Por interventoría en Obra	1			
Certificación de la factura Por Supervisor en Interventoría			X	
Certificación del Uso del anticipo por la interventoría en Obra	1			
Certificación del Uso del anticipo por EL Supervisor a la interventoría			X	
Certificación de los Aportes a Parafiscales x La interventoría en Obra	1			
Certificación de los Aportes a Parafiscales por el Supervisor en interventoría			X	
Nota Aclaratoria como se calculó el cobro del acta de Interventoría			X	
Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de Obra en cuentas de obra con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación DE Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales	13			

DOCUMENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	
Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de interventoría en cuentas de interventoría con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación de Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales			X	
Fotocopias de las Planillas de Pagos Parafiscales del periodo facturado	16			
Certificación Bancaria	1			
Certificación Rut Dian	20			
Certificación de la consignación de los rendimientos Financieros a la entidad Cuando hay Anticipo	2			
Oficio remisorio del Acta a Cobrar	2			
Pantallazo del SECOP Evidenciando el cargue de las cuentas en el numeral 7 Ejecución del contrato / Plan de Pagos A partir de la Segunda Cuenta	1			
Para la primera cuenta de Interventoría la Designación del Supervisor firmada			X	
Documentos de Acuerdo a lo que dice el contrato				
LAS FIRMAS EN LAS ACTAS DE ACUERDO AL ULTIMO MANUAL DE CONTRATACION				
Anexo Memorias o Informes Según el Caso al final de los documentos o PDF aparte.	X			
Para la Primera Y Ultima Cuenta (Acta de recibo Final) Anexar Contrato, Acta de Inicio, CDP, RP, Aprobación de Garantías y Documentos Contractuales que se Presenten en el Contrato			X	
Si es acta de recibo final se requiere anexar el formato 65 acta de recibo final con Aprobación de Garantías y Pólizas Actualizadas.			X	

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente,



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
YAMILL MONTENEGRO CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL S

C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO: Mónica Román

Bogotá, D.C., 05 de Marzo de 2025

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-T-091-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: INFORMES SEMANALES

Cordial Saludo;

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, la firma contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA se permite remitir los siguiente:

- INFORME SEMANAL No. 29 – Febrero 17 – Febrero 23 de 2025
- INFORME SEMANAL No. 30 – Febrero 24 – Marzo 02 de 2025

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente,



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORÓ: E.R.A

Bogotá, D.C., 09 de marzo de 2025

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-T-092-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS

Cordial Saludo;

Adjunto a la presente y de acuerdo a lo requerido a fin de dar cumplimiento a los requerimientos técnicos, la firma contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA se permite remitir los siguiente:

- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNIT
NP-01	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO P-401 - MEJORADO (INCLUYE ILUMINACIÓN Y TRANSPORTE).	M3	$1.712.347,00
NP-03	BASE ESTABILIZADA FAA P-304	M3	$368.381,00
NP-26	SUBRASANTE MEJORADA (MATERIAL RELLENO CRUDO O PIEDRA RAJON)	M3	$316.764,00
NP-04	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO P-403 - MEJORADO (INCLUYE ILUMINACIÓN Y TRANSPORTE).	M3	$1.712.347,00
NP-05	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.(INCLUYE TRANSPORTE E ILUMINACIÓN)	M2	$4.912,00
NP-06	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA	M2	$3.932,00
NP-07	ROCERIA	ML	$37.517,00
NP-08	LIMPIEZA DE CANALES	ML	$6.210,00
NP-09	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	$41.350,00
NP-10	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	M3	$143.873,00
NP-11	DEMOLICION DE CONCRETO	M3	$114.560,00
NP-12	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE ILUMINACIÓN Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL FRESADO)	M3	$1.016.932,00
NP-13	CONCRETO 3.000 PSI	M	$36.542,00
NP-14	CORTE DE PAVIMENTO	M3	$713.759,00

ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNIT
NP-15	CONCRETO 4.000 PSI	M3	$1.056.586,00
NP-16	CONCRETO CICLOPEO	KG	$12.698,00
NP-17	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	M	$52.085,00
NP-18	CERRAMIENTO PROVISIONAL	M2	$91.200,00
NP-19	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE CONCRETO	M2	$33.994,00
NP20	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE CONCRETO	M2	$33.994,00
NP-21	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE CAPAS GRANULARES	M2	$35.361,00
NP-22	SUMINISTRO E INSTALACION ACO QMAX NEO 600 + ACO QMAX NEO 600	M	$2.057.718,00
NP-23	SUMINISTRO E INSTALACION ACO QMAX NEO 300	M	$1.271.028,00
NP-24	SUMINISTRO E INSTALACION ACO QMAX NEO 600	M	$1.726.197,00
NP-25	Suministro Canal ACO Qmax 600+ACO Qmax 300	M	$1.901.679,00
NP-26	SUBRASANTE MEJORADA (MATERIAL RELLENO CRUDO O PIEDRA RAJON)	M3	$316.764,00

- ANEXOS PDF
- ANEXO EXCELL
- COTIZACIONES

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente,

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO: E.M.R.L.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
CONTRATISTA

Bogotá, D.C., 10 de Marzo de 2025

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-T-093-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3486 – cuyo asunto es: Respuesta al COMUNICADO INFRH-T-048-2024 del 15 de noviembre de 2024 observaciones informe mensual No. 3. y COMUNICADO 2024-486-RIO-0484 de fecha 20 de enero del 2025, cuyo asunto es: Solicitud de respuesta al Comunicado 2024-486-RÍO-3486 observaciones informe mensual N° 3.

Cordial Saludo;

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, la firma contratista Consorcio Infraestructura Riohacha y en respuesta a los comunicados 2024-486-RIO-3486 de fecha 27 de noviembre del 2024 y 2024-486-RIO-0484 de fecha 20 de enero del 2025, se envía el informe mensual No.3 corregido de acuerdo con lo solicitado en el comunicado 2024-486-RIO-3486 en donde:

1. Se atienden las observaciones realizadas en el anexo enviado por la interventoría
2. En el anexo 14 se agrega informe sst, donde se registran las actividades del mes en esta área
3. Se agregan las actas de comité firmadas correspondientes al periodo
4. Se agrega formato de seguimiento a los ensayos presentados en el anexo No.3

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente,



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORÓ: E.R.A

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
CONTRATISTA

Bogotá, D.C., 10 de Marzo de 2025

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-T-094-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0443 Solicitud, Relación mano de obra calificada y no calificada.

Cordial Saludo;

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, la firma contratista Consorcio Infraestructura Riohacha, da respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0443 Solicitud, Relación mano de obra calificada y no calificada, anexando relación mes a mes de los empleos programados y realmente generados

También se les indica que a corte de febrero 28 se tiene:

Empleos Directos hombres: 27
Empleos Directos mujeres: 2, las cuales tiene su hogar pero no son madres cabeza de hogar

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente,



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORÓ: E.R.A

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CONTRATO No. CONTRATO No. 23001170 H4 de 2023
PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO

EMPLEOS GENERADOS / ACTIVIDAD GRANDES CAPITULOS	Mes 1 A AGOSTO 31/2024				Mes 2 A SEPTIEMBRE 30/2024				Mes 3 A OCTUBRE 31/2024				Mes 4 A NOVIEMBRE 30/2024				Mes 5 A DICIEMBRE 31/2024				Mes 6 A ENERO 31/2025				Mes 7 A FEBRERO 28/2025			
	CALIFICADOS		NO CALIFICADOS		CALIFICADOS		NO CALIFICADOS		CALIFICADOS		NO CALIFICADOS		CALIFICADOS		NO CALIFICADOS		CALIFICADOS		NO CALIFICADOS		CALIFICADOS		NO CALIFICADOS		CALIFICADOS		NO CALIFICADOS	
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
ACTIVIDADES PRELIMINARES	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2
MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE RODAJE EXISTENTE																												
CONSTRUCCIÓN CALLE DE RODAJE BRAVO																												
MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE - CABECERA 28																												
ADECUACIÓN PLATAFORMA DE VIRAJE - CABECERA 10																												
ADECUACIÓN FRANJA										5		3		5		5	1	5	3	7	1	15	3	9	1	18	3	8
DRENAJE																												
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS																												
REVISIÓN, APROPIACIÓN Y/O AJUSTE, Y/O ACTUALIZACIÓN, Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.	14	12			14	12			14	12			14	12				12										
SUB TOTAL (mensual)	15	13	2	1	15	13	2	1	15	18	2	5	15	19	2	7	2	18	5	9	2	16	5	11	2	19	5	10
TOTAL (mensual)	17		14		17		14		17		23		17		26		7		27		7		27		7		29	

EMPLEOS PROGRAMADO
EMPLEOS CONTRATADOS

NOTA: Los requerimientos de personal serán ajustados y actualizados una vez finalice la fase de apropiación y/o ajuste, y/o actualización y/o complementación de los Estudios y Diseños y en desarrollo de las actividades de obra

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BIOHACHA
R.L. TIBER GILDARDO MUÑOZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

23001170 H4 DE 2023

REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMA DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

RELACION DE CARGOS PERSONAL

ITEM	NOMBRE	CARGO	C.C.	FECHA DE		EPS	PENSION	ARL	TRABAJADOR				GENERO		observaciones
				IINGRESO	RETIRO				Calificados Externos	Calificados Raizales	No Calificados Externos	No Calificados Raizales	Masculino	Femenino	
PERSONAL ADMINISTRATIVO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA															
1	VICTOR DANIEL CASTRO	DIRECTOR DE OBRA	10.524.225	1/10/2024		SURA	Colpensiones	SURA	si				X		
2	JUAN CARLOS PEREZ	RESIDENTE OBRA	92.190.949	01/082024		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	si				X		
3	ELIS ARAUJO PASTRANA	ING AUXILIAR EN CAMPO	1.118.873.533	14/01/2025		SANITAS	PORVENIR	SURA		si			X		
4	ELKIN ROJAS	INGENIERO DE APOYO	11.039.041	11/02/2025		nueva eps	Colpensiones	SURA	si				X		
5	ROGER RODRIGUEZ OJEDA	SISO AUXILIAR	1123625820	10/03/2021		NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA		si			X		
6	ELIANA GOMEZ SANCHEZ	INGENIERO AMBIENTAL	49.781.236	14/01/2025		Salud Total	PORVENIR	SURA		si				X	
7	PEDRO JOSÉ MORA GRANDAS	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS ESPECIALISTA AEROPISTAS	19.272.831	1/08/2024		Compensar	N/A	SURA	si				X		
8	ROBERTO ANDERSON JAIMES SILVA	ESPECIALISTA HIDRÁULICO	79.471.549	1/08/2024		Compensar	Colpensiones	SURA	si				X		
9	MELQUICEDEC CANTOR	ESPECIALSITA EN GEOTECNIA	19.371.269	1/08/2024		Sanitas	N/A	SURA	si				X		
10	CARLOS JAVIER GONZALEZ	ESPECIALISTA DISEÑO GEOMETRÍCO	6.773.087	1/08/2024		Famisanar	Colpensiones	SURA	si				X		
11	DIEGO ALEXANDER OSORIO	ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTO	94.406.535	1/08/2024		Salud Total	Colpensiones	SURA	si				X		
12	JUAN CARLOS SERNA	COORDINADOR TECNICO DE OBRA	80.410.771	10/09/2024		Aliansalud	Porvenir	Sura	si				X		
13	DAVID FELIPE ALFONSO	PROFESIONAL EN GERENCIA DE PROYECTOS	1.030.573.500	1/09/2018		Aliansalud	Colfondos	Sura	si				X		
14	MILDREY LORENA PINILLA	PROFESIONAL SOCIAL	1.018.409.894	28/07/2022		Sanitas	Porvenir	Sura	si					X	
15	DUVAN ELIAS MONTENEGRO	INSPECTOR SST	79.632.567	27/04/2023		Compensar	Colpensiones	Sura	si				X		
PERSONAL OPERATIVO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA															
16	TIBER GILDARDO CHAVARRO	GERENTE	79.311.998	19/04/2021		FAMISANAR	PROTECCIÓN	SURA	si				X		
17	HERNANDO HERNANDEZ BARRERA	JEFE DE LOGISTICA	91.287.950	17/03/2021		SANITAS	COLPENSIONES	SURA	si				X		
18	ARIEL DUVÁN ROBAYO LARA	TOPÓGRAFO	1.102.361.348	20/08/2024		Nueva EPS	Porvenir	SURA	si				X		
19	ALFONSO MORALES ESTEBAN	CADENERO 1	1.095.913.270	20/08/2024		EPS Sura	Porvenir	SURA			si		X		
20	CARLOS ANDRÉS CORREDOR CANO	CADENERO 2	1.052.396.873	20/08/2024		Nueva EPS	Porvenir	SURA			si		X		
21	VICTOR MANUEL ANGULO FONTALVO	OBRERO	1.006.615.156	13/04/2021		NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA				si	X		
22	SAMIR ESCORCIA	OPERADOR FINISHER	8.643.449	8/06/2021		NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA				SI	X		
23	VICTOR RODRIGUEZ	OBRERO	1.121.296.720	16/11/2024		Nueva EPS	Colpensiones	Sura				si	X		

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

23001170 H4 DE 2023

REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMA DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

RELACION DE CARGOS PERSONAL

ITEM	NOMBRE	CARGO	C.C.	FECHA DE		EPS	PENSION	ARL	TRABAJADOR				GENERO		observaciones
				IINGRESO	RETIRO				Calificados Externos	Calificados Raizales	No Calificados Externos	No Calificados Raizales	Masculino	Femenino	
24	JULIO TORRES	OBRERO	81.740.284	16/11/2024		Sanitas	Porvenir	Sura				si	X		
25	CRISTIAN MORA SIERRA	CONDUCTOR	1.118.813.605	2/01/2025		Salud Total	Porvenir	Sura				si	X		
26	ESNEIDER YESID PUELLO BARRIOS	CONDUCTOR	1.003.189.531	15/01/2025		Salud Total	Porvenir	colpatria				si	X		
27	HENRY CRUZ MORENO	OPERADOR MINI	3.144.427	29/08/2024		Famisanar	Porvenir	sura	si				X		
28	OSCAR MAURICIO VERA	CONDUCTOR	1.071.915.149	12/08/2024		Famisanar	Porvenir	SURA			si		X		
29	ELDER CEBALLOS MARTINEZ	OBRERO	84.080.207	8/10/2024		Salud Total	Porvenir	SURA				si	X		

MUJERES	2
HOMBRE	27
TOTAL	**29**

Calificados Externos	16
Calificados Raizales	3
No Calificados Externos	3
No Calificados Raizales	7
TOTAL	**29**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	
SUB TOTAL	29
TOTAL	29

VICTOR CASTRO SALAZAR
DIRECTOR DE OBRA

Bogotá, D.C., 12 de Marzo de 2025

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-T-095-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-0484 de fecha 20 de enero del 2025, cuyo asunto es: Solicitud de respuesta al Comunicado 2024-486-RÍO-3486 observaciones informe mensual N° 3.

Cordial Saludo;

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, la firma contratista Consorcio Infraestructura Riohacha y en respuesta al comunicado 2024-486-RIO-0484 de fecha 20 de enero del 2025, en donde se solicita tomar las observaciones del comunicado 2024-486-RIO-3486 de fecha 27 de noviembre del 2024 y aplicar las observaciones a los informes mensuales de obra 4, 5 y 6, se realiza para estos informes lo siguiente:

1. Se atienden las observaciones realizadas en el anexo enviado por la interventoría
2. Se adiciona informe sst, donde se registran las actividades del mes en esta área
3. Se adiciona las actas de comité firmadas correspondientes al periodo
4. Se adiciona formato de seguimiento a los ensayos presentados durante el mes del informe
5. Se adicionan comunicados en los informes
6. Se adiciona bitácora de obra en informe mensual 5

Se adjuntan informes mensuales 4,5 y 6 y sus anexos

Link Anexos informe 4:
https://drive.google.com/file/d/1rEJRtsOcZE6RR1zUBOOW2vMCndcFRTec/view?usp=sharing

Link Anexos informe 5:
https://drive.google.com/file/d/1WPCKr12M1dKljhvo4F4gJDRyaVSVAN7K/view?usp=sharing

Link Anexos informe 6: https://drive.google.com/file/d/1SSVTdWdBNPgtuBUTkMuF32Fl1Wl-V7Xi/view?usp=sharing

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente,

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA
C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORÓ: E.R.A

Bogotá, D.C., 13 de Marzo de 2025

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-T-096-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3223, cuyo asunto es: Respuesta al comunicado INFRH-T-033-2024 del 22 de octubre de 2024 REMISIÓN METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE REVISIÓN, APROPIACIÓN Y/O AJUSTE, Y/O ACTUALIZACIÓN, Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Observación.

Cordial Saludo;

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y en respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3223, la firma contratista Consorcio Infraestructura Riohacha, ajustó los tiempos de la fase I, en cuanto a levantamiento de información, diagnóstico del estado de la infraestructura lado aire y validación de la información existente en el Cronograma de Revisión, Apropiación y/o Ajuste, y/o Actualización, y/o Complementación de Estudios y Diseños

Se indica a la firma interventora que el Consorcio Infraestructura Riohacha cumplió con los tiempos establecidos para la Fase I del proyecto de la referencia y toda la documentación le fue entregada a ustedes como Interventoría del contrato de obra No.23001170 H4 de 2023

Se adjunta el documento Metodología de trabajo y cronograma de ejecución del componente de revisión, apropiación y/o ajuste, y/o actualización, y/o complementación de los estudios y diseños con la corrección solicitada

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente,

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA
C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORÓ: E.R.A

Bogotá, D.C., 13 de Marzo de 2025

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-T-097-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3445, cuyo asunto es: Respuesta al comunicado INFRH-T-021-2024 del 16 de septiembre de 2024 observaciones al programa de gerencia.

Cordial Saludo;

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y en respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3445, la firma contratista Consorcio Infraestructura Riohacha, atendió los requerimientos solicitados en cuanto al programa de gerencia presentado ante la firma interventora

Si bien es cierto que no se respondió mediante oficio, este programa con las correcciones solicitadas fue enviado mediante correo electrónico en fecha 11 de diciembre del 2024, se adjunta comprobante de envío del documento.

En aras de formalizar la entrega de la documentación nos permitimos enviar el documento Programa de Gerencia mediante este comunicado

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente,

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA
C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORÓ: E.R.A

PROGRAMAS

4 mensajes

infraestructurariohacha rg <infraestructurariohachadm@gmail.com> 11 de diciembre de 2024, 10:21 a.m.
Para: Inter Riohacha <inter.riohacha@incoplansa.com>, o.villareal@incoplansa.com
CC: infraestructurariohacha rg <infraestructurariohachadm@gmail.com>

Cordial Saludo
Dando alcance a lo requerido,adjunto se reenvian Programas y Planes presentados en desarrollo del contrato de obra No. 23001170 H4 de 2023

--
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023

13 archivos adjuntos

1. APROBACIÓN Plan de Seguridad Operacional.pdf
242K

1. PLAN DE SEGURIDAD OPERACIONAL PSO - AEROPUERTO RIO HACHA.pdf
2583K

3. 2024-486-RIO-2422 aprobación plan de calidad.docx.pdf
133K

2. Plan de trabajo Riohacha.pdf
688K

3. PLAN DE CALIDAD AEROPUERTO RIO HACHA.pdf
985K

4. 2024-486-RIO-2425 aprobación programa generacion empleo.docx.pdf
134K

4. PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO AEROPUERTO RIO HACHA.pdf
728K

4. FORMATO GENERACIÒN EMPLEOS AEROPUERTO RIOHACHA.pdf
728K

6. 2024-486-RIO-2488 aprobación manual sgsst.docx.pdf
136K

6. Manual SGSST AEROPUERTO RIOHAHCA.pdf
678K

7. PROGRAMA SOCIAL. V-1.pdf
634K

8. Metodologia Apropiacion Estudios y Diseños Riohacha-V1.pdf
417K

9. PMA AEROPUERTO RIOHACHA V2.pdf
1665K

infraestructurariohacha rg <infraestructurariohachadm@gmail.com> 11 de diciembre de 2024, 10:46 a.m.
Para: Inter Riohacha <inter.riohacha@incoplansa.com>, o.villareal@incoplansa.com

[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

1. ANEXO PLAN DE SEGURIDAD OPERACIONAL PSO.pdf
459K

3. ANEXOS PLAN DE CALIDAD.pdf
723K

4. ANEXO PROGRAMA GENERACIÒN EMPLEOS AEROPUERTO RIOHACHA.pdf
728K

---

infraestructurariohacha rg <infraestructurariohachadm@gmail.com> 11 de diciembre de 2024, 10:46 a.m.
Para: Inter Riohacha <inter.riohacha@incoplansa.com>, o.villareal@incoplansa.com

9. ANEXOS PMA.rar

[Texto citado oculto]

---

2 archivos adjuntos

6. ANEXO SGSST.pdf
572K

7. ANEXOS PROGRAMA SOCIAL.pdf
137K

---

infraestructurariohacha rg <infraestructurariohachadm@gmail.com> 11 de diciembre de 2024, 12:54 p.m.
Para: Inter Riohacha <inter.riohacha@incoplansa.com>, o.villareal@incoplansa.com

[Texto citado oculto]

---

2 archivos adjuntos

5. PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS AEROPUERTO RIO HACHA-1.pdf
2119K

5. ANEXOS PROGRAMA DE GERENCIA RIO HACHA.pdf
7778K

Bogotá, D.C., 13 de Marzo de 2025

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-T-098-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3448, cuyo asunto es: Respuesta al comunicado INFRH-T-008-2024 remitido al correo de la interventoría el día 16 de octubre de 2024 observaciones al programa de gestión social


Cordial Saludo;

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y en respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3448, la firma contratista Consorcio Infraestructura Riohacha, atendió los requerimientos solicitados en su momento, en cuanto al programa social presentado ante la firma interventora

En aras de formalizar la entrega de la documentación nos permitimos enviar el documento Programa de Gestión Social adjunto a este comunicado

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente,



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA
C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORÓ: E.R.A

Bogotá, D.C., 13 de Marzo de 2025

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-T-099-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3476, cuyo asunto es: Respuesta al comunicado INFRH-T-053-2024 del 19 de noviembre de 2024 observaciones al programa de gerencia. Cordial Saludo;

Cordial saludo,

El consorcio infraestructura Riohacha mediante comunicado No. INFRH-T-053-2024 entrega a la firma interventora el Informe Ejecutivo No. 03 – ESTUDIOS Y DISEÑOS

La firma interventora mediante comunicado 2024-486-RIO-3476, envía observaciones al informe ejecutivo No.3, mas no al programa de gerencia como lo indica el asunto del comunicado mencionado anteriormente.

El consorcio infraestructura Riohacha dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y en respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3476, atiende los requerimientos solicitados en dicho comunicado, adjuntando el informe ejecutivo No.3 corregido al presente comunicado.

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente,

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA
C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORÓ: E.R.A

Bogotá, D.C., 14 de Marzo de 2025

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-T-100-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3809, cuyo asunto es: Respuesta comunicado INFRH-T-065-2024 cuyo asunto es Programa De Obra – Flujo De Inversión.

Cordial saludo,

Mediante el siguiente comunicado el Consorcio Infraestructura Riohacha informa:

- El consorcio infraestructura Riohacha mediante comunicado No. INFRH-T-065-2024 entrega a la firma interventora el Programa De Obra – Flujo De Inversión del contrato de obra

- La firma interventora mediante comunicado 2024-486-RIO-3809 de fecha 08/01/2025, envía observaciones al programa de obra y flujo de inversión presentado.

- El consorcio infraestructura Riohacha mediante comunicado No. INFRH-T-084-2024 de fecha 08/02/2025 envía nuevamente a la firma interventora el Programa De Obra – Flujo De Inversión del contrato de obra

Teniendo encuenta lo anteriormente citado, el Consorcio Infraestructura Riohacha dando alcance al comunicado. No.INFRH-T-084-2024 de fecha 08/02/2025, en cumplimiento a las obligaciones contractuales y en respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3809, atiende los requerimientos solicitados en dicho comunicado, adjuntando el Programa De Obra y de Flujo De Inversión del contrato de obra corregido al presente comunicado.

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente,

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA
C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORÓ: E.R.A

Bogotá, D.C., 14 de Marzo de 2025

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-T-101-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0292, cuyo asunto es: Solicitud de informe, laboratorios, cronograma y bitácoras de obra

Cordial saludo,

El Consorcio Infraestructura Riohacha en cumplimiento a las obligaciones contractuales y en respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0292, atendió los requerimientos solicitados en dicho comunicado de la siguiente manera:

- **Informe semanal y mensual del mes de enero detallando el estado actual del proyecto, incluyendo los avances y problemas enfrentados**

  Mediante comunicado No.INFRH-T-083-2025 de fecha 8 de febrero del 2025, se radicó el INFORME MENSUAL No. 06 y se envió corrección solicitada mediante comunicado INFRH-T-095-2025

  Dentro del informe No.6 se adjuntan los informes semanales correspondientes al mes de enero del 2025, en el anexo No.14

  Así mismo se indica que los informes semanales 23, 24, 25 y 26 fueron enviados mediante el comunicado No. INFRH-T-082-2025 de fecha 05 de febrero del 2025

- **Resultados de los laboratorios realizados hasta la fecha incluyendo los análisis y las conclusiones del laboratorio de densidad.**

  Dentro del informe No.6 corregido, el cual fue enviado mediante comunicado INFRH-T-095-2025, se adjuntan los resultados de ensayos correspondientes al mes de enero del 2025, en el anexo No.4

- **Cronograma de obra sobre el cual se está trabajando hasta la fecha.**

  Mediante comunicado No. INFRH-T-100-2025, se envía cronograma de obra y flujo de inversión con las correcciones solicitadas en los comunicados descritos dentro del comunicado enviado

- **Informes de Sg-Sst del mes de enero planillas y bitácoras.**

Dentro del informe No.6 corregido, el cual fue enviado mediante comunicado INFRH-T-095-2025, se adjuntan el informe Sg-Sst y las planillas correspondientes al mes de enero del 2025, en el anexo No.15

En el anexo No.13 del informe No.6 corregido, se adjunta bitácora de obra correspondiente al mes de enero del 2025

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

C.C.	ARCHIVO
ANEXO:	LO ENUNCIADO
ELABORÓ:	E.R.A

Bogotá, D.C., 14 de Marzo de 2025

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-T-102-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0154, cuyo asunto es: Solicitud de documentos para el mes de enero.

Cordial saludo,

El Consorcio Infraestructura Riohacha en cumplimiento a las obligaciones contractuales y en respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0154, atendió los requerimientos solicitados mediante comunicado No. INFRH-T-102-2025, dando respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0292, de la siguiente manera:

- **Informe (6) detallando el estado actual del proyecto, incluyendo los avances y problemas enfrentados**
  Mediante comunicado No.INFRH-T-083-2025 de fecha 8 de febrero del 2025, se radicó el INFORME MENSUAL No. 06 y se envió corrección solicitada mediante comunicado INFRH-T-095-2025


- **Resultados de los laboratorios realizados hasta la fecha incluyendo los análisis y las conclusiones del laboratorio de densidad.**
  Dentro del informe No.6 corregido, el cual fue enviado mediante comunicado INFRH-T-095-2025, se adjuntan los resultados de ensayos correspondientes al mes de enero del 2025, en el anexo No.4

- **Cronograma de obra sobre el cual se está trabajando hasta la fecha.**
  Mediante comunicado No. INFRH-T-100-2025, se envía cronograma de obra y flujo de inversión con las correcciones solicitadas en los comunicados descritos dentro del comunicado enviado

Así mismo se indica que mediante el comunicado No.INFRH-84-2025 de fecha 08 de febrero del 2025, se había atendido solicitudes de los comunicados 2025-486-RÍO-0292 y 2025-486-RÍO-0154.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA
C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORÓ: E.R.A

Bogotá, D.C., 14 de Marzo de 2025

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-T-103-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0500, cuyo asunto es: Reiteración a Solicitud de respuesta al Comunicado 2024-486-RÍO-3486 observaciones informe mensual N° 3.

Cordial saludo,

El Consorcio Infraestructura Riohacha en cumplimiento a las obligaciones contractuales y en respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0500, informa que atendió los requerimientos solicitados en cuanto a las observaciones realizadas a los informes mensuales No.3, 4, 5 y 6, mediante los comunicados:

1. INFRH-T-095-2025, de fecha 12 de Marzo de 2025 y cuyo asunto es *"Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-0484 de fecha 20 de enero del 2025, cuyo asunto es: Solicitud de respuesta al Comunicado 2024-486-RÍO-3486 observaciones informe mensual N° 3"*

2. INFRH-T-093-2025, de fecha 10 de Marzo de 2025 y cuyo asunto es "*Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3486 – cuyo asunto es: Respuesta al COMUNICADO INFRH-T-048-2024 del 15 de noviembre de 2024 observaciones informe mensual No. 3. y COMUNICADO 2024-486-RIO-0484 de fecha 20 de enero del 2025, cuyo asunto es: Solicitud de respuesta al Comunicado 2024-486-RÍO-3486 observaciones informe mensual N° 3"*

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA
C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORÓ: E.R.A

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-AMB-003-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Reiterando respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3745, observaciones frente al plan de manejo ambiental del proyecto de mejoramiento al aeropuerto Almirante de Riohacha

Respetados señores,

En atención al oficio 2024-486-RIO-3745 recibidos el (Fecha de Recepción), mediante la cual se presentan observaciones al Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la referencia antes mencionada, nos permitimos reiterar dar respuesta a cada una de las observaciones planteadas, detallando las acciones y ajustes que se han realizado en el documento con el fin de atender los requerimientos señalados.

Observación 1: Marco legal Ambiental; verificar cuáles normas RAC son aplicables al contrato a desarrollar, citar con número y fecha de emisión de estas.

Respuesta: Se han realizado las modificaciones pertinentes en el Marco Legal, 2.5 RAC; Reglamento Aeronáutico Colombiano incorporando el reglamento que aplica para la obra con número y fecha de emisión.

Observación 2: Especificar claramente si el concreto será adquirido premezclado o elaborado en el sitio.

Respuesta: Se ha aclarado en el documento que el documento será premezclado y será comercializado por la empresa La Macuira pero que esta selección quedará sujeta

a modificaciones según las necesidades del proyecto y en caso de lo contrario se realizaran todas las gestiones ambientales pertinentes.

Observación 3. Adjuntar permiso de emisiones atmosféricas y de vertimientos, así como el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Licencia Ambiental, Titulo Minero se considera pertinente eliminar los documentos; A, C, D, E, F, y G, estos no hacen parte de la empresa en mención.

Respuesta: se adjunta en la carpeta Anexo 1. Y se eliminaron los documentos que no correspondían a la empresa Minera la Milagrosa S.A.

Observación 4: PROVEEDOR AGUA - RESIDUOS, adjuntan información relacionada con el proveedor de agua; sin embargo, en el presente numeral no se menciona dicha información. Se recomienda agregar los detalles correspondientes.

Respuesta: Para las actividades constructivas del proyecto el agua no potable se está comprando en bloque a la Empresa de Acueducto de Riohacha. Se detalla en la Ficha PMA-CIR-14. Y en cuanto a los Residuos se está en proceso de obtener el servicio con la Empresa Interaseo. Detalles en la ficha PMA-CIR-9.

Observación 5: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, dentro de los principales aspectos mencionados en la matriz, se considera pertinente tener en cuenta, la actividad; descapote de capa de tierra vegetal, como un impactos generado y por ende la respectiva evaluación.

Respuesta: se ha aclarado en el Anexo 2. Que pertenece a la Matriz de los Impactos Ambientales.

Observación 6. En la Ficha de Educación Ambiental, se reitera: Definir y enviar el cronograma de capacitaciones a realizar durante las etapas de construcción, operación y desmantelamiento del contrato, indicando los destinatarios, los temas a tratar y la periodicidad de cada capacitación.

Respuesta: se le realizó la modificación a la ficha PMA-CIR-1 Educación Ambiental.

Observación 7: Ficha del Manejo del recurso Hídrica se requiere agregar la meta y el indicador relacionados con el manejo de agua industrial. Se considera necesario presentar a la interventoría un documento que certifique, por parte de la autoridad ambiental correspondiente, que la empresa de Acueducto de Riohacha está autorizada para comercializar agua de tipo industrial.

Respuesta: Se realizó aclaratoria de todos los detalles de observación en cuanto al manejo del agua potable e industrial para las actividades de la obra en la Ficha PMA-CIR- 14.

Observación 8: Ficha **M**anejo de Recurso Hídrico – sistemas de drenaje. En cuanto a la remoción de sedimentos, se recomienda especificar la periodicidad con la que se realizará la actividad. Asimismo, con anticipación a la ejecución de la actividad, debe indicarse a la interventoría el lugar de disposición final de estos residuos.

Respuesta: Esta ficha no aplica dentro del ajuste actual del PMA ya que el sistema de drenaje del Aeropuerto se construirá nuevamente.

Observación 9: Ficha Manejo de la Fauna Citar las acciones contempladas dentro del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL PELIGRO AVIARIO, allegar el documento en mención a la interventoría.

Respuesta: se ha aclarado en el documento con respecto a la Ficha Protección a la Fauna PMA-CIR-16, que se trabajará de la mano con el grupo AVF, ya que realizan todas las actividades con relación a la fauna que pueda afectar la operación aérea.

Observación 10: Ficha Manejo Paisajístico. Se recomienda incluir un mayor nivel de detalle en las actividades relacionadas con el manejo paisajístico, especificando claramente los pasos a seguir, los recursos necesarios, materiales, especies a plantar y métodos, así como los objetivos a alcanzar en cada fase del proceso.

Respuesta: Esta ficha no aplica para las actividades del proyecto ya que la naturaleza del entorno y las condiciones del proyecto no generan impactos visuales significativos que justifiquen la implementación de dicha ficha y no es una actividad que la tenemos contractualmente contemplada y queda sujeta a cambios.

Observación 11: Ficha Manejo de Actividades de construcción y Adecuación: dentro de las acciones a desarrollar, se incluyan medidas específicas de manejo para el concreto y el asfalto, dichas medidas deben abordar aspectos como el almacenamiento, la manipulación, el transporte, y la disposición, garantizando la minimización de impactos ambientales y el cumplimiento de las normas aplicables.

De acuerdo con lo descrito en el anexo técnico de obra numeral 3, actividades por ejecutar y alcance, específicamente en el apartado; mejoramiento de la calle de rodaje existente, es necesario especificar el proveedor de la mezcla asfáltica que se utilizará para ejecutar esta actividad, así mismo, remitir la información necesaria para aprobación de la interventoría.

Respuesta: Se relacionó la información detallada en la Ficha PMA-CIR-8, que relaciona el Manejo de Materiales de Construcción. Y en la ficha PMA-CIR-10 se indicaron las medidas en cuanto a realizar un mantenimiento de algún vehículo o maquinaria.

Observación 12: En el anexo técnico de obra, numeral 3 Actividades por ejecutar y alcance, se menciona el retiro de material producto de excavación, considerando su posible reúso; sin embargo, en caso de que dicho material no pueda ser reutilizado en

su totalidad, la interventoría considera pertinente disponer de un sitio debidamente autorizado y legalizado para la disposición final de material estéril o escombros.

Respuesta: Se ha aclarado en la Ficha PMA-CIR-7 sobre el material sobrante producto de excavación y de la demolición donde se tendrá en cuenta la Res. 1257de 2021.

Observación 13: Como se mencionó en el numeral anterior, en el anexo técnico de obra, numeral 3 Actividades por ejecutar y alcance, se incluye la actividad de "Descapote de capa de tierra vegetal" entre las actuaciones previstas en el contrato, sin embargo, el PMA no presenta una ficha específica relacionada con esta actividad.

Respuesta: Se realizó la modificación y se relacionó en la ficha PMA-CIR-12 Manejo de Remoción de Cobertura Vegetal y Descapote.

Observación 14: Considerando que en la ficha PMA – CIR – 03 Gestión de residuos sólidos especiales y peligrosos se contempla la instalación de sitios de almacenamiento de residuos, la interventoría recomienda revisar y determinar si, en el desarrollo del contrato, se requieren instalaciones e infraestructuras temporales adicionales. En caso afirmativo, es pertinente incorporar en el PMA una ficha específica para la instalación y retiro de infraestructura temporal, esta ficha debe incluir medidas para prevenir daños al área involucrada y proteger la seguridad del personal en obra.

Respuesta: Se ha aclarado incorporando la Ficha PMA-CIR-2 Instalación y Operación de Campamento.

Observación 15: Teniendo en cuenta que en las fichas presentadas en el PMA no se ha incluido un presupuesto específico para cada actividad, la interventoría solicita que el contratista proporcione un desglose detallado del presupuesto para las actividades relacionadas con cada ficha. Este presupuesto debe cubrir todos los costos asociados a la implementación de las medidas de manejo y control ambiental, así como los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de las acciones propuestas en cada una de las fichas del PMA. El presupuesto debe estar estructurado en función de las actividades detalladas en cada ficha, incluyendo los costos de materiales, equipos, infraestructura temporal, recursos humanos, así como la documentación y certificaciones requeridas por la autoridad ambiental y la interventoría.

Respuesta: Con respecto a este ítem de observación se estará dando respuesta en un documento detallado en un lapso de tiempo corto, esperamos su comprensión.

Observación 16: Es fundamental destacar que, en el anexo técnico de obra, numeral 3, "Actividades por ejecutar y alcance", se detallan las actividades relacionadas con

el mejoramiento del sistema de drenaje, dentro de estas actuaciones se contempla la instalación de una; “planta separadora de hidrocarburos, prefabricada y certificada para cumplimiento de normativa colombiana para el tratamiento de aguas contaminadas”, por lo tanto, la interventoría considera pertinente que el contratista, en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), especifique si será necesario realizar toma de muestras, llevar a cabo monitoreos o gestionar la solicitud de permisos de vertimientos ante la autoridad ambiental competente. Esta información es crucial para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y asegurar el adecuado manejo de los efluentes generados durante la ejecución del proyecto.

Respuesta: esta información será detalla en un documento a parte, esperamos su comprensión.

Observación 17: El PMA del contratista debe enriquecerse con fichas de manejo a la gestión social, teniendo en cuenta que únicamente se incluyó una (contratación de mano de obra), tomando como referencia el PMA del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, incluir un programa de manejo a la gestión social bien estructurado en el PMA.

Respuesta: se tomó en cuenta la observación enriqueciendo el programa de gestión social con las fichas PMA-CIR-17, 18, 19, 20. Para contribuir a la mejora social de las actividades.

Observación 18: El contratista debe incluir un numeral específico para el programa de seguimiento y monitoreo en el PMA de acuerdo con el definido en el PMA del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, aunque el documento PMA remitido describe diferentes programas ambientales y uno social, no se encuentra un apartado dedicado exclusivamente al seguimiento y monitoreo de los programas ambientales y el social, lo cual es fundamental para garantizar la eficacia en la aplicación de las medidas ambientales y sociales presentadas.

Respuesta: El seguimiento a las fichas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) se realiza a través de inspecciones periódicas, controles documentales y la verificación en campo de las medidas implementadas. Para ello, se lleva un registro detallado del cumplimiento de cada ficha, identificando posibles desviaciones y aplicando medidas correctivas cuando sea necesario. Además, se elabora un informe de seguimiento con los resultados obtenidos, el cual es revisado por el equipo encargado de la gestión ambiental del proyecto para garantizar su correcta ejecución."

Adicionalmente, adjuntamos el documento actualizado con los ajustes pertinentes del Plan de Manejo Ambiental, en el cual se han destacado los cambios efectuados para su debida revisión y aprobación. Agradecemos su orientación y quedamos atentos a cualquier otra

observación o requerimiento adicional que sea necesario para el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

Quedamos atentos a su pronta respuesta y agradecemos su colaboración en este proceso.

Cordialmente,



ELIANA GÓMEZ SÁNCHEZ
Residente Ambiental
Consorcio Infraestructura Riohacha
Elaboró: EGS
Anexo: Documento PMA y Anexos

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
CONTRATISTA

Riohacha, D.C., 17 de marzo de 2025

Señores
Atn.CONSORCIO AIR RIO
SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal

COMUNICADO No. INFRH-AMB-004-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta a reiteración a observaciones frente al plan de manejo ambiental – COMUNICADO 2024-486-RIO-0582

Cordial Saludo;

Dando alcance al comunicado 2024-486-RÍO-0582, la firma contratista se permite informar lo siguiente:

Se realiza mesa de trabajo convocada el día 05 de Marzo a las 2:30 pm, en la cual se llevó a cabo la revisión de la **Versión 2 del Plan de Manejo Ambiental (PMA)** del proyecto en mención. Durante la sesión, se analizaron los diferentes componentes del documento, se realizaron ajustes y observaciones con el fin de fortalecer su contenido y garantizar su alineación con los requerimientos ambientales establecidos.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se programó una nueva mesa de trabajo para la revisión y presentación de la **versión definitiva del PMA**, en la cual se incorporarán las modificaciones discutidas en la reunión anterior.

Agradecemos la disposición y colaboración de los participantes en este proceso y reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
ELIANA GÓMEZ SÁNCHEZ
RESIDENTE AMBIENTAL
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO: E.G.S.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
CONTRATISTA

Riohacha, D.C., 17 de Marzo de 2025

Señores
CONSORCIO AIR RIO
Atn. SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal

COMUNICADO No. INFRH-AMB-005-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta a solicitud Informes Ambientales – COMUNICADO 2024-486-RÍO-0580

Cordial Saludo;

Dando alcance al comunicado 2024-486-RÍO-0580, la firma contratista se permite informar lo siguiente:

- De acuerdo con los requerimientos contractuales, se solicita al contratista que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la recepción de la presente comunicación, remita los informes ambientales correspondientes a los meses de febrero de 2025 (Informe 7).
  Los informes deberán incluir las gestiones y actividades ejecutadas durante los períodos mencionados, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, Numeral 12.

RTA: Mediante comunicado **INFRH-T-091-2025,** se remite INFORME MENSUAL DE OBRA No.7, periodo febrero 01 a febrero 28 de 2025
EN ANEXO 17 INFORME MENSUAL AMBIENTAL, se remites los documentos soportes dando cumplimiento a lo requerido

(SE ANEXA INFORME AMBIENTAL Y SOPORTES ANEXOS, remitidos mediante comunicado INFRH-T-091-2025)

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional relacionado con este informe.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
ELIANA GÓMEZ SÁNCHEZ
RESIDENTE AMBIENTAL
C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO: E.G.S.
v

Bogotá, D.C., 19 de Marzo de 2025

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-T-104-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0420, cuyo asunto es: Solicitud Profesional Social

Cordial saludo,

El Consorcio Infraestructura Riohacha en cumplimiento a las obligaciones contractuales y en respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0420, informa que:

En comunicado No. 2025-486-RÍO-0191 de fecha 22 de enero del 2025, cuyo asunto es: “Respuesta Comunicado INFRH-T-078-2025 del 16 de enero de 2025 cuyo asunto es: HOJA DE VIDA PROFESIONALES.” Se da aprobación a MILDREY LORENA PINILLA como profesional social del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA, así mismo se le informa a la firma interventora que se cuenta con una profesional social auxiliar, la señora Kenis Cotes, la cual esta disponible para las actividades a desarrollar dentro del contrato de obra a partir del 17 de marzo del 2025

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA
C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORÓ: E.R.A

Bogotá, D.C., 19 de Marzo de 2025

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-T-105-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta al comunicado 2025-486-RÍO-0335, cuyo asunto es: "REMITE RESPUESTA AL COMUNICADO No. INFRH-T-060-2024 CUYO OBJETO ES DISEÑO PAVIMENTO PLATAFORMA DE VIRAJE 10-28"

Cordial saludo,

El Consorcio Infraestructura Riohacha en cumplimiento a las obligaciones contractuales y en respuesta al comunicado 2025-486-RIO-0420, informa que en comunicado No. INFRH-T-093-2025 de fecha 12 de marzo del 2025, cuyo asunto es: RESPUESTA AL COMUNICADO No. INFRH-T-086-2025 CUYO OBJETO ES DISEÑO PAVIMENTO PLATAFORMA DE VIRAJE 10-28.– Comunicado 2024-486-RÍO-0620, se da respuesta a observaciones solicitadas en cuanto al diseño de los pavimentos de las plataformas de viraje 10 y 28

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA
C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORÓ: E.R.A

Riohacha, 19 de marzo de 2025.

CIR-T-024

Doctora
María Geiner Prada Guzmán
Gerente Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha

Referencia: Contrato de obra No. 23001170 H4 de 2023. Realizar el mejoramiento de las plataformas de viraje, franjas de seguridad, sistema de drenaje; y mejoramiento y construcción de calles de rodaje del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF).

Cordial saludo,

Con el fin de realizar el trámite del Permiso Aeroportuario del personal que trabajará durante la ejecución del Contrato de la referencia, adjunto se remiten los documentos de las siguientes personas:

NOMBRE	C.C.	CARGO	PERMANENCIA
Elsa María Rueda Landinez	37.934.541	Coordinadora Técnica	1 año
Kenis Yojana Cotes Suarez	40.938.773	Profesional Social	1 año

De antemano agradecemos su atención y colaboración para realizar este trámite.

Atentamente,

Juan Carlos Pérez Rosales
Ingeniero Residente de Obra
Consorcio Infraestructura Riohacha

Bogotá, D.C., 19 de Marzo de 2025

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-T-106-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta al comunicado 2025-486-RÍO-0113, cuyo asunto es: "Solicitud de laboratorios del mes de diciembre."

Cordial saludo,

El Consorcio Infraestructura Riohacha en cumplimiento a las obligaciones contractuales y dando alcance al comunicado 2025-486-RIO-0113 adjunta a este comunicado:

1. Informe Mensual No.5, el cual incluye anexos los ensayos del mes de diciembre del 2024
2. En el Anexo No.15 se presentan los ensayos correspondientes

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA
C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORÓ: E.R.A

Bogotá, D.C., 21 de Marzo de 2025

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-AMB-008-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta a los Comunicados No.2024-486-RIO-0587 cuyo asunto es "Observaciones Informe Ambiental 6", 2024-486-RIO-0669 cuyo asunto es "Observaciones Informe Ambiental No. 7" y 2024-486-RIO-0733, cuyo asunto es "Reiteración Observaciones Informe Ambiental No. 6 y 7"

Respetados señores,

El Consorcio Infraestructura Riohacha en cumplimiento a las obligaciones contractuales y dando alcance a los comunicados antes mencionados, en la cual se tienen observaciones a los **Informes 6 y 7**, nos permitimos dar respuesta a cada una de ellas, con el fin de atender los requerimientos y garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos.

A continuación, se detallan las observaciones reiteradas al informe 6 y las acciones tomadas para su ajuste:

1. **Observación 1:** Programas del Plan de Manejo Ambiental, revisar cuales otras fichas aplican para la obra
    - **Acción tomada:** Las fichas quedaran sujetas a modificación en el ajuste del PMA para su aprobación.
2. **Observación 2:** Las capacitaciones deben realizarse mensualmente, justificar porque no se realizaron.
    - **Acción tomada:** la ficha se encuentra en modificación y en la elaboración del cronograma, con el fin de garantizar su correcta ejecución en los próximos periodos.
3. **Observación 3:** El agua utilizada para la humectación de las vías donde ha sido adquirida, justificar, adjuntar certificación.
    - **Acción tomada:** El consorcio se encuentra en la gestión de adquirir el certificado de la compra de agua por parte de la empresa Aqualia, luego este sea generado, será presentado.
4. **Observación 4:** Aclarar porque se requiere a la empresa la gestión de los residuos
    - **Acción tomada:** Para formalizar el proceso de la disposición de los residuos que se lleguen a generar en la obra.
5. **Observación 5:** En el área de acopio de los tanques de combustibles, hay vegetación? aclarar
    - **Acción tomada:** Es la aeronáutica quien autoriza esta área para la reserva del combustible, por lo tanto debe ser un espacio que no interfiera con la vegetación.
6. **Observación 6:** Incluir registro fotográfico de los recorridos y especies encontradas
    - **Acción tomada:** se plasmó la corrección que las especies se vieron en la zona pero estas no fue necesario realizar rescate y no hubo registro. Para los próximos periodos se implementará la ficha que quede aprobada.

A continuación, se detallan las observaciones reiteradas al informe 7 y las acciones tomadas para su ajuste:

1. **Observación 1**:Relacionar solo las actas del periodo

Acción tomada: se tomó en cuenta la corrección.

2. **Observación 2:** Seguimiento de implementación de fichas ambientales, agregar evidencias mediante anexos, registros fotográficos y soportes correspondientes, demostrar el porcentaje de avance descrito.
   Acción tomada: Para cada subprograma implementado se le realizó la corrección correspondiente, agregando para las que aplica sus anexos, registro fotográfico y su porcentaje de avance.
3. **Observación 3:** Manejo de materiales de construcción, se debe adjuntar la certificación del proveedor con el volumen utilizado en el frente de obra.
   Acción tomada: Se anexo el certificado de suministro de materiales.
4. **Observación 4:** Adjuntar copia de recibo de entrega de los RS al gestor autorizado
   Acción tomada: La obra aun no genera residuos considerables, estamos en proceso de adquirir su servicio, se anexa oficio.
5. **Observación 5:** A donde es dirigida la capa vegetal retirada, anexo
   Acción tomada: Se dispone a un lado de la franja en un tiempo no mayor a 10 días para su recolección.
6. **Observación 6:** Adjuntar certificado o acuerdo comercial con proveedor de agua uso industrial
   Acción tomada: Estamos en el proceso para que emitan la certificación correspondiente. Anexo solicitud.
7. **Observación 7:** Evidencia de revisión técnico mecánica y mantenimiento de vehículos.
   Acción tomada: se anexó la evidencia de las certificaciones técnico mecánicas.
8. **Observación 8:** Proponer indicadores del PMA
   Acción tomada: Se registra el % de los indicadores que se realizó la actividad y fueron cuantificables.

Agradecemos su revisión y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional para garantizar la validación y aprobación de los informes.

Atentamente,

ELIANA GÓMEZ SÁNCHEZ
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

C.C. ARCHIVO
ANEXOS: INFORMES 6 Y 7 AJUSTADOS, EVIDENCIAS Y SOPORTES SOLICITADOS
ELABORÓ: E.G.S

15.6 ANEXO 6 – REGISTRO FOTOGRÁFICO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº8

AIRRIO CONSORCIO

Riohacha, Guajira
Marzo de 2025

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Descargue de material franja costado norte. 3

Ilustración 2. Descapote franja de seguridad norte tercera tira. 4

Ilustración 3. Extendida de material importado franja norte. 5

Ilustración 4. Extendido de material tercera hilera costado norte en franja de seguridad. 6

Ilustración 5. Compactación y sello material extendido en franja de seguridad costado norte 7

Ilustración 6. charlas de seguridad en el trabajo personal contratista de obra. 8

Ilustración 7. Control y niveles de material extendido franja norte pista 9

Ilustración 8. limpieza de material sobrante en hombro de la pista costado norte 10

Ilustración 9. Rocería manual en canales de desagües costado norte. 11

Ilustración 10. Levantamiento topográfico de linderos lotes. 12

Ilustración 11. construcción bodega para almacenamiento de materiales. ... 13

Ilustración 12. Humectación Franja de seguridad costado norte. 14

ILUSTRACIÓN 1. DESCARGUE DE MATERIAL FRANJA COSTADO NORTE.

Descripción de la actividad: el contratista realiza la movilización del material importado desde el centro de acopio hasta su disposición y extendida sobre la franja de seguridad costado sur, bajo la supervisión de la interventoría.





ILUSTRACIÓN 2. DESCAPOTE FRANJA DE SEGURIDAD NORTE TERCERA TIRA.

Descripción de la actividad: el contratista realiza la remoción de capa vegetal y materiales orgánicos del terreno, preparando la superficie para la disposición y extendida de material importado, bajo la supervisión de la interventoría tal como se presenta en la siguiente imagen:



ILUSTRACIÓN 3. EXTENDIDA DE MATERIAL IMPORTADO FRANJA NORTE.

Descripción de la actividad: el contratista realiza la disposición y extendida de material importado, dicha disposición se ha ejecutado con el ayuda de maquinaria amarilla y volquetas, bajo la supervisión de la interventoría tal como se presenta en las siguientes imágenes:







ILUSTRACIÓN 4. EXTENDIDO DE MATERIAL TERCERA HILERA COSTADO NORTE EN FRANJA DE SEGURIDAD.

Descripción de la actividad: el contratista realiza la disposición y extendida de material importado, dicha disposición se ha ejecutado con el ayuda de maquinaria amarilla y volquetas, bajo la supervisión de la interventoría tal como se presenta en las siguientes imágenes:





ILUSTRACIÓN 5. COMPACTACIÓN Y SELLO MATERIAL EXTENDIDO EN FRANJA DE SEGURIDAD COSTADO NORTE

Descripción de la actividad: el contratista ejecuta el sellado del material importado fortaleciendo la capa granular extendida, disminuyendo la velocidad de infiltración de agua sobre la superficie, la cual en conjunto con la compactación aumenta la densidad y resistencia del material sobre las franjas de seguridad, dicha actividad se ejecuta con la ayuda de maquinaria amarilla como motoniveladora y vibro compactador, bajo la supervisión de la interventoría.





ILUSTRACIÓN 6. CHARLAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA.

Descripción de la actividad: el contratista realiza las respectivas capacitaciones e informa a los trabajadores, sobre los aspectos relevantes de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de minimizar riesgos y promover un entorno laboral seguro.



ILUSTRACIÓN 7. CONTROL Y NIVELES DE MATERIAL EXTENDIDO FRANJA NORTE PISTA

Descripción de la actividad: el contratista realiza las actividades de disposición, extendido y compactación de material de acuerdo a las coordenadas, limites, cotas, pendientes, y otros detalles relevantes establecidas en los planos, para ellos cuenta con la comisión topográfica la cual realiza el chequeo constante de las alturas del relleno, instalada bajo la supervisión de la interventoría.







ILUSTRACIÓN 8. LIMPIEZA DE MATERIAL SOBRANTE EN HOMBRO DE LA PISTA COSTADO NORTE

Descripción de la actividad: luego de la ejecución de las actividades mencionadas anteriormente el contratista realiza la respectiva limpieza manual sobre el borde la pista, al igual que la remoción de material vegetal donde la maquinaria no alcanza a llegar, bajo la supervisión de la interventoría.



ILUSTRACIÓN 9. ROCERÍA MANUAL EN CANALES DE DESAGÜES COSTADO NORTE.

Descripción de la actividad: el contratista realiza la remoción de capa vegetal y materiales orgánicos en la zona del canal costado norte paralelo a las franjas de seguridad, preparando la superficie para la disposición y extendida de material importado, bajo la supervisión de la interventoría tal como se presenta en la siguiente imagen:



ILUSTRACIÓN 10. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LINDEROS LOTES.

Descripción de la actividad: el contratista realiza la planificación y recopilación de datos mediante instrumentos de medición (estaciones totales, GPS, etc.), de acuerdo al perímetro del lote 1.



ILUSTRACIÓN 11. CONSTRUCCIÓN BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.

Descripción de la actividad: el contratista inicia la construcción de una bodega para almacenamiento e materiales.





ILUSTRACIÓN 12. HUMECTACIÓN FRANJA DE SEGURIDAD COSTADO NORTE.

Descripción de la actividad: el contratista realiza la respectiva humectación de la capa de material importando extendido controlando el contenido de humedad de la arena para garantizar la mitigación de las partículas de polvo y afectación de estos sobre comunidades aledañas al perímetro de intervención, bajo la supervisión de la interventoría.



15.7 ANEXO 7 – CRONOGRAMA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	mes 23	mes 24
						ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**																												
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	219.003,97	$ 1.223,00	$ 267.841.855,00					10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
										$ 13.392.093	13.392.093	13.392.093	$ 13.392.093	$ 13.392.093	$ 13.392.093	$ 13.392.093	$ 13.392.093	$ 13.392.093	$ 13.392.093	$ 13.392.093	$ 13.392.093	$ 13.392.093	$ 13.392.093	$ 13.392.093	$ 13.392.093	$ 13.392.093	$ 13.392.093	$ 13.392.093	$ 13.392.093
2	**MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE RODAJE EXISTENTE**																												
2.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE CARGUE	M3	1.739,00	$ 12.650,00	$ 21.998.350,00															870	870								
																				$ 10.999.175	$ 10.999.175								
2.2.1	SUBBASE GRANULAR (FAA P-154), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	663,00	$ 190.000,00	$ 125.970.000,00																332	332							
																					$ 62.985.000	$ 62.985.000							
2.2.2	BASE GRANULAR (FAA P-209), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	332,00	$ 250.000,00	$ 83.000.000,00																	166	166						
																						$ 41.500.000	$ 41.500.000						
2.3.1	LOSA EN CONCRETO (FAA P-501), SUMINSTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA	M3	564,00	$ 1.020.000,00	$ 575.280.000,00																			564					
																								$ 575.280.000					
3	**CONSTRUCCIÓN CALLE DE RODAJE BRAVO**																												
3.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE CARGUE	M3	2.385,00	$ 12.650,00	$ 30.170.250,00						1.193	1.193																	
											$ 15.085.125	$ 15.085.125																	
3.2.1	SUBBASE GRANULAR (FAA P-154), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	1.412,00	$ 190.000,00	$ 268.280.000,00							706	706																
												$ 134.140.000	$ 134.140.000																
3.2.2	BASE GRANULAR (FAA P-209), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	706,00	$ 250.000,00	$ 176.500.000,00								353	353															
													$ 88.250.000	$ 88.250.000															
3.3.1	LOSA EN CONCRETO (FAA P-501), SUMINSTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA	M3	1.201,00	$ 1.020.000,00	$ 1.225.020.000,00										1.201														
															$ 1.225.020.000														
4	**MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE - CABECERA 28**																												
4.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE CARGUE	M3	915,00	$ 12.650,00	$ 11.574.750,00								458	458															
													$ 5.787.375	$ 5.787.375															
4.2.1	SUBBASE GRANULAR (FAA P-154), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	420,00	$ 190.000,00	$ 79.800.000,00									210	210														
														$ 39.900.000	$ 39.900.000														
4.2.2	BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO (FAA P-304), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	210,00	$ 295.000,00	$ 61.950.000,00										105	105													
															$ 30.975.000	$ 30.975.000												
4.3.1	LOSA EN CONCRETO (FAA P-501), SUMINSTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA	M3	357,00	$ 1.020.000,00	$ 364.140.000,00												357												
																	$ 364.140.000												
5	**ADECUACIÓN PLATAFORMA DE VIRAJE - CABECERA 10**																												
5.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE CARGUE	M3	3.046,00	$ 12.650,00	$ 38.531.900,00													1.523	1.523										
																		$ 19.265.950	$ 19.265.950										
5.2.1	SUBBASE GRANULAR (FAA P-154), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	1.304,00	$ 190.000,00	$ 247.760.000,00														652	652									
																			$ 123.880.000	$ 123.880.000									
5.2.2	BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO (FAA P-304), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	652,00	$ 295.000,00	$ 192.340.000,00															326	326								
																				$ 96.170.000	$ 96.170.000								
5.3.1	LOSA EN CONCRETO (FAA P-501), SUMINSTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA	M3	1.108,00	$ 1.020.000,00	$ 1.130.160.000,00																	1.108							
																						$ 1.130.160.000							
6	**ADECUACIÓN FRANJA**																												
6.1	DESMONTE Y REINSTALACIÓN LUCES PAPI	UND	2,00	$ 18.561.950,00	$ 37.123.900,00								1						1										
													$ 18.561.950						$ 18.561.950										
6.2	DESCAPOTE DE CAPA DE TIERRA VEGETAL 0,30 M ESPESOR	M3	1.906,41	$ 7.759,00	$ 14.791.835,00					1.906																			
										$ 14.791.835																			
6.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE CARGUE	M3	104.455,72	$ 12.650,00	$ 1.321.364.858,00					17.409	17.409	17.409	17.409	17.409	17.409														
										$ 220.227,476	$ 220.227,476	$ 220.227,476	$ 220.227,476	$ 220.227,476	$ 220.227,476														
6.4	COMPACTACIÓN Y REFINO DE FONDO DE EXCAVACIÓN	M2	208.911,43	$ 1.724,00	$ 360.163.305,00					34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819														
										$ 60.027.218	$ 60.027.218	$ 60.027.218	$ 60.027.218	$ 60.027.218	$ 60.027.218														
6.5	RELLENOS LOCALIZADOS (EXCAVACIÓN EN SITIO)	M3	73.119,00	$ 27.250,00	$ 1.992.492.750,00					12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187														
										$ 332.082.125	$ 332.082.125	$ 332.082.125	$ 332.082.125	$ 332.082.125	$ 332.082.125														
6.6	RELLENOS LOCALIZADOS CON MATERIAL IMPORTADO	M3	92.232,42	$ 118.500,00	$ 10.929.541.770,00												15.372	15.372	15.372	15.372	15.372	15.372							
																	$ 1.821.590.295	$ 1.821.590.295	$ 1.821.590.295	$ 1.821.590.295	$ 1.821.590.295	$ 1.821.590.295							
6.7	TERRAPLÉN CON MATERIAL NUEVO	M3	41.782,29	$ 97.700,00	$ 4.082.129.733,00												6.964	6.964	6.964	6.964	6.964	6.964							
																	$ 680.354.956	$ 680.354.956	$ 680.354.956	$ 680.354.956	$ 680.354.956	$ 680.354.956							
6.8	CAPA DE TIERRA VEGETAL	M3	26.544,21	$ 11.226,00	$ 297.985.301,00																		6.636	6.636	6.636	6.636			
																							$ 74.496.325	$ 74.496.325	$ 74.496.325	$ 74.496.325			
6.9	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN Y DEPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (5 KM)	M3xKM	365.595,00	$ 1.081,00	$ 395.208.195,00					60.933	60.933	60.933	60.933	60.933	60.933														
										$ 65.868.033	$ 65.868.033	$ 65.868.033	$ 65.868.033	$ 65.868.033	$ 65.868.033														
6.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA (37 KM)	M3xKM	4.958.544,00	$ 1.040,00	$ 5.156.885.760,00												826.424	826.424	826.424	826.424	826.424	826.424							
																	$ 859.480.960	$ 859.480.960	$ 859.480.960	$ 859.480.960	$ 859.480.960	$ 859.480.960							
7	**DRENAJE**																												
7.1	**MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA DRENAJE**																												
7.1.1	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA DRENAJE CON CARGA SOBRE CAMIÓN	M3	46.986,32	$ 12.650,00	$ 594.376.948,00								3.356	3.356	3.356	3.356	3.356	3.356	3.356	3.356	3.356	3.356	3.356	3.356	3.356	3.356			
													$ 42.455.496	$ 42.455.496	$ 42.455.496	$ 42.455.496	$ 42.455.496	$ 42.455.496	$ 42.455.496	$ 42.455.496	$ 42.455.496	$ 42.455.496	$ 42.455.496	$ 42.455.496	$ 42.455.496	$ 42.455.496			
7.1.2	RELLENO DRENAJE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	29.571,57	$ 11.135,00	$ 329.279.432,00								2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112			
													$ 23.519.959	$ 23.519.959	$ 23.519.959	$ 23.519.959	$ 23.519.959	$ 23.519.959	$ 23.519.959	$ 23.519.959	$ 23.519.959	$ 23.519.959	$ 23.519.959	$ 23.519.959	$ 23.519.959	$ 23.519.959			
7.1.3	CAMA DE APOYO (ARENA DE RÍO)	M3	3.846,57	$ 107.635,00	$ 414.025.562,00								275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275			
													$ 29.573.254	$ 29.573.254	$ 29.573.254	$ 29.573.254	$ 29.573.254	$ 29.573.254	$ 29.573.254	$ 29.573.254	$ 29.573.254	$ 29.573.254	$ 29.573.254	$ 29.573.254	$ 29.573.254	$ 29.573.254			
7.2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA TANQUE TORMENTA**																												
7.2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE CARGUE	M3	14.841,99	$ 12.650,00	$ 187.751.174,00								3.710	3.710	3.710	3.710													
													$ 46.937.793	$ 46.937.793	$ 46.937.793	$ 46.937.793													
7.2.2	RELLENO TANQUE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	4.055,18	$ 11.140,00	$ 45.174.705,00																						2.028	2.028	
																											$ 22.587.353	$ 22.587.353	
7.3	**COLECTORES CANALES Y CAJAS**																												
7.3.1	COMPACTACIÓN DE EXCAVACIÓN	M	5.003,50	$ 4.598,00	$ 23.006.093,00								357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357			
													$ 1.643.292	$ 1.643.292	$ 1.643.292	$ 1.643.292	$ 1.643.292	$ 1.643.292	$ 1.643.292	$ 1.643.292	$ 1.643.292	$ 1.643.292	$ 1.643.292	$ 1.643.292	$ 1.643.292	$ 1.643.292			
7.3.2	CÁRCAMO DE CONCRETO FC=280 KG/CM2, REFORZADA CON ACERO FY=4200 KG/CM2	M	3.880,00	$ 500.000,00	$ 1.940.000.000,00											323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323		
																$ 161.666.667	$ 161.666.667	$ 161.666.667	$ 161.666.667	$ 161.666.667	$ 161.666.667	$ 161.666.667	$ 161.666.667	$ 161.666.667	$ 161.666.667	$ 161.666.667	$ 161.666.667		
7.3.3	COLECTORES DE CONCRETO 400MM (CLASE III)	M	1.027,50	$ 276.738,00	$ 284.348.295,00																				514	514			
																									$ 142.174.148	$ 142.174.148			

REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	mes 23	mes 24
						ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26
7.3.4	ACTUACIONES PRELIMINARES COLECTORES DE CONCRETO 600MM (CLASE III)	M	247,00	$ 595.174,00	$ 147.007.978,00																			247 $ 147.007.978					
7.3.5	COLECTORES DE CONCRETO 900MM (CLASE III)	M	150,00	$ 949.786,00	$ 142.467.900,00																		150 $ 142.467.900						
7.3.6	COLECTORES DE CONCRETO 1000MM (CLASE III)	M	351,50	$ 1.125.312,00	$ 395.547.168,00																	352 $ 395.547.168						
7.3.7	COLECTORES DE CONCRETO 1100MM (CLASE III)	M	650,00	$ 1.029.239,00	$ 669.005.350,00															325 $ 334.502.675	325 $ 334.502.675								
7.3.8	COLECTORES DE CONCRETO 1200MM (CLASE III)	M	848,00	$ 1.337.330,00	$ 1.134.055.840,00													424 $ 567.027.920	424 $ 567.027.920										
7.3.9	COLECTORES DE CONCRETO 1300MM (CLASE III)	M	650,00	$ 1.505.829,00	$ 978.788.850,00											325 $ 489.394.425	325 $ 489.394.425												
7.3.10	COLECTORES DE CONCRETO 1400MM (CLASE III)	M	1.079,50	$ 1.660.456,00	$ 1.792.462.252,00								360 $ 597.487.417	360 $ 597.487.417	360 $ 597.487.417														
7.3.11	TAPA/REJILLA DE FUNDICIÓN 1X1 (TIPO TRAMEX O SIMILAR NO ESTRUCTURAL)	UND	1,00	$ 1.263.940,00	$ 1.263.940,00																								1 $ 1.263.940
7.3.12	CANAL DE CONCRETO REFORZADO FC=210 KG/CM2 EJECUTADO IN SITU (BASE 1.50 M, ALTURA 0.80 M, TALUD 1H:2V, ESPESOR 0.15 M)	M	123,00	$ 657.435,00	$ 80.864.505,00																						123 $ 80.864.505		
7.3.13	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1X1 (TIPO 1)	UND	4,00	$ 6.551.044,00	$ 26.204.176,00																					4 $ 26.204.176			
7.3.14	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1,5X1,5 (TIPO 3) CON HUECO EN LA SOLERA	UND	146,00	$ 6.393.467,00	$ 933.446.182,00									10 $ 66.674.727	10 $ 66.674.727	10 $ 66.674.727	10 $ 66.674.727	10 $ 66.674.727	10 $ 66.674.727	10 $ 66.674.727	10 $ 66.674.727	10 $ 66.674.727	10 $ 66.674.727	10 $ 66.674.727	10 $ 66.674.727	10 $ 66.674.727	10 $ 66.674.727		
7.3.15	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1,5X1,5 (TIPO 2)	UND	41,00	$ 9.446.069,00	$ 387.288.829,00												10 $ 96.822.207	10 $ 96.822.207	10 $ 96.822.207	10 $ 96.822.207								
7.3.16	REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CARGA DE ROTURA 400 KN	M	3.920,00	$ 1.100.000,00	$ 4.312.000.000,00										280 $ 308.000.000	280 $ 308.000.000	280 $ 308.000.000	280 $ 308.000.000	280 $ 308.000.000	280 $ 308.000.000	280 $ 308.000.000	280 $ 308.000.000	280 $ 308.000.000	280 $ 308.000.000	280 $ 308.000.000	280 $ 308.000.000	280 $ 308.000.000		
7.3.17	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1.70X1.50 (TIPO 4) CON HUECO EN LA SOLERA	UND	34,00	$ 9.234.034,00	$ 313.957.156,00										9 $ 78.489.289	9 $ 78.489.289	9 $ 78.489.289	9 $ 78.489.289											
7.3.18	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1.70X1.70 (TIPO 5)	UND	2,00	$ 10.712.023,00	$ 21.424.046,00																								2 $ 21.424.046
7.3.19	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1.00X1.00 (TIPO 6)	UND	1,00	$ 1.783.250,00	$ 1.783.250,00																								1 $ 1.783.250
7.3.20	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 2.00X1.50 (TIPO 7)	UND	1,00	$ 8.616.101,00	$ 8.616.101,00																								1 $ 8.616.101
7.3.21	LOSA DE PROTECCIÓN DE CONCRETO FC=210 KG/CM2 ENTRE CARCAMO Y COLECTOR PARA RECUBRIMIENTOS H≤0.30 M	M3	1.232,73	$ 797.000,00	$ 982.485.810,00									88 $ 70.177.558	88 $ 70.177.558	88 $ 70.177.558	88 $ 70.177.558	88 $ 70.177.558	88 $ 70.177.558	88 $ 70.177.558	88 $ 70.177.558	88 $ 70.177.558	88 $ 70.177.558	88 $ 70.177.558	88 $ 70.177.558	88 $ 70.177.558	88 $ 70.177.558		
7.3.22	CONCRETO DE LIMPIEZA BAJO SOLERA DE CAJAS DE REGISTRO	M3	117,65	$ 546.850,00	$ 64.336.903,00								8 $ 4.595.493	8 $ 4.595.493	8 $ 4.595.493	8 $ 4.595.493	8 $ 4.595.493	8 $ 4.595.493	8 $ 4.595.493	8 $ 4.595.493	8 $ 4.595.493	8 $ 4.595.493	8 $ 4.595.493	8 $ 4.595.493	8 $ 4.595.493			
7.4	**TANQUE DE TORMENTAS IN SITU, COLUMNA DE GRAVA Y PSH**																												
7.4.1	CAMA DE APOYO (GRAVA FILTRANTE) TANQUE DE TORMENTA	M3	2.268,00	$ 142.033,00	$ 322.130.844,00											227 $ 32.213.084	227 $ 32.213.084	227 $ 32.213.084	227 $ 32.213.084	227 $ 32.213.084	227 $ 32.213.084	227 $ 32.213.084	227 $ 32.213.084	227 $ 32.213.084	227 $ 32.213.084			
7.4.2	TANQUE DE TORMENTAS MEDIANTE GEO-CELDA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS	M3	8.291,00	$ 702.000,00	$ 5.820.282.000,00												829 $ 582.028.200	829 $ 582.028.200	829 $ 582.028.200	829 $ 582.028.200	829 $ 582.028.200	829 $ 582.028.200	829 $ 582.028.200	829 $ 582.028.200	829 $ 582.028.200			
7.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE SEPARADORA DE HIDROCARBUROS	UND	1,00	$ 383.920.866,00	$ 383.920.866,00																								1 $ 383.920.866
7.4.4	CAJA ENTRADA TANQUE DE TORMENTA	UND	2,00	$ 39.806.688,00	$ 79.613.376,00																						1 $ 39.806.688	1 $ 39.806.688	
7.4.5	COLUMNAS DE GRAVA	M	3.200,00	$ 635.000,00	$ 2.032.000.000,00										320 $ 203.200.000	320 $ 203.200.000	320 $ 203.200.000	320 $ 203.200.000	320 $ 203.200.000	320 $ 203.200.000	320 $ 203.200.000	320 $ 203.200.000	320 $ 203.200.000	320 $ 203.200.000			
7.4.6	CAMA DE APOYO (ARENA DE RÍO) TANQUES DE TORMENTA	M3	227,00	$ 107.636,00	$ 24.433.372,00										23 $ 2.443.337	23 $ 2.443.337	23 $ 2.443.337	23 $ 2.443.337	23 $ 2.443.337	23 $ 2.443.337	23 $ 2.443.337	23 $ 2.443.337	23 $ 2.443.337	23 $ 2.443.337			
7.4.7	CAJA DE INSPECCION TANQUE GEOCELDAS	UND	12,00	$ 5.336.124,00	$ 64.033.488,00																						6 $ 32.016.744	6 $ 32.016.744	
7.5	**INSTALACIONES**																												
7.5.1	TENDIDO DE TUBERÍA BIAXIAL PVC 12"	M	108,00	$ 436.552,00	$ 47.147.616,00																						54 $ 23.573.808	54 $ 23.573.808	
7.5.2	TENDIDO DE TUBERÍA BIAXIAL PVC 18"	M	280,00	$ 900.000,00	$ 252.000.000,00																						140 $ 126.000.000	140 $ 126.000.000	
7.5.3	EXCAVACIÓN DE ZANJA CON CARGA SOBRE CAMIÓN	M3	734,49	$ 12.650,00	$ 9.291.299,00																						367 $ 4.645.649	367 $ 4.645.649	
7.5.4	CAMA DE APOYO (ARENA DE RÍO)	M3	57,76	$ 107.635,00	$ 6.216.998,00																						29 $ 3.108.499	29 $ 3.108.499	
7.5.5	RELLENO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	720,88	$ 11.135,00	$ 8.026.999,00																						360 $ 4.013.499	360 $ 4.013.499	
8	**ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS**																												
8.1.1	MEJORAMIENTO VIA PERIMETRAL, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	1.583,30	$ 68.584,00	$ 108.589.047,00																							792 $ 54.294.524	792 $ 54.294.524
8.1.2	SUBBASE GRANULAR (INVIAS 320), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	2.701,30	$ 198.000,00	$ 534.857.400,00																							1.351 $ 267.428.700	1.351 $ 267.428.700
8.2.1	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3xKM	49.262,675	$ 1.518,00	$ 74.780.741,00																							24.631 $ 37.390.370	24.631 $ 37.390.370
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 55.466.297.003,00**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 706.388.779**	**$ 706.682.069**	**$ 840.822.069**	**$ 1.684.548.975**	**$ 1.708.599.311**	**$ 3.462.689.562**	**$ 1.605.351.469**	**$ 5.931.855.293**	**$ 5.664.614.738**	**$ 5.728.567.399**	**$ 5.565.383.429**	**$ 5.407.666.222**	**$ 6.533.201.540**	**$ 1.800.047.387**	**$ 2.338.367.465**	**$ 1.552.610.297**	**$ 1.546.601.389**	**$ 956.527.790**	**$ 936.257.927**	**$ 789.513.890**
	IVA SOBRE UTILIDAD			19%	$ 405.330.632,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.162.072,00	$ 5.164.215,00	$ 6.144.469,00	$ 12.310.166,00	$ 12.485.918,00	$ 25.304.270,00	$ 11.731.415,00	$ 43.348.173,00	$ 41.395.262,00	$ 41.862.608,00	$ 40.670.110,00	$ 39.517.561,00	$ 47.742.627,00	$ 13.154.192,00	$ 17.088.070,00	$ 11.345.998,00	$ 11.302.087,00	$ 6.990.011,00	$ 6.841.885,00	$ 5.769.524,00
9	**FONDO DE COMPENSACIONES**	**BMA**	**1,00**	**$ 867.219.836,00**	**$ 867.219.836,00**	$ 13.417.012,00	$ 46.959.542,00	$ 149.823.301,00	$ 326.480.625,00																				$ 330.539.356,00
				VALOR TOTAL	**$ 56.738.847.471,00**																								

REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	mes 23	mes 24
						ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26
					PROGRAMADO MENSUAL($)	$ 13.417.012	$ 46.959.542	$ 149.823.301	$ 326.480.625	$ 711.550.851	$ 711.846.284	$ 846.966.538	$ 1.696.859.141	$ 1.721.085.229	$ 3.487.993.832	$ 1.617.082.884	$ 5.975.203.466	$ 5.706.010.000	$ 5.770.430.007	$ 5.606.053.539	$ 5.447.183.783	$ 6.580.944.167	$ 1.813.201.579	$ 2.355.455.535	$ 1.563.956.295	$ 1.557.903.476	$ 963.517.801	$ 943.099.812	$ 1.125.822.770
					PROGRAMADO ACUMULADO ($)	$ 13.417.012	$ 60.376.554	$ 210.199.855	$ 536.680.480	$ 1.248.231.331	$ 1.960.077.615	$ 2.807.044.154	$ 4.503.903.295	$ 6.224.988.524	$ 9.712.982.355	$ 11.330.065.239	$ 17.305.268.706	$ 23.011.278.706	$ 28.781.708.714	$ 34.387.762.253	$ 39.834.946.036	$ 46.415.890.204	$ 48.229.091.783	$ 50.584.547.318	$ 52.148.503.613	$ 53.706.407.089	$ 54.669.924.890	$ 55.613.024.701	$ 56.738.847.471
					PROGRAMADO MENSUAL(%)	0,02%	0,08%	0,26%	0,58%	1,25%	1,25%	1,49%	2,99%	3,03%	6,15%	2,85%	10,53%	10,06%	10,17%	9,88%	9,60%	11,60%	3,20%	4,15%	2,76%	2,75%	1,70%	1,66%	1,98%
					PROGRAMADO ACUMULADO (%)	0,02%	0,11%	0,37%	0,95%	2,20%	3,45%	4,95%	7,94%	10,97%	17,12%	19,97%	30,50%	40,56%	50,73%	60,61%	70,21%	81,81%	85,00%	89,15%	91,91%	94,66%	96,35%	98,02%	100,00%

VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

SANTIAGO PAEZ TALERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

TRAZABILIDAD POR INTERVENTORIA	valor ejecutado Mensual	$ 13.417.012,00	$ 46.959.542,00	$ 149.823.301,00	$ 326.480.625,00	$ 1.439.542.701,00	$ 1.716.544.936,00	$ 2.489.467.398,00	$ 1.102.022.518,00	$ 544.009.440,00																	
	Porcentaje ejecutado mensual %	0,02%	0,08%	0,26%	0,58%	2,54%	3,03%	4,39%	1,94%	0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ejecutado acumulado Mensual	$ 13.417.012,00	$ 60.376.554,00	$ 210.199.855,00	$ 536.680.480,00	$ 1.976.223.181,00	$ 3.692.768.117,00	$ 6.182.235.515,00	$ 7.284.258.033,00	$ 7.828.267.473,00																	
	Porcentaje ejecutado Acumulado mensual %	0,02%	0,11%	0,37%	0,95%	3,48%	6,51%	10,90%	12,84%	13,80%																	
PROGRAMADO SEMANAL / MES	S01					1,80%	0,31%	0,37%	0,75%	0,76%	1,54%	0,71%	2,63%	2,51%	2,54%	2,47%	2,40%	2,90%	0,80%	1,04%	0,69%	0,69%	0,42%	0,42%	0,50%
	S02					0,13%	0,31%	0,37%	0,75%	0,76%	1,54%	0,71%	2,63%	2,51%	2,54%	2,47%	2,40%	2,90%	0,80%	1,04%	0,69%	0,69%	0,42%	0,42%	0,50%
	S03					0,13%	0,31%	0,37%	0,75%	0,76%	1,54%	0,71%	2,63%	2,51%	2,54%	2,47%	2,40%	2,90%	0,80%	1,04%	0,69%	0,69%	0,42%	0,42%	0,50%
	S04					0,13%	0,06%	0,37%	0,75%	0,76%	1,54%	0,71%	2,63%	2,51%	2,54%	2,47%	2,40%	2,90%	0,80%	1,04%	0,69%	0,69%	0,42%	0,42%	0,50%
EJECUTADO SEMANAL /MES	S01								0,00%	0,96%																	
	S02								0,02%	0,00%																	
	S03								0,98%	0,00%																	
	S04								0,94%																		
	TOTAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,20%	0,00%	0,00%	1,94%	0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

15.8 ANEXO 8 – PÓLIZAS

CONTRATISTA

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
170220	BOGOTA	11		30	400056081	2

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas		
10 / 9 / 2024	1 / 8 / 2024	00:00	31 / 1 / 2032	00:00	TRASLADO DE VIGENCIA	1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	NIT	901.831.724 - 8
DIRECCIÓN	CRA 67 NO 167 61 OF 509 , BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6014768462

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	NIT	901.831.724 - 8
DIRECCIÓN	CRA 67 NO 167 61 OF 509 , BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6014768462

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT	899.999.059 - 3	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT	899.999.059 - 3	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO No. 23001170 H4 DE 2023 , DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 23001170 H4 de 2023 ,

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/08/2024	31/05/2027	17.021.654.241.30	110.799.310,44
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/08/2024	31/01/2030	5.673.884.747.10	71.828.271,92
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	01/08/2024	31/05/2027	11.884.371.800.00	77.359.120,44
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/01/2027	31/01/2032	17.021.654.241.30	195.856.283,51
CALIDAD DEL SERVICIO	31/01/2027	31/01/2029	17.021.654.241.30	78.406.869,25

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 534.249.855,56	$ 16.100,00	$ 101.510.531,56	$ 635.776.487,14	Día - Mes - Año 06/09/2024	901831724

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 68.623.219.271,00	SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	2134	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
JDTORRES

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of: 202 / Bogotá D.C.
(601) 926 0801
3137993800
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400056081	2	BOGOTA	10 /9 /2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 1 /8 /2024	00:00 Horas del 31 /1 /2032	TRASLADO DE VIGENCIA

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	NIT	901.831.724 - 8
DIRECCIÓN	CRA 67 NO 167 61 OF 509 , BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6014768462
ASEGURADO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT	899.999.059 - 3
DIRECCIÓN	Av. Eldorado 103-15, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT	899.999.059 - 3
DIRECCIÓN	Av. Eldorado 103-15, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RG NIT: 901831724 -8 CONFORMADO POR:
INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA NIT No. 900055521-7 PART: 40%
RG INGENIERÍA SAS NIT 834000377-7 PART: 40%
IMCCA SAS NIT: 901538098-1 PART:20%

NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO Y TERMINACION TOTAL DE LA OBRA.

********** **FIN PÓLIZA** **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	635.776.487,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
06/09/2024	$ 635.776.487,14

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN SEPTIEMBRE 10 DE 2024



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400056081, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
NIT : 901.831.724 - 8
Asegurado : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT : 899.999.059 - 3

Se expide la presente certificación a los 10 días del mes de Septiembre de 2024.



_____
NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
170226	BOGOTA	11		15	400056083	3

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
10 / 9 / 2024	1 / 8 / 2024	00:00	31 / 1 / 2027	00:00	TRASLADO DE VIGENCIA	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	NIT	901.831.724 - 8
DIRECCIÓN	CRA 67 NO 167 61 OF 509 , BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6014768462

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	NIT	901.831.724 - 8	TELÉFONO	6014768462
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	2.836.942.374,00	2,836,942,374.00	2.836.942.374,00	41.158.204,51
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	2.836.942.374,00	2,836,942,374.00	2.836.942.374,00	0,00
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	2.836.942.374,00	2,836,942,374.00	2.836.942.374,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2.836.942.374,00	2,836,942,374.00	2.836.942.374,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2.836.942.374,00	2,836,942,374.00	2.836.942.374,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	15.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	15.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	15.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	15.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	15.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 41.158.204,51	$ 16.100,00	$ 7.823.117,86	$ 48.997.422,37	Día - Mes - Año 06/09/2024	901831724

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 2.836.942.374,00	DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	2134	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
JDTORRES

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400056083	3	BOGOTA	Día - Mes - Año 10 9 2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
1 8 2024	00:00	31 1 2027	00:00	TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	NIT	901.831.724 - 8
DIRECCIÓN	CRA 67 NO 167 61 OF 509 , BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6014768462

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	NIT	901.831.724 - 8	TELÉFONO	6014768462
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

ANEXO 3:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO No. 23001170 H4 DE 2023 , DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO No. 23001170 H4 DE 2023 , DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA SE ACLARA QUE LA PRESENTE AMPARA PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE): SUBLIMITE POR EVENTO $ 2,836,942,374.00 SUBLIMITE POR VIGENCIA $ 2,836,942,374.00 , SUMA ASEGURADA $ 2,836,942,374.00 , DEDUCIBLE 15.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO 23001170 H4 de 2023 , CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RG NIT 901.831.724-8 CONFORMADO POR:
INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA NIT No. 900055521-7 PART: 40%
RG INGENIERÍA SAS NIT 834000377-7 PART: 40%
IMCCA SAS NIT: 901538098-1 PART:20%

ASEGURADO:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RG NIT 901.831.724-8 SE TENDRA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL NIT 899.999.059 - 3 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RG NIT 901.831.724-8 EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL NIT 899.999.059 - 3

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL NIT 899.999.059 - 3, COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

*SE EXCLUYE RC TERRORISMO, AMIT, ASONADA, MOTIN, VANDALISMO, ENTRE OTROS.
* SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBURO, MERCANCÍA PELIGROSA, QUÍMICOS, PETROQUÍMICOS, ENTRE OTROS.
* SE EXCLUYE CUALQUIER RECLAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DERIVAS DE LAS ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y O DEPOSITO.
* DAÑOS A AERONAVES Y O EMBARCACIONES

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400056083	3	BOGOTA	Día - Mes - Año 10 9 2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
1 8 2024	00:00	31 1 2027	00:00	TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	NIT	901.831.724 - 8
DIRECCIÓN	CRA 67 NO 167 61 OF 509 , BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6014768462

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	NIT	901.831.724 - 8	TELÉFONO	6014768462
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

* SE EXCLUYE LA RC AVIACIÓN
* DAÑOS A, PÉRDIDA O HURTO DE CUALQUIER TIPO DE AERONAVES, SUS PASAJEROS O CARGA, SUS PARTES O APARATOS DESTINADOS A LA REGULACIÓN DEL TRÁFICO AÉREO.
* DAÑOS AL SOFTWARE DE AERONAVEGACIÓN.
* DAÑOS CAUSADOS FUERA DEL TERRITORIO AMPARADO

********** **FIN PÓLIZA** **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400056083

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	48.997.422,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
06/09/2024	$ 48.997.422,37

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN SEPTIEMBRE 10 DE 2.024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Aumentar el contraste 27 UTC -5 18:33:46 CONSORCIO INFRAES...
Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por JANETH DAYANES POLANIAS SOTO 05-07-2024 16:21

Id de la garantía	CO1.WRT.14520448
Referencia de la garantía	POLIZAS DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO CS INF RIOHACHA
Estado	Aceptado
Justificación	☑ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ☑ Cumplimiento - Pago de salarios ☑ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra ☑ Cumplimiento - Calidad del servicio ☑ Responsabilidad civil extra contractual
Tipo de garantía	◉ Contrato de seguro ○ Patrimonio autónomo ○ Garantía bancaria
Entidad aseguradora	LA NACIONAL DE SEGUROS
Número de póliza	CUMPLIMIENTO 400056081 y RCE 400056083 ANEXO 1
Tomador	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Beneficiario	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	11,884,371,800.00 COP	3/30/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	17,021,654,241.30 COP	3/30/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

lotes, grupos o etapas ○ Sí ◉ No

Seriedad de la oferta ◉ Sí ○ No

◉ No. de SMMLV 10

Cumplimiento ◉ Sí ○ No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

◉ % del anticipo	100.00	Fecha de vigencia (desde)	5/23/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/30/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

◉ % del valor del contrato	30.000000	Fecha de vigencia (desde)	5/23/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/30/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

◉ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	5/23/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/30/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra

◉ % del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	8/30/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/30/2031 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

◉ % del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	6/20/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/30/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ◉ Sí ○ No

◉ % del valor de la oferta 5.00

5/24/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 22 horas de tiempo transcurrido *(7/4/2024 7:36:22 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Fecha límite para entrega de garantías:

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle

DETALLE DE LA GARANTÍA

Configu

Condic

Comen

Anexos

Descripción
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 103 - 15
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 103 - 15
Código postal 11001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA	COLOMBIA > La Guajira > Riohacha

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colom 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por JANETH DAYANES POLANIAS SOTO 13-09-2024 09:15

Id de la garantía CO1.WRT.15149404

Referencia de la garantía POLIZAS SEGUN ACTA DE INICIO

Estado Aceptado

Justificación
- [x] Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio
- [x] Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora NACIONAL DE SEGUROS

Número de póliza CUMPLIMIENTO 400056081 ANEXO 2 Y RCE 400056083 ANEXO 3

Tomador CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

Beneficiario UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	11,884,371,800.00 COP	5/31/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	17,021,654,241.30 COP	5/31/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima,*

El contrato puede ser prorrogado ( ) Sí ( ) No

Configuración financiera - Garantías

blank

DETALLE DE LA GARANTÍA

X

ɜ, Lima, Quito)

ıta, Lima, Quito)

ɜ, Lima, Quito)

ıta, Lima, Quito)

ɜ, Lima, Quito)

ɜ, Lima, Quito)

ɜ, Lima, Quito)

ɜ, Lima, Quito)

ɜ, Lima, Quito)

ɜ, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

◉ Sí ○ No

◉ % del valor de la oferta 5.00

Fecha límite para entrega de garantías: 5/24/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(9/10/2024 7:31:56 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

DETALLE DE LA GARANTÍA

x

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Agregar

Plazo de pago de la factura

Comentarios

blank

Comentarios

DETALLE DE LA GARANTÍA

X

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

INTERVENTORIA

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
163438	BOGOTA	11		30	400055844	0

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas		
30 / 5 / 2024	23 / 5 / 2024	00:00	31 / 7 / 2031	00:00	EXPEDICIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO AIR RIO	NIT	901.831.775 - 3
DIRECCIÓN	CALLE 70BIS 4-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3215958

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO AIR RIO	NIT	901.831.775 - 3
DIRECCIÓN	CALLE 70BIS 4-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3215958

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT	899.999.059 - 3	TELÉFONO
BENEFICIARIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT	899.999.059 - 3	TELÉFONO

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO 23001282 H3 DE 2023 , CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/05/2024	30/11/2026	2.317.452.501.00	11.695.198,65
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/05/2024	31/07/2029	1.544.968.334.00	16.042.273,93
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/07/2031	1.544.968.334.00	15.458.148,92

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
				Día - Mes - Año	
$ 43.195.621,50	$ 16.100,00	$ 8.210.227,08	$ 51.421.948,58	31/05/2024	901831775

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 5.407.389.169,00	CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA	40191	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
APAEZ

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400055844	0	BOGOTA	30 /5 /2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 23 /5 /2024	00:00 Horas del 31 /7 /2031	EXPEDICIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO AIR RIO	NIT	901.831.775 - 3
DIRECCIÓN	CALLE 70BIS 4-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3215958
ASEGURADO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT	899.999.059 - 3
DIRECCIÓN	Av. Eldorado 103-15, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	
BENEFICIARIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT	899.999.059 - 3
DIRECCIÓN	Av. Eldorado 103-15, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	

EL CONSORCIO AIR RIO ESTA CONFORMADO POR:
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A - INCOPLAN SA Nit. 800097991-2 PART.90%
INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S NIT. 901115174-6 PART.10%

********** **FIN PÓLIZA** **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	51.421.949,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
31/05/2024	$ 51.421.948,58

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN MAYO 30 DE 2024



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400055844, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO AIR RIO
NIT : 901.831.775 - 3
Asegurado : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT : 899.999.059 - 3

Se expide la presente certificación a los 30 días del mes de Mayo de 2024.

Cordialmente,



_____
NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
163431	BOGOTA	11		15	400055837	0

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
30 / 5 / 2024	23 / 5 / 2024	00:00	31 / 7 / 2026	00:00	EXPEDICIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO AIR RIO	NIT	901.831.775 - 3
DIRECCIÓN	CALLE 70BIS 4-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3215958

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO AIR RIO	NIT	901.831.775 - 3	TELÉFONO	3215958
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	650.000.000,00	650,000,000.00	650.000.000,00	3.414.904,11
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	650.000.000,00	650,000,000.00	650.000.000,00	0,00
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	650.000.000,00	650,000,000.00	650.000.000,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	650.000.000,00	650,000,000.00	650.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	650.000.000,00	650,000,000.00	650.000.000,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 10.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 10.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 10.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 10.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 3.414.904,11	$ 16.100,00	$ 651.890,78	$ 4.082.894,89	Día - Mes - Año 31/05/2024	901831775

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 650.000.000,00	SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA	40191	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
APAEZ

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400055837	0	BOGOTA	Día - Mes - Año 30 5 2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
23 5 2024	00:00	31 7 2026	00:00	EXPEDICIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO AIR RIO	NIT	901.831.775 - 3
DIRECCIÓN	CALLE 70BIS 4-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3215958

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO AIR RIO	NIT	901.831.775 - 3	TELÉFONO	3215958
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO 23001282 H3 de 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

EL CONSORCIO AIR RIO ESTA CONFORMADO POR:
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A – INCOPLAN SA Nit. 800097991-2 PART.90%
INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S NIT. 901115174-6 PART.10%

TOMADOR: CONSORCIO AIR RIO
ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - CONSORCIO AIR RIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADO Y O UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

********** **FIN PÓLIZA** **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400055837

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	4.082.895,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
31/05/2024	$ 4.082.894,89

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN MAYO 30 DE 2.024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
173436	BOGOTA	11		15	400055837	1

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
24 / 10 / 2024	1 / 8 / 2024	00:00	1 / 2 / 2027	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO AIR RIO	NIT	901.831.775 - 3
DIRECCIÓN	CALLE 70BIS 4-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3215958

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO AIR RIO	NIT	901.831.775 - 3	TELÉFONO	3215958
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	650.000.000,00	650,000,000.00	650.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	650.000.000,00	650,000,000.00	650.000.000,00	0,00
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	650.000.000,00	650,000,000.00	650.000.000,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	650.000.000,00	650,000,000.00	650.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	650.000.000,00	650,000,000.00	650.000.000,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 10.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 10.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 10.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 10.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	Día - Mes - Año 24/10/2024	901831775

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 650.000.000,00	SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA	40191	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
06/06/2014|13-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP1|D00I 13/05/2014|13-7|P|06|CL-RC-PARTICULAR-01|D00I
BUJUETA

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400055837	1	BOGOTA	Día - Mes - Año 24 10 2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
1 8 2024	00:00	1 2 2027	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO AIR RIO	NIT	901.831.775 - 3
DIRECCIÓN	CALLE 70BIS 4-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3215958

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO AIR RIO	NIT	901.831.775 - 3	TELÉFONO	3215958
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO Nº 23001282 H3 de 2023, DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO 23001282 H3 de 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

EL CONSORCIO AIR RIO ESTA CONFORMADO POR:
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A – INCOPLAN SA Nit. 800097991-2 PART.90%
INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S NIT. 901115174-6 PART.10%

TOMADOR: CONSORCIO AIR RIO
ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - CONSORCIO AIR RIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADO Y O UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

********** **FIN PÓLIZA** **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400055837

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
24/10/2024	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN OCTUBRE 24 DE 2.024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
173437	BOGOTA	11		30	400055844	1

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas		
24 / 10 / 2024	1 / 8 / 2024	00:00	1 / 2 / 2032	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO AIR RIO	NIT	901.831.775 - 3
DIRECCIÓN	CALLE 70BIS 4-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3215958

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO AIR RIO	NIT	901.831.775 - 3
DIRECCIÓN	CALLE 70BIS 4-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3215958

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT	899.999.059 - 3	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT	899.999.059 - 3	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO Nº 23001282 H3 de 2023, DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/08/2024	01/06/2027	2.317.452.501.00	0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/08/2024	01/02/2030	1.544.968.334.00	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/02/2027	01/02/2032	1.544.968.334.00	0,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
				Día - Mes - Año	
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	25/10/2024	901831775

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 5.407.389.169,00	CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA	40191	100,00			

Nacional de Seguros S.A.
01/09/2022|13-7|NT-P|05|NT-CUMP-ESTATAL5|D00I 01/04/2020|13-7|P|05|CL-CUMP-ESTATAL4|D00I
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
BUJUETA

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
173437	BOGOTA		11		30	400055844	1
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas			
24 / 10 / 2024	1 / 8 / 2024	00:00	1 / 2 / 2032	00:00	MODIFICACIÓN		2

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400055844	1	BOGOTA	24 /10 /2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 1 /8 /2024	00:00 Horas del 1 /2 /2032	MODIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO AIR RIO	NIT	901.831.775 - 3
DIRECCIÓN	CALLE 70BIS 4-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3215958
ASEGURADO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT	899.999.059 - 3
DIRECCIÓN	Av. Eldorado 103-15, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT	899.999.059 - 3
DIRECCIÓN	Av. Eldorado 103-15, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO 23001282 H3 DE 2023 , CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

EL CONSORCIO AIR RIO ESTA CONFORMADO POR:
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A - INCOPLAN SA Nit. 800097991-2 PART.90%
INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S NIT. 901115174-6 PART.10%

********** **FIN PÓLIZA** **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
25/10/2024	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN OCTUBRE 24 DE 2024



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400055844, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO AIR RIO
NIT : 901.831.775 - 3
Asegurado : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT : 899.999.059 - 3

Se expide la presente certificación a los 24 días del mes de Octubre de 2024.

Cordialmente,



_____
NACIONAL DE SEGUROS S.A.

15.9 ANEXO 9 – COPIA BITÁCORA DE OBRA

Clima: Tiempo seco

Juan Pérez
Residente de Obra

Jueves 27 de febrero de 2025

Se realizan actividades de rocería entre las abscisas 0+000 y 0+300 en la cuarta franja por el costado norte de la pista.

Se realizan actividades de humectación y compactación del material instalado entre las abscisas 0+000 y 0+500, en el costado sur de la pista.

Equipo: El mismo del día anterior

Personal: El mismo del día anterior

Clima: Tiempo seco.

Juan Pérez
Residente de Obra

Viernes 28 de febrero de 2025

Se continúa con las actividades de rocería entre las abscisas 0+300 y 0+600, en la cuarta franja por el costado norte de la pista.

Se continúa con las actividades de humectación y compactación del material instalado entre las abscisas 0+500 y 1+000, en el costado sur de la pista.

Equipo: El mismo del día anterior

Personal: El mismo del día anterior

Clima: Tiempo seco

Juan Pérez
Residente de Obra

Sábado 01 de mayo de 2025

Se continúa con las actividades de rocería entre las abscisas 0+600 y 1+000, en la cuarta franja por el

costado norte de la pista.
Se continúa con las actividades de humectación y compactación del material instalado entre las abscisas 1+000 y 1+500, en el costado sur de la pista.
Equipo: El mismo del día anterior
Personal: El mismo del día anterior
Clima: Tiempo seco

Juan Pérez
Residente de Obra

Lunes 03 de mayo de 2025

El día de hoy no se programaron actividades de obra, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto No. 011 de 2025, expedido por la Alcaldía de Riohacha, mediante el cual se declaran los días 03 y 04 de mayo como días cívicos dentro de las festividades del Carnaval de Riohacha.
Equipo: Cargador, Motoniveladora, Mezcladora, Vibrocompactador, Volquetas (3), Carrotanque, Camión NPR, Camionetas (2), Luminarias (3), RTK, Estación, Nivel, Herramienta menor.
Personal: Residente, Ing. Auxiliar, Ing. Ambiental, Profesional SST, Inspector, Operadores (4), Conductores (6), Topografo, Cadeneros (2), Maestro, Obreros (6), Vigilante.
Clima: Tiempo seco

Juan Pérez
Residente de Obra

Martes 04 de mayo de 2025

El día de hoy no se programaron actividades de obra teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto No. 011 de 2025, expedido por la Alcaldía de Riohacha, mediante el cual se declaran los días 03 y 04 de mayo como días cívicos dentro de las festividades del Carnaval de Riohacha.
Equipo: El mismo del día anterior

Personal: El mismo del día anterior
Clima: Tiempo seco

Juan Pérez
Residente de Obra

Miercoles 05 de mayo de 2025
El día de hoy no fue posible continuar con las actividades de rellenos localizados con material importado, debido a inconvenientes de carácter mecánico presentados en la planta que suministra el material importado.
Equipo: El mismo del día anterior
Personal: El mismo del día anterior
Clima: Tiempo seco

Juan Pérez
Residente de Obra

Jueves 06 de mayo de 2025
El día de hoy no fue posible continuar con las actividades de rellenos localizados con material importado, debido a inconvenientes de carácter mecánico presentados en la planta que suministra el material importado
Equipo: El mismo del día anterior
Personal: El mismo del día anterior
Clima: Tiempo seco

Juan Pérez
Residente de Obra

Viernes 07 de mayo de 2025
El día de hoy no fue posible continuar con las actividades de rellenos localizados con material importado, debido a inconvenientes de carácter mecánico presentados en la planta que suministra el material importado.
Equipo: El mismo del día anterior

Personal: El mismo del día anterior
Clima: Tiempo seco

Juan Pérez
Residente de Obra

Sábado 08 de mayo de 2025
El día de hoy no fue posible continuar con las actividades de Rellenos localizados con material importado, debido a inconvenientes de carácter mecanico presentados en la planta que suministra el material importado.
Equipo: El mismo del día anterior
Personal: El mismo del día anterior
Clima: Tiempo seco

Juan Pérez
Residente de Obra

Lunes 10 de mayo de 2025
El día de hoy no fue posible continuar con las actividades de Rellenos localizados con material importado, debido a inconvenientes de carácter mecánico presentados en la planta que suministra el material importado
Equipo: El mismo del día anterior
Personal: El mismo del día anterior
Clima: Tiempo seco

Juan Pérez
Residente de Obra

Martes 11 de mayo de 2025
El día de hoy se realizaron actividades de rocería en las franjas de pistas correspondientes a la cabecera 10.
Se realizaron 8 apiques en el área donde se construirá la Plataforma de viraje de la cabecera 10, con el fin de verificar los espesores del material existente.

Equipo: El mismo del día anterior
Personal: El mismo del día anterior
Clima: Tiempo seco

Juan Pérez
Residente de Obra

Miercoles 12 de mayo de 2025
El día de hoy se realizan otros 4 apiques en el área donde se construirá la Plataforma de viraje de la Cabecera 10, con el fin de verificar los espesores del material existente.
Se realiza el fresado de una capa de pavimento asfaltico encontrada en la cabecera 10 en el área donde se construirá la Plataforma de Viraje.
Se realiza limpieza manual de la vegetación que ha crecido sobre el material instalado en la franja del costado norte de la pista.
Equipo: El mismo del día anterior
Personal: El mismo del día anterior
Clima: Tiempo seco

Juan Pérez
Residente de Obra

Jueves 13 de mayo de 2025
El día de hoy se continúa con las actividades de Rellenos localizados con material importado entre las abscisas 04+140 y 04+300 en la tercera franja por el costado norte de la pista.
Equipo: Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Miricargador, Cavotanque, Volquetas (3), Camión NPR, Camionetas (2), Luminarias (3), RTK, Estación, Nivel, Herramienta menor.
Personal: Residente, Ingeniero Auxiliar (2), Ing Ambiental, Profesional SST, Operadores (4), Conductores

(4). Topógrafo. Cadeneros (2). Maestro. Oficiales (2). Obreros (4). Vigilante.
Clima: Tiempo seco

Juan Pérez
Residente de Obra

Viernes 14 de mayo de 2025
Se continúa con las actividades de Rellenos localizados con material importado entre las abscisas 0+300 y 0+430 en la tercera franja por el costado norte de la pista.
Equipo: El mismo del día anterior
Personal: El mismo del día anterior
Clima: Tiempo seco

Juan Pérez
Residente de Obra

Sábado 15 de mayo de 2025
Se continúa con las actividades de Rellenos localizados con material importado entre las abscisas 0+430 y 0+510 en la tercera franja por el costado norte de la pista.
Equipo: El mismo del día anterior
Personal: El mismo del día anterior
Clima: Tiempo seco

Juan Pérez
Residente de Obra

Lunes 17 de mayo de 2025
El día de hoy se continúa con las actividades de Rellenos localizados con material importado entre las abscisas 0+510 y 0+630, en la tercera franja por el costado norte de la pista.

Equipo: Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Minicargador, Carrotanque, Camionetas (2), Volquetas (3), Camión NPR, Luminarias (3), RTK, Estación, Nivel, Herramienta menor.
Personal: Residente, Ingeniero Auxiliar (2), Ing. Ambiental, Profesional SST, Profesional Social, Operadores (4) Conductores (6), Topógrafo, Cadeneros (2), Maestro, Oficiales (2), Obreros (4), Vigilante.
Clima: Tiempo seco

Juan Perez
Residente de Obra

Martes 18 de mayo de 2025
Se continúa con las actividades de Rellenos localizados con material importado entre las abscisas 0+630 y 0+720, en la tercera franja por el costado norte de la pista
Se realizan actividades de rocería en el área ubicada entre la cabecera 28 y el cerramiento perimetral.
Equipo: El mismo del día anterior
Personal: El mismo del día anterior
Clima: Tiempo seco

Juan Perez
Residente de Obra

Miércoles 19 de mayo de 2025
Se continúa con las actividades de Rellenos localizados con material importado entre las abscisas 0+720 y 0+840, en la tercera franja por el costado norte de la pista.
Equipo: El mismo del día anterior
Personal: El mismo del día anterior
Clima: Tiempo seco

Juan Perez
Residente de Obra

Jueves 20 de mayo de 2025
Se continúa con las actividades de Rellenos localizados con material importado entre las abscisas 0+840 y 0+960, en la tercera franja por el costado norte de la pista
Equipo: El mismo del día anterior
Personal: El mismo del día anterior
Clima: Tiempo seco

Juan Pérez
Residente de Obra

Viernes 21 de mayo de 2025
Se continúa con las actividades de Rellenos localizados con material importado entre las abscisas 0+960 y 1+110, en la tercera franja por el costado norte de la pista
Equipo: El mismo del día anterior
Personal: El mismo del día anterior
Clima: Tiempo seco

Juan Pérez
Residente de Obra

Sabado 22 de mayo de 2025
Se realizan actividades de roceria y limpieza manual en el área de la Manga Veleta, Luces Papi, antenas y equipos, ubicados entre las abscisas 0+150 y 0+320, en el costado norte de la pista.
Se realizan actividades de roceria en el área donde se construirá la Calle de Rodaje Bravo.
Se realiza humectación en las franjas de pista.
Equipo: El mismo del día anterior
Personal: El mismo del día anterior
Clima: Tiempo seco

Juan Pérez
Residente de Obra

Lunes 24 de mayo de 2025 (Festivo)
El día de hoy no se programaron actividades de Obra.

Juan Peíer
Residente de Obra

Martes 25 de mayo de 2025
El día de hoy se realizan actividades de roceria y limpieza manual en el área del canal de concreto ubicado entre las abscisas 1+600 y 1+700, en el costado norte de la pista
Equipo: Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mi-
cargador, Carrotanque, Volquetas (3), Camión NPR,
Luminarias (3), RTK, Estación, Nivel, Camionetas (2),
Herramienta menor.
Personal: Residente, Ingeniero Auxiliar (2), Ingeniera Ambien-
tal, Profesional SST, Profesional Social, Operadores (4),
Conductores (6), Topógrafo, Cadeneros (2), Maestro,
Oficiales (2), Obreros (4), Vigilante.
Clima: Tiempo seco

Juan Peíer
Residente de Obra

Miercoles 26 de mayo de 2025
Se continúa con las actividades de Rellenos localizados con material importado entre las abscisas 1+110 y 1+200, en la tercera franja por el costado norte de la pista.
Se realiza humectación de la franja de pista en el costado norte.
Equipo: El mismo del día anterior
Personal: El mismo del día anterior
Clima: Tiempo seco

Juan Peíer
Residente de Obra

Jueves 27 de mayo de 2025
Se continúa con las actividades de rellenos localizados con material importado entre las abscisas 1+200 y 1+350, en la tercera franja por el costado norte de la pista.
Equipo: El mismo del día anterior
Personal: El mismo del día anterior
Clima: Tiempo seco

Juan Pérez
Residente de Obra

Viernes 28 de mayo de 2025
Se continúa con las actividades de rellenos localizados con material importado entre las abscisas 1+350 y 1+500, en la tercera franja por el costado norte de la pista.
Equipo: El mismo del día anterior
Personal: El mismo del día anterior
Clima: Tiempo seco

Juan Pérez
Residente de Obra

Sábado 29 de mayo de 2025
Se continúa con las actividades de rellenos localizados con material importado entre las abscisas 1+500 y 1+620, en la tercera franja por el costado norte de la pista.
Equipo: El mismo del día anterior
Personal: El mismo del día anterior
Clima: Tiempo seco

Juan Pérez
Residente de Obra

Lunes 31 de mayo de 2025
Se continúa con las actividades de rellenos localizados con material importado entre las abscisas 1+620 y

1+760, en la tercera franja; y entre las abscisas 0+000 y 0+040, en la cuarta franja por el costado norte de la vía.

Equipo: Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mini-cargador, Carrotanque, Volquetas (3), Camión NPR, Camionetas (2), Luminarias (3), RTK, Estación, Nivel, Herramienta menor

Personal: Residente, Residente ambiental, Ing. Auxiliar (2), Profesional SST, Profesional Social, Operadores (4), Conductores (6), Topógrafo, Cadeneros (2), Maestro, Oficiales (2), Obreros (4), Vigilante.

Clima: Tiempo seco

Juan Peiry
Residente de Obra

15.10 ANEXO 10 – INFORME AMBIENTAL Y SST

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).



INFORME MENSUAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA Nº8

AIR RIO
CONSORCIO

Riohacha, Guajira

Marzo de 2025

HOJA DE CONTROL:

Contrato:	**INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).**
Cliente:	AERONAUTICA CIVIL
Referencia:	Contrato No. 23001282 H3 DE 2023
Productos:	INFORME MENSUAL No.8
Folios	Informe contiene 47 folios

RENUNCIA:

Este documento fue desarrollado por el CONSORCIO AIR RIO contemplado dentro del desarrollo del contrato de interventoría integral al mejoramiento de las plataformas de viraje, franjas de seguridad, sistema de drenaje; y mejoramiento y construcción de calles de rodaje del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF). La información contenida en este informe es de carácter estrictamente confidencial.

DATOS DEL DOCUMENTO

Título del documento	Informe Mensual No. 8
Código del documento	INF-MN-08
Revisión No.	Revisión 1

Este documento ha sido revisado y aprobado como se indica abajo. Las modificaciones realizadas se describen a continuación en el índice de modificaciones. Por favor destruir todas las revisiones previas.

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

Elaboró **Consorcio AIR RIO**	Nombre/Cargo	Diana Marcela Niño / Residente Ambiental
	Firma	
Aprobó **Consorcio AIR RIO**	Nombre/Cargo	Santiago Páez / Director de Interventoría
	Firma	

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 5
2 OBJETIVOS 6
2.1 Objetivo General 6
2.2 Objetivo Específicos 6
3 GENERALIDADES DEL PROYECTO 7
3.1 Localización 7
3.2 Características Técnicas Del Proyecto 8
4 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA. 15
4.1 Información Contractual Del Contrato De Obra 15
4.2 Información Contractual Del Contrato De Interventoría 16
4.3 Equipo Para La Gestión Ambiental 16
5 ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 17
6 GESTION AMBIENTAL IMPLEMENTADA POR EL CONTRATISTA 20
6.1 Gestión Documental 20
6.2 Informes Mensuales 21
6.3 Fichas De Manejo Ambiental 22
6.3.1 Manejo De Las Actividades Constructivas (MA) 24
6.3.2 Manejo De Tránsito Vehicular (MTV) 26
6.3.3 Manejo Del Suelo (MS) 27
6.3.4 Manejo Del Recurso Hídrico (MRH) 31
6.3.5 Manejo Del Recurso Aire (MRA) 32
7 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÒN AMBIENTAL ADELANTADA POR LA INTERVENTORIA 34
7.1 Comités Y Avances Por Compromiso 35

7.2 Inspecciones De Campo 35
7.3 Permisos, Trámites Y Licencia 37
7.4 Informes De Interventoría 38
7.5 Correspondencia 39
8 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 45
9 CONCLUSIONES 46
10 ANEXOS 47

1 INTRODUCCIÓN

Este documento se enmarca dentro del contrato No. 23001282 H3 de 2023, suscrito entre el Consorcio AIR RIO y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, mediante Concurso de Méritos Abierto, por medio del cual se designó al Consorcio AIR RIO como consultor para llevar a cabo la “INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)".

El objetivo de este informe mensual ambiental No.8 es mantener informada y actualizada a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL sobre el estado del proyecto, correspondiente al período del 1 al 31 de marzo de 2025. Este informe busca proporcionar un panorama claro de la Gestión Ambiental llevada a cabo durante el contrato y verificar el desempeño y cumplimiento del Contratista en cuanto a las actividades ambientales y sociales implementadas en la obra, con el fin de asegurar que se cumpla con la Gestión Ambiental establecida en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Presentar el estado y avance de la gestión ambiental del CONTRATO No. 23001282 H3 de 2023, suscrito entre el Consorcio AIR RIO y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, cuyo objetivo es el Proyecto "**INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"**; así como las actividades de seguimiento y control adelantadas por la Interventoría CONSORCIO AIR RIO con el fin de cumplir con los requerimientos de la Entidad contratante AEROCIVIL, durante el periodo comprendido entre 1 al 31 de marzo de 2025.

2.2 Objetivo Específicos

- Integrar la información que refleje el estado y avance de la gestión ambiental llevada a cabo durante el desarrollo del proyecto, tanto por parte de la Interventoría como del Contratista, consolidada en el Informe Mensual Ambiental correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo de 2025.

- Elaborar una breve descripción de las actividades y acciones realizadas por el Contratista con el propósito de minimizar, prevenir, mitigar y/o compensar los posibles impactos ambientales generados durante la construcción del proyecto. Estas actividades deben estar contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y cumplir con la normatividad ambiental vigente, así como con los requerimientos de la Entidad Contratante AEROCIVIL, especificados en la Guía de Manejo Ambiental.

- Presentar los mecanismos de verificación, control y seguimiento implementadas por la interventoría consorcio air rio, con el fin de cumplir con la gestión ambiental planteada por el contratista de obra infraestructura Riohacha, bajo el contrato de obra no. 23001282 h3 de 2023 y cuyo objeto es la **"INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"**

3 GENERALIDADES DEL PROYECTO

3.1 Localización

El aeropuerto Almirante Padilla se encuentra ubicado en la ciudad de Riohacha, también llamada Süchiimma, es un municipio colombiano, capital del departamento de La Guajira. Es la cabecera del municipio homónimo, el cual tiene una extensión de 3120 km², 287 009 habitantes al año 2018; está conformado por 15 corregimientos y 8 resguardos indígenas.

Está ubicada al nororiente de la Costa Atlántica colombiana, a orillas del mar caribe y en la desembocadura del Río Ranchería, formado por la Sierra Nevada de Santa Marta al occidente.

Figura 1. Localización general



Fuente: Wikipedia/Google.

3.2 Características Técnicas Del Proyecto

El alcance del proyecto implica que hay zonas del Aeropuerto en el lado aire, que requieren intervención urgente y necesaria para poder seguir prestando los servicios, entre ellos se encuentra que en las zonas de seguridad se presentan sectores en los cuales se debe ofrecer la nivelación de franjas de seguridad, mejoramiento de plataformas de viraje, y mejoramiento y construcción de calles de rodaje; también es importante realizar la construcción de canales con el fin de garantizar el óptimo drenaje de aguas lluvias en eventos de precipitación y no poner en riesgo la operación del aeropuerto por este aspecto.

Teniendo en cuenta la consecución de lo mencionado, la Aeronáutica Civil busca proyectar el proceso de contratación e intervención del aeropuerto Almirante Padilla por medio de la metodología de mejoramiento como solución a las patologías del aeropuerto y que refiere a mejoramiento de las zonas de seguridad, mejoramiento de la calle de rodaje alfa, así como la construcción de la calle de rodaje Bravo. Adicionalmente, las obras incluyen ampliación del área de cabecera 28, Mejoramiento de Plataforma de viraje cabecera 10, y, mejoramiento del sistema de drenaje, proyectando captar y disponer del agua de escorrentía bajo criterios ambientales, económicos y que generen beneficio a la comunidad.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la entidad debe propender por la seguridad operacional y la prestación eficiente de estos servicios a los usuarios, mediante inversiones acordes con las necesidades de calidad de los servicios.

Por lo anterior, la contratación del presente proyecto comprende las actividades de revisar, apropiar, ajustar, actualizar y/o complementar los Estudios y Diseños existentes de los contratos de consultoría No. 18001611 H3 - 2018 y No. 18001651 H3 - 2018; y realizar las obras de: mejoramiento de las plataformas de viraje, de las zonas de seguridad, del sistema de drenaje, y mejoramiento y construcción de las calles de rodaje, y demás obras complementarias. Cabe aclarar que en lo que corresponde a estudios y diseños, no se deberá realizar diseños fuera del objeto del presente proyecto, por lo tanto, el valor del mismo será asumido por cuenta y riesgo del contratista de obra.

Mejoramiento de Calle de Rodaje Existente (Alfa).

Trabajos de campo

- Topografía
- Estudios de suelo

Trabajos de oficina

- Diseño de pavimentos.
- Diseño geométrico.
- Diseño de señalización existente.
-

Figura 2. Mejoramiento calle de rodaje Alfa



Fuente: Google.
AJUSTADO POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Construcción de Calle de Rodaje Bravo.

Trabajos de campo

- Topografía
- Estudios de suelos

Trabajos de oficina

- Diseño de pavimentos
- Diseño geométrico.
- Diseño de Señalización.

Figura 3. Calle de Rodaje Bravo



Fuente: Google.
AJUSTADO POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Mejoramiento Plataforma de Viraje – Cabecera 28.

Trabajos de campo

- Topografía
- Estudios de suelo

Trabajos de oficina

- Diseño de pavimentos
- Diseño geométrico

Figura 4. Cabecera 28



Fuente: Google.
AJUSTADO POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Adecuación Plataforma Viraje – Cabecera 10

Trabajos de campo

- Topografía
- Estudios de suelo

Trabajos de oficina

- Diseño de pavimentos
- Diseño geométrico

Figura 5. Cabecera 10



Fuente: Google.
AJUSTADO POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

.

Adecuación Franja de Seguridad.

Trabajos de campo

- Topografía.

Trabajos de oficina

- Calculo pendiente de diseño de la zona a intervenir.
- Ajuste de cantidades de obra.

Figura 6. Franja de Seguridad



Fuente: Google.
AJUSTADO POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Construcción de nuevos Drenajes.

Trabajos de campo

- Topografía.
- Estudio de Suelos.

Trabajos de oficina

- Diseño Hidráulico
- Cálculo de caudales de diseño.
- Cálculo de precipitaciones y escorrentías que abarcan un volumen para el aeropuerto.
- Recolección de información primaria y secundaria para hacer los cálculos respectivos.

Figura 7. Localización drenajes



Fuente: Google.
AJUSTADO POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

4.1 Información Contractual Del Contrato De Obra

Las labores del contratista iniciaron el día 01 de agosto de 2024, según acta de inicio, y tienen una duración hasta el día 31 de julio de 2026.

Tabla 1. Resumen Contrato De Obra

CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 DE 2023.	
" REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIO A C A (V)""	
Constructor	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Integrantes	INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA (50%) RG INGENIERÍA SAS (40%) IMCCA SAS (20%)
Representante Legal	Gildardo Chavarro
Firma del contrato	30/05/2024
Fecha Acta de Inicio de Obra	01/08/2024
Plazo de Ejecución	HASTA EL 31/07/2026
Fecha Finalización Contrato	31/07/2026
Otrosí	No Aplica
Valor Anticipo	$11.884.371.800,00
Valor del Contrato	$56.738.847.471,00

Fuente: Contrato De Obra No. 23001170 H4 De 2023

4.2 Información Contractual Del Contrato De Interventoría

Tabla 2. Resumen Contrato De Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 23001282-H3 DE 2023.	
" REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"	
Interventor	CONSORCIO AIR-RIO
Integrantes	Incoplan S.A. (90 %) Intercsa Sucursal Colombia (10%)
Representante Legal	Santiago Páez Talero
Firma del contrato	30/05/2024
Fecha Acta de Inicio de Obra	01/08/2024
Plazo de Ejecución	hasta el 31 de julio de 2026
Fecha Finalización Contrato	31/Julio/2026
Otrosí	No Aplica
Valor Anticipo	No existe anticipo
Valor del Contrato	$ 7.724.841.670

Fuente: *Contrato De Interventoría No. 23001282-H3 De 2023*

4.3 Equipo Para La Gestión Ambiental

En la siguiente tabla se relaciona el personal del componente ambiental debidamente aprobado por la Interventoría y la supervisión, que participa en la ejecución del proyecto:

Tabla 3. Resumen Contrato De Gestión Ambiental

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	DEDICACION	CONTACTO
Diana Marcela Niño	Residente Ambiental	Consorcio Air Rio	100%	3208366240
Eliana Gómez	Residente Ambiental	Consorcio Infraestructura Riohacha	100%	3116478319

Fuente: Elaboracion propia, 2025

5 ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS EN EL PERIODO

Se presenta a continuación un resumen de las obras más relevantes ejecutadas durante el mes:

- Cargue de material importado centro de acopio hacia franjas de seguridad.
- Descargue de material importado franja de seguridad costado norte.
- Extendida de material importado y sellado franja de seguridad note de pista.
- Sellado de material importado con cilindro franja de seguridad costado norte.
- Control de material de lleno franja de seguridad norte.
- Descapote y extendida de material importado franja costado norte de pista.
- Control y nivelación de material extendido en la franja del costado norte (Comisión topografía).
- Humectación de las franjas de seguridad y zonas de recorrido de las volquetas.
- Retiro de material sobrante en hombro y pista costado norte.
- Construcción de bodega para acopiar herramientas y materiales.
- Limpieza manual del borde de pista en la franja del costado sur.

Tabla 4. Actividades Técnicas Ejecutadas

ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Topografía Se realizó la verificación del lleno extendido sobre la franja de seguridad norte con respecto a las pendientes establecidas en los planos topográficos. Adicionalmente se continua con la inspección del material importado con el cual se está realizando el lleno en las franjas de seguridad.	

ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Actividades de obra Se dio continuidad a las actividades preliminares de construcción orientadas al aseguramiento de la seguridad operacional, las cuales incluyen la adecuación de la franja de seguridad desde el borde de la pista hasta el límite exterior de las cajas de seguridad del borde de la pista. Durante este mes, dichas actividades se desarrollaron en el costado norte de la pista. Las labores realizadas incluyeron explanaciones enfocadas en la conformación de la franja de seguridad, así como la ejecución de rellenos localizados para garantizar la estabilidad y uniformidad de la misma.	 

Se realizaron actividades descargue de material franja de seguridad de costado norte, extendida del mismo con motoniveladora y sellado con vibrocompactador.	   
Se realizo la construcción de bodega para copio de herramientas y materiales.	

Fuente: Informe Mensual De Obra Interventoría No. 8

6 GESTION AMBIENTAL IMPLEMENTADA POR EL CONTRATISTA

Durante esta etapa realizan actividades de obra, toda vez que el contrato se encuentra en un proceso de Fase II. A la fecha se ejecutó la actualización del Plan De Manejo Ambiental (PMA) por parte del contratista, siendo este aprobado por la interventoría.

De acuerdo con la reunión realizada el 26 de marzo con Aerocivil, el contratista y la interventoría, se estableció que el contratista deberá realizar la justificación del cambio menor al PMA del Aeropuerto Almirante Padilla, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076, así como la presentación de un Documento PAGA para las obras del tanque de tormentas. A la fecha se ejecuto el documento de justificación de cambio menor por parte del contratista y actualmente se encuentra en espera de aprobación. Ver Anexo No. 1 acta de comité.

6.1 Gestión Documental

El contratista adelantó el trámite correspondiente ante la entidad encargada de la recolección de residuos, formalizando la solicitud para el servicio de gestión de residuos, para garantizar una adecuada disposición conforme a la normativa ambiental vigente Este procedimiento fue realizado mediante el comunicado No. INFRH-AMB-009-2025 el 21 de marzo de 2025. Ver Anexo No. 5 Manejo de residuos.

Asimismo, reiteran la solicitud dirigida a la Empresa Aqualia para que emita las certificaciones correspondientes a los periodos de febrero y marzo relativos a la compra de agua en bloque. Una vez emitidas dichas certificaciones, serán entregadas por parte del contratista. Ver anexo No.6 Manejo Del Recurso Hídrico.

6.2 Informes Mensuales

A través de la entrega de informes mensuales, el contratista mantiene actualizada a la interventoría sobre las actividades realizadas y los avances logrados en el proyecto. A continuación, se relacionan los informes mensuales ambientales presentados por el contratista.

Tabla 5. Trazabilidad Informes Ambientales Contratista

Informe	Radicado	Fecha	Estado
Informe ambiental No.6	INFRH-T-083-2025	08-02-2025	En revisión
Informe ambiental No.7	INFRH-T-091-2025	08-03-2025	En revisión
Informe ambiental No.8	INFRH-T-111-2025	09-04-2025	En atención de observaciones

Fuente: Elaboración Propia, 2025

6.3 Fichas De Manejo Ambiental

Se incluyen fichas ambientales, diseñadas como formatos específicos para el seguimiento ambiental. Estas fichas permiten monitorear y evaluar el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos durante la ejecución del proyecto.

A continuación, se detallan los formatos de seguimiento ambiental:

Tabla 6. Fichas Ambientales

PROGRAMA	CODIGO	SUBPROGRAMA	DESCRIPCIÓN
Manejo de las Actividades Constructivas (MA)	MAC-1	Educación Ambiental	PMA-CIR-1
	MAC-2	Instalación y Operación de Campamento	PMA-CIR-2
	MAC-3	Señalización en las Áreas de Construcción	PMA-CIR-3
	MAC-4	Sistema de Drenaje	NO APLICA Se construirá un sistema nuevamente, el actual desaparecerá y se manejaran las medidas pertinentes)
Manejo del Tránsito Vehicular (MTV)	MTV-1	Manejo de Maquinaria, Equipos y Vehículos	PMA-CIR-4
	MTV-2	Manejo del Ruido	PMA-CIR-5
	MTV-3	Desmantelamiento de Instalaciones Temporales y Campamentos	PMA-CIR-6
Manejo del Suelo (MS)	MS-1	Manejo y Disposición de Materiales Sobrantes	PMA-CIR-7
	MS-2	Manejo Paisajístico	NO APLICA (La naturaleza del entorno y las condiciones del proyecto no generan impactos visuales significativos que justifiquen la implementación de dicha ficha) queda sujeta a ser modificada.
	MS-3	Manejo de Materiales de Construcción	PMA-CIR-8
	MS-4	Manejo de Residuos Sólidos, Especiales y Peligrosos	PMA-CIR-9
	MS-5	Construcción y Manejo de Áreas de Almacenamiento de Combustible	PMA-CIR-10
	MS-6	Manejo de Fresado	PMA-CIR-11

	MS-7	Manejo de Remoción de Cobertura Vegetal y Descapote	PMA-CIR-12
Manejo del Recurso Hídrico (MRH)	MRH-1	Manejo de Residuos Líquidos	NO APLICA (El desarrollo del proyecto no generará vertimientos, debido a que se van a utilizar unidades sanitarias)
	MRH-2	Manejo de Escorrentía	PMA-CIR-13
	MRH-3	Manejo de la captación	NO APLICA (No se solicitará concesión de aguas, ya que se comprará en bloque a la empresa de acueducto Aqualia)
	MRH-4	Manejo de Agua Potable y para la Construcción	PMA-CIR-14
Manejo del Recurso Aire (MRA)	MRA-1	Manejo de Emisiones por Maquinaria y Polvo	PMA-CIR-15
Manejo de Fauna y Flora (MFF)	MFF-1	Protección a la Fauna	PMA-CIR-16
	MFF-2	Manejo del Aprovechamiento Forestal y Protección a la Flora	NO APLICA (No hay la necesidad de solicitar aprovechamiento forestal). NOTA: Si acorde con el desarrollo de las actividades constructivas del contrato se ve la necesidad de intervenir algún o algunos árboles o especies de flora, se implementará previamente la ficha de aprovechamiento forestal y protección a la flora.
Gestión Social	GS-1	Comunicación e Información a la Comunidad	PMA-CIR-17
	GS-2	Servicio a la Comunidad	PMA-CIR-18
	GS-3	Participación Comunitaria	PMA-CIR-19
	GS-4	Generación de Empleo	PMA-CIR-20

Elaborado: Informe Mensual Ambiental Contratista

En el marco de las obligaciones contractuales y en cumplimiento de las normativas ambientales vigentes, se presenta el seguimiento detallado de la implementación de las fichas ambientales correspondientes al proyecto en ejecución. Teniendo

como propósito evaluar el desempeño de las actividades desarrolladas por el contratista, verificar su alineación con los compromisos adquiridos y garantizar que las medidas de manejo ambiental se implementen de manera efectiva.

6.3.1 Manejo De Las Actividades Constructivas (MA)

PMA – CIR – 01 Educación Ambiental (MAC-1): El contratista llevó a cabo una charla de concientización dirigida al personal de obra, centrada en el manejo adecuado de los materiales de construcción y en la importancia de los primeros auxilios. Durante la capacitación, se instruyó a los trabajadores en prácticas relacionadas con el almacenamiento, la manipulación y la disposición correcta de los materiales, con el objetivo de minimizar riesgos ambientales y de seguridad. Ver anexo No. 2 Manejo de actividades.

Figura 8. Capacitación Ambiental



Fuente: Informe Mensual Ambiental No. 8 Contratista

Figura 9. Capacitación Ambiental



Fuente: Informe Mensual Ambiental No. 8 Contratista

PMA – CIR – 02 Instalación Y Operación De Campamento (MAC-2): Como parte del seguimiento realizado, se verificó que el contratista realizó una gestión formal ante la gerencia de Aerocivil Riohacha, que incluyó una reunión donde se presentó el plan de instalación del campamento, la ubicación de la caseta destinada al almacenamiento de materiales y herramientas, y el acta de aprobación para la zona destinada a la construcción del dique de reserva de combustible. Todo el proceso fue supervisado para garantizar el cumplimiento de las regulaciones internas y asegurar una ejecución segura y organizada de la obra. Ver anexo No. 3 Instalación Y Operación De Campamento.

PMA – CIR – 03 Señalización En Las Áreas De Construcción (MAC-3): En el seguimiento realizado, se observó que el área donde se desarrollan las actividades, específicamente en las franjas de seguridad, no puede ser completamente señalizada. Sin embargo, se verificó que existe un punto que cuenta con señales instaladas, lo cual contribuye a la seguridad en dicha zona.

Figura 10. Señalización Punto De Emergencia (Predio Aerocivil)



Fuente: Elaboración Propia, 2025

6.3.2 Manejo De Tránsito Vehicular (MTV)

PMA – CIR – 04 Manejo De Maquinaria, Equipos Y Vehículos (MTV-1): En cumplimiento de las normativas de seguridad y prevención de riesgos, se ha verificado que la maquinaria y los vehículos utilizados en la obra cuentan con la señalización reglamentaria requerida. Esta medida contribuye a la seguridad operativa dentro del área de trabajo, asegurando condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades.

Se realiza el lavado de maquinaria, equipos y vehículos se conforme a lo estipulado en los lineamientos ambientales del proyecto. Esta disposición permite minimizar la contaminación del suelo y cuerpos de agua, garantizando el cumplimiento de las regulaciones ambientales aplicables.

PMA – CIR – 05 Manejo De Ruido (MTV-2): Durante la supervisión realizada, se verificó que se mantienen las medidas de protección establecidas mediante el uso de equipos de protección personal (EPP), específicamente tapones auditivos, en los trabajadores. Asimismo, se constató que las actividades desarrolladas no implican exposición a niveles de ruido peligrosos, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral establecidas en el contrato.

6.3.3 Manejo Del Suelo (MS)

PMA – CIR – 08 Manejo De Materiales De Construcción (MS-3): En el seguimiento realizado, se verificó que la procedencia de los materiales de construcción está debidamente garantizada, Se ha verificado que La Milagrosa es la empresa encargada de suministrar el material importado requerido para la obra. Ver anexo No. 4 Manejo de materiales de construcción.

Dicho material es almacenado en un área previamente designada, asegurando que su disposición no genere afectaciones a la cobertura vegetal ni comprometa la estabilidad ambiental del sitio. No obstante, se ha identificado un incremento en la dispersión de material particulado debido a las condiciones climáticas adversas, particularmente por la presencia de fuertes vientos en la zona. Ante esta situación, se están evaluando y gestionando medidas correctivas para minimizar este impacto, como lo es la humectación diaria, garantizando el cumplimiento de los lineamientos ambientales del proyecto y la mitigación de riesgos asociados

Tabla 7. Información Fuente De Suministro De Materiales

Nombre de la Cantera	Empresa Responsable	Ubicación	Tipo de Materiales suministrados	Permisos y Licencias	Medidas Ambientales Implementadas
Majo-La Milagrosa	La Macuira Inversiones y Construcciónes S.A	A 2 Kilometros del Corregimiento de Cuestecitas-Municipio de Riohacha	Material importado para relleno, Base Granular, subbase Granular	Titulo Minero N° HJ6-08111 Licencia Ambiental del Titulo Res. N° 0001926 Modificada por Res. 0944	El transporte de materiales se realiza con protocolos adecuados. Cuenta con autorización vigente para la explotación.

Elaborado: informe mensual ambiental contratista

PMA – CIR – 09 Manejo De Residuos Sólidos, Especiales Y Peligrosos (MS-4): Como parte del seguimiento de las actividades realizadas en la obra, se observó la disposición de contenedores, los residuos son depositados en bolsas para su debida recolección.

Se realizo vinculo formal con la empresa Interaseo, empresa encargada de recolectar los residuos ordinarios y vegetales. Ver anexo No. 5 manejo de residuos. A la fecha no se han generado residuos peligrosos y especiales.

Figura 11. Punto Ecológico (Predio Aerocivil)



Fuente: Elaboración Propia, 2025

Figura 12. Punto Ecológico (Aeropuerto)



Fuente: Informe Mensual Ambiental contratista

PMA – CIR – 10 Construcción Y Manejo De Áreas De Almacenamiento De Combustible (MS-5: En el marco del seguimiento a las gestiones realizadas por el contratista, efectuó la solicitud a la Aerocivil, a través de correo electrónico, con el propósito de disponer del área destinada a la reserva de combustible en caso de requerirse durante la ejecución del proyecto, a partir de esta solicitud se realizó una reunión donde se confirma que el Consorcio Infraestructura cuenta con la aprobación de la Aeronáutica Civil (sede Riohacha) para la utilización del área asignada a la construcción de un dique, cuyas dimensiones han sido establecidas de acuerdo con la cantidad de combustible prevista para el desarrollo de la obra. Ver Anexo No. 3 Instalación Y Operación De Campamento.

Además, dentro de esta misma zona se llevarán a cabo las actividades de cambio de aceite y almacenamiento temporal del aceite usado. Este será depositado en recipientes adecuados y posteriormente gestionado por un prestador autorizado que cuente con los permisos ambientales correspondientes para su recolección y disposición final.

PMA – CIR – 12 Manejo De Remoción De Cobertura Vegetal Y Descapote (MS-7): Se ha efectuado la remoción de la cobertura vegetal, compuesta por rastrojo y pasto, empleando tanto métodos mecánicos como manuales en la zona destinada a la ampliación de la franja de seguridad y canaleta.

Durante este proceso, los residuos generados fueron trasladados y ubicados temporalmente junto al área de almacenamiento de materiales de construcción, con el propósito de facilitar su posterior recolección por parte de la empresa Interaseo ver Anexo No. 5 Manejo de residuos. Esta disposición garantiza una gestión ambiental responsable y alineada con las normativas del proyecto.

En cuanto al material proveniente del descapote, aún no se ha retirado, ya que se prevé su reutilización en un área específica de la obra, optimizando su aprovechamiento dentro del proceso constructivo.

Figura 13. Limpieza Canal De Drenaje



Fuente: Informe Mensual Ambiental No. 8 Contratista

Figura 14. Limpieza Canal De Drenaje



Fuente: Informe Mensual Ambiental No. 8 Contratista

6.3.4 Manejo Del Recurso Hídrico (MRH)

PMA – CIR – 14 Manejo De Agua Potable Y Para La Construcción (MRH-4): se realiza compra de agua potable por parte del contratista para consumo de los trabajadores.

Para el desarrollo de las actividades de obra, se adquiere agua en bloque a través de la empresa Aqualia. Por cada compra realizada, la empresa emite un ticket que incluye un número consecutivo, fecha y hora de emisión, datos del cliente, placa del vehículo transportador, volumen de agua adquirido en metros cúbicos (M^3) y el valor correspondiente.

Asimismo, Aqualia genera un certificado para el período que corresponda al informe, el cual en esta ocasión contempla los meses de febrero y marzo. Ver el anexo No. 6 Manejo del recurso hídrico.

Figura 15. Punto De Captación De Agua (Aqualia)



Fuente: Informe Mensual Ambiental No. 8 Contratista

6.3.5 Manejo Del Recurso Aire (MRA)

PMA – CIR – 15 Manejo De Emisiones Por Maquinaria Y Partículas De Polvo (MRA-1): Como parte del seguimiento realizado, se verificó que el contratista controla el mantenimiento de los vehículos mediante revisiones técnico-mecánicas asegurando su adecuado funcionamiento. Asimismo, se constató que la mitigación de las partículas de polvo se lleva a cabo mediante procesos de humectación del terreno dos veces al día, para mitigar la emisión del polvo ocasionada por las actividades, este impacto continúa siendo relevante, por lo que se están evaluando medidas complementarias para reforzar su control.

Figura 16. Humectación Franja De Seguridad



Fuente: Informe Mensual Ambiental No. 8 Contratista

Figura 17. Humectación de vía



Fuente: Informe Mensual Ambiental No. 8 Contratista

Figura 18. Humectación de vía



Fuente: Informe Mensual Ambiental No. 8 Contratista

7 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÒN AMBIENTAL ADELANTADA POR LA INTERVENTORIA

Se describen las labores de seguimiento, evaluación y supervisión llevadas a cabo por la Interventoría, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los términos de referencia y las cláusulas contractuales de la obra, así como de la normativa ambiental vigente y las directrices establecidas por la entidad contratante.

En el marco de las labores realizadas por la Interventoría Consorcio Air Rio durante el mes de marzo de 2025, relacionadas con el cumplimiento de la gestión ambiental llevada a cabo por el Contratista Consorcio Infraestructura Riohacha, se efectuará la supervisión y evaluación de las medidas y acciones implementadas. Esto con el propósito de prevenir, reducir y/o compensar los potenciales impactos que puedan surgir a lo largo de la ejecución del proyecto, siendo las actividades generales reportadas las siguientes:

- Participación en comités de seguimiento.
- Inspecciones, revisión y monitoreo de las acciones ambientales ejecutadas por el contratista en los distintos frentes de obra o zonas de trabajo.
- Revisión de los documentos contractuales remitidos por el contratista.

7.1 Comités Y Avances Por Compromiso

El 12 de marzo de 2025 se llevó a cabo un comité ambiental, entre la interventoría y el contratista, con el fin de realizar ajustes a las fichas del Plan De Manejo Ambiental (PMA), para que estos puedan ser aprobados.

El 26 de marzo se llevó a cabo una reunión con Aerocivil, el contratista y la interventoría, en la que se abordaron temas clave como la justificación del cambio menor y la presentación del Documento PAGA para el tanque de tormentas. Ver anexo No. 1 Acta de comité.

Tabla 8. Comité Ambiental

No.	Fecha de Comité	Compromisos
003	12/marzo/2025	Entrega de los ajustes de las fichas del PMA
004	26/Marzo/2025	Viernes 28 de marzo de 2025: Documento de Justificación del cambio menor de acuerdo a lo establecido en el decreto 1076
		Miércoles 2 de abril: Documento PAGA para las obras del tanque de tormentas

Fuente: Elaboración Propia, 2025

7.2 Inspecciones De Campo

En el transcurso de este periodo, se realizó por parte de la interventoría inspecciones detalladas en el frente de obra activo. Estas visitas tuvieron como objetivo principal asegurar la estricta observancia de las medidas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, tal como fueron propuestas por el Contratista Consorcio Infraestructura Riohacha, en su Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Los hallazgos y las actividades observadas durante el recorrido de inspección se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 9. Inspecciones De Campo

INSPECCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO
1. IMPACTO AMBIENTAL POR MATERIAL PARTICULADO Y ARRASTRE DE SEDIMENTOS
Se realizó un recorrido en la obra con el fin de evaluar las condiciones actuales en materia de gestión ambiental y el cumplimiento de las medidas establecidas. Se prestó especial atención al control del material particulado y al arrastre de sedimentos. Durante la inspección, se evidenció la presencia de polvo generado por la actividad de maquinaria pesada en diversas zonas de la obra. Asimismo, se verificó la implementación de medidas de control, tales como el riego y la estabilización de áreas intervenidas, con el objetivo de reducir el impacto en la calidad del aire. También se observaron zonas donde el material suelto había sido desplazado por acción del viento y el tránsito de equipos. Por ello, se emitió comunicado No. 2025-486-RÍO-0854, enviado el 27 de marzo de 2025, donde se sugirió al contratista la implementación de estrategias específicas para mitigar dichos efectos, considerando la importancia de proteger la salud de los operarios, las comunidades cercanas y el adecuado desarrollo del proyecto. Entre las medidas recomendadas, se destacó la estabilización de las áreas intervenidas para minimizar la erosión.
 

Fuente: Elaboración propia, 2025

7.3 Permisos, Trámites Y Licencia

De acuerdo con el numeral 3.7.16.1 de las especificaciones técnicas de la obra, referente a los aspectos e impactos ambientales en las actividades de obra, se establece lo siguiente:

> "(...) El contratista eberá realizar las revisiones e tipo jurí ico-ambiental en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) existente, contrastándolo con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Además, deberá llevar a cabo las gestiones ambientales correspondientes ante CORPOGUAJIRA, presentando la documentación solicitada para que esta entidad determine si es necesario mo ificar el instrumento ambiental vi e nte."

En este sentido, el Decreto 1076 de 2015 establece, en su artículo correspondiente, el listado de las obras que pueden considerarse como un cambio menor, dentro de las cuáles se encuentran algunas de las establecidas en el contrato de obra, sin embargo, es importante tener presente que el contrato también incluye la ejecución de actividades (tanque de tormentas y actividades necesarias para tal fin) en los predios contiguos al aeropuerto y que han sido adquiridos por la Aerocivil.

De acuerdo a la reunión sostenida con la Aerocivil el día 26 de marzo de 2025, se reitera al contratista sobre la necesidad de realizar el análisis y las gestiones necesarias.

7.4 Informes De Interventoría

Mediante la presentación de informes mensuales, la interventoría ha mantenido informado a la Aerocivil, de todas las actividades del componente ambiental realizadas en desarrollo del contrato, registrando allí el estado de avance que se presenta en cada uno de los componentes del proyecto. A continuación, se relacionan los informes mensuales acumulados presentados por la interventoría.

Tabla 10. Relación Informes Mensuales

INFORME	PERIODO
Informe mensual ambiental de Interventoría N.º 1	1 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024
Informe mensual ambiental de Interventoría N.º 2	1 de septiembre 2024 al 30 de septiembre de 2024
Informe mensual ambiental de interventoría N.º 3	1 de octubre 2024 al 31 de octubre de 2024
Informe mensual ambiental de interventoría N.º 4	1 de noviembre 2024 al 30 de noviembre de 2024
Informe mensual ambiental de interventoría N.º 5	1 de diciembre 2024 al 31 de diciembre de 2024
Informe mensual ambiental de interventoría N.º 6	1 de enero 2025 al 31 de enero de 2025
Informe mensual ambiental de interventoría N.º 7	1 de febrero 2025 al 28 de febrero de 2025

Fuente: Elaboración propia, 2025

7.5 Correspondencia

Durante este periodo se generó la siguiente correspondencia. Ver anexo No. 7 control correspondencia.

Tabla 11. Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	ASUNTO	FECHA DE REMISIÓN	DIRIGIDO A	ESTADO
INFRH-T-076-2025	Respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3745 Reiteración a observaciones frente al PMA del proyecto de mejoramiento al aeropuerto Almirante de Riohacha	14-01-2025	Interventoría	La interventoría respondió por medio del comunicado 2024-486-RIO-0582 el 03 de marzo de 2025
INFRH-AMB-002-2025	Respuesta – comunicado 2025-486-RIO-0428 – Solicitud Gestión y Tramites Ambientales	25-02-2025	Interventoría	La interventoría respondió por medio del comunicado 2024-486-RIO-0611 el 05 de marzo de 2025
INFRH-AMB-003-2025	Reiterando respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3745, observaciones frente al plan de manejo ambiental del proyecto de mejoramiento al aeropuerto Almirante de Riohacha	14-03-2025	Interventoría	La interventoría respondió dando aprobación al PMA mediante el comunicado 2025-486-RIO-0755 el 19 de marzo de 2025

INFRH-AMB-004-2025	Respuesta a reiteración a observaciones frente al plan de manejo ambiental comunicado No. 2024-486-RIO-0582	17-03-2025	Interventoría	Se realizo mesa de trabajo el día 12 de marzo en las instalaciones de interventoría, donde quedaron subsanas las observaciones del PMA y se aprobó el día 19 de marzo mediante el comunicado 2025-486-RIO-0755
INFRH-AMB-005-2025	Respuesta a solicitud Informes Ambientales – COMUNICADO 2024-486-RÍO-0580	17-03-2025	interventoría	La interventoría reviso lo solicitado
INFRH-AMB-008-2025	Respuesta a los Comunicados No.2024-486-RIO-0587 cuyo asunto es “Observaciones Informe Ambiental 6”, 2024-486-RIO-0669 “Observaciones Informe Ambiental No. 7” y 2024-486-RIO-0733, cuyo asunto es “Reiteraci n Observaciones Informe Ambiental No. 6 y 7”	21-03-2025	interventoría	La interventoría reviso observaciones subsanadas

INFRH-AMB-010-2025	Respuesta a comunicado 2025-486-RIO-3069 cuyo asunto es Observaciones frente al PMA del proyecto, Comunicado 2025-486-RIO-0611 cuyo asunto es Trámites y Gestiones Ambientales, Comunicado 2025-486-RIO-0428 cuyo asunto es Solicitud Gestión y Tramites Ambientales y Comunicado 2025-486-RIO-0839 cuyo asunto es reiteración Trámites y Gestiones Ambientales.	28-03-2025	Interventoría	La interventoría dio respuesta al contratista con observaciones, mediante le comunicado 2025-486-RIO-0872 el 31 de marzo de 2025

Fuente: Elaboración Propia, 2025

Tabla 12. Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	ASUNTO	FECHA DE REMISIÓN	DIRIGIDO A	ESTADO
2024-486-RIO-0580	Solicitud Informes Ambientales	03-03-2025	contratista	El contratista respondió por medio del comunicado INFRH-AMB-005-2025 el día 17-03-2025
2024-486-RIO-0582	Respuesta a COMUNICADO No. INFRH-T-076-2025 Reiteración a observaciones frente al plan de manejo ambiental	03-03-2025	Contratista	El contratista respondió por medio del comunicado INFRH-AMB-004-2025 el día 17-03-2025
2024-486-RIO-0611	Respuesta COMUNICADO No. INFRH-AMB-002-2025	05-03-2025	Contratista	El contratista dio respuesta mediante el comunicado INFRH-AMB-010-2025 el 28 de marzo de 2025
2024-486-RIO-0669	Observaciones Informe Ambiental No. 7	10-03-2025	Contratista	El contratista respondió por medio del comunicado INFRH-AMB-008-2025 el día 21-03-2025

2024-486-RIO-0733	Reiteración Observaciones Informe Ambiental No. 6 y 7	17-03-2025	Contratista	El contratista dio respuesta mediante el comunicado INFRH-AMB-008-2025 el 21 de marzo de 2025
2025-486-RIO-0755	Respuesta al comunicado No. INFRH-AMB-003-2025, aprobación del plan de manejo ambiental (PMA) para el contrato 23001170 H4 de 2023.	19-03-2025	Contratista	La interventoría dio respuesta al contratista con la aprobación del PMA enviado a través del comunicado INFRH-AMB-003-2025 el día 14 de marzo de 2025
2025-486-RIO-0758	Remisión del Plan de manejo ambiental (PMA) actualizado, para el contrato 23001170 H4 de 2023.	21-03-2025	Aerocivil	Se remitió a Aerocivil PMA actualizado.

2024-486-RIO-0839	Reiteración Trámites y Gestiones Ambientales oficio 2024-486-RIO-0611	26-03-2025	Contratista	El contratista dio respuesta mediante el comunicado INFRH-AMB-010-2025 el 28 de marzo de 2025
2025-486-RÍO-0854	Solicitud para la implementación de medidas de mitigación de impacto ambiental por material particulado y arrastre de sedimentos.	27-03-2025	Contratista	En revisión por parte del contratista
2025-486-RIO-0872	Revisión Cambio Menor. Respuesta al Comunicado No. NFRH-AMB-010-2025.	31-03-2025	Contratista	En revisión por parte del contratista

Fuente: Elaboración Propia, 2025

8 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es fundamental para garantizar el bienestar de los trabajadores y el cumplimiento de la normativa vigente. Durante el periodo de interventoría, se realizó una exhaustiva supervisión de las medidas implementadas por el contratista en materia de SST. El informe detallado de esta supervisión se adjunta a continuación en el anexo No. 9 Informe SST.

9 CONCLUSIONES

Conclusiones

Durante el periodo evaluado, se ha verificado que el contratista ha implementado diversas acciones para mitigar impactos ambientales, incluyendo medidas de control de material particulado, disposición adecuada de residuos y cumplimiento de los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Se han llevado a cabo comités y mesas de trabajo, logrando avances en la gestión de trámites ambientales y la aprobación de documentos clave, como el PMA.

Como resultado de la reunión del 26 de marzo, se definieron las responsabilidades del contratista respecto a la justificación del cambio menor al PMA y la presentación del Documento PAGA para las obras del tanque de tormentas, Actualmente, el contratista ha cumplido con la elaboración del documento de justificación del cambio menor, quedando a la espera de revisión por parte de la interventoría.

Se han identificado afectaciones ambientales, particularmente en relación con la dispersión de material particulado debido a condiciones climáticas adversas. Sin embargo, el contratista ha adoptado medidas de mitigación, como la humectación de las zonas intervenidas.

Se ha verificado la entrega periódica de informes ambientales por parte del contratista, lo que permite mantener un control adecuado sobre las actividades realizadas y garantizar la alineación con la normativa ambiental vigente.

Recomendaciones

Se sugiere fortalecer la segregación de residuos en obra y garantizar la trazabilidad de los procesos de recolección y disposición final, en coordinación con la empresa encargada.

Como interventoría continuar con inspecciones periódicas para verificar la correcta ejecución de las medidas de mitigación y asegurar que el contratista cumple con los estándares establecidos en el PMA.

Se debe garantizar que la justificación del cambio menor al PMA sea aprobada en el menor tiempo posible para evitar retrasos en la ejecución del proyecto.

10 ANEXOS

Anexo No. 1 Acta de Comité

Anexo No. 2 Manejo de las actividades

Anexo No. 3 Instalación Y Operación De Campamento

Anexo No. 4 Manejo de materiales de construcción

Anexo No. 5 Manejo de residuos

Anexo No. 6 Manejo Del Recurso Hídrico

Anexo No. 7 Control correspondencia

Anexo No. 8 Informe Ambiental Contratista

Anexo No. 9 Informe SST

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NÚMERO DE ACTA: **003**

ÁREA:	*Técnica ambiental*		**PROCESO:**	**Contrato de Obra 23001170 H4 de 2023**	
TEMA DE LA REUNIÓN:	**Comité seguimiento a las fichas del PMA**				
LUGAR:	**Oficina Consorcio Air Rio (Riohacha)**				
FECHA:	**12 marzo de 2025**	**HORA INICIO:**	**10:00 am**	**HORA FINAL:**	**11:00 am**

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

comité de seguimiento a las fichas ambientales

III. AGENDA:

Orden del Día:
PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)
1. Mesa de trabajo entre la interventoría y el contratista para la entrega de ajustes de las fichas del PMA.

IV. TEMAS A TRATAR EN LA REUNIÓN:

1. **Ajustes a las fichas del Plan de manejo ambiental.**

V. DESARROLLO.

5.1 Ajustes y modificaciones a las fichas del PMA

La ingeniera de la contratista presenta las fichas del PMA con los ajustes, comenzando por la identificación de los impactos y las medidas que se aplicarán en cada programa.
La ingeniera Diana, de la interventoría, sugiere los siguientes ajustes a las fichas presentadas:

- En las señalizaciones, aclarar que, de acuerdo con el reglamento aeronáutico, todas las intervenciones en las calles de rodaje y plataformas se realizan en horario nocturno y que no se pueden instalar señalizaciones.
- Especificar el manejo de los residuos sólidos sobrantes de la construcción, como los de excavación y los RCD. Gestionar con el área técnica las cantidades estimadas de obras

contractuales y contar con un gestor autorizado, registrado ante la corporación, como gestor de RCD. Proponer un manejo para estos residuos y determinar el porcentaje que puede ser reutilizado.

- En la ficha paisajística, se menciona que en la franja de seguridad se realiza rocería donde existe una capa vegetal. Proponer un manejo adecuado para esta capa vegetal. Además, incluir la disposición final en la ficha paisajística. Se propone que la interventoría realice seguimiento.
- En el manejo de material de construcción, agregar que, en caso de que "La Milagrosa" esté cerrada, se podrá buscar otra fuente de materiales, previa aprobación de la interventoría.
- Respecto al manejo de agua potable, adjuntar soportes de la compra de agua por bloque y solicitar un oficio al proveedor donde se certifique que está autorizado para vender agua en bloque.
- Agregar el alquiler de baños portátiles en la ficha de desmantelamiento de instalaciones temporales y campamentos. Aclarar que los residuos domésticos generados por el personal del campamento serán manejados mediante unidades portátiles y que este mismo procedimiento se aplicará en los diferentes frentes de obra. Incluir un indicador de seguimiento.

Al final de la mesa de trabajo, queda en manos de la contratista realizar los ajustes, radicar los soportes y anexos necesarios para que la interventoría emita el concepto de aprobación.
Por otro lado, la ingeniera de la interventoría mencionó que los informes 6 y 7 tienen observaciones, por lo que solicita realizar los ajustes pertinentes e incluir todas las fichas implementadas en cada periodo correspondiente de los informes.

VII PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Radicar ajustes de las fichas del PMA para aprobación por parte de la interventoría	contratista	marzo de 2025
2	Revisión de las observaciones de los informes ambientales	contratista	marzo de 2025

VII. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de Riohacha a los doce (12) días del mes de marzo del año 2025, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Diana niño	Residente ambiental de Interventoría	
Eliana Gómez	Residente ambiental de contratista	
María José Polo	Auxiliar ambiental de interventoría	

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NÚMERO DE ACTA: 004

ÁREA:	*Técnica ambiental*		**PROCESO:**	Contrato de Obra 23001170 H4 de 2023	
TEMA DE LA REUNIÓN:	Comité seguimiento a los trámites ambientales				
LUGAR:	Videoconferencia				
FECHA:	26 de marzo de 2025	**HORA INICIO:**	2:30 pm	**HORA FINAL:**	3:30 pm

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Comité de seguimiento ambiental

III. AGENDA:

Orden del Día:
PLANES DE ACCIÓN

1. El contratista deberá enviar el documento requerido para notificar a la autoridad ambiental sobre las intervenciones en el aeropuerto.
2. El contratista deberá enviar un documento PAGA que describa las actividades y los impactos ambientales relacionados con la construcción del tanque de tormentas.
3. El contratista deberá radicar Justificación del cambio menor del plan de manejo ambiental que incluya las fichas de evaluación de impactos.
4. El contratista deberá proporcionar información sobre las actividades constructivas que se realizarán en el nuevo predio adquirido por Aerocivil.
5. La interventoría deberá revisar y aprobar el documento de actividades constructivas que el contratista envíe.

IV. TEMAS A TRATAR EN LA REUNIÓN:

1. Coordinación entre el contratista, la interventoría y la autoridad ambiental
2. Requisitos y permisos necesarios para las obras en el nuevo predio adquirido por Aerocivil.

3. **Proceso de notificación a la autoridad ambiental sobre las intervenciones planificadas.**
4. **Evaluación de impactos ambientales relacionados con la construcción**

V. DESARROLLO.

Se abordaron aspectos claves relacionados con la construcción del tanque de tormentas y su alineación con el plan de manejo ambiental. Se destacó la necesidad de obtener un concepto favorable de la corporación para avanzar, asegurando que el diseño del tanque prevenga infiltraciones. Se acordó definir un plan de acción para gestionar los procedimientos ambientales requeridos y se mencionó la necesidad de solicitar un cambio menor en el plan de manejo ambiental, que será revisado por el grupo de gestión ambiental.

Se discutió la urgencia de recibir un documento del contratista para notificar a la autoridad ambiental sobre las intervenciones en el aeropuerto, enfatizando la importancia de cumplir con esta formalidad para evitar sanciones. Se propuso que el contratista envíe un documento detallando las actividades a realizar y la evaluación de impactos, contrastando estas con el plan de manejo ambiental y elaborar un informe sobre cambios menores, el cual debe ser enviado a supervisión en un plazo de cinco días hábiles, y se desarrolló un plazo para recibir la información del contratista para su revisión.

5.1 Revisión del Plan de Manejo Ambiental para la Construcción del Tanque de Tormentas

Andrés Arboleda Salazar explicó que la reunión busca definir el procedimiento ambiental necesario para la construcción del tanque de tormentas en el predio adquirido por Aerocivil. Santiago Páez Talero mencionó que se espera un concepto de Corpoguajira sobre la intervención, que debe garantizar que el tanque no cause infiltraciones. Diana Niño subrayó la importancia de establecer un plan de ruta para iniciar las obras.

5.2 Documentación y Requerimientos Ambientales para Contratos en Riohacha

Santiago Páez Talero solicitó al contratista la entrega inmediata de un documento que notifique a la autoridad ambiental sobre las obras planificadas en el aeropuerto, incluyendo la construcción de drenajes y la afectación de árboles. Diana Marcela Cagua Castillo recordó la importancia de que la ingeniera Elsa estuviera presente para informar sobre trámites previos con Corpoguajira.

5.3 Discusión sobre el Plan de Manejo Ambiental y Actividades Constructivas

Eliana Consorcio infraestructura, mencionó que se deben presentar fichas de manejo y control ambiental para las obras fuera del lote actual, indicando que no es necesario un plan de manejo

ambiental formal. Magda Lorena Aguilar sugirió que el contratista envíe un documento con las actividades y la evaluación de impactos, mientras que Andrés Arboleda destacó la necesidad de contrastar estas actividades con el plan de manejo ambiental y solicitar un documento adicional para las obras que no están cubiertas por dicho plan.

5.4 Revisión de Solicitudes y Compromisos Ambientales

La reunión abordó la solicitud del 11 de marzo relacionada con el cumplimiento de requisitos ambientales. Diana Marcela Cagua Castillo explicó que se requiere la intervención para la elaboración de un informe sobre cambios menores en el proyecto, el cual debe ser enviado a la supervisión del contrato. Se acordó que la información debe ser revisada y aprobada rápidamente para su envío a Aerocivil.

VII. Compromisos:

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Justificación del cambio menor del PMA del aeropuerto Almirante Padilla acuerdo a lo establecido en el decreto 1076.	Contratista	28 Marzo de 2025
2	El contratista deberá enviar un documento PAGA que describa las actividades y los impactos ambientales relacionados con la construcción del tanque de tormentas	Contratista	02 De abril de 2025
3	La interventoría deberá revisar y aprobar el documento de actividades constructivas que el contratista envíe	Interventoría	Abril de 2025

VII. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de Riohacha a los trece (26) días del mes de marzo del año 2025, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Santiago Páez	Representante legal/Director consorcio Air Rio	

Diana niño	Residente ambiental de Interventoría	
Oscar Villareal	Residente consorcio Air Rio	
Eliana Gómez	Residente ambiental contratista	
Juan Carlos Pérez	Residente de obra	
Andrés Arboleda	Secretario de Servicios Aeroportuarios	
Magda Lorena Aguilar	Contratista Dirección de Servicios Aeroportuarios	
Diana Marcela Cagua	Contratista Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias	
Aldemar Pinzon	Supervisor contrato de obra/ Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias	
Alba Lucia Riapira	Profesional Aeronáutico II/ Dirección General	
César Rosado	Director general Ambiental	Cesar Alberto Rosado
Gerardo Jaimes	Contratista / Secretaria de Servicios Aeroportuarios	
Katherine Luna	Contratista / Dirección General	
Maria Jose Polo	Auxiliar ambiental de interventoría	

primeros Auxilios

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	REGISTRO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	F-HSEQ-21	VERSIÓN: 03
		PÁGINA 1 DE 1	

CENTRO DE TRABAJO: AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA

FACILITADOR: Elvana Gómez Sánchez **FIRMA:**

FECHA: 22-03-2025. **DURACION: (En horas):** 15min.

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA EL TIPO DE ACTIVIDAD

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	X
CAMPAÑA		DIVULGACIÓN		PAUSA ACTIVA		OTRO	

TEMA: Manejo de Materiales de construcción y Concreto.

OBJETIVO: Tener el conocimiento del manejo de estos materiales como lo son la Subbase, mezda asfaltica. base granular - Concreto.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS)	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Victor manuel angulo	1006615156	Obrero	
2	Julio Tomas Gconin	81740284	obrero	
3	Victor Rodriguez gomez	1121296720	obrero	Victor R
4	[illegible]	84.080207	OBRERO	
5	Elis Araujo Pateraya	1118893537	[illegible]	
6	Cristian Mora	1118813605	Conductor	
7	[illegible]	1103904[illegible]	Ing. Apoyo	
8				
9				
10				
11				
12				
13				

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	REGISTRO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	F-HSEQ-21	VERSIÓN: 03
		PÁGINA 1 DE 1	

CENTRO DE TRABAJO:	AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA		
FACILITADOR:	Ing. Eliana Gomez S.	FIRMA:	
FECHA:	29-03-2025	DURACION: (En horas):	15 min.

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA EL TIPO DE ACTIVIDAD

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	X
CAMPAÑA		DIVULGACIÓN		PAUSA ACTIVA		OTRO	

TEMA: primeros Auxilios.

OBJETIVO: Tener conocimientos basicos ante una emergencia. en obra.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS)	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Julio Torres Ocampo	81740284	OBRERO	
2	Victor Rodriguez gomez	1121296720	Obrero	Victor Rodriguez
3	Jose Ceballos Martinez	84080207	OBRERO	
4	Elvis Araujo Pastrana	1118873533	Ing Aux	
5	Cristian Mora	1118883605	Conductor	
6	Victor manuel angulo	1006615156	OBRERO	
7	Hernan Rojas Hurtado	1103904/	Ing. Apoyo	
8				
9				
10				
11				
12				
13				

ACTA DE APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE PARA RESERVA DE COMBUSTIBLE

CONTRATO N° 23001170H4 2023

MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

Riohacha, 25 de Marzo de 2025

Lugar: Aeropuerto Almirante Padilla

Reunidos en: Gerencia de la Aeronáutica Civil

Asistentes:

- María Geiner Prada - Gerente – Aeronáutica Civil
- Deisy Delgado – Ing. Ambiental – Concesión Aeropuertos de Oriente
- Jessica Amórtegui Tovar - Bióloga - Concesión Aeropuertos de Oriente
- Duvan Arias Trejos – Bomberos Aeropuerto
- Eliana Gómez Sánchez – Ing. Ambiental – Consorcio Infraestructura Riohacha
- Juan Carlos Pérez – Residente Civil – Consorcio Infraestructura Riohacha

Orden del Día:

1. Verificación de asistencia.
2. Presentación del proyecto de construcción del dique para reserva de combustible.
3. Análisis del visto bueno técnico y ambiental otorgado por la Aeronáutica Civil.
4. Aprobación del área destinada para la construcción del dique.
5. Conclusiones y firma del acta.

Desarrollo de la Reunión:

En el día de la fecha, se lleva a cabo la reunión con la finalidad de aprobar el área destinada para la construcción del dique de reserva de combustible para la obra MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF). Durante la sesión, se presentó el proyecto y se expusieron los lineamientos técnicos y ambientales aprobados por la Aeronáutica Civil, garantizando que la construcción cumple con la normativa vigente.

Después de analizar y verificar el cumplimiento de las exigencias técnicas y ambientales, los asistentes otorgan su aprobación para la utilización del área designada para la construcción del dique.

Conclusiones:

- Se aprueba la construcción del dique de reserva de combustible en el área designada.
- Se confirma que el proyecto cuenta con el visto bueno técnico y ambiental de la Aeronáutica Civil.
- Se acuerda el seguimiento de las normativas de seguridad y ambientales establecidas.

No habiendo más puntos a tratar, se firma la presente acta para constancia de lo acordado.

Firmas:

Nombre María Deiner Prada
Cargo Gerente Aeropuerto Almirante Padilla

Nombre JUAN ARIAS TREJOS
Cargo Líder SEI Riohacha.

Nombre Deisy Delgado Arana
Cargo Ing. Ambientes ICAS 2024.

Nombre Eliana Gómez Sánchez
Cargo Ing. Ambiental. CIR

Nombre Jessica Amórtegui
Cargo Biologa Cons. Control AVF.

Gmail **infraestructurariohacha rg <infraestructurariohachadm@gmail.com>**

Solicitud para construcción caseta de combustible

2 mensajes

Maria Geiner Prada Guzman <maria.prada@aerocivil.gov.co> 6 de febrero de 2025, 11:56 a.m.
Para: Duvan Augusto Arias Trejos <duvan.arias@aerocivil.gov.co>
CC: Wilmer Arbey Escobar Revelo <wilmer.escobar@aerocivil.gov.co>, "infraestructurariohachadm@gmail.com" <infraestructurariohachadm@gmail.com>, John Jairo Benitez Betancourt <john.benitez@aerocivil.gov.co>

Estimados reciban un cordial saludo:

En atención al requerimiento del consorcio de infraestructura, quien ejecuta las obras de mejoramiento de plataformas de viraje, franjas de seguridad, sistema de drenajes y mejoramiento de construcción de la calle de rodaje, para el desarrollo de las obras del contrato, se requiere la construcción de la Caseta donde se realizará los tanqueos de combustible para la maquinaria y equipos menores con el fin de dar cumplimiento al plan de manejo ambiental.

Por lo anterior solicitamos el concepto escrito, tanto de soporte técnico como del grupo SEI, respecto de la ubicación donde se realizará dicha construcción; de manera que el sitio propuesto por el contratista no interfiera ni presente riesgo alguno para la seguridad operacional. Para ello es importante contar con el acompañamiento al contratista y su equipo.

Agradezco que la coordinación del día y hora se realice directamente con la ingeniera ambiental al número de contacto 3116478319.

Lo anterior se requiere, con el fin de que la suscrita dé la debida aprobación a la solicitud.

Cordialmente,



---------- Forwarded message ---------
De: **infraestructurariohacha rg** <infraestructurariohachadm@gmail.com>
Date: jue, 30 ene 2025 a la(s) 11:31 a.m.
Subject: Solicitud Caseta de tanqueo
To: <maria.prada@aerocivil.gov.co>

Doctora María

Cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Subprograma Manejo de Combustibles del PMA del Aeropuerto Almirante Padilla, por medio del presente solicitamos su autorización

En dicha caseta se almacenarán, de manera temporal, las canecas de combustible, mientras se realizan las operaciones de tanqueo de cada una de las máquinas.

Eventualmente se podrá presentar el caso, que se almacene por un corto periodo de tiempo los sobrantes de combustible.

Se propone ubicar dicha caseta en las siguientes coordenadas:

Latitud: 11°31'42.10"N

Longitud: 72°55'2.86"O

Se encuentra a 100 metros de la plataforma y a 46 metros de la caseta donde se almacena la pirotecnia.

Características de la caseta:

- Placa de piso en concreto de 2 metros de largo x 2 metros de ancho.
- Columnas metálicas y techo en teja metálica, altura 3,5 metros.
- Se construirá un dique de altura 20 centímetros.

De antemano agradecemos su atención y colaboración.

Se adjunta imagen con la ubicación propuesta.



Atentamente,

Juan Carlos Pérez Rosales

Residente de Obra

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023

--

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023

Duvan Augusto Arias Trejos <duvan.arias@aerocivil.gov.co> 7 de febrero de 2025, 12:10 p.m.
Para: Maria Geiner Prada Guzman <maria.prada@aerocivil.gov.co>
CC: Wilmer Arbey Escobar Revelo <wilmer.escobar@aerocivil.gov.co>, Ernesto Gutierrez Pinilla <ernesto.gutierrez@aerocivil.gov.co>, John Jairo Benitez Betancourt <john.benitez@aerocivil.gov.co>, "infraestructurariohachadm@gmail.com" <infraestructurariohachadm@gmail.com>

3316-25.

Cordial saludo

Estimada señora: María Geiner

Gerente Aeropuerto Almirante Padilla.

En atención a su solicitud, se ha evaluado la propuesta presentada por el contratista y hemos considerado los siguientes aspectos:

- El grupo SEI se encuentra dispuesto a realizar apoyo técnico en el sitio, ayudando a que se cumplan los parámetros de seguridad humana y seguridad operacional adecuados.

- Se recomienda al supervisor del contrato, quien es el responsable de verificar que se cumplas las especificaciones existentes en la ficha técnica tener en cuenta la siguiente información: Norma Técnica Colombiana (NTC 3853) la cual se debe tener en cuenta a la hora de realizar esta área de almacenamiento de combustible.

Atentamente:

Duvan
Arias Trejos
Bombero Aeronáutico

Regional Norte
Servicio de salvamento y
extinción de incendios
Aeropuerto Almirante Padilla

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

duvan.arias@aerocivil.gov.co
(+57) 312 5541945
www.aerocivil.gov.co
Riohacha, Colombia

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos son confidenciales e interesan solamente a su destinatario. No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión equivocada o errónea. Si usted ha recibido este mensaje por error, debe borrarlo en su totalidad de su sistema y notificar de tal hecho al remitente. Cualquier divulgación, copia, distribución o acción tomada por acción o por omisión en relación a ello está prohibida y constituye un delito hacerlo. Cualquier opinión o consejo contenidos en este mensaje dirigido a nuestros usuarios, está sujeto a los términos y condiciones de los contratos vigentes con AEROCIVIL y solo interesan a las partes contractuales.

MENOS PAPEL MÁS AMBIENTE

Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario hacerlo. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos.

[Texto citado oculto]

CONTRATO DE CONCESION PARA LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN YACIMIENTO DE ROCA O PIEDRA CALIZA EN BRUTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION No. HJ6-08111 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA INGEOMINAS Y LA SEÑORA NOGUERA DE GUTIERREZ SARA CECILIA.

Entre los suscritos, **INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA INGEOMINAS**, establecimiento público del Orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, representado en este acto por su Directora de Servicio Minero (E) la Dra. **MARTA URIBE LONDOÑO**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.43.666.576 de Bello, debidamente facultada para la celebración de este contrato de conformidad con el Decreto No. 252 de 2004, la Resolución No. 18 0074 del 27 de enero de 2004 emanada del Ministerio de Minas y Energía y la Resolución No. D 141 del 31 de Mayo de 2006 emanada del INGEOMINAS, en adelante llamada LA **CONCEDENTE** de una parte y de la otra el señora **NOGUERA DE GUTIERREZ SARA CECILIA**, identificada con C.C N. 36'532.019 de Santa Marta, en adelante llamado el **CONCESIONARIO** , acuerdan celebrar un contrato de concesión, con base en la facultad otorgada a LA CONCEDENTE en el artículo 317 del Código de Minas – Ley 685 de 2.001, y por la Resolución No. 18 0074 del 27 de enero de 2004, mediante la cual se delegaron unas funciones en INGEOMINAS, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.- Objeto.** El presente contrato tiene por objeto la realización por parte de LOS CONCESIONARIOS de un proyecto de exploración técnica y explotación económica, de un yacimiento **de ROCA O PIEDRA CALIZA EN BRUTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION** en el área total descrita en la cláusula segunda de este contrato, así como los que se hallaren asociados o en liga íntima o resultaren como subproductos de la explotación. LOS CONCESIONARIOS tendrán la libre disponibilidad de los minerales objeto del contrato de concesión que llegue a extraer en cumplimiento del Programa de Trabajos y Obras, aprobado por LA CONCEDENTE. Los minerales *In Situ* son del Estado Colombiano; y una vez extraídos, serán de propiedad de LOS CONCESIONARIOS. **PARAGRAFO.- Adición al Objeto de la Concesión.** Cuando por los trabajos de exploración o explotación se encontraren minerales distintos de los que son objeto del presente contrato y que no se encontraren en las circunstancias señaladas en el Artículo 61 del Código de Minas, LOS CONCESIONARIOS podrán solicitar que su concesión se extienda a dichos minerales sin más trámite o formalidad que la suscripción de un acta adicional que se anotará en el Registro Minero Nacional. Esta adición no modificará ni extenderá los plazos establecidos en el contrato original y, si a ello hubiere lugar, LOS CONCESIONARIOS, solicitaran la correspondiente ampliación o modificación de la Licencia Ambiental que cubra los minerales objeto de la adición, en el caso de que los impactos ambientales

de estos, sean diferentes de los impactos de la explotación original. **CLAUSULA SEGUNDA.- Area del contrato.-** El área objeto del presente contrato está comprendida por la siguiente alinderación, definida por puntos, rumbos, distancias y coordenadas:

DESCRIPCION DEL P.A. : INTERSECCION ("YE") VIA CUESTECITAS - MAICAO Y CUESTECITAS - MINA DE EL CERREJON

PLANCHA IGAC. DEL P.A. : 14

AREA TOTAL : 1414 HECTAREAS Y 9321.5 METROS(2) DISTRIBUIDAS EN 1 ZONA

PERIMETRO TOTAL : 15833.57770 METROS

ALINDERACION DE LA ZONA NUMERO 11

PUNTO INICIAL	PUNTO FINAL	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADA NORTE INICIAL	COORDENADA ESTE INICIAL
PA	1	S85-40-40.28W	3067.24	1728781.160	1161731.520
1	2	N85-09-06.35W	3656.08	1728550.000	1158673.000
2	3	S40-43-35.81W	3074.56	1728459.000	1155030.000
3	4	S15-30-38.39E	2281.08	1726529.000	1153024.000
4	5	N60-23-10.86E	4061.53	1724331.000	1153634.000
5	6	N41-59-47.37E	917.67	1726338.000	1157165.000
6	7	N42-03-11.13E	646.44	1727020.000	1157779.000
7	8	N41-59-42.38E	539.56	1727500.000	1158212.000
8	1	N08-45-33.94E	656.66	1727901.000	1158573.000

El área total antes descrita está ubicada en jurisdicción de los municipios de RIOHACHA, HATONUEVO Y MAICAO Departamento de LA GUAJIRA y comprende una extensión superficiaria total de **1414 HECTAREAS y 9321.5 Metros Cuadrados (2) DISTRIBUIDOS EN UNA ZONA** la cual se representa gráficamente en el plano topográfico, el cual es el Anexo No.1 de este contrato y hace parte del mismo. Queda entendido que el área se entrega como cuerpo cierto, en consecuencia LOS CONCESIONARIOS no tendrán derecho a reclamo alguno en el evento de que la extensión comprendida dentro de los linderos antes indicados, sea mayor o menor que la enunciada o calculada en este contrato. LA CONCEDENTE no se compromete para con LOS CONCESIONARIOS a ninguna obligación de saneamiento por evicción o vicios redhibitorios sobre el área contratada. Al finalizar el periodo de Exploración, LOS CONCESIONARIOS deberán presentar la delimitación definitiva de la zona del área contratada que va a quedar vinculada a los trabajos y obras de explotación, más las obras estrictamente necesarias para el beneficio, transporte interno, servicios de apoyo y obras de carácter ambiental, para lo cual se deberán tener en cuenta los valores, ubicación y cálculo de las reservas existentes al igual que la producción esperada en el Programa de Trabajos y Obras. Con oportunidad de esta delimitación, LOS CONCESIONARIOS estarán obligados a devolver, en lotes continuos o discontinuos las

Libertad y Orden

partes del área que no serán ocupadas por los trabajos y obras mencionados. El área retenida deberá estar constituida por una extensión continua, que será inscrita en el Registro Minero Nacional. En todo caso no se permitirá retener áreas que no sean económicamente explotables. **CLAUSULA TERCERA. - Valor del Contrato.** El presente contrato al momento de suscribirse es de valor indeterminado. Para efectos fiscales su valor se definirá con cada pago o abono en cuenta determinado sobre las contraprestaciones a favor del Estado, de acuerdo con la cláusula sexta. **CLAUSULA CUARTA- Duración del Contrato y Etapas.** El presente contrato tendrá una duración total de treinta (30) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Minero Nacional, y para cada etapa así: -a) Plazo para Exploración: Tres (3) años contados a partir de su inscripción en el Registro Minero para hacer la exploración técnica del área contratada, pudiendo ser un término menor a solicitud del mismo, ciñéndose a los Términos de Referencia Para Trabajos de Exploración y Programa de Trabajos y Obras PTO adoptados por el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución No. 18 0859 de 2002, y Guías Minero Ambientales adoptadas por los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través de Resolución No. 18 0861 de 2002, los cuales constituyen el Anexo No. 2 de este contrato. Dicha etapa puede ser prorrogada por dos (2) años, con el fin de completar o adicionar los estudios y trabajos dirigidos a establecer la existencia de los minerales concedidos y la factibilidad técnica y económica de explotarlos. La prórroga se debe solicitar con una antelación no menor de tres (3) meses al vencimiento del periodo que se trate. -b) Plazo para Construcción y Montaje: Tres (3) años para la construcción e instalación de la infraestructura y del montaje necesario para las labores de explotación, tiempo que empezará a correr una vez terminado definitivamente el periodo de exploración. Esta etapa puede ser prorrogada por un (1) año, siempre y cuando sea solicitado con una antelación no menor a tres (3) meses del vencimiento de este periodo. -c) Plazo para la Explotación: El tiempo restante, en principio, veinticuatro (24) años, o el que resulte según la duración efectiva de las dos etapas anteriores (junto con sus prórrogas. Antes de vencerse el periodo de explotación, LOS CONCESIONARIOS podrán solicitar una prórroga del contrato de hasta treinta (30) años que se perfeccionará mediante un acta suscrita por las partes, que se inscribirá en el Registro Minero. Para acceder a la prórroga se deberá haber cumplido con las obligaciones correspondientes al contrato inicial y pagadas las sanciones que se hubieren impuesto a la fecha de la anterior solicitud. **PARÁGRAFO 1**: para que la solicitud de prorroga de los periodos establecidos en la presente cláusula pueda ser autorizada, LOS CONCESIONARIOS deberán haber cumplido con las obligaciones correspondientes y pagado las sanciones que se le hubieren impuesto hasta la fecha de la solicitud. **PARÁGRAFO 2**: El CONCESIONARIO tendrá igualmente preferencia para contratar de nuevo la misma área, y continuar con las labores de

Libertad y Orden

explotación sin suspensión de las mismas mientras se perfecciona el nuevo contrato, y podrá ofrecer la sustitución de la obligación de revertir bienes al Estado por la de pagar una suma equivalente al valor de tales bienes. **CLAUSULA QUINTA. -Autorizaciones Ambientales.** La gestión ambiental esta incluida como una obligación del contrato de concesión. Para la etapa de exploración se deben ejecutar los trabajos de acuerdo con las guías minero ambientales adoptadas por los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las cuales constituyen el Anexo No. 2 de este contrato. Para las etapas de construcción, montaje y explotación, beneficio y para las labores adicionales de exploración durante la etapa de explotación se debe contar con el acto administrativo ejecutoriado y en firme, en que la autoridad ambiental competente haya otorgado la Licencia Ambiental, así como con los permisos y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, si fuere el caso. **CLAUSULA SEXTA.- Obligaciones a cargo de LOS CONCESIONARIOS.**- Son obligaciones a cargo de LOS CONCESIONARIOS en desarrollo del presente contrato: 6.1. Para ejecutar las labores de exploración deberá ajustarse a los Términos de Referencia Para Exploración y Programa de Trabajos y Obras PTO, adoptados por el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución No. 18 0859 de 2002 y Guías Minero Ambientales, adoptadas por los Ministerios de Minas y Energía y el de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través de Resolución No. 18 0861 de 2002, los cuales constituyen el Anexo No. 2 del presente contrato. 6.2. Para ejecutar las labores y trabajos de las etapas de Construcción y Montaje y Explotación LOS CONCESIONARIOS deberá presentar el acto administrativo, ejecutoriado y en firme, en que la autoridad competente haya otorgado la Licencia Ambiental. 6.3. LOS CONCESIONARIOS con una antelación no inferior a treinta (30) días de la fecha de vencimiento de la etapa de exploración, deberán presentar el Programa de Trabajos y Obras, a desarrollar en el área total del contrato durante las etapas de Construcción y Montaje y Explotación, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Minas y a los Términos de Referencia adoptados por el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución No. 18 0859 de 2002, que constituyen el Anexo No. 2 de este contrato. 6.4. Aprobado el Programa de Trabajos y Obras pasará a ser el Anexo No.3 y a él deberá sujetarse LOS CONCESIONARIOS en sus labores durante las etapas de Construcción y Montaje y Explotación. 6.5. LOS CONCESIONARIOS, para los efectos de la devolución de zonas, podrán pedir por un plazo prudencial, que no puede pasar de dos (2) años, que se le autorice retener zonas continuas del área contratada, con el objeto de proseguir en ellas labores de exploración técnica, las cuales deberán estar incluidas en la Licencia Ambiental. 6.6. Si LOS CONCESIONARIOS deciden poner estas zonas retenidas en explotación, deberán incorporarlas al Programa de Trabajos y Obras y pedir la modificación de la respectiva Licencia Ambiental, si a ello hubiere lugar. En caso contrario, es decir, si LOS CONCESIONARIOS no deciden poner estas

Libertad y Orden

zonas retenidas en explotación, deberán devolverlas de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código de Minas. 6.7. Cumplida la Exploración y una vez aprobado el Programa de Trabajos y Obras y obtenida la Licencia Ambiental, se iniciará la etapa de Construcción y Montaje, durante la cual LOS CONCESIONARIOS deberán cumplir con las actividades establecidas en el Programa de Trabajos y Obras para esta etapa. 6.8. Las construcciones, instalaciones y montajes mineros deberán tener las características, dimensiones y calidades señaladas en el programa de Trabajos y Obras aprobado. Sin embargo, LOS CONCESIONARIOS podrán, durante su ejecución hacer los cambios y adiciones que sean necesarios. LA CONCEDENTE y la autoridad ambiental deberán ser informados previamente de tales cambios y adiciones. 6.9. Durante la etapa de Construcción y Montaje, LOS CONCESIONARIOS podrán iniciar anticipadamente la explotación del área contratada, sin perjuicio de tener oportunamente establecidas las obras e instalaciones definitivas, siempre y cuando hayan presentado a LA CONCEDENTE el Programa de Trabajos y Obras anticipado que hará parte del Anexo No.3 del presente contrato, junto con una descripción abreviada de los montajes que vaya a utilizar e informado al CONCEDENTE el inicio de la referida explotación anticipada. La explotación anticipada estará sujeta a las mismas condiciones, obligaciones y derechos de la etapa de Explotación. 6.10. Finalizada la etapa de Construcción y Montaje, se iniciará la etapa de Explotación, en la que LOS CONCESIONARIOS desarrollará los trabajos previstos en el Programa de Trabajos y Obras aprobado por LA CONCEDENTE, para dicha etapa. 6.11. En la ejecución de los trabajos de explotación, LOS CONCESIONARIOS deberán adoptar y mantener las medidas y disponer del personal y de los medios materiales necesarios para preservar la vida e integridad de las personas vinculadas a él y de terceros, de conformidad con las normas vigentes sobre seguridad e higiene y salud ocupacional. 6.12. Durante la explotación se deberán llevar registros e inventarios actualizados de la producción en boca o borde de mina y en sitios de acopio, para establecer en todo tiempo los volúmenes de los minerales en bruto y de los entregados a las plantas de beneficio y, si fuere del caso, a las de transformación. Estos registros e inventarios se suministrarán trimestralmente al Sistema Nacional de Información Minera. Para el efecto, LOS CONCESIONARIOS minero deberán diligenciar y suministrar a la autoridad minera con la periodicidad que ésta indique, el Formato Básico Minero adoptado por el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución No. 18 1515 de 2002 o cualquier acto que lo modifique. 6.13. LOS CONCESIONARIOS están obligados a poner en práctica las reglas, métodos y procedimientos técnicos propios de la explotación minera, que eviten daños a los materiales explotados o removidos o que deterioren o esterilicen las reservas *In Situ* susceptibles de eventual aprovechamiento. 6.14. LOS CONCESIONARIOS pagarán las regalías mínimas de que trata el artículo 16 de la Ley 141 de 1994, modificado por el artículo 16 de la Ley 756 de 2002. Igualmente, serán de

Libertad y Orden

Diagonal 53 No. 34 - 53 • PBX: (+1) 2223528 / 2200200 / 2200100 / 2200000 • Fax: (+1) 2223528
NIT 899999294-8 • Bogotá D.C., Colombia • www.ingeominas.gov.co

No. 0039977

95863-IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA 2006

cargo de LOS CONCESIONARIOS, los impuestos o gravámenes del orden nacional, departamental o municipal que se deriven de la actividad que realiza, siempre y cuando sean aplicables. **PARÁGRAFO**: El monto de las regalías y el sistema para liquidarlas y reajustarlas, serán los vigentes a la fecha de la firma del contrato de concesión, y se aplicarán durante toda su vigencia. 6.15. LOS CONCESIONARIOS se obligan a pagar durante las etapas de Exploración y Construcción y Montaje, a LA CONCEDENTE como canon superficiario, una suma equivalente a un día de salario mínimo diario por hectárea contratada y por año. Este pago se realizará por anualidades anticipadas a partir del perfeccionamiento del contrato. **CLAUSULA SEPTIMA.- Autonomía Empresarial**.- En la ejecución de los estudios, trabajos y obras de exploración, montaje, construcción y explotación, beneficio y transformación, LOS CONCESIONARIOS tendrán plena autonomía técnica, industrial, económica y comercial. Por tanto, podrá escoger la índole, forma y orden de aplicación de los sistemas y procesos y determinar libremente la localización, movimientos y oportunidad del uso y dedicación del personal, equipos, instalaciones y obras, siempre y cuando se garantice el aprovechamiento racional de los recursos mineros y la conservación del medio ambiente, sin perjuicio de la función de inspección y fiscalización a cargo de LA CONCEDENTE. **CLAUSULA OCTAVA.- Trabajadores de LOS CONCESIONARIOS**. El personal que LOS CONCESIONARIOS ocupen en la ejecución del presente contrato, será de su libre elección y remoción, sin apartarse cuando sea del caso de lo dispuesto en los artículos 128, 251, 253 y 254 del Código de Minas, estando a su cargo los salarios, prestaciones e indemnizaciones que legalmente le correspondan, entendiéndose que ninguna de tales obligaciones le corresponden a la autoridad minera. En consecuencia, LOS CONCESIONARIOS responderá por toda clase de procesos, demandas, reclamos, gastos, en que incurriere a causa de sus relaciones laborales. **CLAUSULA NOVENA.- Responsabilidades**.- 9.1. De EL CONCEDENTE.- En ningún caso EL CONCEDENTE responderá por las obligaciones de cualquier naturaleza que adquiera LOS CONCESIONARIOS con terceros en desarrollo del presente contrato. 9.2. Responsabilidad de LOS CONCESIONARIOS.- 9.2.1. LOS CONCESIONARIOS serán responsables ante EL CONCEDENTE por todos los trabajos que desarrolle en el área contratada. Además, responderá por cualquier daño que cause a terceros o a EL CONCEDENTE durante el desarrollo de los mismos, frente a terceros dicha responsabilidad se establecerá en la forma y grado en que prevén las disposiciones civiles y comerciales ordinarias (artículo 87) 9.2.2. LOS CONCESIONARIOS serán considerados como contratista independiente para efectos de todos los contratos civiles, comerciales y laborales que celebre por causa de sus estudios, trabajos y obras de exploración y explotación. (artículo 57) **CLAUSULA DECIMA.- Diferencias**.- Las diferencias de carácter exclusivamente técnico que llegaren a surgir entre LOS CONCESIONARIOS y LA CONCEDENTE que no puedan arreglarse en forma amigable,

serán sometidas para su resolución al Arbitramento Técnico previsto en las leyes. Las diferencias de orden legal o económico, quedan sometidas al conocimiento y decisión de la rama jurisdiccional del poder público colombiano. En caso de desacuerdo sobre la calidad técnica, jurídica o económica de las diferencias éstas se considerarán legales. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- Cesión y Gravámenes:** Cesión: La cesión de derechos emanados de este contrato, requerirá aviso previo y escrito a LA CONCEDENTE. La cesión de que trata esta cláusula no podrá estar sometida por las partes a término o condición alguna en cuanto hace relación al Estado. a) Si la cesión fuere total, el cesionario quedará subrogado en todas las obligaciones emanadas del contrato, aún en las contraídas antes de la cesión y que se hallaren pendientes de cumplirse. b) La cesión parcial del derecho emanado del presente contrato podrá hacerse por cuotas o porcentajes de dicho derecho. En este caso, cedente y cesionario serán solidariamente responsables por las obligaciones contraídas. c) Cesión de áreas podrá haber cesión de áreas de los derechos emanados del contrato de concesión mediante la división material de la zona solicitada o amparada por el mismo. Esta clase de cesión dará nacimiento a un nuevo contrato con el cesionario, que se perfeccionará con la inscripción del documento de cesión en el Registro Minero Nacional. Gravámenes: - El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal podrá ser gravado o dado en garantía de obligaciones, en las condiciones y modalidades establecidas por en el Capítulo XXIII el Código de Minas. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- Póliza Minero – Ambiental.** Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de celebración del contrato de concesión minera, LOS CONCESIONARIOS deberán constituir una póliza de garantía, que ampare el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales, el pago de las multas y la caducidad. El valor asegurado se calculará con base en los siguientes criterios: a) Para la etapa de Exploración, un cinco por ciento (5%) del valor anual de la cuantía de la inversión prevista en exploración para la respectiva anualidad, con base en lo establecido por LOS CONCESIONARIOS en el numeral 9 de su propuesta. b) Para la etapa de Construcción y Montaje, el cinco por ciento (5%) de la inversión anual por dicho concepto, con base en lo establecido en el Programa de Trabajos y Obras aprobado para dicha etapa. c) Para la etapa de Explotación, equivaldrá a un diez por ciento (10%) del resultado de multiplicar el volumen de producción anual estimada del mineral objeto de la concesión, con base en lo establecido en el Programa de Trabajos y Obras aprobado para dicha etapa, por el precio en boca de mina del referido mineral fijado anualmente por el Gobierno. La póliza de que trata esta cláusula, deberá ser aprobada por LA CONCEDENTE, deberá mantenerse vigente durante la vida de la concesión, de sus prórrogas y por tres (3) años más. En el evento en que la póliza se haga efectiva, subsistirá la obligación de reponer dicha garantía. **CLAUSULA DECIMA TERCERA.- Inspección.** La autoridad Minera, inspeccionará en cualquier tiempo, en

Libertad y Orden

Diagonal 53 No. 34 - 53 • PBX: (+1) 2223528 / 2200200 / 2200100 / 2200000 • Fax: (+1) 2223528
NIT 899999294-8 • Bogotá D.C., Colombia • www.ingeominas.gov.co

No. 0039979

95003 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA-2004

la forma que lo estime conveniente, las labores que realice LOS CONCESIONARIOS, en procura de alcanzar el debido cumplimiento del presente contrato. **CLAUSULA DECIMA CUARTA.- Fiscalización y Vigilancia**.- La autoridad minera directamente o por medio de los auditores que autorice, ejercerá la fiscalización y vigilancia, de la forma y condiciones en que se ejecuta el contrato de concesión tanto por los aspectos técnicos como de seguridad e higiene minera, como los operativos y ambientales, sin perjuicio que sobre estos últimos la autoridad ambiental o sus auditores autorizados, ejerzan igual vigilancia en cualquier tiempo, manera y oportunidad. **CLAUSULA DECIMA QUINTA.- Multas**. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte de LOS CONCESIONARIOS, previo requerimiento, LA CONCEDENTE podrá imponer administrativamente multas sucesivas de hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cada vez y para cada caso de infracción de las obligaciones emanadas del presente contrato, siempre que no fueren causal de caducidad o que LA CONCEDENTE, por razones de interés público expresamente invocadas, se abstuviere de declararla. Cada multa deberá ser pagada por LOS CONCESIONARIOS dentro del término de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en que quede ejecutoriada la providencia que la imponga. Si LOS CONCESIONARIOS no cancelaren oportunamente las multas de que trata esta cláusula, LA CONCEDENTE las hará efectivas con cargo a la póliza de cumplimiento, sin perjuicio de que se declare la caducidad. En el caso de contravenciones de las disposiciones ambientales, la autoridad ambiental aplicará las sanciones previstas en las normas ambientales vigentes. **CLAUSULA DECIMA SEXTA.- Terminación**. Esta concesión podrá darse por terminada en los siguientes casos: 16.1. Por renuncia de LOS CONCESIONARIOS, siempre que se encuentre a Paz y Salvo en el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de concesión. 16.2. Por mutuo acuerdo. 16.3. Por vencimiento del término de duración. 16.4. Por muerte de LOS CONCESIONARIOS y 16.5. Por caducidad. **PARAGRAFO.-** En caso de Terminación por muerte de LOS CONCESIONARIOS, la esta causal se hará efectiva si dentro de los dos (2) años siguientes al fallecimiento, los asignatarios no pidan subrogarse en los derechos emanados de la concesión, en cumplimiento con lo consagrado en el artículo 111 del Código de Minas. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- Caducidad.-** LA CONCEDENTE podrá mediante providencia motivada declarar la caducidad administrativa del presente contrato en los siguientes casos: 17.1. La disolución de la persona jurídica de LOS CONCESIONARIOS, menos en los casos en que se produzca por fusión, por absorción; 17.2. La incapacidad financiera que le impida cumplir con las obligaciones contractuales y que se presume si LOS CONCESIONARIOS se les ha abierto trámite de liquidación obligatoria de acuerdo con la ley; 17.3. La no realización de los trabajos y obras dentro de los términos establecidos en este contrato y en el Código de Minas o su suspensión no autorizada por más de seis (6) meses continuos; 17.4. El no pago

Libertad y Orden

oportuno y completo de las contraprestaciones económicas; 17.5. El omitir el aviso previo a la autoridad para hacer la cesión total o parcial del contrato o de área del contrato; 17.6. El no pago de las multas impuestas o la no reposición de la garantía que las respalda; 17.7. El incumplimiento grave y reiterado de las regulaciones de orden técnico sobre la exploración y explotación, de higiene, seguridad mineras y laborales, o la revocación de las autorizaciones ambientales necesarias para sus trabajos y obras por incumplimientos imputables al concesionario; 17.8. La violación de las normas sobre zonas excluidas y restringidas para la minería; 17.9. El incumplimiento grave y reiterado de cualquiera otra de las obligaciones derivadas del contrato de concesión; y 17.10. Cuando se declare como procedencia de los minerales explotados un lugar diferente al de su extracción, provocando que las contraprestaciones económicas se destinen a un municipio diferente al de su origen. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA. Procedimiento para la caducidad**.-. La caducidad del contrato, en los casos en que hubiere lugar, será declarada por LA CONCEDENTE previa resolución de trámite en la que, de manera concreta y específica, se señalen la causal o causales en que hubiere incurrido LOS CONCESIONARIOS. En esta misma providencia se le fijará un término, no mayor de treinta (30) días, para que subsane las faltas que se le imputan o formule su defensa, respaldada con las pruebas correspondientes. Vencido este término se resolverá lo pertinente en un plazo máximo de diez (10) días. En el caso contemplado en la presente cláusula, LOS CONCESIONARIOS quedan obligados a cumplir o garantizar todas las obligaciones de orden ambiental que le sean exigibles y las de conservación y manejo adecuado de los frentes de trabajo y de las servidumbres que se hubieren establecido. **CLAUSULA DECIMA NOVENA. - Reversión y Obligaciones en Caso de Terminación**. a) Reversión. En todos los casos de terminación del contrato, ocurrida en cualquier tiempo, operará la reversión gratuita de bienes a favor del Estado, circunscrita ésta medida a los inmuebles e instalaciones fijas y permanentes, construidas y destinadas por LOS CONCESIONARIOS en forma exclusiva al transporte y al embarque de los minerales provenientes del área contratada y de aquellas que se encuentren incorporadas a los yacimientos y accesos y que no puedan retirarse sin detrimento del mismo y de los frentes de trabajo. Esta reversión operará sólo en los casos en que las características y dimensiones de los mencionados bienes, a juicio de LA CONCEDENTE, los hagan aptos como infraestructura destinada a un servicio público de transporte o embarque o darse al uso de la comunidad. b) Obligaciones en caso de terminación. LOS CONCESIONARIOS, en todos los casos de terminación del contrato, quedan obligados a cumplir y a garantizar las obligaciones de orden ambiental exigibles al tiempo de hacerse efectiva dicha terminación. **CLAUSULA VIGESIMA. - Liquidación.** A la terminación del presente contrato por cualquier causa, las partes suscribirán un Acta en la cual deberá constar detalladamente la liquidación definitiva del mismo y el

Libertad y Orden

Diagonal 53 No. 34 - 53 • PBX: (+1) 2223528 / 2200200 / 2200100 / 2200000 • Fax: (+1) 2223528
NIT 899999294-8 • Bogotá D.C., Colombia • www.ingeominas.gov.co

cumplimiento de todas las obligaciones a cargo de LOS CONCESIONARIOS, en especial de las siguientes: 20.1. El recibo por parte de LA CONCEDENTE del área objeto del contrato y de la mina, indicando las condiciones técnicas, físicas y ambientales en que se encuentra. Estas últimas de acuerdo con lo que establezca la autoridad ambiental competente. 20.2. Las pruebas por parte de LOS CONCESIONARIOS del cumplimiento de todas sus obligaciones laborales, o la constancia de su no entrega; 20.3. El cumplimiento de todas las obligaciones consignadas en la cláusula Sexta, dejando constancia de las condiciones de cumplimiento y del detalle de las obligaciones incumplidas, sobre las cuales LA CONCEDENTE tomará las acciones que procedan. 20.4. La relación de pagos de regalías y canon a su cargo, dejando constancia de las condiciones de cumplimiento y del detalle de las obligaciones incumplidas, sobre las cuales LA CONCEDENTE tomará las acciones que procedan. Si LOS CONCESIONARIOS no comparecen a la diligencia en la cual se habrá de levantar el Acta de Liquidación, LA CONCEDENTE suscribirá el acta y se harán efectivas las garantías correspondientes si procediere. La no comparecencia de LOS CONCESIONARIOS no es por si sola causal para hacer efectivas las garantías. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - Normas de Aplicación**. Para todos los efectos a que haya lugar, el presente contrato una vez suscrito por las partes es de obligatorio cumplimiento. El contrato, su ejecución e interpretación, terminación y liquidación quedan sujetos a la Constitución, leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, reglamentos o a cualquier otra disposición emanada de las autoridades competentes colombianas, que en alguna forma tengan relación con el objeto contractual. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- Domicilio Contractual.-** Para todos los efectos derivados de este contrato el domicilio contractual será el lugar de su celebración. **CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- Ley aplicable y Renuncia a Reclamación Diplomática.** El contrato y lo en él estipulado se sujetará exclusivamente a las leyes y jueces colombianos. LOS CONCESIONARIOS renuncian a intentar cualquier reclamación diplomática en razón de este contrato. **CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- Suscripción y Perfeccionamiento.** Las obligaciones que por este contrato adquieren LOS CONCESIONARIOS producen efectos desde su suscripción. El presente contrato se considera perfeccionado una vez se encuentre debidamente inscrito en el Registro Minero Nacional. **VIGESIMA QUINTA.- Anexos.** Son anexos de este contrato y hacen o harán parte integrante del mismo los siguientes:

Anexo No.1. Plano Topográfico

Anexo No.2. Términos de Referencia para trabajos de exploración y Programa de Trabajos y Obras PTO y las Guías Minero Ambientales.

Anexo No.3. Programa de Trabajos y Obras PTO Aprobado.

Anexo No.4. Anexos Administrativos:

Diagonal 53 No. 34 - 53 • PBX: (+1) 2223528 / 2200200 / 2200100 / 2200000 • Fax: (+1) 2223528
NIT 899999294-8 • Bogotá D.C., Colombia • www.ingeominas.gov.co

No. 0039982

- Certificado de Existencia y Representación Legal de LOS CONCESIONARIOS
- La fotocopia de la cédula de ciudadanía del Gerente de la empresa CONCESIONARIA
- Las autorizaciones ambientales
- La póliza minero-ambiental, y
- Constancia de pago de impuesto de timbre.

Para constancia se firma este contrato por los que en él intervienen, en tres (3) ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Bogotá D.C. a

28 NOV. 2006

LA CONCEDENTE

MARTA URIBE LONDOÑO

Directora del Servicio Minero (E)

LOS CONCESIONARIOS

NOGUERA DE GUTIERREZ SARA CECILIA

C.C N. 36´532, 019 de Santa Marta

ELABORÓ: JJ MORALES ALZATE
Técnico. Leonardo Marín Ceballos
REVISÓ: Hugo Sánchez Hernández
Subdirector de Contratación y Titulación.

Libertad y Orden

República de Colombia

Libertad y Orden

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN

RESOLUCIÓN NÚMERO 001256 15 ABR. 2016

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PERFECCIONA UNA CESIÓN DE DERECHOS DENTRO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. HJ6-08111 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

El Vicepresidente de Contratación y Titulación, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el Decreto 4134 del 03 de noviembre de 2011, las Resoluciones Nos. 142 del 03 de agosto de 2012, 206 del 22 de marzo de 2013 y la Resolución No. 049 del 04 de Febrero de 2016, proferidas por la Agencia Nacional de Mineria, y previo los siguientes,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

El 28 de noviembre de 2006 el instituto Colombiano de Geología y Minería **"INGEOMINAS"** y la señora **SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIERREZ** suscribieron contrato de concesión No. HJ6-08111, para la exploración técnica y la explotación económica de un yacimiento de **ROCA O PIEDRA CALIZA EN BRUTO Y MATERILAES DE CONSTRUCCIÓN**, ubicado en jurisdicción de los municipios de **RIOHACHA**, **HATONUEVO** y **MAICAO**, departamento de **LA GUAJIRA**, en un área de 1.414 hectáreas y 9.321,5 metros cuadrados, por el término de treinta (30) años, contados a partir del 27 de junio de 2007, fecha en que se efectuó la inscripción en el Registro Minero Nacional (Folios 25-36 reverso).

Mediante resolución No. 000499 del 18 de febrero de 2014, la vicepresidencia de Contratación y Titulación de la Agencia Nacional de Mineria, resolvió aceptar el desistimiento de la Cesión de Derechos dentro del contrato de concesión No. HJ6-08111, a favor de la sociedad **MINERA LA MILAGROSA S.A**, adicionalmente, Negó la Inscripción de la Cesión Total de Derechos mineros del contrato de concesión No. HJ6-08111, solicitada por la señora **SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIERREZ**, a favor de la sociedad **MINERA LA MILAGROSA S.A**. (Folio 435- 436)

Mediante radicado No. 20149060073752 de fecha 18 de septiembre de 2014, el señor CAMILO ERNESTO CHACÍN LOPEZ, apoderado de la señora **SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIERREZ**, allegó aviso de cesión de Derechos del título No. HJ6-08111, a favor de la sociedad **MINERA LA MILAGROSA S.A** identificada con el NIT. 900210102-9, representada legalmente por el señor ALFREDO ANTONIO CAMPO VERGARA, identificado con la cédula de ciudadanía número 84.459.627. (Folio 508)

Mediante radicado No. 20149060471222 de fecha 25 de noviembre de 2014, el señor CAMILO ERNESTO CHACÍN LOPEZ, en representación de la señora **SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIERREZ**, allegó Contrato de Cesión de Derechos del título No. HJ6-08111, a favor de la sociedad **MINERA LA MILAGROSA S.A**, identificada con el NIT. 900210102-9, representada legalmente por el señor ALFREDO ANTONIO CAMPO VERGARA, identificado con la cédula de ciudadanía número 84.459.627. Contrato de Cesión de derechos suscrito por las partes el 18 de noviembre de 2014. (Folio 526 – 530)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PERFECCIONA UNA CESIÓN DE DERECHOS DENTRO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. HJ6-08111 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

Mediante resolución No. 002074 del 11 de septiembre de 2015, la vicepresidencia de contratación y titulación de la Agencia Nacional de Mineria, evalúo un trámite de Cesión de Derechos dentro del Contrato de Concesión No. HJ6-08111 en el cual se resolvió (Folio 660 – 663):

> *(...)* ***ARTÍCULO PRIMERO.- ENTENDER*** *que la administración no tiene reparo frente a los requisitos de la cesión del 100% de los derechos y obligaciones que le corresponden a la señora* ***SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIERREZ****, identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.532.019 dentro del Contrato de Concesión No.* ***HJ6-08111*** *a favor de la empresa* ***MINERA LA MILAGROSA S.A****, representada legalmente por el señor* ***ALFREDO ANTONIO CAMPO VERGARA****, identificado con la cédula de ciudadanía No. 84.459.627 por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.*
>
> ***PARÁGRAFO 1:*** *Para poder ser inscrita la Cesión de Derechos en el Registro Minero Nacional, el cedente deberá demostrar que el Contrato de Concesión No.* ***HJ6-08111*** *se encuentran al dia en todas las obligaciones de conformidad con el artículo 22 de la Ley 685 de 2001. (...)*

Mediante concepto técnico PARV-0691 del 21 de septiembre de 2015, la vicepresidencia de seguimiento, control y seguridad minera de la Agencia Nacional de Mineria, concluyó que el titulo minero HJ6-08111 se encuentra al dia en el cumplimiento de sus obligaciones. (Folio 664 – 667)

Mediante oficio de radicado No. 20159060021322 del 5 de octubre de 2015, la señora **SARA NOGUERA DE GUTIERREZ**, allegó notificación por conducta concluyente de la resolución No. 002074 de septiembre 11 de 2015. (Folio 675)

Mediante oficio de radicado No. 20159060021542 del 7 de octubre de 2015, la señora **SARA NOGUERA DE GUTIERREZ** allegó solicitud de continuar con el trámite de la cesión del 100% de los derechos y obligaciones dentro del contrato de concesión No. HJ6-08111, a favor de la empresa **MINERA LA MILAGROSA S.A,** adjuntando para tal efecto el concepto técnico PARV-0691 del 21 de septiembre de 2015. (Folio 681 – 685)

Mediante Concepto Técnico No. PARV 0132 del 29 de febrero de 2016 el Punto de Atención Regional de Valledupar concluyó entre otros apartes:

> *(...) Para continuar con el trámite de Cesión de derechos el titular se encuentra al dia en sus obligaciones contractuales para tal fin, se envia el Expediente del Contrato de Concesión No. HJ6-08111, a la parte juridica para su pronunciamiento.*

II. PARA RESOLVER SE CONSIDERA.

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, se procederá a resolver la solicitud de cesión de derechos y obligaciones que le corresponden a la señora **SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIERREZ**, a favor de la empresa **MINERA LA MILAGROSA S.A**, representada legalmente por el señor **ALFREDO ANTONIO CAMPO VERGARA**, conforme a lo señalado en el artículo 22 de la Ley 685 de 2001, el cual dispone:

> *"**ARTÍCULO 22. CESIÓN DE DERECHOS.** La cesión de derechos emanados de una concesión, requerirá aviso previo y escrito a la entidad concedente. Si recibido este aviso dicha entidad no se pronuncia mediante resolución motivada en el término de cuarenta y cinco (45) dias, se entenderá que no tiene reparo a la cesión y se inscribirá el documento de negociación en el Registro Minero Nacional.*

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PERFECCIONA UNA CESIÓN DE DERECHOS DENTRO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. HJ6-08111 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

"Para poder ser inscrita la cesión en el Registro Minero Nacional, el cedente deberá demostrar haber cumplido todas las obligaciones emanadas del contrato de concesión." *(Subraya fuera de texto).*

Conforme al citado artículo, es claro que son dos requisitos diferentes los que deben evaluarse en un trámite de cesión de derechos. Los primeros relacionados con la cesión misma, esto es que el aviso sea previo a la celebración del contrato de cesión, que el cesionario tenga la capacidad legal exigida en el artículo 17 de la Ley 685 de 2001 en el caso de ser persona jurídica y tenga una vigencia superior al tiempo que le resta de ejecución al titulo y que el cesionario no se encuentre inhabilitado. Frente a estos requisitos conforme a las normas citadas, la administración cuenta con el término de cuarenta y cinco (45) para pronunciarse de lo contrario se entiende que no tiene reparo en relación con los mismos.

El segundo, se relaciona con la inscripción de la cesión de derechos en el Registro Minero Nacional, para lo cual, debe verificarse, por parte de la Vicepresidencia de Seguimiento y Control, que el titular se encuentre al día en el cumplimiento de obligaciones derivadas del título minero[1].

De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Minera mediante resolución No. 002074 del 11 de septiembre de 2015, se pronunció frente a los requisitos de cesión de derechos, en la cual resuelve que se encuentran cumplidos toda vez que el aviso de cesión fue presentado con radicado No. 20149060073752 de fecha 18 de septiembre de 2014, y el documento de Cesión fue presentado mediante radicado No. 20149060471222 de fecha 25 de noviembre de 2014, suscrito por las partes el 18 de noviembre de 2014.

Ahora bien, como quiera que el legislador estableció como requisito para la inscripción de la cesión de derechos en el Registro Minero Nacional, que el titular minero se encuentre al día en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera mediante Concepto Técnico **PARV 0132 del 29 de febrero de 2016**, evaluó las obligaciones contractuales, concluyendo que los titulares se encuentran al día en el cumplimiento de las mismas, razón por la que ésta Vicepresidencia encuentra procedente perfeccionar e inscribir en el Registro Minero Nacional la cesión total de derechos y obligaciones que le corresponden a la señora **SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIERREZ** dentro del Contrato de Concesión **HJ6-08111** a favor de la empresa **MINERA LA MILAGROSA S.A.**

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Perfeccionar la Cesión del 100% de los derechos y obligaciones que le corresponden a la señora **SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIERREZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.532.019 dentro del Contrato de Concesión No. **HJ6-08111** a favor de la empresa **MINERA LA MILAGROSA S.A** identificada con Nit 900.210.102-9 representada legalmente por el señor **ALFREDO ANTONIO CAMPO VERGARA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 84.459.627 por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

PARÁGRAFO PRIMERO. Una vez inscrita en el Registro Minero Nacional la presente resolución téngase a la empresa **MINERA LA MILAGROSA S.A,** como única titular del Contrato de Concesión No. **HJ6-08111**, y responsable ante la Agencia Nacional de Minería, de todas las obligaciones que se deriven del mismo.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Excluir del Registro Minero Nacional a la señora **SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIERREZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.532.019, una vez se inscriba el presente acto.

[1] *Concepto No. 2014120030374. Oficina Asesora Jurídica Agencia Nacional de Minería, 8 de septiembre de 2014.*

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PERFECCIONA UNA CESIÓN DE DERECHOS DENTRO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. HJ6-08111 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

PARÁGRAFO TERCERO: Cualquier cláusula estipulada dentro del contrato de cesión que se oponga a la constitución o la ley se entenderá por no escrita.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese la presente Resolución en forma personal a la señora **SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIERREZ**, y al señor **ALFREDO ANTONIO CAMPO VERGARA** representante legal de la empresa **MINERA LA MILAGROSA S.A**, o en su defecto, procédase mediante Edicto, de conformidad con el contenido del artículo 269 de la Ley 685 de 2001.

ARTÍCULO TERCERO.- Una vez en firme la presente resolución, remítase a la Gerencia de Catastro y Registro Minero Nacional, para que se proceda a la respectiva inscripción en el Registro Minero Nacional.

ARTÍCULO CUARTO.- Una vez inscrito el presente proveído, remítase el expediente a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente resolución procede recurso de reposición dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 15 ABR. 2016

Eduardo José Amaya Lacouture
Vicepresidente de Contratación y Titulación

Elaboró: Diego Olarte Grosso-Gestor Profesional-GEMTM-VCT
Revisó: Eva Isolina Mendoza Delgado – Experto G3 Grado 6 VCTM
Con funciones de Coordinación

RESOLUCIÓN No 0001926 **DE 2008**

(04 AGO. 2008)

"POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANTERA MAJO, LOCALIZADA A DOS KILÓMETROS DEL CORREGIMIENTO DE CUESTECITA – MUNICIPIO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, - CORPOGUAJIRA, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por los Decretos 3453 de 1983, modificado por la Ley 99 de 1993, 2811 de 1974, 1594 de 1984,948 de 1995, 1220 de 2005, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política establece en su artículo 8, que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, en concordancia con los artículos 79, 80 y 95 numeral 8 que dispone que todas las personas tengan derecho a gozar de un ambiente sano.

Que según el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, requieren de Licencia Ambiental la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje.

Que según el Articulo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOGUAJIRA, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que según el Articulo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOGUAJIRA, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, el aire y los demás recursos renovables, la cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos, líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire, o a los suelos, así como los vertimiento o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir o obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que el Articulo 9 Numeral 4 Literal C del Decreto 1220 de 2005, consagra que es competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales, otorgar o negar licencia ambiental para proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. *En el Sector Minero: La explotación minera de materiales de construcción: Cuando la explotación proyectada de mineral sea menor a 600.000 toneladas/año.*

Que mediante escrito de fecha 11 de Diciembre de 2007, recibido en esta entidad el día 14 del mismo mes y año, la señora SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIERREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No 36.532.019 de Santa Marta – Magdalena, presentó ante esta Corporación la solicitud de Licencia Ambiental del proyecto de Explotación de Materiales Pétreos para la Construcción de la Cantera Majo, localizada a dos (2) kilómetros del Corregimiento de Cuestecita – Municipio de Riohacha – La Guajira, para que fuese evaluado en sus aspectos ambientales.

Que anexo a la precitada solicitud, la peticionaria allegó:

- Estudio de Impacto Ambiental de la Cantera
- Plan de Manejo Ambiental de la Cantera
- Contrato de Concesión Minera celebrado entre INGEOMINAS y SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIERREZ número HJ6 – 08111 del 28 de Noviembre de 2006.

Que mediante Auto No 0091 de fecha 10 de Marzo de 2008, la Oficina Jurídica de CORPOGUAJIRA avocó conocimiento de dicha solicitud, previa liquidación del cobro por los servicios de evaluación y trámite del mismo por el área y ordenó correr traslado a la Subdirección de Gestión y Desarrollo Ambiental de esta entidad para los fines pertinentes.

Que en cumplimiento al precitado Auto, funcionarios comisionados de la Subdirección de Gestión Ambiental evaluaron el Estudio de Impacto Ambiental presentado, de lo que se derivó la necesidad de presentar información adicional por parte de la peticionaria en los siguientes aspectos: Descripción del proyecto; Identificación y evaluación de impactos; Plan de Manejo Ambiental; Inventario Forestal, etc., siendo requerido mediante oficio No 03.03.231 de fecha 12 de Mayo de 2008.

Que la información fue entregada el día 20 de Junio de 2008, en cumplimiento al requerimiento hecho dentro del proceso evaluativo del Estudio de Impacto Ambiental y allegada a la Oficina Jurídica para soporte del expediente el día 27 de Julio de 2008, previa solicitud realizada por esta dependencia mediante memo No 04.00.1700 de fecha 22 de Julio del mismo año.

Que allegada la información respectiva, mediante Informe Técnico No 03.03.345 de fecha 10 de Julio de 2008, funcionarios comisionados de CORPOGUAJIRA encargados de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto objeto de este acto administrativo, manifiesta el resultado de la evaluación de la siguiente forma:

LOCALIZACIÓN

La cantera MAJO se encuentra localizada en el predio Campo Alegre, en una extensión de 180 has en el Departamento de La Guajira, jurisdicción del Municipio de Albania y pertenece al corregimiento de Cuestecitas.

La cantera se encuentra a unos 105 msnm y enmarcada dentro de las siguientes coordenadas;

"Nuestro Compromiso es la Excelencia"
Cra. 7a No. 12 - 15 Edificio Corpoguajira Tels: (095) 7273905 - 7273652 - 7272581 - 7283472 Telefax: 7273904
e-mail:corpogua@telecom.com.co - www.corpoguajira.gov.co
Laboratorio: 7285052 - Fonseca: 7756123
Página 644 de 1754

N 11°10.83'06"
W 72°38.50'08"

La Cantera Majo está amparada por el titulo minero otorgado a la señora Sara Cecilia Noguera de Gutiérrez en un lote rural de 1.414 hectáreas y 9.321.5 M² sobre la margen izquierda de la vía pavimentada que desde Cuestecitas conduce al municipio de Riohacha, la ubicación y extensión está definida por las siguientes coordenadas geográficas:

COORDENADA NORTE	COORDENADA ESTE
1728781.160	1161731.520
PA	
1728550.000	1158673.000
1728859.000	1155030.000
1726529.000	1153024.000
1724331.000	1153634.000
1726338.000	1157165.000
1727020.000	1157779.000
1727500.000	1158212.000
1727901.000	1158573.000

Se resalta que a pesar de que el contrato de concesión minera fue otorgado para el área relacionada con anterioridad, para esta ocasión, la Licencia Ambiental se solicita para un área de 188 Has + 8.088 M², enmarcadas dentro de las siguientes coordenadas;

Delta	ESTE	NORTE	E X N	N X E
1	1156952,0	1728833,0	2,00012E+12	2,00021E+12
2	1156973,0	1728782,0	1,99777E+12	1,99946E+12
3	1156573,0	1726725,0	1,997551E+12	1,99525E+12
4	1155509,0	1727091,0	1,99567E+12	1,99567E+12
5	1155509,0	1727091,0	1,99771E+12	1,99686E+12
6	1156200,0	1728858,0	1,99886E+12	1,99994E+12
7	1156799,0	1728818,0	1,99991E+12	2,00016E+12
1	1156952,0	1728833,0	0	0

DESCRIPCION DEL PROYECTO

En la Cantera Majo se aplicará el tipo de explotación denominado explotación a cielo o tajo abierto, con el sistema de explotación por bancos descendentes. Se proyecta la conformación de 6 bancos en forma descendentes lo cual permite la revegetalización luego de que se haga la extracción del máximo material del banco propuesto.

En el sentido de explotación será descendente y de norte a sur con las siguientes características operativas:

- *Número de Bancos: Seis (6)*
- *Altura de Banco: 10 a 13 metros.*

Cra. 12 - 15 Edificio Corpoguajira Tels: (095) 7273905 - 7273652 - 7272581 - 7283472 Telefax: 7273904
e-mail:corpogua@telecom.com.co - www.corpoguajira.gov.co

- Ancho Final de Banco: 5 metros
- Angulo de Cara de Banco: 75° a 80°

Este método es factible para la explotación del terreno concesionado principalmente por la poca altura de las colinas que conforman la cantera y la estabilidad de la roca que permite estabilidades en ángulos superiores a 80°.

La explotación será de tipo tradicional, entre baja y mediana escala y a cielo abierto, formando frentes de trabajo de 10 a 13 metros de altura y longitud variable, consistirá en las siguientes etapas:

Limpieza y Acondicionamiento de la Superficie del Terreno ("destape" del material "estéril" de cobertura).

Esta etapa consiste en la extracción y acondicionamiento del suelo vegetal y de los áridos del siguiente perfil edáfico (horizonte A, y del horizonte B). El material retirado se utilizará en la restauración de secciones agotadas del yacimiento. A la vez que se proyecta la realización de la apertura de un nuevo frente, al tiempo que serán cerrados frentes agotados, a los que se les aplicará el proceso de abandono desarrollado más adelante. El material de cobertura retirado en los nuevos destapes se depositará en frentes agotados. La actividad se realizará mediante el uso de palas retroexcavadoras y cargadores frontales.

Construcción De Los Caminos Internos

En el caso de la cantera Majo, el proceso de explotación hará uso de los caminos que se encuentran en la finca Campo Alegre (como se denomina toda el área), simplemente se deberá hacerle mantenimiento respectivo, como en algunos sectores se encuentran enmontados. La circulación de la maquinaria y el equipo que se empleen dentro de la cantera se realizará sobre la superficie del propio yacimiento. Para asegurar el acceso de volquetas y su circulación al interior de la cantera Majo, se recurrirá de los equipos que operarán en la actividad de explotación y aprovechamiento.

Selección de áreas para el acondicionamiento temporario del "estéril"

Durante la explotación de la cantera, se generará material estéril sin valor económico (otras rocas y minerales). Estos se almacenarán en los sitios de acopio de material al interior de la misma cantera. El material será utilizado durante el abandono parcial.

Diseño de frentes y perforación mecánica (en caso de requerirse)

Esta etapa consistirá en la realización de perforaciones sobre la superficie de roca a desprender del yacimiento. Las perforaciones se realizarían utilizando un novedoso sistema mecánico el cual será informado a la corporación previa utilización.

Carga con traxcavator o cargador frontal

Esta etapa consiste en cargar el material en las volquetas para transportarlo a la trituradora primaria. La carga será realizada con maquinaria pesada: cargador frontal o traxcavator. Las máquinas se alternarán de acuerdo a la disposición del material.

Transporte interno del material en volquetas hasta el sistema de trituración en la cantera.

El transporte de material será realizado en volquetas desde el yacimiento hasta la trituradora. Los caminos a utilizar para comunicar el yacimiento en la cantera y la trituradora serán los existentes en la finca.

Abandono parcial o definitivo de la cantera

Se diferencia abandono parcial de abandono definitivo de la cantera de acuerdo a si se van cerrando frentes de explotación parciales o si se cierra todo el yacimiento. Las actividades de una u otra modalidad son las mismas aunque a escalas distintas. Estas actividades se desarrollarán con base al programa de restauración del área de la cantera. El abandono consiste en,
- Traslado de áridos desde los acopios a los sitios a rellenar.
- Restitución (colocación) del suelo vegetal.
- Suavización de las pendientes.
- Plantación de especies arbóreas de rápido crecimiento para fijar el suelo (prevaleciendo especies endémicas).
En esta etapa se busca conservar la configuración de los drenajes naturales del terreno.
Durante el Proyecto Minero no se realizará, ni se requerirá realizar, ningún tipo de tratamiento o pretratamiento de la materia prima mineral que produzca relaves, subproductos o desechos contaminantes, por lo tanto no existirán emisiones líquidas, salvo las de tipo domiciliario (pozo séptica).

LABORES DE EXPLOTACIÓN

La extracción se realiza con los equipos de arranque, carga y transporte; con la siguiente frecuencia de procesos.

1. ***Descapote:*** *Durante esta etapa se retira el material no útil que se encuentra sobre el yacimiento (cantera) y que comprende la cobertura vegetal, la capa orgánica del suelo con un espesor medio de 25 cms. y la roca alterada (máximo 20 cms.) Esta operación se realiza mediante el uso de un buldózer.*

2. ***Arranque mecánico:*** *Luego del descapote el material rocoso a extraer que se encuentra ya expuesto, es arrancado y cortado por medio de un buldózer, previo uso de explosivos cuando sea necesario.*

Cra. 7a. No. 12 - 15 Edificio Corpoguajira Tels: (095) 7273905 - 7273652 - 7272581 - 7283472 Telefax: 7273904
e-mail:corpogua@telecom.com.co - www.corpoguajira.gov.co

3. ***Cargue y transporte:*** *Por medio de excavadoras o mediante el uso del buldózer el material es cargado a volquetas con capacidad entre 7 y 12 M^3 las cuales transportan el material pétreo hasta el sitio de disposición, de donde será vertido a la trituradora.*

PLANTA TRITURADORA

A continuación se describen las operaciones que comprenderá la Planta de Trituración de la roca que sea extraída,

El material está compuesto por rocas sedimentarias de esquistos con un tamaño máximo de 30 pulgadas. El volumen aproximado a extraer durante la primera etapa del proyecto se calcula en 550.000 M^3 en 5 años.

La vía de intercomunicación entre el frente de explotación y el sitio donde se encontrará la trituradora es un camino interno de la misma finca Campo Alegre; sobre el cual se hará un continuo mantenimiento hasta el sitio de la cantera, desembocando en la vía nacional que une a Riohacha con el sur del departamento de la Guajira, en el sector Cuestecitas.

Se resalta que los materiales a producir se destinarán a dos sectores principales, a saber: a) repavimentación de las vías nacionales y veredales de la zona norte y central del sector Barrancas- Riohacha – Maicao. b) Obras civiles, vías internas y demás infraestructuras del proyecto Cerrejón y de las poblaciones cercanas.
El material a triturar con destino a la repavimentación de vías será del tipo "rodada asfáltica"; y según las especificaciones que fija el Instituto Nacional de Vías, consistirá en un material con piedras de tamaño máximo de ¾ de pulgadas y arenas bien gradadas.
El volumen de producción, dependiendo de la humedad del material se estima en 60 ton/hora aproximadamente.

El procedimiento que distinguirá el proceso de triturado del material, se relaciona a continuación:

Un cargador depositará el material de cantera en una plataforma cuya rampa será una parrilla clasificadora. El material grueso quedará en la parrilla y luego rodará al terreno y el material fino pasará por la parrilla y se acumulará debajo de la rampa. Tanto el material grueso como el fino serán recogidos y acarreados por el cargador a la trituradora primaria y a la tolva de pisos respectivamente.

La trituración de los peñones del material de cantera se efectuará en una máquina de molienda de la cual saldrán piedras con tamaños mayores de 3/4". La trituradora primaria requerirá de la presencia de dos (2) operarios para acomodar los peñones en la tolva de alimentación y darle el mantenimiento debido para su operación.

Cra. 7a. No. 12 - 15 Edificio Corpoguajira Tels: (095) 7273905 - 7273652 - 7272581 - 7283472 Telefax: 7273904
e-mail:corpogua@telecom.com.co - www.corpoguajira.gov.co

EVALUACION AMBIENTAL

El documento denominado Estudio de Impacto Ambiental de la cantera Majo, presentado por la señora Sara Cecilia Noguera de Gutiérrez está estructurado en las siguientes partes así: introducción, área de estudio, descripción del proyecto, descripción del ambiente, línea base ambiental, evaluación de efectos ambientales, recomendaciones para el control y mitigaciones de los impactos ambientales a generarse en el proyecto, plan de contingencia, medidas de seguridad industrial anexos.

Adicional al estudio de impacto ambiental presentado por la señora Sara Cecilia Noguera de Gutiérrez y por solicitud de Corpoguajira se presentó la Información complementaria al refererido. De acuerdo con la evaluación realizada se considera que el Plan de Manejo Ambiental contempla las medidas y acciones necesarias para prevenir, controlar, minimizar o compensar los efectos que se causen a los recursos naturales y al medio ambiente del área de influencia del proyecto, particularmente las siguientes:

- TRANSPORTE INTERNO DEL MATERIAL EN LA FINCA O CANTERA
- MANEJO EN EL APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL PÉTREO
- MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y SÓLIDOS SUSPENDIDOS
- PROGRAMA PARA EL CARGUE Y DESCARGUE DEL MATERIAL
- PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
- PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRABAJADORES PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LAS ÁREA QUE SEAN EXPLOTADAS ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS
- MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES
- MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CAMPAMENTO Y EN LA ZONA DE EXPLOTACIÓN EN LA CANTERA
- RESCATE ARQUEOLÓGICO
- PLAN DE CONTINGENCIA.

EVALUACION Y CONCEPTO TECNICO DEL INVENTARIO FORESTAL

Uno de los elementos fundamentales en el momento de evaluar las operaciones forestales son los inventarios forestales, debido a que aportan información valiosa para el conocimiento de las características fundamentales del bosque como especies existentes, estructura, volúmenes por especie, grupo de especies totales y dinámica de la vegetación, entre otros aspectos que a través de su análisis permiten que las corporaciones autónomas regionales, en nuestro caso CORPOGUAJIRA, puedan tener elementos de juicio para otorgar o negar un aprovechamiento forestal solicitado, además estipular la posibilidad de volumen que se puede extraer del bosque por especie en un determinado tiempo y por unidad de área y recomendar técnicas de manejo forestal entre otros aspectos silviculturales de interés.

Cra 7a. No. 12 - 15 Edificio Corpoguajira Tels: (095) 7273905 - 7273652 - 7272581 - 7283472 Telefax: 7273904
e-mail:corpogua@telecom.com.co - www.corpoguajira.gov.co

Antes de haber programado y realizar la visita de campo, el funcionario de CORPOGUAJIRA responsable de la revisión del inventario, verificara y analizara en la oficina toda la información relacionada con el estudio a fin de determinar si se cumple o no con los requisitos exigidos por la normatividad vigente. En caso de no existir deficiencias se realizara la visita de campo y en caso contrario, será necesario generar un concepto técnico y un acto administrativo notificando al usuario o su representante legal al respecto, presentando las recomendaciones para mejorar la información.

REVISION CARTOGRAFICA

Con fundamento en la cartografía presentada por el usuario y en lo señalado en el parágrafo del artículo 23 del Decreto 2811 de 1.974, se confrontaron entre otros los siguientes aspectos:

- *Se determinaron y constataron las coordenadas geográficas y planas.*
- *El Área solicitada objeto del inventario forestal se encuentra al interior del área solicitada en permiso o autorización.*
- *Se constataron las unidades de muestreo según el diseño del Inventario.*
- *No existe interposición con otra área solicitada, autorizada ni permisionada para aprovechamiento forestal.*
- *No se encuentra al interior de un área protegida o declarada o por declarar por las autoridades ambientales, Departamentales o Nacionales, como Parque Nacional Natural o Reserva Forestal Protectora.*
- *El área no se encuentra al interior de una de las reservas forestales creadas por la Ley 2ª de 1959.*
- *El área no se encuentra al interior de resguardo indígena ni en área titulada o en proceso de titulación de las comunidades negras.*

REVISION DEL INVENTARIO FORESTAL

Se reviso el diseño definido para la realización del inventario, confrontando los parámetros establecidos para esta clase de inventario forestal seleccionado, el cual es de tipo aleatorio. Se verifico el cálculo con las formas apropiadas de los indicadores de tendencia central como la media y los indicadores de dispersión como el error estándar.

En el presente documento denominado "ESTUDIO DE IMPACTO PARA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL DE LA CANTERA LA MAJO (EXPLOTACION Y APROVECHAMIENTO DE MATERIALES PETREOS), EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ALBANIA-LA GUAJIRA", se tiene que:

- *Es un Inventario forestal que registra variables dasométricas como por ejemplo el diámetro a la altura del pecho (D.A.P), la altura total, que permiten el cálculo del área basal, el volumen comercial, volumen total, IVI de las especies, etc.,*

Cra. No. 12 - 15 Edificio Corpoguajira Tels: (095) 7273905 - 7273652 - 7272581 - 7283472 Telefax: 7273904
e-mail:corpogua@telecom.com.co - www.corpoguajira.gov.co
Laboratorio: 7286052 Pagaca: 7756122

Nombre Común	Nombre Científico	Familia	Abundancia absoluta	Abundancia relativa	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Dominancia absoluta	Dominancia relativa
Ceiba bruja	*Ceiba pentandra (L.) Gaertn*	Bombacaceae	4	3,10	56,3	3,90	0,6	29,0
Indio desnudo	*Bursera simarouba (L.) Sarg.*	Burseraceae	5	3,88	56,3	3,90	0,5	19,8
Caucho	*Ficus sp*	Moraceae	4	3,10	56,3	3,90	0,3	12,0
Puy	*Tabebura bilbergi (Cham.) Syandl.*	Bignoniaceae	9	6,98	56,3	3,90	0,2	7,4
Tatamaco	*Bursera tomentosa (Jacq.) Triana & Planch*	Burseraceae	12	9,30	37,5	2,60	0,1	2,8
Guamacho	*Peireskia sp*	Cactaceae	9	6,98	56,3	3,90	0,1	2,9
Guaimaro	*Brosimum alicastrum (Pitt.) Berg.*	Moraceae	6	4,65	75,0	5,19	0,1	2,6
Vara santa	*Triplaris lineniana Weed*	Poligonaceae	7	5,43	56,3	3,90	0,1	2,1
Hobo	*Spondias mombin L.*	Anacardiaceae	3	2,33	56,3	3,90	0,1	5,1
Gusanero	*Astronium graveolens Jacq.*	Anacardiaceae	6	4,65	75,0	5,19	0,0	0,1
Guacimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	Sterculiaceae	5	3,88	56,3	3,90	0,1	2,2
Cedrillo	*Guarea guidonia (L.) Sleumer*	Meliaceae	6	4,65	56,3	3,90	0,0	1,0
Pringamosa	*Urera sp*	Urticaceae	6	4,65	37,5	2,60	0,0	1,7
Guayabo de leon	*Adenaria sp*	Lythraceae	5	3,88	56,3	3,90	0,0	0,6
Aceituno	*Vitex cymosa Bertero ex Spreng*	Verbenaceae	3	2,33	37,5	2,60	0,1	2,4
Cauchillo	*Clarisia sp*	Moraceae	2	1,55	37,5	2,60	0,0	1,0
Barbasquillo	*Phyllanthus sp*	Euphorbiaceae	2	1,55	37,5	2,60	0,0	1,0
Uvito	*Cordia dentata Poir*	Boraginaceae	3	2,33	37,5	2,60	0,0	0,2
Corazon fino	*Platymiscium hebestachyum Benth.*	Fabaceae	2	1,55	37,5	2,60	0,0	0,6
Morito	*Maclura tinctoria (L.) D Don ex Steud*	Moraceae	2	1,55	37,5	2,60	0,0	0,6
Toco blanco	*Amyris sp*	Rutaceae	2	1,55	37,5	2,60	0,0	0,5
Mamoncillo	*Melicoccus bijugatus Jacq*	Sapindaceae	2	1,55	37,5	2,60	0,0	0,1
Limonacho	*Achatocarpus nigricans Tr*	Achatocarpaceae	2	1,55	37,5	2,60	0,0	0,1
Maya	*Puya sp*	Bromeliaceae	2	1,55	37,5	2,60	0,0	0,0
Ceiba amarilla	*Hura crepitans (L.)*	Euphorbiaceae	3	2,33	18,8	1,30	0,0	0,2
Cruceto	*Crescentia cujete L.*	Bignoniaceae	2	1,55	18,8	1,30	0,0	0,7
Olivo	*Capparis sp*	Capparaceae	2	1,55	18,8	1,30	0,0	0,4
Huevo de venado	*Stemmadenia sp*	Apocynaceae	2	1,55	18,8	1,30	0,0	0,2
Casero	*Caseana sp*	Flacourtiaceae	1	0,78	18,8	1,30	0,0	0,7
Cañaguate	*Tabebeuia crysantha Chryseum Miranda*	Bignoniaceae	1	0,78	18,8	1,30	0,0	0,6
Tachuelo	*Zanthoxylum monophyllum (Lam) P Wilson*	Rutaceae	1	0,78	18,8	1,30	0,0	0,4
Jaboncillo	*Isertia sp*	Rubiaceae	1	0,78	18,8	1,30	0,0	0,3
Escobillo	*Xylopia sp*	Annonaceae	1	0,78	18,8	1,30	0,0	0,3
Varo blanco	*Phyllostylon rhamnoides (J. Poiss)*	Ulmaceae	1	0,78	18,8	1,30	0,0	0,2
Ebano	*Caesalpinia ebano*	Caesalpinaceae	1	0,78	18,8	1,30	0,0	0,1
Mestre	*Pterygota colombiana Cuatrec*	Sterculiaceae	1	0,78	18,8	1,30	0,0	0,1
Lechero	*Calotropis sp*	Asclepiadaceae	1	0,78	18,8	1,30	0,0	0,0
Caracoli	*Anacardium excelsum Skeels*	Anacardiaceae	1	0,78	18,8	1,30	0,0	0,0
Carreto	*Aspidosperma polyneurum Müell. Arg*	Apocynaceae	1	0,78	18,8	1,30	0,0	0,0
			129	100	1443,8	100	2,6	100,0

Que según Concepto Técnico emanado de CORPOGUAJIRA, previa evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, anexos y demás información relacionada, conceptúa que es viable otorgar Licencia Ambiental a la señora SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIERREZ para el proyecto de explotación de materiales pétreos para la construcción de la Cantera Majo, localizada a dos (2) kilómetros del Corregimiento de Cuestecitas – Municipio de Riohacha – La Guajira.

Exp. 024/08 Licencia Ambiental Cantera Majo

Que de igual forma, se considera viable otorgar Permiso de Vertimiento de Aguas Residuales, Permiso de Emisión Atmosférica y de Aprovechamiento Forestal.

Que en razón y mérito de lo anteriormente expuesto, la Directora General de CORPOGUAJIRA,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a la señora SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía No 36.532.019 de Santa Marta – Magdalena, para el proyecto de explotación de materiales pétreos para la construcción de la Cantera Majo, localizada a dos kilómetros del Corregimiento de Cuestecitas – Municipio de Riohacha – La Guajira.

PARAGRAFO: La Licencia Ambiental que se otorga, incluye los permisos o concesiones para el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, citados en la parte considerativa de esta Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: PERMISO DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:

Se otorga a la señora SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIERREZ, Permiso de Vertimiento de Aguas Residuales para el proyecto de explotación de materiales pétreos para la construcción de la Cantera Majo – Riohacha – La Guajira, por un término de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

En la cantera Majo se generaran aguas residuales de tipo domestico provenientes de la batería sanitaria para el servicio de los trabajadores. Las aguas residuales son captadas y conducidas a un pozo séptico con campo de infiltración como tratamiento y disposición final.

ARTICULO TERCERO: PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICA

Se otorga a la señora SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIERREZ, Permiso de Emisiones Atmosférica para la operación de una planta de trituración de material pétreo en la Cantera Majo ubicada en el predio Campo Alegre, área rural del Municipio de riohacha, a dos kilómetro de Cuestecitas, por el término de dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTICULO CUARTO: PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

Considerando la fragilidad del bosque en donde se realizara la futura explotación de material pétreo, las especies forestales encontradas y constadas en campo, la importancia ecológica que representa en la región y para CORPOGUAJIRA, la ubicación estratégica en el ecosistema, y el numero de hectáreas totales del predio, además del recorrido general por la zona de importancia, se hace necesario realizar un ajuste en el volumen solicitado y en el área a explotar consistente al 60% de lo solicitado. El 40% restante (60 hectáreas) serán áreas de conservación y preservación, cabe anotar que esta área será constituida por la cota mas alta del predio.

Cra. 7a. No. 12 - 15 Edificio Corpoguajira Tels: (095) 7273905 - 7273652 - 7272581 - 7283472 Telefax: 7273904
e-mail:corpogua@telecom.com.co - www.corpoguajira.gov.co

En el siguiente cuadro se expresa el área total del predio, el volumen solicitado, y a su vez el ajuste realizado por el funcionario evaluador de la solicitud de aprovechamiento forestal.

AREA TOTAL DEL PREDIO	AREA SOLICITADA DE EXPLOTACION	AREA OTORGADA	VOLUMEN SOLICITADO	VOLUMEN CONCEDIDO	VOLUMEN TOTAL A LIQUIDARSE POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A TASA FORESTAL (25% Biomasa del Volumen concedido)
200 hectáreas	150 hectáreas	90 hectáreas	3.688,71 M3	2.213,226	2.766,53

PARAGRAFO PRIMERO: El Inventario Forestal presentado en el documento "ESTUDIO DE IMPACTO PARA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL DE LA CANTERA MAJO (EXPLOTACION Y APROVECHAMIENTO DE MATERIALES PETREOS), EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ALBANIA-LA GUAJIRA", contempla **VERACIDAD** de la información mostrada, ya que se realizaron cálculos de estadigrafos que permitieron hacer interpretaciones sustentadas en cálculos matemáticos y apartados de la subjetividad, considerándose factible aceptar por parte de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira -CORPOGUAJIRA, el capitulo de Inventario Forestal expresado en dicho documento.

PARAGRAFO SEGUNDO: El aprovechamiento forestal a realizar es de tipo Único, el valor a pagar por concepto de tasa forestal es de $27.919.820,7 pesos ($10.092 tasa por aprovechamiento Único X 2.766,53 metros Cúbicos de madera en pie).

PARAGRAFO TERCERO: Al analizar la dimensión del área a aprovechar, la dificultad en la topografía del predio, la consistencia del terreno, y el desarrollo dasómetrico expresado en fuste y altura de algunos individuos a apear, se confiere un plazo de tres (3) años para la culminación de actividades (si es necesario aplicarlas) relacionadas con el aprovechamiento forestal.

ARTICULO QUINTO: Los permisos que se otorgan en este acto administrativo podrán ser renovados dentro de los tres (3) meses antes a su vencimiento, salvo por razones de conveniencia pública o cuando la autoridad ambiental así lo considere.

ARTICULO SEXTO: La señora SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIERREZ en desarrollo de las actividades propias del proyecto, deberá cumplir con cada una de las medidas y acciones presentadas en el Estudio de Impacto Ambiental / Plan de Manejo Ambiental entregado a CORPOGUAJIRA.

PARÁGRAFO PRIMERO: La señora NOGUERA DE GUTIERREZ debe cumplir con las siguientes ***recomendaciones*** que a continuación se relacionan:

Cra. No. 12 - 15 Edificio Corpoguajira Tels: (095) 7273905 - 7273652 - 7272581 - 7283472 Telefax: 7273904
e-mail:corpogua@telecom.com.co - www.corpoguajira.gov.co
Laboratorio: 7286962 Fax: 7276133

1. Implementar todas las medidas de manejo necesario para evitar, minimizar y controlar los impactos que se puedan originar por la ejecución del proyecto.

2. El transporte de materiales, equipos y maquinaria se hará con las medidas de seguridad necesarias, según lo establecido en la resolución 00541 del 14 de diciembre de 1994.

3. El cargue, descargue transporte y disposición final de los materiales de extracción, debe realizarse de acuerdo a lo establecido por la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, que entre otros aspectos ordena que:

- Los vehículos transportadores dispongan de platones o contenedores con las caracteristicas necesarias para impedir la fuga o derrame de material transportado.

- Una vez terminadas las obras, se deberá efectuar limpieza de todos los materiales y residuos sobrantes de las actividades realizadas según resolución 00541 de 1994.

- Se deberán retirar cada veinticuatro horas los materiales de desecho que queden como residuos de la ejecución de la obra.

4. Informar a CORPOGUAJIRA del inicio y una vez terminen las actividades propuestas a fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones impuestas y coordinar el seguimiento ambiental de este proyecto.

5. Respetar las prevenciones ambientales e implementar las Medidas de Manejo Ambiental propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado ante Corpoguajira.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La señora NOGUERA DE GUTIERREZ debe cumplir con las siguientes ***obligaciones*** que a continuación se relacionan:

a) Implementar todas las medidas de manejo necesario para evitar, minimizar y controlar los impactos a la masa forestal que se puedan originar por la ejecución del proyecto.

b) Efectuar el monitoreo de los recursos vegetales en especial latizales y brinzales de la masa forestal remanente que se requieran para evaluar los posibles impactos sobre dichos recursos e implementar las acciones correctivas que correspondan.

c) Informar a Corpoguajira del inicio y una vez termine la actividad a fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones impuestas y coordinar el seguimiento ambiental de este proyecto.

d) Como medida de Compensación Y Mitigación del Aprovechamiento forestal realizar el establecimiento y mantenimiento minimo de dos (2) años de 100 hectáreas con especies nativas de la zona de influencia del proyecto en lugares identificados por la Corpoguajira mediante la propuesta de Ordenación forestal planteada por CONIF.

Cra. 7 No. 12 - 15 Edificio Corpoguajira Tels: (095) 7273905 - 7273652 - 7272581 - 7283472 Telefax: 7273904
e-mail:corpogua@telecom.com.co - www.corpoguajira.gov.co

e) Entregar en su momento a Corpoguajira el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal de las ciento veinte (120) hectáreas a reforestar, en donde se exprese claramente las especies forestales a plantar, distancia de siembra de 4mtsx4mts, y los correspondientes conceptos técnicos de ingenieria forestal en siembra de plantaciones protectoras.

f) Respetar el volumen concedido de aprovechamiento forestal único y mantener la cobertura vegetal definida en la parte alta del predio, la cual cumple funciones de Conservación tanto en flora como en fauna en el ecosistema evaluado.

ARTICULO SEPTIMO: Esta licencia se otorga por un período igual al de la duración del Proyecto,

PARÁGRAFO PRIMERO: Esta Licencia podrá ser suspendida, modificada o revocada por CORPOGUAJIRA, cuando el beneficiario haya incumplido cualquiera de los términos, condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a ella consagrados en la ley, los reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento.

ARTICULO OCTAVO: Esta Resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial o Página WEB de Corpoguajira.

ARTICULO NOVENO: Por la Oficina Juridica de esta Corporación, notificar a la señora SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIERREZ identificada con la cédula de ciudadanía No 36.532.019 de Santa Marta, o a su apoderado.

ARTICULO DECIMO: Por la Oficina Juridica de esta Corporación, notificar al Procurador Ambiental, Judicial y Agrario – Seccional Guajira.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición escrito interpuesto dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación personal o por edicto de la presente Resolución.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Esta providencia rige a partir de la fecha de su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira a los, 04 AGO. 2008

ANA CECILIA CASTILLO PARODI
Directora General

Proyectó: A. Majo
Revisó: A. Julio

Exp. 024/08 Licencia Ambiental Cantera Majo

CANTERA MAJO
Jurisdicción del Municipio de Albania – La Guajira
Coordinación de Gestión Ambiental

Santa Marta, Agosto 5 de 2013

CORPOGUAJIRA
No. 20133300139572
Al responder por favor citese este numero
Fecha Radicado 05/08/2013 17:15:07
Radicador:

Doctora:
FANNY ESTHER MEJÍA RAMÍREZ
Sub-Directora de Calidad Ambiental
CORPOGUAJIRA
E. S. D.

Ref: CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE ROCA O PIEDRA CALIZA EN BRUTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N° NJ6-08111 CELEBRADO ENTRE El INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA Y LA SEÑORA SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIÉRREZ. RESOLUCIÓN N° 0001926 DE 2008 "POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PÉTREOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANTERA MAJO, LOCALIZADA A DOS KILÓMETROS DEL CORREGIMIENTO DE CUESTECITAS – MUNICIPIO DE ALBANIA, LA GUAJIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".
Asunto: Respuesta a su comunicación N° 20133300084631 fechada Julio 26 de 2013, a través de la cual solicita notificación de la Resolución N° 0944 del 19 de Junio de 2013. SOLICITUD NOTIFICACIÓN POR AVISO.

Cordial saludo,

Amparado en lo dispuesto en el Articulo 69 de la Ley 1437 del 18 de Enero de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), respetuosamente le solicito a usted, se sirva surtir notificación por aviso o por conducta concluyente de la Resolución N° 0944 de fecha 19 de Junio de 2013 "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN".

De manera respetuosa, solicito hacer entrega de una copia del precitado Acto Administrativo, al Ing. Donis Alberto.

Atentamente,

Sra. Sara Noguera de Gutiérrez
c.c. 36.532.019 de Santa Marta - Magdalena
Titular del Contrato de Concesión N° HJ6-08111
y beneficiaria de la Licencia Ambiental otorgada

Corpoguajira

RESOLUCIÓN No. 0944 **DE 2013**

(19 JUN 2013)

"POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Decretos 3453 de 1983, modificado por la Ley 99 de 1993, Decretos 2811 de 1974, 1753 de 1994, 541 de 1994, 1594 de 1984, 948 de 1995, 2820 de 2010 y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, mediante Resolución No. 0001926 de fecha 04 de agosto de 2008, otorgo Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de materiales pétreo para la construcción de la cantera Majo, localizada a dos kilómetro del corregimiento de Cuestecitas, jurisdicción del Municipio de Riohacha – La Guajira, a la señora SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIÉRREZ.

Que mediante oficio presentado en la Corporación el día Veintitrés (23) de Enero de 2013 y recibido el día 24 del mismo mes y año, con radicado interno Nº 20133300105272, la señora SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIÉRREZ, en su condición de Titular de Contrato de Concesión Nº HJ6-08111, presento solicitud de modificación de la Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de materiales pétreos para la construcción de la cantera Majo, ubicada a dos kilómetros del corregimiento de Cuestecita en Jurisdicción del Municipio de Riohacha – La Guajira, para que fuese evaluada en sus aspectos ambientales.

Que mediante Resolución No 0372 de fecha 14 de Marzo de 2013, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA modifico la Resolución 01926 del 04 de Agosto de 2008 y dicto otras disposiciones.

Que la precitada Resolución fue notificada por aviso, donde se envío el oficio con radicado No 20133300073341 el día 19 de Abril de 2013 conforme a lo establecido en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011.

Que la señora SARA NOGUERA DE GUTIÉRREZ en su condición de Titular de Contrato de Concesión Nº HJ6-0811, mediante escrito recibido en esta Corporación con Radicado Interno Nº 20133300123702 de fecha 29 de Abril de 2013, interpuso recurso de reposición contra la Resolución No 00372 de 2013.

FUNDAMENTOS DEL RECURRENTE:

"Que mediante Resolución N° 0001926 fechada 4 de Agosto de 2008, Corpoguajira le otorgó Licencia Ambiental al Contrato de Concesión Minera HJ6-08111, suscrito entre INGEOMINAS y mi persona.

Posteriormente, mediante oficio fechado 23 de Enero de 2013, de manera formal ante la Corporación solicité la modificación de la precitada Resolución, destacando que para la sustentación de la solicitud, fueron contratos los servicios de un equipo interdisciplinario, formularon el Estudio de Impacto Ambiental que sustentó la solicitud.

El interior del Estudio de Impacto Ambiental radicado en la Corporación y sobre el cual técnica y ambientalmente se sustentó la solicitud, se incluyó el levantamiento topográfico con el cuadro de coordenadas que delimita el área de extracción que fue solicitada en ampliación.

Además, en desarrollo del Capítulo II, del Estudio de Impacto Ambiental formulado y presentado ante Corpoguajira para su evaluación, correspondió la descripción técnica del Proyecto y/o actividad minera, en donde fue definida como área de extracción bajo el

siguiente cuadro de coordenadas, destacando que ella, tienen como base la plancha oficial del ICAG:

COORDENADAS		
	ESTE	NORTE
1	1156956.20	1728695.61
2	1156891.90	1728364.98
3	1157878.44	1728617.39
4	1157844.13	1728289.38

Cuadro de coordenadas del área solicitada en ampliación, incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental y el plano topográfico del área

Posteriormente, con el lleno de los requisitos exigidos por la legislación vigente, la Corporación expidió en primera instancia, el Auto N° 029 de 2013, y cumplido todo el procedimiento y pagos correspondientes, el día 14 de Marzo de 2013 la Corporación expidió la Resolución N° 0372 de 2013.

Como resultado de las gestiones respectivas, y analizando el contenido del preciado Acto Administrativo, me percaté que el ARTÍCULO SEGUNDO, en donde la Corporación define el ÁREA DE EXTRACCIÓN, existe un error de transcripción por parte de la Corporación, precisamente en que en el cuadro de coordenadas, las que corresponden a las Coordenadas NORTE, se encuentran ubicadas en las Coordenadas del ESTE, lo que me hace deducir que el error se centra en que la identificación de las columnas están invertidas, osea que donde fue escrito NORTE, corresponde a la identificación ESTE y viceversa, así:

Cuadro de coordenadas incluidas en el Artículo Segundo de la Resolución N° 0372 de 2013

PUNTO	NORTE	ESTE
1	1156956.20	1728695.61
2	1156891.90	1728364.98
3	1157878.44	1728617.39
4	1157844.13	1728289.38

A simple vista podría uno solo expresar, que es un error de transcripción, pero en plano, realmente la equivocación es astronómica, porque al plasmarlo en plano, el área autorizada por Corpoguajira en el Artículo Segundo de la precitada Resolución, estaría dando como ubicación en el Departamento del Amazonas (Municipio de Leticia, más específicamente), lo cual no corresponde a la realidad.

De igual forma, en el ARTÍCULO TERCERO, sobre Permiso de Aprovechamiento Forestal, establece que se me otorga el respectivo Permiso para las 31 Has, autorizando para ello los 974.26 M³ solicitados de manera formal para un periodo de un (1) año. Sobre ello, respetuosamente resultaría casi imposible hacer el aprovechamiento respectivo en el tiempo otorgado por la Corporación.

Finalmente en el ARTÍCULO CUARTO, se me conmina a cancelar la suma de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ML ($ 17.685.741), por concepto de la tasa de aprovechamiento forestal, basado en el respectivo permiso de aprovechamiento forestal, sin tener en cuenta el inicio y avance de las actividades mineras, que generalmente enmarcan a éste tipo de Proyectos.

ASPECTO PROCEDIMENTAL

De acuerdo al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ley 1437 del 18 de enero de 2011, en su Artículo 3° establece:

*(...)**Artículo 3°. Principios.** Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.*

*Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, **eficacia, economía y celeridad. (Negrilla fuera de texto)***

*(...)11. **En virtud del principio de eficacia**, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.*

*12. **En virtud del principio de economía**, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.*

*13. **En virtud del principio de celeridad**, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas (...)*

PETICIÓN

Solicito la **MODIFICACIÓN** de la Resolución N° 0372 del 14 de Marzo de 2013, "*POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 0001926 DEL 04 DE AGOSTO DE 2008, POR LA CUAL SE OTORGA LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PÉTREOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANTERA MAJO, LOCALIZADA A DOS KILÓMETROS DEL CORREGIMIENTO DE CUESTECITAS, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES*".

Primero: Modificar el ARTÍCULO SEGUNDO, cuya transcripción es: ÁREA DE EXTRACCIÓN: El alcance del área de la Licencia Ambiental otorgada a la señora SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIÉRREZ deberá abarcar la misma área contemplada en el Contrato de Concesión Minera N° HJ6-08111 otorgada por INGEOMINAS y georeferenciada en la siguiente tabla:

PUNTO	NORTE	ESTE
1	1156956.20	1728695.61
2	1156891.90	1728364.98
3	1157878.44	1728617.39
4	1157844.13	1728289.38

Y modificar el cuadro de Coordenadas de la Resolución, que tiene un error de transcripción, que corresponde a que en la columna identificada como NORTE, en realidad, debe identificar a la dirección ESTE y viceversa, para que finalmente, el área de extracción autorizada, quede enmarcada y corresponda al área que fue solicitada en ampliación, para que finalmente el área realmente otorgada desde el inicio del trámite, cubra el área de interés, y sobre todo corresponda a la realidad y jurisdicción de La Guajira.

COORDENADAS		
	ESTE	NORTE
1	1156956.20	1728695.61
2	1156891.90	1728364.98
3	1157878.44	1728617.39
4	1157844.13	1728289.38

Segundo: Modificar el ARTÍCULO TERCERO en cuanto a ampliar por lo menos Tres (3) años, la vigencia del permiso de Aprovechamiento Forestal, para que corresponda a la realidad de la actividad minera y al área ampliada.

Tercero, Modificar el ARTÍCULO CUARTO, en el sentido de permitirme hacer el pago de la tasa forestal, liquidada en DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ML ($ 17.685.741), en un tiempo diferido o dividido en varios plazos, proponiendo para ello, hacer los pagos respectivos en tres cuotas en el tiempo en que sea modificada la vigencia del permiso de que trata el Artículo Tercero, justificado en que en la medida en que avance la actividad minera, se generan ingresos para el titular, lo que permitiría así disponer de los recursos necesarios para cumplir con el requerimiento elevado por la Corporación.

COMPETENCIA DE ESTA CORPORACIÓN PARA RESOLVER

Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política de 1991 es obligación del Estado y de los particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que la Constitución Política elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano (Art. 79 de la C.N.). El medio ambiente es un Derecho colectivo que debe ser protegido por el Estado, estableciendo todos los mecanismos necesarios para su protección.

Que adicionalmente el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. (Art. 80 C.N.). La planificación se realiza mediante una serie de mecanismos que permitan analizar, evaluar y prever unas circunstancias que faciliten la toma de decisión, con el fin de alcanzar un objetivo propuesto, en este caso, el Desarrollo Sostenible.

Que el artículo 50 del decreto 01 de 1984, dispone que el recurso de reposición debe interponerse ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que lo aclare, modifique o revoque.

Que el recurso de reposición fue interpuesto dentro del término legal previsto para tal efecto con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo, por tal motivo esta Corporación procederá a resolverlo, teniendo en cuenta cada una de las cuestiones planteadas por el recurrente.

Que de conformidad con el Artículo 56 y ss del Código Contencioso Administrativo, la administración procederá a decidir de fondo sobre los argumentos planteados por el recurrente.

Que los mencionados requisitos que deben cumplir los recurrentes, tiene por finalidad hacer posible y eficaz el control de legalidad por parte de la administración pública ante quien se interponen. Y respecto de los motivos de inconformidad, se tiene con criterio no unánime de la jurisprudencia contenciosa administrativa que, deben coincidir, necesariamente, con los conceptos de violación en caso de demanda.

ANÁLISIS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

Que una vez analizado el Recurso presentado por la señora SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIÉRREZ nos permitimos manifestar lo siguiente:

El Artículo 2 de la Resolución 01926 del 04 de Agosto de 2008, señala lo siguiente: *"El alcance del área de la licencia ambiental otorgada a la señora SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIÉRREZ deberá abarcar la misma área contemplada en el contrato de concesión minera No. HJ6 - 08111 otorgado por INGEOMINAS y georreferenciada en la siguiente Tabla:*

PUNTO	NORTE	ESTE
1	1156956.20	1728695.61
2	1156891.90	1728364.98
3	1157878.44	1728617.39
4	1157844.13	1728289.38

La señora Noguera de Gutiérrez informa que en la solicitud de modificación, al igual que en el Estudio de Impacto Ambiental entregado a CORPOGUAJIRA, se establecen iguales coordenadas que las presentadas en el contrato de concesión HJ6-08111, y que estas son:

PUNTO	ESTE	NORTE
1	1156956.20	1728695.61
2	1156891.90	1728364.98
3	1157878.44	1728617.39
4	1157844.13	1728289.38

Que el hecho que las palabras norte y este se encuentren intercambiadas, hace que el área de polígono sea muy diferente a la del contrato de concesión, que tal error pudo deberse a un descuido en la transcripción.

Por lo tanto, y una vez se analizaron las informaciones, se encontró que las coordenadas establecidas en el magnético que se adjunto a la solicitud de modificación obedece a lo establecido en la Resolución 01926 del 04 de Agosto de 2008, pero no existe ninguna incompatibilidad desde el punto de vista ambiental, para que las coordenadas se modifiquen y queden de la siguiente manera:

PUNTO	ESTE	NORTE
1	1156956.20	1728695.61
2	1156891.90	1728364.98
3	1157878.44	1728617.39
4	1157844.13	1728289.38

Por lo tanto se deben intercambiar las palabras Norte y Este, entre sí.

Por otra parte el Artículo Tercero de la citada Resolución señala que se debe "*Otorgar a la señora SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIÉRREZ, permiso de aprovechamiento forestal de 974.26 m3, en un 31 hectáreas aproximadamente, ubicado a dos kilómetros del corregimiento de Cuestecitas, Jurisdicción del Municipio de Riohacha – La Guajira, para el proyecto en mención por un término de un (01) año el cual podrá ser prorrogado previa solicitud a CORPOGUAJIRA un mes antes de la fecha de vencimiento*".

A lo cual la solicitante requiere que el mismo permiso se extienda a un periodo de tres (3) años, atendiendo que sería el tiempo necesario para ir ocupando el territorio e ir realizando por etapas tal aprovechamiento forestal.

En este caso, y una vez analizados los documentos que soportan el tema, es pertinente entrar a analizar esta solicitud, para tal efecto es necesario que la señora Noguera de Gutiérrez, entregue un plan de de avance del aprovechamiento porcentuado por etapas, donde se determine con la debida georreferenciación en el área del proyecto, los avances del mismo en periodos mensuales y anuales, proyectando las 31 Has aproximadas, versus el volumen de material a intervenir por etapa.

En cuanto, al pago de la tasa forestal, liquidada en DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ML ($17.685.741) en un tiempo diferido o dividido en varios plazos, me permito señalarle que este despacho no acoge su solicitud por las siguientes razones:

El profesor JUAN CAMILO RESTREPO en su libro de Hacienda Pública, consagra: *«Los ingresos públicos se dividen de manera general en dos grandes grupos: Ordinarios y Extraordinarios. Los primeros son aquellos que con cierta regularidad ingresan a los presupuestos públicos, los segundos aquellos que ingresan de manera esporádica. Por su parte y de acuerdo con la terminología utilizada en los presupuestos nacionales, los ingresos públicos se han dividido en ingresos tributarios y no tributarios. Los primeros incluyen el producido de los impuestos, mientras que los segundos son todos aquellos no considerados impuestos, como es el caso de las tasas, multas, rentas de origen contractual y fondos especiales».*

De acuerdo con lo señalado, se colige que la tasa, en sentido específico, representa un ingreso ordinario no tributario que deben pagar los particulares por ciertos servicios que presta el Estado.

En 1982 el INDERENA a través del acuerdo 048 establece una tasa para el aprovechamiento de los bosques naturales, públicos y privados. Esta tasa se muestra como un desincentivo a la deforestación, y para ello se dotó a cada Corporación Autónoma Regional de la posibilidad de operarlas libremente en sus respectivos ámbitos territoriales. Estas tasas se dirigen al desarrollo de programas de reforestación, tales como el establecimiento de viveros, construcciones de infraestructura, establecimiento y manejo de plantaciones y demás labores afines al manejo de bosques naturales, como también a programas de investigación de este recurso.

Con la entrada en vigor del Decreto – Ley 2811 de 1974 o Código de los Recursos Naturales se retoma el tema de las tasas, y se fortalecen algunas de las ya existentes y se crean otras, así mismo la ley 99 de 1993 establece la importancia de estos ingresos tributarios.

CORPOGUAJIRA revisó los alegatos presentados por la señora SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIERREZ y no accede a la petición de esta, al considerar que la misma debe cancelar el valor por tasa forestal en las condiciones establecidas en el Artículo Cuarto de la Resolución No 0372 de 2013, ya que bajo el principio del Contaminador – Pagador, nuestro país ha desarrollado importantes instrumentos económicos dentro de la dinámica financiera de la gestión ambiental, en tal orden quien causa el deterioro paga los gastos requeridos para prevenir o corregir el mismo.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA CORPORACIÓN

Que el acto administrativo impugnado, era susceptible únicamente del recurso de reposición, el cual fue interpuesto dentro del término legal de los Diez (10) días hábiles, dado que fue notificada por aviso, donde se envió el oficio el día 19 de Mayo de 2013; la Señora SARA NOGUERA DE GUTIÉRREZ en su condición de Titular de Contrato de Concesión Nº HJ6-0811, mediante escrito recibido en esta Corporación con Radicado Interno Nº 20133300123702 de fecha 29 de Abril de 2013, interpuso recurso de reposición contra la Resolución No 00372 de 2013, interpuso el mencionado recurso, dando cumplimiento a los requisitos exigidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

Que la vía gubernativa constituye una prerrogativa de los particulares o interesados que mueve a la administración pública expedidora del acto para que lo revise en una misma instancia o en control jerárquico, mediante la interposición de los recursos procedentes, para que corrija los errores o falencias en que pudo incurrir al proferir el acto administrativo, o confirmar sus propias decisiones.

Que los recursos por la vía gubernativa no han sido establecidos como oportunidades puramente formales destinadas a agotar una etapa indispensable para acudir a la jurisdicción, sino que cumplen una función material, en cuya virtud se brinda al administrado la oportunidad procesal para ejercer el derecho de plantear los motivos de inconformidad que le asistan, a efectos de lograr conforme a derecho que la administración reconsidere la decisión tomada a efectos de revocarla, modificarla o aclararla.

Corpoguajira

0944

19 JUN 2013

Que es deber de la administración decidir en derecho el acto impugnado, habiéndose ejercido en oportunidad legal el derecho de contradicción, para garantizar el debido proceso y sujeción al principio de legalidad consagrado en nuestro ordenamiento jurídico.

Después de examinados los criterios expuestos por La Señora SARA CECILIA NOGUERA GUTIERREZ, se procederá a MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Recurrida, accediendo a la primera petición, no siendo procedente las demás peticiones por las razones expuestas anteriormente.

Que en razón y mérito de lo anteriormente expuesto el Director General de CORPOGUAJIRA,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo Segundo de la Resolución No 0372 de fecha 14 de Marzo de 2013, según las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo, el cual quedará así:

> ***ARTICULO SEGUNDO: AREA DE EXTRACCION*** *"El alcance del área de la licencia ambiental otorgada a la señora SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIÉRREZ deberá abarcar la misma área contemplada en el contrato de concesión minera No. HJ6 - 08111 otorgado por INGEOMINAS y georreferenciada en la siguiente Tabla:*

PUNTO	*ESTE*	*NORTE*
1	*1156956.20*	*1728695.61*
2	*1156891.90*	*1728364.98*
3	*1157878.44*	*1728617.39*
4	*1157844.13*	*1728289.38*

ARTÍCULO SEGUNDO: Queda vigente y aplicable las demás obligaciones contenidas en la Resolución 1926 del 4 de agosto de 1998, No 0372 de 14 de Marzo de 2013 , en lo no modificado en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Por la Subdirección de Calidad Ambiental de esta Corporación, notificar a la señora SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIERREZ, o a su apoderado.

ARTÍCULO CUARTO: Por la Subdirección de Calidad Ambiental, notificar al Procurador Judicial, Agrario y Ambiental – Seccional La Guajira.

ARTICULO QUINTO: Esta Resolución deberá publicarse en la página WEB y en el Boletín oficial de CORPOGUAJIRA.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso.

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira, a los 19 JUN 2013

LUIS MANUEL MEDINA TORO
Director General

Proyectó: A. Mendoza
Revisó: F. Mejía

Corpoguajira

RESOLUCION N° 0376 DE 2017

(03 MAR 2017)

"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCION No. 0001926 DEL 4 DE AGOSTO DE 2008 PARA EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PETREOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANTERA MAJO, LOCALIZADA A DOS KILÓMETROS DEL CORREGIMIENTO DE CUESTECITA – MUNICIPIO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, "CORPOGUAJIRA", en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el Decreto 3453 de 1983, modificado por la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974, 1753 de 1994, 2820 DE 2010 y,

CONSIDERANDO:

Que la Corporación Autónoma Regional de la Guajira - CORPOGUAJIRA, mediante Resolución No. 0001926 de fecha 04 de Agosto de 2008, otorgó Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de materiales pétreo para la construcción de la Cantera Majo, localizada a dos kilómetro del corregimiento de Cuestecita, jurisdicción del Municipio de Riohacha – La Guajira, a la señora SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIÉRREZ identificada con cédula de ciudadanía No 36.532.019 expedida en Santa Marta – Magdalena.

Que CORPOGUAJIRA mediante Resolución No 0372 del 14 Marzo de 2013, modificó la Resolución No 0001926 de 2008, la cual otorgo Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de materiales pétreo para la construcción de la Cantera Majo, localizada a dos kilómetros del corregimiento de Cuestecitas, Jurisdicción del Municipio de Riohacha – La Guajira, ampliando en 31 Has + 2447 m² el yacimiento minero.

Que mediante escrito de fecha 5 de Agosto de 2016 y radicado en esta Corporación bajo el No ENT – 783 del día 6 del mismo mes y año, la señora SARA CECILIA NOGUERA GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía No 36.532.019 en su condición de titular de la precitada Licencia Ambiental solicita autorización de Cesión Total de Derechos y Obligaciones emanada de la Resolución No 1926 de fecha 4 de Agosto de 2008 a la Empresa MINERA LA MILAGROSA SA con NIT No 900210102-9 y representada legalmente por la señora ANA CAROLINA ARIZA TOVAR identificada con la cédula de ciudadanía No 49.608.479, para lo cual se anexó Contrato de Cesión de Derechos y obligaciones de la Licencia Ambiental celebrado entre las partes, incluyendo copia de los documentos de identificación y certificado de existencia y representación legal.

Que en el documento de Cesión de Derechos y Obligaciones suscrita entre las partes establecieron lo siguiente en la Cláusula Primera: OBJETO: *El presente contrato tiene por objeto la cesión de derechos y obligaciones emanados de la licencia ambiental otorgada por CORPOGUAJIRA mediante Resolución No 0001926 de 4 de Agosto de 2008, por ello se expresa a manera de cuerpo cierto lo siguiente: EL CEDENTE transfiere a titulo de cesión a favor del CESIONARIO , el 100% de los derechos y obligaciones emanados de la licencia ambiental para la exploración y explotación de un yacimiento de minerales que son: PROYECTO DE EXPLORACION TECNICA Y EXPLOTACION ECONOMICA DE UN YACIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, así como los que se hallaren asociado o en liga intima o resultaren como sub-productos de la explotación, que se encuentren en el área demarcada dentro del área del título minero identificado con el número HJ6-08111; el área que comprende la licencia ambiental, se encuentra ubicada en jurisdicción del Municipio de Albania – Departamento de La Guajira.*

Que mediante Auto de Tramite No. 1229 de fecha 21 de Octubre de 2016, la Subdirección de Autoridad Ambiental avocó conocimiento de la solicitud de la Cesión Total de Derechos y Obligaciones acordada entre la señora SARA CECILIA NOGUERA GUTIERREZ y la empresa MINERA LA MILAGROSA SA.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que la Constitución Nacional consagra en el artículo 8°: "Es obligación del estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación".

Que así mismo, el artículo 79 ibídem determina: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".

Que el artículo 80 ibídem preceptúa: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas".

Que en la figura jurídica de la cesión es requisito imprescindible, el consentimiento de la parte en cuyo favor se cede, lo cual haría ineficaz la cesión, con lo cual se entiende que el cesionario asume las obligaciones inherentes del título cedido (C.S.J Sentencia Junio 15 de 1993).

Que el Artículo 5° del Código de Procedimiento Civil dispone que cualquier vacío en las disposiciones del presente Código, se llenará con las normas que regulen casos análogos, y a falta de éstas con los principios constitucionales y generales del derecho procesal.

Que el Artículo 8° de la Ley 153 de 1887, establece que, "Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho", de donde se desprende que, en tanto existan figuras jurídicas afines debidamente reguladas, se podrá, de conformidad con el artículo citado, aplicar la figura de analogía.

Que los presupuestos de aplicación de la analogía son: "a) la ausencia de norma expresa aplicable al caso; y, b) que se trate de asuntos similares, uno de ellos regulado en forma expresa por el legislador;" teniendo en cuenta que según el principio de analogía "donde existe una misma razón de hecho debe existir una misma disposición de derecho."

Que cuando por analogía, se aplica la norma a una situación no contemplada explícitamente en ella, pero esencialmente igual, para los efectos de su regulación jurídica, a la que sí lo está. Esta modalidad se conoce en doctrina como analogía Legis, y se la contrasta con la analogía juris en la cual, a partir de diversas disposiciones del ordenamiento, se extraen los principios generales que las informan, por una suerte de inducción, y se aplican a casos o situaciones no previstas de modo expreso en una norma determinada.

ARTÍCULO 2.2.2.3.8.4. Cesión total o parcial de la licencia ambiental; El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se deriven.

En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental competente identificando si es cesión total o parcial y adjuntando para el efecto:

a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y representación legal, en caso de ser personas jurídicas;

b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto: obra o actividad;

c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario deberán anexar un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y obligaciones de la licencia ambiental y de sus actos administrativos expedidos con posterioridad.

Cra. 7 No 12 - 25
www.corpoguajira.gov.co
Riohacha - Colombia.

La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los actos administrativos que fueren necesarios para el efecto.

En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá los derechos y obligaciones derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial en el estado en que se encuentren.

Que de lo anterior, se colige que una vez reunido los requisitos legales señalados anteriormente, para obtener la Cesión de Derechos y Obligaciones, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA como máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción y en cumplimiento de sus funciones, autorizar la cesión, objeto de este acto administrativo.

Que teniendo en cuenta que CORPOGUAJIRA fue la entidad encargada de otorgar la Licencia Ambiental, es la entidad competente para autorizar la Cesión correspondiente.

En razón y mérito de lo anteriormente expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la Cesión Total de Derechos y Obligaciones originados y derivados de la Resolución No. 0001926 de fecha 04 de Agosto de 2008 emanada de esta Corporación, relacionada con la Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de materiales pétreo para la construcción de la Cantera Majo, localizada a dos kilómetro del corregimiento de Cuestecita, jurisdicción del Municipio de Riohacha – La Guajira, otorgada a la señora SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIÉRREZ identificada con cédula de ciudadanía No 36.532.019 expedida en Santa Marta – Magdalena, a favor de la Empresa MINERA LA MILAGROSA SA con NIT No 900210102-9 y representada legalmente por la señora ANA CAROLINA ARIZA TOVAR identificada con la cédula de ciudadanía No 49.608.479, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Tómese a la Empresa MINERA LA MILAGROSA SA con NIT No 900210102-9 y representada legalmente por la señora ANA CAROLINA ARIZA TOVAR identificada con la cédula de ciudadanía No 49.608.479, como Titular de todos los derechos y obligaciones derivados de la Resolución No. 0001926 de fecha 04 de Agosto de 2008 emanada de esta Corporación, relacionada con la Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de materiales pétreo para la construcción de la Cantera Majo, localizada a dos kilómetro del corregimiento de Cuestecita, jurisdicción del Municipio de Riohacha – La Guajira, quien asume como cesionario.

ARTICULO TERCERO: La cesión que se autoriza por esta Corporación, producirá los correspondientes efectos jurídicos entre el cedente y cesionario.

ARTICULO CUARTO: La Empresa MINERA LA MILAGROSA SA, será responsable ante CORPOGUAJIRA, de las obligaciones contenidas en los actos administrativos objeto de cesión, a partir de la firmeza de la presente resolución.

ARTICULO QUINTO: Por la Subdirección de Autoridad Ambiental de esta Corporación notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora SARA CECILIA NOGUERA DE GUTIÉRREZ identificada con cédula de ciudadanía No 36.532.019 y la empresa MINERA LA MILAGROSA SA con NIT No 900210102-9 y representada legalmente por la señora ANA CAROLINA ARIZA TOVAR identificada con la cédula de ciudadanía No 49.608.479 o a sus apoderados debidamente constituidos.

ARTÍCULO SEXTO: Por la Subdirección de Autoridad Ambiental de esta Corporación notificar el contenido de la presente Resolución a la Procuraduría Ambiental y Agraria para su información y fines pertinentes.

ARTICULO SEPTIMO: La presente Resolución deberá publicarse en la página WEB y/o en el Boletín Oficial de CORPOGUAJIRA.

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición, conforme a lo dispuesto en la ley 1437 de 2011.

ARTICULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, a los 03-MAR 2017

LUIS MANUEL MEDINA TORO
Director General

Proyectó: J. Palomino
Revisó: F. Mejía

CORPOGUAJIRA

RIOHACHA, 20 abril/2017
EN LA FECHA NOTIFIQUE PERSONALMENTE EL CONTENIDO DE LA
PROVIDENCIA QUE ANTECEDE AL SR. Jessica
Cotes Gil C.C. 40.935.249
LE ADVERTI DE LOS RECURSOS QUE PROCEDEN. ENTERADO EN
CONSTANCIA FIRMA
EL NOTIFICADO. Jessica Cotes Gil
EL NOTIFICADOR.

ARTICULO SEPTIMO: La presente Resolución deberá publicarse en la página WEB y/o en el Boletín Oficial de CORPOGUAJIRA.

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición, conforme a lo dispuesto en la ley 1437 de 2011.

ARTICULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, a los 03-MAR 2017

LUIS MANUEL MEDINA TORO
Director General

Proyectó: J. Palomino
Revisó: F. Mejía

CORPOGUAJIRA

RIOHACHA, 20 abril/2017

EN LA FECHA NOTIFIQUE PERSONALMENTE EL CONTENIDO DE LA PROVIDENCIA QUE ANTECEDE AL SR. Jessica Cotes Gil C.C. 40.935.249

LE ADVERTI DE LOS RECURSOS QUE PROCEDEN. ENTERADO EN CONSTANCIA FIRMA

EL NOTIFICADO. Jessica Cotes Gil

EL NOTIFICADOR.

MINERA LA MILAGROSA S.A.S.
(NIT. 900.210.102-9)

HACE CONSTAR

Que la firma INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA MACUIRA S.A., identificada con Nit. 825000164-2, se encuentra actualmente desarrollando actividad minera como OPERADOR MINERO en el Contrato de Concesión No. HJ6-08111, localizado en los municipios de Riohacha, Albania y Hatonuevo, en el departamento de la Guajira, Colombia.

La presente se expide por la gerencia del titular minero Minera La Milagrosa S.A.S. a los 29 días del mes de octubre de 2.024.

Atentamente,



ANA CAROLINA ARIZA TOVAR
C.C. No. 49.608.479
Representante Legal
MINERA LA MILAGROSA S.A.S.
Titular Minero No. HJ6-08111
Para notificaciones:
Email: mineralamilagrosa@hotmail.com
Teléfono: 4210408
Dirección: Calle 24 No. 3 -95 OFIC.1503, Ed. Banco de Bogotá
Santa Marta, Magd., Col.

NOS PERMITIMOS INFORMARLE QUE AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, EXISTEN PETICIONES EN TRÁMITE, LO QUE PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN EL MISMO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: MINERA LA MILAGROSA S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900210102-9
ADMINISTRACIÓN DIAN : SANTA MARTA
DOMICILIO : SANTA MARTA

MATRICULA – INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 109312
FECHA DE MATRÍCULA : ABRIL 01 DE 2008
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : ABRIL 10 DE 2024
ACTIVO TOTAL : 1,746,640,494.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 4 23 B 40 OF 1503
BARRIO : CENTRO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 47001 - SANTA MARTA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 4222455
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : mineralamilagrosa@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 4 23 B 40 OF 1503
MUNICIPIO : 47001 - SANTA MARTA
BARRIO : CENTRO
CORREO ELECTRÓNICO : mineralamilagrosa@hotmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : mineralamilagrosa@hotmail.com

CERTIFICA – ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : B0811 - EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRITA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : B0812 - EXTRACCION DE ARCILLAS DE USO INDUSTRIAL, CALIZA, CAOLIN Y BENTONITAS
OTRAS ACTIVIDADES : B0990 - ACTIVIDADES DE APOYO PARA OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
OTRAS ACTIVIDADES : B0899 - EXTRACCION DE OTROS MINERALES NO METALICOS N.C.P.

CERTIFICA – CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 542 DEL 12 DE MARZO DE 2008 OTORGADA POR NOTARIA PRIMERA DE SANTA MARTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21872 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE ABRIL DE 2008, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA MINERA LA MILAGROSA S.A..

CERTIFICA – ACLARATORIAS A LA CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 621 DEL 19 DE MARZO DE 2008 OTORGADA POR NOTARIA PRIMERA DE SANTA MARTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21873 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE ABRIL DE 2008, SE DECRETÓ : ESCRITURA ACLARATORIA DE LA OCNSTITUCION DE LA SOCIEDAD COMERCIAL. MIM NERA LA MILAGROSA S.A..

ACLARACIÓN A LA CONSTITUCIÓN

ACLARATORIA: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000621 DE NOTARIA PRIMERA DE SANTA MARTA DEL 19 DE MARZO DE 2008 , INSCRITA EL 1 DE ABRIL DE 2008 BAJO EL NUMERO 00021873 DEL LIBRO IX, SE ACLARA LA CONSTITUCION DE LA PRESENTE PERSONA JURIDICA

CERTIFICA – RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) MINERA LA MILAGROSA S.A.
Actual.) MINERA LA MILAGROSA S.A.S.

CERTIFICA – CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 11 DEL 14 DE AGOSTO DE 2019 SUSCRITO POR REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 59964 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE AGOSTO DE 2019, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE MINERA LA MILAGROSA S.A. POR MINERA LA MILAGROSA S.A.S.

CERTIFICA – TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 11 DEL 14 DE AGOSTO DE 2019 SUSCRITA POR REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS , REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 59964 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE AGOSTO DE 2019, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS.

CERTIFICA – REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
AC-11	20190814	REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	SANTA MARTA	RM09-59964	20190828

CERTIFICA – VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA – OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL: 1. LA EXPLORACIÓN TÉCNICA Y EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE YACIMIENTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 2. LA EXPLOTACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE YACIMIENTOS DE ROCA O PIEDRA CALIZA. 3. LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR, GRAVAR, LIMITAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO TERRENOS, EDIFICIOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y. EN GENERAL, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; DAR O TOMAR DINEROS EN MUTUO, CON INTERÉS O SIN ELLOS, DAR EN GARANTÍA SUS ACTIVOS MUEBLES E INMUEBLES Y CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES DE CRÉDITO QUE LE PERMITAN OBTENER FONDOS U OTROS NEGOCIOS; Y EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRESENTE ARTICULO, Y TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL Y CONVENCIONAL DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑÍA. EN, GENERAL, REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL LÍCITA.

CERTIFICA – CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	100.000.000,00	1.000.000,00	100,00

CAPITAL SUSCRITO	100.000.000,00	1.000.000,00	100,00
CAPITAL PAGADO	100.000.000,00	1.000.000,00	100,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES – PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 2 DEL 20 DE MAYO DE 2020 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 63051 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE JUNIO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	ARIZA TOVAR ANA CAROLINA	CC 49,608,479

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 2 DEL 20 DE MAYO DE 2020 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 63051 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE JUNIO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	NOGUERA DE GUTIERREZ SARA CECILIA	CC 36,532,019

CERTIFICA – FACULTADES Y LIMITACIONES

ADMINISTRACIÓN: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUIEN SERÁ SU REPRESENTANTE LEGAL, TENDRÁ A SU CARGO LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECIÓN A LA LEY, A ESTOS ESTATUTOS, A LOS REGLAMENTOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ÉSTE A SU VEZ TENDRÁ UN SUBGERENTE QUIEN TENDRÁ SUS MISMAS FACULTADES Y LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES. FACULTADES DEL GERENTE: EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.SALVO LAS LIMITACIONES POR CUANTÍA QUE REQUIERAN EXPRESA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA. LIMITACIONES A LAS FACULTADES DEL GERENTE: LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS AUTORIZARA AL REPRESENTANTE LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ACTOS O CONTRATOS QUE SUPEREN LOS 20 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, PARA LOS ACTOS O CONTRATOS QUE SEAN IGUALES O INFERIORES A 20 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES EL GERENTE NO REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN PREVIA. LIMITACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: 9. DECRETAR LA ENAJENACION TOTAL DE LOS HABERES DE LA SOCIEDAD. 10. DELEGAR EN EL GERENTE AQUELLAS FUNCIONES CUYA DELEGACION NO ESTE PROHIBIDA POR LA LEY.

CERTIFICA – ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** MINERA LA MILAGROSA S.A.
MATRICULA : 109315
FECHA DE MATRICULA : 20080401
FECHA DE RENOVACION : 20240410
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
DIRECCION : CR 4 23 B 40 OF 1503
BARRIO : CENTRO
MUNICIPIO : 47001 - SANTA MARTA
TELEFONO 1 : 4210408
TELEFONO 3 : 4210408
CORREO ELECTRONICO : mineralamilagrosa@hotmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : B0811 - EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRITA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : B0812 - EXTRACCION DE ARCILLAS DE USO INDUSTRIAL, CALIZA, CAOLIN Y BENTONITAS
OTRAS ACTIVIDADES : B0990 - ACTIVIDADES DE APOYO PARA OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
OTRAS ACTIVIDADES : B0899 - EXTRACCION DE OTROS MINERALES NO METALICOS N.C.P.
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 1,746,640,494

INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA

CODIGO DE VERIFICACIÓN 6yTFK6Hdzh

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $2,664,572,618
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : B0811

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $7,900

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)


IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=32 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 6yTFK6Hdzh

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



Bibiana Margarita Ovalle De Andreis
Secretario

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

CRM-202410301532-647122 Fecha de Reporte: 30/oct/2024 15:32

CÓDIGO DE EXPEDIENTE:	HJ6-08111	**MODALIDAD:**	CONTRATO DE CONCESIÓN (L 685)	**FECHA Y HORA DE REGISTRO:**	27/jun/2007 00:00
VIGENCIA HASTA:	26/jun/2037	**ESTADO:**	Activo	**AUTORIDAD MINERA COMPETENTE:**	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

TITULARES			
NOMBRES	**TIPO**	**IDENTIFICACIÓN**	**USUARIO AnnA**
SOCIEDAD MINERA LA MILAGROSA S.A	NIT	900210102	40871

ÁREA TOTAL (ha):	1411.8835
MUNICIPIOS:	RIOHACHA-La Guajira, ALBANIA-La Guajira, HATONUEVO-La Guajira

MINERALES:	GRAVAS, RECEBO, ROCA O PIEDRA CALIZA

ANOTACIONES	
ANOTACIÓN:	1
FECHA DE ANOTACIÓN:	27/jun/2007
TIPO DE ANOTACIÓN:	CONTRATO UNICO DE CONCESION
FECHA EJECUTORIA:	28/nov/2006
TIPO DE DOCUMENTO:	CONTRATO
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	HJ6-08111
ESPECIFICACIÓN:	INSCRIPCION EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL DEL CONTRATO DE CONCESION NO. HJ6-08111

ANOTACIÓN:	2
FECHA DE ANOTACIÓN:	27/jul/2016
TIPO DE ANOTACIÓN:	CESION TOTAL DE DERECHOS
FECHA EJECUTORIA:	09/jun/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	RESOLUCION
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001256
	ARTÍCULO PRIMERO: PERFECCIONAR LA CESIÓN DEL 100% DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES que le corresponden a la señora SARA CECICILIA NOGUERA DE GUTIERREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.532.019 dentro del Contrato de Concesión No. HJ6-08111 a favor de la

Si encuentra inconsistencias en el documento, por favor repórtelas al siguiente vínculo https://pqrs.anm.gov.co/sgd.admin/faces/public/registropqrs.jspx

ESPECIFICACIÓN:	empresa MINERA LA MILAGROSA S.A. identificada con Nit. 900.210.102-9. PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez inscrita en el Registro Minero Nacional la Resolución No. 001256 téngase a la empresa MINERA LA MILAGROSA S.A., como única titular del Contrato de Concesión No. HJ6-08111, y responsable ante la Agencia Nacional de Minería, de todas las obligaciones que se deriven del mismo. De conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la Resolución No. 001256 del 15 de Abril de 2016.

ANOTACIÓN:	3
FECHA DE ANOTACIÓN:	06/ago/2019
TIPO DE ANOTACIÓN:	MODIFICA ETAPAS CONTRATO /RENUNCIA A ETAPA /EXPT. ANTICIPADA
FECHA EJECUTORIA:	24/jul/2019
TIPO DE DOCUMENTO:	RESOLUCION
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	GSC 29
ESPECIFICACIÓN:	ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la renuncia presentada por la titular minero del Contrato de Concesión No. HJ6-08111, al resto de la etapa de Construcción y Montaje. PARÁGRAFO: La anterior MODIFICACIÓN DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES, no implica la modificación de la duración total del Contrato de Concesión HJ6-08111, la cual continúa siendo de treinta años cuyas etapas quedarán así: tres (03) años para exploración; dos (2) años para construcción y montaje; y el término restante, esto es en principio veinticinco (25) años para explotación. De conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la Resolución GSC No. 29 del 30 de Enero de 2014.

ANOTACIÓN:	4
FECHA DE ANOTACIÓN:	20/ene/2023
TIPO DE ANOTACIÓN:	ACLARACION/MODIFICACION DE TITULO
FECHA EJECUTORIA:	19/ene/2023
TIPO DE DOCUMENTO:	OFICIO
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	Circular
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 2023
ESPECIFICACIÓN:	INSCRIPCIÓN en el Registro Minero Nacional de la entrada en producción en la información gráfica de los títulos mineros que se visualiza en el Sistema Integral de Gestión Minera –AnnA Minería-, de conformidad con lo comunicado a través de la Circular Externa No. 001 del 19 de enero de 2023, expedida por la Agencia Nacional de Minería en aplicación de lo dispuesto en la Resolución 370 del 16 de junio de 2021, proferida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, por medio de la cual se establece “el sistema de proyección cartográfica oficial para Colombia, específicamente, la determinación de distancias y áreas para todos los títulos mineros, se hará a partir del 20 de enero de 2023 con respecto la proyección cartográfica “Transverse Mercator” como sistema oficial de coordenadas planas para Colombia, con un único origen denominado “Origen Nacional”, referido al Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, también denominado MAGNA-SIRGAS”; es decir, el valor del área concedida para algunos títulos mineros, puede visualizarse mayor o menor, sin que esto signifique modificación del polígono otorgado.

CELDAS DEL TÍTULO
18P09G19B18Z, 18P09G19B19G, 18P09G19B19H, 18P09G19B19K, 18P09G19B19L, 18P09G19B19M, 18P09G19B19N, 18P09G19B19P, 18P09G19B19Q, 18P09G19B19R, 18P09G19B19S, 18P09G19B19T, 18P09G19B19U, 18P09G19B19V, 18P09G19B19W, 18P09G19B19X, 18P09G19B19Y, 18P09G19B19Z, 18P09G19B20K, 18P09G19B20L, 18P09G19B20M, 18P09G19B20N, 18P09G19B20P, 18P09G19B20Q, 18P09G19B20R, 18P09G19B20S, 18P09G19B20T, 18P09G19B20U, 18P09G19B20V, 18P09G19B20W, 18P09G19B20X, 18P09G19B20Y, 18P09G19B20Z, 18P09G19B22Z, 18P09G19B23D, 18P09G19B23E, 18P09G19B23H, 18P09G19B23I, 18P09G19B23J, 18P09G19B23L, 18P09G19B23M, 18P09G19B23N, 18P09G19B23P, 18P09G19B23Q, 18P09G19B23R, 18P09G19B23S, 18P09G19B23T, 18P09G19B23U, 18P09G19B23V, 18P09G19B23W, 18P09G19B23X, 18P09G19B23Y, 18P09G19B23Z, 18P09G19B24A, 18P09G19B24B, 18P09G19B24C, 18P09G19B24D, 18P09G19B24E, 18P09G19B24F, 18P09G19B24G, 18P09G19B24H, 18P09G19B24I, 18P09G19B24J, 18P09G19B24K,

Si encuentra inconsistencias en el documento, por favor repórtelas al siguiente vínculo https://pqrs.anm.gov.co/sgd.admin/faces/public/registropqrs.jspx

18P09G19B24L, 18P09G19B24M, 18P09G19B24N, 18P09G19B24P, 18P09G19B24Q, 18P09G19B24R, 18P09G19B24S, 18P09G19B24T, 18P09G19B24U, 18P09G19B24V, 18P09G19B24W, 18P09G19B24X, 18P09G19B24Y, 18P09G19B24Z, 18P09G19B25A, 18P09G19B25B, 18P09G19B25C, 18P09G19B25D, 18P09G19B25E, 18P09G19B25F, 18P09G19B25G, 18P09G19B25H, 18P09G19B25I, 18P09G19B25J, 18P09G19B25K, 18P09G19B25L, 18P09G19B25M, 18P09G19B25N, 18P09G19B25P, 18P09G19B25Q, 18P09G19B25R, 18P09G19B25S, 18P09G19B25T, 18P09G19B25U, 18P09G19B25V, 18P09G19B25W, 18P09G19B25X, 18P09G19B25Y, 18P09G19B25Z, 18P09G19C16K, 18P09G19C16L, 18P09G19C16M, 18P09G19C16N, 18P09G19C16P, 18P09G19C16Q, 18P09G19C16R, 18P09G19C16S, 18P09G19C16T, 18P09G19C16U, 18P09G19C16V, 18P09G19C16W, 18P09G19C16X, 18P09G19C16Y, 18P09G19C16Z, 18P09G19C17Q, 18P09G19C17R, 18P09G19C17S, 18P09G19C17T, 18P09G19C17U, 18P09G19C17V, 18P09G19C17W, 18P09G19C17X, 18P09G19C17Y, 18P09G19C17Z, 18P09G19C18Q, 18P09G19C18R, 18P09G19C18S, 18P09G19C18T, 18P09G19C18U, 18P09G19C18V, 18P09G19C18W, 18P09G19C18X, 18P09G19C18Y, 18P09G19C18Z, 18P09G19C19Q, 18P09G19C19V, 18P09G19C19W, 18P09G19C19X, 18P09G19C19Y, 18P09G19C19Z, 18P09G19C20V, 18P09G19C20W, 18P09G19C20X, 18P09G19C20Y, 18P09G19C20Z, 18P09G19C21A, 18P09G19C21B, 18P09G19C21C, 18P09G19C21D, 18P09G19C21E, 18P09G19C21F, 18P09G19C21G, 18P09G19C21H, 18P09G19C21I, 18P09G19C21J, 18P09G19C21K, 18P09G19C21L, 18P09G19C21M, 18P09G19C21N, 18P09G19C21P, 18P09G19C21Q, 18P09G19C21R, 18P09G19C21S, 18P09G19C21T, 18P09G19C21U, 18P09G19C21V, 18P09G19C21W, 18P09G19C21X, 18P09G19C21Y, 18P09G19C21Z, 18P09G19C22A, 18P09G19C22B, 18P09G19C22C, 18P09G19C22D, 18P09G19C22E, 18P09G19C22F, 18P09G19C22G, 18P09G19C22H, 18P09G19C22I, 18P09G19C22J, 18P09G19C22K, 18P09G19C22L, 18P09G19C22M, 18P09G19C22N, 18P09G19C22P, 18P09G19C22Q, 18P09G19C22R, 18P09G19C22S, 18P09G19C22T, 18P09G19C22U, 18P09G19C22V, 18P09G19C22W, 18P09G19C22X, 18P09G19C22Y, 18P09G19C22Z, 18P09G19C23A, 18P09G19C23B, 18P09G19C23C, 18P09G19C23D, 18P09G19C23E, 18P09G19C23F, 18P09G19C23G, 18P09G19C23H, 18P09G19C23I, 18P09G19C23J, 18P09G19C23K, 18P09G19C23L, 18P09G19C23M, 18P09G19C23N, 18P09G19C23P, 18P09G19C23Q, 18P09G19C23R, 18P09G19C23S, 18P09G19C23T, 18P09G19C23U, 18P09G19C23V, 18P09G19C23W, 18P09G19C23X, 18P09G19C23Y, 18P09G19C23Z, 18P09G19C24A, 18P09G19C24B, 18P09G19C24C, 18P09G19C24D, 18P09G19C24E, 18P09G19C24F, 18P09G19C24G, 18P09G19C24H, 18P09G19C24I, 18P09G19C24J, 18P09G19C24K, 18P09G19C24L, 18P09G19C24M, 18P09G19C24N, 18P09G19C24P, 18P09G19C24Q, 18P09G19C24R, 18P09G19C24S, 18P09G19C24T, 18P09G19C24U, 18P09G19C24V, 18P09G19C24W, 18P09G19C24X, 18P09G19C24Y, 18P09G19C24Z, 18P09G19C25A, 18P09G19C25B, 18P09G19C25C, 18P09G19C25D, 18P09G19C25E, 18P09G19C25F, 18P09G19C25G, 18P09G19C25H, 18P09G19C25I, 18P09G19C25J, 18P09G19C25K, 18P09G19C25L, 18P09G19C25M, 18P09G19C25N, 18P09G19C25P, 18P09G19C25Q, 18P09G19C25R, 18P09G19C25S, 18P09G19C25T, 18P09G19C25U, 18P09G19C25V, 18P09G19C25W, 18P09G19C25X, 18P09G19C25Y, 18P09G19C25Z, 18P09G19D16V, 18P09G19D21A, 18P09G19D21F, 18P09G19E15J, 18P09G19E15N, 18P09G19E15P, 18P09G19E15T, 18P09G19E15U, 18P09G19E15Y, 18P09G19E15Z, 18P09G19E20D, 18P09G19E20E, 18P09G19E20J, 18P09G19E20P, 18P09G19E20U, 18P09G19F02D, 18P09G19F02E, 18P09G19F02I, 18P09G19F02J, 18P09G19F02M, 18P09G19F02N, 18P09G19F02P, 18P09G19F02R, 18P09G19F02S, 18P09G19F02T, 18P09G19F02U, 18P09G19F02V, 18P09G19F02W, 18P09G19F02X, 18P09G19F02Y, 18P09G19F02Z, 18P09G19F03A, 18P09G19F03B, 18P09G19F03C, 18P09G19F03D, 18P09G19F03E, 18P09G19F03F, 18P09G19F03G, 18P09G19F03H, 18P09G19F03I, 18P09G19F03J, 18P09G19F03K, 18P09G19F03L, 18P09G19F03M, 18P09G19F03N, 18P09G19F03P, 18P09G19F03Q, 18P09G19F03R, 18P09G19F03S, 18P09G19F03T, 18P09G19F03U, 18P09G19F03V, 18P09G19F03W, 18P09G19F03X, 18P09G19F03Y, 18P09G19F03Z, 18P09G19F04A, 18P09G19F04B, 18P09G19F04C, 18P09G19F04D, 18P09G19F04E, 18P09G19F04F, 18P09G19F04G, 18P09G19F04H, 18P09G19F04I, 18P09G19F04J, 18P09G19F04K, 18P09G19F04L, 18P09G19F04M, 18P09G19F04N, 18P09G19F04P, 18P09G19F04Q, 18P09G19F04R, 18P09G19F04S, 18P09G19F04T, 18P09G19F04U, 18P09G19F04V, 18P09G19F04W, 18P09G19F04X, 18P09G19F04Y, 18P09G19F04Z, 18P09G19F05A, 18P09G19F05B, 18P09G19F05C, 18P09G19F05D, 18P09G19F05E, 18P09G19F05F, 18P09G19F05G, 18P09G19F05H, 18P09G19F05I, 18P09G19F05J, 18P09G19F05K, 18P09G19F05L, 18P09G19F05M, 18P09G19F05N, 18P09G19F05P, 18P09G19F05Q, 18P09G19F05R, 18P09G19F05S, 18P09G19F05T, 18P09G19F05U, 18P09G19F05V, 18P09G19F05W, 18P09G19F05X, 18P09G19F05Y, 18P09G19F05Z, 18P09G19F06E, 18P09G19F06I, 18P09G19F06J, 18P09G19F06M, 18P09G19F06N, 18P09G19F06P, 18P09G19F06R, 18P09G19F06S, 18P09G19F06T, 18P09G19F06U, 18P09G19F06V, 18P09G19F06W, 18P09G19F06X, 18P09G19F06Y, 18P09G19F06Z, 18P09G19F07A, 18P09G19F07B, 18P09G19F07C, 18P09G19F07D, 18P09G19F07E, 18P09G19F07F, 18P09G19F07G, 18P09G19F07H, 18P09G19F07I, 18P09G19F07J, 18P09G19F07K, 18P09G19F07L, 18P09G19F07M, 18P09G19F07N, 18P09G19F07P, 18P09G19F07Q, 18P09G19F07R, 18P09G19F07S, 18P09G19F07T, 18P09G19F07U, 18P09G19F07V, 18P09G19F07W, 18P09G19F07X, 18P09G19F07Y, 18P09G19F07Z, 18P09G19F08A, 18P09G19F08B, 18P09G19F08C, 18P09G19F08D, 18P09G19F08E, 18P09G19F08F, 18P09G19F08G, 18P09G19F08H, 18P09G19F08I, 18P09G19F08J, 18P09G19F08K, 18P09G19F08L, 18P09G19F08M, 18P09G19F08N, 18P09G19F08P, 18P09G19F08Q, 18P09G19F08R, 18P09G19F08S, 18P09G19F08T, 18P09G19F08U, 18P09G19F08V, 18P09G19F08W, 18P09G19F08X, 18P09G19F08Y, 18P09G19F08Z, 18P09G19F09A, 18P09G19F09B, 18P09G19F09C, 18P09G19F09D, 18P09G19F09E, 18P09G19F09F, 18P09G19F09G, 18P09G19F09H, 18P09G19F09I, 18P09G19F09J, 18P09G19F09K, 18P09G19F09L, 18P09G19F09M, 18P09G19F09N, 18P09G19F09P, 18P09G19F09Q, 18P09G19F09R, 18P09G19F09S, 18P09G19F09T, 18P09G19F09U, 18P09G19F09V, 18P09G19F09W, 18P09G19F09X, 18P09G19F09Y, 18P09G19F09Z, 18P09G19F10A, 18P09G19F10B, 18P09G19F10C, 18P09G19F10D, 18P09G19F10E, 18P09G19F10F, 18P09G19F10G, 18P09G19F10H, 18P09G19F10I, 18P09G19F10J, 18P09G19F10K, 18P09G19F10L, 18P09G19F10M, 18P09G19F10N, 18P09G19F10P, 18P09G19F10Q, 18P09G19F10R, 18P09G19F10S, 18P09G19F10T, 18P09G19F10U, 18P09G19F10V, 18P09G19F10W, 18P09G19F10X, 18P09G19F10Y, 18P09G19F10Z, 18P09G19F11A, 18P09G19F11B, 18P09G19F11C, 18P09G19F11D, 18P09G19F11E, 18P09G19F11F, 18P09G19F11G, 18P09G19F11H, 18P09G19F11I, 18P09G19F11J, 18P09G19F11K, 18P09G19F11L, 18P09G19F11M, 18P09G19F11N, 18P09G19F11P, 18P09G19F11Q, 18P09G19F11R, 18P09G19F11S, 18P09G19F11T, 18P09G19F11U, 18P09G19F11V, 18P09G19F11W, 18P09G19F11X, 18P09G19F11Y, 18P09G19F11Z, 18P09G19F12A, 18P09G19F12B, 18P09G19F12C, 18P09G19F12D, 18P09G19F12E, 18P09G19F12F, 18P09G19F12G, 18P09G19F12H, 18P09G19F12I, 18P09G19F12J, 18P09G19F12K, 18P09G19F12L, 18P09G19F12M, 18P09G19F12N, 18P09G19F12P, 18P09G19F12Q, 18P09G19F12R, 18P09G19F12S, 18P09G19F12T, 18P09G19F12U, 18P09G19F12V, 18P09G19F12W, 18P09G19F12X, 18P09G19F12Y, 18P09G19F12Z, 18P09G19F13A, 18P09G19F13B, 18P09G19F13C, 18P09G19F13D, 18P09G19F13E, 18P09G19F13F, 18P09G19F13G, 18P09G19F13H, 18P09G19F13I, 18P09G19F13J, 18P09G19F13K, 18P09G19F13L, 18P09G19F13M, 18P09G19F13N, 18P09G19F13P, 18P09G19F13Q, 18P09G19F13R, 18P09G19F13S, 18P09G19F13T, 18P09G19F13U, 18P09G19F13V, 18P09G19F13W, 18P09G19F13X, 18P09G19F13Y, 18P09G19F13Z, 18P09G19F14A, 18P09G19F14B, 18P09G19F14C, 18P09G19F14D, 18P09G19F14E, 18P09G19F14F, 18P09G19F14G, 18P09G19F14H, 18P09G19F14I, 18P09G19F14J, 18P09G19F14K, 18P09G19F14L, 18P09G19F14M, 18P09G19F14N, 18P09G19F14P, 18P09G19F14Q, 18P09G19F14R, 18P09G19F14S, 18P09G19F14T, 18P09G19F14U, 18P09G19F14V, 18P09G19F14W,

Si encuentra inconsistencias en el documento, por favor repórtelas al siguiente vínculo https://pqrs.anm.gov.co/sgd.admin/faces/public/registropqrs.jspx

18P09G19F14X, 18P09G19F14Y, 18P09G19F14Z, 18P09G19F15A, 18P09G19F15B, 18P09G19F15C, 18P09G19F15D, 18P09G19F15E, 18P09G19F15F, 18P09G19F15G, 18P09G19F15H, 18P09G19F15I, 18P09G19F15J, 18P09G19F15K, 18P09G19F15L, 18P09G19F15M, 18P09G19F15N, 18P09G19F15P, 18P09G19F15Q, 18P09G19F15R, 18P09G19F15S, 18P09G19F15T, 18P09G19F15U, 18P09G19F15V, 18P09G19F15W, 18P09G19F15X, 18P09G19F15Y, 18P09G19F15Z, 18P09G19F16A, 18P09G19F16B, 18P09G19F16C, 18P09G19F16D, 18P09G19F16E, 18P09G19F16F, 18P09G19F16G, 18P09G19F16H, 18P09G19F16I, 18P09G19F16J, 18P09G19F16K, 18P09G19F16L, 18P09G19F16M, 18P09G19F16N, 18P09G19F16P, 18P09G19F16Q, 18P09G19F16R, 18P09G19F16S, 18P09G19F16T, 18P09G19F16U, 18P09G19F16V, 18P09G19F16W, 18P09G19F16X, 18P09G19F16Y, 18P09G19F16Z, 18P09G19F17A, 18P09G19F17B, 18P09G19F17C, 18P09G19F17D, 18P09G19F17E, 18P09G19F17F, 18P09G19F17G, 18P09G19F17H, 18P09G19F17I, 18P09G19F17J, 18P09G19F17K, 18P09G19F17L, 18P09G19F17M, 18P09G19F17N, 18P09G19F17P, 18P09G19F17Q, 18P09G19F17R, 18P09G19F17S, 18P09G19F17T, 18P09G19F17U, 18P09G19F17V, 18P09G19F17W, 18P09G19F17X, 18P09G19F17Y, 18P09G19F17Z, 18P09G19F18A, 18P09G19F18B, 18P09G19F18C, 18P09G19F18D, 18P09G19F18E, 18P09G19F18F, 18P09G19F18G, 18P09G19F18H, 18P09G19F18I, 18P09G19F18J, 18P09G19F18K, 18P09G19F18L, 18P09G19F18M, 18P09G19F18N, 18P09G19F18P, 18P09G19F18Q, 18P09G19F18R, 18P09G19F18S, 18P09G19F18T, 18P09G19F18U, 18P09G19F18V, 18P09G19F18W, 18P09G19F18X, 18P09G19F18Y, 18P09G19F18Z, 18P09G19F19A, 18P09G19F19B, 18P09G19F19C, 18P09G19F19D, 18P09G19F19E, 18P09G19F19F, 18P09G19F19G, 18P09G19F19H, 18P09G19F19I, 18P09G19F19J, 18P09G19F19K, 18P09G19F19L, 18P09G19F19M, 18P09G19F19N, 18P09G19F19P, 18P09G19F19Q, 18P09G19F19R, 18P09G19F19S, 18P09G19F19T, 18P09G19F19U, 18P09G19F19V, 18P09G19F19W, 18P09G19F19X, 18P09G19F19Y, 18P09G19F19Z, 18P09G19F20A, 18P09G19F20B, 18P09G19F20C, 18P09G19F20D, 18P09G19F20E, 18P09G19F20F, 18P09G19F20G, 18P09G19F20H, 18P09G19F20I, 18P09G19F20J, 18P09G19F20K, 18P09G19F20L, 18P09G19F20M, 18P09G19F20N, 18P09G19F20P, 18P09G19F20Q, 18P09G19F20R, 18P09G19F20S, 18P09G19F20T, 18P09G19F20U, 18P09G19F20V, 18P09G19F20W, 18P09G19F20X, 18P09G19F20Y, 18P09G19F20Z, 18P09G19F21A, 18P09G19F21B, 18P09G19F21C, 18P09G19F21D, 18P09G19F21E, 18P09G19F21F, 18P09G19F21G, 18P09G19F21H, 18P09G19F21I, 18P09G19F21J, 18P09G19F21K, 18P09G19F21L, 18P09G19F21M, 18P09G19F21N, 18P09G19F21P, 18P09G19F21R, 18P09G19F21S, 18P09G19F21T, 18P09G19F21U, 18P09G19F21W, 18P09G19F21X, 18P09G19F21Y, 18P09G19F21Z, 18P09G19F22A, 18P09G19F22B, 18P09G19F22C, 18P09G19F22D, 18P09G19F22E, 18P09G19F22F, 18P09G19F22G, 18P09G19F22H, 18P09G19F22I, 18P09G19F22J, 18P09G19F22K, 18P09G19F22L, 18P09G19F22M, 18P09G19F22N, 18P09G19F22P, 18P09G19F22Q, 18P09G19F22R, 18P09G19F22S, 18P09G19F22T, 18P09G19F22U, 18P09G19F22V, 18P09G19F22W, 18P09G19F22X, 18P09G19F22Y, 18P09G19F22Z, 18P09G19F23A, 18P09G19F23B, 18P09G19F23C, 18P09G19F23D, 18P09G19F23E, 18P09G19F23F, 18P09G19F23G, 18P09G19F23H, 18P09G19F23I, 18P09G19F23J, 18P09G19F23K, 18P09G19F23L, 18P09G19F23M, 18P09G19F23N, 18P09G19F23P, 18P09G19F23Q, 18P09G19F23R, 18P09G19F23S, 18P09G19F23T, 18P09G19F23U, 18P09G19F23V, 18P09G19F23W, 18P09G19F23X, 18P09G19F23Y, 18P09G19F23Z, 18P09G19F24A, 18P09G19F24B, 18P09G19F24C, 18P09G19F24D, 18P09G19F24E, 18P09G19F24F, 18P09G19F24G, 18P09G19F24H, 18P09G19F24I, 18P09G19F24J, 18P09G19F24K, 18P09G19F24L, 18P09G19F24M, 18P09G19F24N, 18P09G19F24P, 18P09G19F24Q, 18P09G19F24R, 18P09G19F24S, 18P09G19F24T, 18P09G19F24U, 18P09G19F24V, 18P09G19F24W, 18P09G19F24X, 18P09G19F24Y, 18P09G19F24Z, 18P09G19F25A, 18P09G19F25B, 18P09G19F25C, 18P09G19F25D, 18P09G19F25E, 18P09G19F25F, 18P09G19F25G, 18P09G19F25H, 18P09G19F25I, 18P09G19F25J, 18P09G19F25K, 18P09G19F25L, 18P09G19F25M, 18P09G19F25N, 18P09G19F25Q, 18P09G19F25R, 18P09G19G01A, 18P09G19G01B, 18P09G19G01C, 18P09G19G01D, 18P09G19G01E, 18P09G19G01F, 18P09G19G01G, 18P09G19G01H, 18P09G19G01I, 18P09G19G01J, 18P09G19G01K, 18P09G19G01L, 18P09G19G01M, 18P09G19G01N, 18P09G19G01P, 18P09G19G01Q, 18P09G19G01R, 18P09G19G01S, 18P09G19G01T, 18P09G19G01U, 18P09G19G01V, 18P09G19G01W, 18P09G19G01X, 18P09G19G01Y, 18P09G19G01Z, 18P09G19G02A, 18P09G19G02B, 18P09G19G02C, 18P09G19G02D, 18P09G19G02E, 18P09G19G02F, 18P09G19G02G, 18P09G19G02H, 18P09G19G02I, 18P09G19G02J, 18P09G19G02K, 18P09G19G02L, 18P09G19G02M, 18P09G19G02N, 18P09G19G02P, 18P09G19G02Q, 18P09G19G02R, 18P09G19G02S, 18P09G19G02T, 18P09G19G02U, 18P09G19G02V, 18P09G19G02W, 18P09G19G02X, 18P09G19G02Y, 18P09G19G02Z, 18P09G19G03A, 18P09G19G03B, 18P09G19G03C, 18P09G19G03D, 18P09G19G03E, 18P09G19G03F, 18P09G19G03G, 18P09G19G03H, 18P09G19G03I, 18P09G19G03J, 18P09G19G03K, 18P09G19G03L, 18P09G19G03M, 18P09G19G03N, 18P09G19G03P, 18P09G19G03Q, 18P09G19G03R, 18P09G19G03S, 18P09G19G03T, 18P09G19G03U, 18P09G19G03V, 18P09G19G03W, 18P09G19G03X, 18P09G19G03Y, 18P09G19G03Z, 18P09G19G04A, 18P09G19G04B, 18P09G19G04C, 18P09G19G04D, 18P09G19G04E, 18P09G19G04F, 18P09G19G04G, 18P09G19G04H, 18P09G19G04I, 18P09G19G04J, 18P09G19G04K, 18P09G19G04L, 18P09G19G04M, 18P09G19G04N, 18P09G19G04P, 18P09G19G04Q, 18P09G19G04R, 18P09G19G04S, 18P09G19G04T, 18P09G19G04U, 18P09G19G04V, 18P09G19G04W, 18P09G19G04X, 18P09G19G04Y, 18P09G19G04Z, 18P09G19G05A, 18P09G19G05B, 18P09G19G05C, 18P09G19G05D, 18P09G19G05E, 18P09G19G05F, 18P09G19G05G, 18P09G19G05H, 18P09G19G05I, 18P09G19G05J, 18P09G19G05K, 18P09G19G05L, 18P09G19G05M, 18P09G19G05N, 18P09G19G05Q, 18P09G19G05R, 18P09G19G05S, 18P09G19G05V, 18P09G19G05W, 18P09G19G06A, 18P09G19G06B, 18P09G19G06C, 18P09G19G06D, 18P09G19G06E, 18P09G19G06F, 18P09G19G06G, 18P09G19G06H, 18P09G19G06I, 18P09G19G06J, 18P09G19G06K, 18P09G19G06L, 18P09G19G06M, 18P09G19G06N, 18P09G19G06P, 18P09G19G06Q, 18P09G19G06R, 18P09G19G06S, 18P09G19G06T, 18P09G19G06U, 18P09G19G06V, 18P09G19G06W, 18P09G19G06X, 18P09G19G06Y, 18P09G19G06Z, 18P09G19G07A, 18P09G19G07B, 18P09G19G07C, 18P09G19G07D, 18P09G19G07E, 18P09G19G07F, 18P09G19G07G, 18P09G19G07H, 18P09G19G07I, 18P09G19G07J, 18P09G19G07K, 18P09G19G07L, 18P09G19G07M, 18P09G19G07N, 18P09G19G07P, 18P09G19G07Q, 18P09G19G07R, 18P09G19G07S, 18P09G19G07T, 18P09G19G07U, 18P09G19G07V, 18P09G19G07W, 18P09G19G07X, 18P09G19G07Y, 18P09G19G07Z, 18P09G19G08A, 18P09G19G08B, 18P09G19G08C, 18P09G19G08D, 18P09G19G08E, 18P09G19G08F, 18P09G19G08G, 18P09G19G08H, 18P09G19G08I, 18P09G19G08J, 18P09G19G08K, 18P09G19G08L, 18P09G19G08M, 18P09G19G08N, 18P09G19G08P, 18P09G19G08Q, 18P09G19G08R, 18P09G19G08S, 18P09G19G08T, 18P09G19G08U, 18P09G19G08V, 18P09G19G08W, 18P09G19G08X, 18P09G19G08Y, 18P09G19G08Z, 18P09G19G09A, 18P09G19G09B, 18P09G19G09C, 18P09G19G09D, 18P09G19G09E, 18P09G19G09F, 18P09G19G09G, 18P09G19G09H, 18P09G19G09I, 18P09G19G09J, 18P09G19G09K, 18P09G19G09L, 18P09G19G09M, 18P09G19G09N, 18P09G19G09Q, 18P09G19G09R, 18P09G19G09S, 18P09G19G09V, 18P09G19G09W, 18P09G19G10A, 18P09G19G11A, 18P09G19G11B, 18P09G19G11C, 18P09G19G11D, 18P09G19G11E, 18P09G19G11F, 18P09G19G11G, 18P09G19G11H, 18P09G19G11I, 18P09G19G11J, 18P09G19G11K, 18P09G19G11L, 18P09G19G11M, 18P09G19G11N, 18P09G19G11P, 18P09G19G11Q, 18P09G19G11R, 18P09G19G11S, 18P09G19G11T, 18P09G19G11U, 18P09G19G11V, 18P09G19G11W, 18P09G19G11X, 18P09G19G11Y, 18P09G19G11Z, 18P09G19G12A, 18P09G19G12B, 18P09G19G12C, 18P09G19G12D, 18P09G19G12E, 18P09G19G12F, 18P09G19G12G, 18P09G19G12H, 18P09G19G12I, 18P09G19G12J, 18P09G19G12K, 18P09G19G12L, 18P09G19G12M, 18P09G19G12N, 18P09G19G12P, 18P09G19G12Q, 18P09G19G12R, 18P09G19G12S, 18P09G19G12T, 18P09G19G12U, 18P09G19G12V, 18P09G19G12W,

18P09G19G12X, 18P09G19G12Y, 18P09G19G12Z, 18P09G19G13A, 18P09G19G13B, 18P09G19G13C, 18P09G19G13D, 18P09G19G13E, 18P09G19G13F, 18P09G19G13G, 18P09G19G13H, 18P09G19G13I, 18P09G19G13J, 18P09G19G13K, 18P09G19G13L, 18P09G19G13M, 18P09G19G13N, 18P09G19G13Q, 18P09G19G13R, 18P09G19G13S, 18P09G19G13V, 18P09G19G13W, 18P09G19G13X, 18P09G19G14A, 18P09G19G16A, 18P09G19G16B, 18P09G19G16C, 18P09G19G16D, 18P09G19G16E, 18P09G19G16F, 18P09G19G16G, 18P09G19G16H, 18P09G19G16I, 18P09G19G16J, 18P09G19G16K, 18P09G19G16L, 18P09G19G16M, 18P09G19G16N, 18P09G19G16P, 18P09G19G16Q, 18P09G19G16R, 18P09G19G16S, 18P09G19G16T, 18P09G19G16U, 18P09G19G16V, 18P09G19G16W, 18P09G19G16X, 18P09G19G16Y, 18P09G19G17A, 18P09G19G17B, 18P09G19G17C, 18P09G19G17D, 18P09G19G17E, 18P09G19G17F, 18P09G19G17G, 18P09G19G17H, 18P09G19G17I, 18P09G19G17J, 18P09G19G17K, 18P09G19G17L, 18P09G19G17M, 18P09G19G17Q, 18P09G19G18A, 18P09G19G21A, 18P09G19G21B, 18P09G19G21F, 18P09G19J01B, 18P09G19J01C, 18P09G19J01D, 18P09G19J01E, 18P09G19J01H, 18P09G19J01I, 18P09G19J01J, 18P09G19J01M, 18P09G19J01N, 18P09G19J01P, 18P09G19J01S, 18P09G19J01T, 18P09G19J01U, 18P09G19J01X, 18P09G19J01Y, 18P09G19J01Z, 18P09G19J02A, 18P09G19J02B, 18P09G19J02C, 18P09G19J02D, 18P09G19J02E, 18P09G19J02F, 18P09G19J02G, 18P09G19J02H, 18P09G19J02I, 18P09G19J02J, 18P09G19J02K, 18P09G19J02L, 18P09G19J02M, 18P09G19J02N, 18P09G19J02P, 18P09G19J02Q, 18P09G19J02R, 18P09G19J02S, 18P09G19J02T, 18P09G19J02U, 18P09G19J02V, 18P09G19J02W, 18P09G19J02X, 18P09G19J02Y, 18P09G19J02Z, 18P09G19J03A, 18P09G19J03B, 18P09G19J03C, 18P09G19J03D, 18P09G19J03E, 18P09G19J03F, 18P09G19J03G, 18P09G19J03H, 18P09G19J03I, 18P09G19J03J, 18P09G19J03K, 18P09G19J03L, 18P09G19J03M, 18P09G19J03N, 18P09G19J03P, 18P09G19J03Q, 18P09G19J03R, 18P09G19J03S, 18P09G19J03V, 18P09G19J04A, 18P09G19J04B, 18P09G19J04C, 18P09G19J04F, 18P09G19J04G, 18P09G19J06D, 18P09G19J06E, 18P09G19J06I, 18P09G19J06J, 18P09G19J06N, 18P09G19J06P, 18P09G19J07A, 18P09G19J07B, 18P09G19J07C, 18P09G19J07D, 18P09G19J07F, 18P09G19J07G, 18P09G19J07H, 18P09G19J07K
Nota: Las celdas reportadas en el listado se suporponen total o parcialmente con el título

COORDENADAS DEL TÍTULO
Coordenadas en WKT*
POLYGON ((-72.624793034 11.180124544, -72.658123469 11.183077701, -72.676586011 11.162106952, -72.671098853 11.142216095, -72.638694409 11.160200623, -72.633044345 11.166337032, -72.629059752 11.170655791, -72.625737597 11.174263733, -72.624793034 11.180124544))
* WKT: Well Known Text. Codificación o sintaxis en formato ASCII estandarizada diseñada para describir objetos espaciales expresados de forma vectorial. Para visualizar las coordenadas puede cargar el texto en el sitio https://arthur-e.github.io/Wicket/sandbox-gmaps3.html



WILLIAM ALBERTO MARTINEZ DIAZ

GERENTE DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

Si encuentra inconsistencias en el documento, por favor repórtelas al siguiente vínculo https://pqrs.anm.gov.co/sgd.admin/faces/public/registropqrs.jspx

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

CRM-202410301532-647122 Fecha de Reporte: 30/oct/2024 15:32

NOTAS ACLARATORIAS

De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería - ANM -, se fija la directriz relacionada con la inscripción de prendas mineras, donde se determina que Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras).

Las coordenadas de los vértices están referidas al sistema MAGNA-SIRGAS

Las áreas han sido calculadas con respecto al Origen Nacional de la proyección Gauss-Krüeger, Transverse Mercator Colombia.

Este certificado electrónico tiene validez conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y las demás normas que la complementen, modifiquen o reemplacen. Para verificar su autenticidad escanee el código QR que se encuentra en el encabezado del documento. Este código lo direccionará a una URL que le permitirá descargar el documento original y compararlo con el presente documento electrónico.

Recuerde que la URL válida debe empezar con https://annamineria.anm.gov.co, en caso contrario abstenerse de realizar cualquier acción en el navegador.

El estado del título descrito en este certificado corresponde al día y hora en la que fue expedido.

********** FIN DE ESTE DOCUMENTO **********

RESOLUCION No. 1015 DE 2022

(2 de junio)

"POR LA CUAL SE RENUEVA UN PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE FUENTES FIJAS PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA TRITURADORA DE MATERIALES PÉTREOS, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE CUESTECITAS, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ALBANIA – LA GUAJIRA, A FAVOR DE LA EMPRESA LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A., Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, "CORPOGUAJIRA", en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, La Ley 99 de 1993, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política en su artículo 8º establece que "Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación".

Que el artículo 79 Ibídem consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. Igualmente establece para el Estado, entre otros, el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

VALIDO PARA VERIFICAR VIGENCIA

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que según el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como funciones de las Corporaciones, la evaluación control y seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos así mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que en el Departamento de La Guajira, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA, se constituye en la máxima autoridad ambiental, siendo el ente encargado de otorgar las autorizaciones, permisos y licencia ambiental a los proyectos, obras y/o actividades a desarrollarse en el área de su jurisdicción.

Que según el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993, la entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite.

Que en el Artículo 2.2.5.1.7.1. Del Decreto 1076 de 2015, establece que, el permiso de emisión atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones.

Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades restringidas por razones de orden público, no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de modo que su modificación o suspensión, podrá ser ordenada por las autoridades ambientales competentes cuando surjan circunstancias que alteren sustancialmente aquellas que fueron tenidas en cuenta para otorgarlo, o que ameriten la declaración de los niveles de prevención, alerta o emergencia.

ARTÍCULO 2.2.5.1.7.14. Vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales.

Las modificaciones de los estándares de emisión o la expedición de nuevas normas o estándares de emisión atmosférica, modificarán las condiciones y requisitos de ejercicio de los permisos vigentes.

Los permisos de emisión para actividades industriales y comerciales, si se trata de actividades permanentes, se otorgarán por el término de cinco (5) años; los de emisiones transitorias, ocasionadas por obras, trabajos o actividades temporales, cuya duración sea inferior a cinco (5) años, se concederán por el término de duración de dichas obras, trabajos o actividades, con base en la programación presentada a la autoridad por el solicitante del permiso. Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación, por el titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones" (IE-1) a que se refiere el presente Decreto, ante la autoridad ambiental competente, con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento del término de su vigencia o a la tercera parte del término de! permiso, sí su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días. **La presentación del formulario (IE-1) hará las veces de solicitud de renovación.**

La presentación extemporánea de la solicitud de renovación conjuntamente con el formulario (IE-1) dará lugar a la imposición de multas, previo el procedimiento establecido para tal efecto y sin perjuicio de las demás sanciones que procedan por la falta de permiso vigente o por otras infracciones conexas.

Que CORPOGUAJIRA mediante Resolución No. 564 de Marzo de 2017, otorga permiso de Emisiones Atmosféricas de fuentes fijas para la operación de la planta trituradora de materiales pétreos ubicada en el predio María Cielo en el área rural del Corregimiento de Cuestecitas, Municipio de Albania – La Guajira, a favor de la Empresa, LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A., y se dictaron otras disposiciones.

Que mediante oficio de fecha 11 de marzo de 2021, registrado ante esta Entidad bajo Radicado interno No. ENT – 1645 de la misma fecha y año, el señor DARIO COHEN BARROS ZINMERMAN identificado con la cedula de ciudadanía 84.030.269, en calidad de representante legal de la empresa LA MACUIRA INVERSIOES Y CONSTRUCCIONES S.A, identificada con el número de NIT 825000164 – 2, solicita certificación de estado de vigencia de permiso de Emisiones Atmosféricas de fuentes fijas, otorgado mediante la Resolución 564 de marzo de 2017, el cual venció dentro del periodo de declaratoria de la emergencia sanitaria por el virus COVID-19, decretada mediante Resolución 385 de 2020, la cual amplió su vigencia hasta la 30 de mayo de 2021, mediante la Resolución 222 de 2021, por lo que CORPOGUAJIRA, el día 16 de Marzo de 2021, expide Certificación Ambiental a favor de la Empresa LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A., respecto a la vigencia de dicho permiso.

VALIDO PARA VERIFICAR VIGENCIA

Así mismo, Presidencia de la Republica expide Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, que declaró el Estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, en virtud de la Pandemia Mundial declarada por la OMS a causa del virus COVID-19.

Que la Alcaldía del Distrito de Riohacha mediante Decreto 090 de fecha 17 de marzo de 2020 declaró la emergencia sanitaria y la calamidad pública en todo su territorio y adoptó un conjunto de medidas extraordinarias para la prevención, control y moderación de los efectos del COVID - 19 y demás enfermedades respiratorias.

Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA no fue ajena a la situación vivida en Colombia con relación al COVID – 19 y como medida de prevención, expidió la circular con radicado INT - 973 de fecha 17 de Marzo de 2020, la cual consagró las medidas para atender la contingencia generada por dicho virus, entre ellas la suspensión de todas las comisiones por el periodo en el que se mantuviera la Declaratoria

de Emergencia Sanitaria y el aislamiento preventivo obligatorio por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, a excepción de situaciones que fueran de suma urgencia ambiental.
Además, CORPOGUAJIRA, también expidió la Resolución 0695 del 25 de marzo de 2020, mediante el cual se adoptaron medidas transitorias en los tramites ambientales de Licencias, Permisos, Concesiones, Autorizaciones, Sancionatorios y otros, en el marco del estado de emergencia sanitaria, por consiguiente los tramites que estaban en curso se encontraron suspendidos en sus términos, y los que fueran solicitados con posterioridad no podrían ser adelantados en la visita técnica, debido a las contingencias en las cuales se encontraba sumergido el país y el mundo entero.

Consecuencia de lo anterior, el Gobierno Nacional, expidió dentro de los diferentes Decretos Legislativos, el número 491 del 28 de marzo de 2020, el cual en su artículo 1° señala lo siguiente:

Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente Decreto aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades. De lo anterior, se puede determinar, que el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo, es para todos los organismos, entidades que conforman las ramas del poder público, así como también es aplicable a los órganos autónomos e independientes del estado, como lo son, las Corporaciones Autónomas Regionales, que para el caso en particular es Corpoguajira.

Así mismo, encontramos dentro del Decreto Ibidem, en su artículo octavo, lo siguiente:

Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su renovación.

Por tales razones, mediante Oficio de fecha 2 de Junio de 2021 y registrado en esta Corporación bajo Radicado No. ENT – 3922 del 4 de Junio de 2021, el señor DARIO COHEN BARROS ZINMERMAN en su condición de Representante Legal de la Empresa LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A., solicita Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas de fuentes fijas anteriormente en mención, acogiéndose al Decretos No. 491 del 28 de marzo de 2020 y para tales efectos, allega el IE1, de conformidad a lo establecido por el Decreto 1076 de 2015.

De todo lo expuesto anteriormente, se puede inferir que, el Permiso de Emisiones atmosférica otorgado a la empresa La Macuira Inversiones y Construcciones S.A. mediante Resolución 564 de marzo de 2017, le es aplicable el articulo 8° del Decreto Legislativo 491 de 2020, toda vez que al revisar el termino de vigencia del permiso, su fecha de vencimiento se dio dentro del rango temporal establecido en el precitado Decreto Legislativo y en consecuencia, se entenderá prorrogado automáticamente hasta un mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que, para continuar con el desarrollo del trámite, la Empresa LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A., cancela los cotos por servicio de Evaluación el día 4 de Marzo de 2022, mediante comprobante de pago Bancolombia No. 243266257 por un valor de $ 1.232.383,00 pesos.

Que mediante Auto No. 144 de fecha 8 de Marzo de 2022, CORPOGUAJIRA avocó conocimiento de la solicitud de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas anteriormente descrito.

Que evaluada la solicitud y en cumplimiento del Auto No. 144 de 2022, el funcionario asignado por esta Entidad realizó visita de Inspección Ocular en el sitio de interés, ubicado en jurisdicción del Municipio de Albania - La Guajira, con el fin de constatar la viabilidad Ambiental del Permiso requerido, permitiéndole establecer las siguientes consideraciones en el informe técnico bajo Radicado interno No. INT- 1179(2022) del 27 de Mayo de 2022, donde se manifiesta lo siguiente:

1. VISITA DE INSPECCIÓN OCULAR.

El día 6 de abril de 2022, se practicó visita al sitio donde la empresa La Macuira S.A tiene instalada y en funcionamiento una Trituradora de Material Pétreo, con el fin de atender la adecuación, mejoramiento y pavimentación de las vías o trabajos de construcción que se realicen en el Departamento de La Guajira y otras regiones. La misma fue atendida por la Ingeniera MARLYS ALTAMAR SANCHEZ directora SSTA, la doctora CIDIA CUISZMAN, Inspectora de seguridad y CARLOS ROCHA Inspector SSTA.

En el recorrido se pudo apreciar que la trituradora de material pétreo, se encuentra ubicada en un terreno de aproximadamente 6 hectáreas totalmente adecuado para el desarrollo de los procesos que derivan de la trituración del material a procesar y proveniente de cantera de extracción de materiales de construcción y el cual es utilizado para las obras en el departamento de La Guajira y otros sectores que por la calidad del producto o por su ubicación estratégica lo requieran.
Se evidencia la existencia campamentos e infraestructuras propias de la actividad referenciada.
En el área referenciada se encuentra La Planta Trituradora de Material Pétreo para lo cual se solicita la renovación del permiso de emisiones atmosféricas, la cual no se encontró en funcionamiento al momento de la visita debido a problemas técnicos que requieren proceso de reparación para su normal funcionamiento en condiciones adecuadas para la generación del menor impacto a las condiciones ambientales del sector. La vegetación encontrada en el sector obedece principalmente a matorrales Xerófilos desértico derivado de los escases precipitación existente en el sector lo que también propicia la escasez de cuerpos de agua permanentes o transitorios en la zona donde se desarrollan las actividades de explotación y trituración de material pétreo, no obstante, en épocas de invierno se presentan escorrentías superficiales de corto tránsito y de reducida duración en el sector citado.

VALIDO PARA VERIFICAR VIGENCIA

El personal que atendió la visita manifiesta que la operación de la maquinaria de trituración solo se presenta en las horas del día, pero con el aumento de la demanda que deriva de las obras de gran envergadura que se desarrollar y se proyectan es probable que la operación de estas se desarrolle además en horarios nocturnos para poder abastecer las necesidades de este material en el departamento de La Guajira y sectores aledaños que requieran el material producido en la empresa.

El material pétreo a procesar en la planta se obtendrá en primera instancia del aprovechamiento de las piedras que se encuentran ubicadas en lugar adyacente a la planta procesadora; dicho material pétreo es extraído con maquinaria especializada para el proceso "retroexcavadora de orugas" material que se cargará en camiones articulados para ser depositado en el acopio de material crudo que estará ubicado en la parte más alta del terreno donde se inicia el proceso, pero siempre dentro del polígono licenciado. En la eventualidad que el material pétreo tenga tamaños superiores a la boca de la trituradora se reducirá su diámetro mediante el uso martillo hidráulico hasta llegar a dimensiones adecuadas para su procesamiento.

La trituración de los materiales a procesar se hará mecánicamente para con ello obtener como resultado el diámetro del material deseado, acorde con los diámetros que requerirá cada uno de los materiales que se esté produciendo, sub-base, base, triturado para concreto, triturado y arena para mezcla y en los volúmenes que se requieran para los trabajos que se estén realizando.

El material pétreo para procesar en la planta se transportará en volquetas desde la fuente que sea seleccionada hasta sitio destinado a su trituración y clasificación. Una vez triturado y clasificado, se dispondrá su distribución para cubrir la demanda de este en las diferentes obras particulares y de gran proyección para el mejoramiento de las condiciones de los habitantes de la zona que de manera directa se beneficia de la producción de los materiales que se surten y derivan del proceso de trituración de la planta procesadora de material pétreo ubicada dentro del Municipio de Albania y explotada por la empresa La Macuira SA

LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Localización puntual de la Planta Trituradora.

El proyecto que lleva a cabo la empresa La Macuira Inversiones y Construcciones S.A. la cantera Majo, se en cuenta situado al oeste del departamento de La Guajira, sobre la vía que comunica a la ciudad de Riohacha con

Valledupar en el kilómetro 61 antes del corregimiento de Cuestecitas, municipio de Albania, en sus alrededores presenta zonas verdes, mediante elevaciones altamente boscosas y varios caseríos a su alrededor como son la Bendición y el Peñón.


Su ubicación y localización geográfica se halla a 2.1 kilómetros antes de llegar al centro poblado del corregimiento de Cuestecitas.

En las instalaciones contamos con una extensión de 1.5 hectáreas de patio aproximadamente donde se halla las siguientes disposiciones de construcción y acopio de material como se describe a continuación.

La entrada principal se cuenta con una garita principal por donde se ingresa y se sale del área de la planta, el área de punto de encuentro No.1, es una carpa ubicada a 5 metros de la entrada principal y un segundo punto de encuentro ubicado a lado de zona de parqueo en las áreas de la cantera.

La zona administrativa de la planta trituradora de Cuestecitas se está dotando en un contenedor el cual se distribuirá con un puesto para el director de planta, un puesto para el administrador de planta donde se atiende a los clientes y personal, un puesto para el inspector SSTA, cuenta con dos baños; uno para damas y otro para caballeros, se han acondicionado una bodega para almacén.

Al fondo de las instalaciones administrativas, es decir en la zona este se halla ubicada la planta trituradora la cual cuenta con una sala de mando adecuado en un contenedor, se cuenta también con un cuarto eléctrico. En el área del patio hay un sector destinado para parqueo transitorio de maquinaria y equipos, zona de almacenamiento transitorio de llantas en desuso, zona de almacenamiento de material procesado.

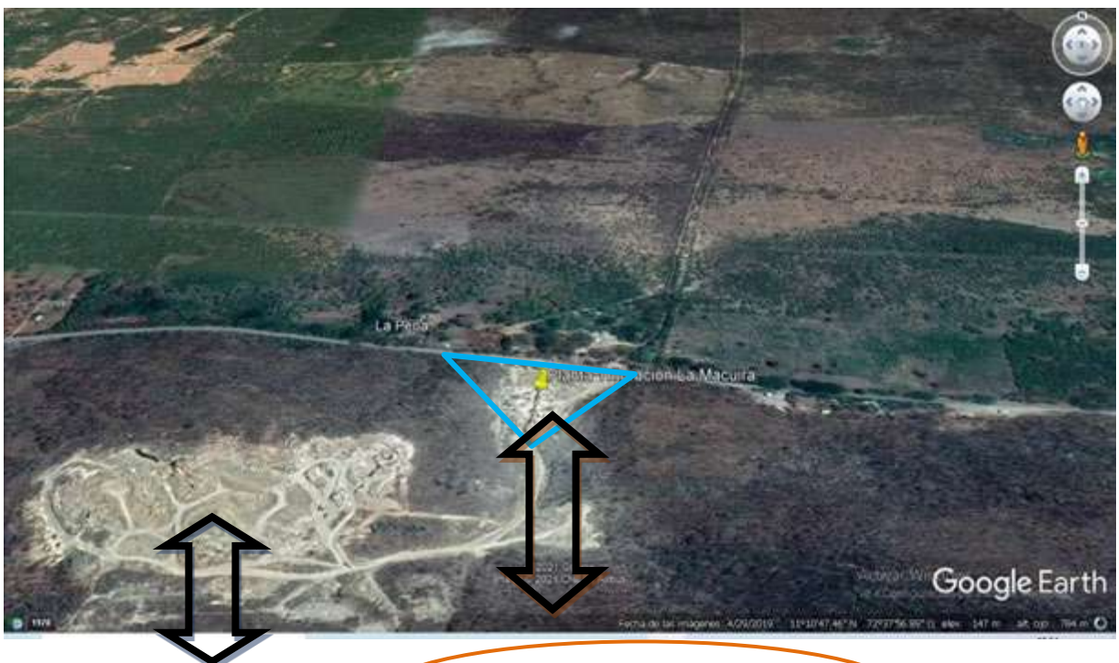

ÁREA DE CANTERA

AREA DE TRITURACION LA MACUIRA

El proyecto que lleva a cabo la empresa La Macuira Inversiones y Construcciones S.A. la cantera Majo, se en cuenta situado al oeste del departamento de La Guajira, sobre la vía que comunica a la ciudad de Riohacha con Valledupar en el kilometro 61 antes del corregimiento de Cuestecitas, municipio de Albania, en sus alrededores presenta zonas verdes, mediante elevaciones altamente boscosas y varios caseríos a su alrededor como son la Bendición y el Peñón.

Su ubicación y localización geográfica se halla a 2.1 kilómetros antes de llegar al centro poblado del corregimiento de Cuestecitas.

En las instalaciones contamos con una extensión de 1.5 hectáreas de patio aproximadamente donde se halla las siguientes disposiciones de construcción y acopio de material como se describe a continuación.

La entrada principal se cuenta con una garita principal por donde se ingresa y se sale del área de la planta, el área de punto de encuentro No.1, es una carpa ubicada a 5 metros de la entrada principal y un segundo punto de encuentro ubicado a lado de zona de parqueo en las áreas de la cantera.

La zona administrativa de la planta trituradora de Cuestecitas se está dotando en un contenedor el cual se distribuirá con un puesto para el director de planta, un puesto para el administrador de planta donde se atiende a los clientes y personal, un puesto para el inspector SSTA, cuenta con dos baños; uno para damas y otro para caballeros, se han acondicionado una bodega para almacén.

Al fondo de las instalaciones administrativas, es decir en la zona este se halla ubicada la planta trituradora la cual cuenta con una sala de mando adecuado en un contenedor, se cuenta también con un cuarto eléctrico. En el área del patio hay un sector destinado para parqueo transitorio de maquinaria y equipos, zona de almacenamiento transitorio de llantas en desuso, zona de almacenamiento de material procesado.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO


2. DESCRIPCION TECNICA PLANTA TRITURADORA

Dentro de las especificaciones técnicas más importantes que caracteriza a la trituradora puesta en operación por la empresa La Macuira inversiones y Construcciones S.A., se encuentran las siguientes consolidadas en la figura y cuadro

Planta de Trituración Telsmit								
Modelo	Peso total *t(lb)	Potencial kw (hp)	Dimensiones de trasporte mm (pies/pul.)			Dimensiones en operación mm (pies/pulga.)		
			Altura	Ancho	Largo	Altura	Ancho	Largo
NW80 100HPS	47,5	265,35	4.000	2.500	19.530	4.636	4.077	18.430
	105.200	355,84	13`-1 1/2"	8`-2 3/8"	64`- 7/4 "	15`- 2 1/2"	13`-4 ½"	60`- 5 5/8"

Granulometría de producto y capacidades (mtph)				
Modelo	38 mm (1 ½ pul.)	32 mm (1 ¼ pul.)	25 mm (1pul.)	19 mm (3/4 pul.)
NW80	120 -150	100 -130	90 – 120	75 -100

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MAQUINARIA UTILIZADA PARA PROCESO DESCRITO, HUMECTACION DE VIAS Y MATERIAL A PROCESAR

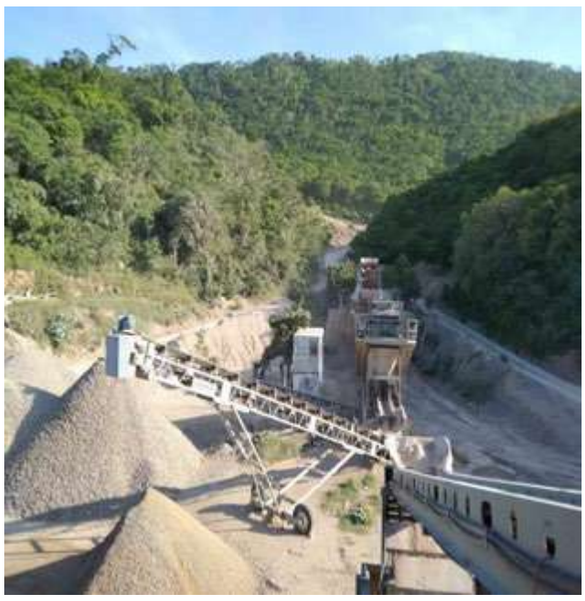








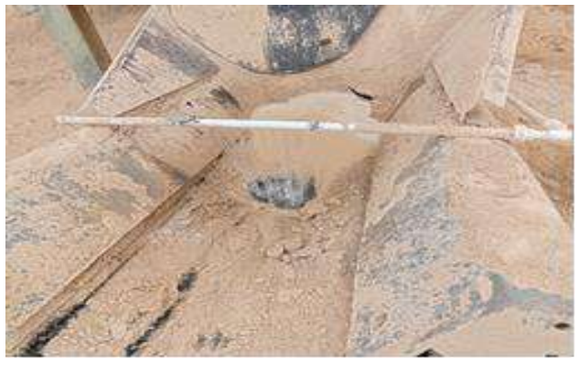

Se proyecta producir triturados de diferentes diámetros, bases y sub-bases y con ello atender la demanda de materiales en los diferentes municipios del departamento de La Guajira; los materiales a producir en su

mayoría están destinados a proyectos viales e infraestructuras civiles en general, pretendiendo con ello ofertar los productos a generar con las diferentes empresas que se encuentran asentados en la zona.

- ✓ ***Alimentadora de Velocidad Variable.*** *Esta sección consta de una tolva ancha y fuerte, con control de alimentación por convertidor de frecuencia para vibración de velocidad*


- ✓ ***Trituradora de Mandíbulas.*** *Es una estructura primaria para servicio pesado; esta incorpora componentes robustos en acero, combinados con una estructura modular sin soldadura, lo que permite una mayor resistencia, confiabilidad, disponibilidad de la trituradora y por ende, menor emisión atmosférica*

- ✓ ***Trituradora Secundaria con Cono*** *Esta selección de la planta, permite una alta producción y calidad de resultados; el sistema es hidráulica con ajuste de la abertura, que le permite asegurar las condiciones para balancear el circuito de trituración y optimizar la producción de la planta; la capacidad de Re-trituración y el chute de la entrada con más amplitud, no influye sobre la abertura de salida del primario. La menor altura de la Re trituradora permite el retorno también del segundo piso de zaranda, facilitando el ajuste de distribución de los productos de agregados pétreos, al igual que permite reducir las emisiones a la atmósfera.*

VALIDO PARA VERIFICAR VIGENCIA

- ✓ ***Zaranda vibratoria horizontal.*** *Permite alta capacidad con movimiento elípticos, ofreciendo un mayor zarandeo libre de acceso trasero, esta zaranda cuenta con dos (2) sincronizados para el control del proceso de zarandeo, de fácil ajuste y amplitud; el movimiento elíptico proporciona clasificación más eficiente y sin obstrucción para 3 o 4 productos.*
- ✓ ***Chasis Sólido y Robusto*** *Está estructura reforzada soportará todos los equipos de la planta trituradora, minimizando las vibraciones y por ende la emisión de partículas a la atmósfera.*
- ✓ ***Grilla.*** *Esta sección es específica para el escalpelo de los materiales finos naturales; lo que siempre resulta es que esta sección permite remover y ampliar los finos para un transporte suministrado opcionalmente.*
- ✓ ***Ultimo piso de la Zaranda.*** *El retiro del material es hecho por una canaleta vibratoria, que permite la combinación o separación de los productos.*

FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN. PLANTA DE TRITURACIÓN CUESTECITA LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

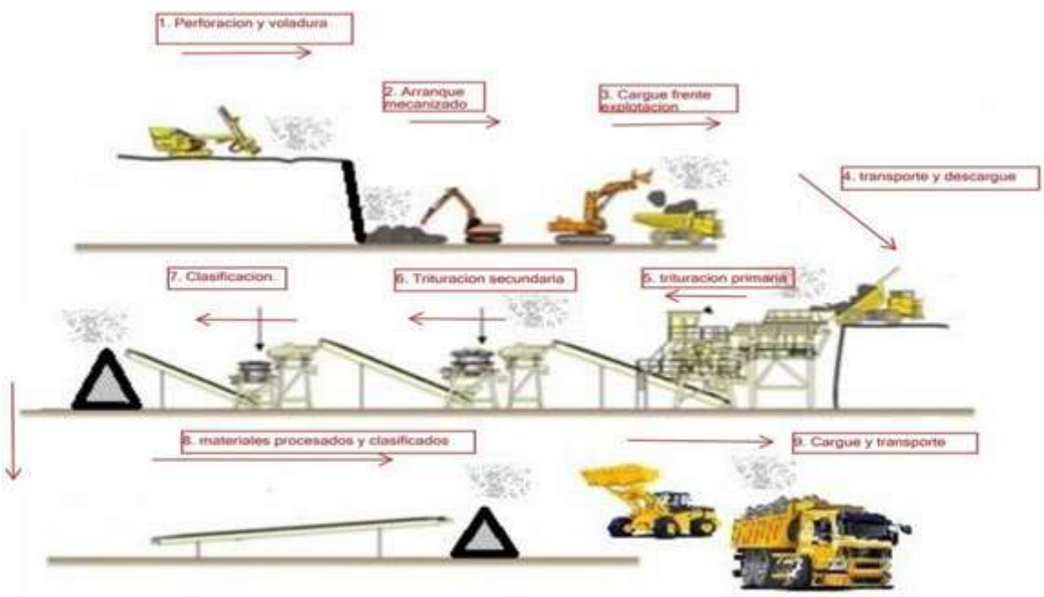

- ✓ *Perforación y voladura: Es el proceso donde se realiza la fragmentación del macizo roco para que quede en los tamaños adecuados para poder triturar la roca atreves de la trituradora Telesmit.*

- ✓ *Arranque mecanizado: Cuando no se puede realizar voladuras se utiliza herramientas como Martillos Hidráulicos, Rippers y valdes que hacen parte de herramientas que utiliza la retroexcavadora, con el fin de arrancar el macizo rocoso para su posterior procesamiento industrial.*
- ✓ *Cargue del Frente de explotación: cuando ya el material rocoso esta fragmentado u arrancado es cargado con la retroexcavadora a las volquetas doble – troques*
- ✓ *Transporte y descargue: es donde se transporta las rocas con las volquetas, del frente de explotación a la tolva de la trituradora Telesmit para descargar el material rocoso en la tolva que tiene una capacidad de almacenamiento de 18 m3*
- ✓ *Trituración primaria: las rocas que provienen de la cantera tienen tamaños de 60 pulgadas donde la trituradora primaria de mandíbulas reduce estos tamaños a 5 pulgadas*
- ✓ *Trituración secundaria: el material rocoso que proviene de la trituración primaria que tiene tamaño máximo de 5 pulgadas es procesado por el cono triturador de 300 Hp para disminuir el tamaño hasta ¼ de pulgada*
- ✓ *Clasificación: los materiales rocosos ya triturados son pasados por una zaranda industrial donde clasifica el material según el tamaño de malla para depositarlos en una banda apiladora correspondiente*
- ✓ *Materiales procesados y clasificados: Los materiales rocosos ya seleccionados se ubican en las pilas de almacenamiento según el tamaño correspondiente.*
- ✓ *Cargue y transporte: los materiales almacenados son cargados a través de un cargador frontal a las volquetas donde estas llevan el material de interés a las obras existentes y demandadas por el mercado.*

DESCRIPCIÓN DE LAS EMISIONES Y GENERACIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE TRITURADOS.

A continuación, se describen las emisiones que se generan durante el proceso de producción de materiales pétreos.

A. ***Ruidos y Vibraciones.*** *Durante la ejecución de los trabajos se producirán ruidos propios del funcionamiento de la operación de la planta trituradora y plantas de eléctricas.*

B. ***Emisiones de Partículas.*** *Se producirá un aumento de los niveles de partículas en suspensión durante la operación de la planta trituradora en el triturado de materiales pétreos, durante la descarga de materiales y el tráfico de vehículo al interior de la planta podría generar impacto sobre la calidad del aire.*

C. ***Vertidos.*** *Durante la etapa de trituración de materiales pétreos se podrían generar vertidos originados por derrames de líquidos por parte de las plantas, camiones y maquinaria.*

D. ***Residuos.*** *Los residuos sólidos que se generan en la planta son de tres tipos: residuos especiales procedentes de las actividades de atención mantenimiento correctivo, reparación de maquinaria y equipos, ordinarios procedentes de las áreas comunes, hidratación, alimentación, resto de residuos producto de las labores de limpieza del área y residuos reciclables cartón, latas, vidrios y recipientes plásticos de bebidas hidratantes.*

E. ***Olores.*** *Se pueden presentar producto de la descomposición de los residuos orgánicos que se almacenan temporalmente en las canecas instaladas para su clasificación antes de la entrega.*

PRODUCCIÓN

La producción estimada de material pétreos en la planta de trituración es de 85.616 metros cúbicos y 100.000 metros cúbicos año y se estima que para los próximo 5 años la producción se incrementara a 200.000 metros cúbicos año, si el mercado se comporta de acuerdo con lo proyectado

SISTEMA DE CONTROL

- ***Planta trituradora***

Para el control de la emisión de material particulado desde la planta trituradora se instaló un sistema de humectación que facilita la humectación de material pétreo en la tolva de alimentación y durante la trituración, transporte por las bandas y caída del material no se generan emisiones altas de material particulado que ponga en riesgo la salud de los trabajadores y el medio ambiente. Además de la humectación de vías de circulación.

- ***Acopio de Sustancias Químicas***

Se cuenta con un punto de acopio de sustancias químicas en el cual se almacenan de manera temporal los residuos especiales o contaminados generados en las actividades de mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos de la empresa los cuales son llevados y acopiados temporalmente en este sitio son entregados a la empresa autorizada en este caso es Recitrac S.A.

- ***Acopio de Sustancias Químicas***

La Planta de trituradora tiene un sistema humectación de material que se está procesando para controlar y mitigar la generación de polución sobre el ambiente durante la actividad de trituración, este sistema está incorporado en los puntos que se muestra a continuación en el flujo de producción:

1. *Mandíbula primaria (punto 5 del diagrama)*
2. *Zaranda de lata frecuencia (punto 6 del diagrama)*
3. *Debajo del cono de trituración (punto 7 del diagrama)*

Control de Polución en vías internas de la operación



Para controlar las emisiones de material particulado que se genera por el tráfico de vehículos en la operación, la empresa cuenta con un carrotanque con una capacidad de 10000 litros destinado para realizar la humectación de la vía de manera regular con una frecuencia que oscila entre los 2 y 4 pasos de riegos durante la jornada de trabajo. El número de frecuencia del riego depende de las condiciones del clima y horas de operación.

El agua usada para las actividades de riego de vías y controles de polución en la planta de trituración proviene de la concesión de agua que la empresa tiene autorizada en el afluente del canal Robles – Rio Tapias ubicado en Matitas, en dicha concesión tiene una distribución de usos del agua según se describe en la siguiente tabla.

USO	***Puntos de captaciónactual (captación 1) caudal (l/s)***	***Puntos de captaciónactual (captación 2) caudal (l/s)***	***TOTAL***
AGRICOLA	*95.55*	*0*	*95.55*
DOMESTICO	*0.005*	*0.5*	*0.555*
INDUSTRIAL	*0*	*4.5*	*4.5*
Total	*95.555*	*5*	*100.565*
Fuente: Corpoguajira, Resolución 2177 del 2017			

ASPECTOS FÍSICOS Y AMBIENTALES

El Clima En La Zona De Interés Del Proyecto.

En Albania, los veranos son cortos, muy calientes y secos marcados mayormente en el primer trimestre del año; los inviernos suelen darse por periodos cortos con abundante precipitación en segundo semestre del año, con frecuencia se presenta nubosidad la mayor parte del añ

Temperatura

Con base a la estación meteorológica La Mina de propiedad del IDEAM registra temperaturas mínimas de 30.6°C, temperaturas medias de 36.1°C y temperaturas máxima de 40.8°C con base los históricos comprendidos en el periodo de 1988-2017.

Precipitación

La temporada más lluviosa dura 7,2 meses, inicia a mediados de abril hasta finales noviembre, las estimaciones de precipitación según la estación meteorológica La Mina de propiedad del IDEAM, ubicada en Albania, es de 920.6mm anual, presentando comportamiento bimodal con periodo de lluvia menor en el primer trimestre entre los meses de abril y mayo; el periodo de lluvias es considerado mayor pluviosidad se concentra en los meses de septiembre – octubre – noviembre.

VALIDO PARA VERIFICAR VIGENCIA

Otra de las estaciones pluviométricas consultadas denominada Cuestecitas también de propiedad del IDEAM ubicada en cercanías al área de operaciones registró 962 mm año en los registros históricos del año 1988 al año 2017.

2.6. PERSONAL REQUERIDO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA GENERAL

Para todas las actividades que se planean realizar en el buen funcionamiento de la planta asfáltica se requiere del siguiente recurso humano:

RELACIÓN DE CARGOS O POSICIONES PARA OPERACIÓN DE LA PLANTA	
CARGOS	***CANTIDAD***
Gerente	*1*
Director de producción	*1*
Administradora	*1*
Despachador	*1*
Inspector SISO	*2*
Supervisores de producción	*2*
Jefe de patio	*1*
Supervisor de maquinaria	*2*
Operadores de retroexcavadora	*2*
Operadores múltiples	*2*
Operadores de cargador	*2*
Operadores de volqueta	*4*
Operadores trituradora	*3*
Eléctrico	*1*
Soldador	*1*
Mecánico	*1*
Auxiliar mecánico	*1*
Oficios varios	*2*
Lubricador	*1*
Vigilantes	*5*

2.7. INSTALACIONES

*En el **Área Administrativa**: Cuenta con un área de **28.36 m2,** la cual se encuentra construida con paredes de lona impermeable columnas en madera, piso en concreto y techo de Eternit Plástico, se cuenta con tres puestos de trabajo, tres equipos de cómputo (Portátiles), una zona de hidratación en área administrativa y una en el área de trituración, 10 radios de comunicación con rango de cobertura de 8 km los cuales son utilizados en la operación para una comunicación permanente de todas las áreas.*

*El área de **Almacenamiento** cuenta con **10.38 m2** y su estructura es toda de hierro pues es un conteiner en el cual se almacenan equipos y herramientas de uso continuo o temporal, dentro de la operación, cuenta con un puesto de trabajo a la entrada del mismo.*

*El área de **soldadura** tiene un espacio de **30.15 m2,** este espacio se encuentra semicubierto pues tiene paredes en poli sombra en sus laterales y en el fondo, el frente es descubierto cuenta con mesa de acero inoxidable para labores, equipos de soldaduras biombo protector un locker para almacenamiento de herramientas e implementos de protección personal para las tareas del área, su piso es de arena.*

*La Zona de almacenamiento de **Sustancias Químicas** tiene **10.83 m2,** cuenta con encerramiento de concreto en sus partes laterales y en el fondo, la parte frontal es abierta para facilitar los movimientos de las sustancias durante la operación.*

3. ASPECTOS AMBIENTALES

Entre los aspectos físicos se destaca el análisis climático (temperatura, precipitación, velocidad del viento, evaporación, humedad relativa). De estos aspectos se destaca que en el área de influencia directa del proyecto no se encuentran fuentes hídricas superficiales que pudieran verse afectados.

VALIDO PARA VERIFICAR VIGENCIA

Las actividades propias de la producción de la planta desencadenan en la posibilidad de la necesidad de desarrollar procesos de tala de vegetación existente de poca altura siendo especímenes aislados de vegetación de tipo bosque seco tropical, rastrojos y pastizales entre otros, que se encuentran amparados en la Licencia Ambiental otorgada por Corpoguajira.

Al visitarse el área del proyecto, se coincide con el documento presentado ya que, en la parte posterior del predio, existe una vegetación conformada por especies como trupillo, dividivi, tuna, espinito, pringamoza, cardón, matorrales y puy entre otros.

En lo correspondiente a la fauna, no se evidenció especies de interés dado las condiciones ralas o escasa vegetación en el área.

El documento enviado como soporte a la solicitud del permiso de emisiones y la visita realizada, se identifica un área de influencia directa en la que no se encuentra comunidades indígenas ni negras, ni población alguna que pueda verse afectada, ya que el perímetro urbano del corregimiento de cuestecitas se encuentra a 2.100 metros de distancia aproximadamente y los vientos predominantes no apuntan a esa población.

***3.1 Vertimientos Líquidos**.*

La planta cuenta con un punto de acopio de sustancias químicas con trampa de aceite en la parte de atrás del área en la cual se almacenan de manera temporal los residuos especiales o contaminados generados y son llevados y acopiados temporalmente en este sitio, posteriormente son entregados a la empresa autorizada para su disposición final RECITRAC S.A.S.

En las demás áreas cuentan con kit antiderrame, así mismo en la maquinaria según su requerimiento. En el proceso de charlas se realizan socializaciones a todo el personal sobre la prevención de los derramen en la realización de nuestras actividades y la rápida atención cuando se presenten los mismos, con la puesta en marcha del plan de emergencia para atención de accidentes de tipo ambiental

La planta cuenta con canales perimetrales a los lados de las áreas por donde baja el torrente de aguas los cuales son direccionados por alcantarillas o BOX CULVERT hacia dos piscinas con mecanismos de filtración de sedimento y agua.

3.2 Almacenamiento y Uso del Agua.

En este tipo de proyectos se quiere el uso del agua tanto para las labores propias del proceso como para el uso doméstico del personal.

Para el control de la emisión de material particulado desde la planta trituradora se instaló un sistema de remojo que facilita la humectación del material pétreo en la tolva de alimentación y durante la trituración, transporte por las bandas y caída del material no se genera emisiones altas de material particulado que pongan en riesgo la salud de los trabajadores y el medio ambiente. Además de humectación de vías de circulación internas por medio de carrotanque.

3.3 Identificación y Evaluación de Impactos Potenciales

La experticia y la visita realizada por el profesional permiten intuir lo siguiente:

Se destacan: generación de empleo, relaciones con la comunidad, incremento de ingresos, disminución de especies endémicas, disminución de la cobertura vegetal, cambio del uso del suelo, emisiones atmosféricas, incremento en los niveles de ruido, deforestación entre otros.
Entre los posibles conflictos podrían estar inconformismo por la no vinculación de personal de esa comunidad en el proyecto, por la operación nocturna de la planta por posible afectación a su tranquilidad por ruido, o por emisiones atmosféricas, entre otras. En conclusión, se debe dar mayor importancia a las relaciones con la comunidad no solamente como aspectos positivos sino también con aspectos negativos para así proponer tanto en las acciones y actividades que conlleven a la mitigación, corrección y compensación de estos aspectos, como en el plan de seguimiento, medidas tendientes a cuantificar y verificar que tan efectivas son las medidas de manejo implementadas para tomar los correctivos oportunos y adecuados.

3.4 Medidas de manejo ambiental
Los funcionarios de la empresa se encuentra en la obligación de desarrollar acciones que se direccionen a la mitigación de los eventuales impactos ambientales que se presenten producto de la actividad que se desarrolla en la empresa, se requiere que se puntualicen las medidas de manejo ambiental, las cuales pueden ser presentadas a través de fichas, donde se describa la actividad que causa el impacto, el objetivo de la ficha, las actividades a realizar, el cronograma, el seguimiento y monitoreo, responsable de la ejecución y los costos de la medida a implementar entre otros aspectos.

VALIDO PARA VERIFICAR VIGENCIA

Derivado de lo anterior, se propone estructurar las siguientes fichas:

Ficha Nº1	***EDUCACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL QUE LABORARÁ EN EL PROYECTO***
Ficha Nº2	***MANEJO DE FAUNA Y FLORA***
Ficha Nº3	***MANEJO EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES (PL. ASFALTICA)***
Ficha Nº4	***ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES***
Ficha Nº5	***MANEJO DE AGUAS RESIDUALES***
Ficha Nº6	***MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS***
Ficha Nº7	***EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO AMBIENTAL***
Ficha Nº8	***RESTAURACIÓN Y PLAN DE ABANDONO***

CONSIDERANDO:

- *Que la Subdirección de Autoridad Ambiental, recibió solicitud de RENOVACIÓN DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE FUENTES FIJAS PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA TRITURADORA DE MATERIALES PETREOS, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE CUESTECITAS, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ALBANIA – LA GUAJIRA, PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.*

- *Que mediante el Auto N.º 144 del 08 de marzo de 2022, se avoca conocimiento de la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas para la operación de la planta trituradora de materiales pétreos, ubicada en el corregimiento de cuestecitas, jurisdicción del municipio de Albania – la guajira, presentada por la empresa, la macuira inversiones y construcciones s.a. y representada legalmente por el señor DARIO COHEN BARROS ZINMERMAN, del mismo se dio traslado al Grupo Territorial del Sur, para la visita de inspección ocular.*

- *Que para la evaluación del documento soporte de la solicitud, el día 6 de abril de 2022, el profesional especializado de la Dirección Territorial del Sur, practicó visita de inspección ocular al sitio dispuesto por la empresa la MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A, para la planta productora y trituración de material pétreo.*

- *Que todas las actividades inherentes a la producción de las plantas productoras trituración de material pétreo, genera emisiones atmosféricas, ruido, residuos sólidos ordinarios y especiales y además generación de líquidos (confinados en tanques sépticos) entre otros y que deberán cumplir estrictamente con lo que establezca la autoridad ambiental y lo que debe estructurar la empresa mediante las Fichas de Manejo Ambiental.*

- *Que los impactos más significativos durante la actividad de la empresa están asociados al manejo de materiales, manejo de residuos líquidos y sólidos, combustibles, aceites y sustancias químicas, manejo de aguas superficiales, control de emisiones atmosféricas y ruidos entre otros.*
- *Que el movimiento de maquinaria y tránsito vehicular permanente durante la actividad de la empresa generará material particulado y gases a la atmósfera, que puede afectar tanto a los trabajadores como a las comunidades asentadas en el área de influencia directa. Por lo anterior, se deberá implementar medidas de mitigación en este aspecto.*

CONCEPTO TÉCNICO

Con fundamento en la revisión de la información presentada por el interesado, la observación del marco normativo, la inspección ocular realizada al área del proyecto y la gestión del Grupo Territorial del Sur, se considera VIABLE desde el punto de vista ambiental, otorgar RENOVACIÓN DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS a favor de la empresa LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A., para LA OPERACIÓN DE LA PLANTA TRITURADORA DE MATERIAL PETREO, ubicada al oeste del Departamento de La Guajira, sobre la vía que comunica a la ciudad de Riohacha con Valledupar en el kilómetro 61 antes del corregimiento de Cuestecitas, Municipio de Albania – La Guajira y exactamente en las coordenadas geográficas: 11°10”35.5”N y 72°38”11.4”W, por el término de TRES (03) años, contados a partir de la ejecutoria del Acto Administrativo que ampare el presente Informe Técnico, renovables de conformidad a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, previa evaluación de la Autoridad Ambiental.

VALIDO PARA VERIFICAR VIGENCIA

En razón y mérito de lo anteriormente expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RENOVAR el Permiso de Emisiones Atmosféricas de fuentes fijas para la operación de la planta trituradora de materiales pétreos, ubicada en la vía Riohacha - Valledupar en el kilómetro 61 antes del Corregimiento de Cuestecitas, jurisdicción del Municipio de Albania – La Guajira, otorgado anteriormente mediante Resolución No. 564 de Marzo de 2017, a favor de la Empresa LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A., identificada con el Nit. No. 825000164 – 2, representada legalmente por el señor DARIO COHEN BARROS ZINMERMAN identificado con la cedula de ciudadanía 84.030.269, de conformidad a lo dispuesto en la parte Considerativa del presente Acto Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: El término de vigencia del presente permiso es de Tres (3) años, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, renovables con la presentación del "Informe de Estado de Emisiones" (IE-1) de conformidad a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.5.1.7.14. y en el término que en el mimo se indica.

ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso queda condicionado al cumplimiento por parte de la Empresa LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. de las medidas establecidas en el Decreto 1076 de 2015, Ley 99 de 1993, la nueva normatividad que llegare a aplicar y lo que CORPOGUAJIRA en

ejercicio de las funciones de control y seguimiento Ambiental llegare a imponer, incluyendo las siguientes Obligaciones:

1. *La empresa **LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A**, debe darles estricto cumplimiento a los compromisos adquiridos en el presente acto administrativo y además deberá estructurar las siguientes fichas de manejo ambiental y enviarlas a Corpoguajira:*

   Ficha Nº1: EDUCACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL EN EL PROYECTO
   Ficha Nº2: MANEJO DE FAUNA Y FLORA
   Ficha Nº3: MANEJO DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES (PASFALTO)
   Ficha Nº4: ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
   Ficha Nº5: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
   Ficha Nº6: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
   Ficha Nº7: EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO AMBIENTAL
   Ficha Nº8: RESTAURACIÓN Y PLAN DE ABANDONO

2. *La empresa **LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A**, debe implementar un sistema de riego que permita controlar las emisiones en pilas de almacenamiento, punto de descarga a las tolvas de recibo, zarandas de las plantas trituradoras de material pétreo en Fase1, Fase2 y Fase3 y adicionalmente en vías internas y externas del proyecto.*

3. *La empresa **LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A**, debe realizar un estudio de calidad del aire representado en material particulado en el año 2022, 2023, 2024 y 2025 antes de la expiración del permiso de emisiones atmosféricas en las plantas trituradoras utilizando equipos de medición según metodología actual, en por lo menos tres (3) estaciones: una ubicada uno (1) en vientos arriba de la empresa, uno dentro de las instalaciones de la empresa y una (1) ultima en el área vientos arriba de la empresa. El estudio señalado debe realizarse por espacio de cinco (5) días continuos y los equipos deben quedar ubicados a una altura mínima de tres (3) metros con relación al piso; es condición fundamental y necesaria que las plantas trituradoras y concreto premezclado, estén en actividad. Estos muestreos deben ser avalados por un funcionario de CORPOGUAJIRA, por lo que se debe invitar a éste con quince (15) días de anticipación.*

VALIDO PARA VERIFICAR VIGENCIA

4. *La empresa **LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A** , debe adelantar un estudio de ruido ambiental en el año 2022 y otro en el 2024 por el término de tres (3) días (diurno y nocturno) en por lo menos tres (03) sitios (vientos arriba), en las instalaciones de la empresa (dentro del proyecto) y después del proyecto (vientos abajo); presentar además de las isófonas una tabla con el Leq, L90, Lmax y Lmin y los comentarios y recomendaciones. Para adelantar este estudio es condición fundamental y necesaria que las plantas productoras estén en plena actividad. Estos muestreos deben ser avalados por un funcionario de CORPOGUAJIRA, debiendo invitar a éste con quince (15) días de anticipación.*

5. *Los residuos sólidos de carácter orgánico e inorgánico clasificados como ordinarios que se generen en esta actividad deben almacenarse temporalmente en recipientes adecuados para tal fin, y posteriormente entregarlos al carro recolector de aseo urbano que preste el servicio en el sector, en la presentación y frecuencia que dicha empresa lo solicite.*

6. *La empresa, no podrá, ni deberá entregar a la empresa prestadora del servicio de aseo urbano, residuos clasificados como peligrosos de acuerdo con lo establecido el Decreto 4741 de 2005. El incumplimiento de esta obligación será causal de las sanciones que correspondan y guardar en archivo las evidencias para que posterior ser cargadas al sistema como usuario generador.*

7. *La empresa **LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A**, debe adelantar un programa de reforestación en los alrededores de la actividad, estableciendo una cortina rompe viento, con el fin de evitar que el material particulado que se genere por el tránsito vehicular y la operación de las plantas de triturado, transciendan los límites de esta; lo anterior debe ser complementado con el riego de las vías internamente, tal como se señaló.*

8. *Los vehículos utilizados para el acarreo de los materiales pétreos, desde el sitio de extracción hasta la planta de triturado y de esta a los sitios de operación, deben cumplir con lo estipulado en el Artículo 2 de la Resolución 541 del 14 de Dic de 1994.*

9. *No se permitirá el vertimiento a ningún cuerpo de agua, los residuos líquidos provenientes de la planta trituradora de material pétreo, al igual que de las escorrentías pluviales que hayan tenido contacto directo con hidrocarburo.*

10. *Las aguas residuales domésticas, deben ser conducidas al sistema de tratamiento existente, en ninguna circunstancia se debe verter las mismas a cuerpos de agua cercanos.*

11. *En un término de un (1) mes posterior a la notificación del acto administrativo que otorga el permiso de emisiones, la empresa* ***LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A*** *debe diseñar y presentar ante CORPOGUAJIRA para su aprobación, un Plan de Riego de vías el cual deberá incluir las vías internas del polígono de la Planta Trituradora y la vía de acarreo de material crudo procedente de una cantera que tenga Título Minero de la ANM e Instrumento Ambiental (Licencia o Plan de Manejo) otorgado por la Autoridad Ambiental. El citado Plan debe incluir la cantidad y capacidad de los vehículos a utilizar para el riego, la frecuencia de riego, entre otros factores. El Plan de Riego hará parte del permiso de emisiones atmosféricas y en caso de no poderse aplicar ante una falla en sus componentes, la empresa* ***LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A*** *deberá suspender las actividades que generan emisiones atmosféricas en las vías del proyecto.*

12. *Buscando garantizar la rápida dispersión de los contaminantes descargados a la atmósfera, con base en el análisis de la Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones y en lo enunciado por el acompañante a la visita técnica; el proceso de trituración de material pétreo en la Planta Trituradora de la empresa* ***LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A*** *y que está ubicada a 2.1 kilómetros antes de llegar al centro poblado del corregimiento de Cuestecitas, Municipio de Albania, La Guajira solo podrá se realizado en el horario comprendido entre las 06:00 y las 18:00 horas del día.*

13. *La empresa* ***LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A*** *debe garantizar que toda la materia prima (material crudo) por utilizar en el proceso de trituración, proceda de una cantera que tenga Título Minero de la ANM e Instrumento Ambiental (Licencia o Plan de Manejo) otorgado por la Autoridad Ambiental; Para esto, deberá remitir a CORPOGUAJIRA mensualmente y dentro de los diez (10) primeros días del mes posterior al mes de reporte, toda la documentación que compruebe la procedencia del material tales como: facturas o contrato de compra, copia del Título Minero de la ANM y del Instrumento Ambiental.*

VALIDO PARA VERIFICAR VIGENCIA

14. *La empresa* ***LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A*** *debe calcular los costos de las obras y actividades de control de las emisiones al aire de la la Planta Trituradora y remitirlos a CORPOGUAJIRA en un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que renueve el permiso de emisiones atmosféricas.*

    De igual forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.7.8. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que la adicione, modifique o sustituya; la empresa ***LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A*** *deberá constituir a favor de CORPOGUAJIRA una póliza de garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso de emisiones otorgado, por un valor equivalente al 30% de los costos calculados y presentarla a esta entidad en el mismo término de treinta (30) días.*

15. *La empresa* ***LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A*** *durante el transporte de la materia prima (material crudo) en la vía de acarreo que conecta a la cantera que tenga Título Minero de la ANM e Instrumento Ambiental (Licencia o Plan de Manejo) otorgado por la Autoridad Ambiental con la Planta Trituradora; deberá cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas. La cobertura utilizada deberá ser en material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del vehículo transportador.*

16. *La empresa* ***LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A*** *en un término de tres (3) meses, debe implementar un programa de mantenimiento de todos los equipos que generen emisiones*

atmosféricas y sus respectivos equipos de control. El programa deberá radicarse dentro del mismo término en CORPOGUAJIRA para ser incluido al expediente del permiso de emisiones atmosféricas.
Dicho programa debe cumplirse a cabalidad; debe ser actualizado periódicamente incluyendo mantenimientos preventivos o correctivos realizados con sus respectivos registros fotográficos que incluyan fecha, hora y ubicación; y debe estar disponible en la Planta Trituradora para presentarlo a CORPOGUAJIRA en las visitas de seguimiento ambiental.

17. *Para cada año del permiso de emisiones, la empresa **LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A** que se encuentra ubicada a 2.1 kilómetros antes de llegar al centro poblado del corregimiento de Cuestecitas, Municipio de Albania, Departamento de La Guajira, deberá realizar una campaña de monitoreo de calidad del aire en inmediaciones de la Planta Trituradora.*

18. *La empresa **LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A**, para cada año del permiso, debe realizar en la Planta Trituradora un monitoreo de emisión de ruido en horario diurno, acorde con el procedimiento establecido en el capítulo I del Anexo 3 de la Resolución 0627 de 2006 emitida por el MAVDT (hoy MADS) o la norma que la adicione, modifique o sustituya.*

    *Los resultados de las mediciones de emisión de ruido deben ser corregidos con los ajustes que le apliquen de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 0627 de 2006 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. Así mismo, teniendo en cuenta que el ruido trasciende a sectores o subsectores vecinos; **LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A** deberá comparar los resultados corregidos contra el estándar máximo permisible para horario diurno del Sector D "Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado", Subsector "Rural habitada destinada a explotación agropecuaria" establecido en el artículo 9 de la Resolución 0627 de 2006 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.*

    Toda la información del monitoreo de emisión de ruido se debe presentar en un informe técnico que cuente como mínimo con la información establecida en el artículo 21 de la Resolución 0627 de 2006 o la norma que la adicione, modifique o sustituya; dicho informe debe ser radicado en CORPOGUAJIRA dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la realización de las mediciones.

    ***NOTA 1**: La empresa **LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A** debe radicar en CORPOGUAJIRA un oficio, con por lo menos treinta (30) días antes de la fecha de realización del monitoreo de ruido, Dicho oficio debe contener por lo menos la siguiente información:*
    Fecha y hora en la cual se realizará el monitoreo de emisión de ruido.

    Nombre del responsable (laboratorio o empresa) de realizar el monitoreo de emisión de ruido, el cual debe estar acreditado por el IDEAM, de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo 2 del artículo 2.2.8.9.1.5 consagrado en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. Cuando se modifique la fecha establecida, se deberá informar sobre este hecho a CORPOGUAJIRA a través del correo electrónico. Sin embargo, no será obligatoria la presencia de un funcionario de CORPOGUAJIRA para la realización de los monitoreos.

19. *cada año del permiso de emisiones y usando información anual del consumo real de materias primas u otros materiales utilizados; la empresa **LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A** deberá calcular las emisiones atmosféricas de Material Particulado (MP) en miligramos por metro cúbico (mg/m^3) de todas las actividades realizadas. Dicho cálculo se realizará utilizando Balance de Masas o Factores de Emisión establecidos en el compendio AP-42 de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos - EPA (siendo prioritario el Balance de Masas).*

    El responsable de realizar la estimación de las emisiones debe acreditar por lo menos cinco (5) años de experiencia relacionada con el cálculo de emisiones atmosféricas por Balance de Masas o Factores de Emisión.

    Los resultados de la estimación de emisiones deberán ser presentados ante CORPOGUAJIRA en un informe técnico, máximo dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al año que se pretende reportar. Junto con el informe técnico deberán remitirse las memorias de cálculos de las emisiones atmosféricas en un documento Excel.

VALIDO PARA VERIFICAR VIGENCIA

20. *La empresa **LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A,** debe realizar anualmente un informe de cumplimiento ambiental donde se especifiquen las acciones para el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el permiso de emisiones atmosféricas y otros relacionados con la actividad que ejecuta la empresa. Cada informe se debe radicar en CORPOGUAJIRA durante el primer trimestre del año posterior al año de reporte.*

21. *CORPOGUAJIRA, realizará en cualquier momento y sin previo aviso, visitas de control, seguimiento y/o monitoreo a la Planta Trituradora de la empresa **LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A,** y en su área de influencia, buscando supervisar la ejecución de actividades y verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el presente documento, reservándose el derecho de hacer nuevas exigencias cuando se desprenda la necesidad.*

22. *La empresa **LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A,** por el tamaño de la empresa y la connotación de tipo ambiental que puede generar las actividades de triturado, debe conformar un departamento ambiental o en su defecto, contar con la asesoría de un profesional del área ambiental para que estructure las fichas de manejo ambiental requeridas e implemente medias y estrategias de control para disminuir las emisiones atmosféricas, los vertimientos líquidos, manejo y disposición de aceites y lubricantes, manejo y disposición de residuos sólidos entre otros.*

23. *La empresa **LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A**, en la etapa de desmantelamiento y abandono, debe restaurar toda el área intervenida y que haya sido susceptible de contaminación, recoger todo el suelo contaminado y reemplazarlo por suelo fresco y adelantar un programa de revegetación y siembra de árboles en la citada área.*

VALIDO PARA VERIFICAR VIGENCIA

ARTICULO CUARTO: Las condiciones técnicas que se encontraron al momento de la visita y que quedaron plasmadas en el concepto técnico rendido por el funcionario comisionado deberán mantenerse.

ARTICULO QUINTO: La Empresa LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A., debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos en el Decreto 1076 de 2015, Ley 99 de 1993 y lo señalado en las demás normas reglamentarias, con el fin de mitigar y eliminar el impacto de actividades contaminantes del Medio Ambiente; el incumplimiento de lo establecido en la Decreto en mención, dará lugar a las medidas preventivas o sancionatorias previstas en la Ley 1333 de 2009 o demás normas que las modifiquen o sustituyan.

VALIDO PARA VERIFICAR VIGENCIA

ARTÍCULO SEXTO: CORPOGUAJIRA podrá modificar unilateralmente de manera total o parcial, los términos y condiciones del permiso, cuando por cualquier causa se hayan modificado las circunstancias tenidas en cuenta al momento de otorgar el mismo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015.

ARTICULO SEPTIMO: CORPOGUAJIRA, ordenará visitas de inspección ocular cuando lo estime conveniente y las veces que sea necesario, a costa del permisionario, con el fin de verificar que efectivamente se acogieron las recomendaciones realizadas por esta corporación y a la normatividad legal colombiana y de no ser así, se procederá de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: Por la Subdirección de Autoridad Ambiental de esta Corporación, notificar al Representante Legal de la Empresa LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A., o a su apoderado debidamente constituido.

ARTICULO NOVENO: Por la Subdirección de Autoridad Ambiental de esta Corporación, notificar al Procurador Ambiental, Judicial y Agrario - Seccional La Guajira o a su apoderado debidamente constituido.

ATICULO DECIMO: El encabezamiento y parte resolutiva de la presente providencia deberán publicarse en el Boletín Oficial y/o Página WEB de CORPOGUAJIRA, para lo cual se remite a la Secretaría General de esta entidad.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o por aviso de esta providencia, conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011.


ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El presente Acto Administrativo rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Riohacha, Capital Distrital del Departamento de La Guajira, a los 2 días del mes de junio del año 2022.



SAMUEL SANTANDER LANAO ROBLES
Director General



Revisó: Jelkin B.
Aprobó: J. Palominc



AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Certificado

Registro Único de RUCOM

Registro **RUCOM-2020070816865**

En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. con NIT número 825000164 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 13-07-2024 hasta el 31-07-2025. Durante el mes de mayo de 2025 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Los minerales autorizados para ser comercializados son: ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS ELABORADAS (TRITURADAS, MOLIDAS O PULVERIZADAS), ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS, RECEBO (MIG), MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, OTRAS ROCAS O PIEDRAS TRITURADAS PARA CONSTRUCCIÓN NCP

Dado en Bogotá D.C., a los 13 dias del mes de julio del año 2024.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

JAIME ALONSO GARCÍA ARANGO
Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

CARLOS ARBEY CEDENO OSSO
13-07-2024 12:41

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 09/10/2024 - 15:05:19
Recibo No. S000581310, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN RXGchzj2MY

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=30 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.
Nit : 825000164-2
Domicilio: Riohacha, La Guajira

MATRÍCULA

Matrícula No: 52765
Fecha de matrícula: 09 de enero de 1996
Ultimo año renovado: 2024
Fecha de renovación: 27 de marzo de 2024
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 1 NRO. 11-75
Municipio : Riohacha, La Guajira
Correo electrónico : contabilidad@lamacuira.com
Teléfono comercial 1 : 7285881
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 1 NRO. 11-75
Municipio : Riohacha, La Guajira
Correo electrónico de notificación : gerencia@lamacuira.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 19 del 09 de enero de 1996 de la Notaria Segunda de Riohacha, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de enero de 1996, con el No. 2403 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA MACUIRA LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 49 del 27 de enero de 2006 de la Notaria Segunda de Riohacha, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de agosto de 2006, con el No. 14153 del Libro IX, se decretó CESION CUOTAS

Por Escritura Pública No. 49 del 27 de enero de 2006 de la Notaria Segunda de Riohacha, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de agosto de 2006, con el No. 14154 del Libro IX, se decretó AUMENTO DE CAPITAL

Por Escritura Pública No. 1194 del 14 de noviembre de 2008 de la Notaria Segunda de Riohacha, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de febrero de 2009, con el No. 15906 del Libro IX, se inscribió MEDIANTE OFICIO DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2014 DE LA NOTARIA SEGUNDA DERIOHACHA SE INFORMA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO EL NUMERO 1196 A LA ESCRITURA DE REFORMA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2008, CUANDO EN REALIDAD LE CORRESPONDIA EL NUMERO 1194, CON BASE EN LO ANTERIOR SEPROCEDIO A REALIZAR LA RESPECTIVA CORRECCION

Por Escritura Pública No. 1194 del 14 de noviembre de 2008 de la Notaria Primera de Riohacha, inscrito en

esta Cámara de Comercio el 24 de febrero de 2009, con el No. 15909 del Libro IX, se decretó MEDIANTE OFICIO DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2014 DE LA NOTARIA SEGUNDA DERIOHACHA SE INFORMA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO EL NUMERO 1196 A LA ESCRITURA DE REFORMA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2008, CUANDO EN REALIDAD LE CORRESPONDIA EL NUMERO 1194, CON BASE EN LO ANTERIOR SEPROCEDIO A REALIZAR LA RESPECTIVA CORRECCION

Por Escritura Pública No. 1307 del 15 de diciembre de 2009 de la Notaria Segunda de Riohacha, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de diciembre de 2009, con el No. 16615 del Libro IX, se decretó REFORMA OBJETO SOCIAL

Por Escritura Pública No. 115 del 10 de febrero de 2010 de la Notaria Segunda de Riohacha, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de febrero de 2010, con el No. 16719 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS

ORDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Por Oficio No. 497 del 11 de abril de 2023 del Juzgado Primero De PequeÑas Causas Y Competencia Multiple De Rioh de Riohacha, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de mayo de 2023, con el No. 11865 del Libro VIII, se decretó INCRIPCION MEDIDA CAUTELAR DE DEMANDA ORDENADA POR JJUZGADO 1 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE RIOHACHA LA GUAJIRA POR OFICIO 497 RAD 2023-00095.

PROCESOS ESPECIALES

CONCORDATO, REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN O LIQUIDACIÓN JUDICIAL

Por Auto No. 460-005463 del 03 de septiembre de 2019 de la Superintendencia De Sociedades de Bogota, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de septiembre de 2019, con el No. 6 del Libro XVIII, se decretó AVISO QUE INFORMA SOBRE LA PROMOCION DEL ACUERDO DE REESTRUCT Y DESIGNACION PROMOTOR, MEDIANTE AUTO EMANADO POR LA SUPER SOCIEDADES CON NUMERO 460-005463 DE FECHA 02-06-2019 Y DONDE SE NOMBRA COMO PROMOTOR AL SEÑOR DARIO COHEN BARROS ZINMERMAN, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 84.030.269. MEDIANTE AUTO 460-007-149 DEL 26 DE AGOSTO DEL 2019.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 10 de febrero de 2060.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

Mediante inscripción No. 20860 de 18 de febrero de 2014 se registró el acto administrativo No. 16 de 17 de junio de 2008, expedido por Ministerio De Transporte, que lo habilita para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor especial.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCION, ASESORIA Y LA CONSULTORIA EN DISEÑOS, CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE OBRAS EN LAS AREAS CIVIL, ARQUITECTONICAS, ELECTRICA, ELECTRONICAS, AMBIENTAL, SANITARIA Y MECANICA, LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA, ALQUILER DE VEHICULOS PARA ACTIVIDADES EN GENERAL, MANTENIMIENTO, COMPRA Y VENTA DE PROPIEDAD RAIZ, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPOS PARA OFICINA, CONTRATACION DE PERSONAL Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, COMPRA-VENTA Y ARRIENDO DE TODA CLASE DE MAQUINARIA PESADA, LA IMPORTACION DE ESTAS MAQUINARIAS PESADAS, Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE VALLAN ACORDE CON EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. ADEMAS TAMBIEN PODRA: A) ADELANTAR ESTUDIOS FISICOS Y TOPOGRAFICOS, TECNICOS, DECLARATORIA DE EFECTOS AMBIENTALES, SANEAMIENTO BASICO Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. B) EFECTUAR POR SI O POR INTERMEDIO DE TERCERAS PERSONAS LA INDUSTRIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES. C) IMPORTAR Y EXPORTAR TODA CLASE DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION. D) INTERVENIR EN VALORES MUEBLES E INMUEBLES. E) ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ADMINISTRAR, TOMAR Y DAR EN ARRIENDO TODA

CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. F) GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, ASEGURAR, CEDER, NEGOCIAR EN GENERAL TITULOS VALORES O CUALQUIER OTRA CLASE DE TITULOS CREDITICIOS. G) CREAR O FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES QUE REALICEN ACTIVIDADES SEMEJANTES, COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS DEL OBJETO SOCIAL O QUE SEAN EN CONVENIENCIA SOCIAL PARA LOS SOCIOS. H) TRANSIGIR, DESISTIR, APELAR A DECISIONES DE ARBITROS EN CUESTION EN QUE TENGA INTERES FRENTE A TERCEROS, A SUS ADMINISTRADORES, A SUS TRABAJADORES O A SUS MISMOS SOCIOS. I) TRANFORMARSE EN OTROS TIPOS LEGALES EN SOCIEDADES O FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES. J) TOMAR DINEROS EN PRESTAMOS, ABRIR CUENTAS CORRIENTES, ENDOSAR, AVALAR, ADQUIRIR, DAR EN GARANTIA BIENES SOCIALES, SOBREGIROS EN CUENTAS CORRIENTES, ETC. D) INTERVENIR EN VALORES MUEBLES E INMUEBLES. EN DESARROLLO DEL MISMO PODRA LA SOCIEDAD: EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO, TALES COMO: FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES ANONIMAS O DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. EXPLOTACION DE TODO LO RELACIONADO CON LA AGRICULTURA Y GANADERIA; DESARROLLO Y EXPLOTACION DE TODO TIPO DE PROYECTOS GANADEROS, AGRÍCOLAS, FORESTALES, MINEROS Y PESQUEROS, Y LA POSTERIOR INDUSTRIALIZACION DE SUS PRODUCTOS, DESECHOS Y DERIVADOS DE CADA UNO DE DICHOS PROYECTOS. DESARROLLO Y EXPLOTACION DE FRIGORIFICOS, PLANTAS DE SACRIFICIOS, Y PROCESADORAS DE CARNICOS PARA TODO DE ESPECIE PECUARIA, INCLUYENDO MARISCOS, PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAR Y PSICULTURA; DESARROLLAR Y EXPLOTAR CENTROS DE ACOPIO DE LECHE, PLANTA DE PASTEORIZACION, DERIVADOS LACTEOS, PURIFICADORAS DE AGUA, PROCESADORAS DE FRUTAS EN PULPA Y JUGOS; DESARROLLO Y EXPLOTACION DE PLANTAS DE PROCESADORAS DE ACEITE, GRASAS ANIMALES Y VEGETALES Y PLANTAS PROCESADORAS DE MADERAS (ASERRADERO S) Y MINERALES, DICHOS PRODUCTOS PODRAN SER ELABORADOS CON MATERIA PRIMA OBTENIDOS EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA Y O POR MEDIO DE COMPRA DE DICHAS MATERIAS PRIMAS A TERCEROS, DE IGUAL FORMA SE PODRAN COMPRAR PRODUCTOS TERMINADOS PARA RE EMPACARLOS O RE ETIQUETARLOS, COMERCIALIZANDOLOS AL POR MAYOR AL DETAL, TAMBIÉN IMPORTAR O EXPORTAR TODOS ESTOS PRODUCTOS, REALIZAR FERIAS Y EXPOSICIONES GANADERAS, PORCINA, BOVINAS, EQUINAS, Y REALIZAR SUBASTAS DE TODAS ESTAS ESPECIES, LO MISMO QUE COMERCIALIZAR GENETICA ANIMAL Y VEGETAL Y TODO TIPO DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS, COMO TAMBIÉN, LA COMERCIALIZACION DE MATERIAS PRIMAS, IMPORTACIONES DE IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA AGRICOLA Y GANADERA, EXPLOTACION DE LA INDUSTRIA TURISTICA Y CULTURAL, MOVILIZACIONES TURISTICAS Y RECREATIVAS, COMERCIO TURISTICO EN GENERAL. TAMBIÉN SE DEDICARA A LA EXPLOTACION DE TODO LO RELACIONADO CON LA INDUSTRIA HOTELERA Y AFINES, CONSTRUCCION DE BIENES RAICES, IMPORACIONES, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL PODRA LA SOCIEDAD REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES CIVILES Y COMERCIALES, CON LA CONDICION DE SOLICITUD Y DE QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA O INDIRECTA CON EL OBJETO PRINCIPAL. PODRA TAMBIÉN LA SOCIEDAD EN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO: 1) ADQUIRIR CUALQUIER TITULO BIENES O INMUEBLES ENAJENARLOS Y EXPLTARLOS Y ADEMÁS: A) ABRIR Y EXPLOTAR LOS ESTABLECIMIENTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, OBTENER CONSECIONES, LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES RELACIONADAS CON SU ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS; CELEBRAR CONTRATOS A PROCURAR A LA SOCIEDAD NUEVAS CONEXIONES O A MEJORAR EN CUALQUIER FORMA LA RELACIÓN DE LAS OPERACIONES QUE CONSTITUYEN SU OBJETO, INTERVENIR EN LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD O VINCULARSE A OTRAS YA EXISTENTES QUE TENGAN FINES IGUALES O SEMEJANTES O SIMPLEMENTE COMPLEMENTARIOS QUE LOS QUE LA COMPAÑÍA PERSIGUE O CUYO OBJETO SEA LA CELEBRACION DE NEGOCIOS QUE PERMITAN A LA SOCIEDAD E MEJOR DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES; B) TOMAR DINERO O DAR DINERO AL INTERES AUN DE LOS PROPIOS SOCIOS, CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTAS CORRIENTES, AGENCIAS BANCARIAS, CORPORACIONES FINANCIERAS Y EN GENERAL A TODA CLASE DE PERSONAS JURIDICAS O NATURALES; DAR EN GARANTIAS SUS BIENES MUEBLES O INMUBLES, NEGOCIAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES; EN FIN HACER EN CUALQUIER PARTE, SEA EN SU PROPIO NOMBRE, POR CUENTAS DE TERCEROS O EN PARTICIPACION CON ELLOS, TODA CLASE DE OPERACIONES CIVILES, COMERCIALES, INDUSTRIALES QUE TIENDEN A FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA. C) TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA Y PESADA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y AFINES, PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E INTERDEPARTAMENTAL, COMPRA, VENTA, Y ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Y DE INGENIERIA, TALES COMO BULDOCER, RETROEXCAVADORA, MOTO NIVELADORA Y AFINES, ASI MISMO LA SOCIEDAD SE ENACARGARA DE COMERCIALIZAR, IMPORTAR CON PRODUCTOS ELECTRONICOS TALES COMO COMPUTADORES, SOFTWARE Y TODO SUS DERIVADOS. EXPLORACION Y EXPLOTACION DE CUALQUIER CLASE DE MINERAL.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	1.000.000,00

Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	1.000.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	1.000.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE, QUE PODRA SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON UN SUPLENTE QUE REEMPLAZARA AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. TANTO EL GERENTE PRINCIPAL, COMO EL SUPLENTE, SERAN ELEGIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA PERIODOS DE 5 (AÑOS), SIN PERJUICIO DE QUE LA MISMA JUNTA PUEDA REMOVERLOS LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO. EL GERENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA TODOS LOS EFECTOS.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, CON FACULTADES ILIMITADAS, Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2: EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CONLO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS; UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA. 6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. 7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. 8. CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 9. CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA, Y, EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACION PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA SEGÚN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. 10. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. AUTORIZADO APRA CONTRATAR, SIN LIMITE ALGUNO CON ENTIDADES DEL ESTADO Y PRIVADAS, CONTRATOS DE OBRA CIVIL, SUSCRIBIR CREDITOS ORDINARIOS, HIPOTECARIOS, OPERACIONES LEASING EN FIN TODAS LAS MODALIDADES DE CREDITOS, AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA, ASI MISMO OTORGAR PODER A ABOGADOS PARA QUE EJERZA LA DEFENSA DE LA SOCIEDAD. 11. SE AUTORIZA EN PLENO AL REPRESENTANTE LEGAL A LA APERTURA DE LA SUCURSALES Y AGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL EXTRANJERO. Y EN ESPECIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ECUADOR).

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 72 del 05 de agosto de 2020 de la Asamblea Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 09 de noviembre de 2020 con el No. 31248 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	DARIO COHEN BARROS ZINMERMAN	C.C. No. 84.030.269
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	JOSE MANUEL BARROS ZIMMERMANN	C.C. No. 19.092.530

JUNTA DIRECTIVA

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPALES		
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	DARIO COHEN BARROS ZINMERMAN	C.C. No. 84.030.269
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	YELITZA CONCEPCION VIÑAS ROMERO	C.C. No. 40.917.614
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	DARIO CAMILO BARROS VIÑAS	C.C. No. 1.020.751.496

Por Escritura Pública No. 1196 del 14 de noviembre de 2008 de la Notaria Segunda de RIOHACHA, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 24 de febrero de 2009 con el No. 15907 del libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	DARIO COHEN BARROS ZINMERMAN	C.C. No. 84.030.269

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 87 del 13 de octubre de 2022 de la Asamblea General Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 26 de octubre de 2022 con el No. 35517 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	FRANCY ELENA VERA GARCIA	C.C. No. 56.089.695	127160-T
REVISOR FISCAL SUPLENTE	MARIANELLA URRUTIA VEGA	C.C. No. 1.118.841.525	222410-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) E.P. No. 49 del 27 de enero de 2006 de la Notaria Segunda Riohacha	14153 del 31 de agosto de 2006 del libro IX
*) E.P. No. 49 del 27 de enero de 2006 de la Notaria Segunda Riohacha	14154 del 31 de agosto de 2006 del libro IX
*) E.P. No. 1194 del 14 de noviembre de 2008 de la Notaria Segunda Riohacha	15906 del 24 de febrero de 2009 del libro IX
*) E.P. No. 1194 del 14 de noviembre de 2008 de la Notaria Primera Riohacha	15909 del 24 de febrero de 2009 del libro IX
*) E.P. No. 1307 del 15 de diciembre de 2009 de la Notaria Segunda Riohacha	16615 del 18 de diciembre de 2009 del libro IX

*) E.P. No. 115 del 10 de febrero de 2010 de la Notaria 16719 del 12 de febrero de 2010 del libro IX Segunda Riohacha
*) Acta No. 57 del 10 de abril de 2014 de la Junta 21130 del 26 de mayo de 2014 del libro IX Extraordinaria De Socios
*) E.P. No. 762 del 12 de junio de 2014 de la Notaria 21160 del 13 de junio de 2014 del libro IX Segunda Riohacha

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: F4220
Otras actividades Código CIIU: G4663 N8299

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: TRITURADORA EBANAL
Matrícula No.: 114656
Fecha de Matrícula: 30 de marzo de 2012
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CLL 1 NRO. 3 - 235
Municipio: Riohacha, La Guajira
** Embargo, medida cautelar o prohibición: Por Oficio No. 950 del 27 de agosto de 2018 de la Juzgao Primero Civil El Circuito De Rioh de Riohacha, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de septiembre de 2018, con el No. 11398 del Libro VIII, se decretó EL JUZGAO PRIMERO CIVIL EL CIRCUITO DE RIOHACHA MEDIANTE OFICIO NO. 950 DEL 27 DE AGOSTO DE 2018 DECRETO EL EMBARGO ESTABLECIMIENTO DENOMINADO TRITURADORA EBANAL.
** Embargo, medida cautelar o prohibición: Por Oficio No. 18-356 del 17 de septiembre de 2018 del Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de septiembre de 2018, con el No. 11401 del Libro VIII, se decretó INSCRIPCIÓN DE DEMANDA.
** Embargo, medida cautelar o prohibición: Por Oficio No. 621 del 22 de octubre de 2018 del Juzgado Segundo De Pequenas Causas Y Competencias Multiples De de Riohacha, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de noviembre de 2018, con el No. 11433 del Libro VIII, se decretó EMBARGO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO POR ORDEN JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEñAS CAUSAS POR OFICIO 621 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2018 RAD 440014003003-2017-00073-00

DEMANDANTE CEMENTO ARGOS S.A.
** Embargo, medida cautelar o prohibición: Por Oficio No. 2018 del 23 de noviembre de 2018 del Juzgado 19 Civil Municipal Mixto De Barranquilla de Barranquilla, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de diciembre de 2018, con el No. 11450 del Libro VIII, se decretó EMBARGO ESTABLECIMIENTO.
** Embargo, medida cautelar o prohibición: Por Oficio No. 1858 del 11 de diciembre de 2018 del Juzgado Trece Civil Del Circuito Oral de Barranquilla, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de diciembre de 2018, con el No. 11455 del Libro VIII, se decretó JUZGADO TRECE CIVIL DEL CIRCUITO ORAL DE BARRANQUILLA DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO TRITURADORA EBANAL.
** Embargo, medida cautelar o prohibición: Por Oficio No. 1073 del 27 de noviembre de 2019 del Juzgado Segundo Civil Municipal de Riohacha, inscrito en esta Cámara de Comercio el 01 de marzo de 2019, con el No. 11472 del Libro VIII, se decretó INSCRIPCION DE EMBARGO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO POR ORDEN JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL POR OFICIO 1073 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 RAD 44-001-40-03-002-2018-00131-00.
** Embargo, medida cautelar o prohibición: Por Oficio No. 251 del 27 de febrero de 2019 del Juzgado Segundo Civil Del Circuito de Riohacha, inscrito en esta Cámara de Comercio el 01 de marzo de 2019, con el No. 11474 del Libro VIII, se decretó EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO POR ORDEN JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOHACHA POR OFICIO 0251 DEL 27 DE FEBRERO DE 2019 RAD 44-001-31-03-002-2018 00159-00.

Nombre: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA MACUIRA
Matrícula No.: 52766
Fecha de Matrícula: 09 de enero de 1996
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CL 1 NRO. 11-75
Municipio: Riohacha, La Guajira
** Embargo, medida cautelar o prohibición: Por Providencia Judicial No. 136 del 23 de marzo de 2018 del Juzgado Primero Laboral Del Circuito de Riohacha, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de abril de 2018, con el No. 11359 del Libro VIII, se decretó EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
** Embargo, medida cautelar o prohibición: Por Oficio No. 950 del 27 de agosto de 2018 de la Embargo de Riohacha, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de septiembre de 2018, con el No. 11399 del Libro VIII, se decretó EMBARGO ESTABLECIMIENTO.
** Embargo, medida cautelar o prohibición: Por Oficio No. 2018- del 23 de noviembre de 2018 del Juzgado 19 Civil Municipal Mixto De Barr de Barranquilla, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de diciembre de 2018, con el No. 11448 del Libro VIII, se decretó EMBARGO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN BLOQUE POR ORDEN JUZGADO 19 CIVIL MUNICIPAL MIXTO DE BARRANQUILLA ATLANTICO POR OFICIO 2018 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 RAD 2018-00311.
** Embargo, medida cautelar o prohibición: Por Oficio No. 1072 del 27 de noviembre de 2018 del Juzgado Segundo Civil Municipal de Riohacha, inscrito en esta Cámara de Comercio el 01 de marzo de 2019, con el No. 11471 del Libro VIII, se decretó INSCRIPCION DE EMBARGO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA MAKUIRA POR ORDEN JUZGADO 2 CIVIL MUINICIPAL DE RIOHACHA LA GUAJIRA POR OFICIO 1072 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 RAD 44-001-40-03-002-2018-00131-00.
** Embargo, medida cautelar o prohibición: Por Oficio No. 269 del 28 de febrero de 2019 del Juzgado Segundo Civil Del Circuito de Riohacha, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de marzo de 2019, con el No. 11476 del Libro VIII, se decretó EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO POR ORDEN DE JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOHACHA POR OFICIO N 0269 DE FECHA 28 DE FEB DE 2019.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de

2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $58.081.372.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

CONTRATOS

Por documento privado No. 1 del 23 de septiembre de 2011 de la Junta de Socios de Barranquilla, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de septiembre de 2011, con el No. 10149 del Libro XI, se inscribió CONSTITUCION DE PRENDA ABIERTA SIN TENENCIA DEL ACREEDOR.

CERTIFICAS ESPECIALES

CONTRATO DE CONSTITUCION DE PRENDA: ENTRE LOS SUSCRITOS A SABER: MIGUEL ANGEL NATERA RAMIREZ MAYOR DE EDAD, VECINO DE BARRANQUILLA , CON CÉDULA DE CIUDADANIA NÚMERO 8.725.788 DE BARANQUILLA , QUIEN OBRA EN SU CONDICION DE APODERADO ESPECIAL DE BANCO DE OCCIDENTE, EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA - ATLANTICO, CONFORME AL PODER ESPECIAL, CONFERIDO EL 12 DE JULIO DE 2011 EN LA NOTARÍA 10 DEL CIRCULO DE CALI OTORGADA POR EL SEÑOR(A) MARIO ERNESTO CALERO BUENDIA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO 14.955.663 EXPEDIDA EN SANTIA9O DE CALI-VALLE REPRESENTANTE LEGAL DE BANCO DE OCCIDENTE, ESTABLECIMIENTO BANCARIO, IDENTIFICADO CON NIT. 890.300.279-4, CON DOMICILIO PRINCIPAL EN CALI, QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LLAMARÁ EL BANCO, Y EL (LA,) SEÑOR (A): BARROS ZINMERMAN DARIO COHEN, MAYOR DE EDAD Y VECINO DE RIOHACHA IDENTIFICADO (A) CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 84.030.269, QUIEN OBRA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A., CON DOMICILIO EN RIOHACHA Y QUIEN EN ADELANTE SE DENOMINARÁ EL DEUDOR SE HA CELEBRADO EL CONTRATO DE PRENDA GLOBAL O ABIERTA SIN TENENCIA, DETERMINADO CONFORME A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: PRIMERA. EL BANCO LE HA CONCEDIDO Y PUEDE LLEGAR A CONCEDERLE AL DEUDOR, EXCLUSIVA O CONJUNTAMENTE CON OTRAS PERSONAS HASTA LA CUANTÍA DE CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. $400.000.000.OO PRÉSTAMOS DE MUTUO, FACILIDADES BANCARIAS DE CAMBIO, SERVICIO DE GARANTÍA, AVALES DE SOBREGIROS Y/O DE CRÉDITO, DE CARTAS DE CRÉDITO PARA DESARROLLO DE LAS OPERACIONES O NEGOCIOS QUE CONSTITUYEN LAS ACTIVIDADES DEL DEUDOR. SEGUNDA. ES ENTENDIDO QUE LA PRESENTE GARANTÍA PRENDARÍA RESPALDA NO SOLAMENTE LOS CAPITALES HASTA LA SUMA DICHA, SINO LOS CORRESPONDIENTES INTERESES, SEGUROS Y GASTOS DE COBRANZAS, SI FUERE DEL CASO, HONORARIOS DE ABOGADOS Y DEMAS CONDICIONES O SANCIONES QUE CONTENGAN LOS DOCUMENTOS EN QUE SE OBSERVEN DEUDAS Y TODA CLASE DE COBRANZAS, SIN QUE ESTOS ULTIMOS Y DEMAS ACCESORIOS COMPUTEN PARA EFECTOS DEL SEÑALADO. LÍMITE TERCERO. EL PRESENTE CONTRATO DE PRENDA ESTARA VIGENTE POR UN PLAZO DE 10 AÑOS Y GARANTIZA OBLIGACIONES PRESENTES Y/O FUTURAS A FAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE. PARAGRAFO: NO OBSTANTE EL VENCIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA OBLIGACION GARANTIZADA, LA PRENDA CONSERVARÁ SU VIGENCIA MIENTRAS EXISTAN OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO, SEAN DIRECTAS O INDIRECTAS A CARGO DEL (LOS) DEUDOR(ES) Y A FAVOR DE LA ACREEDORA Y MIENTRAS ÉSTA NO CANCELE EN FORMA EXPRESA, EL GRAVAMEN PRENDARIO QUE POR MEDIO DE ESTE CONTRATO SE CONSTITUYE. CUARTA. EN SEGURIDAD DE LAS OBLIGACIONES QUE YA TENGA CONTRAÍDAS EL DEUDOR A FAVOR DEL BANCO Y DE LAS QUE EN EL FUTURO LLEGUE A CONTRAER, PARA LOS FINES Y DENTRO DE LA CUANTÍA Y PLAZO YA INDICADOS, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA U ORIGEN, O EN LAS QUE FIGURE COMO ACEPTANTE, ENDOSANTE, SUSCRIPTOR U ORDENANTE, AVALISTA, CODEUDOR, FIADOR O PARTE EL DEUDOR CONSTITUYE A FAVOR DEL BANCO PRENDA SIN TENENCIA SOBRE EL BIEN QUE A CONTINUACION SE ESPECIFICA: 1. EXCAVADORA; REFERENCIA SOLAR S340 LCV; MARCA DOOSAN; MODELO 2010; NO DE MOTOR 001465ECIEC; Nº DE HELWO-0002641 SERIE PARÁGRAFO: LA PRENDA QUE SE CONSTITUYE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, SE REALIZA SOBRE CUERPO CIERTO. "QUINTA. EL BIEN ANTERIORMENTE ESPECIFICADO ES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DE: LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. SEXTA. EL BIEN PIGNORADO NO HA SIDO ENAJENADO EN NINGUNA FORMA Y ESTÁ LIBRE DE EMBARGO, DEMANDAS, GRAVÁMENES ANTERIORES, RESERVAS DE DOMINIO Y SE HALLA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN. EL DEUDOR SE OBLIGA A MANTENER AMPARADO EL BIEN PIGNORADO MEDIANTE UNA PÓLIZA DE SEGUROS DE COMPAÑÍA ASEGURADORA, CUYO PRIMER BENEFICIARIO ES EL BANCO, PÓLIZA O PÓLIZAS CORRESPONDIENTES QUE EL DEUDOR SE OBLIGA A ENTREGAR AL BANCO. LA ASEGURADORA GARANTIZARÁ RENOVACIÓN AUTOMÁTICA AL VENCIMIENTO DE LA PÓLIZA Y ESTARÁ OBLIGADA A ENTREGAR EL NUEVO ENDOSO DE DICHA PÓLIZA A FAVOR DEL BANCO. ASÍ MISMO, EL DEUDOR SE OBLIGA A RENOVAR LOS SEGUROS DE LOS BIENES DADOS EN PRENDA Y AUTORIZA AL BANCO PARA QUE TOME O RENUEVE LA PÓLIZA O PÓLIZAS CORRESPONDIENTES Y AJUSTE EL VALOR ASEGURADO EN CASO DE QUE EL DEUDOR NO LO HICIERA, SIN QUE POR ESTA AUTORIZACIÓN ADQUIERE EL BANCO ESTA OBLIGACIÓN. EN EL EVENTO DE QUE EL BANCO TOME O RENUEVE LA

POLIZA O POLIZAS, EL DEUDOR AUTORIZA CARGAR CON SU VALOR, LA CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS QUE ÉSTA POSEA EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS DEL BANCO, SI HUBIERA SALDO PARA ELLO, PERO SI NO LO HUBIERA EL VALOR DE LAS PRIMAS CANCELADAS DEVENGARÁN INTERESES A LA TASA MORATORIA MÁXIMA DE LEY, DESDE LA FECHA EN QUE SE HAGA EL PAGO Y HARÁ PARTE DE LAS OBLIGACIONES ASEGURADAS CON LA PRENDA QUE AQUI SE FORMALIZA Y TENDRÁ EXIGIBILIDAD INMEDIATA EN SU COBRO. SEPTIMA. EL BIEN OBJETO DE LA PIGNORACIÓN SE ENCUENTRA UBICADO EN CL 1 NO 11- 75 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA CUAL EL DEUDOR SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PROPIETARIO. OCTAVA. EL BIEN PIGNORADO QUEDA EN PODER DEL SR. (A) (S). LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 5.A. QUIEN EJERCERÁ SOBRE ÉSTE TENENCIA EN LAS CONDICIONES DE LEY. IGUALMENTE, EL DEUDOR PERMITIRÁ AL BANCO CADA VEZ QUE LO CONSIDERE CONVENIENTE O NECESARIO, INSPECCIONAR EL ESTADO DE DICHO BIEN. NOVENA. LA PRENDA SIN TENENCIA AQUI CONSTITUIDA SE EXTIENDE IGUALMENTE A TODOS LOS ACCESORIOS PERTENECIENTES AL BIEN DESCRITO EN LA CLÁUSULA CUARTA. DECIMA. TERMINADA LA PRENDA, EL DEUDOR DEBERÁ CANCELAR POR CUENTA PROPIA ESTE GRAVAMEN. DECIMA PRIMERA. EL BANCO PODRÁ DAR POR TERMINADO EL CONTRATO DE PRENDA, SI EL BIEN PIGNORADO FUERE PERSEGUIDO POR UN TERCERO. DECIMA SEGUNDA. EL CAMBIO DE LUGAR DE UBICACIÓN DEL BIEN PIGNORADO SIN PREVIO ACUERDO SUSCRITO CON EL BANCO DEL CUAL SE TOMARÁ NOTA EN LOS REGISTROS ORIGINALES A LOS LUGARES DE LA NUEVA DIRECCIÓN, IGUAL QUE EL CAMBIO DE COMPAÑIA DE SEGUROS DARÁ DERECHO AL BANCO PARA SOLICITAR LA ENTREGA INMEDIATA DE LA PRENDA O EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUE AMPARE, AÚN CUANDO EL PLAZO NO SE ENCUENTRE VENCIDO. DECIMA TERCERA. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DEL DEUDOR DARÁ DERECHO AL BANCO PARA SOLICITAR Y OBTENER LA ENTREGA INMEDIATA DE LA PRENDA O EL PAGO DE TODAS LAS DEUDAS A CARGO DEL DEUDOR AUNQUE EL PLAZO DE ÉSTAS NO SE HALLE VENCIDO, SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES PENALES CORRESPONDIENTES. DECIMA CUARTA. EN CASO DE QUE TODO O PARTE DEL BIEN DADO EN PRENDA SE DESTRUYERE TOTAL O PARCIALMENTE, O POR CUALESQUIERA OTRAS CAUSAS SE VOLVIERA INSERVIBLE, EL BANCO PODRÁ PEDIRLE AL DEUDOR QUE MEJORE O REPONGA LA PRESENTE PRENDA A SU SATISFACCIÓN Y SI ESTA PETICIÓN NO FUERE CUMPLIDA DENTRO DEL PLAZO QUE EL BANCO LE SEÑALE AL EFECTO, ÉSTE TENDRÁ DERECHO A EXIGIR DE INMEDIATO EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DEL DEUDOR, AUNQUE HAYA PLAZO PENDIENTE PARA EL PAGO. DECIMA QUINTA. CORRESPONDEN AL DEUDOR, LOS IMPUESTOS Y GASTOS QUE SE LLEGAREN A CAUSAR PARA LA LEGALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. DECIMA SEXTA. EL DEUDOR ACEPTA CUALQUIER TRASPASO, ENDOSO O CESIÓN QUE EL BANCO HICIERE DE TODAS O PARTE DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS CON LA PRENDA QUE AQUI SE CONSTITUYE Y CONSIGUIENTEMENTE EL DE ESTA PRENDA. DECIMA SEPTIMA. EL BIEN DADO EN PRENDA PODRÁ SER ENAJENADO POR EL (LOS) DEUDOR (ES), PERO SÓLO SE VERIFICARÁ LA TRADICIÓN DE ÉL AL ADQUIRIENTE, CUANDO EL ACREEDOR LO AUTORICE O ESTÉ CUBIERTO EN SU TOTALIDAD EL CRÉDITO, DEBIENDO HACERSE CONSTAR EL RESPECTIVO HECHO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN NOTA SUSCRITA POR EL ACREEDOR. EN CASO DE AUTORIZACIÓN DEL ACREEDOR, LOS ADQUIRIENTES ESTÁN OBLIGADOS A RESPETAR EL CONTRATO PRENDA. EN CONSTANCIA SE FIRMA EN BARRANQUILLA A LOS 23 DIAS DEL MES SEPTIEMBRE 2011. RENUNCIA: MEDIANTE OFICIO DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018 EL SEÑOR LEONARDO RONDON BAQUERO IDENTIFICADO CON C.C. 84.007.483, PRESENTA RENUNCIA COMO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



EL SECRETARIO
JOEL MANJARREZ CUESTA

Fecha expedición: 09/10/2024 - 15:05:19
Recibo No. S000581310, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN RXGchzj2MY

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=30 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14898704104

(415)7707212489984(8020) 000001489870410 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 5 0 0 0 1 6 4	2	Impuestos y Aduanas de Riohacha 2 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla
LA MACUIRA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	La Guajira 4 4	Riohacha 0 0 1

41. Dirección principal
CL 1 11 75 SEC CENTRO

42. Correo electrónico info@lamacuira.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 2 8 5 8 8 1	3 1 3 5 1 7 6 6 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	1 9 9 6 0 1 0 9	4 6 6 3	2 0 0 9 0 1 0 1	4 9 2 3		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 24 / 14 : 38: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BARROS ZINMERMAN DARIO COHEN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14898704104

(415)7707212489984(8020) **000001489870410 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 2 5 0 0 0 1 6 4	2	Impuestos y Aduanas de Riohacha	2 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	0 0 0 1 9	7 6 2
73. Fecha	1 9 9 6 0 1 0 9	2 0 1 4 0 6 1 2
74. Número de notaría	2	2
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 6 0 1 1 0	2 0 1 4 0 6 1 3
77. No. Matrícula mercantil	5 2 7 6 5	5 2 7 6 5
78. Departamento	4 4	4 4
79. Ciudad/Municipio	3 0	3 0
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 6 0 1 0 9	
81. Hasta	2 0 6 0 0 2 1 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 1	2 0 0 9 0 2 2 4		-
2	8 0	2 0 1 8 0 6 2 5		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14898704104

(415)7707212489984(8020) **000001489870410 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 5 0 0 0 1 6 4	2	Impuestos y Aduanas de Riohacha	2 5

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 6 0 1 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 4 0 3 0 2 6 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARROS	ZINMERMAN	DARIO	COHEN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 9 0 2 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 0 9 2 5 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARROS	ZIMMERMANN	JOSE	MANUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14898704104

(415)7707212489984(8020) **000001489870410 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 2 5 0 0 0 1 6 4	2	Impuestos y Aduanas de Riohacha	2 5	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	8 4 0 3 0 2 6 9		COLOMBIA 1 6 9	BARROS	ZINMERMAN	DARIO	COHEN				2 0 0 8 1 1 1 4	
2	Cédula de Ciudada 1 3	4 0 9 1 7 6 1 4		COLOMBIA 1 6 9	VIÑAS	ROMERO	YELITZA	CONCEPCION				2 0 0 8 1 1 1 4	
3	Cédula de Ciudada 1 3	1 0 2 0 7 5 1 4 9 6		COLOMBIA 1 6 9	BARROS	VIÑAS	DARIO	CAMILO				2 0 0 8 1 1 1 4	
4													
5													

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14898704104

(415)7707212489984(8020) **000001489870410 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 5 0 0 0 1 6 4	2	Impuestos y Aduanas de Riohacha 2 5	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 6 0 8 9 6 9 5		1 2 7 1 6 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VERA	GARCIA	FRANCY	ELENA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 0 2 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 8 8 4 1 5 2 5		2 2 2 4 1 0 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
URRUTIA	VEGA	MARIANELLA	MARIA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 0 2 6

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 4 0 9 6 0 5 1		2 3 3 6 9 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PALACIO	CAMPO	JAIRO	VLADIMIR

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 6 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14898704104

(415)7707212489984(8020) **000001489870410 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 5 0 0 0 1 6 4	2	Impuestos y Aduanas de Riohacha 2 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Oficina 0 8	Transporte de carga por carretera 4 9 2 3	

162. Nombre del establecimiento: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA MACUIRA LTDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
La Guajira 4 4	Riohacha 0 0 1	

165. Dirección: CL 1 11 75

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
5 2 7 6 6	1 9 9 6 0 1 0 9	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
7 2 8 5 8 8 1		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento: TRITURADORA EBANAL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
La Guajira 4 4	Riohacha 0 0 1	

165. Dirección: CL 1 3 235

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 1 4 6 5 6	2 0 1 2 0 3 3 0	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
7 2 8 5 8 8 1		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PAIM de Colombia S.A.S

Riohacha 07 de abril de 2025

Por medio de la presente **PAIM DE COLOMBIA S.A.S** identificada con **Nit 900814131-5**, certifica que suministró material entre el 1 y el 31 de Marzo de 2025 a la empresa CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA identificada con Nit: 901831724-8, provenientes de la cantera MINERA LA MILAGROSA S.A.S. con Nit: 900210102-9, para la ejecución de su proyecto de "Mejoramiento de las plataformas de viraje, franjas de seguridad, sistemas de drenaje, y mejoramiento y construcción de calles de rodaje del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF).

Material	**Volumen Total (M^3) suministrado**
Material de Relleno	7500

Dicho suministro está amparado bajo la licencia Ambiental expedida con la Resolución N° 0376 de 2017 por la cual se autoriza cesión de derechos y obligaciones de la Licencia Ambiental mediante Res. 0001926 de 2008. Expedida por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

El titulo Minero mediante RES. 1256/2016 se perfecciona una cesión de derechos dentro del contrato de concesión N° HJ6-08111 a la Empresa MINERA LA MILAGROSA S.A.S.

Registro minero (CRM) N° 202410301532-647122 Contrato de Concesión (L685) Sociedad Minera La Milagrosa.

CESAR DARIO BARROS
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO AREA COMERCIAL

Riohacha, la Guajira 21 de Marzo de 2025

Señores:
INTERASEO S. A. S. E.S.P.
Riohacha – La Guajira
pqrguajira@interaseo.com.co

COMUNICADO No. INFRH-AMB-009-2025

REF: CONTRATO DE OBRA N° 23001170 H4 DE 2023. MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

El CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA con Nit No. 901 831.724-8, se encuentra en la ejecución del contrato citado en la referencia. Por medio de la presente, solicitamos a la empresa Interaseo la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios y de vegetación en nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Troncal del Caribe, al costado suroriente del aeropuerto Almirante Padilla.

Requerimos que dicho servicio se preste de manera mensual, conforme a un esquema basado en el volumen generado, con el fin de garantizar una adecuada disposición de los residuos. Asimismo, solicitamos que al término de cada servicio se nos proporcione un certificado que acredite la correcta gestión de los residuos recolectados.

Agradecemos su pronta respuesta y quedamos atentos a la formalización del servicio, así como a la información sobre costos y requisitos para su contratación.

Sin otro particular, agradecemos su atención y colaboración.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
ING. ELIANA GÓMEZ SÁNCHEZ
Residente Ambiental
C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO: E.G.S

Gmail

infraestructurariohacha rg <infraestructurariohachadm@gmail.com>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y VEGETALES

1 mensaje

infraestructurariohacha rg <infraestructurariohachadm@gmail.com> 21 de marzo de 2025, 6:27 p.m.
Para: pqrguajira@interaseo.com.co

--
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023

2 archivos adjuntos

Solicitud servicio Residuos interaseo.docx
49K

RUT INFRAESTRUCTURA RIOHACHA.pdf
558K

aqualia
Tu compañía del agua

Riohacha, la Guajira

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado N°. CE-RIO-0220-2025
Fecha: 09/04/2025

Señores:
Consorcio Infraestructura Riohacha
Atte., Eliana Gómez Sánchez
Residente Ambiental
Carrera 67 No 167-61
Oficina 509
Infraestructurariohachadm@gmail.com
Bogotá
Celular 3116478319

ASUNTO: **Solicitud Certificación suministro de agua por carrotanque**

Cordial Saludo;

Por medio del presente nos permitimos informar que la empresa AQUALIA S.A.S. E.S.P. ha suministrado al vehículo con placa WCT-885, previo pago del valor de los metros cubico de agua por carrotanques la cantidad de 70 m3 en el mes de febrero y 98m3 en el mes de marzo de 2025

Es importante mencionar que el agua vendida es potable.

Cordialmente,

Manuel Olivella Pabón
Jefe de unidad de
Gestión
Aqualia Riohacha S.A.S. E.S.P

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
CONTRATISTA

aqualia
RADICADO No. 0777
17 MAR. 2025
HORA 10:02 FOLIOS 0
PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Riohacha, DC, 17 de Marzo d e2025

Señores:
EMPRESA AQUALIA
Tu Compañía del Agua
Dir. Cr 7 # 21-15
Riohacha

COMUNICADO No. INFRH-AMB-006-2025

Asunto: Solicitud de Certificado Mensual de Compra de Agua en Bloque

Respetados señores,

Por medio de la presente, el **Consorcio Infraestructura Riohacha** solicita amablemente la expedición del certificado mensual (Febrero) de compra de agua en bloque correspondiente al consumo realizado para el desarrollo de la obra "Mejoramiento de las plataformas de viraje, franjas de seguridad, sistema de drenaje, y mejoramiento y construcción de calles de rodaje del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF), la cual se abastece a través del vehículo con placa **WCT-885**.

Este certificado es requerido para efectos de control y cumplimiento de los compromisos ambientales y operativos del proyecto. Agradecemos su colaboración y quedamos atentos a su pronta emisión.

Cualquier información adicional que se requiera, por favor comunicarse al correo o contacto suministrado.

Atentamente,

ELIANA GÓMEZ SÁNCHEZ
Residente Ambiental
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
3116478319
infraestructurariohachadm@gmail.com

Powered by CamScanner



aqualia

Nit. 901.700.537-4

Dir. Cr 7 # 21-15

Tels. 7286950 - 7274213

TICKET (0068407)


14/03/2025 2:50 pm

Cliente: CONSORCIO INFRA

Placa vehiculo: WCT-885

M^3	M^3	TOTAL
14	$4,200	$58,800
	TOTAL	$58,800

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

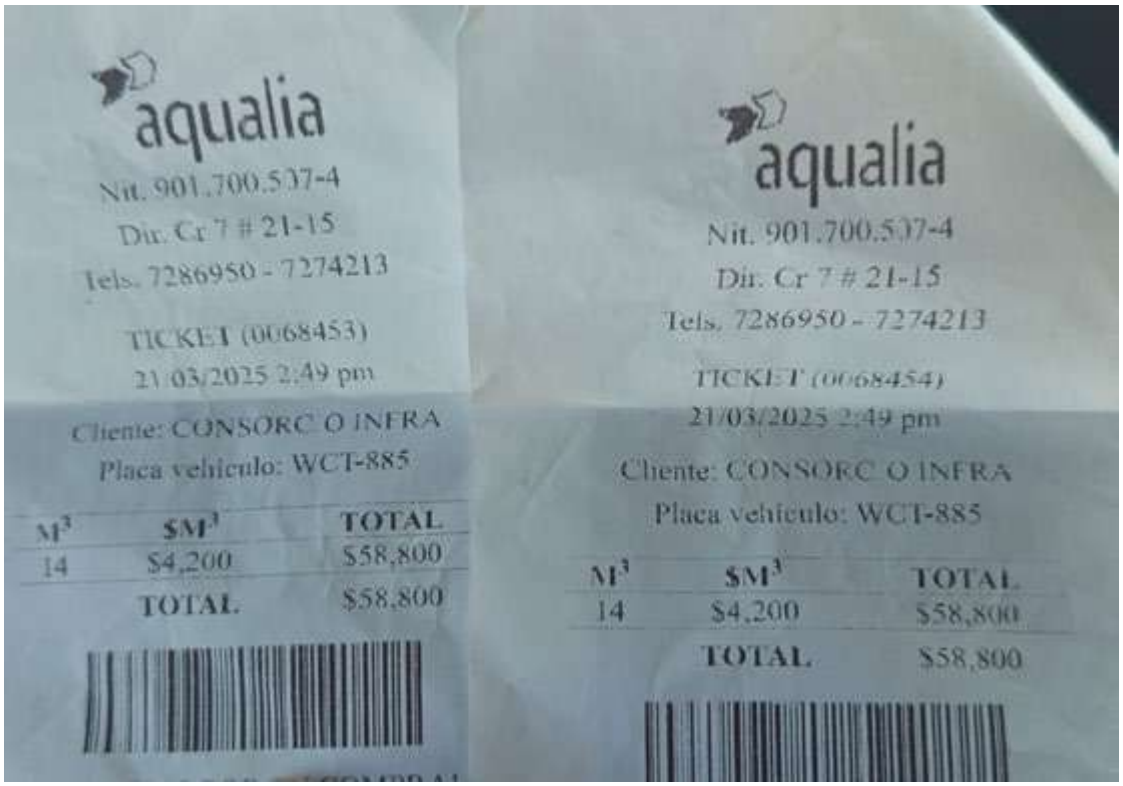

aqualia

Nit. 901.700.537-4

Dir. Cr 7 # 21-15

Tels. 7286950 - 7274213

TICKET (0068453)

21/03/2025 2:49 pm

Cliente: CONSORCIO INFRA

Placa vehiculo: WCT-885

M^3	M^3	TOTAL
14	$4,200	$58,800
	TOTAL	$58,800

aqualia

Nit. 901.700.537-4

Dir. Cr 7 # 21-15

Tels. 7286950 - 7274213

TICKET (0068454)

21/03/2025 2:49 pm

Cliente: CONSORCIO INFRA

Placa vehiculo: WCT-885

M^3	M^3	TOTAL
14	$4,200	$58,800
	TOTAL	$58,800


aqualia
Nit. 901.700.537-4
Dir. Cr 7 # 21-15
Tels. 7286950 - 7274213
TICKET (0068493)
28/03/2025 2:31 pm
Cliente: CONSORC O INFRA
Placa vehículo: WCT-885
M³ $M³ TOTAL
14 $4,200 $58,800
TOTAL $58,800
¡GRACIAS POR SU COMPRA!


aqualia
Nit. 901.700.537-4
Dir. Cr 7 # 21-15
Tels. 7286950 - 7274213
TICKET (0068494)
28/03/2025 2:31 pm
Cliente: CONSORC O INFRA
Placa vehículo: WCT-885
M³ $M³ TOTAL
14 $4,200 $58,800
TOTAL $58,800
¡GRACIAS POR SU COMPRA!
aqualia
Nit. 901.700.537-4
Dir. Cr 7 # 21-15
Tels. 7286950 - 7274213
TICKET (0068493)
28/03/2025 2:31 pm
Cliente: CONSORC O INFRA
Placa vehículo: WCT-885
M³ $M³ TOTAL
14 $4,200 $58,800
TOTAL $58,800
¡GRACIAS POR SU COMPRA!
aqualia
Nit. 901.700.537-4
Dir. Cr 7 # 21-15
Tels. 7286950 - 7274213
TICKET (0068495)
28/03/2025 2:31 pm
Cliente: CONSORC O INFRA
Placa vehículo: WCT-885
M³ $M³ TOTAL
14 $4,200 $58,800
TOTAL $58,800
aqualia
Nit. 901.700.537-4
Dir. Cr 7 # 21-15
Tels. 7286950 - 7274213
TICKET (0068496)
28/03/2025 2:31 pm
Cliente: CONSORC O INFRA
Placa vehículo: WCT-885
M³ $M³ TOTAL
14 $4,200 $58,800
TOTAL $58,800

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 03 de marzo de 2025 **2024-486-RIO-0580**

Al contestar citar este código

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Atn. TIBER GILDARDO CHAVARRO M.
Representante Legal
Carrera 67 # 167 - 61
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Solicitud Informes Ambientales

Cordial saludo,

De acuerdo con los requerimientos contractuales, se solicita al contratista que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la recepción de la presente comunicación, remita los informes ambientales correspondientes a los meses de febrero de 2025 (Informe 7).

Los informes deberán incluir las gestiones y actividades ejecutadas durante los períodos mencionados, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, Numeral 12.

AIR RIO
CONSORCIO

INFORMES AMBIENTALES MENSUALES.

El CONTRATISTA deberá realizar un informe ambiental mensual a la Interventoría, el cual debe ser un capítulo del informe mensual de obra/mejoramiento, en el que se reflejen las actividades que en materia ambiental se hayan desarrollado, las evidencias, registros y las medidas implementadas, de acuerdo con los indicadores de seguimiento consignados en el instrumento de manejo ambiental presentado y aprobado por la interventoría.

Deberá contener como mínimo la siguiente información:

- Resumen.
- Periodo Reportado.
- Descripción del contrato.
- Resumen de Fichas Ambientales (Nombre - Código)
- Resumen de permisos, trámites y gestiones realizadas ante Autoridades Ambientales.
- Resumen de relación de Actas de Comité, Oficios y Correspondencia de temas Ambientales desarrollada durante el periodo (Contratista - Interventoría - Aerocivil).
- Presentación de Fichas Ambientales (Implementadas y no Implementadas en el periodo). En la presentación de las fichas ambientales se detallarán las actividades desarrolladas, evidencias de avances de acuerdo con los indicadores aprobados, acciones y medidas implementadas en el periodo de reporte.
- Resumen de Indicadores. Deberá presentarse una tabla en la que se identifiquen los indicadores de forma resumida de acuerdo con la ficha ambiental que corresponda. los indicadores que no reporten cumplimientos del 100% en el periodo, deberán tener una justificación que sustente la realidad de la situación presentada.
- Tabla resumen de situaciones de emergencia y contingencias tomadas durante el periodo.
- Anexos. Se presentarán las evidencias documentales que sean necesarias para respaldar los avances presentados y acciones ejecutadas durante el periodo reportado.

Para los meses posteriores, se requiere que este informe sea remitido dentro del plazo contractual establecido y acordado con la interventoría.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: D.M.N
Anexo: No Aplica.

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

INCOPLAN intecsa

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2025

2024-486-RIO-0839
Al contestar citar este código

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Atn. TIBER GILDARDO CHAVARRO M.
Representante Legal
Carrera 67 # 167 - 61
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Reiteración Trámites y Gestiones Ambientales oficio 2024-486-RIO-0611

Cordial saludo,

El Decreto 1076 de 2015 establece, en su artículo correspondiente, el listado de las obras que pueden considerarse como un cambio menor, dentro de las cuáles se encuentran algunas de las establecidas al interior del aeropuerto en el contrato de obra, así:

"…artículo 2.2.2.6.1.6 del decreto 1076 de 2015,

8, b. Obras civiles:

i. Remodelación o actualización de canales, drenajes superficiales o subsuperficiales, trampas de grasas, trampas de arena, y otros complementarios de obras de drenajes, box, descoles, encoles.

ii. Remodelación de plataformas, calles de rodaje y pistas, así como mejoras estructurales, mejoras en carpetas de rodadura y ampliaciones menores de secciones transversales.

iii. Mejoras o actualización de nivelación y secciones de zonas de franjas de pista, franjas de calles de rodaje, márgenes de pista y calles de rodaje, zonas de seguridad de plataforma.

c. Infraestructura física:

i. Remodelación o actualización de redes de alcantarillado de aguas servidas o aguas lluvias, sistemas de piscinas de oxidación, sumideros y su infraestructura complementaria.

9. Construcción de nuevas calles de rodaje (calles de acceso a puestos de estacionamiento de aeronaves, calles de rodaje en plataforma y calles de salida rápida) y ampliación de calles

de rodaje (calles de acceso a puestos de estacionamiento de aeronaves, calles de rodaje en plataforma y calles de salida rápida) …"

Sin embargo, el mismo artículo establece que, **previo a la ejecución de las actividades descritas**, el titular de la Licencia Ambiental o del Plan de Manejo Ambiental de cada proyecto, obra o actividad deberá presentar un informe a la Autoridad Ambiental, con el propósito de ser incluido en el expediente de las actividades a ejecutar. Este informe será utilizado en el proceso de seguimiento y control ambiental según lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto 2820 de 2010 (o la norma que lo modifique o sustituya), y deberá contener la siguiente información:

1. Descripción de la actividad, incluyendo planos o mapas de localización y su respectiva geo-referenciación.
2. Justificación de que la actividad a desarrollar no generará nuevos impactos ambientales, tal como se establece en la Ley 1682 de 2013 y el artículo 1 del presente decreto.

Por lo tanto, de acuerdo a la reunión sostenida con la Aerocivil del día de hoy, se reitera al contratista la solicitud realizada mediante los oficios 2024-486-RIO-3069 del 29 de octubre de 2024, 2025-486-RIO-0428 y en la mesa de trabajo del 09 de diciembre de 2024, sobre la necesidad de realizar el análisis y las gestiones necesarias, de acuerdo con la normativa ambiental vigente (Decreto 1076 de 2015) y conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas, en el numeral 3.7.16 sobre Manejo Ambiental y en el numeral 3.7.16.1 del Anexo Técnico del contrato para las actividades de obra según el alcance contractual.

Las fechas acordadas son:

Viernes 28 de marzo de 2025: Justificación del cambio menor de acuerdo a lo establecido en el decreto 1076.

Miércoles 2 de abril: Documento PAGA para las obras del tanque de tormentas.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: DMNS

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 03 de marzo de 2025 **2024-486-RIO-0582**

Al contestar citar este código

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Atn. TIBER GILDARDO CHAVARRO M.
Representante Legal
Carrera 67 # 167 - 61
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta a COMUNICADO No. INFRH-T-076-2025 Reiteración a observaciones frente al plan de manejo ambiental

Observaciones PMA -

Respetado Ingeniero,

Revisada la versión 2 del documento PMA entregado mediante el comunicado del asunto, se evidencia que no fueron atendidas la totalidad de las observaciones realizadas por la interventoría, por lo tanto, se convoca a mesa de trabajo el día miércoles 05 de marzo a las 2:30 pm con el fin de revisar y ajustar el documento conjuntamente.

Link de la reunión:

🗓️ 2025-03-05 a las 14:30

🔗https://whereby.com/sala1-incoplan

Cordialmente,

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

INCOPLAN intecsa



SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: D.M.N
Anexo: No Aplica.

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 5 de marzo de 2025 **2024-486-RIO-0611**

Al contestar citar este código

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Atn. TIBER GILDARDO CHAVARRO M.
Representante Legal
Carrera 67 # 167 - 61
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta COMUNICADO No. INFRH-AMB-002-2025

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta lo manifestado en el comunicado referente a las gestiones que deben adelantarse previo al inicio de las actividades de obra, y conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas, en el numeral 3.7.16 sobre Manejo Ambiental y en el numeral 3.7.16.1, que trata sobre los aspectos e impactos ambientales de las actividades de obra, la interventoría no desconoce lo dispuesto por la normativa ambiental vigente, específicamente el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.2.3.8.9, que establece que solo el titular del instrumento ambiental puede realizar el trámite requerido.

No obstante, se aclara que, como se ha señalado anteriormente, es responsabilidad del Contratista realizar el análisis pertinente y elaborar los documentos necesarios para que la Aerocivil, a través del Concesionario, pueda solicitar ante CORPOGUAJIRA el concepto de aplicabilidad de cambio menor o la modificación de la licencia, según corresponda. Lo anterior según lo establecido en el Anexo Técnico del Contrato Numeral 12, y en las Especificaciones Técnicas Numeral 3.7.16, así:

> *"… 12 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES*
>
> *Es importante mencionar que, el CONTRATISTA debe gestionar cumpliendo con la normatividad vigente, teniendo en cuenta la licencia ambiental con Plan de Manejo ambiental expedidos por la Autoridad competente y en caso que para la ejecución del proyecto se requiera la utilización de los recursos naturales o para la disposición de aguas finales, el CONTRATISTA, deberá obtener los permisos, concesiones y/o autorizaciones de que trata el Decreto 1076 DE 2015, ante la autoridad ambiental competente, esto previo al inicio de las obras, lo anterior con*

la finalidad de mantener indemne a la AEROCIVIL de las sanciones y medidas que contempla la Ley 1333. Adicionalmente el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las medidas de manejo ambiental que imponga la autoridad ambiental del área de influencia del proyecto y que surjan en el desarrollo de los estudios y obras.

El CONTRATISTA identificará en el proyecto los permisos de carácter ambiental necesarios para la ejecución de las diferentes actividades, con el fin de tramitar y obtenerlos previo al inicio de las obras. Lo anterior, sin perjuicio de generar retrasos en los programas de inversión y cumplimiento del objetivo del presente proceso licitatorio.

..Numeral 3.7.16.1

Por otra parte, el contratista deberá realizar las revisiones de tipo jurídico ambiental en el PMA existente, contra lo determinado en el Decreto 1076 de 2015 y con ello realizar las debidas gestiones ambientales ante CORPOGUAJIRA y presentar la documentación solicitada para que esta entidad pueda determinar si requiere de modificación o no el instrumento ambiental vigente. Esto en el entendido de que Aerocivil deberá hacer la compra de 6 predios…"

Por todo lo anterior, nuevamente reitera la solicitud hecha en los comunicados 2024-486-RIO-3069 del 29 de octubre de 2024, 2025-486-RIO-0428 y en la mesa de trabajo del 09 de diciembre de 2024, acerca de realizar el análisis y las gestiones necesarias, conforme a lo establecido contractualmente y a la normativa ambiental vigente (Decreto 1076 de 2015). Se aclara que cualquier afectación del cronograma por no contar con el concepto previo de la Autoridad Ambiental es responsabilidad del contratista

Cordialmente,



SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: DMNS.
Anexo: N/A.

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 10 de marzo de 2025 **2024-486-RIO-0669**

Al contestar citar este código

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Atn. TIBER GILDARDO CHAVARRO M.
Representante Legal
Carrera 67 # 167 - 61
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Observaciones Informe Ambiental No. 7

Respetado Ingeniero,

Revisado el reporte de las actividades de gestión ambiental presentado en el Capítulo 7 del informe de obra, se debe tener en cuenta lo establecido en el anexo técnico, numeral 12:

> *El CONTRATISTA deberá realizar un informe ambiental mensual a la Interventoría, el cual debe ser un capítulo del informe mensual de obra/mejoramiento, en el que se reflejen las actividades que en materia ambiental se hayan desarrollado, las evidencias, registros y las medidas implementadas, de acuerdo con los indicadores de seguimiento consignados en el instrumento de manejo ambiental presentado y aprobado por la interventoría.*

Por lo tanto, el informe presentado se debe complementar incluyendo la totalidad de los soportes y evidencias de las actividades reportadas tales como:

- Manejo de Materiales de Construcción: adjuntar la certificación del proveedor autorizado, con el volumen utilizado en el frente de obra en el período.

- Adjuntar copia de recibo de entrega de los RS al gestor autorizado

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

INCOPLAN intecsa

- Adjuntar certificado o acuerdo comercial con proveedor de agua de uso industrial.

- Incluir los indicadores de seguimiento de cada ficha para soportar el % de avance

- Registro fotografico y evidencia de las actividades realizadas

Se adjunta a la presente el informe con observaciones en modo comentario.

Cordialmente,



SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: DMNS.
Anexo: INFORME DE OBRA AMBIENTAL No. 07 v2

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 17 de marzo de 2025 **2024-486-RIO-0733**

Al contestar citar este código

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Atn. TIBER GILDARDO CHAVARRO M.
Representante Legal
Carrera 67 # 167 - 61
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Reiteración Observaciones Informe Ambiental No. 6 y 7

Respetado Ingeniero,

Por medio del presente comunicado, se reiteran las observaciones realizadas al informe ambiental, previamente señaladas mediante los comunicados 2024-486-RÍO-0587 y 2024-486-RÍO-0669, correspondientes a los informes No. 6 y No. 7 presentados por el contratista.

Se otorga un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la recepción de esta comunicación, para dar respuesta a las observaciones mencionadas.

Cordialmente,

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

INCOPLAN intecsa

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: DMNS.
Anexo: N/A

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2025

2025-486-RIO-0755
Al contestar citar este código

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Atn. TIBER GILDARDO CHAVARRO M.
Representante Legal
Carrera 67 # 167 - 61
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta al comunicado No. INFRH-AMB-003-2025, aprobación del plan de manejo ambiental (PMA) para el contrato 23001170 H4 de 2023.

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente, se informa al contratista que la interventoría aprueba el Plan de manejo ambiental (PMA), del proyecto de mejoramiento al aeropuerto Almirante de Riohacha, el cual se recibe a conformidad de acuerdo a los lineamientos establecidos.

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: M.J.P.M
Anexo: N/A

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

INCOPLAN intecsa

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 21 de marzo de 2025

2025-486-RIO-0758
Al contestar citar este código

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL
Atn. ALDEMAR PINZON.
Representante Legal
Carrera 67 # 167 - 61
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Remisión del Plan de manejo ambiental (PMA) actualizado, para el contrato 23001170 H4 de 2023.

Cordial saludo,

Se da alcance al oficio del Plan De Manejo Ambiental (PMA), mediante el cual la interventoría envío versión uno (1) del documento aprobado en el mes de Diciembre del 2024, el cual fue nuevamente revisado y actualizado a los requerimientos propios del proyecto.

Cordialmente,



SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: M.J.P.M
Anexo: Plan De Manejo Ambiental

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

INCOPLAN intecsa

AIRRIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2025

2025-486-RÍO-0854
Al contestar citar este código

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Atn. TIBER GILDARDO CHAVARRO M.
Representante Legal
Carrera 67 # 167 - 61
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Solicitud para la implementación de medidas de mitigación de impacto ambiental por material particulado y arrastre de sedimentos.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito solicitar formalmente la implementación de medidas de mitigación orientadas a reducir el impacto ambiental asociado al material particulado y el arrastre de sedimentos generado por la maquinaria que se encuentra operando en la zona.

Considerando la importancia de proteger la salud de los operarios, las comunidades cercanas y el buen desarrollo del proyecto, es esencial desarrollar estrategias específicas que permitan disminuir dichos efectos. Acción recomendada:

La estabilización de áreas intervenidas para minimizar la erosión.

A continuación se presenta evidencia del material particulado:

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

INCOPLAN intecsa





Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

AIR RIO
CONSORCIO

Bogotá D.C., 31 de Marzo de 2025

2025-486-RIO-0872
Al contestar citar este código

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Atn. TIBER GILDARDO CHAVARRO M.
Representante Legal
Carrera 67 # 167 - 61
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Revisión Cambio Menor. Respuesta al Comunicado No. INFRH-AMB-010-2025.

Cordial saludo,

De acuerdo con lo solicitado, se remite adjunto para su revisión y ajuste el documento de Justificación de Cambio Menor. Si bien se menciona que las obras no generan cambios en el área de influencia, zonificación ambiental ni riesgos, es necesario que esta afirmación quede claramente justificada. En este sentido, cada criterio del cambio menor debe ser debidamente respaldado y sustentado mediante el análisis comparativo de las obras proyectadas frente a lo que está contemplado en el PMA aprobado del aeropuerto.

Por otro lado, en la descripción del proyecto no debe limitarse a listar las actividades de obra, sino que debe incluir una descripción detallada de en qué consiste el proyecto, como, por ejemplo, las características técnicas de la calle de rodaje que se va a construir.

Cordialmente,

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

INCOPLAN intecsa

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: DMNS
Anexo: Informe de solicitud de cambio menor conforme al Decreto 1076 de 2015.

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
MayeRicate.reyes@intecsa.eu
Bogota, D.C.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
CONTRATISTA

Riohacha, D.C., 17 de marzo de 2025

Señores
Atn.CONSORCIO AIR RIO
SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal

COMUNICADO No. INFRH-AMB-004-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta a reiteración a observaciones frente al plan de manejo ambiental – COMUNICADO 2024-486-RIO-0582

Cordial Saludo;

Dando alcance al comunicado 2024-486-RÍO-0582, la firma contratista se permite informar lo siguiente:

Se realiza mesa de trabajo convocada el día 05 de Marzo a las 2:30 pm, en la cual se llevó a cabo la revisión de la **Versión 2 del Plan de Manejo Ambiental (PMA)** del proyecto en mención. Durante la sesión, se analizaron los diferentes componentes del documento, se realizaron ajustes y observaciones con el fin de fortalecer su contenido y garantizar su alineación con los requerimientos ambientales establecidos.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se programó una nueva mesa de trabajo para la revisión y presentación de la **versión definitiva del PMA**, en la cual se incorporarán las modificaciones discutidas en la reunión anterior.

Agradecemos la disposición y colaboración de los participantes en este proceso y reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
ELIANA GÓMEZ SÁNCHEZ
RESIDENTE AMBIENTAL
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO: E.G.S.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
CONTRATISTA

Riohacha, D.C., 17 de Marzo de 2025

Señores
CONSORCIO AIR RIO
Atn. SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal

COMUNICADO No. INFRH-AMB-005-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta a solicitud Informes Ambientales – COMUNICADO 2024-486-RÍO-0580

Cordial Saludo;

Dando alcance al comunicado 2024-486-RÍO-0580, la firma contratista se permite informar lo siguiente:

- De acuerdo con los requerimientos contractuales, se solicita al contratista que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la recepción de la presente comunicación, remita los informes ambientales correspondientes a los meses de febrero de 2025 (Informe 7).
  Los informes deberán incluir las gestiones y actividades ejecutadas durante los períodos mencionados, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, Numeral 12.

RTA: Mediante comunicado **INFRH-T-091-2025,** se remite INFORME MENSUAL DE OBRA No.7, periodo febrero 01 a febrero 28 de 2025
EN ANEXO 17 INFORME MENSUAL AMBIENTAL, se remites los documentos soportes dando cumplimiento a lo requerido

(SE ANEXA INFORME AMBIENTAL Y SOPORTES ANEXOS, remitidos mediante comunicado INFRH-T-091-2025)

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional relacionado con este informe.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
ELIANA GÓMEZ SÁNCHEZ
RESIDENTE AMBIENTAL
C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO: E.G.S.
v

Bogotá, D.C., 14 de enero de 2025

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-T-076-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta al comunicado No. INFRH-T-062-2024 – Reiteración a observaciones frente al plan de manejo ambiental del proyecto de mejoramiento al aeropuerto Almirante de Riohacha – COMUNICADO 2024-486-RIO-3745

Cordial Saludo;

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, la firma contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA se permite dar respuesta a los requerimientos realizados mediante comunicado 2024-486-RIO-3745:

PMA AEROPUERTO RIOHACHA V2 se atendieron las siguientes observaciones:


- Se actualiza le marco legal ambiental
- Se utilizará la fuente del agua del señor David Iguaran de quien se hace entrega de la aumentación ambiental vigente.
- Se adjuntan los documentos de la Milagrosa y la Macuira en las carpetas anexas.
- Se atendió en el documento la información de las empresas prestadoras de servicio de agua residuos ESEPGUA S.A. E.S.P
- Los tipos de residuos a disponer se aclararon en el documento PMA
- Las observaciones hechas al capítulo En el título 5, IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, se atendieron tanto en el documento como en las matrices adjuntas al documento PMA
- Las observaciones hechas a las fichas PMA-CIR-01, PMA-CIR-02, PMA-CIR-02-02, PMA-CIR-03, PMA-CIR-05, PMA-CIR-09, se atendieron en cada una de ellas en el documento adjunto PMA
- Queda pendiente hacer entrega los documentos legales ambientales de la empresa ESEPGUA S.A. E.S.P y del sitio de disposición de RCD, los cuales ya se solicitaron; una vez se tengan dichos documentos se enviaran a interventoría para su aprobación.

Se anexa:

- PLAN DE MANEJO AMBIENTA RIOHACHA
  ANEXOS:
- ANEXO 1. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS, EVALUACION Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES AEROPUERTO DE RIOHACHA.
- ANEXO 1. MATRIZ RIESGOS AEROPUERTO DE RIOHACHA
- ANEXO 2 INFORMACION CUESTECITAS
- ANEXO 3. DOC. PERMISO DE EMISIONES. -20220824-WA0223.
- ANEXO 4 DOCUMENTOS LEGALES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES
- ANEXO 5 PROVEEDORES
- ANEXO 6 SUMINSITRO DE AGUA Y RESIDUOS

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente,



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
VICTOR DANIEL CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO: E.M.R.L.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
CONTRATISTA

Riohacha 25 de Febrero de 2025

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-AMB-002-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta – COMUNICADO 2025-486-RIO-0428 – Solicitud Gestión y Tramites Ambientales

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de la obra en el numeral 3.7.16., que hace referencia al Manejo Ambiental y numeral el 3.7.16.1 a los aspectos e impactos ambientales en las actividades de obra, que se cita en el documento mencionado, el Consorcio Infraestructura Riohacha en su Gestión Ambiental solicitó ante la autoridad ambiental competente se nos indicara si tenemos la facultad de modificar el Plan de Manejo Ambiental AMPARADO Y APROBADO bajo la Resolución 03374 del 11 de diciembre de 2002 y que mediante Resolución N° 00903 del 29 de mayo de 2014, autorizó la cesión de derechos del PMA actualizado y determinó Obligaciones a la CONCESIÓN AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S.

Haciendo énfasis en la revisión del PMA existente y contrastándolo con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.2.3.8.9. De la Sección 8 establece que ***Para los proyectos, obras o actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales establecidas para las licencias ambientales en el presente título. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan incluir nuevas áreas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se encuentren listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de manejo ambiental deberá tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las demás actividades el titular podrá solicitar la modificación del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas áreas.***

De acuerdo a lo anterior reiteramos que como contratistas estamos sujetos a aplicar el Instrumento Ambiental con el que cuenta el Aeropuerto que en este caso es el ***Plan de Manejo Ambiental***, ajustándose las fichas a las actividades de construcción que ejecutará el consorcio y de esta manera garantizar el cumplimiento de todas las fichas ambientales contempladas en el PMA de la obra para luego presentar ante la interventoría para su aprobación y de conocimiento de la Aerocivil (especificaciones técnicas de la obra en el numeral 3.7.16.1).

Para dichos ajustes se acuerda en comité ambiental con interventoría, haciendo acto de presencia la ingeniera Diana Niño – Residente Ambiental de Interventoría, Ingeniera Eliana Gómez – Residente Ambiental Contratista e Ingeniera María José Polo – Auxiliar Ambiental Interventoría, que una vez radicado el PMA, después de haber tenido correcciones, se realizará una mesa de trabajo para revisión de este y si es el caso emitir concepto de aprobación. (Anexo Acta 002).

Teniendo en cuenta el mencionado Decreto en su Art. 2.2.2.6.16 donde se refiere al Trámite de las modificaciones menores o ajustes normales, menciona que es el titular del Plan de Manejo Ambiental quien deberá presentar ante la Autoridad Ambiental un informe con destino al expediente de las actividades a ejecutar.

Para finalizar las actividades que se van a desarrollar durante la ejecución del proyecto en el Aeropuerto y predio nuevo adquirido por la Aerocivil, se mantendrá sin modificaciones, toda vez que no se generan nuevos impactos ambientales a los inicialmente reportados en el PMA presentado ante la interventoría, el cual es el instrumento ambiental vigente del Aeropuerto.

En este sentido informamos que hasta el momento no requerimos de permisos ambientales para las actividades desarrolladas en la ejecución del contrato de obra



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
ELIANA GÓMEZ SÁNCHEZ
RESIDENTE AMBIENTAL

ADJUNTO: COMITÉ 2 DEL 13 DE FEB 2025
C.C. ARCHIVO
ANEXO: ACTA DE COMITE
ELABORO: E.M.G.S
REVISO: E.M.R.L

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-AMB-003-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Reiterando respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3745, observaciones frente al plan de manejo ambiental del proyecto de mejoramiento al aeropuerto Almirante de Riohacha

Respetados señores,

En atención al oficio 2024-486-RIO-3745 recibidos el (Fecha de Recepción), mediante la cual se presentan observaciones al Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la referencia antes mencionada, nos permitimos reiterar dar respuesta a cada una de las observaciones planteadas, detallando las acciones y ajustes que se han realizado en el documento con el fin de atender los requerimientos señalados.

Observación 1: Marco legal Ambiental; verificar cuáles normas RAC son aplicables al contrato a desarrollar, citar con número y fecha de emisión de estas.

Respuesta: Se han realizado las modificaciones pertinentes en el Marco Legal, 2.5 RAC; Reglamento Aeronáutico Colombiano incorporando el reglamento que aplica para la obra con número y fecha de emisión.

Observación 2: Especificar claramente si el concreto será adquirido premezclado o elaborado en el sitio.

Respuesta: Se ha aclarado en el documento que el documento será premezclado y será comercializado por la empresa La Macuira pero que esta selección quedará sujeta

a modificaciones según las necesidades del proyecto y en caso de lo contrario se realizaran todas las gestiones ambientales pertinentes.

Observación 3. Adjuntar permiso de emisiones atmosféricas y de vertimientos, así como el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Licencia Ambiental, Titulo Minero se considera pertinente eliminar los documentos; A, C, D, E, F, y G, estos no hacen parte de la empresa en mención.

Respuesta: se adjunta en la carpeta Anexo 1. Y se eliminaron los documentos que no correspondían a la empresa Minera la Milagrosa S.A.

Observación 4: PROVEEDOR AGUA - RESIDUOS, adjuntan información relacionada con el proveedor de agua; sin embargo, en el presente numeral no se menciona dicha información. Se recomienda agregar los detalles correspondientes.

Respuesta: Para las actividades constructivas del proyecto el agua no potable se está comprando en bloque a la Empresa de Acueducto de Riohacha. Se detalla en la Ficha PMA-CIR-14. Y en cuanto a los Residuos se está en proceso de obtener el servicio con la Empresa Interaseo. Detalles en la ficha PMA-CIR-9.

Observación 5: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, dentro de los principales aspectos mencionados en la matriz, se considera pertinente tener en cuenta, la actividad; descapote de capa de tierra vegetal, como un impactos generado y por ende la respectiva evaluación.

Respuesta: se ha aclarado en el Anexo 2. Que pertenece a la Matriz de los Impactos Ambientales.

Observación 6. En la Ficha de Educación Ambiental, se reitera: Definir y enviar el cronograma de capacitaciones a realizar durante las etapas de construcción, operación y desmantelamiento del contrato, indicando los destinatarios, los temas a tratar y la periodicidad de cada capacitación.

Respuesta: se le realizó la modificación a la ficha PMA-CIR-1 Educación Ambiental.

Observación 7: Ficha del Manejo del recurso Hídrica se requiere agregar la meta y el indicador relacionados con el manejo de agua industrial. Se considera necesario presentar a la interventoría un documento que certifique, por parte de la autoridad ambiental correspondiente, que la empresa de Acueducto de Riohacha está autorizada para comercializar agua de tipo industrial.

Respuesta: Se realizó aclaratoria de todos los detalles de observación en cuanto al manejo del agua potable e industrial para las actividades de la obra en la Ficha PMA-CIR- 14.

Observación 8: Ficha **M**anejo de Recurso Hídrico – sistemas de drenaje. En cuanto a la remoción de sedimentos, se recomienda especificar la periodicidad con la que se realizará la actividad. Asimismo, con anticipación a la ejecución de la actividad, debe indicarse a la interventoría el lugar de disposición final de estos residuos.

Respuesta: Esta ficha no aplica dentro del ajuste actual del PMA ya que el sistema de drenaje del Aeropuerto se construirá nuevamente.

Observación 9: Ficha Manejo de la Fauna Citar las acciones contempladas dentro del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL PELIGRO AVIARIO, allegar el documento en mención a la interventoría.

Respuesta: se ha aclarado en el documento con respecto a la Ficha Protección a la Fauna PMA-CIR-16, que se trabajará de la mano con el grupo AVF, ya que realizan todas las actividades con relación a la fauna que pueda afectar la operación aérea.

Observación 10: Ficha Manejo Paisajístico. Se recomienda incluir un mayor nivel de detalle en las actividades relacionadas con el manejo paisajístico, especificando claramente los pasos a seguir, los recursos necesarios, materiales, especies a plantar y métodos, así como los objetivos a alcanzar en cada fase del proceso.

Respuesta: Esta ficha no aplica para las actividades del proyecto ya que la naturaleza del entorno y las condiciones del proyecto no generan impactos visuales significativos que justifiquen la implementación de dicha ficha y no es una actividad que la tenemos contractualmente contemplada y queda sujeta a cambios.

Observación 11: Ficha Manejo de Actividades de construcción y Adecuación: dentro de las acciones a desarrollar, se incluyan medidas específicas de manejo para el concreto y el asfalto, dichas medidas deben abordar aspectos como el almacenamiento, la manipulación, el transporte, y la disposición, garantizando la minimización de impactos ambientales y el cumplimiento de las normas aplicables.

De acuerdo con lo descrito en el anexo técnico de obra numeral 3, actividades por ejecutar y alcance, específicamente en el apartado; mejoramiento de la calle de rodaje existente, es necesario especificar el proveedor de la mezcla asfáltica que se utilizará para ejecutar esta actividad, así mismo, remitir la información necesaria para aprobación de la interventoría.

Respuesta: Se relacionó la información detallada en la Ficha PMA-CIR-8, que relaciona el Manejo de Materiales de Construcción. Y en la ficha PMA-CIR-10 se indicaron las medidas en cuanto a realizar un mantenimiento de algún vehículo o maquinaria.

Observación 12: En el anexo técnico de obra, numeral 3 Actividades por ejecutar y alcance, se menciona el retiro de material producto de excavación, considerando su posible reúso; sin embargo, en caso de que dicho material no pueda ser reutilizado en

su totalidad, la interventoría considera pertinente disponer de un sitio debidamente autorizado y legalizado para la disposición final de material estéril o escombros.

Respuesta: Se ha aclarado en la Ficha PMA-CIR-7 sobre el material sobrante producto de excavación y de la demolición donde se tendrá en cuenta la Res. 1257de 2021.

Observación 13: Como se mencionó en el numeral anterior, en el anexo técnico de obra, numeral 3 Actividades por ejecutar y alcance, se incluye la actividad de "Descapote de capa de tierra vegetal" entre las actuaciones previstas en el contrato, sin embargo, el PMA no presenta una ficha específica relacionada con esta actividad.

Respuesta: Se realizó la modificación y se relacionó en la ficha PMA-CIR-12 Manejo de Remoción de Cobertura Vegetal y Descapote.

Observación 14: Considerando que en la ficha PMA – CIR – 03 Gestión de residuos sólidos especiales y peligrosos se contempla la instalación de sitios de almacenamiento de residuos, la interventoría recomienda revisar y determinar si, en el desarrollo del contrato, se requieren instalaciones e infraestructuras temporales adicionales. En caso afirmativo, es pertinente incorporar en el PMA una ficha específica para la instalación y retiro de infraestructura temporal, esta ficha debe incluir medidas para prevenir daños al área involucrada y proteger la seguridad del personal en obra.

Respuesta: Se ha aclarado incorporando la Ficha PMA-CIR-2 Instalación y Operación de Campamento.

Observación 15: Teniendo en cuenta que en las fichas presentadas en el PMA no se ha incluido un presupuesto específico para cada actividad, la interventoría solicita que el contratista proporcione un desglose detallado del presupuesto para las actividades relacionadas con cada ficha. Este presupuesto debe cubrir todos los costos asociados a la implementación de las medidas de manejo y control ambiental, así como los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de las acciones propuestas en cada una de las fichas del PMA. El presupuesto debe estar estructurado en función de las actividades detalladas en cada ficha, incluyendo los costos de materiales, equipos, infraestructura temporal, recursos humanos, así como la documentación y certificaciones requeridas por la autoridad ambiental y la interventoría.

Respuesta: Con respecto a este ítem de observación se estará dando respuesta en un documento detallado en un lapso de tiempo corto, esperamos su comprensión.

Observación 16: Es fundamental destacar que, en el anexo técnico de obra, numeral 3, "Actividades por ejecutar y alcance", se detallan las actividades relacionadas con

el mejoramiento del sistema de drenaje, dentro de estas actuaciones se contempla la instalación de una; “planta separadora de hidrocarburos, prefabricada y certificada para cumplimiento de normativa colombiana para el tratamiento de aguas contaminadas”, por lo tanto, la interventoría considera pertinente que el contratista, en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), especifique si será necesario realizar toma de muestras, llevar a cabo monitoreos o gestionar la solicitud de permisos de vertimientos ante la autoridad ambiental competente. Esta información es crucial para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y asegurar el adecuado manejo de los efluentes generados durante la ejecución del proyecto.

Respuesta: esta información será detalla en un documento a parte, esperamos su comprensión.

Observación 17: El PMA del contratista debe enriquecerse con fichas de manejo a la gestión social, teniendo en cuenta que únicamente se incluyó una (contratación de mano de obra), tomando como referencia el PMA del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, incluir un programa de manejo a la gestión social bien estructurado en el PMA.

Respuesta: se tomó en cuenta la observación enriqueciendo el programa de gestión social con las fichas PMA-CIR-17, 18, 19, 20. Para contribuir a la mejora social de las actividades.

Observación 18: El contratista debe incluir un numeral específico para el programa de seguimiento y monitoreo en el PMA de acuerdo con el definido en el PMA del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, aunque el documento PMA remitido describe diferentes programas ambientales y uno social, no se encuentra un apartado dedicado exclusivamente al seguimiento y monitoreo de los programas ambientales y el social, lo cual es fundamental para garantizar la eficacia en la aplicación de las medidas ambientales y sociales presentadas.

Respuesta: El seguimiento a las fichas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) se realiza a través de inspecciones periódicas, controles documentales y la verificación en campo de las medidas implementadas. Para ello, se lleva un registro detallado del cumplimiento de cada ficha, identificando posibles desviaciones y aplicando medidas correctivas cuando sea necesario. Además, se elabora un informe de seguimiento con los resultados obtenidos, el cual es revisado por el equipo encargado de la gestión ambiental del proyecto para garantizar su correcta ejecución."

Adicionalmente, adjuntamos el documento actualizado con los ajustes pertinentes del Plan de Manejo Ambiental, en el cual se han destacado los cambios efectuados para su debida revisión y aprobación. Agradecemos su orientación y quedamos atentos a cualquier otra

observación o requerimiento adicional que sea necesario para el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

Quedamos atentos a su pronta respuesta y agradecemos su colaboración en este proceso.

Cordialmente,



ELIANA GÓMEZ SÁNCHEZ
Residente Ambiental
Consorcio Infraestructura Riohacha
Elaboró: EGS
Anexo: Documento PMA y Anexos

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-AMB-010-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta a comunicado 2025-486-RIO-3069 cuyo asunto es Observaciones frente al PMA del proyecto, Comunicado 2025-486-RIO-0611 cuyo asunto es Trámites y Gestiones Ambientales, Comunicado 2025-486-RIO-0428 cuyo asunto es Solicitud Gestión y Tramites Ambientales y Comunicado 2025-486-RIO-0839 cuyo asunto es reiteración Trámites y Gestiones Ambientales.


Respetado Ingeniero,

En atención a su solicitud respecto a la necesidad de realizar el análisis y las gestiones ambientales conforme a la normatividad ambiental vigente, nos permitimos remitir el informe en el cual se describen las actividades del proyecto y se justifica que las actividades a desarrollar no generan nuevos impactos ambientales.

El análisis realizado se fundamenta en lo dispuesto en el **Decreto 1076 de 2015**, asegurando que las intervenciones previstas cumplen con los requisitos ambientales establecidos y se desarrollan conforme a las especificaciones técnicas aprobadas. De igual manera, se verificó que las actividades a ejecutar no alteran los impactos ambientales previamente evaluados ni requieren modificaciones en los permisos ambientales vigentes.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,



ELIANA GÓMEZ SÁNCHEZ
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Residente Ambiental
C.c: Archivo
Anexo: Lo enunciado
Elaboró: E.G.S.

Bogotá, D.C., 21 de Marzo de 2025

Señores:
CONSORCIO AIR RIO
Attn: Ing. SANTIAGO PAEZ TALERO
Director de Interventoría
Bogotá D.C

COMUNICADO No. INFRH-AMB-008-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 de 2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Respuesta a los Comunicados No.2024-486-RIO-0587 cuyo asunto es "Observaciones Informe Ambiental 6", 2024-486-RIO-0669 cuyo asunto es "Observaciones Informe Ambiental No. 7" y 2024-486-RIO-0733, cuyo asunto es "Reiteración Observaciones Informe Ambiental No. 6 y 7"

Respetados señores,

El Consorcio Infraestructura Riohacha en cumplimiento a las obligaciones contractuales y dando alcance a los comunicados antes mencionados, en la cual se tienen observaciones a los **Informes 6 y 7**, nos permitimos dar respuesta a cada una de ellas, con el fin de atender los requerimientos y garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos.

A continuación, se detallan las observaciones reiteradas al informe 6 y las acciones tomadas para su ajuste:

1. **Observación 1:** Programas del Plan de Manejo Ambiental, revisar cuales otras fichas aplican para la obra
    - **Acción tomada:** Las fichas quedaran sujetas a modificación en el ajuste del PMA para su aprobación.
2. **Observación 2:** Las capacitaciones deben realizarse mensualmente, justificar porque no se realizaron.
    - **Acción tomada:** la ficha se encuentra en modificación y en la elaboración del cronograma, con el fin de garantizar su correcta ejecución en los próximos periodos.
3. **Observación 3:** El agua utilizada para la humectación de las vías donde ha sido adquirida, justificar, adjuntar certificación.
    - **Acción tomada:** El consorcio se encuentra en la gestión de adquirir el certificado de la compra de agua por parte de la empresa Aqualia, luego este sea generado, será presentado.
4. **Observación 4:** Aclarar porque se requiere a la empresa la gestión de los residuos
    - **Acción tomada:** Para formalizar el proceso de la disposición de los residuos que se lleguen a generar en la obra.
5. **Observación 5:** En el área de acopio de los tanques de combustibles, hay vegetación? aclarar
    - **Acción tomada:** Es la aeronáutica quien autoriza esta área para la reserva del combustible, por lo tanto debe ser un espacio que no interfiera con la vegetación.
6. **Observación 6:** Incluir registro fotográfico de los recorridos y especies encontradas
    - **Acción tomada:** se plasmó la corrección que las especies se vieron en la zona pero estas no fue necesario realizar rescate y no hubo registro. Para los próximos periodos se implementará la ficha que quede aprobada.

A continuación, se detallan las observaciones reiteradas al informe 7 y las acciones tomadas para su ajuste:

1. **Observación 1**:Relacionar solo las actas del periodo

Acción tomada: se tomó en cuenta la corrección.

2. **Observación 2:** Seguimiento de implementación de fichas ambientales, agregar evidencias mediante anexos, registros fotográficos y soportes correspondientes, demostrar el porcentaje de avance descrito.
   Acción tomada: Para cada subprograma implementado se le realizó la corrección correspondiente, agregando para las que aplica sus anexos, registro fotográfico y su porcentaje de avance.
3. **Observación 3:** Manejo de materiales de construcción, se debe adjuntar la certificación del proveedor con el volumen utilizado en el frente de obra.
   Acción tomada: Se anexo el certificado de suministro de materiales.
4. **Observación 4:** Adjuntar copia de recibo de entrega de los RS al gestor autorizado
   Acción tomada: La obra aun no genera residuos considerables, estamos en proceso de adquirir su servicio, se anexa oficio.
5. **Observación 5:** A donde es dirigida la capa vegetal retirada, anexo
   Acción tomada: Se dispone a un lado de la franja en un tiempo no mayor a 10 días para su recolección.
6. **Observación 6:** Adjuntar certificado o acuerdo comercial con proveedor de agua uso industrial
   Acción tomada: Estamos en el proceso para que emitan la certificación correspondiente. Anexo solicitud.
7. **Observación 7:** Evidencia de revisión técnico mecánica y mantenimiento de vehículos.
   Acción tomada: se anexó la evidencia de las certificaciones técnico mecánicas.
8. **Observación 8:** Proponer indicadores del PMA
   Acción tomada: Se registra el % de los indicadores que se realizó la actividad y fueron cuantificables.

Agradecemos su revisión y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional para garantizar la validación y aprobación de los informes.

Atentamente,

ELIANA GÓMEZ SÁNCHEZ
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

C.C. ARCHIVO
ANEXOS: INFORMES 6 Y 7 AJUSTADOS, EVIDENCIAS Y SOPORTES SOLICITADOS
ELABORÓ: E.G.S

INFORME MENSUAL
No. 08

CONTRATO No. 23001170 H4 de 2023

MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

RIOHACHA –LA GUAJIRA

PERIODO DE EJECUCIÓN	INTERVENCIÓN	CONTRATISTA
01 al 30 de Marzo de 2025	**Consorcio Air Río**	**Consorcio Infraestructura Riohaca**

Firma		
Nombre	*ELIANA MARIA GÓMEZ SÁNCHEZ*	
Cargo	**Profesional Ambiental**	**Director de Obra**
	Elaboró	**Aprobó**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. JUSTIFICACIÓN 5

3. OBJETIVO GENERAL 7

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO 8

4.1 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 8

4.2 DESCRIPCIÓN ALCANCE DEL CONTRATO 9

5. GESTIÓN AMBIENTAL 10

6. PERMISOS, TRÁMITES Y GESTIONES REALIZADAS ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES. 12

7. RELACION DE ACTAS DE COMITÉ, OFICIOS Y CORRESPONDENCIA AMBIENTALES 13

7.1 ACTAS DE COMITE 13

7.2 CONTROL CORRESPONDENCIA 13

8. APLICACIÓN DE LAS FICHAS AMBIENTALES 16

9. REGISTRO FOTOGRAFICO 23

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS 23

11. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 24

11.1 CONCLUSIÓN 24

11.2 RECOMENDACIONES 25

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la obra MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF). Esta obra, que busca optimizar las instalaciones y la infraestructura del aeropuerto, es clave para mejorar la eficiencia operativa y la calidad del servicio, lo cual se traduce en beneficios tanto para los usuarios como para el entorno económico y social de la región.

Sin embargo, la ejecución de esta obra contempla una serie de intervenciones, entre las cuales se destaca la construcción de un tanque de tormentas. Esta infraestructura puede generar impactos ambientales tanto directos como indirectos, sobre el ecosistema circundante y la comunidad local. El tanque estará ubicado en el costado noreste del aeropuerto, en un área que va a interactuar con las operaciones del mismo. Por ello, es fundamental que el proyecto se desarrolle bajo un enfoque de sostenibilidad ambiental, que permita prevenir, mitigar y compensar posibles afectaciones, es por esta la razón que se implementara un Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA. Este enfoque debe aplicarse de forma integral en todas las fases del proyecto; desde la planificación y diseño, hasta la ejecución y la etapa posterior a la ejecución.

Este informe detalla la planificación, las acciones específicas y el avance que se llevarán a cabo en el marco del PMA, identificando los posibles impactos ambientales y estableciendo las estrategias de manejo, mitigación y monitoreo que aseguren el cumplimiento de las normativas vigentes y la protección de los recursos naturales.

El compromiso con el manejo ambiental responsable no solo responde a los requisitos legales, sino que también refuerza el compromiso del Aeropuerto Almirante Padilla con el desarrollo sostenible, promoviendo una infraestructura moderna y operativa, sin descuidar el bienestar de la comunidad y el entorno natural.

2. JUSTIFICACIÓN

La implementación de un Plan de Manejo Ambiental (PMA) en la obra de MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)" es esencial para garantizar que el desarrollo de la infraestructura se lleve a cabo de manera sostenible, minimizando los impactos negativos sobre el medio ambiente y la comunidad circundante. La construcción o remodelación de infraestructuras aeroportuarias conlleva actividades que, si no se gestionan adecuadamente, pueden generar alteraciones en el entorno natural, el tráfico de personas y el funcionamiento diario del aeropuerto, así como riesgos para la biodiversidad local.

El Aeropuerto Almirante Padilla es una de las principales puertas de entrada y salida de la región, por lo que su correcto funcionamiento es clave para el desarrollo económico, social y turístico. No obstante, cualquier proyecto de construcción o mejoramiento en este tipo de infraestructuras debe ser evaluado desde una perspectiva ambiental, para identificar posibles efectos negativos y prevenir consecuencias a largo plazo, como la degradación del suelo, la contaminación del agua o la alteración de la calidad del aire.

El PMA, en este contexto, justifica su implementación porque asegura que se realizarán acciones específicas que minimicen los efectos de la obra, promoviendo un enfoque responsable hacia el entorno natural y humano. Además, cumple con las normativas ambientales nacionales que exigen la evaluación y el manejo de los riesgos ambientales en proyectos de esta magnitud.

La correcta ejecución del PMA también contribuirá a la obtención de los permisos necesarios para la realización de la obra, garantizando el cumplimiento con las autoridades ambientales. Por otro lado, al incorporar la participación de la comunidad y los diferentes actores involucrados, se fortalecerá la percepción pública sobre la responsabilidad ambiental del aeropuerto, favoreciendo la transparencia y la aceptación social del proyecto.

En resumen, la justificación del presente PMA radica en la necesidad de gestionar de manera eficiente los impactos ambientales derivados de la obra, protegiendo tanto los recursos naturales como la calidad de vida de las personas, al mismo tiempo que se fomenta el desarrollo de una infraestructura moderna y sostenible.

3. OBJETIVO GENERAL

Presentar el estado y avance de la Gestión Ambiental de la obra de "MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)" de esta manera se identifica, evalúa y mitigan los impactos ambientales asociados a la construcción y/o remodelación de la infraestructura. A través de la implementación de medidas preventivas y correctivas, se busca garantizar que la obra se desarrolle de manera sostenible, respetando las normativas ambientales vigentes, protegiendo el entorno natural y minimizando los efectos negativos sobre la comunidad circundante. Además, se pretende asegurar la integración de buenas prácticas ambientales en todas las fases del proyecto, promoviendo una operación aeroportuaria eficiente y responsable.

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

4.1 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El aeropuerto “Almirante Padilla” se encuentra ubicado en la zona caribe, al suroeste de la ciudad de Riohacha, Capital del departamento de la Guajira, localizado como punto de referencia en las Coordenadas ARP: 11°31’34.05” N 72°55’37.43” W en la cabecera municipal, con promedios de temperatura de 22° y 30°C con máximas de hasta 42°C; sus límites son: por el norte, el mar Caribe; por el oriente, con el municipio de Albania y el río Ranchería que lo separa del Municipio de Maicao y del Municipio de Manaure; al sur, los Municipios de Hato nuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar; y al occidente el Municipio de Dibulla. Se localiza dentro del casco urbano, en la dirección Calle 30 # 26A - 81. A la ciudad de Riohacha se puede acceder vía aérea o vía terrestre pavimentada que permite la comunicación con el resto del país.



Figura 1. Aeropuerto Almirante Padilla - Fuente: *Wikipedia/Google*

4.2 DESCRIPCIÓN ALCANCE DEL CONTRATO

Primera fase: El estado de la infraestructura lado aire del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha. La Guajira, se describe en los informes emitidos por los consultores de estudios y Diseños producto del contrato No 18001611 H3 de 2018 cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ESTADO ACTUAL DIAGNOSTICO ACTUALIZACIÓN PCN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DEL APTO DE RIOHACHA" y contrato de consultoría No 18001651 H3 2018, cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y FRANJAS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA (VIGENCIA FUTURA)"esta actividad contempla realizar revisión, ajustes y/o actualización, y/o complementación sobre los Estudios y Diseños.

Segunda fase: Durante esta fase se desarrollarán la ejecución de actividades de obra y mejoramiento, una vez suscrita el acta de aprobación de los Estudios y Diseños por parte de la Interventoría y el contratista, se dio inicio a las obras del contrato N0 23001170 H4 de 2023.

5. GESTIÓN AMBIENTAL

Aplicando la gestión ambiental en la obra de construcción minimizamos los impactos negativos en el entorno y garantizamos el cumplimiento de la normatividad ambiental. Para ello, se implementan los programas relacionados. Estos programas incluyen medidas preventivas y correctivas y su correcta aplicación no solo protege el medio ambiente, sino que también mejora la eficiencia operativa. A su vez, dentro de la gestión y con el análisis realizado dentro del contrato, se evaluó y elaboro un documento con base en la normativa vigente y la aplicabilidad de Cambio Menor del Plan de Manejo Ambiental (PMA) existente. Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 2.2.2.6.1.6 del decreto 1076 de 2015, el cual establece las actividades en el ámbito aéreo, numeral 8, considerados cambios menores, el cual se entregó a la interventoría para ser analizado y aprobado.

Para este periodo de acuerdo a reunión realizada el día 26 de marzo de 2025 se acordó entre la interventoría y la Aerocivil, que se entregaría el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA para implementar en la ejecución del Tanque de Tormentas del sistema de drenaje del aeropuerto.

A continuación, se relacionan los subprogramas aplicados en obra para el periodo del 1 al 30 de marzo de 2025.

🟢 Aplicada

🟡 En Proceso

🔴 No Aplicada

Tabla 1. Relación de las Fichas Ambientales aplicadas y no aplicada

PROGRAMA	CODIGO	SUBPROGRAMA	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN EN OBRA
Manejo de las Actividades Constructivas (MA)	MAC-1	Educación Ambiental	PMA-CIR-1	Si
	MAC-2	Instalación y Operación de Campamento	PMA-CIR-2	Si
	MAC-3	Señalización en las Áreas de Construcción	PMA-CIR-3	Si
	MAC-4	Sistema de Drenaje	NO APLICA Se construirá un sistema nuevamente, el actual desaparecerá y se manejaran las medidas pertinentes)	N/A
Manejo del Tránsito Vehicular (MTV)	MTV-1	Manejo de Maquinaria, Equipos y Vehículos	PMA-CIR-4	Si
	MTV-2	Manejo del Ruido	PMA-CIR-5	Si
	MTV-3	Desmantelamiento de Instalaciones Temporales y Campamentos	PMA-CIR-6	No
Manejo del Suelo (MS)	MS-1	Manejo y Disposición de Materiales Sobrantes	PMA-CIR-7	No
	MS-2	Manejo Paisajístico	NO APLICA (La naturaleza del entorno y las condiciones del proyecto no generan impactos visuales significativos que justifiquen la implementación de dicha ficha) queda sujeta a ser modificada.	N/A
	MS-3	Manejo de Materiales de Construcción	PMA-CIR-8	Si
	MS-4	Manejo de Residuos Sólidos, Especiales y Peligrosos	PMA-CIR-9	Si
	MS-5	Construcción y Manejo de Áreas de Almacenamiento de Combustible	PMA-CIR-10	No
	MS-6	Manejo de Fresado	PMA-CIR-11	No
	MS-7	Manejo de Remoción de Cobertura Vegetal y Descapote	PMA-CIR-12	Si
Manejo del Recurso Hídrico (MRH)	MRH-1	Manejo de Residuos Líquidos	NO APLICA (El desarrollo del proyecto no generará vertimientos, debido a que se van a utilizar unidades sanitarias)	N/A
	MRH-2	Manejo de Escorrentía	PMA-CIR-13	No

	MRH-3	Manejo de la captación	NO APLICA	N/A
	MRH-4	Manejo de Agua Potable y para la Construcción	PMA-CIR-14	Si
Manejo del Recurso Aire (MRA)	MRA-1	Manejo de Emisiones por Maquinaria y Polvo	PMA-CIR-15	Si
Manejo de Fauna y Flora (MFF)	MFF-1	Protección a la Fauna	PMA-CIR-16	No
	MFF-2	Manejo del Aprovechamiento Forestal y Protección a la Flora	NO APLICA (No hay la necesidad de solicitar aprovechamiento forestal)	N/A
Gestión Social	GS-1	Comunicación e Información a la Comunidad	PMA-CIR-17	No
	GS-2	Servicio a la Comunidad	PMA-CIR-18	No
	GS-3	Participación Comunitaria	PMA-CIR-19	No
	GS-4	Generación de Empleo	PMA-CIR-20	No

6. PERMISOS, TRÁMITES Y GESTIONES REALIZADAS ANTE AUTORIDADES AMBIENTALES.

Se adelantó el trámite correspondiente ante la entidad encargada de la recolección de residuos, solicitando formalmente el servicio para la gestión de residuos ordinarios y vegetales. Esta solicitud se realizó mediante el comunicado N° INFRH-AMB-009-2025, con fecha del 21 de marzo de 2025. En respuesta, la empresa INTERASEO confirmó la prestación del servicio, garantizando así una disposición adecuada y conforme a la normativa ambiental vigente. (Ver Anexo A).

Se reitera la solicitud a la Empresa Aqualia para que emita las certificaciones de los periodos del mes de febrero y marzo correspondientes a la compra de agua en bloque, en cuanto los emitan se les harán llegar (Ver Anexo B)

7. RELACION DE ACTAS DE COMITÉ, OFICIOS Y CORRESPONDENCIA AMBIENTALES

7.1 ACTAS DE COMITE

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo del 2025 se realizó comité ambiental coordinado por la interventoría.

Tabla 2. Relación de Actas

FECHA	ACTA No.	TEMA
12/03/2025	003	Comité seguimiento a las fichas del PMA

7.2 CONTROL CORRESPONDENCIA

Se relaciona los comunicados que se remiten a interventoría y a las entidades para los trámites ambientales que requiera la obra.

Tabla 3. Relación comunicados remitidos.

FECHA	REMITE	DESTINATARIO	CONSECUTIVO	ASUNTO
14/03/2025	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	CONSORCIO AIR RIO	INFRH-AMB-003-2025	COMUNICADO INFRH-AMB-003-2025.Reiterando respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3745, observaciones frente al plan de manejo ambiental
15/03/2025	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA		INFRH-AMB-004-2025	Respuesta a reiteración a observaciones frente al plan de manejo ambiental COMUNICADO

FECHA	REMITE	DESTINATARIO	CONSECUTIVO	ASUNTO
		CONSORCIO AIR RIO		2024-486-RIO-0582
17/03/2025	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	CONSORCIO AIR RIO	INFRH-AMB-005-2025	COMUNICADO No. INFRH-AMB-005-2025. Respuesta a solicitud Informes Ambientales – COMUNICADO 2024-486-RÍO-0580
17/03/2025	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	CONSORCIO AIR RIO	INFRH-AMB-007-2025	Respuesta a Observaciones del Informe 6 – COMUNICADO-2024-486-RÍO-0587
21/03/2025	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	CONSORCIO AIR RIO	INFRH-AMB-008-2025	Respuesta a los Comunicados No. 2024-486-RIO-0587 cuyo asunto es “Observaciones Informe Ambiental 6”, 2024-486-RIO-0669 cuyo asunto es “Observaciones Informe Ambiental No. 7” y 2024-486-RIO-0733, cuyo asunto es “Reiteración Observaciones Informe Ambiental No. 6 y 7”
28/03/2025	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	CONSORCIO AIR RIO	INFRH-AMB-010-2025	Respuesta a comunicado 2025-486-RIO-3069 cuyo asunto es Observaciones frente al PMA del proyecto, Comunicado 2025-486-RIO-0611 cuyo asunto es Trámites y Gestiones Ambientales, Comunicado 2025-486-RIO-

FECHA	REMITE	DESTINATARIO	CONSECUTIVO	ASUNTO
				0428 cuyo asunto es Solicitud Gestión y Tramites Ambientales y Comunicado 2025-486-RIO-0839 cuyo asunto es reiteración Trámites y Gestiones Ambientales.

A continuación se relaciona los comunicados que la interventoría remite al consorcio en cuanto a la gestión del componente ambiental.

Tabla 4. Relación comunicados recibidos por parte de la interventoría

FECHA	REMITE	DESTINATARIO	CONSECUTIVO	ASUNTO
03/03/2025	CONSORCIO AIR RIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	2025-486-RIO-0580	Solicitud Informes Ambientales
03/03/2025	CONSORCIO AIR RIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	2025-486-RIO-0582	Respuesta a COMUNICADO No. INFRH-T-076-2025 Reiteración a observaciones frente al plan de manejo ambiental
04/03/2025	CONSORCIO AIR RIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	2025-486-RIO-0587	Observaciones Informe 6
10/03/2025	CONSORCIO AIR RIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	2025-486-RIO-0669	Observaciones Informe 7

FECHA	REMITE	DESTINATARIO	CONSECUTIVO	ASUNTO
17/03/2025	CONSORCIO AIR RIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	2025-486-RIO-0733	Reiteración Observaciones Informe Ambiental No. 6 y 7
19/03/2025	CONSORCIO AIR RIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	2025-486-RIO-0755	Respuesta al comunicado N°INFRH-AMB-003-2025, aprobación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el contrato 23001170H4 de 2023
26/03/2025	CONSORCIO AIR RIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	2025-486-RIO-0839	Reiteración Trámites y Gestiones Ambientales oficio 2024-486-RIO-0611

8. APLICACIÓN DE LAS FICHAS AMBIENTALES

A continuación, se presenta el detalle de las actividades realizadas en cumplimiento de cada ficha ambiental aplicada durante la ejecución de la obra. En este apartado se describen las medidas implementadas, los procedimientos seguidos y los resultados obtenidos, con el objetivo de verificar el grado de cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos.

- **MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS (MA)**

Subprograma

PMA – CIR – 01 Educación ambiental (MAC-1)

Se llevó a cabo una charla de concientización dirigida al personal de obra, enfocada en el manejo adecuado de materiales de construcción y en la importancia de los primeros auxilios. Durante la capacitación, se instruyó a los trabajadores sobre el almacenamiento, manipulación y disposición correcta de los materiales para minimizar riesgos ambientales y de seguridad. Asimismo, se impartieron conocimientos básicos de primeros auxilios, enfatizando la respuesta ante emergencias

y la correcta utilización del botiquín. Con esta iniciativa, se busca fomentar una cultura de seguridad y responsabilidad en el desarrollo de las actividades de la obra. (Ver Anexo C).

Indicador

(No. de trabajadores capacitados /No. de trabajadores vinculados a la obra civil) X 100

% = (9/9)*100 =100%

PMA – CIR – 02 Instalación y operación de campamento (MAC-2)

Para la instalación del campamento en la parte interna del aeropuerto, se siguieron protocolos más rigurosos debido a las normativas establecidas para este tipo de instalaciones. En cumplimiento de estos requisitos, se llevó a cabo una gestión formal ante la gerencia Aerocivil Riohacha, incluyendo una reunión en la que se presentó el plan de instalación del campamento, la ubicación de la caseta destinada al almacenamiento de materiales y herramientas, y el acta de aprobación para la zona donde se construirá un dique de reserva de combustible. Este proceso aseguró el cumplimiento de las regulaciones internas y garantizó una ejecución segura y organizada de la obra. (Ver Anexo D).

Indicadores

Hasta el momento solo se cuenta con el punto ecológico, campamento en proceso

(N° de puntos ecológicos instalados/N° de campamentos y/o talleres instalados) x 100

%=0

Extintores y punto de emergencia ambiental en proceso de adquisición.

PMA – CIR – 03 Señalización en las áreas de construcción (MAC-3)

Una vez aprobada el área para la instalación, nos encontramos en proceso de adquisición de la señalización, asegurando que esta zona cumpla con la señalización pertinente.

La señalización incluirá indicaciones claras para la circulación, advertencias sobre riesgos y restricciones de acceso, garantizando así un entorno seguro y organizado para el desarrollo de las actividades.

Indicador

(N° de sitios señalizados adecuadamente/ N° de sitios potencialmente peligrosos) x100

%=0

- **MANEJO DE TRÁNSITO VEHICULAR (MTV)**

Subprograma

PMA – CIR – 04 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos (MTV-1)

La maquinaria y los vehículos utilizados en la obra cuentan con su respectiva señalización de seguridad, cumpliendo con las normativas vigentes para prevenir riesgos y garantizar una operación segura dentro del área de trabajo.

El lavado de maquinaria, equipos y/o vehículos se realiza cumpliendo con la disposición de no efectuar estas actividades dentro del frente de obra. Esta medida se aplica con el fin de evitar la contaminación del suelo y cuerpos de agua, así como para cumplir con los lineamientos ambientales establecidos para el proyecto.

La maquinaria utilizada en la obra recibe mantenimiento preventivo cada 250 horas de operación, de acuerdo a lo establecido. Actualmente, todas las unidades y el vehículo se encuentran al día con sus respectivos mantenimientos, garantizando así su óptimo funcionamiento y reduciendo el riesgo de fallas durante las labores. (Ver Anexo E)

Indicadores

(N° de mantenimientos ejecutados a maquinaria/N° de mantenimiento programados a maquinaria) x 100

%= (1/1)*100 = 100%

(N° de mantenimientos ejecutados a vehículos/N° de mantenimientos programados a vehículos) x 100

%= (1/1) *100 = 100%

PMA – CIR – 05 Manejo de ruido (MTV-2)

Se mantienen las medidas preventivas mediante el uso de equipos de protección personal (EPP), como los tapones auditivos, por parte de los trabajadores. No obstante, cabe resaltar que actualmente no se presentan niveles de ruido que representen un riesgo para la salud, lo que indica un ambiente laboral controlado en cuanto a exposición sonora.

- **MANEJO DEL SUELO (MS)**

Subprograma

PMA – CIR – 08 Manejo de materiales de construcción (MS-3)

En cuanto a la documentación que respalda la procedencia de los materiales de construcción, la interventoría cuenta con toda la información correspondiente a su legalización, suministrada en el periodo pasado. Actualmente, la empresa La Milagrosa es la encargada de suministrar material importado, el cual se almacena en un área designada que no genera afectaciones a la cobertura vegetal. Si bien la dispersión de material particulado se ha visto incrementada debido a la presencia de fuertes vientos en la zona, se están evaluando y gestionando medidas para mitigar este impacto de manera efectiva, en cumplimiento con los lineamientos ambientales del proyecto. (Ver anexo F)

Indicador

(N° de personas capacitadas en manejo de materiales de construcción/N° total de personas encargadas en los frentes de obra)

%= (7/7)*100 = 100%

PMA – CIR – 09 Manejo de residuos sólidos, especiales y peligrosos (MS-4)

La obra cuenta con un punto ecológico debidamente implementado para la disposición adecuada de residuos que puedan generarse durante su ejecución. Se hace especial énfasis en la minimización de su generación, motivo por el cual, hasta la fecha, no se ha presentado una producción

significativa de residuos. Estos los depositamos en una bolsa y se dispone en un punto para la recolección de la frecuencia establecida en las cercanías del aeropuerto.

El consorcio ha establecido un vínculo formal con la empresa INTERASEO, responsable de la recolección de residuos ordinarios y vegetales, asegurando así una gestión adecuada y conforme a la normativa vigente. En cuanto a los residuos peligrosos y especiales, durante este periodo no se ha registrado generación de los mismos. (Ver Anexo A)

Indicadores

(Cantidad de RS aprovechados/Cantidad de RS generados) x 100
%= (0/0) = 0
(Cantidad de escombro dispuesto en lugar autorizado/Cantidad de escombro generados) x 100
%= (0/0) = 0
(Cantidad de RP dispuestos adecuadamente/Cantidad de RP generados) x 100
%= (0/0) = 0

PMA – CIR – 10 Construcción y manejo de áreas de almacenamiento de combustible (MS-5)

El Consorcio Infraestructura cuenta con el aval de la Aeronáutica Civil (sede Riohacha) para el uso del área destinada a la construcción de un dique, cuyas dimensiones han sido definidas conforme a la cantidad de combustible que se manejará durante la ejecución de la obra. Asimismo, en esta misma zona se llevarán a cabo las actividades de cambio de aceite y el almacenamiento temporal del aceite usado, el cual será depositado en recipientes adecuados y gestionado posteriormente por un prestador autorizado que cuente con los permisos ambientales vigentes para su recolección y disposición final (En proceso). Esta actividad hasta el momento se le realiza al mini cargado y se reserva en los mismos recipientes, en un área que no afecta vegetación. Esta gestión garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental y de seguridad aplicable al proyecto. (Ver Anexo D).

Indicador

(N° de personas capacitadas en manejo de combustibles/N° total de empleados) x 100

%= (0/0) = 0

PMA – CIR – 12 Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote (MS-7)

Se llevó a cabo el retiro de la capa vegetal, compuesta por rastrojo y pasto, tanto de manera mecánica como manual, en el área destinada a la ampliación de la franja de seguridad y canaleta. Durante este periodo, los residuos generados fueron trasladados y dispuestos temporalmente a un lado de la zona destinada al almacenamiento de material de construcción, con el fin de facilitar su posterior recolección por parte de la empresa INTERASEO, garantizando así una gestión adecuada y responsable de estos desechos vegetales.

El material del descapote aun no es retirado, en su momento este será reutilizado.

Indicadores

(Volumen de material de descapote dispuesto adecuadamente y/o reutilizado/Volumen total de material de descapote) x 100

%= (0/0) = 0

(Volumen de material de cobertura vegetal dispuesto adecuadamente y/o reutilizado/Volumen total de material de cobertura vegetal) x 100

%= (0/0) = 0

- **MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO (MRH)**

Subprograma

PMA – CIR – 14 Manejo de agua potable y para la construcción (MRH-4)

El agua potable para el consumo del personal en obra, es adquirida en puntos de venta diferentes de la ciudad, en presentación de botellón de 5L. Para las actividades de obra se realiza la compra de agua en bloque a la empresa Aqualia, esta genera un ticket por la compra, el cual tiene su número consecutivo, la fecha y hora, el cliente, placa del vehículo, los M^3 de la compra y su valor. (Ver

Anexo Registro Fotográfico). Al igual generara certificado al periodo que corresponda el informe, se presenta febrero y marzo. (Ver Anexo B).

Indicadores

(Litros de agua para consumo humano suministrada a trabajadores/N° de trabajadores)

%= (5/6) = 83%

(Metros cubico de agua para uso constructivo suministrada/Metros cúbicos de agua para uso constructivo consumida)

%= (98/98) = 100%

- **MANEJO DEL RECURSO AIRE (MRA)**

Subprograma

PMA – CIR – 15 Manejo de Emisiones por Maquinaria y Partículas de Polvo (MRA-1)

Se garantiza el mantenimiento preventivo y la revisión tecno mecánica de la maquinaria utilizada en las actividades de obra, asegurando una combustión eficiente de los motores y reduciendo al mínimo las emisiones contaminantes. Además, se ha concientizado a los operadores sobre la importancia de mantener una velocidad máxima de 30 km/h dentro del área de trabajo, como medida de seguridad y control ambiental. En cuanto al manejo del material particulado, se implementa la humectación del terreno dos veces al día para mitigar la emisión de polvo; sin embargo, debido a los fuertes vientos característicos de esta temporada, este impacto continúa siendo relevante, por lo que se están evaluando medidas complementarias para reforzar su control. (Ver Anexo E).

Indicadores

/N° de vehículos que cuentan con el certificado de gases vigentes/N° total de vehículos en la obra) x 100

%= (0/0) = 0

(N° de veces que se realiza riego al día/N° de veces que se programa riego al día) x 100

%= (2/2) = 100%

Tabla 5: Relación Tecno mecánica maquinaria

Maquinaria	Tipo de Combustible	Aplica/No Aplica
Volqueta TMU 354	Diésel	Tecno mecánica
Volqueta XMD 326	Diésel	Tecno mecánica
Volqueta WCT 885	Diésel	Tecno mecánica
Volqueta STR 734	Diésel	Mantenimiento
Camión TAL 474	Diésel	Tecno mecánica
Mini Cargador	Diésel	No aplica
Vibro Compactador	Diésel	Mantenimiento
Motoniveladora	Diésel	Mantenimiento
Cargador	Diésel	No Aplica

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

En anexo se presenta el registro fotográfico correspondiente al informe correspondiente al periodo del 01 – 31 de marzo de 2025

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS

En el desarrollo de una obra pueden surgir diversas situaciones de emergencia o contingencia que demandan una respuesta oportuna y eficiente, respaldada por planes previamente establecidos. No obstante, durante el período comprendido entre el 01 y el 31de marzo de 2025, no se presentaron incidentes ni emergencias que requirieran la activación de dichos protocolos, lo que refleja un entorno de trabajo controlado y con adecuada implementación de medidas preventivas.

11. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

11.1 CONCLUSIÓN

- Educación y sensibilización ambiental: Se promueve entre los trabajadores la importancia de adquirir conocimientos que permitan prevenir y mitigar los impactos ambientales generados por las distintas actividades propias de la obra. Durante este periodo, se realizaron acciones de formación enfocadas en el manejo adecuado de los materiales de construcción y en la importancia de contar con conocimientos básicos en primeros auxilios, como parte de una cultura de responsabilidad ambiental y seguridad en el trabajo.
- Bajo impacto en la fauna local: Durante la ejecución de las actividades no se evidenció la presencia de fauna en la zona intervenida; sin embargo, en caso de ser necesario, se aplicarán los protocolos de manejo establecidos en el PMA.
- Manejo responsable de materiales: El material ha sido suministrado por proveedor autorizado que cuentan con la documentación ambiental y legal requerida, asegurando un proceso de abastecimiento sostenible.
- Cumplimiento de la normativa ambiental: El implementar las fichas del PMA permite garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, minimizando los impactos negativos derivados de las actividades de mejoramiento en el aeropuerto.
- Cabe aclarar que algunas de las fichas ambientales correspondientes no han sido aplicadas, ya que las actividades asociadas a dichas fichas aún no se han desarrollado en obra. Estas se implementarán en el momento en que dichas labores sean ejecutadas para así cumplir con los lineamientos ambientales del proyecto.
- Bajo indicaciones de la interventoría y la Aerocivil se está elaborando el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA para la actividad de la realización del Tanque de Tormentas conexión del sistema de drenaje del aeropuerto almirante padilla.

11.2 RECOMENDACIONES

- Se realizaran las charlas periódicas al personal de obra sobre la importancia y aplicación del PMA.
- Implementar indicadores de desempeño ambiental y realizar inspecciones regulares para evaluar el cumplimiento del PMA.
- Se mantiene el compromiso de fortalecer la ejecución de las fichas ambientales, realizando ajustes y optimizando procesos para mejorar la sostenibilidad del proyecto y reducir su impacto ambiental.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 8

CONTRATO INTERVENTORIA No. 23001282H3 DE 2023

AIRRIO CONSORCIO

Realizó:	**Reviso:**	**Aprobó:**
Oswaldo Martínez Profesional SST	Oscar Villamil Residente de interventoría	Santiago Paez Director de Interventoría
	Firma:	**Firma:**

Riohacha, La Guajira

MARZO 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 6
   2.1 OBJETIVO GENERAL 6
   2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
3. GENERALIDADES DEL PROYECTO 7
   3.1 LOCALIZACIÓN 7
   3.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 8
4. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA. 15
   4.1 INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA 15
   4.2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 17
   5.1 AFILIACIONES Y PAGOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA 17
   5.2 CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL/CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y SUBCONTRATISTA. 17
6. CONTROL DE MATERIALES UTILIZADOS 18
7. LISTADO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA 18
8. SEGUIMIENTO EN CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 19
   8.1 PERSONAL DE OBRA 20
   8.2 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL CONTRATISTA 22
   8.3 CAPACITACIONES CONTRATISTA 22
   8.4 INDUCCIONES 24
   8.5 EXÁMENES MÉDICOS 24
   8.6 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 24
   8.7 ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN 24

8.8 PLAN DE EMERGENCIA 25

9. REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN LA INTERVENTORIA 26

9.1 PERSONAL DE INTERVENTORÍA APROBADO POR AEROCIVIL 26

9.2 PERSONAL AUXILIAR DE INTERVENTORÍA 27

9.3 REGISTRO MEDEVAC INTERVENTORÍA 27

9.4 AFILIACIONES Y PAGOS DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA 27

9.5 EXÁMENES MÉDICOS 28

9.6 ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN 28

9.7 CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL/CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL DEL INTERVENTOR Y SUBCONTRATISTA. 28

9.8 CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA 28

10 ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO 28

11 CONCLUSION 29

12 ANEXO NO. 1 SEGURIDAD SOCIAL Y PAZ Y SALVO 30

12.1 CONTRATISTA 31

12.2 INTERVENTORÍA 46

13 ANEXO NO. 2 CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y SALARIOS 69

13.1 CONTRATISTA 70

13.2 INTERVENTORÍA 72

14 ANEXO NO. 3 CERTIFICADO DE MATERIALES 74

15 ANEXO NO. 4 PG-HSEQ-19 PLAN DE TRABAJO ANUAL 76

16 ANEXO NO. 5 F-HSQE-26 OBJETIVOS Y METAS 78

17 ANEXO NO. 6 PG-HSEQ-13 PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y CHARLAS 80

17.1 ASISTENCIA DE CAPACITACIONES, CHARLAS E INDUCCIONES 83

18 ANEXO NO. 7 EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 99

19 ANEXO NO. 8 F-HSEQ-13 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y CONTROL DE RIESGO 102

20 ANEXO NO. 9 REGISTRO DE ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN 111

21 ANEXO NO. 10 REGISTRO MEDEVAC INTERVENTORÍA 113

22 ANEXO NO. 11 INFORME MENSUAL DEL PLAN DE SEGURIDAD OPERACIONAL (PSO) 116

22.1 ASISTENCIA DE LAS CAPACITACIONES 140

22.2 INSPECCIÓNES PREOPERACIONALES 143

22.3 NOTAM VIGENTE 176

22.4 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO 179

22.5 CARNETS DE TRABAJADORES DE OBRA 192

23 ANEXO NO. 12 FICHA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 196

24.ANEXO NO. 13 ENCUESTA CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRATISTA 218

25.ANEXO NO. 14 INFORME MENSUAL SST CONTRATISTA 234

26 ANEXO NO. 15 REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATISTA 261

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe es realizado por el Consorcio Air Rio, como seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista Consorcio Infraestructura Riohacha, bajo los parámetros celebrados en el contrato de Interventoría No 23001170H4 de 2023, "INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)".

El enfoque principal de la gestión SST en este proyecto, es garantizar que todas las actividades se desarrollen bajo estrictos estándares de seguridad, minimizando riesgos laborales y promoviendo un entorno de trabajo seguro y saludable para todos los empleados. Esto incluye la implementación de medidas preventivas, el cumplimiento de normativas vigentes y la evaluación continua de las condiciones laborales, con el fin de asegurar la protección de los trabajadores y la sostenibilidad del proyecto.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Verificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables con respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio Infraestructura Riohacha, para el proyecto del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha

2.2 Objetivos específicos

- Revisar el avance de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Examinar el cumplimiento de la documentación necesaria para el ingreso de los trabajadores al proyecto.
- Realizar control y seguimiento al contratista sobre el pago oportuno de las partes sociales del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los periodos y plazos estipulados por la ley.
- Verificar el cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de trabajo.
- Supervisar el cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, propuesto y adoptado por el contratista, previamente revisado y aprobado para la prevención y/o reducción de incidentes, accidentes y enfermedades laborales que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto.


3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

3.1 Localización

El aeropuerto Almirante Padilla se encuentra ubicado en la ciudad de Riohacha, también llamada Süchiimma, es un municipio colombiano, capital del departamento de La Guajira. Es la cabecera del municipio homónimo, el cual tiene una extensión de 3120 km², 287 009 habitantes al año 2018; está conformado por 15 corregimientos y 8 resguardos indígenas.

Está ubicada al nororiente de la Costa Atlántica colombiana, a orillas del mar caribe y en la desembocadura del Río Ranchería, formado por la Sierra Nevada de Santa Marta al occidente.

Figura 1. Localización general

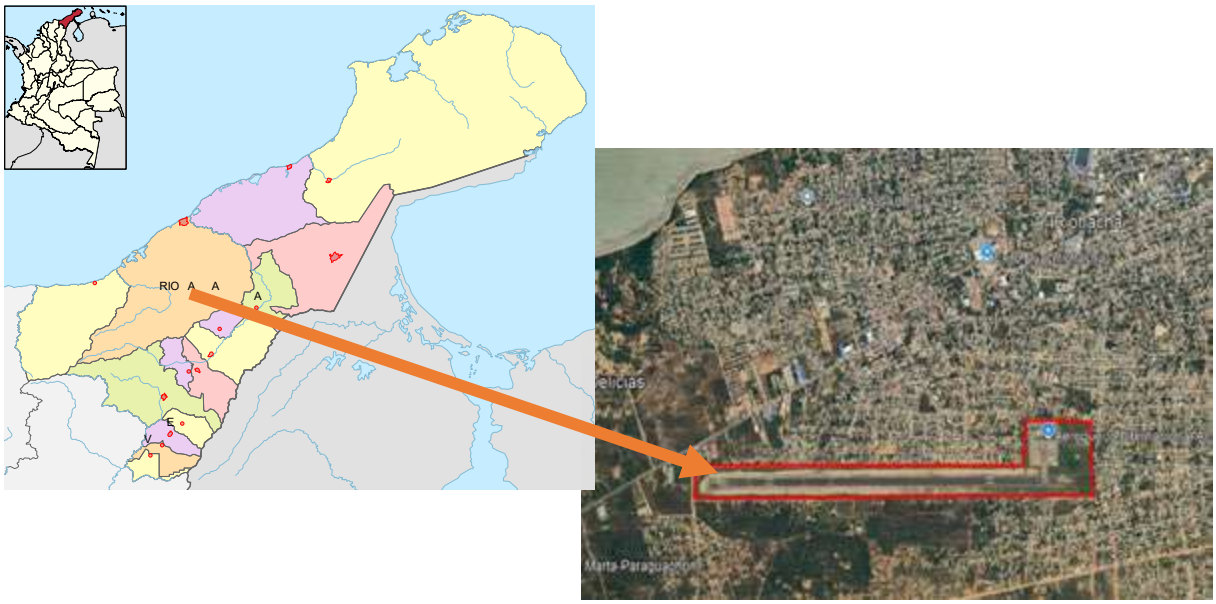

Fuente: Wikipedia/Google.

3.2 Características técnicas del proyecto

El alcance del proyecto implica que hay zonas del Aeropuerto en el lado aire, que requieren intervención urgente y necesaria para poder seguir prestando los servicios, entre ellos se encuentra que en las zonas de seguridad se presentan sectores en los cuales se debe ofrecer la nivelación de franjas de seguridad, mejoramiento de plataformas de viraje, y mejoramiento y construcción de calles de rodaje; también es importante realizar la construcción de canales con el fin de garantizar el óptimo drenaje de aguas lluvias en eventos de precipitación y no poner en riesgo la operación del aeropuerto por este aspecto.

Teniendo en cuenta la consecución de lo mencionado, la Aeronáutica Civil busca proyectar el proceso de contratación e intervención del aeropuerto Almirante Padilla por medio de la metodología de mejoramiento como solución a las patologías del aeropuerto y que refiere a mejoramiento de las zonas de seguridad, mejoramiento de la calle de rodaje alfa, así como la construcción de la calle de rodaje Bravo. Adicionalmente, las obras incluyen ampliación del área de cabecera 28, Mejoramiento de Plataforma de viraje cabecera 10, y, mejoramiento del sistema de drenaje, proyectando captar y disponer del agua de escorrentía bajo criterios ambientales, económicos y que generen beneficio a la comunidad.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la entidad debe propender por la seguridad operacional y la prestación eficiente de estos servicios a los usuarios, mediante inversiones acordes con las necesidades de calidad de los servicios.

Por lo anterior, la contratación del presente proyecto comprende las actividades de revisar, apropiar, ajustar, actualizar y/o complementar los Estudios y Diseños existentes de los contratos de consultoría No. 18001611 H3 - 2018 y No. 18001651 H3 - 2018; y realizar las obras de: mejoramiento de las plataformas de viraje, de las zonas de seguridad, del sistema de drenaje, y mejoramiento y construcción de las calles de rodaje, y demás obras complementarias. Cabe aclarar que en lo que corresponde a estudios y diseños, no se deberá realizar diseños fuera del objeto del presente proyecto, por lo tanto, el valor del mismo será asumido por cuenta y riesgo del contratista de obra.

Mejoramiento de Calle de Rodaje Existente (Alfa).

Trabajos de campo

- Topografía
- Estudios de suelo

Trabajos de oficina

- Diseño de pavimentos.
- Diseño geométrico.
- Diseño de señalización existente.

Figura 2. Mejoramiento calle de rodaje Alfa



Fuente: Google.
AJUSTADO POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Construcción de Calle de Rodaje Bravo.

Trabajos de campo

- Topografía
- Estudios de suelos

Trabajos de oficina

- Diseño de pavimentos
- Diseño geométrico.
- Diseño de Señalización.

Figura 3. Calle de Rodaje Bravo



Fuente: Google.
AJUSTADO POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Mejoramiento Plataforma de Viraje – Cabecera 28.

Trabajos de campo

- Topografía
- Estudios de suelo

Trabajos de oficina

- Diseño de pavimentos
- Diseño geométrico

Figura 4. Cabecera 28



Fuente: Google.
AJUSTADO POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Adecuación Plataforma Viraje – Cabecera 10

Trabajos de campo

- Topografía
- Estudios de suelo

Trabajos de oficina

- Diseño de pavimentos
- Diseño geométrico

Figura 5. Cabecera 10



Fuente: Google.
AJUSTADO POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

.

Adecuación Franja de Seguridad.

Trabajos de campo

- Topografía.

Trabajos de oficina

- Calculo pendiente de diseño de la zona a intervenir.
- Ajuste de cantidades de obra.

Figura 6. Franja de Seguridad



Fuente: Google.
AJUSTADO POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Construcción de nuevos Drenajes.

Trabajos de campo

- Topografía.
- Estudio de Suelos.

Trabajos de oficina

- Diseño Hidráulico
- Cálculo de caudales de diseño.
- Cálculo de precipitaciones y escorrentías que abarcan un volumen para el aeropuerto.
- Recolección de información primaria y secundaria para hacer los cálculos respectivos.

Figura 7. Localización drenajes



Fuente: Google.
AJUSTADO POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

4.1 Información contractual del contrato de obra

Las labores del contratista iniciaron el día 01 de agosto de 2024, según acta de inicio, y tienen una duración hasta el día 31 de julio de 2026.

Tabla 1. Resumen contrato de obra

CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 DE 2023.	
" REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AERO ERTO A IRANTE A I A E RIO A A (V)""	
Constructor	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Integrantes	INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA (40%) RG INGENIERÍA SAS (40%) IMCCA SAS (20%)
Representante Legal	Gildardo Chavarro
Firma del contrato	30/05/2024
Fecha Acta de Inicio de Obra	01/08/2024
Plazo de Ejecución	HASTA EL 31/07/2026
Fecha Finalización Contrato	31/07/2026
Otrosí	No Aplica
Valor Anticipo	$11.884.371.800,00
Valor del Contrato	$56.738.847.471,00

Fuente: contrato de obra no. 23001170 H4 de 2023

4.2 Información Contractual Del Contrato De Interventoría

Tabla 2. Resumen contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 23001282-H3 DE 2023.	
" REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"	
Interventor	CONSORCIO AIR-RIO
Integrantes	Incoplan S.A. (90 %) Intercsa Sucursal Colombia (10%)
Representante Legal	Santiago Páez Talero
Firma del contrato	30/05/2024
Fecha Acta de Inicio de Obra	01/08/2024
Plazo de Ejecución	hasta el 31 de julio de 2026
Fecha Finalización Contrato	31/Julio/2026
Otrosí	No Aplica
Valor Anticipo	No existe anticipo
Valor del Contrato	$ 7.724.841.670

Fuente: *contrato de interventoría no. 23001282-H3 de 2023*

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el presente periodo se realizan las siguientes actividades correspondientes a la adecuación de la franja de pista.

- ✓ Localización Y Replanteo
- ✓ Compactación Y Refino De Fondo De Excavación.
- ✓ Inducción A Personal Y Charlas De Seguridad
- ✓ Rellenos Localizados Con Material Importado
- ✓ Transporte De Material De Cantera

5.1 Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y con el objetivo de garantizar la ejecución del Contrato de Obra, se incluye en el anexo No. 1 seguridad social y paz y salvo, la información relacionada con las afiliaciones y pagos efectuados al Sistema General de Seguridad Social Integral por parte del personal vinculado al contrato de obra e interventoría.

5.2 Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del contratista de obra y subcontratista.

En cumplimiento de las normas legales y contractuales vigentes, se procede a incluir el anexo No. 2 Certificación de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios. Este documento contiene la certificación emitida por el revisor fiscal/contador público y el representante legal del contratista de obra y subcontratista, en la cual se expresa el paz y salvo correspondiente por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios.

6. CONTROL DE MATERIALES UTILIZADOS

Control de materiales de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra. Ver Anexo No. 3 Certificado de Materiales.

Tabla 3. Material utilizado

Material	Volumen Total (M^3) Suministrado
Material de Relleno	7500

Fuente: Certificación De Materiales, Paim De Colombia S.A.S.

7. LISTADO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA

Relación de los vehículos y maquinaria utilizada por el contratista

Tabla 3. Listado de vehículos y maquinaria utilizados en el mes para la obra

Tipo	Contractual	Actual	Observaciones
Excavadora Hidráulica de oruga	2	0	
Retrocargador de neumáticos	2	0	
Fresadora asfalto	1	0	
Volquetas de 15 m3	4	4	Activo
Vibrocompactador	2	1	Activo
Motoniveladora	2	1	En taller
Carrotanque	1	1	Activo
Terminadora de asfalto con sensores	1	1	Inoperativa
Equipo para mezcla de concreto	1	1	Inoperativa
Equipo Topográfico de Alta Precisión	1	1	Activo
Hidrolavadora	1	0	
Minicargador con accesorios	1	1	Activo
Camioneta con platón	1	1	Activo
Luminaria	0	2	Activo

Fuente: Elaboración Propia, 2025

8. SEGUIMIENTO EN CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Se describen las labores de seguimiento, evaluación y supervisión llevadas a cabo por la Interventoría, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los términos de referencia y las cláusulas contractuales de la obra, así como de la normativa relacionada con Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) vigente y las directrices establecidas por la entidad contratante.

En el marco de las labores realizadas por la Interventoría Consorcio Air Rio durante el mes actual, relacionadas con el cumplimiento de los requerimientos de SST llevados a cabo por el Contratista Consorcio Infraestructura Riohacha, se efectuará la supervisión y evaluación de las medidas y acciones implementadas. Esto con el propósito de prevenir, reducir y/o compensar los potenciales riesgos laborales que puedan surgir a lo largo de la ejecución del proyecto, siendo las actividades generales reportadas las siguientes:

• I p , y T
ejecutadas por el contratista en los distintos frentes de obra o zonas de trabajo.

• R p .

8.1 Personal De Obra

Durante el presente periodo, correspondiente a la FASE II del contrato, se presenta la relación detallada del personal que laboró en la obra durante el mes, según los reportes entregados por el contratista y validados por la interventoría.

Tabla 4. Relación de Personal que laboró Durante el Periodo

Profesional ofrecido para el cargo	Nombre	Dedicación Estimada (%)	
		Fase de Apropiación de Estudios y Diseños	Fase de Mejoramiento
		Mes 1 a Mes 5	Mes 6 hasta Finalizar
Director de Obra	Victor Castro	100	100
Residente de obra	Juan Carlos Pérez	50	100
Inspector SST	Roger Rodríguez Ojeda	50	100
Especialista en pavimentos y Diseños Geométrico	Pedro Mora Grandas	50	20
Coordinador técnico de obra	Juan Carlos Serna	0	100
Profesional en Gerencia de proyectos	David Felipe Alfonso	0	100
Ingeniero de apoyo	Elis Jose Araujo Pastrana	0	100
Profesional Social	Mildrey Lorena Pinilla	0	100
Inspector SST	Duvan Elias Montenegro	0	100
Especialista aeroportuario o aeropistas	Pedro Mora	20	20
Especialista en Geotecnia	Melquicedec Cantor	20	20
Especialista hidráulico	Roberto Jaimes	20	20
Ingeniero Ambiental	Eliana Gomez	50	100
Especialista en costos, presupuestos y programación	Diego Alexander Osorio	10	10
Topógrafo	Ariel Duvan Robayo	100	100
Cadenero	Alfonso Morales Esteban	100	100
	Carlos Corredor	100	100
Obrero	Elder Ceballos	100	100
Obrero	Victor Angulo	100	100
Conductor Vibro	Heiner Rondon	100	100
Operador moto niveladora	Nelson Acuña	100	100

Profesional ofrecido para el cargo	Nombre	Dedicación Estimada (%)	
		Fase de Apropiación de Estudios y Diseños	Fase de Mejoramiento
		Mes 1 a Mes 5	Mes 6 hasta Finalizar
Operador volqueta	Jhon Martínez	100	100
Operador volqueta	José Oñate	100	100
Obrero	Victor Rodríguez	100	100
Obrero	Julio Torres	100	100
Conductor	Cristian Mora	0	100
Conductor	Esneider Puello	0	100
Conductor	Oscar Mauricio Vera	100	100
Operador minicargador	Henry Cruz Moreno	100	100
Administrador	Hernando Hernández	30	100
Maestro	Roberto Ávila	0	100
Ayudante	Sandro Villegas	0	100
Ayudante	Osnaider Martínez	0	100
Portera	Eneida Martínez	0	100
Ingeniero de apoyo	Elkin Rojas	0	100
Delfinson Sarmiento	Conductor	0	100
Jhon Deivis Pacheco	Ayudante	0	100
Tiber Chavarro	Representante legal	100	100
Kenis Cotes Suarez	Trabajadora Social	0	50

Fuente: Informe SST No. 8 Contratista

El personal profesional se presenta dando disponibilidad al proyecto, tanto en la fase de revisión a estudios y diseños como en la fase de mejoramiento.

8.2 Seguimiento Del Plan De Trabajo Anual del contratista

La Interventoría supervisa constantemente la implementación del plan de trabajo anual por parte del Contratista, verificando que este permita alcanzar cada uno de los objetivos establecidos en el SG-SST, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. Dicho plan cuenta con la firma del representante legal del Contratista y del Coordinador de SST.

Durante el periodo correspondiente, la Interventoría realiza el seguimiento a las actividades programadas, evaluando su viabilidad con base en la fase de operaciones ejecutada por el Contratista. Asimismo, se verifica un cumplimiento del 100% de las actividades establecidas. Se adjunta el Anexo No. 4 PG-HSEQ-19 Plan De Trabajo Anual.

El seguimiento a las actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por parte de la Interventoría se realiza conforme a los objetivos específicos definidos en las especificaciones técnicas del contrato. Se lleva a cabo un monitoreo constante para verificar el cumplimiento de los programas de gestión implementados por el Contratista. Adicionalmente, se evalúan los resultados obtenidos durante el periodo correspondiente al mes del informe, y se adjunta su registro en el Anexo No. 5 F-HSQE-26 Objetivos Y Metas.

8.3 Capacitaciones Contratista

Durante el periodo correspondiente al mes actual, se programaron las actividades en obra teniendo en cuenta el inicio de la fase de operaciones. En este contexto, se llevaron a cabo las capacitaciones y charlas establecidas en el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) dirigidas al personal, con el propósito de garantizar la implementación adecuada de las medidas relacionadas con SST en la ejecución del proyecto. Ver Anexo No. 6 PG-HSEQ-13 programa de capacitaciones y charlas.

Tabla 5. Charlas/capacitaciones ejecutadas por el contratista

Charlas / Capacitaciones mes de Marzo				
Tema	**Fecha**	**Tipo actividad**	**Duración en minutos**	**Asistentes**
Regla de tolerancia No 1. Está prohibido trabajar bajo los efectos del alcohol o drogas	11/03/2025	Charla	10	9
Cuidado de los EPP	12/03/2025	Charla	10	8
Seguridad en el uso de herramientas manuales	14/03/2025	Charla	10	13
Socialización del SG SST y PSO del Aeropuerto Almirante Padilla	17/03/2025	Inducción	60	1
Mirar siempre antes de actuar	17/03/2025	Charla	10	12
Uso responsable de herramientas	20/03/2025	Charla	5	13
Aprender de los errores	21/03/2025	Charla	5	12
Cuidado de columna Lumbar	22/03/2025	Charla	5	12
Seguridad Basada en el comportamiento	25/03/2025	Charla	5	12
Prevención del riesgo público	29/03/2025	Charla	5	12

Fuente: Informe Mensual SST No. 8 Contratista

8.4 Inducciones

El profesional de seguridad y salud en el trabajo realiza las inducciones de lo siguiente:

- Socialización SG SST y PSO Aeropuerto Seguridad y Salud en el Trabajo:

Durante el periodo correspondiente al mes actual, se reportan las inducciones que corresponden al personal de obra presentado. La evidencia se encuentra en el Anexo No. 6 PG-HSEQ-13 programa de capacitaciones y charlas.

8.5 Exámenes Médicos

Durante el presente periodo se realizó exámenes ocupacionales de ingreso del personal de obra. Se adjuntan el Anexo No. 7 Exámenes Médicos De Ingreso.

8.6 Gestión De Peligros Y Riesgos

Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, la Interventoría supervisará la implementación (SG-SST) por parte del Consorcio Infraestructura Riohacha, en desarrollo del contrato de obra No. 23001170 H4 de 2023. Esta supervisión estará orientada a garantizar la documentación y ejecución adecuada del SG-SST para anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Se verificará la aplicación de las medidas de SST, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, así como el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Ver Anexo No. 8 F-HSEQ-13 Matriz De Identificación De Peligros, Valoración Y Control De Riesgos.

8.7 Entrega de EPP y Dotación

Durante el periodo actual, se realizó la entrega de EPP y dotación al personal de obra, se adjunta en el Anexo No. 9 Registro de entrega de EPP y dotación.

8.8 Plan De Emergencia

La información de las entidades a recurrir en caso de emergencia es:

Tabla 6. Líneas de emergencia

ENTIDADES	TELEFONOS
Centro de Control de Operaciones del Aeropuerto Germán Olano Juan Carlos Vargas	315 5429847
Bomberos Aeronáuticos Duvan Augusto Arias Trejos	312 5541945
Sanidad Aeroportuaria Rudy González	301 4432744
Seguridad Aeroportuaria Glexi Miranda	311090306
Policía Aeroportuaria Sargento Jasmini de la Barrera	3016813452
DEFENSA CIVIL Robin Hisauro Mahecha Fajardo	3118120822
Tránsito accidentes	(60)5 7279805
Dijin Comando de policía Riohacha	166
Acueducto Alcaldía	(60)57286950
Alumbrado publico Alcaldía	(60(57276658
CRUZ ROJA	(60)57290562
Línea de atención de emergencias Riohacha La Guajira (bomberos, ambulancias, policía)	123
ARL SURA	01 8000 51 888 protecciondedatos@suramericana.com.co. .

Fuente: Informe SST No. 8 Contratista

9. REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN LA INTERVENTORIA

Con el propósito de promover condiciones laborales seguras y saludables, y asegurar que se mantengan los estándares adecuados de bienestar, productividad y eficiencia dentro del entorno laboral, la interventoría desarrolla durante el periodo las siguientes actividades correspondientes al área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

9.1 Personal De Interventoría Aprobado por Aerocivil

Durante el presente periodo, correspondiente a la FASE II del contrato, se presenta la relación detallada del personal que laboró en la interventoría durante el mes.

Tabla 7. Relación de Personal de Interventoría que Laboró Durante el Periodo

CARGO	NOMBRE
Director de Interventoría	Santiago Páez Talero
Residente de Interventoría	Oscar Villarreal Silva
Residente Ambiental	Diana Marcela niño Santamaria
Especialista en Pavimentos	Luis Francisco Montes Buritaca
Especialista Hidráulico	Ricardo Bejarano
Profesional de Costos	Jorge Iván Arias López
Auxiliar Administrativo	Yerlis Ramos Casas
Topógrafo	Deyber Eduardo Flórez Caballero
Cadenero 2	Nelson Camilo Guerra Novoa
Residente de Interventoría 2	Andrés Felipe Villamil
Especialista Aeroportuario	Jaime Balaguero Melo
Inspector SISOMA	Oswaldo Martínez Vega
Especialista en Diseño Geométrico	Rafael Armando Carreño Mojica
Especialista en Geotecnia	Martha Elena Morales Guevara

Fuente: Elaboración Propia, 2025

9.2 Personal Auxiliar de interventoría

A continuación, se presenta la relación detallada del personal auxiliar que laboró en la interventoría durante el presente periodo correspondiente a la FASE II del contrato.

Tabla 8. Relación del personal auxiliar que laboró durante el periodo.

Cargo	Nombre
Auxiliar Civil	Enelin Villalobos Angulo
Auxiliar Ambiental	María José Polo Martínez
Cadenero 1	Yair Ustate Acensio
Auxiliar Social	Anyi Paola Cortes Gómez

Fuente: Elaboración propia 2025

9.3 Registro Medevac Interventoría

El siguiente registro MEDEVAC recopila información detallada sobre las evacuaciones médicas de cada trabajador residente en Riohacha, La Guajira. Este documento tiene como objetivo garantizar la trazabilidad y el control de las operaciones relacionadas con el traslado de pacientes a centros médicos especializados. La tabla incluye datos clave como la identificación del paciente, la EPS, RH, el personal responsable y otras observaciones relevantes para la gestión efectiva de emergencias médicas. Este registro se encuentra en el Anexo No. 10 Registro Medevac.

9.4 Afiliaciones y pagos del personal de interventoría

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y con el objetivo de garantizar la ejecución del Contrato de Obra, se incluye en el anexo No. 1 seguridad social y paz y salvo. La información relacionada con las afiliaciones y pagos efectuados al Sistema General de Seguridad Social Integral por parte del personal.

9.5 Exámenes Médicos

Durante el presente periodo no se realizaron exámenes médicos por parte de la Interventoría.

9.6 Entrega de EPP y Dotación

Durante el periodo actual, no se realizó entrega de EPP ni dotación al personal de interventoría.

9.7 Certificado del revisor fiscal/contador público y representante legal del interventor y subcontratista.

En cumplimiento de las normas legales y contractuales vigentes, se procede a incluir el anexo No. 2 Certificación de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios. Este documento contiene la certificación emitida por el revisor fiscal/contador público y el representante legal del contratista de interventoría y subcontratista, en la cual se expresa la paz y salvo correspondiente por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios.

9.8 Certificación de interventoría

A la fecha del presente informe, el Contratista Consorcio Infraestructura Riohacha, no ha presentado los documentos pertinentes para generar el certificado de paz y salvo.

10 ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

En el periodo del presente informe no se presentó ningún tipo de incidentes y accidentes laborales por parte del contratista y la interventoría.

11 CONCLUSION

- ✓ Durante el periodo reportado, se evidenció un cumplimiento general satisfactorio de las actividades enmarcadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), tanto por parte del contratista como de la interventoría. Esto incluyó la supervisión continua de riesgos laborales, la implementación de medidas preventivas, y la capacitación del personal en temas de SST.
- ✓ Se logró un avance significativo en las actividades previstas en el plan de trabajo anual, alcanzando un cumplimiento del 100% de las mismas.
- ✓ La interventoría realizó un monitoreo constante del cumplimiento de las normas legales y contractuales relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, asegurando la documentación adecuada y la implementación de estrategias de prevención de riesgos.
- ✓ Es importante destacar que no se reportaron accidentes ni incidentes laborales durante el periodo evaluado, lo cual refleja la efectividad de las medidas de seguridad adoptadas.
- ✓ El Contratista realizo entrega de equipos de protección personal (EPP) y dotación a los trabajadores, así como las inducciones y exámenes médicos correspondientes, garantizando un entorno de trabajo seguro y alineado con los estándares establecidos.

12 ANEXO NO. 1 SEGURIDAD SOCIAL Y PAZ Y SALVO

12.1 CONTRATISTA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901831724-8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	CRA 67 nO. 167-61 OFIC 509	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	Y	19/03/2025	84929792	$499.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	495.500				495.500	12	3.800	499.300			4.955	499.300	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	12	0	0	0
ICBF				
0	12	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	495.500	499.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	495.500	499.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901831724-8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA		CRA 67 nO. 167-61 OFIC 509	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					5	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-02	2025-02	Y	19/03/2025	84929792	$499.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	10524225	CASTRO SALAZAR VICTOR DANIEL	59	0			N																		0	0	0	0	0			0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	19272831	MORA GRANDAS PEDRO JOSE	59	0			N																		0	0	0	0	0			0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	19371269	CANTOR BELLO MELQUICEDEC	59	0			N																		0	0	0	0	0			0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	6773087	GONZALEZ VERGARA CARLOS JAVIER	59	0			N																		0	0	0	0	0			0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	79471549	JAIMES SILVA ROBERTO ANDERSON	59	0			N																		0	0	0	0	0			0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118843663
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE LUIS ONATE ZUBIRIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CLL 16 N 13 4	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4597903697**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/04/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992200527

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES										
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1118843663	ONATE ZUBIRIA JOSE LUIS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	111884366	$ 34.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 440.500

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	84089176
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JHON JAIRO MARTINEZ ARRIETA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CALLE 34B CRA 33A - 35	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de carga por carretera.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7961579176**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1359015001

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 34.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 34.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 440.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 440.500**

Planilla Pagada

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900814131	5	PAIM DE COLOMBIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMIN PAIM	CALLE 1 N 11 - 75	RIOHACHA-LA GUAJIRA	7285881	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1347875659	9483273526	E	2025/03/10	2025/03/19	BANCOLOMBIA	9	$2,412,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMIN PAIM (3 Afiliados)						$7,744,122	$1,239,200			$7,744,122	$309,900			$7,744,122	$309,900			$7,744,122	$539,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO V (3 Afiliados)						$7,744,122	$1,239,200			$7,744,122	$309,900			$7,744,122	$309,900			$7,744,122	$539,200		$0	$0
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (3 Afiliados)						$7,744,122	$1,239,200			$7,744,122	$309,900			$7,744,122	$309,900			$7,744,122	$539,200		$0	$0
1	CC	72192091	ACUÑA NELSON	230301	30	$3,336,255	$533,900	EPS005	30	$3,336,255	$133,500	CCF30	30	$3,336,255	$133,500	14-23	30	$3,336,255	$232,300	30	$0	$0
2	CC	1067721248	RONDON EINER	230301	30	$2,319,853	$371,200	EPS041	30	$2,319,853	$92,800	CCF30	30	$2,319,853	$92,800	14-23	30	$2,319,853	$161,500	30	$0	$0
3	CC	1118829673	SARMIENTO DELFINSON	230301	30	$2,088,014	$334,100	EPS002	30	$2,088,014	$83,600	CCF30	30	$2,088,014	$83,600	14-23	30	$2,088,014	$145,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$7,744,122	$1,239,200			$7,744,122	$309,900			$7,744,122	$309,900			$7,744,122	$539,200		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900814131	5	PAIM DE COLOMBIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMIN PAIM	CALLE 1 N 11 - 75	RIOHACHA-LA GUAJIRA	7285881	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1347875659	9483273526	E	2025/03/10	2025/03/19	BANCOLOMBIA	9	$2,412,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,239,200	$7,000	$0	$1,246,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,239,200	$7,000	$0	$1,246,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$539,200	$3,100	$0	$542,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$539,200	$3,100	$0	$542,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$309,900	$1,800	$0	$311,700
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	3	$309,900	$1,800	$0	$311,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$309,900	$1,900	$0	$311,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$92,800	$600	$0	$93,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$83,600	$500	$0	$84,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$133,500	$800	$0	$134,300
TOTAL				**3**	**$2,398,200**	**$13,800**	**$0**	**$2,412,000**

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901372705	8	R7 INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RIOHACHA	CL 128 D 86 B 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3167611806	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-02	2025-03	1350287879	9483293757	E	2025/03/04	2025/03/17	BANCO DE BOGOTA	13	$1,587,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

							SALARIO			PENSION													SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No	Fijo	COLPENSIONES	3	$ 142.350	16%	SIN RIESGO	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.800		NUEVA EPS MOVILIDAD	3	$ 142.350	4%	$ 5.700	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	15	$ 711.750	12%	SIN RIESGO	$ 85.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500		SANITAS	15	$ 711.750	0%	$ 0	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	15	$ 711.750	16%	SIN RIESGO	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.900		SANITAS	15	$ 711.750	4%	$ 28.500	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	PROTECCION	15	$ 711.750	12%	SIN RIESGO	$ 85.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500		MUTUAL SER	15	$ 711.750	0%	$ 0	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	PROTECCION	15	$ 711.750	16%	SIN RIESGO	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.900		MUTUAL SER	15	$ 711.750	4%	$ 28.500	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	15	$ 711.750	12%	SIN RIESGO	$ 85.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500		CAJACOPI	15	$ 711.750	0%	$ 0	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	15	$ 711.750	16%	SIN RIESGO	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.900		CAJACOPI	15	$ 711.750	4%	$ 28.500	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	COLPENSIONES	15	$ 711.750	12%	SIN RIESGO	$ 85.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500		ANAS WAYUU	15	$ 711.750	0%	$ 0	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	COLPENSIONES	15	$ 711.750	16%	SIN RIESGO	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.900		ANAS WAYUU	15	$ 711.750	4%	$ 28.500	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PROTECCION	15	$ 711.750	12%	SIN RIESGO	$ 85.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500		NUEVA EPS MOVILIDAD	15	$ 711.750	0%	$ 0	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PROTECCION	15	$ 711.750	16%	SIN RIESGO	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.900		NUEVA EPS MOVILIDAD	15	$ 711.750	4%	$ 28.500	$
																					$ 1.019.800						$ 148.200	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 5.700		COMPENSAR	3	$ 142.350	4%	$ 5.700	ARL SURA	3	$ 142.350	6,96%	5	$ 10.000	3	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 0		COMPENSAR	15	$ 711.750	0%	$ 0	ARL SURA	15	$ 711.750	0%	5	$ 0	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 28.500		COMPENSAR	15	$ 711.750	4%	$ 28.500	ARL SURA	15	$ 711.750	6,96%	5	$ 49.600	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 0		COMPENSAR	15	$ 711.750	0%	$ 0	ARL SURA	15	$ 711.750	0%	5	$ 0	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 28.500		COMPENSAR	15	$ 711.750	4%	$ 28.500	ARL SURA	15	$ 711.750	6,96%	5	$ 49.600	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 0		COMPENSAR	15	$ 711.750	0%	$ 0	ARL SURA	15	$ 711.750	0%	5	$ 0	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 28.500		COMPENSAR	15	$ 711.750	4%	$ 28.500	ARL SURA	15	$ 711.750	6,96%	5	$ 49.600	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 0		COMPENSAR	15	$ 711.750	0%	$ 0	ARL SURA	15	$ 711.750	0%	5	$ 0	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 28.500		COMPENSAR	15	$ 711.750	4%	$ 28.500	ARL SURA	15	$ 711.750	6,96%	5	$ 49.600	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 0		COMPENSAR	15	$ 650.000	0%	$ 0	ARL SURA	15	$ 711.750	0%	5	$ 0	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 28.500		COMPENSAR	15	$ 650.000	4%	$ 26.000	ARL SURA	15	$ 711.750	6,96%	5	$ 49.600	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 148.200						$ 145.700						$ 258.000				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901372705	8	R7 INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RIOHACHA	CL 128 D 86 B 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3167611806	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1350287879	9483293757	E	2025/03/04	2025/03/17	BANCO DE BOGOTA	13	$1,587,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,019,800	$10,300	$0	$1,030,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$222,200	$2,300	$0	$224,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$398,800	$4,000	$0	$402,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$398,800	$4,000	$0	$402,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$258,000	$2,600	$0	$260,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$258,000	$2,600	$0	$260,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$145,700	$1,500	$0	$147,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$145,700	$1,500	$0	$147,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$148,200	$1,600	$0	$149,800
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$28,500	$300	$0	$28,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$28,500	$300	$0	$28,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$28,500	$300	$0	$28,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$34,200	$400	$0	$34,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$28,500	$300	$0	$28,800
TOTAL				**6**	**$1,571,700**	**$16,000**	**$0**	**$1,587,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 834000377	7	RG INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 67 NO. 167-61 OFC 509	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4768462	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1333477450	9483116118	E	2025/03/19	2025/03/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,184,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																							$11,316,083	$1,810,700			$12,739,583	$509,800			$12,739,583	$509,800			$12,739,583		$354,600		$0	$0		$3,184,900
Centro de Trabajo: 0.522 (4 Afiliados)																							$6,847,000	$1,095,600			$8,270,500	$331,000			$8,270,500	$331,000			$8,270,500		$43,400		$0	$0		$1,801,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$6,847,000	$1,095,600			$8,270,500	$331,000			$8,270,500	$331,000			$8,270,500		$43,400		$0	$0		$1,801,000
1	CC	1019065656	CHAVARRO CATHERIN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	79311998	CHAVARRO TIBER																		231001	30	$4,000,000	$640,000	EPS001	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
3	CC	1071914263	NEIRA JUAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
4	CC	20858766	ROBAYO ROCIO																			0	$0	$0	EPS001	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$121,500
Centro de Trabajo: 6.96 (2 Afiliados)																							$4,469,083	$715,100			$4,469,083	$178,800			$4,469,083	$178,800			$4,469,083		$311,200		$0	$0		$1,383,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$4,469,083	$715,100			$4,469,083	$178,800			$4,469,083	$178,800			$4,469,083		$311,200		$0	$0		$1,383,900
5	CC	7332041	MELO JOSE										X								231001	30	$2,769,083	$443,100	EPS001	30	$2,769,083	$110,800	CCF22	30	$2,769,083	$110,800	14-4	30	$2,769,083	6.960%	$192,800	30	$0	$0	Si	$857,500
6	CC	1003189531	PUELLO ESNEIDER																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS002	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	Si	$526,400
Total	**Afiliados(6)**																						$11,316,083	$1,810,700			$12,739,583	$509,800			$12,739,583	$509,800			$12,739,583		$354,600		$0	$0		$3,184,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 834000377	7	RG INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 67 NO. 167-61 OFC 509	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4768462	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1333477450	9483116118	E	2025/03/19	2025/03/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,184,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,810,700	$0	$0	$1,810,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,083,100	$0	$0	$1,083,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$727,600	$0	$0	$727,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$354,600	$0	$0	$354,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$354,600	$0	$0	$354,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$509,800	$0	$0	$509,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$509,800	$0	$0	$509,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$509,800	$0	$0	$509,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	$384,800	$0	$0	$384,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				6	$3,184,900	$0	$0	$3,184,900

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901831724-8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	CRA 67 nO. 167-61 OFIC 509	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	19/03/2025	84929695	$15.233.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	100.000	0		0		0	12	800	0	100.800	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	440.000	0		0		0	12	3.400	0	443.400	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	259.000	0		0		0	12	2.000	0	261.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	71.100	0		0		0	12	600	0	71.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	217.300	0		0		0	12	1.700	0	219.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	490.600	0		0		0	12	3.700	0	494.300	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	153.200	0		0		0	12	1.200	0	154.400	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	122.700	0		0		0	12	1.000	0	123.700	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	100.000	0		0		0	12	800	0	100.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	490.500	0	0	0	0	12	3.700	0	494.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	5.776.600	0	0	0	0	12	43.500	0	5.820.100	13
231001	Colfondos	800227940-6	400.000	0	0	0	0	12	3.100	0	403.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.145.600	0	0	0	0	12	8.700	0	1.154.300	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.398.800				3.398.800	12	25.600	3.424.400			33.988	3.424.400	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF30	Caja Fliar La Guajira	892115006-5	1.953.900	12	14.700	1.968.600	18

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901831724-8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA		CRA 67 nO. 167-61 OFIC 509	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	19/03/2025	84929695	$15.233.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	12	0	0	0
ICBF				
0	12	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	1.953.900	1.969.100
Pensión	4	7.812.700	7.871.700
Riesgos Laborales	1	3.398.800	3.424.400
CCF	1	1.953.900	1.968.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	15.119.300	15.233.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901831724-8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA		CRA 67 nO. 167-61 OFIC 509	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	19/03/2025	84929695	$15.233.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006615156	ANGULO FONTALVO VICTOR MANUEL	1	0			S								X								230301	1.762.355	282.000	0	0	0	0	EPS005	1.762.355	70.500	14-11	1.762.355	5	122.700	CCF30	1.762.355	70.500	0	0	0	0	0
2	CC	1052396873	CORREDOR CANO CARLOS ANDRES	1	0			S								X								230301	1.775.661	284.200	0	0	0	0	EPS037	1.775.661	71.100	14-11	1.775.661	5	123.600	CCF30	1.775.661	71.100	0	0	0	0	0
3	CC	1071915149	VERA RODRIGUEZ OSCAR MAURICIO	1	0			S								X								230301	2.413.956	386.300	0	0	0	0	EPS017	2.413.956	96.600	14-11	2.413.956	5	168.100	CCF30	2.413.956	96.600	0	0	0	0	0
4	CC	1095913270	MORALES ESTEBAN ALFONSO	1	0			S								X								230301	1.775.661	284.200	0	0	0	0	EPS010	1.775.661	71.100	14-11	1.775.661	5	123.600	CCF30	1.775.661	71.100	0	0	0	0	0
5	CC	1102361348	ROBAYO LARA ARIEL DUVAN	1	0			S								X								230301	1.762.664	282.100	0	0	0	0	EPS037	1.762.664	70.600	14-11	1.762.664	5	122.700	CCF30	1.762.664	70.600	0	0	0	0	0
6	CC	11039041	ROJAS ANAYA ELKIN	1	0			S	X															25-14	3.333.334	533.400	0	0	0	0	EPS037	3.333.334	133.400	14-11	3.333.334	5	232.100	CCF30	3.333.334	133.400	0	0	0	0	0
7	CC	1118813605	MORA SIERRA CRISTIAN ELIECER	1	0			S								X								230301	1.802.584	288.500	0	0	0	0	EPS005	1.802.584	72.200	14-11	1.802.584	5	125.500	CCF30	1.802.584	72.200	0	0	0	0	0
8	CC	1118873533	ARAUJO PASTRANA ELIS JOSE	1	0			S								X								230301	2.905.500	464.900	0	0	0	0	EPS005	2.905.500	116.300	14-11	2.905.500	5	202.300	CCF30	2.905.500	116.300	0	0	0	0	0
9	CC	1121296720	RODRIGUEZ GOMEZ VICTOR JAIME	1	0			S								X								230301	1.772.876	283.700	0	0	0	0	EPS041	1.772.876	71.000	14-11	1.772.876	5	123.400	CCF30	1.772.876	71.000	0	0	0	0	0
10	CC	3144427	CRUZ MORENO HENRRY LEONARDO	1	0			S								X								230301	3.017.283	482.800	0	0	0	0	EPS017	3.017.283	120.700	14-11	3.017.283	5	210.100	CCF30	3.017.283	120.700	0	0	0	0	0
11	CC	49781236	GOMEZ SANCHEZ ELIANA MARIA	1	0			S								X								230301	4.184.543	669.600	0	0	0	0	EPS002	4.184.543	167.400	14-11	4.184.543	5	291.300	CCF30	4.184.543	167.400	0	0	0	0	0
12	CC	79311998	CHAVARRO MUÑOZ TIBER GILDARDO	1	0			S																231001	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS001	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF30	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
13	CC	81740284	TORRES GUARIN JULIO	1	0			S								X								25-14	2.052.934	328.500	0	0	0	0	EPS041	2.052.934	82.200	14-11	2.052.934	5	142.900	CCF30	2.052.934	82.200	0	0	0	0	0
14	CC	84007762	RODRIGUEZ OJEDA ROGER RAFAEL	1	0			S								X								230301	5.386.348	861.900	0	0	0	0	EPS037	5.386.348	215.500	14-11	5.386.348	5	374.900	CCF30	5.386.348	215.500	0	0	0	0	0
15	CC	84080207	CEBALLOS MARTINEZ ELDER ENRIQUE	1	0			S								X								25-14	1.772.876	283.700	0	0	0	0	EPS002	1.772.876	71.000	14-11	1.772.876	5	123.400	CCF30	1.772.876	71.000	0	0	0	0	0
16	CC	8643449	ESCORCIA RODRIGUEZ SAMIR ANTONIO	1	0			S								X								230201	3.065.217	490.500	0	0	0	0	ESSC24	3.065.217	122.700	14-11	3.065.217	5	213.400	CCF30	3.065.217	122.700	0	0	0	0	0
17	CC	91287950	BARRERA HERNANDO HERNANDEZ	1	0			S																230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	MIN001	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF30	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
18	CC	92190949	PEREZ ROSALES JUAN CARLOS	1	0			S							X									230301	5.040.000	806.400	0	0	0	0	EPS002	5.040.000	201.600	14-11	5.040.000	5	350.800	CCF30	5.040.000	201.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

12.2 INTERVENTORÍA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800097991	2	INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S A INCOPLAN S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CALLE 70 BIS NO 4 -60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3215958	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1394485422	9484368157	E	2025/04/23	2025/04/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$37,647,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (26 Afiliados)																							**$69,788,197**	**$11,359,100**			**$93,038,697**	**$3,964,200**			**$91,095,975**	**$3,644,300**			**$91,615,197**		**$4,138,200**		**$0**	**$0**		**$23,105,800**
Centro de Trabajo: 0,522 (10 Afiliados)																							**$10,944,030**	**$1,751,100**			**$29,644,530**	**$1,428,100**			**$26,797,530**	**$1,072,100**			**$28,221,030**		**$147,800**		**$0**	**$0**		**$4,399,100**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																							**$10,944,030**	**$1,751,100**			**$29,644,530**	**$1,428,100**			**$26,797,530**	**$1,072,100**			**$28,221,030**		**$147,800**		**$0**	**$0**		**$4,399,100**
1	CC	1015412709	ARIAS ERIKA							X												0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$121,500
2	CC	19332574	BALAGUERA JAIME																			0	$0	$0	EPS008	30	$13,000,000	$520,000	CCF24	30	$13,000,000	$520,000	14-7	30	$13,000,000	0.522%	$67,900	30	$0	$0	Si	$1,107,900
3	CC	93377383	BALLESTEROS EDGAR																			0	$0	$0	EPS017	30	$1,430,000	$57,200	CCF24	30	$1,430,000	$57,200	14-7	30	$1,430,000	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$121,900
4	CC	1032250943	GUTIERREZ YIRA																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
5	CC	1013650711	MONTES DANIELA							X											23030 1	30	$3,710,000	$593,600	EPS037	30	$3,710,000	$148,400	CCF24	30	$3,710,000	$148,400	14-7	30	$3,710,000	0.522%	$19,400	30	$0	$0	Si	$909,800
6	CC	1010009480	OSORIO MARIA							X		X									23020 1	30	$2,310,530	$369,700	EPS002	30	$2,310,530	$92,500	CCF24	30	$2,310,530	$92,500	14-7	30	$2,310,530	0.522%	$12,100	30	$0	$0	Si	$566,800
7	CC	1000719802	PAEZ JUAN									X									23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
8	CC	51595755	PARDO MARIA																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
9	CC	1021669303	POVEDA SANDRA																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
10	CC	1030655137	SAAVEDRA JEIMY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																							**$1,430,000**	**$228,800**			**$1,430,000**	**$57,200**			**$1,430,000**	**$57,200**			**$1,430,000**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$350,700**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							**$1,430,000**	**$228,800**			**$1,430,000**	**$57,200**			**$1,430,000**	**$57,200**			**$1,430,000**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$350,700**
11	CC	80735117	CASTILLO JOSE																		25-14	30	$1,430,000	$228,800	EPS017	30	$1,430,000	$57,200	CCF24	30	$1,430,000	$57,200	14-7	30	$1,430,000	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$350,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																							**$5,130,400**	**$820,900**			**$5,130,400**	**$205,300**			**$5,130,400**	**$205,300**			**$5,130,400**		**$26,800**		**$0**	**$0**		**$1,258,300**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							**$5,130,400**	**$820,900**			**$5,130,400**	**$205,300**			**$5,130,400**	**$205,300**			**$5,130,400**		**$26,800**		**$0**	**$0**		**$1,258,300**
12	CC	1018418498	URREGO KATHERINE							X											25-14	30	$5,130,400	$820,900	EPS017	30	$5,130,400	$205,300	CCF24	30	$5,130,400	$205,300	14-7	30	$5,130,400	0.522%	$26,800	30	$0	$0	Si	$1,258,300
Centro de Trabajo: PUERTOS (1 Afiliados)																							**$3,000,000**	**$480,000**			**$3,000,000**	**$120,000**			**$3,000,000**	**$120,000**			**$3,000,000**		**$208,800**		**$0**	**$0**		**$928,800**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							**$3,000,000**	**$480,000**			**$3,000,000**	**$120,000**			**$3,000,000**	**$120,000**			**$3,000,000**		**$208,800**		**$0**	**$0**		**$928,800**
13	CC	76313591	CERTUCHE CARLOS																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (13 Afiliados)																							**$49,283,767**	**$8,078,300**			**$53,833,767**	**$2,153,600**			**$54,738,045**	**$2,189,700**			**$53,833,767**		**$3,747,300**		**$0**	**$0**		**$16,168,900**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)																							**$49,283,767**	**$8,078,300**			**$53,833,767**	**$2,153,600**			**$54,738,045**	**$2,189,700**			**$53,833,767**		**$3,747,300**		**$0**	**$0**		**$16,168,900**
14	CC	19126685	ACOSTA HUGO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$435,900
15	CC	79798412	AGUIRRE JORGE																		23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF24	30	$3,200,000	$128,000	14-7	30	$3,200,000	6.960%	$222,800	30	$0	$0	Si	$990,800
16	CC	10022629	ARIAS JORGE							X											23030 1	30	$5,600,000	$896,000	EPS005	30	$5,600,000	$224,000	CCF24	30	$5,600,000	$224,000	14-7	30	$5,600,000	6.960%	$389,800	30	$0	$0	Si	$1,733,800
17	CC	84027461	CAMPO DANILO							X												0	$0	$0	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$269,300
18	CC	6009724	CASTILLA JUAN							X											23030 1	30	$4,664,000	$746,300	EPS008	30	$4,664,000	$186,600	CCF24	30	$4,664,000	$186,600	14-7	30	$4,664,000	6.960%	$324,700	30	$0	$0	Si	$1,444,200
19	CC	1020827796	CIFUENTES DANIEL	X																X	23030 1	20	$2,666,667	$426,700	EPS010	20	$2,666,667	$106,700	CCF24	20	$3,694,445	$147,800	14-7	20	$2,666,667	6.960%	$185,700	20	$0	$0	Si	$866,900
20	CC	1099365171	FLOREZ DEYBER																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
21	CC	1032423475	GARCIA IRMA							X											25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF24	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,548,000
22	CC	10246846	GONZALEZ NESTOR																		25-14	30	$4,500,000	$720,000	EPS017	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-7	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
23	CC	79923449	JAIMES JOSE							X											25-14	30	$6,296,400	$1,070,500	EPS005	30	$6,296,400	$251,900	CCF24	30	$6,296,400	$251,900	14-7	30	$6,296,400	6.960%	$438,300	30	$0	$0	Si	$2,012,600
24	CC	79042028	TORRES CARLOS																			0	$0	$0	EPS017	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-7	30	$2,750,000	6.960%	$191,400	30	$0	$0	Si	$411,400
25	CC	19365483	VILLAMIL FABIO							X											23030 1	30	$5,830,000	$991,200	EPS010	30	$5,830,000	$233,200	CCF24	30	$5,830,000	$233,200	14-7	30	$5,830,000	6.960%	$405,800	30	$0	$0	Si	$1,863,400
26	CC	91105056	VILLARREAL ASCANIO																		25-14	30	$7,103,200	$1,207,800	EPS037	30	$7,103,200	$284,200	CCF24	30	$7,103,200	$284,200	14-7	30	$7,103,200	6.960%	$494,400	30	$0	$0	Si	$2,270,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BUENAVENTURA (2 Afiliados)																						$4,800,000	$768,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000		$995,300		$0	$0		$2,907,300
Centro de Trabajo: BUENAVENTURA (2 Afiliados)																						$4,800,000	$768,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000		$995,300		$0	$0		$2,907,300
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (2 Afiliados)																						$4,800,000	$768,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000		$995,300		$0	$0		$2,907,300
27	CC	19258637	MARTINEZ ENRIQUE																		0	$0	$0	EPS005	30	$9,500,000	$380,000	CCF56	30	$9,500,000	$380,000	14-7	30	$9,500,000	6.960%	$661,200	30	$0	$0	Si	$1,421,200
28	CC	94442559	PRECIADO ALEJANDRO																		231001	30	$4,800,000	$768,000	EPS018	30	$4,800,000	$192,000	CCF56	30	$4,800,000	$192,000	14-7	30	$4,800,000	6.960%	$334,100	30	$0	$0	Si	$1,486,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GUATICA RISARALDA COMFAMILIAR (1 Afiliados)																						$5,600,000	$896,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000		$389,800		$0	$0		$1,733,800
Centro de Trabajo: GUATICA RISARALDA (1 Afiliados)																						$5,600,000	$896,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000		$389,800		$0	$0		$1,733,800
Ciudad: GUATICA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)																						$5,600,000	$896,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000		$389,800		$0	$0		$1,733,800
29	CC	1088342910	HOYOS VALENTINA																		25-14	30	$5,600,000	$896,000	EPS018	30	$5,600,000	$224,000	CCF44	30	$5,600,000	$224,000	14-7	30	$5,600,000	6.960%	$389,800	30	$0	$0	Si	$1,733,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CATATUMBO (1 Afiliados)																						$4,591,920	$734,800			$4,591,920	$183,700			$4,591,920	$183,700			$4,591,920		$319,600		$0	$0		$1,421,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																						$4,591,920	$734,800			$4,591,920	$183,700			$4,591,920	$183,700			$4,591,920		$319,600		$0	$0		$1,421,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$4,591,920	$734,800			$4,591,920	$183,700			$4,591,920	$183,700			$4,591,920		$319,600		$0	$0		$1,421,800
30	CC	52256699	GOMEZ MARIA							X											230201	30	$4,591,920	$734,800	EPS005	30	$4,591,920	$183,700	CCF24	30	$4,591,920	$183,700	14-7	30	$4,591,920	6.960%	$319,600	30	$0	$0	Si	$1,421,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SALENTO (2 Afiliados)																						$9,000,000	$1,500,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000		$626,400		$0	$0		$2,846,400
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)																						$9,000,000	$1,500,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000		$626,400		$0	$0		$2,846,400
Ciudad: SALENTO Depto: QUINDIO (2 Afiliados)																						$9,000,000	$1,500,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000		$626,400		$0	$0		$2,846,400
31	CC	7552331	PENAGOS JOSE																		25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF43	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	6.960%	$417,600	30	$0	$0	Si	$1,917,600
32	CC	1089719902	TANGARIFE WALTER																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF43	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONFANARIÑO (1 Afiliados)																						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000		$153,200		$0	$0		$681,200
Centro de Trabajo: COMFANARIÑO (1 Afiliados)																						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000		$153,200		$0	$0		$681,200
Ciudad: NARIÑO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)																						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000		$153,200		$0	$0		$681,200
33	CC	1086753932	YEPES ANYI																		230301	30	$2,200,000	$352,000	ESSC18	30	$2,200,000	$88,000	CCF35	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	Si	$681,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VIAS RURALES (1 Afiliados)																						$4,070,000	$651,200			$4,070,000	$162,800			$4,070,000	$162,800			$4,070,000		$283,300		$0	$0		$1,260,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																						$4,070,000	$651,200			$4,070,000	$162,800			$4,070,000	$162,800			$4,070,000		$283,300		$0	$0		$1,260,100
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$4,070,000	$651,200			$4,070,000	$162,800			$4,070,000	$162,800			$4,070,000		$283,300		$0	$0		$1,260,100
34	CC	1094891333	PARRA JOSE																		25-14	30	$4,070,000	$651,200	EPS010	30	$4,070,000	$162,800	CCF11	30	$4,070,000	$162,800	14-7	30	$4,070,000	6.960%	$283,300	30	$0	$0	Si	$1,260,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

aportes en línea

Planilla Resumen

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TIP (2 Afiliados)																						$11,713,000	$1,938,300			$11,713,000	$468,600			$11,713,000	$468,600			$11,713,000		$815,300		$0	$0		$3,690,800
Centro de Trabajo: TIP (2 Afiliados)																						$11,713,000	$1,938,300			$11,713,000	$468,600			$11,713,000	$468,600			$11,713,000		$815,300		$0	$0		$3,690,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$11,713,000	$1,938,300			$11,713,000	$468,600			$11,713,000	$468,600			$11,713,000		$815,300		$0	$0		$3,690,800
35	CC	79339188	PAEZ SANTIAGO						X											230201	30	$5,300,000	$848,000	EPS005	30	$5,300,000	$212,000	CCF24	30	$5,300,000	$212,000	14-7	30	$5,300,000	6.960%	$368,900	30	$0	$0	Si	$1,640,900
36	CC	1018450051	VILLAMIL ANDRES						X											230901	30	$6,413,000	$1,090,300	EPS008	30	$6,413,000	$256,600	CCF24	30	$6,413,000	$256,600	14-7	30	$6,413,000	6.960%	$446,400	30	$0	$0	Si	$2,049,900
Total		**Afiliados(36)**																				$111,763,117	$18,199,400			$144,513,617	$6,023,300			$142,570,895	$5,703,400			$143,090,117		$7,721,100		$0	$0		$37,647,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800097991	2	INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S A INCOPLAN S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CALLE 70 BIS NO 4 -60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3215958	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1394485422	9484368157	E	2025/04/23	2025/04/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$37,647,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				28	$18,199,400	$0	$0	$18,199,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$768,000	$0	$0	$768,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$8,350,800	$0	$0	$8,350,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$5,477,800	$0	$0	$5,477,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,512,500	$0	$0	$2,512,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,090,300	$0	$0	$1,090,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$7,721,100	$0	$0	$7,721,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	35	$7,721,100	$0	$0	$7,721,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				34	$5,703,400	$0	$0	$5,703,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$88,000	$0	$0	$88,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$224,000	$0	$0	$224,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	2	$360,000	$0	$0	$360,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	$572,000	$0	$0	$572,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	27	$4,296,600	$0	$0	$4,296,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$162,800	$0	$0	$162,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				36	$6,023,300	$0	$0	$6,023,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$1,198,200	$0	$0	$1,198,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$88,000	$0	$0	$88,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$622,700	$0	$0	$622,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$609,700	$0	$0	$609,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$689,600	$0	$0	$689,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$416,000	$0	$0	$416,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$407,500	$0	$0	$407,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$1,991,600	$0	$0	$1,991,600
TOTAL				**36**	**$37,647,200**	**$0**	**$0**	**$37,647,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800097991	2	INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S A INCOPLAN S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CALLE 70 BIS NO 4 -60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3215958	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1317188160	9482863485	E	2025/03/21	2025/03/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$37,754,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMPENSAR (27 Afiliados)						$73,579,967	$11,903,800			$92,656,967	$3,948,800			$90,028,384	$3,601,500			$91,233,467	$4,048,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 0,522 (10 Afiliados)						$10,311,067	$1,649,900			$29,388,067	$1,417,800			$26,446,167	$1,058,000			$27,964,567	$145,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)						$10,311,067	$1,649,900			$29,388,067	$1,417,800			$26,446,167	$1,058,000			$27,964,567	$145,900		$0	$0
1	CC	1015412709	ARIAS ERIKA		0	$0	$0	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
2	CC	19332574	BALAGUERA JAIME		0	$0	$0	EPS008	30	$13,000,000	$520,000	CCF24	30	$13,000,000	$520,000	14-7	30	$13,000,000	$67,900	30	$0	$0
3	CC	93377383	BALLESTEROS EDGAR		0	$0	$0	EPS017	30	$1,430,000	$57,200	CCF24	30	$1,430,000	$57,200	14-7	30	$1,430,000	$7,500	30	$0	$0
4	CC	1032250943	GUTIERREZ YIRA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
5	CC	1013650711	MONTES DANIELA	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
6	CC	1010009480	OSORIO MARIA	230201	30	$1,958,000	$313,300	EPS002	30	$1,958,000	$78,400	CCF24	30	$1,958,000	$78,400	14-7	30	$1,958,000	$10,300	30	$0	$0
7	CC	1000719802	PAEZ JUAN	230201	28	$1,334,667	$213,600	EPS005	28	$1,334,667	$53,400	CCF24	28	$1,334,667	$53,400	14-7	28	$1,334,667	$7,000	28	$0	$0
8	CC	1000719802	PAEZ JUAN	230201	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF24	0	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	0	$0	$0
9	CC	51595755	PARDO MARIA	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
10	CC	1021669303	POVEDA SANDRA		0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
11	CC	1030655137	SAAVEDRA JEIMY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)						$1,428,700	$228,700			$1,428,700	$57,200			$1,286,350	$51,500			$1,428,700	$6,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,428,700	$228,700			$1,428,700	$57,200			$1,286,350	$51,500			$1,428,700	$6,000		$0	$0
12	CC	80735117	CASTILLO JOSE	25-14	6	$284,700	$45,600	EPS017	6	$284,700	$11,400	CCF24	3	$142,350	$5,700	14-7	6	$284,700	$0	3	$0	$0
13	CC	80735117	CASTILLO JOSE	25-14	24	$1,144,000	$183,100	EPS017	24	$1,144,000	$45,800	CCF24	24	$1,144,000	$45,800	14-7	24	$1,144,000	$6,000	24	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)						$6,340,000	$1,014,400			$6,340,000	$253,600			$6,919,167	$276,800			$6,340,000	$33,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$6,340,000	$1,014,400			$6,340,000	$253,600			$6,919,167	$276,800			$6,340,000	$33,200		$0	$0
14	CC	1000224667	DAZA GERMAN	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$2,079,167	$83,200	14-7	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
15	CC	1018418498	URREGO KATHERINE	25-14	30	$4,840,000	$774,400	EPS017	30	$4,840,000	$193,600	CCF24	30	$4,840,000	$193,600	14-7	30	$4,840,000	$25,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PUERTOS (1 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0
16	CC	76313591	CERTUCHE CARLOS	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS018	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (13 Afiliados)						$52,500,200	$8,530,800			$52,500,200	$2,100,200			$52,376,700	$2,095,200			$52,500,200	$3,654,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)						$52,500,200	$8,530,800			$52,500,200	$2,100,200			$52,376,700	$2,095,200			$52,500,200	$3,654,400		$0	$0
17	CC	19126685	ACOSTA HUGO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
18	CC	79798412	AGUIRRE JORGE	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF24	30	$3,200,000	$128,000	14-7	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0
19	CC	10022629	ARIAS JORGE	230301	30	$4,730,000	$756,800	EPS005	30	$4,730,000	$189,200	CCF24	30	$4,730,000	$189,200	14-7	30	$4,730,000	$329,300	30	$0	$0
20	CC	84027461	CAMPO DANILO	230301	30	$1,498,500	$239,800	EPS005	30	$1,498,500	$60,000	CCF24	30	$1,498,500	$60,000	14-7	30	$1,498,500	$104,300	30	$0	$0
21	CC	6009724	CASTILLA JUAN	230301	30	$4,400,000	$704,000	EPS008	30	$4,400,000	$176,000	CCF24	30	$4,400,000	$176,000	14-7	30	$4,400,000	$306,300	30	$0	$0
22	CC	1020827796	CIFUENTES DANIEL	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
23	CC	1099365171	FLOREZ DEYBER	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
24	CC	1032423475	GARCIA IRMA	25-14	30	$4,455,000	$712,800	EPS037	30	$4,455,000	$178,200	CCF24	30	$4,455,000	$178,200	14-7	30	$4,455,000	$310,100	30	$0	$0
25	CC	10246846	GONZALEZ NESTOR	25-14	30	$4,500,000	$720,000	EPS017	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-7	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
26	CC	79923449	JAIMES JOSE	25-14	30	$5,940,000	$1,009,800	EPS005	30	$5,940,000	$237,600	CCF24	30	$5,940,000	$237,600	14-7	30	$5,940,000	$413,500	30	$0	$0
27	CC	79042028	TORRES CARLOS	25-14	30	$2,750,000	$440,000	EPS017	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-7	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0
28	CC	19365483	VILLAMIL FABIO	230301	30	$5,500,000	$880,000	EPS010	30	$5,500,000	$220,000	CCF24	30	$5,500,000	$220,000	14-7	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0
29	CC	91105056	VILLARREAL OSCAR	25-14	30	$7,103,200	$1,207,800	EPS037	30	$7,103,200	$284,200	CCF24	30	$7,103,200	$284,200	14-7	30	$7,103,200	$494,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BUENAVENTURA (2 Afiliados)						$4,800,000	$768,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$995,300		$0	$0
Centro de Trabajo: BUENAVENTURA (2 Afiliados)						$4,800,000	$768,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$995,300		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (2 Afiliados)						$4,800,000	$768,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$995,300		$0	$0
30	CC	19258637	MARTINEZ ENRIQUE		0	$0	$0	EPS005	30	$9,500,000	$380,000	CCF56	30	$9,500,000	$380,000	14-7	30	$9,500,000	$661,200	30	$0	$0
31	CC	94442559	PRECIADO ALEJANDRO	231001	30	$4,800,000	$768,000	EPS018	30	$4,800,000	$192,000	CCF56	30	$4,800,000	$192,000	14-7	30	$4,800,000	$334,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GUATICA RISARALDA COMFAMILIAR (1 Afiliados)						$5,600,000	$896,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000	$389,800		$0	$0
Centro de Trabajo: GUATICA RISARALDA (1 Afiliados)						$5,600,000	$896,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000	$389,800		$0	$0
Ciudad: GUATICA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)						$5,600,000	$896,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000	$389,800		$0	$0
32	CC	1088342910	HOYOS VALENTINA	25-14	30	$5,600,000	$896,000	EPS018	30	$5,600,000	$224,000	CCF44	30	$5,600,000	$224,000	14-7	30	$5,600,000	$389,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CATATUMBO (1 Afiliados)						$4,332,000	$693,200			$4,332,000	$173,300			$4,332,000	$173,300			$4,332,000	$301,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						$4,332,000	$693,200			$4,332,000	$173,300			$4,332,000	$173,300			$4,332,000	$301,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$4,332,000	$693,200			$4,332,000	$173,300			$4,332,000	$173,300			$4,332,000	$301,600		$0	$0
33	CC	52256699	GOMEZ MARIA	230201	30	$4,332,000	$693,200	EPS005	30	$4,332,000	$173,300	CCF24	30	$4,332,000	$173,300	14-7	30	$4,332,000	$301,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SALENTO (2 Afiliados)						$9,000,000	$1,500,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$626,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)						$9,000,000	$1,500,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$626,400		$0	$0
Ciudad: SALENTO Depto: QUINDIO (2 Afiliados)						$9,000,000	$1,500,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$626,400		$0	$0
34	CC	7552331	PENAGOS JOSE	25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF43	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
35	CC	1089719902	TANGARIFE WALTER	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF43	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONFANARIÑO (1 Afiliados)						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000	$153,200		$0	$0
Centro de Trabajo: COMFANARIÑO (1 Afiliados)						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000	$153,200		$0	$0
Ciudad: NARIÑO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000	$153,200		$0	$0
36	CC	1086753932	YEPES ANYI	230301	30	$2,200,000	$352,000	ESSC18	30	$2,200,000	$88,000	CCF35	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: VIAS RURALES (1 Afiliados)						$4,070,000	$651,200			$4,070,000	$162,800			$4,070,000	$162,800			$4,070,000	$283,300		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						$4,070,000	$651,200			$4,070,000	$162,800			$4,070,000	$162,800			$4,070,000	$283,300		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$4,070,000	$651,200			$4,070,000	$162,800			$4,070,000	$162,800			$4,070,000	$283,300		$0	$0
37	CC	1094891333	PARRA JOSE	25-14	30	$4,070,000	$651,200	EPS010	30	$4,070,000	$162,800	CCF11	30	$4,070,000	$162,800	14-7	30	$4,070,000	$283,300	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TIP (2 Afiliados)						$11,050,000	$1,828,600			$11,050,000	$442,000			$11,050,000	$442,000			$11,050,000	$769,100		$0	$0
Centro de Trabajo: TIP (2 Afiliados)						$11,050,000	$1,828,600			$11,050,000	$442,000			$11,050,000	$442,000			$11,050,000	$769,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$11,050,000	$1,828,600			$11,050,000	$442,000			$11,050,000	$442,000			$11,050,000	$769,100		$0	$0
38	CC	79339188	PAEZ SANTIAGO	230201	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF24	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
39	CC	1018450051	VILLAMIL ANDRES	230901	30	$6,050,000	$1,028,600	EPS008	30	$6,050,000	$242,000	CCF24	30	$6,050,000	$242,000	14-7	30	$6,050,000	$421,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(37)**					$114,631,967	$18,592,800			$143,208,967	$5,970,900			$140,580,384	$5,623,600			$141,785,467	$7,567,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800097991	2	INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S A INCOPLAN S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CALLE 70 BIS NO 4 -60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3215958	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1317188160	9482863485	E	2025/03/21	2025/03/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$37,754,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				31	$18,592,800	$0	$0	$18,592,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$768,000	$0	$0	$768,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$8,836,300	$0	$0	$8,836,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$5,604,600	$0	$0	$5,604,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,355,300	$0	$0	$2,355,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,028,600	$0	$0	$1,028,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$7,567,000	$0	$0	$7,567,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	36	$7,567,000	$0	$0	$7,567,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				35	$5,623,600	$0	$0	$5,623,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$88,000	$0	$0	$88,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$224,000	$0	$0	$224,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	2	$360,000	$0	$0	$360,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	$572,000	$0	$0	$572,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	28	$4,216,800	$0	$0	$4,216,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$162,800	$0	$0	$162,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				37	$5,970,900	$0	$0	$5,970,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$88,000	$0	$0	$88,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$662,800	$0	$0	$662,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$598,000	$0	$0	$598,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$837,400	$0	$0	$837,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$536,000	$0	$0	$536,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$215,400	$0	$0	$215,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$1,785,300	$0	$0	$1,785,300
TOTAL				**37**	**$37,754,300**	**$0**	**$0**	**$37,754,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900730165	3	INCOPLAN PROYECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 70 A 4 60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3174250	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1394514555	9484369500	E	2025/04/15	2025/04/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$38,606,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (39 Afiliados)																							$112,661,918	$18,310,200			$115,508,918	$4,863,300			$111,899,391	$4,476,700			$112,661,918		$4,120,000		$0	$0		$31,770,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)																							$1,700,000	$272,000			$4,547,000	$424,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000		$8,900		$0	$0		$772,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$1,700,000	$272,000			$4,547,000	$424,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000		$8,900		$0	$0		$772,900
1	CC	1007105500	ARDILA EVELIN							X											23030 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS008	30	$1,700,000	$68,000	CCF24	30	$1,700,000	$68,000	14-7	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	Si	$416,900
2	CC	1007443731	HURTADO CAROL																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
3	CC	1000352047	MARTINEZ NATALIA																			0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (5 Afiliados)																							$12,114,000	$1,938,300			$12,114,000	$484,600			$13,238,483	$529,600			$12,114,000		$63,500		$0	$0		$3,016,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$12,114,000	$1,938,300			$12,114,000	$484,600			$13,238,483	$529,600			$12,114,000		$63,500		$0	$0		$3,016,000
4	CC	1002408322	BARON EDUAR							X											25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
5	CC	1023981273	FINO JENNYFER							X											23030 1	30	$1,590,000	$254,400	EPS008	30	$1,590,000	$63,600	CCF24	30	$1,590,000	$63,600	14-7	30	$1,590,000	0.522%	$8,300	30	$0	$0	Si	$389,900
6	CC	1026300152	LEON DANIEL							X											23030 1	30	$3,710,000	$593,600	EPS037	30	$3,710,000	$148,400	CCF24	30	$3,710,000	$148,400	14-7	30	$3,710,000	0.522%	$19,400	30	$0	$0	Si	$909,800
7	CC	52546300	PANADERO AZENETH							X											23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS017	30	$3,200,000	$128,000	CCF24	30	$3,200,000	$128,000	14-7	30	$3,200,000	0.522%	$16,800	30	$0	$0	Si	$784,800
8	CC	1001300529	SERRANO CAMILA		X							X								X	25-14	30	$2,014,000	$322,300	EPS037	30	$2,014,000	$80,600	CCF24	30	$3,138,483	$125,600	14-7	30	$2,014,000	0.522%	$10,600	30	$0	$0	Si	$539,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (3 Afiliados)																							$7,900,000	$1,264,000			$7,900,000	$316,000			$8,020,000	$320,800			$7,900,000		$479,000		$0	$0		$2,379,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$7,900,000	$1,264,000			$7,900,000	$316,000			$8,020,000	$320,800			$7,900,000		$479,000		$0	$0		$2,379,800
9	CC	1002526428	FAJARDO LAURA							X											23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
10	CC	1014247733	GUARIN ANDREA							X											23030 1	30	$3,700,000	$592,000	EPS017	30	$3,700,000	$148,000	CCF24	30	$3,700,000	$148,000	14-7	30	$3,700,000	6.960%	$257,600	30	$0	$0	Si	$1,145,600
11	CC	3199862	MORENO SANTOS		X															X	23030 1	3	$180,000	$28,800	EPS017	3	$180,000	$7,200	CCF24	3	$300,000	$12,000	14-7	3	$180,000	6.960%	$12,600	3	$0	$0	Si	$60,600
12	CC	3199862	MORENO SANTOS													X					23030 1	17	$1,020,000	$163,200	EPS017	17	$1,020,000	$40,800	CCF24	17	$1,020,000	$40,800	14-7	17	$1,020,000	0.000%	$0	17	$0	$0	Si	$244,800

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900730165	3	INCOPLAN PROYECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 70 A 4 60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3174250	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1394514555	9484369500	E	2025/04/15	2025/04/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$38,606,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				45	$22,160,600	$0	$0	$22,160,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$920,000	$0	$0	$920,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$6,700,600	$0	$0	$6,700,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$11,387,000	$0	$0	$11,387,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,513,000	$0	$0	$2,513,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$640,000	$0	$0	$640,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$5,211,000	$0	$0	$5,211,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	45	$5,211,000	$0	$0	$5,211,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				45	$5,430,000	$0	$0	$5,430,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$88,000	$0	$0	$88,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	$525,300	$0	$0	$525,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	38	$4,816,700	$0	$0	$4,816,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				47	$5,804,700	$0	$0	$5,804,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$570,800	$0	$0	$570,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$70,000	$0	$0	$70,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$1,324,200	$0	$0	$1,324,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$488,200	$0	$0	$488,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$798,700	$0	$0	$798,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$545,000	$0	$0	$545,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$405,000	$0	$0	$405,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$1,473,800	$0	$0	$1,473,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**47**	**$38,606,300**	**$0**	**$0**	**$38,606,300**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900135636-9	PAVIMENTOS Y GEOTECNIA S.A.S.		Calle 47A No 27-75	3112445197	janeth@pavimentosygeotecnia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	03/03/2025	84488944	$11.387.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.824.200	0		0		0	0	0	0	2.824.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	65.000	0		0		0	0	0	0	65.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.068.500	0	0	106.800	106.800	0	0		4.282.100	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.732.100				1.732.100	0	0	1.732.100			17.321	1.732.100	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.074.200	0	0	1.074.200	4
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
427.100	0	0	427.100	1
ICBF				
640.600	0	0	640.600	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	2.946.200	2.946.200
Pensión	2	4.509.900	4.509.900
Riesgos Laborales	1	1.732.100	1.732.100
CCF	2	1.131.200	1.131.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	640.600	640.600
MEN	0	0	0
SENA	1	427.100	427.100
TOTALES	10	11.387.100	11.387.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900135636-9	PAVIMENTOS Y GEOTECNIA S.A.S.		Calle 47A No 27-75	3112445197	janeth@pavimentosygeotecnia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	03/03/2025	84488944	$11.387.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000944313	PARDO MIRANDA MANUELA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1030657611	PERILLA VARGAS PEDRO JOAQUIN	1	0			S																	25-14	1.878.610	300.600	0	0	0	0	EPS005	1.878.610	75.200	14-25	1.878.610	5	130.800	CCF22	1.878.610	75.200	0	0	0	0	0
3	CC	1030657611	PERILLA VARGAS PEDRO JOAQUIN	1	0			S												X					25-14	571.751	91.500	0	0	0	0	EPS005	571.751	22.900	14-25	571.751	5	0	CCF22	571.751	22.900	0	0	0	0	0
4	CC	17050189	CASALLAS PEREZ FRAY JESUS	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF32	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	17416594	MONTES BURITICA LUIS FRANCISCO	1	0			N							X										25-14	21.352.500	3.416.400	0	0	106.800	106.800	EPS005	21.352.500	2.669.100	14-25	21.352.500	5	1.486.200	CCF22	21.352.500	854.100	21.352.500	427.100	640.600	0	0
6	CC	52385705	CASALLAS GALINDO LUZ JANNETH	1	0			S																	25-14	1.625.000	260.000	0	0	0	0	EPS017	1.625.000	65.000	14-25	1.625.000	1	8.500	CCF22	1.625.000	65.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79515586		BEJARANO CABALLERO RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 131 C # 88B-24 CASA 67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3839179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1000001079	9484438918	I	2025/04/22	2025/04/08	BANCO DE BOGOTA	0	$773,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,665,166	$426,500			$2,665,166	$333,200			$0	$0			$2,665,166	$14,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,665,166	$426,500			$2,665,166	$333,200			$0	$0			$2,665,166	$14,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,665,166	$426,500			$2,665,166	$333,200			$0	$0			$2,665,166	$14,000		$0	$0
1	CC 79515586	BEJARANO RICARDO	25-14	30	$2,665,166	$426,500	EPS008	30	$2,665,166	$333,200		0	$0	$0	14-11	30	$2,665,166	$14,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,665,166	$426,500			$2,665,166	$333,200			$0	$0			$2,665,166	$14,000		$0	$0

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION U	C	S	D	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
NI	901831775-3	CONSORCIO AIR RIO	☑	☐	☐	☐		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
2025	4	2025	8526912

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
	PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☐	14-11	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
AK 19 120 71 OF 516	RIOHACHA	44001	LA GUAJIRA	44	6016560804		contabilidad.col@intecsa.eu	7112	8.300.000	4	2025/04/07	1393756558

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS037	900156264-2	172.000	0		0		0	172.000	0	0	0	172.000	0		0	0	172.000	2
EPS041	900156264-2	160.000	0		0		0	160.000	0	0	0	160.000	0		0	0	160.000	2

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230201	800229739-0	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF30	892115006-5	332.000	0	0	332.000	4

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-11	890903790-5	461.500		0	0	461.500
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	461.500		0	4.615	461.500

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	2
SALUD	2
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	6

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	928.000	928.000
SALUD	332.000	332.000
RIESGOS LABORALES	461.500	461.500
CCF	332.000	332.000
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	2.053.500	2.053.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																			VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
№	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1118871805	CORTES GOMEZ ANYI PAOLA	EPS041	230201	CCF30																			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0			320.000	0	0	80.000	0

PAGADO 19 de Feb

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																	VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
№	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
2	CC	1121043034	USTATE ACENSIO YAIR RAFAEL	EPS041	230301	CCF30																			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0			320.000	0	0	80.000	0

PAGADO
13 Feb 26

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																	VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
№	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
2	CC	1121043034	USTATE ACENSIO YAIR RAFAEL	EPS041	230301	CCF30																			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0			320.000	0	0	80.000	0
3	CC	40801620	RAMOS TORRES YERLIS ENENA	EPS037	230301	CCF30																			1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	0			278.400	0	0	69.600	0

PAGADO Pagado

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
2	CC	1121043034	USTATE ACENSIO YAIR RAFAEL	EPS041	230301	CCF30																			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0			320.000	0	0	80.000	0
3	CC	40801620	RAMOS TORRES YERLIS ENENA	EPS037	230301	CCF30																			1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	0			278.400	0	0	69.600	0
4	CC	40801620	RAMOS TORRES YERLIS ENENA	EPS037	230301	CCF30																			60.000	60.000	60.000	60.000	0			9.600	0	0	2.400	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
2	CC	1121043034	USTATE ACENSIO YAIR RAFAEL	EPS041	230301	CCF30																			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0			320.000	0	0	80.000	0
3	CC	40801620	RAMOS TORRES YERLIS ENENA	EPS037	230301	CCF30																			1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	0			278.400	0	0	69.600	0
4	CC	40801620	RAMOS TORRES YERLIS ENENA	EPS037	230301	CCF30																			60.000	60.000	60.000	60.000	0			9.600	0	0	2.400	0
5	CC	8350167	MARTINEZ VEGA OSWALDO	EPS037		CCF30																			2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	3			0	0	0	100.000	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901115174-6	INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S.	cl 93 b 19 35	6016560804	contabilidad.col@intecsa.eu	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	01/04/2025	85231809	$16.189.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	172.000	0		0		0	0	0	0	172.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.160.800	0		0		0	0	0	0	3.160.800	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPSIC4	ANAS WAYUU EPS	839000495-6	100.100	0		0		0	0	0	0	100.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.896.000	0	0	36.800	36.800	0	0		1.969.600	3
230301	Porvenir	800224808-8	400.100	0	0	0	0	0	0		400.100	1
231001	Colfondos	800227940-6	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.128.000	0	0	122.800	122.800	0	0		5.373.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.469.100				1.469.100	0	0	1.469.100			14.691	1.469.100	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.959.800	0	0	1.959.800	10

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901115174-6	INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S.		cl 93 b 19 35	6016560804	contabilidad.col@intecsa.eu
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	01/04/2025	85231809	$16.189.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
371.000	0	0	371.000	1
ICBF				
556.500	0	0	556.500	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	3.609.900	3.609.900
Pensión	4	8.223.300	8.223.300
Riesgos Laborales	1	1.469.100	1.469.100
CCF	1	1.959.800	1.959.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	556.500	556.500
MEN	0	0	0
SENA	1	371.000	371.000
TOTALES	13	16.189.600	16.189.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901115174-6	INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S.		cl 93 b 19 35	6016560804	contabilidad.col@intecsa.eu
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	01/04/2025	85231809	$16.189.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007652338	LOZANO MORENO CRISTIAN CAMILO	1	0			S	X																230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
2	CC	1007713688	VILLALOBOS ANGULO ENELIN YUSETH	1	0			S																	230301	833.334	133.400	0	0	0	0	EPSIC4	833.334	33.400	14-11	833.334	5	58.100	CCF24	833.334	33.400	0	0	0	0	0
3	CC	1007713688	VILLALOBOS ANGULO ENELIN YUSETH	1	0			S											X						230301	1.666.667	266.700	0	0	0	0	EPSIC4	1.666.667	66.700	14-11	1.666.667	5	0	CCF24	1.666.667	0	0	0	0	0	0
4	CC	1023921176	REYES BAUTISTA MAYERLI CATERINE	1	0			S																	25-14	4.300.000	688.000	0	0	0	0	EPS002	4.300.000	172.000	14-11	4.300.000	1	22.500	CCF24	4.300.000	172.000	0	0	0	0	0
5	CC	1118869235	POLO MARTINEZ MARIA JOSE	1	0			S	X																230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.166.667	86.700	0	0	0	0	0
6	CC	32790637	LEDESMA LEON LISBETH DEL CARMEN	1	0			N																	25-14	18.550.000	2.968.000	0	0	92.800	92.800	EPS005	18.550.000	2.318.800	14-11	18.550.000	1	96.900	CCF24	18.550.000	742.000	18.550.000	371.000	556.500	0	0
7	CC	52780245	AMAZO RAMIREZ INGRID CATHERINE	1	0			S																	230201	6.860.000	1.097.600	0	0	34.300	34.300	EPS005	6.860.000	274.400	14-11	6.860.000	5	477.500	CCF24	6.860.000	274.400	0	0	0	0	0
8	CC	52780245	AMAZO RAMIREZ INGRID CATHERINE	1	0			S													X				230201	490.000	78.400	0	0	2.500	2.500	EPS005	490.000	19.600	14-11	490.000	5	0	CCF24	490.000	19.600	0	0	0	0	0
9	CC	52828482	ROMERO BELTRAN MARISOL	1	0			S																	25-14	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	128.000	14-11	3.200.000	5	222.800	CCF24	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
10	CC	52856479	LEGUIZAMON MENDIVELSO MARTHA LUCIA	1	0			S																	231001	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
11	CC	80365599	SORIANO FRANCO JOSE AVELINO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS001	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	1	5.700	CCF24	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
12	CC	80365599	SORIANO FRANCO JOSE AVELINO	1	1			S											X							0	0	0	0	0	0	EPS001	332.150	13.300	14-11	332.150	1	0	CCF24	332.150	0	0	0	0	0	0
13	CC	85467718	BARROS CABRERA JUAN CARLOS	1	0			S																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS005	6.000.000	240.000	14-11	6.000.000	5	417.600	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

13 ANEXO NO. 2 CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y SALARIOS

13.1 CONTRATISTA

CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023
OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON identificado con C.C. No. 79.512.143 de Bogotá, en mi condición de representante legal del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA identificado con NIT.901.831.724-8, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición del presente certificado y cuando a ello hubiere lugar; en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, D.C., a los 05 días del mes de abril de 2025.

Atentamente,

YAMILL MONTENEGRO CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

13.2 INTERVENTORÍA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito, Santiago Páez Talero identificado con cedula de ciudadanía No. 79.339.188, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO AIR RIO** con **NIT 901.831.775-3**, certifico que el **CONSORCIO** ha cumplido y esta paz y salvo con las obligaciones laborales y los aportes parafiscales relativos a la Sistema de Seguridad Social Integral y Caja de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo expuesto en el artículo 23 de la ley 150 de 2007, de todos los colaboradores correspondientes del periodo del 1 al 31 de marzo de 2025.

Dada en Bogotá D.C. el 9 de abril de 2025.

Agradecemos de antemano su atención a la presente.

Atentamente,

SANTIAGO PÁEZ TALERO
Representante Legal
Consorcio AIR RIO

14 ANEXO NO. 3 CERTIFICADO DE MATERIALES

PAIM de Colombia S.A.S

Riohacha 07 de abril de 2025

Por medio de la presente **PAIM DE COLOMBIA S.A.S** identificada con **Nit 900814131-5**, certifica que suministró material entre el 1 y el 31 de Marzo de 2025 a la empresa CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA identificada con Nit: 901831724-8, provenientes de la cantera MINERA LA MILAGROSA S.A.S. con Nit: 900210102-9, para la ejecución de su proyecto de "Mejoramiento de las plataformas de viraje, franjas de seguridad, sistemas de drenaje, y mejoramiento y construcción de calles de rodaje del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF).

Material	**Volumen Total (M^3) suministrado**
Material de Relleno	7500

Dicho suministro está amparado bajo la licencia Ambiental expedida con la Resolución N° 0376 de 2017 por la cual se autoriza cesión de derechos y obligaciones de la Licencia Ambiental mediante Res. 0001926 de 2008. Expedida por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

El titulo Minero mediante RES. 1256/2016 se perfecciona una cesión de derechos dentro del contrato de concesión N° HJ6-08111 a la Empresa MINERA LA MILAGROSA S.A.S.

Registro minero (CRM) N° 202410301532-647122 Contrato de Concesión (L685) Sociedad Minera La Milagrosa.

CESAR DARIO BARROS
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO AREA COMERCIAL

15 ANEXO NO. 4 PG-HSEQ-19
PLAN DE TRABAJO ANUAL


CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOVACHA	PLAN DE TRABAJO ANUAL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PG-HSEQ-19	Versión 3
		Página 1 de 1	

Metas: Cumplir mínimo el 80 % de las actividades planificadas. Responsabilidades: Los trabajadores asignados en la columna responsable, deberán realizar las actividades asignadas en la columna Actividad.
Recursos: Celulares, transporte, computadores, papelería y logística necesaria para el desarrollo de las actividades y los asignados en el presupuesto del SG SST

Fecha de actualización: 30-jul-24

Item	Objetivo	Actividad	Responsable	Periodicidad	may-24					jun-24					jul-24					ago-24					sep-24					oct-24					nov-24					dic-24				
1		Línea base																																										
1.1	4	Evaluar y analizar estadísticas de enfermedad y accidentalidad de últimos 2 años, implementar planes de acción y línea base.	Coord SST	Anal	P																																						P
2		Documentación y Planificación																																									
2.1	4	Realizar auto evaluación inicial de SG-SST con el fin de identificar las prioridades en SST para establecer el plan de trabajo anual	Coord SST	Anual	P																																						P
2.2	3	Identificar normatividad vigente, actualizar Matriz de requisitos legales	Coord SST	Mensual	E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E
2.3	3	Evaluar el cumplimiento legal y establecer planes de acción requeridos	Coord SST	Trimestral	E			E						E						E						E						E						E						E
2.4	4	Diseñar y desarrollar plan de trabajo anual	Coord SST	Anual	E			E																																				
2.5	4	Asignar los recursos y hacer seguimiento al cumplimiento del presupuesto para el SG-SST	Director General /	Semestral	E																																							P
2.6	4	Realizar el programa de capacitación en SST, con el VIGIA SST y la alta dirección	Coord SST	Semestral	E																																							P
2.7	4	Desarrollo Programa de capacitaciones y charlas	Coord SST	Mensual	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
2.8	4	Realizar la Inducción de SST a los trabajadores, incluyendo contratistas (previo al inicio de labores)	Coord SST	Permanente	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
3		Motivación, comunicación, participación y compromiso																																										
3.1	4	Implementar los mecanismos de comunicación definidos en la matriz de comunicaciones, divulgar el SG SST	Coord SST	Permanente	E						E						E						E						E						E						E		
3.2	4	Comunicar Responsabilidades del SG-SST, por primera vez Luego será permanente al ingreso de un trabajador	Coord SST	Unica	E	E	E	E	E			E			E					E					E					E					E					E			
3.3	4	Divulgar requisitos legales vigentes	Coord SST	Mensual	E												E																											
3.4	4	Motivar la participación de los trabajadores, especialmente en el reporte de actos y condiciones inseguras y de salud	Alta Dirección	Trimestral	E						E												E						E														P
4		Identificación, evaluación y valoración de peligros y riesgos																																									
4.1	1	Identificar inicial y permanentemente peligros, evaluar los riesgos en SST ,priorizarlos y establecer las controles necesarios.	Coord SST	Mensual	P			P			P			P			P			P			P			P			P			P			P			P			P		
4.2	1	Actualizar matriz IPEVRDC, anual o por AT mortal, evento catastrófico, cambio en procesos, instalación, maquina o equipo	Coord SST	Mínimo Anual	P																																						P	
4.3	1	Realizar inspecciones de puesto de trabajo	Coord SST	Cuando se requiera	P						P																																	
4.4	1	Identificar, evaluar, valorar riesgos y determinar controles ante los cambios que se presentan, procedimiento gestión del cambio.	Coord SST	Permanente	P						P			P			P			P			P			P			P			P			P			P			P		
5		Gestión de peligros y riesgos																																									
5.1	2	Identificar e instalar señalización general de seguridad.	Coord SST	Permanente	E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E		
5.2	2	Realizar inventario de productos químicos, rotular envases. Documentar e implementar procedimiento manejo y almacenamiento	Coord SST	Mensual	E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E		
5.3	2	Revisión, actualización, divulgación e implementación de procedimientos seguros de trabajo	Coord SST	Permanente	E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E		
5.4	2	Realizar medición del Riesgo Psicosocial e implementar permanentemente recomendaciones derivadas de los resultados	Coord SST	Permanente	E																																							
5.5	2	Implementación recomendaciones inspección de puestos de trabajo	Coord SST	Permanente	E																																							
5.6	2	Actualizar las condiciones de SST con base en los autoreportes de SST	Coord SST	Mensual	E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E		
5.7	2	Seguimiento al programa de mantenimiento locativo, equipos, incluidas las recomendaciones de las inspecciones.	Coord SST	Semestral	E												E																											
5.8	2	Verificación soportes de entrega de elementos de protección personal	Coord SST	Cuatrimestral	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
5.9	2	Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, la afiliación al SGR laborales del personal contratistas	Coord SST	Semestral	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
5.10	2	Verificar durante el desarrollo del contrato, el cumplimiento de la normatividad SST de los contratistas. (Cuando aplique)	Coord SST	Semestral	E												E																											
6		Vigilancia de la salud																																								
6.1	2	Documentar, evaluar y analizar las estadísticas de enfermedad, accidentalidad y ausentismo.	Coord SST	Trimestral	E						E						E						E						E						E						E		
6.2	2	Actualizar la descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus condiciones de salud	Coord SST	Semestral	E												E																											
6.3	2	Realizar Examenes médico ocupacionales, preingreso, periodicos, retiro, post incapacidad, segun el profesiograma	Coord SST	Permanente	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
6.4	2	Hacer Seguimiento a recomendaciones médicas de trabajadores	Coord SST	Mensual	E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E		
6.5	2	Gestionar diagnóstico de condiciones de salud al personal se haya cumplido un año a través del resultado de las EMO Periódicos.	Coord SST IPS	Mínimo Anual	E																																							
6.6	2	Implementar y hacer seguimiento a las recomendaciones del Diagnóstico de Salud	Copasst	Trimestral	E						E						E						E						E						E						E		
6.7	2	Diseño de protocolos de vigilancia epidemiológica que apliquen a la entidad	Coord SST	Unica	E																																							
7		Respuesta a emergencias																																									
7.1	4	Definir e implementar actividades de promoción y prevención según vigilancia epidemiológica y de de condiciones de salud	Coord SST	Mensual	E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E		
7.2	4	Implementar campañas de orden y aseo	Jefes de Area	Mensual	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
7.3	4	Realizar actividades del día de la salud	Coord SST	Unica	E																																							
7.4	4	Implementar campañas prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas y salud pública.	Coord SST	Mensual	E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E		
7.5	4	Implementar programa de estilos de vida saludable	Coord SST	Trimestral	E			E						E						E						E						E						E						E
8		Programa de inspecciones																																									
8.1	2	Inspección gerencial	Jefes de Area	Semestral	E												E																											
8.2	2	Inspección de comportamiento	Jefes de Area	Trimestral	E						E						E						E						E						E						E		
8.3	2	Inspección equipos de emergencia y primeros auxilios, señalización.	Jefes de Area	Mensual	E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E		
8.4	2	Inspección orden y aseo	Jefes de Area	Bimensual	E			E						E						E						E						E						E					
8.5	2	Inspección de maquinas, equipos y herramientas.	Jefes de Area	Mensual	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
8.6	2	Inspección de equipos y elementos de protección personal	Jefes de Area	Mensual	E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E		
8.7	2	Inspección instalaciones locativas incluye redes eléctricas	Jefes de Area	Mensual	E									E						E						E						E						E					
8.8	2	Inspección uso y almacenamiento de sustancias químicas	Coord SST	Mensual	E						E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E		
8.9	2	Inspección de puestos de trabajo	Coord SST	Mensual	E						E						E						E						E						E						E		
8.10	2	Inspección de condiciones de seguridad	Copasst	Mensual	E						E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E		
9		Brigadistas																																									
9.1	4	Identificar amenazas, evaluar vulnerabilidad, implementar y mantener plan de emergencias	Coord SST	Anual	E																																						E
9.2	4	Conformar, capacitar y entrenar brigadas	Coord SST	Mensual	E																																							
9.3	4	Realizar simulacros con la participación de todos los trabajadores	Coord SST	Mínimo Anual	E												E																											
9.4	4	Divulgar y hacer seguimiento de los planes de acción derivados de los resultados de simulacros	Coord SST	Mínimo Anual	E																																							
9.5	4	Coordinar los planes de ayuda Mutua, en los cantons de trabajo	Coord SST	Mínimo Anual	E																																							
10		Verificar																																									
10.1	3	Verificar la implementación de los planes de acción derivados de la evaluación de cumplimiento legal	Coord SST	Semestral	E												E																											E
10.2	4	Verificar implementación y evaluar la efectividad de los controles de peligros, riesgos Matriz de IPEVRDC y emergencias	Coord SST	Anual	E																																						P	
10.3	4	Seguimiento Plan de Trabajo Anual en SST	Coord SST	Semestral	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
10.4	4	Revisar el cumplimiento del programa de capacitación SST	Coord SST	Anual	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
10.5	4	Revisar la rotación de personal y garantizar que todos los trabajadores tiene inducción de SST	Coord SST	Semestral	E												E																											E
10.6	4	Revisar la realización de las reuniones mensuales del COPASST	Copasst	Semestral	E												E																											P
10.7	4	Seguimiento a los resultados de evaluaciones de ambientes de trabajo	Copasst	Trimestral	E						E						E						E						E						E						E		
10.8	4	Seguimiento y cierre de reportes de actos y condiciones inseguras y a la recolección de inquietudes, ideas y aportes	Coord SST	Trimestral	E						E						E						E						E						E						E		
10.9	4	Seguimiento a la respuesta de la adecuada de las comunicaciones internas y externas relativas a SST	Coord SST	Trimestral	E						E						E						E						E						E						E		
####	4	Realizar seguimiento y cierre a la implementación de las acciones preventivas y correctivas y de mejora	Coord SST	Semestral	E												E																											E
####	4	Realizar revisión de cuentas	Coord SST	Mínimo Anual	E																																							P
####	4	Definir y hacer seguimiento de los indicadores del Sg SST	Coord SST	C / 6 meses	E												E																											E
####	4	Registro y seguimiento de resultados de indicadores del 3Gdel SST año inmediatamente anterior.	Coord SST	C / 6 meses	E												E																											E
####	4	Realizar la programación de la auditoria con la participación del Copasst.	Coord SST	Unica	E																																							P
####	4	Realizar auditoria interna al SG SST	Coord SST	Anual	E																																							
####	4	Revisar y evaluar periódicamente los objetivos del SG-SST y actualizados de ser necesario.	Coord SST	Anual	E																																							P
####	4	Realizar la revisión del SGSST de acuerdo con la normatividad, evaluar mejora respecto a linea base.	Alta Dirección	Anual	E																																							P
####	4	Cierre planes de acción de la revisión por la dirección	Director General	Anual	E																																							
####	4	Revisar y actualizar política acorde con los cambios en materia de SST	Coord SST	Mínimo Anual	E																																							
####	4	Investigar todos los accientes y enfermedades laborales	Coord SST	Permanente	E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E			E		
####	4	Seguimiento al cierre de los planes de acción de investigación de accidentes e incidentes	Copasst	Bimensual	E			E						E						E						E						E						E					
11		Actuar / Mejorar																																									
11.1	4	Actualizar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las oportunidades de mejora.	Coord SST	Trimestral	E						E						E						E						E						E						E		
11.2	4	Identificar y gestionar acciones correctivas y preventivas	Coord SST	Bimensual	E			E						E						E						E						E						E					
11.3	4	Identificar oportunidades de mejora de acuerdo al procedimiento, implamentar y hacer seguimiento.	Coord SST	Semestral	E												E																											

INDICADOR MENSUAL		may-24				jun-24				jul-24				ago-24				sep-24				oct-24				nov-24				dic-24			
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS		31	4	3	7	30	5	6	8	31	5	6	8	31	5	6	8	30	4	5	8	31	5	6	8	30	4	5	8	31	5	6	8
		3	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS		17				44				55				0				0				0				0				0			
PORCENTAJE		100%				99%				100%				0%				0%				0%				0%				0%			



Análisis de Indicadores	
Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

CONTROL DE APROBACIÓN			
Elaborado Por	ROGER RODRIGUEZ OJEDA	Firma:	
Revisado Por	VICTOR CASTRO	Firma:	
Aprobado Por (Representante legal)	TIBER GILDARDO CHAVARRO	Firma:	
Vo.Bo. Integrante COASST		Firma:	
Fecha de aprobación	30/01/2025		

16 ANEXO NO. 5 F-HSQE-26 OBJETIVOS Y METAS

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	MATRIZ DE OBJETIVOS , INDICADORES Y METAS DEL SG-SST - RG INGENIERÍA SAS	F-HSEQ-26	VERSIÓN: 03
		PÁGINA 1 DE 1	

PROCESO	OBJETIVO O RAZÓN DE SER DEL PROCESO	TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	PERIOCIDAD	RESPONSABLE	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANÁLISIS TENDENCIAL	ITEM	INTERPRETACION	FUENTE DE INFORMACION PARA EL CALCULO	QUIENES DEBEN CONOCER EL RESULTADO
SG-SST INDICADORES DE RESULTADO	Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles	Índice de Frecuencia (IF)	Medir la frecuencia con que se presentan accidentes laborales en un periodo de	(número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / número	Mensual	Lider SG SST	<=5	0%	0%	0%	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	No se han presentado accidentes de origen laboral	1	Este indicador mide la frecuencia de accidentes de trabajo que ocurren en el mes. Su interpretación es: Por cada cien (100)	Reportes de accidentalidad internos y de la ARL	Lider SG SST / Talento Humano, COPASST y Colaboradores
		Índice de Severidad (IS)	Medir la severidad de accidentalidad en un periodo de tiempo determinado.	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes) / (número de trabajadores en el	Mensual	Lider SG SST	<=15	0%	0%	0%	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	No se han presentado accidentes de origen laboral	2	Este indicador mide el número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes, lo que permite identificar los riesgos presentes en el lugar de trabajo. Su interpretación es: Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se	Reportes de accidentalidad internos y de la ARL	Lider SG SST / Talento Humano, COPASST y Colaboradores
		Ausentismo por Causa Medica	Este indicador mide la inasistencia a trabajar por motivo de incapacidad médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes /	Mensual	Lider SG SST / Talento Humano	<=5%	0%	0%	0%	NA	NA	NA	NA	0%	0%	0%	0%	0%	No se han registrado ausencias por enfermedad o accidentes de origen común	3	Este indicador mide el número de casos de ausentismo laboral presente en una población por motivo de incapacidad medica	Reportes de ausentismo por incapacidad medica y accidentalidad de la ARL	Lider SG SST / Talento Humano, COPASST y Colaboradores
		Proporcion de Accidentes de Trabajo Mortales en el Año.	Medir el número de accidentes mortales durante el año, con la finalidad que este indicador siempre sea 0.	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se	Semestral	Lider SG SST / Talento Humano	<=0%	0%	0%	0%	NA	NA	NA	NA	0%	0%	0%	0%	0%	No se han presentado mortales	4	Este indicador mide el número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año. Su interpretación es: En el año el X % de accidentes de trabajo fueron mortales.	Reportes de accidentalidad internos y de la ARL	Lider SG SST / Talento Humano, COPASST y Colaboradores
		Incidencia de la Enfermedad Laboral	Medir el número de casos de enfermedad laboral presentes en el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA en un periodo de tiempo	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z / Promedio de trabajadores en el periodo Z) * 100.000	Semestral	Lider SG SST	0	0%	0%	0%	NA	NA	NA	NA	0%	0%	0	0	0	No se han presentado enfermedades calificadas como de origen laboral	5	Este indicador mide el número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un período de tiempo. Su interpretación es: Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z.	Enfermedades Laborales Confirmadas-Soportes ARL	Lider SG SST / Talento Humano, COPASST y Colaboradores
		Prevalencia de la Enfermedad Laboral	Medir el número de casos de enfermedad laboral presentes en un periodo de tiempo.	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo Z / Promedio de trabajadores en el periodo Z) * 100.000	Semestral	Lider SG SST	0	0%	0%	0%	NA	NA	NA	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No se han presentado enfermedades calificadas como de origen laboral	6	Este indicador mide el número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo. Su interpretación es: Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z.	Enfermedades Laborales Confirmadas-Soportes ARL	Lider SG SST / Talento Humano, COPASST y Colaboradores
	Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el D.1072 de 2015, Capítulo VI Artículo 2.2.4.6.22	Cumplimiento del Normativo	Cumplimiento de los requisitos en el normogramal vigente en seguridad y salud en el trabajo	(# Requisitos Cumplidos / # Requisitos Totales)*100	Semestral	COPASST Responsable SST	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	Se da cumplimiento a los requisitos normativos	7	Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Normograma en SG SST	Matriz de Objetivos SST	Lider SG SST / Talento Humano, COPASST y Colaboradores
	Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el D.1072 de 2015, Capítulo VI Artículo 2.2.4.6.22	Evaluación de los hallazgos detectados en el seguimiento al plan anual de trabajo en SST	Seguimiento a la eficacia de los planes de acción establecidos para el cierre de los hallazgos	(# Hallazgos evaluados y cerradas oportunamente / # Hallazgos abiertos en SST) *100	Semestral	Responsable SST	90%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	No se han realizado hallazgos operacionales	8	Seguimiento a la eficacia de los planes de acción establecidos para el cierre de los Hallazgos	Formato de control de Acción correctiva, preventiva, de mejora y No Conformidades	Lider SG SST / Talento Humano, COPASST y Colaboradores
SG-SST INDICADORES DE ESTRUCTURA	Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el D.1072 de 2015, Capítulo VI Artículo 2.2.4.6.20	Indicador de estructura	Declaracion de la Politica Seguridad y Salud en el Trabajo	(# de personas socializada/ # total de colaboradores*100	Semestral	Responsable SST	70%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	Se realiza en la inducción al personal que ingresa	9	Indicadores que evalúan la estructura del SG-SST	Documentos del SG-SST Decreto 1072. Capitulo VI.	Lider SG SST / Talento Humano, COPASST y Colaboradores
			Objetivos de la Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo	(# de Objetivos que se cumplen / # Total de Objetivos Planteados)*100	Semestral	Responsable SST	80%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	Se cumplen las metas de los programas y no se han presentado accidentes ni casos calificados como enfermedad laboral	10	Indicadores que evalúan la estructura del SG-SST	Documentos del SG-SST Decreto 1072. Capitulo VI.	Lider SG SST / Talento Humano, COPASST y Colaboradores
			Establecer el Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo	(# de actividades ejecutadas o cerradas / # de actividades planeadas)	Semestral	Responsable SST	90%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	Se da cumplimiento alas actividades programadas	11	Indicadores que evalúan la estructura del SG-SST	Documentos del SG-SST Decreto 1072. Capitulo VI.	Lider SG SST / Talento Humano, COPASST y Colaboradores
			Plan de Trabajo Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo	(# actividades ejecutadas con el Copasst / # actividades planeadas)	Semestral	Responsable SST	90%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	Se ha conformado el COPASST, las actividades para realizar junto con el encargado SST seran programadas a partir del mes de enero	12	Indicadores que evalúan la estructura del SG-SST	Documentos del SG-SST Decreto 1072. Capitulo VI.	Lider SG SST / Talento Humano, COPASST y Colaboradores
			Establecer los Documentos Soporte del Sistema de Gestion en seguridad y Salud en el Trabajo	((# de Documentos Elaborados en Cumplimiento Res 0312 / # de Documentos Totales)*100	Semestral	Responsable SST	80%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	Se cuenta con la estructura documental del sistema	13	Indicadores que evalúan la estructura del SG-SST	Documentos del SG-SST Decreto 1072. Capitulo VI.	Lider SG SST / Talento Humano, COPASST y Colaboradores
SG-SST INDICADORES DE PROCESO	Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el D.1072 de 2015, Capítulo VI Artículo 2.2.4.6.21	Evaluación inicial	Hallazgos gestionados eficazmente de acuerdo a los resultados de la evaluación inicial	(# de Hallazgos gestionadas eficazmente / # de Hallazgos encontradas)*100	Semestral	COPASST Responsable SST	80%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	Se cumple con el plan de trabajo anual	14	Hallazgos gestionadas eficazmente de acuerdo a los resultados de la evaluación inicial	Resultados de la evaluación inicial	Lider SG SST / Talento Humano, COPASST y Colaboradores
	Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el D.1072 de 2015, Capítulo VI Artículo 2.2.4.6.21	Ejecución del plan de trabajo anual en SG-SST y su cronograma	Cumplimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo	(# de actividades ejecutadas / # de actividades planeadas)*100	Semestral	COPASST Responsable SST	80%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	Se cumple con el plan de trabajo anual	15	Cumplimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo	Plan anual de trabajo	Lider SG SST / Talento Humano, COPASST y Colaboradores
	Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el D.1072 de 2015, Capítulo VI Artículo 2.2.4.6.21	Ejecución del plan de capacitación en SG-SST	Cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Capacitaciónes en SST	(# de capacitaciones ejecutadas / # de capacitaciones planeadas)*100	Semestral	COPASST Responsable SST	80%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	Se da cumplimiento alas actividades programadas	16	Cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Capacitación	Plan anual de trabajo	Lider SG SST / Talento Humano, COPASST y Colaboradores
	Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el D.1072 de 2015, Capítulo VI Artículo 2.2.4.6.21	Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Incidentes, accidentes y enfermedades laborales reportadas e investigadas	(# de incidentes, accidentes y enfermedades investigados / # de incidentes, accidentes y enfermedades reportados)*100	Semestral	Responsable SG-SST	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	No se registran accidentes laborales a la fecha	17	Incidentes, accidentes y enfermedades laborales reportadas e investigadas	Certificado de accidentalidad de ARL. Registros de investigación de Accidentes y enfermedades, Informe de accidentalidad y enfermedad laboral. Reporte de actos y condiciones inseguras	Lider SG SST / Talento Humano, COPASST y Colaboradores
	Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el D.1072 de 2015,	Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias	Cumplimiento de las actividades establecidas para la prevención y atención	(# de actividades ejecutadas / # de actividades planeadas)*100	Semestral	Responsable SST	90%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	Se cuenta con plan de emergencias y se implementará en la fase de construcción	18	Cumplimiento de las actividades establecidas para la prevención y atención de emergencias	Plan anual de trabajo	Lider SG SST / Talento Humano, COPASST y Colaboradores

Elaborado Por	DUVAN MONTENEGRO	FIRMA	
Revisado 1or	VICTOR VASTRO	FIRMA	
Afrobado Por (Representante legal)	TIBER GILDARDO CHAVARRO	FIRMA	
Vo.Bo. Integrante CO1ASST		FIRMA	
Fecha de aprobación	30/11/2024		

17 ANEXO NO. 6 PG-HSEQ-13 PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y CHARLAS

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓNES Y CHARLAS	PG-HSEQ-13	Versiòn 1
		Página	de

Item	Tema: Charlas y Capacitaciones	Prog/Ejec	ene/25				feb/25				mar/25				abr/25				may/25				jun/25				jul/25				ago/25				sep/25				oct/25				nov/25				dic/25			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Inducción / reinduccion SST C.I.R y Clientes	Prog	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p
		Ejec	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e																																		
2	Seguridad en el puesto de trabajo	Prog	p	p	p	p																																										
		Ejec	e	e	e	e																			p																						
3	Tips ergonomicos en la oficina	Prog		p																									p																		
		Ejec		e																																										
4	Prevencion de lesiones en las manos	Prog	p	p	p	p																								p																		
		Ejec	e	e	e	e																																									
5	Seguridad en el uso de herramientas manuales	Prog				p							p																																		
		Ejec				e							e																																		
6	Permisos de trabajo e Inspecciones Preoperacionales	Prog	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p
		Ejec	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e																																		
7	Reconocer los peligros en las superficies de transito	Prog												p																																		
		Ejec												e																																		
8	Seguridad en el hogar	Prog													p																																	
		Ejec																																													
9	Uso de celulares	Prog			p											p																															
		Ejec			e																																										
10	Seguridad vial	Prog															p																															
		Ejec																																													
11	permiso de trabajo	Prog																	p																													
		Ejec																																													
12	Señalizacion y codigo de colores	Prog																			p																											
		Ejec																																													
13	Reporte de incidentes	Prog																					p																								
		Ejec																																													
14	Etiquetado, rotulado y almacenamiento sustancias químicas, hojas de seguridad	Prog																							p																							
		Ejec																																													
15	Analisis de trabajo seguro	Prog				p																					p																				
		Ejec				e																																									
16	Protección y conservación visual	Prog															p												p																		
		Ejec																																													
17	Manejo de reiduos	Prog																													p																
		Ejec																																													
18	Orden y Aseo	Prog	P																													p															
		Ejec	e																																												
19	Arruinando la felicidad	Prog																														p															
		Ejec																																													
20	Que es la prevencion	Prog																																													
		Ejec																													p																
21	Aprendiendo de los errores	Prog		p									p																																		
		Ejec		e									e																																		
22	Seguridad basada en el comportamiento	Prog																																														
		Ejec																																													
23	Evacuacion en caso de emergencia	Prog															p								p																							
		Ejec																																													
24	Uso de extintores	Prog																																	p							p					
		Ejec																																													
25	Regla de tolerancia No. 1 esta prihibido presentarse a trabajar bajo los efectos del alcohol o drogas	Prog																							p																							
		Ejec																																													
26	Regla de tolerancia No. 2 es obligatorio el uso de EPP	Prog																									p																				
		Ejec																																													
27	Regla de tolerancio No. 5 está prohibido operar equipos si no cuenta con la	Prog																													p																
		Ejec																																													
28	Prevencion del riesgo publico	Prog																																			p										
		Ejec												p																																		
29	Regla de tolerancia No. 6 se deben respetas los dispositivos de proteccion de seguridad seguridad estando prohibido	Prog																																									p				
		Ejec												e																																		
30	Regla de tolerancia No. 8 es obligatorio solicitar aprobacion ntes de ingresar a zonas de operación	Prog																																										p			
		Ejec																																													
31	Trabajo con riesgo de incendio y explosion																																													p			
32	Manipilacion de sustancias quimicas peligros y																																													p			

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓNES Y CHARLAS	PG-HSEQ-13	Versiòn 1

	controles																
33	Manipulacion de sustancias quimicas Rombo NFPA														p		
34	Agotamiuento por calor													p			
35	Manejo de materiales de construccion y centros de acopio												p				
36	Ataque de calor											p					
37	GTC 45										p						
38	Uso responsable de harramientas				p					p							
			e														
39	Cuidado de columna lumbar								p								
40	EPP			p				p									
			e														
41	Manejo de residuos flora y fauna						p										
42	Plan de manejo ambiental					p											
43	Aspectos e impactos ambientales				p												
44	Izaje y levantamineto de cargas riesgos y controles					p											
45	Operación de equipo movil: Manejo defensivo	Prog				p										p	
		Ejec															
46	Operación de equipo movil: Manejo defensivo	Prog														p	
		Ejec															
47	Operación de equipo movil: señales de transito	Prog					p										
		Ejec															
48	Operación de equipo mivil: señales de transito	Prog							p								
		Ejec															
49	Respuestas a emergencia- secuencia de comunicación	Prog												p			
		Ejec															
	Actividades programadas		22	8	14	13	11	13	14	20	13	11	12	12			
	Actividades ejecutadas		22	8	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Cumplimiento mensual		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	META								100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	COBERTURA								80%	80%	80%	80%	80%	80%			
	EFICACIA								80%	80%	80%	80%	80%	80%			

17.1 ASISTENCIA DE CAPACITACIONES, CHARLAS E INDUCCIONES

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	REGISTRO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	F-HSEQ-21	VERSIÓN: 03
		PÁGINA 1 DE 1	

CENTRO DE TRABAJO: AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA

FACILITADOR: Roger Rodriguez **FIRMA:**

FECHA: 29/03/2025 **DURACIÓN: (En horas):** 5 min

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA EL TIPO DE ACTIVIDAD

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	
CAMPAÑA		DIVULGACIÓN		PAUSA ACTIVA		OTRO	

TEMA: Manejo de Señalizacion, transito y trafico

OBJETIVO: Comprension, Señalizacion y Manejo Trafico

No.	NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS)	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Julio Torres Guaimaro	8174028	Obrero	
2	Victor Rodriguez gomez	1121296720	Obrero	Victor Rodriguez
3	EDER CEBALLOS Martinez	84080201	Obrero	
4	Elis Arayo Pastrana	1118873533	Ing. Aux.	
5	Cristian Mora	1118813603	Conductor	
6	Victor manuel angulo	1006615156	Obrero	
7	Efren Rojas Anaya	1103904	Ing. Apoy	
8				
9				
10				
11				
12				
13				

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	REGISTRO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	F-HSEQ-21	VERSIÓN: 03
		PÁGINA 1 DE 1	

CENTRO DE TRABAJO: AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA

FACILITADOR: ROGER RODRIGUEZ OJEDA **FIRMA:** Roger Rodríguez

FECHA: 11/03/2025 **DURACION: (En horas):** 10 min

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA EL TIPO DE ACTIVIDAD

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	✓
CAMPAÑA		DIVULGACIÓN		PAUSA ACTIVA		OTRO	

TEMA: Regla de Tolerancia No 1. Está Prohibido Presentarse a laborar bajo el efecto del Alcohol o drogas ilegales

OBJETIVO: Cumplir con el Programa de capacitaciones + Charlas.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS)	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Elder Ceballos	84.080.207	obrero	
2	Victor Angulo	1.006.95.156	obrero	
3	Esneider Puello	1.003.	conductor	
4	Victor Rodríguez	1.121.296720	obrero	Victor. R
5	Julio Torres	82.740284	Obrero	
6	Henry Cruz	3.144.427	Operador	
7	Oscar Vera	1.07[illegible]15.149	conductor	Oscar Mauricio V.
8	Juan Carlos Pérez		Ing. Residente	
9	Elis Acuña	1.118.873537	Ing. Aux.	
10				
11				
12				
13				

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	REGISTRO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	F-HSEQ-21	VERSIÓN: 03
		PÁGINA 1 DE 1	

CENTRO DE TRABAJO:	AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA		
FACILITADOR:	ROGER RODRIGUEZ OJEDA	FIRMA:	Roger Rodríguez
FECHA:	12-03-25	DURACION: (En horas):	10. min

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA EL TIPO DE ACTIVIDAD

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	✓
CAMPAÑA		DIVULGACIÓN		PAUSA ACTIVA		OTRO	

TEMA: Cuidado de los EPP

OBJETIVO: Cumplir con el Programa de capacitaciones y charlas

No.	NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS)	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Elis Araujo	1.118.873.533		
2	Victor Rodríguez	1.121.296720		Victor. R.
3	Elder Ceballos	84.080.207		
4	Henry Cruz	3.144.427		
5	Oscar Vera	1.071.915.149		
6	Victor Angulo	1.006.615.156		
7	Julio Torres	81.710.284		
8	Esneider Pueblo	1.003[illegible]531		
9				
10				
11				
12				
13				

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	REGISTRO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	F-HSEQ-21	VERSIÓN: 03
		PÁGINA 1 DE 1	

CENTRO DE TRABAJO: AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA

FACILITADOR: ROGER RODRIGUEZ OJEDA **FIRMA:** Roger Rodriguez

FECHA: 14-03-25 **DURACION: (En horas):** 10 min

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA EL TIPO DE ACTIVIDAD

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	✓
CAMPAÑA		DIVULGACIÓN		PAUSA ACTIVA		OTRO	

TEMA: Seguridad en el uso de herramientas manuales

OBJETIVO: Cumplir con el Programa de Capacitaciones y Charlas

No.	NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS)	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Elis Araujo Restrana	1118873537	Ing. Aux	
2	Elder Ceballos	84.080.207	obrero	
3	Victor Angulo	1.006.615.156	obrero	
4	Victor Rodríguez G.	1.121.296.720	obrero	Victor Rodriguez
5	Julio Torres	71.840.207	obrero	
6	Esneider Pulido Barrios	1003189731	Conductor	
7	José Oñate	1.118.843.663	Conductor	
8	Jhon Martínez	84.089.176	Conductor	Jhon Martinez
9	Nelson Acuña	72.192.091	OP. Moto	Nelson Acuña
10	Elmer Rondón	1.067.721.248	O.P Vibro	
11	Oscar Vera	1.071.915.149	Conductor	Oscar Vera
12	Henry Cruz	3.144.427	O.P. Mini	
13	Delfinson Sarmiento	1.118.829.673	Conductor	

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	REGISTRO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	F-HSEQ-21	VERSIÓN: 03
		PÁGINA 1 DE 1	

CENTRO DE TRABAJO:	AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA		
FACILITADOR:	ROGER RODRIGUEZ OJEDA	FIRMA:	Roger Rodríguez
FECHA:	17-03-25	DURACION: (En horas):	10 min

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA EL TIPO DE ACTIVIDAD

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	X
CAMPAÑA		DIVULGACIÓN		PAUSA ACTIVA		OTRO	

TEMA: Mirar Siempre antes de Actuar.

OBJETIVO: Cumplir con el Programa de Capacitaciones y Charlas.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS)	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Julio Torres	81.740.284	Obrero	
2	Victor Rodríguez	1.121.296.720	Obrero	Victor Rodriguez
3	Ader Caballos	84.080.207	Obrero	
4	Esnaider Pueblo	1003189531	Conducta	
5	Henry Cha	3.144.427	Op. Mini	Henry Cha
6	Oscar Vera	1.071.915.	Conductor	Oscar Mauro V
7	Elis Arauo	1118 877.533	Ing. Aux	
8	Jhon Martínez	84.069.176	Conductor	Jhon Martinez
9	Einer Rondón	1067717248	Op. Vibro	
10	Juan Pérez	92.190.949	Ing. Residente	
11	Nelson Acuña	72.192.091	Operador	Nelson A
12	Delfinson Sarmiento	1.118824673	Conductor	
13				

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	REGISTRO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	F-HSEQ-21	VERSIÓN: 03
		PÁGINA 1 DE 1	

CENTRO DE TRABAJO: AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA

FACILITADOR: ROGER RODRIGUEZ OJEDA **FIRMA:** Roger R O

FECHA: 20-03-25 **DURACION: (En horas):**

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA EL TIPO DE ACTIVIDAD

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	✓
CAMPAÑA		DIVULGACIÓN		PAUSA ACTIVA		OTRO	

TEMA: Uso responsable de herramientas

OBJETIVO: Cumplir con el programa de capacitaciones x Charlas

No.	NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS)	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Delfinson Sarmiento	1.118.829.673	Conductor	
2	Harry Cruz	3.144.427	O.P. Mini	
3	Oscar Vera	1.071.915.149	Conductor	Oscar Vera
4	Elmer Rondón	1.067.721.248	O.P. Vibo	
5	Nelson Acuña	72.192.091.	O.P. Moto	
6	Jhon Martínez	84.089.176	Conductor	
7	José Ortiz	1.118.843.663	Conductor	
8	Esnaider Puello	1.003.819.531	Conductor	
9	Julio Torres	71.842.894	obrero	Julio Torres
10	Victor Rodrigues	1.121.296.477	obrero	Victor Rodrigues
11	Victor Angulo	1.006.615.156	obrero	
12	Elder Ceballos	84.080.204	obrero	
13	Elis	1.118.873.533	Ing. Aux	

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	REGISTRO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	F-HSEQ-21	VERSIÓN: 03
		PÁGINA 1 DE 1	

CENTRO DE TRABAJO:	AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA		
FACILITADOR:	ROGER RODRIGUEZ OJEDA	FIRMA:	Roger
FECHA:	21-03-25	DURACION: (En horas):	5. Min.

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA EL TIPO DE ACTIVIDAD

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	✓
CAMPAÑA		DIVULGACIÓN		PAUSA ACTIVA		OTRO	

TEMA: Aprendiendo de los errores

OBJETIVO: Cumplir con el Programa de capacitaciones y Charlas

No.	NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS)	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Elder Caballos	84.080.207	obrero	
2	Victor Rodríguez Gómez	1.121.296477	obrero	Victor Rodriguez
3	Julio Torres	71.840 284	obrero	Julio Torres
4	Juan Pérez	92.190.949	Ing. Resi	Juan Téran
5	Elis Araujo	1.118.873.533	Ing. Aux	
6	Jhon Martínez	84.089.176	Conductor	Jhon martinez
7	Jose Luis Onate	1.118.843.663	Conductor	Jose L. Onate
8	Elmer Rondon	1.067.721.248	O.P. Vibro	
9	Víctor Angulo	1.006.615.156	Obrero	Victor Angulo
10	Oscar Vera	1.071.915.149	Conductor	Oscar Vera
11	Henry Cruz	3.144.427	O.P. Mini	
12	Delfinson Sarmiento	1.118.829.673	Conductor	
13				

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	REGISTRO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	F-HSEQ-21	VERSIÓN: 03
		PÁGINA 1 DE 1	

CENTRO DE TRABAJO:	AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA		
FACILITADOR:	ROGER RODRIGUEZ OJEDA	FIRMA:	Roger Rodriguez O
FECHA:	22-03-25	DURACION: (En horas):	5. min

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA EL TIPO DE ACTIVIDAD

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	✓
CAMPAÑA		DIVULGACIÓN		PAUSA ACTIVA		OTRO	

TEMA: Cuidado de columna lumbar

OBJETIVO: Cumplir con el Programa de capacitaciones y charlas

No.	NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS)	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Victor Angulo	1.006.615.156	obrero	Victor Angulo
2	Elder Caballos	84080.207	obrero	
3	José Oñate	1.118.843.663	conductor	José Onate
4	Esneider Puello	1.003.819.531	Conductor	Esneider Puello
5	Einer Rondon	1.062.721.248	O.P. vibro	
6	Delfinson Sarmiento	1.118.829.673	Conductor	
7	Henry Cruz	3.144.427	O.P. Mini	
8	Oscar Vera	1.071.915.149	Conductor	Oscar Vera
9	Julio Torres	71.840.284	obrero	Julio Torres
10	Elis Araujo	1.118.873.533	Inf. Aux	
11	Victor Rodríguez	1.121.296.720	Obrero	Victor Rodriguez
12	Jhon Martínez	84.089.176	Conductor	Jhon Martinez
13				

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	REGISTRO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	F-HSEQ-21	VERSIÓN: 03
		PÁGINA 1 DE 1	

CENTRO DE TRABAJO:	AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA		
FACILITADOR:	ROGER RODRIGUEZ OJEDA	FIRMA:	Roger R O
FECHA:	25-03-26	DURACION: (En horas):	5. min

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA EL TIPO DE ACTIVIDAD

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	✓
CAMPAÑA		DIVULGACIÓN		PAUSA ACTIVA		OTRO	

TEMA: Seguridad basada en el Comportamiento.

OBJETIVO: Cumplir con el Programa de capacitación y charlas

No.	NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS)	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Vera Rodrigues	1.071.915.749	Conductor	Oscar Vera
2	Henry Cruz Moreno	3.144.427	O.P. Mini	Henry Cruz
3	Elder Ceballos	84.080.207	obrero	
4	Victor Rodrigues	1.121.296.720	obrero	Victor Rodrigues
5	Víctor Angulo	1.006.615.156	obrero	Victor Angulo
6	Julio Torros Guerín	71.840.284	obrero	Julio Torres
7	Elis Araujo Pastrana	1.118.873.533	Inf. Aux.	
8	Jhon Martínez	84.089.176	conductor	Jhon martinez
9	Jose Oñata	1.118.843.663	Conductor	Jose Oñata
10	Elmer Rondon	1.067.721.248	OP. Vibro	
11	Esneider Puello	1003.819.531	Conductor	Esneidor Puello
12	Delfinson Sarmiento	1.118.829.673	Conductor	
13				

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	REGISTRO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	F-HSEQ-21	VERSIÓN: 03
		PÁGINA 1 DE 1	

CENTRO DE TRABAJO: AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA

FACILITADOR: ROGER RODRIGUEZ OJEDA FIRMA: Roger

FECHA: 29-03-25 DURACION: (En horas): 5. min

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA EL TIPO DE ACTIVIDAD

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	✓
CAMPAÑA		DIVULGACIÓN		PAUSA ACTIVA		OTRO	

TEMA: Prevencion del riesgo Público

OBJETIVO: Cumplir con el Programa de capacitaciones y Charlas

No.	NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS)	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Elder Ceballos	84.060.207	obrero	
2	Oscar Vera	1.071.915.149	Conductor	Oscar Vera
3	Hory Cruz	3.144.427	Op. mini	Hory Cruz
4	Julio Torres	71.840.284	Obrero	Julio Torres
5	Victor Angulo	1.006.615.156	Obrero	Victor Angulo
6	Victor Rodrigues	1.121.296.720	Obrero	Victor Rodrigues
7	Einer Rondón	1.067.721.248	Op. Vibro	
8	Jose Luis Onate	1.118.843.663	Conductor	Jose Onate
9	Jhon Martinez	84.089.176	Conductor	Jhon martinez
10	Esneider Puello	1.003.819.531	Conductor	Esneider Puello
11	Delfinson Sarmiento	1.118.829.673	Conductor	
12	Elis Araujo	1.118.873.533	Inv. Aux	
13				

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	REGISTRO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	F-HSEQ-21	VERSIÓN: 03
		PÁGINA 1 DE 1	

CENTRO DE TRABAJO: AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA

FACILITADOR: ROGER RODRIGUEZ OJEDA **FIRMA:** Roger Rodriguez

FECHA: 17-03-25 **DURACION: (En horas):** 1. hora

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA EL TIPO DE ACTIVIDAD

INDUCCIÓN	X	REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	
CAMPAÑA		DIVULGACIÓN		PAUSA ACTIVA		OTRO	

TEMA: Socialización del SG-SST del Consorcio

OBJETIVO: Cumplir con el Programa de capacitaciones

No.	NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS)	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Kenis Cotes	40.938.773	Social	Kenis Cotes
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	REGISTRO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	F-HSEQ-21	VERSIÓN: 03
		PÁGINA 1 DE 1	

CENTRO DE TRABAJO: AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA

FACILITADOR: ROGER RODRIGUEZ OJEDA **FIRMA:** Roger Rodriguez

FECHA: 17-03-25 **DURACION: (En horas):**

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA EL TIPO DE ACTIVIDAD

INDUCCIÓN	X	REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	
CAMPAÑA		DIVULGACIÓN		PAUSA ACTIVA		OTRO	

TEMA: Socialización del PSO del Aeropuerto Almirante Padilla

OBJETIVO: Cumplir con el Programa de capacitaciones

No.	NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS)	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Kenis Cotes	40.938.773	Social	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

CONSORCIO INRAESTRUCTURA RIOHACHA	REGISTRO DE EVALACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	F-HSEQ-88	VERSIÓN: 02
		PÁGINA 1 DE 1	

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Keis cotes Torres CÉDULA: 40938223

CARGO Trabajadora social. FECHA DE REALIZACIÓ 17/09/2025

1 Mencione Tres (3) de las politicas con las que contamos en la organizacion:
a. Política de calidad
b. Política SST
c. Política de Prevención de consumo alcohol y drogas.

2. Nombre los dos rglamentos vistos en la induccion?
Reglamento interno
Reglamento higiene y seguridad en el trabajo

3. Mencione cuatro aspectos ambientales que se generan en el proyecto
a. Consumo de agua
b. consumo de energía
c. material particulado
d. generación de residuos

4. Marque Falso ( ) ó Verdadero (X) segun corresponda
Un Acto o Comportamiento inseguro, se refieren a todas la acciones y decisiones humanas, que pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. También incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones inseguras

5. Marque Falso (X) ó Verdadero ( ) segun corresponda
Es accidente Laboral, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. También, es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo

6. Encierra en un circulo cual o cuales de las siguientes respuestas son funciones del COPASST:
A. Participar en Actividades de Promoción, divulgación e informaciónsobre medicina, higiene y seguridad ocupacional
B. Velar por el bienestar de kis trabajadores
C. Realizar inspecciones de seguridad
(D) Todas las anteriores

7. Escriba con sus propias palabras
a. ¿ Que es un accidente laboral ?
«El accidente laboral es el que se puede ocasionar dentro de la obra

b. ¿ Que se debe hacer en caso de accidente laboral?
Reportar al jefe inmediato.

c. ¿ Cual es el objetivo del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo?
Velar por la seguridad de los trabajadores.

8. Marque con una X la respuesta correcta:
¿La accion corecta o acciones correctas , para Manipulacion de carg?
a. Levantarla solo, cuando es mayor a 25 Kg
b. Realizar un sobre esfuerzo.
(c) Solicitar ayuda a un compañero cuando la carga es mayor a 25 Kg y la dimension no sea proporcional a mi masa corporal
d. Ninguna de las anteriores

9. De un ejemplo de riego y peligro
a.
b. Maquinaria en movimiento
c.
d. Riesgo que el trabajador este alexpuesto uso

10. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo son una Modalidad de Discriminación Laboral?
Falso ( ) Verdadero (X)

11. De un ejemplo de acto y condicion insegura
No Usar gafas para soldar y de cuyo
Contacto fisico con el fuego.

12. ¿ Porque es importante el uso de los EPP (Elementos de Proteccion Personal) y mencione cuales debo usar en su labor según el riesgo al cual se encuentra expuesto?
Porque del uso de los EPP es importante para la protección personal del trabajador.

13. Mencione riesgos a los que esta expuesto en el cumplimiento de sus funciones
Psicologico, fisico y quimico. y publicos.

CALIFICACIÓN	Aprobado: Escriba el resultado si es mayor a 3,5	Reprobado: Escriba el resultado si es menor a 3,5

Nombre del Evaluador: Rosa Rodriguez O
Firma
CC: [X] PPT: [ ]
1.001.762

Nombre del Trabajador: Keis cotes.
Firma del Trabajador
CC: [X] PPT: [ ]
40938223
