Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO	4600102792 DE 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
VALOR INCIAL	$ 7.825.688.944
PLAZO INICIAL:	5 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG-VNF
INTERVENTORÍA	SITELSA SAS
FECHA ACTA:	**PERIODO**
	5-may.-25 — **31-may.-25**

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

CONDICIONES CONTRACTUALES										ACTA N°7		ACUMULADO	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR UNITARIO SIN AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL SIN AIU	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1				**PRELIMINARES**									
	1.1			LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la obra. Se entiende por el trabajo que debe realizarse para localizar, replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en los planos (coordenadas, altimetría BM, linderos, ejes, mampostería, verticales, entre otros) y el control durante el proceso de ejecución de la obra. Se utilizará personal experto y calificado (topógrafo con su respectiva matrícula profesional vigente), utilizando equipo moderno y actualizado de precisión. Incluye teodolito electrónico o estación total ((boif bts-962e o similar); colector de datos rígido; mira profesional; nivel circular; medidor de laser horizontal, vertical, inclinación y azimut; dendrómetro electrónico (medidor de diámetro); bastón profesional; trípode profesional; prisma; plomada en zamak (aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre); libretas; cinta métrica 30m, y todos los demás materiales, elementos, equipos, seguros de	dia	50,00	$ 986.161	$ 743.263	$ 49.308.050		$ -	24,00	$ 23.667.864
	1.2			ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta altura de la vegetación de 0,50 m, La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete.	m2	2.000,00	$ 1.268	$ 956	$ 2.536.000	44,20	$ 42.241,18	340,99	$ 432.372
Subtotal									**$ 51.844.050**		**$ 42.241**	0,00	**$ 24.100.236**
2				**RETIROS Y DEMOLICIONES**								0,00	
	2.1			Demolición de piso o anden en concreto, e = hasta 15 cm. Incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento. Se contempla el equipo necesario para su correcta ejecución.	m2	8.200,00	$ 33.222	$ 25.039	$ 272.420.400	2179,03	$ 54.561.135,61	10927,18	$ 363.022.781
	2.2			Desmonte de piso en adoquín . Incluye recuperación de los materiales y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría.	m2	500,00	$ 17.291	$ 13.032	$ 8.645.500	0,00	$ -	0,00	$ -
	2.3			Demolición de andenes o pisos de cualquier espesor. INCLUYE ENTRESUELO, retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos, entre otros	m2	9.181,00	$ 65.474	$ 49.347	$ 601.116.794	80,62	$ 3.978.359,73	2537,11	$ 166.114.923
	2.4			Retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos.	un	20,00	$ 19.024	$ 14.338	$ 380.480	1129,00	$ 16.187.892,67	1614,00	$ 30.704.736
Subtotal									**$ 882.563.174**		**$ 74.727.388**	0,00	**$ 559.842.440**
3				**MOVIMIENTOS DE TIERRA**								0,00	
3.1				Excavaciones								0,00	$ -
	3.1.1			EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, volumen inferior a 0.30 m³. Su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	2.600,00	$ 63.568,00	$ 47.910,76	$ 165.276.800	217,02	$ 10.397.580,79	1480,64	$ 94.121.044
3.2				Llenos							$ -	0,00	$ -
	3.2.1			LLENOS EN ARENILLA compactados mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye: el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m3	100,00	$ 172.066	$ 129.684,96	$ 17.206.600	235,18	$ 30.499.443,41	518,43	$ 89.204.235
	3.2.2			Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios MECÁNICOS y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3	2.600,00	$ 337.253	$ 254.185,26	$ 876.857.800	714,29	$ 181.560.767,68	2412,96	$ 813.776.564
3.3											$ -	0,00	
	3.3.1			Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo.	m3-km	105.000,00	$ 3.357	$ 2.530,15	$ 352.485.000	11700,42	$ 29.603.779,01	96690,56	$ 324.590.208
	3.3.2			Derechos de Botadero en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	m3	4.200,00	$ 7.486	$ 5.642,15	$ 31.441.200	671,39	$ 3.788.060,35	4258,74	$ 31.880.901
Subtotal									**$ 1.443.267.400**		**$ 255.849.631**	0,00	**$ 1.353.572.951**

4				**CONCRETOS**									0,00	
4.1				Concretos para Andenes, rampas y Escalas									0,00	$ -
	4.1.1			Construcción de ANDEN en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.06 m (6 centímetros) Vaciado alternado (Junta fria). Incluye suministro y transporte de los materiales, acabado escobillado y llaneado 0,10 m en los bordes TIPO METRO, los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso de los discapacitados y hasta una huellas y una contrahuella necesarias en los lugares que indique la interventoría. Las excavaciones o descapotes, malla y material de soporte (base, sub base, entresuelo o arenilla) así como las llaves en caso de requerirse, se pagarán en su ítem respectivo.	m2	200,00	$ 120.530	$ 90.843	$ 24.106.000	19,67	$ 1.786.420,30	65,63	$ 7.910.372
	4.1.2			Construcción de ESCALAS sobre entresuelo, en concreto 21 MPa., según diseño y condiciones del sitio. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 18 mm. o su equivalente para acabado a la vista, contrahuellas, moldura chaflán en contrahuellas, vibrado, protección, curado, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m3	69,00	$ 1.337.482	$ 1.008.051	$ 92.286.258	1,43	$ 1.439.496,76	1,54	$ 2.057.382
	4.1.3			Construccion de contenedor de raices U350, incluye viga de fundacion en concreto de 17.5 mpa (20x20m), muro en bloque de concreto (15x20x40m). No incluye marco para alcorque, refuerzo, excavación, Según detalle de MEP	m	30,00	$ 210.925	$ 158.973	$ 6.327.750	0,00	$ -	0,00	$ -
	4.1.4			Construcción de cárcamo en concreto de 17,5 Mpa. Incluye Tapa prefabricada de 40x40x8 cm. dimensiones 30x25 medidas internas, muros de 10 cm. La excavación y acero se pagara en su ítem respectivo.	m	50,00	$ 359.151	$ 270.690	$ 17.957.550	0,00	$ -	0,00	$ -
	4.1.5			Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0,10 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagará en su ítem respectivo. La interventorlia y/o supervisión solicitarán los ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.	m2	17.400,00	$ 136.000	$ 102.502	$ 2.366.400.000	948,80	$ 97.253.839,86	10824,99	$ 1.472.198.112
4.2				Concreto para solado, cunetas y cordones							$ -	0,00	$ -
	4.2.1			Suministro, transporte y colocación de Cordon prefabricado de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80 cm. (BOBAR)	m	10.000,00	$ 120.703,00	$ 90.973	$ 1.207.030.000	1094,14	$ 99.537.217,68	9069,30	$ 1.094.691.718
	4.2.2			Construcción de CUNETA AUXILIAR EN "V" en concreto de 21 Mpa. 0,30 x 0,25 x 0,20 m. según ficha U180 del MEP. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, entresuelo 15 cm de piedra y 5 cm de arenilla y todos lo demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m	1.460,00	$ 139.398,00	$ 105.063	$ 203.521.080		$ -	0,00	$ -
	4.2.3			Suministro, transporte y Construccion de cordon-cuneta en concreto de 21 MPa. Incluye ajustes en concreto donde sea necesario y triturado de fondo. Según detalle S.I.F. No incluye refuerzo.	m	862,00	$ 201.501,00	$ 151.870	$ 173.693.862	9,00	$ 1.366.829,21	9,00	$ 1.813.509
	4.2.4			Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor de mínimo 0.05 m. Incluye: transporte interno y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	1.333,00	$ 42.090,00	$ 31.723	$ 56.105.970	1486,74	$ 47.163.659,55	1486,74	$ 62.576.743
Subtotal									**$ 4.147.426.470**		**$ 248.547.463**	0,00	**$ 2.641.247.836**
5				**ACERO DE REFUERZO**								0,00	
	5.1			Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	2000,00	$ 9.326	$ 7.029	$ 18.652.000	215,09	$ 1.511.855,09	232,25	$ 2.165.964
	5.2			Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84, Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	4200,00	$ 15.704	$ 11.836	$ 65.956.800	218,48	$ 2.585.926,12	1882,01	$ 29.555.021
	5.3			Acarreo interno de ACERO para lugares de difícil acceso, pendiente y/o escalas. Se pagará según lo aprobado por la interventoría. Distancia mayor a 100 m.	kg	1273,00	$ 663	$ 500	$ 843.999		$ -	0,00	$ -
Subtotal									**$ 85.452.799**		**$ 4.097.781**	0,00	**$ 31.720.984**
6				**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**								0,00	$ -
	6.1			Realce para cajas de acueducto y alcantarillado existente y recuperacion de herrajes de andenes. Altura 15 - 20 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	un	315,00	$ 83.564	$ 62.982	$ 26.322.660	840,00	$ 52.904.552,31	1619,00	$ 135.290.116
	6.2			Suministro, transporte e instalación de Tapa en polipropileno para caja de inspección de 0,40x 0,40 m. Incluye marco.	un	190,00	$ 172.204	$ 129.789	$ 32.718.760	0,00	$ -	7,00	$ 1.205.428
	6.3			Construcción de caja de inspección y/o ampliacion de aproximadamente 80x80x80 cm medidas internas (L=80cm) en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa y herraje. Según diseño SIF Municipio de Medellin	un	20,00	$ 907.292	$ 683.820	$ 18.145.840	32,00	$ 21.882.230,93	69,00	$ 62.603.148
Subtotal									**$ 77.187.260**		**$ 74.786.783**	0,00	**$ 199.098.692**

7				COMPLEMENTARIOS EN ADOQUIN PARA PISOS										0,00	
	7.1			Suministro, transporte y colocación de adoquín táctil guía o alerta discapacitados visuales de 20X20X6 cm LOST-AL . Incluye arena de apoyo 5 cm, sello de juntas con arena,cortes a maquina . Según diseño. Seguir recomendaciones MEP color AMARILLO.	m2	48,00	$ 214.709	$ 161.825	$ 10.306.032	177,40	$ 28.707.020,52	302,85	$ 65.025.179
	7.2			Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color oliva, marrón, chocolate, ocre, tojo y terracota. Para un ancho de 0.20m. Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	8600,00	$ 45.895	$ 34.581	$ 394.697.000	378,79	$ 13.102.628,17	2025,36	$ 92.953.897
	7.3			Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados visuales en adoquín ADOP-A de 10x20x6 cm, en color amarillo, salmón o jaspe, según diseño. Incluye cama de arena de apoyo e = 5 cm, sello de juntas con arena de revoque, cortes a maquina y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Cumplir norma NTC 2017, seguir recomendaciones del MEP y patrones de instalación del ICPC. el adoquín deberá resellarse por 2 veces en un lapso de 4 meses luego de su instalación.	m	8500,00	$ 36.909	$ 27.818	$ 313.726.500	328,64	$ 9.142.126,74	1803,29	$ 66.557.631
Subtotal									$ 718.729.532		$ 50.951.775	0,00	$ 224.536.707
8				BARANDAS Y PASAMANOS								0,00	
	8.1			Suministro, transporte e instalación de baranda con pasamanos con una altura de 1,00 m, en tubería galvanizada tipo acueducto en diametros de 2" calibre 10, 1 1/2" calibre 14 y 3/4" calibre 14, segun diseño. Incluye soldadura en todas las uniones, pulida y masillada, anticorrosivo, wash primer, pintura esmalte color a definir, con los espesores especificados en el diseño. Los barrotes verticales de 3/4" deben ir cada 0,10 m centro a centro; los tubos verticales estructurales de soporte de 2" van cada 1,50 m, el anclaje al piso se hará con platinas de 0.15x0.15x1/4" de acero galvanizado y 4 pernos de expansión de diámetro de 1/2" y longitud mínima de 3" y/o concreto de 21 MPa en caso de ser necesario. Los pasamanos irán fijados a la baranda mediante platinas de acero galvanizado de acuerdo a la figura que se plantea en el diseño; incluye todo lo necesario para su correcta anclaje, fijación y funcionamiento.	m	50,00	$ 687.922	$ 518.482	$ 34.396.100		$ -	0,00	$ -
Subtotal									$ 34.396.100		$ -	0,00	$ -
9				ARBORIZACIÓN Y PAISAJISMO								0,00	
	9.1			Suministro, transporte e instalación de grama tipo San Agustín, para conformación de zonas verdes. Incluye perfilación y nivelación de la superficie hasta un espesor de 5 cm , adición de tierra abonada con un espesor de 5 cm, anclaje inicial y final con ganchos de sujeción, regado y todo lo necesario para su correcta siembra y total prendimiento, canote mínimo 5 cm.	m2	300,00	$ 38.160,00	$ 28.760,93	$ 11.448.000	$ 880,92	$ 25.335.982,27	1353,98	$ 51.667.724
Subtotal									$ 11.448.000		$ 25.335.982	0,00	$ 51.667.724
							SUBTOTAL OBRAS		$ 7.452.316.785		$ 734.339.046		$ 5.085.787.571

SUBTOTAL OBRAS					$ 7.452.316.785	A	26,68%	$ 195.921.657,00
Destinación pago de Reajustes			NO MODIFICAR		$ 185.979.642,00	I	1,00%	$ 7.343.390,00
Inversión Socio-Ambiental-Implementación PMT- Gasto Reembolsable-			NO MODIFICAR		$ 157.581.021,00	U	5,00%	$ 36.716.952,00
Pólizas - Gasto Reembolsable-			NO MODIFICAR		$ 29.811.496,00	TOTAL CON AIU	32,68%	$ 974.321.045,00
VALOR TOTAL					$ 7.825.688.944	TOTAL SIN I	31,68%	$ 966.977.655,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION			PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=		26,68%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=		1,00%
NOTA 4: El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que será un gasto reembolsable comprobable, la entidad reconocerá al contratista el valor real efectivamente causado por este concepto (Gasto Reembolsable), para el efecto, el contratista deberá presentar los documentos que soporten el valor facturado por las garantías.	UTILIDAD	U=		5,00%
NOTA 5: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT" reflejado en sus respectivos anexos, es un valor estimado que será un gasto reembolsable demostrable. Lo anterior, con la finalidad de ser ejecutados en la proporción requerida y durante los tiempos en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca satisfacer. Dichas actividades serán reconocidas a cargo de reembolso de gastos.	TOTAL A.I.U	A.I.U.=		32,68%
NOTA 6: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Destinación pago de Reajustes" es un valor estimado, con el cual se realizara el pago de los reajuste de precios que se puedan llegar a causar durante la ejecución del contrato en atención a la forma de pago definida en los documentos del proceso.	Consorcio Vial VG-VNF - Representante Legal			
NOTA 7: Las operaciones y/o formulas que se presentan en estos formularios, solo son de ayuda para la formulación de la oferta, es responsabilidad del proponente verificar las mismas y efectuar sus propios cálculos para la formulación de su oferta.				
NOTA 8: Los valores Definidos para los items Destinación pago de Reajustes, Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT y Pólizas NO PODRÁN ALTERARSE O MODIFICARSE.				

CONTRATISTA

ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA

MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	1
FECHA	DD	15	MM	6	AA	2025	PERÍODO	02/06/2025 - 15/06/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO:

ÍTEM	1.2	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la obra. Se entiende por el trabajo que debe realizarse para localizar, replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en los planos (coordenadas, altimetría BM, linderos, ejes, mampostería, verticales, entre otros) y el control durante el proceso de ejecución de la obra. Se utilizará personal experto y calificado (topógrafo con su respectiva matrícula profesional vigente), utilizando equipo moderno y actualizado de precisión. Incluye teodolito electrónico o estación total ((boif bts-962e o similar); colector de datos rígido; mira profesional; nivel circular; medidor de laser horizontal, vertical, inclinación y azimut; dendrómetro electrónico (medidor de diámetro); bastón profesional; trípode profesional; prisma; plomada en zamak (aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre); libretas; cinta métrica 30m, y todos los demás materiales, elementos, equipos, seguros de equipos, instalaciones, combustibles, lubricantes, energía, transporte, mano de obra, necesarios para una correcta ejecución de los trabajos. Se harán los chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia que indique la interventoría. Incluye elaboración de planos.	UNID.		m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
PENDIENTES					
ACTA Nº6					
Del 05 al 11 de mayo					
BOMBONÁ #2		26,00	1,70	44,20	44,20
Subtotal					44,20
TOTAL					44,20

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA N°	2

FECHA	DD	15	MM	6	AA	2025	PERÍODO	02/06/2025 - 15/06/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	2.1	DESCRIPCIÓN	Demolición de piso o andén en concreto, e = hasta 15 cm. Incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento. Se contempla el equipo necesario para su correcta ejecución.	UNID.		m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO		
ACTA N°7					
Del 2 al 8 de junio de 2025					
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11 CR 31 - 30		24,00	2,50	60,00	
CLL 11 CR 31 - 30		7,70	2,50	19,25	
CLL 11 CR 31 - 30		31,00	1,35	41,85	
MENOS CAJAS				2,13	**118,97**
POBLADO - FLORIDA					
CLL 5G - 5F		37,00	1,32	48,84	
CLL 5G - 5F		1,80	1,20	2,16	
CLL 5G - 5F		14,45	1,30	18,79	
CLL 5G - 5F		14,45	1,42	20,52	**90,30**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40 - CL 54 Y 56		11,86	3,25	38,55	
CR 40 - CL 54 Y 56		31,18	3,25	101,34	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,00	1,70	6,80	
CR 40 - CL 54 Y 56		3,75	1,80	6,75	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,61	1,50	6,92	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,96	1,20	5,95	
CR 40 - CL 54 Y 56		8,60	3,75	32,25	
CR 40 - CL 54 Y 56		7,96	1,10	8,76	
CR 40 - CL 54 Y 56		1,50	1,50	2,25	
CR 40 - CL 54 Y 56		2,75	1,70	4,68	
MENOS CAJAS				9,24	**204,99**
BOSTON - ENCISO					
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	2,14	7,28	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	1,73	5,88	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,45	1,30	3,19	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,10	3,50	3,85	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,50	3,50	19,25	
CR 36A CLL 54 Y 58		7,30	2,10	15,33	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,70	1,90	5,13	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,74	1,20	0,88	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,90	3,50	10,15	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,15	1,65	8,50	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,39	3,36	8,03	
CR 36A CLL 54 Y 58		6,05	1,80	10,89	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,00	1,60	1,60	
MENOS CAJAS				2,36	**97,59**
CL 54 - CR 36 Y 37		2,00	1,98	3,96	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,88	3,68	10,60	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,88	3,60	10,37	
CL 54 - CR 36 Y 37		56,00	2,52	141,12	
CL 54 - CR 36 Y 37		40,00	1,60	64,00	
MENOS CAJAS				4,32	**225,73**
BOMBONÁ I					
CRA 38 - CLL 39A		6,54	2,66	17,40	












CRA 38 - CLL 39A		3,73	3,25	12,12	
CRA 38 - CLL 39A		5,55	2,25	12,49	
CRA 38 - CLL 39A		8,84	4,80	42,43	
CRA 38 - CLL 39A		6,93	2,26	15,66	**100,10**
Del 9 al 15 de junio de 2025					
POBLADO - LAS LOMAS					
CR 31A - CL 11A Y 11		68,00	1,60	108,80	
CR 31A - CL 11A Y 11		12,00	1,65	19,80	
CR 31A - CL 11A Y 11		13,20	2,65	34,98	
MENOS CAJAS				0,90	**162,68**
POBLADO - LAS LOMAS					
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		23,00	1,30	29,90	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		6,20	4,80	29,76	
MENOS CAJAS				1,46	**58,20**
POBLADO - FLORIDA					
CLL 5G - 5F		27,20	1,50	40,80	
CLL 5G - 5F		3,70	1,30	4,81	
CLL 5G - 5F		3,57	1,00	3,57	
CLL 5G - 5F		2,70	2,20	5,94	
CLL 5G - 5F		5,50	2,90	15,95	
CLL 5G - 5F		16,50	0,30	4,95	**76,02**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40 - CL 54 Y 56		4,50	2,90	13,05	
CR 40 - CL 54 Y 56		7,00	2,90	20,30	
CR 40 - CL 54 Y 56		5,82	3,16	18,39	
CR 40 - CL 54 Y 56		8,53	3,87	33,01	
CR 40 - CL 54 Y 56		23,41	2,35	55,01	
MENOS CAJAS				5,20	**134,57**
BOSTON - ENCISO					
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	2,14	7,28	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	1,73	5,88	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,45	1,30	3,19	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,10	3,50	3,85	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,50	3,50	19,25	
CR 36A CLL 54 Y 58		7,30	2,10	15,33	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,70	1,90	5,13	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,74	1,20	0,88	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,90	3,50	10,15	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,15	1,65	8,50	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,39	3,36	8,03	
CR 36A CLL 54 Y 58		6,05	1,80	10,89	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,00	1,60	1,60	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,47	1,83	6,35	
CR 36A CLL 54 Y 58		8,05	2,10	16,91	
CR 36A CLL 54 Y 58		4,80	1,90	9,12	
MENOS CAJAS				2,35	**129,98**
CL 54 - CR 36 Y 37		0,50	1,98	0,99	
CL 54 - CR 36 Y 37		0,72	3,68	2,65	
CL 54 - CR 36 Y 37		0,72	3,60	2,59	
CL 54 - CR 36 Y 37		14,00	2,52	35,28	
CL 54 - CR 36 Y 37		10,00	1,60	16,00	
CL 54 - CR 36 Y 37		3,70	3,60	13,32	
MENOS CAJAS				1,08	**69,75**
BOMBONÁ I					
CRA 38 - CLL 39A		9,50	4,81	45,70	
CRA 38 - CLL 39A		6,60	2,52	16,63	
CRA 38 - CLL 39A		1,20	2,40	2,88	
CRA 38 - CLL 39A		26,58	2,43	64,59	
CRA 38 - CLL 39A		2,20	2,30	5,06	
CRA 38 - CLL 39A		2,40	2,30	5,52	
CRA 38 - CLL 39A		5,40	2,51	13,55	
CRA 38 - CLL 39A		6,34	1,46	9,26	
CRA 38 - CLL 39A		2,45	2,07	5,07	
MENOS CAJAS				11,05	**157,21**
PENDIENTES ACTA N°6					
Del 19 al 25 de mayo					
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40-CL 54 Y 56		12,85	2,20	28,27	
CR 40-CL 54 Y 56		8,60	1,75	15,05	
CR 40-CL 54 Y 56		5,14	1,72	8,84	
CR 40-CL 54 Y 56		0,56	14,00	7,84	
MENOS CAJAS				7,47	**52,53**
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		3,90	2,20	8,58	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		12,45	1,28	15,94	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,90	2,10	10,29	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		7,50	1,50	11,25	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		7,10	2,60	18,46	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		9,40	1,50	14,10	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		8,50	2,60	22,10	

CLL 11B CR 34 Y CL 11A		13,50	1,50	20,25	**120,97**
POBLADO - FLORIDA					
CL 5F Y 5G		17,20	1,05	18,06	
CL 5F Y 5G		4,30	4,00	17,20	
CL 5F Y 5G		3,40	2,80	9,52	
CL 5F Y 5G		3,00	2,80	8,40	
CL 5F Y 5G		5,70	2,80	15,96	
CL 5F Y 5G		18,40	1,26	23,18	**92,32**
CL 7- CR 33		33,20	1,40	46,48	
CL 7- CR 33		1,65	1,65	2,72	
CL 7- CR 33		1,75	1,60	2,80	
CL 7- CR 33		2,80	2,30	6,44	**58,44**
Del 26 de mayo al 01 de junio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		3,80	1,40	5,32	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		9,30	2,30	21,39	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		9,40	2,30	21,62	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		2,60	1,40	3,64	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		8,00	1,80	14,40	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		6,10	3,00	18,30	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		7,00	1,80	12,60	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		6,10	2,80	17,08	**114,36**
POBLADO - FLORIDA					
CL 5F Y 5G		3,50	1,27	4,45	
CL 5F Y 5G		4,00	3,15	12,60	
CL 5F Y 5G		5,60	2,95	16,52	
CL 5F Y 5G		1,50	1,26	1,89	
CL 5F Y 5G		4,40	3,06	13,46	
CL 5F Y 5G		0,80	1,30	1,04	**49,96**
CL 7- CR 33		7,50	5,00	37,50	
CL 7- CR 33		5,00	2,10	10,50	
CL 7- CR 33		2,47	1,77	4,37	**52,37**
BOMBONÁ II		4,00	3,00	12,00	**12,00**
					552,94
	Subtotal				**2.179,03**

OBSERVACIONES:

TOTAL	**2.179,03**

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	3
FECHA	DD	15	MM	6	AA	2025	PERÍODO	02/06/2025 - 15/06/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ITEM	2.3	DESCRIPCIÓN	Demolición de andenes o pisos de cualquier espesor. INCLUYE ENTRESUELO, retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos, entre otros.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO		
ACTA N°7					
Del 2 al 8 de junio de 2025					
POBLADO - FLORIDA					
CLL 5G - 5F		9,40	2,90	27,26	
CLL 5G - 5F		4,90	4,15	20,34	**47,60**
BOSTON - ENCISO					
CR 36A CLL 54 Y 58		14,90	2,23	13,29	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,30	1,35	0,70	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,80	1,60	2,43	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,35	1,45	0,78	
CR 36A CLL 54 Y 58		11,46	1,70	7,79	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,35	1,00	0,54	
MENOS CAJAS				2,12	**23,42**
BOMBONÁ I					
CRA 38 - CLL 39A		3,43	2,80	9,60	**9,60**
Subtotal					**80,62**
TOTAL					**80,62**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF									HOJA N°	4
FECHA	DD	15	MM	6	AA	2025	PERÍODO	02/06/2025 - 15/06/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	2.4	DESCRIPCIÓN	Retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos.	UNID.	Und	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

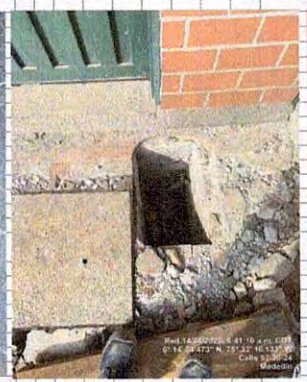




LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	CANTIDAD TOTAL
ACTA N°7		
Del 2 al 8 de junio de 2025		
POBLADO - LAS LOMAS	15,00	**15,00**
POBLADO - FLORIDA	7,00	**7,00**
LA CANDELARIA - BOSTON	24,00	**24,00**
BOSTON - ENCISO	44,00	**44,00**
Del 9 al 15 de junio de 2025		
POBLADO - LAS LOMAS	5,00	**5,00**
POBLADO - FLORIDA	2,00	**2,00**
LA CANDELARIA - BOSTON	14,00	**14,00**
BOSTON - ENCISO	10,00	**10,00**
BOMBONÁ I	20,00	**20,00**
PENDIENTES		
ACTA N°2		
FRENTE: LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVA		
CR 81A-CL 35 Y 36 CD	18,00	
CR 81A-CL 35 Y 36 CI	4,00	
CR 82A-CL 36 Y 37 2° CUADRA	10,00	
CR 82A-CL 36 Y 37 1° CUADRA	8,00	
CR 82A-CL 36 Y 37 3° CUADRA	7,00	
CL 40A - CR 83A Y 84	8,00	
FRENTE: LAURELES - LAS ACACIAS		
CL 36-CR 80 AA Y 80B ANDÉN	8,00	**63,00**
ACTA N°3		
FRENTE: LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVA		
CR 82A-CL 36 Y 37 1° CUADRA CI	10,00	
CR 82A-CL 36 Y 37 2° CUADRA CI	12,00	
CR 82A-CL 36 Y 37 3° CUADRA CI	13,00	
CL 37D - CR 82A Y 83A	34,00	**69,00**
LAURELES - ACACIAS		
CL 36 - CR 80 Y 81	47,00	**47,00**
LAURELES - LORENA		
CR 79 - CL 38 Y TV 39B	3,00	**3,00**
		119,00
ACTA N°4		
Del 01 al 15 de marzo del 2025		
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR	32,00	**32,00**
LAURELES - LAS ACACIAS	14,00	**14,00**
LAURELES - LORENA	50,00	**50,00**
LA AMÉRICA - FERRINI	54,00	**54,00**
BELÉN GRANADA	50,00	**50,00**
BOSTON - ENCISO	28,00	**28,00**
LA AMÉRICA - CALASANZ	2,00	**2,00**

Del 16 al 23 de marzo		
LAURELES - LAS ACACIAS	8,00	8,00
LAURELES - LORENA	9,00	9,00
LA AMÉRICA - FERRINI	3,00	3,00
BELÉN GRANADA	24,00	24,00
BOSTON - ENCISO	8,00	8,00
Del 24 al 31 de marzo		
BOSTON - ENCISO	23,00	23,00
LAURELES - LAS ACACIAS	1,00	1,00
LAURELES - LORENA	7,00	7,00
BELÉN GRANADA	23,00	23,00
		336,00
	ACTA N°5	
Del 01 al 06 de abril del 2025		
BOSTON - ENCISO	38,00	38,00
BELÉN GRANADA	2,00	2,00
Del 07 al 13 de abril		
BOSTON - ENCISO	78,00	78,00
BELÉN GRANADA	42,00	42,00
POBLADO - FLORIDA	2,00	2,00
Del 14 al 20 de abril		
BELÉN GRANADA	10,00	10,00
Del 21 al 27 de abril		
BOSTON - ENCISO	7,00	7,00
BELÉN GRANADA	16,00	16,00
POBLADO - FLORIDA	2,00	2,00
Del 28 al 30 de abril		
BOSTON	73,00	73,00
BELÉN GRANADA	31,00	31,00
		301,00
	ACTA N°6	
Del 05 al 11 de mayo		
BOSTON - ENCISO	43,00	43,00
LA CANDELARIA - BOSTON	17,00	17,00
POBLADO - LAS LOMAS	14,00	14,00
Del 12 al 18 de mayo		
POBLADO - FLORIDA	10,00	10,00
LA CANDELARIA - BOSTON	3,00	3,00
BOSTON - ENCISO	15,00	15,00
POBLADO - LAS LOMAS	5,00	5,00
Del 19 al 25 de mayo		
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR	4,00	4,00
LA CANDELARIA - BOSTON	30,00	30,00
BOSTON - ENCISO	6,00	6,00
POBLADO - LAS LOMAS	4,00	6,00
POBLADO - FLORIDA	6,00	6,00
Del 26 de mayo al 01 de junio		
POBLADO - LAS LOMAS	2,00	2,00
POBLADO - FLORIDA	10,00	10,00
		169,00
Subtotal		1.129,00
TOTAL		1.129,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	5
FECHA	DD	15	MM	6	AA	2025	PERÍODO	02/06/2025 - 15/06/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	3.1.1	DESCRIPCIÓN	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, volumen inferior a 0.30 m³. Su medida será en el sitio. No incluye entibado.	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.








LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR		
ACTA N°7						
Del 2 al 8 de junio de 2025						
POBLADO - FLORIDA						
CLL 5G - 5F		9,00	1,30	0,15	1,76	
CLL 5G - 5F		9,00	1,30	0,50	5,85	
CLL 5G - 5F		1,20	1,80	0,15	0,32	
CLL 5G - 5F		9,40	2,90	0,15	4,09	
CLL 5G - 5F		2,60	1,70	0,15	0,66	
CLL 5G - 5F		14,45	1,30	0,15	2,82	
CLL 5G - 5F		14,45	1,40	0,15	3,03	
CLL 5G - 5F		2,40	4,00	0,20	1,92	**20,45**
CR 33 - CL 7 Y 6		8,00	3,10	0,15	3,72	
CR 33 - CL 7 Y 6		1,40	1,00	0,15	0,21	
CR 33 - CL 7 Y 6		1,40	1,00	0,15	0,21	
CR 33 - CL 7 Y 6		2,80	1,20	0,15	0,50	**4,64**
LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40 - CL 54 Y 56		11,86	3,25	0,15	5,78	
CR 40 - CL 54 Y 56		31,18	3,25	0,15	15,20	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,00	1,70	0,15	1,02	
CR 40 - CL 54 Y 56		3,75	1,80	0,15	1,01	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,61	1,50	0,15	1,04	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,96	1,20	0,15	0,89	
CR 40 - CL 54 Y 56		8,60	3,75	0,15	4,84	
CR 40 - CL 54 Y 56		7,96	1,10	0,15	1,31	
CR 40 - CL 54 Y 56		1,50	1,50	0,15	0,34	
CR 40 - CL 54 Y 56		2,75	1,70	0,15	0,70	
MENOS CAJAS					1,40	**30,73**
BOSTON - ENCISO						
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	2,14	0,15	1,09	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	1,73	0,15	0,88	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,45	1,30	0,15	0,48	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,10	3,50	0,15	0,58	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,50	3,50	0,15	2,89	
CR 36A CLL 54 Y 58		7,30	2,10	0,15	2,30	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,70	1,90	0,15	0,77	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,74	1,20	0,15	0,13	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,90	3,50	0,15	1,52	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,15	1,65	0,15	1,27	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,39	3,36	0,15	1,20	
CR 36A CLL 54 Y 58		6,05	1,80	0,15	1,63	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,00	1,60	0,15	0,24	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,96	2,23	0,50	6,65	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,52	1,35	0,50	0,35	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,52	1,60	0,50	1,22	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,54	1,45	0,50	0,39	
CR 36A CLL 54 Y 58		4,58	1,70	0,50	3,90	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,54	1,00	0,50	0,27	
MENOS CAJAS					1,43	**26,33**
CL 54 - CR 36 Y 37		2,00	1,98	0,15	0,59	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,88	3,68	0,15	1,59	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,88	3,60	0,15	1,56	
CL 54 - CR 36 Y 37		56,00	2,52	0,15	21,17	
CL 54 - CR 36 Y 37		40,00	1,60	0,15	9,60	
MENOS CAJAS					0,66	**33,85**









BOMBONÁ I						
CRA 38 - CLL 39A		6,54	2,66	0,15	2,61	
CRA 38 - CLL 39A		3,73	3,25	0,15	1,82	
CRA 38 - CLL 39A		5,55	2,25	0,15	1,87	
CRA 38 - CLL 39A		8,84	4,80	0,15	6,36	
CRA 38 - CLL 39A		6,93	2,26	0,15	2,35	**15,02**
Del 9 al 15 de junio de 2025						
POBLADO - FLORIDA						
CLL 5G - 5F		27,20	1,50	0,15	6,12	
CLL 5G - 5F		3,70	1,30	0,15	0,72	
CLL 5G - 5F		3,57	1,00	0,15	0,54	
CLL 5G - 5F		2,70	2,20	0,15	0,89	
CLL 5G - 5F		5,50	2,90	0,25	3,99	**12,26**
LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40 - CL 54 Y 56		4,50	2,90	0,15	1,96	
CR 40 - CL 54 Y 56		7,00	2,90	0,15	3,05	
CR 40 - CL 54 Y 56		5,82	3,16	0,15	2,76	
CR 40 - CL 54 Y 56		8,53	3,87	0,15	4,95	
CR 40 - CL 54 Y 56		23,41	2,35	0,15	8,25	
MENOS CAJAS					0,78	**20,18**
BOSTON - ENCISO						
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	2,14	0,15	1,09	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	1,73	0,15	0,88	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,45	1,30	0,15	0,48	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,10	3,50	0,15	0,58	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,50	3,50	0,15	2,89	
CR 36A CLL 54 Y 58		7,30	2,10	0,15	2,30	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,70	1,90	0,15	0,77	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,74	1,20	0,15	0,13	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,90	3,50	0,15	1,52	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,15	1,65	0,15	1,27	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,39	3,36	0,15	1,20	
CR 36A CLL 54 Y 58		6,05	1,80	0,15	1,63	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,00	1,60	0,15	0,24	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,47	1,83	0,15	0,95	
CR 36A CLL 54 Y 58		8,05	2,10	0,15	2,54	
CR 36A CLL 54 Y 58		4,80	1,90	0,15	1,37	
MENOS CAJAS					0,35	**19,50**
CL 54 - CR 36 Y 37		0,50	1,98	0,15	0,15	
CL 54 - CR 36 Y 37		0,72	3,68	0,15	0,40	
CL 54 - CR 36 Y 37		0,72	3,60	0,15	0,39	
CL 54 - CR 36 Y 37		14,00	2,52	0,15	5,29	
CL 54 - CR 36 Y 37		10,00	1,60	0,15	2,40	
CL 54 - CR 36 Y 37		3,70	3,60	0,15	2,00	
MENOS CAJAS					0,16	**10,46**
BOMBONÁ I						
CRA 38 - CLL 39A		9,50	4,81	0,15	6,85	
CRA 38 - CLL 39A		6,60	2,52	0,15	2,49	
CRA 38 - CLL 39A		1,20	2,40	0,15	0,43	
CRA 38 - CLL 39A		26,58	2,43	0,15	9,69	
CRA 38 - CLL 39A		2,20	2,30	0,15	0,76	
CRA 38 - CLL 39A		2,40	2,30	0,15	0,83	
CRA 38 - CLL 39A		5,40	2,51	0,15	2,03	
CRA 38 - CLL 39A		6,34	1,46	0,15	1,39	
CRA 38 - CLL 39A		2,45	2,07	0,15	0,76	
MENOS CAJAS					1,65	**23,59**
Subtotal						**217,02**
TOTAL						**217,02**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF


CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	6
FECHA	DD	15	MM	6	AA	2025	PERÍODO	02/06/2025 - 15/06/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	3.2.1	DESCRIPCIÓN	LLENOS EN ARENILLA compactados mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye: el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





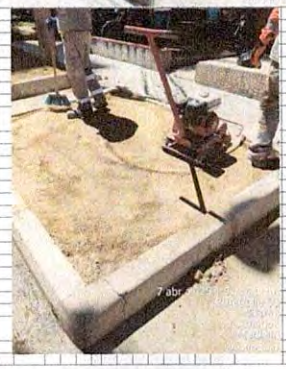


LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR		
ACTA Nº7						
Del 9 al 15 de junio de 2025						
POBLADO - FLORIDA						
CLL 5G - 5F		9.00	1.70	0.30	4.59	
CLL 5G - 5F		19.00	1.00	0.30	3.00	
CLL 5G - 5F		27.70	1.50	0.30	12.47	
CLL 5G - 5F		24.50	1.40	0.30	10.28	
CLL 5G - 5F		7.70	1.26	0.30	2.91	**33,26**
POBLADO - FLORIDA						
CL 7 - CR 33		8.28	1.35	0.35	3.91	
CL 7 - CR 33		7.10	1.00	0.35	2.49	
CL 7 - CR 33		6.50	1.35	0.35	3.07	
CL 7 - CR 33		2.90	2.28	0.35	2.31	**11,78**
		PENDIENTES ACTA Nº 6				
Del 01 al 06 de abril del 2025						
LAURELES - ACACIAS		5.30	1.30	0.20	1.38	
CL 36 - CR 80 Y 81		7.40	1.30	0.15	1.44	
CL 36 - CR 80 Y 81		6.90	1.30	0.20	1.79	
CL 36 - CR 80 Y 81		8.20	1.40	0.20	2.30	
CL 36 - CR 80 Y 81		14.00	1.50	0.30	6.30	
CL 36 - CR 80 Y 81		8.00	1.50	0.10	1.20	
CL 36 - CR 80 Y 81		5.80	1.30	0.15	1.13	
CL 36 - CR 80 Y 81		3.70	1.50	0.30	1.67	
CL 36 - CR 80 Y 81		1.60	1.60	0.25	0.64	
CL 36 - CR 80 Y 81		5.90	1.50	0.20	1.77	
CL 36 - CR 80 Y 81		9.70	1.50	0.15	2.18	
CL 36 - CR 80 Y 81		6.30	1.40	0.10	0.88	
CL 36 - CR 80 Y 81		11.30	1.40	0.10	1.58	
CL 36 - CR 80 Y 81		2.70	1.40	0.15	0.57	
CL 36 - CR 80 Y 81		4.00	1.50	0.20	1.20	
CL 36 - CR 80 Y 81		17.00	1.40	0.10	2.38	
CL 36 - CR 80 Y 81		5.60	1.40	0.15	1.22	
CL 35 - CR 80 Y 81		5.10	1.40	0.15	1.07	
CL 36 - CR 80 Y 81		6.80	1.40	0.15	1.43	
CL 36 - CR 80 Y 81		9.40	1.35	0.10	1.27	**33,40**
LAURELES - LORENA						
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		5.80	1.40	0.20	1.62	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		7.30	1.40	0.25	2.56	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		7.00	1.50	0.20	2.10	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		10.60	1.45	0.15	2.31	**8,58**
LA AMÉRICA - FERRINI						
CL 53A - CR 81 Y 80		2.73	1.90	0.20	1.04	
CL 53A - CR 81 Y 80		2.37	1.83	0.17	0.74	
CL 53A - CR 81 Y 80		7.80	1.77	0.18	2.49	
CL 53A - CR 81 Y 80		4.45	1.75	0.20	1.56	
CL 53A - CR 81 Y 80		3.72	1.92	0.17	1.21	
CL 53A - CR 81 Y 80		2.50	1.97	0.18	0.89	
CL 53A - CR 81 Y 80		2.87	1.98	0.20	1.14	
CL 53A - CR 81 Y 80		4.75	2.07	0.17	1.67	
CL 53A - CR 81 Y 80		4.25	2.11	0.16	1.43	
CL 53A - CR 81 Y 80		4.95	1.70	0.15	1.26	
CL 53A - CR 81 Y 80		20.00	2.00	0.20	8.00	**21,42**
Del 07 al 13 de abril						
BOSTON - ENCISO						
CRA 36A - CLL 58 Y 54		1.47	1.20	0.15	0.26	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		3.15	1.22	0.25	0.96	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		2.31	1.30	0.14	0.42	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		1.73	1.30	0.12	0.27	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		2.93	1.30	0.07	0.27	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		3.55	1.30	0.19	0.88	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		5.65	1.33	0.19	1.43	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		2.05	1.30	0.07	0.19	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		8.05	1.30	0.09	0.94	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		15.00	1.30	0.20	3.90	**9,62**





Del 14 al 20 de abril						
BOSTON - ENCISO						
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5.05	1.20	0.06	0.48	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1.00	1.40	0.10	0.14	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1.02	1.00	0.20	0.20	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1.03	2.45	0.08	0.20	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4.20	1.05	0.01	0.04	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3.15	1.28	0.08	0.32	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1.25	1.50	0.05	0.09	**1,49**
Del 21 al 27 de abril						
BOSTON - ENCISO						
CL 37D-CR 82A Y 83A		4.31	0.97	0.10	0.42	
CL 37D-CR 82A Y 83A		11.14	0.76	0.20	1.69	
CL 37D-CR 82A Y 83A		4.75	0.76	0.18	0.65	
CL 37D-CR 82A Y 83A		2.43	0.93	0.15	0.34	
CL 37D-CR 82A Y 83A		3.50	1.10	0.20	0.77	
CL 37D-CR 82A Y 83A		5.45	0.74	0.12	0.48	
CL 37D-CR 82A Y 83A		4.20	0.69	0.15	0.43	
CL 37D-CR 82A Y 83A		4.45	0.74	0.20	0.66	
CL 37D-CR 82A Y 83A		1.94	0.84	0.08	0.13	
CL 37D-CR 82A Y 83A		9.65	0.79	0.08	0.61	
CL 37D-CR 82A Y 83A		3.34	0.97	0.08	0.26	
CL 37D-CR 82A Y 83A		13.20	0.94	0.08	0.99	
CL 37D-CR 82A Y 83A		3.26	0.90	0.10	0.29	
CL 37D-CR 82A Y 83A		6.04	0.91	0.08	0.44	
CL 37D-CR 82A Y 83A		11.74	0.58	0.15	1.02	
CL 37D-CR 82A Y 83A		1.26	0.82	0.15	0.13	
CL 37D-CR 82A Y 83A		2.81	0.88	0.20	0.49	
CL 37D-CR 82A Y 83A		2.94	0.50	0.15	0.22	
CL 37D-CR 82A Y 83A		18.15	0.90	0.08	1.31	
CL 37D-CR 82A Y 83A		7.70	0.88	0.10	0.75	**12,13**
BELEN GRANADA						
CR 75 - CALLE 30 A Y 28		3.03	1.00	0.25	0.75	
CR 75 - CALLE 30 A Y 28		5.93	1.00	0.28	1.66	
CR 75 - CALLE 30 A Y 28		2.97	0.88	0.18	0.47	
CR 75 - CALLE 30 A Y 28		1.83	0.88	0.23	0.37	
CR 75 - CALLE 30 A Y 28		3.12	0.88	0.42	1.15	
CR 75 - CALLE 30 A Y 28		2.15	0.88	0.35	0.66	
CR 75 - CALLE 30 A Y 28		3.75	0.88	0.29	0.96	
CR 75 - CALLE 30 A Y 28		2.43	0.88	0.37	0.79	
CR 75 - CALLE 30 A Y 28		7.42	1.00	0.35	2.60	**9,42**
CL 28 - CR 75 Y 74A		6.24	1.68	0.20	2.10	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2.06	1.87	0.15	0.58	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2.09	1.87	0.15	0.58	
CL 28 - CR 75 Y 74A		6.78	1.85	0.35	4.39	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2.89	1.80	0.15	0.78	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4.70	1.87	0.25	2.20	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2.22	1.69	0.35	1.31	
CL 28 - CR 75 Y 74A		5.10	1.81	0.30	2.77	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2.42	0.82	0.35	0.69	
CL 28 - CR 75 Y 74A		0.80	0.80	0.15	0.10	
CL 28 - CR 75 Y 74A		0.80	0.80	0.15	0.10	
CL 28 - CR 75 Y 74A		5.24	1.84	0.30	2.89	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3.41	1.86	0.20	1.27	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2.31	1.86	0.15	0.64	
CL 28 - CR 75 Y 74A		11.45	1.81	0.20	4.14	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2.58	1.89	0.30	1.46	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2.66	1.71	0.30	1.36	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4.12	1.81	0.20	1.49	**28,88**
CR 74 - CL 27 Y 28		6.00	2.10	0.35	4.41	
CR 74 - CL 27 Y 28		2.85	2.00	0.35	2.00	
CR 74 - CL 27 Y 28		2.90	1.73	0.35	1.76	
CR 74 - CL 27 Y 28		3.70	1.77	0.35	2.29	
CR 74 - CL 27 Y 28		10.00	2.25	0.35	7.88	
CR 74 - CL 27 Y 28		2.46	2.46	0.30	1.82	
CR 74 - CL 27 Y 28		2.38	2.00	0.35	1.67	
CR 74 - CL 27 Y 28		2.20	1.13	0.30	0.75	
CR 74 - CL 27 Y 28		0.80	2.18	0.35	0.80	
CR 74 - CL 27 Y 28		3.30	2.20	0.30	2.18	
CR 74 - CL 27 Y 28		3.80	2.16	0.15	1.23	
CR 74 - CL 27 Y 28		1.84	2.16	0.30	1.19	
CR 74 - CL 27 Y 28		4.60	2.20	0.35	3.54	
CR 74 - CL 27 Y 28		2.48	1.00	0.35	0.87	
CR 74 - CL 27 Y 28		12.60	2.28	0.35	10.05	
CR 74 - CL 27 Y 28		2.47	2.20	0.35	1.90	**44,13**
						166,84
	ACTA N°6					
Del 26 de mayo al 01 de junio						
POBLADO - FLORIDA						
CL 5F Y 5G		112.90	1.50	0.10	16.94	**16,94**
BOSTON - ENCISO						
CL 54-CR 36A Y 37		1.45	12.86	0.09	1.68	
CL 54-CR 36A Y 37		1.28	20.20	0.10	2.59	**4,26**
						21,20
	Subtotal					**235,18**
TOTAL						**235,18**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	7
FECHA	DD	15	MM	6	AA	2025	PERÍODO	02/06/2025 - 15/06/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO:

ÍTEM	3.2.2	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios MECÁNICOS y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

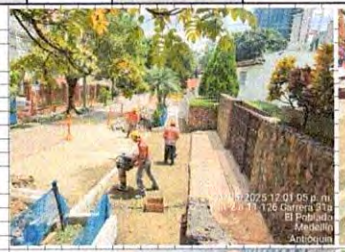






LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR		
ACTA Nº7						
Del 2 al 8 de junio de 2025						
POBLADO - LAS LOMAS						
CLL 11 CR 31 - 30		31,00	1,35	0,15	6,28	**6,28**
POBLADO - FLORIDA						
CLL 5G - 5F		33,00	1,30	0,15	6,44	
CLL 5G - 5F		4,00	1,30	0,40	2,08	
CLL 5G - 5F		1,80	1,20	0,15	0,32	
CLL 5G - 5F		2,60	1,80	0,15	0,70	
CLL 5G - 5F		9,40	2,90	0,15	4,09	
CLL 5G - 5F		14,45	1,30	0,15	2,82	
CLL 5G - 5F		14,45	1,42	0,15	3,08	
CLL 5G - 5F		4,80	4,00	0,15	2,88	**22,41**
CR 33 - CL 7 Y 6		6,00	3,10	0,20	4,96	
CR 33 - CL 7 Y 6		1,40	1,00	0,20	0,28	
CR 33 - CL 7 Y 6		1,40	1,00	0,15	0,21	
CR 33 - CL 7 Y 6		2,80	1,20	0,15	0,50	**5,95**
LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40 - CL 54 Y 56		11,86	3,25	0,15	5,78	
CR 40 - CL 54 Y 56		31,18	3,25	0,15	15,20	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,00	1,70	0,15	1,02	
CR 40 - CL 54 Y 56		3,75	1,80	0,15	1,01	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,61	1,50	0,15	1,04	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,96	1,20	0,15	0,89	
CR 40 - CL 54 Y 56		8,60	3,75	0,15	4,84	
CR 40 - CL 54 Y 56		7,96	1,10	0,15	1,31	
CR 40 - CL 54 Y 56		1,50	1,50	0,15	0,34	
CR 40 - CL 54 Y 56		2,75	1,70	0,15	0,70	
MENOS CAJAS					1,40	**30,73**
BOSTON - ENCISO						
CL 54 - CR 36 Y 37		2,00	1,98	0,15	0,59	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,88	3,68	0,15	1,59	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,88	3,60	0,15	1,56	
CL 54 - CR 36 Y 37		56,00	2,52	0,15	21,17	
CL 54 - CR 36 Y 37		40,00	1,60	0,15	9,60	
MENOS CAJAS					0,66	**33,85**
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	2,14	0,15	1,09	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	1,73	0,15	0,88	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,45	1,30	0,15	0,48	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,10	3,50	0,15	0,58	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,50	3,50	0,15	2,89	
CR 36A CLL 54 Y 58		7,30	2,10	0,15	2,30	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,70	1,90	0,15	0,77	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,74	1,20	0,15	0,13	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,90	3,50	0,15	1,52	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,15	1,65	0,15	1,27	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,39	3,36	0,15	1,20	
CR 36A CLL 54 Y 58		6,05	1,80	0,15	1,63	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,00	1,60	0,15	0,24	
MENOS CAJAS					0,36	**14,63**
BOMBONÁ II						
CR 9A - CL 44AA 45		20,00	2,00	0,30	12,00	**12,00**
Del 9 al 15 de junio de 2025						
POBLADO - LAS LOMAS						
CR 31A - CL 11A Y 11		12,00	1,65	0,15	2,97	
CR 31A - CL 11A Y 11		13,20	2,65	0,15	5,25	**8,22**
POBLADO - LAS LOMAS						
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		23,00	1,30	0,15	4,48	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		6,20	4,80	0,15	4,46	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		4,00	1,30	0,20	1,04	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		9,30	2,65	0,20	4,93	
MENOS CAJAS					0,29	**14,63**





POBLADO - FLORIDA						
CLL 5G - SF		27,20	1,50	0,15	6,12	
CLL 5G - SF		3,70	1,30	0,15	0,72	
CLL 5G - SF		3,57	1,00	0,15	0,54	
CLL 5G - SF		2,70	2,20	0,15	0,89	
CLL 5G - SF		5,50	2,90	0,15	2,39	**10,66**
LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40 - CL 54 Y 56		4,50	2,90	0,15	1,96	
CR 40 - CL 54 Y 56		7,00	2,90	0,15	3,05	
CR 40 - CL 54 Y 56		5,82	3,16	0,15	2,76	
CR 40 - CL 54 Y 56		8,53	3,87	0,15	4,95	
CR 40 - CL 54 Y 56		23,41	2,35	0,15	8,25	
MENOS CAJAS					0,78	**20,18**
BOSTON - ENCISO						
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	2,14	0,15	1,09	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	1,73	0,15	0,88	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,45	1,30	0,15	0,48	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,10	3,50	0,15	0,58	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,50	3,50	0,15	2,89	
CR 36A CLL 54 Y 58		7,30	2,10	0,15	2,30	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,70	1,90	0,15	0,77	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,74	1,20	0,15	0,13	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,90	3,50	0,15	1,52	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,15	1,65	0,15	1,27	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,39	3,36	0,15	1,20	
CR 36A CLL 54 Y 58		6,05	1,80	0,15	1,63	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,00	1,60	0,15	0,24	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,47	1,83	0,15	0,95	
CR 36A CLL 54 Y 58		8,05	2,10	0,15	2,54	
CR 36A CLL 54 Y 58		4,80	1,90	0,15	1,37	
MENOS CAJAS					0,35	**19,50**
CL 54 - CR 36 Y 37		0,50	1,98	0,15	0,15	
CL 54 - CR 36 Y 37		0,72	3,68	0,15	0,40	
CL 54 - CR 36 Y 37		0,72	3,60	0,15	0,39	
CL 54 - CR 36 Y 37		14,00	2,52	0,15	5,29	
CL 54 - CR 36 Y 37		10,00	1,60	0,15	2,40	
CL 54 - CR 36 Y 37		3,70	3,60	0,15	2,00	
MENOS CAJAS					0,16	**10,46**
BOMBONÁ I						
CRA 38 - CLL 39A		26,58	2,43	0,15	9,69	
CRA 38 - CLL 39A		2,20	2,30	0,15	0,76	
CRA 38 - CLL 39A		2,40	2,30	0,15	0,83	
CRA 38 - CLL 39A		5,40	2,51	0,15	2,03	
CRA 38 - CLL 39A		6,34	1,46	0,15	1,39	
CRA 38 - CLL 39A		2,45	2,07	0,15	0,76	
MENOS CAJAS					0,91	**14,55**
Del 2 al 8 de junio de 2025						
POBLADO - LAS LOMAS		85,00	0,20	0,25	4,25	
POBLADO - FLORIDA		150,05	0,20	0,25	7,50	
LA CANDELARIA - BOSTON		153,60	0,20	0,25	7,68	
BOSTON - ENCISO		122,40	0,20	0,25	6,12	
BOMBONÁ II		2,00	0,20	0,25	0,10	**25,65**
Del 9 al 15 de junio de 2025						
POBLADO - LAS LOMAS		172,20	0,20	0,25	8,61	
POBLADO - FLORIDA		115,14	0,20	0,25	5,76	
LA CANDELARIA - BOSTON		60,00	0,20	0,25	3,00	
BOSTON - ENCISO		206,25	0,20	0,25	10,31	
BOMBONÁ I		27,50	0,20	0,25	1,38	**29,05**
		PENDIENTES				
ACTA Nº6						
SIMÓN BOLÍVAR		1971,13	0,20	0,25	98,5565	
FERRINI		544,32	0,20	0,25	27,216	
CALLE NUEVA		115,00	0,20	0,25	5,75	
LORENA		557,55	0,20	0,25	27,8775	
ACACIAS		1117,53	0,20	0,25	55,8765	
GRANADA		1187,30	0,20	0,25	59,365	
ENCISO		1569,79	0,20	0,25	78,4895	
CALASANZ		82,03	0,20	0,25	4,1015	
FLORIDA		769,61	0,20	0,25	38,4805	
LOMAS		419,30	0,20	0,25	20,965	
BOSTON		376,94	0,20	0,25	18,847	**435,53**
		Subtotal				**714,29**
		TOTAL				**714,29**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN


CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	8
FECHA	DD	15	MM	6	AA	2025	PERÍODO	02/06/2025 - 15/06/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ÍTEM	3.3.1	DESCRIPCIÓN	Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo.	UNID.	m3-km	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



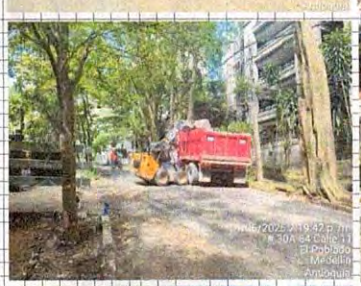




LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	DISTANCIA	CANTIDAD (M3KM)	MEDIDA TOTAL
ACTA N°7								
Del 2 al 8 de junio de 2025								
POBLADO - LAS LOMAS								
CLL 11 CR 31 - 30		24	2,5	0,06	3,60	25,00	90,00	
CLL 11 CR 31 - 30		7,7	2,5	0,06	1,16	25,00	28,88	
CLL 11 CR 31 - 30		31	1,35	0,06	2,51	25,00	62,78	
CLL 11 CR 31 - 30		3,8	0,3	0,5	0,57	25,00	14,25	
CLL 11 CR 31 - 30		94,3	0,3	0,35	9,90	25,00	247,54	443,44
LA CANDELARIA - BOSTON								
CR 40 - CL 54 Y 56		11,86	3,25	0,1	3,85	25,00	96,36	
CR 40 - CL 54 Y 56		31,18	3,25	0,1	10,13	25,00	253,34	
CR 40 - CL 54 Y 56		4	1,7	0,1	0,68	25,00	17,00	
CR 40 - CL 54 Y 56		3,75	1,8	0,1	0,68	25,00	16,88	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,61	1,5	0,1	0,69	25,00	17,29	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,96	1,2	0,1	0,60	25,00	14,88	
CR 40 - CL 54 Y 56		8,6	3,75	0,1	3,23	25,00	80,63	
CR 40 - CL 54 Y 56		7,96	1,1	0,1	0,88	25,00	21,89	
CR 40 - CL 54 Y 56		1,5	1,5	0,1	0,23	25,00	5,63	
CR 40 - CL 54 Y 56		2,75	1,7	0,1	0,47	25,00	11,69	535,67
BOSTON - ENCISO					-	25,00	-	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,4	2,14	0,10	0,73	25,00	18,19	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,4	1,73	0,10	0,59	25,00	14,71	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,45	1,30	0,10	0,32	25,00	7,96	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,1	3,50	0,10	0,39	25,00	9,63	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,5	3,50	0,10	1,93	25,00	48,13	
CR 36A CLL 54 Y 58		7,3	2,10	0,10	1,53	25,00	38,33	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,7	1,90	0,10	0,51	25,00	12,83	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,735	1,20	0,10	0,09	25,00	2,21	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,9	3,50	0,10	1,02	25,00	25,38	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,15	1,65	0,10	0,85	25,00	21,24	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,39	3,36	0,10	0,80	25,00	20,08	
CR 36A CLL 54 Y 58		6,05	1,80	0,10	1,09	25,00	27,23	
CR 36A CLL 54 Y 58		1	1,60	0,10	0,16	25,00	4,00	249,88
CR 36A CLL 54 Y 58		5,96	2,23	0,10	1,33	25,00	33,23	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,52	1,35	0,10	0,07	25,00	1,76	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,52	1,60	0,10	0,24	25,00	6,08	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,54	1,45	0,10	0,08	25,00	1,96	
CR 36A CLL 54 Y 58		4,58	1,70	0,10	0,78	25,00	19,48	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,54	1,00	0,10	0,05	25,00	1,35	63,85
CL 54 - CR 36 Y 37		2,00	1,98	0,10	0,40	25,00	9,90	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,88	3,68	0,10	1,06	25,00	26,50	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,88	3,60	0,10	1,04	25,00	25,92	
CL 54 - CR 36 Y 37		56,00	2,52	0,10	14,11	25,00	352,80	
CL 54 - CR 36 Y 37		40,00	1,60	0,10	6,40	25,00	160,00	575,12
POBLADO - FLORIDA								
CLL 5G - 5F		18,9	0,4	0,3	2,27	25,00	56,70	
CLL 5G - 5F		53,75	0,35	0,3	5,64	25,00	141,09	
CLL 5G - 5F		14,45	1,3	0,1	1,88	25,00	46,96	
CLL 5G - 5F		14,45	1,42	0,1	2,05	25,00	51,30	
CLL 5G - 5F		4,9	4,15	0,2	4,07	25,00	101,68	
CLL 5G - 5F		14,45	1,3	0,15	2,82	25,00	70,44	
CLL 5G - 5F		14,45	1,4	0,15	3,03	25,00	75,86	
CLL 5G - 5F		2,4	4	0,2	1,92	25,00	48,00	
CLL 5G - 5F		35,43	0,35	0,3	3,72	25,00	93,00	
CLL 5G - 5F		5	0,35	0,6	1,05	25,00	26,25	
CLL 5G - 5F		40	0,35	0,3	4,20	25,00	105,00	
CLL 5G - 5F		9	0,3	0,12	0,32	25,00	8,10	
CLL 5G - 5F		37	1,32	0,1	4,88	25,00	122,10	








CLL 5G - 5F		1,8	1,2	0,1	0,22	25,00	5,40	
CLL 5G - 5F		9,4	2,9	0,2	5,45	25,00	136,30	
CLL 5G - 5F		9,4	2,9	0,15	4,09	25,00	102,23	
CLL 5G - 5F		3	2,9	0,2	1,74	25,00	43,50	
CLL 5G - 5F		9	1,3	0,15	1,76	25,00	43,88	
CLL 5G - 5F		9	1,3	0,5	5,85	25,00	146,25	
CLL 5G - 5F		1,2	1,8	0,15	0,32	25,00	8,10	
CLL 5G - 5F		2,6	1,7	0,15	0,66	25,00	16,58	**1.448,71**
CL 7 - CR 33		8	3,1	0,2	4,96	25,00	124,00	
CL 7 - CR 33		1,4	1	0,2	0,28	25,00	7,00	
CL 7 - CR 33		1,4	1	0,15	0,21	25,00	5,25	
CL 7 - CR 33		2,8	1,2	0,15	0,50	25,00	12,60	**148,85**
LA CANDELARIA - BOSTON								
CR 40 - CL 54 Y 56		11,86	3,25	0,15	5,78	25,00	144,54	
CR 40 - CL 54 Y 56		31,18	3,25	0,15	15,20	25,00	380,01	
CR 40 - CL 54 Y 56		4	1,7	0,15	1,02	25,00	25,50	
CR 40 - CL 54 Y 56		3,75	1,8	0,15	1,01	25,00	25,31	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,61	1,5	0,15	1,04	25,00	25,93	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,96	1,2	0,15	0,89	25,00	22,32	
CR 40 - CL 54 Y 56		6,6	3,75	0,15	4,84	25,00	120,94	
CR 40 - CL 54 Y 56		7,96	1,1	0,15	1,31	25,00	32,84	
CR 40 - CL 54 Y 56		1,5	1,5	0,15	0,34	25,00	8,44	
CR 40 - CL 54 Y 56		2,75	1,7	0,15	0,70	25,00	17,53	**803,36**
BOSTON - ENCISO					-		-	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	2,14	0,15	1,09	25,00	27,29	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	1,73	0,15	0,88	25,00	22,06	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,45	1,30	0,15	0,48	25,00	11,94	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,10	3,50	0,15	0,58	25,00	14,44	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,50	3,50	0,15	2,89	25,00	72,19	
CR 36A CLL 54 Y 58		7,30	2,10	0,15	2,30	25,00	57,49	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,70	1,90	0,15	0,77	25,00	19,24	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,74	1,20	0,15	0,13	25,00	3,31	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,90	3,50	0,15	1,52	25,00	38,06	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,15	1,65	0,15	1,27	25,00	31,87	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,39	3,36	0,15	1,20	25,00	30,11	
CR 36A CLL 54 Y 58		6,05	1,80	0,15	1,63	25,00	40,84	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,00	1,60	0,15	0,24	25,00	6,00	**374,82**
CR 36A CLL 54 Y 58		5,96	2,23	0,50	6,65	25,00	166,14	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,52	1,35	0,50	0,35	25,00	8,78	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,52	1,60	0,50	1,22	25,00	30,40	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,54	1,45	0,50	0,39	25,00	9,79	
CR 36A CLL 54 Y 58		4,58	1,70	0,50	3,90	25,00	97,41	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,54	1,00	0,50	0,27	25,00	6,75	**319,26**
CL 54 - CR 36 Y 37		2	1,98	0,15	0,59	25,00	14,85	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,88	3,68	0,15	1,59	25,00	39,74	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,88	3,60	0,15	1,56	25,00	38,88	
CL 54 - CR 36 Y 37		56	2,52	0,15	21,17	25,00	529,20	
CL 54 - CR 36 Y 37		40	1,60	0,15	9,60	25,00	240,00	**862,67**
BOMBONÁ I					-			
CRA 36 - CLL 39A		6,54	2,66	0,1	1,74	25,00	43,49	
CRA 36 - CLL 39A		3,73	3,25	0,1	1,21	25,00	30,31	
CRA 36 - CLL 39A		5,55	2,25	0,1	1,25	25,00	31,22	
CRA 36 - CLL 39A		8,84	4,8	0,1	4,24	25,00	106,08	
CRA 36 - CLL 39A		6,93	2,26	0,1	1,57	25,00	39,15	
CRA 36 - CLL 39A		3,43	2,8	0,1	0,96	25,00	24,01	**274,26**
CRA 35 - CLL 39A		6,54	2,66	0,15	2,61	25,00	65,24	
CRA 35 - CLL 39A		3,73	3,25	0,15	1,82	25,00	45,46	
CRA 35 - CLL 39A		5,55	2,25	0,15	1,87	25,00	46,83	
CRA 35 - CLL 39A		8,84	4,8	0,15	6,36	25,00	159,12	
CRA 35 - CLL 39A		6,93	2,26	0,15	2,35	25,00	58,73	**375,38**

Del 9 al 15 de junio de 2025								
POBLADO - LAS LOMAS								
CR 31A - CL 11A Y 11	68	1,6	0,06	6,53	25,00	163,20		
CR 31A - CL 11A Y 11	12	1,65	0,06	1,19	25,00	29,70		
CR 31A - CL 11A Y 11	13,2	2,65	0,06	2,10	25,00	52,47		
CR 31A - CL 11A Y 11	93,2	0,3	0,5	13,98	25,00	348,50		
CR 31A - CL 11A Y 11	26,4	0,3	0,35	2,77	25,00	69,30		664,17
POBLADO - LAS LOMAS								
CL 11B - CR 34 Y CL 11A	23	1,3	0,07	2,09	25,00	52,33		
CL 11B - CR 34 Y CL 11A	6,2	4,8	0,07	2,08	25,00	52,08		
CL 11B - CR 34 Y CL 11A	12,1	0,3	0,5	1,82	25,00	45,38		
CL 11B - CR 34 Y CL 11A	119,4	0,3	0,35	12,54	25,00	313,43		463,21
POBLADO - FLORIDA								
CLL 5G - 5F	27,2	1,5	0,15	6,12	25,00	153,00		
CLL 5G - 5F	3,7	1,3	0,15	0,72	25,00	18,04		
CLL 5G - 5F	3,57	1	0,15	0,54	25,00	13,39		
CLL 5G - 5F	2,7	2,2	0,15	0,89	25,00	22,28		
CLL 5G - 5F	5,5	2,9	0,15	2,39	25,00	59,81		
CLL 5G - 5F	27,2	1,5	0,15	6,12	25,00	153,00		
CLL 5G - 5F	3,7	1,3	0,15	0,72	25,00	18,04		
CLL 5G - 5F	3,57	1	0,15	0,54	25,00	13,39		
CLL 5G - 5F	2,7	2,2	0,15	0,89	25,00	22,28		
CLL 5G - 5F	5,5	2,9	0,15	2,39	25,00	59,81		
CLL 5G - 5F	77,2	0,35	0,3	8,11	25,00	202,65		
CLL 5G - 5F	13,2	0,35	0,5	2,31	25,00	57,75		793,43
POBLADO - FLORIDA								
CL 7 - CR 33	15,5	0,35	0,3	1,63	25,00	40,69		
CL 7 - CR 33	9	0,35	0,5	1,58	25,00	39,38		
CL 7 - CR 33	6,74	0,35	0,5	1,18	25,00	29,49		109,55
LA CANDELARIA - BOSTON				-	25,00	-		
CR 40 - CL 54 Y 56	4,5	2,9	0,1	1,31	25,00	32,63		
CR 40 - CL 54 Y 56	7	2,9	0,1	2,03	25,00	50,75		
CR 40 - CL 54 Y 56	5,82	3,16	0,1	1,84	25,00	45,98		
CR 40 - CL 54 Y 56	8,53	3,87	0,1	3,30	25,00	82,53		
CR 40 - CL 54 Y 56	23,41	2,35	0,1	5,50	25,00	137,53		
CR 40 - CL 54 Y 56	4,5	2,9	0,15	1,96	25,00	48,94		
CR 40 - CL 54 Y 56	7	2,9	0,15	3,05	25,00	76,13		
CR 40 - CL 54 Y 56	5,82	3,16	0,15	2,76	25,00	68,97		
CR 40 - CL 54 Y 56	8,53	3,87	0,15	4,95	25,00	123,79		
CR 40 - CL 54 Y 56	23,41	2,35	0,15	8,25	25,00	206,30		873,54
BOSTON - ENCISO								
CR 36A CLL 54 Y 58	3,4	2,14	0,1	0,73	25,00	18,19		
CR 36A CLL 54 Y 58	3,4	1,73	0,1	0,59	25,00	14,71		
CR 36A CLL 54 Y 58	2,45	1,3	0,1	0,32	25,00	7,96		
CR 36A CLL 54 Y 58	1,1	3,5	0,1	0,39	25,00	9,63		
CR 36A CLL 54 Y 58	5,5	3,5	0,1	1,93	25,00	48,13		
CR 36A CLL 54 Y 58	7,3	2,1	0,1	1,53	25,00	38,33		
CR 36A CLL 54 Y 58	2,7	1,9	0,1	0,51	25,00	12,83		
CR 36A CLL 54 Y 58	0,735	1,2	0,1	0,09	25,00	2,21		
CR 36A CLL 54 Y 58	2,9	3,5	0,1	1,02	25,00	25,38		
CR 36A CLL 54 Y 58	5,15	1,65	0,1	0,85	25,00	21,24		
CR 36A CLL 54 Y 58	2,39	3,36	0,1	0,80	25,00	20,08		
CR 36A CLL 54 Y 58	6,05	1,8	0,1	1,09	25,00	27,23		
CR 36A CLL 54 Y 58	1	1,6	0,1	0,16	25,00	4,00		
CR 36A CLL 54 Y 58	3,47	1,83	0,1	0,64	25,00	15,88		
CR 36A CLL 54 Y 58	8,05	2,1	0,1	1,69	25,00	42,26		
CR 36A CLL 54 Y 58	4,8	1,9	0,1	0,91	25,00	22,80		
CR 36A CLL 54 Y 58	3,4	2,14	0,15	1,09	25,00	27,29		
CR 36A CLL 54 Y 58	3,4	1,73	0,15	0,88	25,00	22,06		
CR 36A CLL 54 Y 58	2,45	1,3	0,15	0,48	25,00	11,94		
CR 36A CLL 54 Y 58	1,1	3,5	0,15	0,58	25,00	14,44		
CR 36A CLL 54 Y 58	5,5	3,5	0,15	2,89	25,00	72,19		
CR 36A CLL 54 Y 58	7,3	2,1	0,15	2,30	25,00	57,49		
CR 36A CLL 54 Y 58	2,7	1,9	0,15	0,77	25,00	19,24		
CR 36A CLL 54 Y 58	0,735	1,2	0,15	0,13	25,00	3,31		
CR 36A CLL 54 Y 58	2,9	3,5	0,15	1,52	25,00	38,06		
CR 36A CLL 54 Y 58	5,15	1,65	0,15	1,27	25,00	31,87		

CR 36A CLL 54 Y 58		2,39	3,36	0,15	1,20	25,00	30,11	
CR 36A CLL 54 Y 58		6,05	1,8	0,15	1,63	25,00	40,84	
CR 36A CLL 54 Y 58		1	1,6	0,15	0,24	25,00	6,00	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,47	1,83	0,15	0,95	25,00	23,81	
CR 36A CLL 54 Y 58		8,05	2,1	0,15	2,54	25,00	63,39	
CR 36A CLL 54 Y 58		4,8	1,9	0,15	1,37	25,00	34,20	
CL 54 - CR 36 Y 37		0,5	1,88	0,1	0,10	25,00	2,48	
CL 54 - CR 36 Y 37		0,72	3,68	0,1	0,26	25,00	6,62	
CL 54 - CR 36 Y 37		0,72	3,6	0,1	0,26	25,00	6,46	
CL 54 - CR 36 Y 37		14	2,52	0,1	3,53	25,00	88,20	
CL 54 - CR 36 Y 37		10	1,6	0,1	1,60	25,00	40,00	
CL 54 - CR 36 Y 37		3,7	3,6	0,1	1,33	25,00	33,30	
CL 54 - CR 36 Y 37		0,5	1,98	0,15	0,15	25,00	3,71	
CL 54 - CR 36 Y 37		0,72	3,68	0,15	0,40	25,00	9,94	
CL 54 - CR 36 Y 37		0,72	3,6	0,15	0,39	25,00	9,72	
CL 54 - CR 36 Y 37		14	2,52	0,15	5,29	25,00	132,30	
CL 54 - CR 36 Y 37		10	1,6	0,15	2,40	25,00	60,00	
CL 54 - CR 36 Y 37		3,7	3,6	0,15	2,00	25,00	49,95	**1.269,75**
BOMBONÁ I					-	25,00	-	
CRA 38 - CLL 39A		9,5	4,81	0,1	4,57	25,00	114,24	
CRA 38 - CLL 39A		6,6	2,52	0,1	1,66	25,00	41,58	
CRA 38 - CLL 39A		1,2	2,4	0,1	0,29	25,00	7,20	
CRA 38 - CLL 39A		26,58	2,43	0,1	6,46	25,00	161,47	
CRA 38 - CLL 39A		2,2	2,3	0,1	0,51	25,00	12,65	
CRA 38 - CLL 39A		2,4	2,3	0,1	0,55	25,00	13,80	
CRA 38 - CLL 39A		5,4	2,51	0,1	1,36	25,00	33,89	
CRA 38 - CLL 39A		6,34	1,46	0,1	0,93	25,00	23,14	
CRA 38 - CLL 39A		2,45	2,07	0,1	0,51	25,00	12,68	
CRA 38 - CLL 39A		9,5	4,81	0,15	6,85	25,00	171,36	
CRA 38 - CLL 39A		6,6	2,52	0,15	2,49	25,00	62,37	
CRA 38 - CLL 39A		1,2	2,4	0,15	0,43	25,00	10,80	
CRA 38 - CLL 39A		26,58	2,43	0,15	9,69	25,00	242,21	
CRA 38 - CLL 39A		2,2	2,3	0,15	0,76	25,00	18,98	
CRA 38 - CLL 39A		2,4	2,3	0,15	0,83	25,00	20,70	
CRA 38 - CLL 39A		5,4	2,51	0,15	2,03	25,00	50,83	
CRA 38 - CLL 39A		6,34	1,46	0,15	1,39	25,00	34,71	
CRA 38 - CLL 39A		2,45	2,07	0,15	0,76	25,00	19,02	**1.051,61**
				Subtotal				**11.700,42**
TOTAL								**11.700,42**

OBSERVACIONES: Las celdas señaladas de color verde, hacen referencia a la demolición y las de color azul, a las excavaciones pertinentes por frente de trabajo.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N° 9
FECHA	DD	15	MM	6	AA	2025	PERÍODO	02/06/2025 - 15/06/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	3.3.2	DESCRIPCIÓN	Derechos de Botadero en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.








LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	MEDIDA TOTAL
ACTA N°7						
Del 2 al 6 de junio de 2025						
POBLADO - LAS LOMAS						
CLL 11 CR 31 - 30		24,00	2,50	0,06	3,60	
CLL 11 CR 31 - 30		7,70	2,50	0,06	1,16	
CLL 11 CR 31 - 30		31,00	1,35	0,06	2,51	
CLL 11 CR 31 - 30		3,80	0,30	0,50	0,57	
CLL 11 CR 31 - 30		94,30	0,30	0,35	9,90	
CLL 11 CR 31 - 30		37,50	2,50	0,19	17,81	
CLL 11 CR 31 - 30		11,55	2,50	0,19	5,49	
CLL 11 CR 31 - 30		46,50	1,35	0,19	11,91	
CLL 11 CR 31 - 30		5,70	0,30	0,50	0,86	
CLL 11 CR 31 - 30		141,45	0,30	0,35	14,85	**68,67**
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		103,80	0,30	0,35	10,90	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		229,95	0,30	0,50	34,49	**45,39**
LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40 - CL 54 Y 56		11,86	3,25	0,10	3,85	
CR 40 - CL 54 Y 56		31,18	3,25	0,10	10,13	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,00	1,70	0,10	0,68	
CR 40 - CL 54 Y 56		3,75	1,80	0,10	0,68	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,61	1,50	0,10	0,69	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,96	1,20	0,10	0,60	
CR 40 - CL 54 Y 56		8,60	3,75	0,10	3,23	
CR 40 - CL 54 Y 56		7,96	1,10	0,10	0,88	
CR 40 - CL 54 Y 56		1,50	1,50	0,10	0,23	
CR 40 - CL 54 Y 56		2,75	1,70	0,10	0,47	**21,42**
BOSTON - ENCISO					0,00	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	2,14	0,10	0,73	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	1,73	0,10	0,59	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,45	1,30	0,10	0,32	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,10	3,50	0,10	0,39	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,50	3,50	0,10	1,93	
CR 36A CLL 54 Y 58		7,30	2,10	0,10	1,53	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,70	1,90	0,10	0,51	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,74	1,20	0,10	0,09	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,90	3,50	0,10	1,02	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,15	1,65	0,10	0,85	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,39	3,36	0,10	0,80	
CR 36A CLL 54 Y 58		6,05	1,80	0,10	1,09	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,00	1,60	0,10	0,16	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,96	2,23	0,10	1,33	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,52	1,35	0,10	0,07	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,52	1,60	0,10	0,24	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,54	1,45	0,10	0,08	
CR 36A CLL 54 Y 58		4,58	1,70	0,10	0,78	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,54	1,00	0,10	0,05	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,00	1,98	0,10	0,40	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,88	3,68	0,10	1,06	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,88	3,60	0,10	1,04	
CL 54 - CR 36 Y 37		56,00	2,52	0,10	14,11	
CL 54 - CR 36 Y 37		40,00	1,60	0,10	6,40	**35,55**
POBLADO - FLORIDA						
CLL 5G - 5F		18,90	0,40	0,30	2,27	
CLL 5G - 5F		53,75	0,35	0,30	5,64	
CLL 5G - 5F		14,45	1,30	0,10	1,88	
CLL 5G - 5F		14,45	1,42	0,10	2,05	
CLL 5G - 5F		4,90	4,15	0,20	4,07	
CLL 5G - 5F		14,45	1,30	0,15	2,82	













CLL 5G - 5F		14,45	1,40	0,15	3,03	
CLL 5G - 5F		2,40	4,00	0,20	1,92	
CLL 5G - 5F		35,43	0,35	0,30	3,72	
CLL 5G - 5F		5,00	0,35	0,60	1,05	
CLL 5G - 5F		40,00	0,35	0,30	4,20	
CLL 5G - 5F		9,00	0,30	0,12	0,32	
CLL 5G - 5F		37,00	1,32	0,10	4,88	
CLL 5G - 5F		1,80	1,20	0,10	0,22	
CLL 5G - 5F		9,40	2,90	0,20	5,45	
CLL 5G - 5F		9,40	2,90	0,15	4,09	
CLL 5G - 5F		3,00	2,90	0,20	1,74	
CLL 5G - 5F		9,00	1,30	0,15	1,76	
CLL 5G - 5F		9,00	1,30	0,50	5,85	
CLL 5G - 5F		1,20	1,80	0,15	0,32	
CLL 5G - 5F		2,60	1,70	0,15	0,66	**57,95**
CL 7 - CR 33		8,00	3,10	0,20	4,96	
CL 7 - CR 33		1,40	1,00	0,20	0,28	
CL 7 - CR 33		1,40	1,00	0,15	0,21	
CL 7 - CR 33		2,80	1,20	0,15	0,50	**5,95**
LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40 - CL 54 Y 56		11,86	3,25	0,15	5,78	
CR 40 - CL 54 Y 56		31,18	3,25	0,15	15,20	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,00	1,70	0,15	1,02	
CR 40 - CL 54 Y 56		3,75	1,80	0,15	1,01	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,61	1,50	0,15	1,04	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,96	1,20	0,15	0,89	
CR 40 - CL 54 Y 56		8,60	3,75	0,15	4,84	
CR 40 - CL 54 Y 56		7,96	1,10	0,15	1,31	
CR 40 - CL 54 Y 56		1,50	1,50	0,15	0,34	
CR 40 - CL 54 Y 56		2,75	1,70	0,15	0,70	**32,13**
BOSTON - ENCISO					0,00	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	2,14	0,15	1,09	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	1,73	0,15	0,88	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,45	1,30	0,15	0,48	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,10	3,50	0,15	0,58	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,50	3,50	0,15	2,89	
CR 36A CLL 54 Y 58		7,30	2,10	0,15	2,30	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,70	1,90	0,15	0,77	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,74	1,20	0,15	0,13	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,90	3,50	0,15	1,52	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,15	1,65	0,15	1,27	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,39	3,36	0,15	1,20	
CR 36A CLL 54 Y 58		6,05	1,80	0,15	1,63	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,00	1,60	0,15	0,24	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,96	2,23	0,50	6,65	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,52	1,35	0,50	0,35	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,52	1,60	0,50	1,22	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,54	1,45	0,50	0,39	
CR 36A CLL 54 Y 58		4,58	1,70	0,50	3,90	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,54	1,00	0,50	0,27	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,00	1,98	0,15	0,59	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,88	3,68	0,15	1,59	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,88	3,60	0,15	1,56	
CL 54 - CR 36 Y 37		56,00	2,52	0,15	21,17	
CL 54 - CR 36 Y 37		40,00	1,60	0,15	9,60	**62,27**
BOMBONÁ I					0,00	
CRA 38 - CLL 39A		6,54	2,66	0,10	1,74	
CRA 38 - CLL 39A		3,73	3,25	0,10	1,21	
CRA 38 - CLL 39A		5,55	2,25	0,10	1,25	
CRA 38 - CLL 39A		8,84	4,80	0,10	4,24	

CRA 38 - CLL 39A		6,93	2,26	0,10	1,57	
CRA 38 - CLL 39A		3,43	2,80	0,10	0,96	
CRA 38 - CLL 39A		6,54	2,66	0,15	2,61	
CRA 38 - CLL 39A		3,73	3,25	0,15	1,82	
CRA 38 - CLL 39A		5,55	2,25	0,15	1,87	
CRA 38 - CLL 39A		8,84	4,80	0,15	6,36	
CRA 38 - CLL 39A		6,93	2,26	0,15	2,35	**25,99**
Del 9 al 15 de junio de 2025						
POBLADO - LAS LOMAS						
CR 31A - CL 11A Y 11		68,00	1,60	0,06	6,53	
CR 31A - CL 11A Y 11		12,00	1,65	0,06	1,19	
CR 31A - CL 11A Y 11		13,20	2,65	0,06	2,10	
CR 31A - CL 11A Y 11		93,20	0,30	0,50	13,98	
CR 31A - CL 11A Y 11		26,40	0,30	0,35	2,77	
CR 31A - CL 11A Y 11		18,00	1,65	0,19	5,64	
CR 31A - CL 11A Y 11		19,80	2,65	0,19	9,97	**42,18**
POBLADO - LAS LOMAS						
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		23,00	1,30	0,07	2,09	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		6,20	4,80	0,07	2,08	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		18,15	0,30	0,50	2,72	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		179,10	0,30	0,35	18,81	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		34,50	1,30	0,18	8,07	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		9,30	4,80	0,18	8,04	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		13,80	0,30	0,50	2,07	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		72,00	0,30	0,35	7,56	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		64,35	0,30	0,50	9,65	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		182,10	0,30	0,35	19,12	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		6,00	1,30	0,20	1,56	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		13,95	2,65	0,20	7,39	**89,17**
CL 11 - CR 31A Y 30		135,60	0,30	0,50	20,34	
CL 11 - CR 31A Y 30		11,55	0,30	0,35	1,21	**21,55**
POBLADO - FLORIDA						
CLL 5G - 5F		27,20	1,50	0,15	6,12	
CLL 5G - 5F		3,70	1,30	0,15	0,72	
CLL 5G - 5F		3,57	1,00	0,15	0,54	
CLL 5G - 5F		2,70	2,20	0,15	0,89	
CLL 5G - 5F		5,50	2,90	0,15	2,39	
CLL 5G - 5F		27,20	1,50	0,15	6,12	
CLL 5G - 5F		3,70	1,30	0,15	0,72	
CLL 5G - 5F		3,57	1,00	0,15	0,54	
CLL 5G - 5F		2,70	2,20	0,15	0,89	
CLL 5G - 5F		5,50	2,90	0,15	2,39	
CLL 5G - 5F		77,20	0,35	0,30	8,11	
CLL 5G - 5F		13,20	0,35	0,50	2,31	**31,74**
POBLADO - FLORIDA						
CL 7 - CR 33		15,50	0,35	0,30	1,63	
CL 7 - CR 33		9,00	0,35	0,50	1,58	
CL 7 - CR 33		6,74	0,35	0,50	1,18	**4,38**
LA CANDELARIA - BOSTON					0,00	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,50	2,90	0,10	1,31	
CR 40 - CL 54 Y 56		7,00	2,90	0,10	2,03	
CR 40 - CL 54 Y 56		5,82	3,16	0,10	1,84	
CR 40 - CL 54 Y 56		8,53	3,87	0,10	3,30	
CR 40 - CL 54 Y 56		23,41	2,35	0,10	5,50	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,50	2,90	0,15	1,96	
CR 40 - CL 54 Y 56		7,00	2,90	0,15	3,05	
CR 40 - CL 54 Y 56		5,82	3,16	0,15	2,76	
CR 40 - CL 54 Y 56		8,53	3,87	0,15	4,95	
CR 40 - CL 54 Y 56		23,41	2,35	0,15	8,25	**34,94**
BOSTON - ENCISO						
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	2,14	0,10	0,73	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	1,73	0,10	0,59	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,45	1,30	0,10	0,32	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,10	3,50	0,10	0,39	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,50	3,50	0,10	1,93	
CR 36A CLL 54 Y 58		7,30	2,10	0,10	1,53	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,70	1,90	0,10	0,51	

CR 36A CLL 54 Y 58		0,74	1,20	0,10	0,09	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,90	3,50	0,10	1,02	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,15	1,65	0,10	0,85	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,39	3,36	0,10	0,80	
CR 36A CLL 54 Y 58		6,05	1,80	0,10	1,09	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,00	1,60	0,10	0,16	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,47	1,83	0,10	0,64	
CR 36A CLL 54 Y 58		8,05	2,10	0,10	1,69	
CR 36A CLL 54 Y 58		4,80	1,90	0,10	0,91	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	2,14	0,15	1,09	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,40	1,73	0,15	0,88	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,45	1,30	0,15	0,48	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,10	3,50	0,15	0,58	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,50	3,50	0,15	2,89	
CR 36A CLL 54 Y 58		7,30	2,10	0,15	2,30	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,70	1,90	0,15	0,77	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,74	1,20	0,15	0,13	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,90	3,50	0,15	1,52	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,15	1,65	0,15	1,27	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,39	3,36	0,15	1,20	
CR 36A CLL 54 Y 58		6,05	1,80	0,15	1,63	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,00	1,60	0,15	0,24	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,47	1,83	0,15	0,95	
CR 36A CLL 54 Y 58		8,05	2,10	0,15	2,54	
CR 36A CLL 54 Y 58		4,80	1,90	0,15	1,37	
CL 54 - CR 36 Y 37		0,50	1,98	0,10	0,10	
CL 54 - CR 36 Y 37		0,72	3,68	0,10	0,26	
CL 54 - CR 36 Y 37		0,72	3,60	0,10	0,26	
CL 54 - CR 36 Y 37		14,00	2,52	0,10	3,53	
CL 54 - CR 36 Y 37		10,00	1,60	0,10	1,60	
CL 54 - CR 36 Y 37		3,70	3,60	0,10	1,33	
CL 54 - CR 36 Y 37		0,50	1,98	0,15	0,15	
CL 54 - CR 36 Y 37		0,72	3,68	0,15	0,40	
CL 54 - CR 36 Y 37		0,72	3,60	0,15	0,39	
CL 54 - CR 36 Y 37		14,00	2,52	0,15	5,29	
CL 54 - CR 36 Y 37		10,00	1,60	0,15	2,40	
CL 54 - CR 36 Y 37		3,70	3,60	0,15	2,00	**50,79**
BOMBONÁ I					0,00	
CRA 38 - CLL 39A		9,50	4,81	0,10	4,57	
CRA 38 - CLL 39A		6,60	2,52	0,10	1,66	
CRA 38 - CLL 39A		1,20	2,40	0,10	0,29	
CRA 38 - CLL 39A		26,58	2,43	0,10	6,46	
CRA 38 - CLL 39A		2,20	2,30	0,10	0,51	
CRA 38 - CLL 39A		2,40	2,30	0,10	0,55	
CRA 38 - CLL 39A		5,40	2,51	0,10	1,36	
CRA 38 - CLL 39A		6,34	1,46	0,10	0,93	
CRA 38 - CLL 39A		2,45	2,07	0,10	0,51	
CRA 38 - CLL 39A		9,50	4,81	0,15	6,85	
CRA 38 - CLL 39A		6,60	2,52	0,15	2,49	
CRA 38 - CLL 39A		1,20	2,40	0,15	0,43	
CRA 38 - CLL 39A		26,58	2,43	0,15	9,69	
CRA 38 - CLL 39A		2,20	2,30	0,15	0,76	
CRA 38 - CLL 39A		2,40	2,30	0,15	0,83	
CRA 38 - CLL 39A		5,40	2,51	0,15	2,03	
CRA 38 - CLL 39A		6,34	1,46	0,15	1,39	
CRA 38 - CLL 39A		2,45	2,07	0,15	0,76	**41,30**
	Subtotal					**671,39**
	TOTAL					**671,39**

OBSERVACIONES: Las celdas señaladas de color verde, hacen referencia a la demolición y las de color azul, a las excavaciones pertinentes por frente de trabajo.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	10
FECHA	DD	15	MM	6	AA	2025	PERÍODO	02/06/2025 - 15/06/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ÍTEM	4.1.1	DESCRIPCIÓN	Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.08 m (8 centímetros) Vaciado alternado (Junta fría), Incluye suministro y transporte de los materiales, acabado escobillado y llaneado 0.10 m en los bordes TIPO METRO, los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso de los discapacitados y hasta una huellas y una contrahuella necesarias en los lugares que indique la interventoría. Las excavaciones o descapotes, malla y material de soporte (base, sub base, entresuelo o arenilla) así como las llaves en caso de requerirse, se pagarán en su ítem respectivo.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
ACTA N°7					
Del 9 al 15 de junio de 2025					
POBLADO - FLORIDA					
CLL 5G - 5F		43,7	0,45	19,665	19,67
Subtotal					19,67
TOTAL					19,67

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	11
FECHA	DD	15	MM	6	AA	2025	PERÍODO	02/06/2025 - 15/06/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	4.1.2	DESCRIPCIÓN	Construcción de ESCALAS sobre entresuelo, en concreto 21 MPa., según diseño y condiciones del sitio. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 18 mm, o su equivalente para acabado a la vista, contrahuellas, moldura chaflán en contrahuellas, vibrado, protección, curado, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR		
ACTA N°7						
Del 2 al 8 de junio de 2025						
POBLADO - FLORIDA						
CR 33 - CL 7 Y 6		1,40	1,00	0,30	0,42	
CR 33 - CL 7 Y 6		2,80	1,20	0,30	1,01	**1,43**
Subtotal						**1,43**
TOTAL						**1,43**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						**CONSORCIO VIAL VG - VNF**				**HOJA N°**	12
FECHA	**DD**	15	**MM**	6	**AA**	2025	**PERÍODO**	02/06/2025 - 15/06/2025	**ELABORÓ**	**ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA**	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — **FECHA DE INICIO**

ÍTEM	4.1.5	**DESCRIPCIÓN**	Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0,10 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagará en su ítem respectivo. La interventoría y/o supervisión solicitarán los ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.	**UNID.**	m2	**PROYECTO**	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.








LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
ACTA N°7					
Del 2 al 8 de junio de 2025					
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		6,50	2,40	15,60	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		6,60	1,20	7,92	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		6,20	2,40	14,88	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		8,00	1,10	8,80	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		2,00	1,10	2,20	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		10,00	2,20	22,00	**71,40**
POBLADO - FLORIDA					
CLL 5G - 5F		14,45	1,30	18,79	
CLL 5G - 5F		14,45	1,40	20,23	
MENOS CAJAS				1,45	**37,57**
POBLADO - FLORIDA					
CR 33 - CL 7 Y 6		8,00	3,10	24,80	
CR 33 - CL 7 Y 6		1,40	1,00	1,40	
MENOS CAJAS				0,18	**26,03**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40 - CL 54 Y 56		4,96	1,20	5,95	
CR 40 - CL 54 Y 56		8,60	3,75	32,25	
CR 40 - CL 54 Y 56		7,96	1,10	8,76	
CR 40 - CL 54 Y 56		1,50	1,50	2,25	
CR 40 - CL 54 Y 56		2,75	1,70	4,68	
MENOS CAJAS				2,48	**51,40**
BOSTON - ENCISO					
CR 36A CLL 54 Y 58		2,38	2,14	5,09	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,38	1,73	4,12	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,72	1,30	2,23	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,77	3,50	2,70	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,85	3,50	13,48	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,11	2,10	10,73	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,89	1,90	3,59	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,51	1,20	0,62	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,03	3,50	7,11	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,61	1,65	5,95	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,67	3,36	5,62	
CR 36A CLL 54 Y 58		4,24	1,80	7,62	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,70	1,60	1,12	
MENOS CAJAS				1,66	**68,31**
CL 54 - CR 36 Y 37		2,00	1,98	3,96	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,88	3,68	10,60	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,88	3,60	10,37	
CL 54 - CR 36 Y 37		56,00	2,52	141,12	
CL 54 - CR 36 Y 37		40,00	1,60	64,00	
MENOS CAJAS				5,05	**225,00**
Del 9 al 15 de junio de 2025					
POBLADO - LAS LOMAS					
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		23,00	1,10	25,30	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		6,20	4,50	27,90	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		4,00	1,10	4,40	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		9,30	2,35	21,86	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		8,20	1,20	9,84	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		16,00	1,10	17,60	
MENOS CAJAS				1,79	**105,11**









POBLADO - FLORIDA					
CLL 5G - 5F		37,00	0,90	33,30	
CLL 5G - 5F		1,20	1,60	1,92	
CLL 5G - 5F		2,60	1,60	4,16	
MENOS CAJAS				3,05	**36,33**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40 - CL 54 Y 56		4,50	2,90	13,05	
CR 40 - CL 54 Y 56		7,00	2,90	20,30	
CR 40 - CL 54 Y 56		5,82	3,16	18,39	
CR 40 - CL 54 Y 56		8,53	3,87	33,01	
CR 40 - CL 54 Y 56		23,41	2,35	55,01	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,00	4,00	16,00	
MENOS CAJAS				5,21	**150,56**
BOSTON - ENCISO					
CR 36A CLL 54 Y 58		3,74	2,14	8,00	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,74	1,73	6,47	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,70	1,30	3,50	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,21	3,50	4,24	
CR 36A CLL 54 Y 58		6,05	3,50	21,18	
CR 36A CLL 54 Y 58		8,03	2,10	16,86	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,97	1,90	5,64	
CR 36A CLL 54 Y 58		0,81	1,20	0,97	
CR 36A CLL 54 Y 58		3,19	3,50	11,17	
CR 36A CLL 54 Y 58		5,67	1,65	9,35	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,63	3,36	8,83	
CR 36A CLL 54 Y 58		6,66	1,80	11,98	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,10	1,60	1,76	
MENOS CAJAS				2,59	**107,36**
CL 54 - CR 36 Y 37		0,50	1,98	0,99	
CL 54 - CR 36 Y 37		0,72	3,68	2,65	
CL 54 - CR 36 Y 37		0,72	3,60	2,59	
CL 54 - CR 36 Y 37		14,00	2,52	35,28	
CL 54 - CR 36 Y 37		10,00	1,60	16,00	
CL 54 - CR 36 Y 37		3,70	3,60	13,32	
MENOS CAJAS				1,08	**69,75**
	Subtotal				**948,80**
TOTAL					**948,80**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	13
FECHA	DD	15	MM	6	AA	2025	PERÍODO	02/06/2025 - 15/06/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	4.2.1	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de Cordon prefabricado de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80 cm. (BOBAR)	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
ACTA N°7		
Del 2 al 8 de junio de 2025		
POBLADO - LAS LOMAS	85,00	**85,00**
POBLADO - FLORIDA	150,05	**150,05**
LA CANDELARIA - BOSTON	153,60	**153,60**
BOSTON - ENCISO	122,40	**122,40**
BOMBONÁ II	2,00	**2,00**
Del 9 al 15 de junio de 2025		
POBLADO - LAS LOMAS	172,20	**172,20**
POBLADO - FLORIDA	115,14	**115,14**
LA CANDELARIA - BOSTON	60,00	**60,00**
BOSTON - ENCISO	206,25	**206,25**
BOMBONÁ I	27,50	**27,50**
	Subtotal	**1.094,14**
	TOTAL	**1.094,14**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	14
FECHA	DD	15	MM	6	AA	2025	PERÍODO	02/06/2025 - 15/06/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	4.2.3	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y Construccion de cordon-cuneta en concreto de 21 MPa. Incluye ajustes en concreto donde sea necesario y triturado de fondo. Según detalle S.I.F. No incluye refuerzo.	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
ACTA N°7		
Del 9 al 15 de junio de 2025		
BOSTON - ENCISO	9,00	9,00

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF							HOJA N°	15
FECHA	DD	15	MM	6	AA	2025	PERÍODO	02/06/2025 - 15/06/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	4.2.4	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor de mínimo 0.05 m. Incluye: transporte interno y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.








LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
ACTA N°7					
Del 2 al 8 de junio de 2025					
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11 CR 31 - 30		43,20	0,45	19,44	
CLL 11 CR 31 - 30		53,50	0,45	24,08	43,52
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		6,50	0,40	2,60	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		1,10	0,40	0,44	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		4,70	0,40	1,88	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		11,50	0,40	4,60	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		8,70	0,40	3,48	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		23,00	0,45	10,35	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		3,90	0,30	1,17	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		12,45	0,40	4,98	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		4,90	0,45	2,21	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		7,50	0,45	3,38	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		7,10	0,45	3,20	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		9,40	0,45	4,23	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		8,50	0,45	3,83	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		13,50	0,45	6,08	52,41
POBLADO - FLORIDA					
CLL 5G - 5F		1,20	1,20	1,44	
CLL 5G - 5F		1,00	1,00	1,00	
CLL 5G - 5F		0,60	0,60	0,36	
CLL 5G - 5F		63,33	0,12	7,60	10,40
CR 33 - CL 7 Y 6		6,74	0,10	0,67	
CR 33 - CL 7 Y 6		40,90	0,10	4,09	
CR 33 - CL 7 Y 6		35,98	0,10	3,60	
CR 33 - CL 7 Y 6		12,80	0,10	1,28	9,64
BOSTON - ENCISO					
CR 36A CLL 64 Y 58		21,00	0,50	10,50	10,50
BOMBONA II					
CR 9A - CL 444A 45		26,00	0,05	1,30	1,30
Del 9 al 15 de junio de 2025					
POBLADO - LAS LOMAS					
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		46,50	0,45	20,93	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		32,20	0,45	14,49	35,42
POBLADO - FLORIDA					
CLL 5G - 5F		33,20	0,10	3,32	
CLL 5G - 5F		13,20	0,20	2,64	
CLL 5G - 5F		36,40	0,10	3,64	
CLL 5G - 5F		15,40	0,10	1,54	
CLL 5G - 5F		9,60	0,20	1,92	13,06
BOSTON - ENCISO					
CR 36A CLL 64 Y 58		21,00	0,50	10,50	10,50
		PENDIENTE			
ACTA N°6					
SIMÓN BOLÍVAR		1971,13	0,20	394,23	
FERRINI		544,32	0,20	108,86	
CALLE NUEVA		115,00	0,20	23,00	
LORENA		557,55	0,20	111,51	
ACACIAS		1117,53	0,20	223,51	
GRANADA		1187,30	0,20	237,46	
ENCISO		1007,17	0,20	201,43	1300,00
				Subtotal	1.486,74
				TOTAL	1.486,74

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						**CONSORCIO VIAL VG - VNF**				**HOJA N°**	16
FECHA	**DD**	15	**MM**	6	**AA**	2025	**PERÍODO**	02/06/2025 - 15/06/2025	**ELABORÓ**	**ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA**	

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — **FECHA DE INICIO**

ÍTEM	5.1	**DESCRIPCIÓN**	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	**UNID.**	kg	**PROYECTO**	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	KG	MEDIDA TOTAL
ACTA N°7		
Del 2 al 8 de junio de 2025		
POBLADO - FLORIDA	22,06	**22,06**
BOSTON - ENCISO	73,45	**73,45**
Del 9 al 15 de junio de 2025		
BOSTON - ENCISO	80,38	**80,38**
BOMBONÁ II	39,20	**39,20**
Subtotal		**215,09**
TOTAL		**215,09**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	17
FECHA	DD	15	MM	6	AA	2025	PERÍODO	02/06/2025 - 15/06/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	5.2	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO		
ACTA N°7					
Del 2 al 8 de junio de 2025					
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		6,00	2,00	12,00	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		10,00	2,00	20,00	
MENOS CAJAS				1,67	**30,34**
POBLADO - FLORIDA					
CLL 5G - 5F		2,00	1,00	2,00	
CLL 5G - 5F		2,00	1,00	2,00	
CLL 5G - 5F		2,50	1,00	2,50	
CLL 5G - 5F		0,80	0,80	0,64	**7,14**
CR 33 - CL 7 Y 6		4,00	1,00	4,00	**4,00**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40 - CL 54 Y 56		1,15	2,20	2,53	
CR 40 - CL 54 Y 56		1,20	2,04	2,45	
CR 40 - CL 54 Y 56		1,20	1,90	2,28	
CR 40 - CL 54 Y 56		1,20	3,30	3,96	
CR 40 - CL 54 Y 56		1,60	5,40	8,64	
CR 40 - CL 54 Y 56		1,22	2,37	2,89	
CR 40 - CL 54 Y 56		2,20	2,30	5,06	
CR 40 - CL 54 Y 56		2,30	2,30	5,29	
CR 40 - CL 54 Y 56		2,30	1,16	2,67	
CR 40 - CL 54 Y 56		2,30	1,20	2,76	
CR 40 - CL 54 Y 56		2,40	2,10	5,04	
CR 40 - CL 54 Y 56		1,80	1,60	2,88	**46,45**
BOSTON - ENCISO					
CR 36A CLL 54 Y 58		1,35	2,69	3,63	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,36	2,22	3,02	
CR 36A CLL 54 Y 58		12,80	1,70	21,76	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,30	1,70	3,91	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,30	1,70	3,91	**36,23**
CL 54 - CR 36 Y 37		2,40	2,00	4,80	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,40	2,00	4,80	
CL 54 - CR 36 Y 37		3,50	2,00	7,00	
CL 54 - CR 36 Y 37		3,50	2,00	7,00	
CL 54 - CR 36 Y 37		3,50	2,00	7,00	
CL 54 - CR 36 Y 37		1,35	2,69	3,63	
CL 54 - CR 36 Y 37		1,36	2,22	3,02	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,30	1,10	2,53	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,30	1,10	2,53	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,03	1,10	2,23	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,03	1,10	2,23	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,30	1,10	2,53	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,30	1,10	2,53	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,30	1,05	2,42	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,30	1,05	2,42	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,30	1,05	2,42	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,30	1,05	2,42	**61,50**

Del 9 al 15 de junio de 2025					
POBLADO - LAS LOMAS					
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		2,00	2,00	4,00	
MENOS CAJAS				1,46	**2,54**
POBLADO - FLORIDA					
CLL 5G - 5F		2,00	1,00	2,00	**2,00**
BOSTON - ENCISO					
CR 36A CLL 54 Y 58		2,30	1,70	3,91	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,30	1,30	2,99	
CR 36A CLL 54 Y 58		2,30	1,70	3,91	**10,81**
CL 54 - CR 36 Y 37		2,30	1,30	2,99	
CL 54 - CR 38 Y 37		2,30	1,30	2,99	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,30	1,60	3,68	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,30	1,70	3,91	
CL 54 - CR 36 Y 37		2,30	1,70	3,91	**17,48**
SUBTOTAL					**218,48**
TOTAL					**218,48**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	18
FECHA	DD	15	MM	6	AA	2025	PERÍODO	02/06/2025 - 15/06/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	6.1	DESCRIPCIÓN	Realce para cajas de acueducto y alcantarillado existente y recuperacion de herrajes de andenes. Altura 15 - 20 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	UNID.	Und	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	CANTIDAD TOTAL
ACTA N°7		
Del 2 al 8 de junio de 2025		
POBLADO - LAS LOMAS	15,00	**15,00**
POBLADO - FLORIDA	7,00	**7,00**
LA CANDELARIA - BOSTON	6,00	**6,00**
BOSTON - ENCISO	11,00	**11,00**
Del 9 al 15 de junio de 2025		
POBLADO - LAS LOMAS	5,00	**5,00**
POBLADO - FLORIDA	2,00	**2,00**
LA CANDELARIA - BOSTON	28,00	**28,00**
BOSTON - ENCISO	43,00	**43,00**
BOMBONÁ I	3,00	**3,00**
	PENDIENTE	
	ACTA N°4	
Del 01 al 15 de marzo del 2025		
LAURELES - LORENA	49,00	**49,00**
LA AMÉRICA - FERRINI	25,00	**25,00**
BELÉN GRANADA	39,00	**39,00**
BOSTON - ENCISO	28,00	**28,00**
LA AMÉRICA - CALASANZ	2,00	**2,00**
LAURELES - LAS ACACIAS	14,00	**14,00**
Del 16 al 23 de marzo del 2025		
LAURELES - LAS ACACIAS	8,00	**8,00**
LAURELES - LORENA	9,00	**9,00**
BELÉN GRANADA	20,00	**20,00**
BOSTON - ENCISO	8,00	**8,00**
Del 24 al 31 de marzo		
BOSTON - ENCISO	23,00	**23,00**
LAURELES - LAS ACACIAS	1,00	**1,00**
LAURELES - LORENA	7,00	**7,00**
BELÉN GRANADA	23,00	**23,00**
		256,00
	ACTA N°5	
Del 01 al 06 de abril del 2025		
BOSTON - ENCISO	38,00	**38,00**
BELÉN GRANADA	2,00	**2,00**
Del 07 al 13 de abril		
BOSTON - ENCISO	78,00	**78,00**
BELÉN GRANADA	32,00	**32,00**
POBLADO - FLORIDA	2,00	**2,00**
Del 14 al 20 de abril		
BELÉN GRANADA	10,00	**10,00**
Del 21 al 27 de abril		
BOSTON - ENCISO	6,00	**6,00**
BELÉN GRANADA	26,00	**26,00**
POBLADO - FLORIDA	2,00	**2,00**
Del 28 al 30 de abril		
BOSTON - ENCISO	73,00	**73,00**
BELÉN GRANADA	31,00	**31,00**
		300,00

ACTA N°6		
Del 05 al 11 de mayo		
BOSTON - ENCISO	43,00	43,00
LA CANDELARIA - BOSTON	17,00	17,00
POBLADO - LAS LOMAS	13,00	13,00
POBLADO - FLORIDA	7,00	7,00
Del 12 al 18 de mayo		
POBLADO - FLORIDA	2,00	2,00
BOSTON - ENCISO	15,00	15,00
LA CANDELARIA - BOSTON	3,00	3,00
POBLADO - LAS LOMAS	6,00	6,00
Del 19 al 25 de mayo		
BOSTON - ENCISO	3,00	3,00
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR	4,00	4,00
LA CANDELARIA - BOSTON	30,00	30,00
POBLADO - LAS LOMAS	4,00	4,00
POBLADO - FLORIDA	2,00	2,00
Del 26 de mayo al 01 de junio		
POBLADO - LAS LOMAS	2,00	2,00
POBLADO - FLORIDA	10,00	10,00
BOSTON - ENCISO	3,00	3,00
		164,00
Subtotal		840,00
TOTAL		840,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	19
FECHA	DD	15	MM	6	AA	2025	PERÍODO	02/06/2025 - 15/06/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	6.3	DESCRIPCIÓN	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 80x80x80 cm medidas internas (L=80cm) en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa y herraje. Según diseño SIF Municipio de Medellín.	UNID.	Und	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	CANTIDAD TOTAL
ACTA N°7		
Del 2 al 8 de junio de 2025		
POBLADO - LAS LOMAS	1,00	1,00
Del 9 al 15 de junio de 2025		
POBLADO - FLORIDA	12,00	12,00
LA CANDELARIA - BOSTON	2,00	2,00
PENDIENTES		
ACTA N°5		
Del 07 al 13 de abril		
BELÉN GRANADA	5,00	5,00
Del 14 al 20 de abril		
BOSTON - ENCISO	3,00	3,00
		8,00
ACTA N°6		
Del 12 al 18 de mayo		
BOSTON - ENCISO	2,00	2,00
POBLADO - LAS LOMAS	2,00	2,00
Del 19 al 25 de mayo		
LA CANDELARIA - BOSTON	2,00	2,00
POBLADO - LAS LOMAS	2,00	2,00
Del 26 de mayo al 01 de junio		
POBLADO - LAS LOMAS	1,00	1,00
		9,00
Subtotal		32,00
TOTAL		32,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF									HOJA Nº	20
FECHA	DD	15	MM	6	AA	2025	PERÍODO	02/06/2025 - 15/06/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	7.1	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de adoquín táctil guía o alerta discapacitados visuales de 20X20X6 cm LOST-AL . Incluye arena de apoyo 5 cm, sello de juntas con arena,cortes a maquina . Según diseño. Seguir recomendaciones MEP color AMARILLO.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.








LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO		
ACTA N°7					
Del 2 al 8 de junio de 2025					
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		0,60	0,60	0,36	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		0,60	0,60	0,36	
CLL 11B CR 34 Y CLL 11A		0,60	0,60	0,36	**1,08**
POBLADO - FLORIDA					
CLL 5G - 5F		1,20	1,20	1,44	
CLL 5G - 5F		1,00	1,00	1,00	
CLL 5G - 5F		0,60	0,60	0,36	**2,80**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40 - CL 54 Y 56		1,20	1,40	0,84	
CR 40 - CL 54 Y 56		0,80	0,60	0,60	
CR 40 - CL 54 Y 56		0,60	0,60	0,36	**1,80**
BOSTON - ENCISO					
CR 36A CLL 54 Y 58		1,20	0,60	0,72	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,40	0,20	0,28	
CR 36A CLL 54 Y 58		1,00	0,10	0,10	**1,10**
CL 54 - CR 36 Y 37		0,60	0,60	0,36	**0,36**
Del 9 al 15 de junio de 2025					
POBLADO - LAS LOMAS					
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		0,60	0,60	0,36	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		0,60	0,60	0,36	**0,72**
ACTA N°3					
LAURELES - ACACIAS					
CL 36 - CR 80 Y 81		40,00	0,04	1,60	
CL 36 - CR 80 Y 81		57,00	0,04	2,28	
CL 36 - CR 80 Y 81		32,00	0,04	1,28	
CL 36 - CR 80 Y 81		27,00	0,04	1,08	**6,24**
LAURELES - LORENA					
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		36,00	0,04	1,44	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		18,00	0,04	0,72	**2,16**
LA AMÉRICA - FERRINI					
CL 53A - CR 81 Y 80	5,00	1,20	1,20	7,20	**7,20**
CALLE NUEVA					
CR 50 - CL 45 Y 46		0,60	0,60	0,36	**0,36**
					15,96
ACTA N°4					
Del 01 al 15 de marzo del 2025					
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR					
CL 40A - CR 83A Y 84		8,20	0,20	1,64	
CL 40A - CR 83A Y 84		0,60	0,60	0,36	
CL 40A - CR 83A Y 84		9,20	0,20	1,84	**3,84**
LAURELES - LAS ACACIAS					
CL 36 - CR 80 Y 81		2,75	0,86	2,37	**2,37**
LAURELES - LORENA					
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		2,48	0,58	1,44	**1,44**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,20	1,20	1,44	
CR 75 - CL 30 Y 30A		0,06	0,06	0,004	**1,44**
CR 75 - CL 30 Y 30A		5,00	8,00	40,00	**40,00**
CR 74 - CL 27 Y 28		1,20	1,20	1,44	**1,44**
LA AMÉRICA - CALASANZ					
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,20	2,40	2,88	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,20	2,20	2,64	**5,52**













Del 16 al 23 de marzo del 2025					
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR					
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,20	1,20	1,44	**1,44**
LAURELES - LORENA					
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,20	1,00	1,20	**1,20**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30A Y 28		0,6	0,6	0,36	**0,36**
LA AMÉRICA - CALASANZ					
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,20	1,20	2,64	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,40	1,30	3,12	**5,76**
Del 24 al 31 de marzo					
LAURELES - LAS ACACIAS					
CL 36 - CR 80 Y 81		1,20	1,20	1,44	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,20	1,20	1,44	**2,88**
LAURELES - LORENA					
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,20	1,00	1,20	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,20	1,20	1,44	**2,64**
LA AMÉRICA - CALASANZ					
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,20	1,00	1,20	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,20	2,20	2,64	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,20	1,30	1,56	**5,40**
LA AMÉRICA - FERRINI					
CL 53A - CR 81 Y 80		0,60	0,60	0,36	**0,36**
					76,09
		ACTA N°5			
Del 01 al 06 de abril del 2025					
BOSTON - ENCISO					
CL 57-CR 36A Y 34		1,20	1,03	1,24	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,40	1,20	2,88	**4,12**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30A Y 28		2,00	1,20	2,40	**2,40**
Del 07 al 13 de abril					
BOSTON - ENCISO					
CL 57-CR 36A Y 34		2,10	1,20	2,52	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,37	1,20	1,64	**4,16**
LA AMÉRICA - CALASANZ					
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,20	1,20	1,44	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,20	1,00	1,20	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,20	1,20	1,44	**4,08**
BELÉN GRANADA					
CL 28 - CR 75 Y 74A		1,00	1,20	1,20	
CL 28 - CR 75 Y 74A		1,00	1,40	1,40	
CL 28 - CR 75 Y 74A		1,00	1,20	1,20	**3,80**
Del 14 al 20 de abril					
BOSTON - ENCISO					
CL 57-CR 36A Y 34		1,20	1,20	1,44	**1,44**
LA AMÉRICA - CALASANZ					
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,20	1,20	1,44	**1,44**
Del 21 al 27 de abril					
BOSTON - ENCISO					
CL 57-CR 36A Y 34		1,20	0,87	1,04	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,20	1,20	1,44	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,20	1,20	1,44	
CL 57-CR 36A Y 34		1,20	1,20	1,44	
CL 57-CR 36A Y 34		1,20	1,12	1,34	**6,71**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	1,00	1,00	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	1,20	1,20	**2,20**
CL 28 - CR 75 Y 74A		1,00	1,20	1,20	
CL 28 - CR 75 Y 74A		1,00	1,20	1,20	**2,40**
CR 74 - CL 27 Y 28		1,20	1,20	1,44	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,20	1,20	1,44	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	0,24	0,24	**3,12**
LA AMÉRICA - CALASANZ					
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,20	1,20	1,44	**1,44**
POBLADO - FLORIDA					
CALLE 5G		1,20	1,00	1,20	
CALLE 5G		1,20	1,00	1,20	**2,40**
					39,71

ACTA N°6					
Del 05 al 11 de mayo					
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,53	1,76	2,69	**2,69**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40-CL 54 Y 56		1,20	1,20	1,44	**1,44**
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		1,00	1,00	1,00	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		1,00	1,40	1,40	**2,40**
POBLADO - FLORIDA					
CL 5F Y 5G		1,20	1,20	1,44	
CL 5F Y 5G		1,20	1,20	1,44	**2,88**
CL 7 CR 35		1,20	1,20	1,44	**1,44**
Del 12 al 18 de mayo					
POBLADO - FLORIDA					
CL 5F Y 5G		1,20	1,20	1,44	
CL 5F Y 5G		1,20	1,20	1,44	**2,88**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40-CL 54 Y 56		1,65	1,60	2,64	
CR 40-CL 54 Y 56		1,20	1,20	1,44	**4,08**
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,20	1,20	1,44	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,20	1,20	1,44	**2,88**
CL 11 CR 31A Y 30		0,60	0,60	0,36	
CL 11 CR 31A Y 30		0,60	0,60	0,36	**0,72**
Del 19 al 25 de mayo					
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40-CL 54 Y 56		1,32	1,40	1,85	**1,85**
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,20	1,20	1,44	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,20	1,20	1,44	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,20	1,20	1,44	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,20	1,20	1,44	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,20	1,20	1,44	**7,20**
CL 54-CR 36A Y 37		0,60	0,60	0,36	**0,36**
POBLADO - FLORIDA					
CL 7- CR 33		1,20	1,20	1,44	
CL 7- CR 33		1,00	1,20	1,20	**2,64**
Del 26 de mayo al 01 de junio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CL 11 CR 31A Y 30		0,60	0,60	0,36	**0,36**
POBLADO - FLORIDA					
CL 5F Y 5G		1,20	1,20	1,44	
CL 5F Y 5G		0,60	0,60	0,36	**1,80**
CL 7- CR 33		1,20	1,20	1,44	**1,44**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40-CL 54 Y 56		0,60	0,60	0,36	**0,36**
BOSTON - ENCISO					
CL 54-CR 36A Y 37		0,60	0,60	0,36	**0,36**
					37,78
Subtotal					**177,40**
TOTAL					**177,40**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA N°	21

FECHA	DD	15	MM	6	AA	2025	PERÍODO	02/06/2025 - 15/06/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	7.2	DESCRIPCIÓN	Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color oliva, marrón, chocolate, ocre, tojo y terracota. Para un ancho de 0.20m. Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
ACTA N°7		
Del 2 al 8 de junio de 2025		
POBLADO - LAS LOMAS	136,75	**136,75**
POBLADO - FLORIDA	35,30	**35,30**
LA CANDELARIA - BOSTON	25,50	**25,50**
BOSTON - ENCISO	41,91	**41,91**
Del 9 al 15 de junio de 2025		
POBLADO - LAS LOMAS	32,20	**32,20**
POBLADO - FLORIDA	8,80	**8,80**
LA CANDELARIA - BOSTON	59,44	**59,44**
BOSTON - ENCISO	38,89	**38,89**
Subtotal		**378,79**
TOTAL		**378,79**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	22
FECHA	DD	15	MM	6	AA	2025	PERÍODO	02/06/2025 - 15/06/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	7.3	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados visuales en adoquín ADOP-A de 10x20x6 cm, en color amarillo, salmón o jaspe, según diseño. Incluye cama de arena de apoyo e = 5 cm, sello de juntas con arena de revoque, cortes a maquina y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Cumplir norma NTC 2017, seguir recomendaciones del MEP y patrones de instalación del ICPC. el adoquín deberá resellarse por 2 veces en un lapso de 4 meses luego de su instalación.	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	LONGITUD	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
ACTA N°7			
Del 2 al 8 de junio de 2025			
POBLADO - LAS LOMAS		47,10	47,10
POBLADO - FLORIDA		29,10	29,10
LA CANDELARIA - BOSTON		53,20	53,20
BOSTON - ENCISO		33,60	33,60
Del 9 al 15 de junio de 2025			
POBLADO - LAS LOMAS		9,20	9,20
LA CANDELARIA - BOSTON		108,44	108,44
BOSTON - ENCISO		48,00	48,00
Subtotal			328,64
TOTAL			328,64

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF										HOJA N°	23
FECHA	DD	15	MM	5	AA	2025	PERÍODO	02/06/2025 - 15/06/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	9,1	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte e instalación de grama tipo San Agustín, para conformación de zonas verdes. Incluye perfilación y nivelación de la superficie hasta un espesor de 5 cm , adición de tierra abonada con un espesor de 5 cm, anclaje inicial y final con ganchos de sujeción, regado y todo lo necesario para su correcta siembra y total prendimiento, capote mínimo 5 cm.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.









LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
PENDIENTES					
ACTA N°5					
Del 01 al 06 de abril del 2025					
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR					
CR 81A-CL35 Y 36		5,57	1,40	7,80	
CR 82A-CL 36 Y 37D		4,45	0,75	3,34	
CR 82A-CL 36 Y 37D		5,75	0,70	4,03	
CL 37D-CR 82A Y 83A		7,30	0,65	4,75	
CL 37D-CR 82A Y 83A		7,30	0,80	5,84	
CL 37D-CR 82A Y 83A		3,40	0,90	3,06	28,81
Del 28 al 30 de abril					
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR					
CL 37D-CR 82A Y 83A		1,00	0,74	0,74	
CL 37D-CR 82A Y 83A		3,60	0,98	3,53	
CL 37D-CR 82A Y 83A		2,46	0,86	2,12	
CL 37D-CR 82A Y 83A		5,30	0,85	4,51	
CL 37D-CR 82A Y 83A		2,35	0,93	2,19	
CL 37D-CR 82A Y 83A		1,32	1,00	1,32	
CL 37D-CR 82A Y 83A		9,53	1,05	10,01	
CL 37D-CR 82A Y 83A		15,70	0,93	14,60	
CL 37D-CR 82A Y 83A		9,73	1,01	9,83	
CL 37D-CR 82A Y 83A		9,73	1,01	9,83	
CL 37D-CR 82A Y 83A		10,20	0,68	6,94	
CL 37D-CR 82A Y 83A		11,50	0,67	7,71	
CL 37D-CR 82A Y 83A		1,23	0,80	0,98	
CL 37D-CR 82A Y 83A		13,40	0,65	8,71	
CL 37D-CR 82A Y 83A		3,05	0,70	2,14	
CL 37D-CR 82A Y 83A		4,50	0,90	4,05	
CL 37D-CR 82A Y 83A		4,82	0,84	4,05	
CL 37D-CR 82A Y 83A		3,46	0,90	3,11	
CL 37D-CR 82A Y 83A		4,37	1,03	4,50	
CL 37D-CR 82A Y 83A		5,30	0,68	3,60	
CL 37D-CR 82A Y 83A		4,06	0,64	2,60	
CL 37D-CR 82A Y 83A		4,46	0,72	3,21	
CL 37D-CR 82A Y 83A		1,93	0,84	1,62	
CL 37D-CR 82A Y 83A		4,74	0,71	3,37	
CL 40A-CR 83A Y 84		2,79	0,86	2,40	
CL 40A-CR 83A Y 84		2,90	0,82	2,38	
CL 40A-CR 83A Y 84		18,30	0,92	16,84	
CL 40A-CR 83A Y 84		7,81	0,95	7,42	
CL 40A-CR 83A Y 84		40,30	0,90	36,27	180,54
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		5,60	1,20	6,72	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		3,70	1,40	5,18	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		4,20	1,50	6,30	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		4,70	1,30	6,11	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		9,10	1,30	11,83	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		6,50	1,20	7,80	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		5,00	1,40	7,00	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		6,00	1,50	9,00	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		2,50	1,50	3,75	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		3,80	1,40	5,32	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		4,20	1,40	5,88	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		2,00	0,80	1,60	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		5,80	1,40	8,12	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		5,90	1,30	7,67	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		14,50	1,40	20,30	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		2,10	1,10	2,31	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		7,70	1,40	10,78	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		9,10	1,40	12,74	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		9,60	1,20	11,52	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		4,70	1,30	6,11	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		15,80	1,50	23,70	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		4,50	1,60	7,20	





CALLE 36 - CR 81 Y 80A		7,80	1,60	12,48	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		6,50	1,50	9,75	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		8,70	1,30	11,31	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		7,90	1,40	11,06	**231,54**
					440,09
		ACTA N°6			
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,90	1,00	1,90	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		8,00	1,30	10,40	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		6,60	1,20	7,92	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		7,80	1,50	11,70	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		4,90	1,40	6,86	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		6,70	0,80	5,36	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		6,60	1,00	6,60	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		1,90	1,20	2,28	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		6,00	1,30	7,80	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		3,98	1,10	4,38	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		1,00	0,70	0,70	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		4,10	1,10	4,51	
CALLE 36 - CR 81 Y 80A		4,50	0,80	3,60	**74,01**
CRA 79 ENTRE CALLE 38 Y TV 39B		16,80	1,40	23,52	
CRA 79 ENTRE CALLE 38 Y TV 39B		2,30	1,40	3,22	
CRA 79 ENTRE CALLE 38 Y TV 39B		5,40	1,60	8,64	
CRA 79 ENTRE CALLE 38 Y TV 39B		5,00	1,50	7,50	
CRA 79 ENTRE CALLE 38 Y TV 39B		1,50	0,90	1,35	
CRA 79 ENTRE CALLE 38 Y TV 39B		4,50	1,70	7,65	
CRA 79 ENTRE CALLE 38 Y TV 39B		5,40	1,40	7,56	
CRA 79 ENTRE CALLE 38 Y TV 39B		2,70	0,90	2,43	
CRA 79 ENTRE CALLE 38 Y TV 39B		5,90	1,00	5,90	
CRA 79 ENTRE CALLE 38 Y TV 39B		3,30	1,10	3,63	
CRA 79 ENTRE CALLE 38 Y TV 39B		6,50	1,50	9,75	
CRA 79 ENTRE CALLE 38 Y TV 39B		3,30	1,70	5,61	
CRA 79 ENTRE CALLE 38 Y TV 39B		2,80	1,60	4,48	
CRA 79 ENTRE CALLE 38 Y TV 39B		7,20	1,30	9,36	
CRA 79 ENTRE CALLE 38 Y TV 39B		3,00	1,30	3,90	**104,50**
CALLE 53A CR 81 Y 80		1,00	0,70	0,70	
CALLE 53A CR 81 Y 80		2,60	1,80	4,68	
CALLE 53A CR 81 Y 80		1,50	0,60	0,90	
CALLE 53A CR 81 Y 80		5,00	1,80	9,00	
CALLE 53A CR 81 Y 80		2,90	1,90	5,51	
CALLE 53A CR 81 Y 80		1,60	0,60	0,96	
CALLE 53A CR 81 Y 80		2,00	1,20	2,40	
CALLE 53A CR 81 Y 80		8,10	1,90	15,39	
CALLE 53A CR 81 Y 80		7,90	2,20	17,38	
CALLE 53A CR 81 Y 80		2,20	0,80	1,76	
CALLE 53A CR 81 Y 80		4,30	1,50	6,45	
CALLE 53A CR 81 Y 80		4,80	2,10	10,08	
CALLE 53A CR 81 Y 80		3,00	2,10	6,30	
CALLE 53A CR 81 Y 80		2,60	1,60	4,16	
CALLE 53A CR 81 Y 80		3,70	2,00	7,40	
CALLE 53A CR 81 Y 80		4,40	1,50	6,60	
CALLE 53A CR 81 Y 80		8,1	1,7	13,77	
CALLE 53A CR 81 Y 80		2,50	1,98	4,95	
CALLE 53A CR 81 Y 80		4,60	1,80	8,28	
CALLE 53A CR 81 Y 80		3,50	1,60	5,60	**132,27**
CR 75 - CLL 30A Y 28		2,50	0,80	2,00	
CR 75 - CLL 30A Y 28		2,50	0,80	2,00	
CR 75 - CLL 30A Y 28		2,70	0,90	2,43	
CR 75 - CLL 30A Y 28		2,70	0,90	2,43	
CR 75 - CLL 30A Y 28		17,40	1,40	24,36	
CR 75 - CLL 30A Y 28		2,50	0,90	2,25	
CR 75 - CLL 30A Y 28		2,50	0,90	2,25	
CR 75 - CLL 30A Y 28		2,50	0,90	2,25	
CR 75 - CLL 30A Y 28		2,90	0,90	2,61	
CR 75 - CLL 30A Y 28		0,50	0,90	0,45	
CR 75 - CLL 30A Y 28		2,10	0,90	1,89	
CR 75 - CLL 30A Y 28		11,30	1,80	20,34	
CR 75 - CLL 30A Y 28		3,00	1,00	3,00	
CR 75 - CLL 30A Y 28		6,00	0,80	4,80	
CR 75 - CLL 30A Y 28		7,70	1,00	7,70	
CR 75 - CLL 30A Y 28		1,80	0,90	1,62	
CR 75 - CLL 30A Y 28		3,70	0,90	3,33	

CR 75 - CLL 30A Y 28		1,00	0,70	0,70	
CR 75 - CLL 30A Y 28		1,30	0,50	0,65	
CR 75 - CLL 30A Y 28		3,00	0,90	2,70	
CR 75 - CLL 30A Y 28		1,70	0,90	1,53	
CR 75 - CLL 30A Y 28		3,00	0,90	2,70	
CR 75 - CLL 30A Y 28		0,90	0,90	0,81	
CR 75 - CLL 30A Y 28		0,90	0,90	0,81	
CR 75 - CLL 30A Y 28		1,30	0,90	1,17	
CR 75 - CLL 30A Y 28		0,70	0,90	0,63	
CL 28 - CR 75 Y 74		1,70	1,50	2,55	
CL 28 - CR 75 Y 74		2,10	0,60	1,26	
CL 28 - CR 75 Y 74		5,10	1,70	8,67	
CL 28 - CR 75 Y 74		2,00	1,70	3,40	
CL 28 - CR 75 Y 74		2,30	1,20	2,76	
CL 28 - CR 75 Y 74		6,00	2,20	13,20	129,25
					440,03

Alcaldía de Medellín

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO	4600102792 DE 2024	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
VALOR PPTO AMBIENTAL	$ 126,711,013	
PLAZO INICIAL:	5 MESES	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG-VNF	
INTERVENTORÍA	SITELSA SAS	
FECHA ACTA:	PERIODO	
	1-dic.-24	31-ene.-25

CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha de realizacion del presupuesto: 7/03/2024

APLICACIÓN DE GUÍA SOCIOAMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PPTO CONTRACTUAL		ACUMULADO EJECUTADO		ACUMULADO COBRADO		PENDIENTE POR COBRAR	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
1,0	**Manejo de residuos sólidos**										
1,1	Canecas de 5 gl con tapa y debidamente rotuladas (Tres recipientes reciclable, ordinario y organicos)	Juego	8,00	$ 175.030,00	$ 1.400.240,00	2	$ 350.060	2	$ 350.060	0,00	$ -
1,2	Canecas metálica de 55 gl con tapa, pintadas de acuerdo los colores según la Resol N° 2184 de 2019, debidamente rotuladas (Cuatro recipientes recipientes: No aprovechables, Aprovechables, Orgánicos aprovechables, especiales)"	Juego	6,00	$ 541.116,00	$ 3.246.696,00	22	$ 11.904.552	6	$ 3.246.696	16,00	$ 8.657.856,00
1,3	Bolsas plásticas para los frentes de obra color negro (residuos no aprovechables), según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	2200,00	$ 694,00	$ 1.526.800,00	450	$ 312.300	450	$ 312.300	0,00	$ -
1,4	Bolsas plásticas para los frentes de obra color blanco (residuos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	2200,00	$ 708,00	$ 1.557.600,00	395	$ 279.660	395	$ 279.660	0,00	$ -
1,5	Bolsas plásticas para los frentes de obra color verde (residuos orgánicos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) -(Calibre 1,6)	un	2200,00	$ 638,00	$ 1.403.600,00	410	$ 261.580	410	$ 261.580	0,00	$ -
1,6	Bolsas plásticas para los frentes de obra color rojo (residuos peligrosos) (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	1100,00	$ 1.077,00	$ 1.184.700,00	230	$ 247.710	230	$ 247.710	0,00	$ -
1,7	Construcción de caseta de 4 m2 aproximadamente para el acopio de residuos sólidos comunes. Incluye teleras, tejas de zinc, largueros	un	4,00	$ 297.507,00	$ 1.190.028,00	10	$ 2.975.070	4	$ 1.190.028	1,00	$ 297.507,00
1,8	Recolección y disposición de residuos sólidos peligrosos por parte de una empresa autorizada. (Incluye Transporte). Mínimo por recolección - 50 Kg.	kg	200,00	$ 5.236,00	$ 1.047.200,00	59	$ 306.306	59	$ 306.306	0,00	$ -
1,9	Recolección de residuos de Madera por parte de una empresa autorizada	m3	20,00	$ 51.487,00	$ 1.029.740,00	0	$ 0	0	$ 0	0,00	$ -
1,10	Kit aseo y limpieza en obra (pala y cepillo carretero)	un	22,00	$ 63.008,00	$ 1.386.176,00	37	$ 2.331.296	22	$ 1.386.176	15,00	$ 945.120,00
1,11	Bascula colgante industrial digital capacidad maxima 300 Kg "	un	1,00	$ 87.424,00	$ 87.424,00	0	$ 0	0	$ 0	0,00	$ -
1,12	Señalización en sitios de disposicion temporal de residuos. (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios	Global	14,00	$ 12.000,00	$ 168.000,00	50	$ 600.000	14	$ 168.000	36,00	$ 432.000,00
2,00	**Maquinaria, vehículos y equipo en obra**										
2,1	Lona banner, 13 onzas para vehículo (volqueta o camión) de 1,5m x 0,8m con dobles repisado 3 cm por el contorno y ojaletes 1 en cada esquina, impresión inkjet resistente a la interperie según diseño del Manual de Identidad del Municipio.	un	20,00	$ 35.000,00	$ 700.000,00	15	$ 525.000	15	$ 525.000	0,00	$ -
3,00	**Ahorro y uso eficiente de agua y energía**										
3,1	Hidrolavadora portatil acople rápido doble filtro "	un	1,00	$ 264.710,00	$ 264.710,00	1	$ 264.710	1	$ 264.710	0,00	$ -
4,00	**Manejo de sustancias químicas**										
4,1	Kit de emergencia para derrames químicos de 10 galones. Incluye bolsa con arena, caneca de 10 galones, bolsas plásticas, pala pequeña, guantes y mascarilla para concentración de particulas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento).	un	8,00	$ 260.048,00	$ 2.080.384,00	8	$ 2.080.384	8	$ 2.080.384	0,00	$ -
4,2	Estiba de contención de 55 litros fabricada en polietileno de alta densidad, para almacenamiento de sustancias químicas	un	8,00	$ 443.258,00	$ 3.546.064,00	5	$ 2.216.290	5	$ 2.216.290	0,00	$ -
5,00	**Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción**										$ -
5,1	Teleras 1,35m x 0,90 m para construcción de acopios	un	44,00	$ 20.000,00	$ 880.000,00	280	$ 5.600.000	44	$ 880.000	236,00	$ 4.720.000,00
5,2	Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m.	kg	110,00	$ 8.300,00	$ 913.000,00	736	$ 6.100.500	110	$ 913.000	625,00	$ 5.187.500,00
5,3	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m) para adecuación o provisión de senderos peatonales y demarcación de áreas de trabajo	un	22,00	$ 38.735,00	$ 852.170,00	22	$ 852.170	22	$ 852.170	0,00	$ -

5,4	Balizas (Alto 1.4m) Base negra *	un	44,00	$ 27.846,50	$ 1.225.246,00	44	$ 1.225.246	44	$ 1.225.246	0,00	$ -
5,5	Señalización de zonas de acopio (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios	Estimado	22,00	$ 12.000,00	$ 264.000,00	56	$ 672.000	34	$ 408.000	22,00	$ 264.000,00
6,00	**Control de emisiones atmosféricas**										$ -
6,1	Manguera multicapa con refuerzo textil interior y exterior para trabajo pesado. Incluye accesorios de conexión y regulación de agua - Pistola -.	m	200,00	$ 9.802,00	$ 1.960.400,00	400	$ 3.920.800	200	$ 1.960.400	200,00	$ 1.960.400,00
6,2	Cubierta para la concretadora. Incluye largueros y plástico	un	4,00	$ 87.663,00	$ 350.652,00	0	$ 0	0	$ 0	0,00	$ -
7,00	**Protección del suelo**										
7,1	Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m. para la protección del suelo durante el almacenamiento o preparación de materiales de construcción	kg	220,00	$ 8.300,00	$ 1.826.000,00	765	$ 6.349.500	220	$ 1.826.000	545,00	$ 4.523.500,00
8,00	**Manejo de campamento e instalaciones temporales**										
8,1	Señalización para campamento o instalaciones temporales (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios .	Global	22,00	$ 12.000,00	$ 264.000,00	35	$ 420.000	22	$ 264.000	13,00	$ 156.000,00
8,2	Balizas para adecuación o provisión de senderos peatonales 1,4 m base negra*	un	44,00	$ 27.846,50	$ 1.225.246,00	44	$ 1.225.246	44	$ 1.225.246	0,00	$ -
8,3	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m) para adecuación o provisión de senderos peatonales y demarcación de áreas de trabajo	un	22,00	$ 38.735,00	$ 852.170,00	22	$ 852.170	22	$ 852.170	0,00	$ -
9,00	**Prevención de contaminación de cuerpos de agua de redes de servicios públicos**										
9,1	Caja desarenadora móvil para la concretadora	un	8,00	$ 51.878,00	$ 415.024,00	0	$ 0	0	$ 0	0,00	$ -
9,2	Malla tipo polisombra color azúl para proteger sumideros	m	440,00	$ 1.994,00	$ 877.360,00	740	$ 1.475.560	440	$ 877.360	300,00	$ 598.200,00
9,3	Alquiler de baño estandar con 2 limpieza por semana (Zona urbana)	mes	66,00	$ 716.115,00	$ 47.263.590,00	31	$ 22.199.565	31	$ 22.199.565	0,00	$ -
10,00	**Gestión de la fauna y la flora**										
10,1	Malla tipo polisombra color azúl para protección de 1,50 m de ancho para proteccion de árboles	m	50,00	$ 1.994,00	$ 99.700,00	850	$ 1.694.900	50	$ 99.700	800,00	$ 1.595.200,00
10,2	Estación en madera común fijación vertical diámetro 0,10 m x 2,80 m de alto	un	70,00	$ 9.940,00	$ 695.800,00	80	$ 795.200	70	$ 695.800	0,00	$ -
	Plan de Manejo de Tránsito										
11,00	**Señalización y Desvíos**										
11,1	Señales informativa. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015, Vías secundarias, 60x60 *	un	8,00	$ 166.041,00	$ 1.328.328,00	99	$ 16.438.059	8	$ 1.328.328	91,00	$ 15.109.731,00
11,2	Señales reglamentarias. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015, Vías secundarias, 60x60 *	un	8,00	$ 164.779,00	$ 1.318.232,00	108	$ 17.796.132	8	$ 1.318.232	100,00	$ 16.477.900,00
11,3	Señales preventivas. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015, Vías secundarias, 60x60 *	un	8,00	$ 166.041,00	$ 1.328.328,00	116	$ 19.260.756	8	$ 1.328.328	108,00	$ 17.932.428,00
11,4	Paleta de PARE y SIGA. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015 - Numeral 4.10.5 *	un	10,00	$ 40.000,00	$ 400.000,00	10	$ 400.000	10	$ 400.000	0,00	$ -
11,5	Maletin (2,0 x 1,0 m) *	un	8,00	$ 274.976,00	$ 2.199.808,00	8	$ 2.199.808	8	$ 2.199.808	0,00	$ -
11,6	Balizas (1,4 m) *	un	66,00	$ 27.847,00	$ 1.837.902,00	525	$ 14.619.675	66	$ 1.837.902	459,00	$ 12.781.773,00
11,7	Conos (0,90 m de altura, material plástico color naranja, lámina reflectiva tipo III ó IV) *	un	16,00	$ 54.232,00	$ 867.712,00	16	$ 867.712	16	$ 867.712	0,00	$ -
11,8	Barricadas con franjas reflectivas tipo 3 con 1,50m alto y 2,40m de ancho *	un	8,00	$ 210.364,00	$ 1.682.912,00	33	$ 6.942.012	8	$ 1.682.912	25,00	$ 5.259.100,00
11,9	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m)	un	22,00	$ 38.735,00	$ 852.170,00	0	$ 0	0	$ 0	0,00	$ -
11,10	Malla plástica naranja (polietileno de alta densidad, rollo por 50 m, ancho 1,40 m)	m	220,00	$ 1.749,00	$ 384.780,00	1500	$ 2.623.500	220	$ 384.780	1.280,00	$ 2.238.720,00
11,11	Teleras 1,35m x 0,90 m	un	40,00	$ 20.000,00	$ 800.000,00	70	$ 1.400.000	40	$ 800.000	30,00	$ 600.000,00
11,12	Capacitación y entrenamiento para auxiliares de tránsito para obras en vías	un	8,00	$ 222.013,00	$ 1.776.104,00	9	$ 1.998.117	8	$ 1.776.104	1,00	$ 222.013,00
12,0	**Subprograma de seguridad y salud en el trabajo**										
12,1	Extintor multiproposito 10 Lb (Incluye recarga en caso de necesitarse)*	un	8,00	$ 34.769,00	$ 278.152,00	9	$ 312.921	8	$ 278.152	1,00	$ 34.769,00
12,2	Silvato brigadista	un	8,00	$ 8.571,00	$ 68.568,00	8	$ 68.568	8	$ 68.568	0,00	$ -
12,3	Camilla emergencia polietileno 185 cm x 0,45 cm con inmovilizador de cuello y arnés *	un	8,00	$ 144.086,00	$ 1.152.688,00	8	$ 1.152.688	8	$ 1.152.688	0,00	$ -
12,4	Botiquín primeros auxilios (en lona) TIPO A	un	8,00	$ 171.898,00	$ 1.375.184,00	9	$ 1.547.082	8	$ 1.375.184	1,00	$ 171.898,00
13,0	**Personal para brigada Ambiental**										
13,1	Reconocimiento de personal para labores de brigada ambiental	hr	3025,00	$ 9.017,00	$ 27.276.425,00	9525	$ 85.886.925	3025	$ 27.276.425	6.500,00	$ 58.610.500,00
	TOTAL				**$ 126.711.013,00**		$ 251.551.730		$ 91.188.680		$ 158.776.115,00

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	1
FECHA	DD	16	MM	6	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025-31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,20	DESCRIPCIÓN	Canecas metálica de 55 gl con tapa, pintadas de acuerdo los colores según la Resol N° 2184 de 2019, debidamente rotuladas (Cuatro recipientes recipientes: No aprovechables, Aprovechables, Orgánicos aprovechables, especiales)*	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.













		CANTIDAD
	FRENTE:	
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	1,00
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	1,00
	Laureles	
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	1,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	1,00
	Candelaria	
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
	Belén Granada	
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	1,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	1,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	1,00
	Boston/Enciso	
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	1,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	1,00
	Boston	
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	1,00
	Poblado	
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	1,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	1,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	1,00
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	2,00
	Buenos Aires	
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	1,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
	Subtotal	16,00
	TOTAL	16,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	2
FECHA	DD	16	MM	6	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025-31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO: 6/11/2024

ÍTEM	1.70	DESCRIPCIÓN	Construcción de caseta de 4 m2 aproximadamente para el acopio de residuos sólidos comunes. Incluye teleras, tejas de zinc, largueros	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.










		CANTIDAD
	FRENTE:	
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	
	Laureles	
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
	Candelaria	
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
	Belén Granada	
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	
	Boston/Enciso	
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	-
	Boston	
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	1,00
	Poblado	
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	-
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	-
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	-
	Buenos Aires	
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
	Subtotal	1,00
	TOTAL	1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	3
FECHA	DD	16	MM	6	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025-31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024
FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,10	DESCRIPCIÓN	Kit aseo y limpieza en obra (pala y cepillo carretero)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.











LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	1,00
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	1,00
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	1,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	1,00
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	1,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	1,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	1,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	1,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	1,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	1,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	1,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	1,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	1,00
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	1,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	1,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		15,00
TOTAL		15,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	4
FECHA	DD	16	MM	6	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025-31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,12	DESCRIPCIÓN	Señalización en sitios de disposicion temporal de residuos. (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.









LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	2,00
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	2,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	2,00
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	3,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	3,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	3,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	3,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	2,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	2,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	3,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	3,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	3,00
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	3,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	2,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		36,00
TOTAL		36,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	5
FECHA	DD	16	MM	6	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025-31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO: 6/11/2024

ÍTEM	5,1	DESCRIPCIÓN	Teleras 1,35m x 0,90 m para construcción de acopios	UNID.	Estimado	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.











LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	10,00
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	5,00
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	10,00
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	10,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	6,00
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	15,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	15,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	50,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	10,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	15,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	15,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	15,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	30,00
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	30,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		236,00
TOTAL		236,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	6
FECHA	DD	16	MM	6	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025-31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	5,2	DESCRIPCIÓN	Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m.	UNID.	Estimado	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	5,00
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	15,00
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	5,00
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	15,00
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	15,00
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	30,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	25,00
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	55,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	25,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	30,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	75,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	35,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	55,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	55,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	55,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	55,00
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	55,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	20,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		625,00
TOTAL		625,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	7
FECHA	DD	16	MM	6	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025-31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO: 6/11/2024

ÍTEM	5,5	DESCRIPCIÓN	Señalización de zonas de acopio (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios



UNID.	Estimado	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	1,00
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	1,00
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	1,00
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	2,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	2,00
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	2,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	1,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	1,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	1,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	1,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	2,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	2,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	1,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	2,00
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	1,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	1,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		22,00
TOTAL		22,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	8
FECHA	DD	16	MM	6	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025-31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	6,1	DESCRIPCIÓN	Manguera multicapa con refuerzo textil interior y exterior para trabajo pesado. Incluye accesorios de conexión y regulación de agua - Pistola -.









UNID.	Estimado	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	50,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	50,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	-
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	50,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	-
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	50,00
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	-
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 8	-
Subtotal		200,00
TOTAL		200,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN


CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	9
FECHA	DD	16	MM	6	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025-31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	7,1	DESCRIPCIÓN	Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m. para la protección del suelo durante el almacenamiento o preparación de materiales de construcción	UNID.	Estimado	PROYECTO

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

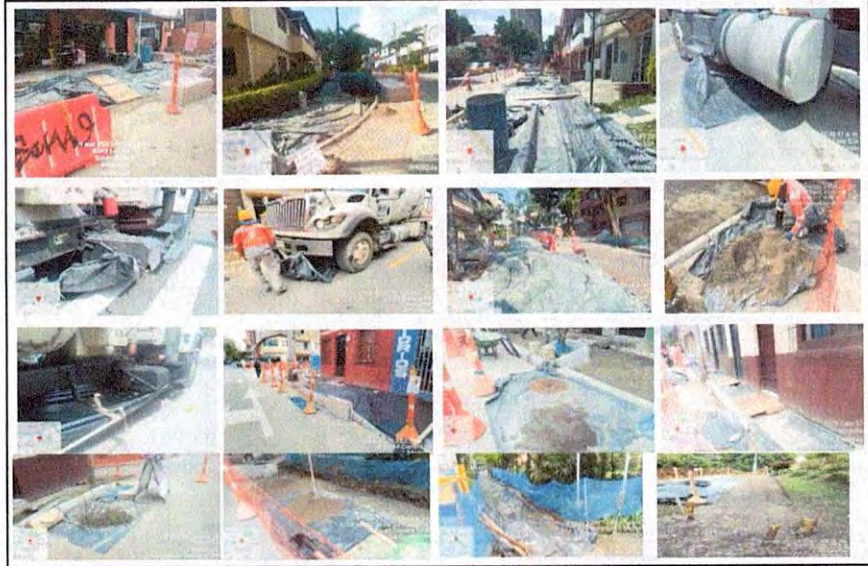

LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	20,00
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	20,00
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	5,00
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	55,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	55,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	40,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	20,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	55,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	30,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	55,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	55,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	40,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	55,00
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	40,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		545,00
TOTAL		545,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	10
FECHA	DD	16	MM	6	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025-31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024
FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	8,1	DESCRIPCIÓN	Señalización para campamento o instalaciones temporales (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios .	UNID.	Global	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.











LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	1,00
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	1,00
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	1,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	1,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	1,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	1,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	1,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	1,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	1,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	1,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	1,00
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	1,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	1,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		13,00
TOTAL		13,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	11
FECHA	DD	16	MM	6	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025-31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS						
CONTRATO No	4600102792 DE 2024			FECHA DE INICIO	6/11/2024		
ÍTEM	9,2	DESCRIPCIÓN	Malla tipo polisombra color azúl para proteger sumideros	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	8,00
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	6,00
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	13,00
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	11,00
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	8,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	6,00
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	50,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	15,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	20,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	70,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	31,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	20,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	15,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	5,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	15,00
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	7,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		300,00
TOTAL		300,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	12
FECHA	DD	16	MM	6	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025-31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	10,1	DESCRIPCIÓN	Malla tipo polisombra color azúl para protección de 1,50 m de ancho para proteccion de árboles	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	10,00
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	5,00
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	5,00
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	10,00
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	10,00
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	30,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	10,00
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	60,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	20,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	35,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	120,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	50,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	50,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	120,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	25,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	150,00
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	80,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	10,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		800,00
TOTAL		800,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	14
FECHA	DD	16	MM	6	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025-31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	11,1	DESCRIPCIÓN	Señales informativa. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. Vías secundarias. 60x60 *



OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	1,00
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	6,00
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	4,00
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	6,00
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	4,00
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	6,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 36 y TV 39b (38b)	4,00
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	4,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	6,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	3,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	4,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	6,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	4,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	6,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	6,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	6,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	6,00
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	6,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	3,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		91,00
TOTAL		91,00

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	15
FECHA	DD	16	MM	6	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025-31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	11,2	DESCRIPCIÓN	Señales reglamentarias. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. Vías secundarias. 60x60 *	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.









OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	1,00
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	6,00
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	4,00
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	6,00
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	4,00
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	6,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	6,00
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	4,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	9,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	3,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	4,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	6,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	4,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	6,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	8,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	6,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	8,00
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	6,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	3,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		100,00
TOTAL		100,00

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	16
FECHA	DD	16	MM	6	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025-31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	11,3	DESCRIPCIÓN	Señales preventivas. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. vías secundarias. 60x60 *	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	1,00
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	6,00
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	4,00
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	6,00
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	4,00
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	6,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	6,00
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	4,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	9,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	3,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	4,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	6,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	4,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	6,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	12,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	6,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	12,00
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	6,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	3,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		108,00
TOTAL		108,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	17
FECHA	DD	16	MM	6	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025-31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	11,6	DESCRIPCIÓN	Balizas (1,4 m) *	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	20,00
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	26,00
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	14,00
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	26,00
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	24,00
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	26,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	26,00
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	20,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	29,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	23,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	24,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	26,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	24,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	26,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	32,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	20,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	33,00
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	20,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	20,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		459,00
TOTAL		459,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	18
FECHA	DD	16	MM	6	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025-31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	11,8	DESCRIPCIÓN	Barricadas con franjas reflectivas tipo 3 con 1,50m alto y 2,40m de ancho *	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.









LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	1,00
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	1,00
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	1,00
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	2,00
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	1,00
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	2,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	2,00
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	1,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	1,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	1,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	1,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	2,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	1,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	1,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	2,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	1,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	2,00
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	1,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	1,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		25,00
TOTAL		25,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	19
FECHA	DD	16	MM	6	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025-31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	11,10	DESCRIPCIÓN	Malla plástica naranja (polietileno de alta densidad, rollo por 50 m, ancho 1,40 m)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	40,00
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	52,00
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	28,00
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	52,00
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	48,00
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	100,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	52,00
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	40,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	100,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	40,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	48,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	100,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	60,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	100,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	100,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	40,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	200,00
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	60,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	20,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		1.280,00
TOTAL		1.280,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	20
FECHA	DD	16	MM	6	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025-31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	11,11	DESCRIPCIÓN	Teleras 1,35m x 0,90 m	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	5,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	5,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	5,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	-
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	5,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	5,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	-
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	5,00
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	-
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		30,00
TOTAL		30,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	21
FECHA	DD	16	MM	6	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025-31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	11,12	DESCRIPCIÓN	Capacitación y entrenamiento para auxiliares de tránsito para obras en vías	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	1,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	-
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	-
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	-
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	-
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		1,00
TOTAL		1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	22
FECHA	DD	28	MM	2	AA	2025	PERÍODO	01/02/2025 - 28/02/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	12,10	DESCRIPCIÓN	Extintor multiproposito 10 Lb (Incluye recarga en caso de necesitarse)*	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	-
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	-
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	-
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	-
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	1,00
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	-
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		1,00
TOTAL		1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	23
FECHA	DD	28	MM	2	AA	2025	PERÍODO	01/02/2025 - 28/02/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	12,30	DESCRIPCIÓN	Camilla emergencia polietileno 185 cm x 0.45 cm con inmovilizador de cuello y arnés *	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	-
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	-
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	-
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	-
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	1,00
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	-
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		1,00
TOTAL		1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF


CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	31
FECHA	DD	28	MM	2	AA	2025	PERÍODO	01/02/2025 - 28/02/2025	ELABORÓ		

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	13,1	DESCRIPCIÓN	Reconocimiento de personal para labores de brigada ambiental	UNID.	hr	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.











LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	520,00
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	250,00
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	250,00
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	500,00
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	120,00
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	620,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	320,00
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	90,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	310,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	160,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	200,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	620,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	320,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	220,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	620,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	320,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	620,00
	Calle 11B entre Cra 34 y Calle 11A	320,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	120,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-

Subtotal	6.500,00
TOTAL	6.500,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141126588964

(415)7707212489984(8020) 000014112658896 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 1 6 8 9	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAL VG-VNF

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 127 # 13 A - 54 OF 603

42. Correo electrónico facturacion@vnfsas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 8 5 4 1 1 2 6	6 0 1 7 1 8 8 6 9 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 9 1 7						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 09 - 18 / 16 : 47: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VEGA CARDENAS HORACIO
985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 18-09-2024 04:54:19PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141126588964

(415)7707212489984(8020) 000014112658896 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 1 6 8 9	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 7 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 7 2 6
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141126588964

(415)7707212489984(8020) 000014112658896 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 1 6 8 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 7 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	9 1 2 0 9 9 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VEGA	CARDENAS	HORACIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 7 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 0 7 7 2 7 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VEGA	GARCIA	NATALIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141126588964

(415)7707212489984(8020) 000014112658896 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 1 6 8 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 4 9 2 7 4	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: VNF S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	5 0	2 0 2 4 0 7 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 7 6 7 5 8 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA VG SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 4 0 7 2 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Gmail **Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>**

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y/O ACREEDORES

Gestion de Proveedores <gestion.proveedores@medellin.gov.co> 28 de noviembre de 2024, 4:17 p.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Buenas tardes,

Consorcio Vial VG VNF, se encuentra registrado desde el **24.09.2024** con el consecutivo interno (Acreedor) N°**1200056338** Tener en cuenta que la inscripción en el registro de proveedores se hace una sola vez y este le sirve para futuros trámites con el Distrito de Medellín, en caso tal que sus datos generales y bancarios hayan cambiado, deben solicitar actualización del registro a este mismo correo.

Se aclara que:

En esta dependencia "Gestión de Proveedores" (Secretaría de Suministros y Servicios), SOLO realizamos la Inscripción como proveedores de personas naturales o jurídicas en el Dato Maestro de Proveedores y Contratistas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín por diferentes conceptos. Debe seguir gestionando el trámite con la dependencia con quien lo inició (Secretaría de Movilidad, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gestión Humana, Secretaría General, entre otras) para que procedan a realizar el contrato o hacer el pago respectivo de ser pertinente, una vez verifiquen la totalidad de los requisitos exigidos y los documentos que debe adjuntar.

Este pantallazo es la prueba de su registro, puede imprimir este correo y adjuntarlo como evidencia que está registrado:



Cordialmente,

Bogotá D.C., 23 de septiembre del 2024

Señores
A Quien interese
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente CONSORCIO VIAL VG-VNF identificado con NIT 901.871.689-9 se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde el 20/09/2024 a través del (los) producto (s):

Producto	No. producto	Fecha de apertura	Estado del producto
CUENTA AHORROS	096-07423-5	23/09/2024	Activo

La (s) cuenta (s) corriente (s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Operaciones
Banco Itaú

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá 5818181 Medellín 6041818 Pereira 3401818 Cali 4861818 Barranquilla 3851818 Cartagena 6931818
Bucaramanga 6971818 Manizales 887 9818 Otras ciudades 01 8000 512 633 www.itau.co
Jose Federico Ustáriz González – Defensor del Consumidor Financiero, Pablo Valencia Agudo– Suplente. Carrera 11 A No. 96 – 51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 6108161/4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua. defensoritau@ustarizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0c395517c79002dc78c95b87bbd59bf74e33b2045e13c3763aaab21948256d292ebc868521270454de3421befae90f74

Número de Factura: FVE-16
Fecha de Emisión: 01/07/2025
Fecha de Vencimiento: 31/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO VIAL VG-VNF
Nombre Comercial: CONSORCIO VIAL VG-VNF
Nit del Emisor: 901871689
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 127 # 13 A - 54 OF 603
Teléfono / Móvil: 3108541126
Correo: facturacion@vnfsas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890905211
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 44 52 165
Teléfono / Móvil: 3855513
Correo: recepcionfacturas@medellin.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	Acta de recibo parcial de obra No 7 del contrato No 4600102792 de 2024 cuy o objeto es la construcció n, mejoramiento y conser vación de vías peatonales y obras complementarias, periodo comprendido entr e el 02 al 15 de junio 202 5	94	1,00	$ 966.977.655,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 966.977.655,00
2	02	Acta Socioambiental No 7	94	1,00	$ 158.776.115,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 158.776.115,00

Notas Finales

Linea de negocio: Linea de negocio: Línea de negocio: Línea de negocio: Consorcio Vial VG- VNF, Porcentaje de Participación: Constructora VG SAS (Nit. 901.767.587-1) 5 0%, VNF SAS (Nit. 900.049.274-8) 5 0%. AU:31.68% Hoja

71615866

Datos Totales

Documento generado el:
01/07/2025 15:31:39
Documento validado por la DIAN:
01/07/2025 15:31:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1125753770
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1125753770
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1125753770
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1125753770

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.125.753.770,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.125.753.770,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.125.753.770,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP** $ 1.125.753.770,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082863001 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-11-05

ORDEN DE PAGO

No. 5100451446

Alcaldía de Medellín

División: 01

Fecha: 01.07.2025
Factura/Número cuenta cobro: FVE16
Secretaría: Secretaría de Infraestructura Física
Dirección: CL 127 13 A 54 OF 603
Teléfono: 6017188690
Fecha Vcto: 03.07.2025
Detalle: **CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS**

Acreedor: Consorcio Vial VG VNF
NIT Acreedor: 9018716899
Codigo del Acreedor: 1200056338

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200056338	Consorcio Vial VG VNF	-968.373.750	2320202005				0701	200030
86	2425909999	Puente Mcia Transito	1.125.753.770	2320202005					200030
50	2436260200	RF Contrat Const.2%	-22.515.075	2320202005					200030
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-2.026.000	2320202005					200030
50	4110610100	Contribuc.Especial	-56.287.689	2320202005					200030
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-11.257.538	2320202005					200030
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-22.515.075	2320202005					200030
50	4105760100	Estamp.Procultura	-5.628.769	2320202005					200030
50	4105900100	Tasa Pro Deporte	-14.634.799	2320202005					200030
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-22.515.075	2320202005					200030

TOTAL A PAGAR: **968.373.750-**

ORDENADO POR: Jaime Naranjo Medina Impreso el 03.07.2025 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Consorcio Vial VG VNF **CEDULA:** 9018716899 **TELEFONO:** 6017188690
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 096074235.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCO ITAÚ
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: LREYES (LEADY JOHANA REYES JIMENEZ).

7 615866

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FVE16
Fecha	01.07.2025
Valor	1.125.753.770,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Consorcio Vial VG VNF
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	CONSORCIO VIAL VG VNF
Entidad Bancaria	BANCO ITAÚ
No.Cuenta Bancaria	096074235
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento

4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600102792

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000765199	5100008518	200030	160070124	1.125.753.770,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 1.125.753.770,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio

7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHN BAYRON SERNA VALENCIA	SUPERVISOR	204	3855555 EXT 6245

Creado por: John Bayron Serna Valencia
Registrado: 01.07.2025 17:28:39

Versión 6 - 2022

71615866

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000765199 **División:01**
Pedido 5100008518
Contrato 4600102792
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 01.07.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: FVE16
Objeto del contrato: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Proveedor

Codigo: 1200056338 **Nit:** 9018716899 **Nombre:** Consorcio Vial VG VNF

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	310001	CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS	1125753.770	1125.753.770,00	5111150000	160070124	200030	030
		TOTAL	**1125.753.770**	**1125.753.770,00**				

Creado por John Bayron Serna Valencia
Registrado el 01.07.2025 17:27:26

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

71615866
