CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 740-2024

“CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.”

CONTRATISTA: CONSORCIO USAQUÉN 005-2024

INFORME No. 4

DE 1 DE JUNIO DE 2025 A 30 DE JUNIO DE 2025

JUNIO DE 2025



ENTIDAD	ALCALDIA LOCAL DE USAQUÉN – FONDO DE DESARROLLO LOCAL
CONTRATISTA	CONSORCIO USAQUÉN 005-2024
INTERVENTORIA	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS

OBJETO.

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 740-2024

INFORME N.º 4

VERSION	FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
1	5 de julio de 2025	Daniel Charry Cediel  Residente de Obra	Arq. Magda Umaña  Directora de Obra	Ing. Margarita Gómez  Directora de Interventoría
2	6 de julio de 2025			

CONTENIDO.

INTRODUCCIÓN 6

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 7

1.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR. 7

1.2 PARQUES A INTERVENIR. 8

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO. 37

3. CONTRATO DE OBRA. 38

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA. 38

3.1.1 ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA. 38

3.1.2 Aspectos legales y revisión de pólizas. 38

3.1.3 Aspectos financieros. 40

3.1.3.1 Control financiero. 40

3.1.3.2 Resumen financiero 41

3.1.3.3 Avance financiero físico en obra. 41

3.2 ASPECTOS TÉCNICOS 43

3.2.1 Personal aprobado de obra. 43

3.2.2 PLANES DE MANEJO DE TRÁFICO. 44

3.2.3 INFORME ADMINISTRATIVO. 45

3.2.3.1 Control de Correspondencia Enviada. 45

3.2.4 AVANCE DE OBRA. 48

3.2.4.1 Avance de Actividades Programadas. 48

3.2.4.2 Avance Físico Ejecutado. 49

3.2.5 PROGRAMACIÓN DE OBRA. 124

3.2.6 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 124

3.2.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS 124

3.2.7 CONTROL DEL CALIDAD 129

3.2.7.1. CONCRETOS 129
3.2.7.1. DENSIDADES EN CAMPO 129
3.2.7.2. EQUIPOS DE MEDICIÓN 130
3.2.7.3. control y seguimiento de materiales y proveedores 130
3.2.7.4. MAQUINARIA Y EQUIPO DISPONIBLE 131
3.2.8 COPIA DE LA BITÁCORA. 131
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 132
5. ANEXOS 134

LISTA DE ANEXOS

Anexo No. 1 Copia Acta de Inicio.

Anexo No. 2 Copia Pólizas Contractuales actualizadas.

Anexo No. 3 .Presupuesto de obra actualizado

Anexo No. 4 Programación actualizada

Anexo No. 5 Flujo De Caja actualizado

Anexo No. 6 Control Avance de obra proyectado v/s ejecutado.

Anexo No. 7 Planes de Manejo de Tráfico (PMT) Aprobado por Secretaria de Movilidad.

Anexo No. 8 Copia Correspondencia Enviada.- Correspondencia Recibida.

Anexo No. 9 Copia Actas de Comité.

Anexo No. 10 Ensayos de Laboratorio y certificación concreto.

Anexo No. 11 Copia Bitácora de Obra

Anexo No. 12 Documentos de Importación de juegos infantiles

Anexo No. 13 Actas de No Previstos

INTRODUCCIÓN

En este informe se describen las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el día 30 de junio del 2025, y se rigen a lo estimado en el cronograma de obra aprobado y de acuerdo a los documentos iniciales del pliego de condiciones del contrato de obra No. 740-2024, celebrado entre el CONSORCIO USAQUÉN 005-2024 Y LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN cuyo objeto es: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."

Valor contrato de obra es por la suma de tres mil trescientos cinco millones doscientos veintiocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos M/CTE ($3.305.228.484), plazo de ejecución seis (6) meses, fecha de inicio 20 de enero de 2025 y fecha de terminación prevista 19 de julio de 2025.

Las actividades ejecutadas y descritas durante el periodo se desarrollaron de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato y teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico, Estudios Previos, Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Apéndices y Contrato.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

CONTRATO DE OBRA No.	740-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO USAQUÉN 005-2024
NIT	901.901.285-7
VALOR DEL CONTRATO	$3.305.228.484,00
PLAZO	6 MESES
FECHA DE INICIO	ENERO 20 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	JULIO 19 DE 2025

1.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR.

Las actividades a ejecutar están determinadas por los diagnósticos elaborados por el CONSORCIO USAQUÉN 005-2024 y aprobados por interventoría y el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, los cuales establecen claramente las áreas a intervenir, así como los mobiliarios y juegos a tener en cuenta.

A continuación de describirán cada uno de los componentes a intervenir en el proyecto.

ARQUITECTURA.

Se define como todas las actividades que tienen que ver con la distribución del mobiliario, áreas sociales o canchas que tenga el parque, así mismo contempla los acabados que se van a tener en cada área, así como texturas, colores y disposición de sardineles, adoquines, rampas, plazoletas, senderos entre otros.

El diseño arquitectónico es la base para las demás disciplinas ya que estas contemplan, ya que a través de la disposición de los elementos y su implantación se construyen las redes tanto húmedas como secas, así como la ubicación del mobiliario planteado.

Es importante precisar que, en el ejercicio de la planeación adelantado en la etapa de diagnóstico, los elementos identificados con este tipo de intervención cuentan con asignación presupuestal para su ejecución.

TOPOGRAFÍA.

Se define como el conjunto de actividades que permite la localización de cada uno de los elementos que comprenden el parque, para ello se deberá usar un equipo que permita la ubicación exacta de este mobiliario.

Dentro de la actividad se deberá tener en cuenta los niveles de cada área como sendero, canchas, plazoletas, bancas, canecas entre otros.

ESTRUCTURAS DE PLAZOLETAS, SENDEROS, ZONAS DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES

Esta actividad se define como las excavaciones para las estructuras en granulares que permitirán soportar las áreas de tránsito peatonal, en esta caso trata de senderos, zonas de juegos infantiles y gimnasios, plazoletas y zonas verdes.

En cada caso de deberán aplicar las profundidades de excavación propuestas para la estructura planteada supervisando que en los posible no se produzcan sobre excavaciones que provoquen mayores cantidades de obra.

ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO

Hace referencia a los elementos tipo bordillo, sardinel, etc., necesarios para confinar la estructura de las zonas duras que se construirán, permitiendo una óptima compactación y mitigando la posibilidad de deformaciones en la superficie (adoquín, placas en concreto, asfalto, etc.).

Se deben chequear niveles y alineamiento de los elementos según lo plasmado en los diseños arquitectónicos.

MOBILIARIO.

Se define como la instalación de bancas, canecas, juegos, mallas contra impacto, cerramientos y demás elementos que disponga el diseño para la armonización del área a intervenir. La Interventoría deberá verificar la calidad de los elementos que se instalen, así como la disposición de cada uno de ellos.

1.2 PARQUES A INTERVENIR.

1.2.1. PARQUE No. 01-003 URBANIZACIÓN ALTABLANCA

Dirección: Entre Carreras 7G y 7H y Calles 160 y 159B



Ilustración 1 Localización parque 01-003

Estado Inicial. El mobiliario en general está en estado aceptable. Sin embargo, las barandas M-83 de los juegos infantiles y el módulo NT están incompletas, ya sea por falta de puerta o de un módulo de malla eslabonada.



Ilustración 2 Estado inicial del parque – enero de 2025

Fuente: Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

Propuesta de Intervención: Se harán las reparaciones necesarias en el mobiliario reponiendo piezas o reinstalando, según sea la necesidad particular. Adicional a lo anterior, se suministrarán dos máquinas de gimnasio al aire libre por solicitud de la comunidad con aprobación de interventoría y la Entidad.



Ilustración 3 Propuesta de intervención

Fuente. Diagnóstico Consorcio Usaquén 005-2024

Estado Actual. Parque entregado a la comunidad el 11 de abril de 2025 con 2 módulos de gimnasio nuevos; arreglo de baranda M-83 en zona de juegos infantiles con reposición de módulo faltante, soldadura y pintura; reinstalación de puerta de acceso de baranda M-83 hacia módulo NT; reposición de barra de giro en módulo NT.



Ilustración 4 Estado Final del parque – mayo de 2025

Fuente. Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

1.2.2. PARQUE No. 01-009 URBANIZACIÓN SAN PATRICIO - 2 SECTOR

Dirección: Calle 108 entre Carreras 17 y 17ª

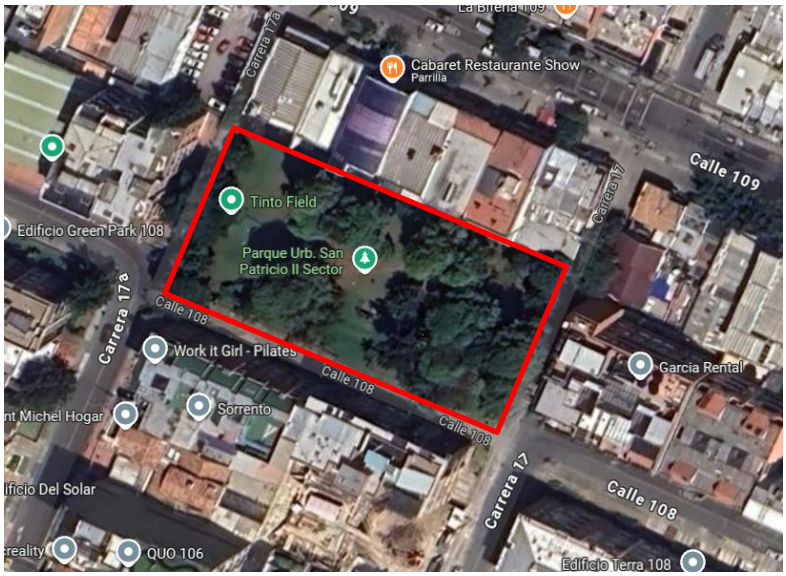


Ilustración 5 Localización parque 01-009

Estado Inicial. El parque cuenta con dos módulos en madera (juegos infantiles). No cuenta con senderos internos, pero se evidencia que los usuarios del parque transitan por zonas específicas, lo que ha marcado caminos.
Adicional a lo anterior, se evidencia que es un terreno con importantes empozamientos cada vez que llueve.




Ilustración 6 Estado inicial del parque – enero de 2025

Fuente: Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

Propuesta de Intervención: Se construirán los senderos en adoquín por los caminos hechos a través del tiempo por el andar de los usuarios del parque.

Adicional a esto, se construirá un gimnasio al aire libre. Las máquinas se instalarán en una placa en concreto reforzado.

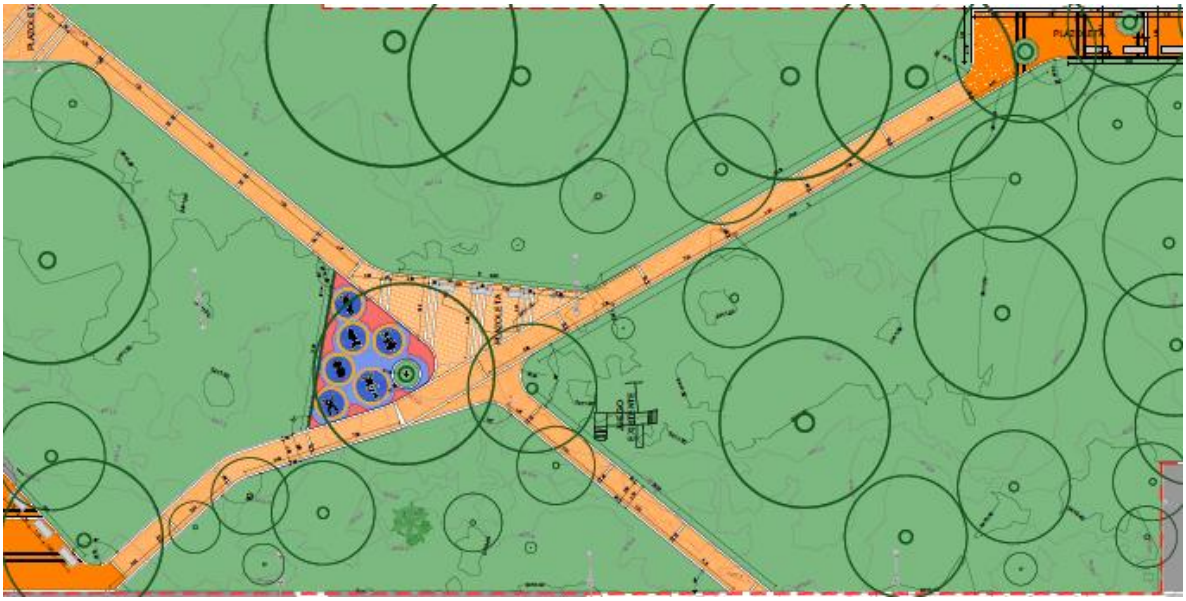


Ilustración 7 Propuesta de intervención

Fuente. Diagnóstico Consorcio Usaquén 005-2024

ESTADO ACTUAL: Entregado a la comunidad el 5 de junio de 2025. Se terminaron los senderos en adoquín, se aplicó pintura sobre placa en concreto, se instaló mobiliario (bancas y canecas) y gimnasios al aire libre, se conformó terreno y se empradizó la totalidad del parque.



Ilustración 8 Estado Actual del parque – junio de 2025

Fuente. Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

1.2.3. PARQUE No. 01-016 EL CEDRO BOLÍVAR - UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS I SECTOR

Dirección: Entre Carreras 22 y 19B con Calle 151



Ilustración 9 Localización parque 01-016

Estado Inicial. Los senderos en concreto están deteriorados y presentar hundimientos por aparente efecto de los árboles aledaños. Existe un módulo M-3 en regular estado que requiere mantenimiento, así como los senderos aledaños, que deben ser intervenidos por su actual estado de deterioro.



Ilustración 10 Estado inicial del parque – enero de 2025

Fuente. Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

Propuesta de Intervención: Se demolerán los tramos de sendero en mal estado en los costados oriente y occidente del parque; se hará mantenimiento al M-3 existente y se suministrarán máquinas biosaludables.

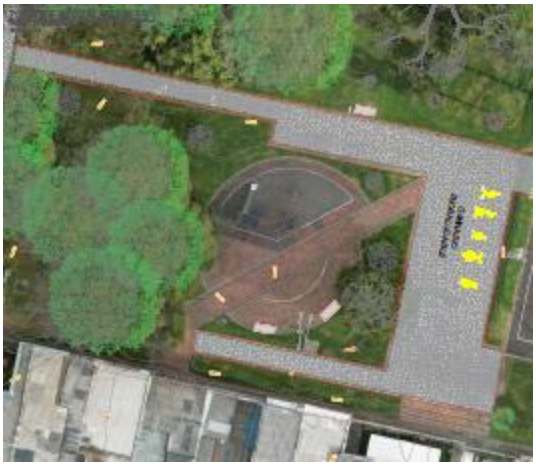


Ilustración 11 Propuesta de intervención

Fuente. Diagnóstico Consorcio Usaquén 005-2024

Estado actual: Se inician demoliciones de senderos en concreto en el costado oriental del parque el día 16 de junio de 2025. Se hace mejoramiento con material proveniente de la misma excavación, se sella y se nivela con SBG. Se da inicio a la fundida de placas en concreto del primer tramo de senderos.



Ilustración 12 - Estado actual parque Margaritas - junio 30 de 2025

Fuente. Propia Consorcio Usaquén 005-2024

1.2.4. PARQUE No. 01-059 URBANIZACIÓN CAPRI

Dirección: Entre Avenida Carrera 9 y 14 y Calles 151 y 148



Ilustración 13 Localización parque 01-059

Estado Inicial. El parque cuenta con dos módulos en madera (juegos infantiles) en regular estado y unas piezas de otro módulo que alguna vez estuvo instalado. Carece de juegos infantiles para cubrir las necesidades de la comunidad.




Ilustración 14 Estado inicial del parque – enero de 2025

Fuente. Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

Propuesta de Intervención: Se construirá una zona de juego infantil y se instalará un módulo con capacidad para 30 niños. Adicional a lo anterior, se construirá una plazoleta de permanencia. Se suministrará el mobiliario según especificación IDRD: baranda M-83, bancas y canecas.

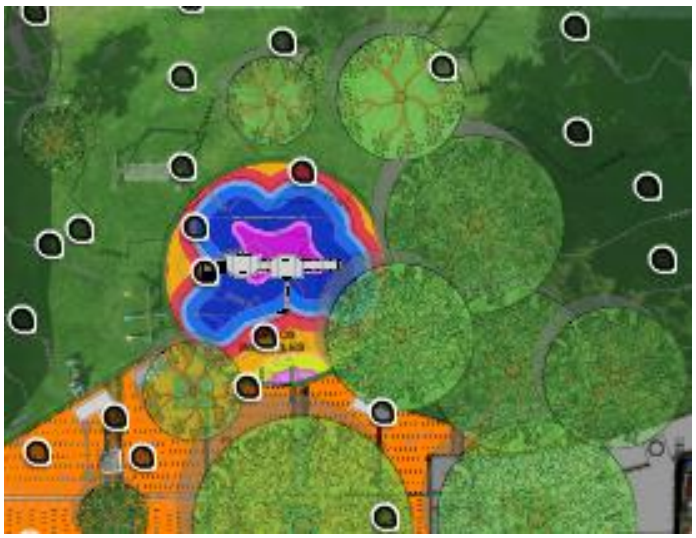


Ilustración 15 Propuesta de intervención

Fuente. Diagnóstico Consorcio Usaquén 005-2024

Estado actual: Se instala cerramiento y se inician desmontes de juegos el día 13 de junio de 2025. A partir de ese momento se realizaron las excavaciones, rellenos, instalación de bordillo A-80 Fundida de placa, avance en barandas, plazoleta en adoquín y cenefas en concreto.



Ilustración 16 Estado actual parque Capri - junio 30 de 2025

Fuente. Propia Consorcio Usaquén 005-2024

1.2.5. PARQUE No. 01-117 URBANIZACIÓN LOS MOLINOS

Dirección: Calle 106 entre Carreras 13A y 14



Ilustración 17 Localización parque 01-117

Estado Inicial. El parque no cuenta no senderos o zonas duras. Sí tiene unas bancas M-31 en regular estado. Es evidente que por donde caminan los usuarios se llena de barro cuando llueve.



Ilustración 18 Estado inicial del parque – enero de 2025

Fuente. Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

Propuesta de Intervención: Se construirá el sendero que atraviesa el parque de oriente a occidente según el diseño proporcionado por la comunidad. Sin embargo, por presupuesto, no se ejecutará el resto del diseño. Tampoco se instalarán bancas por solicitud de los vecinos del parque.

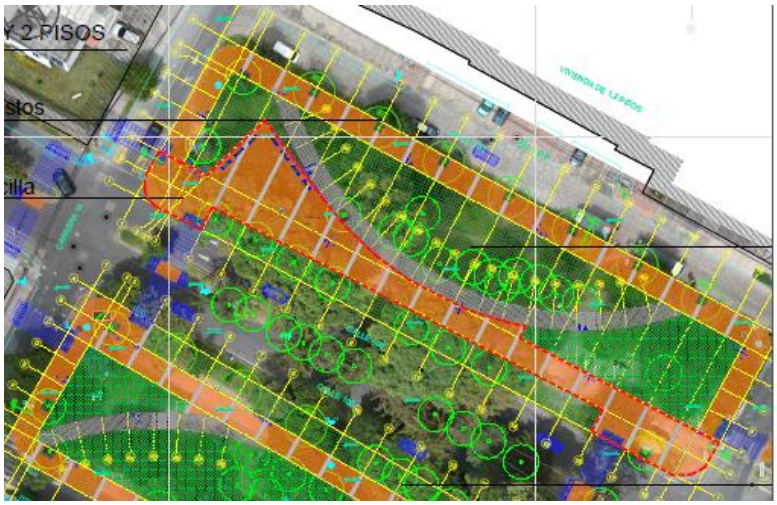


Ilustración 19 Propuesta de intervención

Fuente. Diagnóstico Consorcio Usaquén 005-2024

ESTADO ACTUAL: Parque terminado y a la espera de confirmación de fecha de entrega a la comunidad por parte de la Alcaldía Local. Se terminó la instalación de adoquín y losetas alerta en las rampas y contra sardineles. Se instalaron bolardos, canecas y señal de identificación.

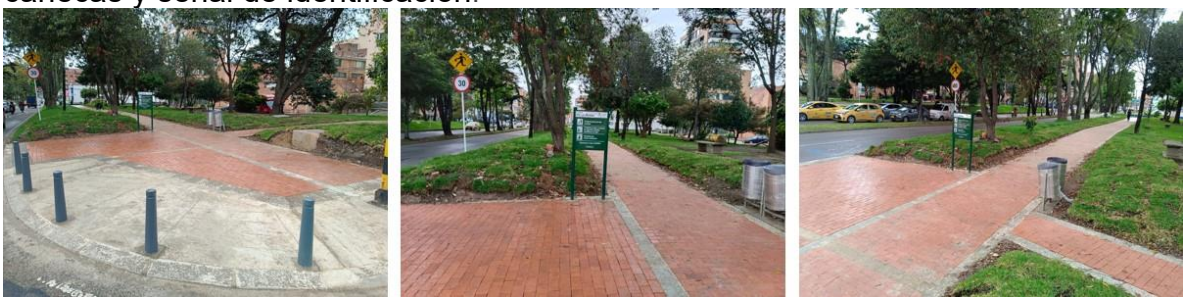


Ilustración 20 Estado actual - parque Molinos junio de 2025

Fuente. Propia Consorcio Usaquén 005-2024

1.2.6. PARQUE No. 01-126 NUEVA URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA

Dirección: Calle 114 entre Avenida Carrera 45 (Auto Norte) y Avenida Carrera 19



Ilustración 21 Localización parque 01-126

Estado Inicial. Se encuentran una serie de módulos de juegos infantiles en mal estado que deben ser desmontados y reemplazados. Las máquinas biosaludables también están en mal estado y se deben desmontar para hacerles mantenimiento.





Ilustración 22 Estado inicial del parque – enero de 2025

Fuente. Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

Propuesta de Intervención: Se construirá una zona para juegos infantiles una vez desmontados y retirados los que están actualmente en mal estado. Se le hará mantenimiento a los biosaludables.



Ilustración 23 Propuesta de intervención

Fuente. Diagnóstico Consorcio Usaquén 005-2024

ESTADO ACTUAL: Se terminó la zona de juegos infantiles (placa, piso en caucho, juego infantil, baranda), se realizó el desmonte de los biosaludables para realizarles mantenimiento.



Ilustración 24 Estado actual parque Santa Bárbara - junio de 2025

Fuente. Propia Consorcio Usaquén 005-2024

1.2.7. PARQUE No. 01-189 DESARROLLO ESTRELLA DEL NORTE

Dirección: Entre Carreras 21 y 19B y Calles 159A y 160



Ilustración 25 Localización parque 01-189

Estado Inicial. El parque cuenta con dos módulos en madera (juegos infantiles). No cuenta con senderos internos, pero se evidencia que los usuarios del parque transitan por zonas específicas, lo que ha marcado caminos. Los biosaludables existentes están en regular estado.



Ilustración 26 Estado inicial del parque – enero de 2025

Fuente. Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

Propuesta de Intervención: Se construirán los senderos en adoquín por los caminos hechos a través del tiempo por el andar de los usuarios del parque. Adicional a esto, se construirá un gimnasio al aire libre y un espacio para juegos infantiles. Los módulos biosaludables se desmontarán para hacerles mantenimiento y posteriormente se instalarán en una placa en concreto reforzado.



Ilustración 27 Propuesta de intervención

Fuente. Diagnóstico Consorcio Usaquén 005-2024

ESTADO ACTUAL: Parque terminado y en etapa de atención a observaciones en espera de definición de fecha de entrega a la comunidad por parte del FDLUS. Se terminaron senderos, zonas de juego infantil y biosaludables, rampas, baranda y mobiliario.



Ilustración 28 Estado Actual del parque – junio de 2025

Fuente. Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

1.2.8. PARQUE No. 01-372 URBANIZACIÓN CODABAS

Dirección: Entre Calles 180 y 181A y Transversal 7D



Ilustración 29 Localización parque 01-372

Estado inicial. El parque tiene alto flujo de perros y carece de una zona específica para los mismos. Adicional a esto, las máquinas biosaludables están en mal estado y requieren cambio, así como los módulos de abdominales y las barras del gimnasio al aire libre. También hay riesgo pues existen cajas sin tapa.



Ilustración 30 Estado inicial del parque – enero de 2025

Fuente. Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

Propuesta de Intervención: Se cambiarán las máquinas biosaludables y se reubicarán dentro del mismo parque. Se hará una zona canina, con división para

razas grandes y pequeñas. Se cambiarán módulos del gimnasio al aire libre y se instalarán unos módulos multi fuerza. Las tapas de las cajas se repondrán.

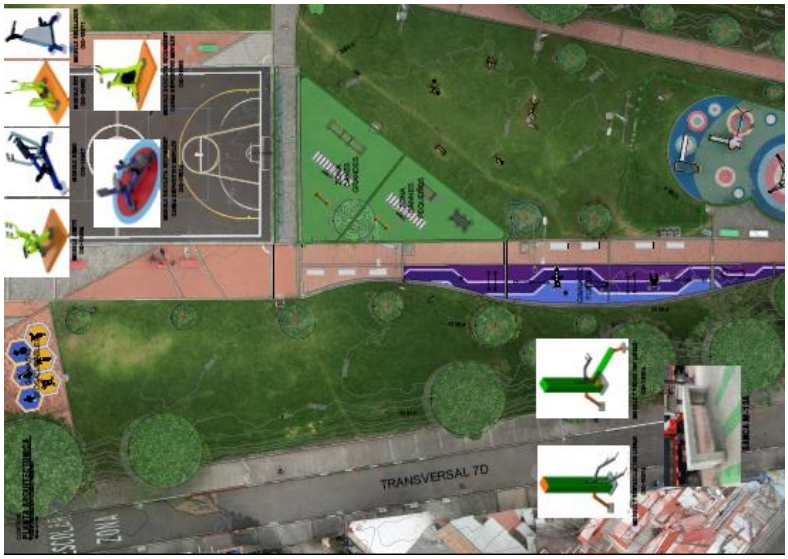


Ilustración 31 Propuesta de intervención

Fuente. Diagnóstico Consorcio Usaquén 005-2024

ESTADO ACTUAL: Se instalan máquinas de gimnasio al aire libre, junto con la valla de instrucción. Se realiza el desmonte y retiro de los biosaludables. El resto de las actividades de la propuesta no se ejecutarán por solicitud de la Entidad. Pendiente aún aseo y entrega de volantes informativos a la comunidad.



Ilustración 32 Estado actual parque Codabas - junio 30 de 2025

Fuente. Propia Consorcio Usaquén 005-2024

1.2.9. PARQUE No. 01-395 URBANIZACIÓN BALMORAL

Dirección: Entre Calles 186A y 186C Bis, Carrera 15 Costado Oriental



Ilustración 33 Localización parque 01-395

Estado Inicial. Cuenta con una zona de juegos infantiles con una baranda M-83 corroída y en regular estado. En el interior se evidencia vandalismo que hay dañado módulos infantiles de resorte, así como los columpios. Hay bancas y canecas en mal estado en general dentro del parque. Las canchas y mallas contra impacto están en buen estado, así como los senderos. El gimnasio multifuerza está en buen estado también.



Ilustración 34 Estado inicial del parque – enero de 2025

Fuente. Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

Propuesta de Intervención: Se hará el mantenimiento de la baranda M-83 cambiando piezas, módulos, soldando y pintando. Se repondrán las puertas. Se desmontarán bancas en mal estado y se hará mantenimiento de las que se puedan rescatar. Se repondrán los columpios vandalizados.

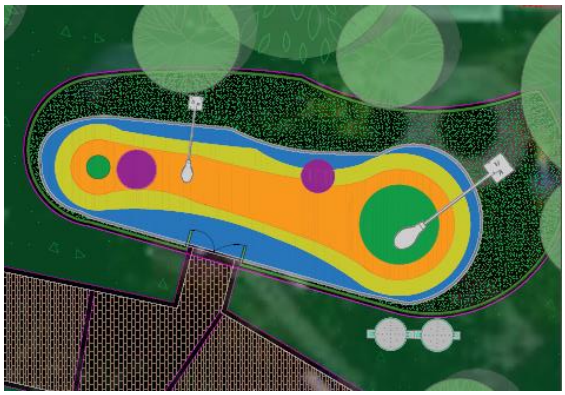


Ilustración 35 Propuesta de intervención

Fuente. Diagnóstico Consorcio Usaquén 005-2024

Estado Actual. Parque entregado a la comunidad el 11 de abril de 2025 con baranda tipo M-83 arreglada con cambio de módulos, encamisado de parales, cambio de un tramo de tubular de 3" para pasamanos y pintura, suministro e instalación de puertas, cinta en concreto bajo baranda M-83; mantenimiento de bancas en madera M-50; y suministro e instalación de columpios en módulo importado existente.

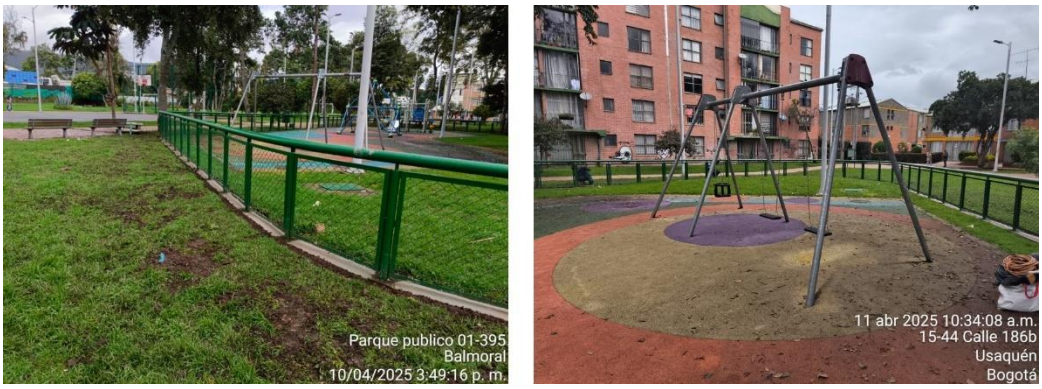


Ilustración 36 Estado Final del parque – junio de 2025

Fuente. Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

1.2.10. PARQUE No. 01-407 URBANIZACIÓN CONJUNTO MULTIFAMILIAR EL VERGEL

Dirección: Calle 131A con Carrera 9ª



Ilustración 37 Localización parque 01-407

Estado Inicial. Cuenta con un módulo infantil en madera de gran tamaño en mal estado, así como con senderos y un buen número de árboles que lo han afectado, así como el crecimiento de pasto.





Ilustración 38 Estado inicial del parque – enero de 2025

Fuente. Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

Propuesta de Intervención: Se desmontarán los juegos existentes en madera y se suministrará un módulo con capacidad para 30 niños. Para su instalación se hará una placa con caucho d y espesor de 5cm, así como baranda M-83. Se hará una plazoleta pequeña de permanencia en adoquín. También se suministrarán bancas.



Ilustración 39 Propuesta de intervención

Fuente. Diagnóstico Consorcio Usaquén 005-2024

Estado Actual: Parque en etapa de remates y atención a observaciones. Se termina zona de juegos (placa en concreto, piso en caucho, juego infantil, baranda) y plazoleta en adoquín.







Ilustración 40 Estado actual parque El Vergel - junio de 2025

Fuente. Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

1.2.11. PARQUE No. 01-483 AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE

Dirección: Avenida Carrera 19 entre Calles 159 y 160A



Ilustración 41 Localización parque 01-483

Estado Inicial. Cuenta con módulos infantiles metálicos (rodadero y columpio) y en madera muy antiguos. Las bancas existentes están deterioradas y los senderos están hundidos, por debajo del nivel del andén sobre la Av. 19, al costado occidental del parque



Ilustración 42 Estado inicial del parque – enero de 2025

Fuente. Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

Propuesta de Intervención: Se desmontarán los juegos existentes y se suministrará un módulo con capacidad para 30 niños. Para su instalación se hará una placa con caucho de espesor de 5cm, así como baranda M-83. Se hará una plazoleta pequeña de permanencia en adoquín. También se suministrarán bancas.

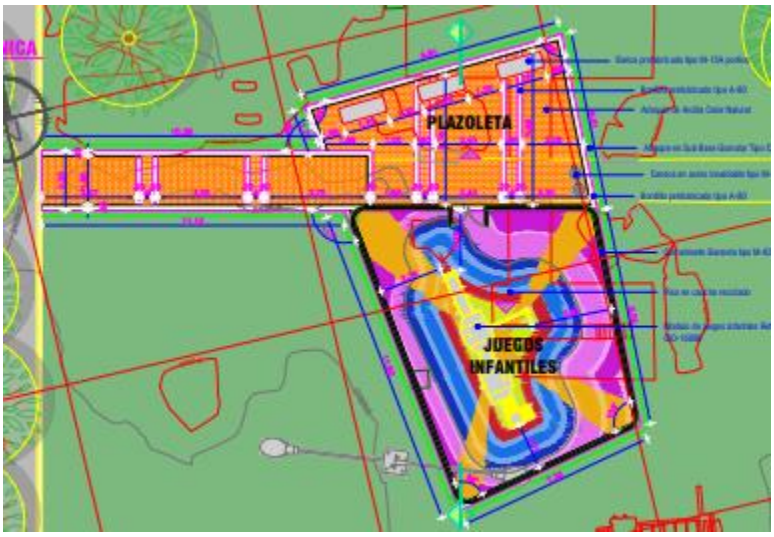


Ilustración 43 Propuesta de intervención

Fuente. Diagnóstico Consorcio Usaquén 005-2024

Estado actual: Parque terminado y en espera de confirmación de fecha de entrega a la comunidad por parte del FDLUS. Se ejecutó zona de juego infantil (placa en concreto, piso en caucho, juego infantil, baranda), sendero y plazoleta en adoquín con su respectivo mobiliario. Hay una colmena de abejas en una llanta que la supervisión solicitó retirar. Se espera solución por parte de Bomberos de Bogotá.



Ilustración 44 Estado actual del parque – junio de 2025

Fuente. Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

1.2.12. PARQUE No. 01-517 URBANIZACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL EL MORAL I

Dirección: Calle 182 con Carrera 8C



Ilustración 45 Localización parque 01-517

Estado Inicial. Cuenta con una plazoleta en adoquín en concreto, con bancas instaladas perimetralmente. El adoquín está en regular estado, así como el mobiliario.



Ilustración 46 Estado inicial del parque – enero de 2025

Fuente. Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

Propuesta de Intervención: Se pintarán las bancas en concreto de gris, se cambiará la señal IDG-S y se limpiarán cañuelas, cajas y tuberías. Se suministrarán e instalarán 4 máquinas de gimnasio al aire libre.

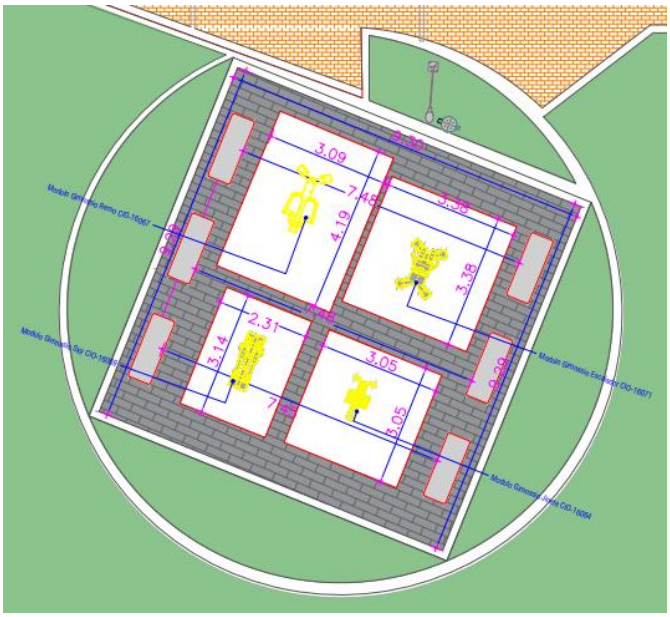


Ilustración 47 Propuesta de intervención

Fuente. Diagnóstico Consorcio Usaquén 005-2024

Estado actual: Se instalan máquinas de gimnasio al aire libre, se pintan bancas M-40, renivelar paños de adoquín con hundimientos, se aplica herbicida y se limpian juntas de bordillos y adoquín, se reemboquilla el área. Se hizo limpieza de caja y sondeo de tubería. Se informó a la comunidad de la culminación de los trabajos por medio de volantes y la puesta en servicio de lo instalado.



Ilustración 48 Estado actual parque El Moral I - junio de 2025

Fuente. Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

1.2.13. PARQUE No. 01-546 URB LAS MERCEDES PARQUE

Dirección: Calle 182 con carrera 8A



Ilustración 49 Localización parque 01-546

Estado Inicial. Cuenta con una zona de juegos infantiles con módulos M-5 y M3. El primero está en muy mal estado, mientras el segundo presenta poco deterioro. El asfalto está en regular estado. La zona de juegos tiene baranda M.80.



Ilustración 50 Estado inicial del parque – enero de 2025

Fuente. Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

Propuesta de Intervención: Se desmontará el M-5 y se reemplazará por un módulo de columpio combinado. El M-3 se arreglará (pintura y cambio de elementos puntuales como rodadero y plataformas). Se demolerá el asfalto, se fundirá placa en concreto y sobre ésta se instalará caucho con espesor de 5cm. Se instalarán los módulos de complemento a la baranda existente para dejarla como una M-83 y se hará mantenimiento general del elemento.



Ilustración 51 Propuesta de intervención

Fuente. Diagnóstico Consorcio Usaquén 005-2024

Estado Actual. Parque entregado a la comunidad el 5 de abril de 2025. Se demolió la carpeta asfáltica, se desmontó el módulo M-5, se instaló un módulo de columpio importado para 6 niños, se hizo mantenimiento con cambio de piezas (rodadero y plataformas) y pintura al módulo M-3; se suministraron e instalaron los módulos para que la baranda quedara tipo M-83, se complementó el tramo de baranda para cerrar la zona de juegos; se suministró e instaló piso en caucho SBR y EPDM; se suministró señalética.



Ilustración 52 Estado Final del parque – junio de 2025

Fuente. Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

1.2.14. PARQUE No. 01-556 URBANIZACIÓN ALCAZAR DEL RIO

Dirección: Carrera 8H entre Calles 166 y 168



Ilustración 53 Localización parque 01-556

Estado Inicial. El parque cuenta con juegos infantiles en madera, una plazoleta de permanencia con bancas en concreto y una amplia zona verde. Es muy visitado por vecinos con sus perros.




Ilustración 54 Estado inicial del parque – enero de 2025

Fuente. Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

Propuesta de Intervención: Se desmontarán los juegos existentes y se suministrará un módulo con capacidad para 30 niños. Para su instalación se hará una placa con caucho de espesor de 5cm, así como baranda M-83. Se harán un sendero de acceso y una plazoleta pequeña de permanencia en adoquín. También se suministrarán bancas. Al fondo del parque se hará una zona canina aislada con baranda M-83.

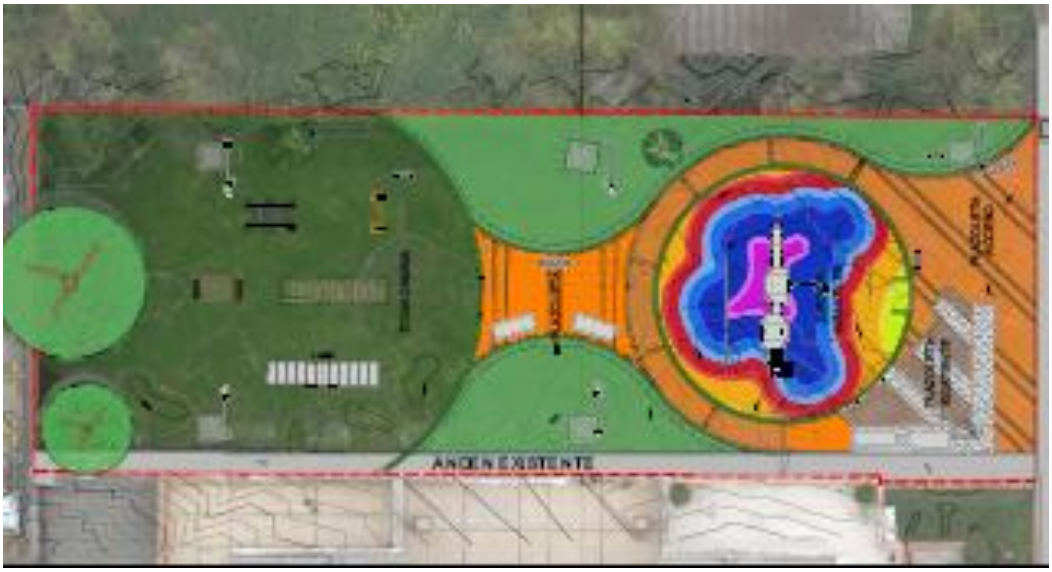


Ilustración 55 Propuesta de intervención

Fuente. Diagnóstico Consorcio Usaquén 005-2024

Estado Actual. Se terminaron la zona de juegos (placa, piso en caucho, baranda, juego infantil), senderos y plazoleta en adoquín, así como la instalación de mobiliario canino.



Ilustración 56 Estado actual del parque - abril de 2025
Fuente. Propia – Consorcio Usaquén 005-2024

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Los 14 parques priorizados por el Fondo y su ubicación están es el siguiente cuadro:

#	DIRECCION	BARRIO	PARQUE	CODIGO
1	Entre Carreras 7G y 7H y Calles 160 y 159B	ALTABLANCA	URBANIZACION ALTABLANCA	01-003
2	Calle 108 entre Carreras 17 y 17A	SAN PATRICIO	URBANIZACION SAN PATRICIO - 2 SECTOR	01-009
3	Entre Carreras 22 y 19B con Calle 151	LAS ACACIAS	EL CEDRO BOLÍVAR - UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS I SECTOR	01-016
4	Entre Avenida Carrera 9 y 14 y Calles 151 y 148	CAPRI	URBANIZACION CAPRI	01-059
5	Calle 106 entre Carreras 13A y 14	MOLINOS	URBANIZACION LOS MOLINOS	01-117
6	Calle 114 entre Avenida Carrera 45 (Autonorte) y Avenida Carrera 19	MOLINOS	NUEVA URBANIZACION SANTA BÁRBARA	01-126
7	Entre Carreras 21 y 19B y Calles 159A y 160	ESTRELLA DEL NORTE	DESARROLLO ESTRELLA DEL NORTE	01-189
8	Entre Calles 180 y 181A y Transversal 7D	SAN ANTONIO	URBANIZACION CODABAS	01-372
9	Entre Calles 186A y 186C Bis, Carrera 15 Costado Oriental	BALMORAL	URBANIZACION BALMORAL	01-395
10	Calle 131A con Carrera 9A	COUNTRY	URBANIZACION CONJUNTO MULTIFAMILIAR EL VERGEL	01-407
11	Avenida Carrera 19 entre Calles 159 y 160A	JARDINES DE ORIENTE	AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE	01-483
12	Calle 182 con Carrera 8C	SAN ANTONIO	URBANIZACION CONJUNTO RESIDENCIAL EL MORAL I	01-517
13	Calle 182 con carrera 8A	SAN ANTONIO	URB LAS MERCEDES PARQUE	01-546
14	Carrera 8H entre Calles 166 y 168	EL DANUBIO OCCIDENTAL	URBANIZACIÓN ALCAZAR DEL RIO	01-556

Tabla 1 Ubicación de los parques
Fuente. Anexo 1- COP 740-2024

3. CONTRATO DE OBRA.

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

3.1.1 ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA.

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	740-2024
OBJETO	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C"
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
VALOR OBRA	$3.133.377.206
VALOR COMPONENTE AMBIENTAL Y SST	$88.354.006
VALOR COMPONENTE SOCIAL	$44.040.822
VALOR COMPONENTE TRÁNSITO	$39.546.450
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.305.228.484
FECHA DE INICIO	20 ENERO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19 JULIO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO USAQUÉN 005-2024
NIT	901.901.285-7
INTERVENTOR	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS

Tabla 2 - Datos Generales del Contrato

3.1.2 ASPECTOS LEGALES Y REVISIÓN DE PÓLIZAS.

Los documentos de carácter legal que se han suscrito a la fecha se relacionan en la siguiente tabla:

No.	DOCUMENTO	FECHA
1	Acta de inicio	20 enero 2025

Tabla 3 - Documentos Legales del contrato de obra

Ver Anexo No. 1 - Copia Acta de Inicio.

El contrato de obra se encuentra amparado por las siguientes pólizas y sus actualizaciones.

- **Seriedad de la Oferta**

ASEGURADORA: EQUIDAD SEGUROS

Amparo	Numero	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
SERIEDAD DE LA OFERTA	AB02511	$330.522.848,40	06/12/2024	05/04/2025

- **Firma y legalización contrato – A0**

ASEGURADORA: EQUIDAD SEGUROS

Amparo	Numero	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	AB002626	$330.522.848,40	30/12/2024	30/12/2025
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$ 165.261.424,20	30/12/2024	30/06/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$991.568.545,20	30/06/2025	30/06/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL	AB002627	$284.700.000,00	30/12/2024	30/06/2025

- **Acta de Inicio – A1**

Amparo	Numero	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	AB002626	$330.522.848,40	20/01/2025	19/01/2026
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$ 165.261.424,20	20/01/2025	19/07/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$991.568.545,20	19/07/2025	19/07/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL	AB002627	$284.700.000,00	20/01/2025	19/07/2025

Tabla 4 - Pólizas que amparan el contrato de obra

Ver Anexo No. 2 Copia Pólizas Contractuales.

3.1.3 ASPECTOS FINANCIEROS.

Valor inicial del contrato **$3.305.228.484,00**

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 7 “FORMA DE PAGO” de la minuta firmada, el valor del contrato se pagará de la siguiente manera:

i) Con pagos mensuales (según actas de corte de obra parciales) hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato. Estos valores dependen de la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible. Todos los pagos están sujetos a previa revisión, aprobación y autorización de la Interventoría.

ii) El diez (10%) restante previa suscripción del acta de liquidación por parte del FONDO, la interventoría y el Contratista. Consolidada para el periodo y de manera individual según la obra ejecutada en el periodo por cada parque.

El FONDO pagará mensualmente al CONTRATISTA el valor de las obras ejecutadas, de acuerdo con el importe de las respectivas actas de obra, suscritas por el contratista y refrendadas por el interventor del contrato, y, si a ello hubiere lugar, autorizadas por el funcionario correspondiente del FONDO.

El valor del contrato se pagará en un 90% con actas parciales de obra y el 10% restante del valor final del contrato contra firma del acta de entrega final a satisfacción y acta de liquidación suscrita por las partes. Estas actas deberán estar debidamente recibidas a satisfacción por parte de la interventoría.

3.1.3.1 Control financiero.

Estado actual	Valor Contrato	$ 3.305.228.484,00
	Acta No. 1	$ 388.497.685,00
	Acta No. 2	$ 685.704.602,00
	Acta No. 3	$ 916.269.545,00
	Valor para ser cancelado en liquidación	$ 330.522.848
	Acumulado valor obras ejecutadas a fecha presente informe	**$ 1.990.471.838,00**

Tabla 5 – Valor obras ejecutadas

3.1.3.2 Resumen financiero

		VALOR CONTRATO	3.305.228.484
# CORTE	# FACTURA	VALOR CORTE-OBRAS EJECUTADAS	SALDO POR EJECUTAR
Acta No. 1		$ 388.497.685,00	**$ 2.916.730.793**
Acta No. 2		$ 685.704.602,00	**$ 2.231.026.188**
Acta No. 2		$ 916.269.545,00	**$ 1.314.756.644**

Tabla 6 - Resumen Actas presentadas / Saldo por ejecutar

3.1.3.3 Avance financiero físico en obra.

El análisis financiero se realiza basado en el flujo de inversión:

- VALORES PROGRAMADOS según cronograma de obra V5 y Flujo de caja V6:
  $ 2.288.346.190,68

- VALORES EJECUTADOS:
  $ 2.888.756.755,09

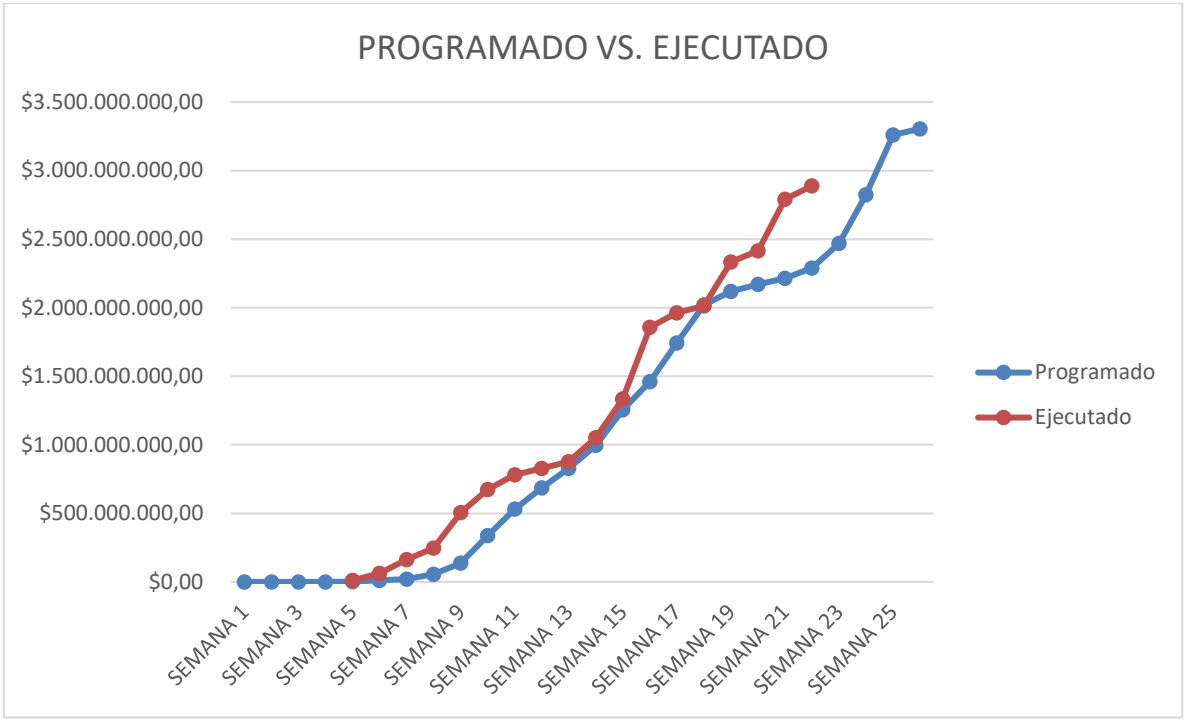


Ilustración 57 Gráfico de Inversión programada VS. ejecutada

Ver Anexo No. 3 Presupuesto actualizado

En el anexo No. 3 se presenta presupuesto actualizado con los No Previstos producto de la etapa de diagnóstico y otros que han resultado de necesidades surgidas durante la ejecución de los trabajos.
En el presente informe se relacionan la programación de obra y flujo de caja. Basado en esto se realiza el control financiero al proyecto.

Ver Anexo No. 4 Programación de obra.
Ver Anexo No. 5 Flujo de inversión semanal.

A continuación, se presenta resumen financiero de inversión presupuestal a 25 de junio de 2025:

FECHA	SEMANAS	PROGRAMADO SEMANAL				EJECUTADO SEMANAL			
		programado semanal	% programado	Acumulado semanal $	acumulado %	ejecutado semanal $	% ejecutado	Acumulado semanal $	% ejecutado acumulado
24/02 al 02/03 2025	semana No.1	$ 7.380.731,66	0,22%	$ 7.380.731,66	0,22%	$ 11.569.102,00	0,35%	$ 11.569.102,00	0,35%
3-9/03-2025	semana No.2	$ 26.612.209,61	0,81%	$ 33.992.941,27	1,03%	$ 51.738.937,00	1,57%	$ 63.308.039,00	1,92%
10-16/03/2025	semana No.3	$ 43.749.878,55	1,32%	$ 77.742.819,82	2,35%	$ 99.128.656,42	3,00%	$ 162.436.695,41	4,92%
17-23/03/2025	semana No.4	$ 60.649.799,56	1,84%	$ 138.392.619,38	4,19%	$ 83.599.333,38	2,53%	$ 246.036.028,79	7,45%
24-30/03/2025	semana No.5	$ 97.244.101,79	2,94%	$ 235.636.721,17	7,13%	$ 259.908.969,56	7,87%	$ 505.944.998,36	15,32%
31-03 al 6-04-2025	semana No.6	$ 92.418.869,10	2,80%	$ 328.055.590,27	9,93%	$ 169.184.106,22	5,12%	$ 675.129.104,58	20,44%
(7-13)-04-2025	semana No.7	$ 126.184.400,79	3,82%	$ 454.239.991,06	13,74%	$ 105.609.810,53	3,20%	$ 780.738.915,11	23,62%
(14-20)-04-2025	semana No.8	$ 240.102.734,31	7,27%	$ 694.342.725,37	21,01%	$ 47.432.192,37	1,44%	$ 828.171.107,49	25,06%
REPROGRAMACION (21-27)-04-2025	semana No.9	$ 141.679.848,08	4,29%	$ 827.545.974,29	25,04%	**$ 51.235.787,42**	**1,55%**	**$ 878.316.345,68**	**26,57%**
(28-30)04-(1-4)05/2025	semana No.10	$ 168.701.076,67	5,11%	$ 996.247.050,96	30,14%	$ 173.141.666,74	5,24%	$ 1.051.458.012,43	31,81%
(5-11)/05/2025	semana No.11	$ 259.445.542,66	7,85%	$ 1.255.692.593,62	37,99%	$ 282.171.357,03	8,54%	$ 1.333.629.369,46	40,35%
(12-18)05/2025	semana No.12	$ 204.379.350,32	6,19%	$ 1.460.071.943,94	44,17%	$ 523.730.545,63	15,85%	$ 1.857.359.915,09	56,19%
(19-25)05-2025	semana No.13	$ 282.178.607,19	8,54%	$ 1.742.250.551,13	52,71%	$ 105.724.687,57	3,20%	$ 1.963.084.602,66	59,39%
(26-31)05-(1-06-2025)	semana No.14	$ 279.638.924,17	8,47%	$ 2.021.889.475,30	61,17%	$ 55.500.280,03	1,68%	$ 2.014.654.796,00	60,95%
(2-8)06-2025	semana No.15	$ 98.188.865,54	2,97%	$ 2.120.078.340,84	64,14%	$ 314.241.497,92	9,51%	$ 2.332.826.380,61	70,58%
(9-15)06/2025	semana No.16	$ 49.971.571,68	1,51%	$ 2.170.049.912,52	65,66%	$ 81.252.869,08	2,46%	$ 2.415.990.648,95	73,10%
(16-22)06-2025	semana No.17	$ 43.886.293,85	1,33%	$ 2.213.936.206,37	66,98%	$ 374.848.904,40	11,34%	$ 2.790.839.553,36	84,44%
(23-29)06-2025	semana No.18	$ 74.409.984,31	2,25%	$ 2.288.346.190,68	69,23%	$ 97.917.201,73	2,96%	$ 2.888.756.755,09	87,40%

Tabla 7 - Resumen financiero PORCENTAJE EJECUTADO

El Análisis de actividades proyectadas v/s ejecutadas se presenta en el anexo 6 .

Ver Anexo No. 6 Control Avance de obra proyectado v/s ejecutado.

El control de avance físico y financiero del proyecto evidencia las siguientes situaciones:

- Las actividades proyectadas para ejecución en el presente período se realizaron sin evidencia de atrasos en la programación presentada. Se cumplió con la ejecución del 69,23% de obra proyectada con costos proyectados de $ 2.288.346.190,68.
- La ejecución total del período superó lo proyectado en el flujo de inversión acumulada, pues se ejecutaron actividades por valor de $2.888.756.755,09. El porcentaje de ejecución en presupuesto llegó al 87,40%.

3.2 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2.1 PERSONAL APROBADO DE OBRA.

A continuación, se relaciona el personal contractual del contratista aprobado por la interventoría.

Tabla 8 - Personal del contrato en obra

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEDICACIÓN
Magda Heynner Umaña Torres	Director de Obra	40%
Daniel Charry Cediel	Residente de Obra	100%
Carlos Andrés Vásquez	Especialista en Urbanismo	25%
Adriana María Oviedo Valero	Especialista Ambiental	20%
Adriana María Oviedo Valero	Profesional Forestal	20%
Víctor Manuel Reyes Caro	Especialista en Tránsito y Transporte	20%
Luz Stella Clavijo Rodríguez	Especialista SST	70%
Sandra Janeth Rodríguez Álvarez	Residente Social	60%
Técnico/Inspector	Andrés Danilo Moreno Ruiz	100%

3.2.2 PLANES DE MANEJO DE TRÁFICO.

Teniendo en cuenta el objeto del contrato y las actividades a ejecutar, se realizaron los Planes de Manejo de Tráfico (PMT), con el fin de garantizar el parqueo temporal de volquetas, durante las actividades de construcción y/o remodelación de los parques a intervenir.

Esto con el fin de mitigar el impacto generado por las obras durante la construcción del proyecto, con el propósito de brindar un ambiente seguro, limpio, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, peatones, personal de la obra y vecinos del área de influencia del proyecto, bajo el cumplimiento de las normas establecidas para la regulación del tránsito.

Se solicitaron prórrogas para los parques Capri y Margaritas, teniendo en cuenta sus nuevas fechas de inicio.

No.	PARQUE	COI No.	FECHA DE VENCIMIENTO	PRÓRROGAS
1	SAN PATRICIO	8 (20/02/2025)	22/05/2025	
2	MOLINOS	8 (20/02/2025)	22/05/2025	
3	ALCÁZAR DEL RÍO	9 (27/02/2025)	22/05/2025	
4	CODABAS	9 (27/02/2025)	22/05/2025	
5	MARGARITAS	9 (27/02/2025)	22/05/2025	COI No. 21 CON FECHA DE

				VENCIMIENTO 24/07/2025
6	LAS MERCEDES	9 (27/02/2025)	22/05/2025	
7	CAPRI	10 (06/03/2025)	22/05/2025	COI No. 21 CON FECHA DE VENCIMIENTO 24/07/2025
8	ESTRELLA NORTE	10 (06/03/2025)	5/06/2025	
9	JARDINES DE ORIENTE	11 (13/03/2025)	12/06/2025	
10	SANTA BARBARA	12(21/03/2025)	26/06/2025	
11	El VERGEL	15(11/04/2025)	19/06/2025	

Tabla 9 PMT's aprobados

Ver Anexo No. 7 Planes de Manejo de Trafico aprobados por la Secretaria de Movilidad.

3.2.3 INFORME ADMINISTRATIVO.

- El día 20 de enero de 2025 se firma acta de inicio.
- El día 30 de enero de 2025, se realiza entrega de pólizas actualizadas de acuerdo con el acta de inicio.
- En comité de obra se definen fechas de corte para informes (día 20 de cada mes) para entrega a interventoría.
- Se actualiza en comité el período para los cortes, dejándolo de inicio a fin de mes (30 o 31 de cada mes).

3.2.3.1 Control de Correspondencia Enviada.

Ver Anexo No. 8 Correspondencia enviada y correspondencia recibida

Correspondencia enviada

No	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO POR	CARTA	EMAIL
SIN OFICIO	3/06/2025	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	NP PPTOS ACTUALIZADOS	MAGDA HEYNNER UMAÑA TORRES	X	X

SIN OFICIO	3/06/2025	PROFESIONAL SST CONSORCIO USAQUEN LUZ	DOCUMENTACION NUEVO TRABAJADOR	CONSORCIO USAQUEN 005 2024	X	X
COF 062-CTO 740 DE 2024	5/06/2025	PROFESIONAL SST CONSORCIO USAQUEN LUZ	ENTREGA DE INFORME SST No 3	LUZ CLAVIJO	X	X
SIN OFICIO	6/06/2025	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	IMPUESTOS ACTUALIZADOS V7 CORTE 7	MAGDA HEYNNER UMAÑA TORRES	X	X
SIN OFICIO	7/06/2025	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	NP 69-73 - SOLICITUD ACTAS DE COM,ITE	MAGDA HEYNNER UMAÑA TORRES	X	X
SIN OFICIO	9/06/2025	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	MEMORIAS - ACTAS CORTE No 3	MAGDA HEYNNER UMAÑA TORRES	X	X
SIN OFICIO	9/06/2025	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	INFORME TECNICO No. 3 - V1	DANIEL CHARRY CEDIEL	X	X
COF 064-CTO 740 DE 2024	11/06/2025	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	ENTREGA INFORME DE GERENCIA DE PROYECTO No 3	MAGDA HEYNNER UMAÑA TORRES	X	X
SIN OFICIO	11/06/2025	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	MEMORIAS - ACTAS CORTE No 3 CORREGIDAS	DANIEL CHARRY CEDIEL	X	X
SIN OFICIO	12/06/2025	FONSECA	DISEÑO CUACHO RECICLADO SANTA BARBARA	CONSORCIO USAQUEN 005 2024	X	X
SIN OFICIO	12/06/2025	GRANITO DE ORO	SOLICITUD REPORTE ACTUALIZACION 4433	ADRIANA OVIEDO	X	X
SIN OFICIO	12/06/2025	FONSECA	DISEÑO CUACHO RECICLADO PARQUE VERGEL	CONSORCIO USAQUEN 005 2024	X	X

SIN OFICIO	12/06/2025	FONSECA	RESUMEN CANTIDADES PARQUE SANTA BARBARA-VERGEL	CONSORCIO USAQUEN 005 2024	X	X
SIN OFICIO	16/06/2025	BENHURT ZULETA	SE ADJUNTA COMPROBANTE DE PAGO	CONSORCIO USAQUEN 005 2024	X	X
COF 065-CTO 740 DE 2024	16/06/2025	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	RESPUESTA DE SOLICITUD DE DOTACIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES	X	X
SIN OFICIO	17/06/2025	FONSECA	DISEÑO CAUCHO PARQUE CAPRI	CONSORCIO USAQUEN 005 2024	X	X
COF 066-CTO 740 DE 2024	18/06/2025	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	ENTREGA INFORME MENSUALES No 3	MAGDA HEYNNER UMAÑA TORRES	X	X
SIN OFICIO	19/06/2025	FERNANDO FONSECA	CORREGIR POLIZA DE ESTABILIDAD	CONSORCIO USAQUEN 005 2024	X	
SIN OFICIO	19/06/2025	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	ENVIO BALANCE	DANIEL CHARRY CEDIEL	X	X
SIN OFICIO	20/06/2025	INPASUELC	REMITE SOPORTE DE PAGO	CONSORCIO USAQUEN 005 2024	X	X
SIN OFICIO	26/06/2025	SOLUCIONES JEN	SE ADJUNTA CONTRATO FIRMADO	CONSORCIO USAQUEN 005 2024	X	X
SIN OFICIO	26/06/2025	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	DISEÑO DE MEZCLA	DANIEL CHARRY CEDIEL	X	X

-Correspondencia Recibida

No	FECHA	ORIGEN	DIRIGIDO	ASUNTO	CARTA	EMAIL
R&M-CTO-049-743-2024	3/06/2025	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.	CONSORCIO USAQUEN 005 2024	SOLICITUD DE DOTACION DEL PUNTO DE ATENCION CIUDADANA	X	X

3.2.4 AVANCE DE OBRA.

3.2.4.1 Avance de Actividades Programadas.

Se evidencia que se dio CUMPLIMIENTO en la totalidad de las actividades con los porcentajes proyectados el mes de junio de 2025.
Se cumple con el cronograma de obra en el tiempo proyectado.

ACTIVIDADES	% DE AVANCE AL 25/05/2025	% EJECUTADO ACUMULADO PRESENTE MES	% ACUMULADO ACTIVIDADES POR EJECUTAR
01-003 URBANIZACIÓN ALTABLANCA	100%	100%	0%
01-395 URBANIZACIÓN BALMORAL	100%	100%	0%
01-546 URB LAS MERCEDES PARQUE	100%	100%	0%
01-009 URBANIZACIÓN SAN PATRICIO - 2 SECTOR	100%	100%	0%
01-117 URBANIZACIÓN LOS MOLINOS	100%	100%	0%
01-372 URBANIZACIÓN CODABAS	98,64%	98,64%	1,36%
01-189 DESARROLLO ESTRELLA DEL NORTE	100%	100%	0%

01-483 Agrupación De Vivienda Jardines De Oriente	100%	100%	0%
01-517 URBANIZACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL EL MORAL I	100%	100%	0%
01-407 URBANIZACIÓN CONJUNTO MULTIFAMILIAR EL VERGEL	97,17%	97,17%	2,83%
01-126 NUEVA URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA	79,17%	79,17%	20,83%
01-556 URBANIZACIÓN ALCÁZAR DEL RÍO	98,78%	98,18%	1,82%
01-016 EL CEDRO BOLÍVAR – UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS I SECTOR	17,51%	17,51%	82,49%
01-059 URBANIZACIÓN CAPRI	20,11%	20,11%	79,89%

Tabla 10 - Avance de ejecución por parque (%)

3.2.4.2 Avance Físico Ejecutado.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de JUNIO de 2025 y el 30 de JUNIO del 2025, se realizaron las siguientes actividades.

Las actividades relacionadas a continuación son las ejecutadas durante el período en mención en el marco del objeto del COP 740-2024.

De las actividades compuestas que incluyen movimiento de tierra, rellenos y acabado, se registra el avance y el respectivo porcentaje.

Se relacionan las actividades por parque:

i. PARQUE ALTABLANCA 01-003

FECHA DE SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD: 17 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 26 de FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN Y ENTREGA: 11 de ABRIL DE 2025

- Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)

- PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)

- Módulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**





- MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta) Brazos al





- BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO(SUM+INST)


OBSERVACIÓN: Se debió instalar de nuevo la barra de giro pues fue cortada en la noche posterior a su primera instalación.

- Corte horizonte en concreto con pulidora e=2cm**


	
CORTE CON PULIDORA PARA INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE BIOSALUDABLE	CORTE CON PULIDORA PARA INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE MÁQUINA DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE.

- PUNTO DE SOLDADURA 6013

			
REINSTALACIÓN PUERTA M-83			

ii. PARQUE LAS MERCEDES 01-546
FECHA DE SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD: 17 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 25 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES: 5 DE ABRIL DE 2025

- BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)

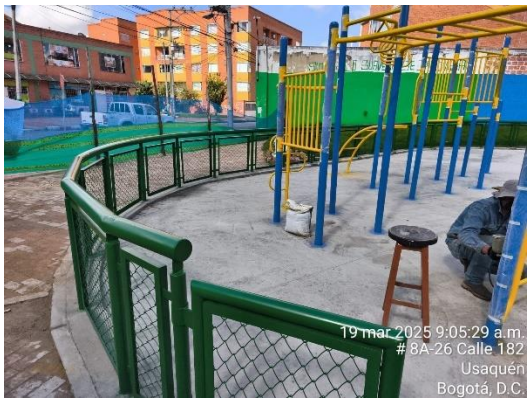- Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm

- Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro

- Columpio Combinado con cesta incluyente

<table>
<tr>
<td colspan="2">




</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">OBSERVACIÓN: La orientación del módulo se tuvo que cambiar, pues al hacer el replanteo en sitio, las distancias de seguridad no cumplían con respecto al módulo M-3 existente.</td>
</tr>
</table>

- Juegos infantiles M-5 o M-5A Columpio (Desmonte)**

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

- Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)

- Caneca M-120 (desmonte) STPM **

- PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)





- Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**





- Excavación manual con retiro en recebo **





- LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

	
OBSERVACIONES: Debido al un fuerte aguacero se evidenció que la caja estaba colmatada. Se destapó y se limpió, lo que permitió el rápido drenaje del agua.	

- Nivelación y Compactación de Subrasante (MdeO+Cilin)

- Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**

- Desmonte Señal (IDG-S)

- Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref

- Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **





- SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)






- SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)





- PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL(DESM+SUM+INST)
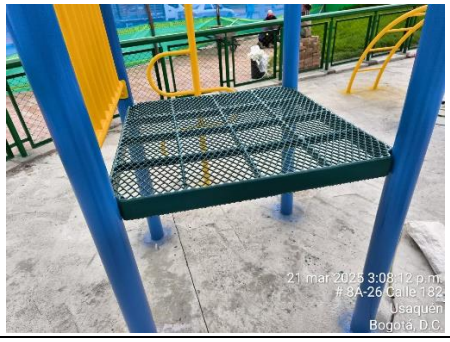
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

- PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFANTIL(DESM+SUM+INST)

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

- Imprimación asfáltica en Frio (Equip.de Bomba)**

iii. PARQUE URBANIZACIÓN BALMORAL 01-395

FECHA DE SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD: 17 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 25 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES: 11 DE ABRIL DE 2025

- Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**





- Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)





- Banca en madera M-50 (instalación) STPM **





- LISTON EN MADERA BANCA (SUM + INST) Y Pintura Banca en Madera (Esmalte Ext).







OBSERVACIONES: Se suministraron 10 listones para bancas en madera y, posteriormente, se pintaron como se evidencia en el registro fotográfico.

- BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)











- CANECA M-120 (desmonte) STPM **





- Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref





- Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**





OBSERVACIONES: Una vez realizado el descapote, se evidenció se la cantidad total de módulos en malla para cambiar por óxido y corrosión aumentó a 15 unidades. El estado de la baranda era muy malo.

- PUNTO DE SOLDADURA 6013

	
OBSERVACIONES: Con la limpieza y retiro del exceso de pasto en la base de la baranda, se evidenciaron serios daños en los parales, especialmente en la base. Se tuvieron que encamisar y re soldar con cordones.	

- Tubo acero negra Estruct. 3" e=4 mm **


- COLUMPIO CONVENCIONAL INCLUYE CADENA + ACOPLES



- LÁMINA SEÑAL (90X120CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobri



- Caneca Acero inoxidable M-121 (sumin e insta) **

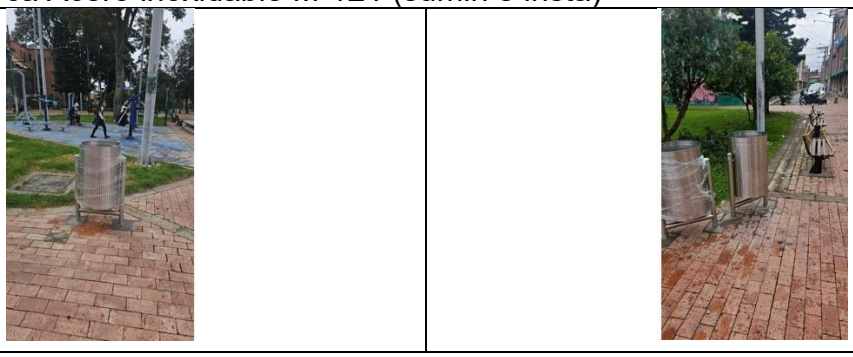

iv. PARQUE DESARROLLO ESTRELLA NORTE 01-189

FECHA DE SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD: 7 de MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 12-03-2025
FECHA DE TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES: 26-06-2025

- LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO





- Desmonte juegos infantiles **





- Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)











OBSERVACIONES: Se hizo necesario el descapote de un área mayor para reutilizar los cespedones para posterior resiembra en las áreas de las demoliciones de placa en concreto.

- DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir









- EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)




- Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin






- Geotextil Tejido T-1700 CDRC







- Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr





- RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) SIN IMPRIMACION









- RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) SIN IMPRIMACION







- AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM


24 abr 2025 1:17:25 p.m.
Usaquén
Bogotá


Parque publico 01-189
Estrella del Norte
25/04/2025 9:29:10 a. m.


11 abr 2025 11:34:13 a.m.
159-89 Carrera 19b
Usaquén
Bogotá, D.C.


21 abr 2026 2:08:12 p.m.
159-89 Carrera 19b
Usaquén
Bogotá, D.C.


11 abr 2025 11:39:11 a.m.
159-89 Carrera 19b
Usaquén
Bogotá, D.C.




29 may 2025 9:08:00 a.m.




21 may 2025 11:56:28 a.m.
159-89 Carrera 19b
Usaquén
Bogotá, D.C.


27 may 2025 10:50:50 a.m.
19B-45 Calle 159a
Usaquén
Bogotá, D.C.


28 may 2025 12:16:41 p.m.
Usaquén
Bogotá



- JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ



- Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm





- Corte horizontal en concreto con pulidora e=2cm**





- Relleno Material Seleccionado Demolicion (Vibro+Minicarg)







- Resiembra de césped común







- BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)







- DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES)








- Loseta IDUA50.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)







- Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM



- Rampa en concreto e=0.10 + RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 22 CM



- Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m



- Desmonte y reinstalacion canecas *



- Piso Caucho recicl 3cm y 5cm



- Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos



- BOLARDO ALTO EN HIERRO M-63 (SUM + INST)



- Banca prefab M-31 sinEspald



- SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST) Y SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)





- ASIENTO FIBRA LONA COLUMPIO(DESM+SUM+INST), CADENA GALVA COLUMPIO M-5 3/8" (SUM + INST) y ACOPLES columpio metal 3/8" forma S(DESM+SUM+INST)





v. PARQUE URBANIZACIÓN SAN PATRICIO - 2 SECTOR 01-009

FECHA DE SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD: 3 de marzo de 2025
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 4 DE MARZO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES: 5 DE JUNIO DE 2025

- LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO

	
OBSERVACIONES: Como resultado de la actividad se concluyó que era necesario reducir el ancho del sendero nororiental de 2.20m a 1.60m por los árboles que existen en ese costado del parque. Se requería distanciarnos, al menos, 30cm a cada lado de los individuos arbóreos.	

- Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)

- Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr



- RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)





	
OBSERVACIONES: Se debieron sellar los fallos que se rellenaron en material seleccionado. El sello se hizo con subbase granular con espesor de 5cm antes de la instalación de geotextil. Se han arreglado 3 fallos en total: plazoleta noroccidental y dos en el sendero suroriental que atraviesa la cuneta natural que permanentemente se inunda y genera los daños en el suelo.	

- Geotextil Tejido T-1700 CDRC

- Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin

- EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">OBSERVACIONES: Se excavaron 3 fallos. El registro anterior muestra los fallos del sendero suroriental, cuya profundidad estuvo entre los 40cm y los 25cm. Sin embargo, con el fin de evitar daños más adelante en la estructura del sendero, se propuso un filtro francés para evacuar el agua de la cuneta evitando empozamientos futuros.</td>
</tr>
</table>

- RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)







- Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm




- Imprimación asfáltica en Frio (Equip.de Bomba)**







- Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref



- Vale Excavación RCD Capa Vegetal (Vj:6M3)



- AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM







- Filtro francés









OBSERVACIONES: Se construyó filtro francés en donde se marca en el plano arriba con el fin de evacuar con rapidez el agua que se empoza en la cuneta natural y causa daños en el terreno. Es un No Previsto que necesario.

- Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM









- Nivelación+Configuracion terreno Mater.Local Selec







- Resiembra de césped común





- Relleno material seleccionado excava (Apiso+Minica)





- Tuberia PVC.S d=4" Excav y relleno recebo **





- Modulo Remo Gimnasio al aire libre (Sumi+Instal), Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst), Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles, Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Moviles, ModuloTPecho100 lbs Gimn aire libre(Incuidoen M-7), ModuloTSentadilla100 lbsGimnaire libre(usadoenM-7)





- Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos







- Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cmTierra)



- MANILA POLIPROP 1/2" Baranda (DESM+SUM+INST); CADENA GALVA COLUMPIO M-5 3/8" (SUM + INST); ASIENTO FIBRA LONA COLUMPIO(DESM+SUM+INST); ACOPLES columpio metal 3/8" forma S(DESM+SUM+INST)



- Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**; Desmonte y reinstalacion banca existente**



- SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST); SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)




vi. PARQUE URBANIZACIÓN LOS MOLINOS

FECHA DE SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD: 3 de MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 7-03-2025

FECHA DE TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES: JUNIO 5 DE 2025

- LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO

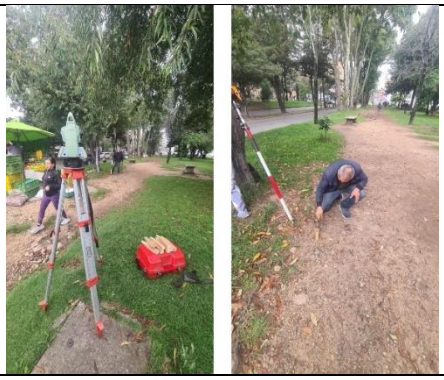

- Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr







- RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)







OBSERVACIONES: Se selló mejoramiento en RCD con SBG con un espesor de 5cm.

- EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)

		
OBSERVACIONES: Se cuantifica la excavación que excede el volumen incluido en las actividades compuestas de adoquín y cenefa.		

- AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM



- Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir



- Relleno Material Seleccionado Demolición (Vibro+Minicarg)



- Rampa en concreto e=0.10 + RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 22 CM



- Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m



- BOLARDO ALTO EN HIERRO M-63 (SUM + INST)



- Loseta IDUA50.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)





- Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cmTierra)









- Caneca Acero inoxidable M-121 (sumin e insta) **); Desmonte y reinstalación canecas **





- ACOPLES columpio metal 3/8" forma S(DESM+SUM+INST); ASIENTO FIBRA LONA COLUMPIO(DESM+SUM+INST); CADENA GALVA COLUMPIO M-5 3/8" (SUM + INST)




- SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)




vii. AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE

FECHA DE SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD: 13 de MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 25-03-2025
FECHA DE TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES: 05-06-2025

- Desmonte juegos infantiles **



- Desmonte Banca Existe.(demol. de bases y retiro)**



- Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)



- EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)








- RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)







- RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) (SIN IMPRIMACIÓN)






- Desmonte y retiro adoquín **



- Demol. manual anden conc iincl. cargue-ret **



- Resiembra de césped común



- Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr







- BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST); JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ







- AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM







- Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm





- Piso Caucho recicl 3cm Y 5cm







- Banca prefab M-31 sinEspald, SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)









viii. URBANIZACIÓN ALCAZAR DEL RIO

FECHA DE SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD: 14 de MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 02-04-2025

- Desmonte juegos infantiles **



- Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**



- EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)





- Desmonte Señal (IDG-S)



- Geotextil Tejido T-1700 CDRC



- AdoquinArcill e=0.06 p<5% y Cenefa Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM



- Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr



- BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST); JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ



- Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm; Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**



- Piso Caucho recicl 3cm y 5cm



- SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL), ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL), AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL), PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST), SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)



- Caja de inspeccion .60x.60, Tuberia PVC.S d=4" Excav y relleno recebo **, PUNTO DESAGUE PVCS Ø2" .(TUBO 2,00M)



- Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **
-





ix. NUEVA URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA

FECHA DE SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD: 9 DE MAYO 2025
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 12-05-2025

- Desmonte juegos infantiles **









- EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)







- Geotextil Tejido T-1700 CDRC



- RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) SIN IMPRIMACION





- RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) SIN IMPRIMACION





- Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr





- Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm






- Piso Caucho recicl 3cm y 5cm, BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST), JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ







x. URBANIZACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL EL MORAL I

FECHA DE SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD: N/A
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 17-05-2025
FECHA DE TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES: 21-06-2025

- Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst); Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal); Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst); Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)



- Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **







- Koraza sobre pañete (2 MANOS) color gris basalto**



- LIMPIEZA Y RETIRO DE QUIKUYO EN BORDILLO Y /O CENEFAS INCLUYE EMBOQUILLADA EN ARENA CEMENTO Y ASEO FINAL



- LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES); Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)



- SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST); SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)





xi. URBANIZACIÓN CONJUNTO MULTIFAMILIAR EL VERGEL

FECHA DE SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD: 9 DE MAYO DE 2025
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 19-05-2025

- Desmonte juegos infantiles **







- EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)







- Geotextil Tejido T-1700 CDRC



- RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) SIN IMPRIMACION



- RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) SIN IMPRIMACION



- Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr





- Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm





- AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo y Cenefa geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM









- Piso Caucho recicl 3cm y 5cm, BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST), JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ



- Caja de inspeccion .60x.60, MARCO+TAPA (ANG+PLAT+ACERO+CONC.3.000) CAJA 60X60CM (sum + inst)



- Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **, Banca en madera M-50 (instalación) STPM **



xii. URBANIZACIÓN CODABAS

FECHA DE SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD: 6 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 19-03-2025


- Demol. manual anden conc iincl. cargue-ret **



- Resiembra de césped común



- Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst), Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal), Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst), Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst), Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles, Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Moviles, SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)

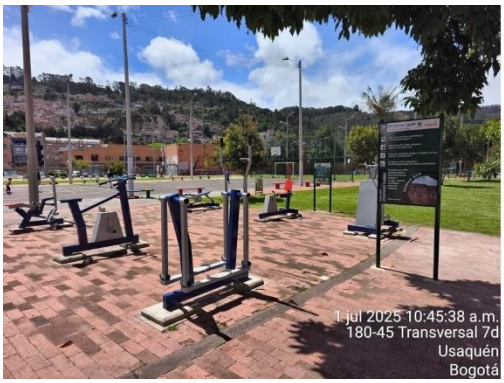



xiii. URBANIZACIÓN CAPRI
FECHA DE SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD: 16 DE MAYO DE 2025
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 13-06-2025

- Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)







- EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)







- RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) SIN IMPRIMACION






- RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN); Geotextil Tejido T-1700







- Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr







- Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**; Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm






- Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**





- AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo y cenefa geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM



xiv. EL CEDRO BOLÍVAR - UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS I SECTOR
FECHA DE SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD: 16 DE MAYO DE 2025
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 16-06-2025

- Demol. manual anden conc iincl. cargue-ret **



- Excavacion manual con retiro en recebo **



- Relleno material seleccionado excava (Apiso+Minica



- RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)



- Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr



- Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**



- Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm



3.2.5 PROGRAMACIÓN DE OBRA.

Se ajustó programación inicial según los inicios de obra proyectados y las adquisiciones de juegos importados. Asimismo, se actualizó el flujo de inversión. Una vez aprobados los precios de las actividades No Previstas, se actualizaron las programaciones, ya que las nuevas actividades requieren de nuevos procesos de ejecución, lo que modifica los tiempos de cada frente.

Ver Anexo No. 4 Programación de obra.

Ver Anexo No. 5 Flujo de Inversión.

3.2.6 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.

Se realizaron los siguientes comités en el transcurso del período comprendido entre 1 de junio y el 30 de junio de 2025.

Acta de Comité de Obra No 17	06-06-2025
Acta de Comité de Obra No 18	13-06-2025
Acta de Comité de Obra No 19	20-06-2025
Acta de Comité de Obra No 20	27-06-2025

Tabla 11 - Relación acta de comité en el periodo

Ver Anexo No. 9 Copia actas de comité.

3.2.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS.

Se han presentado y aprobado por interventoría y la Entidad las siguientes actividades No Previstas:

No.	CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO
NP-1	10848	Juegos infantiles M-5 o M-5A Columpio (Desmonte)**	UND	$ 352.489,48
NP-2	15788	Pintura Modulo- M-3(retir. pint+anticorrosivo+pint)	UND	$ 1.282.828,30
NP-3	12964	Caneca M-120 (desmonte) STPM **	UND	$ 41.419,77
NP-4	10250	Caneca Acero Iinoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND	$ 672.487,86

NP-5	20828	PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	ML	$	30.682,70
NP-6	11304	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	un	$	307.210,57
NP-7	12175	Excavacion manual con retiro en recebo **	M3	$	120.537,53
NP-8	16074	ModuloTSentadilla100 lbsGimnaire libre(usadoenM-7)	UND	$	14.733.858,45
NP-9	13253	Limpieza tuberia existente**	ML	$	27.354,67
NP-10	20802	MARCO+TAPA (ANG+PLAT+ACERO+CONC.3.000) CAJA 60X60CM (sum + inst)	UN	$	227.941,86
NP-11	IDU-3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	$	103.219,00
NP-12	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	$	181,74
NP-13	15820	MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta) Brazos al	UN	$	6.223.791,99
NP-14	103811	BARRA DE GIRO TRAVEZAÑO(Tub. Galv.1"e=0.09")Repues	UN	$	191.865,00
NP-15	16038	LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobril	UN	$	569.670,89
NP-16	16042	LÁMINA SEÑAL (90X120CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobri	UN	$	835.318,09
NP-17		RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) SIN IMPRIMACION	M3	$	233.460,56
NP-18		RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)	M3	$	215.830,00
NP-19	16842	Geotextil Tejido T-1700 CDRC	M2	$	10.248,68
NP-20	15085	Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin	M2	$	1.690,43
NP-21	24	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3	$	127.554,74
NP-22		LIMPIEZA Y RETIRO DE QUIKUYO EN BORDILLO Y /O CENEFAS INCLUYE EMBOQUILLADA EN ARENA CEMENTO Y ASEO FINAL	ML	$	4.200,00

NP-23	10683	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML	$	8.650,35
NP-24	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UN	$	61.428,00
NP-25	13917	Banca M-40 (desmonte)	UN	$	49.413,69
NP-26	106092	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)	m3	$	8.571,00
NP-27	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ml	$	49.402,14
NP-28	14814	PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL(DESM+SUM+INST)	un	$	1.123.484,80
NP-29	14815	PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFAN (DESM+SUM+INST)	un	$	1.011.221,74
NP-30	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN	$	10.105,79
NP-31	100117	Tubo acero negra Estruct. 3" e=4 mm **	ML	$	77.682,00
NP-32	13972	Pintura Banca en Madera(Esmalte Ext).	UN	$	53.383,22
NP-33	14086	Desmonte Lámina Valla Instrucción (Carg+Re	UN	$	46.861,96
NP-34	15122	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2	$	35.026,48
NP-35	10433	Desmonte y retiro adoquín **	M2	$	19.709,92
NP-36	12492	Imprimación asfáltica en Frio (Equip.de Bomba) **	M2	$	13.182,05
NP-37	13574	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica+limpieza	ML	$	14.093,91
NP-38	15807	DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro)	UN	$	190.952,64
NP-39	ESTRUCTURA APU CIO 13017	Loseta IDUA50.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)	ML	$	146.552,65

NP-40	13994	INSTALACION DOTACION	un	$	367.138,36
NP-41	12418	Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**	un	$	36.973,70
NP-42	10603	Koraza sobre pañete (2 MANOS) color gris basalto**	M2	$	52.965,33
NP-43	10803	Desmonte y reinstalación banca existente**	UN	$	252.122,96
NP-44	ESTRUCTURA APU CIO 10160	AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM	M2	$	236.457,76
NP-45	10443	Contened.Raices arboles (1.30x1.30 int) h=1.57 **	UN	$	2.774.389,16
NP-46	ESTRUCTURA APU CIO 13005	Rampa en concreto e=0.10 + RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 22 CM	M2	$	237.506,51
NP-47	14798	PASAMANOS ANGULADO(DESM+SUM+INST)	UN	$	1.226.656,00
NP-48		COLUMPIO CONVENCIONAL INCLUYE CADENA + ACOPLES	UN	$	4.440.340,08
NP-49	20827	SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	UN	$	2.204.629,69
NP-50		CANASTA COLUMPIO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$	8.416.065,12
NP-51	Base insumos cio idrd	Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM	ml	$	69.612,61
NP-52	15008	PUNTO DESAGUE PVCS Ø2" .(TUBO 2,00M)	UN	$	70.728,30
NP-53	15178	CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	$	85.327,60

NP-54	14786	ACOPLES columpio metal 3/8" forma S(DESM+SUM+INST)	un	$	114.029,80
NP-55	15962	Demol. manual anden conc iincl. cargue-ret **	m3	$	394.149,28
NP-56	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ml	$	25.414,85
NP-57	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ml	$	12.558,35
NP-58	10782	Desmonte y reinstalacion canecas **	un	$	108.619,31
NP-59	16253	Relleno Material Seleccionado Demolicion (Vibro+Minicarg)	M3	$	34.989,65
NP-60	10004	Nivelación+Configuracion terreno Mater.Local Selec	M2	$	46.778,79
NP-61	10723	Relleno en arena de rio suelta**	m3	$	293.546,11
NP-62	15479	Resiembra de césped común	M2	$	16.202,59
NP-63	10067	Filtro frances60*80 Excav+geoNT-1600+tubo 65mm **	ML	$	223.656,59
NP-64	14017	Relleno material seleccionado excava (Apiso+Minica	M3	$	35.274,02
NP-65	11702	Tuberia PVC.S d=4" Excav y relleno recebo **	ML	$	123.440,45
NP-66	12541	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2	$	64.583,00
NP-67	11321	Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m	ML	$	118.212,43

Tabla 12 Listado de No Previstos aprobados

Ver Anexo No. 13 Acta de No Previsto No.1

3.2.7 CONTROL DEL CALIDAD

3.2.7.1. CONCRETOS

Como parte de los procedimientos de calidad , y con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones del IDRD, se realizan pruebas en campo al concreto utilizado en la construcción de las placas. De momento se obtuvo el siguiente resultado:

CILNDRO No.	MEZCLA	LOCALIZACIÓN	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Resistencia (MPa)	OBSERVACIÓN
1	3000PSI	Parque Alcázar del Río – Zona de juegos	10/05/2025	07/06/2025	23,8 MPa	28 días - Cumple
1	3000PSI	Parque Estrella Norte – Zona de juegos	10/05/2025	06/06/2025	24,0 MPa	28 días - Cumple
1	3000PSI	Parque El Vergel– Zona Juegos	02/06/2025	09/06/2025	14,5 MPa	7 días - Cumple
1	3000PSI	Parque Santa Bárbara– Zona Juegos	04/06/2025	11/06/2025	15,4 MPa	7 días - Cumple
1	3000PSI	Parque El Vergel– Zona Juegos	02/06/2025	16/06/2025	19,4 MPa	14 días - Cumple
1	3000PSI	Parque Santa Bárbara– Zona Juegos	04/06/2025	18/06/2025	19,6 MPa	14 días - Cumple

Ver Anexo No. 10 Ensayos de laboratorio y certificación concreto

3.2.7.1. DENSIDADES EN CAMPO

Como parte de los procedimientos de calidad, y con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones del IDRD, se realizan pruebas en campo a los rellenos en SBG y BG como parte de la estructura de pavimentos articulados, asfálticos y/o hidráulicos. De momento se obtuvieron los siguientes resultados extraídos de los informes de laboratorio:

No.	MATERIAL	LOCALIZACIÓN	Fecha de Toma	Proctor	Densidad en campo	OBSERVACIÓN
1	BG-RECICLADA	SANTA BÁRBARA – ZONA JUEGOS	04/06/2025	1896	97,4%	>95% CUMPLE
2	BG-RECICLADA	SANTA BÁRBARA – ZONA JUEGOS	04/06/2025	1896	98,2%	>95% CUMPLE
3	BG-RECICLADA	SANTA BÁRBARA – ZONA JUEGOS	04/06/2025	1896	96,7%	>95% CUMPLE
4	BG-RECICLADA	PARQUE CAPRI – ZONA JUEGOS	20/06/2025	1896	97,8%	>95% CUMPLE
5	BG-RECICLADA	PARQUE CAPRI – ZONA JUEGOS	20/06/2025	1896	98,2%	>95% CUMPLE
6	BG-RECICLADA	PARQUE CAPRI – ZONA JUEGOS	20/06/2025	1896	97,4%	>95% CUMPLE

Ver Anexo No. 10 Ensayos de laboratorio y certificación concreto

3.2.7.2. EQUIPOS DE MEDICIÓN

Los equipos de topografía están calibrados según la norma. Se adjuntan certificados en el Anexo 11.

3.2.7.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES Y PROVEEDORES

Se presentaron a la interventoría las caracterizaciones de los siguientes insumos, junto con el respectivo protocolo de proveedor para dar cumplimiento al plan de calidad y al PPI:

- Geotextiles Tejidos
- Bordillo A-80
- Adoquín de arcilla
- Base Granular reciclada
- Subbase Granular reciclada

Se tomaron densidades en campo de los siguientes materiales:

- Base Granular reciclada

- Subbase Granular reciclada

Ver Anexo No. 10 Ensayos de laboratorio

3.2.7.4. MAQUINARIA Y EQUIPO DISPONIBLE

Han funcionado durante el período contractual los siguientes equipos:

No.	EQUIPO	CANTIDAD	USO
1	EXCAVADORA HIDRÁULICA	1	Excavaciones mecánicas
2	VIBROCOMPACTADOR DE 3Ton	1	Compactación de capas granulares
3	MINICARGADOR	1	Carga y extendida de material de relleno
4	RANA	1	Compactación y nivelación de capas granulares
5	PLANTAS ELÉCTRICAS	3	Energizar equipo menor (pulidoras, motosoldadores, compresores)
6	COMPRESOR CON PISTOLA	2	Pintura en campo de barandas, juegos y mobiliario en general
7	PULIDORAS	2	Cortes para dilatar placas, cortes de bordillo.
8	MOTOSOLDADOR	2	Aplicar soldadura en campo para instalación y/o mantenimiento de mobiliario.
9	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 BULTO	1	Mezcla en sitio de concreto.

Tabla 13 Relación de maquinaria y equipo en el contrato

3.2.8 COPIA DE LA BITÁCORA.

Se anexan copias de las bitácoras de los frentes que están ejecución en este período.

Ver Anexo No. 11 Copia bitácora a la fecha.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Se han hecho modificaciones a los diagnósticos aprobados según las necesidades expuestas por la comunidad durante las reuniones de socialización e inicio de obra.
  Sin embargo, las necesidades no han podido ser cubiertas totalmente debido a que el presupuesto está ya asignado y ajustado a los diagnósticos y observaciones de la supervisión.

- Los juegos infantiles se adquirieron al proveedor – BALERCO – y a la fecha de corte (30-06-2025), sólo hay un módulo pendiente por instalación. Esto se considera un avance significativo en el cronograma cuyo seguimiento se hace a través de barras de Gantt. Asimismo, con respecto a los módulos de gimnasio al aire libre, sólo hay 4 máquinas pendientes por instalación.

- Se han generado nuevas actividades No Previstas por necesidades de las obras en cada frente. Se trabaja en los Análisis de Precios Unitarios para el envío a la interventoría y, una vez aprobados, proceder con el respectivo ajuste a la programación.

- Las fuertes lluvias del último mes han dificultado el desarrollo de actividades en los Santa Bárbara, El Vergel, Capri y Margaritas. Los botaderos constantemente se han cerrado por las condiciones del clima bajando los rendimientos de la excavación. Esto se registró en todas las bitácoras de los diferentes frentes de obra abiertos. Adicional a esto, las tarifas incrementaron en más de un 200%.

- Se han elaborado y tramitado once (11) Planes de Manejo de Tráfico. Se considerados necesarios por el movimiento de tierra y retiro de escombros en cada frente. Éstos exceden lo calculado en el rubro correspondiente a PMT del presupuesto. De estos, se prorrogaron 2 (Margaritas y Capri).

- Se considera necesario agilizar con la comunidad las socializaciones de finalización y puesta en servicio de los parques. Los módulos biosaludables o de gimnasios multifuerza, bancas, canecas, señalética y mobiliario instalado en general pueden ser vandalizados

- Se han generado imprevistos de obra debido a las fuertes lluvias que han generado empozamientos en los parques Estrella Norte, Jardines de Oriente, Alcázar del Río, Vergel y Capri. Se han tenido que asignar ayudantes con la tarea específica de retirar el agua con baldes para poder continuar con los trabajos. También se ha dificultado la instalación del caucho y la pintura de las barandas, que se ha tenido que corregir por esta razón.

- Se han generado, además, imprevistos debido al robo de equipo y herramienta en los frentes Alcázar del Río y El Vergel. Los respectivos denuncios ya se hicieron, pero los equipos no se recuperarán, por lo que se han tenido que reemplazar para poder terminar los trabajos.

- Para el parque Codabas habían quedado suspendidas las actividades programadas por las diferencias con la comunidad. La Entidad se reunió con la comunidad y definió que se instalarán las máquinas nuevas (gimnasios al aire libre) y se suministrarán las tapas de las cajas que representan un peligro para los usuarios. Al día 30 de junio de 2025 se han instalado los módulos de gimnasio al aire libre, junto con su respectiva valla con recomendaciones de uso. Para completar las actividades solicitadas por el FDLUSA, el primer día del próximo mes se hará la instalación de las tapas para cajas de inspección y/o sumideros.

- Tras la terminación de todas las actividades en Molino, Estrella Norte y Jardines de Oriente, incluyendo la empradización, se espera confirmación de la fecha de entrega de todos los frentes. En el caso de Estrella Norte, ya se presentan daños en el piso en caucho, presuntamente por el ingreso en horas de la noche de personas al área del juego infantil.

- En Jardines de Oriente la Entidad solicitó retirar dos llantas enterradas junto al sendero nuevo. Sin embargo, en una de éstas hay una colmena de abejas que impide que el personal de obra se acerque. Se le reportó a la Entidad la situación. Actualmente se espera por una solución de parte de Bomberos. Las llantas no se podrán retirar hasta que la colmena sea retirada de la mejor manera. La entrega a la comunidad se ha visto afectada por esto.

- En el parque Margaritas, al demoler las placas del costado oriental, se evidenció que no existía estructura. Las placas estaban apoyadas directamente sobre suelo natural. Esto hizo necesario excavar manualmente y hacer un mejoramiento en rajón proveniente de la demolición

5. ANEXOS

Anexo No. 1

Acta de Inicio.

Anexo No. 2

Copia Pólizas Contractuales.
Actualizadas

Anexo No. 3

Presupuesto actualizado

Anexo No. 4


Programación de obra actualizada.

Anexo No. 5

Flujo de caja actualizado

Anexo No. 6

Control Avance de obra proyectado v/s ejecutado.

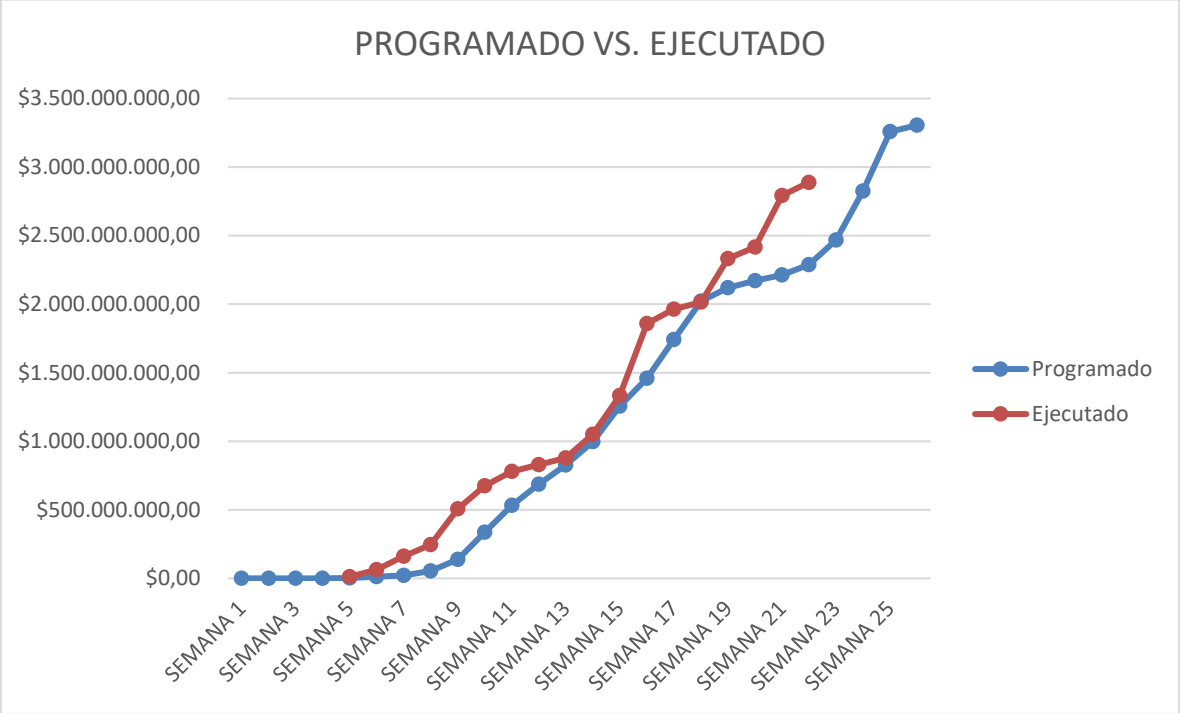
PROGRAMADO VS. EJECUTADO
$3.500.000.000,00
$3.000.000.000,00
$2.500.000.000,00
$2.000.000.000,00
$1.500.000.000,00
$1.000.000.000,00
$500.000.000,00
$0,00
SEMANA 1
SEMANA 3
SEMANA 5
SEMANA 7
SEMANA 9
SEMANA 11
SEMANA 13
SEMANA 15
SEMANA 17
SEMANA 19
SEMANA 21
SEMANA 23
SEMANA 25
Programado
Ejecutado

Anexo No. 7
Plan de Manejo de Tráfico (PMT) Aprobado por Secretaria de Movilidad.

Anexo No. 8

Correspondencia enviada

Correspondencia recibida

Anexo No. 9

Copia actas de comité

CONSORCIO USAQUÉN
005 2024

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

Anexo No. 10

Ensayos de Laboratorio, Equipos de medición y certificación concreto.

Anexo No. 11

Bitácoras

Anexo No. 12
Documentos de importación juegos infantiles

Anexo No. 13
Actas de No Previstos
