CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4 NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.3		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	21/4/2025	Al	27/4/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
3	27/4/2024

AVANCE EN EJECUCION DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
Semana 1 Obra	1.00%	1.00%	0.00%	0.00%	**-1.00%**
Semana 2 Obra	2.00%	1.00%	0.00%	0.00%	**-2.00%**
Semana 3 Obra	3.00%	1.00%	0.00%	0.00%	**-3.00%**

Observaciones:

1. Durante la jornada correspondiente a la semana 1, no se adelantaron actividades en el frente de obra debido a la falta de cumplimiento de los requisitos de estudios de seguridad por parte del contratista, tanto para el personal operativo como para el equipo de interventoría que debía ingresar al área de intervención.
2. Se solicita apoyo al tecnico de la Fac para evacuacion de residuos especiales y ordinarios, debido a que no se encuentra contemplado en el contrato limpieza del predio.

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría//Residente de Interventoría	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Director de Obra// Residente de Obra	Administrativos	si
		Profesionales	si

Disponibilidad de Recursos	SI		
Aspectos Logisticos	SI	Observaciones:	

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4 NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.3		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	21/4/2025	Al	27/4/2024

Herramiento Menor	N/A	Observaciones:	
Maquinaria	N/A		

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1	Se continua la limpieza manual del área de trabajo destinada al replanteo de los ejes del muro, conforme a lo establecido en los planos de diseño y en las especificaciones técnicas del proyecto.
2	Se continua la identificación y caracterización preliminar de árboles ubicados dentro y en el entorno inmediato de la franja de intervención del proyecto, como parte de las actividades de reconocimiento y prevención ambiental.
3	Se inicia la instalación de elementos de señalización preventiva en los accesos y áreas de intervención directa del proyecto, con el fin de advertir a transeúntes, conductores y trabajadores sobre la presencia de actividades de obra y reducir los riesgos de accidentes. Esta labor hace parte del Plan de Manejo de Tránsito (PMT)
4	Se inicia limpieza inicial del área destinada para la intervención fue realizada por personal de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), en el marco de los compromisos establecidos en los comité de proyecto
5	Visita a campo en compañía del contratista ambiental para la identifciacion de los individuos 696, 698, 686, 687, 853, 852 Y 851 por solicitud de la direccion para elaboracion de informe soliictado mediante memorando Interno No. 001 de 2025

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


1	Cerramiento provisional
2	Instalaciones Provisionales
3	DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
4	DEMOLICIÓN EDIFICACION EXISTENTE
5	DEMOLICIÓN CERRAMIENTO EXISTENTE
6	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE, MALEZAS Y CHAMIZOS
7	ADQUISICION E IMPORTACION EQUIPOS
8	Entrega de Informe documental de corroboracion de 7 individuos que se encuenran en la linea de muro.


Firma:		Firma:	
Nombre	Ing. Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría	Nombre	Ing. Yurlanys Garcia Zambrano Residente de Interventoría


CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4** **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	21/4/2025	AL	27/4/2024


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



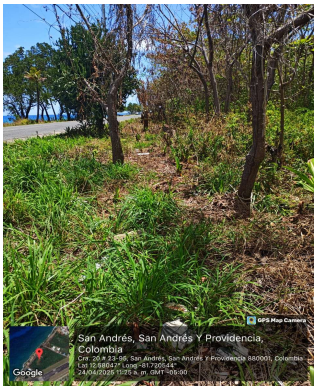

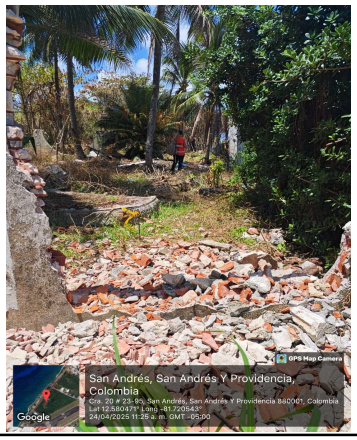

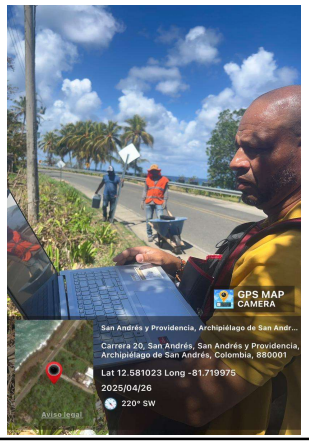

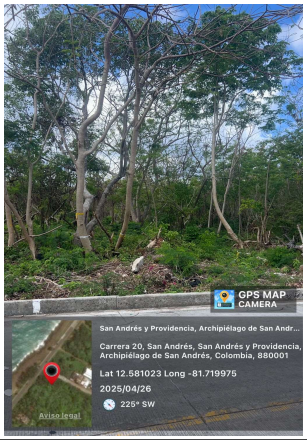



CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4** **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	21/4/2025	AL	27/4/2024

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS









