C.M.15378 – 423

Radicado R:2025010302565
Fecha:2025/06/17 9:32:40 AM
Tpo OFICIO
BEATRIZ ELENA OSPINA MONTOYA

Bogotá D.C., 17 de junio de 2025.

Señores:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Attn.: LUCELLY PENAGOS
Profesional Social

Radicado #. 384

REFERENCIA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. **LOTE 3**

CON 15378: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

ASUNTO: INFORME MENSUAL SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2025.

Cordial saludo,

Adjunto encontrará el Informe Social No. 9 correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2025 para su revisión y consideración. Quedamos a la espera de cualquier observación o comentario.

Agradecemos de antemano su tiempo y atención.

Anexos:
Informe mensual social número 9 correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo.

Cordialmente,

Diana M Ortega R.

DIANA MARCELA ORTEGA RENGIFO
Directora de Interventoría
CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378

Elaboró: Paola Giraldo Mayo – Profesional Social

Recib: Lucelly Penagos anexos 908 ofic. 17-06-2025

ARCHIVO SIF
2025 JUL 14 10:56:03

Carrera 80 bis N° 7ª – 15 T 5 oficina 801

Informe mensual
Gestión social # 9

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3: ORIENTE. Cruces - Narices San Carlos, Cocorná - El Ramal

Contrato de Interventoría No: 23SS111B1465 de 2023

ENTIDAD CONTRATANTE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PERIODO:
1 al 31 DE MAYO 2025

Elaborado por:
Paola Andrea Giraldo Mayo
Profesional del área social
Consorcio Mejoramiento 15378

Municipio Cocorná y San Carlos – Antioquia
MAYO 2025

15378me@gmail.com

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3: ORIENTE. Cruces - Narices San Carlos, Cocorná - El Ramal

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN
No: 4600016585 de 2023

CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378
INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No: 23SS111B1465 de 2023

Firma:	Firma:	Firma:
Paola Giraldo Mayo PAOLA ANDREA GIRALDO MAYO Profesional Social Interventoría	Diana M. Ortega R. DIANA MARCELA ORTEGA RENGIFO Directora de Interventoría	Lucelly Penagos Valencia LUCELLY PENAGOS Apoyo Supervisión Social SIF
Elaboró	Aprobó	Recibe en la SIF

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 7
4. ALCANCE 8
5. LOCALIZACIÓN 9

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 11

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 13

6. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 14

6.1. Tramo San Carlos 14

6.1.2 Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto .. 15

6.1.2 Programa para la atención a la comunidad e interesados en el Proyecto 18

6.1.3 Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria 20

6.2 Tramo Cocorná 21

6.2.1 Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto .. 21

6.2.2 Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria 29

6.2.3 ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Programa para la Contratación de Mano de Obra. 30

6.2.4 Programa de Comunicación y Divulgación. 31

6.2.5 Programa para la atención a la comunidad e interesados en el Proyecto 36

6.2.6 Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural 38

6.2.7 Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria 39

6.2.8 Programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto 41

7. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 43

7.1 45

CONTROL DE INVERSIÓN PRESUPUESTO SOCIAL 45

7.2 45

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 45

8. Listado de Anexos 46

9. Listado de tablas 47

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe contiene el balance de la gestión social realizada en el mes de mayo del año 2025, de los dos tramos que integran el proyecto Mejoramiento y mantenimiento de las vías del grupo 1 de circuitos estratégicos del departamento de Antioquia. Lote 3: Oriente. Cruces - Narices San Carlos, Cocorná - El Ramal.

Este documento pretende dar cuenta de las actividades del componente social a la luz del desarrollo de la Gestión social establecida por la Gobernación de Antioquia para proyectos de infraestructura y que se encuentra establecida en el anexo técnico como obligación del contratista de la siguiente manera: "El contratista de obra deberá formular un Plan de manejo de gestión social, este plan busca informar, atender y generar espacios de participación de la comunidad que se encuentra aledaña al área de influencia del proyecto, con el fin de resolver inquietudes, solicitudes generadas a partir de la ejecución de las obras que comprenden el proyecto, de acuerdo, a lo contenido en la Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, actividades que ya se cuentan contempladas en el presupuesto" (Gobernación de Antioquia, anexo técnico 2023).

En el presente informe se brinda información general del proyecto como contexto, el balance de ejecución de cada uno de los programas integrados en el Plan de Gestión Social, con descripciones de los avances y seguimiento a indicadores de gestión y finalmente las actividades de la Interventoría en el marco del seguimiento y acompañamiento correspondiente en los dos tramos incluidos; San Carlos y Cocorná.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Mediante la Resolución No. 2023060334616 del 06 octubre de 2023 la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia adjudicó el Contrato 4600016585 de 2023, de la Licitación Pública N° LIC-15372, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", Lote 3: Oriente al Consorcio Cocorná 15372, conformado por las empresas Ingetierras de Colombia S.A e IDC Pavimentos S.A.S, mediante el cual se otorgan los tramos:

- SAN CARLOS: Cruces -Narices (60AN20-1-1), Vía de tercer orden, Inicio: K18+840 (Latitud: 06" 15' 10.40" N Longitud: 074° 50' 13.82"W), Fin: K19-'-835 (Latitud: 06° 15' 09.95" N Longitud: 074° 50' 33.15" W) aproximadamente.

- COCORNÁ: Cocorná - El Ramal (Granada) (60AN17-1), Vía de segundo orden, Inicio: K01+205 (Latitud: 06° 03' 53.87" N Longitud: 075° 10' 47.41" W), Fin: K03+205 (Latitud: 06° 04' 17.30" N Longitud: 075° 10,12.67" W) aproximadamente.

El valor del contrato es: cinco mil doscientos cincuenta y tres millones setecientos treinta y tres mil seiscientos noventa y cuatro pesos ($5.253.733.694,00) y cuenta con un plazo de ejecución de 2 meses.

La interventoría del proyecto es llevada a cabo por el Consorcio Mejoramiento 15378, con número de contrato 23SS111B1465 de 2023 celebrado con la Gobernación de Antioquia.

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

De acuerdo a la Resolución 1917 de la Línea Base Red Vial Departamento de Antioquia, del junio 15 de 2018, existe una problemática constante de orden vial que requiere de soluciones óptimas y acciones inmediatas que permitan dar continuidad a la prestación del servicio de todos los usuarios de las vías en las diferentes subregiones en el Departamento.

Con el estado actual de deterioro de las vías, la movilidad entre las subregiones se reduce considerablemente, produciendo consecuencias negativas para los usuarios en todos los campos, económico, social, aumento en gastos de mantenimiento vehicular, tiempos de desplazamiento más largos, además de inseguridad e incomodidad para quienes transitan las vías.

Por lo anterior, con ánimo de mejorar la capa de rodadura y brindar mayor seguridad a las personas que transitan por el corredor vial denominado Cocorná - San Carlos y buscando mejorar un tramo que no presenta problemática geológica y que no requiere de una intervención especial en la vía, se propone un proyecto que beneficia a una población aproximada de 30.000 habitantes entre los municipios de Cocorná y San Carlos, permitiendo así una reducción de tiempos y costos en los desplazamientos, mejorando la economía de la Subregión.

4. ALCANCE

Cocorná

El tramo de mejoramiento Cocorná - El Ramal (60AN17- 1), obedece a una vía de segundo orden, el cual inicia en inicio en el K1+205 (Latitud: 06° 03' 53.87" N Longitud: 075° 10' 47.41"W), y finaliza en el K03+205 (Latitud:06°04 17.30" N Longitud: 075° 10,12.67" W) aproximadamente, así como sus aproximaciones y obras complementarias necesarias para el efectivo funcionamiento del tramo a intervenir. Dicho tramo tiene una longitud aproximada de 2 kilómetros.

San Carlos

El tramo de mejoramiento San Carlos: Cruces – Narices (60AN20-1-1), obedece a una vía de tercer orden, el cual inicia en K18+840 (Latitud: 06° 15' 10.40" N Longitud: 074° 50' 13.82" W), y finaliza en el K19+835 (Latitud: 06° 15' 09.95" N Longitud: 074° 50' 33.15" W) aproximadamente.

Dentro del presente informe de Gestión Social se contemplan actividades que permitirán prevenir, dar respuesta oportuna y/o atender los posibles impactos que se pudieran generar con la ejecución del proyecto y, promoverán la participación de los diversos grupos de interés del área de influencia, en sus diferentes momentos.

5. LOCALIZACIÓN

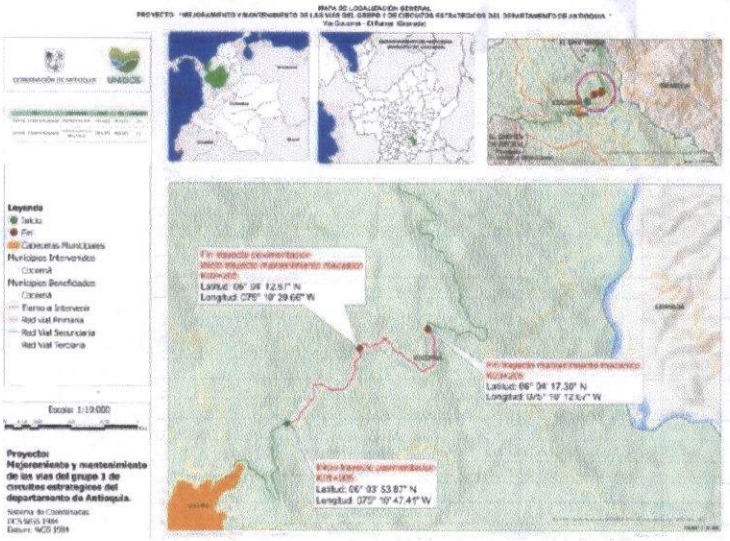


Figura 1.9. Localización de la vía – Cocorná - El Ramal (Granada), (60AN17-1)
Fuente: SIF – Departamento de Antioquia

COCORNÁ: Cocorná - El Ramal (Granada) (60AN17-1), Vía de segundo orden, Inicio: K01+205 (Latitud: 06° 03' 53.87'' N Longitud: 075° 10' 47.41'' W), Fin: K03+205 (Latitud: 06° 04' 17.30'' N Longitud: 075° 10' 12.67'' W) aproximadamente.

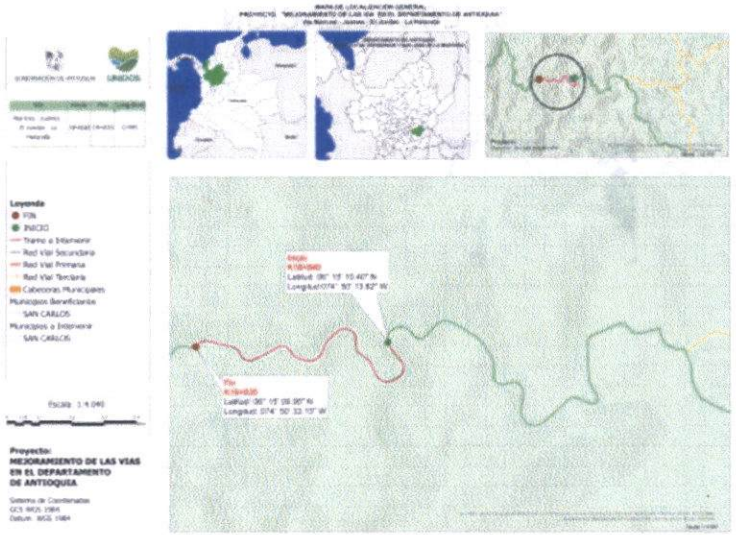


Figura 1.8. Localización de la vía – Cruces – Narices (60AN20-1-1)
Fuente: SIF – Departamento de Antioquia

SAN CARLOS: Cruces -Narices (60AN20-1-1), Vía de tercer orden, Inicio: K18+840 (Latitud: 06" 15' 10.40" N Longitud: 074° 50' 13.82"W), Fin: K19-'-835 (Latitud: 06° 15' 09.95" N Longitud: 074° 50' 33.15" W) aproximadamente.

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 Información del Contrato de obra

ENTIDAD CONCEDENTE	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.**
OBJETO DEL CONTRATO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3: ORIENTE**
CONTRATISTA	**CONSORCIO COCORNA 15372, NIT 901.762.294-6**
CONTRATO Nº	**4600016585 DE 2023**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($5.253.733.694,00) y un A.I.U. de TREINTA DOS PUNTO CERO SEIS POR CIENTO (A.I.U: 32,06 %).**
ADICIÓN 1	**SEISCIENTOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($602.176.279)**
PLAZO INICIAL	**DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO**
PRORROGA 1	**TREINTA (30) DÍAS, del 25/12/2023 al 24/01/2024**
PRORROGA 2	**Dos (2) meses del 24/01/2024 al 24/03/2024**
PRORROGA 3	**TREINTA Y DOS (32) DÍAS CALENDARIO DEL 22/05/2024. AL 23/06/2024**
SUSPENSIÓN No 1	**VEINTE (20) DIAS CALENDARIO DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 19 DE MARZO DE 2024, HASTA EL 7 DE ABRIL DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUIDAS**
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	**DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL 8 ABRIL HASTA EL 23 DE ABRIL, AMBAS FECHAS INCLUSIVE**
AMPLIACIÓN NO. 2 SUSPENSIÓN NO. 1	**OCHO DÍAS (08) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL 24 DE ABRIL, HASTA EL 1 DE MAYO DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE**
AMPLIACIÓN NO. 3	**QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL 2 DE MAYO, HASTA EL 16 DE MAYO DE 2024, AMBAS FECHAS**

SUSPENSIÓN NO. 1	**INCLUSIVE**
SUSPENSIÓN No 2	**DOS (02) MESES A PARTIR DEL 21 DE JUNIO HASTA EL 21 DE AGOSTO DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE**
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 2	**UN (01) MES A PARTIR DEL 22 DE AGOSTO, HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE**
AMPLIACIÓN NO. 2 SUSPENSIÓN NO. 2	**TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DEL 23 DE SEPTIEMBRE, HASTA EL 22 DE OCTUBRE DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE**
AMPLIACIÓN NO. 3 SUSPENSIÓN NO. 2	**TREINTA Y TRES (33) DÍAS A PARTIR DEL 23 DE OCTUBRE, HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE**
AMPLIACIÓN NO. 4 SUSPENSIÓN NO. 2	**TREINTA Y SIETE (37) DIAS A PARTIR DEL 25 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.**
AMPLIACIÓN NO. 5 SUSPENSIÓN NO. 2	**DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.**
AMPLIACIÓN NO. 6 SUSPENSIÓN NO. 2	**DEL 1 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.**
AMPLIACIÓN NO. 7 SUSPENSIÓN NO. 2	**DEL 1 DE MARZO DE 2025, HASTA EL 1 DE ABRIL DE 2025. AMBAS FECHAS INCLUSIVE**
REANUDACIÓN 2	**2 DE ABRIL DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	**4 DE OCTUBRE DE 2025**

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Tabla 2 Información contrato de interventoría.

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3.**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378** **NIT 901.763.954-3**
CONTRATO Nº	**23SS111B1465 de 2023**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$445.039.517 IVA INCLUIDO.**
FECHA DE INICIO	**03/11/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**25/12/2023**
PLAZO	**Dos (2.0) meses sin sobrepasar el 25/12/2023**
PLAZO PRORROGA 1	**Treinta (30) días del 26/12/2023 al 24/01/2024**
PLAZO PRORROGA 2	**Dos (2) meses del 25/01/2024 al 24/03/2024**
PLAZO PRORROGA 3	**Cuarenta y siete (47) días calendario del 22/05/2024 al 08/072024**
SUSPENSIÓN 1	**Del 19/03/2024 al 8/04/2024**
ADICIÓN 1 **SUSPENSIÓN 1**	**Del 8/04/2024 al 24/04/2024**
ADICIÓN 2 **SUSPENSIÓN 1**	**Del 24/04/2024 al 2/05/2024**
ADICIÓN 3 **SUSPENSIÓN 1**	**Del 2/05/2024 al 17/05/2024**
SUSPENSIÓN 2	**Del 21/06/2024 al 22/08/2024**
ADICIÓN 1 **SUSPENSIÓN 2**	**Del 22/08/2024 al 23/09/2024**
ADICIÓN 2 **SUSPENSIÓN 2**	**Del 23/09/2024 al 23/10/2024**
ADICIÓN 3	**Del 23/10/2024 al 25/11/2024**

SUSPENSIÓN 2	
ADICIÓN 4 **SUSPENSIÓN 2**	**Del 25/11/2024 al 01/01/2025**
ADICIÓN 5 **SUSPENSIÓN 2**	**Del 01/01/2025 al 01/02/2025**
ADICIÓN 6 **SUSPENSIÓN 2**	**Del 01/02/2025 al 01/03/2025**
ADICIÓN 7 **SUSPENSIÓN 2**	**Del 01/03/2025 al 02/04/2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**1/11/2025**

6. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

En este apartado se desglosan las actividades realizadas por el contratista, esta información se organizó a partir del informe presentado por el mismo y se incluyen las actividades realizadas, indicadores de gestión y el balance desde la Interventoría. Es de aclarar que el informe comprende las fechas entre el 1 al 31 de mayo de 2025, teniendo en cuenta la reactivación del contrato el cual se encontraba suspendiendo mediante acta N° 2 a la cual se le hicieron siete adiciones que entre el 21 de junio del 2024 hasta el 2 de abril de 2025.

6.1. Tramo San Carlos

En este frente de obra en particular se culminaron las labores de obra en el mes de junio del 2024, sin embargo, teniendo en cuenta que hace parte integral del proyecto y que hace falta que el contratista culmine unas actividades de instalación de señalización en la vía, este tramo aún no se ha cerrado.

Por esta razón, desde el área social no se reportan actividades desarrolladas durante el periodo del presente informe, no obstante, por solicitud de la supervisión se inició con la revisión de la presentación para la reunión de socialización final, la cual se encuentra en ajustes sugeridos por parte de la interventoría.

Se espera que, para el próximo periodo, el contratista lleve a cabo las actividades de obra pendientes y así mismo la reunión de finalización. Es importante mencionar que se encuentran cerradas las actas de vecindad; está pendiente el cierre del permiso de ocupación y el cierre del acta de entorno posterior a las intervenciones.

6.1.2 Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto

Para este tramo el contratista ha desarrollado las actividades necesarias para la correcta aplicación del plan de gestión social, tal como se relaciona a continuación.

- Actas de vecindad

A la fecha se cuenta con el levantamiento de las actas de vecindad de cierre, se realizó la visita a las 10 viviendas y se obtuvo el cierre de la totalidad de las actas de vecindad.

Tabla 3. Relación actas de vecindad de cierre Tramo San Carlos

Relación actas de vecindad Tramo San Carlos		
N° Acta	**Nombre propietario**	**Cierre**
Acta N°1	Gloria Irene Herrera Daza	Junio 2024
Acta N°2	Leonardo de Jesús Rojas Jiménez	Mayo 2024
Acta N°3	Luz Arely Arboleda Zuleta	Junio 2024
Acta N°4	Juan de Jesús Díaz Buitrago	Junio 2024
Acta N°5	Juan de Jesús Jaramillo	Junio 2024
Acta N°6	Sonia Carolina Giraldo Giraldo	Junio 2024
Acta N°7	Rosiris del Carmen Mercado Doria	Junio 2024
Acta N°8	Jesús María Castaño M	Junio 2024
Acta N°9	Javier Arturo Higuita	Junio 2024

Desde la Interventoría se realizó el debido acompañamiento al proceso de levantamiento de actas de vecindad para verificar el correcto desarrollo de la actividad.

- Actas de Entorno

A la fecha del presente informe se encuentra pendiente la elaboración del acta de entorno de cierre, debido a que aún hace falta que culminen las actividades de obra.

Tabla 4. Actas de entorno levantadas y entregadas en dic-2023 tramo san Carlos – Cruces – Narices

Actas de entorno			
N°	**N° de acta de entorno**	**Abierta**	**Cerrada**
1	Acta de entorno n° 1	X	

- Actas permisos intervención en predios privados

Durante la ejecución del proyecto para el frente San Carlos, se levantó un permiso de intervención en predios privados, el cual a la fecha del presente informe se encuentra abierto, sin embargo, el contratista informa que ya tiene el cierre y presentara paz y salvos en el siguiente periodo.

Tabla 5. Indicadores de gestión Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
Una base de datos de actas de vecindad construida.	1 1	Se elaboró y relaciono la base de datos con la información del total de las actas de vecindad de apertura y de cierre.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. Actas de vecindad de inicio diligenciadas/ No. inmuebles en base de datos identificados por el área técnica en zona de influencia directa x 100	10 10	Se encuentran realizadas y cerradas
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. Actas de entorno de levantadas / No. Actas de entorno de inicio x 100	1 1	Se encuentran realizadas
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. actas de permiso de intervención a predios privados / No. actas de permiso necesarias en el proceso constructivo del proyecto x 100	1 1	Se realizo según necesidad del proyecto, para este periodo no fue necesario abrir más permisos
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de actas de vecindad cerradas/ No. de actas de vecindad totales que requieren cierre x 100.	10 10	Se encuentran realizadas
Porcentaje cumplimiento	100%	

Indicador	%	Observaciones
No. Actas de entorno cierre / Número de actas de entorno totales que requieren cierre x 100.	N/A N/A	Se realizará el cierre del acta de entorno cuando la obra esté finalizada.
Porcentaje cumplimiento	N/A	
No. de actas de permisos de intervención de predios privados cierre / No. De actas de permisos de intervención de predios privados totales que requieren cierre x 100.	1 1	El contratista informa que ya cerro el permiso, pendiente que aporte la evidencia en el siguiente periodo
Porcentaje cumplimiento	100%	

Ver en el Anexo 1 base de datos actas de vecindad Tramo San Carlos

6.1.2 Programa para la atención a la comunidad e interesados en el Proyecto

5°

Para este informe se presenta la tabulación de las encuestas realizadas antes de la suspensión del contrato, donde se evidencia el positivo impacto generado por el proyecto a la comunidad del área de influencia.

A continuación, se evidencian las respuestas obtenidas con la aplicación de las encuestas, además, como anexo del informe se presenta el informe de resultados presentado por el contratista.

CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3: ORIENTE. Cruces - Narices San Carlos, Cocorná - El Ramal	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA

NOMBRE COMPLETO	TIENE USTED INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO		POR QUE MEDIOS LE LLEGÓ LA INFORMACIÓN	CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS			GENERACIÓN DE EMPLEO			DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA			INFORMACIÓ PROYECTO COMUNID	
	SI	NO	VER TABLA 2	BUENO	REG	MALO	BUENO	REG	MALO	BUENO	REG	MALO	BUENO	REG
OLGA LUCIA URREA			3	X			X			X			X	
OTONIEL ZAPATA	X		1,4	X			X			X			X	
LEOMAR GARCÍA	X		6	X			X			X			X	
JUAN PABLO GARCÍA	X		4	X			X			X			X	
NELSY MORALES			1	X			X			X			X	
RICARDO JIMENEZ	X		1	X			X			X			X	
OSCAR AGUDELO	X		4	X			X			X			X	
YULI CUARTAS		X	1,6	X			X			X			X	
ADRIANA ZAPATA	X		1,3,4,6	X			X				X		X	
JUAN JARAMILLO	X		1	X			X			X			X	
ALONSO GIRALDO	X		6	X			X			X			X	
SANTIAGO URREA	X		6	X			X			X			X	
ANTONIO GARCIA	X		4	X			X			X			X	
MAURICIO HERNÁNDEZ			6	X			X			X			X	
CRISTIAN HERA	X		4	X			X			X			X	
CARMEN GARCÍA	X		1,4	X			X			X			X	
RAMON JIMENEZ	X		4	X			X			X			X	
MIRLEY URREA	X		3	X			X			X			X	
RUBEN DARIO CEBALLOS	X		6	X			X			X			X	
TERESA GIRALDA	X		4	X			X			X			X	

RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD			RELACIONAMIENTO CON LAS AUTORIDADES			SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS			HORARIO DE CIERRES VIALES			DIFUSIÓN DE HORARIOS DE CIERRES VIALES		
BUENO	REG	MALO	BUENO	REG	MALO	BUENO	REG	MALO	BUENO	REG	MALO	BUENO	REG	MALO
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X				X		X		
X			X			X				X			X	
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		

Tabla 6. Indicadores de Gestión Programa para la Atención a la Comunidad e Interesados en el proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
1 Punto de Atención al Ciudadano Instalado / 1 Punto de Atención al Ciudadano requerido durante el desarrollo de las obras.	1 0 N/A	El PAC no estuvo activo durante el periodo
No. total de PQRS atendidas en el período / No. total de PQRS recibidas en el período x 100	0 0	Durante el período no se recibieron PQRS relacionadas con el proyecto.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de encuestas proyectadas / No. de personas encuestadas x 100	20 20	Se presenta como anexo la tabulación de las encuestas para cumplimiento del indicador
Porcentaje cumplimiento	100%	

Anexo 2. Informe de tabulación de encuestas tramo San Carlos

6.1.3 Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria

La Reunión de Inicio de obra se realizó el día 29/11/2023 para el tramo Cruces – Narices (San Carlos) en la sede de la Junta de Acción Comunal del corregimiento El Jordán perteneciente al municipio de San Carlos. En ella se contó con la asistencia de 26 personas de la comunidad, además del personal de la Interventoría y el contratista de obra.

La Reunión de Finalización de obra se tenía proyectada para el mes de junio de 2024, sin embargo, por la suspensión no se llevó a cabo. Teniendo en cuenta que, pese a la reactivación del contrato el contratista tiene proyectado realizar la actividad en el siguiente periodo.

Tabla 7Indicadores de gestión programa para la Protección de la Infraestructura Social y comunitario tramo – San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
No. de reuniones de inicio ejecutadas /No. de reuniones de inicio programadas x 100	1 1	El día 29/11/2023 se llevó a cabo la reunión de socialización de inicio de obra.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de reuniones de finalización ejecutadas / No. de reuniones de finalización programadas x 100	 0	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	N/A	

6.2 Tramo Cocorná

En este frente se reactivaron las obras y, por tanto, durante el periodo el contratista mediante la aplicación del plan de gestión social busco mitigar el impacto a la comunidad del área de influencia, así como, retomar el relacionamiento con la comunidad e incentivar la participación activa del proceso, a continuación, se detallan los avances desde cada programa.

6.2.1 Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto

A continuación se desarrolla el estado actual de las actas de vecindad, entorno y permisos de intervención de predio en cumplimiento del programa correspondiente en el Plan de Gestión Social el cual pretende "implementar medidas de manejo que permitan reconocer el entorno en el cual se desarrolla el proyecto, a través de actividades con las que se pueda identificar el estado actual del área de influencia de la obra, y en caso de generar algún daño, iniciar con el proceso de reparación directa":

- Actas de vecindad:

El número total de predios identificados como línea base para el levantamiento de actas de vecindad es de 48 inmuebles. De estos, 39 corresponden al tramo de mejoramiento y 9, al tramo de mantenimiento. El levantamiento de estas actas contribuirá a prevenir, mitigar y facilitar la atención en caso de posibles reclamaciones que se pudieran generar por las actividades de obra. En su elaboración se diligenció el formato FO-M2-P2-035 y se levantó el respectivo registro fotográfico de cada predio.

A la fecha, continúa aún pendiente la firma de las actas de vecindad N° 4 (tramo de mejoramiento) y N° 40 (tramo de mantenimiento); después de agotados los acercamientos con las propietarias, el contratista deberá realizar la gestión necesaria para que un líder de la zona firme como testigo, además, avanzar en el cierre de las actas donde se libere por parte del área civil.

El contratista inicio con el cierre de 8 actas de vecindad en los tramos donde se encuentra liberado por parte del área técnica, estas actas se cerraron a satisfacción por parte de los propietarios y se encuentran en revisión de la interventoría para firma. A continuación, se relaciona la tabla con el estado de las actas de vecindad del tramo Cocorná.

Tabla 8 Relación actas de vecindad de cierre Tramo Cocorná

Relación actas de vecindad Tramo Cocorná			
N° Acta	**Nombre propietario**	**Abierta**	**Cerrada**
Acta N°1	Carlos Efrén Montoya Ramírez	X	
Acta N°2	Aida García Ramírez		X
Acta N°3	Carlos Danilo Correa Posada	X	
Acta N°4	Cemida Amaya	X	

Acta N°5	Orlando Arroyave Agudelo	X	
Acta N°6	Sandra Patricia Gómez Villegas	X	
Acta N°7	José Gildardo Jaramillo Aristizábal	X	
Acta N°8	Argiro Montoya Muñoz	X	
Acta N°9	Jorge Alberto Franco	X	
Acta N°10	Jorge Alberto Franco	X	
Acta N°11	Juan Guillermo Hoyos	X	
Acta N°12	Orlando Rosso Castañeda	X	
Acta N°13	Gerces Pelaez Gómez	X	
Acta N°14	María Ofelia Quintero Quintero		X
Acta N°15	Gabriela López de Ramírez	X	
Acta N°16	Flor Adela Gómez	X	
Acta N°17	Hortensia Socorro Alzate	X	
Acta N°18	Victor Emilio Quintero Quintero	X	
Acta N°19	Nicolás Arturo Soto Ramírez	X	
Acta N°20	Luis Carlos Pineda Villegas	X	
Acta N°21	Claver Antonio Vargas Quintero	X	
Acta N°22	Jadier Alberto Agudelo Gómez		X
Acta N°23	Jesús Chamorro Morán	X	
Acta N°24	Rubiela Aristizábal - Manuel José Montoya	X	
Acta N°25	Casa abandonada	X	
Acta N°26	Teresa de Jesús Gómez Zuluaga - Francisco Javier Echeverry		X
Acta N°27	Manuel José Montoya	X	
Acta N°28	Darío Cardona - María Irene Muñoz		X
Acta N°29	Antonio José Marín Ramírez	X	
Acta N°30	Belisario Marín González - Antonio Marín		X
Acta N°31	Jorge Alberto Franco		X



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Acta N°32	Olga Rosa Nieto Marulanda	X	
Acta N°33	Néstor Julio Giraldo A	X	
Acta N°34	Junta de Acción Comunal vereda San Juan - Argiro Montoya		X
Acta N°35	Casa abandonada	X	
Acta N°36	Javier Alonso Saldarriaga	X	
Acta N°37	Javier Alberto Pérez Z.	X	
Acta N°38	Luis Alfredo Valencia M.	X	
Acta N°39	Claver Antonio Vargas Quintero	X	
Acta N°40	Sin información	X	
Acta N°41	Aracely Valencia	X	
Acta N°42	Aracely Valencia	X	
Acta N°43	Luis Alfonso Arias	X	
Acta N°44	María del Socorro Posada Montoya	X	
Acta N°45	María del Socorro Posada Montoya	X	
Acta N°46	Ubaldo de Jesús Vargas	X	
Acta N°47	Mariela Bustamante Blandón	X	
Acta N°48	Joaquín Emilio Quintero	X	

- Actas de Entorno:

Entre los meses de noviembre de 2023 y enero de 2024 fueron levantadas 7 actas de entorno de diferentes tramos de la vía y del ZODME ubicado en el predio El Recreo, las cuales a la fecha del presente informe continúan abiertas.

A continuación, se relaciona la tabla con la información y estado de las actas de entorno.

Tabla 9 Actas de entorno levantadas y entregadas Cocorná

Actas de entorno levantadas y entregadas				
N°	**N° de acta de entorno**	**Abierta Nov 2023**	**Abierta Dic 2023**	**Abierta Ene 2024**
1	Acta de entorno n° 1	X		
2	Acta de entorno n° 2	X		
3	Acta de entorno n° 3		X	
4	Acta de entorno n° 4	X		
5	Acta de entorno n° 5		X	
6	Acta de entorno n° 6			X
7	Acta de entorno n° 7			X

- Actas permisos intervención en predios privados:

A lo largo de la ejecución del proyecto se han elaborado 24 actas de "Autorización para intervenir predios privados", esto mediante aplicación del formato requerido FO-M2-P2-039 de la Gobernación de Antioquia.

Para el corte del presente informe, aún está pendiente por parte del contratista, contactar a los 2 propietarios incluidos dentro de los permisos de intervención elaborados previamente por parte de la Gobernación de Antioquia y, además el contratista debe iniciar con el cierre de los permisos que ya se encuentren liberados por el área técnica. A continuación, se relacionan los permisos que se han diligenciado.

Tabla 10 Permisos levantados tramo Cocorná

	Permisos de intervención en predios privados Tramo Cocorná			
N° Permiso	**Nombre propietario**	**KM**	**Abierto**	**Cerrado**
1	Carlos Efrén Montoya	Km1 Vía	X	
2	Gabriela López	K1+515	X	
3	Orlando Rosso Castañeda	K1+ 380 a K1+.437	X	
4	Olga Rosa Nieto	K1+660 a K1+720	X	
5	Luis Alfredo Valencia	K1+490 a K1+525.	X	
6	Javier Alberto Pérez	K1+660 a K1+720.	X	
7	Rubiela Aristizábal	K1+045	X	
8	Flor Adela Gómez	K1+557	X	
9	Luis Carlos Pineda	K1+740 a K1+745	X	
10	Antonio Marín	K1+630	X	
11	Antonio Marín	K1+676	X	
12	Olga Rosa Nieto	K1+676	X	
13	Javier Saldarriaga	K1+640	X	
14	Claver Vargas	K1+ 820	X	
15	Julio Jaramillo	K1+640	X	
16	Dideison Ocampo	K1+210	X	
17	María Irene Muñoz	K1+700	X	
18	Carlos Danilo Correa	K1+117	X	
19	Jexica Maira Vanegas - Orlando Arroyave	K1+117	X	
20	Jorge Franco	K1+255	X	
21	Joaquín Quintero	K1+480	X	
22	Ruth Elena Torres	K1+820	X	
23	Jorge Franco	K1+743	X	

24	Jorge Franco	K1+735	X	

Tabla 11 Indicadores de gestión programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto Tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
Una base de datos de actas de vecindad construida.	1 1	Se elaboró la base de datos de actas de vecindad, esta se ha ido actualizando de manera permanente, a medida que ha ido avanzando el proceso.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. Actas de vecindad de inicio diligenciadas/ No. inmuebles en base de datos identificados por el área técnica en zona de influencia directa x 100	48 48	La línea base para el levantamiento de actas de vecindad es de 48 predios (39 del tramo de mejoramiento y 9 del tramo de mantenimiento). De estos, 46 han sido entregadas y firmadas por la Interventoría; las otras 2, se encuentran pendiente de firma por parte de los propietarios, a la espera de ser firmadas por el presidente de la junta de acción comunal
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. Actas de entorno de levantadas / No. Actas de entorno de inicio x 100	7 7	Se levantaron 7 actas de entorno de la vía; 6 de ellas corresponden a partes de los tramos de mejoramiento y mantenimiento y 1, al ZODME ubicado en el predio El Recreo.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	

No. actas de permiso de intervención a predios privados levantados y firmados / No. actas de permiso necesarias en el proceso constructivo del proyecto x 100	24 24	A la fecha se han levantado 24 permisos de intervención, Se encuentra pendiente, contactar a los 2 propietarios incluidos dentro de los permisos de intervención elaborados previamente por parte de la Gobernación de Antioquia.
Porcentaje de cumplimiento	**100%**	
No. de actas de vecindad cerradas/ No. de actas de vecindad totales que requieren cierre x 100.	8 48	Se inició con el levantamiento de actas de vecindad de cierre
Porcentaje cumplimiento	**16.6%**	
No. Actas de entorno cierre / Número de actas de entorno totales que requieren cierre x 100.	0 0	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	
No. de actas de permisos de intervención de predios privados cierre / No. De actas de permisos de intervención de predios privados totales que requieren cierre x 100.	0 0	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.

Porcentaje cumplimiento	**N/A**	

Ver en el Anexo 1 base de datos actas de vecindad Tramo Cocorná

6.2.2 Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria

Durante el periodo del presente informe el contratista no realizó actividades para el cumplimiento de los objetivos de este programa, no obstante, en el marco de desarrollo de este programa se realizó la reunión de inicio el 15 de noviembre de 2023 y en el informe del mismo periodo fue reportado.

Tabla 12 Indicadores de gestión para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. de reuniones de inicio ejecutadas /No. de reuniones de inicio programadas x 100	1 1	El día 15/11/2023 se llevó a cabo la reunión de socialización de inicio de obra. Esta información fue reportada en el mes de noviembre.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de reuniones de finalización ejecutadas / No. de reuniones de finalización programadas x 100	0 0	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	

Programa para la Contratación de Mano de Obra.

- Actividades para promover la contratación de mano de obra

Este programa busca establecer mecanismos claros que permitirán beneficiar a la comunidad del área de intervención directa con la contratación de mano de obra requerida para el proyecto, contribuyendo al desarrollo social y económico de la misma.

Durante el periodo del informe el contratista emprendió diferentes mecanismos para la vinculación del personal, desde la definición de perfiles, mecanismos de recepción de hojas de vida y reporta la vinculación de un total de 18 personas, en la siguiente tabla se discrimina esta información.

Tabla 13 Personal vinculado al Proyecto tramo Cocorná

ÍTEM	PERSONAL MOC		PERSONAL MONC	
Procedencia	AID	FORÁNEO	AID	FORÁNEO
Total	0	5	6	7
	5		13	

En este programa, no se han presentado dificultades.

Tabla 14. Indicadores de gestión para la contratación mano de obra – Tramo – Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. trabajadores de MONC del AID contratado / No. total de trabajadores vinculados al proyecto x 100.	6	De las 18 personas que se encuentran activas en el proyecto, 6 corresponden a MONC del AID (33,3%).
	18	

Porcentaje cumplimiento	**33,3%**	
No. de trabajadores del proyecto residentes en el área de influencia / No. total, de empleados del proyecto x 100.	18 18	Todos los trabajadores activos se encuentran residiendo en el municipio de Cocorná.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de Mujeres contratadas del AID / No. total de trabajadores contratados x 100.	1 18	De los 18 empleados que se encuentran activos a la fecha, 1 es mujer del AID (5.5%).
Porcentaje cumplimiento	**5.5%**	

Ver en el Anexo 1 Informe mensual #8 contratista

6.2.4 Programa de Comunicación y Divulgación.

Este programa busca "informar de manera oportuna y veraz a la comunidad del AID, sobre temas relacionados con el proyecto, a través de los mecanismos establecidos para tal fin"

Actividades desarrolladas en el período:

- Afiches Informativos

Durante el periodo del informe se instalaron los afiches en los sitios definidos como estratégicos para lograr la difusión con información de los cierres de vía programados de manera semanal, además fueron compartidos por medio de la línea de atención mediante estados y grupos como el CPC, habitantes de la comunidad, presidentes de las JAC y residentes de las veredas San Juan, El Chocó, Las Playas y Buenos Aires del municipio, el fontanero del acueducto.

- Cartelera informativa

La cartelera informativa se encuentra ubicada en el Punto de Atención a la Comunidad y durante el periodo fue publicada información referente a los avances presentados en los componentes técnico, social, ambiental y SST del proyecto.

- Buzón de sugerencias

Durante el periodo se cumplió con la revisión semanal semanalmente de los 2 buzones de sugerencias, ubicados en el PAC y en la sede de la JAC de la vereda San Juan, de manera conjunta entre interventoría y contratista, en estas revisiones se evidenció que no se recibieron PQRS. De la apertura de estos se levantaron las actas donde se deja constancia del proceso efectuado.

- Valla informativa

Durante la suspensión del contrato, la valla informativa sufrió afectaciones por la ola invernal, lo cual la deterioro a tal punto que la comunidad opto por terminar su desmonte para evitar un accidente por su desplome, esta información fue entregada por los lideres durante el CPC.

Dificultades en el proceso:

Se evidencia como dificultad la situación presentada con la valla informativa, sin embargo, se define en conjunto con la supervisión hacer uso de las vallas tijera para la información del proyecto.

Tabla 15. Indicadores de Gestión programa de Comunicación y Divulgación Tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. vallas informativas instaladas / No. de vallas programadas x 100.	1	La valla se instaló al inicio del proyecto, sin embargo, actualmente no se encuentra debido a las razones mencionadas anteriormente
	1	

Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de tijeras de obra instaladas / No. de tijeras de obra totales programadas x 100.	0 2	Se encuentra pendiente la instalación de las tijeras de obra. Sin embargo, se espera implementarlas en el siguiente periodo
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	
No. de pasacalles instalados / No. de pasacalles totales programadas x 100.	0 2	Se encuentra pendiente la instalación de las tijeras de obra. Sin embargo, este material será incluido en el PMT del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	
No. de volantes distribuidos / No. de volantes programados x 100	0 100	No se elaboraron volantes durante el periodo
Porcentaje cumplimiento	0,0%	
No. de pautas radiales implementadas / No. de pautas programadas x 100.	0 20	Para el período no se contrataron pautas radiales.
Porcentaje cumplimiento	0,0%	
No. de carteleras implementadas / No. de carteleras programadas x 100.	1 1	Durante el periodo se publicó la cartelera informativa
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de buzones de sugerencias instalados / No. de buzones de sugerencias programados x 100.	2 2	Los buzones se encuentran instalados

Porcentaje cumplimiento	100%	


Ilustración 1 Registro fotográfico programa de programa de Comunicación y Divulgación Tramo Cocorná

Punto de atención a la comunidad	Verificación cartelera informativa
	
Buzón de sugerencias	




RESIDUOS
ORGANICO

E-card

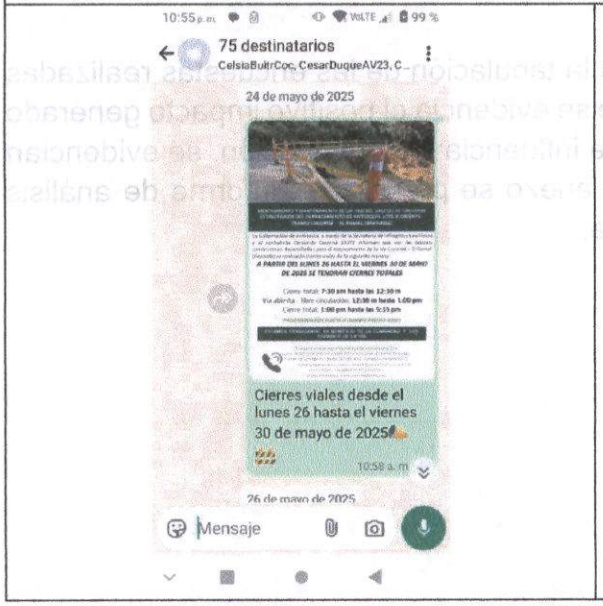
10:55 p. m.
75 destinatarios
24 de mayo de 2025
Cierres viales desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de mayo de 2025
10:58 a. m.
26 de mayo de 2025
Mensaje


Vías para la seguridad
y competitividad de Antioquia
Cierre de la vía Cocorná – El Ramal (Granada)
La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Infraestructura Física, informa que:
Cierre total de vía sábado 31 de mayo 7:00 a.m.- 11:30 a.m.
Domingo 01 y lunes 02 de junio libre circulación
IMPORTANTE
Luisa María Arango Duque
Consorcio Cocorná 15372
Cel 302 395 0452
@VíasAntioquia
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

6.2.5 Programa para la atención a la comunidad e interesados en el Proyecto

Este programa tiene como objetivo Garantizar una participación amplia y efectiva de las comunidades del área de influencia directa del proyecto, donde se generen espacios adecuados para la exposición, conocimiento y solución de dudas, expectativas y reclamos, presentados como consecuencia de las diferentes actividades que componen el proyecto.

Durante el periodo del informe el contratista aseguro la atención en el PAC y divulgo la disponibilidad de este mediante los canales dispuestos para ello; además, en cumplimiento de los compromisos se anexa a este informe la tabulación de la consulta de opinión aplicada a la comunidad y el comercio desde el mes de junio de 2024.

Durante el periodo, el contratista presenta la tabulación de las encuestas realizadas antes de la suspensión del contrato, donde se evidencia el positivo impacto generado por el proyecto a la comunidad del área de influencia; a continuación, se evidencian las respuestas obtenidas, además, como anexo se presenta el informe de análisis de resultados presentado por el contratista.

NOMBRE COMPLETO	TIENE USTED INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO		POR QUE MEDIOS LE LLEGÓ LA INFORMACIÓN	CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS			GENERACIÓN DE EMPLEO			DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA			INFORM PROYE COM
	SI	NO	VER TABLA 2	BUENO	REG	MALO	BUENO	REG	MALO	BUENO	REG	MALO	BUENO
HERNAN DE JESUS GIRALDO OSORIO	X		3	X			X			X			X
CARLOS EFREN MONTOYA RAMIREZ	X		1,3,5	X			X				X		X
ARLEY RUIZ	X		1,3	X			X			X	X		X
LUZ OSORIO ARIAS		X		X			X				X		X
ARGELIO ANTONIO ROQUEME JURADO	X		6	X									
JAVIER VARGAS	X		1,4	X			X			X			X
GILBERTO SANZ	X		4	X						X			X
EDGAR MOYA PANIAGUA		X	3	X			X				X		X
BLANCA ESTELLA GIRALDO	X		1,6,7	X			X				X		X
JOSE OCAMPO P.	X		4,6,7	X			X				X		X
MARIA ALEJANDRA RAMIREZ VILLEGAS	X		1,3,5,6	X			X			X			X
RICARDO LEON OSPINA	X		1,3,6	X			X			X			X
CRISTIAN CADAVID	X		1,2,5,6	X			X			X			X
Anonimo 1	X		1,3,4,6	X			X			X			X
Anonimo 2				X			X			X			X

RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD			RELACIONAMIENTO CON LAS AUTORIDADES			SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS			HORARIO DE CIERRES VIALES			DIFUSIÓN DE HORARIOS DE CIERRES VIALES		
BUENO	REG	MALO	BUENO	REG	MALO	BUENO	REG	MALO	BUENO	REG	MALO	BUENO	REG	MALO
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X									X			X		
	X		X			X				X		X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		
X			X			X			X			X		

Tabla 16. Indicadores de Gestión Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto Tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. total de PQRS atendidas en el período / No. total de PQRS recibidas en el período x 100	0 0	En el periodo no se recibieron PQRS
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	
No. de encuestas proyectadas / No. de personas encuestadas x 100	15 15	Se encuentran aplicadas las encuestas
Porcentaje cumplimiento	**100%**	

Anexo 3. Informe de tabulación de encuestas tramo Cocorná

6.2.6 Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural

Este programa busca "contribuir al manejo adecuado tendiente a la protección del patrimonio arqueológico, en caso de encontrar un hallazgo fortuito". En el período, no se presentaron hallazgos arqueológicos.

Tabla 17. Indicadores de Gestión Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. de trabajadores asistentes a la capacitación / No. total, de trabajadores vinculados al proyecto x 100	0 0	El 29/01/2024 se realizó una capacitación con el personal sobre "Arqueología Preventiva y Patrimonio Arqueológico", a esta asistieron 29 personas vinculadas al proyecto. La información correspondiente a la misma fue presentada en el informe correspondiente al mes de enero del presente año. A la fecha no se han presentado hallazgos de bienes de interés arqueológicos ni culturales en el proyecto. En las inducciones realizadas a los trabajadores que ingresan a laborar en el período, se manifiesta la importancia de seguir el protocolo en caso de un hallazgo fortuito en el proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	

6.2.7 Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria

Este programa está encaminado a "crear un espacio de participación comunitaria, en el cual se brindará información de los avances de las actividades de obra y a su vez serán abordados los cambios generados en la dinámica del territorio y las proyecciones futuras con la operación del proyecto, con el fin de que los integrantes del comité aporten en la construcción de alternativas para atender las problemáticas identificadas y finalmente se conviertan en multiplicadores de la información".

Durante el periodo se realizó reunión con el Comité de Participación Comunitaria el miércoles 28 de mayo de 2025, la cual conto con la asistencia de 8 de los integrantes del comité, este espacio se llevó a cabo en la Junta de Acción Comunal de la vereda San Juan, a las 3:00 p.m., en este espacio se informó a la comunidad los avances del proyecto desde cada uno de los componentes.

Tabla 18Indicadores de gestión Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. reuniones ejecutadas con el CPC / No. reuniones contempladas con el CPC x 100	6 6	Las seis reuniones con el CPC han sido efectuadas los días 07/12/2023, 18/01/2024, 15/02/2024, 14/03/2024 y 28/05/2024, 28/05/2025. A estas asistieron 10, 25, 32, 20, 12, 8 personas, respectivamente.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	

Ilustración 2 Registro fotográfico programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo Cocorná

Comité de Participación Comunitaria



6.2.8 Programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto

Este programa tiene como fin "entrenar al personal que labora en el proyecto, en aspectos relacionados con las medidas de manejo social que se deben implementar en el mismo, con el fin de que establezcan relaciones armónicas con las comunidades del área de influencia".

Durante el periodo el contratista desarrollo la capacitación al personal de obra, el 29 de mayo de 2025, donde abordo la temática "Plan de Gestión Social", buscando hacer una especie de sensibilización con el personal respecto a la importancia de la gestión social en obra.

Tabla 19. Indicadores de Gestión Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones

No. de capacitaciones desarrolladas / No. de capacitaciones programadas x 100	1 1	No se desarrolló capacitación mensual
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de trabajadores asistentes a las capacitaciones / No. de trabajadores convocados x 100	14 18	No se desarrolló la actividad
Porcentaje cumplimiento	**78%**	

Ilustración 3 Registro fotográfico programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo Cocorná

Capacitación personal mayo 2025





Ver en el Anexo 1 Informe mensual #8 contratista

7. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Desde el área social de la Interventoría durante el periodo en referencia se realizó acompañamiento y seguimiento a las actividades implementadas por el contratista para el desarrollo de cada programa, así mismo se solicitó ante la supervisión la aprobación de diferentes piezas y acciones a implementar para el cumplimiento del Plan de Gestión.

El día 12 de mayo se desarrolló mesa de trabajo entre las profesionales sociales tanto de supervisión, interventoría y contratista, con el fin de establecer la ruta de trabajo para esta nueva etapa del proyecto y pactar periodos de ejecución de los programas.

Para el tramo San Carlos, se estableció como compromiso iniciar con la logística para desarrollar la reunión de socialización final de obra, para este caso, el contratista envío la presentación para revisión por parte de interventoría el 15 de mayo de 20205 y esta misma fue devuelta con la solicitud de unos ajustes el 19 de mayo del mismo año; a la fecha de este insumo no ha sido devuelto a la interventoría para remitir a la supervisión. Este es un pendiente que tiene el contratista para el siguiente periodo.

Igualmente se debe tener en cuenta que, en el mes de abril del 2025, teniendo en cuenta la reactivación del contrato, la interventoría emitió un oficio de requerimientos al contratista debido a que no se dio la vinculación del profesional social solicitando la atención de los lineamientos contractuales, comunicación CM15378-386 con asunto "REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL".

El contratista emitió respuesta mediante la comunicación con asunto "Respuesta al comunicado "CM15378-386 REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL", el 23 de mayo de 2025, donde indican que las actividades de corte social

fueron retomadas y como complemento relacionan un cronograma de actividades para el periodo de mayo; al mismo que la interventoría realizó seguimiento y constata que se cumplió con lo establecido.

CRONOGRAMA ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL																								
ÍTEM	ACTIVIDAD	Mensual																						OBSERVACIONES
		Primera semana						Segunda semana						Tercera semana						Cuarta semana					
		L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	
1	Adecuación y atención PAC	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		Instalación nuevamente de la cartelera informativa y el PAC
2	Revisión buzones de sugerencias				X						X						X						X			Instalación y revisión de los buzones de sugerencias
3	Cierre actas de vecindad																				X	X	X			Se programo para continuar el cierre de las actas de vecindad el lunes 26/05/2025
4	Reunión mensual CPC																					X				Se programo la reunión con el CPC para el miercoles 28/05/2025
5	Divulgación de iformación sobre inicio de actividades de obra y cierres viales													X				X	X					X	X	Se envio la información a la comunidad por medio de los grupos de whatsapp, policia, alcaldia municipal y hospital, y por la emisora local
6	Capacitación al personal vinculado a la obra																				X					Capacitación sobre la Gestión Social

7.1 CONTROL DE INVERSIÓN PRESUPUESTO SOCIAL

Teniendo en cuenta la importancia de asegurar los recursos necesarios para la aplicación de los programas durante toda la etapa de ejecución, desde el área social se realiza un control de la inversión la cual se relaciona a continuación

	PRESUPUESTO	ACTA 1			TOTAL COBRADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
SAN CARLOS	$ 13.674.900	$ 7.619.719			$ 7.619.719	$ 6.055.181
	PRESUPUESTO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	TOTAL COBRADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
COCORNÁ	$ 13.674.900	$ 6.789.441	$ 1.352.800	$ 440.816	$ 8.583.057	$ 5.091.843
		TOTAL SALDO PRESUPUESTO SOCIAL				11.147.024

7.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En general se recomienda que el contratista continuar con la correcta implementación de los programas contenidos en el plan de gestión social y continúe con el cumplimiento de los indicadores

- Se debe continuar con el proceso de levantamiento de actas de vecindad de cierre.
- El contratista continuar las estrategias que venía planteando para la vinculación de personal de la zona.
- Se debe continuar con la socialización asertiva los cierres y demás actividades de obra que generen impacto a la comunidad.

- Se recomienda continuar con las capacitaciones y/o inducciones sobre patrimonio arqueológico y los procesos en caso de posibles hallazgos.

- Continuar con la programación regular del CPC de manera mensual, e incluir actividades lúdicas de formación y/ o fortalecimiento del trabajo colaborativo

- Se recomienda continuar con las capacitaciones al personal e incluir dinámicas que favorezcan el aprendizaje

- Debe llevar a cabo en el siguiente periodo la reunión de socialización final de obra en el tramo San Carlos

8. Listado de Anexos

- Anexo 1. Informe mensual # 9 contratista
- Anexo 2. Informe de tabulación de encuestas tramo San Carlos
- Anexo 3. Informe de tabulación de encuestas tramo Cocorná
- Anexo 4. Respuesta al comunicado "CM15378-386 REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL".

9. Listado de tablas

Tabla 1 Información del Contrato de obra 11
Tabla 2 Información contrato de interventoría. 13
Tabla 3. Relación actas de vecindad de cierre Tramo San Carlos 15
Tabla 4. Actas de entorno levantadas y entregadas en dic-2023 tramo san Carlos – Cruces – Narices 16
Tabla 5. Indicadores de gestión Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices 17
Tabla 6. Indicadores de Gestión Programa para la Atención a la Comunidad e Interesados en el proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices 20
Tabla 7Indicadores de gestión programa para la Protección de la Infraestructura Social y comunitario tramo – San Carlos – Cruces – Narices 21
Tabla 8 Relación actas de vecindad de cierre Tramo Cocorná 22
Tabla 9 Actas de entorno levantadas y entregadas Cocorná 25
Tabla 10 Permisos levantados tramo Cocorná 26
Tabla 11 Indicadores de gestión programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto Tramo Cocorná 27
Tabla 12 Indicadores de gestión para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria tramo Cocorná 29
Tabla 13 Personal vinculado al Proyecto tramo Cocorná 30
Tabla 14. Indicadores de gestión para la contratación mano de obra – Tramo – Cocorná 30
Tabla 15. Indicadores de Gestión programa de Comunicación y Divulgación Tramo Cocorná 32
Tabla 17. Indicadores de Gestión Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto Tramo Cocorná 38
Tabla 18. Indicadores de Gestión Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural tramo Cocorná 39
Tabla 19Indicadores de gestión Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo Cocorná 40
Tabla 20. Indicadores de Gestión Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo Cocorná 41
