ANEXO 1

Informes Semanales – Formato - MEPI-MN1-IN-15-FR-3

Anexo 1.1 Alpujarra
Anexo 1.2 Fresno
Anexo 1.3 Valle de San Juan
Anexo 1.4 Flandes
Anexo 1.5 Melgar

ANEXO 1.1 MUNICIPIO DE ALPUJARRA

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SECTOR URBANO ALPUJARRA - PUENTE LAS DELICIAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 101 del 26-abr-24 al 02-Mayo-24. (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal: SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. Lenin Tito Mendoza Peña — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Diego Fernando Caicedo Castro

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA-PUENTE LAS DELICIAS CON RECURSOS DE CORREDORES RURALES INVIAS PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
REPARACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (BACHEO) 6689 m2 **PAVIMENTO FLEXIBLE** 1188 ML

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LAS DELICIAS - ALPUJARRA, MEDIANTE PARCHEO Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ
INTEGRANTES:	
CONTRATO No.	050 DE 2022
FECHA DE INICIO:	3/05/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2022
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023
PRÓRROGA 1	92 DIAS 31-oct-22
PRÓRROGA 2	50 DIAS 20-dic-22
PRÓRROGA 3	70 DIAS 28-feb-23
PRÓRROGA 4	46 DIAS 30-abr-23
PRÓRROGA 5	15 DIAS 15-may-23
PRÓRROGA 6	15 DIAS 31-may-23
PRÓRROGA 7	30 DIAS 30-jun-23
PRÓRROGA 8	31 DIAS 31-jul-23
PRÓRROGA 9	61 DIAS 30-sep-23
PRÓRROGA 10	92 DIAS 31-dic-23
SUSPENSIÓN N°1	15 DIAS Desde 28-dic-23
PRORROGA A LA SUSPENSIÓN N	15 DIAS Desde 11-ene-24
REANUDACIÓN N°1	26-ene-24
PRORROGA 11	31 DIAS 29-feb-24
SUSPENSIÓN N°2	33 DIAS Desde 27-feb-24
REANUDACIÓN N°2	31-mar-24
PRORROGA 12	91 DIAS 3-jul-24

VALOR INICIAL:	$ 4.045.951.044,98
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 4.045.951.044,98
VALOR ANTICIPO:	$ 2.022.975.522,49
VALOR AMORTIZADO:	$ 1.064.050.974,77
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 958.924.547,72

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. - ALCIRA PÁEZ DURÁN
CONTRATO No.	2247 DE 2021
FECHA	4/04/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2022
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	3/05/2023
PRÓRROGA 1: Cinco meses	31-dic-2022
PRÓRROGA 2: Cinco meses	31-may-2023
PRÓRROGA 3: Cinco meses	31-oct-2023
PRÓRROGA 4: Dos meses	31-dic-2023
PRÓRROGA 5: Dos meses	29-feb-24
SUSPENSIÓN N°1 (30 días)	27-feb-24 al 31-mar-24
REINICIO DE OBRA	1-abr-24
PRORROGA 6: Un mes	3-may-24
PLAZO TOTAL ACUMULADO (meses)	VEINTICUATRO

VALOR INICIAL:	$ 1.716.988.701,00
VALOR ADICIONES:	$ 770.000.000,00
VALOR ACUMULADO:	$ 2.486.988.701,00
VALOR ANTICIPO:	$ 150.000.000,00
VALOR AMORTIZADO:	$ 150.000.000,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.050.000.000	$ 4.045.951.045	$ 4.045.951.045	$ 4.045.951.045
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 471.022.547	$ 1.657.079.402	
	SALDO DE VIGENCIA	**$ 4.050.000.000**	**$ 3.574.928.498**	**$ 1.917.849.095**	**$ 1.917.849.095**
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 520.000.000	$ 1.196.988.701		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 32.794.234			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 487.205.766	$ 1.196.988.701		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.045.951.044,98	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.610.492.669,20	89,2%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.146.556.242,43	77,8%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (463.936.426,76)	-11,5%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 14.875.000,00	0,4%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.595.617.669,20	88,9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.131.681.242,43	77,4%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (463.936.426,76)	-11,5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 117.004.058,80	2,9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 72.195.088,27	61,7%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-23
VALOR FACTURA: $ 409.993.767

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Prórroga N°12 hasta 3 de julio de 2024. Se avala Acta Modificatoria N°4 (1-abril-2023).

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.486.988.701,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.482.014.723,60	99,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.760.869,00	100%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.760.869,00	100%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 71.043.476,00

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.022.975.522
Amortizado $	$ 1.064.050.974,77
Saldo $	$ 958.924.547,72

INDICADOR I/C	
En el mes:	**0,25**
Acumulado:	**0,79**

ANTICIPOS	
Otorgado $	150.000.000,00
Amortizado $	150.000.000,00
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 89,2%
Meta Física Ejecutada % 77,8%
Avance o Atraso Físico % -11,5%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada									
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector 3**	**Tramo y/o sector 4**	**Tramo y/o sector 5**	**Tramo y/o sector 6**	**Tramo y/o sector 7**	**Total**	**%**	**Cantidades ejecutadas (m)**
MDC 25 PAVIMENTO FLEXIBLE	M3	480,08	$ 1.086.487.181	Prog			**123,47**	**32,00**	**6,66**	**317,95**		**480,08**	100,0%	**1544**
				Ejec			123			289		412,5	85,9%	1326,6
				Falta				32,00	6,66	28,95		67,6	14,1%	217,4
MDC 19 PAVIMENTO FLEXIBLE	M3	480,08	$ 1.086.487.181	Prog			**123,47**	**32,00**	**6,66**	**317,95**		**480,08**	100,0%	**1544**
				Ejec			123			195		318,0	66,2%	1022,6
				Falta				32,00	6,66	123,45		162,1	33,8%	**521,4**
SEÑALES DE TRANSITO	m	1516	$ 87.976.000	Prog			**392,00**	**32,00**		**1092**		**1516,00**	100,0%	1516,00
				Ejec										
				Falta			392,00	32,00		1092,00		1516,0	100,0%	
MANTENIMIENTO PERIODICO	M3	41,48	$ 230.829.033	Prog	**41,48**							**41,48**	100,0%	155
				Ejec										
				Falta	41,48							41,48	100,0%	
MURO CONTENCIÓN K3+600	Und	1	$ 975.184.753	Prog				**1,00**				1,00	100,0%	**342,81**
				Ejec				0,48				0,48	48,3%	148,10
				Falta				0,52				0,52	51,7%	194,71
CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU.	m3	600,26	$ 669.495.433	Prog	**57,68**		**185,9**	**61,88**		**294,8**		600,26	100,0%	**600,3**
				Ejec	5,3		186	61,88		292,9		546,0	91,0%	546,0
				Falta	52,38					1,91		54,3	9,0%	54,3

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la

TRAMO Y/O SECTOR (1): K0+000 - K0+405
TRAMO Y/O SECTOR (2): K0+664 - K1+662
TRAMO Y/O SECTOR (3): K1+823 - K2+350
TRAMO Y/O SECTOR (4): K3+550 - K3+650 (MURO CONTENCION)
TRAMO Y/O SECTOR 5: K7+000 - K7+265
TRAMO Y/O SECTOR 6: K13+530 - K14+640
TRAMO Y/O SECTOR 7: K14+640 - K15+326

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA	1	
VIBROCOMPACTADOR (Neumático y rodillo)	1	
VOLQUETA	1	
FINISHER	1	
RETRO EXCAVADORA	1	1
CAMIONETA	1	1
MEZCLADORA	1	2
Total	**7**	**4**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

NOTA:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	EL MANA	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	GUAMO/SALDAÑA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	UNION TEMPORAL JC Y HYS S.A.S	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	PURIFICACION	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X

OBSERVACIONES: El Contratista no ha enviado información actualizada respecto a los proveedores y suministros materiales de construcción.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES: El Contratista no ha realizado la entrega informes periódicos de la implementación de las medidas ambientales del PAGA.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: El proyecto está ejecutando las actividades de construcción, por cuanto el contratista se encuentra implementando algunas medidas contempladas del PAGA, como son la señalización y disposición de materiales de excavación.

OBSERVACIONES: La interventoría esta a la espera del envío de informes de implementación del PAGA del proyecto para continuar con el seguimiento y evaluación del cumplimiento, a las actividades ambientales contempladas en el PAGA. El Contratista mantiene la señalización a lo largo del tramo.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Alcaldía municipal
Se instala cartelera informativa con buzón de PQRS

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
* Durante la semana el contratista no reporta ninguna actividad ejecutada desde el componente social.

INTERVENTORÍA:
* Con la comunicación 2024S-VBOG-025774 del 30-abr-2024 el INVIAS presentó su concepto de aprobación y observaciones al informe trimestral N°7 de la gestión social con radicado N°2024E-VUVRAZ-018297 del 28-feb-2024.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NA
AVALÚOS APROBADOS:	NA
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA

OBSERVACIONES: El presente ítem no aplica para el corredor vial objeto del contrato

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Suministro e instalación de Concreto Resistencia 14mpa (F) =1,45m³.	(**Acumulado**= 11,92 m³ ------- Porcentaje acumulado 77,0 %)
2. Suministro e instalación de Concreto Resistencia 28mpa (C) - Mezcla In Situ =9,94m³.	(**Acumulado**= 171,34 m³ ------- Porcentaje acumulado 78,0 %)
3. Suministro e instalación de Acero de refuerzo fy=4200 kg /cm2 =1146 Kg.	(**Acumulado**= 13.208,7 Kg ------- Porcentaje acumulado 97,0 %)
4. Suministro e instalación de Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo y acero. =43,7m³.	(**Acumulado**= 564,76 m³ ------- Porcentaje acumulado 94,1%)
5. Corte de asfalto para construcción de cunetas=127m.	(**Acumulado**= 2.891,10 m³ ------- Porcentaje acumulado 88,0%)
6. Demolición concreto simple (incluye cargue y retiro de material de sobrante a uan distancia de 5km) =11,4 m³	(**Acumulado**= 290,8 m³ ------- Porcentaje acumulado 88,0%)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar suministro e instalación de base granular en el K14+630 hasta K14 +640.
2. Continuar suministro e instalación de Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0 en el K14+ 250 hasta K14 +640.
3. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25 en el K14+ 550 hasta K14 +640. Las dos calzadas
4. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 en el K14+ 250 hasta K14 +640. Las dos calzadas
5. Continuar suministro e instalación de Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo y acero.
6. Continuar suministro e instalación de Relleno para estructuras

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación de aceros de refuerzo caja receptora del Box Culvert. (K3+600)



Instalación de aceros de refuerzo disipador. (K3+600)



Suministro e instalación de Concreto Resistencia 28mpa (C) - Mezcla In Situ. En la caja receptora del Box culvert y el disipador en K3+600.



Suministro e instalación de Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo y acero. en el K14+100 hasta K14+250.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Continuar seguimiento a las actividades de obra de acuerdo a las especificaciones INVIAS ejecutadas por el contratista de obra.
2. Continuar seguimiento cronograma de obra.
3. El Contratista e Interventoría reincia actividades el 1-abr-24.
4. Supervisión instalación de los diferentes materiales en obra.
5. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-351 (29-abr-24) Respuesta a su comunicación OF-174-26-04-2024 - Pólizas Actualizadas.
6. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-350 (29-abr-24) se avala la Modificatoria N°4.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **MARISOL AMAYA CORREA**
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 09-Mayo-24. (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SECTOR URBANO ALPUJARRA - PUENTE LAS DELICIAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 102 del 3-may-24 al 09-Mayo-24. (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal: SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. Lenin Tito Mendoza Peña — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Diego Fernando Caicedo Castro

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA-PUENTE LAS DELICIAS CON RECURSOS DE CORREDORES RURALES INVIAS PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
REPARACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (BACHEO) 6689 m2 **PAVIMENTO FLEXIBLE** 1188 ML

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LAS DELICIAS - ALPUJARRA, MEDIANTE PARCHEO Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 050 DE 2022
FECHA DE INICIO: 3/05/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2022
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023

PRÓRROGA 1	92 DIAS	31-oct-22	
PRÓRROGA 2	50 DIAS	20-dic-22	
PRÓRROGA 3	70 DIAS	28-feb-23	
PRÓRROGA 4	46 DIAS	30-abr-23	
PRÓRROGA 5	15 DIAS	15-may-23	
PRÓRROGA 6	15 DIAS	31-may-23	
PRÓRROGA 7	30 DIAS	30-jun-23	
PRÓRROGA 8	31 DIAS	31-jul-23	
PRÓRROGA 9	61 DIAS	30-sep-23	
PRÓRROGA 10	92 DIAS	31-dic-23	
SUSPENSIÓN N°1	15 DIAS	Desde 28-dic-23	
PRORROGA A LA SUSPENSIÓN N	15 DIAS	Desde 11-ene-24	
REANUDACIÓN N°1		26-ene-24	
PRORROGA 11	31 DIAS	29-feb-24	
SUSPENSIÓN N°2	33 DIAS	Desde 27-feb-24	
REANUDACIÓN N°2		31-mar-24	
PRORROGA 12	91 DIAS	3-jul-24	

VALOR INICIAL:	$ 4.045.951.044,98
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 4.045.951.044,98
VALOR ANTICIPO:	$ 2.022.975.522,49
VALOR AMORTIZADO:	$ 1.064.050.974,77
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 958.924.547,72

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. - ALCIRA PÁEZ DURÁN
CONTRATO No. 2247 DE 2021
FECHA 4/04/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2022
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 3/05/2023

PRÓRROGA 1: Cinco meses	31-dic-2022
PRÓRROGA 2: Cinco meses	31-may-2023
PRÓRROGA 3: Cinco meses	31-oct-2023
PRÓRROGA 4: Dos meses	31-dic-2023
PRÓRROGA 5: Dos meses	29-feb-2024
SUSPENSIÓN N°1 (30 dias)	27-feb-24 al 31-mar-24
REINICIO DE OBRA	1-abr-24
PRÓRROGA 6: Un mes	3-may-24
PRÓRROGA 7: Dos mes	3-jul-24
PLAZO TOTAL ACUMULADO (meses)	VEINTISEIS

VALOR INICIAL:	$ 1.716.988.701,00
VALOR ADICIONES:	$ 930.000.000,00
VALOR ACUMULADO:	$ 2.646.988.701,00
VALOR ANTICIPO:	$ 150.000.000,00
VALOR AMORTIZADO:	$ 150.000.000,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.050.000.000	$ 4.045.951.045	$ 4.045.951.045	$ 4.045.951.045
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 471.022.547	$ 1.657.079.402	
	SALDO DE VIGENCIA	**$ 4.050.000.000**	**$ 3.574.928.498**	**$ 1.917.849.095**	**$ 1.917.849.095**
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 520.000.000	$ 1.196.988.701		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 32.794.234			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 487.205.766	$ 1.196.988.701		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.045.951.044,98	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.727.496.728,00	92,1%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.255.855.841,39	80,5%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (471.640.886,60)	-11,7%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 14.875.000,00	0,4%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.712.621.728,00	91,8%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.240.980.841,39	80,1%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (471.640.886,60)	-11,7%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 117.004.058,80	2,9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 109.299.598,96	93,4%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-23
VALOR FACTURA: $ 409.993.767

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Prórroga N°12 hasta 3 de julio de 2024. Se avala Acta Modificatoria N°4 (1-abril-2023).

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.646.988.701,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.468.825.999,97	93,27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.760.869,00	100%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.760.869,00	100%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 71.043.476,00

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.022.975.522
Amortizado $	$ 1.064.050.974,77
Saldo $	$ 958.924.547,72

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,16
Acumulado:	0,76

ANTICIPOS	
Otorgado $	150.000.000,00
Amortizado $	150.000.000,00
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 92,1%
Meta Física Ejecutada % 80,5%
Avance o Atraso Físico % -11,7%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada									
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Tramo y/o sector 7	Total	%	Cantidades ejecutadas (m)
MDC 25 PAVIMENTO FLEXIBLE	M3	480,08	$ 1.086.487.181	Prog			**123,47**	**32,00**	**6,66**	**317,95**		**480,08**	100,0%	**1544**
				Ejec			123			289		412,5	85,9%	1326,6
				Falta				32,00	6,66	28,95		67,6	14,1%	217,4
MDC 19 PAVIMENTO FLEXIBLE	M3	480,08	$ 1.086.487.181	Prog			**123,47**	**32,00**	**6,66**	**317,95**		**480,08**	100,0%	**1544**
				Ejec			123			195		318,0	66,2%	1022,6
				Falta				32,00	6,66	123,45		162,1	33,8%	**521,4**
SEÑALES DE TRANSITO	m	1516	$ 87.976.000	Prog			**392,00**	**32,00**		**1092**		**1516,00**	100,0%	1516,00
				Ejec										
				Falta			392,00	32,00		1092,00		1516,0	100,0%	
MANTENIMIENTO PERIODICO	M3	41,48	$ 230.829.033	Prog	**41,48**							**41,48**	100,0%	155
				Ejec										
				Falta	41,48							41,48	100,0%	
MURO CONTENCIÓN K3+600	Und	1	$ 975.184.753	Prog				**1,00**				1,00	100,0%	**342,81**
				Ejec				0,48				0,48	48,3%	148,10
				Falta				0,52				0,52	51,7%	194,71
CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU.	m3	600,26	$ 669.495.433	Prog	**57,68**		**185,6**	**61,88**		**295,1**		600,26	100,0%	**600,3**
				Ejec	24,6		186	61,88		296,1		568,2	94,7%	568,2
				Falta	33,11					-1,02		32,1	5,3%	32,1

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la

TRAMO Y/O SECTOR (1): K0+000 - K0+405
TRAMO Y/O SECTOR (2): K0+664 - K1+662
TRAMO Y/O SECTOR (3): K1+823 - K2+350
TRAMO Y/O SECTOR (4): K3+550 - K3+650 (MURO CONTENCION)

TRAMO Y/O SECTOR 5: K7+000 - K7+265
TRAMO Y/O SECTOR 6: K13+530 - K14+640
TRAMO Y/O SECTOR 7: K14+640 - K16+326

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA	1	
VIBROCOMPACTADOR (Neumático y rodillo)	1	
VOLQUETA	1	
FINISHER	1	
RETRO EXCAVADORA	1	1
CAMIONETA	1	1
MEZCLADORA	1	2
Total	**7**	**4**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

NOTA:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	EL MANA	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	GUAMO/SALDAÑA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	UNION TEMPORAL JC Y HYS S.A.S	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	PURIFICACION	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X

OBSERVACIONES: : El Contratista no ha enviado información actualizada respecto a los proveedores y suministros materiales de construcción

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES: No se cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: En cumplimiento de las funciones como interventor del contrato de la referencia, se ha venido realizando la solicitud de los informes mensuales de seguimiento ambiental de conformidad con lo establecido en el informe de avance y seguimiento del PAGA, apéndice de gestión ambiental del contrato de la referencia, el cual menciona que: "El contratista de o bra debe entregar con una frecuencia mensual a la interventoría en medio magnético el informe y anexos, que presenten el avance d e la gestión ambiental adelantada de acuerdo a los programas y proyectos establecidos en el PAGA…." El contratista debe entregar a la Interventoría los informes a los cinco (5) días calendario del vencimiento del periodo respectivo, los cuales a la fecha no l o ha realizado.

OBSERVACIONES: El Contratista continua con incumplimiento en relación al componente ambiental, desde el inicio del proyecto, no se ha enviado los debidos informes de implementación del PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Alcaldía Municipal
Se instala cartelera informativa con buzón de PQRS

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
* El contratista presenta el informe social de febrero.

INTERVENTORÍA:
* Se realiza seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NA
AVALÚOS APROBADOS:	NA
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere Gestión Predial.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Suministro e instalación de Concreto Resistencia 14mpa (F) = 1,59m³.	(**Acumulado**= 13,51 m³ ------- Porcentaje acumulado 87,0 %)
2. Suministro e instalación de Concreto Resistencia 28mpa (C) - Mezcla In Situ =11,5 m³.	(**Acumulado**= 182,84 m³ ------- Porcentaje acumulado 83,0 %)
3. Suministro e instalación de Acero de refuerzo fy=4200 kg /cm2 = 439 Kg.	(**Acumulado**= 13.647,63 Kg ------- Porcentaje acumulado 100,0 %)
4. Suministro e instalación de Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo y acero. =3,41m³.	(**Acumulado**= 568,17 m³ ------- Porcentaje acumulado 94,7%)
5. Corte de asfalto para construcción de cunetas =333,7 ml.	(**Acumulado**= 3.124,8 m³ ------- Porcentaje acumulado 95,0%)
6. Demolición concreto simple (incluye cargue y retiro de material de sobrante a uan distancia de 5km) = 26,13m³	(**Acumulado**= 316,21 m³ ------- Porcentaje acumulado 96,0%)
7. Relleno para estructuras CUNETAS = 450,4m132	(**Acumulado**= 740,37 m³ ------- Porcentaje acumulado 93,0%)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar suministro e instalación de base granular en el K14+630 hasta K14 +640.
2. Continuar suministro e instalación de Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0 en el K14+ 250 hasta K14 +640.
3. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25 en el K14+ 550 hasta K14 +640. Las dos calzadas
4. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 en el K14+ 250 hasta K14 +640. Las dos calzadas
5. Continuar suministro e instalación de Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo y acero.
6. Continuar suministro e instalación de Relleno para estructuras CUNETAS

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación formatleta para construcción Cuneta de Concreto K13+900 hasta K13+930 MD



Construcción Cuneta de Concreto K13+900 hasta K13+930 MD



Construcción Cuneta de Concreto K14+100 hasta K14+250 MD



Construcción Cuneta de Concreto K14+100 hasta K14+250 MI

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Continuar seguimiento a las actividades de obra de acuerdo a las especificaciones INVIAS ejecutadas por el contratista de obra.
2. Continuar seguimiento cronograma de obra.
3. El Contratista e Interventoría reincia actividades el 1-abr-24.
4. Supervisión instalación de los diferentes materiales en obra.
5. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-353 (7-may-24) Reiteración presentación Información Mensual.
6. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-354 (7-may-24) Respuesta a su comunicación OF-175-02-05-2024- Entrega Formatos Informe Mensual febrero 2024.
7. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-355 (7-may-24) Respuesta a su comunicación OF-176-02-05-2024 - Entrega Formatos Informe Mensual abril 2024.
8. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-356 (9-may-24) Requerimiento de cumplimiento de Cláusulas contractuales y presentación de Informes.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **MARISOL AMAYA CORREA**
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 16-Mayo-24. (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SECTOR URBANO ALPUJARRA - PUENTE LAS DELICIAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 103 del 10-may-24 al 16-Mayo-24, Último Informe Semana: SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. Lenin Tito Mendoza Peña — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Diego Fernando Caicedo Castro

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA-PUENTE LAS DELICIAS CON RECURSOS DE CORREDORES RURALES INVIAS PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
REPARACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (BACHEO) 6689 m2 **PAVIMENTO FLEXIBLE** 1188 ML

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LAS DELICIAS - ALPUJARRA, MEDIANTE PARCHEO Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	050 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.045.951.044,98
FECHA DE INICIO:	3/05/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 4.045.951.044,98
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 2.022.975.522,49
PRÓRROGA 1	92 DIAS 31-oct-22	VALOR AMORTIZADO:	$ 1.064.050.974,77
PRÓRROGA 2	50 DIAS 20-dic-22	SALDO POR AMORTIZAR:	$ 958.924.547,72
PRÓRROGA 3	70 DIAS 28-feb-23		
PRÓRROGA 4	46 DIAS 30-abr-23		
PRÓRROGA 5	15 DIAS 15-may-23		
PRÓRROGA 6	15 DIAS 31-may-23		
PRÓRROGA 7	30 DIAS 30-jun-23		
PRÓRROGA 8	31 DIAS 31-jul-23		
PRÓRROGA 9	61 DIAS 30-sep-23		
PRÓRROGA 10	92 DIAS 31-dic-23		
SUSPENSIÓN N°1	15 DIAS Desde 28-dic-23		
PRORROGA A LA SUSPENSIÓN N	15 DIAS Desde 11-ene-24		
REANUDACIÓN N°1	26-ene-24		
PRORROGA 11	31 DIAS 29-feb-24		
SUSPENSIÓN N°2	33 DIAS Desde 27-feb-24		
REANUDACIÓN N°2	31-mar-24		
PRORROGA 12	91 DIAS 3-jul-24		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. - ALCIRA PÁEZ DURÁN		
CONTRATO No.	2247 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 1.716.988.701,00
FECHA	4/04/2022	VALOR ADICIONES:	$ 930.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 2.646.988.701,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	3/05/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 150.000.000,00
PRÓRROGA 1: Cinco meses	31-dic-2022	VALOR AMORTIZADO:	$ 150.000.000,00
PRÓRROGA 2: Cinco meses	31-may-2023	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA 3: Cinco meses	31-oct-2023		
PRÓRROGA 4: Dos meses	31-dic-2023		
PRÓRROGA 5: Dos meses	29-feb-2024		
SUSPENSIÓN N°1 (30 dias)	27-feb-24 al 31-mar-24		
REINICIO DE OBRA	1-abr-24		
PRÓRROGA 6: Un mes	3-may-24		
PRÓRROGA 7: Dos mes	3-jul-24		
PLAZO TOTAL ACUMULADO (meses)	VEINTISEIS		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.050.000.000	$ 4.045.951.045	$ 4.045.951.045	$ 4.045.951.045
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 471.022.547	$ 1.657.079.402	
	SALDO DE VIGENCIA	**$ 4.050.000.000**	**$ 3.574.928.498**	**$ 1.917.849.095**	**$ 1.917.849.095**
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 520.000.000	$ 1.196.988.701		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 32.794.234			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 487.205.766	$ 1.196.988.701		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.045.951.044,98	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.844.500.786,80	95,0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.255.855.841,39	80,5%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (588.644.945,41)	-14,5%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 14.875.000,00	0,4%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.829.625.786,80	94,7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.240.980.841,39	80,1%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (588.644.945,41)	-14,5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 117.004.058,80	2,9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-23
VALOR FACTURA: $ 409.993.767

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Prórroga N°12 hasta 3 de julio de 2024. Se avala Acta Modificatoria N°4 (1-abril-2023).

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.646.988.701,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.494.277.814,40	94,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.760.869,00	100%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.760.869,00	100%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 71.043.476,00

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.022.975.522
Amortizado $	$ 1.064.050.974,77
Saldo $	$ 958.924.547,72

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,00
Acumulado:	0,77

ANTICIPOS	
Otorgado $	150.000.000,00
Amortizado $	150.000.000,00
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 95,0% — Avance o Atraso Físico % -14,5%
Meta Física Ejecutada % 80,5%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada									
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Tramo y/o sector 7	Total	%	Cantidades ejecutadas (m)
MDC 25 PAVIMENTO FLEXIBLE	M3	480,08	$ 1.086.487.181	Prog			**123,47**	**32,00**	**6,66**	**317,95**		**480,08**	100,0%	**1544**
				Ejec			123			289		412,5	85,9%	1326,6
				Falta				32,00	6,66	28,95		67,6	14,1%	217,4
MDC 19 PAVIMENTO FLEXIBLE	M3	480,08	$ 1.086.487.181	Prog			**123,47**	**32,00**	**6,66**	**317,95**		**480,08**	100,0%	**1544**
				Ejec			123			195		318,0	66,2%	1022,6
				Falta				32,00	6,66	123,45		162,1	33,8%	**521,4**
SEÑALES DE TRANSITO	m	1516	$ 87.976.000	Prog			**392,00**	**32,00**		**1092**		**1516,00**	100,0%	1516,00
				Ejec										
				Falta			392,00	32,00		1092,00		1516,0	100,0%	
MANTENIMIENTO PERIODICO	M3	41,48	$ 230.829.033	Prog	**41,48**							**41,48**	100,0%	155
				Ejec										
				Falta	41,48							41,48	100,0%	
MURO CONTENCIÓN K3+600	Und	1	$ 975.184.753	Prog				**1,00**				1,00	100,0%	**342,81**
				Ejec				1,00				1,00	100,0%	342,81
				Falta										
CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU.	m3	600,26	$ 669.495.433	Prog	**57,68**		**185,6**	**61,88**		**295,1**		600,26	100,0%	**600,3**
				Ejec	24,6		186	61,88		296,1		568,2	94,7%	568,2
				Falta	33,11					-1,02		32,1	5,3%	32,1

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA	1	
VIBROCOMPACTADOR (Neumático y rodillo)	1	
VOLQUETA	1	
FINISHER	1	
RETRO EXCAVADORA	1	1
CAMIONETA	1	1
MEZCLADORA	1	2
Total	**7**	**4**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

NOTA:

TRAMO Y/O SECTOR (1): K0+000 - K0+405
TRAMO Y/O SECTOR (2): K0+664 - K1+662
TRAMO Y/O SECTOR (3): K1+823 - K2+350
TRAMO Y/O SECTOR (4): K3+550 - K3+650 (MURO CONTENCION)

TRAMO Y/O SECTOR 5: K7+000 - K7+265
TRAMO Y/O SECTOR 6: K13+530 - K14+640
TRAMO Y/O SECTOR 7: K14+640 - K16+326

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	EL MANA	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	GUAMO/SALDAÑA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	UNION TEMPORAL JC Y HYS S.A.S	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	PURIFICACION	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X

OBSERVACIONES: En el informe del mes de enero de 2024 entregado en este período, el contratista no cuenta con información actualizada relacionada con los provedores de los materias y recursos necesarios para el desarollo del proyecto.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES: No se cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: De acuerdo al seguimiento realizado por la Interventoría, se evidencia que el Contratista está ejecutando las obras inherentes al Contrato, sin embargo no implementa las medidas ambientales contempladas en el PAGA del proyecto. Se observan materiales provenientes de excavaciones dispuestos en los lados del derecho de vía, sin ningún tipo de manejo, no se evidencia aislamiento, ni cubrimiento de los materiales de construcción.

OBSERVACIONES: En cumplimiento de las funciones como interventor del contrato de la referencia, se ha venido realizando la solicitud de los informes mensuales de seguimiento ambiental de conformidad con lo establecido en apéndice de gestión ambiental del contrato de la referencia, en el cual establece que el contratista debe entregar a la Interventoría los informes a los cinco (5) días calendario del vencimiento del período respectivo, los cuales a la fecha no lo ha realizado.
Para el presente informe, el contratista solo entrega informe del mes de enero de 2024 con falta de evidencias de la implementación de las medidas del PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Alcaldía Municipal
Se instala cartelera informativa con buzón de PQRS

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
* El contratista no realiza ninguna actividad relacionada con el componente social durante la semana

INTERVENTORÍA:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NA
AVALUOS APROBADOS: NA
PREDIOS ADQUIRIDOS: NA

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere Gestión Predial.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Suministro e instalación de Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo y acero. =1 m³	(**Acumulado**= 568,17 m³ ------ Porcentaje acumulado 94,7%)
2. Limpieza general de la obra	
3. Se observó poco personal en la obra.	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar suministro e instalación de base granular en el K14+630 hasta K14 +640.
2. Continuar suministro e instalación de Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0 en el K14+ 250 hasta K14 +640.
3. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25 en el K14+ 550 hasta K14 +640. Las dos calzadas
4. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 en el K14+ 250 hasta K14 +640. Las dos calzadas
5. Continuar suministro e instalación de Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo y acero.
6. Continuar suministro e instalación de Relleno para hombro de las Cunetas en concreto.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sector N°1. No se está realizando ninguna actividad de obra K0+000 hasta K0+480



Sector N°3. Se realiza suministro e instalación de concreto para cunetas K3+600.



Sector N°3. se presenta hundimiento en el relleno debido a las fuertes lluvias K3+600.



Sector N°6. No se está realizando ninguna actividad de obra K13+532 hasta K14+640

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Continuar seguimiento a las actividades de obra de acuerdo a las especificaciones INVIAS ejecutadas por el contratista de obra.
2. Continuar seguimiento cronograma de obra.
3. Supervisión instalación de los diferentes materiales en obra.
4. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-357 (10-may-24) Acta Parcial N°23 – Mes de abril 2024.
5.Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-358 (16-may-24) Requerimientos pendientes para aval Acta Parcial N°23.
6. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-359 (16-may-24) Inactividad actividad en la ejecución de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **MARISOL AMAYA CORREA**
Matricula Profesional No.: 25202-74273 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SECTOR URBANO ALPUJARRA - PUENTE LAS DELICIAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 104 del 17-may-24 al 23-Mayo-24, Último Informe Semana? SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. Lenin Tito Mendoza Peña — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Diego Fernando Caicedo Castro

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA-PUENTE LAS DELICIAS CON RECURSOS DE CORREDORES RURALES INVIAS PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
REPARACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (BACHEO) 6689 m2 **PAVIMENTO FLEXIBLE** 1188 ML

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LAS DELICIAS - ALPUJARRA, MEDIANTE PARCHEO Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	050 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.045.951.044,98
FECHA DE INICIO:	3/05/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 4.045.951.044,98
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 2.022.975.522,49
PRÓRROGA 1	92 DIAS 31-oct-22	VALOR AMORTIZADO:	$ 1.629.045.811,83
PRÓRROGA 2	50 DIAS 20-dic-22	SALDO POR AMORTIZAR:	$ 393.929.710,66
PRÓRROGA 3	70 DIAS 28-feb-23		
PRÓRROGA 4	46 DIAS 30-abr-23		
PRÓRROGA 5	15 DIAS 15-may-23		
PRÓRROGA 6	15 DIAS 31-may-23		
PRÓRROGA 7	30 DIAS 30-jun-23		
PRÓRROGA 8	31 DIAS 31-jul-23		
PRÓRROGA 9	61 DIAS 30-sep-23		
PRÓRROGA 10	92 DIAS 31-dic-23		
SUSPENSIÓN N°1	15 DIAS Desde 28-dic-23		
PRORROGA A LA SUSPENSIÓN N	15 DIAS Desde 11-ene-24		
REANUDACIÓN N°1	26-ene-24		
PRORROGA 11	31 DIAS 29-feb-24		
SUSPENSIÓN N°2	33 DIAS Desde 27-feb-24		
REANUDACIÓN N°2	31-mar-24		
PRORROGA 12	91 DIAS 3-jul-24		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. - ALCIRA PÁEZ DURÁN		
CONTRATO No.	2247 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 1.716.988.701,00
FECHA	4/04/2022	VALOR ADICIONES:	$ 930.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 2.646.988.701,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	3/05/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 150.000.000,00
PRÓRROGA 1: Cinco meses	31-dic-2022	VALOR AMORTIZADO:	$ 150.000.000,00
PRÓRROGA 2: Cinco meses	31-may-2023	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA 3: Cinco meses	31-oct-2023		
PRÓRROGA 4: Dos meses	31-dic-2023		
PRÓRROGA 5: Dos meses	29-feb-2024		
SUSPENSIÓN N°1 (30 dias)	27-feb-24 al 31-mar-24		
REINICIO DE OBRA	1-abr-24		
PRÓRROGA 6: Un mes	3-may-24		
PRÓRROGA 7: Dos mes	3-jul-24		
PLAZO TOTAL ACUMULADO (meses)	VEINTISEIS		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.050.000.000	$ 4.045.951.045	$ 4.045.951.045	$ 4.045.951.045
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 471.022.547	$ 1.657.079.402	$ 1.129.989.674
	SALDO DE VIGENCIA	**$ 4.050.000.000**	**$ 3.574.928.498**	**$ 1.917.849.095**	**$ 787.859.421**
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 520.000.000	$ 1.196.988.701		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 32.794.234			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 487.205.766	$ 1.196.988.701		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.045.951.044,98	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.961.504.845,60	97,9%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.255.855.841,39	80,5%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (705.649.004,21)	-17,4%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 14.875.000,00	0,4%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.946.629.845,60	97,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.240.980.841,39	80,1%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (705.649.004,21)	-17,4%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 117.004.058,80	2,9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 1.129.989.674

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite):Última Acta Parcial N°22-Feb2024.

Observaciones: Prórroga N°12 hasta 3 de julio de 2024. Se avala Acta Modificatoria N°4 (1-abril-2023).

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.646.988.701,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.519.729.628,84	95,19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.760.869,00	100%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.760.869,00	100%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 71.043.476,00

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.022.975.522
Amortizado $	$ 1.629.045.811,83
Saldo $	$ 393.929.710,66

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,00
Acumulado:	0,77

ANTICIPOS	
Otorgado $	150.000.000,00
Amortizado $	150.000.000,00
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 97,9% — Avance o Atraso Físico % -17,4%
Meta Física Ejecutada % 80,5%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada									
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Tramo y/o sector 7	Total	%	Cantidades ejecutadas (m)
MDC 25 PAVIMENTO FLEXIBLE	M3	480,08	$ 1.086.487.181	Prog			**123,47**	**32,00**	**6,66**	**317,95**		**480,08**	100,0%	**1544**
				Ejec			123			289		412,5	85,9%	1326,6
				Falta				32,00	6,66	28,95		67,6	14,1%	217,4
MDC 19 PAVIMENTO FLEXIBLE	M3	480,08	$ 1.086.487.181	Prog			**123,47**	**32,00**	**6,66**	**317,95**		**480,08**	100,0%	**1544**
				Ejec			123			195		318,0	66,2%	1022,6
				Falta				32,00	6,66	123,45		162,1	33,8%	**521,4**
SEÑALES DE TRANSITO	m	1516	$ 87.976.000	Prog			**392,00**	**32,00**		**1092**		**1516,00**	100,0%	1516,00
				Ejec										
				Falta			392,00	32,00		1092,00		1516,0	100,0%	
MANTENIMIENTO PERIODICO	M3	41,48	$ 230.829.033	Prog	**41,48**							**41,48**	100,0%	155
				Ejec										
				Falta	41,48							41,48	100,0%	
MURO CONTENCIÓN K3+600	Und	1	$ 975.184.753	Prog				**1,00**				1,00	100,0%	**342,81**
				Ejec				1,00				1,00	100,0%	342,81
				Falta										
CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU.	m3	600,26	$ 669.495.433	Prog	**57,68**		**185,6**	**61,88**		**295,1**		600,26	100,0%	**600,3**
				Ejec	24,6		186	61,88		296,1		568,2	94,7%	568,2
				Falta	33,11					-1,02		32,1	5,3%	32,1

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA	1	
VIBROCOMPACTADOR (Neumático y rodillo)	1	
VOLQUETA	1	
FINISHER	1	
RETRO EXCAVADORA	1	1
CAMIONETA	1	1
MEZCLADORA	1	2
Total	**7**	**4**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

NOTA:

TRAMO Y/O SECTOR (1): K0+000 - K0+405
TRAMO Y/O SECTOR (2): K0+664 - K1+662
TRAMO Y/O SECTOR (3): K1+823 - K2+350
TRAMO Y/O SECTOR (4): K3+550 - K3+650 (MURO CONTENCION)

TRAMO Y/O SECTOR 5: K7+000 - K7+265
TRAMO Y/O SECTOR 6: K13+530 - K14+640
TRAMO Y/O SECTOR 7: K14+640 - K16+326

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	EL MANA	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	GUAMO/SALDAÑA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	UNION TEMPORAL JC Y HYS S.A.S	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	PURIFICACION	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X

OBSERVACIONES: No se cuenta con información actualizada de los proveedores de los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES: No se cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: El Contratista no realiza entrega de los informes del PAGA del proyecto. En cumplimiento de las funciones como interventor del contrato de la referencia, se ha venido realizando la solicitud de los informes mensuales de seguimiento ambiental, los cuales a la fecha no han sido radicados. Teniendo en cuenta que a la fecha llevan un avance del proyecto del 80.5%.

OBSERVACIONES: Esta Interventoría no cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto, desde el mes de Julio de 2023 hasta la fecha. De acuerdo al estado del proyecto se tiene un avance del 80,5%.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Alcaldía Municipal
Se instala cartelera informativa con buzón de PQRS

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
* El contratista no realiza ninguna actividad relacionada con el componente social durante la semana

INTERVENTORÍA:
* Se realiza seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NA
AVALUOS APROBADOS:	NA
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere Gestión Predial.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se realizó ninguna actividad en la obra, no hay presencia de personal en la obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar suministro e instalación de base granular en el K14+630 hasta K14 +640 - Remate.
2. Continuar suministro e instalación de Riego de imprimación con emulsión asfáltica K14+ 250 hasta K14 +640.
3. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25 en el K14+ 550 hasta K14 +640 ambas carriles
4. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 en el K14+ 250 hasta K14 +640 ambos carriles
5. Continuar construcción Cuneta de Concreto Vaciada In Situ.
6. Continuar suministro e instalación de Relleno para hombro de las Cunetas en concreto.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sector N°1. No se está realizando ninguna actividad de obra K0+000 hasta K0+480



Sector N°3. (K1+823 hasta K2+350).



Sector N°4. se presenta hundimiento en el relleno debido a las fuertes lluvias K3+600.



Sector N°6. No se está realizando ninguna actividad de obra K13+532 hasta K14+640

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Continuar seguimiento a las actividades de obra de acuerdo a las especificaciones INVIAS ejecutadas por el contratista de obra.
2. Continuar seguimiento cronograma de obra.
3. Supervisión instalación de los diferentes materiales en obra.
4. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-360 (17-may-24) - Solicitud acciones por socavación y hundimiento de cunetas K3+600.
5. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-361 (17-may-24) - Remisión Acta Parcial de Obra N°22 V6- febrero de 2024.
6. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-362 (20-may-24) - Observaciones Informe Ambiental – Informe enero de 2024.
7. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-363 (20-may-24) - Estado de Avance de Obra.
8. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-364 (22-may-24) - Segunda Reiteración de Gestión a Peticiones Abiertas.
9. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-365 (23-may-24) - Solicitud presentación formatos Informe Mensual Mayo de 2024.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARISOL AMAYA CORREA
Matricula Profesional No.: 25202-74273 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30-Mayo-24. (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SECTOR URBANO ALPUJARRA - PUENTE LAS DELICIAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 105 del 24-may-24 al 30-Mayo-24, Último Informe Semanal: SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. Lenin Tito Mendoza Peña — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Diego Fernando Caicedo Castro

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA-PUENTE LAS DELICIAS CON RECURSOS DE CORREDORES RURALES INVIAS PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
REPARACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (BACHEO) 6689 m2 **PAVIMENTO FLEXIBLE** 1188 ML

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LAS DELICIAS - ALPUJARRA, MEDIANTE PARCHEO Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	050 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.045.951.044,98
FECHA DE INICIO:	3/05/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 4.045.951.044,98
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 2.022.975.522,49
PRÓRROGA 1	92 DIAS 31-oct-22	VALOR AMORTIZADO:	$ 1.629.045.811,83
PRÓRROGA 2	50 DIAS 20-dic-22	SALDO POR AMORTIZAR:	$ 393.929.710,66
PRÓRROGA 3	70 DIAS 28-feb-23		
PRÓRROGA 4	46 DIAS 30-abr-23		
PRÓRROGA 5	15 DIAS 15-may-23		
PRÓRROGA 6	15 DIAS 31-may-23		
PRÓRROGA 7	30 DIAS 30-jun-23		
PRÓRROGA 8	31 DIAS 31-jul-23		
PRÓRROGA 9	61 DIAS 30-sep-23		
PRÓRROGA 10	92 DIAS 31-dic-23		
SUSPENSIÓN N°1	15 DIAS Desde 28-dic-23		
PRORROGA A LA SUSPENSIÓN N	15 DIAS Desde 11-ene-24		
REANUDACIÓN N°1	26-ene-24		
PRORROGA 11	31 DIAS 29-feb-24		
SUSPENSIÓN N°2	33 DIAS Desde 27-feb-24		
REANUDACIÓN N°2	31-mar-24		
PRORROGA 12	91 DIAS 3-jul-24		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. - ALCIRA PÁEZ DURÁN		
CONTRATO No.	2247 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 1.716.988.701,00
FECHA	4/04/2022	VALOR ADICIONES:	$ 930.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 2.646.988.701,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	3/05/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 150.000.000,00
PRÓRROGA 1: Cinco meses	31-dic-2022	VALOR AMORTIZADO:	$ 150.000.000,00
PRÓRROGA 2: Cinco meses	31-may-2023	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA 3: Cinco meses	31-oct-2023		
PRÓRROGA 4: Dos meses	31-dic-2023		
PRÓRROGA 5: Dos meses	29-feb-2024		
SUSPENSIÓN N°1 (30 dias)	27-feb-24 al 31-mar-24		
REINICIO DE OBRA	1-abr-24		
PRÓRROGA 6: Un mes	3-may-24		
PRÓRROGA 7: Dos mes	3-jul-24		
PLAZO TOTAL ACUMULADO (meses)	VEINTISEIS		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.050.000.000	$ 4.045.951.045	$ 4.045.951.045	$ 4.045.951.045
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 471.022.547	$ 1.657.079.402	$ 1.129.989.674
	SALDO DE VIGENCIA	**$ 4.050.000.000**	**$ 3.574.928.498**	**$ 1.917.849.095**	**$ 787.859.421**
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 520.000.000	$ 1.196.988.701		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 32.794.234			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 487.205.766	$ 1.196.988.701		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.045.951.044,98	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.981.932.066,95	98,4%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.255.855.841,39	80,5%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (726.076.225,56)	-17,9%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 14.875.000,00	0,4%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.967.057.066,95	98,1%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.240.980.841,39	80,1%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (726.076.225,56)	-17,9%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.427.221,35	0,5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 1.129.989.674

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite):Última Acta Parcial N°22-Feb2024.

Observaciones: Prórroga N°12 hasta 3 de julio de 2024. Se avala Acta Modificatoria N°4 (1-abril-2023).

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.646.988.701,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.545.181.443,27	96,15%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.781.821,90	100%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.781.821,90	100%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: abr-24
VALOR FACTURA: $ 27.127.287,60

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.022.975.522
Amortizado $	$ 1.629.045.811,83
Saldo $	$ 393.929.710,66

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,00
Acumulado:	0,78

ANTICIPOS	
Otorgado $	150.000.000,00
Amortizado $	150.000.000,00
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 98,4% — Avance o Atraso Físico % -17,9%
Meta Física Ejecutada % 80,5%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada									
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Tramo y/o sector 7	Total	%	Cantidades ejecutadas (m)
MDC 25 PAVIMENTO FLEXIBLE	M3	480,08	$ 1.086.487.181	Prog			**123,47**	**32,00**	**6,66**	**317,95**		**480,08**	100,0%	**1544**
				Ejec			123			289		412,5	85,9%	1326,6
				Falta				32,00	6,66	28,95		67,6	14,1%	217,4
MDC 19 PAVIMENTO FLEXIBLE	M3	480,08	$ 1.086.487.181	Prog			**123,47**	**32,00**	**6,66**	**317,95**		**480,08**	100,0%	**1544**
				Ejec			123			195		318,0	66,2%	1022,6
				Falta				32,00	6,66	123,45		162,1	33,8%	**521,4**
SEÑALES DE TRANSITO	m	1516	$ 87.976.000	Prog			**392,00**	**32,00**		**1092**		**1516,00**	100,0%	1516,00
				Ejec										
				Falta			392,00	32,00		1092,00		1516,0	100,0%	
MANTENIMIENTO PERIODICO	M3	41,48	$ 230.829.033	Prog	**41,48**							**41,48**	100,0%	155
				Ejec										
				Falta	41,48							41,48	100,0%	
MURO CONTENCIÓN K3+600	Und	1	$ 975.184.753	Prog				**1,00**				1,00	100,0%	**342,81**
				Ejec				1,00				1,00	100,0%	342,81
				Falta										
CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU.	m3	600,26	$ 669.495.433	Prog	**57,68**		**185,6**	**61,88**		**295,1**		600,26	100,0%	**600,3**
				Ejec	24,6		186	61,88		296,1		568,2	94,7%	568,2
				Falta	33,11					-1,02		32,1	5,3%	32,1

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la

TRAMO Y/O SECTOR (1): K0+000 - K0+405
TRAMO Y/O SECTOR (2): K0+664 - K1+662
TRAMO Y/O SECTOR (3): K1+823 - K2+350
TRAMO Y/O SECTOR (4): K3+550 - K3+650 (MURO CONTENCION)

TRAMO Y/O SECTOR 5: K7+000 - K7+265
TRAMO Y/O SECTOR 6: K13+530 - K14+640
TRAMO Y/O SECTOR 7: K14+640 - K16+326

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA	1	
VIBROCOMPACTADOR (Neumático y rodillo)	1	
VOLQUETA	1	
FINISHER	1	
RETRO EXCAVADORA	1	
CAMIONETA	1	
MEZCLADORA	1	2
Total	**7**	**2**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

NOTA:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	EL MANA	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	GUAMO/SALDAÑA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	UNION TEMPORAL JC Y HYS S.A.S	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	PURIFICACION	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X

OBSERVACIONES: No se cuenta con información actualizada de los proveedores de los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES: No se cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: El Contratista no realiza entrega de los informes del PAGA del proyecto. En cumplimiento de las funciones como interventor del contrato de la referencia, se ha venido realizando la solicitud de los informes mensuales de seguimiento ambiental, los cuales a la fecha no han sido radicados. Teniendo en cuenta que a la fecha llevan un avance del proyecto del 80.5%.

OBSERVACIONES: Esta Interventoría no cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto, desde el mes de Julio de 2023 hasta la fecha. De acuerdo al estado del proyecto se tiene un avance del 80,5%.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Alcaldía Municipal
Se instala cartelera informativa con buzón de PQRS

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
* El contratista NO presenta el informe mensual correspondiente a la gestión social del mes mayo.

INTERVENTORÍA:
* Se realiza seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista.
* Elaboración del informe mensual N°26 - MAYO.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NA
AVALUOS APROBADOS: NA
PREDIOS ADQUIRIDOS: NA

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere Gestión Predial.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana se observo baja actividad en la obra, se reiteró remate de actividades de concreto y rellenos en cunetas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar suministro e instalación de base granular en el K14+630 hasta K14 +640 - Remate.
2. Continuar suministro e instalación de Riego de imprimación con emulsión asfáltica K14+ 250 hasta K14 +640.
3. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25 en el K14+ 550 hasta K14 +640 ambas carriles
4. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 en el K14+ 250 hasta K14 +640 ambos carriles
5. Continuar construcción Cuneta de Concreto Vaciada In Situ.
6. Continuar suministro e instalación de Relleno para hombro de las Cunetas en concreto.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sector N°1. Terminado demolición pavimento existente K0+000 hasta K0+480



Sector N°3. K1+823 hasta K2+350 pendiente remate entrada a carpta asfáltica



Sector N°4. K3+600 pendiente reparación hundimiento relleno



Sector N°6. K13+532 hasta K14+640 pendiente carpeta de rodadura mezcla asfáltica y señalización.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Continuar seguimiento a las actividades de obra de acuerdo a las especificaciones INVIAS ejecutadas por el contratista de obra.
2. Continuar seguimiento cronograma de obra.
3. Supervisión instalación de los diferentes materiales en obra.
4. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-366 (24-may-24) - Solicitud aplicación Sanciones Contrato de Obra N°050 de 2022 – Convenio N°1131-2021.
5. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-367 (27-may-24) - Reiteración Presentación Planos Récord.
6. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-368 (29-may-24) - Acta de comité de obra N°22.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARISOL AMAYA CORREA
Matricula Profesional No.: 25202-74273 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 1.2 MUNICIPIO DE FRESNO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	
		FECHA	25/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SECTOR VEREDAS PALERMO - AGUAS CLARAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 104 del 19-abr-24 al 25-abr-24 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. Lenin Tito Mendoza Peña — GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO: Ing. Diego Fernando Calcedo Castro

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 3193 - 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCION DE SIETE (7) ALCANTARILLAS, CONSTRUCCION APROXIMADA DE 3.131ML DE PLACA HUELLA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 3.131 ML DE PLACA HUELLAS DISTRIBUIDOS EN 9 TRAMOS EN PUNTOS CRITICOS ENTRE EL K0+000 Y EL K5+500, EL DISEÑO DE LA PLACA HUELLA CONSISTE EN UN ANCHO DE 5 MTS QUE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: BORDILLOS DE 0.1 M, CUNETAS DE 0.7 M, SOBREANCHO VARIABLE EN CONCREO CICLOPEO DE 0.35 M, PLACAHUELLAS DE 0.90 M Y UNA SECCION DE CONCRETO CICLOPEO CENTRAL DE 0.90 M. EL PROYECTO TAMBIEN CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 7 ALCANTARILLAS EN ESE MISMO TRAMO, Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE CONFORMACION DE CALZADA Y APLICACION DE AFIRMADO EN PUNTOS CRITICOS ESPECIFICOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO FRESNO IC
INTEGRANTES: INGENIERIA Y MINERIA INGEMIN S.A.S. — JUAN FRANCO CASTAÑEDA

CONTRATO No.	067-OBRA-13 DE MARZO 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.046.192.741,00
FECHA DE INICIO:	29 DE ABRIL 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 4.046.192.741,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PLAZO VIGENTE (días):	SESENTA Y UNO		
PLAZO TOTAL ACUMULADO (meses):	19 MESES, 4 DIAS		
PRÓRROGA (1). 23/12/2022, (meses):	TRES		
PRÓRROGA (2). 24/03/2023, (meses):	TRES		
PRÓRROGA (3). 15/04/2023, (días):	DIECINUEVE		
PRÓRROGA (4). 30/04/2023, (días):	QUINCE		
PRÓRROGA (5). 31/05/2023, (días):	TREINTA Y UNO		
PRÓRROGA (6). 31/07/2023, (días):	SESENTA Y UNO		
PRÓRROGA (7). 30/09/2023, (días):	SESENTA Y UNO		
PRÓRROGA (8). 31/10/2023, (días):	TREINTA Y UNO		
PRÓRROGA (9). 31/12/2023, (días):	SESENTA Y UNO		
SUSPENSIÓN N°1 (días) Desde 28-dic-23	VEINTIUNO		
PRÓRROGA N°1 SUSPENSIÓN N°1: (días) 28-mar-24	SESENTA		
PRÓRROGA N°2 SUSPENSIÓN N°1: (días) 19-abr-24	VEINTITRES		
FECHA DE REINICIO:	20 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA (10). 30/7/2024 (días):	SETENTA Y CUATRO		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S — ALCIRA PAEZ DURAN

CONTRATO No.	2297 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 1.716.988.701,00
FECHA DE INICIO:	4 de abril de 2022	VALOR ADICIONES:	$ 930.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 2.646.988.701,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de mayo de 2023	VALOR ANTICIPO:	$ 150.000.000,00
PRÓRROGA 1: Cinco meses	31 de 2022	VALOR AMORTIZADO:	$ 150.000.000,00
PRÓRROGA 2: Cinco meses	31 may 2023	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA 3: Cinco meses	31-oct-2023		
PRÓRROGA 4: Dos meses	31 de 2023		
PRÓRROGA 5: Dos meses	31 dic 2023		
SUSPENSIÓN N°1 (30 días)	27 feb 24 A 31 mar 24		
REINICIO DE OBRA	1-abr-24		
PRÓRROGA 6: Un mes	3-may-24		
PRÓRROGA 7: Dos mes	3-jul-24		
PLAZO TOTAL ACUMULADO (meses)	VEINTIDOS		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.050.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.050.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 520.000.000	$ 1.196.988.701	$ 770.000.000	$ 160.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 520.000.000	$ 1.196.988.701	$ 770.000.000	$ 160.000.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.046.192.741,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.050.325.862,26	75,39%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.772.451.266,13	68,52%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -277.874.596,13	-6,87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.050.325.862,26	75,39%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.772.451.266,13	68,52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -277.874.596,13	-6,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 81.901.590,59	3,70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 75.000.374,90	3,14%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 198.312.538,81

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se ajustan los porcentajes de obra programada de acuerdo la Reprogramación Próroga N°10 (3-jul-24).

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.646.988.701,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.641.694.723,60	99,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.760.869,00	100%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.760.869,00	100%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 71.043.476,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.650.429.340
Amortizado $	$ 1.057.561.224
Saldo $	$ 592.868.116

INDICADOR IIC	
En el mes:	0,89
Acumulado:	0,95

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 150.000.000,00
Amortizado $	$ 150.000.000,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 75,39% — Avance o Atraso Físico %: -6,87%
Meta Física Ejecutada %: 68,52%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Total	%
Construcción Placa Huella en concreto	ml	3131,00	$ 3.349.824.725,35		Prog	880,00	1020,00	290,00	220,00	721,00	3.131,00	100,00%
					Ejec	402,00	1020,00	220,00		540,00	**2.182,00**	69,69%
Construcción de Alcantarillas	und	7,00	$ 151.877.890,00		Prog	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00%
					Ejec	1,00	2,00		1,00	1,00	**5,00**	71,43%
Actividades de mejoramiento periódico	m2	5038,12	$ 276.739.357,00		Prog	1100,00	400,00	1350,00	1466,67	721,45	5.038,12	100,00%
					Ejec	1100,00	400,00	1350,00	1466,67	600,00	**4.916,67**	97,59%
Localización y replanteo Muro Gavión	m2	195,50	$ 705.560,00		Prog			195,50			195,50	100,00%
					Ejec			195,50			**195,50**	100,00%
Muro Gavión K2+870	m3	130,00	$ 53.040.130,00		Prog			130,00			130,00	100,00%
					Ejec							
Filtro Francés	ml	240,00	$ 67.481.750,00		Prog	100,00	30,00	60,00	50,00		240,00	100,00%
					Ejec							
Muro de contención K0+397	und	1,00			Prog	1,00					1,00	100,00%
					Ejec	0,95					**0,95**	95,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+000 - K1+100
TRAMO Y/O SECTOR 2: K1+100 - K2+200
TRAMO Y/O SECTOR 3: K2+200 - K3+300
TRAMO Y/O SECTOR 4: K3+300 - K4+400
TRAMO Y/O SECTOR 5: K4+400 - K5+500

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Motoniveladora	1	
Compresor (Barrido y/o soplado de la superficie pavimento)	1	
Total	**5**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Mina San Pedro Ameno Guayabal	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	Concesión de agua San Pedro Ameno Guayabal	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES: El Contratista no se ha puesto al día con la entrega informes de la implementación de las medidas ambientales del PAGA.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES: La interventoría está a la espera de los informes periódicos de la implementación de las medidas contempladas en el PAGA del proyecto, para continuar con el seguimiento y evaluación del cumplimiento.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Las actividades el 25-abr-24, con desmonte, localización y replanteo, para dar inicio a la construcción del muro gavión K2+870 Margen izquierda. Por cuanto, se encuentra implementando algunas medidas contempladas del PAGA.

OBSERVACIONES: El proyecto ya se encuentra activo. Las actividades reiniciaron el 25-abr-24 en el muro gavión K2+870 Margen izquierda. Por cuanto se encuentra implementando algunas medidas contempladas del PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Puesto de salud Vereda
Se instala cartelera informativa con buzón de PQRS

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
* El contrato fue reactivado a partir del día 20 de abril de 2024, sin embargo, a la fecha el contratista no ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el componente social.

INTERVENTORÍA:
* Con la comunicación 2024S-VBOG-025709 del 29-abr-2024 el INVIAS presentó su concepto de aprobación al informe trimestral N°7 de la gestión social con radicado 2024E-VUVRAZ-018860 del 29-feb-2024.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere Gestión Predial.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ÍTEM	UND	CANTIDAD	%AVANCE
Construcción Placa Huella en concreto	ml	-	-
Construcción de Alcantarillas	und	-	-
Actividades de mejoramiento periódico	m2	-	-
Localización y replanteo Muro en Gavión K2+870	und	0,01	0,01
Muro en Gavión K2+870	und	-	-
Muro de contención K0+397	und	-	-


1. Desmonte y limpieza área para construcción de muro gavión K2+870 MI.
2. Localización y replanteo para muro gavión K2+870 MI.
3. Se inició de conformación de canastas y reubicación del material - piedra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ÍTEM	UND	CANTIDAD	%AVANCE
Construcción Placa Huella en concreto	ml		
Construcción de Alcantarillas	und	-	-
Actividades de mejoramiento periódico	m2	-	-
Localización y replanteo Muro en Gavión K2+870	und	-	-
Muro en Gavión K2+870	und	2,20	10,00
Muro de contención K0+397	und	-	-

1. K2+870 Muro gavión - se inicia excavación
2. K2+870 Muro gavión - Continuar con la conformación de canastas y reubicación del material - piedra.
3. Reparación de fisuras pendiente en placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







K2+870 MI Muro gavión - Desmonte, limpieza, localización y replanteo.





K2+870 MI Muro gavión - Se inició de conformación de canastas y reubicación del material - piedra.



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. La Interventoría realiza supervisión de la obra.
2. La Interventoría realiza recorridos para supervisar el estado de las obras.
3. Se realizó seguimiento a la programación
4.Se realizó reunión y recorrido a la obra por solicitud de la Dirección Territorial Tolima INVIAS el día 26-abr-24.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **MARISOL AMAYA CORREA**
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	

FECHA: 9/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SECTOR VEREDAS CALENTICUE - AGUAS CLARAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 106 (Numeración consecutiva) del 3-may-24 al 9-may-24 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. Leon Tito Mendoza Peña — GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO: Ing. Diego Fernando Caicedo Castro

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURAL EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 1133 - 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCION DE SIETE (7) ALCANTARILLAS, CONSTRUCCION APROXIMADA DE 3.131ML DE PLACA HUELLA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 3.131 ML DE PLACA HUELLAS DISTRIBUIDOS EN 9 TRAMOS EN PUNTOS CRITICOS ENTRE EL K0+000 Y EL K5+500, EL DISEÑO DE LA PLACA HUELLA CONSISTE EN UN ANCHO DE 5 MTS QUE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA; BORDILLOS DE 0.1 M, CUNETAS DE 0.7 M, SOBREANCHO VARIABLE EN CONCRETO CICLOPEO DE 0.35 M, PLACAHUELLAS DE 0.90 M Y UNA SECCION DE CONCRETO CICLOPEO CENTRAL DE 0.90 M. EL PROYECTO TAMBIEN CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 7 ALCANTARILLAS EN ESE MISMO TRAMO, Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE CONFORMACION DE CALZADA Y APLICACION DE AFIRMADO EN PUNTOS CRITICOS ESPECIFICOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO FRESNO IC
INTEGRANTES: INGENIERIA Y MINERIA INGEMIN S.A.S. JUAN FRANCO CASTAÑEDA

CONTRATO No.	067-OBRA-13 DE MARZO 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.046.192.741,00
FECHA DE INICIO:	29 DE ABRIL 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 4.046.192.741,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PLAZO VIGENTE (días):	SESENTA Y UNO		
PLAZO TOTAL ACUMULADO (meses):	19 MESES, 4 DIAS		
PRÓRROGA (1). 23/12/2022, (meses):	TRES		
PRÓRROGA (2). 24/03/2023, (meses):	TRES		
PRÓRROGA (3). 15/04/2023, (días):	DOS (NUEVE		
PRÓRROGA (4). 30/04/2023, (días):	DIANCE		
PRÓRROGA (5). 31/05/2023, (días):	TREINTA Y UNO		
PRÓRROGA (6). 31/07/2023, (días):	SESENTA Y UNO		
PRÓRROGA (7). 30/09/2023, (días):	SESENTA Y UNO		
PRÓRROGA (8). 31/10/2023, (días):	TREINTA Y UNO		
PRÓRROGA (9). 31/12/2023, (días):	SESENTA Y UNO		
SUSPENSIÓN N°1 (días) Desde 28-dic-23	TREINTA		
PRÓRROGA N°1 SUSPENSIÓN N°1: (días) 28-mar-24	SESENTA		
PRÓRROGA N°2 SUSPENSIÓN N°1: (días) 19-abr-24	VEINTITRES		
FECHA DE REINICIO:	20 DE ABRIL DE 20224		
PRÓRROGA (10). 30/7/2024, (días):	SETENTA Y CUATRO		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S ALCIRA PAEZ DURAN

CONTRATO No.	4247 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.716.988.701,00
FECHA DE INICIO:	4 de abril de 2022	VALOR ADICIONES:	$ 930.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 2.646.988.701,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de mayo de 2023	VALOR ANTICIPO:	$ 150.000.000,00
PRÓRROGA 1: Cinco meses	31 de 2022	VALOR AMORTIZADO:	$ 150.000.000,00
PRÓRROGA 2: Cinco meses	31 may 2023	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA 3: Cinco meses	31 oct 2023		
PRÓRROGA 4: Dos meses	31 de 2023		
PRÓRROGA 5: Dos meses	29 de 2024		
SUSPENSIÓN N°1 (30 días)	27 de 24 al 31 may 24		
REINICIO DE OBRA	1 abr 24		
PRÓRROGA 6: Un mes	3 may 24		
PRÓRROGA 7: Dos mes	3 jul 24		
PLAZO TOTAL ACUMULADO (meses)	ADICIONAL		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.050.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.050.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 520.000.000	$ 1.196.988.701	$ 770.000.000	$ 160.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 520.000.000	$ 1.196.988.701	$ 770.000.000	$ 160.000.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.046.192.741,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.143.467.140,48	77,69%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.772.451.266,13	68,52%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (371.015.874,35)	-9,17%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.143.467.140,48	77,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.772.451.266,13	68,52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (371.015.874,35)	-11,47%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 61.901.590,59	1,70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 75.081.974,35	0,14%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 198.312.538,81

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se ajustan los porcentajes de obra programada de acuerdo la Reprogramación Prórroga N°10 (3-jul-24).

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.646.988.701,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.468.825.999,97	93,27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.760.869,00	100%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.760.869,00	100%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 71.043.476,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.650.429.340
Amortizado $	$ 1.057.561.224
Saldo $	$ 592.868.116

INDICADOR IC	
En el mes:	0,89
Acumulado:	0,89

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 150.000.000,00
Amortizado $	$ 150.000.000,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 77,69%
Meta Física Ejecutada %: 68,52%
Avance o Atraso Físico %: -9,17%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Total	%
Construcción Placa Huella en concreto	ml	3131,00	$ 3.349.824.725,35		Prog	880,00	1020,00	290,00	220,00	721,00	3.131,00	100,00%
					Ejec	402,00	1020,00	220,00		540,00	**2.182,00**	69,69%
Construcción de Alcantarillas	und	7,00	$ 151.877.890,00		Prog	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00%
					Ejec	1,00	2,00		1,00	1,00	**5,00**	71,43%
Actividades de mejoramiento periódico	m2	5038,12	$ 276.739.357,00		Prog	1100,00	400,00	1350,00	1466,67	721,45	5.038,12	100,00%
					Ejec	1100,00	400,00	1350,00	1466,67	600,00	**4.916,67**	97,59%
Localización y replanteo Muro Gavión	m2	195,50	$ 705.560,00		Prog			195,50			195,50	100,00%
					Ejec			195,50			**195,50**	100,00%
Muro Gavión K2+870	m3	130,00	$ 53.040.130,00		Prog			130,00			130,00	100,00%
					Ejec							
Filtro Francés	ml	240,00	$ 67.481.750,00		Prog	100,00	30,00	60,00	50,00		240,00	100,00%
					Ejec							
Muro de contención K0+397	und	1,00			Prog	1,00					1,00	100,00%
					Ejec	0,95					**0,95**	95,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Motoniveladora	1	
Compresor (Barrido y/o soplado de la superficie pavimento)	1	
Total	**5**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+000 - K1+100
TRAMO Y/O SECTOR 2: K1+200 - K2+300
TRAMO Y/O SECTOR 3: K2+200 - K3+300
TRAMO Y/O SECTOR 4: K3+300 - K4+400
TRAMO Y/O SECTOR 5: K4+400 - K5+500

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:		DISPONIBLE		
Mina San Pedro Armero Guayabal	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
Concesión de agua San Pedro Armero Guayabal	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: El Contratista no se ha puesto al día con la entrega informes de la implementación de las medidas ambientales del PAGA, desde el mes de Julio de 2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES: No se cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto, el contratista tiene pendiente remitir la información completa.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: En cumplimiento de las funciones como interventor del contrato de la referencia, se ha venido realizando la solicitud de los informes mensuales de seguimiento ambiental de conformidad con lo establecido en el el l informe de avance y seguimiento del PAGA, apé ndice de gestión ambiental del contrato de la referencia, el cual menciona que: "El contratista de obra debe entregar con una frecuencia mensual a la interv entoría en medio magnético el informe y anexos, que presenten el avance de la gestión ambiental adelantada de acuerdo a los programas y proyectos establec dos en el PAGA. ." El contratista debe entregar a la Interventoría los informes a los cinco (5) días calendario del vencimiento del periodo respect ivo, los cuales a la fecha no lo ha realizado.

OBSERVACIONES: La interventoría esta a la espera de los informes periódicos de la implementación de las medidas contempladas en el PAGA del proyecto, para continuar con el seguimiento y evaluación del cumplimiento.

V. GESTIÓN SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	2
	PÁGINA	

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Puesto de salud Vereda Aguas Claras
Se instala cartelera informativa con buzón de PQRS

OBSERVACIONES:
CONTRATISTA:
* El día 3 de mayo fue presentado el informe mensual del mes de abril donde se relaciona paz y salvo a los extrabajadores Féiver Calvo y Juan Fernando López

INTERVENTORÍA:
* Con el oficio circular N°316 el Juzgado Promiscuo Primero Municipal de Fresno notifica a las partes implicadas (Contratista, Alcaldía e Interventoría) sobre la aceptación de la acción de tutela interpuesta por el Señor Héctor Bernardo Escucha al Consorcio Fresno IC.

* Con la comunicación CIM-2247-21-1133-21-235 se presenta al Juzgado Primero Promiscuo la trazabilidad de las acciones realizadas por la interventoría sobre la queja presentada por el Señor Escucha.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere Gestión Predial.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ÍTEM	UND	CANTIDAD	%AVANCE
Construcción Placa Huella en concreto	ml	-	-
Construcción de Alcantarillas	und	-	-
Actividades de mejoramiento periódico	m2	-	-
Localización y replanteo Muro en Gavión K2+870	und	0,01	0,01
Muro en Gavión K2+870	und	-	-
Muro de contención K0+397	und	-	-

1. Canalización de agua para iniciar construcción de muro gavión K2+870 MI.

NOTA: LA OBRA ESTUVO INACTIVA DESDE EL 3 AL 8 DE MAYO DE 2024. Se presentaron fuertes lluvias en el sector.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


ÍTEM	UND	CANTIDAD	%AVANCE
Construcción Placa Huella en concreto	ml		
Construcción de Alcantarillas	und	-	-
Actividades de mejoramiento periódico	m2	-	-
Localización y replanteo Muro en Gavión K2+870	und	-	-
Muro en Gavión K2+870	und	2,20	10,00
Muro de contención K0+397	und	-	-

1. K2+870 Muro gavión - continuar con excavación

2. K2+870 Muro gavión - Continuar con la conformación de canastas y reubicación del material - piedra.

3. Reparación de fisuras pendiente en placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Sin actividad en obra (3 al 8 de may-24)

K2+870 MI Muro gavión - Se inició canalización aguas para actividades de construcción.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. La Interventoría realiza supervisión de la obra.
2. La Interventoría realiza recorridos de obra y observó que desde el 2 de mayo de 2024 no hay personal ni actividades en los frentes de obra. El 9 de mayo se presentaron el Ingeniero residente de obra, 1 maestro, 1 oficial y 4 ayudantes con el fin de reiniciar labores en el K2+870.
3. Se han presentado lluvias moderadas y tiempo nublado los días 2, 3, 4, 6 de mayo, el día 5 y 7 de mayo día soleados, 8 de mayo nublado y el 9 de mayo lluvias fuertes.
4. La interventoría ha enviado comunicaciones CIM -2247-21-1133-21-230 del 3 de mayo de 2024 -Estado compromisos pactados Reunión 26 abr-2024, CIM-2247-21-1133-21-231 del 3 de mayo de 2024- Estado avance de obra , CIM. -2247-21-1133-21-232 del 3 de mayo de 2024-Alcance comunicación CIM-2247-21-1133-21-228-Incumplimiento en la entrega del informe mensual SST abril 2024, CIM-2247-21-1133-21-233 del 7 de mayo de 2024-Estado de obra-Inactividad de obra, CIM-2247-21-1133-21-236 del 9 de mayo de 2024-Reiteración solicitud aplicación Sanciones ontrato de Obra No. 167 de 2022-Convenio 1133-2021, solicitud aplicación sanciones Contrato de obra No. 167 de 2022 -Convenio 1133 de 2021, CIM-2247-21-1133-21-237 del 9 de mayo de 2024 -Estado compromisos pactados Acta Reunión 26-abr-24.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **MARISOL AMAYA CORREA**
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	

FECHA: 16/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SECTOR VEREDAS PALENQUE - AGUAS CLARAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 107 (Numeración consecutiva) del 10-may-24 al 16-may-24 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. Leon Tito Mendoza Peña — GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO: Ing. Diego Fernando Caicedo Castro

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURAL EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 1103 - 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCION DE SIETE (7) ALCANTARILLAS, CONSTRUCCION APROXIMADA DE 3.131ML DE PLACA HUELLA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 3.131 ML DE PLACA HUELLAS DISTRIBUIDOS EN 9 TRAMOS EN PUNTOS CRITICOS ENTRE EL K0+000 Y EL K5+500, EL DISEÑO DE LA PLACA HUELLA CONSISTE EN UN ANCHO DE 5 MTS QUE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA; BORDILLOS DE 0.1 M, CUNETAS DE 0.7 M, SOBREANCHO VARIABLE EN CONCRETO CICLOPEO DE 0.35 M, PLACAHUELLAS DE 0.90 M Y UNA SECCION DE CONCRETO CICLOPEO CENTRAL DE 0.90 M. EL PROYECTO TAMBIEN CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 7 ALCANTARILLAS EN ESE MISMO TRAMO, Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE CONFORMACION DE CALZADA Y APLICACION DE AFIRMADO EN PUNTOS CRITICOS ESPECIFICOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO FRESNO IC
INTEGRANTES: INGENIERIA Y MINERIA INGEMIN S.A.S. JUAN FRANCO CASTAÑEDA

CONTRATO No.	007-OBRA-12 DE MARZO 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.046.192.741,00
FECHA DE INICIO:	29 DE ABRIL 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 4.046.192.741,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PLAZO VIGENTE (días):	SESENTA Y UNO		
PLAZO TOTAL ACUMULADO (meses):	19 MESES, 4 DIAS		
PRÓRROGA (1). 23/12/2022, (meses):	TRES		
PRÓRROGA (2). 24/03/2023, (meses):	TRES		
PRÓRROGA (3). 15/04/2023, (días):	DOS (NUEVE		
PRÓRROGA (4). 30/04/2023, (días):	DIANCE		
PRÓRROGA (5). 31/05/2023, (días):	TREINTA Y UNO		
PRÓRROGA (6). 31/07/2023, (días):	SESENTA Y UNO		
PRÓRROGA (7). 30/09/2023, (días):	SESENTA Y UNO		
PRÓRROGA (8). 31/10/2023, (días):	TREINTA Y UNO		
PRÓRROGA (9). 31/12/2023, (días):	SESENTA Y UNO		
SUSPENSIÓN N°1 (días) Desde 28-dic-23	TRENTA		
PRÓRROGA N°1 SUSPENSIÓN N°1: (días) 28-mar-24	SESENTA		
PRÓRROGA N°2 SUSPENSIÓN N°1: (días) 19-abr-24	VEINTITRES		
FECHA DE REINICIO:	20 DE ABRIL DE 20224		
PRÓRROGA (10). 30/7/2024, (días):	SETENTA Y CUATRO		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S ALCIRA PAEZ DURAN

CONTRATO No.	4247 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.716.988.701,00
FECHA DE INICIO:	4 de abril de 2022	VALOR ADICIONES:	$ 930.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 2.646.988.701,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de mayo de 2023	VALOR ANTICIPO:	$ 150.000.000,00
PRÓRROGA 1: Cinco meses	31 de 2022	VALOR AMORTIZADO:	$ 150.000.000,00
PRÓRROGA 2: Cinco meses	31 may 2023	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA 3: Cinco meses	31 oct 2023		
PRÓRROGA 4: Dos meses	31 de 2023		
PRÓRROGA 5: Dos meses	29 de 2024		
SUSPENSIÓN N°1 (30 días)	27 de 24 al 31 may 24		
REINICIO DE OBRA	1 abr 24		
PRÓRROGA 6: Un mes	3 may 24		
PRÓRROGA 7: Dos mes	3 jul 24		
PLAZO TOTAL ACUMULADO (meses)	ADICIONES		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.050.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.050.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 520.000.000	$ 1.196.988.701	$ 770.000.000	$ 160.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 520.000.000	$ 1.196.988.701	$ 770.000.000	$ 160.000.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.046.192.741,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.236.448.408,72	79,99%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.772.451.266,13	68,52%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 463.997.142,57	11,47%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.236.448.408,72	79,99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.772.451.266,13	68,52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 463.997.142,57	11,47%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 61.901.580,56	3,70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 75.091.974,36	0,14%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 198.312.538,81

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se ajustan los porcentajes de obra programada de acuerdo la Reprogramación Prórroga N°10 (3-jul-24).

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.646.988.701,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.494.277.814,40	94,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.760.869,00	100%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.760.869,00	100%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 71.043.476,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.650.429.340
Amortizado $	$ 1.057.561.224
Saldo $	$ 592.868.116

INDICADOR IC	
En el mes:	0,89
Acumulado:	0,90

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 150.000.000,00
Amortizado $	$ 150.000.000,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 79,99%
Meta Física Ejecutada %: 68,52%
Avance o Atraso Físico %: 11,47%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Total	%
Construcción Placa Huella en concreto	ml	3131,00	$ 3.349.824.725,35		Prog	880,00	1020,00	290,00	220,00	721,00	3.131,00	100,00%
					Ejec	402,00	1020,00	220,00		540,00	**2.182,00**	69,69%
Construcción de Alcantarillas	und	7,00	$ 151.877.890,00		Prog	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00%
					Ejec	1,00	2,00		1,00	1,00	**5,00**	71,43%
Actividades de mejoramiento periódico	m2	5038,12	$ 276.739.357,00		Prog	1100,00	400,00	1350,00	1466,67	721,45	5.038,12	100,00%
					Ejec	1100,00	400,00	1350,00	1466,67	600,00	**4.916,67**	97,59%
Localización y replanteo Muro Gavión	m2	195,50	$ 705.560,00		Prog			195,50			195,50	100,00%
					Ejec			195,50			**195,50**	100,00%
Muro Gavión K2+870	m3	130,00	$ 53.040.130,00		Prog			130,00			130,00	100,00%
					Ejec			18,00			**18,00**	13,80%
Filtro Francés	ml	240,00	$ 67.481.750,00		Prog	100,00	30,00	60,00	50,00		240,00	100,00%
					Ejec							
Muro de contención K0+397	und	1,00			Prog	1,00					1,00	100,00%
					Ejec	0,95					**0,95**	95,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Motoniveladora	1	
Compresor (Barrido y/o soplado de la superficie pavimento)	1	
Total	**5**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+000 - K1+100
TRAMO Y/O SECTOR 2: K1+200 - K2+200
TRAMO Y/O SECTOR 3: K2+200 - K3+300
TRAMO Y/O SECTOR 4: K3+300 - K4+400
TRAMO Y/O SECTOR 5: K4+400 - K5+500

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:			DISPONIBLE	
Mina San Pedro	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
Arriero Cocalito	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
Concesión de agua San Pedro	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
Arriero Cocalito	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES: No se cuenta con información actualizada de los proveedores de los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES: No se cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto, desde el mes de Julio de 2023.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: De acuerdo al seguimiento realizado por la Interventoría, se evidencia que el Contratista está ejecutando las obras inherente s al Contrato, sin embargo no implementa las medidas ambientales contempladas en el PAGA del proyecto. Se observan materiales provenientes de excavacion es dispuestos en los lados del derecho de vía, sin ningún tipo de manejo, no se evidencia aislamiento, ni cubrimiento de los materiales de construcción.

OBSERVACIONES: En cumplimiento de las funciones como interventor del contrato de la referencia se ha venido realizando la solicitud de los informes mensuales de seguimiento ambiental de conformidad con lo establecido en el apéndice de gestión ambiental del contrato de la referencia, en el cual establece que el contratista debe entregar a la Interventoría los informes a los cinco (5) días calendario del vencimiento del periodo respectivo, los cuales a la fecha n o lo ha realizado.

V. GESTIÓN SOCIAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Puesto de salud Vereda Aguas Claras
Se instala cartelera informativa con buzón de PQRS

OBSERVACIONES:
CONTRATISTA:
* Se presenta paz y salvo sobre la manifestación ciudadana interpuesta por la ex trabajadora del proyecto Luz Adriana Calderón.
* Se llevo a cabo a una reunión con la propietaria del predio que se ubica en la abscisa k2+870 MD para dialogar sobre problemática que se genera en esté en relación con actividades propias del proyecto (construcción de muro en gavión)

INTERVENTORÍA:
* De manera telefónica se solicita al contratista presentar información sobre el seguimiento y cierre de la petición presentada por el señor Héctor Bernardo Escucha y Claribet Giraldo Parra, sin embargo, el contratista no tiene una respuesta clara sobre dicho proceso.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS. N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere Gestión Predial.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ÍTEM	UND	CANTIDAD	%AVANCE
Construcción Placa Huella en concreto	ml	-	-
Construcción de Alcantarillas	und	-	-
Actividades de mejoramiento periódico	m2	-	-
Localización y replanteo Muro en Gavión K2+870	und	-	-
Muro en Gavión K2+870	m3	18,00	13,80
Muro de contención K0+397	und	-	-


1. K2+870 Muro gavión. Conformación de canastas y elaboración gaviones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ÍTEM	UND	CANTIDAD	%AVANCE
Construcción Placa Huella en concreto	ml		
Construcción de Alcantarillas	und	-	-
Actividades de mejoramiento periódico	m2	-	-
Localización y replanteo Muro en Gavión K2+870	und	-	-
Muro en Gavión K2+870	m3	20,00	15,40
Muro de contención K0+397	und	-	-

1. K2+870 Muro gavión - Continuar con la conformación de canastas y elaboración gaviones
2. K2+870 Muro gavión - Elaboración muro.
3. Reparación de fisuras pendiente en placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO










K2+870 MI Muro Gavión - Preparación material-piedra para elaboración del gavión

K2+870 MI Muro Gavión - Armado de gaviones trabados y amarrados con alambrón

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. La Interventoría realiza supervisión de la obra.
2. Personal Ingeniero residente de obra, 1 maestro, 1 oficial y 7 ayudantes .
3. Dias soleados el 10, 11, 13, 14 y 15 de mayo, Dias lluvioso 12 de mayo, Dia nublado 16 de mayo.
4. El Contratista no ha cumplido con la totalidad de los compromisos pactados Reunión 26.abr-2024, por lo que nuevamente se le oficiará con el fin de que cumpla con lo requerido en anteriores comunicaciones.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **MARISOL AMAYA CORREA**
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	

FECHA: 23/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SECTOR VEREDAS CALENTICUE - AGUAS CLARAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 108 (Numeración consecutiva) del 17-may-24 al 23-may-24 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. Leon Tito Mendoza Peña — GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO: Ing. Diego Fernando Caicedo Castro

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURAL EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 1103 - 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCION DE SIETE (7) ALCANTARILLAS, CONSTRUCCION APROXIMADA DE 3.131ML DE PLACA HUELLA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 3.131 ML DE PLACA HUELLAS DISTRIBUIDOS EN 9 TRAMOS EN PUNTOS CRITICOS ENTRE EL K0+000 Y EL K5+500, EL DISEÑO DE LA PLACA HUELLA CONSISTE EN UN ANCHO DE 5 MTS QUE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA; BORDILLOS DE 0.1 M, CUNETAS DE 0.7 M, SOBREANCHO VARIABLE EN CONCRETO CICLOPEO DE 0.35 M, PLACAHUELLAS DE 0.90 M Y UNA SECCION DE CONCRETO CICLOPEO CENTRAL DE 0.90 M. EL PROYECTO TAMBIEN CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 7 ALCANTARILLAS EN ESE MISMO TRAMO, Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE CONFORMACION DE CALZADA Y APLICACION DE AFIRMADO EN PUNTOS CRITICOS ESPECIFICOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO FRESNO IC
INTEGRANTES: INGENIERIA Y MINERIA INGEMIN S.A.S. — JUAN FRANCO CASTAÑEDA

CONTRATO No.	007-OBRA-12 DE MARZO 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.046.192.741,00
FECHA DE INICIO:	29 DE ABRIL 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 4.046.192.741,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PLAZO VIGENTE (días):	SESENTA Y UNO		
PLAZO TOTAL ACUMULADO (meses):	19 MESES, 4 DIAS		
PRÓRROGA (1). 23/12/2022, (meses):	TRES		
PRÓRROGA (2). 24/03/2023, (meses):	TRES		
PRÓRROGA (3). 15/04/2023, (días):	DOS (NUEVE		
PRÓRROGA (4). 30/04/2023, (días):	DIANCE		
PRÓRROGA (5). 31/05/2023, (días):	TREINTA Y UNO		
PRÓRROGA (6). 31/07/2023, (días):	SESENTA Y UNO		
PRÓRROGA (7). 30/09/2023, (días):	SESENTA Y UNO		
PRÓRROGA (8). 31/10/2023, (días):	TREINTA Y UNO		
PRÓRROGA (9). 31/12/2023, (días):	SESENTA Y UNO		
SUSPENSIÓN N°1 (días) Desde 28-dic-23	TREINTA		
PRÓRROGA N°1 SUSPENSIÓN N°1: (días) 28-mar-24	SESENTA		
PRÓRROGA N°2 SUSPENSIÓN N°1: (días) 19-abr-24	VEINTITRES		
FECHA DE REINICIO:	20 DE ABRIL DE 20224		
PRÓRROGA (10). 30/7/2024, (días):	SETENTA Y CUATRO		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S — ALCIRA PAEZ DURAN		
CONTRATO No.	4247 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.716.988.701,00
FECHA DE INICIO:	4 de abril de 2022	VALOR ADICIONES:	$ 930.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 2.646.988.701,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de mayo de 2023	VALOR ANTICIPO:	$ 150.000.000,00
PRÓRROGA 1: Cinco meses	31-dic-2022	VALOR AMORTIZADO:	$ 150.000.000,00
PRÓRROGA 2: Cinco meses	31-may-2023	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA 3: Cinco meses	31-oct-2023		
PRÓRROGA 4: Dos meses	31-dic-2023		
PRÓRROGA 5: Dos meses	29-feb-2024		
SUSPENSIÓN N°1 (30 días)	27-feb-24 al 31-may-24		
REINICIO DE OBRA	1-abr-24		
PRÓRROGA 6: Un mes	3-may-24		
PRÓRROGA 7: Dos mes	3-jul-24		
PLAZO TOTAL ACUMULADO (meses)	ADICIONES		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.050.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.050.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 520.000.000	$ 1.196.988.701	$ 770.000.000	$ 160.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 520.000.000	$ 1.196.988.701	$ 770.000.000	$ 160.000.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.046.192.741,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.324.409.696,93	82,29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.760.254.514,19	68,96%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 539.155.182,74	13,33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.324.409.696,93	82,29%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.760.254.514,19	68,96%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 539.155.182,74	13,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 61.901.590,56	3,70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.668.076,95	0,26%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 198.312.538,81

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se ajustan los porcentajes de obra programada de acuerdo la Reprogramación Prórroga N°10 (3-jul-24).

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.646.988.701,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.519.729.629,84	95,19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.760.869,00	100%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.760.869,00	100%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 71.043.476,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.650.429.340
Amortizado $	$ 1.057.561.224
Saldo $	$ 592.868.116

INDICADOR IC	
En el mes:	1,43
Acumulado:	0,90

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 150.000.000,00
Amortizado $	$ 150.000.000,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 82,29% — Avance o Atraso Físico %: 13,33%
Meta Física Ejecutada %: 68,96%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Total	%
Construcción Placa Huella en concreto	ml	3131,00	$ 3.349.824.725,35		Prog	880,00	1020,00	290,00	220,00	721,00	3.131,00	100,00%
					Ejec	402,00	1020,00	220,00		540,00	**2.182,00**	69,69%
Construcción de Alcantarillas	und	7,00	$ 151.877.890,00		Prog	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00%
					Ejec	1,00	2,00		1,00	1,00	**5,00**	71,43%
Actividades de mejoramiento periódico	m2	5038,12	$ 276.739.357,00		Prog	1100,00	400,00	1350,00	1466,67	721,45	5.038,12	100,00%
					Ejec	1100,00	400,00	1350,00	1466,67	600,00	**4.916,67**	97,59%
Localización y replanteo Muro Gavión	m2	195,50	$ 705.560,00		Prog			195,50			195,50	100,00%
					Ejec			195,50			**195,50**	100,00%
Muro Gavión K2+870	m3	130,00	$ 53.040.130,00		Prog			130,00			130,00	100,00%
					Ejec			9,00			**26,00**	20,00%
Filtro Francés	ml	240,00	$ 67.481.750,00		Prog	100,00	30,00	60,00	50,00		240,00	100,00%
					Ejec							
Muro de contención K0+397	und	1,00			Prog	1,00					1,00	100,00%
					Ejec	0,95					**0,95**	95,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Motoniveladora	1	
Compresor (Barrido y/o soplado de la superficie pavimento)	1	
Total	**5**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+000 - K1+100
TRAMO Y/O SECTOR 2: K1+200 - K2+200
TRAMO Y/O SECTOR 3: K2+200 - K3+300
TRAMO Y/O SECTOR 4: K3+300 - K4+400
TRAMO Y/O SECTOR 5: K4+400 - K5+500

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	DISPONIBLE SI	DISPONIBLE NO
UBICACIÓN: Mina San Pedro — Arriero Cocadiel		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN: Concesión de agua San Pedro — Arriero Cocadiel		PERMISO MINERO:	SI X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONES: El Proyecto no requierió de permisos ambientales ante la respectiva CAR.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: El Proyecto no requierió de permisos ambientales ante la respectiva CAR.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Esta Interventoría no cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto, desde el mes de Julio de 2023 hasta la fecha. De acuerdo al estado del proyecto se tiene Programado un avance de obra del 82,29%, sin embargo se ha ejecutado 68,96% evidenciando un at raso en el avance del 13,33%.

OBSERVACIONES: Esta Interventoría no cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto, desde el mes de Julio de 2023 hasta la fecha. De acuerdo al e stado del proyecto se tiene Programado un avance de obra del 82,29%, sin embargo se ha ejecutado 68,96, evidenciando un atraso en el avance del 13,33%.

V. GESTIÓN SOCIAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	-
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Puesto de salud Vereda Aguas Claras
Se instala cartelera informativa con buzón de PQRS

OBSERVACIONES:
CONTRATISTA:
* El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fresno remitió el oficio No. 365 donde notifica el fallo de la acción de tutela Rad. 2024-00083 promovida por el Señor HECTOR BERNARDO ESCUCHA contra CONSORCIO FRESNO I.C, CONSORCIO INTERMUNICIPIOS, ALCALDIA MUNICIPAL DE FRESNO Y SECRETARIA DE PLANEACION DE FRESNO.

INTERVENTORÍA:
* Se radica al contratista la comunicación CIM-2247-21-1133-21-239 del 22-may-2024 donde se reitera el requerimiento de gestión y respuesta a las manifestaciones ciudadanas que se encuentran abiertas a la fecha.
* Se gestiona comunicación de respuesta al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fresno sobre fallo de la tutela interpuesta por el señor Héctor B. Escucha y comunicación al contratista sobre este tema.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere Gestión Predial.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ÍTEM	UND	CANTIDAD	%AVANCE
Construcción Placa Huella en concreto	ml	-	-
Construcción de Alcantarillas	und	-	-
Actividades de mejoramiento periódico	m2	-	-
Localización y replanteo Muro en Gavión K2+870	und	-	-
Muro en Gavión K2+870	m3	26,00	20,00
Muro de contención K0+397	und	-	-

1. K2+870 Muro gavión. Conformación de canastas y elaboración gaviones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


ÍTEM	UND	CANTIDAD	%AVANCE
Construcción Placa Huella en concreto	ml		
Construcción de Alcantarillas	und	-	-
Actividades de mejoramiento periódico	m2	-	-
Localización y replanteo Muro en Gavión K2+870	und	-	-
Muro en Gavión K2+870	m3	20,00	15,40
Muro de contención K0+397	und	-	-

1. K2+870 Muro gavión - Continuar con la conformación de canastas y elaboración gaviones

2. Reparación de fisuras pendiente en placa huella.

3. K0+447 Construcción cunetas y bordillos -completar.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





K2+870 Ml Muro Gavión - Armado de gaviones trabados y amarrados con alambrón









K2+870 Ml Muro Gavión - Armado de gaviones trabados y amarrados con alambrón





NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. La Interventoría realiza supervisión de la obra.
2. Personal Ingeniero residente de obra, 1 maestro, 1 oficial y 6 ayudantes .
3. Durante la semana comprendida entre el 17 de mayo al 23 de mayo no se han presentrado lluvias. Dias soleados.
4. El Contratista no ha cumplido con la totalidad de los compromisos pactados Reunión 26.abr-2024, por lo que nuevamente se le oficiará con el fin de que cumpla con lo requerido en anteriores comunicaciones.
5. Se envió comunicación al contratista CIM-2247-21-1133-21-239 del 22-05-2024 -Tercera reiteración de Gestión peticiones abiertas, ya que la interventoría considera de carácter prioritario dar respuesta a esta comunicación por parte del Consorcio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **MARISOL AMAYA CORREA**
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SECTOR VEREDAS CALICHAL - AGUAS CLARAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 109 (Numeración consecutiva) del 24-may-24 al 30-may-24 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. Leon Tito Mendoza Peña — GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO: Ing. Diego Fernando Caicedo Castro

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURAL EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 1103 - 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCION DE SIETE (7) ALCANTARILLAS, CONSTRUCCION APROXIMADA DE 3.131ML DE PLACA HUELLA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 3.131 ML DE PLACA HUELLAS DISTRIBUIDOS EN 9 TRAMOS EN PUNTOS CRITICOS ENTRE EL K0+000 Y EL K5+500, EL DISEÑO DE LA PLACA HUELLA CONSISTE EN UN ANCHO DE 5 MTS QUE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA; BORDILLOS DE 0.1 M, CUNETAS DE 0.7 M, SOBREANCHO VARIABLE EN CONCRETO CICLOPEO DE 0.35 M, PLACAHUELLAS DE 0.90 M Y UNA SECCION DE CONCRETO CICLOPEO CENTRAL DE 0.90 M. EL PROYECTO TAMBIEN CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 7 ALCANTARILLAS EN ESE MISMO TRAMO, Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE CONFORMACION DE CALZADA Y APLICACION DE AFIRMADO EN PUNTOS CRITICOS ESPECIFICOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO FRESNO IC
INTEGRANTES: INGENIERIA Y MINERIA INGEMIN S.A.S. JUAN FRANCO CASTAÑEDA

CONTRATO No.	007-OBRA-13 DE MARZO 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.046.192.741,00
FECHA DE INICIO:	29 DE ABRIL 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 4.046.192.741,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PLAZO VIGENTE (días):	SESENTA Y UNO		
PLAZO TOTAL ACUMULADO (meses):	19 MESES, 4 DIAS		
PRÓRROGA (1). 23/12/2022, (meses):	TRES		
PRÓRROGA (2). 24/03/2023, (meses):	TRES		
PRÓRROGA (3). 15/04/2023, (días):	DOS (2)VEVE		
PRÓRROGA (4). 30/04/2023, (días):	DIANCE		
PRÓRROGA (5). 31/05/2023, (días):	TREINTA Y UNO		
PRÓRROGA (6). 31/07/2023, (días):	SESENTA Y UNO		
PRÓRROGA (7). 30/09/2023, (días):	SESENTA Y UNO		
PRÓRROGA (8). 31/10/2023, (días):	TREINTA Y UNO		
PRÓRROGA (9). 31/12/2023, (días):	SESENTA Y UNO		
SUSPENSIÓN N°1 (días) Desde 28-dic-23	TREINTA		
PRÓRROGA N°1 SUSPENSIÓN N°1: (días) 28-mar-24	SESENTA		
PRÓRROGA N°2 SUSPENSIÓN N°1: (días) 19-abr-24	VEINTITRES		
FECHA DE REINICIO:	20 DE ABRIL DE 20224		
PRÓRROGA (10). 30/7/2024, (días):	SETENTA Y CUATRO		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S ALCIRA PAEZ DURAN

CONTRATO No.	4247 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.716.988.701,00
FECHA DE INICIO:	4 de abril de 2022	VALOR ADICIONES:	$ 930.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 2.646.988.701,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de mayo de 2023	VALOR ANTICIPO:	$ 150.000.000,00
PRÓRROGA 1: Cinco meses	31-dic-2022	VALOR AMORTIZADO:	$ 150.000.000,00
PRÓRROGA 2: Cinco meses	31-may-2023	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA 3: Cinco meses	31-oct-2023		
PRÓRROGA 4: Dos meses	31-dic-2023		
PRÓRROGA 5: Dos meses	29-feb-2024		
SUSPENSIÓN N°1 (30 días)	27-feb-24 al 31-may-24		
REINICIO DE OBRA	1-abr-24		
PRÓRROGA 6: Un mes	3-may-24		
PRÓRROGA 7: Dos mes	3-jul-24		
PLAZO TOTAL ACUMULADO (meses)	ADICIONES		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.050.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.050.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 520.000.000	$ 1.196.988.701	$ 770.000.000	$ 160.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 520.000.000	$ 1.196.988.701	$ 770.000.000	$ 160.000.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.046.192.741,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.427.359.870,34	84,58%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.786.728.422,58	68,12%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 625.641.387,76	15,46%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.427.359.870,34	84,58%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.786.728.422,58	68,12%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 625.641.387,76	15,46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 61.901.590,59	3,70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.872.034,00	0,34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 198.312.538,81

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se ajustan los porcentajes de obra programada de acuerdo la Reprogramación Prórroga N°10 (3-jul-24).

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.646.988.701,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.545.183.443,27	96,15%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.781.821,90	100%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.781.821,90	100%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: abr-24
VALOR FACTURA: $ 27.127.287,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.618.477.096
Amortizado $	$ 1.104.799.137
Saldo $	$ 513.677.959

INDICADOR IC	
En el mes:	1,39
Acumulado:	0,91

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 150.000.000,00
Amortizado $	$ 150.000.000,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 84,58%
Meta Física Ejecutada %: 68,12%
Avance o Atraso Físico %: 15,46%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)
Construcción Placa Huella en concreto	ml	3131,00	$ 3.349.824.725,35	
Construcción de Alcantarillas	und	7,00	$ 151.877.890,00	
Actividades de mejoramiento periódico	m2	5038,12	$ 276.739.357,00	
Localización y replanteo Muro Gavión	m2	195,50	$ 705.560,00	
Muro Gavión K2+870	m3	130,00	$ 53.040.130,00	
Filtro Francés	ml	240,00	$ 67.481.750,00	
Muro de contención K0+397	und	1,00		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Total	%
Construcción Placa Huella en concreto	Prog	880,00	1020,00	290,00	220,00	721,00	3.131,00	100,00%
	Ejec	402,00	1020,00	220,00		540,00	**2.182,00**	69,69%
Construcción de Alcantarillas	Prog	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00%
	Ejec	1,00	2,00		1,00	1,00	**5,00**	71,43%
Actividades de mejoramiento periódico	Prog	1100,00	400,00	1350,00	1466,67	721,45	5.038,12	100,00%
	Ejec	1100,00	400,00	1350,00	1466,67	600,00	**4.916,67**	97,59%
Localización y replanteo Muro Gavión	Prog			195,50			195,50	100,00%
	Ejec			195,50			**195,50**	100,00%
Muro Gavión K2+870	Prog			130,00			130,00	100,00%
	Ejec			34,00			**60,00**	46,10%
Filtro Francés	Prog	100,00	30,00	60,00	50,00		240,00	100,00%
	Ejec							
Muro de contención K0+397	Prog	1,00					1,00	100,00%
	Ejec	0,95					**0,95**	95,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Motoniveladora	1	
Compresor (Barrido y/o soplado de la superficie pavimento)	1	
Total	**5**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+000 - K1+100
TRAMO Y/O SECTOR 2: K1+200 - K2+300
TRAMO Y/O SECTOR 3: K2+200 - K3+300
TRAMO Y/O SECTOR 4: K3+300 - K4+400
TRAMO Y/O SECTOR 5: K4+400 - K5+500

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Mina San Pedro Amarro Cocalito	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Concesión de agua San Pedro Amarro Cocalito	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: El Proyecto no requierió de permisos ambientales ante la respectiva CAR.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: El Proyecto no requierió de permisos ambientales ante la respectiva CAR.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Esta Interventoría no cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto, desde el mes de Julio de 2023 hasta la fecha. De acuerdo al estado del proyecto se tiene Programado un avance de obra del 82,29%, sin embargo se ha ejecutado 68,96% evidenciando un at raso en el avance del 13,33%.

OBSERVACIONES: Esta Interventoría no cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto, desde el mes de Julio de 2023 hasta la fecha. De acuerdo al e stado del proyecto se tiene Programado un avance de obra del 82,29%, sin embargo se ha ejecutado 68,96, evidenciando un atraso en el avance del 13,33%.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	-
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Puesto de salud Vereda Aguas Claras
Se instala cartelera informativa con buzón de PQRS

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
* Se presenta el informe mensual de la gestión social correspondiente al mes de mayo.
* Sobre el oficio No. 365 radicado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fresno remitió donde notifica el fallo de la acción de tutela Rad. 2024-00083 promueda por el Señor HECTOR BERNARDO ESCUCHA, el contratista radica oficio de respuesta al peticionario el día 28 -may-2024.

INTERVENTORÍA:
* Se radica la comunicación CIM-2247-21-1133-21-241 como respuesta al derecho de petición presentado por el señor Héctor Escucha y atendiendo el fallo del 22-may-2024 presentado por el Juzgado 01 Promiscuo Municipal de Fresno.
* Con el oficio CIM-2247-21-121 se radica el informe trimestral N°8 de la gestión social, radicado N°2024E-VUVRAZ-049244 del 31-may-2024 por Atención al Ciudadano - INVIAS.
* Elaboración del informe mensual N°26 - MAYO.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere Gestión Predial.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ÍTEM	UND	CANTIDAD	%AVANCE
Construcción Placa Huella en concreto	ml	-	-
Construcción de Alcantarillas	und	-	-
Actividades de mejoramiento periódico	m2	-	-
Localización y replanteo Muro en Gavión K2+870	und	-	-
Muro en Gavión K2+870	m3	34,00	46,15
Muro de contención K0+397	und	-	-


1. K2+870 Muro gavión. Conformación de canastas y elaboración gaviones. Construcción muro
2.K0+450 al K0+630 Construcción bordillos y cunetas, reinicio esta actividad para completar áreas faltantes.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ÍTEM	UND	CANTIDAD	%AVANCE
Construcción Placa Huella en concreto	ml		
Construcción de Alcantarillas	und	-	-
Actividades de mejoramiento periódico	m2	-	-
Localización y replanteo Muro en Gavión K2+870	und	-	-
Muro en Gavión K2+870	m3	18,00	13,84
Muro de contención K0+397	und	-	-

1. K2+870 Muro gavión - Continuar con la conformación de canastas y elaboración gaviones
2. Reparación de fisuras pendiente en placa huella.
3. K0+450 al K0+630 Construcción cunetas y bordillos - terminar la actividad para completar áreas faltantes.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






K2+870 MI Muro Gavión - Armado de gaviones trabados y amarrados con alambrón






K0+450 al K0+630 - Construcción bordillos y cunetas, reinicio esta actividad para completar áreas faltantes.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. La interventoría realiza supervisión de la obra.
2. Personal Ingeniero residente de obra, SST, 1 maestro, 2 oficiales y 8 ayudantes .
3. Durante la semana comprendida entre el 24 de mayo al 30 de mayo no se han presentado lluvias - Dias soleados.
4. El Contratista no ha cumplido con la totalidad de los compromisos pactados Reunión 26.abr-2024, por lo que nuevamente se le oficiará con el fin de que cumpla con lo requerido en anteriores comunicaciones.
5. Se envió comunicación a la Alcaldía del municipio de Fresno CIM-2247-21-1133-21-242 del 24-05-2024 -Solicitud aplicación sanciones Contrato de Obra No.167 de 2022 Convenio 1133-2021, debido a la falta de respuesta a los requerimientos y el incumplimiento reiterado del Contratista Consorcio Fresno IC.
6. Con la comunicación CIM-2247-21-1133-21-241 del 24-05-2024, se dió respueta al fallo de tutela del Sr. Héctor Escucha, donde solcita la cancelación del alquiler de maquinaria por parte del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **MARISOL AMAYA CORREA**
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND

ANEXO 2

Maquinaria y Equipo – Formato - MEPI-MN1-IN-15-FR-4

Anexo 2.1 Alpujarra
Anexo 2.2 Fresno
Anexo 2.3 Valle de San Juan
Anexo 2.4 Flandes
Anexo 2.5 Melgar

ANEXO 2.1 MUNICIPIO DE ALPUJARRA

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** VIA LAS DELICIAS-ALPUJARRA

CONTRATO No. 050 de 2022 **CONTRATISTA:** ARNULFO HERNÁN ARIAS DÍAZ

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2247-2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motoniveladora	DRESSER A450e																																	
Vibro compactador	RayGo	10 TON																																
Finisher	HYPAC																																	
Retrocargador	KOMAT																																	
Volqueta				I	A	I	I	A	I	I	I	I	A	I																				
Mezcladora				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																				
Vibro de concreto				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																				
Estación Topografica																																		
Nivel de precisión																																		
Camioneta				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																				
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			TOTAL ACTIVO	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	7	6	7	7	6	7	7	7	7	6	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,0	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	1,2	12%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0,0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	8,8	88%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: 1. MOTO NIVELADORA: No se encuentra en la obra.
2. VIBROCOMPACTADOR: Desdeel 29/feb/2024 no se encuentra en obra
3. FINISHER: No se encuentra en obra.
4. RETROEXCAVADORA: En el mes de mayo 2024. No se encuentra en obra.
5. MEZCLADORA DE CONCRETO: Se entra en obra desde el 1 -may-2024 hasta 11-may-2024. En obra once (11) dias
6. VIBRO DE COMCRETO: Se entra en obra desde el 1-may/2024 hasta 11-may-2024.
7. Estación topográfica y nivel: Permanece inactiva porque no se realizaron labores de topografía.
8. CAMIONETA: Se entra en obra desde el 1 -/may-2024 hasta 11-may-2024.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.


3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.

4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.



Firma
Nombre: Arnulfo Hernan Arias Diaz
Residente de obra
Matrícula Profesional No.: 70202-173944 TLM



Firma
Nombre: Faver Arvey Garcia M.
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-184027 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 2.2 MUNICIPIO DE FRESNO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 1133 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE

CONTRATO No. 167 **CONTRATISTA:** CONSORCIO FRESNO IC

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2247-2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Motoniveladora			Tramo de ejecución									I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrocompactador			Tramo de ejecución									I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Retroexcavadora			Tramo de ejecución									I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Volqueta			Tramo de ejecución									I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Equipo Topográfico			Tramo de ejecución									I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mezcladora			Tramo de ejecución									I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cortadora de concreto			Tramo de ejecución									I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrador de concreto			Tramo de ejecución									I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
			TOTAL ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	8	100

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Se encuentra la maquinaria inactiva, toda vez que se realizan actividades de construcción de gaviones para muro-gavión K2+870 , inicio construcción bordillos y cunetas .K0+450 al K0+630 y actividades de orden administrativo en marco del objeto contractual. Así mismo, se presentaron fuertes lluvias.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: LA OBRA ESTUVO INACTIVA DESDE EL 3 AL 8 DE MAYO DE 2024. Se presentaron fuertes lluvias en el sector. Se reinció obra el 9 de mayode 20-abr-24,

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Edison Torres Peralta
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-137684 TLM

Firma
Nombre: Luz Betty Morad Forero
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-29767 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 3

Personal, Control Parafiscales Obra – FORMATO MEPI-MN1-IN-15-6

Anexo 3.1 Alpujarra
Anexo 3.2 Fresno
Anexo 3.3 Valle de San Juan
Anexo 3.4 Flandes
Anexo 3.5 Melgar

ANEXO 3.1 MUNICIPIO DE ALPUJARRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/05/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 050 DE 2022 **CONTRATISTA:** ARNULFO HERNÁN ARIAS DÍAZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** VÍA LAS DELICIAS ALPUJARRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2247-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

NOMBRE ARL: Positiva Compañía de Seguros **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Comfenalco Tolima

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ	1.110.443.738	Representante Legal	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ARNULFO HERNAN	$ 1.300.000	$ 90.500	V	Nueva EPS	78200608	$ 162.500	PORVENIR	77439940	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
2	PEÑA ORDOÑEZ OSCAR RODRIGO	7.686.507	Operario de finisher	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	WGI CONSTRUCCI	$ 1.300.000	$ 90.500	V	Sanitas	9465967103	$ 162.500	Colfondos	9469818623	$ 208.000	$ 52.000	$ 65.000		
3	SAIZ CHIMBACO ISRAEL	7.688.634	Operario de vibrocompactador	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	WGI CONSTRUCCI	$ 1.300.000	$ 90.500	V	Nueva E.P.S	9465967103	$ 162.500	Colfondos	9469818623	$ 208.000	$ 52.000	$ 65.000		
4	SAIZ TORRES JHON EDINSON	1.075.318.930	Conductor	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	WGI CONSTRUCCI	$ 1.300.000	$ 90.500	V	Nueva E.P.S	9465967103	$ 162.500	Porvenir	9469818623	$ 208.000	$ 52.000	$ 65.000		
5	SAIZ TORRES WALTER	1.076.500.131	Ayudantes	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	WGI CONSTRUCCI	$ 1.300.000	$ 90.500	V	Nueva E.P.S	9465967103	$ 162.500	Porvenir	9469818623	$ 208.000	$ 52.000	$ 65.000		
6	SOTO FANDIÑO JOSE OTONIE	12.125.605	Ayudantes	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	WGI CONSTRUCCI	$ 1.300.000	$ 90.500	V	Nueva E.P.S	9465967103	$ 162.500	Porvenir	9469818623	$ 208.000	$ 52.000	$ 65.000		
7	SOTO FANDIÑO JOSE GILDARDO	12.137.732	Ayudantes	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	WGI CONSTRUCCI	$ 1.300.000	$ 90.500	V	Sanitas	9465967103	$ 162.500	Porvenir	9469818623	$ 208.000	$ 52.000	$ 65.000		
8	SOTTO FANDIÑO RUBEN DARIO	7.694.375	Ayudantes	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	WGI CONSTRUCCI	$ 1.300.000	$ 90.500	V	Nueva E.P.S	9465967103	$ 162.500	Colfondos	9469818623	$ 208.000	$ 52.000	$ 65.000		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Se realizan las siguientes solicitudes al contratista con los siguientes comunicados:
• Comunicado CIM-2247-21-1131-21-365 (23-05-2024)- "Solicitud presentación formatos Informe Mensual Mayo de 2024"

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Arnulfo Hernán Arias Díaz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-173944 TLM

Firma
Nombre: Marisol Arroyave Cortes
Directora de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1110443738	ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ	Cra 7 No 9 43 Of 401	2684342	ingearias27@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	17/06/2024	77439940	$488.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162.500	0		0		0	4	600	0	163.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	4	700	0	208.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	90.500				90.500	4	300	90.800			905	90.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF48	Comfatolima	800211025-1	26.000	4	100	26.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	163.100
Pensión	1	208.000	208.700
Riesgos Laborales	1	90.500	90.800
CCF	1	26.000	26.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	487.000	488.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1110443738	ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ		Cra 7 No 9 43 Of 401	2684342	ingearias27@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	17/06/2024	77439940	$488.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1110443738	ARIAS DIAZ ARNULFO HERNAN	57	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF48	1.300.000	26.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901503933	4	WGI CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8C 38 54	NEIVA-HUILA	8773793	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	590829011	9465967103	E	2024/05/09	2024/04/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,046,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	7686507	PEÑA ORDOÑEZ OSCAR RODRIGO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
2	CC	7688634	SAIZ CHIMBACO ISRAEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
3	CC	1075318930	SAIZ TORRES JHON EDINSON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
4	CC	1076500131	SAIZ TORRES WALTER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
5	CC	12125605	SOTO FANDIÑO JOSE OTONIEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
6	CC	12137732	SOTO FANDIÑO JOSE GILDARDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
7	CC	7694375	SOTTO FANDIÑO RUBEN DARIO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
Total	**Afiliados(7)**					$9,100,000	$1,456,000			$9,100,000	$1,137,500			$9,100,000	$364,000			$9,100,000	$633,500		$9,100,000	$455,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,456,000	$0	$0	$1,456,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$416,000	$0	$0	$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$832,000	$0	$0	$832,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$633,500	$0	$0	$633,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$633,500	$0	$0	$633,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$364,000	$0	$0	$364,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	$364,000	$0	$0	$364,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,137,500	$0	$0	$1,137,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$812,500	$0	$0	$812,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$325,000	$0	$0	$325,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$273,000	$0	$0	$273,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$273,000	$0	$0	$273,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$182,000	$0	$0	$182,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$182,000	$0	$0	$182,000
TOTAL				**7**	**$4,046,000**	**$0**	**$0**	**$4,046,000**

ANEXO 3.2 MUNICIPIO DE FRESNO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 167-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO FRESNO IC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 1133 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2247-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

NOMBRE ARL: Axa Colpatria **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Comfatolima

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF		
1	Diego Perez Beltrán	1.110.532.040	Topógrafo		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Diego Perez Beltrán	$ 1.198.667	$ 83.500	V	Salud Total		$ 149.900	Colfondos		$ 191.800	N.A	N.A	N.A		
2	Edison Torres Peralta	5.823.248	Ingeniero Residente de Obra		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Edison Torres Peralta	$ 1.198.667	$ 83.500	V	Nueva EPS		$ 149.900	Porvenir		$ 191.800	N.A	N.A	N.A		
3	Karen I. Bustos Cardenas	1.108.232.403	Ingeniero Auxiliar		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Karen I. Bustos Cardenas	$ 1.198.667	$ 83.500	V	Sanitas		$ 149.900	Porvenir		$ 191.800	N.A	N.A	N.A		
4	Luisa Fernanda Morales	1.010.135.236	Aux. SST-Social		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Luisa Fernanda Morales	$ 1.198.667	$ 83.500	V	Salud Total		$ 149.900	Porvenir		$ 191.800	N.A	N.A	N.A		
5	Jhon Fredy Murillo Olivera	14.137.931	Maestro de obra		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Alexander Calle	$ 1.198.667	$ 83.500	V	Salud Total		$ 149.900	Porvenir		$ 191.800	N.A	N.A	N.A		
6	Luis Armando Hernandez Gutierrez	5.825.367	Aux. Obra		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Fresno IC	$ 1.198.667	$ 83.500	V	Nueva Eps		$ 48.000	Porvenir		$ 191.800	$ 48.000	N.A	N.A		
7	Jose Valencia Acosta	1.056.772.934	Aux. Obra		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Fresno IC	$ 1.198.667	$ 83.500	V	Sanitas		$ 48.000	Porvenir		$ 191.800	$ 48.000	N.A	N.A		
8	Luis Hernandez Gutierrez	5.825.367	Aux. Obra		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Fresno IC	$ 1.198.667	$ 83.500	V	Salud Total		$ 48.000	Porvenir		$ 191.800	$ 48.000	N.A	N.A		
9	Luis Alba Hernandez	93.381.030	Ofi. Obra		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Fresno IC	$ 1.198.667	$ 83.500	V	Nueva Empresa Promotor de		$ 48.000	Porvenir		$ 191.800	$ 48.000	N.A	N.A		
10	Elias Esquivel Acosta	1.046.405.214	Ofi. Obra		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Fresno IC	$ 1.198.667	$ 83.500	V	Nueva Eps		$ 48.000	Porvenir		$ 191.800	$ 48.000	N.A	N.A		
11	Jose Hernandez Castro	93.237.997	Ofi. Obra		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Fresno IC	$ 1.198.667	$ 83.500	V	Salud Total		$ 48.000	Protección		$ 191.800	$ 48.000	N.A	N.A		
12	Ever Marino Melo	10.549.817	Maestro de obra		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Fresno IC	$ 1.198.667	$ 83.500	V	Salud Total		$ 48.000	Porvenir		$ 191.800	$ 48.000	N.A	N.A		
13	Donaldo Amariz Ospino	6.795.129	Ofi. Obra		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Fresno IC	$ 1.198.667	$ 83.500	V	EPS Sanitas		$ 48.000	Porvenir		$ 191.800	$ 48.000	N.A	N.A		
14	Jhoynys Alexis Varon	1.005.766.842	Ayudante Obra		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Fresno IC	$ 1.198.667	$ 83.500	V	Nueva Eps		$ 48.000	Porvenir		$ 191.800	$ 48.000	N.A	N.A		
15	Luis German Blanco	15.668.057	Ayudante Obra		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Fresno IC	$ 1.198.667	$ 83.500	V	Nueva Eps		$ 48.000	Porvenir		$ 191.800	$ 48.000	N.A	N.A		
16	Brayan Estiben Guzman	1.106.738.393	Ayudante Obra		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Fresno IC	$ 1.198.667	$ 83.500	V	Salud Total		$ 48.000	Colpensiones		$ 191.800	$ 48.000	N.A	N.A		
17	Duvan Felipe Varon	1.005.849.347	Ayudante Obra		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Fresno IC	$ 1.198.667	$ 83.500	V	Nueva Eps		$ 48.000	Protección		$ 191.800	$ 48.000	N.A	N.A		
18	Ermides Garaviño	5.916.632	Ayudante Obra		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Fresno IC	$ 1.198.667	$ 83.500	V	Nueva Eps		$ 48.000	Porvenir		$ 191.800	$ 48.000	N.A	N.A		
19	Jolman Estiven Varon	1.106.738.720	Ayudante Obra		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Fresno IC	$ 1.198.667	$ 83.500	V	Nueva Eps		$ 48.000	Porvenir		$ 191.800	$ 48.000	N.A	N.A		
20	Jorge Anibal Garcia	1.105.683.979	Ayudante Obra		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Fresno IC	$ 1.198.667	$ 83.500	V	Nueva Eps		$ 48.000	Porvenir		$ 191.800	$ 48.000	N.A	N.A		
21	Vladimir Rodriguez	1.106.739.239	Ayudante Obra		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Fresno IC	$ 1.198.667	$ 83.500	V	Nueva Eps		$ 48.000	Porvenir		$ 191.800	$ 48.000	N.A	N.A		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
El contratista no aportó las planillas de pago del mes de mayo 2024.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Edison Torres Peralta
Residente de Obra
Matricula Profesional No.: 70202-137684 TLM

Firma
Nombre: Marisol Anaya Correa
Directora de Interventoría
Matricula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 4

Informe Financiero Obra – Formato – MEPI-MN1-IN-15-8

Anexo 4.1 Alpujarra
Anexo 4.2 Fresno
Anexo 4.3 Valle de San Juan
Anexo 4.4 Flandes

ANEXO 4.1 MUNICIPIO DE ALPUJARRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 050 DE 2022 **CONTRATISTA:** ARNULFO HERNÁN ARIAS DÍAZ

MES INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** VIA LAS DELICIAS-ALPUJARRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247 -2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	2022000171	Infraestructura Red Vial Regional	2.3.2.02.005	Transferencias de Capital de Otras Entidades del Gobierno General	050 de 2022	$1.000.000.000,00	$1.000.000.000,00
2022	2022000171	Infraestructura Red Vial Regional	2.3.2.02.005		050 de 2022	$3.045.951.044,98	$3.045.951.044,98
TOTAL						$4.045.951.044,98	$4.045.951.044,98

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$4.045.951.044,98**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	MAYO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.022.975.522		**$ 4.045.951.044,98**	**$ 4.045.951.044,98**				
2	PARCIAL	JUNIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.022.975.522							
3	PARCIAL	JULIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.022.975.522							
4	PARCIAL	AGOSTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.022.975.522							
5	PARCIAL	SEPTIEMBRE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.022.975.522							
6	PARCIAL	OCTUBRE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.022.975.522							
7	PARCIAL	NOVIEMBRE	$ 468.647.547	$ 2.375.000	$ 471.022.547	$ 222.975.522,49	$ 248.047.025	$ 1.800.000.000		$ 3.574.928.497,51	$ 3.574.928.497,51	28/11/2022	X		
8	PARCIAL	DICIEMBRE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.800.000.000		$ 3.574.928.497,51	$ 3.574.928.497,51				
9	PARCIAL	ENERO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.800.000.000		$ 3.574.928.497,51	$ 3.574.928.497,51				
10	PARCIAL	FEBRERO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.800.000.000		$ 3.574.928.497,51	$ 3.574.928.497,51				
11	PARCIAL	MARZO	$ 749.347.102	$ -	$ 1.220.369.649	$ 416.303.946	$ 333.043.156	$ 1.383.696.054		$ 2.825.581.396	$ 2.825.581.396	28/03/2023	X		
12	PARCIAL	ABRIL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.383.696.054		$ 2.825.581.396	$ 2.825.581.396				
13	PARCIAL	MAYO	$ 497.738.533,00	$ -	$ 1.718.108.182	$ 276.521.408	$ 221.217.125	$ 1.107.174.646		$ 2.327.842.863	$ 2.327.842.863				
14	PARCIAL	JUNIO	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1.107.174.646		$ 2.327.842.863	$ 2.327.842.863	28/06/2023	X		
15	PARCIAL	JULIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.107.174.646		$ 2.327.842.863	$ 2.327.842.863				
16	PARCIAL	AGOSTO	$ 409.993.767,07	$ -	$ 2.128.101.950	$ 227.774.316	$ 182.219.451	$ 879.400.330		$ 1.917.849.095	$ 1.917.849.095	31/08/2023	X		
17	PARCIAL	SEPTIEMBRE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 879.400.330		$ 1.917.849.095	$ 1.917.849.095				
18	PARCIAL	OCTUBRE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 879.400.330		$ 1.917.849.095	$ 1.917.849.095				
19	PARCIAL	OCTUBRE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 879.400.330		$ 1.917.849.095	$ 1.917.849.095				
20	PARCIAL	NOVIEMBRE	$ -	$ -	$ -	-$ 79.524.218	$ 79.524.219	$ 958.924.548		$ 1.917.849.095	$ 1.917.849.095				
21	PARCIAL	DICIEMBRE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 958.924.547,7		$ 1.917.849.095	$ 1.917.849.095				
22	PARCIAL	FEBRERO	$ 1.129.989.674,13	$ -	$ 3.258.091.624	$ 564.994.837	$ 564.994.837	$ 393.929.710,7		$ 787.859.421	$ 787.859.421	3/04/2024			
23	PARCIAL	ABRIL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 393.929.710,7		$ 787.859.421	$ 787.859.421				
24	PARCIAL	MAYO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 393.929.710,7		$ 787.859.421	$ 787.859.421				El contratista no ha presentado acta parcial
															El contratista no ha presentado acta parcial
TOTALES			**$ 2.125.726.950**	**$ 2.375.000**	**$ 3.258.091.624**	**$ 1.629.045.811,8**	**$ 1.629.045.813**	**$ 393.929.710,7**							

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 4.031.076.044,98		**$ 4.031.076.045**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			**$ -**
AJUSTES			**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 12.500.000,00	$ 2.375.000,00	**$ 14.875.000**
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD		$ -	**$ -**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			**$ -**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			**$ -**
VALOR TOTAL	**$ 4.043.576.044,98**	**$ 2.375.000,00**	**$ 4.045.951.044,98**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Boanerjes Caicedo Pedrero
Director de obra
Matrícula Profesional No.: 25202-70943 CND

Firma
Nombre: MARISOL AMAYA CORREA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 4.2 MUNICIPIO DE FRESNO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 167-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO FRESNO IC

MES INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 1133 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2247 -2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	322	Servicios de la construcción	2.3.2.02.02.005	23500000	Contrato de Obra No. 167 - 2022	$ 4.046.192.741,00	$ -
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		N/A	N/A	N/A	N/A		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		N/A	N/A	N/A	N/A		
TOTAL						$ 4.046.192.741,00	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.046.192.741,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
6		18/10/2022	$ 481.911.793,00	$ -	$ 481.911.793,00	$ 192.764.717,20	$ 289.147.075,80	$ 1.425.712.379,20	322-2022	$ 2.138.568.569	$ 2.138.568.569				
9		31/01/2023	$ 722.603.579,00	$ -	$ 1.204.515.372,00	$ 289.041.431,60	$ 433.562.147,40	$ 1.136.670.947,60	322-2022	$ 1.705.006.421	$ 1.705.006.421				
11		30/03/2023	$ 445.913.968,00	$ -	$ 1.650.429.340,00	$ 178.365.587,20	$ 267.548.380,80	$ 958.305.360,40	322-2022	$ 1.437.458.041	$ 1.437.458.041				
12		30/04/2023	$ 440.904.430,00	$ -	$ 2.091.333.770,00	$ 176.361.772,00	$ 264.542.658,00	$ 781.943.588,40	322-2022	$ 1.172.915.383	$ 1.172.915.383				
14		30/06/2023	$ 257.655.051,51	$ -	$ 2.348.988.821,51	$ 103.062.020,60	$ 154.593.030,91	$ 678.881.567,80	322-2023	$ 1.018.322.352	$ 1.018.322.352				
16		2/08/2023	$ 214.696.482,25	$ -	$ 2.563.685.303,76	$ 85.878.592,90	$ 128.817.889,35	$ 593.002.974,90	322-2023	$ 889.504.462	$ 889.504.462				
17		30/09/2023	$ 198.312.538,80	$ -	$ 2.761.997.842,56	$ 79.325.015,52	$ 118.987.523,28	$ 513.677.959,38	322-2023	$ 770.516.939	$ 770.516.939				
TOTALES					**$ 2.761.997.842,56**			**$ 513.677.959,38**			**$ 770.516.939**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	$ 29.416.282,45		$ 29.416.282,45
AFIRMADO	$ 733.167.725,56		$ 733.167.725,56
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para placas, cunetas y bordillos	$ 863.293.835,78		$ 863.293.835,78
Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo)	$ 208.531.564,86		$ 208.531.564,86
Relleno para estructuras con material de excavación	$ 3.505.338,82		$ 3.505.338,82
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	$ 557.251.249,77		$ 557.251.249,77
Sello Asfáltico para Juntas.	$ -		$ -
Conformación de calzada Placa Huella.	$ 23.950.352,00		$ 23.950.352,00
Excavaciones varias en material común en seco	$ 4.790.775,26		$ 4.790.775,26
Rellenos para estructuras con material de excavacion	$ 2.867.297,69		$ 2.867.297,69
Concreto resistencia 14 MPA clase F	$ 8.825.855,81		$ 8.825.855,81
Concreto resistencia 21MPA clase D	$ 29.312.295,76		$ 29.312.295,76
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	$ 30.101.843,08		$ 30.101.843,08
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	$ 14.739.012,00		$ 14.739.012,00
Elementos de Bioseguridad	$ -	$ -	$ -
Obras de compensación ambiental y/o complementarios	$ -		$ -
Conformación de calzada	$ 4.849.343,00		$ 4.849.343,00
Afirmado	$ 188.977.175,00		$ 188.977.175,00
Localización y replanteo topografico	$ -		$ -
gavion	$ -		$ -
Filtro Frances	$ -		$ -
Aditivo acelerante para concreto	$ 51.934.678,76		$ 51.934.678,76
Baranda Metálica	$ -		$ -
Defensa Metálica	$ -		$ -
Concreto de 3000 psi Muro de Contención Elevación	$ 6.483.246,96		$ 6.483.246,96
VALOR TOTAL EJECUTADO			**$ 2.761.997.842,56**
VALOR TOTAL POR EJECUTAR			**$ 1.284.194.898,44**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Edison Torres Peralta
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-137684 TLM

Firma
Nombre: Marisol Amaya Correa
Director Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 5

Estado General Tiempo – Formato – MEPI-MN1-IN-15-10

Anexo 5.1 Alpujarra
Anexo 5.2 Fresno
Anexo 5.3 Valle de San Juan
Anexo 5.4 Flandes
Anexo 5.5 Melgar

ANEXO 5.1 MUNICIPIO DE ALPUJARRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 050 DE 2022 **CONTRATISTA:** ARNULFO HERNÁN ARIAS DÍAZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** VÍA LAS DELICIAS.ALPUJARRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2247 - 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	22	22	20	21	24	21	16	21	22	21	22	21	24	24	24	24	24	24	22	24	24	20	24	24	24	22	22	24	24	699
Lluvias moderadas	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	18
Lluvias intensas	0	0	0	2	4	0	0	3	8	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	27
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.


NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.


OBSERVACIONES: En el mes de febrero se presentaron lluvias moderadas; no hubo inconvenientes para la ejecución del proyecto.


Firma
Nombre: Arnulfo Hernan Arias Diaz
Residente de obra
Matrícula Profesional No.: 70202-173944 TLM

Firma
Nombre: Faver Arvey Garcia M.
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-184027 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

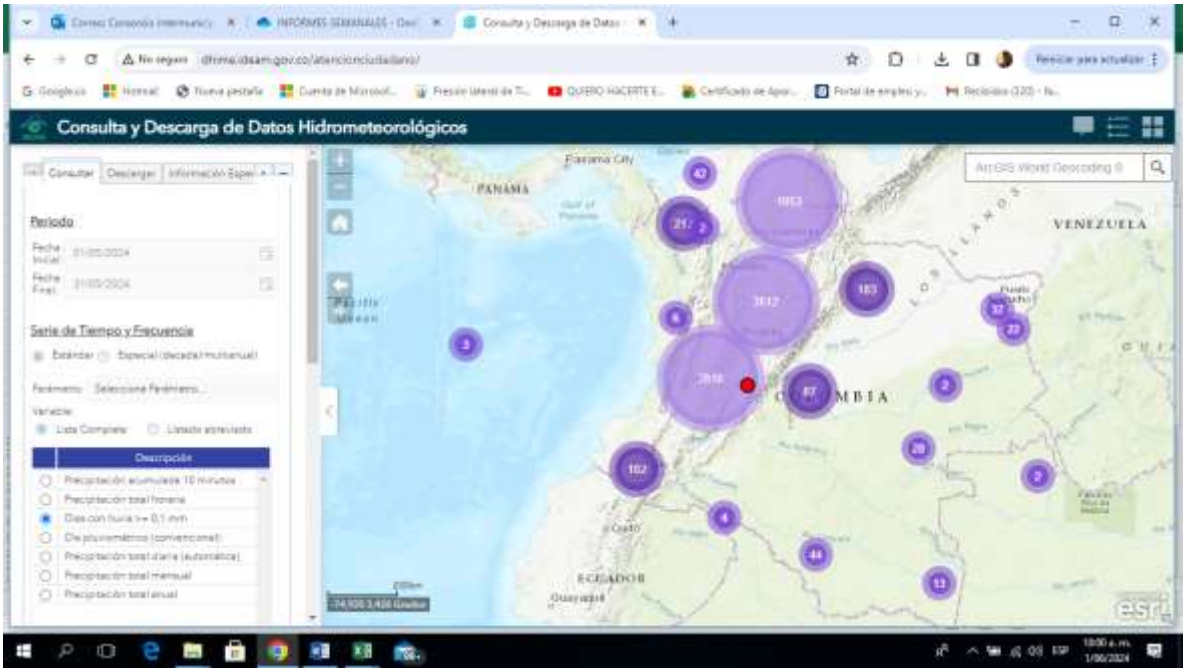
Consulta y Descarga de Datos Hidrometeorológicos
Periodo
Serie de Tiempo y Frecuencia
PANAMA
VENEZUELA
COLOMBIA
ECUADOR

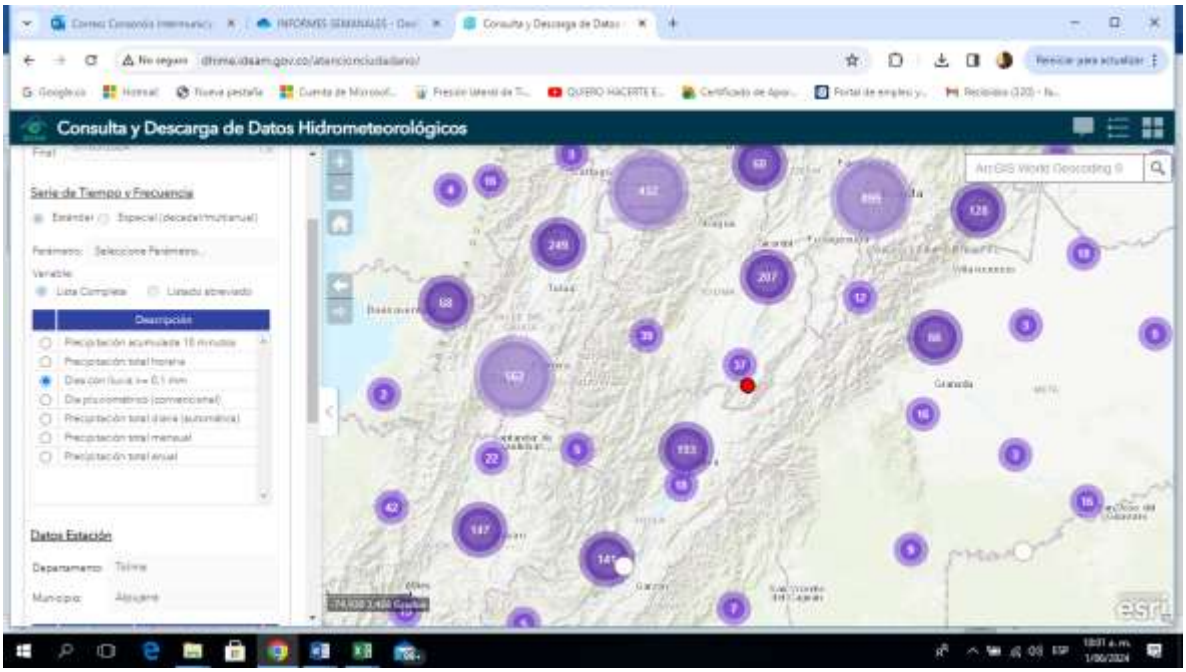
Consulta y Descarga de Datos Hidrometeorológicos
Serie de Tiempo y Frecuencia
Datos Estación

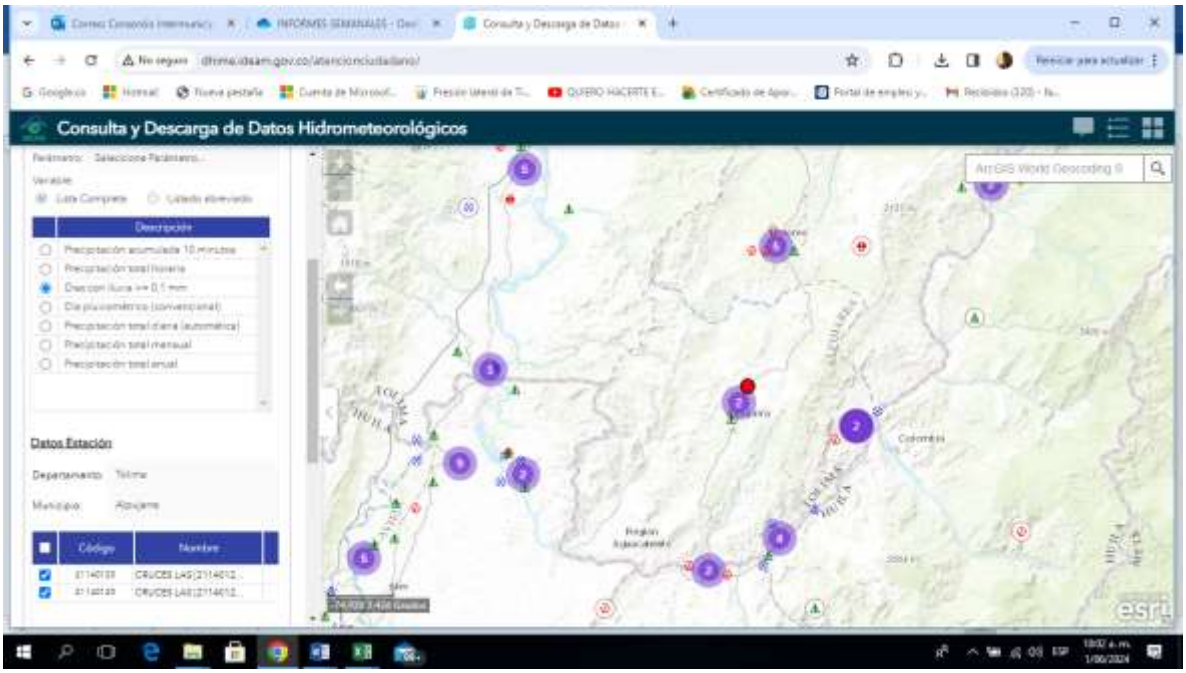
Consulta y Descarga de Datos Hidrometeorológicos
Descripción
Datos Estación
Departamento
Municipio
Código
Nombre

ANEXO 5.2 MUNICIPIO DE FRESNO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 167-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO FRESNO IC

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 1133 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2247 - 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
Seco	0	0	16	0	0	0	0	16	18	16	24	24	24	12	16	24	12	24	24	12	24	24	24	24	16	24	18	12	12	24	464
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0	8	4	0	8	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	8	8	0	55
Lluvias intensas	0	0	8	0	0	0	0	8	2	2	0	0	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	4	4	0	45
Total horas	0	0	24	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	12	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Los continuos efectos causados por la lluvia sobre la estructura de la vía ya conformada y nivelada para la construcción de la placa huella, generan reprocesos en la recuperación de los tramos a intervenir.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Edison Torres Peraltaa
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-137684 TLM

Firma
Nombre: Luz Betty Morad Forero
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-29767 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INFORME TÉCNICO DIARIO

IDEAM comunica al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Bogotá D. C. 31 de mayo de 2024
Hora de actualización 12:30 HLC

Boletín No.
152

IDEAM

CONTENIDO

Lo más destacado
Precipitación
Temperaturas
Alerta por descensos significativos de las temperaturas mínimas del aire
Condiciones Hidrometeorológicas actuales
Pronóstico de precipitación de las próximas 24 horas
Pronóstico condiciones meteorológicas adicionales
Alertas Hidrológicas
Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Deslizamientos
Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios
Alertas Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano
Alertas Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional
Alertas Meteomarinas por Ciclón Tropical Mar Caribe Colombiano

Alerta ROJA

PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

Alerta NARANJA

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

Alerta AMARILLA


PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Alertas vigentes hasta 31 de mayo de 2024 - 18:00 HLC.


Lo más destacado

Mapas de precipitación

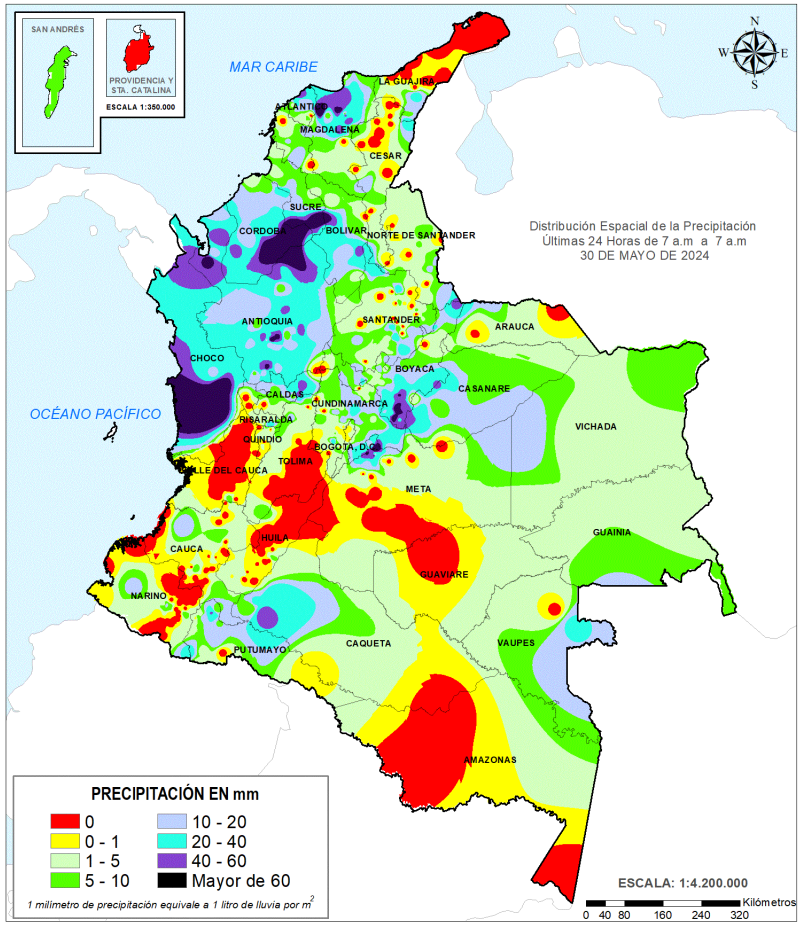

Precipitación diaria desde las 07:00 HLC del jueves 30, hasta las 07:00 HLC del viernes, 31 de mayo de 2024.

Fuente: IDEAM

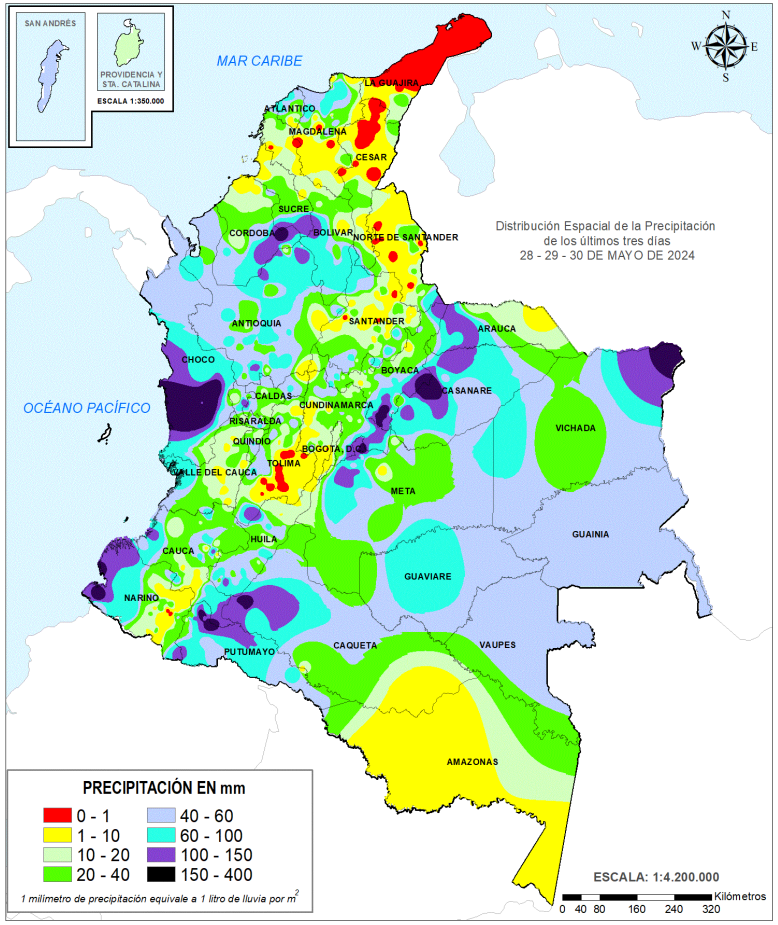

Precipitación últimas 72 horas desde las 07:00 HLC del martes 28, hasta las 07:00 HLC del viernes, 31 de mayo de 2024.

Fuente: IDEAM

- Un milímetro de lluvia (1 mm) equivale a un litro (1 L) de lluvia que ha caído en un metro cuadrado (1 m²). La lluvia acumulada es la suma de los milímetros de agua lluvia que se han registrado en un lapso de tiempo.

Lluvias registradas en las últimas 24 horas

Se ha observado un descenso ligero en los volúmenes de precipitación en todo el país en comparación con el día anterior. Las lluvias más relevantes se han presentado en algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Casanare, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Meta y Sucre. **El registro más alto** en un período de 24 horas se ha presentado en el municipio de **Medio San Juan (Chocó)**, con un total de **150.0 milímetros de lluvia.**

Alerta ROJA


- Por alta probabilidad de crecientes súbitas o niveles altos en las cuencas de los ríos que comprenden las zonas hidrográficas de Atrato - Darién, Caribe - Litoral, Medio Magdalena, Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge, Cauca, Nechí, Bajo Magdalena, Guaviare, Meta, Casanare, Arauca, Caquetá, Caguán, Patía, San Juán.
- Por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte De Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima, Valle Del Cauca.

Alerta NARANJA

- Por moderada probabilidad de crecientes súbitas o niveles altos en las cuencas de los ríos que comprenden las zonas hidrográficas de Atrato - Darién, Caribe - Litoral, Sinú, Caribe - Guajira, Catatumbo, Alto Magdalena, Medio Magdalena, Sogamoso, Cauca, Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge, Nechí, Cesar, Bajo Magdalena, Guaviare, Meta, Casanare, Arauca, Orinoco Directos, Caguán, Mira, Patía, Tapaje - Dagua - Directos, San Juán, Baudó - Directos Pacifico, Pacífico - Directos.
- Por moderada probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en municipios de los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte De Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle Del Cauca.
- Por moderada probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en algunos municipios del departamento de La Guajira.
- Por tiempo lluvioso en alginas zonas del mar Caribe.

Alertas amarillas e información más detallada para cada una de las categorías de alerta, remítase a la temática particular del informe.

Estimación Satelital (24 Horas)

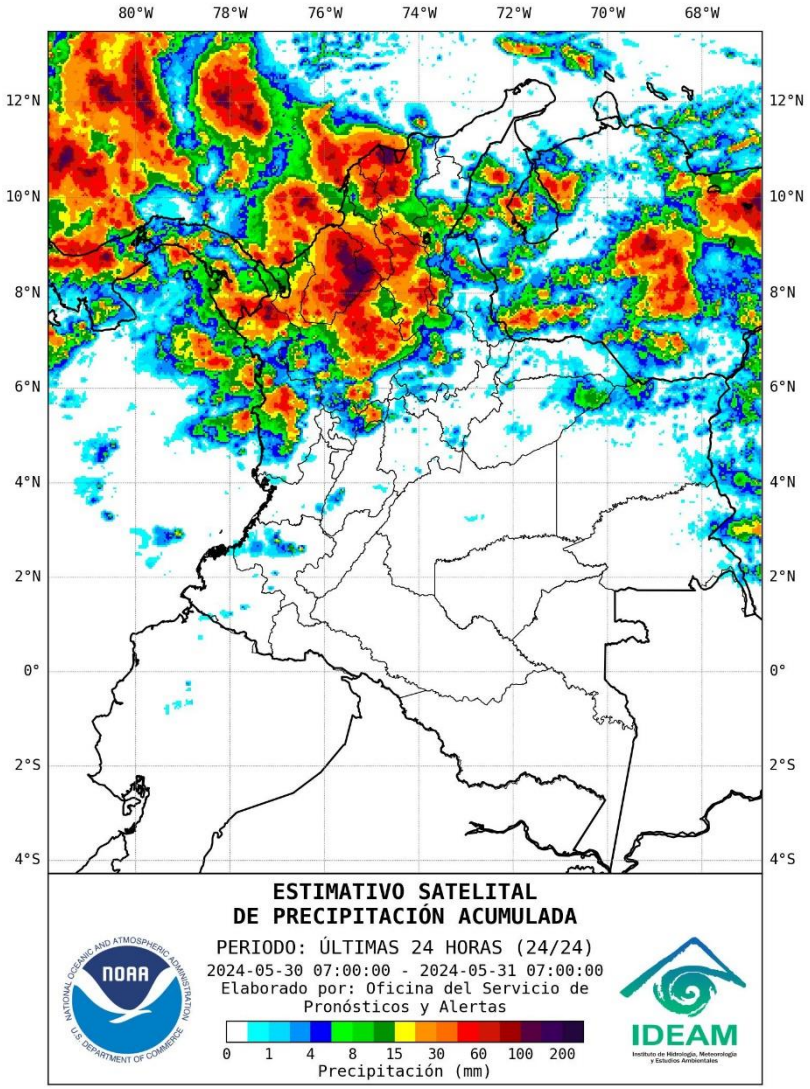

Precipitaciones

A continuación, los municipios donde se registraron precipitaciones iguales o superiores a 50,0 mm en las últimas 24 horas.


Aclaración: aunque los volúmenes de lluvia registrados en un municipio se relacionan con la ubicación de las estaciones de monitoreo del IDEAM, en ocasiones, dichas estaciones pueden estar distantes de los lugares en donde se concentra la mayor población o alejados de los centros municipales.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
ANTIOQUIA	Apto, Carepa (Los Cedros) (66.0), Bello (72.0), **Caucasia (111.0),** Cáceres (70.0), Girardota (62.0), Jericó (55.3), Medellín (20 Km En Línea Recta Al Occidente De La Ciudad) (51.0), Tarazá (55.0), Valparaíso (65.6).
ATLÁNTICO	Puerto Colombia (57.0).
BOYACÁ	Campohermoso (57.0), (83.5), Santa Maria (77.8), Zetaquira (60.3).
CASANARE	Sabanalarga (52.0).
CHOCÓ	**Condoto (115.0),** Istmina (63.0), Lloró (78.4), **Medio San Juan (150.0).**
CÓRDOBA	**Ayapel (117.5), La Apartada (125.0), Montelibano (120.0).**
CUNDINAMARCA	Guayabetal (62.0).
MAGDALENA	Ciénaga (55.2), El Reten (70.0), Remolino (85.0).
META	Restrepo (89.0), Villavicencio (Occidente de La Ciudad) (61.0).
SUCRE	**Majagual (96.0).**

NO SE REGISTRARON VALORES DE PRECIPITACIÓN POR ENCIMA DE LOS MÁXIMOS HISTÓRICOS

El hidroestimador utiliza datos de los satélites ambientales geoestacionarios operacionales (GOES) de NOAA para estimar las tasas de lluvia. Las estimaciones de las precipitaciones de los satélites pueden proporcionar información crítica sobre las precipitaciones en regiones donde los datos de los medidores o radares no están disponibles o no son confiables.

Estimativo Satelital de la Temperatura Superficial

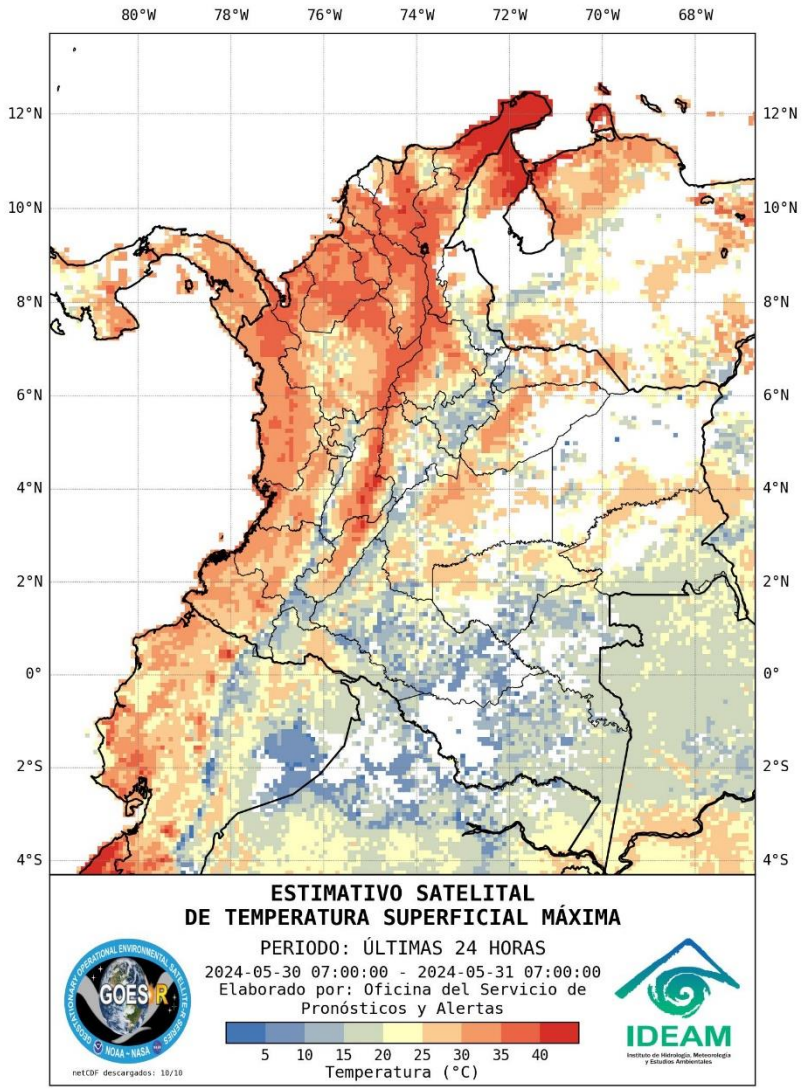

Temperaturas Máximas

A continuación, los municipios donde se registraron temperaturas iguales o superiores a 35.0 ºC en las últimas 24 horas.

Aclaración: aunque los valores registrados en un municipio se relacionan con la ubicación de las estaciones de monitoreo del IDEAM, en ocasiones, dichas estaciones pueden estar distantes de los lugares en donde se concentra la mayor población o alejados de los centros municipales.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
CUNDINAMARCA	Jerusalén (35.4).
LA GUAJIRA	Hatonuevo (36.2), Maicao (35.2), **Manaure (38.0),** Riohacha (36.1), Uribía (36.0).
TOLIMA	Natagaima (35.4).
VALLE DEL CAUCA	Zarzal (35.2).

NO SE REGISTRARON TEMPERATURAS DEL AIRE POR ENCIMA DE LOS MÁXIMOS HISTÓRICOS.

Temperaturas Mínimas

A continuación se relacionan los municipios donde en las últimas 24 horas se registraron temperaturas menores o iguales a 5.0°C.

NO SE REGISTRARON VALORES DE TEMPERATURAS IGUALES O INFERIORES A 5,0°C EN LA RED DE ESTACIONES DEL IDEAM.

NO SE REGISTRARON VALORES DE TEMPERATURAS DE AIRE POR DEBAJO DE LOS MINIMOS HISTÓRICOS

La estimación satelital de la temperatura superficial máxima en 24 horas utiliza datos de los satélites ambientales geoestacionarios operacionales (GOES) de NOAA para estimar al temperatura de la superficie del país, en donde los datos de los medidores o radares no están disponibles o no son confiables.

Condiciones Hidrometeorológicas Actuales


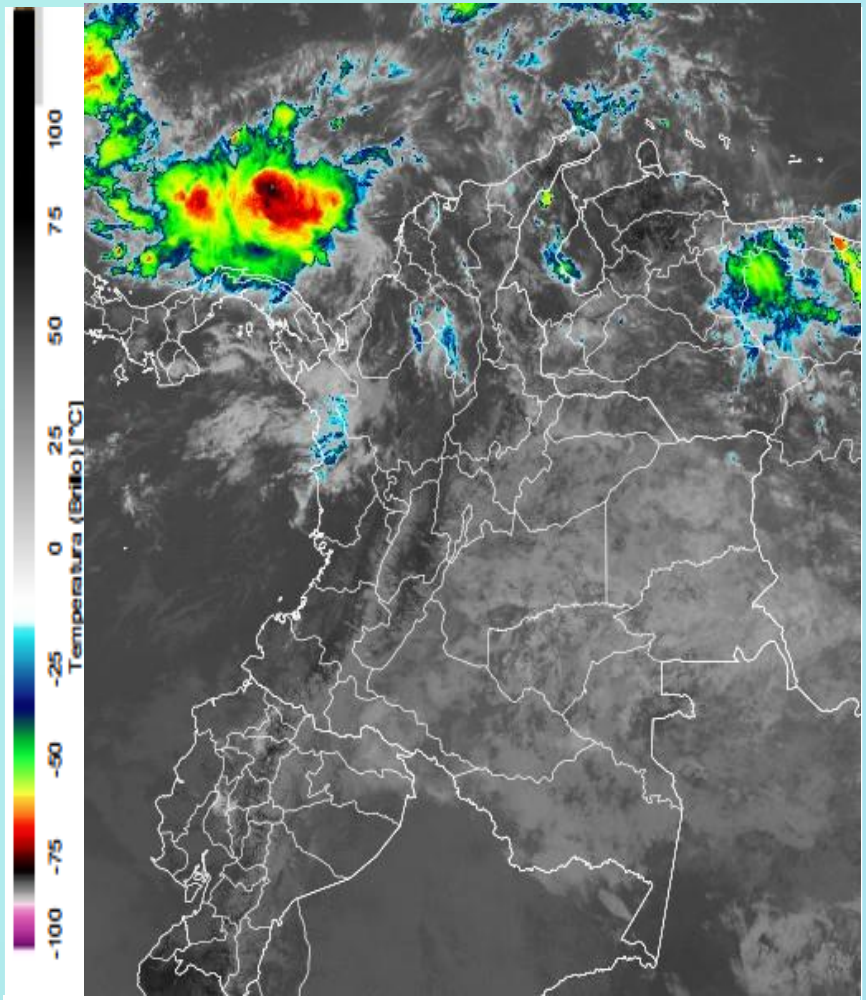


Imagen GOES East Canal Infrarrojo,
31 de mayo de 2024 - Hora 11:40 HLC.
Fuente: GOES 16

En las últimas horas han prevalecido las condiciones nubosas con lluvias y en algunos casos tormentas eléctricas, en varios sectores de oriente, suroccidente y occidente del mar Caribe colombiano, incluida la isla de San Andrés y en áreas de los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Caldas, Risaralda, Chocó, Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas.

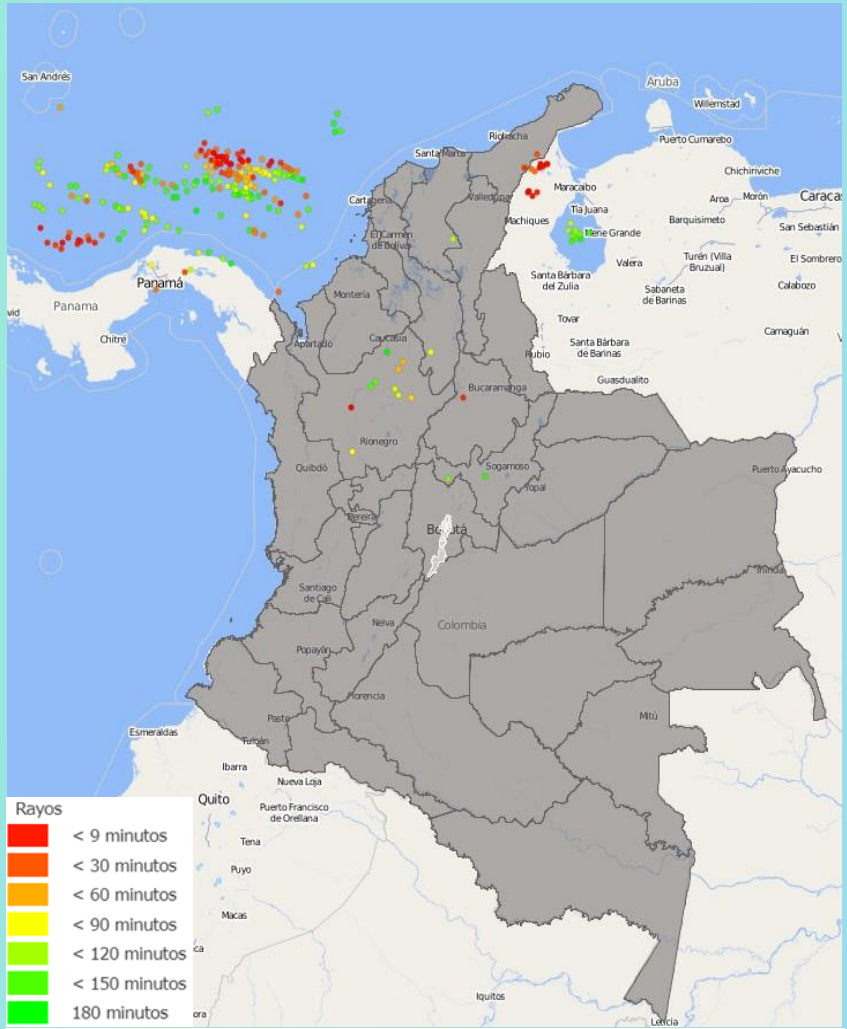


Descargas eléctricas en las últimas 3 horas.
Fuente: Keraunos S.A.S.

- La imagen del canal infrarrojo (10.3 µm) permite identificar nubes en cualquier período temporal a partir de la temperatura de brillo de la nube (ver escala de colores). De esta forma, se puede identificar, clasificar y caracterizar la nubosidad en una zona determinada.
- La imagen de las descargas eléctricas muestra los rayos nube-tierra que se han descargado en una zona en las últimas 4 horas (ver escala de colores)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Pronóstico de precipitación para las próximas veinticuatro (24) horas

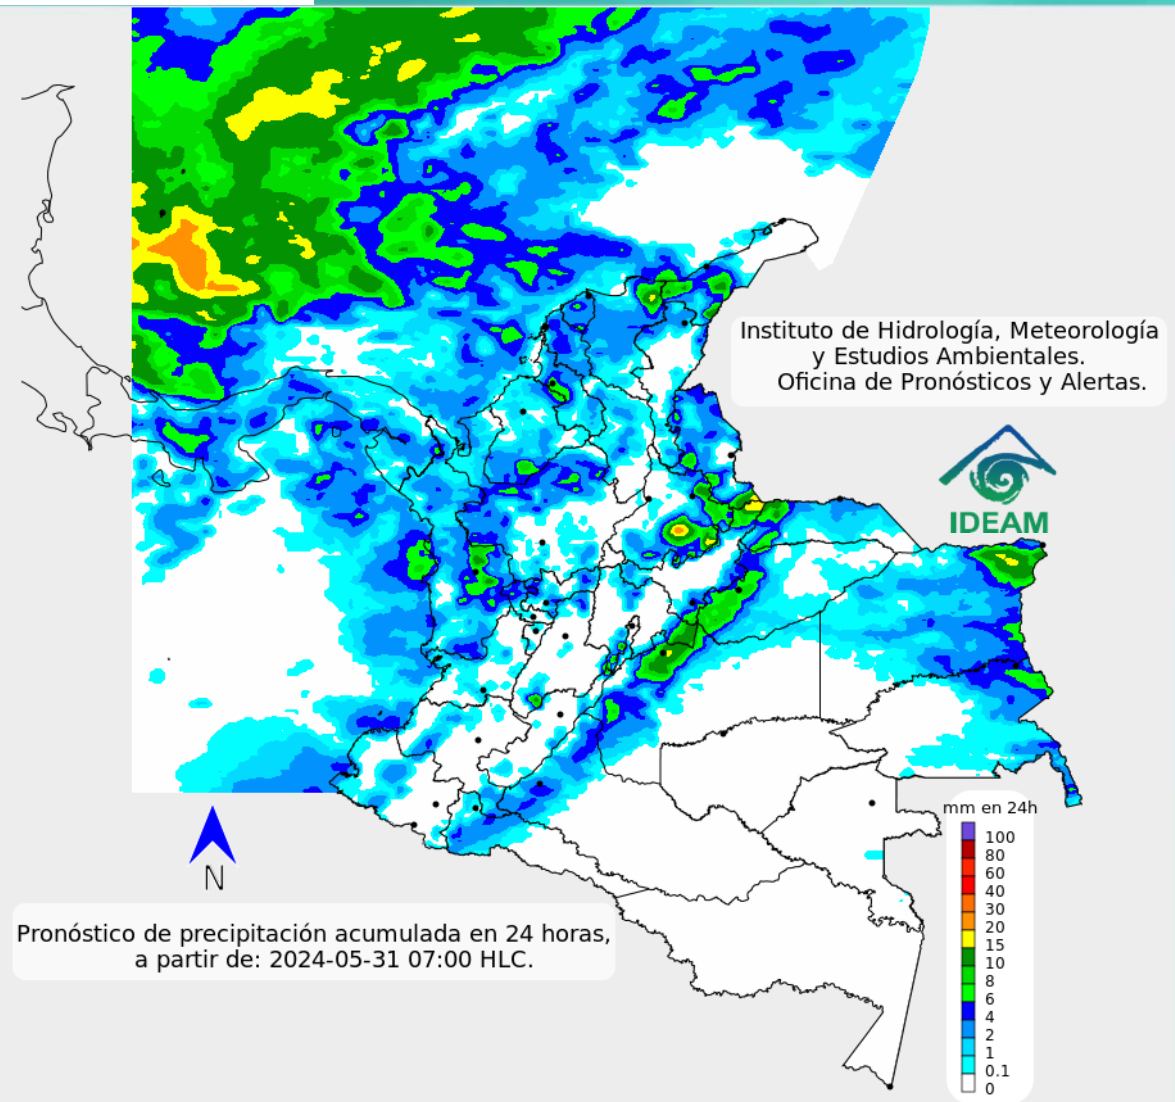

Pronóstico de precipitación acumulada en 24 horas,
a partir de: 2024-05-31 07:00 HLC.

En la región Caribe prevalecerán las condiciones nubosas con probabilidad de precipitaciones y actividad eléctrica en áreas ubicadas en el sur de La Guajira, norte de Cesar, Magdalena, Bolívar, norte de Sucre, Córdoba y Urabá. En la Andina se advierte cielo entre parcial y mayormente cubierto con precipitaciones en sectores Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda y sur de Huila, no se descartan tormentas eléctricas, en el resto de la región predominará el tiempo seco. En la mayor parte de la región Pacífica se pronostica tiempo seco con cielo entre ligera y parcialmente nublado, posibles lluvias con descargas eléctricas en áreas del departamento de Chocó. En gran parte de la Orinoquia son estimadas condiciones secas con cielo parcialmente nublado, salvo sectores del occidente de Arauca, Casanare y Meta y nororiente de Vichada donde se estiman precipitaciones de variada intensidad y en la mayor parte de la región Amazónica predominará el tiempo seco, posibilidad de lluvias en sectores de Guainía y occidente de Caquetá y Putumayo.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias a diferentes horas, acompañadas en algunos momentos de descargas eléctricas.

Para mayor información sobre el estado del tiempo, alertas y pronósticos, consulte la aplicación móvil **MI PRONÓSTICO**

- La resolución espacial del mapa de pronóstico es de 6.5 km aproximadamente. Por lo tanto, fenómenos meteorológicos inferiores a esta escala no están considerados en esta predicción.
- La escala de colores está asociada a un rango de precipitación en el intervalo de tiempo indicado, lo que implica que el pronóstico no es determinista (un valor exacto en una zona) sino corresponde a un pronóstico cuantitativo (un rango de valores en una zona).


Estado de los Embalses

A continuación, se relaciona el volumen útil diario de los principales embalses del país (expresado en porcentaje), de acuerdo con la información reportada por **XM S.A. E.S.P** en la siguiente dirección electrónica: https://ido.xm.com.co/ido/SitePages/hidrologia.aspx?q=reservas




ID_Embalse	Nombre
0	Represa Alto Anchicaya
1	Represa de Betania
2	Embalse La Salvajina
3	Embalse de Calima (Lago Calima)
4	Embalse del Río Prado
5	Embalse Chisacá
6	Reoresa de La Regadera
7	Represa del Muña
8	Embalse de Chuza
9	Embalse San Rafael
10	Embalse Del Guavio
11	Embalse La Esmeralda (Chivor)
12	Embalse de Tomine
13	Represa de Tibito
14	Embalse Pantano de Arce
15	Emblase del Sisga
16	EMBALSE DEL NEUSA
17	Embalse el Hato
18	Embalse El Peñol (Guatape)
19	Embalse Punchina
20	Embalse Las Playas
21	Embalse San Lorenzo
22	Embalse Río Grande
23	Embalse de Miraflores
24	Embalse Troneras
25	Embalse Juan Guillermo Penagos - Porce II
26	Embalse Urra

VOLÚMEN ÚTIL DIARIO EN LOS PRINCIPALES EMBALSES DEL PAÍS

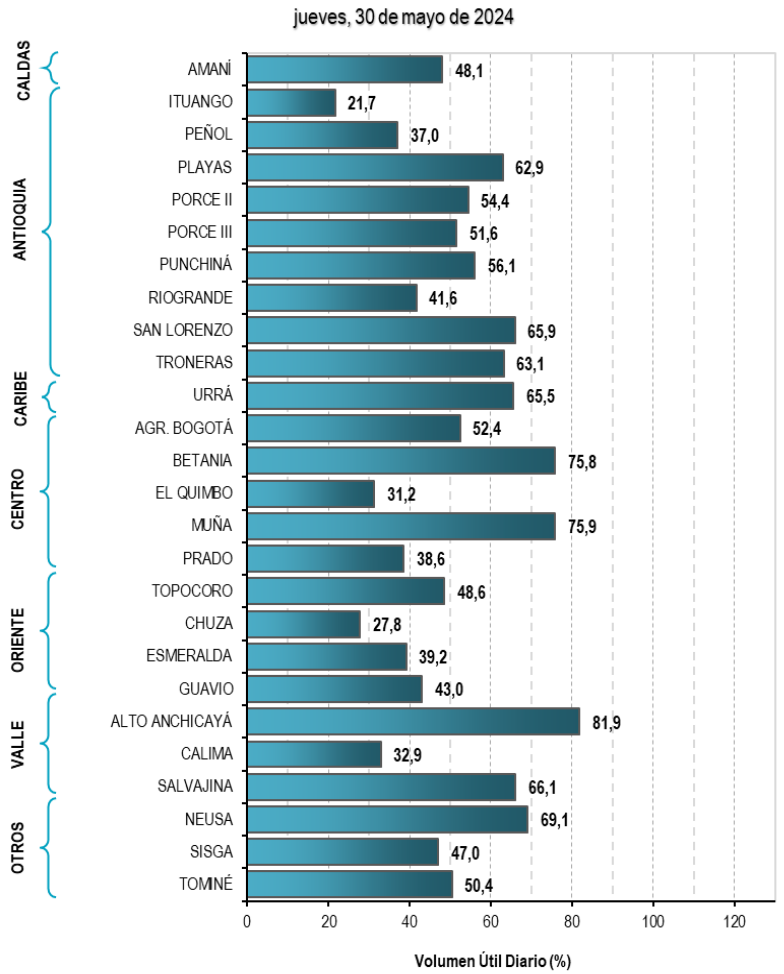

VOLÚMEN ÚTIL DIARIO DE EMBALSES POR REGIONES (%)

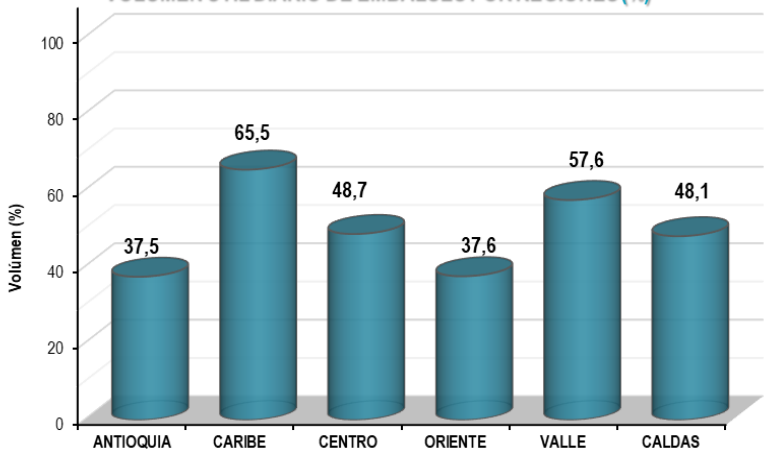


Infografía: IDEAM Fuente: xm

Pronóstico condiciones meteorológicas adicionales

Pronóstico zonas volcánicas

ÁREA DEL VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ			
Mañana: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
Tarde: Cielo parcialmente nublado -tiempo seco			
Noche: Cielo parcialmente nublado - tiempo seco			
Madrugada: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
El SERVICIO GEÓLOGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. Lat: 4.89 Lon: -75.32			
ELEVACIÓN (pies)	DIRECCIÓN	VELOCIDAD	
		VELOCIDAD (Nudos)	VELOCIDAD (Km/h)
10.000	NORESTE	0-5	0-9
18.000	ESTE	15-20	27-36
24.000	ESTE	15-20	27-36
30.000	NORESTE	5-10	9-18
ÁREA DEL VOLCÁN NEVADO DEL HUILA			
Mañana: Cielo mayormente nublado -Tiempo seco			
Tarde: Cielo mayormente nublado - Tiempo seco			
Noche: Cielo mayormente nublado - Tiempo seco			
Madrugada: Cielo mayormente nublado - Tiempo seco			
El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. Lat:2.92 Lon:-76.02			
ELEVACIÓN (pies)	DIRECCIÓN	VELOCIDAD	
		VELOCIDAD (Nudos)	VELOCIDAD (Km/h)
10.000	SURESTE	5-10	9-18
18.000	ESTE	20-25	36-45
24.000	ESTE	20-25	36-45
30.000	NOROESTE	10-15	18-27
ÁREA DEL VOLCÁN CERRO MACHÍN			
Mañana: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
Tarde: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
Noche: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
Madrugada: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. Lat:4.48 Lon:-75.38			
ELEVACIÓN (pies)	DIRECCIÓN	VELOCIDAD	
		VELOCIDAD (Nudos)	VELOCIDAD (Km/h)
10.000	SURESTE	0-5	0-9
18.000	ESTE	15-20	27-36
24.000	ESTE	15-20	27-36
30.000	NOROESTE	5-10	9-18

Mapa de zonas volcánicas

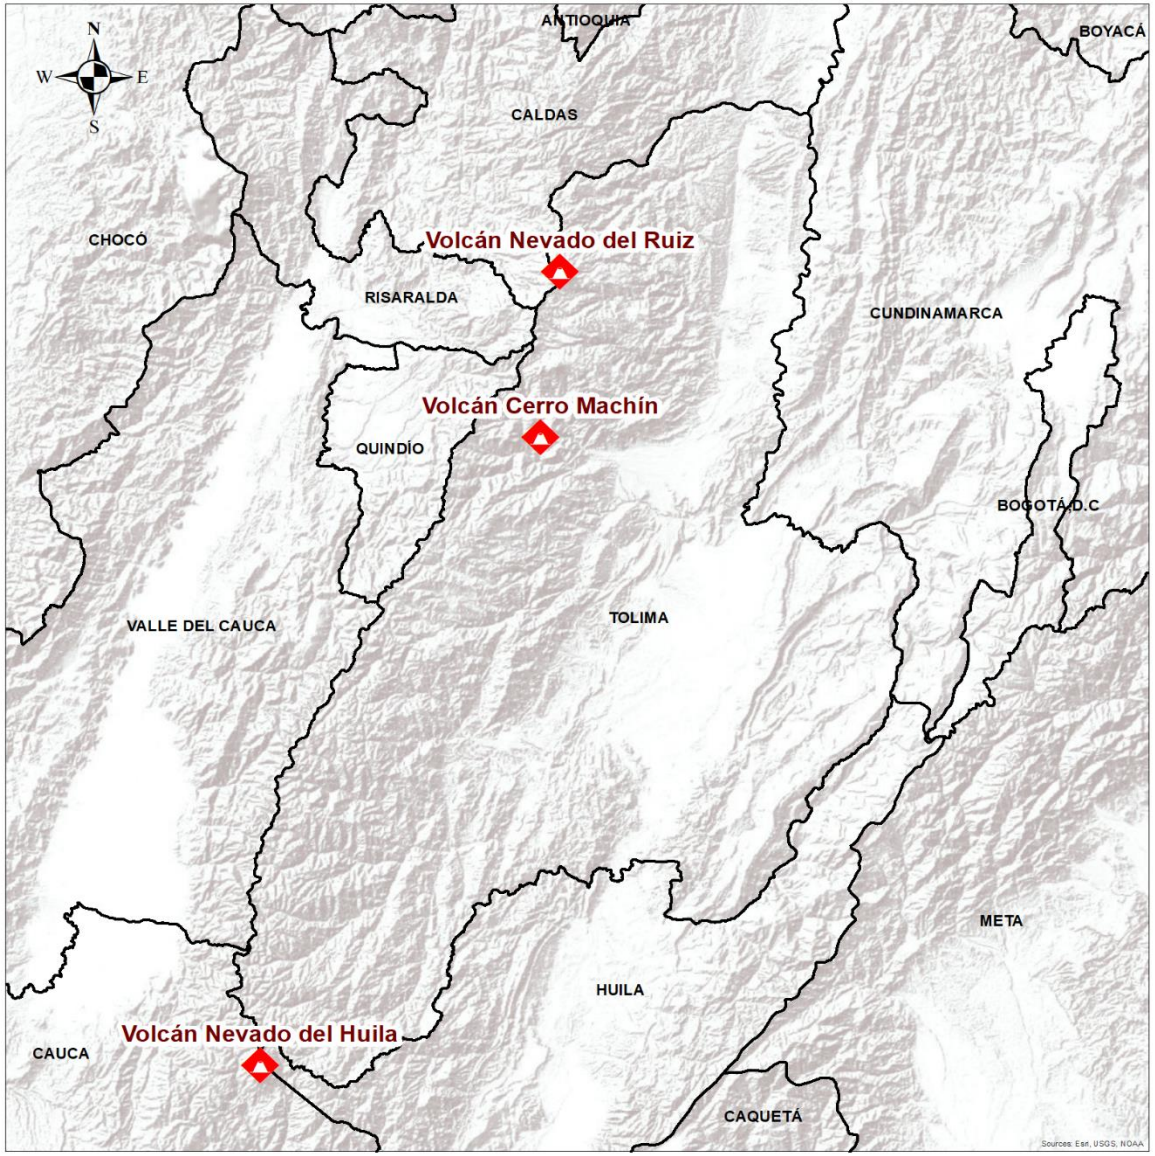

Pronóstico condiciones meteorológicas adicionales

Pronóstico zonas volcánicas


ÁREA DEL VOLCÁN GALERAS			
Mañana: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
Tarde: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
Noche: Cielo mayormente nublado - Lloviznas en diferentes sectores			
Madrugada: Cielo mayormente nublado - Tiempo seco			
EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. Lat: 1.22 Lon: -77.36			
ELEVACIÓN (pies)	DIRECCIÓN	VELOCIDAD	
		VELOCIDAD (Nudos)	VELOCIDAD (Km/h)
10.000	SURESTE	5-10	9-18
18.000	ESTE	15-20	27-36
24.000	ESTE	20-25	36-45
30.000	NOROESTE	10-15	18-27
ÁREA DEL COMPLEJO VOLCÁNICO CHILES-CERRO NEGRO DE MAYASQUER			
Mañana: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
Tarde: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
Noche: Cielo parcialmente nublado - Lloviznas			
Madrugada: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
El SERVICIO GEÓLOGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. Chiles: Lat: 0.81 -Lon:77.93; Cumbal: Lat: 0.95 Lon:-77.88			
ELEVACIÓN (pies)	DIRECCIÓN	VELOCIDAD	
		VELOCIDAD (Nudos)	VELOCIDAD (Km/h)
10.000	SURESTE	5-10	9-18
18.000	ESTE	20-25	36-45
24.000	ESTE	20-25	36-45
30.000	OESTE	10-15	18-27

Mapa de zonas volcánicas



Alertas Hidrológicas

Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

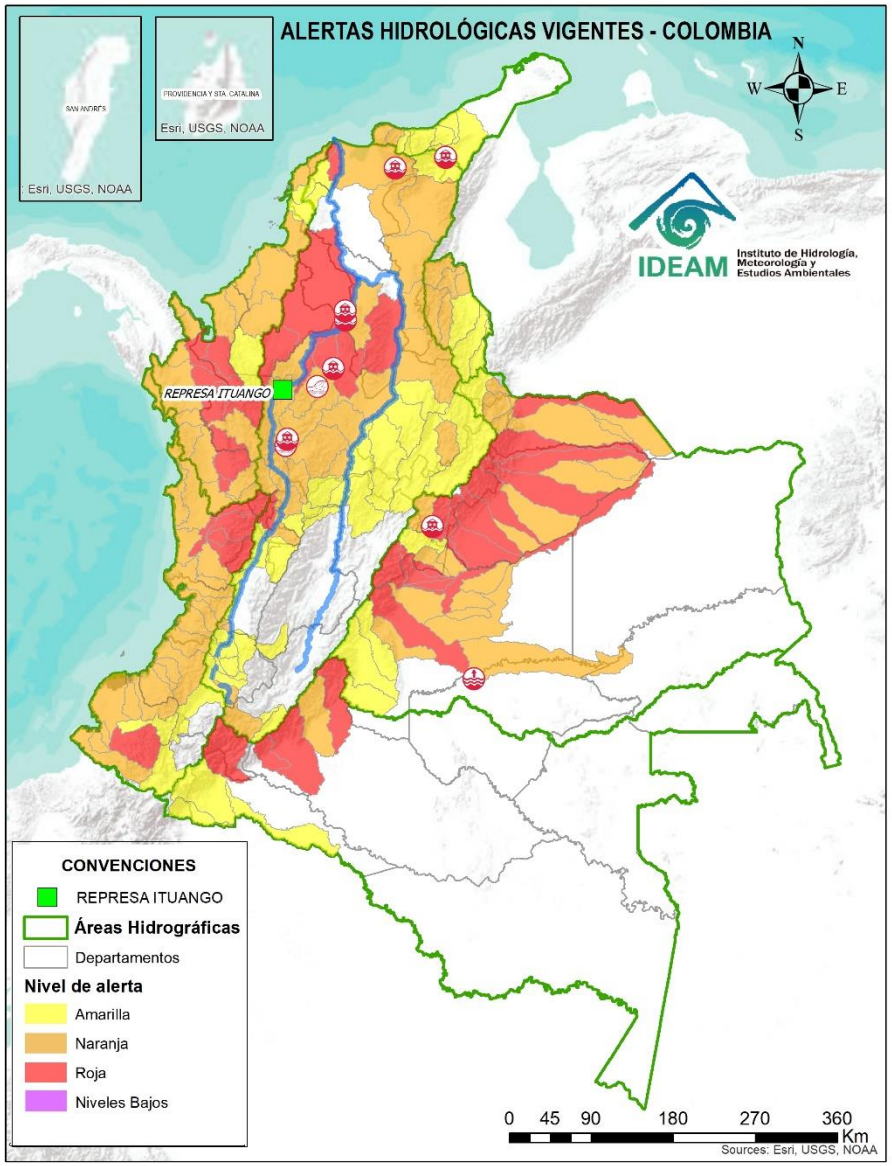



Caño Cristales el río de los cinco colores, paraíso tropical! (Sierra de La Macarena – Meta, Colombia). – Autor: Mcleods, 19 de Febrero de 2018
Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Flashpacker_Connect_-_Cano_Cristales_.webp

FEWS COLOMBIA
SISTEMA DE PRONÓSTICOS HIDROLÓGICOS Y ALERTAS TEMPRANAS

Consulte aquí el estado de los niveles en los ríos del país:

http://fews.ideam.gov.co/colombia/MapaEstacionesColombiaEstado.html

Nota 1: Las alertas hidrológicas pueden ser corregidas y/o actualizadas en el futuro. No representa una certificación oficial del IDEAM.
Nota 2: Es probable que los eventos hidrológicos reportados en las alertas emitidas no se estén presentando sobre los ríos principales sino sobre sus afluentes.
Nota 3: El IDEAM le sugiere a la población ribereña estar muy atentos al comportamiento de los niveles de los ríos y atender las recomendaciones que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emita para la implementación de medidas de contingencia ante posibles afectaciones por desbordamientos e inundaciones.
Nota 4: Dentro de las alertas emitidas no se contemplan aquellas asociadas a desabastecimientos. En caso de requerir información asociada a estos reportes consultar en contactenos@gestiondelriesgo.gov.co


LLUVIAS
NIVELES BAJOS
NIVELES ALTOS
CRECIENTE SÚBITA
TRANSITO DE CRECIENTES
CRECIENTE POR DESEMBALSE
INUNDACIONES

Alertas Hidrológicas

CONVENCIONES		
	Lluvias	Lluvias antecedentes intensas o continuas y/o pronóstico de las mismas, las cuales pueden generar crecientes súbitas en los ríos principales y sus afluentes.
	Niveles bajos	Niveles que se encuentran en una condición de régimen hidrológico con valores cercanos o inferiores a los mínimos históricos, lo que podría ocasionar desabastecimiento de agua a la población u otros sectores, y/o restricciones en la navegabilidad fluvial.
	Niveles altos	Nivel de referencia del río cuyos valores iguales o superiores pueden generar afectaciones en las zonas ribereñas.
	Creciente súbita	Fenómeno natural que se presenta en los ríos de montaña como consecuencia de la ocurrencia de lluvias intensas o torrenciales en zonas de alta pendiente del cauce principal y sus afluentes.
	Tránsito de crecientes	Es el desplazamiento de una onda de creciente de aguas arriba hacia aguas abajo de la corriente.
	Creciente por desembalse	Proceso de tránsito del flujo de agua por descarga controlada desde un embalse.
	Inundación	Aumento en los niveles y/o caudales de los ríos que superan la capacidad máxima de transporte o modificación de la sección transversal que la reduce, ocasionando el desbordamiento e inundación en zonas aledañas al cauce principal.

Resumen de Alertas Hidrológicas

Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

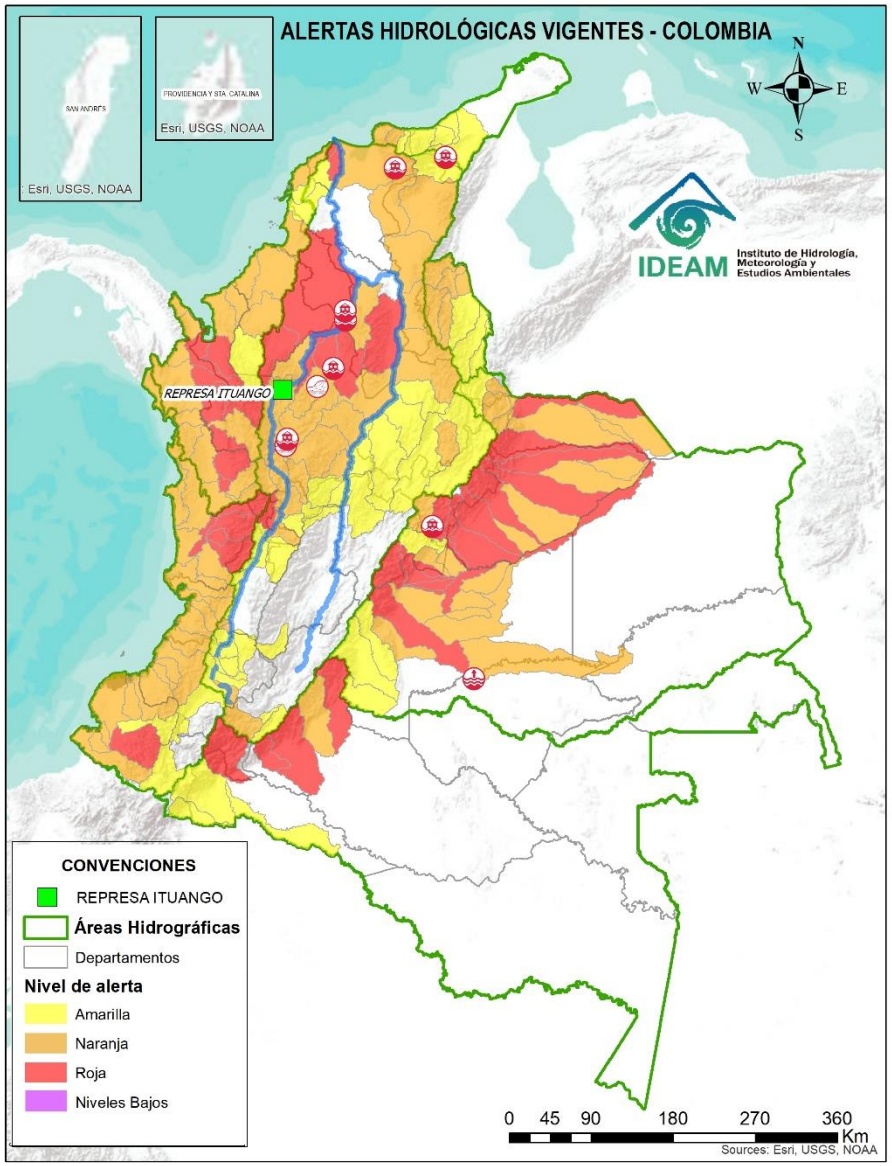

ALERTAS POR PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS Y/O INUNDACIONES

Area Hidrográfica	# de Subzonas
Orinoco	17
Magdalena Cauca	9
Caribe	7
Pacifico	6
Amazonas	4
TOTAL	43

Area Hidrográfica	# de Subzonas
Magdalena Cauca	26
Caribe	25
Orinoco	20
Pacifico	20
Amazonas	1
TOTAL	92

Area Hidrográfica	# de Subzonas
Magdalena Cauca	33
Caribe	9
Orinoco	5
Amazonas	3
Pacifico	3
TOTAL	53

ALERTAS PUNTUALES POR INUNDACIONES Y/O CRECIENTE SÚBITAS

Area Hidrográfica	# de Subzonas
Magdalena Cauca	8
Orinoco	2
TOTAL	10

ALERTAS PUNTUALES POR NIVELES BAJOS

Area Hidrográfica	# de Subzonas
TOTAL	0


- Nota 1: Las alertas hidrológicas pueden ser corregidas y/o actualizadas en el futuro. No representa una certificación oficial del IDEAM.
- Nota 2: Es probable que los eventos hidrológicos reportados en las alertas emitidas no se estén presentando sobre los ríos principales sino sobre sus afluentes.
- Nota 3: El IDEAM le sugiere a la población ribereña estar muy atentos al comportamiento de los niveles de los ríos y atender las recomendaciones que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emita para la implementación de medidas de contingencia ante posibles afectaciones por desbordamientos e inundaciones.
- Nota 4: Dentro de las alertas emitidas no se contemplan aquellas asociadas a desabastecimientos. En caso de requerir información asociada a estos reportes consultar en contactenos@gestiondelriesgo.gov.co

FEWS COLOMBIA
SISTEMA DE PRONÓSTICOS HIDROLÓGICOS Y ALERTAS TEMPRANAS

- Consulte aquí el estado de los niveles en los ríos del país:
- http://fews.ideam.gov.co/colombia/MapaEstacionesColombiaEstado.html

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

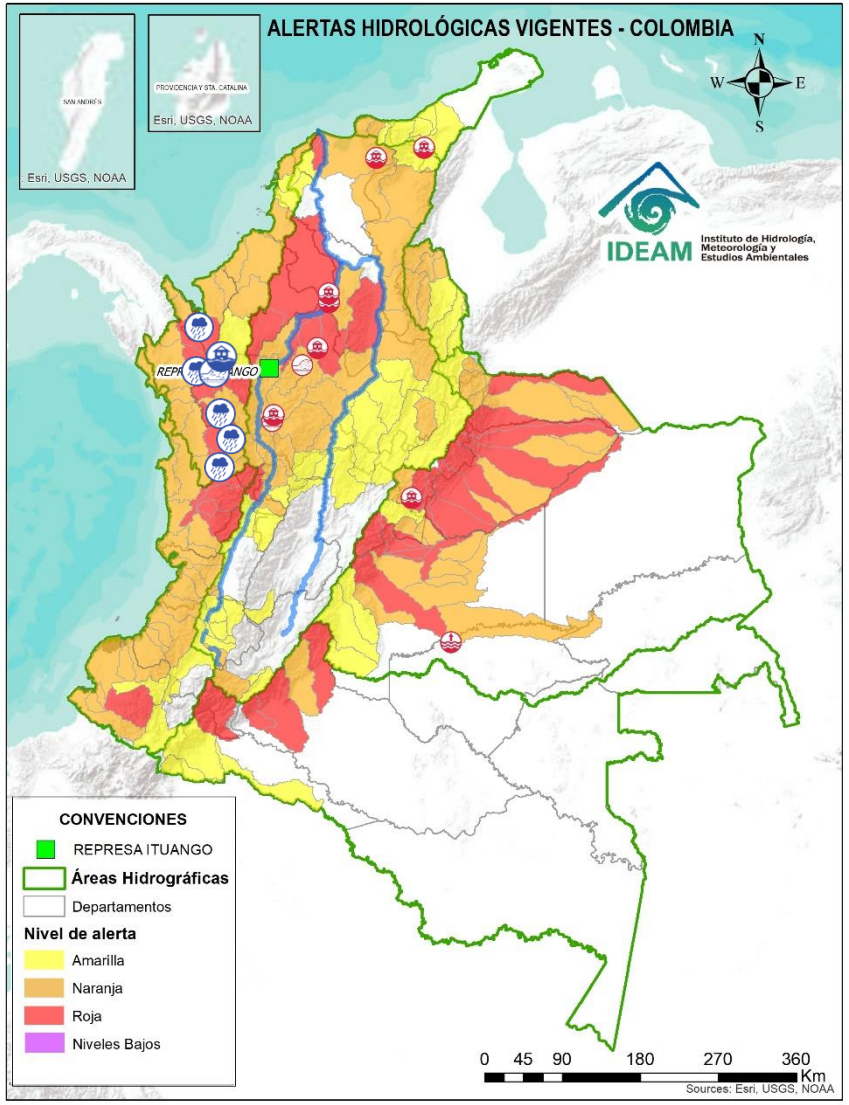

ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORADMIANETOS Y/O INUNDACIONES:
Caribe	• Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Quito. Especial atención en el municipio de Cértegui (Chocó). • Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Cabi y otros directos al río Atrato y creciente súbita del río Atrato. Especial atención en los municipios de Atrato y Quibdó (Chocó). **Nota:** Desbordamiento del río Atrato a la altura del Municipio de Atrato (29/05/2024). • Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Bebaramá y otros Directos Atrato (md). • Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH de los directos al Atrato entre Bebaramá y Murrí (md). • Probabilidad de creciente súbita del río Murindó y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Murindó, Vigía del Fuerte (Antioquia) y Carmen del Darién (Chocó). • Probabilidad de crecientes súbitas en el río Sucio y sus afluentes. Se recomienda especial atención en las quebradas San José de Urama, El Tigre, Agualinda, La Encalichada, Cañada Seca, Desmotadora, La Antigua, La Caracol y Potreros, y los ríos Urumita y Herradura. Especial atención en los municipios de Nuevo Belén de Bajira, Frontino, Abriaquí, Uramita, Dabeiba, Cañasgordas y Mutatá (Antioquia). **Nota**: **1)** Se reportó desbordamiento del río Sucio a la altura del corregimiento de Pavarandocito, en el municipio de Mutatá (Antioquia) (22/05/2024). **2)** Creciente súbita de la quebrada Camparusia en el sector Camparusia del municipio de Dabeiba, Antioquia (27/05/2024). • Probabilidad de incrementos súbitos en la SZH Directos al Bajo Atrato entre río Sucio y Desembocadura al Mar Caribe. Especial atención en el municipio de Riosucio (Chocó). • Probabilidad de crecientes súbitas en el río León y sus afluentes, los ríos Carepa, Chigorodó, Apartadó, Grande y Vijagual, los cuales desembocan al Golfo de Urabá. Especial atención en los municipios de Turbo, Carepa, Chigorodó y Apartadó (Antioquia).

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

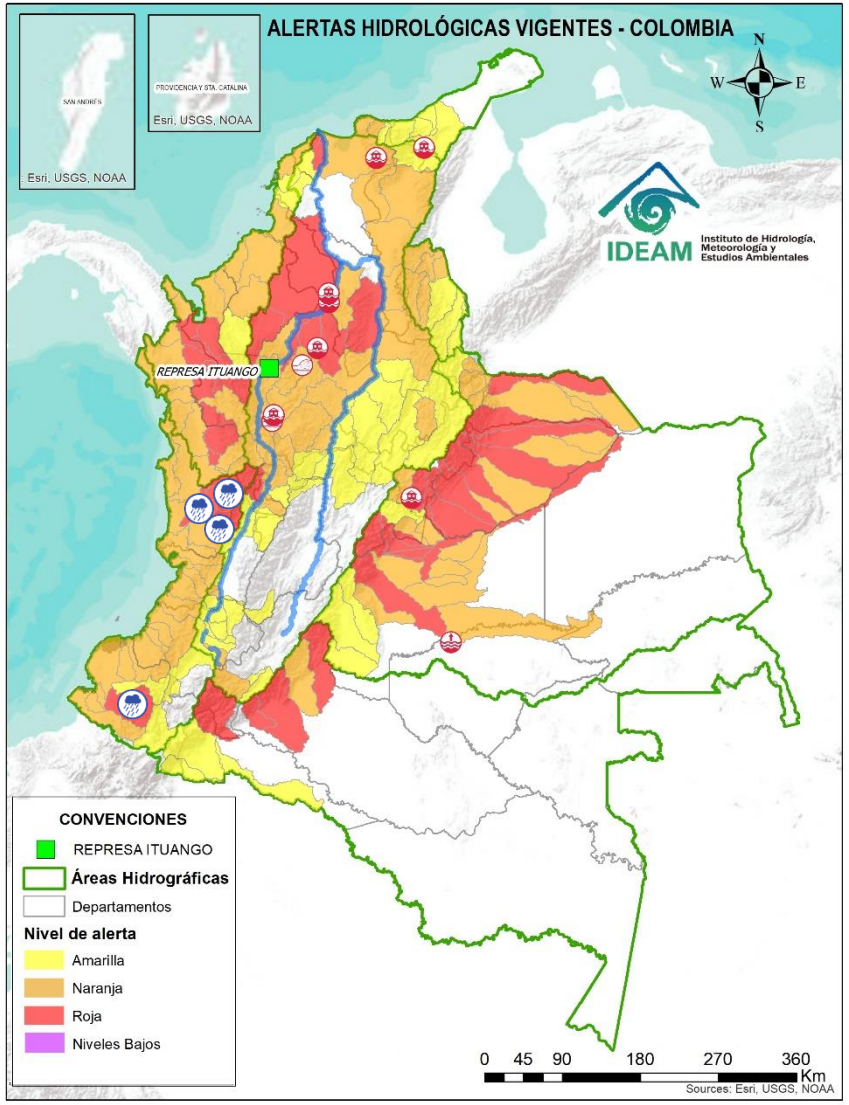

ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORADMIANETOS Y/O INUNDACIONES:
Pacífico	• Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Juan Alto y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico (Risaralda), y Tadó y Istmina (Chocó). • Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Iró, Tamaná, Condoto, entre otros aportantes a la cuenca media del río San Juan. Especial atención a la altura de los municipios San José del Palmar, Rio Iró, Condoto, Novita y Medio San Juan (Chocó). • Probabilidad de incrementos en los niveles de las cuencas del río Cajón entre otros aportantes a la cuenca media del río San Juan. Especial atención a la altura de los municipios Novita y Medio San Juan. • Probabilidad de incrementos en los niveles de la cuenca del río Sipí, especialmente en los ríos Taparal, San Agustín y Garrapatas, a la altura del municipio de Sipí (Chocó) y río Sanquinini, a la altura del municipio de Bolívar (Valle del Cauca). • Probabilidad de incrementos en los niveles de la parte media del río San Juan. Especial atención a la altura del municipio Medio San Juan e Istmina (Chocó). • Probabilidad de crecientes súbitas en el río Telembí y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de Barbacoas y Mallama (Nariño) **Nota:** Se reportó desbordamiento del río Ñambi a la altura de la zona urbana del municipio de Barbacoas (Nariño) (28/05/2024).

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

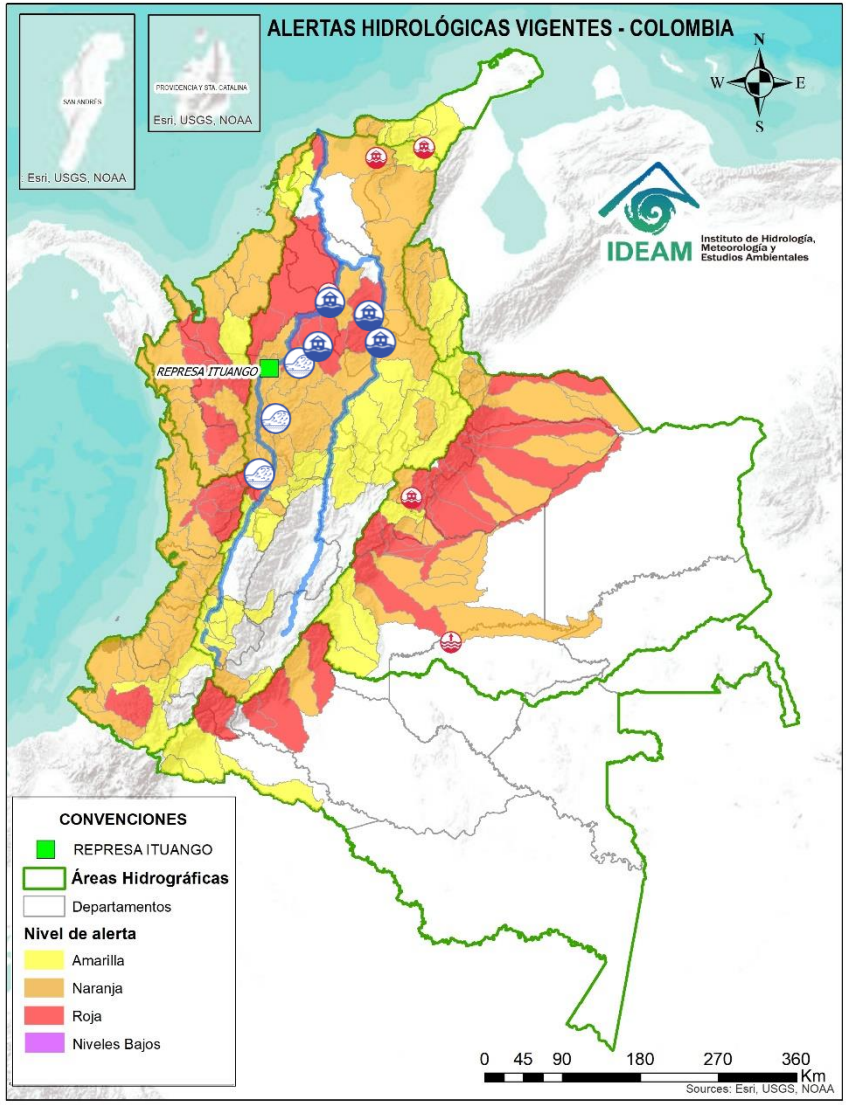

ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORADMIANETOS Y/O INUNDACIONES:
Magdalena – Cauca	• Probabilidad de incremento en los niveles en los ríos directos al Magdalena en el Brazo Morales y sus aportantes. **Nota:** Rompimiento del jarillon en el sector Campo Payares y El Piñal, el 70% de la zona rural esta inundada en el municipio de Simití - Bolívar (14 y 15 de mayo de 2024). • Crecientes súbitas en el río Risaralda y sus afluentes, especialmente en el río Guática y Mapa. Especial atención a la altura del municipio de Anserma, Riosucio Viterbo, Belalcázar (Caldas), Apia, Mistrató, Balboa y La Virginia (Risaralda). • Probabilidad de crecientes súbitas en el río Medellín y en sus aportantes en el Valle de Aburra. Estar atentos en las quebradas La Sabanetica, San Alejo, La Presidenta, La Muñoz, La Magdalena, La Santa Elena, La Iguana, La Madera, La Loca, Cafetal, El Sesteadero, Doña María y el río Medellín. Se recomienda especial atención a los municipios de Barbosa, Caldas, Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Copacabana, Bello y La Estrella (Antioquia). **Nota**: Se reportaron inundaciones en el municipio de Bello, Antioquia (30/05/2024). • **Alerta puntual:** Avenida torrencial de la quebrada Aledaña afectando viviendas en el sector de Paraje el Chillido del municipio de Anorí, Antioquia (30/05/2024) • Probabilidad de incrementos súbitos en el nivel del río Nechí a la altura del municipio de Nechí. Igualmente, por probabilidad de crecientes en sus aportantes, especialmente la quebrada La Oca en el municipio de Zaragoza y la quebrada La Villa en el municipio de El Bagre (Antioquia). **Nota:** Reporte de afectaciones por crecientes en el rio Nechí y la quebrada La Oca en el municipio de Zaragoza, Antioquia (27 y 31 de mayo de 2024). • Niveles altos del río Cauca entre los municipios de Valdivia y Nechí. Especial atención a las comunidades ribereñas asentadas en la zona y a puntos críticos como Nuevo Mundo y Santillana. • **Alerta puntual:** Afectaciones por rompimiento del dique en Caregato debido al ascenso de niveles en el río Cauca a la altura de San Jacinto del Cauca (Bolívar). Se recomienda especial atención en La Región de La Mojana por transvase del caudal del río Cauca (06/04/2024).

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

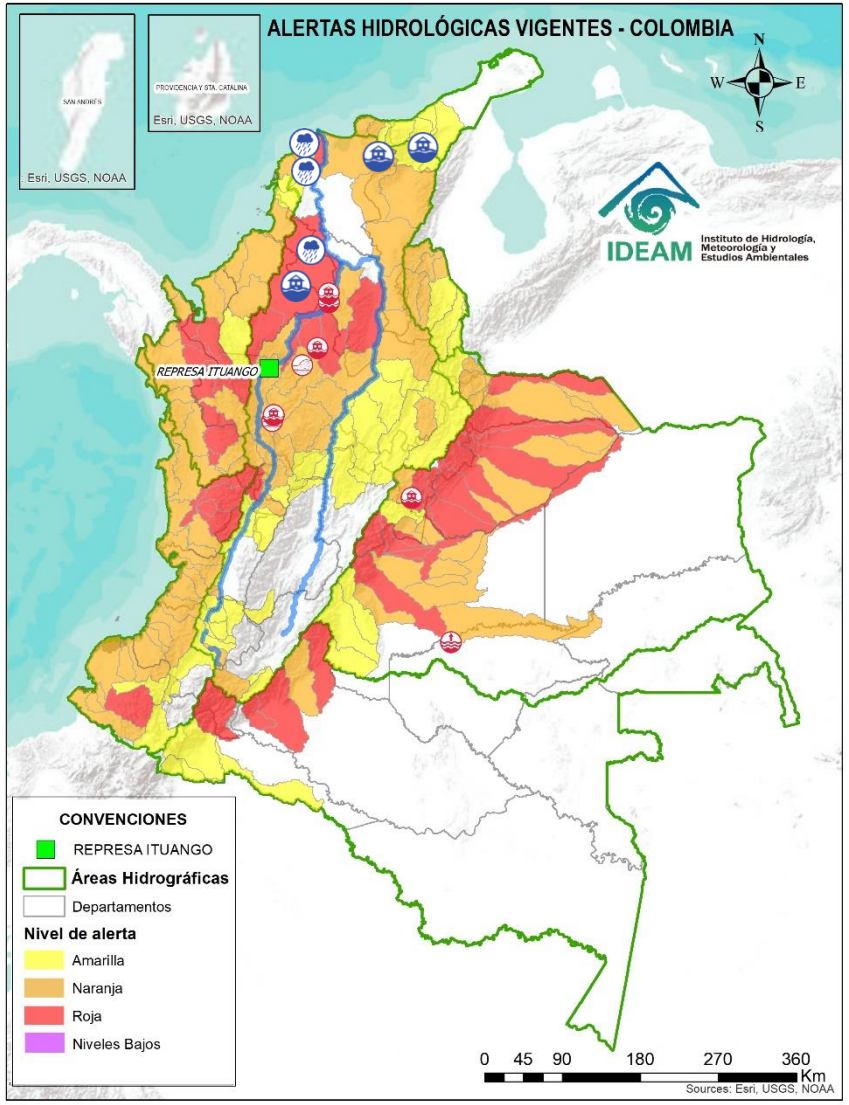

ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORADMIANETOS Y/O INUNDACIONES:
Magdalena – Cauca	• Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Jorge en su cuenca alta, se recomienda especial atención en sus afluentes, los ríos San Pedro y Uré, y la quebrada La Manuela, así como en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano (Córdoba). **Nota:** Se reportan inundación en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano (23/05/2024). • Ascenso de niveles en el sistema de ciénagas y caños de La Mojana. Especial atención en los municipios de Ayapel, Guaranda, Majagual y San Benito Abad por ingreso del río Cauca desde el sector Caregato. **Notas**: **1)** Se reportan inundaciones en los corregimientos de Alfonso López, Sincelejito, Nariño, Pueblonuevo y Totumo en el municipio de Ayapel (Córdoba) (08/05/2024). **2)** Se reportan inundaciones en zona urbana y rural del municipio de San Marcos (Sucre) (10/05/2024). • **Alerta puntual:** Rompimiento de Jarillón en el sector los Arrastres generando el ingreso de agua del Caño Rabón y San Matías a zonas del municipio de Guaranda, Sucre (08/05/2024). • **Alerta puntual:** Desbordamiento de la acequia El Frasquito, al sur de la cabecera municipal del San Juan del Cesar, La Guajira (24/05/2024). • **Alerta puntual:** desbordamiento del canal Tolima afectando a varios barrios del municipio de Aracataca, Atlántico (30/05/2024) • Probabilidad de incrementos de niveles en los directos al Magdalena entre Calamar y desembocadura al mar Caribe. Especial atención a los centros poblados de Suán y Campo de la Cruz, Cerro de San Antonio, El Piñón, Remolino y Sitio Nuevo. No se descartan posibles formaciones de arroyos en los municipios de Barranquilla y Soledad (Atlántico). • Probabilidad de formación de arroyos en la ciudad de Barranquilla y Soledad (Atlántico). De igual forma, se recomienda estar atentos a los niveles de los ríos de la Ciénaga Mallorquín. **Nota:** Formación de arroyos en algunos sectores de Barranquilla (30/05/2024)

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

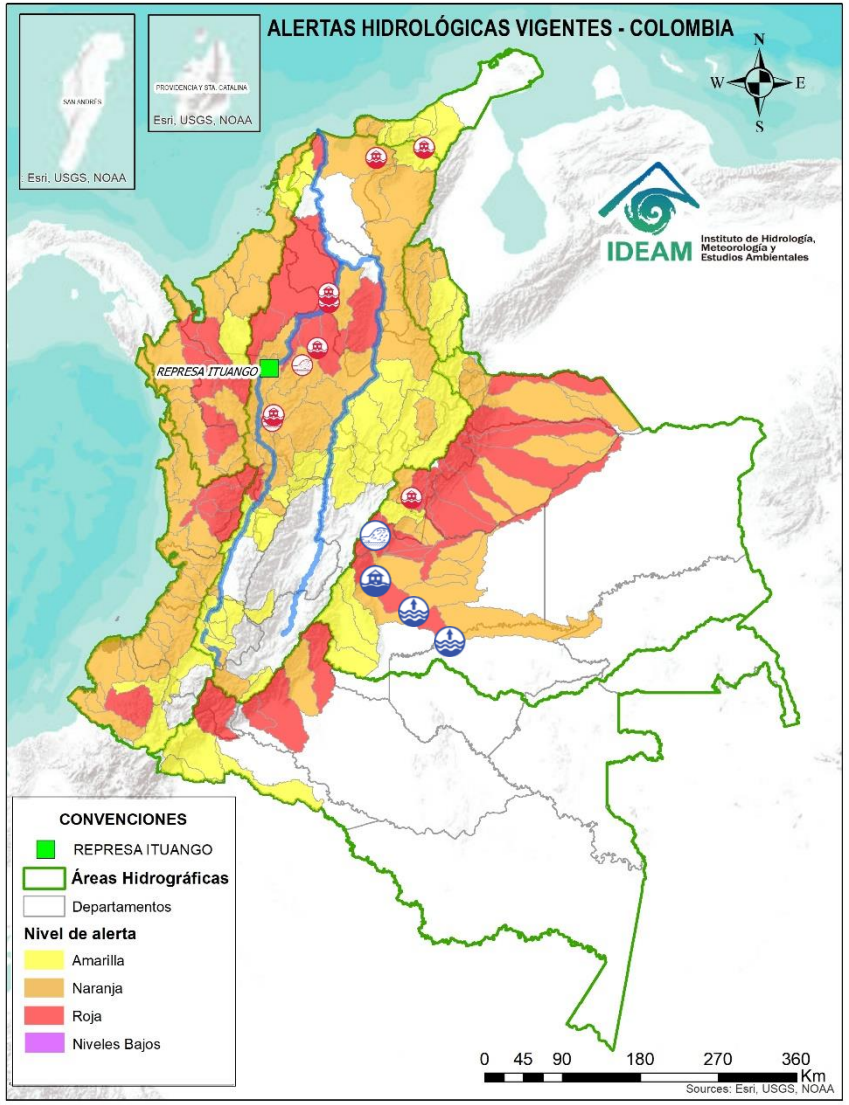

ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORADMIANETOS Y/O INUNDACIONES:
Orinoco	• Niveles altos en la cuenca del río Ariari y sus aportantes, principalmente en los caños Aguas Claras y Buenos Aires. Especial atención en los municipios de Cubarral, Puerto Rico, Fuente de Oro, El Dorado, Granda, Guamal, Lejanías, El Castillo, Puerto Lleras, San Juan de Arama, Vista Hermosa y Puerto Concordia (Meta) **Nota: 1)** Desbordamiento del río Ariari causando inundación en la zona rural de la vereda El Cable y Santa Cruz del municipio El Castillo, Meta (14/05/2024). **2)** Afectaciones por creciente súbita del río Ariari (16/05/2024). **3)** Se reportó creciente súbita del río Ariari a la altura de la vereda Arrayanes, en el municipio de Cubarral (Meta) (18/05/2024). **4)** Se reportó creciente súbita de los ríos Ariari y Tonoa a la altura de la vereda La Amistad, en el municipio de Cubarral (Meta) (18/05/2024). **5)** Se reporta inundación a la altura de la Vereda Angostura del municipio de San Juan De Arama, causando afectaciones (20/05/2024). • **Alerta Puntual:** Niveles altos del río Guaviare a la altura del municipio de San José de Guaviare (Guaviare). **Nota:** Se reportó desbordamiento del río Guaviare a la altura del municipio de San José del Guaviare (Guaviare) (20/05/2024). • Crecientes súbitas en el río Guayuriba en su recorrido por Acacías y Villavicencio (Meta). Probabilidad de crecientes en sus afluentes, especialmente en la quebrada Blanca y el río Negro a la altura de Quetame y Guayabetal (Cundinamarca). **Nota**: **1)** Represamiento del río Negro a la altura de Quetame (29/05/2024). **2)** Se reportó creciente súbita en la vereda Girón de Resguardo en el municipio de Cáqueza – Cundinamarca (29/05/2024). **3)** Se reportó creciente súbita en la quebrada Estaqueca y río Negro a la altura del municipio de Quetame – Cundinamarca (28/05/2024).

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

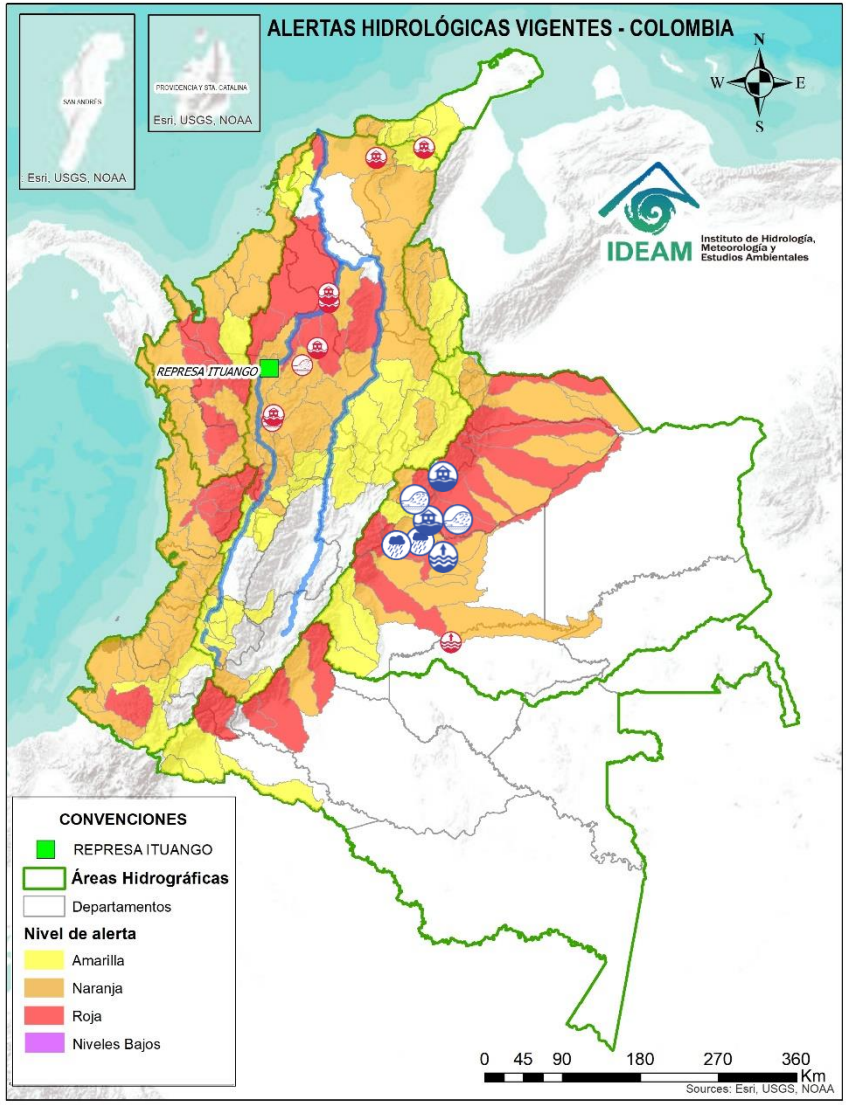

ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORADMIANETOS Y/O INUNDACIONES:
Orinoco	• Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guatiquía y sus afluentes, especialmente los ríos Ocoa y su aportante el caño Grande. Se recomienda especial atención a la altura de Restrepo, Villavicencio y el municipio El Calvario (Meta). • Probabilidad de crecientes súbitas del río Guacavía y sus afluentes, se recomienda especial atención a la altura del municipio Cumaral (Meta). • Probabilidad de crecientes súbitas en el río Negro y sus afluentes, se recomienda especial atención en Villavicencio (Meta). • Niveles altos en el río Meta a la altura de Puerto López y Cabuyaro. Se recomienda especial atención a la altura de Puerto López, Cabuyaro y Puerto Guadalupe (Meta). • **Alerta puntual** por crecientes súbita y desbordamiento a la altura del municipio de Macanal (Boyacá) (29/05/2024). • Crecientes súbitas en el nivel del río Upía y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Sabanalarga, Villanueva (Casanare), Barranca de Upía y Cabuyaro (Meta). **Nota:** Se presentaron inundaciones en el caserío de San Marcos y en la vereda Buenos Aires por el desbordamiento del rio Upía en el municipio de Villanueva Casanare (29/05/2024). • Probabilidad de crecientes súbitas en el río Túa y sus afluentes, se recomienda especial atención sobre los municipios de Monterrey, Tauramena y Villanueva (Casanare). **Nota:** Creciente súbita del caño Arietes a la altura del municipio de Villanueva - Casanare (20/05/2024). • Crecientes súbitas en el nivel del río Cusiana y tributarios. Se recomienda especial atención en los municipios de Pajarito y Aquitania (Boyacá), Tauramena, Recetor, Aguazul y Maní (Casanare). **Nota: 1)** Se presentaron inundaciones en los sectores de San Jose de Bubuy, Llano Lindo y Sabanales y el desbordamiento del río Unete en la vereda La Esperanza del municipio de Aguazul Casanare (29/05/2024). **2)** Creciente súbita de la Quebrada La Magavita, afectando la vía de acceso a las veredas San José Los Alpes y Magavita Alta y Baja sector Puente Duran del municipio de Recetor Casanare (29/05/2024). 3) Se reportan inundaciones en las veredas de Mararabe, Santa Maria de Palmarito, Guafal Pintado, Amparo, del municipio de Mani, Casanare (30/05/2024).

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

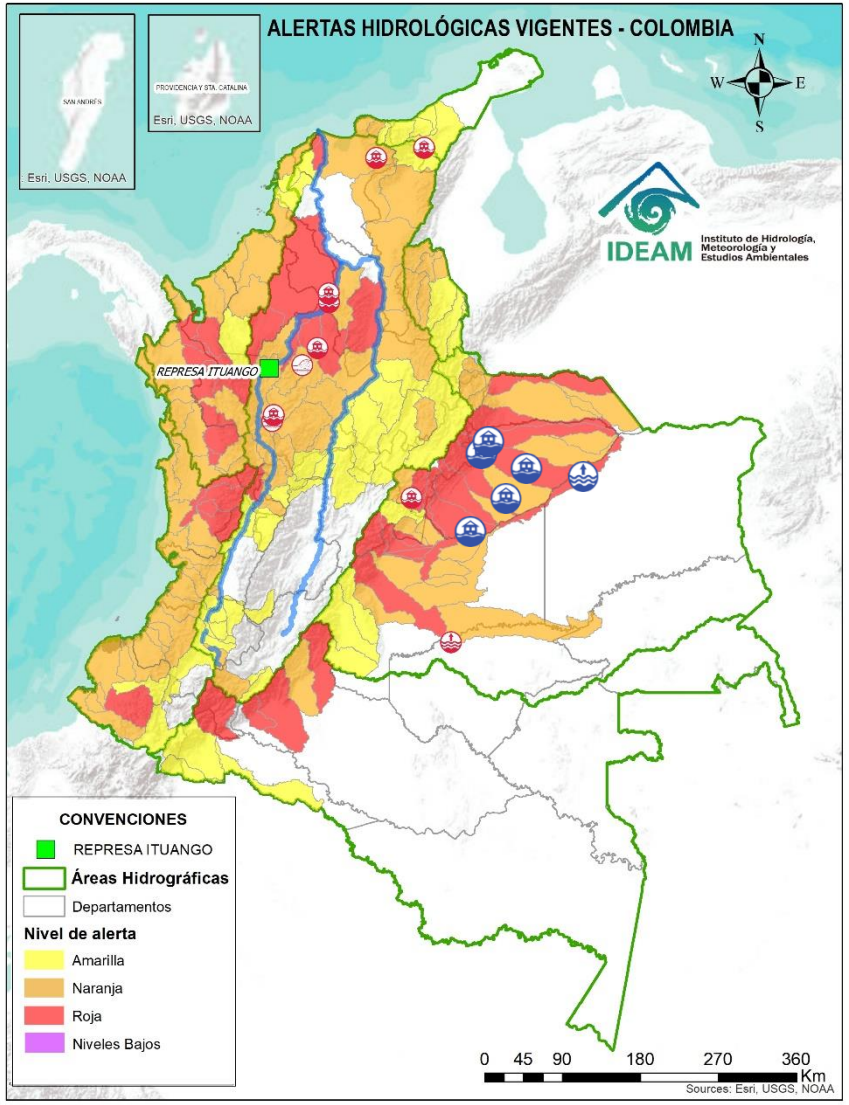

ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORADMIANETOS Y/O INUNDACIONES:
Orinoco	• Crecientes súbitas en el río Cravo Sur y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Labranzagrande (Boyacá), Yopal y Nunchía (Casanare). **Nota**: **1)** inundaciones por el desboradamiento del río Cravo Sur a la altura de las veredas Algarrobo y Mariana del municipio de Orocue Casanare (29/05/2024). **2)** Se reportó inundación por desbordamiento del río Cravo Sur en la zona rural del municipio de Yopal – Casanare (29/05/2024). **3)** Se reportó avenida torrencial en la vereda Sococho y Tisagá a la altura del municipio de Yopal, Casanare (30/05/2024). **4)** Inundación a orillas del río Tocaría en las veredas del municipio de Nunchía, Casanare (29/05/2024) • Crecientes súbitas en los ríos Pauto, Pore, Curama, Guachiria y sus aportantes. Especial atención en los municipios de Chita, Pisba, Socotá (Boyacá), Támara, Pore, San Luis de Palenque y Trinidad (Casanare). **Nota:1)** Se reporta inundación en las veredas La Plata, Regalito, Brisas del Pauto, Miralindo y sector el Garzón en el municipio de Pore Casanare (29/05/2024). **2)** Desbordamiento en el río Pauto, generando inundaciones y afectaciones en la vereda El Romero del municipio de San Luis de Palenque Casanare (29/05/2024). • Niveles altos en la parte media y baja del río Meta, entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) hasta La Hermosa en jurisdicción de Paz de Ariporo (Casanare). **Nota**: Desbordamiento del río Meta, generando inundaciones en la Vereda Tunupe del municipio de Tauramena (29/05/2024). • Incrementos súbitos en los niveles del río Ariporo y sus aportantes, como el río Muese y caño Barrosa. Especial atención en los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal. **Nota: 1)** Se presentaron inundaciones en las veredas La Argentina y San José del Ariporo, como también se presentaron inundaciones en la vereda Las Mercedes por el desbordamiento del río Ariporo en el municipio de Paz de Ariporo Casanare (29/05/2024). **2)** Se reportó desbordamiento del río Ariporo a la altura de la vereda Elvecia en el municipio de Paz de Ariporo (Casanare) (25/05/2024).

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

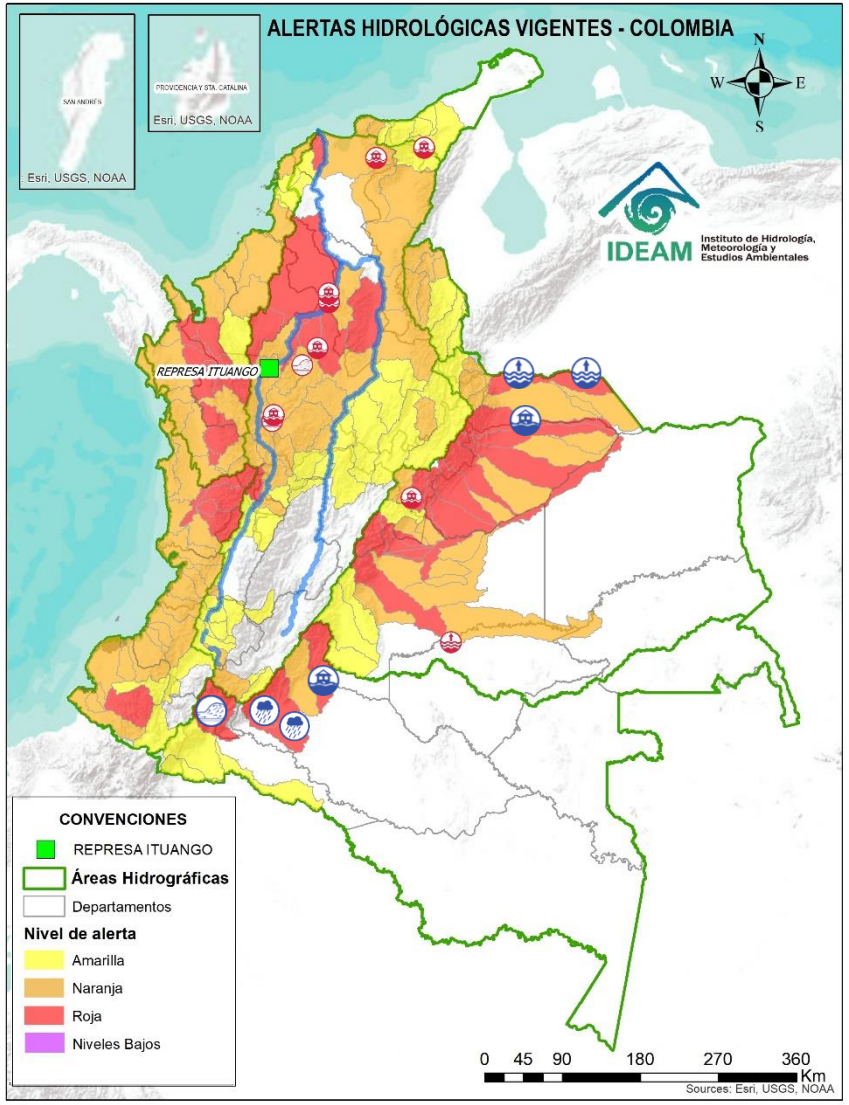

ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORADMIANETOS Y/O INUNDACIONES:
Orinoco	• Creciente súbita en el nivel del río Casanare y sus afluentes, especial atención en los municipios de Chita (Boyacá), Hato Corozal, La Salina, Sácama y Tame Casanare). **Nota:** se presentaron inundaciones por el desbordamiento del río Casanare en las veredas La Argentina, Berlín, El Banco Buenos Aires, San Nicolás, Suní, Casanarito, El Sarrapio, La Manga, Altamira, Pueblo Nuevo, Puente Casanare, Santa Teresa y el Cilantral del municipio de Hato Corozal Casanare (29/05/2024). • Niveles altos del río Arauca a la altura del municipio de Arauquita, Arauca; así como probabilidad de crecientes súbitas del río Banadía entre otros directos al río Arauca y sus aportantes. Se recomienda especial atención en los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y el centro poblado de Puerto Nariño del municipio de Saravena, como a las demás poblaciones ribereñas al río Arauca. • Niveles altos del río Arauca a la altura del municipio de Arauca, Arauca.
Amazonas	• Crecientes súbitas en la cuenca alta del río Caquetá, se recomienda especial atención en el río Mocoa y sus afluentes los ríos Rumiyaco, Tarauquita, Pepino, Sangoyaco, Dantayaco y Mulato, entre otros aportantes a la cuenca alta del río Caquetá. Igual atención al río Inchiyaco y Tambor en el municipio de Piamonte (Cauca). **Nota:** Se reportaron inundaciones en la vereda San Luis a la altura del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo (29/05/2024). • Crecientes súbitas en el Alto Caguán y sus afluentes. Se recomienda especial atención en el municipio San Vicente del Caguán y Puerto Betania. (Caquetá). **Nota:** Desbordamiento del río Caguán a la altura de San Vicente del Caguán (29/05/2024). • Crecientes súbitas en el río Orteguaza y sus afluentes, los ríos Caraño y Hacha en el piedemonte caqueteño, a la altura del municipio de Florencia (Caquetá). Se recomienda especial atención en las ciudades de Florencia, Morelia y Paujil. • Probabilidad de crecientes súbitas en el río Pescado y sus afluentes, a la altura del municipio de Albania, Valparaíso y Belén de los Andaquíes (Caquetá). **Nota:** Desbordamiento del río Pescado sobre la vía Florencia - Valparaíso, en el sector de la Vega, en el municipio de Valparaíso, Caquetá (30/05/2024).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

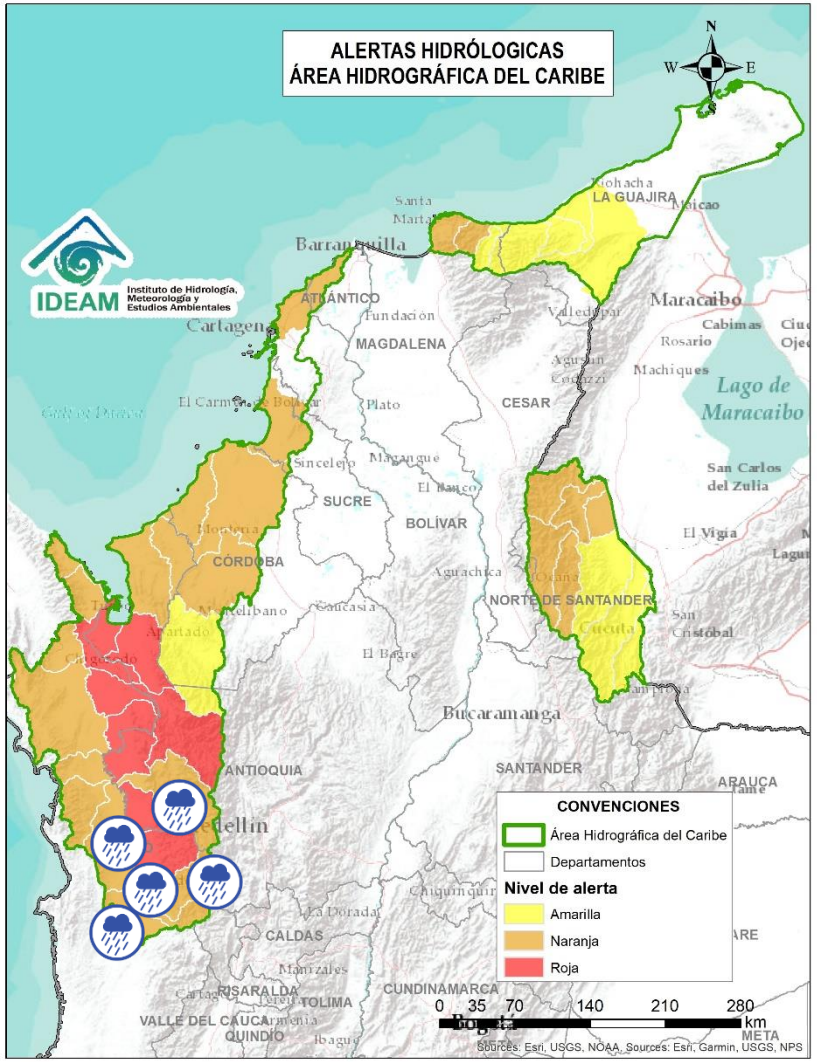

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Atrato - Darién	Cuenca alta del río Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas en la parte alta del río Atrato y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de El Carmen de Atrato, Lloró y Cértegui (Chocó).
	Atrato - Darién	Cuenca del río Andágueda	Probabilidad de crecientes súbitas en el nivel del río Andágueda y sus aportantes. Se recomienda especial atención en los municipios de Bagadó y Cértegui (Chocó).
	Atrato - Darién	Cuenca del río Quito	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Quito. Especial atención en el municipio de Cértegui (Chocó). **Nota:** Desbordamiento del río Atrato a la altura del Municipio de Atrato (29/05/2024).
	Atrato - Darién	Cuenca del río Cabi	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Cabi y otros directos al río Atrato y creciente súbita del río Atrato. Especial atención en los municipios de Atrato y Quibdó (Chocó).
	Atrato - Darién	Cuenca del río Bebaramá	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Bebaramá y otros Directos Atrato (md).
	Atrato - Darién	Cuenca media río Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH Directos al Atrato entre los ríos Quito y Bojayá (mi), espacialmente los ríos Beté y Tanguí, en la zona rural del municipio Medio Atrato. Se recomienda especial atención en el río Atrato a la altura de Vigía de Fuerte (Antioquia).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

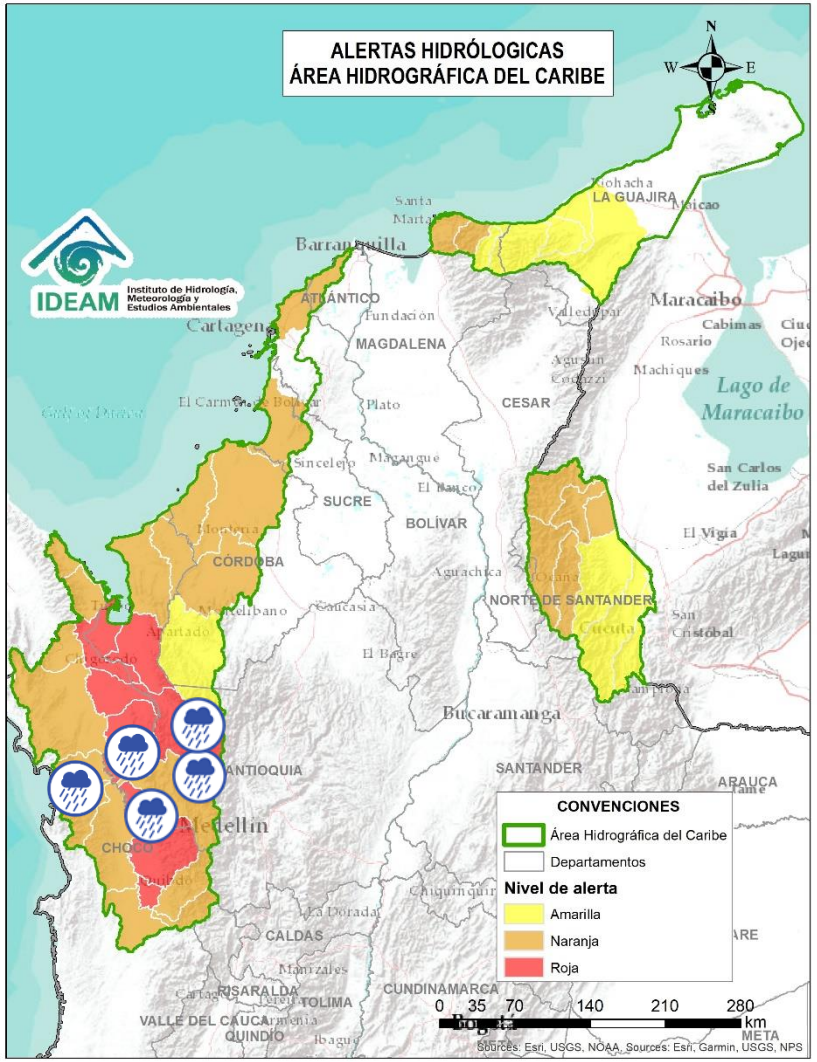

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Atrato - Darién	Cuenca Media del Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH de los directos al Atrato entre Bebaramá y Murrí (md).
	Atrato – Darién	Cuenca del río Murrí	Probabilidad de crecientes súbitas en los niveles del río Murrí y sus afluentes, especialmente el río Ocaidó entre otros directos a la parte media del río Atrato. Se recomienda especial atención en el municipio de Urrao y Vigía del Fuerte (Antioquia).
	Atrato - Darién	Cuenca del río Bojayá	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Bojayá y sus afluentes. Especial atención en el municipio de Bojayá (Chocó).
	Atrato – Darién	Cuenca del río Napipí – río Opogadó	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Napipí – río Opogadó y sus aportantes.
	Atrato - Darién	Cuenca del río Murindó	Probabilidad de creciente súbita del río Murindó y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Murindó, Vigía del Fuerte (Antioquia) y Carmen del Darién (Chocó).
	Atrato – Darién	Cuenca del río Sucio	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Sucio y sus afluentes. Se recomienda especial atención en las quebradas San José de Urama, El Tigre, Agualinda, La Encalichada, Cañada Seca, Desmotadora, La Antigua, La Caracol y Potreros, y los ríos Urumita y Herradura. Especial atención en los municipios de Nuevo Belén de Bajira, Frontino, Abriaquí, Uramita, Dabeiba, Cañasgordas y Mutatá (Antioquia). **Nota: 1)** Se reportó desbordamiento del río Sucio a la altura del corregimiento de Pavarandocito, en el municipio de Mutatá (Antioquia) (22/05/2024). **2)** Creciente súbita de la quebrada Camparusia en el sector Camparusia del municipio de Dabeiba, Antioquia (27/05/2024)

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

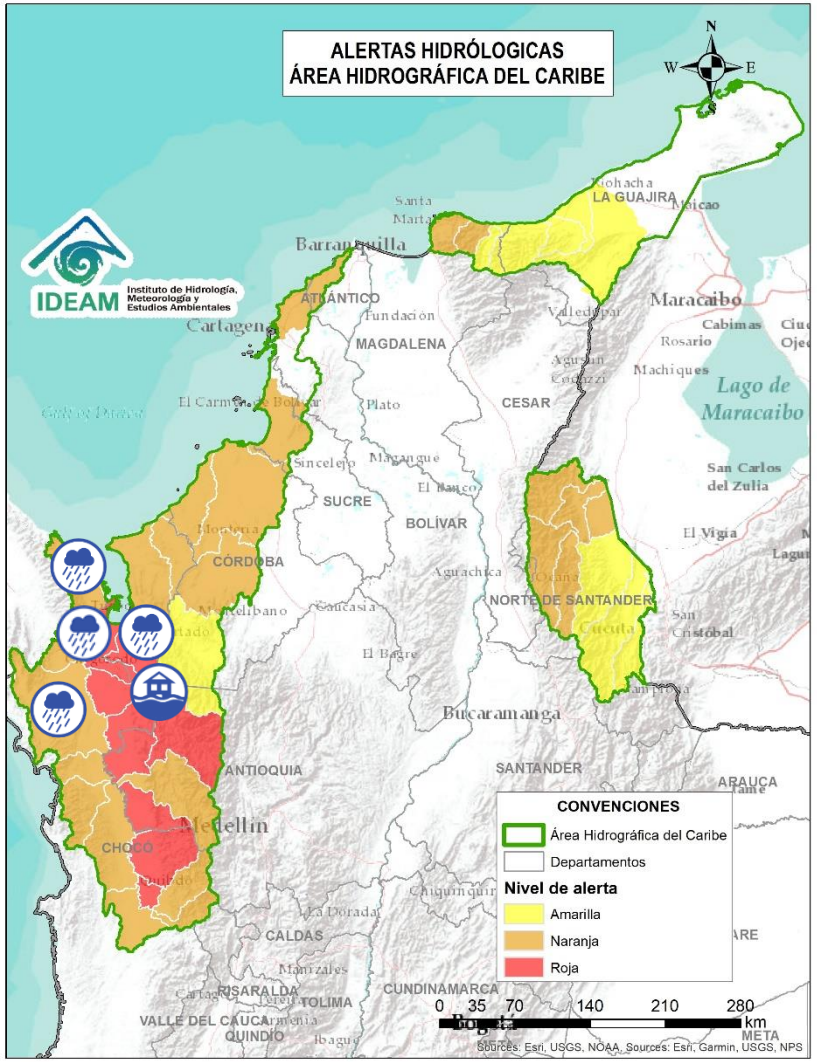

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Atrato – Darién	Cuenca del río Salaquí	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Salaquí y sus aportantes a la cuenca baja del río Atrato. Especial atención en el municipio de Riosucio (Chocó).
	Atrato – Darién	Cuenca del río Cacarica	Probabilidad de incrementos súbitos del río Cacarica y sus afluentes, especialmente en el río Domingodó, aportante a la cuenca baja del río Atrato. Especial atención en los municipios Carmen de Darién y Riosucio(Chocó).
	Atrato – Darién	Cuenca baja del río Atrato	Probabilidad de incrementos súbitos en la SZH Directos al Bajo Atrato entre río Sucio y Desembocadura al Mar Caribe. Especial atención en el municipio de Riosucio (Chocó).
	Atrato – Darién	Cuenca del río Tanela	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Tanela, aportante a la cuenca baja del río Atrato.
	Atrato – Darién	Cuenca del río Tolo	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Tolo entre otros directos al Caribe. Especial atención a la altura de los municipios de Acandí y Capurgana (Chocó).
	Caribe - Litoral	Cuenca del río León	Probabilidad de crecientes súbitas en el río León y sus afluentes, los ríos Carepa, Chigorodó, Apartadó, Grande y Vijagual, los cuales desembocan al Golfo de Urabá. Especial atención en los municipios de Turbo, Carepa, Chigorodó y Apartadó (Antioquia).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

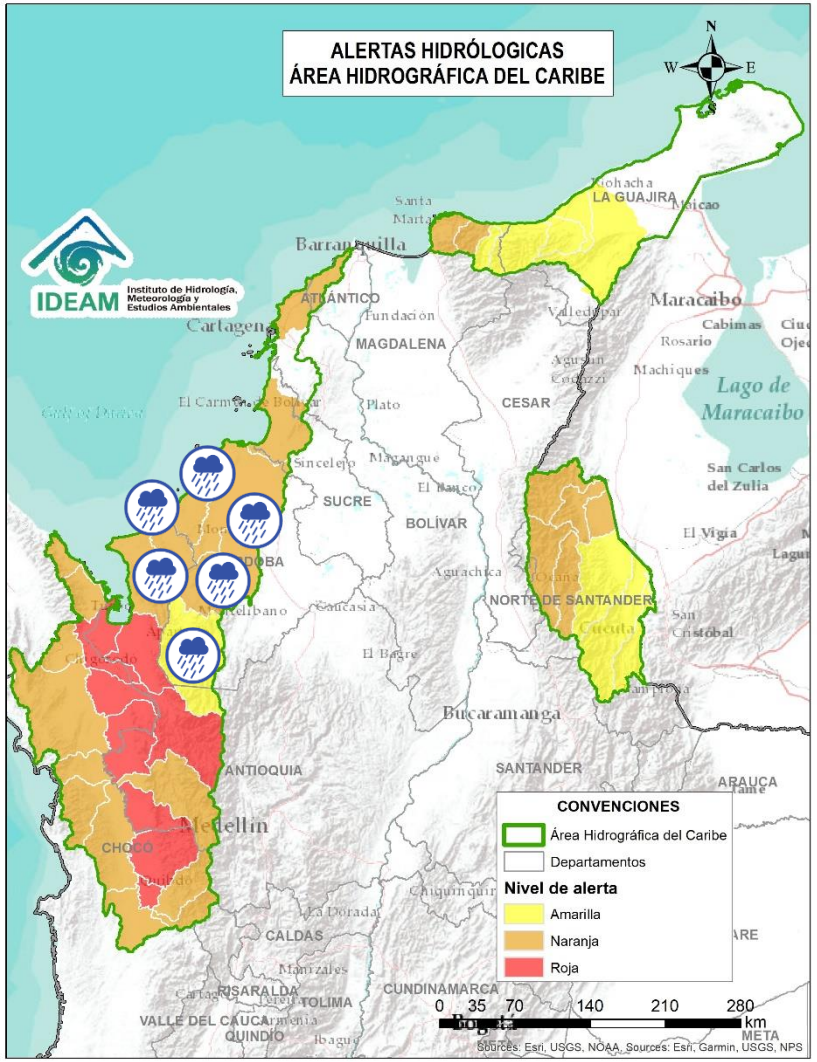

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Caribe - Litoral	Cuenca del río Mulatos	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Mulatos y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Turbo y Necoclí (Antioquia).
	Caribe - Litoral	Cuenca del río San Juan	Probabilidad de crecientes en el río San Juan y sus afluentes, entre otros arroyos directos al Caribe, especial atención en el municipio de Arboletes y San Juan de Urabá (Antioquia).
	Caribe - Litoral	Cuenca del río Canalete	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Canalete y sus afluentes, entre otros arroyos directos al Caribe, especial atención en el municipio de Arboletes (Antioquia).
	Sinú	Cuenca alta del río Sinú	Probabilidad de incrementos súbitos en los niveles del río Sinú y sus afluentes en la parte alta.
	Sinú	Cuenca media del río Sinú	Probabilidad de incremento en los niveles del río Sinú y sus afluentes (aguas abajo del Embalse de Urrá I), se recomienda especial atención en los centros poblados de Tierralta y Valencia (Córdoba).
	Sinú	Cuenca baja del río Sinú	Probabilidad de incremento en los niveles del río Sinú y sus afluentes en la parte baja, se recomienda especial atención en los municipios de San Pelayo, Cereté, Montería, Lorica y San Bernardo del Viento (Córdoba).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

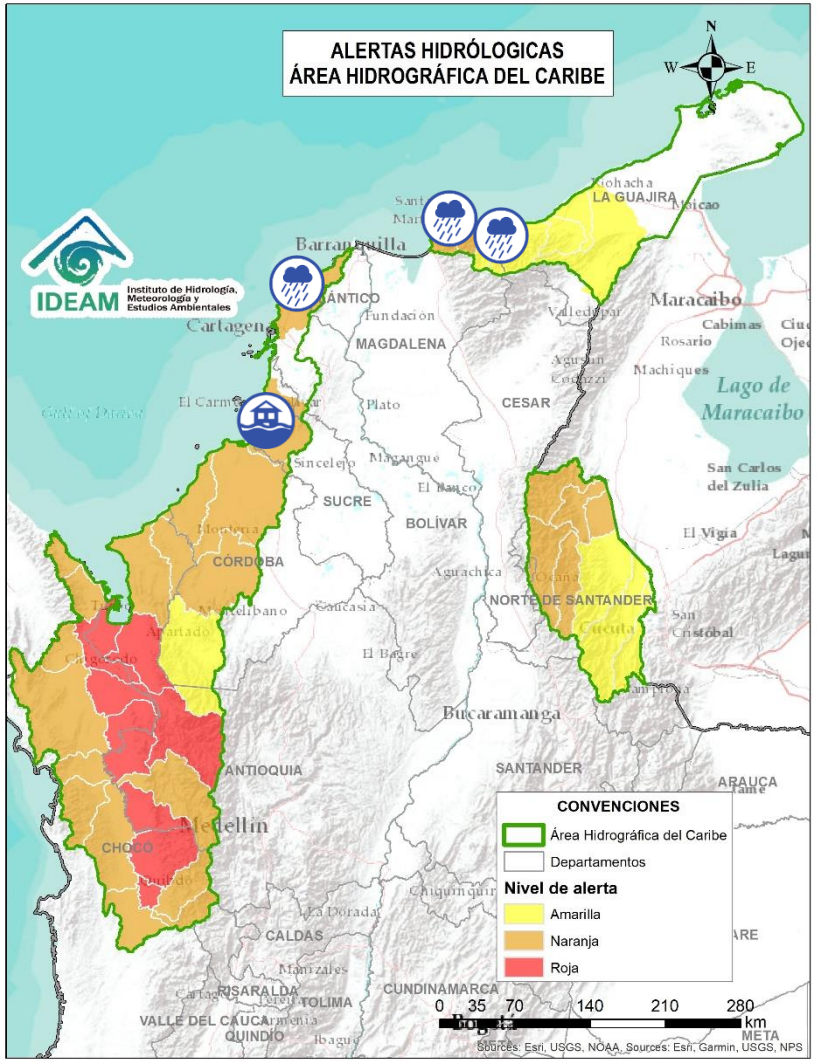

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Caribe - Litoral	Directos al Caribe Golfo de Morrosquillo	Probabilidad de crecientes súbitas o incrementos en los aportantes directos al Mar Caribe en el Golfo de Morrosquillo. Especial atención en los municipios de San Onofre, Tolú, Coveñas, Palmito, Toluviejo, Chalán, Colosó, Morroa y Sincelejo. **Notas**: **1)** Se reportan afectaciones por inundaciones en el municipio de Coveñas (Sucre) (22/05/2024). **2)** Se reportan inundaciones, generando afectaciones en el municipio de San Onofre (Sucre) (22/05/2024).
	Caribe - Litoral	Arroyos Directos al Caribe	Probabilidad de formación de arroyos en los directos al Mar Caribe, especialmente en el corregimiento Galerazamba en el municipio de Santa Catalina, la ciudad de Cartagena (Bolívar), en los municipios Juan de Acosta, Tubará y Puerto Colombia (Atlántico).
	Caribe - Guajira	Cuencas de los ríos Piedras y Manzanares	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos que descargan sus aguas al Mar Caribe, tales como los ríos Piedras y Manzanares, así como en sus aportantes como la quebrada Tigrera. Especial atención a la ciudad de Santa Marta y al corregimiento de Minca (Magdalena).
	Caribe - Guajira	Cuencas río Guachaca-Mendiguaca y Buritaca	Probabilidad de incrementos súbitos en los niveles de los ríos Guachaca, Mendiguaca y Buritaca
	Caribe - Guajira	Cuenca del río Don Diego	Probabilidad de incrementos súbitos en los niveles del río Don Diego.
	Caribe - Guajira	Cuenca del río Ancho	Probabilidad de incrementos súbitos en los niveles del río Ancho y otros directos al Caribe como el río Palomino. Se recomienda especial atención en el municipio de Dibulla (Guajira) y zona oriente de Santa Marta.

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

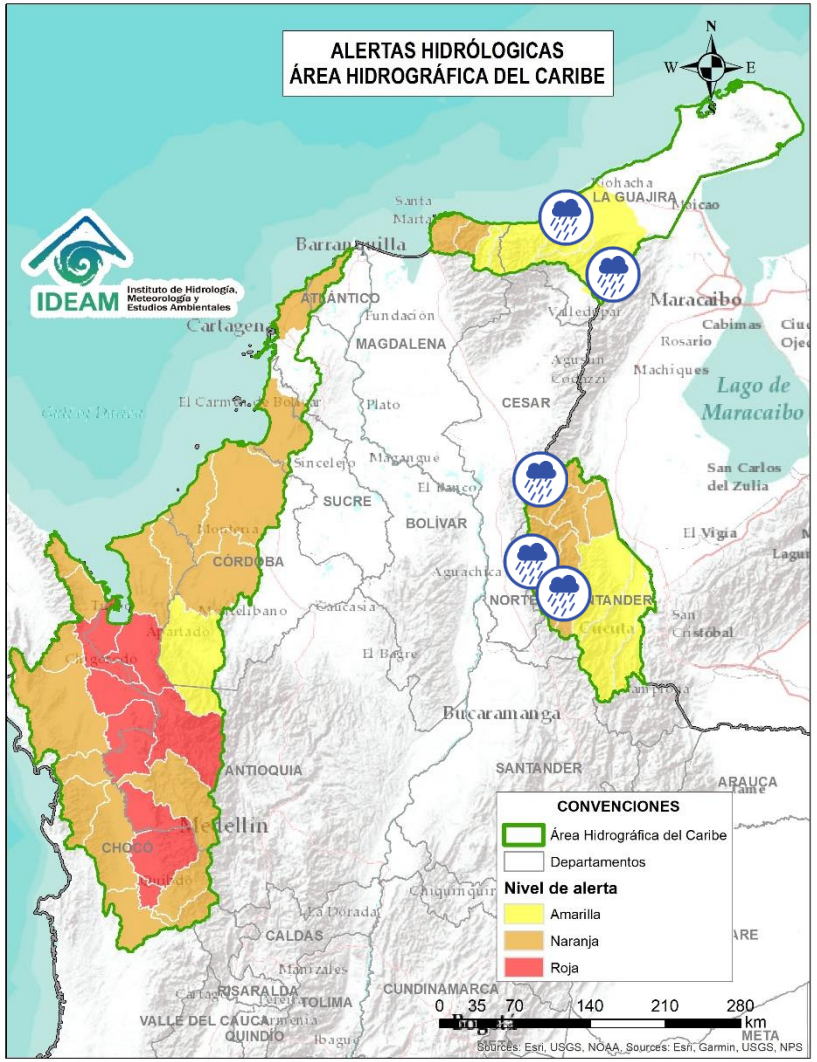

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Caribe - Guajira	Cuenca del río Tapias	Probabilidad de crecientes súbitas del río Tapias y sus afluentes como el río San Francisco, se recomienda especial atención en los municipios de Dibulla y Riohacha (Guajira).
⚠	Caribe - Guajira	Cuenca del río Camarones	Probabilidad de incrementos moderados en el nivel del río Camarones y sus afluentes, se recomienda especial atención en el municipio de Riohacha (Guajira).
⚠	Caribe - Guajira	Cuenca del río Ranchería	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Ranchería y sus afluentes, cómo arroyo Limón entre otros, especialmente en la cuenca alta. Especial atención en los municipios de Riohacha, Distracción, Fonseca, Albania, Barrancas y Hatonuevo, población de Manaure y comunidades indígenas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta como La Laguna, La Peña de los Indios, Ulago, Loma del Potrero, Marocazzo y Caracolí.
⚠	Catatumbo	Cuenca del río Algodonal	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Algodonal y sus afluentes, especialmente en las quebradas Las Liscas, El Loro y El Carbón. Se recomienda especial atención en los municipios de Convención, Ábrego, Ocaña y Teorama (Norte de Santander).
⚠	Catatumbo	Cuenca del río Tarra	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Tarra y sus tributarios. Especial atención en los municipios de Ábrego, Hacarí y El Tarra (Norte de Santander).
⚠	Catatumbo	Río del Suroeste y directos Río de Oro	Probabilidad de creciente súbitas en las cuencas de los ríos Suroeste y río de Oro.

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

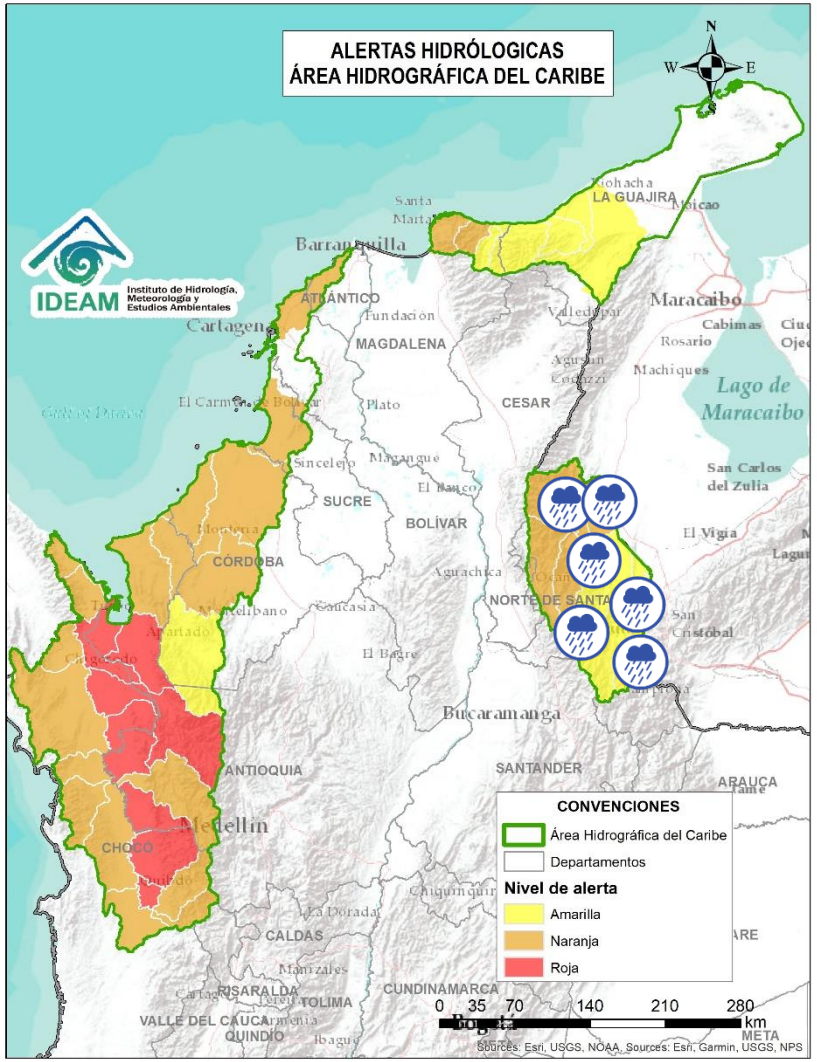

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Catatumbo	Bajo Catatumbo	Probabilidad de creciente súbitas en la cuenca baja del río Catatumbo. Especial atención a la altura del corregimiento de La Gabarra – Tibú.
	Catatumbo	Cuencas del río Socuavo	Probabilidad de creciente súbitas en la cuenca del río Socuavo. Especial atención en el municipio de Tibú (Norte de Santander).
	Catatumbo	Cuencas de los ríos Nuevo Presidente, Sardinata y Tibú	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Tibú, Sardinata, Nuevo Presidente y sus aportantes. Especial atención a la altura de los municipios de Villa Caro, Bucarasica, Lourdes, Sardinata y Tibú (Norte de Santander).
	Catatumbo	Cuenca del río Zulia	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Zulia y sus afluentes, especialmente para las quebradas La Desplayada, Siravita y La Floresta. Especial atención en los municipios de Mutiscua, Cucutilla, Arboledas, Salazar, Gramalote, Santiago, San Cayetano, El Zulia, Cúcuta y Puerto Santander (Norte de Santander).
	Catatumbo	Cuenca del río Pamplonita	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Pamplonita y sus afluentes, especialmente los ríos Grita y Cucutilla. Especial atención en municipio de Pamplona y en los sectores de Aguas Claras, Puerto León y Puerto Santander en el municipio de Cúcuta. Igualmente, se recomienda estar atentos en los municipios de Herrán y Ragonvalia.

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

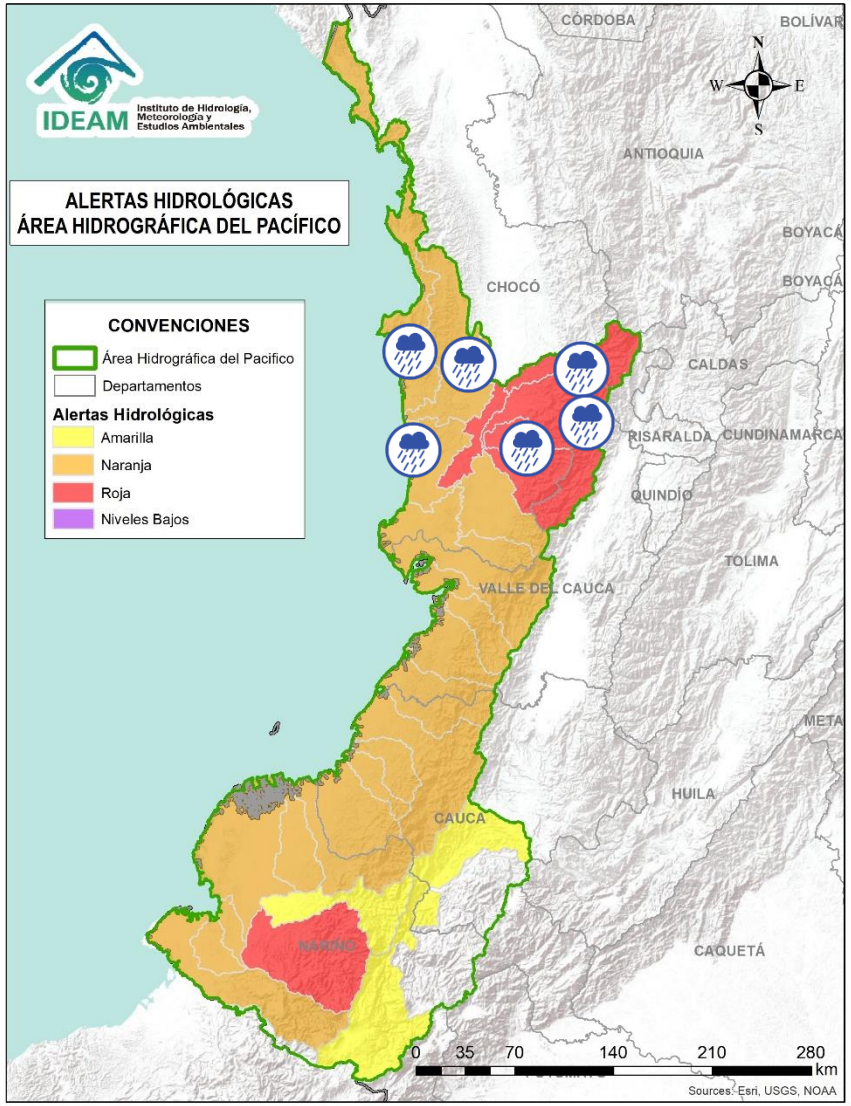

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Directos al Pacífico	Cuencas directas al Pacífico (Chocó)	Probabilidad de incrementos súbitos en el nivel de los ríos Jella, Chocolatal, Jurado y sus afluentes, entre otros directos al Océano Pacifico en el departamento de Chocó, se recomienda especial atención en los municipios de Bahía Solano y Juradó.
	Baudó - Directos al Pacífico	Cuenca del río Baudó	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Baudó y sus afluentes, especialmente los ríos Dubaza Catrú Cedro, Ancosó Cuguchó Berreberre, Pepé, Misará, Torreidó, Pavasa Siguirisua y Purricha. Se recomienda especial atención en los corregimientos de Santa María, Miacorá, Divisa, Cohecho, Chachajo, Santa Rita, La Pureza, Nauca, Almendro, Bellavista y Puerto Elacio, en los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó.
	Baudó - Directos al Pacifico	Cuenca del río Docampadó	Probabilidad de incrementos súbitos en los niveles del río Docampadó y sus afluentes, entre otros directos al océano Pacifico en el departamento de Chocó.
	San Juan	Cuenca alta del río San Juan	Probabilidad de crecientes en el río San Juan Alto y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico (Risaralda), y Tadó y Istmina (Chocó).
	San Juan	Cuenca del río Tamaná	Probabilidad de crecientes en las cuencas de los ríos Iró, Tamaná, Condoto, entre otros aportantes a la cuenca media del río San Juan. Especial atención a la altura de los municipios San José del Palmar, Rio Iró, Condoto, Novita y Medio San Juan (Chocó).
	San Juan	Cuenca del río Cajón	Probabilidad de incrementos en los niveles de las cuencas del río Cajón entre otros aportantes a la cuenca media del río San Juan. Especial atención a la altura de los municipios Novita y Medio San Juan.

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

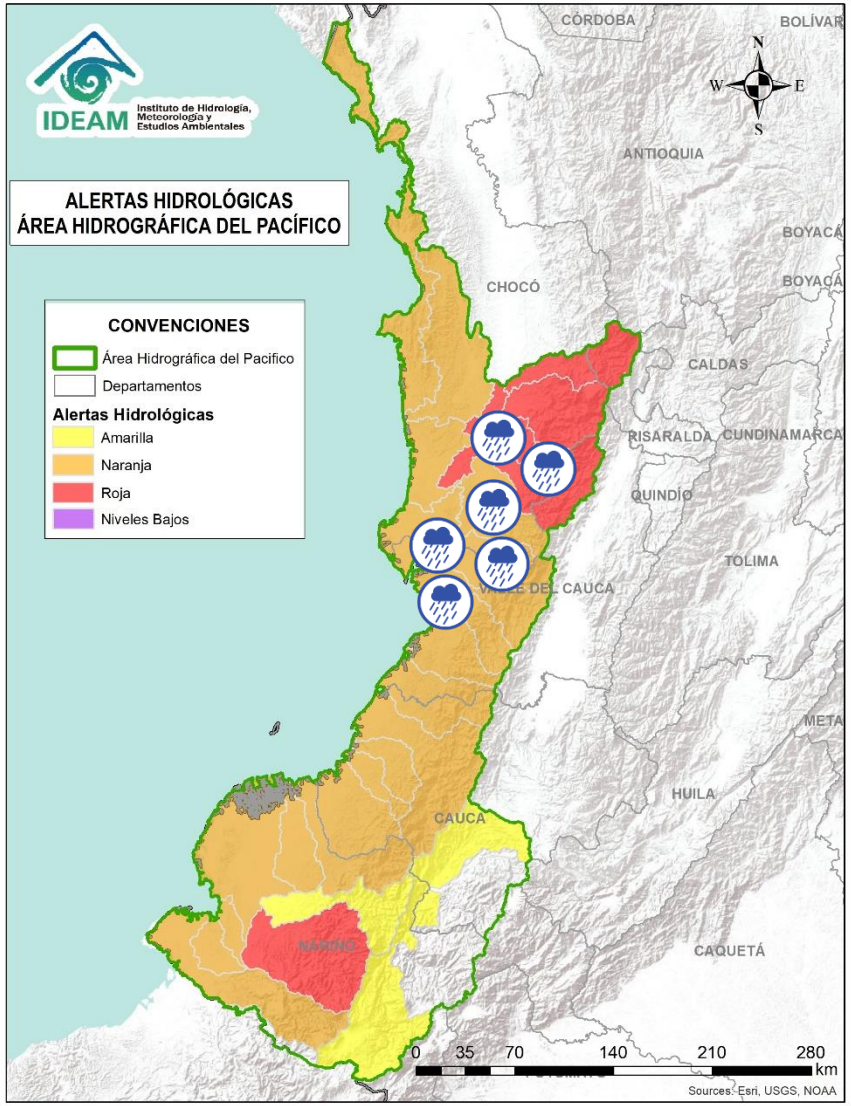

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	San Juan	Cuenca del río Sipí	Probabilidad de incrementos en los niveles de la cuenca del río Sipí, especialmente en los ríos Taparal, San Agustín y Garrapatas, a la altura del municipio de Sipí (Chocó) y río Sanquinini, a la altura del municipio de Bolívar (Valle del Cauca).
	San Juan	Cuenca media del río San Juan	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Iró, Tamaná, Condoto, entre otros aportantes a la cuenca media del río San Juan. Especial atención a la altura de los municipios San José del Palmar, Rio Iró, Condoto, Novita y Medio San Juan (Chocó).
	San Juan	Cuenca del río Capoma	Probabilidad de incrementos en los niveles de la cuenca del río Capoma y otros directos al San Juan, tales como, el río Cucurrupí y la quebrada Fujadó al igual que sus aportantes.
	San Juan	Cuenca del río Munguidó	Probabilidad de incrementos en los niveles de la cuenca del río Munguidó. Se recomienda especial atención en la vereda Las Delicias.
	San Juan	Ríos Calima y Bajo San Juan	Probabilidad de incrementos en los niveles de las cuencas de los ríos Calima y Bajo San Juan. Se recomienda especial atención a el municipio de Litoral de San Juan (Chocó) y los municipios Calima, Darién, Buenaventura y Bahía Málaga (Valle del Cauca). **Nota**: Se presentó inundación el 23 de mayo por desbordamiento de los ríos Copomá y San Juan.
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Dagua	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Dagua y sus afluentes, especialmente en el río Bitaco a la altura del municipio de La Cumbre (Valle del Cauca). Se recomienda especial atención en los municipios de Dagua, La Cumbre y Buenaventura (Valle del Cauca).

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

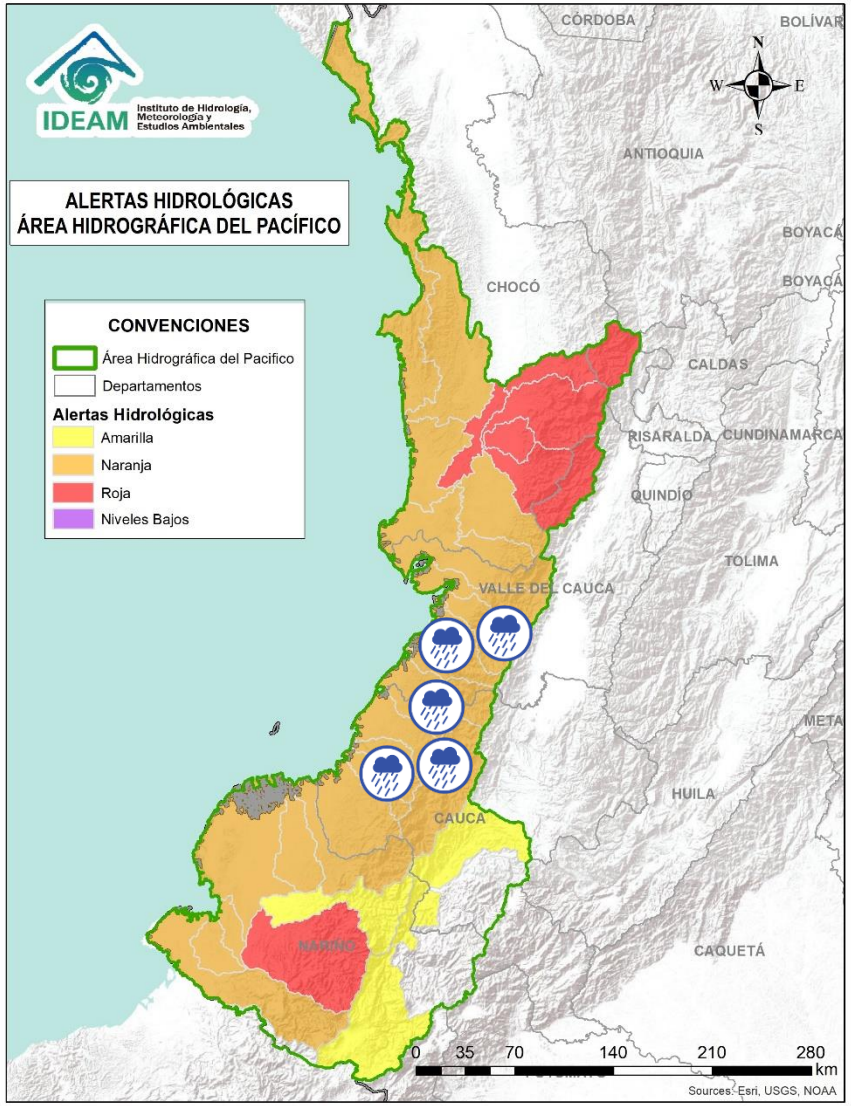

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Anchicayá	Probabilidad de creciente súbita en el río Anchicayá y sus afluentes, que drena sus aguas hacia el Océano Pacífico en el departamento del Valle del Cauca. Se recomienda especial atención en el municipio de Dagua y Buenaventura (Valle del Cauca).
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuencas de los ríos Cajambre, Mayorquín y Raposo	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Cajambre, Mayorquín, Raposo y sus afluentes, directos al Océano Pacífico en el departamento del Valle del Cauca. Se recomienda especial atención en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca).
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Naya – Yurumanguí	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Naya – Yurumanguí y sus afluentes, especialmente el río San Francisco, a la altura del municipio de López de Micay (Cauca).
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río San Juan de Micay	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Juan de Micay y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico. Se recomienda especial atención en los municipios de Argelia, San Miguel y López de Micay (Cauca).
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Saija	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Saija y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico.
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Timbiquí	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Timbiquí y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico. Especial atención en el municipio de Timbiquí (Cauca).

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

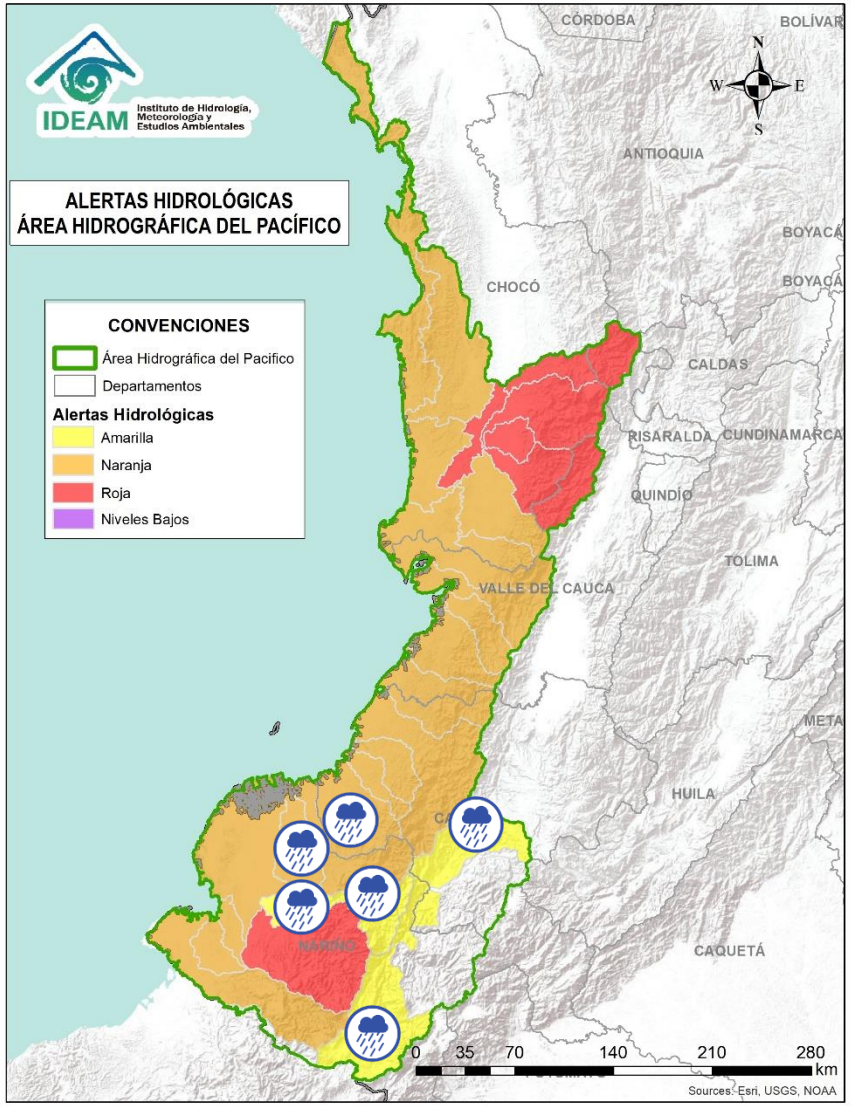

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Guapi	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guapi y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico. Especial atención en el municipio de Guapi (Cauca).
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Iscuandé	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Iscuandé y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico. Especial atención en el municipio de Santa Bárbara Iscuandé (Nariño).
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Tapaje	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Tapaje y sus afluentes, el cual drena sus aguas al Océano Pacífico en el departamento de Nariño.
	Patía	Cuenca alta del río Patía	Probabilidad de crecientes súbitas en el Alto Patía y sus afluentes, particularmente en los ríos Timbío, Quilcacé y Guabas, y las quebradas Sachamates, San Gandinga, Las Tallas y El Águila. Se recomienda especial atención en los municipios de El Tambo, Patía, Mercaderes y Balboa (Cauca), y Leiva (Nariño).
	Patía	Cuenca media del río Patía	Probabilidad de incrementos en los niveles en la cuenca media del río Patía y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Cumbitara, El Charco, El Rosario, Leiva, Los Andes (Sotomayor), Magüí (Payán), Policarpa (Nariño).
	Patía	Cuenca del río Guáitara	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guáitara y sus aportantes. Especial atención en los municipios de Santacruz, Yacuanquer y El Tambo (Nariño).

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

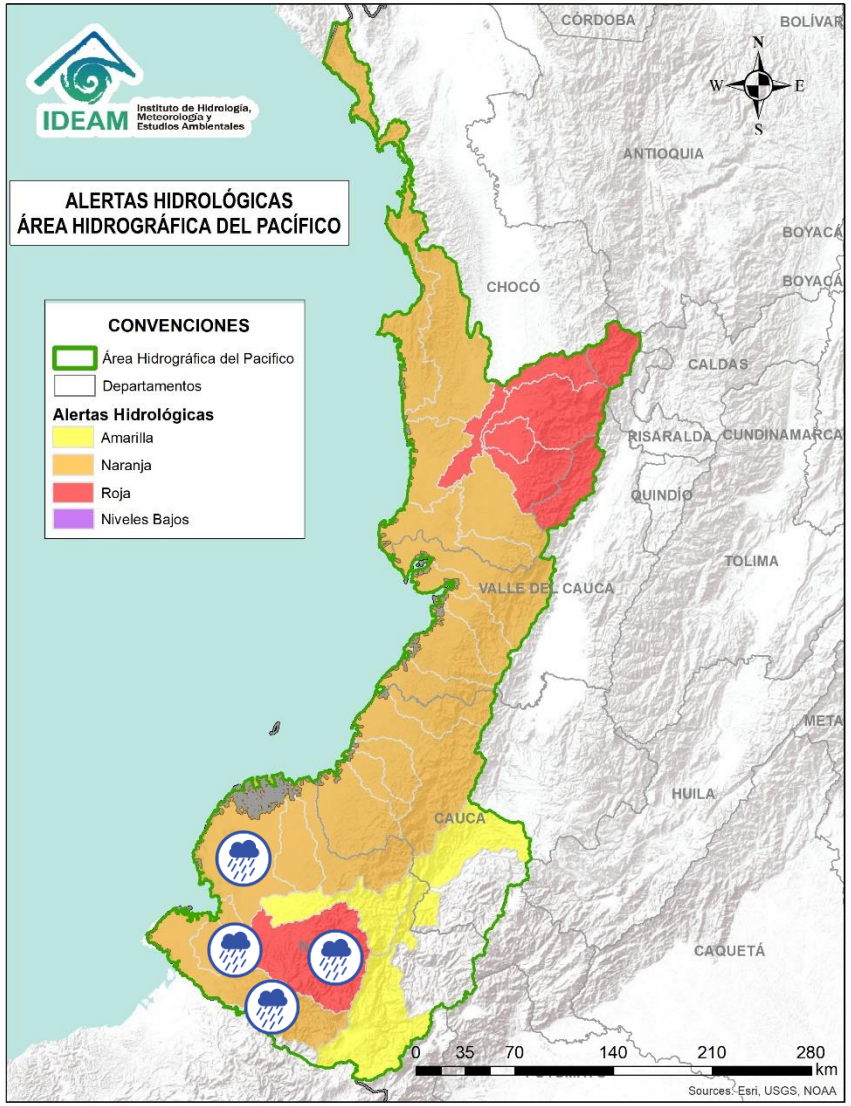

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Patía	Cuenca del río Telembí	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Telembí y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de Barbacoas y Mallama (Nariño).
	Patía	Cuenca baja del río Patía	Probabilidad de incrementos en los niveles de la parte baja del río Patía y sus afluentes, el cual descarga sus aguas al océano Pacífico en el departamento de Nariño. Estar atentos en Bocas de Satinga.
	Mira	Cuenca del río Chagüi	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Chagüi y sus afluentes. Se recomienda especial atención en el municipio de Tumaco (Nariño).
	Mira	Cuenca del río Rosario	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Rosario y sus afluentes. Se recomienda especial atención en el municipio de Tumaco (Nariño).
	Mira	Cuenca del río Mira	Crecientes súbitas en el río Mira con valores que superan la cota de afectación a la altura del municipio de San Andrés de Tumaco. Similar condición se preve en sus afluentes, tales como, los ríos Guiza, San Juan y Chagüi. Se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Barbacoas, Ricaurte y San Andrés de Tumaco (Nariño).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Magdalena)


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

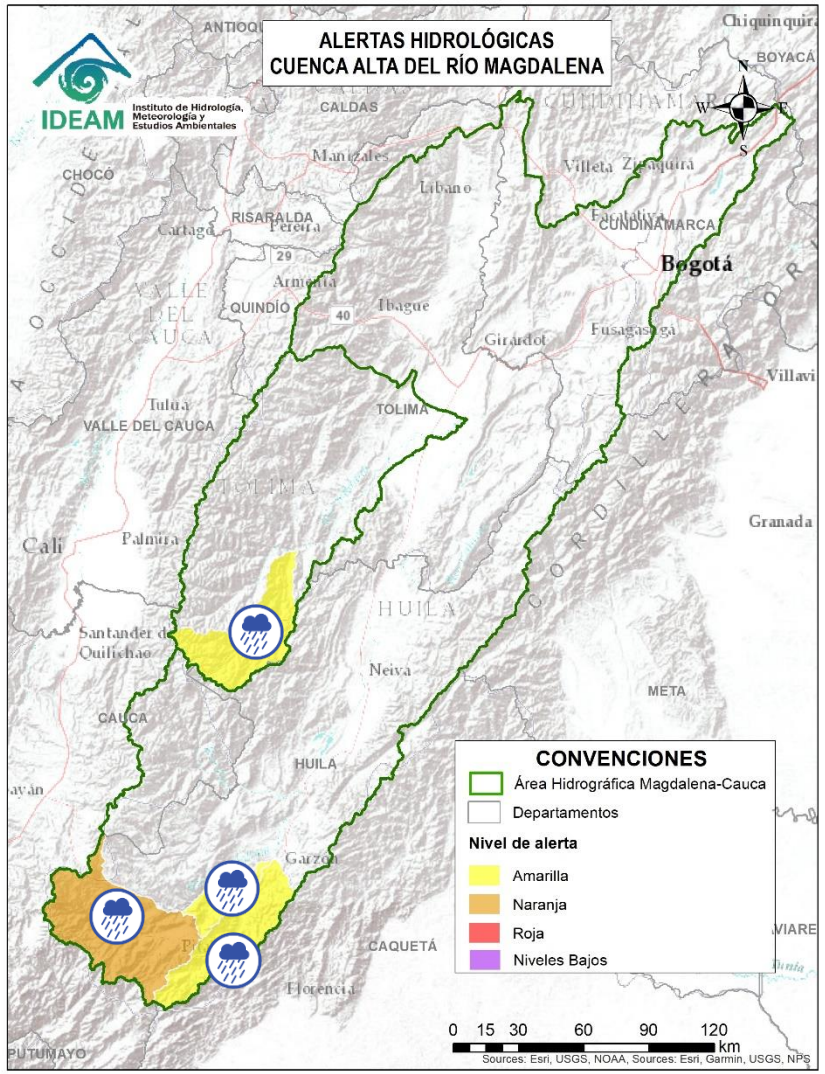

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Alto Magdalena	Cuenca alta del río Magdalena	Probabilidad de crecientes súbitas en el Alto Magdalena y sus aportantes, especialmente el río Guachicos y río Guarapas. Especial atención en los municipios de San Agustín, Isnos, Palestina, Pitalito y Elías (Huila).
⚠	Alto Magdalena	Cuenca del río Suaza	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Suaza y sus aportantes. Especial atención en los municipios de Acevedo, Suaza y Guadalupe (Huila).
⚠	Alto Magdalena	Cuenca del río Timaná	Probabilidad de incrementos súbitos de nivel en la cuenca del río Timaná, otros directos al Magdalena y sus aportantes. Se recomienda, estar atentos a la altura de los municipios de Timaná, Altamira y Elías (Huila).
⚠	Saldaña	Cuenca del río Atá	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Atá, aportante al Alto Saldaña en el departamento del Tolima.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Magdalena)


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

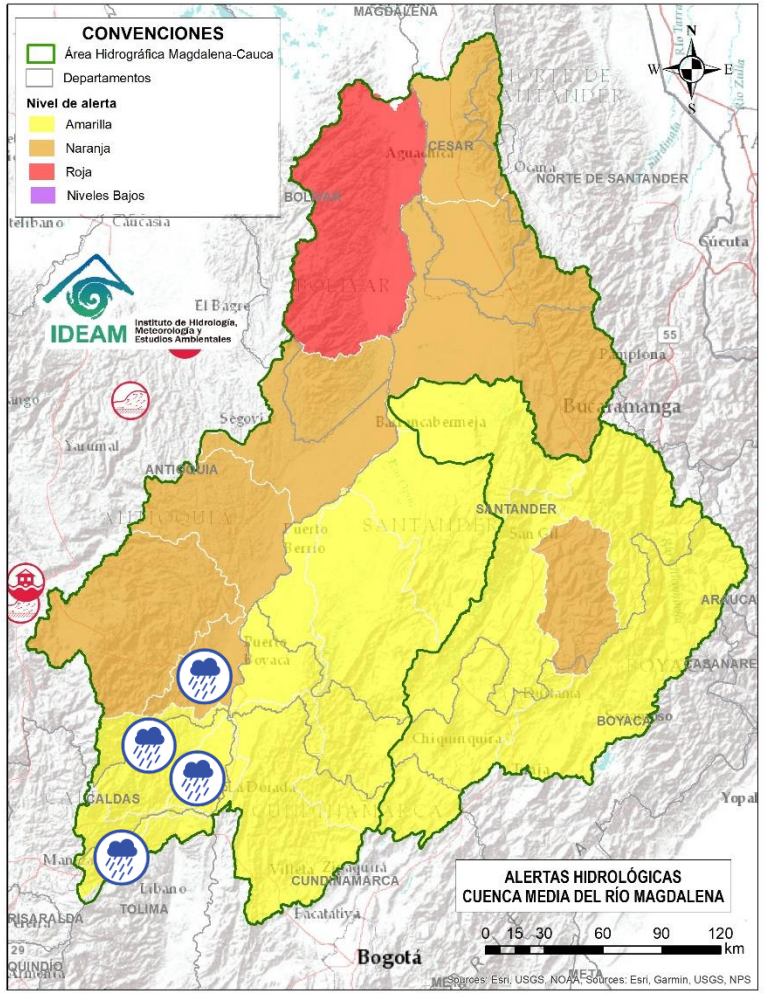

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Medio Magdalena	Cuenca del río Gualí	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Gualí y sus afluentes, especialmente en el río San Juan. Especial atención en los municipios de Fresno (Tolima), Mariquita (Tolima), Pensilvania (Caldas), Casablanca (Tolima) y Samaná (Caldas).
	Medio Magdalena	Cuenca del río Guarinó	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Guarinó, especialmente en la quebrada San Antonio y el río Perrillo. Especial atención en el municipio de Manzanares (Caldas).
	Medio Magdalena	Directos al Medio Magdalena entre los ríos Guarinó y La Miel	Probabilidad de crecientes súbitas en los directos al Medio Magdalena entre los ríos Guarinó y La Miel, se recomienda especial atención en el municipio de La Dorada (Caldas).
	Medio Magdalena	Cuenca del río La Miel (Samaná)	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río La Miel, especialmente en sus aportantes. Especial atención en los municipios de Marquetalia, Samaná, Pensilvania, Norcasia (Caldas), Argelia, Nariño y Sonsón (Antioquia).
	Medio Magdalena	Cuenca de los directos al Magdalena entre La Miel y Nare	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes directos al Medio Magdalena entre los ríos La Miel y Nare, especialmente en el río Claro (Cocorná Sur). Especial atención a la altura de los municipios de Sonsón, Puerto Triunfo, Puerto Nare y San Francisco (Antioquia).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Magdalena)


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

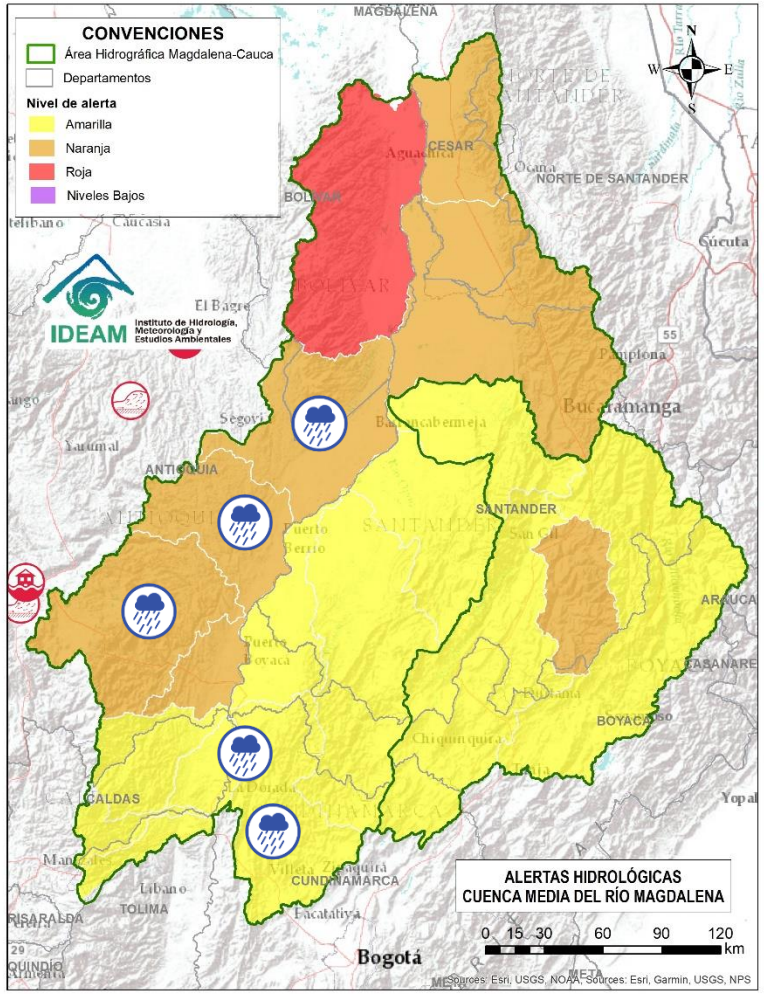

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Medio Magdalena	Cuenca del río Nare	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Nare y sus afluentes, especialmente en los ríos Guatapé, Nus, Negro, Pantanillo y las quebradas San Roque, La Pereira, La Grande, Marinilla, El Arenal, La Mosca, Santa Gertrudis, Guayabal, La Chorrera, La Paisanita, La Aguada, La Cristalina, Bodegas, Tenería y La Reina. Se recomienda estar atentos en los municipios de Guarne, El Retiro, La Ceja, Cisneros, San German, San Roque, Caracolí, Santo Domingo, Concepción, Rionegro, Santuario, Marinilla, Cocorná, San Luis, Yolombó, Puerto Nare, San Francisco, San Carlos y San Rafael (Antioquia).
⚠	Medio Magdalena	Cuenca del río San Bartolo	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río San Bartolomé, especialmente en sus aportantes de la cuenca Media-Baja, estar atentes en los ríos Vegachi y Regla, y la quebrada La Malena, entre otros. Especial atención en los municipios de Yolombó, Vegachi, Yondó y Puerto Berrio (Antioquia).
⚠	Medio Magdalena	Cuenca del río Cimitarra	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cimitarra y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Cantagallo (Bolívar), Yondó y Remedios (Antioquia).
⚠	Medio Magdalena	Directos al medio Magdalena entre los ríos Seco y Negro	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes directos al Medio Magdalena entre los ríos Seco y Negro. Especial atención en el municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca).
⚠	Medio Magdalena	Cuenca del río Negro	Probabilidad de crecientes súbitas del río Negro y sus aportantes, se recomienda especial atención en los ríos Bunque, Villeta, Tobia, Negro, Contador, Guaguaqui, Moras y Las Cañas, y las quebradas Reyes, Amarilla, La Negra, La Chorrera, Cune, Agua Clara, La Papaya, Retama, Furatena y Honduras. Especial atención en los municipios de Villeta, Nimaima, Supatá, La Peña, San Francisco, Útica, La Vega, Caparrapí, Sasaima, Tobia, Guaduas, Pacho, Villagómez, Quebradanegra y Yacopí (Cundinamarca).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Magdalena)


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

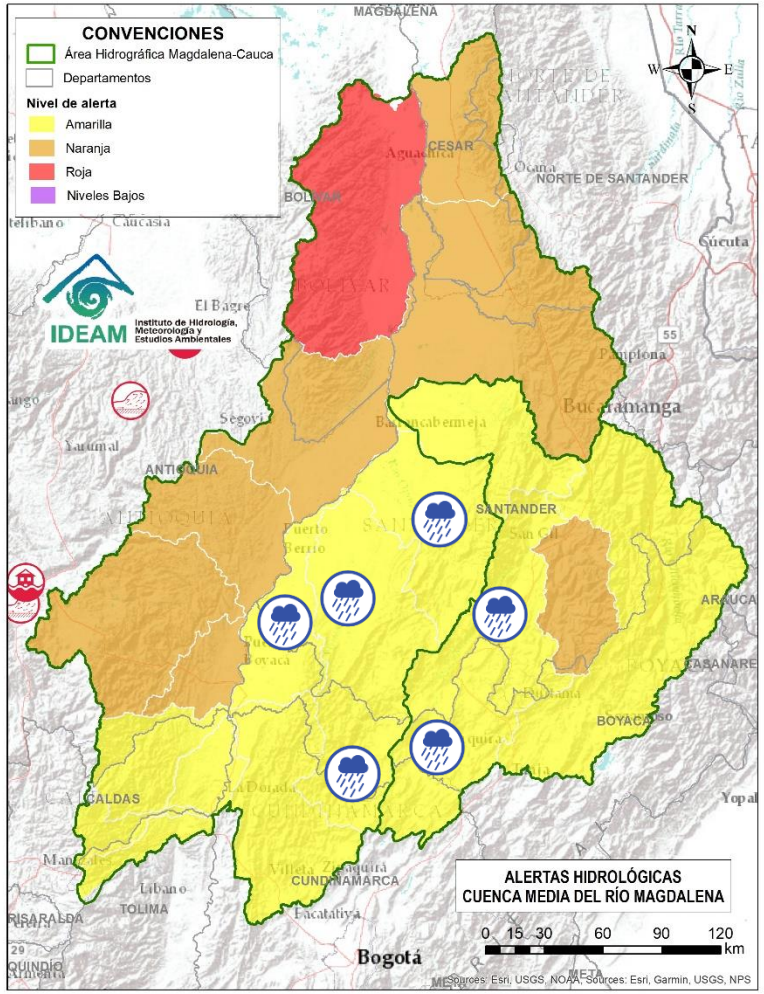

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Medio Magdalena	Directos al Magdalena Medio entre ríos Negro y Carare	Probabilidad de crecientes súbitas en los directos al Medio Magdalena entre los ríos Negro y Carare, especialmente en los ríos Guaguaqui y Ermitaño, y el caño Loco. Se recomienda especial atención en el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).
⚠	Medio Magdalena	Cuenca alta del río Carare	Probabilidad de crecientes súbitas en los niveles de los ríos Minero y sus afluentes (Cuenca alta del río Carare), se recomienda especial atención en los municipios de San Cayetano (Cundinamarca), Pauna, Muzo, Otanche, Buenavista, San Pablo de Borbur y Quípama (Boyacá).
⚠	Medio Magdalena	Cuenca media y baja del río Carare	Probabilidad de crecientes súbitas en la parte media y baja de la cuenca del río Carare. Especial atención en los municipios de Albania, Florián, La Belleza, Sucre, El Peñón, Cimitarra y Puerto Parra (Santander).
⚠	Medio Magdalena	Cuenca del río Opón	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Opón y sus tributarios, espacialmente en la quebrada Capote y en los ríos Cascajales, Honduras, Bermelanola y La Colorada. Especial atención a la altura de los municipios Santa Helena, Puerto Parra y El Carmen del Chucuri (Santander).
⚠	Sogamoso	Cuenca del río Suárez	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Suárez y sus afluentes, especialmente en los ríos Cane, Moniquirá, Jupal, Cedaba y las quebradas La Honda y Favitera. Se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Ubaté, Fúquene (Cundinamarca), Chiquinquirá, Saboya, Chitaraque, Arcabuco, Villa de Leyva, Guachantivá, Saboyá, Santa Sofía, Moniquirá (Boyacá), Barbosa, Puente Nacional, Guadalupe, Oiba, Suata, Güepsa, San Benito, Simacota, Socorro, Palmar, Cabrera, Galán y Villanueva (Santander).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Magdalena)


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

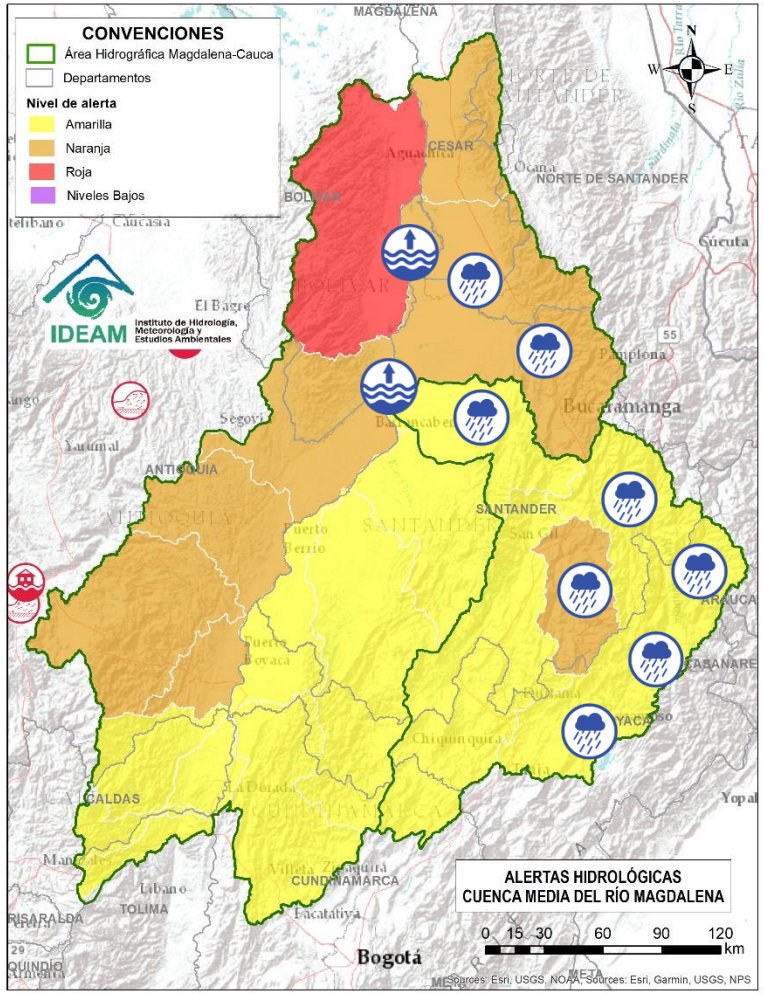

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Sogamoso	Cuenca del río Fonce	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Fonce y sus afluentes, especialmente las quebradas Curití, Pozo Azul, Las Américas y río Mogoticos. Se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Mogotes, Charalá, San Gil, Curití y Paramo (Santander).
	Sogamoso	Cuenca del río Chicamocha	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Chicamocha y aportantes a la altura del municipio de Corrales se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Paipa, Duitama, Nobsa, Tunja, Tibasosa, Sogamoso, Tópaga, Corrales, Betéitiva, Paz De Río, Chiscas, Corrales, Busbanza, Paz del Río y Belén (Boyacá), así como en la cuenca baja en los municipios de Guaca, San Andrés, Cerrito, Capitanejo (Santander).
	Sogamoso	Cuenca del río Chicamocha	**Alerta puntual:** Probabilidad de nuevos incrementos súbitos en el rio Bajira a la altura del municipio de Chiscas (Boyacá).
	Sogamoso	Cuenca del río Sogamoso	Probabilidad de crecientes súbita en el río Sogamoso y sus afluentes. Estar atentos a la altura del municipio de Barrancabermeja.
	Medio Magdalena	Parte media del río Magdalena	Niveles altos en el río Magdalena entre San Pablo y Simití (Bolívar). Se recomienda especial atención ante posibles afectaciones por desbordamientos e inundaciones.
	Medio Magdalena	Cuenca del río Lebrija	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Lebrija y sus aportantes. Especial atención en los ríos Cáchira, Oro, Charta, Florida Blanca, San Pablo, El Playón, Hato y quebrada San Alberto a la altura de los municipios de Sabana de Torres, Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón y Rionegro (Santander).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Magdalena)


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

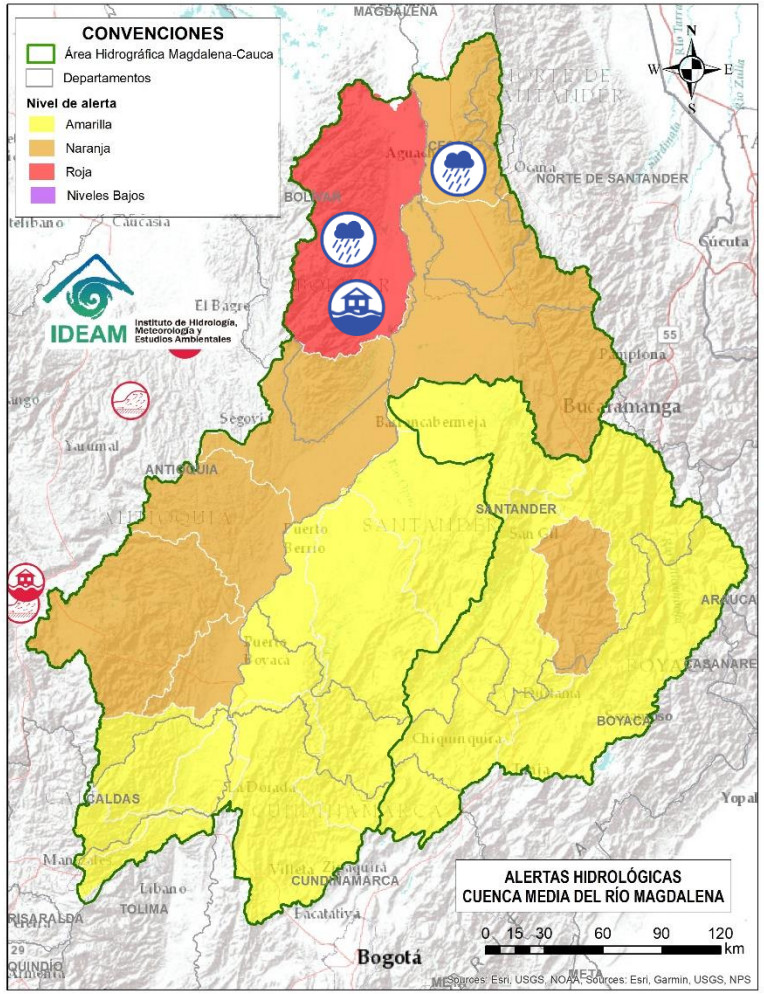

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Medio Magdalena	Directos al Magdalena (Brazo Morales)	Probabilidad de incremento en los niveles en los ríos directos al Magdalena en el Brazo Morales y sus aportantes. **Nota:** Rompimiento del jarillón en el sector Campo Payares y El Piñal, el 70% de la zona rural esta inundada en el municipio de Simití - Bolívar (14 y 15 de mayo de 2024).
	Medio Magdalena	Quebrada El Carmen	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH de la Quebrada el Carmen, entre otros directos al Medio Magdalena, especialmente en los caños El Cristo y Pital, y quebrada Buturama. Especial atención en el municipio de Aguachica (Cesar).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Cauca)


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

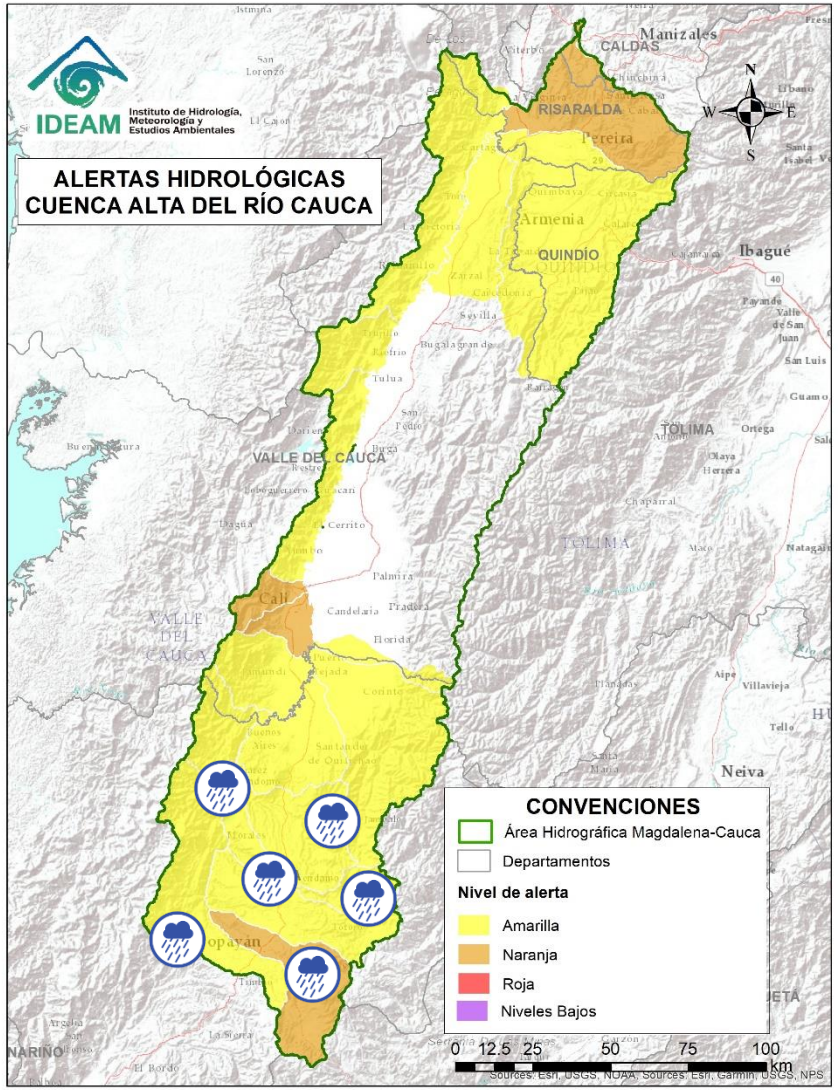

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Alto Río Cauca	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH del Alto Cauca, especialmente en el río San Francisco en el municipio de Puracé (Cauca), también en el río Piedras y la quebrada Pubus en el municipio de Popayán (Cauca). **Nota:** Creciente súbita del río Bedón, a la altura del sector de Santa Leticia municipio de Puracé Cauca (29/05/2024).
⚠	Cauca	Cuenca del río Salado	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Salado y sus afluentes como el río Negro (Cauca). Especial atención entre los municipios de El Tambo, Sotará y Puracé (Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río Palacé	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Palace y sus afluentes (aportante al Alto Cauca). Especial atención en los municipios de Totoró, Popayán y Cajibío (Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río Piendamó	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Piendamó, especialmente en la quebrada Manchay. Se recomienda especial atención en los municipios de Silvia, Piendamo, Morales y Suárez (Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río Ovejas	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Ovejas, especialmente en los municipios de Caldono y Piendamó (Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río Timba	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Timba y sus afluentes. Especial atención entre los municipios de El Cedral y Buenos Aires (Cauca).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Cauca)


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

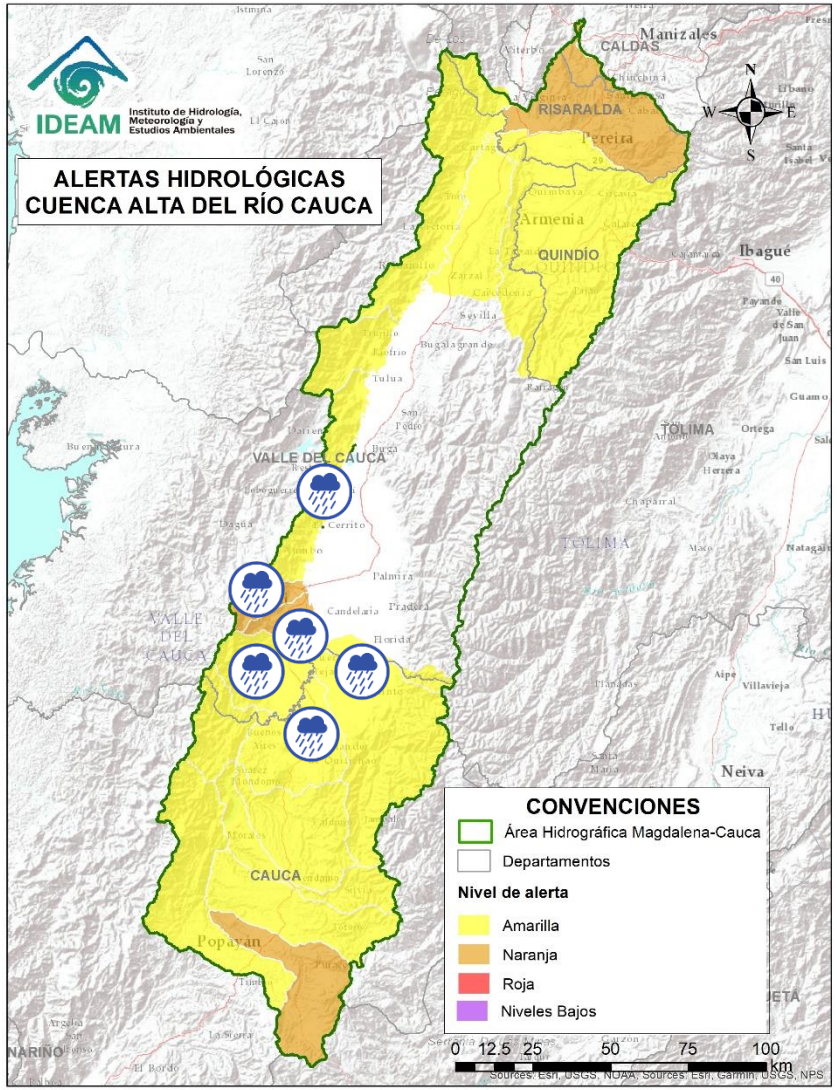

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Cuenca del río Quinamayo	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Quinamayo, Quilichao y aportantes. Especial atención en los municipios de Caloto y Santander de Quilichao (Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca de los ríos Claro y Jamundí	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Claro, Jamundí, Pance y sus afluentes.
⚠	Cauca	Cuencas de los ríos Lilí, Meléndez y Cañaveralejo	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Lilí, Meléndez y Canaveralejo, afluentes al Alto Cauca en el departamento de Valle del Cauca. Se recomienda especial atención en la ciudad de Cali.
⚠	Cauca	Cuenca del río Cali	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cali y sus afluentes. Se recomienda especial atención en el sector norte de la ciudad de Cali. **Nota**: Se reportan inundaciones en vías principales y desbordamientos de canales de aguas lluvias en los sectores de Alto Menga, Montebello, La Flora, Chipichape y la Avenida 4a Norte (22/05/2024).
⚠	Cauca	Cuenca del río Desbaratado	Probabilidad de incrementos súbitos de nivel en la cuenca del río Desbaratado y sus afluentes, aportantes al río Cauca en el departamento Valle del Cauca.
⚠	Cauca	Cuencas aportantes al río Cauca en el departamento del Valle del Cauca	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH de los ríos Arroyohondo, Mulalo, Vijes, Yotoco, Mediacanoa, Piedras y sus afluentes (departamento de Valle del Cauca).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Cauca)


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

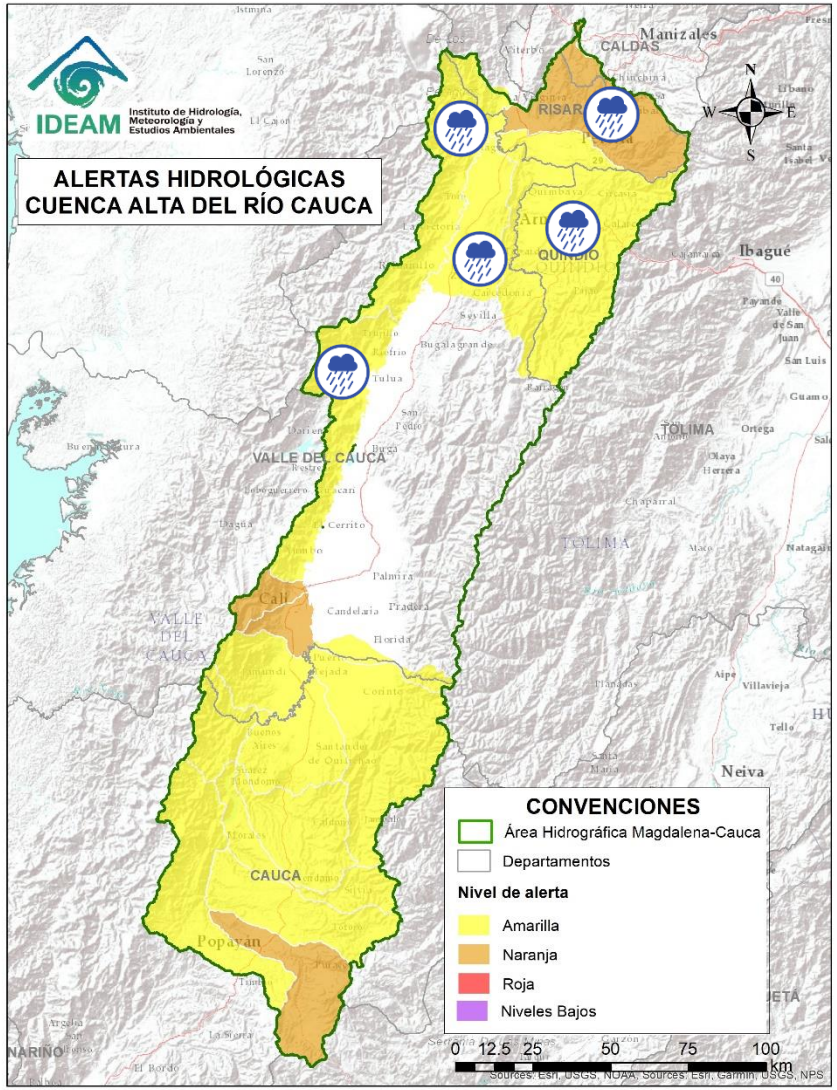

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Cuenca río Frío	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Frío y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Riofrío y Trujillo.
⚠	Cauca	Cuencas aportantes al río Cauca en el departamento del Valle del Cauca	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca de los ríos Las Cañas - Los Micos y Obando, aportantes al Cauca en el departamento Valle del Cauca. Especial atención en los municipios de Cartago y La Victoria.
⚠	Cauca	Ríos Pescador – RUT – Chanco – Catarina – Cañaveral	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Roldanillo, Cáceres, Quebrada El Rey, Zanjón Los Mudos y Quebrada La Unión asociados con el distrito de riego del RUT (ríos Roldanillo - La Unión - Toro) y pertenecientes a la subzona hidrográfica de los ríos Pescador, Chanco, Catarina, Cañaveral (departamento de Valle del Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río La Vieja	Probabilidad de crecientes súbitas en el río La Vieja y sus afluentes, especialmente en los ríos Verde (municipios de Córdoba y Buenavista) y Quindío (municipios de Calarcá y Salento), río Lejos y la quebrada La Iglesia (municipio de Pijao). Se recomienda especial atención en los municipios de Tebaida, Pijao, Génova, Armenia, Calarcá y Salento (Quindío), Caicedonia y Cartago (Valle del Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río Otún	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Otún y sus afluentes, especial atención al río San Eugenio. Se recomienda especial atención en los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Marsella y Pereira (Risaralda).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Cauca)


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

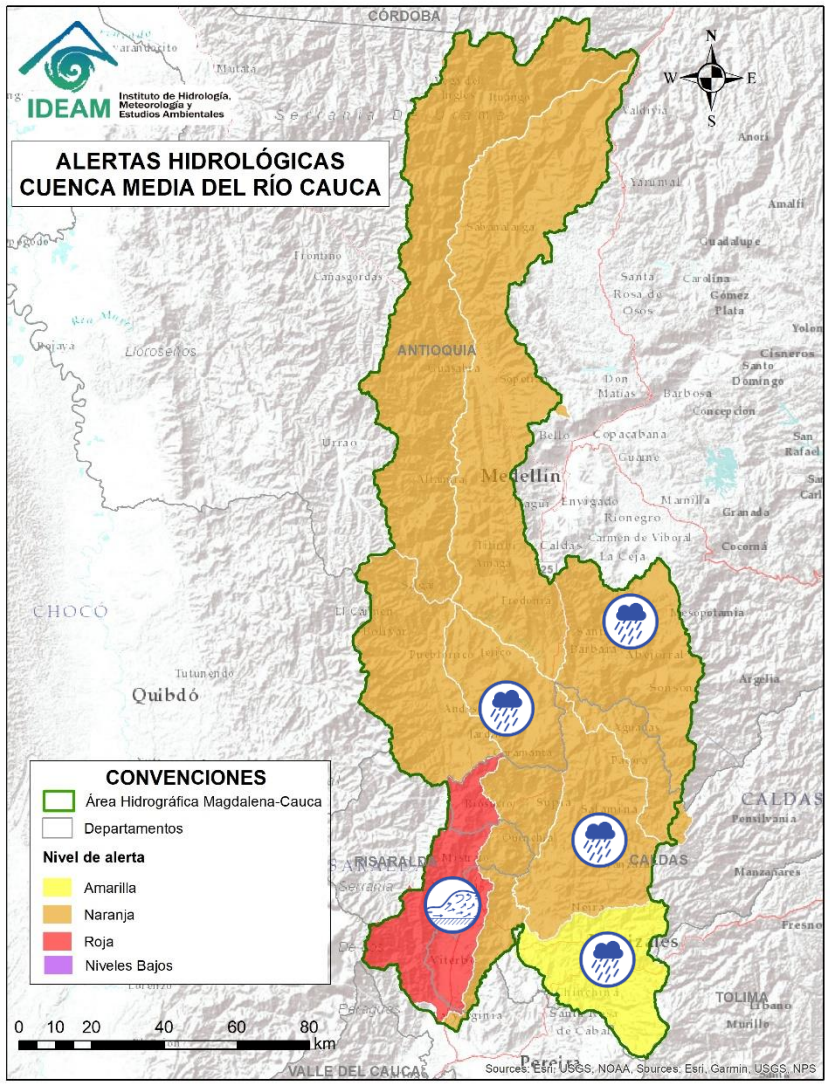

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Cauca	Cuenca del río Chinchiná	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Chinchiná y sus afluentes en el Eje Cafetero. Especial atención en los municipios de Villamaría y Manizales (Caldas).
	Cauca	Cuenca del río Risaralda	Crecientes súbitas en el río Risaralda y sus afluentes, especialmente en el río Guática y Mapa. Especial atención a la altura del municipio de Anserma, Riosucio Viterbo, Belalcázar (Caldas), Apia, Mistrató, Balboa y La Virginia (Risaralda).
	Cauca	Cuenca del río Tapias	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Tapias y sus afluentes en el Eje Cafetero. Especial atención en el municipio de La Merced, Filadelfia, Aranzázu, Neira y Salamina (Caldas).
	Cauca	Cuenca del río Arma	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Arma y sus afluentes, especialmente las quebradas Guz y Gue, en el municipio de Abejorral y el río Piedras a la altura del municipio de La Unión (Antioquia).
	Cauca	Cuenca del río Frío y Otros Directos al Cauca	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Frío y sus aportantes como los ríos Cartama (Antioquia) y Supía (Caldas) y las quebradas Cascabel y Pantanos. Especial atención en los municipios de Pueblorrico, Támesis y Valparaíso (Antioquia), Supía y Marmato (Caldas) y Quinchía (Risaralda).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Cauca)


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

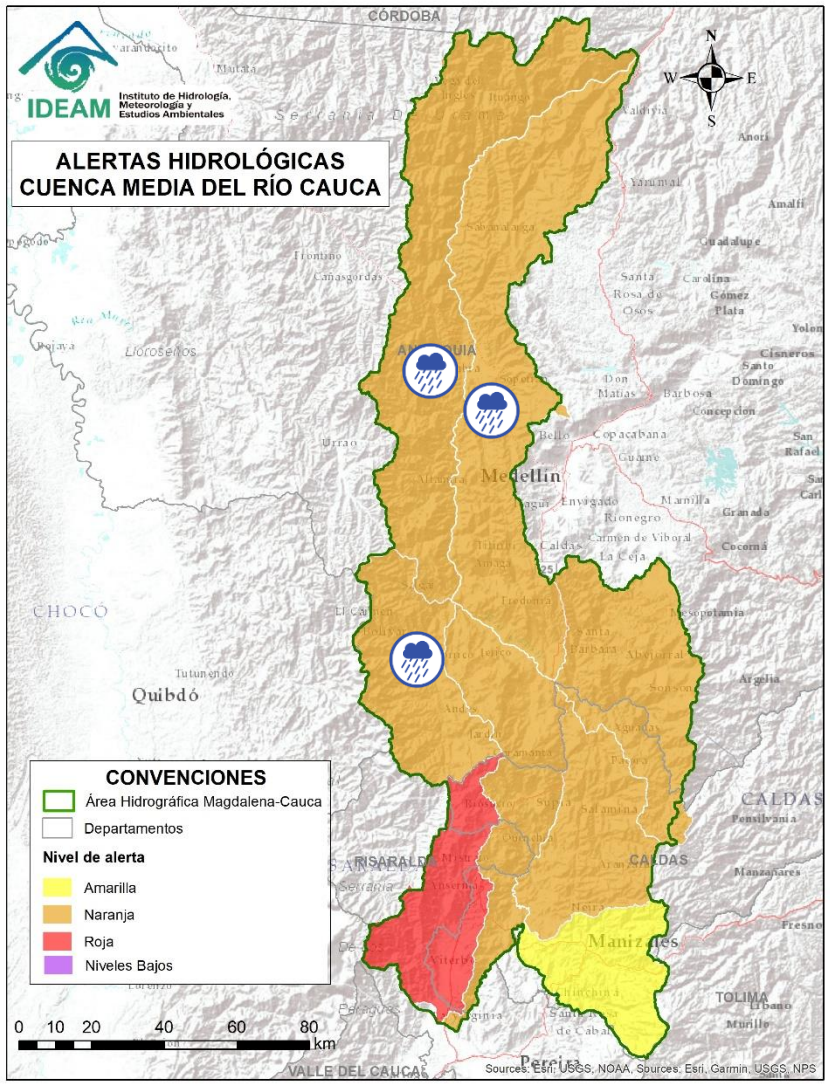

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Cuenca del río San Juan	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Juan y sus afluentes, especialmente en los ríos Tapartó y Bolívar, y las quebradas La Liboriana, Los Monos y La Linda, a la altura de los municipios de Andes, Betania, Salgar, Cuidad Bolívar y Pueblorrico (Antioquia).
⚠	Cauca	Directos al río Cauca entre San Juan - Pto Valdivia	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes a la SZH directos al río Cauca entre el río San Juan - Pto Valdivia, como el río Tonusco en el municipio de Santa Fe de Antioquia, las quebradas Sopetran, La Frisola, Chachafrutal y Murrapal a la altura del municipio de Buriticá, la quebrada La Guaduala a la altura de la cabecera municipal de Ebéjico, quebrada Selvana Sector El Refresco en el municipio Amagá - Antioquia y el caño de La Carolina (Quebrada Piedra Verde) a la altura de la Vereda Jonás en el municipio de Fredonia. Especial atención en los municipios de Briceño, Fredonia, Santafé de Antioquia, Ebejico, Heliconia, Armenia, Buriticá y Sopetran.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca baja del Río Cauca)


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

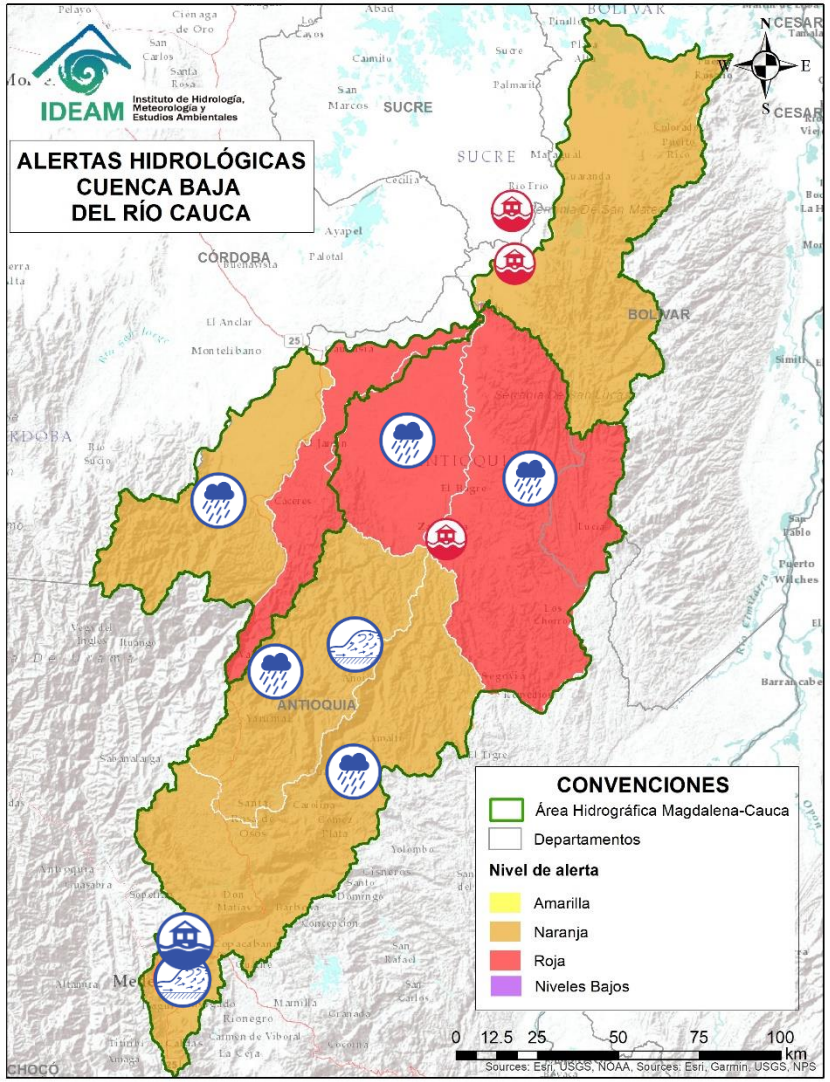

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Cauca	Cuenca del río Tarazá-Man	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Tarazá, Man y sus afluentes. Especial atención a la altura de los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia (Antioquia).
	Nechí	Cuenca Alta del río Porce (río Medellín)	Crecientes súbitas en el río Medellín y en sus aportantes en el Valle de Aburra. Estar atentos en las quebradas La Sabanetica, San Alejo, La Presidenta, La Muñoz, La Magdalena, La Santa Elena, La Iguana, La Madera, La Loca, Cafetal, El Sesteadero, Doña María y el río Medellín. Se recomienda especial atención a los municipios de Barbosa, Caldas, Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Copacabana, Bello y La Estrella (Antioquia). **Nota**: Se presenta desbordamiento de quebradas con inundaciones en sectores del casco urbano del municipio de Bello Antioquia. (23/05/2024).
	Nechí	Cuenca del río Porce	Probabilidad de crecientes súbitas en los niveles del río Porce y sus afluentes en los municipios de Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, Donmatías y Amalfi (Antioquia). Especial atención en la cuenca del río Medellín y en sus aportantes en el Valle de Aburra, como las quebradas La Presidenta, La Muñoz, La Magdalena, La Santa Elena, La Iguana, La Madera, La Loca, Cafetal, El Sesteadero y Doña María.
	Nechí	Alto Nechí	Probabilidad de incrementos súbitos en los niveles del río Nechí y sus aportantes en la cuenca alta. Especial atención a los municipios de Angostura, Anorí, Campamento y Yarumal (Antioquia).
	Nechí	Alto Nechí	**Alerta puntual:** Avenida torrencial de la quebrada Aledaña afectando viviendas en el sector de Paraje el Chillido del municipio de Anorí, Antioquia (30/05/2024)
	Nechí	Cuenca baja del río Nechí y sus aportantes	Probabilidad de incrementos súbitos en el nivel del río Nechí a la altura del municipio de Nechí. Igualmente, por probabilidad de crecientes en sus aportantes, especialmente la quebrada La Oca en el municipio de Zaragoza y la quebrada La Villa en el municipio de El Bagre (Antioquia). **Nota:** Reporte de afectaciones por crecientes en el rio Nechí y la quebrada La Oca en el municipio de Zaragoza, Antioquia (27 y 31 de mayo de 2024).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca baja del Río Cauca)


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

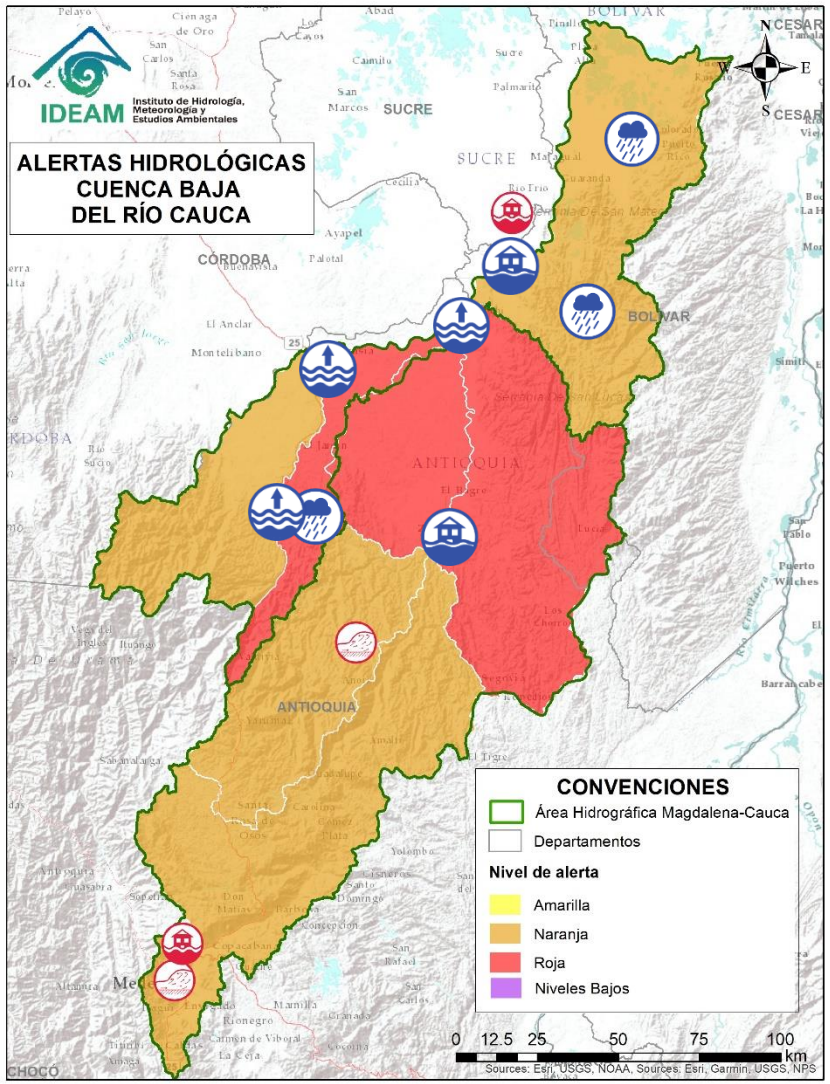

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Nechí	Cuenca baja del río Nechí y sus aportantes	**Alerta puntual:** Desbordamiento de la quebrada La OCA, afectando varios barrios de la cabecera municipal de Zaragoza, Antioquia (27/05/2024)
	Cauca	Directos al Cauca entre Pto. Valdivia y Nechí	Probabilidad de incrementos en los niveles de los aportantes directos al río Cauca entre los municipios de Puerto Valdivia y Nechí. Especial atención a las comunidades ribereñas asentadas en la zona.
	Cauca	Bajo río Cauca	Niveles altos del río Cauca entre los municipios de Valdivia y Nechí. Especial atención a las comunidades ribereñas asentadas en la zona y a puntos críticos como Nuevo Mundo y Santillana.
	Cauca	Bajo río Cauca	**Alerta Puntual:** por desborde del dique de Caregato debido al ascenso de niveles en el río Cauca a la altura de San Jacinto del Cauca (Bolívar)**.** Se recomienda especial atención en La Mojana por transvase del caudal del río (06/04/2024).
	Cauca	Directos Bajo Cauca – Magdalena. Ciénaga La Raya entre Río Nechí y Brazo de Loba	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes directos al Bajo Cauca – Ciénaga La Raya entre río Nechí y Brazo de Loba, con especial atención al río Caribona en el municipio de Montecristo (Bolívar).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca baja del Río Magdalena)


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

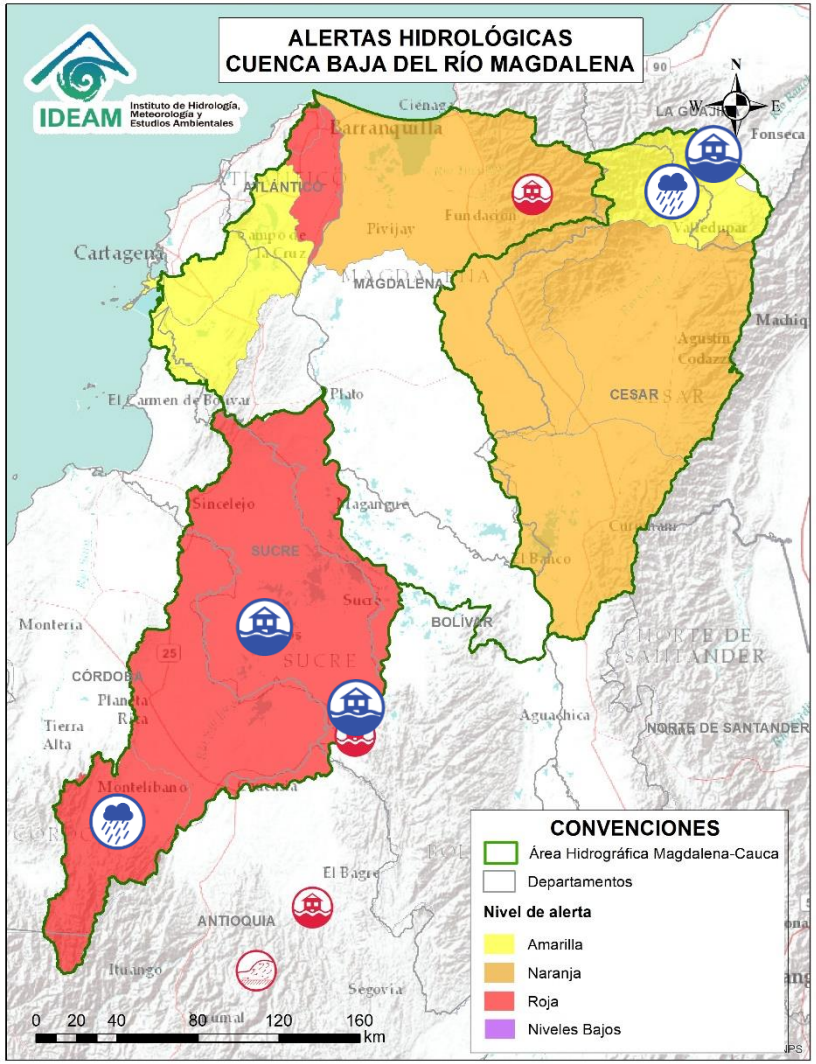

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Bajo Magdalena – Cauca – San Jorge	Cuenca alta del río San Jorge	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Jorge en su cuenca alta, se recomienda especial atención en sus afluentes, los ríos San Pedro y Uré, y la quebrada La Manuela, así como en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano (Córdoba). **Nota:** Se reportan inundación en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano (23/05/2024).
	Bajo Magdalena – Cauca – San Jorge	Bajo San Jorge – La Mojana	Ascenso de niveles en el sistema de ciénagas y caños de La Mojana. Especial atención en los municipios de Ayapel, Guaranda, Majagual y San Benito Abad por ingreso del río Cauca desde el sector Caregato. **Notas: 1)** Se reportan inundaciones en los corregimientos de Alfonso López, Sincelejito, Nariño, Pueblonuevo y Totumo en el municipio de Ayapel (Córdoba) (08/05/2024). **2)** Se reportan inundaciones en zona urbana y rural del municipio de San Marcos (Sucre) (10/05/2024). **3)** Se reportó inundación en el municipio de La Apartada, Córdoba (31/05/2024).
	Bajo Magdalena – Cauca – San Jorge	Bajo San Jorge – La Mojana	**Alerta puntual:** Rompimiento de Jarillón en el sector los Arrastres generando el ingreso de agua del Caño Rabón y San Matías a zonas del municipio de Guaranda, Sucre (08/05/2024).
	Bajo Magdalena	Cuenca alta del río Cesar	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca alta del río Cesar y sus afluentes. Se recomienda especial atención en las riberas de los ríos Guatapurí y Badillo en el municipio de Valledupar (Cesar), en sectores como los corregimientos de Chemesquemena y Vega Arriba. Igualmente, en la quebrada La Malena a la altura del corregimiento de Patillal (Valledupar-Cesar). También, se recomienda estar atentos en el municipio San Juan del Cesar.
	Bajo Magdalena	Cuenca alta del río Cesar	**Alerta puntual:** Desbordamiento de la acequia El Frasquito, al sur de la cabecera municipal del San Juan del Cesar, La Guajira (24/05/2024).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca baja del Río Magdalena)


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

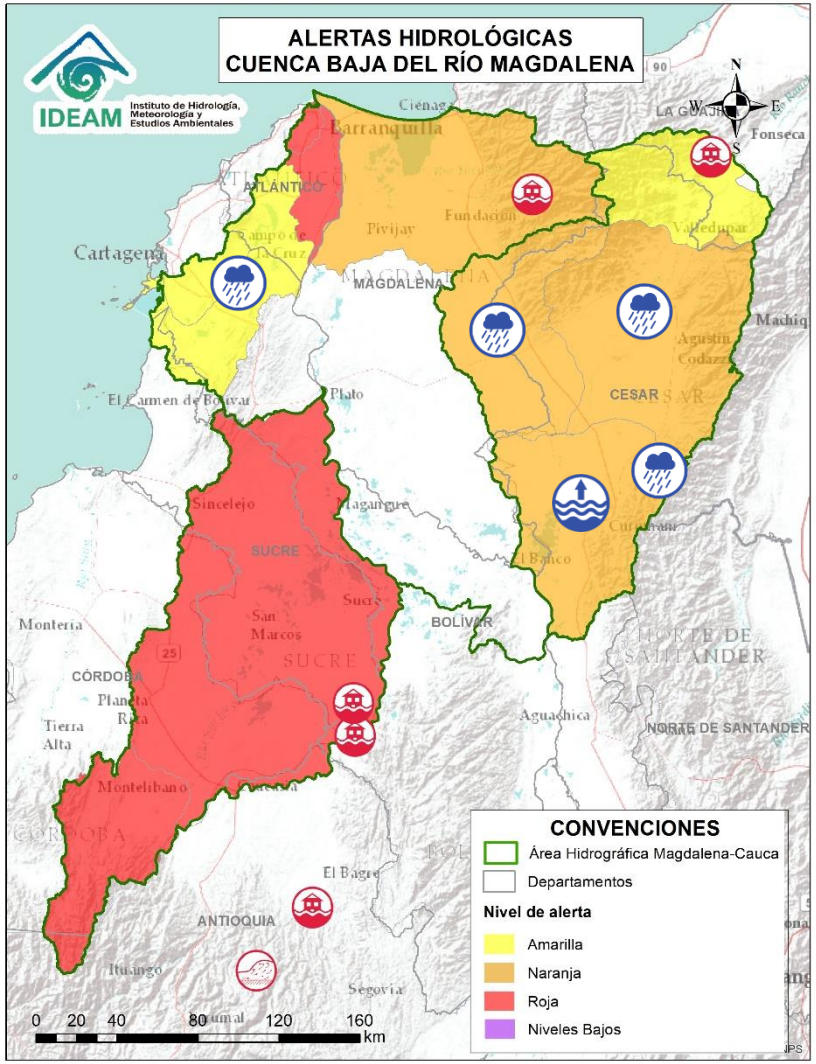

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Bajo Magdalena	Cuenca media del río Cesar	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca media del río Cesar, especial atención en los ríos Sororia, Maracas, Santo Tomás y Tucuy, estos últimos en la Serranía del Perijá. Especial atención en los municipios de Valledupar, Pueblo Bello, Agustín Codazzi, Becerril y La Jagua de Ibirico (Cesar).
	Bajo Magdalena	Cuenca del río Ariguaní	Probabilidad de incrementos moderados en el nivel del río Ariguaní y sus afluentes, especialmente para el río Ariguanicito entre otros aportantes a la margen izquierda del cauce principal. Se recomienda especial atención en los municipios de Pueblo Bello, El Copey, Bosconia (Cesar).
	Bajo Magdalena	Cuenca Baja del río Cesar	Probabilidad de crecientes súbitas en ríos afluentes de la cuenca baja del río Cesar. Especial atención a la altura del municipio de Chimichagua (Cesar).
	Bajo Magdalena	Cuenca Baja del río Cesar	**Alerta puntual:** Niveles altos en la ciénaga de Zapatosa y sistema cenagoso asociado, especial atención a la altura de los municipios de Chimichagua y Tamalameque (Cesar).
	Bajo Magdalena	Canal del Dique	Probabilidad de incrementos en el nivel en el Canal del Dique y sus aportantes, se recomienda especial atención en los municipios de Manatí, Repelón (Atlántico), Pasacaballos, Arjona, Sabanalarga, Mahates, San Cristóbal, Soplaviento, Arroyohondo, Calamar y María La Baja (Bolívar).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca baja del Río Magdalena)


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

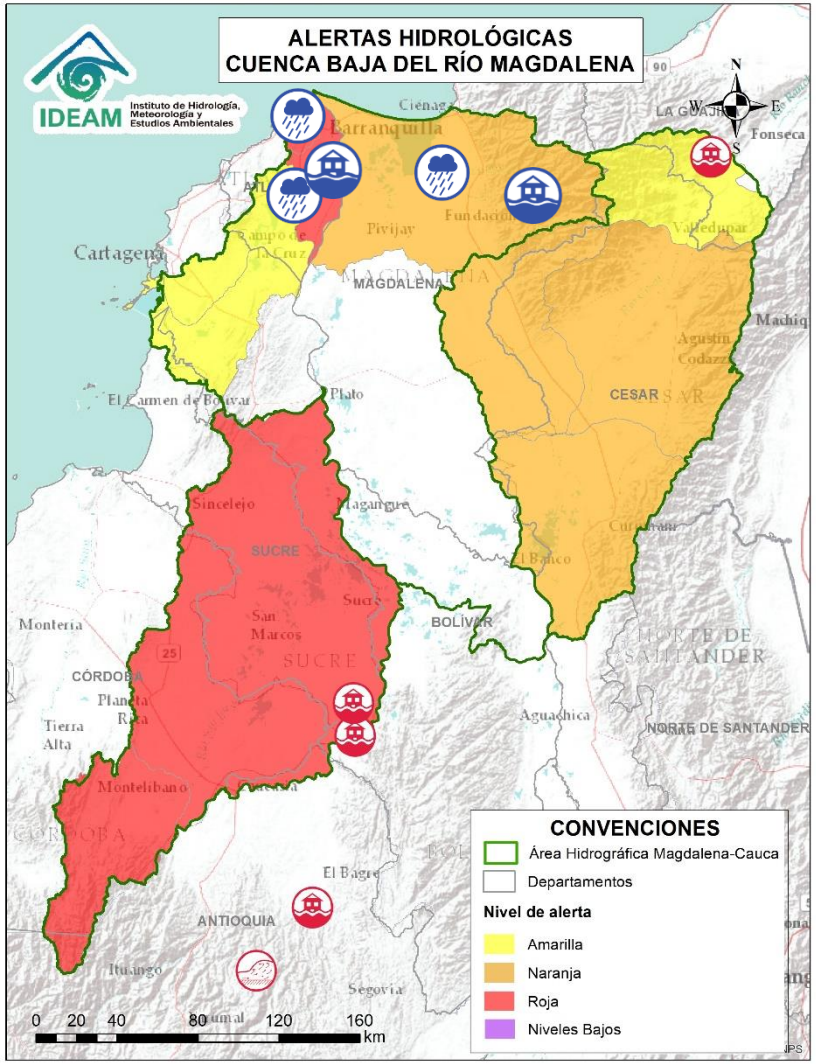

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Bajo Magdalena	Ciénaga Grande de Santa Marta	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta, tales como los ríos Sevilla, Tucurinca, Aracataca, Fundación y sus afluentes (en la parte occidente de la Sierra Nevada de Santa Marta). Se recomienda especial atención en los municipios de Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, Fundación y El Reten (Magdalena).
	Bajo Magdalena	Ciénaga Grande de Santa Marta	**Alerta puntual:** desbordamiento del canal Tolima afectando a varios barrios del municipio de Aracataca, Atlántico (30/05/2024)
	Bajo Magdalena	Directos al Magdalena entre Calamar y desembocadura al mar Caribe	Probabilidad de incrementos de niveles en los directos al Magdalena entre Calamar y desembocadura al mar Caribe. Especial atención a los centros poblados de Suán y Campo de la Cruz, Cerro de San Antonio, El Piñón, Remolino y Sitio Nuevo. No se descartan posibles formaciones de arroyos en los municipios de Barranquilla y Soledad (Atlántico).
	Bajo Magdalena	Ciénaga Mallorquín	Probabilidad de formación de arroyos en la ciudad de Barranquilla y Soledad (Atlántico). De igual forma, se recomienda estar atentos a los niveles de los ríos de la Ciénaga Mallorquín. **Nota:** Formación de arroyos en algunos sectores de Barranquilla (30/05/2024)

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

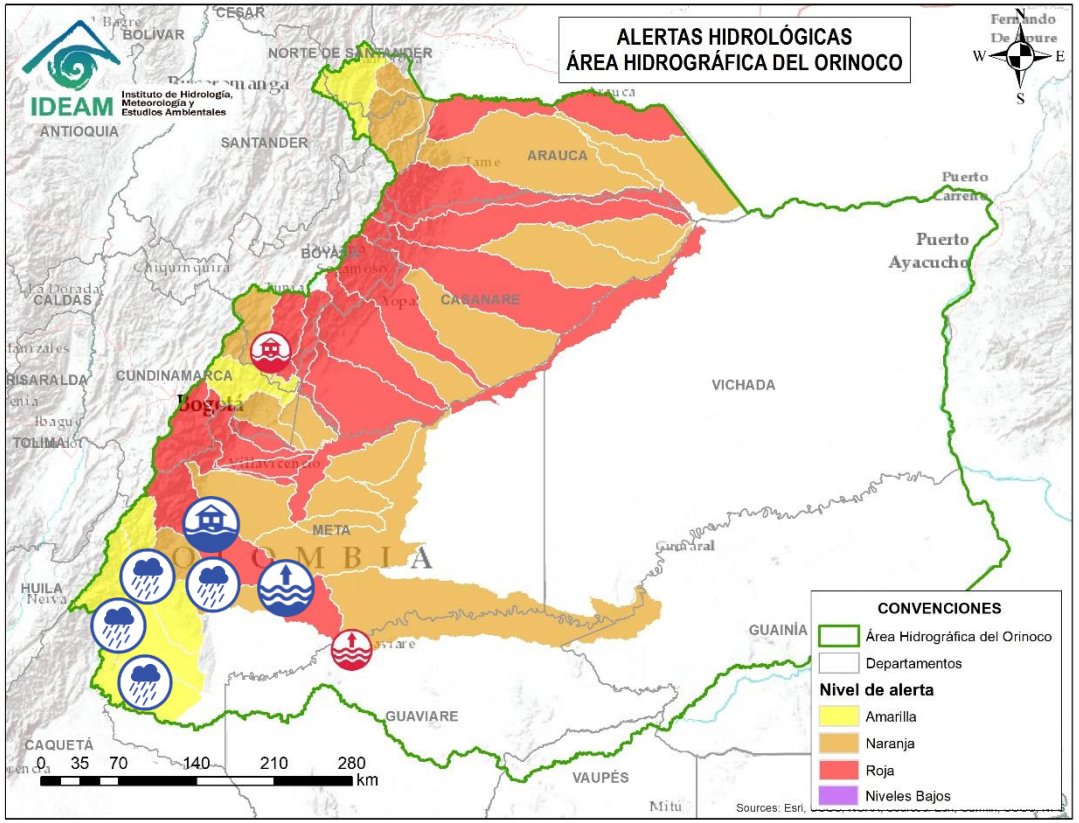

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Guaviare	Cuenca del río Losada	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Losada y sus afluentes. Especial atención en el municipio de la Macarena (Meta).
	Guaviare	Cuenca del río Guayabero	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guayabero y sus afluentes. Especial atención en el municipio de La Macarena (Meta).
	Guaviare	Cuenca del río Guape	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guape y sus afluentes como el río Duda. Especial atención en los municipios de La Uribe y Mesetas.
	Guaviare	Cuenca del río Güejar	Niveles altos en el río Güejar y sus afluentes, se recomienda especial atención entre los municipios de Mesetas, San Juan de Arama y Vistahermosa (Meta).
	Guaviare	Cuenca del río Ariari	Niveles altos en la cuenca del río Ariari y sus aportantes, principalmente en los caños Aguas Claras y Buenos Aires. Especial atención en los municipios de Cubarral, Puerto Rico, Fuente de Oro, El Dorado, Granda, Guamal, Lejanías, El Castillo, Puerto Lleras, San Juan de Arama, Vista Hermosa y Puerto Concordia (Meta) **Notas: 1)** Desbordamiento del río Ariari causando inundación en la zona rural de la vereda El Cable y Santa Cruz del municipio El Castillo, Meta (14/05/2024). **2)** Afectaciones por creciente súbita del río Ariari (16/05/2024). **3)** Se reportó creciente súbita del río Ariari a la altura de la vereda Arrayanes, en el municipio de Cubarral (Meta) (18/05/2024). **4)** Se reportó creciente súbita de los ríos Ariari y Tonoa a la altura de la vereda La Amistad, en el municipio de Cubarral (Meta) (18/05/2024). **5)** Se reporta inundación a la altura de la Vereda Angostura del municipio de San Juan De Arama, causando afectaciones (20/05/2024).

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

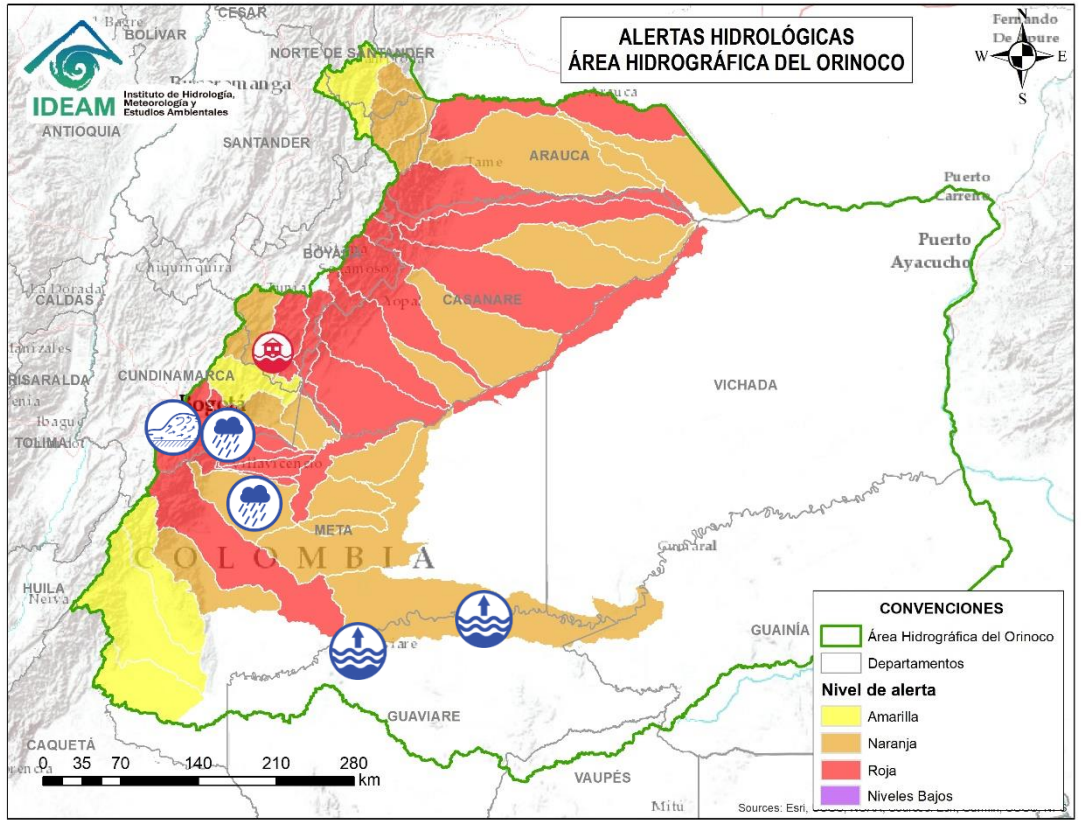

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Guaviare	Cuenca media del río Guaviare	**Alerta Puntual:** Niveles altos del río Guaviare a la altura del municipio de San José de Guaviare (Guaviare). **Nota**: Se reportó desbordamiento del río Guaviare a la altura del municipio de San José del Guaviare (Guaviare) (20/05/2024).
	Guaviare	Cuenca media del río Guaviare	Niveles altos en la cuenca media del río Guaviare. Se recomienda especial atención a la altura del municipio San José del Guaviare y Mapiripán (Guaviare)
	Meta	Cuencas de los ríos Metica, Guamal y Humadea	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Metica, Guamal y Humadea y sus afluentes, aportantes a la cuenca alta del río Meta. **Nota:** Se reporta inundaciones en la zona urbana de San Carlos De Guaroa y Vereda La Raya, debido a desbordamientos de afluentes, causando afectaciones (20/05/2024).
	Meta	Cuenca río Guayuriba	Crecientes súbitas en el nivel río Guayuriba en su recorrido por Acacías y Villavicencio (Meta). Condición similar se prevé la en sus afluentes, especialmente en la quebrada Blanca y en el río Negro a la altura de Quetame y Guayabetal (Cundinamarca). **Nota**: **1)** Represamiento del río Negro a la altura de Quetame (29/05/2024). **2)** Se reportó creciente súbita en la vereda Girón de Resguardo en el municipio de Cáqueza – Cundinamarca (29/05/2024). **3)** Se reportó creciente súbita en la quebrada Estaqueca y río Negro a la altura del municipio de Quetame – Cundinamarca (28/05/2024).
	Meta	Cuenca del río Guatiquía	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guatiquía y sus afluentes, especialmente los ríos Ocoa y su aportante el caño Grande. Se recomienda especial atención a la altura de Restrepo, Villavicencio y el municipio El Calvario (Meta).

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

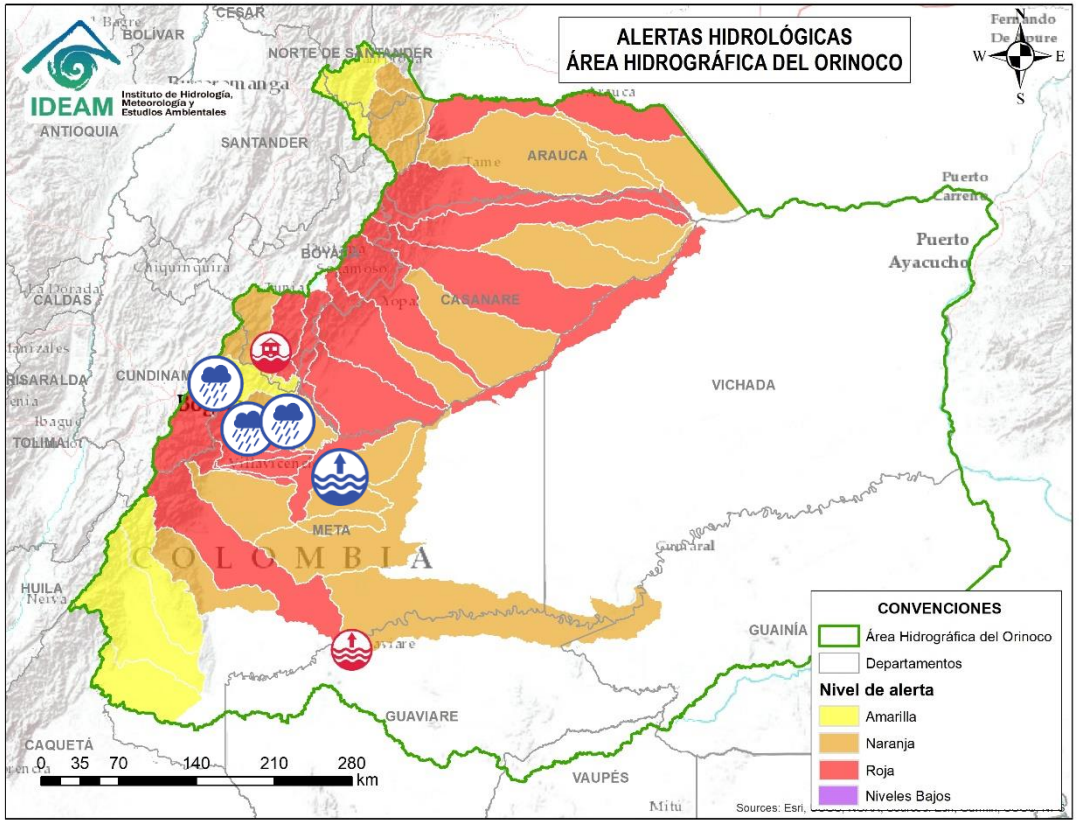

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Meta	Cuenca del río Guacavía	Probabilidad de crecientes súbitas del río Guacavía y sus afluentes, se recomienda especial atención a la altura del municipio Cumaral (Meta).
	Meta	Cuenca del río Negro	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Negro y sus afluentes, se recomienda especial atención en Villavicencio (Meta).
	Meta	Cuenca río Humea	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Humea y sus afluentes, especialmente el río San Juanito. Especial atención en los municipios de Paratebueno y Medina (Cundinamarca).
	Meta	Directos al río Meta entre los ríos Humea y Upía	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes al río Meta entre los ríos Humea y Upía. Especial atención a la altura de los municipios de Paratebueno, Barranca de Upía y Cabuyaro.
	Meta	Directos al Metica entre ríos Guayuriba y Yucao	Niveles altos en el río Meta con valores que superan la cota de afectación a la altura de Puerto López y Cabuyaro. Se recomienda especial atención a la altura de Puerto López, Cabuyaro y Puerto Guadalupe (Meta).
	Meta	Cuenca del río Guavio	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Guavio y sus afluentes, especialmente el río Sueva y Chivor. Especial atención en el municipio de Gachetá (Cundinamarca).

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

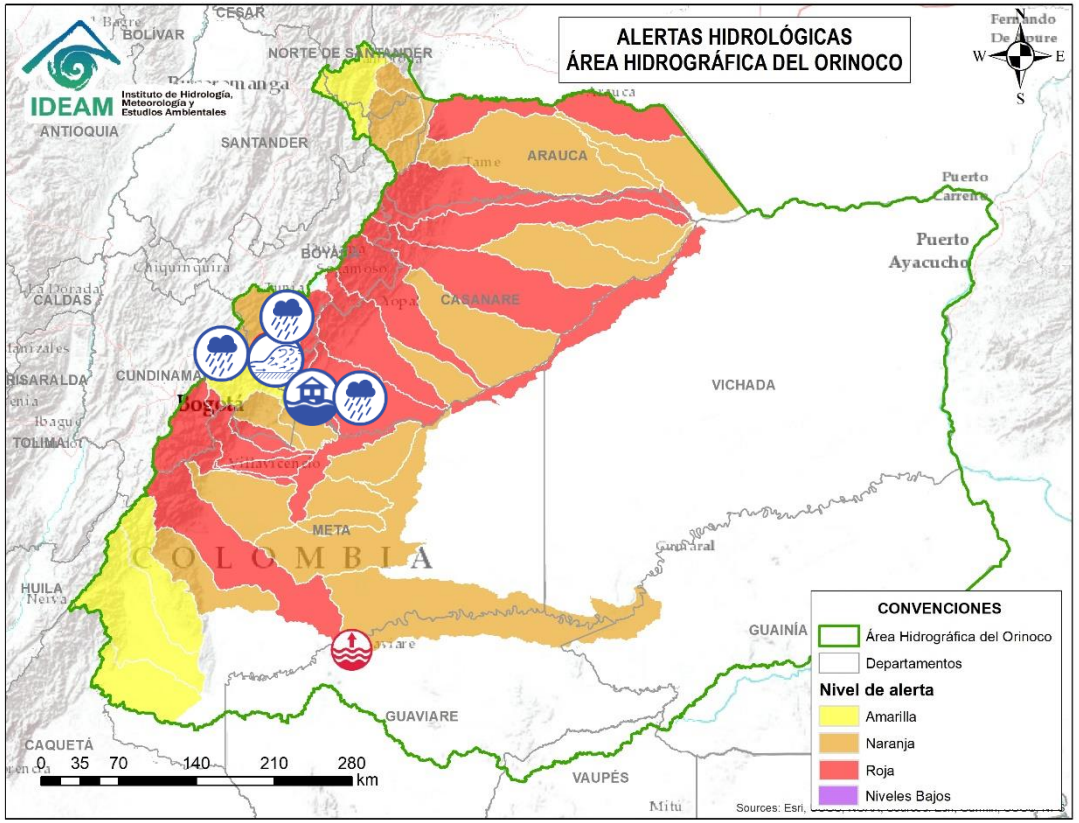

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Meta	Cuenca del río Garagoa	Probabilidad de recientes súbitas en la cuenca del río Garagoa y sus afluentes, especialmente el río Bata. Especial atención en los municipios de Chivor, Macanal, Somondoco, Garagoa, Almeida y Santa María (Boyacá).
	Meta	Cuenca del río Garagoa	**Alerta puntual** por crecientes súbita y desbordamiento a la altura del municipio de Macanal (Boyacá) (29/05/2024).
	Meta	Cuenca del río Lengupá	Probabilidad de creciente súbita en el río Lengupá y aportantes. Especial atención en los municipios de Santa María, Rondón, Zetaquirá, Campohermoso y San Luis de Gaceno (Boyacá).
	Meta	Cuenca del río Upía	Crecientes súbitas en el nivel del río Upía y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Sabanalarga, Villanueva (Casanare), Barranca de Upía y Cabuyaro (Meta). **Nota:** Se presentaron inundaciones en el caserío de San Marcos y en la vereda Buenos Aires por el desbordamiento del rio Upía en el municipio de Villanueva Casanare (29/05/2024).
	Meta	Cuenca del río Túa	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Túa y sus afluentes, se recomienda especial atención sobre los municipios de Monterrey, Tauramena y Villanueva (Casanare). **Nota:** Creciente súbita del caño Arietes a la altura del municipio de Villanueva - Casanare (20/05/2024).

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

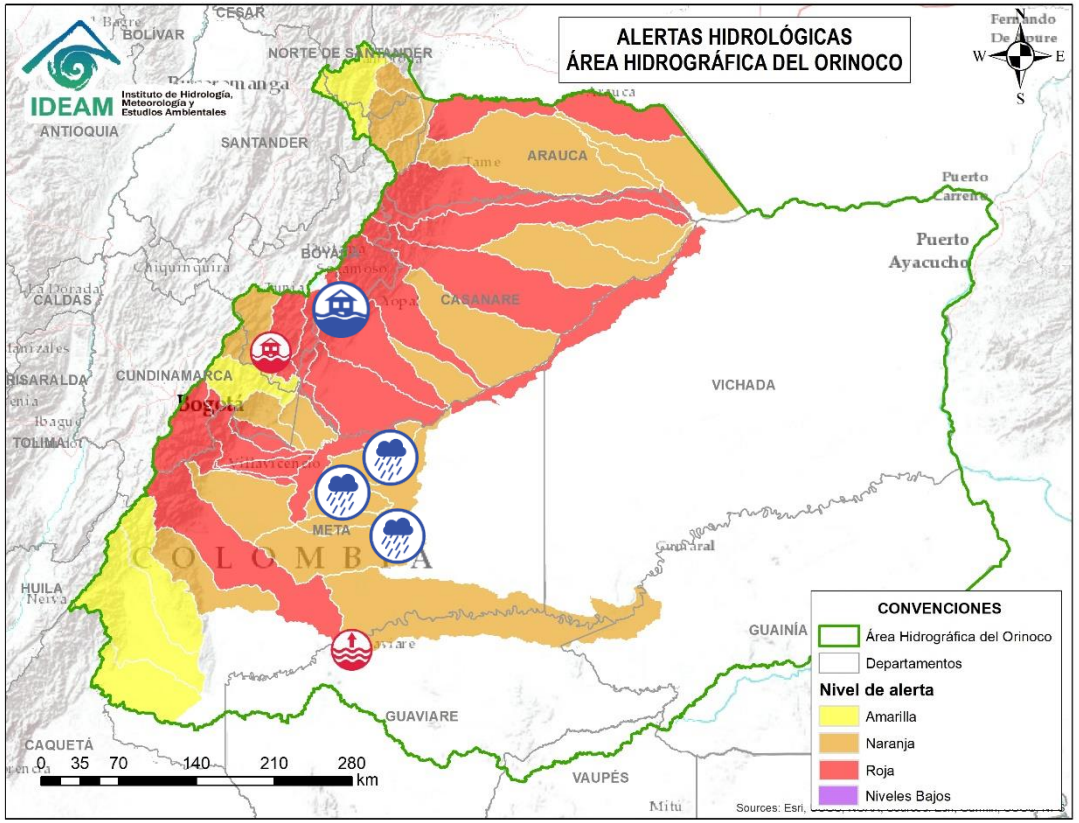

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Meta	Cuenca del río Manacacías	Probabilidad de incremento en los niveles del río Manacacías, aportante a la cuenca alta del río Meta. Especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
	Meta	Cuenca del caño Cumaral	Probabilidad de incrementos súbitos en las cuencas de los ríos caño Cumaral y sus afluentes, especial atención en el municipio de San Martín (Meta) .
	Meta	Cuenca del río Melúa	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Melúa y sus afluentes. Especial atención en el municipio de Puerto López (Meta).
	Meta	Cuenca del río Yucao	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Yucao. Especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
	Meta	Cuenca del río Cusiana	Crecientes súbitas en el nivel del río Cusiana y tributarios. Se recomienda especial atención en los municipios de Pajarito y Aquitania (Boyacá), Tauramena, Recetor, Aguazul y Maní (Casanare). Nota: 1) Se presentaron inundaciones en los sectores de San Jose de Bubuy, Llano Lindo y Sabanales y el desbordamiento del río Unete en la vereda La Esperanza del municipio de Aguazul Casanare (29/05/2024). 2) Creciente súbita de la Quebrada La Magavita, afectando la vía de acceso a las veredas San José Los Alpes y Magavita Alta y Baja sector Puente Duran del municipio de Recetor Casanare (29/05/2024). 3) Se reportan inundaciones en las veredas de Mararabe, Santa Maria de Palmarito, Guafal Pintado, Amparo, del municipio de Mani, Casanare (30/05/2024).

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

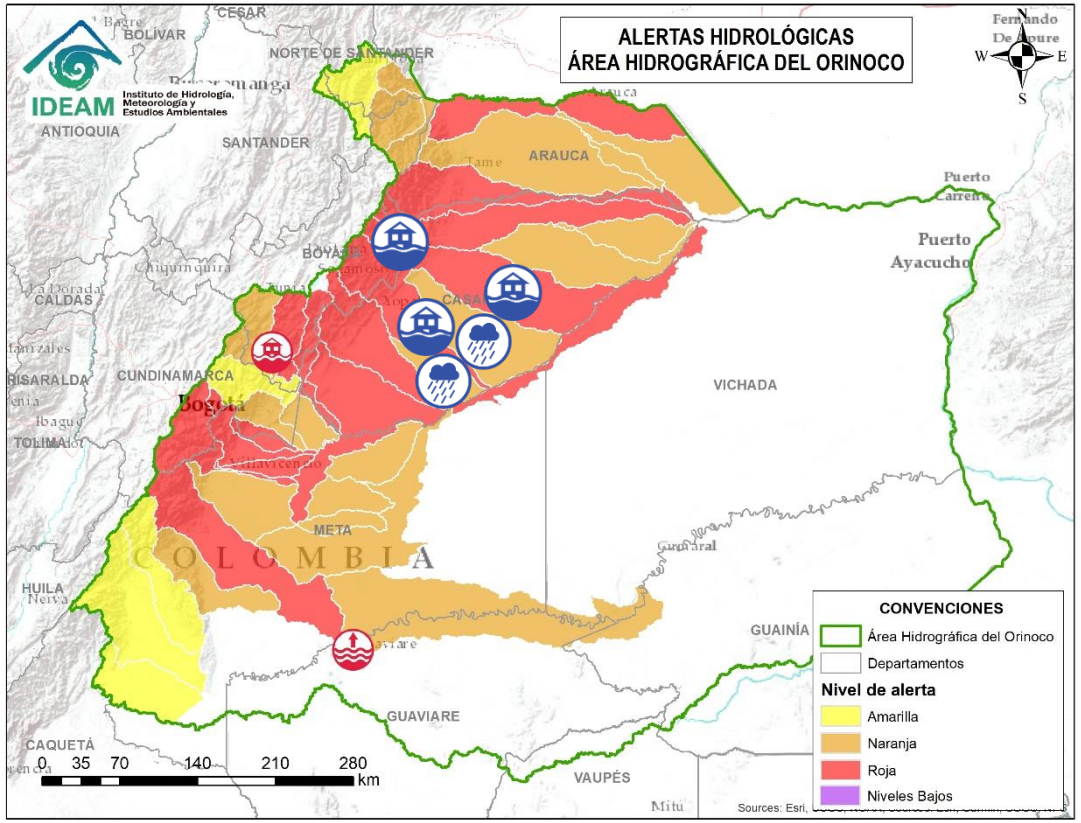

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Meta	Directos al Meta entre Cusiana y Cravo Sur	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos afluentes al río Meta en el sector comprendido entre los ríos Cusiana y Cravo Sur.
	Meta	Cuenca del río Cravo Sur	Crecientes súbitas en el río Cravo Sur y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Labranzagrande (Boyacá), Yopal y Nunchía (Casanare). **Nota**: **1)** inundaciones por el desboradamiento del río Cravo Sur a la altura de las veredas Algarrobo y Mariana del municipio de Orocue Casanare (29/05/2024). **2)** Se reportó inundación por desbordamiento del río Cravo Sur en la zona rural del municipio de Yopal – Casanare (29/05/2024). **3)** Se reportó avenida torrencial en la vereda Sococho y Tisagá a la altura del municipio de Yopal, Casanare (30/05/2024). **4)** Inundación a orillas del río Tocaría en las veredas del municipio de Nunchía, Casanare (29/05/2024)
	Meta	Caño Guanápalo	Probabilidad de crecientes súbitas en el caño Guanápalo. Especial atención a la altura de los municipios de Nunchía, San Luis de Palenque y Orocué (Casanare).
	Meta	Cuenca del río Pauto	Crecientes súbitas en los ríos Pauto, Pore, Curama, Guachiria y sus aportantes. Especial atención en los municipios de Chita, Pisba, Socotá (Boyacá), Támara, Pore, San Luis de Palenque y Trinidad (Casanare). **Nota:**1) Se reporta inundación en las veredas La Plata, Regalito, Brisas del Pauto Miralindo y sector el Garzón en el municipio de Pore Casanare (29/05/2024). 2) Desbordamiento en el río Pauto, generando inundaciones y afectaciones en la vereda El Romero del municipio de San Luis de Palenque Casanare (29/05/2024).

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

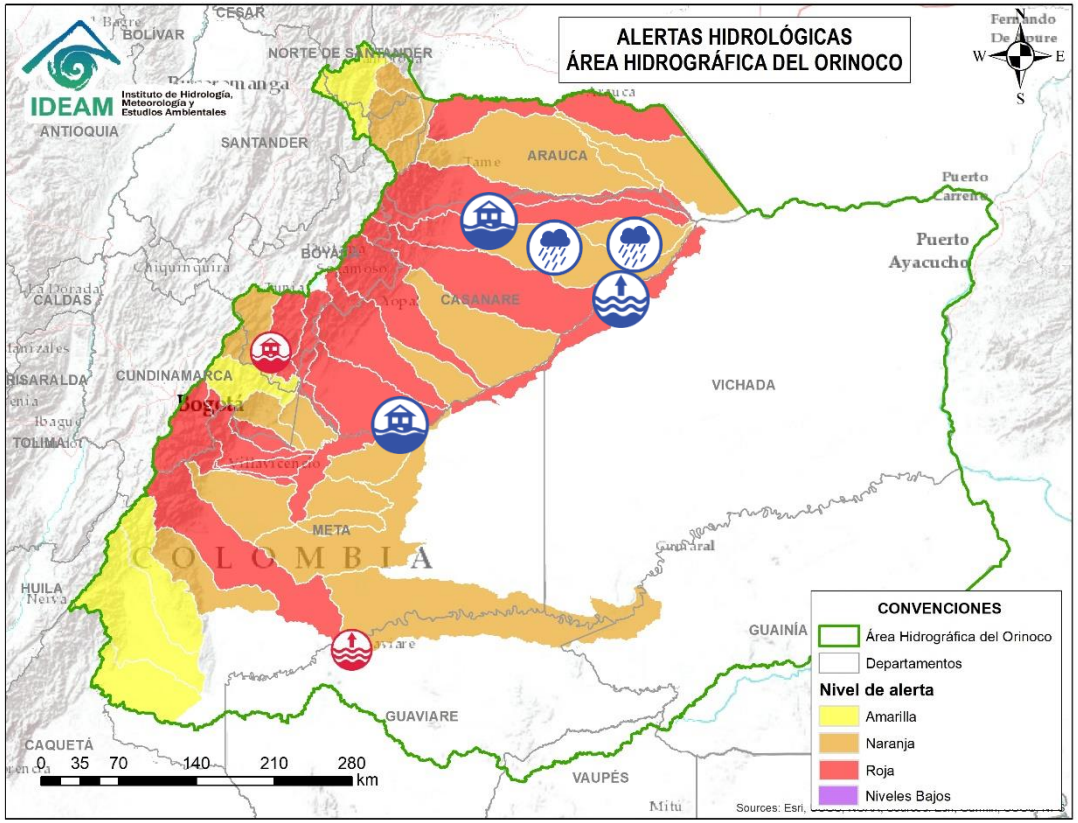

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Meta	Directos al río Meta entre ríos Cusiana y Carare (md)	Niveles altos en la parte media y baja del río Meta, entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) hasta La Hermosa en jurisdicción de Paz de Ariporo (Casanare). Nota: Desbordamiento del río Meta, generando inundaciones en la Vereda Tunupe del municipio de Tauramena (29/05/2024).
	Meta	Directos al río Meta entre ríos Pauto y Carare (mi)	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos directos al río Meta entre ríos Pauto y Carare (mi).
	Casanare	Caño Aguaclarita	Probabilidad de crecientes súbitas en el caño Aguaclarita y sus afluentes.
	Casanare	Cuenca del río Ariporo	Incrementos súbitos en los niveles del río Ariporo y sus aportantes, como el río Muese y caño Barrosa. Especial atención en los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal. **Nota:** 1) Se presentaron inundaciones en las veredas La Argentina y San José del Ariporo, como también se presentaron inundaciones en la vereda Las Mercedes por el desbordamiento del río Ariporo en el municipio de Paz de Ariporo Casanare (29/05/2024). 2) Se reportó desbordamiento del río Ariporo a la altura de la vereda Elvecia en el municipio de Paz de Ariporo (Casanare) (25/05/2024).

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

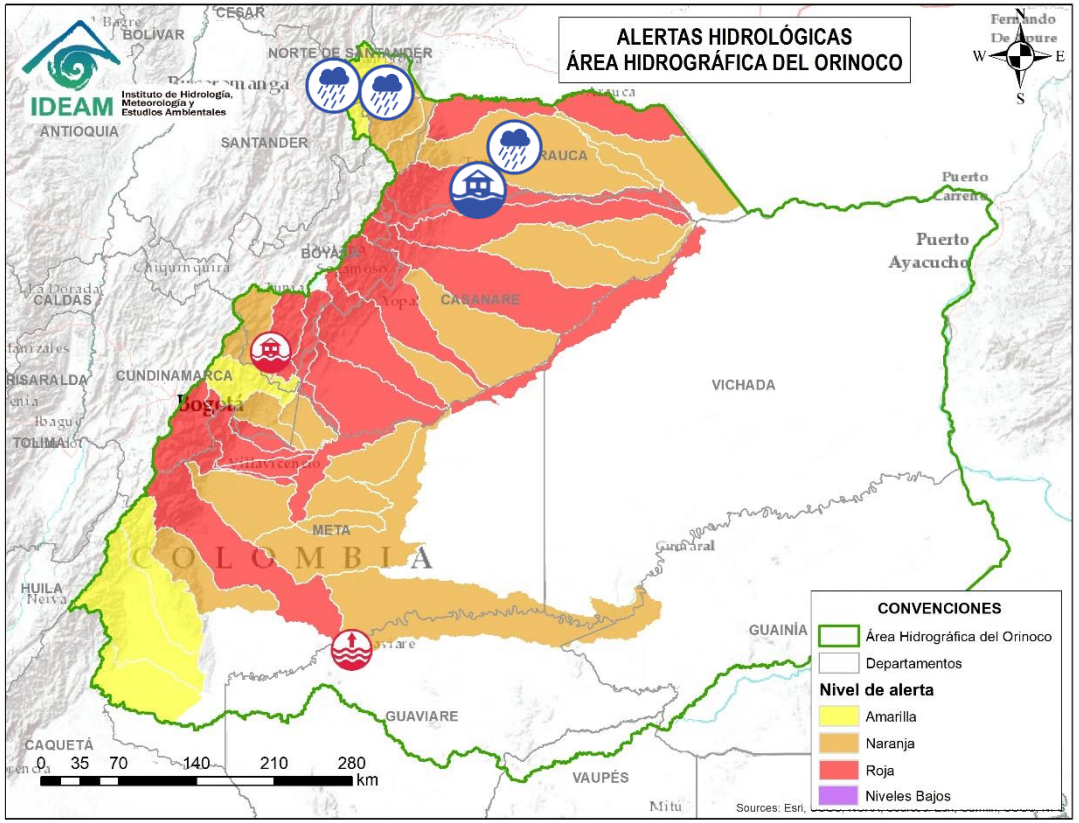

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Casanare	Cuenca del río Casanare	Creciente súbita en el nivel del río Casanare y sus afluentes, especial atención en los municipios de Chita (Boyacá), Hato Corozal, La Salina, Sácama y Tame Casanare). **Nota**: se presentaron inundaciones por el desbordamiento del río Casanare en las veredas San Nicolás, Casanarito, El Sarrapio, La Manga, Altamira, Pueblo Nuevo y el Cilantral del municipio de Hato Corozal Casanare (29/05/2024).
	Casanare	Cuenca del río Cravo Norte	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cravo Norte y sus afluentes, a la altura del municipio de Tame (Arauca) y sectores del piedemonte.
	Arauca	Cuenca del río Chitagá	Probabilidad de Crecientes súbitas en la cuenca del río Chitagá y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Chitagá, Cácota y Silos (Norte de Santander).
	Arauca	Cuenca del río Margua	Crecientes súbitas en la cuenca del río Margua. Especial atención en el municipio de Toledo (Norte de Santander).
	Arauca	Río Cobugón – Río Cobaría	Crecientes súbitas en los ríos Cobugón, Cobaría y sus afluentes. Especial atención en el municipio de Cubará (Boyacá).

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

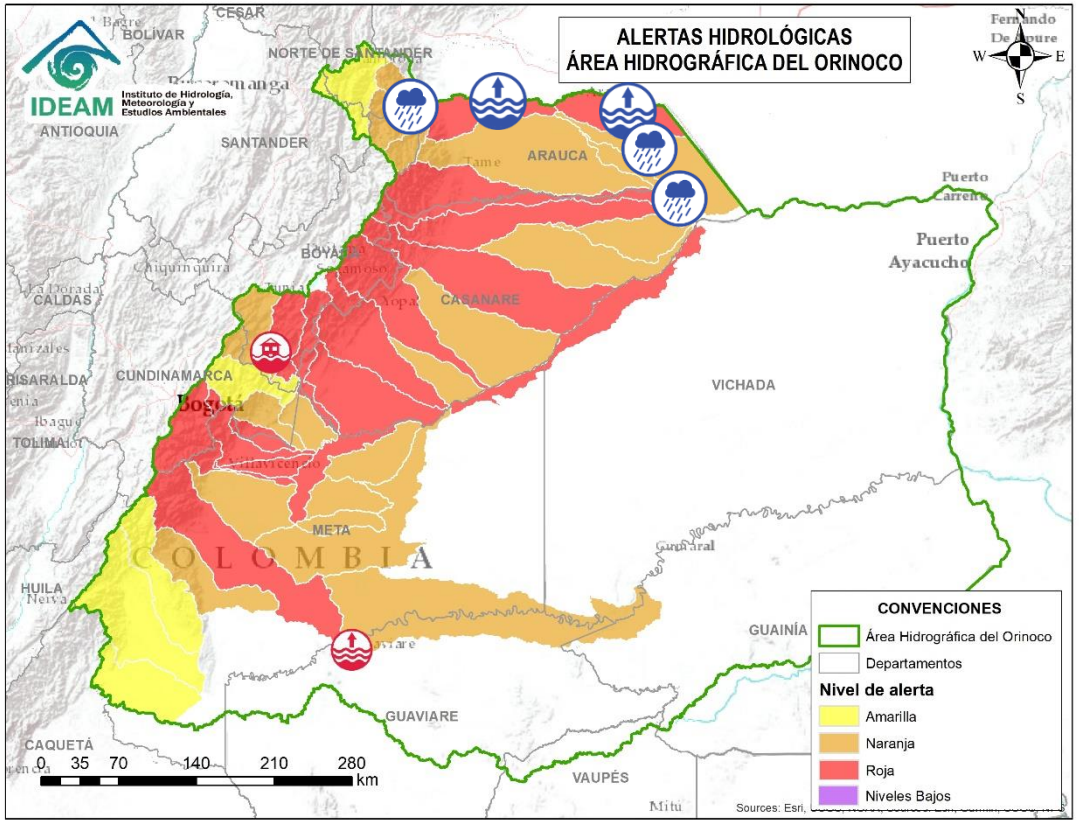

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Arauca	Cuenca del río Bojabá	Crecientes súbitas en el río Bojabá y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de Cubará (Boyacá) y Saravena (Arauca).
	Arauca	Cuenca del río Banadia y otros directos al Arauca	Niveles altos del río Arauca a la altura del municipio de Arauquita, Arauca; así como probabilidad de crecientes súbitas del río Banadía entre otros directos al río Arauca y sus aportantes. Se recomienda especial atención en los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y el centro poblado de Puerto Nariño del municipio de Saravena, como a las demás poblaciones ribereñas al río Arauca.
	Arauca	Bajo río Arauca	Niveles altos del río Arauca a la altura del municipio de Arauca, Arauca.
	Orinoco Directos	Caño Samuco	Probabilidad de incrementos moderados en el nivel del Caño Samuco en Arauca.
	Orinoco Directos	Cuenca del río Cinaruco	Probabilidad de incrementos moderados en el nivel del río Cinaruco y sus afluentes.

Área Hidrográfica del Amazonas


Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

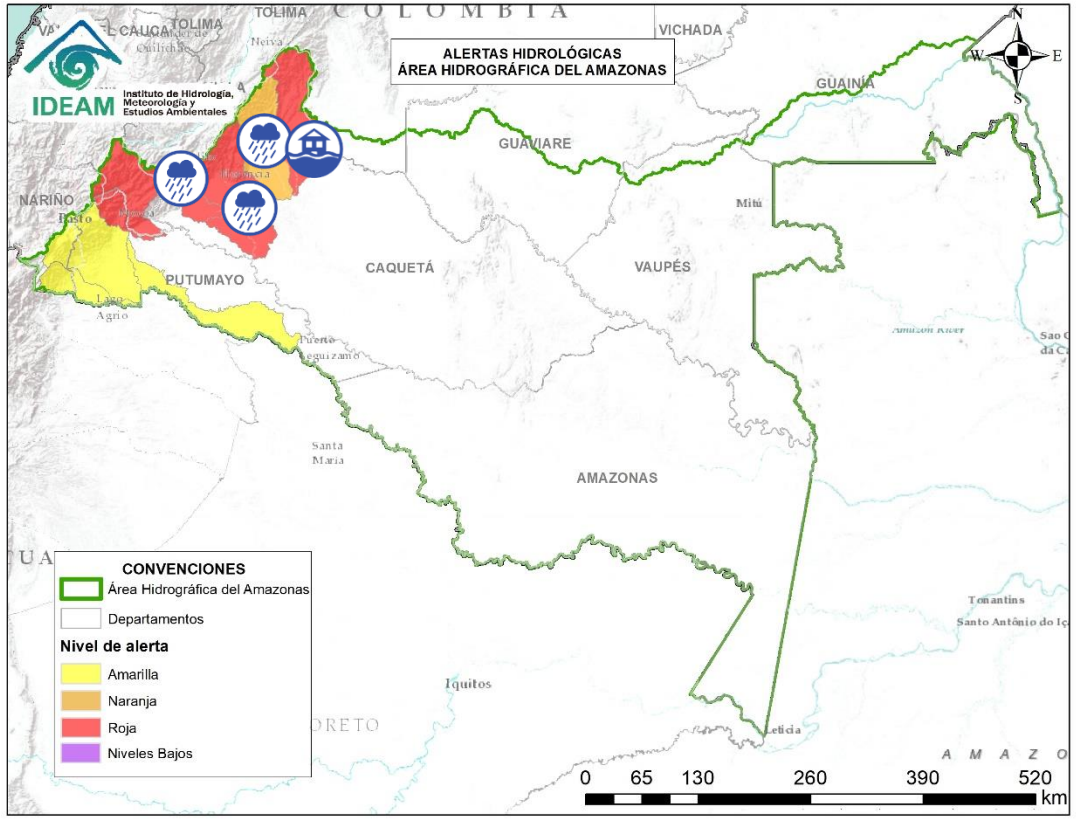

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Caguán	Cuenca del Alto Caguán	Probabilidad de crecientes súbitas en el Alto Caguán y sus afluentes. Se recomienda especial atención en el municipio San Vicente del Caguán y Puerto Betania. (Caquetá). **Nota**: Desbordamiento del río Caguán a la altura del municipio de San Vicente del Caguán (29/05/2024). (Caquetá).
	Caguán	Cuenca del río Guayas	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guayas y sus afluentes (aportante al río Caquetá). Se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Paujil, Puerto Rico y El Doncello (Caquetá).
	Caquetá	Cuenca del río Orteguaza	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Orteguaza y sus afluentes, los ríos Caraño y Hacha en el piedemonte caqueteño, a la altura del municipio de Florencia (Caquetá). Se recomienda especial atención en las ciudades de Florencia, Morelia y Paujil.
	Caquetá	Cuenca del río Pescado	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Pescado y sus afluentes, a la altura del municipio de Albania, Valparaíso y Belén de los Andaquíes (Caquetá). **Nota:** Desbordamiento del río Pescado sobre la vía Florencia - Valparaíso, en el sector de la Vega, en el municipio de Valparaíso, Caquetá (30/05/2024).

Área Hidrográfica del Amazonas

Actualización: 31 de mayo de 2024 12:00 HLC

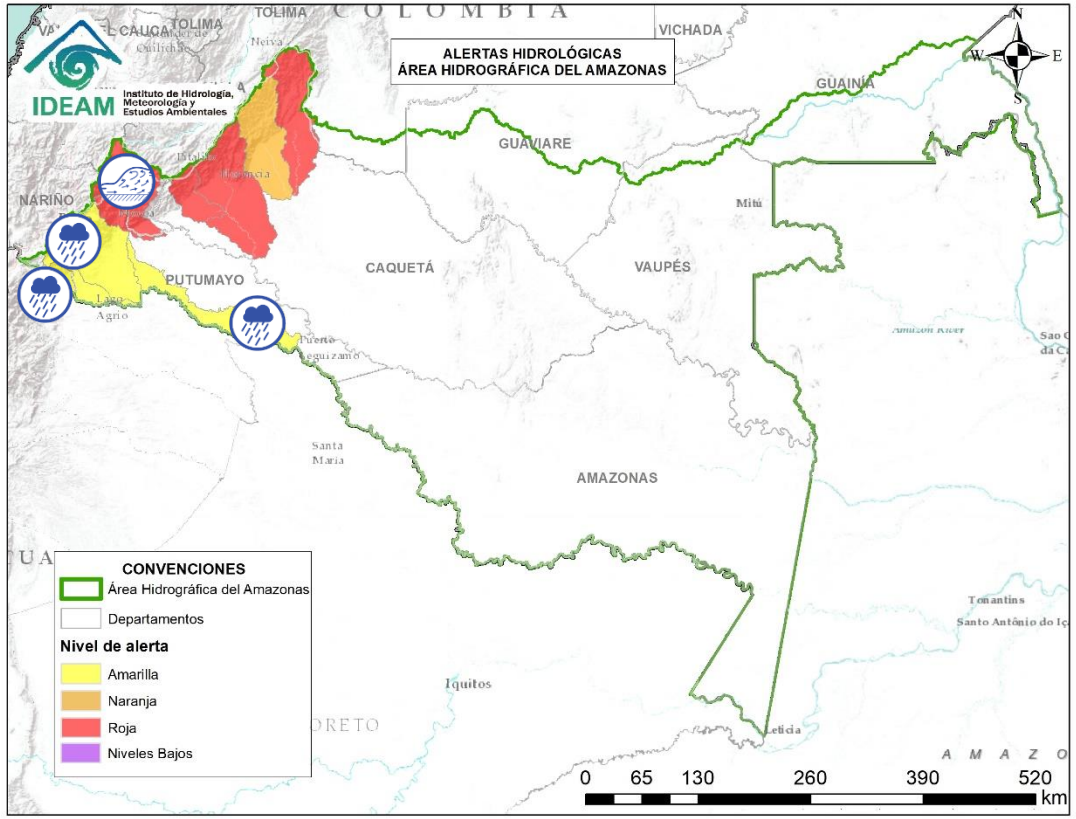

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Caquetá	Cuenca alta del río Caquetá	Crecientes súbitas en la cuenca alta del río Caquetá, se recomienda especial atención en el río Mocoa y sus afluentes los ríos Rumiyaco, Tarauquita, Pepino, Sangoyaco, Dantayaco y Mulato, entre otros aportantes a la cuenca alta del río Caquetá. Igual atención al río Inchiyaco y Tambor en el municipio de Piamonte (Cauca).
	Putumayo	Cuenca alta del río Putumayo	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Putumayo en su recorrido desde Puerto Caicedo hasta Puerto Asís y en sus afluentes localizados en su cuenca alta, principalmente en los ríos Guamuez (desde su nacimiento en el corregimiento El Encano del municipio de Pasto – hasta la Vereda El Tigre del municipio del Valle del Guamuez), Guineo (municipio de Villa Garzón), Orito y Patascoy (municipio de Orito) y Sucio (municipio de Puerres) en el departamento de Putumayo.
	Putumayo	Cuenca del río San Miguel	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Miguel y sus afluentes como la quebrada La Hormiga. Especial atención en los municipios de Ipiales (Nariño), Valle de Guamuez y San Miguel.
	Putumayo	Cuenca media del río Putumayo	Se prevé incremento en los niveles del río Putumayo y sus afluentes entre los municipios de Puerto Asís, Puerto López y Puerto Leguízamo (Putumayo).

RESUMEN

Debido a las precipitaciones de los últimos días, se presenta saturación de humedad en los suelos, que dan origen a diferentes niveles de probabilidad para la ocurrencia de deslizamientos de tierra, en zonas de ladera y alta pendiente:


Alta: Para algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte De Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima, Valle Del Cauca.

Moderada: Para algunos municipios de los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte De Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle Del Cauca.


Baja: Para algunos municipios de los departamentos de las regiones Caribe, Andina, Pacífico, Orinoquía y Amazonía.

En el apartado específico de este informe para cada región, se encuentra información detallada de los niveles de alerta en cada municipio.

Mapa de Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra

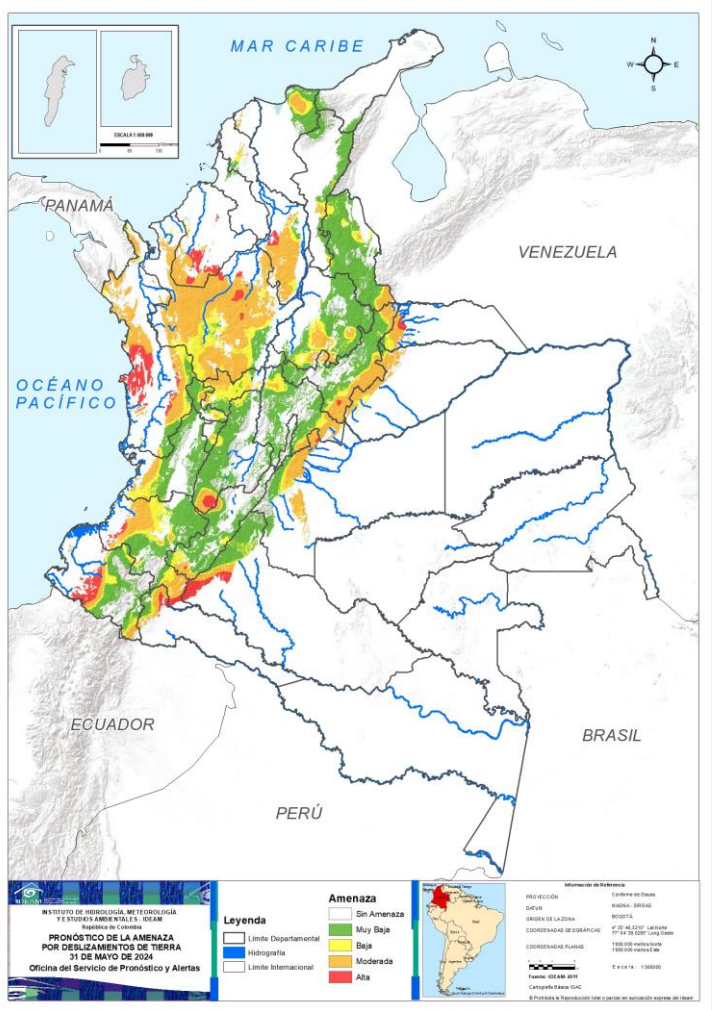

Gráfica de seguimiento de alertas por pronóstico de la amenaza de deslizamientos de tierra para Colombia durante los últimos 30 días

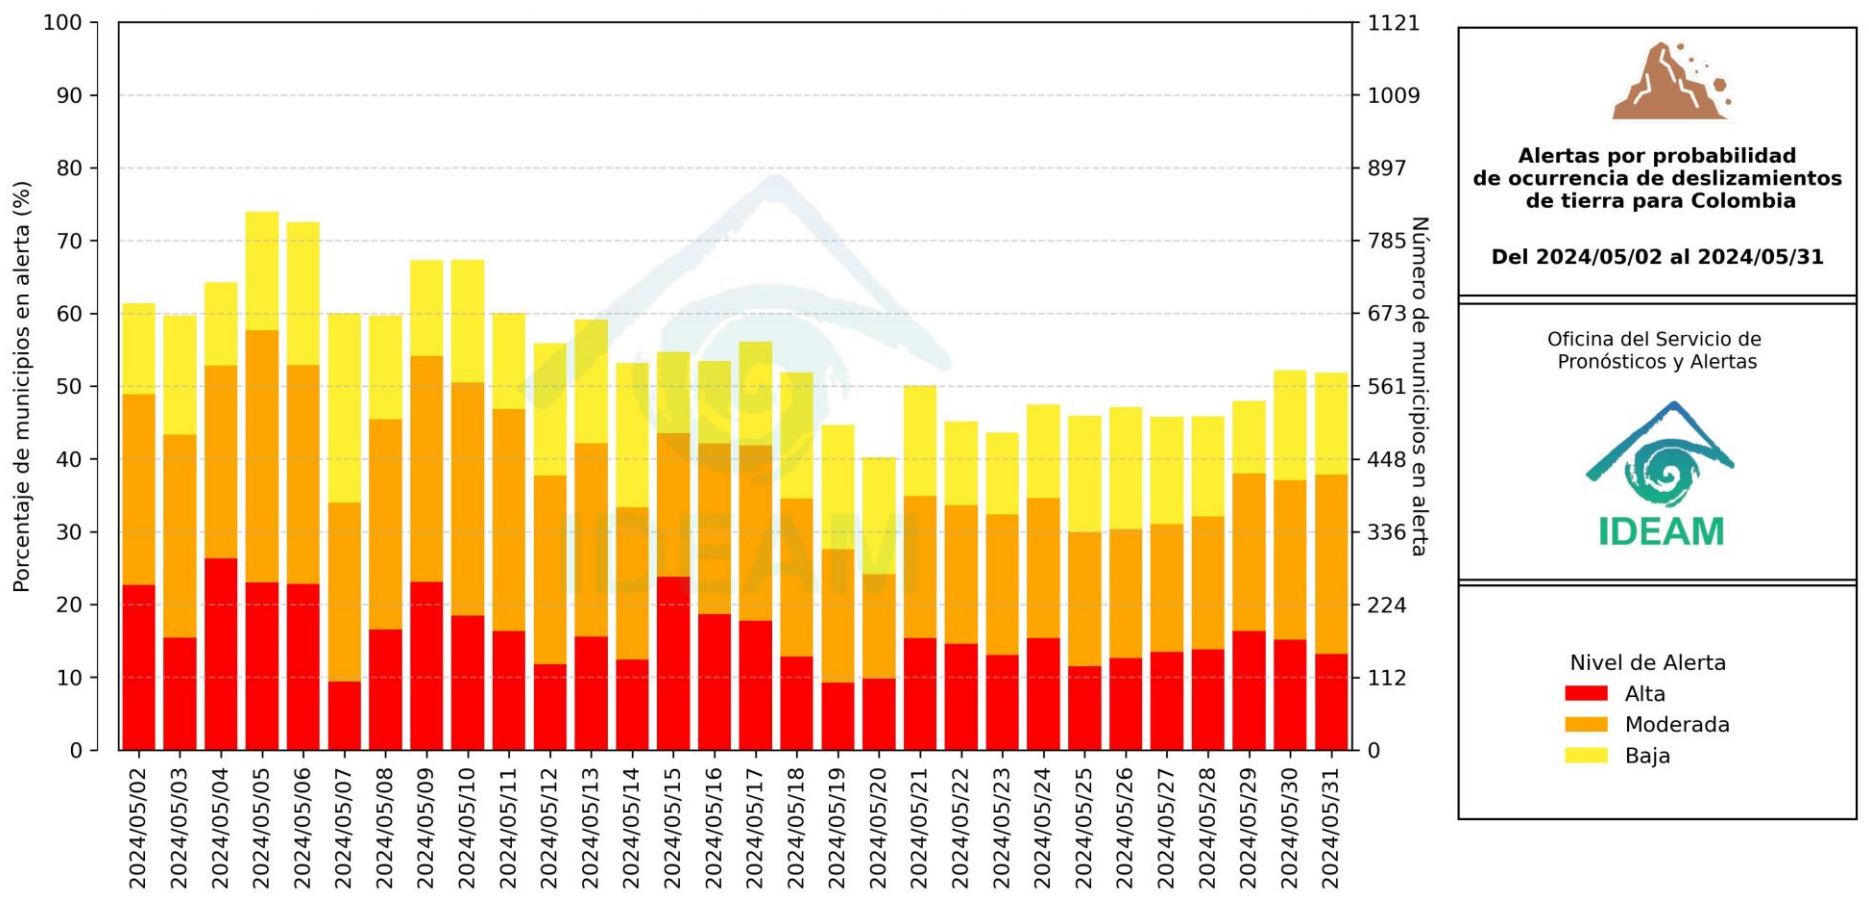


El eje horizontal presenta la fecha de evaluación de las alertas, el eje vertical izquierdo el porcentaje de municipios* en alerta y el eje vertical derecho el número total de éstos; categorizando las alertas en una barra apilada según su nivel de amenaza: alta (rojo), moderada (naranja) y baja (amarillo).


** Municipios oficiales registrados por el DANE representado el 100% (1121 municipios) a la fecha.*

Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra

Actualización: 31 de mayo de 2024 | 12:00 HLC

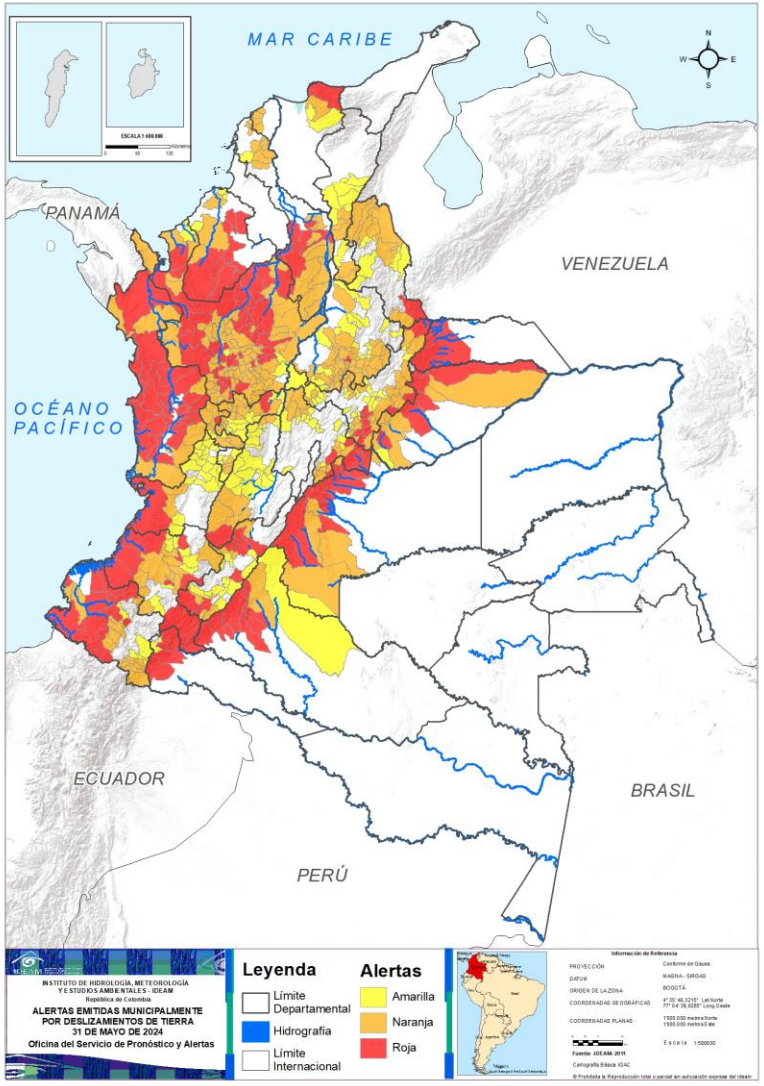

Municipios por regiones:

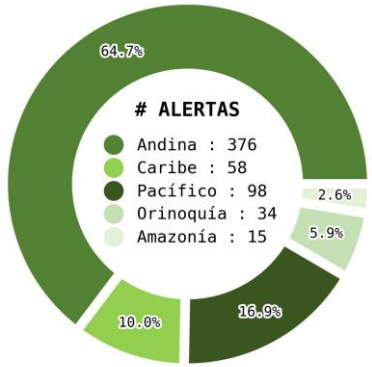


TOTAL MUNICIPIOS : 581
FECHA : 2024-05-31

DEPARTAMENTO	#
ANTIOQUIA	39
CHOCÓ	19
META	11
BOYACÁ	10
CAUCA	9
CÓRDOBA	8
NARIÑO	8
CAQUETÁ	7
BOLÍVAR	6
CASANARE	6
HUILA	6
CUNDINAMARCA	5
PUTUMAYO	4
ARAUCA	3
CALDAS	1
MAGDALENA	1
NORTE DE SANTANDER	1
RISARALDA	1
SANTANDER	1
TOLIMA	1
VALLE DEL CAUCA	1
TOTAL	148

DEPARTAMENTO	#
ANTIOQUIA	79
SANTANDER	32
BOYACÁ	30
BOLÍVAR	18
CALDAS	17
CUNDINAMARCA	11
NARIÑO	11
CAUCA	10
RISARALDA	9
CHOCÓ	8
CASANARE	7
NORTE DE SANTANDER	7
HUILA	6
META	6
TOLIMA	5
CESAR	5
QUINDÍO	4
ATLÁNTICO	4
CÓRDOBA	3
VALLE DEL CAUCA	2
CAQUETÁ	1
MAGDALENA	1
TOTAL	276

DEPARTAMENTO	#
BOYACÁ	27
VALLE DEL CAUCA	20
TOLIMA	17
SANTANDER	16
CUNDINAMARCA	12
HUILA	11
CALDAS	9
CAUCA	7
CESAR	6
ANTIOQUIA	5
NORTE DE SANTANDER	5
QUINDÍO	5
RISARALDA	4
CÓRDOBA	3
NARIÑO	3
MAGDALENA	2
PUTUMAYO	2
BOLÍVAR	1
CAQUETÁ	1
CASANARE	1
TOTAL	157


REGIÓN CARIBE

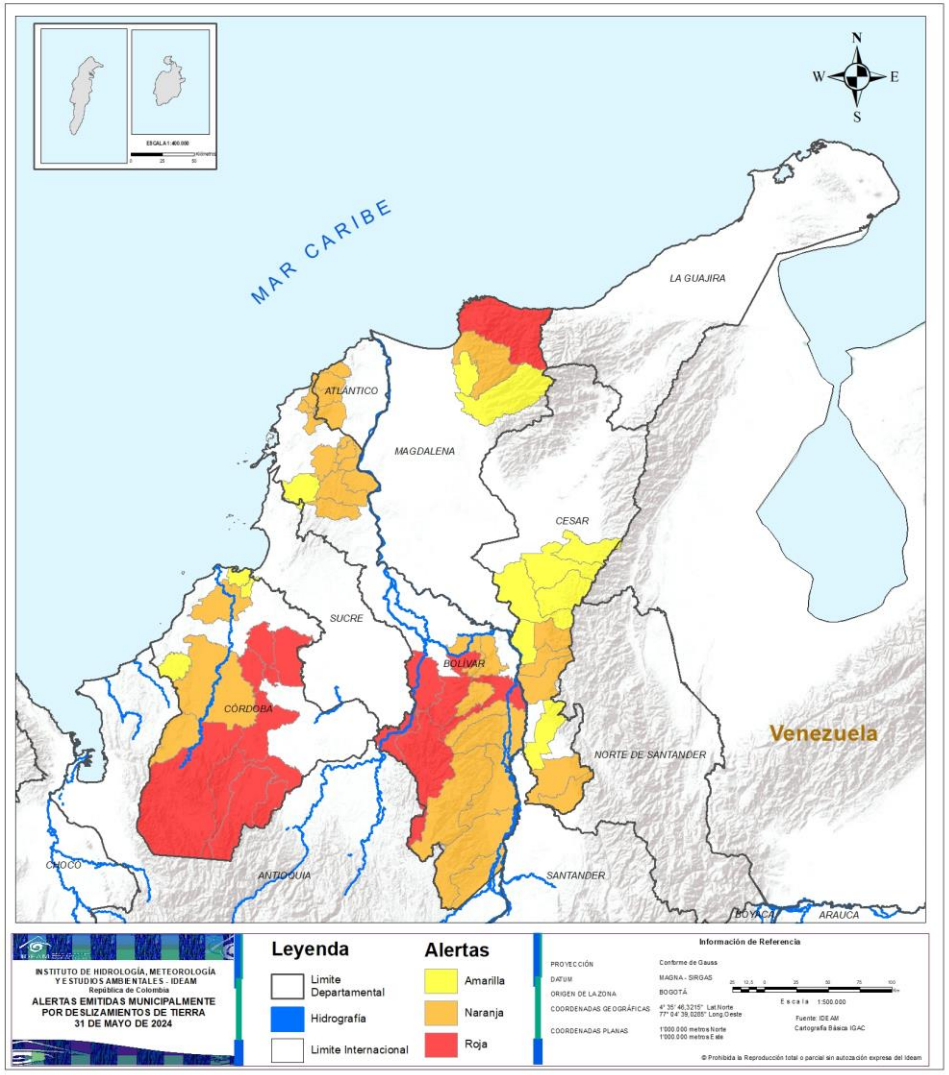

ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	BOLÍVAR : Achí, Altos Del Rosario, Montecristo, Río Viejo, San Jacinto Del Cauca, Tiquisio. CÓRDOBA : Ciénaga De Oro, Montelíbano, Planeta Rica, Puerto Libertador, Sahagún, San Carlos, San José De Uré, Tierralta. MAGDALENA : Santa Marta.
	ATLÁNTICO : Juan De Acosta, Luruaco, Piojó, Repelón. BOLÍVAR : Arenal, Arroyohondo, Barranco De Loba, Calamar, Cantagallo, Clemencia, El Guamo, Mahates, Morales, Norosí, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, San Martín De Loba, San Pablo, Santa Catalina, Santa Rosa Del Sur, Simití, Villanueva. CESAR : La Gloria, Pailitas, Pelaya, San Alberto, San Martín. CÓRDOBA : Lorica, Montería, Valencia. MAGDALENA : Ciénaga.
	BOLÍVAR : María La Baja. CESAR : Aguachica, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, La Jagua De Ibirico, Tamalameque. CÓRDOBA : Canalete, Purísima De La Concepción, San Antero. MAGDALENA : Aracataca, Zona Bananera.

Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra


REGIÓN ANDINA

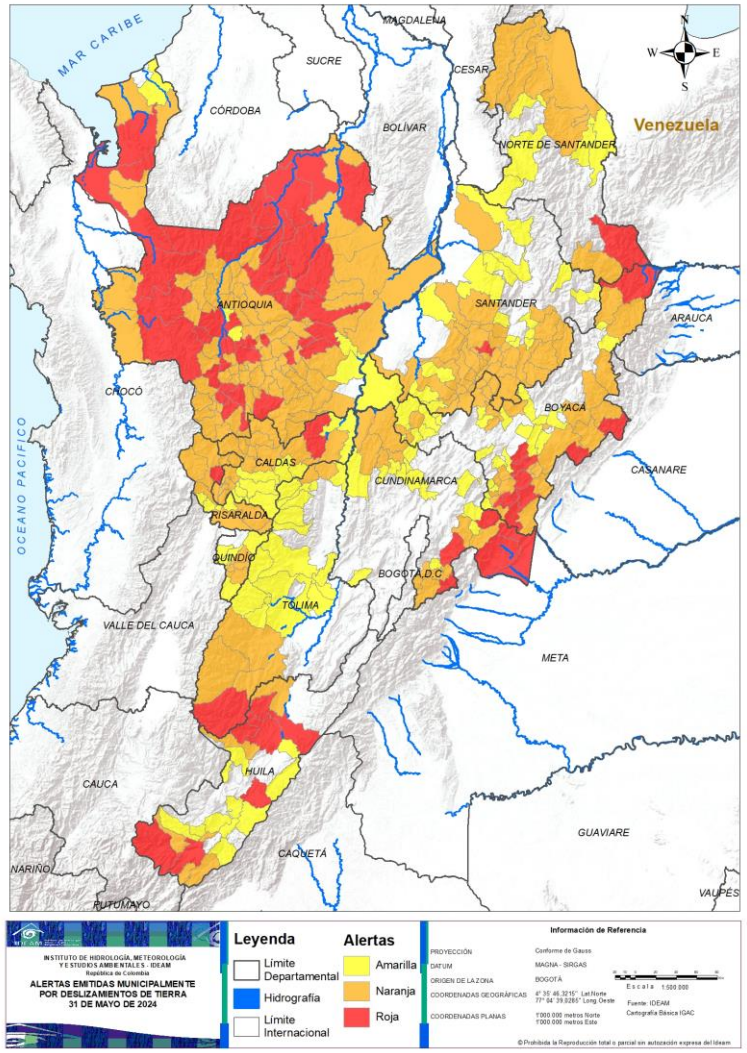

ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	ANTIOQUIA : Abejorral, Alejandría, Amalfi, Angostura, Anorí, Apartadó, Armenia, Bello, Campamento, Carolina, Caucasia, Concordia, Cáceres, Dabeiba, Ebéjico, El Bagre, Fredonia, Frontino, Girardota, Gómez Plata, Ituango, Jericó, Medellín, Mutatá, Peñol, San Rafael, San Roque, Sopetrán, Tarazá, Tarso, Turbo, Urrao, Valdivia, Valparaíso, Venecia, Yarumal, Yolombó, Caicedo, Santa Fé De Antioquia. BOYACÁ : Almeida, Campohermoso, Cubará, Macanal, Miraflores, Pajarito, Paya, Rondón, Santa María, Zetaquira. CALDAS : Samaná. CUNDINAMARCA : Fómeque, Guayabetal, Medina, Paratebueno, Ubalá. HUILA : Gigante, Neiva, Palermo, Pitalito, San Agustín, Santa María. NORTE DE SANTANDER : Toledo. RISARALDA : Belén De Umbría. SANTANDER : Contratación. TOLIMA : Planadas.


Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra

REGIÓN ANDINA

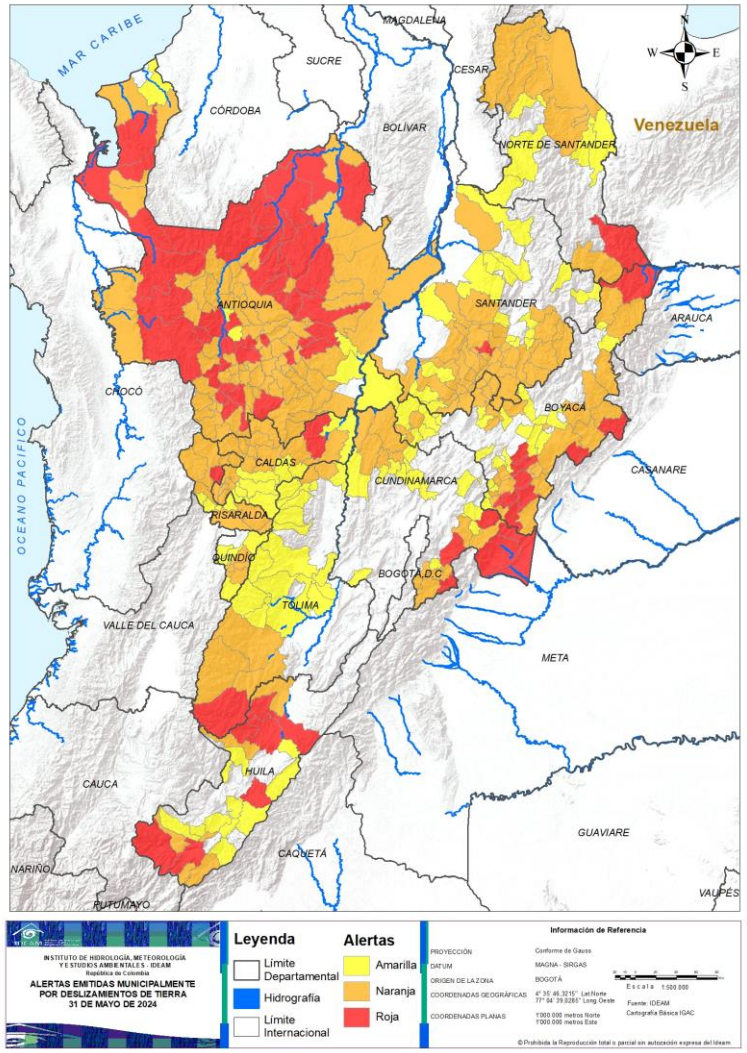

ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	ANTIOQUIA : Abriaquí, Amagá, Andes, Angelópolis, Anzá, Argelia, Barbosa, Belmira, Betania, Betulia, Briceño, Buriticá, Caldas, Caramanta, Carepa, Cañasgordas, Chigorodó, Cisneros, Ciudad Bolívar, Cocorná, Concepción, Copacabana, Donmatías, El Carmen De Viboral, El Santuario, Entrerríos, Envigado, Giraldo, Granada, Guadalupe, Guarne, Guatapé, Heliconia, Hispania, Itagüí, Jardín, La Ceja, La Estrella, La Pintada, La Unión, Liborina, Maceo, Marinilla, Montebello, Murindó, Nariño, Nechí, Necoclí, Peque, Pueblorrico, Puerto Berrío, Remedios, Retiro, Rionegro, Sabanalarga, Sabaneta, Salgar, San Andrés De Cuerquía, San Carlos, San Francisco, San José De La Montaña, San Luis, San Pedro De Los Milagros, San Pedro De Urabá, San Vicente Ferrer, Santa Bárbara, Santa Rosa De Osos, Santo Domingo, Segovia, Sonsón, Titiribí, Toledo, Támesis, Uramita, Vegachí, Vigía Del Fuerte, Yalí, Yondó, Zaragoza. BOYACÁ : Aquitania, Arcabuco, Berbeo, Chinavita, Chiscas, Chita, Chitaraque, Chivor, Chíquiza, Garagoa, Gámeza, Güicán De La Sierra, Iza, Labranzagrande, Mongua, Moniquirá, Pachavita, Pisba, Páez, Quípama, San Eduardo, San José De Pare, San Luis De Gaceno, San Pablo De Borbur, Santana, Socotá, Somondoco, Sotaquirá, Sutatenza, Togüí. CALDAS : Aguadas, Anserma, Aranzazu, Belalcázar, Filadelfia, La Merced, Marmato, Marquetalia, Pensilvania, Pácora, Riosucio, Risaralda, Salamina, San José, Supía, Victoria, Viterbo. CUNDINAMARCA : Une, Caparrapí, Fosca, Gachalá, Gutiérrez, Junín, La Palma, Puerto Salgar, Quetame, Topaipí, Yacopí. HUILA : Acevedo, Aipe, Elías, Isnos, Palestina, Teruel. NORTE DE SANTANDER : Chitagá, Convención, El Carmen, El Tarra, Sardinata, Teorama, Tibú. QUINDÍO : Buenavista, Calarcá, Córdoba, Pijao. RISARALDA : Apía, Dosquebradas, Guática, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa De Cabal, Santuario. SANTANDER : Aguada, Albania, Barbosa, Bolívar, Charalá, Chima, Chipatá, Coromoro, Curití, El Carmen De Chucurí, El Guacamayo, Encino, Guadalupe, Guapotá, Guavatá, Gámbita, Güepsa, Jesús María, La Paz, Landázuri, Mogotes, Oiba, Onzaga, Puente Nacional, Sabana De Torres, San Benito, San Joaquín, Santa Helena Del Opón, Simacota, Suaita, Sucre, Vélez. TOLIMA : Ataco, Chaparral, Fresno, Rioblanco, San Sebastián De Mariquita.


REGIÓN ANDINA

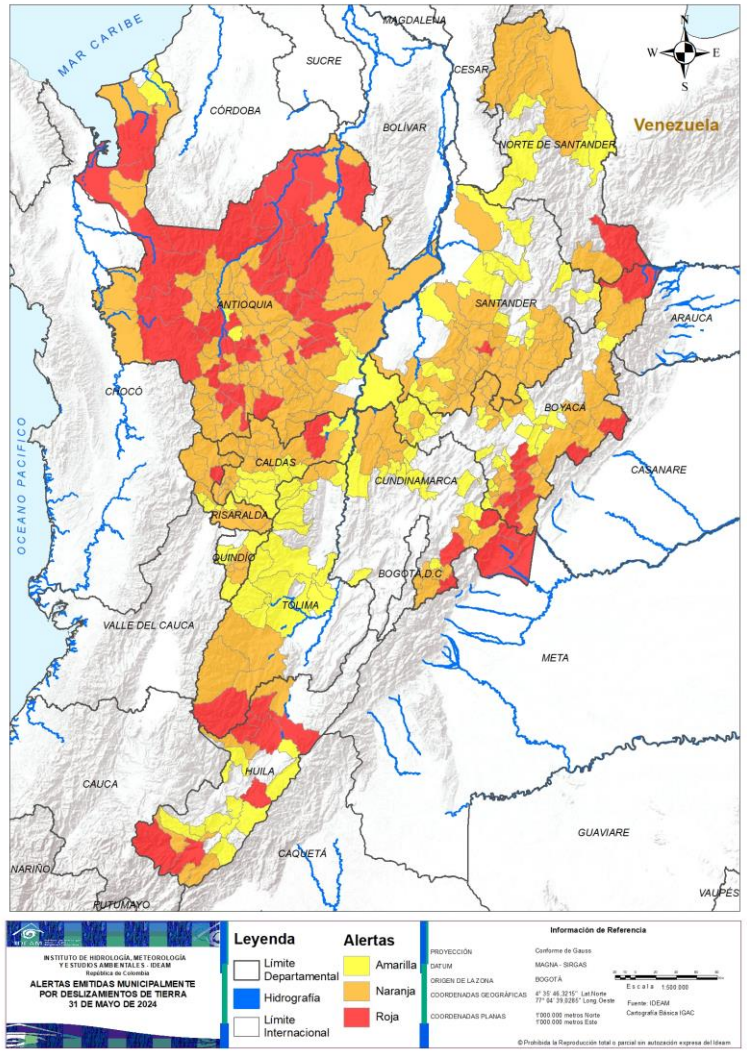

ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
⚠	ANTIOQUIA : Arboletes, Caracolí, Olaya, Puerto Nare, San Jerónimo. BOYACÁ : Briceño, Cómbita, El Cocuy, El Espino, Firavitoba, Gachantivá, Guateque, Guayatá, La Capilla, La Victoria, Maripí, Muzo, Otanche, Paipa, Pauna, Pesca, Puerto Boyacá, Ramiriquí, Sogamoso, Tenza, Tibaná, Toca, Tota, Tununguá, Tópaga, Ventaquemada, Villa De Leyva. CALDAS : Chinchiná, La Dorada, Manizales, Manzanares, Marulanda, Neira, Norcasia, Palestina, Villamaría. CUNDINAMARCA : Chocontá, Cáqueza, El Peñón, Gachetá, Gama, Guaduas, La Peña, Nilo, Pacho, Paime, Villagómez, Zipaquirá. HUILA : Agrado, Algeciras, Altamira, Garzón, Nátaga, Oporapa, Rivera, Saladoblanco, Suaza, Tarqui, Íquira. NORTE DE SANTANDER : El Zulia, La Esperanza, San Calixto, San José De Cúcuta, Ábrego. QUINDÍO : Armenia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Salento. RISARALDA : Balboa, La Celia, La Virginia, Marsella. SANTANDER : Betulia, Concepción, Confines, El Peñón, Florián, Girón, Guaca, Hato, La Belleza, Ocamonte, Palmas Del Socorro, Puerto Parra, Rionegro, San Gil, San Vicente De Chucurí, Valle De San José. TOLIMA : Cajamarca, Casabianca, Coello, Espinal, Guamo, Herveo, Honda, Ibagué, Murillo, Ortega, Palocabildo, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, San Luis, Santa Isabel, Villahermosa.

Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra


REGIÓN PACÍFICO

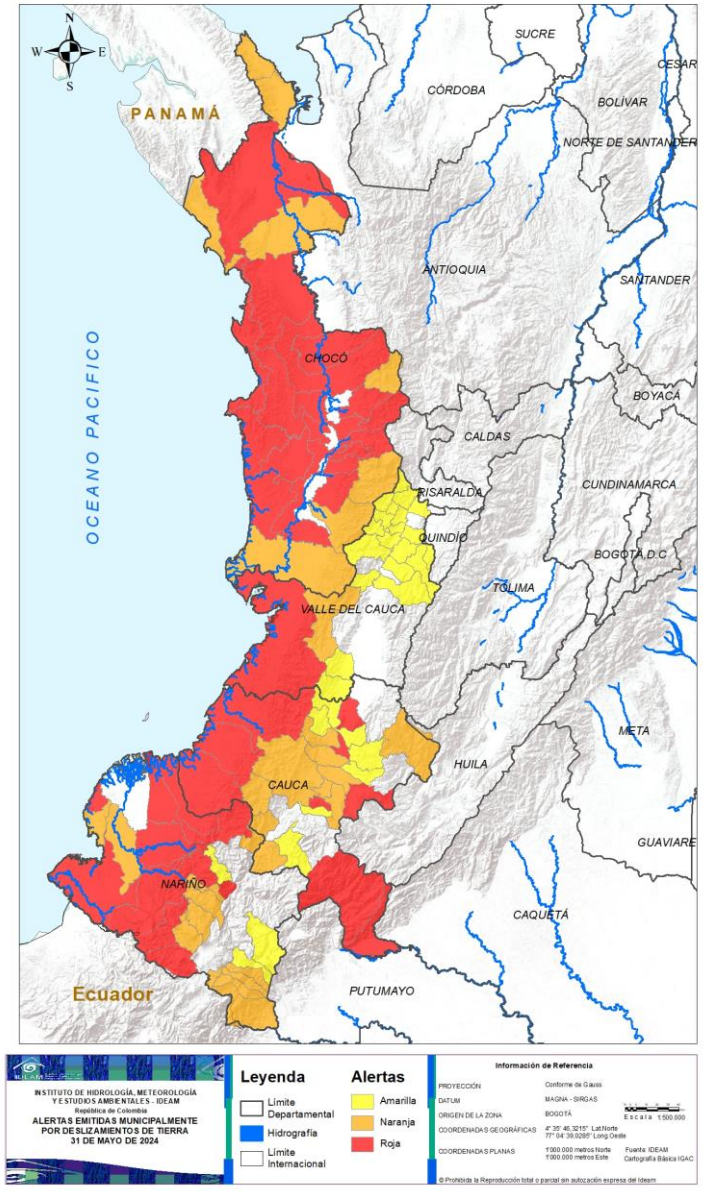

ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	CAUCA : Guapi, López De Micay, Piamonte, Piendamó - Tunía, Puracé, Rosas, Santa Rosa, Santander De Quilichao, Timbiquí. CHOCÓ : Alto Baudó, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Condoto, Cértegui, El Cantón Del San Pablo, Istmina, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Nuquí, Nóvita, Quibdó, Riosucio, Río Iró, Río Quito, Tadó. NARIÑO : Barbacoas, Cumbal, El Charco, Los Andes, Magüí, Ricaurte, San Andrés De Tumaco, Santa Bárbara. VALLE DEL CAUCA : Buenaventura.
	CAUCA : Argelia, Balboa, Cajibío, El Tambo, Mercaderes, Morales, Popayán, Páez, Sotará Paispamba, Timbío. CHOCÓ : Acandí, Carmen Del Darién, El Carmen De Atrato, El Litoral Del San Juan, Juradó, San José Del Palmar, Sipí, Unguía. NARIÑO : Córdoba, Francisco Pizarro, Ipiales, La Llanada, Leiva, Mallama, Potosí, Puerres, Roberto Payán, Samaniego, Santacruz. VALLE DEL CAUCA : Calima, Dagua.
	CAUCA : Bolívar, Buenos Aires, Caldono, La Sierra, Silvia, Suárez, Totoró. NARIÑO : Cumbitara, Funes, Pasto. VALLE DEL CAUCA : Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Bugalagrande, Caicedonia, Cali, Cartago, El Cairo, El Dovio, El Águila, Jamundí, La Unión, La Victoria, Riofrío, Roldanillo, Sevilla, Toro, Tuluá, Versalles, Zarzal.

Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra


REGIÓN ORINOQUÍA

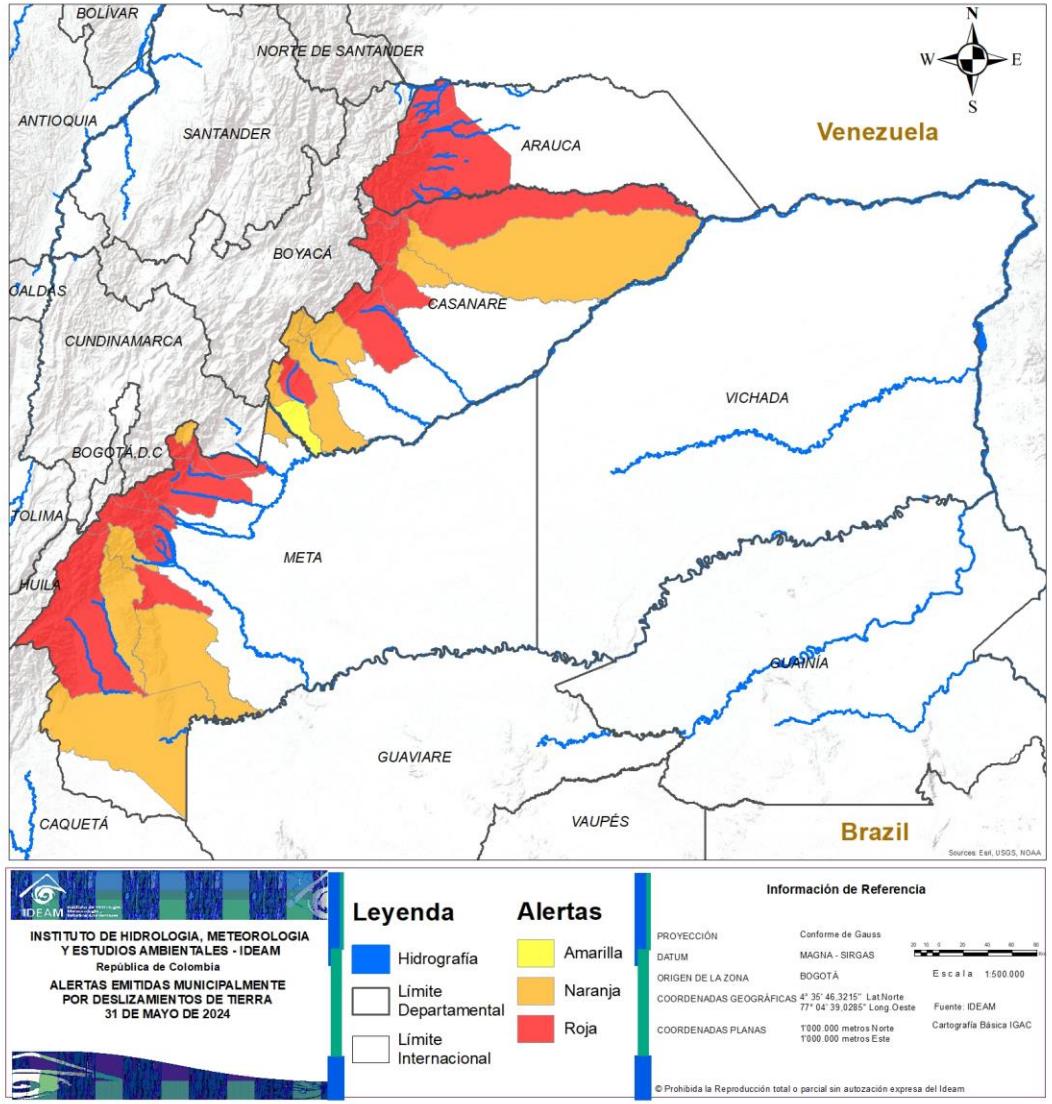

ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	ARAUCA : Fortul, Saravena, Tame. CASANARE : Hato Corozal, Monterrey, Nunchía, Sácama, Támara, Yopal. META : Acacías, Cubarral, Cumaral, El Calvario, El Castillo, El Dorado, Guamal, Restrepo, San Juan De Arama, Uribe, Villavicencio.
	CASANARE : Aguazul, Chámeza, Paz De Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Tauramena. META : Barranca De Upía, La Macarena, Lejanías, Mesetas, San Juanito, Vistahermosa.
	CASANARE : Villanueva.


Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra

REGIÓN AMAZONÍA

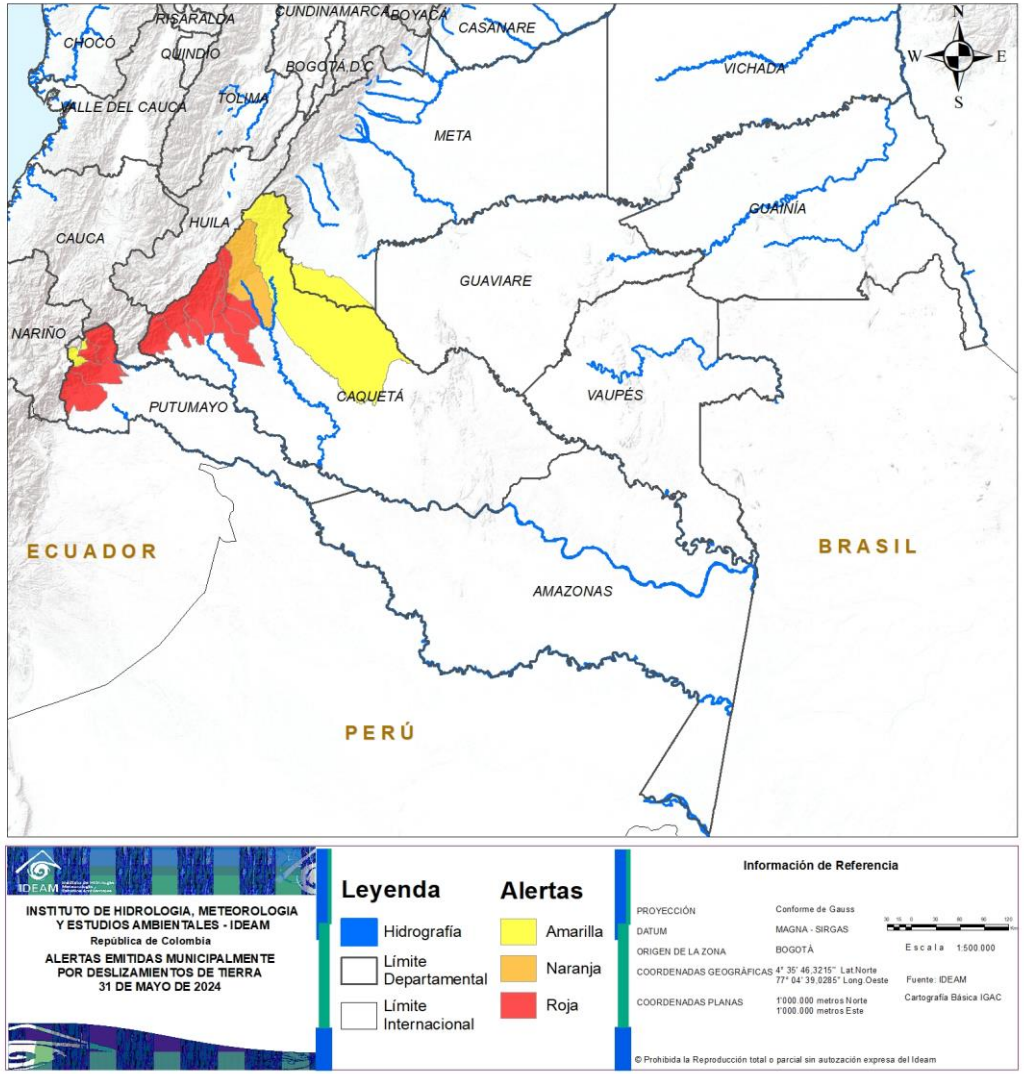

ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	CAQUETÁ : Belén De Los Andaquíes, El Doncello, El Paujíl, Florencia, La Montañita, Morelia, San José Del Fragua. PUTUMAYO : Mocoa, Orito, San Francisco, Villagarzón.
	CAQUETÁ : Puerto Rico.
	CAQUETÁ : San Vicente Del Caguán. PUTUMAYO : Santiago, Sibundoy.

DEFINICIONES Y RECOMENDACIONES

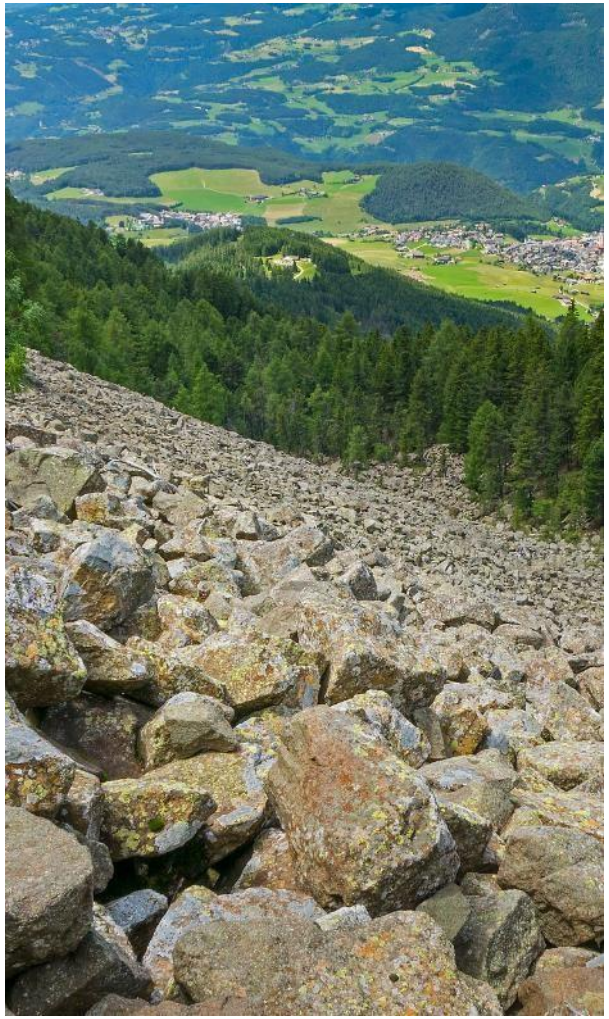

DEFINICIONES	RECOMENDACIONES
DERRUMBE: Término común para referirse a diversos tipos de movimientos en masa, particularmente caídas y deslizamientos. **DESLIZAMIENTO:** Movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de zonas relativamente delgadas con gran deformación cortante. **TIPOS DE DESLIZAMIENTOS:** Deslizamientos: Incluye movimientos tipo deslizamiento rotacional o deslizamiento traslacional en suelo o roca. En este grupo se pueden incluir los procesos en laderas tipo flujo que hacen parte de la zona de alimentación de flujos de detritos o flujos de lodo. **Caídas:** Incluye movimientos tipo caída en suelos o rocas. Se pueden incluir también en este tipo los movimientos tipo volcamiento. **Flujos:** En este tipo se incluyen los procesos tipo flujo de detritos, flujo de lodos o avenida torrencial (Ver numeral 1.2). **Reptación:** Término utilizado para describir movimientos lentos Y extremadamente lentos (Hungr et al., 2014).	• Construya o habite en zonas seguras. • Proteja los bosques. • Evite la tala de árboles y la quema de estos. • Identifique las áreas con amenazas de deslizamientos o derrumbes. • Realice un plan de emergencia familiar. • Estudie rutas alternativas para su evacuación. • No permita que el agua se filtre en el interior de las montañas: abra zanjas, alcantarillas y cuencas firmes que permita el desagüe de agua adecuado. • Evite la acumulación de basura o desechos en suelos ya que esta no permite que el agua filtre por donde debe hacerlo, lo que hace que el terreno se desestabilice.


RESUMEN

Debido a los valores de precipitación y temperatura máxima que se han dado en los últimos días, se presentan condiciones de:

Alerta Moderada: en algunos municipios del departamento de la Guajira.


Alerta Baja: en algunos municipios de los departamentos de Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño y Tolima.

Mapa de Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal

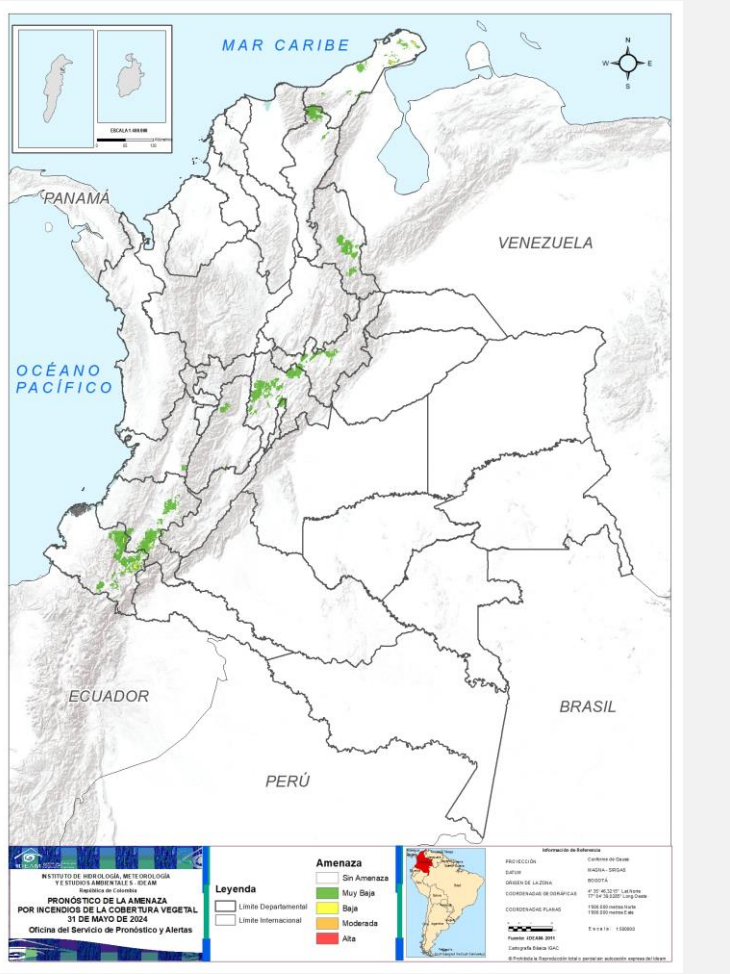

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal

Gráfica de seguimiento de alertas por pronóstico de la amenaza de incendios de la cobertura vegetal para Colombia durante los últimos 30 días

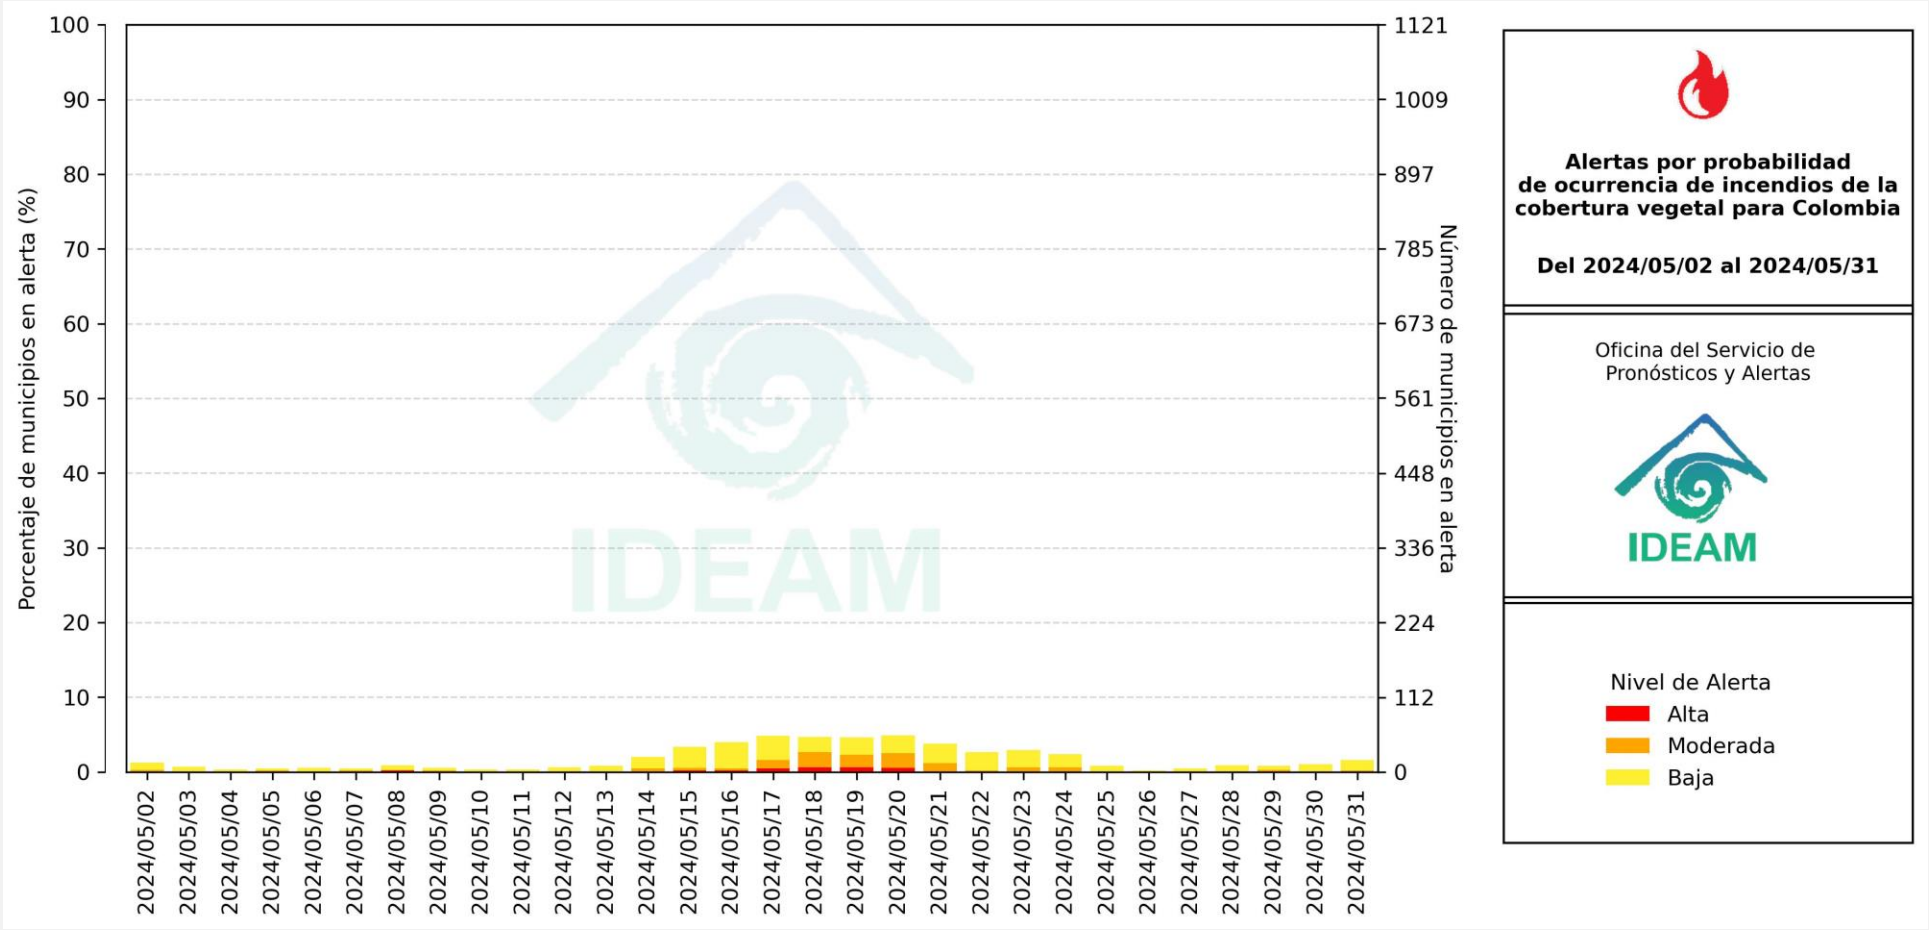


El eje horizontal presenta la fecha de evaluación de las alertas, el eje vertical izquierdo el porcentaje de municipios* en alerta y el eje vertical derecho el número total de éstos; categorizando las alertas en una barra apilada según su nivel de amenaza: alta (rojo), moderada (naranja) y baja (amarillo).

** Municipios oficiales registrados por el DANE representado el 100% (1121 municipios) a la fecha.*

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal

Actualización : 31 de mayo de 2024 | 12:00 HLC



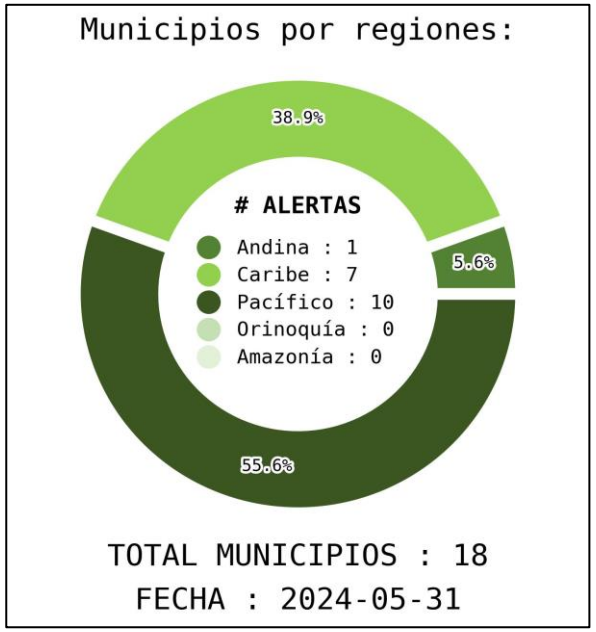


DEPARTAMENTO	#
TOTAL	0

DEPARTAMENTO	#
LA GUAJIRA	2
TOTAL	2

DEPARTAMENTO	#
NARIÑO	8
LA GUAJIRA	3
CAUCA	2
CESAR	1
CÓRDOBA	1
TOLIMA	1
TOTAL	16

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal


REGIÓN CARIBE

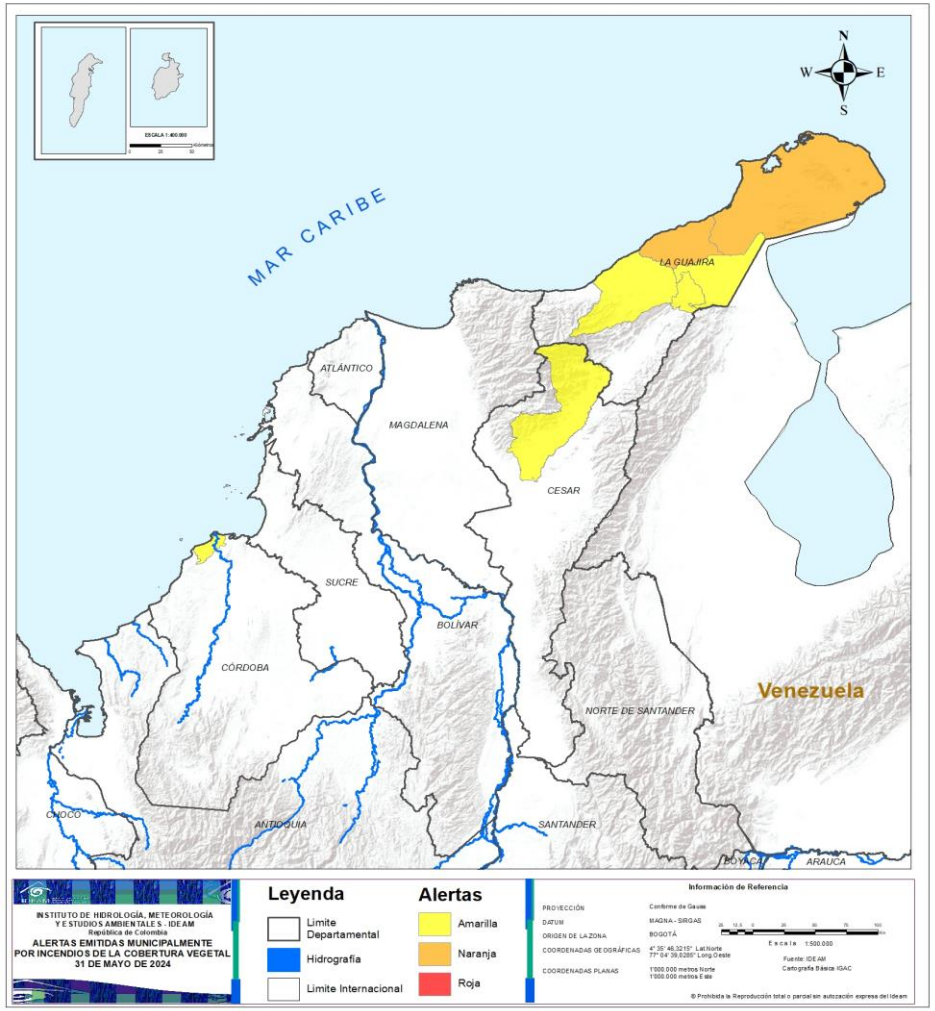

ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	LA GUAJIRA : Manaure, Uribia.
	CESAR : Valledupar. CÓRDOBA : San Bernardo Del Viento. LA GUAJIRA : Albania, Maicao, Riohacha.

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal


REGIÓN ANDINA

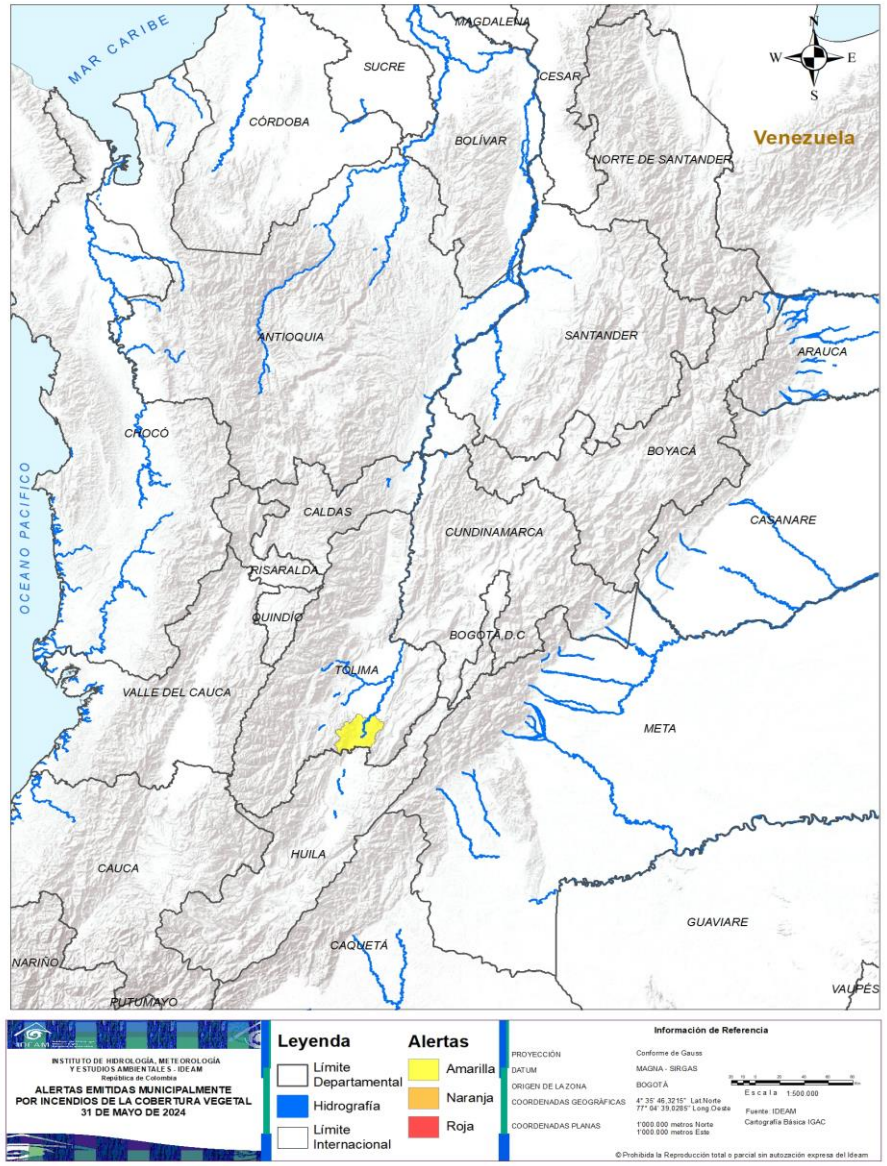

ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
⚠	TOLIMA : Natagaima.

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal


REGIÓN PACÍFICO

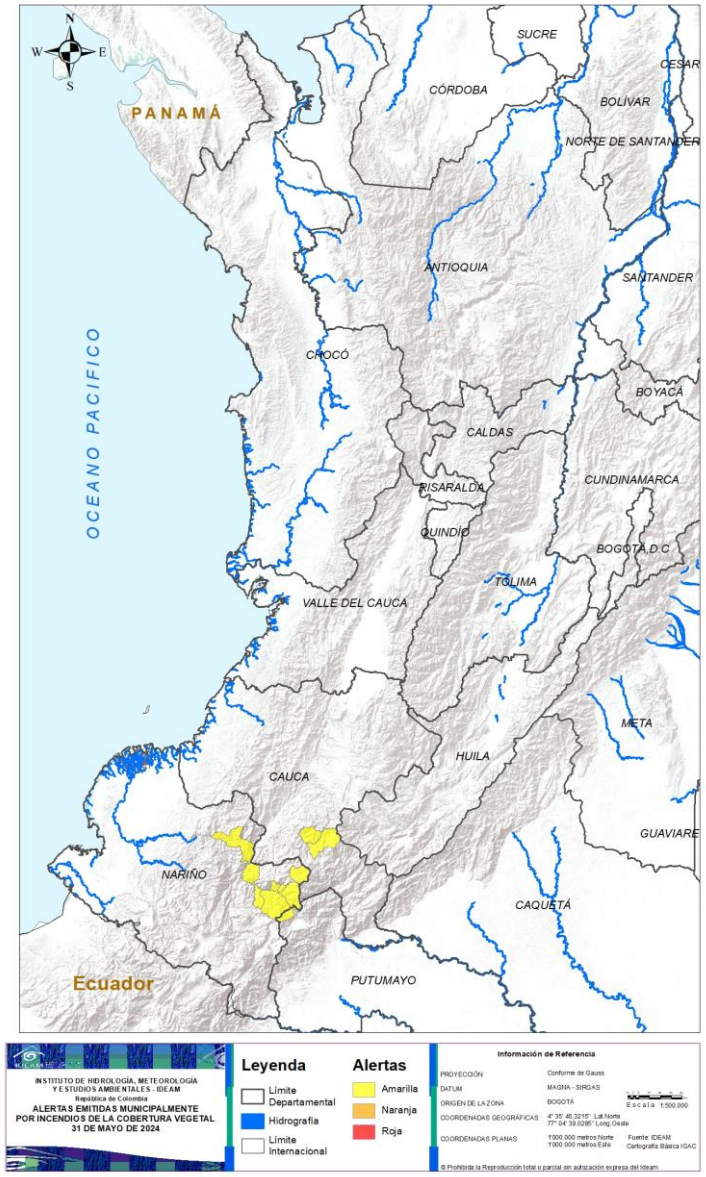

ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	CAUCA : Almaguer, San Sebastián. NARIÑO : Albán, Arboleda, Buesaco, Chachagüí, El Rosario, El Tablón De Gómez, La Cruz, Taminango.

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal

REGIÓN ORINOQUÍA

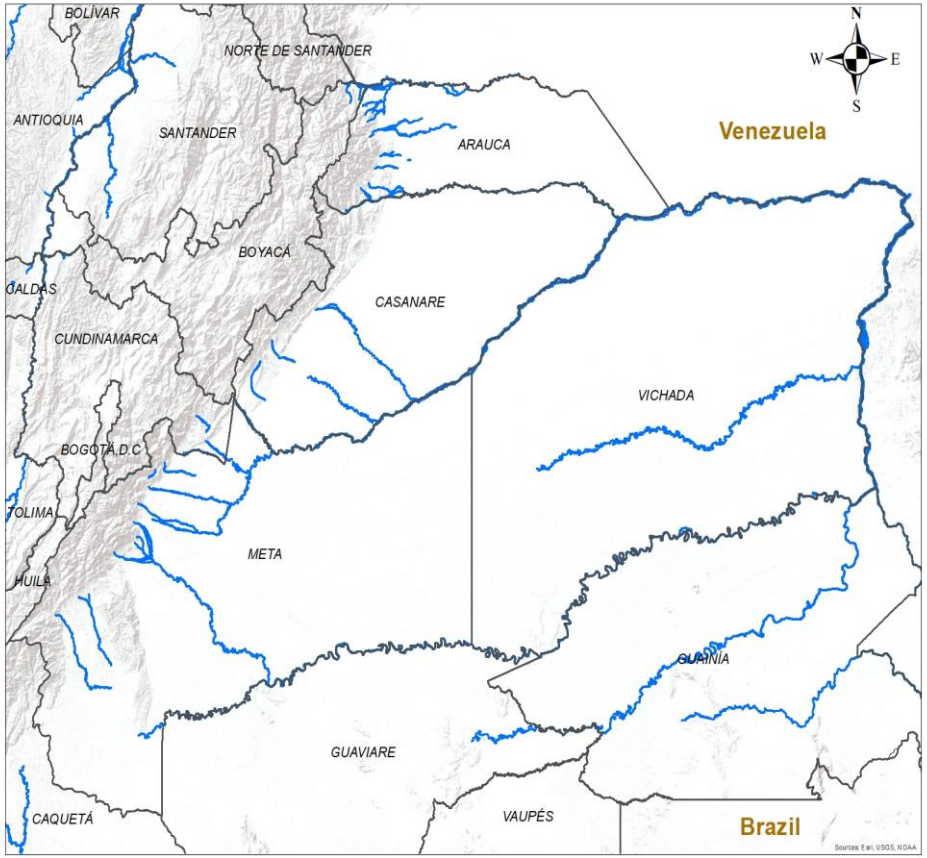




CONDICIONES NORMALES

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal

REGIÓN AMAZONIA

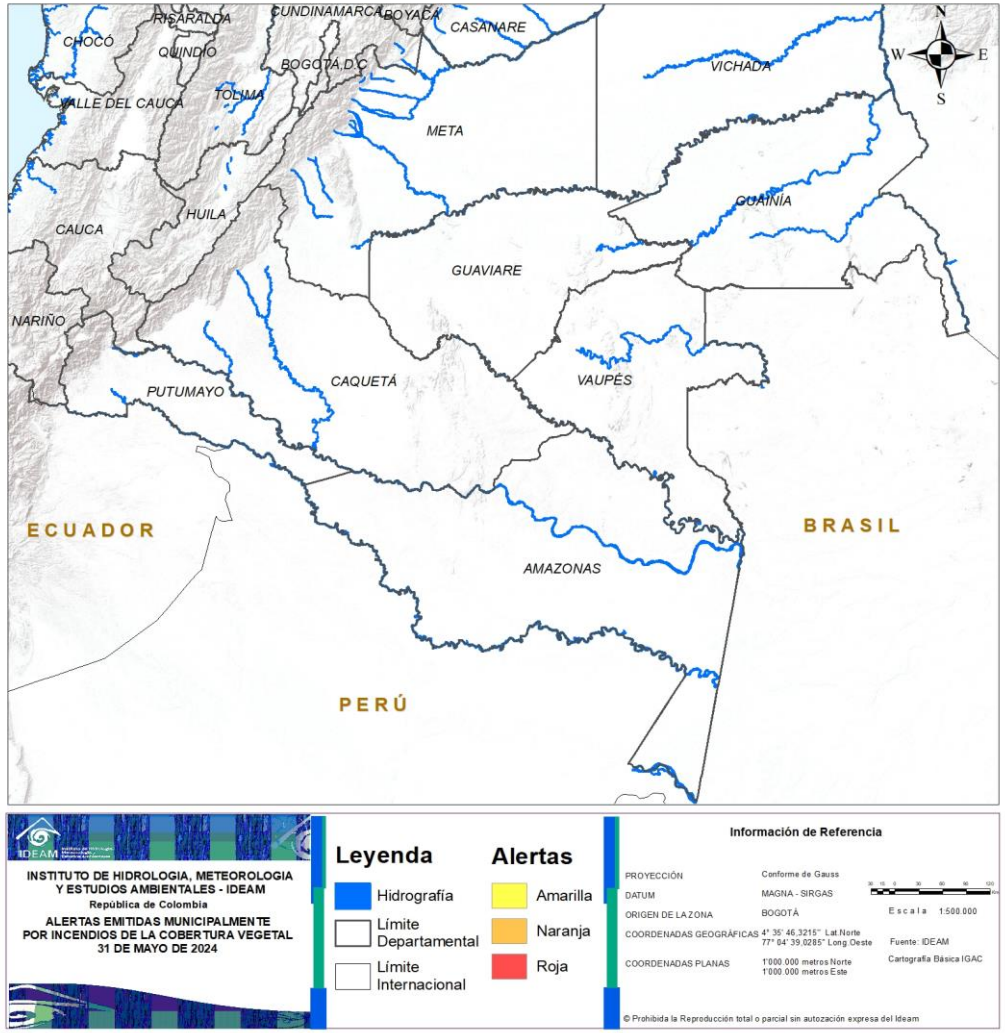

CONDICIONES NORMALES


DEFINICIONES Y RECOMENDACIONES



DEFINICIONES	RECOMENDACIONES
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales (Ley 1523 de 2012). Conato (Incendio): Fuego de origen natural o antrópico que afecta o destruye una extensión inferior a 5.000 m2, de cualquier tipo de cobertura vegetal, ya sea en zona urbana o rural. Incendio de la cobertura vegetal: Fuego sobre la cobertura vegetal de origen natural o antrópico que se propaga sin control, que causa perturbaciones ecológicas afectando o destruyendo una extensión superior a 5.000 m2, ya sea en zona urbana o rural, que responde al tipo de vegetación, cantidad de combustible, oxígeno, condiciones meteorológicas, topografía, actividades humanas, entre otras. Incendio forestal: Un incendio forestal es un "fuego que, cualquiera sea su origen, se propaga sin control en terrenos rurales a través de vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, ya sea viva o muerta". Es decir, no solo se queman los árboles, sino que se destruye todo un ecosistema de especies vegetales silvestres y también animales que habitan en estos terrenos. (Conaf, 2019)	A la comunidad en general, a los turistas y caminantes apagar debidamente las fogatas y no dejar residuos tipo vidrio que sirvan como elementos concentradores de la radiación solar e igualmente reportar a las autoridades en caso de ocurrencia de incendios. A los consejos departamentales y municipales, las autoridades ambientales regionales y locales, mantener activos los planes de prevención y atención de incendios con el fin de evitar la ocurrencia y propagación de los mismos especialmente en áreas de reserva forestal y del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales. A los sistemas regionales y locales de bomberos disponer de los elementos necesarios para la atención oportuna de eventos de incendio de la cobertura vegetal

Alertas Meteomarinas Vigentes
Mar Caribe Colombiano

Actualización: 31 de mayo de 2024 | 12:00 HLC

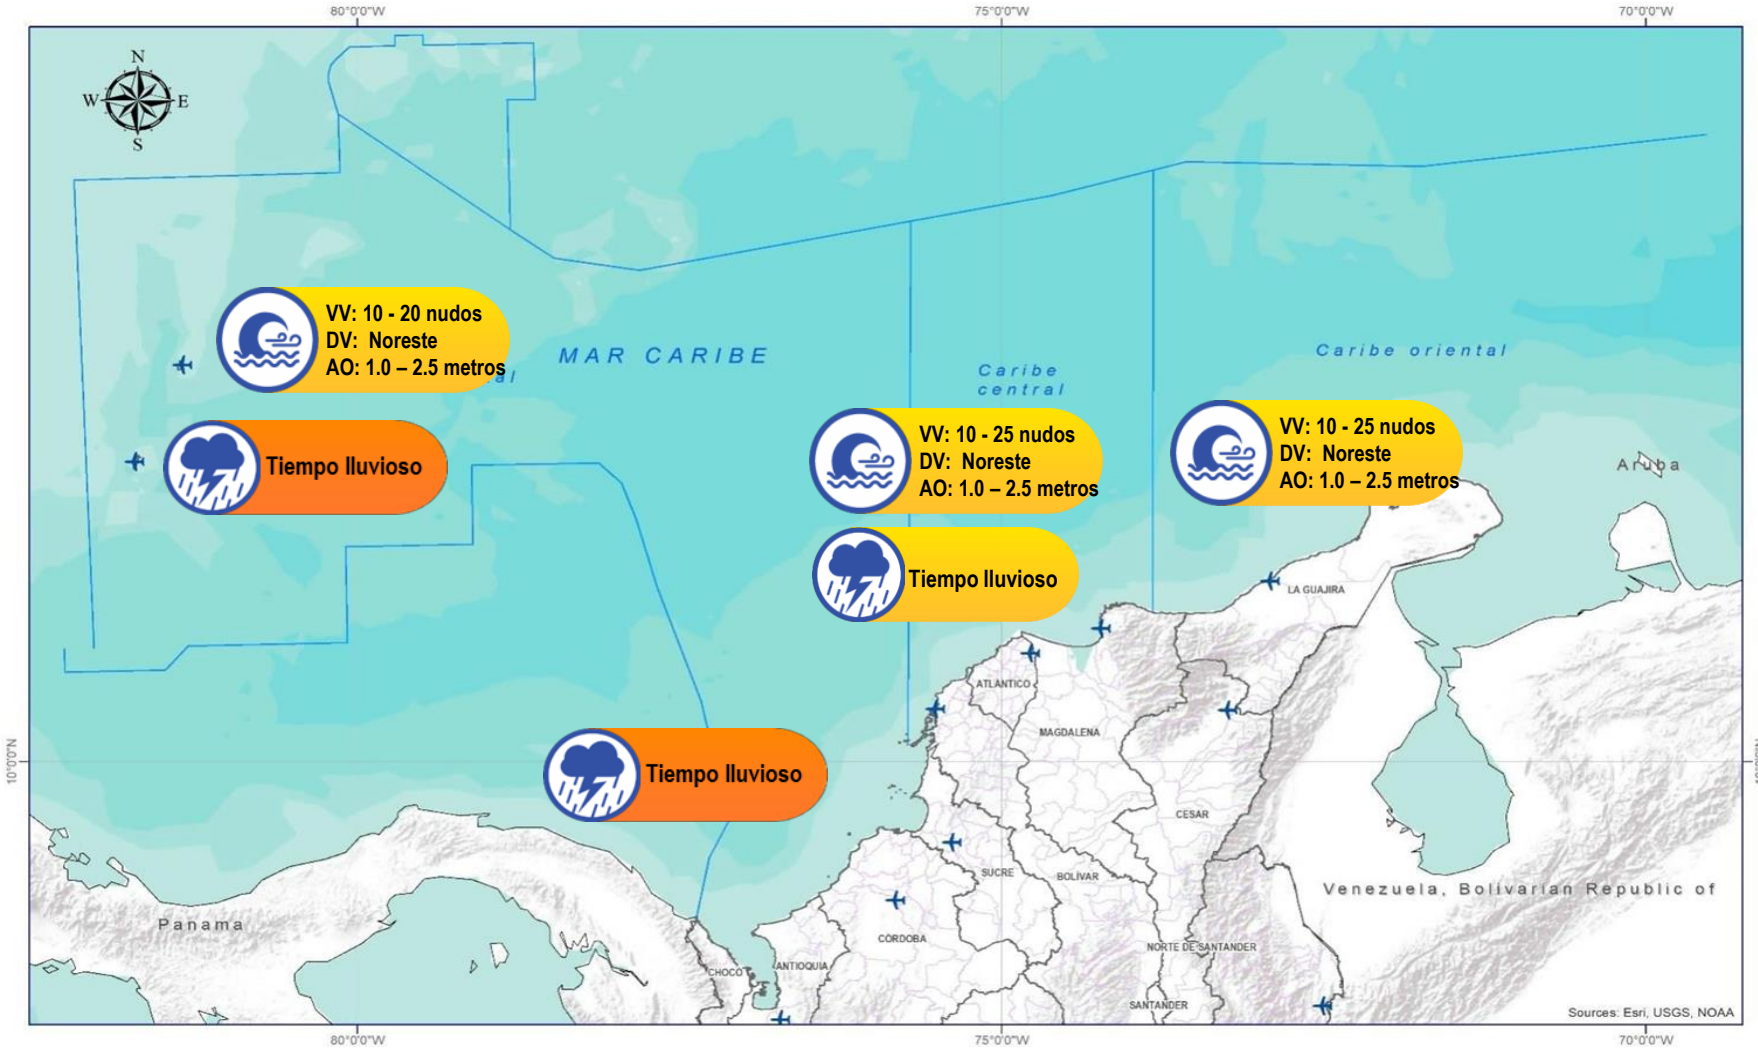

Abreviaturas

VV – Velocidad del viento máxima probable.
DV – Dirección predominante del viento.
AO – Altura significativa de la ola.

Convenciones

Tiempo Lluvioso

Probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, en algunos casos con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento.

Sugerencia o recomendación

A las embarcaciones de poco calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar en zonas de inminente tempestad.

A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a los avisos de las autoridades locales.

Viento y oleaje

Velocidad del viento y altura del oleaje con valores por encima de lo normal para la época.

Sugerencia o recomendación


A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución del fenómeno y a las indicaciones de las autoridades locales.

A las embarcaciones de poco calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar.

* La altura significativa de la ola, representa la media del tercio más alto de las olas, por lo cual la altura máxima posible puede ser incluso superior al doble de este valor.

Alertas Meteomarinas Vigentes
Océano Pacifico Nacional

Actualización: 31 de mayo de 2024 | 12:00 HLC

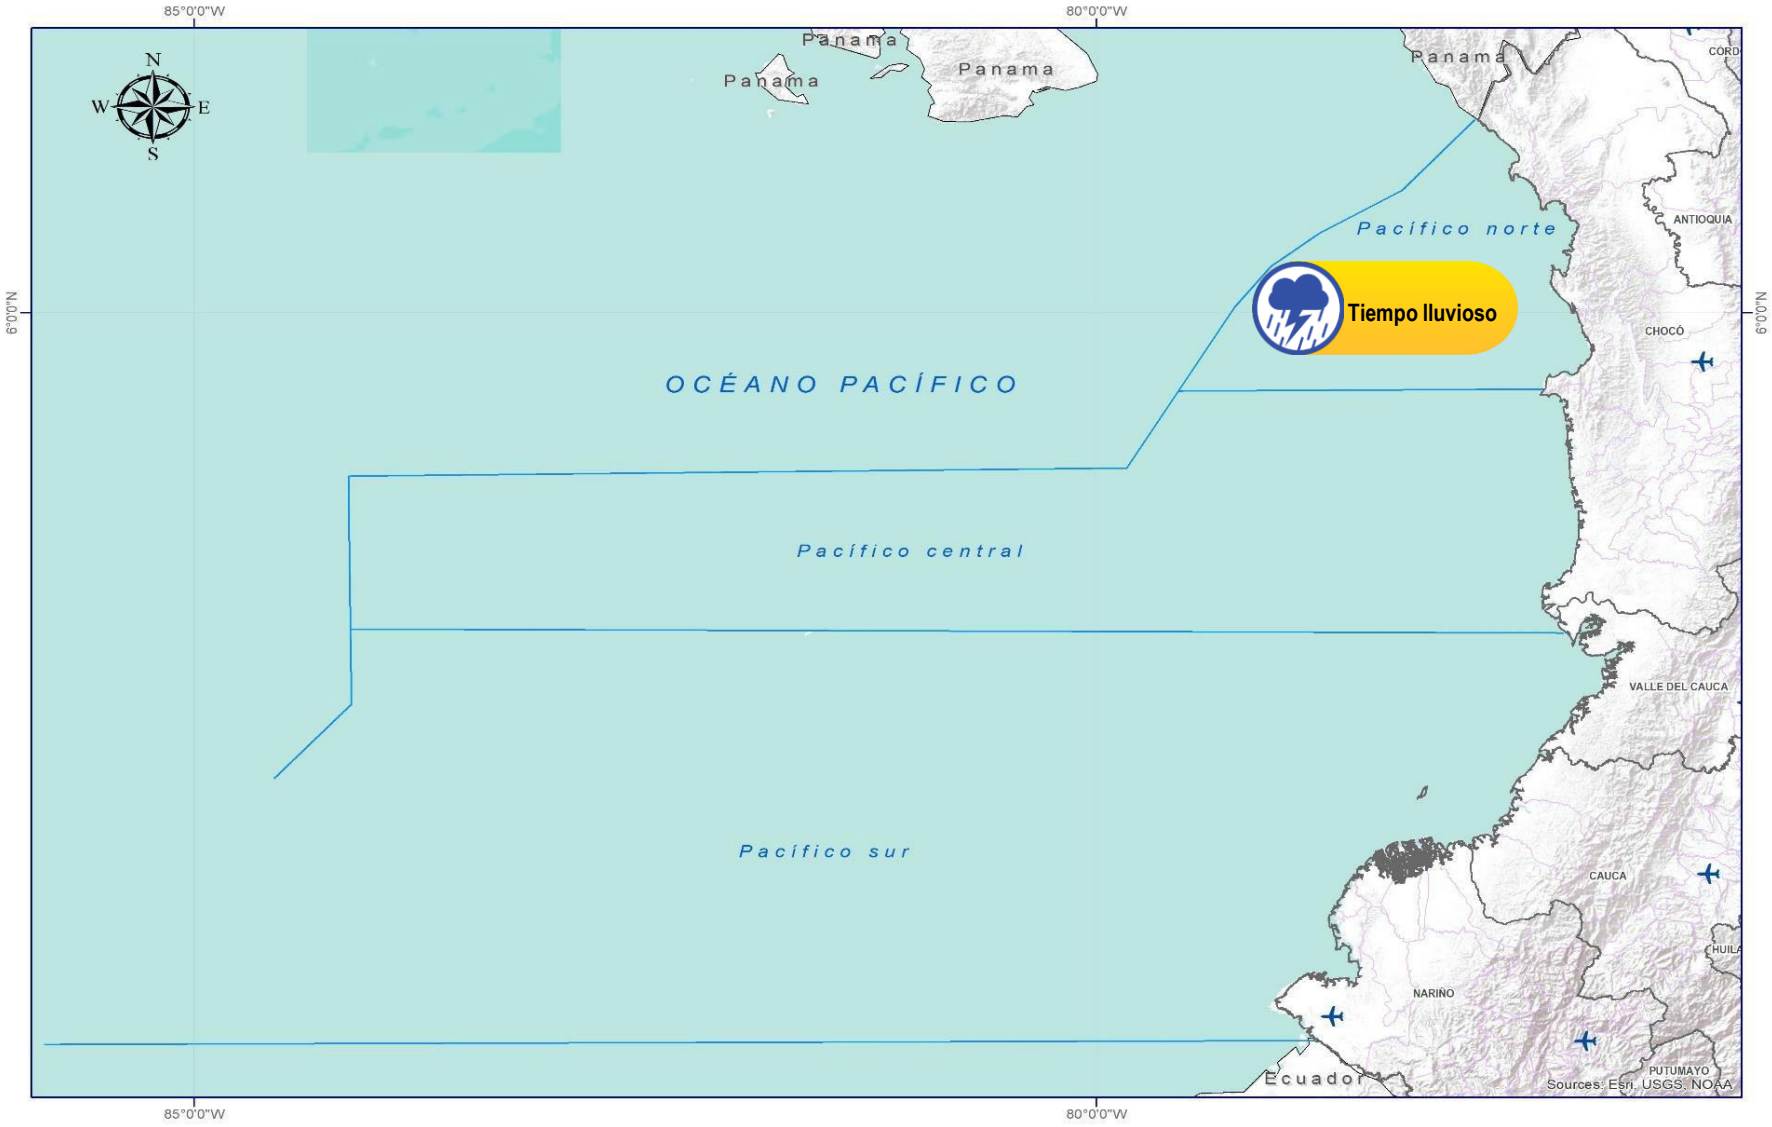

Abreviaturas

VV – Velocidad del viento máxima probable.
DV – Dirección predominante del viento.
AO – Altura significativa de la ola.

Convenciones

Tiempo Lluvioso

Probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, en algunos casos con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento.

Sugerencia o recomendación

A las embarcaciones de poco calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar en zonas de inminente tempestad.

A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a los avisos de las autoridades locales.

Viento y oleaje

Velocidad del viento y altura del oleaje con valores por encima de lo normal para la época.

Sugerencia o recomendación

A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución del fenómeno y a las indicaciones de las autoridades locales.

A las embarcaciones de poco calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar.

* La altura significativa de la ola, representa la media del tercio más alto de las olas, por lo cual la altura máxima posible puede ser incluso superior al doble de este valor.

INFORME TÉCNICO DIARIO

Ghisliane Echeverry Prieto | Directora General
Ingrid Tatiana Sierra Giraldo | Jefe Oficina del Servicio de Pronóstico y Alertas

Elaboró:
Daniel Useche – Carolina Valencia, (Meteorología).
Ana Milena Rincón –Carlos Merchán, (Hidrología).
Nubia Traslaviña, (Deslizamientos de Tierra).
Sergio Ruiz – Willian Riaño, (Incendios de la Cobertura Vegetal).
Mauricio Torres, (Datos Hidrometeorológicos)
Jhon Bermúdez González, (Coordinador Alertas Hidrometeorológicas y Ambientales)

OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICO Y ALERTAS
http://www.ideam.gov.co
Correos electrónicos: servicio@ideam.gov.co, alertas@ideam.gov.co
Calle 25D N° 96B - 70, piso 3. Bogotá, D.C.
Teléfono: 3075625 ext. 1334 -1336.

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES

InstitutoIDEAM

@IDEAMColombia

IdeamColombia

Ideam.Instituto

ANEXO 6

Ensayos de Laboratorio – Formato - MEPI-MN1-IN-15-FR-11

ANEXO 6.1 MUNICIPIO DE ALPUJARRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Tolima

CONTRATO DE OBRA No.: 050 DE 2022 **CONTRATISTA:** ARNULFO HERNÁN ARIAS DÍAZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** VÍA LAS DELICIAS.ALPUJARRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247 - 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo		Resultado del Ensayo		Cumple SI o NO	Observación / Acciones	
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA												
						DIAS	**RESISTENCIA ESPECIF. lb/pul²**	**RESISTENCIA lb/pul²**	**%**			

OBSERVACIONES:

Durante el mes de mayo 2024 no se realizaron ensayos de laboratorio, igualmente se realiza la solicitud con el comunicado CIM-2247-21-1131-21-365. “Solicitud presentación formatos Informe Mensual mayo de 2024.” Del (23/05/2024)

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: Boanerjes Caicedo Pedrero
Director de obra
Matrícula Profesional No.: 25202-70943 CND

Firma

Nombre: Marisol Amaya Borras
Director Interventoria
Matricula Profesional No.: 25202-74273 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 6.2 MUNICIPIO DE FRESNO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.: 167-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO FRESNO IC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 1133 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247 - 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

El Contratista no aportó los resultados de los ensayos de laboratorio para les mes abril-2024 y mayo-2024.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: Edison Torres Peralta
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-137684 TLM



Firma

Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 7

Seguros y Garantías Obra – Formato – MEPI-MN1-IN-15-12

Anexo 6.1 Alpujarra
Anexo 6.2 Fresno
Anexo 6.3 Valle de San Juan
Anexo 6.4 Flandes
Anexo 6.5 Melgar

ANEXO 7.1 MUNICIPIO DE ALPUJARRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 050-2022 **CONTRATISTA:** ARNULFO ARIAS DÍAZ

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA-PUENTE LAS DELICIAS CON RECURSOS DE CORREDORES.

FECHA DE INICIO: 3/.5/2022
PLAZO INICIAL: 2 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 4.045.951.044,98
VALOR ACUMULADO: $ - (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.500.000,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2247 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Calidad del Servicio	10%	$ 404.595.105,00	23	2	2022	8	1	2024
Cumplimiento	10%	$ 404.595.105,00	23	2	2022	8	2	2023
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.213.785.314,00	23	2	2022	23	2	2027
Manejo del anticipo	50%	$ 2.022.975.523,00	23	2	2022	30	11	2022
Pagos de salarios, prestaciones sociales	5%	$ 202.297.552,00	23	2	2022	9	10	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4006000
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200- SMLMV	$ 200.000.000,00	23	2	2022	8	10	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001186 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 12 **MODIFICACIÓN No.:** 15 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Calidad del Servicio	10%	$ 404.595.105,00	3	5	2022	7	10	2024
Cumplimiento	10%	$ 404.595.105,00	3	5	2022	7	10	2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.213.785.314,00	23	2	2022	23	2	2027
Manejo del anticipo	50%	$ 2.022.975.523,00	3	5	2022	7	10	2024
Pagos de salarios, prestaciones sociales	5%	$ 202.297.552,00	3	5	2022	9	6	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4006000

Certificado de modificación o anexo No.: 14
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 12 **MODIFICACIÓN No.:** 15 **SUSPENSIÓN No.:** 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200- SMLMV	$ 260.000.000,00	23	2	2022	10	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001186 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 13
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI - Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Es importante destacar que, con fecha 26 de abril de 2024, el contratista presentó las pólizas correspondientes a la referida prórroga a través de la comunicación OF-174-26-04-2024. En respuesta a dicha presentación, se emitió el comunicado CIM-2247-21-1131-21-351.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto,
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MARISOL ARAYA CORREA
Directora de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-74273 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4006000 **Anexo: 14** **Sucursal: TUNJA C.N.H 29**

Referencia	Fecha de Expedición	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas [d-m-a]	VIGENCIA SEGURO Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo Nº	VIGENCIA ANEXO Desde [d-m-a]	VIGENCIA ANEXO Hasta [d-m-a]	Certificado de
010091062885-42	26/04/2024	23/02/2022	09/06/2027	14	26/04/2024	09/06/2027	PRORROGA

Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación
CLARA MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS LTDA	4003686	100,00		

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	CC	Dirección	Ciudad	Teléfono
ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ	1.110.443.738	MAN 41 CASA NO. 23 BARRIO TOPACHO	IBAGUÉ,TOLIMA	3017940140

Asegurado	NIT
MUNICIPIO DE ALPUJARRA	890.702.017-7

Beneficiario	NIT
MUNICIPIO DE ALPUJARRA	890.702.017-7

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CR 6 CLL NO. 5 ESQ | Ciudad: ALPUJARRA | Total Suma Asegurada $ 4.248.248.599,00

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
CALIDAD DEL SERVICIO	03/05/2022	07/10/2024	$ 404.595.105,00
CUMPLIMIENTO	03/05/2022	07/10/2024	$ 404.595.105,00
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	23/02/2022	23/02/2027	$ 1.213.785.314,00
MANEJO DEL ANTICIPO	03/05/2022	07/10/2024	$ 2.022.975.523,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	03/05/2022	09/06/2027	$ 202.297.552,00

Conducto de Pago	Fecha Máxima Pago Prima
CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	10/06/2024

PRIMA	$ 665.000,00
Otros conceptos	$ 0,00
Gastos de expedición	$ 7.000,00
IVA	$ 127.680,00
Prima total:	$ 799.680,00

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

Yadira Botero Vides

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFECTY / SERVIENTREGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	ÉXITO SURTIMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	**www.hdi.com.co/pagos-en-linea/** PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

DÉBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL $ 799.680,00

HDI SEGUROS

NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (601) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

(415)7702963000020(8020)0100910628542(3900)000000799680(96)20240610

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4006000 Anexo: 14 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas [d-m-a]	Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo Nº	VIGENCIA ANEXO Desde [d-m-a]	Hasta [d-m-a]	Certificado de
010091062885-42	26/04/2024	23/02/2022	09/06/2027	14	26/04/2024	09/06/2027	PRORROGA

Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación
CLARA MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS LTDA	4003686	100,00		

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	CC	Dirección	Ciudad	Teléfono
ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ	1.110.443.738	MAN 41 CASA NO. 23 BARRIO TOPACHO	IBAGUÉ,TOLIMA	3017940140

Asegurado	Beneficiario
MUNICIPIO DE ALPUJARRA	VARIOS SEGÚN RELACIÓN

INFORMACIÓN DEL RIESGO

Riesgo: 1 | Ciudad: | Departamento: VARIOS

Dirección:

Beneficiarios	Tipo Doc.	Nro. Doc.
MUNICIPIO DE ALPUJARRA	NIT	890.702.017-7

Objeto > Ramo > Amparo	Valor asegurable	Valor asegurado	SubLímite	Indice Variable	
CONTRATO		**$ 4.248.248.599,00**		%	Valor
CUMPLIMIENTO		$ 4.248.248.599,00			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		$ 202.297.552,00			
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO		$ 1.213.785.314,00			
CUMPLIMIENTO		$ 404.595.105,00			
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 404.595.105,00			
MANEJO DEL ANTICIPO		$ 2.022.975.523,00			

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

Yadira Botero Vides

FIRMA AUTORIZADA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ — Número de identificación: 1.110.443.738

Número Póliza: 4006000 Anexo: 14 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 — Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

ANEXO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS EN NOVENTA Y UN (91) DIAS MAS SEGUN ACTA DE PRORROGA Y ADICION No 12 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.
****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N 11 DE PROROGA DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.
****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 10 DE PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE FECHA 29 DE JULIO DE 2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 09 DE PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIEGNCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N°08 DE PRÓRROGA No 07 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIEGNCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N°07 DE PRÓRROGA No 06 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIEGNCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N°06 DE PRÓRROGA No 05 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIEGNCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N°05 DE PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N°04 DE PRÓRROGA DE FECHA15 DE DICIEMBRE DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No. 3 DE PRORROGA DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2022

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINACIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ — Número de identificación: 1.110.443.738

Número Póliza: 4006000 Anexo: 14 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 — Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No. 2 DE PRORROGA DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 03 DE MAYO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ADICIONA EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO SEGUN ACTA MODIFICATORIA No 01 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS, SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 03 DE MAYO DE 2022 Y ACTA MODIFICATORIA No 01 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DE LA CESION DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 050 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA-PUENTE LAS DELICIAS CON RECURSOS DE CORREDORES RURALES INVÍAS PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (05) AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LA OBRA

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ALPUJARRA, NIT. 890.702.017-7. E INVÍAS, NIT. 800.215.807-2.

_____
FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINACIERA DE COLOMBIA



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 4001186 **Anexo: 13** **Sucursal: TUNJA C.N.H 29**

Referencia	Fecha de Expedición	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas [d-m-a]	VIGENCIA SEGURO Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo Nº	VIGENCIA ANEXO Desde [d-m-a]	VIGENCIA ANEXO Hasta [d-m-a]	Certificado de
010091062887-84	26/04/2024	23/02/2022	10/06/2024	13	11/03/2024	10/06/2024	PRORROGA

Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación
CLARA MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS LTDA	4003686	100,00		

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	CC	Dirección	Ciudad	Teléfono
ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ	1.110.443.738	MAN 41 CASA NO. 23 BARRIO TOPACHO	IBAGUÉ,TOLIMA	3017940140

Asegurado	CC
ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ	1.110.443.738

Beneficiario	NIT
TERCEROS AFECTADOS	999.999.989-0

PRODUCTO Y PRIMA

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Código CIIU	TOTAL SUMA ASEGURADA	CONDUCTO DE PAGO
7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN…	$ 260.000.000,00	CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL

VALORES ASEGURADOS POR RAMO TÉCNICO		FECHA MÁXIMA PAGO PRIMA 10/06/2024	
RESP CIVIL EXT.	$ 260.000.000,00	PRIMA NETA	$ 0,00
		OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
		GASTOS DE EXPEDICIÓN	$ 0,00
		IVA	$ 0,00
		PRIMA TOTAL:	$ 0,00
		PRIMA	$ 177.000,00
		OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
		GASTOS DE EXPEDICIÓN	$ 7.000,00
		IVA	$ 34.960,00
		PRIMA TOTAL:	$ 218.960,00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

Yadira Botero Vides

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFECTY / SERVIENTREGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	ÉXITO SURTIMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	**www.hdi.com.co/pagos-en-linea/** PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

DÉBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL $ 218.960,00

HDI SEGUROS

NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (601) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

(415)7702963000020(8020)0100910628784(3900)000000218960(96)20240610

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

HDI SEGUROS

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 4001186 Anexo: 13 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas [d-m-a]	VIGENCIA SEGURO Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo Nº	VIGENCIA ANEXO Desde [d-m-a]	VIGENCIA ANEXO Hasta [d-m-a]	Certificado de
010091062887-84	26/04/2024	23/02/2022	10/06/2024	13	11/03/2024	10/06/2024	PRORROGA

Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación
CLARA MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS LTDA	4003686	100,00		

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	CC	Dirección	Ciudad	Teléfono
ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ	1.110.443.738	MAN 41 CASA NO. 23 BARRIO TOPACHO	IBAGUÉ,TOLIMA	3017940140

Asegurado	Beneficiario
ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ	VARIOS SEGÚN RELACIÓN

INFORMACIÓN DEL RIESGO

Riesgo: 1	Ciudad: ALPUJARRA	Departamento: TOLIMA

Dirección: MUNICIPIO DE ALPUJARRA

Beneficiarios	Tipo Doc.	Nro. Doc.
TERCEROS AFECTADOS	NIT	999.999.989-0

Objeto > Ramo > Amparo	Valor asegurable	Valor asegurado	SubLímite	Indice Variable	
OBJETO GENERAL		**$ 260.000.000,00**		%	Valor
RESP CIVIL EXT.		$ 260.000.000,00			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		$ 260.000.000,00			

DEDUCIBLES: 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00SMMLV - No Inferior A: 0.00% EN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINACIERA DE COLOMBIA

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

Yadira Botero Vides

FIRMA AUTORIZADA

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tomador: ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ — Número de identificación: 1.110.443.738

Número Póliza: 4001186 Anexo: 13 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 — Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

ANEXO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS EN NOVENTA Y UN (91) DIAS MAS SEGUN ACTA DE PRORROGA Y ADICION No 12 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2024. Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO SEGUN SMLMV AÑO 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO SEGUN ACTA MODIFICATORIA N 11 DE PROROGA DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 10 DE PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE FECHA 29 DE JULIO DE 2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 09 DE PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIEGNCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N°08 DE PRÓRROGA No 07 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIEGNCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N°07 DE PRÓRROGA No 06 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIEGNCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N°06 DE PRÓRROGA No 05 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIEGNCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N°05 DE PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN EL VALOR ASEGURADO SEGUN SMMLV VIGENCIA 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N°04 DE PRÓRROGA DE FECHA15 DE DICIEMBRE DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINACIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tomador: ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ — Número de identificación: 1.110.443.738

Número Póliza: 4001186 Anexo: 13 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 — Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

****

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No. 3 DE PRORROGA DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No. 2 DE PRORROGA DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS, SEGUN ACTA DE INCIO DE FECHA 03 DE MAYO DE 2022 Y ACTA MODIFICATORIA No 01 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

****

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 4006000

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ACORDE CON EL DECRETO 1082 DE 2015, POR DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES QUE SE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCION DE LA CESION DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 050 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA-PUENTE LAS DELICIAS CON RECURSOS DE CORREDORES RURALES INVÍAS PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TOMADOR/AFIANZADO: ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ CC No. 1.110.443.738
ASEGURADOS: ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ CC No. 1.110.443.738 Y MUNICIPIO DE ALPUJARRA, NIT. 890.702.017-7
BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE ALPUJARRA, NIT. 890.702.017-7. E INVÍAS, NIT. 800.215.807-2. Y TERCEROS AFECTADOS

_____
FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINACIERA DE COLOMBIA
