La equidad es de todos — Prosperidad Social	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 4

FECHA DE INFORME:	viernes, 13 de septiembre de 2024		INFORME Nº:	33	PERÍODO DEL	12 de septiembre de 2024
			ETAPA:	OBRA	AL	14 de septiembre de 2024
Nº Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS):	341FIP 2021		ID DEL PROYECTO:	20210341S232738-1		
DEPARTAMENTO:	HUILA		MUNICIPIO:	HOBO		
Nº Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	208 FIP DE 2019		SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):	CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA / DOUGLAS ELIAS DE JESUS ORTEGA		

1. INFORMACIÓN GENERAL


OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL HOBO - HUILA		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	HOBO - HUILA	No. Beneficiarios	6700
Nº ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA (o su equivalente):	1	Nota: Verificar que el Acta se encuentra suscrita por todas las partes intervinientes	


PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)			CONTRATO DE OBRA	
Nº ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente):	Z7-096		Nº Y AÑO DE CONTRATO:	129-2022
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP.		CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE HOBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD		CONTRATISTA:	ISAIAS VARGAS GONZALEZ
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	0		PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	
PLAZO CONSTRUCCIÓN:	4 MESES		PLAZO CONSTRUCCIÓN:	4 MESES
PLAZO TOTAL INICIAL:	4 MESES		PLAZO TOTAL INICIAL:	4 MESES
FECHA DE INICIO:	29 de junio de 2022		FECHA DE INICIO:	29 de junio de 2022
SUSPENSION 1:	27 de julio de 2022		SUSPENSION 1:	27 de julio de 2022
SUSPENSION 2:	10 de agosto de 2022		SUSPENSION 2:	10 de agosto de 2022
SUSPENSION 3:	29 de agosto de 2022		SUSPENSION 3:	29 de agosto de 2022
REINICIO 1:	12 de septiembre de 2022		REINICIO 1:	12 de septiembre de 2022
PRÓRROGA 1 (1 MES):	9 de diciembre de 2022		PRÓRROGA 1 (1 MES):	9 de diciembre de 2022
SUSPENSION 4:	30 de diciembre de 2022		SUSPENSION 4:	30 de diciembre de 2022
SUSPENSION 5:	10 de enero de 2023		SUSPENSION 5:	10 de enero de 2023
SUSPENSION 6:	25 de enero de 2023		SUSPENSION 6:	25 de enero de 2023
SUSPENSION 7:	9 de febrero de 2023		SUSPENSION 7:	9 de febrero de 2023
SUSPENSION 8:	24 de febrero de 2023		SUSPENSION 8:	24 de febrero de 2023
SUSPENSION 9:	11 de marzo de 2023		SUSPENSION 9:	11 de marzo de 2023
SUSPENSION 10:	27 de marzo de 2023		SUSPENSION 10:	27 de marzo de 2023
SUSPENSION 11:	12 de abril de 2023		SUSPENSION 11:	12 de abril de 2023
SUSPENSION 12:	27 de abril de 2023		SUSPENSION 12:	27 de abril de 2023
SUSPENSION 13:	27 de mayo de 2023		SUSPENSION 13:	27 de mayo de 2023
SUSPENSION 14:	26 de junio de 2023		SUSPENSION 14:	26 de junio de 2023
SUSPENSION 15:	26 de julio de 2023		SUSPENSION 15:	26 de julio de 2023
SUSPENSION 16:	26 de agosto de 2023		SUSPENSION 16:	26 de agosto de 2023
REINICIO 2:	11 de septiembre de 2023		REINICIO 2:	11 de septiembre de 2023
PRÓRROGA 2 (1 MES+ 15 DIAS):	27 de septiembre de 2023		PRÓRROGA 2 (1 MES+ 15 DIAS):	27 de septiembre de 2023
PRÓRROGA 3 (22 DIAS):	14 de noviembre de 2023		PRÓRROGA 3 (22 DIAS):	14 de noviembre de 2023
SUSPENSION 17:	6 de diciembre de 2023		SUSPENSION 17:	6 de diciembre de 2023
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 17	22 de marzo de 2024		AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 17	22 de marzo de 2024
AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 17	12 de abril de 2024		AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 17	12 de abril de 2024
AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSIÓN 17	13 de mayo de 2024		AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSIÓN 17	13 de mayo de 2024
AMPLIACIÓN 4 A LA SUSPENSIÓN 17	12 de junio de 2024		AMPLIACIÓN 4 A LA SUSPENSIÓN 17	12 de junio de 2024
AMPLIACIÓN 5 A LA SUSPENSIÓN 17	12 de julio de 2024		AMPLIACIÓN 5 A LA SUSPENSIÓN 17	12 de julio de 2024
AMPLIACIÓN 6 A LA SUSPENSIÓN 17	12 de agosto de 2024		AMPLIACIÓN 6 A LA SUSPENSIÓN 17	12 de agosto de 2024
AMPLIACIÓN 7 A LA SUSPENSIÓN 17	23 de agosto de 2024		AMPLIACIÓN 7 A LA SUSPENSIÓN 17	23 de agosto de 2024
REINICIO 3:	12 de septiembre de 2024		REINICIO 3:	12 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	14 de septiembre de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	14 de septiembre de 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	20 de mayo de 1901		PLAZO ACTUALIZADO:	506
PLAZO TRANSCURRIDO:	506 EQUIVALE AL 100,00%		PLAZO TRANSCURRIDO:	506 EQUIVALE AL 100,00%
VALOR INICIAL :	$ 115.849.864		VALOR INICIAL :	$1.236.086.290
*VALOR ADICIÓN Nº :	$ -		*VALOR ADICIÓN Nº :	$ 117.835.934
VALOR ACTUALIZADO:	$ 115.849.864		VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.353.922.224
PORCENTAJE DE EJECUCION	100,00%		PORCENTAJE DE EJECUCION	100,00%
VALOR EJECUTADO	$ 115.849.864		VALOR EJECUTADO:	$ 1.353.922.224
PORCENTAJE DE PAGO	0%		PORCENTAJE DE PAGO	30,00%
VALOR PAGADO:	$ -		VALOR PAGADO:	$ 370.825.887
VALOR POR EJECUTAR:	$ -		VALOR POR EJECUTAR:	$ -
SUPERVISOR DE CONVENIO O CONTRATO:	DOUGLAS ELIAS DE JESUS ORTEGA		SUPERVISOR DESIGNADO POR EL CONTRATANTE:	CARLOS ANDRÉS PEÑA

La equidad es de todos · Prosperidad Social	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 4

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
	Programado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	100,00%	100,00%	100,00%
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($)	$ 1.353.922.224	$ 1.353.922.224	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	$ -	0,00%	

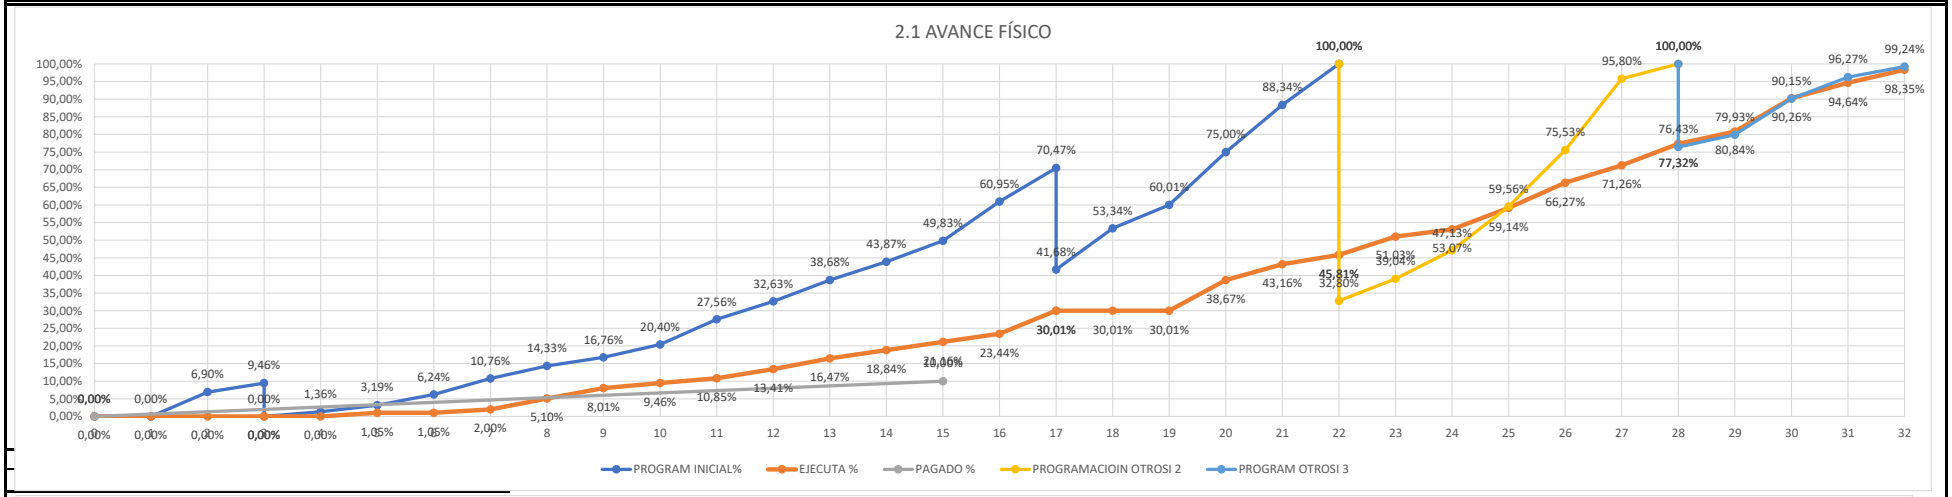

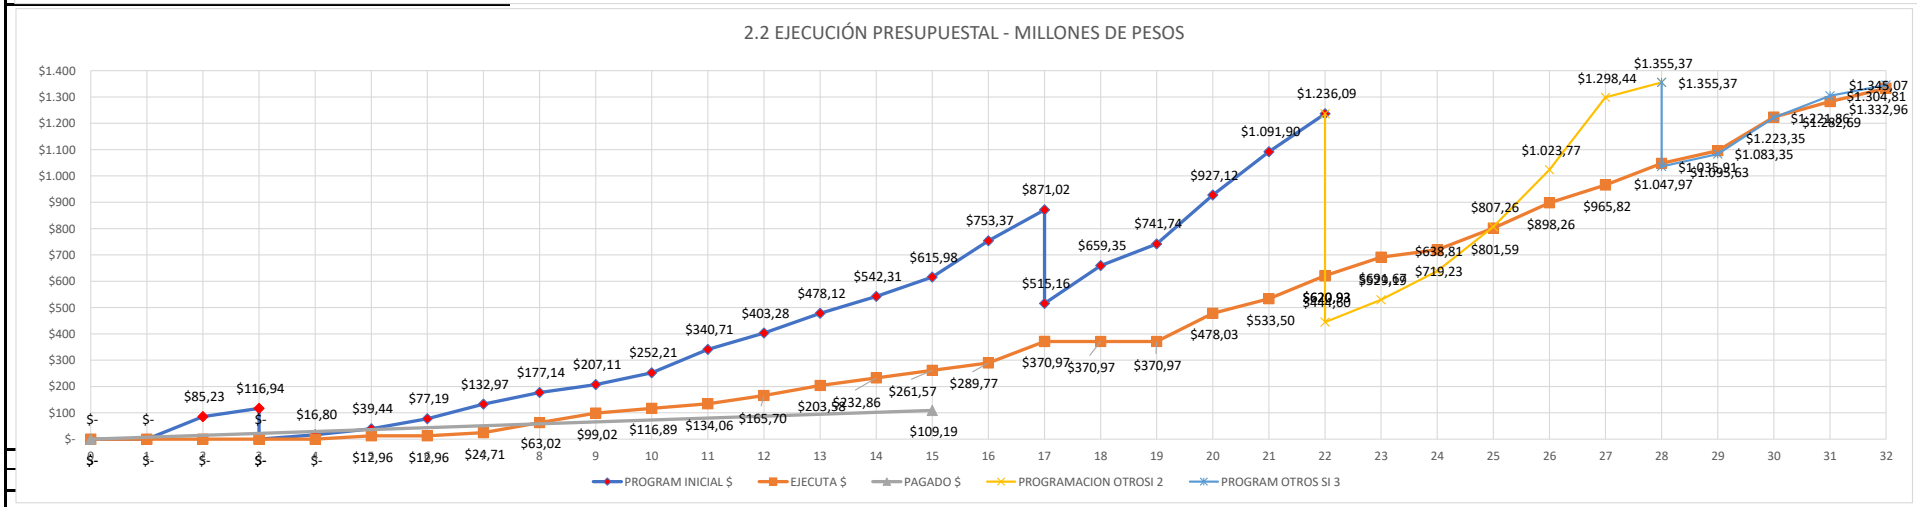

3. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS VISIBLES E INTERMEDIAS				
No.	FECHA PROGRAMADA	HORA INICIO/ HORA FIN	LUGAR	FECHA REAL
1	martes, 26 de julio de 2022	8;00	Municipio	martes, 26 de julio de 2022
2	martes ,31 de octubre de 2023	8;00	Municipio	martes ,31 de octubre de 2023
3				

La equidad es de todos · Prosperidad Social	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 4

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

La reprogramacion se cumplio, contratista cumple con el 100% de las actividades del contrato de obra.

El dia 12 de septiembre del 2024 se da reinicio al contrato de obra y finaliza el 14 de septiembre del 2024. cumpliendo con la meta fisica del contrato de obra.

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC.) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista dispone del personal requerido en obra y manteniene un flujo constante de material.

4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Se le informa al contratista que ya esta cumplido el hito 6 del 100% para que haga entrega de toda la documentacion correspondiente al acta parcial para su revision.

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Se le reitera al contratista en hacer entrega de todos los certificados de calidad correspondiente a la parte electrica y demas que se tengan pendientes como suministro de aparatos sanitarios.

Se le solicita al contratista hacer entrega de resultados de laboratorio que se tengan pendientes a la fecha del vaciado de placas de concreto.

4.5. MANEJO AMBIENTAL

Se le recuerda al contratista que debe presentar todos los certificados de disposicion final de los residuos de obra.

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se le recuerda al contratista que hasta ultimo momento que se tenga personal trabajando en obra debe cumplir con elementos de proteccion personal

Se le informa al contratista que debe realiazar una jornada de orden y aseo para entregar la obra.

4.7 ASPECTOS SOCIALES

No se presentan situaciones problemáticas en el periodo.

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA
4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)	Se le solicita al contratista cumplir con la nueva reprogramación del otros si 3	CUMPLIDO	CONTRATISTA	12 de septiembre de 2024	14 de septiembre de 2024
4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC.) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL	Se solicita mas personal en obra y suministro oportuno de insumos.	CUMPLIDO	CONTRATISTA	12 de septiembre de 2024	14 de septiembre de 2024
4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS	Se solicita al contratista la entrega de los certificados de calidad de los materiales utilizados en obra y los resultados de laboratorio de los concretos	EN ESPERA	CONTRATISTA	12 de septiembre de 2024	EN ESPERA
4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL	se solicita la entrega de la dotacion del personal que se encuentra activo en obra	CUMPLIDO	CONTRATISTA	12 de septiembre de 2024	14 de septiembre de 2024
4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	se le informa al contratista en hacer entrega de la documentacion con respecto del hito 6 del 100%	EN PROCESO	CONTRATISTA	12 de septiembre de 2024	EN ESPERA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Las referentes al balance presupuestal definido en el proceso de reformulacion.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

1) El dia 12 de septiembre del 2024 se da reinicio al contrato de obra.

2) Se le reitera al contratista que para la entrega del proyecto debe hacer entrega de los planos record hidraulicos, sanitarios, electricos y los manuales de mantenimiento que se requieran para el buen funcionamiento de la obra.

3) Se solicita al contratista en hacer entrega de toda la documentacion corresponiente a las actas parciales del 100% para su respectiva revision ya probacion por parte de la interventoria.

4) Se le reitera al contratista que para el recibir la obra, se deben tener todos los remtes,resanes y acabados de obra en perfecto estado para el buen funcionamiento del proyecto.

5) Contratista de obra cumple con el 100% de la meta fisica del proyecto.

6) La interventoría informa que se tiene un avance de las actividades ejecutadas en obra del (100%). Se adelanta Acta de Terminación con pendientes atención de calidad de algunas actividades en obra según Acta de recorrido del 12 de septiembre del 2024 y el cumplimiento optimo de las condiciones de sanidad

7) Contratista remite certificados RETIE y RETILAP.

DÍAS	L	M	M	J
	4	5	6	7
PROFESIONAL SOCIAL	0	0	0	0
RESIDENTE OBRA	1	1	1	1
MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES, ETC.	11	13	15	15
PROFESIONAL PGIO	1	0	0	0
TOTALES	**13**	**14**	**16**	**16**

8. ANEXOS

1. Registro Fotográfico del avance durante la semana (F-IP-209) (aplica para Infraestructura Social)
2. Bitácora de obra
3. Acta de comité

FIRMA: _____

INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)

NOMBRE: LUIS ALVARO GUERRERO PARDO

TP Nº: 25202-07909 CDN

LA OBRA ENTRA EN SUSPENSIÓN TOMANDO COMO CAUSAL principal LA CERTIFICACIÓN RETIE y RETILAP COMO CONDICIÓN PARA EL RECIBO DE LA OBRA

Director.
C.I Prosperidad

12 Sep/2024

Se Retoma el proyecto con base en. LA Expedición de LA CERTIFICACIÓN RETIE y AL ESTABLECER QUE El proyecto TAL COMO lo ESTABLECE LA CERTIFICACIÓN RETIE QUE NO APLICA LA CERTIFICACIÓN RETILAP. —

13 septiembre de 2024 = SE VERIFICA Documentación para LA FIRMA DEL ACTA de TERMINACIÓN CON PENDIENTES De CALIDAD. De ALGUNAS ACTIVIDADES SEGÚN RECORRIDO DEL 12 de septiembre DADO cumplimiento A las CONDICIONES De SANIDAD. ——

14 septiembre de 2024 = SE FIRMA EL ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA, QUEDADO POR LEGALIZAR El ACTA DE ENTREGA y RECIBO FINAL. ——


La equidad es de todos · Prosperidad Social	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	**Código:** F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:** Febrero 2022

N° Y AÑO CONVENIO (DPS):	341FIP 2021
ID PROYECTO (DPS):	20210341S232738-1
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: HOBO HUILA	
FECHA (D/M/A):	viernes, 13 de septiembre de 2024
SEMANA DEL	12 de septiembre de 2024 al 14 de septiembre de 2023
POTENCIAL BENEFICIARIO: LA COMUNIDAD SEGÚN ADMINISTRADO POR LA ALCALDIA MUNICNIPAL DE HOBO CON 36 PUESTO EN LA PLAZA DE MERCADO	
TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO: COMERCIAL	
DIRECCIÓN: CARRERA 4 CON CALLE 6 ESQUINA	
SECTOR: ☐ Vías y Transporte ■ ocial Comunitario ☒ Espacio Público, Recreación y Deporte	
MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: ☐ Unidad Sanitaria ☐ Unidad de Cocina ☒ Unidad Habitacional Pisos ☒ Cubierta ☒ Área Aprendizaje	

KIT:
- ☐ KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración
- ☐ KIT B - Tanque de almacenamiento
- ☐ KIT C -Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo)
- ☐ KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) - Unidad Cocinas/ Habitacional

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE DE LA INTERVENCIÓN

RECORRIDO DE OBRA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

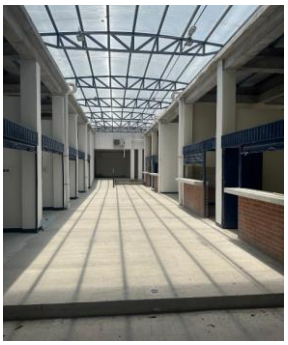




REMATES DE FILOS Y DILATACIONES LIMPIOS, APLOMADOS Y CONFORMADOS






VISTA INSTALACIÓN ABRAZADERAS COMPLETAS PARA LAS BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS,




La equidad es de todos · Prosperidad Social	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	**Código:** F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:** Febrero 2022

CAJAS, TOMAS E INTERRUPTORES EN LOS LOCALES Y EN GENERAL DE LA OBRA






ACABADO DE LOS PIDOS, TAPAS DE LAS CAJAS Y DE LAS REJILLAS DEL CARCAMO





REMATE DE LA RAMPA EXTERIOR



INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS






Nombre:	CARLOS ANDRES GUARNIZO ZAMBRANO
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Entidad:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD

La equidad es de todos / Prosperidad Social	**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA** (INSPECCIÓN SEMANAL DE INTERVENTORIA)	**Código:** F-IP-205	
		Versión: 3	
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2021	

Informe de Interventoría Nº:	Periodo del	12/09/2024	Al	14/09/2024
Tipo de Informe PGIO:	Mensual	Final		Etapa: Obra
Fecha de Inspección:	9/10/2023			
Nombre del Proyecto:	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL HOBO - HUILA			
Nº y Año del Convenio (DPS):	341FIP 2021			
ID del Proyecto:	20210341S232738-1			
Contrato de obra No.	129-2022			
Departamento:	HUILA			
Municipio:	HOBO			
Nombre del Contratante de Obra:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE HOBO			
Nombre Contratista de Obra:	ISAIAS VARGAS GONZALEZ			
Residente de obra:	MICHAEL TAVERA			
Nº y año del Convenio/Contrato de Interventoría:	208 FIP DE 2019			
Nombre Contratista Interventoria:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD			
Supervisor DPS:	CESAR ANDREZ GONZALEZ RONDON			
Plazo de ejecución:	195			
Nombre de la persona que realiza la inspección:	CARLOS ANDRES GUARNIZO ZAMBRANO			
Cargo de la persona que realiza la inspección:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA			

Instructivo: Califique como "1" las caracteristicas que cumplen , "0" las características que no cumplen y "N/A" las características que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así:

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja
70% - 89% Cumple parcialmente y arrojará una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

	Característica a Inspeccionar	Calificación	Indique la Evidencia de Cumplimiento
	A) EJE DE CALIDAD		
1	Está la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministradas por el supervisor del contrato?	1	esta ubicada frente a la obra
2	Existe por parte del **constructor**, operador, ejecutor (según sea el caso que corresponda), un Ingeniero/Arquitecto residente para la obra, cumpliendo con los siguientes aspectos: 1. Personal con el perfil requerido 2. Personal disponible 100% en obra	1	Se encuentra en obra un ingeniero residente con el perfil requerido
3	Existe por parte del **constructor**, operador, ejecutor (según sea el caso que corresponda), el personal requerido (según control operativo SST) para la implementación y ejecución del PGIO que cumpla con los siguientes aspectos? 1. Personal cumpliendo perfil requerido (normatividad vigente) 2. Personal disponible en obra 100%.	1	parcialmente
4	Encuentra en la obra diseños de mezcla? Corrobore que la dosificación diseñada corresponda con la que se está haciendo en obra. Haga comentario respecto a la calidad del material y la protección al mismo (agregados - cemento - otros)	1	si en medio magnetico
5	Verifique el cronograma de obra e inspeccione que las actividades programadas al corte se estén ejecutando, en caso contrario dilagar el porcentaje de retraso y el plan de acción programado para ajustar los tiempos de ejecución al requerido o si se está tramitando prórroga.	1	se vienen ejecutando pero con atraso
6	Verifique que **estén disponibles en obra** los planos vigentes del proyecto y que se lleve un control de las versiones. Verifique que cuenten con la aprobación de la entidad competente.	1	estan en mal estado los planos en medio fisico
7	Verifique que **estén disponibles en obra** las especificaciones técnicas del proyecto.	1	en medio magnetico
8	Verifique que **estén disponibles en obra** las **hojas de seguridad** de los productos químicos utilizados.	N/A	No aplica para el periodo
9	Se han hecho capacitaciones en manejo de hojas de seguridad, verifiquelo y pregunte acerca de su uso.	0	Ninguna
10	Se está llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD establecido en el PGIO. Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él.	0	se lleva de manera muy irregular
11	Se entregan oportunamente los informes de PGIO a la interventoría para su aprobación (incluyendo el reporte de cumplimiento para la gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo)?. Cite el último número del Informe del PGIO presentado a la Interventoría con su fecha respectiva.	1	
12	La Bitácora está disponible en sitio, diligenciada y protegida contra el daño, deterioro o pérdida.	1	Se encuentra disponible en obra
13	Se está registrando diariamente en bitácora como mínimo los siguientes aspectos: *Actividades de obra desarrolladas y localizadas. *Personal de interventoría y de obra (maestros - obreros - residente - etc.). *Estado del tiempo. *Equipos e instrucciones impartidas. *Situaciones que se generen en el desarrollo de la obra.	1	se lleva a diario con toda la informacion requerida
14	La matriz de requisitos legales, se encuentra actualizada? Compruebe el cumplimiento de la misma, verificando como mínimo dos requisitos.	1	
15	Se han hecho ensayos y pruebas de calidad?: verifique que estén registrados en la bitácora y que coincidan con los propuestos en el plan de inspección y ensayo.	N/A	este periodo no se realizaron muestras, debido que no han sido nesesarias
16	Se tiene copia de Certificados de calibración de equipos con los que se validan los resultados de los ensayos de laboratorio (materiales granulares, bordillos, pavimento rígido, etc.) ?	0	se estan a esperas de resultados para este ultimo periodo
17	Los equipos de medición (ejemplo: equipos topografía, balanzas, entre otros) utilizados en obra se encuentran calibrados con patrones certificados y/o laboratorios certificados.	N/A	
18	Se dispone de un control documentado para los equipos de medición, conforme al anexo control de equipos de medición	N/A	
	SUBTOTAL VALORACIÓN EJE CALIDAD	**11**	
	B) EJE AMBIENTAL		
1	Se ha documentado, implementado y efectuado seguimiento del plan de trabajo específico para el proyecto, en gestión ambiental?	1	
2	Se están implementando en obra las medidas de manejo ambiental para los acopios temporales de materiales, escombros, sacos de cemento, material de excavación, separación de residuos ordinarios, peligrosos, reciclables, entre otros?. *Se implementan los recipientes para la clasificación de residuos (las 3 canecas)?. *Se cuenta en obra con el Kit de señalización ambiental. Está debidamente instalado?. *Se identifican todos los residuos tanto sólidos como líquidos?.	1	se tienen sitios dispuesto para cada uno
3	Se ha realizado la disposición final de los residuos (escombros, residuos peligrosos, reciclables y ordinarios) con empresas o sitios autorizados, de acuerdo con lo exigido en la normatividad ambiental legal vigente?. *Se cuenta con los certificados de disposición final de escombros? *Se cuenta con los certificados de disposición final de residuos peligrosos (bolsas de cemento, recipientes usados de químicos o material combustible, entre otros)?. * Se entrega de manera oportuna todos los soportes de proveedores de materiales pétreos y sitio de disposición final de residuos producto de las actividades de obra?.	1	hasta el final del proyecto se realiza uno definitivo
4	Se implementan las medidas de manejo ambiental necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua?.	N/A	
5	Se encuentra documentada la matriz de aspectos e impactos ambientales con sus respectivos controles y se efectúa el seguimiento conforme a lo establecido?	1	Se encuentra la matriz en medio magnetico
6	Se están llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO AMBIENTAL establecido en el PGIO. Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él.	0	pendiente

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA** (INSPECCIÓN SEMANAL DE INTERVENTORIA) **PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos**	**Código:** F-IP-205 **Versión:** 3 **Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2021

Informe de Interventoría Nº:	Periodo del	12/09/2024	Al	14/09/2024
Tipo de Informe PGIO:	Mensual	Final		Etapa: Obra
Fecha de Inspección:	9/10/2023			
Nombre del Proyecto:	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL HOBO - HUILA			
Nº y Año del Convenio (DPS):	341FIP 2021			
ID del Proyecto:	20210341S232738-1			
Contrato de obra No.	129-2022			
Departamento:	HUILA			
Municipio:	HOBO			
Nombre del Contratante de Obra:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE HOBO			
Nombre Contratista de Obra:	ISAIAS VARGAS GONZALEZ			
Residente de obra:	MICHAEL TAVERA			
Nº y año del Convenio/Contrato de Interventoría:	208 FIP DE 2019			
Nombre Contratista Interventoría:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD			
Supervisor DPS:	CESAR ANDREZ GONZALEZ RONDON			
Plazo de ejecución:	195			
Nombre de la persona que realiza la inspección:	CARLOS ANDRES GUARNIZO ZAMBRANO			
Cargo de la persona que realiza la inspección:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA			

Instructivo: Califique como "1" las caracteristicas que cumplen , "0" las características que no cumplen y "N/A" las características que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así:

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja
70% - 89% Cumple parcialmente y arrojará una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

	Característica a Inspeccionar	Calificación	Indique la Evidencia de Cumplimiento
7	¿Existen procedimientos de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos, herramientas ?	0	pendiente
8	La obra cuenta con canecas o un sistema para lavado de herramientas, y se realiza su disposición final de manera correcta?	0	pendiente
9	Los materiales combustibles (gasolina, ACPM, madera, papel, etc.) o sustancias químicas (solventes, thinner, ácidos, combustibles, entre otros)? Para cuando aplique, están éstos debidamente identificados y rotulados? Tienen la hoja de seguridad ? Cuentan con los recursos necesarios para mitigar los posibles derrames que se presenten? El personal conoce los riesgos, cómo actuar en caso de emergencia frente a un riesgo con los materiales o sustancias químicas?.	N/A	
10	Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas Ambientales? Que temas se han dictado? Se encuentran las evidencias?	0	no se han realizado charlas sobre temas de manejo ambiental al personal
11	Los sumideros en obra se encuentra debidamente protegidos?	N/A	
12	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra se encuentran protegidos con plásticos o lonas en buen estado, debidamente acordonados, identificados y con la respectiva señalización?	1	
13	Existe en obra el equipo mínimo (escobas, palas, carretillas, bolsas y demás implementos necesarios) para que las instalaciones se encuentren en adecuadas condiciones de aseo y limpieza?	1	La obra cuenta con implementos de aseo en obra
14	El campamento e instalaciones de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado?.	0	
15	Las zonas verdes que existan en el área de intervención de la obra, se encuentran libres de materiales de construcción y residuos. Si es imprescindible su utilización, son restauradas o recuperadas las áreas intervenidas (conservando o mejorando las condiciones existentes antes de la afectación)?	N/A	
16	Se emplean materiales adecuados para el aislamiento y control de material particulado producido por la obra? (p. ej. Poli sombra, cintas de seguridad, barreras en ladrillo)	0	
17	Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante la E.S.P. correspondiente?	1	La red utilizada son sacada de la intalaciones de la alcaldia municipal
18	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con el decreto 1609 del 2002 o aquella que la que sustituya o modifique (por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera).	1	Los materiales se estan transportando por empresas certificadas
19	Existe en obra copia del SOAT y la REVISIÓN TECNICO-MECÁNICA de los vehículos que transportan materiales (materiales pétreos, materiales en obra)?. Indique la vigencia de estos.	0	
20	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las vías? Se implementa un sistema de verificación de este ítem?	N/A	
21	Se cuenta con las unidades sanitarias de acuerdo con lo exigido por la normatividad legal vigente?	1	
	SUBTOTAL VALORACIÓN EJE AMBIENTAL	**9**	

La equidad es de todos	Prosperidad Social	**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA** (INSPECCIÓN SEMANAL DE INTERVENTORIA)	**Código:** F.IP-205
			Versión: 7
		PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2021

Informe de Interventoría Nº:	Periodo del	12/09/2024	Al	14/09/2024	
Tipo de Informe PGIO:	Mensual	Final		Etapa: Obra	
Fecha de Inspección:	9/10/2023				
Nombre del Proyecto:	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL HOBO - HUILA				
Nº y Año del Convenio (DPS):	341FIP 2021				
ID del Proyecto:	20210341S232738-1				
Contrato de obra No.	129-2022				
Departamento:	HUILA				
Municipio:	HOBO				
Nombre del Contratante de Obra:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE HOBO				
Nombre Contratista de Obra:	ISAIAS VARGAS GONZALEZ				
Residente de obra:	MICHAEL TAVERA				
Nº y año del Convenio/Contrato de Interventoría:	208 FIP DE 2019				
Nombre Contratista Interventoria:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD				
Supervisor DPS:	CESAR ANDREZ GONZALEZ RONDON				
Plazo de ejecución:	195				
Nombre de la persona que realiza la inspección:	CARLOS ANDRES GUARNIZO ZAMBRANO				
Cargo de la persona que realiza la inspección:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA				

Instructivo: Califique como "1" las caracteristicas que cumplen , "0" las caracteristicas que no cumplen y "N/A" las caracteristicas que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así:

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja
70% - 89% Cumple parcialmente y arrojará una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

	Característica a Inspeccionar	Calificación	Indique la Evidencia de Cumplimiento
	C) EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST		
1	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley al Sistema General de Seguridad Social: ARL, EPS y AFP?.	1	no se han entregado en su totalidad
2	Se encuentran en obra las planillas de pago de la seguridad social del personal ? Indique la fecha del último pago efectuado.	N/A	
3	Al personal que labora en el proyecto se le ha efectuado valoración médica ocupacional de ingreso, post incapacidad, reintegro, periódico y/o egreso?. Verifique que en obra se encuentra el respectivo examen firmado por un médico con licencia en salud ocupacional, además que la IPS cuenta con la habilitación y requisitos que solicita la norma para la prestación del servicio.	1	Se encuentra afiliado y cuentan con certificado medico de ingreso
4	Se ha documentado, implementado y ha efectuado seguimiento del plan de trabajo especifico para el proyecto, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo?	1	
5	Se encuentra documentada la matriz de peligros y riesgos con sus respectivos controles y se efectúa el seguimiento conforme a lo establecido?	1	
6	Se han efectuado las inducciones y capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas de Seguridad y Salud en el trabajo? Que temas se han dictado?. Se encuentran las evidencias? Se diferencia el tipo de formación (charlas de 5 minutos y/o capacitaciones)? Se deja constancia escrita y firmada por los trabajadores de los riesgos a los que estará expuesto cada trabajador en su lugar de trabajo?.	1	Capacitación en metodologías de análisis de riesgo, uso adecuado de elementos de protección personal, uso adecuado de residuos sólidos y manejo de sustancias químicas. Fecha 01-12-2022
7	Se ha divulgado al personal de la obra que los accidentes (casi accidentes o accidentes) de trabajo deben ser reportados en un término máximo de 48 horas hábiles, ante quién se reporta, con qué medio se reporta y quién o quienes son las personas encargadas de reportarlo y el procedimiento que se realiza en caso de presentarse?	1	Brigada de emergencia
8	Pregunte si ha habido accidentes, casi accidentes y/o enfermedades laborales. Verifique que se ha realizado todo el proceso respectivo de manejo del accidente o casi accidente acorde con la normatividad legal vigente y que esté reportado en los formatos aprobados de acuerdo con lo descrito en el Control Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo. *Reporte a la ARL Furat *Investigación del ATEL (Accidentes o enfermedades laborales). *Lecciones aprendidas *Seguimiento médico, cuando aplique. *Seguimiento a los controles propuestos para evitar que vuelva a presentarse el suceso.	1	Capacitación al personal de la obra en tema de (casi accidentes o accidentes), la importancia del uso de elementos de protección personal y trabajo en equipo - Fecha: 14-10-2022
9	El personal cuenta con la dotación (calzado y vestido) requerida de acuerdo con los riesgos y actividad contratada?. Se ha establecido control de cambios cuando se requiera?	1	El personal cuenta con vestimenta y calzado adecuado para las actividades que vienen realizando
10	El personal porta adecuadamente la dotación suministrada por el contratista y ésta se encuentra en buen estado?	1	
11	Se ha dotado al personal con los Elementos de Protección Personal - E.P.P. requeridos para la ejecución segura de las labores en obra y se capacita sobre su uso?	1	
12	El personal de obra utiliza los elementos de protección personal?	1	
13	Se encuentra documentado y verificado el plan de emergencias especifico para el proyecto? Se encuentra dentro del plan de emergencias la valoración de vulnerabilidad de acuerdo a las amenazas identificadas. Cuenta con los procedimientos operativos normalizados - PON - por cada amenaza identificada?	1	se entrego en plantilla
14	Todos los frentes de obra cuentan con los elementos necesarios (definidos en el plan de emergencias) para que la brigada pueda actuar en caso de emergencia? Ejemplo: Botiquín, extintores multipropósito, camilla de traslado o inmovilización de pacientes, inmovilizadores de cuello, extremidades superiores inferiores.	1	
15	Se tiene publicado el MEDEVAC (ficha de evacuación médica del personal accidentado) en los frentes de obra?. El personal conoce el procedimiento en caso de contar con un compañero accidentado? Conocen el MEDEVAC?	0	no se tiene en obra
16	Todos los frente de obra cuentan con la señalización de acuerdo a los riesgos identificados? Cuentan con señales de prevención, informativas, de advertencia entre otras de acuerdo a la normatividad legal vigente y los riesgos identificados en obra?. La señalización es distinta de la señalización vial?	0	no se tiene buena señalizacion, falta
17	Se han realizado simulacros de emergencias? Se ha realizado la planificación del tipo de simulacro que se implementará, se evalúa el simulacro, se retroalimenta al personal y se analiza su efectividad?	0	
18	Se verifica que se realizan las inspecciones preoperacionales de los vehículos, equipos, herramientas usadas en el proyecto? Se inspecciona el lugar y no se evidencian derrames o goteos a causa de daño de equipos, vehículos o herramientas? Se verifica que los vehículos y equipos cuenten con toda la documentación necesaria para su operación? (acorde con el PGIO) Se programa y se ejecuta el mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y manual de uso y/u operación?	N/A	

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA** (INSPECCIÓN SEMANAL DE INTERVENTORIA) **PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos**	**Código:** F-IP-205 **Versión:** 3 **Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2021

Informe de Interventoría Nº:	Periodo del	12/09/2024	Al	14/09/2024
Tipo de Informe PGIO:	Mensual	Final		Etapa: Obra
Fecha de Inspección:	9/10/2023			
Nombre del Proyecto:	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL HOBO - HUILA			
Nº y Año del Convenio (DPS):	341FIP 2021			
ID del Proyecto:	20210341S232738-1			
Contrato de obra No.	129-2022			
Departamento:	HUILA			
Municipio:	HOBO			
Nombre del Contratante de Obra:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE HOBO			
Nombre Contratista de Obra:	ISAIAS VARGAS GONZALEZ			
Residente de obra:	MICHAEL TAVERA			
Nº y año del Convenio/Contrato de Interventoría:	208 FIP DE 2019			
Nombre Contratista Interventoria:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD			
Supervisor DPS:	CESAR ANDREZ GONZALEZ RONDON			
Plazo de ejecución:	195			
Nombre de la persona que realiza la inspección:	CARLOS ANDRES GUARNIZO ZAMBRANO			
Cargo de la persona que realiza la inspección:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA			

Instructivo: Califique como "1" las caracteristicas que cumplen , "0" las características que no cumplen y "N/A" las características que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así:

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja
70% - 89% Cumple parcialmente y arrojará una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

	Característica a Inspeccionar	Calificación	Indique la Evidencia de Cumplimiento
19	Se socializa a todo el personal de la obra la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmados por el Representante Legal de la empresa?. Se encuentran en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos (registro capacitación-registro fotográfico)	1	se socializo
20	Los miembros del COPASST o VIGIA se reúnen mensualmente, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	0	
21	Se realizan actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores?	0	se realizaron actividades
22	Todas las sustancias químicas están inventariadas, cuentan con ficha de seguridad y son etiquetadas utilizando el Sistema Globalmente Armonizado - SGA? Son socializadas con el personal involucrado en su manejo?.	N/A	
23	Las sustancias químicas se almacenan según las medidas de seguridad que dictan las hojas de seguridad, están rotuladas y se encuentra señalizado el sitio de almacenamiento?	N/A	
24	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, están activas, especializadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento periódico, se ejecuta y existen los soportes?.	0	Si se encuentra conformada
25	Se realizan simulacros de emergencia?.	0	No se han realizado
26	Se aplican los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo: en caliente, alturas, espacios confinados?	N/A	
27	Se cuenta con procedimientos / instructivos / ATS para actividades de riesgos prioritarios y/o críticos?	N/A	
28	El personal de trabajo en altura está dotado con los elementos de protección personal y colectivo requeridos por ley?.	0	El personal cuenta con equipos necesarios para trabajos en alturas y certificado
29	Se ejecutan las actividades según el cronograma o plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para el proyecto?	0	
30	Se elabora y se cumple con un sistema de archivo o retención documental, acorde con la normatividad vigente y las políticas de la empresa? Para ello verifique: 1. Que en el documento esté descrito el manejo o custodia documental de: *Perfil epidemiológico: Conceptos de exámenes médicos ocupacionales, paraclínicos, entre otros. *Resultados de monitoreos o mediciones ambientales *Registro de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo. *Registro de suministro de elementos y equipos de protección personal. 2. Tome 2 o 3 evidencias de todos los documentos del sistema de gestión establecidos y verifique que cumplen su control documental de acuerdo con lo definido.	1	se tiene en obra
	SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST	**15**	
	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		
	A) EJE CALIDAD	**79%**	
	B) EJE AMBIENTAL	**56%**	
	C) EJE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**63%**	
	TOTAL VALORACIÓN CALIDAD, AMBIENTAL Y SST	**66%**	

Observaciones: El contratista debe subsanar y cumplir el plan de acción en el tema de PGIO

PLANES DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR

Nº	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	CUMPLIÓ SI/NO	OBSERVACIÓN
1	Presencia de profesional PGIO según dedicacion del contrato de obra.	viernes, 13 de septiembre de 2024	Contratista	NO	Anotacion en bitacora
2	Realizar capacitaciones en manejo de hojas de seguridad y su uso.	viernes, 13 de septiembre de 2024	Contratista	NO	
3	Realizar procedimientos de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos, herramientas.	viernes, 13 de septiembre de 2024	Contratista	NO	

Firmas:

MICHAEL TAVERA	**CARLOS ANDRES GUARNIZO ZAMBRANO**
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	**CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	**Código:** F-GI-IH-112
		Versión: 02
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	**Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2018

N° Y AÑO CONVENIO (DPS):	341FIP 2021
ID PROYECTO (DPS):	20210341S232738-1
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	HOBO- HUILA
FECHA (D/M/A):	viernes, 13 de septiembre de 2024
SEMANA DEL	12/9/2024 AL 14/9/2024
SECTOR:	Vías y Transporte Social Comunitario Espacio Público, Recreación y Deporte

ORDEN Y ASEO EN OBRA



CHARLA DE SEGURIDAD





Nombre:	CARLOS ANDRES GUARNIZO ZAMBRANO
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Entidad:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**FORMATO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA**	**Código:** F-GI-IH-116
		Versión: 1
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	**Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2018

INFORMACIÓN GENERAL

N° Y AÑO DE CONVENIO:	341FIP 2021		
PERÍODO:	DESDE 12/09/2024 HASTA EL 14/09/2024		
CONTRATISTA:	ISAIAS VARGAS GONZALEZ	**CONTRATO No.**	**129-2022**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**ACTA DE SERVICIO No.**	**Z7-096**

No./ ID	Descripción del ítem/Actividad	Cantidades de Obra Contractuales	Cantidades de Obra Programadas - Período Anterior	Cantidades de Obra Programadas - Período Actual	Cantidades de Obra Programadas Acumuladas	Cantidades de Obra Ejecutadas - Período Anterior	Cantidades de Obra Ejecutadas - Período Actual	Cantidades de Obra Ejecutadas Acumuladas	Unidad	Valor Unitario	Valor Total del ítem	Peso en % del ítem en relación al valor Total del Contrato (A)	% Acumulado programado por ítem (B)	% Total Programado del ítem (C) = (A)x (B)	% Acumulado de ejecución física por ítem (D)	% Total ejecutado por ítem (E) = (A)x (D)	% Acumulado programado -% Ejecución Física F = (E)/(C)	Desviación por Actividad
3	**CIMIENTOS**																	
3.1	Cimentacion tipo zapatas en concreto de 3,000 P.S.I	44,41	27,14	17,27	44,41	44,77	0,00	44,77	M3	$ 602.494	$ 26.753.866,57	1,98%	100,00%	1,98%	100,82%	1,99%	100,82%	0,82%
3,2	Cimentación tipo viga de amarre concreto 3,000 p.s.i.	45,10	27,86	17,24	45,10	46,88	0,00	46,88	M3	$ 728.921	$ 32.876.888,32	2,43%	100,00%	2,43%	103,94%	2,52%	103,94%	3,94%
3,3	Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1,700 p.s.i.	236,78	114,79	121,99	236,78	236,83	0,00	236,83	M2	$ 29.682	$ 7.028.207,85	0,52%	100,00%	0,52%	100,02%	0,52%	100,02%	0,02%
NP-05	Excavación manual con retiro hasta h=2m	169,24	62,11	107,13	169,24	169,77	0,00	169,77	M3	$ 28.014	$ 4.741.048,74	0,35%	100,00%	0,35%	100,32%	0,35%	100,32%	0,32%
NP-01	CONCRETO CICLOPEO	37,02	54,14	-17,12	37,02	37,02	0,00	37,02	M3	$ 351.201	$ 13.000.670,82	0,96%	100,00%	0,96%	100,02%	0,96%	100,02%	0,02%
4	**MAMPOSTERIA**																	
4.1	Muro ladrillo prensado e=0,12m de ladrillera, dos caras	16,80	18,66	-1,86	16,80	16,80	0,00	16,80	M2	$ 63.158	$ 1.061.054,40	0,08%	100,00%	0,08%	100,00%	0,08%	100,00%	0,00%
4,2	Mesón en concreto 0.60m, revestido granito	41,60	34,29	7,31	41,60	40,40	1,20	41,60	ML	$ 387.352	$ 16.113.843,20	1,19%	100,00%	1,19%	100,00%	1,19%	100,00%	0,00%
4.3	Pañete muros 1:4, Incluye filos y dilataciones	1699,14	1310,53	388,61	1699,14	1699,41	0,00	1699,41	M2	$ 17.363	$ 29.502.185,18	2,18%	100,00%	2,18%	100,02%	2,18%	100,02%	0,02%
NP08	Bloque de arcilla No. 5 e-0.12m (12x20x30)	970,18	588,21	381,97	970,18	956,67	13,51	970,18	M2	$ 40.510	$ 39.301.789,25	2,90%	100,00%	2,90%	100,00%	2,90%	100,00%	0,00%
NP09	Alfajias en concreto 2500 PSI E= 0.15 M	0,00	31,14	-31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	ML	$ 36.292	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
5	**ESTRUCTURA**																	
5.1	Acero de refuerzo de 60000 P.S.I	30102,02	14287,59	15814,43	30102,02	30807,33	-705,31	30102,02	Kg	$ 5.913	$ 177.993.264,44	13,15%	100,00%	13,15%	100,00%	13,15%	100,00%	0,00%
NP10	Viga en concreto de 3000 P.S.I	48,77	41,27	7,50	48,77	48,71	0,00	48,71	M3	$ 762.987	$ 37.212.646,12	2,75%	100,00%	2,75%	99,87%	2,74%	99,87%	-0,13%
NP11	Placa Aerea maciza en concreto de 3.000PSI, e-0.15m	29,46	27,08	2,38	29,46	29,46	0,00	29,46	M2	$ 149.827	$ 4.414.263,00	0,33%	100,00%	0,33%	99,99%	0,33%	99,99%	-0,01%
NP12	Columna en concreto de 3000 P.S.I	36,03	30,02	6,01	36,03	36,03	0,00	36,03	M3	$ 780.330	$ 28.112.948,91	2,08%	100,00%	2,08%	100,00%	2,08%	100,00%	0,00%
6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**																	
NP13	Suministro y montaje de poste de concreto de 12mt x 750Kg. Incluye: Excavación, trasporte de poste, hincada y plomada.	1,00	1,07	-0,07	1,00	0,00	0,00	0,00	UN	$ 1.877.515	$ 1.877.515,00	0,14%	100,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%
NP14	Suministro y montaje de estructura en MT 521	2,00	0,80	1,20	2,00	0,00	0,00	0,00	UN	$ 494.939	$ 989.878,00	0,07%	100,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%
NP15	Suministro y montaje de estructura en MT 711	1,00	0,80	0,20	1,00	0,00	0,00	0,00	UN	$ 1.259.328	$ 1.259.328,00	0,09%	100,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%
NP16	Suministro y montaje de estructura para soportar Pararrayos y cortacircuitos	1,00	0,80	0,20	1,00	0,00	0,00	0,00	UN	$ 245.058	$ 245.058,00	0,02%	100,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%
NP17	Suministro y montaje de cortacircuitos de 15KVA 100A con fusible de 6A	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	UN	$ 251.154	$ 753.462	0,06%	100,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%
NP18	Suministro y montaje de pararrayos de 12KV-10KVA	3,00	0,80	2,20	3,00	0,00	0,00	0,00	UN	$ 224.360	$ 673.080	0,05%	100,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%
NP19	Suministro y montaje de Transformador Trifasico en Aceite de 45 KVA 13.200 v / 208/120 v	1,00	0,25	0,75	1,00	0,00	0,00	0,00	UN	$ 8.305.709	$ 8.305.709	0,61%	100,00%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%
NP20	Suministro y montaje de Equipo de medida General en celda de 3 compartimientos tipo intemperie que incluye: ✓ Celda de 3 compartimintenos certificada tipo exterior ✓ TC's tipo barra 150/5 A clase 0.5s ✓ Medidor Electronico de medida indirecta 3x127/220V 5-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	$ 6.872.294	$ 6.872.294	0,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
NP21	Suministro y montaje de Ducto IMC de 2" para Bajante que incluye: ✓ Capacete ✓ Ducto IMC de 2" ✓ Curva IMC ✓ Accesorios de fijación	1,00	0,80	0,20	1,00	0,00	0,00	0,00	UN	$ 792.229	$ 792.229	0,06%	100,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%
NP22	Construcción de caja de inspección en baja tensión Sencilla según norma E.H	3,00	2,40	0,60	3,00	2,00	1,00	3,00	UN	$ 744.973	$ 2.234.919	0,17%	100,00%	0,17%	100,00%	0,17%	100,00%	0,00%
NP23	Canalización de 2 Ductos PVC de 3". Incluye: Apertura de brecha, canalización de ducto, tapada y pisonada con material de sitio.	11,96	12,79	-0,83	11,96	11,96	0,00	11,96	ML	$ 35.399	$ 423.372	0,03%	100,00%	0,03%	100,04%	0,03%	100,04%	0,04%
NP24	Suministro y montaje de Acometida General en cable (3No.1/0 + 1No.1/0 + 2T) (Desde Trasformador hasta Tablero Principal)	16,00	16,79	-0,79	16,00	0,00	16,00	16,00	ML	$ 190.059	$ 3.040.944	0,22%	100,00%	0,22%	100,00%	0,22%	100,00%	0,00%
NP25	Suministro y montaje de Tablero de Distribución ppal tipo interior que incluye: ✓Tablero certificado Uso exterior certificado ✓Totalizador Industrial 3x125-150Amp ✓2 Totalizadores Industrial 3x70Amp ✓1 DPS ✓ Barrajes de cobre SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR CERTI	1,00	0,80	0,20	1,00	2,00	0,00	2,00	UN	$ 7.051.899	$ 7.051.899	0,52%	100,00%	0,52%	200,00%	1,04%	200,00%	100,00%
NP26	Suministro y montaje de Tablero de medidor 18 cuentas bifasicas (ARM1) que incluye: ✓ Tablero en lamina Galvanizada certificado ✓Totalizador Industrial 3x70Amp ✓11 totalizadores 2x30Amp ✓5 totalizadores 1x30Amp ✓11 Medidores Bifasicos 2x15-	1,00	0,80	0,20	1,00	1,00	0,00	1,00	UN	$ 8.198.093	$ 8.198.093	0,61%	100,00%	0,61%	100,00%	0,61%	100,00%	0,00%
NP27	Suministro y montaje de Tablero de medidor 18 cuentas bifasicas (ARM2) que incluye: ✓ Tablero en lamina Galvanizada certificado ✓Totalizador Industrial 3x70Amp ✓8 totalizadores 2x30Amp ✓10 totalizadores 1x30Amp ✓8 Medidores Bifasicos 2x15-60A/2x120/208V	1,00	0,80	0,20	1,00	1,00	0,00	1,00	UN	$ 8.791.548	$ 8.791.548	0,65%	100,00%	0,65%	100,00%	0,65%	100,00%	0,00%
NP28	Construcción de malla a tierra para subestación eléctrica según diseño.	1,00	0,80	0,20	1,00	1,00	0,00	1,00	GL	$ 2.266.940	$ 2.266.940	0,17%	100,00%	0,17%	100,00%	0,17%	100,00%	0,00%
NP29	Suministro y montaje de Acometida Trifasica en cable (3No.2 + 1No.2 + 8T) en ducto de 2 PVC. Incluye: Apertura de brecha, canalización de ducto, cableado, conexión y accesorios". (Desde Ta Distribución hasta ARM1, ARM2)	5,00	4,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	ML	$ 121.906	$ 609.530	0,05%	100,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%
NP30	Salida de iluminación para Luminaria LED tipo reflector de 50W ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF , en tuberia EMT si es a la vista .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. Incluye: Reflector LED de 50W	29,00	6,39	22,61	29,00	29,00	0,00	29,00	UN	$ 258.540	$ 7.497.660	0,55%	100,00%	0,55%	100,00%	0,55%	100,00%	0,00%
NP31	Salida de iluminación para Luminaria LED tipo bala de 24W ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF , en tuberia EMT si es a la vista .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. Incluye: Panel LED de 24W	30,00	23,98	6,02	30,00	30,00	0,00	30,00	UN	$ 184.356	$ 5.530.680	0,41%	100,00%	0,41%	100,00%	0,41%	100,00%	0,00%
NP32	Salida de iluminación para Luminaria LED tipo aplique de 18W ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF , en tuberia EMT si es a la vista .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. Incluye: Lampara tipo aplique de 18W.	8,00	6,39	1,61	8,00	0,00	0,00	0,00	UN	$ 161.744	$ 1.293.952	0,10%	100,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%
NP33	Salida de iluminación para Luminaria LED de Emergencia ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF , en tuberia EMT si es a la vista .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. Incluye: Luminaria de Emergencia LED tipo milky	14,00	10,39	3,61	14,00	14,00	0,00	14,00	UN	$ 273.552	$ 3.829.728	0,28%	100,00%	0,28%	100,00%	0,28%	100,00%	0,00%

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**FORMATO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA**	**Código:** F-GI-IH-116
		Versión: 1
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	**Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2018

INFORMACIÓN GENERAL

N° Y AÑO DE CONVENIO:	341FIP 2021		
PERÍODO:	DESDE 12/09/2024 HASTA EL 14/09/2024		
CONTRATISTA:	ISAIAS VARGAS GONZALEZ	**CONTRATO No.**	**129-2022**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**ACTA DE SERVICIO No.**	**Z7-096**

No./ ID	Descripción del ítem/Actividad	Cantidades de Obra Contractuales	Cantidades de Obra Programadas - Período Anterior	Cantidades de Obra Programadas - Período Actual	Cantidades de Obra Programadas Acumuladas	Cantidades de Obra Ejecutadas - Período Anterior	Cantidades de Obra Ejecutadas - Período Actual	Cantidades de Obra Ejecutadas Acumuladas	Unidad	Valor Unitario	Valor Total del ítem	Peso en % del ítem en relación al valor Total del Contrato (A)	% Acumulado programado por ítem (B)	% Total Programado del ítem (C) = (A)x (B)	% Acumulado de ejecución física por ítem (D)	% Total ejecutado por ítem (E) = (A)x (D)	% Acumulado programado -% Ejecución Física F = (E)/(C)	Desviación por Actividad
NP34	Salida para interruptor sencillo ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF , en tuberia EMT si es a la vista .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida	1,00	5,60	-4,60	1,00	1,00	0,00	1,00	UN	$ 81.951	$ 81.951	0,01%	100,00%	0,01%	100,00%	0,01%	100,00%	0,00%
NP35	Salida para sensor de movimiento de 360° ,en conductores de cobre 2No12+ 1No12T LSHF , en tuberia EMT si es a la vista .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida	4,00	1,60	2,40	4,00	4,00	0,00	4,00	UN	$ 106.470	$ 425.880	0,03%	100,00%	0,03%	100,00%	0,03%	100,00%	0,00%
NP37	Salida para tomacorriente doble monofásico 110V INTEMPERIE instalado en muro, en conductores de cobre 2No12 + 1No12T , tubería PVC embebida en muros. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	0,00	1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	$ 186.611	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
NP40	Salida de iluminación para Luminaria LED tipo panel redondo de 18W ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF , en tuberia EMT si es a la vista .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.Incluye: Panel LED de 18W	40,00	30,00	10,00	40,00	40,00	0,00	40,00	UN	$ 125.448	$ 5.017.920	0,37%	100,00%	0,37%	100,00%	0,37%	100,00%	0,00%
NP41	Salida para interruptor sencillo ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF , en tuberia PVC en muro .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida	10,00	7,99	2,01	10,00	10,00	0,00	10,00	UN	$ 52.385	$ 523.850	0,04%	100,00%	0,04%	100,00%	0,04%	100,00%	0,00%
NP42	Salida para tomacorriente doble monofásico 110V instalado en muro, en conductores de cobre 2No12 + 1No12T , tubería PVC embebida en muros. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	81,00	7,99	73,01	81,00	81,00	0,00	81,00	UN	$ 88.657	$ 7.181.217	0,53%	100,00%	0,53%	100,00%	0,53%	100,00%	0,00%
NP43	Salida para tomacorriente especial 220V instalado en muro, en conductores de cobre 2No12 + 1No12T , tubería PVC embebida en muros. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	11,00	7,99	3,01	11,00	11,00	0,00	11,00	UN	$ 94.592	$ 1.040.512	0,08%	100,00%	0,08%	100,00%	0,08%	100,00%	0,00%
NP44	Suministro y montaje de tablero bifasico de 6 circuitos, incluye: Interruptores según cuadro de cargas.	10,00	7,99	2,01	10,00	10,00	0,00	10,00	UN	$ 215.721	$ 2.157.210	0,16%	100,00%	0,16%	100,00%	0,16%	100,00%	0,00%
NP45	Salida de iluminación para Luminaria LED Hermetica 2x18W ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF , en tuberia EMT si es a la vista .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. Incluye: Luminaria LED 2x18W	0,00	12,79	-12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	$ 184.793	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
NP46	Salida para interruptor sencillo ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF , en tuberia PVC en muro .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida	8,00	6,39	1,61	8,00	8,00	0,00	8,00	UN	$ 52.385	$ 419.080	0,03%	100,00%	0,03%	100,00%	0,03%	100,00%	0,00%
NP48	Salida para tomacorriente doble monofásico 110V GFCI instalado en muro, en conductores de cobre 2No12 + 1No12T , tubería PVC embebida en muros. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	10,00	8,00	2,00	10,00	19,00	0,00	19,00	UN	$ 124.264	$ 1.242.640	0,09%	100,00%	0,09%	190,00%	0,17%	190,00%	90,00%
NP50	Suministro y montaje de tablero bifasico de 6 circuitos, incluye: Interruptores según cuadro de cargas.	9,00	6,39	2,61	9,00	9,00	0,00	9,00	UN	$ 215.721	$ 1.941.489	0,14%	100,00%	0,14%	100,00%	0,14%	100,00%	0,00%
NP51	Salida de iluminación para Luminaria LED tipo panel redondo de 18W ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF , en tuberia EMT si es a la vista .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.Incluye: Panel LED de 18W	10,00	12,79	-2,79	10,00	10,00	0,00	10,00	UN	$ 125.448	$ 1.254.480	0,09%	100,00%	0,09%	100,00%	0,09%	100,00%	0,00%
NP52	Salida para interruptor sencillo ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF , en tuberia PVC en muro .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida	10,00	7,99	2,01	10,00	10,00	0,00	10,00	UN	$ 52.385	$ 523.850	0,04%	100,00%	0,04%	100,00%	0,04%	100,00%	0,00%
NP54	Suministro y montaje de tablero monfasico de 4 circuitos, incluye: Interruptores según cuadro de cargas.	15,00	8,00	7,00	15,00	15,00	0,00	15,00	UN	$ 176.652	$ 2.649.780	0,20%	100,00%	0,20%	100,00%	0,20%	100,00%	0,00%
NP55	Salida de iluminación para Luminaria LED tipo panel redondo de 18W ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF , en tuberia EMT si es a la vista .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.Incluye: Panel LED de 18W	12,00	9,59	2,41	12,00	12,00	0,00	12,00	UN	$ 125.448	$ 1.505.376	0,11%	100,00%	0,11%	100,00%	0,11%	100,00%	0,00%
NP56	Salida para interruptor sencillo ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF , en tuberia PVC en muro .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida	11,00	3,00	8,00	11,00	11,00	0,00	11,00	UN	$ 52.385	$ 576.235	0,04%	100,00%	0,04%	100,00%	0,04%	100,00%	0,00%
NP63	INSPECCION, TRAMITE Y OBTENCION DE CERTIFICADOS RETIE Y RETILAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GL	$ 4.321.273	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**																	
7.1	Punto de desagüe en pvc 2"	26,00	0,00	26,00	26,00	18,00	8,00	26,00	UN	$ 67.711	$ 1.760.486	0,13%	100,00%	0,13%	100,00%	0,13%	100,00%	0,00%
7.2	Punto de desagüe en pvc 3"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	$ 88.383	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
7.3	Punto de desagüe en pvc 4"	53,00	0,00	53,00	53,00	52,00	0,00	52,00	UN	$ 95.842	$ 5.079.626	0,38%	100,00%	0,38%	98,11%	0,37%	98,11%	-1,89%
7.4	Tuberia de desagüe en pvc 2".Incluye accesorios	33,30	0,22	33,08	33,30	18,90	14,40	33,30	ML	$ 27.281	$ 908.457	0,07%	100,00%	0,07%	99,99%	0,07%	99,99%	-0,01%
7.5	Tuberia de desagüe en pvc 3". Incluye accesorios	117,00	8,90	108,10	117,00	67,50	49,50	117,00	ML	$ 41.408	$ 4.844.736	0,36%	100,00%	0,36%	100,00%	0,36%	100,00%	0,00%
7.6	Tuberia de desague en pvc 4".Incluye accesorios	382,47	237,34	145,13	382,47	371,92	10,55	382,47	ML	$ 78.438	$ 30.000.182	2,22%	100,00%	2,22%	100,00%	2,22%	100,00%	0,00%
7.7	Tuberia de desague en PVC 6".Incluye accesorios	30,70	23,91	6,79	30,70	30,70	0,00	30,70	ML	$ 81.841	$ 2.512.519	0,19%	100,00%	0,19%	100,00%	0,19%	100,00%	0,00%
7.8	Rejilla de piso baño	53,00	18,38	34,62	53,00	0,00	53,00	53,00	UN	$ 13.214	$ 700.342	0,05%	100,00%	0,05%	100,00%	0,05%	100,00%	0,00%
7.9	Caja de inspección de 70x70cm, ladrillo	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	UN	$ 248.186	$ 1.489.116	0,11%	100,00%	0,11%	100,00%	0,11%	100,00%	0,00%
7.10	Caja de inspección de 90x90cm, ladrillo	2,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	UN	$ 405.445	$ 810.890	0,06%	100,00%	0,06%	150,00%	0,09%	150,00%	50,00%
7.13	Registro de paso directo 1"	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	UN	$ 60.460	$ 241.840	0,02%	100,00%	0,02%	100,00%	0,02%	100,00%	0,00%
7.14	Registro de paso directo ½" (bola)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	$ 35.586	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
7.15	Acometida general de ½"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	$ 196.922	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
7.16	Punto agua fria de ½"	48,00	48,00	0,00	48,00	30,00	18,00	48,00	UN	$ 50.518	$ 2.424.864	0,18%	100,00%	0,18%	100,00%	0,18%	100,00%	0,00%
7.17	Tuberia PVC de presion 1"	295,85	295,85	0,00	295,85	295,85	0,00	295,85	ML	$ 12.077	$ 3.572.980	0,26%	100,00%	0,26%	100,00%	0,26%	100,00%	0,00%
7.19	Tuberia presion PVC ½"	35,92	35,92	0,00	35,92	36,00	0,00	36,00	ML	$ 9.458	$ 339.731	0,03%	100,00%	0,03%	100,23%	0,03%	100,23%	0,23%
7.20	Bajante de Aguas lluvias PVC 2" Incluye malla, mortero 1:4 y Accesorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ML	$ 28.279	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**FORMATO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA**	**Código:** F-GI-IH-116
		Versión: 1
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	**Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2018

INFORMACIÓN GENERAL

N° Y AÑO DE CONVENIO:	341FIP 2021		
PERÍODO:	DESDE 12/09/2024 HASTA EL 14/09/2024		
CONTRATISTA:	ISAIAS VARGAS GONZALEZ	**CONTRATO No.**	**129-2022**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**ACTA DE SERVICIO No.**	**Z7-096**

No./ ID	Descripción del ítem/Actividad	Cantidades de Obra Contractuales	Cantidades de Obra Programadas - Período Anterior	Cantidades de Obra Programadas - Período Actual	Cantidades de Obra Programadas Acumuladas	Cantidades de Obra Ejecutadas - Período Anterior	Cantidades de Obra Ejecutadas - Período Actual	Cantidades de Obra Ejecutadas Acumuladas	Unidad	Valor Unitario	Valor Total del ítem	Peso en % del ítem en relación al valor Total del Contrato (A)	% Acumulado programado por ítem (B)	% Total Programado del ítem (C) = (A)x (B)	% Acumulado de ejecución física por ítem (D)	% Total ejecutado por ítem (E) = (A)x (D)	% Acumulado programado -% Ejecución Física F = (E)/(C)	Desviación por Actividad
7.21	Tuberia Aguas lluvias PVC 2"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ML	$ 15.770	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
7.22	Poceta de aseo (0,60x040x0,45m libres), enchapada, según diseño	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	UND	$ 118.256	$ 118.256	0,01%	100,00%	0,01%	100,00%	0,01%	100,00%	0,00%
NP64	Caja de inspección de 1.20 x 1.20, ladrillo	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	UN	$ 473.950	$ 473.950	0,04%	100,00%	0,04%	100,00%	0,04%	100,00%	0,00%
NP65	Caja de inspección de 1.00 x 0.40, ladrillo	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	UN	$ 427.939	$ 3.423.512	0,25%	100,00%	0,25%	100,00%	0,25%	100,00%	0,00%
NP66	Tuberia presion PVC de 3/4"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ML	$ 10.485	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
8	**RED CONTRA INCENDIOS**																	
NP67	GABINETE TIPO I	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	UND	$ 817.727	$ 1.635.454	0,12%	100,00%	0,12%	100,00%	0,12%	100,00%	0,00%
NP68	ACOMETIDA AÉREA 10 M PVC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UND	$ 386.746	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
NP69	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UND	$ 42.472	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
NP70	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UND	$ 66.462	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
NP71	TUBERÍA ACERO ROJA ROSCADA 2 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ML	$ 112.552	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
9	**RED GAS**																	
NP72	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ML	$ 18.527	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
NP73	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UND	$ 18.795	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
10	**CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA**						0,00			$ -								
10.1	Cubierta en teja termoacustica Trapezoidal A360	616,91	616,91	0,00	616,91	616,91	0,00	616,91	M2	$ 84.273	$ 51.988.877	3,84%	100,00%	3,84%	100,00%	3,84%	100,00%	0,00%
10.2	Caballete cubierta termoacustica	35,55	35,55	0,00	35,55	35,55	0,00	35,55	ML	$ 51.644	$ 1.835.944	0,14%	100,00%	0,14%	100,00%	0,14%	100,00%	0,00%
NP74	Limahoya cubierta termoacustica	0,00	18,84	-18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	ML	$ 53.230	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
NP75	Cubierta en policarbonato alveolar	201,82	126,92	74,89	201,82	200,68	1,14	201,82	M2	$ 154.684	$ 31.217.938	2,31%	100,00%	2,31%	100,00%	2,31%	100,00%	0,00%
NP76	Cercha Metálica, 2<2"X1/8" superior y 2<1 1/2x3/16" inferior, celosía en <1 1/4"*1/8" y varilla de 1/2 c .30.	8093,34	5692,14	2401,20	8093,34	8133,34	-40,00	8093,34	KG	$ 11.012	$ 89.123.811	6,58%	100,00%	6,58%	100,00%	6,58%	100,00%	0,00%
11	**ACABADOS**																	
11.1	Cielo raso en PVC con juntas en mediacaña	0,00	143,84	-143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	M2	$ 42.661	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
12	**ENCHAPES**				0,00	0,00	0,00							0,00%				
NP78	Enchape Pared Montecristal Beige Caras Diferenciadas 30x45 (area de cocina y baños)	36,04	0,00	36,04	36,04	17,51	18,53	36,04	M2	$ 50.244	$ 1.810.693	0,13%	100,00%	0,13%	100,01%	0,13%	100,01%	0,01%
13	**PISOS**																	
13.1	Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08, estampado en colores, incluye herramientas, moldes para estampar, dilataciones, sello dilataciones y malla electrosoldada	0,00	57,64	-57,64	0,00	0,00	0,00	0,00	M2	$ 80.770	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
13.2	Relleno en recebo compactado manual	115,12	115,12	0,00	115,12	115,13	0,00	115,13	M3	$ 50.636	$ 5.829.281	0,43%	100,00%	0,43%	100,01%	0,43%	100,01%	0,01%
13.3	Placa de piso en concreto 2500 PSI e=0.08, dilatado	195,14	195,14	0,00	195,14	195,14	0,00	195,14	M2	$ 60.622	$ 11.829.538	0,87%	100,00%	0,87%	100,00%	0,87%	100,00%	0,00%
NP79	Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08, esmaltado con cemento mineral	115,90	115,90	0,00	115,90	115,90	0,00	115,90	M2	$ 63.301	$ 7.336.542	0,54%	100,00%	0,54%	100,00%	0,54%	100,00%	0,00%
NP 80	Placa de piso en concreto 2500 P.S.I, barrido y dilatado e-0.08	586,83	586,83	0,00	586,83	586,83	0,00	586,83	M2	$ 43.570	$ 25.568.192	1,89%	100,00%	1,89%	100,00%	1,89%	100,00%	0,00%
NP81	Piso Juliana Con Gota Azul Caras Diferenciadas Corona 33.8X33.8	73,64	73,64	0,00	73,64	67,55	6,09	73,64	M2	$ 43.535	$ 3.205.721	0,24%	100,00%	0,24%	100,01%	0,24%	100,01%	0,01%
NP82	Piso Mantis gris multitono 51x51	36,49	7,68	28,80	36,49	36,49	0,00	36,49	M2	$ 46.008	$ 1.678.648	0,12%	100,00%	0,12%	100,01%	0,12%	100,01%	0,01%
NP83	Guardaescoba en cemento esmaltado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ML	$ 28.656	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
NP84	Guardaescoba en ceramica Juliana Con Gota Azul Caras Diferenciadas Corona 33.8X33.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ML	$ 10.697	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
NP85	Guardaescoba en ceramica Mantis gris multitono 51x51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ML	$ 31.595	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
NP86	Poyo en concreto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ML	$ 24.660	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
14	**CARPINTERÍA METÁLICA**																	
14.1	Cortinas metálicas enrollables	155,58	91,20	64,38	155,58	156,10	0,00	156,10	M2	$ 412.712	$ 64.211.177	4,74%	100,00%	4,74%	100,33%	4,76%	100,33%	0,33%
14,5	Marco y puerta metalica cal. 18	19,00	18,02	0,98	19,00	19,00	0,00	19,00	UND	$ 465.292	$ 8.840.548	0,65%	100,00%	0,65%	100,00%	0,65%	100,00%	0,00%
14.6	Divisiones para baños en lamina CR. Cal 18	19,28	19,28	0,00	19,28	19,28	0,00	19,28	M2	$ 203.863	$ 3.930.071	0,29%	100,00%	0,29%	100,01%	0,29%	100,01%	0,01%
NP87	Ventana en lámina cal. 18	1,37	1,37	0,00	1,37	1,42	0,00	1,42	M2	$ 136.042	$ 186.065	0,01%	100,00%	0,01%	103,82%	0,01%	103,82%	3,82%
NP88	Luceta metalica en lamina cal. 18-Tubo cuadrado 1"	4,40	4,40	0,00	4,40	4,40	0,00	4,40	M2	$ 165.962	$ 730.233	0,05%	100,00%	0,05%	100,00%	0,05%	100,00%	0,00%
NP89	Baranda pasamanos en tubo	17,68	17,68	0,00	17,68	0,00	17,68	17,68	ML	$ 55.946	$ 989.125	0,07%	100,00%	0,07%	100,00%	0,07%	100,00%	0,00%
NP92	Canal metálico 0.50 mts	131,58	88,64	42,94	131,58	131,58	0,00	131,58	ML	$ 90.945	$ 11.966.543	0,88%	100,00%	0,88%	100,00%	0,88%	100,00%	0,00%
NP93	Cárcamo con rejilla tipo industrial	26,10	7,76	18,34	26,10	12,50	13,60	26,10	ML	$ 320.609	$ 8.367.895	0,62%	100,00%	0,62%	100,00%	0,62%	100,00%	0,00%

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**FORMATO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA**	**Código:** F-GI-IH-116
		Versión: 1
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	**Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2018

INFORMACIÓN GENERAL

N° Y AÑO DE CONVENIO:	341FIP 2021		
PERÍODO:	DESDE 12/09/2024 HASTA EL 14/09/2024		
CONTRATISTA:	ISAIAS VARGAS GONZALEZ	**CONTRATO No.**	**129-2022**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**ACTA DE SERVICIO No.**	**Z7-096**

No./ ID	Descripción del ítem/Actividad	Cantidades de Obra Contractuales	Cantidades de Obra Programadas - Período Anterior	Cantidades de Obra Programadas - Período Actual	Cantidades de Obra Programadas Acumuladas	Cantidades de Obra Ejecutadas - Período Anterior	Cantidades de Obra Ejecutadas - Período Actual	Cantidades de Obra Ejecutadas Acumuladas	Unidad	Valor Unitario	Valor Total del ítem	Peso en % del ítem en relación al valor Total del Contrato (A)	% Acumulado programado por ítem (B)	% Total Programado del ítem (C) = (A)x (B)	% Acumulado de ejecución física por ítem (D)	% Total ejecutado por ítem (E) = (A)x (D)	% Acumulado programado -% Ejecución Física F = (E)/(C)	Desviación por Actividad
15	**APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES**																	
16.1	Lavamanos Acuacer	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	UND	$ 194.858	$ 1.364.006	0,10%	100,00%	0,10%	100,00%	0,10%	100,00%	0,00%
16.2	Sanitario Trevi	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	UND	$ 265.327	$ 1.591.962	0,12%	100,00%	0,12%	100,00%	0,12%	100,00%	0,00%
16.3	Orinal institucional	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	UND	$ 395.497	$ 395.497	0,03%	100,00%	0,03%	100,00%	0,03%	100,00%	0,00%
16.4	Espejos baños	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20	4,20	M2	$ 45.362	$ 190.520	0,01%	100,00%	0,01%	100,00%	0,01%	100,00%	0,00%
16.5	Suministro e instalación de lavaplatos	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	UND	$ 159.053	$ 1.272.424	0,09%	100,00%	0,09%	100,00%	0,09%	100,00%	0,00%
NP94	Vidrios para ventanas 4m.m plano	1,13	0,00	1,13	1,13	0,00	1,13	1,13	M2	$ 44.774	$ 50.639	0,00%	100,00%	0,00%	99,91%	0,00%	99,91%	-0,09%
NP96	Suministro e instalacion de tanque plastico agua potable de 1000lts.(Incluye accesorios)	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	UND	$ 438.330	$ 1.753.320	0,13%	100,00%	0,13%	100,00%	0,13%	100,00%	0,00%
16	**ORNAMENTALES**																	
NP97	Matera en ladrillo a la vista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M2	$ 36.770	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
NP98	Banca plazoleta de comidas en concreto armado sobre muros en ladrillo a la vista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M2	$ 57.765	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
NP99	Banca plazoleta de comidas en ladrillo a la vista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M2	$ 36.770	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
17	**PINTURA GENERAL**																	
17.1	Esmalte sobre lámina llena	120,52	158,76	-38,24	120,52	38,50	82,02	120,52	M2	$ 18.797	$ 2.265.339	0,17%	100,00%	0,17%	100,00%	0,17%	100,00%	0,00%
17.2	Esmalte sobre marcos lámina	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	UN	$ 26.052	$ 494.988	0,04%	100,00%	0,04%	100,00%	0,04%	100,00%	0,00%
NP100	Estuco y pintura vinilo muros	901,76	351,49	550,27	901,76	450,00	451,76	901,76	M2	$ 16.798	$ 15.147.705	1,12%	100,00%	1,12%	100,00%	1,12%	100,00%	0,00%
NP101	Pintura epoxica muros	534,43	107,87	426,56	534,43	200,00	334,43	534,43	M2	$ 24.081	$ 12.869.506	0,95%	100,00%	0,95%	100,00%	0,95%	100,00%	0,00%
NP103	Pintura esmalte ventaneria metálica	5,77	0,00	5,77	5,77	0,00	5,77	5,77	M2	$ 11.670	$ 67.309	0,00%	100,00%	0,00%	100,04%	0,00%	100,04%	0,04%
NP104	Pintura canal a.ll. esmalte sobre wash— primer	131,58	0,00	131,58	131,58	131,58	0,00	131,58	ML	$ 22.462	$ 2.955.550	0,22%	100,00%	0,22%	100,00%	0,22%	100,00%	0,00%
	ITEMS NUEVOS																	
NE1	Acometidas parciales a tableros. Desde tablero de distribucion y control a subtableros en (1FX8+1N#8+1 T#10) en ducto EMT 1"+ accesorios	635,17	0,00	635,17	635,17	546,20	88,97	635,17	ML	$ 59.926	$ 38.063.347	2,81%	100,00%	2,81%	100,00%	2,81%	100,00%	0,00%
NE2	Acometidas parciales a tableros. Desde tablero de distribucion y control a subtableros en (2FX8+1N#8+1 T#10) en ducto EMT 1"+ accesorios	486,18	0,00	486,18	486,18	486,20	0,00	486,20	ML	$ 52.942	$ 25.739.342	1,90%	100,00%	1,90%	100,00%	1,90%	100,00%	0,00%
NE3	Soporte para canalizacion de ductos EMT 1"- en riel chanel y guaya 1/8" + accesorios pernada a estructura metalica. Instalada cada 2 mtrs de canalizacion.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UND	$ 75.833	$ -	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
NE4	Tubería sanitaria PVC 8".Incluye accesorios	47,95	5,95	42,00	47,95	47,55	0,00	47,55	ML	$ 50.127	$ 2.403.590	0,18%	100,00%	0,18%	99,17%	0,18%	99,17%	-0,83%
NE5	Tuberia PVC de presion 1 1/2"	44,61	61,08	-16,47	44,61	40,11	0,00	40,11	ML	$ 22.939	$ 1.023.309	0,08%	100,00%	0,08%	89,91%	0,07%	89,91%	-10,09%
Totales											**$ 1.353.922.224**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EXPRESADO EN COSTOS

Valor Total del Contrato	$ 1.353.922.224
Valor programado del contrato (Es el valor total del contrato multiplicado por el % Total programado (C)	$ 1.353.922.224
Valor de avance físico del contrato (Valor total del contrato multiplicado por el % total ejecutado (E)	$ 1.353.922.224
Diferencia entre el valor programado y ejecutado del contrato	$ 0

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Plazo Total de Ejecución de Obra (Días o meses)	506
Tiempo de Adelanto(+) o atraso (-) (Días o meses)	0,0
(Plazo total multiplicado por el % total de adelanto o atraso)	0%

Firma:
NOMBRE: MICHAEL TAVERA
DIRECTOR DE OBRA

Firma:
NOMBRE: CARLOS ANDRES GUARNIZO ZAMBRANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma:
NOMBRE: LUIS ALVARO GUERRERO PARDO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
