BITACORA DE OBRA - TOMO 2

83	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**lunes, 19 de mayo de 2025**
DIA N°:		**518**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	2	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	1	Auxiliar Social y SST
	0	Topógrafo Inspector
	0	Cadenero Primero
	0	Maestro General
	0	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	2	Operador de maquinaria amarilla
	1	Conductor de volqueta DT
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	1	Retroexcavadora de 8 ton.
	1	Rodillo compactador de 11 ton.
	1	Volqueta DT capacidad 15 m3
	1	Cama baja de 2 ejes

CLIMA:	NO APLICA

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante continua con los acercamientos necesarios en lo concerniente con la gestión y trámites ante la Gobernación de Boyacá, ante Corpoboyacá y ante la ANI con miras a la consecución de los recursos faltantes de acuerdo en un todo con los tiempos requeridos según las actividades relacionadas con la obtención de permisos de ocupación del cauce del rio Jordán y de la vía férrea aledaños a la calle 59, la suscripción del Acta de inicio del Convenio y el desembolso de los recursos por parte del Departamento de Boyacá de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ Con base en el Acta de Comité 001 de fecha 13 de mayo de 2025, correspondiente al Convenio Interadministrativo celebrado entre el Departamento de Boyacá y la Alcaldía de Tunja, y particularmente en lo relacionado con la fecha concertada entre las partes para dar inicio de las actividades de obra, el Consorcio Hayuelos coordina y programa el traslado de maquinaria, equipo y materiales para el cerramiento de obra en la calle 59 en espera de la orden de inicio por parte de la Entidad Contratante. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas imprudentes.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:	**DEL CONTRATISTA:**
RICHARD ALEXANDER ACOSTA	**JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA**
Ingeniero Residente	**Ingeniero Residente**
Firma, Nombre y Cargo	Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

84	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**martes, 20 de mayo de 2025**
DIA N°:		**519**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	2	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	1	Auxiliar Social y SST
	1	Topógrafo Inspector
	1	Cadenero Primero
	1	Maestro General
	3	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	2	Operador de maquinaria amarilla
	2	Conductor de volqueta DT
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	1	Retroexcavadora de 8 ton.
	1	Rodillo compactador de 11 ton.
	2	Volqueta DT capacidad 15 m3

CLIMA:	Lluvias intensas en la madrugada y seco en el resto de día. S reportan lluvias intensas durante la noche del lunes 19/05/2025.

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante Corpoboyacá y ante la ANI con miras a la obtención del POC y la aprobación de las pólizas del proyecto, respectivamente, de igual forma lo hace con la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ Con la suscripción de Acta de Iniciación del Convenio Interadministrativo con fecha de hoy 20/05/2025, el Contratista de obra, procede con el suministro del personal para dar inicio con las actividades preliminares como el cerramiento provisional, de tal forma que se garantice la seguridad del personal y el aislamiento de los equipos y maquinaria a emplearse en las maniobras que en adelante se requieren en cumplimiento del objeto contractual y tipo de obra a ejecutar. Así mismo, se da inicio al suministro de materiales y la fabricación de las piezas metálicas del puente de luz 30m., de acuerdo en un todo con los planos de taller remitidos por el contratista y aprobados por la interventoría del proyecto. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas imprudentes.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:	**DEL CONTRATISTA:**
	
RICHARD ALEXANDER ACOSTA	**JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA**
Ingeniero Residente	**Ingeniero Residente**
Firma, Nombre y Cargo	Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

85	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**miércoles, 21 de mayo de 2025**
DIA N°:		**520**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	2	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	1	Auxiliar Social y SST
	1	Topógrafo Inspector
	1	Cadenero Primero
	1	Maestro General
	3	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	2	Operador de maquinaria amarilla
	2	Conductor de volqueta DT
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	1	Retroexcavadora de 8 ton.
	1	Rodillo compactador de 11 ton.
	2	Volqueta DT capacidad 15 m3

CLIMA:	Seco.

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante Corpoboyacá y ante la ANI con miras a la obtención del POC y la aprobación de las pólizas del proyecto, respectivamente, así mismo, ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ Se culmina la actividad del cerramiento provisional de obra y se procede con la localización y replanteo de la calzada sur (Eje 1) desde el K0+085 al K0+135, con miras a realizar la explanación para la conformación de la plataforma que servirá de patio de trabajo en las tareas de soldadura, armado y montaje del puente de luz 30m. De forma paralela , se avanza en taller con la fabricación de los elementos del puente de acuerdo con los planos de taller aprobados. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas imprudentes.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:

RICHARD ALEXANDER ACOSTA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

DEL CONTRATISTA:

JAVIER MAURICIO RODIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

86	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**jueves, 22 de mayo de 2025**
DIA N°:		**521**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	2	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	1	Auxiliar Social y SST
	1	Topógrafo Inspector
	1	Cadenero Primero
	1	Maestro General
	3	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	2	Operador de maquinaria amarilla
	2	Conductor de volqueta DT
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	1	Retroexcavadora de 8 ton.
	1	Rodillo compactador de 11 ton.
	2	Volqueta DT capacidad 15 m3

CLIMA:	Lluvias leves en la mañana, seco y nublado en horas de la tarde.

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante Corpoboyacá en procura del POC sobre el rio Jordán; ante la ANI para la aprobación de las pólizas del proyecto y ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ Se da inicio con la excavación mecánica de la caja de vía requerida para la estructura de pavimento acorde con los diseños aprobados para tal fin (mejoramiento de la sub rasante natural), se evidencian sectores con presencia de material cuya capacidad portante requiere de profundizar la altura de excavación, para lo cual, se realizan pruebas de carga al paso de una volqueta cargada y conjuntamente con la interventoría, se demarcan y cuantifican las zonas en las cuales se debe retirar el material NO competente para ser reemplazado con piedra rajón siguiendo la recomendación del especialista de suelos. En Bogotá se avanza con la fabricación de los elementos del puente de acuerdo con los planos de taller aprobados. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas imprudentes.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:	**DEL CONTRATISTA:**
RICHARD ALEXANDER ACOSTA	**JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA**
Ingeniero Residente	**Ingeniero Residente**
Firma, Nombre y Cargo	Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

87	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**viernes, 23 de mayo de 2025**
DIA N°:		**522**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	2	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	1	Auxiliar Social y SST
	1	Topógrafo Inspector
	1	Cadenero Primero
	1	Maestro General
	3	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	2	Operador de maquinaria amarilla
	2	Conductor de volqueta DT
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	1	Retroexcavadora de 8 ton.
	1	Rodillo compactador de 11 ton.
	2	Volqueta DT capacidad 15 m3

CLIMA:	Seco en la mañana y con presencia de lluvias leves en la tarde.

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante Corpoboyacá en procura del POC sobre el rio Jordán; ante la ANI para la aprobación de las pólizas del proyecto y ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ Se continua con la excavación de las zonas de fallo y la caja para la estructura de pavimento acorde con los diseños aprobados, de forma paralela, se realiza el suministro de material piedra rajón para conformar la capa de mejoramiento de la sub rasante en la zona destinada para la plataforma de trabajo para el armado y montaje del puente de 30m. En Bogotá se avanza con la fabricación de los elementos del puente de acuerdo con los planos de taller aprobados. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas imprudentes.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:	**DEL CONTRATISTA:**
RICHARD ALEXANDER ACOSTA	**JAVIER MAURICIO RODIGUEZ RIVERA**
Ingeniero Residente	**Ingeniero Residente**
Firma, Nombre y Cargo	Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

88	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**sábado, 24 de mayo de 2025**
DIA N°:		**523**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	2	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	1	Auxiliar Social y SST
	1	Topógrafo Inspector
	1	Cadenero Primero
	1	Maestro General
	3	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	2	Operador de maquinaria amarilla
	2	Conductor de volqueta DT
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	1	Retroexcavadora de 8 ton.
	1	Rodillo compactador de 11 ton.
	2	Volqueta DT capacidad 15 m3

CLIMA:	Seco.

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante Corpoboyacá en procura del POC sobre el rio Jordán; ante la ANI para la aprobación de las pólizas del proyecto y ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ Se continua con la excavación de las zonas de fallo y la caja para la estructura de pavimento acorde con los diseños aprobados, de forma paralela, se realiza el suministro de material piedra rajón y material granular tipo afirmado para conformar la capa de mejoramiento de la sub rasante en la zona destinada para la plataforma de trabajo para el armado y montaje del puente de 30m. En Bogotá se avanza con la fabricación de los elementos del puente de acuerdo con los planos de taller aprobados. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas imprudentes.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:

RICHARD ALEXANDER ACOSTA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

DEL CONTRATISTA:

JAVIER MAURICIO RODIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

89	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA** **NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS** **NIT.: 901.725.176-8** **CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2** **NIT.: 901.728.023-3** **CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**domingo, 25 de mayo de 2025**
DIA N°:		**524**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	2	Residente de Obra
	0	Ingeniero Ambiental y SST
	0	Auxiliar Social y SST
	0	Topógrafo Inspector
	0	Cadenero Primero
	0	Maestro General
	0	Ayudantes de construcción
	0	Conductor vehículo de apoyo
	0	Operador de maquinaria amarilla
	0	Conductor de volqueta DT
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	1	Retroexcavadora de 8 ton.
	1	Rodillo compactador de 11 ton.
	2	Volqueta DT capacidad 15 m3

CLIMA:	NO APLICA

ACTIVIDADES DIARIAS:	SIN (DIA DOMINICAL)

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:



RICHARD ALEXANDER ACOSTA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

DEL CONTRATISTA:



JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

90	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**lunes, 26 de mayo de 2025**
DIA N°:		**525**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	2	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	1	Auxiliar Social y SST
	1	Topógrafo Inspector
	1	Cadenero Primero
	1	Maestro General
	3	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	2	Operador de maquinaria amarilla
	2	Conductor de volqueta DT
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	1	Retroexcavadora de 8 ton.
	1	Rodillo compactador de 11 ton.
	2	Volqueta DT capacidad 15 m3

CLIMA:	Nublado con presencia de lluvias leves y esporádicas.

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante Corpoboyacá en procura del POC sobre el rio Jordán; ante la ANI para la aprobación de las pólizas del proyecto y ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ En la mañana de hoy se realiza visita de campo con posterior reunión en compañía de funcionarios de Corpoboyacá, la Supervisión del proyecto, interventor y contratista, con el fin de revisar las condiciones actuales del proyecto en desarrollo del tramite que adelanta la Administración Municipal para la obtención del POC ante la Corporación. _ Se continua con el suministro de material piedra rajón y material granular tipo afirmado para conformar la capa de mejoramiento de la sub rasante en la zona destinada para la plataforma de trabajo requerida durante la etapa de armado y montaje del puente de 30m. En Bogotá se avanza con la fabricación de los elementos del puente de acuerdo con los planos de taller aprobados. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas imprudentes.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:	**DEL CONTRATISTA:**
RICHARD ALEXANDER ACOSTA	**JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA**
Ingeniero Residente	**Ingeniero Residente**
Firma, Nombre y Cargo	Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

91	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**martes, 27 de mayo de 2025**
DIA N°:		**526**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	2	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	1	Auxiliar Social y SST
	1	Topógrafo Inspector
	1	Cadenero Primero
	1	Maestro General
	3	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	2	Operador de maquinaria amarilla
	2	Conductor de volqueta DT
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	1	Retroexcavadora de 8 ton.
	1	Rodillo compactador de 11 ton.
	2	Volqueta DT capacidad 15 m3

CLIMA:	Se presentan lluvias en horario de las 10:00 a.m., y seco resto de jornada

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante Corpoboyacá en procura del POC sobre el rio Jordán; ante la ANI para la aprobación de las pólizas del proyecto y ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ Se continua con el suministro de material piedra rajón y material granular tipo afirmado para conformar la capa de mejoramiento de la sub rasante en la zona destinada para la plataforma de trabajo para el armado y montaje del puente de 30m. En Bogotá se avanza con la fabricación de los elementos del puente de acuerdo con los planos de taller aprobados. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas imprudentes.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:

RICHARD ALEXANDER ACOSTA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

DEL CONTRATISTA:

JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

92	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**miércoles, 28 de mayo de 2025**
DIA N°:		**527**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	2	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	1	Auxiliar Social y SST
	1	Topógrafo Inspector
	1	Cadenero Primero
	1	Maestro General
	3	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	2	Operador de maquinaria amarilla
	2	Conductor de volqueta DT
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	1	Retroexcavadora de 8 ton.
	1	Rodillo compactador de 11 ton.
	2	Volqueta DT capacidad 15 m3

CLIMA:	Soleado

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante Corpoboyacá en procura del POC sobre el rio Jordán; ante la ANI para la aprobación de las pólizas del proyecto y ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ Se continua con el suministro de material granular tipo afirmado para conformar la capa de mejoramiento de la sub rasante en la zona destinada para la plataforma de trabajo para el armado y montaje del puente de 30m. En Bogotá se avanza con la fabricación de los elementos del puente de acuerdo con los planos de taller aprobados. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas imprudentes.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:

RICHARD ALEXANDER ACOSTA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

DEL CONTRATISTA:

JAVIER MAURICIO RODIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

93	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**jueves, 29 de mayo de 2025**
DIA N°:		**528**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	2	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	1	Auxiliar Social y SST
	1	Topógrafo Inspector
	1	Cadenero Primero
	1	Maestro General
	3	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	2	Operador de maquinaria amarilla
	2	Conductor de volqueta DT
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	1	Retroexcavadora de 8 ton.
	1	Rodillo compactador de 11 ton.
	2	Volqueta DT capacidad 15 m3

CLIMA:	Soleado

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante la ANI para la aprobación de las pólizas del proyecto y ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. El apoyo a la Supervisión del Proyecto informa que, Corpoboyacá emite el día de hoy, respuesta favorable en lo relacionado con las solicitudes efectuadas los días 15 y 26 de mayo de 2025 para el POC sobre el rio Jordán. _ Se continua con el suministro de material granular tipo afirmado para terminar la conformación de la capa de mejoramiento de la sub rasante e iniciar la conformación de la estructura de pavimento hasta alcanzar la cota a partir de la cual, se debe instalar la capa de sub base en la zona destinada para la plataforma de trabajo para el armado y montaje del puente de 30m. En Bogotá se avanza con la fabricación de los elementos del puente de acuerdo con los planos de taller aprobados. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas imprudentes.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:	DEL CONTRATISTA:
RICHARD ALEXANDER ACOSTA	JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente	**Ingeniero Residente**
Firma, Nombre y Cargo	Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

94	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**viernes, 30 de mayo de 2025**
DIA N°:		**529**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	2	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	1	Auxiliar Social y SST
	1	Topógrafo Inspector
	1	Cadenero Primero
	1	Maestro General
	3	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	2	Operador de maquinaria amarilla
	2	Conductor de volqueta DT
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	1	Retroexcavadora de 8 ton.
	1	Rodillo compactador de 11 ton.
	2	Volqueta DT capacidad 15 m3
	1	Cuadrilla para descargue y almacenamiento primeras piezas metálicas del puente 30m

CLIMA:	Soleado con lluvias leves en parte de la tarde

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante la ANI para la aprobación de las pólizas del proyecto y ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ Se continua con el suministro de material granular tipo afirmado para la conformación de la estructura de pavimento hasta alcanzar la cota a partir de la cual, se debe instalar la capa de sub base en la zona destinada para la plataforma de trabajo para el armado y montaje del puente de 30m. En Bogotá se avanza con la fabricación de los elementos del puente de acuerdo con los planos de taller aprobados. _ Llega al sitio de obra el primer viaje con elementos estructurales fabricados en taller los cuales se descargan en el patio de acopio. Estas piezas corresponden a las vigas transversales del puente de luz 30m. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas imprudentes.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:

RICHARD AVELLANEDA ACOSTA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

DEL CONTRATISTA:

JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

95	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**sábado, 31 de mayo de 2025**
DIA N°:		**530**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	2	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	1	Auxiliar Social y SST
	1	Topógrafo Inspector
	1	Cadenero Primero
	1	Maestro General
	3	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	2	Operador de maquinaria amarilla
	2	Conductor de volqueta DT
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	1	Retroexcavadora de 8 ton.
	1	Rodillo compactador de 11 ton.
	2	Volqueta DT capacidad 15 m3
	1	Cuadrilla para descargue y almacenamiento primeras piezas metálicas del puente 30m

CLIMA:	Seco

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante la ANI para la aprobación de las pólizas del proyecto y ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ Se continua hasta terminar el suministro de material granular tipo afirmado empleado en la conformación y compactación de la estructura de pavimento a nivel de la cota de desplante de la capa de sub base en la zona destinada para la plataforma de trabajo para el armado y montaje del puente de 30m. En Bogotá se avanza con la fabricación de los elementos del puente de acuerdo con los planos de taller aprobados. _ Llega al sitio de obra el segundo viaje con elementos estructurales fabricados en taller los cuales se descargan en el patio de acopio. Estas piezas corresponden a las vigas longitudinales del puente de luz 30m. Así mismo, llega a obra un contenedor y sendos equipos para las soldaduras que se ejecutaran en campo a partir de la siguiente semana. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas imprudentes.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:	**DEL CONTRATISTA:**
RICHARD ALEXANDER ACOSTA	**JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA**
Ingeniero Residente	**Ingeniero Residente**
Firma, Nombre y Cargo	Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

96	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA** **NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS** **NIT.: 901.725.176-8** **CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2** **NIT.: 901.728.023-3** **CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**domingo, 01 de junio de 2025**
DIA N°:		**531**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	2	Residente de Obra
	0	Ingeniero Ambiental y SST
	0	Auxiliar Social y SST
	0	Topógrafo Inspector
	0	Cadenero Primero
	0	Maestro General
	0	Ayudantes de construcción
	0	Conductor vehículo de apoyo
	0	Operador de maquinaria amarilla
	0	Conductor de volqueta DT
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo

CLIMA:	NO APLICA

ACTIVIDADES DIARIAS:	SIN (DIA DOMINICAL)

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:

RICHARD ALEXANDER ACOSTA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

DEL CONTRATISTA:

JAVIER MAURICIO RODIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

97	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**lunes, 02 de junio de 2025**
DIA N°:		**532**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	2	Residente de Obra
	0	Ingeniero Ambiental y SST
	0	Auxiliar Social y SST
	0	Topógrafo Inspector
	0	Cadenero Primero
	0	Maestro General
	0	Ayudantes de construcción
	0	Conductor vehículo de apoyo
	0	Operador de maquinaria amarilla
	0	Conductor de volqueta DT
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	2	Generador eléctrico diésel

CLIMA:	NO APLICA

ACTIVIDADES DIARIAS:	SIN (DIA FESTIVO)

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA

RICHARD ALEXANDER ACOSTA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

DEL CONTRATISTA:

JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

98	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**martes, 03 de junio de 2025**
DIA N°:		**533**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	1	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	2	Auxiliar SST y Social
	1	Maestro General
	1	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	2	Generador eléctrico diésel

CLIMA:	Lluvias leves en horas de la mañana y seco en el resto de día.

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante la ANI para la aprobación de las pólizas del proyecto y ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ En los talleres de Bogotá se avanza con etapa final en la fabricación de elementos estructurales acorde con los diseños aprobados para el puente de luz 30m. Así mismo, continúan los suministros en obra de equipos y herramienta menor para las soldaduras previstas a iniciarse durante la presente semana. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas que irrespetan el cierre provisional de obra.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:

RICHARD ALEXANDER ACOSTA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

DEL CONTRATISTA:

JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

99	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA** **NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS** **NIT.: 901.725.176-8** **CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2** **NIT.: 901.728.023-3** **CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**miércoles, 04 de junio de 2025**
DIA N°:		**534**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	1	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	2	Auxiliar SST y Social
	1	Maestro General
	1	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	2	Generador eléctrico diésel
	Gl	Equipo y Herramienta menor

CLIMA:	Nublado con lluvias cortas de intensidad moderada a fuerte durante la media mañana.

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante la ANI para la aprobación de las pólizas del proyecto y ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ Se avanza con etapa final en la fabricación de elementos estructurales acorde con los diseños y planos de taller aprobados para el puente de luz 30m. En obra se realizan campamentos para protección de los equipos ante lluvias súbitas al igual que el acondicionamiento de las áreas de almacén y zonas de trabajo en campo. _ Hace presencia en obra, un funcionario de Alumbrado Publico indicando que se debe implementar una solución en la caja de inspección sobre el separador (K0+210) con miras a permitir la energización del circuito con el alumbrado publico aledaño al CR Ciudad Hayuelos. Para ello se agenda reunión entre las partes para el día viernes 6 de junio en horario de as 9:00 a.m. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas que irrespetan el cierre provisional de obra.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:

RICHARD ALEXANDER ACOSTA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

DEL CONTRATISTA:

JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

100	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA** **NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS** **NIT.: 901.725.176-8** **CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2** **NIT.: 901.728.023-3** **CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**jueves, 05 de junio de 2025**
DIA N°:		**535**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	1	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	2	Auxiliar SST y Social
	1	Maestro General
	1	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	2	Generador eléctrico diésel
	Gl	Equipo y Herramienta menor

CLIMA:	Seco

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante la ANI para la aprobación de las pólizas del proyecto y ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ Se avanza con la fabricación de elementos estructurales acorde con los diseños y planos de taller aprobados para el puente de luz 30m. Así mismo, se avanza con la bores para la protección de los equipos ante presencia de lluvias al igual que el acondicionamiento de las áreas de almacén y zonas de trabajo en campo. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas que irrespetan el cierre provisional de obra.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:

RICHARD ALEXANDER ACOSTA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

DEL CONTRATISTA:

JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

101	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**viernes, 06 de junio de 2025**
DIA N°:		**536**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	1	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	2	Auxiliar SST y Social
	1	Maestro General
	1	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	2	Generador eléctrico diésel
	Gl	Equipo y Herramienta menor

CLIMA:	Nublado con lluvias cortas de intensidad suave a moderada durante el día.

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante la ANI para la aprobación de las pólizas del proyecto y ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ Se termina la fabricación de elementos estructurales acorde con los diseños y planos de taller aprobados para el puente de luz 30m. Así mismo, se continúan labores para la protección de los equipos ante presencia de lluvias al igual que el acondicionamiento de las áreas de almacén y zonas de trabajo en campo. _ En horas de la mañana se realiza reunión conjunta con la Empresa encargada del Alumbrado Publico de la zona, la interventoría, la Constructora Hayuelos y el Consorcio Hayuelos, con miras a definir la solución para permitir energizar el circuito eléctrico que alimenta la red del alumbrado publico aledaño al Conjunto Residencial. Así mismo, para coordinar y realizar el desmonte y retiro temporal del poste de A.P instalado en el separador central de la calle 59 (K0+128) cuyo propósito es el de facilitar el montaje del puente de luz 30m., sobre la cimentación ya construida. _ En horario de las 2:00 p.m. se recibe visita del ing. Juan Pablo Alba, supervisor del Convenio Interadministrativo N° 1940 de fecha 01/04/2025, celebrado entre el Departamento de Boyacá y el Municipio de Tunja. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas que irrespetan el cierre provisional de obra.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:	DEL CONTRATISTA:
RICHARD ALEXANDER ACOSTA	JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente	**Ingeniero Residente**
Firma, Nombre y Cargo	Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

102	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**sábado, 07 de junio de 2025**
DIA N°:		**537**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	1	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	2	Auxiliar SST y Social
	1	Maestro General
	1	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	2	Generador eléctrico diésel
	Gl	Equipo y Herramienta menor

CLIMA:	Seco

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante la ANI para la aprobación de las pólizas del proyecto y ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ Se coordina y programa para la semana entrante, el cargue y transporte de los elementos fabricados en talleres de Bogotá y Tenjo hacia sitio de obra al igual que el suministro del equipo cuya capacidad permita el descargue seguro en el patio de maniobras de la calle 59. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas que irrespetan el cierre provisional de obra.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:

RICHARD ALEXANDER ACOSTA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

DEL CONTRATISTA:

JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

103	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA** **NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS** **NIT.: 901.725.176-8** **CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2** **NIT.: 901.728.023-3** **CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**domingo, 08 de junio de 2025**
DIA N°:		**538**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	1	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	2	Auxiliar SST y Social
	0	Maestro General
	0	Ayudantes de construcción
	0	Conductor vehículo de apoyo
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	2	Generador eléctrico diésel
	Gl	Equipo y Herramienta menor

CLIMA:	NO APLICA

ACTIVIDADES DIARIAS:	SIN (DIA DOMINICAL)

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:

RICHARD ALEXANDER ACOSTA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

DEL CONTRATISTA:

JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

104	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**lunes, 09 de junio de 2025**
DIA N°:		**539**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	3	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	2	Auxiliar SST y Social
	1	Topógrafo Inspector
	1	Maestro General
	4	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	1	Cuadrilla de soldadores y armadores
	2	Operador de maquinaria amarilla
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	2	Vehículo de apoyo
	2	Generador eléctrico diésel
	Gl	Equipo y Herramienta menor
	2	Montacarga Cap. 3 ton.

CLIMA:	Seco con reporte de lluvias durante la noche del lunes.

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante la ANI para la aprobación de las pólizas del proyecto y ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ En este día, y según lo previsto en el cronograma de actividades, llega al sitio de obra un viaje mas con elementos estructurales para el puente metálico de luz 30m, los cuales se descargan y acopian en patio de almacenamiento con ayuda de maquinaria tipo montacarga de capacidad 3 toneladas. Con la llegada del personal de soldadores, se inician las labores de armado del puente comenzando por los elementos tipo Viga Transversales. _ De igual manera, en la sección de vías se coordina el personal de mano de obra necesario para la construcción de la tapa superior en los pozos de inspección de la red de alcantarillado pluvial y de aguas servidas dispuestos sobre la calzada norte (Eje 2) de la calle 59 en el sector de Postobón. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas que irrespetan el cierre provisional de obra.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:	**DEL CONTRATISTA:**
RICHARD ALEXANDER ACOSTA	**JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA**
Ingeniero Residente	**Ingeniero Residente**
Firma, Nombre y Cargo	Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

105	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**martes, 10 de junio de 2025**
DIA N°:		**540**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	3	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	2	Auxiliar SST y Social
	1	Topógrafo Inspector
	1	Maestro General
	5	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	1	Cuadrilla de soldadores y armadores
	2	Operador de maquinaria amarilla
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	2	Vehículo de apoyo
	2	Generador eléctrico diésel
	Gl	Equipo y Herramienta menor
	1	Montacarga Cap. 3 ton.
	1	Auto Grúa Telescópica Cap. 23 ton.

CLIMA:	Seco con lluvias leves y esporádicas en parte de la mañana y tarde.

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante la ANI para la aprobación de las pólizas del proyecto y ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ Se lleva a cabo el comité de seguimiento semanal en compañía del apoyo de la supervisión del proyecto, la interventoría y el contratista de obra. _ En este día, llega al sitio de obra ultimo viaje con elementos estructurales para el puente metálico de luz 30m, los cuales se descargan y acopian en patio de almacenamiento con ayuda de maquinaria tipo montacarga de capacidad 3 toneladas y auto grúa con capacidad 23 toneladas. Se continua la actividad de armado del puente acorde con planos de taller. _ Con el suministro de materiales pétreos, equipos menores, formaleta y acero de refuerzo, se da continuidad en la construcción de la tapa superior en los pozos de inspección de la red de alcantarillado pluvial y de aguas servidas dispuestos sobre la calzada norte (Eje 2) de la calle 59 en el sector de Postobón. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas que irrespetan el cierre provisional de obra.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:	**DEL CONTRATISTA:**
RICHARD ALEXANDER ACOSTA	**JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA**
Ingeniero Residente	**Ingeniero Residente**
Firma, Nombre y Cargo	Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

106	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**miércoles, 11 de junio de 2025**
DIA N°:		**541**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	3	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	2	Auxiliar SST y Social
	1	Topógrafo Inspector
	3	Maestro de obra
	7	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	1	Cuadrilla de soldadores y armadores
	2	Operador de maquinaria amarilla
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	2	Vehículo de apoyo
	2	Generador eléctrico diésel
	Gl	Equipo y Herramienta menor
	1	Montacarga Cap. 3 ton.
	1	Auto Grúa Telescópica Cap. 23 ton.

CLIMA:	Seco

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante la ANI para la aprobación de las pólizas del proyecto y ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ Se continua la actividad de armado del puente acorde con planos de taller y procedimientos de izaje en terreno de cuerdo con la disponibilidad de espacio para maniobras y soldadura de elementos estructurales dispuestos en patio. _ Se avanza con las obras civiles para la terminación y remate de muros en ladrillo y construcción de tapas para los pozos de inspección de la red de alcantarillado pluvial y de aguas servidas dispuestos sobre la calzada norte (Eje 2) de la calle 59 en el sector de Postobón. _ En coordinación con el personal del Alumbrado Publico, se procede con la adecuación de la canalización que llega a la caja de inspección dispuesta en el separador central (K0+210) según lo acordado entre las partes. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas que irrespetan el cierre provisional de obra.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:	DEL CONTRATISTA:
RICHARD ALEXANDER ACOSTA	JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente	Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo	Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

107	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**jueves, 12 de junio de 2025**
DIA N°:		**542**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	2	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	2	Auxiliar SST y Social
	1	Topógrafo Inspector
	3	Maestro de obra
	6	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	1	Inspector pruebas en soldadura
	1	Cuadrilla de soldadores y armadores
	2	Operador de maquinaria amarilla
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	2	Vehículo de apoyo
	2	Generador eléctrico diésel
	Gl	Equipo y Herramienta menor
	1	Montacarga Cap. 3 ton.
	1	Auto Grúa Telescópica Cap. 23 ton.

CLIMA:	Nublado en la mañana y soleado resto de día

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante la ANI para la aprobación de las pólizas del proyecto y ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ Se continua la actividad de armado del puente acorde con planos de taller y procedimientos de izaje en terreno de cuerdo con la disponibilidad de espacio para maniobras y soldadura de elementos estructurales dispuestos en patio. Se practican pruebas sobre la soldadura realizada en campo en desarrollo del control de calidad correspondiente. _ Se avanza con las obras civiles para la terminación y remate de muros en ladrillo y construcción de tapas para los pozos de inspección de la red de alcantarillado pluvial y de aguas servidas dispuestos sobre la calzada norte (Eje 2) de la calle 59 en el sector de Postobón. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas que irrespetan el cierre provisional de obra.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:	DEL CONTRATISTA:
RICHARD ALEXANDER ACOSTA	JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente	**Ingeniero Residente**
Firma, Nombre y Cargo	Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

108	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**viernes, 13 de junio de 2025**
DIA N°:		**543**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	3	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	2	Auxiliar SST y Social
	1	Topógrafo Inspector
	3	Maestro de obra
	7	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	1	Inspector pruebas en soldadura
	1	Cuadrilla de soldadores y armadores
	2	Operador de maquinaria amarilla
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	2	Vehículo de apoyo
	2	Generador eléctrico diésel
	Gl	Equipo y Herramienta menor
	1	Montacarga Cap. 3 ton.
	1	Auto Grúa Telescópica Cap. 23 ton.

CLIMA:	Soleado

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante la ANI para la aprobación de las pólizas del proyecto y ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ Se continua la actividad de armado del puente acorde con planos de taller y procedimientos de izaje en terreno de cuerdo con la disponibilidad de espacio para maniobras y soldadura de elementos estructurales dispuestos en patio. Se practican pruebas sobre la soldadura realizada en campo en desarrollo del control de calidad correspondiente. _ Se avanza con las obras civiles para la terminación y remate de muros en ladrillo y construcción de tapas para los pozos de inspección de la red de alcantarillado pluvial y de aguas servidas dispuestos sobre la calzada norte (Eje 2) de la calle 59 en el sector de Postobón. Se realiza la debida protección de la rejilla en cajas de sumideros sobre la carrera 2este con calle 59. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas que irrespetan el cierre provisional de obra.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:

RICHARD ALEXANDER ACOSTA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

DEL CONTRATISTA:

JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

109	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**sábado, 14 de junio de 2025**
DIA N°:		**544**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	2	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	2	Auxiliar SST y Social
	0	Topógrafo Inspector
	2	Maestro de obra
	5	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	1	Inspector pruebas en soldadura
	1	Cuadrilla de soldadores y armadores
	2	Operador de maquinaria amarilla
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	2	Generador eléctrico diésel
	Gl	Equipo y Herramienta menor
	1	Montacarga Cap. 3 ton.
	1	Auto Grúa Telescópica Cap. 23 ton.

CLIMA:	Soleado

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante la ANI para la aprobación de las pólizas del proyecto y ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ Se continua la actividad de armado del puente acorde con planos de taller y procedimientos de izaje en terreno de cuerdo con la disponibilidad de espacio para maniobras y soldadura de elementos estructurales dispuestos en patio. Se practican pruebas sobre la soldadura realizada en campo en desarrollo del control de calidad correspondiente. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas que irrespetan el cierre provisional de obra.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:

RICHARD ALEXANDER ACOSTA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

DEL CONTRATISTA:

JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

110	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**domingo, 15 de junio de 2025**
DIA N°:		**545**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	2	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	2	Auxiliar SST y Social
	0	Topógrafo Inspector
	0	Maestro de obra
	1	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	0	Inspector pruebas en soldadura
	1	Cuadrilla de soldadores y armadores
	0	Operador de maquinaria amarilla
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	2	Generador eléctrico diésel
	Gl	Equipo y Herramienta menor
	1	Montacarga Cap. 3 ton.
	1	Auto Grúa Telescópica Cap. 23 ton.

CLIMA:	Soleado

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante la ANI para la aprobación de las pólizas del proyecto y ante la Gobernación de Boyacá para el desembolso del anticipo de acuerdo con la clausula QUINTA del Convenio Interadministrativo 1940 de 2025. _ Se continua la actividad de soldaduras para armado del puente acorde con planos de taller. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas que irrespetan el cierre provisional de obra.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:

RICHARD ALEXANDER ACOSTA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

DEL CONTRATISTA:

JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

111	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**lunes, 16 de junio de 2025**
DIA N°:		**546**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	2	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	2	Auxiliar SST y Social
	1	Topógrafo Inspector
	2	Maestro de obra
	6	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	1	Inspector pruebas en soldadura
	1	Cuadrilla de soldadores y armadores
	1	Operador de maquinaria amarilla
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	2	Generador eléctrico diésel
	Gl	Equipo y Herramienta menor
	1	Auto Grúa Telescópica Cap. 23 ton.

CLIMA:	Seco

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante la ANI en espera de respuesta para la aprobación de las pólizas del proyecto. _ En este día se continúan los trabajos de armado y soldaduras del puente de luz 30m, de acuerdo en un todo con los planos de diseño. Con corte al día domingo 15 de junio de2025, se tiene un avance del 50% con armado y soldaduras de vigas cajón y vigas transversales y del 40% con armado y soldadura de viguetas longitudinales. Hoy se da comienzo con la instalación y soldadura de las platinas de refuerzo inferior en intersecciones de la viga transversal del eje 19 con las cinco viguetas longitudinales. _Hoy se continua la excavación y demolición de pavimento junto con la instalación de formaleta para la construcción de tapas superiores sobre los cinco pozos de inspección de la red pluvial y sanitaria de la calzada norte en calle 59, sector de Postobón; así mismo, se inicia intervención de la tapa para la cámara de inspección existente al final del box-coulvert que atraviesa la carrera 2este con calle 59. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas que irrespetan el cierre provisional de obra.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:

RICHARD ALEXANDER ACOSTA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

DEL CONTRATISTA:

JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

112	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**martes, 17 de junio de 2025**
DIA N°:		**547**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	3	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	2	Auxiliar SST y Social
	1	Topógrafo Inspector
	2	Maestro de obra
	7	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	1	Inspector pruebas en soldadura
	1	Cuadrilla de soldadores y armadores
	1	Operador de maquinaria amarilla
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	2	Generador eléctrico diésel
	Gl	Equipo y Herramienta menor
	1	Auto Grúa Telescópica Cap. 23 ton.

CLIMA:	Soleado durante la mayor parte del día y lluvias moderadas a fuertes al final de la jornada de trabajo

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante la ANI en espera de respuesta para la aprobación de las pólizas del proyecto. _ Se da continuidad con las labores de posicionamiento, izaje, soldaduras y demás maniobras para el armado de la superestructura del puente de luz 30m., de acuerdo en un todo con los planos de diseño. _ Con trabajos de mano de obra se logra un importante avance en el corte, figurado, instalación y amarre del acero de refuerzo sobre la formaleta para la construcción de tapas sobre los cinco pozos de inspección de la red pluvial y sanitaria de la calzada norte en calle 59, sector de Postobón; así mismo, se culmina la excavación encontrándose la placa existente sobre la cámara de inspección ubicada al final del box-coulvert que atraviesa la carrera 2este con calle 59. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas que irrespetan el cierre provisional de obra.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:

RICHARD ALEXANDER ACOSTA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

DEL CONTRATISTA:

JAVIER MAURICIO RODIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

113	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**miércoles, 18 de junio de 2025**
DIA N°:		**548**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	3	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	2	Auxiliar SST y Social
	1	Topógrafo Inspector
	1	Maestro de obra
	7	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	1	Inspector pruebas en soldadura
	1	Cuadrilla de 3 soldadores y 2 armadores
	1	Operador de maquinaria amarilla
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	2	Generador eléctrico diésel
	Gl	Equipo y Herramienta menor
	1	Auto Grúa Telescópica Cap. 23 ton.
	1	Minicargador

CLIMA:	Soleado

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante la ANI en espera de respuesta para la aprobación de las pólizas del proyecto. _ Se da continuidad con las labores de posicionamiento, izaje, soldaduras y demás maniobras para el armado de la superestructura del puente de luz 30m., de acuerdo en un todo con los planos de diseño. Ya se cuenta con las vigas cajón en su posición estructural y se avanza con las vigas transversales continuando con las viguetas longitudinales, respectivamente. _ De acuerdo con el cronograma de actividades, el día de hoy se prepara en obra y en cuantías menores, la mezcla de concreto para la tapa sobre los cinco pozos de inspección de la red pluvial y sanitaria de la calzada norte en calle 59, sector de Postobón. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas que irrespetan el cierre provisional de obra.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:	**DEL CONTRATISTA:**
RICHARD ALEXANDER ACOSTA	**JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA**
Ingeniero Residente	**Ingeniero Residente**
Firma, Nombre y Cargo	Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

114	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**jueves, 19 de junio de 2025**
DIA N°:		**549**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	3	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	2	Auxiliar SST y Social
	1	Topógrafo Inspector
	1	Maestro de obra
	7	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	1	Inspector pruebas en soldadura
	1	Cuadrilla de 4 soldadores y 3 armadores
	1	Operador de maquinaria amarilla
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	2	Generador eléctrico diésel
	Gl	Equipo y Herramienta menor
	1	Auto Grúa Telescópica Cap. 23 ton.
	1	Minicargador

CLIMA:	Soleado gran parte del día con presencia de lluvias leves hacia el medio día y comienzo de la tarde

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante la ANI en espera de respuesta ante solicitud de la aprobación de las pólizas del proyecto. _ Se da continuidad con las labores de posicionamiento, izaje, soldaduras y demás maniobras para el armado de la superestructura del puente de luz 30m., de acuerdo en un todo con los planos de diseño. Ya se cuenta con las vigas transversales en su posición estructural y se avanza con las viguetas longitudinales, respectivamente. _ De acuerdo con el cronograma de actividades, el día de hoy se realiza el corte, figurado, instalación y amarre del acero de refuerzo y a su vez, se prepara en obra y en cuantías menores, la mezcla de concreto para la tapa sobre la cámara de inspección ubicada al final del box-coulvert en la Cra 2este, sector de Postobón. Así mismo, se intervienen los pozos de inspección construidos sobre la zona de anden del espacio publico, tanto en el sector de Hayuelos, como en el sector de Postobón. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas que irrespetan el cierre provisional de obra.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:	DEL CONTRATISTA:
RICHARD ALEXANDER ACOSTA	JAVIER MAURICIO RODIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente	Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo	Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

115	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**viernes, 20 de junio de 2025**
DIA N°:		**550**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	3	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	2	Auxiliar SST y Social
	1	Topógrafo Inspector
	1	Maestro de obra
	7	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	1	Inspector pruebas en soldadura
	1	Cuadrilla de 3 soldadores y 3 armadores
	1	Operador de maquinaria amarilla
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	2	Generador eléctrico diésel
	Gl	Equipo y Herramienta menor
	1	Auto Grúa Telescópica Cap. 23 ton.
	1	Minicargador

CLIMA:	Seco

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante la ANI en espera de respuesta ante solicitud de la aprobación de las pólizas del proyecto. _ Se da continuidad con las labores de posicionamiento, izaje, soldaduras y demás maniobras para el armado de la superestructura del puente de luz 30m., de acuerdo en un todo con los planos de diseño. Ya se cuenta con el armado completo de la superestructura del puente de luz 30m, con lo cual se concentran las labores en la soldadura de todos y cada uno de los elementos estructurales como vigas y viguetas, así como de sus elementos complementarios (platinas de refuerzo). Al final de la jornada se retira de obra el equipo auto grúa. _ Se continúan las labores de adecuación, terminación, remates e instalación de formaleta para fundir la tapa de los pozos de inspección ubicados en el anden del espacio publico, tanto en el sector de Hayuelos, como en el sector de Postobón. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas que irrespetan el cierre provisional de obra.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:

RICHARD ALEXANDER ACOSTA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

DEL CONTRATISTA:

JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

116	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS NIT.: 901.725.176-8 CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2 NIT.: 901.728.023-3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**sábado, 21 de junio de 2025**
DIA N°:		**551**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	2	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	2	Auxiliar SST y Social
	0	Topógrafo Inspector
	0	Maestro de obra
	4	Ayudantes de construcción
	1	Conductor vehículo de apoyo
	1	Inspector pruebas en soldadura
	1	Cuadrilla de 3 soldadores y 3 armadores
	0	Operador de maquinaria amarilla
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	2	Generador eléctrico diésel
	Gl	Equipo y Herramienta menor
	1	Minicargador

CLIMA:	Seco

ACTIVIDADES DIARIAS:	_ La Entidad Contratante avanza en su etapa final con la gestión y trámites ante la ANI en espera de respuesta ante solicitud de la aprobación de las pólizas del proyecto. _ Se da continuidad con las labores de soldaduras para el armado de la superestructura del puente de luz 30m. _ Se garantiza por parte del Consorcio Hayuelos, la señalización y demarcación provisional de obra con miras a ofrecer la seguridad vial dentro del área a intervenir ante el paso NO AUTORIZADO de peatones, ciclistas y motociclistas que irrespetan el cierre provisional de obra.

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:

RICHARD ALEXANDER ACOSTA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

DEL CONTRATISTA:

JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

BITACORA DE OBRA - TOMO 2

117	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA** **NIT.: 891.800.846-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS** **NIT.: 901.725.176-8** **CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO TUNJA JI 2** **NIT.: 901.728.023-3** **CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1639 DE 2023**

FECHA:		**domingo, 22 de junio de 2025**
DIA N°:		**552**
PERSONAL DEL CONTRATISTA:	1	Director de Obra
	2	Residente de Obra
	1	Ingeniero Ambiental y SST
	2	Auxiliar SST y Social
	0	Topógrafo Inspector
	0	Maestro de obra
	0	Ayudantes de construcción
	0	Conductor vehículo de apoyo
	0	Inspector pruebas en soldadura
	0	Cuadrilla de 3 soldadores y 3 armadores
	0	Operador de maquinaria amarilla
	1	Vigilancia 24/7
MAQUINARIA Y EQUIPO:	1	Vehículo de apoyo
	2	Generador eléctrico diésel
	Gl	Equipo y Herramienta menor
	1	Minicargador

CLIMA:	NO APLICA

ACTIVIDADES DIARIAS:	SIN (DIA DOMINICAL)

FIRMAS RESPONSABLES DE LA OBRA

DE INTERVENTORIA:

RICHARD ALEXANDER ACOSTA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

DEL CONTRATISTA:

JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA
Ingeniero Residente
Firma, Nombre y Cargo

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1557 de 2023

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA-BOYACÁ

INFORME ACTA PARCIAL DE OBRA 07 - PMT

PRESENTADO POR


CONSORCIO HAYUELOS

PRESENTADO A:

MUNICIPIO DE TUNJA

03 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DE 2025

CONTROL DE DOCUMENTOS

ESTADO, REVISIÓN Y APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORO:	Ing. Javier Mauricio Rodriguez Rivera M.P: 2520237285 CND CONSORCIO HAYUELOS	Residente de Obra	
REVISO:	Ing. Luis Fernando Mesa Ballesteros CONSORCIO HAYUELOS	Director de Obra	
APROBO:	Ing. Richard Alexander Acosta M.P. 25202-094562 CND CONSORCIO TUNJA JI 2	Residente Interventoría	

MODIFICACIONES

FECHA	VERSIÓN	DESCRIBCION DE LA MODIFICACION
Mayo 2025	**0**	

1. INTRODUCCION

El contrato N.º **1557 de 2023.**, cuyo objeto es la **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.**

Se implementa los procedimientos para la implementación de medidas de seguridad vial, durante el tiempo del proceso constructivo de la vía **CALLE 59 ENTRE LA AV. UNIVERSITARIA Y LA ANTIGUA VÍA A PAIPA**, en el municipio de Tunja (Boyacá); por lo cual se debe acatar lo aquí dispuesto por todos los implicados desde las autoridades, contratista, personal de obra y comunidad en general. Adicionalmente se debe verificar y ajustar periódicamente según se requiera durante el tiempo que dure la obra y debe hacerse por un especialista en el tema ajustándose a la normatividad vigente para garantizar las disposiciones existentes y el compromiso de los implicados en el tema como se evidencia a través del registro fotográfico.

Como es de conocimiento de las partes, para el desarrollo del proyecto descrito en el asunto de la presente, se implementó el PMT el cual fue aprobado por secretaria de movilidad e interventoría, la implementación y desarrollo del PMT se comenzó en obra a partir del día 05 de septiembre de 2023 a la fecha, realizando un ajuste el 20 de Marzo de 2024, mejorando de este forma la correcta señalización en óptimas condiciones, de igual forma, contamos con el personal de manejo de tráfico (controlador vial) en las labores de ejecución de la obra.

Todas las señales verticales que se utilizan durante la ejecución de la obra son reflectivas utilizando láminas para este fin, adicionalmente se utiliza cinta de señalización denominada cinta peligro como parte integral de la señalización para indicar zonas de peligro.

2. REGISTRO FOTOGRAFICO


 Utilización de maletines sector Postobón al ingreso de la obra Carrera 2 este	 Utilización de maletines sector Postobón al ingreso de la obra Carrera 2 este
 Utilización de maletines en el paso nivel de la vía férrea	 Utilización de maletines en el paso nivel de la vía férrea
 Utilización de maletines – Sector Hayuelos	 Utilización de maletines – Sector Hayuelos



Utilización de maletines – Sector Hayuelos Avenida Universitaria Calle 59



Utilización de maletines – Sector Hayuelos Avenida Universitaria Calle 59

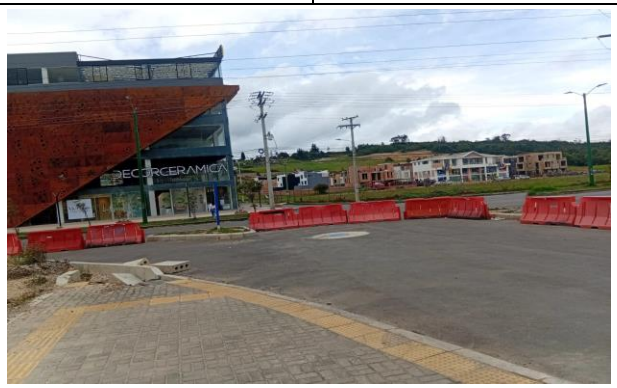

Utilización de maletines – Sector Hayuelos Avenida Universitaria Calle 59


Registro Fotográfico: Se realiza registro fotográfico con el fin de establecer las condiciones actuales de cada frente donde se evidencia que se continua con la ejecución del plan de manejo de tráfico siendo apoyado por la señalización implementada y demarcación

3. Conclusiones


Se continua con la ejecución del plan de transito como se puede ver en el registro fotográfico, realizando el respectivo verificación y mantenimiento necesaria al sistema de señalización comprendida por maletines, señales y demarcaciones de las zonas de tránsito a través del uso de la cinta de señalización de esta forma garantizando protección al personal de obra y comunidad.

Adicionalmente también se viene aplicando el plan de manejo de tránsito en las diferentes intervenciones realizada en las vías aledañas, así mismo las actividades que por su realización es necesario el paso de equipos o maquinaria, a través de maletines y controladores viales como se evidencia en el registro fotográfico, de esta forma se realiza una intervención segura.

ANEXO 1: ESQUEMA DE SEÑALIZACIÓN

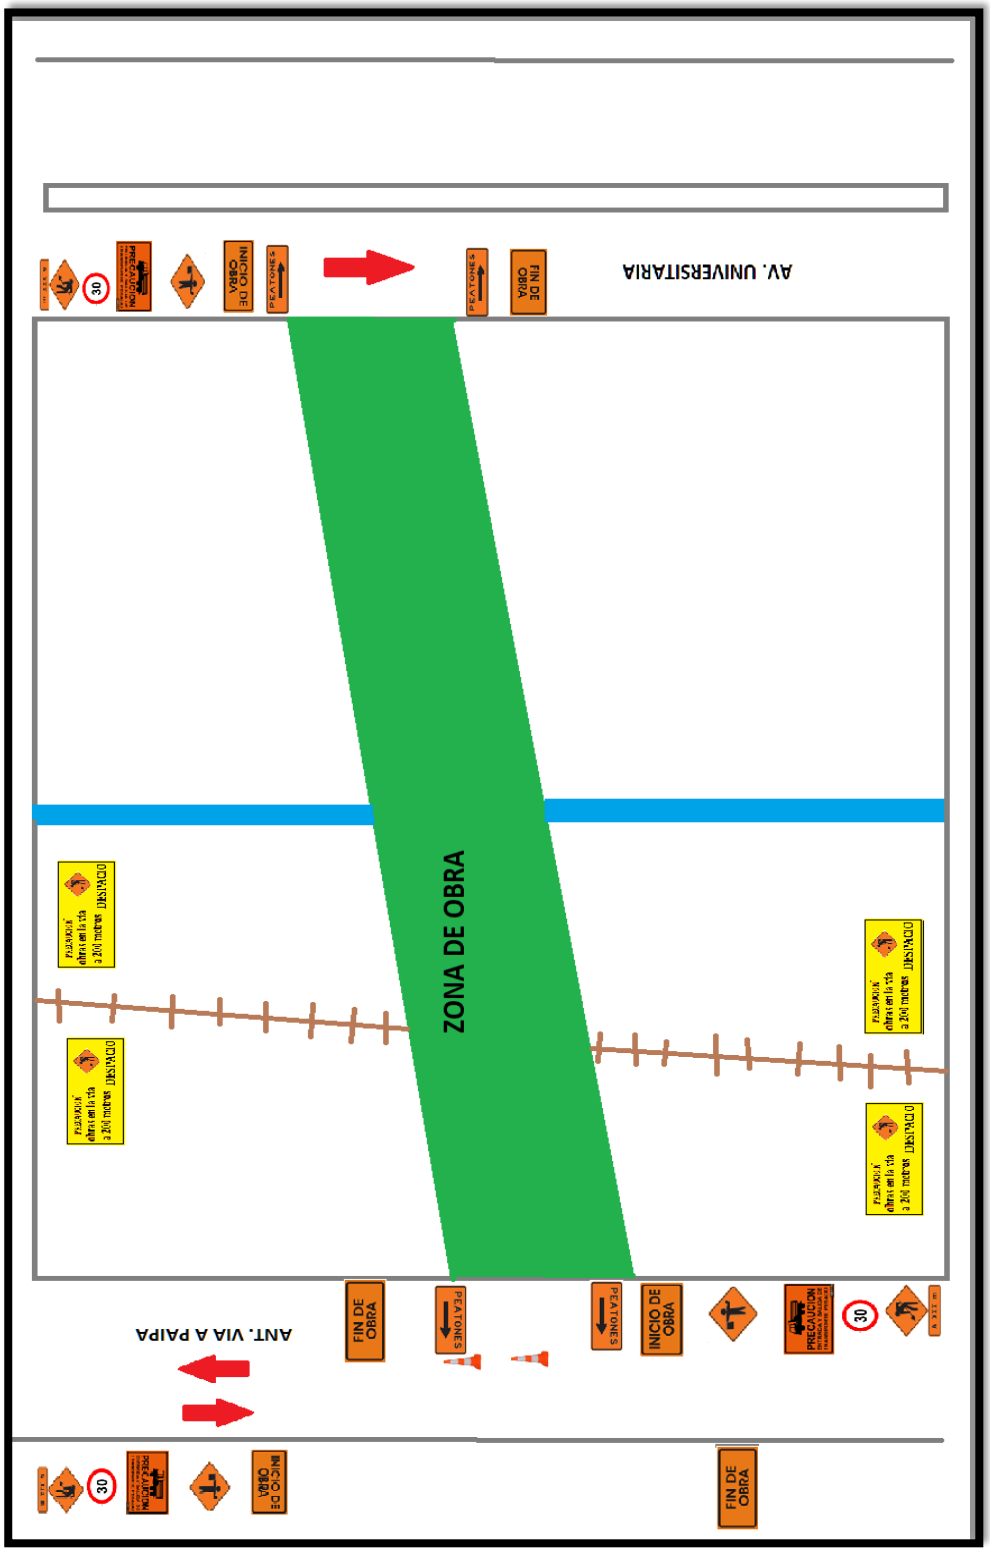

ANEXO 2: ESQUEMA DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

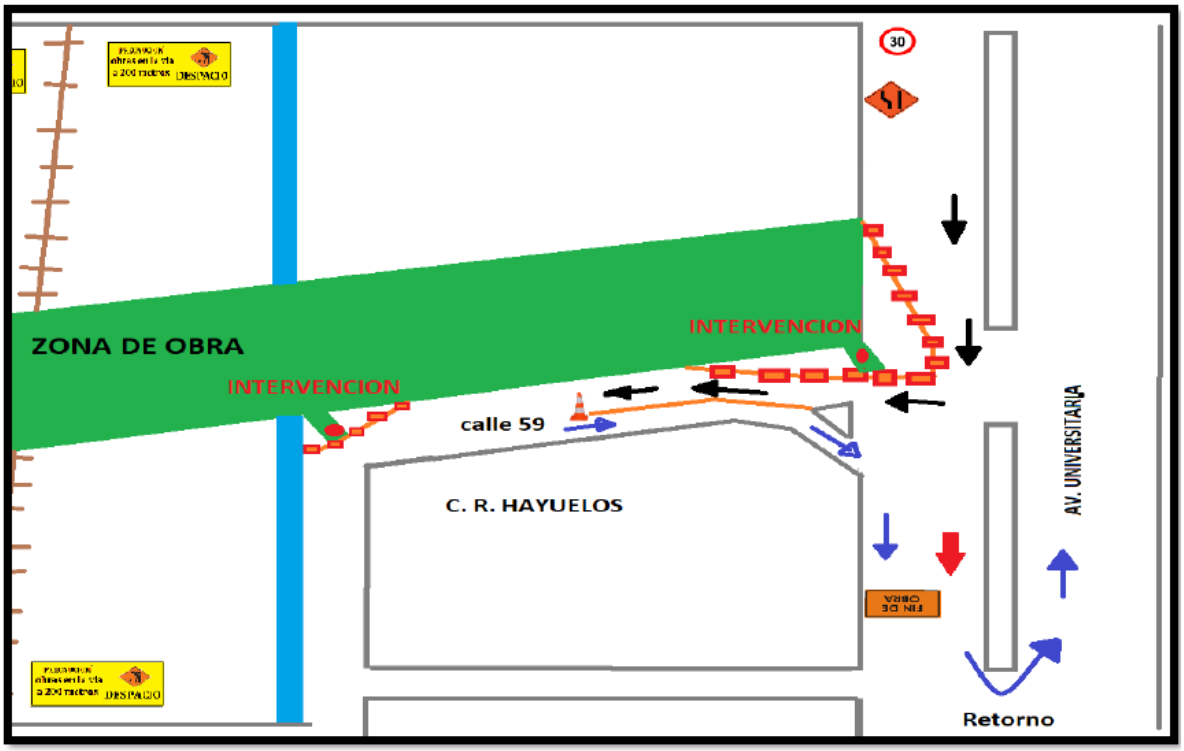

Tunja 20 de Junio de 2025

CERTIFICACIÓN:

El Consorcio Tunja JI 2 en su calidad de interventor mediante el contrato 1639 de 2023 informa que ha presentado las pólizas del contrato 1639 de 2023, conforme con la firma de la modificatoria No 3, se tiene la Póliza de Garantía M 100 202732 anexo 20 emitida por Seguros mundial:

Tabla 1 Relación Pólizas del Interventor

Póliza No	Amparo	Valor Requerido	Valor Asegurado	Vigencia Requerida	Vigencia Desde	Hasta
M 100 202732 anexo 20	Cumplimiento	20% Contrato	225.929.091.60	Plazo contrato y 6 meses mas	18/10/2024	18/09/2026
	Prestaciones sociales	20% Contrato	225.929.091.60	Plazo contrato y 3 años mas	18/10/2024	18/03/2029
	Calidad del Servicios	20% Contrato	225.929.091.60	5 años a partir del recibo de obra	18/03/2026	18/03/2031

Dichos documentos han sido presentados en el SECOP y se encuentran aprobadas por la unidad especial de contratación de Tunja en esta página

Atentamente



Richard Acosta Trochez
Residente de Interventoría
Cto. 1636 de 2023.

Bogotá D. C., Junio 12 de 2025

CONTROL DE EVASIÓN DE RECURSOS PARAFISCALES LEY 789 DE 2002, ART. 50.

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA PARA PERSONA JURÍDICA Y/O UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO

DIRIGIDA A:

ALCALDIA DE TUNJA

Yo, JORGE ELIECER PARRA SALINAS Identificado con cedula No 79.262.203 de Bogotá, obrando como representante legal de CONSORCIO TUNJA JI 2 con Nit. 901.728.023-3 y STIVEN DALADIER OCAMPO RAMIREZ Identificado con cedula No 1.020.799.650 de Bogotá, con tarjeta profesional 228747-T, actuando como Contador del Consorcio, CERTIFICO bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que la empresa ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación familiar.

De igual forma, bajo la ley 1607 de 2012 señaló en su artículo 8 "*...las sociedades, y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)...*"

De igual forma CERTIFICO que la empresa ha cumplido con las obligaciones de pagos a terceros derivados de salarios, contratos de prestaciones de servicios, suministros de materiales entre otros.

Por lo anterior, de manera expresa, por este escrito ACREDITO el pago de los aportes a que estoy obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia a la fecha, en particular los pagos realizados durante el periodo del 3 de Febrero del 2025 al 31 de mayo del 2025

Certifico que no hay saldos a mi cargo derivados de los aportes parafiscales y salarios a que estoy obligado de conformidad con las normas vigentes.



JORGE ELIECER PARRA SALINAS
Representante Legal
C. C. 79.262.203 de Bogotá.



STIVEN DALADIER OCAMPO RAMIREZ
Contador
C.C 1.020.799.650 de Bogotá
T.P 228747-T

Calle 125 N° 20 – 70 Oficina 602
Tel: (601)6129454 – 3112000648
Email: jpsingenieria@gmail.com
Bogotá D.C. – Republica de Colombia


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.020.799.650
OCAMPO RAMIREZ
APELLIDOS
STIVEN DALADIER
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1994
TOPAIPI
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
04-DIC-2012 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

228747-T



STIVEN DALADIER
OCAMPO RAMIREZ
C.C. 1020799650
RES. INSCRIPCION 417 DEL 19/05/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

233470 248564

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2092399B15CF2359

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **STIVEN DALADIER OCAMPO RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1020799650 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 228747-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Tunja 20 de Junio de 2025

CERTIFICACIÓN:

El Consorcio Tunja JI 2 en su calidad de interventor mediante el contrato 1639 de 2023 informa que el personal que se encuentra actualmente vinculado corresponde con las calidades exigidas en el pliego de condiciones del contrato 1639 de 2023, y se encontró disponible según las dedicaciones requeridas en el proyecto para las actividades realizadas en el periodo del del 20 de Mayo de 2025 al 19 de junio de 2025.

Atentamente



Richard Acosta Trochez
Residente de Interventoría
Cto. 1636 de 2023.

Tunja 20 de Junio de 2025

CERTIFICACIÓN:

El Consorcio Tunja JI 2 en su calidad de interventor mediante el contrato 1639 de 2023 informa que ha presentado las pólizas del contrato 1639 de 2023, conforme con la firma de la modificatoria No 3, se tiene la Póliza de Garantía M 100 202732 anexo 20 emitida por Seguros mundial:

Tabla 1 Relación Pólizas del Interventor

Póliza No	Amparo	Valor Requerido	Valor Asegurado	Vigencia Requerida	Vigencia Desde	Hasta
M 100 202732 anexo 20	Cumplimiento	20% Contrato	225.929.091.60	Plazo contrato y 6 meses mas	18/10/2024	18/09/2026
	Prestaciones sociales	20% Contrato	225.929.091.60	Plazo contrato y 3 años mas	18/10/2024	18/03/2029
	Calidad del Servicios	20% Contrato	225.929.091.60	5 años a partir del recibo de obra	18/03/2026	18/03/2031

Dichos documentos han sido presentados en el SECOP y se encuentran aprobadas por la unidad especial de contratación de Tunja en esta página

Atentamente



Richard Acosta Trochez
Residente de Interventoría
Cto. 1636 de 2023.
