CONSTRUCTIVIA S.A.S
CONSTRUCCIONES - CONSULTORÍA - INTERVENTORÍA Y ASESORIAS

Teléfonos
321 388 4497

Ubicación
cra 93#42g 20 sur - Bogotá
cra 6 # 5-18 otanche (Boyaca)

INFORME TÉCNICO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. MC-032-2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RED PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO DANUBIO Y URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.

OTANCHE- BOYACÁ

MAYO 2025

Email
mcconstrucivilessas@gmail.com
constructiviasas@gmail.com

CONSTRUCTIVIA S.A.S
CONSTRUCCIONES · CONSULTORIA · INTERVENTORIA Y ASESORIAS

Teléfonos
321 388 4497

Ubicación
cra 93#42g 20 sur - Bogotá
cra 6 # 5-18 otanche (Boyaca)

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 4
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 5
3. LOCALIZACIÓN 5
4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 6
Avance Técnico: 6
Avance Financiero: 7
5. CONCLUSIONES. 12
6. ANEXOS ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Email
mcconstrucivilessas@gmail.com
constructiviasas@gmail.com

CONSTRUCTIVIA S.A.S
CONSTRUCCIONES - CONSULTORÍA - INTERVENTORÍA Y ASESORÍAS

Teléfonos
321 388 4497

Ubicación
cra 93#42g 20 sur - Bogotá
cra 6 # 5-18 otanche (Boyaca)

TABLA DE ILUSTRACIONES.

Ilustración 1: Localización del proyecto. 6

INDICE DE TABLAS.

Tabla 1: Información Del Contrato. 5
Tabla 2: Avance Financiero. 7
Tabla 3: Presupuesto Final. 8

Email
mcconstrucivilessas@gmail.com
constructiviasas@gmail.com

CONSTRUCTIVIA S.A.S
CONSTRUCCIONES - CONSULTORIA - INTERVENTORIA Y ASESORIAS

Teléfonos
321 388 4497

Ubicación
cra 93#42g 20 sur - Bogotá
cra 6 # 5-18 otanche (Boyaca)

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe recopila las actividades desarrolladas a través de la ejecución del proyecto de, "CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RED PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO DANUBIO Y URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ". que tiene como objetivo primordial transformar y fortalecer la calidad de vida de los habitantes del municipio de Otanche.

Actualmente dentro de la jurisdicción del municipio de Otanche-Boyacá, especialmente en la cabecera municipal, en previa visita técnica realizada por funcionarios adscritos a la secretaria de Planeación e Infraestructura municipal a la red de recolección de aguas pluviales de la cabecera municipal se encontró la necesidad de cambio de la red existente para su funcionamiento en sitio, especialmente en: barrio Danubio en la Calle (3°), barrio Nuevo Horizonte en la Diagonal 3° y en la Calle 4. Se constato que muchos de los componentes de las redes de recolección de manejo de agua pluvial se encuentran ineficientes para su correcto funcionamiento, presentando fallas estructurales en sus tuberías, rellenos y cámaras, inclusive provocando algunas filtraciones superficiales, todo esto debido al cumplimiento de su vida útil, que en algún momento pueden generar inestabilidad del terreno y otras de estabilidad para las viviendas construidas y en el radio de acción de las zonas afectadas como para el buen estado de la transitabilidad de las vías.

Email
mcconstrucivilessas@gmail.com
constructiviasas@gmail.com

Teléfonos
321 388 4497

Ubicación
cra 93#42g 20 sur - Bogotá
cra 6 # 5-18 otanche (Boyaca)

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONVENIO		CONTRATO	X	TIPO	OBRA		
No. Contrato	MC-032-2025		Fecha de suscripción del contrato		DÍA	MES	AÑO
					08	05	2025
Objeto del Contrato:	**CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RED PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO DANUBIO Y URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.**						
Supervisor:	**ANDRY FABIAN JIMENEZ MENDEZ**						
Contratista:	**CONSTRUCTIVA S.A.S** Nit 901.558.363-2 **R/L LUISA FERNANDA SEDANO GONZALEZ** C.C 1.005.195.842 de Fusagasugá						

Fecha Acta de Iniciación:			Fecha Finalización		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
09	05	2025	02	06	2025

Valor inicial del contrato:	$38.980.006	**Valor Adición:** $00	
Valor total del Contrato:		$38.980.006	
Duración inicial del contrato:	VEINTICINCO (25) DIAS	**Prorroga según otro si No:** N/A	
Duración del contrato:	VEINTIUN (21) DÍAS		
Registro Presupuestal:	**No.**	**Código Presupuestal:**	**Denominación Presupuestal:**
	2025050800001	2.3.2.01.01.001.03.16.01	Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua

Tabla 1: Información Del Contrato.

3. LOCALIZACIÓN

Las actividades enmarcadas dentro del proyecto "CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RED PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO DANUBIO Y URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ" se desarrolló en el área urbana del municipio Otanche.

Email
mcconstrucivilessas@gmail.com
constructiviasas@gmail.com

Teléfonos
321 388 4497
g 20 sur - Bogotá
18 otanche (Boyaca)



Ilustración 1: Localización del proyecto.

4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

En cumplimiento al cronograma de obra a continuación, se relacionan y evidencian todas las actividades ejecutadas correspondientes al 100% de avance en la ejecución del contrato de obra MC-032-2025:

Avance Técnico:

- Se realizaron las siguientes actividades:
    - PUNTO 1:

        - Demolición, excavación e instalación de tubería hidrosanitaria (diámetro 8").
        - Construcción de cajas de inspección en ladrillo tolete común.
        - Instalación de tubería PVC (diámetro 6") tipo pesada.
        - Vaciado de concreto 2500PSI para andenes.

Email
mcconstrucivilessas@gmail.com
constructiviasas@gmail.com

Teléfonos
321 388 4497

Ubicación
cra 93#42g 20 sur - Bogotá
cra 6 # 5-18 otanche (Boyaca)

- PUNTO 2:

- Excavación de canal superficial.
- Vaciado de concreto de solado.
- Amarre y figurada de acero de 60000PSI para muros y placa de canal disipador abierto.
- Vaciado de concreto de 3000 PSI para canal disipador abierto.
- Construcción de cajas de inspección y recolección de aguas lluvias.
- Excavación e instalación de tubería PVC (diámetro 8").

- PUNTO 3:

- Excavación e instalación de tubería hidrosanitaria (diámetro 12") para conducción de agua lluvias.
- Excavación e instalación de tubería PVC (diámetro 6") para conducción de aguas lluvias.
- Construcción de poso de inspección para conducción de agua lluvias.
- Construcción de caja de inspección para recolección de agua lluvias.

Avance Financiero:

Establecido el contrato de obra por un valor de $38.980.006 se establecen los siguientes cobros dentro del contrato de obra No MC-032-2025:

Porcentaje de avance	Descripción	Valor	Estado
100%	Pago No. 1	$38.980.006	En cobro

Tabla 2: Avance Financiero.

Email
mcconstrucivilessas@gmail.com
constructiviasas@gmail.com

Teléfonos
321 388 4497

Ubicación
cra 42 # 20 sur - Bogotá
cra 6 # 5-18 otanche (Boyaca)

Se presentaron las siguientes condiciones del contrato las cuales se relacionan a continuación:

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION GENERAL	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. PRELIMINARES							**$ 309.144,00**
1.1	3.13.18	GOBERNACION	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	m²	17,06	$ 18.121,00	$ 309.144,00
2. CIMENTACIÓN Y DESAGUES							**$ 17.036.815,00**
2.1	1.02.05	GOBERNACION	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	und	1,00	$ 471.170,00	$ 471.170,00
2.2	1.02.04	GOBERNACION	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	und	1,00	$ 302.445,00	$ 302.445,00
2.3	1.02.03	GOBERNACION	CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO	und	3,00	$ 703.320,00	$ 2.109.960,00
2.4	1.02.17	GOBERNACION	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	m³	106,06	$50.905,00	$ 5.398.98400
2.5	1.02.36	GOBERNACION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=12" DRENAJE SIN FILTRO	ml	45,00	$112.412,00	$ 5.058.540,00
2.6	1.02.36	GOBERNACION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=8" DRENAJE SIN FILTRO	ml	24,10	$90.516,00	$ 2.181.436,00
2.7	1.06.41	GOBERNACION	TUBERIA DE 6`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	ml	20,00	$75.714,00	$ 1.514.280,00
3. CONCRETOS							**$ 6.547.080,00**
3.1	1.11.25	GOBERNACION	PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI	m²	22,29	$75..438,00	$ 1.681.513,00
3,2	1.02.01	GOBERNACION	BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)	m²	17,50	$35.505,00	$ 621.338,00
3,3	6.02.07	GOBERNACION	CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)	m³	7,68	$552.634,00	$ 4.244.229,00
4. OTROS							**$ 3.899.403,00**
4.1	2.05.04	GOBERNACION	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M , 2.0 < H < 2.5	Und	1,00	$3.232.085,00	$ 3.232.085,00
4,2	2.04.51	GOBERNACION	GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (16- 25 MM) DE CANTO RODADO.	m³	4,96	$134.540,00	$ 667.318,00
5. HIERRO.							**$ 1.734.714,00**
5,1	6.03.02	GOBERNACION	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	kg	252,80	$1.734.714,00	**$ 1.734.714,00**
6. CARPINTERIA METALICA							**$ 457.464,00**
6,1		PARTICULAR	REJILLA METALICA PARA CANAL (1,2MX0,60M)	UND	1,00	$457.464,00	$ 457.464,00
SUBTOTAL OBRAS							**$ 29.984.620,00**
			ADMINISTRACION				**$ 6.596.616,00**
			IMPREVISTOS				**$ 1.199.385,00**
			UTILIDAD				**$ 1.199.385,00**
			VALOR TOTAL				**$38.980.006,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	22,00%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	4,00%
	UTILIDAD	U=	4,00%
	TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	30,00%

Tabla 3: Presupuesto Final.


Email
mcconstrucivilessas@gmail.com
constructiviasas@gmail.com

CONSTRUCTIVIA S.A.S
CONSTRUCCIONES - CONSULTORÍA - INTERVENTORÍA Y ASESORÍAS

Teléfonos
321 388 4497

Ubicación
cra 93#42g 20 sur - Bogotá
cra 6 # 5-18 otanche (Boyaca)

A continuación, se presenta registro fotográfico con la descripción general de las actividades ejecutadas en el contrato de obra MC-032-2025.

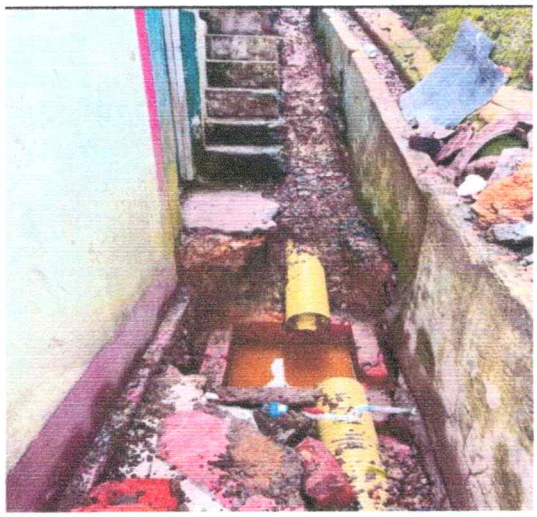Foto 1 	**Foto 2** 
Construcción de cajas de inspección.	*Excavación e instalación de tubería hidrosanitaria (diámetro 6") para conducción de agua pluvial.*
Foto 3 	Foto 4 
Excavación de material común.	*Instalación de tubería corrugada (diámetro 8") para conducción de aguas lluvias.*

Email
mcconstrucivilessas@gmail.com
constructiviasas@gmail.com

Teléfonos
321 388 4497


Foto 5 	Foto 6 
Amarre y figuarada de acero de 60000PSI para construccion de canal.	*Vaciado de concreto de 3000PSI para placa de canal.*
Foto 7 	Foto 8 
Encofrado y vaciado de concreto de 3000PSI para construccion de canal.	*Canal disipador para conducción de agua lluvias.*

Email
mcconstrucivilessas@gmail.com
constructiviasas@gmail.com

Foto 9 	Foto 10 
Construcción de caja de recolección de aguas lluvias.	*Construcción de caja de recolección de aguas lluvias..*
Foto 11 	Foto 12 
Excavación e instalación de tubería PVC (diámetro 12") para conducción de aguas lluvias	*Excavación e instalación de tubería PVC (diámetro 12") para conducción de aguas lluvias*

Teléfonos
321 388 4497

Ubicación
- Bogotá
ne (Boyaca)

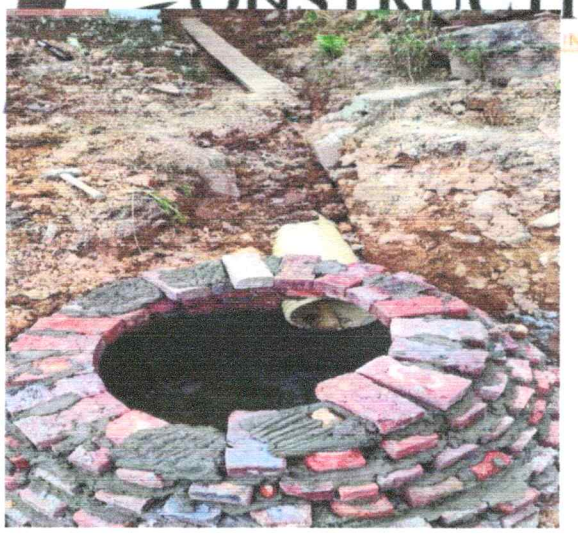Foto 13	Foto 14
	
Construcción de poso de inspección para condición de aguas lluvias.	*Excavación de material común.*

5. CONCLUSIONES.

- Se entregaron todas las obras a satisfacción, en los tiempos y condiciones contratadas, cumpliendo con lo establecido en el contrato de obra MC-032-2025.

Realizó:

29/05/2025

Luisa Fernanda Sedano
Representante Legal
Realizo y aprobó:

Email
mcconstrucivilessas@gmail.com
constructiviasas@gmail.com

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2		
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión

120

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

	Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	INCREMENTO X DISTANIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1. PRELIMINARES								**$ 309.144,00**
1	1.1	3.13.18	GOBERNACION	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	m^2	17,06		$ 18.121,00	$ 309.144,00
	2. CIMENTACIÓN Y DESAGUES								**$ 17.036.815,00**
4	2.1	1.02.05	GOBERNACION	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	und	1,00		$ 471.170,00	$ 471.170,00
5	2.2	1.02.04	GOBERNACION	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	und	1,00		$ 302.445,00	$ 302.445,00
	2.3	1.02.03	GOBERNACION	CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO	und	3,00		$ 703.320,00	$ 2.109.960,00
6	2.4	1.02.17	GOBERNACION	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	m^3	106,06		$ 50.905,00	$ 5.398.984,00
	2.5	1.02.36	GOBERNACION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=12" DRENAJE SIN FILTRO	ml	45,00		$ 112.412,00	$ 5.058.540,00
	2.6	1.02.36	GOBERNACION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=8" DRENAJE SIN FILTRO	ml	24,10		$ 90.516,00	$ 2.181.436,00
7	2.7	1.06.41	GOBERNACION	TUBERIA DE 6'' PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	ml	20,00		$ 75.714,00	$ 1.514.280,00
	3. CONCRETOS								**$ 6.547.080,00**
8	3.1	1.11.25	GOBERNACION	PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI	m^2	22,29		$ 75.438,00	$ 1.681.513,00
	3,2	1.02.01	GOBERNACION	BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)	m^2	17,50		$ 35.505,00	$ 621.338,00
9	3,3	6.02.07	GOBERNACION	CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)	m^3	7,68		$ 552.634,00	$ 4.244.229,00
	4. OTROS								**$ 3.899.403,00**
18	4.1	2.05.04	GOBERNACION	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M , 2.0 < H < 2.5	Und	1,00		$ 3.232.085,00	$ 3.232.085,00
	4,2	2.04.51	GOBERNACION	GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (16- 25 MM) DE CANTO RODADO.	m^3	4,96		$ 134.540,00	$ 667.318,00
	5. HIERRO.								**$ 1.734.714,00**
	5,1	6.03.02	GOBERNACION	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	kg	252,80		$ 6.862,00	$ 1.734.714,00
	6. CARPINTERIA METALICA								**$ 457.464,00**
21	6,1		PARTICULAR	REJILLA METALICA PARA CANAL (1,2MX0,60M)	UND	1,00		$ 457.464,00	$ 457.464,00

SUBTOTAL OBRAS	**$ 29.984.620,00**
ADMINISTRACION	**$ 6.596.616,40**
IMPREVISTOS	**$ 1.199.384,80**
UTILIDAD	**$ 1.199.384,80**
VALOR TOTAL	**$ 38.980.006,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.


NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION			PORCENTAJE
ADMINISTRACION		**A=**	22,00%
IMPREVISTO		**I=**	4,00%
UTILIDAD		**U=**	4,00%
TOTAL A.I.U		**A.I.U.=**	30,00%

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES	PROYECTO:		
		OBJETO:	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE RED PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO DANUBIO Y URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.	
ENTIDAD:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE - BOYACÁ	CONTRATISTA:	INTERVENTOR:	FECHA:
CAPITULO:	1. PRELIMINARES	CONSTRUCTIVIA S.A.S.	N/A	29/05/25
ITEM DE PAGO:	3.13.18			Hoja Nov. de 1

ITEM	UND	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Otanche Boyacá
1.1	m2	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO		

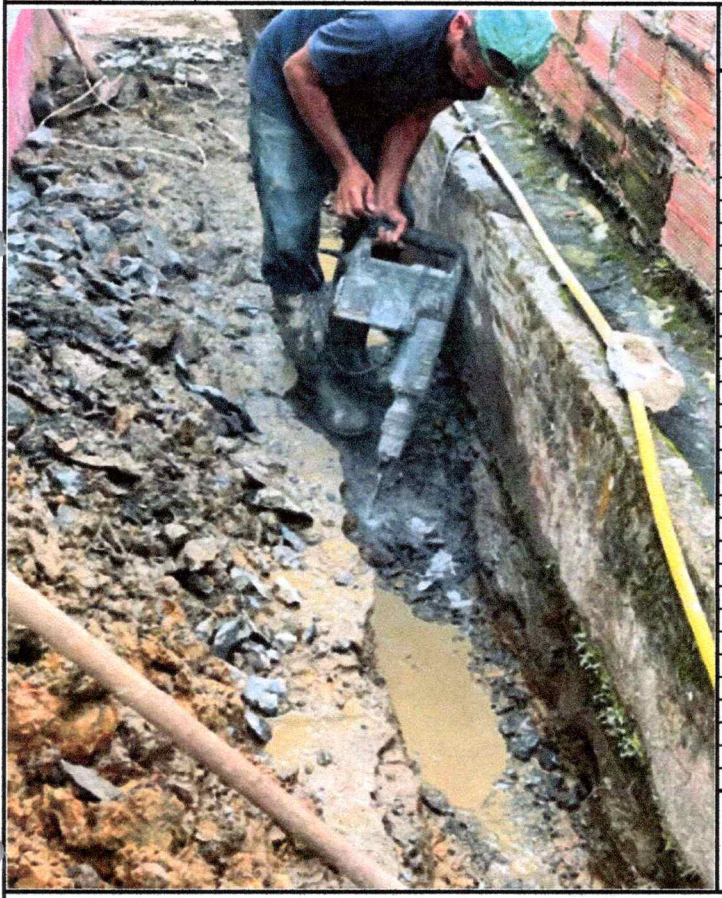


Localización	Dimensiones				OBSERVACION	Total
	No. Elem.	Largo	Ancho	Alto		
Andenes Calle 3 Barrio Danubio	1,00	37,90	0,45	-		17,06

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES	PROYECTO:		
		OBJETO:	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE RED PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO DANUBIO Y URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.	
ENTIDAD:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE - BOYACÁ	CONTRATISTA:	INTERVENTOR:	FECHA:
CAPITULO:	2. CIMENTACIÓN Y DESAGUES	CONSTRUCTIVIA S.A.S.	N/A	29/05/25
ITEM DE PAGO:	1.02.05			Hoja Nov. de 1

ITEM	UND	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Otanche Boyacá
2,1	und	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO		



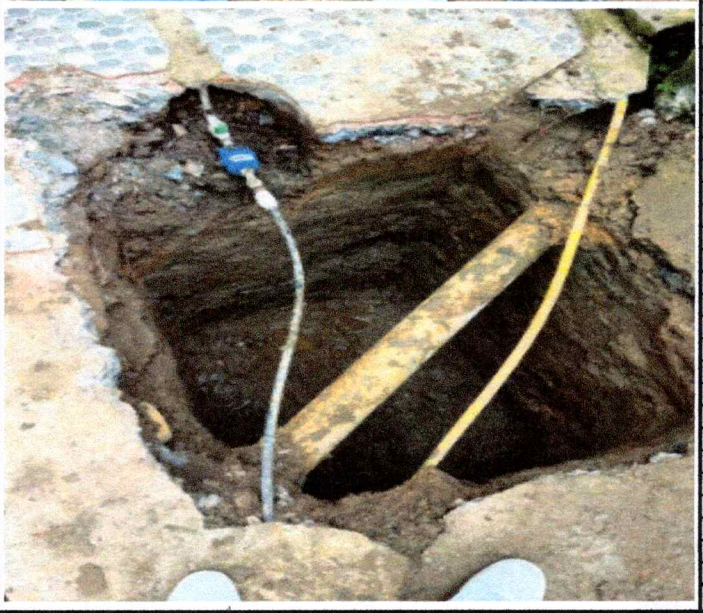

Localización	Dimensiones				OBSERVACION	Total
	No. Elem.	Largo	Ancho	Alto		
cajas de inspeccion Calle 3 Barrio Danubio	1,00	1,00	1,00			1,00
					TOTAL PRESENTE ACTA	1,00

EJECUTADO ACTA 1	-
EJECUTADO ACTA 2	-
EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,00

LUISA FERNANDA SEDANO G. CONTRATISTA	SEBASTIAN MELO C. RESIDENTE	Vo.Bo. PLANEACIÓN

Otanche - Boyacá

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES	PROYECTO:		
		OBJETO:	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE RED PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO DANUBIO Y URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.	
ENTIDAD:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE - BOYACÁ	CONTRATISTA:	INTERVENTOR:	FECHA:
CAPITULO:	2. CIMENTACIÓN Y DESAGUES	CONSTRUCTIVIA S.A.S.	N/A	29/05/25
ITEM DE PAGO:	1.02.04			Hoja Nov. de 1

ITEM	UND	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Otanche Boyacá
2,2	und	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO		



Localización	Dimensiones				OBSERVACION	Total
	No. Elem.	Largo	Ancho	Alto		
cajas de inspeccion Calle 3 Barrio Danubio	1,00	1,00	1,00			1,00
					TOTAL PRESENTE ACTA	1,00
					EJECUTADO ACTA 1	-
					EJECUTADO ACTA 2	-
					EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,00

LUISA FERNANDA SEDANO G. CONTRATISTA	SEBASTIAN MELO C. RESIDENTE	Vo Bo. PLANEACIÓN

Otanche - Boyacá

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES	PROYECTO:		
		OBJETO:	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE RED PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO DANUBIO Y URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.	
ENTIDAD:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE - BOYACÁ	CONTRATISTA:	INTERVENTOR:	FECHA:
CAPITULO:	2. CIMENTACIÓN Y DESAGUES	CONSTRUCTIVIA S.A.S.	N/A	29/05/25
ITEM DE PAGO:	1.02.03			Hoja Nov. de 1

ITEM	UND	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Otanche Boyacá
2,3	und	CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO		





Localización	Dimensiones				OBSERVACION	Total
	No. Elem.	Largo	Ancho	Alto		
Barrio Nuevo Horizonte Diagonal 3	2,00					2,00
Barrio Nuevo Horizonte Calle 4	1,00					1,00
					TOTAL PRESENTE ACTA	3,00

EJECUTADO ACTA 1	-
EJECUTADO ACTA 2	-
EJECUTADO PRESENTE ACTA	3,00

LUISA FERNANDA SEDANO G. CONTRATISTA	SEBASTIAN MELO C. RESIDENTE	Vo.Bo PLANEACIÓN

Otanche - Boyacá

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES	PROYECTO:			
		OBJETO:	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE RED PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO DANUBIO Y URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.		
ENTIDAD:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE - BOYACÁ	CONTRATISTA:		INTERVENTOR:	FECHA:
		CONSTRUCTIVIA S.A.S.		N/A	29/05/25
CAPITULO:	2. CIMENTACIÓN Y DESAGUES				Hoja Nov. de 1
ITEM DE PAGO:	1.02.17				

ITEM	UND	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Otanche Boyacá
2,4	m3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)		



Localización	Dimensiones				OBSERVACION	Total
	No. Elem.	Largo	Ancho	Alto		
Caja de inspeccion (80x80) Barrio Danubio calle 3	1,00	1,10	1,12	1,50		1,85
Caja de inspeccion (60x60) Barrio Danubio calle 3	1,00	1,50	0,90	0,60		0,81
Tuberia 8" tramo 1 Barrio Danubio calle 3	1,00	14,20	0,45	0,30		1,92
Tuberia 8" tramo 2 Barrio Danubio calle 3	1,00	6,70	0,50	1,00		3,35
Tuberia 6" tramo 1 Barrio Danubio calle 3	1,00	7,00	0,45	1,05		3,31
Tuberia 6" tramo 2 Barrio Danubio calle 3	1,00	10,00	0,45	0,65		2,93
Excavacion canal Barrio Nuevo Horizonte Diagonal 3	1,00	16,00	1,20	1,20		23,04
Excavacion Caja 1.2x1.2 Barrio Nuevo Horizonte Diagonal 3	2,00	1,40	1,50	1,50		6,30
Excavacion Corte de agua Barrio Nuevo Horizonte Diagonal 3	1,00	15,00	0,50	1,00		7,50
Excavacion de tuberia 12" Barrio Nuevo Horizonte calle 4	1,00	19,00	0,80	1,20		22,80
Excavacion de pozo Barrio Nuevo Horizonte calle 4	1,00	1,50	1,50	1,50		2,25
Excavacion de canal Barrio Nuevo Horizonte calle 4	1,00	1,50	1,50	1,00		1,50
Excavacion de tuberia 12" Barrio Nuevo Horizonte calle 4	1,00	19,00	1,00	1,50		28,50
					TOTAL PRESENTE ACTA	106,60

EJECUTADO ACTA 1	-
EJECUTADO ACTA 2	-
EJECUTADO PRESENTE ACTA	106,60

LUISA FERNANDA SEDANO G. CONTRATISTA	SEBASTIAN MELO C. RESIDENTE	Vo.Bo. PLANEACIÓN

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES	PROYECTO:		
		OBJETO:	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE RED PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO DANUBIO Y URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.	
ENTIDAD:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE - BOYACÁ	CONTRATISTA:	INTERVENTOR:	FECHA:
		CONSTRUCTIVIA S.A.S.	N/A	29/05/25
CAPITULO:	2. CIMENTACIÓN Y DESAGUES			Hoja Nov. de 1
ITEM DE PAGO:	1.02.36			

ITEM	UND	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Otanche Boyacá
2,5	ml	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=12" DRENAJE SIN FILTRO		



Localización	Dimensiones				OBSERVACION	Total
	No. Elem.	Largo	Ancho	Alto		
Barrio Nuevo Horizonte Diagonal 3	1,00	10,00				10,00
Barrio Nuevo Horizonte Calle 4	1,00	35,00				35,00
					TOTAL PRESENTE ACTA	45,00
					EJECUTADO ACTA 1	-
					EJECUTADO ACTA 2	-
					EJECUTADO PRESENTE ACTA	45,00


LUISA FERNANDA SEDANO G. CONTRATISTA	SEBASTIAN MELO C. RESIDENTE	Vo.Bo. PLANEACIÓN

Otanche - Boyacá

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES	PROYECTO:		
		OBJETO:	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE RED PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO DANUBIO Y URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.	
ENTIDAD:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE - BOYACÁ	CONTRATISTA:	INTERVENTOR:	FECHA:
		CONSTRUCTIVIA S.A.S.	N/A	29/05/25
CAPITULO:	2. CIMENTACIÓN Y DESAGUES			Hoja Nov. de 1
ITEM DE PAGO:	1.02.36			

ITEM	UND	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Otanche Boyacá
2,6	ml	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=8" DRENAJE SIN FILTRO		

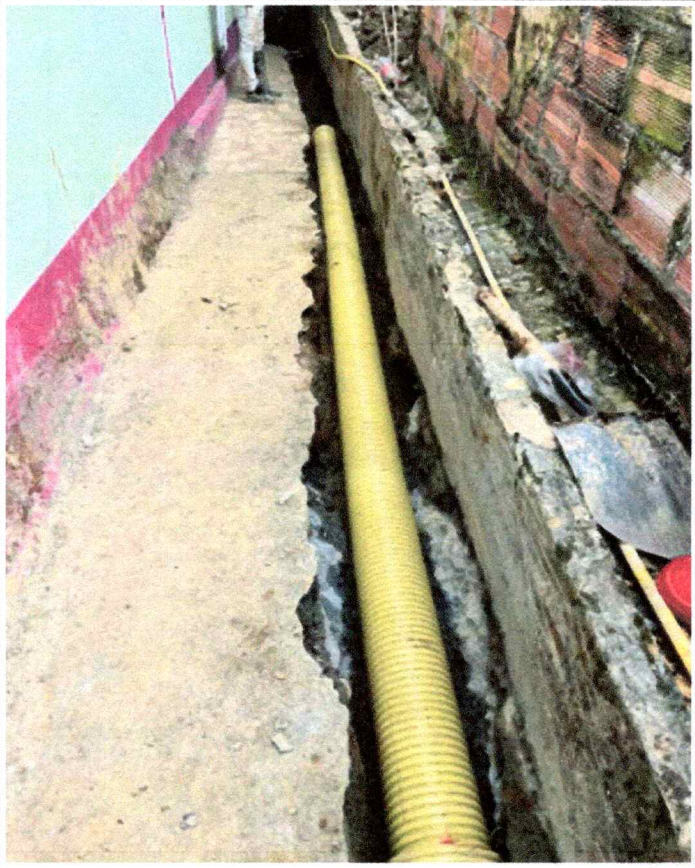


Localización	Dimensiones				OBSERVACION	Total
	No. Elem.	Largo	Ancho	Alto		
Barrio danubio calle 3	1,00	24,10				24,10

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES	PROYECTO:		
		OBJETO:	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE RED PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO DANUBIO Y URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.	
ENTIDAD:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE - BOYACÁ	CONTRATISTA:	INTERVENTOR:	FECHA:
		CONSTRUCTIVIA S.A.S.	N/A	29/05/25
CAPITULO:	2. CIMENTACIÓN Y DESAGUES			Hoja Nov. de 1
ITEM DE PAGO:	1.06.41			

ITEM	UND	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Otanche Boyacá
2,7	ml	TUBERIA DE 6`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION		

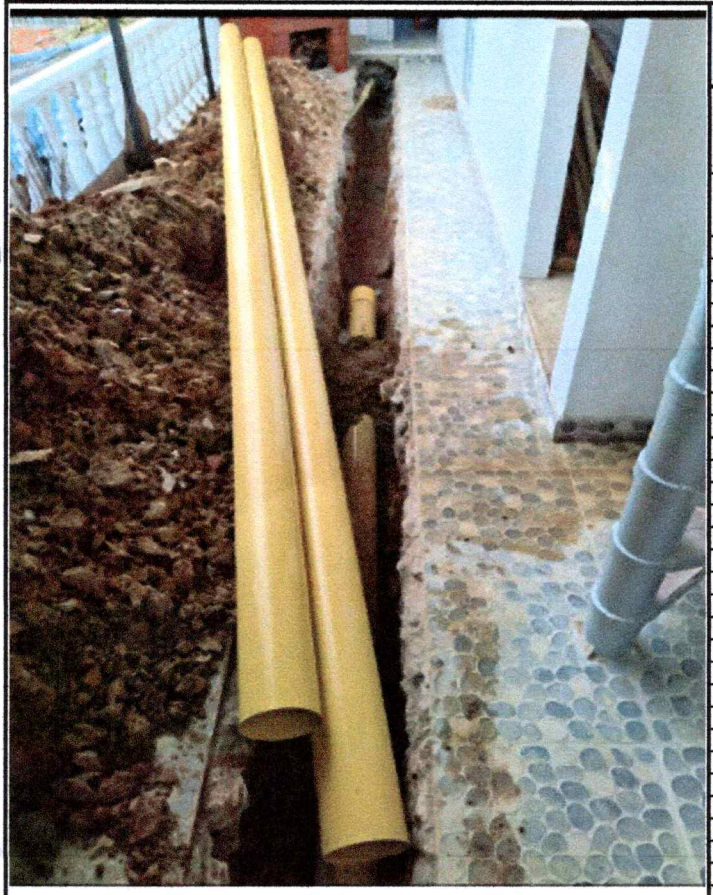

Localización	Dimensiones				OBSERVACION	Total
	No. Elem.	Largo	Ancho	Alto		
Barrio danubio calle 3	1,00	20,00				20,00
					TOTAL PRESENTE ACTA	20,00

EJECUTADO ACTA 1	-
EJECUTADO ACTA 2	-
EJECUTADO PRESENTE ACTA	20,00

LUISA FERNANDA SEDANO G. CONTRATISTA	SEBASTIAN MELO C. RESIDENTE	Vo.Bo. PLANEACIÓN

Otanche - Boyacá

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES	PROYECTO:		
		OBJETO:	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE RED PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO DANUBIO Y URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.	
ENTIDAD:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE - BOYACÁ	CONTRATISTA:	INTERVENTOR:	FECHA:
CAPITULO:	2. CIMENTACIÓN Y DESAGUES	CONSTRUCTIVIA S.A.S.	N/A	29/05/25
ITEM DE PAGO:	1.11.25			Hoja Nov. de 1

ITEM	UND	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Otanche Boyacá
3,1	m2	PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI		



Localización	Dimensiones				OBSERVACION	Total
	No. Elem.	Largo	Ancho	Alto		
Barrio danubio calle 3	1,00	20,90	1,07	1,00		22,29
					TOTAL PRESENTE ACTA	22,29
					EJECUTADO ACTA 1	-
					EJECUTADO ACTA 2	-
					EJECUTADO PRESENTE ACTA	22,29


LUISA FERNANDA SEDANO G. CONTRATISTA	SEBASTIAN MELO C. RESIDENTE	Vo.Bo. PLANEACIÓN

Otanche - Boyacá

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES	PROYECTO:			
		OBJETO:	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE RED PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO DANUBIO Y URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.		
ENTIDAD:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE - BOYACÁ	CONTRATISTA:		INTERVENTOR:	FECHA:
		CONSTRUCTIVIA S.A.S.		N/A	29/05/25
CAPITULO:	2. CIMENTACIÓN Y DESAGUES				Hoja Nov. de 1
ITEM DE PAGO:	1.02.01				

ITEM	UND	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Otanche Boyacá
3,2	m2	BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)		

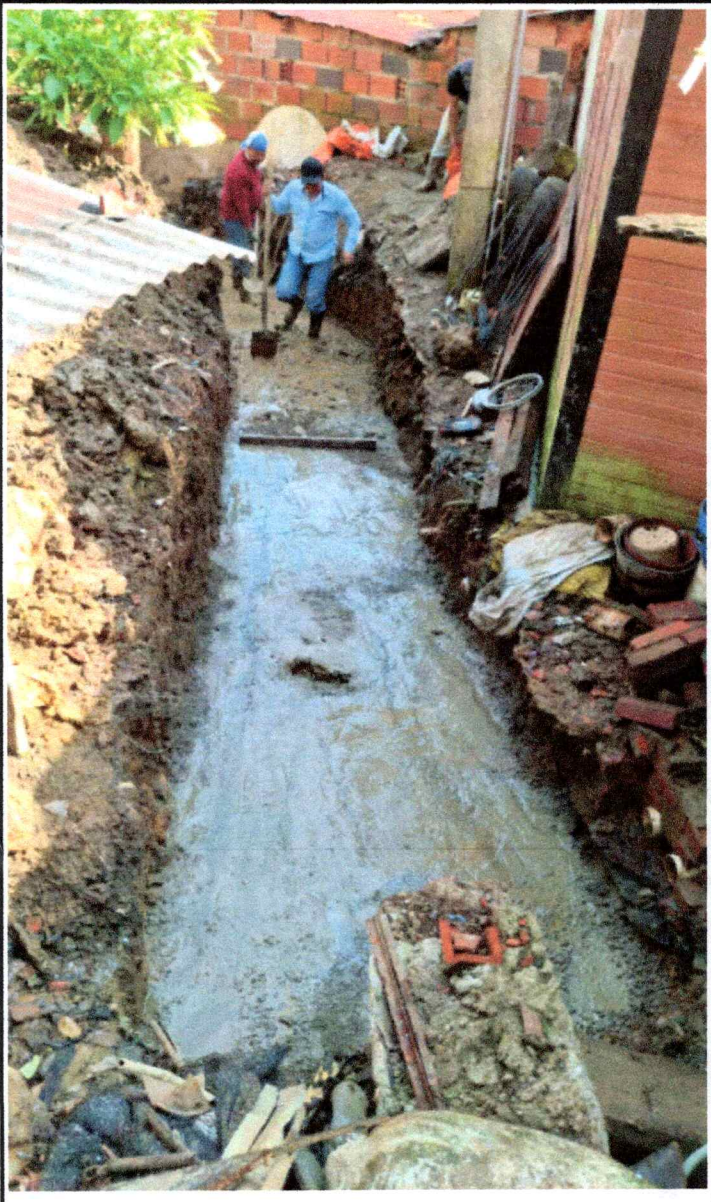

Localización	Dimensiones				OBSERVACION	Total
	No. Elem.	Largo	Ancho	Alto		
Concreto canal Bariio Nuevo Horizonte Diagonal 3	1,00	16,00	1,00	1,00		16,00
Concreto caja Bariio Nuevo Horizonte calle 4	1,00	1,50	1,00	1,00		1,50
					TOTAL PRESENTE ACTA	17,50
					EJECUTADO ACTA 1	-
					EJECUTADO ACTA 2	-
					EJECUTADO PRESENTE ACTA	17,50


LUISA FERNANDA SEDANO G. CONTRATISTA	SEBASTIAN MELO C. RESIDENTE	Vo.Bo. PLANEACIÓN

Otanche - Boyacá

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES	PROYECTO:			
		OBJETO:	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE RED PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO DANUBIO Y URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.		
ENTIDAD:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE - BOYACÁ	CONTRATISTA:		INTERVENTOR:	FECHA:
CAPITULO:	2. CIMENTACIÓN Y DESAGUES	CONSTRUCTIVIA S.A.S.		N/A	29/05/25
ITEM DE PAGO:	6.02.07				Hoja Nov. de 1

ITEM	UND	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Otanche Boyacá
3,3	m3	CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)		

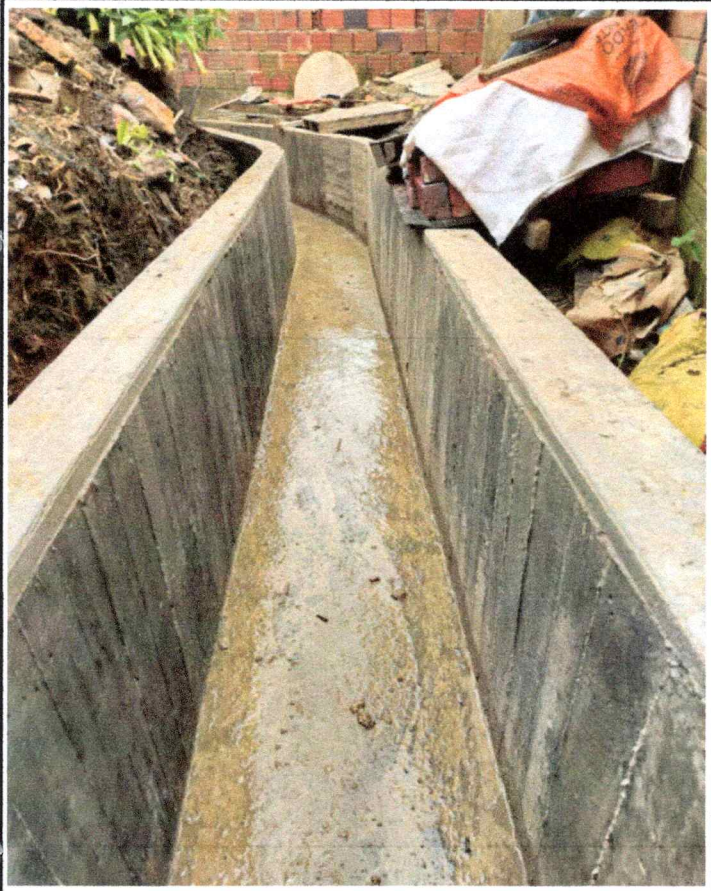

Localización	Dimensiones				OBSERVACION	Total
	No. Elem.	Largo	Ancho	Alto		
Concreto canal aletas Bariio Nuevo Horizonte Diagonal 3	2,00	16,00	0,15	1,00		4,80
Concreto canal placa Bariio Nuevo Horizonte Diagonal 3	1,00	16,00	0,90	0,15		2,16
Concreto placa Bariio Nuevo Horizonte calle 4	1,00	3,00	3,00	0,08		0,72
					TOTAL PRESENTE ACTA	7,68
					EJECUTADO ACTA 1	-
					EJECUTADO ACTA 2	-
					EJECUTADO PRESENTE ACTA	7,68


LUISA FERNANDA SEDANO G. CONTRATISTA	SEBASTIAN MELO C. RESIDENTE	Vo.Bo. PLANEACIÓN

Otanche - Boyacá

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES	PROYECTO:		
		OBJETO:	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE RED PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO DANUBIO Y URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.	
ENTIDAD:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE - BOYACÁ	CONTRATISTA:	INTERVENTOR:	FECHA:
		CONSTRUCTIVIA S.A.S.	N/A	29/05/25
CAPITULO:	4. OTROS			Hoja Nov. de 1
ITEM DE PAGO:	2.05.04			

ITEM	UND	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Otanche Boyacá
4,1	und	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M , 2.0 < H < 2.5		

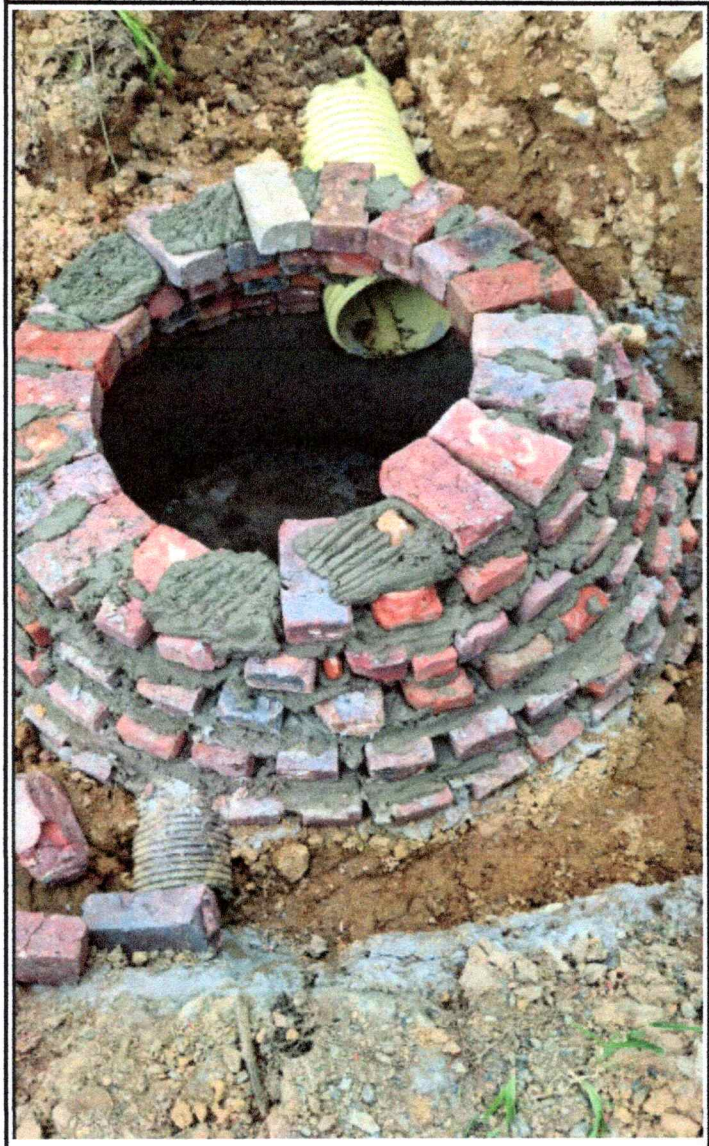


Localización	Dimensiones				OBSERVACION	Total
	No. Elem.	Largo	Ancho	Alto		
pozo de inspeccion Bariio Nuevo Horizonte calle 4	1,00					1,00

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES	PROYECTO:		
		OBJETO:	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE RED PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO DANUBIO Y URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.	
ENTIDAD:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE - BOYACÁ	CONTRATISTA:	INTERVENTOR:	FECHA:
		CONSTRUCTIVIA S.A.S.	N/A	29/05/25
CAPITULO:	4. OTROS			Hoja Nov. de 1
ITEM DE PAGO:	2.04.51			

ITEM	UND	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Otanche Boyacá
4,2	m3	GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (16- 25 MM) DE CANTO RODADO.		

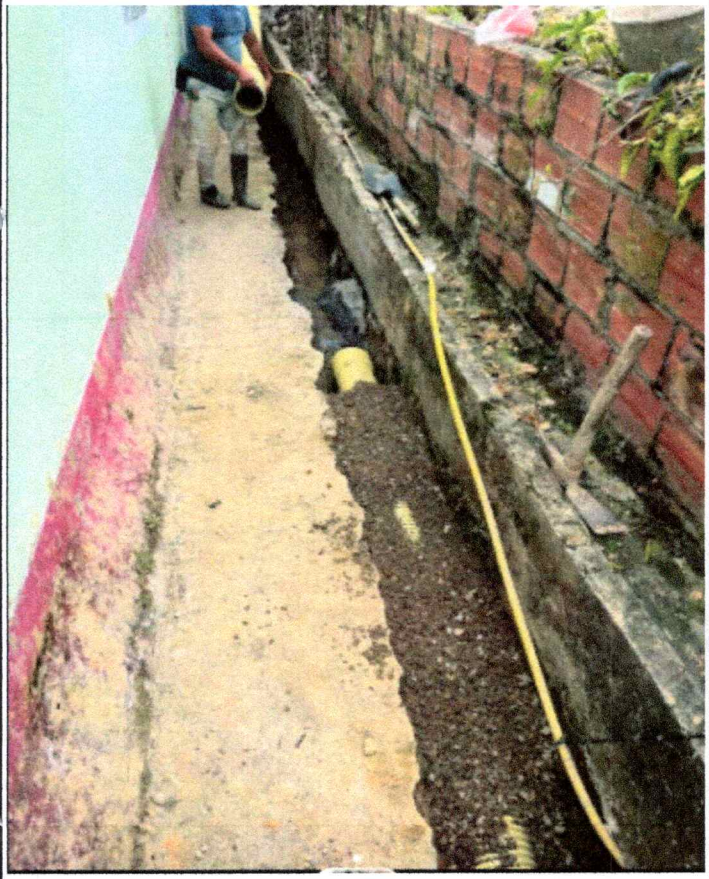

Localización	Dimensiones				OBSERVACION	Total
	No. Elem.	Largo	Ancho	Alto		
pozo de inspeccion Bariio Nuevo Horizonte calle 4	1,00	44,10	0,45	0,25		4,96
					TOTAL PRESENTE ACTA	4,96

EJECUTADO ACTA 1	-
EJECUTADO ACTA 2	-
EJECUTADO PRESENTE ACTA	4,96


LUISA FERNANDA SEDANO G. CONTRATISTA	SEBASTIAN MELO C. RESIDENTE	Vo.Bo. PLANEACIÓN

Otanche - Boyacá

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES	PROYECTO:		
		OBJETO:	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE RED PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO DANUBIO Y URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.	
ENTIDAD:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE - BOYACÁ	CONTRATISTA:	INTERVENTOR:	FECHA:
CAPITULO:	5. HIERRO.	CONSTRUCTIVIA S.A.S.	N/A	29/05/25
ITEM DE PAGO:	6.03.02			Hoja Nov. de 1

ITEM	UND	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Otanche Boyacá
5,1	und	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa		

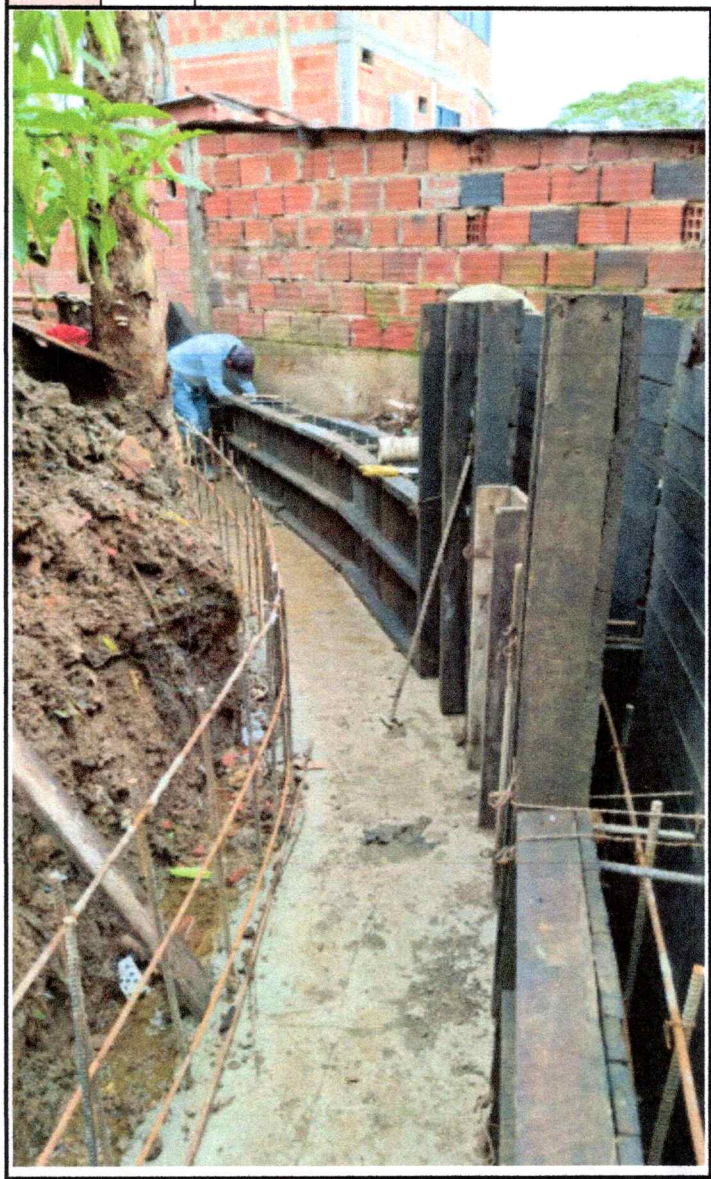

Localización	Dimensiones				OBSERVACION	Total
	No. Elem.	Largo	Peso	Alto		
acero longitudinal Bariio Nuevo Horizonte Diagonal 3	10,00	16,00	0,53			84,80
acero transversal Bariio Nuevo Horizonte Diagonal 3	80,00	2,10	1,00			168,00
					TOTAL PRESENTE ACTA	252,80
					EJECUTADO ACTA 1	-
					EJECUTADO ACTA 2	-
					EJECUTADO PRESENTE ACTA	252,80


LUISA FERNANDA SEDANO G. CONTRATISTA	SEBASTIAN MELO C. RESIDENTE	VoBo. PLANEACIÓN

Otanche - Boyacá

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES	PROYECTO:		
		OBJETO:	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE RED PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO DANUBIO Y URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.	
ENTIDAD:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE - BOYACÁ	CONTRATISTA:	INTERVENTOR:	FECHA:
CAPITULO:	6. CARPINTERIA METALICA	CONSTRUCTIVIA S.A.S.	N/A	29/05/25
ITEM DE PAGO:				Hoja Nov. de 1

ITEM	UND	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Otanche Boyacá
6,1	und	REJILLA METALICA PARA CANAL (1,2MX0,60M)		

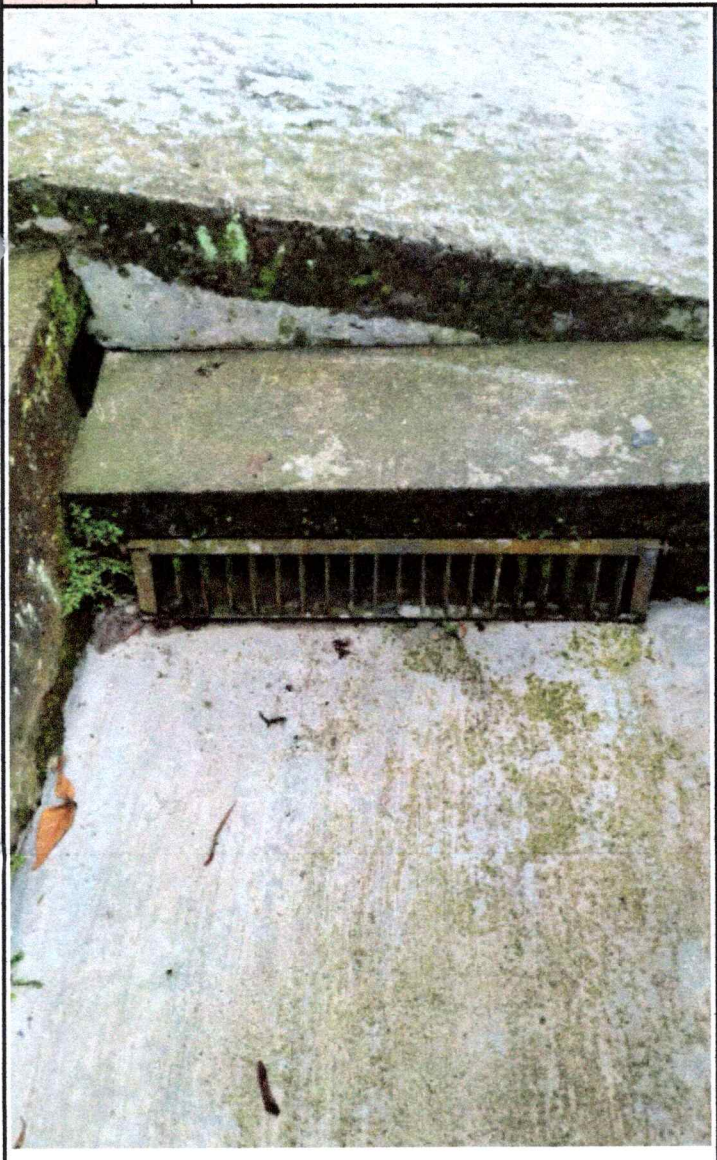

Localización	Dimensiones				OBSERVACION	Total
	No. Elem.	Largo	Peso	Alto		
rejilla metalica Bariio Danubio Calle 3	1,00					1,00

TOTAL PRESENTE ACTA	1,00
EJECUTADO ACTA 1	-
EJECUTADO ACTA 2	-
EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,00

LUISA FERNANDA SEDANO G. CONTRATISTA	SEBASTIAN MELO C. RESIDENTE	Vo.Bo. PLANEACIÓN

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-03, 09:25:42 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 78241376

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 03/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JEFREY SEBASTIAN MELO CORDOBA		
Documento	CC1018457875	**Dirección**	CL 10 #10 - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6014875242
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1018457875	JEFREY SEBASTIAN MELO CORDOBA	57	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-03, 09:15:45 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 78240382

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 03/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FERNEY DAVID BUITRAGO MARTINEZ		
Documento	CC1055550641	**Dirección**	CR 2 #4 - 80
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2408522
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	OTANCHE	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 9497715	JAIME PRIETO CASAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6.960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 9498310	HELBERT ALFONSO BUITRAGO MARTIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6.960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 9498763	BORIS ADRIAN BUITRAGO MARTIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6.960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 683.400	$ 171.000	$ 297.300	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.322.700	$ 0	$ 1.322.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-04, 02:25:42 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Numéro Planilla:** 78241277

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 04/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCTIVIA S.A.S		
Documento	NIT 9015583632	**Dirección**	CL 6 #5 - 18
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6014875242
Tipo Persona	JURIDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006196842	LUISA FERNANDA SEDANO GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1,423,500	$ 178,000	0.522	$ 1,423,500	$ 7,500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413,300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Bancolombia

Comprobante en línea

3 Jun 2025 08:42:52

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1525621472

Comercio
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Referencia 1
191.97.12.94

Fecha
3 Jun 2025 08:42:52

Referencia 2
CC

Número de factura
132681192

Referencia 3
901558363

Descripción del pago
Pago Ordinario - FIC

Valor del Pago
$97,450

Número de comprobante
TR0839411472

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4710**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

150

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	**BANCOLOMBIA**	**132681192**	**1525621472**	**03/06/2025**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901558363**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **191.97.12.94**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 97,450.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 97,450.00	COP$ 97,450.00

ecollect
Seguro para ti

151

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	132681192	1525621472	03/06/2025

Número de Identificación
901558363

Primer Nombre ó Razón Social
CONSTRUCTIVIA S.A.S

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
2

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOYACA

Ciudad Capital
TUNJA (BOYACA)

Dirección de Domicilio
CRA 6 # 5 - 18

Ciudad de Domicilio
OTANCHE

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,321 3884497

Correo electrónico
mcconstrucivilessas@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Boyaca

Regional Centros SIIF
36-02-00-015-000000

Número Licencia de Obra
MC-032-2025

Número Contrato de Obra
MC-032-2025

Nombre Obra
RED DE MANEJO DE AGUAS OTANCHE

Fecha Inicio Obra
09/05/2025

Fecha Terminación Obra
29/05/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
OTANCHE

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
5

Costo Total de Obra a Todo Costo
38980006.00

Costo Total Mano de Obra
6596616.00

Número de Trabajadores en el Periodo
4

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
97450.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
97450.00

ecollect
Seguro para ti

152

Certificado
Bancario

Viernes, 09 de agosto del 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUCTIVIA S.A.S. identificado(a) con NIT 901558363, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	73300001193	2022/07/22	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

153

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141120903282

(415)7707212489984(8020) 000014112090328 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 8 3 6 3	2	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTIVIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Otanche 5 0 7

41. Dirección principal
CL 5 6 20 BRR CENTRO

42. Correo electrónico mcconstrucivilessas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 3 8 8 4 4 9 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 1 1 0 9							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 08 - 30 / 15 : 21: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SEDANO GONZALEZ LUISA FERNANDA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

154

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141120903282

(415)7707212489984(8020) 000014112090328 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 8 3 6 3	2	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		0 1
73. Fecha	2 0 2 1 1 1 0 9	2 0 2 4 0 2 0 1
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 1 2 1	2 0 2 4 0 2 2 0
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 1 9 7 6 6 0	1 9 7 6 6 0
78. Departamento	1 5	1 5
79. Ciudad/Municipio	3 8	3 8

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 1 1 0 9
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 3 1 4		-
2	4 9	2 0 2 2 0 1 2 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141120903282

(415)7707212489984(8020) 000014112090328 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 8 3 6 3	2	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 8 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 0 5 1 9 5 8 4 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SEDANO	GONZALEZ	LUISA	FERNANDA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 8 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 8 4 6 1 9 2 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARDONA	MARTINEZ	FABIAN	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 30-08-2024 03:23:44PM
